INFORME PERIÓDO DE SUPERVISIÓN
Fecha: 01 al 31 de julio 2024

1. DATOS DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRIRIO

1.1. PROYECTOS Y GESTIÓN DEL DESARROLLO S.A.S

NÚMERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	631 DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral a los Contratos de Obra y/o conexos que suscriba el MVCT, encaminados a Atender el Plan Provisional y Estado de Emergencia Económica, Social, y Ecológica en el Departamento de la Guajira y la Extensión de sus Defectos.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	07/02/2024
SUSCRITO ENTRE	Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio- Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – Proyectos y Gestión del Desarrollo S.A.S - P&G
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 6.715.000.000
VALOR ACTUAL CONTRATO	$ 6.715000.000
PLAZO	El plazo de ejecución del contrato será de once (11) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos del perfeccionamiento y ejecución del contrato.
FECHA DE INICIO	27/02/2024
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	31/12/2024
FECHA TERMINACIÓN REAL	31/12/2024

2. DATOS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE DEL SUPERVISOR	GINA JULIANA RINCON RODRIGUEZ – SUPERVISORA DEL CONTRATO POR PARTE DEL MINISTERIO
	DESDE EL 06/02/2024 A 19/05/2024
NOMBRE DEL SUPERVISOR	DIANA MARCELA MEDINA HENAO – SUPERVISORA DEL CONTRATO POR PARTE DEL MINISTERIO
	DESDE EL 20/05/2024 A 27/08/2024

NOMBRE DEL SUPERVISOR	GINA JULIANA RINCON RODRIGUEZ – SUPERVISORA DEL CONTRATO POR PARTE DEL MINISTERIO
	DESDE EL 28/08/2024 A LA FECHA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	CARLOS ALFONSO VARGAS MUÑOZ
	DESDE EL 01/03/2024 A LA FECHA
DEPENDENCIA	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL

3. NFORMACIÓN FÍSICA DE LOS CONTRATOS

3.1. Proyecto(s) Viabilizado(s)

3.1.1. PROYECTOS Y GESTIÓN DEL DESARROLLO S.A.S

Nombre del Contrato	Contrato de Interventoría No. 631 de 2024, suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Proyectos y Gestión del Desarrollo S.A.S - P&G. (ANEXO 1)
Alcance del Contrato:	El Contratista realizará la interventoría integral de ocho (8) contratos clasificados en Contratos Tipo A: Contrato de rehabilitación mayor; Contratos Tipo B, Contrato de suministro y obra menor; Contratos Tipo C: Contrato de rehabilitación mayor con estrategia de aseguramiento y sostenibilidad: y Tipo D. Contrato de rehabilitación menor, con los siguientes objetos y valores.

4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

En el siguiente cuadro se relaciona el valor del contrato conforme se estipula en la sexta clausula;

Componente	PGN 2023	Total
PROYECTOS Y GESTIÓN DEL DESARROLLO S.A.S El valor del contrato es por la suma de hasta SEIS MIL SETECIENTOS QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 6.715.000.000) incluidos IVA y todos los costos y gastos en que debe incurrir el futuro CONTRATISTA para el cumplimiento de sus obligaciones, y los demás tributos que cause	$ 6.715.000.000	$ 6.715.000.000

Componente	PGN 2023	Total
dicho contrato, independientemente de la denominación que asuman o del nivel territorial del que provengan para lo cual se afectará el certificado de disponibilidad presupuestal 94124 del 06 de febrero de 2024		
Totales	$ 6.715.000.000	$ 6.715.000.000
%Participación	100%	100%

Según especificación del alcance del contrato No. 631-2024 en su segunda clausula, en el cual la interventoría debe realizar los procesos y actividades para el control y seguimiento del estado financiero de cada contrato vigilado: "*Gestión Financiera: El INTERVENTOR deberá realizar los procesos y actividades relacionadas con el control y seguimiento del estado financiero de cada Contrato Vigilado e Interventoría, llevando el control y seguimiento de la buena inversión del anticipo, las aprobaciones de la propuesta de intervención, los pagos por concepto de avance de obra o cumplimiento de hitos, las amortizaciones, las retenciones aplicables, entre otros",* a continuación se relaciona la información financiera de cada contrato con acta de inicio;

No.	Numero de Contrato	CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	FECHA ACTA DE INICIO
1	CONTRATO No 632 DE 2024	VEOLIA AGUAS DE LA GUAJIRA S.A.S E.S.P.,	$12.000.000.000	28/02/2024
2	CONTRATO No 605 DE 2024	WORLD VISION INTERNATIONAL - VISION MUNDIAL INTERNACIONAL	$ 6.900.000.000	27/02/2024
3	CONTRATO No 656 DE 2024	FUNDACIÓN CADENA COLOMBIA	$7.400.000.000	18/03/2024
4	CONTRATO No 600 DE 2024	SECRETARIADO DE PASTORAL SOCIAL RIOHACHA	$7.000.000.000	27/02/2024
5	CONTRATO No 706 de 2024	FUNDACION SAVE THE CHILDREN COLOMBIA	$3.7000.000.00	29/04/2024

6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN No 615 DE 2024	ENCINA S.A.S.	$23.000.000.000	11/03/2024
7	CONTRATO No 608 DE 2024	FLESHMAN CONSTRUCTORES	$173.000.000	27/02/2024
			$56.473.000.000	

4.1. Disponibilidad Presupuestal contrato de Interventoría.

No. Resolución de asignación y fecha:	
Valor de Asignación Nación:	$ 6.715.000.000,00
No. Certificado Disponibilidad Presupuestal y Fecha:	94124 del 06 de febrero de 2024.
Cuenta independiente y exclusiva, inembargable y exenta de gravámenes tributarios	09878245175 – Cuenta corriente
Nombre entidad bancaria:	Bancolombia
Titular de la cuenta:	Proyectos y gestión del desarrollo SAS.

4.2. Desembolsos Realizados a la cuenta bancaria:

4.2.1. VEOLIA AGUAS DE LA GUAJIRA S.A.S E.S.P

No.	CONCEPTO	FECHA SOLICITUD DESEMBOLSO	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR
1	Anticipo equivalente al 20% del valor del contrato No. 632-2024– Clausula Séptima	08/04/2024	10/05/2024	$ 2.400.000.000

4.2.2. WORLD VISION INTERNATIONAL - VISION MUNDIAL INTERNACIONAL

No.	CONCEPTO	FECHA SOLICITUD DESEMBOLSO	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR
1	Anticipo equivalente al 20% del valor del contrato No. 605-2024– Clausula Séptima	22/05/2024	12/06/2024	$ 1.380.000.000

4.2.3. FUNDACIÓN CADENA COLOMBIA

No.	CONCEPTO	FECHA SOLICITUD DESEMBOLSO	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR
1	Anticipo equivalente al 20% del valor del contrato No. 656-2024– Clausula Séptima	08/04/2024	17/05/2024	$ 1.480.000.000

4.2.4. SECRETARIADO DE PASTORAL SOCIAL RIOHACHA

No.	CONCEPTO	FECHA SOLICITUD DESEMBOLSO	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR
1	Anticipo equivalente al 20% del valor del contrato No. 600-2024– Clausula Séptima	12/03/2024	30/04/2024	$ 1.400.000.000

4.2.5. FUNDACION SAVE THE CHILDREN COLOMBIA

No.	CONCEPTO	FECHA SOLICITUD DESEMBOLSO	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR
1	Anticipo equivalente al 20% del valor del contrato No. 706-2024– Clausula Séptima	07/06/2024	30/07/2024	$ 740.000.000

4.2.6. ENCINA S.A.S.

No.	CONCEPTO	FECHA SOLICITUD DESEMBOLSO	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR
1	Anticipo equivalente al 30% del valor del contrato No. 615-2024– Clausula Séptima	08/04/2024	10/05/2024	$ 6.900.000.000

5. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

5.1.1. FLESHMAN CONSTRUCTORES


El 24 de mayo de 2024 se suscribió el Otrosí No. 1 al Contrato de obra No. 608- 2024, mediante el cual se modificaron las Cláusulas PRIMERA y SEGUNDA del mismo, mediante el cual para la PRIMERA CLAUSULA se adicionó 45 días del 26 de mayo 2024 al 10 de julio 2024 al plazo inicialmente pactado que correspondió del 27 de febrero 2024 al 26 de mayo 2024 y en la SEGUNDA CLÁUSULA se formalizó las obras ejecutadas en la comunidad de Amuchichon del corregimiento de Yotojorochi, municipio de Maicao con el mismo alcance contractual:

1. Suministro e instalación de tanque plástico de 5 m3. Incluye base, 12.25m2, placa en concreto reforzado, accesorios para entrada de agua en tubería PVC. PRS 1” de diámetro, válvula de flotador y cerramiento de la estructura metálica y cubierta.
2. Suministro e instalación tubería PEAD2” PN10, para suministro de agua e Incluye excavación y lleno.
3. Suministro e instalación accesorios para acople de tubería PEAD2”.
4. Suministro e instalación válvula de cortina de 2”.
5. Suministro e instalación ventosa D = ½“f, incluye válvula de corte y accesorios.
6. Caja de Inspección en concreto.

Y para la comunidad de Ayana'ajirawaa del municipio de Uribia cambio de actividades como:

1. Suministro e instalación de tanque en Fibra de vidrio -PRFV de capacidad de 25000 litros, incluye accesorios de conexión y de aireación.
2. Construcción de obras para la adecuación y mejoramiento de la cimentación base soporte del tanque.

6. MAPA DE ASIGNACIONES A CONTRATISTAS

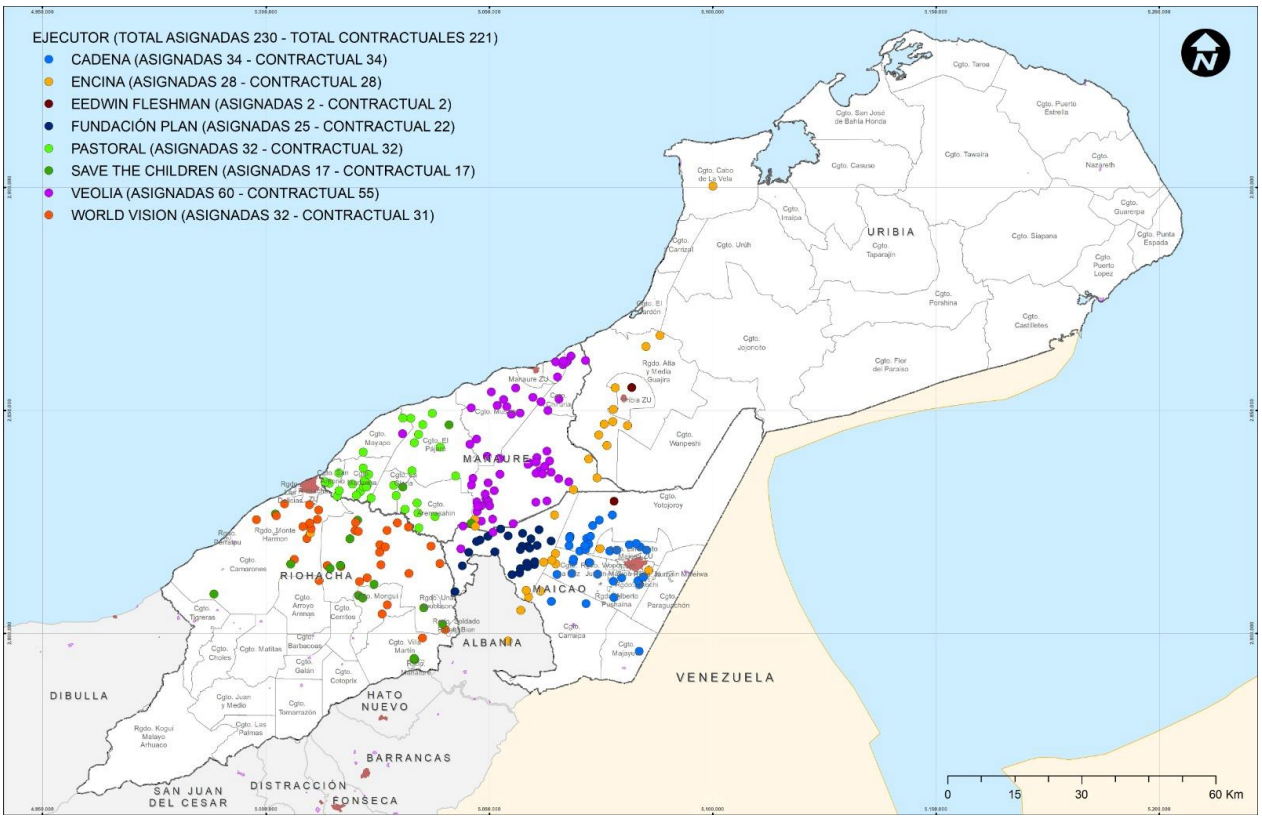


7. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

En virtud de la cláusula tercera del contrato No.631-2024, respecto a las obligaciones técnicas de la interventoría, ítem 3.2.1, numeral 24, en el cual refiere establecer el avance y resultados de las actividades ejecutadas por cada contratista en el desarrollo de las actividades, en el siguiente cuadro se relacionan los avances por cada contrato: (ANEXO 2)

CONTRATOS DIRECTOS	PROGRAMADO	EJECUTADO
VEOLIA	53,97%	7,87%
WORLD VISION	32,94%	12,56%
FUNDACIÓN CADENA	35,19%	8,47%
PASTORAL SOCIAL	23,44%	9,21%

SAVE THE CHILDREN	12,42%	8,91%
ENCINA S.A.S.	57,20%	12,05%
FUNDACIÓN PLAN	0,00%	0,00%
FLESHMAN CONSTRUCTORES	100,00%	100,00%

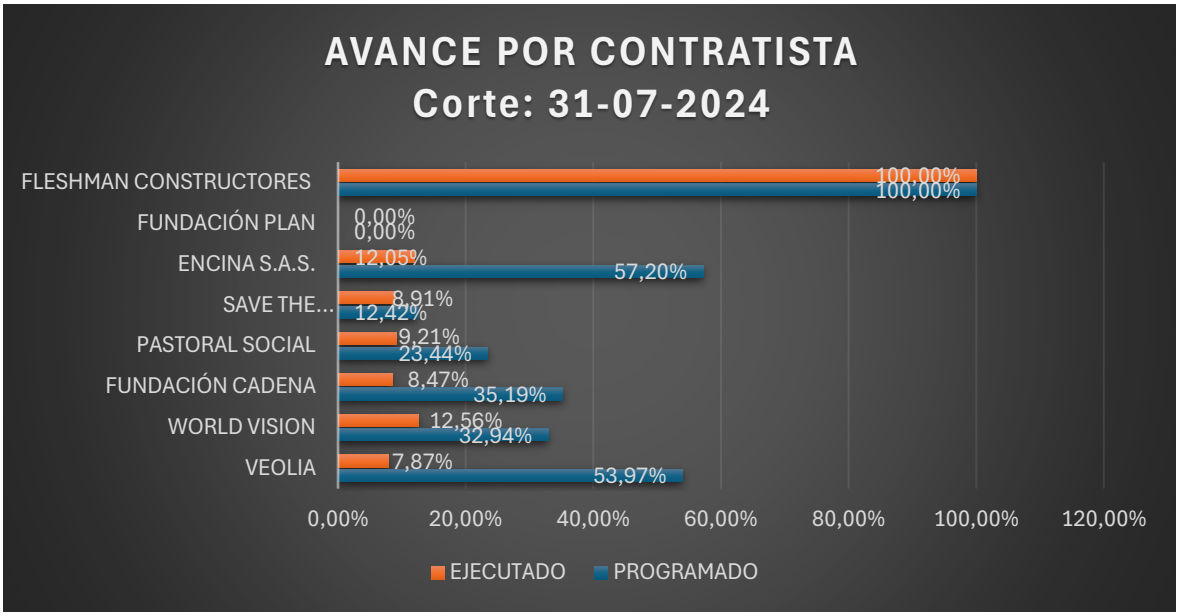

En el análisis del comportamiento de los contratos directos en los que la interventoría P&G ha realizado control y seguimiento a los contratistas muestran las siguientes tendencias:

VEOLIA: Se observa un avance leve de 7,87% con respecto al mes anterior de 7,20%; se han realizado 39 visitas de entrada de las 55 asignadas al contratista con sus respectivos levantamientos sociales, se cuenta con 38 levantamientos técnicos, 25 pruebas de bombeo y 33 caracterizaciones de agua.

En proceso se tiene 20 diagnósticos, de los cuales se han aprobado 8 propuestas económicas y en espera de ejecución de rehabilitaciones para principios de agosto.

No obstante, en razón al avance ejecutado del 7,87% con respecto al avance programado de 53,97%, se observa un retraso considerable por las demoras de entrega de propuestas económicas a interventoría, la no intervención de algunas comunidades debido al balance presupuestal requerido para determinar la cantidad

real de rehabilitaciones a ejecutar y demoras en el inicio de las obras de rehabilitación de las propuestas aprobadas.

Dado lo anterior, Interventoría P&G emitió el siguiente comunicado de alerta.

Comunicado	Fecha	Asunto
P&G-IAG-VAG-631-039	Julio 05 de 2024.	Alerta de posible incumplimiento de obligaciones contractuales

WORLD VISION: Respecto al mes anterior de 9,01% se observa un avance significativo de 12,56%; se continúan con 30 visitas de entrada de las 31 asignadas al contratista con sus respectivos levantamientos sociales, se cuenta con 30 levantamientos técnicos, 21 pruebas de bombeo y caracterizaciones de agua.

En proceso se tiene 20 diagnósticos, de los cuales se han aprobado 7 propuestas económicas y en ejecución 3 rehabilitaciones, a espera de iniciar nuevas rehabilitaciones a principios de agosto.

Sin embargo, según al avance ejecutado del 12,56% con respecto al avance programado de 32,94%, se observa un retraso considerable por las demoras de entrega de propuestas económicas a interventoría, la no intervención de algunas comunidades debido al balance presupuestal requerido para determinar la cantidad real de rehabilitaciones a ejecutar, demoras en el inicio de las obras de rehabilitación de las propuestas aprobadas y bajo rendimiento en las obras en ejecución de Alamarkat y Tulumana.

Dado lo anterior, Interventoría P&G emitió comunicados de alerta, solicitando agilizar los tiempos de entrega de diagnósticos y propuestas, cumplimientos de las programaciones, como también pronto inicio de las activades de rehabilitación constatados en los siguientes comunicados;

Comunicado	Fecha	Asunto
P&G-IAG-VWC-631-081	9 de julio de 2024	Solicitud de cumplimiento de agenda programática
P&G-IAG-VWC-631-085	10 de julio de 2024	Reiteración a solicitud de cumplimiento de agenda programática
P&G-IAG-VWC-631-087	13 de julio de 2024	Solicitud cronograma de visitas de socialización de

		propuestas e inicio de obras

FUNDACIÓN CADENA: Respecto al mes anterior de 7,55% se observa un avance leve de 8,47%; se mantienen las 30 visitas de entrada de las 34 asignadas al contratista con sus respectivos levantamientos sociales y levantamientos técnicos, 13 pruebas de bombeo y 17 caracterizaciones de agua.

En proceso se tiene 10 diagnósticos, de los cuales se espera presentación de propuestas para aprobación por parte de Interventoría a principios del mes de agosto.

Sin embargo, según al avance ejecutado del 8,47% con respecto al avance programado de 35,19%, se observa un retraso considerable por las demoras de entrega de propuestas económicas a interventoría y demoras en el inicio de las obras de rehabilitación.

Dado lo anterior, Interventoría P&G emitió el siguiente comunicado de alerta.

Comunicado	Fecha	Asunto
&G-IAG-FCC-631-015	03 de julio de 2024	Alerta de Incumplimiento de Obligaciones Contractuales

SECRETARIADO DE PASTORAL: Se observa un avance significativo de 9,21% con respecto al mes anterior de 7,78%; se han realizado 25 visitas de entrada de las 32 asignadas con 22 levantamientos sociales, 18 levantamientos técnicos y 18 pruebas de bombeo con caracterizaciones de agua.

En proceso se tiene 14 diagnósticos, de los cuales se han aprobado 10 propuestas económicas y en ejecución 2 rehabilitaciones, a espera de iniciar nuevas rehabilitaciones a principios de agosto.

Sin embargo, según al avance ejecutado del 9,21% con respecto al avance programado de 23,44%, se observa un retraso considerable por las demoras de entrega de propuestas económicas a interventoría, la no intervención de algunas comunidades debido al balance presupuestal requerido para determinar la cantidad real de rehabilitaciones a ejecutar, demoras en el inicio de las obras de rehabilitación de las propuestas aprobadas y bajo rendimiento en las obras en ejecución de Quejamana Y Ceywaka.

SAVE THE CHILDREN: Respecto al mes anterior de 6,71% se observa un avance significativo de 8,91%; se han realizado 16 visitas de entrada de las 17 asignadas al contratista con sus respectivos levantamientos sociales y levantamientos técnicos, 12 pruebas de bombeo y 13 caracterizaciones de agua.


En proceso se tiene 8 diagnósticos, de los cuales se espera presentación de propuestas para aprobación por parte de Interventoría a mediados del mes de agosto.

Sin embargo, en razón al avance ejecutado del 8,91% con respecto al avance programado de 12,42%, se observa retrasos debido a las demoras de entrega de propuestas económicas y por consiguiente retrasos a falta de inicio de dos rehabilitaciones según cronograma emitido por interventoría: CUCURUMANA y TORRINCHI.

ENCINA: Se mantiene el avance de 12,05% igual que el mes anterior, presentado una desviación negativa de 45,15% respecto a lo programado de 57,20%, toda vez que debía estar en ejecución la etapa 2 y hasta la fecha han realizado la entrega de 26 informes autocontenidos de la etapa 1, los cuales fueron observados por interventoría, debido a que no se ha realizado la entrega completa de los resultados de la caracterización del agua, adicional, aún está pendiente la entrega del diseño eléctrico de la propuesta de intervención de Yotojoroin, junto con el presupuesto ajustado, incluyendo cotizaciones, memorias de cantidades de obra y especificaciones técnicas

FUNDACIÓN PLAN: Se encuentra en etapa precontractual y por tanto se observa los avances en 0,00%.

FLESHMAN: se ha llegado al 100% de las actividades conforme al alcance descrito en el Contrato 608-2024 y Otrosi No. 1, dado a las finalizaciones de las obras complementarias para las comunidades AMUCHICHON/YOTOJOROCHI y GUARERAPO #3/AYANA'AJIRAWAA.

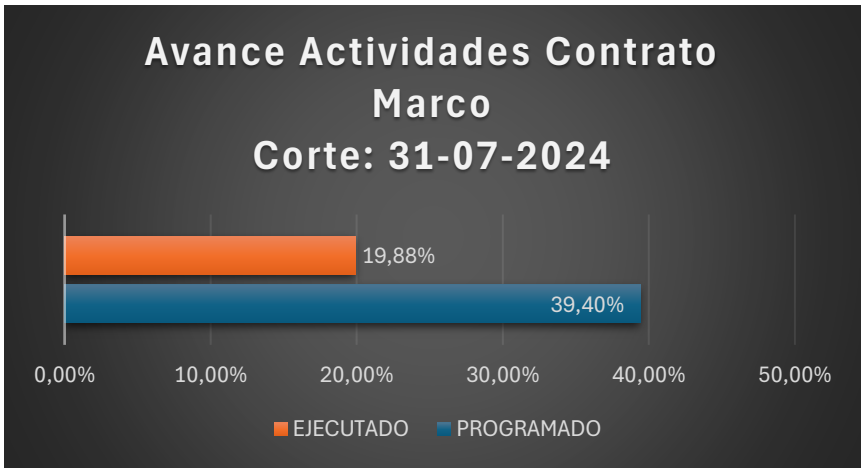

Después de un análisis del desempeño en la ejecución de los contratos que incluyen un total de 221 intervenciones bajo la supervisión de la interventoría P&G, tal como se especifica en el contrato 631 de 2024, se ha observado un avance leve, que ha pasado del 18,70 % en el mes de junio al 19,88 % en este mes julio. Este bajo incremento se debe a las demoras de entrega de propuestas económicas, la no intervención de algunas comunidades debido al balance presupuestal requerido para determinar la cantidad real de rehabilitaciones a ejecutar, demoras en el inicio de las obras de rehabilitación de las propuestas aprobadas y bajo rendimiento en las obras en ejecución.

Plan de acción: En primera instancia y dado los retrasos considerables de los contratistas se solicita a Interventoría P&G generar los incumplimientos respectivos y que apliquen tal y como se observa en el acta de comité de seguimiento del 4 de Julio 2024 y acta de socialización de propuestas del 01 de Julio 2024 (ANEXO 5)

De otra parte, se insta a la interventoría en el comité de socialización de propuestas del 13 de Julio 2024 agilizar y gestionar la entrega de dichas propuestas económicas, dado los retrasos considerables para dar vía libre a la aprobación e inicio de las obras de rehabilitación. (ANEXO 6)

Además, ajustar internamente el cronograma del proyecto con las justificaciones correspondientes para reflejar tiempos de recuperación realistas y establecer metas a corto plazo para alcanzar el progreso previsto y el programado.

8. Avances y/u observaciones

CONCEPTO/OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
1. Presentación supervisión

En mi calidad de supervisora del CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 631 DE 2024 **EL MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y PROYECTOS Y GESTIÓN DEL DESARROLLO S.A.S.**, con el objeto de: *"Interventoría Integral a los Contratos de Obra y/o conexos que suscriba el MVCT, encaminados a Atender el Plan Provisional y Estado de Emergencia Económica, Social, y Ecológica en el Departamento de la Guajira y la Extensión de sus Defectos.",* me permito presentar el siguiente informe de actividades realizadas desde la supervisión del Contrato en mención para el periodo comprendido entre el 01 de julio al 31 de julio de 2024.

2. Avances mes de julio de 2024

El 02 de julio de 2024 Como requisito al alcance financiero y conforme en lo estipulado en la Clausula segunda del contrato de interventoría No 631-2024, ítem **Gestión Financiera** en el que describe: *"El INTERVENTOR deberá realizar los procesos y actividades relacionadas con el control y seguimiento del estado financiero de cada Contrato Vigilado e Interventoría, llevando el control y seguimiento de la buena inversión del anticipo, las aprobaciones de la propuesta de intervención, los pagos por concepto de avance de obra o cumplimiento",* se gestiona y entrega al área financiera los faltantes del informe del contratista Veolia:



El 04 y 12 de julio de 2024: En atención a la cláusula OCTAVA. **- SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EJECUCIÓN** "La vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones a cargo de EL INTERVENTOR será ejercida por un **SUPERVISOR designado por el Ordenador del Gasto, quién será responsable de efectuar el seguimiento a la correcta ejecución del contrato**, aprobar los pagos, los informes que presente el INTERVENTOR, proyectar el acta de liquidación definitiva del contrato y en general cumplir con lo previsto en el Manual de Contratación y el Manual de Supervisión e INTERVENTOR del MVCT así como lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y demás normas que regulan la materia, así como lo indicado en los estudios previos y demás documentos que hacen parte integral del presente proceso**"** y cláusula TERCERA del Contrato, del ítem 3.1 "Obligaciones generales", numeral 26 en el que se establece participar a través del representante legal o director en los comités de seguimiento, se realizaron los comités de seguimiento como control y seguimiento de avance del contrato de interventoría 631-2024 (ANEXO3)

Comité 04/07/2024


MATRIZ DE COMPROMISOS		
Compromiso	**Responsable**	**Fecha de ejecución**
Envió de la Presentación de las propuestas aprobadas	Proyectos y Gestión del Desarrollo SAS	04/07/2024
Reunión de revisión de presupuesto de Veolia	Proyectos y Gestión del Desarrollo SAS	04/07/2024

Reunión con World Vision para revisa	Proyectos y Gestión del Desarrollo SAS y MVCY	04/07/2024
Envió de acta de presentación 1 de julio de 2024	Proyectos y Gestión del Desarrollo SAS	05/07/2024
Envió de cuadro de pagos y cobros a contratistas y soportes de cobro	Ministerio Vivienda Ciudad y Territorio	05/07/2024
Informe N°3 del mes de mayo subsanado	Proyectos y Gestión del Desarrollo SAS	04/07/2024
Envió del informe N°4 de Interventoría	Proyectos y Gestión del Desarrollo SAS	05/07/2024
Enviar las aprobaciones de propuestas de las comunidades de Veolia.	Proyectos y Gestión del Desarrollo SAS	04/07/2024
Revisión valla de World visión	Proyectos y Gestión del Desarrollo SAS Ministerio Vivienda Ciudad y Territorio	Próxima semana

El 09 de julio: De conformidad con lo establecido en el contrato de interventoría No 631-2024, en el numeral 2, en el componente "*Además de las obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del objeto del contrato, la INTERVENTORIA se obliga a*", ítem 3.2.1 Obligaciones Técnica, de la cláusula tercera correspondiente a las obligaciones del contratista, en el cual refiere "*Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el (los) supervisor(es), atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen*.", se solicitó mediante el correo institucional a P&G las actas de socialización, fichas, registro de asistencia, entre otros.




El 09 de julio: en el marco de la tercera cláusula del contrato, numeral 3.2.1 Obligaciones técnicas, ítem 14: "*Asesorar y suministrar la información que requieran el MVCT, el Supervisor designado o las Entidades de control de manera oportuna*", mediante correo electrónico se gestiona y solicita a P&G los cargues a la Plataforma SIGEVAS de cada uno de los contratos de seguimiento y control.

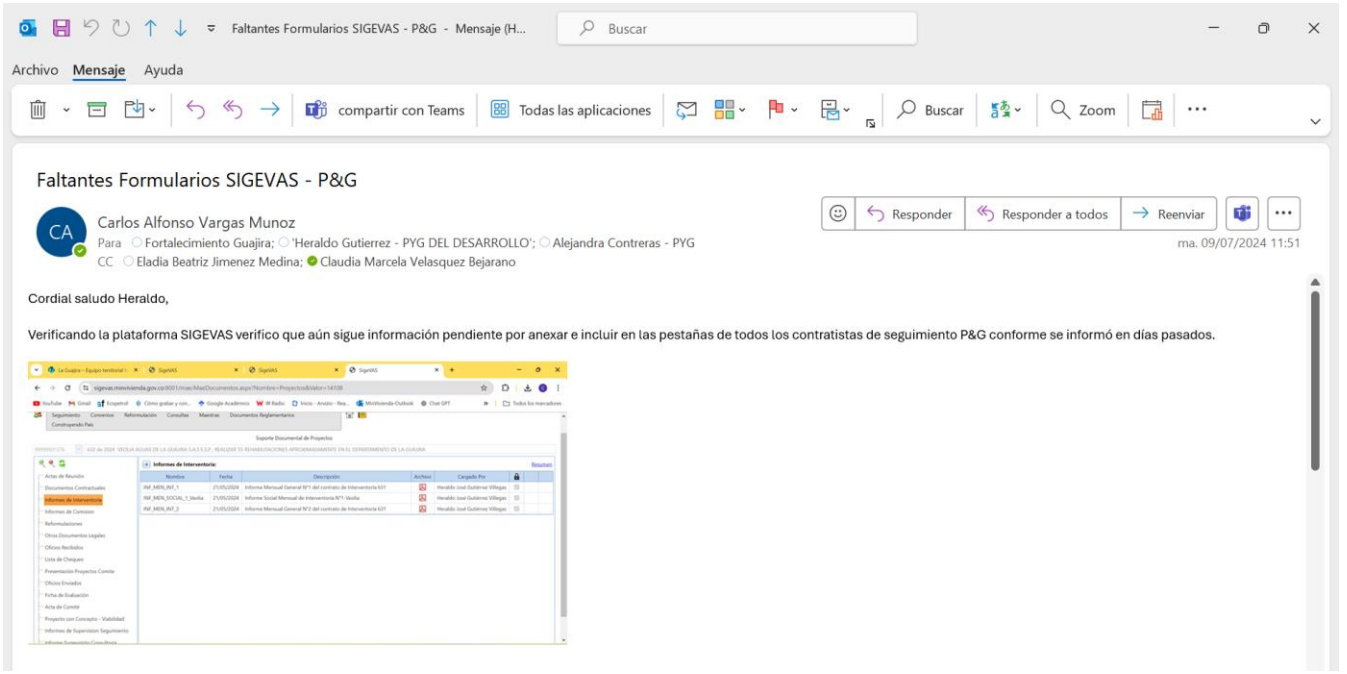


Comité 12/07/2024

MATRIZ DE COMPROMISOS		
Compromiso	**Responsable**	**Fecha de ejecución**
Seguimiento al inicio de obras en comunidades vencidas WORLD VISION	Proyectos y Gestión del Desarrollo SAS	Próxima semana.
Comunicado acerca de cambios en comunidades de VEOLIA	Proyectos y Gestión del Desarrollo SAS	15/07/2024

El 13, 22, 25 de julio: En aras del cumplimiento estipulado en la séptima cláusula del contrato de interventoría, en lo concerniente a solicitudes del área financiera como reza lo siguiente*: "Para gestionar la cuenta de cobro, el INTERVENTOR deberá remitir al MVCT la documentación definida por la subdirección financiera del MVCT para generar dicho trámite"; se recibió, tramitó* gestionó y entrego las cuentas de cobro de los contratistas World Visión y P&G"

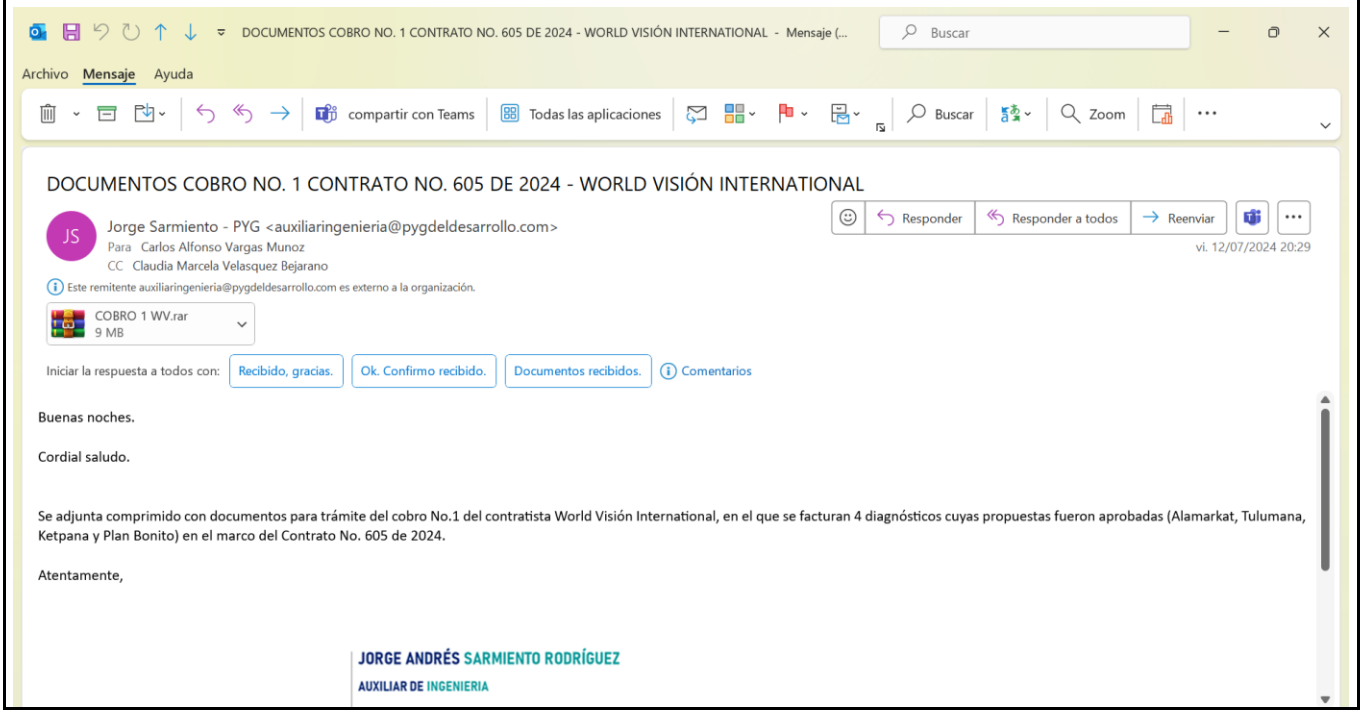

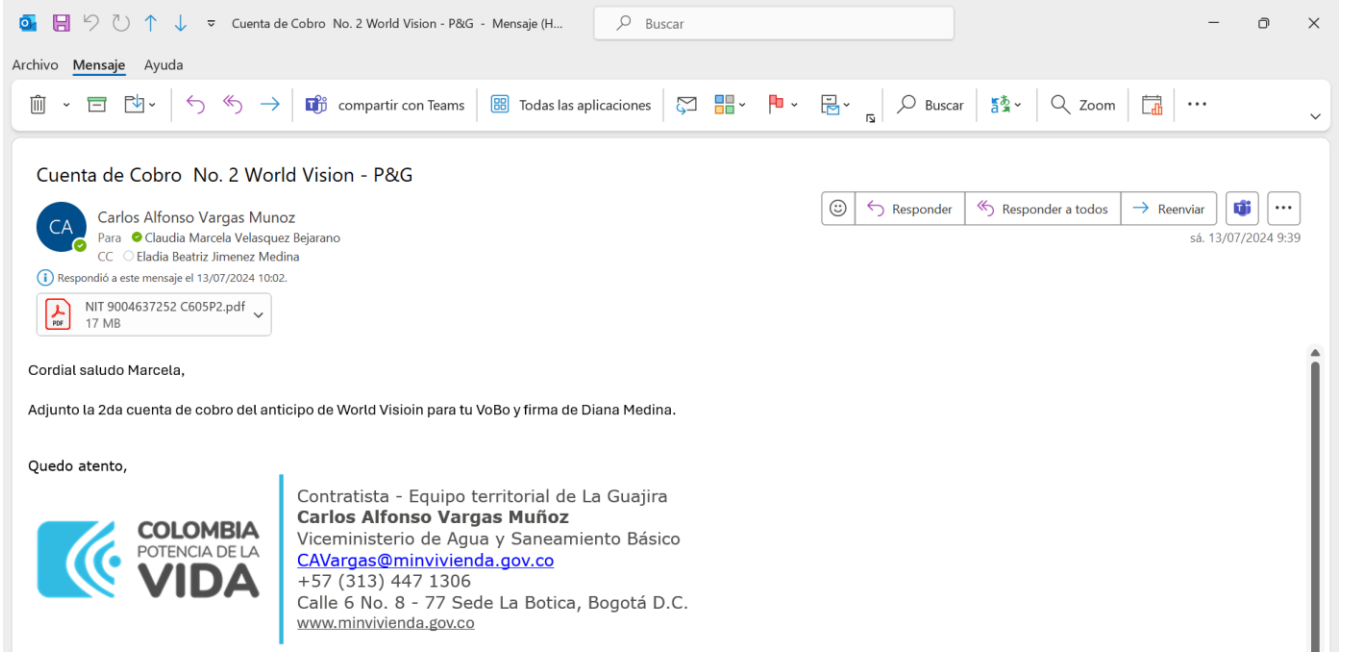

Cuenta de Cobro No. 2 World Vision - P&G - Mensaje (H...

Buscar

Archivo Mensaje Ayuda

compartir con Teams | Todas las aplicaciones | Buscar | Zoom

Cuenta de Cobro No. 2 World Vision - P&G

Responder | Responder a todos | Reenviar

CA Carlos Alfonso Vargas Munoz
Para Claudia Marcela Velasquez Bejarano
CC Eladia Beatriz Jimenez Medina
sá. 13/07/2024 9:39

Respondió a este mensaje el 13/07/2024 10:02.

NIT 9004637252 C605P2.pdf
17 MB


Cordial saludo Marcela,

Adjunto la 2da cuenta de cobro del anticipo de World Visioin para tu VoBo y firma de Diana Medina.

Quedo atento,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Contratista - Equipo territorial de La Guajira
Carlos Alfonso Vargas Muñoz
Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico
CAVargas@minvivienda.gov.co
+57 (313) 447 1306
Calle 6 No. 8 - 77 Sede La Botica, Bogotá D.C.
www.minvivienda.gov.co

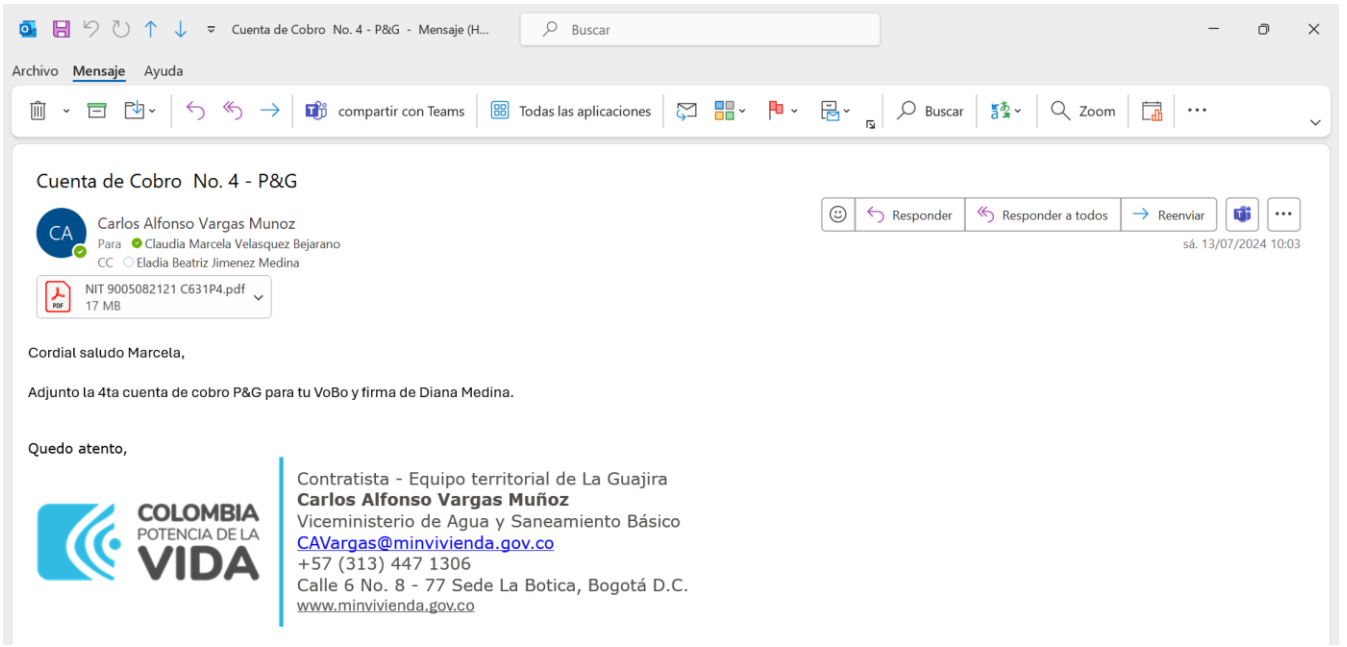

Cuenta de Cobro No. 4 - P&G - Mensaje (H...

Buscar

Archivo Mensaje Ayuda

compartir con Teams | Todas las aplicaciones | Buscar | Zoom

Cuenta de Cobro No. 4 - P&G

Responder | Responder a todos | Reenviar

CA Carlos Alfonso Vargas Munoz
Para Claudia Marcela Velasquez Bejarano
CC Eladia Beatriz Jimenez Medina
sá. 13/07/2024 10:03

NIT 9005082121 C631P4.pdf
17 MB

Cordial saludo Marcela,

Adjunto la 4ta cuenta de cobro P&G para tu VoBo y firma de Diana Medina.


Quedo atento,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Contratista - Equipo territorial de La Guajira
Carlos Alfonso Vargas Muñoz
Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico
CAVargas@minvivienda.gov.co
+57 (313) 447 1306
Calle 6 No. 8 - 77 Sede La Botica, Bogotá D.C.
www.minvivienda.gov.co

El 09, 25 de julio: en el marco de la tercera cláusula del contrato, numeral 3.2.1 Obligaciones técnicas, componente "*Además de las obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del objeto del contrato, la INTERVENTORIA se obliga a*", ítem 45: "*Servir de conducto regular entre el MVCT y los contratistas en todo lo que respecta al desarrollo de las actividades de los contratos objeto de interventoría*", mediante correo electrónico se entrega a P&G el listados de reasignaciones de comunidades a los contratistas *Save the*

children, Encina, *World Vision* y Veolia debido a los diferentes inconvenientes verificados en las visitas.

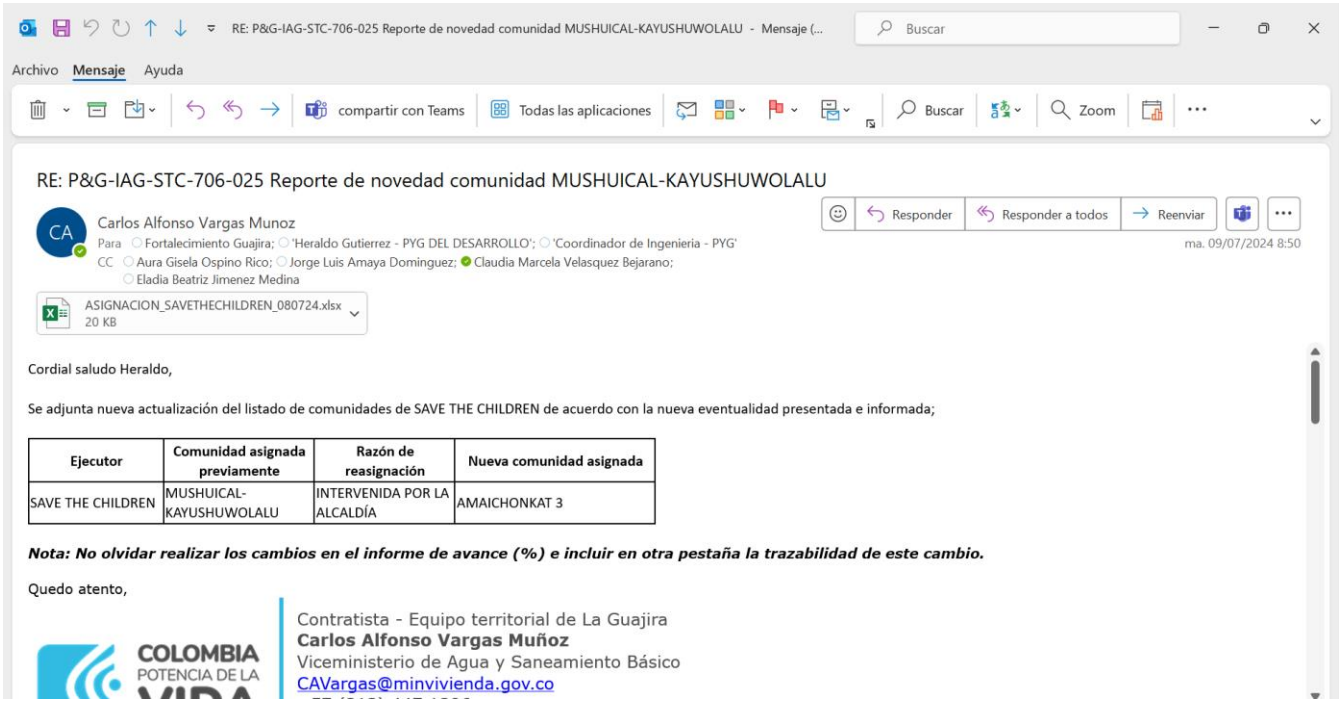

RE: P&G-IAG-STC-706-025 Reporte de novedad comunidad MUSHUICAL-KAYUSHUWOLALU - Mensaje (...

Archivo Mensaje Ayuda

compartir con Teams | Todas las aplicaciones | Buscar | Zoom

RE: P&G-IAG-STC-706-025 Reporte de novedad comunidad MUSHUICAL-KAYUSHUWOLALU

Responder | Responder a todos | Reenviar

Carlos Alfonso Vargas Munoz
Para: Fortalecimiento Guajira; 'Heraldo Gutierrez - PYG DEL DESARROLLO'; 'Coordinador de Ingenieria - PYG'
CC: Aura Gisela Ospino Rico; Jorge Luis Amaya Dominguez; Claudia Marcela Velasquez Bejarano; Eladia Beatriz Jimenez Medina
ma. 09/07/2024 8:50

ASIGNACION_SAVETHECHILDREN_080724.xlsx
20 KB

Cordial saludo Heraldo,

Se adjunta nueva actualización del listado de comunidades de SAVE THE CHILDREN de acuerdo con la nueva eventualidad presentada e informada;


Ejecutor	Comunidad asignada previamente	Razón de reasignación	Nueva comunidad asignada
SAVE THE CHILDREN	MUSHUICAL-KAYUSHUWOLALU	INTERVENIDA POR LA ALCALDÍA	AMAICHONKAT 3

Nota: No olvidar realizar los cambios en el informe de avance (%) e incluir en otra pestaña la trazabilidad de este cambio.

Quedo atento,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Contratista - Equipo territorial de La Guajira
Carlos Alfonso Vargas Muñoz
Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico
CAVargas@minvivienda.gov.co

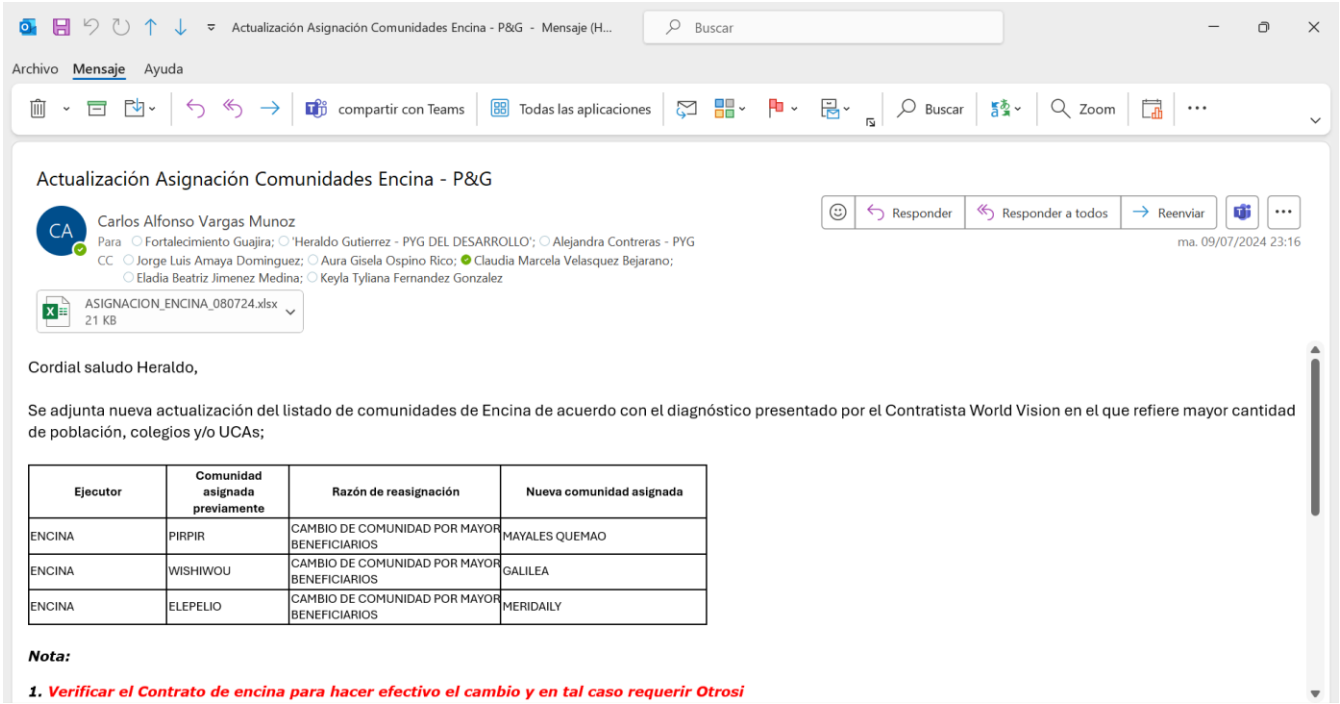

Actualización Asignación Comunidades Encina - P&G - Mensaje (H...

Archivo Mensaje Ayuda

compartir con Teams | Todas las aplicaciones | Buscar | Zoom

Actualización Asignación Comunidades Encina - P&G

Responder | Responder a todos | Reenviar

Carlos Alfonso Vargas Munoz
Para: Fortalecimiento Guajira; 'Heraldo Gutierrez - PYG DEL DESARROLLO'; Alejandra Contreras - PYG
CC: Jorge Luis Amaya Dominguez; Aura Gisela Ospino Rico; Claudia Marcela Velasquez Bejarano; Eladia Beatriz Jimenez Medina; Keyla Tyliana Fernandez Gonzalez
ma. 09/07/2024 23:16

ASIGNACION_ENCINA_080724.xlsx
21 KB


Cordial saludo Heraldo,

Se adjunta nueva actualización del listado de comunidades de Encina de acuerdo con el diagnóstico presentado por el Contratista World Vision en el que refiere mayor cantidad de población, colegios y/o UCAs;

Ejecutor	Comunidad asignada previamente	Razón de reasignación	Nueva comunidad asignada
ENCINA	PIRPIR	CAMBIO DE COMUNIDAD POR MAYOR BENEFICIARIOS	MAYALES QUEMAO
ENCINA	WISHIWOU	CAMBIO DE COMUNIDAD POR MAYOR BENEFICIARIOS	GALILEA
ENCINA	ELEPELIO	CAMBIO DE COMUNIDAD POR MAYOR BENEFICIARIOS	MERIDAILY

Nota:

1. Verificar el Contrato de encina para hacer efectivo el cambio y en tal caso requerir Otrosi

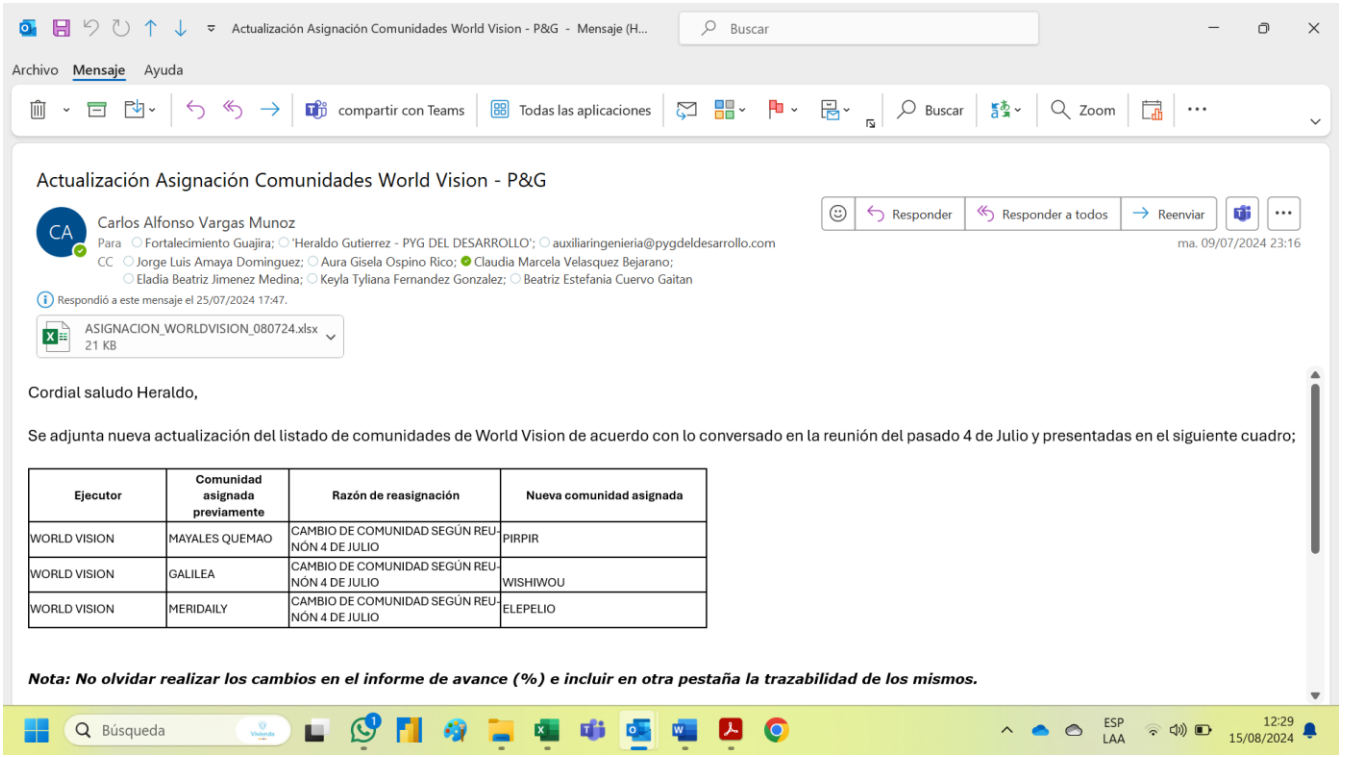

Actualización Asignación Comunidades World Vision - P&G - Mensaje (H...

Archivo Mensaje Ayuda

compartir con Teams | Todas las aplicaciones | Buscar | Zoom

Actualización Asignación Comunidades World Vision - P&G

Carlos Alfonso Vargas Munoz
Para: Fortalecimiento Guajira; 'Heraldo Gutierrez - PYG DEL DESARROLLO'; auxiliaringenieria@pygdeldesarrollo.com
CC: Jorge Luis Amaya Dominguez; Aura Gisela Ospino Rico; Claudia Marcela Velasquez Bejarano; Eladia Beatriz Jimenez Medina; Keyla Tyliana Fernandez Gonzalez; Beatriz Estefania Cuervo Gaitan

Responder | Responder a todos | Reenviar
ma. 09/07/2024 23:16

Respondió a este mensaje el 25/07/2024 17:47.

ASIGNACION_WORLDVISION_080724.xlsx
21 KB


Cordial saludo Heraldo,

Se adjunta nueva actualización del listado de comunidades de World Vision de acuerdo con lo conversado en la reunión del pasado 4 de Julio y presentadas en el siguiente cuadro;

Ejecutor	Comunidad asignada previamente	Razón de reasignación	Nueva comunidad asignada
WORLD VISION	MAYALES QUEMAO	CAMBIO DE COMUNIDAD SEGÚN REUNÓN 4 DE JULIO	PIRPIR
WORLD VISION	GALILEA	CAMBIO DE COMUNIDAD SEGÚN REUNÓN 4 DE JULIO	WISHIWOU
WORLD VISION	MERIDAILY	CAMBIO DE COMUNIDAD SEGÚN REUNÓN 4 DE JULIO	ELEPELIO

Nota: No olvidar realizar los cambios en el informe de avance (%) e incluir en otra pestaña la trazabilidad de los mismos.

Búsqueda | ESP LAA | 12:29 15/08/2024

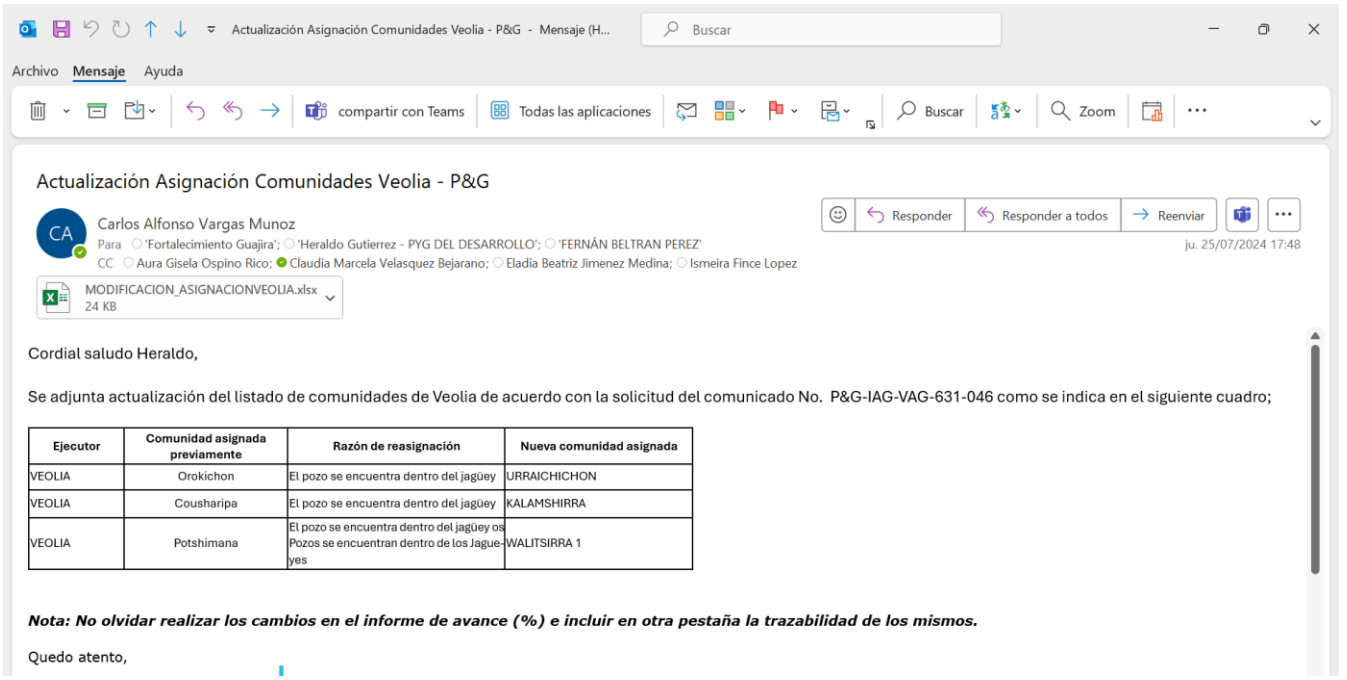

Actualización Asignación Comunidades Veolia - P&G - Mensaje (H...

Archivo Mensaje Ayuda

compartir con Teams | Todas las aplicaciones | Buscar | Zoom

Actualización Asignación Comunidades Veolia - P&G

Carlos Alfonso Vargas Munoz
Para: 'Fortalecimiento Guajira'; 'Heraldo Gutierrez - PYG DEL DESARROLLO'; 'FERNÁN BELTRAN PEREZ'
CC: Aura Gisela Ospino Rico; Claudia Marcela Velasquez Bejarano; Eladia Beatriz Jimenez Medina; Ismeira Fince Lopez

Responder | Responder a todos | Reenviar
ju. 25/07/2024 17:48

MODIFICACION_ASIGNACIONVEOLIA.xlsx
24 KB

Cordial saludo Heraldo,

Se adjunta actualización del listado de comunidades de Veolia de acuerdo con la solicitud del comunicado No. P&G-IAG-VAG-631-046 como se indica en el siguiente cuadro;

Ejecutor	Comunidad asignada previamente	Razón de reasignación	Nueva comunidad asignada
VEOLIA	Orokichon	El pozo se encuentra dentro del jagüey	URRAICHICHON
VEOLIA	Cousharipa	El pozo se encuentra dentro del jagüey	KALAMSHIRRA
VEOLIA	Potshimana	El pozo se encuentra dentro del jagüey os Pozos se encuentran dentro de los Jagueyes	WALITSIRRA 1

Nota: No olvidar realizar los cambios en el informe de avance (%) e incluir en otra pestaña la trazabilidad de los mismos.

Quedo atento,

El 03, 07, 08, 12, 18, 19, 24 y 25 de julio: en Aras del cumplimiento de la tercera cláusula del contrato "Obligaciones del contratista"*, ítem 3.2.2.4.* Obligaciones Sociales, Numeral 5; "Asegurar *el acompañamiento social durante la ejecución del contrato, con el*


fin de atender inquietudes de las comunidades y actores institucionales asociados al desarrollo del mismo y medición de impactos"; se continua con visitas de socialización y concertación de rehabilitaciones aprobadas con el fin de iniciar con la ejecución de las obras.

- **Acompañamiento Social y Aseguramiento**

Dentro del proceso de las visitas realizadas por el contratista, se realiza el respectivo ***acompañamiento de los profesionales sociales y aseguramiento*** *esquematizado en el protocolo de relacionamiento entre contratista y Ministerio: (a) socialización inicial reconocimiento y validación, (b) acompañamiento de diagnóstico y propuesta técnica y (c) entrega de obra.*

CONTRATISTA	COMUNIDAD	MUNICIPIO	CORREGIMIENTO	Fechas Socialización Rehabilitación a Comunidad
Veolia	AYAURI (JUCEPIA)	MANAURE	Rgdo. Alta y Media Guajira	07/07/2024
Veolia	ATUNALAIN	MANAURE	Rgdo. Alta y Media Guajira	07/07/2024
World Vision	ALAMARKAT	RIOHACHA	Rgdo. Alta y Media Guajira	08/07/2024
World Vision	TULUMANA	RIOHACHA	Rgdo. Alta y Media Guajira	03/07/2024
World Vision	PLAN BONITO	RIOHACHA	Rgdo. Alta y Media Guajira	19/07/2024
World Vision	KETPANA	RIOHACHA	Rgdo. Alta y Media Guajira	18/07/2024
Pastoral	CEIWAKA	MANAURE	Aremasain	12/07/2024
Pastoral	QUEJAMANA	MANAURE	La Gloria	12/07/2024
Veolia	MONTE REAL	MANAURE	La Sabana	10/07/2024
Veolia	ISHIPA	MANAURE	Cgto. Aremasahin	25/07/2024
Veolia	ANUTPALAU	MANAURE	Rgdo. Alta y Media Guajira	24/07/2024
Veolia	ANUACHON JULIAKAT	MANAURE	Rgdo. Alta y Media Guajira	25/07/2024
Veolia	AMUCHISON	MANAURE	Rgdo. Alta y Media Guajira	25/07/2024
Veolia	PALILU 1	MANAURE	Rgdo. Alta y Media Guajira	25/07/2024

El 03, 10, 17, 24, 31 de julio Partiendo de las "Obligaciones del Contratista" dispuesto en la tercera cláusula del contrato, numeral 3.2.2.1. INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, ítem 8 en el cual refiere: "*Presentar al MVCT informes sobre el avance del (los) contratista(s) vigilados.*"; se solicita y recibe los cuadros de avances (%) emitidos semanalmente por los contratistas (ANEXO 2).

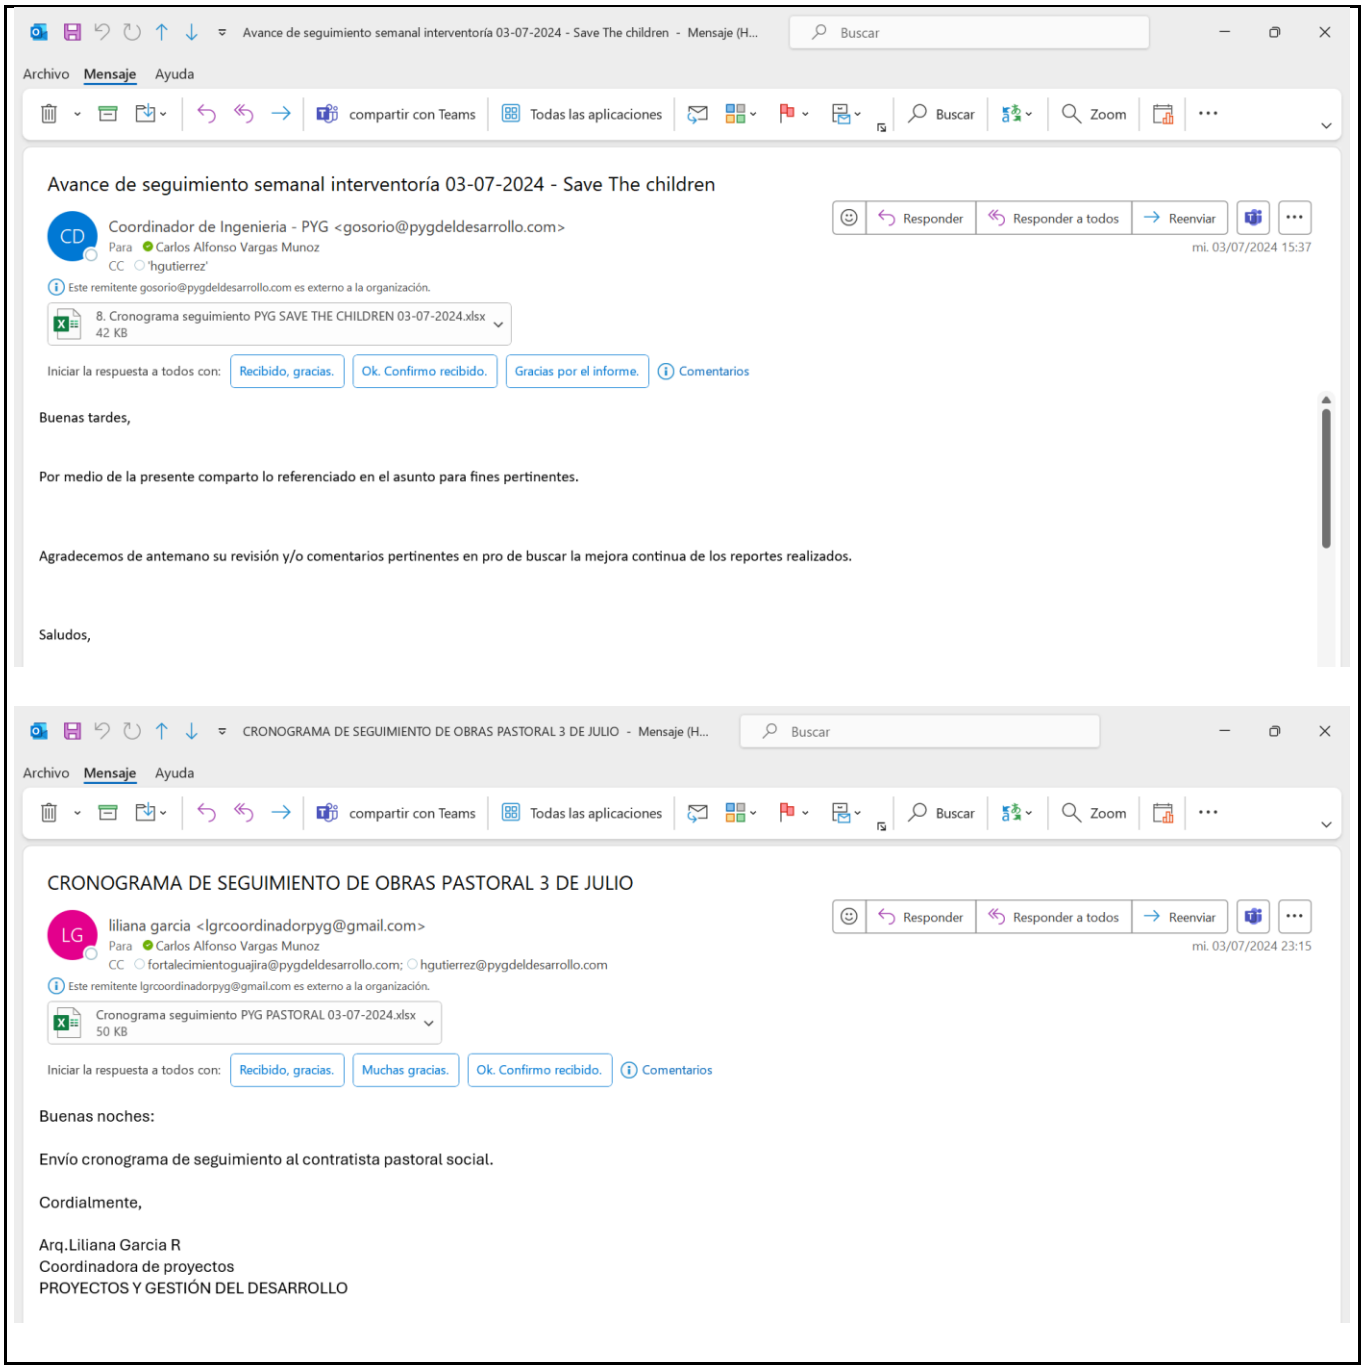

Avance de seguimiento semanal interventoría 03-07-2024 - Save The children - Mensaje (H...

Buscar

Archivo Mensaje Ayuda

compartir con Teams | Todas las aplicaciones | Buscar | Zoom

Avance de seguimiento semanal interventoría 03-07-2024 - Save The children

CD Coordinador de Ingenieria - PYG <gosorio@pygdeldesarrollo.com>

Para Carlos Alfonso Vargas Munoz

CC 'hgutierrez'

Responder | Responder a todos | Reenviar

mi. 03/07/2024 15:37

Este remitente gosorio@pygdeldesarrollo.com es externo a la organización.

8. Cronograma seguimiento PYG SAVE THE CHILDREN 03-07-2024.xlsx
42 KB

Iniciar la respuesta a todos con: Recibido, gracias. | Ok. Confirmo recibido. | Gracias por el informe. | Comentarios

Buenas tardes,

Por medio de la presente comparto lo referenciado en el asunto para fines pertinentes.

Agradecemos de antemano su revisión y/o comentarios pertinentes en pro de buscar la mejora continua de los reportes realizados.

Saludos,

CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS PASTORAL 3 DE JULIO - Mensaje (H...

Buscar

Archivo Mensaje Ayuda

compartir con Teams | Todas las aplicaciones | Buscar | Zoom

CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS PASTORAL 3 DE JULIO

LG liliana garcia <lgrcoordinadorpyg@gmail.com>

Para Carlos Alfonso Vargas Munoz

CC fortalecimientoguajira@pygdeldesarrollo.com; hgutierrez@pygdeldesarrollo.com

Responder | Responder a todos | Reenviar

mi. 03/07/2024 23:15

Este remitente lgrcoordinadorpyg@gmail.com es externo a la organización.

Cronograma seguimiento PYG PASTORAL 03-07-2024.xlsx
50 KB


Iniciar la respuesta a todos con: Recibido, gracias. | Muchas gracias. | Ok. Confirmo recibido. | Comentarios

Buenas noches:

Envío cronograma de seguimiento al contratista pastoral social.

Cordialmente,

Arq.Liliana Garcia R
Coordinadora de proyectos
PROYECTOS Y GESTIÓN DEL DESARROLLO

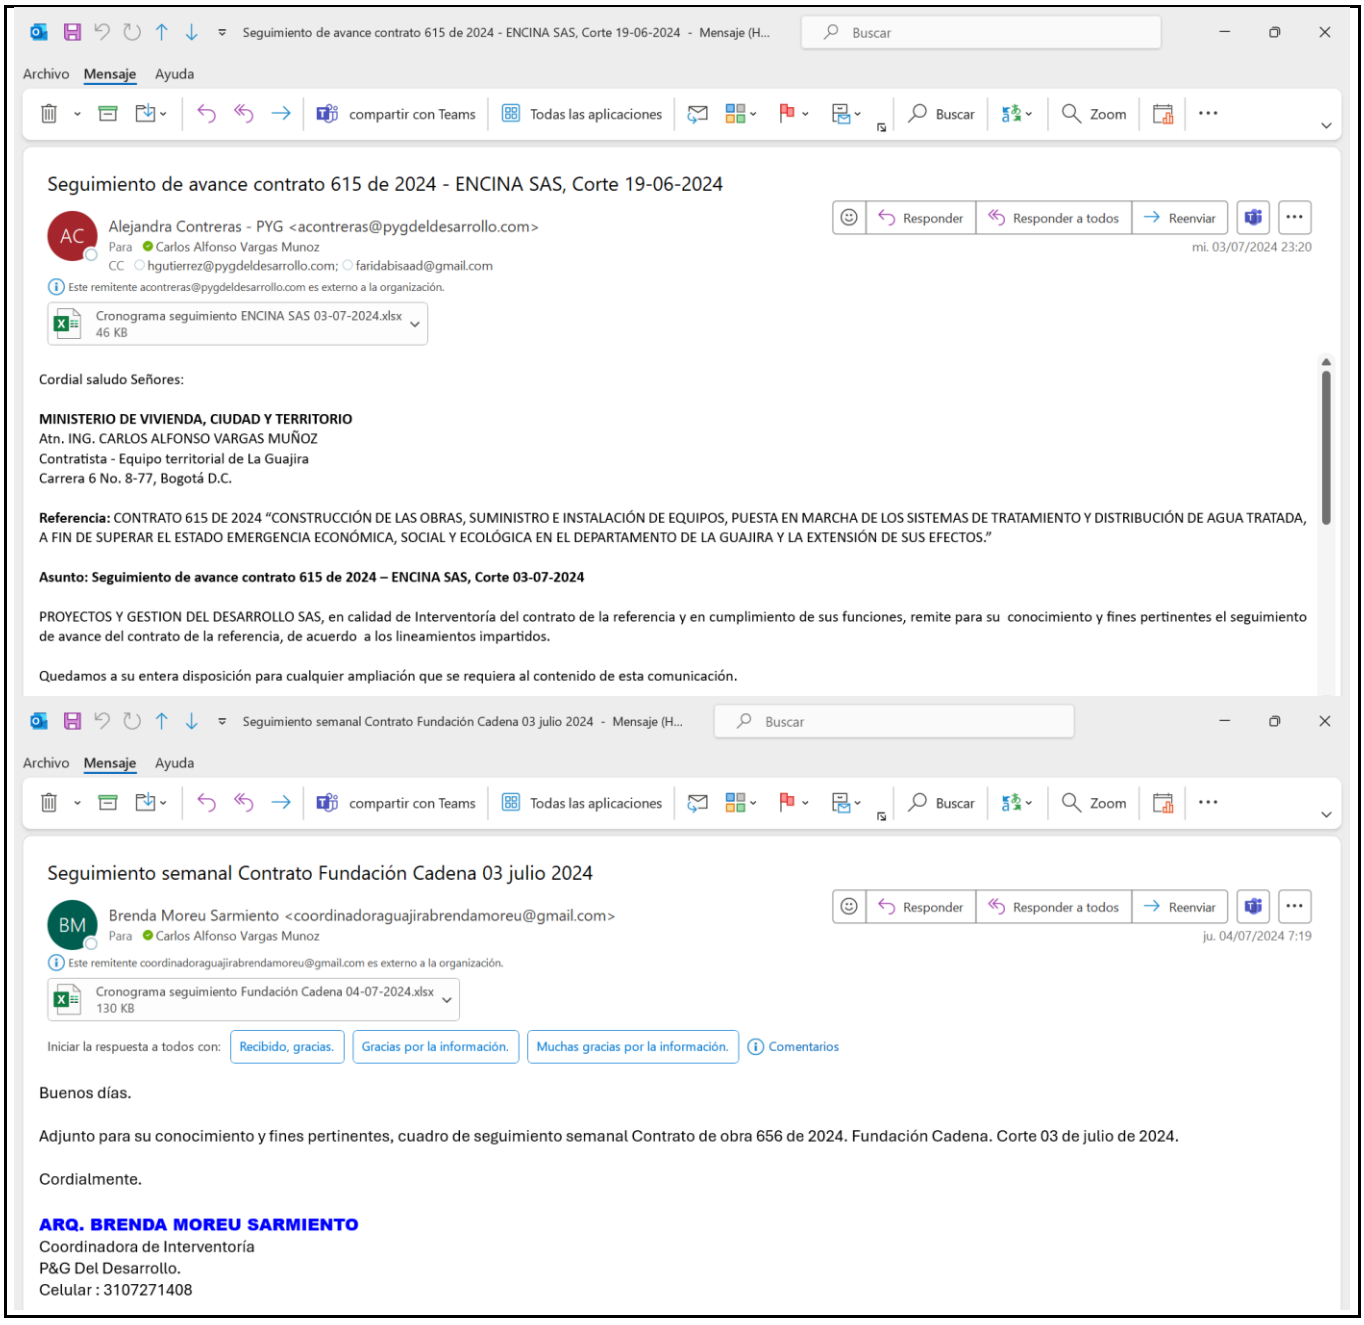

Seguimiento de avance contrato 615 de 2024 - ENCINA SAS, Corte 19-06-2024 - Mensaje (H...

Archivo Mensaje Ayuda

compartir con Teams | Todas las aplicaciones | Buscar | Zoom

Seguimiento de avance contrato 615 de 2024 - ENCINA SAS, Corte 19-06-2024

Alejandra Contreras - PYG <acontreras@pygdeldesarrollo.com>
Para Carlos Alfonso Vargas Munoz
CC hgutierrez@pygdeldesarrollo.com; faridabisaad@gmail.com

Responder | Responder a todos | Reenviar

mi. 03/07/2024 23:20

Este remitente acontreras@pygdeldesarrollo.com es externo a la organización.

Cronograma seguimiento ENCINA SAS 03-07-2024.xlsx
46 KB

Cordial saludo Señores:

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Atn. ING. CARLOS ALFONSO VARGAS MUÑOZ
Contratista - Equipo territorial de La Guajira
Carrera 6 No. 8-77, Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO 615 DE 2024 "CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA TRATADA, A FIN DE SUPERAR EL ESTADO EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA Y LA EXTENSIÓN DE SUS EFECTOS."

Asunto: Seguimiento de avance contrato 615 de 2024 – ENCINA SAS, Corte 03-07-2024

PROYECTOS Y GESTION DEL DESARROLLO SAS, en calidad de Interventoría del contrato de la referencia y en cumplimiento de sus funciones, remite para su conocimiento y fines pertinentes el seguimiento de avance del contrato de la referencia, de acuerdo a los lineamientos impartidos.

Quedamos a su entera disposición para cualquier ampliación que se requiera al contenido de esta comunicación.

Seguimiento semanal Contrato Fundación Cadena 03 julio 2024 - Mensaje (H...

Archivo Mensaje Ayuda

compartir con Teams | Todas las aplicaciones | Buscar | Zoom

Seguimiento semanal Contrato Fundación Cadena 03 julio 2024

Brenda Moreu Sarmiento <coordinadoraguajirabrendamoreu@gmail.com>
Para Carlos Alfonso Vargas Munoz

Responder | Responder a todos | Reenviar

ju. 04/07/2024 7:19

Este remitente coordinadoraguajirabrendamoreu@gmail.com es externo a la organización.

Cronograma seguimiento Fundación Cadena 04-07-2024.xlsx
130 KB


Iniciar la respuesta a todos con: Recibido, gracias. | Gracias por la información. | Muchas gracias por la información. | Comentarios

Buenos días.

Adjunto para su conocimiento y fines pertinentes, cuadro de seguimiento semanal Contrato de obra 656 de 2024. Fundación Cadena. Corte 03 de julio de 2024.

Cordialmente.

ARQ. BRENDA MOREU SARMIENTO
Coordinadora de Interventoría
P&G Del Desarrollo.
Celular : 3107271408

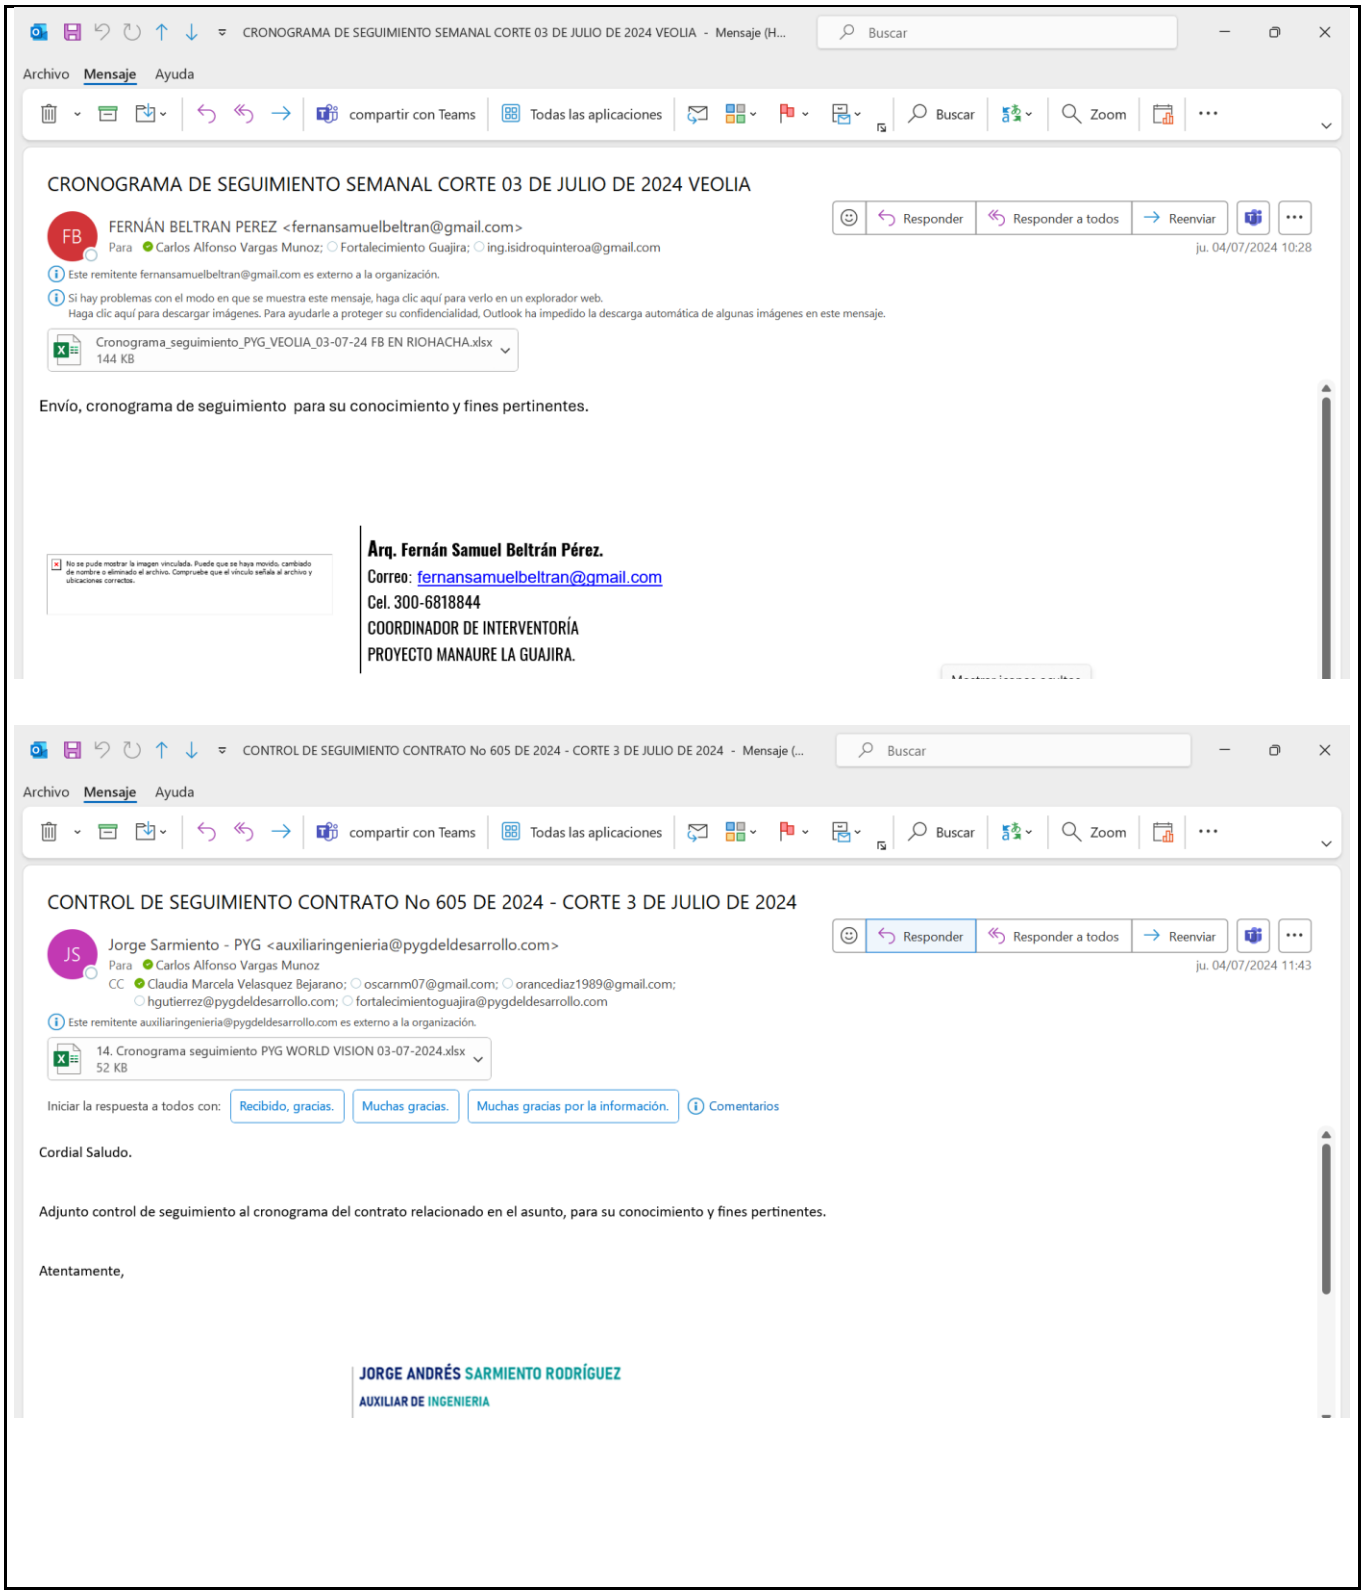

CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO SEMANAL CORTE 03 DE JULIO DE 2024 VEOLIA - Mensaje (H...

Archivo Mensaje Ayuda

compartir con Teams | Todas las aplicaciones | Buscar | Zoom

CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO SEMANAL CORTE 03 DE JULIO DE 2024 VEOLIA

FERNÁN BELTRAN PEREZ <fernansamuelbeltran@gmail.com>
Para Carlos Alfonso Vargas Munoz; Fortalecimiento Guajira; ing.isidroquinteroa@gmail.com

Responder | Responder a todos | Reenviar

ju. 04/07/2024 10:28

Este remitente fernansamuelbeltran@gmail.com es externo a la organización.

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.
Haga clic aquí para descargar imágenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la descarga automática de algunas imágenes en este mensaje.

Cronograma_seguimiento_PYG_VEOLIA_03-07-24 FB EN RIOHACHA.xlsx
144 KB

Envío, cronograma de seguimiento para su conocimiento y fines pertinentes.

No se pudo mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

Arq. Fernán Samuel Beltrán Pérez.
Correo: fernansamuelbeltran@gmail.com
Cel. 300-6818844
COORDINADOR DE INTERVENTORÍA
PROYECTO MANAURE LA GUAJIRA.

CONTROL DE SEGUIMIENTO CONTRATO No 605 DE 2024 - CORTE 3 DE JULIO DE 2024 - Mensaje (...

Archivo Mensaje Ayuda

compartir con Teams | Todas las aplicaciones | Buscar | Zoom

CONTROL DE SEGUIMIENTO CONTRATO No 605 DE 2024 - CORTE 3 DE JULIO DE 2024

Jorge Sarmiento - PYG <auxiliaringenieria@pygdeldesarrollo.com>
Para Carlos Alfonso Vargas Munoz
CC Claudia Marcela Velasquez Bejarano; oscarnm07@gmail.com; orancediaz1989@gmail.com; hgutierrez@pygdeldesarrollo.com; fortalecimientoguajira@pygdeldesarrollo.com

Responder | Responder a todos | Reenviar

ju. 04/07/2024 11:43

Este remitente auxiliaringenieria@pygdeldesarrollo.com es externo a la organización.

14. Cronograma seguimiento PYG WORLD VISION 03-07-2024.xlsx
52 KB

Iniciar la respuesta a todos con: Recibido, gracias. | Muchas gracias. | Muchas gracias por la información. | Comentarios

Cordial Saludo.

Adjunto control de seguimiento al cronograma del contrato relacionado en el asunto, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

JORGE ANDRÉS SARMIENTO RODRÍGUEZ
AUXILIAR DE INGENIERIA

➢ Veolia

Contratista	Comunidad	% programado por unidad	%Ejecutado por unidad	Desviación % por unidad	Días programados	Días ejecutados	Desviación días
VEOLIA	ALTOPINO	1,82%	0,00%	-1,82%	2,36	0,00	-2,36
VEOLIA	AMAMANA	0,99%	0,25%	-0,75%	1,29	0,32	-0,97
VEOLIA	Amuchison	0,99%	0,27%	-0,72%	1,29	0,35	-0,94
VEOLIA	AMUYUWOU	0,97%	0,25%	-0,72%	1,26	0,32	-0,94
VEOLIA	ANUACHON JULIAKAT	1,82%	0,27%	-1,55%	2,36	0,35	-2,01
VEOLIA	ANUTPALAU	1,82%	0,27%	-1,55%	2,36	0,35	-2,01
VEOLIA	ATUNALAIN	1,82%	0,27%	-1,55%	2,36	0,35	-2,01
VEOLIA	ATUNOUTSHON	0,97%	0,12%	-0,85%	1,26	0,16	-1,10
VEOLIA	AYAURI (JUCEPIA)	1,82%	0,27%	-1,55%	2,36	0,35	-2,01
VEOLIA	CAMPAMANA 2	1,82%	0,25%	-1,57%	2,36	0,32	-2,04
VEOLIA	CASHIROUPA	1,05%	0,00%	-1,05%	1,36	0,00	-1,36
VEOLIA	CASUACHON	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
VEOLIA	COTCHAKAT	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
VEOLIA	COUCHARAPO	0,26%	0,27%	0,01%	0,34	0,35	0,02
VEOLIA	COUSHALAIN	1,82%	0,12%	-1,70%	2,36	0,16	-2,20
VEOLIA	COUSHARIPA	0,99%	0,00%	-0,99%	1,29	0,00	-1,29
VEOLIA	CURICHI	0,68%	0,12%	-0,56%	0,89	0,16	-0,73
VEOLIA	GALAN	0,68%	0,12%	-0,56%	0,89	0,16	-0,73
VEOLIA	ICHIEN	0,97%	0,00%	-0,97%	1,26	0,00	-1,26
VEOLIA	IMESITA	0,00%	0,12%	0,12%	0,00	0,16	0,16
VEOLIA	IMESITA 2	1,82%	0,00%	-1,82%	2,36	0,00	-2,36
VEOLIA	IPAIN	1,82%	0,25%	-1,57%	2,36	0,32	-2,04
VEOLIA	IRRUISIRRA 2	0,97%	0,25%	-0,72%	1,26	0,32	-0,94
VEOLIA	ISALAMANA	0,00%	0,25%	0,25%	0,00	0,32	0,32
VEOLIA	ISHIPA	0,97%	0,47%	-0,50%	1,26	0,61	-0,65
VEOLIA	JIYUSHON	0,26%	0,18%	-0,08%	0,34	0,23	-0,11
VEOLIA	JOSOKORROLI	0,99%	0,18%	-0,82%	1,29	0,23	-1,06
VEOLIA	JULIAKAT	0,99%	0,25%	-0,75%	1,29	0,32	-0,97
VEOLIA	JURUWAMANA	1,82%	0,12%	-1,70%	2,36	0,16	-2,20
VEOLIA	KAGUALASH	1,82%	0,18%	-1,64%	2,36	0,23	-2,13
VEOLIA	KALANKALA	0,99%	0,12%	-0,87%	1,29	0,16	-1,13
VEOLIA	KASUMANA 2	1,15%	0,12%	-1,03%	1,49	0,16	-1,33
VEOLIA	KASUSHI	0,25%	0,00%	-0,25%	0,33	0,00	-0,33
VEOLIA	KATIORO	1,82%	0,18%	-1,64%	2,36	0,23	-2,13
VEOLIA	KATNIAMANA	1,05%	0,25%	-0,80%	1,36	0,32	-1,04
VEOLIA	KAUCHIRAIN	1,82%	0,25%	-1,57%	2,36	0,32	-2,04
VEOLIA	KUTIRRAPLEIKA	1,05%	0,10%	-0,95%	1,36	0,12	-1,24
VEOLIA	MALAIRAKAT 1	0,26%	0,12%	-0,14%	0,34	0,16	-0,18
VEOLIA	MANANTIAL	0,68%	0,25%	-0,44%	0,89	0,32	-0,57
VEOLIA	MAPUAIN 3	1,82%	0,00%	-1,82%	2,36	0,00	-2,36
VEOLIA	MERCADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
VEOLIA	MONTEREAL	0,00%	0,27%	0,27%	0,00	0,35	0,35
VEOLIA	Nortechon	0,68%	0,00%	-0,68%	0,89	0,00	-0,89
VEOLIA	OROKICHON	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
VEOLIA	ORROKOT	1,05%	0,00%	-1,05%	1,36	0,00	-1,36
VEOLIA	PALILLU 1	0,00%	0,27%	0,27%	0,00	0,35	0,35
VEOLIA	PERRAMANA	0,99%	0,12%	-0,87%	1,29	0,16	-1,13
VEOLIA	PIOREKAT 2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
VEOLIA	PISOMANA	0,68%	0,12%	-0,56%	0,89	0,16	-0,73
VEOLIA	POTSHIMANA	0,26%	0,00%	-0,26%	0,34	0,00	-0,34
VEOLIA	SABANACHON	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
VEOLIA	SEQUIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
VEOLIA	TOLUNDA	1,82%	0,00%	-1,82%	2,36	0,00	-2,36
VEOLIA	TULAT 2	0,00%	0,12%	0,12%	0,00	0,16	0,16
VEOLIA	TUTCHON 1	0,25%	0,00%	-0,25%	0,33	0,00	-0,33
VEOLIA	USHURU	0,00%	0,12%	0,12%	0,00	0,16	0,16
VEOLIA	WALASCHEN	1,82%	0,00%	-1,82%	2,36	0,00	-2,36
VEOLIA	WARARAKI	0,00%	0,12%	0,12%	0,00	0,16	0,16
VEOLIA	WARUTTAIN 1	0,97%	0,00%	-0,97%	1,26	0,00	-1,26
VEOLIA	YULIRAKAT	1,82%	0,25%	-1,57%	2,36	0,32	-2,04

➢ *World Vision*

Contratista	Comunidad	% programado por unidad	%Ejecutado por unidad	Desviación % por unidad	Días programados	Días ejecutados	Desviación días
World Visión	PARRULAIN	0,80%	0,44%	-0,37%	1,04	0,57	-0,48
World Visión	COPOYOMANA	0,23%	0,41%	0,18%	0,27	0,47	0,20
World Visión	TULUMANA	2,13%	1,02%	-1,11%	2,77	1,33	-1,44
World Visión	AJUMANA	2,13%	0,44%	-1,69%	2,77	0,57	-2,20
World Visión	ALAMARKAT	2,13%	1,02%	-1,11%	2,77	1,32	-1,45
World Visión	CIRUELO I	2,13%	0,44%	-1,69%	2,77	0,57	-2,20
World Visión	PLAN BONITO	2,13%	0,59%	-1,54%	2,77	0,77	-2,00
World Visión	YUTAX	2,13%	0,46%	-1,67%	2,77	0,60	-2,17
World Visión	KETPANA	2,13%	0,48%	-1,65%	2,77	0,63	-2,14
World Visión	KAMUCHASAIN	1,31%	0,44%	-0,87%	1,70	0,57	-1,13
World Visión	KALINASIRRA	0,80%	0,44%	-0,37%	1,04	0,57	-0,48
World Visión	LA ROMANA	0,80%	0,44%	-0,37%	1,04	0,57	-0,48
World Visión	BRASIL	0,80%	0,44%	-0,37%	1,04	0,57	-0,48
World Visión	CERRO AZUL	0,80%	0,44%	-0,37%	1,04	0,57	-0,48
World Visión	MONTERMON 2	0,80%	0,41%	-0,39%	1,04	0,53	-0,51
World Visión	LA TOLDA	1,31%	0,44%	-0,87%	1,70	0,57	-1,13
World Visión	MERIDAILY	1,31%	0,44%	-0,87%	1,70	0,57	-1,13
World Visión	SANTA LUCIA	1,31%	0,44%	-0,87%	1,70	0,57	-1,13
World Visión	MAYAL QUEMADO	0,13%	0,21%	0,08%	0,14	0,23	0,09
World Visión	GALILEA	1,31%	0,44%	-0,87%	1,70	0,57	-1,13
World Visión	GUADALUPE 2	1,31%	0,44%	-0,87%	1,70	0,57	-1,13
World Visión	GUAYABITO 1	1,31%	0,44%	-0,87%	1,70	0,57	-1,13
World Visión	APALASAOU	0,80%	0,44%	-0,37%	1,04	0,57	-0,48
World Visión	KOUSHALAP	0,34%	0,22%	-0,12%	0,41	0,26	-0,15
World Visión	MULUJUICHON	0,40%	0,19%	-0,20%	0,47	0,23	-0,24
World Visión	PUNTA SIERRA	0,40%	0,21%	-0,20%	0,48	0,25	-0,23
World Visión	KAYETAMANA	0,40%	0,19%	-0,20%	0,47	0,23	-0,24
World Visión	JULIANCHON	0,40%	0,21%	-0,20%	0,48	0,25	-0,23
World Visión	EL MANANTIAL	0,17%	0,00%	-0,17%	0,17	0,00	-0,17
World Visión	SAMURRICHAO	0,40%	0,21%	-0,19%	0,47	0,25	-0,22
World Visión	OROGEL	0,40%	0,19%	-0,21%	0,48	0,23	-0,25

➢ Fundación Cadena

Contratista	Comunidad	% programado por unidad	%Ejecutado por unidad	Desviación % por unidad	Días programados	Días ejecutados	Desviación días
CADENA	La Loma	1,40%	0,40%	-1,00%	1,82	0,52	-1,30
CADENA	Ishamana	1,40%	0,40%	-1,00%	1,82	0,52	-1,30
CADENA	Musamana	1,40%	0,40%	-1,00%	1,82	0,52	-1,30
CADENA	Papumana	1,40%	0,40%	-1,00%	1,82	0,52	-1,30
CADENA	SICHEN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
CADENA	Jerjet	1,36%	0,40%	-0,96%	1,77	0,52	-1,25
CADENA	Jaichon	1,36%	0,20%	-1,16%	1,77	0,26	-1,51
CADENA	Palasumana	1,36%	0,20%	-1,16%	1,77	0,26	-1,51
CADENA	Masuren	1,27%	0,40%	-0,88%	1,66	0,52	-1,14
CADENA	La Estrella	1,27%	0,40%	-0,88%	1,66	0,52	-1,14
CADENA	Wlipa	1,27%	0,29%	-0,99%	1,66	0,37	-1,28
CADENA	Yosuipa	1,27%	0,29%	-0,99%	1,66	0,37	-1,28
CADENA	Equimana	1,23%	0,40%	-0,84%	1,60	0,52	-1,09
CADENA	Limoncito	1,23%	0,29%	-0,95%	1,60	0,37	-1,23
CADENA	PUEBLITO WAYUU	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
CADENA	Majayupana	1,23%	0,29%	-0,95%	1,60	0,37	-1,23
CADENA	Cachuyas	1,23%	0,24%	-0,99%	1,60	0,32	-1,29
CADENA	Las Delicias	1,11%	0,20%	-0,91%	1,44	0,26	-1,18
CADENA	Walirrumana	1,11%	0,40%	-0,71%	1,44	0,52	-0,92
CADENA	Wanapaina	1,11%	0,40%	-0,71%	1,44	0,52	-0,92
CADENA	Jirrumana	1,11%	0,29%	-0,82%	1,44	0,37	-1,07
CADENA	PEPETSHI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
CADENA	Carraurachon	1,07%	0,24%	-0,82%	1,39	0,32	-1,07
CADENA	Mi Rosita	1,07%	0,20%	-0,87%	1,39	0,26	-1,13
CADENA	Shonkomana	1,02%	0,20%	-0,83%	1,33	0,26	-1,07
CADENA	Quispa	1,02%	0,20%	-0,83%	1,33	0,26	-1,07
CADENA	Cardonal	1,02%	0,20%	-0,83%	1,33	0,26	-1,07
CADENA	Wairramana	1,02%	0,20%	-0,83%	1,33	0,26	-1,07
CADENA	Pasanualuu	0,98%	0,20%	-0,78%	1,28	0,26	-1,02
CADENA	Uyatpana 2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
CADENA	Kanasumana	0,98%	0,20%	-0,78%	1,28	0,26	-1,02
CADENA	Juttial	0,98%	0,20%	-0,78%	1,28	0,26	-1,02
CADENA	Divino Niño	0,94%	0,20%	-0,74%	1,22	0,26	-0,97
CADENA	La Paz	0,94%	0,20%	-0,74%	1,22	0,26	-0,97

➢ Pastoral Social

Comunidad	% programado por unidad	%Ejecutado por unidad	Desviación % por unidad	Días programados	Días ejecutados	Desviación días
AREMASAIN	1,53%	0,40%	-1,13%	1,53	0,40	-1,13
CAVIMA OLOMANA	2,39%	0,87%	-1,52%	3,56	1,29	-2,27
CEIWAKA	1,53%	0,47%	-1,06%	1,53	0,47	-1,06
KARAROPTAMANA	2,39%	0,96%	-1,43%	3,56	1,43	-2,13
URRAICHIKAT	1,24%	0,42%	-0,81%	1,24	0,42	-0,81
WACHIPA	0,81%	0,45%	-0,36%	1,20	0,66	-0,54
ISHAMANA 2	0,81%	0,45%	-0,36%	1,20	0,66	-0,54
MARRAUYEN	0,81%	0,45%	-0,36%	1,20	0,66	-0,54
POULAKA	0,00%	0,05%	0,05%	0,00	0,04	0,04
GUAYAWCHAIN	0,81%	0,45%	-0,36%	1,20	0,66	-0,54
QUEJAMANA	0,81%	0,47%	-0,34%	1,20	0,70	-0,51
SABANA LARGA	0,81%	0,45%	-0,36%	1,20	0,66	-0,54
SOULUWAMANA	0,81%	0,42%	-0,39%	1,20	0,63	-0,58
PANATSHI	0,81%	0,30%	-0,50%	1,20	0,45	-0,75
KUSKAT 3	0,34%	0,16%	-0,18%	0,42	0,20	-0,22
ALITAYEN	0,34%	0,16%	-0,18%	0,42	0,20	-0,22
PARULUGAIN O PARRULUWAIN	0,78%	0,30%	-0,47%	1,16	0,45	-0,71
JULUWAWAIN	0,78%	0,16%	-0,62%	1,16	0,24	-0,92
MUÑECHIKAT	0,00%	0,16%	0,16%	0,00	0,12	0,12
MIECHI	0,00%	0,05%	0,05%	0,00	0,04	0,04
PARRITCHON	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
SIRUMATCHI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
SHALETKA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
MARAGUANCHA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
PERRAMANA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
ATUNALAAIN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
ARITAMANA	0,00%	0,30%	0,30%	0,00	0,23	0,23
KAUSHALAIN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
IRRUJUNAI	0,98%	0,45%	-0,53%	1,46	0,66	-0,79
JURULUBAN- LAS AMERICAS	1,34%	0,28%	-1,06%	2,00	0,42	-1,58
SANTA LUCIA	1,97%	0,42%	-1,54%	2,93	0,63	-2,30
YOUSULEMANA	1,37%	0,16%	-1,21%	2,05	0,24	-1,80

➢ Save The Children

Contratista	Comunidad	% programado por unidad	%Ejecutado por unidad	Desviación % por unidad	Días programados	Días ejecutados	Desviación días
Save the children	Jotojoroi	0,88%	0,66%	-0,22%	0,53	0,40	-0,13
Save the children	WUIKAT	0,00%	0,26%	0,26%	0,00	0,12	0,12
Save the children	CUCURUMANA	1,36%	0,75%	-0,61%	0,80	0,44	-0,36
Save the children	JATSAMANA	0,88%	0,66%	-0,22%	0,53	0,40	-0,13
Save the children	TORRINCHI	1,36%	0,75%	-0,61%	0,76	0,42	-0,34
Save the children	YATETSHICA	0,00%	0,40%	0,40%	0,00	0,19	0,19
Save the children	MAÑATURE	0,88%	0,66%	-0,22%	0,52	0,39	-0,13
Save the children	Pashara	0,88%	0,49%	-0,40%	0,45	0,25	-0,20
Save the children	PARULUWASII	0,00%	0,40%	0,40%	0,00	0,19	0,19
Save the children	BETANIA 1	0,88%	0,49%	-0,40%	0,45	0,25	-0,20
Save the children	URUMACHIMANA	0,88%	0,49%	-0,40%	0,41	0,23	-0,19
Save the children	KAJUCHONKAL	0,88%	0,66%	-0,22%	0,44	0,33	-0,11
Save the children	LA ISLA	0,88%	0,66%	-0,22%	0,51	0,38	-0,13
Save the children	LA ARENOSA	0,88%	0,66%	-0,22%	0,49	0,36	-0,12
Save the children	KAIPA	0,88%	0,49%	-0,40%	0,42	0,23	-0,19
Save the children	AMAICHONKAT 3	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
Save the children	WAITAPA	0,88%	0,44%	-0,44%	0,41	0,21	-0,21

➢ Encina

Contratista	Comunidad	% programado por unidad	%Ejecutado por unidad	Desviación % por unidad	Días programados	Días ejecutados	Desviación días
ENCINA SAS	Panchomana	1,35%	0,46%	-0,90%	3,14	1,06	-2,08
ENCINA SAS	Pinskit	2,62%	0,46%	-2,17%	3,83	0,66	-3,16
ENCINA SAS	Yotojoloin	1,85%	0,46%	-1,40%	3,45	0,85	-2,60
ENCINA SAS	Santana Norte	3,48%	0,11%	-3,38%	4,18	0,13	-4,05
ENCINA SAS	Amasirralu	1,80%	0,11%	-1,69%	3,28	0,20	-3,08
ENCINA SAS	Urraichirujunai	1,58%	0,46%	-1,12%	3,32	0,96	-2,36
ENCINA SAS	Jatto	2,15%	0,46%	-1,70%	3,74	0,79	-2,95
ENCINA SAS	Cadenachon	3,48%	0,46%	-3,03%	4,15	0,54	-3,60
ENCINA SAS	Karraloutamana	2,63%	0,46%	-2,18%	3,87	0,67	-3,20
ENCINA SAS	Wishiwou	3,48%	0,46%	-3,03%	4,18	0,55	-3,64
ENCINA SAS	Shimolu	1,85%	0,46%	-1,40%	3,45	0,85	-2,60
ENCINA SAS	Ishirrouwou	3,48%	0,46%	-3,03%	4,18	0,55	-3,64
ENCINA SAS	Woluwopana	1,23%	0,46%	-0,78%	3,19	1,18	-2,01
ENCINA SAS	Jaipirijunay	1,58%	0,46%	-1,12%	3,32	0,96	-2,36
ENCINA SAS	Kataysumana	1,58%	0,46%	-1,12%	3,32	0,96	-2,36
ENCINA SAS	Sarruptien	1,57%	0,46%	-1,11%	3,27	0,95	-2,32
ENCINA SAS	Tutchonca	1,24%	0,46%	-0,79%	3,23	1,18	-2,05
ENCINA SAS	El Epelio	1,24%	0,46%	-0,79%	3,23	1,18	-2,05
ENCINA SAS	Kululumana	2,12%	0,46%	-1,66%	3,62	0,78	-2,84
ENCINA SAS	Cadenita	1,41%	0,46%	-0,96%	3,35	1,08	-2,27
ENCINA SAS	Yourepo	2,12%	0,46%	-1,66%	3,62	0,78	-2,84
ENCINA SAS	Warawarao	2,62%	0,46%	-2,17%	3,83	0,66	-3,16
ENCINA SAS	Kaspolamina	2,63%	0,46%	-2,18%	3,87	0,67	-3,20
ENCINA SAS	Pirpir	1,41%	0,46%	-0,96%	3,35	1,08	-2,27
ENCINA SAS	Ishain	2,12%	0,46%	-1,66%	3,62	0,78	-2,84
ENCINA SAS	México	1,90%	0,46%	-1,45%	3,61	0,87	-2,75
ENCINA SAS	Olocomana	1,41%	0,46%	-0,96%	3,35	1,08	-2,27
ENCINA SAS	Los Olivos	1,23%	0,46%	-0,78%	3,19	1,18	-2,01

3. **Relación de comunicaciones** (ANEXO 4)

➢ **Enviada**

Radicado Emitido MVCT	Referencia	Asunto	Remitente	Fecha Envío
2024IE0002138	Emisión Grupo Contratos MVCT	Actas de Inicio Plan Wüin Ülees (Agua Limpia). Esquema rehabilitaciones	GINA JULIANA RINCON RODRIGUEZ	11/03/2024
2024IE0002450	Emisión Grupo Contratos MVCT	Actas de Inicio Plan Wüin Ülees (Agua Limpia). Esquema rehabilitaciones	GINA JULIANA RINCON RODRIGUEZ	20/03/2024
2024IE0013960	Emitido a P&G	Hojas de Vida equipo de Gestión Contrato de Interventoría No. 631 de 2024	GINA JULIANA RINCON RODRIGUEZ	07/03/2024
2024IE0016610	Emitido a P&G	Hojas de Vida equipo de Gestión Contrato de Interventoría No. 631 de 2024	GINA JULIANA RINCON RODRIGUEZ	15/03/2024
2024EE0037021	Pendiente por firmas	Hojas de vida equipo de gestión Contrato de Interventoría No. 631 de 2024	DIANA MARCELA MEDINA HENAO	
2024EE0027943	Pendiente por firmas	Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico – Respuesta al radicado No. P&G-IAG-631-009, con asunto << Aclaración de las comunidades asignadas al contrato 615 de 2024>>.	DIANA MARCELA MEDINA HENAO	
2024EE0036914	Emitido a P&G	Solicitud de aprobación subcontratación del Contrato de Obra No. 632 de 2024 suscrito entre VEOLIA AGUAS DE LA GUAJIRA S.A.S E.S.P. y el MVCT	DIANA MARCELA MEDINA HENAO	21/05/2024
2024IE0018801	Pendiente por firmas	Listado de asignaciones Comunidades - Contrato de suministro e instalación No. 615-2023	GINA JULIANA RINCON RODRIGUEZ	
2024IE0019079	Emitido a P&G	Hojas de vida equipo de gestión Contrato de Interventoría No. 631 de 2024	GINA JULIANA RINCON RODRIGUEZ	03/04/2024
2024IE0019196	Pendiente por firmas	Informes de Alistamiento Contratos P&G	GINA JULIANA RINCON RODRIGUEZ	
2024IE0040017	Pendiente por firmas	Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico – Respuesta a comunicados No. P&G-IAG-631-019, P&G-IAG-631-021, P&G-IAG-631-35 - Aclaraciones y cambio de Comunidades	DIANA MARCELA MEDINA HENAO	
2024IE0004295	Pendiente por firmas	Actas de Inicio Plan Wüin Ülees (Agua Limpia). Esquema rehabilitaciones.	DIANA MARCELA MEDINA HENAO	
2024IE0005220	Pendiente por firmas	Informes de Supervisión Contrato de Interventoría No. 631 de 2024, celebrado entre MVCT y PROYECTOS Y GESTIÓN DEL DESARROLLO S.A.S, meses de abril y mayo de 2024, cuyo objeto es "Interventoría Integral a los Contratos de Obra y/o conexos que suscriba el MVCT, encaminados a Atender el Plan Provisional y Estado de Emergencia Económica, Social, y Ecológica en el Departamento de la Guajira y la Extensión de sus Defectos."	DIANA MARCELA MEDINA HENAO	
2024EE0044280	Pendiente por firmas	Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico – Respuesta al radicado No. P&G-IAG-631-009, con asunto << Aclaración de las comunidades asignadas al contrato 615 de 2024>>.	DIANA MARCELA MEDINA HENAO	
2024EE0044079	Pendiente por firmas	Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico – Respuesta al radicado No. P&G-IAG-631-010, con asunto << Aclaración garantías de las rehabilitaciones en las comunidades Santa Norte (Uribia) y Amasirralu (Uribia) >>.	DIANA MARCELA MEDINA HENAO	
2024EE0041308	Pendiente por firmas	Aprobaciones informes de diagnóstico y propuestas económicas.	DIANA MARCELA MEDINA HENAO	
2024EE0056331	Pendiente por firmas	Informes diagnósticos nuevas comunidades - Contrato de suministro e instalación No. 615-2023	DIANA MARCELA MEDINA HENAO	
2024EE0057072	Pendiente por firmas	Requerimiento No. 1 - Atrasos de actividades contractuales en contratos objeto de interventoría – Contrato Interventoría No. 631 de 2024	DIANA MARCELA MEDINA HENAO	
2024IE0006286	Pendiente por firmas	Informe de Interventoría del Contrato de Interventoría No. 631 de 2024, celebrado entre MVCT y PROYECTOS Y GESTIÓN DEL DESARROLLO S.A.S, mes de mayo de 2024, cuyo objeto es "Interventoría Integral a los Contratos de Obra y/o conexos que suscriba el MVCT, encaminados a Atender el Plan Provisional y Estado de Emergencia Económica, Social, y Ecológica en el Departamento de la Guajira y la Extensión de sus Defectos."	DIANA MARCELA MEDINA HENAO	

➢ **Recibida**

Radicado Emitido P8	Referencia	Asunto	Remitente	Fecha Envío Recibo/Emisión
P&G-IAG-STC-706-025	CONTRATO 631 DE 2024 "INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DE OBRA Y/O CONEXOS QUE SUSCRIBA EL MVCT, ENCAMINADOS A ATENDER EL PLAN PROVISIONAL Y EL ESTADO	Reporte de novedad – Comunidad MUSHUICAL-KAYUSHUWOLALU	Heraldo Gutiérrez Villegas	05 de julio de 2024
P&G-IAG-VWC-631-071	CONTRATO 631 DE 2024 "INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DE OBRA Y/O CONEXOS QUE SUSCRIBA EL MVCT, ENCAMINADOS A ATENDER EL PLAN PROVISIONAL Y EL ESTADO DE	Aprobación propuesta comunidad de Plan Bonito	Heraldo Gutiérrez Villegas	03 de julio de 2024
P&G-IAG-VWC-631-072	CONTRATO 631 DE 2024 "INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DE OBRA Y/O CONEXOS QUE SUSCRIBA EL MVCT, ENCAMINADOS A ATENDER EL PLAN PROVISIONAL Y EL ESTADO DE	Aprobación propuesta comunidad de Ketpana	Heraldo Gutiérrez Villegas	03 de julio de 2024
P&G-IAG-VWC-631-091	CONTRATO 631 DE 2024 "INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DE OBRA Y/O CONEXOS QUE SUSCRIBA EL MVCT, ENCAMINADOS A ATENDER EL PLAN PROVISIONAL Y EL ESTADO DE	Reiteración observaciones: Ajumana y Ciruelo I	Heraldo Gutiérrez Villegas	17 de julio de 2024

4. Actividades para realizar en el mes de agosto de 2024

- Se continuará con aprobación de los informes de diagnósticos y propuestas económicas.
- Se espera liquidación del contrato No. 608-2024 Fleshman Constructores
- Se espera inicio de obras de rehabilitación dada las aprobaciones de las propuestas económicas de 7 infraestructuras pertenecientes al contratista Veolia, 3 infraestructuras pertenecientes al contratista *World Vision*, 6 infraestructuras pertenecientes al contratista Pastoral y 1 infraestructura perteneciente al contratistas Fundación Cadena:

CONTRATISTA	COMUNIDAD	MUNICIPIO	CORREGIMIENTO	Fecha Socialización MVCT
Veolia	AYAURI (JUCEPIA)	MANAURE	Rgdo. Alta y Media Guajira	13/06/2024
Veolia	ATUNALAIN	MANAURE	Rgdo. Alta y Media Guajira	13/06/2024
Veolia	CASHIROUPA	MANAURE	La Sabana	01/07/2024
Veolia	MONTE REAL	MANAURE	La Sabana	01/07/2024
Pastoral	SABANA LARGA	MANAURE	Cgto. Mayapo	13/07/2024
World Vision	YUTAX	RIOHACHA	Rgdo. Alta y Media Guajira	13/07/2024
World Vision	CIRUELO I	RIOHACHA	Rgdo. Alta y Media Guajira	23/07/2024
World Vision	AJUMANA	RIOHACHA	Rgdo. Alta y Media Guajira	23/07/2024
Veolia	ANUACHON JULIAKAT	MANAURE	Rgdo. Alta y Media Guajira	25/07/2024
Veolia	AMUCHISON	MANAURE	Rgdo. Alta y Media Guajira	25/07/2024
Pastoral	MARRAUYEN	MANAURE	Cgto. Manzana	26/07/2024
Pastoral	IRRUJUNAI	MANAURE	Cgto. Manzana	26/07/2024
Pastoral	WACHIPA	MANAURE	Cgto. La Gloria	26/07/2024
Pastoral	JAYAWCHAIN – KULANLANCHIC	MANAURE	Cgto. La Gloria	26/07/2024
Pastoral	ISHAMANA 2	MANAURE	Cgto. La Gloria	26/07/2024
Cadena	ISHAMANA	MAICAO	Cgto. Yotojoroy	26/07/2024
Veolia	PALILU 1	MANAURE	Rgdo. Alta y Media Guajira	25/07/2024

5. SEGUIMIENTO COMPONENTE JURÍDICO:

En el mes de julio no se realizados documentos contractuales de prórroga o suspensiones a los contratos directos

Seguimiento de las actuaciones jurídicas en curso.
No se tienen requerimientos de entes de control, ni solicitudes de derechos de petición o requerimientos en particular asociados a la ejecución del presente contrato.

6. RESUMEN COMPONENTE FINANCIERO

VEOLIA AGUAS DE LA GUAJIRA S.A.S E.S.P., CONTRATO No 632 DE 2024		
1	Aportes Nación – MVCT	$ 12.000.000.000
2	Giros realizados al Contrato	$ 2.400.000.000
3	Saldo de Aportes (1-2-3)	$ 9.600.000.000
4	Valor ejecutado recursos Nación	$ 2.400.000.000
5	**Saldo por ejecutar recursos girados Nación**	**$ 9.600.000.000**

WORLD VISION INTERNATIONAL - VISION MUNDIAL INTERNACIONAL CONTRATO No 605 DE 2024		
1	Aportes Nación – MVCT	$ 6.900.000.000
2	Giros realizados al Contrato	$ 1.380.000.000
3	Saldo de Aportes (1-2-3)	$ 5.520.000.000

4	Valor ejecutado recursos Nación	$ 1.380.000.000
5	**Saldo por ejecutar recursos girados Nación**	**$ 5.520.000.000**

FUNDACIÓN CADENA COLOMBIA CONTRATO No 656 DE 2024		
1	Aportes Nación – MVCT	$ 7.400.000.000
2	Giros realizados al Contrato	$ 1.480.000.000
3	Saldo de Aportes (1-2-3)	$ 5.920.000.000
4	Valor ejecutado recursos Nación	$ 1.480.000.000
5	**Saldo por ejecutar recursos girados Nación**	**$ 5.920.000.000**

SECRETARIADO DE PASTORAL SOCIAL RIOHACHA CONTRATO No 600 DE 2024		
1	Aportes Nación – MVCT	$ 7.000.000.000
2	Giros realizados al Contrato	$ 1.400.000.000
3	Saldo de Aportes (1-2-3)	$ 5.600.000.000
4	Valor ejecutado recursos Nación	$ 1.400.000.000
5	**Saldo por ejecutar recursos girados Nación**	**$ 5.600.000.000,00**

FUNDACION SAVE THE CHILDREN COLOMBIA CONTRATO No 706 de 2024		
1	Aportes Nación – MVCT	$3.700.000.000
2	Giros realizados al Contrato	$740.000.000
3	Saldo de Aportes (1-2-3)	$2.960.000.000
4	Valor ejecutado recursos Nación	$740.000.000
5	**Saldo por ejecutar recursos girados Nación**	**$2.960.000.000**

ENCINA S.A.S. SUMINISTRO E INSTALACIÓN No 615 DE 2024		
1	Aportes Nación – MVCT	$ 23.000.000.000
2	Giros realizados al Contrato	$ 6.900.000.000
3	Saldo de Aportes (1-2-3)	$ 16.100.000.000
4	Valor ejecutado recursos Nación	$ 6.900.000.000
5	**Saldo por ejecutar recursos girados Nación**	**$ 16.100.000.000**

FLESHMAN CONSTRUCTORES CONTRATO No 608 DE 2024		
1	Aportes Nación – MVCT	$ 173.000.000
2	Giros realizados al Contrato	$0,00

3	Saldo de Aportes (1-2-3)	$ 173.000.000
4	Valor ejecutado recursos Nación	$0,00
5	**Saldo por ejecutar recursos girados Nación**	**$ 173.000.000**

A continuación, se describen los desembolsos realizados a Interventoría P&G a 31 de julio 2024; sin embargo, se aclara que dicha interventoría no requiere anticipo dada la connotación del contrato 631-2024, en su cláusula Séptima, en el que especifica que "Los pagos del contrato de INTERVENTORÍA se realizarán mediante pagos parciales mensuales conforme al avance de cada contrato vigilado", de acuerdo con el tipo de clasificación de cada contrato como es; TIPO A, TIPO B, TIPO C y TIPO D.

PROYECTOS Y GESTIÓN DEL DESARROLLO S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 631 DE 2024		
1	Aportes Nación – MVCT	$ 6.715.000.000
2	Giros realizados al Contrato Mayo 1er Pago	$ 49.618.181,82
3	Giros realizados al Contrato Mayo 2do Pago	$106.236.363,64
4	Giros realizados al Contrato Junio 3er Pago	$113.636.363,64
5	Saldo de Aportes (1-2-3-4)	$ 6.445.509.090,90
6	Valor ejecutado recursos Nación	$ 269.490.909,10
7	**Saldo por ejecutar recursos girados Nación**	**$ 6.445.509.090,90**

La información de los numerales 1 fue tomada de la ejecución presupuestal MVCT de cada uno de los contratos

CLAUDIA MARCELA VELASQUEZ BEJARANO
Asesor, Código 1020, Grado 14 Despacho del viceministro de Agua y Saneamiento Básico

Es importante mencionar que el presente informe de supervisión corresponde a la ejecución del mes de julio cuya supervisión fue ejercida por Diana Medina, quien se desempeñó como Supervisora del presente contrato desde el 20 de mayo de 2024 hasta el 27 de agosto de 2024.

VoBo. Carlos Vargas – Profesional de Apoyo Técnico
