INFORME PERIÓDO DE SUPERVISIÓN
Fecha: 01 al 31 de agosto 2024

1. DATOS DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRIRIO

1.1. PROYECTOS Y GESTIÓN DEL DESARROLLO S.A.S

NÚMERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	631 DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	Interventoría Integral a los Contratos de Obra y/o conexos que suscriba el MVCT, encaminados a Atender el Plan **Provisional** y Estado de Emergencia Económica, Social, y Ecológica en el Departamento de la Guajira y la Extensión de sus Defectos.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	07/02/2024
SUSCRITO ENTRE	Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio- Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – Proyectos y Gestión del Desarrollo S.A.S - P&G
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 6.715.000.000
VALOR ACTUAL CONTRATO	$ 6.715000.000
PLAZO	El plazo de ejecución del contrato será de once (11) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos del perfeccionamiento y ejecución del contrato.
FECHA DE INICIO	27/02/2024
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	31/12/2024
FECHA TERMINACIÓN REAL	31/12/2024

2. DATOS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE DEL SUPERVISOR	GINA JULIANA RINCON RODRIGUEZ – SUPERVISORA DEL CONTRATO POR PARTE DEL MINISTERIO
	DESDE EL 06/02/2024 A 19/05/2024
NOMBRE DEL SUPERVISOR	DIANA MARCELA MEDINA HENAO – SUPERVISORA DEL CONTRATO POR PARTE DEL MINISTERIO
	DESDE EL 20/05/2024 A 27/08/2024

NOMBRE DEL SUPERVISOR	GINA JULIANA RINCON RODRIGUEZ – SUPERVISORA DEL CONTRATO POR PARTE DEL MINISTERIO
	DESDE EL 28/08/2024 A 17/09/2024
NOMBRE DEL SUPERVISOR	CLAUDIA MARCELA VELASQUEZ BEJARANO – SUPERVISORA DEL CONTRATO POR PARTE DEL MINISTERIO
	DESDE EL 18/09/2024 A LA FECHA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	CARLOS ALFONSO VARGAS MUÑOZ
	DESDE EL 01/03/2024 A LA FECHA
DEPENDENCIA	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL

3. INFORMACIÓN FÍSICA DE LOS CONTRATOS

3.1. Proyecto(s) Viabilizado(s)

3.1.1. PROYECTOS Y GESTIÓN DEL DESARROLLO S.A.S

Nombre del Contrato	Contrato de Interventoría No. 631 de 2024, suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Proyectos y Gestión del Desarrollo S.A.S - P&G. (ANEXO 1)
Alcance del Contrato:	El Contratista realizará la interventoría integral de ocho (8) contratos clasificados en Contratos Tipo A: Contrato de rehabilitación mayor; Contratos Tipo B, Contrato de suministro y obra menor; Contratos Tipo C: Contrato de rehabilitación mayor con estrategia de aseguramiento y sostenibilidad: y Tipo D. Contrato de rehabilitación menor, con los siguientes objetos y valores.

4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

En el siguiente cuadro se relaciona el valor del contrato conforme se estipula en la sexta clausula;

Componente	PGN 2023	Total
PROYECTOS Y GESTIÓN DEL DESARROLLO S.A.S El valor del contrato es por la suma de hasta SEIS MIL SETECIENTOS QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 6.715.000.000) incluidos IVA y todos los costos y gastos en	$ 6.715.000.000	$ 6.715.000.000

Componente	PGN 2023	Total
que debe incurrir el futuro CONTRATISTA para el cumplimiento de sus obligaciones, y los demás tributos que cause dicho contrato, independientemente de la denominación que asuman o del nivel territorial del que provengan para lo cual se afectará el certificado de disponibilidad presupuestal 94124 del 06 de febrero de 2024		
Totales	$ 6.715.000.000	$ 6.715.000.000
%Participación	100%	100%

Según especificación del alcance del contrato No. 631-2024 en su cláusula segunda, en el cual la interventoría debe realizar los procesos y actividades para el control y seguimiento del estado financiero de cada contrato vigilado: *"Gestión Financiera: El INTERVENTOR deberá realizar los procesos y actividades relacionadas con el control y seguimiento del estado financiero de cada Contrato Vigilado e Interventoría, llevando el control y seguimiento de la buena inversión del anticipo, las aprobaciones de la propuesta de intervención, los pagos por concepto de avance de obra o cumplimiento de hitos, las amortizaciones, las retenciones aplicables, entre otros",* a continuación se relaciona la información financiera de cada contrato con acta de inicio;

No.	Numero de Contrato	CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	FECHA ACTA DE INICIO
1	CONTRATO No 632 DE 2024	VEOLIA AGUAS DE LA GUAJIRA S.A.S E.S.P.,	$12.000.000.000	28/02/2024
2	CONTRATO No 605 DE 2024	WORLD VISION INTERNATIONAL - VISION MUNDIAL INTERNACIONAL	$ 6.900.000.000	27/02/2024
3	CONTRATO No 656 DE 2024	FUNDACIÓN CADENA COLOMBIA	$7.400.000.000	18/03/2024
4	CONTRATO No 600 DE 2024	SECRETARIADO DE PASTORAL SOCIAL RIOHACHA	$7.000.000.000	27/02/2024

5	CONTRATO No 706 de 2024	FUNDACION SAVE THE CHILDREN COLOMBIA	$3.7000.000.00	29/04/2024
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN No 615 DE 2024	ENCINA S.A.S.	$23.000.000.000	11/03/2024
7	CONTRATO No 608 DE 2024	FLESHMAN CONSTRUCTORES	$173.000.000	27/02/2024
			$56.473.000.000	

4.1. Disponibilidad Presupuestal contrato de Interventoría.

No. Resolución de asignación y fecha:	
Valor de Asignación Nación:	$ 6.715.000.000,00
No. Certificado Disponibilidad Presupuestal y Fecha:	94124 del 06 de febrero de 2024.
Cuenta independiente y exclusiva, inembargable y exenta de gravámenes tributarios	09878245175 – Cuenta corriente
Nombre entidad bancaria:	Bancolombia
Titular de la cuenta:	Proyectos y gestión del desarrollo SAS.

4.2. Desembolsos Realizados a la cuenta bancaria:

4.2.1. VEOLIA AGUAS DE LA GUAJIRA S.A.S E.S.P (Contrato No 632 DE 2024)

No.	CONCEPTO	FECHA SOLICITUD DESEMBOLSO	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR
1	Anticipo equivalente al 20% del valor del contrato No. 632-2024– Clausula Séptima	08/04/2024	10/05/2024	$ 2.400.000.000

4.2.2. WORLD VISION INTERNATIONAL - VISION MUNDIAL INTERNACIONAL(Contrato No 605 DE 2024)

No.	CONCEPTO	FECHA SOLICITUD DESEMBOLSO	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR

1	Anticipo equivalente al 20% del valor del contrato No. 605-2024– Clausula Séptima	22/05/2024	12/06/2024	$ 1.380.000.000

4.2.3. FUNDACIÓN CADENA COLOMBIA (Contrato No 656 DE 2024)

No.	CONCEPTO	FECHA SOLICITUD DESEMBOLSO	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR
1	Anticipo equivalente al 20% del valor del contrato No. 656-2024– Clausula Séptima	08/04/2024	17/05/2024	$ 1.480.000.000

4.2.4. SECRETARIADO DE PASTORAL SOCIAL RIOHACHA (Contrato No 600 DE 2024)

No.	CONCEPTO	FECHA SOLICITUD DESEMBOLSO	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR
1	Anticipo equivalente al 20% del valor del contrato No. 600-2024– Clausula Séptima	12/03/2024	30/04/2024	$ 1.400.000.000

4.2.5. FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN COLOMBIA (Contrato No 706 de 2024)

No.	CONCEPTO	FECHA SOLICITUD DESEMBOLSO	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR
1	Anticipo equivalente al 20% del valor del contrato No. 706-2024– Clausula Séptima	07/06/2024	30/07/2024	$ 740.000.000

4.2.6. ENCINA S.A.S. (Contrato No 615 DE 2024)

No.	CONCEPTO	FECHA SOLICITUD DESEMBOLSO	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR

1	Anticipo equivalente al 30% del valor del contrato No. 615-2024– Clausula Séptima	08/04/2024	10/05/2024	$ 6.900.000.000

5. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

5.1.1. FLESHMAN CONSTRUCTORES (Contrato No 608 DE 2024)


El 24 de mayo de 2024 se suscribió entre el**Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio** y **Fleshman Constructores,** el Otrosí No. 1 al Contrato de obra No. 608- 2024, mediante el cual se modificaron las Cláusulas PRIMERA y SEGUNDA del mismo, mediante el cual para la PRIMERA CLÁUSULA se adicionó 45 días del 26 de mayo 2024 al 10 de julio 2024 al plazo inicialmente pactado que correspondió del 27 de febrero 2024 al 26 de mayo 2024 y en la SEGUNDA CLÁUSULA se formalizó las obras ejecutadas en la comunidad de Amuchichon del corregimiento de Yotojorochi, municipio de Maicao con el mismo alcance contractual:

1. Suministro e instalación de tanque plástico de 5 m3. Incluye base, 12.25m2, placa en concreto reforzado, accesorios para entrada de agua en tubería PVC. PRS 1” de diámetro, válvula de flotador y cerramiento de la estructura metálica y cubierta.
2. Suministro e instalación tubería PEAD2” PN10, para suministro de agua e Incluye excavación y lleno.
3. Suministro e instalación accesorios para acople de tubería PEAD2”.
4. Suministro e instalación válvula de cortina de 2”.
5. Suministro e instalación ventosa D = ½“f, incluye válvula de corte y accesorios.
6. Caja de Inspección en concreto.

Y para la comunidad de Ayana'ajirawaa del municipio de Uribia cambio de actividades como:

1. Suministro e instalación de tanque en Fibra de vidrio -PRFV de capacidad de 25000 litros, incluye accesorios de conexión y de aireación.
2. Construcción de obras para la adecuación y mejoramiento de la cimentación base soporte del tanque.

6. MAPA DE ASIGNACIONES A CONTRATISTAS

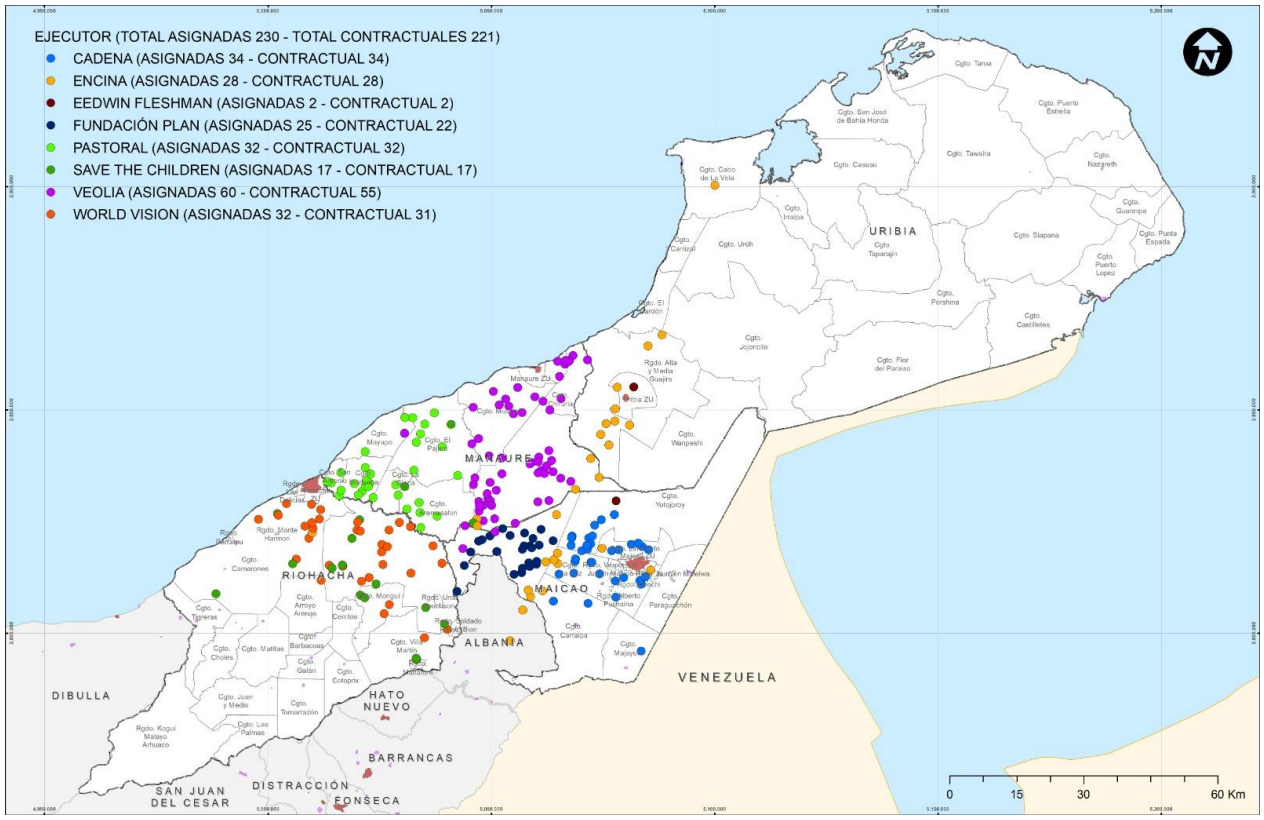

7. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

En virtud de la cláusula tercera del contrato No.631-2024, respecto a las obligaciones técnicas de la interventoría, ítem 3.2.1, numeral 24, en el cual refiere establecer el avance y resultados de las actividades ejecutadas por cada contratista en el desarrollo de las actividades, y tal como consta en el informe de interventoría del mes de agosto, en el siguiente cuadro se relacionan los avances por cada contrato: (ANEXO 2)

CONTRATOS DIRECTOS	PROGRAMADO	EJECUTADO
VEOLIA **(Contrato No 632 DE 2024)**	71,79%	9,09%
WORLD VISION (Contrato No 605 DE 2024)	60,76%	15,33%
FUNDACIÓN CADENA (Contrato No 656 DE 2024)	70,25%	9,99%
PASTORAL SOCIAL (Contrato No 600 DE 2024)	46,58%	12,50%
SAVE THE CHILDREN (Contrato No 706 de 2024)	14,17%	9,93%
ENCINA S.A.S. (Contrato No 615 DE 2024)	71,95%	13,50%
FUNDACIÓN PLAN	0,00%	0,00%
FLESHMAN CONSTRUCTORES (Contrato No 608 DE 2024)	100,00%	100,00%



En el análisis del comportamiento de los contratos directos en los que la interventoría P&G ha realizado control y seguimiento a los contratistas muestran las siguientes tendencias:

VEOLIA: Se observa un avance significativo de 9,09% con respecto al mes anterior de 7,87% tal como consta en los informes de avance semanales presentados por el

contratista; Se han cuyos soportes se encuentran el repositorio del Ministerio; No obstante en el avance ejecutado respecto al programado; No obstante en el avance ejecutado respecto al programado, se observa una desviación considerable, debito a los retrasos generados por parte del contratista en la entrada de materiales a obras, logística interna, como también efectos externos como condiciones climáticas por precipitación de lluvias en la zona, dificultad de acceso en a la obra, entre otras Según alcance presupuestal, estudio del mercado y cotizaciones, el contratista informa a través de la interventoría P&G, realizar menor cantidad de rehabilitaciones de las asignadas presentado un nuevo indicador de 35 unidades.

En proceso se tiene 21 diagnósticos, de los cuales se han aprobado 16 propuestas económicas y en ejecución 4 rehabilitaciones iniciadas los días 5, 13 y 29 de agosto

WORLD VISION: Respecto al mes anterior de 12,56% se observa un avance significativo de 15,33% tal como consta en los informes de avance semanales presentados por el contratista; Se mantienen las 30 visitas de entrada de las 31 asignadas al contratista con sus respectivos levantamientos sociales, se cuenta con 30 levantamientos técnicos, 24 pruebas de bombeo con sus respectivas caracterizaciones de agua cuyos soportes se encuentran el repositorio del Ministerio; No obstante en el avance ejecutado respecto al programado, se observa una desviación considerable, debito a los retrasos generados por parte del contratista en la entrada de materiales a obras, logística interna, como también efectos externos como condiciones climáticas por precipitación de lluvias en la zona, dificultad de acceso en a la obra, entre otras.

Según alcance presupuestal, estudio del mercado y cotizaciones, el contratista informa a través de la interventoría P&G, realizar menor cantidad de rehabilitaciones de las asignadas presentado un nuevo indicador de 22 unidades.

En proceso se tiene 21 diagnósticos, de los cuales se han aprobado 7 propuestas económicas y en ejecución 4 rehabilitaciones.

FUNDACIÓN CADENA: Respecto al mes anterior de 8,47% se observa un avance leve de 9,99% tal como consta en los informes de avance semanales presentados por el contratista; e mantienen las 30 visitas de entrada de las 34 asignadas al contratista con sus respectivos levantamientos sociales y levantamientos técnicos, 15 pruebas de bombeo y 17 caracterizaciones de agua cuyos soportes se encuentran en el repositorio del ministerio; No obstante en el avance ejecutado respecto al programado, se observa una desviación considerable, debito a los retrasos generados por parte del contratista en la entrada de materiales a obras, logística interna, como también efectos externos como condiciones climáticas por precipitación de lluvias en la zona, dificultad de acceso en a la obra, entre otras.

Según alcance presupuestal, estudio del mercado y cotizaciones, el contratista informa a través de la interventoría P&G, realizar menor cantidad de rehabilitaciones de las asignadas presentado un nuevo indicador de 22 unidades.

La interventoría emite presunto incumplimiento por parte del contratista debido a los atrasos presentados en las entregas de los diagnósticos, propuestas y por consiguiente inicio de rehabilitaciones.

En proceso se tiene 14 diagnósticos, de los cuales se han aprobado 3 propuestas económicas y en ejecución 3 rehabilitaciones

SECRETARIADO DE PASTORAL: Se observa un avance significativo de 12,50% con respecto al mes anterior de 9,21% tal como consta en los informes de avance semanales presentados por el contratista; se han realizado 25 visitas de entrada de las 32 asignadas con 24 levantamientos sociales, 21 levantamientos técnicos,19 pruebas de bombeo y 21 caracterizaciones de agua cuyo soporte se encuentra en el repositorio del ministerio; No obstante en el avance ejecutado respecto al programado, se observa una desviación considerable, debito a los retrasos generados por parte del contratista en la entrada de materiales a obras, logística interna, como también efectos externos como condiciones climáticas por precipitación de lluvias en la zona, dificultad de acceso en a la obra, entre otras.

Según alcance presupuestal, estudio del mercado y cotizaciones, el contratista informa a través de la interventoría P&G, realizar menor cantidad de rehabilitaciones de las asignadas presentado un nuevo indicador de 22 unidades.

En proceso se tiene 16 diagnósticos, de los cuales se han aprobado 12 propuestas económicas y en ejecución 6 rehabilitaciones

SAVE THE CHILDREN: Respecto al mes anterior de 8,91% se observa un avance leve de 9,93% tal como consta en los informes de avance semanales presentados por el contratista; Se han realizado 17 visitas de entrada de las 17 asignadas al contratista con sus respectivos levantamientos sociales y levantamientos técnicos, 13 pruebas de bombeo con sus respectivas caracterizaciones de agua cuyos soportes se encuentran en el repositorio del Ministerio; No obstante en el avance ejecutado respecto al programado, se observa una desviación considerable, debito a los retrasos generados por parte del contratista en la entrada de materiales a obras, logística interna, como también efectos externos como condiciones climáticas por precipitación de lluvias en la zona, dificultad de acceso en a la obra, entre otras.

Según alcance presupuestal, estudio del mercado y cotizaciones, el contratista informa a través de la interventoría P&G, realizar menor cantidad de rehabilitaciones de las asignadas presentado un nuevo indicador de 13 unidades.

La interventoría emite presunto incumplimiento por parte del contratista debido a los atrasos presentados en las entregas de los diagnósticos, propuestas y por consiguiente inicio de rehabilitaciones.


En proceso se tiene 9 diagnósticos con sus respectivas propuestas económicas, en proceso de aprobación de 1 propuesta y en espera de presentación de 3

ENCINA: Se evidencia un avance de 13,50% respecto al mes anterior de 12,05%,

Debido a la verificación encontrada en campo respecto a las bajas conductividades y baja población de las infraestructuras asignadas al contratista, se realiza gestión de cambios y se espera 3 propuestas económicas para revisión y aval por parte de Interventoría y socialización al Ministerio.

FUNDACIÓN PLAN: Se encuentra en etapa precontractual y por tanto se observa los avances en 0,00%.

FLESHMAN: se ha llegado al 100% de las actividades conforme al alcance descrito en el Contrato 608-2024 y Otrosi No. 1, dado a las finalizaciones de las obras complementarias para las comunidades AMUCHICHON/YOTOJOROCHI y GUARERAPO #3/AYANA'AJIRAWAA.

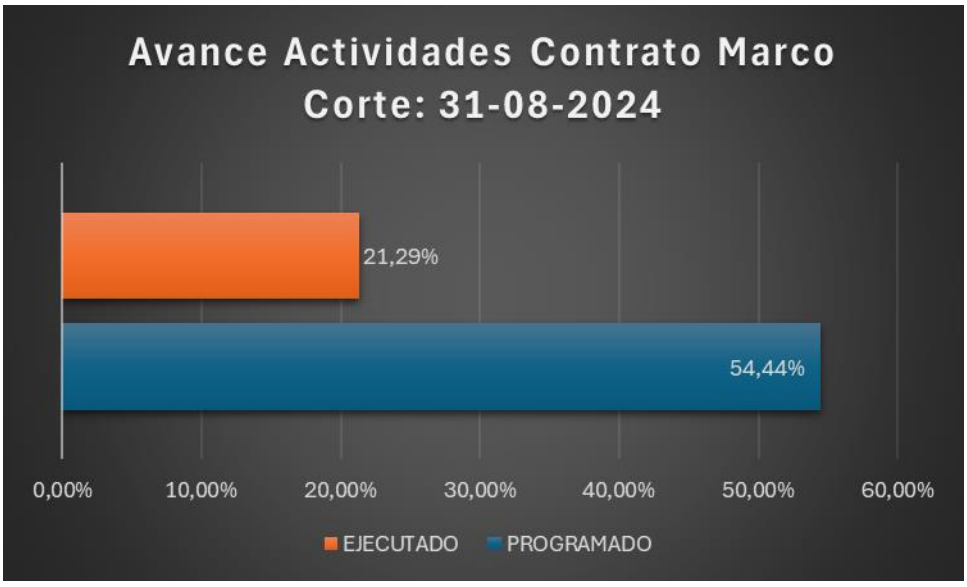


Después de un análisis del desempeño en la ejecución de los contratos que incluyen un total de 221 intervenciones bajo la supervisión de la interventoría P&G, tal como se especifica en el contrato 631 de 2024, se ha observado un avance leve, que ha pasado del 19,88 % en el mes de junio al 21,29 % en este mes agosto. Este bajo incremento se debe a las demoras de entrega de propuestas económicas, la no

intervención de algunas comunidades debido al balance presupuestal requerido para determinar la cantidad real de rehabilitaciones a ejecutar, demoras en el inicio de las obras de rehabilitación de las propuestas aprobadas y bajo rendimiento en las obras en ejecución.

8. Avances y/u observaciones

CONCEPTO/OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
1. Presentación supervisión En mi calidad de supervisora del CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 631 DE 2024 **EL MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y PROYECTOS Y GESTIÓN DEL DESARROLLO S.A.S.**, con el objeto de: "*Interventoría Integral a los Contratos de Obra y/o conexos que suscriba el MVCT, encaminados a Atender el Plan Provisional y Estado de Emergencia Económica, Social, y Ecológica en el Departamento de la Guajira y la Extensión de sus Defectos.",* me permito presentar el siguiente informe de actividades realizadas desde la supervisión del Contrato en mención para el periodo comprendido entre el 01 de agosto al 31 de agosto de 2024. Las siguientes actividades del mes se realizan bajo el componente administrativo conforme se estipula en la cláusula primera del contrato de interventoría No. 631; **"**El INTERVENTOR deberá realizar los procesos y actividades para la coordinación de la gestión administrativa en desarrollo de la ejecución de los Contratos vigilados y del Contrato de Interventoría. El INTERVENTOR deberá establecer un sistema de comunicación eficiente con el CONTRATISTA y la SUPERVISIÓN del MVCT para la entrega y archivo de información de forma oportuna y organizada, la digitalización de correspondencia y documentación del proyecto, la recepción y verificación de informes, entre otros" **2. Avances mes de agosto de 2024** **El 10 de agosto de 2024** Como requisito al alcance financiero y conforme en lo estipulado en la Cláusula segunda del contrato de interventoría No 631-2024, ítem **Gestión Financiera** en el que describe: *"El INTERVENTOR deberá realizar los procesos y actividades relacionadas con el control y seguimiento del estado financiero de cada Contrato Vigilado e Interventoría, llevando el control y seguimiento de la buena inversión del anticipo, las aprobaciones de la propuesta de intervención, los pagos por concepto de avance de obra o cumplimiento",* se gestiona y solicita a la interventoría aspectos financieros para el proceso de cuentas de cobro de los contratista:

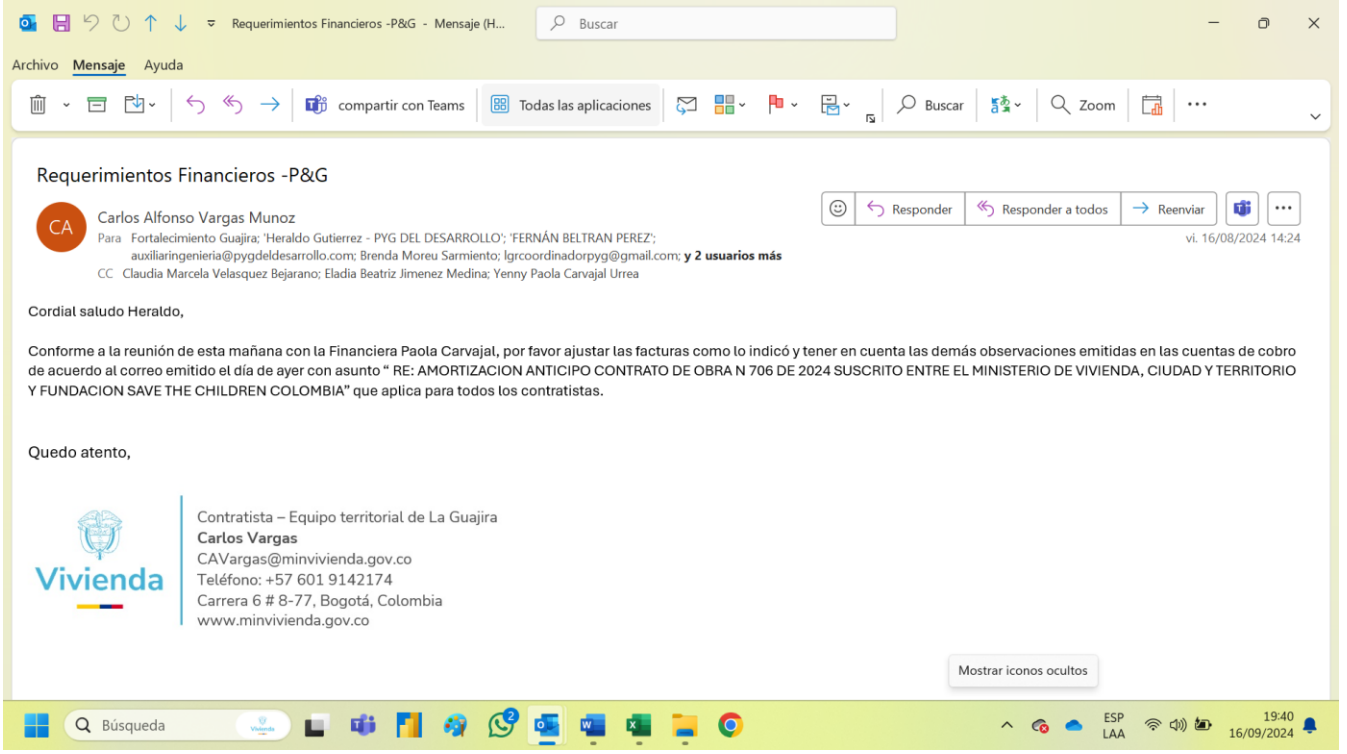

El 01, 15 y 29 de agosto de 2024: En atención a la cláusula OCTAVA. **- SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EJECUCIÓN** "La vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones a cargo de EL INTERVENTOR será ejercida por un **SUPERVISOR designado por el Ordenador del Gasto, quién será responsable de efectuar el seguimiento a la correcta ejecución del contrato**, aprobar los pagos, los informes que presente el INTERVENTOR, proyectar el acta de liquidación definitiva del contrato y en general cumplir con lo previsto en el Manual de Contratación y el Manual de Supervisión e INTERVENTOR del MVCT así como lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y demás normas que regulan la materia, así como lo indicado en los estudios previos y demás documentos que hacen parte integral del presente proceso**"** y cláusula TERCERA del Contrato, del ítem 3.1 "Obligaciones generales", numeral 26 en el que se establece participar a través del representante legal o director en los comités de seguimiento, se realizaron los comités de seguimiento como control y seguimiento de avance del contrato de interventoría 631-2024 (ANEXO3)

Comité 01/08/2024

Compromiso	**Responsable**	**Fecha de ejecución**
Realizar visita a obras en ejecución del contratista World Visión, Pastoral Social y Veolia	Proyectos y Gestión del Desarrollo SAS y MVCT	Próxima semana

Entrega y presentación de propuestas de intervención	Proyectos y Gestión del Desarrollo SAS	Próxima semana
Solicitar plan de contingencia para entrega de todas las propuestas de intervención de cada contratista a corte 15 de agosto	Proyectos y Gestión del Desarrollo SAS	Próxima semana
Aprobación de diagnósticos de los contratistas Save The Children y Cadena	Proyectos y Gestión del Desarrollo SAS	Próxima semana
Presentación de acciones administrativas contra Save The Children y Cadena	Proyectos y Gestión del Desarrollo SAS	Próxima semana
Revisión de los diseños de Yotojoroin (Encina)	Proyectos y Gestión del Desarrollo SAS	Próxima semana
Cargue de información de diagnósticos y propuestas en el link enviado por el MVCT	Proyectos y Gestión del Desarrollo SAS	Próxima semana
Emitir antes de la socialización de las propuestas de la presentación, los diagnósticos para revisión previa de los profesionales Social y Aseguramiento del MVCT	Proyectos y Gestión del Desarrollo SAS	Permanente
En la socialización de las propuestas en las presentaciones, Incluir en el cronograma los tiempos a partir de la socialización	Proyectos y Gestión del Desarrollo SAS	Permanente
Actualización de resultados IRCA (Link pozos) por parte del coordinador Cadena y Save The Children.	Proyectos y Gestión del Desarrollo SAS	Próxima semana

Comité 15/08/2024


MATRIZ DE COMPROMISOS		
Compromiso	**Responsable**	**Fecha de ejecución**
Enviar informe a ministerio de la situación presentada en la comunidad de Campamana de Veolia	Proyectos y gestión del desarrollo SAS	Próxima semana
Subir diagnostico aprobado a drive	Proyectos y gestión del desarrollo SAS	15/08/2024
Llenar los datos del drive IRCA	Proyectos y gestión del desarrollo SAS	15/08/2024
Entrega de informe mensual	Proyectos y gestión del desarrollo SAS	16/08/2024
Fichas. actas y formatos de inspección Pastoral, World Visión y Veolia	Proyectos y gestión del desarrollo SAS	Próxima semana

Comité 29/08/2024

MATRIZ DE COMPROMISOS		
Compromiso	**Responsable**	**Fecha de ejecución**
Cuadro de Excel con la trazabilidad de las comunicaciones entre los contratistas Save The Children, Fundación Cadena y la interventoría.	Proyectos y Gestión del Desarrollo SAS	30/08/24
Verificar la correspondencia para confirmar la fecha de la visita de la Contraloría y coordinar con los contratistas para asegurar que todas las obras aprobadas estén en ejecución al momento de la visita.	MVCT	30/08/24
Revisar y confirmar las comunidades que no podrán ser intervenidas debido a problemas técnicos o alcances presupuestales.	Proyectos y Gestión del Desarrollo SAS	10/09/24
Listado de comunidades en ejecución y en etapa de diagnóstico, comunidades con las cuales no se han realizado acercamiento para que en conjunto con la parte social del ministerio indiquen cueles se deben priorizar.	Proyectos y Gestión del Desarrollo SAS	03/09/24
Organizar una reunión con los profesionales sociales para definir la priorización de las comunidades y garantizar que se cumplan los compromisos del Ministerio.	MVCT	A definir
Suministrar ficha técnica de colores a implementar en acabados de las intervenciones	MVCT	05/09/24
Presentar documentación para cuentas de cobro para su revisión antes de generar la factura.	Proyectos y Gestión del Desarrollo SAS	Primera semana de septiembre
Formato de Aprobaciones P&G firmados Faltantes	Proyectos y Gestión del Desarrollo SAS	05/09/24
Pendiente Cargue de propuestas y diagnósticos aprobados en el link suministrado por el MVCT	Proyectos y Gestión del Desarrollo SAS	05/09/24
Pendiente actualización transcripción de pruebas del agua en el cuadro de Excel (link información de Pozos) de acuerdo a los reportes emitidos por el laboratorio de cada uno de los contratistas.	Proyectos y Gestión del Desarrollo SAS	05/09/24
Pendiente entrega de los formatos; Ficha resumen de sistemas de agua rehabilitados en la guajira- GPA-F-35; Acta de Terminación GPA-F-34 y Acta de Entrega GPA-	Proyectos y Gestión del Desarrollo SAS	05/09/24


F-33, de las rehabilitaciones próximas a finalizar por parte de Pastoral y Veolia		
Revisión y verificación por parte de P&G del ejercicio de revisión de lista de precios de acuerdo con los topes de las propuestas y diagnósticos aprobados de acuerdo en la descripción del contrato 631-2024	Proyectos y Gestión del Desarrollo SAS	05/09/24

El 05 y 30 de agosto: De conformidad con lo establecido en el contrato de interventoría No 631-2024, en el numeral 2, en el componente "*Además de las obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del objeto del contrato, la INTERVENTORIA se obliga a*", ítem 3.2.1 Obligaciones Técnica, de la cláusula tercera correspondiente a las obligaciones del contratista, en el cual refiere "*Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el (los) supervisor(es), atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen*.", se requirió y gestionó mediante el correo institucional a P&G observaciones a las actas de comité para la debida suscripción.

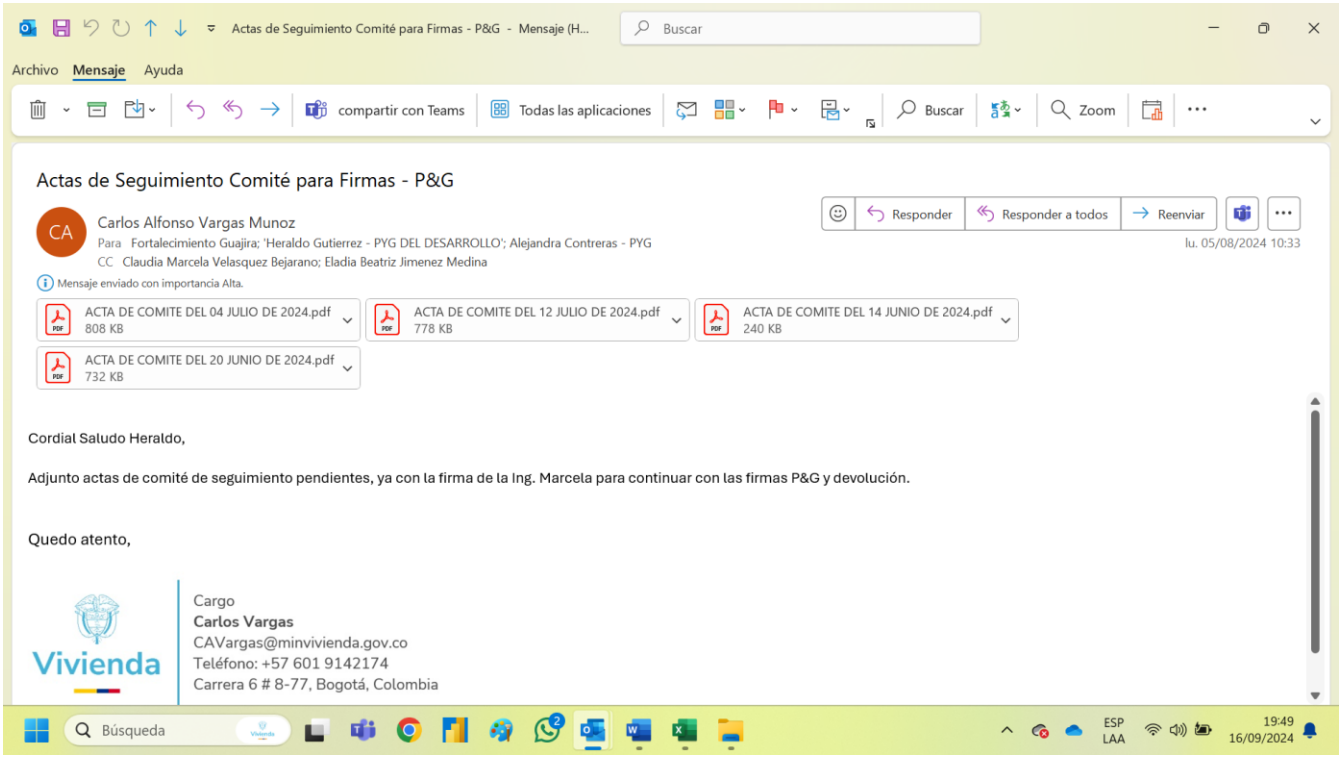



El 30 de agosto: en el marco de la tercera cláusula del contrato, numeral 3.2.1 Obligaciones técnicas, ítem 14: "*Asesorar y suministrar la información que requieran el MVCT, el Supervisor designado o las Entidades de control de manera oportuna*", mediante


correo electrónico se gestiona y solicita a P&G los cargues a la Plataforma SIGEVAS de cada uno de los contratos de seguimiento y control

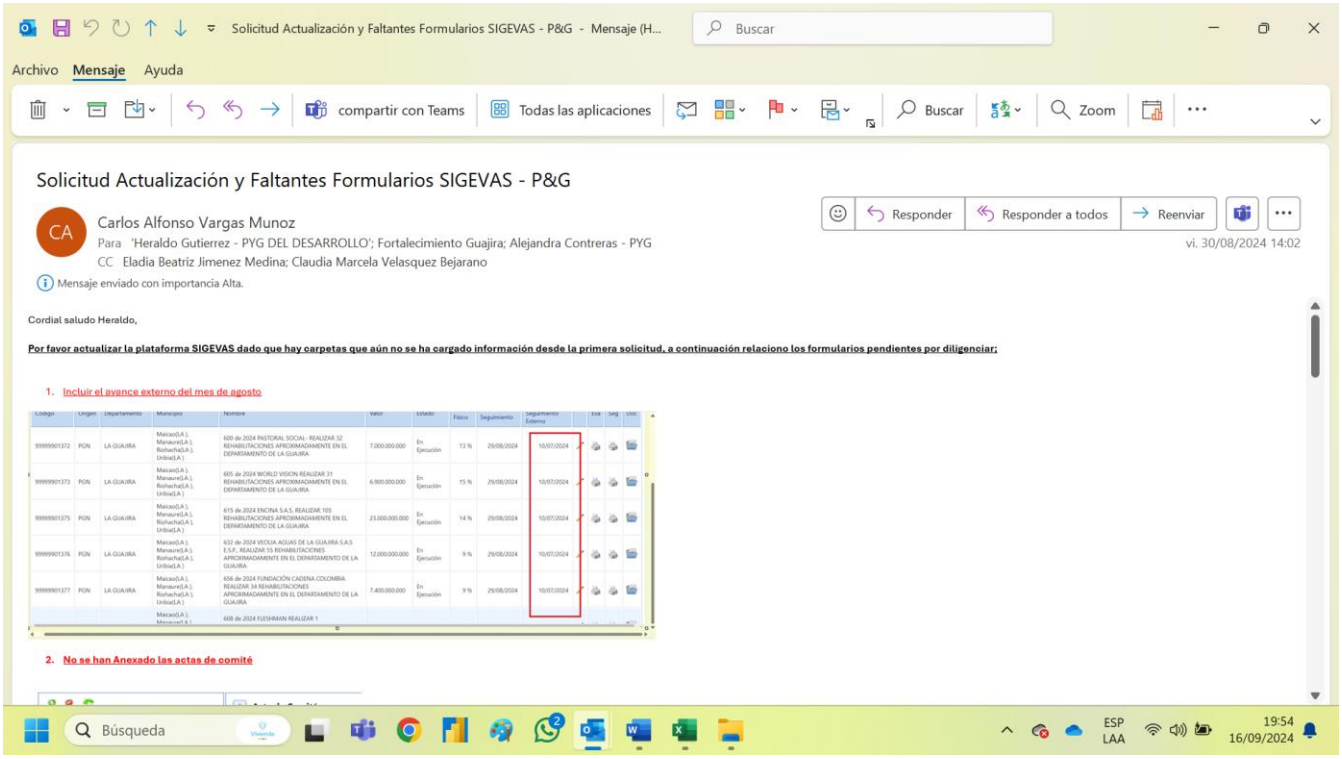


El 09, 10 y 13 de agosto: En aras del cumplimiento estipulado en la séptima cláusula del contrato de interventoría, en lo concerniente a solicitudes del área financiera como reza lo siguiente*: "Para gestionar la cuenta de cobro, el INTERVENTOR deberá remitir al MVCT la documentación definida por la subdirección financiera del MVCT para generar dicho trámite"; se recibió, solicito ajustes, tramitó, gestionó* y entrego las cuentas de cobro de la interventoría P&G, Veolia, Pastoral, World Vision y Encina.

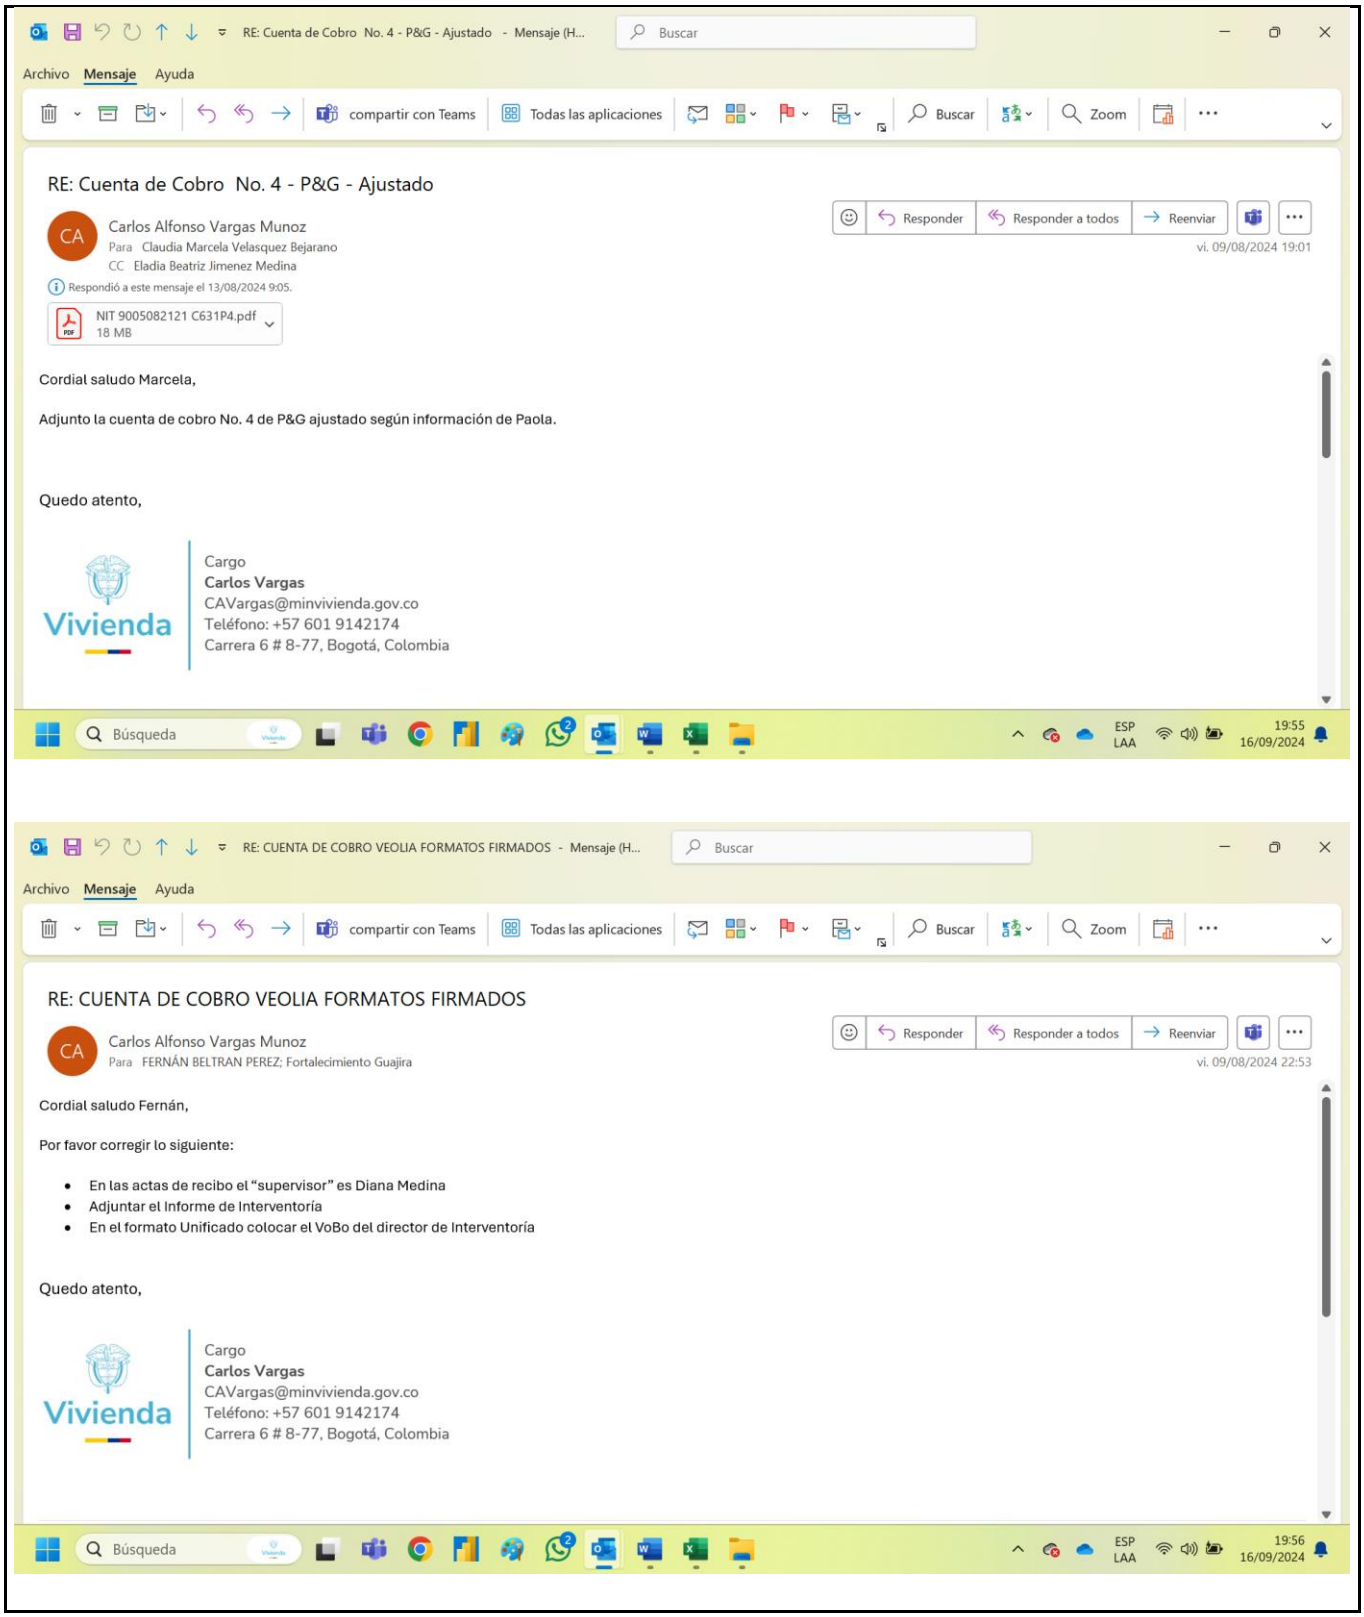
RE: Cuenta de Cobro No. 4 - P&G - Ajustado - Mensaje (H...
Buscar
Archivo Mensaje Ayuda
compartir con Teams
Todas las aplicaciones
Buscar
Zoom
RE: Cuenta de Cobro No. 4 - P&G - Ajustado
Carlos Alfonso Vargas Munoz
Para Claudia Marcela Velasquez Bejarano
CC Eladia Beatriz Jimenez Medina
Respondió a este mensaje el 13/08/2024 9:05.
NIT 9005082121 C631P4.pdf
18 MB
Responder
Responder a todos
Reenviar
vi. 09/08/2024 19:01
Cordial saludo Marcela,
Adjunto la cuenta de cobro No. 4 de P&G ajustado según información de Paola.
Quedo atento,
Cargo
Carlos Vargas
CAVargas@minvivienda.gov.co
Teléfono: +57 601 9142174
Carrera 6 # 8-77, Bogotá, Colombia
Búsqueda
ESP
LAA
19:55
16/09/2024
RE: CUENTA DE COBRO VEOLIA FORMATOS FIRMADOS - Mensaje (H...
Buscar
Archivo Mensaje Ayuda
compartir con Teams
Todas las aplicaciones
Buscar
Zoom
RE: CUENTA DE COBRO VEOLIA FORMATOS FIRMADOS
Carlos Alfonso Vargas Munoz
Para FERNÁN BELTRAN PEREZ; Fortalecimiento Guajira
Responder
Responder a todos
Reenviar
vi. 09/08/2024 22:53
Cordial saludo Fernán,
Por favor corregir lo siguiente:
En las actas de recibo el "supervisor" es Diana Medina
Adjuntar el Informe de Interventoría
En el formato Unificado colocar el VoBo del director de Interventoría
Quedo atento,
Cargo
Carlos Vargas
CAVargas@minvivienda.gov.co
Teléfono: +57 601 9142174
Carrera 6 # 8-77, Bogotá, Colombia
Búsqueda
ESP
LAA
19:56
16/09/2024

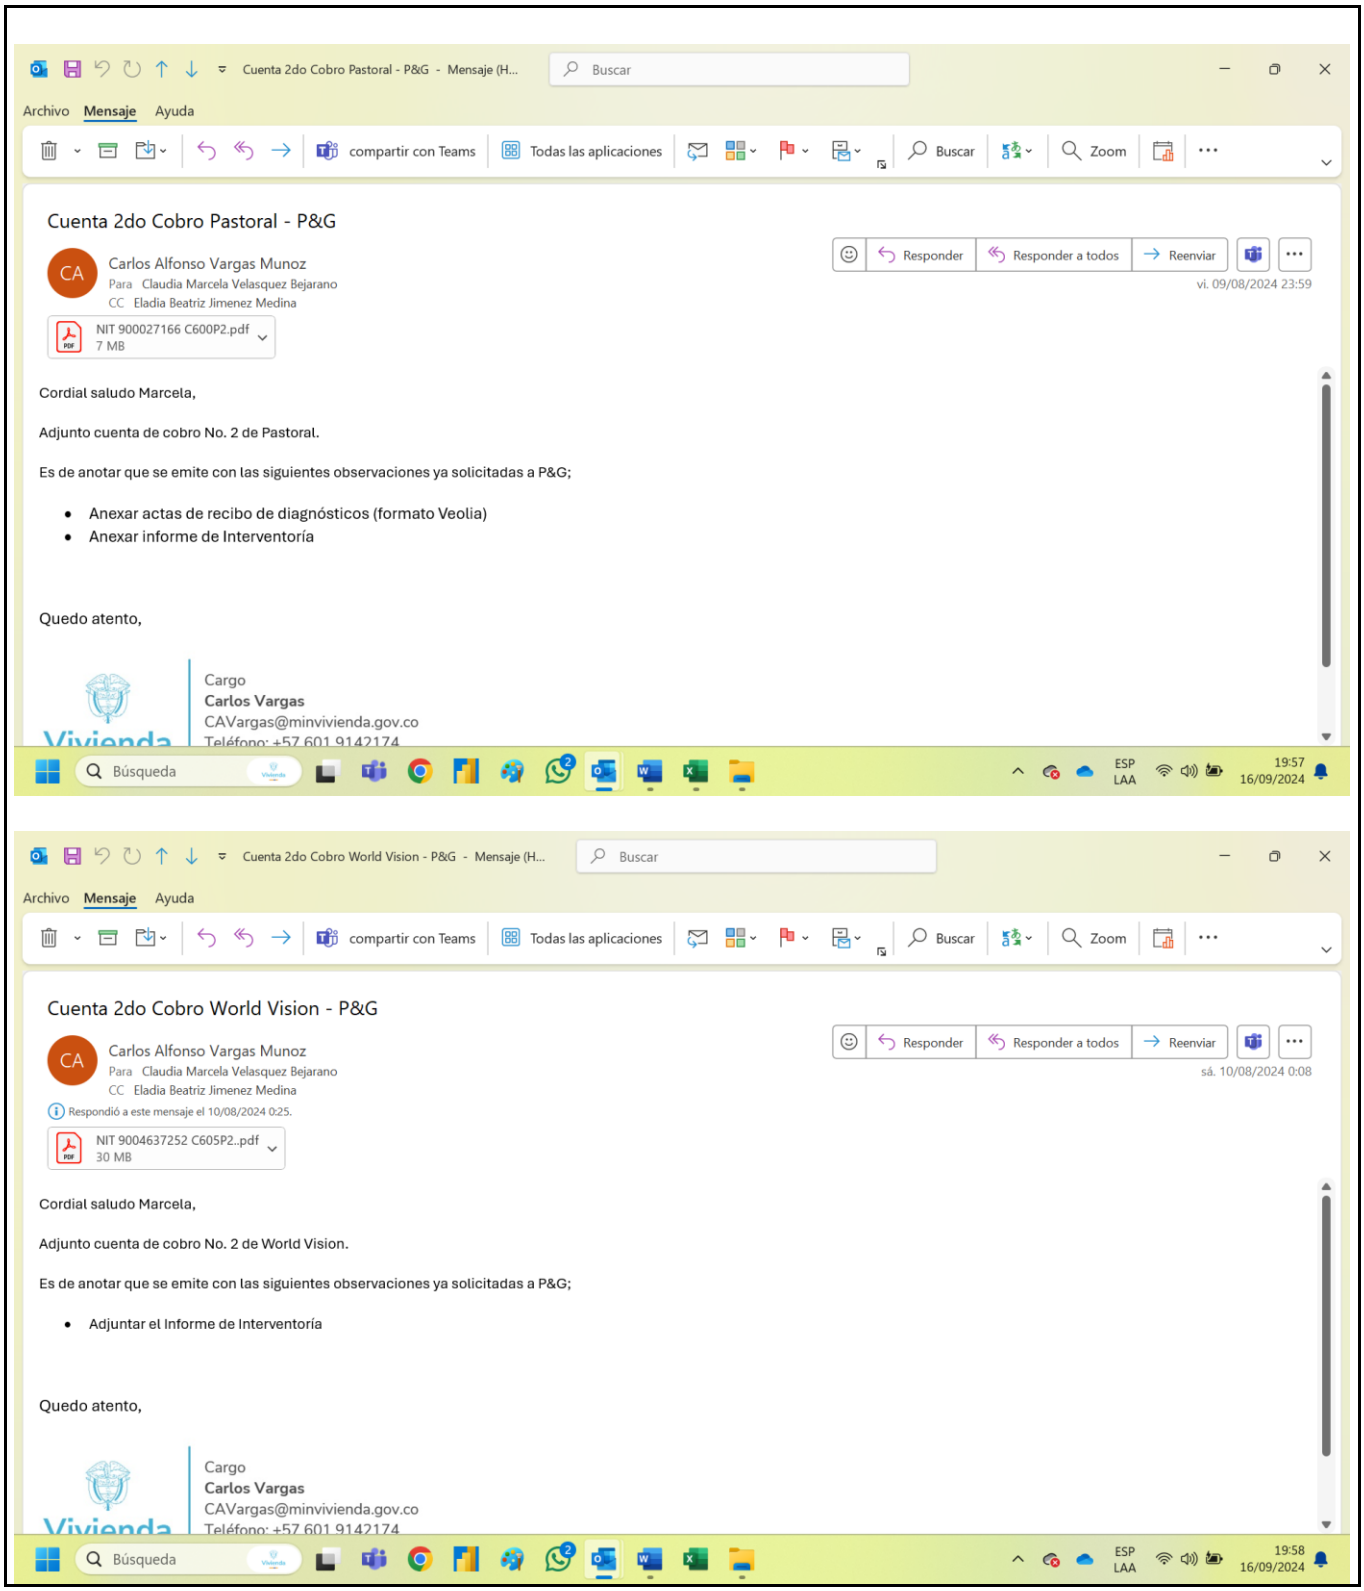
Cuenta 2do Cobro Pastoral - P&G - Mensaje (H...
Buscar
Archivo Mensaje Ayuda
compartir con Teams
Todas las aplicaciones
Buscar
Zoom
Cuenta 2do Cobro Pastoral - P&G
CA
Carlos Alfonso Vargas Munoz
Para Claudia Marcela Velasquez Bejarano
CC Eladia Beatriz Jimenez Medina
Responder
Responder a todos
Reenviar
vi. 09/08/2024 23:59
NIT 900027166 C600P2.pdf
7 MB
Cordial saludo Marcela,
Adjunto cuenta de cobro No. 2 de Pastoral.
Es de anotar que se emite con las siguientes observaciones ya solicitadas a P&G;
Anexar actas de recibo de diagnósticos (formato Veolia)
Anexar informe de Interventoría
Quedo atento,
Cargo
Carlos Vargas
CAVargas@minvivienda.gov.co
Teléfono: +57 601 9142174
Búsqueda
ESP
LAA
19:57
16/09/2024
Cuenta 2do Cobro World Vision - P&G - Mensaje (H...
Buscar
Archivo Mensaje Ayuda
compartir con Teams
Todas las aplicaciones
Buscar
Zoom
Cuenta 2do Cobro World Vision - P&G
CA
Carlos Alfonso Vargas Munoz
Para Claudia Marcela Velasquez Bejarano
CC Eladia Beatriz Jimenez Medina
Responder
Responder a todos
Reenviar
sá. 10/08/2024 0:08
Respondió a este mensaje el 10/08/2024 0:25.
NIT 9004637252 C605P2..pdf
30 MB
Cordial saludo Marcela,
Adjunto cuenta de cobro No. 2 de World Vision.
Es de anotar que se emite con las siguientes observaciones ya solicitadas a P&G;
Adjuntar el Informe de Interventoría
Quedo atento,
Cargo
Carlos Vargas
CAVargas@minvivienda.gov.co
Teléfono: +57 601 9142174
Búsqueda
ESP
LAA
19:58
16/09/2024

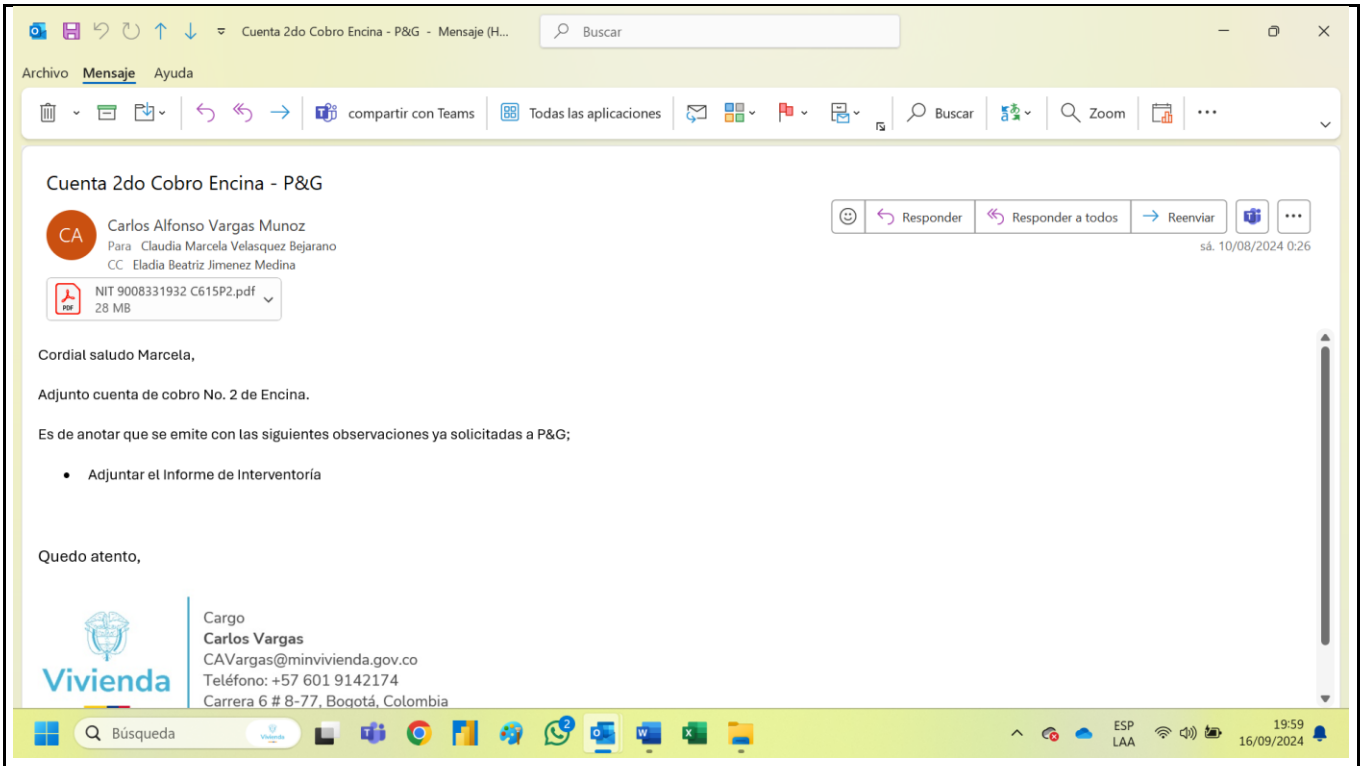

El 12 de agosto: en el marco de la tercera cláusula del contrato, numeral 3.2.1 Obligaciones técnicas, componente "*Además de las obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del objeto del contrato, la INTERVENTORIA se obliga a*", ítem 45: "*Servir de conducto regular entre el MVCT y los contratistas en todo lo que respecta al desarrollo de las actividades de los contratos objeto de interventoría*", mediante correo electrónico se solicita a interventoría las propuesta y los formatos de probación generadas a la fecha.

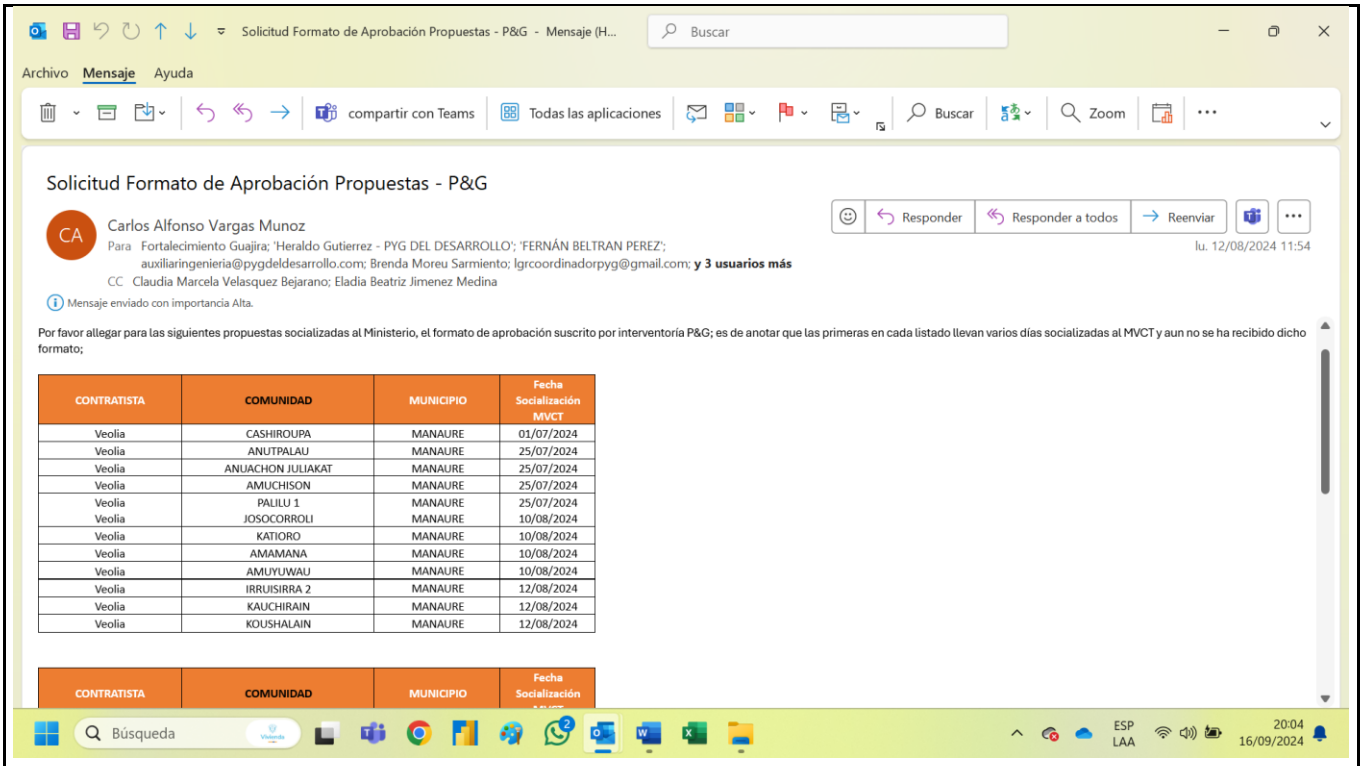

El 01, 13, 14, 21 de agosto: en Aras del cumplimiento de la tercera cláusula del contrato "Obligaciones del contratista"*, ítem 3.2.2.4.* Obligaciones Sociales, Numeral 5; "Asegurar *el acompañamiento social durante la ejecución del contrato, con el fin de atender inquietudes de las comunidades y actores institucionales asociados al desarrollo del mismo y medición de impactos*"; se continua con visitas de socialización y concertación de rehabilitaciones aprobadas con el fin de iniciar con la ejecución de las obras.


- **Acompañamiento Social y Aseguramiento**


Dentro del proceso de las visitas realizadas por el contratista, se realiza el respectivo ***acompañamiento de los profesionales sociales y aseguramiento*** *esquematizado en el protocolo de relacionamiento entre contratista y Ministerio: (a) socialización inicial reconocimiento y validación, (b) acompañamiento de diagnóstico y propuesta técnica y (c) entrega de obra.*

CONTRATISTA	COMUNIDAD	MUNICIPIO	CORREGIMIENTO	Fechas Socialización Rehabilitación
Pastoral	SABANA LARGA	MANAURE	Cgto. Mayapo	01/08/2024
World Vision	CIRUELO I	RIOHACHA	Rgdo. Alta y Media Guajira	21/08/2024
Pastoral	WACHIPA	MANAURE	Cgto. La Gloria	01/08/2024
Cadena	ISHAMANA	MAICAO	Cgto. Yotojoroy	13/08/2024
Cadena	JERJET	MAICAO	Maku	14/08/2024
Cadena	LA LOMA	MAICAO	Cgto. Yotojoroy	14/08/2024


Nota: Las actas de entrada social, concertación de rehabilitaciones y momentos de acompañamiento por parte social y aseguramiento se encuentran en el repositorio del Ministerio

El 01, 08, 15, 22, 29 de agosto Partiendo de las "Obligaciones del Contratista" dispuesto en la tercera cláusula del contrato, numeral 3.2.2.1. INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, ítem 8 en el cual refiere: "*Presentar al MVCT informes sobre el avance del (los) contratista(s) vigilados.*"; se solicita y recibe los cuadros de avances (%) emitidos semanalmente por los contratistas (ANEXO 2).

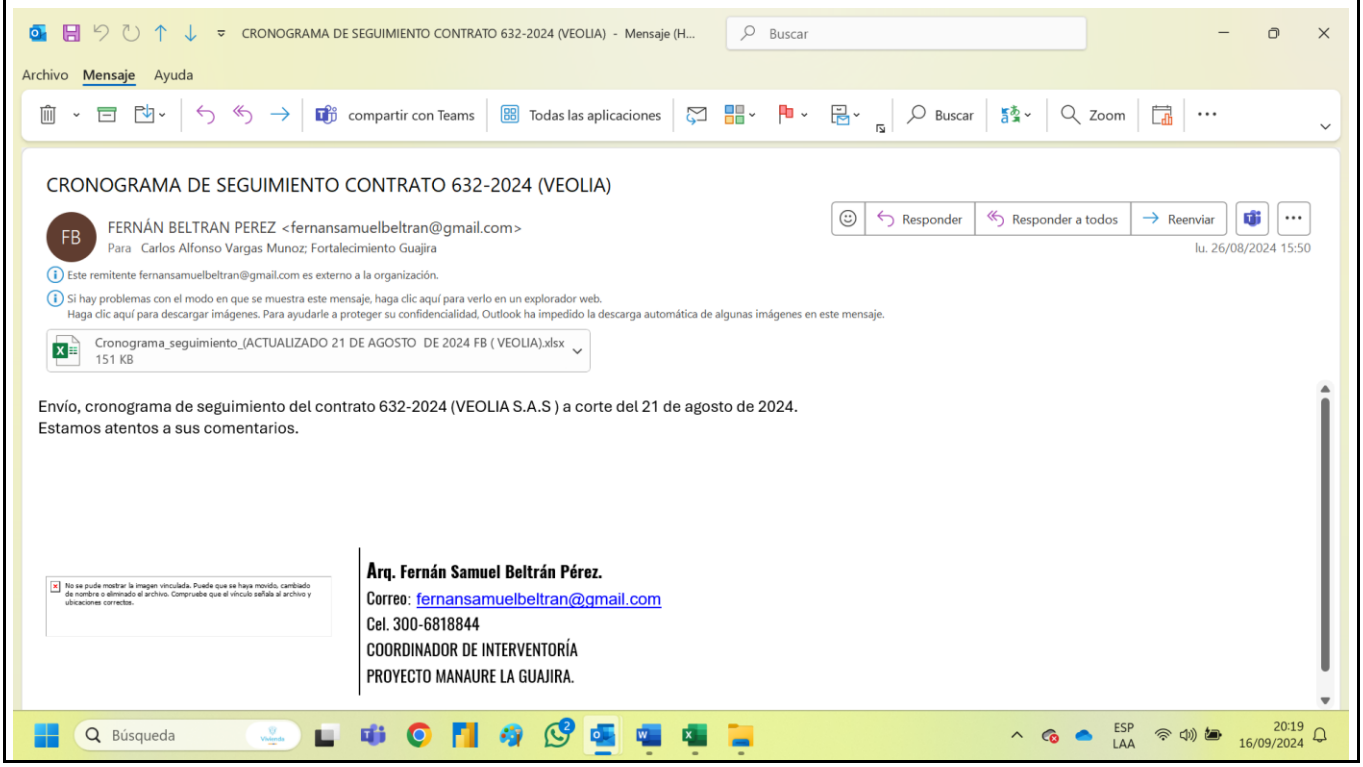

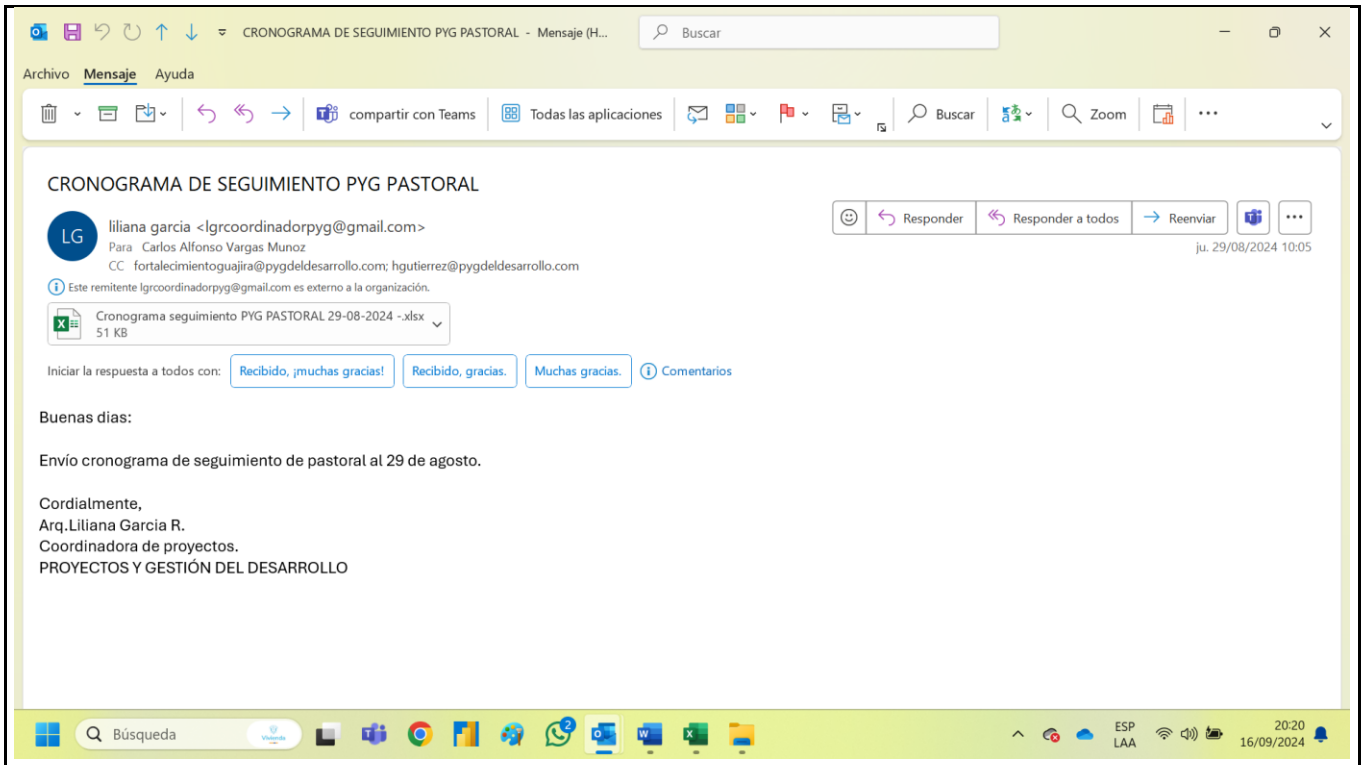
CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO PYG PASTORAL - Mensaje (H...
Buscar
Archivo Mensaje Ayuda
compartir con Teams
Todas las aplicaciones
Buscar
Zoom
CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO PYG PASTORAL
LG
liliana garcia <lgrcoordinadorpyg@gmail.com>
Para Carlos Alfonso Vargas Munoz
CC fortalecimientoguajira@pygdeldesarrollo.com; hgutierrez@pygdeldesarrollo.com
Responder
Responder a todos
Reenviar
ju. 29/08/2024 10:05
Este remitente lgrcoordinadorpyg@gmail.com es externo a la organización.
Cronograma seguimiento PYG PASTORAL 29-08-2024 -.xlsx
51 KB
Iniciar la respuesta a todos con: Recibido, ¡muchas gracias! Recibido, gracias. Muchas gracias. Comentarios
Buenas dias:
Envío cronograma de seguimiento de pastoral al 29 de agosto.
Cordialmente,
Arq.Liliana Garcia R.
Coordinadora de proyectos.
PROYECTOS Y GESTIÓN DEL DESARROLLO
Búsqueda
ESP LAA
20:20
16/09/2024


CONTROL DE SEGUIMIENTO CONTRATO No 605 DE 2024 - CORTE 31 DE JULIO DE 2024 - Mensaje (...
Buscar
Archivo Mensaje Ayuda
compartir con Teams
Todas las aplicaciones
Buscar
Zoom
CONTROL DE SEGUIMIENTO CONTRATO No 605 DE 2024 - CORTE 31 DE JULIO DE 2024
JS
Jorge Sarmiento - PYG <auxiliaringenieria@pygdeldesarrollo.com>
Para Carlos Alfonso Vargas Munoz
CC oscarnm07@gmail.com; orancediaz1989@gmail.com; 'Fortalecimiento Guajira'; 'Heraldo Gutierrez - PYG DEL DESARROLLO'
Responder
Responder a todos
Reenviar
ju. 01/08/2024 14:36
Este remitente auxiliaringenieria@pygdeldesarrollo.com es externo a la organización.
18. Cronograma seguimiento PYG WORLD VISION 30-07-2024.xlsx
52 KB
Cordial Saludo.
Adjunto control de seguimiento al cronograma del contrato relacionado en el asunto, para su conocimiento y fines pertinentes.
Atentamente,
JORGE ANDRÉS SARMIENTO RODRÍGUEZ
AUXILIAR DE INGENIERIA
655-4220
auxiliaringenieria@pygdeldesarrollo.com
PROYECTOS Y GESTIÓN
10 años
Búsqueda
ESP LAA
20:21
16/09/2024

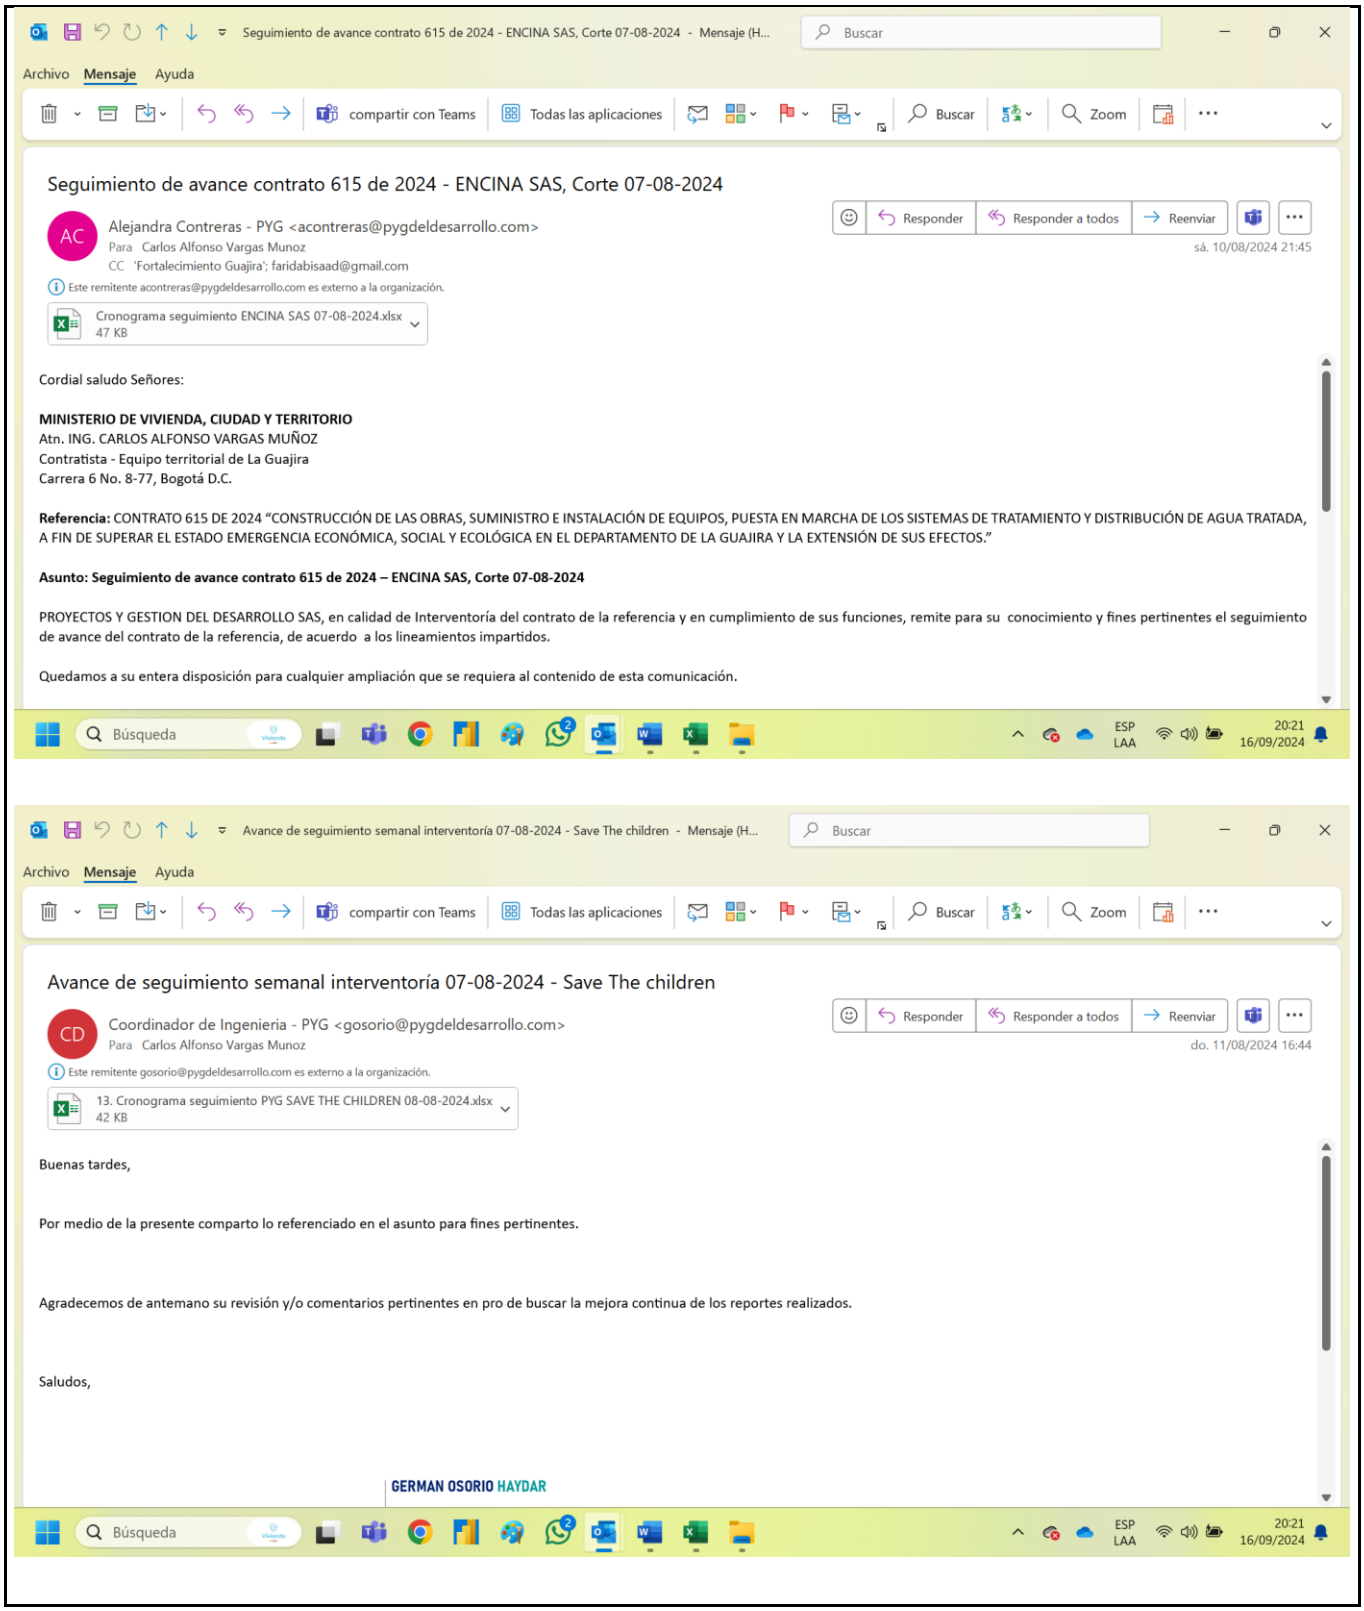

Seguimiento de avance contrato 615 de 2024 - ENCINA SAS, Corte 07-08-2024 - Mensaje (H...

Archivo Mensaje Ayuda

Seguimiento de avance contrato 615 de 2024 - ENCINA SAS, Corte 07-08-2024

Alejandra Contreras - PYG <acontreras@pygdeldesarrollo.com>
Para Carlos Alfonso Vargas Munoz
CC 'Fortalecimiento Guajira'; faridabisaad@gmail.com

Este remitente acontreras@pygdeldesarrollo.com es externo a la organización.

Cronograma seguimiento ENCINA SAS 07-08-2024.xlsx
47 KB

sá. 10/08/2024 21:45

Cordial saludo Señores:

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Atn. ING. CARLOS ALFONSO VARGAS MUÑOZ
Contratista - Equipo territorial de La Guajira
Carrera 6 No. 8-77, Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO 615 DE 2024 "CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA TRATADA, A FIN DE SUPERAR EL ESTADO EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA Y LA EXTENSIÓN DE SUS EFECTOS."

Asunto: Seguimiento de avance contrato 615 de 2024 – ENCINA SAS, Corte 07-08-2024

PROYECTOS Y GESTION DEL DESARROLLO SAS, en calidad de Interventoría del contrato de la referencia y en cumplimiento de sus funciones, remite para su conocimiento y fines pertinentes el seguimiento de avance del contrato de la referencia, de acuerdo a los lineamientos impartidos.

Quedamos a su entera disposición para cualquier ampliación que se requiera al contenido de esta comunicación.

Avance de seguimiento semanal interventoría 07-08-2024 - Save The children - Mensaje (H...

Archivo Mensaje Ayuda

Avance de seguimiento semanal interventoría 07-08-2024 - Save The children

Coordinador de Ingenieria - PYG <gosorio@pygdeldesarrollo.com>
Para Carlos Alfonso Vargas Munoz

Este remitente gosorio@pygdeldesarrollo.com es externo a la organización.

13. Cronograma seguimiento PYG SAVE THE CHILDREN 08-08-2024.xlsx
42 KB

do. 11/08/2024 16:44


Buenas tardes,

Por medio de la presente comparto lo referenciado en el asunto para fines pertinentes.

Agradecemos de antemano su revisión y/o comentarios pertinentes en pro de buscar la mejora continua de los reportes realizados.

Saludos,

GERMAN OSORIO HAYDAR

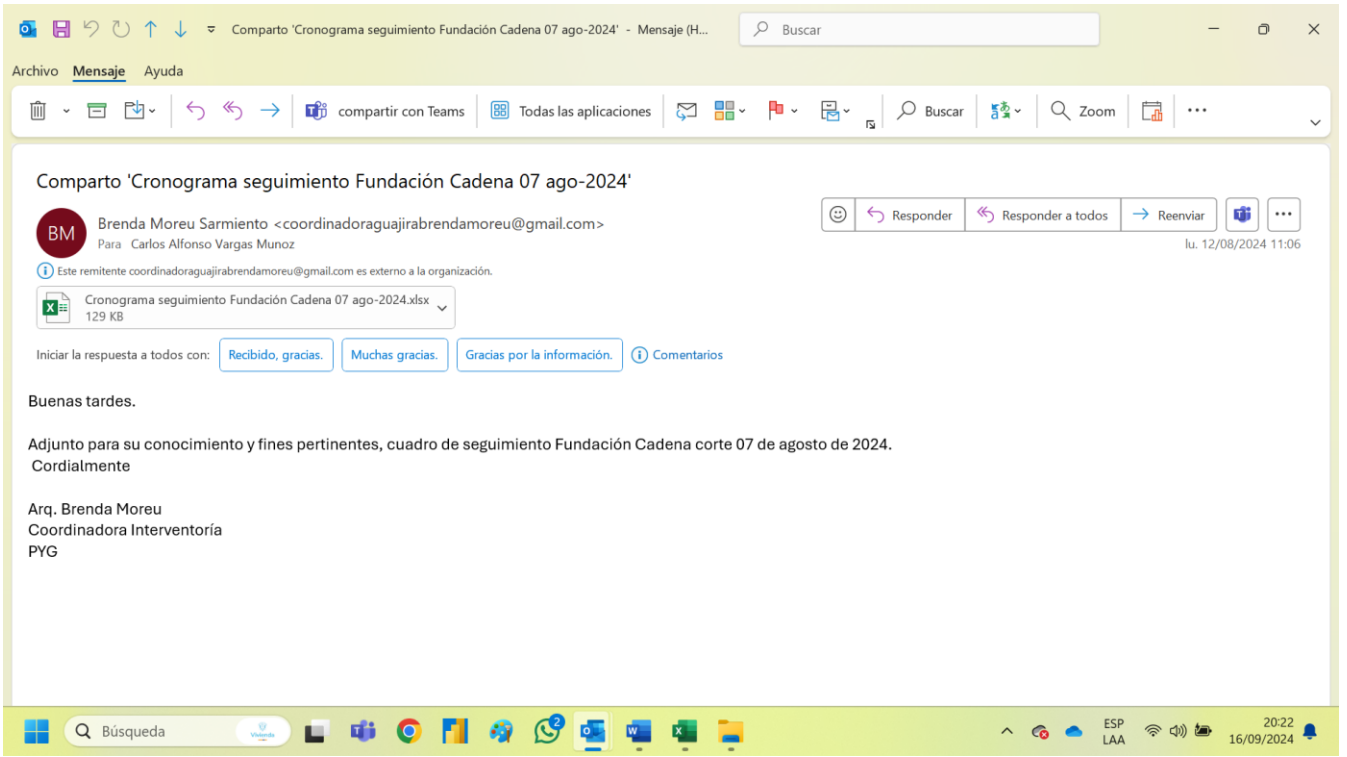
Comparto 'Cronograma seguimiento Fundación Cadena 07 ago-2024' - Mensaje (H...
Buscar
Archivo
Mensaje
Ayuda
compartir con Teams
Todas las aplicaciones
Buscar
Zoom
Comparto 'Cronograma seguimiento Fundación Cadena 07 ago-2024'
BM
Brenda Moreu Sarmiento <coordinadoraguajirabrendamoreu@gmail.com>
Para Carlos Alfonso Vargas Munoz
Responder
Responder a todos
Reenviar
lu. 12/08/2024 11:06
Este remitente coordinadoraguajirabrendamoreu@gmail.com es externo a la organización.
Cronograma seguimiento Fundación Cadena 07 ago-2024.xlsx
129 KB
Iniciar la respuesta a todos con:
Recibido, gracias.
Muchas gracias.
Gracias por la información.
Comentarios
Buenas tardes.
Adjunto para su conocimiento y fines pertinentes, cuadro de seguimiento Fundación Cadena corte 07 de agosto de 2024.
Cordialmente
Arq. Brenda Moreu
Coordinadora Interventoría
PYG
Búsqueda
ESP
LAA
20:22
16/09/2024

➢ Veolia

Contratista	Comunidad	% programado por unidad	%Ejecutado por unidad	Desviación % por unidad	Días programados	Días ejecutados	Desviación días
VEOLIA	AMAMANA	1,82%	0,26%	-1,56%	2,36	0,34	-2,03
VEOLIA	Amuchison	1,82%	0,31%	-1,51%	2,36	0,40	-1,96
VEOLIA	AMUYUWOU	1,82%	0,26%	-1,56%	2,36	0,34	-2,03
VEOLIA	ANUACHON JULIAKAT	1,82%	0,60%	-1,22%	2,36	0,78	-1,58
VEOLIA	ANUTPALAU	1,82%	0,53%	-1,28%	2,36	0,69	-1,67
VEOLIA	ATUNALAIN	1,82%	0,27%	-1,55%	2,36	0,35	-2,01
VEOLIA	ATUNOUTSHON	1,82%	0,12%	-1,70%	2,36	0,16	-2,20
VEOLIA	AYAURI (JUCEPIA)	1,82%	0,27%	-1,55%	2,36	0,35	-2,01
VEOLIA	CAMPAMANA 2	1,82%	0,25%	-1,57%	2,36	0,32	-2,04
VEOLIA	CASHIROUPA	1,82%	0,18%	-1,64%	2,36	0,23	-2,13
VEOLIA	CASUACHON	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
VEOLIA	COTCHAKAT	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
VEOLIA	COUCHARAPO	1,12%	0,25%	-0,88%	1,46	0,32	-1,14
VEOLIA	COUSHALAIN	1,82%	0,12%	-1,70%	2,36	0,16	-2,20
VEOLIA	CURICHI	1,82%	0,00%	-1,82%	2,36	0,00	-2,36
VEOLIA	GALAN	1,82%	0,12%	-1,70%	2,36	0,16	-2,20
VEOLIA	IMESITA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
VEOLIA	IMESITA 2	1,82%	0,00%	-1,82%	2,36	0,00	-2,36
VEOLIA	IRRUISIRRA 2	1,82%	0,12%	-1,70%	2,36	0,16	-2,20
VEOLIA	ISALAMANA	0,00%	0,26%	0,26%	0,00	0,34	0,34
VEOLIA	ISHIPA	1,82%	0,12%	-1,70%	2,36	0,16	-2,20
VEOLIA	JIYUSHON	1,12%	0,18%	-0,95%	1,46	0,23	-1,23
VEOLIA	JOSOKORROLI	1,82%	0,18%	-1,64%	2,36	0,23	-2,13
VEOLIA	JULIAKAT	1,82%	0,00%	-1,82%	2,36	0,00	-2,36
VEOLIA	JURUWAMANA	1,82%	0,25%	-1,57%	2,36	0,32	-2,04
VEOLIA	KAGUALASH	1,82%	0,26%	-1,56%	2,36	0,34	-2,03
VEOLIA	KALANKALA	1,82%	0,00%	-1,82%	2,36	0,00	-2,36
VEOLIA	KASUMANA 2	1,82%	0,12%	-1,70%	2,36	0,16	-2,20
VEOLIA	KASUSHI	1,07%	0,26%	-0,81%	1,39	0,34	-1,06
VEOLIA	KATIORO	1,82%	0,18%	-1,64%	2,36	0,23	-2,13
VEOLIA	KATNIAMANA	1,82%	0,26%	-1,56%	2,36	0,34	-2,03
VEOLIA	KAUCHIRAIN	1,82%	0,26%	-1,56%	2,36	0,34	-2,03
VEOLIA	KUTIRRAPLEIKA	1,82%	0,10%	-1,72%	2,36	0,12	-2,24
VEOLIA	MALAIRAKAT 1	1,12%	0,12%	-1,00%	1,46	0,16	-1,30
VEOLIA	MANANTIAL	1,82%	0,25%	-1,57%	2,36	0,32	-2,04
VEOLIA	MAPUAIN 3	1,82%	0,00%	-1,82%	2,36	0,00	-2,36
VEOLIA	MERCADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
VEOLIA	MONTEREAL	0,00%	0,27%	0,27%	0,00	0,35	0,35
VEOLIA	Nortechon	1,82%	0,00%	-1,82%	2,36	0,00	-2,36
VEOLIA	ORROKOT	1,82%	0,27%	-1,55%	2,36	0,35	-2,01
VEOLIA	PALILLU 1	0,00%	0,12%	0,12%	0,00	0,16	0,16
VEOLIA	PERRAMANA	1,82%	0,00%	-1,82%	2,36	0,00	-2,36
VEOLIA	PIOREKAT 2	0,00%	0,12%	0,12%	0,00	0,16	0,16
VEOLIA	PISOMANA	1,82%	0,00%	-1,82%	2,36	0,00	-2,36
VEOLIA	SABANACHON	0,15%	0,00%	-0,15%	0,20	0,00	-0,20
VEOLIA	SEQUIA	0,00%	0,12%	0,12%	0,00	0,16	0,16
VEOLIA	TOLUNDA	1,82%	0,00%	-1,82%	2,36	0,00	-2,36
VEOLIA	TULAT 2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
VEOLIA	TUTCHON 1	1,07%	0,12%	-0,95%	1,39	0,16	-1,23
VEOLIA	USHURU	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
VEOLIA	WALASCHEN	1,82%	0,00%	-1,82%	2,36	0,00	-2,36
VEOLIA	WARARAKI	0,00%	0,12%	0,12%	0,00	0,16	0,16
VEOLIA	WARUTTAIN 1	1,82%	0,00%	-1,82%	2,36	0,00	-2,36
VEOLIA	YULIRAKAT	1,82%	0,25%	-1,57%	2,36	0,32	-2,04

➢ *World Vision*

Contratista	Comunidad	% programado por unidad	%Ejecutado por unidad	Desviación % por unidad	Días programados	Días ejecutados	Desviación días
World Visión	PARRULAIN	2,08%	0,44%	-1,65%	2,71	0,57	-2,14
World Visión	COPOYOMANA	0,46%	0,41%	-0,05%	0,53	0,47	-0,06
World Visión	TULUMANA	3,23%	1,44%	-1,78%	4,19	1,88	-2,32
World Visión	AJUMANA	3,23%	0,48%	-2,74%	4,19	0,63	-3,56
World Visión	ALAMARKAT	3,23%	1,52%	-1,71%	4,19	1,97	-2,22
World Visión	CIRUELO I	3,23%	0,48%	-2,74%	4,19	0,63	-3,56
World Visión	PLAN BONITO	3,23%	1,29%	-1,94%	4,19	1,68	-2,52
World Visión	YUTAX	3,23%	0,48%	-2,74%	4,19	0,63	-3,56
World Visión	KETPANA	3,23%	1,26%	-1,96%	4,19	1,64	-2,55
World Visión	KAMUCHASAIN	2,59%	0,44%	-2,15%	3,36	0,57	-2,80
World Visión	KALINASIRRA	2,08%	0,44%	-1,65%	2,71	0,57	-2,14
World Visión	LA ROMANA	2,08%	0,44%	-1,65%	2,71	0,57	-2,14
World Visión	BRASIL	2,08%	0,44%	-1,65%	2,71	0,57	-2,14
World Visión	CERRO AZUL	2,08%	0,44%	-1,65%	2,71	0,57	-2,14
World Visión	MONTERMON 2	2,08%	0,44%	-1,65%	2,71	0,57	-2,14
World Visión	LA TOLDA	2,59%	0,44%	-2,15%	3,36	0,57	-2,80
World Visión	MERIDAILY	2,59%	0,44%	-2,15%	3,36	0,57	-2,80
World Visión	SANTA LUCIA	2,59%	0,44%	-2,15%	3,36	0,57	-2,80
World Visión	MAYAL QUEMADO	0,35%	0,21%	-0,15%	0,39	0,23	-0,16
World Visión	GALILEA	2,59%	0,44%	-2,15%	3,36	0,57	-2,80
World Visión	GUADALUPE 2	2,59%	0,44%	-2,15%	3,36	0,57	-2,80
World Visión	GUAYABITO 1	2,59%	0,44%	-2,15%	3,36	0,57	-2,80
World Visión	APALASAOU	2,08%	0,44%	-1,65%	2,71	0,57	-2,14
World Visión	KOUSHALAP	0,48%	0,22%	-0,27%	0,58	0,26	-0,32
World Visión	MULUJUICHON	0,59%	0,19%	-0,40%	0,71	0,23	-0,48
World Visión	PUNTA SIERRA	0,65%	0,31%	-0,33%	0,78	0,38	-0,40
World Visión	KAYETAMANA	0,59%	0,19%	-0,40%	0,71	0,23	-0,48
World Visión	JULIANCHON	0,65%	0,21%	-0,44%	0,78	0,25	-0,53
World Visión	EL MANANTIAL	0,47%	0,00%	-0,47%	0,47	0,00	-0,47
World Visión	SAMURRICHAO	0,59%	0,21%	-0,39%	0,71	0,25	-0,46
World Visión	OROGEL	0,65%	0,31%	-0,33%	0,78	0,38	-0,40

➢ Fundación Cadena

Contratista	Comunidad	% programado por unidad	%Ejecutado por unidad	Desviación % por unidad	Días programados	Días ejecutados	Desviación días
CADENA	La Loma	2,57%	0,76%	-1,81%	3,34	0,99	-2,35
CADENA	Ishamana	2,57%	0,76%	-1,81%	3,34	0,99	-2,35
CADENA	Musamana	2,57%	0,40%	-2,17%	3,34	0,52	-2,82
CADENA	Papumana	2,57%	0,40%	-2,17%	3,34	0,52	-2,82
CADENA	SICHEN	0,01%	0,00%	-0,01%	0,02	0,00	-0,02
CADENA	Jerjet	2,52%	0,75%	-1,77%	3,28	0,98	-2,30
CADENA	Jaichon	2,52%	0,20%	-2,33%	3,28	0,26	-3,02
CADENA	Palasumana	2,52%	0,20%	-2,33%	3,28	0,26	-3,02
CADENA	Masuren	2,44%	0,40%	-2,04%	3,17	0,52	-2,66
CADENA	La Estrella	2,44%	0,40%	-2,04%	3,17	0,52	-2,66
CADENA	Wlipa	2,44%	0,40%	-2,04%	3,17	0,52	-2,66
CADENA	Yosuipa	2,44%	0,40%	-2,04%	3,17	0,52	-2,66
CADENA	Equimana	2,40%	0,40%	-2,00%	3,12	0,52	-2,60
CADENA	Limoncito	2,40%	0,29%	-2,11%	3,12	0,37	-2,75
CADENA	PUEBLITO WAYUU	0,01%	0,00%	-0,01%	0,02	0,00	-0,02
CADENA	Majayupana	2,40%	0,40%	-2,00%	3,12	0,52	-2,60
CADENA	Cachuyas	2,40%	0,24%	-2,16%	3,12	0,32	-2,80
CADENA	Las Delicias	2,27%	0,20%	-2,08%	2,96	0,26	-2,70
CADENA	Walirrumana	2,27%	0,40%	-1,88%	2,96	0,52	-2,44
CADENA	Wanapaina	2,27%	0,40%	-1,88%	2,96	0,52	-2,44
CADENA	Jirrumana	2,27%	0,40%	-1,88%	2,96	0,52	-2,44
CADENA	PEPETSHI	0,01%	0,00%	-0,01%	0,02	0,00	-0,02
CADENA	Carraurachon	2,23%	0,24%	-1,99%	2,90	0,32	-2,59
CADENA	Mi Rosita	2,23%	0,20%	-2,03%	2,90	0,26	-2,64
CADENA	Shonkomana	2,19%	0,20%	-1,99%	2,85	0,26	-2,59
CADENA	Quispa	2,19%	0,20%	-1,99%	2,85	0,26	-2,59
CADENA	Cardonal	2,19%	0,20%	-1,99%	2,85	0,26	-2,59
CADENA	Wairramana	2,19%	0,20%	-1,99%	2,85	0,26	-2,59
CADENA	Pasanualuu	2,15%	0,20%	-1,95%	2,79	0,26	-2,54
CADENA	Uyatpana 2	0,01%	0,00%	-0,01%	0,02	0,00	-0,02
CADENA	Kanasumana	2,15%	0,20%	-1,95%	2,79	0,26	-2,54
CADENA	Juttial	2,15%	0,20%	-1,95%	2,79	0,26	-2,54
CADENA	Divino Niño	2,11%	0,20%	-1,91%	2,74	0,26	-2,48
CADENA	La Paz	2,11%	0,20%	-1,91%	2,74	0,26	-2,48

➢ Pastoral Social

Contratista	Comunidad	% programado por unidad	%Ejecutado por unidad	Desviación % por unidad	Días programados	Días ejecutados	Desviación días
Pastoral	AREMASAIN	3,13%	0,40%	-2,73%	3,13	0,40	-2,73
Pastoral	CAVIMA OLOMANA	3,13%	1,27%	-1,86%	4,66	1,89	-2,77
Pastoral	CEIWAKA	3,13%	1,22%	-1,91%	3,13	1,22	-1,91
Pastoral	KARAROPTAMANA	3,13%	1,18%	-1,95%	4,66	1,75	-2,90
Pastoral	URRAICHIKAT	2,95%	0,42%	-2,53%	2,95	0,42	-2,53
Pastoral	WACHIPA	1,63%	0,47%	-1,16%	2,42	0,70	-1,73
Pastoral	ISHAMANA 2	1,63%	0,47%	-1,16%	2,42	0,70	-1,73
Pastoral	MARRAUYEN	1,63%	0,47%	-1,16%	2,42	0,70	-1,73
Pastoral	POULAKA	0,28%	0,26%	-0,02%	0,21	0,19	-0,02
Pastoral	GUAYAWCHAIN	1,63%	0,47%	-1,16%	2,42	0,70	-1,73
Pastoral	QUEJAMANA	1,63%	1,20%	-0,43%	2,42	1,79	-0,64
Pastoral	SABANA LARGA	1,63%	0,64%	-0,99%	2,42	0,95	-1,48
Pastoral	SOULUWAMANA	1,63%	0,47%	-1,16%	2,42	0,70	-1,73
Pastoral	PANATSHI	1,63%	0,30%	-1,32%	2,42	0,45	-1,97
Pastoral	KUSKAT 3	1,44%	0,26%	-1,18%	1,79	0,32	-1,47
Pastoral	ALITAYEN	1,44%	0,16%	-1,28%	1,79	0,20	-1,58
Pastoral	PARULUGAIN O PARRULUWAIN	1,60%	0,42%	-1,18%	2,38	0,63	-1,75
Pastoral	JULUWAWAIN	1,60%	0,16%	-1,44%	2,38	0,24	-2,14
Pastoral	MUÑECHIKAT	0,28%	0,16%	-0,12%	0,21	0,12	-0,09
Pastoral	MIECHI	0,28%	0,30%	0,02%	0,21	0,23	0,02
Pastoral	PARRITCHON	0,28%	0,00%	-0,28%	0,21	0,00	-0,21
Pastoral	SIRUMATCHI	0,28%	0,00%	-0,28%	0,21	0,00	-0,21
Pastoral	SHALETKA	0,28%	0,00%	-0,28%	0,21	0,00	-0,21
Pastoral	MARAGUANCHA	0,28%	0,00%	-0,28%	0,21	0,00	-0,21
Pastoral	PERRAMANA	0,28%	0,00%	-0,28%	0,21	0,00	-0,21
Pastoral	ATUNALAAIN	0,28%	0,00%	-0,28%	0,21	0,00	-0,21
Pastoral	ARITAMANA	0,28%	0,30%	0,02%	0,21	0,23	0,02
Pastoral	KAUSHALAIN	0,28%	0,00%	-0,28%	0,21	0,00	-0,21
Pastoral	IRRUJUNAI	1,80%	0,47%	-1,33%	2,68	0,70	-1,98
Pastoral	JURULUBAN- LAS AMERICAS	2,16%	0,40%	-1,77%	3,22	0,59	-2,63
Pastoral	SANTA LUCIA	2,79%	0,47%	-2,32%	4,15	0,70	-3,45
Pastoral	YOUSULEMANA	2,19%	0,16%	-2,03%	3,27	0,24	-3,02

➢ Save The Children

Contratista	Comunidad	% programado por unidad	%Ejecutado por unidad	Desviación % por unidad	Días programados	Días ejecutados	Desviación días
Save the children	Jotojoroi	0,88%	0,75%	-0,13%	0,74	0,63	-0,11
Save the children	WUIKAT	0,55%	0,26%	-0,29%	0,26	0,12	-0,13
Save the children	CUCURUMANA	0,88%	0,79%	-0,09%	0,86	0,78	-0,09
Save the children	JATSAMANA	0,88%	0,75%	-0,13%	0,65	0,56	-0,10
Save the children	TORRINCHI	0,88%	0,84%	-0,04%	0,62	0,59	-0,03
Save the children	YATETSHICA	0,83%	0,40%	-0,43%	0,39	0,19	-0,20
Save the children	MAÑATURE	0,88%	0,75%	-0,13%	0,86	0,74	-0,13
Save the children	Pashara	0,88%	0,49%	-0,40%	0,57	0,32	-0,26
Save the children	PARULUWASII	0,88%	0,40%	-0,49%	0,41	0,19	-0,23
Save the children	BETANIA 1	0,88%	0,49%	-0,40%	0,66	0,36	-0,30
Save the children	URUMACHIMANA	0,88%	0,49%	-0,40%	0,36	0,20	-0,16
Save the children	KAJUCHONKAL	0,88%	0,75%	-0,13%	0,64	0,54	-0,10
Save the children	LA ISLA	0,88%	0,75%	-0,13%	0,72	0,62	-0,11
Save the children	LA ARENOSA	0,88%	0,75%	-0,13%	0,70	0,59	-0,10
Save the children	KAIPA	0,88%	0,62%	-0,26%	0,64	0,44	-0,19
Save the children	AMAICHONKAT 3	0,44%	0,22%	-0,22%	0,21	0,10	-0,10
Save the children	WAITAPA	0,88%	0,44%	-0,44%	0,63	0,31	-0,31

- **Encina**

Contratista	Comunidad	% programado por unidad	%Ejecutado por unidad	Desviación % por unidad	Días programados	Días ejecutados	Desviación días
ENCINA SAS	Panchomana	1,82%	0,48%	-1,34%	4,22	1,12	-3,10
ENCINA SAS	Pinskit	3,51%	0,48%	-3,03%	5,12	0,70	-4,42
ENCINA SAS	Yotojoloin	2,48%	0,48%	-2,00%	4,61	0,90	-3,71
ENCINA SAS	Santana Norte	3,57%	0,48%	-3,09%	4,29	0,58	-3,71
ENCINA SAS	Amasirralu	2,44%	0,48%	-1,96%	4,45	0,88	-3,57
ENCINA SAS	Urraichirujunai	2,11%	0,48%	-1,63%	4,43	1,01	-3,42
ENCINA SAS	Jatto	2,84%	0,48%	-2,35%	4,94	0,84	-4,10
ENCINA SAS	Cadenachon	3,57%	0,48%	-3,09%	4,25	0,57	-3,68
ENCINA SAS	Karraloutamana	3,51%	0,48%	-3,03%	5,16	0,71	-4,45
ENCINA SAS	Wishiwou	3,57%	0,48%	-3,09%	4,29	0,58	-3,71
ENCINA SAS	Shimolu	2,48%	0,48%	-2,00%	4,61	0,90	-3,71
ENCINA SAS	Ishirrouwou	3,57%	0,48%	-3,09%	4,29	0,58	-3,71
ENCINA SAS	Woluwopana	1,64%	0,48%	-1,16%	4,25	1,25	-3,00
ENCINA SAS	Jaipirijunay	2,11%	0,48%	-1,63%	4,43	1,01	-3,42
ENCINA SAS	Kataysumana	2,11%	0,48%	-1,63%	4,43	1,01	-3,42
ENCINA SAS	Sarruptien	2,10%	0,48%	-1,62%	4,39	1,01	-3,38
ENCINA SAS	Tutchonca	1,65%	0,48%	-1,17%	4,29	1,25	-3,03
ENCINA SAS	El Epelio	1,65%	0,48%	-1,17%	4,29	1,25	-3,03
ENCINA SAS	Kululumana	2,82%	0,48%	-2,34%	4,82	0,82	-4,00
ENCINA SAS	Cadenita	1,87%	0,48%	-1,38%	4,42	1,14	-3,28
ENCINA SAS	Yourepo	2,82%	0,48%	-2,34%	4,82	0,82	-4,00
ENCINA SAS	Warawarao	3,51%	0,48%	-3,03%	5,12	0,70	-4,42
ENCINA SAS	Kaspolamina	3,51%	0,48%	-3,03%	5,16	0,71	-4,45
ENCINA SAS	Pirpir	1,87%	0,48%	-1,38%	4,42	1,14	-3,28
ENCINA SAS	Ishain	2,82%	0,48%	-2,34%	4,82	0,82	-4,00
ENCINA SAS	México	2,51%	0,48%	-2,03%	4,77	0,92	-3,85
ENCINA SAS	Olocomana	1,87%	0,48%	-1,38%	4,42	1,14	-3,28
ENCINA SAS	Los Olivos	1,64%	0,48%	-1,16%	4,25	1,25	-3,00

Mes de agosto: en cumplimiento a la primera cláusula del contrato "Objeto del Contrato" en el que reza; "*Rehabilitación y/o recuperación y/o construcción y/o reconstrucción y/o mantenimiento de infraestructura existente incluido fortalecimiento de las capacidades técnicas y sociales de las comunidades, a fin de superar el estado emergencia económica, social y ecológica en el departamento de la guajira y la extensión de sus efectos*", se continúan con las rehabilitaciones de las infraestructuras asignadas al contratista Pastoral, *World* Vision y Veolia con las etapa de preliminares, concretos, cerramientos, levantamiento muros caseta según se observa en el siguiente registro fotográfico;

- **Rehabilitaciones de Infraestructuras.**





Foto 1: CAVIMA OLOMANA Armado de hierro de placa tanques – Contratista Pastoral	**Foto 2:** CEIWAKA Funda de conceto placa tanques - – Contratista Pastoral
	
Foto 3: Ishipa Estructura de Soportes Paneles – Contratista Veolia	**Foto 4**: Ishipa Finalización caseta PTAP – Contratista Veolia

3. **Relación de comunicaciones** (ANEXO 4)

- **Enviada**

Radicado Emitido MVCT	Referencia	Asunto	Remitente	Fecha Envío	Estado
2024IE0002138	Emisión Grupo Contratos MVCT	Actas de Inicio Plan Wüin Ülees (Agua Limpia). Esquema rehabilitaciones	GINA JULIANA RINCON RODRIGUEZ	11/03/2024	Entregado
2024IE0002450	Emisión Grupo Contratos MVCT	Actas de Inicio Plan Wüin Ülees (Agua Limpia). Esquema rehabilitaciones	GINA JULIANA RINCON RODRIGUEZ	20/03/2024	Entregado
2024IE0013960	Emitido a P&G	Hojas de Vida equipo de Gestión Contrato de Interventoría No. 631 de 2024	GINA JULIANA RINCON RODRIGUEZ	07/03/2024	Entregado
2024IE0016610	Emitido a P&G	Hojas de Vida equipo de Gestión Contrato de Interventoría No. 631 de 2024	GINA JULIANA RINCON RODRIGUEZ	15/03/2024	Entregado
2024EE0037021	Pendiente por firmas	Hojas de vida equipo de gestión Contrato de Interventoría No. 631 de 2024	DIANA MARCELA MEDINA HENAO		Pendiente Firmas
2024EE0027043	Emitido a P&G	Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico – Respuesta al radicado No. P&G-IAG-631-009, con asunto << Aclaración de las comunidades asignadas al contrato 615 de 2024>>.	DIANA MARCELA MEDINA HENAO	18/04/2024	Entregado
2024EE0036914	Emitido a P&G	Solicitud de aprobación subcontratación del Contrato de Obra No. 632 de 2024 suscrito entre VEOLIA AGUAS DE LA GUAJIRA S.A.S E.S.P. y el MVCT	DIANA MARCELA MEDINA HENAO	21/05/2024	Entregado
2024IE0018801	Emitido a P&G	Listado de asignaciones Comunidades - Contrato de suministro e instalación No. 615-2023	GINA JULIANA RINCON RODRIGUEZ	22/03/2024	Entregado
2024IE0019079	Emitido a P&G	Hojas de vida equipo de gestión Contrato de Interventoría No. 631 de 2024	GINA JULIANA RINCON RODRIGUEZ	03/04/2024	Entregado
2024IE0019196	Pendiente por firmas	Informes de Alistamiento Contratos P&G	GINA JULIANA RINCON RODRIGUEZ		Pendiente Firmas
2024IE0040017	Pendiente por firmas	Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico – Respuesta a comunicados No. P&G-IAG-631-019, P&G-IAG-631-021, P&G-IAG-631-35 - Aclaraciones y cambio de Comunidades	DIANA MARCELA MEDINA HENAO		Pendiente Firmas
2024IE0004295	Emisión Grupo Contratos MVCT	Actas de Inicio Plan Wüin Ülees (Agua Limpia). Esquema rehabilitaciones.	DIANA MARCELA MEDINA HENAO	20/05/2024 - 22/08/2024	Entregado
2024IE0005220	Emisión Grupo Contratos MVCT	Informes de Supervisión Contrato de Interventoría No. 631 de 2024, celebrado entre MVCT y PROYECTOS Y GESTIÓN DEL DESARROLLO S.A.S, meses de abril y mayo de 2024, cuyo objeto es "Interventoría Integral a los Contratos de Obra y/o conexos que suscriba el MVCT, encaminados a Atender el Plan Provisional y Estado de Emergencia Económica, Social, y Ecológica en el Departamento de la Guajira y la Extensión de sus Defectos."	DIANA MARCELA MEDINA HENAO	18/06/2024 - 15/08/2024	Entregado
2024EE0044280	Emitido a P&G	Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico – Respuesta al radicado No. P&G-IAG-631-009, con asunto << Aclaración de las comunidades asignadas al contrato 615 de 2024>>.	DIANA MARCELA MEDINA HENAO	18/06/2024 - 30/08/2024	Entregado
2024EE0044079	Pendiente por firmas	Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico – Respuesta al radicado No. P&G-IAG-631-010, con asunto << Aclaración garantías de las rehabilitaciones en las comunidades Santa Norte (Uribia) y Amasirralu (Uribia) >>.	DIANA MARCELA MEDINA HENAO		Pendiente Firmas
2024EE0057833	Emitido a P&G	Informes diagnósticos nuevas comunidades - Contrato de suministro e instalación No. 615-2023	DIANA MARCELA MEDINA HENAO	05/08/2024-30/08/2024	Entregado
2024IE0006286	Emisión Grupo Contratos MVCT	Informe de Interventoría del Contrato de Interventoría No. 631 de 2024, celebrado entre MVCT y PROYECTOS Y GESTIÓN DEL DESARROLLO S.A.S, mes de mayo de 2024, cuyo objeto es "Interventoría Integral a los Contratos de Obra y/o conexos que suscriba el MVCT, encaminados a Atender el Plan Provisional y Estado de Emergencia Económica, Social, y Ecológica en el Departamento de la Guajira y la Extensión de sus Defectos."	DIANA MARCELA MEDINA HENAO	21/07/2024-22/08/2024	Entregado
2024EE0057072	Emitido a P&G	Requerimiento No. 1 - Atrasos de actividades contractuales en contratos objeto de interventoría – Contrato Interventoría No. 631 de 2024.	DIANA MARCELA MEDINA HENAO	01/08/2024-22/08/2024	Entregado
2024IE0007259	Emisión Grupo Contratos MVCT	Informe de presunto incumplimiento del contratista FUNDACIÓN CADENA COLOMBIA. Contrato de obra 656 de 20241	DIANA MARCELA MEDINA HENAO	17/08/2024	Entregado
2024IE0007368	Emisión Grupo Contratos MVCT	Informe de presunto incumplimiento del contratista FUNDACION SAVE THE CHILDREN. Contrato de Obra No. 706 de 20241.	DIANA MARCELA MEDINA HENAO	21/08/2024	Entregado

- **Recibida**

Radicado Emitido P&G	Referencia	Asunto	Remitente	Fecha Recibo/Emisión
P&G-IAG-ENC-631-019	CONTRATO 631 DE 2024 "INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DE OBRA Y/O CONEXOS QUE SUSCRIBA EL MVCT, ENCAMINADOS A ATENDER EL PLAN PROVISIONAL Y EL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA Y LA EXTENSIÓN DE SUS EFECTOS."	Asunto: Solicitud aclaración comunidades a intervenir por ENCINA SAS en alcance al contrato 615 de 2024	Heraldo Gutiérrez Villegas	28 de agosto de 2024

Dado los retrasos presentados por los contratistas, la interventoría a realizado gestiones de alertas mediante comunicados, los cuales se encuentran descritos en los informes de interventoría entregados al ministerio mensualmente.

4. Actividades para realizar en el mes de septiembre de 2024

- Se continuará con aprobación de los informes de diagnósticos y propuestas económicas.
- Se espera liquidación del contrato No. 608-2024 Fleshman Constructores
- Se espera inicio de obras de rehabilitación dada las aprobaciones de las propuestas económicas de 10 infraestructuras pertenecientes al contratista Veolia y 1 infraestructura perteneciente al contratista *World Vision*

CONTRATISTA	COMUNIDAD	MUNICIPIO	Fechas Socialización Rehabilitación
Veolia	AYAURI (JUCEPIA)	MANAURE	07/07/2024
Veolia	ATUNALAIN	MANAURE	07/07/2024
Veolia	MONTE REAL	MANAURE	10/07/2024
Pastoral	SOULUWAMANA	MANAURE	27/08/2024
Veolia	JOSOCORROLI	MANAURE	27/08/2024
Veolia	KATIORO	MANAURE	02/09/2024
Veolia	AMAMANA	MANAURE	27(08/2024
Veolia	AMUYUWAU	MANAURE	27(08/2024
Veolia	KOUSHALAIN	MANAURE	28/08/2024
Veolia	YULIRACAT	MANAURE	03/09/2024
Veolia	KAGUALASH	MANAURE	06/09/2024

5. SEGUIMIENTO COMPONENTE JURÍDICO Y LEGAL:

En el marco de la obligación contractual definido en la primera cláusula del contrato en el componente jurídico en el que se describe: "El INTERVENTOR deberá verificar la aplicación y cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales a lo largo de la ejecución de cada Contrato Vigilado. De igual manera, deberá emitir un concepto en la materia en lo ateniente a aspectos jurídicos que se susciten en el desarrollo de los contratos vigilados, así como el de interventoría", se presentó lo siguiente;

- Presentó soporte legal en el desarrollo de los contratos vigilados, durante la etapa de ejecución.
- Requerimientos a cada uno de los contratistas de obra asignados, al cumplimiento en sus obligaciones, como las alertas de presuntos incumplimientos y requerimientos de planes de contingencia, los cuales se realizaron a través de comunicados formales.
- Presentó soporte legal en los procesos de subcontratación realizados por parte de los contratistas de obra.

Seguimiento de las actuaciones jurídicas en curso.

No se tienen requerimientos de entes de control, ni solicitudes de derechos de petición o requerimientos en particular asociados a la ejecución del presente contrato.

6. RESUMEN COMPONENTE FINANCIERO

En el marco de la obligación contractual definido en la primera cláusula del contrato en el componente financiero en el que se describe: "El INTERVENTOR deberá realizar los procesos y actividades relacionadas con el control y seguimiento del estado financiero de cada Contrato Vigilado e Interventoría, llevando el control y seguimiento de la buena inversión del anticipo, las aprobaciones de la propuesta de intervención, los pagos por concepto de avance de obra o cumplimiento de hitos, las amortizaciones, las retenciones aplicables, entre otros;

VEOLIA AGUAS DE LA GUAJIRA S.A.S E.S.P., CONTRATO No 632 DE 2024		
1	Aportes Nación – MVCT	$ 12.000.000.000
2	Giros realizados al Contrato	$ 2.400.000.000
3	Saldo de Aportes (1-2-3)	$ 9.600.000.000
4	Valor ejecutado recursos Nación	$ 2.400.000.000
5	**Saldo por ejecutar recursos girados Nación**	**$ 9.600.000.000**

WORLD VISION INTERNATIONAL - VISION MUNDIAL INTERNACIONAL CONTRATO No 605 DE 2024		
1	Aportes Nación – MVCT	$ 6.900.000.000
2	Giros realizados al Contrato	$ 1.380.000.000
3	Saldo de Aportes (1-2-3)	$ 5.520.000.000
4	Valor ejecutado recursos Nación	$ 1.380.000.000
5	**Saldo por ejecutar recursos girados Nación**	**$ 5.520.000.000**

FUNDACIÓN CADENA COLOMBIA CONTRATO No 656 DE 2024		
1	Aportes Nación – MVCT	$ 7.400.000.000

2	Giros realizados al Contrato	$ 1.480.000.000
3	Saldo de Aportes (1-2-3)	$ 5.920.000.000
4	Valor ejecutado recursos Nación	$ 1.480.000.000
5	**Saldo por ejecutar recursos girados Nación**	**$ 5.920.000.000**

SECRETARIADO DE PASTORAL SOCIAL RIOHACHA CONTRATO No 600 DE 2024		
1	Aportes Nación – MVCT	$ 7.000.000.000
2	Giros realizados al Contrato	$ 1.400.000.000
3	Saldo de Aportes (1-2-3)	$ 5.600.000.000
4	Valor ejecutado recursos Nación	$ 1.400.000.000
5	**Saldo por ejecutar recursos girados Nación**	**$ 5.600.000.000,00**

FUNDACION SAVE THE CHILDREN COLOMBIA CONTRATO No 706 de 2024		
1	Aportes Nación – MVCT	$3.700.000.000
2	Giros realizados al Contrato	$740.000.000
3	Saldo de Aportes (1-2-3)	$2.960.000.000
4	Valor ejecutado recursos Nación	$740.000.000
5	**Saldo por ejecutar recursos girados Nación**	**$2.960.000.000**

ENCINA S.A.S. SUMINISTRO E INSTALACIÓN No 615 DE 2024		
1	Aportes Nación – MVCT	$ 23.000.000.000
2	Giros realizados al Contrato	$ 6.900.000.000
3	Saldo de Aportes (1-2-3)	$ 16.100.000.000
4	Valor ejecutado recursos Nación	$ 6.900.000.000
5	**Saldo por ejecutar recursos girados Nación**	**$ 16.100.000.000**


FLESHMAN CONSTRUCTORES CONTRATO No 608 DE 2024		
1	Aportes Nación – MVCT	$ 173.000.000
2	Giros realizados al Contrato	$0,00
3	Saldo de Aportes (1-2-3)	$ 173.000.000
4	Valor ejecutado recursos Nación	$0,00
5	**Saldo por ejecutar recursos girados Nación**	**$ 173.000.000**

A continuación, se describen los desembolsos realizados a Interventoría P&G a 31 de agosto 2024; sin embargo, se aclara que dicha interventoría no requiere anticipo dada la

connotación del contrato 631-2024, en su cláusula Séptima, en el que especifica que "Los pagos del contrato de INTERVENTORÍA se realizarán mediante pagos parciales mensuales conforme al avance de cada contrato vigilado", de acuerdo con el tipo de clasificación de cada contrato como es; TIPO A, TIPO B, TIPO C y TIPO D.

PROYECTOS Y GESTIÓN DEL DESARROLLO S.A.S CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 631 DE 2024		
1	Aportes Nación – MVCT	$ 6.715.000.000
2	Giros realizados al Contrato Mayo 1er Pago	$ 49.618.181,82
3	Giros realizados al Contrato Mayo 2do Pago	$106.236.363,64
4	Giros realizados al Contrato Junio 3er Pago	$113.636.363,64
5	Saldo de Aportes (1-2-3-4)	$ 6.445.509.090,90
6	Valor ejecutado recursos Nación	$ 269.490.909,10
7	**Saldo por ejecutar recursos girados Nación**	**$ 6.445.509.090,90**

La información de los numerales 1 fue tomada de la ejecución presupuestal MVCT de cada uno de los contratos



CLAUDIA MARCELA VELASQUEZ BEJARANO
Asesor, Código 1020, Grado 14 Despacho del Viceministro de Agua y Saneamiento Básico

Es importante mencionar que el presente informe de supervisión corresponde a la ejecución del mes de agosto cuya supervisión fue ejercida en su mayor parte por Diana Medina, quien se desempeñó como Supervisora del presente contrato desde el 20 de mayo de 2024 hasta el 27 de agosto de 2024, y luego retomada por la Ing. Gina Rincón desde el 28 de agosto de 2024 hasta el 17 de septiembre de 2024.

VoBo. Carlos Vargas – Profesional de Apoyo Técnico
