MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 25-10-2024 10:01
Al Contestar Cite Este No.: 2024IE0009777 Fol:0 Anex:0 FA:0
ORIGEN 72000 DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO / CLAUDIA MARCELA VELASQUEZ BEJARANO
DESTINO 73202 GRUPO DE CONTRATOS / ANDRES FELIPE RAMIREZ JARAMILLO
ASUNTO INFORME DE SUPERVISIÓN SEPTIEMBRE 2024. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1205
OBS
2024IE0009777

MEMORANDO

Bogotá D.C., 25 de octubre de 2024

PARA: **ANDRES FELIPE RAMÍREZ JARAMILLO**
Coordinador Grupo de Contratos

DE: **CLAUDIA MARCELA VELÁSQUEZ BEJARANO**
Asesor, Código 1020, Grado 14
Despacho del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico

ASUNTO: Informe de Supervisión septiembre 2024. Contrato Interadministrativo 1205 de 2023 celebrado entre el MVCT y FINDETER, cuyo objeto es *"Prestación del servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos para la ejecución de proyectos integrales de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico que sean priorizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Departamento de La Guajira, los cuales incluyen, entre otras actividades, la elaboración de estudios y diseños, la ejecución de las obras e interventorías, así como las demás actividades necesarias para el cumplimiento del contrato".*

Reciba un cordial saludo doctor Ramírez,

En cumplimiento del deber de construcción y actualización de los expedientes contractuales, de manera atenta, en mi calidad de supervisora del contrato referido en el asunto, me permito adjuntar el informe de supervisión correspondiente a la ejecución del mes de septiembre de 2024, con el fin que obre en el expediente contractual respectivo.

Cordialmente,

CLAUDIA MARCELA VELÁSQUEZ BEJARANO
Asesor, Código 1020, Grado 14
Supervisora del Contrato Interadministrativo No. 1205 de 2023.

Elaboró:
Luis Carlos Olivella
Contratista equipo La Guajira

Revisó:
Diana Clavijo
Contratista equipo La Guajira

INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN

Fecha: 01 al 30 de septiembre 2024

1. DATOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1205 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER.

NÚMERO DEL CONTRATO	1205 de 2023
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación del servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos para la ejecución de proyectos integrales de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico que sean priorizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Departamento de La Guajira, los cuales incluyen, entre otras actividades, la elaboración de estudios y diseños, la ejecución de las obras e interventorías, así como las demás actividades necesarias para el cumplimiento del contrato.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27 de junio de 2023
SUSCRITO ENTRE	Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio- Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER S.A.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 32.097.000.000
VALOR ACTUAL CONTRATO	$ 47.097.000.000
PLAZO	El plazo de ejecución del contrato interadministrativo será de dieciocho (18) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos del perfeccionamiento y ejecución del contrato.
FECHA DE INICIO	28/08/2023
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	27/02/2025
FECHA TERMINACIÓN REAL	27/02/2025

2. DATOS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE DEL SUPERVISOR	**DIANA MARCELA MEDINA HENAO – SUPERVISORA DEL CONTRATO POR PARTE DEL MINISTERIO**
	DESDE EL 15/08/2023 AL 22/08/2024
	GINA JULIANA RINCÓN RODRIGUEZ SUBDIRECTORA TÉCNICA CÓDIGO 0150, GRADO 21 DESDE EL 23/08/2024 HASTA 11/09/2024
	CLAUDIA MARCELA VELASQUEZ BEJARANO
	DESDE 12/09/2024 HASTA LA FECHA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**LUIS CARLOS OLIVELLA FERNANDEZ**
	DESDE EL 01/05/2024 HASTA LA FECHA
	LIYIBETH OCHOA RODRÍGUEZ
	DESDE EL 01/03/2024 AL 30/04/2024
	CARLOS ALFONSO VARGAS MUÑOZ
	DESDE EL 16/08/2023 AL 29/02/2024
	JAHER ENRIQUE MENDOZA TIRADO
	DESDE EL 29/11/2023 AL 29/02/2024
DEPENDENCIA	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL

3. INFORMACIÓN FÍSICA DEL CONTRATO

3.1. Proyecto(s) Viabilizado(s)

Nombre del Contrato	Contrato interadministrativo No. 1205 de 2023, suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER S.A. (ANEXO 1)
Alcance del Contrato:	El alcance del presente contrato incluye la Asistencia Técnica y Administración de Recursos para la ejecución de proyectos integrales de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico que sean priorizados y viabilizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Departamento de La Guajira comprendidos dentro del **Plan *Wüin Ülees*** (Agua Limpia), priorizados y viabilizados por el **MINISTERIO**, los cuales comprenden la zona rural de los municipios de Manaure, Uribia, Maicao y Riohacha; las etapas que se desarrollarán serán las contenidas en el **alcance del contrato y en los estudios previos**, éste último documento que hace parte integral del presente contrato.
Impacto del proyecto	De acuerdo con la meta estimativa del proyecto, y en el marco del cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017, se tiene previsto rehabilitar un total de 191 infraestructuras priorizadas por el MINISTERIO para que vuelvan a entrar en operación concentradas en los municipios de Manaure, Riohacha, Maicao y Uribia para una población total beneficiada de 56.360 aproximadamente, de las cuales se estimaron realizar 131 rehabilitaciones iniciales, y con la adición de

	recursos efectuada mediante el otrosí No. 3 celebrado el 29 de diciembre de 2023, se adicionaron a la meta estimativa, 61 rehabilitaciones más.

4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

4.1. Plan Financiero del Proyecto inicial

Componente	PGN 2023
Prestación del servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos para la ejecución de proyectos integrales de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico que sean priorizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Departamento de La Guajira, los cuales incluyen, entre otras actividades, la elaboración de estudios y diseños, la ejecución de las obras e interventorías, así como las demás actividades necesarias para el cumplimiento del contrato hacer efectivo el Apoyo Financiero de la Nación al Municipio de Uribia.	$ 32.097.000.000
Otrosí No. 3 del Contrato interadministrativo No. 1205 de 2023 suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. FINDETER S.A. (ANEXO 1)	$ 15.000.000.000
Remuneración por los servicios de asistencia técnica y administración.	$3.059.014.864
Recursos objeto de administración para la ejecución de los proyectos.	$43.174.495.231,88
Seguimiento (2%)	$863.489.904,12
Totales	**$ 47.097.000.000**
%Participación	100%

4.2. Disponibilidad Presupuestal.

No. Resolución de asignación y fecha:	El contrato no tiene Resolución de asignación
Valor de Asignación Nación:	El contrato no tiene Resolución de asignación
No. Certificado Disponibilidad Presupuestal y Fecha:	152523 de 30 de mayo de 2023 152623 de 30 de mayo de 2023
Cuenta independiente y exclusiva, inembargable y exenta de gravámenes tributarios	No. 256-144346 (Ahorros)
Nombre entidad bancaria:	Banco de Occidente
Titular de la cuenta:	PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR – FIDUAGRARIA SUBCUENTA MVCT GUAJIRA CTO INTERADMIN 1205 DE 2023

4.3. Disponibilidad Presupuestal Otrosí 3 (ANEXO 2)

No. Resolución de Asignación y Fecha:	El contrato no tiene Resolución de asignación
Valor de Asignación Nación:	El contrato no tiene Resolución de asignación
No. Certificado Disponibilidad Presupuestal y Fecha:	227723 de 28 de diciembre de 2023 227823 de 28 de diciembre de 2023 227923 de 28 de diciembre de 2023
Cuenta independiente y exclusiva, inembargable y exenta de gravámenes tributarios	No. 256-144346 (Ahorros)
Nombre entidad bancaria:	Banco de Occidente
Titular de la cuenta:	PATRIMONIOS AUT DE SOC FID DE DESAR – FIDUAGRARIA SUBCUENTA MVCT GUAJIRA CTO INTERADMIN 1205 DE 2023

4.4. Desembolsos Realizados a la cuenta bancaria:

El 21 de febrero se efectuó el segundo desembolso por parte del Ministerio bajo el siguiente esquema:

No.	CONCEPTO	FECHA SOLICITUD DESEMBOLSO	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR
1	**Primer (1) desembolso de recursos a Findeter**	**01/12/2023**	**28/12/2023**	**$ 1.880.000-000**
2	Segundo (2) pago correspondiente al flujo de	02/02/2024	21/02/2024	$24.528.000.000,00

	inversión de acuerdo con los desembolsos que realizara Findeter a los derivados desde el mes de febrero 2024 al mes de mayo 2024 para ejecución de los diagnósticos y rehabilitaciones para las asociaciones Étnico wayuu, Araurayu, Sukuaipa, Sol guajiro; privados Hidroguajira, Potable, Consorcio Construir Guajira y Jose Luis suaza, Interventoría Interguajira y los nuevos derivados a contratar conforme a lo estipulado en el Otrosi3 más pagos de asistencia técnica. (ANEXO 3)			
TOTAL DESEMBOLSOS				$26.408.000.000,00

A la fecha, de manera acumulativa, se han realizado los siguientes desembolsos:

CDP	Fecha CDP	Valor CDP	Solicitud actual	Solicitudes Anteriores	Saldo CDP
152623	30/05/2023	31.508.764.705,88	24.528.000.000	1.880.000.000	5.100.764.706
Total CDP		31.508.764.705,88	24.528.000.000	1.880.000.000	5.100.764.706

Adición:

CDP	FECHA CDP	VALOR CDP
227823	28/12/2023	$ 275.254.610,00
227923	29/12/2023	$ 13.296.257.536,00
227723	30/12/2023	$ 1.428.487.854,00

5. RESUMEN COMPONENTE FINANCIERO

RESUMEN FINANCIERO Convenio 1205 de 2023		
1	Aportes Nación – MVCT	$ 47.097.000.000
2	Giros realizados al Convenio	$1.880.000.000
3	Giros realizados al Convenio	$24.528.000.000
5	Valor ejecutado recursos Nación (1+2)	$26.408.000.000
4	Saldo de Aportes (1-2-3)	$ 20.689.000.000
6	**Saldo por ejecutar recursos girados Nación**	**$ 20.689.000.000**

La información de los numerales 1 fue tomada de valor inicial del convenio 1205-2023 y la adición que se hizo por medio del Otro Sí No 3 del 29 de diciembre de 2023.

La información de los numerales 2 y 3 fue tomada de los desembolsos realizados a FINDETER el día 29 de diciembre de 2023 y 21 de marzo 2024.

La información del numeral 4 corresponde al saldo que falta por ejecutar en el presente convenio.

La información del numeral 5 corresponde al valor aprobado en los desembolsos realizados a FINDETER.

6. MODIFICACIONES CONTRACTUALES (ANEXO 1)

6.1. OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO EL 14 DE JULIO DE 2023

El 14 de julio de 2023, se suscribió el Otrosí No. 1 al Contrato Interadministrativo No. 1205-2023, mediante el cual se modificaron las Cláusulas QUINTA y NOVENA de este, con el fin de aclarar el valor total del contrato, especificando de manera detallada el valor asignado para la asistencia técnica y administración, así como el monto destinado a la ejecución de los proyectos. Además, se realizaron precisiones sobre los montos que afectarán a las disponibilidades presupuestales, según lo estipulado en la cláusula novena - Disponibilidad Presupuestal.

No. CDP	Fecha	Valor CDP	Valor para afectar
152623	30/05/2023	$31.508.764.706	$31.508.764.705,88
152523	30/05/2023	$641.949.020	$588.235.294,12
total		$32.150.713.726	$32.097.000.000,00

Siendo así, la remuneración por los servicios de asistencia técnica y administración ascienden a la suma de $2.097.000.000 y los recursos objeto de administración para la ejecución de proyectos ascienden a la suma de $30.000.000.000.

6.2. OTROSÍ No. 2 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2023

El 26 de diciembre de 2023 se suscribió el Otrosí No. 2 al Contrato Interadministrativo No. 1205-2023, mediante el cual se modificaron las Cláusulas SEGUNDA, TERCERA Y SÉPTIMA del mismo, principalmente con el fin de extender de manera significativa la cobertura de ejecución del componente relacionado con el diagnóstico, rehabilitación, mejoramiento y/o construcción de jagüeyes, pozos, molinos, reservorios y proyectos, y asignar la totalidad de los recursos administrados para la ejecución de proyectos, estimados en la suma de $29.411.764.705,88. Esta ampliación fue fundamental para atender con urgencia las necesidades de acceso al agua en el departamento y contribuir al cumplimiento del plan provisional para el cumplimiento de la sentencia T 302-2017

Así mismo, se modificaron las obligaciones 4 y 9 en cuanto no resultaba procedente el proceso de viabilización en el marco de un contrato de asistencia técnica o de entrega de apoyos en especie como es el caso de FINDETER. Por lo tanto, no procedía la revisión y aprobación a través del mecanismo de viabilización de proyectos a través del ministerio.

6.3. OTROSÍ No. 3 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023

El 29 de diciembre de 2023 se suscribió el Otrosí No. 3 al Contrato Interadministrativo No. 1205-2023, mediante el cual se efectuó una adición de recursos por valor de quince mil millones de pesos ($15.000.000.000), con el objetivo de extender de manera significativa la cobertura de ejecución del componente relacionado con el diagnóstico, rehabilitación, mejoramiento y/o construcción de jagüeyes, pozos, molinos, reservorios y proyectos a través del apoyo en especie que efectúa el MVCT mencionado líneas atrás y asignar la totalidad de los recursos destinados a la administración para la ejecución de rehabilitaciones, considerando la imperiosa necesidad de encontrar soluciones inmediatas y urgentes para garantizar el acceso al agua a un máximo de comunidades y personas en el menor tiempo posible, y seguir consolidando acciones hacia el cumplimiento del Sentencia T-302 de 2017 y de dar cumplimiento al Plan Provisional de Acción presentado el 28 de agosto de 2023 a la Honorable Corte Constitucional.

No. CDP	Fecha	Valor CDP	Valor para afectar
227723	28/12/2023	$1.428.487.854	$1.428.487.854
227823	28/12/2023	$275.254.610	$275.254.610
227923	28/12/2023	$13.296.257.536	$13.296.257.536
Total		$15.000.000.000	$15.000.000.000

7. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO A CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024:

ÍTEM	EJECUCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO	VALOR
1	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS.	40,00%

Esta información sobre el porcentaje de ejecución física se obtiene de los avances de cada uno de los contratistas derivados de Findeter, según consta en el informe de supervisión del mes de septiembre remitido por Findeter en calidad de ejecutor con fecha de 10 de octubre con No de radicado 2202450510878:

CONTRATISTA	CONTRATO	EJECUTADO	PROGRAMADO
HIDROGUAJIRA	001-2023	71,45%	86,62%
ÉTNICO WAYUU	002-2023	32,59%	86,74%

ARAURAYU	003-2023	55,48%	91,33%
SUKUAIPA	004-2023	61,39%	98,00%
SOL GUAJIRA	005-2023	37,79%	88,01%
JOSE LUIS MOVIL	001-2024	63,77%	77,01%
CONSTRUIR GUAJIRA	002-2024	34,65%	71,98%
TODOS POR LA GUAJIRA	003-PAF AASBGUAJIRA-0-047-2024	9,95%	68,10%

8. ACCIONES EJECUTADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTOS DEL SUPERVISOR:

En atención a las obligaciones de Findeter contenidas en la Cláusula Décima Tercera, consistente en remitir informes periódicos, se recibió el día 10/10/2024 con radicado No 2202450510878, el correspondiente informe de este periodo, en el cual se relacionan las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 1 y 30 de septiembre de 2024.

DÉCIMA TERCERA: INFORMES. FINDETER, en el marco del cumplimiento de sus obligaciones, debe enviar al Supervisor del **MINISTERIO** los siguientes informes:

1. Un Informe mensual de avance de cada uno de los proyectos, dentro de los primeros (10) diez días calendario del mes siguiente que se reporta.
2. Un Informe mensual de avance en ejecución financiera del contrato, donde se presente la información de los pagos efectivos por fuente de recursos derivados de la ejecución del Contrato. Este informe será enviado la última semana del mes siguiente al que se reporta. El informe también deberá incluir el reporte de cumplimiento de todas las obligaciones del contrato. Este informe se deberá presentar de acuerdo con el formato aprobado por el **MINISTERIO**.

8.1 Introducción

En calidad de supervisora del Contrato Interadministrativo N° **1205 de 2023** celebrado entre **EL MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO** y **FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER S.A.**, con el objeto de: "*Prestación del servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos para la ejecución de proyectos integrales de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico que sean priorizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Departamento de La Guajira, los cuales incluyen, entre otras actividades, la elaboración de estudios y diseños, la ejecución de las obras e interventorías, así como las demás actividades necesarias para el cumplimiento del contrato",* me permito presentar el siguiente informe de actividades realizadas desde la supervisión del Contrato en mención para el periodo comprendido entre el 01 de septiembre y el 30 de septiembre de 2024.

8.2 Avances mes de septiembre de 2024

- 02 de septiembre de 2024: Se realizó por parte del personal del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, una visita técnica de supervisión a las obras de infraestructura para el abastecimiento de agua potable en la comunidad de Alewa Los Monos, Municipio de Riohacha. En esta comunidad se presentaron las siguientes observaciones:

Alewa Los Monos (Riohacha):

En el componente técnico, se visita la infraestructura que fue intervenida en compañía de autoridad y líder de la comunidad, los cuales mostraron preocupación después de que a pesar de que los trabajos civiles terminaron, todavía hay detalles que no hacen que el sistema funcione correctamente.

La autoridad comenta que hay un sonido que se presenta en el componente eléctrico, un sonido constante luego de que se apaga la planta, también observa que una lámpara que fue descompuesta por el contratista, no ha sido reparada.

Inicialmente se esperaba la presencia del contratista y la interventoría, pero al llegar a la comunidad solo se encontraba la autoridad, líder y profesor de la escuela, los cuales pudieron brindar una información del sistema. De parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se informa a la comunidad que toda falencia que se presente en el sistema va a ser reparada y entregada en conformidad por el contratista y que en el comité de seguimiento que se realizará en la semana siguiente, se tocaran todos estos temas, se informará a Findeter para que pueda corregir esto en el menor tiempo posible.

Se le informa a la comunidad que el MVCT continuará efectuando seguimiento a esta problemática para que en los días siguientes se pueda realizar la capacitación al sistema.

	
Fotografía 1. Reunión con Autoridad y líder de la comunidad de Alewa Los Monos.	Fotografía 2. Sistema de abastecimiento de agua potable de la comunidad de Alewa Los Monos.

LA ESPERANZA, DISTRITO DE RIOHACHA, LA GUAJIRA:

- 03 de septiembre de 2024: Se realizó visita técnica de acompañamiento con la participación de Findeter, la Interventoría y el Contratista **CONSORCIO HIDROGUAJIRA**, para la realización del momento 2 (conozcamos nuestro sistema) donde se realiza la capacitación técnica de la operación de la planta de filtración en la comunidad de La Esperanza. En esta comunidad se presentaron las siguientes observaciones:

El contratista inicia con la capacitación con la presentación del diagrama de flujo de la PTAP, en donde se evidencia detalladamente su composición:

1- Captación desde el pozo profundo.
2- Filtración (Clarificación)
3- Microfiltración
4- Desinfección del agua con cloro

Entre sus partes se utiliza para el sistema microfiltros, filtros 1 y 2, bomba dosificadora, tanque de cloro, tablero eléctrico, bomba de baja presión, inversor de corriente, además del sistema fotovoltaico (paneles solares), tanques de almacenamiento de agua cruda y potable.

El contratista explica paso a paso la operación del sistema a la comunidad, la operación y el mantenimiento preventivo que tendrá el sistema para su mayor durabilidad en el tiempo. La líder de esta comunidad tiene como nombre María Gouriyu.

Se realizan las siguientes recomendaciones a la comunidad, para cuidado y correcto funcionamiento del sistema:

- Limpieza: asegurar una correcta limpieza y mantenimiento para evitar la acumulación de residuos.
- Bombas: Verificar el estado físico, verificar el voltaje teniendo en cuenta el tablero eléctrico en la caseta del sistema.
- Fugas: Verificar que no existan fugas, en caso de presentarse cerrar todas las válvulas y llamar al servicio técnico.
- Operatividad: La operatividad solo debe estar a cargo de personal capacitado, Usar hipoclorito de calcio al 50%.
- Monitoreo: Realizar toma de análisis de agua cruda y potable, realizar calibraciones y mantenimientos periódicos para asegurar mediciones precisas.
- Cambios: Realizar solo recambios originales de cada uno de los componentes, no realizar modificaciones a la planta.

	
Fotografía 1. Reunión con comunidad de La Esperanza.	**Fotografía 2.** Tanques de almacenamiento.
	
Fotografía 3. Capacitación al sistema fotovoltaico.	**Fotografía 4.** Capacitación sobre la captación del sistema.
	
Fotografía 5. Sistema de filtración en la comunidad de La Esperanza.	**Fotografía 6.** Sistema eléctrico de planta de filtración.

MAKÚ (Maicao):

- 04 de septiembre de 2024: Se realizó visita técnica de acompañamiento para la realización del momento 2 (conozcamos nuestro sistema) donde se realiza la capacitación técnica de la operación del sistema en la comunidad de Makú del contratista derivado **Consorcio Hidrogiajira**. En esta comunidad se presentaron las siguientes observaciones:

Se realiza visita a la comunidad de Makú, en el municipio de Maicao, en compañía de Findeter, Interventoría y Contratista, para la realización del momento 2 (Conozcamos nuestro sistema) para la capacitación sobre la operación de la planta de filtración.

El contratista inicia con la capacitación con la presentación del diagrama de flujo de la PTAP, en donde se evidencia detalladamente su composición:

1- Captación desde el pozo profundo.
2- Filtración (Clarificación)
3- Microfiltración
4- Desinfección del agua con cloro

Entre sus partes se utiliza para el sistema microfiltros, filtros 1 y 2, bomba dosificadora, tanque de cloro, tablero eléctrico, bomba de baja presión, inversor de corriente, además del sistema fotovoltaico (paneles solares), tanques de almacenamiento de agua cruda y potable.

El contratista explica paso a paso la operación del sistema a la comunidad y algo también importante, la operación y el mantenimiento preventivo que tendrá el sistema para su mayor durabilidad en el tiempo.

Como recomendaciones se realizan las siguientes:

- Limpieza: asegurar una correcta limpieza y mantenimiento para evitar la acumulación de residuos.
- Bombas: Verificar el estado físico, verificar el voltaje en los tableros instalados en la caseta del sistema de tratamiento.
- Fugas: Verificar que no existan fugas, en caso de presentarse cerrar todas las válvulas y llamar al servicio técnico.
- Operatividad: La operatividad solo debe estar a cargo de personal capacitado, Usar hipoclorito de calcio al 50%.
- Monitoreo: Realizar toma de análisis de agua cruda y potable, realizar calibraciones y mantenimientos periódicos para asegurar mediciones precisas.
- Cambios: Realizar solo recambios originales de cada uno de los componentes, no realizar modificaciones a la planta.

	
Fotografía 1. Reunión para capacitación del sistema en Makú.	Fotografía 2. Capacitación en el sistema fotovoltaico (paneles solares).
	
Fotografía 3. Tanques de almacenamiento.	Fotografía 4. Capacitación en el sistema de filtración instalado.

- El día 04 de septiembre se realizó reunión presencial en las oficinas del MVCT con el equipo social y técnico de Findeter y sus contratistas derivados, donde se exponen temas relacionados a las reasignaciones de comunidades para su intervención, esto debido a que después de realizar diagnósticos, no cumplieron con los parámetros para ser intervenidas, teniendo en cuando lo anterior, el Ministerio entregó las siguientes comuniadades a Findeter:

#	Municipio	Comunidad	Corregimiento	Asignación
1	Uribia	Cadenachon	Cardón	**Cerrejón**
2	Uribia	Karraloutamana	Cardón	**Cerrejón**
3	Uribia	Amasirralu	Cardón	**Cerrejón**
4	Uribia	Santana Norte	Cardón	**Cerrejón**

5	Uribia	Ishirrouwou	Cardón	**Cerrejón**
6	Uribia	Tutchonca	Cardón	**Cerrejón**
7	Uribia	Kerirarimana	Cardón	**DAPRE**

TODOS POR LA GUAJIRA

	Municipio	Comunidad	Corregimiento	Asignación
1	Uribia	Yourepo	Cardon	**Cerrejón**
2	Uribia	Pinskit	Cardon	**Cerrejón**
3	Uribia	Panchomana	Cardon	**Cerrejón**
4	Uribia	Shimolu	Cardon	**Cerrejón**
5	Uribia	México	Cardon	**Cerrejón**
6	Uribia	Olocomana	Cardon	**Cerrejón**
7	Uribia	Jatto	Cardon	**Cerrejón**
8	Uribia	Shilowuo	Cabo de la Vela	Tiller
9	Uribia	cashusi	Cabo de la Vela	Tiller
10	Riohacha	Jatutuli	Riohacha	Tiller
11	Riohacha	Talawaa inro	Riohacha	Tiller
12	Riohacha	Tablazo	Riohacha	Tiller

	SOL GUAJIRO			
		Comunidad	Corregimiento	Asignación
1	Uribia	Arayad	Jonjoncito	Radicado carta
2	Uribia	Lutaka	Jonjoncito	Radicado carta
3	Uribia	Polotuu	Jonjoncito	Radicado carta
4	Uribia	Polvorin	Cardón	Mesa cardon

	SUKUAIPA			
	Municipio	Comunidad	Corregimiento	Asignación
1	Manaure	Potorkishimana	Manaure	DARPRE
2	Manaure	Cojore	Pájaro	DARPRE

	ARAURAYUU			
	Municipio	Comunidad	Corregimiento	Asignación
1	Uribia	Karaipia – Norte	Tawaira	Zona Norte
2	Uribia	Rroya	Nazareth	Zona Norte
3	Uribia	Wattunaru (5)	Nazareth	Zona Norte
4	Uribia	ALOULIYAPU	Tawaira	Zona Norte

	SUAZA			
	Municipio	**Comunidad**	**Corregimiento**	**Asignación**
1	Maicao	Pepeshi	Paraguachon	Mesa Tranquer
2	Manaure	Urrachichon	Pájaro	Radicado carta
3	Maicao	Ishain	Maicao	Cerrejón
4	Manaure	Maschon	Manaure	Tiller

- El 06 de septiembre de 2024 se realizó visita técnica de acompañamiento para la realización del momento 2 (conozcamos nuestro sistema) donde se realiza la capacitación técnica de la operación del sistema en la comunidad de Alewa Los Monos. En esta comunidad se presentaron las siguientes observaciones:

ALEWA LOS MONOS, RIOHACHA:

Se realiza visita a la comunidad de Alewa Los Monos, en el municipio de Riohacha, en compañía de Findeter, Interventoría y Contratista, para la realización del momento 2 (Conozcamos nuestro sistema) para la capacitación sobre la operación de la planta de filtración.

El contratista inicia con la capacitación con la presentación del diagrama de flujo de la PTAP, en donde se evidencia detalladamente su composición:

1- Captación desde el pozo profundo.
2- Filtración (Clarificación)
3- Microfiltración
4- Desinfección del agua con cloro

Entre sus partes se utiliza para el sistema microfiltros, filtros 1 y 2, bomba dosificadora, tanque de cloro, tablero eléctrico, bomba de baja presión, inversor de corriente, además del sistema fotovoltaico (paneles solares), tanques de almacenamiento de agua cruda y potable.

El contratista explica paso a paso la operación del sistema a la comunidad y algo también importante, la operación y el mantenimiento preventivo que tendrá el sistema para su mayor durabilidad en el tiempo.

Como recomendaciones se realizan las siguientes:

- Limpieza: asegurar una correcta limpieza y mantenimiento para evitar la acumulación de resultados.
- Bombas: Verificar el estado físico, verificar el voltaje en los tableros instalados en la caseta del sistema de tratamiento.
- Fugas: Verificar que no existan fugar, en caso de presentarse cerrar todas las válvulas y llamar al servicio técnico.
- Operatividad: La operatividad solo debe estar a cargo de personal capacitado, Usar hipoclorito de calcio al 50%.
- Monitoreo: Realizar toma de análisis de agua cruda y potable, realizar calibraciones y mantenimientos periódicos para asegurar mediciones precisas.

Cambios: Realizar solo recambios originales de cada uno de los componentes, no realizar modificaciones a la planta.

	
Fotografía 1. Capacitación al sistema de filtración.	Fotografía 2. Infraestructura del sistema en la comunidad de Alewa Los Monos.
	
Fotografía 3. Capacitación al sistema de filtración.	Fotografía 4. Capacitación al sistema de filtración.

GUAYABITA, MUNICIPIO DE MAICAO:

- 07 de septiembre de 2024: Se realizó visita técnica de acompañamiento para la realización del momento 2 (conozcamos nuestro sistema) donde se realizaría la capacitación técnica de la operación del sistema en la comunidad de Guayabita. En esta comunidad se presentaron las siguientes observaciones:

Inicialmente se realizó desplazamiento al municipio de Maicao para luego desplazarnos a la comunidad de Guayabita, pero al momento de llegar al municipio se presenta fuerte lluvia que no permite llegar hasta Guayabita.

En compañía de la Interventoría y del Contratista **CONSORCIO HIDROGUAJIRA**, se visitó la residencia de la autoridad, donde se explicó que debido a las condiciones de lluvia, no sería posible la capacitación y tocaría reprogramar para la semana siguiente. La autoridad de igual forma comenta sobre algunos inconformismos con la infraestructura los cuales son:

- En la socialización se dijo que sería un sistema hibrido entre el sistema fotovoltaico y eólico, pero que a la fecha el molino está desarmado.
- La pintura en las estructuras de los paneles falta.
- Los muros de los puntos de suministro se encuentran en mal estado.
- Hay fuga en la salida del tanque de almacenamiento de agua potable.

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio informa que pondrá en conocimiento de FINDETER toda esta situación en el próximo comité de seguimiento con las partes, para llegar a una pronta solución.



Fotografía 1. Reunión con autoridad de la comunidad de Guayabita – Maicao.



Fotografía 2. Reunión con autoridad de la comunidad de Guayabita – Maicao.

- 11 de septiembre de 2024: Se realiza comité de seguimiento al convenio 1205 de 2023 con Findeter, donde se presentan los avances porcentuales de cada una de las obras en ejecución:

CONTRATISTA	ESTADO	COMUNIDAD	AVANCE
HIDROGUAJIRA	MEJORADO O EJECUCIÓN	Alewa los monos	100,00%
		San felipe	100,00%
		Maku	100,00%
		Guayabita	100,00%
		La esperanza	100,00%
		Maicaito	94,99%
		Merrattushi	96,90%

		Irramashira	28,33%
		Icipa	14,68%
		Loma fresca	18,10%
	POR INICIAR	Pesua	-
		Totopana	-
	POR PROPUESTAS	Toromana	-
		Cactus	-
ÉTNICO WAYUU	MEJORADO O EJECUCIÓN	Rancho grande	100,00%
		Wososopo	12,62%
		Barranca	24,46%
	POR INICIAR	Mashulimana	-
		Chorroise	-
		Ayutpana	-
		Patsuaina	-
		Malajalipa	-
		Buenavista	-
ARAURAYU	MEJORADO O EJECUCIÓN	Aiparao	100,00%
		Kaipawou	100,00%
		Messou	98,52%
		Samaria	98,64%
		Monterrey	96,35%
		Polujali	84,12%
	POR INICIAR	Alas	-
		Wuipa	-
		Chiriguana	-
		Romana	-
		Itain	-
	POR PROPUESTAS	Guaymachon	-
SUKUAIPA	MEJORADO O EJECUCIÓN	Maniature	100,00%
		Cojemana	100,00%
		Amatunao	100,00%
		Eirratamana	100,00%
		Perraca Sabana	23,95%
		Masheinshaka	24,97%
	POR PROPUESTAS	Ishashimana	-
		Playón	-

SOL GUAJIRO	MEJORADO O EJECUCIÓN	Villa Lourdes - Camino verde	100,00%
		Ishishon Kai	100,00%
		Mai	17,38%
		Capernaum	94,29%
		Samutpio	14,69%
	POR INICIAR	Kasiporchi	-
	POR PROPUESTAS	Taiwachon	-
		Nueva esperanza	-
		Kulesiamana	-
		Paroujamana	-
JOSE LUIS SUAZA	MEJORADO O EJECUCIÓN	Shoshishon	100,00%
		Masheralain	100,00%
		Aturaimpa	100,00%
		Jaipa	100,00%
		Samutshira	100,00%
		Pesuapa	100,00%
	POR PROPUESTAS	Urraichirrapa	-
		Jauyamarraly	-
		Papsuarali	-
		Majayura	-
		Kaoripana	-
		Mashi	-
CONSTRIR GUAJIRA	MEJORADO O EJECUCIÓN	Zapatamana	100,00%
		Botoncho 2	100,00%
	POR PROPUESTAS	Buenavista	100,00%
		Tawaya	-
		Majayura	-
		Kaoripana	-
		Mashi	-
		Pepeshi	-
		Urraichichon	-
		Ishain	-
		Maschon	-
TODOS POR LA GUAJIRA	POR PROPUESTA	Jorroloupa, Talinnapa	-
		Jurimanouw	-

		Ichirrapa	-
		Yourepo	-
		Pinskit	-
		Panchomana	-
		Shimolu	-
		Mexico	-
		Olocomana	-
		Jatto	-
		Shilowou	-
		Cashushi	-
		Jatutuli	-
		Talawaiano	-
		Tablazo	-

- 14 de septiembre de 2024: Se realizó visita técnica de acompañamiento para la realización del momento 2 (conozcamos nuestro sistema) donde se realiza la capacitación técnica de la operación del sistema en la comunidad de Guayabita. En esta comunidad se presentaron las siguientes observaciones:

GUAYABITA, MAICAO:

Se realiza visita a la comunidad de Guayabita, en el municipio de Maicao, en compañía de Findeter, Interventoría y Contratista, para la realización del momento 2 (Conozcamos nuestro sistema) para la capacitación sobre la operación de la planta de filtración.

El contratista inicia con la capacitación con la presentación del diagrama de flujo de la PTAP, en donde se evidencia detalladamente su composición:

1- Captación desde el pozo profundo.
2- Filtración (Clarificación)
3- Microfiltración
4- Desinfección de antiincrustante
5- Remoción de sales y minerales por medio de Osmosis inversa
6- Desinfección del agua con cloro


Entre sus partes se utiliza para el sistema microfiltros, filtros 1 y 2, bomba dosificadora, bomba dosificadora de antiincrustante, tanque de cloro y antiincrustante, tablero eléctrico, bomba de baja presión, bomba de alta presión, inversor de corriente, además del sistema fotovoltaico (paneles solares), tanques de almacenamiento de agua cruda y potable.

El contratista explica paso a paso la operación del sistema a la comunidad y algo también importante, la operación y el mantenimiento preventivo que tendrá el sistema para su mayor durabilidad en el tiempo.

Como recomendaciones se realizan las siguientes:

- Limpieza: asegurar una correcta limpieza y mantenimiento para evitar la acumulación de resultados.
- Bombas: Verificar el estado físico, verificar el voltaje.
- Fugas: Verificar que no existan fugar, en caso de presentarse cerrar todas las válvulas y llamar al servicio técnico.
- Operatividad: La operatividad solo debe estar a cargo de personal capacitado, Usar hipoclorito de calcio al 50%.
- Monitoreo: Realizar toma de análisis de agua cruda y potable, realizar calibraciones y mantenimientos periódicos para asegurar mediciones precisas.

Cambios: Realizar solo recambios originales de cada uno de los componentes, no realizar modificaciones a la planta.

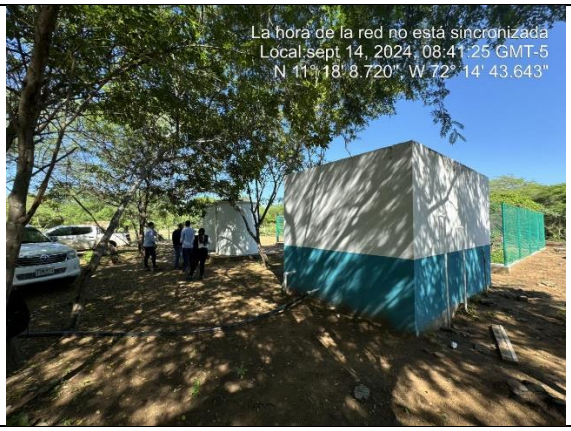	
Fotografía 1. Capacitación al sistema de osmosis inversa.	Fotografía 2. Remoción de sales y minerales por medio de osmosis inversa.
	
Fotografía 3. Sistema foltovoltaico.	Fotografía 4. Caseta y tanques de almacenamiento.

- 18 de septiembre de 2024: Se realiza comité de seguimiento al convenio 1205 de 2024 con Findeter, donde se presentan los avances porcentuales de cada una de las obras en ejecución:

CONTRATISTA	ESTADO	COMUNIDAD	AVANCE
HIDROGUAJIRA	MEJORADO O EJECUCIÓN	Alewa los monos	100,00%
		San felipe	100,00%
		Maku	100,00%
		Guayabita	100,00%
		La esperanza	100,00%
		Maicaito	94,09%
		Merrattushi	96,90%
		Irramashira	28,33%
		Icipa	18,68%
		Loma fresca	14,10%
		Totopana	1,26-
	POR INICIAR	Pesua	
	POR PROPUESTAS	Toromana	-
		Cactus	-
ÉTNICO WAYUU	MEJORADO O EJECUCIÓN	Rancho grande	100,00%
		Wososopo	12,62%
		Barranca	24,46%
	POR INICIAR	Mashulimana	-
		Chorroise	-
		Ayutpana	-
		Patsuaina	-
		Malajalipa	-
		Buenavista	-
ARAURAYU	MEJORADO O EJECUCIÓN	Aiparao	100,00%
		Kaipawou	100,00%
		Messou	98,52%
		Samaria	98,64%
		Monterrey	96,35%
		Polujali	84,12%
	POR INICIAR	Alas	-
		Wuipa	-
		Chiriguana	-
		Romana	-

		Itain	-
	POR PROPUESTAS	Guaymachon	-
SUKUAIPA	MEJORADO O EJECUCIÓN	Maniature	100,00%
		Cojemana	100,00%
		Amatunao	100,00%
		Eirratamana	100,00%
		Perraca Sabana	23,95%
		Masheinshaka	24,97%
	POR PROPUESTAS	Ishashimana	-
		Playón	-
SOL GUAJIRO	MEJORADO O EJECUCIÓN	Villa Lourdes - Camino verde	100,00%
		Ishishon Kai	100,00%
		Mai	17,38%
		Capernaum	94,29%
		Samutpio	14,69%
	POR INICIAR	Kasiporchi	-
	POR PROPUESTAS	Taiwachon	-
		Nueva esperanza	-
		Kulesiamana	-
		Paroujamana	-
JOSE LUIS SUAZA	MEJORADO O EJECUCIÓN	Shoshishon	100,00%
		Masheralain	100,00%
		Aturaimpa	100,00%
		Jaipa	100,00%
		Samutshira	100,00%
		Pesuapa	100,00%
	POR PROPUESTAS	Urraichirrapa	-
		Jauyamarraly	-
		Papsuarali	-
		Majayura	-
		Kaoripana	-
		Mashi	-
CONSTRIR GUAJIRA	MEJORADO O EJECUCIÓN	Zapatamana	100,00%
		Botoncho 2	100,00%
		Buenavista	100,00%

	POR PROPUESTAS	Tawaya Majayura Kaoripana Mashi	- - - -
		Pepeshi	-
		Urraichichon	-
		Ishain	-
		Maschon	-
TODOS POR LA GUAJIRA	POR PROPUESTA	Jorroloupa, Talinnapa	-
		Jurimanouw	-
		Ichirrapa	-
		Yourepo	-
		Pinskit	-
		Panchomana	-
		Shimolu	-
		Mexico	-
		Olocomana	-
		Jatto	-
		Shilowou	-
		Cashushi	-
		Jatutuli	-
		Talawaiano	-
		Tablazo	-

El MVCT, solicitó a Findeter realizar las acciones pertinentes para que la ejecución del contrato interadministrativo se cumpla, teniendo en cuenta que a pesar de estar entregando infraestructuras, las comunidades siguen realizando observaciones sobre las obras realizadas. Ademas, también se solicita hacer entrega de las propuestas faltantes de los contratistas derivados y que se dé inicio a las que ya fueron aprobadas anteriormente.

- 23 de septiembre de 2024: se realiza reunión virtual con profesionales de Findeter para acordar la entrega de los insumos de la operación del sistema a las comunidades, en esta reunión se concertó entregar por parte del MVCT el formato para que Findeter haga su gestión de entrega a cada una de las comunidades que ya se han entregado formalmente. Esta acta será entregada a Findeter el dia 11/10/2024.

- 27 y 28 de septiembre de 2024: se realiza visita de campo en compañía de Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Dra. Helga Rivas, Viceministro de Agua y Saneamiento Básico, Dr. Edward Libreros, Findeter, Contratistas derivados e Interventoría para hacer seguimiento e inauguración de infraestructuras de abastecimiento de agua potable en distintas comunidades:

1. **Comunidad La Esperanza, municipio de Riohacha**

Se inició con la apertura del saludo de todos los miembros de la comunidad y de su autoridad tradicional y líder, ante el Viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico, seguidamente la autoridad tradicional narró en su idioma el agradecimiento por la rehabilitación de su sistema, y la calidad de agua que ahora consumen.

Posterior se realizó el recorrido por la infraestructura de agua potable en la cual participaron miembros de la comunidad de **La Esperanza**, FINDETER, contratista derivado Asociación HIDROGUAJIRA, y funcionarios del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio. Se destaca la apropiación y corresponsabilidad de la comunidad al conocer e identificar el uso de su sistema de agua. En cabeza de la comunidad se hace explicación sobre el funcionamiento del sistema, desde la captación del agua cruda hasta realizar todo su tratamiento en la planta para así entregar agua potable a toda la comunidad y beneficiarios.

2. **Comunidad Ceiwacal, municipio de Manaure**

Saludos de bienvenida por miembros de la comunidad de Ceiwacal, la comunidad destaca el avance de la obra que está en un 95%. La líder de la comunidad y miembros de su familia invitan al Viceministro de Agua potable y Saneamiento Básico, en conjunto con el contratista derivado Pastoral Social, quienes expusieron el progreso de la obra física. **La contratista se comprometió a culminar la obra en su 100%** en dos semanas, a los cual la comunidad hará veeduría. Esta obra consiste en realizar la captación de agua cruda y hacer un tratamiento por medio de un sistema de osmosis inversa el cual tratara y brindará agua potable a la comunidad y sus beneficiarios.

3. **Pila Pública de Sararao, Municipio de Maicao**

El Viceministro de Agua y Saneamiento Básico, en compañia del equipo Guajira realizó dialogo con los miembros de la corporación wayuu prestadores del servicio público de agua potable COWA, que son los prestadores del servicio público de agua potable en la zona rural dispersa del municipio de Maicao, con un enfoque diferencial y responsabilidad social, la cual lleva agua potable a 4 pilas aferentes. La pila pública de Sararao, asigna un cupo semanal de agua potable a las familias del territorio, teniendo en cuenta el número de integrantes.

4. **Botonchon 2, municipio de Maicao.**

Se llevó a cabo el desarrollo del evento de inauguración del sistema de tratamiento para el abastecimiento de agua potable en la comunidad, presidido por la Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Viceministro de Agua Potable, el alcalde de Maicao, la Autoridad tradicional de la comunidad de Botonchon 2 y demás miembros de la comunidad.

- Recorrido por el sistema de abastecimiento de agua potable

- Marca de huellas con la mano, Wuin Ulees
- Inicio acto protocolario
- Palabras de la Autoridad de la comunidad
- Palabras del alcalde de Maicao
- Palabras del Viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico
- Palabras de la Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio
- Acróstico por parte de los niños y niñas de la comunidad
- Fotografía final del evento

Esta comunidad se encuentra en un 100% de ejecución en su componente de Infraestructura, de la cual ya se recibió por medio de acta de entrega del componente con fecha 31 de julio de 2024.

5. Zapatamana, municipio de Uribia

Se desarrolló el acto protocolario de inauguración del sistema de abastecimiento de agua potable presidido por la Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Viceministro de Agua Potable, en la comunidad de Zapatamana, inauguran la Autoridad tradicional de la comunidad de Zapatamana y demás miembros de la comunidad. Esta comunidad ya cuenta con comité de agua aprobado en espacio propio, en donde eligieron; presidente, Vocal, secretaria, Tesorero y Fontanero.

- Presentación de la danza Younna
- Corte de cinta de inauguración
- Explicación por miembros de la comunidad acerca del uso del sistema de agua potable
- Inicio acto protocolario
- Palabras de la Autoridad de la comunidad
- Presentación del Comité de Agua de la comunidad de Zapatamana
- Palabras del Viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico
- Palabras de la Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio
- Fotografía final del evento

Esta comunidad se encuentra en un 100% de ejecución en su componente de Infraestructura, de la cual ya se recibió por medio de acta de entrega del componente con fecha 31 de julio de 2024.

6. Pepsuapa, municipio de Uribia

La comunidad de Pepsuapa, ubicada cerca del casco urbano de Uribia, cuenta con un sistema de agua potable y una línea de agua hasta la escuela. Se desarrolló un recorrido por el sistema de potabilización en donde se sostuvo un dialogo con la comunidad, en donde la Autoridad de la comunidad hizo una petición y fue la de una asistencia técnica por parte del equipo territorial de La Guajira, acerca de las alternativas para la sostenibilidad del sistema.

Sábado 28 de septiembre de 2024

7. **Wososopo, municipio de Uribia**

En compañía de los representantes de Findeter, la Interventoría, y el viceministro de Agua y Saneamiento Básico, Edward Libreros, se realizó una visita técnica a la infraestructura de agua que esta llevado a cabo la asociación indígena Etnico Wayuu, para conocer el estado de retraso de la obra e iniciar un seguimiento.

Se pudo evidenciar importantes retrasos en la obra, estos atrasos en el proyecto están causando una gran molestia en los miembros de la comunidad de Wososopo, quienes manifiestan que la obra debió terminar hace meses.

Findeter informa que ha tratado de comunicarse con la asociación Étnico Wayuu para que informe sobre los atrasos, sin tener respuesta de la misma.

Frente al cumplimiento desde la aprobación tienen un porcentaje de ejecución inferior al 15% tiene un retraso del 85%.

Frente a este retraso se hicieron los siguientes compromisos

- Se acordó que el contratista debería iniciar obra el día lunes 30 de septiembre de 2024 y tendrá solo 15 días para terminar toda la infraestructura.
- El contratista Étnico Wayuu no se presentó en la comunidad el día 30 de septiembre para retomar las obras.


8. **Cojemana, municipio de Manaure**

En la comunidad de Cojemana se dialogó con la autoridad y miembros de la comunidad en donde se les informó que el viceministro de Agua y Saneamiento Básico, Edward Libreros, por cuestión de tiempo no alcanzó a llegar a la comunidad de Cojemana. La comunidad comprendió y agradeció que hayamos llegado.

La infraestructura se encuentra ejecutada en un 100% en su componente de infraestructura y recibido por medio de acta de entrega del componente con fecha de 31 de agosto de 2024.

Compromisos

- El viceministro debe volver a la comunidad para socializar las intervenciones realizadas por el MVCT.
- La comunidad pidió un cerramiento de la fuente agua y los tanques de almacenamiento. Inicialmente esto no estaba contemplado en el alcance inicial, por lo que el Ministerio se dispone a estudiar la posibilidad de la solicitud.

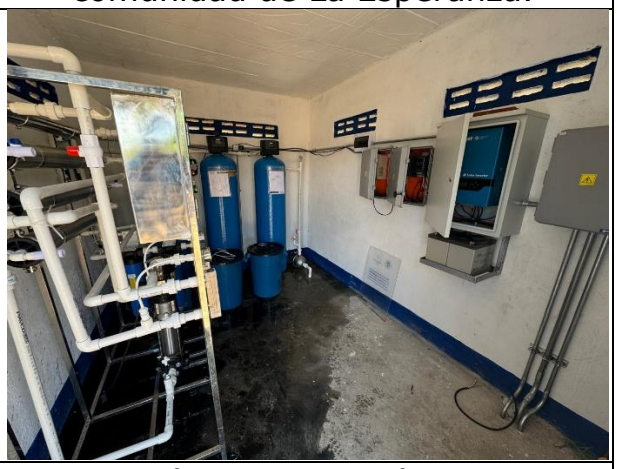	
Fotografía 1. Socialización en la comunidad La Esperanza.	Fotografía 2. Explicación sobre el funcionamiento del sistema en la comunidad de La Esperanza.
	
Fotografía 3. Socialización en la comunidad Ceiwacal.	Fotografía 4. Explicación sobre el funcionamiento del sistema en la comunidad de Ceiwacal.
	

Fotografía 5. Pila Pública de sararao.	Fotografía 6. Pila Pública de sararao.
	
Fotografía 7. Socialización en la comunidad de Botoncho 2.	Fotografía 8. Infraestructura de abastecimiento de agua potable en la comunidad de Botoncho 2.
	
Fotografía 9. Inauguración del sistema de tratamiento en la comunidad de Zapatamana.	Fotografía 10. Planta de osmosis inversa en la comunidad de Zapatamana.

	
Fotografía 11. Socialización en la comunidad de Petsuapa.	Fotografía 12. Sistema de abastecimiento de agua potable en la comunidad de Petsuapa.
	
Fotografía 13. Socialización en la comunidad en la comunidad de Wososopo.	Fotografía 14. Seguimiento a la ejecución del componente de infraestructura en la comunidad de Wososopo.

	
Fotografía 15. Socialización en la comunidad de Cojemana.	Fotografía 16. Sistema de abastecimiento de agua potable en la comunidad de Cojemana.

- **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A CORTE AGOSTO POR CONTRATISTA Y TOTAL DEL CONVENIO:**

Según consta en el informe remitido por FINDETER el día 10/10/2024 con radicado No 2202450510878:

PORCENTAJE DE AVANCE	
ARAURAYU	55,84%
SOL GUAJIRO	37,79%
ÉTNICO WAYUU	30,06%
HIDROGUAJIRA	67,84%
SUKUAIPA	61,39%
JOSE LUIS SUAZA	63,77%
CONSTRUIR GUAJIRA	34,58%
TODOS POR LA GUAJIRA	9,75%
TOTAL CONVENIO	**40.00%**

SISTEMAS COMUNITARIOS DE ACCESO AL AGUA TERMINADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024:

CONTRATISTA	COMUNIDAD	MUNICIPIO
HIDROGUAJIRA	MAICAITO	MAICAO
SUKUAIPA	COJEMANA	MANAURE
ARAURAYU	POLUJALI	URIBIA
HIDROGUAJIRA	ICIPA	MANAURE
HIDROGUAJIRA	LOMA FRESCA	MAICAO
HIDROGUAJIRA	IRRAMASHIRA	MAICAO

De estos sistemas comunitarios terminados, a la fecha no se han entregado las actas de terminación del componente de infraestructura, debido a que se encuentra en trámites de firmas por parte de Findeter y sus Contratistas.

Gestión Social

El Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio lidera la estrategia social y de aseguramiento para la promoción de la gestión comunitaria del agua en cada una de las comunidades que se han rehabilitado en el marco de este convenio.

A continuación, se describe las actividades realizadas.





Implementación del momento 3-Parte 2 organicémonos para la gestión del agua em nuestro territorio. Se desarrollo el 3/09/2024 en el municipio de Uribia en la comunidad **CAMINO VERDE – VILLA LOURDES** con la participación de **37 personas**, de los cuales fueron **31** adultos y **6** NNA. La actividad fue desarrollada por los profesionales sociales del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio; Ismeira Fince y Alcides Escobar.





Implementación del momento 3-Parte 2 organicémonos para la gestión del agua em nuestro territorio. 3/09/2024 en el municipio de Uribia en la comunidad **ICHICHON** con la participación de **52 personas**, de los cuales fueron **30** adultos y **22** NNA. La actividad fue desarrollada por los profesionales sociales del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio; Ismeira Fince y Alcides Escobar.





Implementación del momento 2 Conozcamos nuestro sistema en la comunidad **LA ESPERANZA -RIOHACHA** el día 03/09/2024 con la participación de 33 personas, de los cuales fueron 19 adultos y 14 NNA, la actividad fue liderada por la contratista Hidroguajira y acompañada por los profesionales del Ministerio de Vivienda, Yuliana Hernández y Luis Olivella





Implementación del momento 2 Conozcamos nuestro sistema en la comunidad **MAKÚ – MAICAO** el día 04/09/2024 con la participación de 15 personas, de los cuales fueron 15 adultos, la actividad fue liderada por la contratista Hidroguajira acompañada por los profesionales del Ministerio de Vivienda, Yuliana Hernández y Luis Olivella.





Implementación del momento 3-Parte 1 organicémonos para la gestión del agua em nuestro territorio. 5/09/2024 en el municipio de Uribia en la comunidad **BOTONCHON 2** con la participación de **64 personas**, de los cuales fueron **47** adultos y **17** NNA. La actividad fue desarrollada por los profesionales sociales del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio; Ismeira Fince y Alcides Escobar.





Implementación del momento 3-Parte 2 organicémonos para la gestión del agua em nuestro territorio. 5/09/2024 en el municipio de Uribia en la comunidad **ZAPATAMANA** con la participación de **23 personas**, de los cuales fueron **16** adultos y **7** NNA. La actividad fue desarrollada por los profesionales sociales del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio; Ismeira Fince y Alcides Escobar.





Implementación del momento 2 Conozcamos nuestro sistema. 6/09/2024 en el municipio de Riohacha en la comunidad **BUENAVISTA** con la participación de **30 personas**, de los cuales fueron **18** adultos y **12** NNA. La actividad fue liderada por la constratista Costruir Guajira y con el acompañamiento de los profesionales sociales del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio; Ismeira Fince y Alcides Escobar.





Implementación del momento 2 Conozcamos nuestro sistema en la comunidad **ALEWA DE LOS MONOS – RIOHACHA** el día 06/09/2024 con la participación de 16 personas, de los cuales fueron 16 adultos, la actividad fue liderada por la contratista Hidroguajira y acompañada por los profesionales del Ministerio de Vivienda, Yuliana Hernández y Luis Carlos Olivella.





Implementación del momento 2 Conozcamos nuestro sistema. 10/09/2024 en el municipio de Uribia en la comunidad **SOCHINCHON** con la participación de **20 personas**, de los cuales fueron **15** adultos y **5** NNA. La actividad fue liderada por el contratista José Luis Suaza, y acompañada por los profesionales sociales del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio; Ismeira Fince y Alcides Escobar.





Implementación del momento 3-Parte 1 organicémonos para la gestión del agua em nuestro territorio. 10/09/2024 en el municipio de Uribia en la comunidad **PEPSUAPA** con la participación de **16 personas**, de los cuales fueron **16** adultos. La actividad fue desarrollada por los profesionales sociales del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio; Ismeira Fince y Alcides Escobar.





Implementación del momento 1 ¿Por qué es importante la gestión del agua y el saneamiento básico en nuestra comunidad? En el municipio de Manaure en la comunidad **MASHENSHAKAT – MANAURE** el día 10/09/2024 con la participación de 26 personas, de los cuales fueron 23 adultos y 3 NNA, la actividad fue desarrollada por los profesionales Yuliana Hernández y Keyla Fernández.





Implementación del momento 3 "Organicémonos para la gestión del agua en nuestro territorio" el día 11/09/2024 en el municipio de Manaure en la comunidad **COSEMANA** con la participación de 43 personas, de los cuales fueron 27 adultos y 16 NNA. La actividad fue desarrollada por los profesionales del Ministerio de Vivienda Jorge Amaya y Keyla Fernández.





Implementación del momento 3 "Organicémonos para la gestión del agua en nuestro territorio" el día 11/09/2024 en el municipio de Manaure en la comunidad MANIATURE participaron 45 personas de los cuales fueron 24 adultos y 21 NNA. La actividad fue desarrollada por los profesionales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jorge Amaya y Keyla Fernández.





Implementación del momento 3-Parte 2 organicémonos para la gestión del agua em nuestro territorio. 12/09/2024 en el municipio de Uribia en la comunidad **ZAPATAMANA** con la participación de **50 personas**, de los cuales fueron **27** adultos y **23** NNA. La actividad fue desarrollada por los profesionales sociales del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio; Ismeira Fince y Alcides Escobar.





Implementación del momento 1 ¿Por qué es importante la gestión del agua y el saneamiento básico en nuestra comunidad? El día 10/09/2024 en el municipio de Manaure en la comunidad de **PERRAKAT** con la participación de 44 personas, de los cuales fueron 19 adultos y 25 NNA. La actividad fue desarrollada por los profesionales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jorge Amaya y Keyla Fernández.





Implementación del momento 1 ¿Por qué es importante la gestión del agua y el saneamiento básico en nuestra comunidad? El día 10/09/2024 en el municipio de Manaure en la comunidad **LOMA FRESCA** participaron 39 personas de las cuales fueron 29 adultos y 10 NNA. La actividad fue desarrollada por los profesionales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jorge Amaya y Keyla Fernández.




Momento 0: "*Conozcámonos para la GCAyS" en la comunidad* ***Quejamana*** **/ Manaure** implementado el día 13/09/2024. Con la participación de 40 personas, 22 adultos y 18 NNA. Esta actividad fue liderada los profesionales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jorge Amaya y Keyla Fernández.





Implementación del momento 3 sección 1: Organización Social para la Gestión Comunitaria del Agua en la comunidad de **IRRAMASHIRA – MAICAO** el día 17/09/2024 con la participación de 34 personas, de los cuales fueron 22 adultos y 12 NNA, la actividad acompañada por la profesional Yuliana Hernández y Keyla Fernández.



Implementación del momento 3-Parte 1 organicémonos para la gestión del agua en nuestro territorio. 18/09/2024 en el municipio de Uribia en la comunidad **CAPERNAUM** con la participación de **36 personas**, de los cuales fueron **20** adultos y **16** NNA. La actividad fue desarrollada por los profesionales Ismeira y Alcides.



Implementación del momento 3-Parte 1 organicémonos para la gestión del agua em nuestro territorio. 18/09/2024 en el municipio de Uribia en la comunidad **JAIPA** con la participación de **29 personas**, de los cuales fueron **23** adultos y **6** NNA. La actividad fue desarrollada por los profesionales Ismeira y Alcides.





Implementación del momento 1. 19/09/2024 en el municipio de Uribia en la comunidad **SAMUTSHIRRA** con la participación de **53 personas**, de los cuales fueron **35** adultos y **16** NNA. La actividad fue desarrollada por los profesionales Ismeira y Alcides.





Implementación del momento 3 "Organicémonos para la gestión del agua en nuestro territorio" el día 20/09/2024 en el municipio de Manaure en la comunidad **EIRRATAMANA** con la participación de 25 personas, de los cuales fueron 16 adultos y 9 NNA. La actividad fue desarrollada por los profesional Yuliana Hernández y Keyla Fernández.





Implementación del momento 3-Parte 2 organicémonos para la gestión del agua em nuestro territorio. 24/09/2024 en el municipio de Uribia en la comunidad **BOTONCHON 2** con la participación de **70 personas**, de los cuales fueron **40** adultos y **30** NNA. La actividad fue desarrollada por los profesionales Ismeira y Alcides





Implementación del momento 1 ¿Por qué es importante la gestión del agua y el saneamiento básico en nuestra comunidad? En la comunidad de **WOSOSOPO – URIBIA** el día 24/09/2024 con la participación de 34 personas, de los cuales fueron 21 adultos y 13 NNA, la actividad acompañada por la profesional de aseguramiento y gestión social del equipo territorial del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

9. SEGUIMIENTO COMPONENTE JURÍDICO:

Durante el mes de septiembre de 2024 correspondiente al periodo del presente informe y acorde al apoyo a la supervisión técnica y jurídica, se informa que existen algunos retrasos en el cronograma de ejecución de actividades, los cuales FINDETER se encuentra gestionando con sus contratistas derivados, para lo cual le informa al ministerio que ha realizado las siguientes actuaciones:

Según la información suministrada por Findeter por medio de oficio con RAD. 2202450510878, REMISIÓN INFORME DE GESTIÓN No. 13:

ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES SOL GUAJIRO: en proceso de apremio a la asociación por parte de Findeter debido a el atraso en la ejecución del convenio solidario; se programó reunión presencial en las instalaciones de Findeter a la representante legal de la asociación para el día 10 de octubre de 2024, para tratarán los atrasos del mismo.

ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES TERRITORIO ÉTNICO WAYUU: en proceso de apremio a la asociación por parte de Findeter debido al atraso en la ejecución del convenio solidario; se programó reunión presencial en las instalaciones de Findeter a la representante legal de la asociación para el día 10 de octubre de 2024, para tratarán los atrasos del mismo.

A continuación se adjunta tabla de avances por contratista de ejecución vs programado, información suministrada por Findeter en documento Base de Seguimiento con corte a 31 de septiembre de 2024:

CONTRATISTA	CONTRATO	EJECUTADO	PROGRAMADO
HIDROGUAJIRA	001-2023	71,45%	86,62%
ÉTNICO WAYUU	002-2023	32,59%	86,74%
ARAURAYU	003-2023	55,48%	91,33%
SUKUAIPA	004-2023	61,39%	98,00%
SOL GUAJIRA	005-2023	37,79%	88,01%
JOSE LUIS MOVIL	001-2024	63,77%	77,01%
CONSTRUIR GUAJIRA	002-2024	34,65%	71,98%
TODOS POR LA GUAJIRA	003-PAF AASBGUAJIRA-0-047-2024	9,95%	68,10%

Requerimientos jurídicos remitidos:

- 02 de septiembre de 2024: Se requirió a Findeter información sobre el estado de la construcción de los bebederos.



Solicitud de Información sobre el Estado de Construcción de los bebederos

Luis Carlos Olivella Fernandez — Responder | Responder a todos | Reenviar — Lun 02/09/2024 18:25

Para: ALLAM ALEXANDER ALVARADO RUIZ <AAALVARADO@findeter.gov.co>; HENRY ANDRES GAÑAN LOPEZ <HAGANAN@findeter.gov.co>; **y 1 más**


CC: UT INTERGUAJIRA POTABLE <interguajira.potable@gmail.com>; Claudia Marcela Velasquez Bejarano; Aura Gisela Ospino Rico; **y 4 más**

Me permito solicitar información detallada sobre el estado actual de la construcción de los bebederos, los cuales fueron aprobados en comités anteriores. A la fecha, no hemos recibido la entrega de ninguno de estos, lo cual está afectando significativamente la ejecución de las obras de infraestructura de abastecimiento de agua y el cumplimiento de los tiempos establecidos en el cronograma.

COMUNIDAD	CONTRATISTA
RANCHO GRANDE	ÉTNICO
WOSOSOPO	ÉTNICO
MAICAITO	HIDROGUAJIRA
ICIPA	HIDROGUAJIRA
MAKU	HIDROGUAJIRA
SAN FELIPE	HIDROGUAJIRA
COJEMANA	SUKUAIPA
BOTONCHO 2	CONSTRUIR GUAJIRA
PEPSUAPA	JOSE LUIS SUAZA
MASHURRAMANA	ÉTNICO
CHIRIGUANA	ARAURAYU
WUIPA	ARAURAYU
ROMANA	ARAURAYU
BUENAVISTA	ÉTNICO
KALAJALIPA	ÉTNICO

Estos proyectos son de alta prioridad tanto para ustedes como para nosotros, por lo que agradeceríamos su pronta respuesta con un reporte del avance de las obras y una estimación actualizada de la fecha de entrega, teniendo en cuenta que ya hay obras que se encuentran terminadas y no se han podido reportar debido a la no construccion de estos bebederos.

- 05 de septiembre de 2024: Se envió a Findeter listado de comunidades reasignadas con diagnosticos para los diferentes contratistas derivados.

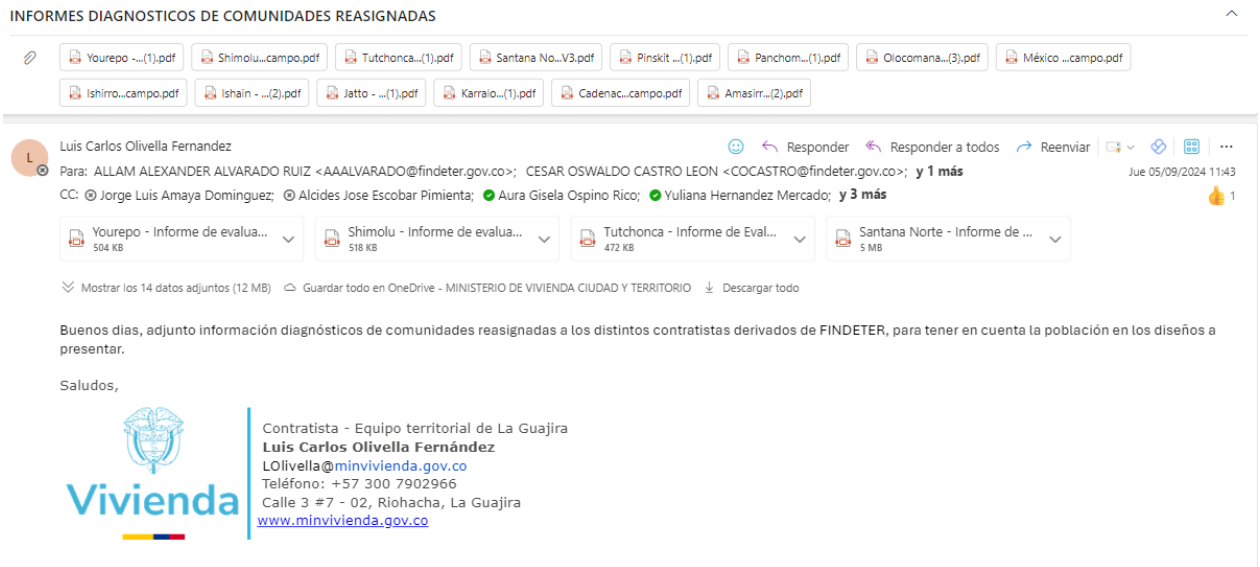

INFORMES DIAGNOSTICOS DE COMUNIDADES REASIGNADAS

Yourepo -...(1).pdf | Shimolu...campo.pdf | Tutchonca...(1).pdf | Santana No...V3.pdf | Pinskit ...(1).pdf | Panchom...(1).pdf | Olocomana...(3).pdf | México ...campo.pdf | Ishirro...campo.pdf | Ishain - ...(2).pdf | Jatto - ...(1).pdf | Karralo...(1).pdf | Cadenac...campo.pdf | Amasirr...(2).pdf

Luis Carlos Olivella Fernandez — Responder | Responder a todos | Reenviar — Jue 05/09/2024 11:43

Para: ALLAM ALEXANDER ALVARADO RUIZ <AAALVARADO@findeter.gov.co>; CESAR OSWALDO CASTRO LEON <COCASTRO@findeter.gov.co>; **y 1 más**

CC: Jorge Luis Amaya Dominguez; Alcides Jose Escobar Pimienta; Aura Gisela Ospino Rico; Yuliana Hernandez Mercado; **y 3 más**

Yourepo - Informe de evalua... 504 KB | Shimolu - Informe de evalua... 518 KB | Tutchonca - Informe de Eval... 472 KB | Santana Norte - Informe de ... 5 MB

Mostrar los 14 datos adjuntos (12 MB) | Guardar todo en OneDrive - MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO | Descargar todo

Buenos dias, adjunto información diagnósticos de comunidades reasignadas a los distintos contratistas derivados de FINDETER, para tener en cuenta la población en los diseños a presentar.

Saludos,

Vivienda

Contratista - Equipo territorial de La Guajira
Luis Carlos Olivella Fernández
LOlivella@minvivienda.gov.co
Teléfono: +57 300 7902966
Calle 3 #7 - 02, Riohacha, La Guajira
www.minvivienda.gov.co

- 16 de septiembre de 2024: se hace requerimiento a Findeter después de realizar visita a las infraestructuras en la comunidad de Guayabita y encontrar algunas observaciones en cuanto a calidad de la obra.



VISITA A LA COMUNIDAD GUAYABITA

WhatsApp ...(2).mp4 | WhatsApp ...(2).jpeg | WhatsApp...(11).jpeg | WhatsAp...08.43.jpeg | WhatsAp...08.42.jpeg | WhatsApp ...(2).jpeg | WhatsAp...08.41.jpeg

Buenos días, cordial saludo,

Después de realizar visita de acompañamiento al momento 2 (Conozcamos nuestro sistema), o capacitación sobre el funcionamiento del sistema, en compañia de UT INTERGUAJIRA y Contratista Hidroguajira, se pudieron notar todavía algunas observaciones de infraestructura que siguen persistiendo:

- Fuga de agua en accesorio de salida de tanque de agua tratada.
- Se encuentra construido muro de puntos de distribución, el cual se encuentra en malas condiciones, fisuras en la parte superior, hundimiento del muro de descanso.
- No se ha realizado la conexión del tanque que agua tratada a los puntos de suministro.
- Las estructuras de soporte de los paneles solares no tienen pintura anticorrosiva por lo que ya muestra signos de corrosión.
- Cuando se encienden las bombas dosificadoras, la pantalla que muestra el TDR en la planta de osmosis comienza a prenderse y apagarse.


Teniendo en cuenta que el próximo sábado se realizará la segunda capacitación del sistema, es importante ya se encuentren subsanados todos estos pendientes.

Saludos,

Vivienda

Contratista - Equipo territorial de La Guajira
Luis Carlos Olivella Fernández
LOlivella@minvivienda.gov.co
Teléfono: +57 300 7902966
Calle 3 #7 - 02, Riohacha, La Guajira
www.minvivienda.gov.co

- 16 de septiembre de 2024: Se informa a Findeter sobre la exclusión de la comunidad de ERCOJORE teniendo en cuenta que el pozo que hay en la comunidad se encuentra obstruido.

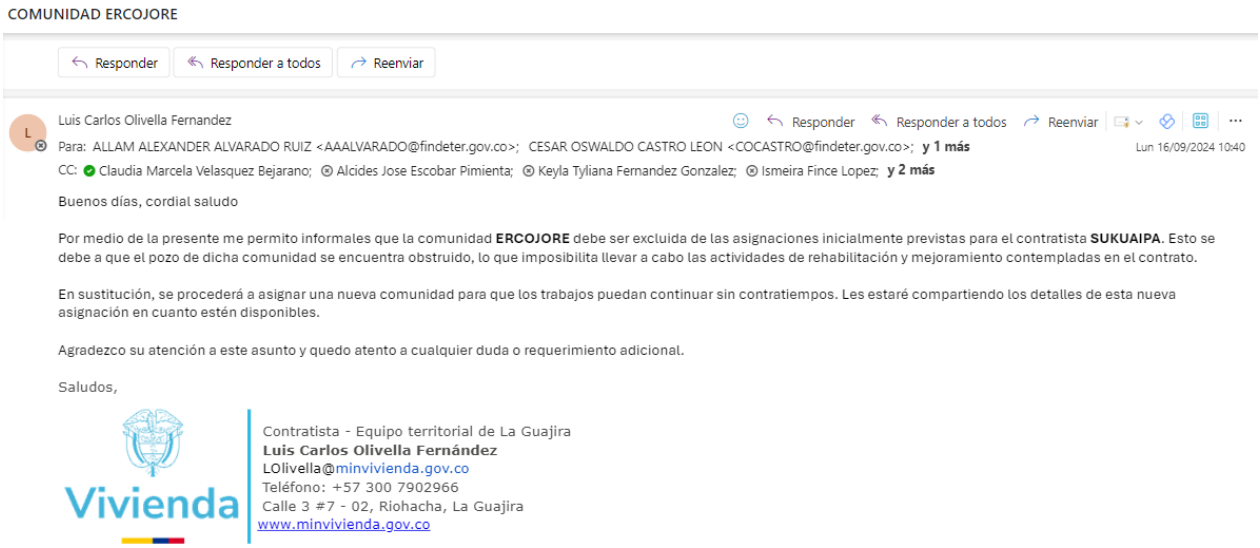

COMUNIDAD ERCOJORE

Responder | Responder a todos | Reenviar

Luis Carlos Olivella Fernandez

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para: ALLAM ALEXANDER ALVARADO RUIZ <AAALVARADO@findeter.gov.co>; CESAR OSWALDO CASTRO LEON <COCASTRO@findeter.gov.co>; **y 1 más** Lun 16/09/2024 10:40

CC: Claudia Marcela Velasquez Bejarano; Alcides Jose Escobar Pimienta; Keyla Tyliana Fernandez Gonzalez; Ismeira Fince Lopez; **y 2 más**

Buenos días, cordial saludo

Por medio de la presente me permito informales que la comunidad **ERCOJORE** debe ser excluida de las asignaciones inicialmente previstas para el contratista **SUKUAIPA**. Esto se debe a que el pozo de dicha comunidad se encuentra obstruido, lo que imposibilita llevar a cabo las actividades de rehabilitación y mejoramiento contempladas en el contrato.

En sustitución, se procederá a asignar una nueva comunidad para que los trabajos puedan continuar sin contratiempos. Les estaré compartiendo los detalles de esta nueva asignación en cuanto estén disponibles.

Agradezco su atención a este asunto y quedo atento a cualquier duda o requerimiento adicional.

Saludos,

Vivienda

Contratista - Equipo territorial de La Guajira
Luis Carlos Olivella Fernández
LOlivella@minvivienda.gov.co
Teléfono: +57 300 7902966
Calle 3 #7 - 02, Riohacha, La Guajira
www.minvivienda.gov.co

- 25 de septiembre de 2024: se da respuesta a Findeter sobre la solicitud de información en las comunidades de ISHIRROWOU, AMASIRRALU Y KOTORELAIN.



Reasignación de comunidades 20 de agosto

Reasiga...2024.xlsx

Luis Carlos Olivella Fernandez
Para: ALLAM ALEXANDER ALVARADO RUIZ <AAALVARADO@findeter.gov.co>
Mié 25/09/2024 17:12
CC: Claudia Marcela Velasquez Bejarano; CESAR OSWALDO CASTRO LEON <COCASTRO@findeter.gov.co>

Buenas tardes, cordial saludo Allan

En respuesta a tus observaciones:

1. El Ministerio se encuentra en comunicaciones con el Contratista que realizó el diagnostico, para dar una respuesta mas precisa sobre la fuente de agua de la comunidad de Ishirrowou, en tanto tengamos la información, se le entregará.
2. La comunidad de Amashirralu fue entregada a ustedes para su ejecución, con esa conductividad, teniendo en cuenta que en el contrato no hay nada que impida que pueda ejecutarse por sus contratistas derivados.
3. Teniendo en cuenta la conductividad alta y la población de 50 personas, no sería recomendable intervenir esta comunidad, no obstante, se puede averiguar si cuentan con alguna otra fuente de agua que pueda ser mejorada.

Saludos,

Vivienda
Contratista - Equipo territorial de La Guajira
Luis Carlos Olivella Fernández
LOlivella@minvivienda.gov.co
Teléfono: +57 300 7902966
Calle 3 #7 - 02, Riohacha, La Guajira
www.minvivienda.gov.co

<u>El presente informe se firma el día 08 de octubre de 2024, por la actual supervisora de conformidad con la información que reposa en el expediente contractual del mismo.</u>

CLAUDIA MARCELA VELASQUEZ BEJARANO
Supervisora
Contrato Inter-administrativo No. 1205 de 2023

VoBo. Luis Carlos Olivella Fernandez – Profesional de Apoyo Técnico

VoBo. Diana Clavijo Jaimes – Profesional de Apoyo Jurídico – Equipo Guajira

VoBo. Alcides Escobar Pimienta – Profesional de Apoyo Social
