ABACO S.A.S

Yopal, 08 de abril de 2024

ABACOSAS-2024-004.3

Sres.
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S. P
ING. LUIS RENE GRANADOS
ING. ELKIN OMAR ROMERO
SUPERVISORES DEL CONTRATO
Cra 19 No.6-100
Yopal-Casanare

REF: Contrato de consultoría 251 de 2023

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE MANÍ Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.".

ASUNTO: RADICACION DE INFORME MENSUAL INTERVENTORIA Y DE OBRA No.04- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

Cordial saludo,

Por medio de la presente remitimos informe mensual de interventoría No.04 del proyecto en referencia correspondiente al periodo del 01 de marzo al 31 de marzo de 2024.

Sin otro particular; en espera de su buena aceptación.

Atentamente;

Rdo. Supervisor.

GRUPO ABACO CONSULTORES S.A.S.
R/L. HERNAN ALBERTO FORERO JIMENEZ
Dirección: Carrera 4 N° 11 – 82
Email: grupoabacomani@gmail.com.
1 Carpetas interventoría 130 Folios
1 Carpetas obra 210 Folios

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 251-2023.

OBJETO: "INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE MANÍ Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.".

PERIODO: 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2024

CONTRATISTA: GRUPO ABACO CONSULTORES S.A.S
R/L HERNAN ALBERTO FORERO JIMENEZ.



SUPERVISION
ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO / LUIS RENE GRANADOS VARGAS
ENERCA S.A. E.S.P.

CONTRATO DE OBRA No. 250 DE 2023
CONTRATISTA
INGFOX S.A.S.
R/L. MAYRA LILIANA RODRIGUEZ CABULO

YOPAL-CASANARE

REVISION Y APROBACIÓN

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 251 DE 2023

"INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE MANÍ Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Titulo documento: Informe Mensual No. 4. MARZO 2024

Responsable de la Elaboración	Nombre	ETMAN GABRIEL NIÑO SANDOVAL.
	Cargo	Director de interventoría
	Firma	
	Fecha	MARZO 2024
Responsable de la revisión y aprobación	Nombre	HERNAN ALBERTO FORERO JIMENEZ
	Cargo	Representante Legal de la interventoría
	Firma	
	Fecha	MARZO 2024

Tabla de contenido

1. INTRODUCCION 7
2. ANTECEDENTES-DESCRIPCION GENERAL-ASPECTOS GENERALES. 8
2.1. DESCRIPCION DEL PROYECTO 8
2.1.1. Justificación. 8
2.1.2. Alcance del contrato de obra 8
2.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 9
3. AREA ADMINISTRATIVA Y JURIDICA 10
3.1. CONTROL ADMINISTRATIVO Y JURIDICO CONTRATO DE OBRA 10
3.1.1. Información Básica. 10
3.1.2. Personal Profesional Propuesto 11
3.1.3. Control personal mano de obra calificada / No calificada. 11
3.1.4. Control de equipo y maquinaria 12
3.1.5. Control de Acciones Administrativas 13
3.1.6. Control cumplimiento pago de parafiscales 13
3.1.7. Control de pólizas 14
3.2. CONTROL ADMINISTRATIVO Y JURIDICO CONTRATO DE INTERVENTORIA ... 18
3.2.1. Información General 18
3.2.2. Personal Profesional Propuesto 19
3.2.3. Acciones Administrativas 20
3.2.4. Seguimiento y control pago de seguridad social y parafiscales. 21
3.2.5. Control de Pólizas 22
3.2.6. Aprobación de Pólizas 23
4. AREA FINANCIERA Y CONTABLE 24
4.1. CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA 24
4.1.1. Control de pagos efectuados al contrato 24

4.1.2. Balance financiero del contrato 24
4.1.3. Control Anticipo 25
4.2. CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE AL CONTRATO DE INTERVENTORIA. .. 25
4.2.1. Control de pagos efectuados al contrato de interventoría 25
4.2.2. Balance financiero del contrato de interventoría 26
4.2.3. Seguimiento contable al contrato de interventoría No. 251 de 2023. 27
5. AREA TECNICA 27
5.1. CONTROL TECNICO AL CONTRATO DE OBRA 27
5.1.1. Normas técnicas aplicables a la obra. 27
5.1.2. Actividades Contractuales 28
5.1.3. Avance en plazo del contrato de obra No. 250 de 2023. 30
5.1.4. Actividades ejecutadas 30
5.1.5. Avance de obra 31
5.1.6. Inconvenientes y Determinaciones 33
5.1.7. Resumen del estado del clima en el área de trabajo 34
5.2. CONTROL TECNICO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA 35
5.2.1. Metodología y descripción de las actividades ejecutadas por la interventoría. .. 35
5.2.2. Actividades Contractuales 36
5.2.3. Relación Avance de ejecución 36
5.2.4. Actividades ejecutadas 37
5.2.5. Avance de interventoría 38
INFORMACION AMBIENTAL. 39
Disposición de aguas residuales 39
Control de nivel de ruido 39
Control Sobre emisión de gases 40
Disposición de residuos solidos 40
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 41

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Información básica del contrato de obra No. 250 de 20 10
Tabla 2. Personal Propuesto Contrato de Obra No. 250 de 2023 11
Tabla 3. Personal activo para la ejecución del contrato de obra No. 250 de 2023 12
Tabla 4 Control de Equipos 13
Tabla 5. Actos administrativos del Cto 250 de 2023. 13
Tabla 6. Actas de Comité y/o Socialización. 13
Tabla 7. Póliza de cumplimiento según minuta 15
Tabla 8. Póliza de responsabilidad civil según minuta 15
Tabla 9. Póliza de cumplimiento según acta de inicio 16
Tabla 10. Póliza de responsabilidad civil según acta de inicio 16
Tabla 11. Póliza de cumplimiento según prorroga No.1 17
Tabla 12. Póliza de responsabilidad civil según prorroga No.1 18
Tabla 13 Información básica del contrato de interventoría No. 251 de 2023 19
Tabla 14 Personal Propuesto contrato de Interventoría No. 251 de 2023. 20
Tabla 15. Actas Generadas para el contrato de interventoría No. 251 de 2023 20
Tabla 17. Actas Generadas para el contrato de interventoría No. 251 de 2023 21
Tabla 18. Póliza según Minuta 22
Tabla 19. Póliza según acta de inicio 23
Tabla 20. Póliza según prorroga No.1 23
Tabla 21. Avance financiero contrato de obra 250-2023 24
Tabla 22. Balance financiero del contrato de obra No. 250 de 2023 25
Tabla 23. Plan de inversión del anticipo Cto. 250 de 2023. 25
Tabla 24. Avance financiero contrato de interventoría No. 251 de 2023 26
Tabla 25. Balance del contrato de interventoría No. 251 de 2023 26
Tabla 26. Cantidades contractuales Cto. 250 29
Tabla 27. Planes Contemplados Cto. 250 29
Tabla 28. Avance plazo contractual 30
Tabla 29. Actividades Ejecutadas 31
Tabla 30. Relación % Programado vs % Ejecutado 32
Tabla 31. Actividades contractuales 36
Tabla 32. Control de ejecución interventoría 37

Tabla 33. Actividades Ejecutadas. 38
Tabla 34. Relación % Programado vs % Ejecutado 38

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización General Respecto al País y al Departamento 9
Ilustración 2.Ubicación Veredas Armenia y La Consigna 9
Ilustración 3.Grafico avance interventoría 38

LISTA DE GRAFICOS

Gráfico 1. Obra programada vs Obra ejecutada 32
Gráfico 2. Relación clima 34
Gráfico 3. Porcentaje ejecutado al corte y proyectado en meses restantes 38

1. INTRODUCCION

La Empresa de Energía de Casanare **ENERCA S.A. E.S.P**. celebró el contrato de Consultoría No. 251 de 2023 con la empresa **GRUPO ABACO CONSULTORES S.A.S**, cuyo objeto es la ***"INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE MANÍ Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"***, por un plazo de ejecución de cuatro (04) meses.

La ejecución física del proyecto está a cargo de la empresa **INGFOX S.A.S**., identificado con Nit. 901388183-3, representada legalmente por **MAYRA LILIANA RODRIGUEZ CABULO**, bajo el contrato de obra pública No. 250 del 30 de noviembre del 2023 mediante el proceso contratación con pluralidad de oferentes **SVO-GGAS-030-2023**.

De esta manera en el presente informe se muestra el desarrollo técnico, legal, administrativo y presupuestal de la obra en el periodo de tiempo comprometido **entre 01 de marzo y el 31 de marzo de 2024**, con el fin de informar a ENERCA S.A. sobre el cumplimiento de las actividades y los contratiempos presentados durante este tiempo en la ejecución del contrato de Obra pública No. 250 de 2023.

Esta interventoría garantizará la calidad del servicio y el cumplimiento de contrato de obra al que se le hará seguimiento, velando por la correcta ejecución para cumplir con las metas trazadas, para así poder favorecer a la comunidad, beneficiaria del proyecto.

2. ANTECEDENTES-DESCRIPCION GENERAL-ASPECTOS GENERALES.

2.1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1.1. Justificación.

Debido a la gran importancia en que la población rural del Departamento de Casanare cuente con el servicio de gas natural domiciliario, se logra estructurar un proyecto que abarca a las veredas Armenia, La Consigna del Municipio de Maní, pero además se logra vincular a la población del corregimiento de Morichal jurisdicción del municipio de Yopal. Para esto se logra que la administración departamental auné esfuerzos y en compañía de la empresa de Energía de Casanare ENERCA S.A., se logre consolidar el proyecto de gas natural para estas poblaciones, las cuales a la fecha seguían preparando sus alimentos ya sea con combustibles fósiles como la madera o con pipetas de gas, las cuales el día de hoy son costosas y no están al alcance de estas comunidades.

La **"CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE MANÍ Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"**, desarrolla la información necesaria para su construcción de acuerdo con el alcance y en los términos establecidos en la NTC 3728 en lo que al diseño hace referencia.

2.1.2. Alcance del contrato de obra

El proyecto contempla la construcción de 70.801m de redes de gas en Tubería de dimensiones de 1", ¾" y ½", que incluyen excavación, instalación de tubería y tapado de las mismas, además de la construcción de 249 centros de medición ubicados en cada una de las viviendas contempladas como beneficiarias del proyecto. Todo esto se ejecutará específicamente en los municipios de Maní y Yopal del Departamento de Casanare. El alcance final será que estos beneficiarios cuenten con sus redes de gas hasta la puerta de su vivienda, esto no incluyen las redes internas puesto que cada usuario tendrá que costear las mismas.

El cierre financiero del proyecto está dado por los recursos de SGR por valor de $ 2.434.092.534, correspondiente al 100%, SGR-03850003 EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SA ESP.

Por otra parte, en razón a los recursos proyectados para la ejecución, se determinó el presupuesto correspondiente para un alcance del 100% de la construcción de las redes para los beneficiarios proyectados, determinado por los valores asignados en el presupuesto oficial.

2.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Las actividades del proyecto se están llevando a cabo en dos municipios que son Maní específicamente en las veredas La Consigna y Armenia y en el Municipio de Yopal en el corregimiento de Morichal.

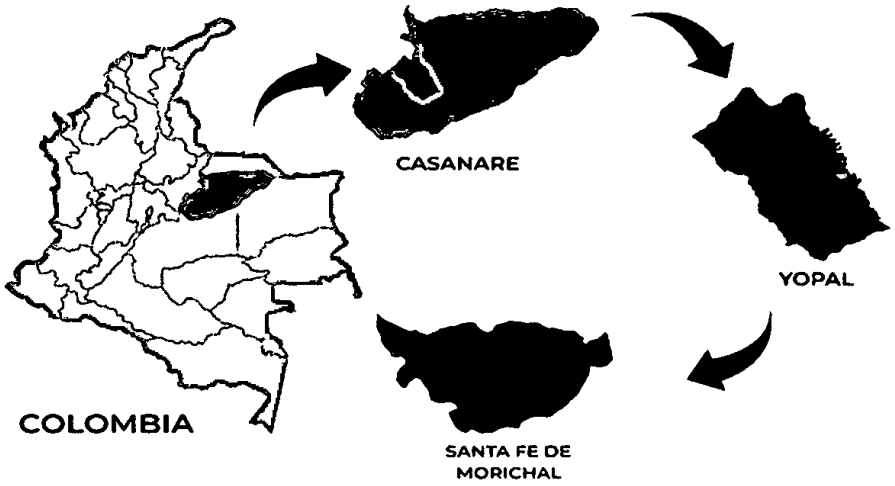


Ilustración 1. Localización General Respecto al País y al Departamento

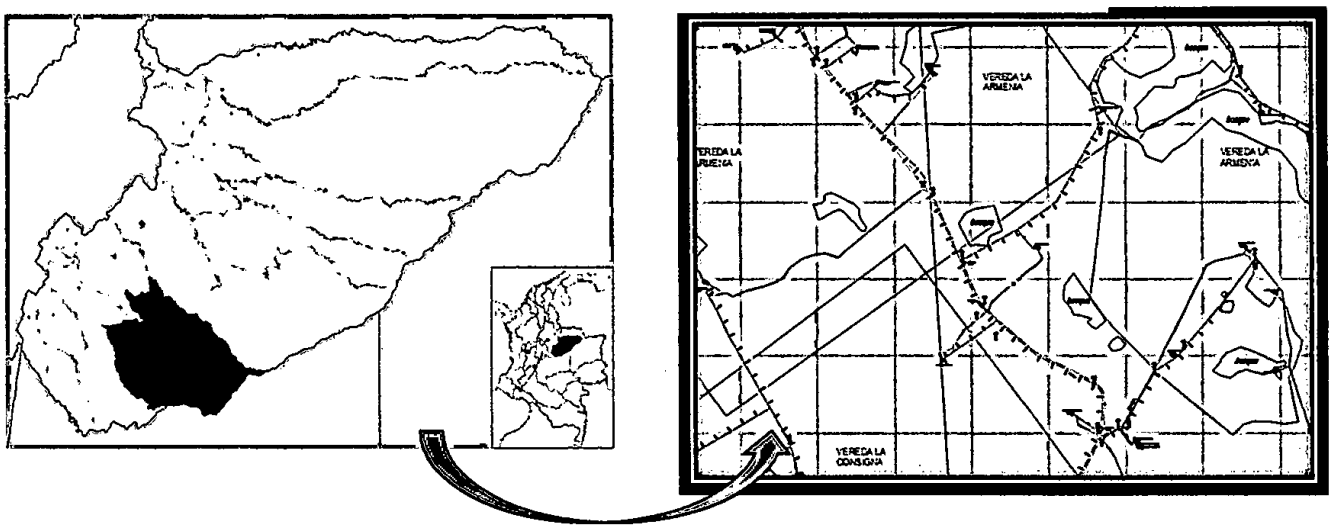


Ilustración 2.Ubicación Veredas Armenia y La Consigna

3. AREA ADMINISTRATIVA Y JURIDICA

3.1. CONTROL ADMINISTRATIVO Y JURIDICO CONTRATO DE OBRA.

3.1.1. Información Básica.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 002 de 2022	
Entidad Contratante	ENERCA S.A. E.S.P.
Contratista	INGFOX S.A.S
C.C. / NIT.	901.388.183-3
Representante Legal	MAYRA LILIANA RODRIGUEZ CABULO
Plazo inicial (Meses)	TRES (03) MESES
Valor inicial del contrato	DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($2.434.092.534,00) M/CTE
Valor anticipo 50% RECURSOS SPGR	MIL DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($1.217.046.267,00)
Fecha de Inicio	30 de noviembre de 2023
Fecha de terminación inicial	29 de febrero de 2023
Objeto	CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE MANÍ Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
Estado actual	Ejecución
Prorroga No.1	Cuarenta y cinco (45) días
Nueva fecha de terminación	14 de abril de 2024

Tabla 1. Información básica del contrato de obra No. 250 de 20

3.1.2. Personal Profesional Propuesto

El contratista de obra remitió a esta interventoría, información del personal propuesto, la cual incluye afiliaciones, hojas de vida y demás información necesaria para dar inicio al contrato de la referencia. A continuación, se relacionan los profesionales propuestos por el contratista de obra para la ejecución del presente contrato:

No.	Cargo	% Ded.	Nombre del profesional	Cedula de ciudadanía	Profesión
1	R/L	N/A	MAYRA LILIANA RODRIGUEZ CABULO	1.118.549.962	Ingeniero civil
2	Director de Obra	50%	JUAN DE JESUS CALIXTO NOCUA	74.302.329	Ingeniero civil
3	Residente de obra	50%	YEISSON CAMILO TUNAROSA SÁNCHEZ	1.118.552.097	Ingeniero civil
4	Técnico 1	100%	DIXON JHON JAIRO RAMIREZ RODRIGUEZ	1.118.566.140	Técnico 1
5	Técnico 2	100%	GEINER GIOVANNY GUALDRON ORTIZ	74.860.966	Técnico 2

Tabla 2. Personal Propuesto Contrato de Obra No. 250 de 2023

3.1.3. Control personal mano de obra calificada / No calificada.

A continuación, se relaciona el personal de mano de obra no calificada que se encuentra en obra durante la ejecución del presente informe.

No.	NOMBRE	No. C.C.	CARGO
1	BRICEÑO CARLOS	17.549.084	AUXILIAR
2	CALIXTO JUAN	74.302.329	AUXILIAR
3	GOMEZ JUAN	1.119.666.909	AUXILIAR
4	GONZALEZ CELIS LUIS ALEXANDER	1.002.526.712	TOPOGRAFO
5	GUALDRON GEINER	74.860.966	AUXILIAR
6	GUTIERREZ QUERUBIN	74.859.073	AUXILIAR
7	HERNANDEZ AVILA KEDUYN	1.118.196.490	AUXILIAR
8	MARIÑO MORENO JEFERSON ARIALDO	1.116.615.687	AUXILIAR
9	MARIÑO MORENO WILBER	1.116.612.350	AUXILIAR
10	PUENTES ARTURO	7.312.162	AUXILIAR
11	RAMIREZ DIXON	1.118.566.140	AUXILIAR
12	TUNAROSA YEISSON	1.118.552.097	INGENIERO CIVIL

Tabla 3. Personal activo para la ejecución del contrato de obra No. 250 de 2023

3.1.4. Control de equipo y maquinaria

Durante el periodo del 01 de marzo al 31 de marzode 2024, el contratista de obra dispuso de los siguientes equipos:

EQUIPO	CANT.	PROPIO/ ALQUILADO	ESTADO	OBSERVACION
Herramienta menor	30	propio	bueno	N/A
Retroexcavadora 4x4 llanta	4	alquilado	bueno	N/A
Retroexcavadora 4x4 llanta	1	propio	bueno	N/A

Volqueta 6 m3	1	alquilado	bueno	N/A
Planta eléctrica	2	alquilado	bueno	N/A
Motocarro	1	propio	bueno	N/A
Camioneta Jac	1	propio	bueno	N/A

Tabla 4 Control de Equipos.

3.1.5. Control de Acciones Administrativas

El contratista de obra realizó entrega de información previa para la suscripción del acta de inicio, la cual fue revisada por esta interventoría. Durante la ejecución del proyecto esta interventoría suscribió los siguientes actos administrativos relacionadas a continuación:

OBJETO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
Minuta de contrato de obra	08/11/2023	N. A	Tres (03) meses
Acta No. 1 de inicio	30/11/2023	N.A	Tres (03) meses
Plan de inversión del anticipo.	30/11/2023	$1.217.046.267,00	50% recursos SGR
Prorroga No.1	29/02/2024	N/A	Cuarenta y cinco (45) días

Tabla 5. Actos administrativos del Cto 250 de 2023.

Durante el periodo del presente informe de ejecución de las actividades de seguimiento y control al contrato de obra No. 250 de 2023, no se han realizado actas de comité y reunión.

Tabla 6. Actas de Comité y/o Socialización.

3.1.6. Control cumplimiento pago de parafiscales

Para efectos de cumplimiento con los aportes y los pagos de salud, pensión y riesgos, lo que corresponde al mes de **marzo** de 2024 el contratista realizo las afiliaciones del personal en lo referente a la seguridad social y parafiscales así mismo se realizó el pago de la planilla, lo cual deja claro que hasta el momento el INGFOX S.A.S., se encuentra al día referente a este tema,

por lo cual en el capítulo anexos se adjunta la documentación del pago de las planillas respectivamente del mes de **marzo** de 2024.

- Según planilla No. 9465592520 cancelando pensiones, cajas y salud del mes de marzo de 2024, con pago realizado por un valor de siete millones novecientos setenta y ocho mil cuatrocientos pesos M/CTE ($7,978,400.00).
- *NOTA: En el capítulo anexo se incluye copia de las planillas de seguridad social canceladas.*

3.1.7. Control de pólizas

La empresa ejecutora **INGFOX S.A.S.**, representada legalmente por **MAYRA LILIANA RODRIGUEZ CABULO**, elevó las pólizas exigidas para el contrato No 250 de 2023 Así:

POLIZA MINUTA							
POLIZA DE CUMPLIMIENTO							
Compañía	Póliza No.	Riesgo	Vr / asegurado	VIGENCIA		Fecha Aprobación	Acta con el que se generó la aprobación
				Desde	Hasta		
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	BY-100038484	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	$243.409.253,40	08/11/2023	11/06/2024	21/11/2023	APROBACIÓN DE PÓLIZA ANEXO 0
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	BY-100038484	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	$1.217.046.267,00	08/11/2023	11/06/2024	21/11/2023	APROBACIÓN DE PÓLIZA ANEXO 0
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	BY-100038484	PRESTACIONES SOCIALES Y PAGO DE SALARIOS E INDEMNIZACIONES	$243.409.253,40	08/11/2023	11/02/2027	21/11/2023	APROBACIÓN DE PÓLIZA ANEXO 0
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	BY-100038484	ESTABILIDAD DE LA OBRA	$486.818.506,80	08/02/2024	08/02/2029	21/11/2023	APROBACIÓN DE PÓLIZA ANEXO 0

SEGUROS DEL ESTADO S.A.	BY-100038484	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	$486.818.506,80	08/02/2024	08/02/2025	21/11/2023	APROBACIÓN DE PÓLIZA ANEXO

Tabla 7. Póliza de cumplimiento según minuta

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL							
COMPAÑIA	**No. DE POLIZA**	**AMPAROS**	**LIMITE POR EVENTO**	**LIMITE POR VIGENCIA**	**VALOR ASEGURADO**	**FECHA DE APROBACION**	**ANEXO**
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	BY-100005063	AMPARO BÁSICO-PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$121.704.627,00	$243.409.253,00	$243.409.253,40	21/11/2023	APROBACIÓN DE PÓLIZA ANEXO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	BY-100005063	AMPARO BÁSICO-PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$73.022.776,00	$243.409.253,00	$243.409.253,40	21/11/2023	APROBACIÓN DE PÓLIZA ANEXO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	BY-100005063	AMPARO BÁSICO-PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$73.022.776,00	$243.409.253,00	$243.409.253,40	21/11/2023	APROBACIÓN DE PÓLIZA ANEXO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	BY-100005063	AMPARO BÁSICO-PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$73.022.776,00	$243.409.253,00	$243.409.253,40	21/11/2023	APROBACIÓN DE PÓLIZA ANEXO

Tabla 8. Póliza de responsabilidad civil según minuta

POLIZA ACTA DE INICIO							
POLIZA DE CUMPLIMIENTO							
Compañía	**Póliza No.**	**Riesgo**	**Vr / asegurado**	**VIGENCIA**		**Fecha Aprobación**	**Acta con el que se generó la aprobación**
				Desde	**Hasta**		
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	BY-100038484	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	$243.409.253,40	30/11/2023	03/07/2024	06/12/2023	APROBACIÓN DE PÓLIZA ANEXO 2

MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	BY-100038484	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	$1.217.046.267,00	30/11/2023	03/07/2024	06/12/2023	APROBACIÓN DE PÓLIZA ANEXO 2
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	BY-100038484	PRESTACIONES SOCIALES Y PAGO DE SALARIOS E INDEMNIZACIONES	$243.409.253,40	30/11/2023	05/03/2027	06/12/2023	APROBACIÓN DE PÓLIZA ANEXO 2
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	BY-100038484	ESTABILIDAD DE LA OBRA	$486.818.506,80	01/03/2024	02/03/2029	06/12/2023	APROBACIÓN DE PÓLIZA ANEXO 2
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	BY-100038484	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	$486.818.506,80	01/03/2024	02/03/2025	06/12/2023	APROBACIÓN DE PÓLIZA ANEXO 2

Tabla 9. Póliza de cumplimiento según acta de inicio

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL							
COMPAÑIA	**No. DE POLIZA**	**AMPAROS**	**LIMITE POR EVENTO**	**LIMITE POR VIGENCIA**	**VALOR ASEGURADO**	**FECHA DE APROBACION**	**ANEXO**
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	BY-100005063	AMPARO BÁSICO-PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$121.704.627,00	$243.409.253,00	$ 243.409.253,40	06/12/2023	APROBACIÓN DE PÓLIZA ANEXO 2
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	BY-100005063	AMPARO BÁSICO-PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$73.022.776,00	$243.409.253,00	$ 243.409.253,40	06/12/2023	APROBACIÓN DE PÓLIZA ANEXO 2
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	BY-100005063	AMPARO BÁSICO-PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$73.022.776,00	$243.409.253,00	$ 243.409.253,40	06/12/2023	APROBACIÓN DE PÓLIZA ANEXO 2
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	BY-100005063	AMPARO BÁSICO-PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$73.022.776,00	$243.409.253,00	$ 243.409.253,40	06/12/2023	APROBACIÓN DE PÓLIZA ANEXO 2

Tabla 10. Póliza de responsabilidad civil según acta de inicio

POLIZA PRORROGA No.1							
POLIZA DE CUMPLIMIENTO							
Compañía	**Póliza No.**	**Riesgo**	**Vr / asegurado**	**VIGENCIA**		**Fecha Aprobación**	**Acta con el que se generó la aprobación**
				Desde	**Hasta**		
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	BY-100038484	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	$243.409.253,40	29/02/2024	18/08/2024	19 de marzo de 2024	PRORROGA AL PLAZO No.1
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	BY-100038484	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	$1.217.046.267,00	29/02/2024	18/08/2024	19 de marzo de 2024	PRORROGA AL PLAZO No.1
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	BY-100038484	PRESTACIONES SOCIALES Y PAGO DE SALARIOS E INDEMNIZACIONES	$243.409.253,40	29/02/2024	18/04/2027	19 de marzo de 2024	PRORROGA AL PLAZO No.1
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	BY-100038484	ESTABILIDAD DE LA OBRA	$486.818.506,80	CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO DEFINITIVO		19 de marzo de 2024	PRORROGA AL PLAZO No.1
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	BY-100038484	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	$486.818.506,80	CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO DEFINITIVO		19 de marzo de 2024	PRORROGA AL PLAZO No.1

Tabla 11. Póliza de cumplimiento según prorroga No.1

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL							
COMPAÑIA	**No. DE POLIZA**	**AMPAROS**	**LIMITE POR EVENTO**	**LIMITE POR VIGENCIA**	**VALOR ASEGURADO**	**FECHA DE APROBACION**	**ANEXO**
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	BY-100005063	AMPARO BÁSICO-PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$121.704.627,00	$243.409.253,00	$ 243.409.253,40	06/12/2023	APROBACIÓN DE PÓLIZA ANEXO 2
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	BY-100005063	AMPARO BÁSICO-PREDIOS LABORES Y	$73.022.776,00	$243.409.253,00	$ 243.409.253,40	06/12/2023	APROBACIÓN DE PÓLIZA ANEXO 2

		OPERACIONES					
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	BY-100005063	AMPARO BÁSICO-PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$73.022.776,00	$243.409.253,00	$ 243.409.253,40	06/12/2023	APROBACIÓN DE PÓLIZA ANEXO 2
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	BY-100005063	AMPARO BÁSICO-PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$73.022.776,00	$243.409.253,00	$ 243.409.253,40	06/12/2023	APROBACIÓN DE PÓLIZA ANEXO 2

Tabla 12. Póliza de responsabilidad civil según prorroga No.1

3.2. CONTROL ADMINISTRATIVO Y JURIDICO CONTRATO DE INTERVENTORIA.

3.2.1. Información General

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 251 de 2023	
Entidad Contratante	EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P.
Contratista	GRUPO ABACO CONSULTORES S.A.S.
C.C. / NIT.	900.775.416-6
Representante Legal	HERNAN ALBERTO FORERO JIMENEZ
Plazo inicial (Meses)	CUATRO (04) MESES
Valor inicial del contrato	CIENTO SETENTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS MICTE PESOS ($170.684.324)
Valor anticipo	NA
Fecha de Inicio	30 de noviembre de 2023
Fecha de terminación Inicial	29 de marzo de 2024
Objeto	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DE MANÍ

	Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
Estado actual	En Ejecución
Prorroga No.1	Quince (15) días
Nueva fecha de terminación	14 de abril de 2024

Tabla 13 Información básica del contrato de interventoría No. 251 de 2023

3.2.2. Personal Profesional Propuesto

A continuación, se relacionan los profesionales propuestos por esta interventoría para el seguimiento y control del contrato de obra No. 251 de 2023.

No.	Cargo	% Ded.	Nombre del profesional	CC/Matricula profesional	Profesión
1	R/L GRUPO ABACO CONSULTORES S.A.S.	N/A	HERNAN ALBERTO FORERO JIMENEZ	C.C 6.774.062 EXPEDIDA EN TUNJA	NA
2	Director de Interventoría	50%	ETMAN GABRIEL NIÑO SANDOVAL	C.C 74.182.882 MP 54 202-244 732 NTS	Ingeniero civil con Especialización en Gerencia de proyectos
3	Residente de Interventoría	100%	CAMILO ANDRES QUIÑONEZ SALAS	C.C. 1.052.400.216 DE DUITAMA M.P. BY250-134472	Ingeniero Electromecánico con Especialización en Automatización Industrial
4	Ingeniero Ambiental	100%	CARLOS ARTURO	C.C. 13.861.526 DE BUCARAMANGA	Ingeniero Sanitario y ambiental Civil,

	PROFESIONAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		CHAPARRO SANCHEZ	MP 68236-104225	con especialización en Gerencia de proyectos
5	Abogado	20%	JOSE AUDUL SUAREZ AVILA	C.C. 86.043.430 DE VILLAVICENCIO MP 239283	Abogado, con especialización en Alta Gerencia y Economía Solidaria.
6	Ingeniero de Proyectos	20%	JONATHAN PEREZ NIÑO	C.C. 1.014.210.470 DE BOGOTA MP 15202-365461 BYC	Ingeniero Civil, con especialización en Evaluación y gestión ambiental

Tabla 14 Personal Propuesto contrato de Interventoría No. 251 de 2023.

3.2.3. Acciones Administrativas

En el desarrollo del contrato de han generado actas desde el inicio del contrato de interventoría las cuales se describen en el siguiente cuadro de resumen de actas, con las respectivas fechas:

No.	OBJETO	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
1	Acta No. 1 de inicio	30/11/2023	N.A.	Plazo Cuatro (04) meses
	Prorroga No.1	29/03/2024	N/A	Plazo Quince (15) días

Tabla 15. Actas Generadas para el contrato de interventoría No. 251 de 2023

3.2.3.1. Socialización, Actas de visita y de comité técnico

En el periodo correspondiente del 01 de marzo al 31 de marzo de 2024 no se suscribieron comités técnicos, sin embargo la interventoría realizó sus labores de supervisión continuamente en campo al contratista de obra :

3.2.3.2. Correspondencia enviada y recibida

En el periodo correspondiente del 01 de marzo al 31 de marzo de 2024 se generó la siguiente correspondencia la cual se anexa en el presente informe:

CORRESPONDENCIA ENVIADA				
CONSECUTIVO	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN**	**REMITENTE**	**DESTINATARIO**
ABACOSAS-2024-004.2	08-03-24	Radicación de informe mensual interventoría y de obra No.3 correspondiente al mes de febrero de 2024	Grupo Abaco Consultores SAS	Empresa de energía de Casanare SA E.S.P Dr. Elkin Omar Romero e Ing. Luis Rene Granados Supervisores del contrato

Tabla 16. Actas Generadas para el contrato de interventoría No. 251 de 2023

3.2.4. Seguimiento y control pago de seguridad social y parafiscales.

Para efectos de cumplimiento con los aportes y los pagos de salud, pensión y riesgos, la empresa GRUPO ABACO CONSULTORES S.A.S. Presenta los siguientes soportes. (Anexo Copias Pagos Salud, Pensión y Riesgos).

Pagos mes de febrero de 2024

- GRUPO ABACO CONSULTORES S.A.S. realizo el pago de la seguridad social para el mes de marzo en la planilla No. 9467380961 el cual se anexa al presente informe.

3.2.5. Control de Pólizas

Para efecto de amparos del contrato, se expiden pólizas con la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A. La cual fue actualizada según la siguiente información:

POLIZA MINUTA							
Compañía	Póliza o certificación modificada No.	Riesgo	Vr / asegurado	VIGENCIA		Fecha aprobación	Acta con el que se generó la aprobación
				Desde	Hasta		
SURAMERICANA	3785325-8	CUMPLIMIENTO	$34.136.865,00	15/11/2023	15/07/2024	24/11/2023	0
SURAMERICANA	3785325-8	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	$17.068.432,00	15/11/2023	15/03/2027		0
SURAMERICANA	3785325-8	CALIDAD DEL SERVICIO	$17.068.432,00.	15/03/2024	15/03/2029		0
SURAMERICANA	0938442-9	RESPONSABILIDAD CIVIL	$17.068.432,00	15/11/2023	15/07/2024		0

Tabla 17. Póliza según Minuta

POLIZA SEGÚN ACTA DE INICIO							
Compañía	Póliza o certificación modificada No.	Riesgo	Vr / asegurado	VIGENCIA		Fecha aprobación	Acta con el que se generó la aprobación
				Desde	Hasta		
SURAMERICANA	3785325-8	CUMPLIMIENTO	$17.068.432,00	15/11/2023	15/07/2029	07/12/2023	1

SURAMERICANA	3785325-8	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	$17.068.432,00	15/11/2023	15/03/2027		1
SURAMERICANA	3785325-8	CALIDAD DEL SERVICIO	$34.136.865,00	15/03/2024	15/03/2029		1
SURAMERICANA	0938442-9	RESPONSABILIDAD CIVIL	$17.068.432,00	22/11/2023	15/07/2024		1

Tabla 18. Póliza según acta de inicio

POLIZA SEGÚN PRORROGA No.1							
Compañía	**Póliza o certificación modificada No.**	**Riesgo**	**Vr / asegurado**	**VIGENCIA**		**Fecha aprobación**	**Acta con el que se generó la aprobación**
				Desde	**Hasta**		
SURAMERICANA	3785325-8	CUMPLIMIENTO	$17.068.432,00	30-11-2023	14-08-2024		
SURAMERICANA	3785325-8	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	$17.068.432,00	30-11-23	14-04-27		
SURAMERICANA	3785325-8	CALIDAD DEL SERVICIO	$34.136.865,00	14-04-2024	14-04-2029		
SURAMERICANA	0938442-9	RESPONSABILIDAD CIVIL	$17.068.432,00	02-04-2024	14-08-2024		

Tabla 19. Póliza según prorroga No.1

3.2.6. Aprobación de Pólizas

La empresa ENERCA da aprobación con fecha del 24 de noviembre de 2023 y 07 de diciembre de 2023 a las pólizas que corresponden al contrato de interventoría No. 251 de 2023. El cual se anexa a este informe.

4. AREA FINANCIERA Y CONTABLE

4.1. CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA.

4.1.1. Control de pagos efectuados al contrato

En la ejecución del contrato de obra No. 250 de 2023, a la fecha se realizó el giro de los recursos a una cuenta conjunta donde la aprobación del desembolso es autorizada por el representante legal de la Interventoría, así mismo se realiza un seguimiento y control de todas las actividades ejecutadas, así como de la inversión del anticipo en la siguiente tabla se realiza relación de actas de pagos generadas al contratista.

CONTROL DE OBRA	VALOR CONTRATADO	VALOR ACTAS	VALOR GIRADO Y/O PAGADO	% ACTAS
Valor inicial del contrato	$2.434.092.534,00			
Valor anticipo (50%) recursos SGR			$1.217.046.267,00	50%
Acta Parcial N° 1				
Valor por cobrar			$1.217.046.267,00	50%
TOTALES	$2.434.092.534,00		$2.434.092.534,00	100%
		% EJECUTADO ACTAS		0%
		% COBRADO SEGÚN ACTAS Y ANTICIPO		50%

Tabla 20. Avance financiero contrato de obra 250-2023

4.1.2. Balance financiero del contrato

En la siguiente tabla se puede observar o evidenciar el estado financiero actual del contrato de obra.

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$2.434.092.534,00		
VALOR ADICIONES			
VALOR ANTICIPO 50% RECURSOS DE SGR			$1.217.046.267,00

VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO (50%)			
VALOR POR FACTURAR		$2.434.092.534,00	$1.217.046.267,00
VALOR POR AMORTIZAR (50%)			
VALOR POR GIRAR			
SUMAS IGUALES	$2.434.092.534,00	$2.434.092.534,00	$2.434.092.534,00
		VALOR PENDIENTE POR FACTURAR	**$1.217.046.267,00**

Tabla 21. Balance financiero del contrato de obra No. 250 de 2023

4.1.3. Control Anticipo

Para efectos del anticipo del contrato 250 de 2023, se suscribió el Plan de inversión de anticipo, donde como su nombre lo indica se determinó y avaló por esta interventoría los programas para invertir el recurso girado al contratista bajo el concepto de anticipo:

No.	DESCRIPCION	VALOR	PORCENTAJE
1	Compra de materiales	$ 973.637.013,60	80,00%
2	Pago de salarios, honorarios, jornales, subcontratos, mano de obra y seguridad social	$ 182.556.940,05	15,00%
3	Transporte personal, materiales, equipo, cargue y descargues materiales	$ 60.852.313,35	5,00%
TOTALES		**$1.217.046.267,00**	**100.00%**

Tabla 22. Plan de inversión del anticipo Cto. 250 de 2023.

4.2. CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE AL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

4.2.1. Control de pagos efectuados al contrato de interventoría

En la ejecución del contrato de interventoría No. 251 de 2023, no se realizó ningún desembolso, ya que es un contrato que no cuenta con anticipos.

A la fecha no se han tramitados actas parciales.

CONTROL DE OBRA	VALOR CONTRATADO	VALOR ACTAS	VALOR GIRADO Y/O PAGADO	% ACTAS
Valor inicial del contrato	$170.684.324,00			
Valor anticipo (50%)			**$ 0,00**	
TOTALES	$170.684.324,00	$ 0,00	**$ 0,00**	**0.00%**
		% EJECUTADO ACTAS		**0.00%**
		% COBRADO SEGÚN ACTAS Y ANTICIPO		**0.00%**

Tabla 23. Avance financiero contrato de interventoría No. 251 de 2023

4.2.2. Balance financiero del contrato de interventoría

En la siguiente tabla se puede observar o evidenciar el estado financiero actual del contrato de interventoría:

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$170.684.324,00		
VALOR ADICIONES			
VALOR ANTICIPO (50%)			$0,00
VALOR EJECUTADO PARCIAL 1		$ 0,00	
VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO (50%)			
VALOR NETO GIRADO		$170.684.324,00	
VALOR POR FACTURAR		$170.684.324,00	$170.684.324,00
VALOR POR AMORTIZAR (50%)			
VALOR POR GIRAR			
SUMAS IGUALES	$170.684.324,00	$170.684.324,00	$170.684.324,00
VALOR PENDIENTE POR FACTURAR			$170.684.324,00

Tabla 24. Balance del contrato de interventoría No. 251 de 2023

4.2.3. Seguimiento contable al contrato de interventoría No. 251 de 2023.

En la ejecución de este contrato, se realizan las funciones de seguimiento técnico, administrativa, financiero, contable, ambiental y jurídico para llevar a feliz término el contrato de obra 250 de 2023, dentro de un esquema natural con el presupuesto tanto para el contratante como para el contratista, esto se logra mediante un seguimiento paralelo entre el plazo contractual y el plazo a la fecha en la que se ha desarrollado el contrato de interventoría. Se aclara que no se han cobrado actas parciales de interventoría

5. AREA TECNICA

5.1. CONTROL TECNICO AL CONTRATO DE OBRA

5.1.1. Normas técnicas aplicables a la obra.

Para las actividades a ejecutar en el proyecto se tuvieron y se tienen en cuenta las normas técnicas a ser evaluados por el interventor de obra y de las especificaciones particulares que pudieran resultar para cada ítem del proyecto, además de Las normas técnicas aplicables a la construcción de redes de gas natural que incluyen:

- NOM-001-SECRE-2010: Define las especificaciones del gas natural.
- NTC 2505: Establece las instalaciones para el suministro de gas combustible para uso residencial y comercial.
- NTC 3728: Establece las líneas de transporte y redes de distribución de gas.
- NSR 10 (Según decreto No. 926 de 2010). Titulo J. Requisitos de Protección contra incendios.
- La norma CREG 059 de 2012 establece que todas las instalaciones deben cumplir con las normas técnicas y de seguridad correspondientes.
- Especificaciones Técnicas de Construcción del proyecto

- Especificaciones Técnicas de construcción de la empresa ENERCA S.A. y oficina de asuntos energéticos de la gobernación del Casanare.

5.1.2. Actividades Contractuales

Dentro de la elaboración de la programación y elaboración del proyecto, se determinó las actividades y cantidades a ejecutar, las cuales se encuentran descritas en la minuta del contrato de obra

CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE MANÍ Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
UNIDADES CONSTRUCTIVAS HOMOLOGADAS					
1	Conexión domiciliaria residencial (acometida + medidor)	und	249	$393,747.76	$98,043,192.24
CANTIDADES DE OBRA CONSTRUCTIVAS ESPECIALES - NO HOMOLOGADAS					
1	Replanteo y localización de tuberías de gas	m	70.801,00	$ 1.692,00	$ 119.795.292,00
2	Excavación mecánica en zanja (0 - 15 m)	m^3	6.696,63	$ 14.558,00	$ 97.489.539,54
3	Excavación a mano en material conglomerado línea de gas	m^3	7.556,00	$ 49.091,00	$ 370.931.596,00
4	Excavación a mano en material común línea de gas	m^3	2.501,00	$ 31.961,00	$ 79.934.461,00
5	Solado y encamado tubería de gas con arena apisonada (arena sucia de rio)	m^3	2.333,00	$ 43.720,00	$ 101.998.760,00
6	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado para línea de gas	m^3	13.341,00	$ 22.849,00	$ 304.828.509,00
7	Tubería de Polietileno PE-80 RDE 11 de 1" para gas. Suministro e Instalación	m	20.926,00	$ 9.373,00	$ 196.139.398,00
8	Tubería de Polietileno PE-80 RDE 11 de 3/4" para gas. Suministro e Instal	m	13.893,00	$ 6.994,00	$ 97.167.642,00

9	Tubería de Polietileno PE-80 RDE 9 de 1/2" para gas. Suministro e Instal	m	35.982,00	$ 5.956,00	$ 214.308.792,00
10	Poliválvula 1" PE-80 RDE11. Suministro e instal.	und	4,00	$ 614.384,00	$ 2.457.536,00
11	Poliválvula 3/4" PE-80 RDE11. Suministro e instal.	und	1,00	$ 611.188,00	$ 611.188,00
12	Poliválvula 1/2" PE-80 RDE11. Suministro e instal.	und	6,00	$ 608.088,00	$ 3.648.528,00
13	Prueba de hermeticidad red de gasoducto	m	70.801,00	$ 306,00	$ 21.665.106,00
14	Cruce aéreo especial tipo marco H Ø 2"	m	143,00	$ 503.424,00	$ 71.989.632,00
15	Mojón de señalización rural. Suministro e Instal.	und	158,00	$ 224.543,00	$ 35.477.794,00
COSTO DIRECTO UNIDADES CONSTRUCTIVAS NO HOMOLOGADAS (ajustado al peso)					**$1,816,486,965.78**
VALOR (A.I.U.34%) UNIDADES CONSTRUCTIVAS NO HOMOLOGADAS				**34,00%**	**$ 490,451,480.76**
VALOR UNIDADES CONSTRUCTIVAS NO HOMOLOGADAS					**$ 36,329,739.32**
UNIDADES CONSTRUCTIVAS HOMOLOGADAS					**$ 90,824,348.29**
					-0.15
VALOR DE LA OBRA					**$2.434.092.535,00**

Tabla 25. Cantidades contractuales Cto. 250

Así mismo el contrato de obra No. 250 de 2023, contempla los siguientes planes:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	Plan de gestión integral de obra	Und	1,00
	Plan de Manejo Ambiental.	Und	1,00

Tabla 26. Planes Contemplados Cto. 250

5.1.3. Avance en plazo del contrato de obra No. 250 de 2023.

El contrato presenta el siguiente avance en plazo de ejecución:

CUADRO PLAZO TRANSCURRIDO CONTRATO DE OBRA			
FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	CANTIDAD DE DIAS	DIAS TRABAJADOS
30/11/2023	14/04/2024	**135**	**123**
PLAZO TRANSCURRIDO A LA FECHA EN DIAS			
PORCENTAJE AL 31 DE MARZO DE 2024, UNICAMENTE EN DIAS TRABAJADOS			**91.11%**

Tabla 27. Avance plazo contractual

Según la información de la tabla No. 28 a la fecha del corte para este informe mensual, 31 de marzo de 2024, han transcurrido 123 días de ejecución del proyecto se observa que se ha ejecutado el **91.11%** del plazo contractual.

5.1.4. Actividades ejecutadas

Las actividades ejecutadas por el INGFOX S.A.S., desarrolladlas entre 01 y 31 de marzo de 2024, conciernen a ítems como lo que se relaciona a continuación

CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE MANÍ Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDADES CONTRACTUALES**	**CANTIDADES EJECUTADO**	**PORCENTAJE (%)**
1	Replanteo y localización de tuberías de gas	m	70801	0.00	0%
2	Excavación mecánica en zanja (0 - 15 m)	M3	6696	0.00	0%

3	Excavación manual en conglomerado	M3	7556	0.00	0%
4	Excavación a mano en material común	M3	2501	0.00	0%
5	Solado y encamado tubería de gas con arena apisonada (arena sucia de rio)	M3	2333	0.00	0%
6	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	M3	13341	0.00	0%
7	Tubería de Polietileno PE-80 RDE 11 de 1" par gas. Suministro e Instalación	m	20926	0.00	0%
8	Tubería de Polietileno PE-80 RDE 11 de 3/4" para gas. Suministro e Instalación	m	13893	0.00	0%
9	Tubería de Polietileno PE-80 RDE 9 de 1/2" para gas. Suministro e Instalación	m	35982	0.00	0%
10	Poliválvula 1" PE-80 RDE11. Suministro e instal.	und	4	1.00	25%
11	Poliválvula 3/4" PE-80 RDE11. Suministro e instal.	und	1	0.00	0%
12	Poliválvula 1/2" PE-80 RDE11. Suministro e instal	und	6	1.00	16.67%
13	Prueba de hermeticidad	m	70801	35,400.50	50%
14	Cruce aéreo especial tipo marco H Ø 2"	m	143	77.00	53.85%
15	Mojón de señalización rural	und	158	158.00	100%
16	Conexión domiciliaria residencial (acometida + medidor)	und	249	120	48.19%

Tabla 28. Actividades Ejecutadas

5.1.5. Avance de obra

El avance de obra se mide respecto a las actividades ejecutadas en correlación con las actividades descritas en la programación de obra, de igual manera la interventoría realiza el seguimiento al avance de obra y las cantidades que se desarrollan hasta el día **31 de marzo de 2024,** se relacionan descriptivamente en el registro fotográfico, así como en bitácora de obra.

Para el día del **31 de marzo de 2024**, se tiene porcentaje acumulado ejecutado de **96.94%,** respecto a un porcentaje proyectado dé **98.40%,** evidenciando que a la fecha se encuentra un atraso frente a lo programado del **1.46%**.

	Valor	Porcentaje
Acumulado ejecutado	$ 2,359,655,410.00	96.94%
Acumulado programado	$ 2,395,147,054.00	98.40%
Diferencia	$ 35,491,644.00	**1.46 %**

Tabla 29. Relación % Programado vs % Ejecutado

DIAGRAMA DE PROGRAMACIÓN VRS EJECUCIÓN DE OBRA

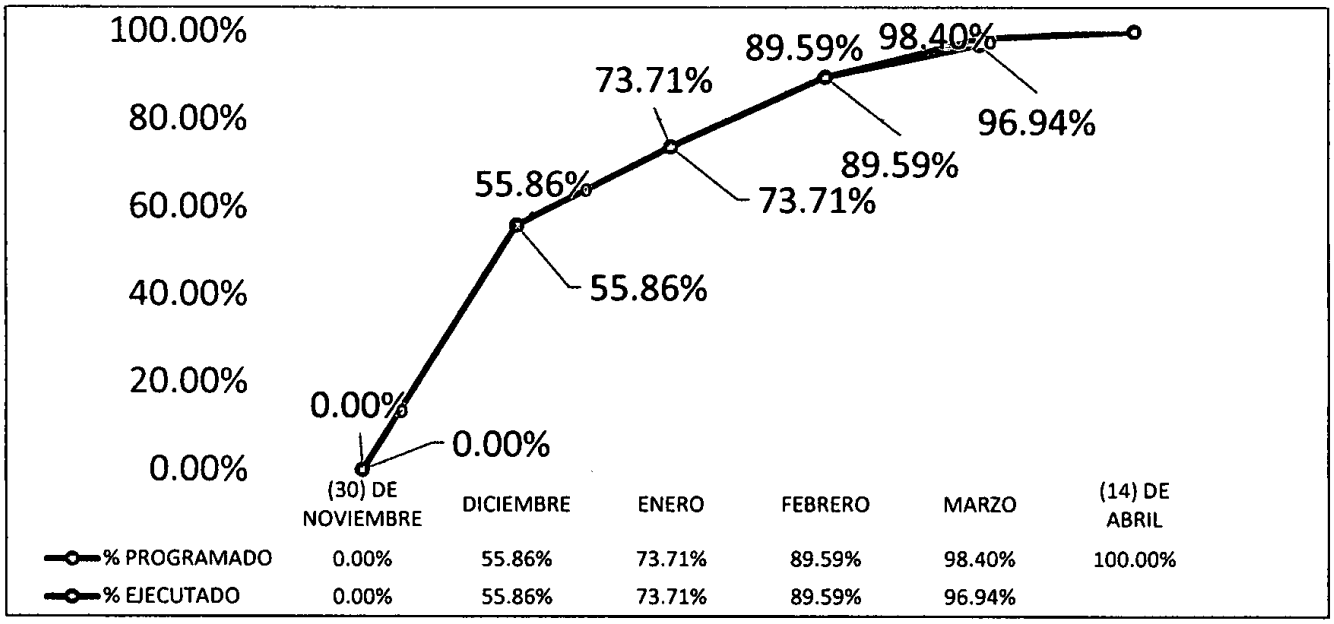


Gráfico 1. Obra programada vs Obra ejecutada

5.1.6. Inconvenientes y Determinaciones

En relación a la ejecución se han tenido inconvenientes durante el mes de marzo con respecto a lo siguiente:

- A la fecha del 31 de marzo de 2024 no se han terminado de ejecutar las actividades del presupuesto de obra, por lo tanto, se hace necesario ampliar el plazo para poder ejecutarlas y cumplir con el objeto contractual.
- La actividad de "Conexión domiciliaria residencial (acometida + medidor) la cual fue planeada para cada uno de los usuarios, esta requiere de unas especificaciones, una de las más importantes es la instalación del centro de medición el cual debe contar con una vivienda construida y un lugar específico para la misma, en ningún caso se podrá instalar en lotes donde no se determine dicha condición. Esta situación afecta a varios de los usuarios, lo que ha retrasado su instalación y por ende los tiempos de entrega final al usuario, así mismo no se puede dar por concluida esta actividad lo que incurre en retrasos de la misma.

5.1.7. Resumen del estado del clima en el área de trabajo

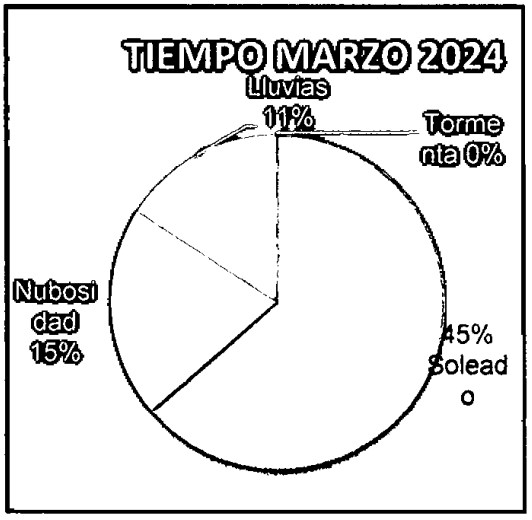


Gráfico 2. Relación clima

CONVENCIONES

SOL	NUBLADO	LLUVIA	TORMENTA

		CANTIDAD
D.L	DIAS LABORABLES	23
D	DESCANSO O FERIADO	8
		31

porcentajes del estado de tiempo		%	subtotal %
mañanas soleadas	17	27.42%	45%
tardes soleadas	11	17.74%	
mañanas nubladas	3	4.84%	15%
tardes nubladas	6	9.68%	
mañanas lluviosas	3	4.84%	11%
tardes lluviosas	4	6.45%	
mañanas tormenta	0	0.00%	0%
tardes tormenta	0	0.00%	
Total en porcentaje		70.97%	71.0%

Entre el 01 de marzo al 31 de marzo de 2024, se presentaron condiciones de lluvia lo que ocasionó que algunos días se cancelaran las actividades previstas bajo programación diaria, puesto que las mismas se realizan al aire libre, sin embargo, se presentaron mañanas y tardes soleadas que arrojan un porcentaje de 45%, por otro lado, el 15% en condiciones de tiempo nublado y un 11% con condición de lluvia, así mismo, el 29% restante equivale a los días no laborales los cuales no se tienen en cuenta para la ejecución de las actividades.

5.2. CONTROL TECNICO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.2.1. Metodología y descripción de las actividades ejecutadas por la interventoría.

- Aplicar dentro de la ejecución de cada actividad lo relacionado en las especificaciones técnicas.
- Se lleva un control de pólizas y sus plazos contractuales así cuando se genere un acto administrativo se amplíen las vigencias de los amparos de ser necesario.
- Revisión y aprobación de los cronogramas de ejecución de los trabajos, verificación de aspectos técnicos de la obra y todo lo relacionada con la ejecución de cada uno de los capítulos suscritos en presupuesto y en el contrato de obra.
- La Interventoría realiza la vigilancia y el control del suministro de materiales, equipos y herramientas al sitio de trabajo por parte del contratista de obra y se verifica que estos cumplan con las especificaciones técnicas estipuladas, y con los estándares de calidad de materiales de estos. es así que se le solicita al contratista una buena ejecución de obra y estricto control con todo lo relacionado con estas actividades ejecutadas.
- Se lleva un control y seguimiento diario de todas las actividades que está ejecutando el contratista de obra, quedando éstas plasmadas en la Bitácora de obra, de acuerdo a esto se adjunta copia de bitácora en anexos.
- Se lleva un registro fotográfico diario del estado actual de la obra.
- Durante el periodo del presente informe se adelantó la verificaron con equipo de topografía de interventoría los trazados de cada una de las tuberías.

5.2.2. Actividades Contractuales

Dentro de la elaboración de la programación y elaboración del proyecto, se determinó las actividades a ejecutar, las cuales se encuentran descritas en la minuta del contrato de obra:

ETAPA PRECONSTRUCTIVA
Revisión y verificación en campo de los diseños
Cumplimiento requerimientos ambientales
Permisos y/o disponibilidad de servicios públicos
Permisos y/o disponibilidad fuentes de materiales
ETAPA CONSTRUCTIVA
Interventoría técnica
Interventoría ambiental
Interventoría administrativa
Interventoría financiera
Interventoría contable
Interventoría jurídica

Tabla 30. Actividades contractuales

5.2.3. Relación Avance de ejecución

El Proyecto de interventoría No. 251 de 2023 cuyo objeto es: "*INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE MANÍ Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE*"., presenta el siguiente cuadro de avance en semanas y días cronológicamente lo cual nos muestra un avance en porcentaje respecto al plazo

ejecutado, y no tiene relación directa con el porcentaje de ejecución de las actividades ejecutadas en el contrato de obra.

CUADRO PLAZO TRANSCURRIDO CONTRATO DE INTERVENTORIA			
FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**CANTIDAD DE DIAS**	**CANTIDAD DE DIAS**
30/11/2023	14/04/2024	**136**	**123**
PLAZO TRANSCURRIDO A LA FECHA EN DIAS			
PORCENTAJE AL 31 DE MARZO DE 2024, UNICAMENTE EN DIAS TRABAJADOS			**90.44%**

Tabla 31. Control de ejecución interventoría

A la fecha del corte para este informe mensual No. 4, de 01 a 31 de marzo de 2024 han trascurrido 123 días en ejecución, y el porcentaje de ejecución del contrato de interventoría es de 90.44%.

5.2.4. Actividades ejecutadas

Las actividades ejecutadas por LA INTEVENTORIA entre el 01 de marzo al 31 de marzo de 2024, se relacionan con la siguiente tabla:

ETAPA PRECONSTRUCTIVA	
Revisión y verificación en campo de los diseños	100%
Cumplimiento requerimientos ambientales	100%
Permisos y/o disponibilidad de servicios públicos	100%
Permisos y/o disponibilidad fuentes de materiales	100%
ETAPA CONSTRUCTIVA	
Interventoría técnica	90.44%
Interventoría ambiental	90.44%
Interventoría administrativa	90.44%
Interventoría financiera	90.44%
Interventoría contable	90.44%

Interventoría jurídica	90.44%

Tabla 32. Actividades Ejecutadas.

5.2.5. Avance de interventoría

El avance de obra se mide respecto al tiempo ejecutado.

	Valor	Porcentaje
Valor interventoría	$ 170.684.323,71	**100,00%**
Acumulado ejecutado	$ 154.366.902,36	**90.44%**

Tabla 33. Relación % Programado vs % Ejecutado

Para el día del **31 de marzo de 2024**, se tiene porcentaje ejecutado de **90.44%**

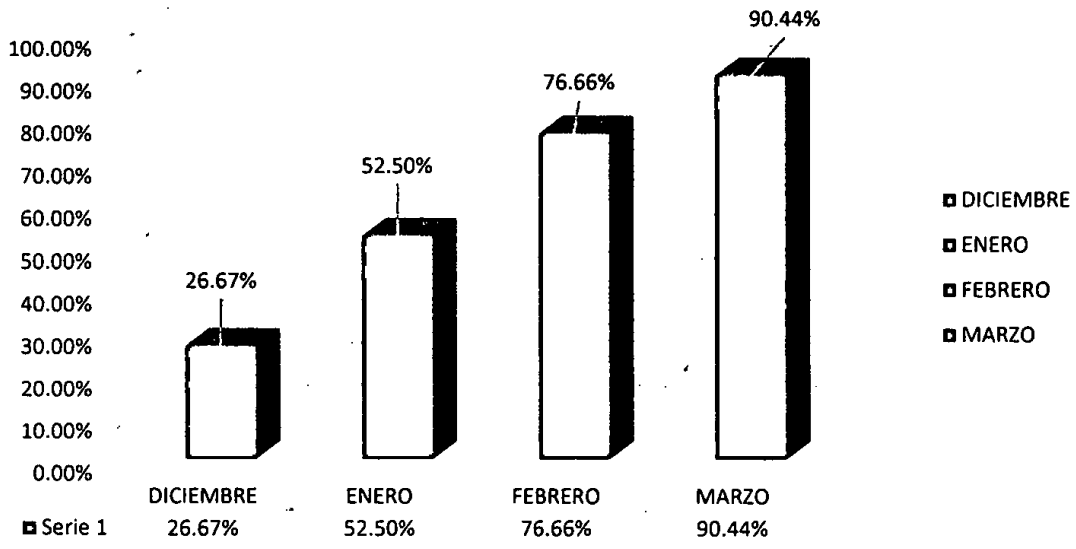


Gráfico 3. Porcentaje ejecutado al corte y proyectado en meses restantes

El avance de interventoría se mide respecto al plazo trascurrido ya que la forma de medición es hombre/mes, de esta manera la interventoría hace el seguimiento al avance de obra, y en

donde las cantidades que se desarrollan entre el **01 de marzo de 2024 y el 31 de marzo de 2024**, restando los días de suspensión que se hayan aprobado mediante actas, se relacionan descriptivamente, en todo el contexto de este informe y gráficamente en el registro fotográfico y cada una de las imágenes, así como en bitácora de obra; a la fecha del presente informe apreciamos un avance del **90.44%** del plazo contractual para interventoría; esto teniendo en cuenta la fecha de terminación del contrato de interventoría No. 251 de 2023, el 29 de marzo de 2024, según acta de inicio y con prorroga No.1 la fecha de terminación el 14 de abril de 2024.

INFORMACION AMBIENTAL.

En la parte del componente ambiental dentro de la ejecución del proyecto de construcción de redes de gas vivienda, se tienen en cuenta las siguientes actividades:

Se realiza seguimiento al cumplimiento de los programas establecidos en la guía de manejo ambiental, para su aplicación se subdivide en nueve fichas de seguimiento.

Disposición de aguas residuales

El manejo, tratamiento y disposición de las aguas residuales generadas en el mes de enero de 2024, es así que los residuos generados por el mantenimiento de la maquinaria y equipos usados, así como los materiales peligrosos son almacenados en un sitio seguro que cuente con piso impermeabilizado, su transporte y disposición deberá ser por una compañía que cuente con los permisos respectivos y que además ofrezca el servicio de disposición final de los residuos generados en sitios debidamente autorizados por la autoridad ambiental competente, cabe resaltar que hasta el momento no se ha generado incidentes por derrame de combustibles.

Control de nivel de ruido

Se realiza el control a equipos dentro de la obra y así garantizar el buen funcionamiento de la maquinaria siendo que, si esta funciona bien, los niveles de ruido de estos serán mínimos y se reduciría el ruido si se llegase a presentar

Los equipos usados para la ejecución de las actividades en el mes de enero de 2024 dentro de la obra, son alquilados y propios; como, por ejemplo:

- Herramienta menor
- Estación total
- Retroexcavadora 4x4 llanta
- Volqueta 6 m3

En el mes de enero de 2024 los niveles de ruido aumentaron, puesto que se estuvo desarrollando actividades con maquinaria pesada.

Control Sobre emisión de gases

Se exige y verifica certificados tecnicomecanicos de los vehículos que se usaron durante las actividades. Lo anterior teniendo en cuenta que para circulación de vehículos de transporte por ley debe tener toda la documentación vigente, aun así, se está al tanto y pendiente de factores anómalos que pudiesen presentarse de improviso que generen gases dañosos para el entorno y el personal obrero en la obra. Se exigió al contratista que debe contar con la certificación de sincronización y emisión de gases de los vehículos y maquinaria usada.

Disposición de residuos solidos

Se realiza clasificación de residuos, utilizando códigos de colores, los cuales implementa el contratista, esto se ve reflejado en la utilización de puntos ecológicos que se instalan en la obra; aclarando que las basuras por lo general que se están acopiando durante este mes son muy mínimas ya que se está realizando excavaciones

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. A la fecha del 31 de marzo de 2024, el contrato de obra presenta un avance ejecutado del 96.94%, respecto a un porcentaje proyectado dé 98.40%, evidenciando que a la fecha se encuentra un atraso frente a lo programado del 1.46%, principalmente el atraso obedece a que no se han ejecutado completamente todas las actividades a final del mes de marzo, una de ellas es la instalación de los centros de medición en donde deben estar las viviendas construidas, pero muchos usuarios cuentan con lotes lo cual ha impedido el avance de esta actividad, por ende, se continua con la prórroga No.1, solicitada en el mes de febrero con ampliación en el plazo por cuarenta y cinco días, para poder completar cada una de las actividades pendientes y cumplir el objeto del contrato

2. Se está llevando un seguimiento a las actividades contractuales en obra con el fin de que cumplan con las especificaciones técnicas del contrato.

3. Se lleva el control de pagos de seguridad social del personal que se encuentra en obra y el uso de los EPP con el fin de garantizar su integridad.

4. Teniendo en cuenta que el contratista de obra cuenta con un profesional HSE se exige ya esté en campo y que realiza las charlas de seguridad para dar cumplimiento al plan de seguridad y salud en el trabajo.

5. Desde la parte financiera y contable los contratos de obra e interventoría, a la fecha no se han realizado tramites de pago parciales. Por otro lado, para el pago del anticipo al contratista de obra el mismo es autorizado por la interventoría mediante una cuenta conjunta.

6. Desde el punto de vista jurídico los contratos cuentan con las pólizas actualizadas según acta de inicio del contrato de obra e interventoría.

Atentamente

HERNÁN ALBERTO FORERO JIMÉNEZ
C.C. 6.774.062
RL GRUPO ABACO CONSULTORES S.A.S

ANEXOS

TABLA DE ANEXOS

- **ANEXO 1.** CANTIDADES EJECUTADAS
- **ANEOX 2.** REGISTRO FOTOGRAFICO
- **ANEXO 3**. POLIZAS
- **ANEXO 4**. NOMINA
- **ANEXO 5**. SEGURIDAD SOCIAL
- **ANEXO 6.** CONTROL DEL CLIMA
- **ANEXO 7.** ACTAS DE COMITE TECNICO
- **ANEXO 8**. BITACORA DE OBRA
- **ANEXO 9**. INFORMES SEMANALES
- **ANEXO 10**. INFORME DE OBRA

- **ANEXO 1.** CANTIDADES EJECUTADAS

CANTIDADES DE OBRA MES DE MARZO 2024

CONTRATO DE CONSULTORIA No.251

INTERVENTOR:	**GRUPO ABACO CONSULTORES S.A.S**
OBJETO:	**"INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE MANÍ Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.".**
DIRECTOR DE OBRA:	***ING. ETMAN GABRIEL NIÑO SANDOVAL***

CONTRATO DE OBRA No. 250

CONTRATISTA	**INGFOXSAS**
OBJETO:	**"CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE MANÍ Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."**

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE MES	VALOR EJECUTADO PRESENTE MES	CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	VALOR EJECUTADO ACUMULADO
UNIDADES CONSTRUCTIVAS HOMOLOGADAS									
1	Conexión domiciliaria residencial (acometida + medidor)	und	249.00	$ 527,622.00	$ 131,377,878.00	120.00	$ 63,314,640.00	220.00	$ 116,076,840.00
CANTIDADES DE OBRA CONSTRUCTIVAS ESPECIALES - NO HOMOLOGADAS									
1	Replanteo y localizacion de tuberías de gas	m	70,801.00	$ 1,692.00	$ 119,795,292.00	0.00	$ 0.00	70,801.00	$ 119,795,292.00
2	Excavacion mecanica en zanja (0 - 15 m)	m3	6,696.63	$ 14,558.00	$ 97,489,539.54	0.00	$ 0.00	6,696.63	$ 97,489,539.54
3	Excavacion a mano en material conglomerado linea de gas	m3	7,556.00	$ 49,091.00	$ 370,931,596.00	0.00	$ 0.00	7,556.00	$ 370,931,596.00
4	Excavacion a mano en material comun linea de gas	m3	2,501.00	$ 31,961.00	$ 79,934,461.00	0.00	$ 0.00	2,501.00	$ 79,934,461.00
5	Solado y encamado tubería de gas con arena apisonada (arena sucia de rio)	m3	2,333.00	$ 43,720.00	$ 101,998,760.00	0.00	$ 0.00	2,333.00	$ 101,998,760.00
6	Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado para linea de gas	m3	13,341.00	$ 22,849.00	$ 304,828,509.00	0.00	$ 0.00	13,341.00	$ 304,828,509.00
7	Tubería de Polietileno PE-80 RDE 11 de 1" para gas. Suministro e Instalación	m	20,926.00	$ 9,373.00	$ 196,139,398.00	0.00	$ 0.00	20,926.00	$ 196,139,398.00
8	Tubería de Polietileno PE-80 RDE 11 de 3/4" para gas. Suministro e Instal	m	13,893.00	$ 6,994.00	$ 97,167,642.00	0.00	$ 0.00	13,893.00	$ 97,167,642.00
9	Tubería de Polietileno PE-80 RDE 9 de 1/2" para gas. Suministro e Instal	m	35,982.00	$ 5,956.00	$ 214,308,792.00	0.00	$ 0.00	35,982.00	$ 214,308,792.00
10	Polivávula 1" PE-80 RDE11. Suministro e instal.	und	4.00	$ 614,384.00	$ 2,457,536.00	1.00	$ 614,384.00	4.00	$ 2,457,536.00
11	Polivávula 3/4" PE-80 RDE11. Suministro e instal.	und	1.00	$ 611,188.00	$ 611,188.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 611,188.00
12	Polivávula 1/2" PE-80 RDE11. Suministro e instal.	und	6.00	$ 608,088.00	$ 3,648,528.00	1.00	$ 608,088.00	6.00	$ 3,648,528.00
13	Prueba de hermeticidad red de gasoducto	m	70,801.00	$ 306.00	$ 21,665,106.00	35,400.50	$ 10,832,553.00	35,400.50	$ 10,832,553.00
14	Cruce aereo especial tipo marco H Ø 2"	m	143.00	$ 503,424.00	$ 71,989,632.00	77.00	$ 38,763,648.00	77.00	$ 38,763,648.00
15	Mojon de señalizacion rural. Suministro e instal.	und	158.00	$ 224,543.00	$ 35,477,794.00	158.00	$ 35,477,794.00	158.00	$ 35,477,794.00
				VALOR COSTO DIRECTO	$ 1,718,443,773.54		$ 86,296,467.00		$ 1,674,385,237.00
				VALOR A.I.U. (34%)	$ 584,270,883.00		$ 29,340,799.00		$ 569,290,981.00
				VALOR UNIDADES CONSTRUCTIVAS NO HOMOLOGADAS	$ 2,302,714,657.00		$ 115,637,266.00		$ 2,243,676,218.00
				UNIDADES CONSTRUCTIVAS HOMOLOGADAS	$ 131,377,878.00		$ 63,314,640.00		$ 116,076,840.00
				VALOR TOTAL	$ 2,434,092,535.00		$ 178,951,906.00		$ 2,359,655,410.00
				PORCENTAJE (%)			7.35%		96.94%

HERNAN ALBERTO FORERO JIMENEZ
R/L GRUPO ABACO CONSULTORES S.A.S

- **ANEOX 2.** REGISTRO FOTOGRAFICO

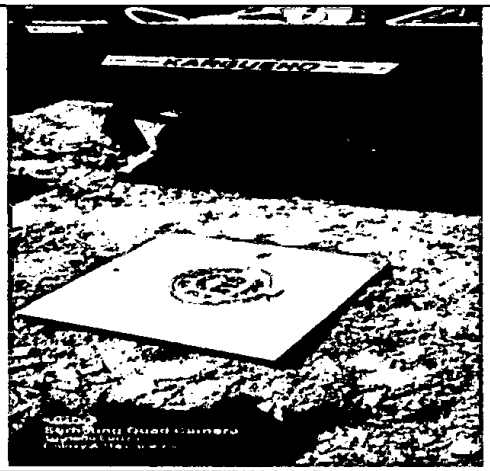
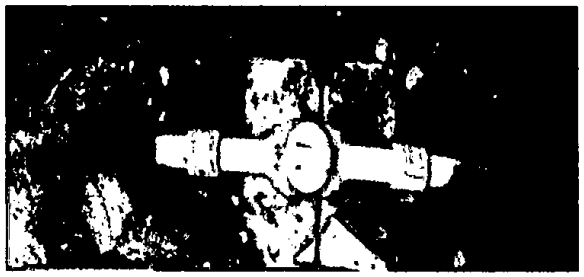
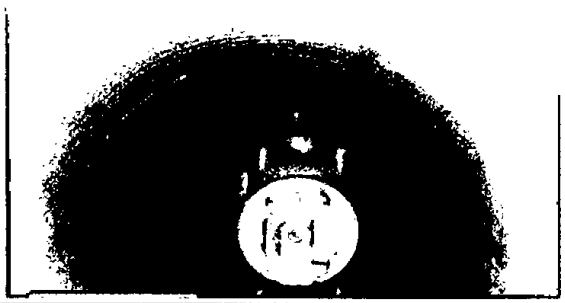
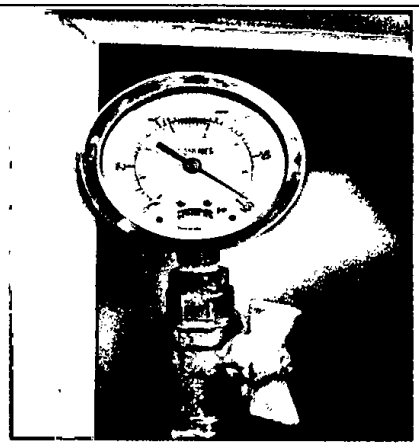
FOTO No.1. Poliválvula 1" PE-80 RDE11. Suministro e Instal.	FOTO No.2 Poliválvula 1" PE-80 RDE11. Suministro e Instal.
	
FOTO No.3 Poliválvula 1/2" PE-80 RDE11. Suministro e Instal.	FOTO No.4 Poliválvula 1/2" PE-80 RDE11. Suministro e Instal.
	
FOTO No.5 Prueba de hermeticidad red de gasoducto.	FOTO No.6 Prueba de hermeticidad red de gasoducto.
	

FOTO No.7. Cruce aéreo especial tipo marco H Ø 2	FOTO No.8. Cruce aéreo especial tipo marco H Ø 2
	
FOTO No.9. Cruce aéreo especial tipo marco H Ø 2	FOTO No.10. Cruce aéreo especial tipo marco H Ø 2
	
FOTO No.11 Mojón de señalización rural. Suministro e instalación	FOTO No.12 Mojón de señalización rural. Suministro e instalación
	

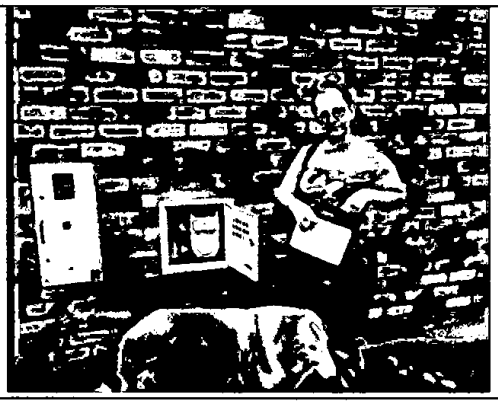
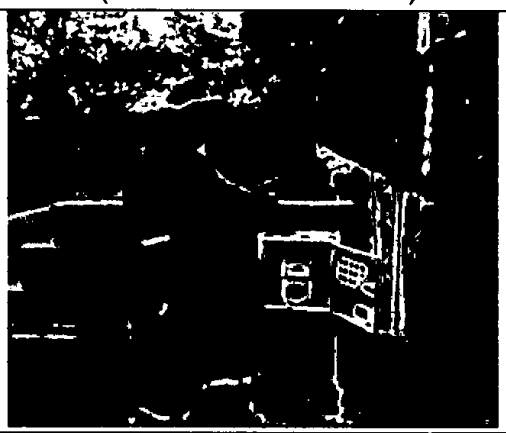
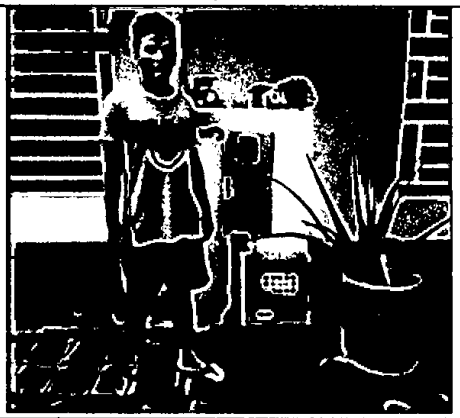
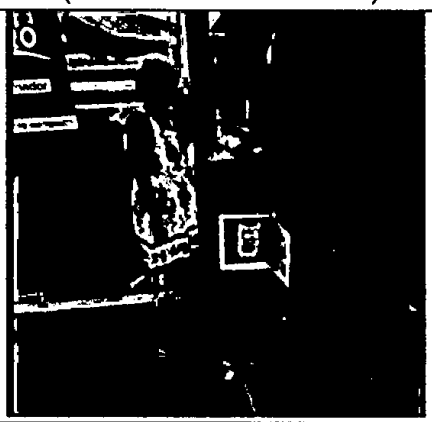
FOTO No.13 Mojón de señalización rural. Suministro e instalación	FOTO No.14 Mojón de señalización rural. Suministro e instalación
	
FOTO No.13 Conexión domiciliaria residencial (acometida + medidor)	FOTO No.14 Conexión domiciliaria residencial (acometida + medidor)
	
FOTO No.15 Conexión domiciliaria residencial (acometida + medidor)	FOTO No.16 Conexión domiciliaria residencial (acometida + medidor)
	

FOTO No.17 Conexión domiciliaria residencial (acometida + medidor)	FOTO No.18 Conexión domiciliaria residencial (acometida + medidor)
	
FOTO No.19 Conexión domiciliaria residencial (acometida + medidor)	FOTO No.20 Conexión domiciliaria residencial (acometida + medidor)
	

- **ANEXO 3**. POLIZAS

LA OFICINA JURÍDICA DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P

En ejercicio de la Facultad otorgada por el Artículo 42 del Acuerdo 004 de 2013 por medio del cual se modifica el Reglamento de Contratación de ENERCA S.A. E.S.P. Efectuo la Revisión de la Póliza respecto del Contrato que a continuación se describe:

ORDEN: DE CONSULTORIA N° 251 DE 2023
CONTRATISTA: GRUPO ABACO CONSULTORES S.A.S.
NIT N° 900.795.416-6
R/L: HERNAN ALBERTO FORERO JIMENEZ
C.C: 6.774.062 EXPEDIDA EN TUNJA
VALOR INICIAL: $170.684.324
VALOR ADICIONAL : N/A
VALOR TOTAL: $170.684.324
PLAZO: CUATRO (4) MESES
OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DE MANÍ Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

AMPARO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	VLR ASEGURADO $	NOMBRE ASEGURADORA	N° POLIZA	OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO	15-11-2023	15-07-2024	$17.068.432	SURAMERICANA	3785325-8	CONTRATO INICIAL
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	———	———	———	———	———	———
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	15-11-2023	15-03-2027	$17.068.432	SURAMERICANA	3785325-8	CONTRATO INICIAL
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	———	———	———	———	———	———
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS	———	———	———	———	———	———
SUMINISTRO DE REPUESTOS	———	———	———	———	———	———
ESTABILIDAD DE OBRA						
CALIDAD DEL SERVICIO	———	———	———	———	———	———
OTRAS	———	———	———	———	———	———
RESPONSABILIDAD CIVIL	15-11-2023	15-07-2024	$17.068.432	SURAMERICANA	0938442-9	CONTRATO INICIAL

CON BASE EN LO ANTERIOR, ESTA OFICINA IMPARTE SU APROBACIÓN, A LOS VEINTICUATRO (24) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.

ITEM	NOMBRE	CARGO	FIRMA
REVISÓ	GLORIA SOFIA MARTINEZ	PROFESIONAL DE APOYO	
APROBÓ	CAROL ROSS MARY ESCOBAR PATERNINA.	Con funciones asignadas de Asesora Jurídica, según Acto de Gerencia N° 742 del 9 de	

SEGURO DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS

suramericana

Ciudad y Fecha de Expedición	Póliza		Documento
TUNJA, 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	3785325-8		15407732
Intermediario	**Código**	**Oficina**	**Referencia de Pago**
ASESORES DE SEGUROS FANNY MEDINA LT	80512	2529	01215407732

TOMADOR

NIT	Razón Social y/o Nombres y Apellidos
9007954166	GRUPO ABACO CONSULTORES S.A.S.

Dirección	Ciudad	Teléfono
CRA 4 11 82 CEL 3144483506	MANI	4483506

GARANTIZADO

NIT	Nombres y Apellidos
9007954166	GRUPO ABACO CONSULTORES S.A.S.

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

NIT	Nombres y Apellidos
8440045760	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A ESP

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
CALIDAD DEL SERVICIO	15-MAR-2024	15-MAR-2029	17.068.432,00	213.472,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15-NOV-2023	15-JUL-2024	34.136.865,00	68.180,00
PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15-NOV-2023	15-MAR-2027	17.068.432,00	142.159,00

VIGENCIA DEL SEGURO		VIGENCIA DEL MOVIMIENTO			VLR. PRIMA SIN IVA	VLR. IMPUESTOS (IVA)	TOTAL A PAGAR
Desde	Hasta	Días	Desde	Hasta			
15-NOV-2023	15-MAR-2029	1947	15-NOV-2023	15-MAR-2029	$423.811	$80.524	$504.335

VALOR A PAGAR EN LETRAS
QUINIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/L

Documento de:	Valor Asegurado Movimiento	Prima Anual	Total Valor Asegurado
POLIZA NUEVA	$68.273.729	$187.753	$68.273.729,00

103 - NEGOCIOS MEDIANA Y PEQUEÑA EMP

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA	COASEGURO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
012	NDX	2529	CUM001	01	PESO COLOMBIANO	DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
80512	ASESORES DE SEGUROS FANNY MEDINA LT	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	AGENCIAS	100,00	423.811

DESCRIPCION	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación interna de la proforma
CÓDIGO CLAUSULADO	01/08/2016	13 - 18	P	5	F-01-12-083
CÓDIGO NOTA TÉCNICA	25/06/2017	13 - 18	NT-P	5	N-01-012-010

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

Proceso de selección: Prestacion de servicios Interventoria
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE CONSULTORIA NO. 251 DE 2023 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DE MANI Y AMPLIACION DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
** EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA INICIA VIGENCIA DE CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA CONSULTORIA.
LA PRESENTE POLIZA SE RIGE POR EL CLAUSULADO A FAVOR DE EMPRESAS DE SERVICIOS

SEGURO DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS

suramericana

Ciudad y Fecha de Expedición	Póliza		Documento
TUNJA, 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	3785325-8		15407732
Intermediario	**Código**	**Oficina**	**Referencia de Pago**
ASESORES DE SEGUROS FANNY MEDINA LT	80512	2529	01215407732

TOMADOR

NIT	Razón Social y/o Nombres y Apellidos		
9007954166	GRUPO ABACO CONSULTORES S.A.S.		
Dirección		**Ciudad**	**Teléfono**
CRA 4 11 82 CEL 3144483506		MANI	4483506

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

PUBLICOS F 01 12 083 N 01 012 010
HTTPS://APPSSEG.SURANET.COM/CUMPLIMIENTOWLS/JSP/TOOLBAR.JSP#

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO

suramericana

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PÓLIZA NÚMERO	REFERENCIA DE PAGO
TUNJA, 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	0938442-9	01313923411

INTERMEDIARIO	CÓDIGO	OFICINA	DOCUMENTO NÚMERO
ASESORES DE SEGUROS FANNY MEDINA LT	80512	2529	13923411

TOMADOR	NIT
GRUPO ABACO CONSULTORES S.A.S.	9007954166

ASEGURADO	NIT
GRUPO ABACO CONSULTORES S.A.S.	9007954166

BENEFICIARIO	
TERCEROS AFECTADOS	

DIRECCIÓN DE COBRO	CIUDAD	TELÉFONO
CRA 4 11 82 CEL 3144483506	MANI	4483506

DIRECCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO	CIUDAD	DEPARTAMENTO	DESCRIPCIÓN DEL SECTOR
CR 4 # 11 82	MANT	CASANARE	SECTOR SERVICIOS

ACTIVIDAD	CÓDIGO ACTIVIDAD
OFICINAS Y/O DESPACHOS PROFESIONALES (ABOGADOS, ARQUITECTOS, CONTADORES, INGENIEROS, PUBLICISTAS Y SIMILARES), CASA CURAL, SEGUN 7267	

DESCRIPCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO	RIESGO No
	1

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	VLR. ASEGURADO	VLR. MOVIMIENTO	% ÍNDICE VARIABLE	PRIMA	I.V.A	PRIMA + IVA
* BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	17.068.432,00	17.068.432,00	0	72.070	13.883	86.953
* R.C. CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	1.706.843,00	0,00	0	3.655	694	4.349
* R.C. PATRONAL	1.706.843,00	0,00	0	3.655	694	4.349
* R.C. VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	1.706.843,00	0,00	0	3.655	694	4.349

VIGENCIA DEL MOVIMIENTO DESDE	HASTA	NÚMERO DÍAS	PRIMA	IVA	TOTAL A PAGAR
15-NOV-2023	15-JUL-2024	243	$84.034	$15.966	$100.000

VALOR A PAGAR EN LETRAS
CIEN MIL PESOS M/L

VIGENCIA DEL SEGURO DESDE	HASTA	NÚMERO DE RIESGOS VIGENTES	VALOR ASEGURADO	VALOR INDICE VARIABLE	TOTAL VALOR ASEGURADO
15-NOV-2023	15-JUL-2024	1	$17.068.432,00	$0,00	$17.068.432,00

DOCUMENTO DE:
POLIZA NUEVA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17

TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DEL SEGURO: "LA MORA DEL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO".
EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 01-13-040 , LAS CUALES SE ADJUNTAN

EL TOMADOR, ASEGURADO, BENEFICIARIO O AFIANZADO, SE OBLIGAN A ACTUALIZAR ANUALMENTE O AL MOMENTO DE LA RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA, LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL FORMULARIO DE VINCULACIÓN DE CLIENTES Y SUS ANEXOS Y A ENTREGAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE. A SU VEZ, LA COMPAÑÍA TIENE LA FACULTAD DE CANCELAR EL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO AUTORIZADO POR EL RÉGIMEN LEGAL PROPIO DE CADA CONTRATO, EN CASO DE DESATENCIÓN A ESTOS DEBERES.

103 - NEGOCIOS MEDIANA Y PEQUEÑA EMP

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA
013	AG5	2529	CUM001	01	PESO COLOMBIANO

COASEGURO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA ASEGURADO

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO COMO RECIBO DE PRIMA SI ESTA FIRMADO POR UN CAJERO O COBRADOR AUTORIZADO POR LA SURAMERICANA. SI SE ENTREGA A CAMBIO DE UN CHEQUE, LA PRIMA SÓLO SERÁ ABONADA AL RECIBIR SURAMERICANA SU VALOR.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PARTICIPACIÓN DE ASESORES

CÓDIGO	NOMBRE DEL ASESOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
80512	ASESORES DE SEGUROS FANNY MEDINA LT	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA	AGENCIAS	100,00	84.034

FECHA A PARTIR DE LA CUAL SE UTILIZA	RO Y NUMERO DE LA ENTIDAD	TIPO DE DOCUMENTO	RAMO AL CUAL PERTENECE	IDENTIFICACION INTERNA DE LA FROFORMA
01 - 07 - 2003	13 - 18	P	6	F-01-13-040

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN
LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
0
TUNJA

Seguros Generales Suramericana S.A.

- CLIENTE -

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 860.503.407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN

www.suramericana.com

11
55

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO

suramericana

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICION	POLIZA NÚMERO	REFERENCIA DE PAGO
TUNJA, 21 DE NOVIEMBRE DE 2023	0938442-9	01313923411

INTERMEDIARIO	CODIGO	OFICINA	DOCUMENTO NUMERO
ASESORES DE SEGUROS FANNY MEDINA LT	80512	2529	13923411

TOMADOR	NIT
GRUPO ABACO CONSULTORES S.A.S.	9007954166
ASEGURADO	**NIT**
GRUPO ABACO CONSULTORES S.A.S.	9007954166
BENEFICIARIO	
TERCEROS AFECTADOS	

DIRECCIÓN DE COBRO	CIUDAD	TELÉFONO
CRA 4 11 32 CEL 3144483506	MANI	4483506

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO
012003785325. NO. DE CONTRATO 251 DE 2023.
LA PRESENTE POLIZA CUENTA CON UNA COBERTURA DE 17,068,432.39 PARA CUBRIR LOS PERJUICIOS QUE CAUSE EL ASEGURADO TANTO EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE, COMO EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE; AL IGUAL QUE LA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE CONSULTORIA NO. 251 DE 2023 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DE MANI Y AMPLIACION DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
ASEGURADO Y BENEFICIARIO ADICIONAL EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SA ESP, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE ESTE SE VEA OBLIGADO APAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR PARTE DEL ASEGURADO PRINCIPAL INGFOX SAS, Y POR LOS CUALES SEAN SOLIDARIAMENTE RESPONSABLES. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACUAL PROPIA E INDEPENDIENTE DEL EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SAESP.
LA PRESENTE POLIZA SE RIGE POR EL CLAUSULADO SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVILPOR DAÑOS A TERCEROS, PROFORMA F 01 13 040

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN
LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
0
TUNJA

LA OFICINA JURÍDICA DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P

En ejercicio de la Facultad otorgada por el Artículo 42 del Acuerdo 004 de 2013 por medio del cual se modifica el Reglamento de Contratación de ENERCA S.A. E.S.P. Efectuo la Revisión de la Póliza respecto del Contrato que a continuación se describe:

ORDEN: DE CONSULTORIA N° 251 DE 2023
CONTRATISTA: GRUPO ABACO CONSULTORES S.A.S.
NIT N° 900.795.416-6
R/L: HERNAN ALBERTO FORERO JIMENEZ
C.C: 6.774.062 EXPEDIDA EN TUNJA
VALOR INICIAL: $170.684.324
VALOR ADICIONAL : N/A
VALOR TOTAL: $170.684.324
PLAZO: CUATRO (4) MESES
OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DE MANÍ Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

AMPARO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	VLR ASEGURADO $	NOMBRE ASEGURADORA	N° POLIZA	OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO	30-11-2023	30-07-2024	$17.068.432	SURAMERICANA	3785325-8	ACTA DE INICIO
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	———	———	———	———	———	———
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	30-11-2023	30-03-2027	$17.068.432	SURAMERICANA	3785325-8	ACTA DE INICIO
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	———	———	———	———	———	———
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS	———	———	———	———	———	———
SUMINISTRO DE REPUESTOS	———	———	———	———	———	———
ESTABILIDAD DE OBRA						
CALIDAD DEL SERVICIO	———	———	———	———	———	———
OTRAS	———	———	———	———	———	———
RESPONSABILIDAD CIVIL	30-11-2023	30-07-2024	$17.068.432	SURAMERICANA	0938442-9	ACTA DE INICIO

CON BASE EN LO ANTERIOR, ESTA OFICINA IMPARTE SU APROBACIÓN, A LOS SIETE (7) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023.

ITEM	NOMBRE	CARGO	FIRMA
REVISÓ	GLORIA SOFIA MARTINEZ	PROFESIONAL DE APOYO	
APROBÓ	MARJA BELEN BELTRAN LEÓN	ASESORA JURIDICA	

SEGURO DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS

suramericana

Ciudad y Fecha de Expedición	Póliza	Documento
TUNJA, 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	3785325-8	15412063

Intermediario	Código	Oficina	Referencia de Pago
ASESORES DE SEGUROS FANNY MEDINA LT	80512	2529	01215412063

TOMADOR

NIT	Razón Social y/o Nombres y Apellidos
9007954166	GRUPO ABACO CONSULTORES S.A.S.

Dirección	Ciudad	Teléfono
CRA 6 11 82 CEL 3144683506	MANI	4483506

GARANTIZADO

NIT	Nombres y Apellidos
9007954166	GRUPO ABACO CONSULTORES S.A.S.

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

NIT	Nombres y Apellidos
8460045760	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A ESP

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
CALIDAD DEL SERVICIO	15-MAR-2024	15-MAR-2029	34.136.865,00	213.473,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15-NOV-2023	15-JUL-2024	17.068.432,00	-34.090,00
PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15-NOV-2023	15-MAR-2027	17.068.432,00	0,00

VIGENCIA DEL SEGURO		VIGENCIA DEL MOVIMIENTO			VLR. PRIMA SIN IVA	VLR. IMPUESTOS (IVA)	TOTAL A PAGAR
Desde	Hasta	Días	Desde	Hasta			
15-NOV-2023	15-MAR-2029	1940	22-NOV-2023	15-MAR-2029	$179.383	$34.083	$213.466

VALOR A PAGAR EN LETRAS

DOSCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/L

Documento de:	Valor Asegurado Movimiento	Prima Anual	Total Valor Asegurado
MODIFICACION VALORABLE CON COBRO DE PRIMA	$0	$179.218	$51.205.297,00

103 - NEGOCIOS MEDIANA Y PEQUEÑA EMP

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA	COASEGURO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
012	NDX	2529	984266	07	PESO COLOMBIANO	DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
80512	ASESORES DE SEGUROS FANNY MEDINA LT	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	AGENCIAS	100,00	179.383

DESCRIPCIÓN	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación interna de la proforma
CÓDIGO CLAUSULADO	01/08/2016	13 - 18	P	5	F-C1-12-083
CÓDIGO NOTA TÉCNICA	25/06/2017	13 - 18	NT-P	5	N-01-012-010

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

Proceso de selección: Prestacion de servicios Interventoria
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE CONSULTORIA NO. 251 DE 2023 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DE MANI Y AMPLIACION DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
** EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA INICIA VIGENCIA DE CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA CONSULTORIA.
LA PRESENTE POLIZA SE RIGE POR EL CLAUSULADO A FAVOR DE EMPRESAS DE SERVICIOS

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

SEGURO DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS

suramericana

Ciudad y Fecha de Expedición	Póliza		Documento
TUNJA, 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	3785325-8		15412063
Intermediario	**Código**	**Oficina**	**Referencia de Pago**
ASESORES DE SEGUROS FANNY MEDINA LT	80512	2529	01215412063

TOMADOR

NIT	Razón Social y/o Nombres y Apellidos		
9007954166	GRUPO ABACO CONSULTORES S.A.S.		
Dirección		**Ciudad**	**Teléfono**
CRA 4 11 82 CEL 3144483506		MANI	6483506

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

PUBLICOS F 01 12 083 N 01 012 010

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE CORRIGEN VALOES DE CADA AMPARO, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES

VIGILADO

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
0
TUNJA

DOCUMENTO PROTEGIDO ELECTRONICAMENTE BAJO EL CODIGO: 1593280021

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN

COMPROBANTE DE PAGO

Seguros Generales Suramericana S.A.
890.903.407-9

sura

Referencia de pago 550146127839

Información del cliente	
Nombre	**Identificación**
GRUPO ABACO CONSULTORES S.A.S.	9007954186

Estado de transferencia			
Descripción		**Estado**	**Aprobada**
Fecha de pago	2023-11-23 14:18:25	**Forma de pago**	COMPROBANTE
Banco	7701	**Descripción IP**	181.53.63.27

Resumen de pago

Número de recibo	Número de póliza	Monto
15412063	012003785325	$213,466
13924281	013000938442	$54,767
	Total	$268,233

Si tienes alguna inquietud podrás contactarnos en los siguientes teléfonos, para Medellín, Cali y Bogotá: 347 88 88. En el resto del país: 01800 051 8888 o envíanos un correo electrónico a pagoexpress@sura.com.co.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO

suramericana

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PÓLIZA NÚMERO		REFERENCIA DE PAGO
TUNJA, 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	0938442-9		01313924281
INTERMEDIARIO	CÓDIGO	OFICINA	DOCUMENTO NÚMERO
ASESORES DE SEGUROS FANNY MEDINA LT	80512	2529	13924281

TOMADOR	NIT
GRUPO ABACO CONSULTORES S.A.S.	9007954166
ASEGURADO	NIT
GRUPO ABACO CONSULTORES S.A.S.	9007954166
BENEFICIARIO	
TERCEROS AFECTADOS	

DIRECCIÓN DE COBRO	CIUDAD	TELÉFONO
CRA 4 11 82 CEL 3144483506	MANI	4483506

DIRECCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO	CIUDAD	DEPARTAMENTO	DESCRIPCIÓN DEL SECTOR
CR 4 # 11 82	MANI	CASANARE	SECTOR SERVICIOS

ACTIVIDAD	CÓDIGO ACTIVIDAD
OFICINAS Y/O DESPACHOS PROFESIONALES (ABOGADOS, ARQUITECTOS, CONTADORES, INGENIEROS, PUBLICISTAS Y SIMILARES), CASA CURAL	9499967
DESCRIPCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO	RIESGO No
	1

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	VLR. ASEGURADO	VLR. MOVIMIENTO	% ÍNDICE VARIABLE	PRIMA	I.V.A	PRIMA + IVA
* BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	17.068.432,00	0,00	0	0	0	0
* R.C. CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	17.068.432,00	0,00	0	15.341	2.915	18.256
* R.C. PATRONAL	17.068.432,00	0,00	0	15.341	2.915	18.256
* R.C. VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	17.068.432,00	0,00	0	15.341	2.915	18.256

VIGENCIA DEL MOVIMIENTO DESDE	HASTA	NÚMERO DÍAS	PRIMA	IVA	TOTAL A PAGAR
22-NOV-2023	15-JUL-2024	236	$46.023	$8.744	$54.767

VALOR A PAGAR EN LETRAS
CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/L

VIGENCIA DEL SEGURO DESDE	HASTA	NÚMERO DE RIESGOS VIGENTES	VALOR ASEGURADO	VALOR INDICE VARIABLE	TOTAL VALOR ASEGURADO
15-NOV-2023	15-JUL-2024	1	$17.068.432,00	$0,00	$17.068.432,00

DOCUMENTO DE:
MODIFICACION VALORABLE CON AUMENTO DE PRIMA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17

TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DEL SEGURO: "LA MORA DEL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO".
EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 01-13-040 , LAS CUALES SE ADJUNTAN

EL TOMADOR, ASEGURADO, BENEFICIARIO O AFIANZADO, SE OBLIGAN A ACTUALIZAR ANUALMENTE O AL MOMENTO DE LA RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA, LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL FORMULARIO DE VINCULACIÓN DE CLIENTES Y SUS ANEXOS Y A ENTREGAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE. A SU VEZ, LA COMPAÑÍA TIENE LA FACULTAD DE CANCELAR EL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO AUTORIZADO POR EL RÉGIMEN LEGAL PROPIO DE CADA CONTRATO, EN CASO DE DESATENCIÓN A ESTOS DEBERES.

103 - NEGOCIOS MEDIANA Y PEQUEÑA EMP

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA
013	AG5	2529	984266	07	PESO COLOMBIANO

COASEGURO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA ASEGURADO

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO COMO RECIBO DE PRIMA, SI ESTÁ FIRMADO POR UN CAJERO O COBRADOR AUTORIZADO POR LA SURAMERICANA. SI SE ENTREGA A CAMBIO DE UN CHEQUE, LA PRIMA SÓLO SERÁ ABONADA AL RECIBIR SURAMERICANA SU VALOR.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

PARTICIPACIÓN DE ASESORES

CÓDIGO	NOMBRE DEL ASESOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
80512	ASESORES DE SEGUROS FANNY MEDINA LT	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA	AGENCIAS	100,00	46.023

FECHA A PARTIR DE LA CUAL SE UTILIZARÁ	TIPO Y NÚMERO DE LA ENTIDAD	TIPO DE DOCUMENTO	RAMO AL CUAL PERTENECE	IDENTIFICACIÓN INTERNA DE LA PROFORMA
01 - 06 - 2009	13 - 18	P	6	F-01-13-040

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN
LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
0
TUNJA

Seguros Generales Suramericana S.A.

- CLIENTE -

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN

www.suramericana.com

61

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO

suramericana

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PÓLIZA NÚMERO	REFERENCIA DE PAGO
TUNJA, 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	0938442-9	01313924281

INTERMEDIARIO	CÓDIGO	OFICINA	DOCUMENTO NÚMERO
ASESORES DE SEGUROS FANNY MEDINA LT	80512	2529	13924281

TOMADOR GRUPO ABACO CONSULTORES S.A.S.	NIT 9007954166
ASEGURADO GRUPO ABACO CONSULTORES S.A.S.	NIT 9007954166
BENEFICIARIO TERCEROS AFECTADOS	

DIRECCIÓN DE COBRO	CIUDAD	TELÉFONO
CRA 4 11 82 CEL 3144483506	MANI	4483506

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO
0120037853325. NO. DE CONTRATO 251 DE 2023.
LA PRESENTE POLIZA CUENTA CON UNA COBERTURA DE 17.068,432.39 PARA CUBRIR LOS PERJUICIOS QUE CAUSE EL ASEGURADO TANTO EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE, COMO EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE; AL IGUAL QUE LA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIONIALES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE CONSULTORIA NO. 251 DE 2023 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DE MANI Y AMPLIACION DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
ASEGURADO Y BENEFICIARIO ADICIONAL EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SA ESP, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE ESTE SE VEA OBLIGADO APAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR PARTE DEL ASEGURADO PRINCIPAL INGFOX SAS, Y POR LOS CUALES SEAN SOLIDARIAMENTE RESPONSABLES. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACUAL PROPIA E INDEPENDIENTE DEL EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SAESP.
LA PRESENTE POLIZA SE RIGE POR EL CLAUSULADO SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVILPOR DAÑOS A TERCEROS, PROFORMA F 01 13 040
**
MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE CORRIGEN COBERTURAS, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES
ESTA POLIZA CUBRE EL AMPARO BASICO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (PLO) PREDIOS LABORES Y OPERACIONES

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN
LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
D
TUNJA

COMPROBANTE DE PAGO

Seguros Generales Suramericana S.A.
890.903.407-9

sura

Referencia de pago	550146071809

Información del cliente

Nombre	Identificación
GRUPO ABACO CONSULTORES S.A.S.	9007954166

Estado de transferencia

Descripción	APROBADA	Estado	Aprobada
Fecha de pago	2023-11-21 10:54:39	Forma de pago	BTNBC
Banco	BTNBC	Descripción IP	10.201.138.7

Resumen de pago

Número de recibo	Número de póliza	Monto
15407732	012003785325	$504,335
13923411	013000938442	$100,000
	Total	$604,335

Si tienes alguna inquietud podrás contactarnos en los siguientes teléfonos, para Medellín, Cali y Bogotá: 347 88 88. En el resto del país: 01800 051 8888 o envíanos un correo electrónico a pagoexpress@sura.com.co.

LA OFICINA JURÍDICA DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P

En ejercicio de la Facultad otorgada por el Artículo 42 del Acuerdo 004 de 2013 por medio del cual se modifica el Reglamento de Contratación de ENERCA S.A. E.S.P. efectuo la revisión y aprobación de la Póliza respecto del Contrato que a continuación se describe:

ORDEN: DE CONSULTORIA N° 251 DE 2023
CONTRATISTA: GRUPO ABACO CONSULTORES S.A.S.
NIT Nº 900.795.416-6
R/L: HERNAN ALBERTO FORERO JIMENEZ
C.C: 6.774.062 EXPEDIDA EN TUNJA
VALOR INICIAL: $170.684.324
VALOR ADICIONAL : N/A
VALOR TOTAL: $170.684.324
PLAZO: CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DIAS
OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DE MANÍ Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

AMPARO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	VLR_ ASEGURADO $	NOMBRE ASEGURADORA	N°_ POLIZA	OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO	30-11-2023	14-08-2024	$17.068.432	SURAMERICANA	3785325-8	PRORROGA AL PLAZO N°1
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO						
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	30-11-2023	14-04-2027	$17.068.432	SURAMERICANA	3785325-8	PRORROGA AL PLAZO N°1
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS						
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS	----------	----------	----------	----------	----------	----------
SUMINISTRO DE REPUESTOS	----------	----------	----------	----------	----------	----------
ESTABILIDAD DE OBRA	----------	----------	----------	----------	----------	----------
CALIDAD DEL SERVICIO	----------	----------	----------	----------	----------	----------
OTRAS	----------	----------	----------	----------	----------	----------

RESPONSABILIDAD CIVIL	30-11-2023	14-08-2024	$17.068.432	SURAMERICANA	0938442-9	PRORROGA AL PLAZO N°1

CON BASE EN LO ANTERIOR, ESTA OFICINA IMPARTE SU APROBACIÓN, A LOS (10) DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2024.

ITEM	NOMBRE	CARGO	FIRMA
REVISÓ	GLORIA SOFIA MARTINEZ	PROFESIONAL DE APOYO	
APROBÓ	CAROL ROSS MARY ESCOBAR PATERNINA.	ASESORA JURIDICA con funciones asignadas mediante A.G.G. 294 del 1 de abril de 2024	

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO

suramericana

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PÓLIZA NÚMERO	REFERENCIA DE PAGO
TUNJA, 02 DE ABRIL DE 2024	0938442-9	01313974656

INTERMEDIARIO	CÓDIGO	OFICINA	DOCUMENTO NÚMERO
ASESORES DE SEGUROS FANNY MEDINA LT	80512	2529	13974656

TOMADOR	NIT
GRUPO ABACO CONSULTORES S.A.S.	9007954166

ASEGURADO	NIT
GRUPO ABACO CONSULTORES S.A.S.	9007954166

BENEFICIARIO	
TERCEROS AFECTADOS	

DIRECCIÓN DE COBRO	CIUDAD	TELÉFONO
CRA 4 11 82 CEL 3144483506	MANI	4483506

DIRECCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO	CIUDAD	DEPARTAMENTO	DESCRIPCIÓN DEL SECTOR
CR 4 # 11 82	MANI	CASANARE	SECTOR SERVICIOS

ACTIVIDAD	CÓDIGO ACTIVIDAD
OFICINAS Y/O DESPACHOS PROFESIONALES (ABOGADOS, ARQUITECTOS, CONTADORES, INGENIEROS, PUBLICISTAS Y SIMILARES), CASA CURAL, JUNTAS	9007

DESCRIPCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO	RIESGO No
	1

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	VLR. ASEGURADO	VLR. MOVIMIENTO	% ÍNDICE VARIABLE	PRIMA	I.V.A	PRIMA + IVA
* BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	17.068.432,00	17.068.432,00	0	0	0	0
* R.C. CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	17.068.432,00	0,00	0	0	0	0
* R.C. PATRONAL	17.068.432,00	0,00	0	0	0	0
* R.C. VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	17.068.432,00	0,00	0	0	0	0

VIGENCIA DEL MOVIMIENTO DESDE	VIGENCIA DEL MOVIMIENTO HASTA	NÚMERO DÍAS	PRIMA	IVA	TOTAL A PAGAR
02-ABR-2024	14-AGO-2024	134	$0	$0	$0

VALOR A PAGAR EN LETRAS
CERO PESOS M/L

VIGENCIA DEL SEGURO DESDE	VIGENCIA DEL SEGURO HASTA	NÚMERO DE RIESGOS VIGENTES	VALOR ASEGURADO	VALOR INDICE VARIABLE	TOTAL VALOR ASEGURADO
30-NOV-2023	14-AGO-2024	1	$17.068.432,00	$0,00	$17.068.432,00

DOCUMENTO DE:

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17

TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DEL SEGURO: "LA MORA DEL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO".
EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 01-13-040 , LAS CUALES SE ADJUNTAN

EL TOMADOR, ASEGURADO, BENEFICIARIO O AFIANZADO, SE OBLIGAN A ACTUALIZAR ANUALMENTE O AL MOMENTO DE LA RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA, LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL FORMULARIO DE VINCULACIÓN DE CLIENTES Y SUS ANEXOS Y A ENTREGAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE. A SU VEZ, LA COMPAÑÍA TIENE LA FACULTAD DE CANCELAR EL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO AUTORIZADO POR EL RÉGIMEN LEGAL PROPIO DE CADA CONTRATO, EN CASO DE DESATENCIÓN A ESTOS DEBERES.

103 - NEGOCIOS MEDIANA Y PEQUEÑA EMP

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA
013	AGS	2529	984266	07	PESO COLOMBIANO

COASEGURO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA ASEGURADO

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO COMO RECIBO DE PRIMA, SI ESTÁ FIRMADO POR UN CAJERO O COBRADOR AUTORIZADO POR LA SURAMERICANA, SI SE ENTREGA A CAMBIO DE UN CHEQUE. LA PRIMA SÓLO SERÁ ABONADA AL RECIBIR SURAMERICANA SU VALOR.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PARTICIPACIÓN DE ASESORES

CÓDIGO	NOMBRE DEL ASESOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
80512	ASESORES DE SEGUROS FANNY MEDINA LT	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA	AGENCIAS	100,00	0

FECHA A PARTIR DE LA CUAL SE UTILIZA	RAMO Y NUMERO DE LA ENTIDAD	TIPO DE DOCUMENTO	RAMO AL CUAL PERTENECE	IDENTIFICACION INTERNA DE LA PROFORMA
01 - 06 - 2009	13 - 18	P	6	F-01-13-040

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN
LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
0
TUNJA

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS REGIMEN COMÚN

66

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO

suramericana

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PÓLIZA NÚMERO	REFERENCIA DE PAGO
TUNJA, 02 DE ABRIL DE 2024	0938442-9	01313974656

INTERMEDIARIO	CÓDIGO	OFICINA	DOCUMENTO NÚMERO
ASESORES DE SEGUROS FANNY MEDINA LT	80512	2529	13974656

TOMADOR	NIT
GRUPO ABACO CONSULTORES S.A.S.	9007954166

ASEGURADO	NIT
GRUPO ABACO CONSULTORES S.A.S.	9007954166

BENEFICIARIO	
TERCEROS AFECTADOS	

DIRECCIÓN DE COBRO	CIUDAD	TELÉFONO
CRA 4 11 82 CEL 3144483506	MANI	4483506

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO
012003785325. NO. DE CONTRATO 251 DE 2023.
LA PRESENTE POLIZA CUENTA CON UNA COBERTURA DE 17,068,432.39 PARA CUBRIR LOS PERJUICIOS QUE CAUSE EL ASEGURADO TANTO EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE, COMO EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE; AL IGUAL QUE LA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE CONSULTORIA NO. 251 DE 2023 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DE MANI Y AMPLIACION DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
ASEGURADO Y BENEFICIARIO ADICIONAL EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SA ESP, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE ESTE SE VEA OBLIGADO APAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR PARTE DEL ASEGURADO PRINCIPAL INGFOX SAS, Y POR LOS CUALES SEAN SOLIDARIAMENTE RESPONSABLES. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACUAL PROPIA E INDEPENDIENTE DEL EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SAESP.
LA PRESENTE POLIZA SE RIGE POR EL CLAUSULADO SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVILPOR DAÑOS A TERCEROS, PROFORMA F 01 13 040
**
MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE CORRIGEN COBERTURAS, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES
ESTA POLIZA CUBRE EL AMPARO BASICO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (PLO) PREDIOS LABORES Y OPERACIONES
****
MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON EL ACTA DE INICIO DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LA POLIZA
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES
**
MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON LA PRORROGA AL PLAZO NO. 1 DEL18 DE MARZO
DEL 2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONTRATO EN 15 DIAS
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN
LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
0
TUNJA

SEGURO DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS

suramericana

Ciudad y Fecha de Expedición	Póliza		Documento
TUNJA, 02 DE ABRIL DE 2024	3785325-8		15649266
Intermediario	**Código**	**Oficina**	**Referencia de Pago**
ASESORES DE SEGUROS FANNY MEDINA LT	80512	2529	01215649266

TOMADOR

NIT	Razón Social y/o Nombres y Apellidos		
9007954166	GRUPO ABACO CONSULTORES S.A.S.		
Dirección		**Ciudad**	**Teléfono**
CRA 4 11 82 CEL 3144483506		MANI	4483506

GARANTIZADO

NIT	Nombres y Apellidos
9007954166	GRUPO ABACO CONSULTORES S.A.S.

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

NIT	Nombres y Apellidos
8440045760	EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A ESP

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
CALIDAD DEL SERVICIO	14-ABR-2024	14-ABR-2029	34.136.865,00	0,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30-NOV-2023	14-AGO-2024	17.068.432,00	0,00
PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	30-NOV-2023	14-ABR-2027	17.068.432,00	0,00

VIGENCIA DEL SEGURO		VIGENCIA DEL MOVIMIENTO			VLR. PRIMA SIN IVA	VLR. IMPUESTOS IVA	TOTAL A PAGAR
Desde	Hasta	Días	Desde	Hasta			
30-NOV-2023	14-ABR-2029	1838	02-ABR-2024	14-ABR-2029	$0	$0	$0

VALOR A PAGAR EN LETRAS
CERO PESOS M/L

Documento de:	Valor Asegurado Movimiento	Prima Anual	Total Valor Asegurado
MODIFICACION VALORABLE CON COBRO DE PRIMA	$68.273.729	$179.218	$68.273.729,00

103 - NEGOCIOS MEDIANA Y PEQUEÑA EMP

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA	COASEGURO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
012	NDX	2529	984266	07	PESO COLOMBIANO	DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
80512	ASESORES DE SEGUROS FANNY MEDINA LT	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	AGENCIAS	100,00	0

DESCRIPCIÓN	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación interna de la proforma
CÓDIGO CLAUSULADO	01/08/2016	13 - 18	P	5	F-01-12-083
CÓDIGO NOTA TÉCNICA	25/06/2017	13 - 18	NT-P	5	N-01-012-010

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

Proceso de selección: Prestacion de servicios Interventoria
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE CONSULTORIA NO. 251 DE 2023 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DE MANI Y AMPLIACION DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
** EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA INICIA VIGENCIA DE CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA CONSULTORIA.
LA PRESENTE POLIZA SE RIGE POR EL CLAUSULADO A FAVOR DE EMPRESAS DE SERVICIOS

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGURO DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS

suramericana

Ciudad y Fecha de Expedición	Póliza		Documento
TUNJA, 02 DE ABRIL DE 2024	3785325-8		15649266
Intermediario	**Código**	**Oficina**	**Referencia de Pago**
ASESORES DE SEGUROS FANNY MEDINA LT	80512	2529	01215649266

TOMADOR

NIT	Razón Social y/o Nombres y Apellidos		
9007954166	GRUPO ABACO CONSULTORES S.A.S.		
Dirección		**Ciudad**	**Teléfono**
CRA 4 11 82 CEL 3144483506		MANI	4483506

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

PUBLICOS F 01 12 083 N 01 012 010

**

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE CORRIGEN VALOES DE CADA AMPARO, LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES

****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON EL ACTA DE INICIO DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LA POLIZA
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES

**

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON LA PRORROGA AL PLAZO NO. 1 DEL18 DE MARZO
DEL 2024 SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONTRATO EN 15 DIAS
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

- **ANEXO 4**. NOMINA

ABACO S.A.S

GRUPO ABACO CONSULTORES S.A.S

Nomina del dia 01 al 30 de Marzo del 2024

		DEVENGADO									DEDUCCIONES					
Nombre del Empleado	Cargo	Sueldo basico	Dias trabajados	Total basico	Incapacidad	Aux de transporte	Horas Extras	Rodamiento	Bono No salarial del 40%	Total Devengado	Salud	Pensión	Retención/ otras deducciones	Prestamos	Total Deducciones	Neto Pagado
ETMAN GABRIEL NIÑO	DIRECTOR INTERVENTORIA	2,610,000.00 $	30	2,610,000 $		- $			- $	2,610,000.00 $	104,400.00 $	104,400.00 $	- $		208,800.00 $	2,401,200.00 $
CARLOS ARTURO CHAPARRO SANCHEZ	HSE - AMBIENTAL	5,800,000.00 $	8	1,546,667 $		- $			- $	1,546,666.67 $	61,866.67 $	61,866.67 $	- $		123,733.33 $	1,422,933.33 $
CAMILO ANDRES QUIÑONEZ SALAS	RESIDENTE INTERVENTORIA	4,350,000.00 $	30	4,350,000 $		- $			- $	4,350,000.00 $	174,000.00 $	174,000.00 $	- $		348,000.00 $	4,002,000.00 $
JOSE AUDUL SUAREZ AVILA	ABOGADO - ADMINISTRADOR	4,640,002.00 $	8	1,237,334 $		- $			- $	1,237,333.87 $	49,493.35 $	49,493.35 $	- $		98,986.71 $	1,138,347.16 $
JONATHAN PEREZ NIÑO	INGENIERO ESPECIALISTA	7,540,005.00 $	4	1,005,334 $		- $			- $	1,005,334.00 $	40,213.36 $	40,213.36 $	- $		80,426.72 $	924,907.28 $
				0 $		- $				- $	- $	- $	- $		- $	- $
TOTALES				$ 10,749,336	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10,749,336	$ 429,973	$ 429,973	$ 0	$ 0	$ 858,947	$ 9,889,388

A cargo del empleador					
Seguridad Social	%	Valor	Provisiones Prest. Soc y Vac.	%	Valor
Salud	8.5%	$ 913,603	Cesantías	8.330%	$ 895,420
Fondo de Pensiones	12%	$ 1,289,920	Intereses sobre cesantías	1%	$ 107,493
ARL (riesgos laborales) Selecciona la tarifa:	6.960%	$ 748,154	Prima	8.330%	$ 895,420
Total Seguridad Social		$ 2,951,787	Vacaciones	4.170%	$ 448,247
Parafiscales	%	Valor	Total prestaciones sociales		$ 2,346,580
Caja Compensación Familiar	4%	$ 429,973			
ICBF	3%	$ 322,480			
SENA	2%	$ 214,987			
Total Parafiscales		$ 967,440			

Total a cargo del empleador	$ 6,263,787

Salario mínimo	$ 1,300,000
Auxilio de transporte	$ 162,000

Tipo	Tarifa	Actividades
I	0.52%	Financieras, Trabajos de Oficina, Administrativos; centros Educativos, Restaurantes
II	1.04%	Algunos procesos manufactureros como la fabricación de tapetes, bijidos, confecciones y fibras artificiales Almacenes por Departamentos, Algunas labores Agricolas
III	2.44%	Algunos procesos manufactureros como la elaboración de agujas, economia Articulos de cuero
IV	4.35%	Procesos manufactureros como fabricación de aceites, cervezas, vidrios, procesos de galvanización; transporte, servicios de vigilancia privada
V	6.96%	Aserrios, manejo de asbesto, Bomberos, manejo de explosivos, construccion, explotacion petrolera

IMPORTANTE!
Se encuentra exonerado de pago de aporte de Parafiscales y Salud Ley 1607 de 2012?
marque con una "x" si es asi.
SI

Dias de la nomina	30
Horas trabajadas en el dia	8

NOMBRE DEL EMPLEADO	Basico	Valor Hora Ordinaria	Cant hora extra ordinaria	Valor hora extra o.	Cant hora extra nocturna	Valor hora extra nocturna	Cant hora extra dia festivo	Valor hora extra dia festivo	Cant hora extra noche festivo	Valor hora extra noche festivo	TOTAL HORAS EXTRAS
ETMAN GABRIEL NIÑO	$ 2,610,000	10,875		-		-		-		-	$ -
CARLOS ARTURO CHAPARRO SANCHEZ	$ 5,800,000	24,167		-		-		-		-	$ -
CAMILO ANDRES QUIÑONEZ SALAS	$ 4,350,000	18,125		-		-		-		-	$ -
JOSE AUDUL SUAREZ AVILA	$ 4,640,002	19,333		-		-		-		-	$ -
JONATHAN PEREZ NIÑO	$ 7,540,005	31,417		-		-		-		-	$ -

ABACO S.A.S

GRUPO ABACO CONSULTORES S.A.S
Nit.: 900.795.416 - 6
Teléfono: 3144483506
Dirección: Carrera 4 N° 11 - 82 Mani
Email: grupoabacomani@gmail.com

COMPRABANTE DE EGRESO

FECHA		
30	3	2024

Pagado a: **JOSE AUDUL SUAREZ AVILA**

La Suma de: UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/cte

Concepto: PAGO DE NÓMINA ABOGADO - ADMINISTRADOR, EN EJECUCION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 251-2023 CUYO OBJETO "INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DE MANÍ Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE", de 12/03/2024 al 19/03/2024.

$ 1.138.347	**Efectivo**	☐
Cheque No.		

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

12

ABACO S.A.S

GRUPO ABACO CONSULTORES S.A.S
Nit.: 900.795.416 - 6
Teléfono: 3144483506
Dirección: Carrera 4 N° 11 - 82 Mani
Email: grupoabacomani@gmail.com

COMPRABANTE DE EGRESO

FECHA		
30	3	2024

Pagado a: **JONATHAN PEREZ NIÑO**

La Suma de: NOVECIENTOS VEITNICUATRO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS M/cte

Concepto: PAGO DE NÓMINA INGENIERO ESPECIALISTA, EN EJECUCION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 251-2023 CUYO OBJETO "INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DE MANÍ Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE", de 12/03/2024 al 15/03/2024.

$ 924.907	**Efectivo**	**FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO**
Cheque No.		

ABACO S.A.S

GRUPO ABACO CONSULTORES S.A.S
Nit.: 900.795.416 - 6
Teléfono: 3144483506
Dirección: Carrera 4 N° 11 - 82 Mani
Email: grupoabacomani@gmail.com

COMPRABANTE DE EGRESO

FECHA		
30	3	2024

Pagado a: **CAMILO ANDRES QUIÑONEZ SALAS**

La Suma de: CUATRO MILLONES DOS MIL PESOS M/cte

Concepto: PAGO DE NÓMINA RESIDENTE INTERVENTORIA, EN EJECUCION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 251-2023 CUYO OBJETO "INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DE MANÍ Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE", de 01/03/2024 al 30/03/2024.

$ 4.002.000	**Efectivo**	☐
Cheque No.		

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ABACO S.A.S

GRUPO ABACO CONSULTORES S.A.S
Nit.: 900.795.416 - 6
Teléfono: 3144483506
Dirección: Carrera 4 N° 11 - 82 Mani
Email: grupoabacomani@gmail.com

COMPRABANTE DE EGRESO

FECHA		
30	3	2024

Pagado a: CARLOS ARTURO CHAPARRO SANCHEZ

La Suma de: UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/cte

Concepto: PAGO DE NÓMINA HSE - AMBIENTAL, EN EJECUCION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 251-2023 CUYO OBJETO "INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DE MANÍ Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE", de 12/03/2024 al 19/03/2024.

$ 1.422.933	**Efectivo**	☐
Cheque No.		

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Carlos Chaparro.

st

ABACO S.A.S

GRUPO ABACO CONSULTORES S.A.S
Nit.: 900.795.416 - 6
Teléfono: 3144483506
Dirección: Carrera 4 N° 11 - 82 Mani
Email: grupoabacomani@gmail.com

COMPRABANTE DE EGRESO

FECHA		
30	3	2024

Pagado a: **ETMAN GABRIEL NIÑO**

La Suma de: DOS MILLONES CUATROCIENTOS UNO MIL DOSCIENTOS PESOS M/cte

Concepto: PAGO DE NÓMINA DIRECTOR INTERVENTORIA, EN EJECUCION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 251-2023 CUYO OBJETO "INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DE MANÍ Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE", de 01/03/2024 al 30/03/2024.

$ 2.401.200	**Efectivo**	X	**FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO**
Cheque No.			

- **ANEXO 5**. SEGURIDAD SOCIAL

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900795416	6	GRUPOABACO CONSULTORES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GRUPO ABACO	Cll 14 No 9102	MANI-CASANARE	3507974239	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	9467380961	9467380961	E	2024/04/04	2024/05/23	BANCO DE BOGOTA	49	$3,172,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: INTERVENTORIA ARMENIA (5 Afiliados)					$10,749,335	$1,720,000			$10,749,335	$430,100			$10,749,335	$430,100			$10,749,335	$467,900		$0	$0
Centro de Trabajo: INTRVENTORIA ARMENIA (5 Afiliados)					$10,749,335	$1,720,000			$10,749,335	$430,100			$10,749,335	$430,100			$10,749,335	$467,900		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (5 Afiliados)					$10,749,335	$1,720,000			$10,749,335	$430,100			$10,749,335	$430,100			$10,749,335	$467,900		$0	$0
1	CC	13861526	CHAPARRO CARLOS	25-14	8	$1,546,667	$247,500	EPS001	8	$1,546,667	$61,900	CCF69	8	$1,546,667	$61,900	14-21	8	$1,546,667	$67,300	8	$0	$0
2	CC	74182882	NIÑO ETMAN	230301	30	$2,610,000	$417,600	EPS005	30	$2,610,000	$104,400	CCF69	30	$2,610,000	$104,400	14-23	30	$2,610,000	$113,600	30	$0	$0
3	CC	1014210470	PEREZ JONATHAN	25-14	4	$1,005,334	$160,900	EPS005	4	$1,005,334	$40,300	CCF69	4	$1,005,334	$40,300	14-23	4	$1,005,334	$43,800	4	$0	$0
4	CC	1052400216	QUIÑONEZ CAMILO	230301	30	$4,350,000	$696,000	EPS037	30	$4,350,000	$174,000	CCF69	30	$4,350,000	$174,000	14-23	30	$4,350,000	$189,300	30	$0	$0
5	CC	86043430	SUAREZ JOSE	25-14	8	$1,237,334	$198,000	EPS005	8	$1,237,334	$49,500	CCF69	8	$1,237,334	$49,500	14-23	8	$1,237,334	$53,900	8	$0	$0
Total		**Afiliados(5)**			$10,749,335	$1,720,000			$10,749,335	$430,100			$10,749,335	$430,100			$10,749,335	$467,900		$0	$0

2024/05/23 04:26 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900795416	6	GRUPOABACO CONSULTORES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GRUPO ABACO	Cll 14 No 9102	MANI-CASANARE	3507974239	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	9467380961	9467380961	E	2024/04/04	2024/05/23	BANCO DE BOGOTA	49	$3,172,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$1,720,000	$70,000	$0	$1,790,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$606,400	$24,700	$0	$631,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$1,113,600	$45,300	$0	$1,158,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$467,900	$19,100	$0	$487,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$467,900	$19,100	$0	$487,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$430,100	$17,500	$0	$447,600
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	$430,100	$17,500	$0	$447,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$430,100	$17,600	$0	$447,700
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$61,900	$2,600	$0	$64,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$174,000	$7,100	$0	$181,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$194,200	$7,900	$0	$202,100
TOTAL				5	$3,048,100	$124,200	$0	$3,172,300

- **ANEXO 6.** CONTROL DEL CLIMA

CUADRO DE CONTROL DIARIO EN OBRA DE ESTADO DEL TIEMPO

CONTRATO DE OBRA 250 DE 2023	**"CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE MANÍ Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE",**
CONTRATO INTERVENTORIA 251 DE 2023	**"INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE MANÍ Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE",**

ESTADO DEL TIEMPO DESDE EL 01 DE MARZO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

	VIERNES	SABADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	AM	AM		AM	AM	AM	AM	AM	AM		AM	AM	AM	AM	AM
	PM	PM		PM	PM	PM	PM	PM	PM		PM	PM	PM	PM	PM
	D.L	D.L	D	D.L	D.L	D.L	D.L	D.L	D.L	D	D.L	D.L	D.L	D.L	D.L


SABADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
AM		AM	AM	AM	AM	AM	AM		AM	AM	AM				
PM		PM	PM	PM	PM	PM	PM		PM	PM	PM				
D.L	D	D.L	D.L	D.L	D.L	D.L	D.L	D	D.L	D.L	D.L	D	D	D	D

CONVENCIONES

SOL	NUBLADO	LLUVIA	TORMENTA

		CANTIDAD
D.L	DIAS LABORABLES	23
D	DESCANSO O FERIADO	8
		31

porcentajes del estado de tiempo		%	subtotal %
mañanas soleadas	17	27.42%	45%
tardes soleadas	11	17.74%	
mañanas nubladas	3	4.84%	15%
tardes nubladas	6	9.68%	
mañanas lluviosas	3	4.84%	11%
tardes lluviosas	4	6.45%	
mañanas tormenta	0	0.00%	0%
tardes tormenta	0	0.00%	
	total en porcentaje	70.97%	71.0%

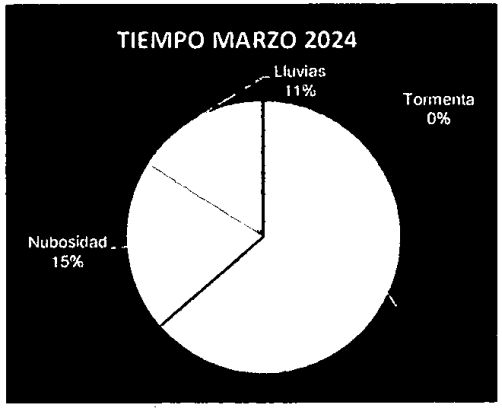

DIR. ETMAN GABRIEL NIÑO SANDOVAL
GRUPO ABACO CONSULTORES S.A.S
INTERVENTORIA

ABACO S.A.S

Se firma el dia 31 de marzo de 2024

- **ANEXO 7.** ACTAS DE COMITE TECNICO

- **ANEXO 8**. BITACORA DE OBRA

*Viernes, 01 de Marzo de 2024

Clima mañana: Soleado
Clima tarde: soleado

Personal de obra
- 2 técnicos instaladores
- 4 Auxiliares
- 1 Ingeniero residente.

Personal de interventoria
- 1 Ingeniero residente.

Maquinaria y equipos de obra.
- 1 Equipo de termofusión
- Herramienta menor
- 1 camioneta.

Actividades desarrolladas.
- Se adelanto actividad de instalación de Conexión domiciliaria residencial en la vereda Armenia y consigna.
- Se realizaron las excavaciones para la actividad de cruce aereo especial tipo marco # ϕ 2"
- Se instalan polivalvulas de 1" y 3/4"
- Se inicia instalación de mojones de señalización rural.

Residente de interventoria

Residente de obra

*Sábado, 02 de Marzo de 2024

Clima mañana: Soleado
Clima tarde: soleado.

Powered by CamScanner

Personal de obra
- 2 tecnicos instaladores
- 4 Auxiliares.
- 1 Ingeniero residente.

Personal de interventoria
- 1 Ingeniero residente

Maquinaria y equipos de obra
- 1 Equipo de termofusión
- Herramienta menor
- 1 camioneta

Actividades desarrolladas
- Se adelantó actividad de instalación de conexión domiciliaria residencial en la vereda Armenia y Consrgna
- Se realizaron excavaciones para la actividad de cruce aereo especial tipo i marco + ϕ 2"
- Se instalan polivalvulas de 1" 1 4 3/4"
- Se inicia instalación de mejores de señalización rural
- Jornada laboral hasta mediodia

Residente de interventoria

Residente de obra

* Domingo, 03 de Marzo de 2024.

Clima mañana: soleado
Clima tarde: soleado

No se realizaron actividades el dia de hoy.

Residente de interventoria

Residente de obra

Powered by CamScanner

*Lunes, 04 de Marzo de 2024

Clima mañana: soleado
Clima tarde: soleado

Personal de obra
- 2 técnicos instaladores
- 4 Auxiliares
- 1 Ingeniero residente.

Personal de interventoría
- 1 Ingeniero residente

Maquinaria y equipos de obra.
- 1 Equipo de termofusión
- Herramienta menor
- 1 camioneta

Actividades desarrolladas.
- La HSE desarrolló una charla acerca de "los hábitos de vida saludable" para los trabajadores.
- Se adelantaron actividades de conexión domiciliar residencial en la vereda Armenia y Consigno.
- Se realizaron excavaciones para la actividad de cruce aereo especial tipo marco # Φ2".
- Se instalan ventosas de 1" y 3/4"
- Se continua instalación de mojones de señalización

Residente de interventoría

Residente de obra

*Martes, 05 de Marzo de 2024

Clima mañana: soleado
Clima tarde: soleado

Powered by CamScanner

Personal de obra
- 2 técnicos instaladores
- 4 Auxiliares
- 1 Ingeniero residente

Personal de interventoria
- 1 Ingeniero residente

Maquinaria y equipos de obra:
- 1 Equipo de termofusión
- Herramienta menor
- 1 camioneta

Actividades desarrolladas:
- Se adelantaron actividades de conexión domiciliaria residencial en la vereda Armenia y consigna
- Se realizaron excavaciones para la actividad de cruce aereo especial tipo marco # ϕ2"
- Se instalan poliválvulas de 1" y 3/4"
- Se continua instalación de mojones de señalización

Residente de interventoría

Residente de obra

* Miércoles, 06 de Marzo de 2024

Clima mañana: soleado
clima tarde: soleado

Personal de obra
- 2 técnicos instaladores
- 4 Auxiliares
- 1 Ingeniero residente

Personal de interventoria
- 1 Ingeniero Residente

Maquinaria y equipos de obra:
- 1 Equipo de termofusión
- Herramienta menor

Powered by CamScanner

-1 camioneta

Actividades desarrolladas:
-Se realizaron instalaciones de conexiones domiciliarias residenciales en la vereda la consigna y Armenia.
- Se realizaron excavaciones para los cruces aereos especial tipo marco #ϕ2"
-Se continua instalación de mojones de señalizacion

Residente de interventoria | Residente de obra.

Jueves 07 de Marzo de 2024

Clima mañana: soleado.
Clima tarde: soleado.

Personal de obra
-2 técnicos instaladores
-4 Auxiliares
-1 Ingeniero Residente.

Personal de interventoria
1 Ingeniero residente.

Maquinaria y equipos de obra
- 1 Equipo de termofusión
- Herramienta menor
- 1 camioneta.

Actividades desarrolladas
- Se realizaron instalaciones de conexiones domiciliarias residenciales en la vereda la consigna y Armenia.
- Se realizaron excavaciones para los cruces aereos especial tipo marco #ϕ2"

Powered by CamScanner

-Se continua instalación de mojones de señalización.

Residente de interventoria

Residente de obra

*Viernes, 08 de Marzo de 2024

Clima mañana: lluviosa

Clima tarde: lluviosa

Personal de obra.

- 2 técnicos instaladores
- 4 Auxiliares
- 1 Ingeniero residente.

Personal de interventoria

- 1 Ingeniero residente.

Maquinaria y equipos de obra

- 1 Equipo de termofusión
- Herramienta menor
- 1 Camioneta

Actividades desarrolladas.

-Se presento lluvia durante el dia completamente lo que no permitió el desarrollo de actividades por parte del personal de obra.

Residente de interventoria

Residente de obra

*Sábado, 09 de Marzo de 2024.

Clima mañana: Soleado.

Clima tarde: lluviosa

Powered by CamScanner

Personal de obra
-2 técnicos instaladores
-4 Auxiliares
- 1 Ingeniero residente.

Personal de interventoría
- 1 Ingeniero residente.

Maquinaria y equipos de obra
- 1 Equipo de termofusión
- Herramienta menor
- 1 camioneta

Actividades desarrolladas.
- Se continua con la instalación y construcción de centros de medición.
- Se instalan tapas para polivalvulas.
- Se continua con instalación de mojones de señalización rural.
- Se realiza jornada laboral hasta mediodía.

Residente de interventoría

Residente de obra.

*Domingo, 10 de Marzo de 2024

Clima mañana: soleado
clima tarde: soleado.

No se realizaron actividades el dia de hoy.

Residente de interventoría

Residente de obra

Powered by CamScanner

*Lunes, 11 de Marzo de 2024.

Clima mañana: soleado
Clima tarde: Soleado.

Personal de obra
- 2 técnicos instaladores
- 4 Auxiliares
- 1 Ingeniero residente.

Personal de interventoria
- 1 Ingeniero residente.

- Maquinaria y equipos
- 1 Equipo de termofusión
- Herramienta menor
Camioneta

Actividades desarrolladas
- se continua con la instalación y construcción de centros de medición
- Se instalan tapas para polivalvulas.
- Se continua con instalación de mojones de señalización rural.
- El HSE realiza charla sobre: "Identificación de peligros y riesgos"

Residente de interventoria

Residente de obra.

* Martes, 12 de Marzo de 2024.

Clima mañana: soleado
Clima tarde: Soleado.

Personal de obra.
- 2 técnicos instaladores
- 4 Auxiliares
- 1 Ingeniero residente

Personal de interventoria
- 1 Ingeniero residente

Maquinaria y equipos de obra
- 1 Equipo de termofusión - Herramienta menor - Camioneta

Powered by CamScanner

Actividades desarrolladas
-Se continua con la construcción e instalación de conexión domiciliaria residencial en la vereda la Arnavia y Consigna.
- Se realizaron excavaciones para los cruces aereos especial tipo marco #Φ2".
- Se continua instalación de mojones de señalizacion

Residente de interventoria Residente de obra.

* Miercoles; 13 de Marzo de 2024.

Clima mañana: nublado
Clima tarde: nublado.

Personal de obra:
- 2 tecnicos instaladores
- 4 Auxiliares
- 1 Ingeniero residente

Personal de interventoria
- 1 Ingeniero residente

Maquinaria y equipos de obra.
- 1 Equipo de termofusión
- Herramienta menor
- 1 Camioneta.

Actividades desarrolladas
- Se continua con la construcción e instalación de centros de medición
- Se continua con instalación de mojones de señalización rural.

Residente de interventoria Residente de obra.

Powered by CamScanner

*Jueves, 14 de Marzo de 2024.

Clima mañana: soleado.
Clima tarde: soleado

Personal de obra
-2 técnicos instaladores
- 4 Auxiliares
- 1 Ingeniero residente

Personal de interventoria
- 1 Ingeniero residente.

Maquinaria y equipos de obra.
- 1 Equipo de termofusión
- Herramienta menor.
- 1 camioneta.

Actividades desarrolladas:
- Se continua con la construcción e instalación de centros de medición en Monichal.
- Se continua con instalación de mojones de señalización rural.
- Se inicia con pruebas de hermeticidad en tramos de veredas de Armenia y consigna.

Residente de interventoria

Residente de obra

*Viernes, 15 de Marzo de 2024

Clima mañana: soleado.
Clima tarde: nublado

Personal de obra
-2 técnicos instaladores
-4 Auxiliares

Personal de interventoria
- 1 Ingeniero residente

Powered by CamScanner

-1 Ingeniero residente

Maquinaria y equipos de obra.
-1 Equipo de termofusión
- Herramienta menor
- 1 camioneta.

Actividades desarrolladas.
- Se continua con la construcción e instalación de centros de medición en Morichal
- Se continua con instalación de mojones de señalización rural
- Se continua con pruebas de hermeticidad en tramos de veredas de Armenia y Consigna.

Residente de interventoria

Residente de obra.

* Sábado, 16 de Marzo de 2024

Clima mañana: soleado.
Clima tarde: Nublado.

Personal de obra
-2 técnicos instaladores
-4 Auxiliares.
-1 Ingeniero residente.

Personal de interventoria
-1 Ingeniero residente.

Maquinaria y equipos de obra.
-1 Equipo de termofusión
- Herramienta menor
- 1 camioneta

Powered by CamScanner

Actividades desarrolladas.
- Se continua con la construcción e instalación de centros de medición en Monchal.
- Se continua con instalacion de mojones de senalizacion rural.
- Se laboró hasta medio dia.

Residente de interventoria

Residente de obra.

* Domingo, 17 de Marzo de 2024.

No se realizaron actividades el día de hoy

Residente de interventoria

Residente de obra.

* Lunes, 18 de Marzo de 2024.

Clima mañana: soleado
Clima tarde: lluvioso

Personal de obra
- 2 técnicos instaladores
- 4 Auxiliares
- 1 Ingeniero residente

Personal de interentoria
- 1 Ingeniero residente.

Maquinaria y equipos de obra.
- 1 Equipo de termofusión
- Herramenta menor
- 1 camioneta.

Actividades desarrolladas.
- Se continua con la construcción e instalación de centros de medición en Monchal.
- Se continua con instalación de mojones de

Powered by CamScanner

señalización rural.
-Durante la tarde se presentaron lluvias que impidieron continuar con las actividades programadas.
-La HSE realizó charla sobre: "cuidados y conservación auditiva".

Residente de interventoría

Residente de obra.

* Martes, 19 de Marzo de 2024

Clima mañana: Soleado
Clima tarde: Soleado

Personal de obra
- 2 técnicas instaladores
- 4 Auxiliares
- 1 Ingeniero residente

Personal de interventoría
- 1 Ingeniero residente

Maquinaria y equipos de obra
- 1 Equipo de termofusión
- Herramienta menor
- 1 Camioneta

Actividades desarrolladas
- Se continua con la construcción e instalación de centros de medición en el corregimiento de Monichal.
- Se continua con la instalación de mojones de señalización rural.
- Se continua con pruebas de hermeticidad en tramos de las veredas la Armenia y Consigna.

Residente de interventoría

Residente de obra.

Powered by CamScanner

* Miercoles, 20 de Marzo de 2024.

Clima mañana: Nublado
Clima tarde: Nublado.

Personal de obra.
- 2 tecnicos instaladores
- 4 Auxiliares
- 1 Ingeniero residente

Personal de interventoria
- 1 Ingeniero residente.

Maquinaria y equipos de obra:
- 1 Equipo de termofusión.
- Herramienta menor
- 1 camioneta

Actividades desarrolladas.
- Se continua con la construcción e instalación de centros de medición en el corregimiento de Marcial.
- Se continua con la instalación de mojones de señalización rural.
- Se continua con pruebas de hermeticidad en tramos de las veredas la Armenia y Consigna.

Residente de interventoria

Residente de obra.

* Jueves, 21 de Marzo de 2024.

Clima mañana: Nublado
Clima tarde: Nublado.

Personal de obra
- 2 técnicos instaladores
- 4 Auxiliares

Personal de interventoria
- 1 Ingeniero residente

Powered by CamScanner

1 Ingeniero residente.

Maquinaria y equipos de obra.
- 1 Equipo de termofusión
- Herramienta menor
- 1 camioneta.

Actividades desarrolladas.
- Se continua con la construcción e instalación de centros de medición en el corregimiento de noriales
- Se continua con la instalación de mojones de señalización rural.
- Se continua con pruebas de hermeticidad en tramos de las veredas la Armenia y la Consigna.

Residente de interventoria

Residente de obra.

* Viernes, 22 de Marzo de 2024.

Clima mañana: lluvioso
Clima tarde: Nublado.

Personal de obra
- 2 tecnicos instaladores
- 4 Auxiliares
- 1 Ingeniero residente.

Personal de interventoria
- 1 Ingeniero residente

Maquinaria y equipos de obra.
- 1 Equipo de termofusión
- Herramienta menor
- 1 camioneta

Powered by CamScanner

Actividades desarrolladas:
- Se continua con la construcción e instalación de centros de medición en el corregimiento de Monchal.
- Se continua con la instalación de mojones de señalización rural.
- Se continua con pruebas de hermeticidad en tramos de las veredas la Armenia y la Consigna.

Residente de interventoria

Residente de obra

* Sábado, 23 de Marzo de 2024

Clima mañana: lluvioso
Clima tarde: lluvioso

Personal de obra	Personal de interventoria
-2 técnicos instaladores	- 1 Ingeniero residente
- 4 Auxiliares	
- 1 Ingeniero residente	

Maquinaria y equipos de obra
- 1 Equipo de termofusión.
- Herramienta menor
- 1 camioneta.

Actividades desarrolladas
- Se continua con la construcción e instalación de centros de medición en el corregimiento de Monchal.
- Durante la mañana se presentan lluvias intermitentes que impidieron continuar con las actividades programadas.

Powered by CamScanner

Residente de interventoria

Residente de obra

*Domingo, 24 de marzo de 2024.

Clima mañana: lluvioso
Clima tarde: lluvioso

No se realizaron actividades el día de hoy.

Residente de interventoria

Residente de obra

*Lunes, 25 de marzo de 2024.

Clima mañana: soleado
Clima tarde: soleado

No se realizaron actividades el día de hoy, por ser feriado.

Residente de interventoria

Residente de obra

*Martes, 26 de Marzo de 2024.

Clima mañana: soleado
clima tarde: soleado

Personal de obra
- 2 tecnicos instaladores
- 4 Auxiliares
- 1 Ingeniero residente

Personal de interventoria
- 1 Ingeniero residente

Powered by CamScanner

Maquinaria y equipos de obra
- 1 Equipo de termofusión
- Herramienta menor
- 1 Camioneta.

Actividades desarrolladas:
- Se continua con la construcción e instalación de centros de medición en el corregimiento de Mondial.
- Se continua con la instalación de mojones de señalización rural.
- Se continua con pruebas de hermeticidad en tramos de las veredas la Armenia y la Consigna.
- La HSE realizo charla a los trabajadores sobre "Riesgos electricos".

Residente de interventoria

Residente de obra.

* Miercoles, 27 de Marzo de 2024.

Clima mañana: Soleado
Clima tarde: lluvioso.

Personal de obra
- 2 técnicos instaladores
- 4 Auxiliares
- 1 Ingeniero residente

Personal de interventoria
- 1 Ingeniero residente.

Maquinaria y equipos de obra.
- 1 Equipo de termofusión
- Herramienta menor.
- 1 camioneta.

Powered by CamScanner

Actividades desarrolladas.
- Se continua con la construcción e instalación de centros de medición en el corregimiento de Monichal.
- Se continua con la instalación de mojones de señalización rural.
- Durante el mediodia y la tarde se presentaron lluvias que impidieron la ejecución de actividades.

Residente de interventoria — Residente de Obra

* Jueves, 28 de Marzo de 2024

Clima mañana: lluvioso
Clima tarde: Nublado

No se realizaron actividades el dia de hoy, por inicio de semana santa.

Residente de interventoria — Residente de Obra

* Viernes, 29 de Marzo de 2024.

Clima mañana: Nublado
clima tarde: lluvioso

NO se realizaron actividades el dia de hoy, por inicio de dias santos.

Residente de interventoria — Residente de Obra

Powered by CamScanner

* Sábado, 30 de Marzo de 2024

Clima mañana: Nublado
Clima tarde: lluvioso.

No se realizaron actividades el día de hoy por días santos.

Residente de interventoria | Residente de Obra.

* Domingo, 31 de Marzo de 2024

Clima mañana: Nublado
Clima tarde: Soleado

No se realizaron actividades el día de hoy.

Residente de interventoria | Residente de Obra

Powered by CamScanner

- **ANEXO 9**. INFORMES SEMANALES

ENERCA S.A E.S.P.

CONTRATO No.:	251 DE 2023				
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE MANÍ Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	FECHA	DD	MM	AA
			7	3	2024

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR — CODIGO BPIN: 2023005650041

INTERVENTORIA: X

Semana Número	14	Del	29/02/2024	Al	6/03/2024	No	14

Tiempo transcurrido desde la ejecución del contrato: 3 Meses y 7 Días (Calendario)

Nombre del Contratista: INGFOX S A S. R/L MAYRA LILIANA RODRIGUEZ CABULO
Nombre del Interventor: GRUPO ABACO CONSULTORES S A S / DIR ETMAN GABRIEL MIÑO SANCOVAL
Nombre del Supervisor: LUIS RENE GRANADOS VARGAS /ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO
Nombre Apoyo a la Supervisión: OSCAR EDUARDO ARCINIEGAS CHACON

CONTRATO DE OBRA

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE MANÍ Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE							
CONTRATO No	250 DE 2023	NOMBRE DEL CONTRATISTA		INGFOX S A S R/L MAYRA LILIANA RODRIGUEZ CABULO				
NOMBRE DEL RUBRO	00AD-2101-1900-2023-00585-0041-SSF	RUBRO	2 3 2 01 01 001 02 14 21	No. C.D.P.	93	No R.P.	103	
	00AD-2101-1900-2023-00585-0041-SSF	RUBRO	00AD-2101-1900-2023-00585-0041	No. C.D.P.	8223	No R.P.	8323	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 2.434.092.534,00	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN		TRES (3) MESES				
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	NA	PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN		CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DÍAS				
FECHA DE INICIÓ	30 de noviembre de 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	29 de febrero de 2024	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		14 de abril de 2024		

DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA FECHA

CONCEPTO DEL DESEMBOLSO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DESEMBOLSADO	% DESEMBOLSO
ANTICIPO	ANTICIPO	NA	$ 1.217.046.267,00	50,00%
TOTAL DESEMBOLSADO A LA FECHA			$ 1.217.046.267,00	50,00%

PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	45 (DIAS)	14/04/2024

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N.A	N/A	N/A

ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO
N/A	N/A	N.A

EJECUCIÓN

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
OBRA PROGRAMADA (%)	1,56%	91,16%	OBRA EJECUTADA (%)	1,70%	91,29%
VALOR DE LA OBRA PROGRAMADA	$ 38.053.659,00	$ 2.218.854.811,00	VALOR DE LA OBRA EJECUTADA	$ 41.355.944,00	$ 2.222.089.446,11

ENERCA S.A E.S.P.

CONTRATO No.:	251 DE 2023		DD	MM	AA
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE MANÍ Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	FECHA	7	3	2024

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

INTERVENTORIA [X] PROYECTO SGR CODIGO BPIN: 2023005850041

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DE MANÍ Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.						
CONTRATO No	251 de 2023	NOMBRE DEL CONTRATISTA	GRUPO ABACO CONSULTORES S.A.S.				
NOMBRE DEL RUBRO	00AD-2101-1900-2023-00585-0041-SSF	RUBRO	2 3 2 02 02 008 30	No. C D P.	94	No R P	104
	00AD-2101-1900-2023-00585-0041-SSF	RUBRO	00AD-2101-1900-2023-00585-0041	No C D P.	8323	No R P	8423
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 170.684.324,00	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	CUATRO (4) MESES				
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	N/A	PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN	N/A				
FECHA DE INICIO	30 de noviembre de 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	29 de marzo de 2024	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A		

DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA FECHA

CONCEPTO DEL DESEMBOLSO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DESEMBOLSADO	% DESEMBOLSO
N/A	NA	NA		
TOTAL DESEMBOLSADO A LA FECHA			$ -	0

PRORROGAS				SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION		
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A

ADICIONES			
CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO	
N/A	N/A	N/A	

ENERCA S.A E.S.P.

CONTRATO No.:	251 DE 2023				
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE MANÍ Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	FECHA	DD	MM	AA
			7	1	2024

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

INTERVENTORIA	X	PROYECTO SGR	CODIGO BPIN	2023000050041


RESUMEN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Esta semana se adelantaron las siguentes actividades Conexión domiciliaria residencial (acometida + medidor) en las veredas Armenia y La consigna instalacion de Polivalvula 1" PE-80 RDE11 y polivalvula de 3/4" RDE11, se adelanto ademas la excavacion de huecos para la actividad de Cruce aereo especial tipo marco H D 2", por ultimo se comenzan con la instalación de Mojon de señalizacion rural


REGISTRO FOTOGRAFICO



Excavación para cimentos del paso elevado

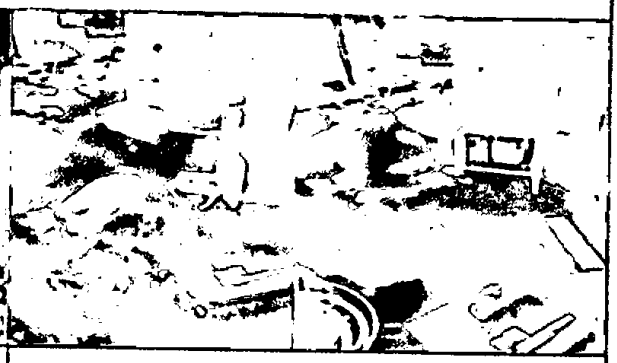

Construccion de centro de medición

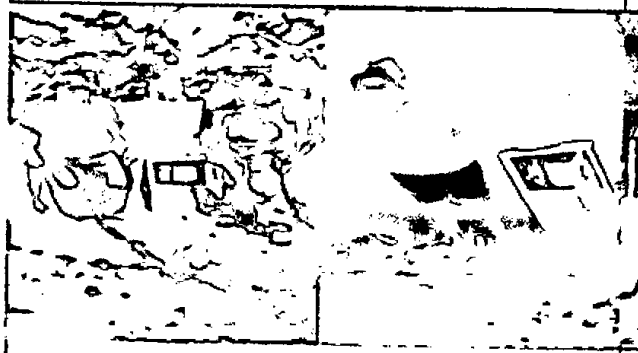

Construccion de centros de medicion y entrega de medidores



Construccion de centros de medicion y entrega de medidores

ENERCA S.A E.S.P.

CONTRATO No :	251 DE 2023				
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE MANÍ Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	FECHA	DD	MM	AA
			7	3	2024

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

INTERVENTORIA [X] PROYECTO SGR CODIGO BPIN 2023000050041



Construccion de centros de medicion y entrega de medidores



Construccion de centros de medicion y entrega de medidores




Tapas para Polivictuta 3/4" PE-80 RDE11 Suministro e instal



Construccion de centros de medicion y entrega de medidores



Suministro e Instalación de Mojon de señalizacion rural



Construccion de centros de medicion y entrega de medidores

ENERCA S.A E.S.P.

CONTRATO No.:	251 DE 2023		DD	MM	AA
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE MANÍ Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	FECHA	7	3	2024

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

INTERVENTORIA [X] PROYECTO SGR CODIGO BPIN: 2023005850041

ACTIVIDADES PROYECTADAS PARA LA SIGUIENTE SEMANA/QUINCENA

Se espera continuar con las actividades de: Conexión domiciliaria residencial (acometida + medidor) en las veredas Armania y La consigna, instalacion de Polivalvula 1" PE-80 RDE11 y polivalvula de 3/4" RDE11, excavación de huecos para la actividad de Cruce aereo especial tipo marco H Ø 2", por ultimo se continuara con la instalación de Mojon de señalizacion rural

OBSERVACIONES

Para esta semana queda en firme la prorroga de 45 dias para el contrato de obra y se esta adelantando lo pertinente con el contrato de interventoria. Por ultimo de acuerdo al avance de obra, el porcentaje de ejecucion acumulado es de 91,2% vs el programado que es de 91,16% con una diferencia positiva de 0,13%, lo que significa que se estan realizando las actividades programadas.

En constancia se firma.

Elaboró
GRUPO ABACO CONSULTORES S.A.S.
DIR. ETMAN GABRIEL NIÑO SANDOVAL
INTERVENTOR

Recibe
OSCAR EDUARDO ARCINIEGAS CHACON
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Revisó:
ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO
GERENTE GAS

Revisó:
LUIS RENE GRANADOS VARGAS
LIDER DE SUPERVISION E INTERVENTORIA

ENERCA S.A E.S.P.

CONTRATO No.:	251 DE 2023		DD	MM	AA
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE MANÍ Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL. DEPARTAMENTO DE CASANARE.	FECHA	14	3	2024

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR — CODIGO BPIN: 2023005850041

INTERVENTORIA: X

Semana Número:	15	Del	7/03/2024	Al	13/03/2024	No	15

Tiempo transcurrido desde la instalación del contrato: 3 Meses y 14 Días (Calendario)

Nombre del Contratista: INGFOX S.A.S. R/L. MAYRA LILIANA RODRIGUEZ CABULO
Nombre del Interventor: GRUPO ABACO CONSULTORES S.A.S / DIR. ETMAN GABRIEL NIÑO SANDOVAL
Nombre del Supervisor: LUIS RENE GRANADOS VARGAS /ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO
Nombre Apoyo a la Supervisión: OSCAR EDUARDO ARCINIEGAS CHACON

CONTRATO DE OBRA

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE MANÍ Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL. DEPARTAMENTO DE CASANARE.						
CONTRATO No	250 DE 2023	NOMBRE DEL CONTRATISTA		INGFOX S.A.S. R/L. MAYRA LILIANA RODRIGUEZ CABULO			
NOMBRE DEL RUBRO	00AD-2101-1900-2023-00585-0041-SSF	RUBRO	2.3.2.01.01.001.02.14.21	No. C.D.P.	93	No R.P.	103
	00AD-2101-1900-2023-00585-0041-SSF	RUBRO	00AD-2101-1900-2023-00585-0041	No. C.D.P.	8223	No R.P.	8323
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 2.434.092.534,00	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN		TRES (3) MESES			
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	NA	PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN		CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DÍAS			
FECHA DE INCIO	30 de noviembre de 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	29 de febrero de 2024	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		14 de abril de 2024	

DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA FECHA

CONCEPTO DEL DESEMBOLSO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DESEMBOLSADO	% DESEMBOLSO
ANTICIPO	ANTICIPO	NA	$ 1.217.046.267,00	50,00%
TOTAL DESEMBOLSADO A LA FECHA			$ 1.217.046.267,00	50,00%

PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	45 (DIAS)	14/04/2024

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N.A	N.A	N/A

ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO
N/A	N/A	N.A

EJECUCIÓN

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
OBRA PROGRAMADA (%)	1,69%	93,09%	OBRA EJECUTADA (%)	2,30%	93,59%
VALOR DE LA OBRA PROGRAMADA	$ 46.080.038,00	$ 2.264.934.849,00	VALOR DE LA OBRA EJECUTADA	$ 55.991.238,00	$ 2.278.060.684,11

ENERCA S.A E.S.P.

CONTRATO No.:	251 DE 2023		DD	MM	AA
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE MANÍ Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	FECHA	14	3	2024

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

INTERVENTORIA [X] PROYECTO SGR CODIGO BPIN: 2023005850041

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DE MANÍ Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.						
CONTRATO No	251 de 2023	NOMBRE DEL CONTRATISTA		GRUPO ABACO CONSULTORES S.A S.			
NOMBRE DEL RUBRO	00AD-2101-1900-2023-00585-0041-SSF	RUBRO	2 3 2 02 02 008 30	No. C.D.P.	94	No R.P	104
	00AD-2101-1900-2023-00585-0041-SSF	RUBRO	00AD-2101-1900-2023-00585-0041	No. C.D.P.	8323	No R.P.	8423
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 170.584.324,00	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN		CUATRO (4) MESES			
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	N/A	PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN		N/A			
FECHA DE INCIO	30 de noviembre de 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	29 de marzo de 2024	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		N/A	

DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA FECHA

CONCEPTO DEL DESEMBOLSO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DESEMBOLSADO	% DESEMBOLSO
N/A	N/A	NA		
TOTAL DESEMBOLSADO A LA FECHA			$ -	0

PRORROGAS				SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION		
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A

ADICIONES			
CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO	
N/A	N/A	N/A	

ENERCA S.A E.S.P.

CONTRATO No.:	251 DE 2023				
OBJETO	INTERVENTORIA TÉCNICA AMBIENTAL ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE MANÍ Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	FECHA	DD	MM	AA
			14	3	2024

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

INTERVENTORIA [X] PROYECTO SGR CODIGO BPIN: [redacted]

RESUMEN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Esta semana se adelantaron las siguientes actividades Conexion domiciliaria residencial (acometida + medidor) en las veredas Armenia y La consigna, instalacion de Polivalvula 1" PE-80 RDE11 y polivalvula de 3/4" RDE11, se adelanto ademas la excavación de huecos para la actividad de Cruce aereo especial tipo marco H Ø 2", por ultimo se comienzan con la instalación de Mojon de señalizacion rural

REGISTRO FOTOGRAFICO



Excavación para elementos del paso elevado



Construccion de centros de medicion



Construccion de centros de medicion y entrega de medidores



Construccion de centros de medicion y entrega de medidores


IQNET

Vigilado Superservicios

CONTRATO No.:	251 DE 2023				
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE MANÍ Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	FECHA	DD	MM	AA
			14	3	2024

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

INTERVENTORIA [X] PROYECTO SGR CODIGO BPIN: [illegible]

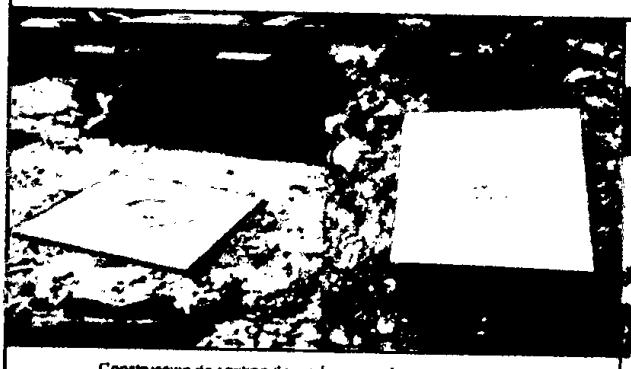

Construccion de centros de medicion y entrega de medidores



Suministro e Instalacion de Mojon de señalizacion rural



Construccion de centros de medicion y entrega de medidores



Construccion de centros de medicion y entrega de medidores



Construccion de centros de medicion y entrega de medidores



Construccion de centros de medicion y entrega de medidores

ENERCA S.A E.S.P.

CONTRATO No.:	251 DE 2023				
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE MANÍ Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	FECHA	DD	MM	AA
			14	3	2024

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

INTERVENTORIA [X] PROYECTO SGR CODIGO BPIN: 2023005850041

ACTIVIDADES PROYECTADAS PARA LA SIGUIENTE SEMANA/QUINCENA

Se espera continuar con las actividades de Conexión domiciliaria residencial (acometida + medidor) en las veredas Armania y La consigna, instalacion de Polivalvula 1" PE-80 RDE11 y polivalvula de 3/4" RDE11, excavación de huecos para la actividad de Cruce aereo especial tipo marco H Ø 2", por ultimo se continuara con la instalación de Mojon de señalizacion rural.

OBSERVACIONES

De acuerdo al avance de obra, el porcentaje de ejecucion acumulado es de 93,59% vs el programado que es de 93,05% con una diferencia positiva de 0,54%, lo que se aprecia es que se estan cumpliendo con las actividades proyectadas dando cumplimiento a la reprogramación entregada por el contratista de obra

En constancia se firma.

Elaboro
GRUPO ABACO CONSULTORES S.A.S.
DIR. ETMAN GABRIEL IIIÑO SANDOVAL
INTERVENTOR

Recibo
OSCAR EDUARDO ARCINIEGAS CHACON
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Revisó
ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO
GERENTE GAS

Revisó
LUIS RENE GRANADOS VARGAS
LIDER DE SUPERVISION E INTERVENTORIA

ENERCA S.A E.S.P.

CONTRATO No.:	251 DE 2023		DD	MM	AA
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE MANÍ Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	FECHA	21	3	2024

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR CODIGO BPIN: 2023005850041

INTERVENTORIA X

Semana Número	16	Del:	14/03/2024	Al:	20/03/2024	No	16

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato, 3 Meses y 21 Días (Calendario)

Nombre del Contratista: INGFOX S.A.S R/L MAYRA LILIANA RODRIGUEZ CABULO

Nombre del Interventor: GRUPO ABACO CONSULTORES S.A.S./ DIR. ETMAN GABRIEL NIÑO SANDOVAL

Nombre del Supervisor: LUIS RENE GRANADOS VARGAS /ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO

Nombre Apoyo a la Supervisión: OSCAR EDUARDO ARCINIEGAS CHACON

CONTRATO DE OBRA

OBJETO:	CONSTRUCCION DE LAS REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE MANÍ Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.						
CONTRATO No	250 DE 2023	NOMBRE DEL CONTRATISTA		INGFOX S.A.S R/L MAYRA LILIANA RODRIGUEZ CABULO			
NOMBRE DEL RUBRO	00AD-2101-1900-2023-00585-0041-SSF	RUBRO	2 3 2 01 01 001 02 14 21	No. C.D.P.	93	No R.P.	103
	00AD-2101-1900-2023-00585-0041-SSF	RUBRO	00AD-2101-1900-2023-00585-0041	No. C.D.P.	8223	No R.P.	8323
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 2.434.092.534,00	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	TRES (3) MESES				
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	NA	PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN	CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DÍAS				
FECHA DE INCIO	30 de noviembre de 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	29 de febrero de 2024	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	14 de abril de 2024		

DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA FECHA

CONCEPTO DEL DESEMBOLSO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DESEMBOLSADO	% DESEMBOLSO
ANTICIPO	ANTICIPO	NA	$ 1.217.046.267,00	50,00%
TOTAL DESEMBOLSADO A LA FECHA			$ 1.217.046.267,00	50,00%

PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	45 (DIAS)	14/04/2024

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A

ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO
N/A	N/A	N/A

EJECUCIÓN

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
OBRA PROGRAMADA (%)	2,72%	95,77%	OBRA EJECUTADA (%)	2,30%	93,59%
VALOR DE LA OBRA PROGRAMADA	$ 66.170.152,00	$ 2.331.105.001,00	VALOR DE LA OBRA EJECUTADA	$ 55.991.238,00	$ 2.278.060.684,11

icontec ISO 9001 icontec ISO 14001 IQNET

Vigilado Superservicios

ENERCA S.A E.S.P.

CONTRATO No.:	251 DE 2023		DD	MM	AA
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE MANÍ Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	FECHA	21	3	2024

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR — CODIGO BPIN: 2023005850041

INTERVENTORIA [X]

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DE MANÍ Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.						
CONTRATO No	251 de 2023	NOMBRE DEL CONTRATISTA	GRUPO ABACO CONSULTORES S.A.S.				
NOMBRE DEL RUBRO	00AD-2101-1900-2023-00585-0041-SSF	RUBRO	2.3.2 02 02 008 30	No. C.D.P.	84	No R.P.	104
	00AD-2101-1900-2023-00585-0041-SSF	RUBRO	00AD-2101-1900-2023-00585-0041	No. C.D.P.	8323	No R.P.	8423
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 170.684.324,00	PLAZO INICIAL DE EJECUCION	CUATRO (4) MESES				
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	N/A	PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN	CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DÍAS				
FECHA DE INICIO	30 de noviembre de 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	29 de marzo de 2024	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	14 de abril de 2024		

DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA FECHA

CONCEPTO DEL DESEMBOLSO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	VALOR DESEMBOLSADO	% DESEMBOLSO
N/A	NA	NA		
TOTAL DESEMBOLSADO A LA FECHA			$ -	0

PRORROGAS				SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION		
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A

ADICIONES			
CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO	
N/A	N/A	N/A	

IQNET

Vigilado Superservicios

CONTRATO No.:	251 DE 2023		DD	MM	AA
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE MANI Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	FECHA	21	1	2024

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

INTERVENTORIA [X] PROYECTO SGR CODIGO BPIN: 2023000[illegible]


RESUMEN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Esta semana se adelantaron las siguientes actividades Conexón domiciliana residencial (acometida + medidor) en el corregimiento de Morichal,se comienzan con las pre pruebas de ermeticidad por tramos en las veredas Armenia y La Consigna por ultimo se continuan con la instalación de Mojon de señalizacion rural en las veredas Armenia y La Consigna

REGISTRO FOTOGRAFICO



[illegible]



[illegible]

ENERCA S.A E.S.P.

CONTRATO No.:	251 DE 2023		DD	MM	AA
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE MANÍ Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	FECHA	21	3	2024

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

INTERVENTORIA [X] PROYECTO SGR CODIGO BPIN: 7023005450041




Construccion de centros de medicion y entrega de medidores

Construccion de centros de medicion y entrega de medidores



Construccion de Mojon de señalizacion rural

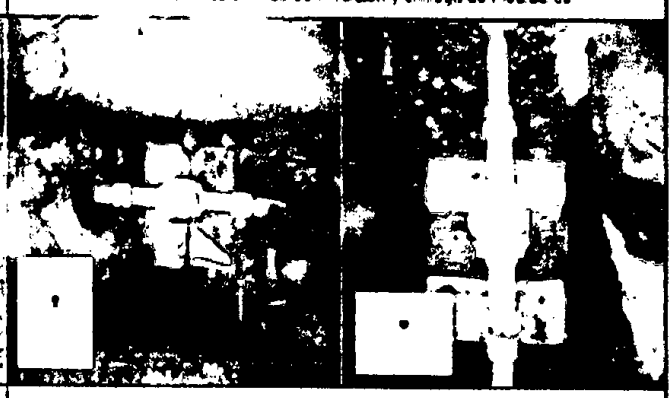

Suministro e instal. Polietileno 3 4" PE-80 RDE 11



Construccion de Mojon de señalizacion rural



Construccion de centros de medicion y entrega de medidores

IQNET

Vigilado Superservicios

ENERCA S.A E.S.P.

CONTRATO No.:	251 DE 2023		DD	MM	AA
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE MANÍ Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	FECHA	21	3	2024

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR — CODIGO BPIN: 2023005850041

INTERVENTORIA [X]

ACTIVIDADES PROYECTADAS PARA LA SIGUIENTE SEMANA/QUINCENA

Se espera continuar con las actividades de, Conexión domiciliaria residencial (acometida + medidor) en el corregimiento de Morichal,se comienzan con las pre pruebas de hermeticidad por tramos en las veredas Armenia y La Consigna, por ultimo se continuan con la instalación de Mojon de señalizacion rural en las veredas Armenia y La Consigna.

OBSERVACIONES

De acuerdo al avance de obra, el porcentaje de ejecucion acumulado es de 95,77% vs el programado que es de 94,80% con una diferencia negativa de 0,97%, lo que se aprecia es que se evidencio un atraso debido a actividades que no se desarrollaron.

En constancia se firma.

Elaboró
GRUPO ABACO CONSULTORES S.A.S.
DIR. ETMAN GABRIEL NIÑO SANDOVAL
INTERVENTOR

Recibió
OSCAR EDUARDO ARCINIEGAS CHACON
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Revisó:
ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO
GERENTE GAS

Revisó:
LUIS RENE GRANADOS VARGAS
LIDER DE SUPERVISION E INTERVENTORIA

ENERCA S.A E.S.P.

CONTRATO No.:	251 DE 2023		DD	MM	AA
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE MANÍ Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	FECHA	28	3	2024

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR — CODIGO BPIN: 2023005850041

INTERVENTORIA: X

Semana Numero:	17	Del:	21/03/2024	Al:	27/03/2024	No	17

Tiempo transcurrido desde la iniciacion del contrato: 3 Meses y 28 Dias (Calendario)

Nombre del Contratista: INGFOX S.A.S. R/L. MAYRA LILIANA RODRIGUEZ CABULO
Nombre del Interventor: GRUPO ABACO CONSULTORES S.A.S./ DIR. ETMAN GABRIEL NIÑO SANDOVAL
Nombre del Supervisor: LUIS RENE GRANADOS VARGAS /ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO
Nombre Apoyo a la Supervisión: OSCAR EDUARDO ARCINIEGAS CHACON

CONTRATO DE OBRA

OBJETO:	CONSTRUCCION DE LAS REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE MANÍ Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.						
CONTRATO No	250 DE 2023	NOMBRE DEL CONTRATISTA		INGFOX S.A.S. R/L. MAYRA LILIANA RODRIGUEZ CABULO			
NOMBRE DEL RUBRO	00AD-2101-1900-2023-00585-0041-SSF	RUBRO	2.3.2.01.01.001.02.14.21	No. C.D.P.	93	No R.P.	103
	00AD-2101-1900-2023-00585-0041-SSF	RUBRO	00AD-2101-1900-2023-00585-0041	No. C.D.P.	8223	No R.P.	8323
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 2.434.092.534,00	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN		TRES (3) MESES			
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	NA	PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN		CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DÍAS			
FECHA DE INICIO	30 de noviembre de 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	29 de febrero de 2024	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	14 de abril de 2024		

DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA FECHA

CONCEPTO DEL DESEMBOLSO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	VALOR DESEMBOLSADO	% DESEMBOLSO
ANTICIPO	ANTICIPO	NA	$ 1.217.046.267,00	50,00%
TOTAL DESEMBOLSADO A LA FECHA			$ 1.217.046.267,00	50,00%

PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	45 (DÍAS)	14/04/2024

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A

ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO
N/A	N/A	N/A

EJECUCIÓN

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
OBRA PROGRAMADA (%)	2,64%	98,40%	OBRA EJECUTADA (%)	2,14%	98,94%
VALOR DE LA OBRA PROGRAMADA	$ 64.146.387,00	$ 2.395.251.388,00	VALOR DE LA OBRA EJECUTADA	$ 29.474.990,00	$ 2.359.655.410,11

IQNET

Vigilado Superservicios

ENERCA S.A E.S.P.

CONTRATO No.:	251 DE 2023		DD	MM	AA
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE MANÍ Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	FECHA	28	3	2024

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR — CODIGO BPIN: 2023005850041

INTERVENTORIA [X]

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DE MANÍ Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.						
CONTRATO No	251 de 2023	NOMBRE DEL CONTRATISTA	GRUPO ABACO CONSULTORES S.A.S.				
NOMBRE DEL RUBRO	00AD-2101-1900-2023-00585-0041-SSF	RUBRO	2 3 2 02 02 008 30	No. C.D.P.	84	No R.P.	104
	00AD-2101-1900-2023-00585-0041-SSF	RUBRO	00AD-2101-1900-2023-00585-0041	No. C.D.P.	8323	No R.P.	8423
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 170.684.324,00	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	CUATRO (4) MESES				
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	N/A	PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN	CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DÍAS				
FECHA DE INCIO	30 de noviembre de 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	29 de marzo de 2024	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	14 de abril de 2024		

DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA FECHA

CONCEPTO DEL DESEMBOLSO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	VALOR DESEMBOLSADO	% DESEMBOLSO
N'A	NA	NA		
TOTAL DESEMBOLSADO A LA FECHA			$ -	0

PRORROGAS				SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION		
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A

ADICIONES		
CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO
N/A	N/A	N/A

Vigilado Superservicios

CONTRATO No.	251 DE 2023		DD	MM	AA
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE MANÍ Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	FECHA	25	1	2024

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

INTERVENTORIA [X] PROYECTO SGR CODIGO BPIN: 2022000680041

RESUMEN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Esta semana se adelantaron las siguientes actividades Conexión domiciliaria residencial (acometida + medidor) en el corregimiento de Morichal se comienzan con las pre pruebas de ermeticidad por tramos en las veredas Armenia y La Consigna por ultimo se continuan con la instalación de Mojon de señalizacion rural en las veredas Armenia y La Consigna


REGISTRO FOTOGRAFICO





CONTRATO No.	251 DE 2023		DD	MM	AA
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE MANÍ Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	FECHA	22	3	2024

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

INTERVENTORIA [X] PROYECTO SGR CODIGO BPIN: [redacted]

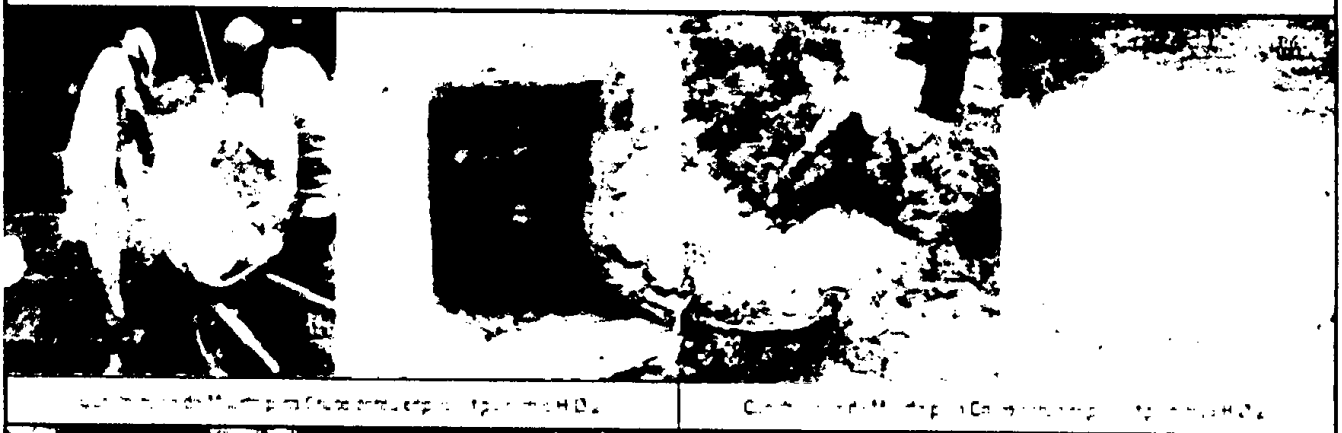

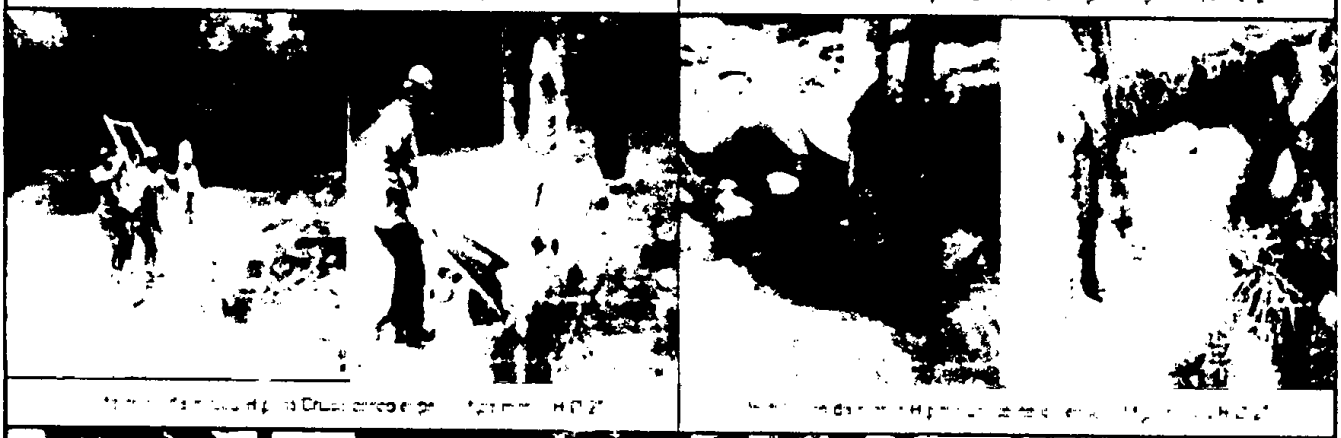

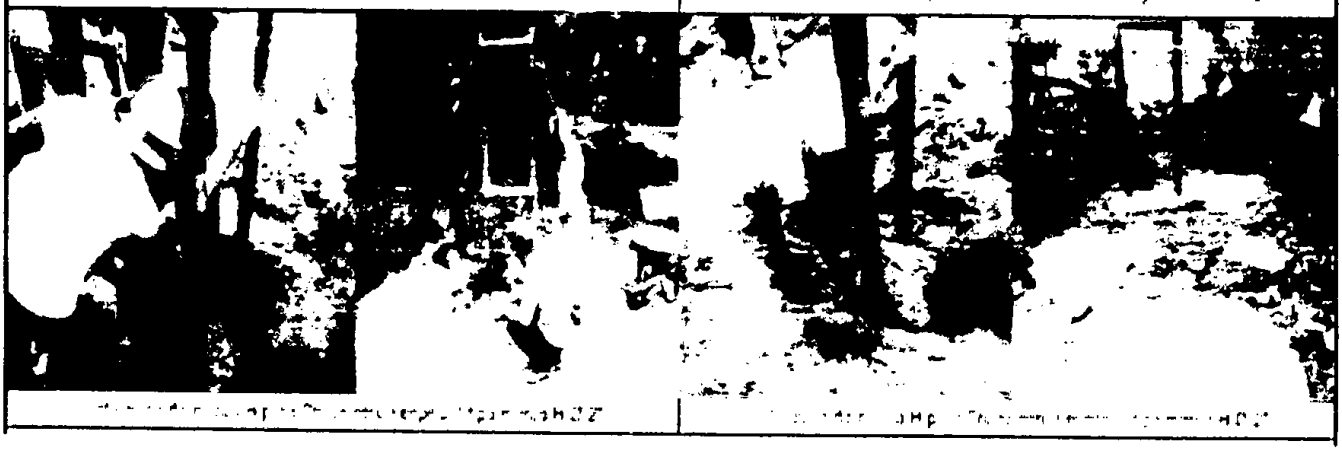

ENERCA S.A.E.S.P.

CONTRATO No.:	251 DE 2023		DD	MM	AA
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE MANÌ Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	FECHA	28	3	2024

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

INTERVENTORIA [X] PROYECTO SGR CODIGO BPIN: 2023005850041

ACTIVIDADES PROYECTADAS PARA LA SIGUIENTE SEMANA/QUINCENA

Se espera continuar con las actividades de; Conexión domiciliaria residencial (acometida + medidor) en el corregimiento de Morichal,se comienzan con las pre pruebas de ermeticidad por tramos en las veredas Armenia y La Consigna. por ultimo se continuan con la instalación de Mojon de señalizacion rural en las veredas Armenia y La Consigna.

OBSERVACIONES

De acuerdo al avance de obra, el porcentaje de ejecucion acumulado es de 98,94% vs el programado que es de 98,40% con una diferencia negativa de 1.46%, teniendo en cuenta el receso por semana santa que se presento durante esta semana por lo que se evidencio un atraso en las actividades.

En constancia se firma.

Elaboro
GRUPO ABACO CONSULTORES S.A.S.
DIR. ETMAN GABRIEL NIÑO SANDOVAL
INTERVENTOR

Recibió
OSCAR EDUARDO ARCINIEGAS CHACON
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Revisó:
ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO
GERENTE GAS

Revisó:
LUIS RENE GRANADOS VARGAS
LIDER DE SUPERVISION E INTERVENTORIA

Vigilado Superservicios

ENERCA S.A E.S.P.

CONTRATO No.:	251 DE 2023		DD	MM	AA
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE MANÍ Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	FECHA	4	4	2024

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR — CODIGO BPIN: 2023005850041

INTERVENTORIA: X

Semana Número	18	Del:	28/03/2024	Al:	3/04/2024	No:	18

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 4 Meses y 5 Días (Calendario)

Nombre del Contratista: INGFOX S.A.S R/L. MAYRA LILIANA RODRIGUEZ CABULO
Nombre del Interventor: GRUPO ABACO CONSULTORES S.A.S / DIR. ETMAN GABRIEL NIÑO SANDOVAL
Nombre del Supervisor: LUIS RENE GRANADOS VARGAS /ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO
Nombre Apoyo a la Supervisión: OSCAR EDUARDO ARCINIEGAS CHACON

CONTRATO DE OBRA

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE MANÍ Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.						
CONTRATO No	250 DE 2023	NOMBRE DEL CONTRATISTA		INGFOX S.A.S R/L. MAYRA LILIANA RODRIGUEZ CABULO			
NOMBRE DEL RUBRO	00AD-2101-1900-2023-00585-0041-SSF	RUBRO	2 3 2 01 01 001 02 14 21	No. C.D.P.	93	No R.P.	103
	00AD-2101-1900-2023-00585-0041-SSF	RUBRO	00AD-2101-1900-2023-00585 0041	No. C.D.P.	8223	No R.P.	8323
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 2,434,092,534,00	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN		TRES (3) MESES			
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	NA	PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN		CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DÍAS			
FECHA DE INCIO	30 de noviembre de 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	29 de febrero de 2024	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	14 de abril de 2024		

DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA FECHA

CONCEPTO DEL DESEMBOLSO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DESEMBOLSADO	% DESEMBOLSO
ANTICIPO	ANTICIPO	NA	$ 1,217,046,267,00	50,00%
TOTAL DESEMBOLSADO A LA FECHA			$ 1,217,046,267,00	50,00%

PRORROGAS		
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	45 (DIAS)	14/04/2024

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION		
ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A

ADICIONES		
CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO
N/A	N/A	N/A

EJECUCIÓN

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
OBRA PROGRAMADA (%)	1,13%	95,87%	OBRA EJECUTADA (%)	0,52%	97,46%
VALOR DE LA OBRA PROGRAMADA	$ 27,601,746,00	$ 2,357,799,656,00	VALOR DE LA OBRA EJECUTADA	$ 12,580,027,00	$ 2,372,235,437,11

Vigilado Superservicios

ENERCA S.A E.S.P.

CONTRATO No.:	251 DE 2023		DD	MM	AA
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE MANÍ Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	FECHA	4	4	2024

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR CODIGO BPIN: 2023005850041

INTERVENTORIA X

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DE MANÍ Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE						
CONTRATO No	251 de 2023	NOMBRE DEL CONTRATISTA	GRUPO ABACO CONSULTORES S.A S.				
NOMBRE DEL RUBRO	00AD-2101-1900-2023-00585-0041-SSF	RUBRO	2.3.2.02.02.009.30	No. C.D.P.	94	No R.P.	104
	00AD-2101-1900-2023-00585-0041-SSF	RUBRO	00AD-2101-1900-2023-00585-0041	No. C.D.P.	8323	No R.P.	8423
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 170 684.324,00	PLAZO INICIAL DE EJECUCION	CUATRO (4) MESES				
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	N/A	PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN	CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DÍAS				
FECHA DE INCIO	30 de noviembre de 2023	FECHA DE TERMINACIÓN	29 de marzo de 2024	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	14 de abril de 2024		

DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA FECHA

CONCEPTO DEL DESEMBOLSO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DESEMBOLSADO	% DESEMBOLSO
N/A	NA	NA		
TOTAL DESEMBOLSADO A LA FECHA			$ -	0

PRORROGAS				SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION		
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A

ADICIONES		
CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO
N/A	N/A	N/A

Vigilado Superservicios

CONTRATO No.	251 DE 2023		DD	MM	AA
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA AMBIENTAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE MANI Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	FECHA	4	4	2024


INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

INTERVENTORIA	X	PROYECTO SGR	CODIGO BPIN	2320230053041

RESUMEN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Esta semana se adelantaron las siguientes actividades Conexion domiciliaria residencial (acometida + medidor) en el corregimiento de Monchal se comienzan con las pre pruebas de hermeticidad por tramos en las veredas Armenia y La Consigna en compañía del tecnico de Enerca esto con el fin de hacer verificación del estado de la tubería y de que no existan fugas en la red. por ultimo se termina con la instalación de Mojon de señalizacion rural en las veredas Armenia y La Consigna

REGISTRO FOTOGRAFICO

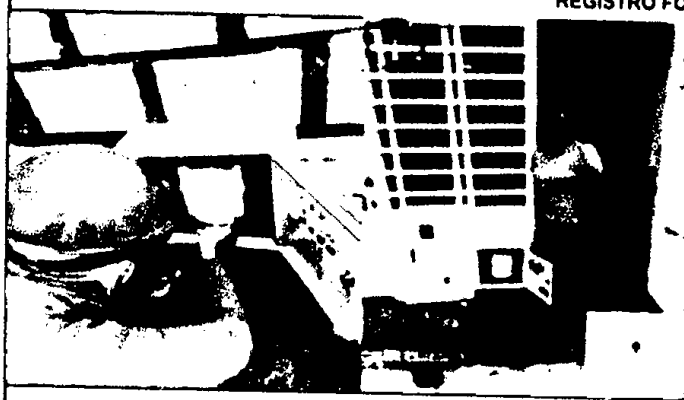

Construcción de acometida de medición y entrega de medidores



Construcción de acometida de medición y entrega de medidores



Construcción de acometida de medición y entrega de medidores



Construcción de acometida de medición y entrega de medidores

ENERCA S.A E.S.P.

CONTRATO No.:	251 DE 2023		DD	MM	AA
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE MANÍ Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	FECHA	4	4	2024

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION


INTERVENTORIA [X] PROYECTO SGR CODIGO BPIN: 2023006850041




Construccion de centros de medicion y entrega de medidores



Construccion de centros de medicion y entrega de medidores

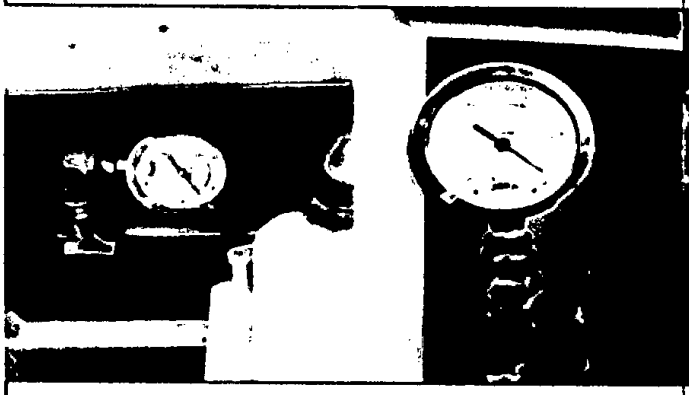

Prueba de hermeticidad red de gasoducto

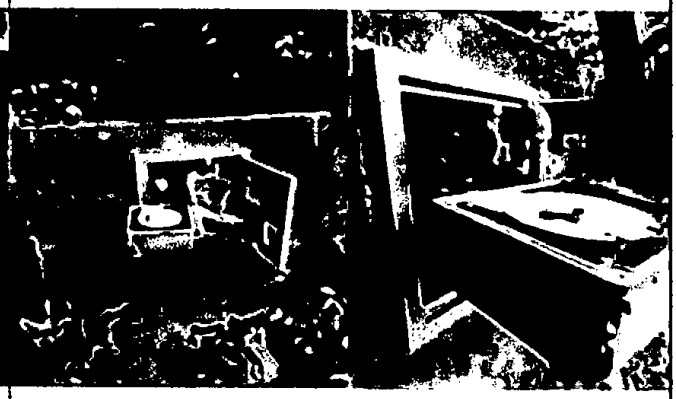

Prueba de hermeticidad red de gasoducto



Prueba de hermeticidad red de gasoducto



Mojon de señalizacion rural. Suministro e instal

IQNET

Vigilado Superservicios

ENERCA S.A E.S.P.

CONTRATO No.:	251 DE 2023		DD	MM	AA
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE MANÌ Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	FECHA	4	4	2024

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

INTERVENTORIA [X] PROYECTO SGR CODIGO BPIN: 2023005850041

ACTIVIDADES PROYECTADAS PARA LA SIGUIENTE SEMANA/QUINCENA

Se espera continuar con las actividades de: Conexión domiciliaria residencial (acometida + medidor) en el corregimiento de Morichal,se comienzan con las pre pruebas de ermeticidad por tramos en las veredas Armenia y La Consigna.

OBSERVACIONES

De acuerdo al avance de obra, el porcentaje de ejecucion acumulado es de 97,46% vs el programado que es de 96,87% con una diferencia positiva de 0,59%.

En constancia se firma.

Elaboro
GRUPO ABACO CONSULTORES S.A.S.
DIR. ETMAN GABRIEL NIÑO SANDOVAL
INTERVENTOR

Recibió
OSCAR EDUARDO ARCINIEGAS CHACON
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Revisó
ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO
GERENTE GAS

Revisó:
LUIS RENE GRANADOS VARGAS
LIDER DE SUPERVISION E INTERVENTORIA

Vigilado Superservicios

- **ANEXO 10**. INFORME DE OBRA
