UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CODAF – JELOG – DILOS

FECHA INFORME: Día: 04 Mes: 08 Año: 2025

CONTRATO N°. 246-00-A-COFAC-DILOS-2024

CONTRATISTA: RB TECNOLOGIA SAS

VALOR DEL CONTRATO: VIGENCIA FISCAL 2024: $ 15.569.000,00
VIGENCIA FISCAL 2025: $ 1.000.000.000,00

FORMA DE PAGO:

Los recursos de la **VIGENCIA FISCAL 2024**, se cancelarán así:

Lo facturado desde la suscripción del acta de inicio del contrato y hasta el 31 de Diciembre de 2024 correspondiente a los servicios de mantenimiento recibidos a satisfacción conforme a lo establecido, sin que el valor llegue a superar la suma de $15.569.620, se cancelará con el PAC cuentas por pagar (CXP) 2024 para ser pagado en el primer trimestre del año 2025, contra recibo a satisfacción parcial de los servicios contratados, facturación de mantenimientos y demás documentos relacionados en las notas del presente acápite.

Los recursos de la **VIGENCIA FISCAL 2025**, se cancelarán así:

OTROS PAGOS PARCIALES: Se realizarán pagos parciales con corte de ejecución los 20 de cada mes por los servicios de mantenimiento recibidos a satisfacción, desde el 1 de enero de 2025 y hasta el 20 de septiembre de 2025, los cuales serán pagaderos dentro de los 60 días posteriores a la entrega de los servicios de mantenimiento, contra recibo a satisfacción parcial de los servicios contratados, facturación de mantenimientos y demás documentos relacionados en las notas del presente acápite

PAGO SALDO: El saldo del contrato se cancelará contra entrega total de los servicios de mantenimiento prestados desde el 21 de septiembre de 2025 y hasta el vencimiento del plazo de ejecución del contrato con cargo al de PAC DICIEMBRE de 2025, contra recibo a satisfacción total de los servicios contratados, facturación de mantenimientos y demás documentos relacionados en las notas del presente acápite.

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 24 Mes 12 Año 2024

OBJETO DEL CONTRATO: El servicio de mantenimiento preventivo (Fase 2), predictivo y/o correctivo (Fase 3) para los vehículos de bomberos en su sistema automotriz y de extinción de incendios que prestan el servicio de atención de emergencias, salvamento y extinción de incendios en las unidades militares aéreas, conforme al anexo técnico.

CONTRATO MODIFICATORIO: 001

FECHA DE FIRMA: 31 diciembre de 2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Reducción presupuestal de la siguiente manera:

FASE 2: Valor Inicial: $ 5.000.000,00
Valor Final: $ 4.908.100,00

FASE 3: Valor Inicial: $ 10.569.620,00
Valor Final: $ 10.286.199,00

CONTRATO MODIFICATORIO: 002

FECHA DE FIRMA: 23 julio de 2025

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Adición presupuestal en la vigencia 2025 de la siguiente manera:

FASE 2: Valor Inicial: $ 300.000.000,00

Adición: $ 100.000.000,00
Valor Final: $ 400.000.000

FASE 3: Valor Inicial: $ 700.000.000,00
Adición: $ 300.000.000,00
Valor Final: $ 1.000.000.000,00

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 30/12/2024 hasta el 31/10/2025

Porcentaje Avance en tiempo: 71.89%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 71.42%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 69.94%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 30.06%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X____ Sí _____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X__. Sí ____.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ___ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

A continuación, se relacionan los trabajos ejecutados en el mes de julio de 2025 con fecha de corte 30 de julio:

El contratista realizó los trabajos de mantenimiento preventivo (Fase 2) y mantenimiento correctivo (Fase 3) en el Comando Aéreo de Mantenimiento, conforme a las actas de mantenimientos enviadas por el personal de supervisor técnico nombrado en esta unidad. Realizando los siguientes trabajos:

FASE 2 - OSHKOSH T6 - PLACA FAC 7-6871
- Cambio y suministro de aceite hidráulico. (A todo costo).
- Cambio y suministro filtro de aceite hidráulico. (A todo costo).

FASE 3 - OSHKOSH T6 - PLACA FAC 7-6871
- Reparación carretel sistema de extinción de incendios. (A todo costo).

El contratista realizó los trabajos de mantenimiento preventivo (Fase 2) en el Comando Aéreo de Combate N° 6, conforme a las actas de mantenimientos enviadas por el personal de supervisor técnico nombrado en esta unidad. Realizando los siguientes trabajos:

FASE 3 - OSHKOSH P19 B - PLACA 8-H0629
- Recarga de botella de agente expulsor (nitrógeno) sistema P.Q.S. (A todo costo).
- Prueba hidrostática botella de agente expulsor (nitrógeno) sistema P.Q.S. (A todo costo).

El contratista realizó los trabajos de mantenimiento preventivo (Fase 2) y mantenimiento correctivo (Fase 3) a la camioneta de investigación de la Inspección General, conforme a las actas de mantenimientos enviadas por el personal de supervisor técnico nombrado en esta unidad. Realizando los siguientes trabajos:

FASE 2 - FORD 250 SUPER DUTY – PLACA MOL 063
- Cambio y suministro de aceite del motor (A todo costo).
- Cambio. suministro e instalación de (los) filtro(s) de aceite del motor. (A todo costo).
- Cambio y suministro liquido refrigerante. (A todo costo).
- Lubricación y engrase de juntas de la suspensión (A todo costo).
- Mantenimiento Preventivo motor de arranque (A todo costo)

FASE 3 - FORD 250 SUPER DUTY – PLACA MOL 063
- Cambio y suministro del refrigerante del aire acondicionado (A todo costo).
- Cambio una (01) llanta delantera. (Mano de Obra).
- Cambio. Suministro e instalación tapa de aceite. (A todo costo).

El contratista realizó los trabajos de mantenimiento correctivo (Fase 3) en el Comando Aéreo de Combate N° 4, conforme a las actas de mantenimientos enviadas por el personal de supervisor técnico nombrado en esta unidad. Realizando los siguientes trabajos:

FASE 3 - CHEVROLET KODIAK – PLACA FAC 9-6889

- Mantenimiento Preventivo del Motor Extinción de Incendios (A todo costo).

El contratista realizó los trabajos de mantenimiento correctivo (Fase 3) en el Comando Aéreo de Combate N° 1, conforme a las actas de mantenimientos enviadas por el personal de supervisor técnico nombrado en esta unidad. Realizando los siguientes trabajos:

FASE 3 - OSHKOSH T3000 – PLACA FAC 8-6894

- Cambio. Suministro e instalación válvula neumática unidireccional. (A todo costo).
- Cambio y Suministro e instalación juego de cámaras de freno trasero. (A todo costo).
- Cambio. Suministro e instalación empaquetadura válvula relay frenos traseros. (A todo costo). (02 Unidades)

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

_____

_____

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO:** ___X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: T2. CONTRERAS GONZALEZ CRISTIAN EDGARDO

FIRMA: Cristian C.

C.C. No. 1.030.550.961

DEPENDENCIA: JELOG - DILOS

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	**X**		Resolución 001 del 07-nov-2024
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución	**SI**		CRP 2024: 1193224 CRP 2025: 37425

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)			Garantías: Aprobada 27/dic/2024 Garantías modificatorio adición: Aprobada 27/jul/2025
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	**SI**		Se hace verificación de las condiciones del contrato electrónico y del anexo aceptación oferta.
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	**SI**		Las condiciones están acordes a las exigidas en la ficha técnica del proceso
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	**SI**		Acta de inicio firmada por las partes el 30/dic/2024
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	**SI**		Estos documentos se adjuntan a los tramites de pago. A la fecha se han tramitado 05 paquetes de pago.
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	**SI**		Se adjuntan las actas de trabajo enviadas por los supervisores técnicos en las unidades
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	**SI**		Mediante correo electrónico se informan los trabajos de mantenimiento que debe ejecutar en las UMA´s
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones	**SI**		Hasta la fecha no se han presentado novedades respecto de las condiciones exigidas.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	equivalentes cuando fuese necesario			
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	**SI**		Se ha cumplido con el cargue en la plataforma SECOP de los informes de supervisión los 05 primeros días del mes
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo		**NO**	A la fecha no se han presentado inconvenientes que conlleven a incumplimiento por parte de contratista
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda		**NO**	De acuerdo a la proyección del contrato esta se realizará una vez se verifique el cumplimiento de la cancelación total del contrato.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEGED-FR-003
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	03-03-2025

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2025-064790-AG	Lugar y Fecha	Bomberos,31-07-2025

Asunto	Trabajos Mantenimiento Fase 3 vehículo OSHKOSH T3000		
Oficina Productora	Bomberos		
Hora Inicio	08:00	**Hora Finalización**	14:00
Ausentes	N/A		


Orden del día: Trabajos Mantenimiento Fase 3 vehículo OSHKOSH T3000

Desarrollo: En las Instalaciones del comando Aéreo de Combate No. 1 el señor AT. Aguilar Obando Cesar Camilo supervisa los trabajos realizados al vehículo Mantenimiento Fase 3 vehículo OSHKOSH T3000 descritos a continuación:

Orden de Mantenimineto NO. 100369572: OSHKOSH T3000 FAC 8-6894

Vehículo	Placa	ítem	Descripción de la Novedad
OSHKOSH T3000	FAC 8-6894	8.2.46	Cambio. Suministro e instalación válvula neumática unidireccional. (A todo costo).
		7.2.11	Cambio y Suministro e instalación juego de cámaras de freno trasero. (A todo costo).
		7.2.37	Cambio. Suministro e instalación empaquetadura válvula relay frenos traseros. (A todo costo). (02 Unidades)



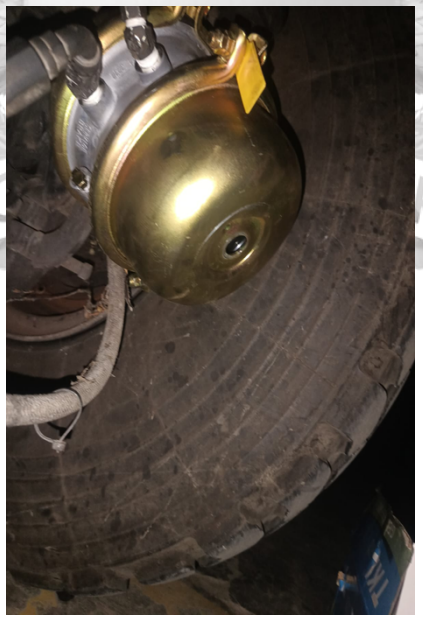



	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEGED-FR-003
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	03-03-2025

Actividades a Realizar			
Actividad		**Responsable**	**Fecha Entrega**
Convocatoria Próxima Reunión			
Tema			
Fecha - Hora	-	**Lugar**	

Capitán ELIAS FERNANDO ACOSTA PALACIOS
Jefe Oficina Seguridad Operacional

Técnico Primero RICARDO ANDRES LOPEZ PENAGOS
Técnico Experto Jefe Estación Bomberos

Aerotécnico CESAR CAMILO AGUILAR OBANDO
Técnico Asistente Mantenimiento Bomberos Aeronáuticos

FAC-S-2025-064790-AG

Elaboró: AT. AGUILAR / OFSOP Revisó: AT. AGUILAR / OFSOP Aprobó:AT. AGUILAR / OFSOP



	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEGED-FR-003
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	03-03-2025

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2025-064987-AG	Lugar y Fecha	CACOM-6,31-07-2025

Asunto	Trabajos de mantenimiento FASE 3 vehículo OSHKOSH P19 de Bomberos CACOM-6		
Oficina Productora	OFSOP		
Hora Inicio	08:00	**Hora Finalización**	12:00
Ausentes	N/A		

Orden del día:
Trabajos de mantenimiento FASE 3 vehículo OSHKOSH P19 de Bomberos CACOM-6

En el Comando Aereo de Combate No. 6, Se realiza la presente acta con el fin de dejar constancia de los trabajos de mantenimiento FASE 3 del vehículo OSHKOSH P19 de Bomberos con numero de Orden de Mantenimiento **100369604**:

DATOS DEL VEHICULO.
Marca: OSHKOSH
Tipo: P-19
Modelo:1980
Registro FAC: 8-0629
No. Motor: 8VF1934480877703
No.Chasis: 10T9L5BE6G1028213
No.Chasis: 10T9L5BE6G1028213

Mantenimiento FASE 3

Vehículo	Placa	ítem	Descripción de la Novedad
OSHKOSH P19 B	8-H0629	7.1.12	Recarga de botella de agente expulsor (nitrógeno) sistema P.Q.S. (A todo costo).
		16.1.120	Prueba hidrostática botella de agente expulsor (nitrógeno) sistema P.Q.S. (A todo costo).





	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEGED-FR-003
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	03-03-2025

HIDROPROB Laboratorio de pruebas hidrostáticas | ONAC ACREDITADO

INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO

Código	F-PHM-04
Versión	9
Vigencia	2024-04-10

830.000.356-8 ISO/IEC 17025:2017 15-LAB-049

SEDE	CONSECUTIVO No.
Bogotá	8878

TARJETA DE ENTRADA No.	BTA47409	FECHA DE RECEPCIÓN	2025-06-16	FECHA DE EMISIÓN	2025-06-17

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	AIRE GASES LTDA.
Dirección:	CL 17 NO 104 B 03
Teléfono:	2989735, 2989735
NIT:	800252682
Ciudad:	BOGOTA D.C.

IDENTIFICACIÓN DEL CILINDRO

Serial No::	1720147Y	F. Fabricación:	1996-04
Tamaño:	9,000 X 57,000 in	Cilindro con válvula:	SÍ
Presión de Prueba (psi):	4000,00	Presión de Servicio (psi):	2400,00
Peso tara (kg):	NA	Gas:	N2
Especificación:	DOT 3AA	Capacidad (l):	NA
Fabricante:	Norris	Tipo de Rosca:	3/4"- NGT (12N)

CONDICIONES AMBIENTALES

TEMPERATURA	INICIAL	19,10	°C
	FINAL	19,20	°C
HUMEDAD RELATIVA	INICIAL	65,00	% HR
	FINAL	66,50	% HR

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

BALANZA	SN	YS163675
MANÓMETRO	SN	A29037

RESULTADOS DEL ENSAYO — REALIZÓ: CRISTIAN DURÁN

Método de Ensayo según: NTC 5171 :2013-03-20 Numeral 5.

Presión de Prueba Leida (psi)	Exp. Total (cm^3)	Exp. Permanente (cm^3)	REE	Exp. Elástica (cm^3)	Exp. Volumétrica (%)	Incertidumbre (%)	Tiempo de Prueba (s)	Disposición	Fecha Prueba
4000,00	225,40	2,60	266,000	222,80	1,15	1,6E-01	30,00	CUMPLE	2025-06-16

APROBACIÓN DEL LABORATORIO

Nombre: DIDIER ALBERTO GIRALDO GUERRERO
Cargo: DIRECTOR DE SEDE
BFEA64A9-4661-4B54-A35D-12B09CFFADE8

Incertidumbre: Parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a un mesurando a partir de la información que se utiliza.
La incertidumbre reportada está estimada con un factor de cobertura k = 2 y garantiza una probabilidad de cobertura aproximada del 95%.

Disposición: La declaración de conformidad de los ensayos realizados, por método de camisa de agua, se establece aplicando regla de decisión basada en zona de seguridad (expansión volumétrica + incertidumbre expandida con una probabilidad de cobertura aproximadamente en 95% y un nivel de riesgo del 2,3 %, como máximo), la expansión no debe exceder el 10% según la ISO 9809-1 e ISO 8909-3, el 5% según la ISO 9809-2 e ISO 7866, el 10% para especificaciones DOT excepto cilindro DOT 4E o permisos especiales, ver el CFR 49 sección 180.205.

Tabla de equivalencias
1 in = 25,4 mm
1 psi = 6,895 kPa
1 bar = 100 kPa
1 atm = 101,325 kPa
1 kgf/cm² = 98,07 kPa
1 l = 0,001 m³

SIGLA
REE: Rechazo Expansión Elástica

NOTA: El presente informe de resultados sólo puede ser reproducido parcial o totalmente con la autorización expresa de HIDROPROB S.A.S. Sin firma no tiene validez.
La información y valores reportados en el informe corresponden a las actividades realizadas en el momento y en las condiciones en las que se realizó el ensayo al ítem relacionado en la identificación del cilindro.
HIDROPROB S.A.S. no se responsabiliza por los perjuicios ocasionados por el uso incorrecto o no autorizado del ítem ensayado.

- FIN DEL INFORME -

ANEXO A

EVALUACIÓN CARACTERÍSTICAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL CILINDRO — REALIZÓ: CRISTIAN DURÁN

Corrosión Picaduras	Corrosión Externa	Rosca de Entrada	Abolladuras	Cortes / Surcos / Canales	Contaminación Interna	Daños por Fuego	Protuberancias	Defectos en Marcación	Abrasión	Tara Actual (kg)	Pérdida de masa (%)
RV	RV	RV	RV	RV	RV	RV	RV	RV	RV	0	0

REVISIÓN VÁLVULA, ROSCA Y CUELLO DEL CILINDRO — REALIZÓ: NA

VÁLVULA								CUELLO CILINDRO		
Fabricante	No. de Serie	Rosca Entrada	Rosca Salida	Presión Fusible (psi)	Condición Válvula	Prueba Funcionamiento	Torque (Nm)	Grietas o Defectos Cuello	Condición de Rosca	Grietas en la Rosca
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

ESPESORES PARED CILINDRO — REALIZÓ: NA

(No aplica en cilindros Tipo 2,3,4)
Espesor mínimo (mm): NA — Espesor mínimo medido (mm): NA

OBSERVACIONES — REQUALIFIER IDENTIFICATION NUMBER: N346

OK

CONVENCIONES

SI: Presenta Defectos | **No**: No Presenta Defectos | **NA**: No Aplica | **RV**: Revisado

Página 1 de 1

Barranquilla: Calle 110 No. 33 – 12 Centro Industrial Circunvalar, Bodega 14. Teléfonos: 605 3852136
Bogotá: Carrera 21 No. 65 - 41. Teléfonos: 6012551529
Cali: Calle 33A No. 8A - 30. Teléfonos: 6024481810
Medellín: Calle 25 No. 58 - 29. Teléfonos: 6040916
Mosquera: Calle 7 No. 13A - 139, Parque Industrial Montana Lote 4 Manzana 3. Teléfonos: 8299792

Actividades a Realizar

Actividad	Responsable	Fecha Entrega

FAC-S-2025-064987-AG

Convocatoria Próxima Reunión			
Tema			
Fecha - Hora	-	**Lugar**	

Técnico Segundo CRISTIAN CAMILO ZEA PEREZ
Técnico Especialista Operacional Bomberos Aeronáuticos

Subteniente SERGIO ESTEBAN BEJARANO QUESADA
Especialista Investigación Seguridad Operacional

Elaboró: T2. ZEA / OFSOP Revisó: T2. ZEA / OFSOP Aprobó:T2. ZEA / OFSOP

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEGED-FR-003
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	03-03-2025

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2025-065501-AG	Lugar y Fecha	Bogotá,31-07-2025

Asunto	Mantenimiento camioneta MOL063		
Oficina Productora	SUISO		
Hora Inicio	15:00	**Hora Finalización**	15:30
Ausentes	Ninguno		

Orden del día:
1. Informe de actividades de mantenimiento realizado a la camioneta FORD SUPER DUTY placa MOL063 asignada a la subdirección de investigación de seguridad operacional.

Desarrollo:

1. Con el fin de garantizar las capacidades investigativas con que cuenta la Subdirección de Investigaciónen materia de vehículos, se realizó el mantenimiento correctivo y preventivo a la camioneta deinvestigación Ford Super Duty MOL 063, el cual incluyó específicamente las siguientes tareas

Mantenimiento FASE 3

ítem	Descripción de la Novedad
6.1.1	Cambio y suministro del refrigerante del aire acondicionado (A todo costo)
6.2.4	Cambio una (01) llanta delantera. (Mano de Obra).
13.2.9	Cambio. Suministro e instalación tapa de aceite. (A todo costo).

Mantenimiento FASE 2

ítem	Descripción de la Novedad
1.1.1	Cambio y suministro de aceite del motor (A todo costo).
1.1.2	Cambio. suministro e instalación de (los) filtro(s) de aceite del motor. (A todo costo)
1.1.11	Cambio y suministro líquido refrigerante. (A todo costo).
2.3.1	Lubricación y engrase de juntas de la suspensión (A todo costo)
5.1	Mantenimiento Preventivo motor de arranque (A todo costo)


2.Se envía evidencia fotografica del cambió de los elementos en el taller REB TECNOLOGIA:

FAC-S-2025-065501-AG

SAS





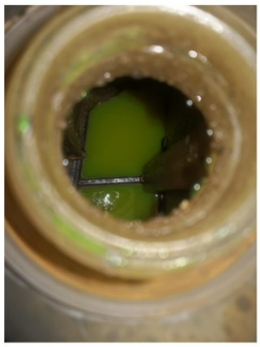





3.No siendo otro el motivo del presente informe, se da por terminada la reunión.

Actividades a Realizar		
Actividad	**Responsable**	**Fecha Entrega**
Convocatoria Próxima Reunión		
Tema		
Fecha - Hora	-	**Lugar**

Teniente Coronel GIOVANNI ANDRES PEREZ SOSA
Subdirector Investigación Seguridad Operacional



Técnico Subjefe ARBEY GONZALO PINTO AREVALO
Técnico Especialista Investigación Incidentes Aéreos

Elaboró: TS. PINTO / SUISO Revisó: TS. PINTO / SUISO Aprobó:TS. PINTO / SUISO

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEGED-FR-003
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	03-03-2025

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2025-065822-AG	Lugar y Fecha	Madrid - Cundinamarca,31-07-2025

Asunto	Mantenimiento Fase 3 - Vehículo Bomberos OSHKOSH T6 CAMAN FAC 7-6871- Falla Hidráulica		
Oficina Productora	OFSOP- BOMBEROS		
Hora Inicio	07:30	**Hora Finalización**	16:30
Ausentes	N/A		

Orden del día:

- Revisión y diagnóstico
- Reparación de fallas

Desarrollo:

En las instalaciones del CAMAN - ESTACION DE BOMBEROS, en cumplimiento del CONTRATO 246-00-A-COFAC-DILOS-2024, a cargo del contratista:

Empresa: RB TECNOLOGIA SAS
Nit: 900063374-4
Dirección: Calle 161 a # 7f - 21
Tel: 3115226867
Correo: asistente@rb-tecnologia.com

Se supervisan los trabajos de mantenimientos correctivos realizados a un vehículo de bomberos asignado al Comando Aéreo de Mantenimiento; como se relaciona a continuación:


Mantenimiento FASE 3

Vehículo	Placa	ítem	Descripción de la Novedad
OSHKOSH T6	FAC 7-6871	16.2.173	Reparación carretel sistema de extinción de incendios. (A todo costo).

FAC-S-2025-065822-AG

Mantenimiento FASE 2

OSHKOSH T6	FAC 7-6871	2.1.1	Cambio y suministro de aceite hidráulico. (A todo costo).
		2.1.2	Cambio y suministro filtro de aceite hidráulico. (A todo costo).

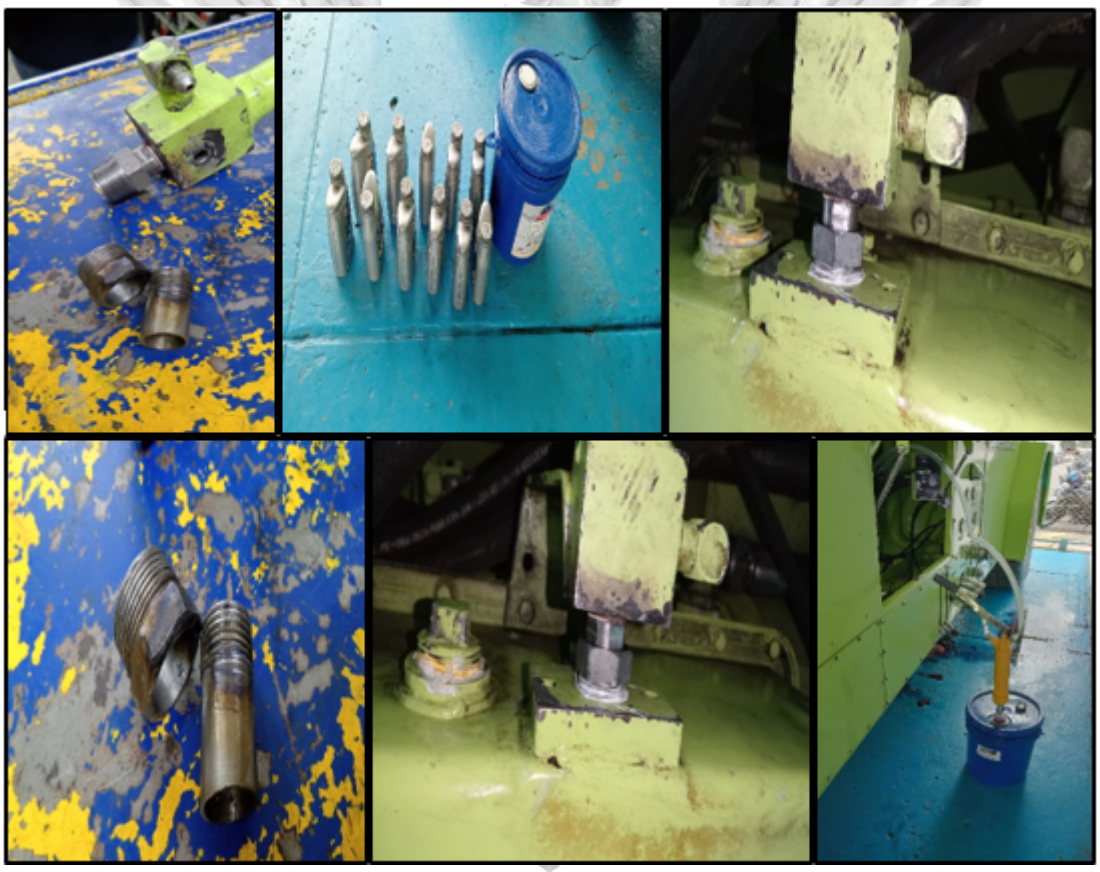

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEGED-FR-003
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	03-03-2025



Actividades a Realizar		
Actividad	**Responsable**	**Fecha Entrega**

Convocatoria Próxima Reunión			
Tema			
Fecha - Hora	-	**Lugar**	

Técnico Primero EDWIN ANDRES GOMEZ GONZALEZ
Técnico Especialista Operacional Bomberos Aeronáuticos

Técnico Segundo CRISTIAN EDGARDO CONTRERAS GONZALEZ
Técnico Especialista Asistente Material Y Equipo Bomberos

FAC-S-2025-065822-AG

Elaboró: T1. GOMEZ / OFSOP Revisó: T1. GOMEZ / OFSOP Aprobó:T1. GOMEZ / OFSOP



	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEGED-FR-003
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	03-03-2025

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2025-064656-AG	Lugar y Fecha	CACOM-4,31-07-2025

Asunto	Mantenimiento FASE-2 vehículo de Bomberos KODIAK SLE-050.		
Oficina Productora	Oficina de Seguridad Operacional - Bomberos Aeronáuticos.		
Hora Inicio	07:30	**Hora Finalización**	16:30
Ausentes	N/A		

Orden del día:
Mantenimiento FASE-2 vehículo de Bomberos KODIAK SLE-050.

Desarrollo:

Se realiza la presente acta con el fin de dejar constancia de los trabajos de mantenimiento FASE-2 realizados en el vehículo de Bomberos Chevrolet Kodiak, placas SLE-050, registro FAC 9-6889, de acuerdo con lo establecido en la relación de trabajos ejecutados a través del CONTRATO 246-00-A-COFAC-DILOS-2024:

Mantenimiento FASE 2 CHEVROLET KODIAK FAC 9-6889:

Kilometraje: 18592,8

Horas motor: 12447,7

Horas bomba: 1008

ITEM 7,2 Mantenimiento Preventivo del Motor Extinción de Incendios (A todo costo):

Se retira el filtro de aire usado, se limpia cuidadosamente la cavidad donde va instalado, asegurándose de que no queden residuos de suciedad o partículas. Luego, se coloca el nuevo filtro de forma adecuada y se cierra correctamente la tapa del compartimiento.

Marca: BALDWIN

Referencia: PA2805





	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEGED-FR-003
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	03-03-2025

Se retira el filtro de combustible usado, se inspecciona visualmente el área de montaje para verificar que no haya presencia de fugas o suciedad. Se limpia la zona, se instala el nuevo filtro asegurando un correcto ajuste para evitar la presencia de aire.

Marca: BALDWIN

Referencia: BF7634



Sin otro en particular.

Actividades a Realizar		
Actividad	**Responsable**	**Fecha Entrega**
N/A	N/A	N/A

Convocatoria Próxima Reunión			
Tema	N/A		
Fecha - Hora	N/A	**Lugar**	N/A

Técnico Primero EDWARD ROBERTO ROA ROA
Técnico Experto Jefe Estación Bomberos

FAC-S-2025-064656-AG

Elaboró: T1. ROA / OFSOP Revisó: T1. ROA / OFSOP Aprobó:T1. ROA / OFSOP

