MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
NIT. 800102912-2

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ

La Hormiga Valle del Guamuez, 14 de julio de 2025

Señor
CARLOS ESNEHIDER QUIROZ CAMPAÑA
GERENTE EMSERPUVAG S.A. E.S.P
Beneficiario

Asunto: Citación a comité técnico No. 1 de Convenio Interadministrativo

Ref. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° SPOPM-CONV-010-2025 DEL 14 DE MARZO DE 2025 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA LA OPTIMIZACIÓN CELDA 01 DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS LOCALIZADO EN LA VEREDA LA PRIMAVERA E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE APROVECHAMIENTO, PARA GARANTIZAR LA BUENA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

Cordial saludo,

La secretaria de Planeación y Obras Públicas del Municipio Valle del Guamuez – Putumayo solicita contar con su presencia el día martes 15 de julio de 2025 a las 02:00 PM de manera personal en nuestras oficinas, para tratar temas con respecto a la solicitud de modificación, adicional necesaria para el Convenio Interadministrativo No. SPOPM-CONV-010-2025 DEL 14 DE MARZO DE 2025, hecha por parte de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios del Valle del Guamuez - EMSERPUVAG S.A. E.S.P.

Por la atención y colaboración prestada a esta solicitud anticipo sinceros agradecimientos.

Cordialmente,

HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS
Supervisor

Proyectó: Mario Leandro Ojeda
Contratista SPOPM

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUÉZ
NIT: 800.102.912-2

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES

TIPO DE CONVENIO: INTERADMINISTRATIVO
CONVENIO No. SPOPM-CONV-010-2025 DEL 14 DE MARZO DE 2025
CONTRATANTE: MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
NIT: 800.102.912-2
REPRESENTANTE LEGAL: JEURIN ZAN MENESES GOMEZ
C.C. No. 18.157.378 DE VALLE DEL GUAMUEZ (P)
OBJETO : AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA LA OPTIMIZACIÓN CELDA 01 DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS LOCALIZADO EN LA VEREDA LA PRIMAVERA E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE APROVECHAMIENTO, PARA GARANTIZAR LA BUENA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
BENEFICIARIO: EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ "EMSERPUVAG S.A. E.S.P."
NIT: 900.304.997-8
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ESNEHIDER QUIROZ CAMPAÑA
C.C. 1.126.454.088 De Valle Del Guamuez (P)
SUPERVISOR: HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS
FECHA DE INICIO: viernes, 14 de marzo de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN: viernes, 29 de agosto de 2025
FECHA DE LA PRESENTE : martes, 15 de julio de 2025

En el Municipio Valle del Guamuez, a los quince (15) días del mes de julio del año 2025, se reunieron en las instalaciones de la Secretaría de Planeación y Obras Públicas Municipal, el Ingeniero HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ, Secretario de Planeación y Obras Públicas Municipal, en calidad de SUPERVISOR del Convenio Interadministrativo No. SPOPM-CONV-010 DEL 14 DE MARZO DE 2025, y el señor CARLOS ESNEHIDER QUIROZ CAMPAÑA, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.126.454.088 De Valle Del Guamuez (P), GERENTE Y Representante Legal de la Empresa Administrativa De Servicios Públicos Domiciliarios Del Municipio Valle Del Guamuez "EMSERPUVAG S.A. E.S.P.", mediante el presente documento se deja constancia del Acta De Mayores Y Menores Cantidades, teniendo en cuenta las actividades contractuales detalladas a continuación:

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES		VALORES		CANT FINAL	VALOR TOTAL
			CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES (+)	MENORES (-)	MAYORES (+)	MENORES (-)		
1	**DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CELDA DEL SISTEMA NUEVO**										
1.10	Conformación y compactación de residuos sólidos que diariamente llegan a la celda en operación.	Ton	4725.00	$44,360.00	$ 209,601,000.00		45.00	$ 0.00	$ 1,996,200.00	4680.00	$ 207,604,800.00
1.20	Suministro e Instalación de cal para estabilización de residuos sólidos en la celda.	Kg	4725.00	$3,368.00	$ 15,913,800.00		45.00	$ 0.00	$ 151,560.00	4680.00	$ 15,762,240.00
1.30	Suministro e Instalación de material tipo arcilla para tapado de residuos sólidos	m3	708.75	$48,013.00	$ 34,029,214.00		6.75	$ 0.00	$ 324,088.00	702.00	$ 33,705,126.00
2	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**							$ 0.00	$ 0.00		
2.10	Suministro e Instalación y compactación de material tipo arcilla para conformación terraplen ingreso principal.	m3	731.88	$56,638.00	$ 41,452,219.00	2989.52		$ 169,320,434.00	$ 0.00	3721.40	$ 210,772,653.00
2.20	Suministro e instalación de geomembrana calibre 40 para evitar la filtración de lixiviados.	m2	460.00	$48,227.00	$ 22,184,420.00	77.00		$ 3,713,479.00	$ 0.00	537.00	$ 25,897,899.00
2.30	Ampliación de chimeneas existentes en la celda.	ml	15.00	$448,951.00	$ 6,734,265.00	10.00		$ 4,489,510.00	$ 0.00	25.00	$ 11,223,775.00
TOTAL COSTO DIRECTO					**$329,914,918.00**			**$177,523,423.00**	**$2,471,848.00**		**$504,966,493.00**
ADMINISTRACION			29%		$95,675,326.00			$51,481,793.00	$716,836.00		$146,440,283.00
UTILIDAD			1%		$3,299,149.00			$1,775,234.00	$24,718.00		$5,049,665.00
IMPREVISTOS			4%		$13,196,597.00			$7,100,937.00	$98,874.00		$20,198,660.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS			30%		**$112,171,072.00**			**$60,357,964.00**	**$840,428.00**		**$171,688,608.00**
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL					**$27,098,852.00**						**$27,098,852.00**
COSTO TOTAL OBRA					**$469,184,842.00**			**$237,881,387.00**	**$3,312,276.00**		**$703,753,953.00**
INTERVENTORIA INTEGRAL DEL PROYECTO					**$30,946,019.00**			**$0.00**			**$30,946,019.00**
APOYO A LA SUPERVISION					**$5,001,309.00**			**$0.00**			**$5,001,309.00**
VALOR TOTAL DEL PROYECTO					**$505,132,170.00**			**$237,881,387.00**	**$3,312,276.00**		**$739,701,281.00**

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUÉZ
NIT: 800.102.912-2

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES

TIPO DE CONVENIO:	INTERADMINISTRATIVO	**CONVENIO No.**	SPOPM-CONV-010-2025 DEL 14 DE MARZO DE 2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ	**NIT:**	800.102.912-2
REPRESENTANTE LEGAL:	JEURIN ZAN MENESES GOMEZ C.C. No. 18.157.378 DE VALLE DEL GUAMUEZ (P)	**OBJETO :**	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA LA OPTIMIZACIÓN CELDA 01 DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS LOCALIZADO EN LA VEREDA LA PRIMAVERA E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE APROVECHAMIENTO, PARA GARANTIZAR LA BUENA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
BENEFICIARIO:	EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÙBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ "EMSERPUVAG S.A. E.S.P."	**NIT:**	900.304.997-8
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ESNEHIDER QUIROZ CAMPAÑA C.C. 1.126.454.088 De Valle Del Guamuez (P)		
SUPERVISOR:	HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS		
FECHA DE INICIO:	viernes, 14 de marzo de 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	viernes, 29 de agosto de 2025
FECHA DE LA PRESENTE :	martes, 15 de julio de 2025		

En el Municipio Valle del Guamuez, a los quince (15) días del mes de julio del año 2025, se reunieron en las instalaciones de la Secretaría de Planeación y Obras Públicas Municipal, el Ingeniero HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ, Secretario de Planeación y Obras Públicas Municipal, en calidad de SUPERVISOR del Convenio Interadministrativo No. SPOPM-CONV-010 DEL 14 DE MARZO DE 2025, y el señor CARLOS ESNEHIDER QUIROZ CAMPAÑA, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.126.454.088 De Valle Del Guamuez (P), GERENTE Y Representante Legal de la Empresa Administrativa De Servicios Públicos Domiciliarios Del Municipio Valle Del Guamuez "EMSERPUVAG S.A. E.S.P.", mediante el presente documento se deja constancia del Acta De Mayores Y Menores Cantidades, teniendo en cuenta las actividades contractuales detalladas a continuación:

DIFERENCIA CONVENIO INICIAL VS. CONDICIONES ACTUALIZADAS	$234,569,111.00

FECHA ELABORACIÓN: 15/07/2025

Valor Aporte Inicial Del Municipio	$ 469,184,842.00
Valor Aporte De EMSERPUVAG S.A. E.S.P.	$ 35,947,328.00
Valor Inicial Del Convenio	$ 505,132,170.00
Valor Adicional Del Aporte Del Municipio Al Convenio	$ 234,569,111.00
Valor Adicional Del Aporte De De EMSERPUVAG S.A. E.S.P.	$ 0.00
Valor Total final Del Convenio	**$ 739,701,281.00**

POR LA EMPRESA
R.L. CARLOS ESNEHIDER QUIROZ CAMPAÑA **C.C. 1.126.454.088 De Valle Del Guamuez (P)**
EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EMSERPUVAG S.A. E.S.P. - Nit. No. 900.304.997-8

POR LA SUPERVISIÓN DEL CONVENIO
HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL

Elaboró: EDWIN RICARDO MARTINEZ
APOYO A LA SUPERVISION EMSERPUVAG S.A. E.S.P.

Reviso: EDELBERTO JEREZ NOVOA.
Apoyo Profesional EMSERPUVAG S.A. E.S.P.

Reviso: Mario Leandro Ojeda
Profesional de apoyo SPOPM.

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL PUTUMATO

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ


EMSERPUVAG S.A. E.S.P.

NIT. 900.304.997-8

AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA LA OPTIMIZACIÓN CELDA 01 DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS LOCALIZADO EN LA VEREDA LA PRIMAVERA E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE APROVECHAMIENTO, PARA GARANTIZAR LA BUENA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ITEM Nº:	1.01	DESCRIPCIÓN:	Conformación y compactación de residuos sólidos que diariamente llegan a la celda en operación.	UND:	Ton


ESQUEMA DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

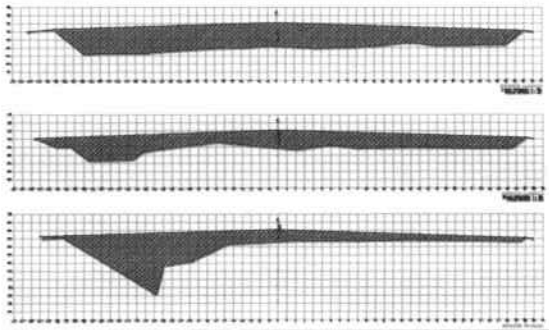

DESCRIPCIÓN [Tramo]	Días		UNIDAD	MEDIDA PARCIAL	VIAJES	MEDIDA TOTAL
	Calendario	Trabajo	Ton			
ABRIL	20	17	9.00	153.00	5.00	765.00
MAYO	31	27	9.00	243.00	5.00	1215.00
JUNIO	30	25	9.00	225.00	5.00	1125.00
JULIO	31	27	9.00	243.00	5.00	1215.00
AGOSTO	31	8	9.00	72.00	5.00	360.00
Cantidad Ejecutada					***2,520.00***	Ton
Cantidad Contractual					***4,725.00***	Ton
Cantidad Imprevista					***-45.00***	
Cantidad Reporte Informe 1					*2,520.00*	*Ton*
Cantidad Reporte Informe 2					***0.00***	***Ton***
Cantidad proyección Final:					*4,680.00*	*Ton*
TOTAL						4,680.00

ITEM N.º:	1.02	DESCRIPCIÓN:	Suministro e instalación de cal para estabilización de residuos sólidos en la celda.	UND:	Kg

ESQUEMA DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

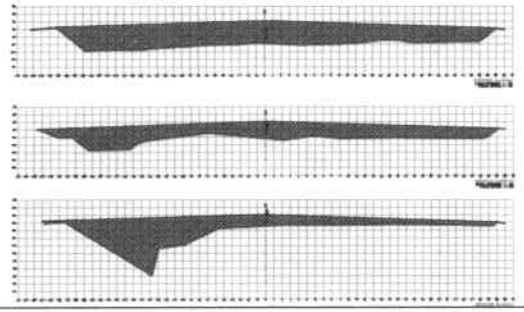

DESCRIPCIÓN [Tramo]	Días		UNIDAD	MEDIDA PARCIAL	VIAJES	MEDIDA TOTAL
	Calendario	Trabajo	Kg			
ABRIL	20	17	9.00	153.00	5.00	765.00
MAYO	31	27	9.00	243.00	5.00	1215.00
JUNIO	30	25	9.00	225.00	5.00	1125.00
JULIO	31	27	9.00	243.00	5.00	1215.00
AGOSTO	31	8	9.00	72.00	5.00	360.00
Cantidad Ejecutada					***2,520.00***	Kg
Cantidad Contractual					***4,725.00***	Kg
Cantidad Imprevista					***-45.00***	
Cantidad Reporte Informe 1					*2,520.00*	*Kg*
Cantidad Reporte Informe 2					***0.00***	***Kg***
Cantidad proyección Final:					*4,680.00*	*Kg*
TOTAL						4,680.00

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL PUTUMATO

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ


EMSERPUVAG S.A. E.S.P.

NIT. 900.304.997-8

AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA LA OPTIMIZACIÓN CELDA 01 DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS LOCALIZADO EN LA VEREDA LA PRIMAVERA E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE APROVECHAMIENTO, PARA GARANTIZAR LA BUENA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ITEM N.°:	1.03	DESCRIPCIÓN:	Suministro e instalación de material tipo arcilla para tapado de residuos sólidos	UND:	m3


ESQUEMA DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

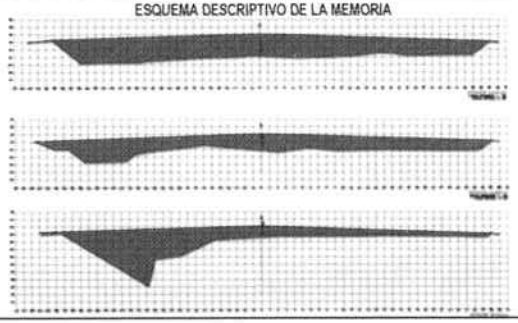

DESCRIPCIÓN [Tramo]	Días		UNIDAD	MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Calendario	Trabajo	m3			
ABRIL	20	17	1.35	22.95	5.00	114.75
MAYO	31	27	1.35	36.45	5.00	182.25
JUNIO	30	25	1.35	33.75	5.00	168.75
JULIO	31	27	1.35	36.45	5.00	182.25
AGOSTO	31	8	1.35	10.80	5.00	54.00
Cantidad Ejecutada					***378.00***	m3
Cantidad Contractual					***708.75***	m3
Cantidad Imprevista					***-6.75***	
Cantidad Reporte Informe 1					*378.00*	*m3*
Cantidad Reporte Informe 2					***0.00***	***m3***
Cantidad proyección Final:					*702.00*	*m3*
	TOTAL					702.00

ITEM N.°:	2.01	DESCRIPCIÓN:	Suministro e instalación y compactación de material tipo arcilla para conformación terraplen ingreso principal.	UND:	m3

ESQUEMA DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

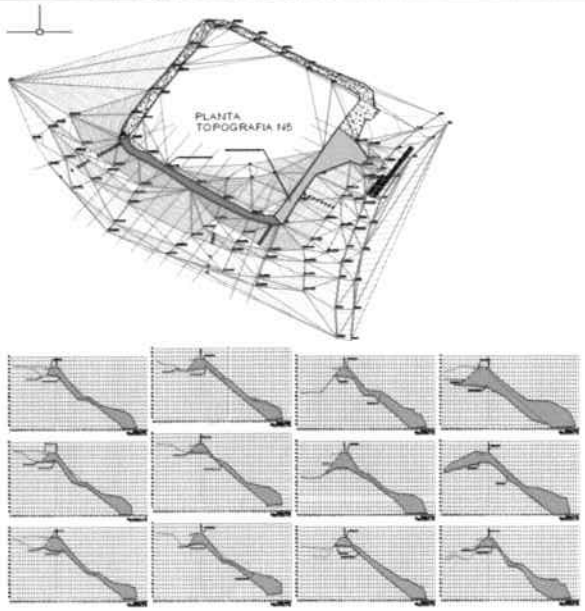


DESCRIPCIÓN [Tramo]	LARGO	AREA RELLENO	DIMENCIONES ANCHO	DIMENCIONES Altura	Factor compactación	MEDIDA TOTAL
Entrada principal	k0+000	34	2.50		1	85.00
	k0+005	35	5.00		1.00	175.00
	k0+010	33	5.00		1.00	165.00
	k0+015	34.28	5.00		1.00	171.40
	k0+020	20	5.00		1.00	100.00
	k0+025	14	2.50		1.00	35.00
TERRAPLÉN LONGITUDINAL MARGEN IZQUIERDO	k0+000	57	2.50		1.00	142.50
	k0+005	55	5.00		1.00	275.00
	k0+010	58	5.00		1.00	290.00
	k0+015	54	5.00		1.00	270.00
	k0+020	55	5.00		1.00	275.00
	k0+025	60	5.00		1.00	300.00
	k0+030	59	5.00		1.00	295.00
	k0+035	55	5.00		1.00	275.00
	k0+040	60	5.00		1.00	300.00
	k0+045	49	5.00		1.00	245.00
	k0+050	44	5.00		1.00	220.00
	k0+055	41	2.50		1.00	102.50
Cantidad Ejecutada					***731.43***	m3
Cantidad Contractual					***731.88***	m3
Cantidad Imprevista					***2,989.52***	m3
Cantidad Reporte Informe 1					*731.43*	*m3*
Cantidad Reporte Informe 2					***0.00***	***m3***
Cantidad proyección Final:					*3,721.40*	*m3*
TOTAL						3721.40

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMATO
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
EMSERPUVAG S.A. E.S.P.
NIT. 900.304.997-8

AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA LA OPTIMIZACIÓN CELDA 01 DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS LOCALIZADO EN LA VEREDA LA PRIMAVERA E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE APROVECHAMIENTO, PARA GARANTIZAR LA BUENA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

ITEM N.°:	2.02	DESCRIPCIÓN:	Suministro e instalación de geomembrana calibre 40 para evitar la filtración de lixiviados.	UND:	m2


ESQUEMA DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

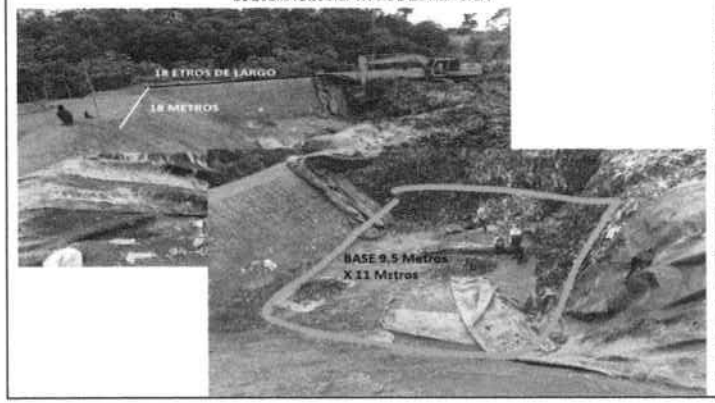

DESCRIPCIÓN [Tramo]	Secciones	DIMENCIONES		Factor compactación	MEDIDA TOTAL
	Altura	Longitud	Ancho		
Muro Entrada	12.00		18.00	1.00	216.00
Muro talud Izquierdo	12.00		18.00	1.00	216.00
Base Celda		9.50	11.00	1.00	104.50
Cantidad Ejecutada				***460.00***	m2
Cantidad Contractual				***460.00***	m2
Cantidad Imprevista				***77.00***	
Cantidad Reporte Informe 1				*460.00*	*m2*
Cantidad Reporte Informe 2				***0.00***	***m2***
Cantidad proyección Final:				*537.00*	*m2*
TOTAL					537.00

ITEM N.°:	2.03	DESCRIPCIÓN:	Ampliación de chimeneas existentes en la celda.	UND:	ml

ESQUEMA DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

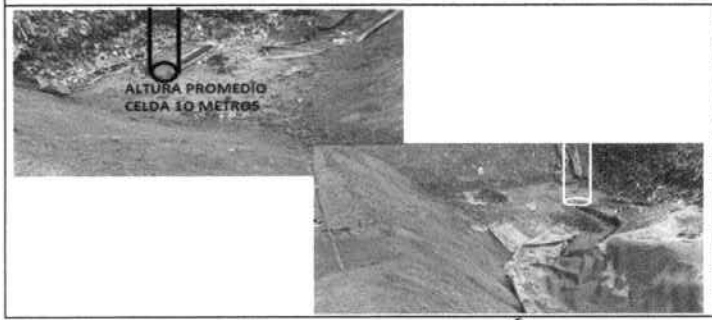

DESCRIPCIÓN [Tramo]			DIMENCIONES			MEDIDA TOTAL
			Longitud	Espesor	Total	
Chimenea 1			3.00		1.00	3.00
Chimenea 2			3.00		1.00	3.00
Chimenea 3			3.00		1.00	3.00
Chimenea 4			3.00		1.00	3.00
Chimenea 5			3.00		1.00	3.00
Chimenea 6 Entrada Celda Principal			10.00		1.00	10.00
Cantidad Ejecutada					***15.00***	ml
Cantidad Contractual					***15.00***	ml
Cantidad Imprevista					***10.00***	ml
Cantidad Reporte Informe 1					*15.00*	*ml*
Cantidad Reporte Informe 2					***0.00***	***ml***
Cantidad proyección Final:					*25.00*	*ml*
TOTAL						25.00

POR EL BENEFICIARIO	POR LA SUPERVISIÓN
CARLOS ESNEHIDER QUIROZ CAMPAÑA GERENTE EMSERPUVAG S.A. E.S.P.	HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS

Elaboró: EDWIN RICARDO MARTINEZ
APOYO A LA SUPERVISION EMSERPUVAG S.A. E.S.P.

Reviso: EDELBERTO JEREZ NOVOA
Apoyo Profesional EMSERPUVAG S.A. E.S.P.

Reviso: Mario Leandro Ojeda
Profesional de apoyo SPOPM.
