INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON

CONVENIO No. 1369 de 2024, MUNICIPIO DE GUAPI-CAUCA

INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE JUNIO DE 2025

1 GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	**"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GUAPI - CAUCA".**		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural**: Vereda y breve descripción para llegar)	Carrera 2 #5-73 Barrio la Esperanza ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAPI CAUCA		
BENEFICIARIO:	**MUNICIPIO DE GUAPI- CAUCA**		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MINISTERIO**	**$ 6,759,781,412.00**	
	APORTES MUNICIPIO DE GUAPI CAUCA	**$ 1,194,353,703.00**	
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO	**$ 7,954,135,115.00**	
FECHA SUSCRIPCIÓN	23/04/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONVENIO/ CONTRATO	23/06/2025		
SUPERVISOR DEL CONVENIO - MINISTERIO	**MANUEL ANTONIO LINARES DONATO**		
SUPERVISOR DEL CONVENIO - GOBERNACION	**N/A**		
SUPERVISOR DEL CONVENIO - MUNICIPIO	**GIL MILENA GRUESO ROMERO**		
APOYO A LA SUPERVISION	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	BYRON CAMAPAZ SINISTERRA	24/4/2024	Actual
	NELLY YANETH BONILLA RUIZ	24/4/2024	Actual
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR			
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MININTERIOR	N° 33324	2024-04-08	
COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA (si aplica)	Radicado N° 2-2024-004715	6/2/2024	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD MUNICIPIO	CDP-001-2024	2/1/2024	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	23/04/2024		
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	24/04/2024		
FFECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRORROGA		FECHA: DD/MM/AA
	SEGUNDA PRORROGA		FECHA: DD/MM/AA
	TERCERA PRORROGA		FECHA: DD/MM/AA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		FECHA: DD/MM/AA
	AMPLIACION DE SUSPENSION		FECHA: DD/MM/AA
	REINICIO		FECHA: DD/MM/AA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo	FECHA:DD/MM/AA		
	FECHA:DD/MM/AA		
	FECHA:DD/MM/AA		
VALOR DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA	$ 250,152,201.00		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA	$ 67,716,201.00		
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	N/A		
VALOR ADICIONAL DE OBRA	N/A		

2 ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/CONTRTATO

Convenio interadministrativo/ Contrato (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/
contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza.		**03/07/2024**	**$ 1,689,945,353.00**

SEGUNDO DESEMBOLSO	A. Acta de recibo de estudios y diseños (anexo 22), con sus anexos. B. Certificación del supervisor del Convenio designado por el MUNICIPIO que acredite la ejecución de las actividades de descapote, nivelado, demoliciones, retiro y disposición final de escombros en sitio autorizado, rellenos y disponibilidad de servicios públicos con sus respectivas acometidas hasta el predio, y la ejecución de las obras de estabilidad en el evento en que sea necesario		DD/MM/AAAA	$ 1,689,945,353.00
TERCER DESEMBOLSO	A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 40% de ejecución de la obra B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.		DD/MM/AAAA	$ 1,689,945,353.00
ULTIMO DESEMBOLSO	A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP C. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado.		DD/MM/AAAA	$ 1,689,945,353.00

TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME $ 1,689,945,353.00

TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)	$ 1,194,353,703.00
TOTAL, DE RECURSOS EN LAS CUENTAS APERTURADAS PARA EL CONVENIO A LA FECHA DEL INFORME	$2,884,299,053.0 0

3 POLIZA CONVENIO/CONTRATO

Nombre Aseguradora: **ASEGURADORA SOLIDARIA**

POLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
435 47 994000056648	Cumplimiento	$ 1,591,427,023.00	12/042024	31/03/2026

4 INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

	SI	NO
FEHCA DE ULTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: 09/04/2025	X	
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA		X
INFORME FINANCIERO	X	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	X	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X	
OTROS		X

6 INFORME DEL SUPERVISOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAPI CAUCA

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/CONTRATO	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% **PROGRAMADO DE EJECUCCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS**	**100%**
% PROGRAMADO DE EJECUCCION DE OBRA	**0.00%**
% EJECUTADO DE OBRA	**0.00%**

Componente Técnico.

En el mes de Junio se llevaron a cabo 3 encuentros de mesas técnicas en la ciudad de Bogotá, todo en harás de realizar el radicado oficial de los estudios y diseños del centro administrativo municipal del municipio de Guapi Cauca.

El pasado 13 de Junio la comisión en cabeza de la alcaldesa Gil Milena Grueso Romero, la Secretaria de Planeación y Obras Públicas, un contratista de apoyo a la supervisión y los contratistas de los

contratos derivados del convenio se desplazaron a la ciudad de Bogotá D. C con el fin de realizar la entrega física de las subsanaciones realizadas.




Fuente: Elaboración propia

Fue necesario realizar un comité técnico nuevamente en las instalaciones del ministerio del interior para la fecha del 24, 25, 26 de junio

En esta ocasión no fue posible realizar la mesa técnica en las instalaciones del Ministerio del Interior debido que por problemas de orden público estas no se encontraban abiertas.

Por ese motivo fue necesario realizar la revisión de manera digital, de acuerdo a los requerimientos que se realizaron en las anteriores actas y por ende determinados como entregables mininos del presente convenio.

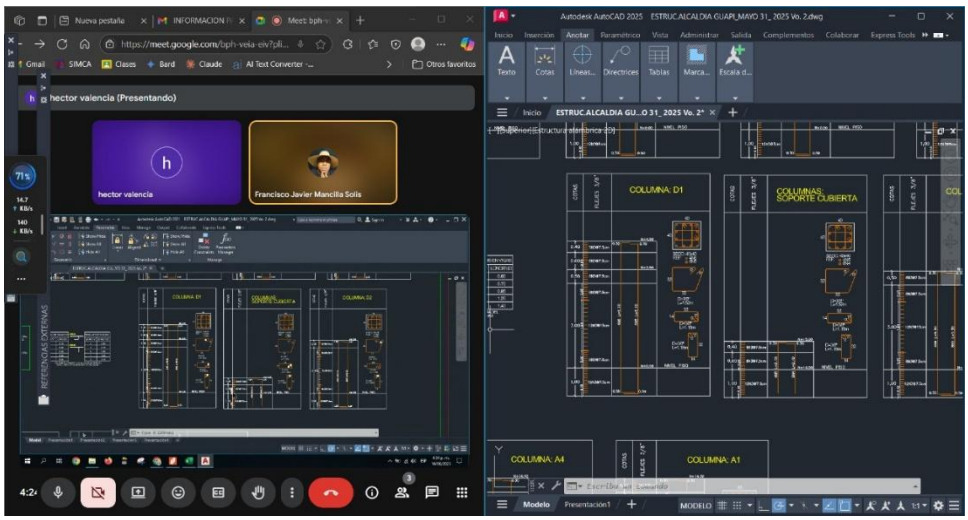

Fuente: Elaboración propia

Dentro de esta revisión se encontraron que la mayoría de requisitos solicitados se lograron subsanar, mas sin embargo se realizo un requerimiento de revisar el presupuesto y las cantidades de obras presentadas.

Para el día 30 de junio fue necesario que el contratista de apoyo a la supervisión Francisco Javier Mancilla Solis realizara un nuevo desplazamiento a la ciudad de Bogotá D.C, para poder realizar el folio de los documentos en físico y lograr organizar la documentación digital, todo con el ánimos de poder obtener el concepto de viabilidad para el inicio de obra, con esto se radico en conjunto la solicitud de prorroga y además la adición del recurso la cual fue soportad por los CDPS aportados por el municipio.

Componente Financiero.

Se anexa a este informe el componente financiero firmado y diligenciado por la Secretaria de Hacienda municipal.

Además de ello se aportan los CDPS con los cuales el municipio realiza el cierre financiero y logra aportar el valor adicional el cual arrojo la consultoría del presente convenio.

Justificación del avance: Prórroga, Adición, Subsanar

7. SUPERVISORA

GIL MILENA GRUESO ROMERO
Supervisora Municipio Convenio No. 1369 de 2024
Municipio de Guapi, Cauca

Proyectó: Francisco Javier Mancilla Solis
Reviso: Nelly Yaneth Bonilla Ruiz
Aprobó: Gil Milena Grueso Romero

ALCALDÍA DE GUAPI

ESTADO FINANCIERO
CONVENIO No. 1396 DE 2024 - MUNICIPIO DE GUAPI - CAUCA

CONVENIO SUSCRITO ENTRE MUNICIPIO DE GUAPI - CAUCA Y MINISTERIO DEL INTERIOR
No. CUENTAS: 4-2125-3-00877-1 Y 4-2125-3-00849-6 / BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

RECURSOS APORTADOS

VALOR CONVENIO	**$ 7.954.135.115,00**	APORTES MINISTERIO	$	6.759.781.412,00	
		APORTES MUNICIPIO	$	1.194.353.703,00	
		ADICIÓN			

DESEMBOLSOS	CONCEPTO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	APORTANTE	VALOR	TOTAL
DESEMBOLSOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR A LA CUENTA DEL CONVENIO						
Primer desembolso	A.Suscripción Acta de Inicio. B. Aprobación de la Poliza.	212492624	3/07/2024	Ministerio del Interior	$ 1.689.945.353	
Rendimientos generados	Rendimientos generados en la cuenta para el desembolso de los recursos del convenio por parte de l Ministerio del Interior				**41.462.227,00**	
TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS					**$ 1.689.945.353,00**	
DESEMBOLSOS DEL MUNICIPIO A LA CUENTA DEL CONVENIO						
Primer desembolso			30/08/2024	Municipio	$ 1.194.353.703	
TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS					**$ 1.194.353.703,00**	
TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS SUMADOS A CADA CUENTA DEL CONVENIO						**$ 2.884.299.056,00**

PAGOS REALIZADOS POR EL MUNICIPIO A CONTRATOS DERIVADOS

VALOR CONTRATADO

CONTRATO No.	NOMBRE DEL CONTRATISTA	VALOR CONTRATADO	VALOR ADICIÓN	VALOR TOTAL CONTRATADO
CC-001-2024	CONSORCIO INTERVENTORIA CAM GUAPI	$ 465.805.675,00	$ -	$ 465.805.675,00
COP-001-2024	CONSORCIO GUAPI	$ 7.482.236.983,00	$ -	$ 7.482.236.983,00

PAGOS	CONCEPTO	No. ORDEN DE PAGO	No.COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACIÓN DE RECURSOS	VALOR	TOTAL	
PAGOS DEL MUNICIPIO AL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA								
250.152.201,00	PAGO 100% DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM-GUAPI CAUCA	43898	43552	5/05/2025	APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON	$ 250.152.201,00		
						$ -		
						$ -		
						$ -		
TOTAL RECURSOS PAGADOS AL CONTRATO DE OBRA						**$ 250.152.201,00**		3,34%
PAGOS DEL MUNICIPIO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA								
67.716.201,00	PAGO 100% DE LA INTERVENTORIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM-GUAPI CAUCA	43834	43461	29/04/2025	APORTE MUNICIPIO DE GUAPI	$ 67.716.201,00		
						$ -		
						$ -		
TOTAL RECURSOS PAGADOS AL CONTRATO DE INTERVENTORIA						**$ 67.716.201,00**		0,91%
TOTAL RECURSOS PAGADOS A LOS CONTRATOS DERIVADOS								**$ 317.868.402,00**
TOTAL RECURSOS GIRADOS PENDIENTES POR PAGAR A JUNIO 2025								**$ 2.566.430.654,00**
SALDO EN LAS CUENTAS A JUNIO DE 2025								**$ 1.787.657.361,00**

NOTA:
- La diferencia entre el total de recursos por comprometer y el saldo en cuenta corresponde a los rendimientos financieros generados, asi como tambien a el pago pendiente por el Municipio correspondiente a estampillas y FONSECON.
- Ultimo extracto de JUNIO de 2025.
- Informe financiero del Municipio JUNIO de 2025.

LEIDY TATIANA LOPEZ HERRERA
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

Nit: 800084378-0
Dirección: Carrera 2a N°- 5-73
Correo institucional: secretariadehacienda@guapi-cauca.gov.co

LA SUSCRITA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL DE GUAPI-CAUCA

Certifica que la contrapartida para el CONVENIO DE LA CONTRUCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO por valor de ochocientos noventa y cuatro millones trescientos cincuenta y tres mil setecientos tres pesos $ 894.353.703, se encuentra en la cuenta del sistema general de participaciones, una vez realizado los ajustes con relación al acuerdo de vigencias futuras que se realizó para este proyecto.

Para constancia se firma en guapi cauca a los 30 días del mes de Junio de 2025.

Atentamente:

LEYDY TATIANA PONCE HERRERA
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

Banco Agrario de Colombia

ESTADO DE CUENTAS DE AHORRO ACTIVO

Hasta 20 millones, su dinero está asegurado — Depósito seguro de Fogafín

MES	JUNIO	AÑO	2025

NÚMERO DE CUENTA:
421253008496

OFICINA: 2125 GUAPI

NOMBRE MUNICIPIO DE GUAPI\CONV PARA LA CONSTR DE ,

DIRECCIÓN CRA 2 NO 5 73 BARRIO LA ESPERANZA


CIUDAD CAUCA, GUAPI

RESUMEN DE MOVIMIENTO

	No. Transacciones	Valor		Valor
SALDO ANTERIOR		1.533.648.216,00	SALDO ACTUAL	1.536.556.049,00
TOTAL ABONOS	18	2.907.833,00	PROMEDIO MES	1.535.115.573,00
TOTAL CARGOS	0	0,00	INTERESES	2.907.833,00

INFORMACIÓN IMPORTANTE

ESTIMADO CLIENTE: PARA SU COMODIDAD, AHORA USTED PUEDE ACTUALIZAR SUS DATOS BASICOS COMO TELEFONOS DE CONTACTO Y DIRECCIONES, A TRAVES DE NUESTRA LINEA GRATUITA DE CONTACTO BANAGRARIO 018000 915000 O DESDE BOGOTA AL 5948500, SERVICIO 24 HORAS.



www.bancoagrario.gov.co
· Banca Agropecuaria · Banca Personas · Banca Oficial · Banca Empresarial · Banca Microfinanzas

DIA	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	OFICINA	No. DCTO	VALOR	SALDO
03/06	INTERESES DE AHORROS	GUAPI		103.756,00	1.533.751.972,00
04/06	INTERESES DE AHORROS	GUAPI		103.763,00	1.533.855.735,00
05/06	INTERESES DE AHORROS	GUAPI		103.770,00	1.533.959.505,00
06/06	INTERESES DE AHORROS	GUAPI		311.353,00	1.534.270.858,00
09/06	INTERESES DE AHORROS	GUAPI		103.798,00	1.534.374.656,00
10/06	INTERESES DE AHORROS	GUAPI		103.805,00	1.534.478.461,00
11/06	INTERESES DE AHORROS	GUAPI		103.813,00	1.534.582.274,00
12/06	INTERESES DE AHORROS	GUAPI		103.820,00	1.534.686.094,00
13/06	INTERESES DE AHORROS	GUAPI		311.501,00	1.534.997.595,00
16/06	INTERESES DE AHORROS	GUAPI		103.848,00	1.535.101.443,00
17/06	INTERESES DE AHORROS	GUAPI		103.855,00	1.535.205.298,00
18/06	INTERESES DE AHORROS	GUAPI		103.862,00	1.535.309.160,00
19/06	INTERESES DE AHORROS	GUAPI		103.869,00	1.535.413.029,00
20/06	INTERESES DE AHORROS	GUAPI		415.545,00	1.535.828.574,00
24/06	INTERESES DE AHORROS	GUAPI		103.904,00	1.535.932.478,00
25/06	INTERESES DE AHORROS	GUAPI		103.911,00	1.536.036.389,00
26/06	INTERESES DE AHORROS	GUAPI		103.918,00	1.536.140.307,00
27/06	INTERESES DE AHORROS	GUAPI		415.742,00	1.536.556.049,00

NIT. 800.037.800-8
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
Autorregulado amv
Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8 6418

Cualquier inquietud por favor comunicarla por escrito a la Revisoría Fiscal PrincewaterhouseCoopers LTDS | http://www.pwc.com/co | Directo: +57 (1) 634 05 55 | Mobile: 304 674 98 60 Fax: +57 (1) 218 85 44 | Office: Calle 100 No. 11 A 35, Piso 6 Bogotá, Colombia | Revisor Fiscal Principal: José Wilson Rodríguez · Revisor Fiscal Primer Suplente: Joaquín Guillermo Molina Morales · Revisor Fiscal Segundo Suplente: Dorian del Socorro Echeverri Quintero o al e-mail: Raquel.viveros@co.pwc.com. Tenemos a su disposición, los siguientes canales para presentar peticiones, quejas o reclamos: Línea Contacto Banco Agrario: Bogotá (1) 5948500, resto del país Línea gratuita 01 8000 91 5000. Correo electrónico Banco Agrario: servicio.cliente@bancoagrario.gov.co Defensor del consumidor financiero: Dr. José Guillermo Peña

Banco Agrario de Colombia

ESTADO DE CUENTAS DE AHORRO ACTIVO

Hasta 20 millones, su dinero está asegurado — Depósito seguro de Fogafin

MES	JUNIO	AÑO	2025

NÚMERO DE CUENTA: 421253008771

OFICINA: 2125 GUAPI

NOMBRE MUNICIPIO DE GUAPI ,

DIRECCIÓN BARRIO LA ESPERANZA


CIUDAD CAUCA, GUAPI

RESUMEN DE MOVIMIENTO

	No. Transacciones	Valor		Valor
SALDO ANTERIOR		250.757.905,00	SALDO ACTUAL	251.101.312,00
TOTAL ABONOS	18	343.407,00	PROMEDIO MES	250.931.209,00
TOTAL CARGOS	0	0,00	INTERESES	343.407,00

INFORMACIÓN IMPORTANTE

ESTIMADO CLIENTE: PARA SU COMODIDAD, AHORA USTED PUEDE ACTUALIZAR SUS DATOS BASICOS COMO TELEFONOS DE CONTACTO Y DIRECCIONES, A TRAVES DE NUESTRA LINEA GRATUITA DE CONTACTO BANAGRARIO 018000 915000 O DESDE BOGOTA AL 5948500, SERVICIO 24 HORAS.



www.bancoagrario.gov.co
· Banca Agropecuaria · Banca Personas · Banca Oficial · Banca Empresarial · Banca Microfinanzas

DIA	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	OFICINA	No. DCTO	VALOR	SALDO
03/06	INTERESES DE AHORROS	GUAPI		12.256,00	250.770.161,00
04/06	INTERESES DE AHORROS	GUAPI		12.257,00	250.782.418,00
05/06	INTERESES DE AHORROS	GUAPI		12.258,00	250.794.676,00
06/06	INTERESES DE AHORROS	GUAPI		36.777,00	250.831.453,00
09/06	INTERESES DE AHORROS	GUAPI		12.260,00	250.843.713,00
10/06	INTERESES DE AHORROS	GUAPI		12.261,00	250.855.974,00
11/06	INTERESES DE AHORROS	GUAPI		12.261,00	250.868.235,00
12/06	INTERESES DE AHORROS	GUAPI		12.262,00	250.880.497,00
13/06	INTERESES DE AHORROS	GUAPI		36.789,00	250.917.286,00
16/06	INTERESES DE AHORROS	GUAPI		12.264,00	250.929.550,00
17/06	INTERESES DE AHORROS	GUAPI		12.265,00	250.941.815,00
18/06	INTERESES DE AHORROS	GUAPI		12.265,00	250.954.080,00
19/06	INTERESES DE AHORROS	GUAPI		12.266,00	250.966.346,00
20/06	INTERESES DE AHORROS	GUAPI		49.070,00	251.015.416,00
24/06	INTERESES DE AHORROS	GUAPI		12.269,00	251.027.685,00
25/06	INTERESES DE AHORROS	GUAPI		12.270,00	251.039.955,00
26/06	INTERESES DE AHORROS	GUAPI		12.270,00	251.052.225,00
27/06	INTERESES DE AHORROS	GUAPI		49.087,00	251.101.312,00

NIT. 800.037.800-8
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
Autorregulado amv
Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8 6418

Cualquier inquietud por favor comunicarla por escrito a la Revisoría Fiscal PrincewaterhouseCoopers LTDS | http://www.pwc.com/co | Directo: +57 (1) 634 05 55 | Mobile: 304 674 98 60 Fax: +57 (1) 218 85 44 | Office: Calle 100 No. 11 A 35, Piso 6 Bogotá, Colombia | Revisor Fiscal Principal: José Wilson Rodríguez · Revisor Fiscal Primer Suplente: Joaquín Guillermo Molina Morales · Revisor Fiscal Segundo Suplente: Dorian del Socorro Echeverri Quintero o al e-mail: Raquel.viveros@co.pwc.com. Tenemos a su disposición, los siguientes canales para presentar peticiones, quejas o reclamos: Línea Contacto Banco Agrario: Bogotá (1) 5948500, resto del país | línea gratuita 01 8000 91 5000. Correo electrónico Banco Agrario: servicio.cliente@bancoagrario.gov.co Defensor del consumidor financiero: Dr. José Guillermo Peña

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE GUAPI - CAUCA
800084378
Vigencia Fiscal **2025**

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero	Fecha	Vigencia
321	lunes, 3 de marzo de 2025	**31/12/2025**

EL JEFE DE PRESUPUESTO

CERTIFICA:

Que en el presupuesto de gastos de la presente vigencia, existe disponibilidad . presupuestal para respaldar el siguiente compromiso:

ADICCION AL CONVENIO 1396 DE 2024 - AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE GUAPI CAUCA.

Codigo del Rubro	Codigo del Rubro	Valor Rubro	
2-16-1-0-0-0-ENTIDAD-0	GASTOS	$436.000.000,00	☐
2.3-16-1-0-0-0-ENTIDAD-0	INVERSION	$436.000.000,00	☐
2.3.2-16-1-0-0-0-ENTIDAD-0	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	$436.000.000,00	☐
2.3.2.01.01.001.02.14-459900900-1000-16-1-1.2.1.0.00-1-Actual-ENTIDAD-1	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	$148.000.000,00	☑
CCPET: 2.3.2.01.01.001.02.04-EDIFICIOS PUBLICOS DE ENTRETENIMIENTO UNIDAD EJECUTORA: 16-1-ET - ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE FINANC: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION SECTOR: 45-GOBIERNO TERRITORIAL PROGRAMA: 4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial SUBPROGRAMA: 1000-Intersubsectorial Gobierno PRODUCTO: 4599009-Sedes construidas INDICADOR 459900900-Sedes construidas CPC DANE: NA-NO APLICA BPIN: 202500000008262			
2.3.2.01.01.001.02.14-459900900-1000-16-1-1.2.4.3.03-1-Actual-ENTIDAD-1	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	$88.000.000,00	☑
CCPET: 2.3.2.01.01.001.02.14-OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES UNIDAD EJECUTORA: 16-1-ET - ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE FINANC: 1.3.3.8.03-R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION SECTOR: 45-GOBIERNO TERRITORIAL PROGRAMA: 4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial SUBPROGRAMA: 1000-Intersubsectorial Gobierno PRODUCTO: 4599009-Sedes construidas INDICADOR 459900900-Sedes construidas CPC DANE: NA-NO APLICA BPIN: 202500000008262			

Powered by CamScanner

Codigo del Rubro	Codigo del Rubro	Valor Rubro	
2.3.2.01.01.001.02.14-459900900-1000-16-1-1.3.2.3.01-04-1-Actual-ENTIDAD-1	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	$200.000.000,00	☑
CCPET: 2.3.2.01.01.001.02.14-OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES UNIDAD EJECUTORA: 16-1-ET - ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE FINANC: 1.3.2.3.01-R.F. DISTINTOS AL SGP - RF RECURSOS PROPIOS SECTOR: 45-GOBIERNO TERRITORIAL PROGRAMA: 4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial SUBPROGRAMA: 1000-Intersubsectorial Gobierno PRODUCTO: 4599009-Sedes construidas INDICADOR 459900900-Sedes construidas CPC DANE: NA-NO APLICA BPIN: 202500000008262			
2.3.2.02-16-1-0-0-0-ENTIDAD-0	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	$436.000.000,00	☐
2.3.2.02.02-16-1-0-0-0-ENTIDAD-0	ADQUISICION DE SERVICIOS	$436.000.000,00	☐
	Valor Total Disponibilidad	**$436.000.000,00**	

Los actos administrativos que autorizan el gasto deben expresar claramente el número de este Certificado de Disponibilidad indicando el nombre y código presupuestal

JENNY PATRICIA SINISTERRA RUIZ
Jefe de Presupuesto

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE GUAPI - CAUCA
800084378
Vigencia Fiscal 2025

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero	Fecha	Vigencia
589	martes, 24 de junio de 2025	**31/12/2025**

EL JEFE DE PRESUPUESTO €

CERTIFICA:

Que en el presupuesto de gastos de la presente vigencia, existe disponibilidad . presupuestal para respaldar el siguiente compromiso:


ADICION AL CONTRATO No. COP-001-2024 CUYO OBJETO ES "BAJO MODALIDAD LLAVE EN MANO DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GUAPI DEPARTAMENTO DEL CAUCA".

Codigo del Rubro	Codigo del Rubro	Valor Rubro	
2-16-1-0-0-0-ENTIDAD-0	GASTOS	$910.000.000,00	☐
2.3-16-1-0-0-0-ENTIDAD-0	INVERSION	$910.000.000,00	☐
2.3.2-16-1-0-0-0-ENTIDAD-0	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	$910.000.000,00	☐
2.3.2.01-16-1-0-0-0-ENTIDAD-0	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	$910.000.000,00	☐
2.3.2.01.01-16-1-0-0-0-ENTIDAD-0	ACTIVOS FIJOS	$910.000.000,00	☐
2.3.2.01.01.001-16-1-0-0-0-ENTIDAD-0	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	$910.000.000,00	☐
2.3.2.01.01.001.02-16-1-0-0-0-ENTIDAD-0	EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS	$910.000.000,00	☐
2.3.2.01.01.001.02.14-459900900-1000-16-1-1.2.4.3.03-1-Actual-ENTIDAD-1	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	$910.000.000,00	☑

CCPET: 2.3.2.01.01.001.02.14-OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES UNIDAD EJECUTORA: 16-1-ET - ADMINISTRACION CENTRAL FUENTE FINANC: 1.3.3.8.03-R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION SECTOR: 45-GOBIERNO TERRITORIAL PROGRAMA: 4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial SUBPROGRAMA: 1000-Intersubsectorial Gobierno PRODUCTO: 4599009-Sedes construidas INDICADOR 459900900-Sedes construidas CPC DANE: NA-NO APLICA BPIN: 202500000008262

Codigo del Rubro	Codigo del Rubro	Valor Rubro
	Valor Total Disponibilidad	**$910.000.000,00**

Los actos administrativos que autorizan el gasto deben expresar claramente el número de este Certificado de Disponibilidad indicando el nombre y código presupuestal



WILSON QUIÑONES
Jefe de Presupuesto €
