BITACORA DE OBRA

DATOS DE LA OBRA

Nombre de la obra	ADECUACION SERVICIO SUMINISTRO ARCHIVO Y FARMACIA DE LA E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES.		
Localización	E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES		
Fecha programada de inicio	28/02/2025	**Fecha real de inicio**	3/03/2025
Fecha programada finalización	28/05/2025	**Fecha real de finalización**	13/08/2025

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombre o razón social	CONSTRUCTORA LDG 360 S.A.S
NIT	901912259-2
Domicilio	CALLE 11 #28-43
Teléfono	3132001703

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

Fecha	Actividades realizadas	Registro fotográfico y bosquejos	Firma responsable
03/03/2025	Demolición de muro divisorio en el segundo nivel, destinado para la ubicación del archivo histórico.	 	Firma de contratista: Firma de supervisor:
04/03/2025	Instalación de estructura metálica con perfiles tipo omega y viguetas para el montaje del cielo raso en el segundo nivel, destinado al archivo histórico.	 	Firma de contratista: Firma de supervisor:
05/03/2025	Instalación de estructura metálica con perfiles tipo omega y viguetas para el montaje del cielo raso en el segundo nivel, destinado al archivo histórico.		Firma de contratista: Firma de supervisor:
06/03/2025	Demolición de cárcamos en concreto ciclópeo utilizando martillo neumático.	 	Firma de contratista:
07/03/2025	Demolición de cárcamos en concreto ciclópeo con martillo neumático. Instalación de aislante térmico y acústico frescasa y de láminas para cielo raso en drywall.	   	Firma de contratista: Firma de supervisor:
08/03/2025	Continuación de la demolición de cárcamos en concreto ciclópeo. Instalación del cielo raso.	  	Firma de contratista: Firma de supervisor:

BITACORA DE OBRA

DATOS DE LA OBRA

Nombre de la obra	ADECUACION SERVICIO SUMINISTRO ARCHIVO Y FARMACIA DE LA E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES.		
Localización	E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES		
Fecha programada de inicio	28/02/2025	**Fecha real de inicio**	3/03/2025
Fecha programada finalización	28/05/2025	**Fecha real de finalización**	13/08/2025

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombre o razón social	CONSTRUCTORA LDG 360 S.A.S
NIT	901912259-2
Domicilio	CALLE 11 #28-43
Teléfono	3132001703

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

Fecha	Actividades realizadas	Registro fotográfico y bosquejos	Firma responsable
10/03/2025	Retiro de escombros de los cárcamos previamente demolidos, garantizando la limpieza del área. Excavación para el desmontaje y retiro de un gato hidráulico para vehículos.	 	Firma de contratista: Firma de supervisor:
11/03/2025	Excavación y retiro de material para la extracción del gato hidráulico, asegurando un acceso adecuado al equipo. Recolección y disposición de escombros para mantener el área despejada. Aplicación de masilla en varias capas sobre el cielo raso en drywall, con lijado entre cada aplicación para un acabado liso. Trazado de ejes para la correcta ubicación de la cimentación.	    	Firma de contratista: Firma de supervisor:
12/03/2025	Delimitación del área y corte del perímetro con pulidora para la ubicación de las zapatas. Excavación con martillo neumático para el retiro de capa de concreto existente. Excavación manual para cimentación. Remoción del material excavado. Armado de acero para las zapatas. Cielo raso en drywall.	      	Firma de contratista: Firma de supervisor:
13/03/2025	Excavación con martillo neumático para el retiro de capa de concreto existente. Excavación manual para cimentación. Armado de acero para zapatas. Armado de acero para columnas.	   	Firma de contratista: Firma de supervisor:
14/03/2025	Delimitación del área de vigas de cimentación, para su posterior corte con pulidora. Excavaciones con martillo neumático para retirar la capa de concreto. Excavación manual para cimentación. Armado de acero para las columnas.	   	Firma de contratista: Firma de supervisor:
15/03/2025	Excavaciones con martillo neumático para retiro de capa de concreto. Excavación manual para cimentación. Armado de acero para las columnas. Demolición de muro divisorio para el retiro de cajas que se encuentran en la bodega.	   	Firma de contratista: Firma de supervisor:

BITACORA DE OBRA


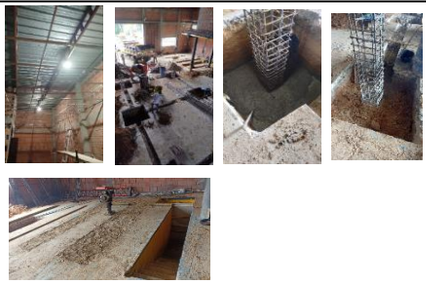
DATOS DE LA OBRA

Nombre de la obra	ADECUACION SERVICIO SUMINISTRO ARCHIVO Y FARMACIA DE LA E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES.		
Localización	E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES		
Fecha programada de inicio	28/02/2025	**Fecha real de inicio**	3/03/2025
Fecha programada finalización	28/05/2025	**Fecha real de finalización**	13/08/2025

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombre o razón social	CONSTRUCTORA LDG 360 S.A.S
NIT	901912259-2
Domicilio	CALLE 11 #28-43
Teléfono	3132001703

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

Fecha	Actividades realizadas	Registro fotográfico y bosquejos	Firma responsable
17/03/2025	Demolición de muro divisorio(19m2). Armado de acero para columnas. Excavaciones con martillo neumático para retirar la capa de concreto. Excavación manual para cimentación.		Firma de contratista: Firma de supervisor:
18/03/2025	Excavación manual y con martillo neumático debido a que en la excavación se ha evidenciado presencia de rocas. Colocación de parrilla de acero en la zapata y anclaje de la estructura metálica de la columna, garantizando nivelación, alineación y fijación. Vaciado de concreto en zapata.		Firma de contratista: Firma de supervisor:
19/03/2025	Excavación manual y con martillo neumático debido a que en la excavación se ha evidenciado presencia de rocas. Colocación de parrilla de acero en la zapata y anclaje de la estructura metálica de la columna, garantizando nivelación, alineación y fijación. Vaciado de concreto en zapata. Armado de formaleta y vaciado de concreto para pedestal Instalación de cielo raso en drywall Retiro de escombros y material excavado.		Firma de contratista: Firma de supervisor:
20/03/2025	Excavación manual y con martillo neumático debido a que en la excavación se ha evidenciado presencia de rocas. Relleno y compactación de huecos existentes en la estructura actual con rana vibro compactadora. Colocación de parrilla de acero en la zapata y anclaje de la estructura metálica de la columna, garantizando nivelación, alineación y fijación. Vaciado de concreto en zapata. Encofrado y vaciado de concreto para pedestal		Firma de contratista: Firma de supervisor:
21/03/2025	Desmonte de estructura existente de cielo raso. Relleno con material seleccionado de unos vacíos de la estructura actual. Relleno con material seleccionado para llegar al nivel de los pedestales. Trazado de ejes para cimentación del área 1. Delimitación del perímetro de las zapatas. Vaciado de concreto para zapatas.		Firma de contratista: Firma de supervisor:
22/03/2025	Excavación con martillo neumático para retirar capa de concreto en el área 1. Excavación manual de vigas y zapatas. Encofrado y vaciado de concreto para pedestal.		Firma de contratista: Firma de supervisor:

BITACORA DE OBRA


DATOS DE LA OBRA

Nombre de la obra	ADECUACION SERVICIO SUMINISTRO ARCHIVO Y FARMACIA DE LA E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES.		
Localización	E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES		
Fecha programada de inicio	28/02/2025	**Fecha real de inicio**	3/03/2025
Fecha programada finalización	28/05/2025	**Fecha real de finalización**	13/08/2025

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombre o razón social	CONSTRUCTORA LDG 360 S.A.S
NIT	901912259-2
Domicilio	CALLE 11 #28-43
Teléfono	3132001703

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

Fecha	Actividades realizadas	Registro fotográfico y bosquejos	Firma responsable
24/03/2025	Armado de acero para las columnas. -Excavación manual de vigas de cimentación N+0.00. Excavación con martillo neumático para retirar la capa de concreto en la zona donde se ubicaran las zapatas del área 1. Armado de acero para vigas de cimentación nivel N+0.00. Vaciado y fundido de zapatas del área 1.		Firma de contratista: Firma de supervisor:
25/03/2025	Armado y colocación del acero de refuerzo para vigas de cimentación en el nivel N+0.00 Encofrado con formaletas metálicas para pedestales de zapatas del área 1. Reposición de filtros existentes. Excavación manual en vigas de cimentación.		Firma de contratista: Firma de supervisor:
26/03/2025	Armado y colocación del acero de refuerzo para vigas de cimentación en el nivel N+0.00 Encofrado con formaletas metálicas para pedestales de zapatas del área 1. Reposición de filtros existentes. Excavación manual en vigas de cimentación.		Firma de contratista: Firma de supervisor:
27/03/2025	Armado y colocación del acero de refuerzo para vigas de cimentación en el nivel N+0.00 Encofrado con formaletas metálicas para pedestales de zapatas del área 1. Vaciado de concreto en pedestales del área 1. Relleno y compactación en zapatas. Excavación manual en vigas de cimentación.		Firma de contratista: Firma de supervisor:
28/03/2025	Relleno, compactación y nivelación en las zapatas. vaciado de concreto para vigas de cimentación. Excavación con martillo neumático para instalación de tuberías. Armado y colocación del acero de refuerzo para vigas de cimentación en el nivel N+0.00 Encofrado de vigas de cimentación.		Firma de contratista: Firma de supervisor:
29/03/2025	Armado de formaleta para vigas Vaciado de concreto en vigas de cimentación. Armado de acero para columnas. Relleno y compactación.		Firma de contratista: Firma de supervisor:

BITACORA DE OBRA

DATOS DE LA OBRA

Nombre de la obra	ADECUACION SERVICIO SUMINISTRO ARCHIVO Y FARMACIA DE LA E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES.		
Localización	E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES		
Fecha programada de inicio	28/02/2025	**Fecha real de inicio**	3/03/2025
Fecha programada finalización	28/05/2025	**Fecha real de finalización**	13/08/2025

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombre o razón social	CONSTRUCTORA LDG 360 S.A.S
NIT	901912259-2
Domicilio	CALLE 11 #28-43
Teléfono	3132001703

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

Fecha	Actividades realizadas	Registro fotográfico y bosquejos	Firma responsable
31/03/2025	Perforación para incrustar anclajes de vigas. Armado de acero para columnas		Firma de contratista: Firma de supervisor:
01/04/2025	Encofrado con formaletas metálicas para columnas. Realización de viga divisoria para relleno, compactación y nivelación del terreno Armado de acero en columnas del área 1		Firma de contratista: Firma de supervisor:
02/04/2025	Vaciado de concreto para fundida de columnas. Realización de viga para relleno, compactación y nivelación del terreno. Relleno, compactación y nivelación del terreno.		Firma de contratista: Firma de supervisor:
03/04/2025	Relleno, compactación y nivelación del terreno. Desencofrado de formaletas en columnas		Firma de contratista: Firma de supervisor:
04/04/2025	Relleno, compactación y nivelación del terreno. Vaciado de concreto en vigas de cimentación del área 1.		Firma de contratista: Firma de supervisor:
05/04/2025	Encofrado para vigas de cimentación. Vaciado de concreto en vigas de cimentación.		Firma de contratista: Firma de supervisor:

BITACORA DE OBRA

DATOS DE LA OBRA

Nombre de la obra	ADECUACION SERVICIO SUMINISTRO ARCHIVO Y FARMACIA DE LA E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES.		
Localización	E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES		
Fecha programada de inicio	28/02/2025	**Fecha real de inicio**	3/03/2025
Fecha programada finalización	28/05/2025	**Fecha real de finalización**	13/08/2025

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombre o razón social	CONSTRUCTORA LDG 360 S.A.S
NIT	901912259-2
Domicilio	CALLE 11 #28-43
Teléfono	3132001703

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

Fecha	Actividades realizadas	Registro fotográfico y bosquejos	Firma responsable
07/04/2025	Retiro de escombros. Vaciado de concreto en vigas de cimentación.		Firma de contratista: Firma de supervisor:
08/04/2025	Encofrado con formaletas metálicas para columnas. Viaje de material. Vaciado de concreto para columnas del área 1.		Firma de contratista: Firma de supervisor:
09/04/2025	Vaciado de concreto en columnas. Armado de formaletas para columnas.		Firma de contratista: Firma de supervisor:
10/04/2025	Relleno, compactación y nivelación. Demolición de escaleras existentes. Instalaciones hidráulicas.		Firma de contratista: Firma de supervisor:
11/04/2025	Aplicación de pañete en muros. Armado de acero para columnas.		Firma de contratista: Firma de supervisor:
12/04/2025	Aplicación de pañete en muros. Demolición de escaleras.		Firma de contratista: Firma de supervisor:

BITACORA DE OBRA

DATOS DE LA OBRA

Nombre de la obra	ADECUACION SERVICIO SUMINISTRO ARCHIVO Y FARMACIA DE LA E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES.		
Localización	E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES		
Fecha programada de inicio	28/02/2025	**Fecha real de inicio**	3/03/2025
Fecha programada finalización	28/05/2025	**Fecha real de finalización**	13/08/2025

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombre o razón social	CONSTRUCTORA LDG 360 S.A.S
NIT	901912259-2
Domicilio	CALLE 11 #28-43
Teléfono	3132001703

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

Fecha	Actividades realizadas	Registro fotográfico y bosquejos	Firma responsable
14/04/2025	Armado de acero para vigas de entrepiso.	 	Firma de contratista: Firma de supervisor:
15/04/2025	Armado de acero para vigas de entrepiso. Relleno, compactación y nivelación del terreno.	 	Firma de contratista: Firma de supervisor:
16/04/2025	Armado de acero y colocación para vigas de entrepiso	  	Firma de contratista: Firma de supervisor:
17/04/2025	JUEVES SANTO		
18/04/2025	VIERNES SANTO		
19/04/2025	VIERNES SANTO		

BITACORA DE OBRA

DATOS DE LA OBRA

Nombre de la obra	ADECUACION SERVICIO SUMINISTRO ARCHIVO Y FARMACIA DE LA E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES.		
Localización	E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES		
Fecha programada de inicio	28/02/2025	**Fecha real de inicio**	3/03/2025
Fecha programada finalización	28/05/2025	**Fecha real de finalización**	13/08/2025

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombre o razón social	CONSTRUCTORA LDG 360 S.A.S
NIT	901912259-2
Domicilio	CALLE 11 #28-43
Teléfono	3132001703

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

Fecha	Actividades realizadas	Registro fotográfico y bosquejos	Firma responsable
21/04/2025	Encofrado con formaleta metálica para pedestales del área 7. Relleno y compactación del terreno en el área 7. Pañete de muro. Armado y colocación de vigas de entrepiso Delimitación y corte de piso en concreto para vigas de cimentación nivel N+0.00.		Firma de contratista: Firma de supervisor:
22/04/2025	Armado y colocación de vigas de entrepiso. Armado y colocación de acero para columnas del área 7. Adecuación de punto sanitario existente.		Firma de contratista: Firma de supervisor:
23/04/2025	Realización de formaletas de madera para vigas de entrepiso. Retiro de escombros. Colocado y armado de acero de vigas de entrepiso del N+4.00. Instalación de vigas de cimentación. "		Firma de contratista: Firma de supervisor:
24/04/2025	Encofrado para vigas de entrepiso N+4.00 m. Apertura de orificios e instalación de lámparas		Firma de contratista: Firma de supervisor:
25/04/2025	Encofrado y vaciado de concreto para vigas del nivel N+4.00 m Armado de acero para vigas de entrepiso		Firma de contratista: Firma de supervisor:
26/04/2025	Encofrado y vaciado de concreto para vigas del nivel N+4.00 m Armado de acero para vigas de entrepiso		Firma de contratista: Firma de supervisor:

BITACORA DE OBRA


DATOS DE LA OBRA

Nombre de la obra	ADECUACION SERVICIO SUMINISTRO ARCHIVO Y FARMACIA DE LA E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES.		
Localización	E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES		
Fecha programada de inicio	28/02/2025	**Fecha real de inicio**	3/03/2025
Fecha programada finalización	28/05/2025	**Fecha real de finalización**	13/08/2025

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombre o razón social	CONSTRUCTORA LDG 360 S.A.S
NIT	901912259-2
Domicilio	CALLE 11 #28-43
Teléfono	3132001703

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

Fecha	Actividades realizadas	Registro fotográfico y bosquejos	Firma responsable
28/04/2025	Armado de acero para vigas de entrepiso Instalación de rieles metálicos tipo C		Firma de contratista: Firma de supervisor:
29/04/2025	Instalación de rieles metálicos tipo C Armado de acero para las vigas de entrepiso del nivel N+4.00		Firma de contratista: Firma de supervisor:
30/04/2025	Vaciado de concreto para vigas de entrepiso		Firma de contratista: Firma de supervisor:
01/05/2025	Desencofrado de vigas de entrepiso Instalación de puntos sanitarios 2"-4" Realización de caja de recolección para el desagüe de agua residual de los nuevos puntos sanitarios		Firma de contratista: Firma de supervisor:
02/05/2025	Desmonte de combo sanitario Armado y colocación de acero para vigas de entrepiso nivel N+4.00 m Instalación de lámparas led 24"		Firma de contratista: Firma de supervisor:
03/05/2025	Vaciado de concreto para vigas de entrepiso		Firma de contratista: Firma de supervisor:

BITACORA DE OBRA

DATOS DE LA OBRA

Nombre de la obra	ADECUACION SERVICIO SUMINISTRO ARCHIVO Y FARMACIA DE LA E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES.		
Localización	E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES		
Fecha programada de inicio	28/02/2025	**Fecha real de inicio**	3/03/2025
Fecha programada finalización	28/05/2025	**Fecha real de finalización**	13/08/2025

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombre o razón social	CONSTRUCTORA LDG 360 S.A.S
NIT	901912259-2
Domicilio	CALLE 11 #28-43
Teléfono	3132001703

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

Fecha	Actividades realizadas	Registro fotográfico y bosquejos	Firma responsable
05/05/2025	Armado de acero para vigas de entrepiso Desencofrado de vigas de entrepiso		Firma de contratista: Firma de supervisor:
06/05/2025	Instalación de laminas de metaldeck para la posterior fundida de losa Retiro de escombros Encofrado para vigas de entrepiso		Firma de contratista: Firma de supervisor:
07/05/2025	Instalación de laminas de metaldeck para la posterior fundida de losa Construcción de muros divisorios		Firma de contratista: Firma de supervisor:
08/05/2025	Instalación de laminas de metaldeck para la posterior fundida de la losa Armado de acero para las vigas de entrepiso Construcción de muros divisorios		Firma de contratista: Firma de supervisor:
09/05/2025	Construcción de muros divisorios Instalación de laminas de metaldeck para la posterior fundida de la losa Vaciado de concreto para vigas de entrepiso		Firma de contratista: Firma de supervisor:
10/05/2025	Construcción de muros divisorios Instalación de laminas de metaldeck para la posterior fundida de la losa del área 1 Vaciado de concreto para vigas de entrepiso		Firma de contratista: Firma de supervisor:

BITACORA DE OBRA


DATOS DE LA OBRA

Nombre de la obra	ADECUACION SERVICIO SUMINISTRO ARCHIVO Y FARMACIA DE LA E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES.		
Localización	E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES		
Fecha programada de inicio	28/02/2025	**Fecha real de inicio**	3/03/2025
Fecha programada finalización	28/05/2025	**Fecha real de finalización**	13/08/2025

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombre o razón social	CONSTRUCTORA LDG 360 S.A.S
NIT	901912259-2
Domicilio	CALLE 11 #28-43
Teléfono	3132001703

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

Fecha	Actividades realizadas	Registro fotográfico y bosquejos	Firma responsable
12/05/2025	Construcción de muros divisorios	 	Firma de contratista: Firma de supervisor:
13/05/2025	Fundida de losa de entrepiso N+4.00m del área 1	       	Firma de contratista: Firma de supervisor:
14/05/2025	Construcción de muros divisorios. Instalación de láminas de metaldeck para la posterior fundida de losa del área 2. Encofrado con formaletas de madera para vigas de entrepiso nivel +4.00m área 2. Vaciado de concreto para vigas de entrepiso del nivel +4.00m.	    	Firma de contratista: Firma de supervisor:
15/05/2025	Encofrado con formaletas de madera para vigas de entrepiso nivel +4.00m área 2. Vaciado de concreto para vigas de entrepiso del nivel +4.00m.		Firma de contratista: Firma de supervisor:
16/05/2025	Vaciado de concreto para vigas de entrepiso del nivel +4.00m.		Firma de contratista: Firma de supervisor:
17/05/2025	Construcción de muros en ladrillo h10		Firma de contratista: Firma de supervisor:

BITACORA DE OBRA


DATOS DE LA OBRA

Nombre de la obra	ADECUACION SERVICIO SUMINISTRO ARCHIVO Y FARMACIA DE LA E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES.		
Localización	E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES		
Fecha programada de inicio	28/02/2025	**Fecha real de inicio**	3/03/2025
Fecha programada finalización	28/05/2025	**Fecha real de finalización**	13/08/2025

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombre o razón social	CONSTRUCTORA LDG 360 S.A.S
NIT	901912259-2
Domicilio	CALLE 11 #28-43
Teléfono	3132001703

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

Fecha	Actividades realizadas	Registro fotográfico y bosquejos	Firma responsable
19/05/2025	Construcción de muros divisorios.	 	Firma de contratista:  Firma de supervisor: 
20/05/2025	Construcción de muros divisorios. Fundida de losa de entrepiso área 2 N+4.00m	  	Firma de contratista:  Firma de supervisor: 
21/05/2025	Armado de acero para escaleras. Construcción de muros divisorios. Suministro e instalación de toma corriente doble 110V Instalación de tableta de Gress 30x30 CM	    	Firma de contratista:  Firma de supervisor: 
22/05/2025	Armado de acero para escaleras. Construcción de muros divisorios. Suministro e instalación de toma corriente doble 110V Instalación de tableta de Gress 30x30 CM. Relleno y compactación del terreno.	      	Firma de contratista:  Firma de supervisor:
23/05/2025	Armado de acero para escaleras. Construcción de muros divisorios. Instalación de tableta de Gress 30x30 CM. Encofrado para el posterior vaciado de concreto en las escaleras.	  	Firma de contratista:  Firma de supervisor: 
24/05/2025	Pañete para muros. Construcción de muros divisorios. Vaciado de concreto para escaleras.	  	Firma de contratista:  Firma de supervisor: 

BITACORA DE OBRA


DATOS DE LA OBRA

Nombre de la obra	ADECUACION SERVICIO SUMINISTRO ARCHIVO Y FARMACIA DE LA E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES.		
Localización	E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES		
Fecha programada de inicio	28/02/2025	**Fecha real de inicio**	3/03/2025
Fecha programada finalización	28/05/2025	**Fecha real de finalización**	13/08/2025

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombre o razón social	CONSTRUCTORA LDG 360 S.A.S
NIT	901912259-2
Domicilio	CALLE 11 #28-43
Teléfono	3132001703

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

Fecha	Actividades realizadas	Registro fotográfico y bosquejos	Firma responsable
26/05/2025	Aplicación de pañete para muros. Construcción de muros divisorios.	 	Firma de contratista: Firma de supervisor:
27/05/2025	Construcción de muro divisorios. Instalación de tableta de Gress 30x30cm.	  	Firma de contratista: Firma de supervisor:
28/05/2025	Construcción de muros divisorios. Aplicación de pañete para muros. Apertura de regatas para instalación de redes eléctricas.	  	Firma de contratista: Firma de supervisor:
29/05/2025	Realización de regata para la instalación del tablero trifásico. Construcción de muros divisorios. Aplicación de pañete para muros.	 	Firma de contratista: Firma de supervisor:
30/05/2025	Construcción de muros divisorios. Armado de acero para columnetas.	 	Firma de contratista: Firma de supervisor:
31/05/2025	Aplicación de pañete para muros divisorios.	 	Firma de contratista: Firma de supervisor:

BITACORA DE OBRA



DATOS DE LA OBRA

Nombre de la obra	ADECUACION SERVICIO SUMINISTRO ARCHIVO Y FARMACIA DE LA E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CANIZARES.		
Localización	E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CANIZARES		
Fecha programada de inicio	28/02/2025	**Fecha real de inicio**	3/03/2025
Fecha programada finalización	28/05/2025	**Fecha real de finalización**	13/08/2025

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombre o razón social	CONSTRUCTORA LDG 360 S.A.S
NIT	901912259-2
Domicilio	CALLE 11 #28-43
Teléfono	3132001703

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

Fecha	Actividades realizadas	Registro fotográfico y bosquejos	Firma responsable
02/06/2025	Aplicación de estuco en muros. Instalación de estructura metálica para cielo raso en PVC. Construcción de muros divisorios.	   	Firma de contratista: Firma de supervisor:
03/06/2025	Aplicación de estuco en muros. Instalación de estructura metálica para cielo raso en PVC. Construcción de muros divisorios. Instalación de tableta de Gress 30x30 CM.	  	Firma de contratista: Firma de supervisor:
04/06/2025	Aplicación de estuco en muros. Instalación de estructura metálica para cielo raso en PVC.	 	Firma de contratista: Firma de supervisor:
05/06/2025	Aplicación de pañete en muros. Estuco para muros. Instalación de estructura metálica para cielo raso en PVC.	   	Firma de contratista: Firma de supervisor:
06/06/2025	Construcción de muros divisorios. Aplicación de estuco para muros.	 	Firma de contratista: Firma de supervisor:
07/06/2025	Instalación de puntos sanitarios 2"-4" Construcción de muros divisorios.	  	Firma de contratista: Firma de supervisor:

BITACORA DE OBRA

DATOS DE LA OBRA

Nombre de la obra	ADECUACION SERVICIO SUMINISTRO ARCHIVO Y FARMACIA DE LA E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES.		
Localización	E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES		
Fecha programada de inicio	28/02/2025	**Fecha real de inicio**	3/03/2025
Fecha programada finalización	28/05/2025	**Fecha real de finalización**	13/08/2025

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombre o razón social	CONSTRUCTORA LDG 360 S.A.S
NIT	901912259-2
Domicilio	CALLE 11 #28-43
Teléfono	3132001703

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

Fecha	Actividades realizadas	Registro fotográfico y bosquejos	Firma responsable
09/06/2025	Instalación de estructura metálica para cielo raso en drywall. Instalación de puntos sanitarios de 2"-4".	 	Firma de contratista: Firma de supervisor:
10/06/2025	Instalación de estructura metálica para cielo raso en drywall.		Firma de contratista: Firma de supervisor:
11/06/2025	Realización de caja de inspección para el desagüe de aguas residuales.		Firma de contratista: Firma de supervisor:
12/06/2025	Instalación de estructura metálica para cielo raso en drywall. Realización de caja de inspección para el desagüe de aguas residuales. Instalación de tuberías para redes eléctricas.	   	Firma de contratista: Firma de supervisor:
13/06/2025	Instalación de cielo raso en drywall. Ante piso e:5cm.	 	Firma de contratista: Firma de supervisor:
14/06/2025	Aplicación de ante piso e:5cm Instalación de cielo raso en drywall.	  	Firma de contratista: Firma de supervisor:

BITACORA DE OBRA

DATOS DE LA OBRA

Nombre de la obra	ADECUACION SERVICIO SUMINISTRO ARCHIVO Y FARMACIA DE LA E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES.		
Localización	E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES		
Fecha programada de inicio	28/02/2025	**Fecha real de inicio**	3/03/2025
Fecha programada finalización	28/05/2025	**Fecha real de finalización**	13/08/2025

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombre o razón social	CONSTRUCTORA LDG 360 S.A.S
NIT	901912259-2
Domicilio	CALLE 11 #28-43
Teléfono	3132001703

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

Fecha	Actividades realizadas	Registro fotográfico y bosquejos	Firma responsable
16/06/2025	Instalación de cielo raso en drywall. Aplicación de resane y estuco en muros.	  	Firma de contratista: Firma de supervisor:
17/06/2025	Relleno compactación y nivelación del terreno.	 	Firma de contratista: Firma de supervisor:
18/06/2025	Relleno compactación y nivelación del terreno.	 	Firma de contratista: Firma de supervisor:
19/06/2025	Instalación de cielo raso en drywall. Instalación de tuberías para redes eléctricas. Ante piso e:5cm	   	Firma de contratista: Firma de supervisor:
20/06/2025	Instalación de cerámica en las escaleras. Aplicación de barniz para muros.	 	Firma de contratista: Firma de supervisor:
21/06/2025	Aplicación de barniz en los muros. Apertura de regatas para instalación de tubería de aire acondicionado. Instalación de cerámica.	    	Firma de contratista: Firma de supervisor:

BITACORA DE OBRA

DATOS DE LA OBRA

Nombre de la obra	ADECUACION SERVICIO SUMINISTRO ARCHIVO Y FARMACIA DE LA E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES.		
Localización	E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES		
Fecha programada de inicio	28/02/2025	**Fecha real de inicio**	3/03/2025
Fecha programada finalización	28/05/2025	**Fecha real de finalización**	13/08/2025

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombre o razón social	CONSTRUCTORA LDG 360 S.A.S
NIT	901912259-2
Domicilio	CALLE 11 #28-43
Teléfono	3132001703

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

Fecha	Actividades realizadas	Registro fotográfico y bosquejos	Firma responsable
23/06/2025	Instalación de cerámica. Ante piso e:5cm Instalación de tubería para aire acondicionado.	  	Firma de contratista: Firma de supervisor:
24/06/2025	Instalación de cerámica. Ante piso e:5cm.	 	Firma de contratista: Firma de supervisor:
25/06/2025	Resane y estuco. Instalación de lámparas led. Enchape en los baños.	  	Firma de contratista: Firma de supervisor:
26/06/2025	Piso requemado. Instalación de lámparas led. Instalación de cielo raso en PVC.	   	Firma de contratista: Firma de supervisor:
27/06/2025	Piso requemado. Aplicación de pañete en muros. Ante piso e:5cm.	  	Firma de contratista: Firma de supervisor:
28/06/2025	Realización de caja de inspección. Instalación de tableta de Gress. Aplicación de pañete en muros. Ante piso e:5cm.	   	Firma de contratista: Firma de supervisor:

BITACORA DE OBRA





DATOS DE LA OBRA

Nombre de la obra	ADECUACION SERVICIO SUMINISTRO ARCHIVO Y FARMACIA DE LA E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES.		
Localización	E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES		
Fecha programada de inicio	28/02/2025	**Fecha real de inicio**	3/03/2025
Fecha programada finalización	28/05/2025	**Fecha real de finalización**	13/08/2025

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombre o razón social	CONSTRUCTORA LDG 360 S.A.S
NIT	901912259-2
Domicilio	CALLE 11 #28-43
Teléfono	3132001703

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

Fecha	Actividades realizadas	Registro fotográfico y bosquejos	Firma responsable
30/06/2025	Ante piso e:5cm. Aplicación de estuco en muros. Instalación de cerámica.	  	Firma de contratista: Firma de supervisor:
01/07/2025	Reparación y pintura de marcos de puertas y ventanas. Ante piso e:5cm. Instalación de cielo raso en PVC. Apertura de regatas para tuberías eléctricas.	   	Firma de contratista: Firma de supervisor:
02/07/2025	Instalación de cerámica. Instalación de estructura metálica para cielo raso. Instalación de cielo raso en drywall.	  	Firma de contratista: Firma de supervisor:
03/07/2025	Aplicación de pintura de alta asepsia en muros. Instalación de cielo raso en drywall. Instalación de cerámica.	  	Firma de contratista: Firma de supervisor:
04/07/2025	Cielo raso en PVC. Piso requemado. Instalación de estructura metálica para cielo raso.	  	Firma de contratista: Firma de supervisor:
05/07/2025	Instalación de tablero trifásico con puerta de 12 circuitos. Instalación de puerta metálica. Instalación de combos sanitarios. Instalación de tablero monofásico con puerta 6 circuitos 75A. Instalación de breaker industrial trifásico CHINT 150A.	    	Firma de contratista: Firma de supervisor:

BITACORA DE OBRA





DATOS DE LA OBRA

Nombre de la obra	ADECUACION SERVICIO SUMINISTRO ARCHIVO Y FARMACIA DE LA E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES.		
Localización	E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES		
Fecha programada de inicio	28/02/2025	**Fecha real de inicio**	3/03/2025
Fecha programada finalización	28/05/2025	**Fecha real de finalización**	13/08/2025

DATOSDEL CONTRATISTA

Nombre o razón social	CONSTRUCTORA LDG 360 S.A.S
NIT	901912259-2
Domicilio	CALLE 11 #28-43
Teléfono	3132001703

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

Fecha	Actividades realizadas	Registro fotográfico y bosquejos	Firma responsable
07/07/2025	Instalación de combos sanitarios. Piso requemado.	  	Firma de contratista: Firma de supervisor:
08/07/2025	Aplicación de pintura de alta asepsia en los muros. Aseo y limpieza. Reparación y pintura de marcos de puertas y ventanas.	  	Firma de contratista: Firma de supervisor:
09/07/2025	Aplicación de pintura alta asepsia en los muros. Piso requemado. Aplicación de barniz para muros.	   	Firma de contratista: Firma de supervisor:
10/07/2025	Instalación de rejilla de ventilación. Instalación de toma corriente doble 110V. Salida para teléfono. Salida para red de datos.	   	Firma de contratista: Firma de supervisor:
11/07/2025	Instalación de baranda en acero. Aplicación de pintura de alta asepsia para muros.	  	Firma de contratista: Firma de supervisor:
12/07/2025	Se realizó un aseo y limpieza general y adecuaciones finales.	  	Firma de contratista: Firma de supervisor:
