FUVDAMIS
FUNDACION VIDA DIGNA Y DESARROLLO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE

NIT. **900. 450.733-5**

INFORME DE AVANCE MENSUAL SEIS (6).

PERIODO INFORMADO 01/04/2025 - 30/04/2025.





Contratante: **GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA**

Contratista: **FUNDACION VIDA DIGNA Y DESARROLLO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE "FUVDAMIS"**

MAYO DE 2025.

C L 25 4 F 21 BRR CANDELARIA SUR.
TELEFONO: (57) 581 2856 - CELULAR: 314 532 8821-3004004573
E-MAIL: fuvdamis@hotmail.com
Valledupar-CESAR

FUVDAMIS
FUNDACION VIDA DIGNA Y DESARROLLO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE

NIT. **900. 450.733-5**

GENERALIDADES.

CONTRATO No.	CE-SGE-0020-2024 - CO1.PCCNTR.7030654.
FECHA.	15 de noviembre de 2024.
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.	Proceso competitivo
CLASE DE CONTRATO.	Convenio.
CONTRATISTA.	**FUNDACION VIDA DIGNA Y DESARROLLO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE "FUVDAMIS".** R.L: RUBEN ESTRADA GAMEZ.
NIT.	**900. 450.733-5**
SUPERVISOR.	**ALFRED HUDGSON MARTINEZ –** Secretario de Servicios públicos y Medio Ambiente.
OBJETO DEL CONTRATO.	AUNAR RECURSOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, HUMANOS Y FINANCIEROS PARA FORTALECER LA RESILIENCIA CLIMTICA, LA BIODIVERSIDAD, Y EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES VEGETALES Y LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE EN LA ISLA DE SAN ANDRES.
ACTIVIDADES.	• Instalación de macetas artísticas y ecológicas. • Establecimiento de frutales. • Limpieza y embellecimiento. • Talleres de educación ambiental.
VALOR DEL CONTRATO.	SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS ($751.103.800) MCTE.
FORMA DE PAGO.	El Departamento desembolsará el valor de su aporte de la siguiente forma: 1) Un primer desembolso por concepto de anticipo del VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del aporte de la Entidad estatal, por valor de CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS MICTE ($140.000.000) M/CTE, luego de firmar el acta de inicio y presentación del cronograma de trabajo. 2) El saldo, es decir, el OCHENTA POR CIENTO (80%), QUINIENTOS SESENTA

	MILLONES DE PESOS ($560.000.000) MCTE restantes se cancelará mediante actas parciales de ejecución, las cuales serán suscritas por el contratista y el supervisor, previa presentación de informes de cumplimiento de actividades, donde se evidencie el porcentaje de avance de las actividades objeto del contrato, así mismo, un informe financiero y contable, factura o cuenta de cobro, certificado a satisfacción expedido por el supervisor, y acreditación del pago de seguridad social y parafiscales. Los productos deberán entregarse con base en el cronograma aprobado por el supervisor del convenio una vez se suscriba la respectiva acta de inicio del convenio de asociación con ESAL.
LUGAR DE EJECUCIÓN.	Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN.	UN MES Y MEDIO (1,5 MESES).
PERIODO INFORMADO.	1/03/2025 - 31/03/2025.
FECHA DE INICIO.	19/11/2024.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL.	31/12/2024.
FECHA DE SUSPENSIÓN 1.	23/12/2024.
FECHA DE REINICIO.	23/01/2025.
FECHA DE TERMINACIÓN ANTERIOR.	31/01/2025.
FECHA DE PRORROGA 1.	31/01/2025.
FECHA DE TERMINACIÓN ANTERIOR.	20/02/2025.
FECHA DE PRORROGA 2.	20/02/2025.
FECHA DE TERMINACIÓN ANTERIOR.	07/03/2025.
FECHA DE PRORROGA 3.	07/03/2025.
FECHA DE TERMINACIÓN ANTERIOR.	07/04/2025.
FECHA PRORROGA 4.	04/04/2025.
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL.	07/06/2025.

ALCANCES DEL OBJETO DEL CONTRATO.

- Implementar estrategias innovadoras de arborización, con la utilización de macetas artísticas para el establecimiento de especies vegetales nativas y ornamentales, complementado con la siembra de árboles frutales en diferentes puntos de la isla (espacio público y zonas peatonales, plazoletas, instituciones educativas, parques, estadios, zonas con poca cobertura vegetal, degradadas o con riesgo de degradación, ecosistemas estratégicos, entre otros), con la finalidad permite la creación de corredores biológicos urbanos que funcionen como barreras vivas, las cuales, no solo pueden mitigar el impacto del viento y la erosión, sino que también contribuyen significativamente a la captura de gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos.

- Implementar un componente específico de limpieza y embellecimiento de zonas públicas, con énfasis en parques que presentan un estado de deterioro avanzado. Esta actividad se ejecutará a través de tres (3) jornadas intensivas que buscan transformar estos espacios en ambientes más saludables, atractivos y funcionales para la comunidad.

- Realizar talleres en temas relacionados con la conservación de especies vegetales nativas, restauración y protección de la biodiversidad local, y prácticas productivas sostenibles, que propicien conciencia ambiental; en aras de generar un empoderamiento de las comunidades, a través de las cuales se establezcan mecanismos sociales de participación, que propicien un manejo integral y sostenible de los recursos naturales, sin olvidar sus valores históricos, culturales, espirituales y ambientales, lo cual es fundamental para fortalecer la resiliencia climática.

ACTIVIDADES.

- Instalación de macetas artísticas y ecológicas.
- Establecimiento de frutales.
- Limpieza y embellecimiento.
- Talleres de educación ambiental.

ESPECIFICACIONES TECNICAS.

- Se deben instalar un total de **SESENTA (60) especies vegetales nativas**, con una altura mínima de 30 cm, en materas con un exterior decorado con arte (pinturas alusivas a la cultura y naturaleza de la isla), también se podrá vidrio y cerámica para su decoración. Las materas serán ubicadas en diferentes lugares de la isla: vías públicas, senderos peatonales, lugares turísticos, parques, plazoletas, instituciones públicas, estadios, etc., previa concertación con el supervisor del convenio. Las materas deben ser de un metro de alto, y un ancho de 0,7 por 0,7, de forma cilíndrica, elaboradas con ferrocemento (cemento y estructura en varillas milimétricas-tripa de pollo), botellas recicladas de vidrio junto con arena de rio, cenizas resultantes del proceso de incineración de residuos sólidos urbanos provenientes de la planta RSU.

- Se debe realizar el establecimiento de **cuarenta y cinco (45) árboles frutales**, de una altura mínima de 1,5 metros, en diferentes sectores de la Isla: espacio público, plazoletas, instituciones educativas, parques, estadios, zonas con poca cobertura vegetal, instituciones públicas, entre otros.

- Se deben implementar **3 jornadas de limpieza y embellecimiento de zonas públicas** de la Isla (parques).

- Se deben realizar **TRES (03) talleres de educación ambiental**, cada taller constará de dos (2) jornadas, una teórica y una práctica, de ocho horas cada una, cada jornada de 8 horas se trabajará un área curricular/modulo, las cuales deben ser definidas y diseñadas de acuerdo con la oferta ambiental de la región.

PRESUPUESTO DETALLADO DEL CONTRATO.

PRESUPUESTO GENERAL						Aporte Fundación
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor unitario**	**Valor total**	
2	Macetas Artísticas Ecológicas	Unidad	60	10.358.800	621.528.000	
3	Siembra de frutales	Unidad	45	60.662	2.729.782	
4	Limpieza y Embellecimiento	Unidad	3	17.034.600	51.103.800	51.103.800
5	Talleres de educación ambiental	Taller	3	25.247.406	75.742.218	
	COSTO TOTAL PROYECTO				**751.103.800**	**51.103.800**

GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA.

FUVDAMIS
FUNDACION VIDA DIGNA Y DESARROLLO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE

NIT. **900. 450.733-5**

Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO**		**Póliza No: 75-44-101141068**	
DESCRIPCION DEL RIESGO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**HASTA**
Cumplimiento del Contrato.	$ 150.220.760,00	15/11/2024	07/12/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.	$ 75.110.380,00	15/11/2024	07/06/2028
Calidad del servicio.	$ 150.220.760,00	15/11/2024	07/10/2025
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO**		**Póliza No: 75-40-101053252**	
DESCRIPCION DEL RIESGO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**HASTA**
Predios Laborales, y Operaciones	$ 260.000.000,00	15/11/2024	07/06/2025

FUENTES DE FINANCIACIÓN.

Las fuentes de financiación para el contrato de se dan a cargo al certificado de disponibilidad presupuestal, expedido por el coordinador del GIT para la gestión financiera de la Corporación, de la siguiente manera:

DESCRIPCION.	No	VALOR	DÍA	MES	AÑO
Certificado de disponibilidad presupuestal.	5287	$ 1.100.000,00	28	10	2024
Registro presupuestal.	5353				

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA.

Dirección oficina:	CL 25 4 F 21 BRR Candelaria Sur, Valledupar, Cesar.
Representante Legal:	RUBEN ESTRADA GAMEZ.
Municipio:	Valledupar – Cesar.
Página web – Correo electrónico:	fuvdamis@hotmail.com .

FUVDAMIS
FUNDACION VIDA DIGNA Y DESARROLLO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE

NIT. **900. 450.733-5**

Teléfonos:	5873576 - 3162453497.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO DE INFORME MENSUAL SEIS (6).

- **OBJETIVO DEL INFORME.**

Informar a la **GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA** el avance en el desarrollo del objeto contractual, en el periodo comprendido entre el 01/04/2025 y el 30/04/2025, correspondiente al informe de avance mensual SEIS (6) del **CONTRATO No. CE-SGE-0020-2024 - CO1.PCCNTR.7030654.**

- **INICIO DE ACTIVIDADES.**

El desarrollo del **CONTRATO** se inició mediante acta suscrita por los intervinientes el día diecinueve (19) de noviembre de 2024, por tanto, la **FUNDACION VIDA DIGNA Y DESARROLLO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE "FUVDAMIS",** en su condición de Contratista ha dado cabal cumplimiento a las especificaciones técnicas, alcance financiero y desarrollo administrativo del mismo con base en las condiciones contempladas en los documentos que sirvieron de fundamento jurídico al proceso de contratación que originó el contrato.

- **BALANCE DE ACTIVIDADES.**

La ejecución integral del contrato a la fecha del presente informe presenta un avance del **94,73%.**

1. ACTIVIDADES.

En el periodo de informe fueron llevados a cabo las actividades correspondientes a:

1.1. MACETAS ARTÍSTICAS ECOLÓGICAS.

La ejecución de esta actividad en el periodo de informe constó con las siguientes consideraciones:

- Se realizó la instalación específica de las macetas en los sitios seleccionados por la administración departamental, siendo transportadas y revisadas antes de ser instaladas.

Debido a las fechas de los permisos obtenidos, a final del periodo informado se realizó una total de **60 MACETAS ARTÍSTICAS ECOLÓGICAS INSTALADAS** y **25 FINALIZADAS** a conformidad por lo exigido

por el departamento. La siembra de las macetas artísticas ecológicas es realizada con los siguientes parámetros:

- Debido al espacio dentro de las macetas, se puede considerar que es un espacio limitado para el crecimiento, por lo que es recomendable el uso de plantas ornamentales o arbustivas. La especie escogida fue **Croton (Codiaeum Variegatum)**, debido a su cualidad decorativa, generado por su follaje, color y su optima adaptación a ambientes soleados.

- Desde la base de la maceta, se coloca una capa de 10 centímetros de material granular, disminuyendo su tamaño gradualmente hasta los 50 centímetros aproximadamente, con la finalidad de evitar encharcamientos y que la maceta tenga un drenaje optimo, asegurando la oxigenación del sustrato. Sobre la capa rocosa se dispone de una mezcla de ramas, hojarascas (material orgánico), contribuyendo al proceso de enriquecimiento del sustrato.

- Con la finalidad de mantener el equilibrio biológico del sustrato, posterior a la capa de drenaje, se coloca una capa de tierra local con abono orgánico, mejorando la estructura del sustrato, aumentando la capacidad de retener nutrientes y estimulando el desarrollo radicular de la planta.

- La planta es sembrada con el pan de tierra original que trae desde el vivero. Al momento de plantar, se retira la bolsa y compacta el sustrato alrededor del cepellón para eliminar bolsas de aire y fomentar un contacto firme entre las raíces y el nuevo sustrato, lo que facilitará su adaptación y crecimiento.

- Antes de sembrar se verifica que las plantas estén libres de plagas o enfermedades, evitando limitar el crecimiento, aumentando las posibilidades de supervivencia. En caso de presencia de plagas o enfermedades es necesario aplicar los correctivos específicos de acuerdo con el manejo integrado de plagas requerido.

ESTA ACTIVIDAD PRESENTA UNA TOTALIDAD DE 60 MACETAS ARTÍSTICAS UBICADAS E INSTALADAS EN LOS PUNTOS DETERMINADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL. PERO, VEINTICINCO DE ELLAS, A FECHA DE INFORME SE ENCUENTRAN 100% FINALIZADAS, INCLUYENDO LA SIEMBRA DE LA ESPECIE VEGETAL.

La actividad puede ser resumida de la siguiente manera:

FUVDAMIS
FUNDACION VIDA DIGNA Y DESARROLLO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE

NIT. **900. 450.733-5**

Actividad	Cumplido (✓/X)	Observaciones
Creación del diseño de las macetas artísticas.	✓	
Construcción de la maceta.	✓	
Revisión del estado de la maceta.	✓	
Instalación de la maceta.	✓	
Selección de material vegetal.	✓	La escogencia fue realizada teniendo en cuenta las características de la siembra.
Disposición de material granular.	✓	Esta actividad se encuentra en un porcentaje de ejecución, faltando 35 macetas por aplicar la siembra.
Aplicación de materia orgánica para enriquecimiento del sustrato.	✓	Esta actividad se encuentra en un porcentaje de ejecución, faltando 35 macetas por aplicar la siembra.
Aplicación del sustrato mezclado con abono orgánico.	✓	Esta actividad se encuentra en un porcentaje de ejecución, faltando 35 macetas por aplicar la siembra.
Revisión final del estado del material vegetal.	✓	Esta actividad se encuentra en un porcentaje de ejecución, faltando 35 macetas por aplicar la siembra.
Siembra del material vegetal.	✓	Esta actividad se encuentra en un porcentaje de ejecución, faltando 35 macetas por aplicar la siembra.
Control fitosanitario y de malezas.	✓	Esta actividad se encuentra en un porcentaje de ejecución, faltando 35 macetas por aplicar la siembra.
Seguimiento de la actividad	✓	Esta actividad se encuentra en un porcentaje de ejecución, faltando 35 macetas por aplicar la siembra.

C L 25 4 F 21 BRR CANDELARIA SUR.
TELEFONO: (57) 581 2856 - CELULAR: 314 532 8821-3004004573
E-MAIL: fuvdamis@hotmail.com
Valledupar-CESAR

FUVDAMIS
FUNDACION VIDA DIGNA Y DESARROLLO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE

NIT. **900. 450.733-5**

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA HASTA FECHA DE INFORME.

CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCION FINANCIERA DE ACTIVIDADES.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR EN EL PROYECTO					DURACIÓN (MESES)								
	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO TOTAL ($)	MES 1 (noviembre)	MES 2 (diciembre)	MES 3 (enero)	MES 4 (febrero)	MES 5 (marzo)	MES 6 (abril)	MES 7 (mayo)	MES 8 (junio)	%
1	Macetas Artísticas	Unidad	60,0	$ 621.526.000	$ 49.722.240	$ 397.777.920	$ 37.291.680	$ 12.430.560	$ 82.152.800	$ 22.598.274	$ -	$ -	$ 551.973.474,00
2	Siembra de frutales	Unidad	45,0	$ 2.729.782		$ 2.729.782							$ 2.729.782,00
3	Limpieza y Embellecimiento	Unidad	3,0	$ 51.103.800		$ 51.103.800							$ 51.103.800,00
4	Talleres de educación ambiental	Taller	3,0	$ 75.742.218				$ 75.742.218					$ 75.742.218,00
TOTAL COSTO PROGRAMA DE TRABAJO				$ 751.103.800									
EJECUCIÓN FINANCIERA EJECUTADA PROGRAMA DE TRABAJO ($)					$ 49.722.240	$ 451.611.502	$ 37.291.680	$ 88.172.778	$ 82.152.800	$ 22.598.274	$ -	$ -	$ 711.549.274
EJECUCIÓN EJECUTADA PROGRAMA DE TRABAJO (%)					6,62%	60,13%	4,96%	11,74%	8,27%	3,01%	0,00%	0,00%	94,73%

EL AVANCE FINANCIERO DE ACTIVIDADES CORRESPONDE A LOS VALORES MONETARIOS O DE INVERSIÓN QUE PUEDEN SER REPRESENTADO EN EL PORCENTAJE DEL CRONOGRAMA PRESENTADO. SIN EMBARGO, LAS ACTIVIDADES 2,3 Y 4 SE ENCUENTRAN FINALIZADAS, MIENTRAS QUE EN LA ACTIVIDAD DE MACETAS ARTÍSTICAS ECOLÓGICAS SE DEJA REPRESENTADO EN **EL CUADRO DE AVANCE DE ACTIVIDADES Y EL BALANCE DE ACTIVIDADES FINALIZADAS A CONFORMIDAD,** SIENDO EJECUTADAS AL 100% LA TOTALIDAD DE **25 MACETAS Y FALTANDO 35 MACETAS** POR SIEMBRA DE ARBOLES ORNAMENTALES.

DIFICULTADES.

- La adquisición de permisos retrasó las actividades correspondientes a la correcta instalación y siembra de árboles ornamentales. La revisión del estado de las macetas y especificaciones u observaciones presentadas por la supervisión deben ser corregidas acorde con el producto esperado.

AVANCE FISICO MENSUAL SEIS (6).

A continuación, en la se muestra el avance hasta la fecha del presente informe.

AVANCE FISICO DEL PERIODO:	**27,58 %.**
AVANCE FINANCIERO PARA COBRO:	**94,73 %.**

Tabla de avance informe mensual SEIS (6).

Nota: El avance físico mostrado corresponde al avance porcentual de las actividades conforme al cronograma de actividades, donde se analiza el porcentaje teniendo en cuenta el avance en actividades críticas y así tomar decisiones conforme a los resultados observados en el análisis de la programación.

BALANCE DE EJECUCION FINANCIERA A LA FECHA DEL INFORME MENSUAL SEIS (6).

VALOR INICIAL:	**$**	**751.103.800**
VALOR ANTICIPO **(20,00%)**:	**$**	**140.000.000**
VALOR AVANCE DE INFORME MENSUAL SEIS (6):	**$**	**207.176.000**

ACUMULADO EJECUTADO:	**$**	**388.545.800**
FALTANTE POR EJECUTAR	**$**	**362.558.000**

Tabla de avance informe mensual SEIS (6).

Nota: Aunque el valor que se informa en el avance físico del periodo se denota el porcentaje de **27,58%**, el avance porcentual de la ejecución financiera del contrato corresponde a un **94,73%**. Financieramente el contrato tiene gastos e inversiones, pero esos avances serán descritos en el avance físico cuando las actividades sean cabalmente finalizadas a conformidad.

AVANCE DEL PLAZO CONTRACTUAL A LA FECHA DEL INFORME MENSUAL SEIS (6).

El siguiente cuadro corresponde al avance en el tiempo del plazo contractual, contado desde la fecha del acta de inicio hasta la fecha del **INFORME MENSUAL SEIS (6).**

Plazo inicial:	**Un mes y medio (1,5).**
Primer plazo añadido:	**Cero coma sesenta y siete meses (0,67).**
Segundo plazo añadido:	**Cero coma cinco meses (0,5).**
Tercer plazo añadido:	**Un mes (1).**
Cuarto plazo añadido:	**Dos meses (2).**
Tiempo del plazo transcurrido:	**Cuatro meses y medio (4,5).**
Avance porcentual del plazo transcurrido:	**79,36 %.**
Avance Porcentual del plazo faltante:	**20,64 %.**

Tabla de avance del plazo informe mensual SEIS (6).

CUADRO DE EJECUCION FINANCIERA CONTRATO HASTA INFORME MENSUAL SEIS (6).

La ejecución financiera del contrato, a la fecha del presente informe arroja los siguientes índices:

- La cifra de ejecución en el período informado es de: **VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($ 22.598.274) M/L**, equivalente a un porcentaje de **3,01%** para un total ejecutado acumulado de: **SETECIENTOS ONCE MILLONES QUINIENTOS CURENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($ 711.549.274) M/L**, equivalente a un porcentaje de **94,73%**, del valor total del **CONTRATO.**

VALOR CONTRATADO	VALOR ANTICIPO	VALOR INVERTIDO	VALOR POR EJECUTAR
SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS **($751.103.800) M/L.**	CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS **($140.000.000) M/L.**	SETECIENTOS ONCE MILLONES QUINIENTOS CURENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS **($711.549.274) M/L.**	QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS **($569.734.000) M/L.**

JUSTIFICACIÓN DEL BALANCE DE EJECUCIÓN.

- En el periodo de informe se certifican los avances correspondientes a la siembra de plantaciones ornamentales en las macetas artísticas ecológicas ya instaladas, con respecto a las condiciones exigidas por el contratante. A su vez, debido a la fecha de la adquisición de permisos, **VEINTICINCO** fueron finalizadas al 100%, ubicando las plantas ornamentales e insumos.

RESULTADOS OBTENIDOS.

El avance de las actividades y resultados presentados son sustentados mediante los siguientes cuadros:

Macetas artísticas ecológicas.

	CONTRATO No. CE-SGE-0020-2024 - CO1.PCCNTR.7030654.
	AUNAR RECURSOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, HUMANOS Y FINANCIEROS PARA FORTALECER LA RESILIENCIA CLIMTICA, LA BIODIVERSIDAD, Y EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES VEGETALES Y LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE EN LA ISLA DE SAN ANDRES.

Item	Actividad	Ubicación	Propietario	Estado		No. macetas
				Instalada	Finalizada (siembra)	
1	Macetas Artísticas Ecológicas.	Avenida Colon.	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.	SI	SI	10,00
		Peatonal Avenida Providencia.	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.	SI	SI	5,00
		Avenida Colon con Carrera 1 (Newball).	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.	SI	SI	10,00
		Avenida las Américas.	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.	SI	NO	12,00
		Parque Tropical.	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.	SI	NO	9,00
		Avenida Colon en Boulevard Banco de la república.	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.	SI	NO	2,00
		Calle 2 frente a la Iglesia Cristo Salvador.	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.	SI	NO	5,00
		Calle 3 con Avenida Duarte Blum.	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.	SI	NO	7,00
ESTADO DE LA ACTIVIDAD		EN EJECUCIÓN.	TOTALIDAD DE MACETAS			60 MACETAS
			TOTALIDAD DE MACETAS DEBIDAMENTE FINALIZADAS			25 MACETAS

ACTAS Y DOCUMENTOS.

- Acta: **Inicio de actividades.**
  Fecha: **Diecinueve (19) de noviembre de 2024..**
- Acta: **Suspensión No. 01.**
  Fecha: **Veintitrés (23) de diciembre de 2024.**
- Acta: **Reinicio de actividades.**
  Fecha: **Veintitrés (23) de enero de 2025.**
- Acta: **Acta modificatoria No. 01.**
  Fecha: **Treinta y uno (31) de enero de 2025.**
- Acta: **Acta modificatoria No. 02.**
  Fecha: **Treinta y uno (31) de enero de 2025.**
- Acta: **Acta modificatoria No. 03.**
  Fecha: **Veinte (20) de febrero de 2025.**
- Acta: **Acta modificatoria No. 04.**
  Fecha: **Siete (7) de marzo de 2025.**
- Acta: **Acta modificatoria No. 05.**
  Fecha: **Cuatro (4) de abril de 2025.**

ADMINISTRACIÓN.

Se reseña por parte del contratista el cumplimiento de cada uno de los aspectos administrativos contemplados por el contrato, durante el periodo del presente informe, y a lo largo del plazo de ejecución de este, la **FUNDACION VIDA DIGNA Y DESARROLLO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE**

FUVDAMIS
FUNDACION VIDA DIGNA Y DESARROLLO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE

NIT. **900. 450.733-5**

"FUVDAMIS", en su condición de ejecutor, ha realizado la inversión y seguimiento a los aspectos relacionados con **SST,** de acuerdo con lo estipulado en su propuesta para el proceso de contratación que origino el contrato de la referencia.

OBSERVACIONES.

- El avance en las actividades presentadas, fueron entregadas de manera **SATISFACTORIA**, gracias a la buena disposición del personal de **mano de obra** destacado para el cumplimiento de los objetivos físicos del contrato.

- Los avances correspondientes a las actividades de **macetas artísticas ecológicas**, representa un avance significativo en el porcentaje de ejecución, siendo necesario la culminación total de las actividades, ya que el avance físico y financiero del contrato está por encima de lo presentado en el presente informe.

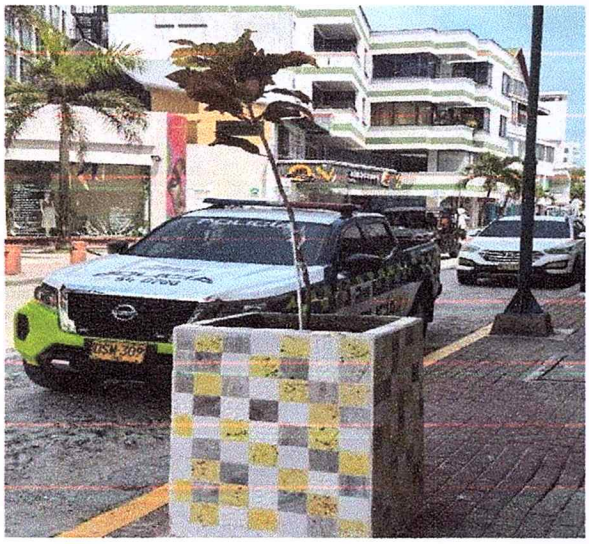
RUBEN ESTRADA GAMEZ .
C.C. 77.168.859 de Valledupar, Cesar.
Representante Legal FUVDAMIS.
Contratista.

C L 25 4 F 21 BRR CANDELARIA SUR.
TELEFONO: (57) 581 2856 - CELULAR: 314 532 8821-3004004573
E-MAIL: fuvdamis@hotmail.com
Valledupar-CESAR

FUVDAMIS
FUNDACION VIDA DIGNA Y DESARROLLO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE

NIT. **900. 450.733-5**

REGISTRO FOTOGRÁFICO.

	
Macetas artísticas ecológicas para entrega.	**Macetas artísticas ecológicas para entrega.**
	
Macetas artísticas ecológicas para entrega.	**Macetas artísticas ecológicas para entrega.**

C L 25 4 F 21 BRR CANDELARIA SUR.
TELEFONO: (57) 581 2856 - CELULAR: 314 532 8821-3004004573
E-MAIL: fuvdamis@hotmail.com
Valledupar-CESAR

FUVDAMIS
FUNDACION VIDA DIGNA Y DESARROLLO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE

NIT. **900. 450.733-5**

	
Macetas artísticas ecológicas para entrega.	**Macetas artísticas ecológicas para entrega.**
	
Macetas artísticas ecológicas para entrega.	**Macetas artísticas ecológicas para entrega.**

C L 25 4 F 21 BRR CANDELARIA SUR.
TELEFONO: (57) 581 2856 - CELULAR: 314 532 8821-3004004573
E-MAIL: fuvdamis@hotmail.com
Valledupar-CESAR

FUVDAMIS
FUNDACION VIDA DIGNA Y DESARROLLO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE

NIT. **900. 450.733-5**

	
Macetas artísticas ecológicas para entrega.	**Macetas artísticas ecológicas para entrega.**
	
Macetas artísticas ecológicas para entrega.	**Macetas artísticas ecológicas para entrega.**

C L 25 4 F 21 BRR CANDELARIA SUR.
TELEFONO: (57) 581 2856 - CELULAR: 314 532 8821-3004004573
E-MAIL: fuvdamis@hotmail.com
Valledupar-CESAR

FUVDAMIS
FUNDACION VIDA DIGNA Y DESARROLLO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE

NIT. **900. 450.733-5**

	
Macetas artísticas ecológicas para entrega.	**Macetas artísticas ecológicas para entrega.**
	
Macetas artísticas ecológicas para entrega.	**Macetas artísticas ecológicas para entrega.**

C L 25 4 F 21 BRR CANDELARIA SUR.
TELEFONO: (57) 581 2856 - CELULAR: 314 532 8821-3004004573
E-MAIL: fuvdamis@hotmail.com
Valledupar-CESAR



NIT. **900. 450.733-5**

C L 25 4 F 21 BRR CANDELARIA SUR.
TELEFONO: (57) 581 2856 - CELULAR: 314 532 8821-3004004573
E-MAIL: fuvdamis@hotmail.com
Valledupar-CESAR

	ANEXO 1. CUADRO DE AVANCE DE ACTIVIDADES - INFORME MENSUAL SEIS (06).			
	Corresponde al informe de avance mensual No.	SEIS (06).	**Periodo del Informe:**	01/04/2025 - 30/04/2025.
	Nombre del proyecto:	AUNAR RECURSOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, HUMANOS Y FINANCIEROS PARA FORTALECER LA RESILIENCIA CLIMTICA, LA BIODIVERSIDAD, Y EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES VEGETALES Y LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE EN LA ISLA DE SAN ANDRES.		

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS						**MODIFICACIONES**			
AUNAR RECURSOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, HUMANOS Y FINANCIEROS PARA FORTALECER LA RESILIENCIA CLIMTICA, LA BIODIVERSIDAD, Y EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES VEGETALES Y LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE EN LA ISLA DE SAN ANDRES.						**(Describa las cantidades y valores unitarios ajustados, los cuales no podrán incurrir en incrementos del presupuesto total aprobado. En caso de no requerir modificaciones, estos valores deben ser iguales a las cantidades y valores aprobados del proyecto).**			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANTIDAD**	**V/ UNITARIO**	**V/ TOTAL**	**MAYOR O MENOR CANTIDAD**	**CANTIDAD TOTAL**	**V/UNITARIO**	**V/TOTAL**
1	Macetas Artísticas Ecológicas.	Un	60,00	$ 10.358.800	$ 621.528.000				
2	Siembra de frutales.	Un	45,00	$ 60.662	$ 2.729.782				
3	Limpieza y Embellecimiento.	Un	3,00	$ 17.034.600	$ 51.103.800				
4	Talleres de educación ambiental.	Un	3,00	$ 25.247.406	$ 75.742.218				
TOTAL COSTOS PROYECTO					**$ 751.103.800**				

ANEXO 1. CUADRO DE AVANCE DE ACTIVIDADES - INFORME MENSUAL SEIS (06).			
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.		**CE-SGE-0020-2024 - CO1.PCCNTR.7030654.**	
CONTRATISTA:	FUNDACION VIDA DIGNA Y DESARROLLO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE "FUVDAMIS". R.L: RUBEN ESTRADA GAMEZ.	**CE-SGE-0020-2024 - CO1.PCCNTR.7030654.**	

CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO							
CANTIDADES (UN)			VALORES ($)			SALDOS FALTANTE POR EJECUTAR	
ACUMULADO INFORME ANTERIOR	PRESENTE INFORME SEIS (6)	ACUMULADO	ACUMULADO INFORME ANTERIOR	PRESENTE INFORME SEIS (6)	ACUMULADO	CANTIDAD	VALOR
5,00	20,00	**25,00**	$ 51.794.000,00	$ 207.176.000,00	**$ 258.970.000,00**	35,00	$ 362.558.000
45,00	0,00	**45,00**	$ 2.729.782,00	$ -	**$ 2.729.782,00**	0,00	$ -
3,00	0,00	**3,00**	$ 51.103.800,00	$ -	**$ 51.103.800,00**	0,00	$ -
3,00	0,00	**3,00**	$ 75.742.218,00	$ -	**$ 75.742.218,00**	0,00	$ -
			$ 181.369.800,00	**$ 207.176.000,00**	**$ 388.545.800,00**		**$ 362.558.000,00**
			24,15%	**27,58%**	**51,73%**		**48,27%**

FUNDACION VIDA DIGNA Y DESARROLLO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE "FUVDAMIS". R.L: RUBEN ESTRADA GAMEZ.	**AUNAR RECURSOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, HUMANOS Y FINANCIEROS PARA FORTALECER LA RESILIENCIA CLIMTICA, LA BIODIVERSIDAD, Y EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES VEGETALES Y LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE EN LA ISLA DE SAN ANDRES.**
CONTRATISTA	

CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCION FINANCIERA DE ACTIVIDADES.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR EN EL PROYECTO					DURACIÓN (MESES)								%
	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO TOTAL ($)	MES 1 (noviembre)	MES 2 (diciembre)	MES 3 (enero)	MES 4 (febrero)	MES 5 (marzo)	MES 6 (abril)	MES 7 (mayo)	MES 8 (junio)	
1	Macetas Artisticas	Unidad	60,0	$ 621.528.000	$ 49.722.240	$ 397.777.920	$ 37.291.680	$ 12.430.560	$ 62.152.800	$ 22.598.274	$ -	$ -	$ 581.973.474,00
2	Siembra de frutales	Unidad	45,0	$ 2.729.782		$ 2.729.782							$ 2.729.782,00
3	Limpieza y Embellecimiento	Unidad	3,0	$ 51.103.800		$ 51.103.800							$ 51.103.800,00
4	Talleres de educación ambiental	Taller	3,0	$ 75.742.218				$ 75.742.218					$ 75.742.218,00
TOTAL COSTO PROGRAMA DE TRABAJO				$ 751.103.800									
EJECUCIÓN FINANCIERA EJECUTADA PROGRAMA DE TRABAJO ($)					$ 49.722.240	$ 451.611.502	$ 37.291.680	$ 88.172.778	$ 62.152.800	$ 22.598.274	$ -	$ -	$ 711.549.274
EJECUCIÓN EJECUTADA PROGRAMA DE TRABAJO (%)					6,62%	60,13%	4,96%	11,74%	8,27%	3,01%	0,00%	0,00%	94,73%

EL AVANCE FINANCIERO DE ACTIVIDADES CORRESPONDE A LOS VALORES MONETARIOS O DE INVERSIÓN QUE PUEDEN SER REPRESENTADO EN EL PORCENTAJE DEL CRONOGRAMA PRESENTADO. SIN EMBARGO, LAS ACTIVIDADES 2,3 Y 4 SE ENCUENTRAN FINALIZADAS, MIENTRAS QUE EN LA ACTIVIDAD DE MACETAS ARTÍSTICAS ECOLÓGICAS SE DEJA REPRESENTADO EN **EL CUADRO DE AVANCE DE ACTIVIDADES** Y **EL BALANCE DE ACTIVIDADES FINALIZADAS A CONFORMIDAD,** SIENDO EJECUTADAS AL 100% LA TOTALIDAD DE **25 MACETAS** Y **FALTANDO 35 MACETAS** POR SIEMBRA DE ARBOLES ORNAMENTALES.

ELABORADO POR:

FUNDACIÓN VIDA DIGNA Y DESARROLLO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE (FUVDAMIS) - NIT. 900.450.733-5.

REP LEG. RUBEN ESTRADA GAMEZ

Cédula: No. 77.168.859 de Valledupar, Cesar.

FUVDAMIS	**CONTRATO No. CE-SGE-0020-2024 - CO1.PCCNTR.7030654.**
	AUNAR RECURSOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, HUMANOS Y FINANCIEROS PARA FORTALECER LA RESILIENCIA CLIMTICA, LA BIODIVERSIDAD, Y EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES VEGETALES Y LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE EN LA ISLA DE SAN ANDRES.

Item	Actividad	Ubicación	Propietario	Estado		No. macetas
				Instalada	Finalizada (siembra)	
1	Macetas Artísticas Ecológicas.	Avenida Colon.	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.	SI	SI	10,00
		Peatonal Avenida Providencia.	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.	SI	SI	5,00
		Avenida Colon con Carrera 1 (Newball).	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.	SI	SI	10,00
		Avenida las Américas.	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.	SI	NO	12,00
		Parque Tropical.	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.	SI	NO	9,00
		Avenida Colon en Boulevard Banco de la república.	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.	SI	NO	2,00
		Calle 2 frente a la Iglesia Cristo Salvador.	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.	SI	NO	5,00
		Calle 3 con Avenida Duarte Blum.	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.	SI	NO	7,00
ESTADO DE LA ACTIVIDAD		**EN EJECUCIÓN.**	**TOTALIDAD DE MACETAS**			**60 MACETAS**
			TOTALIDAD DE MACETAS DEBIDAMENTE FINALIZADAS			**25 MACETAS**

ELABORADO POR:

FUNDACIÓN VIDA DIGNA Y DESARROLLO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE (FUVDAMIS) - NIT. 900.450.733-5.
REP LEG. RUBEN ESTRADA GAMEZ
Cédula: No. 77.168.859 de Valledupar, Cesar.

BALANCE DE ACTIVIDADES FINALIZADAS A CONFORMIDAD.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR EN EL PROYECTO					ACTIVIDADES			
	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO TOTAL ($)	EJECUTADAS	VALOR	POR EJECUTAR	VALOR
1	Macetas Artísticas	Unidad	60,0	$ 621.528.000	25,00	**$ 258.970.000**	**35,00**	$ 362.558.000
2	Siembra de frutales	Unidad	45,0	$ 2.729.782	45,00	**$ 2.729.782**	**0,00**	**$ -**
3	Limpieza y Embellecimiento	Unidad	3,0	$ 51.103.800	3,00	**$ 51.103.800**	**0,00**	**$ -**
4	Talleres de educación ambiental	Taller	3,0	$ 75.742.218	3,00	**$ 75.742.218**	**0,00**	**$ -**
TOTAL				**$ 751.103.800**		**$ 388.545.800**		**$ 362.558.000**

ELABORADO POR:

FUNDACIÓN VIDA DIGNA Y DESARROLLO AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE (FUVDAMIS) - NIT. 900.450.733-5.
REP LEG. RUBEN ESTRADA GAMEZ

Cédula: No. 77.168.859 de Valledupar, Cesar.
