MUNICIPIO DE POPAYÁN
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

INFORME DE OBRA N°2
CONTRATO 20241800037637

Popayán - Cauca, del 02/04/2025 de noviembre al 20/05/2025



"REALIZAR LA RESTITUCION DE LA CAPACIDAD HIDRAULICA DE CAUCES DE RIOS Y/O QUEBRADAS MEDIANTE ACCIONES DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DENTRO DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES PRIORIZADAS EN LOS PROGRAMAS DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES: CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN Y MANEJO, PARA EL 2024 EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN"

1. INTRODUCION 3
1. DESCRIPCIÓN 4
1.1. LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN 4
1.2. LOCALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA 4
1.3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 4
2. **CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO** 7
2.1. INVENTARIO ESTADO INICIAL 8
3. DESCRIPCION DEL INFORME DE CONTRATISTA 10
3.1. DESCRIPCION DEL CONTRATO DE OBRA 11
3.2. INFORMACION GENERAL 11
3.4. NOVEDADES DEL CONTRATO 12
I. INFORME GENERAL: 12
4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 12
4.1. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA 12
4.2. CRONOGRAMA INICIAL CONTRACTUAL 14
4.3. CONTROL PRESUPUESTAL 15
5. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATOS 15
6. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 16
7. **REGISTRO FOTOGRÁFICO** 16
8. CONCLUSIONES 18

1. INTRODUCION

En el Municipio de Popayán, existe una serie de sistemas ecológicos naturales de gran importancia para la estructura ecológica y la sostenibilidad del territorio, como son los humedales y ecosistemas híbridos, que salpican la geografía municipal y que regulan el caudal de quebradas y riachuelos, dentro y fuera del casco urbano y que además albergan una flora y fauna particulares, los cerros tutelares, que enmarcan el paisaje urbano y que prestan importantes bienes y servicios para los habitantes del municipio, senderos ecológicos, cauces de ríos, quebradas y corredores verdes paralelos a las zonas de ribera, con influencia de microcuencas.

Dentro de la estructura de la administración central del Municipio de Popayán se encuentra la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres, la cual tiene como misión: "orientar la actualización, ejecución y evaluación del Plan Municipal de Gestión del Riesgo y apoyar la coordinación del Sistema Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, conformado por los sectores institucionales y comunitarios mediante la realización de actividades integrales de la situación municipal con el fin de visualizar orientaciones de carácter estratégico hacia la gestión del riesgo de desastres en lo social, ambiental e institucional del municipio, mediante la formulación, implementación y realización de actividades para planes, programas y proyectos, con participación comunitaria y articulados a la planeación, regional y nacional".

Es importante señalar que el Municipio de Popayán, esta irrigado por 8 fuentes hídricas denominadas: Río Las Piedras, Q. Pisojé, Q. Pubús, Río Saté, Río Ejido, Rio Hondo, Río Palace y Rio Molino; este último es de gran importancia para la ciudad, pues a partir del río Molino, se abastece de agua potable gran parte de la ciudad y sus humedales, representan lugares de amortiguación durante los periodos de lluvia. Todos los afluentes hídricos señalados desembocan en el Rio Cauca.

Actualmente, tanto los ríos como los humedales presentan diversos problemas ambientales, entre los cuales se tiene que no existe un programa de limpieza municipal, que se concentre en dar mantenimiento las zonas ribereñas de los ríos y humedales de la ciudad y en consecuencia a partir del bajo nivel de mantenimiento que reciben estas áreas y la falta de cultura ciudadana respecto al cuidado de las fuentes hídricas de la ciudad y el manejo adecuado de los residuos sólidos, se tiene una disposición inadecuada de residuos sólidos en sus riberas.

Aunado a lo anterior, las zonas ribereñas del Municipio de Popayán, presentan condiciones de deterioro ambiental, toda vez que la gran cantidad de residuos sólidos en estas zonas, causan incomodos problemas ambientales a las comunidades aledañas, así como la proliferación de vectores por taponamiento en las fuentes hídricas, al no permitir el libre paso del agua por el cauce de los ríos, adicional a ello en el Plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) de acuerdo a la normatividad nacional, no se autoriza al prestador el servicio de aseo el mantenimiento de las zonas ribereñas, y delega al municipio esta función.

De este modo, la subcuenca rio molino, y la cuenca del rio Cauca exigen mantener un proceso integral y permanente de gestión ambiental, social, riesgo y adaptación al cambio climático, tendientes a contrarrestar la amenaza, reducir la vulnerabilidad existente y fortalecer la resiliencia frente a procesos de distintos orígenes que pueden dar lugar a emergencia y desastres naturales. Siendo necesaria su descolmatación, limpieza y recuperación, en busca de restablecer las condiciones socio-ecosistémicas, principalmente minimizando el riesgo de

movimientos, deslizamientos, proliferación de vectores y de manera simultánea lograr la estabilización de la ladera, control de la erosión y regeneración de cursos de agua de las zonas ribereñas.

Cabe resaltar que la problemática ambiental, desencadenada en distintos eventos de desastre a lo largo de la historia de la subcuenca rio Molino, los cuales datan desde 1928, hasta el 2017, destacando entre ellos, el evento sucedido el 24 de diciembre de 2013, el cual generó una situación de alto riesgo en la parte media y baja de la subcuenca, trayendo consigo flujo de lodos con presencia de material vegetal, deslizamientos y posteriores represamientos que desencadenaron inundaciones y pérdidas materiales sociales y económicas en la ciudad, afectando, las zonas ribereñas de las fuentes hídricas.

El alcance del objeto está destinado a realizar la **"REALIZAR LA RESTITUCION DE LA CAPACIDAD HIDRAULICA DE CAUCES DE RIOS Y/O QUEBRADAS MEDIANTE ACCIONES DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DENTRO DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES PRIORIZADAS EN LOS PROGRAMAS DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES: CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN Y MANEJO, PARA EL 2024 EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN."**

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

1. DESCRIPCIÓN

1.1. LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN

A continuación, se presenta una breve reseña geográfica del municipio de Popayán teniendo en cuenta su localización, extensión territorial, clima, fuentes hídricas, elevaciones y límites.

1.2. LOCALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

El Departamento de Cauca está situado en el suroeste del país entre las regiones andina y pacífica; localizado entre los 00°58'54" y 03°19'04" de latitud norte y los 75°47'36" y 77°57'05" de longitud oeste. Cuenta con una superficie de 29.308 km2 lo que representa el 2.56 % del territorio nacional. Limita por el Norte con el departamento del Valle del Cauca, por el Este con los departamentos de Tolima, Huila y Caquetá, por el Sur con Nariño y Putumayo y por el Oeste con el océano Pacífico.

1.3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El municipio de Popayán se encuentra ubicado en el departamento del Cauca, en la región Andina de Colombia.
Está situado en el valle del río Cauca, a una altitud de 1.760 metros sobre el nivel del mar.

Popayán es la capital del departamento del Cauca y cuenta con una población aproximada de 300.000 habitantes. La ciudad es conocida por su arquitectura colonial, su rica historia y su patrimonio cultural. El clima es templado, con una temperatura promedio de 18°C.

Ubicación geográfica:

- Latitud: 2° 26' 30" N
- Longitud: 76° 37' 30" O
- Altitud: 1.760 msnm

Límites:

- Norte: Municipio de Santander de Quilichao
- Sur: Municipio de Timbío
- Este: Municipio de Cajibío
- Oeste: Municipio de El Tambo

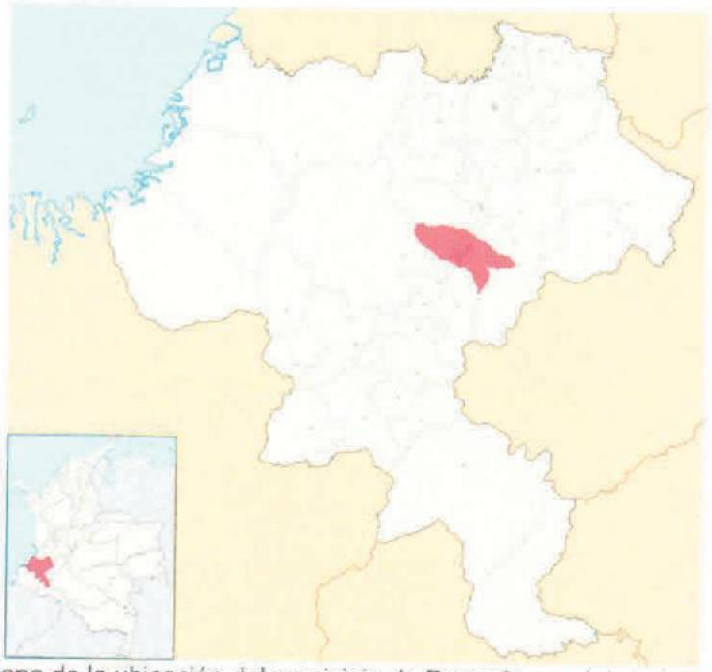


Figura No 1. Mapa de la ubicación del municipio de Popayán en el departamento del Cauca.

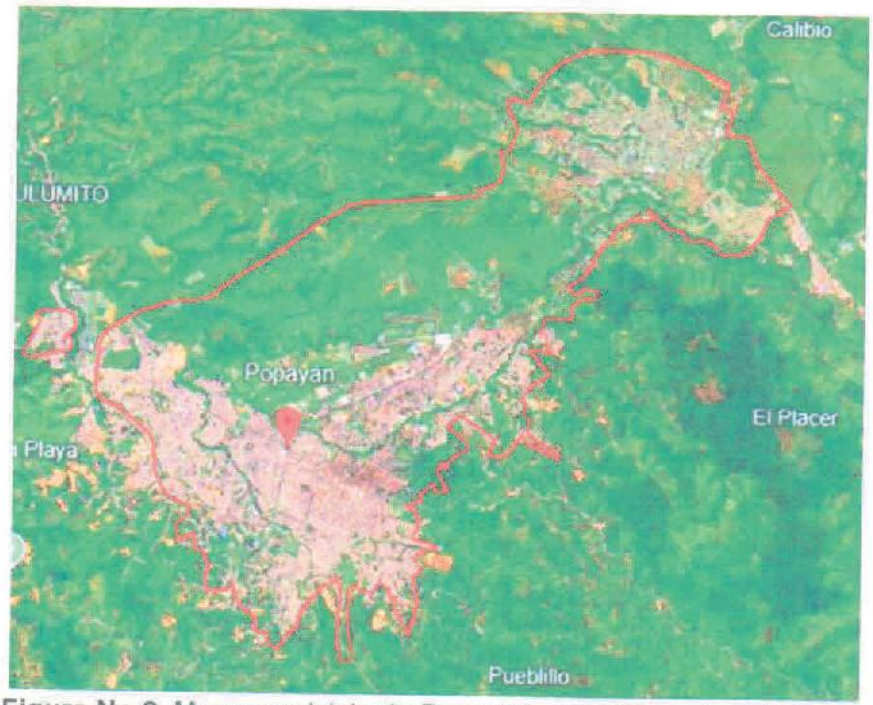


Figura No 2. Mapa municipio de Popayán, departamento del Cauca.

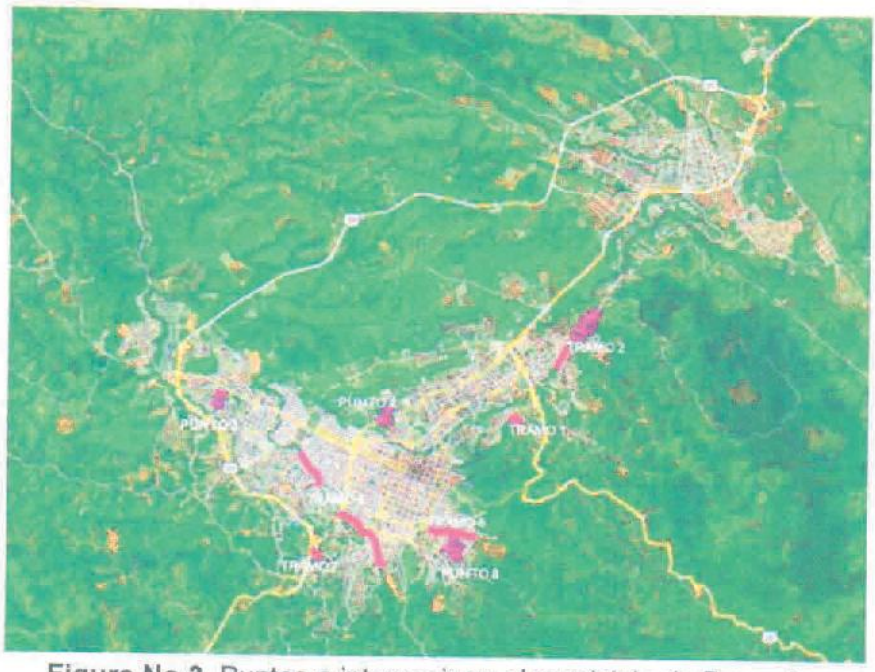


Figura No 3. Puntos a intervenir en el municipio de Popayán.

TRAMO NRO. 01 Sector Real Pomona, Quebrada La Chirria: Tramo paralelo a la Calle 20N empezando en la Cra 2, 100 m aguas arriba

- Punto inicial: 2.449471 - 76.593033
- Punto final: 2.449347, -76.592156

TRAMO NRO. 02 Sector Yambitará, Quebrada La Cantera y Caracol: Tramo calle 5 desde puente de Aida Lucia hasta, 300 m aguas arriba. Especies arbóreas volcadas en puntos específicos. Las coordenadas del tramo son:

- Punto inicial: 2.449471-76.593033
- Punto final: 2.449347-76.592156

TRAMO NRO. 03 Sector Puente las Palmas, Quebrada Pubús: Puente del barrio las Palmas sobre la quebrada Pubús. Las coordenadas del tramo son:

- Punto: 2.449394-76.634512

TRAMO NRO. 04 Sector Barrio Cadillal, Rio Molino: Lecho del Rio Molino 400 m aprox. aguas abajo del puente de la Calle 1N. Las coordenadas del tramo son:

- Punto: 2.447671-76.611848

TRAMO NRO. 05 Sectores la Gran Victoria, Comuneros, El Limonar, Sindical, Minuto de Dios, Retiro bajo, Q. la Monja-Rio Ejido: Desde el puente de la gran victoria sobre la Q. La Monja hasta la avenida panamericana pasando por debajo y desde el puente de la Cra 20 hasta el puente de la Cra 23. 2km aproximadamente.

Las coordenadas del tramo son:

- Punto inicial 1: 2.429095-76.610273
- Punto final 1: 2.449394-76.634512
- Punto inicial 2: 2.439665-76.619512
- Punto final 2: 2.444347-76.622276

TRAMO NRO. 06 Sector Avelino UI, Moscopan, Las ferias, Brazo Seco del Rio Ejido: Desde la entrada al box culvert del brazo seco en la Cra 1 hasta 750m aguas arriba. Las coordenadas del tramo son:

- Punto inicial: 2.433818, -76.604219
- Punto final: 2.432682, -76.597648

TRAMO NRO. 07 Sector anillo vial del sur, túnel bajo, Q. Pubús: Desde la entrada al box culvert de la quebrada Pubús en el anillo vial hasta 200m aguas arriba. Las coordenadas del tramo son:

- Punto inicial: 2.430857-76.620371
- Punto final: 2.429821-76.619202

TRAMO NRO. 08 Sector Sauces, María Oriente, Q. dos agüitas: Puentes vehiculares que comunican los barrios Sauces y María Oriente. Cra 6E y Cra 5AE. Las coordenadas del tramo son:

- Punto 1: 2.429483, -76.601705
- Punto 2: 2.428469, -76.600875

2. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

Para cumplir con su objeto misional la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres gestiona proyectos a través de Convenios con distintas instituciones que persigan sus mismos intereses y metas programadas, tales como: Obras para la restitución de la capacidad hidráulica de cauces y las establecidas en el Acuerdo de Voluntades del rio Molino, a fin de reducir el riesgo de desastre en zonas que presenten amenaza a las comunidades.


En atención a lo anterior, se hace necesario que la Administración Municipal de Popayán, adelante el proceso de selección abreviada mediante la modalidad de menor cuantía, para seleccionar una persona jurídica o natural idónea, con el fin de que realice la descolmatación, limpieza y recuperación de las fuentes hídricas priorizadas de acuerdo a las solicites de la comunidad en el marco del proyecto "FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES PRIORIZADAS EN LOS PROGRAMAS DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES: CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN Y MANEJO, PARA EL 2024 EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN", para efectos de ejecutar los recursos aprobados y que se encuentra en el proyecto anteriormente mencionado, en el marco del Plan de Desarrollo Municipal denominado ALIANZA CON POPAYÁN" y así garantizar el cumplimiento del mismo.

PRINCIPALES ÍTEMS DE PAGO

- Cortes en zonas pantanosas de lechos de ríos y/o quebradas (lodos, material sedimentable) de forma manual en sectores determinados por acumulación de sedimentos.
- Limpieza y extracción a mano de materia degradable y no degradable (material vegetal, residuo vegetal, residuos sólidos, escombros y otros) sobre cauce de ríos y quebradas márgenes, en el ancho del lecho y sobre las márgenes entre 2 y 4 mts. Incluye rocería sobre márgenes.
- Trozado de troncos sobre lecho de rio.
- Acarreo manual de material sobrante como lodos, basuras, madera y otros de cortes y limpiezas, hasta 120 mt .
- Retiro en volqueta de material sobrante dist > a 120m (volqueta y limpieza en general).
- Limpieza de box culvert (retiro de lodos, material sedimentable y residuos sólidos) de forma manual.

2.1. INVENTARIO ESTADO INICIAL

Una vez realizada visita técnica entre supervisión y contratista en los diferentes frentes de obra a intervenir se observa que la ubicación entregada por la entidad contratante coincide con y se encuentra dentro de las coordenadas por otro lado se identifican algunas características con respecto al estado actual de la obra las cuales se relacionan a continuación:

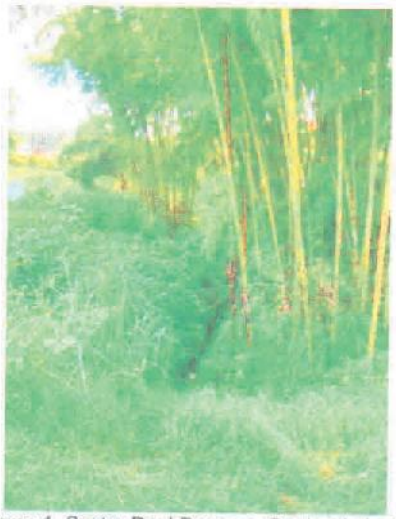


Tramo 1. Sector Real Pomona, Quebrada La Chirria



Tramo 2. Sector Yambitará, Quebrada La Cantera y Caracol



Tramo 3. Sector Puente las Palmas, Quebrada Pubús

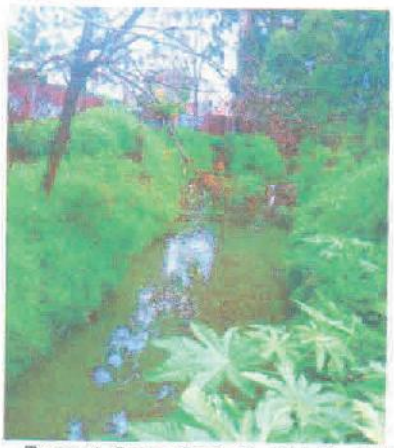

Tramo 4. Sector Barrio Cadillal, Rio Molino










Tramo 5. Sectores la Gran Victoria, Comuneros, El Limonar, Sindical, Minuto de Dios, Retiro bajo, Q. la Monja-Rio Ejido



Tramo 6. Sector Avelino Ul, Moscopan, Las ferias, Brazo Seco

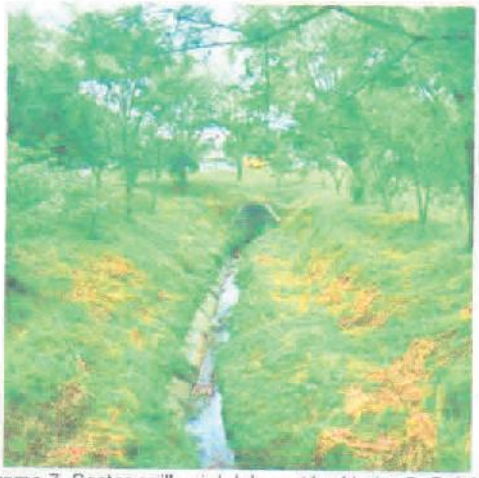

Tramo 7. Sector anillo vial del sur, túnel bajo, Q. Pubús



Tramo 8. Sector Sauces, Maria Oriente, Q. dos agüitas

3. DESCRIPCION DEL INFORME DE CONTRATISTA

El presente Informe de Contratista, muestra una descripción del proyecto, toda la información pertinente del contrato de obra y el seguimiento a la ejecución del mismo, durante el período comprendido entre el 02/04/2025 de noviembre y el 20/05/2025.

Este informe es presentado por la CONSTRUCTORA ALPON SAS, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales en la ejecución del Contrato No. 20241800037637, denominado "*Y/O QUEBRADAS MEDIANTE ACCIONES DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DENTRO DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES PRIORIZADAS EN LOS PROGRAMAS DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES: CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN Y MANEJO, PARA EL 2024 EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN.*", en él se determina el estado general del contrato, el avance de las actividades contratadas, el registro fotográfico, que permite visualizar el antes y el después de los avances de la obra, la calidad de la misma y finalmente determinar un análisis de la programación y el estado actual del respectivo contrato.

3.1. DESCRIPCION DEL CONTRATO DE OBRA

Con el objeto de garantizar la limpieza y descolmatación de los ríos y quebradas, los servicios del contratista van dirigidos a alcanzar una eficiente y especializada ejecución en el Contrato de Obra Pública No. 20241800037637, cuyo objeto principal es la *"REALIZAR LA RESTITUCION DE LA CAPACIDAD HIDRAULICA DE CAUCES DE RIOS Y/O QUEBRADAS MEDIANTE ACCIONES DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DENTRO DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES PRIORIZADAS EN LOS PROGRAMAS DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES: CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN Y MANEJO, PARA EL 2024 EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN."*, adjudicado a la CONSTRUCTORA ALPON SAS.

3.2. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA	
Contratista Inicial	CONSTRUCTORA ALPON SAS
Contrato No.	20241800037637
Valor inicial	$ 598.172.067,00
Valor total	$ 598.172.067,00
Plazo	Hasta el 31 de diciembre de 2024
Fecha de acta inicio	29 de Noviembre de 2024
Fecha de vencimiento inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2024
Fecha de suspensión:	31 de diciembre de 2024
Fecha de reinicio:	02/04/2025
Fecha de vencimiento final	02/08/2025

Tabla N°1 Información General

3.3. INFORMACION DE LA EJECUCION CONTRATO DE OBRA

Certificado de disponibilidad presupuestal No. 2024.CEN.01.5275	09	De	Septiembre	de	2024
Registro presupuestal No. 2024.CEN.01.07083	29	De	Noviembre	de	2024
Aprobación de Pólizas No 20241800125634	26	De	Noviembre	de	2024
Fecha de Acta de inicio:	29	De	Noviembre	de	2024
Fecha de terminación inicial:	31	De	Diciembre	de	2024
Modificatorio suspension del contrato	31	De	Diciembre	de	2024
Fecha de reinicio:	02	De	abril	de	2025
Adicional en recursos					
Certificado de disponibilidad presupuestal No. 2025.CEN.01.2599	19	de	mayo	de	2025
Registro presupuestal No. 2025.CEN.01.02845	19	de	mayo	de	2025

Tabla N°2 Información Ejecución Contrato de Obra

3.4. NOVEDADES DEL CONTRATO

- **Modificaciones y/o adiciones**

En el periodo no se presentaron modificaciones y/o adiciones.

- Suspensión del contrato: 31/12/2024
- Reinicio: 02/04/2025
- Prórroga: 4 meses
- Adición en recursos: $180.000.000

I. INFORME GENERAL:

REALIZAR LA RESTITUCION DE LA CAPACIDAD HIDRAULICA DE CAUCES DE RIOS Y/O QUEBRADAS MEDIANTE ACCIONES DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DENTRO DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES PRIORIZADAS EN LOS PROGRAMAS DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES: CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN Y MANEJO, PARA EL 2024 EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Las actividades que el contratista ejecutó durante el periodo del presente informe comprendieron las siguientes actividades:

4.1. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

Las actividades que el contratista ejecutó durante el periodo del presente informe comprendieron las siguientes actividades:

- **SOCIALIZACIÓN**

- El contratista realiza la socialización inicial del proyecto con los miembros de las juntas de acción de los barrios a intervenir, así mismo durante el transcurso de la primera semana de ejecución del contrato se realizaron encuentros con diferentes grupos de la comunidad de cada sector.

- Cortes en zonas pantanosas de lechos de ríos y/o quebradas (lodos, material sedimentable) de forma manual en sectores determinados por acumulación de sedimentos.

Tramo 1 : sector real pomona, quebrada la chirria	0 m3
Tramo 2: sector yambitara, quebrada la cantera y caracol	0 m3
Tramo 3: sector puente las palmas, quebrada pubus	0m3
Tramo 4: sector barrio cadillal, rio molino	0m3
Tramo 5: sector la g. Victoria, comuneros..., quebrada la monja-rio ejido	0m3

Tramo 6: sector avelino, moscopan, brazo seco del rio ejido	320m3
Tramo 7: sector anillo vial sul, tunel bajo quebrada pubus	0m3
Tramo 8: sector sauces, maria oriente, quebrada dos aguitas.	0m3
Sector rural	0m3

- Limpieza y extracción a mano de materia degradable y no degradable (material vegetal, residuo vegetal, residuos sólidos, escombros y otros) sobre cauce de ríos y quebradas márgenes, en el ancho del lecho y sobre las márgenes entre 2 y 4 mts. Incluye rocería sobre márgenes.

Tramo 1 : sector real Pomona, quebrada la chirria	0ml
Tramo 2: sector yambitara, quebrada la cantera y caracol	0 ml
Tramo 3: sector puente las palmas, quebrada pubus	0
Tramo 4: sector barrio cadillal, rio molino	0
Tramo 5: sector la g. Victoria, comuneros.... quebrada la monja-rio ejido	0ml
Tramo 6: sector avelino, moscopan, brazo seco del rio ejido	0 ml
Tramo 7: sector anillo vial sur, túnel bajo quebrada pubus	0ml
Tramo 8: sector sauces, maria oriente, quebrada dos aguitas.	0ml
Sector rural	0ml

- Acarreo manual de material sobrante como lodos, basuras, madera y otros de cortes y limpiezas, hasta 120 mt .

Tramo 1 : sector real pomona, quebrada la chirria	0 m3
Tramo 2: sector yambitara, quebrada la cantera y caracol	0 m3
Tramo 3: sector puente las palmas, quebrada pubus	0 m3
Tramo 4: sector barrio cadillal, rio molino	0 m3
Tramo 5: sector la g. Victoria, comuneros..., quebrada la monja-rio ejido	0 m3
Tramo 6: sector avelino, moscopan, brazo seco del rio ejido	444m3
Tramo 7: sector anillo vial sul, tunel bajo quebrada pubus	0 3

Tramo 8: sector sauces, maria oriente, quebrada dos aguitas.	m3
Sector rural	m3

- Retiro en volqueta de material sobrante dist > a 120m (volqueta y limpieza en general).

Tramo 1 : sector real pomona, quebrada la chirria	0 m3
Tramo 2: sector yambitara, quebrada la cantera y caracol	0 m3
Tramo 3: sector puente las palmas, quebrada pubus	0 m3
Tramo 4: sector barrio cadillal, rio molino	0 m3
Tramo 5: sector la g. Victoria, comuneros..., quebrada la monja-rio ejido	0m3
Tramo 6: sector avelino, moscopan, brazo seco del rio ejido	762 m3
Tramo 7: sector anillo vial sul, tunel bajo quebrada pubus	0m3
Tramo 8: sector sauces, maria oriente, quebrada dos aguitas.	0m3
Sector rural	0m3

- Limpieza de box coulvert

Tramo 1 : sector real Pomona, quebrada la chirria	0ml
Tramo 2: sector yambitara, quebrada la cantera y caracol	0 ml
Tramo 3: sector puente las palmas, quebrada pubus	0 ml
Tramo 4: sector barrio cadillal, rio molino	0 ml
Tramo 5: sector la g. Victoria, comuneros..., quebrada la monja-rio ejido	0 ml
Tramo 6: sector avelino, moscopan, brazo seco del rio ejido	0 ml
Tramo 7: sector anillo vial sul, tunel bajo quebrada pubus	0ml
Tramo 8: sector sauces, maria oriente, quebrada dos aguitas.	0 ml
Sector rural	0 ml

- El contratista cumplió con el 90% de las actividades programadas en este capítulo.

CONTROL DE PROGRAMACION

4.2. CRONOGRAMA INICIAL CONTRACTUAL

A la fecha de corte de este informe N°1, se viene realizando el seguimiento y realización de la programación de obra del contratista, avalada y aprobada por la Supervisión.

4.3. CONTROL PRESUPUESTAL

Cabe anotar que, a la fecha de corte del presente informe, el contratista ha proyectado 1 acta parcial.

ACTA DE OBRA	FECHA	VALOR TOTAL	SALDO DEL CONTRATO	% DE AVANCE FINANCIERO
	VALOR CONTRATO	$ 598.172.067,00		100%
01	12 de Diciembre de 2024	$ 499,623,456.00	$98,548,611.00	84%
02	21 DE MAYO DE 2025	$98,548,610.00	1	99%
	ADICIONAL EN RESURSOS	$ 180.000.000		
	VALOR CONTRATO	$ 778.127.067		

Tabla N°8 Control presupuestal

5. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATOS

A continuación, relaciono POLIZA CONTRACTUAL de CONTRATO DE OBRA

AMPARO	VALOR ASEGURADO	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO
NOMBRE DE LA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO. NIT 860.009.578-6		
Póliza de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales de acuerdo con firma del contrato de fecha 26 de Noviembre de 2024			
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$119.994.803,20	26/11/2024	30/04/2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	$ 29.998.700,80	26/11/2024	31/12/2027
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 59.997.401,60	SI AMPARA 1 AÑO, 11 MESES Y 30 DÍAS	
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 59.997.401,60	26/11/2024	30/04/2025
POLIZA N°41-44-101288416 - ANEXO 0			
RESPONSABILIDAD CIVIL	$ 260.000.000,00	26/11/2024	31/12/2024
POLIZA N° 41-40-101054275 – ANEXO 0			
POLIZA N°41-44-101288416 - ANEXO 9			
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$119.994.803,20	29/11/2024	03/12/2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	$ 29.998.700,80	29/11/2024	03/12/2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 59.997.401,60	SI AMPARA 1 AÑO, 11 MESES Y 30 DÍAS	
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 59.997.401,60	29/11/2024	03/12/2025
POLIZA N° 41-40-101054275 – ANEXO 9			
RESPONSABILIDAD CIVIL	$ 260.000.000,00	29/11/2024	03/08/2025

Tabla N°10 Garantias de Contratista

6. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

El cauca es un departamento con precipitaciones significativas, incluso en el mes más seco hay mucha lluvia, siendo diciembre el mes con más precipitación del año, el clima del Cauca se clasifica como cálido y templado, la temperatura promedio de los frentes de obra ha sido de 19°C con una precipitación de lluvia aproximada de 3000 mm al año con una precipitación de 35mm en el mes de diciembre. Durante el presente periodo se presentaron lluvias un 30%, fue relativamente poco lluvioso para lo que usualmente corresponde en la zona.

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO

TRAMO 6: SECTOR AVELINO, MOSCOPAN, BRAZO SECO DEL RIO EJIDO

- Cortes en zonas pantanosas de lechos de ríos y/o quebradas (lodos, material sedimentable) de forma manual en sectores determinados por acumulación de sedimentos






- Limpieza y extracción a mano de materia degradable y no degradable (material vegetal, residuo vegetal, residuos sólidos, escombros y otros) sobre cauce de rios y quebradas márgenes, en el ancho del lecho y sobre las márgenes entre 2 y 4 mts. Incluye rocería sobre márgenes





- **Acarreo manual de material sobrante como lodos, basuras, madera y otros de cortes y limpiezas, hasta 120 mt en todos los tramos**





- Retiro en volqueta de material sobrante dist > a 120m (volqueta y limpieza en general)



- **Limpieza de box culvert (retiro de lodos, material sedimentable y residuos sólidos) de forma manual.**



8. CONCLUSIONES

✓ El contratista cumple con el 100% de las actividades programadas, estás incluyen los siguientes capitulos.

- ❖ Cortes en zonas pantanosas de lechos de ríos y/o quebradas (lodos, material sedimentable) de forma manual en sectores determinados por acumulación de sedimentos.
- ❖ Limpieza y extracción a mano de materia degradable y no degradable (material vegetal, residuo vegetal, residuos sólidos, escombros y otros) sobre cauce de ríos y quebradas márgenes, en el ancho del lecho y sobre las márgenes entre 2 y 4 mts. Incluye rocería sobre márgenes.
- ❖ Trozado de troncos sobre lecho de rio.
- ❖ Acarreo manual de material sobrante como lodos, basuras, madera y otros de cortes y limpiezas, hasta 120 mt .

- Retiro en volqueta de material sobrante dist > a 120m (volqueta y limpieza en general).
- Limpieza de box culvert (retiro de lodos, material sedimentable y residuos sólidos) de forma manual.

- ✓ Se realiza el control y seguimiento al uso de EPPS, Elementos de seguridad Industrial, como casco, gafas, guantes, tapa oidos, botas de seguridad, etc.
- ✓ Para cierre a este Informe N°2 con corte de 20 de mayo de 2025, se tiene que el avance ejecutado acumulado general que presentó el contratista fue de aproximadamente 90%
- ✓ Se logra recuperar el cauce del rio en los lugares intervenidos.
- ✓ Falta por terminar la intervención en el tramo de brazo seco ejido

JUAN CAMILO ALEGRIA PONCE
CONTRATISTA
M.P 091037-0533238 CND

ING.GONZALO PAZ GONZALEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO

	ALCALDÍA DE POPAYÁN	F-GC-CT-20
	CONTROL EXPEDIENTE CONTRACTUAL	Versión: 03
		Página 1 de 1

# DE CONTRATO O CONVENIO:	2024180003763-7 **# INFORME:** 3	
DEPENDENCIA CONTRATANTE:	Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres	
CONTRATISTA / CONVENIANTE:	CONSTRUCTORA ALPON S.A.S	
C.C.-N.I.T.: 901364270-2	**DIRECCIÓN:** CRA15 #8N-124	**TELÉFONO:** 3108280117
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA RESTITUCION LA CAPACIDAD HIDRAULICA DE CAUCES DE RIOS Y/O QUEBRADAS MEDIANTE ACCIONES DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DENTRO DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES PRIORIZADAS EN LOS PROGRAMAS DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES: CONOCIMIENTO , REDUCCION Y MANEJO, PARA EL 2024 EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN		
SUPERVISOR O INTERVENTOR:	GONZALO PAZ GONZALEZ	

1. CERTIFICACION DE PUBLICACIÓN EN EL SECOP Y SIA OBSERVA.

IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP II:

TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y PUBLICADAS EN EL SECOP II SI X, NA_____

El funcionario / contratista, _ **MARIA CAMILA ARGOTE ANAYA**_ identificado con CC. **1.061.777.484** designado por el secretario o jefe de la Unidad Administrativa, para la administración y registro del **SECOP.II**, Y El funcionario / contratista, _ **MARIA CAMILA ARGOTE ANAYA** __ identificado con CC. **1.061.777.484** designado por el secretario o jefe de la Unidad Administrativa, para la administración y registro de SIA OBSERVA:
CERTIFICAN que a la fecha (12 /Jun-25) una vez consultado el SECOP II Y SIA OBSERVA, que el CONTRATISTA en mención, tiene publicados los documentos correspondientes al mes de Junio del expediente contractual en las plataformas. Por lo tanto, se otorga visto bueno para continuar con el trámite del pago.

Maria Camila Argote A
FIRMA DEL RESPONSABLE SECOP II

Maria Camila Argote A
FIRMA DEL RESPONSABLE SIA OBSERVA

2. CERTIFICACIÓN DE ARCHIVO DE GESTIÓN DE LA OFICINA JURÍDICA.

El funcionario/contratista__FARES YANET CAMPO ARROYO__, identificado con CC. __34558117_, responsable del control del Archivo de Gestión de la Oficina Asesora Jurídica, **CERTIFICA** que a la fecha (2-7-25), una vez consultado el expediente físico que reposa en el **Archivo de Gestión de la Oficina Jurídica**, el **CONTRATISTA** en mención, cuenta con los documentos al día, por lo tanto, se otorga visto bueno para continuar con el trámite del pago.

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN
Fares Yanet Campo Arroyo
Contratista
ARCHIVO OFICINA JURIDICA

FIRMA DEL RESPONSABLE _____

3. CERTIFICACIÓN DE PQRSD

La secretaria(o) ejecutiva o quien haga sus veces Zorbeida Vallejo Moreno, identificada(o), con CC. No 35512312, responsable del control de requerimientos o PQRSD que ingresan a la Unidad Administrativa. **CERTIFICA** que a la fecha (12 JUN. 2025), el contratista en mención. No presenta requerimientos o PQRSD vencidas o pendientes de tramite o respuesta. De conformidad con lo registrado en el formato de control a PQRSD F-GAC-03 a mi cargo. Por lo anterior se otorga visto bueno para continuar con tramite del pago.

FIRMA DEL RESPONSABLE _____ 12 JUN. 2025
