CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIHCM 396DE 2023
CONTRATO DE OBRA No. CSAMCIH428 DE 2023

INFORME DE SUPERVISION N°.05

PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMCIH396 DE 2023

OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDÍGENA YAKUAS EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA Y RESGUARDO INDÍGENA YANACONA - RUMIYACO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA"

PERIODO

01 DE AGOSTO DE 2024 AL 30 DE AGOSTO DE 2024.

MUNICIPIO: PALESTINA - PITALITO

DEPARTAMENTO: HUILA

1. PRESENTACIÓN

El presente informe corresponde a las labores desarrolladas por el apoyo a la supervisión desde el **1 DE AGOSTO DE 2024 AL 30 DE AGOSTO DE 2024**, en cumplimiento del contrato general de **INTERVENTORIA No. CIHCM 396 DE 2023"** cuyo objeto es **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDÍGENA YAKUAS EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA Y RESGUARDO INDÍGENA YANACONA - RUMIYACO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA"**

Mediante cuadros anexos y registro fotográfico se pretende dejar constancia de los trabajos adelantados hasta lograr la culminación de los trabajos. En este informe se da a conocer las obras ejecutadas a la fecha de cada una de las actividades con un registro fotográfico mostrando la obra en ejecución.

2. JUSTIFICACIÓN

En los resguardos indígenas Yanacona Rumiyaco del Municipio de Pitalito y Resguardo Indígena Yakuas del Municipio de Palestina, los espacios para la práctica recreativa de los niños y niñas son insuficientes. Los espacios existentes están deteriorados y con frecuencia son ocupados para desarrollar otras actividades. Este proyecto surgió con la finalidad de mejorar los espacios de recreación de las comunidades fortaleciendo el crecimiento de la niñez y problemáticas sociales que se viven en el entorno.

Buscando el mejoramiento de las zonas de recreación, para que los niños y estudiantes puedan llevar a cabo las actividades recreativas en un ambiente agradable, seguro y adecuado; se planteó la construcción de dos parques de juegos infantiles, que permita a todos los niños que habitan en cada comunidad, puedan adelantar actividades recreativas las cuales permiten que se diviertan y desarrollen sus habilidades motoras para el desarrollo cognitivo y emocional, fomentando la creatividad, por otro lado se pretende promover la actividad física, reduciendo el sedentarismo y mejorando la salud en general de los niños y niñas fortaleciendo la identidad cultural.


3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto arquitectónico tiene como objetivo la construcción de dos parques infantiles, el primero ubicado en el resguardo Indígena Yanacona – Rumiyaco del Municipio de Pitalito y el segundo en el Resguardo Indígena Yakuas del Municipio de Palestina, la cual tiene una destinación de uso recreativo; el parque corresponde a una placa 12cm de espesor en concreto de 3000 PSI de 7 x 15 cm , vigas de cimentación, cuneta para las aguas lluvias, cerramiento perimetral para separar los espacios recreacionales de los niños de pequeña edad pedestales en concreto, jardines perimetrales, andenes de comunicación, 7 mobiliarios de juegos infantiles, pintura en acrílico antideslizante y un muro de contención en concreto ciclópeo para el resguardo de Pitalito. Todas las obras atienden lo establecido en la NORMA SISMORESISTENTE de 2010 – NSR-10


3.1. LOCALIZACIÓN

El proyecto se encuentra ubicado en el Municipio de Pitalito y en el Municipio de Palestina del departamento del Huila.

1. Resguardo Indígena Yanacona – Rumiyaco del Municipio de Pitalito departamento del Huila.

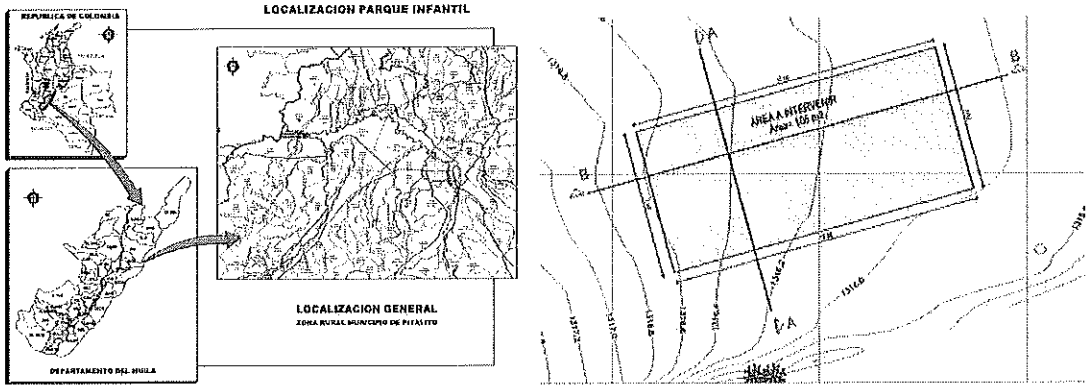

2. Resguardo Indígena Yakuas del Municipio de Palestina departamento del Huila.

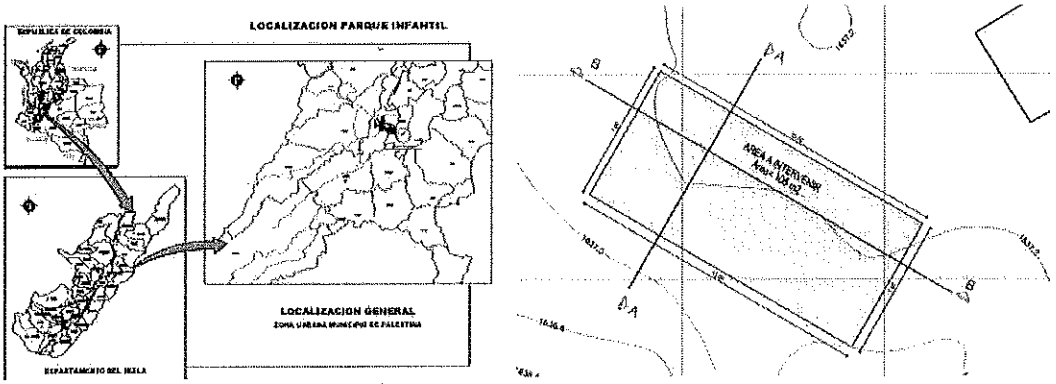

3.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

La obra consiste en la construcción de una placa 12cm de espesor en concreto de 3000 PSI de 7 x 15 cm el cual la soporta dos vigas de cimentación 25 x 25 cm de 3000 Psi, esta placa cuenta con cuneta de 40 cm de ancho para las aguas lluvias con su respectiva malla electrosoldada, así mismo cada parque cuenta con un cerramiento perimetral en baranda metálica de 2" para separar los espacios recreacionales de los niños de pequeña edad y los de mayor edad los cuales están anclado a un pedestal en concreto mediante una platina y pernos de ½", jardines perimetrales que abarcan 3 tipos de plantas, andenes de comunicación de espesor de 10cm con su respectiva malla electrosoldada , 7 mobiliarios de juegos infantiles anclado a la placa mediante

pedestales en concreto por medio de 4 pernos y platina de 25x25 cm , pintura en acrílico antideslizante y un muro de contención en concreto ciclópeo para el resguardo de Pitalito.

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

- **ACTIVIDADES PRELIMINARES**
  * Localización y replanteo.

- **MOVIMIENTO DE TIERRA**
  * Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.
  * Relleno en recebo seleccionado y compactado mecánicamente.

- **CIMENTACION**
  * Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0.05 mts
  * Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño
  * Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I
  * Suministro e instalación de platina para pedestal de juego (incluye 4 pernos ø1/2" L=0.55 con arandela, tuerca y platina .25x.25 e=1/4")

- **ZONA VERDE**
  * Jardines perimetrales

- **PLACA DE CONTRAPISO**
  * Placa de piso en concreto de 3000 PSI e=0,10 mts, incluye corte de juntas y sello y Malla electrosoldada 2,35X6 15X15 4mm
  * Pintura en acrilico antideslizante base agua, resistente a la abrasión, intemperie, con aplicación de tres (03) manos a placa en concreto color según diseño incluye figuras.
  * Cuneta en concreto de 3000 PSI, según diseño
  * Placa de piso para area de Juegos en concreto de 3000 PSI e=0,12 mts, incluye corte de juntas y sello

- **INSTALACIONES MOVILES DE LOS PARQUES INFANTILES**
  * Suministro, transporte e instalacion de circuito, según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación
  * Suministro, transporte e instalación de modulo recreativo, según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación
  * Suministro, transporte e instalación de carrusel (sencilla), según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación
  * Suministro, transporte e instalación de columpio inclusivo. según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación

* Suministro, transporte e instalación de módulo triqui inclusivo. según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación
* Suministro, transporte e instalación de modulo Abaco inclusivo. según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación
* Suministro, transporte e instalación de modulo piano inclusivo. según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación

- **OBRAS COMPLEMENTARIAS**
  * Muro de contención en concreto ciclópeo - 3000 psi (**SOLO PARA PITALITO**)
  * Construcción de pedestales en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI de 30*30 altura 40 cm, para soportar barandas perimetrales. Incluye (2 pernos ø1/2" L=0.40 c/u, con arandela, tuerca y todas las actividades necesarias para correcta ejecución de la actividad)
  * Suministro e instalación de baranda metálica en tubo de 2", incluye soldadura, thinner, anticorrosivo, pintura y todas las actividades necesarias para la correcta ejecución de la actividad.

- **TRANSPORTE**
  * Transporte de materiales pétreos

4. INFORMACION GENERAL DE CONTRATOS

4.1. CONTRATO DE INTERVENTORIA

Que, mediante plataforma del secop II se firmó la carta de aceptación del proceso de invitación publica de mínima cuantía N°IPMCIH011-2023 cuyo objeto es "*INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDÍGENA YAKUAS EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA Y RESGUARDO INDÍGENA YANACONA - RUMIYACO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA", el día 9 de noviembre del 2023, por un valor de DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHO PESOS ($ 17.467.508,00) M/CTE, INCLUYE IVA.*

CONTRATO:	**No. CMCIH396 DE 2023**
OBJETO:	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDIGENA YAKUAS EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA Y RESGUARDO INDIGENA YANACONA - RUMIYACO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA**
CONTRATISTA:	**FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA** C.C. 7.711.430 de Neiva - Huila
FECHA INICIACION:	04/12/2023

PLAZO EJECUCIÓN:	TRES (03) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos legales de perfeccionamiento y ejecución, en todo caso sin superar la presente vigencia fiscal.
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN 01	28 de diciembre de 2023
FECHA ACTA DE REINICIO 01	7 de mayo de 2024
OTROSÍ No. 01 9 de mayo de 2024	Modificación Numeral 2. Plazo de ejecución – Vigencia Fiscal-
OTROSÍ No. 02 11 de julio de 2024	Modificación Numeral 2. Plazo de ejecución – Prorroga de Dos (02) meses.
PLAZO TOTAL:	CINCO (05) MESES, contados a partir del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones sin superar la vigencia fiscal.
VALOR INICIAL CONTRATO:	DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHO PESOS ($ 17.467.508,00) M/CTE, INCLUYE IVA
ADICIONAL VALOR:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO:	DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHO PESOS ($ 17.467.508,00) M/CTE, INCLUYE IVA
VALOR NO EJECUTADO:	0,00 M/CTE
% EJECUCION	86.816%

Estado Financiero del Contrato de Interventoría			**CMCIH396DE 2023**	
Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDIGENA YAKUAS EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA Y RESGUARDO INDIGENA YANACONA - RUMIYACO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA".				
Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	**Fecha** (dd/mm/aaaa)	**Valor contrato**	**Valor ejecutado**	**Valor no ejecutado**
Acta Parcial No. 1	N/A	$ 0,0	$0,0	$ 0,0
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$ 17.467.508,00	**$ 0,00**	**$ 17.467.508,00**	$ 0,00	**$ 17.467.508,00**

ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)		
Tipo de Acta	**No.**	**Fecha**
CONTRATO	CMCIH396-2023	9/11/2023
ACTA DE INICIO	1	04/12/2023
ACTA DE JUSTIFICACIÓN NO.01 DE SUSPENSIÓN	1	28/12/2023
ACTA DE SUSPENSIÓN NO. 01	1	28/12/2023
ACTA DE JUSTIFICACIÓN NO.2 DE REINICIO	2	07/05/2024

ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)		
ACTA DE REINICIO NO. 01	1	07/05/2024
OTROSI NO. 01 – NUMERAL 2. PLAZO	2	09/05/2024
ACTA DE JUSTIFICACIÓN NO. 03 DE PRORROGA	3	11/07/2024
OTROSI NO. 02 - NUMERAL 2. PLAZO	2	11/07/2024

4.1.1. INFORMACION PRESUPUESTAL

PROYECTO PRESUPUESTAL:	CDP	RP	VALOR	VIGENCIA
PROYECTO 2023004410134– CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDÍGENA YAKUAS EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA, FUENTE: 150103-9-RECURSOS PROPIOS -EXCEDENTES F2022 2023004410132 - CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDÍGENA YANACONA - RUMIYACO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA. FUENTE: 150103-9-RECURSOS PROPIOS - EXCEDENTES F2022	2023000703	2023000645	$ 17.467.508	2023
PROYECTO 2023004410134– CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDÍGENA YAKUAS EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA, FUENTE: 50103- RB RECURSOS PROPIOS -EXCEDENTES F2022 2023004410132 - CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDÍGENA YANACONA - RUMIYACO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA. FUENTE: 50103- RB RECURSOS PROPIOS - EXCEDENTES F2022	2024000501	2024000523	$ 17.467.508	2024

4.1.2. RELACION DE POLIZAS DE GARANTIAS

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO – Anexo 0)						
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
				Cumplimiento del contrato	09/11/2023	09/08/2024

SEGUROS MUNDIAL	CHU-100010190	0	10/11/2023	Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	09/11/2023	09/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	09/02/2024	09/02/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO – Anexo 0)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100002049	0	10/11/2023	09/11/2023	09/02/2024

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Acta de Inicio – Anexo 1-2)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100010190	1-2	05/12/2023	Cumplimiento del contrato	04/12/2023	03/09/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	04/12/2023	06/03/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	05/03/2024	06/03/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Acta de inicio – Anexo 1-2)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100002049	1-2	05/12/2023	04/12023	05/03/2024

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Acta de suspensión y reinicio – Anexo 3)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100010190	3	07/05/2024	Cumplimiento del contrato	07/05/2024	16/01/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	07/05/2024	16/07/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	05/03/2024	06/03/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Acta de suspensión y reinicio – Anexo 3)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	**CHU-100002049**	3	07/05/2024	04/12023	16/07/2024

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (OTROSI 1 – Anexo 4)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100010190	4	07/05/2024	Cumplimiento del contrato	07/05/2024	16/01/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	07/05/2024	16/07/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	05/03/2024	06/03/2029

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (OTROSI 2 – Anexo 5)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA DESDE)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100010190	5	13/07/2024	Cumplimiento del contrato	11/07/2024	16/03/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	11/07/2024	16/09/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	16/09/2024	16/09/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ((OTROSI 2 – Anexo 4)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA DESDE
SEGUROS MUNDIAL	**CHU-100002049**	4	13/07/2024	07/05/2024	16/09/2024

4.2. CONTRATO DE OBRA

Que, el 25 de septiembre de 2023 por medio de la Resolución No.306 se dio apertura al proceso de selección abreviada de menor cuantía No. SAMCIH006-2023 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDÍGENA YAKUAS EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA

RESGUARDO INDÍGENA YANACONA - RUMIYACO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA" y mediante Resolución N°405 del 02 de noviembre de 2023 se adjudicó el proceso en mención al CONSORCIO PARKS RESGUARDOS.

CONTRATO:	**No. CSAMCIH428 DE 2023**
OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDIGENA YAKUAS EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA Y RESGUARDO INDIGENA YANACONA - RUMIYACO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARKS RESGUARDO NIT. 901.775.154-1 JOSE WILLIAM TAMAYO POLANIA C.C. No. 7.718.981 de Neiva – Huila
FECHA INICIACIÓN:	04 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO EJECUCIÓN:	TRES (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, EN TODO CASO, SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL.
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1:	28 de diciembre de 2023
FECHA DE REINICIO N°1:	07 de mayo del 2024
OTROSÍ N° 1: 07/12/2023	Modificación Cláusula 6. – Anticipo-.
OTROSÍ N°2: 08/05/2024	Modificación a la Cláusula 4. -Plazo del contrato –, Vigencia Fiscal.
OTROSÍ N°3: 11/07/2024	Modificación a la Cláusula 4. -Plazo del contrato-, Prórroga de DOS (2) MESES.
PLAZO TOTAL:	CINCO (05) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, EN TODO CASI, SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL.
VALOR INICIAL CONTRATO:	DOS CIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE UN MIL CUARENTA Y DOS PESOS ($ 282,421,042.00) M/CTE
ADICIONAL VALOR:	CERO ($ 0.00) M/CTE
VALOR TOTAL CONTRATO:	DOS CIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE UN MIL CUARENTA Y DOS PESOS ($ 282,421,042.00) M/CTE

Estado Financiero del Contrato de Obra			CSAMCIH428 DE 2023	
Objeto: " CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDÍGENA YAKUAS EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA Y RESGUARDO INDÍGENA YANACONA - RUMIYACO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA"				
Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	**Fecha (dd/mm/aaaa)**	**Valor Acta**	**Amortización 25%**	**Valor pagado**
Valor Anticipo (25%)	10/05/2024	$ 70.605.260,50	$ 0.00	$ 70.605.260,50
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$ 282.421.042,00	$0,00	$ 282.421.042,00	$ 0.00	$ 282.421.042,00

HISTORIAL CRONOLÓGICO DEL PROYECTO				
ACTIVIDAD	**FECHA (dd/mm/aaaa)**	**DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS**	**DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS**	**NUEVA FECHA DE TERMINACION**
Iniciacion	04/12/2023			12/09/2024
Suspensión No. 1	28/12/2023	24		
Reiniciación No. 1	07/05/2024		131	
TERMINACIÓN Cto.	12/09/2024-	117		12/09/2024
TOTAL DIAS		**141**	**131**	

ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No.	Fecha
CONTRATO	CSAMCIH428	17 /11/ 2023
Acta de Inicio		04/12/2023
ACTA DE JUSTIFICACION DE MODIFICACION No.01 - ANTICIPO	1	05/12/2023
OTROSÍ N°1	1	07/12/2023
ACTA DE JUSTIFICACION No. 01 - SUSPENSION	1	28/12/2023
ACTA DE SUSPENSION	1	28/12/2023
ACTA DE JUSTIFICACION No. 02 - REINICIO	2	07/05/2024
ACTA DE REINICIO	1	07/05/2024

OTROSÍ No. 02 – Clausula 4 – Plazo de contrato	2	08/05/2024
ACTA DE SOCIALIZACON DE PROYECTO PITALITO	1	24/05/2024
ACTA DE VEEDURIA PITALITO	1	24/05/2024
ACTA DE SOCIALIZACON DE PROYECTO PALESTINA	1	24/05/2024
ACTA DE VEEDURIA PALESTINA	1	24/05/2024
ACTA DE MODIFICACION No.1 MAYORES Y MENORES	1	10/07/2024
ACTA DE JUSTIFICACION No.03 – PRORROGA Y BALANCE	3	11/07/2024
OTROSÍ No 03 – CLAUSULA 3 Y 4	3	11/07/2024

4.3. INFORMACION PRESUPUESTAL

PROYECTO PRESUPUESTAL:	CDP	RP	VALOR	VIGENCIA
PROYECTO 2023004410134 – CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDÍGENA YAKUAS EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA, FUENTE: 150103-9-RECURSOS PROPIOS - EXCEDENTES F2022	2023000685		$141.210.521	2023
PROYECTO 2023004410132 - CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDÍGENA YANACONA - RUMIYACO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA. FUENTE: 150103-9-RECURSOS PROPIOS -EXCEDENTES F2022	2023000684	2023000693	$141.210.521	2023
PROYECTO 2023004410134 – CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDÍGENA YAKUAS EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA, FUENTE: 50103- RB RECURSOS PROPIOS - EXCEDENTES F2022	2024000489	2024000510	$211815781,50	2024
PROYECTO 2023004410132 - CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDÍGENA YANACONA - RUMIYACO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA. FUENTE: 50103- RB RECURSOS PROPIOS -EXCEDENTES F2022				

4.4. RELACION DE POLIZAS DE GARANTIAS

Póliza actualizada

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Acta de Inicio – Anexo 0)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	560 - 47 - 994000171292	0	17/11/2023	Cumplimiento del contrato	17/11/2023	07/09/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	17/11/2023	07/09/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	17/11/2023	08/03/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	5 AÑOS	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Acta de inicio – Anexo 0)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	560 -74 - 994000031429	0	17/11/2023	17/11/2023	17/02/2024

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Acta de Inicio – Anexo 1)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	560 - 47 - 994000171292	1	05/12/2023	Cumplimiento del contrato	17/11/2023	07/09/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	17/11/2023	07/09/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	17/11/2023	08/03/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	5 AÑOS	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Acta de inicio – Anexo 1)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	560 -74 - 994000031429	1	05/12/2023	17/02/2024	08/03/2024

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Acta de reinicio No. 01– Anexo 2)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	**560 - 47 - 994000171292**	**2**	07/05/2024	Cumplimiento del contrato	17/11/2023	17/01/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	17/11/2023	17/01/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	17/11/2023	18/07/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	5 años	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Acta de reinicio No. 01– Anexo 2)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	**560 -74 - 994000031429**	2	07/05/2024	08/03/2024	18/07/2024

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Actualización de SMMLV – Anexo 3)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	**560 -74 - 994000031429**	3	07/05/2024	07/05/2024	18/07/2024

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Otro si No.03 – Anexo 3)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	**560 - 47 - 994000171292**	**3**	15/07/2024	Cumplimiento del contrato	17/11/2023	18/03/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	17/11/2023	18/03/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	17/11/2023	30/08/2024
				Estabilidad y Calidad de Obras	5 años	
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Otro si No.03 – Anexo 3)						
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)		VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	**560 -74 - 994000031429**	3	15/07/2024		18/07/2024	18/09/2024

5. DESIGNACIÓN APOYO A LA SUPERVISIÓN

- El día 14 de febrero el 2024, la ingeniera **NATALIA BUSTOS BOTERO** es designada mediante oficio por el Director del INDERHUILA **FELIPE VICTORIA BARRAGAN**, como apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. **CMCIH396 DE 2023** cuyo objeto es la "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDÍGENA YAKUAS EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA Y RESGUARDO INDÍGENA YANACONA - RUMIYACO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA". mediante proceso precontractual de invitación publica de mínima cuantía No. IPMCIH011-2023.

6. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Dentro de las actividades desarrolladas al seguimiento de la interventoría No. CMCIH396-2023 quien vigila el contrato de obra CSAMCIH428-2023 se tienen las siguientes:

- ✓ Citación a comité técnico virtual por medio del comunicado externo No. 2-2024-930, en base a las observaciones presentadas por el contratista de interventoría.

- ✓ Asistencia a reunión de comité técnico el día 9 de agosto de 2024, en aclaración de observaciones por parte del contratista de obra, presentadas por el contratista de interventoría descritas en el comunicado No. 1-2024-1374.

- ✓ Solicitud de presentación de informe mediante comunicado No. 2-2024-958.

- ✓ Se revisó el informe mensual de interventoría No.04 con fecha de entrega del 27 de agosto de 2024 y se verifica nuevamente el pago de seguridad social, planilla No. 7939310694 del Representante legal de interventoría y planilla No. 9470705261 del Director de interventoría.

- ✓ Asistencia a reunión de comité técnico el día 29 de agosto de 2024, junto con el contratista de obra e interventoría en definición de cambio de colores para la placa.

7. DECRIPCIÓN DEL AVANCE DE OBRA / INTERVENTORIA SEGÚN ACTA FINAL

De acuerdo con el informe de interventoría presentado el 09 de septiembre de 2024, se evidenció un avance operativo de obra del 72,82% en el resguardo Indígena Yakuas del municipio de Palestina y un avance del 74,716% en el resguardo indígena Yanacona Rumiyaco del municipio de Pitalito, para un avance acumulado mensual del 73,769% y total acumulado del proyecto del 86,816%.

Con base a lo anterior se ejecutaron en los dos frentes de las siguientes actividades:

- **CIMENTACION**
  - * Suministro e instalación de platina para pedestal de juego (incluye 4 pernos ø1/2" L=0.55 con arandela, tuerca y platina .25x.25 e=1/4")

- **PLACA DE CONTRAPISO**
  - * Placa de piso en concreto de 3000 PSI e=0,10 mts, incluye corte de juntas y sello y Malla electrosoldada 2,35X6 15X15 4mm
  - * Pintura en acrilico antideslizante base agua, resistente a la abrasión, intemperie, con aplicación de tres (03) manos a placa en concreto color según diseño incluye figuras.
  - * Cuneta en concreto de 3000 PSI, según diseño
  - * Placa de piso para area de Juegos en concreto de 3000 PSI e=0,12 mts, incluye corte de juntas y sello

- **INSTALACIONES MOVILES DE LOS PARQUES INFANTILES**
  - * Suministro, transporte e instalacion de circuito, según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación

* Suministro, transporte e instalación de modulo recreativo, según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación
* Suministro, transporte e instalación de carrusel (sencilla), según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación
* Suministro, transporte e instalación de columpio inclusivo. según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación
* Suministro, transporte e instalación de módulo triqui inclusivo. según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación
* Suministro, transporte e instalación de modulo Abaco inclusivo. según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación
* Suministro, transporte e instalación de modulo piano inclusivo. según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación

- **OBRAS COMPLEMENTARIAS**
  * Muro de contención en concreto ciclópeo - 3000 psi (**SOLO PARA PITALITO)**
  * Construcción de pedestales en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI de 30*30 altura 40 cm, para soportar barandas perimetrales. Incluye (2 pernos ø1/2" L=0.40 c/u, con arandela, tuerca y todas las actividades necesarias para correcta ejecución de la actividad)

Por otro lado, la interventoría realizó actividades administrativas del cual se constata:

a. Ha ejecutado el contrato de interventoría de acuerdo con los precios establecidos en la propuesta y con los propios medios, equipo y personal y con plena autonomía técnica y administrativa.

b. Ha cumplido con el pago de los aportes al sistema de seguridad social Integral, respecto al personal vinculado a la ejecución de interventoría.

c. A la fecha el Inderhuila se ha mantenido indemne de cualquier reclamación de terceras personas, subcontratistas y proveedores y demás servicios.

d. Ha velado por que el Inderhuila se mantenga indemne de cualquier reclamación de terceras personas, subcontratistas y proveedores y demás servicios que de forma indirecta se hayan requeridas para la ejecución del contrato.

e. Ha realizado la inspección y el control de las especificaciones técnicas, donde ha verificado los análisis de laboratorio de densidades y el diseño de mezcla de concreto.

f. Se ha inspeccionado los trabajos vigilando el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, en donde el contratista de obra ha tenido la señalización prudencia de utilización de equipos.

g. Se ha mantenido el Director de interventoría Javier Humberto Giraldo.

h. Se ha venido presentando los informes mensuales de interventoría.

i. Se ha solicitado al contratista de obra cumplir con los soportes de pago de seguridad social de los trabajadores.

j. Han revisado las sugerencias por parte del contratista respecto al cambio de altura del muro de contención en Pitalito de 0.40 a 0.55 teniendo en cuenta los niveles del terreno, cambios que fueron aprobados por interventoría, sin afectar el presupuesto oficial.

k. Se ha velado porque la ejecución del contrato de obra no se interrumpa injustificadamente.

l. Ha asistido a las reuniones programadas con la entidad.

m. Ha realizado los ensayos respectivos para la placa de piso.

n. Ha realizado el seguimiento a las actividades de obra ejecutadas y mediciones pertinentes.

o. Ha realizado el seguimiento de programa de gerencia de proyectos y plan de calidad.

p. Ha mantenido actualizadas las garantías del con trato de interventoría como el de obra.

8. ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO

RESGUARDO INDIGENA YAKUAS – MUNICIPIO DE PALESTINA HUILA

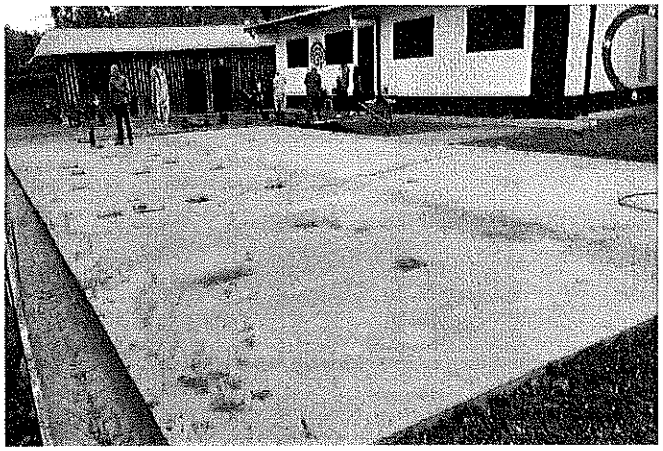


Ilustración 1. Placa de piso en concreto de 3000 PSI e=12

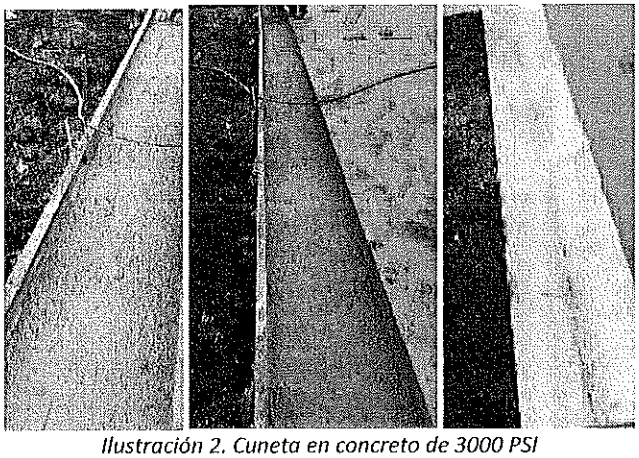
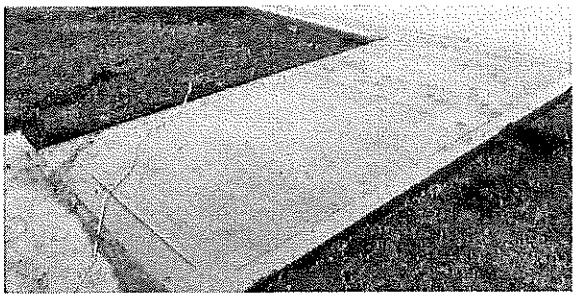


Ilustración 2. Cuneta en concreto de 3000 PSI



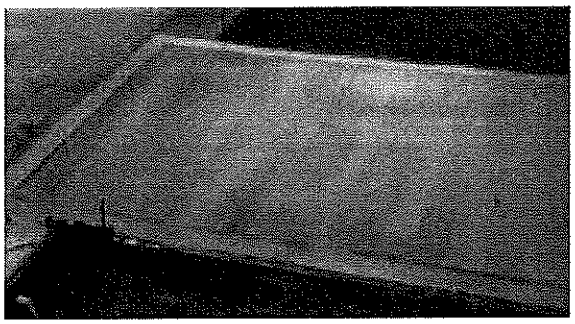
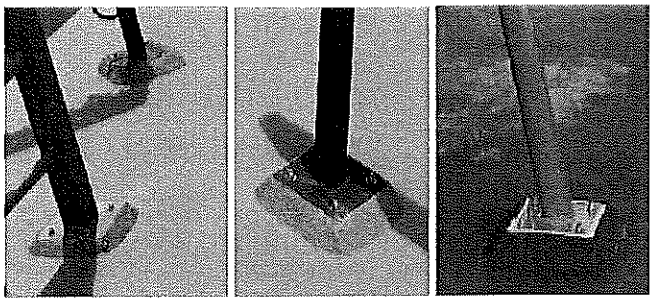


Ilustración 3. Placa de piso en concreto de 3000 PSI e=10 cm



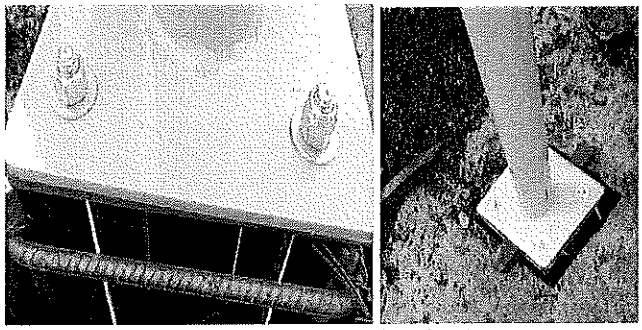


Ilustración 4. Platina para pedestales de juegos

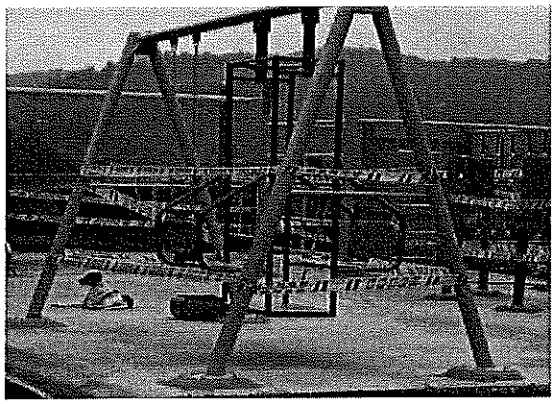


Ilustración 5. Mobiliario juego Culumpio inclusivo

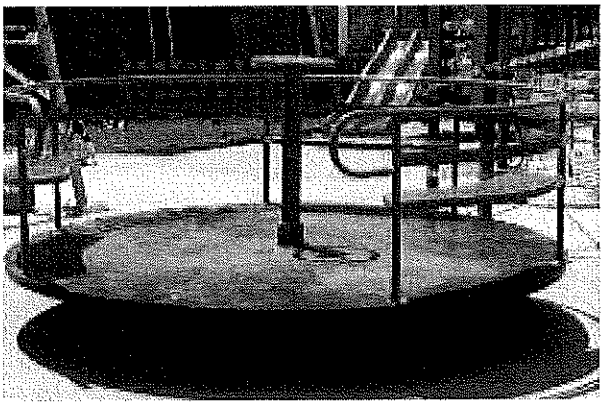


Ilustración 6. Mobiliario juego carrusel

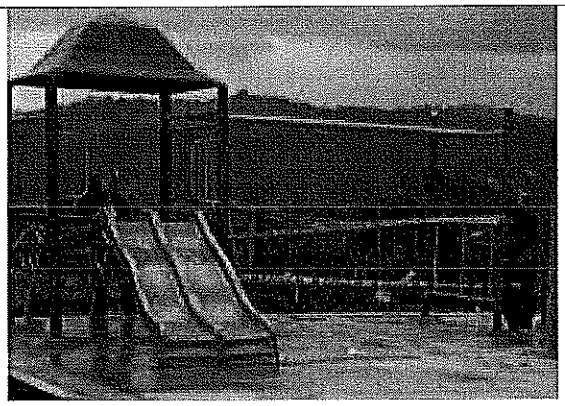


Ilustración 7. Mobiliario juego modulo recreaivo



Ilustración 8. Mobiliario juego Circuito



Ilustración 9. Mobiliario juego abaco



Ilustración 10. Mobiliario juego triqui



Ilustración 11. Mobiliario juego Piano

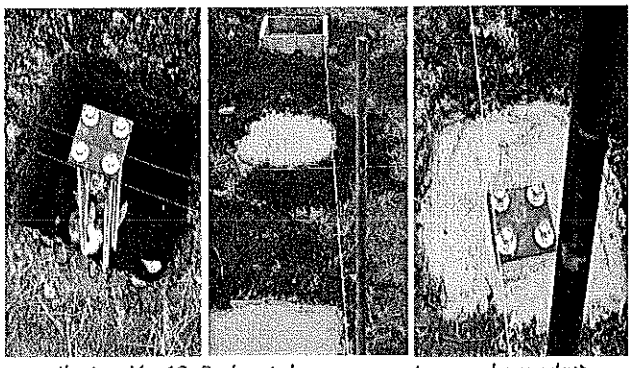
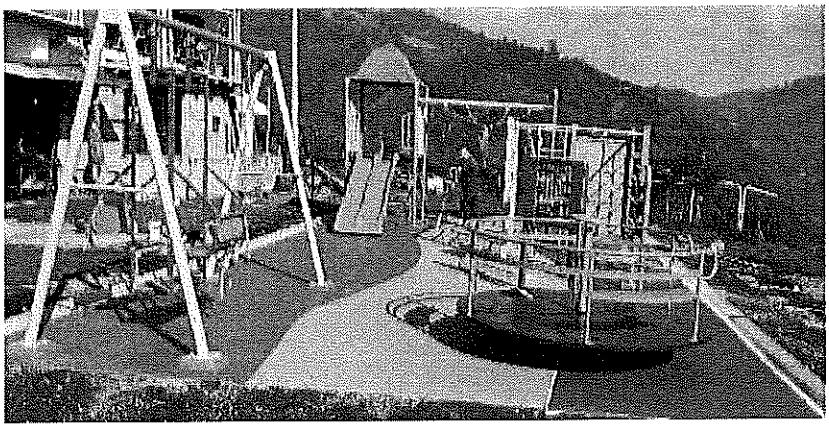


Ilustración 12. Pedesatales en concreto para baranda.



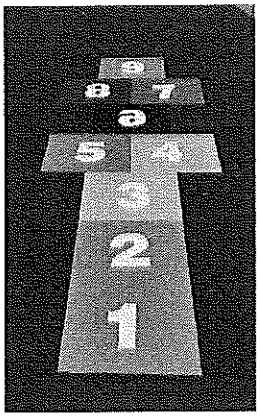


Ilustración 13. Pintura en acrilico para placa y rampa

RESGUARDO INDIGENA YANACONA RUMIYACO – MUNICIPIO DE PITALITO HUILA

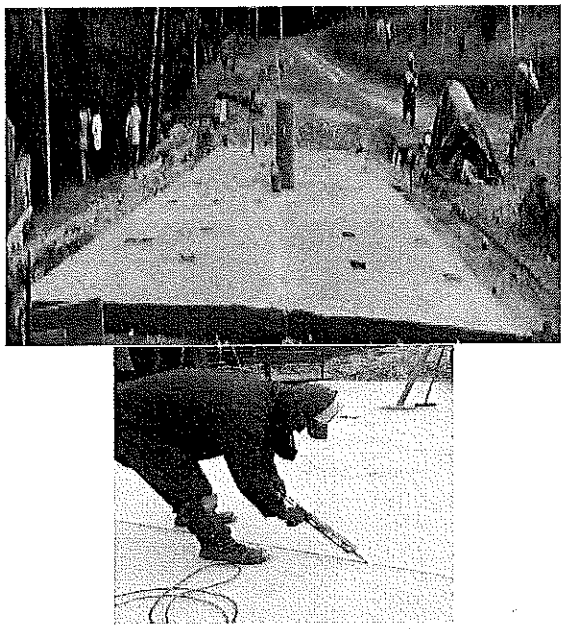


Ilustración 14. Placa de piso en concreto de 3000 PSI e=12

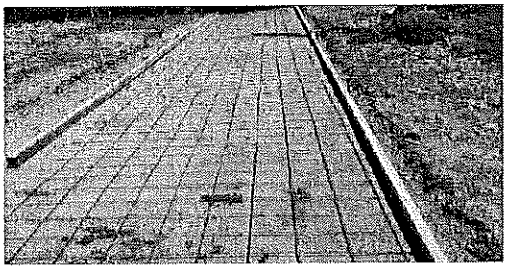
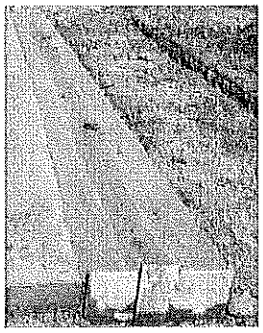




Ilustración 15. Placa de piso en concreto de 3000 PSI e=10






Ilustración 16. Cuneta en concreto de 3000 PSI

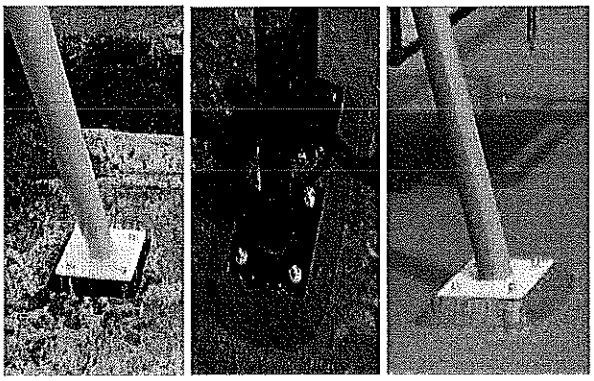


Ilustración 17. Platina para pedestales de juegos



Ilustración 18. Pedesatales en concreto para baranda.

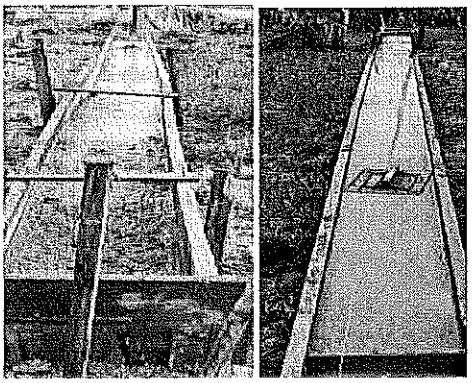


Ilustración 19. Muro ciclopeo

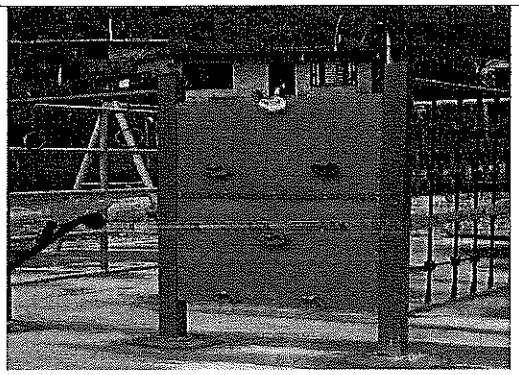


Ilustración 20. Mobiliario juego Circuito

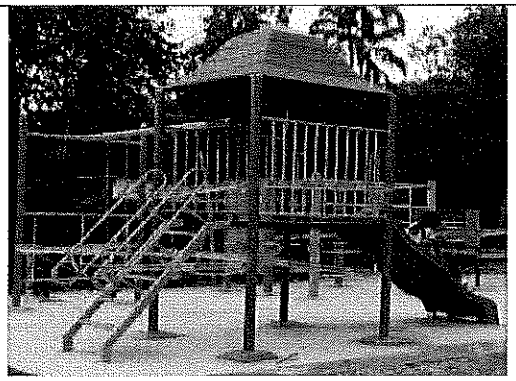


Ilustración 21. Mobiliario juego modulo recreaivo

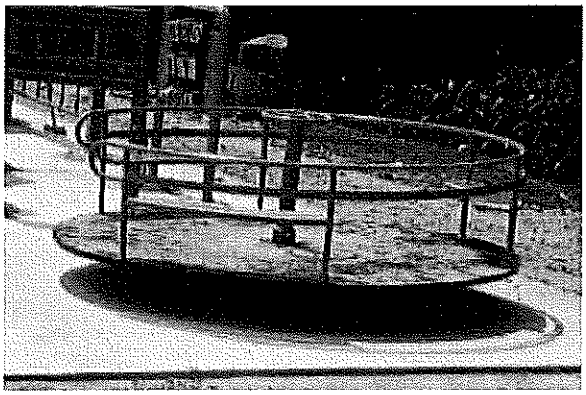


Ilustración 22. Mobiliario juego carrusel

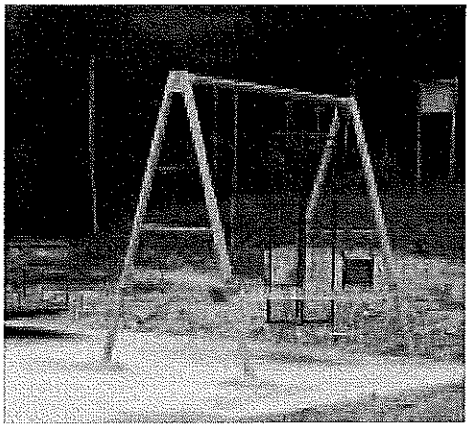


Ilustración 23. Mobiliario juego culumpio inclusivo

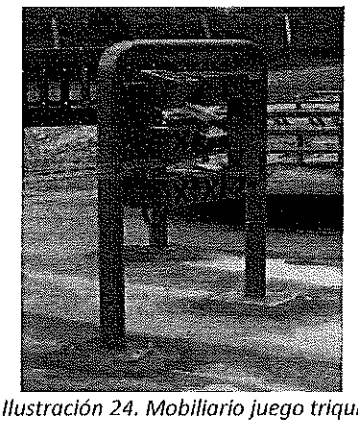


Ilustración 24. Mobiliario juego triqui

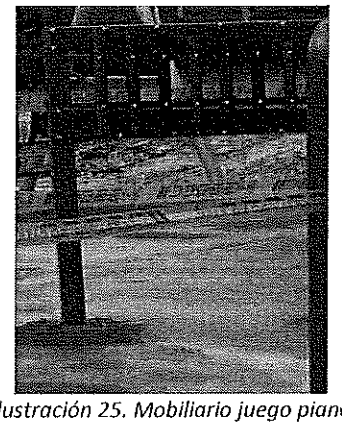


Ilustración 25. Mobiliario juego piano

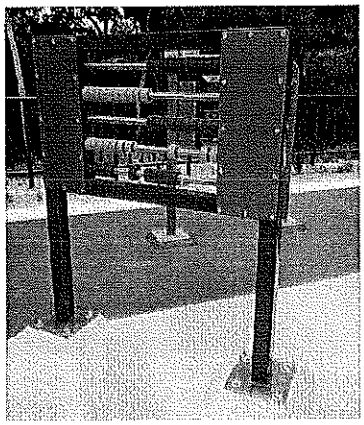


Ilustración 26. Mobiliario juego abaco






Ilustración 27. Pintura en acrilico para placa y rampa

Ing. NATALIA BUSTOS BOTERO
APOYO A LA SUPERVISIÓN
09/09/2024
