21 de Marzo de 2025.
Se continua con estructurado y armado de módulos en pasillo, adicional se realiza cargue de sobrepiso en el primer tramo del pasillo.
Personal en Obra: 2 Oficiales . 2 Ayudantes
Clima: Soleado.

22 de Marzo de 2025.
Se continua con estructurado y armado de modulos en superboard.
Personal en Obra: 1 Oficial . 1 Ayudante
Clima: Nublado.

23 de Marzo de 2025.
Se continuan actividades de modulos en superboard, adicional se realiza aplicación de esmalte en ventanas del pasillo perimetral.
Personal en Obra: 1 Oficial . 2 Ayudantes
Clima: Soleado.

25 de Marzo de 2025.
Se avanza con estructurado y armado del ultimo modulo de superboard, Se continua con aplicación de esmalte en ventaneria.
Personal en Obra: 1 Oficial . 2 Ayudantes
Clima: Soleado

26 de Marzo de 2025.
Se continua con estructurado y armado de módulo en superboard., se comienza con actividades eléctricas en pasillo perimetral.
Personal en Obra: 2 Oficiales . 2 Ayudante
Clima: Soleado.

27 de Marzo de 2025

Se finaliza armado de modulos. se comienza con aplicación de pintura de esmalte, adicional se continua con actividades eléctricas, especificamente cableado e instalación de luminaria tipo tortuga, tambien se realiza aplicación de esmalte sobre ventaneria.

Personal en Obra: 2 Oficiales · 2 Ayudantes

Clima: Soleado.

28 de Marzo de 2025.

Se realiza aplicación de masilla y posterior pintura de esmalte en los demás modulos, adicional se aplica pintura en zona de primer frame en pasillo, Se realizan remates generales en pasillo y se finaliza. instalación de luminarios tipo tortuga.

Personal en Obra: 2 Oficiales · 2 Ayudantes

Clima: Soleado

Adicional se le recuerda al contratista subsanar pendientes relacionados a remate de pintura en comedor I y. plancha en cuarto de cilindros de Gas.

29 de Marzo de 2025.

Se realiza instalación de puertas en alvanio en modulos de superboard en pasillo, se continua con remates generales, adicional se le recomienda al contratista retirar herramientas y elementos utilizados con el fin de poder despejar los espacios intervenidos y proceder con la entrega.

Personal en Obra: 2 Oficiales 2 Ayudante

Clima: Nublado.

31 de Marzo de 2025

Se realizan remates, se adecuan rateras externas.

sigue pendiente el retiro de herramientas y equipos.

Personal: 1 Oficial. 2 Ayudantes — Clima: Nublado.

01 de Abril de 2025:
Se realiza recorrido conjunto entre contratista e interventoría, revisando los trabajos realizados, evidenciando la finalización de los mismos, dando por terminadas las actividades en la unidad operativa.

09 de Abril de 2025.
Se realiza recorrido final entre coordinación de la sede, contratista de Obra e interventoría, verificando las actividades realizadas, procediendo con la entrega final de los espacios.

§13. CENTRO DIA.
TEJEDORES DE SUEÑOS.

CONTRATO DE OBRA: 9198-2024.
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL
NIT: 901.889.243-7.

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 9221-2024.
CONTRATISTA: TRIPLE C.
NIT: 901.256.066-3.

RELACIÓN DE FIRMAS.

Director de Obra

Director de Interventoría

Residente de Obra.

Residente de Interventoría.

Inspector de Obra.

Inspector de Interventoría.

28 de Febrero de 2025.
Se continua con resanes y lijado de muros internos de la U.O.
Personal en Obra: 1 Maestro · 1 Oficial · 1 Ayudante
Clima: Soleado.

28.02.25 Est. Ingreso a las 7:00am ~~1~~ Est. 20F 04. del contratista de Andrio Cely se anexa orden y acta; se realiza acondicionamiento Est. Act. de lijar, y aplicar estuco.

01 de Marzo de 2025.
Se continua con resanes y lijado de muros internos de la U.O.
Personal en Obra: 1 Oficial · 1 Ayudante
Clima: Soleado.

03 de Marzo de 2025.
Continuan con trabajos de resanes y estuco en oficina administrativa. se adecuan ventanas del comedor.
Personal en Obra: 1 Oficial · 1 Ayudante
Clima: Nublado.

04 de Marzo de 2025
Se realiza fundida de concreto de limpieza sobre material de relleno localizado en rampa, adicional se realiza demolición de acabado de piso en pasillo de entrada externo y de entrada a shut de basuras.
Personal en Obra: 1 Oficial - 2 Ayudantes
Clima: Nublado.

05 de Marzo de 2025.
Se continua con resanes y se da inicio a la aplicación de la primera mano de Vinilo T1 en oficina administrativa.
Personal en Obra: 1 Oficial - 1 Ayudante
Clima: Nublado.

06 de Marzo de 2025
Se continua con trabajos de Resane y Pintura.
Personal en Obras 1 Oficial - 1 Ayudante / Clima: Lluvioso

07 de Marzo de 2025.
Se continua con trabajos internos de resane y pintura en zona de gimnasio.
Se le recomienda al contratista revisar los desagües de los lavamanos instalados, verificando que no queden filtraciones en los mismos.
Personal en Obra: 1 Oficial. 1 Ayudante
Clima: Soleado.

08 de Marzo de 2025.
Se continua con resanes y lijado de muros internos
Personal en Obra: 1 Oficial. 1 Ayudante.
Clima: Soleado.

10 de Marzo de 2025.
Continuan con actividades de resane y lijado.
Se le recomienda al contratista incluir más personal operativo, dado que no se evidencia avance significativo
Personal: 1 Oficial. 2 Ayudantes
Clima: Soleado.

11 de Marzo de 2025.
Se comienza aplicación de pintura vinilo Tipo 1, en zona de ingreso baños.
Personal en Obra: 2 Oficiales. 2 Ayudantes.
Clima: Soleado.

12 de Marzo de 2025.
Se continua con aplicación de pintura vinilo tipo 1, en zona de gimnasio.
Personal en Obra: 2 Oficiales - 2 Ayudantes.
Clima: Soleado.

13 de Marzo de 2025
Se continua con aplicación de pintura y se comienza alrestado de piso externo.
Personal en Obra: 2 Oficiales. 2 Ayudantes / Clima: Nublado

14 de Marzo de 2025.
Se adecua espacio para comenzar con fundida de placa de rampa, así mismo se realizó la instalación de malla electrosoldada, se comienza instalación de enchape en zona externa de cuartos de basura
Personal en Obra: 1 Encargado, 2 Maestros, 3 Ayudantes.
Clima: Nublado.

14 de marzo de 2025. SST. Ingreso de 1 SST 1 residente 1 inspector de obra. Contratista Andrés Coly 1 of 1 representante del fundir rampla. Inf. AC. enchafle se realiza acompañamiento SST.

15 de Marzo de 2025.
Se continua con enchape en zona externa, se retoman actividades de aplicación de pintura tipo Vinilo
Personal en Obra: 1 Oficial. 3 Ayudantes.
Clima: Soleada

17 de Marzo de 2025
Se avanza con aplicación de pintura tipo vinilo zona de gimnasio, adicional se avanza con enchape externo.
Personal en Obra: 2 Oficiales. 3 Ayudantes.
Clima: Lluvioso.

18 de Marzo de 2025.
Se avanza con enchape de cuarto externo y se finaliza enchape de piso en zona de acceso.
Personal en Obra: 2 Oficiales. 2 Ayudantes
Clima: Soleado

19 de Marzo de 2025:
Se continua con pintura tipo vinilo y se comienza aplicación de esmalte de 1.50
Personal en Obra: 1 Oficial 1 Ayudante
Clima: Soleado

20 de Marzo de 2025.
Continuan con actividades de pintura al interior y remates de enchape en zona de cuarto externo.
Personal en Obra: 1 Oficial - 1 Ayudante
Clima: Soleado.

21 de Marzo de 2025.
Se finaliza instalación de puerta principal, adicional se realiza instalación de cielorraso PVC en cocina. se continua con aplicación de pintura de esmalte h: 1.50
Personal en Obra: 1 Oficial - 1 Ayudante.
Clima: Soleado.

22 de Marzo de 2025.
Se finaliza instalación de Cielorraso en cocina, se continua con aplicación de pintura, adicional se comienza armado de estructura para pergola externa.
Personal en Obra: 2 Oficiales - 2 Ayudantes
Clima: Nublado.

23 de Marzo de 2025.
Se continua con armado de estructura para pergola externa. adicional continuan actividades de pintura.
Personal en Obra: 2 Oficiales - 2 Ayudantes
Clima: Soleado

24 de Marzo de 2025
Se finaliza armado de estructura para pergola externa.
Personal en Obra: 1 Oficial - 1 Ayudante.
Clima: Soleado.

25 de Marzo de 2025.
Se continua con aplicación de segunda mano de pintura de techos en baños.
Personal en Obra: 1 Oficial - 1 Ayudante
Clima: Soleado.

26 de Marzo de 2025
Se realiza emboguillado de ladrillo en fachada y se aplica esmalte a puertas de cocina y alacena
Personal en Obra: 1 Oficial. 1 Ayudante
Clima: Soleado

27 de Marzo de 2025.
Se continua con emboguillado de ladrillo en fachada y antepechos maceras, se continua con aplicacion de esmalte sobre puertas de cocina y alacena.
Personal en Obra: 1 Oficial. 2 Ayudantes.
Clima: Soleado.

28 de Marzo de 2025.
Se comienza el lavado del ladrillo en fachada, y se continua con aplicacion de esmalte en puertas y barandas internas
Se le recomienda al contratista incorporar mas personal para culminar las actividades en las fechas establecidas según cronograma.
Personal en Obra: 1 Oficial. 2 Ayudantes
Clima: Soleado.

29 de marzo de 2025.
se comienza la Pintura de los muros externos de la fachada y limpieza del lugar.
Personal: 1 Oficial, 3 ayudantes
Clima: Soleado.

30 de marzo de 2025
Se continua con la Pintura de los muros de fachada, instalacion de Canal y bajantes, Pintura de reja de puerta e instalacion de Policarbonato y baranda rampa, se detienen actividades por motivos de lluvia desde la 13:00
Personal: 2 oficiales, 1 ayudante Clima: lluvioso.

31 de marzo de 2025.
Se continua con instalación de Baranda rampa, Pintora de muros Fachada, se detienen actividades por lluvias a las 10:20 am. de soldadora y Pintora. Se activan labores a las 10:53 am Unicamente de soldadura.
Personal en obra: 2oficiales, 5 ayudantes.
Clima: lluvioso.
A las 11:15 se continua con pintura de fachada e instalacion de rejas externas

01 de Abril de 2025.
Se continua con instalacion de luminarias Faltantes, Instalacion de techo en PVC en el shut de basuras arreglo de canal de Pergola
Personal: 1 oficial, 3 ayudantes.
Clima: Soleado.

02 de abril de 2025.
Se finaliza instalacion de techo en PVC en el shut y bodega, se continua con los arreglos de pintura pendientes.
Personal: 1 oficial, 2 ayudantes.
Clima: soleado.

03 de abril de 2025.
Se realiza instalacion de pasamanos externo, se realiza Pintura de señalizacion y detalles de pintura.
Personal: 1 oficial, 2 ayudantes.
Clima: lluvioso.
04 de abril de 2025.
Se realiza Pintura de columnas externas, instalacion de pelicula en ventanas administrativa, Pintura rampa.
Personal: 1 oficial, 2 ayudantes.
Clima: Soleado.

07 de Abril de 2025.
Se realiza recorrido, realizando revisión de actividades pendientes determinando que todo se finalizó correctamente. [illegible] C.

08-04-25 DIA LLUVIOSO, Ingreso de 1 SST de CSM 2 Of. Act. Pomate. en Aplicar Sello 4 Pintura, Acompañamiento SST. C.

11 de Abril de 2025.
Se realiza recorrido final entre coordinación de la sede, contratista e interventoría, revisando trabajos realizados procediendo con la entrega final del espacio. [illegible] C.

35. JARDIN INFANTIL RINCÓN DE LAS ARDILLAS.

CONTRATO DE OBRA: 9198 - 2024.
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL.
NIT: 901.889.243-7.

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 9221-2024.
CONTRATISTA: CONSORCIO TRIPLE C. SAS.
NIT: 901.286.066-3.

RELACION DE FIRMAS.

Director de Obra

V°B°

Director de Interventoría.

V°B°

Residente de Obra.

V°B°

Residente de Interventoría.

Inspector de Obra

Inspector de Interventoría.

28 de Febrero de 2025
No se ejecutan actividades.

01 de Marzo - No se ejecutan actividades.

03 de marzo de 2025.
No se realizan actividades.

04 de Marzo de 2025
No se ejecutan actividades

05 de Marzo de 2025.
No se ejecutan actividades.
Nota: De acuerdo a lo conversado en comité semanal, la interventoría realizó visita para determinar el estado del manto instalado en terrazas 1 y 2, evidenciando empozamientos en diversos puntos, se le manifiesta al contratista que se debe corregir para evitar afectaciones futuras.

06 de Marzo de 2025
No se ejecutan actividades

07 de Marzo de 2025
No se ejecutan actividades
Nota: Se le recalca al contratista la necesidad de corregir lo antes posible las observaciones del manto, como los empozamientos y falta de adherencia en algunos puntos, tanto perimetrales como entre traslapos.

08 de Marzo de 2025
Se realiza aplicación de pintura bituminosa de Alcanfor.
Personal en Obra: 1 Oficial.
Clima: Soleado.

10 de Marzo de 2025
No se ejecutan actividades

11 de marzo de 2025.
Se aprueba la actividad del aislo caso en la zona de la cocina, se le pregunta a la coordinadora gte si podemos comenzar el dia jueves. 13 de marzo y queda en confirmarnos en la hora de la tarde.

12 de Marzo de 2025
No se ejecutaron actividades.

13 de Marzo de 2025.
La sede despeja los espacios de la cocina, salón párvulos y prejardin 1 y 2, de este modo se comienzan actividades de desmonte de Cielorraso en cocina y resanes y estuco en muros de salones, adicional personal de Plantas Físicas realizó el retiro de un tramo de instalación de la Red de gas, para poder continuar con desmonte de cielorraso.
Personal en Obra: 1 Maestro; 2 Oficiales; 2 Ayudante
Clima: Nublado.

14 de Marzo de 2025.
Se finaliza instalación de cielorraso en cocina, se procede a encintar, masillar e instalar moldaccaño PVC, adicional se comienza aplicación de pintura tipo vinilo en salones de segundo piso
Personal en Obra: 1 Maestro, 2 Oficiales, 2 Ayudantes
Clima: Lluvioso

16 de Marzo de 2025.
Se finaliza instalación de medicación en cocina y se realiza aplicación de pintura epoxica en cielorraso instalado, adicional se continua con la aplicación de pintura de esmalte h: 1.50 en los salones
Personal en Obra: 2 Oficiales 2 Ayudantes
Clima: Soleado.

17 de Marzo de 2025.
Se realiza recorrido conjunto entre coordinación, contratista de obra e interventoría, verificando el estado de los trabajos realizados en cocina y salones de 2do Piso, determinando que se finalizaron actividades correctamente, se procede a realizar entrega parcial
Se realiza aplicación de estuco en muros de jardineras.
Personal en Obra: 2 Oficiales 3 Ayudantes
Clima: Lluvioso.

18 de Marzo de 2025
Se continua con actividades en muros de jardineras, se finaliza aplicación de estuco y se comienza aplicación de pintura tipo koraza.
Personal en Obra: 1 Oficial. 1 Ayudante
Clima: Soleado.

19 de Marzo de 2025.
No se ejecutan actividades

20 de Marzo de 2025
No se ejecutaron actividades.

21 de Marzo de 2025
No se ejecutaron actividades

22 de Marzo de 2025
No se ejecutaron actividades

25 de Marzo de 2025
No se ejecutaron actividades
Se le recomienda al contratista subsanar observación frente a filtración en jardinera II.

26 de Marzo de 2025
No se ejecutaron actividades

27 de Marzo de 2025.
No se ejecutaron actividades
Nuevamente se le recomienda al contratista subsanar observaciones tanto en jardinera I. (pintura en bordillo) y en jardinera II (manto). para proceder con la entrega de los espacios.

28 de Marzo de 2025.
Se retoman actividades, retirando manto en zona afectada en jardineras y cargando alistados que permitan la evacuación del agua.
Personal en Obra: 1 Oficial.
Clima: Soleado

29 de Marzo de 2025.
Se realiza imprimación de zonas donde se cargaron alistados de piso nuevamente.
Personal en Obra: 1 Oficial.
Clima: Soleado.

30 de Marzo de 2025
Se realiza instalación de manto en jardineras 1 y 2.
Personal: 1 Oficial. 1 Ayudante / Clima: Nublado

31 de Marzo de 2025
Se realizan remates de estuco y pintura, pero se detienen actividades por lluvias.
Personal en Obra: 1 Oficial.
Clima: Lluvioso.

01 de Abril de 2025.
Se realiza recorrido conjunto entre contratista e interventoría, revisando los trabajos realizados evidenciando la culminación de estos, dando por terminadas las actividades en la unidad operativa.

09 de Abril de 2025.
Se realiza recorrido final entre coordinación de la sede, contratista de Obra e interventoría, verificando las actividades realizadas, procediendo la entrega final de los espacios.

SB. CULTURA POPULAR
YANACONA MUYU KAWSAY.

CONTRATO DE OBRA: 9198 - 2024.
CONTRATISTA : CONSORCIO SAN MIGUEL
NIT: 901.889.243 - 7.

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 9221 - 2024.
CONTRATISTA: CONSORCIO TRIPLE C. S.A.S.
NIT: 901.256.066 - 3.

RELACIÓN DE FIRMAS

Director de Obra.

Director de Interventoría.

Residente de Obra.

Residente de Interventoría

Inspector de Obra.

Inspector de Interventoría

Medidas.

muros laterales.

→ Contenedor 1

atras

2,13 x0,20 (x3)

2,13 x0,96 (x2)

lateral 1

2,33 x0,96

3,30 x0,20

• frontal

2,13 x.0,20 (x3)

2,13 x0,20 (x2)

lateral 2

4,50 x 0,96

Contenedor 2

atras

2,13 x0,20 (x2.))

2,13 x0,96 (x3)

lateral 1

2,33 x0,96

3,30 x0,20


frontal.

2,13 x0,20 (x3)

2,13 x 0,96 (x2)

lateral 2

4,50 x 0,96 .

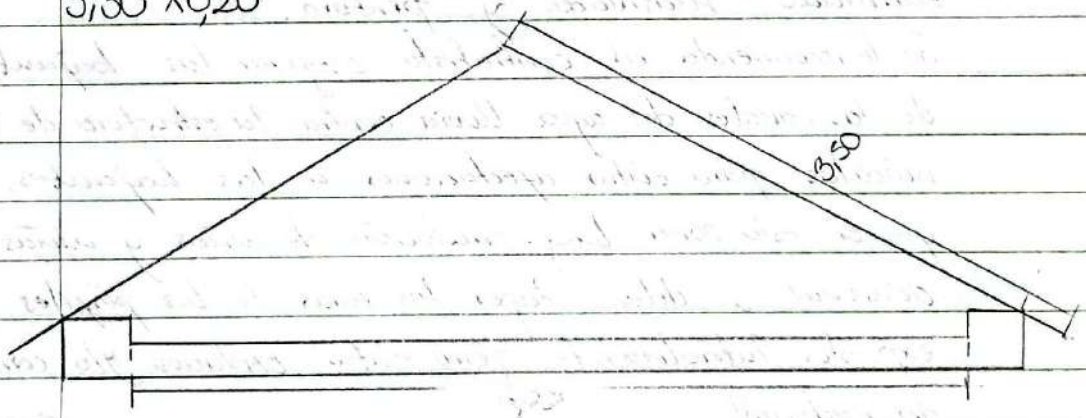

01 de Marzo de 2025.
Se continua con la instalación de muro en superboard en sala materna, resane, adicional se realiza la instalación del Canal de agua.
Clima Soleado
Personal: 1 Oficial, 1 ayudante.

03 de Marzo de 2025.
se continua con la instalación de Canal de agua en la sala materna, se termina de instalar muro en superboard resane y Pintura.
Clima: Soleado.
Personal: 1 Oficial, 1 ayudante

04 de marzo de 2025.
Se continuan actividades de muros en superboard. encintado, masillado y pintura.
Se le recomienda al contratista asegurar las bajantes de las canales del agua lluvia contra la estructura de los módulos para evitar afectaciones a las bajantes, dado que en esta zona hay circulación de niños y niñas, adicional se deben tapar las caras de los perfiles expuestos lateralmente para evitar oxidación y/o corrosión del material.
Clima: Nublado.
Personal: 1 Oficial.

05 de marzo de 2025.
Se continuan con las actividades de resane, masilla y Pintura en los muros en superboard
Clima: nublado
Personal 1 oficial.

06 de Marzo de 2025.
Se continua con remates del Superboard.
Clima: Lluvioso
Personal en Obra: 1 Oficial.

07 de Marzo de 2025.
Se continua con remates de superboard módulo de sala materno, se le recuerda al contratista que se deben asegurar las bajantes lo más pronto posible para proceder con la entrega a interventoría.
Clima: Nublado,
Personal en Obra: 1 Oficial.

08 de Marzo de 2025
Se realiza remate superior en Superboard, sellando los vacios entre el contenedor y la sobrecubierta.
Clima: Soleado
Personal: 1 Oficial.

10 de Marzo de 2025.
Se continua con remate superior de Superboard.
Clima: Soleado
Personal en Obra: 1 Oficial . 1 Ayudante.

11 de Marzo de 2025.
Se realiza recorrido en conjunto entre contratista e interventoría, revisando los trabajos ejecutados en la sede, encontrando observaciones que se deben subsanar para la entrega final a la coordinación de la sede y la S.D.I.S.
Personal en Obra: 2 Oficiales . 2 Ayudantes
Clima: Soleado.

12 de Marzo de 2025.
Se realiza entrega de espacios intervenidos a Coordinación

21 de Marzo de 2025
Se realiza visita a la rede, se hace socialización con la profesora Jehidy Magín, a quien se le informa el alcance de actividades adicionales como son: Impermeabilización contenedores (cubierta) cocina y alacena, pintura de elementos metálicos en la fachada (verticales/horizontales) pintura baranda rampa, pintura sobre board base rampe con cocina, aseo del policarbonato. Estas actividades iniciarán el martes 25/03/2025 JWB.
Jehidy Magín - Maestra encargada

25 de Marzo de 2025.
De acuerdo a revisión realizada sobre las actividades previstas en zona de cocina y alacena (cubierta), se identifica que no es posible adelantar dichos trabajos por temas presupuestales y la premura del tiempo, que impide ejecutar los trabajos requeridos para garantizar una solución eficaz. se determina continuar con la intervención de fachada.
Se comienza intervención en fachada, con el lijado de elementos metálicos (barandas).
Personal en Obra: 1 Oficial · 1 Ayudante.
Clima: Soleado.

26 de Marzo de 2025.
Se continuan trabajos en fachada, lijado de elementos metálicos, (perfiles verticales) y resanes en laterales de rampa.
Personal en Obra: 1 Oficial · 1 Ayudante
Clima: Soleado.

27 de Febrero de 2025.
Se continuan trabajos en fachada, especificamente aplicación de pintura de esmalte sobre barandas de rampa de acceso.
Personal en Obra: 1 Oficial. 1 Ayudante.
Clima: Soleado.

28 de Marzo de 2025
Se continua con trabajos en fachada, especificamente aplicación de esmalte sobre perfiles principales de la estructura de modulos
Personal en Obra: 1 Oficial
Clima: Soleado

29 de Marzo de 2025.
Se realiza instalación de laminas de Superboard en fachada, se continua con aplicación de esmalte y koraza en barandas y laminas
Personal en Obra: 1 Oficial. 1 Ayudante.
Clima: Nublado.


31 de Marzo de 2025.
Se avanza con remates y aplicación de pintura en superboard existente en laterales de rampa, adicional se corrigen detalles de esmalte en perfiles de estructura principal.
Personal en Obra: 1 Oficial.
Clima: Nublado.

01 de Abril de 2025
Se realiza recorrido revisando las actividades realizadas en la sede; dando por terminado los trabajos en la unidad operativa. se programa entrega final la siguiente semana.


09 de Abril de 2025.

Se realiza recorrido conjunto entre coordinación de la sede, contratista de obra e interventoría, verificando los trabajos realizados en la sede, procediendo con la entrega final de los espacios.


01/03/2025 Continua desmonte de losetas en cubiertas, retiro de monto sobre cubiertas
Clima: Nublado
Personal en obra: 2 Ayudantes, 1 Insp de obra
1 Insp de Interventoria, 1 Insp SST.




02/03/2025 No se ejecutaron actividades de obra. Dia Domingo.




03/03/2025 Picado de membrana sobre la terraza de media luna
Clima: Nublado / Lluvioso 1:20 a 3:30
Personal en obra:
2 Ayudantes
1 Insp de obra
1 Insp de Interventoria.
1 Insp SST
1 Residente de obra
1 Residente Interventoria.
1 Director de obra.




04/03/2025 Demolición de acabado y alistado de piso en terraza de media luna, se detienen actividades en las horas de lluvia.
Clima: Lluvioso / 1:10 a 4:30
Personal en obra:
1 Oficial, 1 Ayudante
1 Residente de obra
1 Inspectora de obra
1 Inspector de Interventoria.



05/03/2025 Continuan demolición de alistado de piso en cubierta del centro día,
Clima: Nublado, Lluvioso 13:00 P.M a 14:00 P.M.
Personal en obra: 1 Inspecta de obra
1 Inspecta SST
2 Ayudantes, 2 Oficial.



06/03/2025 Continuan con demolición de alistado de piso y retiro de RCO proveniente de esta actividad.
Clima: Nublado
Personal en obra: 1 Residente de obra
1 Inspecta de obra
1 Director de obra
1 Inspecta interventoría
2 Oficiales, 2 Ayudantes.




07/03/2025 Continuan con demolición de alistado de piso en las terrazas contiguas a la cocina.
Clima: Nublado / Lluvioso: lluvia Moderada
Personal en obra: 1 Inspecta de obra
1 Inspecta SST
2 Oficiales, 2 Ayudantes.




08/03/25 Continuan con demolición de alistado de piso y acopio del RCO proveniente de esta actividad.


Clima: Nublado / Lluvioso: lluvia Nocturna.
Personal en obra:
1 Inspector de obra
1 Inspector de Interventoría
2 Inspector SST
2 Oficiales, 2 Ayudantes.




09/03/2025 No se ejecutaron actividades de obra, Día Domingo.



10/03/2025 Continua con demolición de alistado de piso en las cubiertas del centro Día.
Clima: Nublado / Lluvioso: lluvia Nocturna
Personal en obra:
2 Oficiales, 2 Ayudantes
1 Inspector de obra
1 Inspector de Interventoría
2 Oficiales, 2 Ayudantes
1 Director de obra.
1 Residente de obra.
2 Instaladores de puntos de anclaje



11/03/2025 Inicia instalación de puntos de anclaje sobre la cubierta con gravilla. Continua demolición de alistado de piso en las cubiertas del centro Día. lluvias Nocturnas
Clima: Nublado / Lluvioso. 2 Instaladores
Personal en obra:
1 Inspectora SST
1 Maestro de obra
2 Oficiales, 2 Ayudantes
1 Inspector de obra
1 Inspector de Interventoría.



12/03/2025 Continuan y finalizan con instalación y certificación de puntos de anclaje sobre terraza de gravilla
Continuan con demolición de alistado de piso.
Personal en obra:
1 Maestro, 2 Oficiales
2 Ayudantes, 1 Insp de obra
1 Insp de Interventoria.
1 Residente de obra
1 Inspectos SST.
2 Instaladores de puntos de anclaje.

En horas de la tarde ingreso a obra por punto autorizado a Área de acopio 20 bultos de Cemento. Para actividad de Afinado de piso en terraza.
- Se han evidenciado lluvias en la zona, en horas laborales y en horas nocturnas estas con mayor intensidad. Se Cubre las áreas demolidas con plastico para mitigar las filtraciones bajo placa y en espacios inferiores.

Firmas: Inp. obra. R. obra.

13/03/2025 Inicia alistado de piso en la terraza contigua a la cocina, se vaciaron las maestras de las crestas (puntos mas altos del alistado) para verificación de niveles y pendientes en esta zona.
Personal en obra:
1 Maestro de obra
2 Oficiales, 2 Ayudantes.
1 Inspector de obra
1 Inspectos de Interventoria.
Clima: Nublado.

Se realiza recorrido y levantamiento de actas de vecindad.


19/03/2025 Continuan con alistado de piso en terraza contigua a la cocina.

Clima: Lluvioso de 7 am - 8:30 am
Personal en obra:
1 Maestro de obra
2 Oficiales, 1 Ayudante.
1 Residente de obra.
1 Inspector de obra
1 Inspector de Interventoria







15/03/2025 Inicia afinado del piso en cocina y verificación de niveles en terraza corredor, continua la demolición en terraza. Se Vaciaron maestras de la cresta para Verificación de niveles y pendiente de terraza.
se realizo 1 Viaje de retiro de escombro.
Clima: nublado / soleado.
Personal en obra:
1 Maestro de obra
2 Oficiales, 5 Ayudantes
1 Inspector de obra
1 Inspector SST






16/03/2025 No se ejecutaron actividades. Dia Domingo.

17/03/2025 Continuan con alistado de piso en la zona del corredor de las terrazas del centro Día.
Clima: Lluvioso [10:00 A.M - 11:20] y [12:40 - 3:00 P.M]
Personal en obra:
1 Maestro de obra
1 Oficial, 4 Ayudantes
1 Inspector de obra
1 Inspector SST
1 Inspector de Interventoria





18/03/2025 Continuan con alistado de piso y vaciado de maestras sobre la cubiertas del centro Día
Clima: Nublado / lluvioso : 12:00 P.M. a 12:05 P.M.

Personal en obra: 1 Inspector de obra
1 Inspector de Interventoría
1 Maestro de obra
1 Oficial, 4 Ayudantes.

Se solicita nuevamente al contratista reforzar el personal operativo y se recomienda asignar una cuadrilla de trabajo para cada zona en específico, teniendo en cuenta que estamos a 14 días calendario de finalizar el contrato y que las zonas se pueden intervenir paralelamente. Además se solicita priorizar la instalación del manto en la terraza sobre el comedor ya que esta lleva bastante tiempo sin impermeabilizar y puede generar filtraciones y que además se están presentando fisuras sobre este alistado.

19/03/2025 Inicia construcción de media caña sobre terraza contigua a la cocina del segundo piso, continúan con alistado de piso sobre terraza de media torta.

Clima: Nublado. Lluvioso. 3:40 P.M. a 5:40 P.M.

Personal en obra: 1 Inspector de obra
1 Inspector interventoría
1 Maestro de obra
1 Oficial, 4 Ayudantes.

Se solicita generar rugosidad en la superficie de la media caña para garantizar la adherencia del nuevo elemento.

Inp. Obra

20/03/2025 Inicia Retiro de gravilla en cubierta alistado de piso en terraza transitable y continua la demolición en terraza y media caña sobre comedor.
Clima: nublado
Personal en obra:

1 Director de obra
2. Residentes de obra
4 Inspectores de obra.
2 Inspector SST.
1 Inspector Ambiental
1 Contratista
1 Encargado de obra
4 Oficiales
1 Ayudante.

Imp. Obra.

21/03/2025 Ingresa Pluma y se deja montada en terraza sillar. Continuan con la media caña en terraza sobre comedor hasta Pozillo, se Continua con el alistado de piso en terraza con media tota y se realizan las maestras del siguiente tramo. Se hace retiro de geo textil en area de gravilla terraza. Se realiza aseo en Area de terraza comedor para iniciar con el impermeabilizado para la aplicación del manto. Retiro de escombro, 1 Viaje de Arena.
Clima: nublado.
Personal en obra:

1 Director de obra
1 Residente de obra
1 Inspector de obra
1 Inspector SST.
1 Contratista.
1 Encargado de obra.
4 Oficiales
1 Ayudante

Imp. Obra.

Se le reitera al contratista la importancia y necesidad de reforzar el personal operativo teniendo en cuenta el plazo de finalización del contrato.

22/03/2025 Inicia la aplicación del impermabilizante emulcionado en terraza sobre Comedor, Continuan con las demoliciones en terraza media torta. Instalación de muertos para los Pendientes, Inician con el retiro de loseta en terraza sillar. Continuan con la media caña en terraza.
Clima: nublado/soleado.
Personal en obra:
2 Contratistas
2 Encargados
5 Oficiales
2 Ayudantes
1 Inpector de obra
1 inspector SST
Ingresa Volqueta para hacer retiro de escombros y un viaje de Arena

Inp. Obra.

23/03/2025 Inicia instalación de monto sobre terraza comedor, se Continua con el retiro de loseta en terraza sillar se Continuo con el afinado de piso dejando ultimo tramo por Pendiente, hacer muertos y afinar piso en area de acopio.

Clima: nublado/soleado.
Personal en obra:
1 Inspector de Obra
1 Residente SST
1 Inspector SST
2 contratistas
2 Encargados
5 Oficiales
2 ayudantes

24/03/2025 Continuan con alistado de piso en terraza transitable. Continua instalación de manto sobre cubierta de comedor demolición de alistado de piso, contrucción media caña
Clima: Soleado.
Personal en obra
1 Inspector de obra
1 Inspector de Interventoria
5 Oficiales, 2 Ayudantes
1 Residente SST.
2 Instaladores de manto.

Insp obra

25/03/2025 Continuan con construcción de media caña perimetral continuan con instalación de manto sobre terraza. de comedor, continuan con demolición de alistado de piso en terraza sobre salones.
Clima: Soleado
Personal en obra
5 Oficiales, 2 Ayudantes
1 Inspector de obra
1 Director de obra
1 Inspector de Interventoria.
2 Instaladores de manto

Insp. obra.

26/03/2025 Finaliza instalación de manto con aplicación de pintura/emulsión sobre las justas. Continua alistado de piso y contrucción de media caña. Demolición de alistado terraza sobre salones. Inicia retiro de manto y picado de membrana sobre cubierta de piscina.
Clima: Soleado / Lluvias (Nocturnas)
Personal en obra: 7 Oficiales, 6 Ayudantes
1 Inspector de obra

Inspector SST, inspector de interventoria,

Insp. obra.


27/03/2025 Demolición de alistado de piso en cubierta de salones y de piscina, alistado de piso en terraza transitable, construcción de media caña perimetral, Retiro de RCD.
Clima: Soleado.
Personal en obra: 7 Oficiales 6 Ayudantes
1 Inspector SST
1 Inspector de obra
1 Inspector de Interventoria
Se reitera la necesidad de aumentar el personal operativo.
Se solicita realizar la debida señalización de las áreas de acopio y retiro de material Ademas de prohibir el paso peatonal sobre el manto instalado.

Insp. obra


28/03/2025 Continuan con alistado de piso en terraza de media luna, demolición de alistado de piso en cubierta sobre salones, construcción de media caña perimetral, inicia alistado de piso sobre cubierta de piscina.
Clima: Nublado / lluvia Nocturna.
Personal en obra: 7 Oficiales, 6 Ayudantes
1 Inspector de obra
1 Inspector de Interventoria
1 Inspector. SST.

Insp. obra

29/03/2025 Continuan con alistado de piso sobre cubiertas de salones y sobre piscina; demolición de alistado sobre cubierta de gravilla, [illegible] construcción de media caña perimetral.
Clima: Lluvioso desde 11:40 a 22:40
Personal en obra: 8 Oficiales, 6 Ayudantes
1 Inspector de obra
1 Inspector de Interventoría



30/03/2025 Continuan con alistado de piso en cubierta de piscina, construcción de media caña perimetral, demolición de alistado de piso en cubierta de gravilla.
Clima: Lluvioso de 12pm a 2:30 pm, Lluvias Nocturnas.
Personal en obra. 3 Oficiales, 3 Ayudantes
1 Inspector de obra
1 Inspector SST.



31/03/2025 Continuan con demolición de alistado sobre cubierta de gravilla, alistado de piso sobre cubierta de piscina, media caña perimetral, alistado de piso sobre cubierta de salones. Retiro de RCD.
Clima: Nublado
Personal en obra: 8 Oficiales, 6 Ayudantes.
1 Inspector de obra
1 Residente de obra
1 Inspector de Interventoría
1 Director de obra

Teniendo en cuenta que la fecha de finalización del contrato es hoy se observa que aún falta una cantidad importante de actividades por ejecutar


El contratista se compromete a finalizar las actividades de obra para el día viernes 4 de abril y se procederá con el recibo final el día

Imp. Obra


01/04/2025 Se realiza recorrido en conjunto entre contratista e interventoria para verificar la entrega final de los espacios a la interventoria. y se programa recorrido de entrega a la SOIS y la coordinación de la sede

Imp. Obra


01/03/2025 Instalación de flanches sobre cubiertas, pintura sobre estructura metalica, finaliza instalación de malla colaborada, instalación de bajantes de las canaletas instaladas.
Clima: Nublado
Personal en obra: 1 Oficial, 1 Ayudante
1 Inspector de obra
1 Inspector de Interventoría
1 Inspectora SST.



02/03/2025 No se ejecutaron actividades. Dia Domingo.




03/03/2025 Instalación de flanche, retiro de cerramiento
Clima: Nublado, Lluvioso.
Personal en obra: 1 Oficial, 1 Ayudante
1 Inspector de obra
2 Inspector de Interventoría.
1 Inspector SST



04/03/2025	Se realiza instalación de malla plastica en cerramiento de tanque, instalación de cinta tapa goteras en la cubierta de sala amiga, Clima: lluvioso 1:30 a 4:30 Se hace recorrido para verificar el estado de las actividades y programar entrega final de espacios a la SOIS, se levanta acta de reunión con observaciones. Personal en obra: Residente de obra Inspector de obra Inspector interventoria 1 Oficial, 2 Ayudantes.
05/03/2025	Se realiza las correcciones solicitadas para programar la entrega final de los espacios. Personal en obra: 1 Oficial en obra 1 Inspector de obra 1 Inspector de Interventoria 1 Inspector SST.
06/03/2025 - 10/03/25	No se ejecutaron actividades de obra, actividades finalizadas.
11/03/2025	Recorrido para verificación de pendientes

12/03/2025	Se realiza recorrido con la SOIS y la coordinación del jardín para hacer entrega de los espacios se levanta acta de entrega a satisfacción entre las partes (Contratista, Interventoría, SOIS y la coordinación del jardín).



1. FECHA ELABORACIÓN:	10	3	25	2. No. INFORME	3	3. SEMANA No.	13				
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	GRUPO 4			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	BOSA - CIUDAD BOLIVAR - TUNJUELITO						

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9198-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$ 2.354.314.500				
9. FECHA ACTA INICIO:	9	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	21	2	25	11. PLAZO:	74	Días	
12. PRORROGAS:	1	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$ -					
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9221-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402				
20. FECHA ACTA INICIO:	9	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	8	3	25	22. PLAZO:	89	Días	
23. PRORROGAS:	1	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$ -					
26. INTEVENTORÍA:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC										
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
DIAGNÓSTICO	2,80%	2,80%	-	
PRELIMINARES	11,40%	11,29%	**Se cotinuó con demoliciones y desmontes requeridos.**	
ESTRUCTURA	2,31%	0,89%	**Se avanzó con elementos estructurales requeridos para rampa de CSAM Tejedores**	
MAMPOSTERÍA	8,12%	11,03%	**Se avanzó con resanes requeridos.**	
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	0,92%	0,73%	**Se avanzó con adecuaciones de grifería.**	
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0,32%	0,44%	**Se adelantaron trabajos relacionados.**	
ACABADO PISOS	5,00%	4,77%	**Se culminaron alistados de piso, adicional se avanzó con enchapes de pisos y muros.**	
ACABADO MUROS	9,61%	8,33%	**Se adelantaron trabajos de resanes y se continúa con actividades de vinilo y esmalte.**	
CARPINTERÍA METÁLICA Y ACERO	3,74%	1,58%	**Se realizó instalación de ventanería**	
CARPINTERÍA DE MADERA	0,00%	0,00%		
CIELORRASOS	5,74%	7,12%	**Se realiza instalación de cielorrasos.**	
VENTANERÍA, VIDRIOS Y ESPEJOS	0,00%	0,00%		
PUERTAS	0,00%	0,00%		
CUBIERTAS	23,14%	24,62%	**Se avanza con los mantenimientos requeridos y se realizó el desmonte e instalación de cubiertas.**	
OBRAS EXTERIORES	0,00%	0,00%		
DISEÑOS - PRUEBAS	0,00%	0,00%		
ASEO GENERAL	3,04%	2,76%	**Se avanza con aseo de espacios finalizados.**	
TOTAL	76,14%	76,36%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	68,96%	66,60%	2,36%
Durante el periodo	7,40%	9,54%	-2,14%
Acumulado Actual	76,36%	76,14%	0,22%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	9,54%	73,34%
Valor de la Obra Programada	$ 224.601.603,30	$ 1.726.654.254,30

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	7,40%	73,56%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 174.219.273,00	$ 1.731.833.746,20

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

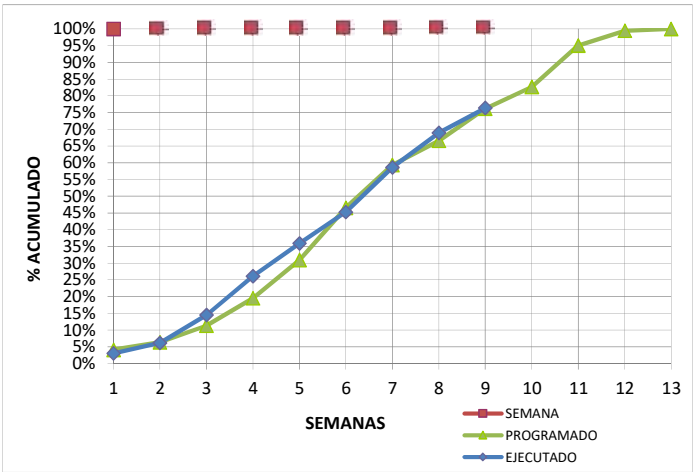

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	-	Herramienta menor		LUNES	N
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	-			MARTES	N
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	-			MIERCOLES	N
MAESTRO	-			JUEVES	L
OFICIAL	14			VIERNES	N
AYUDANTE	16			SÁBADO	S
RESIDENTE	2			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Durante la semana comprendida desde el 10/03/2025 hasta el 16/03/2025 la interventoría adelantará las respectivas revisiones y aprobaciones según corresponda en medida que el contratista realice la entrega de los requerimientos, así mismo, se espera que se continuen ejecutando las actividades de acuerdo al ultimo cronograma remitido, sin niguna novedad.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se avanzó con las actividades en todas las sedes, se le recomienda al contratista mantener aseados los espacios intervenidos e incorporar más personal operativo para tener mejores resultados de avance, adicionalmnete se realizó entrega a interventoría de las sedes:
JI - Campo Verde, JI - Torito, JI - Estrellas y JI - Yanacona, por lo cual se programa realizar la entrega de los espacios intervenidos a la SDIS la próxima semana.

Nombre Residente: Luis Oswaldo Campaña
INTERVENTOR DE LA OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	10 / 3 / 25	No. INFORME	3	SEMANA No.	13
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.				
CONTRATO OBRA No:	9198-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9221-2024	INTEVENTORÍA	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC		

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 06/03/2025
DESCRIPCIÓN: Cerramiento en malla - JI Torito.



FECHA FOTO: 07/03/2025
DESCRIPCIÓN: Instalación de anclajes - JI Campo Verde.



FECHA FOTO: 07/03/2025
DESCRIPCIÓN: Enchape alacenas - CSAM Acacias.



FECHA FOTO: 07/03/2025
DESCRIPCIÓN: Resane de muros - CSAM Sierra Morena.



FECHA FOTO: 06/03/2025
DESCRIPCIÓN: Retiro de losetas - CDC Porvenir.



FECHA FOTO: 05/03/2025
DESCRIPCIÓN:Instalación de ventanería - CSAM Tejedores.



FECHA FOTO: 04/03/2025
DESCRIPCIÓN: Instalación de superboard - JI Yanacona.



FECHA FOTO: 04/03/2025
DESCRIPCIÓN: Aplicación de estuco - CSAM Carlos Gaviria.



FECHA FOTO: 05/03/2025
DESCRIPCIÓN: Remates de esmalte - JI Estrellas.



FECHA FOTO: 06/03/2025
DESCRIPCIÓN: Aplicación de vinilo 3er piso - CSAM Bella Flor.

1. FECHA ELABORACIÓN:	17	3	25	2. No. INFORME	3	3. SEMANA No.	14				
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	GRUPO 4			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	BOSA - CIUDAD BOLIVAR - TUNJUELITO						

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9198-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$ 2.354.314.500				
9. FECHA ACTA INICIO:	9	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	21	2	25	11. PLAZO:	74	Días	
12. PRORROGAS:	1	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$ -					
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9221-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402				
20. FECHA ACTA INICIO:	9	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	8	3	25	22. PLAZO:	89	Días	
23. PRORROGAS:	1	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$ -					
26. INTEVENTORÍA:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC										
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
DIAGNÓSTICO	2,80%	2,80%	-	
PRELIMINARES	11,40%	11,29%	**Se cotinuó con demoliciones y desmontes requeridos.**	
ESTRUCTURA	3,31%	1,89%	**Se avanzó con elementos estructurales requeridos para rampa de CSAM Tejedores**	
MAMPOSTERÍA	8,12%	11,03%	**Se avanzó con actividades realcionadas.**	
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	0,92%	0,73%	**Se avanzó con adecuaciones de grifería.**	
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0,32%	0,44%		
ACABADO PISOS	5,10%	4,87%	**Se adelantan alistados de piso, adicional se avanzó con enchapes de pisos y muros.**	
ACABADO MUROS	12,51%	10,83%	**Se adelantaron trabajos de resanes y se continúa con actividades de vinilo y esmalte.**	
CARPINTERÍA METÁLICA Y ACERO	3,83%	1,67%	**Se realizó instalación de ventanería**	
CARPINTERÍA DE MADERA	0,00%	0,00%		
CIELORRASOS	5,74%	7,12%	**Se realiza instalación de cielorrasos.**	
VENTANERÍA, VIDRIOS Y ESPEJOS	0,00%	0,00%		
PUERTAS	0,00%	0,00%		
CUBIERTAS	24,14%	24,62%	**Se avanza con los mantenimientos requeridos y se realizó instalación de flanches.**	
OBRAS EXTERIORES	0,00%	0,00%		
DISEÑOS - PRUEBAS	0,00%	0,00%		
ASEO GENERAL	4,45%	4,17%	**Se avanza con aseo de espacios finalizados.**	
TOTAL	82,64%	81,46%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	76,36%	76,14%	0,22%
Durante el periodo	5,10%	6,50%	-1,40%
Acumulado Actual	81,46%	82,64%	-1,18%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	6,50%	79,84%
Valor de la Obra Programada	$ 153.030.442,50	$ 1.879.684.696,80

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	5,10%	78,66%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 120.070.039,50	$ 1.851.903.785,70

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

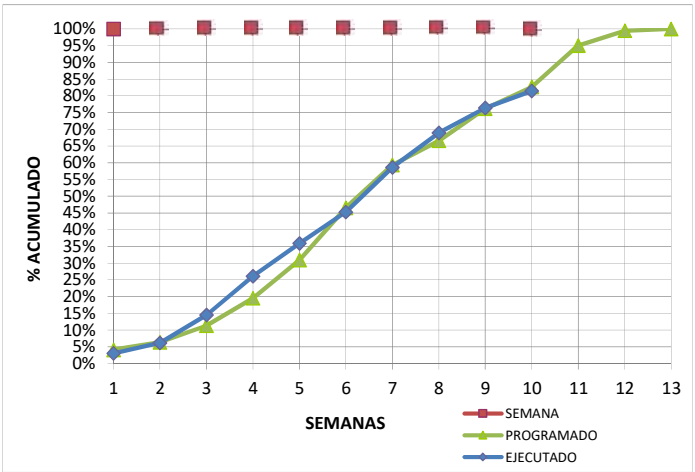

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	-	Herramienta menor		LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	-			MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	-			MIERCOLES	N
MAESTRO	-			JUEVES	L
OFICIAL	14			VIERNES	N
AYUDANTE	16			SÁBADO	S
RESIDENTE	2			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Durante la semana comprendida desde el 17/03/2025 hasta el 23/03/2025 la interventoría adelantará las respectivas revisiones y aprobaciones según corresponda en medida que el contratista realice la entrega de los requerimientos, así mismo, se espera que se continuen ejecutando las actividades de acuerdo al ultimo cronograma remitido, sin niguna novedad.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se avanzó con las actividades en todas las sedes, se le recomienda al contratista mantener aseados los espacios intervenidos e incorporar más personal operativo para tener mejores resultados de avance, adicionalmnete se realizó entrega a la coordinación y a la SDIS de los espacios intervenidos en las sedes: JI - Campo Verde, JI - Torito, JI - Estrellas y JI - Yanacona.

Nombre Residente: Luis Oswaldo Campaña
INTERVENTOR DE LA OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	17 / 3 / 25	No. INFORME	3	SEMANA No.	14
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.				
CONTRATO OBRA No:	9198-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9221-2024	INTEVENTORÍA	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC		

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 12/03/2025
DESCRIPCIÓN: Entrega Final de la sede - JI Torito.



FECHA FOTO: 12/03/2025
DESCRIPCIÓN: Entrega Final de la sede - JI Campo Verde.



FECHA FOTO: 15/03/2025
DESCRIPCIÓN: Instalación de flanche - CSAM Acacias.



FECHA FOTO: 13/03/2025
DESCRIPCIÓN: Desmonte de cielorraso - JI Ardillas.



FECHA FOTO: 11/03/2025
DESCRIPCIÓN: Demolición alistado de pisos - CDC Porvenir.



FECHA FOTO: 14/03/2025
DESCRIPCIÓN:Fundida de placa de rampa - CSAM Tejedores.



FECHA FOTO: 12/03/2025
DESCRIPCIÓN: EntregA Final de la sede - JI Yanacona.



FECHA FOTO: 13/03/2025
DESCRIPCIÓN: Aplicación de pintura Koraza - CSAM Carlos Gaviria.



FECHA FOTO: 11/03/2025
DESCRIPCIÓN: Entrega Final de la sede - JI Estrellas.



FECHA FOTO: 14/03/2025
DESCRIPCIÓN: Aplicación de esmalte 2do piso - CSAM Bella Flor.

1. FECHA ELABORACIÓN:	25	3	25	2. No. INFORME	4	3. SEMANA No.	15				
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	GRUPO 4			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	BOSA - CIUDAD BOLIVAR - TUNJUELITO						

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9198-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$ 2.354.314.500				
9. FECHA ACTA INICIO:	9	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	3	25	11. PLAZO:	112	Días	
12. PRORROGAS:	2	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$ -					
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9221-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402				
20. FECHA ACTA INICIO:	9	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	15	4	25	22. PLAZO:	127	Días	
23. PRORROGAS:	2	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$ -					
26. INTEVENTORÍA:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC										
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
DIAGNÓSTICO	2,80%	2,80%	-	
PRELIMINARES	11,40%	11,29%	**Se cotinuó con demoliciones y desmontes requeridos.**	
ESTRUCTURA	4,81%	2,89%	**Se avanzó con elementos estructurales requeridos.**	
MAMPOSTERÍA	8,12%	11,03%		
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	0,92%	0,73%		
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0,32%	0,44%		
ACABADO PISOS	6,90%	6,75%	**Se adelantan alistados de piso, adicional se avanzó con enchapes de pisos y muros.**	
ACABADO MUROS	15,51%	14,63%	**Se adelantaron trabajos de resanes y se continúa con actividades de vinilo y esmalte.**	
CARPINTERÍA METÁLICA Y ACERO	3,83%	1,67%	**Se realizó instalación de marcos**	
CARPINTERÍA DE MADERA	0,00%	0,00%		
CIELORRASOS	7,54%	7,54%	**Se realiza instalación de cielorrasos.**	
VENTANERÍA, VIDRIOS Y ESPEJOS	1,48%	1,91%	**Se realizó instalación de ventanería**	
PUERTAS	0,00%	0,00%		
CUBIERTAS	24,14%	24,62%		
OBRAS EXTERIORES	0,00%	0,00%		
DISEÑOS - PRUEBAS	0,00%	0,00%		
ASEO GENERAL	4,45%	4,17%	**Se avanza con aseo de espacios finalizados.**	
TOTAL	92,22%	90,47%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	81,46%	82,64%	-1,18%
Durante el periodo	9,01%	9,58%	-0,57%
Acumulado Actual	90,47%	92,22%	-1,75%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	9,58%	89,42%
Valor de la Obra Programada	$ 225.543.329,10	$ 2.105.228.025,90

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	9,01%	87,67%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 212.123.736,45	$ 2.064.027.522,15

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

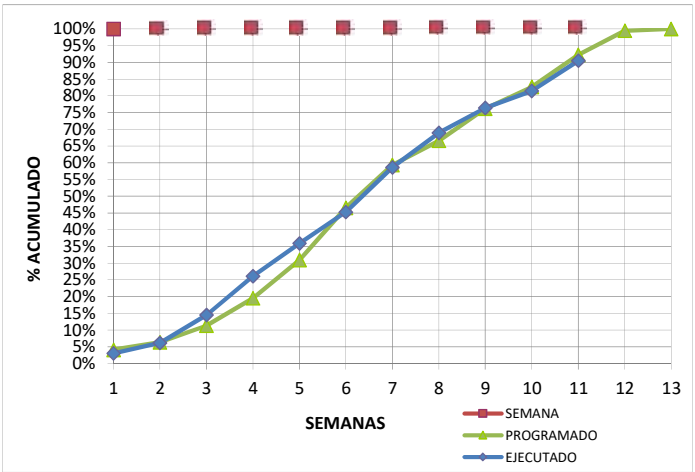

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	-	Herramienta menor		LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	-			MARTES	S
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	-			MIERCOLES	S
MAESTRO	-			JUEVES	S
OFICIAL	12			VIERNES	S
AYUDANTE	14			SÁBADO	N
RESIDENTE	2			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Durante la semana comprendida desde el 24/03/2025 hasta el 30/03/2025 la interventoría adelantará las respectivas revisiones y aprobaciones según corresponda en medida que el contratista realice la entrega de los requerimientos, así mismo, se espera que se continuen ejecutando las actividades de acuerdo al ultimo cronograma remitido, sin niguna novedad.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se avanzó con las actividades en todas las sedes, se le recomienda al contratista mantener aseados los espacios intervenidos e incorporar más personal operativo para tener mejores resultados de avance, especificamente en la sede CDC Porvenir.

Nombre Residente: Luis Oswaldo Campaña
INTERVENTOR DE LA OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	25 / 3 / 25	No. INFORME	4	SEMANA No.	15
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.				
CONTRATO OBRA No:	9198-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9221-2024	INTEVENTORÍA	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC		

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 17/03/2025
DESCRIPCIÓN: Resane de muros - JI Ardillas.



FECHA FOTO: 20/03/2025
DESCRIPCIÓN: Armado de módulos - CSAM Carlos Gaviria.



FECHA FOTO: 20/03/2025
DESCRIPCIÓN: Resane y estuco - CSAM Bella Flor.



FECHA FOTO: 20/03/2025
DESCRIPCIÓN: Armado de muros livianos - CSAM Bella Flor.



FECHA FOTO: 20/03/2025
DESCRIPCIÓN: Enchape de piso - CSAM Tejedores.



FECHA FOTO: 20/03/2025
DESCRIPCIÓN: Limpieza de ventanería - CSAM Acacias.



FECHA FOTO: 20/03/2025
DESCRIPCIÓN: Instalación de anclajes - CSAM Sierra Morena.



FECHA FOTO: 21/03/2025
DESCRIPCIÓN: Alistado de piso - CDC Porvenir.

1. FECHA ELABORACIÓN:	1	4	25	2. No. INFORME	4	3. SEMANA No.	16				
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	GRUPO 4			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	BOSA - CIUDAD BOLIVAR - TUNJUELITO						

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9198-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$ 2.354.314.500				
9. FECHA ACTA INICIO:	9	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	3	25	11. PLAZO:	112	Días	
12. PRORROGAS:	2	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$ -					
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9221-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402				
20. FECHA ACTA INICIO:	9	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	15	4	25	22. PLAZO:	127	Días	
23. PRORROGAS:	2	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$ -					
26. INTEVENTORÍA:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC										
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
DIAGNÓSTICO	2,80%	2,80%		
PRELIMINARES	11,40%	11,40%		
ESTRUCTURA	4,81%	3,73%		
MAMPOSTERÍA	8,34%	11,03%		
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	0,92%	0,92%		
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0,32%	0,44%		
ACABADO PISOS	6,90%	6,90%		
ACABADO MUROS	20,52%	20,52%		
CARPINTERÍA METÁLICA Y ACERO	3,83%	1,67%		
CARPINTERÍA DE MADERA	0,00%	0,00%		
CIELORRASOS	7,54%	7,54%		
VENTANERÍA, VIDRIOS Y ESPEJOS	1,48%	1,91%		
PUERTAS	0,00%	0,00%		
CUBIERTAS	24,69%	24,69%		
OBRAS EXTERIORES	0,00%	0,00%		
DISEÑOS - PRUEBAS	0,00%	0,00%		
ASEO GENERAL	6,45%	6,45%		
TOTAL	100,00%	100,00%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	90,47%	92,22%	-1,75%
Durante el periodo	9,53%	7,78%	1,75%
Acumulado Actual	100,00%	100,00%	0,00%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	7,78%	100,00%
Valor de la Obra Programada	$ 183.165.668,10	$ 2.354.314.500,00

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	9,53%	100,00%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 224.366.171,85	$ 2.354.314.500,00

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

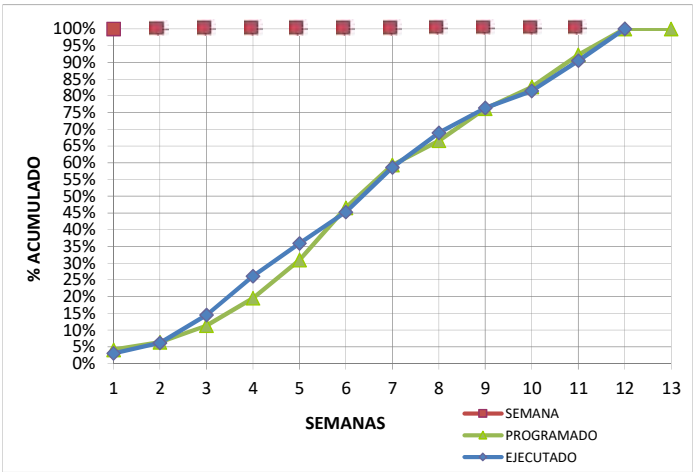

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	-	Herramienta menor		LUNES	S
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	-			MARTES	N
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	-			MIERCOLES	S
MAESTRO	-			JUEVES	S
OFICIAL	10			VIERNES	N
AYUDANTE	12			SÁBADO	L
RESIDENTE	1			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Durante la semana comprendida desde el 01/04/2025 hasta el 06/04/2025 la interventoría adelantará las respectivas revisiones finales de los espacios intervenidos en medida que el contratista realice la entrega de los mismos, en caso de evidenciarse observaciones o pendientes deben ser subsanados durante el transcurso de la semana, para proceder con la entrega a cada coordinador y la SDIS.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se avanzó con las actividades en todas las sedes, se le recomienda al contratista incorporar más personal operativo para tener mejores resultados de avance, especificamente en la sede CDC Porvenir, así mismo realizar aseo y despejar las áreas intervenidas para ir cerrando actividades en cada sede.

Nombre Residente: Luis Oswaldo Campaña
INTERVENTOR DE LA OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	1 4 25	No. INFORME	4	SEMANA No.	16
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.				
CONTRATO OBRA No:	9198-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9221-2024	INTEVENTORÍA	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC		

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 01/04/2025
DESCRIPCIÓN: CSAM Sierra Morena.



FECHA FOTO: 01/04/2025
DESCRIPCIÓN: CDC Porvenir.



FECHA FOTO: 01/04/2025
DESCRIPCIÓN: CSAM Acacias.



FECHA FOTO: 31/03/2025
DESCRIPCIÓN: JI Yanacona.



FECHA FOTO: 01/04/2025
DESCRIPCIÓN: CSAM Carlos Gaviria.



FECHA FOTO: 01/04/2025
DESCRIPCIÓN: CSAM Tejedores de Sueños.



FECHA FOTO: 01/04/2025
DESCRIPCIÓN: JI Ardillas.



FECHA FOTO: 01/04/2025
DESCRIPCIÓN: JI Yanacona.



FECHA FOTO: 31/03/2025
DESCRIPCIÓN: CSAM Bella Flor.



FECHA FOTO: 31/03/2025
DESCRIPCIÓN: CSAM Bella Flor.

	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA OBRA	Código: FOR-GIF-020 Versión: 1 Fecha: Memo I2024037699 - 18/12/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN:	5	4	2025								
2. ACTA No.	3		3. TIPO DE ACTA PARCIAL:			RECIBO PARCIAL DE OBRA	3	MODIFICACIONES	2		
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	GRUPO 4			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:		KR 95A 85 80 SUR					

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9198-2024		7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024			8. VALOR CONTRATO:	$	2,354,314,500
9. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	MARZO	2.00	2025	11. PLAZO:	3 MESE 21 DÍAS	Meses/dias
12. PRORROGAS:	89 DÍAS		13. SUSPENSIONES:		Meses/dias				14. ADICIONES:	$	-
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9221-2024		18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024			19. VALOR CONTRATO:	$	382,708,445
20. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	15	ABRIL	4	2025	22. PLAZO:	4 MESES 15 DIAS	Meses/dias
23. PRORROGAS:	104 DIAS		24. SUSPENSIONES:		Meses/dias				25. ADICIONES:	$	98,026,043
26. INTEVENTORÍA:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC										
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA										

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 5 días del mes de ABRIL del año 2025 se reunieron EL ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO representante legal del contratista y LA ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obray/o Modificaciones del mes de MARZO según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)		
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
S1	**JARDINI INFANTIL CAMPO VERDE**													
1	PRELIMINARES				**$ 11,237,683.17**									
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL			$ -								-		
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	115.70	$ 43,298.00	$ 5,009,578.60	**83.7**	$ 3,624,042.60		$ 0.00	83.70	$ 3,624,042.60	83.70	$ 3,624,042.60	#
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS			$ -			$ -			0.00	$ -	-	$ 0.00	#
1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	67.15	$ 27,519.00	$ 1,847,900.85	**70.76**	$ 1,947,244.44		$ 0.00	70.76	$ 1,947,244.44	70.76	$ 1,947,244.44	#
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	62.76	$ 18,929.00	$ 1,187,984.04	**66.77**	$ 1,263,889.33		$ 0.00	66.77	$ 1,263,889.33	66.77	$ 1,263,889.33	#
1.3.23	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	158.47	$ 20,144.00	$ 3,192,219.68	**158.47**	$ 3,192,219.68		$ 0.00	158.47	$ 3,192,219.68	158.47	$ 3,192,219.68	#
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			$ -	**$ 5,079,089.14**							-		#
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			$ -						0.00	$ -	-		#
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	234.47	$ 21,662.00	$ 5,079,089.14	**122**	$ 2,642,764.00		$ 0.00	122.00	$ 2,642,764.00	122.00	$ 2,642,764.00	#
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 0.00**									#
5.1.77	REINSTALACIÓN DE LAMPARAS EXISTENTES (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		$ 319,430.00	$ 0.00	**23**	$ 7,346,890.00		$ 0.00	23	$ 7,346,890.00	23.00	$ 7,346,890.00	#
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			$ -	**$ 21,070,713.79**							-		#
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			$ -						0.00	$ -	-		#
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	M2	238.79	$ 41,523.00	$ 9,915,277.17	**242.4**	$ 10,065,175.20		$ 0.00	242.40	$ 10,065,175.20	242.40	$ 10,065,175.20	#
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	119.68	$ 14,846.00	$ 1,776,769.28	**119.43**	$ 1,773,057.78		$ 0.00	119.43	$ 1,773,057.78	119.43	$ 1,773,057.78	#
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			$ -			$ -		$ 0.00	0.00	$ -	-	$ 0.00	#
7.2.8	GUARDA ESCOBA MEDIACAÑA EN GRAVILLA LAVADO MONA, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	37.50	$ 42,471.00	$ 1,592,662.50		$ -		$ 0.00	0.00	$ -	-	$ 0.00	#
7.2.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MIKONOS BLANCO 33.8 X 33.8 CM	M2	61.06	$ 127,514.00	$ 7,786,004.84	**70.76**	$ 9,022,890.64		$ 0.00	70.76	$ 9,022,890.64	70.76	$ 9,022,890.64	#
7.2.40	GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	0.00	$ 20,496.00	$ 0.00	**41.87**	$ 858,167.52		$ 0.00	41.87	$ 858,167.52	41.87	$ 858,167.52	#
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 0.00**									#
11.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN		$ 33,334.00	$ 0.00	**2.00**	$ 66,668.00		$ 0.00	2	$ 66,668.00	2.00	$ 66,668.00	#
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			$ -	**$ 4,303,656.88**							-		#

13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			$ -			$ -			0.00	$ -	-	$ 0.00	#
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	194.22	$ 10,754.00	$ 2,088,641.88	**88.83**	$ 955,277.82	- 66.84	-$ 718,797.36	155.67	$ 1,674,075.18	88.83	$ 955,277.82	#
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	103.00	$ 21,505.00	$ 2,215,015.00	**112.59**	$ 2,421,247.95		$ 0.00	112.59	$ 2,421,247.95	112.59	$ 2,421,247.95	#
14	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0.00	$ -	**$ 32,162,936.65**							-		#
14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORASO FALSO EN PANEL SUPERBOARD DE 6 MM - INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA MASILLA Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	M2	84.30	$ 272,113.00	$ 22,939,125.90		$ -		$ 0.00	0.00	$ -	-	$ 0.00	#
14.1.3	CIELORASO EN LAMINA DE YESO DE 1/2" ST (Incluyendo todo lo necesario para su correcta instalación)	M2	62.75	$ 146,993.00	$ 9,223,810.75	**66.77**	$ 9,814,722.61		$ 0.00	66.77	$ 9,814,722.61	66.77	$ 9,814,722.61	#
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0.00	$ -	**$ 24,833,580.48**							-		#
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	14.60	$ 51,981.00	$ 758,922.60	**27.66**	$ 1,437,794.46		$ 0.00	27.66	$ 1,437,794.46	27.66	$ 1,437,794.46	#
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	175.63	$ 137,076.00	$ 24,074,657.88	**175.63**	$ 24,074,657.88		$ 0.00	176	$ 24,074,657.88	175.63	$ 24,074,657.88	#
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL		0.00	$ -	**$ 1,660,001.85**							-		#
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	315.29	$ 5,265.00	$ 1,660,001.85	**413.83**	$ 2,178,814.95		$ 0.00	414	$ 2,178,814.95	413.83	$ 2,178,814.95	#
21	PRECIOS NO PREVISTOS		0.00	$ 3,919.00	**$ 0.00**							-		#
NP 001	DESMONTE, INSTALACION Y CERTIFICACION DE PUNTOS DE ANCLAJE PARA TRABAJO EN ALTURAS	UN		$ 382,772.00	$ 0.00	**60.00**	$ 22,966,320.00		$ 0.00	60	$ 22,966,320.00	60.00	$ 22,966,320.00	#
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				**$ 100,347,661.96**		**$ 105,651,844.86**		**-$ 718,797.36**		**$ 106,370,642.22**		**$ 105,651,844.86**	
S2	**JARDINI INFANTIL TORITO FELIZ**													
1	PRELIMINARES				**$ 17,784,609.96**									
1.1	OBRAS PRELIMINARES													
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACIONES (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE CONSTRUCCION)	M2	180.09	$ 19,797.00	$ 3,565,241.73	**98.77**	$ 1,955,349.69		$ 0.00	98.77	$ 1,955,349.69	98.77	$ 1,955,349.69	
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL						$ -		$ 0.00					
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	66	$ 43,298.00	$ 2,857,668.00	**37.37**	$ 1,618,046.26		$ 0.00	37.37	$ 1,618,046.26	37.37	$ 1,618,046.26	
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS						$ -		$ 0.00					
1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	28.8	$ 27,519.00	$ 792,547.20	**2.13**	$ 58,615.47		$ 0.00	2.13	$ 58,615.47	2.13	$ 58,615.47	
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	91.37	$ 32,417.00	$ 2,961,941.29	**86.94**	$ 2,818,333.98		$ 0.00	86.94	$ 2,818,333.98	86.94	$ 2,818,333.98	
1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS)	UN		$ 18,691.00	$ 0.00	**2.00**	$ 37,382.00		$ 0.00	2.00	$ 37,382.00	2.00	$ 37,382.00	
1.3.43	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS.	M2	177.83	$ 42,778.00	$ 7,607,211.74	**332.97**	$ 14,243,790.66		$ 0.00	332.97	$ 14,243,790.66	332.97	$ 14,243,790.66	
2	CIMENTACIÓN				**$ 3,438,908.32**									
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS						$ -		$ 0.00					
2.1.1	EXCAVACION MECANICA. DESCAPOTE Y MOVIMIENTO MASIVO DE TIERRA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL SOBRANTE EN BOTADEROS OFICIALES	M3	0	$ 123,789.00	$ 0.00		$ -		$ 0.00	0.00	$ -	-	$ 0.00	
2.1.2	EXCAVACION MANUAL EN TIERRA HASTA 2.50 M. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL.	M3	14.4	$ 123,243.00	$ 1,774,699.20		$ -		$ 0.00	0.00	$ -	-	$ 0.00	
2.1.5	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3		$ 87,634.00	$ 0.00	**5.45**	$ 477,605.30		$ 0.00	5.45	$ 477,605.30	5.45	$ 477,605.30	
2.1.9	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO	M3	11.52	$ 100,826.00	$ 1,161,515.52	**2.23**	$ 224,841.98		$ 0.00	2.23	$ 224,841.98	2.23	$ 224,841.98	
2.2	CONCRETOS						$ -		$ 0.00					
2.2.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGUETA EN CONCRETO DE 3000 PSI. DIMENSIONES 20X15CM. NO INCLUYE REFUERZO	M	3.8	$ 108,899.00	$ 413,816.20	**3.40**	$ 370,256.60		$ 0.00	3.40	$ 370,256.60	3.40	$ 370,256.60	
2.5	ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA						$ -		$ 0.00					
2.5.2	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	16.7	$ 5,322.00	$ 88,877.40	**4.48**	$ 23,842.56		$ 0.00	4.48	$ 23,842.56	4.48	$ 23,842.56	
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 2,488,968.00**									
4.1	TUBERIA						$ -		$ 0.00					
4.1.61	TUBERIA PVCS 3" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	M	72	$ 34,569.00	$ 2,488,968.00	**17.47**	$ 603,920.43		$ 0.00	17.47	$ 603,920.43	17.47	$ 603,920.43	
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 0.00**									
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -		$ 0.00					
7.1.3	CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI E = 0.05 M	M2		$ 26,737.00		**0.64**	$ 17,111.68		$ 0.00	0.64	$ 17,111.68	0.64	$ 17,111.68	
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 7,855,027.45**									

13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -		$ 0.00					
13.4.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M2	10.75	$ 26,869.00	$ 288,841.75	**12.10**	$ 325,114.90		$ 0.00	12.10	$ 325,114.90	12.10	$ 325,114.90
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	174.15	$ 39,517.00	$ 6,881,885.55	**244.10**	$ 9,646,099.70	6.50	$ 256,860.50	237.60	$ 9,389,239.20	244.10	$ 9,646,099.70
13.4.4	ESMALTE SOBRE CANAL METÁLICA EN ACERO GALVANIZADO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	22.95	$ 29,817.00	$ 684,300.15	**13.42**	$ 400,144.14		$ 0.00	13.42	$ 400,144.14	13.42	$ 400,144.14
16	OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 2,490,949.30**								
16.1.1	ANDEN EN CONCRETO 2500 PSI H = 0.08 M. FUNDIDO EN SITIO. INCLUYE BORDILLO	M2	28.8	$ 53,266.00	$ 1,534,060.80		$ -		$ 0.00	0.00	$ -	-	$ 0.00
16.1.2	ANDEN EN CONCRETO 2500 PSI H = 0.10 M. FUNDIDO EN SITIO. INCLUYE BORDILLO	M2		$ 60,245.00	$ 0.00	**1.14**	$ 68,679.30		$ 0.00	1.14	$ 68,679.30	1.14	$ 68,679.30
16.1.3	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA	M2	5	$ 107,387.00	$ 536,935.00	**6.76**	$ 725,936.12		$ 0.00	6.76	$ 725,936.12	6.76	$ 725,936.12
16.1.4	PUERTA DE CERRAMIENTO EN TUBO GALVANIZADO DE 2" Y MALLA ONDULADA CALIBRE 10, HUECO DE 2"X 2"	M2	4.5	$ 93,323.00	$ 419,953.50	**2.26**	$ 210,909.98		$ 0.00	2.26	$ 210,909.98	2.26	$ 210,909.98
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 38,683,355.20**								
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	57.00	$ 51,981.00	$ 2,962,917.00	**67.53**	$ 3,510,276.93	1.50	$ 77,971.50	66.03	$ 3,432,305.43	67.53	$ 3,510,276.93
17.1.2	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	22.95	$ 80,829.00	$ 1,855,025.55	**28.85**	$ 2,331,916.65		$ 0.00	28.85	$ 2,331,916.65	28.85	$ 2,331,916.65
17.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	29.4	$ 44,561.00	$ 1,310,093.40	**34.42**	$ 1,533,789.62		$ 0.00	34.42	$ 1,533,789.62	34.42	$ 1,533,789.62
17.1.18	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	102.04	$ 61,523.00	$ 6,277,806.92	**88.19**	$ 5,425,713.37		$ 0.00	88.19	$ 5,425,713.37	88.19	$ 5,425,713.37
17.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	10.75	$ 200,325.00	$ 2,153,493.75	**9.76**	$ 1,955,172.00		$ 0.00	9.76	$ 1,955,172.00	9.76	$ 1,955,172.00
17.1.24.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	102.04	$ 205,696.00	$ 20,989,219.84	**88.19**	$ 18,140,330.24		$ 0.00	88.19	$ 18,140,330.24	88.19	$ 18,140,330.24
17.1.30	CANAL AMAZONA	M	29.98	$ 104,563.00	$ 3,134,798.74	**30.49**	$ 3,188,125.87		$ 0.00	30.49	$ 3,188,125.87	30.49	$ 3,188,125.87
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				**$ 1,864,968.30**								
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	354.22	$ 5,265.00	$ 1,864,968.30	**202.21**	$ 1,064,635.65		$ 0.00	202.21	$ 1,064,635.65	202.21	$ 1,064,635.65
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				**$ 74,606,786.53**		**$ 70,975,941.08**		**$ 334,832.00**		**$ 70,641,109.08**		**$ 70,975,941.08**
s3 S3	**JARDINI INFANTIL OJO DE PERDIZ**												
1	PRELIMINARES				**$ 21,219,301.01**								
1.1	OBRAS PRELIMINARES												
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACIONES (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE CONSTRUCCION)	M2	322.41	$ 19,797.00	$ 6,382,750.77	**292.55**	$ 5,791,612.35		$ 0.00	292.55	$ 5,791,612.35	292.55	$ 5,791,612.35
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL			$ -			$ -			0.00	$ -	-	
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	71.05	$ 43,298.00	$ 3,076,322.90	**56.66**	$ 2,453,264.68		$ 0.00	56.66	$ 2,453,264.68	56.66	$ 2,453,264.68
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS						$ -						
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA.	M2	292.55	$ 32,417.00	$ 9,483,593.35	**292.55**	$ 9,483,593.35		$ 0.00	292.55	$ 9,483,593.35	292.55	$ 9,483,593.35
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	117.31	$ 18,929.00	$ 2,220,560.99	**117.31**	$ 2,220,560.99		$ 0.00	117.31	$ 2,220,560.99	117.31	$ 2,220,560.99
1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELECTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERIAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS)	UN	3.00	$ 18,691.00	$ 56,073.00	**3**	$ 56,073.00		$ 0.00	3.00	$ 56,073.00	3.00	$ 56,073.00
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 1,201,591.14**								
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	55.47	$ 21,662.00	$ 1,201,591.14	**77.51**	$ 1,679,021.62		$ 0.00	77.51	$ 1,679,021.62	77.51	$ 1,679,021.62
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 3,719,982.00**								
5.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINI INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TERMOMAGNÉTICO PARA INSTALACIÓN EN RIEL DIN (RIEL OMEGA) 1X50A 10KA	UN		$ 38,918.00	$ 0.00	**1.00**	$ 38,918.00		$ 0.00	1.00	$ 38,918.00	1.00	$ 38,918.00
5.1.64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA OCTAGONAL, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	4.00	$ 319,430.00	$ 1,277,720.00	**4.00**	$ 1,277,720.00		$ 0.00	4.00	$ 1,277,720.00	4.00	$ 1,277,720.00
5.1.71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	10.00	$ 184,447.00	$ 1,844,470.00	**10.00**	$ 1,844,470.00		$ 0.00	10.00	$ 1,844,470.00	10.00	$ 1,844,470.00
5.1.71.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CIRCULAR DE 24 W. 11" INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	13.00	$ 45,984.00	$ 597,792.00	**13.00**	$ 597,792.00		$ 0.00	13.00	$ 597,792.00	13.00	$ 597,792.00
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 2,848,251.78**					0.00	$ -	-	
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												

7.2.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM	M	109.81	$ 25,938.00	$ 2,848,251.78	**131.85**	$ 3,419,925.30		$ 0.00	131.85	$ 3,419,925.30	131.85	$ 3,419,925.30
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 11,585,024.48**								
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -						
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	174.03	$ 10,754.00	$ 1,871,518.62	**161.14**	$ 1,732,899.56		$ 0.00	161.14	$ 1,732,899.56	161.14	$ 1,732,899.56
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2	96.54	$ 20,469.00	$ 1,976,077.26	**96.54**	$ 1,976,077.26		$ 0.00	96.54	$ 1,976,077.26	96.54	$ 1,976,077.26
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 45,138.00	$ 0.00	**29.76**	$ 1,343,306.88		$ 0.00	29.76	$ 1,343,306.88	29.76	$ 1,343,306.88
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -		$ 0.00				
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	195.8	$ 39,517.00	$ 7,737,428.60	**293.91**	$ 11,614,441.47		$ 0.00	293.91	$ 11,614,441.47	293.91	$ 11,614,441.47
14	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 18,820,629.85**								
14.1.1	CIELORASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	117.31	$ 160,435.00	$ 18,820,629.85	**119.11**	$ 19,109,412.85		$ 0.00	119.11	$ 19,109,412.85	119.11	$ 19,109,412.85
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 79,059,630.58**								
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	73.6	$ 51,981.00	$ 3,825,801.60	**90.33**	$ 4,695,443.73		$ 0.00	90.33	$ 4,695,443.73	90.33	$ 4,695,443.73
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	292.55	$ 247,595.00	$ 72,433,917.25	**292.55**	$ 72,433,917.25		$ 0.00	292.55	$ 72,433,917.25	292.55	$ 72,433,917.25
17.1.18	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	45.51	$ 61,523.00	$ 2,799,911.73		$ -			0.00	$ -	-	
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				**$ 2,158,650.00**								
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	410	$ 5,265.00	$ 2,158,650.00	**375.75**	$ 1,978,323.75		$ 0.00	375.75	$ 1,978,323.75	375.75	$ 1,978,323.75
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				**$ 140,613,060.84**		**$ 143,746,774.04**		**$ 0.00**		**$ 143,746,774.04**		**$ 143,746,774.04**
S4	**JARDINI INFANTIL PORVENIR**												
1	PRELIMINARES				**$ 11,125,360.74**								
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL												
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	66.05	$ 43,298.00	$ 2,859,832.90	**66.05**	$ 2,859,832.90		$ 0.00	66.05	$ 2,859,832.90	66.05	$ 2,859,832.90
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS						$ -			0.00	$ -	-	$ 0.00
1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	82.92	$ 27,519.00	$ 2,281,875.48	**95.42**	$ 2,625,862.98		$ 0.00	36.92	$ 1,016,001.48	36.92	$ 1,016,001.48
1.3.20	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO	M2	140.47	$ 10,188.00	$ 1,431,108.36	**135.60**	$ 1,381,492.80		$ 0.00	135.60	$ 1,381,492.80	135.60	$ 1,381,492.80
1.3.23	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	226	$ 20,144.00	$ 4,552,544.00	**191.96**	$ 3,866,842.24		$ 0.00	191.96	$ 3,866,842.24	191.96	$ 3,866,842.24
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 10,732,808.64**					0.00	$ -	-	
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -			0.00	$ -	-	
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04	M2	226	$ 41,523.00	$ 9,384,198.00	**212.73**	$ 8,833,187.79		$ 0.00	191.96	$ 7,970,755.08	191.96	$ 7,970,755.08
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	90.84	$ 14,846.00	$ 1,348,610.64	**80.48**	$ 1,194,806.08		$ 0.00	78.28	$ 1,162,144.88	78.28	$ 1,162,144.88
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 30,979,176.00**					0.00	$ -	-	
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	226	$ 137,076.00	$ 30,979,176.00	**204.03**	$ 27,967,616.28		$ 0.00	28.89	$ 3,960,125.64	28.89	$ 3,960,125.64
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				**$ 1,316,250.00**					0.00	$ -	-	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	250	$ 5,265.00	$ 1,316,250.00	**85.99**	$ 452,737.35			0.00	$ -	-	$ 0.00
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				**$ 54,153,595.38**		**$ 49,182,378.42**		**$ 0.00**		**$ 22,217,195.02**		**$ 22,217,195.02**
S5	**JARDINI INFANTIL RINCON DE LAS ARDILLAS**												
1	PRELIMINARES				**$ 3,699,158.00**								
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL			$ -								-	
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	50.00	$ 43,298.00	$ 2,164,900.00		$ -			0.00	$ -	-	
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS						$ -			0.00	$ -		
1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	26.00	$ 27,519.00	$ 715,494.00		$ -			0.00	$ -	-	
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 18,929.00	$ 0.00	**26.16**	$ 495,182.64	26.16	$ 495,182.64	0.00	$ -	26.16	$ 495,183
1.3.23	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	26.00	$ 20,144.00	$ 523,744.00	**35.6**	$ 717,126.40			35.60	$ 717,126.40	35.60	$ 717,126
1.3.40	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	30.00	$ 9,834.00	$ 295,020.00		$ -			0.00	$ -	-	
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 1,125,340.90**								
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -			0.00	$ -		

3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	51.95	$ 21,662.00	$ 1,125,340.90	**200.55**	$ 4,344,314.10	200.55	$ 4,344,314.10	0.00	$ -	200.55	$ 4,344,314
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 1,780,818.00**								
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -			0.00	$ -		
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	M2	26.00	$ 41,523.00	$ 1,079,598.00	**18**	$ 747,414.00			18.00	$ 747,414.00	18.00	$ 747,414
7.1.7.	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M		$ 14,846.00	$ 0.00	**48.19**	$ 715,428.74			48.19	$ 715,428.74	48.19	$ 715,429
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -			0.00	$ -		
7.2.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 6 CM	M		$ 20,419.00	$ 0.00	**35.94**	$ 733,858.86	35.94	$ 733,858.86	0.00	$ -	35.94	$ 733,859
7.2.33	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS A NIVEL DE PISO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M	30.00	$ 23,374.00	$ 701,220.00		$ -			0.00	$ -	-	
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 0.00**								
11.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN		$ 33,334.00	$ 0.00	**2**	$ 66,668.00	2.00	$ 66,668.00			2.00	$ 66,668
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 8,817,560.00**								
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -			0.00	$ -		
13,1,7	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 25,832.00	$ 0.00	**129.82**	$ 3,353,510.24	129.82	$ 3,353,510.24	0.00	$ -	129.82	$ 3,353,510
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	340	$ 10,754.00	$ 3,656,360.00	**129.75**	$ 1,395,331.50	129.75	$ 1,395,331.50	0.00	$ -	129.75	$ 1,395,332
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2		$ 20,469.00	$ 0.00	**26.16**	$ 535,469.04	26.16	$ 535,469.04	0.00	$ -	26.16	$ 535,469
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	240	$ 21,505.00	$ 5,161,200.00	**127.22**	$ 2,735,866.10	127.22	$ 2,735,866.10	0.00	$ -	127.22	$ 2,735,866
13.2.4	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 11,796.00	$ 0.00	**23.03**	$ 271,661.88	23.03	$ 271,661.88	0.00	$ -	23.03	$ 271,662
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 45,138.00	$ 0.00	**69.02**	$ 3,115,424.76			0.00	$ -	-	
14	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 0.00**								
14.1.8	CIELORASO PLANO DRYWALL ANTIHUMEDAD 1/2" (Incluyendo todo lo necesario para su correcta instalación)	M2		$ 133,664.00	$ 0.00	**23.26**	$ 3,109,024.64	23.26	$ 3,109,024.64	0.00	$ -	23.26	$ 3,109,025
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 3,563,976.00**								
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	26	$ 137,076.00	$ 3,563,976.00	**35.6**	$ 4,879,905.60			35.60	$ 4,879,905.60	35.60	$ 4,879,906
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL		0	$ -	**$ 331,695.00**							-	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	63	$ 5,265.00	$ 331,695.00	**155.52**	$ 818,812.80			0.00	$ -	-	
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				**$ 19,318,547.90**		**$ 28,034,999.30**		**$ 17,040,887.00**		**$ 7,059,874.74**		**$ 24,100,761.74**
S6	**JARDINI INFANTIL TUNJUELITO**												
1	PRELIMINARES				**$ 23,871,967.34**								
1.1	OBRAS PRELIMINARES												
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACIONES (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE CONSTRUCCION)	M2	124.09	$ 19,797.00	$ 2,456,609.73	**111.8**	$ 2,213,304.60		$ 0.00	111.80	$ 2,213,304.60	111.80	$ 2,213,304.60
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL						$ -			0.00	$ -	-	$ 0.00
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	49.20	$ 43,298.00	$ 2,130,261.60	**49.2**	$ 2,130,261.60		$ 0.00	49.20	$ 2,130,261.60	49.20	$ 2,130,261.60
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS						$ -			0.00	$ -	-	$ 0.00
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	111.14	$ 32,417.00	$ 3,602,825.38	**111.14**	$ 3,602,825.38		$ 0.00	111.14	$ 3,602,825.38	111.14	$ 3,602,825.38
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	85.45	$ 18,929.00	$ 1,617,483.05	**62.98**	$ 1,192,148.42		$ 0.00	62.98	$ 1,192,148.42	62.98	$ 1,192,148.42
1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS)	UN	21.00	$ 18,691.00	$ 392,511.00	**18**	$ 336,438.00		$ 0.00	18.00	$ 336,438.00	18.00	$ 336,438.00
1.3.43	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS.	M2	319.61	$ 42,778.00	$ 13,672,276.58	**301.25**	$ 12,886,872.50		$ 0.00	301.25	$ 12,886,872.50	301.25	$ 12,886,872.50
2	CIMENTACIÓN		0	$ -	**$ 7,102,384.26**					0	$ -	-	
2.2	CONCRETOS						$ -			0.00	$ -	-	$ 0.00
2.2.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA DE CONFINAMIENTO 20 X 15 CMS. EN CONCRETO DE 3000 PSI NO INCLUYE REFUERZO	M	4.38	$ 111,104.00	$ 486,635.52	**4.38**	$ 486,635.52		$ 0.00	4.38	$ 486,635.52	4.38	$ 486,635.52
2.2.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES DE MUROS DE 5/8" PROFUNDIDADES ENTRE 3 Y 5 CM	M	1.50	$ 25,381.00	$ 38,071.50	**1.50**	$ 38,071.50		$ 0.00	1.50	$ 38,071.50	1.50	$ 38,071.50
2.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000PSI. NO INCLUYE REFUERZO	M	61.64	$ 102,054.00	$ 6,290,608.56	**26.07**	$ 2,660,547.78		$ 0.00	26.07	$ 2,660,547.78	26.07	$ 2,660,547.78
2.5	ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA						$ -			0.00	$ -	-	$ 0.00
2.5.2	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	53.94	$ 5,322.00	$ 287,068.68	**31.35**	$ 166,844.70		$ 0.00	31.35	$ 166,844.70	31.35	$ 166,844.70
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 2,981,683.71**					0	$ -		
3.1	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -		$ 0.00	0.00	$ -	-	$ 0.00
3.1.2	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No 4	M2	2.89	$ 48,199.00	$ 139,295.11	**2.89**	$ 139,295.11		$ 0.00	2.89	$ 139,295.11	2.89	$ 139,295.11
3.1.4	MURO EN LADRILLO TOLETE RUGOSO 24.5X12X6CM	M2	9.48	$ 210,897.00	$ 1,999,303.56	**9.48**	$ 1,999,303.56		$ 0.00	9.48	$ 1,999,303.56	9.48	$ 1,999,303.56
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -		$ 0.00	0.00	$ -	-	$ 0.00
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	38.92	$ 21,662.00	$ 843,085.04	**27.22**	$ 589,639.64		$ 0.00	27.22	$ 589,639.64	27.22	$ 589,639.64
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 1,083,325.00**					0	$ -	-	
5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	4.00	$ 185,011.00	$ 740,044.00	**4.00**	$ 740,044.00		$ 0.00	4.00	$ 740,044.00	4.00	$ 740,044.00

5.1.77	REINSTALACIÓN DE LAMPARAS EXISTENTES (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	17.00	$ 20,193.00	$ 343,281.00	**13.00**	$ 262,509.00		$ 0.00	13.00	$ 262,509.00	13.00	$ 262,509.00	
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 0.00**					0	$ -	-		
8.1.4.	MURO EN LÁMINA FIBRO - CEMENTO 10 MM	M2		$ 128,794.00	$ 0.00	**10.79**	$ 1,389,687.26		$ 0.00	10.79	$ 1,389,687.26	10.79	$ 1,389,687.26	
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 1,626,319.31**					0	$ -	-		
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -		$ 0.00	0.00	$ -	-	$ 0.00	
13.1.1	PAÑETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	14.97	$ 28,666.00	$ 429,130.02	**14.97**	$ 429,130.02		$ 0.00	14.97	$ 429,130.02	14.97	$ 429,130.02	
13.1.7	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	14.97	$ 25,832.00	$ 386,705.04	**14.97**	$ 386,705.04		$ 0.00	14.97	$ 386,705.04	14.97	$ 386,705.04	
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -		$ 0.00	0.00	$ -	-	$ 0.00	
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	45.55	$ 10,754.00	$ 489,844.70	**173.51**	$ 1,865,926.54		$ 0.00	173.51	$ 1,865,926.54	173.51	$ 1,865,926.54	
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2		$ 20,469.00	$ 0.00	**96.22**	$ 1,969,527.18		$ 0.00	96.22	$ 1,969,527.18	96.22	$ 1,969,527.18	
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	14.91	$ 21,505.00	$ 320,639.55	**15.61**	$ 335,693.05		$ 0.00	15.61	$ 335,693.05	15.61	$ 335,693.05	
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 45,138.00	$ 0.00	**58.08**	$ 2,621,615.04		$ 0.00	58.08	$ 2,621,615.04	58.08	$ 2,621,615.04	
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 39,517.00	$ 0.00	**13**	$ 513,721.00		$ 0.00	13.00	$ 513,721.00	13.00	$ 513,721.00	
14	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 43,672,804.11**					0	$ -	-		
14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORASO FALSO EN PANEL SUPERBOARD DE 6 MM - INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA MASILLA Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	M2	94.03	$ 272,113.00	$ 25,586,785.39	**62.98**	$ 17,137,676.74		$ 0.00	62.98	$ 17,137,676.74	62.98	$ 17,137,676.74	
14.1.3	CIELORASO EN LAMINA DE YESO DE 1/2" ST (Incluyendo todo lo necesario para su correcta instalación)	M2	123.04	$ 146,993.00	$ 18,086,018.72	**104.83**	$ 15,409,276.19		$ 0.00	104.83	$ 15,409,276.19	104.83	$ 15,409,276.19	
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 49,264,210.15**					0	$ -	-		
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	84.14	$ 51,981.00	$ 4,373,681.34	**81.88**	$ 4,256,204.28		$ 0.00	81.88	$ 4,256,204.28	81.88	$ 4,256,204.28	
17.1.4	ADECUACIÓN ENTRAMADO METÁLICO EXISTENTE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	137.94	$ 64,769.00	$ 8,934,235.86	**137.94**	$ 8,934,235.86		$ 0.00	137.94	$ 8,934,235.86	137.94	$ 8,934,235.86	
17.1.6	DOMO EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 5 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	14.00	$ 220,149.00	$ 3,082,086.00		$ -		$ 0.00	0.00	$ -	-	$ 0.00	
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	118.69	$ 247,595.00	$ 29,387,050.55	**114.4**	$ 28,324,868.00		$ 0.00	114.40	$ 28,324,868.00	114.40	$ 28,324,868.00	
17.1.17	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CERCHA PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	36.40	$ 95,801.00	$ 3,487,156.40	**23.4**	$ 2,241,743.40		$ 0.00	23.40	$ 2,241,743.40	23.40	$ 2,241,743.40	
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				**$ 2,832,570.00**					0	$ -	-		
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	538.00	$ 5,265.00	$ 2,832,570.00	**364.03**	$ 1,916,617.95		$ 0.00	364.03	$ 1,916,617.95	364.03	$ 1,916,617.95	
21	PRECIOS NO PREVISTOS		0.00	$ -	**$ 0.00**					0	$ -	-		#
NP 002	MANTENIMIENTO GENERAL DE CARPINTERIA, INCLUYE DESMONTE, REPARACION, AJUSTES NECESARIOS, MASILLA, GRADUACION DE CERRADURAS, INCLUYE TRANSPORTE EN CASO DE REQUERIRSE, NO INCLUYE PINTURA, NI CAMBIO DE CERRADURAS NI BRAZOS ESPECIALES.	m2		$ 246,667.00	$ 0.00	**14.4**	$ 3,552,004.80		$ 0.00	14.40	$ 3,552,004.80	14.40	$ 3,552,004.80	#
34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO					**$ 132,435,263.88**		**$ 120,729,373.66**		**$ 0.00**		**$ 120,729,373.66**		**$ 120,729,373.66**	
S7	**JARDINI INFANTIL ESTRELLAS DEL MAÑANA**													
1	PRELIMINARES				**$ 1,938,368.95**									
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL													
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	15.5	$ 43,298.00	$ 671,119.00	**15.3**	$ 662,459.40		$ 0.00	15.30	$ 662,459.40	15.30	$ 662,459.40	
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS						$ -		$ 0.00					
1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	46.05	$ 27,519.00	$ 1,267,249.95	**42.58**	$ 1,171,759.02		$ 0.00	42.58	$ 1,171,759.02	42.58	$ 1,171,759.02	
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 907,171.67**									
3.1	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -		$ 0.00					
3.1.3	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	24.85	$ 17,799.00	$ 442,305.15	**7.95**	$ 141,502.05		$ 0.00	7.95	$ 141,502.05	7.95	$ 141,502.05	
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -		$ 0.00					
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	21.46	$ 21,662.00	$ 464,866.52	**21.46**	$ 464,866.52		$ 0.00	21.46	$ 464,866.52	21.46	$ 464,866.52	
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 4,250,282.09**									
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -		$ 0.00					
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	M2	46.05	$ 41,523.00	$ 1,912,134.15	**42.58**	$ 1,768,049.34		$ 0.00	42.58	$ 1,768,049.34	42.58	$ 1,768,049.34	
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	16.44	$ 14,846.00	$ 244,068.24	**16.44**	$ 244,068.24		$ 0.00	16.44	$ 244,068.24	16.44	$ 244,068.24	
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -		$ 0.00					

7.2.2	BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A = 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	2.2	$ 68,333.00	$ 150,332.60	**1.2**	$ 81,999.60		$ 0.00	1.2	$ 81,999.60	1.20	$ 81,999.60
7.2.16	CINTA ANTIDESLIZANTE A = 2 CM	M		$ 3,594.00	$ 0.00	**8**	$ 28,752.00		$ 0.00	8	$ 28,752.00	8.00	$ 28,752.00
7.2.26	ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	19.53	$ 95,370.00	$ 1,862,576.10	**19.19**	$ 1,830,150.30		$ 0.00	19.19	$ 1,830,150.30	19.19	$ 1,830,150.30
7.2.35	WIN DE ALUMINIO	M	9.00	$ 9,019.00	$ 81,171.00	**8.93**	$ 80,539.67		$ 0.00	8.93	$ 80,539.67	8.93	$ 80,539.67
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 1,741,166.60**								
8.1.2	ENCHAPE 25 X 35	M2	13.85	$ 125,716.00	$ 1,741,166.60	**13.14**	$ 1,651,908.24		$ 0.00	13.14	$ 1,651,908.24	13.14	$ 1,651,908.24
8.1.4	MURO EN LÁMINA FIBRO - CEMENTO 10 MM	M2		$ 128,794.00	$ 0.00	**3.46**	$ 445,627.24		$ 0.00	3.46	$ 445,627.24	3.46	$ 445,627.24
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 5,107,411.87**								
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -		$ 0.00				
13.1.7	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	9.9	$ 25,832.00	$ 255,736.80	**8.75**	$ 226,030.00		$ 0.00	8.75	$ 226,030.00	8.75	$ 226,030.00
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -		$ 0.00				
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	6.02	$ 21,505.00	$ 129,460.10	**5.94**	$ 127,739.70		$ 0.00	5.94	$ 127,739.70	5.94	$ 127,739.70
13.2.9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA PISO TRÁFICO PESADO	M2	30.4	$ 54,958.00	$ 1,670,723.20	**27.38**	$ 1,504,750.04		$ 0.00	27.38	$ 1,504,750.04	27.38	$ 1,504,750.04
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -		$ 0.00				
13.4.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS A DOS MANOS Y DOS CARAS	M2	2.55	$ 43,779.00	$ 111,636.45	**2.55**	$ 111,636.45		$ 0.00	2.55	$ 111,636.45	2.55	$ 111,636.45
13.4.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M2	57.13	$ 26,869.00	$ 1,535,025.97	**54.07**	$ 1,452,806.83		$ 0.00	54.07	$ 1,452,806.83	54.07	$ 1,452,806.83
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	35.55	$ 39,517.00	$ 1,404,829.35	**36.6**	$ 1,446,322.20		$ 0.00	36.6	$ 1,446,322.20	36.60	$ 1,446,322.20
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 5,823,432.81**								
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	5.35	$ 51,981.00	$ 278,098.35	**5.35**	$ 278,098.35		$ 0.00	5.35	$ 278,098.35	5.35	$ 278,098.35
17.1.19	IMPERMEABILIZACIÓN INTERNA PARA TANQUE DE AGUA POTABLE, CON MORTERO DE REVESTIMIENTO CON BASE DE CEMENTO, MODIFICADO CON POLIMEROS, DE UN SOLO COMPONENTE, PARA APLICACIONES DE BAJO ESPESOR.	M2	36.31	$ 52,838.00	$ 1,918,547.78	**35.86**	$ 1,894,770.68		$ 0.00	35.86	$ 1,894,770.68	35.86	$ 1,894,770.68
17.1.20	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	38.89	$ 42,262.00	$ 1,643,569.18	**37.55**	$ 1,586,938.10		$ 0.00	37.55	$ 1,586,938.10	37.55	$ 1,586,938.10
17.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	9.9	$ 200,325.00	$ 1,983,217.50	**7.14**	$ 1,430,320.50		$ 0.00	7.14	$ 1,430,320.50	7.14	$ 1,430,320.50
19	DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN				**$ 1,456,470.00**								
19.1.3	PRUEBA DE PRESION Y ESTANQUEIDAD	UN	1	$ 1,456,470.00	$ 1,456,470.00	**1.00**	$ 1,456,470.00		$ 0.00	1.00	$ 1,456,470.00	1.00	$ 1,456,470.00
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				**$ 242,453.25**								
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	46.05	$ 5,265.00	$ 242,453.25	**46.05**	$ 242,453.25		$ 0.00			46.05	$ 242,453.25
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				**$ 21,466,757.24**		**$ 20,330,017.72**		**$ 0.00**		**$ 20,330,017.72**		**$ 20,330,017.72**
S8	**JARDINI INFANTIL YANACONA**												
1	PRELIMINARES				**$ 6,903,307.28**								
1.1	OBRAS PRELIMINARES												
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACIONES (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE CONSTRUCCION)	M2	156.24	$ 19,797.00	$ 3,093,083.28	**144.00**	$ 2,850,768.00			144.00	$ 2,850,768.00	144.00	$ 2,850,768
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL						$ -						
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	88.00	$ 43,298.00	$ 3,810,224.00	**18.15**	$ 785,858.70			18.15	$ 785,858.70	18.15	$ 785,859
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2		$ 21,662.00	$ 0.00	**12.23**	$ 264,926.26	12.23	$ 264,926.26	0.00	$ -	12.23	$ 264,926
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 3,688,940.00**								
5.1.71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	20.00	$ 184,447.00	$ 3,688,940.00		$ -			0.00	$ -	-	
5.1.74	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER	UN		$ 99,525.00	$ 0.00	**20.00**	$ 1,990,500.00			20.00	$ 1,990,500.00	20.00	$ 1,990,500
7	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 0.00**								
7.2.35	WIN DE ALUMINIO	M		$ 9,019.00	$ 0.00	**62.86**	$ 566,934.34			62.86	$ 566,934.34	62.86	$ 566,934
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 7,482,931.40**								
8.1.4	MURO EN LÁMINA FIBRO - CEMENTO 10 MM	M2	58.10	$ 128,794.00	$ 7,482,931.40	**50.88**	$ 6,553,038.72	- 6.26	-$ 806,250.44	57.14	$ 7,359,289.16	50.88	$ 6,553,039
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 10,732,713.70**					0.00	$ -	-	
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -						
13.1.7	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	58.10	$ 25,832.00	$ 1,500,839.20	**72.04**	$ 1,860,937.28	14.90	$ 384,896.80	57.14	$ 1,476,040.48	72.04	$ 1,860,937
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -						
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	58.10	$ 21,505.00	$ 1,249,440.50	**82.94**	$ 1,783,624.70	25.80	$ 554,829.00	57.14	$ 1,228,795.70	82.94	$ 1,783,625
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 45,138.00	$ 0.00	**0.00**	$ -			0.00	$ -	-	
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -						

13.4.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M2		$ 26,869.00	$ 0.00	**32.41**	$ 870,824.29	32.41	$ 870,824.29	0.00	$ -	32.41	$ 870,824
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	202.00	$ 39,517.00	$ 7,982,434.00	**270.60**	$ 10,693,300.20	80.40	$ 3,177,166.80	190.20	$ 7,516,133.40	270.60	$ 10,693,300
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 40,570,913.88**					0.00	$ -	-	
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2		$ 137,076.00	$ 0.00		$ -			0.00	$ -	-	
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	156.24	$ 247,595.00	$ 38,684,242.80	**179.40**	$ 44,418,543.00			179.40	$ 44,418,543.00	179.40	$ 44,418,543
17.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSIÓN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	M2	26.964	$ 69,970.00	$ 1,886,671.08	**10.40**	$ 727,688.00			10.40	$ 727,688.00	10.40	$ 727,688
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL		0	$ -	**$ 1,210,950.00**					0.00	$ -	-	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	230	$ 5,265.00	$ 1,210,950.00	**287.40**	$ 1,513,161.00	63.40	$ 333,801.00	224.00	$ 1,179,360.00	287.40	$ 1,513,161
34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO					**$ 70,589,756.26**		**$ 74,880,104.49**		**$ 4,780,193.71**		**$ 70,099,910.78**		**$ 74,880,104.49**

S	S9	CDA SIERRA MORENA												
	1	PRELIMINARES				**$ 11,364,335.27**								
	1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL					**0.00**	$ -						
	1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	120.00	$ 43,298.00	$ 5,195,760.00	**19.93**	$ 862,929.14	9.73	$ 421,289.54	10.20	$ 441,639.60	19.93	$ 862,929
	1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS					**0.00**	$ -						
	1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	136.00	$ 27,519.00	$ 3,742,584.00	**144.30**	$ 3,970,991.70	77.44	$ 2,131,071.36	66.86	$ 1,839,920.34	144.30	$ 3,970,992
	1.3.3	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, ETC, CORRIDOS, POYOS, MESONES, PREFABRICADOS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	7.80	$ 32,197.00	$ 251,136.60	**8.01**	$ 257,897.97	8.01	$ 257,897.97	0.00	$ -	8.01	$ 257,898
	1.3.4	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3.06	$ 10,672.00	$ 32,656.32	**13.89**	$ 148,234.08	13.89	$ 148,234.08	0.00	$ -	13.89	$ 148,234
	1.3.5	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	39.00	$ 21,344.00	$ 832,416.00	**20.00**	$ 426,880.00	16.00	$ 341,504.00	4.00	$ 85,376.00	20.00	$ 426,880
	1.3.7	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO VIDRIO Y REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	7.66	$ 18,347.00	$ 140,538.02	**1.54**	$ 28,254.38	1.54	$ 28,254.38	0.00	$ -	1.54	$ 28,254
	1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	61.77	$ 18,929.00	$ 1,169,244.33	**82.37**	$ 1,559,181.73	51.27	$ 970,489.83	31.10	$ 588,691.90	82.37	$ 1,559,182
	1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS)	UN		$ 18,691.00	$ 0.00	**33.00**	$ 616,803.00	33.00	$ 616,803.00	0.00	$ -	33.00	$ 616,803
	1.3.26	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.35M (POR LAS 4 CARAS). INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M		$ 26,470.00	$ 0.00	**12.60**	$ 333,522.00	12.60	$ 333,522.00	0.00	$ -	12.60	$ 333,522
	3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0.00	$ -	**$ 34,672,732.40**	**0.00**	$ -			0.00	$ -	-	
	3.1.3	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 17,799.00	$ 0.00	**100.50**	$ 1,788,799.50	100.50	$ 1,788,799.50	0.00	$ -	100.50	$ 1,788,800
	3.2.9	REEMBOQUILLADO DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA O ADOQUIN CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M		$ 26,449.00	$ 0.00	**176.20**	$ 4,660,313.80	176.20	$ 4,660,313.80	0.00	$ -	176.20	$ 4,660,314
	3.2.11	EMBOQUILLADO DE LADRILLO A LA VISTA EN ALTURA MENOR A 1.50 M	M2		$ 7,718.00	$ 0.00		$ -	-	$ 0	0.00	$ -	-	
	3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			$ -		**0.00**	$ -	-	$ 0.00	0.00	$ -	-	
	3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	1289.80	$ 21,662.00	$ 27,939,647.60	**754.34**	$ 16,340,513.08	413.80	$ 8,963,735.60	340.54	$ 7,376,777.48	754.34	$ 16,340,513
	3.2.19	MESÓN EN GRANITO NATURAL ANCHO MENOR O IGUAL A 80CM - INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M	7.80	$ 863,216.00	$ 6,733,084.80	**8.01**	$ 6,914,360.16	8.01	$ 6,914,360.16	0.00	$ -	8.01	$ 6,914,360
	4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0.00	$ -	**$ 8,816,976.00**	**0.00**	$ -			0.00	$ -	-	
	4.1	TUBERIA		0.00	$ -		**0.00**	$ -	-	$ 0.00	0.00	$ -	-	
	4.1.81	INSTALACION DE SANITARIO, INCLUYE LOS ACCESORIOS	UN	21.00	$ 419,856.00	$ 8,816,976.00	**11.00**	$ 4,618,416.00	11.00	$ 4,618,416.00	0.00	$ -	11.00	$ 4,618,416
	4.1.82	INSTALACION DE LAVAMANOS, INCLUYE LOS ACCESORIOS	UN		$ 124,694.00	$ 0.00	**6.00**	$ 748,164.00	6.00	$ 748,164.00	0.00	$ -	6.00	$ 748,164
	5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0.00	$ -	**$ 2,713,056.00**	**0.00**	$ -			0.00	$ -	-	
	5.1,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO PARA INSTALACIÓN EN TECHO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	UN		$ 255,601.00	$ 0.00	**3.00**	$ 766,803.00	3.00	$ 766,803.00	0.00	$ -	3.00	$ 766,803
	5.1,13	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 347,467.00	$ 0.00	**3.00**	$ 1,042,401.00	3.00	$ 1,042,401.00	0.00	$ -	3.00	$ 1,042,401
	5.1.71.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CIRCULAR DE 24 W. 11" INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	59.00	$ 45,984.00	$ 2,713,056.00	**0.00**	$ -	-	$ 0.00	0.00	$ -	-	
	5.1.97	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA LED DE 18 W INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 47,671.00	$ 0.00	**69.00**	$ 3,289,299.00	69.00	$ 3,289,299.00	0.00	$ -	69.00	$ 3,289,299

7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0.00	$ -	**$ 21,641,952.00**	**0.00**	$ -			0.00	$ -	-	
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					**0.00**	$ -	-	$ 0.00				
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	M2	136.00	$ 41,523.00	$ 5,647,128.00	**144.30**	$ 5,991,768.90	77.44	$ 3,215,541.12	66.86	$ 2,776,227.78	144.30	$ 5,991,769
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					**0.00**	$ -	-	$ 0.00				
7.2.16	CINTA ANTIDESLIZANTE A = 2 CM	M		$ 3,594.00	$ 0.00	**100.00**	$ 359,400.00	100.00	$ 359,400.00	0.00	$ -	100.00	$ 359,400
7.2.17	PISO EN DUROPISO 33.8 X 33.8 CMS, ANTIDESLIZANTE E= 5 MM TIPO TRAFICO PESADO	M2		$ 70,927.00	$ 0.00	**48.13**	$ 3,413,716.51	-	$ 0.00	48.13	$ 3,413,716.51	48.13	$ 3,413,717
7.2.18	PISO CERAMICA ANTIDESLIZANTE, REFERENCIA MIKONOS FORMATO 33 X 33 (COLORES VARIOS)	M2	136.00	$ 117,609.00	$ 15,994,824.00	**96.18**	$ 11,311,633.62	96.18	$ 11,311,633.62	0.00	$ -	96.18	$ 11,311,634
7.2.40	GUARDAESCOBA EN DUROPISO DE 8 A 10 CM DE ALTO	M		$ 20,496.00	$ 0.00	**24.57**	$ 503,586.72	-	$ 0.00	24.57	$ 503,586.72	24.57	$ 503,587
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0.00	$ -	**$ 9,023,894.48**	**0.00**	$ -			0.00	$ -	-	
8.1.2	ENCHAPE 25 X 35	M2	71.78	$ 125,716.00	$ 9,023,894.48	**13.89**	$ 1,746,195.24	13.89	$ 1,746,195.24	0.00	$ -	13.89	$ 1,746,195
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 0.00**	**0.00**	$ -						
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2		$ 439,181.00	$ 0.00	**0.00**	$ -	-	$ 0.00	0.00	$ -	-	
9.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, INCLUYE TORNILLOS, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.	M2	0.00	$ 227,408.00	$ 0.00	**0.00**	$ -	-	$ 0.00	0.00	$ -	-	
9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2		$ 142,958.00	$ 0.00	**4.34**	$ 620,437.72	4.34	$ 620,437.72	0.00	$ -	4.34	$ 620,438
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0.00	$ -	**$ 20,101,338.00**	**0.00**	$ -			0.00	$ -	-	
11.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE INCRUSTAR COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA Y GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	18.00	$ 705,542.00	$ 12,699,756.00	**1.00**	$ 705,542.00	1.00	$ 705,542.00	0.00	$ -	1.00	$ 705,542
11.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN		$ 408,380.00	$ 0.00	**1.00**	$ 408,380.00	1.00	$ 408,380.00	0.00	$ -	1.00	$ 408,380
11.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLADORES TIPO CUELLO DE GANSO DE 8" SENCILLOS PARA LAVAPLATOS	UN		$ 197,730.00	$ 0.00	**2.00**	$ 395,460.00	2.00	$ 395,460.00	0.00	$ -	2.00	$ 395,460
11.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 5" A 4"	UN		$ 33,334.00	$ 0.00	**1.00**	$ 33,334.00	1.00	$ 33,334.00	0.00	$ -	1.00	$ 33,334
11.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PEDAL PARA LAVAMANOS O LAVAPLATOS	UN	18.00	$ 411,199.00	$ 7,401,582.00	**19.00**	$ 7,812,781.00	19.00	$ 7,812,781.00	0.00	$ -	19.00	$ 7,812,781
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0.00	$ -	**$ 50,168,106.82**	**0.00**	$ -			0.00	$ -	-	
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					**0.00**	$ -	-	$ 0.00				
13.1.2	PAÑETE MURO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	21.78	$ 78,779.00	$ 1,715,806.62	**16.20**	$ 1,276,219.80	16.20	$ 1,276,219.80	0.00	$ -	16.20	$ 1,276,220
13.1,7	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 25,832.00	$ 0.00	**15.12**	$ 390,579.84	15.12	$ 390,579.84	0.00	$ -	15.12	$ 390,580
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					**0.00**	$ -	-	$ 0.00				
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1174.80	$ 10,754.00	$ 12,633,799.20	**1058.25**	$ 11,380,420.50	451.11	$ 4,851,236.94	607.14	$ 6,529,183.56	1,058.25	$ 11,380,421
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2		$ 20,469.00	$ 0.00	**174.91**	$ 3,580,232.79	174.91	$ 3,580,232.79	0.00	$ -	174.91	$ 3,580,233
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 21,505.00	$ 0.00	**317.94**	$ 6,837,299.70	317.94	$ 6,837,299.70	0.00	$ -	317.94	$ 6,837,300
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	639.50	$ 45,138.00	$ 28,865,751.00	**563.66**	$ 25,442,485.08	255.45	$ 11,530,502.10	308.21	$ 13,911,982.98	563.66	$ 25,442,485
13.2.8	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 14,653.00	$ 0.00	**118.89**	$ 1,742,095.17	118.89	$ 1,742,095.17	0.00	$ -	118.89	$ 1,742,095
13.2.9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA PISO TRÁFICO PESADO	M2		$ 54,958.00	$ 0.00	**5.91**	$ 324,801.78	5.91	$ 324,801.78	0.00	$ -	5.91	$ 324,802
13.2.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE RECUBRIMIENTO ANTIGRAFFITI A DOS MANOS	M2	350.00	$ 19,865.00	$ 6,952,750.00			-	$ 0.00	0.00	$ -	-	
13.4.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS A DOS MANOS Y DOS CARAS	M2		$ 43,779.00	$ 0.00	**6.65**	$ 291,130.35	6.65	$ 291,130.35	0.00	$ -	6.65	$ 291,130
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 39,517.00	$ 0.00	**22.98**	$ 908,100.66	22.98	$ 908,100.66	0.00	$ -	22.98	$ 908,101
14	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0.00	$ -	**$ 8,256,425.28**	**0.00**	$ -			0.00	$ -	-	
14.1.3	CIELORASO EN LAMINA DE YESO DE 1/2" ST (Incluyendo todo lo necesario para su correcta instalación)	M2		$ 146,993.00	$ 0.00	**50.25**	$ 7,386,398.25	50.25	$ 7,386,398.25	0.00	$ -	50.25	$ 7,386,398
14.1.8	CIELORASO PLANO DRYWALL ANTIHUMEDAD 1/2" (Incluyendo todo lo necesario para su correcta instalación)	M2	61.77	$ 133,664.00	$ 8,256,425.28	**32.12**	$ 4,293,287.68	1.02	$ 136,337.28	31.10	$ 4,156,950.40	32.12	$ 4,293,288
15	CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0.00	$ -	**$ 1,137,257.22**	**0.00**	$ -			0.00	$ -	-	
15.2	VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0.00	$ -		**0.00**	$ -	-	$ 0.00	0.00	$ -	-	
15.2.2	VIDRIOS INCOLOROS DE 4 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD EN AMBAS CARAS	M2	7.66	$ 148,467.00	$ 1,137,257.22	**0.00**	$ -	-	$ 0.00	0.00	$ -	-	
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0.00	$ -	**$ 23,659,413.03**	**0.00**	$ -			0.00	$ -	-	
17.1.6	DOMO EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 5 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	107.47	$ 220,149.00	$ 23,659,413.03			-	$ 0.00	0.00	$ -	-	
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL		0.00	$ -	**$ 3,949,487.10**	**0.00**	$ -			0.00	$ -	-	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	750.14	$ 5,265.00	$ 3,949,487.10	**1189.01**	$ 6,260,137.65	1,189.01	$ 6,260,137.65	0.00	$ -	1,189.01	$ 6,260,138

21	PRECIOS NO PREVISTOS		0.00	$ -	**$ 0.00**					0.00		-	

NP 001	DESMONTE, INSTALACION Y CERTIFICACION DE PUNTOS DE ANCLAJE PARA TRABAJO EN ALTURAS	UN		$ 382,772.00	$ 0.00	**35.00**	$ 13,397,020.00	35.00	$ 13,397,020	0.00	$ -	35.00	$ 13,397,020.00
NP 002	MANTENIMIENTO GENERAL DE CARPINTERIA, INCLUYE DESMONTE, REPARACION, AJUSTES NECESARIOS, MASILLA, GRADUACION DE CERRADURAS, INCLUYE TRANSPORTE EN CASO DE REQUERIRSE, NO INCLUYE PINTURA, NI CAMBIO DE CERRADURAS NI BRAZOS ESPECIALES.	m2		$ 246,667.00	$ 0.00	**49.23**	$ 12,143,416.41	41.49	$ 10,234,213.83	7.74	$ 1,909,202.58	49.23	$ 12,143,416.41
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				**$ 195,504,973.60**		**$ 177,329,624.91**		**$ 133,796,369.06**		**$ 43,533,255.85**		**$ 177,329,624.91**
S10	**CDA BELLA FLOR**												
1	PRELIMINARES				**$ 2,032,579.00**								
1.1	OBRAS PRELIMINARES												
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACIONES (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE CONSTRUCCION)	M2	13.00	$ 19,797.00	$ 257,361.00	**18.90**	$ 374,163.30	18.90	$ 374,163.30			18.90	$ 374,163
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL			$ -			$ -					-	
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	41.00	$ 43,298.00	$ 1,775,218.00	**0.00**	$ -					-	
1.3.7	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO VIDRIO Y REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 18,347.00	$ 0.00	**3.03**	$ 55,591.41	3.03	$ 55,591.41			3.03	$ 55,591
1.3.46	PICADO DE MUROS DE MAMPOSTERÍA. INCLUYE DISPOSICIÓN Y RETIRO DE MATERIAL	M2		$ 9,474.00	$ 0.00	**264.19**	$ 2,502,936.06	264.19	$ 2,502,936.06			264.19	$ 2,502,936
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 37,539,989.24**								
3.1	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
3.1.3	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	213.06	$ 17,799.00	$ 3,792,254.94	**248.68**	$ 4,426,255.32	248.68	$ 4,426,255.32			248.68	$ 4,426,255
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					**0.00**	$ -						
3.2.9	REEMBOQUILLADO DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA O ADOQUIN CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	ML	213.06	$ 26,449.00	$ 5,635,223.94	**32.03**	$ 847,161.47	32.03	$ 847,161.47			32.03	$ 847,161
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	1297.78	$ 21,662.00	$ 28,112,510.36	**721.84**	$ 15,636,498.08	721.84	$ 15,636,498.08			721.84	$ 15,636,498
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ 274,986.00	**$ 0.00**							-	
5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 267,457.00	$ 0.00	**0.00**	$ -					-	
5.1.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M		$ 49,725.00	$ 0.00	**3.38**	$ 168,070.50	3.38	$ 168,070.50			3.38	$ 168,070.50
5.1.65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 353,778.00	$ 0.00	**2.00**	$ 707,556.00	2.00	$ 707,556.00			2.00	$ 707,556.00
5.1.71.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 65,387.00	$ 0.00	**2.00**	$ 130,774.00	2.00	$ 130,774.00			2.00	$ 130,774.00
5.1.71.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CIRCULAR DE 24 W. 11" INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 45,984.00	$ 0.00	**4.00**	$ 183,936.00	4.00	$ 183,936.00			4.00	$ 183,936.00
5.1.74	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER	UN		$ 99,525.00	$ 0.00	**1.00**	$ 99,525.00	1.00	$ 99,525.00			1.00	$ 99,525.00
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 1,000,290.90**								
7.2.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM	M		$ 25,938.00	$ 0.00	**3.01**	$ 78,073.38	3.01	$ 78,073.38			3.01	$ 78,073
7.2.34	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS EN ALTURA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ANDAMIOS CERTIFICADOS.	M		$ 26,250.00	$ 0.00	**64.37**	$ 1,689,712.50	64.37	$ 1,689,712.50			64.37	$ 1,689,713
7.2.40	GUARDAESCOBA EN DUROPISO DE 8 A 10 CM DE ALTO	M		$ 20,496.00	$ 0.00	**10.82**	$ 221,766.72	10.82	$ 221,766.72			10.82	$ 221,767

8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 1,000,290.90**								
8.1.2	ENCHAPE 25 X 35	M2		$ 125,716.00	$ 0.00	**13.85**	$ 1,741,166.60	13.85	$ 1,741,166.60			13.85	$ 1,741,167
8.1.3	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E = 10CM, INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	6.86	$ 145,815.00	$ 1,000,290.90	**15.45**	$ 2,252,841.75	15.45	$ 2,252,841.75			15.45	$ 2,252,842
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 5,185,213.55**								
9.1	CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					**0.00**	$ -						
9.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE POMO METÁLICA, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS..	M2	1.68	$ 330,393.00	$ 555,060.24	**0.00**	$ -					-	
9.2	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					**0.00**	$ -						
9.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO SIN BATIENTES, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	0.48	$ 439,181.00	$ 210,806.88	**3.03**	$ 1,330,718.43	3.03	$ 1,330,718.43			3.03	$ 1,330,718
9.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2		$ 231,307.00	$ 0.00	**5.56**	$ 1,286,066.92	5.56	$ 1,286,066.92			5.56	$ 1,286,067
9.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, INCLUYE TORNILLOS, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.	M2		$ 227,408.00	$ 0.00	**0**	$ -					-	
9.3	OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			$ -		**0.00**	$ -					-	
9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2	30.9136	$ 142,958.00	$ 4,419,346.43	**1.44**	$ 205,859.52	1.44	$ 205,859.52			1.44	$ 205,860
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 62,941,332.80**								
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					**0.00**	$ -						
13.1.2	PAÑETE MURO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 78,779.00	$ 0.00	**329.31**	$ 25,942,712.49	329.31	$ 25,942,712.49			329.31	$ 25,942,712
13.1.7	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	348.562	$ 25,832.00	$ 9,004,053.58	**106.84**	$ 2,759,890.88	106.84	$ 2,759,890.88			106.84	$ 2,759,891
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					**0.00**	$ -						
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1531.14	$ 10,754.00	$ 16,465,879.56	**1023.86**	$ 11,010,590.44	1,023.86	$ 11,010,590.44			1,023.86	$ 11,010,590
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2		$ 20,469.00	$ 0.00	**121.18**	$ 2,480,433.42	121.18	$ 2,480,433.42			121.18	$ 2,480,433
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	548.56	$ 21,505.00	$ 11,796,782.80	**362.03**	$ 7,785,455.15	362.03	$ 7,785,455.15			362.03	$ 7,785,455
13.2.4	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 11,796.00	$ 0.00	**267.79**	$ 3,158,850.84	267.79	$ 3,158,850.84			267.79	$ 3,158,851
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	416.97	$ 45,138.00	$ 18,821,191.86	**469.35**	$ 21,185,520.30	469.35	$ 21,185,520.30			469.35	$ 21,185,520
13.2.8	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 14,653.00	$ 0.00	**86.42**	$ 1,266,312.26	86.42	$ 1,266,312.26			86.42	$ 1,266,312
13.2.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE RECUBRIMIENTO ANTIGRAFFITI A DOS MANOS	M2	345.00	$ 19,865.00	$ 6,853,425.00		$ -					-	
14	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 0.00**								
14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORASO FALSO EN PANEL SUPERBOARD DE 6 MM - INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA MASILLA Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	M2		$ 272,113.00	$ 0.00	**6.62**	$ 1,801,388.06	6.62	$ 1,801,388.06			6.62	$ 1,801,388
14.1.4	TAPALUCES DE CUBIERTA EN LÁMINA DE SUPERBOARD 6 MM UNA CARA. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M		$ 57,761.00	$ 0.00	**33.85**	$ 1,955,209.85	33.85	$ 1,955,209.85			33.85	$ 1,955,210
15	CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 0.00**								
15.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANDBLASTING COLOR OPAL SÓLIDO O TIPO PERSIANA (AMBAS CARAS)	M2		$ 76,779.00	$ 0.00	**19.22**	$ 1,475,692.38	19.22	$ 1,475,692.38			19.22	$ 1,475,692
15.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VINILO ADHESIVO TIPO SANBLASTING CORTADO EN PLOTTER INSTALADO	M2		$ 40,834.00	$ 0.00	**8.18**	$ 334,022.12	8.18	$ 334,022.12			8.18	$ 334,022
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 3,377,839.20**								
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M		$ 51,981.00	$ 0.00	**9.00**	$ 467,829.00	9.00	$ 467,829.00			9.00	$ 467,829
17.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 67,966.00	$ 0.00	**3.00**	$ 203,898.00	3.00	$ 203,898.00			3.00	$ 203,898.00
17.1.17	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CERCHA PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M		$ 95,801.00	$ 0.00	**5.72**	$ 547,981.72	5.72	$ 547,981.72			5.72	$ 547,982
17.1.18	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	12.90	$ 61,523.00	$ 793,646.70	**17.20**	$ 1,058,195.60	17.20	$ 1,058,195.60			17.20	$ 1,058,196
17.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	12.90	$ 200,325.00	$ 2,584,192.50		$ -					-	
17.1.24,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 205,696.00	$ 0.00	**18.90**	$ 3,887,654.40	18.90	$ 3,887,654.40			18.90	$ 3,887,654
17.1.30	CANAL AMAZONA	M		$ 67,966.00	$ 0.00	**9.00**	$ 611,694.00	9.00	$ 611,694.00			9.00	$ 611,694.00
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				**$ 4,501,048.50**								

20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	854.9	$ 5,265.00	$ 4,501,048.50	**1157.74**	$ 6,095,501.10	1,157.74	$ 6,095,501.10			1,157.74	$ 6,095,501	
21	PRECIOS NO PREVISTOS				**$ 0.00**									#
NP 001	DESMONTE, INSTALACION Y CERTIFICACION DE PUNTOS DE ANCLAJE PARA TRABAJO EN ALTURAS	UN		$ 382,772.00	$ 0.00	**24.00**	$ 9,186,528.00	24.00	$ 9,186,528.00			24.00	$ 9,186,528.00	#
34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO					**$ 117,078,438.64**		**$ 137,154,032.97**		**$ 137,154,032.97**		**$ 0**		**$ 137,154,032.97**	
S11	**CDA ACACIAS**													
1	PRELIMINARES				**$ 11,000,340.14**									
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL													
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	50	$ 43,298.00	$ 2,164,900.00	**30.33**	$ 1,313,228.34	6.00	$ 259,788.00	24.33	$ 1,053,440.34	30.33	$ 1,313,228.34	
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS						$ -							
1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	174.75	$ 27,519.00	$ 4,808,945.25	**184.51**	$ 5,077,530.69		$ 0.00	184.51	$ 5,077,530.69	184.51	$ 5,077,530.69	
1.3.2	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	2.2	$ 24,524.00	$ 53,952.80	**2.75**	$ 67,441.00		$ 0.00	2.75	$ 67,441.00	2.75	$ 67,441.00	
1.3.4	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	7.33	$ 10,672.00	$ 78,225.76	**7.33**	$ 78,225.76		$ 0.00	7.33	$ 78,225.76	7.33	$ 78,225.76	
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO	M2	5.76	$ 32,417.00	$ 186,721.92	**12.42**	$ 402,619.14	3.80	$ 123,184.60	8.62	$ 279,434.54	12.42	$ 402,619.14	
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	36.17	$ 18,929.00	$ 684,661.93	**39.15**	$ 741,070.35		$ 0.00	39.15	$ 741,070.35	39.15	$ 741,070.35	
1.3.23	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	111.48	$ 20,144.00	$ 2,245,653.12	**100.06**	$ 2,015,608.64		$ 0.00	100.06	$ 2,015,608.64	100.06	$ 2,015,608.64	
1.3.40	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	79.04	$ 9,834.00	$ 777,279.36	**73.38**	$ 721,618.92		$ 0.00	73.38	$ 721,618.92	73.38	$ 721,618.92	
2	CIMENTACIÓN		0	$ -	**$ 667,900.56**				$ 0.00	-	$ 0.00	-		
2.2	CONCRETOS								$ 0.00					
2.2.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA DE CONFINAMIENTO 20 X 15 CMS. EN CONCRETO DE 3000 PSI NO INCLUYE REFUERZO	M	4.4	$ 111,104.00	$ 488,857.60	**2.83**	$ 314,424.32		$ 0.00	2.83	$ 314,424.32	2.83	$ 314,424.32	
2.2.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGUETA EN CONCRETO DE 3000 PSI. DIMENSIONES 20X15CM. NO INCLUYE REFUERZO	M	1	$ 108,899.00	$ 108,899.00	**1.00**	$ 108,899.00		$ 0.00	1.00	$ 108,899.00	1.00	$ 108,899.00	
2.5	ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA						$ -		$ 0.00					
2.5.2	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	13.18	$ 5,322.00	$ 70,143.96	**10.58**	$ 56,306.76		$ 0.00	10.58	$ 56,306.76	10.58	$ 56,306.76	
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 42,502,376.87**				$ 0.00	-	$ 0.00	-		
3.1	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -			$ -		$ 0.00	-	$ 0.00	-		
3.1.2	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No 4	M2	0.27	$ 48,199.00	$ 13,013.73	**0.37**	$ 17,833.63		$ 0.00	0.37	$ 17,833.63	0.37	$ 17,833.63	
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -			$ -		$ 0.00	-	$ 0.00	-		
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	1961.47	$ 21,662.00	$ 42,489,363.14	**1851.85**	$ 40,114,774.70		$ 0.00	1,851.85	$ 40,114,774.70	1,851.85	$ 40,114,774.70	
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 48,267.00**				$ 0.00	-	$ 0.00	-		
4.1	TUBERIA		0	$ -			$ -		$ 0.00	-	$ 0.00	-		
4.1.15	PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	UN	1	$ 48,267.00	$ 48,267.00	**1.00**	$ 48,267.00		$ 0.00	1.00	$ 48,267.00	1.00	$ 48,267.00	
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 40,386.00**				$ 0.00	-	$ 0.00	-		
5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES,	UN		$ 267,457.00	$ 0.00	**0.00**	$ -		$ 0.00	-	$ 0.00	-		
5.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO PARA INSTALACIÓN EN TECHO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA,	UN		$ 255,601.00	$ 0.00	**1.00**	$ 255,601.00	1.00	$ 255,601.00	-	$ 0.00	1.00	$ 255,601.00	
5.1.65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT,	UN		$ 353,778.00	$ 0.00		$ -		$ 0.00	-	$ 0.00	-		
5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 185,011.00	$ 0.00	**13.00**	$ 2,405,143.00	13.00	$ 2,405,143.00	-	$ 0.00	13.00	$ 2,405,143.00	
5.1.74	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER	UN		$ 99,525.00	$ 0.00		$ -		$ 0.00	-	$ 0.00	-		
5.1.76	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED CIRCULAR DE 18 W 8" INCRUSTAR	UN		$ 43,609.00	$ 0.00	**11.00**	$ 479,699.00	11.00	$ 479,699.00	-	$ 0.00	11.00	$ 479,699.00	
5.1.77	REINSTALACIÓN DE LAMPARAS EXISTENTES (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	2	$ 20,193.00	$ 40,386.00	**8.00**	$ 161,544.00		$ 0.00	8.00	$ 161,544.00	8.00	$ 161,544.00	

7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 15,775,122.80**				$ 0.00	-	$ 0.00	-	
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -			$ -		$ 0.00	-	$ 0.00	-	
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	M2	167.88	$ 41,523.00	$ 6,970,881.24	**156.1**	$ 6,481,740.30		$ 0.00	156.10	$ 6,481,740.30	156.10	$ 6,481,740.30
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M		$ 14,846.00		**94.56**	$ 1,403,837.76		$ 0.00	94.56	$ 1,403,837.76	94.56	$ 1,403,837.76
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -		$ 0.00				
7.2.4	GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	20.38	$ 54,616.00	$ 1,113,074.08	**1.80**	$ 98,308.80		$ 0.00	1.80	$ 98,308.80	1.80	$ 98,308.80
7.2.17	PISO EN DUROPISO 33.8 X 33.8 CMS, ANTIDESLIZANTE E= 5 MM TIPO TRAFICO PESADO	M2	48.96	$ 70,927.00	$ 3,472,585.92	**59.01**	$ 4,185,402.27	0.20	$ 14,185.40	58.81	$ 4,171,216.87	59.01	$ 4,185,402.27
7.2.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 6 CM	M		$ 20,419.00	$ 0.00	**77.50**	$ 1,582,472.50		$ 0.00	77.50	$ 1,582,472.50	77.50	$ 1,582,472.50
7.2.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM	M	103.81	$ 25,938.00	$ 2,692,623.78		$ -		$ 0.00	-	$ 0.00	-	
7.2.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MIKONOS BLANCO 33.8 X 33.8 CM	M2	7.73	$ 127,514.00	$ 985,683.22	**7.85**	$ 1,000,984.90		$ 0.00	7.85	$ 1,000,984.90	7.85	$ 1,000,984.90
7.2.40	GUARDAESCOBA EN DUROPISO DE 8 A 10 CM DE ALTO	M	26.36	$ 20,496.00	$ 540,274.56	**42.6**	$ 873,129.60	6.75	$ 138,348.00	35.85	$ 734,781.60	42.60	$ 873,129.60
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 13,337,688.38**								
8.1.2	ENCHAPE 25 X 35	M2	84.02	$ 125,716.00	$ 10,562,658.32	**92.24**	$ 11,596,043.84		$ 0.00	92.24	$ 11,596,043.84	92.24	$ 11,596,043.84
8.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPER BOARD 8 MM A DOS CARAS EN ALTURA SUPERIOR A 3 M (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	13.53	$ 205,102.00	$ 2,775,030.06	**9.47**	$ 1,942,315.94		$ 0.00	9.47	$ 1,942,315.94	9.47	$ 1,942,315.94
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 689,165.40**								
9.1	CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -						
9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LAMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18 ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	2.2	$ 313,257.00	$ 689,165.40	**2.2**	$ 689,165.40		$ 0.00	2.20	$ 689,165.40	2.20	$ 689,165.40
9.3.1.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2		$ 142,958.00	$ 0.00	**21.25**	$ 3,037,857.50	21.25	$ 3,037,857.50	-	$ 0.00	21.25	$ 3,037,857.50
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 218,977,704.91**				$ 0.00	-	$ 0.00		
11.1,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA TIPO CUPULA DE 5" A 3"	UN		$ 74,334.00		**7.00**	$ 520,338.00	7.00	$ 520,338.00	-	$ 0.00	7.00	$ 520,338.00
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 109,939,119.47**				$ 0.00	-	$ 0.00		
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -		$ 0.00				
13.1.2	PAÑETE MURO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	107.06	$ 78,779.00	$ 8,434,079.74	**432.27**	$ 34,053,798.33	140.33	$ 11,055,057.07	291.94	$ 22,998,741.26	432.27	$ 34,053,798.33
13.1.7	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	283.87	$ 25,832.00	$ 7,332,929.84	**249.2**	$ 6,437,334.40	26.28	$ 678,864.96	222.92	$ 5,758,469.44	249.20	$ 6,437,334.40
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -			$ -		$ 0.00	-	$ 0.00	-	
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	932.86	$ 10,754.00	$ 10,031,976.44	**1258.91**	$ 13,538,318.14	- 6.91	-$ 74,310.14	1,265.82	$ 13,612,628.28	1,258.91	$ 13,538,318.14
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2	0	$ 20,469.00	$ 0.00	**21.44**	$ 438,855.36		$ 0.00	21.44	$ 438,855.36	21.44	$ 438,855.36
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1028.26	$ 21,505.00	$ 22,112,731.30	**1032.57**	$ 22,205,417.85	140.33	$ 3,017,796.65	892.24	$ 19,187,621.20	1,032.57	$ 22,205,417.85
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	901.69	$ 45,138.00	$ 40,700,483.22	**496.35**	$ 22,404,246.30		$ 0.00	496.35	$ 22,404,246.30	496.35	$ 22,404,246.30
13.2.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE RECUBRIMIENTO ANTIGRAFFITI A DOS MANOS	M2	1028.26	$ 19,865.00	$ 20,426,384.90		$ -		$ 0.00	-	$ 0.00	-	
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -			$ -		$ 0.00	-	$ 0.00	-	
13.4.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS A DOS MANOS Y DOS CARAS	M2	20.57	$ 43,779.00	$ 900,534.03	**31.79**	$ 1,391,734.41		$ 0.00	31.79	$ 1,391,734.41	31.79	$ 1,391,734.41
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 39,517.00	$ 0.00	**13.38**	$ 528,737.46	13.38	$ 528,737.46	-	$ 0.00	13.38	$ 528,737.46
14	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 5,750,106.89**				$ 0.00	-	$ 0.00	-	
14.1.1	CIELORASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	32.24	$ 160,435.00	$ 5,172,424.40	**32.24**	$ 5,172,424.40		$ 0.00	32.24	$ 5,172,424.40	32.24	$ 5,172,424.40
14.1.3	CIELORASO EN LAMINA DE YESO DE 1/2" ST (Incluyendo todo lo necesario para su correcta instalación)	M2	3.93	$ 146,993.00	$ 577,682.49	**6.91**	$ 1,015,721.63		$ 0.00	6.91	$ 1,015,721.63	6.91	$ 1,015,721.63
15	CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ 146,993.00	**$ 0.00**				$ 0.00	-	$ 0.00	-	
15.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANDBLASTING COLOR OPAL SÓLIDO O TIPO PERSIANA (AMBAS CARAS)	M2		$ 76,779.00	$ 0.00		$ -		$ 0.00	-	$ 0.00	-	

17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 19,734,487.95**				$ 0.00	-	$ 0.00	-	
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	8.23	$ 51,981.00	$ 427,803.63	**16.03**	$ 833,255.43	3.80	$ 197,527.80	12.23	$ 635,727.63	16.03	$ 833,255.43
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	123.61	$ 137,076.00	$ 16,943,964.36	**119.68**	$ 16,405,255.68		$ 0.00	119.68	$ 16,405,255.68	119.68	$ 16,405,255.68
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2		$ 247,595.00	$ 0.00	**2.86**	$ 708,121.70		$ 0.00	2.86	$ 708,121.70	2.86	$ 708,121.70
17.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	5.88	$ 200,325.00	$ 1,177,911.00		$ -		$ 0.00	-	$ 0.00	-	
17.1.24.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	5.76	$ 205,696.00	$ 1,184,808.96	**9.56**	$ 1,966,453.76	3.80	$ 781,644.80	5.76	$ 1,184,808.96	9.56	$ 1,966,453.76
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL		0	$ -	**$ 7,098,273.00**				$ 0.00	-	$ 0.00	-	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1348.2	$ 5,265.00	$ 7,098,273.00	**1008.99**	$ 5,312,332.35	1,008.99	$ 5,312,332.35	-	$ 0.00	1,008.99	$ 5,312,332.35
21	PRECIOS NO PREVISTOS		0.00	#¡REF!	**$ 0.00**					-	$ 0.00	-	
NP 001	DESMONTE, INSTALACION Y CERTIFICACION DE PUNTOS DE ANCLAJE PARA TRABAJO EN ALTURAS	UN		$ 382,772.00	$ 0.00	**19**	$ 7,272,668.00	19.00	$ 7,272,668.00	-	$ -	19.00	$ 7,272,668.00
NP 002	MANTENIMIENTO GENERAL DE CARPINTERIA, INCLUYE DESMONTE, REPARACION, AJUSTES NECESARIOS, MASILLA, GRADUACION DE CERRADURAS, INCLUYE TRANSPORTE EN CASO DE REQUERIRSE, NO INCLUYE PINTURA, NI CAMBIO DE CERRADURAS NI BRAZOS ESPECIALES.	m2		$ 246,667.00	$ 0.00	**45.74**	$ 11,282,548.58		$ 0.00	45.74	$ 11,282,548.58	45.74	$ 11,282,548.58
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				**$ 336,072,086.92**		**$ 238,758,655.84**		**$ 36,004,463.45**		**$ 202,754,192.39**		**$ 238,758,655.84**
S12	**CDA CARLOS GAVIRIA**												
1	PRELIMINARES				**$ 25,359,901.39**								
1.1	OBRAS PRELIMINARES												
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACIONES (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE CONSTRUCCION)	M2	90.75	$ 19,797.00	$ 1,796,577.75	**62.97**	$ 1,246,617.09		$ 0.00	62.97	$ 1,246,617.09	62.97	$ 1,246,617.09
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL						$ -			0.00	$ 0.00	-	
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	30	$ 43,298.00	$ 1,298,940.00	**4.45**	$ 192,676.10		$ 0.00	4.45	$ 192,676.10	4.45	$ 192,676.10
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS						$ -			0.00	$ 0.00	-	
1.3.2	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	31.2	$ 24,524.00	$ 765,148.80	**24.64**	$ 604,271.36		$ 0.00	24.64	$ 604,271.36	24.64	$ 604,271.36
1.3.3	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, ETC, CORRIDOS, POYOS, MESONES, PREFABRICADOS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	5.00	$ 32,197.00	$ 160,985.00	**5.00**	$ 160,985.00		$ 0.00	5.00	$ 160,985.00	5.00	$ 160,985.00
1.3.5	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	6.00	$ 21,344.00	$ 128,064.00	**6.00**	$ 128,064.00		$ 0.00	6.00	$ 128,064.00	6.00	$ 128,064.00
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	21.3	$ 32,417.00	$ 690,482.10	**20.70**	$ 671,031.90	- 2.15	-$ 69,696.55	22.85	$ 740,728.45	20.70	$ 671,031.90
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	123.06	$ 18,929.00	$ 2,329,402.74	**37.52**	$ 710,216.08		$ 0.00	37.52	$ 710,216.08	37.52	$ 710,216.08
1.3.16	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	2.00	$ 21,344.00	$ 42,688.00	**2.00**	$ 42,688.00		$ 0.00	2.00	$ 42,688.00	2.00	$ 42,688.00
1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS)	UN	7.00	$ 18,691.00	$ 130,837.00	**7.00**	$ 130,837.00		$ 0.00	7.00	$ 130,837.00	7.00	$ 130,837.00
1.3.39	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	1.50	$ 33,344.00	$ 50,016.00	**1.50**	$ 50,016.00		$ 0.00	1.50	$ 50,016.00	1.50	$ 50,016.00
1.3.43	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS.	M2	420	$ 42,778.00	$ 17,966,760.00	**304.44**	$ 13,023,334.32		$ 0.00	304.44	$ 13,023,334.32	304.44	$ 13,023,334.32
2	CIMENTACIÓN				**$ 498,286.44**					0.00	$ 0.00	-	
2.2	CONCRETOS						$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00
2.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000PSI. NO INCLUYE REFUERZO	M	3.91	$ 102,054.00	$ 399,031.14	**0.00**	$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00
2.5	ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA						$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00
2.5.2	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	18.65	$ 5,322.00	$ 99,255.30	**0.00**	$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 15,387,961.44**					0.00	$ 0.00	-	
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	511.12	$ 21,662.00	$ 11,071,881.44	**390.31**	$ 8,454,895.22		$ 0.00	390.31	$ 8,454,895.22	390.31	$ 8,454,895.22
3.2.19	MESÓN EN GRANITO NATURAL ANCHO MENOR O IGUAL A 80CM - INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M	5.00	$ 863,216.00	$ 4,316,080.00	**5.00**	$ 4,316,080.00		$ 0.00	5.00	$ 4,316,080.00	5.00	$ 4,316,080.00
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 748,164.00**					0.00	$ 0.00	-	
4.1	TUBERIA						$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00
4.1.82	INSTALACION DE LAVAMANOS, INCLUYE LOS ACCESORIOS	UN	6.00	$ 124,694.00	$ 748,164.00	**0.00**	$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 7,305,161.60**					0.00	$ 0.00	-	

5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 LIBBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2.00	$ 225,465.00	$ 450,930.00	**2.00**	$ 450,930.00		$ 0.00	2.00	$ 450,930.00	2.00	$ 450,930.00
5.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 398,468.00	$ 0.00	**2.00**	$ 796,936.00	2.00	$ 796,936.00	0.00	$ 0.00	2.00	$ 796,936.00
5.1.11	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	5.00	$ 363,183.00	$ 1,815,915.00	**3.00**	$ 1,089,549.00		$ 0.00	3.00	$ 1,089,549.00	3.00	$ 1,089,549.00
5.1.12	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	4.00	$ 400,322.00	$ 1,601,288.00	**4.00**	$ 1,601,288.00		$ 0.00	4.00	$ 1,601,288.00	4.00	$ 1,601,288.00
5.1.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	1.00	$ 937,578.00	$ 937,578.00	**1.00**	$ 937,578.00		$ 0.00	1.00	$ 937,578.00	1.00	$ 937,578.00
5.1.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN	2.00	$ 34,729.00	$ 69,458.00	**2.00**	$ 69,458.00		$ 0.00	2.00	$ 69,458.00	2.00	$ 69,458.00
5.1.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	34.6	$ 49,909.00	$ 1,726,851.40	**34.60**	$ 1,726,851.40		$ 0.00	34.60	$ 1,726,851.40	34.60	$ 1,726,851.40
5.1.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS.	M	34.6	$ 20,322.00	$ 703,141.20	**34.60**	$ 703,141.20		$ 0.00	34.60	$ 703,141.20	34.60	$ 703,141.20
5.1.65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 353,778.00	$ 0.00	**6.00**	$ 2,122,668.00	6.00	$ 2,122,668.00	0.00	$ 0.00	6.00	$ 2,122,668.00
5.1.70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO TORTUGA SOCKET E27. INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR 60W LUZ DÍA O EQUIVALENTE LED.	UN		$ 26,955.00	$ 0.00	**6.00**	$ 161,730.00	6.00	$ 161,730.00	0.00	$ 0.00	6.00	$ 161,730.00
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 17,420,991.38**					0.00	$ 0.00	-	
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -			$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04	M2	90.75	$ 41,523.00	$ 3,768,212.25	**100.73**	$ 4,182,611.79	10.41	$ 432,254.43	90.32	$ 3,750,357.36	100.73	$ 4,182,611.79
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	41.1	$ 14,846.00	$ 610,170.60	**0.00**	$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -			$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00
7.2.2	BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A = 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	6.91	$ 68,333.00	$ 472,181.03	**3.00**	$ 204,999.00		$ 0.00	3.00	$ 204,999.00	3.00	$ 204,999.00
7.2.4	GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	41.1	$ 54,616.00	$ 2,244,717.60	**40.57**	$ 2,215,771.12		$ 0.00	40.57	$ 2,215,771.12	40.57	$ 2,215,771.12
7.2.26	ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	108.27	$ 95,370.00	$ 10,325,709.90	**90.32**	$ 8,613,818.40		$ 0.00	90.32	$ 8,613,818.40	90.32	$ 8,613,818.40
7.2.35	WIN DE ALUMINIO	M		$ 9,019.00	$ 0.00	**20.16**	$ 181,823.04	20.16	$ 181,823.04			20.16	$ 181,823.04
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 20,752,320.44**					0.00	$ 0.00	-	
8.1.2	ENCHAPE 25 X 35	M2	77.72	$ 125,716.00	$ 9,770,647.52	**62.87**	$ 7,903,764.92	- 2.51	-$ 315,547.16	65.38	$ 8,219,312.08	62.87	$ 7,903,764.92
8.1.4	MURO EN LÁMINA FIBRO - CEMENTO 10 MM	M2	35.58	$ 128,794.00	$ 4,582,490.52	**38.71**	$ 4,985,615.74		$ 0.00	38.71	$ 4,985,615.74	38.71	$ 4,985,615.74
8.1.5	ESQUINERO PLÁSTICO	m		$ 7,743.00	$ 0.00	**140.17**	$ 1,085,336.31	140.17	$ 1,085,336.31	0.00	$ 0.00	140.17	$ 1,085,336.31
8.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPER BOARD 8 MM A DOS CARAS EN ALTURA SUPERIOR A 3 M (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	31.2	$ 205,102.00	$ 6,399,182.40	**26.74**	$ 5,484,427.48		$ 0.00	26.74	$ 5,484,427.48	26.74	$ 5,484,427.48
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 0.00**					0.00	$ 0.00	-	
9.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2		$ 231,307.00	$ 0.00	**13.57**	$ 3,138,835.99	13.57	$ 3,138,835.99	0.00	$ 0.00	13.57	$ 3,138,835.99
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 2,467,194.00**					0.00	$ 0.00	-	
11.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE INCRUSTAR COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA Y GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN		$ 705,542.00	$ 0.00	**6.00**	$ 4,233,252.00		$ 0.00	6.00	$ 4,233,252.00	6.00	$ 4,233,252.00
11.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PEDAL PARA LAVAMANOS O LAVAPLATOS	UN	6	$ 411,199.00	$ 2,467,194.00	**6.00**	$ 2,467,194.00		$ 0.00	6.00	$ 2,467,194.00	6.00	$ 2,467,194.00
12	APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 2,324,770.40**					0.00	$ 0.00	-	
12.1.17	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDA DE PROTECCIÓN DE ALTURA DE 1,20MTS CON DOBLE PASAMANOS DE 2" Y TUBERÍA VERTICAL CADA 40CM DE 1/2". INCLUYE 2 CAPAS DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE EXTERIOR	M	3.40	$ 683,756.00	$ 2,324,770.40	**3.40**	$ 2,324,770.40		$ 0.00	3.40	$ 2,324,770.40	3.40	$ 2,324,770.40

13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 37,868,166.74**					0.00	$ 0.00	-		
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	-		
13.1.2	PAÑETE MURO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	80.34	$ 78,779.00	$ 6,329,104.86	**80.34**	$ 6,329,104.86		$ 0.00	80.34	$ 6,329,104.86	80.34	$ 6,329,104.86	
13.1.7	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	114.33	$ 25,832.00	$ 2,953,372.56	**168.15**	$ 4,343,650.80	53.82	$ 1,390,278.24	114.33	$ 2,953,372.56	168.15	$ 4,343,650.80	
13.1.9	CAÑUELA PARA MURO DE LIMPIEZA ESMALTADA 0,12 X 0,20 M CON MEDIACAÑA	M	30	$ 78,160.00	$ 2,344,800.00	**17.95**	$ 1,402,972.00		$ 0.00	17.95	$ 1,402,972.00	17.95	$ 1,402,972.00	
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	330.07	$ 10,754.00	$ 3,549,572.78	**313.37**	$ 3,369,980.98	7.74	$ 83,235.96	305.63	$ 3,286,745.02	313.37	$ 3,369,980.98	
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	398.32	$ 21,505.00	$ 8,565,871.60	**289.53**	$ 6,226,342.65	177.99	$ 3,827,674.95	111.54	$ 2,398,667.70	289.53	$ 6,226,342.65	
13.2.4	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 11,796.00	$ 0.00	**191.53**	$ 2,259,287.88	191.53	$ 2,259,287.88			191.53	$ 2,259,287.88	
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	177.3	$ 45,138.00	$ 8,002,967.40	**331.23**	$ 14,951,059.74	164.26	$ 7,414,367.88	166.97	$ 7,536,691.86	331.23	$ 14,951,059.74	
13.2.8	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 14,653.00	$ 0.00	**95.08**	$ 1,393,207.24	95.08	$ 1,393,207.24	0.00	$ 0.00	95.08	$ 1,393,207.24	
13.2.9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA PISO TRÁFICO PESADO	M2		$ 54,958.00	$ 0.00	**10.41**	$ 572,112.78	10.41	$ 572,112.78	0.00	$ 0.00	10.41	$ 572,112.78	
13.2.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE RECUBRIMIENTO ANTIGRAFFITI A DOS MANOS	M2	170	$ 19,865.00	$ 3,377,050.00		$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	
13.4.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS A DOS MANOS Y DOS CARAS	M2	11.97	$ 43,779.00	$ 524,034.63	**11.82**	$ 517,467.78	11.82	$ 517,467.78	0.00	$ 0.00	11.82	$ 517,467.78	
13.4.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M2	35.29	$ 26,869.00	$ 948,207.01	**59.52**	$ 1,599,242.88	59.52	$ 1,599,242.88	0.00	$ 0.00	59.52	$ 1,599,242.88	
13.4.4	ESMALTE SOBRE CANAL METÁLICA EN ACERO GALVANIZADO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	42.7	$ 29,817.00	$ 1,273,185.90	**9.80**	$ 292,206.60	9.80	$ 292,206.60	0.00	$ 0.00	9.80	$ 292,206.60	
14	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 19,743,131.10**					0.00	$ 0.00	-		
14.1.1	CIELORASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	123.06	$ 160,435.00	$ 19,743,131.10	**35.91**	$ 5,761,220.85		$ 0.00	35.91	$ 5,761,220.85	35.91	$ 5,761,220.85	
14.1.5	MURO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO (Incluyendo todo lo necesario para su correcta instalación)	M2		$ 176,437.00	$ 0.00	**25.90**	$ 4,569,718.30	25.90	$ 4,569,718.30	0.00	$ 0.00	25.90	$ 4,569,718.30	
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 34,208,949.74**					0.00	$ 0.00	-		
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	52.24	$ 51,981.00	$ 2,715,487.44	**56.30**	$ 2,926,530.30	56.30	$ 2,926,530.30	0.00	$ 0.00	56.30	$ 2,926,530.30	
17.1.2	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	42.7	$ 80,829.00	$ 3,451,398.30	**35.55**	$ 2,873,470.95	35.55	$ 2,873,470.95	0.00	$ 0.00	35.55	$ 2,873,470.95	
17.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	11	$ 44,561.00	$ 490,171.00	**7.00**	$ 311,927.00	7.00	$ 311,927.00	0.00	$ 0.00	7.00	$ 311,927.00	
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2		$ 247,595.00	$ 0.00	**11.42**	$ 2,827,534.90	11.42	$ 2,827,534.90	0.00	$ 0.00	11.42	$ 2,827,534.90	
17.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSIÓN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	M2	25	$ 69,970.00	$ 1,749,250.00		$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	
17.1.18	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	90.75	$ 61,523.00	$ 5,583,212.25	**59.32**	$ 3,649,544.36	- 10.41	-$ 640,454.43	69.73	$ 4,289,998.79	59.32	$ 3,649,544.36	
17.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	7.75	$ 200,325.00	$ 1,552,518.75		$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	
17.1.24.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	90.75	$ 205,696.00	$ 18,666,912.00	**51.98**	$ 10,692,078.08	51.98	$ 10,692,078.08	0.00	$ 0.00	51.98	$ 10,692,078.08	
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL		0	$ -	**$ 2,689,414.65**					0.00	$ 0.00	-		
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	510.81	$ 5,265.00	$ 2,689,414.65	**378.36**	$ 1,992,065.40	378.36	$ 1,992,065.40	0.00	$ 0.00	378.36	$ 1,992,065.40	
21	PRECIOS NO PREVISTOS		0.00	$ -	**$ 0.00**					0.00	$ 0.00	-		#
NP 002	MANTENIMIENTO GENERAL DE CARPINTERIA, INCLUYE DESMONTE, REPARACION, AJUSTES NECESARIOS, MASILLA, GRADUACION DE CERRADURAS, INCLUYE TRANSPORTE EN CASO DE REQUERIRSE, NO INCLUYE PINTURA, NI CAMBIO DE CERRADURAS NI BRAZOS ESPECIALES.	M2		$ 246,667.00	$ 0.00	**0**	$ -	-	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00	#
34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO					**$ 186,774,413.32**		**$ 165,274,788.19**		**$ 52,436,292.75**		**$ 112,838,495.44**		**$ 165,274,788.19**	

S13	CDA TEJEDORES DE SUEÑOS													
1	PRELIMINARES				$ 17,229,420.96									
1.1	OBRAS PRELIMINARES													
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACIONES (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE CONSTRUCCION)	M2	52.36	$ 19,797.00	$ 1,036,570.92	54.65	$ 1,081,906.05	54.65	$ 1,081,906.05	0.00	$ -	54.65	$ 1,081,906.05
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL						$ -		$ 0.00				
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	30	$ 43,298.00	$ 1,298,940.00	36.42	$ 1,576,913.16	26.42	$ 1,143,933.16	10.00	$ 432,980.00	36.42	$ 1,576,913.16
1.2.2	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M, PARALES CON UNA SEPARACIÓN DE UN METRO, INCLUYE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 1500 PSI	M	0	$ 91,583.00	$ 0.00		$ -		$ 0.00	0	$ 0.00	-	
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS						$ -		$ 0.00				
1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	170.62	$ 27,519.00	$ 4,695,291.78	153.72	$ 4,230,220.68		$ 0.00	153.72	$ 4,230,220.68	153.72	$ 4,230,220.68
1.3.2	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	13.2	$ 24,524.00	$ 323,716.80	18.66	$ 457,617.84		$ 0.00	18.66	$ 457,617.84	18.66	$ 457,617.84
1.3.3	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, ETC, CORRIDOS, POYOS, MESONES, PREFABRICADOS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	3.9	$ 32,197.00	$ 125,568.30	3.65	$ 117,519.05		$ 0.00	3.65	$ 117,519.05	3.65	$ 117,519.05
1.3.5	DESMONTE Y DESCONEXION DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	10	$ 21,344.00	$ 213,440.00	10.00	$ 213,440.00		$ 0.00	10.00	$ 213,440.00	10.00	$ 213,440.00
1.3.6	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 27,336.00	$ 0.00	1.00	$ 27,336.00	1.00	$ 27,336.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 27,336.00
1.3.7	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO VIDRIO Y REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	31.43	$ 18,347.00	$ 576,646.21	28.71	$ 526,742.37		$ 0.00	28.71	$ 526,742.37	28.71	$ 526,742.37
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	10.51	$ 32,417.00	$ 340,702.67	10.72	$ 347,510.24	10.72	$ 347,510.24	0	$ 0.00	10.72	$ 347,510.24
1.3.12	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	11	$ 57,448.00	$ 631,928.00	12.77	$ 733,610.96		$ 0.00	12.77	$ 733,610.96	12.77	$ 733,610.96
1.3.13	DEMOLICIÓN DE PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA O MACIZA E= 0.20 M EXISTENTE, EN CONCRETO REFORZADO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1.72	$ 47,779.00	$ 82,179.88	1.72	$ 82,179.88		$ 0.00	1.72	$ 82,179.88	1.72	$ 82,179.88
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	26.4	$ 18,929.00	$ 499,725.60	29.80	$ 564,084.20	2.88	$ 54,515.52	26.92	$ 509,568.68	29.80	$ 564,084.20
1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS)	UN	10	$ 18,691.00	$ 186,910.00	10.00	$ 186,910.00		$ 0.00	10	$ 186,910.00	10.00	$ 186,910.00
1.3.30	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA	M	12.5	$ 8,990.00	$ 112,375.00	12.50	$ 112,375.00		$ 0.00	12.5	$ 112,375.00	12.50	$ 112,375.00
1.3.43	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS.	M2	166.1	$ 42,778.00	$ 7,105,425.80	166.10	$ 7,105,425.80		$ 0.00	166.1	$ 7,105,425.80	166.10	$ 7,105,425.80
2	CIMENTACIÓN				$ 15,710,536.98									
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS						$ -		$ 0.00				
2.1.2	EXCAVACION MANUAL EN TIERRA HASTA 2.50 M. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL.	M3	16.85	$ 123,243.00	$ 2,076,644.55	16.85	$ 2,076,644.55		$ 0.00	16.85	$ 2,076,644.55	16.85	$ 2,076,644.55
2.1.8	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	10.25	$ 17,979.00	$ 184,284.75	10.87	$ 195,431.73		$ 0.00	10.87	$ 195,431.73	10.87	$ 195,431.73
2.2	CONCRETOS						$ -		$ 0.00				
2.2.5	VIGA 30 X 40 EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	M	30.58	$ 283,869.00	$ 8,680,714.02	20.20	$ 5,734,153.80		$ 0.00	20.2	$ 5,734,153.80	20.20	$ 5,734,153.80
2.2.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA DE CONFINAMIENTO 20 X 15 CMS. EN CONCRETO DE 3000 PSI NO INCLUYE REFUERZO	M		$ 111,104.00	$ 0.00	7.40	$ 822,169.60		$ 0.00	7.4	$ 822,169.60	7.40	$ 822,169.60
2,2,17	CONCRETO CICLÓPEO - 40 % DE CONCRETO F*C = 3000 PSI CONCRETOS PARA CIMENTACIÓN	M3		$ 319,074.00	$ 0.00	4.73	$ 1,509,220.02		$ 0.00	4.73	$ 1,509,220.02	4.73	$ 1,509,220.02
2.4	ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO						$ -		$ 0.00				
2.4.15	RAMPA EN CONCRETO E = 0.12 M 3000 PSI	M2	29.92	$ 110,685.00	$ 3,311,695.20	29.92	$ 3,311,695.20	29.92	$ 3,311,695.20	0	$ 0.00	29.92	$ 3,311,695.20
2.5	ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA						$ -		$ 0.00				
2.5.1	MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	107.64	$ 3,444.00	$ 370,712.16	0.00	$ -		$ 0.00	0	$ 0.00	-	
2.5.2	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	204.15	$ 5,322.00	$ 1,086,486.30	384.87	$ 2,048,278.14		$ 0.00	384.87	$ 2,048,278.14	384.87	$ 2,048,278.14

3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 16,883,705.76**									
3.1	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -							
3.1.1	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No 5	M2		$ 49,452.00	$ 0.00	**6.81**	$ 336,768.12		$ 0.00	6.81	$ 336,768.12	6.81	$ 336,768.12
3.1.3	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	60.89	$ 17,799.00	$ 1,083,781.11	**47.30**	$ 841,892.70	- 13.59	-$ 241,888.41	60.89	$ 1,083,781.11	47.30	$ 841,892.70
3.1.5	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL PORTANTE 30 CM	M2	15.55	$ 104,509.00	$ 1,625,114.95		$ -		$ 0.00	0	$ 0.00	-	
3.2.9	REEMBOQUILLADO DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA O ADOQUIN CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	ML	43.58	$ 26,449.00	$ 1,152,647.42	**48.81**	$ 1,290,975.69	5.23	$ 138,328.27	43.58	$ 1,152,647.42	48.81	$ 1,290,975.69
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	445.74	$ 21,662.00	$ 9,655,619.88	**385.71**	$ 8,355,250.02		$ 0.00	385.71	$ 8,355,250.02	385.71	$ 8,355,250.02
3.2.19	MESÓN EN GRANITO NATURAL ANCHO MENOR O IGUAL A 80CM - INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M	3.90	$ 863,216.00	$ 3,366,542.40	**3.65**	$ 3,150,738.40		$ 0.00	3.65	$ 3,150,738.40	3.65	$ 3,150,738.40
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 2,898,201.00**									
4.1	TUBERIA						$ -							
4.1.15	PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	UN	2.00	$ 48,267.00	$ 96,534.00	**4.00**	$ 193,068.00		$ 0.00	4.00	$ 193,068.00	4.00	$ 193,068.00
4.1.56	LLAVE MANGUERA 1/2" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	UN	2.00	$ 99,652.00	$ 199,304.00	**2.00**	$ 199,304.00		$ 0.00	2.00	$ 199,304.00	2.00	$ 199,304.00
4.1.57	PUNTO SANITARIO 4" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 68,453.00	$ 68,453.00	**1.00**	$ 68,453.00		$ 0.00	1.00	$ 68,453.00	1.00	$ 68,453.00
4.1.68	SIFON DE PISO 3" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	UN	3.00	$ 55,547.00	$ 166,641.00	**1.00**	$ 55,547.00		$ 0.00	1.00	$ 55,547.00	1.00	$ 55,547.00
4.1.81	INSTALACION DE SANITARIO, INCLUYE LOS ACCESORIOS	UN	1.00	$ 419,856.00	$ 419,856.00	**1.00**	$ 419,856.00		$ 0.00	1.00	$ 419,856.00	1.00	$ 419,856.00
4.1.84	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE ACOPLE, GRIFERÍA ELECTRÓNICA, SIFÓN EN P, DESAGÜE Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	UN	1.00	$ 1,332,994.00	$ 1,332,994.00	**0.00**	$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	
4.2	CAJAS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -		$ 0.00				
4.2.1	CAJA DE INSPECCION 60 X 60	UN	1.00	$ 614,419.00	$ 614,419.00	**1.00**	$ 614,419.00		$ 0.00	1.00	$ 614,419.00	1.00	$ 614,419.00
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 7,728,642.00**					0	$ 0.00	-	
5.1.13	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 347,467.00	$ 347,467.00	**1.00**	$ 347,467.00		$ 0.00	1.00	$ 347,467.00	1.00	$ 347,467.00
5.1.59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED NORMAL TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 8X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, TAPA DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	UN	9.00	$ 275,099.00	$ 2,475,891.00	**9.00**	$ 2,475,891.00		$ 0.00	9.00	$ 2,475,891.00	9.00	$ 2,475,891.00
5.1.68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA DE 60 W TIPO LED. INCLUYE TUBOS, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	5.00	$ 734,271.00	$ 3,671,355.00	**13.00**	$ 9,545,523.00	13.00	$ 9,545,523.00	0	$ 0.00	13.00	$ 9,545,523.00
5.1.71.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 184,447.00	$ 0.00	**6.00**	$ 1,106,682.00	6.00	$ 1,106,682.00	0	$ 0.00	6.00	$ 1,106,682.00
5.1.71.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CIRCULAR DE 24 W . 11" INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2.00	$ 45,984.00	$ 91,968.00	**0.00**	$ -		$ 0.00	0	$ 0.00	-	
5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 185,011.00	$ 185,011.00	**0.00**	$ -		$ 0.00	0	$ 0.00	-	
5.1.77	REINSTALACIÓN DE LAMPARAS EXISTENTES (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		$ 20,193.00	$ 0.00	**7.00**	$ 141,351.00	7.00	$ 141,351.00	0	$ 0.00	7.00	$ 141,351.00
5.1.78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA DE 4 X 8 CM TROQUELADA	M	12.5	$ 76,556.00	$ 956,950.00	**12.50**	$ 956,950.00	12.50	$ 956,950.00	0	$ 0.00	12.50	$ 956,950.00
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 29,383,903.12**								
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -		$ 0.00				
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04	M2	204.4	$ 41,523.00	$ 8,487,301.20	**153.11**	$ 6,357,586.53		$ 0.00	153.11	$ 6,357,586.53	153.11	$ 6,357,586.53
7.1.5	PULIDA DE MEDIACAÑA EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE FRONTAL (ANCHO < 0.75 M)	M	92	$ 30,510.00	$ 2,806,920.00	**70.61**	$ 2,154,311.10		$ 0.00	70.61	$ 2,154,311.10	70.61	$ 2,154,311.10
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	20.96	$ 14,846.00	$ 311,172.16		$ -		$ 0.00	0	$ 0.00	-	
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -		$ 0.00				

7.2.2	BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A = 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	4.4	$ 68,333.00	$ 300,665.20	**14.98**	$ 1,023,628.34		$ 0.00	14.98	$ 1,023,628.34	14.98	$ 1,023,628.34
7.2.4	GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	20.96	$ 54,616.00	$ 1,144,751.36	**20.52**	$ 1,120,720.32		$ 0.00	20.52	$ 1,120,720.32	20.52	$ 1,120,720.32
7.2.8	GUARDA ESCOBA MEDIACAÑA EN GRAVILLA LAVADO MONA, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M		$ 42,471.00	$ 0.00	**7.87**	$ 334,246.77	7.87	$ 334,246.77	0	$ 0.00	7.87	$ 334,246.77
7.2.11	PISO TABLÓN DE 33 X 33, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	20.4	$ 108,637.00	$ 2,216,194.80	**15.00**	$ 1,629,555.00	15.00	$ 1,629,555.00	0	$ 0.00	15.00	$ 1,629,555.00
7.2.16	CINTA ANTIDESLIZANTE A = 2 CM	M		$ 3,594.00	$ 0.00	**10.00**	$ 35,940.00	10.00	$ 35,940.00	0	$ 0.00	10.00	$ 35,940.00
7.2.26	ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	136.45	$ 95,370.00	$ 13,013,236.50	**132.71**	$ 12,656,552.70		$ 0.00	132.71	$ 12,656,552.70	132.71	$ 12,656,552.70
7.2.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM	M	42.55	$ 25,938.00	$ 1,103,661.90	**26.01**	$ 674,647.38	26.01	$ 674,647.38	0	$ 0.00	26.01	$ 674,647.38
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 8,725,137.85**					0	$ 0.00	-	
8.1.2	ENCHAPE 25 X 35	M2	43.21	$ 125,716.00	$ 5,432,188.36	**47.43**	$ 5,962,709.88		$ 0.00	47.43	$ 5,962,709.88	47.43	$ 5,962,709.88
8.1.5	ESQUINERO PLÁSTICO	M	75.63	$ 7,743.00	$ 585,603.09	**81.63**	$ 632,061.09		$ 0.00	81.63	$ 632,061.09	81.63	$ 632,061.09
8.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPER BOARD 8 MM A DOS CARAS EN ALTURA SUPERIOR A 3 M (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	13.2	$ 205,102.00	$ 2,707,346.40	**12.06**	$ 2,473,530.12		$ 0.00	12.06	$ 2,473,530.12	12.06	$ 2,473,530.12
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 19,720,466.67**								
9.1	CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -		$ 0.00				
9.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA CON MARCO EN LAMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERROJO DOBLE, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y VENTANILLA DE 0,20 X 0,40 M CON VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE	M2	6.4	$ 330,393.00	$ 2,114,515.20	**6.40**	$ 2,114,515.20	6.40	$ 2,114,515.20	0	$ 0.00	6.40	$ 2,114,515.20
9.2	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -		$ 0.00				
9.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO SIN BATIENTES, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	26.47	$ 439,181.00	$ 11,625,121.07	**26.61**	$ 11,686,606.41		$ 0.00	26.61	$ 11,686,606.41	26.61	$ 11,686,606.41
9.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE CORREDIZAS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2		$ 231,307.00	$ 0.00	**2.14**	$ 494,996.98	2.14	$ 494,996.98	0.00	$ 0.00	2.14	$ 494,996.98
9.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, INCLUYE TORNILLOS, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.	M2	26.3	$ 227,408.00	$ 5,980,830.40	**26.30**	$ 5,980,830.40		$ 0.00	26.30	$ 5,980,830.40	26.30	$ 5,980,830.40
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 8,927,554.00**								
11.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE INCRUSTAR COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA Y GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	5.00	$ 705,542.00	$ 3,527,710.00	**5.00**	$ 3,527,710.00		$ 0.00	5.00	$ 3,527,710.00	5.00	$ 3,527,710.00
11.1.7	ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2.00	$ 840,074.00	$ 1,680,148.00	**2.00**	$ 1,680,148.00		$ 0.00	2.00	$ 1,680,148.00	2.00	$ 1,680,148.00
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE SENSOR, SISTEMA DE INSTALACIÓN EP/ES, ASIENTO SANITARIO)	UN	1.00	$ 1,663,701.00	$ 1,663,701.00	**0.00**	$ -	- 1.00	-$ 1,663,701.00	1.00	$ 1,663,701.00	-	
11.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PEDAL PARA LAVAMANOS O LAVAPLATOS	UN	5.00	$ 411,199.00	$ 2,055,995.00	**5.00**	$ 2,055,995.00		$ 0.00	5.00	$ 2,055,995.00	5.00	$ 2,055,995.00
12	APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 26,153,667.00**								
12.1.17	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDA DE PROTECCIÓN DE ALTURA DE 1,20MTS CON DOBLE PASAMANOS DE 2" Y TUBERÍA VERTICAL CADA 40CM DE 1/2". INCLUYE 2 CAPAS DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE EXTERIOR	M	38.25	$ 683,756.00	$ 26,153,667.00	**31.21**	$ 21,340,024.76	31.21	$ 21,340,024.76	0	$ 0.00	31.21	$ 21,340,024.76
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 21,958,065.41**								
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -		$ 0.00				
13.1.1	PAÑETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	18.2	$ 28,666.00	$ 521,721.20	**31.82**	$ 912,152.12		$ 0.00	31.82	$ 912,152.12	31.82	$ 912,152.12
13.1.8	PAÑETE MURO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (A=0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	72.3	$ 14,824.00	$ 1,071,775.20	**72.06**	$ 1,068,217.44		$ 0.00	72.06	$ 1,068,217.44	72.06	$ 1,068,217.44
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -		$ 0.00				
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	480.41	$ 10,754.00	$ 5,166,329.14	**396.91**	$ 4,268,370.14		$ 0.00	396.91	$ 4,268,370.14	396.91	$ 4,268,370.14
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2		$ 20,469.00	$ 0.00	**35.84**	$ 733,608.96		$ 0.00	35.84	$ 733,608.96	35.84	$ 733,608.96
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	48.33	$ 21,505.00	$ 1,039,336.65	**56.33**	$ 1,211,376.65	56.33	$ 1,211,376.65	0	$ 0.00	56.33	$ 1,211,376.65
13.2.4	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 11,796.00	$ 0.00	**69.59**	$ 820,883.64	69.59	$ 820,883.64	0	$ 0.00	69.59	$ 820,883.64
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	270.96	$ 45,138.00	$ 12,230,592.48	**168.35**	$ 7,598,982.30		$ 0.00	168.35	$ 7,598,982.30	168.35	$ 7,598,982.30

13.2.8	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 14,653.00	$ 0.00	**11.75**	$ 172,172.75	11.75	$ 172,172.75			11.75	$ 172,172.75
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -		$ 0.00				
13.4.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS A DOS MANOS Y DOS CARAS	M2	27.5	$ 43,779.00	$ 1,203,922.50	**21.53**	$ 942,561.87	21.53	$ 942,561.87	0	$ 0.00	21.53	$ 942,561.87
13.4.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M2	26.96	$ 26,869.00	$ 724,388.24	**28.03**	$ 753,138.07	28.03	$ 753,138.07	0	$ 0.00	28.03	$ 753,138.07
14	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 4,318,910.20**					0	$ 0.00	-	
14.1.1	CIELORASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	26.92	$ 160,435.00	$ 4,318,910.20	**34.35**	$ 5,510,942.25	7.43	$ 1,192,032.05	26.92	$ 4,318,910.20	34.35	$ 5,510,942.25
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			$ -	**$ 10,745,012.78**					0	$ 0.00	-	
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	46.00	$ 51,981.00	$ 2,391,126.00	**58.34**	$ 3,032,571.54		$ 0.00	58.34	$ 3,032,571.54	58.34	$ 3,032,571.54
17.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	6.40	$ 44,561.00	$ 285,190.40	**6.07**	$ 270,485.27	6.07	$ 270,485.27	0	$ 0.00	6.07	$ 270,485.27
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	10.51	$ 247,595.00	$ 2,602,223.45	**11.33**	$ 2,805,251.35	11.33	$ 2,805,251.35	0	$ 0.00	11.33	$ 2,805,251.35
17.1.17	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CERCHA PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M		$ 95,801.00	$ 0.00	**6.15**	$ 589,176.15	6.15	$ 589,176.15	0	$ 0.00	6.15	$ 589,176.15
17.1.18	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	12.96	$ 61,523.00	$ 797,338.08	**10.51**	$ 646,606.73	10.51	$ 646,606.73	0	$ 0.00	10.51	$ 646,606.73
17.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	2.33	$ 200,325.00	$ 466,757.25	**14.01**	$ 2,806,553.25	14.01	$ 2,806,553.25	0	$ 0.00	14.01	$ 2,806,553.25
17.1.24.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	15.55	$ 205,696.00	$ 3,198,572.80		$ -		$ 0.00	0	$ 0.00	-	
17.1.30	CANAL AMAZONA	M	9.6	$ 104,563.00	$ 1,003,804.80	**8.59**	$ 898,196.17	8.59	$ 898,196.17	0	$ 0.00	8.59	$ 898,196.17
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				**$ 1,736,923.50**								
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	329.9	$ 5,265.00	$ 1,736,923.50	**213.53**	$ 1,124,235.45	213.53	$ 1,124,235.45	0	$ 0.00	213.53	$ 1,124,235.45
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				**$ 192,120,147.23**		**$ 183,263,318.28**		**$ 56,806,736.52**		**$ 126,456,581.76**		**$ 183,263,318.28**
S14	**CDA PORVENIR**												
1	PRELIMINARES				**$ 80,495,369.77**								
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL												
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	294.67	$ 43,298.00	$ 12,758,621.66	**0**	$ -			0.00	$ -	-	
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS						$ -						
1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1407.61	$ 27,519.00	$ 38,736,019.59	**1662.38**	$ 45,747,035.22	1,080.57	$ 29,736,205.83	581.81	$ 16,010,829.39	1,662.38	$ 45,747,035.22
1.3.20	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO	M2	956.11	$ 10,188.00	$ 9,740,848.68	**960.25**	$ 9,783,027.00	507.24	$ 5,167,761.12	453.01	$ 4,615,265.88	960.25	$ 9,783,027.00
1.3.23	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	956.11	$ 20,144.00	$ 19,259,879.84	**826.84**	$ 16,655,864.96	328.39	$ 6,615,088.16	498.45	$ 10,040,776.80	826.84	$ 16,655,864.96
1.3.39	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M		$ 33,344.00	$ 0.00	**3.28**	$ 109,368.32	3.28	$ 109,368.32			3.28	$ 109,368.32
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 2,605,213.75**					0.00	$ 0.00	-	
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0.00				$ -			0.00	$ 0.00	-	
3.2.13	RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	87.35	$ 29,825.00	$ 2,605,213.75	**52.4**	$ 1,562,830.00		$ 0.00	52.40	$ 1,562,830.00	52.40	$ 1,562,830.00
3.2.4	REMATE LINEAL CUBIERTA EN LADRILLO TOLETE	M		$ 28,641.00	$ 0.00	**3.28**	$ 93,942.48	3.28	$ 93,942.48			3.28	$ 93,942.48
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 15,480,632.00**					0.00	$ 0.00	-	

5.1.11	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 363,183.00	$ 0.00	**2.00**	$ 726,366.00	2.00	$ 726,366.00	0.00	$ 0.00	2.00	$ 726,366.00
5.1.12	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 400,322.00	$ 400,322.00	**3.00**	$ 1,200,966.00	3.00	$ 1,200,966.00	0.00	$ 0.00	3.00	$ 1,200,966.00
5.1.59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED NORMAL TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 8X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, TAPA DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	UN	2.00	$ 275,099.00	$ 550,198.00	**0.00**	$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00
5.1.60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED REGULADA TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 8X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, TAPA DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION.	UN	1.00	$ 226,931.00	$ 226,931.00	**0.00**	$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00
5.1.61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA DE VOZ Y DATOS RJ45 CATEGORÍA 5 TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 8X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, TAPA DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. NO INCLUYE CABLEADO.	UN	1.00	$ 122,364.00	$ 122,364.00	**1.00**	$ 122,364.00	1.00	$ 122,364.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 122,364.00
5.1.68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA DE 60 W TIPO LED. INCLUYE TUBOS, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	UN	19.00	$ 734,271.00	$ 13,951,149.00		$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00
5.1.74	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER	UN		$ 99,525.00	$ 0.00	**19.00**	$ 1,890,975.00		$ 0.00	19.00	$ 1,890,975.00	19.00	$ 1,890,975.00
5.1.78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA DE 4 X 8 CM TROQUELADA	M	3.00	$ 76,556.00	$ 229,668.00	**0.00**	$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00
5.1.94	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAT 6A F/UTP L.H AMP	M		$ 11,536.00	$ 0.00	**0.00**	$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00
5.1.95	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DATOS CATEGORÍA 6A	UN		$ 121,904.00	$ 0.00		$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 46,812,383.37**					0.00	$ 0.00	-	
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0.00	$ -			$ -			0.00	$ 0.00	-	
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04	M2	956.11	$ 41,523.00	$ 39,700,555.53	**1205.14**	$ 50,041,028.22	1,039.17	$ 43,149,455.91	140.53	$ 5,835,227.19	1,179.70	$ 48,984,683.10
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	479.04	$ 14,846.00	$ 7,111,827.84	**712.04**	$ 10,570,945.84	682.54	$ 10,132,988.84	29.50	$ 437,957.00	712.04	$ 10,570,945.84
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 0.00**					0.00	$ 0.00	-	
11.1.20.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA TIPO CUPULA DE 5" A 3"	UN		$ 74,334.00	$ 0.00	**29**	$ 2,155,686.00	29.00	$ 2,155,686.00			29.00	$ 2,155,686.00
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 4,502,238.08**					0.00	$ 0.00	-	
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -			0.00	$ 0.00	-	
13.1.7	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	91.12	$ 25,832.00	$ 2,353,811.84	**91.12**	$ 2,353,811.84		$ 0.00	91.12	$ 2,353,811.84	91.12	$ 2,353,811.84
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)									0.00			
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2	104.96	$ 20,469.00	$ 2,148,426.24	**104.96**	$ 2,148,426.24		$ 0.00	104.96	$ 2,148,426.24	104.96	$ 2,148,426.24
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 132,993,427.56**					0.00	$ 0.00	-	
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	37.20	$ 51,981.00	$ 1,933,693.20	**0**	$ -		$ 0.00	0.00		-	
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	956.11	$ 137,076.00	$ 131,059,734.36	**1120.47**	$ 153,589,545.72	576.83	$ 79,069,549.08	105.52	$ 14,464,259.52	682.35	$ 93,533,808.60
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				**$ 9,089,706.60**					0.00	$ 0.00	-	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1726.44	$ 5,265.00	$ 9,089,706.60	**1126.02**	$ 5,928,495.30	-	$ 0.00	128.05	$ 674,183.25	128.05	$ 674,183
21	PRECIOS NO PREVISTOS		0.00	$ 5,265.00	**$ 0.00**					0.00	$ 0.00	-	
NP 001	DESMONTE, INSTALACION Y CERTIFICACION DE PUNTOS DE ANCLAJE PARA TRABAJO EN ALTURAS	UN		$ 382,772.00	$ 0.00	**8.00**	$ 3,062,176.00	8.00	$ 3,062,176.00	0.00	$ 0.00	8.00	$ 3,062,176.00
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				**$ 291,978,971.13**		**$ 307,742,854.14**		**$ 181,341,917.74**		**$ 60,034,542.11**		**$ 241,376,459.85**
s14													
	SUBTOTAL COSTO DIRECTO GENERAL				**$ 1,823,071,472.99**		**$ 1,823,054,707.90**		**$ 618,976,927.84**		**$ 1,106,811,964.81**		**$ 1,725,788,892.65**
	35. DESCRIPCIÓN		**36. VALOR CONTRACTUAL**										
	ADMINISTRACIÓN		25.64%		$ 467,435,525.67		$ 467,431,227.11		$ 158,705,684.30		$ 283,786,587.78		$ 442,492,272.08
	IMPREVISTO		0.50%		$ 9,115,357.36		$ 9,115,273.54		$ 3,094,884.64		$ 5,534,059.82		$ 8,628,944.46
	UTILIDAD		3.00%		$ 54,692,144.19		$ 54,691,641.24		$ 18,569,307.84		$ 33,204,358.94		$ 51,773,666.78
	SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)				**$ 531,243,027.22**		**$ 531,238,141.89**		**$ 180,369,876.78**		**$ 322,525,006.54**		**$ 502,894,883.32**
	ANTICIPO		0%		$ 0		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00
	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO		0%		$ 0		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00
	AJUSTE AL PESO				$ (0.21)		$ 0.21		-$ 0.62		-$ 0.35		$ 0.03
	37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO				**$ 2,354,314,500.00**		**$ 2,354,292,850.00**		**$ 799,346,804.00**		**$ 1,429,336,971.00**		**$ 2,228,683,776.00**

C. OBSERVACIONES

La informacion reportada corresponde a los informes aprobados por la intrventoria y cargados en el secop

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

DESCRIPCION	38. No. INFORME MENSUAL	39. PERIODO	40. NOMBRE DEL ARCHIVO	41. FECHA DE CARGUE	42. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO	3	9/02/2025 - 8/03/2025	9198-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 3 PARTE 1	02/04/2025	
INFORME SOCIAL	N/A	N/A	N/A	02/04/2025	
INFORME AMBIENTAL	3	9/02//2025 - 8/03/2025	9198-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 3 PARTE 2	02/04/2025	
INFORME SST	3	9/02//2025 - 8/03/2025	9198-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 3 PARTE 3.1 y 3.2	02/04/2025	
INFORME DE SUPERVISION	3	9/02//2025 - 8/03/2025	9198-2024 CORTE GENERAL DE OBRA No. 2	21/03/2025	
ACTA PARCIAL	3	9/02//2025 - 8/03/2025	9198-2024 CORTE GENERAL DE OBRA No. 2	21/03/2025	
SOPORTE PAGO SDH	3	9/02//2025 - 8/03/2025	9198-2024 CORTE GENERAL DE OBRA No. 2	21/03/2025	
FACTURA	3	9/02//2025 - 8/03/2025	9198-2024 CORTE GENERAL DE OBRA No. 2	21/03/2025	
FORMATO MC 14	3	9/02//2025 - 8/03/2025			

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 05 días del mes de ABRIL del año 2025

Nombre: ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO
CONTRATISTA DE LA OBRA

MEBYS DE LA OSSA L.

Nombre: ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ
INTERVENTOR DE LA OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

| | | |

	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA OBRA	Código: FOR-GIF-020 Versión: 1 Fecha: Memo I2024037699 - 18/12/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN:	5	4	2025								
2. ACTA No.	3		3. TIPO DE ACTA PARCIAL:			RECIBO PARCIAL DE OBRA	3	MODIFICACIONES	2		
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDIN INFANTIL CAMPO VERDE			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:			KR 95A 85 80 SUR				

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9198-2024		7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024		8. VALOR CONTRATO:	$ 2,354,314,500		
9. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	MARZO	2	2025	11. PLAZO:	3 MESES 21 DÍAS	Meses/días
12. PRORROGAS:	89 DÍAS		13. SUSPENSIONES:		Meses/días				14. ADICIONES:	$ -	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9221-2024		18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024		19. VALOR CONTRATO:	$ 382,708,445		
20. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	15	ABRIL	4	2025	22. PLAZO:	4 MESES 15 DIAS	Meses/días
23. PRORROGAS:	104 DIAS		24. SUSPENSIONES:		Meses/días				25. ADICIONES:	$ 98,026,043	
26. INTEVENTORÍA:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC										
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA										

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 5 días del mes de ABRIL del año 2025 se reunieron EL ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO representante legal del contratista y LA ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obray/o Modificaciones del mes de MARZO según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR

C. OBSERVACIONES

La informacion reportada corresponde a los informes aprobados por la intrventoria y cargados en el secop

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

DESCRIPCION	38. No. INFORME MENSUAL	39. PERIODO	40. NOMBRE DEL ARCHIVO	41. FECHA DE CARGUE	42. PANTALLAZOS SECOP II
DESCRIPCION	38. No. INFORME MENSUAL	39. PERIODO	40. NOMBRE DEL ARCHIVO	41. FECHA DE CARGUE	42. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO	3	9/02/2025 - 8/03/2025	9198-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 3 PARTE 1	02/04/2025	
INFORME SOCIAL	N/A	N/A	N/A	02/04/2025	
INFORME AMBIENTAL	3	9/02//2025 - 8/03/2025	9198-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 3 PARTE 2	02/04/2025	
INFORME SST	3	9/02//2025 - 8/03/2025	9198-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 3 PARTE 3.1 y 3.2	02/04/2025	
INFORME DE SUPERVISION	3	9/02//2025 - 8/03/2025	9198-2024 CORTE GENERAL DE OBRA No. 2	21/03/2025	
ACTA PARCIAL	3	9/02//2025 - 8/03/2025	9198-2024 CORTE GENERAL DE OBRA No. 2	21/03/2025	
SOPORTE PAGO SDH	3	9/02//2025 - 8/03/2025	9198-2024 CORTE GENERAL DE OBRA No. 2	21/03/2025	
FACTURA	3	9/02//2025 - 8/03/2025	9198-2024 CORTE GENERAL DE OBRA No. 2	21/03/2025	
FORMATO MC 14	3	9/02//2025 - 8/03/2025			

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 05 días del mes de ABRIL del año 2025

Nombre: ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO
CONTRATISTA DE LA OBRA

MEBYS DE LA OSSA L.

Nombre: ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ
INTERVENTOR DE LA OBRA

Origin Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia Interventor
Copia Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	5	4	2025						
2. ACTA No.	3		3. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	3	MODIFICACIONES	2	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDIN INFANTIL TORITO FELIZ		5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:		KR 91C 51 52 SUR				

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9198-2024			7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024		8. VALOR CONTRATO:	$	2,354,314,500
9. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	MARZO	2	2025	11. PLAZO:	3 MESES 21 DÍAS	Meses/días
12. PRORROGAS:	89 DÍAS			13. SUSPENSIONES:		Meses/días			14. ADICIONES:	$	-
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9221-2024			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024		19. VALOR CONTRATO:	$	382,708,445
20. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	15	ABRIL	4	2025	22. PLAZO:	4 MESES 15 DIAS	Meses/días
23. PRORROGAS:	104 DIAS			24. SUSPENSIONES:		Meses/días			25. ADICIONES:	$	98,026,043
26. INTEVENTORÍA:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC										
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA										

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 5 días del mes de ABRIL del año 2025 se reunieron EL ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO representante legal del contratista y LA ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obray/o Modificaciones del mes de MARZO según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	PRELIMINARES				**$ 17,784,609.96**								
1.1	OBRAS PRELIMINARES												
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACIONES (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE CONSTRUCCION)	M2	180.09	$ 19,797.00	$ 3,565,241.73	98.77	$ 1,955,349.69		$ 0.00	98.77	$ 1,955,349.69	98.77	$ 1,955,349.69
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL						$ -		$ 0.00				
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	66	$ 43,298.00	$ 2,857,668.00	37.37	$ 1,618,046.26		$ 0.00	37.37	$ 1,618,046.26	37.37	$ 1,618,046.26
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS						$ -		$ 0.00				
1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	28.8	$ 27,519.00	$ 792,547.20	2.13	$ 58,615.47		$ 0.00	2.13	$ 58,615.47	2.13	$ 58,615.47
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA	M2	91.37	$ 32,417.00	$ 2,961,941.29	86.94	$ 2,818,333.98		$ 0.00	86.94	$ 2,818,333.98	86.94	$ 2,818,333.98
1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS)	UN		$ 18,691.00	$ 0.00	2.00	$ 37,382.00		$ 0.00	2.00	$ 37,382.00	2.00	$ 37,382.00
1.3.43	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS.	M2	177.83	$ 42,778.00	$ 7,607,211.74	332.97	$ 14,243,790.66		$ 0.00	332.97	$ 14,243,790.66	332.97	$ 14,243,790.66
2	CIMENTACIÓN				**$ 3,438,908.32**								
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS						$ -		$ 0.00				
2.1.1	EXCAVACION MECANICA. DESCAPOTE Y MOVIMIENTO MASIVO DE TIERRA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL SOBRANTE EN BOTADEROS OFICIALES	M3	0	$ 123,789.00	$ 0.00		$ -		$ 0.00	0.00	$ -	-	$ 0.00
2.1.2	EXCAVACION MANUAL EN TIERRA HASTA 2.50 M. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL.	M3	14.4	$ 123,243.00	$ 1,774,699.20		$ -		$ 0.00	0.00	$ -	-	$ 0.00
2.1.5	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3		$ 87,634.00	$ 0.00	5.45	$ 477,605.30		$ 0.00	5.45	$ 477,605.30	5.45	$ 477,605.30
2.1.9	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO	M3	11.52	$ 100,826.00	$ 1,161,515.52	2.23	$ 224,841.98		$ 0.00	2.23	$ 224,841.98	2.23	$ 224,841.98
2.2	CONCRETOS						$ -		$ 0.00				
2.2.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGUETA EN CONCRETO DE 3000 PSI. DIMENSIONES 20X15CM. NO INCLUYE REFUERZO	M	3.8	$ 108,899.00	$ 413,816.20	3.40	$ 370,256.60		$ 0.00	3.40	$ 370,256.60	3.40	$ 370,256.60
2.5	ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA						$ -		$ 0.00				
2.5.2	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	16.7	$ 5,322.00	$ 88,877.40	4.48	$ 23,842.56		$ 0.00	4.48	$ 23,842.56	4.48	$ 23,842.56
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 2,488,968.00**								
4.1	TUBERIA						$ -		$ 0.00				
4.1.61	TUBERIA PVCS 3" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	M	72	$ 34,569.00	$ 2,488,968.00	17.47	$ 603,920.43		$ 0.00	17.47	$ 603,920.43	17.47	$ 603,920.43
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 0.00**								
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -		$ 0.00				
7.1.3	CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI E = 0.05 M	M2		$ 26,737.00		0.64	$ 17,111.68		$ 0.00	0.64	$ 17,111.68	0.64	$ 17,111.68
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 7,855,027.45**								
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -		$ 0.00				
13.4.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M2	10.75	$ 26,869.00	$ 288,841.75	12.10	$ 325,114.90		$ 0.00	12.10	$ 325,114.90	12.10	$ 325,114.90
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	174.15	$ 39,517.00	$ 6,881,885.55	244.10	$ 9,646,099.70	6.50	$ 256,860.50	237.60	$ 9,389,239.20	244.10	$ 9,646,099.70
13.4.4	ESMALTE SOBRE CANAL METÁLICA EN ACERO GALVANIZADO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	22.95	$ 29,817.00	$ 684,300.15	13.42	$ 400,144.14		$ 0.00	13.42	$ 400,144.14	13.42	$ 400,144.14
16	OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 2,490,949.30**								
16.1.1	ANDEN EN CONCRETO 2500 PSI H = 0.08 M. FUNDIDO EN SITIO. INCLUYE BORDILLO	M2	28.8	$ 53,266.00	$ 1,534,060.80		$ -		$ 0.00	0.00	$ -	-	$ 0.00
16.1.2	ANDEN EN CONCRETO 2500 PSI H = 0.10 M. FUNDIDO EN SITIO. INCLUYE BORDILLO	M2		$ 60,245.00	$ 0.00	1.14	$ 68,679.30		$ 0.00	1.14	$ 68,679.30	1.14	$ 68,679.30
16.1.3	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA	M2	5	$ 107,387.00	$ 536,935.00	6.76	$ 725,936.12		$ 0.00	6.76	$ 725,936.12	6.76	$ 725,936.12
16.1.4	PUERTA DE CERRAMIENTO EN TUBO GALVANIZADO DE 2" Y MALLA ONDULADA CALIBRE 10, HUECO DE 2"X 2"	M2	4.5	$ 93,323.00	$ 419,953.50	2.26	$ 210,909.98		$ 0.00	2.26	$ 210,909.98	2.26	$ 210,909.98
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 38,683,355.20**								
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	57.00	$ 51,981.00	$ 2,962,917.00	67.53	$ 3,510,276.93	1.50	$ 77,971.50	66.03	$ 3,432,305.43	67.53	$ 3,510,276.93
17.1.2	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	22.95	$ 80,829.00	$ 1,855,025.55	28.85	$ 2,331,916.65		$ 0.00	28.85	$ 2,331,916.65	28.85	$ 2,331,916.65
17.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	29.4	$ 44,561.00	$ 1,310,093.40	34.42	$ 1,533,789.62		$ 0.00	34.42	$ 1,533,789.62	34.42	$ 1,533,789.62
17.1.18	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	102.04	$ 61,523.00	$ 6,277,806.92	88.19	$ 5,425,713.37		$ 0.00	88.19	$ 5,425,713.37	88.19	$ 5,425,713.37
17.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	10.75	$ 200,325.00	$ 2,153,493.75	9.76	$ 1,955,172.00		$ 0.00	9.76	$ 1,955,172.00	9.76	$ 1,955,172.00

	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA OBRA	Código: FOR-GIF-020 Versión: 1 Fecha: Memo I2024037699 - 18/12/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN:	5	4	2025										
2. ACTA No.	3			3. TIPO DE ACTA PARCIAL:			RECIBO PARCIAL DE OBRA	3	MODIFICACIONES	2			
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDIN INFANTIL TORITO FELIZ			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:			KR 91C 51 52 SUR						

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9198-2024			7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024			8. VALOR CONTRATO:	$	2,354,314,500	
9. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:		31	MARZO	2	2025	11. PLAZO:	3 MESES 21 DÍAS		Meses/días
12. PRORROGAS:	89 DÍAS			13. SUSPENSIONES:			Meses/días			14. ADICIONES:	$	-	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO												
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL												
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9221-2024			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024			19. VALOR CONTRATO:	$	382,708,445	
20. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:		15	ABRIL	4	2025	22. PLAZO:	4 MESES 15 DIAS		Meses/días
23. PRORROGAS:	104 DIAS			24. SUSPENSIONES:			Meses/días			25. ADICIONES:	$	98,026,043	
26. INTEVENTORÍA:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC												
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA												

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 5 días del mes de ABRIL del año 2025 se reunieron EL ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO representante legal del contratista y LA ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obray/o Modificaciones del mes de MARZO según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
17.1.24.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	102.04	$ 205,696.00	$ 20,989,219.84	88.19	$ 18,140,330.24		$ 0.00	88.19	$ 18,140,330.24	88.19	$ 18,140,330.24
17.1.30	CANAL AMAZONA	M	29.98	$ 104,563.00	$ 3,134,798.74	30.49	$ 3,188,125.87		$ 0.00	30.49	$ 3,188,125.87	30.49	$ 3,188,125.87
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				**$ 1,864,968.30**								
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	354.22	$ 5,265.00	$ 1,864,968.30	202.21	$ 1,064,635.65		$ 0.00	202.21	$ 1,064,635.65	202.21	$ 1,064,635.65
34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO					$ 74,606,786.53		$ 70,975,941.08		$ 334,832.00		$ 70,641,109.08		$ 70,975,941.08
35. DESCRIPCIÓN			**36. VALOR CONTRACTUAL**										
ADMINISTRACIÓN			25.64%		$ 19,129,180.07		$ 18,198,231.29		$ 85,850.92		$ 18,112,380.37		$ 18,198,231.29
IMPREVISTO			0.50%		$ 373,033.93		$ 354,879.71		$ 1,674.16		$ 353,205.55		$ 354,879.71
UTILIDAD			3.00%		$ 2,238,203.60		$ 2,129,278.23		$ 10,044.96		$ 2,119,233.27		$ 2,129,278.23
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)					$ 21,740,417.60		$ 91,658,330.31		$ 97,570.04		$ 91,225,928.27		$ 91,323,498.31
ANTICIPO			0%		$ -		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO			0%		$ -		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00
AJUSTE AL PESO					$ (0.13)		-$ 0.31		-$ 0.04		-$ 0.27		-$ 0.31
37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO					$ 96,347,204.00		$ 91,658,330.00		$ 432,402.00		$ 91,225,928.00		$ 91,658,330.00

100.00%

	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA OBRA	Código: FOR-GIF-020 Versión: 1 Fecha: Memo I2024037699 - 18/12/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN:	5	4	2025								
2. ACTA No.	3		3. TIPO DE ACTA PARCIAL:			RECIBO PARCIAL DE OBRA	3	MODIFICACIONES	2		
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDIN INFANTIL TORITO FELIZ		5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:			KR 91C 51 52 SUR					

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9198-2024		7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024		8. VALOR CONTRATO:	$	2,354,314,500	
9. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	MARZO	2025	11. PLAZO:	3 MESES 21 DÍAS	Meses/días	
12. PRORROGAS:	89 DÍAS		13. SUSPENSIONES:		Meses/días			14. ADICIONES:	$	-	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9221-2024		18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024		19. VALOR CONTRATO:	$	382,708,445	
20. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	15	ABRIL	2025	22. PLAZO:	4 MESES 15 DIAS	Meses/días	
23. PRORROGAS:	104 DIAS		24. SUSPENSIONES:		Meses/días			25. ADICIONES:	$	98,026,043	
26. INTEVENTORÍA:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC										
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA										

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 5 días del mes de ABRIL del año 2025 se reunieron EL ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO representante legal del contratista y LA ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obray/o Modificaciones del mes de MARZO según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR

C. OBSERVACIONES

La informacion reportada corresponde a los informes aprobados por la intrventoria y cargados en el secop

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

DESCRIPCION	38. No. INFORME MENSUAL	39. PERIODO	40. NOMBRE DEL ARCHIVO	41. FECHA DE CARGUE	42. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO	3	9/02/2025 - 8/03/2025	9198-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 3 PARTE 1	02/04/2025	
INFORME SOCIAL	N/A	N/A	N/A	02/04/2025	
INFORME AMBIENTAL	3	9/02//2025 - 8/03/2025	9198-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 3 PARTE 2	02/04/2025	
INFORME SST	3	9/02//2025 - 8/03/2025	9198-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 3 PARTE 3.1 y 3.2	02/04/2025	
INFORME DE SUPERVISION	3	9/02//2025 - 8/03/2025	9198-2024 CORTE GENERAL DE OBRA No. 2	21/03/2025	
ACTA PARCIAL	3	9/02//2025 - 8/03/2025	9198-2024 CORTE GENERAL DE OBRA No. 2	21/03/2025	
SOPORTE PAGO SDH	3	9/02//2025 - 8/03/2025	9198-2024 CORTE GENERAL DE OBRA No. 2	21/03/2025	
FACTURA	3	9/02//2025 - 8/03/2025	9198-2024 CORTE GENERAL DE OBRA No. 2	21/03/2025	
FORMATO MC 14	3	9/02//2025 - 8/03/2025			

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 05 días del mes de ABRIL del año 2025

Nombre: ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO
CONTRATISTA DE LA OBRA

MEBYS DE LA OSSA L.

Nombre: ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ
INTERVENTOR DE LA OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia 1: Interventor
Copia 2: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN: 5 | 4 | 2025

2. ACTA No. 3 | 3. TIPO DE ACTA PARCIAL: | RECIBO PARCIAL DE OBRA 3 | MODIFICACIONES 2

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: JARDIN SOCIAL OJO DE PERDIZ | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: KR 92 70 15 SUR

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No: 9198-2024 | 7. FECHA CONTRATO: 19 | 11 | 2024 | 8. VALOR CONTRATO: $ 2,354,314,500

9. FECHA ACTA INICIO: 9 | 12 | 2024 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: 31 | MARZO | 2 | 2025 | 11. PLAZO: 3 MESES 21 DÍAS | Meses/días

12. PRORROGAS: 89 DÍAS | 13. SUSPENSIONES: | Meses/días | 14. ADICIONES: $ -

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

16. CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

17. CONTRATO INTEVENTORIA No: 9221-2024 | 18. FECHA CONTRATO: 26 | 11 | 2024 | 19. VALOR CONTRATO: $ 382,708,445

20. FECHA ACTA INICIO: 9 | 12 | 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: 15 | ABRIL | 4 | 2025 | 22. PLAZO: 4 MESES 15 DIAS | Meses/días

23. PRORROGAS: 104 DIAS | 24. SUSPENSIONES: | Meses/días | 25. ADICIONES: $ 98,026,043

26. INTEVENTORÍA: COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC

27. SUPERVISOR SDIS: JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 5 días del mes de ABRIL del año 2025 se reunieron EL ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO representante legal del contratista y LA ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obray/o Modificaciones del mes de MARZO según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	PRELIMINARES				**$ 21,219,301.01**								
1.1	OBRAS PRELIMINARES												
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACIONES (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE CONSTRUCCION)	M2	322.41	$ 19,797.00	$ 6,382,750.77	292.55	$ 5,791,612.35		$ 0.00	292.55	$ 5,791,612.35	292.55	$ 5,791,612.35
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL			$ -			$ -			0.00	$ -	-	
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	71.05	$ 43,298.00	$ 3,076,322.90	56.66	$ 2,453,264.68		$ 0.00	56.66	$ 2,453,264.68	56.66	$ 2,453,264.68
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS						$ -						
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, [illegible]	M2	292.55	$ 32,417.00	$ 9,483,593.35	292.55	$ 9,483,593.35		$ 0.00	292.55	$ 9,483,593.35	292.55	$ 9,483,593.35
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	117.31	$ 18,929.00	$ 2,220,560.99	117.31	$ 2,220,560.99		$ 0.00	117.31	$ 2,220,560.99	117.31	$ 2,220,560.99
1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE [illegible]	UN	3.00	$ 18,691.00	$ 56,073.00	3	$ 56,073.00		$ 0.00	3.00	$ 56,073.00	3.00	$ 56,073.00
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 1,201,591.14**								
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	55.47	$ 21,662.00	$ 1,201,591.14	77.51	$ 1,679,021.62		$ 0.00	77.51	$ 1,679,021.62	77.51	$ 1,679,021.62
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 3,719,982.00**								
5.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINI INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TERMOMAGNÉTICO PARA INSTALACIÓN EN RIEL DIN (RIEL OMEGA) 1X50A 10KA	UN		$ 38,918.00	$ 0.00	1.00	$ 38,918.00		$ 0.00	1.00	$ 38,918.00	1.00	$ 38,918.00
5.1.64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA OCTAGONAL, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	4.00	$ 319,430.00	$ 1,277,720.00	4.00	$ 1,277,720.00		$ 0.00	4.00	$ 1,277,720.00	4.00	$ 1,277,720.00
5.1.71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	10.00	$ 184,447.00	$ 1,844,470.00	10.00	$ 1,844,470.00		$ 0.00	10.00	$ 1,844,470.00	10.00	$ 1,844,470.00
5.1.71.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CIRCULAR DE 24 W. 11" INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	13.00	$ 45,984.00	$ 597,792.00	13.00	$ 597,792.00		$ 0.00	13.00	$ 597,792.00	13.00	$ 597,792.00
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 2,848,251.78**					0.00	$ -	-	
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
7.2.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM	M	109.81	$ 25,938.00	$ 2,848,251.78	131.85	$ 3,419,925.30		$ 0.00	131.85	$ 3,419,925.30	131.85	$ 3,419,925.30
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 11,585,024.48**								
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -						
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	174.03	$ 10,754.00	$ 1,871,518.62	161.14	$ 1,732,899.56		$ 0.00	161.14	$ 1,732,899.56	161.14	$ 1,732,899.56
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2	96.54	$ 20,469.00	$ 1,976,077.26	96.54	$ 1,976,077.26		$ 0.00	96.54	$ 1,976,077.26	96.54	$ 1,976,077.26
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 45,138.00	$ 0.00	29.76	$ 1,343,306.88		$ 0.00	29.76	$ 1,343,306.88	29.76	$ 1,343,306.88
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -		$ 0.00				
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	195.8	$ 39,517.00	$ 7,737,428.60	293.91	$ 11,614,441.47		$ 0.00	293.91	$ 11,614,441.47	293.91	$ 11,614,441.47
14	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 18,820,629.85**								
14.1.1	CIELORASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7	M2	117.31	$ 160,435.00	$ 18,820,629.85	119.11	$ 19,109,412.85		$ 0.00	119.11	$ 19,109,412.85	119.11	$ 19,109,412.85
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 79,059,630.58**								
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	73.6	$ 51,981.00	$ 3,825,801.60	90.33	$ 4,695,443.73		$ 0.00	90.33	$ 4,695,443.73	90.33	$ 4,695,443.73
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO. ACCESORIOS DE	M2	292.55	$ 247,595.00	$ 72,433,917.25	292.55	$ 72,433,917.25		$ 0.00	292.55	$ 72,433,917.25	292.55	$ 72,433,917.25
17.1.18	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	45.51	$ 61,523.00	$ 2,799,911.73		$ -			0.00	$ -	-	
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				**$ 2,158,650.00**								
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	410	$ 5,265.00	$ 2,158,650.00	375.75	$ 1,978,323.75		$ 0.00	375.75	$ 1,978,323.75	375.75	$ 1,978,323.75
34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO					$ 140,613,060.84		$ 143,746,774.04		$ 0.00		$ 143,746,774.04		$ 143,746,774.04
35. DESCRIPCIÓN		**36. VALOR CONTRACTUAL**											
ADMINISTRACIÓN		25.64%			$ 36,053,188.80		$ 36,856,672.86		$ 0.00		$ 36,856,672.86		$ 36,856,672.86
IMPREVISTO		0.50%			$ 703,065.30		$ 718,733.87		$ 0.00		$ 718,733.87		$ 718,733.87
UTILIDAD		3.00%			$ 4,218,391.83		$ 4,312,403.22		$ 0.00		$ 4,312,403.22		$ 4,312,403.22
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)					$ 40,974,645.93		$ 185,634,583.99		$ 0.00		$ 185,634,583.99		$ 185,634,583.99
ANTICIPO		0%			$ -		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO		0%			$ -		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00
AJUSTE AL PESO					$ 0.23		$ 0.01				$ 0.01		$ 0.01
37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO					$ 181,587,707.00		$ 185,634,584.00		$ 0.00		$ 185,634,584.00		$ 185,634,584.00

100.00%

	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA OBRA	Código: FOR-GIF-020 Versión: 1 Fecha: Memo I2024037699 - 18/12/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN: 5 | 4 | 2025

2. ACTA No.: 3 | 3. TIPO DE ACTA PARCIAL: | RECIBO PARCIAL DE OBRA: 3 | MODIFICACIONES: 2

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: JARDIN SOCIAL OJO DE PERDIZ | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: KR 92 70 15 SUR

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9198-2024	7. FECHA CONTRATO:	19 / 11 / 2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 2,354,314,500		
9. FECHA ACTA INICIO:	9 / 12 / 2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31 / MARZO / 2 / 2025	11. PLAZO:	3 MESES 21 DÍAS	Meses/días	
12. PRORROGAS:	89 DÍAS	13. SUSPENSIONES:	Meses/días	14. ADICIONES:	$ -		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO						
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL						
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9221-2024	18. FECHA CONTRATO:	26 / 11 / 2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 382,708,445		
20. FECHA ACTA INICIO:	9 / 12 / 2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	15 / ABRIL / 4 / 2025	22. PLAZO:	4 MESES 15 DIAS	Meses/días	
23. PRORROGAS:	104 DIAS	24. SUSPENSIONES:	Meses/días	25. ADICIONES:	$ 98,026,043		
26. INTEVENTORÍA:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC						
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA						

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 5 días del mes de ABRIL del año 2025 se reunieron EL ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO representante legal del contratista y LA ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra/o Modificaciones del mes de MARZO según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR

	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA OBRA	Código: FOR-GIF-020 Versión: 1 Fecha: Memo I2024037699 - 18/12/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN: 5 | 4 | 2025

2. ACTA No. 3 — 3. TIPO DE ACTA PARCIAL: — RECIBO PARCIAL DE OBRA 3 — MODIFICACIONES 2

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: JARDIN SOCIAL OJO DE PERDIZ — 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: KR 92 70 15 SUR

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No: 9198-2024 — 7. FECHA CONTRATO: 19 | 11 | 2024 — 8. VALOR CONTRATO: $ 2,354,314,500

9. FECHA ACTA INICIO: 9 | 12 | 2024 — 10. FECHA DE TERMINACIÓN: 31 | MARZO | 2 | 2025 — 11. PLAZO: 3 MESES 21 DÍAS — Meses/días

12. PRORROGAS: 89 DÍAS — 13. SUSPENSIONES: — Meses/días — 14. ADICIONES: $ -

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

16. CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

17. CONTRATO INTEVENTORIA No: 9221-2024 — 18. FECHA CONTRATO: 26 | 11 | 2024 — 19. VALOR CONTRATO: $ 382,708,445

20. FECHA ACTA INICIO: 9 | 12 | 2025 — 21. FECHA DE TERMINACIÓN: 15 | ABRIL | 4 | 2025 — 22. PLAZO: 4 MESES 15 DIAS — Meses/días

23. PRORROGAS: 104 DIAS — 24. SUSPENSIONES: — Meses/días — 25. ADICIONES: $ 98,026,043

26. INTEVENTORÍA: COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC

27. SUPERVISOR SDIS: JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 5 días del mes de ABRIL del año 2025 se reunieron EL ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO representante legal del contratista y LA ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra/o Modificaciones del mes de MARZO según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR

C. OBSERVACIONES

La informacion reportada corresponde a los informes aprobados por la intrventoria y cargados en el secop

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

DESCRIPCION	38. No. INFORME MENSUAL	39. PERIODO	40. NOMBRE DEL ARCHIVO	41. FECHA DE CARGUE	42. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO	3	9/02/2025 - 8/03/2025	9198-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 3 PARTE 1	02/04/2025	
INFORME SOCIAL	N/A	N/A	N/A	02/04/2025	
INFORME AMBIENTAL	3	9/02/2025 - 8/03/2025	9198-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 3 PARTE 2	02/04/2025	
INFORME SST	3	9/02/2025 - 8/03/2025	9198-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 3 PARTE 3.1 y 3.2	02/04/2025	
INFORME DE SUPERVISION	3	9/02/2025 - 8/03/2025	9198-2024 CORTE GENERAL DE OBRA No. 2	21/03/2025	
ACTA PARCIAL	3	9/02/2025 - 8/03/2025	9198-2024 CORTE GENERAL DE OBRA No. 2	21/03/2025	
SOPORTE PAGO SDH	3	9/02/2025 - 8/03/2025	9198-2024 CORTE GENERAL DE OBRA No. 2	21/03/2025	
FACTURA	3	9/02/2025 - 8/03/2025	9198-2024 CORTE GENERAL DE OBRA No. 2	21/03/2025	
FORMATO MC 14	3	9/02/2025 - 8/03/2025			

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 05 días del mes de ABRIL del año 2025

Nombre: ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO
CONTRATISTA DE LA OBRA

MEBYS DE LA OSSA L.

Nombre: ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ
INTERVENTOR DE LA OBRA

Origin Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia Interventor
Copia Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	5	4	2025						
2. ACTA No.	3		3. TIPO DE ACTA PARCIAL:			RECIBO PARCIAL DE OBRA	3	MODIFICACIONES	2
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PORVENIR		5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:			KR 100 52 24 SUR			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9198-2024		7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024		8. VALOR CONTRATO:	$	2,354,314,500	
9. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	MARZO	2025	11. PLAZO:	3 MESES 21 DÍAS	Meses/días	
12. PRORROGAS:	89 DÍAS		13. SUSPENSIONES:		Meses/días			14. ADICIONES:	$	-	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9221-2024		18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024		19. VALOR CONTRATO:	$	382,708,445	
20. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	15	ABRIL	2025	22. PLAZO:	4 MESES 15 DIAS	Meses/días	
23. PRORROGAS:	104 DIAS		24. SUSPENSIONES:		Meses/días			25. ADICIONES:	$	98,026,043	
26. INTEVENTORÍA:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC										
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA										

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 5 días del mes de ABRIL del año 2025 se reunieron EL ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO representante legal del contratista y LA ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de MARZO según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	PRELIMINARES				**$ 11,125,360.74**								
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL												
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	66.05	$ 43,298.00	$ 2,859,832.90	66.05	$ 2,859,832.90		$ 0.00	66.05	$ 2,859,832.90	66.05	$ 2,859,832.90
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS						$ -			0.00	$ -	-	$ 0.00
1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	82.92	$ 27,519.00	$ 2,281,875.48	95.42	$ 2,625,862.98		$ 0.00	36.92	$ 1,016,001.48	36.92	$ 1,016,001.48
1.3.20	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO	M2	140.47	$ 10,188.00	$ 1,431,108.36	135.6	$ 1,381,492.80		$ 0.00	135.60	$ 1,381,492.80	135.60	$ 1,381,492.80
1.3.23	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	226	$ 20,144.00	$ 4,552,544.00	191.96	$ 3,866,842.24		$ 0.00	191.96	$ 3,866,842.24	191.96	$ 3,866,842.24
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 10,732,808.64**					0.00	$ -	-	
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -			0.00	$ -	-	
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04	M2	226	$ 41,523.00	$ 9,384,198.00	212.73	$ 8,833,187.79		$ 0.00	191.96	$ 7,970,755.08	191.96	$ 7,970,755.08
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	90.84	$ 14,846.00	$ 1,348,610.64	80.48	$ 1,194,806.08		$ 0.00	78.28	$ 1,162,144.88	78.28	$ 1,162,144.88
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 30,979,176.00**					0.00	$ -	-	
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	226	$ 137,076.00	$ 30,979,176.00	204.03	$ 27,967,616.28		$ 0.00	28.89	$ 3,960,125.64	28.89	$ 3,960,125.64
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				**$ 1,316,250.00**					0.00	$ -	-	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	250	$ 5,265.00	$ 1,316,250.00	85.99	$ 452,737.35		$ 0.00	0.00	$ -	-	$ 0.00
34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO					$ 54,153,595.38		$ 49,182,378.42		$ 0.00		$ 22,217,195.02		$ 22,217,195.02
35. DESCRIPCIÓN		**36. VALOR CONTRACTUAL**											
ADMINISTRACIÓN		25.64%			$ 13,884,981.86		$ 12,610,361.83		$ 0.00		$ 5,696,488.80		$ 5,696,488.80
IMPREVISTO		0.50%			$ 270,767.98		$ 245,911.89		$ 0.00		$ 111,085.98		$ 111,085.98
UTILIDAD		3.00%			$ 1,624,607.86		$ 1,475,471.35		$ 0.00		$ 666,515.85		$ 666,515.85
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)					$ 15,780,357.70		$ 63,514,123.49		$ 0.00		$ 28,691,285.65		$ 28,691,285.65
ANTICIPO		0%			$ -		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO		0%			$ -		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00
AJUSTE AL PESO					$ (0.08)		$ 0.51		$ 0.00		$ 0.35		$ 0.35
37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO					$ 69,933,953.00		$ 63,514,124.00		$ 0.00		$ 28,691,286.00		$ 28,691,286.00

45.17%

C. OBSERVACIONES

La informacion reportada corresponde a los informes aprobados por la intrventoria y cargados en el secop

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

DESCRIPCION	38. No. INFORME MENSUAL	39. PERIODO	40. NOMBRE DEL ARCHIVO	41. FECHA DE CARGUE	42. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO	3	9/02/2025 - 8/03/2025	9198-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 3 PARTE 1	02/04/2025	
INFORME SOCIAL	N/A	N/A	N/A	02/04/2025	
INFORME AMBIENTAL	3	9/02//2025 - 8/03/2025	9198-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 3 PARTE 2	02/04/2025	
INFORME SST	3	9/02//2025 - 8/03/2025	9198-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 3 PARTE 3.1 y 3.2	02/04/2025	
INFORME DE SUPERVISION	3	9/02//2025 - 8/03/2025	9198-2024 CORTE GENERAL DE OBRA No. 2	21/03/2025	
ACTA PARCIAL	3	9/02//2025 - 8/03/2025	9198-2024 CORTE GENERAL DE OBRA No. 2	21/03/2025	
SOPORTE PAGO SDH	3	9/02//2025 - 8/03/2025	9198-2024 CORTE GENERAL DE OBRA No. 2	21/03/2025	
FACTURA	3	9/02//2025 - 8/03/2025	9198-2024 CORTE GENERAL DE OBRA No. 2	21/03/2025	
FORMATO MC 14	3	9/02//2025 - 8/03/2025			

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 05 días del mes de ABRIL del año 2025

Nombre: ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO
CONTRATISTA DE LA OBRA

MEBYS DE LA OSSA L.

Nombre: ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ
INTERVENTOR DE LA OBRA

Origin Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia Interventor
Copia Contratista

	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA OBRA	Código: FOR-GIF-020 Versión: 1 Fecha: Memo I2024037699 - 18/12/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN: 5 | 4 | 2025

2. ACTA No.: 3 — 3. TIPO DE ACTA PARCIAL: RECIBO PARCIAL DE OBRA: 3 — MODIFICACIONES: 2

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: JARDIN INFANTIL RINCON DE LAS ARDILLAS — 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: CL 53 SUR 13C 56

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No: 9198-2024 — 7. FECHA CONTRATO: 19 | 11 | 2024 — 8. VALOR CONTRATO: $ 2,354,314,500

9. FECHA ACTA INICIO: 9 | 12 | 2024 — 10. FECHA DE TERMINACIÓN: 31 | MARZO | 2 | 2025 — 11. PLAZO: 3 MESES 21 DÍAS (Meses/días)

12. PRORROGAS: 89 DÍAS — 13. SUSPENSIONES: (Meses/días) — 14. ADICIONES: $ -

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

16. CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

17. CONTRATO INTEVENTORIA No: 9221-2024 — 18. FECHA CONTRATO: 26 | 11 | 2024 — 19. VALOR CONTRATO: $ 382,708,445

20. FECHA ACTA INICIO: 9 | 12 | 2025 — 21. FECHA DE TERMINACIÓN: 15 | ABRIL | 4 | 2025 — 22. PLAZO: 4 MESES 15 DIAS (Meses/días)

23. PRORROGAS: 104 DIAS — 24. SUSPENSIONES: (Meses/días) — 25. ADICIONES: $ 98,026,043

26. INTEVENTORÍA: COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC

27. SUPERVISOR SDIS: JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 5 días del mes de ABRIL del año 2025 se reunieron EL ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO representante legal del contratista y LA ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obray/o Modificaciones del mes de MARZO según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	PRELIMINARES				**$ 3,699,158.00**								
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL			$ -								-	
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	50.00	$ 43,298.00	$ 2,164,900.00		$ -			0.00	$ -	-	
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS						$ -			0.00	$ -		
1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	26.00	$ 27,519.00	$ 715,494.00		$ -			0.00	$ -	-	
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 18,929.00	$ 0.00	26.16	$ 495,182.64	26.16	$ 495,182.64	0.00	$ -	26.16	$ 495,183
1.3.23	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	26.00	$ 20,144.00	$ 523,744.00	35.6	$ 717,126.40			35.60	$ 717,126.40	35.60	$ 717,126
1.3.40	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	30.00	$ 9,834.00	$ 295,020.00		$ -			0.00	$ -	-	
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 1,125,340.90**								
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -			0.00	$ -		
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	51.95	$ 21,662.00	$ 1,125,340.90	200.55	$ 4,344,314.10	200.55	$ 4,344,314.10	0.00	$ -	200.55	$ 4,344,314
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 1,780,818.00**								
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -			0.00	$ -		
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	M2	26.00	$ 41,523.00	$ 1,079,598.00	18	$ 747,414.00			18.00	$ 747,414.00	18.00	$ 747,414
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M		$ 14,846.00	$ 0.00	48.19	$ 715,428.74			48.19	$ 715,428.74	48.19	$ 715,429
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -			0.00	$ -		
7.2.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 6 CM	M		$ 20,419.00	$ 0.00	35.94	$ 733,858.86	35.94	$ 733,858.86	0.00	$ -	35.94	$ 733,859
7.2.33	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS A NIVEL DE PISO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M	30.00	$ 23,374.00	$ 701,220.00		$ -			0.00	$ -	-	
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 0.00**								
11.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN		$ 33,334.00	$ 0.00	2	$ 66,668.00	2.00	$ 66,668.00			2.00	$ 66,668
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 8,817,560.00**								
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -			0.00	$ -		
13,1,7	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 25,832.00	$ 0.00	129.82	$ 3,353,510.24	129.82	$ 3,353,510.24	0.00	$ -	129.82	$ 3,353,510
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	340	$ 10,754.00	$ 3,656,360.00	129.75	$ 1,395,331.50	129.75	$ 1,395,331.50	0.00	$ -	129.75	$ 1,395,332
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2		$ 20,469.00	$ 0.00	26.16	$ 535,469.04	26.16	$ 535,469.04	0.00	$ -	26.16	$ 535,469
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	240	$ 21,505.00	$ 5,161,200.00	127.22	$ 2,735,866.10	127.22	$ 2,735,866.10	0.00	$ -	127.22	$ 2,735,866
13.2.4	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 11,796.00	$ 0.00	23.03	$ 271,661.88	23.03	$ 271,661.88	0.00	$ -	23.03	$ 271,662
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 45,138.00	$ 0.00	69.02	$ 3,115,424.76			0.00	$ -	-	
14	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 0.00**								
14.1.8	CIELORASO PLANO DRYWALL ANTIHUMEDAD 1/2" (Incluyendo todo lo necesario para su correcta instalación)	M2		$ 133,664.00	$ 0.00	23.26	$ 3,109,024.64	23.26	$ 3,109,024.64	0.00	$ -	23.26	$ 3,109,025
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 3,563,976.00**								
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	26	$ 137,076.00	$ 3,563,976.00	35.6	$ 4,879,905.60			35.60	$ 4,879,905.60	35.60	$ 4,879,906
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL		0	$ -	**$ 331,695.00**							-	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	63	$ 5,265.00	$ 331,695.00	155.52	$ 818,812.80			0.00	$ -	-	
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				$ 19,318,547.90		$ 28,034,999.30		$ 17,040,887.00		$ 7,059,874.74		$ 24,100,761.74
	35. DESCRIPCIÓN	**36. VALOR CONTRACTUAL**											
	ADMINISTRACIÓN	25.64%			$ 4,953,275.68		$ 7,188,173.82		$ 4,369,283.43		$ 1,810,151.88		$ 6,179,435.31
	IMPREVISTO	0.50%			$ 96,592.74		$ 140,175.00		$ 85,204.44		$ 35,299.37		$ 120,503.81
	UTILIDAD	3.00%			$ 579,556.44		$ 841,049.98		$ 511,227.00		$ 211,796.24		$ 723,023.24
	SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)				$ 5,629,424.86		$ 36,204,398.10		$ 4,965,714.87		$ 9,117,122.23		$ 14,082,837.10
	ANTICIPO	0%			$ -		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00
	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	0%			$ -		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00
	AJUSTE AL PESO				$ 0.24		-$ 0.10		$ 0.13		-$ 0.23		-$ 0.10
	37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO				$ 24,947,973.00		$ 36,204,398.00		$ 22,006,602.00		$ 9,117,122.00		$ 31,123,724.00

85.97%

	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA OBRA	Código: FOR-GIF-020 Versión: 1 Fecha: Memo I2024037699 - 18/12/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN: 5 | 4 | 2025

2. ACTA No.: 3 — 3. TIPO DE ACTA PARCIAL: RECIBO PARCIAL DE OBRA: 3 — MODIFICACIONES: 2

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: JARDIN INFANTIL RINCON DE LAS ARDILLAS — 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: CL 53 SUR 13C 56

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9198-2024	7. FECHA CONTRATO:	19 / 11 / 2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 2,354,314,500
9. FECHA ACTA INICIO:	9 / 12 / 2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31 / MARZO / 2 / 2025	11. PLAZO:	3 MESES 21 DÍAS (Meses/días)
12. PRORROGAS:	89 DÍAS	13. SUSPENSIONES:	(Meses/días)	14. ADICIONES:	$ -
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO				
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL				
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9221-2024	18. FECHA CONTRATO:	26 / 11 / 2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 382,708,445
20. FECHA ACTA INICIO:	9 / 12 / 2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	15 / ABRIL / 4 / 2025	22. PLAZO:	4 MESES 15 DIAS (Meses/días)
23. PRORROGAS:	104 DIAS	24. SUSPENSIONES:	(Meses/días)	25. ADICIONES:	$ 98,026,043
26. INTEVENTORÍA:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC				
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA				

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 5 días del mes de ABRIL del año 2025 se reunieron EL ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO representante legal del contratista y LA ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra/o Modificaciones del mes de MARZO según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR

C. OBSERVACIONES

La informacion reportada corresponde a los informes aprobados por la intrventoria y cargados en el secop

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

DESCRIPCION	38. No. INFORME MENSUAL	39. PERIODO	40. NOMBRE DEL ARCHIVO	41. FECHA DE CARGUE	42. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO	3	9/02/2025 - 8/03/2025	9198-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 3 PARTE 1	02/04/2025	
INFORME SOCIAL	N/A	N/A	N/A	02/04/2025	
INFORME AMBIENTAL	3	9/02//2025 - 8/03/2025	9198-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 3 PARTE 2	02/04/2025	
INFORME SST	3	9/02//2025 - 8/03/2025	9198-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 3 PARTE 3.1 y 3.2	02/04/2025	
INFORME DE SUPERVISION	3	9/02//2025 - 8/03/2025	9198-2024 CORTE GENERAL DE OBRA No. 2	21/03/2025	
ACTA PARCIAL	3	9/02//2025 - 8/03/2025	9198-2024 CORTE GENERAL DE OBRA No. 2	21/03/2025	
SOPORTE PAGO SDH	3	9/02//2025 - 8/03/2025	9198-2024 CORTE GENERAL DE OBRA No. 2	21/03/2025	
FACTURA	3	9/02//2025 - 8/03/2025	9198-2024 CORTE GENERAL DE OBRA No. 2	21/03/2025	
FORMATO MC 14	3	9/02//2025 - 8/03/2025			

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 05 días del mes de ABRIL del año 2025

Nombre: ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO
CONTRATISTA DE LA OBRA

MEBYS DE LA OSSA L.

Nombre: ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ
INTERVENTOR DE LA OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN: 5 | 4 | 2025

2. ACTA No. 3 | 3. TIPO DE ACTA PARCIAL: | RECIBO PARCIAL DE OBRA 3 | MODIFICACIONES 2

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: JARDIN INFANTIL TUNJUELITO | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: CL 58A SUR 12A 25

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No: 9198-2024 | 7. FECHA CONTRATO: 19 | 11 | 2024 | 8. VALOR CONTRATO: $ 2,354,314,500

9. FECHA ACTA INICIO: 9 | 12 | 2024 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: 31 | MARZO | 2 | 2025 | 11. PLAZO: 3 MESES 21 DÍAS Meses/días

12. PRORROGAS: 89 DÍAS | 13. SUSPENSIONES: Meses/días | 14. ADICIONES: $ -

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

16. CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

17. CONTRATO INTEVENTORIA No: 9221-2024 | 18. FECHA CONTRATO: 26 | 11 | 2024 | 19. VALOR CONTRATO: $ 382,708,445

20. FECHA ACTA INICIO: 9 | 12 | 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: 15 | ABRIL | 4 | 2025 | 22. PLAZO: 4 MESES 15 DIAS Meses/días

23. PRORROGAS: 104 DIAS | 24. SUSPENSIONES: Meses/días | 25. ADICIONES: $ 98,026,043

26. INTEVENTORÍA: COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC

27. SUPERVISOR SDIS: JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 5 días del mes de ABRIL del año 2025 se reunieron EL ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO representante legal del contratista y LA ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obray/o Modificaciones del mes de MARZO según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	PRELIMINARES				**$ 23,871,967.34**								
1.1	OBRAS PRELIMINARES												
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACIONES (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE CONSTRUCCION)	M2	124.09	$ 19,797.00	$ 2,456,609.73	111.8	$ 2,213,304.60		$ 0.00	111.80	$ 2,213,304.60	111.80	$ 2,213,304.60
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL						$ -			0.00	$ -	-	$ 0.00
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	49.20	$ 43,298.00	$ 2,130,261.60	49.2	$ 2,130,261.60		$ 0.00	49.20	$ 2,130,261.60	49.20	$ 2,130,261.60
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS						$ -			0.00	$ -	-	$ 0.00
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	111.14	$ 32,417.00	$ 3,602,825.38	111.14	$ 3,602,825.38		$ 0.00	111.14	$ 3,602,825.38	111.14	$ 3,602,825.38
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	85.45	$ 18,929.00	$ 1,617,483.05	62.98	$ 1,192,148.42		$ 0.00	62.98	$ 1,192,148.42	62.98	$ 1,192,148.42
1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS)	UN	21.00	$ 18,691.00	$ 392,511.00	18	$ 336,438.00		$ 0.00	18.00	$ 336,438.00	18.00	$ 336,438.00
1.3.43	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS.	M2	319.61	$ 42,778.00	$ 13,672,276.58	301.25	$ 12,886,872.50		$ 0.00	301.25	$ 12,886,872.50	301.25	$ 12,886,872.50
2	CIMENTACIÓN		0	$ -	**$ 7,102,384.26**					0	$ -	-	
2.2	CONCRETOS						$ -			0.00	$ -	-	$ 0.00
2.2.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA DE CONFINAMIENTO 20 X 15 CMS. EN CONCRETO DE 3000 PSI NO INCLUYE REFUERZO	M	4.38	$ 111,104.00	$ 486,635.52	4.38	$ 486,635.52		$ 0.00	4.38	$ 486,635.52	4.38	$ 486,635.52
2.2.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES DE MUROS DE 5/8" PROFUNDIDADES ENTRE 3 Y 5 CM	M	1.50	$ 25,381.00	$ 38,071.50	1.50	$ 38,071.50		$ 0.00	1.50	$ 38,071.50	1.50	$ 38,071.50
2.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000PSI. NO INCLUYE REFUERZO	M	61.64	$ 102,054.00	$ 6,290,608.56	26.07	$ 2,660,547.78		$ 0.00	26.07	$ 2,660,547.78	26.07	$ 2,660,547.78
2.5	ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA						$ -			0.00	$ -	-	$ 0.00
2.5.2	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	53.94	$ 5,322.00	$ 287,068.68	31.35	$ 166,844.70		$ 0.00	31.35	$ 166,844.70	31.35	$ 166,844.70
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 2,981,683.71**					0	$ -		
3.1	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -		$ 0.00	0.00	$ -	-	$ 0.00
3.1.2	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No 4	M2	2.89	$ 48,199.00	$ 139,295.11	2.89	$ 139,295.11		$ 0.00	2.89	$ 139,295.11	2.89	$ 139,295.11
3.1.4	MURO EN LADRILLO TOLETE RUGOSO 24.5X12X6CM	M2	9.48	$ 210,897.00	$ 1,999,303.56	9.48	$ 1,999,303.56		$ 0.00	9.48	$ 1,999,303.56	9.48	$ 1,999,303.56
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -		$ 0.00	0.00	$ -	-	$ 0.00
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	38.92	$ 21,662.00	$ 843,085.04	27.22	$ 589,639.64		$ 0.00	27.22	$ 589,639.64	27.22	$ 589,639.64
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 1,083,325.00**					0	$ -	-	
5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	4.00	$ 185,011.00	$ 740,044.00	4.00	$ 740,044.00		$ 0.00	4.00	$ 740,044.00	4.00	$ 740,044.00
5.1.77	REINSTALACIÓN DE LAMPARAS EXISTENTES (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	17.00	$ 20,193.00	$ 343,281.00	13.00	$ 262,509.00		$ 0.00	13.00	$ 262,509.00	13.00	$ 262,509.00
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 0.00**					0	$ -	-	
8.1.4.	MURO EN LÁMINA FIBRO - CEMENTO 10 MM	M2		$ 128,794.00	$ 0.00	10.79	$ 1,389,687.26		$ 0.00	10.79	$ 1,389,687.26	10.79	$ 1,389,687.26
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 1,626,319.31**					0	$ -	-	
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -		$ 0.00	0.00	$ -	-	$ 0.00
13.1.1	PAÑETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	14.97	$ 28,666.00	$ 429,130.02	14.97	$ 429,130.02		$ 0.00	14.97	$ 429,130.02	14.97	$ 429,130.02
13.1.7	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	14.97	$ 25,832.00	$ 386,705.04	14.97	$ 386,705.04		$ 0.00	14.97	$ 386,705.04	14.97	$ 386,705.04
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -		$ 0.00	0.00	$ -	-	$ 0.00
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	45.55	$ 10,754.00	$ 489,844.70	173.51	$ 1,865,926.54		$ 0.00	173.51	$ 1,865,926.54	173.51	$ 1,865,926.54
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2		$ 20,469.00	$ 0.00	96.22	$ 1,969,527.18		$ 0.00	96.22	$ 1,969,527.18	96.22	$ 1,969,527.18
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	14.91	$ 21,505.00	$ 320,639.55	15.61	$ 335,693.05		$ 0.00	15.61	$ 335,693.05	15.61	$ 335,693.05
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 45,138.00	$ 0.00	58.08	$ 2,621,615.04		$ 0.00	58.08	$ 2,621,615.04	58.08	$ 2,621,615.04
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 39,517.00	$ 0.00	13	$ 513,721.00		$ 0.00	13.00	$ 513,721.00	13.00	$ 513,721.00
14	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 43,672,804.11**					0	$ -	-	
14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORASO FALSO EN PANEL SUPERBOARD DE 6 MM - INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA, MASILLA Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	M2	94.03	$ 272,113.00	$ 25,586,785.39	62.98	$ 17,137,676.74		$ 0.00	62.98	$ 17,137,676.74	62.98	$ 17,137,676.74
14.1.3	CIELORASO EN LAMINA DE YESO DE 1/2" ST (Incluyendo todo lo necesario para su correcta instalación)	M2	123.04	$ 146,993.00	$ 18,086,018.72	104.83	$ 15,409,276.19		$ 0.00	104.83	$ 15,409,276.19	104.83	$ 15,409,276.19
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 49,264,210.15**					0	$ -	-	

	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA OBRA	Código: FOR-GIF-020 Versión: 1 Fecha: Memo I2024037699 - 18/12/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN:	5	4	2025										
2. ACTA No.	3		3. TIPO DE ACTA PARCIAL:				RECIBO PARCIAL DE OBRA	3	MODIFICACIONES	2			
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDIN INFANTIL TUNJUELITO			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:			CL 58A SUR 12A 25						
A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO													
6. CONTRATO OBRA No:	9198-2024		7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024		8. VALOR CONTRATO:	$ 2,354,314,500				
9. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	MARZO	2	2025	11. PLAZO:	3 MESES 21 DÍAS	Meses/días		
12. PRORROGAS:	89 DÍAS		13. SUSPENSIONES:		Meses/días				14. ADICIONES:	$ -			
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO												
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL												
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9221-2024		18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024		19. VALOR CONTRATO:	$ 382,708,445				
20. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	15	ABRIL	4	2025	22. PLAZO:	4 MESES 15 DIAS	Meses/días		
23. PRORROGAS:	104 DIAS		24. SUSPENSIONES:		Meses/días				25. ADICIONES:	$ 98,026,043			
26. INTEVENTORÍA:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC												
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA												

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 5 días del mes de ABRIL del año 2025 se reunieron EL ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO representante legal del contratista y LA ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra/o Modificaciones del mes de MARZO según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	84.14	$ 51,981.00	$ 4,373,681.34	81.88	$ 4,256,204.28		$ 0.00	81.88	$ 4,256,204.28	81.88	$ 4,256,204.28

	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA OBRA	Código: FOR-GIF-020 Versión: 1 Fecha: Memo I2024037699 - 18/12/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN: 5 | 4 | 2025

2. ACTA No. 3 | 3. TIPO DE ACTA PARCIAL: | RECIBO PARCIAL DE OBRA 3 | MODIFICACIONES 2

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: JARDIN INFANTIL TUNJUELITO | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: CL 58A SUR 12A 25

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9198-2024	7. FECHA CONTRATO:	19 / 11 / 2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 2,354,314,500		
9. FECHA ACTA INICIO:	9 / 12 / 2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31 / MARZO / 2 / 2025	11. PLAZO:	3 MESES 21 DÍAS	Meses/días	
12. PRORROGAS:	89 DÍAS	13. SUSPENSIONES:	Meses/días	14. ADICIONES:	$ -		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO						
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL						
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9221-2024	18. FECHA CONTRATO:	26 / 11 / 2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 382,708,445		
20. FECHA ACTA INICIO:	9 / 12 / 2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	15 / ABRIL / 4 / 2025	22. PLAZO:	4 MESES 15 DIAS	Meses/días	
23. PRORROGAS:	104 DIAS	24. SUSPENSIONES:	Meses/días	25. ADICIONES:	$ 98,026,043		
26. INTEVENTORÍA:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC						
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA						

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 5 días del mes de ABRIL del año 2025 se reunieron EL ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO representante legal del contratista y LA ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de MARZO según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)		
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
17.1.4	ADECUACIÓN ENTRAMADO METÁLICO EXISTENTE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	137.94	$ 64,769.00	$ 8,934,235.86	137.94	$ 8,934,235.86		$ 0.00	137.94	$ 8,934,235.86	137.94	$ 8,934,235.86	
17.1.6	DOMO EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 5 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	14.00	$ 220,149.00	$ 3,082,086.00		$ -		$ 0.00	0.00	$ -	-	$ 0.00	
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	118.69	$ 247,595.00	$ 29,387,050.55	114.4	$ 28,324,868.00		$ 0.00	114.40	$ 28,324,868.00	114.40	$ 28,324,868.00	
17.1.17	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CERCHA PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	36.40	$ 95,801.00	$ 3,487,156.40	23.4	$ 2,241,743.40		$ 0.00	23.40	$ 2,241,743.40	23.40	$ 2,241,743.40	
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				**$ 2,832,570.00**					0	$ -	-		
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	538.00	$ 5,265.00	$ 2,832,570.00	364.03	$ 1,916,617.95		$ 0.00	364.03	$ 1,916,617.95	364.03	$ 1,916,617.95	
21	PRECIOS NO PREVISTOS		0.00	$ -	**$ 0.00**					0	$ -	-		#
NP 002	MANTENIMIENTO GENERAL DE CARPINTERIA, INCLUYE DESMONTE, REPARACION, AJUSTES NECESARIOS, MASILLA, GRADUACION DE CERRADURAS, INCLUYE TRANSPORTE EN CASO DE REQUERIRSE, NO INCLUYE PINTURA, NI CAMBIO DE CERRADURAS NI BRAZOS ESPECIALES.	m2		$ 246,667.00	$ 0.00	14.4	$ 3,552,004.80		$ 0.00	14.40	$ 3,552,004.80	14.40	$ 3,552,004.80	#
34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO					$ 132,435,263.88		$ 120,729,373.66		$ 0.00		$ 120,729,373.66		$ 120,729,373.66	

35. DESCRIPCIÓN	**36. VALOR CONTRACTUAL**					
ADMINISTRACIÓN	25.64%	$ 33,956,401.66	$ 30,955,011.41	$ 0.00	$ 30,955,011.41	$ 30,955,011.41
IMPREVISTO	0.50%	$ 662,176.32	$ 603,646.87	$ 0.00	$ 603,646.87	$ 603,646.87
UTILIDAD	3.00%	$ 3,973,057.92	$ 3,621,881.21	$ 0.00	$ 3,621,881.21	$ 3,621,881.21
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)		$ 38,591,635.90	$ 155,909,913.15	$ 0.00	$ 155,909,913.15	$ 155,909,913.15
ANTICIPO	0%	$ -	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	0%	$ -	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
AJUSTE AL PESO		$ 0.22	-$ 0.15		-$ 0.15	-$ 0.15
37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO		$ 171,026,900.00	$ 155,909,913.00	$ 0.00	$ 155,909,913.00	$ 155,909,913.00

100.00%

C. OBSERVACIONES

La informacion reportada corresponde a los informes aprobados por la intrventoria y cargados en el secop

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

DESCRIPCION	38. No. INFORME MENSUAL	39. PERIODO	40. NOMBRE DEL ARCHIVO	41. FECHA DE CARGUE	42. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO	3	9/02/2025 - 8/03/2025	9198-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 3 PARTE 1	02/04/2025	
INFORME SOCIAL	N/A	N/A	N/A	02/04/2025	
INFORME AMBIENTAL	3	9/02//2025 - 8/03/2025	9198-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 3 PARTE 2	02/04/2025	
INFORME SST	3	9/02//2025 - 8/03/2025	9198-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 3 PARTE 3.1 y 3.2	02/04/2025	
INFORME DE SUPERVISION	3	9/02//2025 - 8/03/2025	9198-2024 CORTE GENERAL DE OBRA No. 2	21/03/2025	
ACTA PARCIAL	3	9/02//2025 - 8/03/2025	9198-2024 CORTE GENERAL DE OBRA No. 2	21/03/2025	
SOPORTE PAGO SDH	3	9/02//2025 - 8/03/2025	9198-2024 CORTE GENERAL DE OBRA No. 2	21/03/2025	
FACTURA	3	9/02//2025 - 8/03/2025	9198-2024 CORTE GENERAL DE OBRA No. 2	21/03/2025	
FORMATO MC 14	3	9/02//2025 - 8/03/2025			

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 05 días del mes de ABRIL del año 2025

Nombre: ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO
CONTRATISTA DE LA OBRA

MEBYS DE LA OSSA L.

Nombre: ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ
INTERVENTOR DE LA OBRA

Origin Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia Interventor
Copia Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN: 5 | 4 | 2025

2. ACTA No. 3 | 3. TIPO DE ACTA PARCIAL: | RECIBO PARCIAL DE OBRA 3 | MODIFICACIONES 2

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: JARDIN INFANTIL ESTRELLAS DEL MAÑANA | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: KR 19 78D 05 SUR IN 1

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No: 9198-2024 | 7. FECHA CONTRATO: 19 | 11 | 2024 | 8. VALOR CONTRATO: $ 2,354,314,500

9. FECHA ACTA INICIO: 9 | 12 | 2024 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: 31 | MARZO | 3 | 2025 | 11. PLAZO: 3 MESES 21 DÍAS | Meses/días

12. PRORROGAS: 89 DÍAS | 13. SUSPENSIONES: | Meses/días | 14. ADICIONES: $ -

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

16. CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

17. CONTRATO INTEVENTORIA No: 9221-2024 | 18. FECHA CONTRATO: 26 | 11 | 2024 | 19. VALOR CONTRATO: $ 382,708,445

20. FECHA ACTA INICIO: 9 | 12 | 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: 15 | ABRIL | 4 | 2025 | 22. PLAZO: 4 MESES 15 DIAS | Meses/días

23. PRORROGAS: 104 DIAS | 24. SUSPENSIONES: | Meses/días | 25. ADICIONES: $ 98,026,043

26. INTEVENTORÍA: COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC

27. SUPERVISOR SDIS: JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 5 días del mes de ABRIL del año 2025 se reunieron EL ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO representante legal del contratista y LA ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obray/o Modificaciones del mes de MARZO según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	PRELIMINARES				**$ 1,938,368.95**								
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL												
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	15.5	$ 43,298.00	$ 671,119.00	15.3	$ 662,459.40		$ 0.00	15.30	$ 662,459.40	15.30	$ 662,459.40
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS						$ -		$ 0.00				
1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	46.05	$ 27,519.00	$ 1,267,249.95	42.58	$ 1,171,759.02		$ 0.00	42.58	$ 1,171,759.02	42.58	$ 1,171,759.02
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 907,171.67**								
3.1	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -		$ 0.00				
3.1.3	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	24.85	$ 17,799.00	$ 442,305.15	7.95	$ 141,502.05		$ 0.00	7.95	$ 141,502.05	7.95	$ 141,502.05
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -		$ 0.00				
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	21.46	$ 21,662.00	$ 464,866.52	21.46	$ 464,866.52		$ 0.00	21.46	$ 464,866.52	21.46	$ 464,866.52
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 4,250,282.09**								
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -		$ 0.00				
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	M2	46.05	$ 41,523.00	$ 1,912,134.15	42.58	$ 1,768,049.34		$ 0.00	42.58	$ 1,768,049.34	42.58	$ 1,768,049.34
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	16.44	$ 14,846.00	$ 244,068.24	16.44	$ 244,068.24		$ 0.00	16.44	$ 244,068.24	16.44	$ 244,068.24
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -		$ 0.00				
7.2.2	BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A = 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	2.2	$ 68,333.00	$ 150,332.60	1.2	$ 81,999.60		$ 0.00	1.2	$ 81,999.60	1.20	$ 81,999.60
7.2.16	CINTA ANTIDESLIZANTE A = 2 CM	M		$ 3,594.00	$ 0.00	8	$ 28,752.00		$ 0.00	8	$ 28,752.00	8.00	$ 28,752.00
7.2.26	ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	19.53	$ 95,370.00	$ 1,862,576.10	19.19	$ 1,830,150.30		$ 0.00	19.19	$ 1,830,150.30	19.19	$ 1,830,150.30
7.2.35	WIN DE ALUMINIO	M	9.00	$ 9,019.00	$ 81,171.00	8.93	$ 80,539.67		$ 0.00	8.93	$ 80,539.67	8.93	$ 80,539.67
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 1,741,166.60**								
8.1.2	ENCHAPE 25 X 35	M2	13.85	$ 125,716.00	$ 1,741,166.60	13.14	$ 1,651,908.24		$ 0.00	13.14	$ 1,651,908.24	13.14	$ 1,651,908.24
8.1.4	MURO EN LÁMINA FIBRO - CEMENTO 10 MM	M2		$ 128,794.00	$ 0.00	3.46	$ 445,627.24		$ 0.00	3.46	$ 445,627.24	3.46	$ 445,627.24
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 5,107,411.87**								
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -		$ 0.00				
13.1.7	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	9.9	$ 25,832.00	$ 255,736.80	8.75	$ 226,030.00		$ 0.00	8.75	$ 226,030.00	8.75	$ 226,030.00
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -		$ 0.00				
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	6.02	$ 21,505.00	$ 129,460.10	5.94	$ 127,739.70		$ 0.00	5.94	$ 127,739.70	5.94	$ 127,739.70
13.2.9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA PISO TRÁFICO PESADO	M2	30.4	$ 54,958.00	$ 1,670,723.20	27.38	$ 1,504,750.04		$ 0.00	27.38	$ 1,504,750.04	27.38	$ 1,504,750.04
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -		$ 0.00				
13.4.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS A DOS MANOS Y DOS CARAS	M2	2.55	$ 43,779.00	$ 111,636.45	2.55	$ 111,636.45		$ 0.00	2.55	$ 111,636.45	2.55	$ 111,636.45
13.4.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M2	57.13	$ 26,869.00	$ 1,535,025.97	54.07	$ 1,452,806.83		$ 0.00	54.07	$ 1,452,806.83	54.07	$ 1,452,806.83
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	35.55	$ 39,517.00	$ 1,404,829.35	36.6	$ 1,446,322.20		$ 0.00	36.6	$ 1,446,322.20	36.60	$ 1,446,322.20
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 5,823,432.81**								
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	5.35	$ 51,981.00	$ 278,098.35	5.35	$ 278,098.35		$ 0.00	5.35	$ 278,098.35	5.35	$ 278,098.35
17.1.19	IMPERMEABILIZACIÓN INTERNA PARA TANQUE DE AGUA POTABLE, CON MORTERO DE REVESTIMIENTO CON BASE DE CEMENTO, MODIFICADO CON POLIMEROS, DE UN SOLO COMPONENTE, PARA APLICACIONES DE BAJO ESPESOR.	M2	36.31	$ 52,838.00	$ 1,918,547.78	35.86	$ 1,894,770.68		$ 0.00	35.86	$ 1,894,770.68	35.86	$ 1,894,770.68
17.1.20	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	38.89	$ 42,262.00	$ 1,643,569.18	37.55	$ 1,586,938.10		$ 0.00	37.55	$ 1,586,938.10	37.55	$ 1,586,938.10
17.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	9.9	$ 200,325.00	$ 1,983,217.50	7.14	$ 1,430,320.50		$ 0.00	7.14	$ 1,430,320.50	7.14	$ 1,430,320.50
19	DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN				**$ 1,456,470.00**								
19.1.3	PRUEBA DE PRESION Y ESTANQUEIDAD	UN	1	$ 1,456,470.00	$ 1,456,470.00	1.00	$ 1,456,470.00		$ 0.00	1.00	$ 1,456,470.00	1.00	$ 1,456,470.00
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				**$ 242,453.25**								
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	46.05	$ 5,265.00	$ 242,453.25	46.05	$ 242,453.25		$ 0.00			46.05	$ 242,453.25
34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO					$ 21,466,757.24		$ 20,330,017.72		$ 0.00		$ 20,330,017.72		$ 20,330,017.72
35. DESCRIPCIÓN			**36. VALOR CONTRACTUAL**										
ADMINISTRACIÓN			25.64%		$ 5,504,076.56		$ 5,212,616.54		$ 0.00		$ 5,212,616.54		$ 5,212,616.54
IMPREVISTO			0.50%		$ 107,333.79		$ 101,650.09		$ 0.00		$ 101,650.09		$ 101,650.09
UTILIDAD			3.00%		$ 644,002.72		$ 609,900.53		$ 0.00		$ 609,900.53		$ 609,900.53

	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA OBRA	Código: FOR-GIF-020 Versión: 1 Fecha: Memo I2024037699 - 18/12/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN: 5 / 4 / 2025

2. ACTA No.: 3 — 3. TIPO DE ACTA PARCIAL: RECIBO PARCIAL DE OBRA 3 — MODIFICACIONES 2

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: JARDIN INFANTIL ESTRELLAS DEL MAÑANA — 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: KR 19 78D 05 SUR IN 1

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No: 9198-2024 — 7. FECHA CONTRATO: 19 / 11 / 2024 — 8. VALOR CONTRATO: $ 2,354,314,500

9. FECHA ACTA INICIO: 9 / 12 / 2024 — 10. FECHA DE TERMINACIÓN: 31 MARZO 3 2025 — 11. PLAZO: 3 MESES 21 DÍAS Meses/días

12. PRORROGAS: 89 DÍAS — 13. SUSPENSIONES: Meses/días — 14. ADICIONES: $ -

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

16. CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

17. CONTRATO INTEVENTORIA No: 9221-2024 — 18. FECHA CONTRATO: 26 / 11 / 2024 — 19. VALOR CONTRATO: $ 382,708,445

20. FECHA ACTA INICIO: 9 / 12 / 2025 — 21. FECHA DE TERMINACIÓN: 15 ABRIL 4 2025 — 22. PLAZO: 4 MESES 15 DIAS Meses/días

23. PRORROGAS: 104 DIAS — 24. SUSPENSIONES: Meses/días — 25. ADICIONES: $ 98,026,043

26. INTEVENTORÍA: COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC

27. SUPERVISOR SDIS: JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 5 días del mes de ABRIL del año 2025 se reunieron EL ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO representante legal del contratista y LA ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obray/o Modificaciones del mes de MARZO según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
	SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)				$ 6,255,413.07		$ 26,254,184.88		$ 0.00		$ 26,254,184.88		$ 26,254,184.88
	ANTICIPO		0%		$ -		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00
	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO		0%		$ -		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00
	AJUSTE AL PESO				$ (0.31)		$ 0.12		$ 0.00		$ 0.12		$ 0.12
	37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO				$ 27,722,170.00		$ 26,254,185.00		$ 0.00		$ 26,254,185.00		$ 26,254,185.00

100.00%

1. FECHA ELABORACIÓN:	5	4	2025						
2. ACTA No.	3		3. TIPO DE ACTA PARCIAL:			RECIBO PARCIAL DE OBRA	3	MODIFICACIONES	2
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDIN INFANTIL ESTRELLAS DEL MAÑANA			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:			KR 19 78D 05 SUR IN 1		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9198-2024		7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024		8. VALOR CONTRATO:	$	2,354,314,500	
9. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	MARZO	3	2025	11. PLAZO:	3 MESES 21 DÍAS	Meses/días
12. PRORROGAS:	89 DÍAS		13. SUSPENSIONES:		Meses/días				14. ADICIONES:	$	-
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9221-2024		18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024		19. VALOR CONTRATO:	$	382,708,445	
20. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	15	ABRIL	4	2025	22. PLAZO:	4 MESES 15 DIAS	Meses/días
23. PRORROGAS:	104 DIAS		24. SUSPENSIONES:		Meses/días				25. ADICIONES:	$	98,026,043
26. INTEVENTORÍA:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC										
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA										

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 5 días del mes de ABRIL del año 2025 se reunieron EL ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO representante legal del contratista y LA ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obray/o Modificaciones del mes de MARZO según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR

C. OBSERVACIONES

La informacion reportada corresponde a los informes aprobados por la intrventoria y cargados en el secop

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

DESCRIPCION	38. No. INFORME MENSUAL	39. PERIODO	40. NOMBRE DEL ARCHIVO	41. FECHA DE CARGUE	42. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO	3	9/02/2025 - 8/03/2025	9198-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 3 PARTE 1	02/04/2025	
INFORME SOCIAL	N/A	N/A	N/A	02/04/2025	
INFORME AMBIENTAL	3	9/02/2025 - 8/03/2025	9198-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 3 PARTE 2	02/04/2025	
INFORME SST	3	9/02/2025 - 8/03/2025	9198-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 3 PARTE 3.1 y 3.2	02/04/2025	
INFORME DE SUPERVISION	3	9/02/2025 - 8/03/2025	9198-2024 CORTE GENERAL DE OBRA No. 2	21/03/2025	
ACTA PARCIAL	3	9/02/2025 - 8/03/2025	9198-2024 CORTE GENERAL DE OBRA No. 2	21/03/2025	
SOPORTE PAGO SDH	3	9/02/2025 - 8/03/2025	9198-2024 CORTE GENERAL DE OBRA No. 2	21/03/2025	
FACTURA	3	9/02/2025 - 8/03/2025	9198-2024 CORTE GENERAL DE OBRA No. 2	21/03/2025	
FORMATO MC 14	3	9/02/2025 - 8/03/2025			

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 05 días del mes de ABRIL del año 2025

Nombre: ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO
CONTRATISTA DE LA OBRA

MEBYS DE LA OSSA L.

Nombre: ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ
INTERVENTOR DE LA OBRA

Origin Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia Interventor
Copia Contratista

	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA OBRA	Código: FOR-GIF-020 Versión: 1 Fecha: Memo I2024037699 - 18/12/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN:	5	4	2025						
2. ACTA No.	3		3. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	3	MODIFICACIONES	2	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CASA POPULAR YANACONA MUKU KAWSAY			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:		TV 17B 77A 74 SUR			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9198-2024		7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024		8. VALOR CONTRATO:	$	2,354,314,500	
9. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	MARZO	2025	11. PLAZO:	3 MESES 21 DÍAS		Meses/días
12. PRORROGAS:	89 DÍAS		13. SUSPENSIONES:		Meses/días			14. ADICIONES:	$	-	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9221-2024		18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024		19. VALOR CONTRATO:	$	382,708,445	
20. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	15	ABRIL	2025	22. PLAZO:	4 MESES 15 DIAS		Meses/días
23. PRORROGAS:	104 DIAS		24. SUSPENSIONES:		Meses/días			25. ADICIONES:	$	98,026,043	
26. INTEVENTORÍA:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC										
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA										

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 5 días del mes de ABRIL del año 2025 se reunieron EL ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO representante legal del contratista y LA ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obray/o Modificaciones del mes de MARZO según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA				33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	PRELIMINARES				**$ 6,903,307.28**								
1.1	OBRAS PRELIMINARES												
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACIONES (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE CONSTRUCCION)	M2	156.24	$ 19,797.00	$ 3,093,083.28	144.00	$ 2,850,768.00			144.00	$ 2,850,768.00	144.00	$ 2,850,768
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL						$ -						
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	88.00	$ 43,298.00	$ 3,810,224.00	18.15	$ 785,858.70			18.15	$ 785,858.70	18.15	$ 785,859
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2		$ 21,662.00	$ 0.00	12.23	$ 264,926.26	12.23	$ 264,926.26	0.00	$ -	12.23	$ 264,926
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 3,688,940.00**								
5.1.71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	20.00	$ 184,447.00	$ 3,688,940.00		$ -			0.00	$ -	-	
5.1.74	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER	UN		$ 99,525.00	$ 0.00	20.00	$ 1,990,500.00			20.00	$ 1,990,500.00	20.00	$ 1,990,500
7	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 0.00**								
7.2.35	WIN DE ALUMINIO	M		$ 9,019.00	$ 0.00	62.86	$ 566,934.34			62.86	$ 566,934.34	62.86	$ 566,934
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 7,482,931.40**								
8.1.4	MURO EN LÁMINA FIBRO - CEMENTO 10 MM	M2	58.10	$ 128,794.00	$ 7,482,931.40	50.88	$ 6,553,038.72	-6.26	-$ 806,250.44	57.14	$ 7,359,289.16	50.88	$ 6,553,039
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 10,732,713.70**					0.00	$ -	-	
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -						
13.1.7	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	58.10	$ 25,832.00	$ 1,500,839.20	72.04	$ 1,860,937.28	14.90	$ 384,896.80	57.14	$ 1,476,040.48	72.04	$ 1,860,937
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -						
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	58.10	$ 21,505.00	$ 1,249,440.50	82.94	$ 1,783,624.70	25.80	$ 554,829.00	57.14	$ 1,228,795.70	82.94	$ 1,783,625
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 45,138.00	$ 0.00	0.00	$ -			0.00	$ -	-	
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -						
13.4.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M2		$ 26,869.00	$ 0.00	32.41	$ 870,824.29	32.41	$ 870,824.29	0.00	$ -	32.41	$ 870,824
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	202.00	$ 39,517.00	$ 7,982,434.00	270.60	$ 10,693,300.20	80.40	$ 3,177,166.80	190.20	$ 7,516,133.40	270.60	$ 10,693,300
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 40,570,913.88**					0.00	$ -	-	
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2		$ 137,076.00	$ 0.00		$ -			0.00	$ -	-	
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	156.24	$ 247,595.00	$ 38,684,242.80	179.40	$ 44,418,543.00			179.40	$ 44,418,543.00	179.40	$ 44,418,543
17.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSIÓN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	M2	26.964	$ 69,970.00	$ 1,886,671.08	10.40	$ 727,688.00			10.40	$ 727,688.00	10.40	$ 727,688
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL		0	$ -	**$ 1,210,950.00**					0.00	$ -	-	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	230	$ 5,265.00	$ 1,210,950.00	287.40	$ 1,513,161.00	63.40	$ 333,801.00	224.00	$ 1,179,360.00	287.40	$ 1,513,161
34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO					$ 70,589,756.26		$ 74,880,104.49		$ 4,780,193.71		$ 70,099,910.78		$ 74,880,104.49

35. DESCRIPCIÓN	36. VALOR CONTRACTUAL					
ADMINISTRACIÓN	25.64%	$ 18,099,213.51	$ 19,199,258.79	$ 1,225,641.67	$ 17,973,617.12	$ 19,199,258.79
IMPREVISTO	0.50%	$ 352,948.78	$ 374,400.52	$ 23,900.97	$ 350,499.55	$ 374,400.52
UTILIDAD	3.00%	$ 2,117,692.69	$ 2,246,403.13	$ 143,405.81	$ 2,102,997.32	$ 2,246,403.13
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)		$ 20,569,854.98	$ 21,820,062.44	$ 1,392,948.45	$ 20,427,113.99	$ 21,820,062.44
ANTICIPO	0%	$ -	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	0%	$ -	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
AJUSTE AL PESO		$ (0.24)	$ 0.07	-$ 0.16	$ 0.23	$ 0.07
37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO		$ 91,159,611.00	$ 96,700,167.00	$ 6,173,142.00	$ 90,527,025.00	$ 96,700,167.00

100.00%

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA OBRA	Código: FOR-GIF-020 Versión: 1 Fecha: Memo I2024037699 - 18/12/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN:	5	4	2025								
2. ACTA No.	3		3. TIPO DE ACTA PARCIAL:			RECIBO PARCIAL DE OBRA	3	MODIFICACIONES	2		
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CASA POPULAR YANACONA MUKU KAWSAY			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:		TV 17B 77A 74 SUR					
A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO											
6. CONTRATO OBRA No:	9198-2024		7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024		8. VALOR CONTRATO:	$	2,354,314,500	
9. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	MARZO	2	2025	11. PLAZO:	3 MESES 21 DÍAS	Meses/días
12. PRORROGAS:	89 DÍAS		13. SUSPENSIONES:		Meses/días				14. ADICIONES:	$	-
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9221-2024		18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024		19. VALOR CONTRATO:	$	382,708,445	
20. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	15	ABRIL	4	2025	22. PLAZO:	4 MESES 15 DIAS	Meses/días
23. PRORROGAS:	104 DIAS		24. SUSPENSIONES:		Meses/días				25. ADICIONES:	$	98,026,043
26. INTEVENTORÍA:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC										
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA										

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 5 días del mes de ABRIL del año 2025 se reunieron EL ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO representante legal del contratista y LA ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra/o Modificaciones del mes de MARZO según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA				33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR

C. OBSERVACIONES

La informacion reportada corresponde a los informes aprobados por la intrventoria y cargados en el secop

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

DESCRIPCION	38. No. INFORME MENSUAL	39. PERIODO	40. NOMBRE DEL ARCHIVO	41. FECHA DE CARGUE	42. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO	3	9/02/2025 - 8/03/2025	9198-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 3 PARTE 1	02/04/2025	
INFORME SOCIAL	N/A	N/A	N/A	02/04/2025	
INFORME AMBIENTAL	3	9/02//2025 - 8/03/2025	9198-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 3 PARTE 2	02/04/2025	
INFORME SST	3	9/02//2025 - 8/03/2025	9198-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 3 PARTE 3.1 y 3.2	02/04/2025	
INFORME DE SUPERVISION	3	9/02//2025 - 8/03/2025	9198-2024 CORTE GENERAL DE OBRA No. 2	21/03/2025	
ACTA PARCIAL	3	9/02//2025 - 8/03/2025	9198-2024 CORTE GENERAL DE OBRA No. 2	21/03/2025	
SOPORTE PAGO SDH	3	9/02//2025 - 8/03/2025	9198-2024 CORTE GENERAL DE OBRA No. 2	21/03/2025	
FACTURA	3	9/02//2025 - 8/03/2025	9198-2024 CORTE GENERAL DE OBRA No. 2	21/03/2025	
FORMATO MC 14	3	9/02//2025 - 8/03/2025			

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 05 días del mes de ABRIL del año 2025

Nombre: ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO
CONTRATISTA DE LA OBRA

MEBYS DE LA OSSA L.

Nombre: ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ
INTERVENTOR DE LA OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA OBRA	Código: FOR-GIF-020 Versión: 1 Fecha: Memo I2024037699 - 18/12/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN:	5	4	2025												
2. ACTA No.	3			3. TIPO DE ACTA PARCIAL:						RECIBO PARCIAL DE OBRA	3	MODIFICACIONES	2		
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR SIERRA MORENA					5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:				TV 60 73C 07 SUR					
A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO															
6. CONTRATO OBRA No:	9198-2024			7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024			8. VALOR CONTRATO:	$ 2,354,314,500	##			
9. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	MARZO	2	2025		11. PLAZO:	3 MESES 21 DÍAS	Meses/días	##		
12. PRORROGAS:	89 DÍAS			13. SUSPENSIONES:		Meses/días				14. ADICIONES:	$ -				
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO														
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL														
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9221-2024			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024			19. VALOR CONTRATO:	$ 382,708,445				
20. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	15	ABRIL	4	2025		22. PLAZO:	4 MESES 15 DIAS	Meses/días			
23. PRORROGAS:	104 DIAS			24. SUSPENSIONES:		Meses/días				25. ADICIONES:	$ 98,026,043				
26. INTEVENTORÍA:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC														
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA														

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 5 días del mes de ABRIL del año 2025 se reunieron EL ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO representante legal del contratista y LA ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra/o Modificaciones del mes de MARZO según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	PRELIMINARES				**$ 11,364,335.27**								
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL					0.00	$ -						
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	120.00	$ 43,298.00	$ 5,195,760.00	19.93	$ 862,929.14	9.73	$ 421,289.54	10.20	$ 441,639.60	19.93	$ 862,929
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS					0.00	$ -						
1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	136.00	$ 27,519.00	$ 3,742,584.00	144.30	$ 3,970,991.70	77.44	$ 2,131,071.36	66.86	$ 1,839,920.34	144.30	$ 3,970,992
1.3.3	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, ETC, CORRIDOS, POYOS, MESONES, PREFABRICADOS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	7.80	$ 32,197.00	$ 251,136.60	8.01	$ 257,897.97	8.01	$ 257,897.97	0.00	$ -	8.01	$ 257,898
1.3.4	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3.06	$ 10,672.00	$ 32,656.32	13.89	$ 148,234.08	13.89	$ 148,234.08	0.00	$ -	13.89	$ 148,234
1.3.5	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	39.00	$ 21,344.00	$ 832,416.00	20.00	$ 426,880.00	16.00	$ 341,504.00	4.00	$ 85,376.00	20.00	$ 426,880
1.3.7	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO VIDRIO Y REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	7.66	$ 18,347.00	$ 140,538.02	1.54	$ 28,254.38	1.54	$ 28,254.38	0.00	$ -	1.54	$ 28,254
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	61.77	$ 18,929.00	$ 1,169,244.33	82.37	$ 1,559,181.73	51.27	$ 970,489.83	31.10	$ 588,691.90	82.37	$ 1,559,182
1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS)	UN		$ 18,691.00	$ 0.00	33.00	$ 616,803.00	33.00	$ 616,803.00	0.00	$ -	33.00	$ 616,803
1.3.26	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.35M (POR LAS 4 CARAS). INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS	M		$ 26,470.00	$ 0.00	12.60	$ 333,522.00	12.60	$ 333,522.00	0.00	$ -	12.60	$ 333,522
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0.00	$ -	**$ 34,672,732.40**	0.00	$ -			0.00	$ -	-	
3.1.3	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 17,799.00	$ 0.00	100.50	$ 1,788,799.50	100.50	$ 1,788,799.50	0.00	$ -	100.50	$ 1,788,800
3.2.9	REEMBOQUILLADO DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA O ADOQUIN CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M		$ 26,449.00	$ 0.00	176.20	$ 4,660,313.80	176.20	$ 4,660,313.80	0.00	$ -	176.20	$ 4,660,314
3.2.11	EMBOQUILLADO DE LADRILLO A LA VISTA EN ALTURA MENOR A 1.50 M	M2		$ 7,718.00	$ 0.00		$ -	0	$ 0	0.00	$ -	-	
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			$ -		0.00	$ -	0.00	$ 0.00	0.00	$ -	-	
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	1289.80	$ 21,662.00	$ 27,939,647.60	754.34	$ 16,340,513.08	413.80	$ 8,963,735.60	340.54	$ 7,376,777.48	754.34	$ 16,340,513
3.2.19	MESÓN EN GRANITO NATURAL ANCHO MENOR O IGUAL A 80CM - INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M	7.80	$ 863,216.00	$ 6,733,084.80	8.01	$ 6,914,360.16	8.01	$ 6,914,360.16	0.00	$ -	8.01	$ 6,914,360
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0.00	$ -	**$ 8,816,976.00**	0.00	$ -			0.00	$ -	-	
4.1	TUBERIA		0.00	$ -		0.00	$ -	0.00	$ 0.00	0.00	$ -	-	
4.1.81	INSTALACION DE SANITARIO, INCLUYE LOS ACCESORIOS	UN	21.00	$ 419,856.00	$ 8,816,976.00	11.00	$ 4,618,416.00	11.00	$ 4,618,416.00	0.00	$ -	11.00	$ 4,618,416
4.1.82	INSTALACION DE LAVAMANOS, INCLUYE LOS ACCESORIOS	UN		$ 124,694.00	$ 0.00	6.00	$ 748,164.00	6.00	$ 748,164.00	0.00	$ -	6.00	$ 748,164
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0.00	$ -	**$ 2,713,056.00**	0.00	$ -			0.00	$ -	-	
5.1,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO PARA INSTALACIÓN EN TECHO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	UN		$ 255,601.00	$ 0.00	3.00	$ 766,803.00	3.00	$ 766,803.00	0.00	$ -	3.00	$ 766,803
5.1,13	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 347,467.00	$ 0.00	3.00	$ 1,042,401.00	3.00	$ 1,042,401.00	0.00	$ -	3.00	$ 1,042,401
5.1.71.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CIRCULAR DE 24 W. 11" INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	59.00	$ 45,984.00	$ 2,713,056.00	0.00	$ -	0.00	$ 0.00	0.00	$ -	-	
5.1.97	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA LED DE 18 W INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 47,671.00	$ 0.00	69.00	$ 3,289,299.00	69.00	$ 3,289,299.00	0.00	$ -	69.00	$ 3,289,299
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0.00	$ -	**$ 21,641,952.00**	0.00	$ -			0.00	$ -	-	
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					0.00	$ -	0.00	$ 0.00				
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	M2	136.00	$ 41,523.00	$ 5,647,128.00	144.30	$ 5,991,768.90	77.44	$ 3,215,541.12	66.86	$ 2,776,227.78	144.30	$ 5,991,769
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					0.00	$ -	0.00	$ 0.00				
7.2.16	CINTA ANTIDESLIZANTE A = 2 CM	M		$ 3,594.00	$ 0.00	100.00	$ 359,400.00	100.00	$ 359,400.00	0.00	$ -	100.00	$ 359,400
7.2.17	PISO EN DUROPISO 33.8 X 33.8 CMS, ANTIDESLIZANTE E= 5 MM TIPO TRAFICO PESADO	M2		$ 70,927.00	$ 0.00	48.13	$ 3,413,716.51	0.00	$ 0.00	48.13	$ 3,413,716.51	48.13	$ 3,413,717
7.2.18	PISO CERAMICA ANTIDESLIZANTE, REFERENCIA MIKONOS FORMATO 33 X 33 (COLORES VARIOS)	M2	136.00	$ 117,609.00	$ 15,994,824.00	96.18	$ 11,311,633.62	96.18	$ 11,311,633.62	0.00	$ -	96.18	$ 11,311,634
7.2.40	GUARDAESCOBA EN DUROPISO DE 8 A 10 CM DE ALTO	M		$ 20,496.00	$ 0.00	24.57	$ 503,586.72	0.00	$ 0.00	24.57	$ 503,586.72	24.57	$ 503,587
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0.00	$ -	**$ 9,023,894.48**	0.00	$ -			0.00	$ -	-	
8.1.2	ENCHAPE 25 X 35	M2	71.78	$ 125,716.00	$ 9,023,894.48	13.89	$ 1,746,195.24	13.89	$ 1,746,195.24	0.00	$ -	13.89	$ 1,746,195
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 0.00**	0.00	$ -						
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2		$ 439,181.00	$ 0.00	0.00	$ -	0.00	$ 0.00	0.00	$ -	-	

	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA OBRA	Código: FOR-GIF-020 Versión: 1 Fecha: Memo I2024037699 - 18/12/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN:	5	4	2025															
2. ACTA No.	3			3. TIPO DE ACTA PARCIAL:								RECIBO PARCIAL DE OBRA	3	MODIFICACIONES	2			
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR SIERRA MORENA						5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:					TV 60 73C 07 SUR						
A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO																		
6. CONTRATO OBRA No:	9198-2024			7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024				8. VALOR CONTRATO:	$ 2,354,314,500	##					
9. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	MARZO	2	2025			11. PLAZO:	3 MESES 21 DÍAS	Meses/días	##				
12. PRORROGAS:	89 DÍAS			13. SUSPENSIONES:		Meses/días					14. ADICIONES:	$ -						
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO																	
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL																	
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9221-2024			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024				19. VALOR CONTRATO:	$ 382,708,445						
20. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	15	ABRIL	4	2025			22. PLAZO:	4 MESES 15 DIAS	Meses/días					
23. PRORROGAS:	104 DIAS			24. SUSPENSIONES:		Meses/días					25. ADICIONES:	$ 98,026,043						
26. INTEVENTORÍA:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC																	
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA																	

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 5 días del mes de ABRIL del año 2025 se reunieron EL ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO representante legal del contratista y LA ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra/o Modificaciones del mes de MARZO según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
9.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, INCLUYE TORNILLOS, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.	M2	0.00	$ 227,408.00	$ 0.00	0.00	$ -	0.00	$ 0.00	0.00	$ -	-	
9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2		$ 142,958.00	$ 0.00	4.34	$ 620,437.72	4.34	$ 620,437.72	0.00	$ -	4.34	$ 620,438
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0.00	$ -	**$ 20,101,338.00**	0.00	$ -			0.00	$ -	-	
11.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE INCRUSTAR COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA Y GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	18.00	$ 705,542.00	$ 12,699,756.00	1.00	$ 705,542.00	1.00	$ 705,542.00	0.00	$ -	1.00	$ 705,542
11.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN		$ 408,380.00	$ 0.00	1.00	$ 408,380.00	1.00	$ 408,380.00	0.00	$ -	1.00	$ 408,380
11.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLADORES TIPO CUELLO DE GANSO DE 8" SENCILLOS PARA LAVAPLATOS	UN		$ 197,730.00	$ 0.00	2.00	$ 395,460.00	2.00	$ 395,460.00	0.00	$ -	2.00	$ 395,460
11.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 5" A 4"	UN		$ 33,334.00	$ 0.00	1.00	$ 33,334.00	1.00	$ 33,334.00	0.00	$ -	1.00	$ 33,334
11.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PEDAL PARA LAVAMANOS O LAVAPLATOS	UN	18.00	$ 411,199.00	$ 7,401,582.00	19.00	$ 7,812,781.00	19.00	$ 7,812,781.00	0.00	$ -	19.00	$ 7,812,781
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0.00	$ -	**$ 50,168,106.82**	0.00	$ -			0.00	$ -	-	
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					0.00	$ -	0.00	$ 0.00				
13.1.2	PAÑETE MURO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	21.78	$ 78,779.00	$ 1,715,806.62	16.20	$ 1,276,219.80	16.20	$ 1,276,219.80	0.00	$ -	16.20	$ 1,276,220
13,1,7	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 25,832.00	$ 0.00	15.12	$ 390,579.84	15.12	$ 390,579.84	0.00	$ -	15.12	$ 390,580
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					0.00	$ -	0.00	$ 0.00				
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1174.80	$ 10,754.00	$ 12,633,799.20	1058.25	$ 11,380,420.50	451.11	$ 4,851,236.94	607.14	$ 6,529,183.56	1,058.25	$ 11,380,421
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2		$ 20,469.00	$ 0.00	174.91	$ 3,580,232.79	174.91	$ 3,580,232.79	0.00	$ -	174.91	$ 3,580,233
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 21,505.00	$ 0.00	317.94	$ 6,837,299.70	317.94	$ 6,837,299.70	0.00	$ -	317.94	$ 6,837,300
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	639.50	$ 45,138.00	$ 28,865,751.00	563.66	$ 25,442,485.08	255.45	$ 11,530,502.10	308.21	$ 13,911,982.98	563.66	$ 25,442,485
13.2.8	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 14,653.00	$ 0.00	118.89	$ 1,742,095.17	118.89	$ 1,742,095.17	0.00	$ -	118.89	$ 1,742,095
13.2.9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA PISO TRÁFICO PESADO	M2		$ 54,958.00	$ 0.00	5.91	$ 324,801.78	5.91	$ 324,801.78	0.00	$ -	5.91	$ 324,802
13.2.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECUBRIMIENTO ANTIGRAFFITI A DOS MANOS	M2	350.00	$ 19,865.00	$ 6,952,750.00			0.00	$ 0.00	0.00	$ -	-	
13.4.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS A DOS MANOS Y DOS CARAS	M2		$ 43,779.00	$ 0.00	6.65	$ 291,130.35	6.65	$ 291,130.35	0.00	$ -	6.65	$ 291,130
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 39,517.00	$ 0.00	22.98	$ 908,100.66	22.98	$ 908,100.66	0.00	$ -	22.98	$ 908,101
14	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0.00	$ -	**$ 8,256,425.28**	0.00	$ -			0.00	$ -	-	
14.1.3	CIELORASO EN LAMINA DE YESO DE 1/2" ST (Incluyendo todo lo necesario para su correcta instalación)	M2		$ 146,993.00	$ 0.00	50.25	$ 7,386,398.25	50.25	$ 7,386,398.25	0.00	$ -	50.25	$ 7,386,398
14.1.8	CIELORASO PLANO DRYWALL ANTIHUMEDAD 1/2" (Incluyendo todo lo necesario para su correcta instalación)	M2	61.77	$ 133,664.00	$ 8,256,425.28	32.12	$ 4,293,287.68	1.02	$ 136,337.28	31.10	$ 4,156,950.40	32.12	$ 4,293,288
15	CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0.00	$ -	**$ 1,137,257.22**	0.00	$ -			0.00	$ -	-	
15.2	VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0.00	$ -		0.00		0.00	$ 0.00	0.00	$ -	-	
15.2.2	VIDRIOS INCOLOROS DE 4 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD EN AMBAS CARAS	M2	7.66	$ 148,467.00	$ 1,137,257.22	0.00	$ -	0.00	$ 0.00	0.00	$ -	-	
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0.00	$ -	**$ 23,659,413.03**	0.00	$ -			0.00	$ -	-	
17.1.6	DOMO EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 5 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	107.47	$ 220,149.00	$ 23,659,413.03			0.00	$ 0.00	0.00	$ -	-	
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL		0.00	$ -	**$ 3,949,487.10**	0.00	$ -			0.00	$ -	-	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	750.14	$ 5,265.00	$ 3,949,487.10	1189.01	$ 6,260,137.65	1189.01	$ 6,260,137.65	0.00	$ -	1,189.01	$ 6,260,138
21	PRECIOS NO PREVISTOS		0.00	#¡REF!	**$ 0.00**					0.00		#¡REF!	
NP 001	DESMONTE, INSTALACION Y CERTIFICACION DE PUNTOS DE ANCLAJE PARA TRABAJO EN ALTURAS	UN		$ 382,772.00	$ 0.00	35.00	$ 13,397,020.00	35	$ 13,397,020	0.00	$ -	35.00	$ 13,397,020.00
NP 002	MANTENIMIENTO GENERAL DE CARPINTERIA, INCLUYE DESMONTE, REPARACION, AJUSTES NECESARIOS, MASILLA, GRADUACION DE CERRADURAS, INCLUYE TRANSPORTE EN CASO DE REQUERIRSE, NO INCLUYE PINTURA, NI CAMBIO DE CERRADURAS NI BRAZOS ESPECIALES.	m2		$ 246,667.00	$ 0.00	49.23	$ 12,143,416.41	41.49	$ 10,234,213.83	7.74	$ 1,909,202.58	49.23	$ 12,143,416.41
34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO					$ 195,504,973.60		$ 177,329,624.91		$ 133,796,369.06		$ 43,533,255.85		$ 177,329,624.91

35. DESCRIPCIÓN	36. VALOR CONTRACTUAL				
ADMINISTRACIÓN	25.64%	$ 50,127,475.23	$ 45,467,315.83	$ 34,305,389.03	$ 11,161,926.80	$ 45,467,315.83
IMPREVISTO	0.50%	$ 977,524.87	$ 886,648.12	$ 668,981.85	$ 217,666.28	$ 886,648.13
UTILIDAD	3.00%	$ 5,865,149.21	$ 5,319,888.75	$ 4,013,891.07	$ 1,305,997.68	$ 5,319,888.75
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)		$ 56,970,149.31	$ 51,673,852.70	$ 38,988,261.95	$ 12,685,590.76	$ 51,673,852.71
ANTICIPO	0%	$ -	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	0%	$ -	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
AJUSTE AL PESO		$ 0.09	$ 0.39	-$ 0.01	$ 0.39	$ 0.38
37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO		$ 252,475,123.00	$ 229,003,478.00	$ 172,784,631.00	$ 56,218,847.00	$ 229,003,478.00

100.00%

	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA OBRA	Código: FOR-GIF-020 Versión: 1 Fecha: Memo I2024037699 - 18/12/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN:	5	4	2025								
2. ACTA No.	3		3. TIPO DE ACTA PARCIAL:			RECIBO PARCIAL DE OBRA	3	MODIFICACIONES	2		
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR SIERRA MORENA			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:			TV 60 73C 07 SUR				

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9198-2024		7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024		8. VALOR CONTRATO:	$ 2,354,314,500	##	
9. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	MARZO	2025	11. PLAZO:	3 MESES 21 DÍAS	Meses/días	##
12. PRORROGAS:	89 DÍAS		13. SUSPENSIONES:		Meses/días			14. ADICIONES:	$ -		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9221-2024		18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024		19. VALOR CONTRATO:	$ 382,708,445		
20. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	15	ABRIL	2025	22. PLAZO:	4 MESES 15 DIAS	Meses/días	
23. PRORROGAS:	104 DIAS		24. SUSPENSIONES:		Meses/días			25. ADICIONES:	$ 98,026,043		
26. INTEVENTORÍA:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC										
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA										

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 5 días del mes de ABRIL del año 2025 se reunieron EL ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO representante legal del contratista y LA ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra/o Modificaciones del mes de MARZO según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR

C. OBSERVACIONES

La informacion reportada corresponde a los informes aprobados por la intrventoria y cargados en el secop

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

DESCRIPCION	38. No. INFORME MENSUAL	39. PERIODO	40. NOMBRE DEL ARCHIVO	41. FECHA DE CARGUE	42. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO	3	9/02/2025 - 8/03/2025	9198-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 3 PARTE 1	02/04/2025	
INFORME SOCIAL	N/A	N/A	N/A	02/04/2025	
INFORME AMBIENTAL	3	9/02//2025 - 8/03/2025	9198-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 3 PARTE 2	02/04/2025	
INFORME SST	3	9/02//2025 - 8/03/2025	9198-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 3 PARTE 3.1 y 3.2	02/04/2025	
INFORME DE SUPERVISION	3	9/02//2025 - 8/03/2025	9198-2024 CORTE GENERAL DE OBRA No. 2	21/03/2025	
ACTA PARCIAL	3	9/02//2025 - 8/03/2025	9198-2024 CORTE GENERAL DE OBRA No. 2	21/03/2025	
SOPORTE PAGO SDH	3	9/02//2025 - 8/03/2025	9198-2024 CORTE GENERAL DE OBRA No. 2	21/03/2025	
FACTURA	3	9/02//2025 - 8/03/2025	9198-2024 CORTE GENERAL DE OBRA No. 2	21/03/2025	
FORMATO MC 14	3	9/02//2025 - 8/03/2025			

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 05 días del mes de ABRIL del año 2025

Nombre: ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO
CONTRATISTA DE LA OBRA

MEBYS DE LA OSSA L.

Nombre: ING. MEBYS DE LA OSSA LÓPEZ
INTERVENTOR DE LA OBRA

Origin Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia Interventor
Copia Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN: 5 | 4 | 2025

2. ACTA No. 3 | 3. TIPO DE ACTA PARCIAL: | RECIBO PARCIAL DE OBRA 3 | MODIFICACIONES 2

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR BELLA FLOR | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: KR 27A BIS 73 14 SUR

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No: 9198-2024 | 7. FECHA CONTRATO: 19 | 11 | 2024 | 8. VALOR CONTRATO: $ 2,354,314,500

9. FECHA ACTA INICIO: 9 | 12 | 2024 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: 31 | MARZO | 2 | 2025 | 11. PLAZO: 3 MESES 21 DÍAS Meses/días

12. PRORROGAS: 89 DÍAS | 13. SUSPENSIONES: Meses/días | 14. ADICIONES: $ -

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

16. CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

17. CONTRATO INTEVENTORIA No: 9221-2024 | 18. FECHA CONTRATO: 26 | 11 | 2024 | 19. VALOR CONTRATO: $ 382,708,445

20. FECHA ACTA INICIO: 9 | 12 | 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: 15 | ABRIL | 4 | 2025 | 22. PLAZO: 4 MESES 15 DIAS Meses/días

23. PRORROGAS: 104 DIAS | 24. SUSPENSIONES: Meses/días | 25. ADICIONES: $ 98,026,043

26. INTEVENTORÍA: COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC

27. SUPERVISOR SDIS: JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 5 días del mes de ABRIL del año 2025 se reunieron EL ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO representante legal del contratista y LA ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obray/o Modificaciones del mes de MARZO según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	PRELIMINARES				**$ 2,032,579.00**								
1.1	OBRAS PRELIMINARES												
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACIONES (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE CONSTRUCCION)	M2	13.00	$ 19,797.00	$ 257,361.00	18.90	$ 374,163.30	18.90	$ 374,163.30			18.90	$ 374,163
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL			$ -			$ -					-	
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	41.00	$ 43,298.00	$ 1,775,218.00	0.00	$ -					-	
1.3.7	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO VIDRIO Y REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 18,347.00	$ 0.00	3.03	$ 55,591.41	3.03	$ 55,591.41			3.03	$ 55,591
1.3.46	PICADO DE MUROS DE MAMPOSTERÍA. INCLUYE DISPOSICIÓN Y RETIRO DE MATERIAL	M2		$ 9,474.00	$ 0.00	264.19	$ 2,502,936.06	264.19	$ 2,502,936.06			264.19	$ 2,502,936
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 37,539,989.24**								
3.1	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
3.1.3	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	213.06	$ 17,799.00	$ 3,792,254.94	248.68	$ 4,426,255.32	248.68	$ 4,426,255.32			248.68	$ 4,426,255
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					0.00	$ -						
3.2.9	REEMBOQUILLADO DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA O ADOQUIN CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	ML	213.06	$ 26,449.00	$ 5,635,223.94	32.03	$ 847,161.47	32.03	$ 847,161.47			32.03	$ 847,161
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	1297.78	$ 21,662.00	$ 28,112,510.36	721.84	$ 15,636,498.08	721.84	$ 15,636,498.08			721.84	$ 15,636,498
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ 274,986.00	**$ 0.00**							-	
5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 267,457.00	$ 0.00	0.00	$ -					-	
5.1.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M		$ 49,725.00	$ 0.00	3.38	$ 168,070.50	3.38	$ 168,070.50			3.38	$ 168,070.50
5.1.65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 353,778.00	$ 0.00	2.00	$ 707,556.00	2.00	$ 707,556.00			2.00	$ 707,556.00
5.1.71.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 65,387.00	$ 0.00	2.00	$ 130,774.00	2.00	$ 130,774.00			2.00	$ 130,774.00
5.1.71.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CIRCULAR DE 24 W. 11" INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 45,984.00	$ 0.00	4.00	$ 183,936.00	4.00	$ 183,936.00			4.00	$ 183,936.00
5.1.74	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER	UN		$ 99,525.00	$ 0.00	1.00	$ 99,525.00	1.00	$ 99,525.00			1.00	$ 99,525.00
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 1,000,290.90**								
7.2.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM	M		$ 25,938.00	$ 0.00	3.01	$ 78,073.38	3.01	$ 78,073.38			3.01	$ 78,073
7.2.34	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS EN ALTURA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ANDAMIOS CERTIFICADOS.	M		$ 26,250.00	$ 0.00	64.37	$ 1,689,712.50	64.37	$ 1,689,712.50			64.37	$ 1,689,713
7.2.40	GUARDAESCOBA EN DUROPISO DE 8 A 10 CM DE ALTO	M		$ 20,496.00	$ 0.00	10.82	$ 221,766.72	10.82	$ 221,766.72			10.82	$ 221,767
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 1,000,290.90**								
8.1.2	ENCHAPE 25 X 35	M2		$ 125,716.00	$ 0.00	13.85	$ 1,741,166.60	13.85	$ 1,741,166.60			13.85	$ 1,741,167
8.1.3	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E = 10CM, INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	6.86	$ 145,815.00	$ 1,000,290.90	15.45	$ 2,252,841.75	15.45	$ 2,252,841.75			15.45	$ 2,252,842
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 5,185,213.55**								
9.1	CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					0.00	$ -						
9.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE POMO METÁLICA, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	1.68	$ 330,393.00	$ 555,060.24	0.00	$ -					-	
9.2	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					0.00	$ -						
9.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO SIN BATIENTES, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	0.48	$ 439,181.00	$ 210,806.88	3.03	$ 1,330,718.43	3.03	$ 1,330,718.43			3.03	$ 1,330,718
9.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2		$ 231,307.00	$ 0.00	5.56	$ 1,286,066.92	5.56	$ 1,286,066.92			5.56	$ 1,286,067
9.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, INCLUYE TORNILLOS, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.	M2		$ 227,408.00	$ 0.00	0	$ -					-	
9.3	OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			$ -		0.00	$ -					-	

1. FECHA ELABORACIÓN:	5	4	2025								
2. ACTA No.	3		3. TIPO DE ACTA PARCIAL:			RECIBO PARCIAL DE OBRA	3	MODIFICACIONES	2		
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR BELLA FLOR			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:			KR 27A BIS 73 14 SUR				

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9198-2024		7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024		8. VALOR CONTRATO:	$	2,354,314,500	
9. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	MARZO	2025	11. PLAZO:	3 MESES 21 DÍAS	Meses/días	
12. PRORROGAS:	89 DÍAS		13. SUSPENSIONES:		Meses/días			14. ADICIONES:	$	-	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9221-2024		18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024		19. VALOR CONTRATO:	$	382,708,445	
20. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	15	ABRIL	2025	22. PLAZO:	4 MESES 15 DIAS	Meses/días	
23. PRORROGAS:	104 DIAS		24. SUSPENSIONES:		Meses/días			25. ADICIONES:	$	98,026,043	
26. INTEVENTORÍA:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC										
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA										

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 5 días del mes de ABRIL del año 2025 se reunieron EL ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO representante legal del contratista y LA ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obray/o Modificaciones del mes de MARZO según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)		
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2	30.9136	$ 142,958.00	$ 4,419,346.43	1.44	$ 205,859.52	1.44	$ 205,859.52			1.44	$ 205,860	
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 62,941,332.80**									
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					0.00	$ -							
13.1.2	PAÑETE MURO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 78,779.00	$ 0.00	329.31	$ 25,942,712.49	329.31	$ 25,942,712.49			329.31	$ 25,942,712	
13.1.7	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	348.562	$ 25,832.00	$ 9,004,053.58	106.84	$ 2,759,890.88	106.84	$ 2,759,890.88			106.84	$ 2,759,891	
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					0.00	$ -							
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1531.14	$ 10,754.00	$ 16,465,879.56	1023.86	$ 11,010,590.44	1023.86	$ 11,010,590.44			1,023.86	$ 11,010,590	
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2		$ 20,469.00	$ 0.00	121.18	$ 2,480,433.42	121.18	$ 2,480,433.42			121.18	$ 2,480,433	
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	548.56	$ 21,505.00	$ 11,796,782.80	362.03	$ 7,785,455.15	362.03	$ 7,785,455.15			362.03	$ 7,785,455	
13.2.4	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 11,796.00	$ 0.00	267.79	$ 3,158,850.84	267.79	$ 3,158,850.84			267.79	$ 3,158,851	
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	416.97	$ 45,138.00	$ 18,821,191.86	469.35	$ 21,185,520.30	469.35	$ 21,185,520.30			469.35	$ 21,185,520	
13.2.8	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 14,653.00	$ 0.00	86.42	$ 1,266,312.26	86.42	$ 1,266,312.26			86.42	$ 1,266,312	
13.2.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE RECUBRIMIENTO ANTIGRAFFITI A DOS MANOS	M2	345.00	$ 19,865.00	$ 6,853,425.00		$ -					-		
14	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 0.00**									
14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORASO FALSO EN PANEL SUPERBOARD DE 6 MM - INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA MASILLA Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	M2		$ 272,113.00	$ 0.00	6.62	$ 1,801,388.06	6.62	$ 1,801,388.06			6.62	$ 1,801,388	
14.1.4	TAPALUCES DE CUBIERTA EN LÁMINA DE SUPERBOARD 6 MM UNA CARA. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M		$ 57,761.00	$ 0.00	33.85	$ 1,955,209.85	33.85	$ 1,955,209.85			33.85	$ 1,955,210	
15	CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 0.00**									
15.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANDBLASTING COLOR OPAL SÓLIDO O TIPO PERSIANA (AMBAS CARAS)	M2		$ 76,779.00	$ 0.00	19.22	$ 1,475,692.38	19.22	$ 1,475,692.38			19.22	$ 1,475,692	
15.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VINILO ADHESIVO TIPO SANBLASTING CORTADO EN PLOTTER INSTALADO	M2		$ 40,834.00	$ 0.00	8.18	$ 334,022.12	8.18	$ 334,022.12			8.18	$ 334,022	
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 3,377,839.20**									
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M		$ 51,981.00	$ 0.00	9.00	$ 467,829.00	9.00	$ 467,829.00			9.00	$ 467,829	
17.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 67,966.00	$ 0.00	3.00	$ 203,898.00	3.00	$ 203,898.00			3.00	$ 203,898.00	
17.1.17	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CERCHA PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M		$ 95,801.00	$ 0.00	5.72	$ 547,981.72	5.72	$ 547,981.72			5.72	$ 547,982	
17.1.18	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	12.90	$ 61,523.00	$ 793,646.70	17.20	$ 1,058,195.60	17.2	$ 1,058,195.60			17.20	$ 1,058,196	
17.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	12.90	$ 200,325.00	$ 2,584,192.50		$ -					-		
17.1.24,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 205,696.00	$ 0.00	18.90	$ 3,887,654.40	18.9	$ 3,887,654.40			18.90	$ 3,887,654	
17.1.30	CANAL AMAZONA	M		$ 67,966.00	$ 0.00	9.00	$ 611,694.00	9.00	$ 611,694.00			9.00	$ 611,694.00	
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				**$ 4,501,048.50**									
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	854.9	$ 5,265.00	$ 4,501,048.50	1157.74	$ 6,095,501.10	1157.74	$ 6,095,501.10			1,157.74	$ 6,095,501	
21	PRECIOS NO PREVISTOS				**$ 0.00**									#
NP 001	DESMONTE, INSTALACION Y CERTIFICACION DE PUNTOS DE ANCLAJE PARA TRABAJO EN ALTURAS	UN		$ 382,772.00	$ 0.00	24.00	$ 9,186,528.00	24	$ 9,186,528.00			24.00	$ 9,186,528.00	#
34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO					$ 117,078,438.64		$ 137,154,032.97		$ 137,154,032.97		$ 0		$ 137,154,032.97	
35. DESCRIPCIÓN		**36. VALOR CONTRACTUAL**												
ADMINISTRACIÓN		25.64%			$ 30,018,911.67		$ 35,166,294.05		$ 35,166,294.05		$ 0.00		$ 35,166,294.05	
IMPREVISTO		0.50%			$ 585,392.19		$ 685,770.16		$ 685,770.16		$ 0.00		$ 685,770.16	
UTILIDAD		3.00%			$ 3,512,353.16		$ 4,114,620.99		$ 4,114,620.99		$ 0.00		$ 4,114,620.99	
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)					$ 34,116,657.02		$ 39,966,685.20		$ 39,966,685.20		$ 0.00		$ 39,966,685.20	
ANTICIPO		0%			$ -		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO		0%			$ -		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	
AJUSTE AL PESO					$ 0.17		-$ 0.17		$ 0.00		$ 0.00		-$ 0.17	
37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO					$ 151,195,095.83		$ 177,120,718.00		$ 177,120,718.00		$ 0.00		$ 177,120,718.00	

	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA OBRA	Código: FOR-GIF-020 Versión: 1 Fecha: Memo I2024037699 - 18/12/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN:	5	4	2025										
2. ACTA No.	3		3. TIPO DE ACTA PARCIAL:				RECIBO PARCIAL DE OBRA	3	MODIFICACIONES	2			
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR BELLA FLOR			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:			KR 27A BIS 73 14 SUR						

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9198-2024		7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024			8. VALOR CONTRATO:	$	2,354,314,500		
9. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:		31	MARZO	2025	11. PLAZO:	3 MESES 21 DÍAS	Meses/días		
12. PRORROGAS:	89 DÍAS		13. SUSPENSIONES:			Meses/días			14. ADICIONES:	$	-		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO												
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL												
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9221-2024		18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024			19. VALOR CONTRATO:	$	382,708,445		
20. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:		15	ABRIL	2025	22. PLAZO:	4 MESES 15 DIAS	Meses/días		
23. PRORROGAS:	104 DIAS		24. SUSPENSIONES:			Meses/días			25. ADICIONES:	$	98,026,043		
26. INTEVENTORÍA:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC												
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA												

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 5 días del mes de ABRIL del año 2025 se reunieron EL ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO representante legal del contratista y LA ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obray/o Modificaciones del mes de MARZO según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR

C. OBSERVACIONES

La informacion reportada corresponde a los informes aprobados por la intrventoria y cargados en el secop

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

DESCRIPCION	38. No. INFORME MENSUAL	39. PERIODO	40. NOMBRE DEL ARCHIVO	41. FECHA DE CARGUE	42. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO	3	9/02//2025 - 8/03/2025	9198-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 3 PARTE 1	02/04/2025	
INFORME SOCIAL	N/A	N/A	N/A	02/04/2025	
INFORME AMBIENTAL	3	9/02//2025 - 8/03/2025	9198-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 3 PARTE 2	02/04/2025	
INFORME SST	3	9/02//2025 - 8/03/2025	9198-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 3 PARTE 3.1 y 3.2	02/04/2025	
INFORME DE SUPERVISION	3	9/02//2025 - 8/03/2025	9198-2024 CORTE GENERAL DE OBRA No. 2	21/03/2025	
ACTA PARCIAL	3	9/02//2025 - 8/03/2025	9198-2024 CORTE GENERAL DE OBRA No. 2	21/03/2025	
SOPORTE PAGO SDH	3	9/02//2025 - 8/03/2025	9198-2024 CORTE GENERAL DE OBRA No. 2	21/03/2025	
FACTURA	3	9/02//2025 - 8/03/2025	9198-2024 CORTE GENERAL DE OBRA No. 2	21/03/2025	
FORMATO MC 14	3	9/02//2025 - 8/03/2025			

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 05 días del mes de ABRIL del año 2025

Nombre: ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO
CONTRATISTA DE LA OBRA

MEBYS DE LA OSSA L.

Nombre: ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ
INTERVENTOR DE LA OBRA

Origin Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia Interventor
Copia Contratista

	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA OBRA	Código: FOR-GIF-020 Versión: 1 Fecha: Memo I2024037699 - 18/12/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN: 5 | 4 | 2025

2. ACTA No. 3 | 3. TIPO DE ACTA PARCIAL: | RECIBO PARCIAL DE OBRA 3 | MODIFICACIONES 2

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR ACACIAS | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: DG 63 SUR 19C 06

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No: 9198-2024 | 7. FECHA CONTRATO: 19 | 11 | 2024 | 8. VALOR CONTRATO: $ 2,354,314,500

9. FECHA ACTA INICIO: 9 | 12 | 2024 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: 31 | MARZO | 2 | 2025 | 11. PLAZO: 3 MESES 21 DÍAS Meses/días

12. PRORROGAS: 89 DÍAS | 13. SUSPENSIONES: Meses/días | 14. ADICIONES: $ -

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

16. CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

17. CONTRATO INTEVENTORIA No: 9221-2024 | 18. FECHA CONTRATO: 26 | 11 | 2024 | 19. VALOR CONTRATO: $ 382,708,445

20. FECHA ACTA INICIO: 9 | 12 | 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: 15 | ABRIL | 4 | 2025 | 22. PLAZO: 4 MESES 15 DIAS Meses/días

23. PRORROGAS: 104 DIAS | 24. SUSPENSIONES: Meses/días | 25. ADICIONES: $ 98,026,043

26. INTEVENTORÍA: COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC

27. SUPERVISOR SDIS: JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 5 días del mes de ABRIL del año 2025 se reunieron EL ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO representante legal del contratista y LA ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obray/o Modificaciones del mes de MARZO según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	PRELIMINARES				**$ 11,000,340.14**								
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL												
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	50	$ 43,298.00	$ 2,164,900.00	30.33	$ 1,313,228.34	6.00	$ 259,788.00	24.33	$ 1,053,440.34	30.33	$ 1,313,228.34
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS						$ -						
1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	174.75	$ 27,519.00	$ 4,808,945.25	184.51	$ 5,077,530.69		$ 0.00	184.51	$ 5,077,530.69	184.51	$ 5,077,530.69
1.3.2	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERÍA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	2.2	$ 24,524.00	$ 53,952.80	2.75	$ 67,441.00		$ 0.00	2.75	$ 67,441.00	2.75	$ 67,441.00
1.3.4	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	7.33	$ 10,672.00	$ 78,225.76	7.33	$ 78,225.76		$ 0.00	7.33	$ 78,225.76	7.33	$ 78,225.76
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O	M2	5.76	$ 32,417.00	$ 186,721.92	12.42	$ 402,619.14	3.8	$ 123,184.60	8.62	$ 279,434.54	12.42	$ 402,619.14
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	M2	36.17	$ 18,929.00	$ 684,661.93	39.15	$ 741,070.35		$ 0.00	39.15	$ 741,070.35	39.15	$ 741,070.35
1.3.23	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	111.48	$ 20,144.00	$ 2,245,653.12	100.06	$ 2,015,608.64		$ 0.00	100.06	$ 2,015,608.64	100.06	$ 2,015,608.64
1.3.40	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	79.04	$ 9,834.00	$ 777,279.36	73.38	$ 721,618.92		$ 0.00	73.38	$ 721,618.92	73.38	$ 721,618.92
2	CIMENTACIÓN		0	$ -	**$ 667,900.56**				$ 0.00	-	$ 0.00	-	
2.2	CONCRETOS								$ 0.00				
2.2.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA DE CONFINAMIENTO 20 X 15 CMS. EN CONCRETO DE 3000 PSI NO INCLUYE REFUERZO	M	4.4	$ 111,104.00	$ 488,857.60	2.83	$ 314,424.32		$ 0.00	2.83	$ 314,424.32	2.83	$ 314,424.32
2.2.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGUETA EN CONCRETO DE 3000 PSI. DIMENSIONES 20X15CM. NO INCLUYE REFUERZO	M	1	$ 108,899.00	$ 108,899.00	1.00	$ 108,899.00		$ 0.00	1.00	$ 108,899.00	1.00	$ 108,899.00
2.5	ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA						$ -		$ 0.00				
2.5.2	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	13.18	$ 5,322.00	$ 70,143.96	10.58	$ 56,306.76		$ 0.00	10.58	$ 56,306.76	10.58	$ 56,306.76
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 42,502,376.87**				$ 0.00	-	$ 0.00	-	
3.1	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -			$ -		$ 0.00	-	$ 0.00	-	
3.1.2	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No 4	M2	0.27	$ 48,199.00	$ 13,013.73	0.37	$ 17,833.63		$ 0.00	0.37	$ 17,833.63	0.37	$ 17,833.63
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -			$ -		$ 0.00	-	$ 0.00	-	
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	1961.47	$ 21,662.00	$ 42,489,363.14	1851.85	$ 40,114,774.70		$ 0.00	1,851.85	$ 40,114,774.70	1,851.85	$ 40,114,774.70
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 48,267.00**				$ 0.00	-	$ 0.00	-	
4.1	TUBERIA		0	$ -			$ -		$ 0.00	-	$ 0.00	-	
4.1.15	PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	UN	1	$ 48,267.00	$ 48,267.00	1.00	$ 48,267.00		$ 0.00	1.00	$ 48,267.00	1.00	$ 48,267.00
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 40,386.00**				$ 0.00	-	$ 0.00	-	
5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO	UN		$ 267,457.00	$ 0.00	0.00	$ -		$ 0.00	-	$ 0.00	-	
5.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO PARA INSTALACIÓN EN TECHO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO,	UN		$ 255,601.00	$ 0.00	1.00	$ 255,601.00	1.00	$ 255,601.00	-	$ 0.00	1.00	$ 255,601.00
5.1.65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12	UN		$ 353,778.00	$ 0.00		$ -		$ 0.00	-	$ 0.00	-	
5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER, INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS	UN		$ 185,011.00	$ 0.00	13.00	$ 2,405,143.00	13.00	$ 2,405,143.00	-	$ 0.00	13.00	$ 2,405,143.00
5.1.74	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER	UN		$ 99,525.00	$ 0.00		$ -		$ 0.00	-	$ 0.00	-	
5.1.76	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED CIRCULAR DE 18 W 8" INCRUSTAR	UN		$ 43,609.00	$ 0.00	11.00	$ 479,699.00	11.00	$ 479,699.00	-	$ 0.00	11.00	$ 479,699.00
5.1.77	REINSTALACIÓN DE LAMPARAS EXISTENTES (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	2	$ 20,193.00	$ 40,386.00	8.00	$ 161,544.00		$ 0.00	8.00	$ 161,544.00	8.00	$ 161,544.00
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 15,775,122.80**				$ 0.00	-	$ 0.00	-	
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -			$ -		$ 0.00	-	$ 0.00	-	
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	M2	167.88	$ 41,523.00	$ 6,970,881.24	156.1	$ 6,481,740.30		$ 0.00	156.10	$ 6,481,740.30	156.10	$ 6,481,740.30
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M		$ 14,846.00		94.56	$ 1,403,837.76		$ 0.00	94.56	$ 1,403,837.76	94.56	$ 1,403,837.76
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -		$ 0.00				
7.2.4	GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	20.38	$ 54,616.00	$ 1,113,074.08	1.80	$ 98,308.80		$ 0.00	1.80	$ 98,308.80	1.80	$ 98,308.80
7.2.17	PISO EN DUROPISO 33.8 X 33.8 CMS, ANTIDESLIZANTE E= 5 MM TIPO TRAFICO PESADO	M2	48.96	$ 70,927.00	$ 3,472,585.92	59.01	$ 4,185,402.27	0.2	$ 14,185.40	58.81	$ 4,171,216.87	59.01	$ 4,185,402.27
7.2.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 6 CM	M		$ 20,419.00	$ 0.00	77.50	$ 1,582,472.50		$ 0.00	77.50	$ 1,582,472.50	77.50	$ 1,582,472.50
7.2.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM	M	103.81	$ 25,938.00	$ 2,692,623.78		$ -		$ 0.00	-	$ 0.00	-	
7.2.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MIKONOS BLANCO 33.8 X 33.8 CM	M2	7.73	$ 127,514.00	$ 985,683.22	7.85	$ 1,000,984.90		$ 0.00	7.85	$ 1,000,984.90	7.85	$ 1,000,984.90
7.2.40	GUARDAESCOBA EN DUROPISO DE 8 A 10 CM DE ALTO	M	26.36	$ 20,496.00	$ 540,274.56	42.6	$ 873,129.60	6.75	$ 138,348.00	35.85	$ 734,781.60	42.60	$ 873,129.60
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 13,337,688.38**								
8.1.2	ENCHAPE 25 X 35	M2	84.02	$ 125,716.00	$ 10,562,658.32	92.24	$ 11,596,043.84		$ 0.00	92.24	$ 11,596,043.84	92.24	$ 11,596,043.84
8.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPER BOARD 8 MM A DOS CARAS EN ALTURA SUPERIOR A 3 M (INCLUYE ANDAMIO	M2	13.53	$ 205,102.00	$ 2,775,030.06	9.47	$ 1,942,315.94		$ 0.00	9.47	$ 1,942,315.94	9.47	$ 1,942,315.94
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 689,165.40**								
9.1	CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -						
9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LAMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18 ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	2.2	$ 313,257.00	$ 689,165.40	2.2	$ 689,165.40		$ 0.00	2.20	$ 689,165.40	2.20	$ 689,165.40
9.3.1.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2		$ 142,958.00	$ 0.00	21.25	$ 3,037,857.50	21.25	$ 3,037,857.50	-	$ 0.00	21.25	$ 3,037,857.50
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 218,977,704.91**				$ 0.00	-	$ 0.00		
11,1,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA TIPO CUPULA DE 5" A 3"	UN		$ 74,334.00		7.00	$ 520,338.00	7	$ 520,338.00	-	$ 0.00	7.00	$ 520,338.00
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 109,939,119.47**				$ 0.00	-	$ 0.00		

	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA OBRA	Código: FOR-GIF-020 Versión: 1 Fecha: Memo I2024037699 - 18/12/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN: 5 | 4 | 2025

2. ACTA No. 3 | 3. TIPO DE ACTA PARCIAL: | RECIBO PARCIAL DE OBRA 3 | MODIFICACIONES 2

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR ACACIAS | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: DG 63 SUR 19C 06

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9198-2024	7. FECHA CONTRATO:	19 / 11 / 2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 2,354,314,500
9. FECHA ACTA INICIO:	9 / 12 / 2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31 / MARZO / 2 / 2025	11. PLAZO:	3 MESES 21 DÍAS Meses/días
12. PRORROGAS:	89 DÍAS	13. SUSPENSIONES:	Meses/días	14. ADICIONES:	$ -
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO				
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL				
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9221-2024	18. FECHA CONTRATO:	26 / 11 / 2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 382,708,445
20. FECHA ACTA INICIO:	9 / 12 / 2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	15 / ABRIL / 4 / 2025	22. PLAZO:	4 MESES 15 DIAS Meses/días
23. PRORROGAS:	104 DIAS	24. SUSPENSIONES:	Meses/días	25. ADICIONES:	$ 98,026,043
26. INTEVENTORÍA:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC				
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA				

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 5 días del mes de ABRIL del año 2025 se reunieron EL ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO representante legal del contratista y LA ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obray/o Modificaciones del mes de MARZO según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -		$ 0.00				
13.1.2	PAÑETE MURO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	107.06	$ 78,779.00	$ 8,434,079.74	432.27	$ 34,053,798.33	140.33	$ 11,055,057.07	291.94	$ 22,998,741.26	432.27	$ 34,053,798.33
13.1.7	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	283.87	$ 25,832.00	$ 7,332,929.84	249.2	$ 6,437,334.40	26.28	$ 678,864.96	222.92	$ 5,758,469.44	249.20	$ 6,437,334.40
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -			$ -		$ 0.00	-	$ 0.00	-	
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	932.86	$ 10,754.00	$ 10,031,976.44	1258.91	$ 13,538,318.14	-6.91	-$ 74,310.14	1,265.82	$ 13,612,628.28	1,258.91	$ 13,538,318.14
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2	0	$ 20,469.00	$ 0.00	21.44	$ 438,855.36		$ 0.00	21.44	$ 438,855.36	21.44	$ 438,855.36
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1028.26	$ 21,505.00	$ 22,112,731.30	1032.57	$ 22,205,417.85	140.33	$ 3,017,796.65	892.24	$ 19,187,621.20	1,032.57	$ 22,205,417.85
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	901.69	$ 45,138.00	$ 40,700,483.22	496.35	$ 22,404,246.30		$ 0.00	496.35	$ 22,404,246.30	496.35	$ 22,404,246.30
13.2.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE RECUBRIMIENTO ANTIGRAFFITI A DOS MANOS	M2	1028.26	$ 19,865.00	$ 20,426,384.90		$ -		$ 0.00	-	$ 0.00	-	
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -			$ -		$ 0.00	-	$ 0.00	-	
13.4.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS A DOS MANOS Y DOS CARAS	M2	20.57	$ 43,779.00	$ 900,534.03	31.79	$ 1,391,734.41		$ 0.00	31.79	$ 1,391,734.41	31.79	$ 1,391,734.41
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 39,517.00	$ 0.00	13.38	$ 528,737.46	13.38	$ 528,737.46	-	$ 0.00	13.38	$ 528,737.46
14	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 5,750,106.89**				$ 0.00	-	$ 0.00	-	
14.1.1	CIELORASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	32.24	$ 160,435.00	$ 5,172,424.40	32.24	$ 5,172,424.40		$ 0.00	32.24	$ 5,172,424.40	32.24	$ 5,172,424.40
14.1.3	CIELORASO EN LAMINA DE YESO DE 1/2" ST (Incluyendo todo lo necesario para su correcta instalación)	M2	3.93	$ 146,993.00	$ 577,682.49	6.91	$ 1,015,721.63		$ 0.00	6.91	$ 1,015,721.63	6.91	$ 1,015,721.63
15	CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ 146,993.00	**$ 0.00**				$ 0.00	-	$ 0.00	-	
15.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANDBLASTING COLOR OPAL SÓLIDO O TIPO PERSIANA (AMBAS CARAS)	M2		$ 76,779.00	$ 0.00		$ -		$ 0.00	-	$ 0.00	-	
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 19,734,487.95**				$ 0.00	-	$ 0.00	-	
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	8.23	$ 51,981.00	$ 427,803.63	16.03	$ 833,255.43	3.80	$ 197,527.80	12.23	$ 635,727.63	16.03	$ 833,255.43
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	123.61	$ 137,076.00	$ 16,943,964.36	119.68	$ 16,405,255.68		$ 0.00	119.68	$ 16,405,255.68	119.68	$ 16,405,255.68
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2		$ 247,595.00	$ 0.00	2.86	$ 708,121.70		$ 0.00	2.86	$ 708,121.70	2.86	$ 708,121.70
17.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	5.88	$ 200,325.00	$ 1,177,911.00		$ -		$ 0.00	-	$ 0.00	-	
17.1.24.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	5.76	$ 205,696.00	$ 1,184,808.96	9.56	$ 1,966,453.76	3.8	$ 781,644.80	5.76	$ 1,184,808.96	9.56	$ 1,966,453.76
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL		0	$ -	**$ 7,098,273.00**				$ 0.00	-	$ 0.00	-	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1348.2	$ 5,265.00	$ 7,098,273.00	1008.99	$ 5,312,332.35	1008.99	$ 5,312,332.35	-	$ 0.00	1,008.99	$ 5,312,332.35
21	PRECIOS NO PREVISTOS		0.00	#¡REF!	**$ 0.00**					-	$ 0.00	-	
NP 001	DESMONTE, INSTALACION Y CERTIFICACION DE PUNTOS DE ANCLAJE PARA TRABAJO EN ALTURAS	UN		$ 382,772.00	$ 0.00	19	$ 7,272,668.00	19	$ 7,272,668.00	-	$ -	19.00	$ 7,272,668.00 #
NP 002	MANTENIMIENTO GENERAL DE CARPINTERIA, INCLUYE DESMONTE, REPARACION, AJUSTES NECESARIOS, MASILLA, GRADUACION DE CERRADURAS, INCLUYE TRANSPORTE EN CASO DE REQUERIRSE, NO INCLUYE PINTURA, NI CAMBIO DE CERRADURAS NI BRAZOS ESPECIALES.	m2		$ 246,667.00	$ 0.00	45.74	$ 11,282,548.58		$ 0.00	45.74	$ 11,282,548.58	45.74	$ 11,282,548.58
34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO					$ 336,072,086.92		$ 238,758,655.84		$ 36,004,463.45		$ 202,754,192.39		$ 238,758,655.84


35. DESCRIPCIÓN	36. VALOR CONTRACTUAL				
ADMINISTRACIÓN	25.64%	$ 86,168,883.09	$ 61,217,719.36	$ 9,231,544.43	$ 51,986,174.93	$ 61,217,719.36
IMPREVISTO	0.50%	$ 1,680,360.43	$ 1,193,793.28	$ 180,022.32	$ 1,013,770.96	$ 1,193,793.28
UTILIDAD	3.00%	$ 10,082,162.61	$ 7,162,759.68	$ 1,080,133.90	$ 6,082,625.77	$ 7,162,759.67
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)		$ 97,931,406.13	$ 69,574,272.32	$ 10,491,700.65	$ 59,082,571.66	$ 69,574,272.31
ANTICIPO	0%	$ -	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	0%	$ -	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
AJUSTE AL PESO		$ 0.02	-$ 0.16	-$ 0.10	-$ 0.05	-$ 0.15
37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO		$ 434,003,493.07	$ 308,332,928.00	$ 46,496,164.00	$ 261,836,764.00	$ 308,332,928.00

100.00%

C. OBSERVACIONES

La informacion reportada corresponde a los informes aprobados por la intrventoria y cargados en el secop

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

DESCRIPCION	38. No. INFORME MENSUAL	39. PERIODO	40. NOMBRE DEL ARCHIVO	41. FECHA DE CARGUE	42. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO	3	9/02/2025 - 8/03/2025	9198-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 3 PARTE 1	02/04/2025	
INFORME SOCIAL	N/A	N/A	N/A	02/04/2025	
INFORME AMBIENTAL	3	9/02//2025 - 8/03/2025	9198-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 3 PARTE 2	02/04/2025	
INFORME SST	3	9/02//2025 - 8/03/2025	9198-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 3 PARTE 3.1 y 3.2	02/04/2025	
INFORME DE SUPERVISION	3	9/02//2025 - 8/03/2025	9198-2024 CORTE GENERAL DE OBRA No. 2	21/03/2025	
ACTA PARCIAL	3	9/02//2025 - 8/03/2025	9198-2024 CORTE GENERAL DE OBRA No. 2	21/03/2025	
SOPORTE PAGO SDH	3	9/02//2025 - 8/03/2025	9198-2024 CORTE GENERAL DE OBRA No. 2	21/03/2025	
FACTURA	3	9/02//2025 - 8/03/2025	9198-2024 CORTE GENERAL DE OBRA No. 2	21/03/2025	
FORMATO MC 14	3	9/02//2025 - 8/03/2025			

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA OBRA	Código: FOR-GIF-020 Versión: 1 Fecha: Memo I2024037699 - 18/12/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN:	5	4	2025								
2. ACTA No.	3		3. TIPO DE ACTA PARCIAL:			RECIBO PARCIAL DE OBRA	3	MODIFICACIONES	2		
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR ACACIAS			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:			DG 63 SUR 19C 06				
A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO											
6. CONTRATO OBRA No:	9198-2024		7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024		8. VALOR CONTRATO:	$	2,354,314,500	
9. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	MARZO	2	2025	11. PLAZO:	3 MESES 21 DÍAS	Meses/días
12. PRORROGAS:	89 DÍAS		13. SUSPENSIONES:			Meses/días			14. ADICIONES:	$ -	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9221-2024		18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024		19. VALOR CONTRATO:	$	382,708,445	
20. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	15	ABRIL	4	2025	22. PLAZO:	4 MESES 15 DIAS	Meses/días
23. PRORROGAS:	104 DIAS		24. SUSPENSIONES:			Meses/días			25. ADICIONES:	$ 98,026,043	
26. INTEVENTORÍA:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC										
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA										

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 5 días del mes de ABRIL del año 2025 se reunieron EL ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO representante legal del contratista y LA ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra/o Modificaciones del mes de MARZO según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 05 días del mes de ABRIL del año 2025

Nombre: ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO
CONTRATISTA DE LA OBRA

MEBYS DE LA OSSA L.

Nombre: ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ
INTERVENTOR DE LA OBRA

Origin Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia Interventor
Copia Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	5	4	2025												
2. ACTA No.	3		3. TIPO DE ACTA PARCIAL:						RECIBO PARCIAL DE OBRA	3	MODIFICACIONES	2			
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR CARLOS GAVIRIA					5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:				CL 69 SUR 18B 36					

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9198-2024		7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024		8. VALOR CONTRATO:	$ 2,354,314,500				
9. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:		31	MARZO	2	2025	11. PLAZO:	3 MESES 21 DÍAS	Meses/días	
12. PRORROGAS:	89 DÍAS			13. SUSPENSIONES:			Meses/días			14. ADICIONES:	$ -		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO												
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL												
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9221-2024		18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024		19. VALOR CONTRATO:	$ 382,708,445				
20. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:		15	ABRIL	4	2025	22. PLAZO:	4 MESES 15 DÍAS	Meses/días	
23. PRORROGAS:	104 DIAS			24. SUSPENSIONES:			Meses/días			25. ADICIONES:	$ 98,026,043		
26. INTEVENTORÍA:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC												
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA												

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 5 días del mes de ABRIL del año 2025 se reunieron EL ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO representante legal del contratista y LA ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de MARZO según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	PRELIMINARES				**$ 25,359,901.39**								
1.1	OBRAS PRELIMINARES												
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACIONES (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE CONSTRUCCION)	M2	90.75	$ 19,797.00	$ 1,796,577.75	62.97	$ 1,246,617.09		$ 0.00	62.97	$ 1,246,617.09	62.97	$ 1,246,617.09
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL						$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	30	$ 43,298.00	$ 1,298,940.00	4.45	$ 192,676.10		$ 0.00	4.45	$ 192,676.10	4.45	$ 192,676.10
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS						$ -			0.00	$ 0.00	-	
1.3.2	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	31.2	$ 24,524.00	$ 765,148.80	24.64	$ 604,271.36		$ 0.00	24.64	$ 604,271.36	24.64	$ 604,271.36
1.3.3	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, ETC, CORRIDOS, POYOS, MESONES, PREFABRICADOS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	5.00	$ 32,197.00	$ 160,985.00	5.00	$ 160,985.00		$ 0.00	5.00	$ 160,985.00	5.00	$ 160,985.00
1.3.5	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	6.00	$ 21,344.00	$ 128,064.00	6.00	$ 128,064.00		$ 0.00	6.00	$ 128,064.00	6.00	$ 128,064.00
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA.	M2	21.3	$ 32,417.00	$ 690,482.10	20.70	$ 671,031.90	-2.15	-$ 69,696.55	22.85	$ 740,728.45	20.70	$ 671,031.90
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS).	M2	123.06	$ 18,929.00	$ 2,329,402.74	37.52	$ 710,216.08		$ 0.00	37.52	$ 710,216.08	37.52	$ 710,216.08
1.3.16	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	2.00	$ 21,344.00	$ 42,688.00	2.00	$ 42,688.00		$ 0.00	2.00	$ 42,688.00	2.00	$ 42,688.00
1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS)	UN	7.00	$ 18,691.00	$ 130,837.00	7.00	$ 130,837.00		$ 0.00	7.00	$ 130,837.00	7.00	$ 130,837.00
1.3.39	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	M	1.50	$ 33,344.00	$ 50,016.00	1.50	$ 50,016.00		$ 0.00	1.50	$ 50,016.00	1.50	$ 50,016.00
1.3.43	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS.	M2	420	$ 42,778.00	$ 17,966,760.00	304.44	$ 13,023,334.32		$ 0.00	304.44	$ 13,023,334.32	304.44	$ 13,023,334.32
2	CIMENTACIÓN				**$ 498,286.44**					0.00	$ 0.00	-	
2.2	CONCRETOS						$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00
2.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000PSI. NO INCLUYE REFUERZO	M	3.91	$ 102,054.00	$ 399,031.14	0.00	$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00
2.5	ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA						$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00
2.5.2	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	18.65	$ 5,322.00	$ 99,255.30	0.00	$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 15,387,961.44**					0.00	$ 0.00	-	
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	511.12	$ 21,662.00	$ 11,071,881.44	390.31	$ 8,454,895.22		$ 0.00	390.31	$ 8,454,895.22	390.31	$ 8,454,895.22
3.2.19	MESÓN EN GRANITO NATURAL ANCHO MENOR O IGUAL A 80CM - INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M	5.00	$ 863,216.00	$ 4,316,080.00	5.00	$ 4,316,080.00		$ 0.00	5.00	$ 4,316,080.00	5.00	$ 4,316,080.00
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 748,164.00**					0.00	$ 0.00	-	
4.1	TUBERIA						$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00
4.1.82	INSTALACION DE LAVAMANOS, INCLUYE LOS ACCESORIOS	UN	6.00	$ 124,694.00	$ 748,164.00	0.00	$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 7,305,161.60**					0.00	$ 0.00	-	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4"	UN	2.00	$ 225,465.00	$ 450,930.00	2.00	$ 450,930.00		$ 0.00	2.00	$ 450,930.00	2.00	$ 450,930.00
5.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4"	UN		$ 398,468.00	$ 0.00	2.00	$ 796,936.00	2.00	$ 796,936.00	0.00	$ 0.00	2.00	$ 796,936.00
5.1.11	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE	UN	5.00	$ 363,183.00	$ 1,815,915.00	3.00	$ 1,089,549.00		$ 0.00	3.00	$ 1,089,549.00	3.00	$ 1,089,549.00
5.1.12	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE	UN	4.00	$ 400,322.00	$ 1,601,288.00	4.00	$ 1,601,288.00		$ 0.00	4.00	$ 1,601,288.00	4.00	$ 1,601,288.00
5.1.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO	UN	1.00	$ 937,578.00	$ 937,578.00	1.00	$ 937,578.00		$ 0.00	1.00	$ 937,578.00	1.00	$ 937,578.00
5.1.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN	2.00	$ 34,729.00	$ 69,458.00	2.00	$ 69,458.00		$ 0.00	2.00	$ 69,458.00	2.00	$ 69,458.00
5.1.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	34.6	$ 49,909.00	$ 1,726,851.40	34.60	$ 1,726,851.40		$ 0.00	34.60	$ 1,726,851.40	34.60	$ 1,726,851.40
5.1.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS.	M	34.6	$ 20,322.00	$ 703,141.20	34.60	$ 703,141.20		$ 0.00	34.60	$ 703,141.20	34.60	$ 703,141.20
5.1.65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 353,778.00	$ 0.00	6.00	$ 2,122,668.00	6.00	$ 2,122,668.00	0.00	$ 0.00	6.00	$ 2,122,668.00
5.1.70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO TORTUGA SOCKET E27. INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR 60W LUZ DÍA O EQUIVALENTE LED.	UN		$ 26,955.00	$ 0.00	6.00	$ 161,730.00	6.00	$ 161,730.00	0.00	$ 0.00	6.00	$ 161,730.00

1. FECHA ELABORACIÓN: 5 | 4 | 2025

2. ACTA No. 3 — 3. TIPO DE ACTA PARCIAL: — RECIBO PARCIAL DE OBRA 3 — MODIFICACIONES 2

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR CARLOS GAVIRIA — 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: CL 69 SUR 18B 36

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No: 9198-2024 — 7. FECHA CONTRATO: 19 | 11 | 2024 — 8. VALOR CONTRATO: $ 2,354,314,500

9. FECHA ACTA INICIO: 9 | 12 | 2024 — 10. FECHA DE TERMINACIÓN: 31 | MARZO | 2 | 2025 — 11. PLAZO: 3 MESES 21 DÍAS Meses/días

12. PRORROGAS: 89 DÍAS — 13. SUSPENSIONES: Meses/días — 14. ADICIONES: $ -

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

16. CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

17. CONTRATO INTEVENTORIA No: 9221-2024 — 18. FECHA CONTRATO: 26 | 11 | 2024 — 19. VALOR CONTRATO: $ 382,708,445

20. FECHA ACTA INICIO: 9 | 12 | 2025 — 21. FECHA DE TERMINACIÓN: 15 | ABRIL | 4 | 2025 — 22. PLAZO: 4 MESES 15 DIAS Meses/días

23. PRORROGAS: 104 DIAS — 24. SUSPENSIONES: Meses/días — 25. ADICIONES: $ 98,026,043

26. INTEVENTORÍA: COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC

27. SUPERVISOR SDIS: JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 5 días del mes de ABRIL del año 2025 se reunieron EL ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO representante legal del contratista y LA ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de MARZO según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 17,420,991.38**					0.00	$ 0.00	-	
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -			$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04	M2	90.75	$ 41,523.00	$ 3,768,212.25	100.73	$ 4,182,611.79	10.41	$ 432,254.43	90.32	$ 3,750,357.36	100.73	$ 4,182,611.79
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	41.1	$ 14,846.00	$ 610,170.60	0.00	$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -			$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00
7.2.2	BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A = 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	6.91	$ 68,333.00	$ 472,181.03	3.00	$ 204,999.00		$ 0.00	3.00	$ 204,999.00	3.00	$ 204,999.00
7.2.4	GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	41.1	$ 54,616.00	$ 2,244,717.60	40.57	$ 2,215,771.12		$ 0.00	40.57	$ 2,215,771.12	40.57	$ 2,215,771.12
7.2.26	ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	108.27	$ 95,370.00	$ 10,325,709.90	90.32	$ 8,613,818.40		$ 0.00	90.32	$ 8,613,818.40	90.32	$ 8,613,818.40
7.2.35	WIN DE ALUMINIO	M		$ 9,019.00	$ 0.00	20.16	$ 181,823.04	20.16	$ 181,823.04			20.16	$ 181,823.04
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 20,752,320.44**					0.00	$ 0.00	-	
8.1.2	ENCHAPE 25 X 35	M2	77.72	$ 125,716.00	$ 9,770,647.52	62.87	$ 7,903,764.92	-2.51	-$ 315,547.16	65.38	$ 8,219,312.08	62.87	$ 7,903,764.92
8.1.4	MURO EN LÁMINA FIBRO - CEMENTO 10 MM	M2	35.58	$ 128,794.00	$ 4,582,490.52	38.71	$ 4,985,615.74		$ 0.00	38.71	$ 4,985,615.74	38.71	$ 4,985,615.74
8.1.5	ESQUINERO PLÁSTICO	m		$ 7,743.00	$ 0.00	140.17	$ 1,085,336.31	140.17	$ 1,085,336.31	0.00	$ 0.00	140.17	$ 1,085,336.31
8.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPER BOARD 8 MM A DOS CARAS EN ALTURA SUPERIOR A 3 M (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	31.2	$ 205,102.00	$ 6,399,182.40	26.74	$ 5,484,427.48		$ 0.00	26.74	$ 5,484,427.48	26.74	$ 5,484,427.48
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 0.00**					0.00	$ 0.00	-	
9.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2		$ 231,307.00	$ 0.00	13.57	$ 3,138,835.99	13.57	$ 3,138,835.99	0.00	$ 0.00	13.57	$ 3,138,835.99
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 2,467,194.00**					0.00	$ 0.00	-	
11.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE INCRUSTAR COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA Y GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN		$ 705,542.00	$ 0.00	6.00	$ 4,233,252.00		$ 0.00	6.00	$ 4,233,252.00	6.00	$ 4,233,252.00
11.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PEDAL PARA LAVAMANOS O LAVAPLATOS	UN	6	$ 411,199.00	$ 2,467,194.00	6.00	$ 2,467,194.00		$ 0.00	6.00	$ 2,467,194.00	6.00	$ 2,467,194.00
12	APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 2,324,770.40**					0.00	$ 0.00	-	
12.1.17	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDA DE PROTECCIÓN DE ALTURA DE 1,20MTS CON DOBLE PASAMANOS DE 2" Y TUBERÍA VERTICAL CADA 40CM DE 1/2". INCLUYE 2 CAPAS DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE EXTERIOR	M	3.40	$ 683,756.00	$ 2,324,770.40	3.40	$ 2,324,770.40		$ 0.00	3.40	$ 2,324,770.40	3.40	$ 2,324,770.40
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 37,868,166.74**					0.00	$ 0.00	-	
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	
13.1.2	PAÑETE MURO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	80.34	$ 78,779.00	$ 6,329,104.86	80.34	$ 6,329,104.86		$ 0.00	80.34	$ 6,329,104.86	80.34	$ 6,329,104.86
13.1.7	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	114.33	$ 25,832.00	$ 2,953,372.56	168.15	$ 4,343,650.80	53.82	$ 1,390,278.24	114.33	$ 2,953,372.56	168.15	$ 4,343,650.80
13.1.9	CAÑUELA PARA MURO DE LIMPIEZA ESMALTADA 0,12 X 0,20 M CON MEDIACAÑA	M	30	$ 78,160.00	$ 2,344,800.00	17.95	$ 1,402,972.00		$ 0.00	17.95	$ 1,402,972.00	17.95	$ 1,402,972.00
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	330.07	$ 10,754.00	$ 3,549,572.78	313.37	$ 3,369,980.98	7.74	$ 83,235.96	305.63	$ 3,286,745.02	313.37	$ 3,369,980.98
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	398.32	$ 21,505.00	$ 8,565,871.60	289.53	$ 6,226,342.65	177.99	$ 3,827,674.95	111.54	$ 2,398,667.70	289.53	$ 6,226,342.65
13.2.4	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 11,796.00	$ 0.00	191.53	$ 2,259,287.88	191.53	$ 2,259,287.88			191.53	$ 2,259,287.88
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	177.3	$ 45,138.00	$ 8,002,967.40	331.23	$ 14,951,059.74	164.26	$ 7,414,367.88	166.97	$ 7,536,691.86	331.23	$ 14,951,059.74
13.2.8	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 14,653.00	$ 0.00	95.08	$ 1,393,207.24	95.08	$ 1,393,207.24	0.00	$ 0.00	95.08	$ 1,393,207.24
13.2.9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA PISO TRÁFICO PESADO	M2		$ 54,958.00	$ 0.00	10.41	$ 572,112.78	10.41	$ 572,112.78	0.00	$ 0.00	10.41	$ 572,112.78
13.2.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE RECUBRIMIENTO ANTIGRAFFITI A DOS MANOS	M2	170	$ 19,865.00	$ 3,377,050.00		$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00
13.4.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS A DOS MANOS Y DOS CARAS	M2	11.97	$ 43,779.00	$ 524,034.63	11.82	$ 517,467.78	11.82	$ 517,467.78	0.00	$ 0.00	11.82	$ 517,467.78
13.4.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M2	35.29	$ 26,869.00	$ 948,207.01	59.52	$ 1,599,242.88	59.52	$ 1,599,242.88	0.00	$ 0.00	59.52	$ 1,599,242.88
13.4.4	ESMALTE SOBRE CANAL METÁLICA EN ACERO GALVANIZADO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	42.7	$ 29,817.00	$ 1,273,185.90	9.80	$ 292,206.60	9.80	$ 292,206.60	0.00	$ 0.00	9.80	$ 292,206.60

1. FECHA ELABORACIÓN:	5	4	2025								
2. ACTA No.	3		3. TIPO DE ACTA PARCIAL:			RECIBO PARCIAL DE OBRA	3	MODIFICACIONES	2		
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR CARLOS GAVIRIA			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:			CL 69 SUR 18B 36				

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9198-2024		7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024		8. VALOR CONTRATO:	$ 2,354,314,500		
9. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	MARZO	2	2025	11. PLAZO:	3 MESES 21 DÍAS	Meses/días
12. PRORROGAS:	89 DÍAS		13. SUSPENSIONES:		Meses/días				14. ADICIONES:	$ -	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9221-2024		18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024		19. VALOR CONTRATO:	$ 382,708,445		
20. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	15	ABRIL	4	2025	22. PLAZO:	4 MESES 15 DÍAS	Meses/días
23. PRORROGAS:	104 DIAS		24. SUSPENSIONES:		Meses/días				25. ADICIONES:	$ 98,026,043	
26. INTEVENTORÍA:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC										
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA										

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 5 días del mes de ABRIL del año 2025 se reunieron EL ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO representante legal del contratista y LA ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obray/o Modificaciones del mes de MARZO según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
14	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 19,743,131.10**					0.00	$ 0.00	-	
14.1.1	CIELORASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM -	M2	123.06	$ 160,435.00	$ 19,743,131.10	35.91	$ 5,761,220.85		$ 0.00	35.91	$ 5,761,220.85	35.91	$ 5,761,220.85
14.1.5	MURO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO (Incluyendo todo lo necesario para su correcta instalación)	M2		$ 176,437.00	$ 0.00	25.90	$ 4,569,718.30	25.90	$ 4,569,718.30	0.00	$ 0.00	25.90	$ 4,569,718.30

1. FECHA ELABORACIÓN:	5	4	2025						
2. ACTA No.	3		3. TIPO DE ACTA PARCIAL:			RECIBO PARCIAL DE OBRA	3	MODIFICACIONES	2
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR CARLOS GAVIRIA			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:			CL 69 SUR 18B 36		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9198-2024		7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024		8. VALOR CONTRATO:	$	2,354,314,500	
9. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	MARZO	2	2025	11. PLAZO:	3 MESES 21 DÍAS	Meses/días
12. PRORROGAS:	89 DÍAS		13. SUSPENSIONES:		Meses/días				14. ADICIONES:	$	-
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9221-2024		18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024		19. VALOR CONTRATO:	$	382,708,445	
20. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	15	ABRIL	4	2025	22. PLAZO:	4 MESES 15 DÍAS	Meses/días
23. PRORROGAS:	104 DIAS		24. SUSPENSIONES:		Meses/días				25. ADICIONES:	$	98,026,043
26. INTEVENTORÍA:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC										
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA										

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 5 días del mes de ABRIL del año 2025 se reunieron EL ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO representante legal del contratista y LA ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de MARZO según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 34,208,949.74**					0.00	$ 0.00	-	
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	52.24	$ 51,981.00	$ 2,715,487.44	56.30	$ 2,926,530.30	56.30	$ 2,926,530.30	0.00	$ 0.00	56.30	$ 2,926,530.30
17.1.2	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	42.7	$ 80,829.00	$ 3,451,398.30	35.55	$ 2,873,470.95	35.55	$ 2,873,470.95	0.00	$ 0.00	35.55	$ 2,873,470.95
17.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	11	$ 44,561.00	$ 490,171.00	7.00	$ 311,927.00	7.00	$ 311,927.00	0.00	$ 0.00	7.00	$ 311,927.00
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE	M2		$ 247,595.00	$ 0.00	11.42	$ 2,827,534.90	11.42	$ 2,827,534.90	0.00	$ 0.00	11.42	$ 2,827,534.90
17.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSIÓN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	M2	25	$ 69,970.00	$ 1,749,250.00		$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00
17.1.18	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	90.75	$ 61,523.00	$ 5,583,212.25	59.32	$ 3,649,544.36	-10.41	-$ 640,454.43	69.73	$ 4,289,998.79	59.32	$ 3,649,544.36
17.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	7.75	$ 200,325.00	$ 1,552,518.75		$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00
17.1.24.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	90.75	$ 205,696.00	$ 18,666,912.00	51.98	$ 10,692,078.08	51.98	$ 10,692,078.08	0.00	$ 0.00	51.98	$ 10,692,078.08
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL		0	$ -	**$ 2,689,414.65**					0.00	$ 0.00	-	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	510.81	$ 5,265.00	$ 2,689,414.65	378.36	$ 1,992,065.40	378.36	$ 1,992,065.40	0.00	$ 0.00	378.36	$ 1,992,065.40
21	PRECIOS NO PREVISTOS		0.00	$ -	**$ 0.00**					0.00	$ 0.00	-	
NP 002	MANTENIMIENTO GENERAL DE CARPINTERIA, INCLUYE DESMONTE, REPARACION, AJUSTES NECESARIOS, MASILLA, GRADUACION DE CERRADURAS, INCLUYE TRANSPORTE EN CASO DE REQUERIRSE, NO INCLUYE PINTURA, NI CAMBIO DE CERRADURAS NI BRAZOS ESPECIALES	M2		$ 246,667.00	$ 0.00	0	$ -	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00
34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO					$ 186,774,413.32		$ 165,274,788.19		$ 52,436,292.75		$ 112,838,495.44		$ 165,274,788.19

35. DESCRIPCIÓN	36. VALOR CONTRACTUAL					
ADMINISTRACIÓN	25.64%	$ 47,888,959.58	$ 42,376,455.69	$ 13,444,665.46	$ 28,931,790.23	$ 42,376,455.69
IMPREVISTO	0.50%	$ 933,872.07	$ 826,373.94	$ 262,181.46	$ 564,192.48	$ 826,373.94
UTILIDAD	3.00%	$ 5,603,232.40	$ 4,958,243.65	$ 1,573,088.78	$ 3,385,154.86	$ 4,958,243.65
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)		$ 54,426,064.05	$ 48,161,073.28	$ 15,279,935.70	$ 32,881,137.57	$ 48,161,073.28
ANTICIPO	0%	$ -	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	0%	$ -	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
AJUSTE AL PESO		$ (0.37)	-$ 0.47	-$ 0.45	-$ 0.01	-$ 0.47
37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO		$ 241,200,477.00	$ 213,435,861.00	$ 67,716,228.00	$ 145,719,633.00	$ 213,435,861.00

C. OBSERVACIONES

La informacion reportada corresponde a los informes aprobados por la intrventoria y cargados en el secop

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

DESCRIPCION	38. No. INFORME MENSUAL	39. PERIODO	40. NOMBRE DEL ARCHIVO	41. FECHA DE CARGUE	42. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO	3	9/02/2025 - 8/03/2025	9198-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 3 PARTE 1	02/04/2025	
INFORME SOCIAL	N/A	N/A	N/A	02/04/2025	
INFORME AMBIENTAL	3	9/02//2025 - 8/03/2025	9198-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 3 PARTE 2	02/04/2025	
INFORME SST	3	9/02//2025 - 8/03/2025	9198-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 3 PARTE 3.1 y 3.2	02/04/2025	
INFORME DE SUPERVISION	3	9/02//2025 - 8/03/2025	9198-2024 CORTE GENERAL DE OBRA No. 2	21/03/2025	
ACTA PARCIAL	3	9/02//2025 - 8/03/2025	9198-2024 CORTE GENERAL DE OBRA No. 2	21/03/2025	
SOPORTE PAGO SDH	3	9/02//2025 - 8/03/2025	9198-2024 CORTE GENERAL DE OBRA No. 2	21/03/2025	
FACTURA	3	9/02//2025 - 8/03/2025	9198-2024 CORTE GENERAL DE OBRA No. 2	21/03/2025	
FORMATO MC 14	3	9/02//2025 - 8/03/2025			

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 05 días del mes de ABRIL del año 2025

Nombre: ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO
CONTRATISTA DE LA OBRA

MEBYS DE LA OSSA L.

Nombre: ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ
INTERVENTOR DE LA OBRA

Origin Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia Interventor
Copia Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN: 5 | 4 | 2025

2. ACTA No. 3 | 3. TIPO DE ACTA PARCIAL: | RECIBO PARCIAL DE OBRA 3 | MODIFICACIONES 2

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR TEJEDORES DE SUEÑOS | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: TV 35 69M 85 S

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9198-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 2,354,314,500				
9. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	MARZO	2	2025	11. PLAZO:	3 MESES 21 DÍAS	Meses/días
12. PRORROGAS:	89 DÍAS	13. SUSPENSIONES:			Meses/días				14. ADICIONES:	$ -	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9221-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	19. VALOR CONTRATO:	$ 382,708,445				
20. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	15	ABRIL	4	2025	22. PLAZO:	4 MESES 15 DIAS	Meses/días
23. PRORROGAS:	104 DIAS	24. SUSPENSIONES:			Meses/días				25. ADICIONES:	$ 98,026,043	
26. INTEVENTORÍA:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC										
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA										

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 5 días del mes de ABRIL del año 2025 se reunieron EL ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO representante legal del contratista y LA ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra/o Modificaciones del mes de MARZO según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	PRELIMINARES				**$ 17,229,420.96**								
1.1	OBRAS PRELIMINARES												
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACIONES (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE CONSTRUCCION)	M2	52.36	$ 19,797.00	$ 1,036,570.92	54.65	$ 1,081,906.05	54.65	$ 1,081,906.05	0.00	$ -	54.65	$ 1,081,906.05
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL						$ -		$ 0.00				
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	30	$ 43,298.00	$ 1,298,940.00	36.42	$ 1,576,913.16	26.42	$ 1,143,933.16	10.00	$ 432,980.00	36.42	$ 1,576,913.16
1.2.2	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M, PARALES CON UNA SEPARACIÓN DE UN METRO, INCLUYE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 1500 PSI	M	0	$ 91,583.00	$ 0.00		$ -		$ 0.00	0	$ 0.00	-	
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS						$ -		$ 0.00				
1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	M2	170.62	$ 27,519.00	$ 4,695,291.78	153.72	$ 4,230,220.68		$ 0.00	153.72	$ 4,230,220.68	153.72	$ 4,230,220.68
1.3.2	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	13.2	$ 24,524.00	$ 323,716.80	18.66	$ 457,617.84		$ 0.00	18.66	$ 457,617.84	18.66	$ 457,617.84
1.3.3	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, ETC, CORRIDOS, POYOS, MESONES, PREFABRICADOS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE	M	3.9	$ 32,197.00	$ 125,568.30	3.65	$ 117,519.05		$ 0.00	3.65	$ 117,519.05	3.65	$ 117,519.05
1.3.5	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC. (INCLUYE CARGUE Y	UN	10	$ 21,344.00	$ 213,440.00	10.00	$ 213,440.00		$ 0.00	10.00	$ 213,440.00	10.00	$ 213,440.00
1.3.6	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 27,336.00	$ 0.00	1.00	$ 27,336.00	1.00	$ 27,336.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 27,336.00
1.3.7	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO VIDRIO Y REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	31.43	$ 18,347.00	$ 576,646.21	28.71	$ 526,742.37		$ 0.00	28.71	$ 526,742.37	28.71	$ 526,742.37
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	10.51	$ 32,417.00	$ 340,702.67	10.72	$ 347,510.24	10.72	$ 347,510.24	0	$ 0.00	10.72	$ 347,510.24
1.3.12	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	11	$ 57,448.00	$ 631,928.00	12.77	$ 733,610.96		$ 0.00	12.77	$ 733,610.96	12.77	$ 733,610.96
1.3.13	DEMOLICIÓN DE PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA O MACIZA E= 0.20 M EXISTENTE, EN CONCRETO REFORZADO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1.72	$ 47,779.00	$ 82,179.88	1.72	$ 82,179.88		$ 0.00	1.72	$ 82,179.88	1.72	$ 82,179.88
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	26.4	$ 18,929.00	$ 499,725.60	29.80	$ 564,084.20	2.88	$ 54,515.52	26.92	$ 509,568.68	29.80	$ 564,084.20
1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS)	UN	10	$ 18,691.00	$ 186,910.00	10.00	$ 186,910.00		$ 0.00	10	$ 186,910.00	10.00	$ 186,910.00
1.3.30	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA	M	12.5	$ 8,990.00	$ 112,375.00	12.50	$ 112,375.00		$ 0.00	12.5	$ 112,375.00	12.50	$ 112,375.00
1.3.43	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS.	M2	166.1	$ 42,778.00	$ 7,105,425.80	166.10	$ 7,105,425.80		$ 0.00	166.1	$ 7,105,425.80	166.10	$ 7,105,425.80
2	CIMENTACIÓN				**$ 15,710,536.98**								
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS						$ -		$ 0.00				
2.1.2	EXCAVACION MANUAL EN TIERRA HASTA 2.50 M. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL.	M3	16.85	$ 123,243.00	$ 2,076,644.55	16.85	$ 2,076,644.55		$ 0.00	16.85	$ 2,076,644.55	16.85	$ 2,076,644.55
2.1.8	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	10.25	$ 17,979.00	$ 184,284.75	10.87	$ 195,431.73		$ 0.00	10.87	$ 195,431.73	10.87	$ 195,431.73
2.2	CONCRETOS						$ -		$ 0.00				
2.2.5	VIGA 30 X 40 EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	M	30.58	$ 283,869.00	$ 8,680,714.02	20.20	$ 5,734,153.80		$ 0.00	20.2	$ 5,734,153.80	20.20	$ 5,734,153.80
2.2.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA DE CONFINAMIENTO 20 X 15 CMS. EN CONCRETO DE 3000 PSI NO INCLUYE REFUERZO	M		$ 111,104.00	$ 0.00	7.40	$ 822,169.60		$ 0.00	7.4	$ 822,169.60	7.40	$ 822,169.60
2.2.17	CONCRETO CICLÓPEO - 40 % DE CONCRETO F'C = 3000 PSI CONCRETOS PARA CIMENTACIÓN	M3		$ 319,074.00	$ 0.00	4.73	$ 1,509,220.02		$ 0.00	4.73	$ 1,509,220.02	4.73	$ 1,509,220.02
2.4	ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO						$ -		$ 0.00				
2.4.15	RAMPA EN CONCRETO E = 0.12 M 3000 PSI	M2	29.92	$ 110,685.00	$ 3,311,695.20	29.92	$ 3,311,695.20	29.92	$ 3,311,695.20	0	$ 0.00	29.92	$ 3,311,695.20
2.5	ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA						$ -		$ 0.00				
2.5.1	MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	107.64	$ 3,444.00	$ 370,712.16	0.00	$ -		$ 0.00	0	$ 0.00	-	
2.5.2	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	204.15	$ 5,322.00	$ 1,086,486.30	384.87	$ 2,048,278.14		$ 0.00	384.87	$ 2,048,278.14	384.87	$ 2,048,278.14
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 16,883,705.76**								
3.1	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -						
3.1.1	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No 5	M2		$ 49,452.00	$ 0.00	6.81	$ 336,768.12		$ 0.00	6.81	$ 336,768.12	6.81	$ 336,768.12
3.1.3	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	60.89	$ 17,799.00	$ 1,083,781.11	47.30	$ 841,892.70	-13.59	-$ 241,888.41	60.89	$ 1,083,781.11	47.30	$ 841,892.70
3.1.5	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL PORTANTE 30 CM	M2	15.55	$ 104,509.00	$ 1,625,114.95		$ -		$ 0.00	0	$ 0.00	-	
3.2.9	REEMBOQUILLADO DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA O ADOQUIN CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	ML	43.58	$ 26,449.00	$ 1,152,647.42	48.81	$ 1,290,975.69	5.23	$ 138,328.27	43.58	$ 1,152,647.42	48.81	$ 1,290,975.69
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	445.74	$ 21,662.00	$ 9,655,619.88	385.71	$ 8,355,250.02		$ 0.00	385.71	$ 8,355,250.02	385.71	$ 8,355,250.02
3.2.19	MESÓN EN GRANITO NATURAL ANCHO MENOR O IGUAL A 80CM - INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M	3.90	$ 863,216.00	$ 3,366,542.40	3.65	$ 3,150,738.40		$ 0.00	3.65	$ 3,150,738.40	3.65	$ 3,150,738.40

1. FECHA ELABORACIÓN: 5 | 4 | 2025

2. ACTA No. 3 | 3. TIPO DE ACTA PARCIAL: | RECIBO PARCIAL DE OBRA 3 | MODIFICACIONES 2

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR TEJEDORES DE SUEÑOS | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: TV 35 69M 85 S

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No: 9198-2024 | 7. FECHA CONTRATO: 19 | 11 | 2024 | 8. VALOR CONTRATO: $ 2,354,314,500

9. FECHA ACTA INICIO: 9 | 12 | 2024 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: 31 | MARZO | 2 | 2025 | 11. PLAZO: 3 MESES 21 DÍAS | Meses/días

12. PRORROGAS: 89 DÍAS | 13. SUSPENSIONES: | Meses/días | 14. ADICIONES: $ -

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

16. CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

17. CONTRATO INTEVENTORIA No: 9221-2024 | 18. FECHA CONTRATO: 26 | 11 | 2024 | 19. VALOR CONTRATO: $ 382,708,445

20. FECHA ACTA INICIO: 9 | 12 | 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: 15 | ABRIL | 4 | 2025 | 22. PLAZO: 4 MESES 15 DIAS | Meses/días

23. PRORROGAS: 104 DIAS | 24. SUSPENSIONES: | Meses/días | 25. ADICIONES: $ 98,026,043

26. INTEVENTORÍA: COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC

27. SUPERVISOR SDIS: JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 5 días del mes de ABRIL del año 2025 se reunieron EL ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO representante legal del contratista y LA ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra/o Modificaciones del mes de MARZO según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E				**$ 2,898,201.00**								
4.1	TUBERIA						$ -						
4.1.15	PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	UN	2.00	$ 48,267.00	$ 96,534.00	4.00	$ 193,068.00		$ 0.00	4.00	$ 193,068.00	4.00	$ 193,068.00
4.1.56	LLAVE MANGUERA 1/2" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	UN	2.00	$ 99,652.00	$ 199,304.00	2.00	$ 199,304.00		$ 0.00	2.00	$ 199,304.00	2.00	$ 199,304.00
4.1.57	PUNTO SANITARIO 4" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 68,453.00	$ 68,453.00	1.00	$ 68,453.00		$ 0.00	1.00	$ 68,453.00	1.00	$ 68,453.00
4.1.68	SIFON DE PISO 3" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	UN	3.00	$ 55,547.00	$ 166,641.00	1.00	$ 55,547.00		$ 0.00	1.00	$ 55,547.00	1.00	$ 55,547.00
4.1.81	INSTALACION DE SANITARIO, INCLUYE LOS ACCESORIOS	UN	1.00	$ 419,856.00	$ 419,856.00	1.00	$ 419,856.00		$ 0.00	1.00	$ 419,856.00	1.00	$ 419,856.00
4.1.84	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE ACOPLE, GRIFERÍA ELECTRÓNICA, SIFÓN EN P, DESAGÜE Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	UN	1.00	$ 1,332,994.00	$ 1,332,994.00	0.00	$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	
4.2	CAJAS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -		$ 0.00				
4.2.1	CAJA DE INSPECCION 60 X 60	UN	1.00	$ 614,419.00	$ 614,419.00	1.00	$ 614,419.00		$ 0.00	1.00	$ 614,419.00	1.00	$ 614,419.00
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 7,728,642.00**					0	$ 0.00	-	
5.1.13	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M	UN	1.00	$ 347,467.00	$ 347,467.00	1.00	$ 347,467.00		$ 0.00	1.00	$ 347,467.00	1.00	$ 347,467.00
5.1.59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED NORMAL TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 8X4 CM CON DIVISIÓN, INCLUYE APARATO, TAPA DE	UN	9.00	$ 275,099.00	$ 2,475,891.00	9.00	$ 2,475,891.00		$ 0.00	9.00	$ 2,475,891.00	9.00	$ 2,475,891.00
5.1.68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA DE 60 W TIPO LED. INCLUYE TUBOS, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	5.00	$ 734,271.00	$ 3,671,355.00	13.00	$ 9,545,523.00	13.00	$ 9,545,523.00	0	$ 0.00	13.00	$ 9,545,523.00
5.1.71.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 184,447.00	$ 0.00	6.00	$ 1,106,682.00	6.00	$ 1,106,682.00	0	$ 0.00	6.00	$ 1,106,682.00
5.1.71.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CIRCULAR DE 24 W. 11" INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2.00	$ 45,984.00	$ 91,968.00	0.00	$ -		$ 0.00	0	$ 0.00	-	
5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 185,011.00	$ 185,011.00	0.00	$ -		$ 0.00	0	$ 0.00	-	
5.1.77	REINSTALACIÓN DE LAMPARAS EXISTENTES (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		$ 20,193.00	$ 0.00	7.00	$ 141,351.00	7.00	$ 141,351.00	0	$ 0.00	7.00	$ 141,351.00
5.1.78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA DE 4 X 8 CM TROQUELADA	M	12.5	$ 76,556.00	$ 956,950.00	12.50	$ 956,950.00	12.50	$ 956,950.00	0	$ 0.00	12.50	$ 956,950.00
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 29,383,903.12**								
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -		$ 0.00				
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04	M2	204.4	$ 41,523.00	$ 8,487,301.20	153.11	$ 6,357,586.53		$ 0.00	153.11	$ 6,357,586.53	153.11	$ 6,357,586.53
7.1.5	PULIDA DE MEDIACAÑA EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE FRONTAL (ANCHO < 0.75 M)	M	92	$ 30,510.00	$ 2,806,920.00	70.61	$ 2,154,311.10		$ 0.00	70.61	$ 2,154,311.10	70.61	$ 2,154,311.10
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	20.96	$ 14,846.00	$ 311,172.16		$ -		$ 0.00	0	$ 0.00	-	
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -		$ 0.00				
7.2.2	BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A = 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	4.4	$ 68,333.00	$ 300,665.20	14.98	$ 1,023,628.34		$ 0.00	14.98	$ 1,023,628.34	14.98	$ 1,023,628.34
7.2.4	GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	20.96	$ 54,616.00	$ 1,144,751.36	20.52	$ 1,120,720.32		$ 0.00	20.52	$ 1,120,720.32	20.52	$ 1,120,720.32
7.2.8	GUARDA ESCOBA MEDIACAÑA EN GRAVILLA LAVADO MONA, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M		$ 42,471.00	$ 0.00	7.87	$ 334,246.77	7.87	$ 334,246.77	0	$ 0.00	7.87	$ 334,246.77
7.2.11	PISO TABLÓN DE 33 X 33, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	20.4	$ 108,637.00	$ 2,216,194.80	15.00	$ 1,629,555.00	15.00	$ 1,629,555.00	0	$ 0.00	15.00	$ 1,629,555.00
7.2.16	CINTA ANTIDESLIZANTE A = 2 CM	M		$ 3,594.00	$ 0.00	10.00	$ 35,940.00	10.00	$ 35,940.00	0	$ 0.00	10.00	$ 35,940.00
7.2.26	ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	136.45	$ 95,370.00	$ 13,013,236.50	132.71	$ 12,656,552.70		$ 0.00	132.71	$ 12,656,552.70	132.71	$ 12,656,552.70
7.2.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM	M	42.55	$ 25,938.00	$ 1,103,661.90	26.01	$ 674,647.38	26.01	$ 674,647.38	0	$ 0.00	26.01	$ 674,647.38
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 8,725,137.85**					0	$ 0.00	-	
8.1.2	ENCHAPE 25 X 35	M2	43.21	$ 125,716.00	$ 5,432,188.36	47.43	$ 5,962,709.88		$ 0.00	47.43	$ 5,962,709.88	47.43	$ 5,962,709.88
8.1.5	ESQUINERO PLÁSTICO	M	75.63	$ 7,743.00	$ 585,603.09	81.63	$ 632,061.09		$ 0.00	81.63	$ 632,061.09	81.63	$ 632,061.09
8.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPER BOARD 8 MM A DOS CARAS EN ALTURA SUPERIOR A 3 M (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	13.2	$ 205,102.00	$ 2,707,346.40	12.06	$ 2,473,530.12		$ 0.00	12.06	$ 2,473,530.12	12.06	$ 2,473,530.12
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 19,720,466.67**								
9.1	CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -		$ 0.00				
9.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERROJO	M2	6.4	$ 330,393.00	$ 2,114,515.20	6.40	$ 2,114,515.20	6.40	$ 2,114,515.20	0	$ 0.00	6.40	$ 2,114,515.20
9.2	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -		$ 0.00				

	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA OBRA	Código: FOR-GIF-020 Versión: 1 Fecha: Memo I2024037699 - 18/12/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN:	5	4	2025														
2. ACTA No.	3			3. TIPO DE ACTA PARCIAL:								RECIBO PARCIAL DE OBRA	3	MODIFICACIONES	2		
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR TEJEDORES DE SUEÑOS						5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:						TV 35 69M 85 S				
A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO																	
6. CONTRATO OBRA No:	9198-2024			7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024					8. VALOR CONTRATO:	$ 2,354,314,500				
9. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:		31	MARZO	2	2025			11. PLAZO:	3 MESES 21 DÍAS	Meses/días			
12. PRORROGAS:	89 DÍAS			13. SUSPENSIONES:			Meses/días					14. ADICIONES:	$ -				
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO																
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL																
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9221-2024			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024					19. VALOR CONTRATO:	$ 382,708,445				
20. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:		15	ABRIL	4	2025			22. PLAZO:	4 MESES 15 DIAS	Meses/días			
23. PRORROGAS:	104 DIAS			24. SUSPENSIONES:			Meses/días					25. ADICIONES:	$ 98,026,043				
26. INTEVENTORÍA:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC																
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA																

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 5 días del mes de ABRIL del año 2025 se reunieron EL ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO representante legal del contratista y LA ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra/o Modificaciones del mes de MARZO según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
9.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO SIN BATIENTES, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS	M2	26.47	$ 439,181.00	$ 11,625,121.07	26.61	$ 11,686,606.41		$ 0.00	26.61	$ 11,686,606.41	26.61	$ 11,686,606.41
9.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA. INSTALADA. VERIFICAR EN	M2		$ 231,307.00	$ 0.00	2.14	$ 494,996.98	2.14	$ 494,996.98	0.00	$ 0.00	2.14	$ 494,996.98
9.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, INCLUYE TORNILLOS, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA . VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA	M2	26.3	$ 227,408.00	$ 5,980,830.40	26.30	$ 5,980,830.40		$ 0.00	26.30	$ 5,980,830.40	26.30	$ 5,980,830.40
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 8,927,554.00**								
11.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE INCRUSTAR COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA Y GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	5.00	$ 705,542.00	$ 3,527,710.00	5.00	$ 3,527,710.00		$ 0.00	5.00	$ 3,527,710.00	5.00	$ 3,527,710.00
11.1.7	ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2.00	$ 840,074.00	$ 1,680,148.00	2.00	$ 1,680,148.00		$ 0.00	2.00	$ 1,680,148.00	2.00	$ 1,680,148.00
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE SENSOR, SISTEMA DE INSTALACIÓN EP/ES, ASIENTO SANITARIO)	UN	1.00	$ 1,663,701.00	$ 1,663,701.00	0.00	$ -	-1.00	-$ 1,663,701.00	1.00	$ 1,663,701.00	-	
11.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PEDAL PARA LAVAMANOS O LAVAPLATOS	UN	5.00	$ 411,199.00	$ 2,055,995.00	5.00	$ 2,055,995.00		$ 0.00	5.00	$ 2,055,995.00	5.00	$ 2,055,995.00
12	APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 26,153,667.00**								
12.1.17	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDA DE PROTECCIÓN DE ALTURA DE 1,20MTS CON DOBLE PASAMANOS DE 2" Y TUBERÍA VERTICAL CADA 40CM DE 1/2". INCLUYE 2 CAPAS DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE	M	38.25	$ 683,756.00	$ 26,153,667.00	31.21	$ 21,340,024.76	31.21	$ 21,340,024.76	0	$ 0.00	31.21	$ 21,340,024.76
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 21,958,065.41**								
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -		$ 0.00				
13.1.1	PAÑETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	18.2	$ 28,666.00	$ 521,721.20	31.82	$ 912,152.12		$ 0.00	31.82	$ 912,152.12	31.82	$ 912,152.12
13.1.8	PAÑETE MURO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (A=0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	72.3	$ 14,824.00	$ 1,071,775.20	72.06	$ 1,068,217.44		$ 0.00	72.06	$ 1,068,217.44	72.06	$ 1,068,217.44
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -		$ 0.00				
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	480.41	$ 10,754.00	$ 5,166,329.14	396.91	$ 4,268,370.14		$ 0.00	396.91	$ 4,268,370.14	396.91	$ 4,268,370.14
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2		$ 20,469.00	$ 0.00	35.84	$ 733,608.96		$ 0.00	35.84	$ 733,608.96	35.84	$ 733,608.96
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	48.33	$ 21,505.00	$ 1,039,336.65	56.33	$ 1,211,376.65	56.33	$ 1,211,376.65	0	$ 0.00	56.33	$ 1,211,376.65
13.2.4	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 11,796.00	$ 0.00	69.59	$ 820,883.64	69.59	$ 820,883.64	0	$ 0.00	69.59	$ 820,883.64
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	270.96	$ 45,138.00	$ 12,230,592.48	168.35	$ 7,598,982.30		$ 0.00	168.35	$ 7,598,982.30	168.35	$ 7,598,982.30
13.2.8	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 14,653.00	$ 0.00	11.75	$ 172,172.75	11.75	$ 172,172.75			11.75	$ 172,172.75
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -		$ 0.00				
13.4.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS A DOS MANOS Y DOS CARAS	M2	27.5	$ 43,779.00	$ 1,203,922.50	21.53	$ 942,561.87	21.53	$ 942,561.87	0	$ 0.00	21.53	$ 942,561.87
13.4.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M2	26.96	$ 26,869.00	$ 724,388.24	28.03	$ 753,138.07	28.03	$ 753,138.07	0	$ 0.00	28.03	$ 753,138.07
14	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 4,318,910.20**					0	$ 0.00	-	
14.1.1	CIELORASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	26.92	$ 160,435.00	$ 4,318,910.20	34.35	$ 5,510,942.25	7.43	$ 1,192,032.05	26.92	$ 4,318,910.20	34.35	$ 5,510,942.25
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			$ -	**$ 10,745,012.78**					0	$ 0.00	-	
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	46.00	$ 51,981.00	$ 2,391,126.00	58.34	$ 3,032,571.54		$ 0.00	58.34	$ 3,032,571.54	58.34	$ 3,032,571.54
17.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	6.40	$ 44,561.00	$ 285,190.40	6.07	$ 270,485.27	6.07	$ 270,485.27	0	$ 0.00	6.07	$ 270,485.27
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	10.51	$ 247,595.00	$ 2,602,223.45	11.33	$ 2,805,251.35	11.33	$ 2,805,251.35	0	$ 0.00	11.33	$ 2,805,251.35
17.1.17	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CERCHA PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M		$ 95,801.00	$ 0.00	6.15	$ 589,176.15	6.15	$ 589,176.15	0	$ 0.00	6.15	$ 589,176.15
17.1.18	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	12.96	$ 61,523.00	$ 797,338.08	10.51	$ 646,606.73	10.51	$ 646,606.73	0	$ 0.00	10.51	$ 646,606.73
17.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	2.33	$ 200,325.00	$ 466,757.25	14.01	$ 2,806,553.25	14.01	$ 2,806,553.25	0	$ 0.00	14.01	$ 2,806,553.25
17.1.24.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	15.55	$ 205,696.00	$ 3,198,572.80		$ -		$ 0.00	0	$ 0.00	-	
17.1.30	CANAL AMAZONA	M	9.6	$ 104,563.00	$ 1,003,804.80	8.59	$ 898,196.17	8.59	$ 898,196.17	0	$ 0.00	8.59	$ 898,196.17
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				**$ 1,736,923.50**								
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	329.9	$ 5,265.00	$ 1,736,923.50	213.53	$ 1,124,235.45	213.53	$ 1,124,235.45	0	$ 0.00	213.53	$ 1,124,235.45

	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA OBRA	Código: FOR-GIF-020 Versión: 1 Fecha: Memo I2024037699 - 18/12/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN:	5	4	2025										
2. ACTA No.	3		3. TIPO DE ACTA PARCIAL:					RECIBO PARCIAL DE OBRA	3	MODIFICACIONES	2		
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR TEJEDORES DE SUEÑOS			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:				TV 35 69M 85 S					

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9198-2024		7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024		8. VALOR CONTRATO:	$ 2,354,314,500				
9. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:		31	MARZO	2	2025	11. PLAZO:	3 MESES 21 DÍAS	Meses/días	
12. PRORROGAS:	89 DÍAS		13. SUSPENSIONES:			Meses/días				14. ADICIONES:	$ -		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO												
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL												
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9221-2024		18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024		19. VALOR CONTRATO:	$ 382,708,445				
20. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:		15	ABRIL	4	2025	22. PLAZO:	4 MESES 15 DIAS	Meses/días	
23. PRORROGAS:	104 DIAS		24. SUSPENSIONES:			Meses/días				25. ADICIONES:	$ 98,026,043		
26. INTEVENTORÍA:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC												
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA												

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 5 días del mes de ABRIL del año 2025 se reunieron EL ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO representante legal del contratista y LA ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obray/o Modificaciones del mes de MARZO según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO					$ 192,120,147.23		$ 183,263,318.28		$ 56,806,736.52		$ 126,456,581.76		$ 183,263,318.28
35. DESCRIPCIÓN			**36. VALOR CONTRACTUAL**										
ADMINISTRACIÓN			25.64%		$ 49,259,605.75		$ 46,988,715.81		$ 14,565,247.24		$ 32,423,467.56		$ 46,988,715.81
IMPREVISTO			0.50%		$ 960,600.74		$ 916,316.59		$ 284,033.68		$ 632,282.91		$ 916,316.59
UTILIDAD			3.00%		$ 5,763,604.42		$ 5,497,899.55		$ 1,704,202.10		$ 3,793,697.45		$ 5,497,899.55
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)					$ 55,983,810.91		$ 53,402,931.95		$ 16,553,483.02		$ 36,849,447.92		$ 53,402,931.95
ANTICIPO			0%		$ -		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO			0%		$ -		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00
AJUSTE AL PESO					$ (0.14)		-$ 0.23		$ 0.46		$ 0.32		-$ 0.23
37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO					$ 248,103,958.00		$ 236,666,250.00		$ 73,360,220.00		$ 163,306,030.00		$ 236,666,250.00

100.00%

C. OBSERVACIONES

La informacion reportada corresponde a los informes aprobados por la intrventoria y cargados en el secop

	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA OBRA	Código: FOR-GIF-020 Versión: 1 Fecha: Memo I2024037699 - 18/12/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN:	5	4	2025										
2. ACTA No.	3		3. TIPO DE ACTA PARCIAL:				RECIBO PARCIAL DE OBRA	3	MODIFICACIONES	2			
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR TEJEDORES DE SUEÑOS			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:			TV 35 69M 85 S						

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9198-2024		7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024			8. VALOR CONTRATO:	$	2,354,314,500		
9. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	MARZO	2	2025	11. PLAZO:	3 MESES 21 DÍAS		Meses/días	
12. PRORROGAS:	89 DÍAS		13. SUSPENSIONES:		Meses/días				14. ADICIONES:	$	-		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO												
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL												
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9221-2024		18. FECHA CONTRATO:	26	11	2024			19. VALOR CONTRATO:	$	382,708,445		
20. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	15	ABRIL	4	2025	22. PLAZO:	4 MESES 15 DIAS		Meses/días	
23. PRORROGAS:	104 DIAS		24. SUSPENSIONES:		Meses/días				25. ADICIONES:	$	98,026,043		
26. INTEVENTORÍA:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC												
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA												

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 5 días del mes de ABRIL del año 2025 se reunieron EL ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO representante legal del contratista y LA ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obray/o Modificaciones del mes de MARZO según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

DESCRIPCION	38. No. INFORME MENSUAL	39. PERIODO	40. NOMBRE DEL ARCHIVO	41. FECHA DE CARGUE	42. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO	3	9/02/2025 - 8/03/2025	9198-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 3 PARTE 1	02/04/2025	
INFORME SOCIAL	N/A	N/A	N/A	02/04/2025	
INFORME AMBIENTAL	3	9/02//2025 - 8/03/2025	9198-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 3 PARTE 2	02/04/2025	
INFORME SST	3	9/02//2025 - 8/03/2025	9198-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 3 PARTE 3.1 y 3.2	02/04/2025	
INFORME DE SUPERVISION	3	9/02//2025 - 8/03/2025	9198-2024 CORTE GENERAL DE OBRA No. 2	21/03/2025	
ACTA PARCIAL	3	9/02//2025 - 8/03/2025	9198-2024 CORTE GENERAL DE OBRA No. 2	21/03/2025	
SOPORTE PAGO SDH	3	9/02//2025 - 8/03/2025	9198-2024 CORTE GENERAL DE OBRA No. 2	21/03/2025	
FACTURA	3	9/02//2025 - 8/03/2025	9198-2024 CORTE GENERAL DE OBRA No. 2	21/03/2025	
FORMATO MC 14	3	9/02//2025 - 8/03/2025			

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 05 días del mes de ABRIL del año 2025

Nombre: ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO
CONTRATISTA DE LA OBRA

MEBYS DE LA OSSA L.

Nombre: ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ
INTERVENTOR DE LA OBRA

Origin Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia Interventor
Copia Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN: 5 / 4 / 2025

2. ACTA No. 3 — 3. TIPO DE ACTA PARCIAL: RECIBO PARCIAL DE OBRA 3 — MODIFICACIONES 2

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PORVENIR — 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: KR 100 52 24 SUR

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No: 9198-2024 — 7. FECHA CONTRATO: 19 / 11 / 2024 — 8. VALOR CONTRATO: $ 2,354,314,500

9. FECHA ACTA INICIO: 9 / 12 / 2024 — 10. FECHA DE TERMINACIÓN: 31 / MARZO / 2 / 2025 — 11. PLAZO: 3 MESES 21 DÍAS (Meses/días)

12. PRORROGAS: 89 DÍAS — 13. SUSPENSIONES: (Meses/días) — 14. ADICIONES: $ -

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

16. CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

17. CONTRATO INTEVENTORIA No: 9221-2024 — 18. FECHA CONTRATO: 26 / 11 / 2024 — 19. VALOR CONTRATO: $ 382,708,445

20. FECHA ACTA INICIO: 9 / 12 / 2025 — 21. FECHA DE TERMINACIÓN: 15 / ABRIL / 4 / 2025 — 22. PLAZO: 4 MESES 15 DIAS (Meses/días)

23. PRORROGAS: 104 DIAS — 24. SUSPENSIONES: (Meses/días) — 25. ADICIONES: $ 98,026,043

26. INTEVENTORÍA: COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC

27. SUPERVISOR SDIS: JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 5 días del mes de ABRIL del año 2025 se reunieron EL ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO representante legal del contratista y LA ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de MARZO según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	PRELIMINARES				**$ 80,495,369.77**								
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL												
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTANCIAMIENTO CADA	M	294.67	$ 43,298.00	$ 12,758,621.66	0	$ -			0.00	$ -	-	
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS						$ -						
1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y	M2	1407.61	$ 27,519.00	$ 38,736,019.59	1662.38	$ 45,747,035.22	1080.57	$ 29,736,205.83	581.81	$ 16,010,829.39	1,662.38	$ 45,747,035.22
1.3.20	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL	M2	956.11	$ 10,188.00	$ 9,740,848.68	960.25	$ 9,783,027.00	507.24	$ 5,167,761.12	453.01	$ 4,615,265.88	960.25	$ 9,783,027.00
1.3.23	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	956.11	$ 20,144.00	$ 19,259,879.84	826.84	$ 16,655,864.96	328.39	$ 6,615,088.16	498.45	$ 10,040,776.80	826.84	$ 16,655,864.96
1.3.39	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM	M		$ 33,344.00	$ 0.00	3.28	$ 109,368.32	3.28	$ 109,368.32			3.28	$ 109,368.32
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 2,605,213.75**					0.00	$ 0.00	-	
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0.00				$ -			0.00	$ 0.00	-	
3.2.13	RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	87.35	$ 29,825.00	$ 2,605,213.75	52.4	$ 1,562,830.00		$ 0.00	52.40	$ 1,562,830.00	52.40	$ 1,562,830.00
3.2.4	REMATE LINEAL CUBIERTA EN LADRILLO TOLETE	M		$ 28,641.00	$ 0.00	3.28	$ 93,942.48	3.28	$ 93,942.48			3.28	$ 93,942.48
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E				**$ 15,480,632.00**					0.00	$ 0.00	-	
5.1.11	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 363,183.00	$ 0.00	2.00	$ 726,366.00	2.00	$ 726,366.00	0.00	$ 0.00	2.00	$ 726,366.00
5.1.12	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 400,322.00	$ 400,322.00	3.00	$ 1,200,966.00	3.00	$ 1,200,966.00	0.00	$ 0.00	3.00	$ 1,200,966.00
5.1.59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED NORMAL TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 8X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, TAPA DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA	UN	2.00	$ 275,099.00	$ 550,198.00	0.00	$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00
5.1.60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED REGULADA TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 8X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, TAPA DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA	UN	1.00	$ 226,931.00	$ 226,931.00	0.00	$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00
5.1.61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA DE VOZ Y DATOS RJ45 CATEGORÍA 5 TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 8X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, TAPA DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. NO INCLUYE CABLEADO.	UN	1.00	$ 122,364.00	$ 122,364.00	1.00	$ 122,364.00	1.00	$ 122,364.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 122,364.00
5.1.68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA DE 60W, TIPO LED, INCLUYE TUBOS, SOPORTES,	UN	19.00	$ 734,271.00	$ 13,951,149.00		$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00
5.1.74	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER	UN		$ 99,525.00	$ 0.00	19.00	$ 1,890,975.00		$ 0.00	19.00	$ 1,890,975.00	19.00	$ 1,890,975.00
5.1.78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA DE 4 X 8 CM TROQUELADA	M	3.00	$ 76,556.00	$ 229,668.00	0.00	$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00
5.1.94	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAT 6A F/UTP LH AMP	M		$ 11,536.00	$ 0.00	0.00	$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00
5.1.95	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DATOS CATEGORÍA 6A	UN		$ 121,904.00	$ 0.00		$ -		$ 0.00	0.00	$ 0.00	-	$ 0.00
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 46,812,383.37**					0.00	$ 0.00	-	
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0.00	$ -			$ -			0.00	$ 0.00	-	
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04	M2	956.11	$ 41,523.00	$ 39,700,555.53	1205.14	$ 50,041,028.22	1039.17	$ 43,149,455.91	140.53	$ 5,835,227.19	1,179.70	$ 48,984,683.10
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	479.04	$ 14,846.00	$ 7,111,827.84	712.04	$ 10,570,945.84	682.54	$ 10,132,988.84	29.50	$ 437,957.00	712.04	$ 10,570,945.84
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 0.00**					0.00	$ 0.00	-	
11.1.20.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA TIPO CUPULA DE 5" A 3"	UN		$ 74,334.00	$ 0.00	29	$ 2,155,686.00	29.00	$ 2,155,686.00			29.00	$ 2,155,686.00
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 4,502,238.08**					0.00	$ 0.00	-	
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E						$ -			0.00	$ 0.00	-	
13.1.7	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	91.12	$ 25,832.00	$ 2,353,811.84	91.12	$ 2,353,811.84		$ 0.00	91.12	$ 2,353,811.84	91.12	$ 2,353,811.84
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E									0.00			
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2	104.96	$ 20,469.00	$ 2,148,426.24	104.96	$ 2,148,426.24		$ 0.00	104.96	$ 2,148,426.24	104.96	$ 2,148,426.24
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E				**$ 132,993,427.56**					0.00	$ 0.00	-	
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANTAMIO CERTIFICADO	M	37.20	$ 51,981.00	$ 1,933,693.20	0	$ -		$ 0.00	0.00		-	
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	956.11	$ 137,076.00	$ 131,059,734.36	1120.47	$ 153,589,545.72	576.83	$ 79,069,549.08	105.52	$ 14,464,259.52	682.35	$ 93,533,808.60
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				**$ 9,089,706.60**					0.00	$ 0.00	-	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1726.44	$ 5,265.00	$ 9,089,706.60	1126.02	$ 5,928,495.30	0.00	$ 0.00	128.05	$ 674,183.25	128.05	$ 674,183
21	PRECIOS NO PREVISTOS		0.00	$ 5,265.00	**$ 0.00**					0.00	$ 0.00	-	
NP 001	DESMONTE, INSTALACION Y CERTIFICACION DE PUNTOS DE ANCLAJE PARA TRABAJO EN ALTURAS	UN		$ 382,772.00	$ 0.00	8	$ 3,062,176.00	8	$ 3,062,176.00	0.00	$ 0.00	8.00	$ 3,062,176.00
34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO					$ 291,978,971.13		$ 307,742,854.14		$ 181,341,917.74		$ 60,034,542.11		$ 241,376,459.85
35. DESCRIPCIÓN		**36. VALOR CONTRACTUAL**											
ADMINISTRACIÓN		25.64%			$ 74,863,408.20		$ 78,905,267.80		$ 46,496,067.71		$ 15,392,856.60		$ 61,888,924.31
IMPREVISTO		0.50%			$ 1,459,894.86		$ 1,538,714.27		$ 906,709.59		$ 300,172.71		$ 1,206,882.30
UTILIDAD		3.00%			$ 8,759,369.13		$ 9,232,285.62		$ 5,440,257.53		$ 1,801,036.26		$ 7,241,293.80
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)					$ 85,082,672.19		$ 89,676,267.69		$ 52,843,034.83		$ 17,494,065.57		$ 70,337,100.41
ANTICIPO		0%			$ -		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO		0%			$ -		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00
AJUSTE AL PESO					$ (0.32)		$ 0.17		-$ 0.57		-$ 0.68		-$ 1.26
37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO					$ 377,061,643.00		$ 397,419,122.00		$ 234,184,952.00		$ 77,528,607.00		$ 311,713,559.00

C. OBSERVACIONES

La informacion reportada corresponde a los informes aprobados por la intrventoria y cargados en el secop

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

DESCRIPCION	38. No. INFORME MENSUAL	39. PERIODO	40. NOMBRE DEL ARCHIVO	41. FECHA DE CARGUE	42. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO	3	9/02/2025 - 8/03/2025	9198-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 3 PARTE 1	02/04/2025	
INFORME SOCIAL	N/A	N/A	N/A	02/04/2025	
INFORME AMBIENTAL	3	9/02//2025 - 8/03/2025	9198-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 3 PARTE 2	02/04/2025	
INFORME SST	3	9/02//2025 - 8/03/2025	9198-2024 INFORME MENSUAL OBRA No. 3 PARTE 3.1 y 3.2	02/04/2025	
INFORME DE SUPERVISION	3	9/02//2025 - 8/03/2025	9198-2024 CORTE GENERAL DE OBRA No. 2	21/03/2025	
ACTA PARCIAL	3	9/02//2025 - 8/03/2025	9198-2024 CORTE GENERAL DE OBRA No. 2	21/03/2025	
SOPORTE PAGO SDH	3	9/02//2025 - 8/03/2025	9198-2024 CORTE GENERAL DE OBRA No. 2	21/03/2025	
FACTURA	3	9/02//2025 - 8/03/2025	9198-2024 CORTE GENERAL DE OBRA No. 2	21/03/2025	
FORMATO MC 14	3	9/02//2025 - 8/03/2025			

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los __05____ días del mes de ____ABRIL_____ del año __2025_____

Nombre: ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO
CONTRATISTA DE LA OBRA

Nombre: ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ
INTERVENTOR DE LA OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Versión: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9122-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**


CAPITULO	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**003**
ITEM	**13.2.1** **VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

ZONA ADMINISTRATIVA





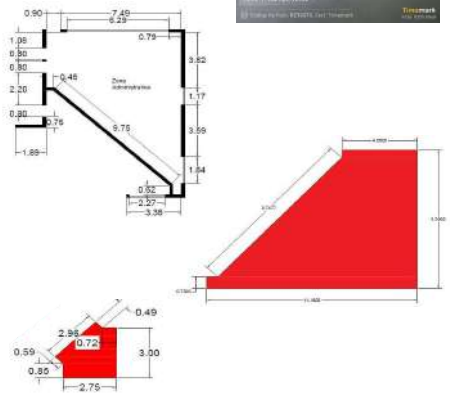

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
						CORTE 2			
						CIELO RASOS			
CIELO RASO OFICINAS	1,00	5,58	11,18			62,38	62,38	M2	
CIELO RASO MESON TERRAZA	1,00	2,55	3,00			7,65	7,65	M2	
						MUROS			
MURO 1	1,00		1,89	2,42		4,57	4,57	M2	
MURO 2	1,00		6,56	2,42		15,88	15,88	M2	
DESCUENTO PUERTAS BAÑOS	-3,00		0,80	2,40		-5,76	-5,76	M2	
MURO 3	1,00		8,39	2,42		20,30	20,30	M2	
DESCUENTO VENTANA	-1,00		6,29	1,98		-12,45	-12,45	M2	
DESCUENTO PUERTA TERRAZA	-1,00		0,90	2,05		-1,85	-1,85	M2	
MURO 4	1,00		11,18	2,42		27,06	27,06	M2	
DECUENTO VENTANA	-1,00		1,17	0,94		-1,10	-1,10	M2	
DECUENTO VENTANA	-1,00		1,84	1,80		-3,31	-3,31	M2	
MURO 5	1,00		3,38	2,42		8,18	8,18	M2	
DESCUENTO VENTANA	-1,00		2,27	2,13		-4,84	-4,84	M2	
COLUMNA	1,00		1,64	2,42		3,97	3,97	M2	
MURO DOBLE ALTURA AREA ADMNISTRATIVA	1,00		10,82	3,60		38,95	38,95	M2	
DESCUENTO LAMPARA	-11,00		0,60	0,60		-3,96	-3,96	M2	
						CORTE 3			
						DESCUENTO PINTURA CIELO RASOS			
CIELO RASO OFICINAS	-1,00	5,59	11,18			-62,45	-62,45	M2	
DINTEL	-1,00	0,45	9,75			-4,39	-4,39	M2	

TOTAL EJECUTADO	88,83	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	155,67	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**-66,84**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
-66,84	155,67	**88,83**

OBSERVACIONES:

RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**	
NOMBRE	ING. LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
FIRMA		**FIRMA**	
DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C	**FRENTE OBRA**	TORITO FELIZ
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de Marzo de 2025**

CAPITULO	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**003**
ITEM	**13.4.3**	**ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)**		**UNIDAD**	**M**


ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



NIVEL 1





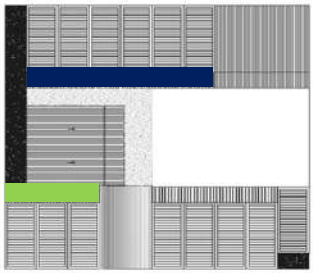





LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
CORTE #1									
CUBIERTA ACCESO	5,00	4,43				22,15	22,15	M	
	2,00		7,90			15,80	15,80	M	
CUBIERTA ZONA ADMINISTRATIVA	3,00		8,10			24,30	24,30	M	
CUBIERTA FRENTE COCINA	5,00		8,10			40,50	40,50	M	
CUBIERTA ZONA TANQUE DE AGUA	4,00		8,10			32,40	32,40	M	
CORTE #2									
CUBIERTA INGRESO	11,00		4,50			49,50	49,50	M	
CUBIERTA INGRESO	6,00		8,05			48,30	48,30	M	
CUBIERTA ADMINISTRACION	2,00		7,35			14,70	14,70	M	
CUBIERTA ADMINISTRACION	4,00		1,60			6,40	6,40	M	
CUBIERTA ADMINISTRACION	8,00		1,30			10,40	10,40	M	
AULAS	14,00		1,30			18,20	18,20	M	
AULAS	7,00		1,54			10,78	10,78	M	
AULAS	2,00		14,75			29,50	29,50	M	
COCINA Y AULAS	11,00		1,30			14,30	14,30	M	
COCINA Y AULAS	1,00		2,10			2,10	2,10	M	
COCINA Y AULAS	1,00		1,40			1,40	1,40	M	
COCINA Y AULAS	2,00		1,40			2,80	2,80	M	
COCINA Y AULAS	4,00		1,50			6,00	6,00	M	
COCINA Y AULAS	2,00		9,76			19,52	19,52	M	
COCINA Y AULAS	1,00		3,70			3,70	3,70	M	
DESCUENTO PROYECCION CORTE #1	-1,00		135,2			-135,15	-135,15	M	









CORTE #3									
DETALLE EN COLUMNETA	1,00		2,50			2,50	2,50	M	
DETALLE FACHADA EN EXTERIOR	5,00		0,40			2,00	2,00	M	
DETALLE INTERIOR ENTRADA	5,00		0,40			2,00	2,00	M	
TOTAL EJECUTADO							244,10	M	
MENOS ACTAS ANTERIORES							237,60	M	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X							0,00	M	
PRESENTE ACTA							**6,50**	M	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
6,50	237,60	**244,10**

OBSERVACIONES:

RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**	
NOMBRE	ING. LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
FIRMA		**FIRMA**	
DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	TORITO FELIZ
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de Marzo de 2025**

CAPITULO	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**003**
ITEM	**17.1.1**	**FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO**		**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
CORTE #2									
COCINA	1,00		3,71			3,71	3,71	**M**	
AULAS	2,00		9,84			19,68	19,68	**M**	
ADMINISTRACION	2,00		7,40			14,80	14,80	**M**	
ADMINISTRACION	1,00		1,70			1,70	1,70	**M**	
SALA AMIGA	1,00		6,05			6,05	6,05	**M**	
SALA AMIGA	1,00		5,45			5,45	5,45	**M**	
AULAS CALLE	1,00		6,64			6,64	6,64	**M**	
AULAS CALLE	1,00		8,00			8,00	8,00	**M**	
CORTE #3									
ENTRE CUBIERTA AULAS Y BAÑO	1,00		1,50			1,50	1,50	**M**	
						TOTAL EJECUTADO	67,53	M	
						MENOS ACTAS ANTERIORES	66,03	M	
						MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M	
						PRESENTE ACTA	**1,50**	M	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
1,50	66,03	**67,53**


OBSERVACIONES:

RESIDENTE INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA**	
NOMBRE	ING. LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
FIRMA		**FIRMA**	
DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	RINCON DE ARDILLAS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**003**
ITEM	**1.3.15**	**DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
COCINA	**PRIMER PISO**									
   	COCINA									
			3,80	4,25			1,00	16,15	M2	
			1,46	1,52			1,00	2,22	M2	
			0,93	0,47			1,00	0,44	M2	
			1,88	1,15			1,00	2,16	M2	
			1,91	1,61			1,00	3,08	M2	
			1,47	1,44			1,00	2,12	M2	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024	FRENTE OBRA	RINCON DE ARDILLAS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	31 de marzo de 2025

CAPITULO	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			ACTA No:	003
ITEM	3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE		UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA











LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
TERRAZA POR EJE A									
JARDINERA			2,80	2,96		1,00	8,29	M2	
			5,17	2,96		1,00	15,30	M2	
			4,84	2,96		1,00	14,33	M2	
			2,46	2,96		1,00	7,28	M2	
			1,11	2,96		1,00	3,29	M2	
			5,22	2,96		1,00	15,45	M2	
			3,05	2,96		1,00	9,03	M2	
			1,19	3,02		1,00	3,59	M2	
MENOS VENTANAS		2,38	1,97			-1,00	-4,69	M2	
CLARABOYAS		4,67		1,00		3,00	14,01	M2	
TERRAZA POR EJE E									
JARDIERA			4,60	2,89		1,00	13,29	M2	
			0,64	2,89		1,00	1,85	M2	
			3,88	0,76		1,00	2,95	M2	
			3,88	0,53		1,00	2,06	M2	
			0,56	3,01		1,00	1,69	M2	
			2,27	3,01		1,00	6,83	M2	
			2,40	0,34		1,00	0,83	M2	
			3,34	0,40		1,00	1,34	M2	
			0,43	2,86		1,00	1,23	M2	
CLARABOYAS		4,64		1,00		2,00	9,28		
AULAS									
ITEM VINILO AULAS 60%	60%	122,22				1,00	73,33	M2	

TOTAL EJECUTADO	200,55	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**200,55**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
200,55	0,00	**200,55**


OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	ING. LUIS OSWALDO CAMPAÑA RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA	NOMBRE	ING. JOHANNA DEL PILAR NUSTES VELASQUEZ RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	RINCON DE ARDILLAS
INTERVENTOR:	COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**003**
ITEM	**7.2.30**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 6 CM**		**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
COCINA										
   	**PRIMER PISO**									
	COCINA MEDIA CAÑA			3,80			1,00	3,80	M	
				1,29			1,00	1,29	M	
				0,29			1,00	0,29	M	
				0,44			1,00	0,44	M	
				0,29			1,00	0,29	M	
				2,35			1,00	2,35	M	
				0,82			1,00	0,82	M	
				0,16			1,00	0,16	M	
				0,82			1,00	0,82	M	
				1,51			1,00	1,51	M	
				0,82			1,00	0,82	M	
				0,48			1,00	0,48	M	
				0,52			1,00	0,52	M	
				1,13			1,00	1,13	M	
				1,87			1,00	1,87	M	
				1,35			1,00	1,35	M	
				0,59			1,00	0,59	M	
				1,90			1,00	1,90	M	
				0,59			1,00	0,59	M	
				0,45			1,00	0,45	M	
				1,60			1,00	1,60	M	
				0,44			1,00	0,44	M	
				1,35			1,00	1,35	M	
				1,46			1,00	1,46	M	
				1,45			1,00	1,45	M	
				0,16			1,00	0,16	M	
				0,60			1,00	0,60	M	
				0,60			1,00	0,60	M	
				1,25			1,00	1,25	M	
				0,61			1,00	0,61	M	
				0,16			1,00	0,16	M	
				4,34			1,00	4,34		
				0,45			1,00	0,45		

TOTAL EJECUTADO	35,94	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	**35,94**	M

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
35,94	0,00	**35,94**



OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPIÑA **RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR RUSTES VELASQUEZ **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	RINCON DE ARDILLAS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**003**	
ITEM	**11.1.19**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"**		**UNIDAD**	**UND**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	TERRAZA POR EJE A									
   	REJILLA EN SIFON JARDINDERA						1,00	1,00	UND	
	TERRAZA POR EJE E									
	REJILLA EN SIFON JARDINDERA						1,00	1,00	UND	
							TOTAL EJECUTADO	2,00	UND	
							MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UND	
							MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UND	
							PRESENTE ACTA	**2,00**	UND	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
2,00	0,00	**2,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR RUSTES VELASQUEZ
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9398-2024	FRENTE OBRA	RINCÓN DE ARDILLAS
INTERVENTOR:	COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	31 de marzo de 2025

CAPITULO	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	003
ITEM	13.1.7	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UNIDAD M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA















LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
PISO 2									
SALON PREJARDIN		1,00		2,60		1,00	2,60	M2	
TERRAZA POR EJE A									
JARDINERA			2,80	2,96		1,00	8,29	M2	
			5,17	2,96		1,00	15,30	M2	
			4,84	2,96		1,00	14,33	M2	
			2,46	2,96		1,00	7,28	M2	
			1,11	2,96		1,00	3,29	M2	
			5,22	2,96		1,00	15,45	M2	
			3,05	2,96		1,00	9,03	M2	
			1,19	3,02		1,00	3,59	M2	
MENOS VENTANAS		2,38	1,97			-1,00	-4,69	M2	
CLARABOYAS		4,67		1,00		3,00	14,01	M2	
TERRAZA POR EJE E									
JARDIERA			4,60	2,89		1,00	13,29	M2	
			0,64	2,89		1,00	1,85	M2	
			3,88	0,76		1,00	2,95	M2	
			3,88	0,53		1,00	2,06	M2	
			0,56	3,01		1,00	1,69	M2	
			2,27	3,01		1,00	6,83	M2	
			2,40	0,34		1,00	0,83	M2	
			3,34	0,40		1,00	1,34	M2	
			0,43	2,86		1,00	1,23	M2	
CLARABOYAS		4,64		1,00		2,00	9,28		

TOTAL EJECUTADO	129,82	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	**129,82**	M2	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
129,82	0,00	**129,82**


OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR RÚSTES VELASQUEZ RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024	FRENTE OBRA	RINCON DE ARDILLAS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	31 de marzo de 2025

CAPITULO	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	003
ITEM	13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UNIDAD M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	SEGUNDO PISO									
     	SALON DE PREJARDIN 1 Y 2									
				0,74	2,65		1,00	1,96	M2	
			4,11		2,65		1,00	10,89	M2	
			2,54		2,65		1,00	6,73	M2	
				8,22	2,65		1,00	21,78	M2	
			2,79		2,65		1,00	7,39	M2	
				1,18	2,65		1,00	3,13	M2	
				4,45	2,65		1,00	11,79	M2	
				4,47	2,65		1,00	11,85	M2	
			2,84		2,65		1,00	7,53	M2	
	FILO PUERTA		0,14		1,40		1,00	0,20	M2	
			0,06	6,72			1,00	0,40	M2	
	MENOS VENTANA			2,39	1,94		-1,00	-4,64	M2	
	PARVULOS 1 Y 2									
				9,24	2,66		1,00	24,58	M2	
				10,10	2,66		1,00	26,87	M2	
			4,23		2,66		2,00	22,50	M2	
	COLUMNA		0,94		2,66		1,00	2,50	M2	
	BORDILLO VENTANA		0,05	5,35			2,00	0,54	M2	
	MENOS VENTANAS		3,35	2,00			-1,00	-6,70	M2	
			3,35	2,00			-1,00	-6,70	M2	
	MENOS PUERTAS									
			2,57	2,59			-1,00	-6,66	M2	
			2,39	2,59			-1,00	-6,19	M2	
							TOTAL EJECUTADO	129,75	M2	
							MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2	
							MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
							PRESENTE ACTA	**129,75**	M2	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
129,75	0,00	**129,75**


OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	RINCON DE ARDILLAS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**003**
ITEM	**13.2.2**	**PINTURA EPOXICA A DOS MANOS**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	PRIMER PISO									
	COCINA									
			3,80	4,25			1,00	16,15	M2	
			1,46	1,52			1,00	2,22	M2	
			0,93	0,47			1,00	0,44	M2	
			1,88	1,15			1,00	2,16	M2	
			1,91	1,61			1,00	3,08	M2	
			1,47	1,44			1,00	2,12	M2	
 										

TOTAL EJECUTADO	26,16	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	**26,16**	M2	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
26,16	0,00	**26,16**



OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR RUSTES VELASQUEZ **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	RINCON DE ARDILLAS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C.S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**003**
ITEM	**13.2.3**	**PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	TERRAZA POR EJE A									
	JARDINERA			2,80	2,96		1,00	8,29	M2	
				5,17	2,96		1,00	15,30	M2	
				4,84	2,96		1,00	14,33	M2	
				2,46	2,96		1,00	7,28	M2	
				1,11	2,96		1,00	3,29	M2	
				5,22	2,96		1,00	15,45	M2	
				3,05	2,96		1,00	9,03	M2	
				1,19	3,02		1,00	3,59	M2	
	MENOS VENTANAS		2,38	1,97			-1,00	-4,69	M2	
							-1,00	0,00	M2	
	CLARABOYAS		4,67		1,00		3,00	14,01	M2	
	**TERRAZA POR EJE E**									
	JARDIERA			4,60	2,89		1,00	13,29	M2	
				0,64	2,89		1,00	1,85	M2	
				3,88	0,76		1,00	2,95	M2	
				3,88	0,53		1,00	2,06	M2	
				0,56	3,01		1,00	1,69	M2	
				2,27	3,01		1,00	6,83	M2	
				2,40	0,34		1,00	0,83	M2	
				3,34	0,40		1,00	1,34	M2	
				0,43	2,86		1,00	1,23	M2	
										
	CLARABOYAS		4,64		1,00		2,00	9,28	M2	
							TOTAL EJECUTADO	127,22	M2	
							MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2	
							MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
							PRESENTE ACTA	**127,22**	M2	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
127,22	0,00	**127,22**



OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	RINCON DE ARDILLAS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**003**
ITEM	**13.2.4**	**PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)**		**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	TERRAZA POR EJE A									
     	BORDILLOS			9,58			1,00	9,58	M	
				2,60			1,00	2,60	M	
				1,80			1,00	1,80	M	
				2,60			1,00	2,60	M	
	TERRAZA POR EJE E									
	BORDILLOS			4,85			1,00	4,85	M	
				1,60			1,00	1,60	M	
							TOTAL EJECUTADO	23,03	M	
							MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M	
							MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M	
							PRESENTE ACTA	**23,03**	M	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
23,03	0,00	**23,03**


OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR RUSTES VELASQUEZ **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	RINCON DE ARDILLAS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**003**
ITEM	**14.1.8**	**CIELORASO PLANO DRYWALL ANTIHUMEDAD 1/2" (Incluyendo todo lo necesario para su correcta instalación)**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
COCINA	**PRIMER PISO**									
    	COCINA									
			3,80	4,25			1,00	16,15	M2	
			1,46	1,52			1,00	2,22	M2	
			0,93	0,47			1,00	0,44	M2	
			1,88	0,60			1,00	1,13	M2	
			1,91	1,61			1,00	3,08	M2	
			1,47	0,17			1,00	0,25	M2	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** **PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)**	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	J.J. YANACONA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de Marzo del 2025**

CAPITULO	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**003**
ITEM	**3.2.12**	**RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
BLOQUE 3									
FACHADA		0,96	1,39			1,00	1,33	M2	
LATERAL RAMPA 1		1,40	1,03			1,00	1,44	M2	
FRONTAL RAMPA 1		4,10	1,15			1,00	4,72	M2	
FRONTAL RAMPA 2		4,90	0,92			1,00	2,25	M2	area de un triangulo
		1,40	0,92			1,00	1,29	M2	
LATERAL RAMPA 2		1,35	0,89			1,00	1,20	M2	

TOTAL EJECUTADO	12,23	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	**12,23**	M2	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
12,23	0,00	**12,23**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** **PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)**	Version: 01 Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	J.J. YANACONA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de Marzo del 2025**

CAPITULO	**MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**003**
ITEM	**8.1.4**	**MURO EN LÁMINA FIBRO - CEMENTO 10 MM**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA













LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
ACTA PARCIAL No 2									
BLOQUE 1-BLOQUE 2									
PARVULOS-PREJARDIN									
PARTE TRASERA		2,13	0,2			1,00	0,43	M2	
		2,13	0,96			3,00	6,13	M2	
		2,13	0,96			2,00	4,09	M2	
		2,13	0,2			2,00	0,85	M2	
		2,13	0,2			2,00	0,85	M2	
LATERAL 1		2,33	0,96			2,00	4,47	M2	
		3,30	0,2			2,00	1,32	M2	
FRONTAL		2,13	0,2			1,00	0,43	M2	
		2,13	0,2			2,00	0,85	M2	
		2,13	0,96			3,00	6,13	M2	
		2,13	0,2			2,00	0,85	M2	
		2,13	0,96			2,00	4,09	M2	
LATERAL 2		4,50	0,96			2,00	8,64	M2	
ESPACIO ENTRE CUBIERTA									AREA DE UN TRIANGULO
LATERALES (TRIANGULOS)		6,00		0,5		4,00	6,00	M2	
POR EL LADO LARGO DEL MODULO		12,00		0,25		4,00	12,00	M2	
ACTA PARCIAL No 3									
BLOQUE 3									
DESCUENTO POR AJUSTE EN APU							-6,26	M2	

TOTAL EJECUTADO	50,88	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	57,14	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	-6,26	M2	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
-6,26	57,14	**50,88**


OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR NUSTES VELASQUEZ **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** **PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)**	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	J.J. YANACONA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de Marzo del 2025**

CAPITULO	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**003**
ITEM	**13.1.7**	**ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
     	**ACTA PARCIAL No 2**									
	BLOQUE 1- BLOQUE 2									
	PARVULOS-PREJARDIN									
	PARTE TRASERA		2,13	0,2			1,00	0,43	M2	
			2,13	0,96			3,00	6,13	M2	
			2,13	0,96			2,00	4,09	M2	
			2,13	0,2			2,00	0,85	M2	
			2,13	0,2			2,00	0,85	M2	
	LATERAL 1		2,33	0,96			2,00	4,47	M2	
			3,30	0,2			2,00	1,32	M2	
	FRONTAL		2,13	0,2			1,00	0,43	M2	
			2,13	0,2			2,00	0,85	M2	
			2,13	0,96			3,00	6,13	M2	
			2,13	0,2			2,00	0,85	M2	
			2,13	0,96			2,00	4,09	M2	
	LATERAL 2		4,50	0,96			2,00	8,64	M2	
	ESPACIO ENTRE CUBIERTA									
	LATERALES (TRIANGULOS)		6,00		0,5		4,00	6,00	M2	
	POR EL LADO LARGO DEL MODULO		12,00		0,25		4,00	12,00	M2	
	ACTA PARCIAL No 3									
	BLOQUE 3									
	FACHADA		1,25	0,95			1,00	1,19	M2	
			0,76	0,2			3,00	0,46	M2	
			2,14	0,95			6,00	12,20	M2	
			1,11	0,95			1,00	1,05	M2	

TOTAL EJECUTADO	72,04	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	57,14	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	**14,90**	M2	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
14,90	57,14	**72,04**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** **PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)**	Version: 01 Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	J.J. YANACONA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de Marzo del 2025**

CAPITULO	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**003**
ITEM	**13.2.3**	**PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACÓN AREA INTERVENIDA













LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
ACTA PARCIAL No 2									
BLOQUE 1 -BLOQUE 2									
PARVULOS-PREJARDIN									
PARTE TRASERA		2,13	0,2			1,00	0,43	M2	
		2,13	0,96			3,00	6,13	M2	
		2,13	0,96			2,00	4,09	M2	
		2,13	0,2			2,00	0,85	M2	
		2,13	0,2			2,00	0,85	M2	
LATERAL 1		2,33	0,96			2,00	4,47	M2	
		3,30	0,2			2,00	1,32	M2	
FRONTAL		2,13	0,2			1,00	0,43	M2	
		2,13	0,2			2,00	0,85	M2	
		2,13	0,96			3,00	6,13	M2	
		2,13	0,2			2,00	0,85	M2	
		2,13	0,96			2,00	4,09	M2	
LATERAL 2		4,50	0,96			2,00	8,64	M2	
ESPACIO ENTRE CUBIERTA									
LATERALES (TRIANGULOS)		6,00		0,5		4,00	6,00	M2	AREA DE UN TRIANGULO
POR EL LADO LARGO DEL MODULO		12,00		0,25		4,00	12,00	M2	
ACTA PARCIAL No 3									
BLOQUE 3									
FACHADA		1,25	0,95			1,00	1,19	M2	
		0,76	0,2			3,00	0,46	M2	
		2,14	0,95			6,00	12,20	M2	
		1,11	0,95			1,00	1,05	M2	
LATERAL RAMPA 1		1,40	1,03			1,00	1,44	M2	
FRONTAL RAMPA 1		4,10	1,15			1,00	4,72	M2	
FRONTAL RAMPA 2		4,90	0,92			1,00	2,25	M2	AREA DE UN TRIANGULO
		1,40	0,92			1,00	1,29	M2	
LATERAL RAMPA 2		1,35	0,89			1,00	1,20	M2	

TOTAL EJECUTADO	82,94	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	57,14	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	**25,80**	M2	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
25,80	57,14	**82,94**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR NUSTES VELASQUEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** **PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)**	Versión: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	J.I. YANACONA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de Marzo del 2025**

CAPITULO	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**003**
ITEM	**13.4.2**	**ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA











LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
BLOQUE 3									
BARANDA RAMPA FACHADA			2,80	1,10		1,00	3,08	M2	
			6,36	1,10		1,00	7,00	M2	
			5,00	1,10		1,00	5,50	M2	
			6,00	1,10		1,00	6,60	M2	
			3,00	1,10		1,00	3,30	M2	
			1,35	1,10		1,00	1,49	M2	
ESTRUCTURA POLICARBONATO		1,65	3,30			1,00	5,45	M2	

TOTAL EJECUTADO	32,41	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**32,41**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
32,41	0,00	**32,41**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR NUSTES VELASQUEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	J.J. YANACONA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de Marzo del 2025**

CAPITULO	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**003**
ITEM	**13.4.3** **ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)**	**UNIDAD**	**ML**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA













LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
ACTA PARCIAL No 2									
PINTURA SOBRE LA ESTRUCTURA DE LOS CONTENEDORES									
PARVULOS Y CAMINADORES	VERTICALES			2,45		24,00	58,80	ML	
HORIZONTALES				6		2,00	12,00	ML	
				2,43		10,00	24,30	ML	
BLOQUE 2									
SALA MATERNA	VERTICALES			2,45		24,00	58,80	ML	
HORIZONTALES				6		2,00	12,00	ML	
				2,43		10,00	24,30	ML	
ACTA PARCIAL No 3									
BLOQUE 3									
FACHADA	VERTICALES			2,80		16,00	44,80	ML	
HORIZONTALES				2,14		14,00	29,96	ML	
				5,64		1,00	5,64	ML	

TOTAL EJECUTADO	270,60	ML
MENOS ACTAS ANTERIORES	190,20	ML
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	ML
PRESENTE ACTA	**80,40**	ML

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
80,40	190,20	**270,60**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR NUSTES VELASQUEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024	FRENTE OBRA	J.J. YANACONA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	31 de Marzo del 2025

CAPITULO	ASEO Y DISPOSICION FINAL	ACTA No:	003
ITEM	20.1.1 ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACÓN AREA INTERVENIDA













LOCALIZACIÓN / LUGAR	DIMENSIÓN Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
ACTA PARCIAL No 2									
BLOQUE 1									
MODULO PREJARDIN Y PARVULOS		8,00	14,00			1,00	112,00	M2	
BLOQUE 2									
MODULO SALA MATERNA		8,00	14,00			1,00	112,00	M2	
ACTA PARCIAL No 3									
BLOQUE 3									
POLICARBONATO		3,10	1,65			1,00	5,12	M2	
RAMPA FACHADA		1,40	2,80			1,00	3,92	M2	
		1,40	6,36			1,00	8,90	M2	
		1,40	5,00			1,00	7,00	M2	
		1,40	6,00			1,00	8,40	M2	
		1,40	3,00			1,00	4,20	M2	
		1,40	1,35			1,00	1,89	M2	
AREA DE JARDINERA EXTERIOR EN FACHADA		8,56	2,8			1,00	23,97	M2	

TOTAL EJECUTADO	287,40	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	224,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**63,40**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
63,40	224,00	**287,40**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR RUSTES VELASQUEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	SIERRA MORENA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**CERRAMIENTO PROVISIONAL**		**ACTA No:**	**003**
ITEM	**1.2.1**	**CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
  	CORTE 2									
	CERRAMIENTO ZONA DE ACOPIO	1,00		1,60			1,60	1,60	M	
	CERRAMIENTO ZONA DE ACOPIO EXTERIOR	1,00		8,60			8,60	8,60	M	
	CORTE 3									
	CERRAMIENTO BAÑOS PRIMER NIVEL	1,00		2,00			2,00	2,00	M	
	CERRAMIENTO VACIO PRIMER NIVEL	1,00		7,73			7,73	7,73	M	

TOTAL EJECUTADO	19,93	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	10,20	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	**9,73**	M

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
9,73	10,20	**19,93**

OBSERVACIONES:

RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**	
NOMBRE	ING. LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
FIRMA		**FIRMA**	
DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	SIERRA MORENA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**


CAPITULO	**DEMOLICIONES DESMONTES Y RETIROS**		**ACTA No:**	**003**
ITEM	**1.3.1**	**DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA









LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
CORTE 2									
BAÑO MUJERES PISO 3	1,00	3,56	5,26			18,73	18,73	M2	
GIMNASIO Y ZONA RECREACIÓN	1,00	6,46	7,45			48,13	48,13	M2	
CORTE 3									
BAÑO HOMBRES PISO 1	1,00	3,60	5,28			19,01	19,01	M2	
BAÑO MUJERES PISO 1	1,00	3,64	5,28			19,22	19,22	M2	
BAÑO MUJERES PISO 2 DUCHA	1,00	0,84	1,46			1,23	1,23	M2	
BAÑO MUJERES PISO 2 MESON	1,00	0,68	2,67			1,82	1,82	M2	
PISO COCINA	1,00	4,20	8,61			36,16	36,16	M2	

TOTAL EJECUTADO	144,30	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	66,86	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**77,44**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
77,44	66,86	**144,30**

OBSERVACIONES:

RESIDENTE INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA**	
NOMBRE	ING. LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
FIRMA		**FIRMA**	
DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	SIERRA MORENA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**DEMOLICIONES DESMONTES Y RETIROS**			**ACTA No:**	**003**
ITEM	**1.3.3**	**DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, ETC, CORRIDOS, POYOS, MESONES, PREFABRICADOS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)**		**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
CORTE 3									
BAÑO HOMBRES PISO 1	1,00		2,67			2,67	2,67	M	
BAÑO MUJERES PISO 1	1,00		2,67			2,67	2,67	M	
BAÑO MUJERES PISO 2	1,00		2,67			2,67	2,67	M	

TOTAL EJECUTADO	8,01	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	**8,01**	M

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
8,01	0,00	**8,01**

OBSERVACIONES:

RESIDENTE INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA**	
NOMBRE	ING. LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR NUSTES V.
FIRMA		**FIRMA**	
DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	SIERRA MORENA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**DEMOLICIONES DESMONTES Y RETIROS**	**ACTA No:**	**003**
ITEM	**1.3.4**	**DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)**	**UNIDAD** **M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
CORTE 3									
BAÑO HOMBRES PISO 1	1,00	0,90	3,87			3,48	3,48	M2	
BAÑO MUJERES PISO 1	1,00	0,90	3,87			3,48	3,48	M2	
BAÑO MUJERES PISO 2	1,00	0,90	3,87			3,48	3,48	M2	
BAÑO MUJERES PISO 3	1,00	0,90	3,83			3,45	3,45	M2	

TOTAL EJECUTADO	13,89	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**13,89**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
13,89	0,00	**13,89**

OBSERVACIONES:

RESIDENTE INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA	
NOMBRE	ING. LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR NUSTES V.
FIRMA		**FIRMA**	
DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	SIERRA MORENA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**DEMOLICIONES DESMONTES Y RETIROS**			**ACTA No:**	**003**
ITEM	**1.3.5**	**DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)**		**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
CORTE 2									
BAÑO MUJERES PISO 3 SANITARIOS	4,00					4,00	4,00	UN	
CORTE 3									
LAVAMANOS BAÑO HOMBRES PISO 1	3,00					3,00	3,00	UN	
LAVAMANOS BAÑO MUJERES PISO 1	3,00					3,00	3,00	UN	
LAVAMANOS BAÑO MUJERES PISO 2	3,00					3,00	3,00	UN	
BAÑO HOMBRES PISO 1 SANITARIOS	3,00					3,00	3,00	UN	
BAÑO MUJERES PISO 1 SANITARIOS	4,00					4,00	4,00	UN	
						TOTAL EJECUTADO	20,00	UN	
						MENOS ACTAS ANTERIORES	4,00	UN	
						MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN	
						PRESENTE ACTA	**16,00**	UN	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
16,00	4,00	**20,00**

OBSERVACIONES:

RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**	
NOMBRE	ING. LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
FIRMA		**FIRMA**	
DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	SIERRA MORENA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**DEMOLICIONES DESMONTES Y RETIROS**		**ACTA No:**	**003**
ITEM	**1.3.7**	**DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO VIDRIO Y REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	CORTE 3									
	VENTANA CORREDOR SEGUNDO NIVEL	1,00	1,10	1,40			1,54	1,54	M2	

TOTAL EJECUTADO	1.54	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	M2
PRESENTE ACTA	**1.54**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
1,54	0,00	**1,54**

OBSERVACIONES:


RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**	
NOMBRE	ING. LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR NUSTES V.
FIRMA		**FIRMA**	
DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024	**FRENTE OBRA**	SIERRA MORENA
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**DEMOLICIONES DESMONTES Y RETIROS**		**ACTA No:**	**003**
ITEM	**1.3.15**	**DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

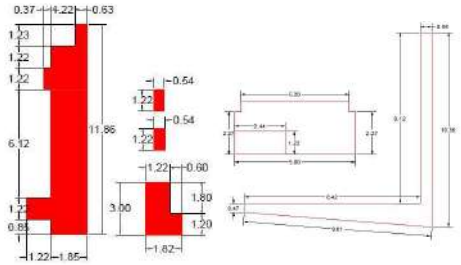





LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
CORTE 2									
OFICINAS ADMINISTRACIÓN CORREDOR	1,00	1,89	11,86			22,42	22,42	M2	
TERCER PISO SALA DE ESPERA	1,00	1,46	3,00			4,38	4,38	M2	
	2,00	0,54	1,22			1,32	1,32	M2	
CIELO RASO ESCALERA #1	1,00	1,22	2,44			2,98	2,98	M2	
CORTE 3									
BAÑO HOMBRES PISO 1	1,00	1,22	2,44			2,98	2,98	M2	
BAÑO MUJERES PISO 1	1,00	1,22	2,44			2,98	2,98	M2	
BAÑO HOMBRES PISO 2	1,00	1,22	1,22			1,49	1,49	M2	
BAÑO MUJERES PISO 2	1,00	1,22	2,44			2,98	2,98	M2	
BAÑO HOMBRES PISO 3	1,00	1,22	2,44			2,98	2,98	M2	
BAÑO MUJERES PISO 3	2,00	1,22	2,44			5,95	5,95	M2	
CIELO RASO POCETA PISO 1	1,00	1,43	4,37			6,25	6,25	M2	
CIELO RASO ESCALERA #1	1,00	2,48	5,20			12,90	12,90	M2	
CIELO RASO EXTERIOR	1,00	1,23	10,37			12,76	12,76	M2	

TOTAL EJECUTADO	82,37	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	31,10	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**51,27**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
51,27	31,10	**82,37**

OBSERVACIONES:


RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**	
NOMBRE	ING. LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR NUSTES V.
FIRMA		**FIRMA**	
DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	SIERRA MORENA
INTERVENTOR:	COMPANIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**DEMOLICIONES DESMONTES Y RETIROS**		**ACTA No:**	**003**
ITEM	**1.3.18**	**DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS)**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

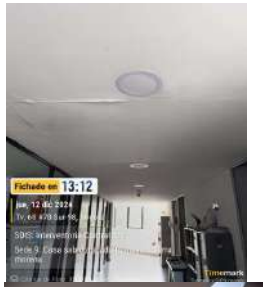







LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
BAÑO MUJERES PISO 1	2,00					2,00	2,00	UND	
PISO 1 CORREDOR	6,00					6,00	6,00	UND	
PISO 3 CORREDOR	10,00					10,00	10,00	UND	
SALA DE ESPERA PISO 3	12,00					12,00	12,00	UND	
SENSORES	3,00					3,00	3,00	UND	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	SIERRA MORENA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**003**
ITEM	**1.3.26**	**DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.35M (POR LAS 4 CARAS). INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS**	**UNIDAD** **M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	MURO EXTERIOR FACHADA	1,00		6,20			6,20	6,20	M	
		1,00		6,40			6,40	6,40	M	
							TOTAL EJECUTADO	12,60	M	
							MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M	
							MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M	
							PRESENTE ACTA	**12,60**	M	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
12,60	0,00	**12,60**

OBSERVACIONES:

RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**	
NOMBRE	ING. LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
FIRMA		**FIRMA**	
DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	


ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	SIERRA MORENA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**003**
ITEM	**3.1.3**	**LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



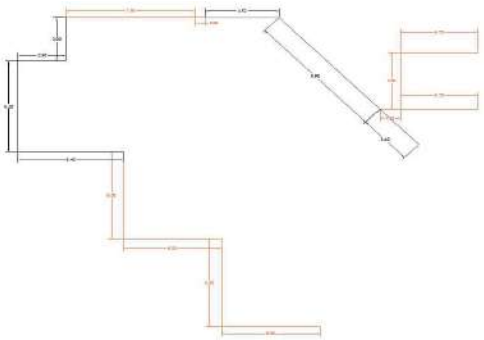

LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
CORTE 3									
FACHADA	1,00		0,60	10,81		6,49	6,49	M2	
	1,00		3,00	1,80		5,40	5,40	M2	
	1,00		7,90	1,80		14,22	14,22	M2	
	1,00		1,25	3,00		3,75	3,75	M2	
	1,00		1,60	0,80		1,28	1,28	M2	
	0,20		6,00	10,81		12,97	12,97	M2	
	0,20		6,00	10,81		12,97	12,97	M2	
	0,20		6,00	10,81		12,97	12,97	M2	
	0,20		6,00	10,81		12,97	12,97	M2	
	0,20		3,90	4,25		3,32	3,32	M2	
	0,20		4,70	4,25		4,00	4,00	M2	
	0,20		4,70	10,81		10,16	10,16	M2	

TOTAL EJECUTADO	100,50	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**100,50**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
100,50	0,00	**100,50**

OBSERVACIONES:

RESIDENTE INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA**	
NOMBRE	ING. LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR NUSTES V.
FIRMA		**FIRMA**	
DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024	**FRENTE OBRA**	SIERRA MORENA
OBJETO:	**REEMBOQUILLADO DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA O ADOQUIN CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**003**
ITEM	**3.2.9**	**REEMBOQUILLADO DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA O ADOQUIN CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





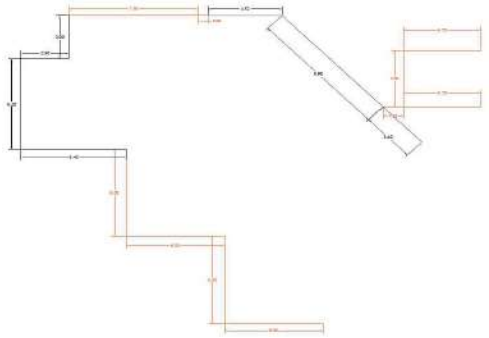

LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
CORTE 3									
FACHADA	1,00		0,60	10,81		6,49	6,49	M2	
	1,00		6,00	10,81		64,86	64,86	M2	
	0,40		6,00	10,81		25,94	25,94	M2	
	0,40		6,00	10,81		25,94	25,94	M2	
	0,40		6,00	10,81		25,94	25,94	M2	
	1,00		7,90	1,80		14,22	14,22	M2	
	1,00		1,25	3,00		3,75	3,75	M2	
	0,40		3,90	4,25		6,63	6,63	M2	
	0,40		4,70	4,25		7,99	7,99	M2	
	0,40		4,70	10,81		20,32	20,32	M2	
VENTANAS FACHADA LADRILLO	0,40		3,60	1,62		-4,00	-9,33	M2	
	0,40		1,80	2,60		-4,00	-7,49	M2	
	0,40		1,90	0,70		-6,00	-3,19	M2	
	0,40		3,97	1,41		-2,00	-4,48	M2	
PUERTA EXTERIOR COCINA	0,40		1,48	2,35		-1,00	-1,39	M2	

TOTAL EJECUTADO	176,20	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**176,20**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
176,20	0,00	**176,20**

OBSERVACIONES:


	RESIDENTE INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA
NOMBRE	ING. LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR NUSTES V.
FIRMA		**FIRMA**	
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	SIERRA MORENA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**003**
ITEM	**3.2.12**	**RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

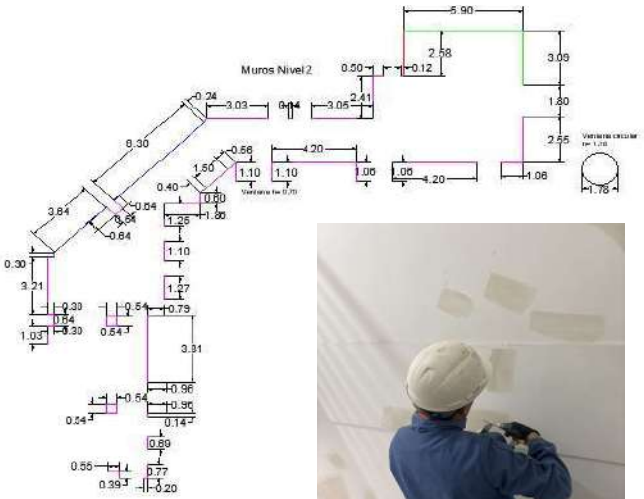










LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
CORTE 2									
MUROS NIVEL 2									
	0,80		0,20	2,25		0,36	0,36	M2	
	0,80		0,77	2,25		1,39	1,39	M2	
	0,80		0,69	2,25		1,24	1,24	M2	
	0,80		0,14	2,25		0,25	0,25	M2	
	0,80		0,96	2,25		1,73	1,73	M2	
	0,80		0,96	2,25		1,73	1,73	M2	
	0,80		3,81	2,25		6,86	6,86	M2	
	0,80		0,79	2,25		1,42	1,42	M2	
	0,80		1,27	2,25		2,29	2,29	M2	
	0,80		1,10	2,25		1,98	1,98	M2	
	0,80		1,25	2,25		2,25	2,25	M2	
	0,80		1,86	2,25		3,35	3,35	M2	
	0,80		0,60	2,25		1,08	1,08	M2	
	0,80		0,40	2,25		0,72	0,72	M2	
VENTANA	-1,00		1,50	0,70		-1,05	-1,05	M2	
	0,80		1,50	2,25		2,70	2,70	M2	
	0,80		0,56	2,25		1,01	1,01	M2	
	0,80		1,10	2,25		1,98	1,98	M2	
	0,80		1,10	2,25		1,98	1,98	M2	
	0,80		4,20	2,25		7,56	7,56	M2	
	0,80		1,06	2,25		1,91	1,91	M2	
	0,80		1,06	2,25		1,91	1,91	M2	
	0,80		4,20	2,25		7,56	7,56	M2	
	0,80		1,06	2,25		1,91	1,91	M2	
	0,80		2,55	2,25		4,59	4,59	M2	
VENTANA CIRCULAR	-1,00		1,39	1,78		-2,47	-2,47	M2	
	0,80		2,55	2,25		4,59	4,59	M2	
	0,80		3,09	0,48		1,19	1,19	M2	
	0,80		5,90	0,48		2,27	2,27	M2	
	0,80		0,50	2,25		0,90	0,90	M2	
	0,80		2,41	2,25		4,34	4,34	M2	
	0,80		3,05	2,25		5,49	5,49	M2	





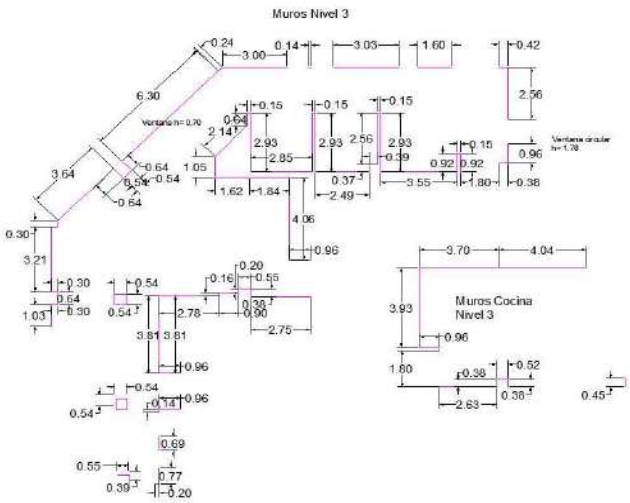










	0,80		0,14	2,25		0,25	0,25	M2	
	0,80		3,03	2,25		5,45	5,45	M2	
	0,80		0,24	2,25		0,43	0,43	M2	
	0,80		6,30	1,07		5,39	5,39	M2	
	0,80		0,64	2,25		1,15	1,15	M2	
	0,80		0,64	2,25		1,15	1,15	M2	
	0,80		0,54	2,25		0,97	0,97	M2	
	0,80		3,64	1,07		3,12	3,12	M2	
	0,80		0,30	2,25		0,54	0,54	M2	
	0,80		3,21	2,25		5,78	5,78	M2	
	0,80		0,30	2,25		0,54	0,54	M2	
	0,80		0,30	2,25		0,54	0,54	M2	
	0,80		0,64	2,25		1,15	1,15	M2	
	0,80		1,03	2,25		1,85	1,85	M2	
	0,80		0,54	2,25		0,97	0,97	M2	
	0,80		0,54	2,25		0,97	0,97	M2	
	0,80		0,54	2,25		0,97	0,97	M2	
	0,80		0,54	2,25		0,97	0,97	M2	
	0,80		0,54	2,25		0,97	0,97	M2	
	0,80		0,54	2,25		0,97	0,97	M2	
	0,80		0,54	2,25		0,97	0,97	M2	
	0,80		0,54	2,25		0,97	0,97	M2	
	0,80		0,55	2,25		0,99	0,99	M2	
	0,80		0,39	2,25		0,70	0,70	M2	
					MUROS NIVEL 3				
	0,80		0,20	2,25		0,36	0,36	M2	
	0,80		0,77	2,25		1,39	1,39	M2	
	0,80		0,69	2,25		1,24	1,24	M2	
	0,80		0,14	2,25		0,25	0,25	M2	
	0,80		0,96	2,25		1,73	1,73	M2	
	0,80		0,96	2,25		1,73	1,73	M2	
	0,80		3,81	2,25		6,86	6,86	M2	
	0,80		2,78	2,25		5,00	5,00	M2	
	0,80		0,16	2,25		0,29	0,29	M2	
	0,80		0,90	2,25		1,62	1,62	M2	
	0,80		0,20	2,25		0,36	0,36	M2	
	0,80		0,55	2,25		0,99	0,99	M2	
	0,80		0,38	2,55		0,78	0,78	M2	
	0,80		0,90	2,55		1,84	1,84	M2	
	0,80		2,75	2,55		5,61	5,61	M2	
	0,80		0,96	2,55		1,96	1,96	M2	
	0,80		4,06	2,55		8,28	8,28	M2	
	0,80		1,84	2,55		3,75	3,75	M2	
	0,80		1,62	2,25		2,92	2,92	M2	
	0,80		1,05	2,25		1,89	1,89	M2	
	0,80		2,14	2,25		3,85	3,85	M2	
VENTANA	-1,00		1,50	0,70		-1,05	-1,05	M2	
	0,80		0,64	2,25		1,15	1,15	M2	
	0,80		0,15	2,25		0,27	0,27	M2	
	0,80		0,15	2,25		0,27	0,27	M2	
	0,80		0,15	2,25		0,27	0,27	M2	





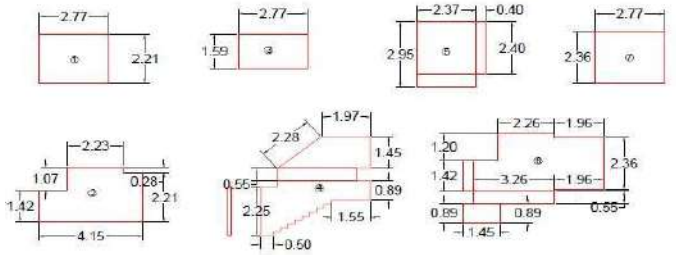













	0,80		0,15	2,25		0,27	0,27	M2	
	0,80		2,93	2,25		5,27	5,27	M2	
	0,80		2,93	2,25		5,27	5,27	M2	
	0,80		2,93	2,25		5,27	5,27	M2	
	0,80		2,93	2,25		5,27	5,27	M2	
	0,80		2,85	2,25		5,13	5,13	M2	
	0,80		2,49	2,25		4,48	4,48	M2	
	0,80		0,37	2,25		0,67	0,67	M2	
	0,80		0,39	2,25		0,70	0,70	M2	
	0,80		3,55	2,25		6,39	6,39	M2	
	0,80		0,92	2,25		1,66	1,66	M2	
	0,80		0,92	2,25		1,66	1,66	M2	
	0,80		0,38	2,25		0,68	0,68	M2	
	0,80		0,96	2,25		1,73	1,73	M2	
VENTANA CIRCULAR	-1,00		1,39	1,78		-2,47	-2,47	M2	
	0,80		2,56	2,25		4,61	4,61	M2	
	0,80		0,42	2,25		0,76	0,76	M2	
	0,80		1,60	2,25		2,88	2,88	M2	
	0,80		3,03	2,25		5,45	5,45	M2	
	0,80		0,14	2,25		0,25	0,25	M2	
	0,80		3,00	2,25		5,40	5,40	M2	
	0,80		0,24	2,25		0,43	0,43	M2	
	0,80		6,30	1,07		5,39	5,39	M2	
	0,80		0,64	2,25		1,15	1,15	M2	
	0,80		0,64	2,25		1,15	1,15	M2	
	0,80		0,54	2,25		0,97	0,97	M2	
	0,80		3,64	1,07		3,12	3,12	M2	
	0,80		0,30	2,25		0,54	0,54	M2	
	0,80		3,21	2,25		5,78	5,78	M2	
	0,80		0,30	2,25		0,54	0,54	M2	
	0,80		0,30	2,25		0,54	0,54	M2	
	0,80		0,64	2,25		1,15	1,15	M2	
	0,80		1,03	2,25		1,85	1,85	M2	
	0,80		0,54	2,25		0,97	0,97	M2	
	0,80		0,54	2,25		0,97	0,97	M2	
	0,80		0,54	2,25		0,97	0,97	M2	
	0,80		0,54	2,25		0,97	0,97	M2	
	0,80		0,54	2,25		0,97	0,97	M2	
	0,80		0,54	2,25		0,97	0,97	M2	
	0,80		0,54	2,25		0,97	0,97	M2	
	0,80		0,54	2,25		0,97	0,97	M2	
	0,80		0,55	2,25		0,99	0,99	M2	
	0,80		0,39	2,25		0,70	0,70	M2	
MUROS COCINA NIVEL 3									
	0,80		4,04	2,25		7,27	7,27	M2	
	0,80		3,70	2,55		7,55	7,55	M2	
	0,80		3,93	2,55		8,02	8,02	M2	
	0,80		0,96	2,55		1,96	1,96	M2	
	0,80		2,63	2,55		5,37	5,37	M2	
	0,80		0,38	2,55		0,78	0,78	M2	
	0,80		0,38	2,55		0,78	0,78	M2	






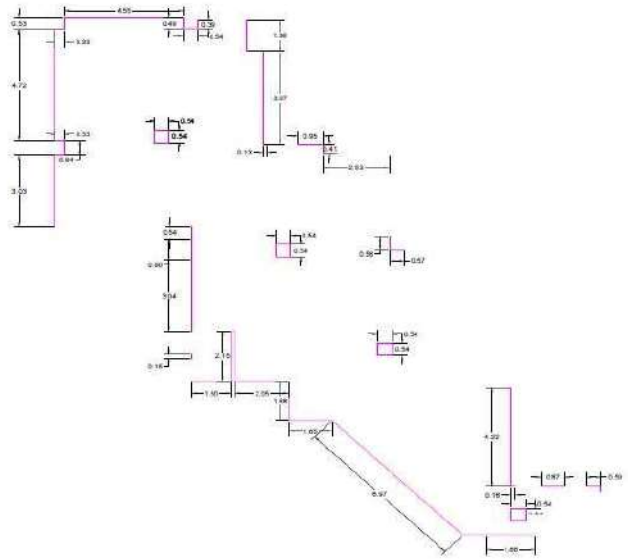

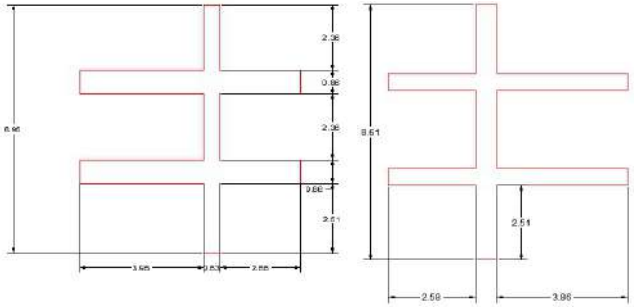


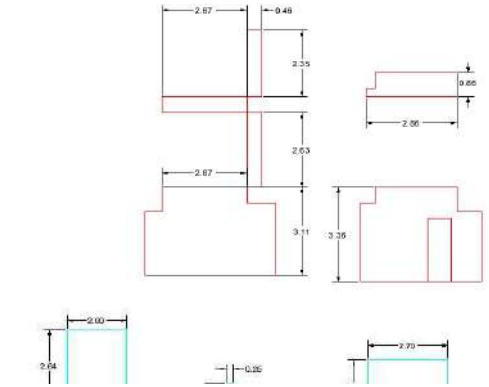


	0,80		0,52	2,55		1,06	1,06	M2	
	0,80		0,40	2,25		0,72	0,72	M2	
DINTEL PUERTA COCINA	0,80		1,80	0,30		0,43	0,43	M2	
DINTEL PUERTA COCINA	0,80		1,80	0,30		0,43	0,43	M2	
MUROS ESCALERA #1									
	0,50		2,77	2,21		3,06	3,06	M2	
	0,50		2,77	1,59		2,20	2,20	M2	
	0,50		2,37	2,95		3,50	3,50	M2	
	0,50		2,37	2,95		3,50	3,50	M2	
	0,50		0,40	2,40		0,48	0,48	M2	
	0,50		0,40	2,40		0,48	0,48	M2	
	0,50		2,77	2,36		3,27	3,27	M2	
	0,50		2,26	2,30		2,60	2,60	M2	
	0,50		0,51	2,30		0,59	0,59	M2	
	0,50		4,02	2,21		4,44	4,44	M2	
	0,50		5,46	2,25		6,14	6,14	M2	
	0,50		6,38	2,36		7,53	7,53	M2	
	0,50		0,41	2,30		0,47	0,47	M2	
	0,50		0,13	2,36		0,15	0,15	M2	
	0,50		6,76	2,36		7,98	7,98	M2	
CORTE 3									
LINEALES DE VACIO	1,00	1,00	8,96	1,78		15,95	15,95	M2	
	1,00	1,00	8,61	1,47		12,66	12,66	M2	
	1,00	2,00	0,46	2,35		2,16	2,16	M2	
	1,00	4,00	2,67	0,56		5,98	5,98	M2	
	1,00	2,00	2,63	0,46		2,42	2,42	M2	
	1,00	4,00	3,95	0,46		7,27	7,27	M2	
	1,00	4,00	2,55	0,46		4,69	4,69	M2	
	1,00	1,00	2,86	0,86		2,46	2,46	M2	
	1,00	1,00	3,11	3,78		11,76	11,76	M2	
	1,00	1,00	3,36	3,01		10,11	10,11	M2	
MUROS DE PRIMER NIVEL	1,00		64,95	2,24		145,49	145,49	M2	
POCETA PRIMER PISO	1,00		0,53	2,27		1,20	1,20	M2	
	1,00		1,43	0,55		0,79	0,79	M2	
	0,90		8,32	1,90		14,23	14,23	M2	
SALON DE PROFESORES	0,85		3,37	2,27		6,46	6,46	M2	
	0,80		3,20	0,55		1,41	1,41	M2	
OFICINA COORDINACION	0,80		9,81		2,25	17,66	17,66	M2	
ESCALERA #2									
	0,50	1,00	2,00		2,64	2,64	2,64	M2	
	0,50	2,00	0,30		2,64	0,79	0,79	M2	
	0,50	2,00	0,48		2,64	1,27	1,27	M2	
	0,50	2,00	0,25		2,64	0,66	0,66	M2	
	0,50	2,00	0,31		1,45	0,45	0,45	M2	
	0,50	2,00	2,35		0,55	1,29	1,29	M2	
	0,50	2,00	0,12		1,48	0,18	0,18	M2	
	0,50	2,00	3,15		2,64	8,32	8,32	M2	
	0,50	2,00	1,20		1,44	1,73	1,73	M2	
	0,50	2,00	3,00		0,55	1,65	1,65	M2	
	0,50	2,00	0,94		1,22	1,15	1,15	M2	
	0,50	2,00	1,20		0,16	0,19	0,19	M2	

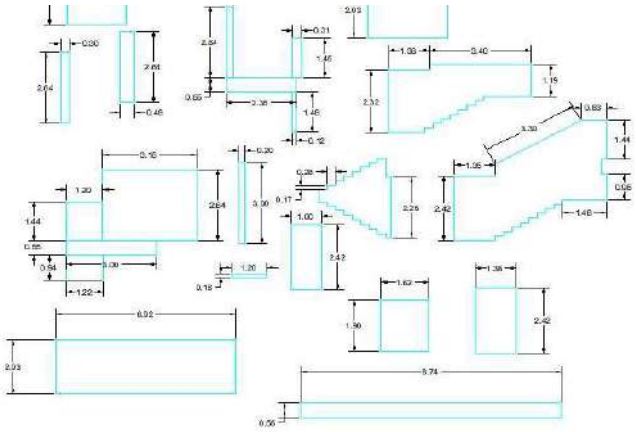


B. H NIVEL 1

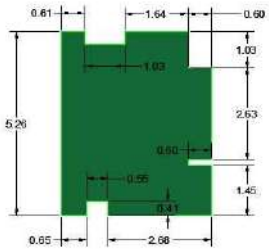


B. M NIVEL 1




B. H NIVEL 2

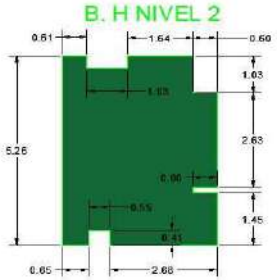


B. M NIVEL 2

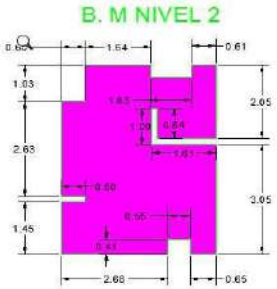

B. H NIVEL 3



B. M NIVEL 3





	0,50	2,00	1,00		2,42	2,42	2,42	M2	
	0,50	1,00	1,62		1,90	1,54	1,54	M2	
	0,50	1,00	1,38		2,42	1,67	1,67	M2	
	0,50	2,00	6,02		2,03	12,22	12,22	M2	
	0,50	2,00	2,70		2,03	5,48	5,48	M2	
	0,50	1,00	8,74		0,55	2,40	2,40	M2	
	0,50	1,00	3,59		2,32	4,16	4,16	M2	
	0,50	2,00	5,58		2,42	13,50	13,50	M2	
	0,50	1,00	1,78		2,25	2,00	2,00	M2	
BAÑO HOMBRE PISO 1	0,40		18,89	0,6		4,53	4,53	M2	
BAÑO MUJERES PISO 1	0,40		20,92	0,6		8,37	8,37	M2	
BAÑO HOMBRE PISO 2	0,40		20,84	0,6		8,34	8,34	M2	
BAÑO MUJERES PISO 2	0,40		25,88	0,6		10,35	10,35	M2	
BAÑO HOMBRE PISO 3	0,40		20,84	0,6		8,34	8,34	M2	
BAÑO MUJERES PISO 3	0,40		20,98	0,6		8,39	8,39	M2	
SALON DE ARTES NIVEL 3	0,50		9,57		2,26	10,81	10,81	M2	
	0,50		3,57		0,93	1,66	1,66	M2	
	0,50		0,81		1,32	0,53	0,53	M2	
	0,50		0,48		2,26	0,54	0,54	M2	
	0,50		3,22		2,26	3,64	3,64	M2	
DINTELES COCINA	0,50		28,49	0,44		6,27	6,27	M2	
	0,50		5,53	0,44		1,22	1,22	M2	
ENFERMERIA PRIMER NIVEL	0,50		10,06	2,25		11,32	11,32	M2	
	0,50		2,54	0,85		1,08	1,08	M2	

MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	**413,80**	M2	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
413,80	340,54	**754,34**

OBSERVACIONES:

RESIDENTE INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA**	
NOMBRE	ING. LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
FIRMA		**FIRMA**	
DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024	**FRENTE OBRA**	SIERRA MORENA
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**003**
ITEM	**3.2.19**	**MESÓN EN GRANITO NATURAL ANCHO MENOR O IGUAL A 80CM - INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE**		**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
						CORTE 3			
BAÑO HOMBRES PISO 1	1,00		2,67			2,67	2,67	M	
BAÑO MUJERES PISO 1	1,00		2,67			2,67	2,67	M	
BAÑO MUJERES PISO 2	1,00		2,67			2,67	2,67	M	

TOTAL EJECUTADO	8,01	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	**8,01**	M

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
8,01	0,00	**8,01**

OBSERVACIONES:

RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**	
NOMBRE	ING. LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
FIRMA		**FIRMA**	
DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	SIERRA MORENA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**ALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALAC**		**ACTA No:**	**003**
ITEM	**4.1.81**	**INSTALACION DE SANITARIO, INCLUYE LOS ACCESORIOS**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
CORTE 3									
BAÑO HOMBRES PISO 1 SANITARIOS	3,00					3,00	3,00	UN	
BAÑO MUJERES PISO 1 SANITARIOS	4,00					4,00	4,00	UN	
BAÑO MUJERES PISO 3 SANITARIOS	4,00					4,00	4,00	UN	
TOTAL EJECUTADO							11,00	UN	
MENOS ACTAS ANTERIORES							0,00	UN	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X							0,00	UN	
PRESENTE ACTA							**11,00**	UN	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
11,00	0,00	**11,00**


OBSERVACIONES:

RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**	
NOMBRE	ING. LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
FIRMA		**FIRMA**	
DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	SIERRA MORENA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO		**ACTA No:**	**003**
ITEM	**4.1.82**	**INSTALACION DE LAVAMANOS, INCLUYE LOS ACCESORIOS**	**UNIDAD** **UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	CORTE 3									
	REINSTALACION BAÑO MUJERES PISO 2	3,00					3,00	3,00	UN	
	REINSTALACION BAÑO HOMBRES PISO 1	1,00					1,00	1,00	UN	
	REINSTALCION BAÑO MUJERES PISO 1	2,00					2,00	2,00	UN	
	TOTAL EJECUTADO							6,00	UN	
	MENOS ACTAS ANTERIORES							0,00	UN	
	MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X							0,00	UN	
	PRESENTE ACTA							**6,00**	UN	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
6,00	0,00	**6,00**

OBSERVACIONES:


RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**	
NOMBRE	ING. LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
FIRMA		**FIRMA**	
DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	SIERRA MORENA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**003**	
ITEM	**5.1.9**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO PARA INSTALACIÓN EN TECHO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)**		**UNIDAD**	**UND**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

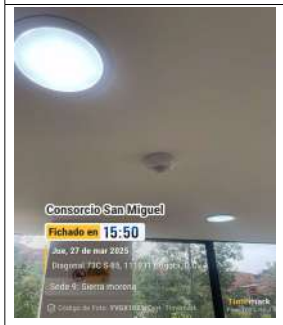



LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
CORTE 3									
OFICINA 1 TERCER NIVEL	1,00	1,00	1,00			1,00	1,00	UND	
PISO 3 CORREDOR	1,00	1,00	1,00			1,00	1,00	UND	
BAÑO MUJERES PISO 3	1,00	1,00	1,00			1,00	1,00	UND	

TOTAL EJECUTADO	3,00	UND
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UND
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UND
PRESENTE ACTA	**3,00**	UND

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
3,00	0,00	**3,00**

OBSERVACIONES:

RESIDENTE INTERVENTORÍA		RESIDENTE CONTRATISTA	
NOMBRE	ING. LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
FIRMA		**FIRMA**	
DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024	**FRENTE OBRA**	SIERRA MORENA
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**003**
ITEM	**5.1.13**	**SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**			**UNIDAD**	**UND**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	GIMNASIO SEGUNDO NIVEL	3,00	1,00	1,00			3,00	3,00	UND	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	SIERRA MORENA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**003**
ITEM	**5.1.97**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA LED DE 18 W INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**	**UNIDAD**	**UND**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





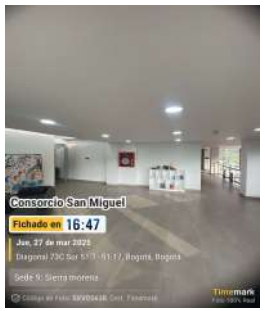



LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
					CORTE 3				
BAÑO MUJERES PISO 3	4,00					4,00	4,00	UND	
BAÑO MUJERES PISO 1	2,00					2,00	2,00	UND	
PISO 1 CORREDOR	6,00					6,00	6,00	UND	
PISO 2 CORREDOR	7,00					7,00	7,00	UND	
PISO 3 CORREDOR	10,00					10,00	10,00	UND	
SALA DE ESPERA PISO 3	12,00					12,00	12,00	UND	
VACIO TERCER NIVEL	8,00					8,00	8,00	UND	
OFICINA 1 TERCER NIVEL	6,00					6,00	6,00	UND	
OFICINA 2 TERCER NIVEL	6,00					6,00	6,00	UND	
OFICINA 3 TERCER NIVEL	5,00					5,00	5,00	UND	
ESCALERA 4 NIVEL	1,00					1,00	1,00	UND	
ESCALERA 3 NIVEL	2,00					2,00	2,00	UND	
						TOTAL EJECUTADO	69,00	UND	
						MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UND	
						MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UND	
						PRESENTE ACTA	**69,00**	UND	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
69,00	0,00	**69,00**

OBSERVACIONES:


RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**	
NOMBRE	ING. LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
FIRMA		**FIRMA**	
DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	SIERRA MORENA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**


CAPITULO	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**003**
ITEM	**7.1.2**	**ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M**	**UNIDAD**	**M2**


ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

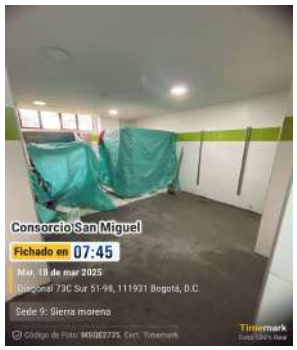







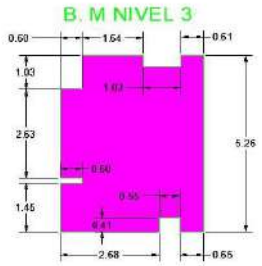







LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
CORTE 2									
BAÑO MUJERES PISO 3	1,00	3,56	5,26			18,73	18,73	M2	
GIMNASIO Y ZONA RECREACIÓN	1,00	6,46	7,45			48,13	48,13	M2	
CORTE 3									
BAÑO HOMBRES PISO 1	1,00	3,60	5,28			19,01	19,01	M2	
BAÑO MUJERES PISO 1	1,00	3,64	5,28			19,22	19,22	M2	
BAÑO MUJERES PISO 2 DUCHA	1,00	0,84	1,46			1,23	1,23	M2	
BAÑO MUJERES PISO 2 MESON	1,00	0,68	2,67			1,82	1,82	M2	
PISO COCINA	1,00	4,20	8,61			36,16	36,16	M2	


0.60
0.05
1.45
0.41
0.85
2.68


0.60
1.45
0.55
0.41
2.68
0.85

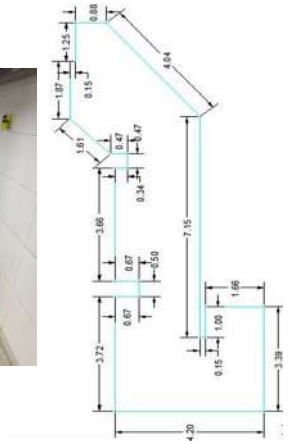


0.88
1.25
4.64
1.87
0.15
1.61
0.47
0.47
0.34
3.66
7.15
0.67
0.50
1.66
0.67
1.00
3.72
0.15
3.39
4.20

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	SIERRA MORENA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**003**
ITEM	**7.2.16**	**CINTA ANTIDESLIZANTE A = 2 CM**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
			CORTE 3						
CINTA ANTIDELIZANTE HUELLAS ESCALAERAS	1,00		100,00			100,00	100,00	M	

TOTAL EJECUTADO	100,00	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	**100,00**	M

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
100,00	0,00	**100,00**

OBSERVACIONES:


FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	SIERRA MORENA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**003**
ITEM	**7.2.18**	**PISO CERAMICA ANTIDESLIZANTE, REFERENCIA MIKONOS FORMATO 33 X 33 (COLORES VARIOS)**	**UNIDAD**	**M2**


ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA









B. M NIVEL 3



B. H NIVEL 1



B. M NIVEL 1



LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
CORTE 3									
BAÑO HOMBRES PISO 1	1,00	3,60	5,28			19,01	19,01	M2	
BAÑO MUJERES PISO 1	1,00	3,64	5,28			19,22	19,22	M2	
BAÑO MUJERES PISO 2 DUCHA	1,00	0,84	1,46			1,23	1,23	M2	
BAÑO MUJERES PISO 2 MESON	1,00	0,68	2,67			1,82	1,82	M2	
BAÑO MUJERES PISO 3	1,00	3,56	5,26			18,74	18,74	M2	
PISO COCINA	1,00	4,20	8,61			36,16	36,16	M2	

TOTAL EJECUTADO	96,18	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**96,18**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
96,18	0,00	**96,18**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	SIERRA MORENA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**003**
ITEM	**8.1.2**	**ENCHAPE 25 X 35**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
CORTE 3									
BAÑO HOMBRES PISO 1	1,00	0,90	3,87			3,48	3,48	M2	
BAÑO MUJERES PISO 1	1,00	0,90	3,87			3,48	3,48	M2	
BAÑO MUJERES PISO 2	1,00	0,90	3,87			3,48	3,48	M2	
BAÑO MUJERES PISO 3	1,00	0,90	3,83			3,45	3,45	M2	

TOTAL EJECUTADO	13,89	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**13,89**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
13,89	0,00	**13,89**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	SIERRA MORENA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**NO PREVISTOS**		**ACTA No:**	**003**
ITEM	**9.3.1**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
 	**COCINA NIVEL 1**									
	VENTANA SUPERIOR COMPLETA	2,00		2,00	0,7		2,80	2,80	M2	
	VENTANA BODEGA	1,00		0,74	0,7		0,52	0,52	M3	
	REJILLA VENITLACION AL EXTERIOR	1,00		0,60	0,6		0,36	0,36	M2	
	PUERTA AL EXTERIOR BODEGA	1,00		0,30	2,2		0,66	0,66	M2	

TOTAL EJECUTADO	4,34	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	**4,34**	M2	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
4,34	0,00	**4,34**

OBSERVACIONES:

RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**	
NOMBRE	ING. LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
FIRMA		**FIRMA**	
DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	SIERRA MORENA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**003**
ITEM	**11.1.1**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE INCRUSTAR COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA Y GRIFERÍA TIPO PUSH)**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	CORTE 3									
	SUMINISTRO BAÑO MUJERES PISO 2	1,00					1,00	1,00	UN	
	TOTAL EJECUTADO							1,00	UN	
	MENOS ACTAS ANTERIORES							0,00	UN	
	MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X							0,00	UN	
	PRESENTE ACTA							**1,00**	UN	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
1,00	0,00	**1,00**

OBSERVACIONES:

RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**	
NOMBRE	ING. LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR NUSTES V.
FIRMA		**FIRMA**	
DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	SIERRA MORENA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**


CAPITULO	**LACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALA**		**ACTA No:**	**003**
ITEM	**11.1.5**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	CORTE 3									
	BAÑO MUJERES PISO 3 SANITARIOS	1,00					1,00	1,00	UN	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	SIERRA MORENA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**003**
ITEM	**11.1.16**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLADORES TIPO CUELLO DE GANSO DE 8" SENCILLOS PARA LAVAPLATOS**	**UNIDAD**	**UN**

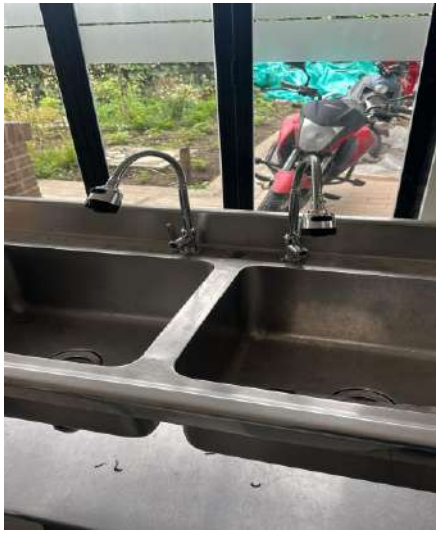ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE 3**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	CORTE 3									
	COCINA LAVAPLATOS - 1 PISO	1,00					2,00	2,00	UNIDAD	

TOTAL EJECUTADO	2.00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	UN
PRESENTE ACTA	**2.00**	UN

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
2,00	0,00	**2,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	SIERRA MORENA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**003**
ITEM	**11.1.18**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 5" A 4"**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE 3**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	CORTE 3									
	COCINA PRIMER NIVEL	1,00					1,00	1,00	UNIDAD	

TOTAL EJECUTADO	1.00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	UN
PRESENTE ACTA	**1.00**	UN

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
1,00	0,00	**1,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	SIERRA MORENA
INTERVENTOR:	COMPANIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**003**
ITEM	**11.1.23**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PEDAL PARA LAVAMANOS O LAVAPLATOS**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
 	BAÑO HOMBRES PISO 1	3,00					3,00	3,00	UN	
	BAÑO MUJERES PISO 1	3,00					3,00	3,00	UN	
	BAÑO HOMBRES PISO 2	3,00					3,00	3,00	UN	
	BAÑO MUJERES PISO 2	3,00					3,00	3,00	UN	
	BAÑO HOMBRES PISO 3	3,00					3,00	3,00	UN	
	BAÑO MUJERES PISO 3	3,00					3,00	3,00	UN	
	LAVAMANOS AUXILIAR COCINA	1,00					1,00	1,00	UN	

TOTAL EJECUTADO	19,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN
PRESENTE ACTA	**19,00**	UN

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
19,00	0,00	**19,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	SIERRA MORENA
INTERVENTOR:	COMPANIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**003**
ITEM	**13.1.2**	**PAÑETE MURO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
MOCHETA MESON	2,00	0,60	0,80			0,96	0,96	M2	
	1,00	0,15	0,80			0,12	0,12	M2	
MURO FACHADA EXTERIOR	1,00	1,20	6,20			7,44	7,44	M2	
	1,00	1,20	6,40			7,68	7,68	M2	

TOTAL EJECUTADO	16,20	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**16.20**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
16,20	0,00	**16,20**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	SIERRA MORENA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**003**
ITEM	**13.1.7**	**ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	MURO FACHADA EXTERIOR	1,00	1,20	6,20			7,44	7,44	M2	
		1,00	1,20	6,40			7,68	7,68	M2	


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	SIERRA MORENA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**003**
ITEM	**13.2.1** **VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



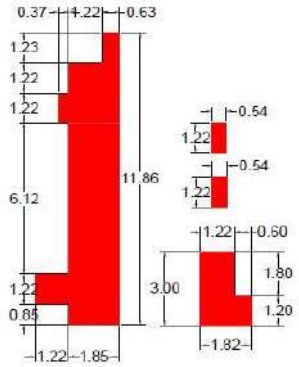






LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
CORTE 2									
PINTURA CIELO RASOS									
BAÑO HOMBRES PISO 1	1,00	3,60	5,28			19,01	19,01	M2	
BAÑO MUJERES PISO 1	1,00	3,64	5,28			19,22	19,22	M2	
BAÑO HOMBRES PISO 2	1,00	3,60	5,28			19,01	19,01	M2	
BAÑO MUJERES PISO 2	1,00	3,56	5,26			18,73	18,73	M2	
BAÑO HOMBRES PISO 3	1,00	3,60	5,28			19,01	19,01	M2	
BAÑO MUJERES PISO 3	1,00	3,56	5,26			18,73	18,73	M2	
OFICINAS ADMINISTRACIÓN CORREDOR	1,00	1,89	11,86			22,42	22,42	M2	
TERCER PISO SALA DE ESPERA	1,00	1,46	3,00			4,38	4,38	M2	
	2,00	0,54	1,22			1,32	1,32	M2	
CIELO RASO ESCALERA #1	1,00	1,22	2,44			2,98	2,98	M2	
MUROS NIVEL 2									
	1,00		0,20	2,25		0,45	0,45	M2	
	1,00		0,77	2,25		1,73	1,73	M2	
	1,00		0,69	2,25		1,55	1,55	M2	
	1,00		0,14	2,25		0,32	0,32	M2	
	2,00		0,96	2,25		4,32	4,32	M2	
	1,00		3,81	2,25		8,57	8,57	M2	
	1,00		0,79	2,25		1,78	1,78	M2	
	1,00		1,27	2,25		2,86	2,86	M2	
	1,00		1,10	2,25		2,48	2,48	M2	
	1,00		1,25	2,25		2,81	2,81	M2	
	1,00		1,86	2,25		4,19	4,19	M2	
	1,00		0,60	2,25		1,35	1,35	M2	
	1,00		0,40	2,25		0,90	0,90	M2	

CAPITULO	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	003
ITEM	13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UNIDAD	M2


ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

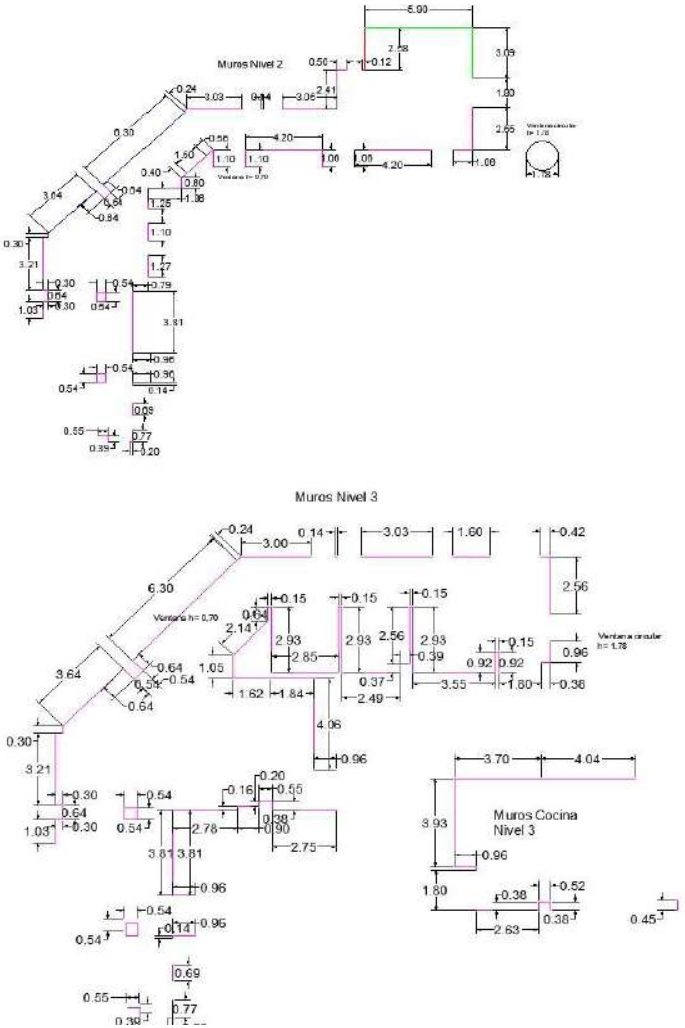


LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
VENTANA	-1,00		1,50	0,70		-1,05	-1,05	M2	
	1,00		1,50	2,25		3,38	3,38	M2	
	1,00		0,56	2,25		1,26	1,26	M2	
	2,00		1,10	2,25		4,95	4,95	M2	
	1,00		4,20	2,25		9,45	9,45	M2	
	2,00		1,06	2,25		4,77	4,77	M2	
	1,00		4,20	2,25		9,45	9,45	M2	
	1,00		1,06	2,25		2,39	2,39	M2	
	1,00		2,55	2,25		5,74	5,74	M2	
VENTANA CIRCULAR	-1,00		1,39	1,78		-2,47	-2,47	M2	
	1,00		2,55	2,25		5,74	5,74	M2	
	1,00		3,09	0,48		1,48	1,48	M2	
	1,00		5,90	0,48		2,83	2,83	M2	
	1,00		0,50	2,25		1,13	1,13	M2	
	1,00		2,41	2,25		5,42	5,42	M2	
	1,00		3,05	2,25		6,86	6,86	M2	
	1,00		0,14	2,25		0,32	0,32	M2	
	1,00		3,03	2,25		6,82	6,82	M2	
	1,00		0,24	2,25		0,54	0,54	M2	
	1,00		6,30	1,07		6,74	6,74	M2	
	2,00		0,64	2,25		2,88	2,88	M2	
	1,00		0,54	2,25		1,22	1,22	M2	
	1,00		3,64	1,07		3,89	3,89	M2	
	1,00		0,30	2,25		0,68	0,68	M2	
	1,00		3,21	2,25		7,22	7,22	M2	
	2,00		0,30	2,25		1,35	1,35	M2	
	1,00		0,64	2,25		1,44	1,44	M2	
	1,00		1,03	2,25		2,32	2,32	M2	
	8,00		0,54	2,25		9,72	9,72	M2	
	1,00		0,55	2,25		1,24	1,24	M2	
	1,00		0,39	2,25		0,88	0,88	M2	
MUROS NIVEL 3									
	1,00		0,20	2,25		0,45	0,45	M2	
	1,00		0,77	2,25		1,73	1,73	M2	
	1,00		0,69	2,25		1,55	1,55	M2	
	1,00		0,14	2,25		0,32	0,32	M2	
	2,00		0,96	2,25		4,32	4,32	M2	
	1,00		3,81	2,25		8,57	8,57	M2	
	1,00		2,78	2,25		6,26	6,26	M2	
	1,00		0,16	2,25		0,36	0,36	M2	

CAPITULO	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	003
ITEM	13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

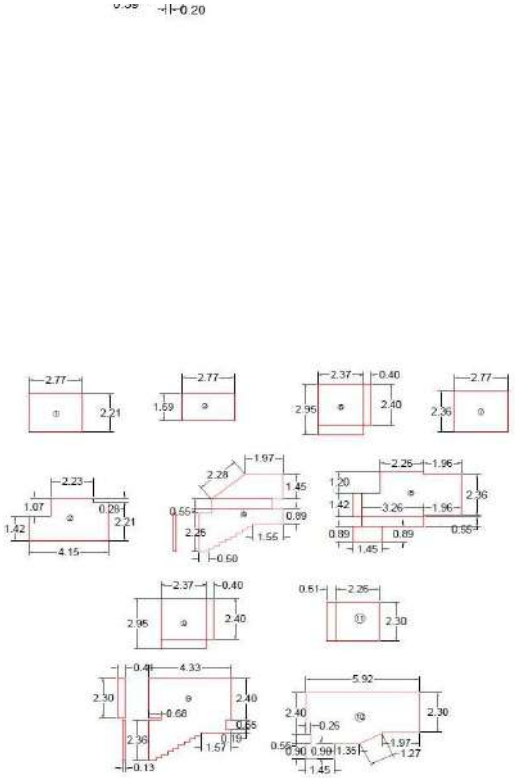

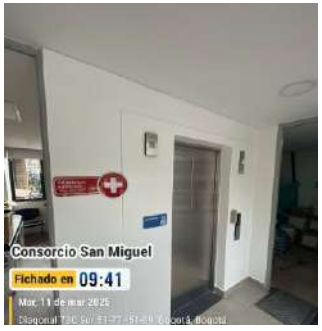



LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	1,00		0,90	2,25		2,03	2,03	M2	
	1,00		0,20	2,25		0,45	0,45	M2	
	1,00		0,55	2,25		1,24	1,24	M2	
	1,00		0,38	2,55		0,97	0,97	M2	
	1,00		0,90	2,55		2,30	2,30	M2	
	1,00		2,75	2,55		7,01	7,01	M2	
	1,00		0,96	2,55		2,45	2,45	M2	
	1,00		4,06	2,55		10,35	10,35	M2	
	1,00		1,84	2,55		4,69	4,69	M2	
	1,00		1,62	2,25		3,65	3,65	M2	
	1,00		1,05	2,25		2,36	2,36	M2	
	1,00		2,14	2,25		4,82	4,82	M2	
VENTANA	-1,00		1,50	0,70		-1,05	-1,05	M2	
	1,00		0,64	2,25		1,44	1,44	M2	
	4,00		0,15	2,25		1,35	1,35	M2	
	4,00		2,93	2,25		26,37	26,37	M2	
	1,00		2,85	2,25		6,41	6,41	M2	
	1,00		2,49	2,25		5,60	5,60	M2	
	1,00		0,37	2,25		0,83	0,83	M2	
	1,00		0,39	2,25		0,88	0,88	M2	
	1,00		3,55	2,25		7,99	7,99	M2	
	2,00		0,92	2,25		4,14	4,14	M2	
	1,00		0,38	2,25		0,86	0,86	M2	
	1,00		0,96	2,25		2,16	2,16	M2	
VENTANA CIRCULAR	-1,00		1,39	1,78		-2,47	-2,47	M2	
	1,00		2,56	2,25		5,76	5,76	M2	
	1,00		0,42	2,25		0,95	0,95	M2	
	1,00		1,60	2,25		3,60	3,60	M2	
	1,00		3,03	2,25		6,82	6,82	M2	
	1,00		0,14	2,25		0,32	0,32	M2	
	1,00		3,00	2,25		6,75	6,75	M2	
	1,00		0,24	2,25		0,54	0,54	M2	
	1,00		6,30	1,07		6,74	6,74	M2	
	2,00		0,64	2,25		2,88	2,88	M2	
	1,00		0,54	2,25		1,22	1,22	M2	
	1,00		3,64	1,07		3,89	3,89	M2	
	1,00		0,30	2,25		0,68	0,68	M2	
	1,00		3,21	2,25		7,22	7,22	M2	
	2,00		0,30	2,25		1,35	1,35	M2	
	1,00		0,64	2,25		1,44	1,44	M2	
	1,00		1,03	2,25		2,32	2,32	M2	

CAPITULO	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	003
ITEM	13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA


















LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	8,00		0,54	2,25		9,72	9,72	M2	
	1,00		0,55	2,25		1,24	1,24	M2	
	1,00		0,39	2,25		0,88	0,88	M2	
MUROS COCINA NIVEL 3									
	1,00		4,04	2,25		9,09	9,09	M2	
	1,00		3,70	2,55		9,44	9,44	M2	
	1,00		3,93	2,55		10,02	10,02	M2	
	1,00		0,96	2,55		2,45	2,45	M2	
	1,00		2,63	2,55		6,71	6,71	M2	
	2,00		0,38	2,55		1,94	1,94	M2	
	1,00		0,52	2,55		1,33	1,33	M2	
	1,00		0,40	2,25		0,90	0,90	M2	
DINTEL PUERTA COCINA	2,00		1,80	0,30		1,08	1,08	M2	
MUROS ESCALERA #1									
	1,00		2,77	2,21		6,12	6,12	M2	
	1,00		2,77	1,59		4,40	4,40	M2	
	2,00		2,37	2,95		13,98	13,98	M2	
	2,00		0,40	2,40		1,92	1,92	M2	
	1,00		2,77	2,36		6,54	6,54	M2	
	1,00		2,26	2,30		5,20	5,20	M2	
	1,00		0,51	2,30		1,17	1,17	M2	
	1,00		4,02	2,21		8,88	8,88	M2	
	1,00		5,46	2,25		12,29	12,29	M2	
	1,00		6,38	2,36		15,06	15,06	M2	
	1,00		0,41	2,30		0,94	0,94	M2	
	1,00		0,13	2,36		0,31	0,31	M2	
	1,00		6,76	2,36		15,95	15,95	M2	
CORTE 3									
LINEALES DE VACIO	1,00		7,63	8,94		68,21	68,21	M2	
MUROS DE PRIMER NIVEL	1,00		64,95	2,24		145,49	145,49	M2	
POCETA PRIMER PISO	1,00		0,53	2,27		1,20	1,20	M2	
	1,00		1,43	0,55		0,79	0,79	M2	
	2,00		8,32	1,90		31,62	31,62	M2	
SALON DE PROFESORES	1,00		3,37	2,27		7,65	7,65	M2	
	1,00		3,20	0,55		1,76	1,76	M2	
OFICINA COORDINACION	1,00		9,81		2,25	22,07	22,07	M2	
ESCALERA #2	1,00		2,00		2,64	5,28	5,28	M2	
	2,00		0,30		2,64	1,58	1,58	M2	
	2,00		0,48		2,64	2,53	2,53	M2	
	2,00		0,25		2,64	1,32	1,32	M2	

CAPITULO	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	003
ITEM	13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

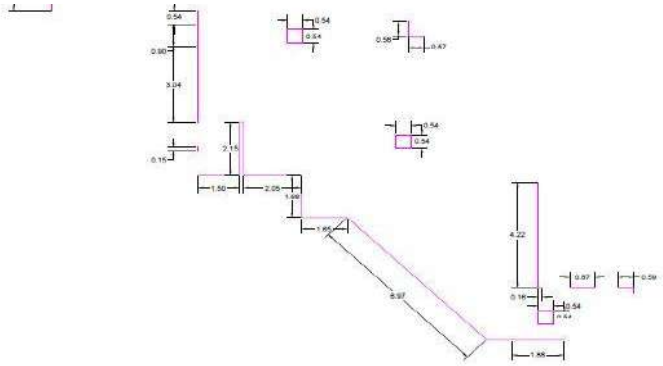

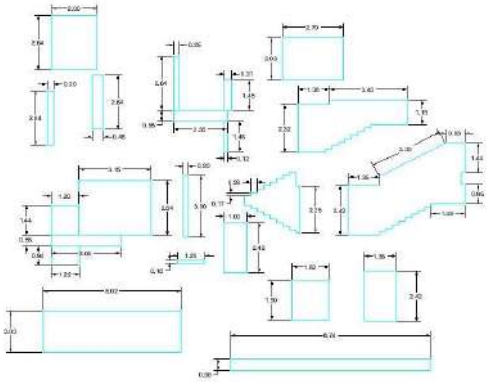

LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	2,00		0,31		1,45	0,90	0,90	M2	
	2,00		2,35		0,55	2,59	2,59	M2	
	2,00		0,12		1,48	0,36	0,36	M2	
	2,00		3,15		2,64	16,63	16,63	M2	
	2,00		1,20		1,44	3,46	3,46	M2	
	2,00		3,00		0,55	3,30	3,30	M2	
	2,00		0,94		1,22	2,29	2,29	M2	
	2,00		1,20		0,16	0,38	0,38	M2	
	2,00		1,00		2,42	4,84	4,84	M2	
	1,00		1,62		1,90	3,08	3,08	M2	
	1,00		1,38		2,42	3,34	3,34	M2	
	2,00		6,02		2,03	24,44	24,44	M2	
	2,00		2,70		2,03	10,96	10,96	M2	
	1,00		8,74		0,55	4,81	4,81	M2	
	1,00		3,59		2,32	8,33	8,33	M2	
	2,00		5,58		2,42	27,01	27,01	M2	
	1,00		1,78		2,25	4,01	4,01	M2	
CIELO RASO EXTERIOR	1,00	1,23	10,37			12,76	12,76	M2	
SALON DE ARTES NIVEL 3	1,00		9,57		2,26	21,63	21,63	M2	
	1,00		3,57		0,93	3,32	3,32	M2	
	1,00		0,81		1,32	1,07	1,07	M2	
	1,00		0,48		2,26	1,08	1,08	M2	
	1,00		3,22		2,26	7,28	7,28	M2	
ENFERMERIA PRIMER NIVEL	1,00		10,06		2,25	22,64	22,64	M2	
	1,00		2,54		0,85	2,16	2,16	M2	
DESCUENTO CIELO RASOS									
OFICINAS ADMINISTRACIÓN CORREDOR	-1,00	1,89	11,86			-22,38	-22,38	M2	
TERCER PISO SALA DE ESPERA	-1,00	1,46	3,00			-4,38	-4,38	M2	
	-2,00	0,54	1,22			-1,32	-1,32	M2	
CIELO RASO ESCALERA #1	-1,00	1,22	2,44			-2,98	-2,98	M2	

TOTAL EJECUTADO	1.058,25	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	607,14	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	

CAPITULO	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	003
ITEM	13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
							PRESENTE ACTA	451,11	M2	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
451,11	607,14	1058,25

OBSERVACIONES:


FIRMA		FIRMA	
	LUIS OSWALDO CAMPAÑA RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	SIERRA MORENA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**003**
ITEM	**13.2.2**	**PINTURA EPOXICA A DOS MANOS**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

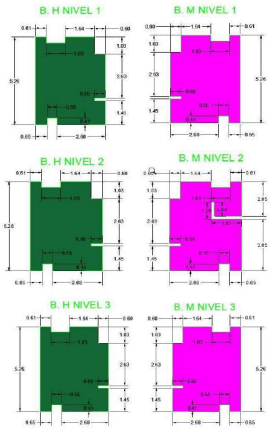





LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
CORTE 3									
BAÑO HOMBRE PISO 1	1,00		18,89	0,6		11,33	11,33	M2	
BAÑO MUJERES PISO 1	1,00		20,92	0,6		20,92	20,92	M2	
BAÑO HOMBRE PISO 2	1,00		20,84	0,6		20,84	20,84	M2	
BAÑO MUJERES PISO 2	1,00		25,88	0,6		25,88	25,88	M2	
BAÑO HOMBRE PISO 3	1,00		20,84	0,6		20,84	20,84	M2	
BAÑO MUJERES PISO 3	1,00		20,98	0,6		20,98	20,98	M2	
POCETA PRIMER PISO	1,00		0,53	2,27		1,20	1,20	M2	
	1,00		1,43	0,55		0,79	0,79	M2	
	2,00		8,32	1,90		31,62	31,62	M2	
DINTELES COCINA	1,00		28,49	0,44		12,54	12,54	M2	
	1,00		5,53	0,44		2,43	2,43	M2	
CIELO RASO BODEGAS COCINA	1,00		1,70	3,9		1,70	1,70	M2	
	1,00		2,32	1,6		2,32	2,32	M2	
	1,00		1,52	1,06		1,52	1,52	M2	

TOTAL EJECUTADO	174,91	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**174,91**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
174,91	0,00	**174,91**

OBSERVACIONES:

	RESIDENTE INTERVENTORÍA		RESIDENTE CONTRATISTA
NOMBRE	ING. LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR NUSTES V.
FIRMA		**FIRMA**	
	DIRECTOR INTERVENTORÍA		**DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	SIERRA MORENA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**003**
ITEM	**13.2.3**	**PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





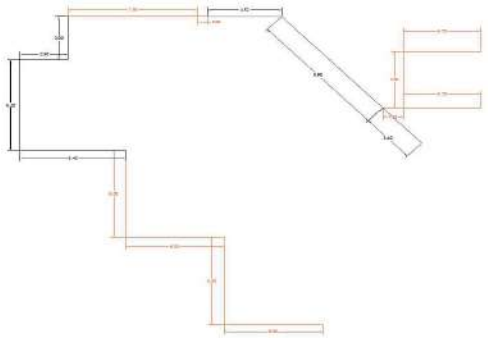

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
MURO EXTERIOR FACHADA	1,00	6,20	10,81			67,02	67,02	M2	
	1,00	0,50	3,00			1,50	1,50	M2	
	1,00	6,40	10,81			69,18	69,18	M2	
	1,00	8,88	10,81			95,99	95,99	M2	
	1,00	3,40	10,81			36,75	36,75	M2	
	1,00	2,90	7,62			22,10	22,10	M2	
	1,00	4,52	10,81			48,86	48,86	M2	
VENTANA CORREDOR SEGUNDO Y TERCER NIVEL	-2,00		6,30	1,18		-14,87	-14,87	M2	
	-2,00		3,64	1,18		-8,59	-8,59	M2	

TOTAL EJECUTADO	317,94	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**317,94**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
317,94	0,00	**317,94**

OBSERVACIONES:


RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**	
NOMBRE	ING. LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
FIRMA		**FIRMA**	
DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	SIERRA MORENA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**003**
ITEM	**13.2.7**	**PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)**	**UNIDAD**	**M2**


ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

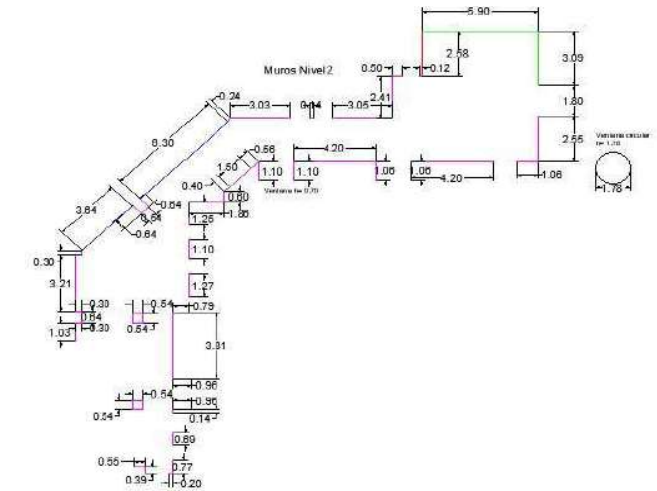





LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
CORTE 2									
MUROS NIVEL 2									
	1,00		0,20	1,50		0,30	0,30	M2	
	1,00		0,77	1,50		1,16	1,16	M2	
	1,00		0,69	1,50		1,04	1,04	M2	
	1,00		0,14	1,50		0,21	0,21	M2	
	2,00		0,96	1,50		2,88	2,88	M2	
	1,00		3,81	1,50		5,72	5,72	M2	
	1,00		0,79	1,50		1,19	1,19	M2	
	1,00		1,27	1,50		1,91	1,91	M2	
	1,00		1,10	1,50		1,65	1,65	M2	
	1,00		1,25	1,50		1,88	1,88	M2	
	1,00		1,86	1,50		2,79	2,79	M2	
	1,00		0,60	1,50		0,90	0,90	M2	
	1,00		0,40	1,50		0,60	0,60	M2	
VENTANA	-1,00		1,50	1,50		-2,25	-2,25	M2	
	1,00		1,50	1,50		2,25	2,25	M2	
	1,00		0,56	1,50		0,84	0,84	M2	
	2,00		1,10	1,50		3,30	3,30	M2	
	1,00		4,20	1,50		6,30	6,30	M2	
	2,00		1,06	1,50		3,18	3,18	M2	
	1,00		4,20	1,50		6,30	6,30	M2	
	1,00		1,06	1,50		1,59	1,59	M2	
	1,00		2,55	1,50		3,83	3,83	M2	
VENTANA CIRCULAR	-0,50		1,39	1,78		-1,24	-1,24	M2	
	1,00		2,55	1,50		3,83	3,83	M2	
	1,00		3,09	0,48		1,48	1,48	M2	
	1,00		5,90	0,48		2,83	2,83	M2	
	1,00		0,50	1,50		0,75	0,75	M2	
	1,00		2,41	1,50		3,62	3,62	M2	
	1,00		3,05	1,50		4,58	4,58	M2	
	1,00		0,14	1,50		0,21	0,21	M2	
	1,00		3,03	1,50		4,55	4,55	M2	
	1,00		0,24	1,50		0,36	0,36	M2	
	1,00		6,30	1,07		6,74	6,74	M2	
	2,00		0,64	1,50		1,92	1,92	M2	

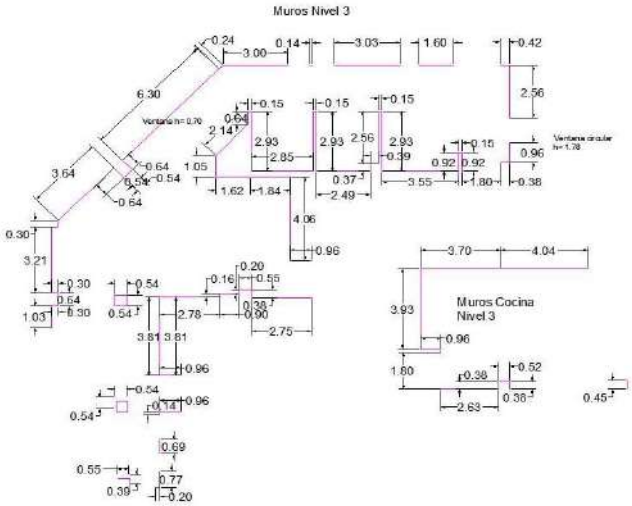











	1,00		0,54	1,50		0,81	0,81	M2	
	1,00		3,64	1,07		3,89	3,89	M2	
	1,00		0,30	1,50		0,45	0,45	M2	
	1,00		3,21	1,50		4,82	4,82	M2	
	2,00		0,30	1,50		0,90	0,90	M2	
	1,00		0,64	1,50		0,96	0,96	M2	
	1,00		1,03	1,50		1,55	1,55	M2	
	8,00		0,54	1,50		6,48	6,48	M2	
	1,00		0,55	1,50		0,83	0,83	M2	
	1,00		0,39	1,50		0,59	0,59	M2	
				MUROS NIVEL 3					
	1,00		0,20	1,50		0,30	0,30	M2	
	1,00		0,77	1,50		1,16	1,16	M2	
	1,00		0,69	1,50		1,04	1,04	M2	
	1,00		0,14	1,50		0,21	0,21	M2	
	2,00		0,96	1,50		2,88	2,88	M2	
	1,00		3,81	1,50		5,72	5,72	M2	
	1,00		2,78	1,50		4,17	4,17	M2	
	1,00		0,16	1,50		0,24	0,24	M2	
	1,00		0,90	1,50		1,35	1,35	M2	
	1,00		0,20	1,50		0,30	0,30	M2	
	1,00		0,55	1,50		0,83	0,83	M2	
	1,00		0,38	1,50		0,57	0,57	M2	
	1,00		0,90	1,50		1,35	1,35	M2	
	1,00		2,75	1,50		4,13	4,13	M2	
	1,00		0,96	1,50		1,44	1,44	M2	
	1,00		4,06	1,50		6,09	6,09	M2	
	1,00		1,84	1,50		2,76	2,76	M2	
	1,00		1,62	1,50		2,43	2,43	M2	
	1,00		1,05	1,50		1,58	1,58	M2	
	1,00		2,14	1,50		3,21	3,21	M2	
VENTANA	-1,00		1,50	0,70		-1,05	-1,05	M2	
	1,00		0,64	1,50		0,96	0,96	M2	
	4,00		0,15	1,50		0,90	0,90	M2	
	4,00		2,93	1,50		17,58	17,58	M2	
	1,00		2,85	1,50		4,28	4,28	M2	
	1,00		2,49	1,50		3,74	3,74	M2	
	1,00		0,37	1,50		0,56	0,56	M2	
	1,00		0,39	1,50		0,59	0,59	M2	
	1,00		3,55	1,50		5,33	5,33	M2	
	2,00		0,92	1,50		2,76	2,76	M2	
	1,00		0,38	1,50		0,57	0,57	M2	
	1,00		0,96	1,50		1,44	1,44	M2	
VENTANA CIRCULAR	-0,50		1,39	1,78		-1,24	-1,24	M2	
	1,00		2,56	1,50		3,84	3,84	M2	
	1,00		0,42	1,50		0,63	0,63	M2	
	1,00		1,60	1,50		2,40	2,40	M2	
	1,00		3,03	1,50		4,55	4,55	M2	
	1,00		0,14	1,50		0,21	0,21	M2	
	1,00		3,00	1,50		4,50	4,50	M2	
	1,00		0,24	1,50		0,36	0,36	M2	






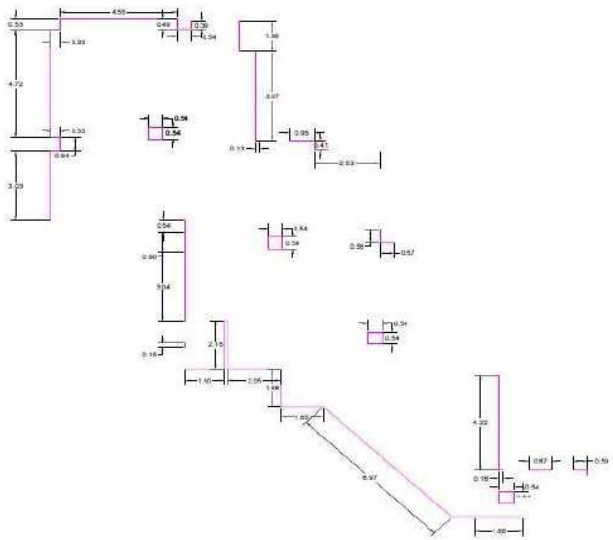

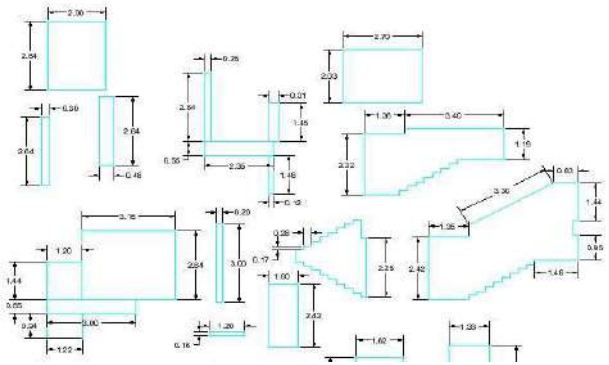

	1,00		6,30	1,07		6,74	6,74	M2	
	2,00		0,64	1,50		1,92	1,92	M2	
	1,00		0,54	1,50		0,81	0,81	M2	
	1,00		3,64	1,07		3,89	3,89	M2	
	1,00		0,30	1,50		0,45	0,45	M2	
	1,00		3,21	1,50		4,82	4,82	M2	
	2,00		0,30	1,50		0,90	0,90	M2	
	1,00		0,64	1,50		0,96	0,96	M2	
	1,00		1,03	1,50		1,55	1,55	M2	
	8,00		0,54	1,50		6,48	6,48	M2	
	1,00		0,55	1,50		0,83	0,83	M2	
	1,00		0,39	1,50		0,59	0,59	M2	
				MUROS COCINA NIVEL 3					
	1,00		4,04	1,50		6,06	6,06	M2	
	1,00		3,70	1,50		5,55	5,55	M2	
	1,00		3,93	1,50		5,90	5,90	M2	
	1,00		0,96	1,50		1,44	1,44	M2	
	1,00		2,63	1,50		3,95	3,95	M2	
	2,00		0,38	1,50		1,14	1,14	M2	
	1,00		0,52	1,50		0,78	0,78	M2	
	1,00		0,40	1,50		0,60	0,60	M2	
				MUROS ESCALERA #1					
	1,00		2,77	1,50		4,16	4,16	M2	
	1,00		2,77	1,50		4,16	4,16	M2	
	2,00		2,37	1,50		7,11	7,11	M2	
	2,00		0,40	1,50		1,20	1,20	M2	
	1,00		2,77	1,50		4,16	4,16	M2	
	1,00		2,26	1,50		3,39	3,39	M2	
	1,00		0,51	1,50		0,77	0,77	M2	
	1,00		4,02	1,50		6,03	6,03	M2	
	1,00		5,46	1,50		8,19	8,19	M2	
	1,00		6,38	1,50		9,57	9,57	M2	
	1,00		0,41	1,50		0,62	0,62	M2	
	1,00		0,13	1,50		0,20	0,20	M2	
	1,00		6,76	1,50		10,14	10,14	M2	
				CORTE 3					
MUROS DE PRIMER NIVEL	1,00		64,95	1,50		97,43	97,43	M2	
SALON DE PROFESORES	1,00		3,37	1,50		5,06	5,06	M2	
	1,00		3,20	0,55		1,76	1,76	M2	
OFICINA COORDINACION	1,00		9,81	1,50		14,72	14,72	M2	
ESCALERA #2	1,00		2,00	1,50		3,00	3,00	M2	
	2,00		0,30	1,50		0,90	0,90	M2	
	2,00		0,48	1,50		1,44	1,44	M2	
	2,00		0,25	1,50		0,75	0,75	M2	
	2,00		0,31	1,45		0,90	0,90	M2	
	2,00		2,35	0,55		2,59	2,59	M2	
	2,00		0,12	1,48		0,36	0,36	M2	
	2,00		3,15	1,50		9,45	9,45	M2	
	2,00		1,20	1,44		3,46	3,46	M2	
	2,00		3,00	0,55		3,30	3,30	M2	
	2,00		0,94	1,22		2,29	2,29	M2	
	2,00		1,20	0,16		0,38	0,38	M2	
	2,00		1,00	1,50		3,00	3,00	M2	
	1,00		1,62	1,90		3,08	3,08	M2	
	1,00		1,38	1,50		2,07	2,07	M2	
	2,00		6,02	1,50		18,06	18,06	M2	
	2,00		2,70	1,50		8,10	8,10	M2	



	1,00		8,74	0,55		4,81	4,81	M2	
	1,00		3,59	1,50		5,39	5,39	M2	
	2,00		5,58	1,50		16,74	16,74	M2	
	1,00		1,78	1,50		2,67	2,67	M2	
SALON DE ARTES NIVEL 3	1,00		9,57	1,50		14,36	14,36	M2	
	1,00		3,57	1,50		5,36	5,36	M2	
	1,00		0,81	1,50		1,22	1,22	M2	
	1,00		0,48	1,50		0,72	0,72	M2	
	1,00		3,22	1,50		4,83	4,83	M2	
ENFERMERIA PRIMER NIVEL	1,00		10,06	1,50		15,09	15,09	M2	
	1,00		2,54	0,85		2,16	2,16	M2	

TOTAL EJECUTADO	563.66	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	308.21	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	M2
PRESENTE ACTA	**255.45**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
255,45	308,21	**563,66**

OBSERVACIONES:

RESIDENTE INTERVENTORÍA		RESIDENTE CONTRATISTA	
NOMBRE	ING. LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
FIRMA		**FIRMA**	
DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	SIERRA MORENA
INTERVENTOR:	COMPANIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**003**
ITEM	**13.2.8**	**PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)**		**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





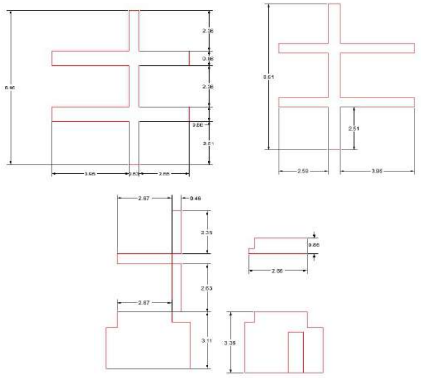

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
ESMALTE LINEAL VACIO	4,00		2,36	1,00		9,44	9,44	M	
	1,00		8,95	1,00		8,95	8,95	M	
	6,00		3,95	1,00		23,70	23,70	M	
	2,00		2,51	1,00		5,02	5,02	M	
	6,00		2,55	1,00		15,30	15,30	M	
	1,00		8,61	1,00		8,61	8,61	M	
	2,00		2,58	1,00		5,16	5,16	M	
	2,00		3,86	1,00		7,72	7,72	M	
	2,00		2,35	1,00		4,70	4,70	M	
	2,00		2,63	1,00		5,26	5,26	M	
	4,00		2,67	1,00		10,68	10,68	M	
	2,00		2,51	1,00		5,02	5,02	M	
	1,00		2,86	1,00		2,86	2,86	M	
	1,00		3,11	1,00		3,11	3,11	M	
	1,00		3,36	1,00		3,36	3,36	M	

TOTAL EJECUTADO	118,89	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	**118.89**	M

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
118,89	0,00	**118,89**

OBSERVACIONES:

RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**	
NOMBRE	ING. LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
FIRMA		**FIRMA**	
DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	SIERRA MORENA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**003**
ITEM	**13.2.9**	**SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA PISO TRÁFICO PESADO**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
 	INGRESO CENTRO DIA	1,00	1,40	4,22			5,91	5,91	M2	

TOTAL EJECUTADO	5,91	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**5,91**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
5,91	0,00	**5,91**

OBSERVACIONES:


RESIDENTE INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA**	
NOMBRE	ING. LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR NUSTES V.
FIRMA		**FIRMA**	
DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	SIERRA MORENA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**003**
ITEM	**13.4.1**	**ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS A DOS MANOS Y DOS CARAS**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
PUERTA EXTERIOR ANTIPANICO	1,00	1,19	2,66			3,17	3,17	M	
PUERTA EXTERIOR COCINA	1,00		1,48	2,35		3,48	3,48	0	

TOTAL EJECUTADO	6,65	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	**6,65**	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
6,65	0,00	**6,65**

OBSERVACIONES:

RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**	
NOMBRE	ING. LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
FIRMA		**FIRMA**	
DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	SIERRA MORENA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**003**
ITEM	**13.4.3**	**ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)**		**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
ESTRUCTURA MESONES	3,00	2,00	2,63			15,78	15,78	M	
	3,00	2,00	0,60			3,60	3,60	M	
SOPORTE	3,00	2,00	0,60			3,60	3,60	M	

TOTAL EJECUTADO	22,98	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	**22,98**	M

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
22,98	0,00	**22,98**



OBSERVACIONES:

RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**	
NOMBRE	ING. LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
FIRMA		**FIRMA**	
DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024	**FRENTE OBRA**	SIERRA MORENA
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**003**
ITEM	**14.1.3**	**CIELORASO EN LAMINA DE YESO DE 1/2" ST (Incluyendo todo lo necesario para su correcta instalación)**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
 	CORTE 3									
	OFICINAS ADMINISTRACIÓN CORREDOR	1,00	1,89	11,86			22,42	22,42	M2	
	TERCER PISO SALA DE ESPERA	1,00	1,46	3,00			4,38	4,38	M2	
		2,00	0,54	1,22			1,32	1,32	M2	
	CIELO RASO ESCALERA #1	1,00	1,22	2,44			2,98	2,98	M2	
	CIELO RASO POCETA PISO 1	1,00	1,43	4,37			6,25	6,25	M2	
	CIELO RASO ESCALERA #1	1,00	2,48	5,20			12,90	12,90	M2	
 										
								TOTAL EJECUTADO	50,25	M2
								MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
								MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
								PRESENTE ACTA	**50,25**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
50,25	0,00	**50,25**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	SIERRA MORENA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**


CAPITULO	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**003**
ITEM	**14.1.8** — **CIELORASO PLANO DRYWALL ANTIHUMEDAD 1/2" (Incluyendo todo lo necesario para su correcta instalación)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA









LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
CORTE 2									
OFICINAS ADMINISTRACIÓN CORREDOR	1,00	1,89	11,86			22,42	22,42	M2	
TERCER PISO SALA DE ESPERA	1,00	1,46	3,00			4,38	4,38	M2	
	2,00	0,54	1,22			1,32	1,32	M2	
CIELO RASO ESCALERA #1	1,00	1,22	2,44			2,98	2,98	M2	
CORTE 3									
BAÑO HOMBRES PISO 1	1,00	1,22	2,44			2,98	2,98	M2	
BAÑO MUJERES PISO 1	1,00	1,22	2,44			2,98	2,98	M2	
BAÑO HOMBRES PISO 2	1,00	1,22	1,22			1,49	1,49	M2	
BAÑO MUJERES PISO 2	1,00	1,22	2,44			2,98	2,98	M2	
BAÑO HOMBRES PISO 3	1,00	1,22	2,44			2,98	2,98	M2	
BAÑO MUJERES PISO 3	2,00	1,22	2,44			5,95	5,95	M2	
CIELO RASO EXTERIOR	1,00	1,23	10,37			12,76	12,76	M2	
DESCUENTO CIELO RASO									
OFICINAS ADMINISTRACIÓN CORREDOR	-1,00	1,89	11,86			-22,42	-22,42	M2	
TERCER PISO SALA DE ESPERA	-1,00	1,46	3,00			-4,38	-4,38	M2	
	-2,00	0,54	1,22			-1,32	-1,32	M2	
CIELO RASO ESCALERA #1	-1,00	1,22	2,44			-2,98	-2,98	M2	

TOTAL EJECUTADO	32,12	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	31,10	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**1.02**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
1,02	31,10	**32,12**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	SIERRA MORENA
INTERVENTOR:	COMPANIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**		**ACTA No:**	**003**
ITEM	**20.1.1**	**ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA






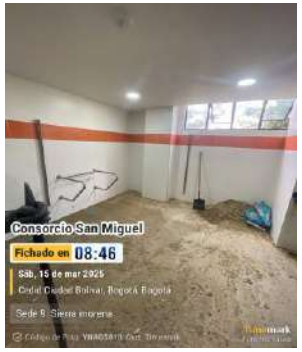






Muros Nivel 3





LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
BAÑO HOMBRES PISO 1	1,00	3,60	5,28			19,01	19,01	M2	
BAÑO MUJERES PISO 1	1,00	3,64	5,28			19,22	19,22	M2	
BAÑO HOMBRES PISO 2	1,00	3,60	5,28			19,01	19,01	M2	
BAÑO MUJERES PISO 2	1,00	3,64	5,28			19,22	19,22	M2	
BAÑO HOMBRES PISO 3	1,00	3,60	5,28			19,01	19,01	M2	
BAÑO MUJERES PISO 3	1,00	3,56	5,26			18,74	18,74	M2	
OFICINAS ADMINISTRACIÓN	1,00	1,82	10,00			18,20	18,20	M2	
GIMNASIO Y ZONA RECREACIÓN	1,00	1,50	7,50			11,25	11,25	M2	
ESCALERA #2	3,00	3,05	5,20			47,58	47,58	M2	
ESCALERA #1	4,00	5,67	2,77			62,82	62,82	M2	
NIVEL 1	1,00	141,65				141,65	141,65	M2	
NIVEL 2	1,00	141,65				141,65	141,65	M2	
NIVEL 3	1,00	141,65				141,65	141,65	M2	
OFICINA COORDINACION	1,00	2,10	3,26			6,85	6,85	M2	
SALON DE ARTES	1,00	9,57	5,49			52,54	52,54	M2	
COCINA TERCER NIVEL	1,00	6,89	7,44			51,26	51,26	M2	
VENTANA CORREDOR SEGUNDO Y TERCER NIVEL	2,00		6,30	1,18		14,87	14,87	M2	
	2,00		3,64	1,18		8,59	8,59	M2	
VENTANAS HALL ACCESO SEDE	2,00		2,63	2,62		13,78	13,78	M2	
	3,00		3,96	2,62		31,13	31,13	M2	
	2,00		2,55	2,62		13,36	13,36	M2	
VENTANAS FACHADA LADRILLO	4,00		3,60	1,62		23,33	23,33	M2	
	4,00		1,80	2,60		18,72	18,72	M2	
	6,00		1,90	0,70		7,98	7,98	M2	
	2,00		3,97	1,41		11,20	11,20	M2	
CIELO RASO EXTERIOR	1,00	1,23	10,37			12,76	12,76	M2	
ANDEN EXTERIOR	1,00	3,00	31,82			95,46	95,46	M2	
PISO COCINA	1,00	4,20	11,47			48,17	48,17	M2	

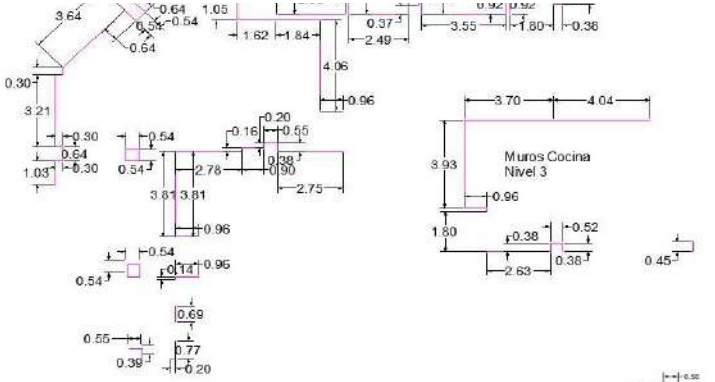





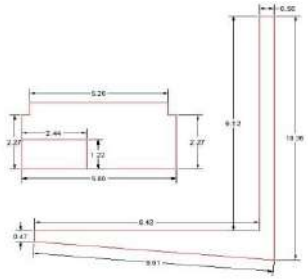



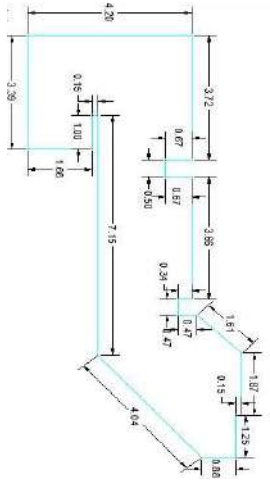







	1,00	2,58	2,31			5,96	5,96	M2	
FACHADA ACCESO EN VIDRIO	1,00		7,90	9,01		71,18	71,18	M2	
	1,00		3,00	7,62		22,86	22,86	M2	

TOTAL EJECUTADO	1.189,01	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**1189.01**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
1189,01	0,00	**1189,01**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA**		ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	SIERRA MORENA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**NO PREVISTOS**	**ACTA No:**	**003**
ITEM	**NP001**	**DESMONTE, INSTALACION Y CERTIFICACION DE PUNTOS DE ANCLAJE PARA TRABAJO EN ALTURAS**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
  	ANCLAJE	1,00	35,00		1,00		35,00	35,00	M2	

TOTAL EJECUTADO	35,00	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**35,00**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
35,00	0,00	**35,00**

OBSERVACIONES:

RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**	
NOMBRE	ING. LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
FIRMA		**FIRMA**	
DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	SIERRA MORENA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**NO PREVISTOS**		**ACTA No:**	**003**
ITEM	**NP002**	**MANTENIMIENTO GENERAL DE CARPINTERIA INCLUYE, DESMONTE REPARACION AJUSTES NECESARIOS MASILLA GRADUACION DE CERRADURAS INCLUYE TRANSPORTE EN CASO DE REQUERIRSE, NO INCLUYE PINTURA NI CAMBIO DE CERRADURAS NI BRAZOS ESPACIALES**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
CORTE 2									
DESMONTE DIVISION EN ACERO INOXIDABLE BAÑO MUJERES 3 NIVEL	0,50	5,48	1,60			1,00	4,38	M2	
	0,50	1,40	1,60			3,00	3,36	M2	
CORTE 3									
INSTALACION DIVISION EN ACERO INOXIDABLE BAÑO MUJERES 3 NIVEL	0,50	5,47	1,60			1,00	4,38	M2	
	0,50	1,40	1,60			3,00	3,36	M2	
BAÑO HOMBRES PISO 1 SANITARIOS	1,00	6,00	2,50			1,00	15,00	M2	
BAÑO MUJERES PISO 1 SANITARIOS	1,00	7,50	2,50			1,00	18,75	M2	

TOTAL EJECUTADO	49,23	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	7,74	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**41,49**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
41,49	7,74	**49,23**


OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CD BELLA FLOR
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**PRELIMINARES**		**ACTA No:**	**003**
ITEM	**1.1.1**	**LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACIONES (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE CONSTRUCCION)**	**UNIDAD**	**M2**

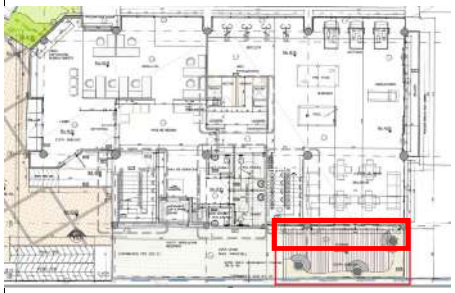ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
										
	SEGUNDO NIVEL									
	TERRAZA	1.00	9.00	2.10			18.90	18.90		
										

TOTAL EJECUTADO	18.90	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	M2	
PRESENTE ACTA	**18.90**	M2	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
18.90	0.00	**18.90**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR AUSTES VELASQUEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024	FRENTE OBRA	CD BELLA FLOR
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	31 de marzo de 2025

CAPITULO	PRELIMINARES		ACTA No:	003
ITEM	1.3.7	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO VIDRIO Y REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
COCINA									
VENTANAS EN COCINA		0.63		2.66		1.00	1.68		
VENTANAS EN COCINA		0.62		2.18		1.00	1.35		

TOTAL EJECUTADO	3.03	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	M2	
PRESENTE ACTA	**3.03**	M2	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
3.03	0.00	**3.03**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR RUSTES VELASQUEZ RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CD BELLA FLOR
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**PRELIMINARES**			**ACTA No:**	**003**
ITEM	**1.3.46**	**PICADO DE MUROS DE MAMPOSTERÍA. INCLUYE DISPOSICIÓN Y RETIRO DE MATERIAL**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	**FACHADA NORTE-KR 27 BIS**									
	MURO CERRAMIENTO INCLINADO									
			0.88		1.79		1.00	1.58	M2	
			2.66		4.14		1.00	11.01	M2	
			3.82		3.94		1.00	15.05	M2	
			2.85		0.91		1.00	2.59	M2	
			2.75		1.00		1.00	2.75	M2	
			0.85		22.48		1.00	19.11	M2	
										
	FACHADA OCCIDENTAL ACCESO DG 73 B SUR									
	NIOVEL CALLE		1.24		2.65		1.00	3.29	M2	AREA DE UN TRAPECIO
			2.36		2.43		1.00	5.73	M2	AREA DE UN TRAPECIO
			2.08		2.42		1.00	5.03	M2	AREA DE UN TRAPECIO
			0.80		2.22		1.00	1.78	M2	AREA DE UN TRAPECIO
			0.85		2.11		1.00	1.79	M2	AREA DE UN TRAPECIO
			1.24		8.25		1.00	10.23	M2	
			3.32		8.01		1.00	26.59	M2	AREA DE UN TRAPECIO
			3.71		6.80		1.00	25.23	M2	
	**DESCUENTO AVISO**		2.50		1.00		-1.00	-2.50	M2	
	VANO PUERTA PRINCIPAL		0.92		2.53		2.00	4.66	M2	
	VIGAS P2/P3		3.58		0.68		2.00	4.87	M2	
	COSTADO IZQ PTA PPAL		1.34		6.80		1.00	9.11	M2	
			1.31		13.23		1.00	17.33	M2	
										
	FACHADA SUR KR 27A									

CAPITULO	PRELIMINARES	ACTA No:	003
ITEM	1.3.46	PICADO DE MUROS DE MAMPOSTERÍA. INCLUYE DISPOSICIÓN Y RETIRO DE MATERIAL	UNIDAD: M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
RECEPCION /LOBBY		1.67		6.89		1.00	11.51	M2	AREA DE UN TRAPECIO
		0.89		2.75		1.00	2.45	M2	AREA DE UN TRAPECIO
VIGA		3.86		0.68		2.00	5.25	M2	
MURO TERRAZA EXTERIOR		8.50		2.88		1.00	24.48	M2	AREA DE UN TRAPECIO
		5.85		3.18		1.00	18.60	M2	AREA DE UN TRAPECIO
		3.65		2.8		1.00	10.22	M2	
INTERIOR TERRAZA		3.50		0.95		1.00	3.33	M2	
		8.17		0.95		1.00	7.76	M2	
		1.55		0.95		1.00	1.47	M2	
		1.21		0.95		1.00	1.15	M2	
VIGAS P2/P3		9.37		0.68		2.00	12.74	M2	

TOTAL EJECUTADO	264.19	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	M2	
PRESENTE ACTA	**264.19**	M2	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
264.19	0.00	**264.19**

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA			RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE		NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024	FRENTE OBRA	CD BELLA FLOR
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	31 de marzo de 2025

CAPITULO	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	003
ITEM	3.1.3	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
FACHADA NORTE-KR 27 BIS									
PRIMER NIVEL			21.86	3.4		1.00	74.32		
PUERTA BASURAS		1.00		2.1		-1.00	-2.10		
PUERTA PLANTA ELECTRICA		2.00		2.1		-1.00	-4.20		
PASILLO		2.10		2.75		-1.00	-5.78		
VENTANA-REJILLAS		0.67		0.65		-4.00	-1.74		
PUERTA PESAJE		1.20		2.1		-1.00	-2.52		
VENTANAS COCINA		2.45		0.65		-1.00	-1.59		
VENTANA-		0.57		0.65		-1.00	-0.37		
VENTANA COCINA		3.52		0.65		-1.00	-2.29		
FACHADA POSTERIOR (ORIENTE)									
PRIMER NIVEL			7.7	3.4		1.00	26.18		
PUERTA BASURAS		0.90		2.1		-1.00	-1.89		
VENTANA LAVADO		2.71		0.65		-1.00	-1.76		
MURO CERRAMIENTO		13.18		2.43		1.00	32.03		
FACHADA SUROCCIDENTAL KR 27A									
NIVEL EXTERIOR CALLE			10.29	9.55		1.00	98.27		
VENTANAS BAÑOS		3.71		0.3		-2.00	-2.23		
FACHADA ACCESO DG 73 B SUR									
NIVEL EXTERIOR CALLE			3.89	9.55		1.00	37.15		
MACHONES TERRAZA- CUBIERTA			0.3	4.000		6.00	7.20		

TOTAL EJECUTADO	248.68	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	M2	
PRESENTE ACTA	**248.68**	M2	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
248.68	0.00	**248.68**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR RUSTES VELASQUEZ RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CD BELLA FLOR
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**003**
ITEM	**3.2.9**	**REEMBOQUILLADO DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA O ADOQUIN CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
FACHADA ORIENTAL (TERRAZA INTERNA)									
MURO CERRAMIENTO		13.18		2.43		1.00	32.03	M2	

TOTAL EJECUTADO	32.03	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	M2
PRESENTE ACTA	**32.03**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
32.03	0.00	**32.03**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR RUSTES VELASQUEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)


Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CD BELLA FLOR
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**003**
ITEM	**3.2.12**	**RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

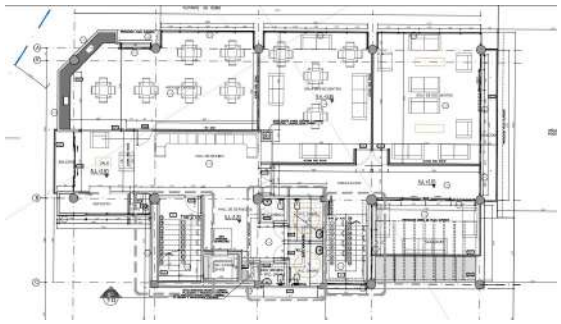





LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
PISO 3								M2	
SALON 1	0.60	2.37	5.9			1.00	8.39	M2	
	0.60	2.37	1.18			1.00	1.68	M2	
	0.60	1.01		2.02		-1.00	-1.22	M2	
PUERTA ANCHO	0.60	0.08	3.03			1.00	0.15	M2	
	0.60	2.37	5.49			1.00	7.81	M2	
FLAJONES	0.60	1.24	3.98			2.00	5.92	M2	
luminarias	0.60	0.58	0.58			-4.00	-0.81	M2	
	0.60	1.24	4.59			1.00	3.41	M2	
luminarias	0.60	0.58	0.58			-2.00	-0.40	M2	
SALON 2	0.60	2.37	5.5			1.00	7.82	M2	
	0.60	2.37	1.16			1.00	1.65	M2	
puerta	0.60	1.00		2.03		-1.00	-1.22	M2	
puerta ancho	0.60	0.07	3.03			1.00	0.13	M2	
	0.60	2.37	5.68			1.00	8.08	M2	
	0.60	2.37	5.97			1.00	8.49	M2	
FLAJONES	0.60	1.23	3.98			2.00	5.87	M2	
luminarias	0.60	0.58	0.58			-4.00	-0.81	M2	
	0.60	1.23	4.58			1.00	3.38	M2	
luminarias	0.60	0.58	0.58			-2.00	-0.40	M2	
								M2	

CAPITULO	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	003
ITEM	3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA








LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
SALON 3	0.60	2.37	4.43			1.00	6.30	M2	
	0.60	2.37	7.72			1.00	10.98	M2	
puerta	0.60	1.00		2.03		-1.00	-1.22	M2	
ancho puerta	0.60	0.07	5.06			1.00	0.21	M2	
	0.60	2.37	1.19			1.00	1.69	M2	
mueble	0.60	0.60		0.82		-1.00	-0.30	M2	
	0.60	2.37	4.29			1.00	6.10	M2	
	0.60	2.37	2.98			1.00	4.24	M2	
	0.60	2.37	1.15			1.00	1.64	M2	
mueble	0.60	0.60		0.82		-1.00	-0.30	M2	
FLAJONES	0.60	1.23	4.23			5.00	15.61	M2	
luminarias	0.60	0.58	0.58			-10.00	-2.02	M2	
								M2	
CAFETERIA	0.60	1.53	1.53			1.00	1.40	M2	
	0.60	0.33	0.81			1.00	0.16	M2	
	0.60	0.06	0.81			1.00	0.03	M2	
	0.60	2.37	1.08			1.00	1.54	M2	
								M2	
PASILLO	0.60	2.37	4.65			1.00	6.61	M2	
	0.60	2.37	1.76			1.00	2.50	M2	
	0.60	2.37	0.31			1.00	0.44	M2	
	0.60	2.37	0.68			1.00	0.97	M2	
	0.60	0.34	0.8			1.00	0.16	M2	
	0.60	2.37	3.62			1.00	5.15	M2	
puerta	0.60	1.00		2		-1.00	-1.20	M2	
ancho puerta	0.60	0.05	5			1.00	0.15	M2	
	0.60	2.37	3.23			1.00	4.59	M2	
ANCENSOR	0.60	0.31	0.94			1.00	0.17	M2	
ancho puerta	0.60	0.17	5.05			1.00	0.52	M2	
	0.60	2.37	1.93			1.00	2.74	M2	
	0.60	2.37	2.72			1.00	3.87	M2	
puerta	0.60	1.00		2.02		-1.00	-1.21	M2	
puerta	0.60	0.70		2.02		-1.00	-0.85	M2	
ancho puerta	0.60	0.05	7.76			1.00	0.23	M2	
	0.60	0.42	2.15			1.00	0.54	M2	
	0.60	0.26	2.01			1.00	0.31	M2	
	0.60	2.37	2.94			1.00	4.18	M2	
puerta	0.60	1.00		2.01		-1.00	-1.21	M2	
	0.60	2.37	0.7			1.00	1.00	M2	
PASILLO CUBIERTA	0.60	2.37	5			1.00	7.11	M2	
	0.60	2.37	5.78			1.00	8.22	M2	
	0.60	2.16	0.34			1.00	0.44	M2	
	0.60	2.02	0.16			1.00	0.19	M2	
	0.60	2.37	6.06			1.00	8.62	M2	
	0.60	2.37	1.37			1.00	1.95	M2	
	0.60	2.37	1.04			1.00	1.48	M2	

CAPITULO	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	003
ITEM	3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA






LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	0.60	2.37	7.97			1.00	11.33	M2	
	0.60	0.99		1.08		-1.00	-0.64	M2	
PLAFONES	0.60	1.23	2.46			2.00	3.63	M2	
luminarias diametro 0.30 cm	0.60		0.0707			-2.00	-0.08	M2	
NEGRO									
SALON 1	0.60	0.30	5.9			1.00	1.06	M2	
	0.60	0.30	1.18			1.00	0.21	M2	
	0.60	0.30	5.89			1.00	1.06	M2	
	0.60	0.30	0.9			1.00	0.16	M2	
SALON 2	0.60	0.30	5.5			1.00	0.99	M2	
	0.60	0.30	1.16			1.00	0.21	M2	
	0.60	0.30	5.68			1.00	1.02	M2	
	0.60	0.30	0.4			1.00	0.07	M2	
	0.60	0.30	6.37			1.00	1.15	M2	
SALON 3	0.60	0.30	4.83			1.00	0.87	M2	
	0.60	0.30	7.72			1.00	1.39	M2	
	0.60	0.30	1.14			1.00	0.21	M2	
	0.60	0.30	9.69			1.00	1.74	M2	
	0.60	0.30	1.07			1.00	0.19	M2	
	0.60	0.30	0.5			1.00	0.09	M2	
								M2	
CAFETERIA	0.60	0.30	1.21			1.00	0.22	M2	
	0.60	0.30	1.08			1.00	0.19	M2	
	0.60	0.30	1.08			1.00	0.19	M2	
PASILLO	0.60	0.30	4.65			1.00	0.84	M2	
	0.60	0.30	1.76			1.00	0.32	M2	
	0.60	0.30	0.31			1.00	0.06	M2	
	0.60	0.30	0.46			1.00	0.08	M2	
PASILLO CUBIERTA	0.60	0.30	1.4			1.00	0.25	M2	
	0.60	0.30	0.7			1.00	0.13	M2	
	0.60	0.30	0.45			1.00	0.08	M2	
PISO 2									
ARCHIVO	0.50	2.36	2.89			1.00	3.41	M2	
	0.50	2.36	0.78			1.00	0.92	M2	
	0.50	2.36	3.5			1.00	4.13	M2	
	0.50	2.36	0.82			1.00	0.97	M2	
	0.50	2.36	5.64			1.00	6.66	M2	
	0.50	2.36	0.12			1.00	0.14	M2	
	0.50	2.36	4.42			1.00	5.22	M2	
puerta	0.50	1.00		2.02		-1.00	-1.01	M2	

CAPITULO	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	003
ITEM	3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA














LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	0.50	2.36	2.03			1.00	2.40	M2	
	0.50	1.39	2.5			2.00	3.48	M2	
	0.50	2.50	0.15			1.00	0.19	M2	
	0.50	2.36	2.4			1.00	2.83	M2	
	0.50	2.36	4.77			1.00	5.63	M2	
	0.50	2.36	1.43			1.00	1.69	M2	
	0.50	2.20	1.39			2.00	3.06	M2	
	0.50	2.20	0.15			1.00	0.17	M2	
	0.50	2.36	3.12			1.00	3.68	M2	
	0.50	2.36	4.28			1.00	5.05	M2	
	0.50	2.36	3.33			1.00	3.93	M2	
puertas	0.50	4.04		2		-1.00	-4.04	M2	
	0.50	0.05	8.06			1.00	0.20	M2	
	0.50	2.36	4.31			1.00	5.09	M2	
	0.50	3.13	1.1			1.00	1.72	M2	
luminarias	0.50	0.58	0.58			-1.00	-0.17	M2	
PLAFONES ADMINISTRACION	0.50	3.17	1.4			4.00	8.88	M2	
luminarias	0.50	0.58	0.58			-8.00	-1.35	M2	
PLAFONES CIELO RASO (circulares)	0.50		2.5447			16.00	20.36	M2	
luminarias	0.50	0.58	0.58			-16.00	-2.69	M2	
perimetro flajones	0.50	0.10	5.6549			16.00	4.52	M2	
								M2	
PORTERIA	0.50	2.36	4.07			1.00	4.80	M2	
	0.50	2.36	5.9			1.00	6.96	M2	
puerta	0.50	1.00		2.01		-1.00	-1.01	M2	
	0.50	0.04	5			1.00	0.10	M2	
	0.50	0.96	0.3			1.00	0.14	M2	
	0.50	0.15	5.06			1.00	0.38	M2	
	0.50	2.36	1.91			1.00	2.25	M2	
	0.50	2.36	2.72			1.00	3.21	M2	
puerta	0.50	1.00		2.01		-1.00	-1.01	M2	
	0.50	0.05	7.76			1.00	0.19	M2	
	0.50	2.16	0.38			1.00	0.41	M2	
	0.50	2.02	0.25			1.00	0.25	M2	
	0.50	2.36	2.92			1.00	3.45	M2	
puerta	0.50	1.00		2.01		-1.00	-1.01	M2	
	0.50	2.36	0.82			1.00	0.97	M2	
	0.50	2.36	3.25			1.00	3.84	M2	
	0.50	2.36	1.53			1.00	1.81	M2	
PLAFONES PORTERIA	0.50	1.41	1.1			1.00	0.78	M2	
luminarias	0.50	0.58	0.58			-1.00	-0.17	M2	


CAPITULO	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	003
ITEM	3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







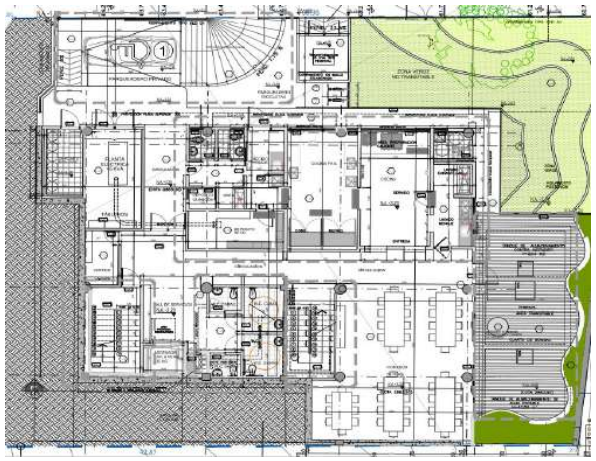






LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	0.50	3.13	1.1			1.00	1.72	M2	
luminarias	0.50	0.58	0.58			-1.00	-0.17	M2	
NEGRO									
ARCHIVO	0.50	0.30	2.99			1.00	0.45	M2	
	0.50	0.30	1.2			1.00	0.18	M2	
	0.50	0.30	0.78			1.00	0.12	M2	
	0.50	0.30	3.5			1.00	0.53	M2	
	0.50	0.30	0.82			1.00	0.12	M2	
	0.50	0.30	5.64			1.00	0.85	M2	
	0.50	0.30	0.12			1.00	0.02	M2	
	0.50	0.30	4.42			1.00	0.66	M2	
	0.50	0.30	2.4			1.00	0.36	M2	
	0.50	0.30	4.77			1.00	0.72	M2	
	0.50	0.30	1.06			1.00	0.16	M2	
	0.50	0.30	0.4			1.00	0.06	M2	
	0.50	0.30	4.43			1.00	0.66	M2	
								M2	
MUROS GYM	0.50	0.30	3.85			1.00	0.58	M2	
	0.50	0.30	0.2			1.00	0.03	M2	
	0.50	0.30	6.95			1.00	1.04	M2	
	0.50	0.30	0.4			1.00	0.06	M2	
								M2	
PORTERIA	0.50	0.30	4.07			1.00	0.61	M2	
	0.50	0.30	1.32			1.00	0.20	M2	
	0.50	0.30	1.53			1.00	0.23	M2	
								M2	
PISO 1								M2	
ENTRADA PARQUEADERO	0.85	2.33	6.75			1.00	13.37	M2	
puerta	0.85	1.00		2.02		-1.00	-1.72	M2	
	0.85	0.03	5.06			1.00	0.13	M2	
	0.85	2.33	6.75			1.00	13.37	M2	
puerta	0.85	0.79		2		-1.00	-1.34	M2	
	0.85	0.64		0.57		-1.00	-0.31	M2	
	0.85	1.80	0.36			1.00	0.55	M2	
	0.85	2.32	0.36			1.00	0.71	M2	
	0.85	2.35	9.5			1.00	18.98	M2	
	0.85	0.05	4.79			1.00	0.20	M2	
	0.85	2.28	5.63			1.00	10.91	M2	
	0.85	1.10		1.13		-2.00	-2.11	M2	
	0.85	0.89		2		-1.00	-1.51	M2	
	0.85	2.28	3.59			1.00	6.96	M2	
	0.85	1.20		2		-1.00	-2.04	M2	
								M2	
COMEDOR	0.85	2.30	7.8			1.00	15.25	M2	

CAPITULO	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	003
ITEM	3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	UNIDAD: M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





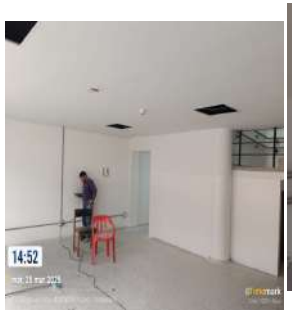





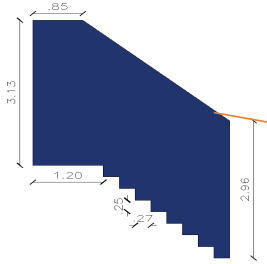


FIGURA 1
AREA:

LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	0.85	2.30	1.9			1.00	3.71	M2	
CIELO RASO COMEDOR	0.85	3.75	7.94			1.00	25.31	M2	
	0.85	6.85	6.8			1.00	39.59	M2	
luminarias	0.85	0.58	0.58			-7.00	-2.00	M2	
luminarias redondas	0.85		0.0707			-2.00	0.00	M2	
columna	0.85	2.39	0.81			1.00	1.65	M2	
								M2	
PASILLO	0.85	2.36	1.55			1.00	3.11	M2	
	0.85	0.40	1.8			1.00	0.61	M2	
	0.85	2.36	3.4			1.00	6.82	M2	
puerta	0.85	1.00		2.02		-2.00	-3.43	M2	
	0.85	0.05	6			1.00	0.26	M2	
	0.85	2.36	3.37			1.00	6.76	M2	
	0.85	0.44	0.96			1.00	0.36	M2	
	0.85	0.13	5.02			1.00	0.55	M2	
	0.85	2.36	1.75			1.00	3.51	M2	
	0.85	2.36	2.65			1.00	5.32	M2	
puerta	0.85	0.70		2		-1.00	-1.19	M2	
puerta	0.85	0.80		2		-1.00	-1.36	M2	
	0.85	2.14	0.41			1.00	0.75	M2	
	0.85	2.00	0.55			1.00	0.94	M2	
	0.85	2.36	3.92			1.00	7.86	M2	
puerta	0.85	1.00		2.02		-1.00	-1.72	M2	
	0.85	0.06	4.8			1.00	0.24	M2	
	0.85	2.36	5.35			1.00	10.73	M2	
	0.85	1.95	2.37			1.00	3.93	M2	
PNTO FIJO 1									
PISO 1 A PISO 2									
figura 1	0.85		10.23			1.00	8.70	M2	
	0.85	3.13	2.46			1.00	6.54	M2	
	0.85	0.55	1.3			1.00	0.61	M2	
	0.85	0.94	2.59			1.00	2.07	M2	promedio alturas

CAPITULO	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	003
ITEM	3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA




FIGURA 2
AREA:



LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
PISO 2 A PISO 3									
figura 2	0.85		5.16			1.00	4.39	M2	
	0.85	0.70	1.26			1.00	0.75	M2	
	0.85	3.45	3.37			1.00	9.88	M2	
	0.85	0.98	2.46			1.00	2.05	M2	
	0.85	0.70	2.8			1.00	1.67	M2	promedio alturas
PISO 4 ENTRADA A TERRAZA	0.60	2.13	2.13			1.00	2.72	M2	
	0.60	2.13	1			1.00	1.28	M2	
	0.60	0.75	0.16			1.00	0.07	M2	
	0.60	0.08	0.95			1.00	0.05	M2	
	0.60	5.03	0.19			1.00	0.57	M2	
	0.60	2.13	0.64			1.00	0.82	M2	
	0.60	1.00	0.16			1.00	0.10	M2	
PUNTO FIJO 2									
PISO 4 A PISO 3	0.85	2.37	2.74			1.00	5.52	M2	
	0.85	0.30	2.74			1.00	0.70	M2	
	0.85	2.37	1.47			1.00	2.96	M2	
puerta	0.85	1.00		2.04		-1.00	-1.73	M2	
	0.85	2.37	1.47			1.00	2.96	M2	
	0.85	2.55	3.35			2.00	14.52	M2	
	0.85	1.74	2.55			1.00	3.77	M2	
	0.85	2.21	1.5			1.00	2.82	M2	promedio alturas
	0.85	1.57	2.47			1.00	3.29	M2	promedio alturas
	0.85	1.25	1.65			1.00	1.75	M2	
	0.85	2.39	2.1			1.00	4.27	M2	
	0.85	1.28	0.34			1.00	0.37	M2	
	0.85	2.37	1.45			2.00	5.84	M2	
	0.85	2.37	1.5			1.00	3.02	M2	
	0.85	1.00	0.42			1.00	0.36	M2	
								M2	
PISO 3 A PISO 2	0.85	2.70	2.92			1.00	6.70	M2	
	0.85	3.11	2.48			1.00	6.56	M2	
	0.85	3.11	0.85			1.00	2.25	M2	
	0.85	3.01	3.3			1.00	8.43	M2	promedio alturas
	0.85	2.37	1.4			1.00	2.82	M2	
	0.85	2.37	1.47			1.00	2.96	M2	
	0.85	1.00	0.42			1.00	0.36	M2	
								M2	
PISO 2 A PISO 1	0.85	3.17	1.2			1.00	3.23	M2	
	0.85	2.70	2.95			1.00	6.77	M2	
	0.85	3.11	2.79			1.00	7.38	M2	
	0.85	3.11	0.9			1.00	2.38	M2	
	0.85	3.05	3.05			1.00	7.91	M2	promedio alturas
	0.85	2.37	1.53			1.00	3.08	M2	

CAPITULO	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	003
ITEM	3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	UNIDAD: M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	0.85	1.00	0.4			1.00	0.34	M2	
	0.85	2.35	1.5			2.00	5.99	M2	
	0.85	2.16	2.3			1.00	4.22	M2	promedio alturas
	0.85	1.47	1.19			1.00	1.49	M2	
	0.85	1.47	1.3			1.00	1.62	M2	
MUROS CUARTO TECNICO	0.85	1.31	2.51			1.00	2.79	M2	
	0.85	0.66	1			1.00	0.56	M2	
	0.85	0.05	2.02			1.00	0.09	M2	
	0.85	1.13	2.65			1.00	2.55	M2	
NEGRO COLUMNAS GYM	0.50	0.30	1.95			1.00	0.29	M2	
	0.50	0.30	0.98			1.00	0.15	M2	
	0.50	0.30	0.42			1.00	0.06	M2	
	0.50	0.30	0.94			1.00	0.14	M2	
	0.50	0.30	0.91			1.00	0.14	M2	
	0.50	0.30	0.7			1.00	0.11	M2	
	0.50	0.30	0.4			1.00	0.06	M2	
FACHADA ORIENTAL (TERRAZA INTERNA)									
PISO 1/2	100%	1.20		1.1		1.00	1.32	M2	
	100%	1.20		0.05		1.00	0.06	M2	
	100%	3.20		0.3		2.00	1.92		
	100%	3.20		1.03		1.00	3.30	M2	
	100%	0.40		0.5		1.00	0.20	M2	
VIGA	100%	3.90		0.68		1.00	2.65	M2	
	100%	4.30		0.24		1.00	1.03	M2	
TERRAZA (PISO 2) POR FUERA	100%	1.90		1.72		1.00	3.27	M2	
	100%	4.53		0.19		1.00	0.86	M2	
	100%	4.53		1.73		1.00	7.84	M2	
	100%	5.71		2.4		1.00	13.70	M2	
	100%	5.71		0.16		1.00	0.91	M2	
VIGA P3/CUBIERTA	100%	3.90		0.68		2.00	5.30	M2	
VOLADIZOS	100%	0.70		0.17		6.00	0.71	M2	AREA DE UN TRAPECIO
	100%	10.10		0.16		3.00	4.85	M2	
VIGA CUBIERTA	100%	10.10		0.68		1.00	6.87	M2	

CAPITULO	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	003
ITEM	3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	UNIDAD: M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				

TOTAL EJECUTADO	721.84	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	M2	
PRESENTE ACTA	**721.84**	M2	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
721.84	0.00	**721.84**

OBSERVACIONES:


FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CD BELLA FLOR
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**003**	
ITEM	**5.1.45**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.**	**UNIDAD**	**ML**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

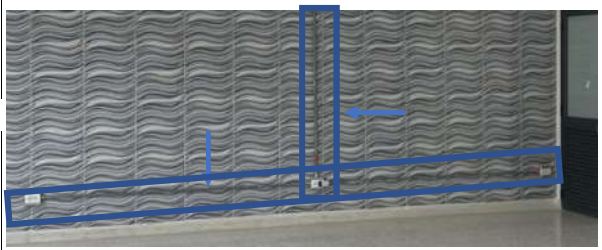

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
TUBERIA EMT SOBRE MURO ENCHAPADO EN COMEDOR			3.38			1.00	3.38	ML	

TOTAL EJECUTADO	3.38	ML	
MENOS ACTAS ANTERIORES		ML	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	ML	
PRESENTE ACTA	**3.38**	ML	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
3.38	0.00	**3.38**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CD BELLA FLOR
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**003**
ITEM	**5.1.65**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**	**UNIDAD**	**UND**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	**DEPOSITO 2 (COMEDOR- BAJO ESCALERA)**						1.00	1.00	UND	
	DEPOSITO 3 (PUNTO FIJO- BAJO ESCALERA)						1.00	1.00	UND	

TOTAL EJECUTADO	2.00	UND	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	UND	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	UND	
PRESENTE ACTA	**2.00**	UND	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
2.00	0.00	**2.00**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CD BELLA FLOR
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**003**	
ITEM	**5.1.71**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**	**UNIDAD**	**UND**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	SALON ELIPTICAS Y BICICLETAS						2.00	2.00	UND	

TOTAL EJECUTADO	2.00	UND	
MENOS ACTAS ANTERIORES		UND	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	UND	
PRESENTE ACTA	**2.00**	UND	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
2.00	0.00	**2.00**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CD BELLA FLOR
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**003**	
ITEM	**5.1.71.1**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CIRCULAR DE 24 W. 11" INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**	**UNIDAD**	**UND**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA




LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**								
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**	**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
DEPOSITO 3 (PUNTO FIJO- BAJO ESCALERA)						1.00	1.00	UND	
PASILLO PISO 2 DEL COMEDOR AL ACCESO						3.00	3.00	UND	

TOTAL EJECUTADO	4.00	UND	
MENOS ACTAS ANTERIORES		UND	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	UND	
PRESENTE ACTA	**4.00**	UND	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
4.00	0.00	**4.00**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CD BELLA FLOR
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**003**	
ITEM	**5.1.74**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER**	**UNIDAD**	**UND**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





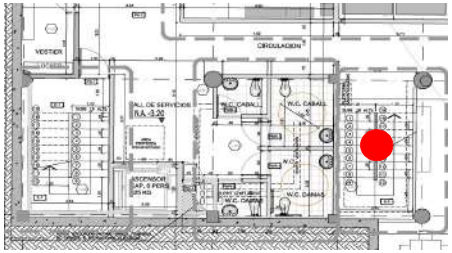

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
DEPOSITO 2 (PUNTO FIJO- BAJO ESCALERA)						1.00	1.00	UND	

TOTAL EJECUTADO	1.00	UND	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	UND	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	UND	
PRESENTE ACTA	**1.00**	UND	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
1.00	0.00	**1.00**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)

Version: 01


Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CD BELLA FLOR
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**003**
ITEM	**7.2.31**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM**	**UNIDAD**	**ML**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
MURO ENCHAPADO EN COMEDOR			3.01			1.00	3.01	ML	

TOTAL EJECUTADO	3.01	ML	
MENOS ACTAS ANTERIORES		ML	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	ML	
PRESENTE ACTA	**3.01**	ML	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
3.01	0.00	**3.01**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024	FRENTE OBRA	CD BELLA FLOR
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	31 de marzo de 2025

CAPITULO	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	003
ITEM	7.2.34	SELLADOR ELASTICO VENTANERIA	UNIDAD	ML

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
FACHADA NORTE-KR 27 BIS									
VENTANERIA									
PISO 3									
SALON DE ENCUENTROS 1			7.78			1.00	7.78		
SALON DE ENCUENTRO 2			7.78			1.00	7.78		
ARTES Y OFICIOS			7.18			1.00	7.18		
PISO 2							0.00		
ELIPTICAS			7.78			1.00	7.78		
BICICLETA			7.78			1.00	7.78		
DIRECCION			7.18			1.00	7.18		
			0.94			1.00	0.94		
FACHADA SUR KR 27A									
PISO 3			5.85			1.00	5.85		
VENTANAS			2.88			1.00	2.88		
ESCALERA			2.44			1.00	2.44		
PISO 2			4.34			1.00	4.34		
ESCALERA			2.44			1.00	2.44		

TOTAL EJECUTADO	64.37	ML	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	ML	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	ML	
PRESENTE ACTA	**64.37**	ML	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
64.37	0.00	**64.37**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CD BELLA FLOR
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**003**
ITEM	**7.2.40**	**GUARDAESCOBA EN DUROPISO DE 8 A 10 CM DE ALTO**	**UNIDAD**	**ML**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
										
	**MUROS SECOS DEPOSITOS COMEDOR**									
	DEPOSITO 1			2.27			2.00	4.54	ML	
	DEPOSITO 2			1.24			2.00	2.48	ML	
				1.90			2.00	3.80	ML	

TOTAL EJECUTADO	10.82	ML	
MENOS ACTAS ANTERIORES		ML	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	ML	
PRESENTE ACTA	**10.82**	ML	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
10.82	0.00	**10.82**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024	FRENTE OBRA	CD BELLA FLOR
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	31 de marzo de 2025

CAPITULO	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	003
ITEM	8.1.2	ENCHAPE 25 X 35	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





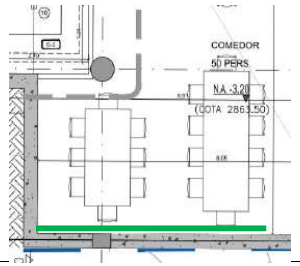

LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
COMEDOR-DIVISION ALACENA									
MURO TALUD COMEDOR		6.02		2.30		1.00	13.85		

TOTAL EJECUTADO	13.85	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	M2
PRESENTE ACTA	**13.85**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
13.85	0.00	**13.85**

OBSERVACIONES:


FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CD BELLA FLOR
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**003**
ITEM	**8.1.3**	**MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E = 10CM, INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA











LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
COMEDOR-DIVISION ALACENA									
MURO DIVISORIO		2.45	2.27			1.00	5.56		
PUERTA		0.30	1.01			1.00	0.30		
DEBAJO ESCALERA COMEDOR									
DEBAJO PLANO INCLINADO		1.58	2.17			1.00	3.43		
DEBAJO DEL DESCANSO		1.00	1.4			-1.00	-1.40		
LATERAL		1.90	1.27			1.00	1.21		AREA DE UN TRAINGULO
ESCALERA PUNTO FIJO PRIMER PISO									
LATERAL PLANO INCLINADO		2.69	1.19			1.00	3.20		PROMEDIO DE ALTURAS
MENOS VANO PUERTA		1.00	2.09			-1.00	-2.09		
FRONTAL		2.34	2.24			1.00	5.24		

TOTAL EJECUTADO	15.45	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	M2
PRESENTE ACTA	**15.45**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
15.45	0.00	**15.45**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024	FRENTE OBRA	CD BELLA FLOR
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	31 de marzo de 2025

CAPITULO	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	003
ITEM	9.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO SIN BATIENTES, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN VIDRIO Y ALUMINIO (REJA TIPO PERSIANA) LA EXISTENTE ERA SOLO VIDRIO





LOCALIZACIÓN / LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
COCINA									
VENTANAS EN COCINA		0,63		2,66		1,00	1,68		
VENTANAS EN COCINA		0,62		2,18		1,00	1,35		

TOTAL EJECUTADO	3,03	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	**3,03**	M2	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
3,03	0,00	**3,03**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Version: 01 Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024	FRENTE OBRA	CD BELLA FLOR
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	31 de marzo de 2025

CAPITULO	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			ACTA No:	003
ITEM	9.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA.		UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





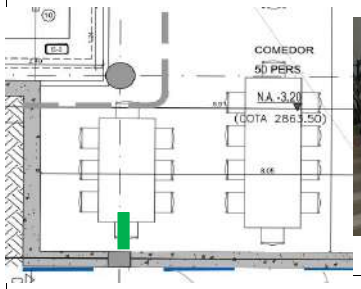



LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
PUERTA ALACENA NUEVA COMEDOR									
PUERTA DEPOSITO COMEDOR		1.01		2.08		1.00	2.10		
PUERTA DEPOSTO BAJO ESCALERA		1.00		1.38		1.00	1.38		
PUERTA DEPOSITO PUNTO FIJO		1.00		2.08		1.00	2.08		

TOTAL EJECUTADO	5.56	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	M2
PRESENTE ACTA	**5.56**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
5.56	0.00	**5.56**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CD BELLA FLOR
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**003**
ITEM	**9.3.1**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA**	**UNIDAD** **M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**								
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**	**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
COCINA									
AREA DE PREPARACION		0.92		1.12		1.00	1.03		
MALLA ANGEO SOBRE REJILLAS COCINA		0.60		0.48		1.00	0.29		
		0.34		0.37		1.00	0.13		

TOTAL EJECUTADO	1.44	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	M2	
PRESENTE ACTA	**1.44**	M2	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
1.44	0.00	**1.44**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR NUSTES VELASQUEZ **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CD BELLA FLOR
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**003**	
ITEM	**13.1.2**	**PAÑETE MURO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
FACHADA NORTE-KR 27 BIS									
MURO CERRAMIENTO INCLINADO		0.88		0.75		1.00	0.66	M2	
Y REJA		0.14		0.75		1.00	0.11	M2	
		0.88		1.79		1.00	1.58	M2	
		2.66		4.14		1.00	11.01	M2	
		3.82		3.94		1.00	15.05	M2	
		2.85		0.91		1.00	2.59	M2	
		2.14		0.51		1.00	1.09	M2	
		2.80		0.55		1.00	1.54	M2	
MUROS REJAS (EXTERIOR)		2.58		0.41		1.00	1.06	M2	AREA DE UN TRAPECIO
		2.14		0.34		1.00	0.73	M2	AREA DE UN TRAPECIO
		2.10		0.54		1.00	1.13	M2	
PLACA PISO 2/3		2.53		0.16		1.00	0.40	M2	
VOLADIZOS 1		0.70		0.17		6.00	0.71	M2	AREA DE UN TRAPECIO
		5.54		0.16		3.00	2.66	M2	
		0.57		0.18		3.00	0.31	M2	
VOLADIZO 2		0.70		0.17		6.00	0.71	M2	AREA DE UN TRAPECIO
		6.18		0.16		3.00	2.97	M2	
		0.53		0.18		3.00	0.29	M2	

CAPITULO	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	003
ITEM	13.1.2	PAÑETE MURO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
VOLADIZO 3		0.70		0.17		3.00	0.36	M2	
		7.13		0.16		3.00	3.42	M2	
VIGAS		2.53		0.68		1.00	1.72	M2	
		2.53		0.24		2.00	1.21	M2	
		0.75		0.67		1.00	0.50	M2	
		0.75		0.18		1.00	0.14	M2	
		1.31		0.18		1.00	0.24	M2	
		2.75		1.00		1.00	2.75	M2	
		0.75		0.68		1.00	0.51	M2	
		0.85		22.48		1.00	19.11	M2	
FACHADA OCCIDENTAL ACCESO DG 73 B SUR		0.87		0.30		1.00	0.26		
NIVEL DE CALLE (PISO2)		1.90		0.17		1.00	0.32		
		1.24		2.65		1.00	3.29	M2	AREA DE UN TRAPECIO
		2.36		2.43		1.00	5.73	M2	AREA DE UN TRAPECIO
		2.08		2.42		1.00	5.03	M2	AREA DE UN TRAPECIO
		0.80		2.22		1.00	1.78	M2	AREA DE UN TRAPECIO
		0.85		2.11		1.00	1.79	M2	AREA DE UN TRAPECIO
		1.24		8.25		1.00	10.23	M2	
		3.32		8.01		1.00	26.59	M2	AREA DE UN TRAPECIO
		3.65		0.13		1.00	0.47	M2	
		2.22		0.24		1.00	0.53	M2	

CAPITULO	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	003
ITEM	13.1.2	PAÑETE MURO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	UNIDAD: M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
		0.63		0.42		1.00	0.26	M2	
		0.70		0.60		1.00	0.42	M2	
		0.94		0.16		1.00	0.15	M2	
		3.71		6.80		1.00	25.23	M2	
DESCUENTO AVISO		2.50		1.00		-1.00	-2.50	M2	
VANO PUERTA PRINCIPAL		0.92		2.53		2.00	4.66	M2	
VIGAS P2/P3		3.58		0.68		2.00	4.87	M2	
COSTADO IZQ PTA PPAL		1.34		6.80		1.00	9.11	M2	
		1.31		13.23		1.00	17.33	M2	
		0.92		2.65		2.00	4.88	M2	
		0.30		3.58		1.00	1.07	M2	
FACHADA SUR KR 27A									
RECEPCION /LOBBY		1.67		6.89		1.00	11.51	M2	AREA DE UN TRAPECIO
		0.89		2.75		1.00	2.45	M2	AREA DE UN TRAPECIO
VIGA		3.86		0.68		2.00	5.25	M2	
MURO TERRAZA EXTERIOR		8.50		2.88		1.00	24.48	M2	AREA DE UN TRAPECIO
		5.85		3.18		1.00	18.60	M2	AREA DE UN TRAPECIO
		3.65		2.8		1.00	10.22	M2	
INTERIOR TERRAZA		3.50		0.95		1.00	3.33	M2	
		8.17		0.95		1.00	7.76	M2	
		1.55		0.95		1.00	1.47	M2	
		1.21		0.95		1.00	1.15	M2	
		3.65		0.15		1.00	0.55	M2	
		8.17		0.15		1.00	1.23	M2	
		1.91		0.15		1.00	0.29	M2	
		0.95		0.15		1.00	0.14	M2	
		0.20		0.15		1.00	0.03	M2	
		1.55		0.15		1.00	0.23	M2	

CAPITULO	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	003
ITEM	13.1.2	PAÑETE MURO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	UNIDAD: M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	VIGAS P2/P3		9.37		0.68		2.00	12.74	M2	
	BORDILLO EN CUBIERTA		57.65		0.42		1.00	24.21	M2	
	MURO PISO 1 CIRCULACION HACIA CTOS TECNICOS (HUMEDAD)		1.85		0.40		1.00	0.74	M2	
			3.82		0.40		1.00	1.53	M2	
			6.50		0.40		1.00	2.60	M2	
			2.90		0.40		1.00	1.16	M2	
			2.45		0.64		1.00	1.57	M2	

TOTAL EJECUTADO	329.31	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	M2	
PRESENTE ACTA	**329.31**	M2	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
329.31	0.00	**329.31**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024	FRENTE OBRA	CD BELLA FLOR
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	31 de marzo de 2025

CAPITULO	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	003
ITEM	13.1.7	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





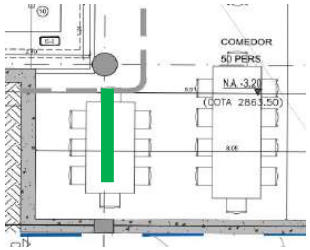

LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
FACHADA ORIENTAL (TERRAZA INTERNA)									
PISO 1/2		1.20		1.1		1.00	1.32	M2	
		1.20		0.05		1.00	0.06	M2	
		3.20		0.3		2.00	1.92		
		3.20		1.03		1.00	3.30	M2	
		0.40		0.5		1.00	0.20	M2	
VIGA		3.90		0.68		1.00	2.65	M2	
		4.30		0.24		1.00	1.03	M2	
TERRAZA (PISO 2) POR FUERA		1.90		1.72		1.00	3.27	M2	
		4.53		0.19		1.00	0.86	M2	
		4.53		1.73		1.00	7.84	M2	
		5.71		2.4		1.00	13.70	M2	
		5.71		0.16		1.00	0.91	M2	
VIGA P3/CUBIERTA		3.90		0.68		2.00	5.30	M2	
VOLADIZOS		0.70		0.17		6.00	0.71	M2	AREA DE UN TRAPECIO
		10.10		0.16		3.00	4.85	M2	
VIGA CUBIERTA		10.10		0.68		1.00	6.87	M2	
ESTUCO EN MUROS DE DRYWALL									
COMEDOR									
MURO DIVISORIO		2.45	2.27			2.00	11.12	M2	
PUERTA		0.30	1.01			2.00	0.61	M2	

CAPITULO	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	003
ITEM	13.1.7	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
DEBAJO ESCALERA COMEDOR									
DEBAJO PLANO INCLINADO		1.58	2.17			2.00	6.86	M2	
DEBAJO DEL DESCANSO		1.00	1.4			-2.00	-2.80	M2	
LATERAL		1.90	1.27			2.00	2.41	M2	AREA DE UN TRAINGULO
ESCALERA PUNTO FIJO PRIMER PISO									
LATERAL PLANO INCLINADO		2.69	1.19			2.00	6.40	M2	PROMEDIO DE ALTURAS
MENOS VANO PUERTA		1.00	2.09			-2.00	-4.18	M2	
FRONTAL		2.34	2.24			2.00	10.48	M2	
TAPAS -ENTRE VOLADIZOS SUPERB.									
FACHADA NORTE-KR 27 BIS									
VOLADIZOS (P2-P3)			0.70	0.40		2.00	0.56	M2	
			5.54	0.40		1.00	2.22	M2	
			0.70	0.40		2.00	0.56	M2	
			6.18	0.40		1.00	2.47	M2	
			0.70	0.40		2.00	0.56	M2	
			7.13	0.40		1.00	2.85	M2	
FACHADA ORIENTAL									
VOLADIZOS (P2-P3)			0.70	0.40		1.00	0.28	M2	
			10.10	0.40		1.00	4.04	M2	
MURO PISO 1 CIRCULACION HACIA CTOS TECNICOS (HUMEDAD)		1.85		0.40		1.00	0.74	M2	
		3.82		0.40		1.00	1.53	M2	
		6.50		0.40		1.00	2.60	M2	
		2.90		0.40		1.00	1.16	M2	
		2.45		0.64		1.00	1.57	M2	

TOTAL EJECUTADO	106.84	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	M2	
PRESENTE ACTA	**106.84**	M2	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
106.84	0.00	**106.84**

OBSERVACIONES:


FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR NUSTES VELASQUEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CD BELLA FLOR
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**003**
ITEM	**13.2.1**	**VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

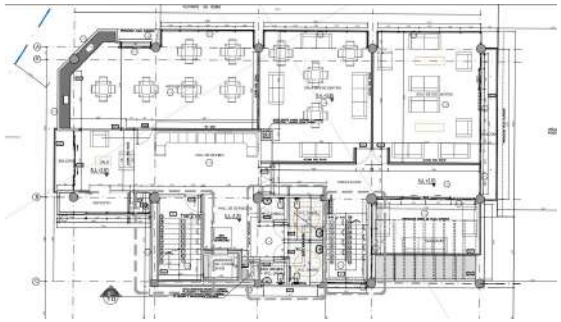







LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
PISO 3								M2	
SALON 1		2.37	5.90			1.00	13.98	M2	
		2.37	1.18			1.00	2.80	M2	
		1.01		2.02		-1.00	-2.04	M2	
PUERTA ANCHO		0.08	3.03			1.00	0.24	M2	
		2.37	5.49			1.00	13.01	M2	
FLAJONES		1.24	3.98			2.00	9.87	M2	
luminarias		0.58	0.58			-4.00	-1.35	M2	
		1.24	4.59			1.00	5.69	M2	
luminarias		0.58	0.58			-2.00	-0.67	M2	
SALON 2		2.37	5.50			1.00	13.04	M2	
		2.37	1.16			1.00	2.75	M2	
puerta		1.00		2.03		-1.00	-2.03	M2	
puerta ancho		0.07	3.03			1.00	0.21	M2	
		2.37	5.68			1.00	13.46	M2	
		2.37	5.97			1.00	14.15	M2	
FLAJONES		1.23	3.98			2.00	9.79	M2	
luminarias		0.58	0.58			-4.00	-1.35	M2	
		1.23	4.58			1.00	5.63	M2	
luminarias		0.58	0.58			-2.00	-0.67	M2	
								M2	
SALON 3		2.37	4.43			1.00	10.50	M2	
		2.37	7.72			1.00	18.30	M2	
puerta		1.00		2.03		-1.00	-2.03	M2	
ancho puerta		0.07	5.06			1.00	0.35	M2	
		2.37	1.19			1.00	2.82	M2	

CAPITULO	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	003
ITEM	13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA






LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
mueble		0.60		0.82		-1.00	-0.49	M2	
		2.37	4.29			1.00	10.17	M2	
		2.37	2.98			1.00	7.06	M2	
		2.37	1.15			1.00	2.73	M2	
mueble		0.60		0.82		-1.00	-0.49	M2	
FLAJONES		1.23	4.23			5.00	26.01	M2	
luminarias		0.58	0.58			-10.00	-3.36	M2	
								M2	
CAFETERIA		1.53	1.53			1.00	2.34	M2	
		0.33	0.81			1.00	0.27	M2	
		0.06	0.81			1.00	0.05	M2	
		2.37	1.08			1.00	2.56	M2	
								M2	
PASILLO		2.37	4.65			1.00	11.02	M2	
		2.37	1.76			1.00	4.17	M2	
		2.37	0.31			1.00	0.73	M2	
		2.37	0.68			1.00	1.61	M2	
		0.34	0.80			1.00	0.27	M2	
		2.37	3.62			1.00	8.58	M2	
puerta		1.00		2		-1.00	-2.00	M2	
ancho puerta		0.05	5.00			1.00	0.25	M2	
		2.37	3.23			1.00	7.66	M2	
ANCENSOR		0.31	0.94			1.00	0.29	M2	
ancho puerta		0.17	5.05			1.00	0.86	M2	
		2.37	1.93			1.00	4.57	M2	
		2.37	2.72			1.00	6.45	M2	
puerta		1.00		2.02		-1.00	-2.02	M2	
puerta		0.70		2.02		-1.00	-1.41	M2	
ancho puerta		0.05	7.76			1.00	0.39	M2	
		0.42	2.15			1.00	0.90	M2	
		0.26	2.01			1.00	0.52	M2	
		2.37	2.94			1.00	6.97	M2	
puerta		1.00		2.01		-1.00	-2.01	M2	
		2.37	0.70			1.00	1.66	M2	
PASILLO CUBIERTA		2.37	5.00			1.00	11.85	M2	
		2.37	5.78			1.00	13.70	M2	
		2.16	0.34			1.00	0.73	M2	
		2.02	0.16			1.00	0.32	M2	
		2.37	6.06			1.00	14.36	M2	
		2.37	1.37			1.00	3.25	M2	
		2.37	1.04			1.00	2.46	M2	
		2.37	7.97			1.00	18.89	M2	
		0.99		1.08		-1.00	-1.07	M2	
PLAFONES		1.23	2.46			2.00	6.05	M2	
luminarias diametro 0.30 cm			0.07			-2.00	-0.14	M2	

CAPITULO	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	003
ITEM	13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

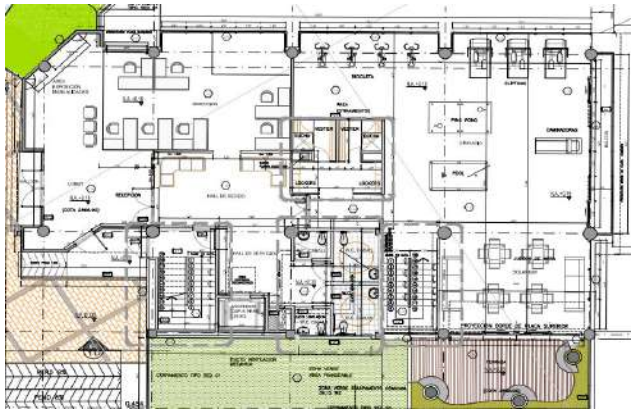



LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
NEGRO									
SALON 1		0.30	5.90			1.00	1.77	M2	
		0.30	1.18			1.00	0.35	M2	
		0.30	5.89			1.00	1.77	M2	
		0.30	0.90			1.00	0.27	M2	
SALON 2		0.30	5.50			1.00	1.65	M2	
		0.30	1.16			1.00	0.35	M2	
		0.30	5.68			1.00	1.70	M2	
		0.30	0.40			1.00	0.12	M2	
		0.30	6.37			1.00	1.91	M2	
SALON 3		0.30	4.83			1.00	1.45	M2	
		0.30	7.72			1.00	2.32	M2	
		0.30	1.14			1.00	0.34	M2	
		0.30	9.69			1.00	2.91	M2	
		0.30	1.07			1.00	0.32	M2	
		0.30	0.50			1.00	0.15	M2	
								M2	
CAFETERIA		0.30	1.21			1.00	0.36	M2	
		0.30	1.08			1.00	0.32	M2	
		0.30	1.08			1.00	0.32	M2	
PASILLO		0.30	4.65			1.00	1.40	M2	
		0.30	1.76			1.00	0.53	M2	
		0.30	0.31			1.00	0.09	M2	
		0.30	0.46			1.00	0.14	M2	
PASILLO CUBIERTA		0.30	1.40			1.00	0.42	M2	
		0.30	0.70			1.00	0.21	M2	
		0.30	0.45			1.00	0.14	M2	
PISO 2									
ARCHIVO		2.36	2.89			1.00	6.82	M2	
		2.36	0.78			1.00	1.84	M2	
		2.36	3.50			1.00	8.26	M2	
		2.36	0.82			1.00	1.94	M2	
		2.36	5.64			1.00	13.31	M2	
		2.36	0.12			1.00	0.28	M2	
		2.36	4.42			1.00	10.43	M2	
puerta		1.00		2.02		-1.00	-2.02	M2	
		2.36	2.03			1.00	4.79	M2	
		1.39	2.50			2.00	6.95	M2	
		2.50	0.15			1.00	0.38	M2	
		2.36	2.40			1.00	5.66	M2	
		2.36	4.77			1.00	11.26	M2	

CAPITULO	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	003
ITEM	13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA












LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
		2.36	4.43			1.00	10.45	M2	
		2.20	1.39			2.00	6.12	M2	
		2.20	0.15			1.00	0.33	M2	
		2.36	3.12			1.00	7.36	M2	
		2.36	4.28			1.00	10.10	M2	
		2.36	3.33			1.00	7.86	M2	
puertas		4.04		2		-1.00	-8.08	M2	
		0.05	8.06			1.00	0.40	M2	
		2.36	4.31			1.00	10.17	M2	
		3.13	1.10			1.00	3.44	M2	
luminarias		0.58	0.58			-1.00	-0.34	M2	
PLAFONES ADMINISTRACION		3.17	1.40			4.00	17.75	M2	
luminarias		0.58	0.58			-8.00	-2.69	M2	
PLAFONES CIELO RASO (circulares)			2.54			16.00	40.72	M2	
luminarias		0.58	0.58			-16.00	-5.38	M2	
perimetro flajones		0.10	5.65			16.00	9.05	M2	
								M2	
PORTERIA		2.36	4.07			1.00	4.07	M2	
		2.36	5.90			1.00	5.90	M2	
puerta		1.00		2.01		-1.00	-2.01	M2	
		0.04	5.00			1.00	5.00	M2	
		0.96	0.30			1.00	0.30	M2	
		0.15	5.06			1.00	5.06	M2	
		2.36	1.91			1.00	1.91	M2	
		2.36	2.72			1.00	2.72	M2	
		0.70		2.01		-1.00	-1.41	M2	
puerta		1.00		2.01		-1.00	-2.01	M2	
		0.05	7.76			1.00	7.76	M2	
		2.16	0.38			1.00	0.38	M2	
		2.02	0.25			1.00	0.25	M2	
		2.36	2.92			1.00	2.92	M2	
puerta		1.00		2.01		-1.00	-2.01	M2	
		2.36	0.82			1.00	1.94	M2	
		2.36	3.25			1.00	7.67	M2	
		2.36	1.53			1.00	3.61	M2	
PLAFONES PORTERIA		1.41	1.10			1.00	1.55	M2	
luminarias		0.58	0.58			-1.00	-0.34	M2	
		3.13	1.10			1.00	3.44	M2	
luminarias		0.58	0.58			-1.00	-0.34	M2	
								M2	

CAPITULO	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	003
ITEM	13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UNIDAD M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



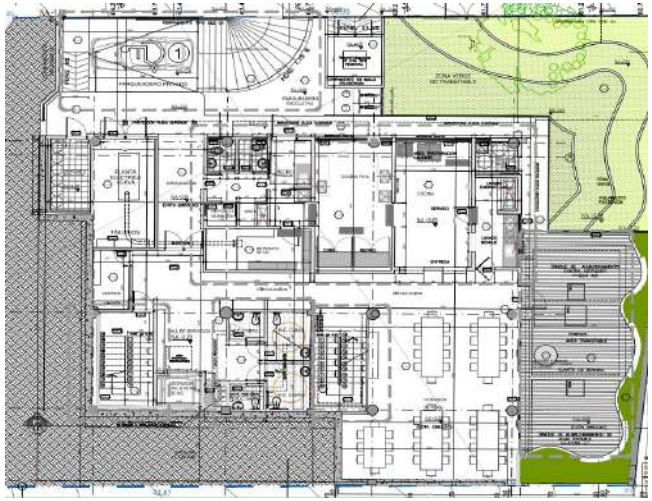





LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
NEGRO								M2	
ARCHIVO		0.30	2.99			1.00	0.90	M2	
		0.30	1.20			1.00	0.36	M2	
		0.30	0.78			1.00	0.23	M2	
		0.30	3.50			1.00	1.05	M2	
		0.30	0.82			1.00	0.25	M2	
		0.30	5.64			1.00	1.69	M2	
		0.30	0.12			1.00	0.04	M2	
		0.30	4.42			1.00	1.33	M2	
		0.30	2.40			1.00	0.72	M2	
		0.30	4.77			1.00	1.43	M2	
		0.30	1.06			1.00	0.32	M2	
		0.30	0.40			1.00	0.12	M2	
		0.30	4.43			1.00	1.33	M2	
								M2	
MUROS GYM		0.30	3.85			1.00	1.16	M2	
		0.30	0.20			1.00	0.06	M2	
		0.30	6.95			1.00	2.09	M2	
		0.30	0.40			1.00	0.12	M2	
								M2	
PORTERIA		0.30	4.07			1.00	1.22	M2	
		0.30	1.32			1.00	0.40	M2	
		0.30	1.53			1.00	0.46	M2	
								M2	
PISO 1								M2	
ENTRADA PARQUEADERO		2.33	6.75			1.00	15.73	M2	
puerta		1.00		2.02		-1.00	-2.02	M2	
		0.03	5.06			1.00	0.15	M2	
		2.33	6.75			1.00	15.73	M2	
puerta		0.79		2		-1.00	-1.58	M2	
		0.64		0.57		-1.00	-0.36	M2	
		1.80	0.36			1.00	0.65	M2	
		2.32	0.36			1.00	0.84	M2	
		2.35	9.50			1.00	22.33	M2	
		0.05	4.79			1.00	0.24	M2	
		2.28	5.63			1.00	12.84	M2	
		1.10		1.13		-2.00	-2.49	M2	
		0.89		2		-1.00	-1.78	M2	
		2.28	3.59			1.00	8.19	M2	
		1.20		2		-1.00	-2.40	M2	
								M2	
COMEDOR		2.30	7.80			1.00	17.94	M2	
		2.30	1.90			1.00	4.37	M2	
CIELO RASO COMEDOR		3.75	7.94			1.00	29.78	M2	
		6.85	6.80			1.00	46.58	M2	
luminarias		0.58	0.58			-7.00	-2.35	M2	

CAPITULO	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	003
ITEM	13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UNIDAD M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA









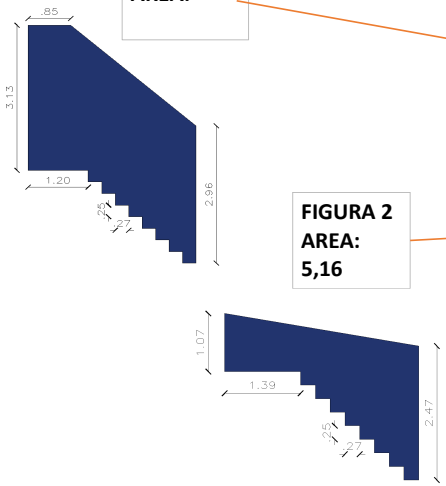


FIGURA 1

LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
luminarias redondas			0.07			-2.00	-0.14	M2	
columna		2.39	0.81			1.00	1.94	M2	
								M2	
PASILLO		2.36	1.55			1.00	3.66	M2	
		0.40	1.80			1.00	0.72	M2	
		2.36	3.40			1.00	8.02	M2	
puerta		1.00		2.02		-2.00	-4.04	M2	
		0.05	6.00			1.00	0.30	M2	
		2.36	3.37			1.00	7.95	M2	
		0.44	0.96			1.00	0.42	M2	
		0.13	5.02			1.00	0.65	M2	
		2.36	1.75			1.00	4.13	M2	
		2.36	2.65			1.00	6.25	M2	
puerta		0.70		2		-1.00	-1.40	M2	
puerta		0.80		2		-1.00	-1.60	M2	
		2.14	0.41			1.00	0.88	M2	
		2.00	0.55			1.00	1.10	M2	
		2.36	3.92			1.00	9.25	M2	
puerta		1.00		2.02		-1.00	-2.02	M2	
		0.06	4.80			1.00	0.29	M2	
		2.36	5.35			1.00	12.63	M2	
		1.95	2.37			1.00	4.62	M2	
BODEGA 1		2.36	2.27			2.00	10.71	M2	
		0.11	3.10			1.00	0.34	M2	
		0.30	1.01			2.00	0.61	M2	
BODEGA 2		2.17	1.58			2.00	6.86	M2	
puerta		1.00		1.4		-2.00	-2.80	M2	
		1.90	0.64			2.00	2.43	M2	TRIANGULO
		0.13	1.20			1.00	0.16	M2	
		0.08	1.45			1.00	0.12	M2	
		2.39	1.40			1.00	3.35	M2	PROMEDIO DE ALTURAS
		1.10	1.32			1.00	1.45	M2	
		0.66	2.05			1.00	1.35	M2	TRIANGULO
		0.12	1.40			1.00	0.17	M2	
BODEGA 3		2.69	1.19			2.00	6.40	M2	
puerta		1.00		2.09		-2.00	-4.18	M2	
		2.24	2.34			2.00	10.48	M2	PROMEDIO DE ALTURAS
		1.41	2.55			1.00	3.58	M2	
		0.66	2.20			1.00	1.45	M2	
		0.87	1.32			1.00	1.15	M2	

CAPITULO	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	003
ITEM	13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
PNTO FIJO 1									
PISO 1 A PISO 2									
FIGURA 1						1.00	10.23	M2	
		3.13	2.46			1.00	7.70	M2	
		0.55	1.30			1.00	0.72	M2	
		0.94	2.59			1.00	2.43	M2	promedio alturas
PISO 2 A PISO 3									
FIGURA 2						1.00	5.16	M2	
		0.70	1.26			1.00	0.88	M2	
		3.45	3.37			1.00	11.63	M2	
		0.98	2.46			1.00	2.41	M2	
		0.70	2.80			1.00	1.96	M2	promedio alturas
PISO 4 ENTRADA A TERRAZA		2.13	2.13			1.00	4.54	M2	
		2.13	1.00			1.00	2.13	M2	
		0.75	0.16			1.00	0.12	M2	
		0.08	0.95			1.00	0.08	M2	
		5.03	0.19			1.00	0.96	M2	
		2.13	0.64			1.00	1.36	M2	
		1.00	0.16			1.00	0.16	M2	
		1.25	2.13			1.00	2.66	M2	
PUNTO FIJO 2									
PISO 4 A PISO 3		2.37	2.74			1.00	6.49	M2	
		0.30	2.74			1.00	0.82	M2	
		2.37	1.47			1.00	3.48	M2	
puerta		1.00		2.04		-1.00	-2.04	M2	
		2.37	1.47			1.00	3.48	M2	
		2.55	3.35			2.00	17.09	M2	
		1.74	2.55			1.00	4.44	M2	
		2.21	1.50			1.00	3.32	M2	promedio alturas
		1.57	2.47			1.00	3.87	M2	promedio alturas
		1.25	1.65			1.00	2.06	M2	
		2.39	2.10			1.00	5.02	M2	
		1.28	0.34			1.00	0.44	M2	
		2.37	1.45			2.00	6.87	M2	
		2.37	1.50			1.00	3.56	M2	
		1.00	0.42			1.00	0.42	M2	
								M2	
PISO 3 A PISO 2		2.70	2.92			1.00	7.88	M2	
		3.11	2.48			1.00	7.71	M2	
		3.11	0.85			1.00	2.64	M2	
		3.01	3.30			1.00	9.92	M2	promedio alturas
		2.37	1.40			1.00	3.32	M2	
		2.37	1.47			1.00	3.48	M2	

CAPITULO	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	003
ITEM	13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
		1.00	0.42			1.00	0.42	M2	
								M2	
PISO 2 A PISO 1		3.17	1.20			1.00	3.80	M2	
		2.70	2.95			1.00	7.97	M2	
		3.11	2.79			1.00	8.68	M2	
		3.11	0.90			1.00	2.80	M2	
		3.05	3.05			1.00	9.30	M2	promedio alturas
		2.37	1.53			1.00	3.63	M2	
		1.00	0.40			1.00	0.40	M2	
		2.35	1.50			2.00	7.05	M2	
		2.16	2.30			1.00	4.97	M2	promedio alturas
		1.47	1.19			1.00	1.75	M2	
		1.47	1.30			1.00	1.91	M2	
MUROS CUARTO TECNICO		1.31	2.51			1.00	3.29	M2	
		0.66	1.00			1.00	0.66	M2	
		0.05	2.02			1.00	0.10	M2	
		1.13	2.65			1.00	2.99	M2	

CAPITULO	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	003
ITEM	13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	NEGRO COLUMNAS GYM		0.30	1.95			1.00	0.59	M2	
			0.30	0.98			1.00	0.29	M2	
			0.30	0.42			1.00	0.13	M2	
			0.30	0.94			1.00	0.28	M2	
			0.30	0.91			1.00	0.27	M2	
			0.30	0.70			1.00	0.21	M2	
			0.30	0.40			1.00	0.12	M2	

TOTAL EJECUTADO	1,023.86	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	M2	
PRESENTE ACTA	**1023.86**	M2	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
1023.86	0.00	**1023.86**



OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CD BELLA FLOR
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**003**
ITEM	**13.2.2**	**PINTURA EPOXICA A DOS MANOS**		**UNIDAD**	**M2**

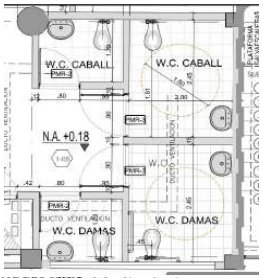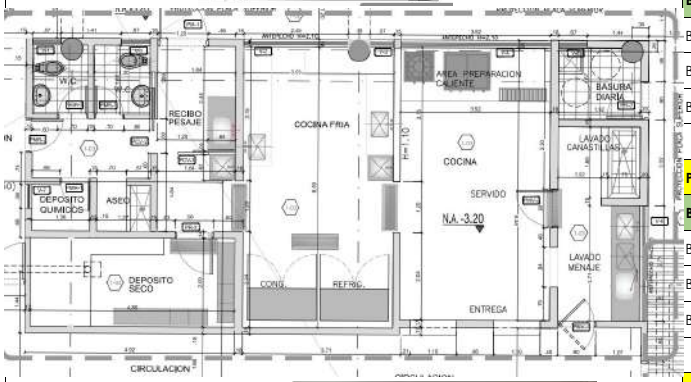ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	**PISO 1**									
	BAÑO 1 DAMAS		1.90	2.3			1.00	4.37	M2	
	BAÑO 2 DAMAS		1.87	2.32			1.00	4.34	M2	
	BAÑO 3 HOMBRES		1.16	1.46			1.00	1.69	M2	
	BAÑO 4 HOMBRES		1.47	1.13			1.00	1.66	M2	
	PISO 2									
	BAÑO 1 DAMAS		1.90	2.3			1.00	4.37	M2	
	BAÑO 2 DAMAS		1.87	2.32			1.00	4.34	M2	
	BAÑO 3 HOMBRES		1.16	1.46			1.00	1.69	M2	
	BAÑO 4 HOMBRES		1.47	1.13			1.00	1.66	M2	
	**PISO 3**									
	BAÑO 1 DAMAS		1.90	2.3			1.00	4.37	M2	
	BAÑO 2 DAMAS		1.87	2.32			1.00	4.34	M2	
	BAÑO 3 HOMBRES		1.16	1.46			1.00	1.69	M2	
	BAÑO 4 HOMBRES		1.47	1.13			1.00	1.66	M2	
	**PISO 1 COCINA**		3.40	5.31			1.00	18.05	M2	
			1.86	1.61			1.00	2.99	M2	
			0.18	0.78			1.00	0.14	M2	
			2.00	1.63			1.00	3.26	M2	
			0.18	1.08			1.00	0.19	M2	
			3.43	6.66			1.00	22.84	M2	
			1.13	1.71			1.00	1.93	M2	
			0.18	1.1			1.00	0.20	M2	
			1.98	4.68			1.00	9.27	M2	

CAPITULO	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	003
ITEM	13.2.2 PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
			0.72	0.72			-1.00	-0.52	M2	
			1.75	2.55			1.00	4.46	M2	
			1.15	1.15			1.00	1.32	M2	
			2.66	1.29			1.00	3.43	M2	
			1.22	1.56			1.00	1.90	M2	
			1.80	2.36			1.00	4.25	M2	
			0.65	0.3			-1.00	-0.20	M2	
			0.99	1.24			1.00	1.23	M2	
	columna		2.36	1.35			1.00	3.19	M2	
			2.36	0.45			1.00	1.06	M2	
	COLUMNA BAÑO 2 (PISO 1,2,3)		2.36	0.4			1.00	0.94	M2	
			2.36	0.4			1.00	0.94	M2	
			2.36	0.4			1.00	0.94	M2	
	PRIMEROS AUXILIOS		1.75	1.84			1.00	3.22	M2	
	luminaria			0.0707			-1.00	-0.07	M2	

TOTAL EJECUTADO	121.18	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	M2
PRESENTE ACTA	**121.18**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
121.18	0.00	**121.18**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR NUSTES VELASQUEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CD BELLA FLOR
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**003**
ITEM	**13.2.3**	**PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
FACHADA NORTE-KR 27 BIS									
MURO CERRAMIENTO INCLINADO		0,88		0,75		1,00	0,66	M2	
Y REJA		0,14		0,75		1,00	0,11	M2	
		0,88		1,79		1,00	1,58	M2	
		2,66		4,14		1,00	11,01	M2	
		3,82		3,94		1,00	15,05	M2	
		2,85		0,91		1,00	2,59	M2	
VIGAS		2,53		0,68		1,00	1,72	M2	
		0,75		0,67		1,00	0,50	M2	
		2,75		1,00		1,00	2,75	M2	
		0,75		0,68		1,00	0,51	M2	
		0,85		22,48		1,00	19,11	M2	
NEGRO BAJO PLACAS (VOLADIZOS)									
PISO 2/3		6,18		0,70		2,00	8,65	M2	
		7,13		0,70		2,00	9,98	M2	
		0,57		1,00		1,00	0,57	M2	
		0,53		1,00		1,00	0,53	M2	
FACHADA ORIENTAL (TERRAZA INTERNA)									
PISO 1/2		1,20		1,1		1,00	1,32	M2	
		3,20		1,03		1,00	3,30	M2	
		0,40		0,5		1,00	0,20	M2	
VIGA		3,90		0,68		1,00	2,65	M2	
TERRAZA (PISO 2) POR FUERA		1,90		1,72		1,00	3,27	M2	
		4,53		1,73		1,00	7,84	M2	
		5,71		2,4		1,00	13,70	M2	

CAPITULO	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	003
ITEM	13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
VIGA P3/CUBIERTA		3,90		0,68		2,00	5,30	M2	
VIGA CUBIERTA		10,10		0,68		1,00	6,87	M2	
NEGRO BAJO PLACAS									
PISO 2		10,10		0,70		1,00	7,07	M2	
DESCUENTO		1,03		0,3		-1,00	-0,31	M2	
PISO 3		10,10		1,03		1,00	10,40	M2	
FACHADA OCCIDENTAL ACCESO DG 73 B SUR									
NIVEL DE CALLE (PISO2)									
		1,24		2,65		1,00	3,29	M2	AREA DE UN TRAPECIO
		2,36		2,43		1,00	5,73	M2	AREA DE UN TRAPECIO
		2,08		2,42		1,00	5,03	M2	AREA DE UN TRAPECIO
		0,80		2,22		1,00	1,78	M2	AREA DE UN TRAPECIO
		0,85		2,11		1,00	1,79	M2	AREA DE UN TRAPECIO
		1,24		8,25		1,00	10,23	M2	
		3,32		8,01		1,00	26,59	M2	AREA DE UN TRAPECIO
		0,70		0,60		1,00	0,42	M2	
		3,71		6,80		1,00	25,23	M2	
		2,50		1,00		-1,00	-2,50	M2	
VANO PUERTA PRINCIPAL		0,92		2,53		2,00	4,66	M2	
VIGAS P2/P3		3,58		0,68		2,00	4,87	M2	
COSTADO IZQ PTA PPAL		1,34		6,80		1,00	9,11	M2	
		1,31		13,23		1,00	17,33	M2	
		0,92		2,65		2,00	4,88	M2	
		0,30		3,58		1,00	1,07	M2	
NEGRO BAJO PLACAS									
PISO 2		3,58		0,92		1,00	3,29	M2	

CAPITULO	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	003
ITEM	13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
FACHADA SUR KR 27A									
RECEPCION /LOBBY		1,67		6,89		1,00	11,51	M2	AREA DE UN TRAPECIO
		0,89		2,75		1,00	2,45	M2	AREA DE UN TRAPECIO
VIGA		3,86		0,68		2,00	5,25		
MURO TERRAZA EXTERIOR		8,50		2,88		1,00	24,48	M2	AREA DE UN TRAPECIO
		5,85		3,18		1,00	18,60	M2	AREA DE UN TRAPECIO
		3,65		2,8		1,00	10,22	M2	
INTERIOR TERRAZA		3,50		0,95		1,00	3,33	M2	
		8,17		0,95		1,00	7,76	M2	
		1,55		0,95		1,00	1,47	M2	
		1,21		0,95		1,00	1,15	M2	
VIGAS P2/P3		9,37		0,68		2,00	12,74	M2	
NEGRO BAJO PLACAS									
PISO 2		2,60		1,06		1,00	2,76	M2	
		1,08		1,06		1,00	0,57	M2	AREA TRIANGULO

TOTAL EJECUTADO	362,03	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	**362,03**	M2	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
362,03	0,00	**362,03**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CD BELLA FLOR
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**003**
ITEM	**13.2.4**	**PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)**	**UNIDAD**	**ML**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
FACHADA NORTE-KR 27 BIS									
			2,14			1,00	2,14	ML	
			2,80			1,00	2,80	ML	
MUROS REJAS (EXTERIOR)			2,58			1,00	2,58	ML	
			2,14			1,00	2,14	ML	
			2,10			1,00	2,10	ML	
			0,45			1,00	0,45	ML	
			0,40			1,00	0,40	ML	
PLACA PISO 2/3			2,53			1,00	2,53	ML	
VOLADIZOS 1			0,70			6,00	4,20	ML	
			5,54			3,00	16,62	ML	
			0,57			3,00	1,71	ML	
VOLADIZO 2			0,70			6,00	4,20	ML	
			6,18			3,00	18,54	ML	
			0,53			3,00	1,59	ML	
VOLADIZO 3			0,70			3,00	2,10	ML	
			7,13			3,00	21,39	ML	
			2,53			2,00	5,06	ML	
							0,00		
			0,75			1,00	0,75	ML	
			1,31			1,00	1,31	ML	

CAPITULO	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	003
ITEM	13.2.4	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UNIDAD	ML

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
FACHADA OCCIDENTAL ACCESO DG 73 B SUR			0,87			1,00	0,87	ML	
NIVEL DE CALLE (PISO2)			1,90			1,00	1,90	ML	
			3,65			1,00	3,65	ML	
			2,22			1,00	2,22	ML	
			0,63			1,00	0,63	ML	
			0,94			1,00	0,94	M2	
FACHADA SUR KR 27A									
INTERIOR TERRZA P1			3,65			1,00	3,65	ML	
			8,17			1,00	8,17	ML	
			1,91			1,00	1,91	ML	
			0,95			1,00	0,95	ML	
			0,20			1,00	0,20	ML	
			1,55			1,00	1,55	ML	
FACHADA ORIENTAL (TERRAZA INTERNA)									
PISO 1/2									
			1,20			1,00	1,20	ML	
			3,20			2,00	6,40	ML	
			0,40			1,00	0,40	ML	
VIGA									
			4,30			1,00	4,30	ML	
TERRAZA (PISO 2) POR FUERA									
			4,53			1,00	4,53	ML	
			5,71			1,00	5,71	ML	

CAPITULO	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	003
ITEM	13.2.4	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UNIDAD: ML

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
VIGA P3/CUBIERTA									
VOLADIZOS			0,70			6,00	4,20	ML	
			10,10			3,00	30,30	ML	
VIGA CUBIERTA									
TAPAS -ENTRE VOLADIZOS SUPERB.									
FACHADA NORTE-KR 27 BIS									
VOLADIZOS (P2-P3)			0,70			2,00	1,40	ML	
			5,54			1,00	5,54	ML	
			0,70			2,00	1,40	ML	
			6,18			1,00	6,18	ML	
			0,70			2,00	1,40	ML	
			7,13			1,00	7,13	ML	
FACHADA ORIENTAL									
VOLADIZOS (P2-P3)			0,70			1,00	0,70	ML	
			10,10			1,00	10,10	ML	
BORDILLO EN CUBIERTA			57,65			1,00	57,65	ML	

TOTAL EJECUTADO	267,79	ML
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	ML
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	ML
PRESENTE ACTA	**267,79**	ML

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
267,79	0,00	**267,79**

OBSERVACIONES:


FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CD BELLA FLOR
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**003**
ITEM	**13.2.7**	**PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

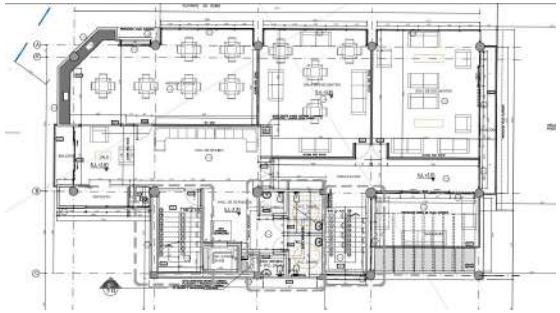








LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
PISO 3									
SALON 1		1.40	5.9			1.00	8.26	M2	
		1.40	5.49			1.00	7.69	M2	
SALON 2		1.40	5.5			1.00	7.70	M2	
		1.40	5.68			1.00	7.95	M2	
		1.40	5.97			1.00	8.36	M2	
SALON 3		1.40	4.43			1.00	6.20	M2	
		1.40	7.72			1.00	10.81	M2	
puerta		1.40	1			-1.00	-1.40	M2	
		1.40	1.09			1.00	1.53	M2	
cajon		0.60		0.82		-1.00	-0.49	M2	
arriba de cajon		0.58	4.29			1.00	2.49	M2	
arriba de cajon		0.58	2.98			1.00	1.73	M2	
		1.40	1.15			1.00	1.61	M2	
cajon		0.60		0.82		-1.00	-0.49	M2	
CAFETERIA									
arriba de cajon		0.58	1.53			1.00	0.89	M2	
		1.40	1.08			1.00	1.51	M2	

CAPITULO	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	003
ITEM	13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



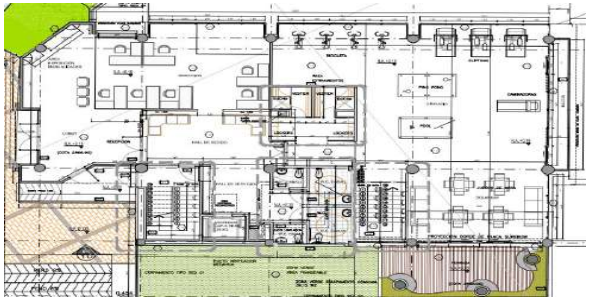

LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
PASILLO									
		1.40	4.65			1.00	6.51	M2	
		1.40	1.76			1.00	2.46	M2	
		1.40	0.31			1.00	0.43	M2	
		1.40	0.68			1.00	0.95	M2	
		1.40	3.62			1.00	5.07	M2	
puerta		1.40	1			-1.00	-1.40	M2	
		1.40	3.23			1.00	4.52	M2	
ZONA DE ANCENSOR		1.40	1.93			1.00	2.70	M2	
		1.40	2.72			1.00	3.81	M2	
puerta		1.40	1			-1.00	-1.40	M2	
puerta		1.40	0.7			-1.00	-0.98	M2	
		1.40	0.15			1.00	0.21	M2	
		1.40	2.94			1.00	4.12	M2	
puerta		1.40	1			-1.00	-1.40	M2	
		1.40	0.7			1.00	0.98	M2	
PASILLO CUBIERTA		1.40	5			1.00	7.00	M2	
		1.40	5.78			1.00	8.09	M2	
		1.40	6.06			1.00	8.48	M2	
		1.40	1.37			1.00	1.92	M2	
		1.40	1.04			1.00	1.46	M2	
		1.40	7.97			1.00	11.16	M2	
puerta		1.40	0.94			-1.00	-1.32	M2	
PISO 2									
ARCHIVO		1.40	2.89			1.00	4.05	M2	
		1.40	0.78			1.00	1.09	M2	
		1.40	3.5			1.00	4.90	M2	
		1.40	0.82			1.00	1.15	M2	
		1.40	5.64			1.00	7.90	M2	
		1.40	4.42			1.00	6.19	M2	
puerta		1.40	1			-1.00	-1.40	M2	
		1.40	2.03			1.00	2.84	M2	
		1.39	2.5			2.00	6.95	M2	
		1.40	2.4			1.00	3.36	M2	
		1.40	4.77			1.00	6.68	M2	
		1.40	4.43			1.00	6.20	M2	
		1.39	2.2			2.00	6.12	M2	

CAPITULO	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	003
ITEM	13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UNIDAD: M2


ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA









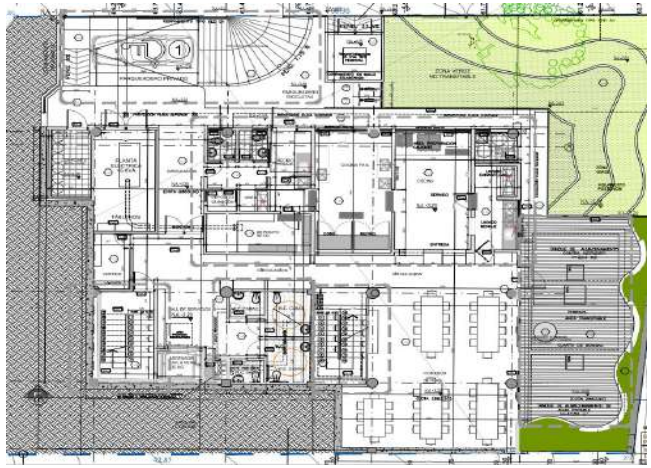

LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
		1.40	3.2			1.00	4.48	M2	
		1.40	4.28			1.00	5.99	M2	
		1.40	4.31			1.00	6.03	M2	
MUROS GYM		2.36	3.85			1.00	9.09	M2	
		2.36	6.95			1.00	16.40	M2	
PORTERIA		1.40	4.07			1.00	5.70	M2	
		1.40	5.9			1.00	8.26	M2	
puerta		1.40	1			-1.00	-1.40	M2	
		1.40	1.91			1.00	2.67	M2	
		1.40	2.72			1.00	3.81	M2	
puerta		1.40	1			-1.00	-1.40	M2	
puerta		1.40	0.7			-1.00	-0.98	M2	
		1.40	2.92			1.00	4.09	M2	
puerta		1.40	1			-1.00	-1.40	M2	
		1.40	0.82			1.00	1.15	M2	
		1.40	3.25			1.00	4.55	M2	
		1.40	1.53			1.00	2.14	M2	
PISO 1									
ENTRADA PARQUEADERO		1.40	6.75			1.00	9.45	M2	
puerta		1.40	1.02			-1.00	-1.43	M2	
		1.40	9.5			1.00	13.30	M2	
		1.40	5.63			1.00	7.88	M2	
puerta		1.40	0.89			-1.00	-1.25	M2	
		1.40	3.59			1.00	5.03	M2	
		0.60	1.1			-2.00	-1.32	M2	
puerta		1.40	1			-1.00	-1.40	M2	
COMEDOR		1.40	7.8			1.00	10.92	M2	
		1.40	1.9			1.00	2.66	M2	
		1.40	0.81			1.00	1.13	M2	
PASILLO		1.40	1.55			1.00	2.17	M2	
		1.40	4.3			1.00	6.02	M2	
puerta		1.40	1			-2.00	-2.80	M2	
		1.40	3.37			1.00	4.72	M2	
		1.40	2.75			1.00	3.85	M2	
		1.40	2.65			1.00	3.71	M2	
		0.70	0.7			-1.00	-0.49	M2	
		1.40	0.8			-1.00	-1.12	M2	
		1.40	3.92			1.00	5.49	M2	
puerta		1.40	0.8			-1.00	-1.12	M2	
		1.40	0.35			1.00	0.49	M2	
		1.40	2.37			1.00	3.32	M2	
BODEGA 1		1.40	2.27			2.00	6.36	M2	
BODEGA 2		2.17	1.58			2.00	6.86	M2	
puerta		1.00		1.4		-2.00	-2.80	M2	
		1.90	0.635			1.00	1.21	M2	TRIANGULO
		2.39	1.395			1.00	3.33	M2	PROMEDIO DE ALTURAS
		1.10	1.32			1.00	1.45	M2	
		0.66	2.05			1.00	1.35	M2	TRIANGULO
		0.12	1.4			1.00	0.17	M2	
BODEGA 3		1.40	1.19			1.00	1.67	M2	

CAPITULO	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	003
ITEM	13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

FIGURA 1





FIGURA 2









LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
		1.40	1			-1.00	-1.40	M2	
		1.40	2.34			1.00	3.28	M2	
		1.40	2.55			1.00	3.57	M2	
		0.66	2.2			1.00	1.45	M2	
		1.32	0.87			1.00	1.15	M2	
PUNTO FIJO 1									
PISO 1 A PISO 2									
FIGURA 1		1.00				1.00	3.77	M2	
		1.40	2.46			1.00	3.44	M2	
		1.40	0.55			1.00	0.77	M2	
		1.40	0.94			1.00	1.32	M2	
								M2	
PISO 2 A PISO 3								M2	
FIGURA 2						1.00	3.71	M2	
		1.40	3.45			1.00	4.83	M2	
		0.98	2.46			1.00	2.41	M2	
		0.70	1.26			1.00	0.88	M2	
		1.40	0.7			1.00	0.98	M2	
PISO 4 ENTRADA A TERRAZA		1.40	2.13			1.00	2.98	M2	
		1.00	2.13			1.00	2.13	M2	
		0.64	2.13			1.00	1.36	M2	
		1.40	1.25			1.00	1.75	M2	
								M2	
PUNTO FIJO 2								M2	
PISO 4 A PISO 3		1.40	2.74			1.00	3.84	M2	
		1.40	1.47			1.00	2.06	M2	
puerta		1.40	1			-1.00	-1.40	M2	
		1.40	1.47			1.00	2.06	M2	
		1.40	1.5			1.00	2.10	M2	
		1.40	2.47			1.00	3.46	M2	
		1.40	1.25			1.00	1.75	M2	
		1.40	2.1			1.00	2.94	M2	
		1.40	1.45			2.00	4.06	M2	
		1.40	1.44			1.00	2.02	M2	
PISO 3 A PISO 2								M2	
		1.40	2.7			1.00	3.78	M2	
		1.40	2.48			1.00	3.47	M2	
		1.40	0.85			1.00	1.19	M2	
		1.40	3.3			1.00	4.62	M2	
		1.40	1.4			1.00	1.96	M2	
		1.40	1.47			1.00	2.06	M2	
PISO 2 A PISO 1								M2	
		1.40	1.2			1.00	1.68	M2	
		1.40	2.7			1.00	3.78	M2	
		1.40	2.49			1.00	3.49	M2	
		1.40	0.9			1.00	1.26	M2	
		1.40	3.05			1.00	4.27	M2	
		1.40	1.5			2.00	4.20	M2	
		1.40	2.3			1.00	3.22	M2	
		1.40	1.47			1.00	2.06	M2	
		1.40	1.3			1.00	1.82	M2	
		1.40	1.48			1.00	2.07	M2	

CAPITULO	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	003
ITEM	13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UNIDAD: M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	MUROS CUARTO TECNICO		1.40	1.31			1.00	1.83	M2	
			1.40	1.13			1.00	1.58	M2	
	COLUMNA PORTERIA		1.36	2.36			1.00	3.21	M2	
			0.96	0.74			1.00	0.71	M2	
			0.96	1.2			1.00	1.15	M2	
	COLUMNAS GYM		1.95	2.36			1.00	4.60	M2	
			0.98	2.36			1.00	2.31	M2	
			0.94	2.36			1.00	2.22	M2	
			0.92	2.36			1.00	2.17	M2	
			0.70	2.36			1.00	1.65	M2	

TOTAL EJECUTADO	469.35	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	M2	
PRESENTE ACTA	**469.35**	M2	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
469.35	0.00	**469.35**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024	FRENTE OBRA	CD BELLA FLOR
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	31 de marzo de 2025

CAPITULO	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	003
ITEM	13.2.8	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UNIDAD	ML

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA









LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
PISO 3									
SALON 1									
puerta				1,4		1,00	1,40	ML	
SALON 2				1,4		1,00	1,40	ML	
SALON 3				1,4		1,00	1,40	ML	
				1,4		1,00	1,40	ML	
				1,4		1,00	1,40	ML	
				1,4		1,00	1,40	ML	
CAFETERIA									
puerta				1,4		1,00	1,40	ML	
PASILLO				1,4		2,00	2,80	ML	
ZONA DE ACENSOR				1,4		2,00	2,80	ML	
				1,4		3,00	4,20	ML	
				1,4		2,00	2,80	ML	
PASILLO CUBIERTA				1,4		1,00	1,40	ML	
PISO 2									
ARCHIVO				1,4		1,00	1,40	ML	
				2,5		1,00	2,50	ML	
				2,2		1,00	2,20	ML	
				1,4		3,00	4,20	ML	
PORTERIA				1,4		2,00	2,80	ML	

CAPITULO	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	003
ITEM	13.2.8	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UNIDAD	ML

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
				1,4		2,00	2,80	ML	
				1,4		3,00	4,20	ML	
				1,4		2,00	2,80	ML	
PISO 1									
ENTRADA PARQUEADERO				1,4		2,00	2,80	ML	
				1,4		2,00	2,80	ML	
				1,4		1,00	1,40	ML	
PASILLO				1,4		2,00	2,80	ML	
				1,4		2,00	2,80	ML	
				1,4		9,00	12,60	ML	
PISO 4 ENTRADA A TERRAZA									
				1,4		5,00	7,00	ML	
PUNTO FIJO 2									
PISO 4 A PISO 3				1,4		1,00	1,40	ML	
PISO 2 A PISO 1				1,4		1,00	1,40	ML	
COLUMNAS GYM				2,36		1,00	2,36	ML	
				2,36		1,00	2,36	ML	

TOTAL EJECUTADO	86,42		
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00		
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00		
PRESENTE ACTA	**86,42**		

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
86,42	0,00	**86,42**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CD BELLA FLOR
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**003**
ITEM	**14.1.2** — **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORASO FALSO EN PANEL SUPERBOARD DE 6 MM - INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA MASILLA Y ANDAMIOS CERTIFICADOS**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
FACHADA DE ACCESO A LA SEDE									
PISO 2									
BAJO PLACA SOBRE ACCESO		0.92	3.58			1.00	3.29		
PUERTA 2		1.06	2.60			1.00	2.76		
		1.08		1.06		1.00	0.57		AREA TIANGULO

TOTAL EJECUTADO	6.62	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	M2
PRESENTE ACTA	**6.62**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
6.62	0.00	**6.62**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR NUSTES VELASQUEZ **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CD BELLA FLOR
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**003**
ITEM	**14.1.4**	**TAPALUCES DE CUBIERTA EN LÁMINA DE SUPERBOARD 6 MM UNA CARA. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE Y ANDAMIO CERTIFICADO**	**UNIDAD** **ML**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
FACHADA NORTE-KR 27 BIS									
VOLADIZOS (P2-P3)			0.70			2.00	1.40	ML	
			5.54			1.00	5.54	ML	
			0.70			2.00	1.40	ML	
			6.18			1.00	6.18	ML	
			0.70			2.00	1.40	ML	
			7.13			1.00	7.13	ML	
FACHADA ORIENTAL									
VOLADIZOS (P2-P3)			0.70			1.00	0.70	ML	
			10.10			1.00	10.10	ML	
								ML	

TOTAL EJECUTADO	33.85	ML
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	ML
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	ML
PRESENTE ACTA	**33.85**	ML

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
33.85	0.00	**33.85**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR NUSTES VELASQUEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	BELLA FLOR
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9122-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**003**
ITEM	**15.2.7**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANDBLASTING COLOR OPAL SÓLIDO O TIPO PERSIANA (AMBAS CARAS)**	**UNIDAD** **M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN / LUGAR	DIMENSIÓN Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
SALA DE ENCUENTROS 2									
VENTANA PRINCIPAL		1.14		1.55		5.00	8.84	M2	
		1.14		0.73		5.00	4.16	M2	
LATERALES		0.87		1.55		2.00	2.70	M2	
		0.87		0.73		2.00	1.27	M2	
VENTANA INTERIOR									
		0.50		0.26		2.00	0.26	M2	
		0.50		1.25		2.00	1.25	M2	
		0.50		0.74		2.00	0.74	M2	

TOTAL EJECUTADO	19.22	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	M2
PRESENTE ACTA	**19.22**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
19.22	0.00	**19.22**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024	FRENTE OBRA	BELLA FLOR
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9122-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	31 de marzo de 2025

CAPITULO	CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	003
ITEM	15.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VINILO ADHESIVO TIPO SANBLASTING CORTADO EN PLOTTER INSTALADO	UNIDAD: M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL									
FIJOS		0.83		1.25		2.00	2.08	M2	
		0.83		0.73		2.00	1.21	M2	
		0.83		0.54		2.00	0.90	M2	
PUERTA DE ARCHIVO									
FIJOS		0.49		1.26		1.00	0.62	M2	
		0.49		0.74		1.00	0.36	M2	
		0.49		0.27		1.00	0.13	M2	
		1.74		0.30		1.00	0.52	M2	
PUERTA DE ARCHIVO									
HOJAS PUERTA		0.66		1.15		2.00	1.52	M2	
		0.66		0.64		2.00	0.84	M2	

TOTAL EJECUTADO	8.18	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	M2
PRESENTE ACTA	**8.18**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
8.18	0.00	**8.18**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR RUSTES VELASQUEZ RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CD BELLA FLOR
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**ITEMS NO PREVISTOS**	**ACTA No:**	**003**
ITEM	**17.1.1**	**FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO**	**UNIDAD**	**ML**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	**EN CUBIERTA POLICARBONATO**									
	SOBRE POLICARBONATO			9.00			1.00	9.00	ML	

TOTAL EJECUTADO	9.00	ML	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	ML	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	ML	
PRESENTE ACTA	**9.00**	ML	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
9.00	0.00	**9.00**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CD BELLA FLOR
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**ITEMS NO PREVISTOS**	**ACTA No:**	**003**
ITEM	**17.1.3**	**BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)**	**UNIDAD**	**ML**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	**BAJANTE PVC**									
	SOBRE POLICARBONATO			3.00			1.00	3.00	ML	
	BAJANTE									

TOTAL EJECUTADO	3.00	ML	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	ML	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	ML	
PRESENTE ACTA	**3.00**	ML	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
3.00	0.00	**3.00**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CD BELLA FLOR
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**ITEMS NO PREVISTOS**	**ACTA No:**	**003**
ITEM	**17.1.17**	**SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO**	**UNIDAD** **ML**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
FACHADA SUROCCIDENTAL KR 27A									
PERFILES VERTICALES				1.86		2.00	3.72	ML	
CERCHA DE APOYO TRANSVERSAL				2.00		1.00	2.00	ML	

TOTAL EJECUTADO	5.72	ML	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	ML	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	ML	
PRESENTE ACTA	**5.72**	ML	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
5.72	0.00	**5.72**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR NUSTES VELASQUEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CD BELLA FLOR
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**ITEMS NO PREVISTOS**		**ACTA No:**	**003**
ITEM	**17.1.18**	**SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
FACHADA SUROCCIDENTAL KR 27A									
		2.00	8.60			1.00	17.20	M2	

TOTAL EJECUTADO	17.20	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	M2
PRESENTE ACTA	**17.20**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
17.20	0.00	**17.20**

OBSERVACIONES:


FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR NUSTES VELASQUEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CD BELLA FLOR
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**ITEMS NO PREVISTOS**	**ACTA No:**	**003**
ITEM	**17.1.24.1**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA









LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
FACHADA SUROCCIDENTAL KR 27A (TERRAZA PISO 2)									
TERRAZA PISO 2		2.10	9.00			1.00	18.90		

TOTAL EJECUTADO	18.90	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	M2
PRESENTE ACTA	**18.90**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
18.90	0.00	**18.90**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR NUSTES VELASQUEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CD BELLA FLOR
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**ITEMS NO PREVISTOS**		**ACTA No:**	**003**	
ITEM	**17.1.30**	**CANAL AMAZONA**		**UNIDAD**	**ML**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	**EN CUBIERTA POLICARBONATO**									
	SOBRE POLICARBONATO			9.00			1.00	9.00	ML	
 										

TOTAL EJECUTADO	9.00	ML
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	ML
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	ML
PRESENTE ACTA	**9.00**	ML

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
9.00	0.00	**9.00**

OBSERVACIONES:


FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024	FRENTE OBRA	CD BELLA FLOR
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	31 de marzo de 2025

CAPITULO	ASEO Y DISPOSICION FINAL	ACTA No:	003
ITEM	20.1.1 ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

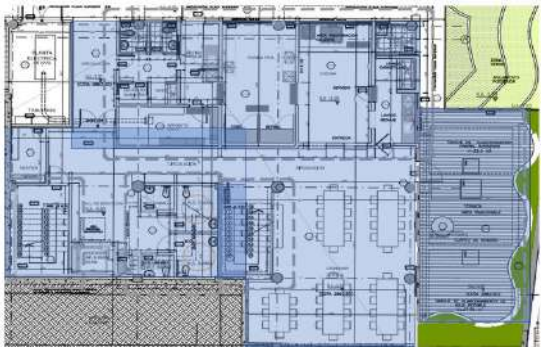








LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
PRIMER NIVEL (PISO 1)									
TERRAZA		5.30	13.81			1.00	73.19		
COMEDOR		10.64	9.35			1.00	99.48		
CIRCULACION		1.86	8.16			1.00	15.18		
SALIDA AL PATIO		2.08	5.79			1.00	12.04		
PUNTO FIJO 2		5.30	2.53			4.00	53.64		
PUNTO FIJO 1		4.34	2.45			3.00	31.90		
BAÑO 1 DAMAS		1.90	2.3			1.00	4.37	M2	
BAÑO 2 DAMAS		1.87	2.32			1.00	4.34	M2	
BAÑO 3 HOMBRES		1.16	1.46			1.00	1.69	M2	
BAÑO 4 HOMBRES		1.47	1.13			1.00	1.66	M2	
COCINA		3.40	5.31			1.00	18.05	M2	
		1.86	1.61			1.00	2.99	M2	
		0.18	0.78			1.00	0.14	M2	
		2.00	1.63			1.00	3.26	M2	
		0.18	1.08			1.00	0.19	M2	
		3.43	6.66			1.00	22.84	M2	
		1.13	1.71			1.00	1.93	M2	
		0.18	1.1			1.00	0.20	M2	
		1.98	4.68			1.00	9.27	M2	
		0.72	0.72			-1.00	-0.52	M2	
		1.75	2.55			1.00	4.46	M2	
		1.15	1.15			1.00	1.32	M2	
		2.66	1.29			1.00	3.43	M2	
		1.22	1.56			1.00	1.90	M2	

CAPITULO	ASEO Y DISPOSICION FINAL		ACTA No:	003
ITEM	20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

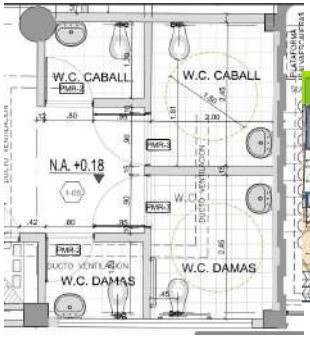
















LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
		1.80	2.36			1.00	4.25	M2	
		0.65	0.3			-1.00	-0.20	M2	
		0.99	1.24			1.00	1.23	M2	
		2.36	0.45			1.00	1.06	M2	
SEGUNDO NIVEL									
SALON DE ENSAYOS		9.00	14.64			1.00	131.76		
AREA DE ESCRITORIOS		4.21	4.11			1.00	17.30		
CIRCULACION		1.64	4.45			1.00	7.30		
HALL DE RECIBO		5.99	3.74			1.00	22.40		
HALL DE SERVICIOS		3.17	3.28			1.00	10.40		
RECEPCION		2.21	3.74			1.00	8.27		
		2.31	3.59			1.00	8.29		
		0.79	2			1.00	1.58		
DIRECCION		4.80	8.44			1.00	40.51		
		0.78	5.46			1.00	4.26		
TERRAZA		8.60	3.9			1.00	33.54		
BAÑO 1 DAMAS		1.90	2.3			1.00	4.37	M2	
BAÑO 2 DAMAS		1.87	2.32			1.00	4.34	M2	
BAÑO 3 HOMBRES		1.16	1.46			1.00	1.69	M2	
BAÑO 4 HOMBRES		1.47	1.13			1.00	1.66	M2	
PRIMEROS AUXILIOS		1.75	1.84			1.00	3.22	M2	
luminaria			0.0707			-1.00	-0.07	M2	
TERCER NIVEL									
BAÑO 1 DAMAS		1.90	2.3			1.00	4.37	M2	
BAÑO 2 DAMAS		1.87	2.32			1.00	4.34	M2	
BAÑO 3 HOMBRES		1.16	1.46			1.00	1.69	M2	
BAÑO 4 HOMBRES		1.47	1.13			1.00	1.66	M2	
CIRCULACION		5.42	1.89			1.00	10.24	M2	
		4.94	1.8			1.00	8.89		
		1.92	1.89			1.00	3.63		
		3.50	3.95			1.00	13.83	M2	
HALL DE RECIBO		5.99	3.74			1.00	22.40	M2	
HALL DE SERVICIOS		3.17	3.28			1.00	10.40	M2	

CAPITULO	ASEO Y DISPOSICION FINAL		ACTA No:	003
ITEM	20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
									M2	
	SALA DE ENCUENTROS 1		7.56	6.36			1.00	48.08		
	SALA DE ENCUENTROS 2		7.56	6.41			1.00	48.46	M2	
	ARTES Y OFICIOS		11.06	4.98			2.00	110.16	M2	
									M2	
	CUBIERTA									
	AREA AL INTERIOR DEL BORDILLO PERIMETRAL		22.26	8.78			1.00	195.44	M2	
									M2	

TOTAL EJECUTADO	1,157.74	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	M2	
PRESENTE ACTA	**1157.74**	M2	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
1157.74	0.00	**1157.74**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CD BELLA FLOR
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**NO PREVISTOS**		**ACTA No:**	**003**	
ITEM	**NP-001**	**DESMONTE, INSTALACION Y CERTIFICACION DE PUNTOS DE ANCLAJE PARA TRABAJO EN ALTURAS**		**UNIDAD**	**UND**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
   	**TERRAZA**						24.00	24.00		
	SE ADJUNTA AL ACTA PARCIAL No 3 informe de certificacion de anclajes									
	https://drive.google.com/drive/folders/1qdcWxQvgv0UV0CqqcYBVHiXeruqpcSmk?usp=sharing									

TOTAL EJECUTADO	24.00	UND
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	UND
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	UND
PRESENTE ACTA	**24.00**	UND

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
24.00	0.00	**24.00**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CASA SABIDURIA ACACIAS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**OBRAS PRELIMINARES**		**ACTA No:**	**003**
ITEM	**1.2.1**	**CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA











LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
CORTE 1									
INSTALADO ACOPIO - ANDAMIO	1,00		####			10,40	10,40	M	
INSTALADO ANDAMIO	1,00		####			11,00	11,00	M	
CORTE 2									
CERRAMIENTO CAMBIO DE ENCHAPE 3 PISO	1,00		2,93			2,93	2,93	M	
CORTE 3									
POLISOMBRA PROTECCION PAÑETE	1,00		6,00			6,00	6,00	M	

TOTAL EJECUTADO	30.33	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	24.33	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	M
PRESENTE ACTA	**6.00**	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
6,00	24,33	**30,33**

OBSERVACIONES:

RESIDENTE INTERVENTORÍA		RESIDENTE CONTRATISTA	
NOMBRE	ING. LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
FIRMA		**FIRMA**	
DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	


ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CASA SABIDURIA ACACIAS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**		**ACTA No:**	**003**
ITEM	**1.3.11**	**DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
CORTE 2									
POLICARBONATO DUCTO 1	1,00	0,70	5,50			3,85	3,85	M2	
POLICARBONATO DUCTO 2	1,00	0,70	2,13			1,49	1,49	M2	
POLICARBONATO DUCTO 3	1,00	0,70	0,60			0,42	0,42	M2	
POLICARBONATO CUBIERTA ASCENSOR	1,00	1,10	2,60			2,86	2,86	M2	
CORTE 3									
POLICARBONATO PUERTA ESCALERA Y ASCENSOR	1,00	1,00	3,80			3,80	3,80	M2	

TOTAL EJECUTADO	12,42	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	8,62	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**3.80**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
3,80	8,62	**12,42**

OBSERVACIONES:

RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**	
NOMBRE	ING. LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR NUSTES V.
FIRMA		**FIRMA**	
DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CASA SABIDURÍA ACACIAS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**003**
ITEM	**5.1.9**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO PARA INSTALACIÓN EN TECHO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)**	**UNIDAD**	**UND**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	CORTE 3									
	BODEGA BAJO ESCALERA	1,00					1,00	1,00	UND	

TOTAL EJECUTADO	1,00	UND
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UND
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UND
PRESENTE ACTA	**1.00**	UND

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
1,00	0,00	**1,00**

OBSERVACIONES:


RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**	
NOMBRE	ING. LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR NUSTES V.
FIRMA		**FIRMA**	
DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CASA SABIDURIA ACACIAS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**


CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**003**
ITEM	**5.1.72**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**	**UNIDAD**	**UND**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







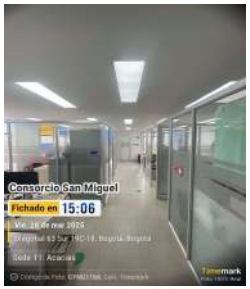

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
CORTE 3									
OFICINAS	5,00					5,00	5,00	UND	
GIMNASIO	3,00					3,00	3,00	UND	
SALON POLIVALENTE	1,00					1,00	1,00	UND	
COMEDOR	3,00					3,00	3,00	UND	
ESCALERA # 2 TERCER NIVEL	1,00					1,00	1,00	UND	

TOTAL EJECUTADO	13,00	UND
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UND
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UND
PRESENTE ACTA	**13,00**	UND

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
13,00	0,00	**13,00**

OBSERVACIONES:

RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**	
NOMBRE	ING. LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
FIRMA		**FIRMA**	
DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CASA SABIDURIA ACACIAS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**003**
ITEM	**5.1.76**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED CIRCULAR DE 18 W 8" INCRUSTAR**	**UNIDAD**	**UND**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	CORTE 3									
 	BAÑO SEGURIDAD	1,00					1,00	1,00	UND	
	BAÑO HOMBRE SEGUNDO PISO	1,00					1,00	1,00	UND	
	BAÑO MUJERES SEGUNDO PISO	1,00					1,00	1,00	UND	
	BAÑO MIXTO SEGUNDO PISO	1,00					1,00	1,00	UND	
	BAÑO HOMBRE TERCE PISO	1,00					1,00	1,00	UND	
	BAÑO MUJERES TERCER PISO	1,00					1,00	1,00	UND	
	BAÑO MIXTO 3 PISO	1,00					1,00	1,00	UND	
	BODEGA PRIMER NIVEL	1,00					1,00	1,00	UND	
	BAÑO MIXTO PRIMER PISO COCINA	1,00					1,00	1,00	UND	
	BODEGA DEBAJO ESCALERA	2,00					2,00	2,00	UND	
							TOTAL EJECUTADO	11,00	UND	
							MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UND	
							MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UND	
							PRESENTE ACTA	**11,00**	UND	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
11,00	0,00	**11,00**

OBSERVACIONES:

RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**	
NOMBRE	ING. LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
FIRMA		**FIRMA**	
DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	


ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CASA SABIDURIA ACACIAS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**003**
ITEM	**7.2.17**	**PISO EN DUROPISO 33.8 X 33.8 CMS, ANTIDESLIZANTE E= 5 MM TIPO TRAFICO PESADO**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
CORTE 1									
DURO PISO 3 GIMNASIO	1,00	6,80	7,20			48,96	48,96		
CORTE 2									
CORREDOR GIMNASIO CONTRA FACHADA	1,00	1,36	7,24			9,85	9,85		
CORTE 3									
PUERTA BODEGA	1,00	0,20	1,00			0,20	0,20		

TOTAL EJECUTADO	59,01	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	58,81	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**0.20**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
0,20	58,81	**59,01**

OBSERVACIONES:

RESIDENTE INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA**	
NOMBRE	ING. LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
FIRMA		**FIRMA**	
DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CASA SABIDURIA ACACIAS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**003**
ITEM	**7.2.40**	**GUARDAESCOBA EN DUROPISO DE 8 A 10 CM DE ALTO**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
CORTE 1									
DURO PISO 3 GIMNASIO	1,00		26,36			26,36	26,36	M	
CORTE 2									
CORREDOR GIMNASIO CONTRA FACHADA	1,00		9,49			9,49	9,49	M	
CORTE 3									
BODEGA	1,00		6,75			6,75	6,75	M	

TOTAL EJECUTADO	42.60	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	35.85	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	M
PRESENTE ACTA	**6.75**	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
6,75	35,85	**42,60**

OBSERVACIONES:

RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**	
NOMBRE	ING. LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR NUSTES V.
FIRMA		**FIRMA**	
DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024	**FRENTE OBRA**	CASA SABIDURIA ACACIAS
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**003**
ITEM	**9.3.1**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	CORTE 3									
	REJA DUCTO MURO POSTERIOR	1,00	2,50	3,00			7,50	7,50	M2	
		1,00	0,60	22,91			13,75	13,75	M2	
										

TOTAL EJECUTADO	21,25	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	**21,25**	M2	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
21,25	0,00	**21,25**

OBSERVACIONES:

RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**	
NOMBRE	ING. LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
FIRMA		**FIRMA**	
DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CASA SABIDURIA ACACIAS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**003**
ITEM	**11.1.20**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA TIPO CUPULA DE 5" A 3"**	**UNIDAD**	**UND**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
CORTE 3									
TERRAZA 3 NIVEL	1,00	1,00	1,00			2,00	2,00	UND	
TERRAZA 4 NIVEL	1,00	1,00	1,00			5,00	5,00	UND	

TOTAL EJECUTADO	7,00	UND
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UND
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UND
PRESENTE ACTA	**7.00**	UND

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
7,00	0,00	**7,00**

OBSERVACIONES:

RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**	
NOMBRE	ING. LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
FIRMA		**FIRMA**	
DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CASA SABIDURIA ACACIAS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**003**
ITEM	**13.1.2**	**PAÑETE MURO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	M2
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
CORTE 1									
COCINA ALACENAS CUARTO 3	1,00		8,42	2,84		23,91	23,91	M2	
COCINA ALACENAS CUARTO 2	1,00		9,50	2,84		26,98	26,98	M2	
CORTE 2									
COCINA ALACENAS CUARTO 1	1,00		9,72	2,84		27,60	27,60	M2	
MURO PERIMETRAL FACHADA NIVEL 1	1,00		48,86	3,55		173,45	173,45	M2	
FACHADA ACCESO ENREJADO	1,00		11,70	1,60		18,72	18,72	M2	
	1,00		13,30	1,60		21,28	21,28	M2	
CORTE 3									
FACHADA POSTERIOR	1,00		6,00	21,91		131,46	131,46	M2	
	1,00		0,30	22,91		6,87	6,87	M2	
HUECOS IPE ESTRUCTURA ASCENSOR	1,00		1,00	2,00		2,00	2,00	M2	

TOTAL EJECUTADO	432,27	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	291,94	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	**140,33**	M2	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
140,33	291,94	**432,27**

OBSERVACIONES:


RESIDENTE INTERVENTORÍA		RESIDENTE CONTRATISTA	
NOMBRE	ING. LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
FIRMA		**FIRMA**	
DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	


ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CASA SABIDURIA ACACIAS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**003**
ITEM	**13.1.7**	**ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

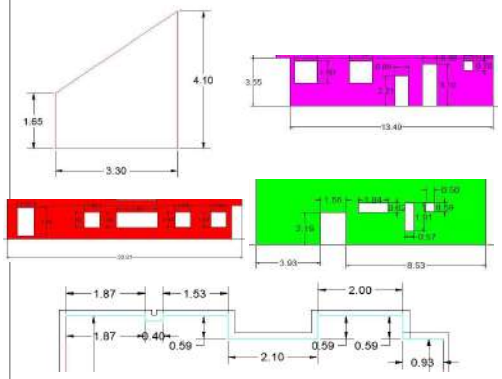





LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
CORTE 2									
MURO BAJO ESCALERA	1,00		2,31	4,1		9,47	9,47	M2	
MURO PERIMETRAL FACHADA NIVEL 1	1,00		48,86	3,55		173,45	173,45	M2	
FACHADA ACCESO ENREJADO	1,00		11,70	1,60		18,72	18,72	M2	
	1,00		13,30	1,60		21,28	21,28	M2	
CORTE 3									
MUROS AULA POLIVALENTE	1,00		10,86	2,42		26,28	26,28	M2	

TOTAL EJECUTADO	249,20	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	222,92	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**26,28**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
26,28	222,92	**249,20**

OBSERVACIONES:

RESIDENTE INTERVENTORÍA		RESIDENTE CONTRATISTA	
NOMBRE	ING. LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR NUSTES V.
FIRMA		**FIRMA**	
DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CASA SABIDURIA ACACIAS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**003**
ITEM	**13.2.1**	**VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)**	**UNIDAD**	**m2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





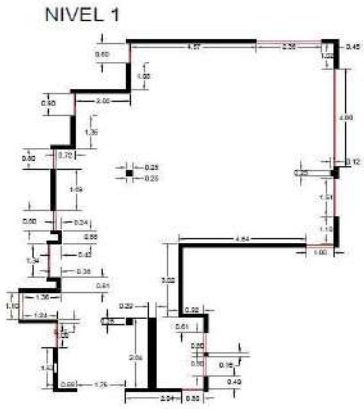






LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
CORTE 1									
GIMNASIO PISO 3	1,00		29,59	2,50		73,98	73,98	M2	
OFICINA PISO 3 - CORREDOR Y HALL	1,00		74,92	2,42		181,31	181,31	M2	
DINTELES PISO 3	1,00		28,66	0,30		8,60	8,60	M2	
NIVEL 1									
	1,00		0,69	2,83		1,95	1,95	M2	
	1,00		1,63	2,83		4,61	4,61	M2	
dintel puerta bodega	1,00		1,00	0,63		0,63	0,63	M2	
	1,00		0,15	2,83		0,42	0,42	M2	
	1,00		1,24	2,83		3,51	3,51	M2	
dintel puerta escalera	1,00		1,10	0,63		0,69	0,69	M2	
	1,00		1,36	2,83		3,85	3,85	M2	
	1,00		0,61	2,83		1,73	1,73	M2	
	1,00		0,38	2,83		1,08	1,08	M2	
	1,00		0,42	2,83		1,19	1,19	M2	
dintel puerta ascensor	1,00		1,34	0,7		0,94	0,94	M2	
	1,00		0,58	2,83		1,64	1,64	M2	
	1,00		0,24	2,83		0,68	0,68	M2	
dintel puerta baño y acceso cocina	3,00		0,80	0,63		1,51	1,51	M2	
	1,00		1,69	2,83		4,78	4,78	M2	
	1,00		0,72	2,83		2,04	2,04	M2	
	1,00		1,36	2,83		3,85	3,85	M2	
puerta ingreso bodega aseo	1,00		0,90	0,63		0,57	0,57	M2	
	1,00		2,00	2,83		5,66	5,66	M2	
	1,00		1,08	2,83		3,06	3,06	M2	
	1,00		4,57	2,83		12,93	12,93	M2	
mocheta ventana	1,00		2,35	1		2,35	2,35	M2	
	1,00		0,45	2,83		1,27	1,27	M2	
	1,00		1,02	2,83		2,89	2,89	M2	
mocheta ventana	1,00		4,00	1,3		5,20	5,20	M2	
	2,00		0,12	2,83		0,68	0,68	M2	










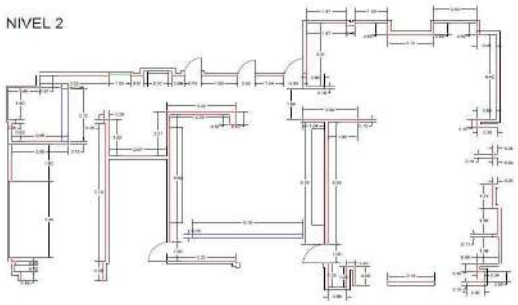

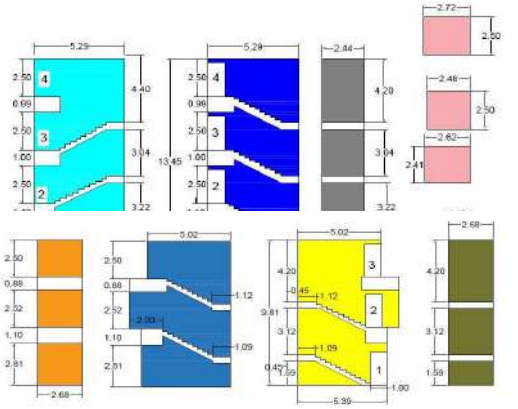

	1,00		0,25	2,83		0,71	0,71	M2	
mocheta ventana	1,00		1,51	1,3		1,96	1,96	M2	
	1,00		1,10	2,83		3,11	3,11	M2	
puerta escalera #2	1,00		1,00	0,63		0,63	0,63	M2	
	1,00		4,64	2,83		13,13	13,13	M2	
	1,00		3,02	2,83		8,55	8,55	M2	
	3,00		0,92	2,83		7,81	7,81	M2	
	1,00		0,61	2,83		1,73	1,73	M2	
puerta cuarto electrico- baño-bodega	3,00		0,80	0,63		1,51	1,51	M2	
	1,00		0,16	2,83		0,45	0,45	M2	
	1,00		0,49	2,83		1,39	1,39	M2	
	1,00		2,04	2,83		5,77	5,77	M2	
ANTE PECHOS RECEPCION 1 PISO	2,00		2,84	0,88		5,00	5,00	M2	
	1,00		2,84	0,29		0,82	0,82	M2	
COLUMNAS	8,00		0,25	2,83		5,66	5,66	M2	
MUROS CORREDOR COCINA PRIMER PISO	1,00		23,36	2,93		68,44	68,44	M2	
NIVEL 2									
DINTELES PISO 2	1,00		8,00	0,37		2,96	2,96	M2	
ANTEPECHO PISO 2	1,00		5,54	0,61		3,38	3,38	M2	
MOCHETA 1 PISO 2	1,00		2,72	0,34		0,92	0,92	M2	
MOCHETA 2 PISO 2	1,00		2,72	0,90		2,45	2,45	M2	
MOCHETA 3 PISO 2	1,00		5,15	1,13		5,82	5,82	M2	
MOCHETA 4 PISO 2	1,00		5,15	0,16		0,82	0,82	M2	
MUROS PISO 2	1,00		107,15	2,42		259,30	259,30	M2	
DINTELES BAÑOS PISO 2	2,00		3,66	0,2		1,46	1,46	M2	
PINTURA CIELO RASO ESCALERA 2 PISO	1,00		1,60	2,6		4,16	4,16	M2	
PINTURA CIELO RASO 2 PISO	1,00		4,37	10,6		46,19	46,19	M2	
NIVEL 3									
DINTEL BAÑO PISO 3	1,00		10,46	0,20		2,09	2,09	M7	
DINTEL BAÑO MUJERES PISO 3	1,00		10,32	0,2		2,06	2,06	M2	
PINTURA CIELO RASO 3 PISO	1,00		1,00	172		172,00	172,00	M2	
ESCALERA									
ESCALERA MURO 1	1,00		4,57	13,45		61,47	61,47	M2	
ESCALERA MURO 2	1,00		4,01	13,45		53,93	53,93	M2	
ESCALERA MURO 3	1,00		2,19	13,45		29,46	29,46	M2	
ESCALERA MURO 4	1,00		2,72	2,50		6,80	6,80	M2	
ESCALERA MURO 5	1,00		2,48	2,50		6,20	6,20	M2	
ESCALERA MURO 6	1,00		2,62	2,41		6,31	6,31	M2	
ESCALERA MURO 7	1,00		1,43	2,84		4,06	4,06	M2	
ESCALERA #2 MURO 1	1,00		2,13	9,81		20,90	20,90	M2	
ESCALERA #2 MURO 2	1,00		4,87	9,81		47,77	47,77	M2	
ESCALERA #2 MURO 3	1,00		4,20	9,81		41,20	41,20	M2	
ESCALERA #2 MURO 4	1,00		2,43	9,81		23,84	23,84	M2	
DESCUENTO CIELO RASOS									
CIELO RASO OFICINA PISO 3	-1,00	1,22	2,44			-2,98	-2,98	M2	
CIELO RASO OFICINA PISO 3	-1,00	1,35	0,7			-0,95	-0,95	M2	
CAMBIO CIELO RASO PISO 2	-1,00	1,22	1,22			-1,49	-1,49	M2	

	CIELO RASO PISO 1 DESMONTE POR ANCLAJE EPOXICO COLUMNETA	-1,00	1,22	1,22			-1,49	-1,49	M2	

TOTAL EJECUTADO	1.258.91	m2
MENOS ACTAS ANTERIORES	1.265.82	m2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	m2
PRESENTE ACTA	**-6.91**	m2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
-6,91	1265,82	**1258,91**

OBSERVACIONES:

RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**	
NOMBRE	ING. LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
FIRMA		**FIRMA**	
DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	


ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CASA SABIDURIA ACACIAS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**


CAPITULO	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**003**
ITEM	**13.2.3**	**PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)**		**UNIDAD**	**M2**


ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA













LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
CORTE 1									
FACHADA SUR ESCALONES	1,00		3,85	0,95		3,66	3,66	M2	
FACHADA SUR VANOS VENTANAS	1,00		62,88	0,20		12,58	12,58	M2	
FACHADA OCCIDENTAL VOLADIZO	1,00		36,99	1,00		36,99	36,99	M2	
FACHADA OCCIDENTAL VANOS VENTANAS COLOR	1,00		43,36	0,20		8,67	8,67	M2	
FACHADA OCCIDENTAL VANOS VENTANA BLANCO	1,00		13,08	0,20		2,62	2,62	M2	
MUROS FACHADA TERRAZA 3 NIVEL	1,00		12,48	4,74		59,16	59,16	M2	
	1,00		5,21	7,26		37,82	37,82	M2	
ANTEPECHO INTERNO 4 NIVEL	1,00		57,14	1,00		57,14	57,14	M2	
	1,00		57,14	0,48		27,43	27,43	M2	
ANTEPECHO INTERNO 3 NIVEL	1,00		17,05	1,00		17,05	17,05	M2	
	1,00		17,05	0,48		8,18	8,18	M2	
ASCENSOR MUROS	1,00		5,41	6,15		33,27	33,27	M2	
	1,00		1,63	0,99		1,61	1,61	M2	
	1,00		2,70	2,00		5,40	5,40	M2	
FACHADA ACCESO ENREJADO	1,00		11,70	6,00		70,20	70,20	M2	
	1,00		13,30	1,60		21,28	21,28	M2	
CORTE 2									
FACHADA SUR	1,00		11,18	12,50		139,75	139,75	M2	
FACHADA SUR VOLADIZO	1,00		14,43	1,00		14,43	14,43	M2	
FACHADA SUR ESCALONES	1,00		1,74	0,52		0,90	0,90	M2	
FACHADA NORTE	1,00		14,02	9,26		129,83	129,83	M2	



FACHADA NORTE MUROS ACCESO	2,00		1,69	2,92		9,87	9,87	M2	
FACHADA NORTE CIELO RASO ACCESO	1,00		1,57	1,69		2,65	2,65	M2	
FACHADA OCCIDENTAL	1,00		15,34	12,50		191,75	191,75	M2	
CORTE 3									
MURO POSTERIOR FACHADA	1,00		6,00	21,91		131,46	131,46	M2	
	1,00		0,30	22,91		6,87	6,87	M2	
HUECOS IPE ESTRUCTURA ASCENSOR	1,00		1,00	2,00		2,00	2,00	M2	

TOTAL EJECUTADO	1.032,57	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	892,24	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	**140,33**	M2	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
140,33	892,24	**1032,57**

OBSERVACIONES:

RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**	
NOMBRE	ING. LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
FIRMA		**FIRMA**	
DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CASA SABIDURIA ACACIAS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**003**
ITEM	**13.4.3**	**ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
CORTE 3									
PERIMETRO	1,00	1,00	9,24			9,24	9,24	M	
RIOSTRAS	3,00	1,00	0,90			2,70	2,70	M	
SOPORTES	3,00	1,00	0,48			1,44	1,44	M	

TOTAL EJECUTADO	13,38	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	**13,38**	M

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
13,38	0,00	**13,38**

OBSERVACIONES:

RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**	
NOMBRE	ING. LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR NUSTES V.
FIRMA		**FIRMA**	
DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CASA SABIDURIA ACACIAS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**		**ACTA No:**	**003**
ITEM	**17.1.1**	**FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
CORTE 2									
DUCTO 1	1,00		6,20			6,20	6,20	M	
DUCTO 2	1,00		2,13			2,13	2,13	M	
DUCTO 3	1,00		1,30			1,30	1,30	M	
CUBIERTA ESCALERA	1,00		2,60			2,60	2,60	M	
CORTE 3									
PUERTA ESCALERA Y ASCENSOR	1,00		3,80			3,80	3,80	M	

TOTAL EJECUTADO	16,03	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	12,23	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	**3.80**	M

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
3,80	12,23	**16,03**

OBSERVACIONES:

RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**	
NOMBRE	ING. LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR NUSTES V.
FIRMA		**FIRMA**	
DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	


ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CASA SABIDURIA ACACIAS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**		**ACTA No:**	**003**
ITEM	**17.1.24.1**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
CORTE 2									
DUCTO 1	1,00	0,70	5,50			3,85	3,85	M2	
DUCTO 2	1,00	0,70	2,13			1,49	1,49	M2	
DUCTO 3	1,00	0,60	0,70			0,42	0,42	M2	
CORTE 3									
POLICARBONATO PUERTA ESCALERA Y ASCENSOR	1,00	1,00	3,80			3,80	3,80	M2	

TOTAL EJECUTADO	9,56	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	5,76	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**3.80**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
3,80	5,76	**9,56**

OBSERVACIONES:

RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**	
NOMBRE	ING. LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR NUSTES V.
FIRMA		**FIRMA**	
DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CASA SABIDURIA ACACIAS
INTERVENTOR:	COMPANIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**


CAPITULO	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**	**ACTA No:**	**003**
ITEM	**20.1.1**	**ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA**	**UNIDAD**	**M2**


ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



















LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
CORTE 3									
NIVEL 1	1,00	1,00	104,56			104,56	104,56	M2	
NIVEL 2	1,00	1,00	232,23			232,23	232,23	M2	
NIVEL 3	1,00	1,00	172,00			172,00	172,00	M2	
NIVEL 4	1,00	1,00	22,30			22,30	22,30	M2	
TERRAZA 3 NIVEL	1,00	1,00	44,23			44,23	44,23	M2	
TERRAZA 4 NIVEL	1,00	1,00	206,90			206,90	206,90	M2	
ALACENA 1	1,00	1,00	5,24			5,24	5,24	M2	
ALACENA 2	1,00	1,00	5,24			5,24	5,24	M2	
ALACENA 3	1,00	1,00	4,83			4,83	4,83	M2	
ESCALERA 1	4,00	2,44	5,42			52,90	52,90	M2	
ESCALERA 2	3,00	2,70	4,90			39,69	39,69	M2	
CUBIERTA ESCALERA	1,00	2,44	5,42			13,22	13,22	M2	
VENTANAS FACHADA SUR	8,00	2,53		1,4		28,34	28,34	M2	
PUERTA ASEO	1,00	0,98		3,1		3,04	3,04	M2	
REJILLA ASEO	1,00	0,60		0,7		0,42	0,42	M2	
PUERTA COCINA	1,00	0,89		2,21		1,97	1,97	M2	
VENTANA	1,00	1,50		1,6		2,40	2,40	M2	
VENTANA	1,00	1,50		1,6		2,40	2,40	M2	
VENTANA	1,00	1,50		1,6		2,40	2,40	M2	
VENTANA	1,00	1,50		1,6		2,40	2,40	M2	
VENTANA	1,00	3,90		2,5		9,75	9,75	M2	
VENTANA	1,00	3,90		2,5		9,75	9,75	M2	
VENTANA	1,00	1,60		3,9		6,24	6,24	M2	
VENTANA	1,00	1,50		1,6		2,40	2,40	M2	
VENTANA	1,00	2,50		1,5		3,75	3,75	M2	
VENTANA	1,00	2,50		1,5		3,75	3,75	M2	
VENTANA	1,00	2,50		1,5		3,75	3,75	M2	
VENTANA	1,00	2,50		1,5		3,75	3,75	M2	
VENTANA TERRAZA 3 PISO	1,00	1,50		1,6		2,40	2,40	M2	
PUERTA TERRAZA 3 PISO	1,00	2,50		1,5		3,75	3,75	M2	
VENTANA	1,00	1,84		0,62		1,14	1,14	M2	
VENTANA	1,00	0,57		1,91		1,09	1,09	M2	
VENTANA	1,00	1,59		1,87		2,97	2,97	M2	
VENTANA	1,00	3,94		1,9		7,49	7,49	M2	
VENTANA	1,00	0,50		0,59		0,30	0,30	M2	





TOTAL EJECUTADO	1.008,99	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**1008,99**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
1008,99	0,00	**1008,99**

OBSERVACIONES:

RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**	
NOMBRE	ING. LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
FIRMA		**FIRMA**	
DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CASA SABIDURIA ACACIAS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**NO PREVISTOS**		**ACTA No:**	**003**
ITEM	**NP001**	**DESMONTE, INSTALACION Y CERTIFICACION DE PUNTOS DE ANCLAJE PARA TRABAJO EN ALTURAS**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	CORTE 3									
	SEDE ACACIAS EDIFICIO	19,00	1,00	1,00			19,00	19,00	UND	
										

TOTAL EJECUTADO	19,00	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**19,00**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
19,00	0,00	**19,00**

OBSERVACIONES:

RESIDENTE INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA	
NOMBRE	ING. LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR NUSTES V.
FIRMA		**FIRMA**	
DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CARLOS GAVIRIA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**	**ACTA No:**	**003**	
ITEM	**1.3.11**	**DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN								
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
ACTA No 1									
CANAL EXISTENTE EN PATIO POSTERIOR		1,00	15,00			1,00	15,00	M2	
FACHADA PPAL SECTOR GIMNASIO		0,90	7,00			1,00	6,30	M2	
ACTA No 2									
SOBRE CUARTO CILINDROS		1,00	1,55			1,00	1,55	M2	
ACTA No 3									
CANAL EXISTENTE EN PATIO POSTERIOR SALDO		1,00	4,15			1,00	4,15	M2	LONGITUD TOTAL ES 19,15
FACHADA PPAL SECTOR GIMNASIO		0,90	7,00			-1,00	-6,30	M2	

TOTAL EJECUTADO	20,70	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	22,85	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	**-2,15**	M2	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
-2,15	22,85	**20,70**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR NUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CARLOS GAVIRIA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**003**
ITEM	**5.1.6**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**		**UNIDAD**	**UND**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	**PASILLO PERIMETRAL**									
	INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO						2,00	2,00	UND	

TOTAL EJECUTADO	2,00	UND
MENOS ACTAS ANTERIORES		UND
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UND
PRESENTE ACTA	**2,00**	UND

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
2,00	0,00	**2,00**


OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024	FRENTE OBRA	CARLOS GAVIRIA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	31 de marzo de 2025

CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	003	
ITEM	5.1.65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UNIDAD	UND

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	PASILLO PERIMETRAL									
	SALIDA DE ILUMINACION CONTEMPLA TUBERIA Y CABLEADO, DEJANDO LA ESTRUCTURA LISTA PARA INSTALAR LA LUMINARIA									
	PASILLO COSTADO IZQUIERDO						4,00	4,00	UND	
	PASILLO FACHADA POSTERIOR (CERCA VENTANA OFICINAS)						2,00	2,00	UND	
										

TOTAL EJECUTADO	6,00	UND
MENOS ACTAS ANTERIORES		UND
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UND
PRESENTE ACTA	**6,00**	UND

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
6,00	0,00	**6,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR RUSTES V. RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CARLOS GAVIRIA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**003**
ITEM	**5.1.70**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO TORTUGA SOCKET E27. INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR 60W LUZ DÍA O EQUIVALENTE LED.**		**UNIDAD**	**UND**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	**PASILLO PERIMETRAL**									
	LUMINARIAS TIPO TORTUGA									
	PASILLO COSTADO IZQUIERDO						4,00	4,00	UND	
	PASILLO FACHADA POSTERIOR (CERCA VENTANA OFICINAS)						2,00	2,00	UND	

TOTAL EJECUTADO	6,00	UND	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UND	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UND	
PRESENTE ACTA	**6,00**	UND	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
6,00	0,00	**6,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)


Version: 01

Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CARLOS GAVIRIA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		**ACTA No:**	**003**
ITEM	**7.1.1**	**ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
ACTA No 1									
CARLOS GAVIRIA ZONA PERIMETRAL									
COSTADO IZQUIERDO		1,44	18,2			1,00	26,21	M2	
POSTERIOR		1,56	18,42			1,00	28,74	M2	
ALACENAS Y COCINA									
ALACENAS		3,95	4,65			1,00	18,37	M2	
COCINA		4,05	4,20			1,00	17,01	M2	
ACTA No 3									
AREA DE TRIÁNGULO		0,95	1,45			1,00	0,69	M2	
AREA DE RECTANGULO		1,69	5,75			1,00	9,72	M2	

TOTAL EJECUTADO	100,73	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	90,32	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**10,41**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
10,41	90,32	**100,73**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CARLOS GAVIRIA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**003**	
ITEM	**7.2.35**	**WIN DE ALUMINIO**	**UNIDAD**	**ML**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA









LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**								
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**	**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
PASILLO ACCESO A ALACENA E COCINA									
ESCALON 1			1,59			1,00	1,59	ML	
ESCALON 2			1,40			1,00	1,40	ML	
			1,40			1,00	1,40	ML	
			0,36			1,00	0,36	ML	
			0,12			1,00	0,12	ML	
			0,42			1,00	0,42	ML	
ESCALON 3			1,59			1,00	1,59	ML	
ALACENAS									
PUERTA 1			2,00			1,00	2,00	ML	
			2,00			1,00	2,00	ML	
			1,06			1,00	1,06	ML	
PUERTA 2			2,00			1,00	2,00	ML	
			2,00			1,00	2,00	ML	
			1,06			1,00	1,06	ML	
ENCHAPE PASILLO AL FRENTE DE SALIDA DE ALACENA			1,58			2,00	3,16	ML	

TOTAL EJECUTADO	20,16	ML	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	ML	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	ML	
PRESENTE ACTA	**20,16**	ML	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
20,16	0,00	**20,16**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** **PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)**	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CARLOS GAVIRIA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**003**
ITEM	**8.1.2**	**ENCHAPE 25 X 35**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
ACTA No 1									
COCINA Y ALACENAS									
DIVISORIO ENTRE ALACENAS Y ALACENA COCINA		3,45		2,8		4,00	38,64	M2	
MUROS TRANVERSAL PARALELO AL PASILLO		4,15		2,8		1,00	11,61	M2	
DESCUENTO VANOS PUERTAS		1,00		2,1		-2,00	-4,20	M2	
MURO PATIO HACIA CUARTO DE GAS		3,50		1,63		1,00	5,71	M2	
		1,90		1,63		1,00	3,10	M2	
		0,30		1,63		3,00	1,47	M2	
		3,10		1,63		1,00	5,05	M2	
ACTA No 2									
REMATE EN ANTEPECHO DE MESONES LAVAMANOS (HOMBRES Y MUJERES)		1,00				4,00	4,00	M2	
ACTA No 3									
MURO PATIO FACHADA POSTERIOR		3,44		1,60		1,00	5,50	M2	
		4,57		1,60		1,00	7,31	M2	

TOTAL EJECUTADO	62,87	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	65,38	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	-2,51	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
-2,51	65,38	**62,87**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CARLOS GAVIRIA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**003**
ITEM	**8.1.5**	**ESQUINERO PLÁSTICO**		**UNIDAD**	**ML**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





CINTA FILO (ESQUINERO) INSTALADO EN TODOS LOS FILOS DE MUROS INTERNOS Y EN FILOS DE LOS MODULOS DE ALMACENAMIENTO











LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
MODULO 1			1,01			1,00	1,01	ML	
			0,84			1,00	0,84	ML	
			0,84			6,00	5,04	ML	
			2,02			2,00	4,04	ML	
			2,07			2,00	4,14	ML	
MUDULO (2-3)			0,84			14,00	11,76	ML	
			1,93			1,00	1,93	ML	
			2,02			4,00	8,08	ML	
			2,1			2,00	4,20	ML	
MODULO (4-5)			0,84			14,00	11,76	ML	
			1,93			1,00	1,93	ML	
			2,02			4,00	8,08	ML	
			2,1			2,00	4,20	ML	
MODULO (6-7)			0,84			14,00	11,76	ML	
			1,93			1,00	1,93	ML	
			2,02			4,00	8,08	ML	
			2,1			2,00	4,20	ML	
MODULO 8			2,02			2,00	4,04	ML	
			0,84			5,00	4,20	ML	
			1,4			1,00	1,40	ML	
			2,1			1,00	2,10	ML	
ESQUINEROS MUROS INTERIORES									
ACCESO A GIMNASIO			1,90			2,00	3,80	ML	
PORTERIA			1,75			1,00	1,75	ML	
			1,60			1,00	1,60	ML	
			0,90			3,00	2,70	ML	
			0,48			1,00	0,48	ML	
			0,34			1,00	0,34	ML	
			1,88			2,00	3,76	ML	
OFICINA ADMINISTRATIVA			1,80			1,00	1,80	ML	
ACCESO A BAÑO ADM-COMEDOR			1,90			7,00	13,30	ML	
MURO COMEDOR 2			1,10			2,00	2,20	ML	
ENTRADA COMDEOR 1			1,86			2,00	3,72	ML	

TOTAL EJECUTADO	140,17	ML	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	ML	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	ML	
PRESENTE ACTA	**140,17**	ML	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
140,17	0,00	**140,17**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CARLOS GAVIRIA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**003**
ITEM	**9.2.5**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	**MODULO 1**		0,84	2,02			1,00	1,70		
	MODULO (2-3)		0,84	2,02			2,00	3,39		
	MODULO (4-5)		0,84	2,02			2,00	3,39		
	MODULO (6-7)		0,84	2,02			2,00	3,39		
	MODULO 8		0,84	2,02			1,00	1,70		
  										
										

TOTAL EJECUTADO	13,57	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	**13,57**	M2	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
13,57	0,00	**13,57**

OBSERVACIONES:


FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CARLOS GAVIRIA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**003**
ITEM	**13.1.7**	**ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA















LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
ACTA No 1									
CARLOS GAVIRIA ZONA PERIMETRAL (MURO DE LIMPIEZA) X CARRERA 18I			16,50	2,2		1,00	35,64	M2	
		0,60	16,50			1,00	9,90	M2	
BAJO TANQUE			2,16	2,10		1,00	4,54	M2	
			1,60	2,43		1,00	3,89	M2	
MODULOS DEL CERRAMIENTO FRENTE PARQ DE MOTOS		1,16		1,55		1,00	1,80	M2	
		1,20		1,65		1,00	1,98	M2	
		1,68		1,60		1,00	2,69	M2	
		2,15		1,70		1,00	3,66	M2	
ACTA No 2									
SOBRE MURO DE LADRILLO CERCA DEL CUARTO DE GAS		14,00		2,325		1,00	32,55	M2	
		0,30		2,325		4,00	2,79	M2	
		5,45		1,3		1,00	7,09	M2	
		3,50		1,05		1,00	3,68	M2	
		3,50		0,6		1,00	2,10	M2	
		5,10		0,4		1,00	2,04	M2	
ACTA No 3									
MODULO 1		0,50	2,07			4,00	4,14	M2	
		0,44	0,85			6,00	2,24	M2	
		0,42	0,85			2,00	0,71	M2	
		0,06	0,44			-6,00	-0,16	M2	
		0,08	2,07			2,00	0,33	M2	
		0,05	0,85			1,00	0,04	M2	
MODULO (2-3)		0,50	2,1			6,00	6,30	M2	
		0,45	0,84			12,00	4,54	M2	
		0,50	0,84			4,00	1,68	M2	
		0,06	0,45			-12,00	-0,32	M2	
		0,08	2,1			3,00	0,50	M2	
		0,08	0,84			2,00	0,13	M2	
MODULO (4-5)		0,50	2,1			6,00	6,30	M2	
		0,45	0,84			12,00	4,54	M2	
		0,50	0,84			4,00	1,68	M2	
		0,06	0,45			-12,00	-0,32	M2	
		0,08	2,1			3,00	0,50	M2	
		0,08	0,84			2,00	0,13	M2	
MODULO (6-7)		0,50	2,1			6,00	6,30	M2	
		0,45	0,84			12,00	4,54	M2	
		0,50	0,84			4,00	1,68	M2	
		0,06	0,45			-12,00	-0,32	M2	
		0,08	0,84			2,00	0,13	M2	
MODULO 8		0,51	2,11			2,00	2,15	M2	
		0,43	2,11			2,00	1,81	M2	
		0,04	2,11			2,00	0,17	M2	
		0,54	1,33			4,00	2,87	M2	
		0,61	1,33			2,00	1,62	M2	
		0,06	0,97			-2,00	-0,12	M2	

TOTAL EJECUTADO	168,15	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	114,33	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	**53,82**	M2	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
53,82	114,33	**168,15**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CARLOS GAVIRIA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**003**
ITEM	**13.2.1**	**VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
ACTA No 1									
MUROS INTERIORES SEDE									
PRIMEROS AUXILIOS			9,76	2,4		1,00	23,42	M2	
COMEDOR-AULA MULTIPLE			4,3	2,2		1,00	9,46	M2	
		-0,80		2,3		2,00	-3,68	M2	
			8	3,55		1,00	28,40	M2	H PROMEDIO
			3,2	2,7		1,00	8,64	M2	
			1,3	3		2,00	7,80	M2	
			0,15	3		1,00	0,45	M2	
			1,8	3		1,00	5,40	M2	
			2	3		1,00	6,00	M2	
			3,8	3		1,00	11,40	M2	
			3,33	3		1,00	9,99	M2	
			3,45	0,6		1,00	2,07	M2	
			0,15	2,3		1,00	0,35	M2	
			5,4	2,6		1,00	14,04	M2	
			0,7	3,4		1,00	2,38	M2	
			3,4	3,4		1,00	11,56	M2	
			0,8	2,6		1,00	2,08	M2	
			5,09	0,3		1,00	1,53	M2	
			2,1	1,03		1,00	2,16	M2	
			2,25	1,03		1,00	2,32	M2	
PORTERIA			1,5	2,4		1,00	3,60	M2	
			1,8	2,4		1,00	4,32	M2	
			3,36	2,4		1,00	8,06	M2	

CAPITULO	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	003
ITEM	13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
			1,47	3,1		1,00	4,56	M2	
			2,8	2,75		2,00	15,40	M2	
ACTA No 2									
CUARTO RECREATIVO (GYM)		5,60	2,1			1,00	11,48	M2	
ventana		1,08		2,2		-2,00	-4,84	M2	
		2,51	5,9			1,00	14,81	M2	
		5,60	2,97			1,00	16,63	M2	
		5,90	2,51			1,00	14,81	M2	
puerta		1,42		1,93		-1,00	-2,74	M2	
COMEDOR 1 (PEQUEÑO)		2,62	4,2			1,00	11,00	M2	
ventana		1,86		0,9		-1,00	-1,67	M2	
		2,60	4,2			1,00	10,92	M2	
puerta		2,18		1,33		-1,00	-2,90	M2	
ventana		2,31		0,99		-1,00	-2,29	M2	
		2,61	5,45			1,00	14,22	M2	
ventana		1,80		1,2		-1,00	-2,16	M2	
		2,61	5,45			1,00	14,22	M2	
		3,44		1,18		-1,00	-4,06	M2	
ACCESO A COMEDOR 2									
		0,29	4,88			1,00	1,42	M2	
		0,15	1,84			1,00	0,28	M2	
		1,24	3,01			1,00	3,73	M2	
		1,09	3,01			1,00	3,28	M2	
		0,19	2,31			2,00	0,85	M2	
COMEDOR 2 (GRANDE)									
		2,70	4,82			1,00	13,01	M2	
ventana		3,46		1,34		-1,00	-4,64	M2	
		1,65	2,9			1,00	4,79	M2	
ventana		1,31		0,96		-1,00	-1,26	M2	

CAPITULO	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	003
ITEM	13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA








LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
		3,28	3			1,00	9,84	M2	
		0,64	3,37			1,00	2,16	M2	
		1,28	5,47			2,00	14,00	M2	
		0,70	3,37			1,00	2,36	M2	
		3,38	6,28			1,00	21,20	M2	
		2,90	4,23			1,00	12,27	M2	
puerta		2,21		0,89		-1,00	-1,97	M2	
puerta		2,21		1,05		-1,00	-2,32	M2	
		3,16	3,42			1,00	10,79	M2	
ventana		2,23		0,9		-1,00	-2,01	M2	
		0,15	2,61			1,00	0,39	M2	
BAÑO ADMINISTRATIVO									
		0,14	5,56			1,00	0,78	M2	
		1,58	2,5			1,00	3,95	M2	
puerta		0,65		2,22		-1,00	-1,44	M2	
		1,58	2,5			1,00	3,95	M2	
puerta		0,90		2,22		-1,00	-2,00	M2	
		1,60	2,5			1,00	4,00	M2	
		0,90		2,3		-1,00	-2,07	M2	
		1,60	2,5			1,00	4,00	M2	
		3,40	5,72			1,00	19,45	M2	
ventana		1,45		1,2		-1,00	-1,74	M2	
ZONA DE ENTRADA PASILLO ENTRADA									
		1,33	3,15			1,00	4,19	M2	
		3,28	1,74			1,00	5,71	M2	
		3,17	0,75			1,00	2,37	M2	
		1,49	2,15			1,00	3,19	M2	
		1,55	0,92			1,00	1,43	M2	
		2,87	3,4			1,00	9,76	M2	

CAPITULO	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	003
ITEM	13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UNIDAD	M2

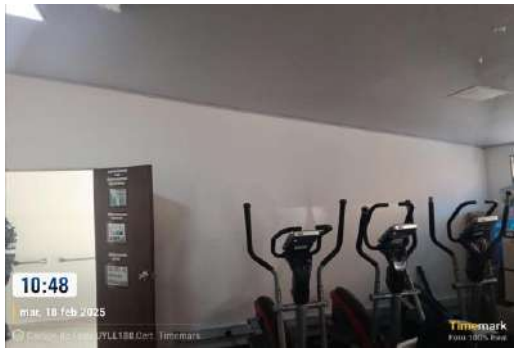ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	ventana		1,90		1,42		-1,00	-2,70	M2	
			0,21	5,22			1,00	1,10	M2	
			1,28	2,36			1,00	3,02	M2	
	ventana		1,90		0,95		-1,00	-1,81	M2	
			2,63	2,8			1,00	7,36	M2	
			2,24	0,92			1,00	2,06	M2	
			2,24	1,07			1,00	2,40	M2	
	VIGILANCIA									
			1,75	2,26			1,00	3,96	M2	
			1,46	2,26			1,00	3,30	M2	
			4,97	0,27			1,00	1,34	M2	
			0,36	3,07			1,00	1,11	M2	
			0,63	2,26			1,00	1,42	M2	
			1,01	2,26			1,00	2,28	M2	
	ventana		2,20		0,85		-1,00	-1,87	M2	
			2,04	2,26			1,00	4,61	M2	
			2,18	2,26			1,00	4,93	M2	
	ventana		2,20		0,83		-1,00	-1,83	M2	
	ventana		2,17		0,83		-1,00	-1,80	M2	
										
	OFICINA ADMINISTRATIVA									
			1,74	2,47			1,00	4,30	M2	
			4,42	2,47			1,00	10,92	M2	
			2,18	4,13			1,00	8,98	M2	
			2,08	5,6			1,00	11,65	M2	
			2,00		1,1		-1,00	-2,20	M2	

CAPITULO	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	003
ITEM	13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UNIDAD M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
		2,00		1,1		-1,00	-2,20	M2	
		2,18	4,13			1,00	8,98	M2	
		1,74	2,47			1,00	4,30	M2	
		1,17	2,47			1,00	2,89	M2	
		2,16		0,93		-1,00	-2,01	M2	
ACTA No 3									
MUROS SHUT		1,42	1,92			1,00	2,73	M2	
		0,82	1,05			1,00	0,86	M2	
		1,53	2,1			1,00	3,21	M2	
		1,40	0,38			1,00	0,53	M2	
		0,24	1,7			1,00	0,41	M2	

TOTAL EJECUTADO	313,37	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	305,63	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	**7,74**	M2	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
7,74	305,63	**313,37**

OBSERVACIONES:


FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CARLOS GAVIRIA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**003**
ITEM	**13.2.3**	**PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA






















LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
ACTA No 1									
MODULOS DEL CERRAMIENTO FRENTE PARQ DE MOTOS		1,16		1,55		1,00	1,80	M2	
		1,20		1,65		1,00	1,98	M2	
		1,68		1,6		1,00	2,69	M2	
		2,15		1,7		1,00	3,66	M2	
MURO LADRILLO FACHADA POSTERIOR		14,00		2,325		1,00	32,55	M2	
(MURO DE LIMPIEZA) X CARRERA 18I			16,50	2,2		1,00	35,64	M2	
		0,60	16,5			1,00	9,90	M2	
BAJO TANQUE			2,16	2,1		1,00	4,54	M2	
			1,6	2,43		1,00	3,89	M2	
			3,5		1,05	1,00	3,68	M2	
			3,5		0,60	1,00	2,10	M2	
			5,1		0,40	1,00	2,04	M2	
			5,45		1,30	1,00	7,09	M2	
ACTA No 3									
PASILLO ZONA INGRESO A ALACENAS E COCINA		1,37	4,38			1,00	6,00	M2	
		0,45	2,70			-1,00	-1,22	M2	
		0,45	1,00			-1,00	-0,45	M2	
		2,62	4,15			1,00	10,87	M2	
		2,63		1,35		-1,00	-3,55	M2	
		1,32		0,50		-1,00	-0,66	M2	
		2,23	3,20			1,00	7,14	M2	
		0,29	0,30			1,00	0,09	M2	
		1,09		2,81		-1,00	-3,06	M2	
		2,03	6,15			1,00	12,48	M2	
		2,00		1,09		-2,00	-4,36	M2	
PASILLO AL FRENTE MURO DE LIMPIEZA		2,35	16,48			1,00	38,73	M2	
		2,00		0,54		-1,00	-1,08	M2	
		1,33		0,54		-1,00	-0,72	M2	
		0,78		0,54		-1,00	-0,42	M2	
		1,30	16,48			1,00	21,42	M2	
INGRESO PARQUEADERO		4,85	2,15			1,00	10,43	M2	
		2,25		1,10		-2,00	-4,95	M2	
		0,75	2,15			1,00	1,61	M2	
KORASA MURO LIMPIEZA		1,97	18,05			1,00	35,56	M2	
		0,30	1,77			1,00	0,53	M2	
		1,88	1,66			1,00	3,12	M2	
MUROS PARQUEADERO (LLORADERO)		1,60	1,19			1,00	1,90	M2	
		1,40	1,07			1,00	1,50	M2	
		1,80	1,68			1,00	3,02	M2	
		1,68	2,05			1,00	3,44	M2	
FACHADA PRINCIPAL Y FACHADA PARQUE		3,85	4,27			1,00	16,44	M2	
		3,53	1,26			1,00	4,45	M2	
		1,98		0,94		-1,00	-1,86	M2	
		4,28	6,00			1,00	25,65	M2	
		3,45		1,20		-1,00	-4,14	M2	
		4,25	6,33			1,00	26,88	M2	
		3,20		0,35		-1,00	-1,12	M2	
		3,36	4,87			1,00	16,36	M2	
		2,40		1,00		-1,00	-2,40	M2	
		1,35		1,21		-1,00	-1,63	M2	
		3,12	4,79			1,00	14,92	M2	
		3,46		1,35		-1,00	-4,67	M2	
		3,40	2,50			1,00	8,50	M2	
		1,32		0,97		-1,00	-1,28	M2	
		1,89		0,95		-1,00	-1,80	M2	
		2,47	2,69			1,00	6,63	M2	
MUROS POSTERIOR CONTRA VECINO		4,25	3,60			1,00	15,30	M2	
		2,20	0,24			1,00	0,53	M2	
		3,20	0,08			1,00	0,26	M2	
		5,15	0,27			1,00	1,39	M2	
		3,24	2,24			1,00	7,26	M2	
		2,24	0,36			1,00	0,81	M2	
		3,24	0,35			1,00	1,13	M2	
		3,24	1,15			1,00	3,73	M2	

CAPITULO	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	003
ITEM	13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UNIDAD M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
			3,48	0,41			1,00	1,43	M2	
			2,31	0,24			1,00	0,55	M2	
			3,48	0,80			1,00	2,78	M2	
			7,04	2,32			1,00	16,33	M2	
			5,15	1,02			1,00	5,25	M2	
			3,30	0,08			1,00	0,26	M2	
			2,32	0,67			1,00	1,55	M2	
	DESCUENTO ENCHAPE		4,60	1,60			-1,00	-7,36	M2	

TOTAL EJECUTADO	289,53	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	111,54	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	**177,99**	M2	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
177,99	111,54	**289,53**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA	FIRMA	ING JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CARLOS GAVIRIA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**003**
ITEM	**13.2.4**	**PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)**		**UNIDAD**	**ML**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	**PASILLO ZONA INGRESO A ALACENAS E COCINA**			6,3			1,00	6,30	ML	
				1,6			1,00	1,60	ML	
				2,63			1,00	2,63	ML	
				2,63			1,00	2,63	ML	
				1,35			1,00	1,35	ML	
				1,35			1,00	1,35	ML	
				2,04			1,00	2,04	ML	
				1			1,00	1,00	ML	
				2,16			1,00	2,16	ML	
				2,81			1,00	2,81	ML	
				2,81			1,00	2,81	ML	
				8			1,00	8,00	ML	
				4,36			1,00	4,36	ML	
	PASILLO AL FRENTE MURO DE LIMPIEZA			0,78			2,00	1,56	ML	
				0,54			2,00	1,08	ML	
				1,33			2,00	2,66	ML	
				0,54			2,00	1,08	ML	
				2			2,00	4,00	ML	
				0,54			2,00	1,08	ML	
	INGRESO PARQUEADERO			2,31			1,00	2,31	ML	
				2,26			1,00	2,26	ML	
				2,15			1,00	2,15	ML	
				2,25			2,00	4,50	ML	
				2,2			2,00	4,40	ML	
	MUROS PARQUEADERO (LLORADERO)			1,04			1,00	1,04	ML	
				1,6			1,00	1,60	ML	
				1,19			3,00	3,57	ML	
				1,4			1,00	1,40	ML	
				1,7			3,00	5,10	ML	
				1,88			1,00	1,88	ML	
				1,68			3,00	5,04	ML	
				1,68			1,00	1,68	ML	
				2,05			1,00	2,05	ML	
	**FACHADA PRINCIPAL Y PARQUE**			3,45			2,00	6,90	ML	
				1,2			2,00	2,40	ML	
				3,2			2,00	6,40	ML	
				0,35			2,00	0,70	ML	
				3,15			1,00	3,15	ML	
				2			1,00	2,00	ML	
				1,21			2,00	2,42	ML	
				1,35			2,00	2,70	ML	
				3,57			1,00	3,57	ML	
				3,15			1,00	3,15	ML	
				3,46			2,00	6,92	ML	
				1,35			2,00	2,70	ML	
				4,79			2,00	9,58	ML	
				1,32			2,00	2,64	ML	
				0,97			2,00	1,94	ML	
				1,89			1,00	1,89	ML	
				0,95			1,00	0,95	ML	
				1,24			1,00	1,24	ML	

OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.	FECHA	31 de marzo de 2025

CAPITULO	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	003
ITEM	13.2.4	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UNIDAD	ML

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
 	MATERAS 1 LADO 1			2,08			2,00	4,16	ML	
	MATERIA 1 LADO 2			2,78			2,00	5,56	ML	
	MATERA 1 LADO 3			2,14			2,00	4,28	ML	
	MATERA 1 LADO 4			2,8			2,00	5,60	ML	
	MATERA 2 LADO 1			2,24			2,00	4,48	ML	
	MATERA 2 LADO 2			5,36			2,00	10,72	ML	
	MATERA 2 LADO 3			3			2,00	6,00	ML	
							TOTAL EJECUTADO	191,53	ML	
							MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	ML	
							MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	ML	
							PRESENTE ACTA	191,53	ML	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
191,53	0,00	**191,53**

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	LUIS OSWALDO CAMPAÑA RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CARLOS GAVIRIA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**003**	
ITEM	**13.2.7**	**PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	**ACTA No 2**									
	ENFERMERIA		1,35	2,28			1,00	3,08	M2	
			2,32	2,28			1,00	5,29	M2	
			1,80	2,28			1,00	4,10	M2	
			2,85	2,46			1,00	7,01	M2	
	ventana		2,63		1,35		-1,00	-3,55	M2	
			0,18	2,06			1,00	0,37	M2	
			0,08	1,35			1,00	0,11	M2	
			0,08	2,63			1,00	0,21	M2	
	**COMEDOR 2 (GRANDE)**		1,40	4,82			1,00	6,75	M2	
			3,46		0,48		-1,00	-1,66	M2	
			1,40	1,65			1,00	2,31	M2	
			0,96		0,48		-1,00	-0,46	M2	
			1,40	3			1,00	4,20	M2	
			1,40	0,64			1,00	0,90	M2	
			1,40	0,7			1,00	0,98	M2	
			1,40	6,28			1,00	8,79	M2	
			1,40	4,23			1,00	5,92	M2	
			0,89		1,4		-1,00	-1,25	M2	
			1,05		1,4		-1,00	-1,47	M2	
			1,40	3,42			1,00	4,79	M2	
			0,90		1,4		-1,00	-1,26	M2	
			1,40	5,72			1,00	8,01	M2	
			1,20		1,45		-1,00	-1,74	M2	

CAPITULO	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	003
ITEM	13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	BAÑO ADMINISTRATIVO		0,14	2,8			1,00	0,39	M2	
			1,40	1,58			1,00	2,21	M2	
			0,65		1,4		-1,00	-0,91	M2	
			1,40	1,58			1,00	2,21	M2	
			0,90		1,4		-1,00	-1,26	M2	
			1,40	1,6			1,00	2,24	M2	
			0,90		1,4		-1,00	-1,26	M2	
			1,40	1,6			1,00	2,24	M2	
	PASILLO ZONA ENTRADA		1,40	1,33			1,00	1,86	M2	
			1,40	1,74			1,00	2,44	M2	
			1,40	0,75			1,00	1,05	M2	
			1,40	0,92			1,00	1,29	M2	
			1,40	3,4			1,00	4,76	M2	
			1,40		1,42		-1,00	-1,99	M2	
			0,21	6,87			1,00	1,44	M2	
			1,40	1,28			1,00	1,79	M2	
			1,40		0,95		-1,00	-1,33	M2	
			1,40	2,8			1,00	3,92	M2	
			2,24	0,92			1,00	2,06	M2	
			2,24	1,07			1,00	2,40	M2	
	VIGILANCIA		1,40	1,75			1,00	2,45	M2	
			1,40	1,46			1,00	2,04	M2	
			1,40	0,63			1,00	0,88	M2	
			1,40	1,01			1,00	1,41	M2	
			1,40		0,85		-1,00	-1,19	M2	
			1,40	2,04			1,00	2,86	M2	
			1,40	2,18			1,00	3,05	M2	
			1,40		0,83		-2,00	-2,32	M2	

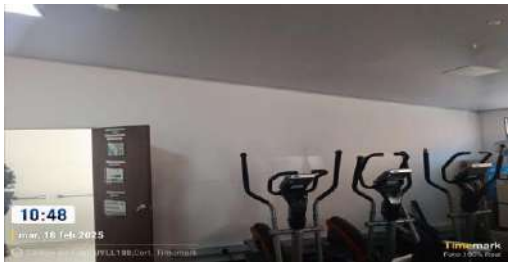



CAPITULO	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	003
ITEM	13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	OFICINA ADMINISTRATIVA		1,40	1,74			1,00	2,44	M2	
			1,40	4,42			1,00	6,19	M2	
			1,40	4,13			1,00	5,78	M2	
			1,40	5,6			1,00	7,84	M2	
			2,00		0,73		-2,00	-2,92	M2	
			1,40	4,13			1,00	5,78	M2	
			1,40	1,74			1,00	2,44	M2	
			1,40	1,17			1,00	1,64	M2	
			1,40		0,93		-1,00	-1,30	M2	
	GYM		5,60	1,2			1,00	6,72	M2	
			2,24		0,57		-2,00	-2,55	M2	
			1,21	5,6			1,00	6,78	M2	
			1,21	5,9			2,00	14,28	M2	
			1,42		1,21		-1,00	-1,72	M2	
	COMEDOR 1 (PEQUEÑO)		1,40	4,2			1,00	5,88	M2	
			1,40		0,9		-1,00	-1,26	M2	
			1,40	4,2			1,00	5,88	M2	
			2,18		0,43		-1,00	-0,94	M2	
			1,40		0,99		-1,00	-1,39	M2	
			1,40	5,45			1,00	7,63	M2	
			1,40		1,2		-1,00	-1,68	M2	
			1,40	5,45			1,00	7,63	M2	
			3,44		0,55		-1,00	-1,89	M2	
	ACCESO A COMEDOR 2									
			0,29	4,88			1,00	1,42	M2	
			0,15	1,84			1,00	0,28	M2	
			1,24	3,01			1,00	3,73	M2	
			1,09	3,01			1,00	3,28	M2	
			0,19	2,31			2,00	0,85	M2	

CAPITULO	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	003
ITEM	13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UNIDAD M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
ACTA No 3									
MURO AL FRENTE COCINA		1,42	1,16			1,00	1,65	M2	
		1,42	3,21			1,00	4,56	M2	
		0,62	0,43			-1,00	-0,27	M2	
		1,42	3,19			1,00	4,53	M2	
		0,91	0,2			-1,00	-0,18	M2	
		1,42	3,22			1,00	4,57	M2	
		1,42	1,29			1,00	1,83	M2	
		1,42	1,4			1,00	1,99	M2	
PASILLO MURO PARA ACCESO A ALACENAS E COCINA		4,82	1,42			1,00	6,84	M2	
		2,63		0,36		-1,00	-0,95	M2	
		2,82	0,89			1,00	2,51	M2	
		6,18	1,41			1,00	8,71	M2	
		2,00		0,72		-2,00	-2,88	M2	
		1,42	16,48			1,00	23,40	M2	
		1,42	18,05			1,00	25,63	M2	
MURO LIMPIEZA		1,42	18,05			1,00	25,63	M2	
		1,42	1,66			1,00	2,36	M2	
MODULO 1		0,50	2,07			4,00	4,14	M2	
		0,44	0,85			6,00	2,24	M2	
		0,42	0,85			2,00	0,71	M2	
		0,06	0,44			-6,00	-0,16	M2	
		0,08	2,07			2,00	0,33	M2	
		0,05	0,85			1,00	0,04	M2	
MODULO (2-3)		0,50	2,1			6,00	6,30	M2	
		0,45	0,84			12,00	4,54	M2	
		0,50	0,84			4,00	1,68	M2	
		0,06	0,45			-12,00	-0,32	M2	
		0,08	2,1			3,00	0,50	M2	
		0,08	0,84			2,00	0,13	M2	

CAPITULO	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	003
ITEM	13.2.7 PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
MODULO (4-5)		0,50	2,1			6,00	6,30	M2	
		0,45	0,84			12,00	4,54	M2	
		0,50	0,84			4,00	1,68	M2	
		0,06	0,45			-12,00	-0,32	M2	
		0,08	2,1			3,00	0,50	M2	
		0,08	0,84			2,00	0,13	M2	
MODULO (6-7)		0,50	2,1			6,00	6,30	M2	
		0,45	0,84			12,00	4,54	M2	
		0,50	0,84			4,00	1,68	M2	
		0,06	0,45			-12,00	-0,32	M2	
		0,08	0,84			2,00	0,13	M2	
		0,08	2,1			3,00	0,50	M2	
MODULO 8		0,51	2,11			2,00	2,15	M2	
		0,43	2,11			2,00	1,81	M2	
		0,04	2,11			2,00	0,17	M2	
		0,54	1,33			4,00	2,87	M2	
		0,61	1,33			2,00	1,62	M2	
		0,06	0,97			-2,00	-0,12	M2	

TOTAL EJECUTADO	331,23	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	166,97	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	**164,26**	M2	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
164,26	166,97	**331,23**



OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CARLOS GAVIRIA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**003**
ITEM	**13.2.8**	**PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)**	**UNIDAD**	**ML**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	**MURO FACHADA POSTERIOR**			1,42			3,00	4,26	ML	
	COLUMNAS			1,42			3,00	4,26	ML	
	COLUMNAS			1,42			3,00	4,26	ML	
	COLUMNAS			1,42			3,00	4,26	ML	
	COLUMNAS			1,42			3,00	4,26	ML	
	PASILLO MURO PARA ACCESO A ALACENAS E COCINA			0,36			2,00	0,72	ML	
				2,63			1,00	2,63	ML	
				2,82			1,00	2,82	ML	
				0,11			1,00	0,11	ML	
				0,72			1,00	0,72	ML	
				4			1,00	4,00	ML	
				0,71			4,00	2,84	ML	
	BAJANTES 1			2,03			1,00	2,03	ML	
	BAJANTES 2			2,67			1,00	2,67	ML	
										
	MODULOS ALMACENAMIENTO									
	MODULO 1			2,07			2,00	4,14	ML	
	TAPA			0,85			1,00	0,85	ML	
	ENTREPAÑOS			0,84			3,00	2,52	ML	
	MODULO (2-3)			2,10			3,00	6,30	ML	
	TAPAS Y ENTREPAÑOS			0,84			8,00	6,72	ML	

CAPITULO	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	003
ITEM	13.2.8 PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UNIDAD	ML

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA









LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
MODULO (4-5)			2,1			3,00	6,30	ML	
TAPAS Y ENTREPAÑOS			0,84			8,00	6,72	ML	
MODULO (6-7)			2,1			3,00	6,30	ML	
TAPAS Y ENTREPAÑOS			0,84			8,00	6,72	ML	
MODULO 8			2,11			1,00	2,11	ML	
			2,02			2,00	4,04	ML	
			0,84			3,00	2,52	ML	

TOTAL EJECUTADO	95,08	ML	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	ML	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	ML	
PRESENTE ACTA	**95,08**	ML	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
95,08	0,00	**95,08**

OBSERVACIONES:


FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CARLOS GAVIRIA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**003**
ITEM	**13.2.9**	**SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA PISO TRÁFICO PESADO**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
SOBREPISO ACCESO A PERIMETRAL									
AREA DE TRIÁNGULO		0,95	1,45			1,00	0,69	M2	
AREA DE RECTANGULO		1,69	5,75			1,00	9,72	M2	

TOTAL EJECUTADO	10,41	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**10,41**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
10,41	0,00	**10,41**

OBSERVACIONES:


FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE		**NOMBRE**	
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CARLOS GAVIRIA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**003**
ITEM	**13.4.1**	**ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS A DOS MANOS Y DOS CARAS**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

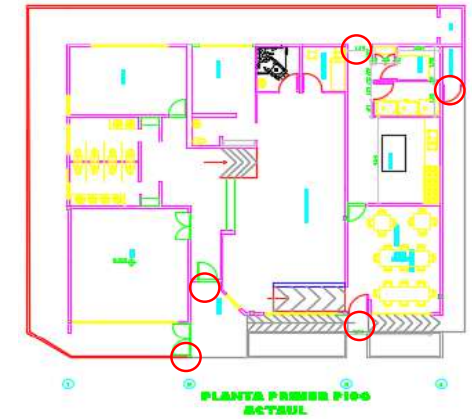





LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
PUERTAS METALICAS									
EXTERIORES									
PUERTA ACCESO PARQUEADERO		1,63		2,3		1,00	3,75	M2	
PUERTA INGRESO PRINCIPAL		0,95		2,00		1,00	1,90	M2	
PUERTA SHUT		0,94		1,98		1,00	1,86	M2	
PUERTA SALIDA COCINA		0,99		2,03		1,00	2,01	M2	
PUERTA INGRESO A COCINA DESDE FACHADA		0,96		2,4		1,00	2,30	M2	

CAPITULO		PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	003
ITEM	13.4.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS A DOS MANOS Y DOS CARAS	UNIDAD	M2


ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				

TOTAL EJECUTADO	11,82	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	**11,82**	M2	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
11,82	0,00	**11,82**

OBSERVACIONES:

1

FIRMA		FIRMA	
	LUIS OSWALDO CAMPAÑA		ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)


Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CARLOS GAVIRIA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**003**
ITEM	**13.4.2**	**ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

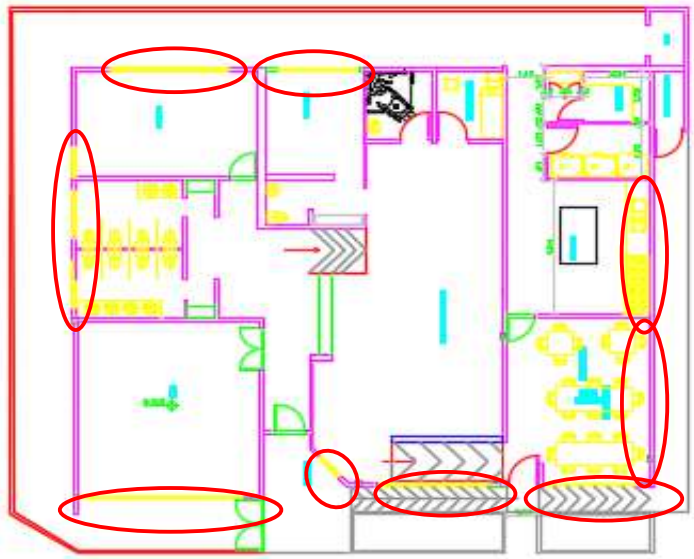



LOCALIZACIÓN / LUGAR	DIMENSIÓN Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
REJAS DE FACHADA PRINCIPAL (negro)									
			1,06	1,41		1,00	1,49	M2	
			3,55	1,45		1,00	5,15	M2	
			2,29	1,45		1,00	3,32	M2	
REJAS DE FACHADA PARQUE									
			3,55	1,29		1,00	4,58	M2	
			3,27	0,44		1,00	1,44	M2	
REJA ENTRADA INTERNA SHUT (BLANCO)									
			1,53	2,8		1,00	4,28	M2	
VENTANAS PASILLO ENTRADA A ALACENA Y COCINA (GRISPLATA)									
V-1			2,70	0,49		1,00	1,32	M2	
V-2			2,63	1,34		1,00	3,52	M2	
V-3			1,31	0,49		1,00	0,64	M2	
V-4			2,81	1,09		1,00	3,06	M2	
V-5			1,99	1,10		1,00	2,19	M2	
V-6			2,01	1,10		1,00	2,21	M2	
VENTANAS BAÑOS									
V-7			0,78	0,54		1,00	0,42	M2	
V-8			1,33	0,54		1,00	0,72	M2	

CAPITULO	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	003
ITEM	13.4.2 — ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
V-9			1,98	0,54		1,00	1,07	M2	
V-10 OFICINA			2,26	1,10		1,00	2,49	M2	
V-11 OFICINA			2,25	1,10		1,00	2,48	M2	
VENTANAS FACHADA PRINCIPAL									
V-1			2,26	1,10		1,00	2,49	M2	
V-2			2,25	1,10		1,00	2,48	M2	
V-3			3,18	0,35		1,00	1,11	M2	
V-4			3,45	1,20		1,00	4,14	M2	
V-5			2,2	1,35		1,00	2,97	M2	
VENTANAS FACHADA PARQUE									
V-6			3,45	1,35		1,00	4,66	M2	
V-7			0,97	1,33		1,00	1,29	M2	

TOTAL EJECUTADO	59,52	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	**59,52**	M2	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
59,52	0,00	**59,52**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA

CAPITULO	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	003
ITEM	13.4.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
FIRMA		FIRMA								

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CARLOS GAVIRIA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**003**	
ITEM	**13.4.4**	**ESMALTE SOBRE CANAL METÁLICA EN ACERO GALVANIZADO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
  	**FACHADA PPAL**									
	VIGACANAL-AREA COMEDORES		0,55	12,22			1,00	6,72	M2	
	AREA GIMNASIO		0,55	5,60			1,00	3,08	M2	

TOTAL EJECUTADO	9,80	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	**9,80**	M2	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
9,80	0,00	**9,80**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CARLOS GAVIRIA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	**ACTA No:**	**003**	
ITEM	**14.1.5**	**MURO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO (Incluyendo todo lo necesario para su correcta instalación)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
MODULO 1		0,50	2,07			2,00	2,07	M2	
		0,55	0,85			3,00	1,40	M2	
		0,85	0,42			1,00	0,36	M2	
		0,06	0,44			-6,00	-0,16	M2	
MODULO (2-3)		0,50	2,1			3,00	3,15	M2	
		0,45	0,84			6,00	2,27	M2	
		0,50	0,84			2,00	0,84	M2	
		0,06	0,44			-12,00	-0,32	M2	
MODULO (4-5)		0,50	2,1			3,00	3,15	M2	
		0,45	0,84			6,00	2,27	M2	
		0,50	0,84			2,00	0,84	M2	
		0,06	0,44			-12,00	-0,32	M2	
MODULO (6-7)		0,50	2,1			3,00	3,15	M2	
		0,45	0,84			6,00	2,27	M2	
		0,50	0,84			2,00	0,84	M2	
		0,06	0,44			-12,00	-0,32	M2	

CAPITULO	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	003
ITEM	14.1.5	MURO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO (Incluyendo todo lo necesario para su correcta instalación)	UNIDAD M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
 	MODULO 8		0,61	2,11			1,00	1,29	M2	
			0,43	2,11			1,00	0,91	M2	
			0,04	2,11			1,00	0,08	M2	
			0,54	1,33			2,00	1,44	M2	
			0,61	1,33			1,00	0,81	M2	
			0,06	0,97			-2,00	-0,12	M2	

TOTAL EJECUTADO	25,90	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	**25,90**	M2	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
25,90	0,00	**25,90**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CARLOS GAVIRIA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	**ACTA No:**	**003**	
ITEM	**17.1.1**	**FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA









LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
CUBIERTA PASILLO MURO DE LIMPIEZA			16,12			2,00	32,24	ML	
REMATE DE CUBIERTA A PLACA DE TANQUE			1,45			1,00	1,45	ML	
REMATE DE CUBIERTA A PLACA DE TANQUE			1,86			1,00	1,86	ML	
PASILLO ENTRADA A ALACENA y COCINA (fachada posterior contra muro vecino)			19,15			1,00	19,15	ML	
REMATE DE CUBIERTA A MURO DE SHUT			1,60			1,00	1,60	ML	

TOTAL EJECUTADO	56,30	ML	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	ML	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	ML	
PRESENTE ACTA	**56,30**	ML	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
56,30	0,00	**56,30**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CARLOS GAVIRIA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**003**
ITEM	**17.1.2**	**CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)**		**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA









LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
CANAL A LA CUB POLICARBONATO			16,40			1,00	16,40	ML	
CANAL A CUBIERTA ECOROOF			19,15			1,00	19,15	ML	

TOTAL EJECUTADO	35,55	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	**35,55**	M

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
35,55	0,00	**35,55**


OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CARLOS GAVIRIA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**003**
ITEM	**17.1.3**	**BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)**	**UNIDAD**	**M**

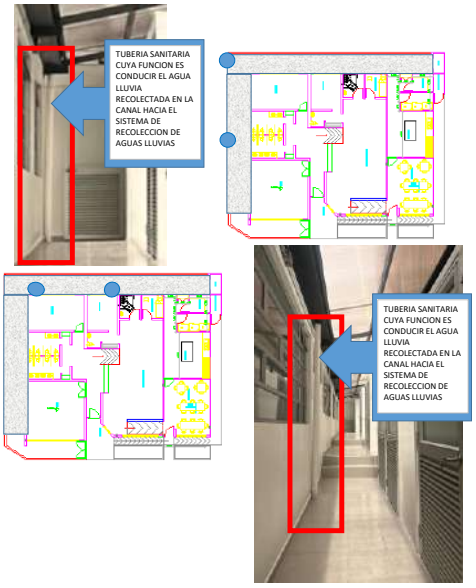ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	**BAJANTES EN EL COSTADO DEL MURO DE LIMPIEZA**			2,00			3,00	6,00	ML	
	BAJANTES EN LA FACHADA POSTERIOR			0,5			2,00	1,00	ML	
	(ADICION A BAJANTE EXISTENTE, PARA LLEGAR A NUEVA ALTURA DE CANAL									

TOTAL EJECUTADO	7,00	M	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M	
PRESENTE ACTA	**7,00**	M	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
7,00	0,00	**7,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CARLOS GAVIRIA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**003**
ITEM	**17.1.14**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
CUBIERTA									
TEJA ECORROF INSTALADA EN CUMBRERA DE CUBIERTA		1,07	10,67			1,00	11,42	M2	

TOTAL EJECUTADO	11,42	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	**11,42**	M2	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
11,42	0,00	**11,42**

OBSERVACIONES:


FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CARLOS GAVIRIA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**003**
ITEM	**17.1.18**	**SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
ACTA No 2									
CARLOS GAVIRIA ZONA PERIMETRAL		1,65	16,5			1,00	27,23	M2	
		1,70	25			1,00	42,50	M2	
ACTA No 3									
CUBIERTA PASILLO		1,47	16,12			1,00	23,70	M2	
		1,86	19,15			1,00	35,62	M2	

TOTAL EJECUTADO	59,32	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	69,73	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	**-10,41**	M2	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
-10,41	69,73	**59,32**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024	FRENTE OBRA	CARLOS GAVIRIA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	31 de marzo de 2025


CAPITULO	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	003
ITEM	17.1.24.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA









LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR		Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
CUBIERTA PASILLO			1,27	16,20			1,00	20,57	M2	
			1,64	19,15			1,00	31,41	M2	

TOTAL EJECUTADO	51,98	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	51,98	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
51,98	0,00	51,98

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CARLOS GAVIRIA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**OBRAS PRELIMINARES**		**ACTA No:**	**003**
ITEM	**20.1.1**	**ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA









LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
CARLOS GAVIRIA AREA BAJO CUBIERTA		16,50	19,15			1,00	315,98	M2	
CARLOS GAVIRIA CUBIERTA ZONA PERIMETRAL	**CUBIERTA PASILLO**	1,27	16,20			1,00	20,57	M2	
		1,64	19,15			1,00	31,41	M2	
ACCESO A PASILLO PERIMETRAL									
AREA DE TRIÁNGULO		0,95	1,45			1,00	0,69	M2	
AREA DE RECTANGULO		1,69	5,75			1,00	9,72	M2	

TOTAL EJECUTADO	378,36	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**378,36**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
378,36	0,00	**378,36**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)

Version: 01


Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	TEJEDORES DE SUEÑOS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**OBRAS PRELIMINARES**		**ACTA No:**	**003**
ITEM	**1.1.1**	**LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACIONES (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE CONSTRUCCION)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







PROCESO DE REPLANTEO PARA LA ADECUACION DE LA RAMPA EXTERIOR



EN ESTA IMAGEN SE PUEDEN DETALLAR LAS ESTACAS Y LOS HILOS TRAZADOS PARA EL REPLANTEO Y LOCALIZACION DE LA RAMPA



LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
CUBIERTA POLICARBONATO ACCESO		2,98	4,70			1,00	14,01	M2	
CUBIERTA ECORROF SHUT DEPOSITO		2,42	4,43			1,00	10,72	M2	
RAMPA EN CONCRETO									
TRAMO 1		2,00	2,03			1,00	4,06	M2	
TRAMO 2		2,00	0,66			1,00	0,66	M2	
		2,00	2,13			1,00	4,26	M2	
TRAMO 3		2,00	10,47			1,00	20,94	M2	

TOTAL EJECUTADO	54,65	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	**54,65**	M2	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
54,65	0,00	**54,65**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	TEJEDORES DE SUEÑOS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO		**OBRAS PRELIMINARES**		**ACTA No:**	**003**
ITEM	**1.2.1**	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)		**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
ACTA No 1									
TEJEDORES DE SUEÑOS			10,00			1,00	10,00	M	
ACTA No 3									
TRAMO 1			2,03			1,00	2,03	M	
TRAMO 2			0,66			2,00	1,32	M	
			2,13			1,00	2,13	M	
TRAMO 3			10,47			2,00	20,94	M	

TOTAL EJECUTADO	36,42	M	
MENOS ACTAS ANTERIORES	10,00	M	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M	
PRESENTE ACTA	**26,42**	M	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
26,42	10,00	**36,42**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024	FRENTE OBRA	
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	31 de marzo de 2025

CAPITULO	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS		ACTA No:	003
ITEM	1.3.6	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UNIDAD	UN

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	PUERTA PRINCIPAL (2HOJAS)	1,00					1,00	1,00		





TOTAL EJECUTADO	1,00	UN	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN	
PRESENTE ACTA	**1,00**	UN	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
1,00	0,00	**1,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR RUSTES V. RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	TEJEDORES DE SUEÑOS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**	**ACTA No:**	**003**	
ITEM	**1.3.11**	**DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
 	SHUT DE BASURAS	1,00	2,42	4,43			1,00	10,72	M2	

	TOTAL EJECUTADO	10,72	M2
	MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
	MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
	PRESENTE ACTA	**10,72**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
10,72	0,00	**10,72**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024	FRENTE OBRA	TEJEDORES DE SUEÑOS
INTERVENTOR:	COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	31 de marzo de 2025

CAPITULO	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS		ACTA No:	003
ITEM	1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA








LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
ACTA No 1									
COCINA Y ALACENA		6,05	4,45			26,92		M2	
SE COBRA EN ACTA No.1							26,40		
ACTA No 2									
COCINA Y ALACENA		6,05	4,45			26,92		M2	
SE COBRA EN LA PRESENTE ACTA EL SALDO							0,52		
ACTA No 3									
SHUT		1,50	1,92			1,00	2,88	M2	

TOTAL EJECUTADO	29,80	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	26,92	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**2,88**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
2,88	26,92	**29,80**

OBSERVACIONES:


FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR NUSTES V. RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024	FRENTE OBRA	TEJEDORES DE SUEÑOS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	31 de marzo de 2025

CAPITULO	CIMENTACION	ACTA No:	003
ITEM	2.4.15 RAMPA EN CONCRETO E = 0.12 M 3000 PSI	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA













LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
RAMPA EN CONCRETO									
TRAMO 1		2,00	2,03			1,00	4,06		
TRAMO 2		2,00	0,66			1,00	0,66		AREA DE UN TRAINGULO
		2,00	2,13			1,00	4,26		
TRAMO 3		2,00	10,47			1,00	20,94		

TOTAL EJECUTADO	29,92	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**29,92**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
29,92	0,00	**29,92**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR RUSTES V. RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** **PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)**	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	TEJEDORES DE SUEÑOS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**003**
ITEM	**3.1.3**	**LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)**	**UNIDAD** **M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
ACTA PARCIAL No 1									
MURO ALTO FACHADA PPAL			18,69	1,9		1,00	35,51	M2	
MUROS DE JARDINERAS			15,05	0,8		1,00	12,04	M2	
MURO EN LADRILLO EXTERIOR A OFICINAS			2,25	2,62		1,00	5,90	M2	
			1,1	2,62		1,00	2,88	M2	
			2,6	2,77		1,00	7,20	M2	
			1,02	2,2		1,00	2,24	M2	
DESCUENTO VANOS PUERTAS		0,90		2,2		-1,00	-1,98	M2	
		1,00		2,2		-1,00	-2,20	M2	
VENTANA		0,76		0,93		-1,00	-0,71	M2	
ACTA PARCIAL No 3									
MURO ALTO FACHADA PPAL		1,85	1,87			1,00	3,46	M2	
		1,40	4,5			1,00	6,32	M2	
		1,87	6,44			1,00	12,04	M2	
MUROS DE JARDINERAS		0,30	15,05			3,00	13,55	M2	
MURO EN LADRILLO EXTERIOR A OFICINAS		2,50	5,83			1,00	14,58	M2	
		1,02	2,08			1,00	2,12	M2	
puerta		1,00		2,12		-1,00	-2,12	M2	
ventana		0,77		0,92		-1,00	-0,71	M2	
puerta		0,91		2,12		-1,00	-1,93	M2	

TOTAL EJECUTADO	47,30	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	60,89	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	**-13,59**	M2	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
-13,59	60,89	**47,30**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR RUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024	FRENTE OBRA	TEJEDORES DE SUEÑOS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	31 de marzo de 2025

CAPITULO	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	003
ITEM	3.2.9	REEMBOQUILLADO DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA O ADOQUIN CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	UNIDAD	ML

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN / LUGAR	DIMENSIÓN Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
ACTA PARCIAL No 1									
MURO ALTO FACHADA PPAL			18,69			1,00	18,69	ML	
MUROS DE JARDINERAS			15,05			1,00	15,05	ML	
MURO EN LADRILLO EXTERIOR A OFICINAS			2,25			1,00	2,25	ML	
			2,62			1,00	2,62	ML	
			2,77			1,00	2,77	ML	
			2,2			1,00	2,20	ML	
ACTA PARCIAL No 3									
MURO ALTO FACHADA PPAL		1,85	1,87			1,00	3,46	ML	
		1,40	4,5			1,00	6,32	ML	
		1,87	6,44			1,00	12,04	ML	
MUROS DE JARDINERAS			15,05			1,00	15,05	ML	
MURO EN LADRILLO EXTERIOR A OFICINAS		2,50	5,83			1,00	14,58	ML	
		1,02	2,08			1,00	2,12	ML	
puerta		1,00		2,12		-1,00	-2,12	ML	
ventana		0,77		0,92		-1,00	-0,71	ML	
puerta		0,91		2,12		-1,00	-1,93	ML	

TOTAL EJECUTADO	48,81	ML
MENOS ACTAS ANTERIORES	43,58	ML
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	ML
PRESENTE ACTA	**5,23**	ML

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
5,23	43,58	**48,81**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	TEJEDORES DE SUEÑOS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**003**	
ITEM	**5.1.68**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA DE 60 W TIPO LED. INCLUYE TUBOS, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**		**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	TEJEDORES DE SUEÑOS COMEDOR						13,00	13,00	UND	
										

TOTAL EJECUTADO	13,00	UN	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN	
PRESENTE ACTA	**13,00**	UN	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
13,00	0,00	**13,00**

OBSERVACIONES:


FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** **PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)**	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	TEJDORES DE SUEÑOS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**003**	
ITEM	**5.1.71**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60X60 CM DE INCRUSTAR.INCLUYE SOPORTES,ACCESORIOSNECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**		**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
DEPOSITO EN SEGUNDO PISO (lockers)						1,00	1,00	UN	
BAÑO PMR						1,00	1,00	UN	
COCINA						2,00	2,00	UN	
ALACENA 2						2,00	2,00	UN	

TOTAL EJECUTADO	6,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN
PRESENTE ACTA	**6,00**	UN

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
6,00	0,00	**6,00**

OBSERVACIONES:


FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	TEJEDORES DE SUEÑOS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**003**	
ITEM	**5.1.77**	**REINSTALACIÓN DE LAMPARAS EXISTENTES (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)**		**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA






LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
SHUT Y DEPOSITO						2,00	2,00	UND	
BAÑOS MUJERES						3,00	3,00	UND	
BAÑO HOMBRES						2,00	2,00	UND	

TOTAL EJECUTADO	7,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN
PRESENTE ACTA	**7,00**	UN

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
7,00	0,00	**7,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	TEJEDORES DE SUEÑOS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**003**
ITEM	**5.1.78**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA DE 4 X 8 CM TROQUELADA**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
 	TEJEDORES DE SUEÑOS ZONA ESPERA	12,50					12,50	12,50		

TOTAL EJECUTADO	12,50	M	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M	
PRESENTE ACTA	**12,50**	M	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
12,50	0,00	**12,50**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024	FRENTE OBRA	
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	31 DE MARZO

CAPITULO	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	003
ITEM	7.2.8	GUARDA ESCOBA MEDIACAÑA EN GRAVILLA LAVADO MONA, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	UNIDAD M

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
ENTRADA PRINCIPAL			2			1,00	2,00	ML	
ENTRADA A SHUT Y BODEDA			1,8			1,00	1,80	ML	
			0,96			1,00	0,96	ML	
			0,17			1,00	0,17	ML	
			0,71			1,00	0,71	ML	
			0,16			1,00	0,16	ML	
			2,07			1,00	2,07	ML	

TOTAL EJECUTADO	7,87	M	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M	
PRESENTE ACTA	**7,87**	M	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
7,87	0,00	**7,87**

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	LUIS OSWALDO CAMPAÑA		ING. JOHANNA DEL PILAR RUSTES V.
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024	FRENTE OBRA	TEJEDORES DE SUEÑOS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	31 DE MARZO

CAPITULO	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	003
ITEM	7.2.11	PISO TABLÓN DE 33 X 33, INCLUYE GUARDAESCOBA	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
ESTRADA A SGUT Y BODEGA	ENTRADA PRINCIPAL		4,00	2,00			1,00	8,00	M2	
	ENTRADA A SHUT Y BODEDA		4,4	1,71			1,00	7,52	M2	
			0,30	0,79			-1,00	-0,24	M2	
			0,30	0,95			-1,00	-0,29	M2	
ESTRADA PRINCIPAL										
										

TOTAL EJECUTADO	15,00	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	**15,00**	M2	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
15,00	0,00	**15,00**

OBSERVACIONES:


FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR RUSTES V. RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** **PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)**	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	TEJEDORES DE SUEÑOS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**003**
ITEM	**7.2.16**	**CINTA ANTIDESLIZANTE A = 2 CM**	**UNIDAD**	**ML**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
RAMPA DE ACCESO AL PISO 2			1,0			10,00	10,00		

TOTAL EJECUTADO	10,00	ML
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	ML
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	ML
PRESENTE ACTA	**10,00**	ML

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
10,00	0,00	**10,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	TEJEDORES DE SUEÑOS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**002**
ITEM	**7.2.31**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM**		**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA








LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
SHUT BASURAS 1 TECHO			2,37			2,00	4,74	M	
SHUT BASURAS 2 TECHO			1,92			2,00	3,84	M	
HORIZONTALES			4,35			3,00	13,05	M	
			2,68			1,00	2,68	M	
			1,70			1,00	1,70	M	

TOTAL EJECUTADO	26,01	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	**26,01**	M

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
26,01	0,00	**26,01**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	TEJEDORES DE SUEÑOS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**003**
ITEM	**9.1.4**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERROJO DOBLE, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y VENTANILLA DE 0,20 X 0,40 M CON VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
 	**PUERTA PRINCIPAL**		2,00		3,2		1,00	6,40	M2	

TOTAL EJECUTADO	6,40	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**6,40**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
6,40	0,00	**6,40**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR RUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024	FRENTE OBRA	TEJEDORES DE SUEÑOS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	31 de marzo de 2025

CAPITULO	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	003
ITEM	9.2.6 — SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE CORREDIZAS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
PUERTA OFICINA ADMINISTRATIVA		1,02		2,1		1,00	2,14	M2	

TOTAL EJECUTADO	2,14	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**2,14**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
2,14	0,00	**2,14**


OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	TEJEDORES DE SUEÑOS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**003**	
ITEM	**11.1.8**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO MOVILIDAD REDUCIDA ((INCLUYE SENSOR, SISTEMA DE INSTALACIÓN EP/ES, ASIENTO SANITARIO)**		**UNIDAD**	**UND**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	**ACTA PARCIAL No 2**									
	BAÑO PMR						1,00	1,00	UN	
	ACTA PARCIAL No 3									
	BAÑO PMR						1,00	-1,00	UN	
NO SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO, TENIENDO EN CUENTA QUE LA ACTIVIDAD NO SE EJECUTÓ, MEMORIA CORRESPONDE CON CANTIDAD NEGATIVA (DESCUENTO)										

TOTAL EJECUTADO	0,00	UND	
MENOS ACTAS ANTERIORES	1,00	UND	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UND	
PRESENTE ACTA	**-1,00**	UND	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
-1,00	1,00	**0,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024	FRENTE OBRA	TEJEDORES DE SUEÑOS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	31 de marzo de 2025

CAPITULO		ACTA No:	003	
ITEM	12.1.17	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDA DE PROTECCIÓN DE ALTURA DE 1,20MTS CON DOBLE PASAMANOS DE 2" Y TUBERÍA VERTICAL CADA 40CM DE 1/2". INCLUYE 2 CAPAS DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE EXTERIOR	UNIDAD	M

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
     	TEJEDORES DE SUEÑOS ENTRADA (RAMPA)			9,66			1,00	9,66	ML	
				11,35			1,00	11,35	ML	
	FACHADA PRINCIPAL SOBRE MURO JARDINERA			2,50			1,00	2,50	ML	
				5,50			1,00	5,50	ML	
				2,20			1,00	2,20	ML	

TOTAL EJECUTADO	31,21	M	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M	
PRESENTE ACTA	**31,21**	M	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
31,21	0,00	**31,21**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	TEJEDORES DE SUEÑOS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**003**
ITEM	**13.2.3**	**PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
PINTURA FACHADA		2,23	2,80			1,00	6,24	M2	
		2,16	4,43			1,00	9,57	M2	
puertas shut y deposito		0,90		2		-2,00	-3,60	M2	
		0,80	2,27			1,00	1,82	M2	
		2,18	4,30			1,00	9,37	M2	
ventanas		0,91		0,92		-1,00	-0,84	M2	
		1,64	8,20			2,00	26,90	M2	
RAMPA		0,92	2,11			1,00	1,94	M2	
		0,93	1,53			1,00	1,42	M2	
		0,45	7,80			1,00	3,51	M2	

TOTAL EJECUTADO	56,33	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	**56,33**	M2	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
56,33	0,00	**56,33**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	TEJEDORES DE SUEÑOS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**003**
ITEM	**13.2.4**	**PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (A= 0.6M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)**	**UNIDAD** **ML**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
PINTURA FACHADA									
VIGA EN CONCRETO			6,44			1,00	6,44	ML	
			2,24			1,00	2,24	ML	
COLUMNAS EN CONCRETO CERRAMIENTO REJA			2,4			2,00	4,80	ML	
			2,5			3,00	7,50	ML	
			2,6			3,00	7,80	ML	
COLUMNA EN CONCRETO 1 FACHADA			4,67			3,00	14,01	ML	
			1,05			1,00	1,05	ML	
COLUMNA EN CONCRETO 2 FACHADA			5,15			5,00	25,75	ML	

TOTAL EJECUTADO	69,59	ML	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	ML	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	ML	
PRESENTE ACTA	**69,59**	ML	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
69,59	0,00	**69,59**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	TEJEDORES DE SUEÑOS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**003**
ITEM	**13.2.8**	**PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)**	**UNIDAD**	**ML**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
  	ARRANQUE Y LLEGADA RAMPA METALICA			1,22			4,00	4,88		
	ESCALONES ACCESO SHUT			0,78			2,00	1,56		
				0,98			3,00	2,94		
				0,79			3,00	2,37		

TOTAL EJECUTADO	11,75	ML
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	ML
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	ML
PRESENTE ACTA	**11,75**	ML

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
11,75	0,00	**11,75**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** **PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)**	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	TEJEDORES DE SUEÑOS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**003**
ITEM	**13.4.1**	**ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS A DOS MANOS Y DOS CARAS**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA











LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
PUERTA SHUT		0,90		2		1,00	1,80	M2	
PUERTA BODEGA		0,90		2		1,00	1,80	M2	
PUERTA COCINA		1,00		2,02		1,00	2,02	M2	
PUERTA ALACENA		0,88		2,00		1,00	1,76	M2	
PUERTA COCINA ALACENA		1,00		2,01		1,00	2,01	M2	
RAMPA METALICA						1,00	0,00	M2	
tramo 1		1,22	3,05			1,00	3,72	M2	
descanso		1,22	2,56			1,00	3,12	M2	
tramo 2		1,22	4,34			1,00	5,29	M2	

TOTAL EJECUTADO	21,53	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	**21,53**	M2	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
21,53	0,00	**21,53**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024	FRENTE OBRA	TEJEDORES DE SUEÑOS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	31 de marzo de 2025

CAPITULO	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	003
ITEM	13.4.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
REJAS FACHADA PRINCIPAL EXISTENTES EN LA SEDE									
		3,42	1,57			1,00	5,37	M2	
		3,47	1,57			1,00	5,45	M2	
		1,34	1,52			1,00	2,04	M2	
		0,77	1,52			1,00	1,17	M2	
RAMPA INTERNA EXISTENTE EN LA SEDE									
BARANDA RAMPA INTERNA			13,76	0,9		1,00	12,38	M2	
PASAMANOS			5,40	0,3		1,00	1,62	M2	

TOTAL EJECUTADO	28,03	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**28,03**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
28,03	0,00	**28,03**

OBSERVACIONES:


FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FÁBIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	TEJDORES DE SUEÑOS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**003**
ITEM	**14.1.1**	**CIELORASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA











LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
ACTA No 2									
TEJEDORES DE SUEÑOS ZONA COCINA		6,05	4,45			1,00	26,92	M2	
ACTA No 3									
SHUT BASURA		2,37	1,92			1,00	4,55	M2	
BODEGA		1,92	1,5			1,00	2,88	M2	

TOTAL EJECUTADO	34,35	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	26,92	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	**7,43**	M2	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
7,43	26,92	**34,35**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OVIEDO CAMPOS **RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024	FRENTE OBRA	TEJEDORES DE SUEÑOS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	31 de marzo de 2025

CAPITULO	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	003
ITEM	17.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UNIDAD	M

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
BAJANTE 1				1,7		1,00	1,70	ML	
				0,24		1,00	0,24	ML	
				0,75		1,00	0,75	ML	
BAJANTE 2				1,7		1,00	1,70	ML	
				0,24		1,00	0,24	ML	
				1,44		1,00	1,44	ML	

TOTAL EJECUTADO	6,07	M	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M	
PRESENTE ACTA	**6,07**	M	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
6,07	0,00	**6,07**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LORENA DE LA AMPOLLA RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024	FRENTE OBRA	TEJEDORES DE SUEÑOS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	31 de marzo de 2025

CAPITULO	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	003
ITEM	17.1.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
CUBIERTA ECORROF SHUT DEPOSITO		2,42	4,68			1,00	11,33		

TOTAL EJECUTADO	11,33	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**11,33**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
11,33	0,00	**11,33**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSVALDO CAMPAÑA RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024	FRENTE OBRA	TEJEDORES DE SUEÑOS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	31 de marzo de 2025

CAPITULO		CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	003
ITEM	17.1.17	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	UNIDAD	ML

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
PERFILES VERTICALES CUBIERTA POLICARBONATO				2,05		3,00	6,15	M2	

TOTAL EJECUTADO	6,15	ML
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	ML
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	ML
PRESENTE ACTA	6,15	ML

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
6,15	0,00	6,15

OBSERVACIONES:


FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** **PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)**	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	TEJEDORES DE SUEÑOS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**003**
ITEM	**17.1.18** **SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
ESTRUCTURA ENTRADA PRINCIPAL		2,25	4,67			1,00	10,51	M2	

TOTAL EJECUTADO	10,51	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**10,51**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
10,51	0,00	**10,51**


OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OMAR TAMPARA **RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	TEJEDORES DE SUEÑOS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**003**
ITEM	**17.1.24**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	**POLICARBONATO ESTRUCTURA PRINCIPAL**		2,98	4,7			1,00	14,01	M2	
										
										

TOTAL EJECUTADO	14,01	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**14,01**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
14,01	0,00	**14,01**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS CARLOS CAMARA **RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	TEJEDORES DE SUEÑOS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**003**
ITEM	**17.1.30**	**CANAL AMAZONAS**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
CUBIERTA ENTRADA A TEJEDORES DE SUEÑOS									
CANAL 1			4,09			1,00	4,09	M2	
CANAL 2			4,5			1,00	4,50	M2	

TOTAL EJECUTADO	8,59	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	**8,59**	M

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
8,59	0,00	**8,59**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	TEJEDORES DE SUEÑOS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de marzo de 2025**

CAPITULO			**ACTA No:**		**002**
ITEM	**20.1.1**	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA		**UNIDAD**	**M2**

ASEO GENRAL

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	**AREA BAJO CUBIERTA SEDE**		13,40	10,6			1,00	142,04	M2	
			5,12	4,7			1,00	24,06	M2	
	ENTRADA PRINCIPAL		4,20	2,20			1,00	9,24	M2	1
	ENTRADA A SHUT Y BODEDA		4,6	1,91			1,00	8,79	M2	
			0,30	0,79			-1,00	-0,24	M2	
			0,30	0,95			-1,00	-0,29	M2	
	RAMPA EN CONCRETO									
	TRAMO 1		2,00	2,03			1,00	4,06	M2	
	TRAMO 2		2,00	0,66			1,00	0,66	M2	
			2,00	2,13			1,00	4,26	M2	
	TRAMO 3		2,00	10,47			1,00	20,94	M2	
										

TOTAL EJECUTADO	213,53	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	**213,53**	M2	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
213,53	0,00	**213,53**

OBSERVACIONES:


FIRMA		**FIRMA**	
	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE DE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA**		ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C	**FRENTE OBRA**	PORVENIR CDC
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de Marzo del 2025**


CAPITULO	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**		**ACTA No:**	**003**
ITEM	**1.3.1**	**DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA








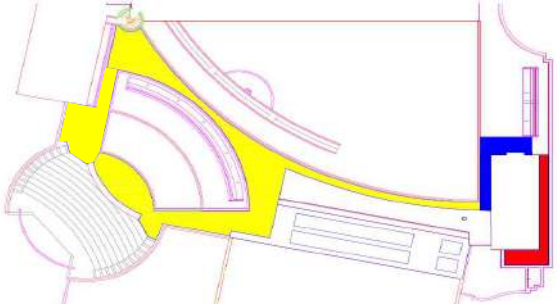

LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Descuento				
CORTE 1									
CUBIERTA DE COCINA	1,00	7,10	6,2			44,02	44,02	M2	
CUBIERTA DE COCINA	1,00	1,00	1,28			1,28	1,28	M2	
CUBIERTA DE COCINA	2,00	1,95	0,5			1,95	1,95	M2	
CORTE 2									
CUBIERTA CIRCULACION LOSETAS	1,00	444,39	1,00			444,39	444,39	M2	
CORREDOR HACIA PLAZOLETA	1,00	10,30	1,70			17,51	17,51	M2	
CORREDOR HACIA PLAZOLETA	1,00	3,54	8,30			29,38	29,38	M2	
CORREDOR HACIA PLAZOLETA	-1,00	0,50	2,90			-1,45	-1,45	M2	
CORREDOR HACIA VIA	1,00	7,12	2,78			19,79	19,79	M2	
CORREDOR HACIA VIA	1,00	1,45	17,20			24,94	24,94	M2	





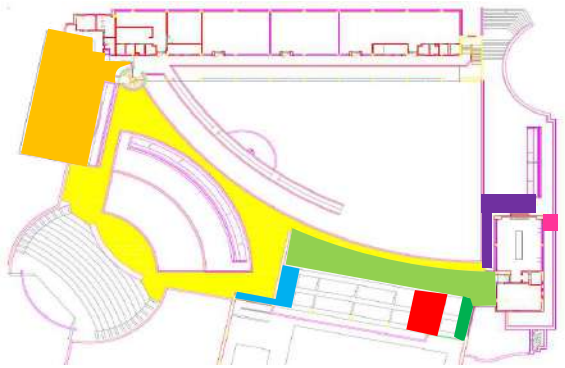





CORTE 3									
RETIRO DE GRAVILLA	1,00	124,69	1,00			124,69	124,69	M2	
GRAVILLA	1,00	124,69	1,00			124,69	124,69	M2	
SOBRE GYM	1,00	0,96	6,55			6,29	6,29	M2	
SOBRE GYM	1,00	1,27	6,75			8,57	8,57	M2	
SOBRE GYM	1,00	4,42	6,75			29,84	29,84	M2	
SOBRE GYM	1,00	2,75	7,04			19,36	19,36	M2	
RETIRO LOCETAS	1,00	197,48	1,00			197,48	197,48	M2	
DEMOLICION DE ALISTADO	1,00	197,48	1,00			197,48	197,48	M2	
DEMOLICION DE ALISTADO	1,00	392,09	1,00			392,09	392,09	M2	
DEMOLICION DE ALISTADO	1,00	3,85	1,00			3,85	3,85	M2	
DEMOLICION DE ALISTADO	1,00	45,44	1,00			45,44	45,44	M2	
TERRAZA SOBRE COMEDOR	1,00	154,23	1,00			154,23	154,23	M2	
DESCUENTO M2 LOSETAS RETIRADAS POR LA ENTIDAD	-456,00	0,70	0,70			-223,44	-223,44	M2	

TOTAL EJECUTADO	1.662,38	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	581,81	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**1080,57**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
1080,57	581,81	**1662,38**

OBSERVACIONES:


RESIDENTE INTERVENTORÍA		RESIDENTE CONTRATISTA	
NOMBRE	ING. LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
FIRMA		**FIRMA**	
DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C	**FRENTE OBRA**	PORVENIR CDC
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de Marzo del 2025**

CAPITULO	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**		**ACTA No:**	**003**
ITEM	**1.3.20**	**PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA






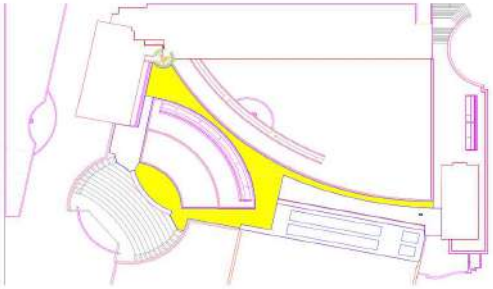

LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Descuento				
CORTE 1									
CUBIERTA DE COCINA	1,00	7,10	6,2			44,02	44,02	M2	
CUBIERTA DE COCINA	1,00	8,90	6,8			60,52	60,52	M2	
CUBIERTA DE COCINA	2,00	1,95	0,5			1,95	1,95	M2	
CORTE 2									
CUBIERTA CIRCULACION LOSETAS									
	1,00	346,52	1,00			346,52	346,52	M2	





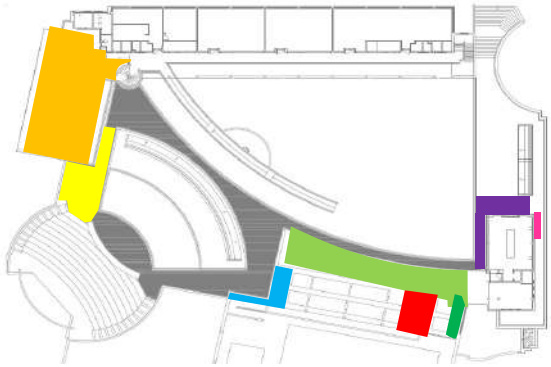






CORTE 3									
GRAVILLA	1,00	124,69	1,00			124,69	124,69	M2	
SOBRE GYM	1,00	0,96	6,55			6,29	6,29	M2	
SOBRE GYM	1,00	1,27	6,75			8,57	8,57	M2	
SOBRE GYM	1,00	4,42	6,75			29,84	29,84	M2	
SOBRE GYM	1,00	2,75	7,04			19,36	19,36	M2	
SILLAS	1,00	197,48	1,00			197,48	197,48	M2	
AREA MEDIA TORTA	1,00	71,72	1,00			71,72	71,72	M2	
COCINA A VIA	1,00	3,85	1,00			3,85	3,85	M2	
COCINA A TERRAZA	1,00	45,44	1,00			45,44	45,44	M2	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C	**FRENTE OBRA**	PORVENIR CDC
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de Marzo del 2025**


CAPITULO	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**		**ACTA No:**	**003**	
ITEM	**1.3.23**	**RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







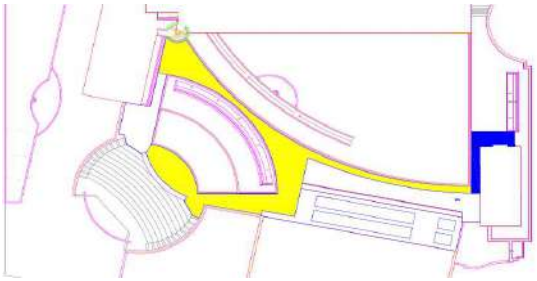








LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Descuento				
CORTE 1									
CUBIERTA DE COCINA	1,00	7,10	6,2			44,02	44,02	M2	
CUBIERTA DE COCINA	1,00	8,90	6,8			60,52	60,52	M2	
CUBIERTA DE COCINA	2,00	1,95	0,5			1,95	1,95	M2	
CORTE 2									
CUBIERTA CIRCULACION LOSETAS	1,00	346,52	1,00			346,52	346,52	M2	
CORREDOR HACIA PLAZOLETA	1,00	10,30	1,70			17,51	17,51	M2	
CORREDOR HACIA PLAZOLETA	1,00	3,54	8,30			29,38	29,38	M2	
CORREDOR HACIA PLAZOLETA	-1,00	0,50	2,90			-1,45	-1,45	M2	

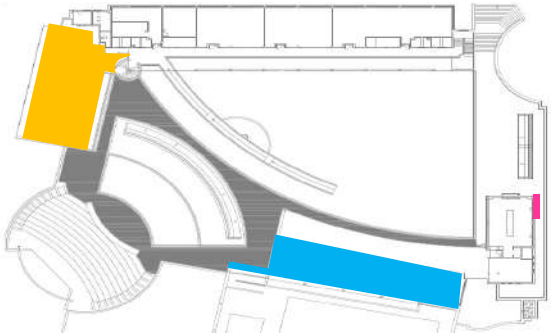









CORTE 3									
SOBRE GYM	1,00	124,68	1,00			124,68	124,68	M2	
SILLAS	1,00	199,86	1,00			199,86	199,86	M2	
COCINA A VIA	1,00	3,85	1,00			3,85	3,85	M2	

TOTAL EJECUTADO	826,84	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	498,45	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	**328,39**	M2	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
328,39	498,45	**826,84**


OBSERVACIONES:

RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**	
NOMBRE	ING. LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
FIRMA		**FIRMA**	
DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C	**FRENTE OBRA**	PORVENIR CDC
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de Marzo del 2025**

CAPITULO	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**		**ACTA No:**	**003**
ITEM	**1.3.39**	**PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)**	**UNIDAD**	**M**


ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Descuento				
	CORTE 3									
  	SALA DE JUNTAS	1,00		3,28			3,28	3,28	M	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C	**FRENTE OBRA**	PORVENIR CDC
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPANIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de Marzo del 2025**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**003**
ITEM	**3.2.4**	**REMATE LINEAL CUBIERTA EN LADRILLO TOLETE**		**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







REMATE LINEAL CUBIERTA EN LADRILLO TOLETE., SE REQUIRIO UN REMATE LINEAL DENTRO DE LA SALA DE JUNTAS AL REALIZAR LA INSTALACION DE LA TUBERIA PARA LAS TOMAS ELECTRICAS Y DE VOZ Y DATOS.
SE REALIZO EL REMATE EN MAMPOSTERIA PARA MANTENER LA CONTINUIDAD DEL ESPACIO Y NO LA INSTALACION DE UNA CANALETA EN PISO PARA NO

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
CORTE 3									
SALA DE JUNTAS	1,00		3,28			3,28	3,28	M	

TOTAL EJECUTADO	3,28	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	**3,28**	M

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
3,28	0,00	**3,28**



OBSERVACIONES:

RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**	
NOMBRE	ING. LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
FIRMA		**FIRMA**	
DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C	**FRENTE OBRA**	PORVENIR CDC
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPANIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de Marzo del 2025**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**003**
ITEM	**5.1.1**	**SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**		**UNIDAD**	**UND**

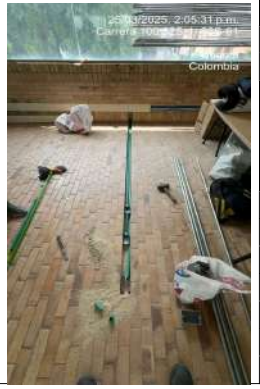ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	CORTE 3									
	SALA DE JUNTAS	2,00					2,00	2,00	UND	
 										

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C	**FRENTE OBRA**	PORVENIR CDC
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de Marzo del 2025**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**003**	
ITEM	**5.1.12**	**SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**	**UNIDAD**	**UND**


ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	CORTE 3									
	SALA DE JUNTAS	3,00					3,00	3,00	UND	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C	**FRENTE OBRA**	PORVENIR CDC
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de Marzo del 2025**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**003**	
ITEM	**5.1.61**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA DE VOZ Y DATOS RJ45 CATEGORÍA 5 TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 8X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, TAPA DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. NO INCLUYE CABLEADO.**		**UNIDAD**	**UND**

v

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	CORTE 3									
		1,00					1,00	1,00	UND	
 										
								TOTAL EJECUTADO	1,00	UND
								MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UND
								MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UND
								PRESENTE ACTA	**1,00**	UND

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
1,00	0,00	**1,00**

OBSERVACIONES:


RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**	
NOMBRE	ING. LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
FIRMA		**FIRMA**	
DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C	**FRENTE OBRA**	PORVENIR CDC
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de Marzo del 2025**


CAPITULO	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**003**
ITEM	**7.1.1**	**ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA









Terrza sobre Comedor






LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
CORTE 1									
CUBIERTA DE COCINA	1,00	7,10	6,2			44,02	44,02	M2	
CUBIERTA DE COCINA	1,00	8,90	6,8			60,52	60,52	M2	
CUBIERTA DE COCINA	2,00	1,95	0,5			1,95	1,95	M2	
CORTE 2									
TERRAZA SOBRE COMEDOR	1,00	34,04	1			34,04	34,04	M2	







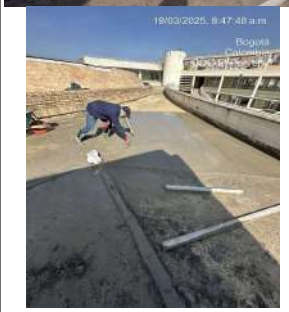



CORTE 3									
GRAVILLA	1,00	124,69	1,00			124,69	124,69	M2	
GRAVILLA	0,21	124,69	1,00			26,18	26,18	M2	
SOBRE GYM	1,00	125,87	1,00			125,87	125,87	M2	
SILLAS	1,00	197,48	1,00			197,48	197,48	M2	
SILLAS	0,21	197,48	1,00			41,47	41,47	M2	
AREA MEDIA TORTA	1,00	418,24	1,00			418,24	418,24	M2	
AREA MEDIA TORTA	0,21	418,24	1,00			87,83	87,83	M2	
TERRAZA SOBRE COMEDOR	1,00	13,56	1,00			13,56	13,56	M2	
FRENTE CALLE COCINA	1,00	2,62	1,47			3,85	3,85	M2	

TOTAL EJECUTADO	1.179,70	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	140,53	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	**1039,17**	M2	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
1039,17	140,53	**1179,70**

OBSERVACIONES:


RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**	
NOMBRE	ING. LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
FIRMA		**FIRMA**	
DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C	**FRENTE OBRA**	PORVENIR CDC
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de Marzo del 2025**


CAPITULO	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**003**
ITEM	**7.1.7**	**MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO**		**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







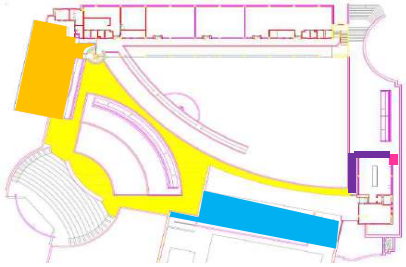





LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
CORTE 1									
CUBIERTA DE COCINA	1,00		7,1			7,10	7,10	M	
CUBIERTA DE COCINA	1,00		15,6			15,60	15,60	M	
CUBIERTA DE COCINA	1,00		6,8			6,80	6,80	M	
CORTE 3									
GRAVILLA	1,00		85,36			85,36	85,36	M	
SOBRE GYM	1,00		133,09			133,09	133,09	M	
SILLAS	1,00		133,47			133,47	133,47	M	
AREA MEDIA TORTA	1,00		275,41			275,41	275,41	M	
FRENTE COCINA	1,00		49,97			49,97	49,97	M	
FRENTE CALLE COCINA	1,00		5,24			5,24	5,24	M	

TOTAL EJECUTADO	712,04	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	29,50	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	**682,54**	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
682,54	29,50	**712,04**


OBSERVACIONES:

RESIDENTE INTERVENTORÍA		RESIDENTE CONTRATISTA	
NOMBRE	ING. LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
FIRMA		**FIRMA**	
DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C	**FRENTE OBRA**	PORVENIR CDC
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de Marzo del 2025**

CAPITULO	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**		**ACTA No:**	**003**	
ITEM	**11.1.20**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA TIPO CUPULA DE 5" A 3"**		**UNIDAD**	**UND**

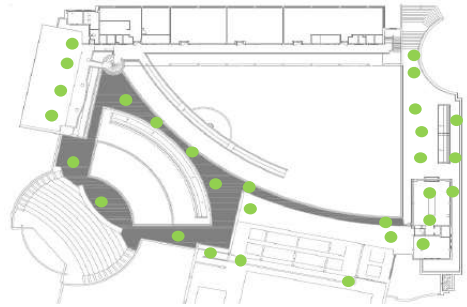
ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	CORTE 3									
		29,00					29,00	29,00	UND	
 										

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C	**FRENTE OBRA**	PORVENIR CDC
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de Marzo del 2025**


CAPITULO	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**003**
ITEM	**17.1.5**	**MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







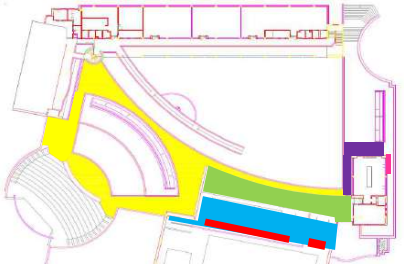





LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
CORTE 1									
CUBIERTA DE COCINA	1,00	7,10	6,2			44,02	44,02	M2	
CUBIERTA DE COCINA	1,00	8,90	6,8			60,52	60,52	M2	
CUBIERTA DE COCINA	1,00	1,95	0,5			0,98	0,98	M2	
CORTE 3									
GRAVILLA	1,00	137,49	1,00			137,49	137,49	M2	
SOBRE GYM	1,00	149,57	1,00			149,57	149,57	M2	
LUCARNAS DESCUENTO	-1,00	19,30	0,50			-9,65	-9,65	M2	
LUCARNAS DESCUENTO	-1,00	3,30	0,50			-1,65	-1,65	M2	
LUCARNA	0,40	19,30	0,50			3,86	3,86	M2	
LUCARNA	0,40	3,30	0,50			0,66	0,66	M2	
AREA MEDIA TORTA	0,52	459,55	1,00			238,97	238,97	M2	
FRENTE COCINA	1,00	10,30	1,70			17,51	17,51	M2	
FRENTE COCINA	1,00	3,54	8,30			29,38	29,38	M2	
FRENTE COCINA	-1,00	0,50	2,90			-1,45	-1,45	M2	
FRENTE COCINA	1,00	1,00	7,50			7,50	7,50	M2	
FRENTE CALLE COCINA	1,00	1,00	4,64			4,64	4,64	M2	
						TOTAL EJECUTADO	682,35	M2	
						MENOS ACTAS ANTERIORES	105,52	M2	
						MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
						PRESENTE ACTA	**576,83**	M2	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
576,83	105,52	**682,35**

OBSERVACIONES:

RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**	
NOMBRE	ING. LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
FIRMA		**FIRMA**	
DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C	**FRENTE OBRA**	PORVENIR CDC
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**31 de Marzo del 2025**

CAPITULO	**PRECIOS NO PREVISTOS**		**ACTA No:**	**003**	
ITEM	**NP 001**	**DESMONTE, INSTALACION Y CERTIFICACION DE PUNTOS DE ANCLAJE PARA TRABAJO EN ALTURAS**		**UNIDAD**	**UND**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA









LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
CORTE 3									
ANCLAJES	8,00					8,00	8,00	UND	

TOTAL EJECUTADO	8,00	UND
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UND
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UND
PRESENTE ACTA	**8,00**	UND

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
8,00	0,00	**8,00**

OBSERVACIONES:

RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**	
NOMBRE	ING. LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**NOMBRE**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
FIRMA		**FIRMA**	
DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

Tenga en cuenta al momento de diligenciarlo eliminar las instrucciones al final del documento.

Datos generales:

Período a que corresponde el informe *1	09 02 2025	08 03 2025
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar? *2	SI	NO x
Porcentaje de ejecución *3	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	60,71%	$232.342.500

Datos del supervisor/interventor: *4

NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR	JOHNNY EDWARD PADILLA
NUMERO DE CTO DE INTERVENTORIA	CONTRATO 9221-2024
DEPENDENCIA	PLANTAS FISICAS
CARGO	SUBDIRECTOR
LOCALIDAD	TUNJUELITO-BOSA-CIUDAD BOLIVAR
APOYO A LA SUPERVISIÓN	ADRIANA MARCELA VELANDIA

Datos del contrato supervisado: *5

NUMERO DE CONTRATO	9221-2024
FECHA DE CONTRATO	26/11/2024
FECHA APROBACIÓN DE POLIZA	09/12/2024
CONTRATISTA	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S – BIC
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	901.889.243-7
PROYECTO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO
VALOR	$382.708.445,00
PLAZO	CUATRO (4) MESES
FECHA ACTA DE INICIO	09/12/2024
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	15/04/2025
ADICION	NOVENTA Y OCHO MILLONES VEINTISÉIS MIL CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($98.026.043)
PRORROGA	HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2025
SUSPENSIÓN	N/A
FUENTE DE FINANCIACIÓN	9221-2024

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

Bitácora de actividades: *6

OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. 22. Suscribir con el contratista de obra una bitácora para registrar las actividades programadas, en la cual se llevará una memoria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, de igual manera se deberá registrar la visita de funcionarios que tengan relación con la ejecución del proceso. Lo anterior deberá firmarse por el director de la interventoría y debe encontrarse debidamente foliada. En caso de que se realicen actividades, acontecimientos, sucesos y decisiones relacionadas con adecuaciones, complementación, ajuste y/o del alcance de las intervenciones, las mismas también deben registrarse en la bitácora. Al finalizar los trabajos, en su informe final, el interventor deberá entregar como anexo este documento, el cual debe permitir la comprensión general y el desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión aprobada. La interventoría será responsable de la custodia en físico de la bitácora.	Se realiza el registro diario en las bitácoras de cada uno de los frentes de obra, en donde se describen las actividades ejecutadas, el personal presente en la sede y el estado del tiempo	BITÁCORA DE OBRA POR SEDE

Este espacio es solo para contratos diferentes a prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO *7

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS M/CTE ($284.682.402,00)
ADICIONES:	*NOVENTA Y OCHO MILLONES VEINTISÉIS MIL CUARENTA Y TRES* PESOS M/CTE *($98.026.043,00)*

REDUCCIONES:	*N/A*
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	*OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES* PESOS M/CTE *($87.625.243,00)*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES, OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DOS PESOS M/CTE ($295.083.202.00)
VALOR ANTICIPO: (EN CASO DE QUE APLIQUE)	*N/A*
AMORTIZACIÓN:	*N/A*

Certifico que el valor autorizado por concepto de ANTICIPO está de acuerdo al plan del manejo de inversión del mismo.	SI:___ NO APLICA: _X__

	CONCEPTO	VALOR A PAGAR
COSTO FIJO	$144.717.054,00	$144.717.054,00
COSTO VARIABLE	$0	$0
COSTO DE REALIZACIÓN	$0	$0
OTROS	$0	$0

Este espacio es solo para contratos diferentes a prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión.

REPORTE DEL MONITOREO A LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONVENIO O CONTRATO *8

Se debe diligenciar el reporte del monitoreo a los riesgos asignados a la contratación, conforme a la identificación y periodicidad establecida en el FOR-GEC-035 FORMATO ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES DE LA CONTRATACIÓN.

Durante la ejecución del contrato no se han presentado riesgos previsibles _

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO: *9

Durante la ejecución del contrato se han realizado todas las actividades requeridas y necesarias para llevar a cabo el objeto del contrato en cada una de las sedes ubicadas en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar y Tunjuelito.

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: *10

2.1 OBLIGACIONES GENERALES

No OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	ESTADO (Registrar según corresponda DEFICIENTE/ A MEJORAR/SATISFACTORIO/ SOBRESALIENTE/NO APLICA)	OBSERVACIÓN *En este espacio es importante que el supervisor reporte como se dio cumplimiento a la obligación y cuál es el soporte y su ubicación entre otras observaciones que considere necesarias incluir.*
1	Conocer y cumplir a cabalidad las condiciones establecidas en el estudio previo, anexo técnico, pliego de condiciones, adendas y todos los documentos que hacen parte de manera integral del proceso, para realizar la ejecución del contrato con eficiencia y eficacia.	SATISFACTORIO	Entrega de documentación preliminar y radicación mediante oficios:
2	Conocer, revisar y exigir el cumplimiento a cabalidad del Estudio Previo, Anexo Técnico, Pliego de Condiciones, Adendas y todos los documentos que hagan parte integral del contrato cuyo objeto es: "REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO" Según el grupo que aplique, con eficiencia, calidad y eficacia.	SATISFACTORIO	Revisión de documentación preliminar y radicación mediante oficios: CSM 027 – 2024 - Remisión de documentación - Obligación No. 1 del contrato de obra. CSM 028 – 2024 - Remisión de documentación - Obligación No. 4 del contrato de obra - APUS CSM 029 – 2024 - Remisión de documentación - Obligación No. 5 del contrato de obra - AIU CSM 030 – 2024 - Remisión de programación de obra - Obligación No. 3.3 del contrato de obra. CSM 034 – 2024 - Remisión de documentación - Obligación No. 6 del contrato de obra. CSM 035 – 2024 - Remisión de documentación - Obligación No. 2 del contrato de obra.
3	Asumir el conocimiento de los sitios vulnerables y no vulnerables donde se desarrollarán todas las actividades contractuales del contrato.	SATISFACTORIO	Diagnósticos de obra realizados en conjunto con el contratista de obra.
4	Cumplir con los deberes que contrae en calidad de interventor de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 80 de 1993.	SATISFACTORIO	
5	Suscribir juntamente con el supervisor designado por la SDIS, el Acta de Inicio de ejecución del contrato de interventoría, previo al cumplimiento de los requisitos necesarios para ello.	SATISFACTORIO	Se suscribió del acta de inicio el 09 de diciembre de 2024.
6	Elaborar y entregar todos los documentos e informes establecidos en el Pliego de Condiciones, Estudios Previos y Anexo Técnico, así como aquellos otros requeridos por la SDIS en la ejecución del contrato. Para dar cumplimiento a esta obligación, el contratista deberá seguir los lineamientos, metodologías y los formatos establecidos en los documentos enunciados antes y/o	SATISFACTORIO	Se realizó entrega del informe mensual No. 1 y No. 2 en todos sus componentes, mediante radicados: CCCTC-9221-2024-0066 - INFORME TECNICO 1 INTERVENTORIA CCCTC-9221-2024-0065 - INF AMB N°1 INTERVENTORIA

	los que se establezcan institucionalmente por la SDIS para su elaboración.		
7	Requerir toda la información, informes, explicaciones, aclaraciones y documentos que permitan verificar el correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones al contratista de obra.	SATISFACTORIO	Se revisó la entrega del informe mensual No. 1 y No. 2 en todos sus componentes, mediante radicados: CSM 032 – 2024 - REMISION INFORME TECNICO MENSUAL 01. CSM 018 – 2024 - Informe Mensual Ambiental No. 01. CSM 025 – 2024 - Informe Mensual SST No. 01. CSM 040 – 2024 - REMISION INF. SST, AMBIENTAL MENSUAL Y PMA No. 2.
8	Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el supervisor designado por la SDIS.	SATISFACTORIO	Se dio respuesta a los requerimientos hechos por parte de la SDIS en relación a la ejecución del contrato. Mediante los canales de comunicación entre la interventoría y la supervisión del contrato.
9	Cumplir sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, para lo cual, deberá realizar los aportes a que se refiere la Ley 828 de 2003, el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, SENA (Fondo Para la industria de la Construcción – FIC), e ICBF cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia . Este requisito deberá acreditarse para la realización de los pagos derivados del contrato y se debe reportar mensualmente para verificación y aprobación de la supervisión.	SATISFACTORIO	Se realizó el pago de la seguridad social y aportes parafiscales de todo el personal vinculado al contrato de interventoría.
10	Asumir el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. Todos estos gastos han sido estimados integralmente por el Contratista e incluidos en el precio de su oferta bajo su análisis y responsabilidad.	SATISFACTORIO	Se realizó el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del contrato.
11	Asesorar de manera objetiva e imparcial, otorgando en todo momento la máxima importancia a los intereses de la SDIS,	SATISFACTORIO	Se realizaron conceptos técnicos en relación a los APU y los ITEMS no previstos cuidando que los precios estuvieran dentro de los rangos del mercado y no hubiera un desbalance financiero en el contrato.

	asegurándose de no incurrir en conflicto de intereses.		
12	Suministrar una dirección, teléfonos y persona de contacto en la ciudad que tenga el domicilio principal, de manera permanente durante la vigencia y el plazo exigido en las garantías, que le permita interacción más eficiente en la gestión relacionada con el compromiso que se suscribe.	SATISFACTORIO	Se recibió la información correspondiente a dirección, teléfonos y persona de contacto en la ciudad de Bogotá de los encargados de la coordinación del contrato de interventoría así como de la representación legal de la interventoría..
13	Presentar antes de la suscripción del acta de inicio, todos los documentos previos que se soliciten de conformidad con el pliego de condiciones, el contrato y demás documentos que hacen parte integral del proceso de contratación.	SATISFACTORIO	Se realizó la entrega de los documentos solicitados como pólizas, hojas de vida y demás requerimientos solicitados en el pliego de condiciones antes de suscribir el acta de inicio del contrato
14	indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo de este. Así mismo, responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la Administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993 o la norma que la reemplace.	NO APLICA	No se han presentado daños que se causen a terceros, a bienes propios o de terceros
15	Pagar a la SDIS todas la sumas y costos que la misma deba asumir por razón de la acción que contra ella inicien terceros que hayan sufrido daños por causa del Contratista, de su personal, de los subcontratistas, proveedores, así como el personal al servicio de estos durante la ejecución del contrato.	NO APLICA	No se han presentado acciones que inicien procesos por daños terceros que hayan sufrido daños por causa del Contratista, de su personal, de los subcontratistas, proveedores, así como el personal al servicio
16	Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecución de las actividades o en las instalaciones de la SDIS, relacionadas con los trabajos objeto del contrato, así como elaborar y suscribir las actas correspondientes, a cada una de las reuniones que se citen, deberá asistir una persona en representación del contratista que tenga poder de decisión dentro de la ejecución del objeto pactado. En los casos en que expresamente se indique en la citación, deberá asistir el representante legal o principal del contratista dependiendo de la naturaleza jurídica de éste.	SATISFACTORIO	Asistieron a todas la reuniones y comités de obra ya sean presenciales o virtuales, convocadas por la esta supervisión o la misma interventoría, para revisar los temas específicos.
17	Consultar a las entidades competentes, para garantizar el cumplimiento de las normas	NO APLICA	No fue necesario la consulta a empresas de servicio público.

	vigentes: estructurales, servicios públicos (redes eléctricas, hidrosanitarias, gas y contra incendio), obras de mitigación, ambientales, de seguridad y las demás que apliquen, con el fin de mantener actualizados los lineamientos de la SDIS.		
18	Consultar de manera oportuna con la SDIS, cualquier inquietud que se presenten en relación con la ejecución del contrato, en el marco del documento "MANUAL DE CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN" y demás documentos expedidos por la SDIS para el adecuado seguimiento y supervisión de los contratos. Y vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado de acuerdo con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 1474.	SATISFACTORIO	Se realizaron consultas basadas en los diagnósticos proporcionados por el contratista de obra, con el fin de garantizar la correcta ejecución de las actividades relacionadas con el contrato
20	Actuar con sinergia entre la SDIS, el Supervisor y/o apoyo de la supervisión designado por la SDIS y el Contratista de obra, para la ejecución idónea de los contratos de obra e interventoría, en las condiciones de calidad y en las oportunidades previstas.	SATISFACTORIO	Se llevaron a cabo recorridos, reuniones virtuales, comités de seguimiento semanales y otras actividades conjuntas entre el contratista de obra y la interventoría, con el objetivo de abordar temas relacionados con la ejecución de la obra y el presupuesto, garantizando así el adecuado desarrollo y mejora del proyecto.
21	Ejercer su labor con agilidad, oportunidad, objetividad y rigor técnico, evitando situaciones que puedan conllevar reclamaciones por parte del Contratista de obra, generando alertas oportunas a la SDIS y al Supervisor designado, atendiendo con especial cuidado lo establecido en el numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, modificado por el parágrafo 1° del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011.	SATISFACTORIO	Se llevaron a cabo recorridos, reuniones virtuales, comités de seguimiento semanales y otras actividades conjuntas entre el contratista de obra y la interventoría, con el objetivo de abordar temas relacionados con la ejecución de la obra y el presupuesto, garantizando así el adecuado desarrollo y mejora del proyecto.
22	Realizar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones técnico, financiera, contable, administrativa, legal, social y ambiental, pactadas en el contrato de obra, procurando que se desarrollen dentro de los presupuestos de tiempo e inversión previstos originalmente, para proteger efectivamente los intereses de SDIS.	SATISFACTORIO	Se realizó entrega del informe mensual No. 1 y No. 2 en todos sus componentes, mediante radicados: CCCTC-9221-2024-0066 - INFORME TECNICO 1 INTERVENTORIA CCCTC-9221-2024-0065 - INF AMB N°1 INTERVENTORIA
23	Vigilar que las asignaciones presupuestales definidas dentro del contrato de obra se cumplan tal como fueron acordadas, caso de algún ajuste, estas deberán ser autorizado por la Subdirección de Plantas Físicas de la SDIS.	SATISFACTORIO	Se realizaron diagnósticos detallados de las actividades a ejecutar para garantizar que las asignaciones presupuestas se cumplan como fueron acordadas y las modificaciones de cantidades y actividades fueron evaluadas y autorizadas por la Subdirección de Plantas Físicas de la SDIS.
24	Facilitar el control ejercido por las veedurías ciudadanas y los organismos de control del estado, conforme a lo establecido en la	SATISFACTORIO	Fue cargada toda la documentación correspondiente a la ejecución y seguimiento del contrato en la plataforma SECOP 2 para facilitar

	Ley 850 de 2003, modificada por el Decreto Ley 403 de 2020.		el control ejercido por las veedurías ciudadanas y los organismos de control
25	Velar por el cumplimiento de las obligaciones técnico constructiva, financiera, contable, administrativa, legal, social y ambiental, establecidas para el contrato de obra, controlando que no haya interrupciones injustificadas.	SATISFACTORIO	Se realizó seguimiento al desarrollo al contrato de obra en todo el periodo mediante recorridos de obra, comités, reuniones, informes semanales, informes mensuales y demás actividades relacionadas. La evidencia de este seguimiento se encuentra en los informes mensuales y semanales entregados a la SDIS.
26	Hacer seguimiento a los trámites que deba adelantar el contratista de obra para la consecución de autorizaciones, permisos, instalaciones y/o cualquier otra actividad que sea necesaria para que la ejecución del contrato cuando aplique.	SATISFACTORIO	Se realizó acompañamiento y seguimiento para la solitud de autorizaciones de ingreso de personal y herramienta necesaria para la ejecución de las actividades de obra en las distintas sedes
27	Entregar a la SDIS, los informes y demás productos en medio físico y magnético conforme a la normatividad vigente de archivo. (Para la entrega de los documentos de archivo producidos como resultado del desarrollo de las funciones de las obligaciones de Contratistas de la SDIS, se requiere el cumplimiento de lo establecido en la Ley 594 de 2000; en lo referente a sus artículos 2, 11, 15 y 24, el Decreto 514 de 2006, Ley 1409 de 2010, los artículos 1 y 2 del Acuerdo No. 038 del 2002 del A.G.N. y los parámetros establecidos por el SIGA de la Secretaría Distrital de Integración Social.		Se realizó entrega del informe mensual No. 1 y No. 2 en todos sus componentes, mediante radicados: CCCTC-9221-2024-0066 - INFORME TECNICO 1 INTERVENTORIA CCCTC-9221-2024-0065 - INF AMB N°1 INTERVENTORIA
28	Revisar con el contratista de obra y la SDIS las condiciones jurídicas de los contratos de arrendamiento de los inmuebles en los que se requiera realizar una intervención, previo al inicio de obra.	SATISFACTORIO	Se realizaron recorridos de diagnóstico para verificar las condiciones jurídicas de los contratos de arrendamiento de los inmuebles en los que se requiera realizar una intervención,
29	Velar por que la ejecución del contrato no se interrumpa injustificadamente por parte del contratista de obra o un tercero.	SATISFACTORIO	Se ejecutaron las aprobaciones correspondientes en los tiempos establecidos para evitar interrupciones injustificadas por parte del contratista
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		**SATISFACTORIO**	**Se evidenció el cumplimiento de las obligaciones generales del contrato.**

2.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

No OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO *(Reportar el Cumplimiento cualitativo de la obligación)*	OBSERVACION
1	Presentar las garantías exigidas para la ejecución del Contrato de Interventoría, las cuales deberán	SATISFACTORIO	Se presentaron las pólizas de garantías y fueron cargadas al SECOP II dentro de los plazos establecidos.

	ser publicadas mediante el portal transaccional SECOP II, y posteriormente notificadas sobre su publicación a la Secretaría Distrital de Integración Social, para su respectiva revisión y aprobación.		
2	Presentar las hojas de vida de los profesionales del equipo mínimo requerido, para la ejecución del contrato, acorde con lo dispuesto en el pliego de condiciones, estudio previo, anexo técnico y demás documentos. El director y residente de la interventoría deberá corresponder a los mismos profesionales que fue objeto de evaluación durante el proceso de selección (en caso de haber ofertado este criterio). Si se llegase a cambiar un miembro de los profesionales evaluables; la persona que reemplazará al profesional del Personal Evaluable debe contar un perfil igual o superior a los criterios de evaluación establecidos en el proceso de selección y por el cual se otorgó puntaje. En todo caso, la Entidad se reserva el derecho de aceptarlos o no, sin perjuicio de que, en el evento de rechazarlo, deba motivar las razones objetivas y suficientes relacionadas directamente con alguna o algunas de las condiciones exigidas. En caso de incumplimiento por parte del interventor en la presentación de los soportes del personal antes indicado, en el plazo señalado, se procederá a la aplicación de las sanciones contractuales correspondientes. Es importante mencionar que la hoja de vida y soportes del director y residente de interventoría deberá aportarse nuevamente, tal y como fue presentada en la propuesta.	SATISFACTORIO	Se realizo el envió de las hojas de vidas del equipo mínimo requerido en el contrato el cual fue aprobado por la SDIS
3	Presentar discriminado el presupuesto de la interventoría y el factor multiplicador en el formato indicado por la SDIS debidamente firmado por el representante legal; teniendo presente el personal mínimo requerido, dedicaciones mínimas, plazo, otros costos y el factor multiplicador desglosado; establecidas en el anexo técnico y demás documentos que hacen parte del presente proceso. Se deberá tener en cuenta que el valor total del presupuesto de la interventoría presentada a la	SATISFACTORIO	Se entrego el presupuesto de interventoría según los requerimientos hechos por la SDIS. Oficio No. CCCTC-9221-2024-0004 Presentación presupuesto de la interventoría y el factor multiplicador

	SDIS debe ser igual al valor adjudicado.		
4	Presentar certificado de revisión y aprobación, del cumplimiento de los requisitos previos a la suscripción del acta de inicio del CONTRATO DE OBRA, de conformidad con lo definido en los pliegos de condiciones, anexo técnico estudios previos y demás documentos que hacen parte integral del proceso que dio lugar a la celebración del contrato.	SATISFACTORIO	Se presento el certificado de correspondiente y fue cargado a la plataforma del SECOP II
5	Remitir el documento de revisión y aprobación de los programas detallados para la ejecución de la obra (recurso humano, inversión del contrato), de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico del proceso	SATISFACTORIO	Se realizó revisión y aprobación a los programas detallados para la ejecución de la obra (recurso humano, inversión del contrato). Mediante los oficios No. CCCTC-9221-2024-0026 - APROBACIÓN PROGRAMACION LB1 Y FLUJO DE CAJA CCCTC-9221-2024-0025 - Aprobación Hojas de vida personal mínimo requerido Obra CCCTC-9221-2024-0024 - Aprobación con comentarios presupuestos por sede. CCCTC-9221-2024-0015 - Aprobación de pólizas contrato 9198-2024.
6	Remitir el documento de revisión y aprobación de los programas de seguridad industrial, programa del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, programa de aseguramiento de calidad y programa de manejo ambiental. De acuerdo con lo establecido en el anexo técnico del contrato objeto de la interventoría.	SATISFACTORIO	Se realizó revisión y aprobación a los programas de seguridad industrial, programa del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, programa de aseguramiento de calidad y programa de manejo ambiental mediante los oficios No. CCCTC-9221-2024-0007 - OBSERVACIONES DOCUMENTO SG-SST CONSORCIO SAN MIGUEL. CCCTC-9221-2024-0022 - Segunda revisión SG-SST Consorcio San Miguel. CCCTC-9221-2024-0034 - Aprobación SG-SST VERSION 2 CONTRATISTA SAN MIGUEL. CCCTC-9221-2024-0045 - APROBACIÓN PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS
7	Remitir el documento de revisión y aprobación de los Análisis de Precios Unitarios y listado de precios de los insumos de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico de todas las actividades incluidas en la lista de cantidades y precios de la oferta económica del contratista de obra, lo cual se debe verificar con las especificaciones técnicas, los recursos de equipo, materiales, transporte y personal que se requieren para cumplir con la estimación de la duración de la respectiva actividad indicado en el cronograma de ejecución. Es de precisar que la información detallada que hacen parte de los análisis de precios unitarios (APU), será la base para nuevos análisis de precios unitarios de acuerdo con las necesidades y dinámica del área de obras de la Subdirección de Plantas Físicas	SATISFACTORIO	Se realiza revisión y aprobación de los análisis de precios unitarios mediante el oficio No. CCCTC-9221-2024-0043, APROBACIÓN ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

	que se requieran en el desarrollo del contrato.		
8	Presentar las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral del recurso humano exigido contractualmente, y demás obligaciones de Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y de Gestión Social del personal que ingresará a la obra.	SATISFACTORIO	Se presentaron las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral del recurso humano mediante el oficio No. CCCTC-9221-2024-0049, Entrega de afiliaciones al sistema general de seguridad social integral del personal plantilla mínima requerida de Interventoría.
9	Remitir el documento de revisión y aprobación de las hojas de vida y los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia específica del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato de obra, acorde a lo dispuesto en el Pliego de Condiciones, Estudio Previo, Anexo Técnico y demás documentos del contrato objeto de la interventoría.	SATISFACTORIO	Se entrego la aprobación del personal mínimo requerido mediante el oficio No. CCCTC-9221-2024-0025, Aprobación Hojas de vida personal mínimo requerido Obra
10	Suscribir juntamente con LA SDIS y el CONTRATISTA DE OBRA el acta de inicio del contrato objeto de interventoría.	SATISFACTORIO	Se suscribió del acta de inicio el 09 de diciembre de 2024
11	Solicitar a LA SDIS, o a quien éste indique, la documentación e información necesaria para desarrollar adecuadamente la Interventoría.	SATISFACTORIO	Se solicito toda la información del contrato, manuales de interventoría, planos, especificaciones técnicas entre otros documentos necesarios para desarrollar adecuadamente la interventoría
12	Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la Interventoría a su cargo.	SATISFACTORIO	Se establecieron canales de comunicación rápida para atender recomendaciones, solicitudes, observaciones, correcciones, gestionar logística y demás actividades para el desarrollo de la interventoría.
13	Revisar y verificar toda la documentación técnica, social, legal, ambiental, seguridad industrial y económica requerida para la ejecución del proyecto, con el objeto de proponer recomendaciones para poder desarrollar el contrato de obra sin ningún contratiempo y dando cumplimiento al marco normativo que le pueda afectar.	SATISFACTORIO	Se realizó revisión de la documentación técnica, social, legal, ambiental, seguridad industrial y económica entregada por la SDIS.
14	Verificar que el personal propuesto por el CONTRATISTA DE OBRA se encuentre vinculado al mismo mediante contrato de trabajo o de prestación de servicios, así como estar afiliado y al día con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral.	SATISFACTORIO	Se realizó verificación de la afiliación del personal mínimo requerido a la empresa a cargo del contrato de obra.
15	Revisar y verificar que los amparos correspondientes a las garantías suscritas por el CONTRATISTA DE OBRA se hallen conforme a lo exigido en los términos de referencia y/o en el contrato objeto de esta interventoría, para efectos de su	SATISFACTORIO	Se realizó verificación de las pólizas entregadas por el contratista de obra, se remitió la aprobación mediante el oficio No. CCCTC-9221-2024-0015, Aprobación de pólizas contrato 9198-2024

	presentación y aprobación por parte de LA SDIS.		
16	Aprobar la metodología y programación de actividades del contrato de obra. Así mismo el Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecución de los trabajos y el flujo de inversión del contrato, presentados por parte del CONTRATISTA DE OBRA.	SATISFACTORIO	Aprobación de metodología y programación de actividades del contrato de obra mediante el oficio No. CCCTC-9221-2024-0026 - APROBACIÓN PROGRAMACION LB1 Y FLUJO DE CAJA
17	Suministrar y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecución del contrato y hasta la terminación de este, el personal ofrecido y requerido para la ejecución del objeto contractual, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas y/o profesionales y la experiencia general y específica exigidas en el anexo técnico y demás documentos que hacen parte integral del contrato.	SATISFACTORIO	Hasta el momento se a mantenido el personal mínimo requerido en el contrato de interventoría
18	Obtener la aprobación del supervisor designado por la SDIS, con antelación al cambio de profesionales o técnicos requeridos y ofrecidos. La solicitud de sustitución deberá informarse al menos cinco (05) días antes de la necesidad de retiro del profesional, para el cambio deberá remitir las justificaciones correspondientes y presentar los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades de los profesionales o técnicos, los cuales deberán cumplir con un perfil igual o superior al establecido en el anexo técnico (EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA).	SATISFACTORIO	Se obtuvo la aprobación del supervisor de los cambios del director de obra mínimo 5 días antes de la necesidad de sustitución. S2025008359 - Cambio director de Interventoría. Contrato de interventoría 9221 de 2024.
19	Suministrar la dotación a los trabajadores que ejecuten la interventoría.	SATISFACTORIO	Realizó la entrega de dotación y EPP al personal que ejecuta la interventoría de obra media
20	Marcar los uniformes del personal de Interventoría con la identidad visual del Distrito Capital, con base en el “Manual de Imagen Institucional de la Alcaldía Mayor de Bogotá”.	SATISFACTORIO	La dotación se marcó con base en el “Manual de Imagen Institucional de la Alcaldía Mayor de Bogotá”.
21	Adoptar todas las medidas de Seguridad Industrial que prevengan la ocurrencia de accidentes durante la ejecución del objeto contractual y deberá dotar a sus equipos de trabajo con los elementos de Seguridad Industrial y de protección personal necesarios para la ejecución de las labores propias del contrato, de acuerdo con la normatividad vigente. Será responsabilidad del	SATISFACTORIO	Se adoptaron las medidas de Seguridad Industrial mediante inducciones y entregas de EPP. Para garantizar la seguridad del personal que ejecuta la interventoría

	CONTRATISTA salvaguardar la seguridad de todas las personas vinculadas por él mismo a la ejecución de la obra y a los funcionarios, contratistas y ciudadanía que pueda ser afectada en cualquier actividad en desarrollo del contrato que él o sus empleados desarrolle. Los elementos de seguridad industrial serán los necesarios para el tipo de actividad que se desarrolle en cumplimiento del contrato. Así mismo, los operarios del CONTRATISTA no deberán manipular equipos ni insumos que se encuentren por fuera de los establecidos de manera específica para la ejecución del contrato. En todo caso, EL CONTRATISTA está obligado a implementar lo establecido en el Decreto del 1072 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo".		
22	Presentar para todo el personal calificado y no calificado los respectivos certificados o documentos equivalentes de acuerdo con la normatividad vigente en la materia; para así poder iniciar la ejecución de cualquiera actividad que necesite dichos certificados, durante el plazo contractual.	SATISFACTORIO	Se entregaron todos los certificados de estudios del personal mínimo requerido del contrato de interventoría.
23	Vincular y mantener un mínimo de mujeres para la ejecución del contrato, según las disposiciones del Decreto 332 de 2020, garantizando una vinculación con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. El contratista deberá presentar a la SDIS los documentos necesarios para corroborar la contratación de las mujeres durante el periodo de ejecución del contrato en los porcentajes indicados, para lo cual será válida la manifestación bimensual bajo juramento del Representante legal y del Revisor Fiscal del contratista, sin perjuicio de otros mecanismos de verificación que establezca la supervisión. Cuando el contratista en la etapa de ejecución del contrato, no vinculen o no mantengan el porcentaje mínimo de mujeres establecido en el contrato, podrán ser objeto de las multas, sanciones y demás consecuencias previstas por el incumplimiento contractual, según lo establezcan las cláusulas	SATISFACTORIO	Mas del 40% del personal de la interventoría son mujeres los cual hace cumplimiento al Decreto 332 de 2020

	sancionatorias pactadas y las normas aplicables.		
24	Garantizar el registro de las mujeres que potencialmente serán contratadas para la ejecución del contrato cumplimiento del Decreto 332 de 2020, en la plataforma de información que disponga la Agencia Pública de Empleo del Distrito "Bogotá Trabaja", con el fin de identificar barreras de empleo de las beneficiarias, y realizar su respectivo perfilamiento laboral.	NO APLICA	No fue necesario realizar el registro de las mujeres contratadas.
25	Presentar los informes semanales el primer día hábil de cada semana donde se evidencie el seguimiento al avance de obra versus a la programación inicial de cada frente, días de atraso o adelanto de la obra, pago ejecutado, plan de mejora si aplica, personal directo e indirecto que ha trabajado, seguimiento de lluvias.	SATISFACTORIO	Se realizó la entrega de los informes semanales durante el periodo correspondiente donde se evidencia se evidencie el seguimiento al avance de obra versus a la programación inicial de cada frente, días de atraso o adelanto de la obra, pago ejecutado, plan de mejora si aplica, personal directo e indirecto que ha trabajado, seguimiento de lluvias.
26	Presentar los informes mensuales a más tardar el quinto (05) día hábil del mes para la revisión y aprobación de la supervisión y/o apoyo de la supervisión del contrato de interventoría designada por la SDIS, de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico Presentar el Informe Final a más tardar dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de haber finalizado el plazo contractual. De conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico.	SATISFACTORIO	Se radicaron los informes mensuales correspondientes en los plazos establecidos.
27	Entregar dentro de los plazos requeridos por la Entidad los ajustes, revisiones, correcciones e informes antes indicados, siguiendo los lineamientos y observaciones señalados por la Entidad.	SATISFACTORIO	Se atendieron las observaciones hechas por parte de la SDIS al informe mensual No. 1 dentro de los plazos establecidos.
28	Verificar y velar que el Contratista de obra cumpla con todas las obligaciones generales y especificas relacionadas con la ejecución y cumplimiento del objeto contractual, así mismo, que cumpla con cada una de las cláusulas de su respectivo contrato.	SATISFACTORIO	Se realizó revisión y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista así como el apremio correspondiente por el incumplimientos de las mismas CCCTC-9221-2024-0038, Apremio 1 – REITERACIÓN OBLIGACIONES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
29	Estudiar y analizar oportunamente las sugerencias, reclamaciones, peticiones y consultas generas por el contratista de obra y resolver aquellas que fueren de su competencia, en atención al numeral 16 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, buscando	SATISFACTORIO	Se realizó revisión y seguimiento constante a las sugerencias, reclamaciones, peticiones y consultas generas por el contratista de obra dentro de los plazos establecidos por la ley.

	solucionar juntamente con el contratista los problemas que puedan afectar la adecuada ejecución del contrato. Las respuestas generadas por la interventoría deberán estar debidamente soportadas y documentadas para la resolución final de las mismas y deberá dar traslado a la SDIS, únicamente, de las reclamaciones y consultas que a este le competan, junto con el informe y recomendaciones que correspondan.		
30	Realizar y suscribir el acta de terminación, recibo a satisfacción y acta de liquidación del contrato de obra, dentro de los plazos contemplados en la ley dando cumplimiento a los requisitos exigidos para el efecto.	NO APLICA	A la fecha no ha sido necesario suscribir el acta de terminación, recibo a satisfacción y acta de liquidación del contrato de obra
31	Revisar y aprobar los informes mensuales y final del contrato de obra de conformidad con las obligaciones contractuales del contrato objeto de interventoría. Además, deberá realizar las observaciones a estos informes de obra, e informar al contratista de obras para las respectivas correcciones y/o ajustes de estos informes, si a ello hubiere lugar; teniendo en cuenta los lineamientos y procedimientos vigentes establecidos por la SDIS.	SATISFACTORIO	Se hizo revisión, observaciones, seguimiento y aprobación del informe No 1 del contrato de obra. CCCTC-9221-2024-0067 - INFORME TECNICO 1 CONTRATISTA
32	Verificar que el contratista de obra realice el pago de los salarios y prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal de cada uno de ellos.	SATISFACTORIO	Se realizó la verificación del pago de los salarios, prestaciones e in indemnizaciones de carácter laboral del personal vinculado al contrato de obra.
33	Verificar el cumplimiento del pago de mano de obra de las labores realizadas con su respectivo paz y salvo firmado por quien realizó dichos trabajos igualmente deberá verificar el pago de honorarios, impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género, que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato.	NO APLICA	No ha sido necesario la verificación del pago de la mano de obra y paz y salvos ya que a la fecha no se han finalizados trabajos por parte del personal operativo, ni administrativo.
34	Acopiar de manera ordenada en medios físico y magnético, la documentación producida en la ejecución del proyecto, de tal manera que la SDIS tenga acceso a la misma en cualquier momento.	SATISFACTORIO	Se tienen los documentos en medio magnético y físico correspondientes a la ejecución del proyecto, estos fueron anexados en los informes mensuales
35	Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el contratista de obra, durante el desarrollo del contrato, de tal forma que la SDIS cuente con los insumos para intervenir	SATISFACTORIO	Se realizó control de la correspondencia entre el contratista de obra, la SDIS y la interventoría, Esta se anexo en los informes mensuales correspondientes

	oportunamente frente a las solicitudes presentadas.		
36	Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relación con el desarrollo del proyecto.	N/A	No se han presentado solicitudes y/o peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relación con el desarrollo del proyecto.
37	Realizar la verificación, seguimiento y control al contratista de obra dentro del cronograma de ejecución del contrato, con los ofrecimientos que acreditó en su propuesta, los cuales fueron objeto de puntuación adicional en la oferta presentada, además, hacer seguimiento al contratista de obra en el cumplimiento de lo relacionado con el artículo 2.2.1.2.4.2.7. del Decreto Nacional 1082 de 2015; en caso contrario, dará lugar a las consecuencias previstas en el contrato y en las normas aplicables, cualquier modificación del cronograma deberá ser concertada con la entidad y se deberá actualizar a la mayor brevedad, incluyendo las actividades mediante las cuales el contratista de obra cumplirá con la fecha de finalización y entrega de la obra de forma satisfactoria.	SATISFACTORIO	Se realizó seguimiento a la programación entregada, dicho seguimiento se evidencia dentro de los informes semanales, mensuales y comités de obra.
38	Conocer y hacer cumplir las especificaciones técnicas de su competencia contenidas en el proceso de selección del contrato de obra y en general, estudiar de manera integral los documentos e información que dieron origen al contrato objeto de Interventoría, con el propósito de establecer criterios claros y precisos sobre el alcance del contrato, que le permitan adelantar con efectividad las labores encomendadas, solicitando a la SDIS, las aclaraciones del caso, con el objeto de proponer recomendaciones para poder desarrollar el contrato de obra sin ningún contratiempo.	SATISFACTORIO	Se realizó revisión de las especificaciones técnicas correspondientes al contrato.
39	Dar aval a complementos y justificaciones técnicas de toda adecuación, ajuste y/o modificación de estudios técnicos y/o especificaciones de construcción necesarias para el cumplimiento del objeto contractual que realice el contratista en la ejecución de la obra.	SATISFACTORIO	Se emitieron conceptos técnicos a los análisis de precios unitarios de los ítems no previstos, Así como visita de parte de los especialistas para dar su concepto en la ejecución de actividades especificas del contrato.
40	Requerir, revisar y aprobar al contratista de obras, los planes de contingencias del cronograma de obras aprobado, si llegasen a	SATISFACTORIO	Se realizó petición y seguimiento al plan de contingencia y se evidencia mediante el oficio No. CCCTC-9221-2024-0056 - R CSM No. 041 -

	presentar retrasos significativos hasta el 4,9% en la ejecución de la obra, que impactan los plazos del contrato de obra, dicha revisión deberá incluir los cuadros de rendimiento de la maquinaria empleada y el cumplimiento de las cuadrillas de personal necesarias para cumplir con el cronograma. Vencido el plazo sin la presentación del plan de contingencia, se procederá a adelantar la actuación contractual sancionatoria. La interventoría en control y seguimiento a la ejecución de las actividades de la obra deberá implementar en su monitoreo la técnica del valor ganado para evaluar la magnitud de las desviaciones en tiempo y costo durante el desarrollo del contrato.		Reiteración solicitud plan de contingencia y información actualizada del contrato
41	Convocar reuniones de seguimiento y visitas de campo, proponiendo alternativas, generando soluciones y demás acciones para el buen desarrollo del proyecto. Suscribir las actas correspondientes a dichas reuniones.	SATISFACTORIO	Se realizaron comités de obra, reuniones virtuales, recorridos de obra, visita de especialistas en campo para para generar alternativas, generando soluciones y demás acciones para el buen desarrollo del proyecto. Dichas revisiones quedaron evidenciadas en actas y las bitácoras de obra.
42	Dar acompañamiento o conceptos técnicos al contratista de obra para el normal desarrollo del contrato, en caso de requerirse.	SATISFACTORIO	Se realizó revisión y seguimiento a los conceptos técnicos entregados por el contratista de obra.
43	Verificar que el contratista de obra, en caso de requerir ejecutar demoliciones en la obra, tome las medidas de seguridad necesarias para garantizar que no se ponga en riesgo al personal o personas del servicio o beneficiarios. En caso que se evidencie el incumplimiento, se tomen las acciones jurídicas correspondientes., lo cual se deberá verificar que haya sido señalado en el plan de seguridad industrial y salud en el trabajo.	SATISFACTORIO	Se tomaron las medidas de seguridad industrial correspondientes y de acuerdo al programa de seguridad y salud en el trabajo entregado por el contratista de obra.
44	Verificar en la obra, el suministro de todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos, cumpliendo con las fechas indicadas en la programación detallada aprobada.	SATISFACTORIO	Se realizó seguimiento y verificación a la calidad de los materiales utilizados por el contratista de obra.
45	Exigir al contratista de obra el cambio de procedimientos o equipos y la disposición de medidas que considere necesarias por razones de seguridad, riesgo de perjuicios o para garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta ejecución contractual.	SATISFACTORIO	Se realizaron recomendaciones y observaciones a los procedimientos de ejecución del contrato con el fin de garantizar la calidad y seguridad durante las actividades de obra.

46	Verificar que el contratista de obra mantenga calibrados los equipos necesarios para la ejecución del contrato de obra, según los lineamientos vigentes y a reportar los soportes del estado de los equipos en la ejecución del contrato de obra cuando el Interventor así lo requiera. Así mismo, se obliga a verificar las certificaciones de calidad de los materiales a usar en las obras a ejecutar, entregadas por el contratista de obra, en cumplimiento de la Ley 1480 de 2011, cuando ello aplique.	SATISFACTORIO	Verificación de los andamios utilizados por el contratista de obra, los EPC y demás necesarios para la ejecución de trabajo en alturas, trabajo en caliente y otras actividades de alto riesgo.
47	Impartir instrucciones sobre los trabajos de campo y control de calidad (toma de muestras, ensayos de laboratorio, etc.) y de oficina (análisis y complementación de información, sistematización, simulación) y demás observaciones que al respecto juzgue pertinentes y conceptuar sobre la interpretación de pruebas, ensayos y demás aspectos de control de la ejecución de la obra con apego a la normatividad vigente.	NO APLICA	A la fecha no ha sido necesario solicitar ensayos de calidad,
48	Verificar y velar en cumplimiento a la normatividad aplicable de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) vigente, que los equipos y/o herramientas requeridas para la ejecución de todas las actividades contractuales y las no previstas en el contrato, sean certificados.	SATISFACTORIO	Verificación de los andamios utilizados por el contratista de obra, los EPC y demás necesarios para la ejecución de trabajo en alturas, trabajo en caliente y otras actividades de alto riesgo.
49	Revisar, conceptuar y avalar las diferentes solicitudes de modificación del contrato de obra tales como: adición de recursos, prorrogas, mayores cantidades de obra e ítems no previstos necesarios para la ejecución de la Obra, cuando así se requiera. Posteriormente, dar traslado a la entidad con el fin de que la misma adelante el proceso de modificación contractual pertinente.	SATISFACTORIO	Se realizó seguimiento y aprobación a la solicitud de prorroga hecha por el contrato de obra. Mediante el oficio No. CCCTC-9221-2024-0003 - Aprobación de Solicitud de Prórroga No. 1 para el Contrato No. 9198-2024 y solicitud prorroga No. 1 para el contrato No. 9221-2024
20	Exigir al contratista de obra la disponibilidad de recursos de personal, materiales y equipos, de acuerdo con el pliego de condiciones, la propuesta presentada, el contrato suscrito y las especificaciones técnicas acordadas en el proceso de selección.	SATISFACTORIO	Se realizó seguimiento a la disponibilidad de recursos de personal, materiales y equipos, de acuerdo con el pliego de condiciones
51	Garantizar que el personal de obra e interventoría relacionado en el anexo técnico y demás documentos que hacen parte de los procesos de selección cumplan con los porcentajes de	SATISFACTORIO	Se verifico que el personal de obra e interventoría relacionado en el anexo técnico y demás documentos que hacen parte de los procesos de selección cumplieran con la dedicación requerida.

	dedicación estipulados en proceso de selección.		
52	Cumplir que el personal de la interventoría relacionado en el anexo técnico y demás documentos que hacen parte del proceso sea idóneo para la labor a desarrollar y que cuente con los implementos de seguridad industrial, en cumplimiento de la normatividad vigente en la materia.	SATISFACTORIO	Se presento el personal de interventoría que cumple con la experiencia solicitada por el anexo técnico. Además, la entrega de la dotación, EPP, EPC e inducciones correspondientes.
53	Verificar y velar en cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del contrato, especialmente en los elementos de Seguridad Industrial, uniforme y carné necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades de obra, manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual, dotación de calzado y vestido de labor y documento de identificación para todo el personal utilizado en la ejecución de la obra.	SATISFACTORIO	Se realizó la entrega de la dotación, EPP, EPC e inducciones correspondientes. Al personal vinculado a la interventoría.
54	Realizar las reuniones con el contratista de obra del contrato, con el fin de verificar el desarrollo de este y firmar las actas que documenten el estado de éste.	SATISFACTORIO	Se realizaron los comités de obra y mesas de trabajo para revisar avance y temas correspondientes a la ejecución del contrato.
55	Asistir y convocar a las reuniones que se celebren en el sitio de ejecución de las obras o en las instalaciones de la SDIS relacionadas con los trabajos objeto de la Interventoría y elaborar y suscribir las actas correspondientes, garantizando que las mismas sean suscritas por todas las personas que hayan intervenido.	SATISFACTORIO	Se realizaron los comités de obra y mesas de trabajo para revisar avance y temas correspondientes a la ejecución del contrato.
56	Velar por el cumplimiento de las normas técnicas vigentes, especificaciones, procedimientos, cálculos e instrucciones para la construcción y las actividades, objeto del contrato de obra.	SATISFACTORIO	Se realizaron observaciones, conceptos técnicos y seguimiento en obra a los procesos contractivos de las actividades ejecutadas
57	Llevar un registro del avance de la ejecución del contrato de obra, del personal y de los equipos empleados en cada frente de trabajo activo los cuales deben ser mínimo 8 y otros aspectos relevantes de la ejecución del contrato.	SATISFACTORIO	Se realiza registro mediante la bitácora de obra y reporte diario por medio de canales de comunicación rápida con la SDIS
58	Suscribir con el contratista de obra una bitácora para registrar las actividades programadas, en la cual se llevará una memoria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en	SATISFACTORIO	Se realiza el registro diario en las bitácoras de cada uno de los frentes de obra, en donde se describen las actividades ejecutadas, el personal presente en la sede y el estado del tiempo

	la ejecución de los trabajos, de igual manera se deberá registrar la visita de funcionarios que tengan relación con la ejecución del proceso. Lo anterior deberá firmarse por el director de la interventoría y debe encontrarse debidamente foliada. En caso de que se realicen actividades, acontecimientos, sucesos y decisiones relacionadas con adecuaciones, complementación, ajuste y/o del alcance de las intervenciones, las mismas también deben registrarse en la bitácora. Al finalizar los trabajos, en su informe final, el interventor deberá entregar como anexo este documento, el cual debe permitir la comprensión general y el desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión aprobada. La interventoría será responsable de la custodia en físico de la bitácora.		
59	Velar por el cumplimiento de los compromisos que se hubiesen acordado o se hayan dejado registrados en la Bitácora, debiendo formular los requerimientos pertinentes y teniendo el deber de informar a la entidad en caso de que exista un evidente incumplimiento de éstos por parte del contratista ejecutor de la obra.	SATISFACTORIO	Se registran las observaciones y solicitudes al contratista de obra en las bitácoras de obra en cada sede
60	Revisar y aprobar las modificaciones y actualizaciones del programa completo de servicio de seguridad industrial, quien podrá además ordenar cualquier otra medida adicional que considere necesaria para la seguridad del personal de obra o servicio y los transeúntes, de acuerdo con las reglas vigentes en el país. Además, la interventoría deberá aprobar la persona que designe EL CONTRATISTA para velar por el cumplimiento de dichas medidas, de acuerdo con dichas normas vigentes.	No aplica.	No se realizaron modificaciones al programa de servicio de seguridad industrial,
61	Estudiar y conceptuar acerca de los procedimientos y procesos constructivos que proponga el contratista de obra y, si fuera el caso, sugerirá u ordenará los cambios que considere necesarios o convenientes para el buen desarrollo de los trabajos, previa aprobación de la SDIS. Es pertinente aclarar que es responsabilidad del interventor	SATISFACTORIO	Se realizaron observaciones, solicitudes, evaluación de los conceptos técnicos entregados por el contratista y demás revisiones correspondientes a los procedimientos y procesos constructivos propuestos por el contratista.

	emitir conceptos técnicos constructivos.		
62	Informar a la entidad para que se adopten las medidas correctivas correspondientes incluyendo la posibilidad de adelantar actuaciones administrativas contractuales sancionatorias por la negativa por parte del contratista a adoptar los ajustes técnicos en la ejecución de la obra la suspensión temporal o definitiva de las operaciones o procedimientos utilizados por el contratista de obra, que a juicio de la interventoría resulten inaceptables o representen un grave riesgo para los trabajos o incumplimiento sistemático de los requisitos generales de seguridad o de las instrucciones del interventor a ese respecto para el contratista, para la SDIS o para terceros, sin que el contratista de obras tenga derecho a reclamo o a la ampliación del plazo de ejecución.	No aplica	No se hizo necesario adelantar actuaciones administrativas contractuales sancionatorias por la negativa por parte del contratista a adoptar los ajustes técnicos en la ejecución de la obra la suspensión temporal o definitiva de las operaciones o procedimientos utilizados por el contratista de obra
63	Exigir y verificar que el personal del contratista de obra cumpla con el reglamento de seguridad para protección en trabajo en alturas, establecido en la Resolución 1409 de 2012 del Ministerio de Trabajo, modificada por la Resolución 3368 de 12 de agosto de 2014 o las normas vigentes para el mismo efecto.	SATISFACTORIO	Se realizó revisión y aprobación del personal del contratista de obra que realizará trabajo en alturas durante la ejecución del contrato.
64	Exigir y verificar que el contratista de obra cumpla lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 962 de 2005 y la normatividad vigente, en lo referente a las condiciones de Higiene y Seguridad y además cumpla lo dispuesto en la Ley 52 de 1993, por medio de la cual se aprueban el “Convenio No. 167 y la Recomendación No. 175 y la normatividad vigente, sobre Seguridad y Salud en la Construcción o las normas vigentes para el mismo efecto.	SATISFACTORIO	Se realiza verificación del cumplimiento de la ley 962 de 2005 mediante el programa de SG-SST presentado por el contratista de obra.
65	Conocer y hacer cumplir lo establecido en los Lineamientos y Estándares Técnicos para cada uno de los servicios de la SDIS.	SATISFACTORIO	Se hizo seguimiento a los procesos constructivos a las actividades ejecutadas dentro de este periodo, así como las observaciones, conceptos técnicos y acompañamientos para garantizar las especificaciones técnicas suministradas por la SDIS
66	Analizar en caso de requerirse labores o actividades no previstas y/o adicionales, su aprobación estará a cargo de la Interventoría, por lo tanto, esta deberá entregar los soportes y la solicitud correspondiente para gestionar dicha modificación, prórroga o adición al contrato. En ningún	SATISFACTORIO	Se realizó revisión y aprobación de los ítems no previstos dentro de los plazos establecidos por la SDIS. CCCTC-9221-2024-0058, Aprobación de Solicitud de Prórroga No. 2 e inclusión no previstos para el Contrato No. 9198-2024

	caso el Interventor podrá bajo su propio criterio, autorizar la realización de obras adicionales o suministros de mayores cantidades, sin previa autorización del Ordenador del Gasto.		
67	Presentar de manera conjunta con el contratista de obra ante la SDIS con antelación mínima de diez (10) días hábiles, a la fecha prevista de ejecución de los ítems, los Análisis de Precios Unitarios (APU) de los ítems no previstos, junto con las actas de aprobación de estos y debidamente suscritos por ambas partes teniendo en cuenta el procedimiento o lineamiento vigente en la Secretaría, y contemplando en su presentación los tiempos necesarios para no impactar el cronograma contractual. Adicionalmente, deberá analizar y aprobar los nuevos análisis de precios unitarios de las actividades o ítems no previstos, junto con las especificaciones y justificaciones técnicas respectivas para la ejecución de la obra de acuerdo con el lineamiento o procedimiento vigente de la SDIS, previos a la radicación en la SDIS.	SATISFACTORIO	Se presento la aprobación de los ítems no previstos dentro de los plazos establecidos por la SDIS. CCCTC-9221-2024-0058, Aprobación de Solicitud de Prórroga No. 2 e inclusión no previstos para el Contrato No. 9198-2024
68	Revisar y avalar los soportes de los imprevistos presentados por el contratista de obra, de acuerdo con lo manifestado en la oferta económica presentada a la SDIS.	No aplica	No se han presentando imprevistos significativos.
69	Aprobar la totalidad de los recursos ejecutados que estén a cargo del contratista de obra, sin excepción; por lo anterior, el pago de imprevistos del AIU, cuando a ello haya lugar, deben ser acreditados por el contratista de obra previo al pago mensual junto con la presentación del acta de recibo del informe mensual ejecutada por el Contratista de obra, en todo caso antes de la liquidación del contrato de obra.	SATISFACTORIO	Se verifico y aprobó las memorias de cálculo, pre actas y acta de cobro presentada por el contratista de obra.
70	Exigir la ejecución de acciones correctivas de las actividades y/o de aquellas que fueron indebidamente ejecutadas, para que el contratista, a su costa, las ejecute adecuadamente, sin derecho a remuneración distinta a la que se hubiere pactado.	SATISFACTORIO	Se realizaron observaciones a algunas actividades que no se ejecutaron de manera adecuada solicitando su corrección inmediata, Los registros fueron hechos en la bitácora de obra y medios de comunicación rápida
71	Realizar todas las observaciones técnicas y administrativas en cuanto a calidad, presupuesto, programación, seguridad industrial y manejo ambiental de	SATISFACTORIO	Se hizo seguimiento a la calidad, presupuesto, programación, seguridad industrial y manejo ambiental de la obra y manejo de personal. Mediante la bitácora de obra, oficios y medios de comunicación rápida.

	la obra y en especial de manejo de personal.		
72	Controlar permanentemente la entrega de los suministros a cargo del contratista, velando por su oportuna disposición en obra y por el cumplimiento de las especificaciones técnicas. Para el efecto, el interventor podrá rechazar los suministros que no cumplan con las especificaciones técnicas y de calidad.	SATISFACTORIO	Se verificó el cumplimiento de las especificaciones del material suministrado por el contratista, solicitando en obra las fichas técnicas correspondientes
73	Impartir por escrito todas las instrucciones, órdenes y autorizaciones que se requieran para el desarrollo de las obras reportadas por el contratista de obra y/o el supervisor designado por la SDIS para el contrato.	SATISFACTORIO	Se realizaron las solicitudes, observaciones y/o instrucciones mediante la bitácora de obra, conceptos técnicos por medio electrónico y medios de comunicación rápida**.**
74	Realizar un seguimiento diario a la programación con el fin de no tener retrasos en la ejecución de cada una de las actividades de obras contratadas.	SATISFACTORIO	Se realiza seguimiento a la programación de obra, dejando reporte de las actividades diarias dentro de las bitácoras y canales de comunicación rápida,
75	Controlar las cantidades ejecutadas por el contratista, que serán la base de las actas de recibo parcial, la cuales se remitirán al área respectiva de la SDIS junto con el informe mensual establecido en el numeral anterior.	SATISFACTORIO	Se realizó medición de las cantidades de obra ejecutadas por el contratista de obra, así como mesas de trabajo para conciliación de cantidades ejecutadas.
76	Verificar las actividades durante la ejecución del contrato de obra y una vez terminadas las mismas verificar el estado en que se encuentra y si es procedente recibir la obra para ser entregada a la SDIS.	SATISFACTORIO	Se realizaron las revisiones de los trabajos, así como las observaciones a los mismos informados mediante la bitácora de obra y medios de comunicación rápida.
77	Garantizar que previo a la terminación de cada uno de los frentes de obra, el contratista establezca los mecanismos necesarios para que se cumpla con los detalles de acabados, garantías y aseo final, que correspondan a las actividades desarrolladas en el objeto contractual. Así mismo deberá verificar que se cumplan las buenas condiciones de aseo y seguridad de cada una de las áreas objeto de la obra, teniendo en cuenta lo indicado en el plan de manejo ambiental.	SATISFACTORIO	Se han realizado revisiones previas a la entrega parcial de los espacios de las unidades operativas para garantizar los detalles de acabados, garantías y aseo final.
78	Revisar y aprobar las hojas de vida y soportes del personal que intervendrá en la ejecución del contrato de obra, así como la de aquel que reemplace o releve al existente, de conformidad con las condiciones exigidas en el pliego de condiciones y demás documentos del proceso de selección del contratista de obra, Para estos efectos, emitirá	SATISFACTORIO	Se realiza revisión y aprobación del personal operativo del contratista de obra.

	concepto que será enviado al supervisor designado por la SDIS, para el contrato de interventoría.		
79	Participar y asegurar su asistencia y la del Contratista de obra, en las socializaciones que la SDIS programe con la comunidad involucrada antes de iniciar la ejecución de la obra física o durante la ejecución de esta, para recoger las inquietudes y expectativas de la comunidad y los interesados del proyecto, para evitar retrasos en desarrollo de la construcción del proyecto, de las cuales deberá levantar las correspondientes actas.	SATISFACTORIO	Se asistió junto con el contratista de obra a las reuniones de socialización del alcance del contrato en cada unidad operativa de la SDIS.
80	Verificar y establecer en conjunto con la supervisión de la SDIS, un sistema de medición de los consumos atribuibles al contratista de obra, por concepto de servicios públicos utilizados en la ejecución de la obra, cuyo valor será descontado de la liquidación del contrato. Lo anterior, es requisito previo para la suscripción del acta de liquidación del contrato de obra.	SATISFACTORIO	Se acordó en conjunto que la medición de gastos de servicios públicos será hecha por la coordinación de las unidades operativas y será entregado al contratista para su respectivo pago.
	Vigilar el cumplimiento de la entrega los soportes o productos documentales (planos récord, manual de equipamientos, manuales de mantenimientos de los sistemas de hidráulicos-sanitarios, eléctricos, detección de incendio, bomberos, etc.; el directorio de obras, inventario de maquinaria y equipos instalados, inventarios por espacios, servicios públicos, original de la bitácora de obra, control de asentamientos, compilación de catálogos de equipos e inventarios y gabinetes de llaves), para lo cual la entidad determinó desarrollar el proceso de entrega y recibo del contrato de obra. Lo anterior, es previo requisito para la elaboración del acta de entrega y recibo final de obra y del acta de liquidación.	NO APLICA	No ha sido necesario la entrega de dichos documentos ya que el contrato sigue en proceso de ejecución.
81	Revisar, aprobar y/o desaprobar y autorizar la facturación que presente el contratista de obra. Para esta actividad deberá verificar que lo cobrado corresponda a las actividades efectivas y debidamente desarrolladas en las calidades y cantidades exigidas.	SATISFACTORIO	Se realizó la aprobación del corte de obra, acta de cobro, factura y demás documentos correspondientes para el pago del contratista de obra.
82	Presentar oportunamente la factura electrónica, el informe mensual y los documentos complementarios y necesarios, según la forma de pago	SATISFACTORIO	Se presento dentro de los plazos establecidos factura electrónica, el informe mensual y los documentos complementarios y necesarios, según la forma de pago establecida en el Pliego de Condiciones

	establecida en el Pliego de Condiciones y en el Contrato, dando cumplimiento al PAC programado, de acuerdo con las fechas indicadas por la Entidad. En este mismo sentido, ajustar y efectuar las correcciones de los documentos solicitados por la Entidad, siendo su responsabilidad el plazo que demore en realizar las correcciones requeridas y la nueva radicación.		
83	Revisar, verificar y aprobar por escrito todas las órdenes y autorizaciones que impliquen gastos del valor del contrato y que se requieran para el desarrollo de las obras.	SATISFACTORIO	Revisión de las cantidades de obra, actas de cobro correspondientes a la ejecución del contrato de obra.
84	Presentar documentos de cuentas de cobro, informes, y demás documentos solicitados por la SDIS en los formatos y procedimientos establecidos por la Entidad, de conformidad con los valores ejecutados y la Forma de pago establecida en el contrato de obra, debiendo informar a la entidad sobre cualquier irregularidad que se presente en su manejo.	SATISFACTORIO	Se realizó la aprobación del corte de obra, acta de cobro y demás documentos correspondientes para el pago del contratista de obra.
85	Presentar cuando el supervisor lo requiera, un valor proyectado de las actividades a realizar por el contratista en los siguientes meses; lo anterior con el fin de realizar la programación en el PAC (Programa anual de caja), exigiendo el cumplimiento del PAC por parte del contratista de obra, lo cual debe corresponder al plan de inversión del contrato presentado al inicio del contrato.	SATISFACTORIO	Se entrego el flujo de caja aprobado al contratista de obra,
86	Verificar las Facturas o documentos equivalentes presentados por el contratista de obra. El interventor verificará que las facturas o documentos equivalentes que sean presentadas por el contratista de obra correspondan en valor a la ejecución y Forma de pago establecida en el contrato. De haber inconsistencias o errores, se deberá solicitar al contratista el cambio de dicho documento, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción, informando claramente los errores o inconsistencias, para que el contratista realice la corrección correspondiente. Por su parte el contratista deberá realizar las correcciones dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación por	SATISFACTORIO	Se realizó la verificación correspondiente al corte de obra para la aprobación del pago del contrato de obra.

	parte del Interventor. Una vez verificada por parte del Interventor el documento corregido, iniciará el trámite para pago, se contará el término de pago a partir de este momento. El Interventor deberá verificar el cumplimiento de los pagos a los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales del contratista de obra, previo a la aprobación para el trámite de pago.		
87	Aprobar los pagos del contratista, de acuerdo con la correcta ejecución del contrato.	SATISFACTORIO	Se realizó la aprobación del corte de obra, acta de cobro y demás documentos correspondientes para el pago del contratista de obra.
88	Mantener actualizado el registro de los pagos.	NO APLICA	No se ha realizado ningún pago.
89	Elaborar los documentos de justificación, evaluación al contratista de obra debidamente diligenciados y soportados por la presente Interventoría para proceder a la aprobación por parte de la SDIS, relacionados con la viabilidad o no del pago del corte de obra mensual, de las solicitudes de modificación, adición, suspensión, reiniciación o liquidación del contrato de obra.	SATISFACTORIO	Se realizó diligenciamiento del documento "FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA" para dar viabilidad al pago del corte de obra.
90	Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure o impulse el personal o los subcontratistas contra la SDIS, por causa o con ocasión del contrato.	NO APLICA	No se han hecho cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure o impulse el personal o los subcontratistas contra la SDIS
91	Consultar de manera oportuna con la SDIS, cualquier inquietud que se presenten en relación con la ejecución del contrato, en el marco del documento "Manual de Contratación y Supervisión" o el documento que haga sus veces y demás documentos vigentes expedidos por la SDIS para el adecuado seguimiento y supervisión de los contratos. Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicación de incumplimientos, sanciones contractuales y requerimientos al contratista de obra. El interventor, antes de la solicitud de aplicación de incumplimientos y sanciones contractuales, deberá seguir el siguiente procedimiento previo: 1) Requerir a los contratistas para exponer las razones por las cuales se presenta un presunto incumplimiento, otorgándole un plazo no mayor a cinco días calendario de lo cual dejará constancia con los respectivos soportes a que haya lugar, velando por que sus acciones sean oportunas y eficaces. 2) En	NO APLICA	No se realizaron consultas a la SDIS en relación con el manual de contratación y supervisión.

	caso de que persista el incumplimiento, sin que se evidencia paralización del servicio, elaborar el Plan de Mejoramiento acompañado de todo el soporte documental respectivo. En todo caso el interventor deberá dar estricto cumplimiento al "Manual de Supervisión y/o Interventoría" o documento equivalente de la SDIS y a la metodología que durante el plazo de ejecución del contrato establezca la Oficina Jurídica sobre el particular.		
92	3. Mantener indemne a la Secretaría Distrital de Integración Social de los reclamos, demandas, acciones legales y costos que surjan en la ejecución del contrato. En caso de que se intente una acción o se presente una reclamación contra la Secretaría Distrital de Integración Social, por la cual deba responder el Contratista, aquella procederá a notificarle a la mayor brevedad para que el Contratista adopte bajo su propia costa todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios a la SDIS. Si EL CONTRATISTA no logra resolver la controversia en el plazo que fije la SDIS, la misma podrá resolverla directamente en cuyo caso el Contratista asumirá todos los costos en que se incurra por tal motivo.	NO APLICA.	No se han presentado reclamos, demandas, o acciones legales
93	Elaborar los informes que correspondan para que la SDIS adelante los procesos por presunto incumplimiento del contratista de obra cuando el atraso en la programación de ejecución de la obra supere el cinco por ciento (5%), informando a la Entidad. La interventoría en control y seguimiento a la ejecución de las actividades de la obra deberá implementar en su monitoreo la técnica del valor ganado para evaluar la magnitud de las desviaciones en tiempo y costo durante el desarrollo del contrato.	NO APLICA.	No se han presentado incumplimiento del contratista de obra.
94	Mantener informada a la SDIS, al Supervisor y/o apoyo de la supervisión designado, de manera continua, oportuna y periódica, sobre el avance presentado en el desarrollo del proyecto, sobre resultados que permiten tomar correctivos y mejorar las condiciones del proyecto, además de los hechos o circunstancias que constituyan	SATISFACTORIO	Se han entregado informes diarios, semanales y mensuales correspondientes a la ejecución del contrato de obra.

	riesgo para el mismo, que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando tal incumplimiento se presente.		
95	Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al supervisor y/o apoyo de la supervisión del contrato designado por la SDIS y recomendar la actuación que debe proceder, inmediatamente tenga conocimiento de ellas, siempre que afecte la adecuada ejecución del contrato.	NO APLICA.	No se han presentado situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del contrato.
96	Elaborar los documentos y presentar los informes que le sean requeridos en caso de que se interponga en contra de la SDIS alguna acción administrativa, policial o judicial, incluida información que resulte necesaria en caso de la solicitud de convocatoria del tribunal de arbitramento o requerimientos formulados por los organismos de control del Estado, que guarde relación con la celebración, ejecución o liquidación del contrato.	NO APLICA.	No se ha interpuesto ninguna acción administrativa policial o judicial en contra de la SDIS.
97	Mantener vigentes las garantías exigidas por el tiempo establecido en el Estudio Previo, Anexo Técnico, Pliego de Condiciones y cualquier otro documento que haga parte integral del contrato o que por norma, decreto o ley se requiera, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución de este. Las garantías deberán ser actualizadas cada vez que se realice un modificatorio del contrato (suspensión, reinicio, adición y/o prórroga) o en caso de que se afecten los montos amparados por la imposición de sanciones y/o declaratorias de siniestro por parte de la Entidad en un término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la ocurrencia de cualquiera de las situaciones indicadas.	SATISFACTORIO	Se entregaron las pólizas de amparo al contrato de interventoría, así como las correspondientes a la prorroga del contrato.
98	Exigir, garantizar y hacer seguimiento para que el contratista de obra, al cual se ejerce la interventoría, entregue a la Entidad las garantías correspondientes a las modificaciones contractuales o las que haya a lugar, en los plazos indicados por la entidad.	SATISFACTORIO	Se solicito y se hizo seguimiento de las modificaciones contractuales como la prorroga del contrato y la inclusión de los ítems No previstos.

99	Verificar permanentemente el cumplimiento de los plazos y montos asegurados de las pólizas de garantía o garantías bancarias, según sea el caso, y solicitar su modificación, de ser necesario. Del vencimiento de las garantías deberá informar a la Subdirección de Contratación de la SDIS con una anticipación nunca inferior a diez (10) días hábiles.	SATISFACTORIO	Se realizó seguimiento a las pólizas de amparo al contrato de obra, así como la aprobación de las pólizas de la prorroga
100	Elaborar el informe de posible incumplimiento para la imposición de multas o efectividad de la cláusula penal pecuniaria o declaratoria de caducidad, según se reúnan los presupuestos y requisitos según el caso, en oportunidad y teniendo en cuenta los lineamientos y parámetros institucionales que maneja la Secretaría a fin de que ésta pueda adelantar la audiencia de que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Para ello, deberá prestar toda la colaboración en desarrollo de la precitada audiencia incluyendo la valoración técnica, financiera, administrativas, jurídicas y económicas que se ordenen y acompañando a la entidad en el desarrollo de las sesiones a las cuales deberá asistir el director general y/o quien haga sus veces junto con el personal técnico necesario.	NO APLICA	No se han evidenciado incumplimientos que ameriten multas o efectividad de la cláusula penal pecuniaria o declaratoria de caducidad
101	Evaluar, en caso de cualquier incumplimiento del contrato, el tipo y magnitud de la falla, retraso, omisión, exceso y en general, del desconocimiento del contratista del contenido de las obligaciones para así, determinar si las falencias del contratista revisten tal nivel de gravedad que configura un incumplimiento que afecta de forma directa el objeto (medidas apremiantes o sancionatorias) del contrato o si las dificultades son menores y pueden mejorarse en el corto plazo con la implementación de correctivos, a fin de no agravar las condiciones de ejecución del contrato (medidas correctivas o de administración). Le concurre la responsabilidad al interventor de efectuar oportunamente los requerimientos o remitir al contratista las recomendaciones, instrucciones o sugerencias encaminadas a garantizar el cumplimiento del objeto contractual y enviar al Supervisor de la SDIS el respaldo	SATISFACTORIO	Se realizó apremio solicitando el cumplimiento de las obligaciones al contratista de obra.

	documental que evidencie la medida correctiva o de administración adoptada (compromisos, visitas, planes de mejoramiento, actas de reuniones).		
102	Remitir a la Compañía Aseguradora, copia de las comunicaciones que se produzcan en el contexto de cualquier medida correctiva o de administración, con el objetivo de poner en su conocimiento los hechos constitutivos de las medidas adoptadas y que puedan redundar en la alteración del estado del riesgo asegurado. Es importante contar con el registro de recibido de la comunicación por parte de la compañía Aseguradora y enviar al supervisor copia de este registro.	NO APLICA.	No se han aplicado medidas correctivas durante este periodo.
103	14. Informar de manera oportuna sobre cualquier situación que pueda llegar a implicar una modificación contractual.	SATISFACTORIO	Se comunico oportunamente la solicitudes de prorroga y de inclusión de ítems no previstos mediante el oficio No. CCCTC-9221-2024-0055 y CCCTC-9221-2024-0059
104	Estudiar y conocer la organización y normatividad vigente de la CONTRATANTE, para su aplicación y cumplimiento en el contrato principal y en el CONTRATO DE INTERVENTORÍA, en especial lo establecido en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo.	SATISFACTORIO	Se realizó el estudio de la normatividad vigente de la SDIS para dar cumplimiento al contrato de interventoría y de obra.
105	Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y el supervisor designado, que en materia jurídica y legal se formulen.	NO APLICA	No se han realizado instrucciones en materia jurídica y/o legal
106	Poner en conocimiento de la SDIS y el supervisor designado, de manera oportuna todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoría.	SATISFACTORIO	Se anexó la relación de correspondencia en los informes mensuales correspondientes.
107	Suscribir el Acta de liquidación del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones necesarias para tal fin, tales como, la terminación del contrato suscrito por las partes, la debida entrega del archivo a la SDIS y la aprobación por parte de la interventoría de los documentos de liquidación finales presentados a la terminación del contrato. En todo caso el trámite de suscripción de la respectiva acta de liquidación deberá corresponder a los procedimientos establecidos por la SDIS.	NO APLICA	No ha sido necesario suscribir el acta de liquidación.

108	Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la función de interventoría en lo que a obligaciones jurídicas y legales se refiere.	SATISFACTORIO	Se evidenció el cumplimiento de las obligaciones generales del contrato.
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		**SATISFACTORIO**	**Se evidenció el cumplimiento de las obligaciones especificas del contrato.**

2.3 OBLIGACIONES AMBIENTALES

No OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO *(Reportar el Cumplimiento cualitativo de la obligación)*	OBSERVACION *En este espacio es importante que el supervisor reporte como se dio cumplimiento a la obligación y cuál es el soporte y su ubicación entre otras observaciones que considere necesarias incluir.*
1	Comunicar las buenas prácticas ambientales establecidas en los programas del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA al personal que participe en el desarrollo del presente contrato, con el fin de que se realicen cuando se encuentre en las instalaciones de la SDIS.	SATISFACTORIO	Se realizó jornada de divulgación del PIGA con personal vinculado, firmando acta correspondiente.
2	Entregar el(los) informe(s) y la documentación relacionada con la ejecución del contrato de manera digital de acuerdo a los lineamientos de gestión documental, la supervisión del contrato y en cumplimiento de la política cero papeles de la SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL. En caso de presentarse observaciones sobre los informes o documentación suministrada se deberán entregar los documentos ajustados en un plazo no mayor a los cinco (5) días calendario posterior a la notificación.	SATISFACTORIO	El contratista realiza todas las entregas de manera digital, de este modo la interventoría revisa y emite observaciones de manera digital, en cumplimiento con las políticas de la SDIS.
3	Verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas en el contrato cuyo objeto es "REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", correspondiente al grupo adjudicado en los tiempos establecidos.	SATISFACTORIO	Se realizó seguimiento, observaciones, revisión y aportación a las obligaciones ambientales del contratista de obra. Se entrega informes mensuales de seguimiento a la gestión ambiental CCCTC-9221-2024-0065, INF AMB N°1 INTERVENTORIA

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones	**SATISFACTORIO**	**Se evidenció el cumplimiento de las obligaciones ambientales del contrato.**

2.4 OBLIGACIONES CONJUNTAS *En este parte, no es obligatorio para los contratos de prestación de servicios profesionales y/o apoyo a la gestión.*

No OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO *(Reportar el Cumplimiento cualitativo de la obligación)*	OBSERVACION *En este espacio es importante que el supervisor reporte como se dio cumplimiento a la obligación y cuál es el soporte y su ubicación entre otras observaciones que considere necesarias incluir.*
1	Presentar los informes mensuales a más tardar el quinto (5) día hábil del mes para la revisión y aprobación de la interventoría del contrato de obra, los cuales deberán ser presentados a la interventoría a más tardar el décimo (10) día hábil del mes. De conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico. Dentro del informe deberá detallar la gestión de los recursos discriminado por rubro e intervención	SATISFACTORIO	El contratista presentó los informes mensuales No. 01 y No. 02 en todos sus componentes y con sus respectivos soportes, dentro de los tiempos establecidos.
2	Presentar a la interventoría el Informe Final a más tardar dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de haber finalizado el plazo contractual. De conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico.	NO APLICA	A la fecha el contrato se encuentra en el plazo de ejecución, por ende, aún no aplica esta obligación.
3	Será responsabilidad exclusiva del contratista los ajustes, revisiones, correcciones y nueva radicación de los informes antes indicados siguiendo los lineamientos y observaciones señalados por la interventoría y/o la entidad.	SATISFACTORIO	El contratista ha acatado y ajustado las observaciones realizadas por la interventoría y/o entidad.
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		**SATISFACTORIO**	**Se evidenció el cumplimiento de las obligaciones conjuntas del contrato.**

2.5 OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

En este parte, no es obligatorio para los contratos de prestación de servicios profesionales y/o apoyo a la gestión.

No OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO (Registrar según corresponda DEFICIENTE/ A MEJORAR/SATISFACTORIO/ SOBRESALIENTE/NO APLICA)	*OBSERVACIÓN* *En este espacio es importante que el supervisor reporte como se dio cumplimiento a la obligación y cuál es el soporte y su ubicación entre otras observaciones que considere necesarias incluir*
1	Suministrar la información que previamente requiera EL	SATISFACTORIO	Se recibió la información requerida por parte de

	CONTRATISTA en relación con el objeto del presente contrato		la entidad respecto al contrato.
2	Exigir a EL CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del presente contrato.	SATISFACTORIO	Se realizaron comités de obra semanalmente y recorridos, con el fin de precisar la correcta ejecución y el cumplimiento de las obligaciones.
3	Efectuar la supervisión y seguimiento del presente contrato.	SATISFACTORIO	Se realizó la supervisión y seguimiento del presente contrato, tanto administrativamente como operativamente.
4	Cancelar el valor del contrato en la forma y términos establecidos en el Pliego de Condiciones, Estudio Previo y/o Anexo Técnico.	SATISFACTORIO	Se realizó el trámite correspondiente para el pago.
5	Permitir el desarrollo y la ejecución del contrato por parte del contratista.	SATISFACTORIO	A la fecha se garantizó el correcto desarrollo y ejecución del contrato por parte del contratista, gestionando oportunamente.
6	Asumir los riesgos que correspondan, de conformidad con lo establecido en el numeral de “RIESGOS PREVISIBLES” el cual fue debidamente avalado por la Subdirección de Contratación, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	SATISFACTORIO	No se presentaron riesgos previsibles.
7	Dar cumplimiento al Manual de supervisión establecido por la entidad con el fin de hacer seguimiento al contratista para que cumpla con el objeto del contrato.	SATISFACTORIO	Se dio cumplimiento a lo establecido en el manual de supervisión.
8	Las demás que correspondan para el cumplimiento del objeto contratado y de acuerdo con la naturaleza de este.	SATISFACTORIO	Se ha dado cumplimiento a todas las obligaciones de la entidad en el desarrollo del contrato.
9	Revisar que cada una de las obligaciones del CONTRATISTA se cumplan en su totalidad.	SATISFACTORIO	Se hizo seguimiento, observaciones a las obligaciones del contratista.
10	Informar oportunamente al contratista, sobre quién será la persona natural o jurídica designada por la SDIS, encargada de ejecutar la supervisión, este deberá realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, social, ambiental, contable y jurídico del contrato verificando además la correcta ejecución del objeto contratado.	SATISFACTORIO	Se comunico quien seria la persona encargada de la supervisión del contrato de interventoría.
11	Aprobar las garantías exigidas para el cumplimiento del contrato y la póliza de responsabilidad civil extracontractual aportada por el contratista, siempre que se ajuste a las condiciones exigidas en el proceso.	SATISFACTORIO	Se realizó aprobación a las garantías entregadas por la interventoría del contrato de obra.
12	Comunicar por escrito al contratista de manera directa, cualquier reclamación por deficiencia en los servicios contratados, con el fin de exigir que la calidad de los bienes y servicios contratados se ajuste a los	SATISFACTORIO	Se comunicó por medio magnético y físico las exigencias de calidad de los trabajos ejecutados en el proyecto

	requisitos mínimos previstos en las normas vigentes.		
13	Responder oportunamente las reclamaciones que formule la comunidad, los entes de control, los contratistas de obra y/o de interventoría, con respecto a la ejecución de las obras de construcción.	SATISFACTORIO	Se respondieron oportunamente por medio magnético y físico a las observaciones hechas por la interventoría y las coordinaciones de las unidades operativas
14	Verificar que el Interventor se encuentre al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. La omisión de esta obligación será causal de mala conducta y sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente.	SATISFACTORIO	Se recibió el soporte correspondiente al pago de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes
15	Las demás que correspondan para el cumplimiento del objeto contratado y de acuerdo con la naturaleza de este.	SATISFACTORIO	Se ha dado cumplimiento a todas las obligaciones de la entidad en el desarrollo del contrato.
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		**SATISFACTORIO**	**Se evidenció el cumplimiento de las obligaciones de la entidad en la ejecución del contrato.**

(En el evento de existir otro tipo de obligaciones agregar el numeral con la identificación de estas, así como las casillas que correspondan).

2. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA: *11

Se recomienda al contratista continuar con el mismo compromiso y disposición que ha tenido hasta la fecha, para dar cumplimiento al alcance del contrato en los tiempos estipulados contractualmente.

3. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES: *12

El contratista realizó seguimiento a los trabajos durante las jornadas que amplió el contratista de obra para mitigar los atrasos presentados y lograr el cumplimiento de la programación aprobada.

5. RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES: *13

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA*	VALOR
SALUD	2025- ENERO	15/02/2025	$ 2.364.600
PENSIÓN	2025- ENERO	15/02/2025	$ 5.725.500
ARL	2025- ENERO	15/02/2025	$ 2.807.700
PARAFISCALES	2025- ENERO	15/02/2025	$ 1.297.800

6. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO: *14

Haber ejecutado de manera adecuada el servicio con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto contractual relacionado con la optimización de la infraestructura de los centros, sedes y predios donde la Secretaría Distrital

de Integración Social ofrece sus servicios sociales o requiera intervención, en el contexto de la implementación del Sistema Distrital de Cuidado."

¿Quieres que haga más ajustes o esta versión se adapta a lo que necesitas?

7. RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS: *15

Hasta el presente periodo del contrato se ha realizado el control y verificación de los recursos para que sean destinados de manera correcta con el fin de cumplir con el objeto del contrato.

8. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO? SI [ ] NO [x] (En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento): *16

9. ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN? *17

SI [x]	NO [ ]
RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: ● Fichas técnicas y certificaciones de calidad de los materiales ● Memorias de cantidades por sede - Preactas ● Balances de obra ● Programación de obra ● Bitácora de obra	

10. PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO? *18

SI (x)	NO
SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO	

11. INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO, DE ACUERDO A LAS METAS DEL PROYECTO AL QUE PERTENECE: *19

Ciudad Bolívar y Tunjuelito, se presenta la siguiente información cuantitativa y cualitativa, siendo: 5 = Excelente, 4 = Bueno, 3 = Regular, 2 = Deficiente, 1= Malo o Insuficiente.

Localidad de Bosa		
JI - Campo Verde	4	Bueno
JI - Torito Feliz	4	Bueno
JS - Ojo de Perdiz	4	Bueno
CDC Porvenir	4	Bueno
Localidad de Ciudad Bolívar		
JI - Estrellas del Mañana	4	Bueno
JI - Yanacona	4	Bueno
CSAM - Acacias	5	Excelente
CSAM - Carlos Gaviria	4	Bueno
CSAM - Tejedores	5	Excelente
Localidad de Tunjuelito		

JI - Tunjuelito	4	Bueno
JI - Rincón de las Ardillas	4	Bueno

12. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR: *20

Durante la ejecución del contrato, se ha llevado a cabo un seguimiento continuo por parte de la interventoría al contratista de obra, con el objetivo de evaluar el avance evidenciado en cada sede activa. Este seguimiento ha permitido controlar y verificar el cumplimiento del cronograma de actividades aprobado. Además, se realizó la entrega satisfactoria de dos sedes: Ojo de Perdiz y Tunjuelito, lo que contribuye al cumplimiento de los plazos establecidos en el proyecto

FECHA DE ELABORACIÓN: 14/03/2025
*21

FIRMA DEL SUPERVISOR
JOHNNY EDWARD PADILLA

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

Los numerales en * en color gris corresponden al orden que se encuentra las instrucciones de diligenciamiento.

1. PERÍODO AL QUE CORRESPONDE EL INFORME: señale el período a que corresponde el informe que se está presentando. Se debe tener en cuenta que la periodicidad de la presentación de los informes corresponda a la exigida en el contrato. En caso de no estipular plazo de presentación de los informes debe ser la misma periodicidad de los pagos (Formato MC-14). En ningún caso puede sobrepasar el plazo de ejecución del contrato.
2. ¿SE REPORTA ALGÚN DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR?: en caso de reportarse un desempeño deficiente (el contratista ha incumplido esa obligación) o a mejorar (el cumplimiento de la obligación está por debajo de lo esperado para el logro del objetivo), el supervisor deberá indicar con una (X) de manera general si se reporta alguna de las obligaciones contractuales bajo esta calificación en el informe del período que se está presentando.
3. PORCENTAJE DE EJECUCION
   FISICA: indicar el valor porcentual en tiempo acumulado frente al tiempo total del contrato, o el valor de avance de acuerdo al cumplimiento del cronograma de actividades.
   PRESUPUESTAL: indicar el valor porcentual acumulado frente al valor total del contrato.
4. DATOS DEL SUPERVISOR/INTERVENTORI: Se deberá indicar
   Nombre del supervisor/ interventor: se incluirá el nombre del supervisor o interventor de acuerdo con la minuta del contrato o convenio.
   Numero de Cto de interventoría: número y año del contrato que mediante e cual se ejerce la interventoría del contrato o convenio
   Dependencia: se deberá registrar la dependencia a la cual corresponde el supervisor de acuerdo con la minuta del contrato.
   Cargo: se deberá incluir el cargo que ostenta el supervisor del contrato
   Localidad: se deberá incluir la ubicación del supervisor del contrato
   Apoyo a la supervisión: se deberá incluir el nombre del /los profesionales que prestan el apoyo a la supervisión.
5. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO
   Número del contrato: número asignado a la minuta del contrato
   Fecha del contrato: fecha de suscripción de la minuta
   Contratista: nombre de la persona natural o jurídica que presta el servicio
   Cédula: identificación de la persona natural o jurídica que presta el servicio
   Proyecto: código y nombre del proyecto el cual financia el bien o servicio suministrado.
   Valor: se deberá registrar el valor total asignado al contrato
   Plazo: se deberá indicar el tiempo por el cual se suscribió el contrato
   Fecha acta de inicio: se deberá indicar dd/mm/aaaa del acta de inicio
   Fecha de terminación: se deberá indicar dd/mm/aaaa del acta de inicio
   Adición: en caso de existir adiciones registrar el valor de cada uno de ellos.
   Prorroga: en caso de existir prorrogas registrar el tiempo de cada uno de ellas.
   Suspensión: indicar el periodo y tiempo de suspensión.
   Fuente de financiación proyecto: código y nombre del proyecto el cual financia el bien o servicio suministrado.
   Objeto: indicar el objeto contractual
6. BITÁCORA DE ACTIVIDADES: señalar las obligaciones según como se encuentra en el contrato, identificar las actividades que se desarrollan para su cumplimiento y los soportes que evidencian el respectivo cumplimiento, este especio aplica para contratos diferentes a prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión.
7. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO: se debe diligenciar la información a la fecha final período a que corresponde el informe, en la estructura de costos a pagar, se debe identificar de manera detallada los cotos fijos, costos variables, costos por realización y otros, agregar las filas que sean necesarias.
8. REPORTE DEL MONITOREO A LOS RIESGOS PREVISIBLES: Luego de hacer el monitoreo en el evento de configurarse un riesgo previsible, se deberá registrar la implementación del plan de tratamiento. Este monitoreo debe: (a) garantizar que los controles son eficaces y eficientes en el diseño y en la operación. (b) obtener información adicional para mejorar la valoración del riesgo. (c) analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos. (d) detectar cambios en el contexto externo e interno que puedan exigir revisión de los tratamientos del riesgo y establecer un orden de prioridades de acciones para el tratamiento del riesgo. (e) identificar nuevos riesgos que pueden surgir. Se debe realizar un monitoreo constante a los riesgos identificados de la contratación pues las circunstancias cambian rápidamente y los riesgos no son estáticos. El formato de análisis de riegos previsibles, así como el plan de tratamiento registrado deben ser revisados constantemente para determinar si es necesario hacer ajustes.
9. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO: elaborar un concepto general o síntesis acerca del cumplimiento del objeto del contrato.
10. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: señale el grado de cumplimiento de las obligaciones contractuales. La calificación va desde deficiente (el contratista ha incumplido esa obligación), a mejorar (el cumplimiento de la obligación está por debajo de lo esperado para el logro del objetivo), satisfactorio (el cumplimiento de la obligación está acorde con lo contratado) y sobresaliente (el contratista ha cumplido la

obligación por encima de las expectativas respecto a esa obligación). También califique el concepto general del cumplimiento de las obligaciones.

11. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA: indicar de acuerdo al cumplimiento de las obligaciones y análisis de las mismas, las recomendaciones y observaciones acerca del desempeño del contratista.
12. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES: en caso de presentarse un desempeño deficiente o a mejorar por parte del contratista, el supervisor debe indicar qué recomendaciones o propuestas ha hecho el contratista para lograr el cumplimiento a satisfacción de la obligación.
13. RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES: relacionar los respectivos pagos hechos por el contratista al Sistema de Seguridad Social y aportes a Parafiscales para el periodo certificado. Se debe tener en cuenta que cuando se trate de una persona jurídica, se debe acreditar el pago de aportes de sus empleados mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal a falta de éste. En el caso de personas naturales que presten directamente servicios al Estado bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios o cualquier otra modalidad de contratos de prestación de servicios deben acreditar el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales y aportes a Parafiscales, cuando a ello haya lugar, basta hacerlo con la respectiva planilla de pago. Los trabajadores independientes que son contratistas por prestación de servicios no son considerados como cotizantes obligatorios al Sistema General de Riesgos Profesionales.
14. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO: se debe registrar el resultado esperado que puede ser un bien o un servicio con el cual se pretendió suplir una necesidad de la administración.
15. RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS: indique si pueden presentarse inconvenientes con el manejo de los recursos presupuestales durante la ejecución del contrato, por ejemplo, hacer una destinación de los recursos diferente a los asuntos propios del objeto del contrato. En caso afirmativo adjunte los respectivos soportes (facturas, estados de cuenta, extractos, etc.).
16. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO? SI – NO: señale si se ha acordado un plan de mejoramiento con el contratista, en caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento.
17. ¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN? SI – NO: se deberá señalar si se entregó o no informe de ejecución y se deberá relacionar los soportes que se adjuntaron al mismo.
18. ¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO? SI – NO: se deberá señalar si procede o no el pago y de ser afirmativo se adjuntará la certificación para pago de lo contrario no procederá la certificación de pago.
19. INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO, DE ACUERDO A LAS METAS DEL PROYECTO AL QUE PERTENECE: este numeral deberá diligenciarse cuando se pretenda evaluar el cumplimiento de la prestación de servicios sociales. El supervisor del respectivo contrato deberá indicar las metas a las cuales le apunta el cumplimiento del objeto contractual de forma cuantitativa y cualitativa.

    De igual forma, podrá hacerse mención a los anexos que soportan la gestión del contratista de conformidad con los informes previstos por componentes (Ejemplo: técnico, administrativo, nutricional, financiero, entre otros) en la minuta del contrato.
20. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR: indicar las observaciones relevantes por parte del supervisor. Es importante señalar si ha habido requerimientos o medidas de gestión por parte del supervisor tendientes a lograr el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones, en caso afirmativo anexar copias de los soportes.
21. FECHA: señale la fecha en la que diligencia el presente formato.
22. FIRMA SUPERVISOR/ INTERVENTOR: el supervisor del respectivo contrato debe firmar el informe que está enviando.

Nota1: En caso de reportar por parte del supervisor algún desempeño deficiente o a mejorar y de hacer declaraciones y propuestas del contratista ante un eventual desempeño deficiente o a mejorar de las obligaciones se recomienda tener registro de recibo del informe por parte del contratista.

Nota2: El presente formato es sujeto de modificación solo para los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, por lo cual, la modificación ya se encuentra parametrizada en IOPS, con la información que es aplicable para esta tipología contractual

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FORMATO RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE MANTENIMIENTO

Código: FOR-GIF-006
Versión: 2
Fecha: Memo I2024010244 - 17/04/2024
Página: 1 de 1

1. FECHA VERIFICACIÓN:	12	03	25					2. CONSECUTIVO			
3. LOCALIDAD:	Bosa			4. FORMATO DE SOLICITUD ATENDIDO:		No. RADICADO:					
5. NOMBRE DEL CENTRO O SEDE ATENDIDO:	Jardin Infantil Campo Verde.					FECHA DEL RADICADO:	DD	MM	AA		
6. DIRECCION DEL CENTRO	Cra 95A # 95-80 Sur										
8. ESTRATEGIA POR MEDIO DEL CUAL SE ATENDIO LA UNIDAD OPERATIVA:	2. Técnicos de la Subdirección de Plantas Físicas			7. TELÉFONO DE LA UNIDAD OPERATIVA:							
	3. Contratista de obra		x								
9. EMPRESA CONTRATISTA QUE EJECUTÓ LA OBRA:	Consorcio San Miguel.					10. NÚMERO DE CONTRATO Y AÑO:	9198 - 2024				
11. PERIODO DE REALIZACIÓN DE TRABAJOS :	FECHA INICIO:	17	01	25		FECHA FINAL:	12	03	25		

12. DESCRIPCION GENERAL DE LOS SERVICIOS ATENDIDOS

SOPORTE TECNICO EQUIPOS HIDRONEUMATICOS:		SOPORTE TECNICO SISTEMA DETECCION HUMO:		SOPORTE TECNICO SISTEMA DE ELEVACION:		GARANTÍA SOBRE OBRAS CIVILES REALIZADAS	
SOPORTE TECNICO SISTEMAS ELECTRICOS:		SOPORTE TECNICO HIDROSANITARIO:		SOPORTE TECNICO SISTEMAS GAS:		SOPORTE TECNICO SISTEMAS DE REDES CONTRAINCENDIOS:	
SOPORTE TECNICO SISTEMAS DE COMUNICACIONES		SOPORTE TECNICO SISTEMAS FOTOVOLTAICOS:		SOPORTE TECNICO EQUIPOS ELECTROGENOS:		OTROS:	x

13. DESCRIPCION DE LOS TRABAJO REALIZADOS

Lugar especifico donde se realizaron las obras (detalle de manera especifica)	Trabajos realizados (agregue filas según considere pertinente)
Terraza 2do Piso.	Alistado de piso, construcción de mediacaña e instalación de muro.
Terraza Exterior.	Demolición acabado de piso, alistado, instalación de enchape y resane y pintura en muros.
Oficinas Administrativas.	Desmonte e instalación de cielorraso, resane y aplicación de pintura
Cubierta	Desmonte e instalación de 60 puntos de anclaje.

14. ENCUESTA DE SATISFACCION

PREGUNTA	CALIFICACION (siendo 1 malo y 5 excelente) 1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
1. Califique el aseo y orden durante la ejecución del servicio					✓	Entrega Manual de Mantenimiento
2. Califique la cortesía y amabilidad del personal técnico y profesional de la empresa contratista.					✓	fecha 31-03-2025

15. FIRMAS

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL CENTRO O PERSONA QUE SOLICITO EL SERVICIO	FIRMA DEL CONTRATISTA (ESTRATEGIA 3)/ OPERARIO QUE ATENDIO LA SOLICITUD (ESTRATEGIA 2)
Nombre: Adriana Patricia Bocanegra	Nombre: Claudia Moncada
Cargo: Administradora.	Cargo: Dir. Obra
FIRMA DEL INTERVENTOR QUE SUPERVISÓ LA OBRA (ESTRATEGIA 3) / RESIDENTE DE LA LOCALIDAD (ESTRATEGIA 2)	FIRMA DE SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE LA SDIS
Nombre: Fabian Omar Vallejo	Nombre: Adriana M. Velandia B.
Cargo: Director de obra	Cargo: Apoyo a supervision SDIS

16. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA (OBLIGATORIO)	
Antes	Después
	
Antes	Después
	
Antes	Después
	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FORMATO RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE MANTENIMIENTO

Código: FOR-GIF-006	
Versión: 2	
Fecha: Memo I2024010244 - 17/04/2024	
Página: 1 de 1	

1. FECHA VERIFICACIÓN:	12	03	25				2. CONSECUTIVO		
3. LOCALIDAD:	Ciudad Bolivar			4. FORMATO DE SOLICITUD ATENDIDO:	No. RADICADO:				
5. NOMBRE DEL CENTRO O SEDE ATENDIDO:	Jardin Infantil Estrellas del Mañana				FECHA DEL RADICADO:	DD	MM	AA	
6. DIRECCION DEL CENTRO	Cra 19 # 78 D 05 Sur								
8. ESTRATEGIA POR MEDIO DEL CUAL SE ATENDIO LA UNIDAD OPERATIVA:	2. Técnicos de la Subdirección de Plantas Físicas			7. TELÉFONO DE LA UNIDAD OPERATIVA:					
	3. Contratista de obra	X							
9. EMPRESA CONTRATISTA QUE EJECUTÓ LA OBRA:	Consorcio San Miguel					10. NÚMERO DE CONTRATO Y AÑO:			
11. PERIODO DE REALIZACIÓN DE TRABAJOS :	FECHA INICIO:	09	01	25	FECHA FINAL:	12	03	25	

12. DESCRIPCION GENERAL DE LOS SERVICIOS ATENDIDOS

SOPORTE TÉCNICO EQUIPOS HIDRONEUMATICOS:		SOPORTE TÉCNICO SISTEMA DETECCION HUMO:		SOPORTE TÉCNICO SISTEMA DE ELEVACION:		GARANTÍA SOBRE OBRAS CIVILES REALIZADAS	
SOPORTE TÉCNICO SISTEMAS ELECTRICOS:		SOPORTE TÉCNICO HIDROSANITARIO:		SOPORTE TÉCNICO SISTEMAS GAS:		SOPORTE TÉCNICO SISTEMAS DE REDES CONTRAINCENDIOS:	
SOPORTE TÉCNICO SISTEMAS DE COMUNICACIONES		SOPORTE TÉCNICO SISTEMAS FOTOVOLTAICOS:		SOPORTE TÉCNICO EQUIPOS ELECTROGENOS:		OTROS:	X

13. DESCRIPCION DE LOS TRABAJO REALIZADOS

Lugar especifico donde se realizaron las obras (detalle de manera especifica)	Trabajos realizados (agregue filas según considere pertinente)
Tanque	Demolición y construcción de acabado de piso Tratamiento de fisuras e impermeabilización interna
Salón	Retiro piso caucho, alistado de piso, instalación de enchape en piso y muros, resanes y aplicación de pintura tipo viniltex, lavado de ladrillo con hidrófugo, aplicación de esmalte en perfileria metalica y barandas.
Barandas y Rejas	Mantenimiento de elementos ; aplicación de esmalte. e instalación de policarbonato.


14. ENCUESTA DE SATISFACCION

PREGUNTA	CALIFICACION (siendo 1 malo y 5 excelente)					OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5	
1. Califique el aseo y orden durante la ejecución del servicio				X		Manual de Mantenimiento a 31-03-2025
2. Califique la cortesía y amabilidad del personal técnico y profesional de la empresa contratista.				X		entrega.

15. FIRMAS

Yuli F Herrera T.	
FIRMA DEL RESPONSABLE DEL CENTRO O PERSONA QUE SOLICITO EL SERVICIO	FIRMA DEL CONTRATISTA (ESTRATEGIA 3)/ OPERARIO QUE ATENDIO LA SOLICITUD (ESTRATEGIA 2)
Nombre: Yuli F Herrera	Nombre: Claudia Manuela
Cargo: Docente encargada.	Cargo: Dir Obra
FIRMA DEL INTERVENTOR QUE SUPERVISO LA OBRA (ESTRATEGIA 3) / RESIDENTE DE LA LOCALIDAD (ESTRATEGIA 2)	FIRMA DE SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE LA SDIS
Nombre: Diana Triana Bayona	Nombre: Adriana M. Ubaldo B
Cargo: Coordinadora Interventoria	Cargo: Apoyo Supervision SDIS

16. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA (OBLIGATORIO)

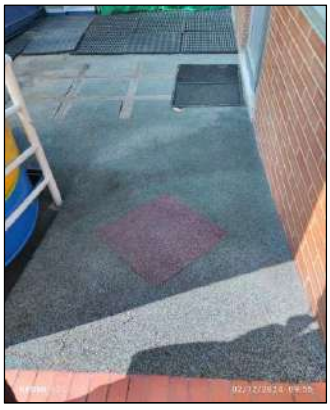Antes	Después
	
Antes	Después
	
Antes	Después
	
Antes	Después
	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FORMATO RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE MANTENIMIENTO

Código: FOR-GIF-006
Versión: 2
Fecha: Memo I2024010244 - 17/04/2024
Página: 1 de 1

1. FECHA VERIFICACIÓN:	12	03	25					2. CONSECUTIVO		
3. LOCALIDAD:	Bosa				4. FORMATO DE SOLICITUD ATENDIDO:	No. RADICADO:				
5. NOMBRE DEL CENTRO O SEDE ATENDIDO:	Jardin Infantil Torito Feliz.					FECHA DEL RADICADO:	DD	MM	AA	
6. DIRECCION DEL CENTRO	Cra 91C # 51-52 Sur				7. TELÉFONO DE LA UNIDAD OPERATIVA:					
8. ESTRATEGIA POR MEDIO DEL CUAL SE ATENDIO LA UNIDAD OPERATIVA:	2. Técnicos de la Subdirección de Plantas Físicas									
	3. Contratista de obra		X							
9. EMPRESA CONTRATISTA QUE EJECUTÓ LA OBRA:	Consorcio San Miguel.					10. NÚMERO DE CONTRATO Y AÑO:	9198-2024			
11. PERIODO DE REALIZACIÓN DE TRABAJOS :	FECHA INICIO:	24	01	25		FECHA FINAL:	12	03	25	

12. DESCRIPCION GENERAL DE LOS SERVICIOS ATENDIDOS

SOPORTE TECNICO EQUIPOS HIDRONEUMATICOS:		SOPORTE TECNICO SISTEMA DETECCION HUMO:		SOPORTE TECNICO SISTEMA DE ELEVACION:		GARANTÍA SOBRE OBRAS CIVILES REALIZADAS	
SOPORTE TECNICO SISTEMAS ELECTRICOS:		SOPORTE TECNICO HIDROSANITARIO:		SOPORTE TECNICO SISTEMAS GAS:		SOPORTE TECNICO SISTEMAS DE REDES CONTRAINCENDIOS:	
SOPORTE TECNICO SISTEMAS DE COMUNICACIONES		SOPORTE TECNICO SISTEMAS FOTOVOLTAICOS:		SOPORTE TECNICO EQUIPOS ELECTROGENOS:		OTROS:	X

13. DESCRIPCION DE LOS TRABAJO REALIZADOS


Lugar especifico donde se realizaron las obras (detalle de manera especifica)	Trabajos realizados (agregue filas según considere pertinente)
Zona de Circulación	Desmonte e instalación de policarbonato, instalación de estructura metálica, instalación de canaleta y bajantes, excavación manual, instalación tubería agua lluvia, reinstalación de losetas.
Tanque	Construcción de dados en concreto e instalación de cerramiento en malla eslabonada.
Puerta de ingreso	Instalación de policarbonato y aplicación de esmalte sobre reja.
Cubierta	Mantenimiento general de cubierta.
	Se entregan los espacios a la coordinación.

14. ENCUESTA DE SATISFACCION

PREGUNTA	CALIFICACION (siendo 1 malo y 5 excelente) 1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
1. Califique el aseo y orden durante la ejecución del servicio					✓	El manual de Mantenimiento sera entregado a 31-03-2025
2. Califique la cortesía y amabilidad del personal técnico y profesional de la empresa contratista.					✓	

15. FIRMAS

Claudia Duarte	
FIRMA DEL RESPONSABLE DEL CENTRO O PERSONA QUE SOLICITO EL SERVICIO	FIRMA DEL CONTRATISTA (ESTRATEGIA 3)/ OPERARIO QUE ATENDIO LA SOLICITUD (ESTRATEGIA 2)
Nombre: Claudia Duarte	Nombre: Claudia Monroy T
Cargo: Responsable	Cargo: Dir. Obra
FIRMA DEL INTERVENTOR QUE SUPERVISÓ LA OBRA (ESTRATEGIA 3) / RESIDENTE DE LA LOCALIDAD (ESTRATEGIA 2)	FIRMA DE SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE LA SDIS
Nombre: Fabian Omar Vallejo	Nombre: Adriana M. Velasco B
Cargo: Director de obra	Cargo: Apoyo a Supervision SDIS

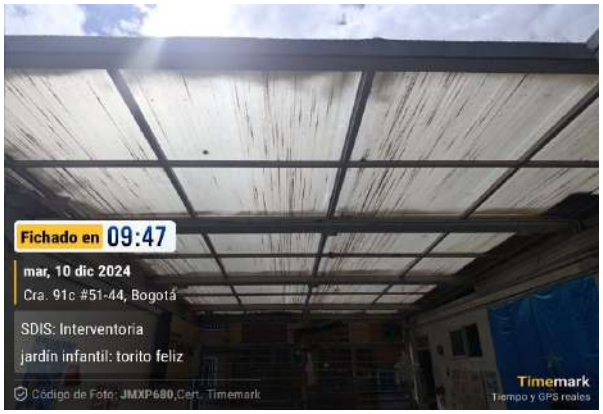16. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA (OBLIGATORIO)	
Antes	Después
	
Antes	Después
	
Antes	Después
	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FORMATO RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE MANTENIMIENTO

Código: FOR-GIF-006	
Versión: 2	
Fecha: Memo I2024010244 - 17/04/2024	
Página: 1 de 1	

1. FECHA VERIFICACIÓN:	12	03	25					2. CONSECUTIVO		
3. LOCALIDAD:	Ciudad Bolivar				4. FORMATO DE SOLICITUD ATENDIDO:		No. RADICADO:			
5. NOMBRE DEL CENTRO O SEDE ATENDIDO:	Jardin Infantil - Jamaconа						FECHA DEL RADICADO:	DD	MM	AA
6. DIRECCION DEL CENTRO	Tv 17B # 77 A 74 Sur.									
8. ESTRATEGIA POR MEDIO DEL CUAL SE ATENDIO LA UNIDAD OPERATIVA:	2. Técnicos de la Subdirección de Plantas Físicas				7. TELÉFONO DE LA UNIDAD OPERATIVA:					
	3. Contratista de obra			x						
9. EMPRESA CONTRATISTA QUE EJECUTÓ LA OBRA:	Consorcio San Miguel						10. NÚMERO DE CONTRATO Y AÑO:			
11. PERIODO DE REALIZACIÓN DE TRABAJOS :	FECHA INICIO:	04	02	25	FECHA FINAL:	12	03	25		

12. DESCRIPCION GENERAL DE LOS SERVICIOS ATENDIDOS

SOPORTE TÉCNICO EQUIPOS HIDRONEUMATICOS:		SOPORTE TÉCNICO SISTEMA DETECCION HUMO:		SOPORTE TÉCNICO SISTEMA DE ELEVACION:		GARANTÍA SOBRE OBRAS CIVILES REALIZADAS	
SOPORTE TÉCNICO SISTEMAS ELECTRICOS:		SOPORTE TÉCNICO HIDROSANITARIO:		SOPORTE TÉCNICO SISTEMAS GAS:		SOPORTE TÉCNICO SISTEMAS DE REDES CONTRAINCENDIOS:	
SOPORTE TÉCNICO SISTEMAS DE COMUNICACIONES		SOPORTE TÉCNICO SISTEMAS FOTOVOLTAICOS:		SOPORTE TÉCNICO EQUIPOS ELECTROGENOS:		OTROS:	x

13. DESCRIPCION DE LOS TRABAJO REALIZADOS

Lugar especifico donde se realizaron las obras (detalle de manera especifica)	Trabajos realizados (agregue filas según considere pertinente)
Módulo Sala Materna	Instalación de estructura metálica, instalación de cubierta ecorgoa, instalación de bajantes y canaletas de agua lluvia.
Módulo Párvulos	Instalación de luminaria tipo led Hermética
	Instalación de superboard

14. ENCUESTA DE SATISFACCION

PREGUNTA	CALIFICACION (siendo 1 malo y 5 excelente) 1	2	3	4	5	OBSERVACIONES
1. Califique el aseo y orden durante la ejecución del servicio					x	Mantenimiento Mensual a entregar
2. Califique la cortesía y amabilidad del personal técnico y profesional de la empresa contratista.					x	a 31-03-2025

15. FIRMAS

Jehidy Johana Magin	
FIRMA DEL RESPONSABLE DEL CENTRO O PERSONA QUE SOLICITO EL SERVICIO	FIRMA DEL CONTRATISTA (ESTRATEGIA 3)/ OPERARIO QUE ATENDIO LA SOLICITUD (ESTRATEGIA 2)
Nombre: Jehidy Magin	Nombre: Claudia Marcela
Cargo: Maestra encargada	Cargo: Dir. Obra
FIRMA DEL INTERVENTOR QUE SUPERVISÓ LA OBRA (ESTRATEGIA 3) / RESIDENTE DE LA LOCALIDAD (ESTRATEGIA 2)	FIRMA DE SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE LA SDIS
Nombre: Diana Triana	Nombre: Adriana M. Ubadia B
Cargo: Coordinadora interventoria	Cargo: Apoyo supervisor SDIS

16. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA (OBLIGATORIO)

Antes	Después
	
Antes	Después
	
Antes	Después
 	
Antes	Después
	

PROYECTO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.	CONSORCIO SAN MIGUEL

FORMATO DE REPORTE EVENTOS DE LLUVIAS

SEDE: BELLA FLOR

FECHA	INTENSIDAD			SUSPENSION LABORES		H Inicio	H Fin	OBSERVACIONES
	L	M	I	SI	NO			
3/04/2025		X			X	11:00	13:00	No se detienen actividades, Se ejecutan actividades al interior de la sede
4/03/2025		X			X	15:00	16:00	No se detienen actividades, Se ejecutan actividades al interior de la sede
11/03/2025		X			X	15:40	17:00	No se detienen actividades, Se ejecutan actividades al interior de la sede
16/03/2025		X			X	13:00	14:00	No se detienen actividades, Se ejecutan actividades al interior de la sede
23/03/2025		X		X		13:53	15:00	Se detiene actividad de resane de fachada, y pintura de fachada
26/03/2025			X	X		10:00	1:30	Se pausan actividades de retiro de pintura y resanes en la fachda, dichas actividades se realizan con acceso, decenso desde fachdas
29/03/2025			X	X		1:26	3:40	Se pausan actividades de aplicación de mortero impermevilizado en la fachdadichas actividades se realizan con acceso, decenso desde fachdas
30/03/2025			X	X		2:10	3:55	Se pausan actividades de aplicación pintura en la fachdadichas actividades se realizan con acceso, decenso desde fachdas
31/03/2025			X	X		10:02	3:22	Se pausan actividades de retiro de pintura y resanes en la fachdadichas actividades se realizan con acceso, decenso desde fachdas
1/04/2025			X	X		11:03	1:03	Se pausan actividades de retiro de pintura y resanes en la fachdadichas actividades se realizan con acceso, decenso desde fachdas
Es importante tener en cuenta que si la fachada está mojada o el mortero aún está húmedo, no se debe aplicar la pintura directamente. Del mismo modo, si comienza a llover, se deberá hacer una pausa en las actividades hasta que la superficie esté completamente seca y en condiciones óptimas para la aplicación de la pintura								

L: LEVE
M: MODERADO
I: INTENSO



Ingeniero Residente de Obra

Vo. Bo. Residente de interventoría

PROYECTO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.	CONSORCIO SAN MIGUEL

FORMATO DE REPORTE EVENTOS DE LLUVIAS

SEDE: ACACIAS

FECHA	INTENSIDAD			SUSPENSION LABORES		H Inicio	H Fin	OBSERVACIONES
	L	M	I	SI	NO			
11-mar		X			X	15:00	17:00	No se detienen actividades
19-mar	X			X		15:21	16:30	Se detienen labores de aseo de ventanas fachada

L: LEVE
M: MODERADO
I: INTENSO

Ingeniero Residente de Obra

Vo. Bo. Residente de interventoría

PROYECTO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.	CONSORCIO SAN MIGUEL

FORMATO DE REPORTE EVENTOS DE LLUVIAS

SEDE: CARLOS GAVIRIA

FECHA	INTENSIDAD			SUSPENSION LABORES		H Inicio	H Fin	OBSERVACIONES
	L	M	I	SI	NO			
3/04/2025		X			X	11:00	13:00	No se detienen actividades, Se ejecutan actividades al interior de la sede
4/03/2025		X			X	15:00	16:00	No se detienen actividades, Se ejecutan actividades al interior de la sede
11/03/2025		X			X	15:40	17:00	No se detienen actividades, Se ejecutan actividades al interior de la sede
16/03/2025		X			X	13:00	14:00	No se detienen actividades, Se ejecutan actividades al interior de la sede
23/03/2025		X		X		13:53	15:00	Se detiene actividad de resane de fachada, y pintura de fachada
26/03/2025			X	X		10:00	1:30	Se pausan actividades de retiro de pintura y resanes en la fachda, dichas actividades se realizan con acceso, decenso desde fachdas
29/03/2025			X	X		1:26	3:40	Se pausan actividades de aplicación de mortero impermevilizado en la fachdadichas actividades se realizan con acceso, decenso desde fachdas
30/03/2025			X	X		2:10	3:55	Se pausan actividades de aplicación pintura en la fachdadichas actividades se realizan con acceso, decenso desde fachdas
31/03/2025			X	X		10:02	3:22	Se pausan actividades de retiro de pintura y resanes en la fachdadichas actividades se realizan con acceso, decenso desde fachdas

L: LEVE
M: MODERADO
I: INTENSO

Ingeniero Residente de Obra

Vo. Bo. Residente de interventoría

PROYECTO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.	CONSORCIO SAN MIGUEL

FORMATO DE REPORTE EVENTOS DE LLUVIAS

SEDE: TEJEDORES DE SUEÑOS

FECHA	INTENSIDAD			SUSPENSION LABORES		H Inicio	H Fin	OBSERVACIONES
	L	M	I	SI	NO			
3-mar		X			X	11:00	13:00	No se detienen actividades, Se ejecutan actividades al interior de la sede
4-mar		X			X	15:00	16:00	No se detienen actividades, Se ejecutan actividades al interior de la sede
11-mar		X			X	15:40	17:00	No se detienen actividades, Se ejecutan actividades al interior de la sede
16-mar		X			X	13:00	14:00	No se detienen actividades, Se ejecutan actividades al interior de la sede
23-mar		X		X		13:53	15:00	Se detiene actividad de resane de fachada, y pintura
26-mar			X	X		10:00	1:30	Se pausan actividades de retiro de pintura y resanes en la fachada
29-mar			X	X		1:26	3:40	Se pausan actividades de aplicación de mortero impermevilizado en la fachada dichas actividades se realizan con acceso, decenso desde fachdas
30-mar			X	X		13:00	16:00	Se detienen labores de soldadura y pintura de fachada e instalación de policarbonato
31-mar			X	X		10:20	10:53	Se detienen labores de soldadura de la baranda rampa y pintura de muros fachada

L: LEVE
M: MODERADO
I: INTENSO



Ingeniero Residente de Obra

Vo. Bo. Residente de interventoría

PROYECTO:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.	CONSORCIO SAN MIGUEL

FORMATO DE REPORTE EVENTOS DE LLUVIAS

SEDE: CDC PORVENIR

FECHA	INTENSIDAD			SUSPENSION LABORES		H Inicio	H Fin	OBSERVACIONES
	L	M	I	SI	NO			
3/03/2025		X		X		13:20 P.M.	15:30 P.M.	Se detuvieron las actividades de picado de membrana en terraza media luna.
4/03/2025			X	X		13:00 P.M.	16:30 P.M	Se detuvieron las actividades de demolicion y alistado de piso en terraza media luna.
5/03/2025		X		X		13:00 P.M.	14:00 P.M	Se detuvieron las actividades de demolicion en terraza centro dia.
7/03/2025			X		X	18:00 P.M.	6:00 A.M.	Lluvia nocturna. El piso se encuentra humedo por las lluvias el cual las actividades del dia se ven atrazadas hasta poder limpiar el area y dejar que se seque el piso.
8/03/2025			X		X	18:00 P.M.	6:00 A.M.	Lluvia nocturna. El piso se encuentra humedo por las lluvias el cual las actividades del dia se ven atrazadas hasta poder limpiar el area y dejar que se seque el piso.
10/03/2025			X		X	18:00 P.M.	6:00 A.M.	Lluvia nocturna. El piso se encuentra humedo por las lluvias el cual las actividades del dia se ven atrazadas hasta poder limpiar el area y dejar que se seque el piso.
11/03/2025		X			X	18:00 P.M.	6:00 A.M.	Lluvia nocturna. El piso se encuentra humedo por las lluvias el cual las actividades del dia se ven atrazadas hasta poder limpiar el area y dejar que se seque el piso.
14/03/2025		X		X		7:00 A.M.	8:30 A.M.	Se detuvieron las actividades, por lluvia y por la lluvia nocturna.
17/03/2025		X			X	10:00 A.M.	11:20 A.M.	No se detuvieron las actividades
17/03/2025			X	X		12:40 P.M.	15:00 P.M.	Se detuvieron las actividades, de alistado de piso en area de corredor terraza.
18/03/2025	X				X	12:00 P.M.	12:35 P.M.	No se detuvieron las actividades
19/03/2025			X	X		15:40 P.M.	17:40 P.M.	Se detuvieron las actividades, de alistado de piso en area de corredor terraza.
26/03/2025			X		X	18:00 P.M.	6:00 A.M.	Lluvia nocturna. El piso se encuentra humedo por las lluvias el cual las actividades del dia se ven atrazadas hasta poder limpiar el area y dejar que se seque el piso.
28/03/2025			X		X	18:00 P.M.	6:00 A.M.	Lluvia nocturna. El piso se encuentra humedo por las lluvias el cual las actividades del dia se ven atrazadas hasta poder limpiar el area y dejar que se seque el piso para iniciar a aplicar la emulcion.
29/03/2025			X	X		11:40 A.M.	12:40 P.M.	Se detuvieron las actividades de alistado de piso en terraza sillas y sobre piscina, por las lluvias se inicio y paro la actividad de demolicion de alistado.
30/03/2025			X	X		12:00 P.M.	14:30 P.M.	Se detuvieron las actividades de alistado de piso en terraza sobre piscina y terraza gravilla.
30/03/2025			X		X	18:00 P.M.	6:00 A.M.	Lluvia nocturna. El piso se encuentra humedo por las lluvias el cual las actividades del dia se ven atrazadas hasta poder limpiar el area y dejar que se seque el piso.

L: LEVE
M: MODERADO
I: INTENSO



Ingeniero Residente de Obra

PROYECTO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.	CONSORCIO SAN MIGUEL

FORMATO DE REPORTE EVENTOS DE LLUVIAS

SEDE: JARDIN PORVENIR

FECHA	INTENSIDAD			SUSPENSION LABORES		H Inicio	H Fin	OBSERVACIONES
	L	M	I	SI	NO			
3/03/2025		X		X		13:20 P.M.	15:30 P.M.	Se detuvieron las actividades de picado de membrana en terraza media luna.
4/03/2025			X	X		13:00 P.M.	16:30 P.M	Se detuvieron las actividades de demolicion y alistado de piso en terraza media luna.
5/03/2025		X		X		13:00 P.M.	14:00 P.M	Se detuvieron las actividades de demolicion en terraza centro dia.
7/03/2025			X		X	18:00 P.M.	6:00 A.M.	Lluvia nocturna. El piso se encuentra humedo por las lluvias el cual las actividades del dia se ven atrazadas hasta poder limpiar el area y dejar que se seque el piso.
8/03/2025			X		X	18:00 P.M.	6:00 A.M.	Lluvia nocturna. El piso se encuentra humedo por las lluvias el cual las actividades del dia se ven atrazadas hasta poder limpiar el area y dejar que se seque el piso.
10/03/2025			X		X	18:00 P.M.	6:00 A.M.	Lluvia nocturna. El piso se encuentra humedo por las lluvias el cual las actividades del dia se ven atrazadas hasta poder limpiar el area y dejar que se seque el piso.
11/03/2025		X			X	18:00 P.M.	6:00 A.M.	Lluvia nocturna. El piso se encuentra humedo por las lluvias el cual las actividades del dia se ven atrazadas hasta poder limpiar el area y dejar que se seque el piso.
14/03/2025		X		X		7:00 A.M.	8:30 A.M.	Se detuvieron las actividades, por lluvia y por la lluvia nocturna.
17/03/2025		X			X	10:00 A.M.	11:20 A.M.	No se detuvieron las actividades
17/03/2025			X	X		12:40 P.M.	15:00 P.M.	Se detuvieron las actividades, de alistado de piso en area de corredor terraza.
18/03/2025	X				X	12:00 P.M.	12:35 P.M.	No se detuvieron las actividades
19/03/2025			X	X		15:40 P.M.	17:40 P.M.	Se detuvieron las actividades, de alistado de piso en area de corredor terraza.
26/03/2025			X		X	18:00 P.M.	6:00 A.M.	Lluvia nocturna. El piso se encuentra humedo por las lluvias el cual las actividades del dia se ven atrazadas hasta poder limpiar el area y dejar que se seque el piso.
28/03/2025			X		X	18:00 P.M.	6:00 A.M.	Lluvia nocturna. El piso se encuentra humedo por las lluvias el cual las actividades del dia se ven atrazadas hasta poder limpiar el area y dejar que se seque el piso para iniciar a aplicar la emulcion.
29/03/2025			X	X		11:40 A.M.	12:40 P.M.	Se detuvieron las actividades de alistado de piso en terraza sillas y sobre piscina, por las lluvias se inicio y paro la actividad de demolicion de alistado.
30/03/2025			X	X		12:00 P.M.	14:30 P.M.	Se detuvieron las actividades de alistado de piso en terraza sobre piscina y terraza gravilla.
30/03/2025			X		X	18:00 P.M.	6:00 A.M.	Lluvia nocturna. El piso se encuentra humedo por las lluvias el cual las actividades del dia se ven atrazadas hasta poder limpiar el area y dejar que se seque el piso.

L: LEVE
M: MODERADO
I: INTENSO

Ingeniero Residente de Obra

Vo. Bo. Residente de interventoría

PROYECTO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.	CONSORCIO SAN MIGUEL

FORMATO DE REPORTE EVENTOS DE LLUVIAS

SEDE: RINCON DE ARDILLAS

FECHA	INTENSIDAD			SUSPENSION LABORES		H Inicio	H Fin	OBSERVACIONES
	L	M	I	SI	NO			
3-mar		X			X	11:00	13:00	No se detienen actividades
4-mar		X			X	15:00	16:00	No se detienen actividades
7-mar			X		X	13:00	16:30	No se detienen actividades
11-mar		X			X	15:40	17:00	No se detienen actividades
16-mar		X			X	13:00	14:00	No se detienen actividades, Se ejecutan actividades al interior de la sede
17-mar			X	X		6:30	13:25	Se detienen labores de pintura en jardineras
18-mar		X		X		11:20	13:25	Se detienen labores de pintura en jardineras
23-mar		X			X	13:53	15:00	No se detienen actividades, Se ejecutan actividades al interior de la sede
26-mar			X		X	10:00	1:30	No se detienen actividades, Se ejecutan actividades al interior de la sede
29-mar			X	X		1:26	3:40	Se detienen labores de resane y pintura muros de la fachada
30-mar			X	X		2:10	3:55	Se detienen labores de resane y pintura muros de la fachada

L: LEVE
M: MODERADO
I: INTENSO



Ingeniero Residente de Obra

Vo. Bo. Residente de interventoría

PROYECTO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.	CONSORCIO SAN MIGUEL

FORMATO DE REPORTE EVENTOS DE LLUVIAS

SEDE: YANACONA

FECHA	INTENSIDAD			SUSPENSION LABORES		H Inicio	H Fin	OBSERVACIONES
	L	M	I	SI	NO			
3-mar		X			X	11:00	13:00	No se detienen actividades
4-mar		X			X	15:00	16:00	No se detienen actividades
11-mar		X			X	15:40	17:00	No se detienen actividades
16-mar		X			X	13:00	14:00	No se detienen actividades, Se ejecutan actividades al interior de la sede
23-mar		X			X	13:53	15:00	No se detienen actividades, Se ejecutan actividades al interior de la sede
26-mar			X		X	10:00	1:30	No se detienen actividades, Se ejecutan actividades al interior de la sede
29-mar			X	X		1:26	3:40	Se detienen labores de resane y pintura muros de la fachada
30-mar			X	X		2:10	3:55	Se detienen labores de resane y pintura muros de la fachada
31-mar			X	X		10:15	11:30	Se detienen labores de resane y pintura muros de la fachada

L: LEVE
M: MODERADO
I: INTENSO

Ingeniero Residente de Obra

Vo. Bo. Residente de interventoría

PROYECTO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.	CONSORCIO SAN MIGUEL

FORMATO DE REPORTE EVENTOS DE LLUVIAS

SEDE: SIERRA MORENA

FECHA	INTENSIDAD			SUSPENSION LABORES		H Inicio	H Fin	OBSERVACIONES
	L	M	I	SI	NO			
3-mar		X			X	11:00	14:00	No se detienen actividades
4-mar		X			X	14:00	16:30	No se detienen actividades
11-mar		X			X	15:40	17:00	No se detienen actividades
19-mar	X				X	15:21	12:30	No se detienen actividades

L: LEVE
M: MODERADO
I: INTENSO



Ingeniero Residente de Obra

Vo. Bo. Residente de interventoría

CORTE DE OBRA N. 3

BALANCE FINANCIERO

GRUPO 4

							29.14%			VALOR BOLSA	SDIS	DIFERENCIA
SEDE	LOCALIDAD	TIPO	NOMBRE	COD	DIRECCION	COSTO DIRECTO	AIU	AJUSTE AL PESO	COSTO TOTAL	VALOR POR RECURSO	VALOR A AGOTAR	AJUSTE AL PESO
SEDE 1	BOSA	JARDIN INFANTIL	CAMPO VERDE	LC 7-351-1	KR 95A 85 80 SUR	$ 105,651,844.86	$ 30,786,947.59	-$ 0.45	$ 136,438,792.00			
SEDE 2	BOSA	JARDIN INFANTIL	TORITO FELIZ	LC 7-256	KR 91C 51 52 SUR	$ 70,975,941.08	$ 20,682,389.23	-$ 0.31	$ 91,658,330.00			
SEDE 3	BOSA	JARDIN SOCIAL	OJOS DE PERDIZ	LC 7-262	KR 92 70 15 SUR	$ 143,746,774.04	$ 41,887,809.95	$ 0.01	$ 185,634,584.00			
SEDE 4	BOSA	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	PORVENIR	LC 7-69-5	KR 100 52 24 SUR	$ 49,522,023.57	$ 14,430,717.67	-$ 0.24	$ 63,514,124.00			
SEDE 5	TUNJUELITO	JARDIN INFANTIL	RINCON DE LAS ARDILLAS	LC 6-141	CL 53 SUR 13C 56	$ 24,969,086.98	$ 7,275,991.94	$ 0.08	$ 36,204,398.00			
SEDE 6	TUNJUELITO	JARDIN INFANTIL	TUNJUELITO	LC 6-140	CL 58A SUR 12A 25	$ 120,729,373.66	$ 35,180,539.49	-$ 0.15	$ 155,909,913.00			
SEDE 7	CIUDAD BOLIVAR	JARDIN INFANTIL	ESTRELLAS DEL MAÑANA	LC 19-179	KR 19 78D 05 SUR IN 1	$ 20,330,017.72	$ 5,924,167.16	$ 0.12	$ 26,254,185.00			
SEDE 8	CIUDAD BOLIVAR	CULTURA POPULAR	YANACONA MUYU KAWSAY	LC 19-133	TV 17B 77A 74 SUR	$ 77,604,955.43	$ 22,614,084.01	-$ 0.44	$ 96,700,167.00	$ 792,314,493.00	$ 792,314,500.00	$ (7.00)
SEDE 9	CIUDAD BOLIVAR	CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR	SIERRA MORENA	LC 19-131	TV 60 73C 07 SUR	$ 177,648,815.24	$ 51,766,864.77	-$ 0.01	$ 229,003,478.00			
SEDE 10	CIUDAD BOLIVAR	CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR	BELLA FLOR	LC 19-183	KR 27A BIS 73 14 SUR	$ 135,578,916.11	$ 39,507,696.15	-$ 0.26	$ 177,120,718.00			
SEDE 11	CIUDAD BOLIVAR	CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR	ACACIAS	LC 19-7	DG 63 SUR 19C 06	$ 238,758,655.84	$ 69,574,272.32	-$ 0.16	$ 308,332,928.00			
SEDE 12	CIUDAD BOLIVAR	CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR	CARLOS GAVIRIA	LC 19-177	CL 69 SUR 18B 36	$ 168,648,031.24	$ 49,144,036.31	$ 0.45	$ 213,435,861.00			
SEDE 13	CIUDAD BOLIVAR	CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR	TEJEDORES DE SUEÑOS	LC 19-64-3	TV 35 69M 85 S	$ 183,263,318.28	$ 53,402,930.95	-$ 0.23	$ 236,666,250.00			
SEDE 14	BOSA	CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR	PORVENIR	LC 7-69-5	KR 100 52 24 SUR	$ 305,641,680.72	$ 89,063,985.76	-$ 0.48	$ 397,419,122.00	$ 1,561,978,357.00	$ 1,562,000,000.00	$ (21,643.00)
									$ 2,354,292,850.00	$ 2,354,292,850.00	$ 2,354,314,500.00	-$ 21,650.00

ING TELMO ALEXANDER CASTILLO
REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICADO DE CALIDAD
Fecha Emisión:
06 de noviembre de 2024

Productos:

El presente certificado hace referencia a la Placa Eterboard fabricada por Eternit Colombiana en las fechas relacionadas.

Descripción	Norma.	Especificación.	Referencia	Fecha de Fabricación	Valor Promedio Obtenido.
Módulo de Ruptura	NTC-4373	7.0 MPa	6mm	05/09/2024	9,87MPa
Espesor	NTC-4373	≤6mm (±0.6mm) >6mm ±10%	6mm	05/09/2024	5,73mm

Los datos registrados en el presente certificado son resultado de los ensayos realizados en laboratorio de control calidad de la compañía de acuerdo con los procedimientos y planes de control internos.

DEPARTAMENTO DE CALIDAD
ETERNIT COLOMBIANA – PLANTA BOGOTÁ.

	INFORME DE RESULTADOS VINILOS	Código: PE-GO-FO-06
		Versión: 7
		Página: 1 de 1

FECHA: 08/11/2024

ELABORADO POR: ZULMA ROMERO

DIRIGIÓ A: PINTART

COMERCIAL RESPONSABLE: FERNANDA MENDEZ

MUESTRA: #604A; 604 B; 604 C

MÉTODOS DE ENSAYO		VINILO BLANACO EXTERIOR LOTE: 07102024-3782 (#604 A)	VINILO BAÑOS Y COCINAS LOTE: 07102024-3782 (#604 B)	VINILO INTERIOR/ EXTERIOR T1 (#604 C)
PARÁMETROS DE VERIFICACIÓN	**NORMA**			
Sólidos/peso (%)	NTC 1227	50,40	50,10	53,75
Solidos/volumen (%)	NTC 6217	38,50	35,13	36,18
Viscosidad (Ku)	NTC 559	>140	>140	>140
Ph	NTC 624	9,3	9,44	8,52
Gravedad especifica (g/mL)	NTC 561	1,24	1,30	1,38
Peso por Galón (Kg/gal)	NTC 561	4,7	4,9	5,2
Finura de dispersión (Hg)	NTC 557	6,5	6,5	6
Resistencia al álcali (H)	NTC 1114	1H Sin defecto	1H Sin defecto	1H Sin defecto
		2H Sin defecto	2H Sin defecto	2H Sin defecto
		3H Sin defecto	3H Sin defecto	3H Sin defecto
		4H Sin defecto	4H Sin defecto	4H Sin defecto
Resistencia al agua (H)	NTC 1114	1H Sin defecto	1H Sin defecto	1H Sin defecto
		2H Sin defecto	2H Sin defecto	2H Sin defecto
		3H Sin defecto	3H Sin defecto	3H Sin defecto
		4H Sin defecto	4H Sin defecto	4H Sin defecto
Abrasión en húmedo (ciclos)	NTC 966	497-503	463-469	406-411
Remosion de manchas (%)	NTC 799	86,8	86,2	80,8
Poder cubriente (%)	NTC 4974	97,62	97,22	97,24
Película 7 mils	N.A	Sin defecto	Sin defecto	Sin defecto
Nivelación	ASTM D 4062	40	40	40
Chorreo	ASTM D 4400	7	7	8
Cuarteamiento a alto espesor	N.A	Sin defecto	Sin defecto	leve defecto
Brillo	N.A	10,7	5,4	3,0
Blancura	N.A	82,57	82,61	77,68
Amarillamiento	N.A	2,40	2,15	3,27
IMAGEN MUESTRA ENVIADA POR EL CLIENTE				
ESTABILIDAD ACELERADA				
Viscosidad KU final	NTC 845	>140	>140	>140
pH final	N.A	8,88	9,32	8,43
Piel/ nata	NTC 845	Sin defecto	Sin defecto	No presenta
Sedimentación	NTC 845	Sin defecto	Sin defecto	No presenta
Sinéresis	NTC 845	Sin defecto	Sin defecto	No presenta

SYGLA COLOMBIA LTDA. CONFIRMA QUE HA EVALUADO LA MUESTRA EMPACADA, ENTREGADA E IDENTIFICADA POR EL FABRICANTE DE PINTURA Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS SE PRESENTAN EN ESTE DOCUMENTO.

SYGLA COLOMBIA LTDA. NO ES RESPONSABLE DE LAS VARIACIONES QUE SE PUEDAN PRESENTAR EN OTROS LOTES DE FABRICACIÓN DEL MISMO FABRICANTE.

COPIA CONTROLADA

Bogota,dic 18/2024

CERTIFICADO DE INSPECCION DE CALIDAD

NOMBRE DE PRODUCTO	MASILLA GYPSUMASTIC PASTA

NUMERO DEL LOTE	02122024

BLANCURA CIE313	>60
ASPECTO	PASTA VISCOSA
VISCOSIDAD brookielf	>140 Ku
PH	8.59
CONTENIDO DE SOLIDOS	69.4
DENSIDAD DE LA PASTA	1.7
TIEMPO DE SECADO	90
RETENCIO N DE AGUA	88%
CAMBIO DE CONSISTENCIA	5.17"
SOLIDOS POR VOLUMEN	49.02%
ESTABILIDAD TERMICA	8.67
ADHERENCIA EN CINTA	80%

Esta inspecion certfica que el producto esta fabricado bajo procesos , dando cumpliemiento alas normas ASTM C475C474 , producto premezclado para acabados en lamina de yeso y sustratos interiores (mamposteria)

El Patio Constructor®
División Proyectos

CERTIFICADO DE CALIDAD MASILLA PARA TRATAMIENTO DE JUNTAS EN PLACAS DE FIBROCEMENTO MEGAJUNTAS ®

Nos permitimos informar que la masilla **MEGAJUNTAS® EL PATIO CONSTRUCTOR** es fabricada por **INDUSTRIAS VENTURA S.A.S**, empresa líder en la elaboración de MASILLAS tipo **DRYWALL Y FIBROCEMENTO.**

MEGAJUNTAS® es una masilla plástica de gran elasticidad y grano grueso, desarrollada especialmente para ser utilizada en el tratamiento de juntas en placas de fibrocemento, acabados en fachadas donde se presentan los movimientos más críticos de dilatación y contracción típicas en este tipo de placas, la cual proporciona una excelente adherencia a las placas, de rápido secado, alto llenado y excelente resistencia mecánica.

La fabricación de Masilla **MEGAJUNTAS®** se ciñe a los estándares internacionales para la fabricación de masillas mediante la norma **ASTM (American Society for Testing Materials) C475**. Para fabricación y elaboración de masillas tipo **DRYWALL**.


Nuestros productos se adaptan a los requerimientos de Calidad, Gestión ambiental y Gestión de seguridad y salud ocupacional exigidos para Colombia.

INDUSTRIAS VENTURA S.A.S, garantiza la Masilla **MEGAJUNTAS®** dentro de las exigencias nacionales e internacionales de fabricación para este tipo de producto, elaborada con los más estrictos parámetros de cumplimiento de Normas técnicas tanto de fabricación como de comportamiento antes, durante y después de su aplicación.

Este certificado se ha emitido para el lote de producción correspondiente a la fecha de fabricación **10 de JULIO de 2024.**

Si Usted tiene cualquier duda o inquietud técnica al respecto, por favor no dude en contactarnos.

Atentamente,



NESTOR HERNANDO MELO G.
Director Sistemas de Gestión de la Calidad
INDUSTRIAS VENTURA S.A.S
NIT.901.179.443-7

CERTIFICADO DE CALIDAD MATERIA PRIMA PARA LA FABRICACION DE PERFILES DE ACERO LAMINADO GALVANIZADO.

MULTIOBRAS SISTEMA DRYWALL SAS es una empresa presente en varias ciudades de Colombia con su línea de perfilería y con 30 años de experiencia en Colombia, MULTIOBRAS entiende las necesidades del mercado de los sistemas constructivos livianos en seco tipo “DRYWALL”, y como resultado incursionó como empresa líder en la fabricación y comercialización de productos para el sistema, ofreciendo a sus clientes la mejor calidad, un excepcional servicio y el más amplio portafolio de productos en el país. La mejor forma de identificar un perfil rolado es encontrando dobleces que son imposibles de realizar con dobladoras, denominados VENAS DE RIGIDIZACIÓN.

El sistema de rolado nos permite escoger el radio de curvatura, lo que nos aporta un control absoluto sobre el perfil y evitar deformaciones que comprometan la estructura interna del mismo.

A continuación, se relacionan las materias primas usadas para la producción de los diferentes tipos de perfiles con: Espesor de acero, sección transversal y referencias comerciales.

PERFIL CIELO RASO Y MURO LINEA COMERCIAL
MATERIAL: 314535 - Rollo 0.38 1220 Z30 Galv. NORMA DE CALIDAD: NTC 4011 / ASTM A653

PER ANGULO PERIMETRAL CAL 26
PER ANGULO DILATACION CAL 26
PER OMEGA CAL 26 2.44, 3.05, 3.66
PER VIGUETA CAL 26 2.44, 3.05, 3.66
PER PARAL BASE 6 (60 x 32mm) CAL 26
PER CANAL BASE 6 (60 x 32mm) CAL 26
PER PARAL BASE 9 (90 x 32mm) CAL 26
PER CANAL BASE 9 (90 x 32mm) CAL 26

MULTIOBRAS
SISTEMA DRYWALL
multiobras.com

ACESCO

CERTIFICADO DE CALIDAD

ACESCO COLOMBIA S.A.S.
Nit. 8600267530
Parque Industrial Malambo S.A., Km 3 Vía Malambo-Sabanagrande,
Atlántico, Colombia.
PBX: 57-5-3718100,
Fax: 57-5-3478030/31/32
www.acesco.com

N. ENTREGA: 8000377182
CLIENTE: MULTIOBRAS SISTEMA DRYWALL SAS

FECHA 10.12.2022

MATERIAL: 314535 - Lam 0.38-1220x2440 Z03 Galv. **NORMA DE CALIDAD:** NTC 4011 / ASTM A653/653M					
LOTE No	0007422463	0008830565	0008830593	0008830687	
COLADA No	0903	2612	2612	2612	
PESO	898 kg	3.442 kg	3.444 kg	3.438 kg	
PORCENTAJE DE CARBONO	0,050 %	0,040 %	0,040 %	0,040 %	
PORCENTAJE DE MANGANESO	0,200 %	0,200 %	0,200 %	0,200 %	
PORCENTAJE DE FÓSFORO	0,011 %	0,011 %	0,011 %	0,011 %	
PORCENTAJE DE AZUFRE	0,009 %	0,007 %	0,007 %	0,007 %	
PORCENTAJE DE BORO	0,0030 %	0,0030 %	0,0030 %	0,0030 %	
PORCENTAJE DE ALUMINIO	0,041 %	0,032 %	0,032 %	0,032 %	
PORCENTAJE DE COBRE	%	%	%	%	
PORCENTAJE DE NÍQUEL	%	%	%	%	
PORCENTAJE DE CROMO	0,010 %	0,020 %	0,020 %	0,020 %	
PORCENTAJE DE MOLIBDENO	%	%	%	%	
PORCENTAJE DE VANADIO	%	%	%	%	

Las propiedades químicas presentadas son las reportadas por el proveedor de origen de la materia prima.

Certificamos que el material aquí descrito ha sido inspeccionado y ensayado conforme a los estándares mencionados. No requiere firma autógrafa ya que los resultados son generados por computador.

Lámina para entrepiso

Perfil Muro Linea PS

MATERIAL: 302320 - Rollo 0.55 1220 Z180 Galv. NORMA DE CALIDAD: ASTM A653

PER ANGULO PERIMETRAL CAL 24 2.44
PER ANGULO DILATACION CAL 24 2.44
PER OMEGA CAL 24 2.44, 3.05
PER VIGUETA CAL 24 2.44
PER PARAL 2 ½ X 1 5/8 CAL 24 2.44, 3.05, 3.66
PER CANAL 2 ½ X 1 CAL 24
PERFIL CANAL 3 1/2" X 1 5/8" CAL 24 2.44
PER PARAL 3 1/2 X 1 5/8 CAL 24 2.44

MULTIOBRAS
SISTEMA DRYWALL
multiobras.com

ACESCO

CERTIFICADO DE CALIDAD

ACESCO COLOMBIA S.A.S.
Nit. 8600267530
Parque Industrial Malambo S.A., Km 3 Vía Malambo-Sabanagrande,
Atlántico, Colombia.
PBX: 57-5-3718100,
Fax: 57-5-3478030/31/32
www.acesco.com

N. ENTREGA: 8000383150 **FECHA** 18.02.2023
CLIENTE: MULTIOBRAS SISTEMA DRYWALL S.A.S.

MATERIAL: 302320 - Rollo 0.55-1220 Z180 Galv. **NORMA DE CALIDAD:** ASTM A 653					
LOTE No	0009076957	0009077378	0009077395	0009077399	0009077404
COLADA No	449105	641160	641160	641160	641160
PESO	3.872 kg	3.752 kg	3.790 kg	3.816 kg	3.812 kg
PORCENTAJE DE NIOBIO O COLUMBIO	%	%	%	%	%
PORCENTAJE DE TITANIO	%	%	%	%	%
PORCENTAJE DE BORO	0,0011 %	0,0012 %	0,0012 %	0,0012 %	0,0012 %
DUREZA PROMEDIO	52 HRB	47 HRB	47 HRB	47 HRB	47 HRB
ANCHO	1221 mm	1220 mm	1220 mm	1220 mm	1220 mm
COMBADURA	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm
RECUBRIMIENTO Z180	187,0 g/m2	182,0 g/m2	182,0 g/m2	182,0 g/m2	182,0 g/m2
ESPESOR DE LÁMINA	0,54 mm	0,54 mm	0,54 mm	0,54 mm	0,54 mm

Las propiedades químicas presentadas son las reportadas por el proveedor de origen de la materia prima.

Certificamos que el material aquí descrito ha sido inspeccionado y ensayado conforme a los estándares mencionados. No requiere firma autógrafa ya que los resultados son generados por computador.

multideck.co
Lámina para entrepiso

Perfil Muro Linea PS

MATERIAL: 304037 - Rollo 0.70 1220 Z180 Galv. NORMA DE CALIDAD: ASTM A653

PER PARAL 2 ½ X 1 5/8 CAL 22
PER CANAL 2 ½ X 1 CAL 22
PERFIL CANAL 3 1/2" X 1 5/8" CAL 22
PER PARAL 3 1/2 X 1 5/8 CAL 22

MULTIOBRAS
SISTEMA DRYWALL
multiobras.com

ACESCO

CERTIFICADO DE CALIDAD

ACESCO COLOMBIA S.A.S.
Nit. 8600267530
Parque Industrial Malambo S.A., Km 3 Vía Malambo-Sabanagrande,
Atlántico, Colombia.
PBX: 57-5-3718100,
Fax: 57-5-3478030/31/32
www.acesco.com

N. ENTREGA: 8000383150 **FECHA** 18.02.2023
CLIENTE: MULTIOBRAS SISTEMA DRYWALL S.A.S.

MATERIAL: 304037 - Rollo 0.70-1220 Z180 Galv.
NORMA DE CALIDAD: ASTM A 653

LOTE No	0009075293	0009077030	0009077054		
COLADA No	2B50935	2B51008	2B51008		
PESO	3.484 kg	3.800 kg	3.388 kg		
PORCENTAJE DE CARBONO	0,030 %	0,020 %	0,020 %		
PORCENTAJE DE MANGANESO	0,180 %	0,170 %	0,170 %		
PORCENTAJE DE FÓSFORO	0,013 %	0,011 %	0,011 %		
PORCENTAJE DE AZUFRE	0,004 %	0,004 %	0,004 %		
PORCENTAJE DE ALUMINIO	0,031 %	0,034 %	0,034 %		
PORCENTAJE DE COBRE	0,010 %	0,010 %	0,010 %		
PORCENTAJE DE NÍQUEL	0,010 %	0,010 %	0,010 %		
PORCENTAJE DE CROMO	0,010 %	0,020 %	0,020 %		
PORCENTAJE DE MOLIBDENO	0,000 %	0,000 %	0,000 %		
PORCENTAJE DE VANADIO	0,001 %	0,001 %	0,001 %		
PORCENTAJE DE NIOBIO O COLUMBIO	0,000 %	0,000 %	0,000 %		
PORCENTAJE DE TITANIO	0,0000 %	0,0000 %	0,0000 %		
PORCENTAJE DE BORO	0,0015 %	0,0018 %	0,0018 %		
DUREZA PROMEDIO	44 HRB	47 HRB	47 HRB		
ANCHO	1222 mm	1221 mm	1221 mm		
COMBADURA	0 mm	0 mm	0 mm		
RECUBRIMIENTO Z180	183,3 g/m2	190,3 g/m2	190,3 g/m2		
ESPESOR DE LÁMINA	0,69 mm	0,68 mm	0,68 mm		

Las propiedades químicas presentadas son las reportadas por el proveedor de origen de la materia prima.

Certificamos que el material aquí descrito ha sido inspeccionado y ensayado conforme a los estándares mencionados. No requiere firma autógrafa ya que los resultados son generados por computador.

Perfil Muro Linea PS
MATERIAL: 301029 - Rollo 0.85 1220 Z180 Galv. NORMA DE CALIDAD: ASTM A653

PER CANAL 3 ½" X 1" CAL 20
PER PARAL 3 ½“ X 1 5/8 CAL 20
PER CANAL 2 ½” X 1” CAL 20
PER PARAL 2 ½” X 1 5/8 CAL 20

ACESCO

CERTIFICADO DE CALIDAD

ACESCO COLOMBIA S.A.S.
Nit. 8600267530
Parque Industrial Malambo S.A., Km 3 Vía Malambo-Sabanagrande,
Atlántico, Colombia.
PBX: 57-5-3718100,
Fax: 57-5-3478030/31/32
www.acesco.com

N. ENTREGA: 8000379872
CLIENTE: MULTIOBRAS SISTEMA DRYWALL SAS

FECHA 14.01.2023

MATERIAL: 301029 - Rollo 0.85-1220 Z180 Galv.
NORMA DE CALIDAD: ASTM A 653

LOTE No	0008975847	0008975865	0008975946		
COLADA No	552497	552497	552497		
PESO	3.876 kg	3.898 kg	3.520 kg		
PORCENTAJE DE CARBONO	0,040 %	0,040 %	0,040 %		
PORCENTAJE DE MANGANESO	0,250 %	0,250 %	0,250 %		
PORCENTAJE DE FÓSFORO	0,015 %	0,015 %	0,015 %		
PORCENTAJE DE AZUFRE	0,004 %	0,004 %	0,004 %		
PORCENTAJE DE ALUMINIO	0,037 %	0,037 %	0,037 %		
PORCENTAJE DE COBRE	%	%	%		
PORCENTAJE DE NÍQUEL	%	%	%		
PORCENTAJE DE CROMO	0,010 %	0,010 %	0,010 %		
PORCENTAJE DE MOLIBDENO	%	%	%		
PORCENTAJE DE VANADIO	0,001 %	0,001 %	0,001 %		

Las propiedades químicas presentadas son las reportadas por el proveedor de origen de la materia prima.

Certificamos que el material aquí descrito ha sido inspeccionado y ensayado conforme a los estándares mencionados. No requiere firma autógrafa ya que los resultados son generados por computador.

Nota: Las marcas de materias primas usadas en la producción de perfiles línea comercial pueden cambiar, sin desmejorar las propiedades del acero base. El lote en mención no es exacto.

LINEA COMERCIAL

Perfiles de acero galvanizado bajo norma **ASTM A 653/924** galvanizado G30 – Z90, fabricado bajo el proceso de rol-formado con máquinas de control número de última tecnología.” Para los perfiles en
0.38mm Los flejes de acero galvanizado G30 (suministrados por CORPACERO®, ACESCO, e importados) fabricación e importación de Acero para Colombia cuentan con la norma **ASTM A 653 C TIPO** para lámina galvanizada en el proceso de inmersión en caliente; los cuales al pasar por la maquina roladora por medio de dobleces obtienen la forma y el diseño geométrico y estructura.

Perfil Liviano para Muro – Línea PS

“Perfiles de acero galvanizado bajo norma **ASTM A 653/924 NTC 4911 ICONTEC** y galvanizado G60 - Z180, fabricado bajo el proceso de rolformado con máquinas de control número de última tecnología.” Para los perfiles en 0.55mm-0.75mm y 0.85mm Los flejes de acero galvanizado G60 (suministrados por ACESCO®, empresa líder en la fabricación e importación de Acero para Colombia) cuentan con la norma **ASTM A 653** para lámina galvanizada en el proceso de inmersión en caliente; los cuales al pasar por la maquina roladora por medio de dobleces obtienen la forma y el diseño geométrico y estructural.

LINEA COMERCIAL Y PS

Poseemos la versatilidad de fabricación de perfiles en longitudes exactas de acuerdo con las necesarias por el cliente o el proyecto, lo que nos permite ahorros sustanciales en uso y en la optimización económica por la disminución de traslapos en los perfiles. Sin embargo, tenemos las medidas estándar y comerciales de 2.44 m, 3.05m y 3.66 m. Nuestros perfiles parales presentan perforaciones, realizadas por troquelado, a las medidas estipuladas por requerimientos propios de instalaciones internas o domiciliarias, para contemplar el pasaje de instalaciones eléctricas, hidráulicas, oxigeno o de gases, entre otras. Los perfiles MULTIOBRAS permiten garantizar el perfecto plomado e hilo de la estructura, que finalmente será el reflejo de la perfecta aplicación en el sistema drywall.

Notas:

1. Los Certificados de Calidad hacen referencia a la composición de material con el que están fabricados nuestros perfiles, los productos que representamos y/o fabricamos cuentan con el respaldo completo de garantía de suministro y de calidad, por lo tanto, obtienen todo nuestro respaldo técnico y comercial por cualquier defecto de fabricación y no por malas prácticas de instalación.

2. Los Certificados de Calidad No hacen referencia a diseños y/o cálculos de elementos No estructurales, esta labor será responsabilidad de cada proyecto y la ejecución de este, estará a cargo de profesional encargado de Diseño, Multiobras Sistema Drywall SAS no realiza diseño, ni calculo en su función de comercialización.

3. Multiobras Sistema Drywall SAS no se hace responsable por omisiones en especificaciones propias del proyecto, nuestra función es de carácter comercial y no de especificación, las fichas técnicas del producto se han entregado previamente al comprador donde conoce nuestras características de desarrollo, espesores y geométricas propias del producto.

Si necesitan ampliar la Información suministrada se puede comunicar al 2017411 0 3124578243

Cordialmente



Arq. Vladimir Romero
Coordinador Técnico
Multiobras Sistema Drywall S. A. S.

multideck.co
Lámina para entrepiso

Sello de Calidad

icontec internacional

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

BALDOSAS CERÁMICAS

Fabricado por **COMPAÑIA COLOMBIANA DE CERAMICA S.A.S. - COLCERAMICA S.A.S.,** en **Pisos & Paredes Planta Prestigio:** kilómetro 2 Vía Briceño - Sopó, Sopó, Cundinamarca; **Pisos & Paredes Planta Sopó:** Kilómetro 2 Vía Briceño - Sopó, Sopó, Cundinamarca; **Pisos & Paredes Planta Madrid:** Calle 7 No. 15 - 96, Madrid, Cundinamarca; **Pisos & Paredes Planta Girardota:** Carrera 18A No. 04A - 004 Girardota, Antioquia; **Pisos & Paredes Planta La Estrella:** Carrera 50 No. 80 Sur - 73, La Estrella, Antioquia, Colombia

Manufactured by **COMPAÑIA COLOMBIANA DE CERAMICA S.A.S. - COLCERAMICA S.A.S.,** in **Pisos & Paredes Planta Prestigio:** kilómetro 2 Vía Briceño - Sopó, Sopó, Cundinamarca; **Pisos & Paredes Planta Sopó:** Kilómetro 2 Vía Briceño - Sopó, Sopó, Cundinamarca; **Pisos & Paredes Planta Madrid:** Calle 7 No. 15 - 96, Madrid, Cundinamarca; **Pisos & Paredes Planta Girardota:** Carrera 18A No. 04A - 004 Girardota, Antioquia; **Pisos & Paredes Planta La Estrella:** Carrera 50 No. 80 Sur - 73, La Estrella, Antioquia, Colombia

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

NTC 919 (2015)

Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características y rotulado
Ceramic tiles. Definitions, classification, characteristics and marking

SECTOR ICS 91.100.23

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity product is subject to the company´s and product´s permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSC-0064-1
Certificate

Fecha de Aprobación: Approval Date:	2011-11-18	**Fecha Última Modificación:** Last Modification Date:	2018-11-30
Fecha de Renovación: Renewal Date:	2017-11-17	**Fecha de Vencimiento:** Expiration Date:	2023-11-17

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo
CEO

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accreditated by:

ACREDITADO ONAC ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA
ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002

ANSI ACCREDITED
ID #0677
ISO/IEC 17065
Product Certification Body

CERTIFICADO DE ANÁLISIS			
06-FT-002	Versión: 1	Fecha: 15/01/2022	

VINILO T1

PRODUCTO: Vinilo Tipo 1 BLANCO
FECHA FABRICACIÓN: 19 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA VENCIMIENTO: 19 DE DICIEMBRE DE 2025
LOTE: 0610191205

PRUEBA	ESPECIFICACION	UNIDADES	RESULTADO	MÉTODO
Relación de Contraste	96,0 min	%	97,2	NTC 4974
Ciclos de abrasión	400 min	Ciclos	400	NTC 966
Lavabilidad	80 min	%	85%	NTC 799
Ph Diluido al 10%	Min. 8,00 - Máx 10,00		8,8	NTC 4292
Viscosidad KU	Máx. 140	cps	128	NTC 559
Finura de Dispersión	Min. 4	Hegman	5,5	NTC 557
Peso por galón	Min. 5,4	Kg/Gl	5,45	ASTM D2244
Sólidos por peso	Min. 54% - Máx 60%	%	59,5%	NTC 592-1

Pruebas de Calidad emitidas de acuerdo con la Norma NTC 1335 "Pinturas al agua tipo emulsión"

Los datos anteriores indican que este lote evaluado cumple con los requisitos referente a un vinilo tipo 1 de acuerdo con la norma colombiana NTC 1335.

VERIFICADO Y APROBADO POR:

ING. OSCAR L. DURAN
Coordinador de Diseño y Desarrollo

www.icc-es.org | (800) 423-6587 | (562) 699-0543 *A Subsidiary of the International Code Council®*

ICC-ES Evaluation Report
ESR-1799

Reissued June 2023

This report is subject to renewal June 2025.

DIVISION: 03 00 00—CONCRETE
Section: 03 16 00—Concrete Anchors

DIVISION: 04 00 00—MASONRY
Section: 04 05 19.16—Masonry Anchors

DIVISION: 05 00 00—METALS
Section: 05 05 23—Metal Fastenings

DIVISION: 09 00 00—FINISHES
Section: 09 22 16.23—Fasteners

REPORT HOLDER:

ITW RAMSET

ADDITIONAL LISTEE:

ITW BRANDS

EVALUATION SUBJECT:

POWER-ACTUATED FASTENERS AND CEILING CLIP ASSEMBLIES

1.0 EVALUATION SCOPE

Compliance with the following codes:

- 2021, 2018, 2015, 2012, 2009 and 2006 *International Building Code*® (IBC)
- 2021, 2018, 2015, 2012, 2009 and 2006 *International Residential Code*® (IRC)

For evaluation for compliance with codes adopted by the Los Angeles Department of Building and Safety (LADBS), see ESR-1799 LABC and LARC Supplement.

For evaluation for compliance with codes adopted by the California Office of Statewide Health Planning and Development (OSHPD) and Division of State Architect (DSA), see ESR-1799 CBC and CRC Supplement.

Property evaluated:

Structural

2.0 USES

The 1500 Series, SP Series Power Point, and TE Series fasteners are power-actuated fasteners (PAFs) used for fastening of building components to normalweight concrete, sand-lightweight concrete, sand-lightweight concrete filled steel deck panels, concrete masonry and structural steel substrates. The fasteners are used as alternatives to the cast-in-place concrete anchors described in IBC Section 1901.3 (2012 IBC Section 1908; 2009 and 2006 IBC Section 1911) for placement in concrete; the embedded anchors described in Section 8.1.3 of TMS 402, referenced in Section 2107 of the IBC (Section 2.1.4 of TMS 402, referenced in Section 2107 of the 2012, 2009 and 2006 IBC); and to the welds and bolts used to attach to steel, described in IBC Sections 2204.1 and 2204.2. For structures regulated under the IRC, the fasteners may also be used where an engineered design is submitted in accordance with IRC Section R301.1.3.

SDC, SPC and TEC ceiling clip assemblies are used to attach wire for suspended ceilings to the supporting structure above. The ceiling clip assemblies are used as alternatives to cast-in-place concrete anchors described in IBC Section 1901.3 (2012 IBC Section 1908; 2009 and 2006 IBC Section 1911); and may also be used in structures regulated under the IRC where an engineered design is submitted in accordance with IRC Section R301.1.3.

3.0 DESCRIPTION

3.1 General:

See Table 1A in this report for shank descriptions fastener dimensions, coating information and applicable base materials. The fasteners are available in various lengths to achieve embedment depths as noted in Tables 2 through 9. See Table 10 for a correlation of products between ITW Ramset and ITW Brands.

3.2 1500 Series Fasteners:

The 1500 series fasteners are manufactured from steel complying with ASTM A510, Grade 1060 or 1062, and austempered to a Rockwell “C” core hardness of 52 to 56 for smooth-shank fasteners and 54 to 56 for knurled-shank fasteners.

The 1500 series fasteners have a nominal shank diameter of 0.145 inch (3.7 mm) and a nominal head diameter of 0.3 inch (7.6 mm). All of the 1500 series fasteners have a zinc-plated finish, except for the smooth-shank 1506B fasteners, which has a black oxide finish.

3.3 SP Series Power Point Fasteners:

The SP Series Power Point fasteners are straight or stepped shank series fasteners manufactured from steel wire complying with ASTM A510, Grade 1060 or 1062, and austempered to a Rockwell “C” hardness of 55 to 56.

ICC-ES Evaluation Reports are not to be construed as representing aesthetics or any other attributes not specifically addressed, nor are they to be construed as an endorsement of the subject of the report or a recommendation for its use. There is no warranty by ICC Evaluation Service, LLC, express or implied, as to any finding or other matter in this report, or as to any product covered by the report.

Copyright © 2023 ICC Evaluation Service, LLC. All rights reserved.

The SP Series Power Point fasteners have a head diameter of 0.3 inch (7.62 mm). Fasteners having nominal shank lengths of $^{7}/_{8}$ inch and less have a smooth, straight, nominally 0.150-inch diameter shank. Fasteners having a nominal shank length of 1 inch or longer have a smooth, stepped shank with a nominally 0.150-inch diameter shank at the tapered end and a nominally 0.180-inch diameter shank at the headed end. The SP Series Power Point fasteners have a zinc-plated finish.

3.4 True Embedment (TE) Series Fasteners:

The TE series fasteners are straight and tapered shank fasteners manufactured from steel wire complying with ASTM A510, Grade 1070, and austempered to a Rockwell "C" hardness of 55 to 58.

The TE series fasteners have a head diameter of 0.32 inch (8.1 mm). The smooth shank fasteners have a tapered point and a nominal straight shank diameter of 0.157 inch. The knurled fasteners have a straight shank with a nominal diameter of 0.157 inch. The TE series fasteners have a zinc-plated finish.

3.5 Ceiling Clip Assemblies:

The ceiling clip assemblies are comprised of a power-actuated fastener with a premounted steel clip. See Figure 4. See Table 1B for descriptions and applicable allowable load tables.

3.5.1 SDC100 and SDC125 Ceiling Clip Assemblies: The fasteners used in the SDC100 and SDC125 ceiling clip assemblies are 1500 series, smooth, straight shank fasteners, described in Section 3.2, with shank lengths of 1 inch and $1^{1}/_{4}$ inches (25.4 and 31.7 mm), respectively. The clip angles have a 120-degree angle between the legs of the clip and are manufactured from $^{3}/_{4}$-inch-wide steel strips conforming to ASTM A653 FS Type B and having a base-metal thickness of 0.074 inch (1.88 mm). One leg of the clip is $^{29}/_{32}$ inch long (23 mm) and the opposite leg is $^{3}/_{4}$ inch long (19.1 mm). The fasteners are inserted through a dimple formed in the longer leg of the clip angle. The other leg has a hole with a nominal diameter of 0.335 inch (8.5 mm) through which the ceiling wire is attached.

3.5.2 SPC78 and SPC114 Ceiling Clip Assemblies: The fasteners used in the SPC78 and SPC114 ceiling clip assemblies are SP series Power Point smooth, straight shank fasteners, described in Section 3.3, with shank lengths of $^{7}/_{8}$ inch and $1^{1}/_{4}$ inches (22 and 31.7 mm), respectively. The clip angles have a 90-degree angle between the legs of the clips and are manufactured from $^{3}/_{4}$-inch-wide (19.1 mm), No. 14 gage [0.0747 inch (1.90 mm) base-metal thickness], steel strips conforming to ASTM A653 CS Type B. One leg of the clip is 1 inch long (25.4 mm) and the opposite leg is $^{3}/_{4}$ inch long (19.1 mm). The fasteners are inserted through an eyelet which is inserted through the hole in the 1-inch-long (25.4 mm) leg of the clip. The eyelet is manufactured from 5052-0 grade aluminum having a thickness of 0.032 inch (0.81 mm). The $^{3}/_{4}$-inch-long (19.1 mm) leg has a hole with a nominal diameter of 0.313 inch (8.0 mm) through which the ceiling wire is attached.

3.5.3 TEC100 Ceiling Clip Assemblies: The fastener used in the TEC100 ceiling clip assemblies is the TE series smooth shank fastener, described in Section 3.4, with a shank length of 1 inch (25.4 mm). The clip angle and eyelet are the same as for the SPC78 and SPC114 ceiling clip assemblies described in Section 3.5.2.

3.6 Substrate Materials:

3.6.1 Structural Steel: Structural steel used in supports must comply with the minimum requirements of ASTM A36 (see Table 5), ASTM A572 Grade 50 or ASTM A992 (see Table 6), and must have thicknesses as noted in Table 5 or 6.

3.6.2 Concrete: Normalweight and sand-lightweight concrete must comply with IBC Chapter 19 or IRC Section R402.2, as applicable. The minimum concrete compressive strength at the time of fastener installation must be as noted in applicable allowable load table.

3.6.3 Steel Deck Panels: Steel deck panels must conform to a code-referenced material standard, with the minimum thickness and minimum yield strength and specified tensile strength noted in Tables 4 and 9. See Figure 1 for panel configuration requirements.

3.6.4 Concrete Masonry: Concrete Masonry Units (CMUs) must be minimum 8-inch-thick, normal weight blocks conforming to ASTM C90. Mortar must be Type S mortar complying with ASTM C270. Grout must be coarse grout complying with ASTM C476.

4.0 DESIGN AND INSTALLATION

4.1 Design:

4.1.1 General: Selection of fasteners must take into consideration the applicable base material and the length of the fastener. The minimum fastener length must be determined as follows:

- Unless otherwise noted, for installation into concrete, concrete-filled steel deck panels, concrete masonry and steel base materials, the minimum effective shank length shown in Table 1A must equal or exceed the sum of the thickness of the attached material and the minimum embedment depth (penetration) shown in the applicable tables in this report.
- For installation through steel base materials, the minimum effective shank length shown in Table 1A must equal or exceed the sum of the following: the thickness of the attached material, the thickness of the base material and the required point penetration shown in the applicable tables in this report.

4.1.2 Allowable Loads: The applicable allowable shear and tension load tables for the fasteners and ceiling clip assemblies driven into different base materials may be determined by referencing Tables 1A and 1B. The most critical applied loads, excluding seismic load effects, resulting from the load combinations in Section 2.4 of ASCE 7-16/S1 (referenced in 2021 IBC Section 1605.1) or 2021 IBC Section 1605.2 (Section 1605.3.1 or 1605.3.2 of the 2018, 2015, 2012 IBC) must not exceed the allowable loads described in this section. For fasteners which are subjected to seismic loads, see Section 4.1.5 for additional information.

The allowable shear and tension (pullout) values in the tables of this report are for use in allowable stress design (ASD). The allowable loads apply to the interaction between the fasteners and the specified base materials only, and limit states such as pull-over and lateral bearing, which are governed by the properties of attached materials, are outside the scope of this report. Design of the connection to the attached material must comply with the applicable requirements of the IBC. When designing the connection of wood members to the base material, the bending yield strength of the PAFs can be assumed to be the same as that of a nail with the same shank diameter. The stress increases and load reductions described in 2021 IBC Section 1605.2 (2018, 2015, 2012 and 2009 IBC Section 1605.3) are not allowed.

4.1.3 Combined Loading: For fasteners subjected to both shear and tension loads, compliance with the following interaction equation must be verified:

$$(p/P_a) + (v/V_a) \leq 1$$

where:

p = Actual applied tension load on fastener, lbf (N).

P_a = Allowable tension load for the fastener, lbf (N).

v = Actual applied shear load on fastener, lbf (N).

V_a = Allowable shear load for the fastener, lbf (N).

4.1.4 Steel-to-steel Connections: When the fasteners listed in Tables 5 and 6 are used in connections of two steel elements in accordance with Section J5 of AISI S100 (Section E5 of AISI S100-12 for the 2015, 2012 and 2009 IBC), connection capacity must be determined in accordance with Sections 4.1.4.1 and 4.1.4.2, as applicable.

4.1.4.1 Connection Strength - Tension: To determine tensile connection strength in accordance with Section J5.2 of AISI S100 (Section E5.2 of AISI S100-12), the fastener tension strength, pull-out strength and pull-over strength must be known. These characteristics must be determined as follows:

- **PAF Tensile Strength:** The allowable fastener tension strengths must be calculated in accordance with Section J5.2.1 of AISI S100 (Section E5.2.1 of AISI S100-12) using a value of 260,000 psi for F_{uh}.
- **Pull-out Strength:** See Table 5 or 6, as applicable, for available pull-out strength.
- **Pull-over Strength:** The available pull-over strengths must be calculated in accordance with Section J5.2.3 of AISI S100 (Section E5.2.3 of AISI S100-12).

4.1.4.2 Connection Strength - Shear: To determine shear connection strength in accordance with Section J5.3 of AISI S100 (Section E5.3 of AISI S100-12), the fastener shear strength, bearing and tilting strength, pull-out strength in shear, net section rupture strength and shear strength limited by edge distance must be known. These characteristics must be determined as follows:

- **PAF Shear Strength:** The allowable fastener shear strengths must be calculated in accordance with Section J5.3.1 of AISI S100 (Section E5.3.1 of AISI S100-12) using a value of 260,000 psi for F_{uh}.
- **Bearing and Tilting Strength:** The available bearing and tilting strengths must be calculated in accordance with Section J5.3.2 of AISI S100 (Section E5.3.2 of AISI S100-12).
- **Pull-out Strength in Shear:** The available pull-out strength in shear must be the applicable allowable shear strength from Table 5 or 6, as applicable, or must be calculated in accordance with Section J5.3.3 of AISI S100 (Section E5.3.3 of AISI S100-12).
- **Net Section Rupture Strength and Shear Strength Limited by Edge Distance:** The net section rupture strength must be determined in accordance with Section J5.3.4 of AISI S100 (Section E5.3.4 of AISI S100-12) and the shear strength limited by edge distance must be determined in accordance with Section J5.3.5 of AISI S100 (Section E5.3.5 of AISI S100-12).

4.1.5 Seismic Considerations: When subjected to seismic loads, the fasteners may be used as follows:

1. The fasteners may be used for attachment of nonstructural components listed in Section 13.1.4 of ASCE 7, which are exempt from the requirements of ASCE 7.
2. Concrete Base Materials: The fasteners installed in concrete base materials may be used to support acoustical tile or lay-in panel suspended ceiling systems, distributed systems and distribution systems where the service load on any individual fastener does not exceed the lesser of 90 lbf (400 N) or the published allowable load in Tables 2, 3, 4,8, and 9, as applicable.
3. Steel Base Materials: The fasteners installed in steel may be used for attaching nonstructural components where the service load on any individual fastener does not exceed the lesser of 250 lbf (1112 N) or the published allowable load shown in Tables 5 and 6, as applicable.
4. Interior, Nonstructural Walls: For interior, nonstructural walls that are not subject to sustained tension loads and are not a bracing application, the power-actuated fasteners described in Section 3.0 may be used to attach steel track to concrete or steel in all Seismic Design Categories. In Seismic Design Categories D, E and F, the allowable shear load due to transverse pressure must be no more than 90 pounds (400 N) when attaching to concrete; or 250 pounds (1,112 N) when attaching to steel. Substantiating calculations must be submitted addressing the fastener-to-base-material capacity and the fastener-to-attached-material capacity. Interior nonstructural walls are limited to locations where bearing walls, shear walls or braced walls are not required by the approved plans. The design load on the fastener must not exceed the allowable load shown in Tables 2 through 6, as applicable.

4.2 Installation:

4.2.1 General: The fasteners must be installed in accordance with this report and the ITW Ramset or ITW Brands installation instructions. A copy of these instructions must be available on the jobsite at all times during installation.

A low-velocity, powder-actuated fastening tool, recommended by ITW Ramset or ITW Brands, must be used to install the fasteners. The fastener penetration, spacing and edge distances must be as noted in the tables of this report. For fasteners installed into concrete, the fasteners must not be driven until the concrete has reached the designated compressive strength.

4.2.2 Use with Treated Lumber: The fasteners described in Table 1 may be used in contact with fire-retardant-treated wood in dry, interior locations only, in accordance with IBC Section 2304.10.6.4 (2018 and 2015 IBC Section 2304.10.5.4, 2012 and 2009 IBC Section 2304.9.5.4) and ITW Ramset's recommendations. Use of fasteners in contact with preservative-treated wood or fire-retardant-treated wood in exterior applications is outside the scope of this report

5.0 CONDITIONS OF USE

The power-actuated fasteners and ceiling clip assemblies described in this report comply with, or are suitable alternatives to what is specified in, those codes listed in Section 1.0 of this report, subject to the following conditions:

5.1 The fasteners must be manufactured and identified in accordance with this report.

5.2 Fastener installation complies with this report and ITW Ramset or ITW Brands published installation

instructions. In the event of a conflict between this report and the published installation instructions, the more restrictive requirements govern.

5.3 Calculations demonstrating that the applied loads are less than the maximum allowable loads described in this report must be submitted to the code official. The calculations must be prepared by a registered design professional where required by the statutes of the jurisdiction in which the project is to be constructed.

5.4 For steel-to-steel connections that meet the applicability requirements of Section J5 of AISI S100 (Section E5 of AISI S100-12), calculations demonstrating that the available connection strength has been determined in accordance with Section J5 of AISI S100 (Section E5 of AISI S100-12) and Section 4.1.4 of this report, and equals to or exceeds the applied load, must be submitted to the code official. The calculations must be prepared by a registered design professional where required by the statutes of the jurisdiction in which the project is to be constructed.

5.5 Refer to Section 4.1.5 for seismic considerations.

5.6 The minimum concrete thickness must be three times the fastener embedment in concrete, except where noted otherwise in this report.

5.7 The use of fasteners is limited to uncracked concrete or masonry. Cracking occurs when $f_t > f_r$ due to service loads or deformations.

5.8 Installation must be limited to dry interior environments, which include exterior walls which are protected by an exterior wall envelope.

5.9 Refer to Section 4.2.2 regarding the use of fasteners in contact with preservative-treated or fire-retardant-treated.

5.10 The fasteners and ceiling clip assemblies addressed in this report are manufactured under a quality-control program with inspections by ICC-ES.

6.0 EVIDENCE SUBMITTED

Data in accordance with the ICC-ES Acceptance Criteria for Power-actuated Fasteners Driven into Concrete, Steel and Masonry Elements (AC70), dated December 2019 (editorially revised January 2021).

7.0 IDENTIFICATION

7.1 The containers of the fasteners are labeled with the company name (ITW Ramset or ITW Brands); the brand name (Ramset, Duo-Fast or Tapcon), the fastener product name, length, catalog number, and quantity; the evaluation report number (ESR-1799); and the manufacturing date. In addition, the ITW Ramset 1500 series and SP series fasteners are identified by the letter "R" stamped into the fastener head, and the ITW Brands Duo-Fast and Tapcon1500 series and SP series fasteners have a semi-circle stamped on the fastener head. The ITW Ramset TE Series fasteners have the nominal length marked on the fastener head. See Figure 3.

7.2 The report holder's contact information is the following:

ITW RAMSET
Brand name: Ramset
155 HARLEM AVENUE
GLENVIEW, ILLINOIS 60025
(800) 848-5611
www.ramset.com
techsupport@itwccna.com

7.3 The Additional Listee's contact information is the following:

ITW BRANDS
Brand names: Duo-Fast, Tapcon
155 HARLEM AVENUE, N3E
GLENVIEW, ILLINOIS 60025
(847) 489-2726
brandscs@itwbrands.com

TABLE 1A—FASTENER DESCRIPTIONS AND APPLICATIONS

FASTENER[1]		SHANK TYPE	SHANK DIAMETER (inch)	HEAD DIAMETER (inch)	MAXIMUM POINT LENGTH (inch)	MINIMUM EFFECTIVE SHANK LENGTH (inch)	FASTENER COATING	APPLICABLE BASE MATERIAL	APPLICABLE LOAD TABLES
1500 Series	1506B	Smooth, straight	0.145	0.300	0.280	Designated shank length – 0.03 inch (2.84 inch for 1524 fastener)	Black Oxide	Concrete	2
	15##						Zinc	Concrete	2, 3
								Conc.-filled deck	4
								Steel	5
	1503K	Knurled, straight			0.300	Designated shank length	Zinc	Steel	5, 6
SP Powerpoint Series	SP12 SP58 SP34	Smooth, straight	0.150	0.300	0.335	Designated shank length	Zinc	Concrete	2
								Steel	5, 6
	SP100 SP114 SP178	Smooth, stepped	0.150/0.180	0.300	0.335	Designated shank length	Zinc	Concrete	2, 3
								Conc.-filled deck	4
True Embedment (TE) Series	TE##	Smooth, straight and tapered	0.157	0.320	0.40	Shank length + 1/16 inch	Zinc	Concrete	2, 3
								Conc.-filled deck	4
								CMU	7
	TE##	Knurled, straight	0.157	0.320	0.30	Shank length	Zinc	Steel	5, 6

For **SI:** 1 inch = 25.4 mm.

[1]## denotes numbers used in fastener designation.

TABLE 1B—CEILING CLIP ASSEMBLY DESCRIPTIONS AND APPLICATIONS

ASSEMBLY	FASTENER	CLIP DESCRIPTION	CLIP MATERIAL & FINISH	APPLICABLE BASE MATERIAL	APPLICABLE LOAD TABLES
SDC100	1508	0.074 inch thick, 120° clip angle 0.335 inch diameter hole	Carbon steel, zinc coating	Concrete	8
SDC125	1510			Conc.-filled deck	9
SPC78	SP78	0.074 inch thick, 90° clip angle 0.313 inch diameter hole	Carbon steel, zinc coating	Concrete	8
SPC114	SP114			Conc.-filled deck	9
TEC100	TE100	0.074 inch thick, 90° clip angle 0.313 inch diameter hole	Carbon steel, zinc coating	Concrete	8
				Conc.-filled deck	9

For **SI:** 1 inch = 25.4 mm.

TABLE 2—ALLOWABLE TENSION AND SHEAR VALUES FOR FASTENERS INSTALLED IN NORMALWEIGHT CONCRETE[1]

PART NUMBER SERIES	NOMINAL SHANK DIAMETER (inch)	SHANK DESCRIPTION	MINIMUM EMBEDMENT DEPTH (inches)	MINIMUM SPACING (inches)	MINIMUM EDGE DISTANCE (inches)	ALLOWABLE LOADS (lbf)					
Concrete Compressive Strength:						2500 psi		4000 psi		6000 psi	
Load Direction:						Tension	Shear	Tension	Shear	Tension	Shear
1500	0.145	Smooth-straight	3/4 1 1 1/4 1 1/2	5.1	3.2	50 152 159 154	66 166 265 340	100 157 179 209	104 182 267 342	— — — —	— — — —
SP	0.150	Smooth-straight	3/4	5.1	3.2	—	—	150	105	81	82
SP	0.150/0.180	Smooth-stepped	1 1 1/4 1 1/2	5.1	3.5	154 207 —	200 230 —	243 298 384	175 218 391	189 213 239	210 305 594
TE	0.157	Smooth-tapered	3/4 1 1 1/4	5.1	2.75	71 197 264	116 216 283	71 258 377	116 216 317	109 214 415	117 383 349

For **SI:** 1 inch = 25.4 mm, 1 lbf = 4.45 N, 1 psi = 6.89 kPa.

[1]The fasteners must not be driven until the concrete has reached the designated minimum compressive strength. Minimum concrete thickness must be three times the fastener embedment into the concrete.

TABLE 3—ALLOWABLE TENSION AND SHEAR VALUES FOR FASTENERS INSTALLED IN MINIMUM 3000 psi SAND-LIGHTWEIGHT CONCRETE[1]

PART NUMBER SERIES	NOMINAL SHANK DIAMETER (inch)	SHANK DESCRIPTION	MINIMUM EMBEDMENT DEPTH (inches)	MINIMUM SPACING (inches)	MINIMUM EDGE DISTANCE (inches)	ALLOWABLE LOADS (lbf)	
						Tension	Shear
1500	0.145	Smooth-straight	3/4 1 1 1/4 1 1/2	4	3.2	167 200 333 391	179 228 400 410
SP	0.150/0.180	Smooth-stepped	1 1 1/4 1 1/2	4	3.5	226 329 406	250 377 380
TE	0.157	Smooth-tapered	3/4 1 1 1/4 1 1/2	5.1	3.0	152 325 358 466	159 347 437 478

For **SI:** 1 inch = 25.4 mm, 1 lbf = 4.45 N, 1 psi = 6.89 kPa.

[1]The fasteners must not be driven until the concrete has reached the designated minimum compressive strength. Minimum concrete thickness must be three times the fastener embedment into the concrete, unless noted otherwise.

TABLE 4—ALLOWABLE TENSION AND SHEAR VALUES FOR FASTENERS INSTALLED THROUGH METAL DECK INTO MINIMUM 3000 psi SAND-LIGHTWEIGHT CONCRETE[1]

PART NUMBER SERIES	NOMINAL SHANK DIAMETER (inch)	SHANK DESCRIPTION	MINIMUM EMBEDMENT DEPTH (inches)	MINIMUM SPACING (inches)	ALLOWABLE LOADS (lbf)					
Deck Type:					3-INCH DEEP W TYPE STEEL DECK[2,3]		1 1/2-INCH DEEP B TYPE STEEL DECK[4,5]			
Fastener Location:					Lower Flute		Upper Flute		Lower Flute	
Load Direction:					Tension	Shear	Tension	Shear	Tension	Shear
1500	0.145	Smooth-straight	3/4 1 1 1/4 1 1/2	4	76 134 157 233	260 265 269 346	-	-	-	-
SP	0.150/0.180	Smooth-stepped	1 1 1/4 1 1/2	4	119 175 179	336 372 426	-	-	-	-
TE	0.157	Smooth-tapered	3/4 1 1 1/4 1 1/2	5.1	106 152 164 238	265 327 330 448	131 156 - -	261 273 - -	154 138 - -	307 265 - -

For **SI:** 1 inch = 25.4 mm, 1 lbf = 4.45 N, 1 psi = 6.89 kPa.

[1]The fasteners must not be driven until the concrete has reached the designated minimum compressive strength. Minimum concrete thickness must be three times the fastener embedment into the concrete, unless noted otherwise.

[2]The fastener must be installed through the lower flutes of the metal deck with a minimum edge distance of 1 1/8 inches from the edge of the steel deck web and 4 inches (5.1 inches for TE fasteners) from the end of the deck. Concrete thickness above the deck must be a minimum of 3 1/2 inches (2 1/4 inches for TE fasteners). See Figure 1 of this report.

[3]The steel deck must be configured as shown in Figure 1, have a minimum base-metal thickness of 0.035 inch, and have a minimum yield strength of 50 ksi and a minimum tensile strength of 65 ksi.

[4]The fastener must be installed through the upper or lower flutes of the metal deck at the center of the flute and a minimum of 5.1 inches from the end of the deck. Concrete thickness above the deck must be a minimum of 2 1/4 inches. See Figure 2 of this report.

[5]The steel deck must be configured as shown in Figure 2, have a minimum base-metal thickness of 0.035 inch, and have a minimum yield strength of 50 ksi and a minimum tensile strength of 65 ksi.

TABLE 5—ALLOWABLE TENSION AND SHEAR VALUES FOR FASTENERS INSTALLED IN ASTM A36 STEEL[1]

PART NUMBER SERIES	NOMINAL SHANK DIAMETER (inch)	TYPE OF SHANK	MINIMUM SPACING (inches)	MINIMUM EDGE DISTANCE (inches)	ALLOWABLE LOADS (lbf)									
Steel Thickness (inch):					3/16		1/4		3/8		1/2		≥3/4	
Load Direction:					Tension[4]	Shear	Tension[4]	Shear	Tension[4]	Shear	Tension	Shear	Tension	Shear
1500 (excluding 1506B)	0.145	Smooth	1	1/2	81	373	181	273	397	489	243[2]	277[2]	—	—
1500K	0.145	Knurled	1	1/2	296	636	584	659	680	730	253[2]	293[2]	—	—
SP	0.150	Smooth	1	1/2	385	662	445	477	393	574	948[4]	597	234[2]	356[2]
TE	0.157	Knurled	1	1/2	323	606	562	673	934	820	603[4]	766	343[3]	496[3]

For **SI:** 1 inch = 25.4 mm, 1 lbf = 4.45 N.

[1]Except where noted otherwise in this table, the allowable load values shown are for fastenings that have the entire pointed end of the fastener driven through the steel plate.

[2]Fastener penetration into steel must be a minimum of 7/16 inch.

[3]Fastener penetration into steel must be a minimum of 3/8 inch.

[4]For steel-to-steel connections designed in accordance with Section 4.1.4, the tabulated allowable load may be increased by a factor of 1.25, and the design strength may be taken as the tabulated allowable load multiplied by a factor of 2.0.

TABLE 6—ALLOWABLE LOADS FOR FASTENERS INSTALLED IN ASTM A572 GRADE 50 OR ASTM A992 STEEL[1] (lbf)

PART NUMBER SERIES	NOMINAL SHANK DIAMETER (inch)	TYPE OF SHANK	MINIMUM SPACING (inch)	MINIMUM EDGE DISTANCE (inch)	ALLOWABLE LOADS (lbf)									
Steel Thickness (inch):					3/16		1/4		3/8		1/2		≥3/4	
Load Direction:					Tension[4]	Shear	Tension[4]	Shear	Tension	Shear	Tension	Shear	Tension	Shear
1500K (excluding 1506B)	0.145	Knurled	1	1/2	260	499	579	725	383[2]	595[2]	—	—	—	—
SP	0.150	Smooth	1	1/2	356	569	554	637	604[4]	602	814[3]	820[3]	243[4]	381[4]
TE	0.157	Knurled	1	1/2	442	676	630	662	760[4]	725	582[4]	532	311[2]	467[2]

For **SI:** 1 inch = 25.4 mm, 1 lbf = 4.45 N.

[1]Except where noted otherwise in this table, the allowable load values shown are for fastenings that have the entire pointed end of the fasteners driven through the steel plate.
[2]Fastener penetration into the steel must be a minimum of 3/8 inch.
[3]Fastener penetration into the steel must be a minimum of 1/2 inch.
[4]Fastener penetration into the steel must be a minimum of 7/16 inch.
[4]For steel-to-steel connections designed in accordance with Section 4.1.4, the tabulated allowable load may be increased by a factor of 1.25, and the design strength may be taken as the tabulated allowable load multiplied by a factor of 2.0.

TABLE 7—ALLOWABLE LOADS FOR FASTENERS DRIVEN INTO CONCRETE MASONRY UNITS[1,2]

PART NUMBER SERIES	SHANK DIAMETER (inch)	MINIMUM EMBEDMENT (inch)	ALLOWABLE LOADS (lbf)									
Masonry Type:			HOLLOW UNGROUTED CMU				GROUT-FILLED CMU					
Fastener Location:			Face Shell[3]		Mortar Joint[4]		Face Shell[3]		Mortar Joint[4]		Top of Grouted Cell[3,6]	
Load Direction:			Tension	Shear[7]	Tension	Shear[5]	Tension	Shear[7]	Tension	Shear[5]	Tension	Shear[7]
TE	0.157	1	33	100	42	68	139	145	91	127	165	171

For **SI:** 1 inch = 25.4 mm, 1 lbf = 4.4 N.

[1]See Section 3.6.4 for CMU, mortar and grout requirements.
[2]Fasteners must be installed a minimum of 5.1 inches from the end of the wall.
[3]Fasteners must be installed at the center of the CMU cell. No more than one fastener may be installed in an individual CMU cell.
[4]Applicable to fasteners installed in the horizontal mortar joint (bed joint). Minimum fastener spacing must be 5.1 inches.
[5]Allowable shear load value applies to load applied perpendicular to the mortar joint.
[6]Fastener must be installed vertically at the top, center of grouted cell.
[7]Shear load can be in any direction perpendicular to the axis of the fastener.

TABLE 8—ALLOWABLE TENSION AND SHEAR VALUES FOR CEILING CLIP ASSEMBLIES INSTALLED IN NORMALWEIGHT CONCRETE[1]

PART NUMBER	NOMINAL SHANK DIAMETER (inch)	MINIMUM EMBEDMENT DEPTH (inches)	MINIMUM SPACING (inches)	MINIMUM EDGE DISTANCE (inches)	ALLOWABLE LOADS (lbf)			
Concrete Compressive Strength:					4000 psi		6000 psi	
Load Direction:					Tension	Shear	Tension	Shear
SDC100	0.145	7/8	4	3.2	115	120	—	—
SDC125	0.145	1 1/8	4	3.2	130	167	—	—
SPC78	0.150	3/4	5.1	3.2	155	188	150	153
SPC114	0.150/0.180	1 1/8	5	3.5	127	226	169	300
TEC100	0.157	7/8	5.1	3.5	207	—	—	—

For **SI:** 1 inch = 25.4 mm, 1 lbf = 4.45 N, 1 psi = 6.89 kPa.

[1]The fasteners must not be driven until the concrete has reached the designated minimum compressive strength. Minimum concrete thickness must be three times the fastener embedment into the concrete.

TABLE 9—ALLOWABLE TENSION AND SHEAR VALUES FOR CEILING CLIP ASSEMBLIES INSTALLED IN MINIMUM 3000 psi SAND-LIGHTWEIGHT CONCRETE FILLED STEEL DECK PANEL [1,2,3]

PART NUMBER	NOMINAL SHANK DIAMETER (inch)	MINIMUM EMBEDMENT DEPTH (inches)	MINIMUM SPACING (inches)	ALLOWABLE LOADS (lbf)			
Fastener Installation Location and Loading Condition:				**Lower Flute Tension**	**Lower Flute Shear**	**Upper Flute Tension**	**Upper Flute Shear**
SDC100	0.145	$^7/_8$	4	67	237	104	310
SDC125	0.145	$1^1/_8$	4	94	276	106	319
SPC78	0.150	$^7/_8$	4	59	202	84	324
SPC114	0.150/0.180	$1^1/_8$	4	157	272	180	334
TEC100	0.157	$^7/_8$	5.1	88	—	—	—

For **SI:** 1 inch = 25.4 mm, 1 lbf = 4.45 N, 1 psi = 6.89 kPa.


[1]The fasteners must not be driven until the concrete has reached the designated minimum compressive strength. Minimum concrete thickness above the deck must be a minimum of $3^1/_2$ inches ($2^1/_4$ inches for TEC fasteners).

[2]For fasteners installed through steel deck, the fastener must be installed through and into the upper or lower flute of the deck with a minimum edge distance of $1^1/_8$ inches from the edge of the steel deck and 4 inches (5.1 inches for TE fasteners) from the end of the deck panel.

[3]The steel deck panel must be configured as shown in Figure 1 and have a minimum base-metal thickness of 0.035 inch and minimum yield strength of 50 ksi and a minimum tensile strength of 65 ksi.

TABLE 10—CORRELATION OF PRODUCTS

ITW RAMSET	ITW BRANDS
Ramset 1500 Series	Duo-Fast 1500 Series, Tapcon 1500 Series
Ramset SP Series	Duo-Fast SP Series, Tapcon SP Series
Ramset True Embedment Series	–
Ramset Ceiling Clip Assemblies	–

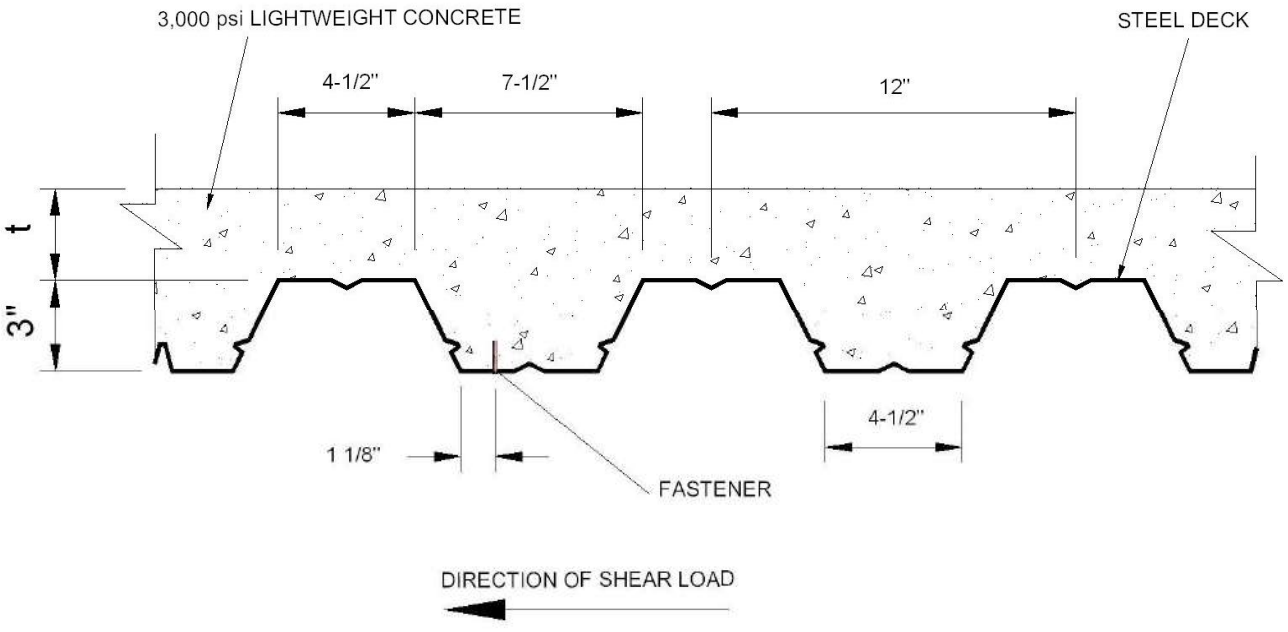

For **SI:** 1 inch = 25.4 mm.

See Tables 4 and 9.

t = $3^1/_2$″ for 1500 and SP Series Fasteners (See Table 4)

t = $3^1/_2$″ for SDC100, SDC125, SPC78, and SPC114 (See Table 9)

t = $2^1/_4$″ for TE Series Fasteners (See Tables 4 and 9)

FIGURE 1—FASTENER INSTALLATION LOCATION IN SAND-LIGHTWEIGHT CONCRETE FILLED 3-INCH DEEP STEEL DECK

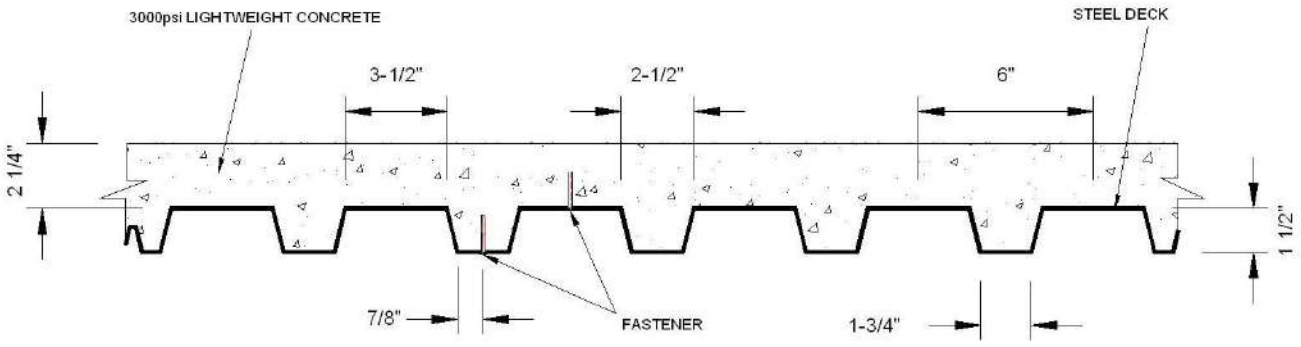


FIGURE 2—FASTENER INSTALLATION LOCATION IN SAND-LIGHTWEIGHT CONCRETE FILLED $1^1/_2$-INCH DEEP STEEL DECK



ITW RAMSET TE FASTENERS



ITW RAMSET **ITW BRANDS DUO-FAST and TAPCON**

FIGURE 3—FASTENER MARKING



SDC **SPC**

FIGURE 4—ITW RAMSET CEILING CLIP ASSEMBLIES

DIVISION: 03 00 00—CONCRETE
Section: 03 16 00—Concrete Anchors

DIVISION: 04 00 00—MASONRY
Section: 04 05 19.16—Masonry Anchors

DIVISION: 05 00 00—METALS
Section: 05 05 23—Metal Fastenings

DIVISION: 09 00 00—FINISHES
Section: 09 22 16.23—Fasteners

REPORT HOLDER:

ITW RAMSET

EVALUATION SUBJECT:

POWER-ACTUATED FASTENERS AND CEILING CLIP ASSEMBLIES

1.0 REPORT PURPOSE AND SCOPE

Purpose:

The purpose of this evaluation report supplement is to indicate that Power-Actuated Fasteners and Ceiling Clip Assemblies, described in ICC-ES evaluation report ESR-1799, have also been evaluated for compliance with the codes noted below as adopted by the Los Angeles Department of Building and Safety (LADBS).

Applicable code editions:

- 2020 *City of Los Angeles Building Code* (LABC)
- 2020 *City of Los Angeles Residential Code* (LARC)

2.0 CONCLUSIONS

The Power-Actuated Fasteners and Ceiling Clip Assemblies, described in Sections 2.0 through 7.0 of the evaluation report ESR-1799, comply with the LABC Chapters 19, 21, 22 and the LARC, and are subject to the conditions of use described in this supplement.

3.0 CONDITIONS OF USE

The Power-Actuated Fasteners and Ceiling Clip Assemblies described in this evaluation report must comply with all the following conditions:

- All applicable sections in the evaluation report ESR-1799.
- The design, installation, conditions of use and identification of the Powder-Actuated Fasteners and Ceiling Clip Assemblies are in accordance with the 2018 *International Building Code*® (IBC) provisions noted in the evaluation report ESR-1799.
- The design, installation and inspection are in accordance with additional requirements of LABC Chapters 16 and 17, as applicable.
- Under the LARC, an engineered design in accordance with LARC Section R301.1.3 must be submitted.

ICC-ES Evaluation Reports are not to be construed as representing aesthetics or any other attributes not specifically addressed, nor are they to be construed as an endorsement of the subject of the report or a recommendation for its use. There is no warranty by ICC Evaluation Service, LLC, express or implied, as to any finding or other matter in this report, or as to any product covered by the report.

Copyright © 2023 ICC Evaluation Service, LLC. All rights reserved.

- The allowable strength values listed in the evaluation report are for the connection of the fasteners or ceiling clip assemblies to normalweight concrete, and sand-lightweight concrete over metal decks. The connection between the fasteners/ceiling clip assemblies and the connected members must be checked for capacity (which may govern).

This supplement expires concurrently with the evaluation report, reissued June 2023.

DIVISION: 03 00 00—CONCRETE
Section: 03 16 00—Concrete Anchors

DIVISION: 04 00 00—MASONRY
Section: 04 05 19.16—Masonry Anchors

DIVISION: 05 00 00—METALS
Section: 05 05 23—Metal Fastenings

DIVISION: 09 00 00—FINISHES
Section: 09 22 16.23—Fasteners

REPORT HOLDER:

ITW RAMSET

EVALUATION SUBJECT:

POWER-ACTUATED FASTENERS AND CEILING CLIP ASSEMBLIES

1.0 REPORT PURPOSE AND SCOPE

Purpose:

The purpose of this evaluation report supplement is to indicate that Power-Actuated Fasteners and Ceiling Clip Assemblies, described in ICC-ES evaluation report ESR-1799, have also been evaluated for compliance with the codes noted below.

Applicable code editions:

- 2019 *California Building Code* (CBC)

For evaluation of applicable chapters adopted by the California Office of Statewide Health Planning and Development (OSHPD) AKA: California Department of Health Care Access and Information (HCAI) and the Division of State Architect (DSA), see Sections 2.1.1 and 2.1.2 below.

- 2019 *California Residential Code* (CRC)

2.0 CONCLUSIONS

2.1 CBC:

The Power-Actuated Fasteners and Ceiling Clip Assemblies, described in Sections 2.0 through 7.0 of the evaluation report ESR-1799, comply with CBC Chapters 19, 21 and 22, provided the design and installation are in accordance with the 2018 *International Building Code*® (IBC) provisions noted in the evaluation report and the additional requirements of CBC Chapters 16, 17, 19, 21 and 22, as applicable.

2.1.1 OSHPD:

The Power-Actuated Fasteners and Ceiling Clip Assemblies, described in Sections 2.0 through 7.0 of the evaluation report ESR-1799, comply with CBC amended Chapters 19, 21 and 22 [OSHPD 1R, 2 & 5], and Chapters 19A. 21A and 22A [OSHPD 1 & 4], provided the design and installation are in accordance with the 2018 *International Building Code*® (IBC) provisions noted in the evaluation report and the additional requirements in Sections 2.1.1.1 and 2.1.1.2 of this supplement:

2.1.1.1 Verification Test Requirements: The installation verification test loads, frequency, and acceptance criteria shall be in accordance with Section 1901.3.4 [OSHPD 1R, 2 & 5] or 1910A.5 [OSHPD 1 & 4] of the CBC, as applicable.

2.1.1.2 Conditions of Use: Power actuated fastener in seismic shear application shall be in accordance with Section 1901.3.1 [OSHPD 1R, 2 & 5] or Section 1617A.1.20 [OSHPD 1 & 4].

ICC-ES Evaluation Reports are not to be construed as representing aesthetics or any other attributes not specifically addressed, nor are they to be construed as an endorsement of the subject of the report or a recommendation for its use. There is no warranty by ICC Evaluation Service, LLC, express or implied, as to any finding or other matter in this report, or as to any product covered by the report.

Copyright © 2023 ICC Evaluation Service, LLC. All rights reserved.

2.1.2 DSA:

The Power-Actuated Fasteners and Ceiling Clip Assemblies, described in Sections 2.0 through 7.0 of the evaluation report ESR-1799, comply with CBC amended Chapters 19, 21 and 22 [DSA-SS/CC] and Chapters 19A, 21A and 22A [DSA-SS], provided the design and installation are in accordance with the 2018 *International Building Code*® (IBC) provisions noted in the evaluation report and the additional requirements in Sections 2.1.2.1 and 2.1.2.2 of this supplement:

2.1.2.1 Verification Test Requirements: The installation verification test loads, frequency, and acceptance criteria shall be in accordance with Section 1909.2.7 [DSA-SS/CC] or 1910A.5 [DSA-SS] of the CBC, as applicable.

2.1.2.2 Conditions of Use: Power actuated fastener in seismic shear application shall be in accordance with Section 1617A.1.20 [DSA-SS].

2.2 CRC:

The Power-Actuated Fasteners and Ceiling Clip Assemblies, described in Sections 2.0 through 7.0 of the evaluation report ESR-1799, comply with the CRC, provided the design and installation are in accordance with the 2018 *International Residential Code*® provisions noted in the evaluation report.

This supplement expires concurrently with the evaluation report, reissued June 2023.

PISOS CORONA

PISO BELAIRE DUROPISO GRIS CD

Referencia: 565212501
Formato: 55.2X55.2 Cm
Color: GRIS\GRAY



TRÁFICO | TRAFFIC	**Comercial General / General Commercial**
ACABADO |FINISH	Mate / Matte
ASPECTO	CD / Caras diferenciadas
M2 POR CAJA SQ FT APPROX	1,52 16,36114383
UNIDADES | PIECES	5
PESO BRUTO CAJA kg WEIGTH LB APPROX	26,8888 59,27904848
ESPESOR NOMINAL NOMINAL THICKNESS	8.6 ± 0.3
CAJAS POR ESTIBA CARTONS PER PALLET	60
VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS	0

El color presentado en la fotografía es una aproximación al color real.
The color represented in the photograph is an approximation to the real color.

TRÁFICO COMERCIAL GENERAL
Pisos para uso en zonas comerciales e institucionales con un tráfico inferior a 5.000 personas diarias promedio. Estos pisos también son aptos para todas las áreas de viviendas. Importante: No usar para pisos de aeropuertos, terminales de transporte, industrias que utilizan maquinaria pesada, súper e hipermercados. Precaución: A excepción de los productos Corona ARD®, los productos cerámicos al contacto con el agua disminuyen su resistencia al deslizamiento. En áreas húmedas son recomendados productos con alto coeficiente de fricción.

CARACTERÍSTICAS, VENTAJAS Y BENEFICIOS:

Piso Comercial Mate BELAIRE DUROPISO color Gris de formato 55.2x55.2, diseño tipo terrazo con mezcla de áreas en cemento de alta combinabilidad. con 4 caras diferenciadas (CD), baldosas diferentes unas de otras.
Tecnología Duropiso®, piso con mayor dureza para tráficos comerciales, fácil de limpiar y de mantener.
La Tecnología de Impresión Digital (HIGH DEFINITION HD) le brinda al producto mayor nitidez y realismo en su diseño, logrando un alto grado de naturalidad.

Garantía Corona | Corona quality guaranteed: 10 Años/Years

Mayor información de garantía consulte www.corona.co/garantia

PISO BELAIRE DUROPISO GRIS CD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS		ENSAYO |TEST	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION NTC 919 / ISO 13006	MEDICIONES LOTES PROMEDIO CORONA/ CORONA AVERAGE LOT MEASUREMENTS
ANCHO Y LARGO LENGHT AND WIDTH		NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	(±) 2.00% del tamaño de fabricación; hasta máximo 5 mm	(±) 2.00% del tamaño de fabricación; hasta máximo 5 mm
PLANIRADIDAD DE LA SUPERFICIE SURFACE FLATNESS	**Curvatura Central** Central Curvature	NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	(±) 0.50% de la diagonal del tamaño de fabricación	(±) 0.30% de la diagonal del tamaño de fabricación
	Curvatura del lado Edge Curvature	NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	(±) 0.50% del del tamaño de fabricación	(±) 0.30% del tamaño de fabricación
	Ortogonalidad Warpage	NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	(±) 0.50% de la diagonal del tamaño de fabricación	(±) 0.30% de la diagonal del tamaño de fabricación
DEFECTOS SUPERFICIALES SURFACE DEFECTS		NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	Minimo 95% libre de defectos / Minimum 95% without deffects	Minimo 95% libre de defectos / Minimum 95% without deffects
ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION		NTC 4321 - 3 ISO 10545 - 3	Mínimo 6% Máximo 10%	Mínimo 6% Máximo 10%
RESISTENCIA A LA ROTURA BREAKING STRENGHT		NTC 4321 - 4 ISO 10545 - 4	Mínimo 800 N / Minimum 800 N	Mínimo 900 N / Minimum 900 N
MÓDULO DE ROTURA MODULUS OF RUPTURE		NTC 4321 - 4 ISO 10545 - 4	Mínimo 18 N/mm2, Mínimo indivudual 16 N/mm2, Mínimum 18 N/mm2	Mínimo 25 N/mm2 / Minimum 25 N/mm2
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ABRASION RESISTANCE		NTC 4321 - 7 ISO 10545 - 7	Informe de cumplimiento de la clase de abrasión y los ciclos	Clase 5 / Class 5
COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION		NTC 4321 - 17 ISO 10545 - 17	Declarado por el fabricante / Metodo de ensayo disponible	Clase 2/ Class 2
RESISTENCIA AL MANCHADO RESISTANCE TO STAINING		NTC 4321 - 14 NTC 4321 - 14	Mínimo clase 3 / Mínimum class 3	Mínimo clase 5 / Mínimum class 5
RESISTENCIA A AGENTES QUÍMICOS RESISTANCE TO CHEMICALS		NTC 4321 - 13 NTC 4321-2 - 13	Mínimo clase GB / Minimum GB class	Mínimo Clase GA / Minimun GA Class
RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO THERMAL SHOCK RESISTANCE		NTC 4321-2 - 9 NTC 4321 - 9	La indicada por el fabricante/Manufacturer to state classification	Mínimo clase GLA/ Mimimum GLA class

Descargar recomendaciones de uso en: http://www.corona.co/instructivos/pisos-y-paredes
Este producto es elaborado en Colombia, en el Parque Industrial de Sopó Cundinamarca.

FUENTES DE MATERIA PRIMA RESPONSABLES:
Corona tiene un reporte sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report.
Puede encontrarlo aquí: http://www.corona.co/nuestra-empresa/corona-sostenible

PARED JAYA PLANA BLANCO CU

Referencia: 431229001
Formato: 25X43.2 cm
Color: BLANCO\WHITE
Colección: INTRO 2013

	TRÁFICO | TRAFFIC	Paredes / Walls
	ACABADO |FINISH	Brillante / Glossy
	ASPECTO	CU / Piezas diseño único
	M2 POR CAJA SQ FT APPROX	1,94 20,88198621
	UNIDADES | PIECES	18
	PESO BRUTO CAJA kg WEIGTH LB APPROX	24,6574 54,35970404
	ESPESOR NOMINAL NOMINAL THICKNESS	7.4 ± 0.3
	CAJAS POR ESTIBA CARTONS PER PALLET	64
	VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS	0

El color presentado en la fotografía es una aproximación al color real.
The color represented in the photograph is an approximation to the real color.

Por las características de las paredes cerámicas (Resistencia Mecánica y al rayado) NO se recomienda el uso en pisos, USE For the characteristics of the ceramic walls (Mechanical Resistence and scratch) them do not are suitable for use in floor.

CARACTERÍSTICAS, VENTAJAS Y BENEFICIOS:
Superficie BRILLANTE que embellece los espacios generando una mayor sensación de claridad e higiene, diseño enriquecido con figuras que permiten tener un efecto decorativo sobre el piso.

Garantía Corona | Corona quality guaranteed: 10 Años/Years

Mayor información de garantía consulte www.corona.co/garantia

PARED JAYA PLANA BLANCO CU

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS		ENSAYO |TEST	ESPECIFICACIÓN SPECIFITACION NTC 919 / ISO 13006	MEDICIONES LOTES PROMEDIO CORONA/ CORONA AVERAGE LOT MEASUREMENTS
ANCHO Y LARGO LENGHT AND WIDTH		NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	(±) 2.00% del tamaño de fabricación; hasta máximo 5 mm	(±) 2.00% del tamaño de fabricación; hasta máximo 5 mm
PLANIRADIDAD DE LA SUPERFICIE SURFACE FLATNESS	**Curvatura Central** Central Curvature	NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	(-) 0.30% (+) 0.50% de la diagonal del tamaño de fabricación	(±) 0.30% de la diagonal del tamaño de fabricación
	Curvatura del lado Edge Curvature	NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	(-) 0.30% (+) 0.50% del tamaño de fabricación	(±) 0.30% del tamaño de fabricación
	Ortogonalidad Warpage	NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	(±) 0.50% de la diagonal del tamaño de fabricación	(±) 0.30% de la diagonal del tamaño de fabricación
DEFECTOS SUPERFICIALES SURFACE DEFECTS		NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	Minimo 95% libre de defectos / Minimum 95% without deffects	Minimo 95% libre de defectos / Minimum 95% without deffects
ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION		NTC 4321 - 3 ISO 10545 - 3	Mínimo 10% / Minimum 10%	Mínimo 10% / Minimum 10%
RESISTENCIA A LA ROTURA BREAKING STRENGHT		NTC 4321 - 4 ISO 10545 - 4	Mínimo 200 N / Minimum 200 N	Mínimo 680 N / Minimum 680 N
MÓDULO DE ROTURA MODULUS OF RUPTURE		NTC 4321 - 4 ISO 10545 - 4	Mínimo 15 N/mm2 / Mínimum 15 N/mm2	Mínimo 24 N/mm2 / Mínimum 24 N/mm2
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ABRASION RESISTANCE		NTC 4321 - 7 ISO 10545 - 7	No Aplica / Not Applicable	No Aplica / Not Applicable
COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION		NTC 4321 - 17 ISO 10545 - 17	Declarado por el fabricante / Metodo de ensayo disponible	No aplica / Not applicable
RESISTENCIA AL MANCHADO RESISTANCE TO STAINING		NTC 4321 - 14 NTC 4321 - 14	Mínimo clase 3 / Mínimum class 3	Mínimo clase 5 / Mínimum class 5
RESISTENCIA A AGENTES QUÍMICOS RESISTACE TO CHEMICALS		NTC 4321 - 13 NTC 4321-2 - 13	Mínimo clase B / Minimum B class	Mínimo Clase A / Minimun A Class
RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO THERMAL SHOCK RESISTANCE		NTC 4321-2 - 9 NTC 4321 - 9	La indicada por el fabricante/Manufacturer to state classification	Mínimo clase BA/ Mimimum BA class

Descargar recomendaciones de uso en: http://www.corona.co/instructivos/pisos-y-paredes
Este producto es elaborado en Colombia, en la planta de Girardota (Medellín, Antioquia)

FUENTES DE MATERIA PRIMA RESPONSABLES:
Colombia

1. Descripción General

Vinilo blanco Tipo Exterior Pintart Colombia, esta formulado con base en resinas acrílicas, lo que imparte a la pinturas una excelente resistencia, poder cubriente, especialmente formulada para resistir los cambios climáticos e inhibir el crecimiento de hongos y algas ideal para exteriores e interiores. Especialmente formulado para proveer muy bajo salpique, excelente nivelación y flujo, sin perder las propiedades de viscosidad y cubrimiento. La composición de la pintura produce un acabado terso, suave de excelente cubrimiento y alta durabilidad.

2. Composición Química

Resinas poliméricas (acrílicas), pigmentos, aditivos y solventes.

3. Campos de Aplicación

Vinilo Blanco tipo Exterior blanco Pintart Colombia, debido a su alto cubrimiento y composición es recomendado para decorar y proteger muros, oficinas, exteriores y todo tipo de superficie o edificaciones en general. Siendo este ideal para dar terminación y durabilidad.

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE PINTART COLOMBIA SAS QUEDA EXTRICTAMENTE PROHIBIDA SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACIÓN PREVIA

4. Especificaciones Técnicas: CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN 1154 – 22 JUNIO 2016

Apariencia	Cuerpo cremoso con buena fluidez sin presencia de sedimento duro.
Tiempo de secamiento para repintar, en horas, min.	4
Viscosidad	120 ± 5 KU/ 25°C
Poder Cubriente, relación de contraste, min.	≥96
Finura de dispersión en unidades Hegman, min.	5 unidades
Resistencia a la abrasión húmeda con cuña y medio abrasivo estándar.	≥ 600
Remoción de manchas	≥ 85%
Resistencia hongos y algas	No presenta
Resistencia al álcali	No presenta ampollamiento, arrugamiento u otro defecto visible
Contenido compuestos orgánicos volátiles (VOC)	40 g/L Concentrados / colores 70g/L
pH	≧ 9.0 ± 1.0 *unidades*
Modo de empleo	
Preparación de la Superficie: Antes de aplicar la pintura se debe resanar grietas, agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado. La superficie debe estar completamente seca, libre de polvo, suciedad, grasa y pintura deteriorada.	
Durabilidad	
Ésta referencia de vinilo está dispuesta en durabilidad de 3 a 5 años, dependiendo la superficie y los ciclos de Lavabilidad a la que sea expuesta.	
Dilución	
Para la aplicación con brocha o rodillo, diluir con 25 a 30% de agua. Aplique 2 manos del producto dependiendo del color, porosidad y tipo de superficie. Los equipos de aplicación se lavan con agua.	
Aplicación	
Vinilo Blanco tipo exterior Pintart S.A.S puede aplicarse por los métodos tradicionales de brocha, rodillo o pistola. Antes de aplicar se debe revolver la pintura hasta obtener una completa homogeneidad. -Para aplicar con pistola se requiere mayor dilución de la pintura. - Se recomienda dejar secar 2 horas para segundas manos - Se recomienda no aplicar bajo condiciones de lluvia.	
Observaciones	
Para el cálculo del rendimiento de la pintura, se debe tener en cuenta la porosidad de la superficie y los desperdicios ocasionados por la aplicación. La obtención de un excelente acabado depende de la buena preparación de la superficie.	
Seguridad	
Vinilo blanco tipo exterior Pintart S.A.S no presenta riesgos de incendio y nivel de toxicidad bajo, ya que la base de la pintura es agua. Se recomienda asegurar una ventilación adecuada y buenas condiciones de almacenamiento. Mantener lejos del alcance los niños.	

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE PINTART COLOMBIA SAS QUEDA EXTRICTAMENTE PROHIBIDA SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACIÓN PREVIA

CUADRO DE FIRMAS.

	Cargo	Área	Versión	Fecha	Cambio
Emitió	Jefe de Producción	Producción	1	01-03-2018	Creación del documento
Revisó	Gerente General	Gerencia.	1	01-03-2018	Creación del documento
Aprobó	Gerente General	Gerencia.	1	01-03-2018	Creación del documento

CUADRO RESUMEN
Empresa:
EMPRESA COLOMBIANA DE PINTURAS – PINTART COLOMBIA SAS
CUMPLIMIENTO NORMA RESOLUCIÓN 1154 – 22 JUNIO DE 2016
Documento:
Controlado [____] No controlado [____]
Sitio web del sistema integrado:
http://www.pintart.com.co/iso9001_2015
Enlace:
Código: PPI – FT01 v1
Ultimo cambio: **2017/01/13 10:53**

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE PINTART COLOMBIA SAS QUEDA EXTRICTAMENTE PROHIBIDA SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACIÓN PREVIA

FICHA TÉCNICA VINILO TIPO 1

1. Descripción General

Vinilo blanco tipo 1 Pintart S.A.S, esta formulado en base a resinas vinil-acrílicas/Acrílicas puras lo que imparte a la pinturas una excelente resistencia a la abrasión ideal para interiores y exteriores. Especialmente formulado para proveer muy bajo salpique, excelente nivelación y flujo, sin perder las propiedades de viscosidad y cubrimiento. La composición de la pintura produce un acabado terso, suave y mate de excelente cubrimiento y alta durabilidad.

2. Composición Química

Resinas poliméricas (vinil-acrílicas/acrílicas puras), pigmentos, aditivos y solventes.

3. Campos de Aplicación

Vinilo Blanco tipo 1 blanco Pintart S.A.S, debido a su alto cubrimiento y composición es recomendado para decorar y proteger muros, cielos rasos, oficinas, y todo tipo de superficie o edificaciones en general. Siendo este ideal para interiores y exteriores bajo cubierta.



ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE EMPRESA COLOMBIANA DE PINTURAS – PINTART COLOMBIA SAS. QUEDA EXTRICTAMENTE PROHIBIDA SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACIÓN PREVIA

FICHA TÉCNICA VINILO TIPO 1

4. Especificaciones Técnicas:

Apariencia	Cuerpo cremoso con buena fluidez sin presencia de sedimento duro.
Tiempo de secamiento para repintar, en horas, min.	4
Viscosidad	120 ± 5 KU/ 25°C
Poder Cubriente, relación de contraste, min.	≧ 96
Finura de dispersión en unidades Hegman, min.	4 *unidades*
Resistencia a la abrasión húmeda con cuña y medio abrasivo estándar.	≧ 400
pH	≧ 9.0 ± 1.0 *unidades*
Remoción de manchas	80% min
Resistencia al álcali	No presenta cambios notorios de color, arrugamiento, ampollamiento o cualquier otro efecto visible
Resistencia al agua	No presenta cambios notorios de color, arrugamiento, ampollamiento o cualquier otro efecto visible
Entizamiento	No presenta
Acabado	mate
Contenido compuestos orgánicos volátiles (VOC)	40 g/L Concentrados / colores 70g/L
Modo de empleo	
Preparación de la Superficie: Antes de aplicar la pintura se debe: resanar grietas, agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado. La superficie debe estar completamente seca, libre de polvo, suciedad, grasa y pintura deteriorada.	
Durabilidad	
Ésta referencia de vinilo está dispuesta en durabilidad de 2 año, dependiendo la superficie y los ciclos de Lavabilidad a la que sea expuesta.	
Dilución	
Para la aplicación con brocha o rodillo, diluir con 25 a 30% de agua. Aplique 2 manos del producto dependiendo del color, porosidad y tipo de superficie. Los equipos de aplicación se lavan con agua.	
Aplicación	

ESTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DE EMPRESA COLOMBIANA DE PINTURAS – PINTART COLOMBIA SAS. QUEDA EXTRICTAMENTE PROHIBIDA SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACIÓN PREVIA
