	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-020
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1 DICIEMBRE 2024	Versión	6
		Vigencia	12/12/2024

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	03/07/2025	**PERIODO REPORTADO DEL:**	1/06/2025	**AL:**	30/06/2025
CONTRATO Nº	155-00-A-COFAC-DIFRA-2024	**CONTRATISTA**	CONSORCIO INTERSEDES 4		
OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA Y TRAMITES DEL PROYECTO DE TRASLADO DE GACAR (CERRAMIENTO Y GUARDIA) EN SAN ANDRÉS ISLA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS".				
FECHA DE INICIO	10/12/2024	**FECHA DE TERMINACIÓN**	11/08/2025		

VALOR INICIAL	$ 250.000.000,00	**VALOR ADICIONAL** (Si aplica)	$ 249.817.896,59	**VALOR REDUCCIÓN** (Si aplica)	$ 0,00	**VALOR TOTAL**	$ 499.817.896,59

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

A la fecha se trabaja en la revision de cantidades, reprogramacion y balance de obra.

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1	**100**	**100**	SI	TRÁMITE ADMINISTRATIVO ITEM 3.2 del anexo
						TOTAL	1				


4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

4.1 - CONTROL DE PROGRAMACIÓN MES ADMINISTRAVITO

PORCENTAJE PONDERADO EN MES ADMINISTRATIVO

% Ejecutado acumulado a la fecha	0,00%	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
EJECUCIÓN SEMANAL (MES DICIEMBRE 2024)				
Semana 1 (01 AL 04/05/25)	0,00%	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Semana 2 (05 AL 11/05/25)	0,00%			
Semana 4 (12 AL 18/05/25)	0,00%			
Semana 4 (19 AL 25/05/25)	30,00%			
Semana 4 (26 AL 31/05/25)	60,00%			
Semana 4 (01 AL 07/04/25)	80,00%			

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA


AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJES	TOTAL
PROGRAMADO		**100,00%**
EJECUTADO		**100,00%**

4.2 - CONTROL DE PROGRAMACIÓN OBRA

PORCENTAJE PONDERADO EN OBRA

% Ejecutado acumulado a la fecha	0,00%	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
EJECUCIÓN SEMANAL (MES MAYO 2025)				
Semana 1 (29 May -5 Jun)	1,52%	**2,21%**	**49,37%**	**-47,16%**
Semana 2 (06 Jun -11 Jun))	0,10%			
Semana 3 (12 Jun -18 Jun))	0,34%			
Semana 4 (19 Jun - 25 Jun)	0,10%			
Semana 5 (26 Jun -03 Jul)	0,15%			

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJES	TOTAL
PROGRAMADO		2,21%
EJECUTADO		49,37%

5- DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN

EL PRESENTE INFORME DE INTERVENTORIA CORRESPONDE AL MES DONDE SE EJECUTO LA TALA DE LAS ESPECIES Y DEMOLICION DE EDIFICACIONES ACORDE A LOS ANEXOS

6- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	245	203	42
Proyección	360,542	203	157,542

7- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

7.1. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR PARA CON LA SUPERVISIÓN

ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIO	OBSERVACIONES
INFORME DE INTERVENTORIA SOBRE CTO DE OBRA	SI	SI	SI	Ver en plataforma SECOP II informe supervision
POLIZAS	SI	SI	SI	N/A
ACTAS DE PAGO	SI	SI	SI	N/A
INFORMES SEMANALES	SI	SI	SI	N/A
REGISTRO FOTOGRAFICO	SI	SI	SI	N/A
ACTAS DE COMITES	SI	SI	SI	N/A
BITACORA	SI	SI	SI	N/A
CORRESPONDENCIA	SI	SI	SI	N/A
FORMATO DE OBRA PUBLICA	SI	SI	SI	N/A
INFORME SISOMA	SI	SI	SI	Ver en plataforma SECOP II informe supervision

7.2. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE OBRA PARA CON LA INTERVENTORÍA

SE CUMPLIO CON LAS OBLIGACIONES SEGÚN LO ESTIPULADO PARA LE MES REPORTADO.

8 - DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA CORRESPONDEN A LAS LISTADAS EN EL APARTADO ANTERIOR CUYO SUSTENTO SON LOS DOCUMENTOS ANEXOS AL PRESENTE INFORME

9- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PENDIENTES

9.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PENDIENTES DEL INTERVENTOR PARA CON LA SUPERVISIÓN

NO EXISTEN ACTIVIDADES QUE SE PUEDAN CONSIDERAR PENDIENTES, SE TIENE COMO COMPROMISOS LOS ITEMS CONTRACTUALES.

9.2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PENDIENTES DEL CONTRATISTA DE OBRA PARA CON LA INTERVENTORÍA

NO EXISTEN ACTIVIDADES QUE SE PUEDAN CONSIDERAR PENDIENTES, SE TIENE COMO COMPROMISOS LOS ITEMS CONTRACTUALES.

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	$	%	$	%
Directos+Indirectos+IVA	$ 250.000.000,00	$ 250.000.000,00	$ 11.045.975,51	2,21%	$ 488.771.921,08	98%
Adiciones	N/A	$ 249.817.896,59				
Reducciones		$ 0,00				
TOTAL	$ 250.000.000,00	$ 499.817.896,59				

11- CONTROL PAGOS

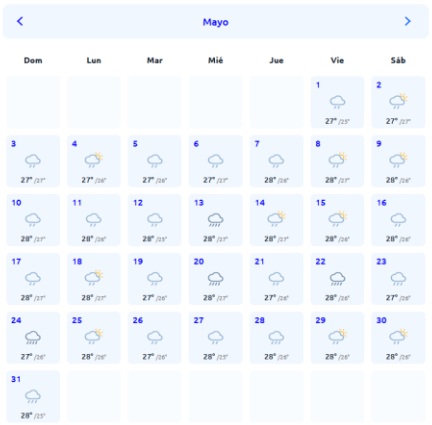
DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 250.000.000,00	SIN NOVEDAD
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 249.817.896,59	VALOR ADICIONADO MEDIANTE PRIMER MODIFICATORIO.
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	$ 0,00	N/A
VALOR TOTAL	$ 499.817.896,59	N/A
TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 0,00	N/A

12- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SE SOLICITA A LA FIRMA CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORÍA DAR CELERIDAD A LOS DOCUMENTOS QUE DEBEN SER ENTREGADOS PARA APROBACIÓN EN EL LAPSO ADMINISTRATIVO.

13- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):

SOLEADO Y CON LLUVIAS.



ST. ORTEGA CHACON JOSE LUIS
Supervisor Contrato de Interventoria No. 155-00-A-COFAC-DIFRA-2024
