	CONSORCIO INTERSEDES 4 **NIT 901.884.356-8**		
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - N.9		
Objeto Informe	Seguimiento Semanal al Contrato de Obra N.153-00-A-COFAC-DIFRA-2024		
Semana De:	2/6/2025	Al	8/6/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRACTUAL

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PUBLICA PARA LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA Y TRAMITES DEL PROYECTO DE TRALADO DE GACAR (CERRAMIENTO Y GUARDIA) EN SAN ANDRES ISLA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
Interventor:	Consorcio Intersedes 4	Contratista	Consorcio AW
Nit:	901.884.356-8	Nit:	901.883.213-9
Contrato N.	155-00-A-COFAC-DIFRA-2024	Contrato N.	153-00-A-COFAC-DIFRA-2024
Valor Inicial:	$ 250,000,000.00	Valor Inicial:	$ 6,112,824,982.80
Fecha Inicial	10/12/2024 - 24/12/2024	Fecha Inicial	10/12/2024 - 24/12/2024
Prórroga N.1	11/12/2025 - 15/5/2025	Prórroga N.1	11/12/2025 - 15/5/2025
Valor Prórroga N.1	$ 249,817,896.59	Valor Prórroga N.1	$ -
Suspension N.1	31/12/2024 - 31/01/2025	Suspension N.1	31/12/2024 - 31/01/2025
Prorroga Suspension N.1	31/01/2025 - 17/03/2025	Prorroga Suspension N.1	31/01/2025 - 17/03/2025
Reinicio Contrato	8/04/2025 - 11/08/2025	Reinicio Contrato	8/04/2025 - 11/08/2025
Valor Total Contrato	$ 499,817,896.59	Valor Total Contrato	$ 6,112,824,982.80

2. SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO

Semana	Fecha de Corte
9	8/6/2025

AVANCE EN EJECUCION DE OBRA

	% Prog. Acumulado	% Prog. Semana	% Ejecutado Acumulado	% Ejecutado Semana	Desviación Acumulado
Semana 1 Obra	1.00%	1.00%	0.00%	0.00%	**-1.00%**
Semana 2 Obra	2.00%	1.00%	0.00%	0.00%	**-2.00%**
Semana 3 Obra	3.00%	1.00%	0.00%	0.00%	**-3.00%**
Semana 4 Obra	5.00%	2.00%	0.25%	0.25%	**-4.75%**
Semana 5 Obra	7.00%	2.00%	0.30%	0.05%	**-6.70%**
Semana 6 Obra	9.00%	2.00%	1.00%	0.70%	**-8.00%**
Semana 7 Obra	12.00%	3.00%	2.00%	1.00%	**-10.00%**
Semana 8 Obra	16.00%	4.00%	3.00%	1.00%	**-13.00%**
Semana 9 Obra	26.93%	10.93%	3.66%	0.66%	**-23.27%**
Semana 10 Obra					**0.00%**

Observaciones:

1. Durante la jornada correspondiente a la semana 1, no se adelantaron actividades en el frente de obra debido a la falta de cumplimiento de los requisitos de estudios de seguridad por parte del contratista, tanto para el personal operativo como para el equipo de interventoría que debía ingresar al área de intervención.
2. Durante la ejecución del proyecto, se identificaron limitaciones en el desarrollo de la programación de actividades, debido a la presencia de especies arbóreas en el área de intervención, las cuales están sujetas a protección ambiental conforme a la normatividad vigente. Esta situación fue informada y se encuentra en proceso de gestión ante CORALINA, autoridad ambiental competente en la jurisdicción. Hasta la fecha, no se ha recibido autorización o lineamientos específicos que permitan proceder con la intervención de dichas especies.
3.
4.
5.

	CONSORCIO INTERSEDES 4 **NIT 901.884.356-8**			
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - N.9			
Objeto Informe	Seguimiento Semanal al Contrato de Obra N.153-00-A-COFAC-DIFRA-2024			
Semana De:	2/6/2025	Al	8/6/2025	

3. RESUMEN SEMANAL COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Interventoría	Director de Interventoría//Residente de Interventoría	Administrativos	si
		Profesionales	si
Contratista	Director de Obra// Residente de Obra	Administrativos	si
		Profesionales	si

Disponibilidad de Recursos	SI	Observaciones:	
Aspectos Logisticos	SI		
Herramiento Menor	N/A		
Maquinaria	N/A		

4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1	Se continua la limpieza manual del área de trabajo destinada al replanteo de los ejes del muro, conforme a lo establecido en los planos de diseño y en las especificaciones técnicas del proyecto.
2	Se continua la identificación y caracterización preliminar de árboles ubicados dentro y en el entorno inmediato de la franja de intervención del proyecto, como parte de las actividades de reconocimiento y prevención ambiental.
3	Se continua inicio a la actividad correspondiente a la instalación del cerramiento perimetral provisional, como parte de las acciones iniciales de control y seguridad en el área de intervención
4	Se continua con la actividad de demolicion de la edificacion conocidad como " Sexy bar"
5	Se continua la actividad de la construccion del campamento
6	Se continua la disposicion final de la demolicion e la edificacion conocidad como " Sexy bar"
7	Se finaliza tala de arboles porte medio y alto
8	Se continua escavacion en material rocoso (zapatas)

5. COMPROMISOS A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1	Instalaciones Provisionales
2	DESCAPOTE H= 0.20 MTS, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES
3	DEMOLICIÓN CERRAMIENTO EXISTENTE
4	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE, MALEZAS Y CHAMIZOS
5	ADQUISICION E IMPORTACION EQUIPOS
6	RELLENO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO TIPO SUB-BASE B-200 SEGÚN PLANOS. INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.
7	SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO DE 2.000 PSI DE E=0.05 M SEGÚN PLANOS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS
8	VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO Y RESISTENTE A LOS SULFATOS SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.
9	MEDIDAS DE COMPENSACIÓN SEGÚN AUTORIDAD AMBIENTAL
10	COLUMNA EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO RESISTENTE A LOS SULFATOS SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO
11	ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420 MPA GR 60 -NTC 2289.

Firma:		Firma:
Nombre	Ing. Carlos Felipe Correa Barreto Director de Interventoría	Nombre Ing. Yurlanys Garcia Zambrano Residente de Interventoría

CONSORCIO INTERSEDES 4	**CONSORCIO INTERSEDES 4** **NIT 901.884.356-8**		
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - N.1 - REGISTRO FOTOGRAFICO		
Objeto Informe	Seguimiento Semanal al Contrato de Obra N.153-00-A-COFAC-DIFRA-2024		
Semana De:	2/6/2025	AL	8/6/2025

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PUBLICA PARA LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA Y TRAMITES DEL PROYECTO DE TRALADO DE GACAR (CERRAMIENTO Y GUARDIA) EN SAN ANDRES ISLA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS













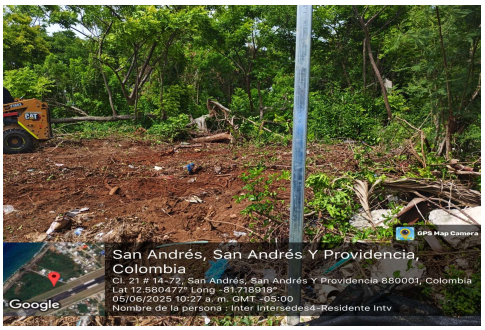

CONSORCIO INTERSEDES 4	**CONSORCIO INTERSEDES 4** **NIT 901.884.356-8**		
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - N.1 - REGISTRO FOTOGRAFICO		
Objeto Informe	Seguimiento Semanal al Contrato de Obra N.153-00-A-COFAC-DIFRA-2024		
Semana De:	2/6/2025	AL	8/6/2025

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PUBLICA PARA LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA Y TRAMITES DEL PROYECTO DE TRALADO DE GACAR (CERRAMIENTO Y GUARDIA) EN SAN ANDRES ISLA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

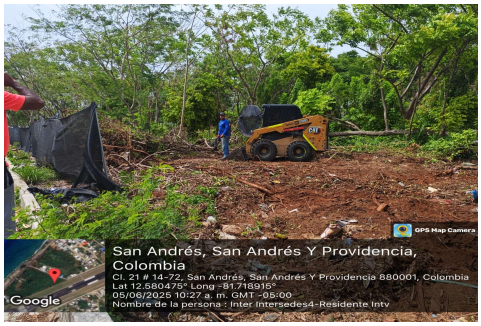CONSORCIO INTERSEDES 4
NIT 901.884.356-8

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - N.10

Objeto Informe	Seguimiento Semanal al Contrato de Obra N.153-00-A-COFAC-DIFRA-2024		
Semana De:	9/6/2025	Al	15/6/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRACTUAL

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PUBLICA PARA LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA Y TRAMITES DEL PROYECTO DE TRALADO DE GACAR (CERRAMIENTO Y GUARDIA) EN SAN ANDRES ISLA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
Interventor:	Consorcio Intersedes 4	Contratista	Consorcio AW
Nit:	901.884.356-8	Nit:	901.883.213-9
Contrato N.	155-00-A-COFAC-DIFRA-2024	Contrato N.	153-00-A-COFAC-DIFRA-2024
Valor Inicial:	$ 250,000,000.00	Valor Inicial:	$ 6,112,824,982.80
Fecha Inicial	10/12/2024 - 24/12/2024	Fecha Inicial	10/12/2024 - 24/12/2024
Prórroga N.1	11/12/2025 - 15/5/2025	Prórroga N.1	11/12/2025 - 15/5/2025
Valor Prórroga N.1	$ 249,817,896.59	Valor Prórroga N.1	$ -
Suspension N.1	31/12/2024 - 31/01/2025	Suspension N.1	31/12/2024 - 31/01/2025
Prorroga Suspension N.1	31/01/2025 - 17/03/2025	Prorroga Suspension N.1	31/01/2025 - 17/03/2025
Reinicio Contrato	8/04/2025 - 11/08/2025	Reinicio Contrato	8/04/2025 - 11/08/2025
Valor Total Contrato	$ 499,817,896.59	Valor Total Contrato	$ 6,112,824,982.80

2. SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO

Semana	Fecha de Corte
10	15/6/2025

AVANCE EN EJECUCION DE OBRA

	% Prog. Acumulado	% Prog. Semana	% Ejecutado Acumulado	% Ejecutado Semana	Desviación Acumulado
Semana 1 Obra	1.00%	1.00%	0.00%	0.00%	**-1.00%**
Semana 2 Obra	2.00%	1.00%	0.00%	0.00%	**-2.00%**
Semana 3 Obra	3.00%	1.00%	0.00%	0.00%	**-3.00%**
Semana 4 Obra	5.00%	2.00%	0.25%	0.25%	**-4.75%**
Semana 5 Obra	7.00%	2.00%	0.30%	0.05%	**-6.70%**
Semana 6 Obra	9.00%	2.00%	1.00%	0.70%	**-8.00%**
Semana 7 Obra	12.00%	3.00%	2.00%	1.00%	**-10.00%**
Semana 8 Obra	16.00%	4.00%	3.00%	1.00%	**-13.00%**
Semana 9 Obra	26.93%	10.93%	3.66%	0.66%	**-23.27%**
Semana 10 Obra	34.30%	7.37%	3.76%	0.10%	**-30.54%**
Semana 11 Obra	34.30%		3.76%		**-30.54%**
Semana 12 Obra	34.30%		3.76%		**-30.54%**
Semana 13 Obra	34.30%		3.76%		**-30.54%**

Observaciones:

1. Durante la jornada correspondiente a la semana 1, no se adelantaron actividades en el frente de obra debido a la falta de cumplimiento de los requisitos de estudios de seguridad por parte del contratista, tanto para el personal operativo como para el equipo de interventoría que debía ingresar al área de intervención.
2. Durante la ejecución del proyecto, se identificaron limitaciones en el desarrollo de la programación de actividades, debido a la presencia de especies arbóreas en el área de intervención, las cuales están sujetas a protección ambiental conforme a la normatividad vigente. Esta situación fue informada y se encuentra en proceso de gestión ante CORALINA, autoridad ambiental competente en la jurisdicción. Hasta la fecha, no se ha recibido autorización o lineamientos específicos que permitan proceder con la intervención de dichas especies.
3. Durante el periodo evaluado se presentaron precipitaciones intensas y continuas en la zona de intervención, las cuales afectaron directamente el desarrollo normal de las actividades programadas en obra. Estas lluvias, registradas principalmente entre los días 09/06/2025-10/06/2025, generaron condiciones de humedad en el terreno y en los accesos, impidiendo el ingreso seguro de maquinaria y personal, así como la ejecución de labores técnicas que requieren estabilidad del terreno y visibilidad adecuada.
4.
5.

CONSORCIO INTERSEDES 4	**CONSORCIO INTERSEDES 4 NIT 901.884.356-8**			
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - N.10			
Objeto Informe	Seguimiento Semanal al Contrato de Obra N.153-00-A-COFAC-DIFRA-2024			
Semana De:	9/6/2025	Al	15/6/2025	

3. RESUMEN SEMANAL COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Interventoría	Director de Interventoría//Residente de Interventoría	Administrativos	si
		Profesionales	si
Contratista	Director de Obra// Residente de Obra	Administrativos	si
		Profesionales	si

Disponibilidad de Recursos	SI	Observaciones:	
Aspectos Logisticos	SI		
Herramiento Menor	N/A		
Maquinaria	N/A		

4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1	Se continua la identificación y caracterización preliminar de árboles ubicados dentro y en el entorno inmediato de la franja de intervención del proyecto, como parte de las actividades de reconocimiento y prevención ambiental.
2	Se continua con la actividad de demolicion de la edificacion conocidad como " Sexy bar"
3	Se continua la disposicion final de la demolicion e la edificacion conocidad como " Sexy bar"
4	Se continua escavacion en material rocoso (zapatas)
5	Se inicia con Figurado acero de refuerzo estructural fy: 420 mpa gr 60 -ntc 2289.

5. COMPROMISOS A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


1	Instalaciones Provisionales
2	DESCAPOTE H= 0.20 MTS, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES
3	DEMOLICIÓN CERRAMIENTO EXISTENTE
4	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE, MALEZAS Y CHAMIZOS
5	ADQUISICION E IMPORTACION EQUIPOS
6	RELLENO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO TIPO SUB-BASE B-200 SEGÚN PLANOS. INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.
7	SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO DE 2.000 PSI DE E=0.05 M SEGÚN PLANOS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS
8	VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO Y RESISTENTE A LOS SULFATOS SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.
9	MEDIDAS DE COMPENSACIÓN SEGÚN AUTORIDAD AMBIENTAL
10	COLUMNA EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO RESISTENTE A LOS SULFATOS SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO

Firma:		Firma:	
Nombre	Ing. Carlos Felipe Correa Barreto Director de Interventoría	Nombre	Ing. Yurlanys Garcia Zambrano Residente de Interventoría

	CONSORCIO INTERSEDES 4 **NIT 901.884.356-8**		
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - N.1 - REGISTRO FOTOGRAFICO		
Objeto Informe	Seguimiento Semanal al Contrato de Obra N.153-00-A-COFAC-DIFRA-2024		
Semana De:	9/6/2025	AL	15/6/2025


OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PUBLICA PARA LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA Y TRAMITES DEL PROYECTO DE TRALADO DE GACAR (CERRAMIENTO Y GUARDIA) EN SAN ANDRES ISLA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

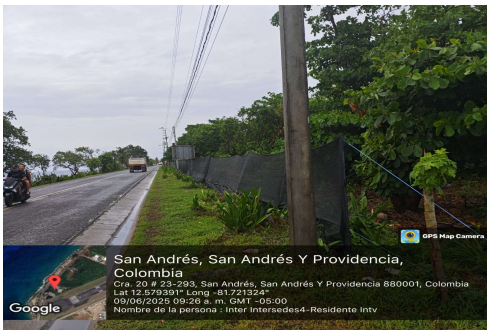





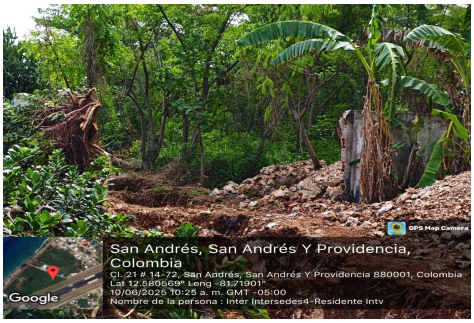

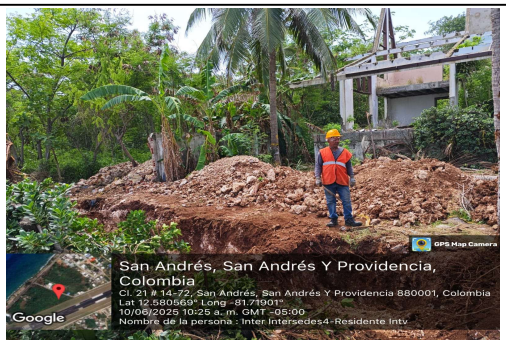




	CONSORCIO INTERSEDES 4 **NIT 901.884.356-8**		
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - N.1 - REGISTRO FOTOGRAFICO		
Objeto Informe	Seguimiento Semanal al Contrato de Obra N.153-00-A-COFAC-DIFRA-2024		
Semana De:	9/6/2025	AL	15/6/2025

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PUBLICA PARA LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA Y TRAMITES DEL PROYECTO DE TRALADO DE GACAR (CERRAMIENTO Y GUARDIA) EN SAN ANDRES ISLA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



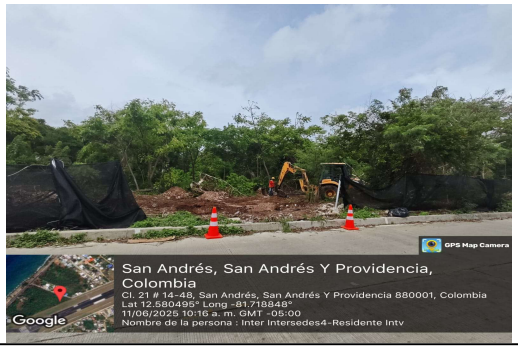









	CONSORCIO INTERSEDES 4 **NIT 901.884.356-8**		
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - N.1 - REGISTRO FOTOGRAFICO		
Objeto Informe	Seguimiento Semanal al Contrato de Obra N.153-00-A-COFAC-DIFRA-2024		
Semana De:	9/6/2025	AL	15/6/2025

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PUBLICA PARA LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA Y TRAMITES DEL PROYECTO DE TRALADO DE GACAR (CERRAMIENTO Y GUARDIA) EN SAN ANDRES ISLA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSORCIO INTERSEDES 4	**CONSORCIO INTERSEDES 4 NIT 901.884.356-8**		
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - N.11		
Objeto Informe	Seguimiento Semanal al Contrato de Obra N.153-00-A-COFAC-DIFRA-2024		
Semana De:	16/6/2025	Al	22/6/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRACTUAL

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PUBLICA PARA LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA Y TRAMITES DEL PROYECTO DE TRALADO DE GACAR (CERRAMIENTO Y GUARDIA) EN SAN ANDRES ISLA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
Interventor:	Consorcio Intersedes 4	Contratista	Consorcio AW
Nit:	901.884.356-8	Nit:	901.883.213-9
Contrato N.	155-00-A-COFAC-DIFRA-2024	Contrato N.	153-00-A-COFAC-DIFRA-2024
Valor Inicial:	$ 250,000,000.00	Valor Inicial:	$ 6,112,824,982.80
Fecha Inicial	10/12/2024 - 24/12/2024	Fecha Inicial	10/12/2024 - 24/12/2024
Prórroga N.1	11/12/2025 - 15/5/2025	Prórroga N.1	11/12/2025 - 15/5/2025
Valor Prórroga N.1	$ 249,817,896.59	Valor Prórroga N.1	$ -
Suspension N.1	31/12/2024 - 31/01/2025	Suspension N.1	31/12/2024 - 31/01/2025
Prorroga Suspension N.1	31/01/2025 - 17/03/2025	Prorroga Suspension N.1	31/01/2025 - 17/03/2025
Reinicio Contrato	8/04/2025 - 11/08/2025	Reinicio Contrato	8/04/2025 - 11/08/2025
Valor Total Contrato	$ 499,817,896.59	Valor Total Contrato	$ 6,112,824,982.80

2. SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO

Semana	Fecha de Corte
11	22/6/2025

AVANCE EN EJECUCION DE OBRA

	% Prog. Acumulado	% Prog. Semana	% Ejecutado Acumulado	% Ejecutado Semana	Desviación Acumulado
Semana 1 Obra	1.00%	1.00%	0.00%	0.00%	**-1.00%**
Semana 2 Obra	2.00%	1.00%	0.00%	0.00%	**-2.00%**
Semana 3 Obra	3.00%	1.00%	0.00%	0.00%	**-3.00%**
Semana 4 Obra	5.00%	2.00%	0.25%	0.25%	**-4.75%**
Semana 5 Obra	7.00%	2.00%	0.30%	0.05%	**-6.70%**
Semana 6 Obra	9.00%	2.00%	1.00%	0.70%	**-8.00%**
Semana 7 Obra	12.00%	3.00%	2.00%	1.00%	**-10.00%**
Semana 8 Obra	16.00%	4.00%	3.00%	1.00%	**-13.00%**
Semana 9 Obra	26.93%	10.93%	3.66%	0.66%	**-23.27%**
Semana 10 Obra	34.30%	7.37%	3.76%	0.10%	**-30.54%**
Semana 11 Obra	43.08%	8.78%	4.10%	0.34%	**-38.98%**
Semana 12 Obra	43.08%		4.10%		**-38.98%**
Semana 13 Obra	43.08%		4.10%		**-38.98%**

Observaciones:

1. Durante la jornada correspondiente a la semana 1, no se adelantaron actividades en el frente de obra debido a la falta de cumplimiento de los requisitos de estudios de seguridad por parte del contratista, tanto para el personal operativo como para el equipo de interventoría que debía ingresar al área de intervención.
2. Durante la ejecución del proyecto, se identificaron limitaciones en el desarrollo de la programación de actividades, debido a la presencia de especies arbóreas en el área de intervención, las cuales están sujetas a protección ambiental conforme a la normatividad vigente. Esta situación fue informada y se encuentra en proceso de gestión ante CORALINA, autoridad ambiental competente en la jurisdicción. Hasta la fecha, no se ha recibido autorización o lineamientos específicos que permitan proceder con la intervención de dichas especies.
3. Durante el periodo evaluado se presentaron precipitaciones intensas y continuas en la zona de intervención, las cuales afectaron directamente el desarrollo normal de las actividades programadas en obra. Estas lluvias, registradas principalmente entre los días 09/06/2025-10/06/2025, generaron condiciones de humedad en el terreno y en los accesos, impidiendo el ingreso seguro de maquinaria y personal, así como la ejecución de labores técnicas que requieren estabilidad del terreno y visibilidad adecuada.
4.
5.

	CONSORCIO INTERSEDES 4 **NIT 901.884.356-8**			
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - N.11			
Objeto Informe	Seguimiento Semanal al Contrato de Obra N.153-00-A-COFAC-DIFRA-2024			
Semana De:	16/6/2025	Al	22/6/2025	

3. RESUMEN SEMANAL COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Interventoría	Director de Interventoría//Residente de Interventoría	Administrativos	si
		Profesionales	si
Contratista	Director de Obra// Residente de Obra	Administrativos	si
		Profesionales	si

Disponibilidad de Recursos	SI	Observaciones:	
Aspectos Logisticos	SI		
Herramiento Menor	N/A		
Maquinaria	N/A		

4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1	Se continua la identificación y caracterización preliminar de árboles ubicados dentro y en el entorno inmediato de la franja de intervención del proyecto, como parte de las actividades de reconocimiento y prevención ambiental.
2	Se continua con la actividad de demolicion de la edificacion conocidad como " Sexy bar"
3	Se continua la disposicion final de la demolicion e la edificacion conocidad como " Sexy bar"
4	Se continua escavacion en material rocoso (zapatas)
5	Se inicia con Figurado acero de refuerzo estructural fy: 420 mpa gr 60 -ntc 2289.

5. COMPROMISOS A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1	Instalaciones Provisionales
2	DESCAPOTE H= 0.20 MTS, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES
3	DEMOLICIÓN CERRAMIENTO EXISTENTE
4	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE, MALEZAS Y CHAMIZOS
5	ADQUISICION E IMPORTACION EQUIPOS
6	RELLENO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO TIPO SUB-BASE B-200 SEGÚN PLANOS. INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.
7	SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO DE 2.000 PSI DE E=0.05 M SEGÚN PLANOS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS
8	VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO Y RESISTENTE A LOS SULFATOS SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.
9	MEDIDAS DE COMPENSACIÓN SEGÚN AUTORIDAD AMBIENTAL
10	COLUMNA EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO RESISTENTE A LOS SULFATOS SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO

Firma:		Firma:	
Nombre	Ing. Carlos Felipe Correa Barreto Director de Interventoría	Nombre	Ing. Yurlanys Garcia Zambrano Residente de Interventoría


CONSORCIO INTERSEDES 4	**CONSORCIO INTERSEDES 4** **NIT 901.884.356-8**		
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - N.1 - REGISTRO FOTOGRAFICO		
Objeto Informe	Seguimiento Semanal al Contrato de Obra N.153-00-A-COFAC-DIFRA-2024		
Semana De:	16/6/2025	AL	22/6/2025


OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PUBLICA PARA LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA Y TRAMITES DEL PROYECTO DE TRALADO DE GACAR (CERRAMIENTO Y GUARDIA) EN SAN ANDRES ISLA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS






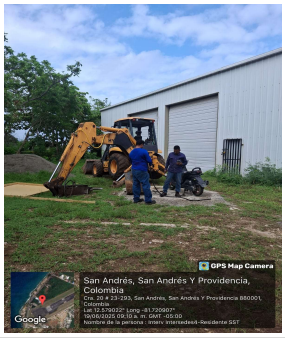

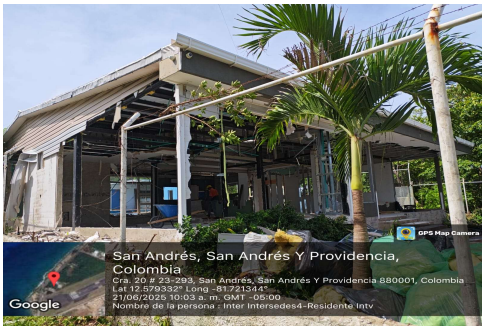




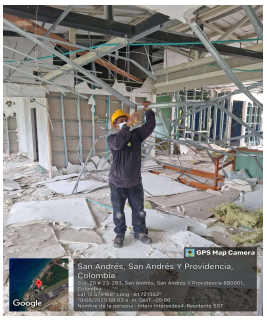

CONSORCIO INTERSEDES 4	**CONSORCIO INTERSEDES 4** **NIT 901.884.356-8**		
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - N.1 - REGISTRO FOTOGRAFICO		
Objeto Informe	Seguimiento Semanal al Contrato de Obra N.153-00-A-COFAC-DIFRA-2024		
Semana De:	16/6/2025	AL	22/6/2025


OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PUBLICA PARA LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA Y TRAMITES DEL PROYECTO DE TRALADO DE GACAR (CERRAMIENTO Y GUARDIA) EN SAN ANDRES ISLA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

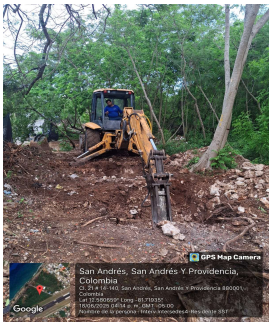








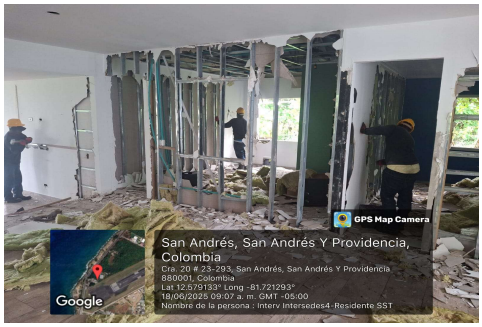

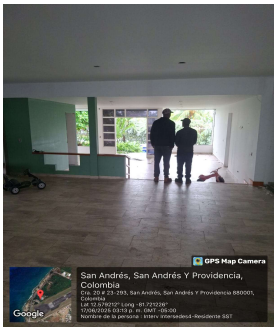


	CONSORCIO INTERSEDES 4 **NIT 901.884.356-8**		
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - N.1 - REGISTRO FOTOGRAFICO		
Objeto Informe	Seguimiento Semanal al Contrato de Obra N.153-00-A-COFAC-DIFRA-2024		
Semana De:	16/6/2025	AL	22/6/2025

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PUBLICA PARA LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA Y TRAMITES DEL PROYECTO DE TRALADO DE GACAR (CERRAMIENTO Y GUARDIA) EN SAN ANDRES ISLA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS







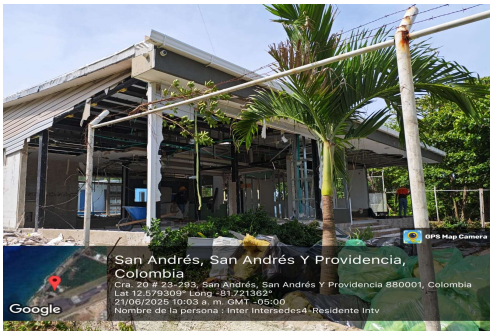

	CONSORCIO INTERSEDES 4 **NIT 901.884.356-8**		
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - N.12		
Objeto Informe	Seguimiento Semanal al Contrato de Obra N.153-00-A-COFAC-DIFRA-2024		
Semana De:	23/6/2025	Al	29/6/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRACTUAL

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PUBLICA PARA LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA Y TRAMITES DEL PROYECTO DE TRALADO DE GACAR (CERRAMIENTO Y GUARDIA) EN SAN ANDRES ISLA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
Interventor:	Consorcio Intersedes 4	Contratista	Consorcio AW
Nit:	901.884.356-8	Nit:	901.883.213-9
Contrato N.	155-00-A-COFAC-DIFRA-2024	Contrato N.	153-00-A-COFAC-DIFRA-2024
Valor Inicial:	$ 250,000,000.00	Valor Inicial:	$ 6,112,824,982.80
Fecha Inicial	10/12/2024 - 24/12/2024	Fecha Inicial	10/12/2024 - 24/12/2024
Prórroga N.1	11/12/2025 - 15/5/2025	Prórroga N.1	11/12/2025 - 15/5/2025
Valor Prórroga N.1	$ 249,817,896.59	Valor Prórroga N.1	$ -
Suspension N.1	31/12/2024 - 31/01/2025	Suspension N.1	31/12/2024 - 31/01/2025
Prorroga Suspension N.1	31/01/2025 - 17/03/2025	Prorroga Suspension N.1	31/01/2025 - 17/03/2025
Reinicio Contrato	8/04/2025 - 11/08/2025	Reinicio Contrato	8/04/2025 - 11/08/2025
Valor Total Contrato	$ 499,817,896.59	Valor Total Contrato	$ 6,112,824,982.80

2. SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO

Semana	Fecha de Corte
12	29/6/2025

AVANCE EN EJECUCION DE OBRA

	% Prog. Acumulado	% Prog. Semana	% Ejecutado Acumulado	% Ejecutado Semana	Desviación Acumulado
Semana 1 Obra	1.00%	1.00%	0.00%	0.00%	**-1.00%**
Semana 2 Obra	2.00%	1.00%	0.00%	0.00%	**-2.00%**
Semana 3 Obra	3.00%	1.00%	0.00%	0.00%	**-3.00%**
Semana 4 Obra	5.00%	2.00%	0.25%	0.25%	**-4.75%**
Semana 5 Obra	7.00%	2.00%	0.30%	0.05%	**-6.70%**
Semana 6 Obra	9.00%	2.00%	1.00%	0.70%	**-8.00%**
Semana 7 Obra	12.00%	3.00%	2.00%	1.00%	**-10.00%**
Semana 8 Obra	16.00%	4.00%	3.00%	1.00%	**-13.00%**
Semana 9 Obra	26.93%	10.93%	3.66%	0.66%	**-23.27%**
Semana 10 Obra	34.30%	7.37%	3.76%	0.10%	**-30.54%**
Semana 11 Obra	43.08%	8.78%	4.10%	0.34%	**-38.98%**
Semana 12 Obra	51.99%	8.91%	4.30%	0.20%	**-47.69%**
Semana 13 Obra	51.99%		4.30%		**-47.69%**

Observaciones:

1. Durante la jornada correspondiente a la semana 1, no se adelantaron actividades en el frente de obra debido a la falta de cumplimiento de los requisitos de estudios de seguridad por parte del contratista, tanto para el personal operativo como para el equipo de interventoría que debía ingresar al área de intervención.
2. Durante la ejecución del proyecto, se identificaron limitaciones en el desarrollo de la programación de actividades, debido a la presencia de especies arbóreas en el área de intervención, las cuales están sujetas a protección ambiental conforme a la normatividad vigente. Esta situación fue informada y se encuentra en proceso de gestión ante CORALINA, autoridad ambiental competente en la jurisdicción. Hasta la fecha, no se ha recibido autorización o lineamientos específicos que permitan proceder con la intervención de dichas especies.
3. Durante el periodo evaluado se presentaron precipitaciones intensas y continuas en la zona de intervención, las cuales afectaron directamente el desarrollo normal de las actividades programadas en obra. Estas lluvias, registradas principalmente entre los días 09/06/2025-10/06/2025-17/06/2025- 23/06/2025, generaron condiciones de humedad en el terreno y en los accesos, impidiendo el ingreso seguro de maquinaria y personal, así como la ejecución de labores técnicas que requieren estabilidad del terreno y visibilidad adecuada.
4.
5.

	CONSORCIO INTERSEDES 4 **NIT 901.884.356-8**			
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - N.12			
Objeto Informe	Seguimiento Semanal al Contrato de Obra N.153-00-A-COFAC-DIFRA-2024			
Semana De:	23/6/2025	Al	29/6/2025	

3. RESUMEN SEMANAL COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Interventoría	Director de Interventoría//Residente de Interventoría	Administrativos	si
		Profesionales	si
Contratista	Director de Obra// Residente de Obra	Administrativos	si
		Profesionales	si

Disponibilidad de Recursos	SI	Observaciones:	
Aspectos Logisticos	SI		
Herramiento Menor	N/A		
Maquinaria	N/A		

4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1	Se continua la identificación y caracterización preliminar de árboles ubicados dentro y en el entorno inmediato de la franja de intervención del proyecto, como parte de las actividades de reconocimiento y prevención ambiental.
2	Se continua con la actividad de demolicion de la edificacion conocidad como " Sexy bar"
3	Se continua la disposicion final de la demolicion e la edificacion conocidad como " Sexy bar"
4	Se continua escavacion en material rocoso (zapatas)
5	Se continua con Figurado acero de refuerzo estructural fy: 420 mpa gr 60 -ntc 2289.
6	Se continua demolicion de Vivienda cambio de ubicaion Guardia

5. COMPROMISOS A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1	Instalaciones Provisionales
2	DESCAPOTE H= 0.20 MTS, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES
3	DEMOLICIÓN CERRAMIENTO EXISTENTE
4	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE, MALEZAS Y CHAMIZOS
5	ADQUISICION E IMPORTACION EQUIPOS
6	RELLENO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO TIPO SUB-BASE B-200 SEGÚN PLANOS. INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.
7	SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO DE 2.000 PSI DE E=0.05 M SEGÚN PLANOS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS
8	VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO Y RESISTENTE A LOS SULFATOS SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.
9	MEDIDAS DE COMPENSACIÓN SEGÚN AUTORIDAD AMBIENTAL
10	COLUMNA EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO RESISTENTE A LOS SULFATOS SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO

Firma:		Firma:	
Nombre	Ing. Carlos Felipe Correa Barreto Director de Interventoría	Nombre	Ing. Yurlanys Garcia Zambrano Residente de Interventoría


	CONSORCIO INTERSEDES 4 **NIT 901.884.356-8**		
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - N.1 - REGISTRO FOTOGRAFICO		
Objeto Informe	Seguimiento Semanal al Contrato de Obra N.153-00-A-COFAC-DIFRA-2024		
Semana De:	23/6/2025	AL	29/6/2025

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PUBLICA PARA LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA Y TRAMITES DEL PROYECTO DE TRALADO DE GACAR (CERRAMIENTO Y GUARDIA) EN SAN ANDRES ISLA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS





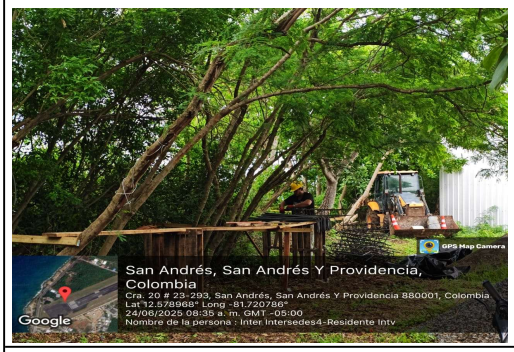







	CONSORCIO INTERSEDES 4 **NIT 901.884.356-8**		
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - N.1 - REGISTRO FOTOGRAFICO		
Objeto Informe	Seguimiento Semanal al Contrato de Obra N.153-00-A-COFAC-DIFRA-2024		
Semana De:	23/6/2025	AL	29/6/2025

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PUBLICA PARA LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA Y TRAMITES DEL PROYECTO DE TRALADO DE GACAR (CERRAMIENTO Y GUARDIA) EN SAN ANDRES ISLA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS














	CONSORCIO INTERSEDES 4 **NIT 901.884.356-8**		
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - N.1 - REGISTRO FOTOGRAFICO		
Objeto Informe	Seguimiento Semanal al Contrato de Obra N.153-00-A-COFAC-DIFRA-2024		
Semana De:	23/6/2025	AL	29/6/2025

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PUBLICA PARA LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA Y TRAMITES DEL PROYECTO DE TRALADO DE GACAR (CERRAMIENTO Y GUARDIA) EN SAN ANDRES ISLA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS





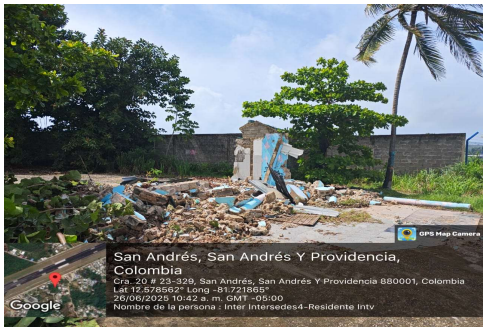







CONSORCIO INTERSEDES 4	**CONSORCIO INTERSEDES 4 NIT 901.884.356-8**			
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - N.1			
Objeto Informe	Seguimiento Semanal al Contrato de Obra N.153-00-A-COFAC-DIFRA-2024			
Semana De:	2/6/2025	Al	8/6/2024	

1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRACTUAL

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PUBLICA PARA LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA Y TRAMITES DEL PROYECTO DE TRALADO DE GACAR (CERRAMIENTO Y GUARDIA) EN SAN ANDRES ISLA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
Interventor:	Consorcio Intersedes 4	Contratista	Consorcio AW
Nit:	901.884.356-8	Nit:	901.883.213-9
Contrato N.	155-00-A-COFAC-DIFRA-2024	Contrato N.	153-00-A-COFAC-DIFRA-2024
Valor Inicial:	$ 250,000,000.00	Valor Inicial:	$ 6,112,824,982.80
Fecha Inicial	10/12/2024 - 24/12/2024	Fecha Inicial	10/12/2024 - 24/12/2024
Prórroga N.1	11/12/2025 - 15/5/2025	Prórroga N.1	11/12/2025 - 15/5/2025
Valor Prórroga N.1	$ 249,817,896.59	Valor Prórroga N.1	$ -
Suspension N.1	31/12/2024 - 31/01/2025	Suspension N.1	31/12/2024 - 31/01/2025
Prorroga Suspension N.1	31/01/2025 - 17/03/2025	Prorroga Suspension N.1	31/01/2025 - 17/03/2025
Reinicio Contrato	8/04/2025 - 11/08/2025	Reinicio Contrato	8/04/2025 - 11/08/2025
Valor Total Contrato	$ 499,817,896.59	Valor Total Contrato	$ 6,112,824,982.80

2. SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO

Semana	Fecha de Corte
9	8/6/2024

AVANCE EN EJECUCIÓN DE OBRA

	% Prog. Acumulado	% Prog. Semana	% Ejecutado Acumulado	% Ejecutado Semana	Desviación Acumulado
Semana 1 Obra					0.00%
Semana 2 Obra					0.00%
Semana 3 Obra					0.00%
Semana 4 Obra					0.00%
Semana 5 Obra					0.00%
Semana 6 Obra					0.00%
Semana 7 Obra					0.00%
Semana 8 Obra					0.00%
Semana 9 Obra					0.00%
Semana 10 Obra					0.00%

Observaciones:

1

2

3

4

5

CONSORCIO INTERSEDES 4	**CONSORCIO INTERSEDES 4 NIT 901.884.356-8**			
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - N.1			
Objeto Informe	Seguimiento Semanal al Contrato de Obra N.153-00-A-COFAC-DIFRA-2024			
Semana De:	2/6/2025	Al	8/6/2024	

3. RESUMEN SEMANAL COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Interventoría	Director de Interventoría/Asesor Ambiental	Administrativos	si
		Profesionales	si
Contratista	Residente Ambiental Contratista	Administrativos	si
		Profesionales	si

Disponibilidad de Recursos	SI	Observaciones:	
Aspectos Logisticos	SI		
Herramiento Menor	N/A		
Maquinaria	N/A		

4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1. Se realizò revicion de plan forestal para remision a CORALINA en relacion a las observacion remitidas de manera previa por la Autoridad ambiental
2. Seguimiento a las actividades de recoleccion de residuos de tala de arboles autorizados
3.
4.
5.

5. COMPROMISOS A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


1.
2.
3.
4.
5.

Firma:		Firma:	
Nombre	Ing. Carlos Felipe Correa Barreto Director de Interventoría	Nombre	Ing. Estefania Ochoa Manuel Asesor Ambiental

CONSORCIO INTERSEDES 4	**CONSORCIO INTERSEDES 4** **NIT 901.884.356-8**		
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - N.1 - REGISTRO FOTOGRAFICO		
Objeto Informe	Seguimiento Semanal al Contrato de Obra N.153-00-A-COFAC-DIFRA-2024		
Semana De:	2/6/2025	AL	8/6/2024

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PUBLICA PARA LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA Y TRAMITES DEL PROYECTO DE TRALADO DE GACAR (CERRAMIENTO Y GUARDIA) EN SAN ANDRES ISLA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

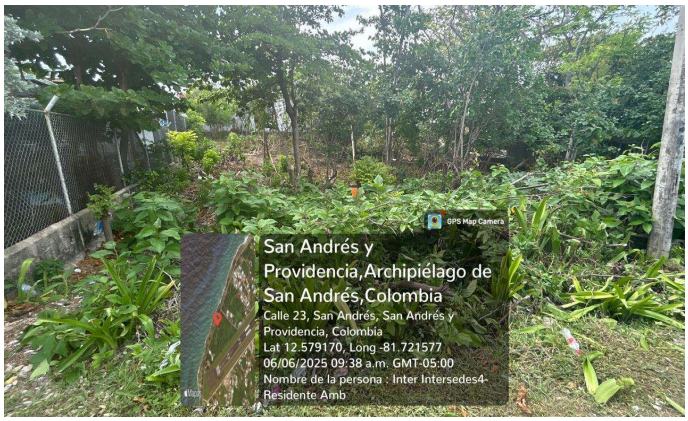





CONSORCIO INTERSEDES 4	**CONSORCIO INTERSEDES 4 NIT 901.884.356-8**			
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - N.1			
Objeto Informe	Seguimiento Semanal al Contrato de Obra N.153-00-A-COFAC-DIFRA-2024			
Semana De:	9/6/2025	Al	15/6/2024	

1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRACTUAL

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PUBLICA PARA LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA Y TRAMITES DEL PROYECTO DE TRALADO DE GACAR (CERRAMIENTO Y GUARDIA) EN SAN ANDRES ISLA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
Interventor:	Consorcio Intersedes 4	Contratista	Consorcio AW
Nit:	901.884.356-8	Nit:	901.883.213-9
Contrato N.	155-00-A-COFAC-DIFRA-2024	Contrato N.	153-00-A-COFAC-DIFRA-2024
Valor Inicial:	$ 250,000,000.00	Valor Inicial:	$ 6,112,824,982.80
Fecha Inicial	10/12/2024 - 24/12/2024	Fecha Inicial	10/12/2024 - 24/12/2024
Prórroga N.1	11/12/2025 - 15/5/2025	Prórroga N.1	11/12/2025 - 15/5/2025
Valor Prórroga N.1	$ 249,817,896.59	Valor Prórroga N.1	$ -
Suspension N.1	31/12/2024 - 31/01/2025	Suspension N.1	31/12/2024 - 31/01/2025
Prorroga Suspension N.1	31/01/2025 - 17/03/2025	Prorroga Suspension N.1	31/01/2025 - 17/03/2025
Reinicio Contrato	8/04/2025 - 11/08/2025	Reinicio Contrato	8/04/2025 - 11/08/2025
Valor Total Contrato	$ 499,817,896.59	Valor Total Contrato	$ 6,112,824,982.80

2. SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO

Semana	Fecha de Corte
10	15/6/2024

AVANCE EN EJECUCIÓN DE OBRA

	% Prog. Acumulado	% Prog. Semana	% Ejecutado Acumulado	% Ejecutado Semana	Desviación Acumulado
Semana 1 Obra					0.00%
Semana 2 Obra					0.00%
Semana 3 Obra					0.00%
Semana 4 Obra					0.00%
Semana 5 Obra					0.00%
Semana 6 Obra					0.00%
Semana 7 Obra					0.00%
Semana 8 Obra					0.00%
Semana 9 Obra					0.00%
Semana 10 Obra					0.00%

Observaciones:

1

2

3

4

5

CONSORCIO INTERSEDES 4	**CONSORCIO INTERSEDES 4 NIT 901.884.356-8**			
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - N.1			
Objeto Informe	Seguimiento Semanal al Contrato de Obra N.153-00-A-COFAC-DIFRA-2024			
Semana De:	9/6/2025	Al	15/6/2024	

3. RESUMEN SEMANAL COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Interventoría	Director de Interventoría/Asesor Ambiental	Administrativos	si
		Profesionales	si
Contratista	Residente Ambiental Contratista	Administrativos	si
		Profesionales	si


Disponibilidad de Recursos	SI	Observaciones:	
Aspectos Logisticos	SI		
Herramiento Menor	N/A		
Maquinaria	N/A		

4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1	Se realizò revicion de plan forestal para remision a CORALINA en relacion a las observacion remitidas de manera previa por la Autoridad ambiental
2	Seguimiento a las actividades de recoleccion de residuos de tala de arboles autorizados, no realizada.
3	Verificacion de radicado No. OFICO CAW 100 25 INVENTARIO FORESTAL ARBOLES NO INCLUIDOS EN PERMISO 604 DE 2024
4	Se realizo requermiento de recoleccion de residuos vetegales de tala autorizada Rad C-155-126-2024
5	

5. COMPROMISOS A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1	
2	
3	
4	
5	

Firma:		Firma:	
Nombre	Ing. Carlos Felipe Correa Barreto Director de Interventoría	Nombre	Ing. Estefania Ochoa Manuel Asesor Ambiental

CONSORCIO INTERSEDES 4	**CONSORCIO INTERSEDES 4** **NIT 901.884.356-8**		
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - N.1 - REGISTRO FOTOGRAFICO		
Objeto Informe	Seguimiento Semanal al Contrato de Obra N.153-00-A-COFAC-DIFRA-2024		
Semana De:	9/6/2025	AL	15/6/2024

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PUBLICA PARA LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA Y TRAMITES DEL PROYECTO DE TRALADO DE GACAR (CERRAMIENTO Y GUARDIA) EN SAN ANDRES ISLA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS







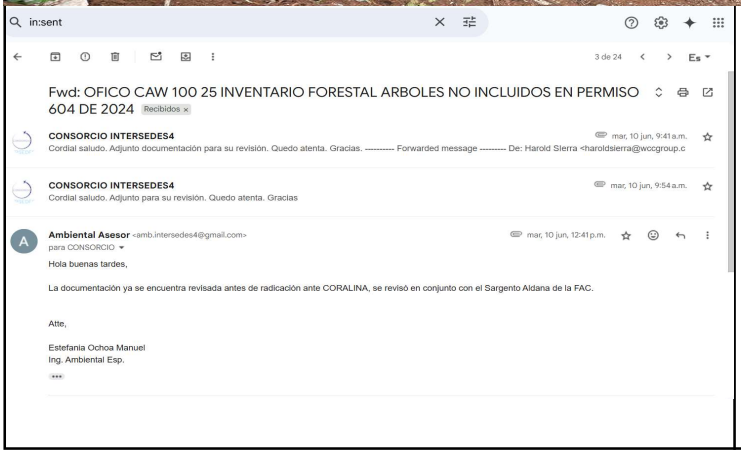


in:sent

Fwd: OFICO CAW 100 25 INVENTARIO FORESTAL ARBOLES NO INCLUIDOS EN PERMISO 604 DE 2024 Recibidos

CONSORCIO INTERSEDES4 mar, 10 jun, 9:41 a.m.
Cordial saludo. Adjunto documentación para su revisión. Quedo atenta. Gracias. ---------- Forwarded message --------- De: Harold Sierra <haroldsierra@wccgroup.c

CONSORCIO INTERSEDES4 mar, 10 jun, 9:54 a.m.
Cordial saludo. Adjunto para su revisión. Quedo atenta. Gracias

Ambiental Asesor <amb.intersedes4@gmail.com> mar, 10 jun, 12:41 p.m.
para CONSORCIO

Hola buenas tardes,

La documentación ya se encuentra revisada antes de radicación ante CORALINA, se revisó en conjunto con el Sargento Aldana de la FAC.

Atte,

Estefania Ochoa Manuel
Ing. Ambiental Esp.

CONSORCIO INTERSEDES 4	**CONSORCIO INTERSEDES 4 NIT 901.884.356-8**		
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - N.1		
Objeto Informe	Seguimiento Semanal al Contrato de Obra N.153-00-A-COFAC-DIFRA-2024		
Semana De:	16/6/2025	Al	22/6/2024

1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRACTUAL

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PUBLICA PARA LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA Y TRAMITES DEL PROYECTO DE TRALADO DE GACAR (CERRAMIENTO Y GUARDIA) EN SAN ANDRES ISLA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
Interventor:	Consorcio Intersedes 4	Contratista	Consorcio AW
Nit:	901.884.356-8	Nit:	901.883.213-9
Contrato N.	155-00-A-COFAC-DIFRA-2024	Contrato N.	153-00-A-COFAC-DIFRA-2024
Valor Inicial:	$ 250,000,000.00	Valor Inicial:	$ 6,112,824,982.80
Fecha Inicial	10/12/2024 - 24/12/2024	Fecha Inicial	10/12/2024 - 24/12/2024
Prórroga N.1	11/12/2025 - 15/5/2025	Prórroga N.1	11/12/2025 - 15/5/2025
Valor Prórroga N.1	$ 249,817,896.59	Valor Prórroga N.1	$ -
Suspension N.1	31/12/2024 - 31/01/2025	Suspension N.1	31/12/2024 - 31/01/2025
Prorroga Suspension N.1	31/01/2025 - 17/03/2025	Prorroga Suspension N.1	31/01/2025 - 17/03/2025
Reinicio Contrato	8/04/2025 - 11/08/2025	Reinicio Contrato	8/04/2025 - 11/08/2025
Valor Total Contrato	$ 499,817,896.59	Valor Total Contrato	$ 6,112,824,982.80

2. SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO

Semana	Fecha de Corte
11	22/6/2024

AVANCE EN EJECUCIÓN DE OBRA

	% Prog. Acumulado	% Prog. Semana	% Ejecutado Acumulado	% Ejecutado Semana	Desviación Acumulado
Semana 1 Obra					0.00%
Semana 2 Obra					0.00%
Semana 3 Obra					0.00%
Semana 4 Obra					0.00%
Semana 5 Obra					0.00%
Semana 6 Obra					0.00%
Semana 7 Obra					0.00%
Semana 8 Obra					0.00%
Semana 9 Obra					0.00%
Semana 10 Obra					0.00%

Observaciones:

1

2

3

4

5

	CONSORCIO INTERSEDES 4 **NIT 901.884.356-8**			
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - N.1			
Objeto Informe	Seguimiento Semanal al Contrato de Obra N.153-00-A-COFAC-DIFRA-2024			
Semana De:	16/6/2025	Al	22/6/2024	

3. RESUMEN SEMANAL COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Interventoría	Director de Interventoría/Asesor Ambiental	Administrativos	si
		Profesionales	si
Contratista	Residente Ambiental Contratista	Administrativos	si
		Profesionales	si


Disponibilidad de Recursos	SI	Observaciones:	
Aspectos Logisticos	SI		
Herramiento Menor	N/A		
Maquinaria	N/A		

4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1	Visita a CORALINA para seguimiento de radicacion de plan forestal
2	Seguimiento a las actividades de recoleccion de residuos de tala de arboles autorizados, no realizada.
3	Reunion con equipo ambiental de seguimiento: Sargento Aldana e Ing. Ana Maria del contratista y supervisor del contrato por parte de la FAC el TN Ortega.
4	Se realizo requermiento de recoleccion de residuos vetegales de tala autorizada Rad C-155-126-2024
5	

5. COMPROMISOS A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


1	
2	
3	
4	
5	

Firma:		Firma:	
Nombre	Ing. Carlos Felipe Correa Barreto Director de Interventoría	Nombre	Ing. Estefania Ochoa Manuel Asesor Ambiental

CONSORCIO INTERSEDES 4	**CONSORCIO INTERSEDES 4** **NIT 901.884.356-8**		
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - N.1 - REGISTRO FOTOGRAFICO		
Objeto Informe	Seguimiento Semanal al Contrato de Obra N.153-00-A-COFAC-DIFRA-2024		
Semana De:	16/6/2025	AL	22/6/2024

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PUBLICA PARA LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA Y TRAMITES DEL PROYECTO DE TRALADO DE GACAR (CERRAMIENTO Y GUARDIA) EN SAN ANDRES ISLA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

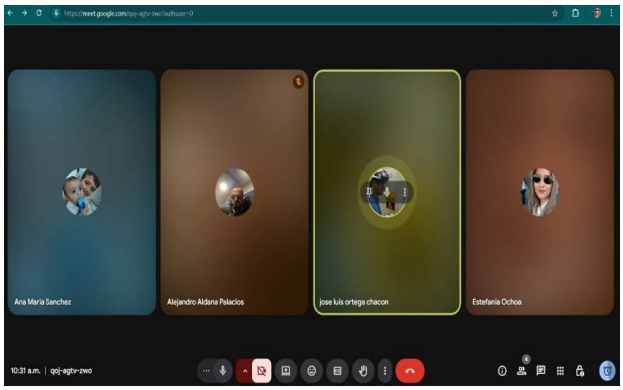



Bogotá D.C., 9 de junio de 2025

C-155-126-2024

SEÑORES:
CONSORCIO AW
Atn. Harold Sierra Arismendy
Representante Legal.
Ciudad

REFERENCIA: Contrato No. 155-00-A-COFAC-DIFRA-2024 cuyo objeto es: "**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA Y TRÁMITES DEL PROYECTO DE TRASLADO DE GACAR (CERRAMIENTO Y GUARDIA) EN SAN ANDRÉS ISLA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**".

Asunto: REQUERIMIENTO AMBIENTAL

Respetado Arquitecto

En estricto cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de **INTERVENTORÍA**, de la referencia, nos permitimos solicitar lo siguiente:

1. En el marco del proyecto de muro de cerramiento perimetral de la **Fuerza Aérea Colombia** y en relación con las actividades de tala realizada con fecha de inicio 26 de mayo de 2025, se solicita que los residuos generados, sean evacuados de manera rápida, por motivo de ejecución de obra civil, la cual se puede ver afectada en cuanto a la ejecución o rendimiento de obra, por los mismos, de igual manera para dar cumplimiento de la **Resolución 608 de 2024 de CORALINA.**

Ilustración 1 fotografías 1 y 2: Residuos de Tala permitida





CONSORCIO INTERSEDES 4	**CONSORCIO INTERSEDES 4 NIT 901.884.356-8**			
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - N.1			
Objeto Informe	Seguimiento Semanal al Contrato de Obra N.153-00-A-COFAC-DIFRA-2024			
Semana De:	23/6/2025	Al	29/6/2024	

1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRACTUAL

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PUBLICA PARA LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA Y TRAMITES DEL PROYECTO DE TRALADO DE GACAR (CERRAMIENTO Y GUARDIA) EN SAN ANDRES ISLA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
Interventor:	Consorcio Intersedes 4	Contratista	Consorcio AW
Nit:	901.884.356-8	Nit:	901.883.213-9
Contrato N.	155-00-A-COFAC-DIFRA-2024	Contrato N.	153-00-A-COFAC-DIFRA-2024
Valor Inicial:	$ 250,000,000.00	Valor Inicial:	$ 6,112,824,982.80
Fecha Inicial	10/12/2024 - 24/12/2024	Fecha Inicial	10/12/2024 - 24/12/2024
Prórroga N.1	11/12/2025 - 15/5/2025	Prórroga N.1	11/12/2025 - 15/5/2025
Valor Prórroga N.1	$ 249,817,896.59	Valor Prórroga N.1	$ -
Suspension N.1	31/12/2024 - 31/01/2025	Suspension N.1	31/12/2024 - 31/01/2025
Prorroga Suspension N.1	31/01/2025 - 17/03/2025	Prorroga Suspension N.1	31/01/2025 - 17/03/2025
Reinicio Contrato	8/04/2025 - 11/08/2025	Reinicio Contrato	8/04/2025 - 11/08/2025
Valor Total Contrato	$ 499,817,896.59	Valor Total Contrato	$ 6,112,824,982.80

2. SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO

Semana	Fecha de Corte
12	29/6/2024

AVANCE EN EJECUCIÓN DE OBRA

	% Prog. Acumulado	% Prog. Semana	% Ejecutado Acumulado	% Ejecutado Semana	Desviación Acumulado
Semana 1 Obra					0.00%
Semana 2 Obra					0.00%
Semana 3 Obra					0.00%
Semana 4 Obra					0.00%
Semana 5 Obra					0.00%
Semana 6 Obra					0.00%
Semana 7 Obra					0.00%
Semana 8 Obra					0.00%
Semana 9 Obra					0.00%
Semana 10 Obra					0.00%

Observaciones:

1

2

3

4

5

	CONSORCIO INTERSEDES 4 **NIT 901.884.356-8**			
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - N.1			
Objeto Informe	Seguimiento Semanal al Contrato de Obra N.153-00-A-COFAC-DIFRA-2024			
Semana De:	23/6/2025	Al	29/6/2024	

3. RESUMEN SEMANAL COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Interventoría	Director de Interventoría/Asesor Ambiental	Administrativos	si
		Profesionales	si
Contratista	Residente Ambiental Contratista	Administrativos	si
		Profesionales	si


Disponibilidad de Recursos	SI	Observaciones:	
Aspectos Logisticos	SI		
Herramiento Menor	N/A		
Maquinaria	N/A		

4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1. Seguimiento a la aprobacion del plan de Forestal por parte de la FAC
2. Seguimiento a las actividades de recoleccion de residuos de tala de arboles autorizados, no realizada a la fecha
3. Seguimiento a los residuos de demolicion de vivienda autorizando punto de acopio temporanl.
4.
5.

5. COMPROMISOS A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1.
2.
3.
4.
5.

Firma:		Firma:	
Nombre	Ing. Carlos Felipe Correa Barreto Director de Interventoría	Nombre	Ing. Estefania Ochoa Manuel Asesor Ambiental

CONSORCIO INTERSEDES 4	**CONSORCIO INTERSEDES 4** **NIT 901.884.356-8**		
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - N.1 - REGISTRO FOTOGRAFICO		
Objeto Informe	Seguimiento Semanal al Contrato de Obra N.153-00-A-COFAC-DIFRA-2024		
Semana De:	23/6/2025	AL	29/6/2024

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PUBLICA PARA LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA Y TRAMITES DEL PROYECTO DE TRALADO DE GACAR (CERRAMIENTO Y GUARDIA) EN SAN ANDRES ISLA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

