ALCALDÍA DE BARRANQUILLA — urba caribe 24

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 08

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	01/05/2025 AL 31/05/2025		
CAPITULO:	OBRAS PRELIMINARES - MOVIMIENTOS DE TIERRA	CÓDIGO DEL ITEM: 1499	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



REGISTRO FOTOGRAFICO



LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 1								
ZONA DE BIOSALUDABLES	AREA IRREGULAR			M2			62,50	
COSTADO IZQUIERDO								
VIG101-V113	57	1,1		M2			62,70	
CANTIDAD CONTRACTUAL			1250,00					
ACUMULADO ANTERIOR			1111,97					
ACUMULADO PRESENTE ACTA			1237,17					
TOTAL PRESENTE ACTA:								125,20

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	


Powered by CamScanner

Powered by CamScanner


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA urba caribe 24	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 08				
CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1			OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	01/05/2025 AL 31/05/2025				
CAPITULO:	OBRAS PRELIMINARES - MOVIMIENTOS DE TIERRA	CÓDIGO DEL ITEM:	557	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

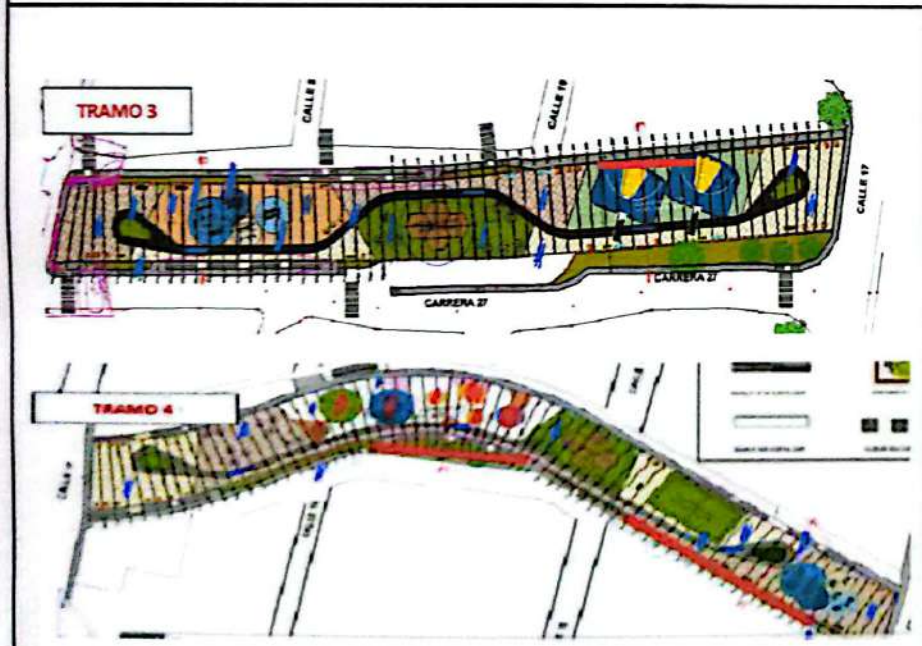

LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
TRAMO 4								
COSTADO DERECHO								
V325-V343	54			ML		54		
V300-V305 INTERIOR	11			ML		11		
TRAMO 5								
COSTADO DERECHO								
V361-V397	103.50			ML		103.50		
VIG 397 - VIG 469	216			ML		216.00		
COSTADO IZQUIERDO								
V358-V463	328.00			ML		328.00		

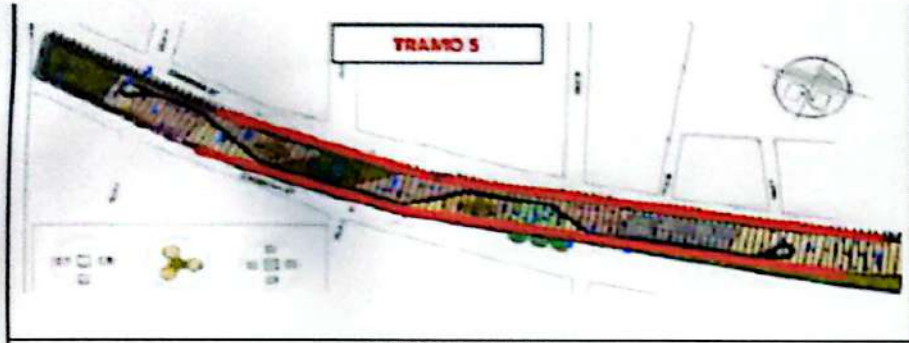

REGISTRO FOTOGRAFICO








MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 8

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	01/05/2025 AL 31/05/2025		
CAPITULO: OBRAS PRELIMINARES - MOVIMIENTOS DE TIERRA	CÓDIGO DEL ITEM: 5724	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	EDU. RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO, COMPACTADO

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

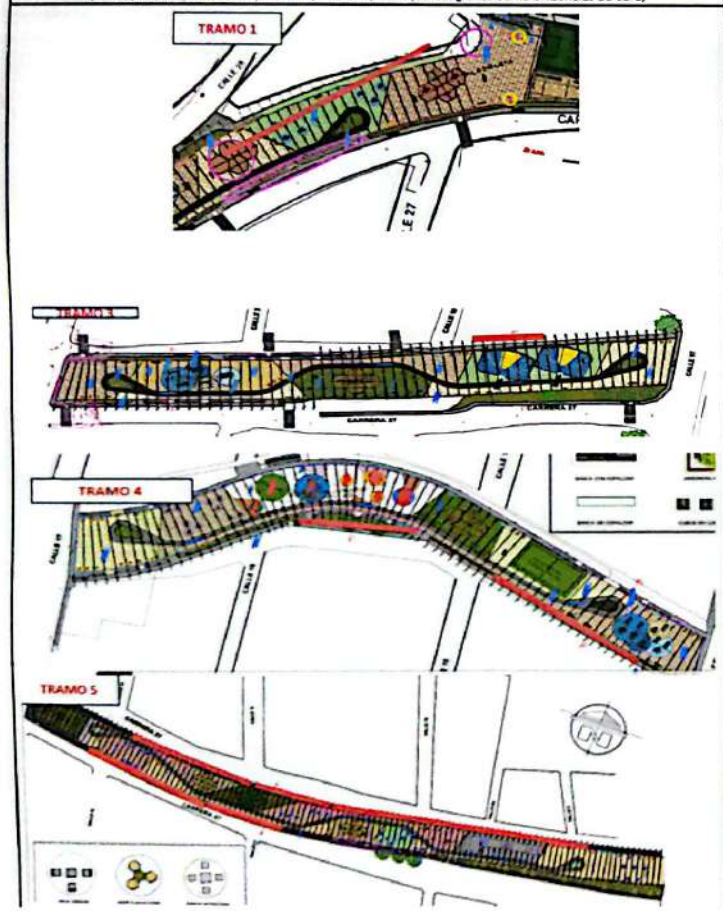

LOCALIZACION		DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 1									
COSTADO IZQUIERDO	V101-V122	57	1,10	0,10	M3				6,27
	V112 INGRESO	3	2,00	1,00	M3				6,00
TRAMO 2									
COSTADO IZQUIERDO	RAMPA V208-V213	13,53	1,45	0,72	M3				14,03
COSTADO DERECHO	RAMPA V208-V213	9,05	1,52	0,51	M3				7,02
TRAMO 3									
COSTADO IZQUIERDO	V270-V275 INTERNO	15,4	0,73	0,15	M3				1,69
TRAMO 4									
COSTADO DERECHO	V280-V285	18,00	1,35	0,10	M3				2,43
	V324-V327	9,00	1,35	0,25	M3				3,04
	V329-V330	15,67	1,30	0,35	M3				7,13
	V331-V346	21,1	3,00	0,35	M3				22,16
COSTADO IZQUIERDO	V329- V339	30	1,30	0,10	M3				3,90
TRAMO 5									
COSTADO IZQUIERDO	VIG 368- VIG 395 INTERNO	65,6	1,00	0,10	M3				6,56
	VIG 386- VIG 395 INTERNO	19	1,15	0,10	M3				2,19
	VIG 397- VIG 425 INTERNO	51	1,00	0,10	M3				5,10
	V429-V439 INTERNO	30	1,30	0,10	M3				3,90
	V439-VV442 INTERNO	30	1,30	0,10	M3				3,90
	V444-V453 INTERNO	30	1,30	0,10	M3				3,90
COSTADO DERECHO	V360-V370 INTERNO	36,6	1,35	0,1	M3				4,94
	V372-V403 INTERNO	8,35	1,35	0,1	M3				1,13
		22,7	1,30	0,10	M3				2,95
		9,8	0,70	0,10	M3				0,69
		8,35	0,89	0,10	M3				0,74
		25,2	1,60	0,10	M3				4,03
		15,17	1,90	0,10	M3				2,88

Powered by CamScanner

REGISTRO FOTOGRAFICO







CANTIDAD CONTRACTUAL	376,23
ACUMULADO ANTERIOR	241,14
ACUMULADO PRESENTE ACTA	357,70
TOTAL PRESENTE ACTA:	116,56

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

OBSERVACIONES:


Powered by CamScanner

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 08

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1		OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"	
PERIODO:	01/05/2025 AL 31/05/2025				
CAPITULO:	Capítulo - ESTRUCTURA	CÓDIGO DEL ITEM: 2142	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.15 X 0.20 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 VARILLAS D = 3/8", ESTRIBOS D = 1/4" A CADA 0.20 METROS	

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

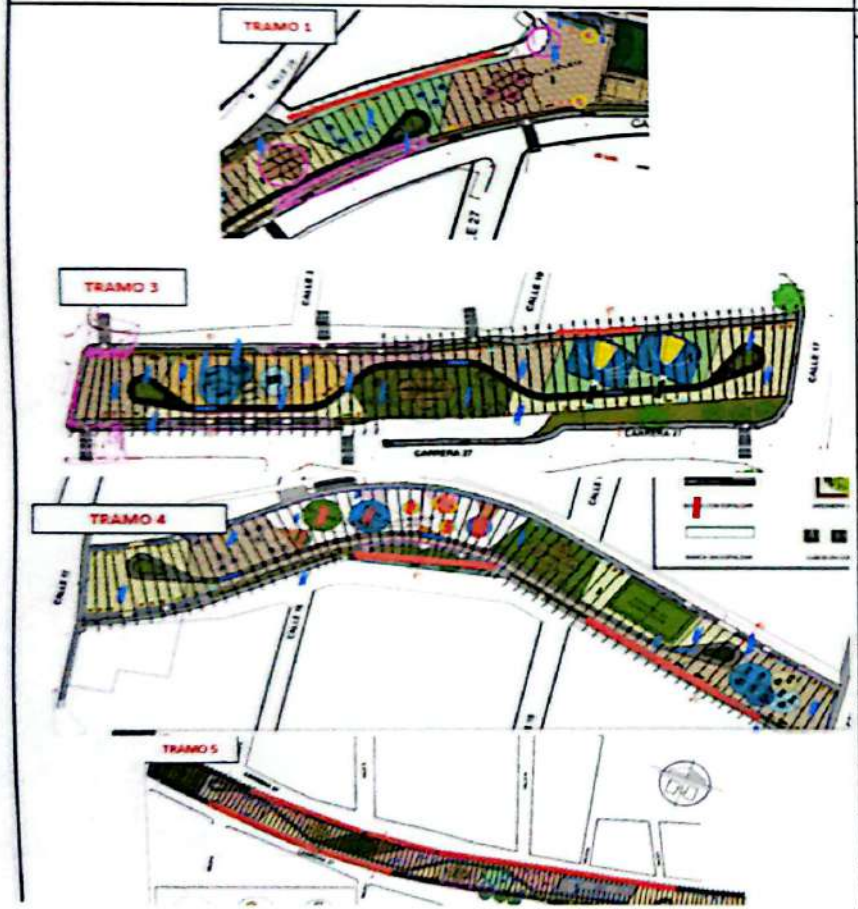

LOCALIZACION		DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 1									
COSTADO IZQUIERDO	V112-V122 INTERNO	57			ML	1,00	57,00		
	V112-V122 EXTERNO	57			ML	1,00	57,00		
	V102	3			ML	1,00	3,00		
	V103	3			ML	1,00	3,00		
TRAMO 2									
COSTADO DERECHO	RAMPAV207- V213	11							
COSTADO IZQUIERDO	RAMPA V207- V213	14,42							
TRAMO 3									
COSTADO IZQUIERDO	VIG 253 - VIG 261	24			ML	1,00	24,00		
	V270-V275 INTERNO	15,4			ML	1,00	15,40		
COSTADO DERECHO	V260 (ENTRADA DE AGUA)	4			ML	2,00	8,00		
TRAMO 4									
COSTADO DERECHO	V276-V285 EXTERNO	28,00			ML		28,00		
	V276-V285 INTERNO	28,00			ML		28,00		
	V321-V345 EXTERNO	49,10			ML		49,10		
	V321-V345 INTERNO	49,10			ML		49,10		
	V314-V317 BORDILLO EXTERIOR	8,5			ML		8,50		
LADO IZQUIERDO	V275-V293 EXTERNO	66,02			ML		66,02		
	V328-V343 EXTERNO	37,5			ML		37,50		
TRAMO 5									
	V350-V351 EXTERNO	2,9			ML		2,90		


Powered by CamScanner

REGISTRO FOTOGRAFICO







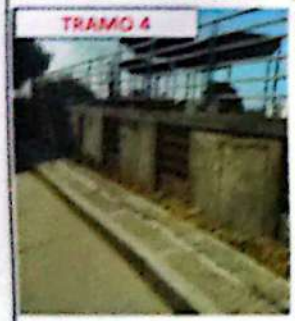





	V355-V351 INTERNO	2.9			ML		2.99		
	V365 INTERNO	2.7			ML		2.79		
	V367/V368-V398 EXTERNO	85.9			ML		85.99		
LADO IZQUIERDO	V367/V368-V398 INTERNO	85.9			ML		85.99		
	V389-V398 INTERNO	24.8			ML		24.80		
	V399/V400-V429 EXTERNO	87.9			ML		87.99		
	V399/V400-V429 INTERNO	87.9			ML		87.99		
	V431-V442 EXTERNO	34.2			ML		34.20		
	V431-V442 INTERNO	34.2			ML		34.20		
	V454-V444 EXTERNO	30.15			ML		30.15		
	V454-V444 INTERNO	30.15			ML		30.15		
LADO DERECHO	V358-V385 EXTERNO	80			ML		80.00		
	V358-V385 INTERNO	80			ML		80.00		
	V385-V406 EXTERNO	65			ML		65.00		
	V385-V406 INTERNO	65			ML		65.00		

CANTIDAD CONTRACTUAL	4445.37
ACUMULADO ANTERIOR	2575.37
ACUMULADO PRESENTE ACTA	3808.39
TOTAL PRESENTE ACTA	1.233.02

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA


Powered by CamScanner

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 08

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"		
PERIODO:	01/05/2025 AL 31/05/2025				
CAPITULO:	Capítulo - ESTRUCTURA	CÓDIGO DEL ITEM: 6742	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI	

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

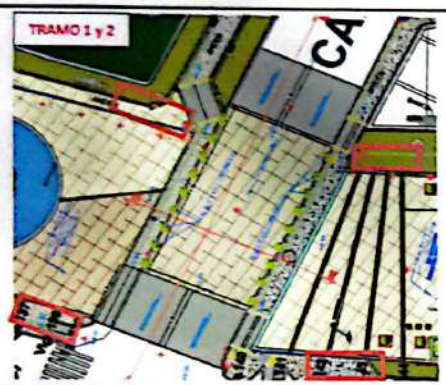

REGISTRO FOTOGRAFICO





LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 1								
ZAPATAS PORTICO	3	1.2	0.1	M3	2			0.72
TRAMO 2								
ZAPATAS PORTICO	3	1.2	0.1	M3	2			0.72
CANTIDAD CONTRACTUAL			192.00					
ACUMULADO ANTERIOR			0.00					
ACUMULADO PRESENTE ACTA			1.44					

TOTAL PRESENTE ACTA: 1.44

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 08

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1		OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"	
PERIODO:	01/05/2025 AL 31/05/2025				
CAPITULO:	Capitulo - ESTRUCTURA	CÓDIGO DEL ITEM: 214	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE O,30 X O,30 MTS, INCLUYE 4 VARILLAS DE D= 1/2" , ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.20 MTS	


REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

TRAMO 1

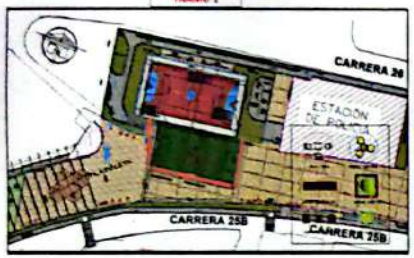

TRAMO 5



REGISTRO FOTOGRAFICO

TRAMO 1



TRAMO 1



LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
TRAMO 1								
CANCHA SINTETICA	42.20			ML		42.20		
TRAMO 2								
RAMPA COSTADO IZQUIERDO V209-V213	17.98			ML		15.01		
RAMPA COSTADO DERECHO	10.60			ML		10.60		
TRAMO 3								
CANCHA SINTETICA	96.00			ML		96.00		

Powered by CamScanner

TRAMO 5



CANTIDAD CONTRACTUAL	289.99
ACUMULADO ANTERIOR	123.20
ACUMULADO PRESENTE ACTA	287.01
TOTAL PRESENTE ACTA:	163.81

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA — urba caribe 24


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 08


CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	01/05/2025 AL 31/05/2025		
Capitulo - ESTRUCTURA	CÓDIGO DEL ITEM: 1141	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.10 METROS, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

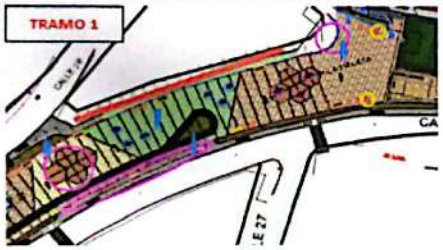




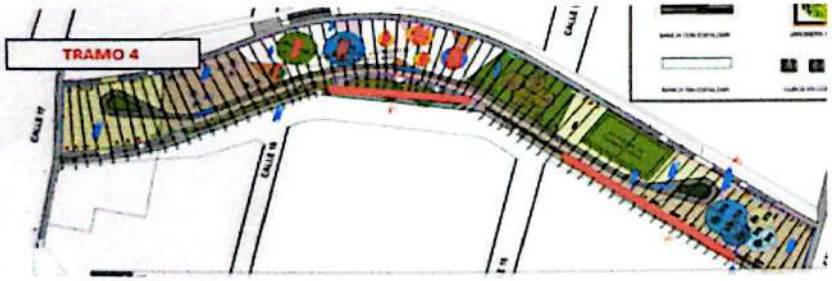

LOCALIZACION		DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 1									
COSTADO IZQUIERDO	V112-V122	56	1,10		M2			61,60	
	V112 INGRESO	3	2,00		M2			6,00	
MODULO DE SERVICIO		AREA IRREGULAR			M2			55,00	
TRAMO 2									
CONCHA ACUSTICA		AREA IRREGULAR			M2			40,00	
COSTADO DERECHO	RAMPAV207- V213	11	1,5		M2			16,50	
COSTADO IZQUIERDO	RAMPA V207- V213	14,42	1,5		M2			21,63	
TRAMO 3									
COSTADO IZQUIERDO	VIG 253 - VIG 261	24	1,10		M2			26,40	
	V270-V275	15,4	0,73		M2			11,24	
MODULO DE SERVICIO		AREA IRREGULAR			M2			55,00	
TRAMO 4									
COSTADO DERECHO	V276-V285	28,00	1,00		M2			28,00	
	V321-V345	49,10	1,00		M2			49,10	
LADO IZQUIERDO	V275-V293	66,02	1,30		M2			85,83	
	V328-V343	37,5	1,10		M2			41,25	

Powered by CamScanner

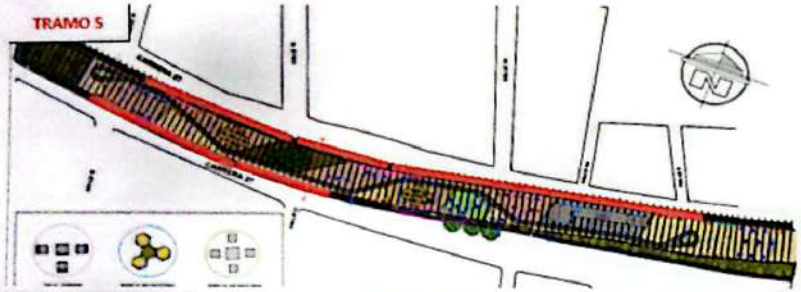

REGISTRO FOTOGRAFICO














TRAMO 5									
LADO IZQUIERDO	V350-V351	2,9	1,00		M2			2,90	
	V365 INTERNO	2,7	1,00		M2			2,70	
	V367/V368-V398	85,9	1,00		M2			85,90	
	V389-V398 INTERNO	24,6	1,00		M2			24,60	
	V399/V400-V429	87,9	1,00		M2			87,90	
	V431-V442	34,2	1,00		M2			34,20	
	V454-V444	30,15	1		M2			30,15	
LADO DERECHO	V358-V385	80	1,00		M2			80,00	
	V385-V406	65	1,00		M2			65,00	

Powered by CamScanner





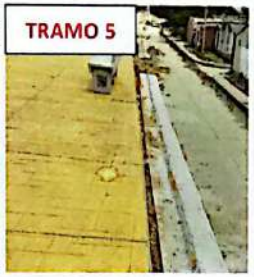

CANTIDAD CONTRACTUAL	3037,30	
ACUMULADO ANTERIOR	1948,30	
ACUMULADO PRESENTE ACTA	2859,20	
TOTAL PRESENTE ACTA:		910,90

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

OBSERVACIONES:


Powered by CamScanner

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 08

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1		OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"	
PERIODO:	01/05/2025 AL 31/05/2025				
CAPITULO:	Capítulo - ESTRUCTURA	CÓDIGO DEL ITEM: 7038	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA	

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

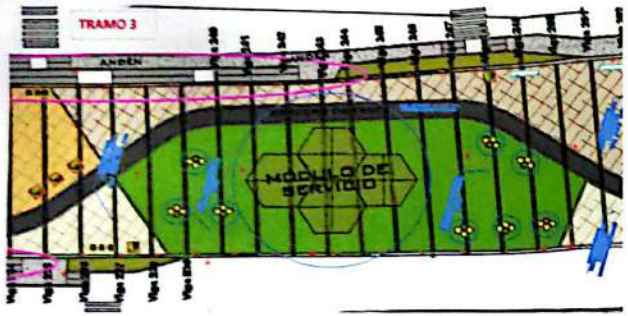

REGISTRO FOTOGRAFICO







LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	KG
TRAMO 3								
ESTRUCTURA DE CUBIERTA Y PUNTOS DE VENTAS				KG	387.87			387.87
MODULO DE SERVICIO V241-V245								

CANTIDAD CONTRACTUAL	50616.34
ACUMULADO ANTERIOR	39016.34
ACUMULADO PRESENTE ACTA	39404.21

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TOTAL PRESENTE ACTA: 387.87

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner


ESTRUCTURA DE CUBIERTA Y PUNTOS DE VENTAS											
ESTRUCTURA CUBIERTA	TUBO RECTANGULAR		3,4	76	38	0,0015	KG	3	1	2,67	27,23
	TUBO RECTANGULAR		3,2	76	38	0,0015	KG	3	1	2,67	25,63
	TUBO CUADRADO		2,93	38	38	0,0015	KG	1	1	1,74	5,1
	TUBO CUADRADO		1,15	38	38	0,0015	KG	1	1	1,74	2
	TUBO CUADRADO		4,61	38	38	0,0015	KG	1	1	1,74	8,02
	TUBO CUADRADO		1,24	38	38	0,0015	KG	1	1	1,74	2,16
	TUBO CUADRADO		2,86	38	38	0,0015	KG	1	1	1,74	4,98
	TUBO CUADRADO		2,96	38	38	0,0015	KG	1	1	1,74	5,15
	TUBO CUADRADO		0,83	38	38	0,0015	KG	1	1	1,74	1,44
	TUBO CUADRADO		5,13	38	38	0,0015	KG	1	1	1,74	8,93
	TUBO CUADRADO		0,76	38	38	0,0015	KG	1	1	1,74	1,32
	TUBO CUADRADO		2,91	38	38	0,0015	KG	1	1	1,74	5,06
	TUBO CUADRADO		3	38	38	0,0015	KG	1	1	1,74	5,22
	TUBO CUADRADO		3,2	38	38	0,0015	KG	2	1	1,74	11,14
ESTRUCTURA CUBIERTA NEGRA	TUBO CUADRADO	A36	5,1	100	100	0,002	KG	1	1	6,22	31,722
	TUBO CUADRADO	A36	2,17	100	100	0,002	KG	1	1	6,22	13,4974
	TUBO CUADRADO	A36	2,19	100	100	0,002	KG	1	1	6,22	13,6218
	TUBO CUADRADO	A36	3,09	100	100	0,002	KG	1	1	6,22	19,2198
	TUBO CUADRADO	A36	2,91	100	100	0,002	KG	1	1	6,22	18,1002
	TUBO CUADRADO	A36	1,45	100	100	0,002	KG	1	1	6,22	9,019
	TUBO CUADRADO	A36	1,5	100	100	0,002	KG	1	1	6,22	9,33
	TUBO CUADRADO	A36	5,12	100	100	0,002	KG	1	1	6,22	31,8464
	TUBO CUADRADO	A36	2,15	100	100	0,002	KG	1	1	6,22	13,373
	TUBO CUADRADO	A36	2,13	100	100	0,002	KG	1	1	6,22	13,2486
	TUBO CUADRADO	A36	1,53	100	100	0,002	KG	1	1	6,22	9,5166
	TUBO CUADRADO	A36	1,55	100	100	0,002	KG	1	1	6,22	9,641
	TUBO CUADRADO	A36	3,1	100	100	0,002	KG	1	1	6,22	19,282
	TUBO CUADRADO	A36	2,84	100	100	0,002	KG	1	1	6,22	17,6648
	TUBO CUADRADO	A36	2,55	38	38	0,00152	KG	2	1	2,67	13,617
	TUBO CUADRADO	A36	1,55	38	38	0,00152	KG	4	1	2,67	16,5408
	TUBO CUADRADO	A36	2,56	38	38	0,00152	KG	2	1	2,67	13,6704
	TUBO CUADRADO	A36	2,59	38	38	0,00152	KG	2	1	2,67	0,798855
	TUBO CUADRADO	A36	2,53	38	38	0,00152	KG	2	1	2,67	0,780349
										TOTAL	387,87

Powered by CamScanner

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 08

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1		OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"	
PERIODO:	01/05/2025 AL 31/05/2025				
CAPITULO:	Capítulo - ESTRUCTURA	CÓDIGO DEL ITEM: AD-11	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TEJA COLOR AZUL-BLANCO 11.8X0.95 MT 2M UPVC, INCLUYE TOS LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN	

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

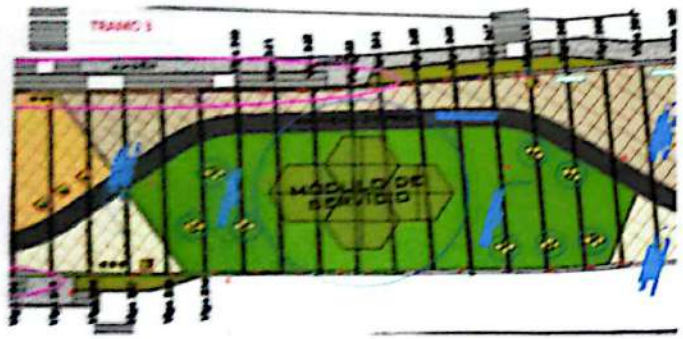

REGISTRO FOTOGRAFICO







LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 3								
MODULO DE SERVICIO V2A1 - V1Q 2A5	2.61	1.05		M2	2		5.48	
	3.18	1.05		M2	2		6.68	
	3.63	1.05		M2	2		7.62	
	3.16	1.05		M2	2		6.64	
	2.56	1.05		M2	2		5.38	
	3.72	1.05		M2	3		11.72	
	3.42	1.05		M2	3		10.77	
	2.8	1.05		M2	4		11.76	
CANTIDAD CONTRACTUAL			132.10					
ACUMULADO ANTERIOR			66.05					
ACUMULADO PRESENTE ACTA			132.10					
TOTAL PRESENTE ACTA:							66.05	

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

OBSERVACIONES:


Powered by CamScanner

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 08

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SUROPIENTE"
PERIODO:	01/05/2025 AL 31/05/2025		
CAPITULO:	Capitulo - ESTRUCTURA	CÓDIGO DEL ITEM: 3432	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: REGISTRO EN CONCRETO DE 0.60 x 0.60 MTS.

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografias como evidencias de obra)

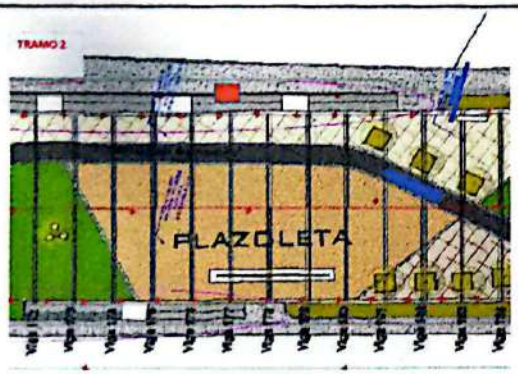

REGISTRO FOTOGRAFICO



LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 1								
COSTADO IZQUIERDO V176 V178				UND	1			
CANTIDAD CONTRACTUAL			3.00					
ACUMULADO ANTERIOR			0.00					
ACUMULADO PRESENTE ACTA			1.00					
TOTAL PRESENTE ACTA:								1.00

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA — urbanizamos

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 08

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	01/05/2025 AL 31/05/2025		
CAPITULO:	Capítulo - ESTRUCTURA	CÓDIGO DEL ITEM: 78	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: ACERO DE REFUERZO FIGURADO

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



REGISTRO FOTOGRAFICO











LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	KG
TRAMO 1								
BASE PORTICO 1				KG	163.20			163.20
BASE PORTICO 1				KG	163.20			163.20
TRAMO 2								
BASE PORTICO 2				KG	163.20			163.20
BASE PORTICO 2				KG	163.20			163.20
TRAMO 4								
COSTADO DERECHO								
SOPORTES DE BARANDAS - V143-210				KG	45.00			45.00
COSTADO IZQUIERDO								
SOPORTES DE BARANDAS V169-210				KG	44.10			44.10
SOPORTES DE BARANDAS CALLE 17				KG	4.05			4.05
SOPORTES DE BARANDAS CALLE 17				KG	3.60			3.60

Soporte

Powered by CamScanner

Lista de barras 5/8

DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAM	LONG	PESO	UBICACION
0.30 / 2.83 / 0.30	14	5/8	3.43	75	(M En ZAPATA CORTE 3.43)
0.30 / 1.08 / 0.30	34	5/8	1.68	89	(M En ZAPATA CORTE 1.68)

CANTIDAD CONTRACTUAL			10799,00					
ACUMULADO ANTERIOR			691,74					
ACUMULADO PRESENTE ACTA			1441,29					

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TOTAL PRESENTE ACTA: 749,55

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

PEDESTALES BARANDAS

Peso total barras
1/4" =0,45 kg

Lista de barras 1/4"

0.25	4	1/4	0.25	0.25	(1 Ø PEDESTALES BARANDAS)
h b=0.10 h=0.22 g=0.08 b	1	1/4	0.8	0.20	(1 Ø PEDESTALES BARANDAS)

TRAMO 4								
COSTADO DERECHO								
SOPORTES DE BARANDAS - V143-210				KG	45,00			45,00
COSTADO IZQUIERDO								
SOPORTES DE BARANDAS V169-210				KG	44,10			44,10
SOPORTES DE BARANDAS CALLE 17				KG	4,05			4,05
SOPORTES DE BARANDAS CALLE 17				KG	3.60			3,60

ACERO PORTICOS

Lista de barras 5/8

DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAM	LONG	PESO	UBICACION
0.30 2.83 0.30	14	5/8	3.43	75	(14 Ø ZAPATA CORTE 3.43)
0.30 1.08 0.30	34	5/8	1.68	89	(34 Ø ZAPATA CORTE 1.68)

TRAMO 1								
BASE PORTICO 1				KG	163,20			163,20
BASE PORTICO 1				KG	163,20			163,20
TRAMO 2								
BASE PORTICO 2				KG	163,20			163,20
BASE PORTICO 2				KG	163,20			163,20

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

urba caribe 24


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 08

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	01/05/2025 AL 31/05/2025		

CAPITULO:	Capitulo - MAMPOSTERIA	CÓDIGO DEL ITEM:	AD-14	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ABUZARDADO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 METROS, CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO DE 2500 PSI, REFUERZO CENTRAL DE D= 1/2" A CADA 2.00 METROS, MORTERO DE PEGA 1:4 CON ANCLAJE A CONCRETO EXISTENTE CON SIKADUR ANCHOR FIX - 4 PARA FIJAR VARILLAS CON ACABADO EN PINTURA VINILTEX TIPO I (VER DISEÑO).

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

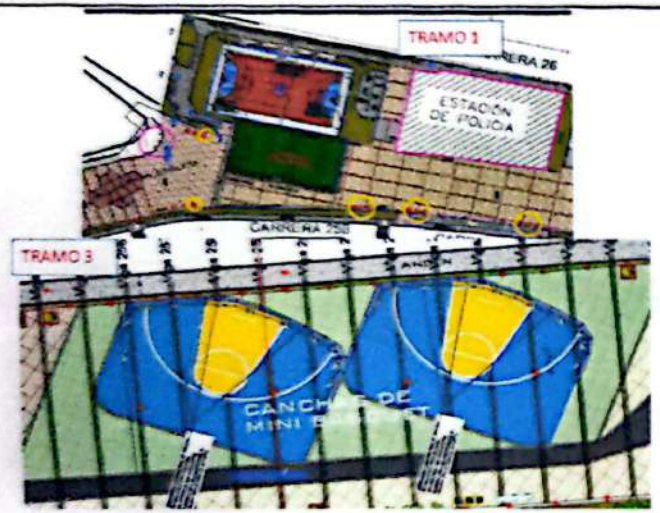

REGISTRO FOTOGRAFICO





LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	AREA M2			ML	M2	M3
TRAMO 1								
CANCHA EXISTENTE VIGAS ESPECIALES				M2			44.2	
TRAMO 3								
CANCHA DE LANZAMIENRTO V255-V261				M2			13.2	
CANCHA DE LANZAMIENTO V262-V266				M2			12.13	

Powered by CamScanner





CANTIDAD CONTRACTUAL	194,60
ACUMULADO ANTERIOR	13,78
ACUMULADO PRESENTE ACTA	83,31
TOTAL PRESENTE ACTA:	69,53

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA — urba caribe 24

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 08

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	01/05/2025 AL 31/05/2025		
CAPITULO:	Capitulo - MAMPOSTERIA	CÓDIGO DEL ITEM: 544	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: FILETE O JUNTAS DE MURO CON MORTERO 1:4

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

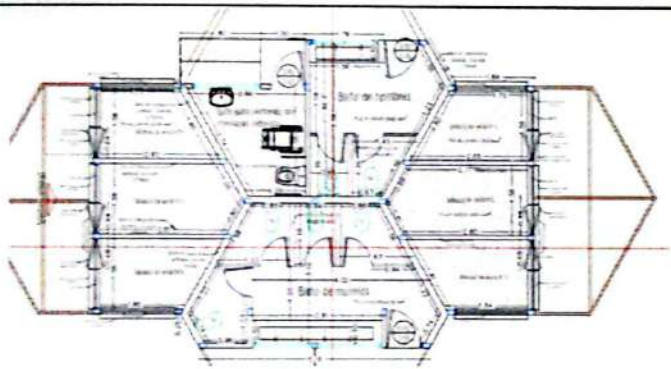

REGISTRO FOTOGRAFICO







LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
MODULO DE SERVICIOS TRAMO 1								
PUNTO DE VENTA 1								
PUNTO DE VENTA 2								
PUNTO DE VENTA 3								
BAÑO DISCAPACITADO			3.11	ML	1.00	3.11		
BAÑO HOMBRES			5.00	ML	1.00	5.00		
PUNTO DE VENTA 4								
PUNTO DE VENTA 5								
PUNTO DE VENTA 6								
BAÑO DE MUJERES			2.67	ML	1.00	2.67		
CUARTO ELECTRICO			4.73	ML	1.00	4.73		
VENTANA DISCAPACITADO			3.60	ML	1.00	3.60		
VENTANA BAÑO HOMBRES			3.60	ML	1.00	3.60		
VENTANA BAÑO MUJERES			4.44	ML	1.00	4.44		
MODULO DE SERVICIOS TRAMO 3								
PUNTO DE VENTA 1			5.31	ML	1.00	5.31		
PUNTO DE VENTA 2			5.60	ML	1.00	5.60		
PUNTO DE VENTA 3			5.18	ML	1.00	5.18		
BAÑO DISCAPACITADO			3.11	ML	1.00	3.11		
BAÑO HOMBRES			5.00	ML	1.00	5.00		
PUNTO DE VENTA 4			6.68	ML	1.00	6.68		
PUNTO DE VENTA 5			4.46	ML	1.00	4.46		
PUNTO DE VENTA 6			5.07	ML	1.00	5.07		
BAÑO DE MUJERES			5.82	ML	1.00	5.82		
CUARTO ELECTRICO			4.73	ML	1.00	4.73		
VENTANA DISCAPACITADO			3.60	ML	1.00	3.60		
VENTANA BAÑO HOMBRES			3.60	ML	1.00	3.60		
VENTANA BAÑO MUJERES			7.00	ML	1.00	7.00		
CANTIDAD CONTRACTUAL			135.00					
ACUMULADO ANTERIOR			38.01					
ACUMULADO PRESENTE ACTA			130.32					
TOTAL PRESENTE ACTA:								92.31

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA — urbe caribe 24


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 08

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	01/05/2025 AL 31/05/2025		

CAPITULO:	Capítulo - MAMPOSTERIA	CÓDIGO DEL ITEM:	1181	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO EN MORTERO 1:4, EN ÁREAS CON ANCHO < 0.80 METROS

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

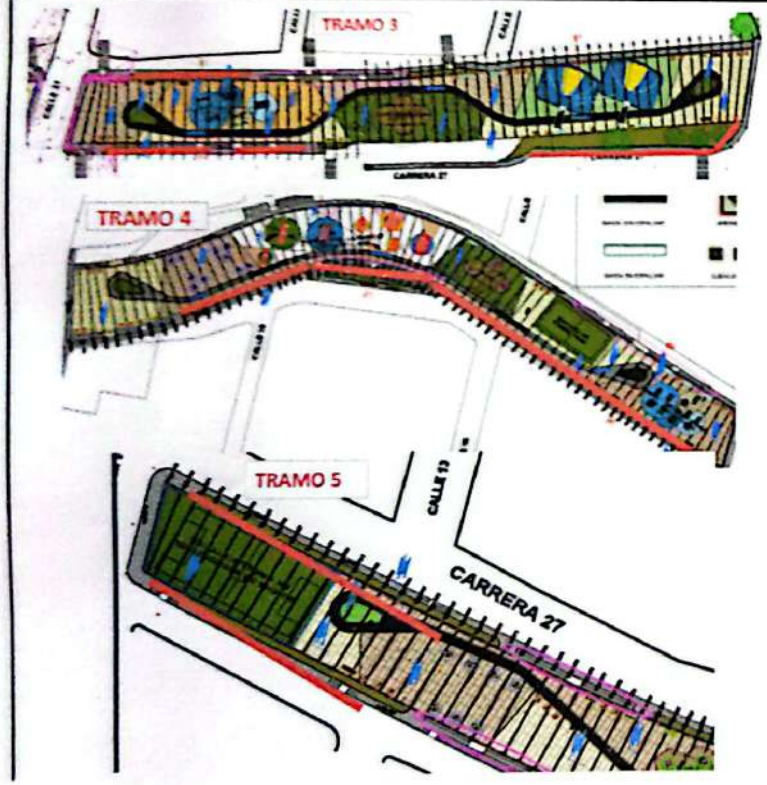

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 3									
COSTADO DERECHO	VIG 214-VIG 221	19.85			ML	1.00	19.85		
	VIG 236-VIG239	12.2			ML	1.00	12.20		
	VIG 252-VIG 259	26.2			ML	1.00	26.20		
	VIG 260 (ENTRADA DE AGUA)	4			ML	2.00	8.00		
	VIG 260-VIG 270	26			ML	1.00	26.00		
	VIG 272-VIG 275	11			ML	1.00	11.00		
COSTADO IZQUIERDO	VIG 217-VIG 229	19.5			ML	1.00	19.50		
LOSA									
CANCHA DE LANZAMIENTO	VIG 255-VIG 261	22.50			ML	1.00	22.50		
CANCHA DE LANZAMIENTO	VIG 262-VIG 266	22.45			ML	1.00	22.45		
TRAMO 4									
COSTADO DERECHO	VIG 288-VIG 321	96.55			ML	1.00	96.55		
	VIG 329-VIG 330	10			ML	1.00	10.00		
	VIG 330-VIG 346	14.8			ML	1.00	14.80		
TRAMO 5									
COSTADO IZQUIERDO	VIG 349- VIG 365	46.5			ML	1.00	46.50		
COSTADO DERECHO	VIG 349 A VIG 354	15			ML	1.00	15.00		

Powered by CamScanner

REGISTRO FOTOGRAFICO






ALCALDÍA DE BARRANQUILLA — urbe caribe 24

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 08

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	01/05/2025 AL 31/05/2025		
CAPITULO:	Capitulo - ACABADOS	CÓDIGO DEL ITEM: AD-17	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: ALFAJIAS EN CONCRETO DE 0,20 X 0,08 , INCLUYE 2 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0,25 METROS

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

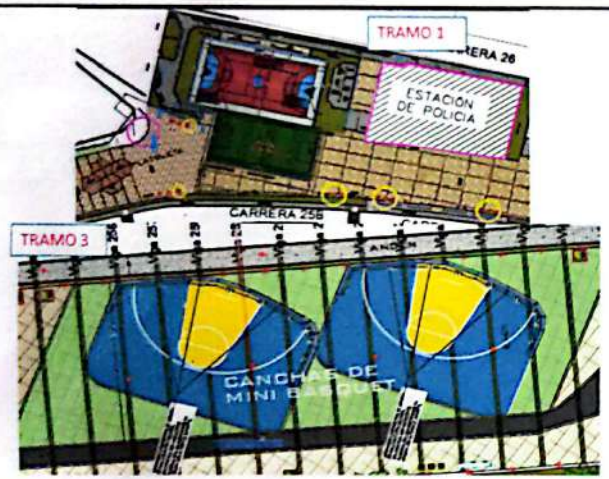

REGISTRO FOTOGRAFICO





LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 1								
CANCHA SINTETICA DE FUTBOL VIGAS ESPECIALES	62.27			ML		57.50		
TRAMO 3								
CANCHA DE LANZAMIENRTO V255-V261	22.50			ML		22.50		
CANCHA DE LANZAMIENTO V262-V266	22.45			ML		22.45		

Powered by CamScanner





CANTIDAD CONTRACTUAL	249.00
ACUMULADO ANTERIOR	0.00
ACUMULADO PRESENTE ACTA	192.46
TOTAL PRESENTE ACTA	192.46

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA — urba caribe 24

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 08


CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	01/05/2025 AL 31/05/2025		
CAPITULO:	Capitulo - ACABADOS	CÓDIGO DEL ITEM: 7657	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: ENCHAPE PARED EGEO BLANCO DE 0.30 X 0.60 METROS O SIMILAR (INCLUYE BISELADA, WIN DE ALUMNO Y EMBOQUILLADA)

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografias como evidencias de obra)

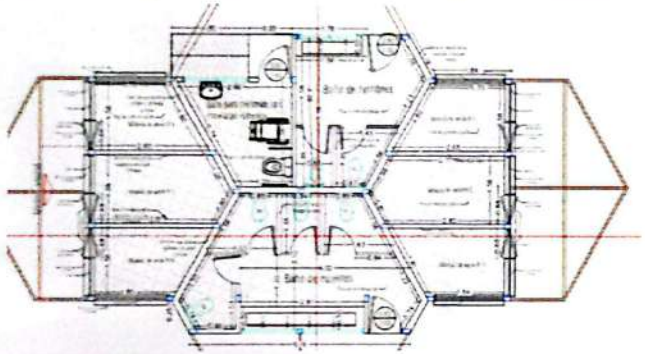

REGISTRO FOTOGRAFICO





LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 3								
BAÑO MUJERES	14,04		1,50	M2			21,06	
BAÑO HOMBRES	10,08		1,50	M2			15,12	
BAÑO DISCAPACITADOS	8,70		1,50	M2			13,05	
CANTIDAD CONTRACTUAL			104,00					
ACUMULADO ANTERIOR			51,08					
ACUMULADO PRESENTE ACTA			100,31					
TOTAL PRESENTE ACTA:								49,23

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner


ALCALDIA DE BARRANQUILLA | urba caribe 24

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 08

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	01/05/2025 AL 31/05/2025		
CAPITULO: Capitulo - ACABADOS	CÓDIGO DEL ITEM: 604	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	CIELO RASO EN YESO CARTON

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografias como evidencias de obra)

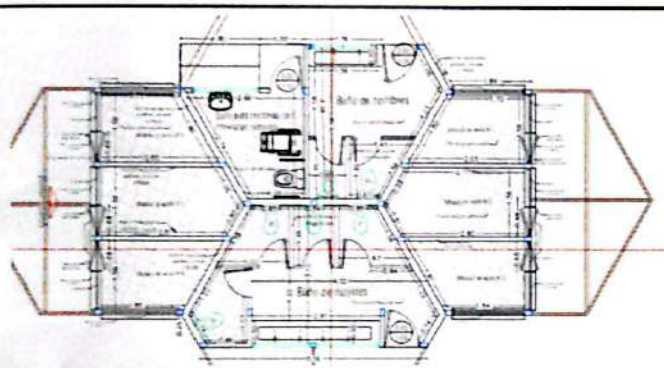

REGISTRO FOTOGRAFICO



LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 3								
ZONA DE SERVICIO 1				M2			3.65	
ZONA DE SERVICIO 2				M2			3.58	
ZONA DE SERVICIO 3				M2			4.77	
CUARTO TECNICO				M2			1.92	
BAÑO DISCAPACITDO				M2			4.58	
ZONA DE SERVICIO 4				M2			3.53	
ZONA DE SERVICIO 5				M2			3.87	
ZONA DE SERVICIO 6				M2			4.62	
BAÑO HOMBRES				M2			7.81	
BAÑO MUJERES				M2			11.71	
CANTIDAD CONTRACTUAL			110.00					
ACUMULADO ANTERIOR			50.04					
ACUMULADO PRESENTE ACTA			100.08					
TOTAL PRESENTE ACTA:								50.04

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

OBSERVACIONES:


Powered by CamScanner

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 08

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SUROMENTE"
PERIODO:	01/05/2025 AL 31/05/2025		
CAPITULO: Capitulo - EQUIPAMENTO	CÓDIGO DEL ITEM: B028	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTERÍAS Y MALLAS DE 7.32 X 2.44 MTS.

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografias como evidencias de obra)

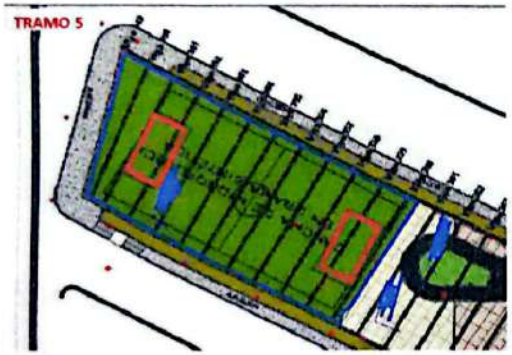

REGISTRO FOTOGRAFICO





LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 6								
CANCHA MICROFUTBOL				UN	2			
CANTIDAD CONTRACTUAL			4.00					
ACUMULADO ANTERIOR			0.00					
ACUMULADO PRESENTE ACTA			2.00					
TOTAL PRESENTE ACTA								2.00

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 08

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1		OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"	
PERIODO:	01/05/2025 AL 31/05/2025				
CAPITULO:	Capítulo - JUEGOS INFANTILES	CÓDIGO DEL ITEM: AD-25	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA CON ALEACION DE ALUMINIO 90/10 RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN RESINA DE POLIESTER CON ALTURA FINAL DE 2,40 MT.	

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)





REGISTRO FOTOGRAFICO



LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 1								
CANCHA DE FUTBOL SINTETICA VIGAS ESPECIALES	26,5		2,4	M2	1		63,6	
CANCHA MULTIPLE	28,6		2,4	M2	1		68,64	
TRAMO 3								
CANCHAS MINIBASKET	22,3		2,4	M2	2		107,04	

Powered by CamScanner

TRAMO 3





CANTIDAD CONTRACTUAL	528.00
ACUMULADO ANTERIOR	0.00
ACUMULADO PRESENTE ACTA	239.28
TOTAL PRESENTE ACTA:	239.28

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 08

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1		OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"	
PERIODO:	01/05/2025 AL 31/05/2025				
CAPITULO:	Capitulo - JUEGOS INFANTILES	CÓDIGO DEL ITEM: AD-26	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA CON ALEACION DE ALUMINIO 90/10 RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN RESINA DE POLIESTER CON ALTURA FINAL DE 3,60 MT.	

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografias como evidencias de obra)



REGISTRO FOTOGRAFICO



LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 1								
CANCHA DE FUTBOL SINTETICA								
TRAMO A	18,46		3,6	M2	1		66,46	
TRAMO B	12,98		3,6	M2	1		46,73	
TRAMO C	4,00		3,6	M2	1		14,40	
PUERTA	2,50		4,40	M2	1		11,00	
CANTIDAD CONTRACTUAL			280,00					
ACUMULADO ANTERIOR			0,00					
ACUMULADO PRESENTE ACTA			138,58					
TOTAL PRESENTE ACTA:								138,58

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA


Powered by CamScanner


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 08

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1		OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"	
PERIODO:	01/05/2025 AL 31/05/2025				
	Capítulo - NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM: NP.2	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLETA GUÍA Y TÁCTIL DE 20*20 PARA ANDENES SEGÚN MEP.	

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)


(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

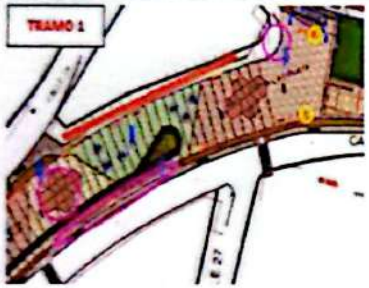

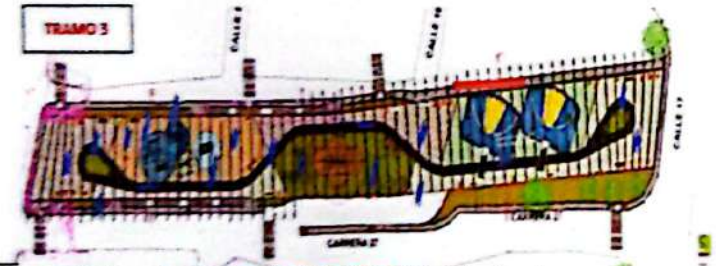

LOCALIZACION		DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 1									
COSTADO IZQUIERDO	V112-V122	56			ML		56		
	V112 INGRESO	3			ML		3		
TRAMO 3									
COSTADO IZQUIERDO	VIG 253 - VIG 261	24			ML		24		
	V270-V275	15,4			ML		15,4		
TRAMO 4									
COSTADO DERECHO	V276-V285	28,00			ML		28,00		
	V321-V345	49,10			ML		49,10		
COSTADO IZQUIERDO	V275-V293	66,02			ML		66,02		
	V328-V343	37,5			ML		37,5		
TRAMO 5									
COSTADO IZQUIERDO	V350-V351	2,9			ML		2,9		
	V365 INTERNO	2,7			ML		2,7		
	V367/V368-V398	85,9			ML		85,9		
	V389-V398 INTERNO	24,8			ML		24,8		
	V399/V400-V429	87,9			ML		87,9		
	V431-V442	34,2			ML		34,2		
	V454-V444	30,15			ML		30,15		
COSTADO DERECHO	V358-V385	80			ML		80		
	V385-V406	65			ML		65		

Powered by CamScanner

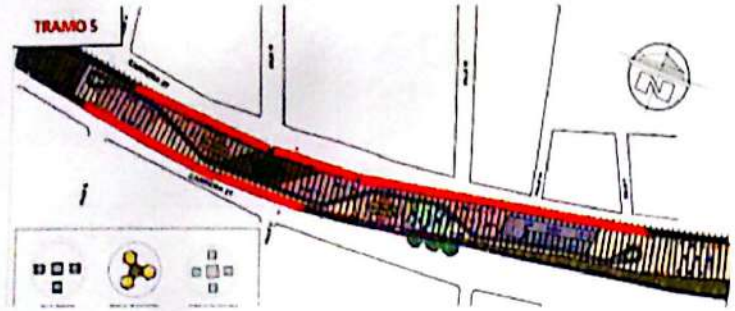

REGISTRO FOTOGRAFICO













Powered by CamScanner


TRAMO 4


TRAMO 4


TRAMO 5


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 08

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	01/05/2025 AL 31/05/2025		

CAPITULO:	Capitulo - NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP.3	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA PISTA DE TROTE, NO ADHERIDA, DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO PARA PISTA DE TROTE, REFORZADA CON FIBRAS MACROSINTETETICAS Y MALLA PARA PAÑOS IRREGULARES, ACABADO CON ENDURECEDOR DE QUARZO COLOR GRIS NEUTRO (NO INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS)

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

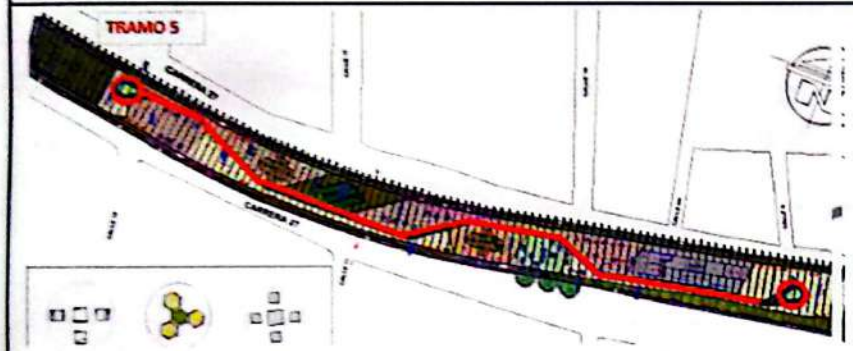

REGISTRO FOTOGRAFICO







LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 5								
V361-V455				M2	492.48		492.48	

CANTIDAD CONTRACTUAL	1917.35
ACUMULADO ANTERIOR	1397.28
ACUMULADO PRESENTE ACTA	1589.76
TOTAL PRESENTE ACTA:	492.48

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 08

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII), LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	01/05/2025 AL 31/05/2025		

CAPITULO:	Capitulo - NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP.4	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI, PARA PISOS ESTAMPADOS DE COLOR NO ADHERIDA, DE 10 CM DE ESPESOR, REFORZADA CON FIBRAS MACROSINTETETICAS, REFORZADAS CON MALLA EN PAÑOS IRREGULARES, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE 6 MM PARA SEPARACIÓN. (NO INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS)

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

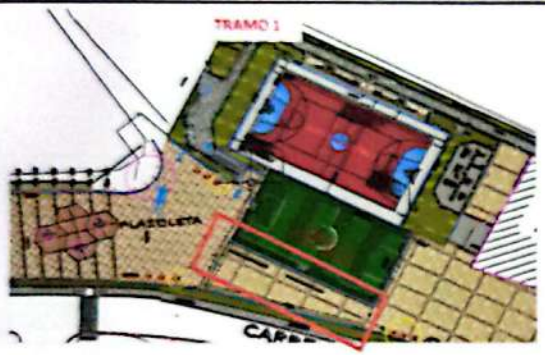

REGISTRO FOTOGRAFICO



LOCALIZACION	DESCRIPCIÓN COLOR	UND	CANT.	TOTALES ML	TOTALES M2	TOTALES M3
TRAMO 1						
CANCHA EXISTENTE VIGAS ESPECIALES	COQUINA	M2			97.08	

CANTIDAD CONTRACTUAL	13366.66
ACUMULADO ANTERIOR	13268.66
ACUMULADO PRESENTE ACTA	13365.74

TOTAL PRESENTE ACTA:	97.08

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT 890102018-1 | urba caribe 24

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 08

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	01/05/2025 AL 31/05/2025		
CAPITULO: Capítulo - NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM: NP.5	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	CORTE DE PISOS EN CONCRETO, PISOS EN CONCRETO DE NIVELACIÓN Y SEGÚN REQUERIMIENTOS OBRA QUE NO ESTÉN DIRECTAMENTE EXPUESTOS AL TRAFICO


REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

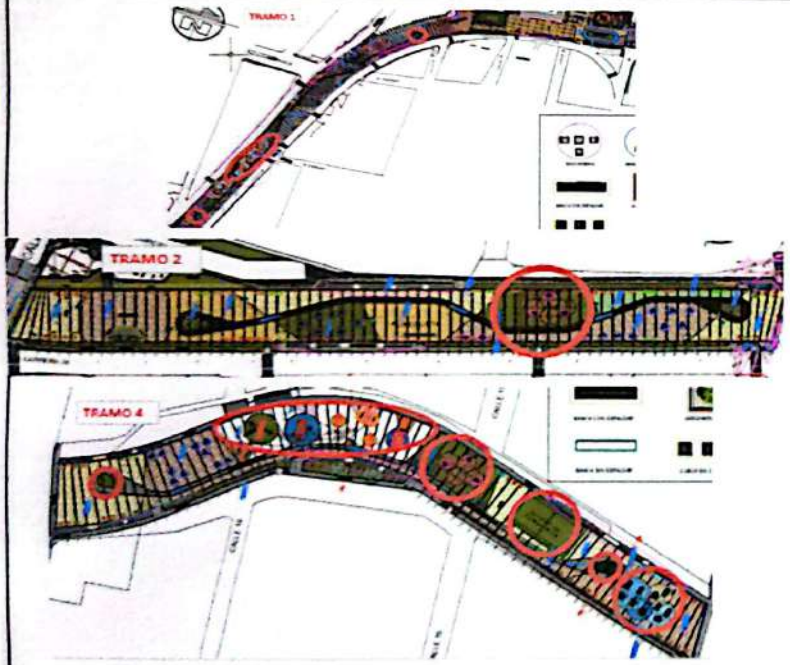

LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 1								
GOTA V19-V22				ML		25.00		
V26-V54 RESTANTE PISO CAUCHO				ML		820.80		
V18-V28 NIVELACIÓN GRAMA				ML		820.32		
TRAMO 2								
V183-V194 PISO GRAMA				ML		244.50		
TRAMO 4								
GOTA 1 V280-V283				ML		14.34		
GOTA 2 V334-V336				ML		14.34		
V337-V345 CIRCULOS BIOSALUDABLES				ML		222.89		
V293-V315 PISOS DE CAUCHO				ML		899.1		
V313-V323 GRAMA				ML		350.16		
V325-V332 CANCHA FUTBOL TENIS				ML		244.74		

Powered by CamScanner

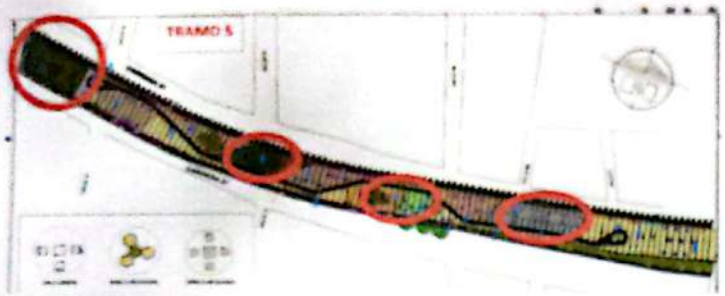

REGISTRO FOTOGRAFICO







TRAMO 5								
V349-V360 CANCHA DE FUTBOL				ML		559.96		
V386-V402 JAULA DE BATEO				ML		400.94		
V417-V424 GRAMA				ML		290.04		
V361-V364 GOTA 1				ML		14.48		
V453-V455 GOTA 2				ML		17.02		

CANTIDAD CONTRACTUAL	9687.64
ACUMULADO ANTERIOR	2538.67
ACUMULADO PRESENTE ACTA	7477.50

TOTAL PRESENTE ACTA:	4.938,83

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA — Barranquilla Caribe 24

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 08

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"		
PERIODO:	01/05/2025 AL 31/05/2025				
CAPITULO:	Capítulo - NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP.6	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	CORTE Y SELLO DE JUNTAS CON SELLO, PARA ZONAS DE ANDENES, CANCHAS, PISOS ESTAMPADOS, SENDERO DE TROTE, PISTAS Y ZONAS EXPUESTAS AL TRAFICO.


REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

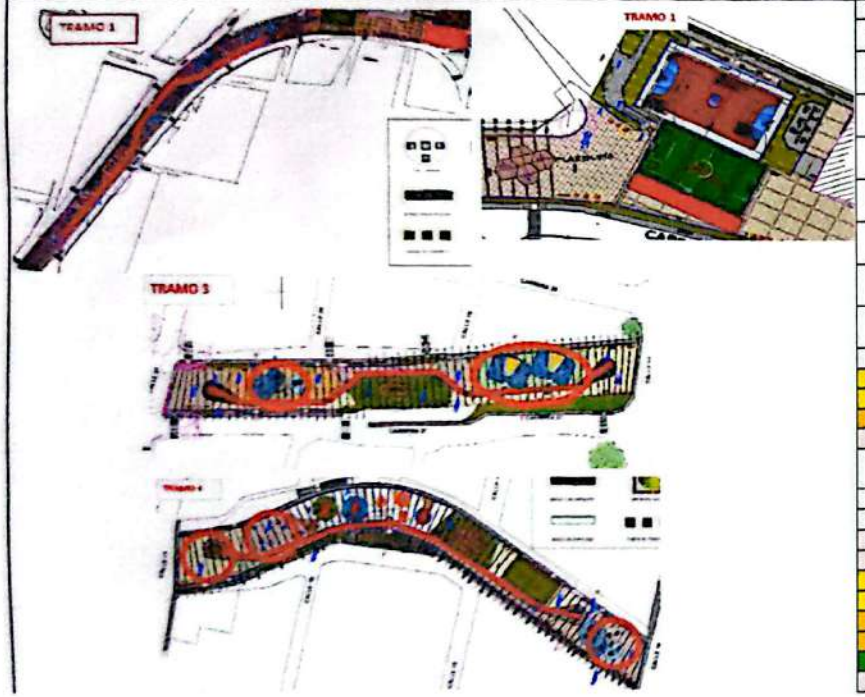

LOCALIZACION	DESCRIPCIÓN			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	COLOR				ML	M2	M3
TRAMO 1								
VIGAS ESPECIALES- NARANJA	157,42			ML		157,42		
VIGAS ESPECIALES COQUINA	133,48			ML		133,48		
V126-V136 CUNETA PISTA PATINAJE	720,00			ML		720,00		
V18-V114 PISTA DE TROTE	329,47			ML		329,47		
TRAMO 3								
V218-V272 PISTA DE TROTE				ML		202,56		
V224-V232 CIRCULOS BIOSALUDABLES				ML		240,25		
V255-V266 CANCHAS MINI BALONCESTO				ML		280,27		
TRAMO 4								
V276-V285 AMARILLO	358,66			ML		358,66		
V322-V337 AMARILLO	230,82			ML		230,82		
V285-V294 NARANJA	286,88			ML		286,88		
V284-V248 COQUINA	996,35			ML		996,35		
V337-V345 CIRCULOS BIOSALUDABLES				ML		222,89		
V280-V339 PISTA	344,14			ML		344,14		
TRAMO 5								
V385-V392 COQUINA	277,71			ML		277,71		
V396-V434 COQUINA	613,41			ML		613,41		
V385-V410 AMARILLO	527,91			ML		527,91		
V424-V460 AMARILLO	968,17			ML		968,17		
V409-V419 NARANJA	439,38			ML		439,38		
V460-V465 NARANJA	783,91			ML		783,91		
V385-V407 VERDE	125,39			ML		125,39		
V467-V469 COQUINA	222,97			ML		222,97		

Powered by CamScanner

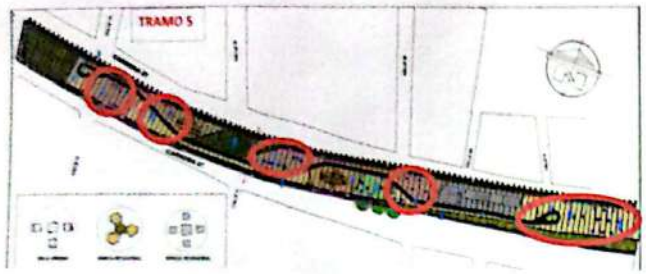

REGISTRO FOTOGRAFICO



V361-V455 PISTA DE TROTE	334,47			ML		334,47		
V432-V448 SKATE PARK	620,96			ML		620,96		

Powered by CamScanner



CANTIDAD CONTRACTUAL	32501.58
ACUMULADO ANTERIOR	13379.99
ACUMULADO PRESENTE ACTA	22797.56

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA


TOTAL PRESENTE ACTA:	9.417,57
OBSERVACIONES:	

Powered by CamScanner


ALCALDIA DE BARRANQUILLA	urbe caribe 24	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 08			
CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"		
PERIODO:	01/05/2025 AL 31/05/2025				
CAPITULO:	Capítulo - NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP.7	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	ANCLAJE EPOXICO PARA VARILLAS DE MUROS, VIGAS, COLUMNETAS ESPESOR ENTRE 3/8", INCLUYE PERFORACIÓN Y EPOXICO.

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)






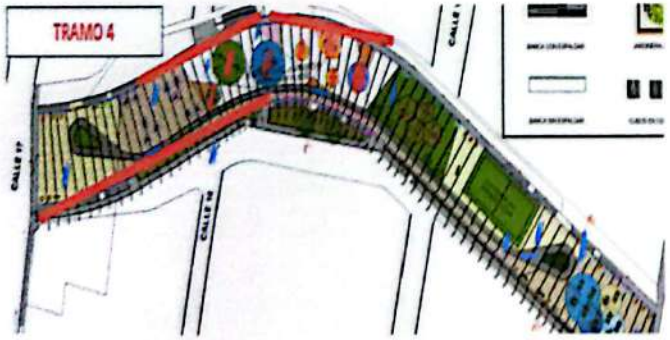

LOCALIZACION		DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 1									
COSTADO IZQUIERDO	V112-V122 INTERNO	56			UND	168			
	V112-V122 EXTERNO	56			UND	168			
	V112 INGRESO	3			UND	10			
	V112 INGRESO	3			UND	10			
JARDINERAS									
COSTADO DERECHO	V52-V54	8.7			UND	4			
	V69-V97	79			UND	40			
	V112-PARQUE EXISTENTE CLL 26	90			UND	45			
	EXISTENTE CALLE 25-V137	32.12			UND	16			
COSTADO IZQUIERDO	V1-V19	48.64			UND	24			
	V33-V68	106.86			UND	53			
	V71-V75	13.33			UND	7			
	V92-V94	8.93			UND	4			
	V98-V100	12.4			UND	6			
TRAMO 3									
COSTADO IZQUIERDO	VIG 253 - VIG 261	24			UND	80			
	V270-V275 INTERNO	15.4			UND	51			
COSTADO DERECHO	V271-V275 INTERNO	8			UND	27			
JARDINERAS									
COSTADO DERECHO	V216-V222	25.9			UND	13			
	V236-V239	13.94			UND	7			
	V252-V259	17.2			UND	9			
	V260-V275	60			UND	30			
	V275-V269	10.5			UND	5			
	V260 ENTRADA DE AGUA	4			UND	2			
	V260 ENTRADA DE AGUA	3.3			UND	2			
COSTADO IZQUIERDO	V217-V229	19.5			UND	10			

Powered by CamScanner

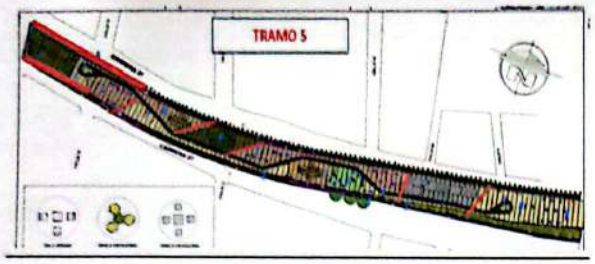

REGISTRO FOTOGRAFICO





















TRAMO 4									
COSTADO DERECHO	V285-V313 EXTERNO	92,71			UND	309			
	V313-V331 EXTERNO	51,12			UND	170			
	V280-V294 INTERNO	34,26			UND	114			
	V280-V294 EXTERNO	34,26			UND	114			
	V314-V316 INTERNO	6,84			UND	23			
	V314-V316 EXTERNO	6,84			UND	23			
	V324-V327 INTERNO	9,00			UND	30			
	V324-V327 EXTERNO	9,00			UND	30			
	V329-V330 INTERNO	15,67			UND	52			
	V329-V330 EXTERNO	15,67			UND	52			
	V331-V346 EXTERNO	21,1			UND	70			
	V331-V346 INTERNO	21,1			UND	70			
	EXCAVACION ENTRADAS DE AGUA VIG 322 Y 325	14,9			UND	50			
COSTADO IZQUIERDO	V279-V301	65			UND	217			
	V339-V329	30			UND	100			
	V285-V313 EXTERNO	75,15			UND	251			
	V313-V331 EXTERNO	53,35			UND	178			
JARDINERAS									
COSTADO DERECHO	V288-V321	96,55			UND	48			
	V329-V330	10			UND	5			
	V330-V346	14,8			UND	7			
TRAMO 5									
LADO IZQUIERDO	V351-V361 INTERNO	46,50			UND	155			
	V351-V361 EXTERNO	46,50			UND	155			
	VIG 368- VIG 395 INTERNO	65,6			UND	219			
	VIG 368- VIG 395 EXTERNO	65,6			UND	219			
	VIG 386- VIG 395 INTERNO	19			UND	63			
	VIG 397- VIG 425 INTERNO	51			UND	170			
	VIG 397- VIG 425 EXTERNO	51			UND	170			
	V429-V439 INTERNO	30			UND	100			
	V429-V439 EXTERNO	30			UND	100			
	V439-VV442 INTERNO	30			UND	100			
	V439-VV442 EXTERNO	30			UND	100			
	V444-V453 INTERNO	30			UND	100			
	V444-V453 EXTERNO	30			UND	100			
COSTADO DERECHO	V360-V370 INTERNO	36,6			UND	122			
	V360-V370 EXTERNO	36,6			UND	122			
	V372-V403 INTERNO	8,35			UND	28			
		22,7			UND	76			
		9,8			UND	33			
		8,35			UND	28			
		25,2			UND	84			
		15,17			UND	51			


Powered by CamScanner

















JARDINERAS									
COSTADO IZQUIERDO	VIG 349- VIG 365	46,5			UND	23			
COSTADO DERECHO	VIGA 349 A VIGA 354	15			UND	8			
	PISTA								
GOTA 1	V361-V364 VIGA INTERNA	19,29			UND	64			
GOTA 2	V453-V455 VIGA INTERNA	17,53			UND	58			
PISTA	V361-V455	593,03			UND	1977			
LOSA									
BORDILLO DE CONFINAMIENTO	V360-V361	16,73			UND	56			
	V362-V365	18,93			UND	63			
	V373-V374	13,51			UND	45			
	V385-V392	22,74			UND	76			
	V396-V403	22,74			UND	76			
	V409-V410	7,47			UND	25			
	V417-V419	14,99			UND	50			
	V423-V425	10,50			UND	35			
	V432-V434	12,80			UND	43			
	V446-V448	13,45			UND	45			
	V458	17,58			UND	59			
	V462-V468	19,96			UND	67			
	V465-V468	18,52			UND	62			

CANTIDAD CONTRACTUAL	32251,22	
ACUMULADO ANTERIOR	16085,47	
ACUMULADO PRESENTE ACTA	23916,47	7.831,00

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA | urba caribe 24

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 08

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	01/05/2025 AL 31/05/2025		

CAPITULO:	Capítulo - NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP.9	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA CAL 14 DE 2" PARA RODAMANOS, 5 REFUERZOS INTERMEDIOS EN TUBERIA DE 1", GALVANIZADA CAL.14, CON APOYOS EN FLANCHES DE 15 CM. *25*3/8, ALTURA 1,2 ML. TODAS LAS PIEZAS GALVANIZADAS MAS ACABADO EN PINTURA COLORPLATEADOTIPO BUQUE, SEGUN DISEÑO SUMINISTRADO.

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



REGISTRO FOTOGRAFICO





LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 5								
COSTADO DERECHO								
V349-408	162.00			ML		162.00		
COSTADO IZQUIERDO								
V349-V365	48			ML		48.00		

CANTIDAD CONTRACTUAL	2861.48
ACUMULADO ANTERIOR	2063.51
ACUMULADO PRESENTE ACTA	2273.51

TOTAL PRESENTE ACTA:	210.00

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA


Powered by CamScanner

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 08

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"		
PERIODO:	01/05/2025 AL 31/05/2025				
CAPITULO:	Capitulo - NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP.11	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALA URBANA DE 3 PUESTOS CON MESA DE CENTRO, ACABADO MATE,PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografias como evidencias de obra)

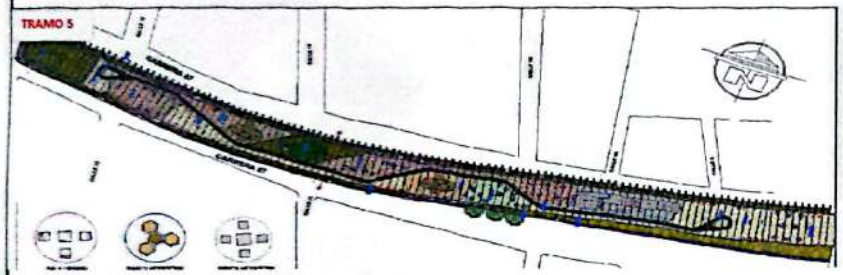

REGISTRO FOTOGRAFICO



LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 5				UN	5.00			
CANTIDAD CONTRACTUAL			22.00					
ACUMULADO ANTERIOR			17.00					
ACUMULADO PRESENTE ACTA			22.00					

TOTAL PRESENTE ACTA: 5.00

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA


Powered by CamScanner

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 08

CONTRATO:	SP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII), LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	01/05/2025 AL 31/05/2025		
CAPITULO:	Capítulo - NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM: NP 12	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: SUMINISTRO E INSTALACION MESAS DE JUEGO WAITE AJEDREZ O DOMINO PARA 4 PUESTOS PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para colocar partes de planos en donde ubicar fotografías como evidencias de obra)

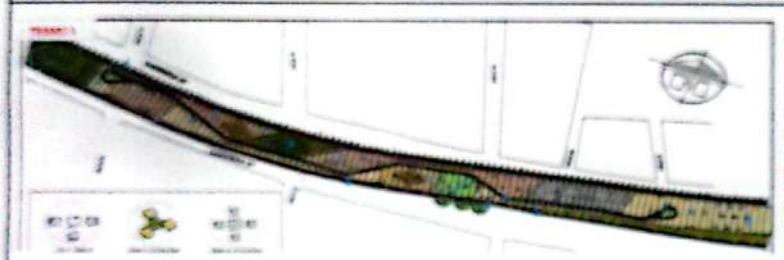

REGISTRO FOTOGRAFICO









LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 8				UND	3,00			
CANTIDAD CONTRACTUAL					3,00			
ACUMULADO ANTERIOR					0,00			
ACUMULADO PRESENTE ACTA					3,00			

TOTAL PRESENTE ACTA: 3,00

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA — urbacaribe 24


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 08

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	01/05/2025 AL 31/05/2025		
CAPITULO:	Capítulo - NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM: NP.13	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA CON ESPALDAR DE 2.40 MT, BISCOLOR MATE RANURADA PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

TRAMO 5



REGISTRO FOTOGRAFICO



LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 5				UN	3.00			

CANTIDAD CONTRACTUAL	25.00
ACUMULADO ANTERIOR	22.00
ACUMULADO PRESENTE ACTA	25.00

TOTAL PRESENTE ACTA:	3.00

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA — urbaCaribe 24

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 08

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	01/05/2025 AL 31/05/2025		
CAPITULO: Capítulo - NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM: NP.14	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA SIN ESPALDAR DE 2.40 MT, BISCOLOR MATE RANURADA PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



REGISTRO FOTOGRAFICO





LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 5				UN	7,00			
TRAMO 2				UN	1,00			
CANTIDAD CONTRACTUAL			29,00					
ACUMULADO ANTERIOR			21,00					
ACUMULADO PRESENTE ACTA			29,00					
TOTAL PRESENTE ACTA:								8,00

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA | urbacarib24


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 08

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	01/05/2025 AL 31/05/2025		
CAPITULO:	Capítulo - NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM: NP.15	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBOS EN CONCRETO BICOLOR MATE DE 40*40 RANURADA PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

TRAMO 5



REGISTRO FOTOGRAFICO





LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 5				UN	15.00			
TRAMO 2				UN	3.00			
CANTIDAD CONTRACTUAL			93.00					
ACUMULADO ANTERIOR			75.00					
ACUMULADO PRESENTE ACTA			93.00					

TOTAL PRESENTE ACTA:	18.00

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA / urba caribe 24	**MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA** **ACTA No. 08**	

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1		**OBJETO DEL CONTRATO:**	**MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"**	
PERIODO:	01/05/2025 AL 31/05/2025				
CAPITULO:	**OBRAS PRELIMINARES - MOVIMIENTOS DE TIERRA**	**CÓDIGO DEL ITEM:** NP.18	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANCHA SINTÉTICA HIBRIDA MONO-FIBRILADA DE 50 MM DE ESPESOR CON RELLENO EN CASCARILLA DE COCO CAUCHO Y ARENA DE CUARZO**	


REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)


TRAMO 1



TRAMO 4

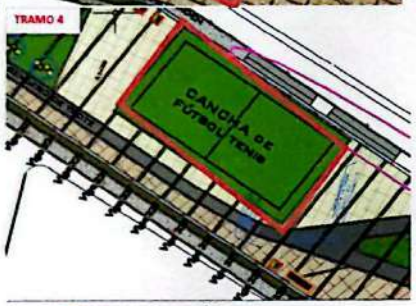

TRAMO 5

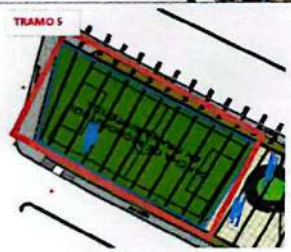

LOCALIZACION	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
TRAMO 1								
CANCHA DE FUTBOL SINTETICA				M2	441,43		441,43	
TRAMO 4								
V336-V346 CANCHA FUTBOLTENIS				M2	226,4		226,4	
TRAMO 5								
V361-V368 CANCHA				M2	489,37		489,37	

Powered by CamScanner

REGISTRO FOTOGRAFICO







CANTIDAD CONTRACTUAL	1504.35
ACUMULADO ANTERIOR	0.00
ACUMULADO PRESENTE ACTA	1157.20
OBRA A EJECUTAR	347.15

TOTAL PRESENTE ACTA:	1.157.20

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 08

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1		OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"	
PERIODO:	01/08/2025 AL 31/08/2025				
CAPITULO:	Capítulo - NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM: NP.17	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	CÉSPED ARTIFICIAL RECREATIVO Y DECORATIVO-20-25MM CON ARENA DE CUARZO COMO RELLENO ESTABILIZADOR	

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



REGISTRO FOTOGRAFICO







LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 5								
V453-V455 GOTA				M2	20.28		20.28	
V354-V357 GOTA				M2	23.42		23.42	
V417-V425 ZONA VERDE				M2	249.56		249.56	
V387-V402 ZONA DE JAULA DE BATEO				M2	356.85		356.85	
CANTIDAD CONTRACTUAL			2961.75					
ACUMULADO ANTERIOR			2311.64					
ACUMULADO PRESENTE ACTA			2961.75					
TOTAL PRESENTE ACTA:							650.11	

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA | urbe caribe 24


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 08


CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1		OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII), LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"	
PERIODO:	01/05/2025 AL 31/05/2025				
CAPITULO:	Capitulo - NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM: NP.18	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	BASE ELÁSTICA DE 10MM PARA AMORTIGUACIÓN DE BAJO DEL CÉSPED ARTIFICIAL	

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



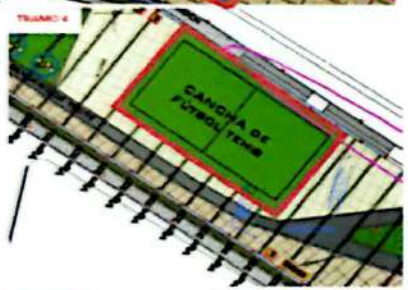

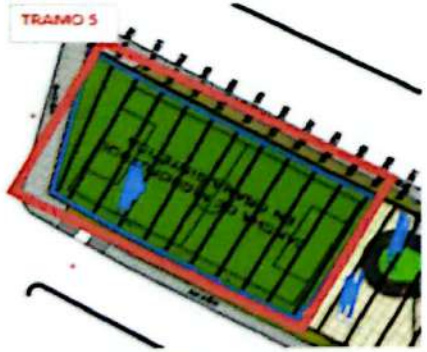

LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 1								
CANCHA DE FUTBOL SINTETICA				M2	441.43		441.43	
TRAMO 4								
V336-V346 CANCHA FUTBOLTENIS				M2	226.4		226.4	
TRAMO 5								
V361-V368 CANCHA				M2	489.37		489.37	

Powered by CamScanner

REGISTRO FOTOGRAFICO

TRAMO 1



TRAMO 5



TRAMO 4



CANTIDAD CONTRACTUAL	1814.35
ACUMULADO ANTERIOR	0.00
ACUMULADO PRESENTE ACTA	1157.20

TOTAL PRESENTE ACTA: 1157.20

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner


ALCALDIA DE BARRANQUILLA — urbacaribe 24

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 08

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1			OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	01/05/2025 AL 31/05/2025				
CAPITULO:	Capítulo - NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP.19	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA HEXAGONAL ACABADO MATE, ALIGERADA, PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO DE 5000 PSI, CON INCLUSION DE FIBRA

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

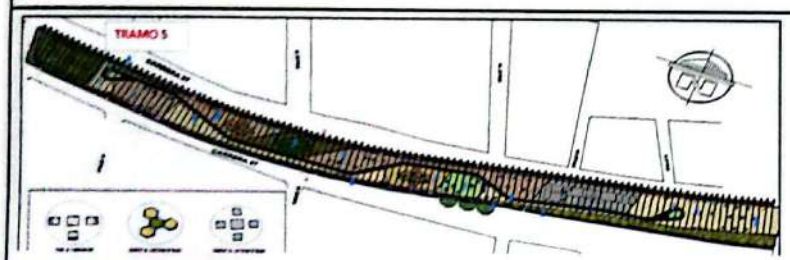

REGISTRO FOTOGRAFICO





LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 5				UN	96.00			

CANTIDAD CONTRACTUAL	312.00
ACUMULADO ANTERIOR	204.00
ACUMULADO PRESENTE ACTA	300.00

TOTAL PRESENTE ACTA:	96.00

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA


Powered by CamScanner

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 08

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1			OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	01/05/2025 AL 31/05/2025				
CAPITULO:	Capitulo - NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP.20	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE MASETA HEXAGONAL ACABADO MATE, ALIGERADA, PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO DE 5000 PSI, CON INCLUSION DE FIBRA

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

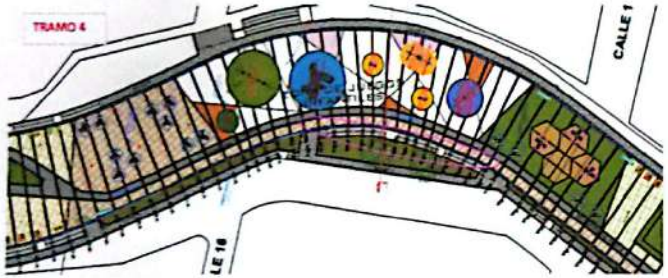

REGISTRO FOTOGRAFICO





LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 1				UN	8.00			
TRAMO 2				UN	4.00			
TRAMO 4				UN	14.00			
TRAMO 5				UN	32.00			
CANTIDAD CONTRACTUAL			240.00					
ACUMULADO ANTERIOR			66.00					
ACUMULADO PRESENTE ACTA			124.00					
TOTAL PRESENTE ACTA:								58.00

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA | urbacaribe24


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 08

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	01/05/2025 AL 31/05/2025		

CAPITULO:	Capitulo - NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP.21	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	ANCLAJE EPOXICO PARA VARILLAS DE MUROS, VIGAS, COLUMNETAS ESPEROR ENTRE 1/2", INCLUYE PERFORACION Y EPOXICO.

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

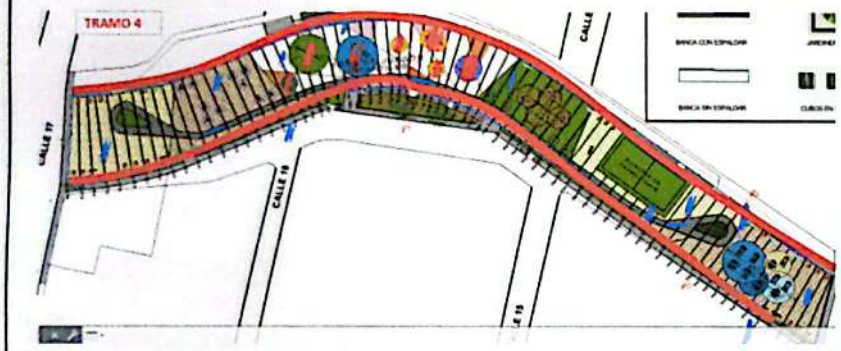

REGISTRO FOTOGRAFICO



LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 4								
COSTADO IZQUIERDO				UND	368			
COSTADO DERECHO				UND	392			
CALLE 17				UND	36			
CALLE 14				UND	32			

CANTIDAD CONTRACTUAL	6276.00
ACUMULADO ANTERIOR	2868.00
ACUMULADO PRESENTE ACTA	3696.00

TOTAL PRESENTE ACTA:	828.00

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA


Powered by CamScanner

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 08

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1			OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	01/06/2025 AL 31/05/2025				
CAPITULO:	Capitulo - NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP.22	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO PANEL LABERINTO

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

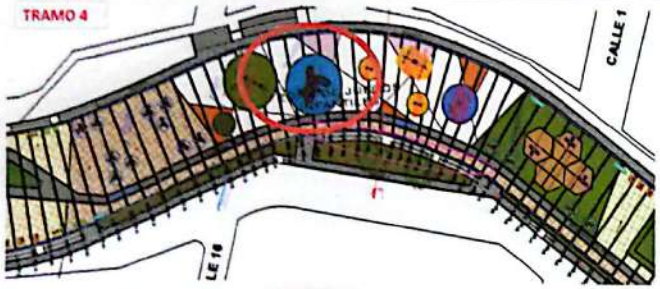

REGISTRO FOTOGRAFICO





LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 4								
VIG 294-VIG 313				UND	2.00			
CANTIDAD CONTRACTUAL			3.00					
ACUMULADO ANTERIOR			1.00					
ACUMULADO PRESENTE ACTA			3.00					
TOTAL PRESENTE ACTA:								2.00

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA


Powered by CamScanner

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 08

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1			OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	01/05/2025 AL 31/05/2025				
CAPITULO:	Capitulo - NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP.43	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SISTEMA CALISTEMIA CAPACIDAD 5 PERSONAS

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

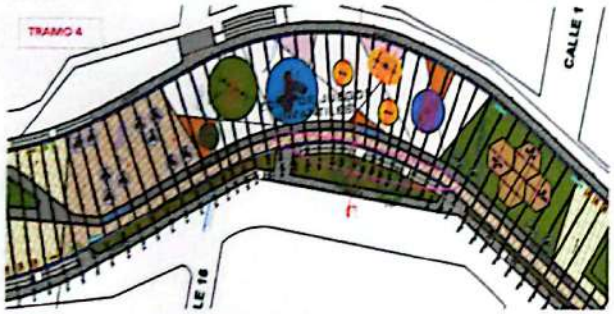

REGISTRO FOTOGRAFICO





LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 4				UN	2.00			

CANTIDAD CONTRACTUAL	2.00
ACUMULADO ANTERIOR	0.00
ACUMULADO PRESENTE ACTA	2.00

TOTAL PRESENTE ACTA:	2.00

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTO DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA — urba caribe 24


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 08

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	01/05/2025 AL 31/05/2025		

CAPITULO:	Capítulo - NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM:	NP.45	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	ANCLAJE EPOXICO PARA VARILLAS DE MUROS, VIGAS, COLUMNETAS ESPEROR ENTRE 1/4", INCLUYE PERFORACION Y EPOXICO.

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

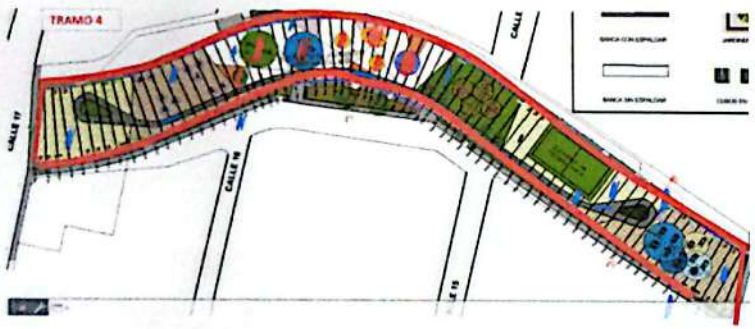

REGISTRO FOTOGRAFICO





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	CANT	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 4								
COSTADO IZQUIERDO				UND	368			
COSTADO DERECHO				UND	392			
CALLE 17				UND	36			
CALLE 14				UND	32			

CANTIDAD CONTRACTUAL	6276.00
ACUMULADO ANTERIOR	3180.00
ACUMULADO PRESENTE ACTA	4008.00

TOTAL PRESENTE ACTA:	828.00

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA		**MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA** **ACTA No. 08**			
CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"		
PERIODO:	DEL 01/12/24 AL 31/12/24				
CAPITULO:	Capitulo - NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM:	NP-47	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	ACTAS DE VECINDAD DE INICIO Y/O CIERRE

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



REGISTRO FOTOGRAFICO





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 1								
ACTA DE APERTURA				UND	147.00			
ACTA DE CIERRE								
TRAMO 2								
ACTA DE APERTURA				UND	12.00			
ACTA DE CIERRE								
TRAMO 3								
ACTA DE APERTURA				UND	66.00			
ACTA DE CIERRE								
TRAMO 4								
ACTA DE APERTURA				UND	75.00			
ACTA DE CIERRE								
TRAMO 5								
ACTA DE APERTURA				UND	161.00			
ACTA DE CIERRE								
CANTIDAD CONTRACTUAL			1278.00					
ACUMULADO ANTERIOR			172.00					
ACUMULADO PRESENTE ACTA			633.00					
TOTAL PRESENTE ACTA								461.00

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA


Powered by CamScanner

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 08

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1			OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	01/05/2025 AL 31/05/2025				
CAPITULO:	Capítulo - NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM:	NP.49	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SERVICIO DE GALVANIZADO EN CALIENTE DE ESTRUCTURAS METALICAS

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

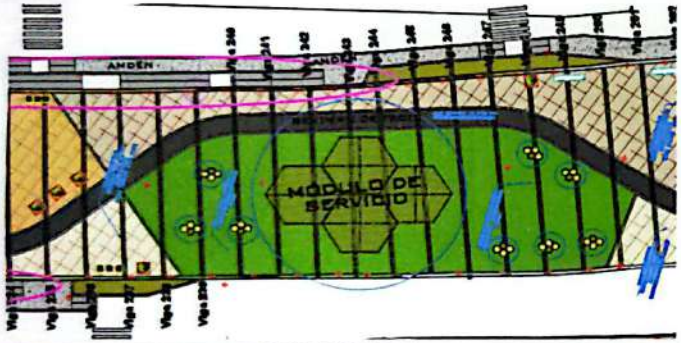

REGISTRO FOTOGRAFICO





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	KG
TRAMO 3								
ESTRUCTURA DE CUBIERTA Y PUNTOS DE VENTAS				KG	387,87			387,87
MODULO DE SERVICIO V241-V245								
CANTIDAD CONTRACTUAL			50616,34					
ACUMULADO ANTERIOR			39016,34					
ACUMULADO PRESENTE ACTA			39404,21					
TOTAL PRESENTE ACTA:								387,87

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

ESTRUCTURA DE CUBIERTA Y PUNTOS DE VENTAS											
ESTRUCTURA CUBIERTA	TUBO RECTANGULAR		3,4	76	38	0,0015	KG	3	1	2,67	27,23
	TUBO RECTANGULAR		3,2	76	38	0,0015	KG	3	1	2,67	25,63
	TUBO CUADRADO		2,93	38	38	0,0015	KG	1	1	1,74	5,1
	TUBO CUADRADO		1,15	38	38	0,0015	KG	1	1	1,74	2
	TUBO CUADRADO		4,61	38	38	0,0015	KG	1	1	1,74	8,02
	TUBO CUADRADO		1,24	38	38	0,0015	KG	1	1	1,74	2,16
	TUBO CUADRADO		2,86	38	38	0,0015	KG	1	1	1,74	4,98
	TUBO CUADRADO		2,96	38	38	0,0015	KG	1	1	1,74	5,15
	TUBO CUADRADO		0,83	38	38	0,0015	KG	1	1	1,74	1,44
	TUBO CUADRADO		5,13	38	38	0,0015	KG	1	1	1,74	8,93
	TUBO CUADRADO		0,76	38	38	0,0015	KG	1	1	1,74	1,32
	TUBO CUADRADO		2,91	38	38	0,0015	KG	1	1	1,74	5,06
	TUBO CUADRADO		3	38	38	0,0015	KG	1	1	1,74	5,22
	TUBO CUADRADO		3,2	38	38	0,0015	KG	2	1	1,74	11,14
ESTRUCTURA CUBIERTA NEGRA	TUBO CUADRADO	A36	5,1	100	100	0,002	KG	1	1	6,22	31,722
	TUBO CUADRADO	A36	2,17	100	100	0,002	KG	1	1	6,22	13,4974
	TUBO CUADRADO	A36	2,19	100	100	0,002	KG	1	1	6,22	13,6218
	TUBO CUADRADO	A36	3,09	100	100	0,002	KG	1	1	6,22	19,2198
	TUBO CUADRADO	A36	2,91	100	100	0,002	KG	1	1	6,22	18,1002
	TUBO CUADRADO	A36	1,45	100	100	0,002	KG	1	1	6,22	9,019
	TUBO CUADRADO	A36	1,5	100	100	0,002	KG	1	1	6,22	9,33
	TUBO CUADRADO	A36	5,12	100	100	0,002	KG	1	1	6,22	31,8464
	TUBO CUADRADO	A36	2,15	100	100	0,002	KG	1	1	6,22	13,373
	TUBO CUADRADO	A36	2,13	100	100	0,002	KG	1	1	6,22	13,2486
	TUBO CUADRADO	A36	1,53	100	100	0,002	KG	1	1	6,22	9,5166
	TUBO CUADRADO	A36	1,55	100	100	0,002	KG	1	1	6,22	9,641
	TUBO CUADRADO	A36	3,1	100	100	0,002	KG	1	1	6,22	19,282
	TUBO CUADRADO	A36	2,84	100	100	0,002	KG	1	1	6,22	17,6648
	TUBO CUADRADO	A36	2,55	38	38	0,00152	KG	2	1	2,67	13,617
	TUBO CUADRADO	A36	1,55	38	38	0,00152	KG	4	1	2,67	16,5408
	TUBO CUADRADO	A36	2,56	38	38	0,00152	KG	2	1	2,67	13,6704
	TUBO CUADRADO	A36	2,59	38	38	0,00152	KG	2	1	2,67	0,798855
	TUBO CUADRADO	A36	2,53	38	38	0,00152	KG	2	1	2,67	0,780349
										TOTAL	387,87


Powered by CamScanner

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 08

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BULEVARES, EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)". GRUPO III
PERIODO:	01/05/2025 AL 31/05/2025		
CAPITULO: Capitulo - NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM: NP.53	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CORTINAS ENRROLLABLES EN FLEJE MOCROPERFORADO GALVANIZADO CAL.20, ALTO 1.0 ANCHO ENTRE 1.5 Y 1.66

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

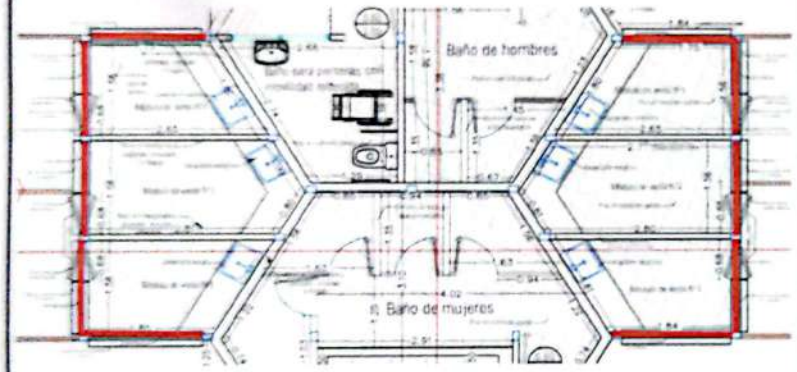

REGISTRO FOTOGRAFICO



LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 3								
PUNTO DE VENTA 1				UND	2.00			
PUNTO DE VENTA 2				UND	1.00			
PUNTO DE VENTA 3				UND	2.00			
PUNTO DE VENTA 4				UND	2.00			
PUNTO DE VENTA 5				UND	1.00			
PUNTO DE VENTA 6				UND	2.00			
CANTIDAD CONTRACTUAL			20.00					
ACUMULADO ANTERIOR			10.00					
ACUMULADO PRESENTE ACTA			20.00					
TOTAL PRESENTE ACTA:								10.00

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA


Powered by CamScanner

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 08

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1			OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BULEVARES, EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)". GRUPO III
PERIODO:	01/06/2025 AL 31/06/2025				
CAPITULO:	Capitulo - NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP.57	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE VENTANAS CORREDIZAS EN ALUMINIO DE 1.5*1.5

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta v/s fotografías como evidencias de obra)

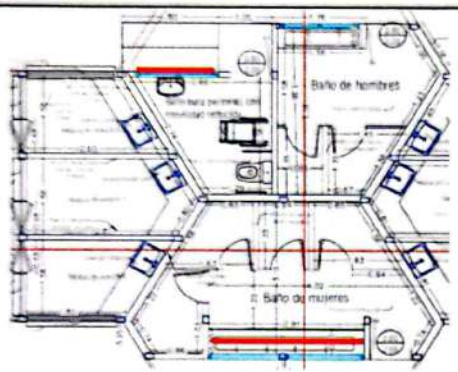

REGISTRO FOTOGRAFICO







LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 1								
BAÑOS MUJERES				UND	1.75			
TRAMO 3								
BAÑOS MUJERES				UND	1.75			
BAÑOS DISCAPACITADOS				UND	1.00			
CANTIDAD CONTRACTUAL			8.00					
ACUMULADO ANTERIOR			3.00					
ACUMULADO PRESENTE ACTA			4.50					
TOTAL PRESENTE ACTA								3.50

OBSERVACIONES

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA


Powered by CamScanner

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 08

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1		OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII), LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"	
PERIODO:	01/05/2025 AL 31/05/2025				
CAPITULO:	Capitulo - NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM:	NP.58	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	CONSTRUCCIÓN DE SOPORTES EN CONCRETO PARA BARANDAS DE 30*15 Y ALTO 10CM, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO NO ANCLAJES

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

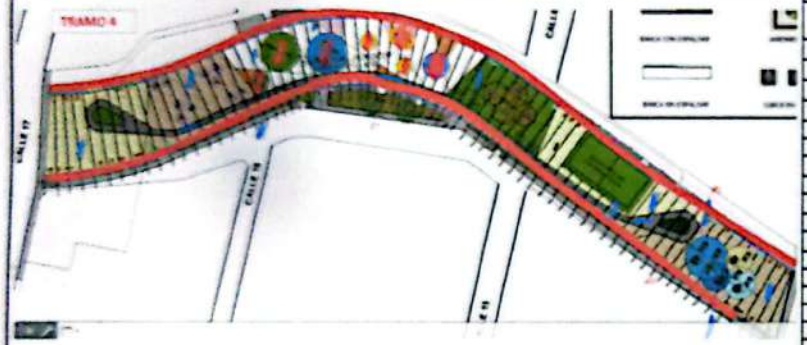

REGISTRO FOTOGRAFICO





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 4								
COSTADO IZQUIERDO				UND	92			
COSTADO DERECHO				UND	98			
CALLE 17				UND	9			
CALLE 14				UND	8			

Powered by CamScanner





CANTIDAD CONTRACTUAL	1569.00		
ACUMULADO ANTERIOR	795.00		
ACUMULADO PRESENTE ACTA	1002		
TOTAL PRESENTE ACTA:			297

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA — urbe caribe 24


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 08

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	01/05/2025 AL 31/05/2025		

CAPITULO:	Capítulo - NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP.69	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MESONES EN GRANITO GRIS CON LAVAMANOS INCORPORADO

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

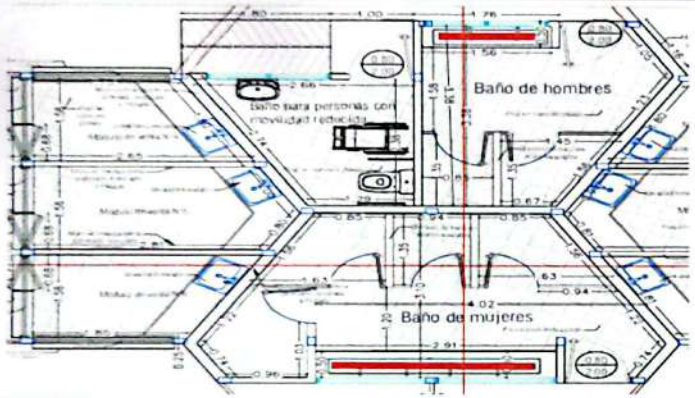

REGISTRO FOTOGRAFICO





LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 1								
BAÑO HOMBRE				ML	1,48			
BAÑO MUJER				ML	2,87			
CANTIDAD CONTRACTUAL			8,94					
ACUMULADO ANTERIOR			4,40					
ACUMULADO PRESENTE ACTA			8,75					
TOTAL PRESENTE ACTA:								4,35

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 08

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	01/05/2025 AL 31/05/2025		

CAPITULO:	Capitulo - NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP.70	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MESONES EN GRANITO GRIS TIPO MOSTRADOR

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografias como evidencias de obra)

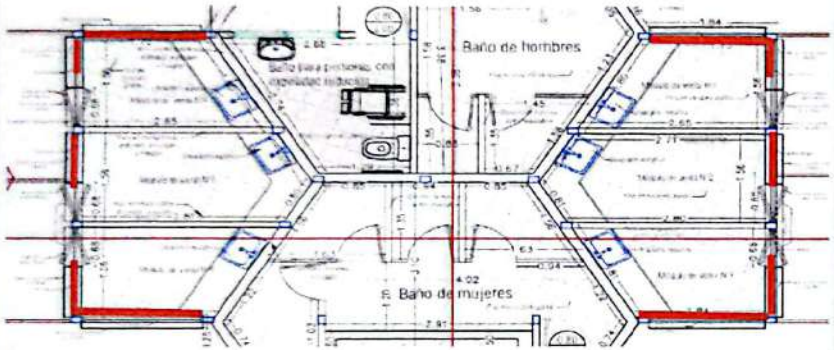

REGISTRO FOTOGRAFICO





LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 3								
PUNTO DE VENTA 1				ML		2,53		
PUNTO DE VENTA 2				ML		0,83		
PUNTO DE VENTA 3				ML		2,61		
PUNTO DE VENTA 4				ML		2,72		
PUNTO DE VENTA 5				ML		0,85		
PUNTO DE VENTA 6				ML		2,71		
CANTIDAD CONTRACTUAL			23,10					
ACUMULADO ANTERIOR			10,85					
ACUMULADO PRESENTE ACTA			23,10					
TOTAL PRESENTE ACTA:								12,25

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

ALCALDIA DE BARRANQUILLA — urba caribe 24

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 08

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	01/05/2025 AL 31/05/2025		

CAPITULO:	Capitulo - NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM:	NP.89	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACETA VERTICAL de 1,20 DE ALTURA, ANCHO DE 60*60 E INFERIOR 40*40, EN CONCRETO AVANZADO

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



REGISTRO FOTOGRAFICO





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 5				UND	8.00			
CANTIDAD CONTRACTUAL			49.00					
ACUMULADO ANTERIOR			41.00					
ACUMULADO PRESENTE ACTA			49.00					
TOTAL PRESENTE ACTA:								8.00

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA | urbe caribe 24


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 08

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	01/05/2025 AL 31/05/2025		
CAPITULO: Capitulo - NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM: NP.90	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACETA DE 1.2MT*1.2*0.80M DE ALTURA, FABIRCADA EN FIBRA DE VIDRIO

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

TRAMO 5



REGISTRO FOTOGRAFICO





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 5				UND	20.00			

CANTIDAD CONTRACTUAL	130.00
ACUMULADO ANTERIOR	100.00
ACUMULADO PRESENTE ACTA	120.00

TOTAL PRESENTE ACTA:	20.00

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA


Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA — urbacaribe S.A.

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 08

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	01/05/2025 AL 31/05/2025		
CAPITULO: Capítulo - NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM: NP.93	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINSITRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ANGULO EN ALUMINIO DE 1""1/8, PARA CONTENCION DEL PISO EN CAUCHO CONTRA EL BORDE DE LA PLACA

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

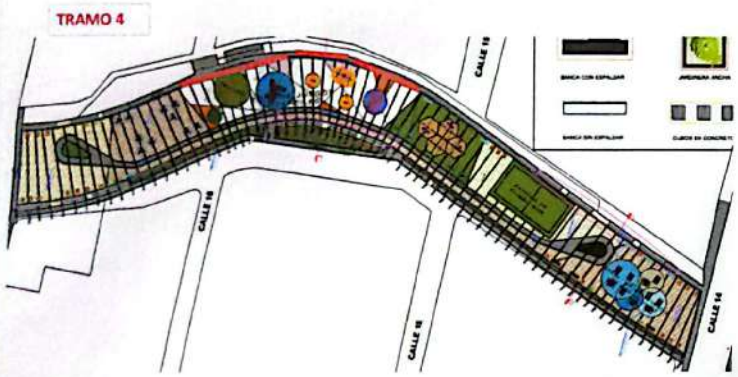

REGISTRO FOTOGRAFICO





LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 4								
V293-V314	66.80			ML		66.80		
CANTIDAD CONTRACTUAL			137,13					
ACUMULADO ANTERIOR			70,33					
ACUMULADO PRESENTE ACTA			137,13					
TOTAL PRESENTE ACTA:								66.80

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 8

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	01/05/2025 AL 31/05/2025		


CAPITULO:	Capitulo - NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP.95	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SACANUCLEOS PARA DESAGUES DE 4"

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar cortes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

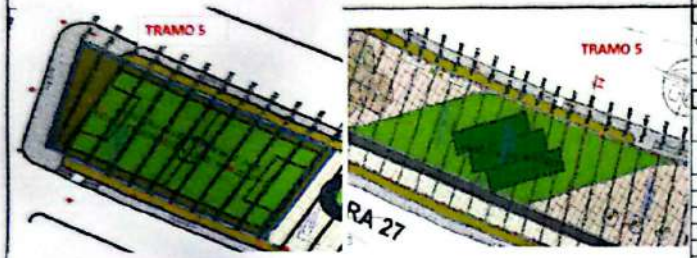

REGISTRO FOTOGRAFICO

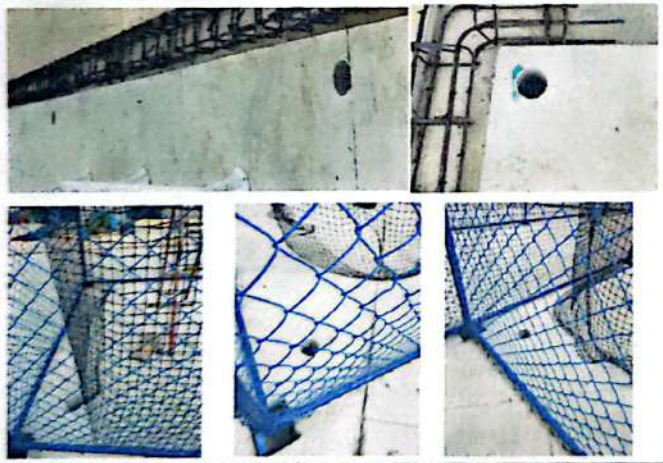

LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 1								
CANCHA SINTETICA				UND	2.00			
TRAMO 5								
CANCHA FUTBOL V353-V360				UND	6.00			
JAULAS DE BATEO V391-V397				UND	6.00			
CANTIDAD CONTRACTUAL			22.00					
ACUMULADO ANTERIOR			8.00					
ACUMULADO PRESENTE ACTA			22.00					
TOTAL PRESENTE ACTA:								14.00

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA — urba caribe 24

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 08

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	01/05/2025 AL 31/05/2025		
CAPITULO: Capítulo - NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM: NP.98	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINSITRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MURO EN BLOQUE ABUZARDADO DE 15 CM DE ANCHO Y 40 CM DE ALTURA PARA CONFORMACION DE JARDINERAS, SE INCLUYE EL RELLENO DE DOVELAS Y REFORZAMIENTO REQUERIDO (NO INCLUYE ANCLAJE EPOXICO)

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)


(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

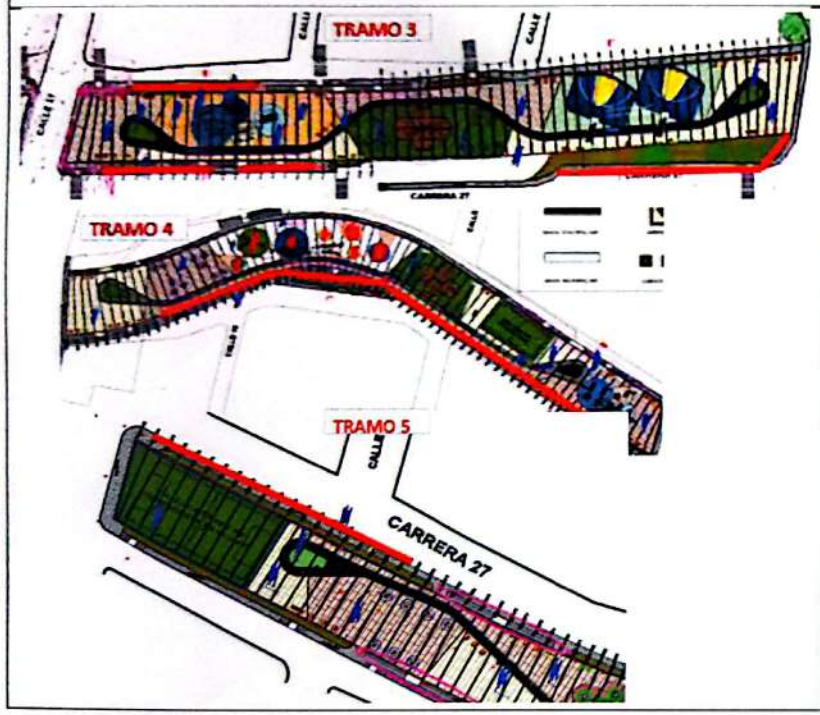

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 3									
COSTADO DERECHO	V214-V221	19,85			ML	1,00	19,85		
	V236-V239	12,2			ML	1,00	12,20		
	VIG 252-VIG 259	26,2			ML	1,00	26,20		
	VIG 260 (ENTRADA DE AGUA)	4			ML	2,00	8,00		
	VIG 260-VIG 270	26			ML	1,00	26,00		
	VIG 272-VIG 275	11			ML	1,00	11,00		
COSTADO IZQUIERDO	V217-V229	19,5			ML	1,00	19,50		
TRAMO 4									
COSTADO DERECHO	V288-V321	96,55			ML	1,00	96,55		
	V329-V330	10			ML	1,00	10,00		
	V330-V346	14,8			ML	1,00	14,80		
TRAMO 5									
COSTADO IZQUIERDO	VIG 349- VIG 365	46,5			ML	1,00	46,50		


Powered by CamScanner

REGISTRO FOTOGRAFICO

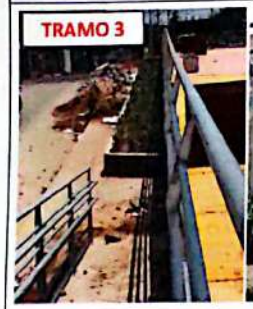





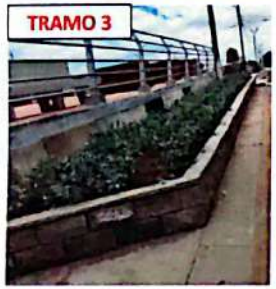



CANTIDAD CONTRACTUAL	1816.07
ACUMULADO ANTERIOR	779.03
ACUMULADO PRESENTE ACTA	1069.63

TOTAL PRESENTE ACTA: 290,60

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA


Powered by CamScanner

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 08

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1			OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	01/05/2025 AL 31/05/2025				
CAPITULO:	Capítulo - NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP.99	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINSITRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MURO EN BLOQUE LISO DE 15 CM DE ANCHO Y 40 CM DE ALTURA PARA CONFORMACION DE JARDINERAS HACIA EL CANAL, SE INCLUYE EL RELLENO DE DOBELAS Y REFORZAMIENTO REQUERIDO (NO INCLUYE ANCLAJE EPOXICO)

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)



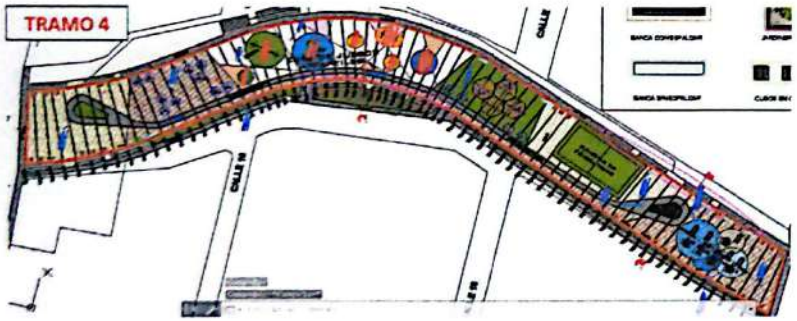

LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	TRAMO	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 3								
COSTADO DERECHO ENTRE VIGAS 217 A 275		0,94		ML		0,94		
		0,97		ML		0,97		
		1,06		ML		1,06		
		1,07		ML		1,07		
		1,09		ML		1,09		
		1,12		ML		1,12		
		0,97		ML		0,97		
		1,11		ML		1,11		
		1,10		ML		1,10		
		1,06		ML		1,06		
		1,08		ML		1,08		
		1,02		ML		1,02		
		1,10		ML		1,10		
		1,09		ML		1,09		
		1,04		ML		1,04		
		0,65		ML		0,65		
		1,08		ML		1,08		
		1,10		ML		1,10		
		1,10		ML		1,10		
		1,10		ML		1,10		
		1,08		ML		1,08		
		0,70		ML		0,70		
		1,08		ML		1,08		
		1,12		ML		1,12		
		1,09		ML		1,09		
		1,09		ML		1,09		
		0,99		ML		0,99		
		1,09		ML		1,09		
		1,13		ML		1,13		
		1,07		ML		1,07		
		0,81		ML		0,81		
		0,80		ML		0,80		
		0,76		ML		0,76		
		0,72		ML		0,72		

Powered by CamScanner






	1,16		ML		1,16		
	1,17		ML		1,17		
	1,02		ML		1,02		
	1		ML		1		
	1,1		ML		1,1		
	1,13		ML		1,13		
	1,15		ML		1,15		
	1,1		ML		1,1		
	1,2		ML		1,2		
	1,22		ML		1,22		
	1,14		ML		1,14		
	1,15		ML		1,15		
	1,1		ML		1,1		
	1,12		ML		1,12		
	1,19		ML		1,19		
	1,08		ML		1,08		
	1,06		ML		1,06		
	1,15		ML		1,15		
	0,74		ML		0,74		
	0,63		ML		0,63		
	0,52		ML		0,52		
	0,32		ML		0,32		
	1		ML		1		
COSTADO DERECHO V276-V348 (NO INCLUYE VENTANAS DE ENTRADAS DE AGUA)	1,12		ML		1,12		
	0,82		ML		0,82		
	1,1		ML		1,1		
	1,04		ML		1,04		
	1,13		ML		1,13		
	1,4		ML		1,4		
	1,11		ML		1,11		
	0,45		ML		0,45		
	0,5		ML		0,5		
	0,5		ML		0,5		
	0,7		ML		0,7		
	0,64		ML		0,64		
	1,07		ML		1,07		
	0,94		ML		0,94		
	1,16		ML		1,16		
	1,06		ML		1,06		
	1,12		ML		1,12		
	1,07		ML		1,07		
	1,09		ML		1,09		
	1,03		ML		1,03		
	1,12		ML		1,12		
	1,10		ML		1,10		
	1,10		ML		1,10		
	0,43		ML		0,43		
	1,10		ML		1,10		
	1,00		ML		1,00		
	1,05		ML		1,05		
	1,03		ML		1,03		
	0,38		ML		0,38		
	0,80		ML		0,80		
	0,35		ML		0,35		
	0,34		ML		0,34		
	0,27		ML		0,27		
	0,27		ML		0,27		
	0,55		ML		0,55		
	0,91		ML		0,91		
	0,45		ML		0,45		

Powered by CamScanner

REGISTRO FOTOGRAFICO



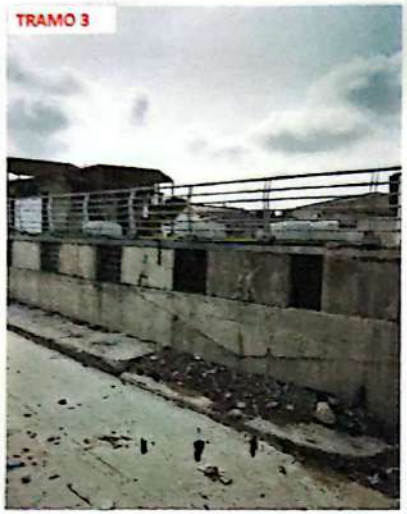



COSTADO IZQUIERDO ENTRE VIGAS 240 Y 275, NO INCLUYE ENTRADAS DE AGUA		0,72		ML		0,72		
		0,74		ML		0,74		
		0,68		ML		0,68		
		0,65		ML		0,65		
		0,63		ML		1		
		0,64		ML		0,64		
		0,64		ML		0,64		
		0,70		ML		0,70		
		0,74		ML		0,74		
		0,76		ML		0,76		
		0,81		ML		0,81		
		0,88		ML		0,88		
		0,93		ML		0,93		
		0,97		ML		0,97		
		1,07		ML		1,07		
		1,12		ML		1,12		
		1,15		ML		1,15		
		1,20		ML		1,20		
		1,22		ML		1,22		
		1,26		ML		1,26		
		1,27		ML		1,27		
		1,12		ML		1,12		
		1,02		ML		1,02		
		0,91		ML		0,91		
		0,88		ML		0,88		
		0,64		ML		0,64		
TRAMO 4								
COSTADO IZQUIERDO V276-V348		1,13		ML		1,13		
		1,1		ML		1,1		
		1,09		ML		1,09		
		0,65		ML		0,65		
		0,36		ML		0,36		
		1		ML		1		
		1,07		ML		1,07		
		1,13		ML		1,13		
		1,09		ML		1,09		
		1,1		ML		1,1		
		1,1		ML		1,1		
		1,11		ML		1,11		
		1,15		ML		1,15		
		1,15		ML		1,15		
		1,11		ML		1,11		
		1,13		ML		1,13		
		1,1		ML		1,1		
		1,15		ML		1,15		
		1,18		ML		1,18		
		1,12		ML		1,12		
		1,07		ML		1,07		
		1,07		ML		1,07		
		1,08		ML		1,08		
		1,04		ML		1,04		
		0,46		ML		0,46		
		0,34		ML		0,34		
		0,56		ML		0,56		
		1,1		ML		1,1		
		0,75		ML		0,75		
		1,1		ML		1,1		
		1,07		ML		1,07		

Powered by CamScanner

		0,76		ML		0,76			
		0,52		ML		0,52			
		0,36		ML		0,36			
		0,66		ML		0,66			
		0,84		ML		0,84			
		0,84		ML		0,84			

CANTIDAD CONTRACTUAL	561,26
ACUMULADO ANTERIOR	189,48
ACUMULADO PRESENTE ACTA	335,97

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TOTAL PRESENTE ACTA:	146,49
OBSERVACIONES:	

Powered by CamScanner


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA | urbanizadora caribe 24

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 08

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	01/05/2025 AL 31/05/2025		

CAPITULO:	Capítulo - NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM:	NP.102	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO DE SIKA 1 EN REVOQUES PARA IMPERMEABILIZACION DE JARDINERAS

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

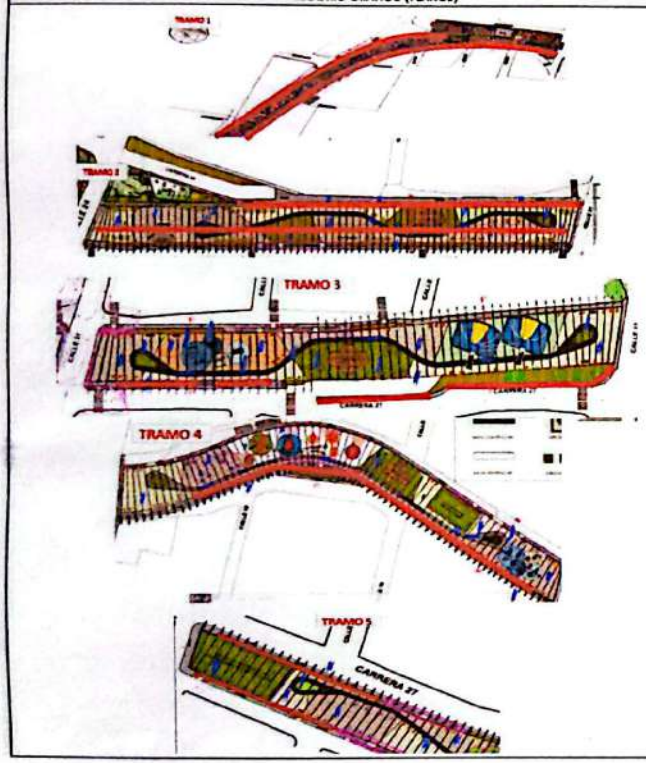

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 1									
COSTADO DERECHO	V1-V11				M2			7.16	
	V22-V50				M2			35.56	
	V52-V54				M2			3.48	
	V69-V97				M2			31.60	
	V112-PARQUE EXISTENTE CLL 26				M2			36.10	
	EXISTENTE CALLE 25-V137				M2			15.37	
COSTADO IZQUIERDO	V1-V19				M2			19.46	
	V33-V68				M2			42.74	
	V71-V75				M2			5.33	
	V92-V94				M2			3.57	
	V98-V100				M2			4.96	
TRAMO 2									
COSTADO DERECHO	V143-V165				M2			28.78	
	V179-V199				M2			20.48	
	V203-V213				M2			6.61	
COSTADO IZQUIERDO	V140-V163				M2			29.97	
	FRENTE A LA RAMPA V170-V182				M2			10.14	
	V183-V199				M2			14.84	
	V200-V207				M2			8.67	
TRAMO 3									
COSTADO DERECHO	V216-V222				M2			10.36	
	V236-V239				M2			5.58	
	V252-V259				M2			6.88	
	V260-V275				M2			24.00	
	V275-V269				M2			4.20	
	V259 ENTRADA DE AGUA				M2			1.32	
	V260 ENTRADA DE AGUA				M2			1.32	
COSTADO IZQUIERDO	V217-V229				M2			7.80	
TRAMO 4									
COSTADO DERECHO	V288-V321				M2			38.62	
	V330-V346				M2			5.92	
	V329-V330				M2			4.00	

Powered by CamScanner

REGISTRO FOTOGRAFICO

















TRAMO 5									
COSTADO IZQUIERDO	VIG 349- VIG 365				M2			18.60	
COSTADO DERECHO	VIGA 349 A VIGA 354				M2			6.00	

CANTIDAD CONTRACTUAL	1271,41
ACUMULADO ANTERIOR	0.00
ACUMULADO PRESENTE ACTA	459,42

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TOTAL PRESENTE ACTA: 459,42

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

ALCALDIA DE BARRANQUILLA | urbacaribe 24


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 08

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	01/05/2025 AL 31/05/2025		


CAPITULO:	Capítulo - NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP.105	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SACANUCLEOS PARA DESAGUES 21/2"" Y 11/2"

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

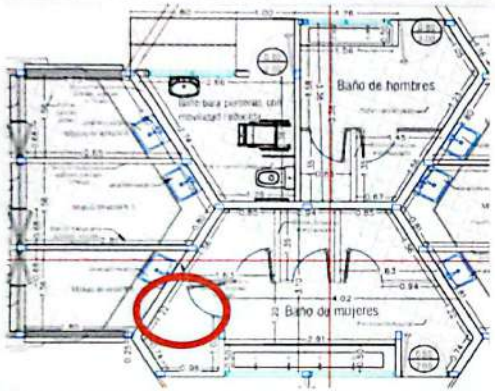

REGISTRO FOTOGRAFICO

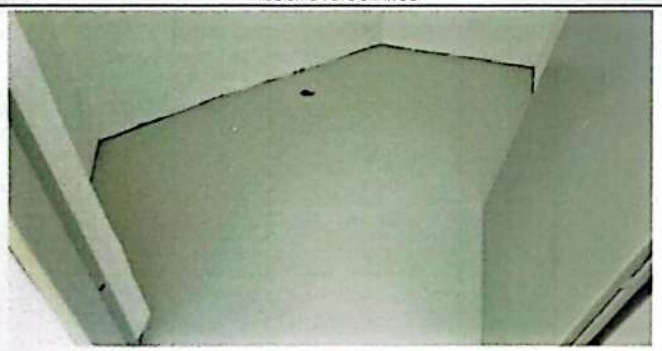

LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 1								
MODULO DE SERVICIO								
CUARTO ELECTRICO				UND	1,00			
CANTIDAD CONTRACTUAL			2.00					
ACUMULADO ANTERIOR			0.00					
ACUMULADO PRESENTE ACTA			1.00					
TOTAL PRESENTE ACTA:								1,00

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA — urba caribe 24

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 08

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1			OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	01/05/2025 AL 31/05/2025				
CAPITULO:	Capítulo - MAMPOSTERIA	CÓDIGO DEL ITEM:	NP.106	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	ALFAJIA EN CONCRETO DE ANCHO 15 CM, ALTURA 8 CM, REFUERZO 2 VARILLAS DE 1/4 Y ESTRIBOS DE 1/4 CADA 15 CM. INCLUYE BISEL EN LA CARA INFERIOR INTERNA

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

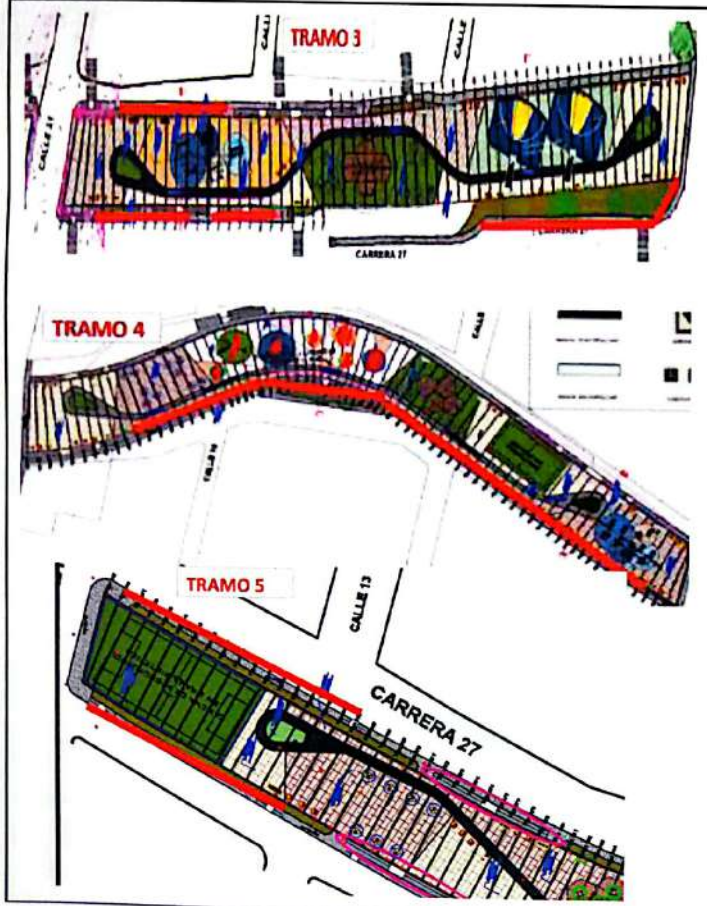

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 3									
COSTADO DERECHO	VIG 214-VIG 221	19,85			ML	1,00	19,85		
	VIG 236-VIG239	12,2			ML	1,00	12,20		
	VIG 252-VIG 259	26,2			ML	1,00	26,20		
	VIG 260 (ENTRADA DE AGUA)	4			ML	2,00	8,00		
	VIG 260-VIG 270	26			ML	1,00	26,00		
	VIG 272-VIG 275	11			ML	1,00	11,00		
COSTADO IZQUIERDO	VIG 217-VIG 229	19,5			ML	1,00	19,50		
TRAMO 4									
COSTADO DERECHO	VIG 288-VIG 321	96,55			ML	1,00	96,55		
	VIG 329-VIG 330	10			ML	1,00	10,00		
	VIG 330-VIG 346	14,8			ML	1,00	14,80		
TRAMO 5									
COSTADO IZQUIERDO	VIG 349- VIG 365	46,5			ML	1,00	46,50		
COSTADO DERECHO	VIG 349 A VIG 354	15			ML	1,00	15,00		


Powered by CamScanner

REGISTRO FOTOGRAFICO







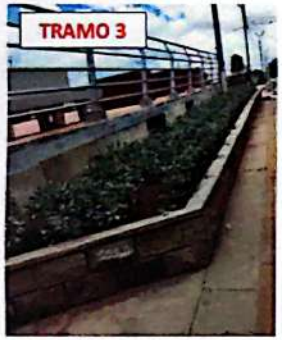



CANTIDAD CONTRACTUAL	1746,07
ACUMULADO ANTERIOR	761,81
ACUMULADO PRESENTE ACTA	1067,41
OBRA A EJECUTAR	678,66

TOTAL PRESENTE ACTA:	305,60

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	*DIRECTOR DE OBRA*	DIRECTOR DE INTERVENTORIA


Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA — urba caribe 24

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 08

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	01/05/2025 AL 31/05/2025		
CAPITULO: Capítulo - NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM: NP.107	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINSITRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MURO EN BLOQUE CALADO DE 20*20 PARA CIERRE DE VENTANAS DE RESPIRACION DEL CANAL

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

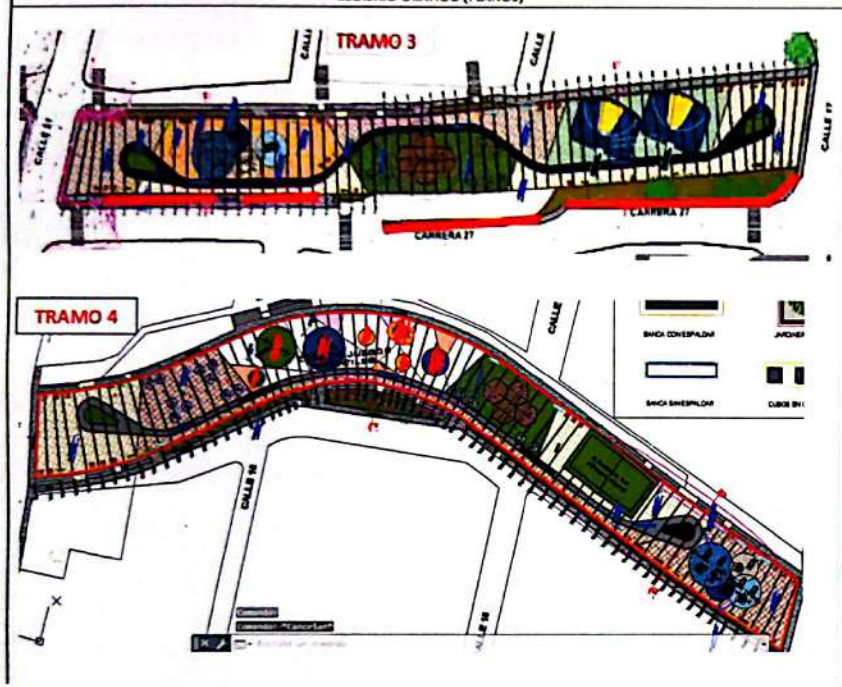

LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 2								
COSTADO IZQUIERDO								
ENTRADA DE AGUA VIG 183 -VIG 186		0,78	1,01	M2	1,00		0,79	
		1,07	0,80	M2	1,00		0,86	
		0,99	1,07	M2	1,00		1,06	
TRAMO 3								
COSTADO DERECHO ENTRE VIGAS 217 A 275		0,94	1,17	M2	1,00		1,10	
		0,97	1,17	M2	1,00		1,13	
		1,06	1,16	M2	1,00		1,23	
		1,07	1,08	M2	1,00		1,16	
		1,09	1,11	M2	1,00		1,21	
		1,12	1,10	M2	1,00		1,23	
		0,97	1,06	M2	1,00		1,03	
		1,11	1,10	M2	1,00		1,22	
		1,10	1,08	M2	1,00		1,19	
		1,06	1,08	M2	1,00		1,14	
		1,08	0,87	M2	1,00		0,94	
		1,02	0,86	M2	1,00		0,88	
		1,10	0,92	M2	1,00		1,01	
		1,09	1,00	M2	1,00		1,09	
		1,04	0,99	M2	1,00		1,03	
		0,65	1,15	M2	1,00		0,75	
		1,08	1,18	M2	1,00		1,27	
		1,10	1,23	M2	1,00		1,35	
		1,10	1,23	M2	1,00		1,35	
		1,10	1,2	M2	1,00		1,32	
		1,08	1,14	M2	1,00		1,23	
		0,70	1,03	M2	1,00		0,72	
		1,08	0,93	M2	1,00		1,00	
		1,12	0,85	M2	1,00		0,95	

Powered by CamScanner







COSTADO IZQUIERDO V274-V348		1,08	0,93	M2	1,00		1,00
		1,04	0,85	M2	1,00		0,88
		0,46	0,70	M2	1,00		0,32
		0,34	0,67	M2	1,00		0,23
		0,56	1,10	M2	1,00		0,62
		1,1	1,07	M2	1,00		1,18
		0,75	1,05	M2	1,00		0,79
		1,1	1,15	M2	1,00		1,27
		1,07	1,14	M2	1,00		1,22
		1,16	1,06	M2	1,00		1,23
		1,17	1,10	M2	1,00		1,29
		1,02	1,06	M2	1,00		1,08
		1	1,10	M2	1,00		1,10
		1,1	1,09	M2	1,00		1,20
		1,13	1,09	M2	1,00		1,23
		1,15	1,06	M2	1,00		1,22
		1,1	1,17	M2	1,00		1,29
		1,2	1,17	M2	1,00		1,40
		1,22	1,16	M2	1,00		1,42
		1,14	1,08	M2	1,00		1,23
		1,15	1,11	M2	1,00		1,28
		1,1	1,10	M2	1,00		1,21
		1,12	1,06	M2	1,00		1,19
		1,19	1,10	M2	1,00		1,31
		1,08	1,08	M2	1,00		1,17
		1,06	1,08	M2	1,00		1,14
		1,15	0,87	M2	1,00		1,00
		0,74	0,86	M2	1,00		0,64
		0,63	0,92	M2	1,00		0,58
		0,52	1,00	M2	1,00		0,52
		0,32	0,99	M2	1,00		0,32
		1	1,15	M2	1,00		1,15
COSTADO DERECHO V276-V348 (NO INCLUYE VENTANAS DE ENTRADAS DE AGUA)		1,12	1,23	M2	1,00		1,38
		0,82	1,23	M2	1,00		1,01
		1,1	1,2	M2	1,00		1,32
		1,04	1,14	M2	1,00		1,19
		1,13	1,03	M2	1,00		1,16
		1,4	0,93	M2	1,00		1,30
		1,11	0,85	M2	1,00		0,94
		0,45	0,70	M2	1,00		0,32
		0,5	0,67	M2	1,00		0,34
		0,5	1,10	M2	1,00		0,55
		0,7	1,07	M2	1,00		0,75
		0,64	1,05	M2	1,00		0,67
		1,07	1,15	M2	1,00		1,23
		0,94	1,14	M2	1,00		1,07
		1,16	1,06	M2	1,00		1,23
		1,06	1,10	M2	1,00		1,17
		1,12	1,06	M2	1,00		1,19
		1,07	1,10	M2	1,00		1,18
		1,09	1,09	M2	1,00		1,19
		1,03	1,09	M2	1,00		1,12
		1,12	1,06	M2	1,00		1,19
		1,10	0,70	M2	1,00		0,77
		1,10	0,67	M2	1,00		0,74
		0,43	1,10	M2	1,00		0,47
		1,10	1,07	M2	1,00		1,18
		1,00	1,14	M2	1,00		1,14
		1,05	1,06	M2	1,00		1,11
		1,03	1,10	M2	1,00		1,13

Powered by CamScanner

REGISTRO FOTOGRAFICO







		1,09	0,70	M2	1,00		0,76	
		1,09	0,67	M2	1,00		0,73	
		0,99	1,10	M2	1,00		1,09	
		1,09	1,07	M2	1,00		1,17	
		1,13	1,05	M2	1,00		1,19	
		1,07	1,15	M2	1,00		1,23	
		0,81	1,14	M2	1,00		0,92	
		0,80	1,06	M2	1,00		0,85	
		0,76	1,10	M2	1,00		0,84	
		0,72	1,06	M2	1,00		0,76	
		0,72	1,10	M2	1,00		0,79	
		0,74	1,09	M2	1,00		0,81	
		0,68	1,09	M2	1,00		0,74	
		0,65	1,06	M2	1,00		0,69	
		0,63	1,05	M2	1,00		0,66	
		0,64	1,10	M2	1,00		0,70	
		0,64	1,11	M2	1,00		0,71	
		0,70	1,18	M2	1,00		0,83	
COSTADO IZQUIERDO ENTRE VIGAS 240 Y 275, NO INCLUYE ENTRADAS DE AGUA		0,74	1,03	M2	1,00		0,76	
		0,76	1,06	M2	1,00		0,81	
		0,81	1,07	M2	1,00		0,87	
		0,88	1,10	M2	1,00		0,97	
		0,93	1,08	M2	1,00		1,00	
		0,97	1,10	M2	1,00		1,07	
		1,07	1,08	M2	1,00		1,16	
		1,12	1,09	M2	1,00		1,22	
		1,15	1,06	M2	1,00		1,22	
		1,20	1,03	M2	1,00		1,24	
		1,22	1,09	M2	1,00		1,33	
		1,26	1,01	M2	1,00		1,27	
		1,27	1,07	M2	1,00		1,36	
		1,12	1,20	M2	1,00		1,34	
		1,02	1,21	M2	1,00		1,23	
		0,91	0,75	M2	1,00		0,68	
		0,88	0,85	M2	1,00		0,75	
		0,64	1,10	M2	1,00		0,70	
TRAMO 4								
		1,13	1,17	M2	1,00		1,32	
		1,1	1,17	M2	1,00		1,29	
		1,09	1,16	M2	1,00		1,26	
		0,65	1,08	M2	1,00		0,70	
		0,36	1,11	M2	1,00		0,40	
		1	1,10	M2	1,00		1,10	
		1,07	1,06	M2	1,00		1,13	
		1,13	1,10	M2	1,00		1,24	
		1,09	1,08	M2	1,00		1,18	
		1,1	1,08	M2	1,00		1,19	
		1,1	0,87	M2	1,00		0,96	
		1,11	0,86	M2	1,00		0,95	
		1,15	0,92	M2	1,00		1,06	
		1,15	1,00	M2	1,00		1,15	
		1,11	0,99	M2	1,00		1,10	
		1,13	1,15	M2	1,00		1,30	
		1,1	1,18	M2	1,00		1,30	
		1,15	1,23	M2	1,00		1,41	
		1,18	1,23	M2	1,00		1,45	
		1,12	1,2	M2	1,00		1,34	
		1,07	1,14	M2	1,00		1,22	
		1,07	1,03	M2	1,00		1,10	

Powered by CamScanner

TRAMO 4



TRAMO 4



	0,38	1,06	M2	1,00		0,40	
	0,80	1,10	M2	1,00		0,88	
	0,35	1,09	M2	1,00		0,38	
	0,34	1,09	M2	1,00		0,37	
	0,27	1,06	M2	1,00		0,29	
	0,27	1,17	M2	1,00		0,32	
	0,55	1,17	M2	1,00		0,64	
	0,91	1,16	M2	1,00		1,06	
	0,45	1,08	M2	1,00		0,49	
	0,76	1,11	M2	1,00		0,84	
	0,52	1,10	M2	1,00		0,57	
	0,36	1,06	M2	1,00		0,38	
	0,66	1,11	M2	1,00		0,73	
	0,84	1,11	M2	1,00		0,93	
	0,84	1,11	M2	1,00		0,93	

CANTIDAD CONTRACTUAL	638,48	
ACUMULADO ANTERIOR	147,59	
ACUMULADO PRESENTE ACTA	306,38	
TOTAL PRESENTE ACTA:		158,79

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA — urba caribe 24


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 08

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	01/05/2025 AL 31/05/2025		


CAPITULO:	Capítulo - NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM:	NP.110	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINSITRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ESTUCO PLASTICO


REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

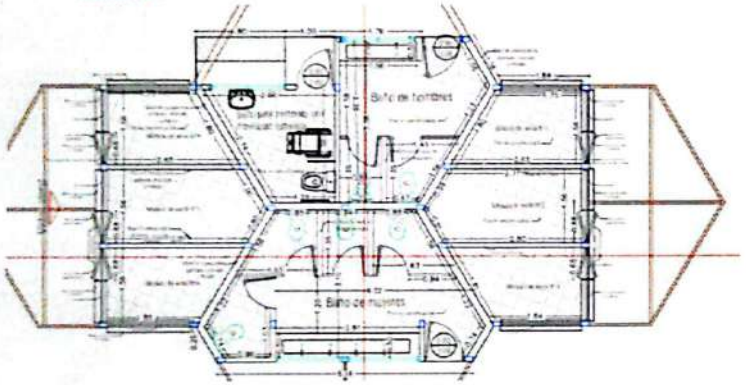

REGISTRO FOTOGRAFICO

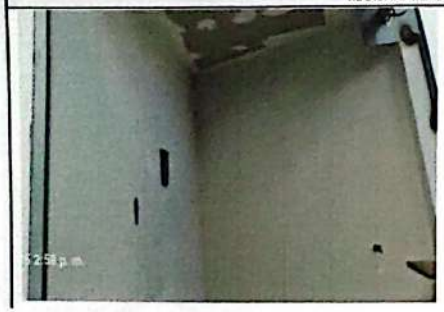


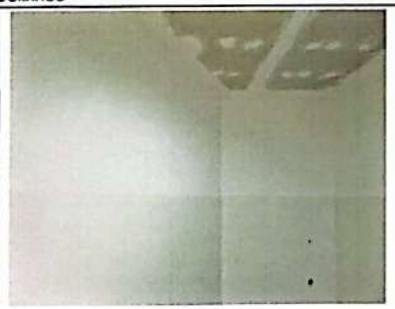

LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 3								
PUNTO DE VENTA 1	1,77		3,12	M2	1		5,52	
	1,76		1,22	M2	1		2,15	
	0,77		1,22	M2	1		0,94	
	2,74		2,6	M2	1		7,12	
PUNTO DE VENTA 2	1,78		3,22	M2	1		5,73	
	2,74		2,6	M2	1		7,12	
	2,82		2,58	M2	1		7,28	
	0,84		1,22	M2	1		1,02	
PUNTO DE VENTA 3	1,79		3,15	M2	1		5,64	
	2,82		2,58	M2	1		7,28	
	1,78		1,22	M2	1		2,17	
	0,82		1,22	M2	1		1,00	
BAÑO DISCAPACITADO	1,24		1,15	M2	1		1,43	
	2,6		2,5	M2	1		6,50	
	2,83		3,2	M2	1		9,06	
	2,64		3,04	M2	1		8,03	
BAÑO HOMBRES	1,64		1,56	M2	1		2,56	
	2,93		2,49	M2	1		7,30	
	1,03		3,1	M2	1		3,19	
	2,57		3,15	M2	1		8,10	
	3,43		3,2	M2	1		10,98	
BAÑO MUJERES	3,05		1,56	M2	1		4,76	
	1,58		2,75	M2	1		4,35	
	0,89		2,3	M2	1		2,05	
	1,72		3,17	M2	1		5,45	
	2,91		3,17	M2	1		9,22	
	0,57		3,1	M2	2		1,77	
	0,79		3,2	M2	1		2,53	
	2,73		3,25	M2	1		8,87	
CUARTO TECNICO	1,71		3,15	M2	1		5,39	
	0,85		3,2	M2	1		2,72	
	1,08		3,15	M2	1		3,40	
	1,18		3,08	M2	1		3,63	
PUNTO DE VENTA 4	1,85		1,15	M2	1		2,13	
	1,76		1,65	M2	1		2,90	
	2,81		2,7	M2	1		7,59	
	0,84		1,15	M2	1		0,97	
PUNTO DE VENTA 5	1,81		3,23	M2	1		5,85	
	2,77		2,71	M2	1		7,51	
	2,81		2,7	M2	1		7,59	
	0,81		1,15	M2	1		0,93	
MODULO 6	2,77		2,71	M2	1		7,51	

Powered by CamScanner



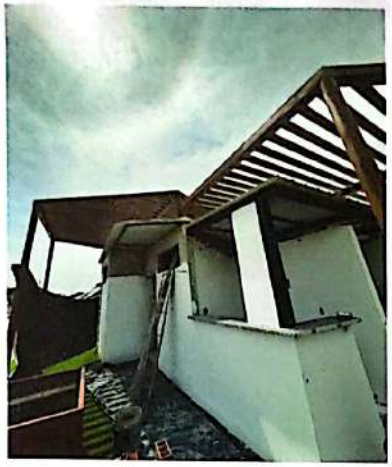

	1,75		3,1	M2	1		5,43	
	1,72		1,2	M2	1		2,06	
	0,75		1,2	M2	1		0,90	
FACHADA	5,16		3,13	M2	1		16,15	
	0,89		3,17	M2	1		2,82	
	1,94		1,2	M2	1		2,33	
	0,95		1,2	M2	1		1,14	
	0,9		1,2	M2	1		1,08	
	0,85		1,2	M2	1		1,02	
	1,85		1,2	M2	1		2,22	
	1,14		1,2	M2	1		1,37	
	2,79		3,15	M2	1		8,79	
	1		3,15	M2	1		3,15	
	2,83		3,14	M2	1		8,89	
	1,88		1,24	M2	1		2,33	
	0,96		1,24	M2	1		1,19	
	0,94		1,21	M2	1		1,14	
	0,95		1,22	M2	1		1,16	
	1,97		1,22	M2	1		2,40	
	0,86		3,08	M2	1		2,65	
	5,34		0,57	M2	1		3,04	
	5,32		0,48	M2	1		2,55	
DESCUENTO DE ENCHAPE							-49,23	

CANTIDAD CONTRACTUAL	461,70
ACUMULADO ANTERIOR	229,92
ACUMULADO PRESENTE ACTA	461,70

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TOTAL PRESENTE ACTA:	231,78
OBSERVACIONES:	


Powered by CamScanner

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 08

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PUBUCOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	01/05/2025 AL 31/05/2025		
CAPITULO:	Capitulo - NO PREVISTOS	CÓDIGO DEL ITEM: NP.113	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE MAQUINAS BIOSALUDABLES DE PARQUE EXISTENTE EN TRAMO 1 Y 2. INCLUYE CAMBIO DE TORNILLERIA POR TORNILLERIA ACERADA, GRATEADA DE ESTRUCTURA METALICA, RETIRO DE OXIDO APLICACION DE ANTICORROSIVO Y ACABADO FINAL Y CAMBIO DE PIEZAS EN CASO DE REQUERIRLO.

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografias como evidencias de obra)

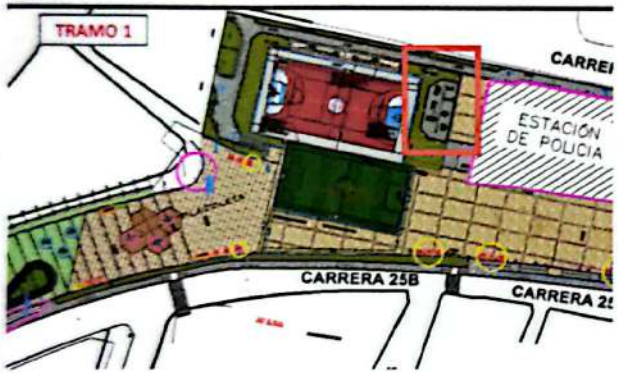

REGISTRO FOTOGRAFICO





LOCALIZACION	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 1								
ZONA DE BIOSALUDABLES VIGAS ESPECIALES				UND	6.00			
CANTIDAD CONTRACTUAL			12.00					
ACUMULADO ANTERIOR			6.00					
ACUMULADO PRESENTE ACTA			12.00					
TOTAL PRESENTE ACTA:								6.00

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 08

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	01/05/2025 AL 31/05/2025		

CAPITULO:	Capítulo - NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM:	NP.115	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DEMOLICIÓN CONCRETO REFORZADO DE 17 X 0,30 X1,2 MTS

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

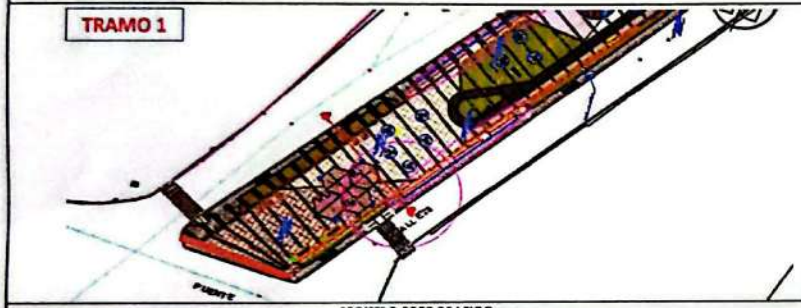

REGISTRO FOTOGRAFICO







LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 1								
VIG 1				GB	1,00			
CANTIDAD CONTRACTUAL			1,00					
ACUMULADO ANTERIOR			0,00					
ACUMULADO PRESENTE ACTA			1,00					
TOTAL PRESENTE ACTA:								1,00

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA


Powered by CamScanner

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 08

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1			OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	01/05/2025 AL 31/05/2025				
CAPITULO:	Capitulo - NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM:	NP.119	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 4"

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

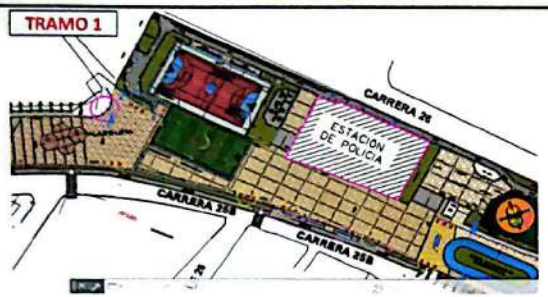

REGISTRO FOTOGRAFICO







LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 1								
CANCHA SINTETICA DE FUTBOL	33.50			ML		33.50		
TRAMO 2								
DESAGUES JARDINERAS	12.95			ML		12.95		

CANTIDAD CONTRACTUAL	105.00	
ACUMULADO ANTERIOR	0.00	
ACUMULADO PRESENTE ACTA	46.45	
TOTAL PRESENTE ACTA:		46.45

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA — urbe caribe 24


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 08

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	01/05/2025 AL 31/05/2025		

CAPITULO:	Capítulo - NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM:	NP.116	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	CONSTRUCCIÓN DE DINTEL DE 15 X 10 CMS EN CONCRETO INCLUYE ACERO DE REFUERZO PARA VENTANAS Y PUERTAS EN MÓDULO DE SERVICIO

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

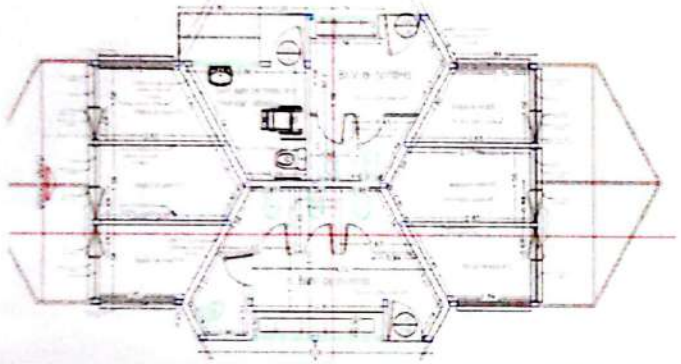

REGISTRO FOTOGRAFICO







LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 1								
MODULO DE SERVICIO								
BAÑO HOMBRES		2.30		ML		2.30		
BAÑO MUJERES		3.30		ML		3.30		
BAÑO DISCAPACITADOS		2.60		ML		2.60		
CUARTO ELECTRICO		0.80		ML		0.80		
TRAMO 3								
MODULO DE SERVICIO								
BAÑO HOMBRES		2.30		ML		2.30		
BAÑO MUJERES		3.30		ML		3.30		
BAÑO DISCAPACITADOS		2.60		ML		2.60		
CUARTO ELECTRICO		0.80		ML		0.80		

CANTIDAD CONTRACTUAL	25.00
ACUMULADO ANTERIOR	0.00
ACUMULADO PRESENTE ACTA	18.00
TOTAL PRESENTE ACTA:	18.00

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 08

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	01/05/2025 AL 31/05/2025		

CAPITULO:	CÓDIGO DEL ITEM:	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:
Capitulo - NO PREVISTO	NP.120	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MURO EN BLOQUE ABUZARDADO DE 15 CM DE ANCHO PARA CONFORMACIÓN DE RAMPAS, SE INCLUYE EL RELLENO DE DOVELAS CADA 40 CM, Y ACERO DE REFUERZO

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



REGISTRO FOTOGRAFICO



LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 2									
COSTADO IZQUIERDO	RAMPA DE ACCESO VIG 270- VIG 275				M2			9.80	
COSTADO DERECHO	RAMPA DE ACCESO VIG 270- VIG 275				M2			4.85	

CANTIDAD CONTRACTUAL	90.00
ACUMULADO ANTERIOR	0.00
ACUMULADO PRESENTE ACTA	14.65

TOTAL PRESENTE ACTA: 14.65

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA — urbacaribe 24

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 08

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	01/05/2025 AL 31/05/2025		
CAPITULO:	Capitulo - NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM: NP.121	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE FAJAS EN SUPER BOARD PARA CUBRIR ROLLO EN ESTERAS DE LOCALES

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

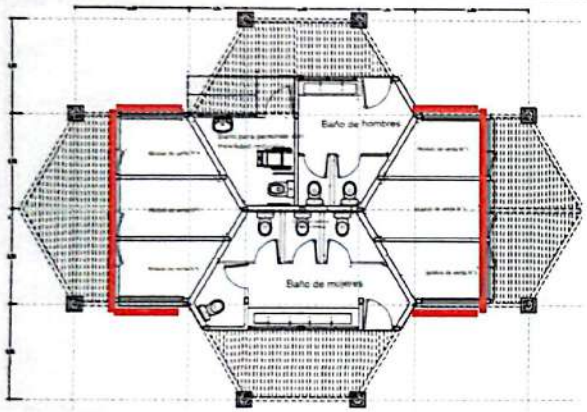

REGISTRO FOTOGRAFICO





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 1								
PUNTOS DE VENTAS INTERNO								
PUNTO DE VENTA 1	5,93			ML		5,93		
PUNTO DE VENTA 2	3,00			ML		3,00		
PUNTO DE VENTA 3	5,59			ML		5,59		
PUNTO DE VENTA 4	5,83			ML		5,83		
PUNTO DE VENTA 5	3,08			ML		3,08		
PUNTO DE VENTA 6	6,04			ML		6,04		
PUNTO DE VENTA EXTERNO								
PUNTO DE VENTA 1	3,10			ML		3,10		
PUNTO DE VENTA 2	1,50			ML		1,50		
PUNTO DE VENTA 3	2,91			ML		2,91		
PUNTO DE VENTA 4	3,06			ML		3,06		
PUNTO DE VENTA 5	1,54			ML		1,54		
PUNTO DE VENTA 6	3,14			ML		3,14		

Powered by CamScanner



CANTIDAD CONTRACTUAL	117,88
ACUMULADO ANTERIOR	0.00
ACUMULADO PRESENTE ACTA	44,72

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TOTAL PRESENTE ACTA:	44,72

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA — urbe caribe 24

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 08

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	01/05/2025 AL 31/05/2025		


CAPITULO:	Capítulo - NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM:	NP.122	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 12 CIRCUITOS

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)



REGISTRO FOTOGRAFICO

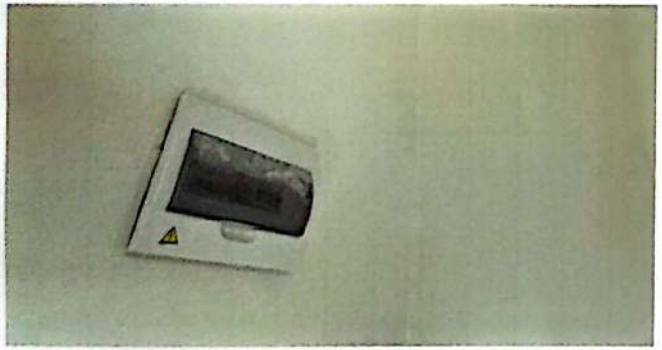

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 1								
MODULO 1				UND	1.00			

CANTIDAD CONTRACTUAL	2.00
ACUMULADO ANTERIOR	0.00
ACUMULADO PRESENTE ACTA	1.00

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TOTAL PRESENTE ACTA:	1.00

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA — urbacaribe 24


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 08

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	01/05/2025 AL 31/05/2025		

CAPITULO:	Capítulo - NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM:	NP.123	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MALLA DE NYLON PARA PROTECCIÓN DE MALLA ESLABONADA EN JAULAS DE BATEO

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

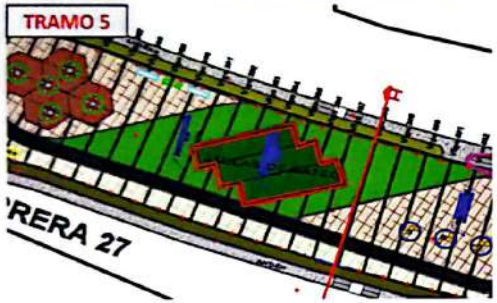

REGISTRO FOTOGRAFICO





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 5								
JALUA DE BATEO								
FRONTALES		3.00	3.00	M2	6.00		54.00	
LATERALES		12.00	3.00	M2	2.00		72.00	
LATERALES INTERMEDIOS		3.00	3.00	M2	4.00		36.00	
CANTIDAD CONTRACTUAL			198.00					
ACUMULADO ANTERIOR			0.00					
ACUMULADO PRESENTE ACTA			162.00					
TOTAL PRESENTE ACTA:								162.00

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA — urba caribe 24

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 08

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1			OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	01/05/2025 AL 31/05/2025				
CAPITULO:	Capítulo - NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM:	NP.124	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MALLA DE NYLON PARA CANCHA DE FUTBOL TENIS DE 9,5 DE LARGO X1,0 DE ALTO INCLUYE Y TUBERÍA DE 2" Y 2 MM PARA AMARRAR LA MALLA

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

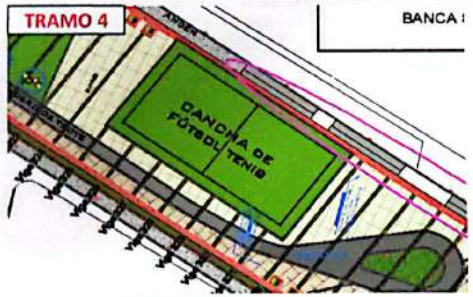

REGISTRO FOTOGRAFICO





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 4								
CANCHA DE FUTBOL TENIS				UN	1,00			

CANTIDAD CONTRACTUAL	1,00
ACUMULADO ANTERIOR	0,00
ACUMULADO PRESENTE ACTA	1,00

TOTAL PRESENTE ACTA:	1,00

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA | urbacaribe 24


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 08

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1			OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	01/05/2025 AL 31/05/2025				
CAPITULO:	Capítulo - NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM:	NP.125	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE BALONCESTO CON TUBERÍA GALVANIZADA Y TABLERO EN ACRÍLICO DE 10 MM, MALLAS Y AROS, CON CONTRAPESO PARA APOYO

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)


(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

TRAMO 3

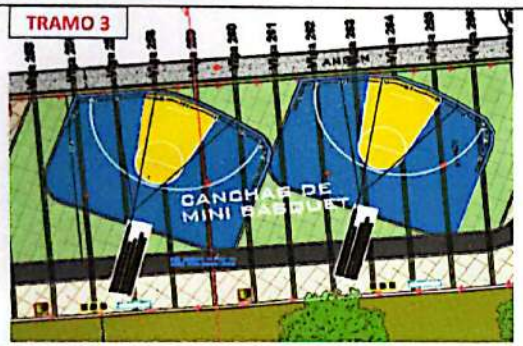

REGISTRO FOTOGRAFICO



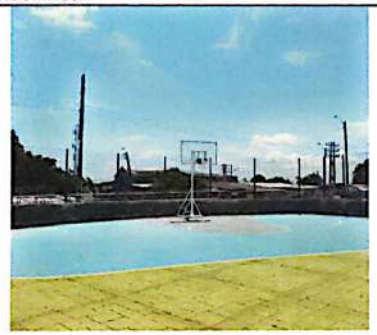

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 3				PAR	1.00			

CANTIDAD CONTRACTUAL	1.00
ACUMULADO ANTERIOR	0.00
ACUMULADO PRESENTE ACTA	1.00

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TOTAL PRESENTE ACTA: 1.00

OBSERVACIONES:


Powered by CamScanner

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 08

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1			OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	01/06/2025 AL 31/06/2025				
CAPITULO:	Capitulo - NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM:	NP.126	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DEMOLICION PLANTILLA DE CONCRETO CON ESPESORES ENTE 15 Y 30 CM

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

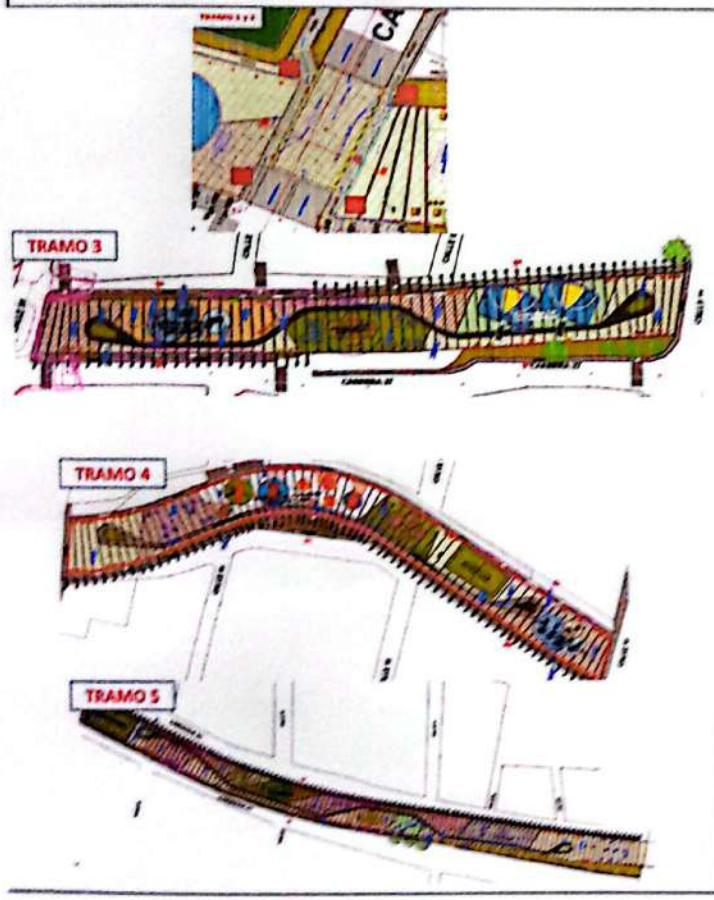

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES LONG (M)	DIMENSIONES ANCHO (M)	DIMENSIONES ALTURA (M)	UNID	CANT.	TOTALES ML	TOTALES M2	TOTALES M3
TRAMO 3									
BASES PORTICOS		3.00	1.25		M2	4.00		15.00	
TRAMO 3									
COSTADO DERECHO	VG16-VG6A	51.77	1.25		M2	1		64.71	
	VG46-VG47	23.50	1.25		M2	1		29.38	
	VG47-VG55	32.00	1.25		M2	1		39.65	
	VG63-VG69	24.30	1.6		M2	1		38.72	
COSTADO IZQUIERDO	VG217- VG226	44.9	1.15		M2	1		51.64	
	VG226- VG235	1.13	1		M2	1		1.13	
	VG95-VG76	15.6	0.75		M2	1		11.24	
TRAMO 4									
COSTADO DERECHO	VG85-VG6A	17	1.80		M2	1		27.20	
	VG84-VG20 INTERNO	96	1.35			1		115.40	
	VG83-VG20 EXTERNO	40	1.90		M2	1		64.10	
	VG84-VG14 ZONA DE LA VIRGEN	95	1.20		M2	1		98.80	
	VG17-VG18	1.38	1.60		M2	1		2.21	
	VG83-VG20	80	1.35		M2	1		21.20	
						1		1.35	
COSTADO IZQUIERDO	VG95-VG28	87.55	1.35		M2	1		117.45	
TRAMO 5									
COSTADO DERECHO	VG 350- VG 397	150	1.35		M2	1.35		45.35	
	VG 397 - VG 460	210	1.35		M2	1.35		205.35	
COSTADO IZQUIERDO	VG 350- VG 460	350	1.35		1.0	1.35		405.35	

Powered by CamScanner

REGISTRO FOTOGRAFICO













CANTIDAD CONTRACTUAL	1435.81
ACUMULADO ANTERIOR	0.00
ACUMULADO PRESENTE ACTA	1355.37

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TOTAL PRESENTE ACTA: 1.355,37

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA — urba caribe 24


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 08

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	01/05/2025 AL 31/05/2025		
CAPITULO:	Capítulo - NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM: NP.127	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE MALLAS EXISTENTES EN CANCHA MULTIPLE Y ZONA DE JUEGOS INFANTILES TRAMO 1 PARQUE EXISTENTE, INCLUYE PINTURA DE POSTES, ABRAZADERA, PUERTAS, INSTALACIÓN Y CAMBIO DE MALLAS DETERIORADAS

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

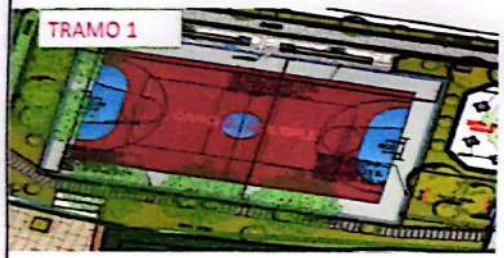

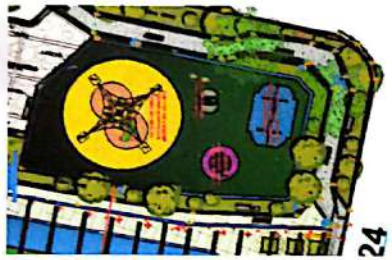

REGISTRO FOTOGRAFICO



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 1								
PARQUE EXISTENTE				GB	1			

CANTIDAD CONTRACTUAL	1.00
ACUMULADO ANTERIOR	0.00
ACUMULADO PRESENTE ACTA	1.00

TOTAL PRESENTE ACTA: 1.00

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA — urba caribe 24

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 08

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	01/05/2025 AL 31/05/2025		
CAPITULO: Capítulo - NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM: NP.128	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE MOBILIARIO EXISTENTE EN PARQUE


REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

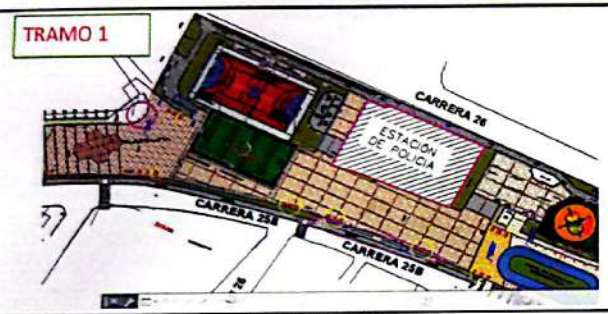

REGISTRO FOTOGRAFICO



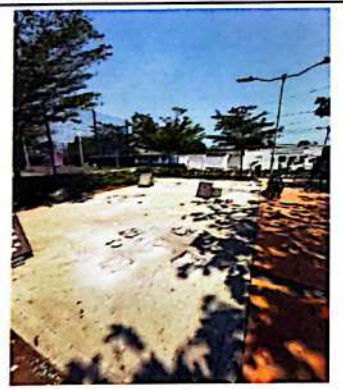

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 1								
CUBOS 40X40				UND	40,00			
BANCAS DE JUEGO DE AJEDREZ				UND	20,00			

CANTIDAD CONTRACTUAL	67.00
ACUMULADO ANTERIOR	0.00
ACUMULADO PRESENTE ACTA	60.00
TOTAL PRESENTE ACTA:	60.00

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA — urba caribe 24


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 08

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	01/05/2025 AL 31/05/2025		

CAPITULO:	Capítulo - NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM:	NP.130	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	LIMPIEZA Y BOTADA DE ESCOMBROS

REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

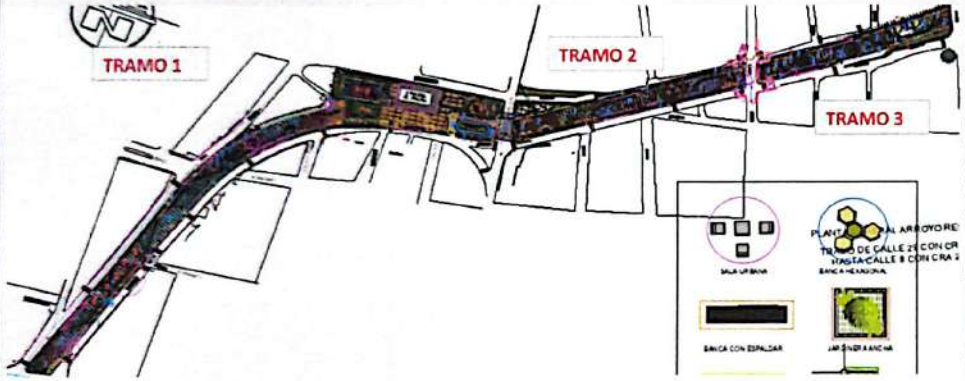



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES VIAJES	UND	CANT.	TOTALES ML	TOTALES M2	TOTALES M3
TRAMO 1						
OCTUBRE - 2024	6,00	M3	8,00			48,00
NOVIEMBRE - 2024	8,00	M3	8,00			64,00
DICIEMBRE - 2024	20,00	M3	8,00			160,00
TRAMO 2						
DICIEMBRE - 2024	8,00	M3	8,00			64,00
ENERO- 2025	8,00	M3	8,00			64,00
TRAMO 3						
ENERO- 2025	11,00					
FEBRERO- 2025	12,00	M3	8,00			96,00
MARZO- 2025 LIMPIEZA ESQUINA DE LA 17- COSTADO DERECHO	12,00	M3	8,00			96,00
MARZO- 2025 LIMPIEZA ENRADA DE CAPTACION DE AGUA	12,00	M3	8,00			96,00
ABRIL- 2025 LIMPIEZA DE CALLE 21 COSTADO IZQUIERDO	12,00	M3	8,00			96,00
TRAMO 4						
ABRIL- 2025 LIMPIEZA ANDENES COSTADO DERECHO	23,00	M3	8,00			184,00
TRAMO 5						
ABRIL- 2025 LIMPIEZA ANDENES COSTADO IZQUIERDO	23,00	M3	8,00			184,00

Powered by CamScanner

REGISTRO FOTOGRAFICO

TRAMO 5



TRAMO 4






TRAMO 2



TRAMO 3



Powered by CamScanner

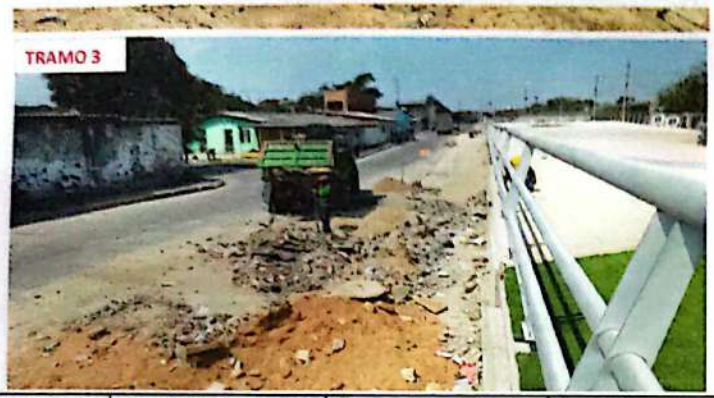

CANTIDAD CONTRACTUAL	1500,00
ACUMULADO ANTERIOR	0,00
ACUMULADO PRESENTE ACTA	1152,00

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

TOTAL PRESENTE ACTA:	1.152,00

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA | urbacaribe


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 08

CONTRATO:	LP-001-2024 LOTE 1	OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 1 "CONSTRUCCIÓN DEL MALECON DEL SURORIENTE"
PERIODO:	01/05/2025 AL 31/05/2025		
CAPITULO: Capitulo - NO PREVISTO	CÓDIGO DEL ITEM: NP.132	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIETINENO PARA ANDENES SOBRE PLACAS EXISTENTES


REGISTRO GRAFICO (PLANOS)

(Este espacio es para anexar partes de planos en planta y/o fotografías como evidencias de obra)

TRAMO 3



TRAMO 4

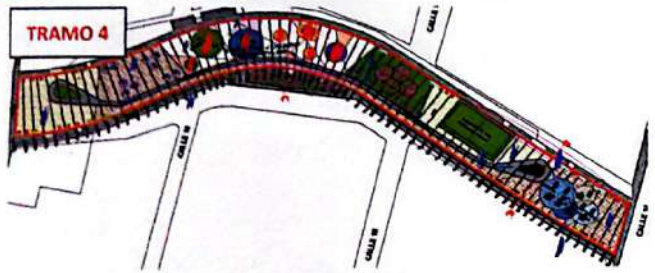

REGISTRO FOTOGRAFICO







LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	TOTALES ML	M2	M3
TRAMO 3									
COSTADO IZQUIERDO	V257-V272	48.69	1,10		M2			53.56	
	V256-V257	1,15	1,10		M2			1,27	
TRAMO 4									
COSTADO IZQUIERDO	V279-V301	85	1,30		M2			84.50	
	V339-V329	30	1,10		M2			33.00	

CANTIDAD CONTRACTUAL	316.00
ACUMULADO ANTERIOR	0.00
ACUMULADO PRESENTE ACTA	172.32

TOTAL PRESENTE ACTA: 172.32

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner
