INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA NO. 2

"INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA,JURIDICA,FINANCIERA,Y AMBIENTAL DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS ACCIONADOS CON ENERGIA FOTOVOLTAICA COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACION DE LAS COMUNIDADES A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO EN EL MUNICIPIO SAHAGUN DEPARTAMENTO DE CORDOBA

CONSORCIO INTERPOZOS
CONTRATO 065-2024

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22 FEBRERO 2025 - 22 MARZO 2025

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO....3
1. INTRODUCCIÓN....5
1.1 GENERALIDADES....6
2. ASPECTOS GENERALES....7
2.1 LOCALIZACION GENERAL....7
2.2 CARACTERISTICAS GENERALES DE LA OBRA....8
3. INFORMACION BASICA CONTRACTUAL....10
3.1 DATOS DEL CONTRATO DE OBRA....10
3.1.1 POLIZAS CONTRATO DE OBRA....11
3.2 DATOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA....12
3.2.1 POLIZAS CONTRATO INTERVENTORIA....13
4. ASPECTOS TECNICOS FINANCIEROS Y JURIDICOS....14
4.1 ASPECTOS TECNICOS....14
4.2 Control diario del equipo del contratista....15
4.3 Control de calidad de los materiales....15
4.3.1Información relacionada con ensayos....17
4.4 Descripción de actividades ejecutadas en el mes....17
4.5 ASPECTOS FINANCIEROS....17
4.5.1 Relación de pagos....17
4.5.2 Balance presupuestal del contrato....19
4.5.3 Avance de obra....19
4.5.4 Cronograma de Obra....19
4.5.5 Seguimiento de las condiciones climáticas....20
4.5.6. Informes semanales de obra....20
5.0 VERIFICACION PGIO....21
6.0 COMITES DE SEGUIMIENTO....21
7.0 RELACION DE CORRESPONDENCIA....21
8.0 ASPECTOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS....23
9.0 REGISTRO FOTOGRAFICO....24
10. CONCLUSIONES OBSERVACIONES RECOMENDACIONES....27

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1. ACTIVIDADES DE LA OBRA 7
TABLA 2. BALANCE PRESUPUESTAL DEL CONTRATO. 18
TABLA 3.COMITES DE SEGUIMIENTO.....20
TABLA 4. RELACION CORRESPONDENCIA.....20

ÍNDICE DE GRAFICAS

GRÁFICA 1. RELACIÓN DE AVANCE PROGRAMADO Y EJECUTADO 19

1.0 INTRODUCCIÓN

Las comunidades asentadas en la zona rural del Departamento de Córdoba tienen grandes dificultades de acceso al recurso hídrico, el cual es necesario para el desarrollo de sus actividades cotidianas y productivas. En temporada seca, dichos pobladores, sufren los efectos y rigores del cambio climático con mayor severidad al punto de no contar con el preciado líquido en largas temporadas, lo que causa grandes problemas sociales y de salud. Por lo que, debido al cambio climático, las lluvias cada vez son más escasas y los niveles de agua en los reservorios comunitarios son muy bajos o nulos. Aunado a esto, la poca agua que queda se encuentra contaminada, afectando en gran medida la calidad de vida de las comunidades.

En la zona rural del departamento de córdoba, existen pocas fuentes de agua superficial, por lo que puede resultar más económico aprovisionarse de agua a través de pozos profundos, pues no se necesita construir obras de captación costosas, ya que el agua subterránea se encuentra embalsada en acuíferos de fácil intervención. Además, se reduce el costo de explotación del líquido, ya que este sistema puede ser accionado con energía solar, por lo tanto, no se tendría que construir infraestructura eléctrica ni contratar a un operador de la energía por redes.

Así las cosas, las comunidades tendrían en gran parte del tiempo, disponibilidad de agua especialmente en épocas de sequía. Además, no sería necesario el tratamiento del agua para retirar sólidos ni tratamientos químicos robustos para el proceso de desinfección, si a futuro se decide utilizar el agua para consumo doméstico.

Con este proyecto, se daría continuidad al apoyo gradual que se viene dando por parte de la CVS a los municipios del departamento, con el fin de atender parcialmente la demanda de agua y atenuar la problemática de desabastecimiento que viven las comunidades rurales en temporada de extrema sequía, todo esto enmarcado en la estrategia de adaptación al cambio climático del departamento.

Se adelantará la construcción de 2 pozos profundos accionados con energía solar, para beneficiar a 2 comunidades rurales del municipio de Sahagún.

• Competencia. Dentro del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) establecido por la Ley 1523 de 2012, se identifica la importancia del trabajo de diversas instituciones del gobierno a través de las instancias de coordinación y articulación creadas en el marco de esa ley y de las acciones que cada entidad aborda en relación con los procesos de conocimiento, reducción del riesgo y manejo del desastre.

Así mismo, el Plan de Acción institucional de la CVS, establece en una de sus líneas estratégicas, que el cambio climático, se constituye en una variable determinante del accionar del estado para regular y orientar el proceso de diseño y planificación de uso del territorio y de los recursos naturales renovables a fin de garantizar su adecuada explotación y su desarrollo sostenible, lo cual apunta al eje de transformación 4 del PND: "Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática", la cual busca una transición económica para alcanzar la carbono neutralidad, consolidar territorios resilientes y sociedad resiliente al clima, la descarbonización, la resiliencia de sectores productivos y la gestión de sus riesgos climáticos e infraestructura de proyectos de adaptación al cambio climático con menos emisiones.

Por su parte, el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, en su numeral 1°, establece que es función de las CAR: "Ejecutar las políticas, planes y programas nacionales en materia ambiental definidos por la ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de Inversiones o por el Ministerio del Medio Ambiente, así como los del orden regional que le hayan sido confiados conforme a la ley, dentro del ámbito de su jurisdicción".

Conforme lo anterior, se considera que la CVS tiene la competencia en el desarrollo de acciones para el desarrollo sostenible, el manejo adecuado de los recursos naturales y la gestión del riesgo y del cambio climático en el departamento de Córdoba.

1.1. GENERALIDADES

El presente documento corresponde al informe de obra mensual del contrato de obra No. 064-2024, correspondiente al periodo del 22 de febrero al 22 de marzo de 2025, cuyo objeto es "CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS ACCIONADOS CON ENERGIA FOTOVOLTAICA COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACION DE LAS COMUNIDADES A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO EN EL MUNICIPIO SAHAGUN, DEPARTAMENTO DE CORDOBA"

El objeto de los trabajos de la Interventoría del contrato de obra No. 064-2024, es apoyar y supervisar técnica, financiera, ambiental y jurídicamente el manejo de los recursos y la ejecución del contrato de obras adjudicado a través del proceso de contratación de manera que el Proyecto se realice de acuerdo a los planos, especificaciones y programación de obra, y proporcionar a la entidad contratante C.V.S la información correspondiente sobre las obras ejecutadas.

El documento detalla la descripción general del contrato, seguido de los aspectos contractuales más relevantes del contrato, luego se describen las actividades desarrolladas por el contratista, incluyendo la metodología del trabajo del proyecto, al final del documento se establecen las conclusiones del periodo de ejecución

2.0 ASPECTOS GENERALES

2.1 LOCALIZACIÓN GENERAL

El proyecto se ejecutará en las veredas Gato Caro del corregimiento las Llanadas y El Tesoro del Corregimiento Arenas del Norte, del municipio de Sahagún, Departamento de Córdoba.

Corregimiento las Llanadas (**GATO CARO**)



Corregimiento Arenas del norte (**EL TESORO**)



2.2 CARACTERISTICAS GENERALES DE LA OBRA.

El proyecto de obra para la "CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS ACCIONADOS CON ENERGIA FOTOVOLTAICA COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACION DE LAS COMUNIDADES A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO EN EL MUNICIPIO SAHAGUN, DEPARTAMENTO DE CORDOBA" comprende las siguientes actividades:

VEREDAS GATO CARO Y EL TESORO

Tabla 1. Actividades de la obra

ITEM	ACTIVIDAD
1.0	**CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO**
1.1	Transporte de la maquinaria de perforación y demás accesorios y herramientas hasta el sitio de la obra y regreso a la sede. se incluye el montaje y desmontaje del equipo
1.2	Adecuación del sitio y construcción de piscinas de lodos
1.3	Construcción de pozo para sondeo exploratorio de diámetro 8 1/2 pulgadas. Incluye colocación de lodos a base de bentonita
1.4	Toma del registro eléctrico (SP y Resistividad), confrontados con columna Litológica y rata de perforación
1.5	Ampliación de Agujero de 8 1/2 pulgadas a 12 pulgadas de diámetro
1.6	Suministro e instalación de tubería acampanada PVC 6" - RDE 21 - 200 PSI
1.7	Suministro e Instalación de Filtros tecnislop. Ranura 0.20
1.8	Suministro e instalación de empaque de gravas. Incluye lavado y seleccionado
1.9	Desarrollo y lavado del pozo utilizando el método combinado de aire y pistón, con aplicación de químicos
1.10	Prueba de aforo con compresor para determinar parámetros básicos de selección del equipo de bombeo
1.11	Sello sanitario y base del pozo
1.12	Toma de muestras de agua para su análisis físico-químico y bacteriológico

ITEM	ACTIVIDAD
2.0	**EQUIPO DE BOMBEO Y SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA (SOLAR)**
2.1	Instalación de bomba solar y motor con cabeza dinámica total hasta (HDT) = 140 mca, caudal (Q) =30 M3/día Potencia : 5 HP
2.2	Instalación de panel mono cristalino de 560Wp para sistema fotovoltaico
2.3	Instalación de controlador. Incluye todos los accesorios para su funcionamiento
2.4	Instalación de cable encauchetado AWG 4x10 entre controlador y bomba
2.5	Instalación de cable encauchetado AWG 2x16 entre controlador e interruptor flotador y entre controlador y sensor de nivel de agua
2.6	Instalación de cable solar de 4 mm
2.7	Instalación de sistema de puesta (polo) a tierra. Incluye suministro e instalación de accesorios y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento
2.8	Instalación de estructura metálica para instalación de seis (6) paneles solares. Incluyen suministro e instalación de accesorios, anclaje al suelo y demás elementos necesarios que preserven la integridad de los paneles
2.9	Instalación de gabinete metálico con interruptores. Incluye accesorios
2.1	Instalación de interruptor flotador, interruptor seccionador para corte visible, sensor de nivel de agua, adaptador de camisa y dispositivo de protección contra sobretensiones
3.0	**CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE SOPORTE E INSTALACION DE TANQUES Y TUBERIA DE IMPULSION Y DISTRIBUCION**
3.1	Construcción de estructura en concreto reforzado para instalación de tanques de reserva de agua. H= 6 m
3.2	Instalación de tanques de reserva de 2.000 Litros. Incluye suministro e instalación de accesorios y demas elementos necesarios para su correcto funcionamiento
3.3	Instalación de tubería de PVC 2" RDE 21 de alimentación de tanques y distribución de agua. Incluye accesorios y demas elementos necesarios para su correcta operación

3.0 INFORMACION BASICA CONTRACTUAL

3.1 DATOS DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE:	**OBRA**
CONTRATO No.:	064 DE 2024.
CONTRATISTA:	CONSORCIO HIDROCIVIL NIT 901.902.140-2
SUPERVISOR:	DAMARIS PEÑA ORDOSGOITIA
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES
FECHA DE INICIO:	22 de Enero de 2025
FECHA DE TERMINACION:	22 de Mayo de 2025
PLAZO TRANSCURRIDO:	UNO (1) MES
VALOR INICIAL :	SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($662.661.158).
VALOR ACTUALIZADO:	SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($662.661.158).
VALOR ANTICIPO:	DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($265.064.463).
VALOR PAGADO:	A la fecha no se han realizado pagos de actas parciales
VALOR POR PAGAR:	Ala fecha no se han realizado pagos de actas parciales

3.1.1 POLIZAS CONTRATO DE OBRA

POLIZAS DE GARANTIA-ANEXO 0

TOMADOR	CONSORCIO HIDROCIVIL NIT: 901.902.140-2		
BENEFICIARIO	**CORPORACION AUTONOMA DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE C.V.S – NIT 891.000.627-0**		
ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**		
POLIZA No	DE CUMPLIMIENTO No 53-44-101036240		
GARANTIAS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/12/2024	30/11/2025	$ 132.532.231,60
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	31/12/2024	30/11/2025	$265.064.463,20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	31/12/2024	31/05/2028	$ 66.266.115,80
ESTABILIDAD DE LA OBRA	31/05/2025	31/05/2030	$ 66.266.115,80
POLIZA No	R.C No 53-40-101011733		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	31/12/2024	31/05/2025	$ 284.700.000,00

ANEXO 3-VIGENCIA SEGÚN ACTA DE INICIO

TOMADOR	CONSORCIO HIDROCIVIL NIT: 901.902.140-2		
BENEFICIARIO	**CORPORACION AUTONOMA DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE C.V.S – NIT 891.000.627-0**		
ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**		
POLIZA No	DE CUMPLIMIENTO No 53-44-101023950		
GARANTIAS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22/01/2025	22/12/2025	$ 132.532.231,60
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	22/01/2025	22/12/2025	$265.064.463,20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	22/01/2025	22/06/2028	$ 66.266.115,80
ESTABILIDAD DE LA OBRA	22/06/2025	22/06/2030	$ 66.266.115,80
POLIZA No	R.C No 53-40-101011733		

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (anexo 1)	31/12/2024	31/05/2025	$ 284.700.000

3.2 DATOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE:	**INTERVENTORÍA**
CONTRATO No.:	065 DE 2024.
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTER POZOS SAHAGUN. NIT 901.901.669-1
SUPERVISOR:	DAMARIS PEÑA ORDOSGOITIA
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES
FECHA DE INICIO:	22 de Enero de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	22 de Mayo de 2025
VALOR INICIAL :	CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($45.917.816).
VALOR ACTUALIZADO:	CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($45.917.816).
VALOR ANTICIPO:	TRECE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($13.775.345).
VALOR PAGADO:	A la fecha no se han realizado pagos de actas parciales
VALOR POR PAGAR:	A la fecha no se han realizado pagos de actas parciales

3.2.1 POLIZAS CONTRATO INTERVENTORIA

POLIZAS DE GARANTIA-ANEXO 0

TOMADOR	CONSORCIO INTERPOZOS SAHAGUN NIT: 901.901.669-1		
BENEFICIARIO	CORPORACION AUTONOMA DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE C.V.S – NIT 891.000.627-0		
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
POLIZA No	DE CUMPLIMIENTO No 53-44-101036239		
GARANTIAS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/12/2024	15/11/2025	$ 4.591.781,60
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	30/12/2024	15/11/2025	$ 13.775.344,80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	30/12/2024	15/05/2028	$ 4.591.781,60
CALIDAD DEL SERVICIO	30/04/2025	30/04/2030	$ 9.183.563,20

ANEXO 2-VIGENCIA SEGÚN ACTA DE INICIO

TOMADOR	CONSORCIO INTERPOZOS SAHAGUN NIT: 901.901.669-1		
BENEFICIARIO	CORPORACION AUTONOMA DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE C.V.S – NIT 891.000.627-1		
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
POLIZA No	DE CUMPLIMIENTO No 53-44-101036239		
GARANTIAS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22/01/2025	08/12/2025	$ 4.591.781,60
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	22/01/2025	08/12/2025	$13.775.344,80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	22/01/2025	07/06/2028	$ 4.591.781,60
CALIDAD DEL SERVICIO	23/05/2025	23/05/2030	$ 9.183.563,20

4.0 ASPECTOS TECNICOS FINANCIEROS Y JURIDICOS

A continuación, se realiza un análisis de cada uno de los aspectos relevantes para el desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta los procesos surtidos por la interventoría, la información entregada por la C.V.S y el constructor de obra.

4.1 ASPECTOS TÉCNICOS

Con el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecución de las obras y, a su vez, para buscar una mayor eficiencia en la administración de las mismas la Interventoría realizará las siguientes funciones técnicas entre otras:

- Revisión del proyecto, planos y presupuestos
- Control de personal y equipo contratado por el Contratista
- Control de calidad de los materiales utilizados en obra
- Revisión de cantidades de obra ejecutadas
- Exigir al Contratista la ejecución idónea y oportuna del contrato.
- Adoptar las medidas necesarias para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento del ofrecimiento y de la celebración del contrato.
- Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas del contratista.
- Estudio y aprobación del programa de trabajo presentado por el contratista

Teniendo en cuenta la documentación entregada por la C.V.S, se realizó la revisión de los siguientes aspectos técnicos:

-Revisión de planos y diseños:

Se realizó la revisión de los planos correspondientes entregados por la entidad contratante C.V.S

-Control de personal y equipo contratado por el contratista:

En lo referente al Control de personal y equipo contratado por el Contratista, este cuenta con el personal idóneo para ejecutar las actividades contractuales del proyecto y los equipos necesarios para el desarrollo de las obras

4.2 CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATISTA

Conforme a las especificaciones técnicas, el contratista de obra mantuvo en obra los siguientes equipos:

-Equipo de Geoelectrica

-Equipo de perforación Failin 1500

-Bomba de lodos con motor diésel

-Sarta de perforación tipo petrolera2”,7/8”,3” y 4”

-Brocas de aleta 7” y 8”

-Brocas tricono de 8” y 12”

-Herramientas menores

4.2.1 RELACION PERSONAL DEL CONTRATISTA

El contratista de obra mantuvo el siguiente personal:

Vereda Gato Caro y el Tesoro

-Director de obra

-Ingeniero Residente

-Ingeniero Ambiental

-Ingeniero Eléctrico

-Supervisor

-Ayudantes (3)

4.2.2 RELACION PERSONAL DE INTERVENTORIA

La interventoría mantuvo en obra el siguiente personal:

-Director Interventoría

-Ingeniero Residente

4.3 CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN OBRA

La política de calidad del proyecto se da en aras de velar por el cumplimiento oportuno del presupuesto, cronograma y calidad de los productos a instalar

El control de calidad de las obras incluye:

- El control de recepción de productos.
- El control de la ejecución.
- El control de la obra terminada.

Para ello se recopila la documentación del control realizado, se verifica que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anexos y modificaciones.

El contratista tiene de los fabricantes, la documentación de los productos a instalar, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes (cuando proceda). **Ver anexos.**

Los objetivos de la calidad del proyecto son:

- Cumplir con el presupuesto de la obra.
- Cumplir con los tiempos requeridos para el proyecto
- Cumplir con todos los compromisos contractuales que garanticen una adecuada ejecución del proyecto.
- Garantizar que las especificaciones técnicas específicas de la instalación de los paneles solares se cumplan y se entreguen de acuerdo al alcance acordado y por ultimo lograr la satisfacción de las partes interesadas
- Apoyar el desarrollo del proyecto de acuerdo a las responsabilidades que se han asignado.
- Verificar condiciones y características de materiales para lograr que el proyecto sea terminado exitosamente y satisfaga a los interesados.

4.3.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON ENSAYOS

Durante el periodo correspondiente del informe no se realizaron ensayos

4.4 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante la ejecución del contrato de obra, el contratista ha adoptado las medidas necesarias para mantener las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la celebración del contrato.
Las actividades representativas desarrolladas en el periodo comprendido entre el 22 de febrero y el 22 de marzo de 2025, corresponden principalmente a:

VEREDA GATO CARO

ITEM	DESCRIPCION	% EJECUCION
1.0	**CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO**	
1.1	Transporte de la maquinaria de perforación y demás accesorios y herramientas hasta el sitio de la obra y regreso a la sede. se incluye el montaje y desmontaje del equipo	100%
1.2	Adecuación del sitio y construcción de piscinas de lodos	100%
1.3	Construcción de pozo para sondeo exploratorio de diámetro 8 1/2 pulgadas. Incluye colocación de lodos a base de bentonita	100%
1.4	Toma del registro eléctrico (SP y Resistividad), confrontados con columna Litológica y rata de perforación	100%
1.5	Ampliación de Agujero de 8 1/2 pulgadas a 12 pulgadas de diámetro	18%

VEREDA EL TESORO

ITEM	DESCRIPCION	% EJECUCION
1.0	**CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO**	
1.1	Transporte de la maquinaria de perforación y demás accesorios y herramientas hasta el sitio de la obra y regreso a la sede. se incluye el montaje y desmontaje del equipo	100%
1.2	Adecuación del sitio y construcción de piscinas de lodos	100%
1.3	Construcción de pozo para sondeo exploratorio de diámetro 8 1/2 pulgadas. Incluye colocación de lodos a base de bentonita	68%

4.5 ASPECTOS FINANCIEROS

Para el Control Financiero de la ejecución de los contratos se realizarán las siguientes actividades:

- θ Control sobre el cronograma de obra
- θ Verificar que los ítems contratados correspondan a los ítems efectivamente ejecutados e incluidos en las condiciones contractuales

4.5.1 RELACION DE PAGOS

TOTAL VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$662.661.158
TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA (Anticipo 40%)	$265.064.463
PENDIENTE POR PAGAR	$397.596.695

HIDROCIVIL	PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO OBRA	FECHA	
		VERSIÓN:	01

CONTRATO No. :	**064-2024**			
PROGRAMACIÓN INICIAL:				
OBJETO CONTRATO :	**CONSTRUCCIÓN DE POZOS PROFUNDOS ACCIONADOS CON**			
VALOR DEL CONTRATO:	**$**			**662.661.158,00**
ANTICIPO				**40,0%**
VALOR ADICIONAL	**$**			**-**
INTERVENTOR:	**CONSORCIO INTERPOZOS SAHAGUN**			
FIDUCIA:	**FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A**			
PLAZO CONTRATO:			**4**	**MESES**
VALOR ANTICIPO:	**$**			**265.064.463,00**

No.	DESCRIPCION	VALOR	%
1	Construccion de dos (2) Pozos Profundos	$ 132.532.231,50	50,00
2	Suministro e instalacion de dos (2) Equipos de bombeo y sistema de energía fotovoltaica (solar)	$ 66.266.115,75	25,00
3	Construcción de dos (2) estructuras de soporte e instalación de tanques y tubería de impulsión y distribución	$ 66.266.115,75	25,00
TOTAL		$ 265.064.463,00	100,00

EVIN CUARTAS PACHECO	**EDUAR MONTIEL PERALTA**
R/L CONSORCIO HIDROCIVIL	**R/L CONSORCIO INTERPOZOS SAHAGUN**
CONTRATISTA	**INTERVENTORIA**

4.5.2 BALANCE PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Tabla 2. Balance presupuestal del contrato.


VALOR INICIAL	SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($662.661.158).
VALOR ADICIONES	No se han realizado adiciones
VALOR ACTUALIZADO	SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($662.661.158).
VALOR ANTICIPO	DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($265.064.463).
VALOR PAGADO ACTAS	A la fecha no se han realizado pagos de actas parciales

4.5.3 AVANCES DE OBRA

Mes	Inicio	Final	% Programado	% Ejecutado
Mes 1	Miércoles 22/01/2025	Sábado 22/02/2025	2.87%	2.08%
Mes 2	Lunes 24/02/2025	sábado 22/03/2025	17.17%	17.49%

4.5.4 CRONOGRAMA DE OBRA

La duración estimada del proyecto es de CUATRO (4) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio con fecha del 22-01-2025, siendo el 22-05-2025 la fecha límite máxima de terminación Inicial del contrato.
A la fecha del presente informe se presenta un porcentaje ejecutado del **17.49%** frente a un **17.17%** programado en el mismo periodo, presentando un avance del **0,32%,** como se puede observar en la **gráfica 1**
Nota: Estos avances son generados de la nueva programación presentada por el contratista y aprobada por la interventoría. Ver anexo. Nueva programación

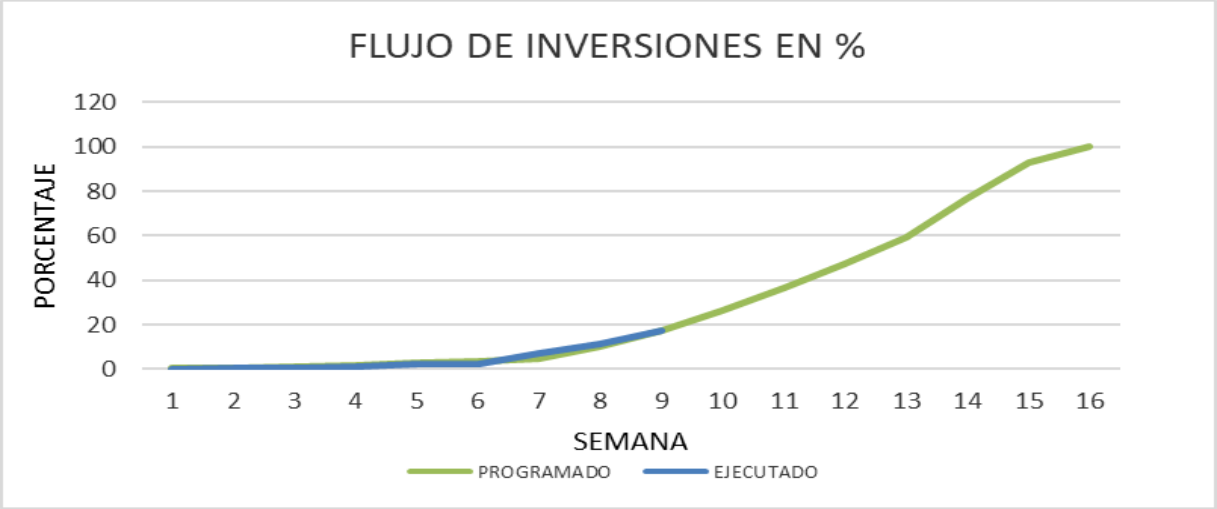

Gráfica 1. Relación de avance programado y ejecutado

4.5.5 Seguimiento de las condiciones climáticas

Para el período de tiempo correspondiente al presente informe, la condición climática general fue un clima SOLEADO

4.5.6 Informes semanales de obra

El avance físico y el desarrollo del proyecto se relaciona en los informes semanales, los cuales son presentados por el contratista, previamente revisados por la interventoría, en estos se describen temas relevantes, problemáticas en obra, avances de las actividades, entre otras decisiones tomadas entre las partes involucradas para el correcto desarrollo del contrato No. 064 DE 2024 que tiene por objeto: "CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS ACCIONADOS CON ENERGIA FOTOVOLTAICA COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACION DE LAS COMUNIDADES A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO EN EL MUNICIPIO SAHAGUN, DEPARTAMENTO DE CORDOBA". Se anexan los informes semanales. Ver Anexos.

5.VERIFICACION DEL PGIO

El contratista hace entrega del componente PGIO, en el cual se establecen los lineamientos y controles que se deben establecer tanto en seguridad industrial y parámetros ambientales, la interventoría realiza la verificación respectiva a dicho componente, cumpliendo con la información establecida.
Ver Anexo componente PGIO

6.COMITÉS DE SEGUIMIENTO

Tabla 3. Comités de seguimiento.

CONTRATO	ASUNTO	FECHA	HORA PROGRAMADA	
			INICIO	FIN
064-2024	REUNIÓN DE SEGUIMIENTO CONTRATO 064-2024	05/03/2025	9:30 AM	11:30 AM

Nota: Se anexa acta de seguimiento correspondiente.

7.RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Siguiendo con el control del proyecto de la referencia, se relaciona la correspondencia emitida por los entes participantes en este, en donde se busca implementar los medios de comunicación oficiales en función de la calidad de las actividades a ejecutar.

Tabla 4. Relación de correspondencia Enviada.

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
24/02/2025	CIN-065-2024-03	SOLICITUD INSTALACION VALLA INFORMATIVA	CONSORCIO INTERPOZOS SAHAGUN	CONSORCIO HIDROCIVIL
17/03/2025	CIN-065-2025-04	ACTIVIDADES POR INICIAR SEGÚN PROGRAMACION	CONSORCIO INTERPOZOS SAHAGUN	CONSORCIO HIDROCIVIL

Tabla 5. Relación de correspondencia Recibida

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
08/03/2025	CO-064-2024-05	INSTALACION VALLA INFORMATIVA CONTRATO 064-2024	CONSORCIO HIDROCIVIL	CONSORCIO INTERPOZOS
25/02/2025	20252102609	SOLICITUD ACTUALIZACION POLIZASCONFORME ACTA DE INICIO 22 DE ENERO	C.V.S	CONSORCIO INTERPOZOS
25/02/2025	20252102610	SOLICITUD ACTUALIZACION POLIZASCONFORME ACTA DE INICIO 22 DE ENERO Y ENTTREGA DE INFORMACION PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO	C.V.S	CONSORCIO INTERPOZOS
21/03/2025	20252103855	RESPUESTA AL RADICADO 20251102802	C.V.S	CONSORCIO INTERPOZOS
11/03/2025	CO-064-2024-06	REMISION DOCUMENTACION PENDIENTE CONTRATO 064-2024	CONSORCIO HIDROCIVIL	CONSORCIO INTERPOZOS
18/03/2025	CO-064-2024-07	ACTIVIDADES POR INICIAR SEGÚN PROGRAMACION EXISTENTE	CONSORCIO HIDROCIVIL	CONSORCIO INTERPOZOS

Como soporte del control realizado por esta Interventoría se adjunta relación de correspondencia.

8.ASPECTOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS

En lo concerniente al Control Administrativo específico de los diferentes contratos, se ejercerán las siguientes funciones:

- θ Velar y controlar con esmero, el cumplimiento de todas las condiciones del contrato por parte de los contratistas.
- θ Identificar problemas actuales y potenciales y proponer medidas correctivas o preventivas.
- θ Resolver las consultas formuladas por los contratistas, referente a las obras que realiza.
- θ Documentar suficientemente el desarrollo de los contratos.
- θ Implementar los mecanismos de acción, competentes, necesarios para que se efectúen los trabajos correctamente.
- θ Realizar el procesamiento de facturas y pagos.
- θ Realizar las acciones competentes derivadas de la iniciación, desarrollo, finalización y liquidación de los contratos.
- θ Informar oportunamente a la C.V.S las situaciones irregulares que se presenten en el desarrollo del contrato, solicitando concepto para proceder de conformidad.
- θ Estudiar y predecir el comportamiento del plazo del contrato para recomendar con razones fundamentales la declaratoria de incumplimiento o caducidad del mismo.
- θ Elaboración del informe de avance del proyecto. Este será enviado por la Interventoría a la entidad contratante, en los plazos estipulados en el contrato.
- θ Celebrar comités de obra cuando sea necesario, con participación de los contratistas, el Supervisor de la C.V.S y la Interventoría.
- θ Aprobar el programa de trabajo, supervisar su desarrollo y exigir el cumplimiento de los plazos para las entregas parciales y definitivas de las obras.
- θ Vigilar las fechas y valores de las garantías y seguros, su vencimiento y renovación.
- θ Velar por que en el desarrollo de los contratos se cumplan las disposiciones legales, las normas de los reglamentos y en particular las regulaciones relacionadas con la actividad constructora.

9.REGISTRO FOTOGRÁFICO

Para el presente informe se realiza el correspondiente registro fotográfico de las actividades ejecutadas durante el periodo.

VEREDA GATO CARO

VALLA INFORMATIVA



PERFORACION POZO PROFUNDO



REGISTRO ELECTRICO





PISCINAS DE LODOS





PISCINAS DE LODOS





VEREDA EL TESORO

PISCINAS DE LODOS









PERFORACION POZO PROFUNDO









10 CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ Del presente informe se concluye que, del desarrollo de las actividades del periodo, se logró un porcentaje aprobado por la interventoría del 17.49**%,** comparado con lo proyectado del 17.17**%,** por lo cual el contratista presenta un avance del 0,32%

- ✓ En general las actividades desarrolladas han sido objeto de seguimiento y control por parte de la interventoría, sin embargo, se le reitera al contratista continuar con las recomendaciones de interventoría y las especificaciones mínimas del proyecto, respecto a los procesos constructivos y de seguridad industrial para así finalizar de manera satisfactoria el correspondiente proyecto.

- ✓ El contratista hace entrega del componente PGIO,cumpliendo con los parámetros establecidos de seguridad industrial y ambiental.

- ✓ Se reitera el uso adecuado de los elementos de protección personal para todo el personal de obra, estos son de suma importancia para así evitar accidentes durante las jornadas laborales.



_____



Ing. Eduar Montiel Peralta
Rep. Legal de interventoría

ANEXOS:

ACTAS DE COMITÉ
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
CORRESPONDENCIA ENVIADA
BITACORA
INFORME AMBIENTAL SST

Nombre del Comité: CONTRATO 064 DEL 2024	
Tema/Proyecto/asunto: CONSTRUCCIÓN DE POZOS PROFUNDOS ACCIONADOS CON ENERGÍA FOTOVOLTAICA EN EL MUNICIPIO SAHAGÚN COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	**Fecha: 5-03-2025** **Hora de inicio: 09:30 a.m** **Hora Fin: 11:30 a.m**
Objetivo de la Reunión: **Realizar seguimiento de avances a la ejecución del contrato 064-2024.**	

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
DAMARIS PEÑA ORDOSGOITIA	**Subdirectora de planeación CVS SUPERVISORA**	
NILTON VERGARA PORTILLO	**Representante legal CONSORCIO HIDROCIVIL**	
EDUARD MONTIEL	**Rep Legal Consorcio Interpozo Sahagún**	
INGRID GARCIA	**Apoyo a la supervisión CVS**	

ORDEN DEL DÍA

1. Saludo de bienvenida y Presentación de los asistentes.

2. Visita al sitio de las obras para verificar avances de ejecución vs programación.

3. Varios

SEGUIMIENTO COMPROMISO REUNION ANTERIOR			
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**% CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES**
Presentar trámite para pagos de anticipo	CONSORCIO HIDROCIVIL-CONSORCIO INTERPOZOSA HAGUN	100%	Se realizaron los trámites correspondientes para la entrega del anticipo

DESARROLLO

1. Saludo de bienvenida y Presentación de los asistentes.
Se dio lectura al orden del día. La subdirectora de planeación y supervisora del contrato, Dra. Damaris Peña Ordosgoitia, da la bienvenida a los asistentes, e invita a todos para que se presenten.

2 Visita al sitio de las obras (vereda Gato Caro) para verificar avances de ejecución vs programación.
El día 5 de marzo de 2025 se realiza visita al sitio de las obras, en el cual participan: por parte de la entidad contratante CVS: Doctora Damaris Peña Ordosgoitia subdirectora de planeación y supervisora del contrato, así mismo la doctora Ingrid Garcia (apoyo a la supervisión), por parte del contratista de obra: Nilton Vergara Portillo, ingeniero Residente de obra, y por la interventoría Eduard Montiel, representante legal, en el cual se verificaron avances de ejecución a la fecha.

-Ejecutado acumulado:7,41%
-Programado acumulado:4,55%
-Avance:2,87%

Así mismo se realiza recorrido por el sitio verificándose las actividades de: Transporte de la maquinaria de perforación, construcción de piscinas de lodos, y construcción de pozo para sondeo, el personal de obra (1 supervisor,3 ayudantes), así mismo el equipo utilizado (maquinaria de perforación del pozo, motobombas, tanques de almacenamiento de agua, herramientas menores).
El personal cuenta con su respectiva dotación y afiliaciones correspondientes
Hasta el momento en la ejecución de la obra, no se presentan inconvenientes que puedan incidir en el normal desarrollo de la misma.

3 Varios.

La supervisión informa al contratista de obra, continuar con las recomendaciones de interventoría, las especificaciones del proyecto, así como los sistemas de calidad, seguridad salud en el trabajo y ambiental, evitando cualquier tipo de accidentes durante la jornada laboral.

Observaciones.
La supervisora de la CVS solicita al contratista la instalación de la valla correspondiente. Por lo que el contratista manifiesta instalarla antes de finalizar la semana. Fecha prevista (8 marzo de 2025)

CONCLUSIONES




La ejecución de la obra mantiene su avance en normal desarrollo, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas correspondientes, así como la implementación en seguridad industrial y ambiental.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Instalación de la valla informativa	CONSORCIO HIDROCIVIL-CONSORCIO INTERPOZOSAHAGUN	8/03/2025

Nombre del Comité: COMITÉ DE SUPERVISION CONTRATO 064 DE 2024	
Tema/Proyecto/asunto: Reunión de seguimiento de obra “Construcción de pozos profundos accionados con energía fotovoltaica como estrategia de adaptación del cambio climático en el Municipio de Sahagún, Departamento de Córdoba”	**Fecha:17-03-2025** **Hora de inicio: 9:00 AM** **Hora Fin: 10:20 AM**
Objetivo de la Reunión: Reunión de Socialización para revisar el avance de obra.	

PARTICIPANTES CVS

NOMBRE	CARGO	FIRMA
DAMARIS PEÑA ORDOSGOITIA	Subdirectora de Planeación CVS	
INGRID GARCIA MARTINEZ	Profesional de apoyo subdirección de planeación	
ANDREA VASQUEZ VELEZ	Ing. Ambiental y de SST Consorcio Hidrocivil Contratista de obra	
NILTON VERGARA	Ing. Residente Consorcio Hidrocivil Contratista de obra	
EDUARD MONTIEL	Rep Legal Consorcio Interpozo Sahagún	

ORDEN DEL DÍA

1. Saludo de los asistentes
2. Presentación del orden del día
3. Socialización.

SEGUIMIENTO COMPROMISO REUNION ANTERIOR			
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**% CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES**
N/A	NA	N/A	N/A

DESARROLLO

La supervisora del proyecto por parte de la CVS ,del contrato de obra no. 065 de 2024 con objeto "Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental para la Construcción de pozos profundos accionados con energía fotovoltaica como estrategia de adaptación del cambio climático en el Municipio de Sahagún, Departamento de Córdoba" convocó comité de seguimiento con la participación del Contratista de obra, y el Interventor con el fin de socializar el avance de obra hasta la fecha.

No siendo otro el presente, se da inicio a la reunión y el resultado es esta acta.

1. AVANCES DE OBRA: La interventoría comenta que durante este periodo el contratista presenta un avance de ejecución del 11,60% con relación al 10,30% programado, presentando un avance de 1,31% producto de actividades como son:
   Vereda Gato Caro:
   1.1 Transporte de la maquinaria de perforación y demás accesorios. (100%)
   1.2 Adecuación del sitio y construcción de piscinas de lodos. (100%)
   1.3 Construcción de pozo para sondeo exploratorio de diámetro 8 1/2 pulgadas (92%)

Vereda El Tesoro:

1.1 Transporte de la maquinaria de perforación y demás accesorios. (100%)
1.2 Adecuación del sitio y construcción de piscinas de lodos. (100%)
1.3 Construcción de pozo para sondeo exploratorio de diámetro 8 1/2 pulgadas (26%)

2. Para este periodo se implementa el PGIO, correspondiente a los componentes que hacen parte integral del mismo como lo es calidad, seguridad industrial y gestión ambiental, el contratista de obra realizó las actividades de obra teniendo en cuenta las disposiciones y requerimientos exigidos.
3. La doctora Damaris, subdirectora de Planeación Ambiental de la CVS y el apoyo a la supervisión del contrato, realizaron seguimiento al presupuesto, verificando cada ítem ejecutado.

La interventoría realiza el seguimiento y control de las actividades ejecutadas por el contratista, validándolas positivamente, así mismo recomienda mantener y cumplir con las especificaciones técnicas establecidas, haciendo énfasis en los componentes relacionados con la calidad, seguridad industrial y gestión ambiental.

Hasta la fecha no reportaron inconvenientes en la ejecución de las obras.

OBSERVACIONES: IMPREVISTOS: El contratista de obra hace referencia a las actividades NO PREVISTAS, que fueron necesarias para el inicio de actividades, entre las cuales se encuentran:

1-Desmonte de lote para construcción de pozo
2-Desmonte de cerca de alambre de puas.
3-Reconstrucción de cerca en alambre de puas
Por lo que deben tenerse en cuenta, como parte integral en el normal desarrollo de la obra.

CONCLUSIONES

1. La supervisión de la CVS realizó seguimiento técnico y financiero al avance correspondiente
2. La obra en la vereda Gato Caro avanza según lo programado, ejecutando una perforación del pozo de 158 m
3. En la vereda Las llanadas (el tesoro) se reporta un avance de 45 ml en la perforación del pozo.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Remitir acta a Contratista	Ingrid García	20/03/25
Entrega de informes semanales	Ing. Residente de Obra	

CVS 25/02/2025 14:52
Al Contestar cite este No.: **20252102609**
Origen: Subdirección de Planeación Ambie
Destino:EVIN CUARTAS PADILLA
Anexos: Fol: 1

Montería,

Señor
EVIN CUARTAS PADILLA
Representante Legal Consorcio Hidrocivil
Cel: 3014037705
CL 57 # 11 - 120 CA 43
hidrocivilconsorcio@gmail.com
Montería (Cordoba)

ASUNTO: • Solicitud de Actualización de Pólizas conforme a Acta de Inicio de 22 de Enero de 2025 • Programación de Obras de Acuerdo a fecha del Acta de Inicio

Respetados señores,


En virtud del CONTRATO DE OBRA 064 DE 2024, cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DE POZOS PROFUNDOS ACCIONADOS CON ENERGÍA FOTOVOLTAICA COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN DE LAS COMUNIDADES A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MUNICIPIO SAHAGÚN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA", solicitamos amablemente lo siguiente:

1. Modificación de las pólizas correspondientes, ajustadas a las condiciones estipuladas en el acta de inicio y las necesidades del proyecto, de acuerdo con lo especificado en la CLÁUSULA SEXTA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA del contrato 064, en la cual se establece que el contratista deberá mantener vigentes todas las pólizas y garantías que amparan el contrato durante su ejecución, liquidación y responsabilidades futuras. Actualización de pólizas 53-44-101036240 de cumplimiento de Seguros del Estado S.A a Acta de Inicio del contrato.

2. Presentación de la programación de obras actualizada, alineada con el cronograma aprobado en el acta de inicio.

Agradecemos su pronta atención a esta solicitud para garantizar el adecuado desarrollo y cumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco del contrato.

Cordialmente,



DAMARIS PEÑA ORDOSGOITIA
Subdirectora de Planeación Ambiental

Elaboró: Ingrid Paola Garcia Martinez / SPA

CVS 25/02/2025 15:08
Al Contestar cite este No.: **20252102610**
Origen: Subdirección de Planeación Ambie
Destino:EDUAR ALFONSO MONTIEL PERALTA
Anexos: Fol: 4

Montería,

Señor
EDUAR ALFONSO MONTIEL PERALTA
Rep legal Consorcio Interpozos Sahagun
Cel: 3246800324
Calle 14 No .10a-01
interpozosahagun@gmail.com
Chinú (Cordoba)

ASUNTO: Solicitud de Actualización de Pólizas conforme a Acta de Inicio de 22 de Enero de 2025 y Entrega de información para la ejecución del contrato.

Respetados señores,

En virtud del CONTRATO No 065 DE 2024, cuyo objeto es la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE POZOS PROFUNDOS ACCIONADOS CON ENERGÍA FOTOVOLTAICA COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN DE LAS COMUNIDADES A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA., solicitamos amablemente lo siguiente:

1. Modificación de las pólizas correspondientes, ajustadas a las condiciones estipuladas en el acta de inicio y las necesidades del proyecto, de acuerdo con lo especificado en la **CLAUSULA NOVENA - PARÁGRAFO PRIMERO**: Las garantías expedidas a favor de la Corporación serán aprobadas, como requisito para suscribir el Acta de Iniciación del contrato. en la cual se establece que el contratista deberá mantener vigentes todas las pólizas y garantías que amparan el contrato durante su ejecución, liquidación y responsabilidades futuras. Actualización de pólizas **53-44-101036239** de cumplimiento de Seguros del Estado S.A a Acta de Inicio del contrato.
2. Solicitud de informe inicial y mensual de interventoría el cual deberá desarrollar los siguientes aspectos:

INFORME INICIAL (entrega 15 días después de suscrita el acta de inicio)

1. *Antecedentes, descripción del proyecto y localización*
2. *Identificación y georreferenciación de predios o áreas de construcción*
3. *Descripción estado inicial del sitio del proyecto y su línea base (características ecosistémicas, geomorfológicas, hidrológicas, hidráulicas y climáticas)*
4. *Concepto de revisión inicial del proyecto (diseños, presupuestos, apus, planos, especificaciones técnicas, ambientales, PGIO,),*

5. *Observaciones y recomendaciones para la efectiva ejecución del contrato*

INFORME MENSUAL (entrega los primeros 5 días de cada mes calendario)

Todos los informes mensuales deben están enmarcados en los siguientes temas:

1. *Introducción*

INFORMACION SOBRE EL CONTRATO DE OBRA

1. *Alcance del proyecto*
2. *Información general de los contratos de obras relacionando objeto, valor plazo, fechas de inicio terminación, novedades (prorrogas, suspensiones, reinicios, adiciones)*
3. *Control de Pólizas de Garantías relacionando póliza inicial y cada uno de los anexos modificatorios que se vayan dando en la ejecución del contrato.*
4. *Descripción de aspectos administrativos, oficios enviados, recibidos, comités, reuniones,*
5. *Descripción de actividades desarrolladas por trabajo social*
6. *Descripción de las actividades físicas ejecutadas durante el mes por el contratista*
7. *Modificaciones y/o problemas presentados durante el periodo de ejecución debidamente explicadas y justificadas y de las medidas preventivas deben implementarse para evitar futuras situaciones anómalas o problemas, atrasos o modificaciones presentadas en la obra.*
8. *Cuadro de avance de ejecución física de obra.*
9. *Soportes de gastos detallados de Administración e imprevistos*
10. *Estado y avance presupuestal de ejecución de obras*
11. *Control de programación de obra – grafica de avance. En caso de que se presente, descripción de los atrasos con su respectiva justificación, en relación con el desarrollo de los trabajos conforme al programa aprobado por la Interventoría al Contratista de obra.*
12. *Recursos del Contratista (Equipos utilizados en obra, Personal administrativo y de campo)*
13. *Control de Calidad (certificados de calidad de materiales; garantías de productos, ensayos de laboratorio, entre otros)*
14. *Control de Aspectos de cumplimiento de SST*
15. *Cumplimiento de Aspectos Ambientales*

INFORMACION SOBRE CONTRATO DE INTERVENTORIA

1. Información general del contrato de interventoría relacionando objeto, valor, plazo, fechas de inicio terminación, novedades (prorrogas, suspensiones, reinicios, adiciones).
2. Control de Pólizas de Garantías del contrato de interventoría, relacionando póliza inicial y cada uno de los anexos modificatorios que se vayan dando en la ejecución del contrato.
3. Descripción de cada una de las actividades desarrolladas por la interventoría durante el periodo, en cuanto a los aspectos técnicos, administrativos, legales, financieros y ambientales.
4. Descripción sobre apoyo en la gestión de trámites de permisos, servidumbres terrenas y requerimientos ambientales.
5. Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo, efectuados por el Contratista de Obra y por parte del Interventor como medio de comprobación o verificación. Emitir concepto de análisis de los ensayos.

6. Informes de verificación de puntos topográficos (en las obras que aplique)
7. Relación de Actas suscritas durante el periodo, comunicaciones cruzadas con el Contratista de Obra y con la Supervisión del Contrato, Actas de reuniones comités y demás.
8. Informe de inversión del anticipo del contrato de obra.
9. Avance financiero del contrato de interventoría.
10. Relación de personal de Interventoría.
11. Soporte de gastos detallados del Factor Multiplicador
12. Verificación de cumplimiento de pagos de seguridad social y parafiscales del Contratista de Obra y de Interventoría.
13. Certificado de aprobación de la relación de gastos y soportes del componente de Administración e imprevistos del Contratista de obra.
14. Verificación del Cumplimiento del PGIO del contrato.
15. Registro fotográfico de cada una de las actividades de realizadas por el contratista de obra e interventoría
16. Bitácora de Obra
17. Memoria de cantidades, Informe topográfico (cuando aplique).
18. Informe hidráulico (cuando aplique).
19. Planos de detalles constructivos y avance georreferenciado.
20. Conclusiones y recomendaciones del Interventor.

INFORME FINAL

Debe incluir toda la información relacionada anteriormente más la siguiente:

- Planos récord de obras
- Manual de conservación y mantenimiento de obras
- Acta de entrega a satisfacción a la comunidad beneficiada
- Acta de recibo a satisfacción de propietario predio (cuando aplique)
- Certificado de garantía de equipos en el caso que aplique
- Paz y salvo de pagos a personal de obra e interventoría
- Certificado de entrega de información ambiental al SIG

PARA LIQUIDACION


- Póliza de garantía actualizando el amparo de estabilidad de obra.
- Póliza de garantía actualizando el amparo de calidad del servicio.

.Informe financiero de los contratos de obra e interrventoria

Agradecemos su pronta atención a esta solicitud para garantizar el adecuado desarrollo y

cumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco del contrato.

Cordialmente,



DAMARIS PEÑA ORDOSGOITIA
Subdirectora de Planeación Ambiental

Elaboró: Ingrid Paola Garcia Martinez / SPA

CVS 21/03/2025 12:13
Al Contestar cite este No.: **20252103855**
Origen: Subdirección de Planeación Ambie
Destino:EDUAR ALFONSO MONTIEL PERALTA
Anexos: Fol: 2

Montería,

Señor
EDUAR ALFONSO MONTIEL PERALTA
Rep legal Consorcio Interpozos Sahagun
Cel: 3246800324
Calle 14 No .10a-01
interpozosahagun@gmail.com
Chinú (Cordoba)

ASUNTO: Respuesta al radicado 20251102802: remisión informe mensual 1

Buenos dias

Revisado el documento de informe de interventoría, se solicita realizar los siguientes ajustes:


Como obligación se tiene la presentación de un informe inicial que debe evidenciar la revisión del proyecto por parte del interventor, presupuesto cantidades, diseños y demás, así como la verificación de las áreas de construcción de acuerdo a los sitios referidos en el proyecto.

En el informe mensual, dentro del cuerpo del informe debe evidenciarse las actividades ejecutadas durante el periodo, es decir en el informe se presenta lo realizado semana tras semana, sin embargo la actividad que se ejecutó durante el periodo corresponde a la realización de los estudios geo eléctrico, por parte del contratista de obra, y no se menciona nada de los resultados del estudio ni se hace ningún comentario de la interventoría con respecto al seguimiento de dicha actividad, debe incluirse en el cuerpo de informe los esquemas del pozo y los resultados del estudio.

Por otra parte, los aspectos que debe atender la Interventoría, son de tipo técnico, administrativo, financiero, jurídica , ambiental ; por tanto debe describir que actuaciones realizó la interventoría en el periodo reportado, con respecto a cada uno de estas obligaciones. El control de las pólizas debe evidenciarse en el documento del informe, así mismo debe mostrarse el cronograma en tiempo y flujo de fondos de las actividades del contrato de obras, no sólo la gráfica, para que pueda evidenciarse el cumplimiento de lo programado.

Favor tener presente lo indicado en la nota interna enviada 20252102610 del 25 de febrero del presente, como aspectos a tener en cuenta en el contenido del informe.

Atentamente



DAMARIS PEÑA ORDOSGOITIA
Subdirectora de Planeación Ambiental

Respuesta a: 20251102802 del 12/03/2025

C.C: Ingrid Paola Garcia Martinez / SPA

Elaboró: Damaris Peña Ordosgoitia / SPA

CONSORCIO INTERPOZOS SAHAGUN

Montería, febrero 24 de 2025 CIN-065-2024-03

Señores
CONSORCIO HIDROCIVIL
EVIN MARIO CUARTAS PADILLA
Representante Legal.

REF: CONTRATO N° 065-2024 - OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO ¨CONSTRUCCIÓN DE POZOS PROFUNDOS ACCIONADOS CON ENERGÍA FOTOVOLTAICA COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN DE LAS COMUNIDADES A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MUNICIPIO SAHAGÚN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA¨

REF: SOLICITUD INSTALACION VALLA INFORMATIVA

Cordial saludo:

En el marco de seguimiento del contrato de la referencia, se hace necesario instalar lo más pronto posible la Valla informativa del proyecto, teniendo en cuenta que éste requerimiento se encuentra consignada en la CLAUSULA SEXTA –OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

2-Obligaciones administrativas

Valla informativa: El CONTRATISTA instalará en un lugar visible y por su cuenta una valla con el logotipo de la CVS, alusiva a los trabajos a realizar. La valla tendrá las dimensiones acordadas con la supervisión asignada por la CVS y contendrá el objeto del contrato, nombre de la Corporación, valor y otros requerimientos que designe la supervisión; EL CONTRATISTA deberá presentar foto de la valla, la que anexará a los informes de ejecución del objeto contractual.

Atentamente.



EDUAR ALFONSO MONTIEL PERALTA
C.C. No. 78.734.804 de Chinú
R/LCONSORCIO INTER POZOS SAHAGUN

CONSORCIO INTERPOZOS SAHAGUN

Montería, marzo 17 de 2025 CIN-065-2024-04

Señores
CONSORCIO HIDROCIVIL
EVIN MARIO CUARTAS PADILLA
Representante Legal.

REF: CONTRATO N° 065-2024 - OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO ¨CONSTRUCCIÓN DE POZOS PROFUNDOS ACCIONADOS CON ENERGÍA FOTOVOLTAICA COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN DE LAS COMUNIDADES A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MUNICIPIO SAHAGÚN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA¨

REF: ACTIVIDADES POR INICIAR SEGÚN PROGRAMACION

Cordial saludo:

En el marco de seguimiento del contrato de Interventoría 065-2024, se hace necesario iniciar con las actividades que se encuentran en la programación correspondiente, esto con el fin de implementar el normal desarrollo y supervisión de la misma.

A continuación, se relacionan dichas actividades:

VEREDA GATO CARO

ITEM	ACTIVIDAD	FECHA INICIO
3.1	Construcción de estructura en concreto reforzado para instalación de tanques de reserva de agua. H= 6 m	Semana 1(22 enero al 26 enero)
1.5	Ampliación de Agujero de 8 1/2 pulgadas a 12 pulgadas de diámetro	Semana 8 (10 marzo-16 marzo)
1.6	Suministro e instalación de tubería acampanada PVC 6" - RDE 21 - 200 PSI	Semana 8 (10 marzo-16 marzo)

CONSORCIO INTERPOZOS SAHAGUN

VEREDA EL TESORO

ITEM	ACTIVIDAD	FECHA INICIO
3.1	Construcción de estructura en concreto reforzado para instalación de tanques de reserva de agua. H= 6 m	Semana 8 (10 marzo-16 marzo)

Atentamente.



EDUAR ALFONSO MONTIEL PERALTA
C.C. No. 78.734.804 de Chinú
R/LCONSORCIO INTER POZOS SAHAGUN

Fecha: Febrero 24 - 26 - 2025
Contrato: 064-2024
Objeto: Construcción de pozos profundos accionados con energía fotovoltaica como estrategia de adaptación de las comunidades a los efectos del cambio climático en el municipio Sahagun departamento de Cordoba.
Personal obra: Ing. Residente, 1 Supervisor, 3 ayudantes
Personal interventoria: Ing. Residente
Estado tiempo: Soleado
Maquinaria. Equipos: Equipo geoeléctrico
Actividades: Logistica para inicio actividades (perforación del pozo y construcción piscina todas)
Observaciones: Ninguna.

Daniago Ramos G
Resid. Obra. Resid interv

Fecha: Febrero 27 - Marzo 2 - 2025
Contrato: 064-2024
Objeto: Construcción de pozos profundos accionados con energía fotovoltaica como estrategia de adaptación de las comunidades a los efectos del cambio climático en el municipio Sahagun departamento de Cordoba.
Personal obra: Ing. Residente 1 Supervisor, 3 ayudantes
Personal interventoria: Ing. Residente
Estado tiempo: Soleado
Maquinaria - Equipos: Maquinaria de Perforacion motobomba, tolnque almacenamiento agua herr. menores
Actividades: Se realiza llegada de maquinaria para perforacion del pozo en la vereda Caño Caro y el Tesoro.
Observaciones: Ninguna.

Daniago Ramos G
Resid. obra. Resid interv

Powered by CamScanner

Fecha: Marzo 3 - 4 - 2025
Contato: 064-2024
Objeto: Construcción de pozos profundos accionados con energía fotovoltaica como estrategia de adaptación de las comunidades a los efectos del cambio climático en el municipio Sahagún departamento de Cordoba.
Personal obra: Ing. Residente, 1 Supervisor, 3 ayudantes
Personal interventoria: Ing. Residente
Estado tiempo: Soleado
Maquinaria - Equipos: Maquinaria de perforación, motobomba, tanque almacenamiento agua, herr. menores
Actividades: Construcción Piscina todos vereda Gato Caro.
Observaciones: Ninguna.

Residente obra. Domingo Pauni G. Resid. inter.

Fecha: 13 Marzo - 2025.
Contato: 064-2024.
Objeto: Construcción de pozos profundos accionados con energía fotovoltaica como estrategia de adaptación de las comunidades a los efectos del cambio climático en el municipio Sahagún departamento de Cordoba.
Personal obra: Ing. Residente, 1 Supervisor, 3 ayudantes
Personal interventoria: Ing. Residente.
Estado tiempo: Soleado.
Maquinaria - Equipos: Maquinaria de perforacion, motobomba tanques almacenamiento agua, herr. menores
Actividades: Inicio perforación pozo vereda Gato Caro
Observaciones: Se realiza visita funcionarios CVS. para verificar avance y Seguimiento respectivo

Residente obra. Domingo Pauni G. Resid. interv.

Powered by CamScanner

Fecha: 6 Marzo 2025
Contrato: 064-2024
Objeto: Construcion de pozos profundos accionados con energia fotovoltaica como estrategia de adaptacion de las comunidades a los efectos del cambio climático en el municipio Sahagun departamento de Cordoba.
Personal obra: Ing. Residente, 1 supervisor, 3 ayudante Gato Caro: Ing. ambiental
Personal obra El Tesoro: 3 ayudante Supervisor
Personal interventoria: Ing. Residente
Estado tiempo: Soleado
Maquinaria y Equipos: Maquinas perforadoras, motobombas, tanques almacenamiento agua, herramientas
Actividades: Perforacion vereda Gato Caro e inicio perforacion Vereda el Tesoro
Observaciones: Ninguna.

Residente Obra. — Domingo Ramirez Residente interv

Fecha: 7 Marzo 2025
Contrato: 064-2024
Objeto: Construcion de pozos profundos accionados con energia fotovoltaica como estrategia de adaptacion de las comunidades a los efectos del cambio climático en el municipio Sahagun departamento de Cordoba.
Personal Obra: Gato Caro (Ing Residente, 1 supervisor 3 ayudantes; El Tesoro (3 ayudantes), Supervisor
Personal interventoria: Ing. Residente
Estado tiempo: Soleado
Maquinaria. Equipos: Maquinas perforadoras, motobombas, HM
Actividades: Perforacion de pozos (Gato Caro - Tesoro)
Observaciones: Ninguna

Residente Obra — Domingo Ramirez Residente interv

Powered by CamScanner

Fecha: 8 Marzo 2025
Contrato: 064-2024
Objeto: Construcion de pozos profundos accionados con energia fotovoltaica como estrategia de adaptacion de las comunidades a los efectos del cambio climático en el municipio Sahagun departamento de Cordoba.
Personal Obra "Gato Caro": Ing. Residente, 1 Sup. 3 ayudantes
Personal obra "El Tesoro": 3 ayudante. Supervisor, ing. ambiental
Personal interventoria: Ing. Residente
Estado tiempo: Soleado.
Maquinaria. Equipos: Maquinas perforadoras, motobombas tanques almacenamiento agua, herr. menores.
Actividades: Perforacion pozo vereda El Tesoro
No hubo actividades en Gato Caro por mantenimiento de maquinaria de perforacion, Instalacion valla informativa.
Observaciones: Ninguna.

Cesar
Resid. obra

Domingo Pearn G.
Resid. interv

Fecha: 10 Marzo 2025
Contrato: 064-2024
Objeto: Construcion de pozos profundos accionados con energia fotovoltaica como estrategia de adaptacion de las comunidades a los efectos del cambio climático en el municipio Sahagun departamento de Cordoba
Personal obra "Gato Caro": Ing. Residente, 1 Supervisor, 3 ayudantes
Personal obra "El Tesoro": 3. ayudantes. Supervisor
Personal interventoria: Ing Residente.
Estado tiempo: Soleado
Maquinaria. Equipos: Maquinas perforadoras, motobombas tanques alm. agua, herr. menores
Actividades: Se continua perforacion en dos pozos Gato caro y el Tesoro
Observ: Ninguna

Cesar
Resid obra

Domingo Pearn G
Resid interv.

Powered by CamScanner

Fecha: 11 Marzo 2025 - 13 Marzo -2025
Contrato: 064-2024
Objeto: Construcción de pozos profundos accionados con energía fotovoltaica como estrategia de adaptación de las comunidades a los efectos del cambio climático en el municipio Sahagún departamento de Cordoba.
Personal obra Gato Caro: Ing. Residente, 1 Supervisor, 3 ayud.
Personal obra El Tesoro: 3 ayudantes, Supervisor, Ing. ambiental
Personal interventoria: Ing. Residente
Estado tiempo: Soleado
Maquinaria - Equipos: Máquinas perforadoras, motobombas tanques almacenamiento agua, herr. menores
Actividades: Perforación de pozo Gato Caro (acumulado 150m). Perforación de pozo El tesoro (acumulado 33m)
Observaciones: Ninguna.

Residente obra — Residente interventoría: Domingo Ramírez G.

Fecha: 14-15 Marzo 2025
Contrato: 064-2024
Objeto: Construcción de pozos profundos accionados con energía fotovoltaica como estrategia de adaptación de las comunidades a las efectos del cambio climático en el municipio Sahagún departamento de Cordoba.
Personal obra Gato Caro: Ing. Residente, 1 Supervisor, 3 ayudantes
Personal obra El Tesoro: 3 ayudantes, Supervisor, Ing Ambiental
Personal interventoría: Ing. Residente
Estado tiempo: Soleado
Maq - Equipos: Maq. perforadoras, motobombas, tanques agua, herr. men.
Actividades: Perforación pozos Gato Caro (115m acum)
El Tesoro (45m acumulado)
Observaciones: Ninguna

Residente obra — Residente interventoría: Domingo Ramírez G.

Fecha: 17 Marzo 2025
Contrato: 064-2024
Objeto: Construcción de pozos profundos accionados con energía fotovoltaica como estrategia de adaptación de las comunidades a los efectos del cambio climático en el municipio Sahagún departamento de Córdoba.
Personal obra Cato Caro: Ing. Residente, 1 Supervisor, 3 ayud.
Personal obra El Tesoro: 3 ayudantes, Supervisor
Personal interventoría: Ing. Residente.
Estado tiempo: Soleado
Maquinaria - Equipos: Maquinas perforadoras, motobombas tanques agua, herr. menores.
Actividades: Perforación de pozo Cato Caro (total 159m)
Perforación pozo El Tesoro (total 69m)
Observaciones: Se presenta estrato rocoso en la Vereda Cato Caro, por lo que disminuye la prof. de perforación

Residente obra — Diego Ramos G. Resid. interv.

Fecha: 18 Marzo 2025
Contrato: 064-2024
Objeto: Construcción de pozos profundos accionados con energía fotovoltaica como estrategia de adaptación de las comunidades a los efectos del cambio climático en el municipio Sahagún departamento de Córdoba.
Personal obra Cato Caro: Ing. Residente, 1 Supervisor 3 ayudantes
Personal obra El Tesoro: 3 ayudantes, Supervisor, Ing. Ambiental
Personal interventoría: Ing. Residente
Estado tiempo: Soleado.
Maquinaria. Equipos: Maquinas perforadoras, motobombas, tanques
Actividades: Perforación de pozo Cato Caro (161 m total)
Perforación pozo El Tesoro (84 m total)

Residente obra — Domingo Ramos G. Resid. interv.

Powered by CamScanner

Fecha. 19 Marzo 2025
Contrato: 064-2024
Objeto: Construcción de pozos profundos accionados con energía fotovoltaica como estrategia de adaptación de las comunidades a los efectos del cambio climático en el municipio Sahagún departamento de Córdoba.
Personal obra: Gato Caro: Ing. Residente, 1 Supervisor, 3 ayud
Personal obra El Tesoro: 3 ayudantes, Supervisor
Personal interventoría: Ing. Residente.
Estado tiempo: Soleado
Maquinaria - Equipos: Maquinas perforadoras, motobombas tanques almacenamiento agua, herr. menores.
Actividades: Perforación pozo Gato Caro (total 164m)
Perforación pozo El Tesoro. (total 89m)
Observaciones: Ninguna.

Residente Obra

Domingo Ram G.
Resid. interv.

Fecha: 20 Marzo 2025
Contrato: 064-2024
Objeto: Construcción de pozos profundos accionados con energía fotovoltaica como estrategia de adaptación de las comunidades a los efectos del cambio climático en el municipio Sahagún departamento de Córdoba.
Personal obra Gato Caro: Ing. Residente, Supervisor, 3 ayudantes
Personal obra El Tesoro: Supervisor, 3 ayudantes
Personal interventoría: Ing. Residente
Estado tiempo: Soleado
Maquinaria - Equipos: Maquinas perforadoras, motobombas tanques almacenamiento agua, herr. menores
Actividades: Perforación pozo Gato Caro (total 175m)
Perforación Pozo El Tesoro (total 94m)
Observaciones: Ninguna

Residente obra

Domingo Ram G.
Resid interv.

Powered by CamScanner

Fecha: 21 Marzo 2025
Contrato: 064-2024
Objeto: Construcción de pozos profundos accionados con energía fotovoltaica como estrategia de adaptación de las comunidades a los efectos del cambio climático en el municipio Sahagún departamento de Cordoba.
Personal obra Gato Caro: Ing. Residente, Supervisor, 3 ayudantes
Personal obra El Tesoro: Supervisor 3 ayudantes, ing. ambiental
Personal interventoría: Ing. Residente.
Estado tiempo: Soleado - Nublado
Maquinaria - Equipos: Maquinas perforadoras, motobombas tanques almacenamiento agua, herr. menores
Actividades: Gato Caro: Se realiza registro eléctrico para determinar diseño del pozo
El Tesoro: Se realiza perforación del pozo (total 105 m)
Observaciones: Ninguna.

Perfd. obra

Domingo Ramos G.
Resid. interv

Fecha: 22 Marzo 2025 ; Contrato: 064-2024
Objeto: Construcion de pozos profundos accionados con energia fotovoltaica como estrategia de adaptación de las comunidades a los efectos del cambio climático en el municipio Sahagún departamento de Cordoba.
Personal obra Gato Caro: Ing. Residente, Supervisor, 3 ayudantes
Personal obra El Tesoro: Supervisor, 3 ayudantes
Estado tiempo: Soleado
Maquinaria - Equipos: Máquinas perforadoras, motobombas, tanques almacenamiento agua, herr. menores
Actividades: Gato Caro: Mantenimiento maquina perforadora
El Tesoro: Perforación pozo (total 107)

Perfd. obra.

Domingo Ramos G.
Resid interv

	INFORME MENSUAL No. 2	
Código:	Versión: 02	Emisión: 23/03/2025

INFORME PGIO No.:	02

CONTRATO DE OBRA No.:	**064 DEL 2024**

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE POZOS PROFUNDOS ACCIONADOS CON ENERGÍA FOTOVOLTAICA EN EL MUNICIPIO SAHAGÚN COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

CONTRATANTE:	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES SINÚ Y DEL SAN JORGE - CVS

CONTRATISTA:	CONSORCIO HIDROCIVIL

PLAZO: 4 MESES	FECHA DE INICIO:	22 / 01 / 2025	FECHA DE TERMINACIÓN:	22 / 05 / 2025	
PERIODO DEL INFORME	DESDE:	23 02 2025	HASTA:	22 03 2025	

CIUDAD Y FECHA:	MONTERÍA, 23 MARZO DE 2025

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO 2
1. INTRODUCCIÓN 4
2.LOCALIZACIÓN GENERAL 5
3.INFORMACION CONTRACTUAL DEL PROYECTO 6
4. DATOS DEL CONTRATO DE OBRA 7
5. DATOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 8
6. ACTIVIDADES DE GESTION REALIZADAS DURANTE EL PERIODO....9
6.1.GESTIÓN DE CALIDAD 9
6.1.2. Recursos humanos 9
6.1.3. Listado del personal....10
6.1.4.Clasificación del personal....10
6.1.5. Materiales,productos y servicios 11
6.1.6 Relación de maquinaria y equipos utilizados 11
6.1.7. Comunicación....12
6.1.7.1.Retroalimentación con el clientes y otras partes....12
6.1.7.2. Comunicación interna……..…13
6.1.7.3. Bitácora de obra……13
6.1.8. Gestión de documentación……..13
6.2. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO……...14
6.2.1 Identificación de peligros y valoración de riesgos……14
6.2.2. Supervisión de elementos de protección personal ……14
6.2.3. Sistema integral de seguridad social……..……...……...14
6.2.4. Manejo de RESPEL....15
6.2.5. Ejecución de pausas activas durante las jornadas laboral....16
6.2.6. Inspecciones de equipos de seguridad....18
6.2.7. Saneamiento básico....18
6.2.7.1. Hidratación....19
6.2.7.2. Servicios sanitarios....21
6.3. ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL....22
6.3.1 Capacitación de inducción ambiental....22
6.3.2. Manejo y disposición de residuos....23
6.3.3. Jornadas de orden y aseo....24

6.3.4. Control de emisiones atmosféricas……25
7.ANEXOS……26

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1. LISTADO DEL PERSONAL 10
TABLA 2. CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL. 10
TABLA 3. LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CAMPO…… 11

LISTADO DE ILUSTRACIONES

ILUSTRACIÓN 1. MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA ……12
ILUSTRACIÓN 2. ALMACENAMIENTO ACPM……15
ILUSTRACIÓN 3. FICHA DE SEGURIDAD……16
ILUSTRACIÓN 4. EJECUCIÓN DE PAUSAS ACTIVAS……17
ILUSTRACIÓN 5. INSPECCIONES DE EQUIPOS DE SEGURIDAD ……18
ILUSTRACIÓN 6. HIDRATACIÓN……20
ILUSTRACIÓN 7. SERVICIO SANITARIO……21
ILUSTRACIÓN 8. CAPACITACIÓN DE INDUCCIÓN AMBIENTAL……22
ILUSTRACIÓN 9. PUNTO ECOLÓGICO……23
ILUSTRACIÓN 10. JORNADAS DE ORDEN Y ASEO……24

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como finalidad ofrecer un análisis exhaustivo del Plan de Gestión Integral de Obra (PGIO). Este plan ha sido diseñado para supervisar y asegurar que la ejecución de las obras se realice de manera adecuada, cumpliendo con los estándares de calidad, los plazos estipulados y los presupuestos asignados.
Se ha abarcado todas las fases del proyecto, desde su planificación inicial hasta la finalización de la obra. En este documento se registran las actividades de control, seguimiento y evaluación llevadas a cabo durante este periodo, proporcionando una visión integral y precisa del estado actual del proyecto.

Se detallan los procedimientos establecidos para la gestión integral de la obra, los métodos de monitoreo empleados y los indicadores clave de desempeño utilizados. junto con las recomendaciones y acciones correctivas que se han implementado para asegurar el éxito del proyecto.

El objetivo de este informe es ofrecer una evaluación completa de la ejecución del PGIO, destacando tanto los logros obtenidos como las áreas de mejora identificadas. A su vez, se busca fomentar la transparencia en la gestión de los recursos y establecer una base sólida para optimizar futuros proyectos.

2. LOCALIZACIÓN GENERAL

El proyecto se ejecutará en las veredas Gato Caro del corregimiento las Llanadas y El Tesoro del Corregimiento Arenas del Norte, del municipio de Sahagún, Departamento de Córdoba.

Corregimiento las Llanadas



Corregimiento Arenas del norte



3. INFORMACION CONTRACTUAL DEL PROYECTO

OBJETO DEL CONTRATO:	**“CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS ACCIONADOS CON ENERGIA FOTOVOLTAICA COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACION DE LAS COMUNIDADES A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO EN EL MUNICIPIO SAHAGUN, DEPARTAMENTO DE CORDOBA"**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Veredas Gato Caro del corregimiento las Llanadas y El Tesoro del Corregimiento Arenas del Norte, del municipio de Sahagún, Departamento de Córdoba

4. DATOS DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE:	**OBRA**
CONTRATO No.:	064 DE 2024.
CONTRATISTA:	CONSORCIO HIDROCIVIL NIT 901.902.140-2
SUPERVISOR:	DAMARIS PEÑA ORDOSGOITIA
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES
FECHA DE INICIO:	22 de Enero de 2025
FECHA DE TERMINACION:	22 de Mayo de 2025
PLAZO TRANSCURRIDO:	UNO (1) MES
VALOR INICIAL :	SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($662.661.158).
VALOR ACTUALIZADO:	SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($662.661.158).
VALOR ANTICIPO:	DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($265.064.463).
VALOR PAGADO:	A la fecha no se han realizado pagos de actas parciales
VALOR POR PAGAR:	Ala fecha no se han realizado pagos de actas parciales

5. DATOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE:	**INTERVENTORÍA**
CONTRATO No.:	065 DE 2024.
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTER POZOS SAHAGUN. NIT 901.901.669-1
SUPERVISOR:	DAMARIS PEÑA ORDOSGOITIA
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES
FECHA DE INICIO:	22 de Enero de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	22 de Mayo de 2025
VALOR INICIAL :	CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($45.917.816).
VALOR ACTUALIZADO:	CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($45.917.816).
VALOR ANTICIPO:	TRECE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($13.775.345).
VALOR PAGADO:	A la fecha no se han realizado pagos de actas parciales
VALOR POR PAGAR:	A la fecha no se han realizado pagos de actas parciales

6. ACTIVIDADES DE GESTION REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

6.1 ACTIVIDADES EN GESTIÓN DE CALIDAD

El Consorcio lleva a cabo las acciones establecidas en su plan de calidad, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, gestionar eficientemente los recursos y asegurar la correcta ejecución del proyecto, todo dentro de los marcos legales y técnicos, en aras de la satisfacción del cliente.

En este informe, se detallan las actividades que reflejan el progreso del plan de calidad durante el período comprendido entre el 1 y el 31 de marzo.

6.1.2. Recursos humanos

Selección del personal: para la escogencia del personal requerido en la ejecución del Contrato de obra N° **064 DEL 2024**, se tuvo en cuenta los requerimientos estipulados por la CVS en la licitación e incluidas en el plan de calidad, como evidencia se encuentran las hojas de vida de los profesionales con todos sus soporte y experiencias.

Se contrató un asesor externo, especialista en sistemas integrados de gestión para coordinar, diseñar, implementar y hacer seguimiento a los sistemas de gestión. Así mismo, asegurando los procesos de gestión de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. Se anexa a esta informe carpeta donde se encuentra adjunto la hoja de vida con todos los soportes correspondientes.

6.1.3. Listado de personal

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO
1	ANDRES VILLALBA BARRIOS	10.772.157	ING. DIRECTOR	3.000.000
2	NILTON VERGARA PORTILLO	72.191.970	ING.RESIDENTE	2.000.000
3	JAMM FERNANDEZ PEREZ	78.034.100	ING.ELECTRICO	2.000.000
4	GUSTAVOCASTILLO BERMEJO	78.733.966	ING.AMBIENTAL	2.000.000
5	MANUEL JOSE SOTO OSORIO	11.002.696	DIREC. DE INTER	4.490.000
6	DOMINGO GUERRA ZAPA	78.673.879	RESIDENTE INTERVENTORIA	3.490.000
7.	ANGEL BELTRÁN PEÑATE	78.726.645	OPERADOR	2.000.000
8.	EDER ARGEL RAMIREZ	1073.994.338	OPERADOR	2.000.000
9.	JUAN HERNÁNDEZ JIMENEZ	15.674.443	OPERADOR	2.000.000
10.	EDGAR UPARELA JARABA	15.046.499	OPERADOR	2.000.000
11.	WILLIAM RUÍZ MAESTRA	78.674.561	OBRERO	1.500.000
12.	MIGUEL PÉREZ HERNÁNDEZ	78.674.342	OPERADOR	2.000.000

Tabla 1. Listado de personal.

6.1.4 Clasificación del personal

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	N° DE TRABAJADORES
Administrativo	**2**
Profesional	**4**
Mano de obra no calificada	**6**
TOTAL	**12**

Tabla 2. clasificación del personal

6.1.5. Materiales, productos y servicios

Los materiales, productos y servicios necesarios son gestionados de acuerdo al procedimiento de compras y contratación de servicios, este mes no se llevó a cabo proceso de compra, pero sí de servicios para el estudio geo eléctrico y perforación.

para ello se llevó a cabo la evaluación y selección de servicios, teniendo en cuenta el instructivo evaluación y selección (INS-HSEQ-01), el cual se tuvieron los siguientes criterios:

- Sistema de calidad
- Precios
- Forma de pago
- Reconocimiento
- Atención al cliente

6.1.6. Relación de maquinaria y equipos utilizados

El contratista en el informe de PGIO presenta un listado de los equipos y maquinaria que fueron requeridos en la ejecución de las actividades realizadas en el periodo a evaluar, el cual es analizado a continuación.

EQUIPO Y MAQUINARIA	CANTIDAD
Equipo de geo eléctrica	1
Equipo de perforación Failin 1500	2
Bomba de lodos Diesel 15 HP	2
Sarta de perforación tipo petrolera	6
Brocas de aletas	4
Brocas tritono	4

Tabla 4. listado de maquinaria y equipos en campo.



Ilustración1.maquinaria y equipos en obra

6.1.7. Comunicación

La comunicación se realiza a través de diversos canales establecidos en el plan de calidad.

6.1.7.1. Retroalimentación con el cliente y otras partes interesadas

La retroalimentación con el cliente y comunicación se lleva a cabo a través de los canales dispuestos en el plan de calidad, es decir por medio de comités, reuniones, correos electrónicos y los informes de avance del proyecto.

Las comunicaciones contractuales son realizadas a través del contratante y el director del proyecto.

Las comunicaciones con interventoría son realizadas por medio de oficios, llamadas telefónicas y correos electrónicos.

6.1.7.2. Comunicación interna

Se establecieron canales de comunicación interna como oficios, reuniones, charlas, actividades de formación, grupo de WhatsApp y llamadas telefónicas.

6.1.7.3. Bitácora de obra: el ingeniero residente es el responsable del diligenciamiento de la bitácora donde se deja constancia de lo realizado día a día de las actividades ejecutadas en el proyecto, esta es revisada por la interventoría, a fin de evitar su adulteración. Esta información se encuentra adjunta a la carpeta de informes técnicos.

6.1.8 Gestión de documentación

Los documentos, soporte y registro que hacen parte del PGIO del proyecto son controlados y vigilados según lo establecido en el procedimiento de control de información documentada con el fin de facilitar su ubicación y que no presenten ninguna modificación no autorizada.

Toda la información documentada referente al PGIO se encuentra relacionada en el listado maestro de la información documentada, en el que se ha ido actualizado los documentos.

6.2. ACTIVIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Para el cumplimiento de estas políticas se realizaron las siguientes actividades en la obra:

6.2.1. Procedimiento para la identificación de peligros y valoración de riesgos

Se cuenta con matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos, donde se tienen identificados todos los riesgos asociados a las actividades que se desarrollan este mes en el proyecto ANEXO N°1, como lo establece el PGIO del proyecto, para la gestión de los riesgos prioritarios se realiza el seguimiento en campo, se realizan capacitación, establecen controles y se usan los elementos de protección personal necesarios para cada actividad.

6.2.2. Entrega, reposición y supervisión de elementos de protección personal y dotación.

Se realiza entrenamientos e inducciones al personal en obra de tal manera conozcan los riesgos a los que se enfrentaran, en el periodo no se realizó reposición de EPP
el consorcio garantiza que los trabajadores cuenten con los elementos de protección personal como cascos, guantes, gafas, botas, protectores auditivos tipo inserción, y dotación de trabajo (camisa y pantalón). A su vez se realiza cambio de todo EPP deteriorado llevando como evidencia el elemento dañado.

6.2.3. Sistema integral de seguridad social

Todos los trabajadores administrativos y profesional del consorcio se encuentran afiliados al Sistema de Seguridad Social en Colombia (ARL-EPS-AFP). se adjunta planilla de pago de seguridad social del mes de enero ANEXO N°2 y febrero ANEXO N°3


6.2.4. Manejo de residuos peligrosos (líquidos, combustibles, aceites y sustancias químicas.) y Fichas de datos de seguridad.

Las fichas de datos de seguridad FDS se tendrán en el lugar donde se almacene el producto químico de ser necesario el almacenamiento. Se evidencia el manejo adecuado de dichas sustancias que se manejan en obra.

Para este mes se reporta la utilización de sustancias químicas tales como ACPM, para el tanqueo de la máquina que se tienen en la obra se anexa registro fotográfico y ficha de seguridad.



Ilustración 2. almacenamiento de ACPM

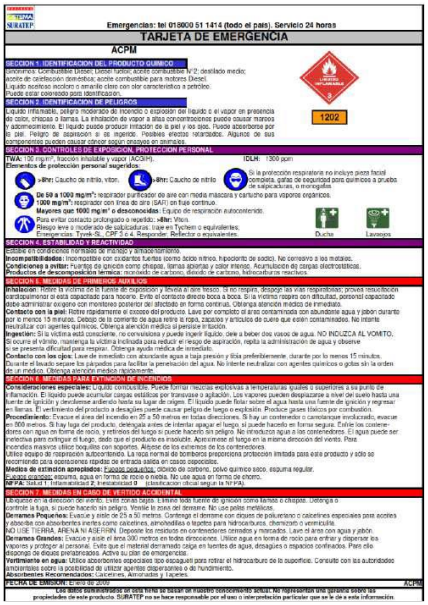

Emergencias: tel 018000 51 1414 (todo el país). Servicio 24 horas

TARJETA DE EMERGENCIA

ACPM

SECCION 1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO QUIMICO

SECCION 2. IDENTIFICACION DE PELIGROS

1202

SECCION 3. CONTROLES DE EXPOSICION, PROTECCION PESONAL

SECCION 4. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

SECCION 5. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

SECCION 6. MEDIDAS PARA EXTINCION DE INCENDIOS

SECCION 7. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

FECHA DE EMISION: El año de 2010

ACPM

Ilustración 3.ficha de seguridad.

6.2.5. Ejecución de pausas activas durante las jornadas laborales.

En el mes de marzo se realizó unas pausas activas liderada por los encargados. Sesiones de actividad física de 10 minutos que incluyeron adaptación física, fortalecimiento muscular, mejoramiento de la flexibilidad, entre otros. Lista de asistencia ANEXO N°4

Realizar estos descansos en la jornada laboral trae beneficios como:

- Ayuda a controlar los niveles de estrés.
- Evita la fatiga física y mental.
- Previene los espasmos musculares.
- Combate la baja productividad.
- Aumenta la motivación y el estado de ánimo.



Ilustración 4. Ejecución de pausas activas durante las jornadas laborales.

6.2.6. Inspecciones equipos de seguridad

El consorcio cuenta con recursos básicos para prestar primeros auxilios (Botiquín), inmovilización y traslado de heridos (CAMILLA); elementos indispensables para dar la primera atención básica a víctimas de un accidente durante la ejecución de actividades del proyecto.

En el periodo de referencia se realizó inspección a los equipos de seguridad de la obra se adjunta la evidencia fotográfica a continuación y planilla de inspección de extintores ANEXO N°5



Ilustración 5. inspecciones de equipos de seguridad

6.2.7. Saneamiento básico

El saneamiento básico es crucial para garantizar la salud y seguridad de los trabajadores, al prevenir enfermedades y contaminación. Además, contribuye a la protección del medio ambiente al manejar adecuadamente las aguas residuales y los desechos sólidos.

6.2.7.1. Hidratación

En el mes de marzo se realizó entrega de hidratación periódica en el frente de trabajo. La hidratación es suministrada al personal en campo mediante pacas de agua que se hacen llegar al punto donde se están realizando las actividades. Posterior a eso se hace recolección de los residuos.

Para el consorcio es indispensable mantener el bienestar de los trabajadores, como es sabido las actividades que se desarrollan al interior de la obra, se realizan a cielo abierta, en zona de mucha vegetación, por lo cual en aquellos momentos de fuertes temperaturas es indispensable mantener el estado de salud de los trabajadores en óptimas condiciones.
Para ello se describirán algunas de las ventajas de suministran hidratación a los trabajadores:

Prevención de Golpes de Calor: Los trabajos en construcción suelen realizarse en ambientes calurosos y a menudo expuestos al sol. La deshidratación aumenta el riesgo de golpes de calor, que pueden ser peligrosos y causar síntomas como mareos, confusión y desmayos.

Mantener la Productividad: La deshidratación puede llevar a la fatiga y disminución de la concentración, lo cual puede afectar la eficiencia y el rendimiento en el trabajo. Estar bien hidratado ayuda a mantener un nivel óptimo de energía y enfoque.

Salud General: El agua es esencial para el funcionamiento adecuado de todos los sistemas del cuerpo, incluidos los sistemas cardiovascular, digestivo y renal. La deshidratación puede causar problemas como dolores de cabeza, calambres musculares y problemas digestivos.

Reducción del Riesgo de Lesiones: Una buena hidratación ayuda a mantener la función adecuada de los músculos y las articulaciones, reduciendo el riesgo de calambres y lesiones relacionadas con el esfuerzo físico.

Regulación de la Temperatura Corporal: El agua ayuda a regular la temperatura corporal a través de la transpiración. En ambientes calurosos, la sudoración es el principal mecanismo para enfriar el cuerpo, y este proceso requiere una adecuada hidratación para ser efectivo.



Ilustración 6. hidratación

6.2.7.2. Servicios Sanitarios

Por las características del proyecto se cuenta con servicios sanitarios en los campamentos provisionales establecidos (casas cercanas a las áreas de trabajo). el contratista evidencia el cumplimiento de dicha actividad por medio del registro fotográfico suministrado en el informe de PGIO N°2



Ilustración 7. servicio sanitario

6.3. ACTIVIDADES DE GESTION AMBIENTAL

El consorcio se mantiene comprometido con las buenas prácticas ambientales y en pro del cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, este mes se realizó una capacitación de inducción ambiental al personal de trabajo, jornadas de orden y aseo, el adecuado manejo de residuos.

6.3.1. Capacitación de inducción ambiental

En el mes de marzo, se llevó a cabo una capacitación de inducción ambiental en la cual se manejaron temas como manejo de residuos sólidos, orden y aseo en la obra, manejo de sustancias químicas y protección de recursos naturales. Se anexa registro de asistencia a la capacitación ANEXO N°6 y registro fotografico a continuación.



Ilustración 8. capacitación de inducción ambiental.

6.3.2. Manejo y disposición final de residuos.

El consorcio cuenta con punto ecológico y se mantiene comprometido con las buenas prácticas ambientales y en pro del cumplimiento de la normatividad ambiental vigente en manejo de Residuos garantizará la adecuada gestión y disposición de los RCD generadas en las actividades constructivas del proyecto. Sin embargo, es importante resaltar que el manejo de residuos sólidos en el frente de trabajo es casi nulo, debido a que en la obra no se maneja campamentos para toma de alimentos, el personal de obra toma la alimentación en una vivienda cercana la cual se la suministra.

De acuerdo con las especificaciones del proyecto el mismo no presenta generación de escombros por lo que solo se le solicitara al contratista las evidencias del manejo adecuado de residuos generados dentro de la obra tales como basuras, repuestos de mantenimiento, etc.



Ilustración 9. punto ecológico.

6.3.3. Jornadas de orden y aseo.

Se realizan controles de orden y aseo bajo la metodología 5s, con el fin de mantener el frente de obra limpio para evitar la aparición de virus y bacterias por acumulación de residuos, y orden para disminuir para probabilidad de un accidente laboral por golpe contra objetos o caídas al mismo nivel.





Ilustración 10. jornadas de orden y aseo.

6.3.4. Control de emisiones atmosféricas.

Para controlar las emisiones atmosféricas que pueden ocasionarse con el desarrollo de algunas actividades contenidas en el proyecto, el contratista realiza los siguientes controles:

• Las maquinas operan en horarios adecuados 7:00 a.m. – 5:00 p.m.

• Los materiales que generan material particulado son cubiertos con plásticos.

• A la fecha no se maneja transporte de materiales por lo que no se tiene volquetas en obra o transportando materiales, en el momento en el cual se requiera realizar el transporte de materiales se les pedirá a los propietarios d de las volquetas, la documentación exigida por el Ministerio de Transporte para el transito libre de vehículos por las carreteras del país.

• No se realizan quemas a cielo abierto.

• Los trabajadores son dotados con EPP apropiados a las labores.

ANEXOS: ANEXO N°1

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

consorcio interpozos Sahagún

DIA, MES AÑO 28/02/2025

PROCESO	ZONA / LUGAR	ACTIVIDADES	TAREAS	RUTINARIA: SI o NO	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO		MEDIDAS DE INTERVENCIÓN				
					DECRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN		FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE PROBABILIDAD (NP= ND x NE)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO (NR) e INTERVENCIÓN	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO (NR)	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	PEOR CONSECUENCIA	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA	EQUIPOS / ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
locativo	obra	obras preliminares	despeje y preparación zona del terreno	no	caídas mismo nivel, golpes por o contra herramientas	mecánico	lesiones por golpes		NIVELACIÓN	uso de EPP	6	3	18	alto	25	450	II	Aceptable con control específico	Fracturas				uso de EPP adecuado, uso adecuado de herramientas, visita previa a los terrenos,mantener áreas de circulación despejadas	guantes, casco, botas
mantenimiento	Obra	mantenimiento de maquinaria	limpieza,lubricación, ajustes y reparación	no	caída de objetos por manipulación, golpes	mecánico	lesiones por golpes			uso de EPP	2	3	6	medio	25	150	II	Aceptable con control específico	muerte				implementar uso de EPP	Casco, botas
operativo	obra	perforación	perforación y construcción	si	impacto continuo e intermitente del ruido producido por el proceso	Físico	cefalea,estrés, perdida auditiva	inspecciones y mantenimiento de maquinaria		uso de EPP , examenes médicos,estudio de dosimetría del ruido	6	3	18	Alto	25	450	II	Aceptable con control específico	perdida auditiva					orejeras con protección auditiva
administrativo	oficina	digitar	mantenimiento locativo	si	mala postura prolongada sin cambio de posición	Biomecánico	lumbalgias		sillas comodas y ajustables	pausas activas	2	4	8	medio	25	200	II	Aceptable con control específico	displasia lumbar				implementar sillas reclinables, ajustables y cómodas que se ajusten a la morfología	
administrativo	oficina	digitar	mantenimiento locativo	si	Movimientos repetitivos	Biomecánico	tendinitis, síndrome del tunel carpiano			pausas activas	2	3	6	medio	10	60	III	Mejorable	ruptura o desgarro de tendón					

ANEXO N°2

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901901669-1	CONSORCIO INTER POZOS SAHAGUN	CALLE 14 NRO 10a01 BARRIO TURBO	7821332	emonpe78@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		CÓRDOBA	CHINÚ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-01	E	25/02/2025	84445917	$659.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	53.400	0		0		0	8	300	0	53.700	1
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	130.900	0		0		0	8	700	0	131.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	68.400	0	0	0	0	8	400	0	68.800	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	167.600	0	0	0	0	8	900	0	168.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	102.700				102.700	8	600	103.300			1.027	103.300	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF16	Comfacor	891080005-1	59.000	8	400	59.400	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
29.600	8	200	29.800	2
ICBF				
44.400	8	300	44.700	2
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, RP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	184.300	185.300
Pensión	2	236.000	237.300
Riesgos Laborales	1	102.700	103.300
CCF	1	59.000	59.400
ESAP	0	0	0
ICBF	1	44.400	44.700
MEN	0	0	0
SENA	1	29.600	29.800
TOTALES	8	656.000	659.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901901669-1	CONSORCIO INTER POZOS SAHAGUN	CALLE 14 NRO 10a01 BARRIO TURBO	7821332	emonpe78@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			CÓRDOBA	CHINÚ	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 2 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-02	2025-01	E	25/02/2025	84445917	$859.800

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Extranjero	Residente	Ciudad Ubicación	Ing	Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC-LR	VAC	AVP	VCT	IRL	COTIZACIÓN	Cód. AFP	ISC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	ISC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	ISC ARL	Clase de riesgo	Cotización	Código CCF	ISC CCF	Aporte CCF	ISC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	11002698	SOTO OSORIO MANUEL JOSE	1	0			N	X															230301	427.050	66.400	0	0	0	0	EPS002	427.050	93.400	14-11	427.050	5	29.800	CCF16	427.050	17.100	427.030	6.600	12.900	0	0
2	CC	7667079	GUERRA ZAPA DOMINGO RAMON	1	0			N	X															23-14	1.047.000	167.600	0	0	0	0	MIN001	1.047.000	130.900	14-11	1.047.000	5	72.900	CCF16	1.047.000	41.900	1.047.000	21.000	31.500	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901902140-2	CONSORCIO HIDROCIVIL		CALLE57 NRO 11 120 CLL 43	7821332	HIDROCIVILCONSORCIO@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot			CÓRDOBA	MONTERÍA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-01	E	01/04/2025	85229939	$1.119.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	160.200	0		0		0	49	5.100	0	165.300	3
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	178.000	0		0		0	49	5.800	0	183.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	433.000	0	0	0	0	49	13.600	0	446.600	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	69.400				69.400	49	2.200	71.600			694	71.600	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF16	Comfacor	891080005-1	108.300	49	3.400	111.700	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
54.300	49	1.800	56.100	4
ICBF				
81.500	49	2.600	84.100	4
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	338.200	348.900
Pensión	1	433.000	446.600
Riesgos Laborales	1	69.400	71.600
CCF	1	108.300	111.700
ESAP	0	0	0
ICBF	1	81.500	84.100
MEN	0	0	0
SENA	1	54.300	56.100
TOTALES	7	1.084.700	1.119.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901902140-2	CONSORCIO HIDROCIVIL	CALLE57 NRO 11 120 CLL 43	7821332	HIDROCIVILCONSORCIO@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A – Más de 200 cot			CÓRDOBA	MONTERÍA	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-01	E	01/04/2025	85229939	$1.119.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							BALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Ubicación	Tarifa	Alto Riesgo Pensión	Cotiza a Pensión	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL			Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Valor Aporte Afiliado	Valor Aporte Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	10772157	VILLALBA BARRIOS ANDRES FABIAN	1	0		N	N																		25-14	427.050	90.400	0	0	0	0	EPS002	427.050	53.400	14-11	427.050	5	29.800	CCF16	427.050	17.100	427.050	5.600	12.900	0	0
2	CC	72191970	VERGARA PORTILLO MILTON CESAR	1	0		N	N																		25-14	427.050	90.400	0	0	0	0	EPS002	427.050	53.400	14-11	427.050	5	29.800	CCF16	427.050	17.100	427.050	5.600	12.900	0	0
3	CC	78036100	FERNANDEZ PEREZ JAAM	1	0		N	N																		25-14	427.050	90.400	0	0	0	0	EPS002	427.050	53.400	14-11	427.050	1	2.300	CCF16	427.050	17.100	427.050	5.600	12.900	0	0
4	CC	78730986	CASTILLO BERMEJO GUSTAVO ENRIQUE	1	0		N																			25-14	1.423.500	227.500	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	176.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF16	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ANEXO N°3

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901901669-1	CONSORCIO INTER POZOS SAHAGUN	CALLE 14 NRO 10a01 BARRIO TURBO	7821332	emonpe78@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		CÓRDOBA	CHINÚ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-02	E	27/03/2025	85255944	$1.314.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	178.000	0		0		0	10	1.200	0	179.200	1
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	189.100	0		0		0	10	1.200	0	190.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	10	1.500	0	229.300	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	242.000	0	0	0	0	10	1.600	0	243.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	204.400				204.400	10	1.300	205.700			2.044	205.700	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF16	Comfacor	891080005-1	117.500	10	800	118.300	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
58.800	10	400	59.200	2
ICBF				
88.200	10	600	88.800	2
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	367.100	369.500
Pensión	2	469.800	472.900
Riesgos Laborales	1	204.400	205.700
CCF	1	117.500	118.300
ESAP	0	0	0
ICBF	1	88.200	88.800
MEN	0	0	0
SENA	1	58.800	59.200
TOTALES	8	1.305.800	1.314.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901901669-1	CONSORCIO INTER POZOS SAHAGUN		CALLE 14 NRO 10a01 BARRIO TURBO	7821332	emonpe78@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			CÓRDOBA	CHINÚ	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-02	E	27/03/2025	85255944	$1.314.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombiano	Extranjero	Colombiano en el Exterior	Cotiza a Pensión	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días Cotizados	Cod. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Días Cotizados	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	11002695	SOTO OSORIO MANUEL JOSE	1	0		N																30	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	176.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF16	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
2	CC	78670879	GUERRA ZAPA DOMINGO RAMON	1	0		N	X															30	25-14	1.512.334	242.000	0	0	0	0	MIN001	1.512.334	189.100	14-11	1.512.334	5	105.300	CCF16	1.512.334	60.500	1.512.334	30.300	45.400	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901902143-2	CONSORCIO HIDROCIVIL	CALLE ST NRO 11 120 CLL 43	7821332	HIDROCIVILCONSORCIO@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A – Más de 200 cot			CÓRDOBA	MONTERIA	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO APORTES ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					INFILIADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-02	E	01/04/2025	85230197	$1.925.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	445.800	0		0		0	21	5.800	0	493.900	3
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	89.000	0		0		0	21	1.200	0	90.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	883.400	0	0	0	0	21	9.100	0	892.500	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	800063780-5	297.400				297.400	21	4.000	301.400			2.974	301.400	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF18	Comfacor	891080005-1	171.000	21	2.300	173.300	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
85.600	21	1.200	86.800	4
ICBF				
128.400	21	1.700	130.100	4
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	534.000	541.100
Pensión	1	883.400	892.500
Riesgos Laborales	1	297.400	301.400
CCF	1	171.000	173.300
ESAP	0	0	0
ICBF	1	128.400	130.100
MEN	0	0	0
SENA	1	85.600	86.800
TOTALES	7	1.899.800	1.925.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901902143-2	CONSORCIO HIDROCIVIL	CALLE ST NRO 11 120 CLL 43	7821332	HIDROCIVILCONSORCIO@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	A – Más de 200 cot			CORDOBA	MONTERIA	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO APORTES A (BANCARIA)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					IMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-02	E	01/04/2025	85230197	$1.025.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres																					Cod. AFP	IBC AFP	Cotización				Cod. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL		Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte CBAF	Aporte MEN
1	CC	1072157	VILLALBA BARRIOS ANDRES FABIAN	1	0																			25-14	711.750	113.904	0	0	0	EPS462	711.750	89.880	14-11	711.750	0	49.680	CCF16	711.750	35.588	711.750	14.300	21.480	0	0
2	CC	72191979	VERGARA PORTILLO HILTON CESAR	1	0																			25-14	1.423.500	227.808	0	0	0	EPS462	1.423.500	179.800	14-11	1.423.588	0	99.180	CCF16	1.423.500	57.808	1.423.580	35.600	42.960	0	0
3	CC	7900188	FERNANDEZ PEREZ JHAM	1	0																			25-14	1.423.500	227.808	0	0	0	EPS462	1.423.500	179.800	14-11	1.423.588	0	99.180	CCF16	1.423.500	57.808	1.423.580	35.600	42.960	0	0
4	CC	7972198	CASTELLO BERMEJO GUSTAVO ENRIQUE	1	0																			25-14	711.750	113.904	0	0	0	EPS461	711.750	89.880	14-11	711.750	0	49.680	CCF16	711.750	35.588	711.750	14.300	21.480	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ANEXO N°4

CONSORCIO INTERPOZOS SAHAGUN

ASISTENCIA A CAPACITACIÓN/EVENTOS

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE POZOS PROFUNDOS ACCIONADOS CON ENERGIA FOTOVOLTAICA COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN DE LAS COMUNIDADES A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MUNICIPIO SAHAGÚN DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

LUGAR	Arenas del norte	**HORA**	11:20 am	**FECHA**	20/03/2025
CAPACITACITACIÓN/EVENTO	Pausas activas.				
RESPONSABLE					

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	TIPO DE ASISTENTE	TELÉFONO	FIRMA
1	Edgar Varela Jaraba	15046499	Operador	3136774845	Edgar Varela.
2	William Ruiz Maestra	78674561	Obrero	N/A.	William Ruiz.
3	Miguel Perez H.	78674342	operador	3145340900	Miguel P.
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

Los aquí firmantes autorizan la toma de fotografías institucionales como evidencia de su participación en las capacitaciones y demás eventos, las cuales podrán ser usadas y difundidas en los documentos físicos y/o digitales del consorcio.

CONSORCIO INTERPOZOS SAHAGUN

ASISTENCIA A CAPACITACIÓN/EVENTOS

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE POZOS PROFUNDOS ACCIONADOS CON ENERGIA FOTOVOLTAICA COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN DE LAS COMUNIDADES A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MUNICIPIO SAHAGÚN DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

LUGAR	Las llanadas.	**HORA**	3:30 P.m.	**FECHA**	17/03/2025
CAPACITACITACIÓN/EVENTO	Pausas activas.				
RESPONSABLE					

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	TIPO DE ASISTENTE	TELÉFONO	FIRMA
1	Angel Beltran Penate	78726645	Operador		Angel B
2	Eder Argel ramirez	1073999338	aux. Perforacion		Eder Argel
3	Juan Hernandez Jimenez	15679443	auxiliar		Juan Hernandez
4	Nilton Vergara P.	72191970	Res. Obra.		Nilton
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

Los aquí firmantes autorizan la toma de fotografías institucionales como evidencia de su participación en las capacitaciones y demás eventos, las cuales podrán ser usadas y difundidas en los documentos físicos y/o digitales del consorcio.

ANEXON°5

CONSORCIO INTERPOZOS SAHAGÚN	INSPECCIÓN DE EXTINTORES VERSIÓN: 01	EDITADO: 22/02/2025

NOMBRE DEL RESPONSABLE INSPECCIÓN: FECHA:

No	No. de Extintor	TIPO DE CARGA	TIPO DE EXTINTOR	FECHA DE RECARGA	UBICACIÓN	PRESIÓN		SELLO GARANTÍA		MANÓMETRO		RECIPIENTE		MANIJA		MANGUERA		PINTURA		OBSERVACIONES
						B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
1	1	ABC	ABC	30/10/25	Camp. Las Llamadas	X		X		X		X		X		N/A		X		
2	2	ABC		28/08/25	Camp. A. del Norte.	X		X		X		X		X		N/A		X		
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				

OBSERVACIONES:

ANEXO N° 6

INDUCCIÓN AMBIENTAL

CONSORCIO INTERPOZOS SAHA	Version: 02	EDITADO: 22/02/2025

TEMAS INDUCCIÓN:	1. Manejo de Residuos Sólidos 2. Orden y aseo en la obra 3. Manejo de sustancias químicas 4. Protección de recursos naturales		
EMPRESA RESPONSABLE:	CONSORCIO INTERPOZOS	MES:	03
NOMBRE DE QUIEN LA LIDERA:	Gustavo Castillo B.	CARGO:	Ing. Amb.
DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:	15 - 20 MINUTOS	LUGAR:	
OBJETO DE LA ACTIVIDAD:	fortalecer buenas prácticas ambientales en la Obra.		

REGISTRO DE ASISTENCIA

No.	FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	05/03/2025	Juan Hernandez Jimenez	auxiliar	15674443	
2	05/03/2025	Eder Angel ramirez	aux. perforación	1073993385	
3	05/03/2025	Angel Beltrán Peñate	Operario.	78726645	
4	05/03/2025	Nilton Vergara P.	Residente Obra	72191970	
5	05/03/2025	Miguel Perez H.	Operario	78624342	
6	05/03/2025	William Ruiz Maestre	78674561	obrero	
7	05/03/2025	Edgar Urueta Jaraba	Operario	15048149	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

Escaneado con CamScanner
