# INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA

ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO

NIT: 9.731.335-1

Interventor

ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO CPNT
INTERVENTOR

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

| | | |
|---|---|---|
| INFORME No. | OCHO (08) | PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ABRIL DE 2025 AL 15 DE ABRIL DE 2025 |
| OBJETO | REALIZAR LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO | |
| LOCALIZACIÓN | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | |

| CONTRATO DE CONSULTORÍA | | CONTRATO DE INTERVENTORIA | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No.: | 86003992024 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 | CONTRATO No.: | 86004032024 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| CONTRATISTA: | MIGUEL ROBLES S.A.S<br>R/L. MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO | CONTRATISTA: | ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO |
| PLAZO INICIAL: | DOS (02) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO | PLAZO INICIAL: | DOS (02) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO |
| FECHA DE INICIO: | 12 DE DICIEMBRE DE 2024 | FECHA DE INICIO: | 12 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 11 DE FEBRERO DE DE 2025 | FECHA DE FINALIZACIÓN: | 11 DE FEBRERO DE DE 2025 |
| VALOR INICIAL CONTRATO DE CONSULTORIA: | $ 330.866.547,00 | VALOR CONTRATO INTERVENTORÍA: | $ 66.173.309 |
| PRÓRROGA 01: | UN (01) MES | PRÓRROGA 01: | UN (01) MES |
| FECHA DE FINALIZACIÓN 2: | 11 MARZO DE 2025 | FECHA DE FINALIZACIÓN 2: | 11 MARZO DE 2025 |
| PRÓRROGA 02: | UN (01) MES | PRÓRROGA 02: | UN (01) MES |
| FECHA DE FINALIZACIÓN 3: | 11 ABRIL DE 2025 | FECHA DE FINALIZACIÓN 3: | 11 ABRIL DE 2025 |
| PRÓRROGA 03: | UN (01) MES | PRÓRROGA 03: | UN (01) MES |
| FECHA DE FINALIZACIÓN 4: | 11 DE MAYO DE 2025 | FECHA DE FINALIZACIÓN 4: | 11 MAYO DE 2025 |

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

## 2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS

### CONTRATO DE CONSULTORÍA

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° CHU-100035049 - ANEXO No. 2 (20-12-2024)

ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS CON ACTA DE INICIO DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2024

| CONCEPTO | VIGENTE (Fechas) | | VALOR |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| Cumplimiento del Contrato | 12/12/2024 | 17/08/2025 | $ 33.086.660,00 |
| Pago de Salarios y Prestaciones Sociales | 12/12/2024 | 17/02/2028 | $ 49.629.990,00 |
| Calidad del servicio | 11/02/2025 | 11/02/2030 | $ 33.086.660,00 |

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° CHU-100035049 - ANEXO No. 2 (20-12-2024)

ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS CON ACTA DE PRORROGA 01 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2025

| CONCEPTO | VIGENTE (Fechas) | | VALOR |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| Cumplimiento del Contrato | 31/12/2024 | 17/09/2025 | $ 33.086.660,00 |
| Pago de Salarios y Prestaciones Sociales | 31/12/2024 | 17/03/2028 | $ 49.629.990,00 |
| Calidad del servicio | 11/03/2025 | 11/03/2030 | $ 33.086.660,00 |

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° CHU-100035049 - ANEXO No. 4 (13-03-2025)

ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS CON ACTA DE PRORROGA 02 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2025

| CONCEPTO | VIGENTE (Fechas) | | VALOR |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| Cumplimiento del Contrato | 11/03/2025 | 17/10/2025 | $ 33.086.660,00 |
| Pago de Salarios y Prestaciones Sociales | 11/03/2025 | 17/04/2028 | $ 49.629.990,00 |
| Calidad del servicio | 11/04/2025 | 11/04/2030 | $ 33.086.660,00 |

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° CHU-100035049 - ANEXO No. 6 (15-04-2025)

ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS CON ACTA DE PRORROGA 03 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2025

| CONCEPTO | VIGENTE (Fechas) | | VALOR |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| Cumplimiento del Contrato | 11/04/2025 | 17/11/2025 | $ 33.086.660,00 |
| Pago de Salarios y Prestaciones Sociales | 11/04/2025 | 17/05/2028 | $ 49.629.990,00 |
| Calidad del servicio | 11/05/2025 | 11/05/2030 | $ 33.086.660,00 |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° CHU-1000361669 - ANEXO No, 2 (20-12-2024)

ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS CON ACTA DE INICIO DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2024

| CONCEPTO | VIGENTE (Fechas) | | VALOR |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| Cumplimiento del Contrato | 12/12/2024 | 22/08/2025 | $ 4.995.096,40 |
| Pago de Salarios y Prestaciones Sociales | 12/12/2024 | 12/03/2028 | $ 2.497.548,20 |
| Calidad del servicio | 12/12/2024 | 22/08/2025 | $ 4.995.096,40 |

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° CHU-1000361669 - ANEXO No, 2 (20-12-2024)

ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS CON ACTA DE PRORROGA 01 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2025

| CONCEPTO | VIGENTE (Fechas) | | VALOR |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| Cumplimiento del Contrato | 31/01/2025 | 30/09/2025 | $ 4.995.096,40 |
| Pago de Salarios y Prestaciones Sociales | 31/01/2025 | 20/04/2028 | $ 2.497.548,20 |
| Calidad del servicio | 31/01/2025 | 30/09/2025 | $ 4.995.096,40 |

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° CHU-100035049 - ANEXO No. 4 (12-03-2025)

ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS CON ACTA DE PRORROGA 02 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2025

| CONCEPTO | VIGENTE (Fechas) | | VALOR |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| Cumplimiento del Contrato | 11/03/2025 | 30/10/2025 | $ 4.995.096,40 |
| Pago de Salarios y Prestaciones Sociales | 11/03/2025 | 20/05/2028 | $ 2.497.548,20 |
| Calidad del servicio | 11/03/2025 | 30/10/2025 | $ 4.995.096,40 |

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° CHU-100035049 - ANEXO No. 5 (16-04-2025)

ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS CON ACTA DE PRORROGA 03 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2025


| CONCEPTO | VIGENTE (Fechas) | | VALOR |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| Cumplimiento del Contrato | 11/04/2025 | 30/11/2025 | $ 4.995.096,40 |
| Pago de Salarios y Prestaciones Sociales | 11/04/2025 | 20/06/2028 | $ 2.497.548,20 |
| Calidad del servicio | 11/04/2025 | 30/11/2025 | $ 4.995.096,40 |

| | | |
|---|---|---|
| BIENESTAR FAMILIAR | INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA<br>ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO<br>NIT: 9.731.335-1<br>Interventor | ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO CPAL INTERVENTOR |

## 3. RESUMEN DE PAGOS

| CONTRATO DE OBRA | | | CONTRATO DE INTERVENTORÍA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONCEPTO | FECHA DE ACTA | VALOR | CONCEPTO | FECHA DE ACTA | VALOR |
| ACTA DE EJECUCIÓN No. 1 | 24/12/2024 | $ 99.259.964,00 | | | |
| ACTA DE EJECUCIÓN No. 2 | | | | | |
| | | | | | |

## 4. CONTROL DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

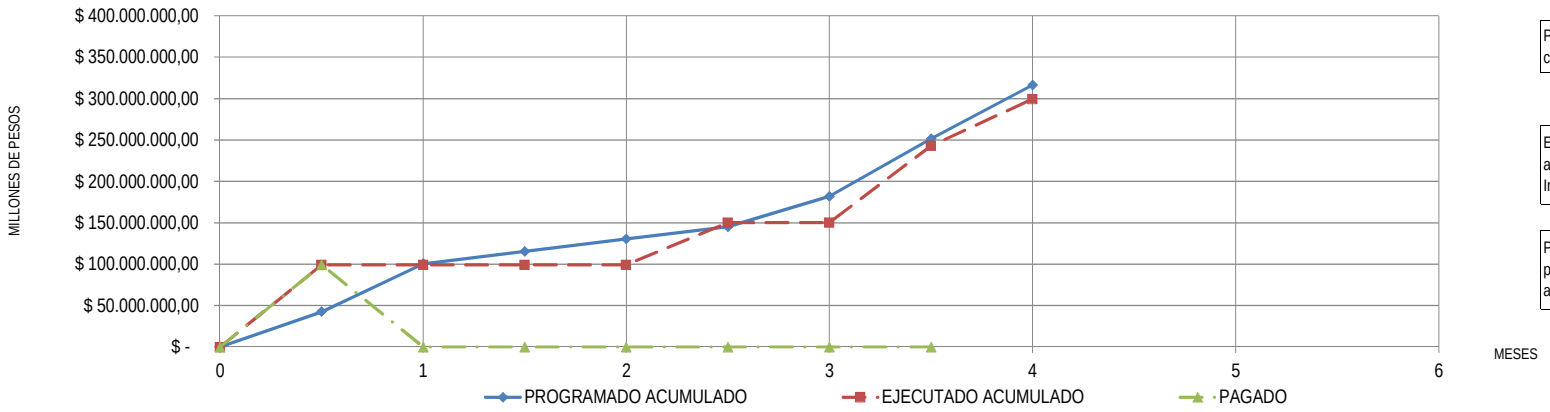


PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al contratista (Recuerde que el anticipo no es un pago).

## 5. CONTROL FINANCIERO DEL PROYECTO POR COMPONENTES

REALIZAR LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO INICIALMENTE CONTRATADO: | $ 330.866.547,00 |
| VALOR TOTAL PROGRAMADO MENSUAL: | $ 64.886.513,51 |
| VALOR TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO: | $ 316.441.352,04 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO AVANCE No. 8 : | $ 56.530.954,76 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO: | $ 299.477.490,18 |
| PORCENTAJE DE EJECUCION PRESENTE MES CON RESPECTO AL VALOR TOTAL DEL CONTRATO: | 17,09% |
| PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO CON RESPECTO AL VALOR TOTAL DEL CONTRATO: | 90,51% |
| SALDO PENDIENTE DE EJECUCIÓN: | $ 31.389.056,82 |
| VALOR PAGADO EN ACTAS PARCIALES: | $ 0,00 |
| PORCENTAJE POR EJECUTAR SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO: | 9,49% |

ING. ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO
C.C. 9.731.335 de Armenia
Interventor
