INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA

ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO

NIT: 9.731.335-1

Interventor

ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO CPAL
INTERVENTOR

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORME No.	NUEVE (09)	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE ABRIL DE 2025 AL 30 DE ABRIL DE 2025
OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO	
LOCALIZACIÓN	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	

CONTRATO DE CONSULTORÍA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
CONTRATO No.:	86003992024 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	CONTRATO No.:	86004032024 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2024
CONTRATISTA:	MIGUEL ROBLES S.A.S R/L. MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO	CONTRATISTA:	ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO	PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO:	12 DE DICIEMBRE DE 2024	FECHA DE INICIO:	12 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	11 DE FEBRERO DE DE 2025	FECHA DE FINALIZACIÓN:	11 DE FEBRERO DE DE 2025
VALOR INICIAL CONTRATO DE CONSULTORIA:	$ 330.866.547,00	VALOR CONTRATO INTERVENTORÍA:	$ 66.173.309
PRÓRROGA 01:	UN (01) MES	PRÓRROGA 01:	UN (01) MES
FECHA DE FINALIZACIÓN 2:	11 MARZO DE 2025	FECHA DE FINALIZACIÓN 2:	11 MARZO DE 2025
PRÓRROGA 02:	UN (01) MES	PRÓRROGA 02:	UN (01) MES
FECHA DE FINALIZACIÓN 3:	11 ABRIL DE 2025	FECHA DE FINALIZACIÓN 3:	11 ABRIL DE 2025
PRÓRROGA 03:	UN (01) MES	PRÓRROGA 03:	UN (01) MES
FECHA DE FINALIZACIÓN 4:	11 DE MAYO DE 2025	FECHA DE FINALIZACIÓN 4:	11 MAYO DE 2025

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE CONSULTORÍA

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° CHU-100035049 - ANEXO No. 2 (20-12-2024)

ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS CON ACTA DE INICIO DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	12/12/2024	17/08/2025	$ 33.086.660,00
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	12/12/2024	17/02/2028	$ 49.629.990,00
Calidad del servicio	11/02/2025	11/02/2030	$ 33.086.660,00

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° CHU-100035049 - ANEXO No. 2 (20-12-2024)

ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS CON ACTA DE PRORROGA 01 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2025

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	31/12/2024	17/09/2025	$ 33.086.660,00
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	31/12/2024	17/03/2028	$ 49.629.990,00
Calidad del servicio	11/03/2025	11/03/2030	$ 33.086.660,00

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° CHU-100035049 - ANEXO No. 4 (13-03-2025)

ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS CON ACTA DE PRORROGA 02 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	11/03/2025	17/10/2025	$ 33.086.660,00
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	11/03/2025	17/04/2028	$ 49.629.990,00
Calidad del servicio	11/04/2025	11/04/2030	$ 33.086.660,00

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° CHU-100035049 - ANEXO No. 6 (15-04-2025)

ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS CON ACTA DE PRORROGA 03 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2025

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	11/04/2025	17/11/2025	$ 33.086.660,00
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	11/04/2025	17/05/2028	$ 49.629.990,00
Calidad del servicio	11/05/2025	11/05/2030	$ 33.086.660,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° CHU-1000361669 - ANEXO No, 2 (20-12-2024)

ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS CON ACTA DE INICIO DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	12/12/2024	22/08/2025	$ 4.995.096,40
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	12/12/2024	12/03/2028	$ 2.497.548,20
Calidad del servicio	12/12/2024	22/08/2025	$ 4.995.096,40

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° CHU-1000361669 - ANEXO No, 2 (20-12-2024)

ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS CON ACTA DE PRORROGA 01 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2025

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	31/01/2025	30/09/2025	$ 4.995.096,40
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	31/01/2025	20/04/2028	$ 2.497.548,20
Calidad del servicio	31/01/2025	30/09/2025	$ 4.995.096,40

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° CHU-100035049 - ANEXO No. 4 (12-03-2025)

ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS CON ACTA DE PRORROGA 02 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	11/03/2025	30/10/2025	$ 4.995.096,40
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	11/03/2025	20/05/2028	$ 2.497.548,20
Calidad del servicio	11/03/2025	30/10/2025	$ 4.995.096,40

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° CHU-100035049 - ANEXO No. 5 (16-04-2025)

ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS CON ACTA DE PRORROGA 03 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2025


CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	11/04/2025	30/11/2025	$ 4.995.096,40
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	11/04/2025	20/06/2028	$ 2.497.548,20
Calidad del servicio	11/04/2025	30/11/2025	$ 4.995.096,40

BIENESTAR FAMILIAR	INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO NIT: 9.731.335-1 Interventor	ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO CPVL INTERVENTOR

3. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
CONCEPTO	FECHA DE ACTA	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE ACTA	VALOR
ACTA DE EJECUCIÓN No. 1	24/12/2024	$ 99.259.964,00			
ACTA DE EJECUCIÓN No. 2					

4. CONTROL DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

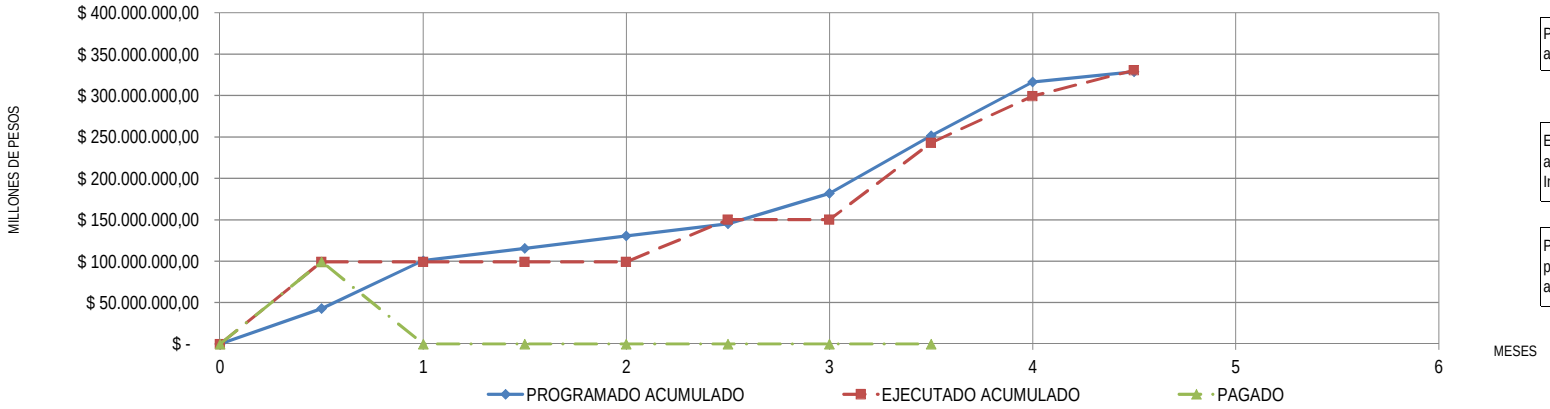

PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al contratista (Recuerde que el anticipo no es un pago).

5. CONTROL FINANCIERO DEL PROYECTO POR COMPONENTES

REALIZAR LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), REGIONAL PUTUMAYO

VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO INICIALMENTE CONTRATADO:	$ 330.866.547,00
VALOR TOTAL PROGRAMADO MENSUAL:	$ 12.318.854,35
VALOR TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO:	$ 328.760.206,39
VALOR TOTAL EJECUTADO AVANCE No. 9 :	$ 31.224.117,26
VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO:	$ 330.701.436,08
PORCENTAJE DE EJECUCION PRESENTE MES CON RESPECTO AL VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	9,44%
PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO CON RESPECTO AL VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	99,95%
SALDO PENDIENTE DE EJECUCIÓN:	$ 165.110,92
VALOR PAGADO EN ACTAS PARCIALES:	$ 0,00
PORCENTAJE POR EJECUTAR SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	0,05%

ING. ALLAN EDWARD SANCHEZ QUICENO
C.C. 9.731.335 de Armenia
Interventor
