Alcaldía de IBAGUÉ

INFORME MENSUAL

No. 4009 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2024
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

OBJETO

CONTRATAR CON UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO, LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.

IBAGUÉ– TOLIMA

Mayo del 2025

Alcaldía de IBAGUÉ

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 4
   2.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 4
      2.1.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 4
      2.1.2 CONDICIONES INICIALES 4
      2.1.3 ALCANCE DEL PROYECTO 5
3. CONTRATO DE OBRA 5
   3.1 INFORMACIÓN DEL CONTRATO 5
      3.1.1 GENERALIDADES 5
      3.1.2 PERSONAL DEL CONTRATISTA 6
   3.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS 6
      3.2.1 MAQUINARIA Y EQUIPOS 7
   3.3 PLAZO CONTRACTUAL 8
   3.4 GARANTÍAS DEL CONTRATO 8
4. CONCLUSIONES 11
5. ANEXOS 11

ANEXOS 12

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe mensual tiene como finalidad documentar y evaluar el desarrollo de las actividades ejecutadas durante el mes de enero en el marco del contrato suscrito para la prestación de servicios de mano de obra calificada y no calificada en el mejoramiento y optimización de la infraestructura vial urbana del municipio de Ibagué.

Durante el periodo reportado, se han llevado a cabo diversas actividades encaminadas al cumplimiento de los objetivos contractuales, garantizando el adecuado mantenimiento, rehabilitación y optimización de la red vial urbana. En este sentido, este informe detalla las labores realizadas, los avances alcanzados, las dificultades presentadas y las estrategias implementadas para la continuidad eficiente del proyecto.

Asimismo, se incluyen registros fotográficos, cantidades ejecutadas asegurando la transparencia y trazabilidad de las actividades ejecutadas.


Con este informe, se busca proporcionar una visión clara y detallada de la gestión realizada, en cumplimiento de las condiciones contractuales y los lineamientos establecidos por la entidad competente.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

2.1.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El municipio de Ibagué se encuentra ubicado en el centro-occidente de Colombia, sobre la cordillera central de los andes entre el cañón del Combeima y el valle del Magdalena en cercanías del nevado del Tolima, con coordenadas: Longitud75°12'02''-Latitud4°26'16''N. K4+850aK5+750

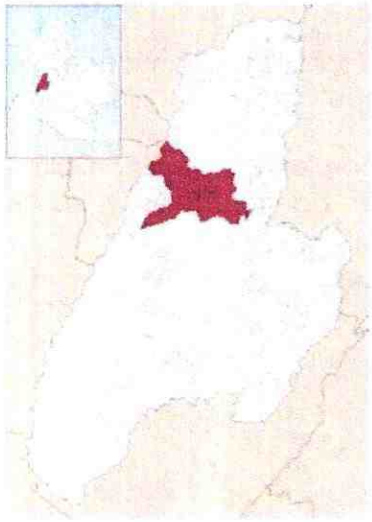

2.1.2 CONDICIONES INICIALES

En vista del crecimiento urbano y considerando las necesidades de mejoramiento de la infraestructura vial en el municipio de Ibagué, se identifican sectores que requieren intervención para garantizar una movilidad segura y eficiente. Actualmente, algunas vías presentan deterioro significativo, afectando la calidad de vida de los ciudadanos y el desarrollo económico de la región.

Por lo anterior, la Administración Municipal contempla la contratación de una entidad sin ánimo de lucro para la prestación de servicios de mano de obra calificada y no calificada, con el propósito de ejecutar actividades orientadas al mejoramiento y optimización de la infraestructura vial urbana, contribuyendo así al desarrollo sostenible y a la conectividad del municipio.

2.1.3 ALCANCE DEL PROYECTO

El presente proyecto contempla todas las intervenciones necesarias para la ejecución de las distintas fases del proyecto que involucran las actividades relacionadas con el mejoramiento y optimización de la infraestructura vial urbana del municipio de Ibagué.

Se hace necesaria la intervención en las diferentes fases o frentes del proyecto para dar mejor calidad de vida a cada uno de los transeúntes de la ciudad de Ibagué

3. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

3.1 INFORMACIÓN DEL CONTRATO

3.1.1 GENERALIDADES

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
CONTRATISTA	SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS
OBJETO	CONTRATAR CON UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO, LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.
VALOR	SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($656.229.349) MCTE IVA INCLUIDO SOBRE COSTOS INDIRECTOS
PLAZO	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024
PRORROGA No. 1	SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO

DOCUMENTOS GENERADOS DENTRO DEL CONTRATO	
ACTA DE INICIO	23 DE DICIEMBRE DE 2024
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1	30 DE DICIEMBRE DE 2024
ACTA DE REINICIO No.1	15 DE ENERO DE 2025
PRORROGA No.1	15 DE ENERO DE 2025
PRORROGA No.2	14 DE MARZO DE 2025
PRORROGA No.3	15 DE MAYO DE 2025

3.1.2 PERSONAL DEL CONTRATISTA

- Un (1) director del Proyecto.
- Un (1) residente de obra.
- Un (1) auxiliar de ingeniería.
- Un (1) conductor.
- Un (1) Inspector topógrafo.
- Un (1) SST.
- Tres (3) cuadrillas: Conformadas por dos (2) oficiales, seis (6) y/o siete (7) ayudantes de obra
- Una (1) cuadrilla: Conformada por un (1) maestro y un (1) ayudante)

3.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

El contratista ejecuto la intervención de diferentes puntos de la ciudad de acuerdo a las directrices del Ingeniero asignado por la secretaria de infraestructura, realizando el cajeo, re parcheo y nivelaciones en las siguientes ubicaciones:

A continuación, se presenta la relación semanal de lo ejecutado:

- Semana del 12 al 17 mayo

  Área cajeo: 861,54 m2
  Área nivelaciones: 113,19 m2
  Volumen asfalto suelto: 123,81 m3
  Viajes de escombros: 22

  Semana del 19 al 23 mayo

  Área cajeo: 444,56m2
  Área nivelaciones: 121,02 m2
  Volumen asfalto suelto: 87,23 m3
  Viajes de escombros: 8

- Semana del 26 al 31 mayo

  Área cajeo: 785,58 m2
  Área nivelaciones: 82,491 m2
  Volumen asfalto suelto: 106,79 m3
  Viajes de escombros: 14

Se anexa Excel con las áreas, volúmenes y cantidades ejecutas (Ver anexo III).

3.2.1 MAQUINARIA Y EQUIPOS

En cumplimiento de la ejecución del contrato, la Secretaría de Infraestructura pone a disposición del contratista, en la obra, los equipos necesarios para la ejecución de las actividades que requiere el proyecto, tales como:

- Dos (2) retroexcavadora.
- Tres (3) volquetas.
- Dos (2) vibrocompactador.
- Dos (2) cortadoras de pavimento.
-

Por su parte, el contratista pone a disposición en la obra la siguiente herramienta:

- Herramienta menor.
- Dos (2) benetin.

Los tiempos que se utilizaron esta maquinaria se encuentran en el anexo III









3.3 PLAZO CONTRACTUAL

PLAZO		DÍAS
INICIAL		8
PRORROGA No. 1		60
PRORROGA No. 2		60
PRORROGA No. 3		120
PLAZO TOTAL		248
ACTA	**FECHA**	**DÍAS EJECUTADOS**
INICIO	23/12/2024	
SUSPENSIÓN No.1	30/12/2024	8
REINICIO No.1	15/01/2025	8
FECHA ACTUAL	31/05/2025	137
TOTAL		**111**

3.4 GARANTÍAS DEL CONTRATO

PÓLIZAS				
AMPAROS	**No. PÓLIZA**	**VALOR AMPARADO**	**VIGENCIA**	**ASEGURADORA**
CUMPLIMIENTO	I-100039457	$65,622,934.90	15/01/2025-21/10/2025	SEGUROS MUNDIAL
PRESTACIONES SOCIALES	I-100039457	$98,434,402.35	15/01/202521/04/2028	SEGUROS MUNDIAL
CALIDAD DEL SERVICIO	I-100039457	$65,622,934.90	15/01/2025-21/10/2025	SEGUROS MUNDIAL
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	I-100009683	$260,000,000.00	16/01/2024-21/10/2025	SEGUROS MUNDIAL


Alcaldía de IBAGUÉ

3.5 PERSONAL EN OBRA


	CARGO	NOMBRE	
	CONDUCTOR	JOSE POLICARPO QUINTERO CRUZ	
FRENTE RESTREPO	MAESTRO	JUAN CARLOS ALBA QUINTERO	
	AYUDANTE	GONZALO SALGUERO SAENZ	
FRENTE No.1	OFICIAL RASTRILLERO	SERGIO CASTELLANOS	
	OFICIAL RASTRILLERO	ANDRÉS FABIAN GARZÓN	
	OFICIAL	JOSÉ EMILIO FIGUEROA	
	AYUDANTE	CESAR AUGUSTO PÉREZ	
	AYUDANTE	JUAN CARLOS FLORES MARTÍNEZ	
	AYUDANTE	HERNEL ARTURO GONZALES CHAGUALA	
	AYUDANTE	BRANDON STIVEN DIAZ BOBADILLA	
FRENTE No.2	OFICIAL RASTRILLERO	LUIS ALBERTO BOBADILLA	
	OFICIAL RASTRILLERO	ENALBER LEAL MORENO	
	AYUDANTE	JUNIOR RAFAEL PERDONOMO AGUILAR	
	AYUDANTE	GUILLERMO LEÓN HERNÁNDEZ	No trene
	AYUDANTE	DOMINGO OLMOS	
	AYUDANTE	OSCAR ALEJANDRO ECHAVARRIA MARTINEZ	
	AYUDANTE	JORGE ELIECER BETANCUR CASTAÑEDA	
	AYUDANTE	LUIS EDUARDO RODRÍGUEZ NARANJO	
	AYUDANTE	LUIS EDUARDO SALCEDO	
FRENTE No.3	OFICIAL RASTRILLERO	JOSÉ ALFREDO GIRALDO BEDOLLA	No trene
	AYUDANTE	ALONSO GUZMÁN BELTRÁN	
	AYUDANTE	RAMIRO VARÓN CABIEDES	
	AYUDANTE	EDUARD FABIAN LEAL	
	AYUDANTE	ANDREAL JELINECK QUINTANA MARIN	
	AYUDANTE	OSCAR NARANJO RUIZ	
	AYUDANTE	GABRIEL QUINAJO GARCIA	
	AYUDANTE	JUAN DIEGO RIVERA	
	AYUDANTE	JHOBANY ALBA HERNANDEZ	No trene
PERSONAL ADMINISTRATIVO	DIRECTOR OBRA	FERNANDO SANCHEZ	
	ING. RESIDENTE	JORGE ALBERTO LLANO	
	CONDUCTOR	HANNYA LUCIA MORALES	
	ING. AUXILIAR	LAURA JULIANA AROCA	
	INSPECTOR TOPOGRAFO	ANDRES MAURICIO CALDERON	
	PROFESIONAL SST	ANNA LORENA CAMPOS	


Alcaldía de IBAGUÉ

3.6 GRÁFICOS DE AVANCE

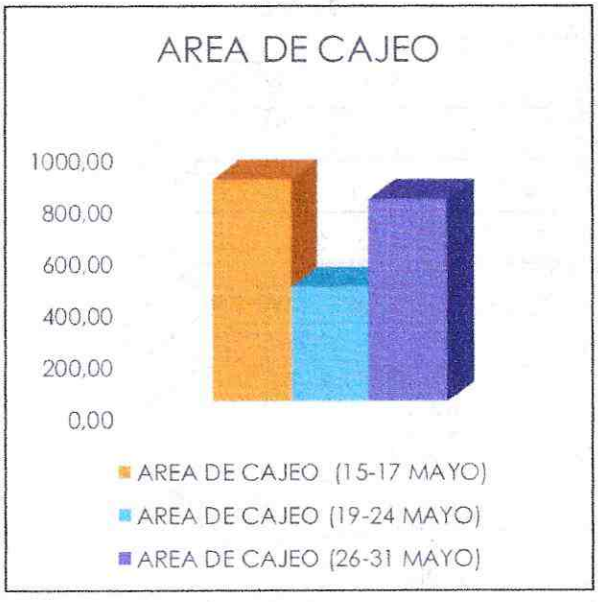



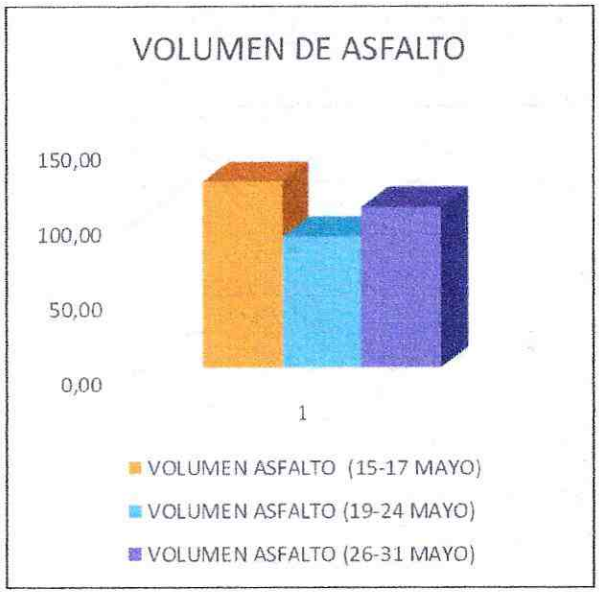

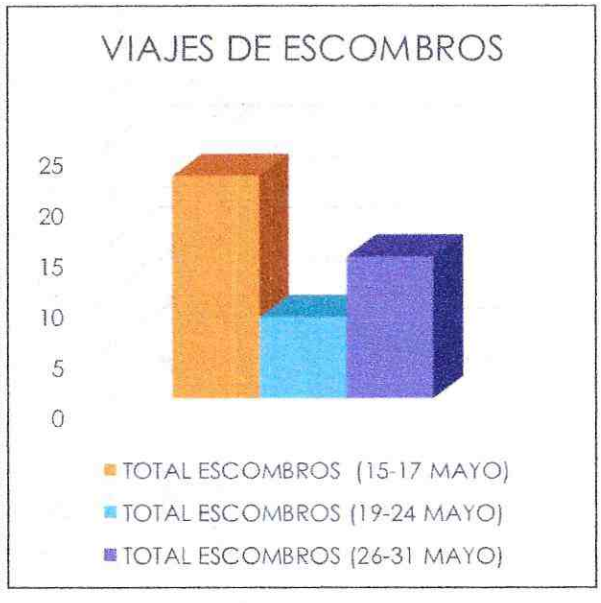

ANEXOS

I. Estado del tiempo

REGISTRO CLIMATICO DIARIO							
MAYO							
Obra:	CUADRILLAS 2025						
Fecha	Estado Climatico	Horario		Intensidad			Observaciones
		AM	PM	Baja	Media	Alta	
16/05/2025	LLUVIAS		X			X	
17/05/2025	SOLEADO						
18/05/2025	SOLEADO						
19/05/2025	SOLEADO						
20/05/2025	SOLEADO						
21/05/2025	SOLEADO						
22/05/2025	SOLEADO						
23/05/2025	SOLEADO						
24/05/2025	SOLEADO						
25/05/2025	SOLEADO						
26/05/2025	SOLEADO						
27/05/2025	SOLEADO						
28/05/2025	SOLEADO						
29/05/2025	SOLEADO						
30/05/2025	SOLEADO						
31/05/2025	SOLEADO						

II. Se anexa informe en modelo de EXCEL con el nombre "INFORME MENSUAL SST MAYO"

III. Se anexa informe en modelo de EXCEL con el nombre "INFORME MENSUAL MAYO"

4. CONCLUSIONES

- El contratista, contrato el personal profesional, técnico y operativo y administrativo requerido para dar cumplimiento al proyecto.
- EL contratista da cumplimiento a las instrucciones impartidas por la alcaldía por medio de la supervisión del ingeniero asignado por secretaria de infraestructura.
- El contratista cuenta con una oficina administrativa y campamentos móviles en sitio.

5. ANEXOS

I. Estado del tiempo.
II. Informe SST.
III. Excel de cantidades mensuales.

ING. FERNANDO SANCHEZ CARDOZO
Director De Obra

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	FECHA SEMANA:	16 de Mayo al 30 de Mayo del 2025
		FRENTE 1 , 2 ,3 y Cuadrilla de Apoyo
EMPRESA CONTRATISTA: SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS		
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA CIUDAD DE IBAGUE – TOLIMA	**ELABORADO POR: Anna Lorena Campos Henao**	
PERIODO: 1	**FECHA ELABORACION: 30 de Mayo del 2025**	

1. ESTADISTICAS DE ACCIDENTALIDAD

PROMEDIO TRABAJADORES	HORAS HOMBRE TRABAJADAS	No ACCIDENTES EN EL PERIODO		DIAS PERDIDOS POR AT		INDICE DE FRECUENCIA	INDICE DE SEVERIDAD		INDICE DE LESION INCAPACITANTE
		0	ACUMULADO	MAYO	ACUMULADO	MAYO	MAYO	ACUMULADO	
26	100	1	2	7	10	3,84	26,92		0,10

2. PERSONAL EN OBRA.

FRENTE 1

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	EMPRESA
Castellanos Garcia Sergio Alirio	oficial	Sociedad Tolimense de Ingenieros
Figueroa Garzón Jesús Emilio	Auxiliar de Obra	Sociedad Tolimense de Ingenieros
Perez Cesar Augusto	Auxiliar de Obra	Sociedad Tolimense de Ingenieros
Florez Martinez Juan Carlos	Auxiliar de Obra	Sociedad Tolimense de Ingenieros
Garzon Andres Fabian	Auxiliar de Obra	Sociedad Tolimense de Ingenieros
Diaz Bobadilla Brando Steven	Auxiliar de Obra	Sociedad Tolimense de Ingenieros
Arturo Gonzalez Hernel	Auxiliar de Obra	Sociedad Tolimense de Ingenieros
FRENTE 2		
Bobadilla Gomez Luis Alberto	Oficial	Sociedad Tolimense de ingenieros
Hernandez Guillermo León	Auxiliar de Obra	Sociedad Tolimense de ingenieros
Olmos Domingo	Auxiliar de Obra	Sociedad Tolimense de ingenieros
Salsedo Rodriguez Luis Eduardo	Auxiliar de Obra	Sociedad Tolimense de ingenieros
Leal Enalber	Auxiliar de Obra	Sociedad Tolimense de Ingenieros
Rodriguez Naranjo Luis Eduardo	Auxiliar de Obra	Sociedad Tolimense de Ingenieros
Rafael Perdomo Junior	Auxiliar de Obra	Sociedad Tolimense de Ingenieros
Oscar Alejandro Echavarria	Auxiliar de Obra	Sociedad Tolimense de ingenieros
Jorge Eliécer Betancur Castañeda	Auxiliar de Obra	Sociedad Tolimense de ingenieros
FRENTE 3		
José Alfredo Giraldo Bedoya	Oficial	Sociedad Tolimense de ingenieros
Varón Cabiedes Ramiro	Auxiliar de Obra	Sociedad Tolimense de Ingenieros
Guzman Beltrán Alonso	Auxiliar de Obra	Sociedad Tolimense de ingenieros
Leal Eduardo Fabian	Auxiliar de Obra	Sociedad Tolimense de ingenieros
Quintana Marín Andreal Jelineck	Auxiliar de Obra	Sociedad Tolimense de ingenieros
Alba Jhobany	Auxiliar de Obra	Sociedad Tolimense de ingenieros

Quijano Garcia Gabriel	Auxiliar de Obra	Sociedad Tolimense de ingenieros
Naranjo Oscar	Auxiliar de Obra	Sociedad Tolimense de ingenieros
CUADRILLA DE APOYO		
Alba Quintero Juan Carlos	Maestro	Sociedad Tolimense de Ingenieros
Salguero Saenz Gonzalo	Auxiliar de Obra	Sociedad Tolimense de Ingenieros
PERSONAL ADMINISTRATIVO DE APOYO OPERATIVO		
Llano Gomez Jorge Alberto	Ingeniero Residente	*Sociedad Tolimense de ingenieros*
Morales Aranguren Hannya Lucía	Conductora	*Sociedad Tolimense de ingenieros*
Aroca Laguna Laura Juliana	Ingeniera Auxiliar	*Sociedad Tolimense de ingenieros*
Calderón Andrés Mauricio	Inspector Topógrafo	*Sociedad Tolimense de ingenieros*
Campos Henao Anna Lorena	Profesional SST	*Sociedad Tolimense de ingenieros*
Sanchez Cardozo Fernando	Director de Obra	*Sociedad Tolimense de ingenieros*

INGRESO DE PERSONAL

Se presentó 1 ingreso el día 16 de mayo del señor Policarpo como conductor de volqueta

RETIROS EN EL PERIODO

FECHA DE RETIRO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	AREA
30/05/25	Anna Lorena Campos Henao	Profesional SST	Administrativo

AUSENTISMOS

NOMBRES	CARGO	AREA	CAUSAS Y/O DUAGNOSTICO	TIEMPO		ACUMULADO
				DIAS	FECHA INCAPACIDAD	
Jose Alfredo Giraldo	Oficial	Frente 3	Se encuentra en hospitalización desde el 22 de Mayo	Sin definir	En hospitalización por EPS	9
Oscar Naranjo Ruiz	Auxiliar de Obra	Frente 4	S913: Heridas de otras partes del pie Accidente de Trabajo	7	20-26 de Mayo	7
Andrés Fabian Garzón	Oficial	Frente 1	Atoramiento de espiana en garganta	2	25-26 de Mayo	2
Andrés Mauricio Calderón	Inspector Topógrafo	Administrativo/ operativo	Cirugia Oral Exodoncia Quirurgica	3	26-28 de mayo	3

LLAMADOS DE ATENCION

NOMBRES	CARGO	AREA	OBSERVACION	NUMERO DE LLAMADOS DE ATENCION	ACUMULADO
Brandon Steven Bobadilla	Auxiliar de Obra	Frente 1	Reiteradas llegadas tarde al frente de trabajo	2	7

RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL PERIODO

ACTIVIDAD	TEMA	CONTRATISTA	Controles para Eliminar Reducir los Riesgos
INSPECCIONES DE SEGURIDAD	HERRAMIENTAS MANUALES	SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS	SEVERIFICAN LAS HERRAMIENTAS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO(BARRAS, PICAS, PALAS, CEPILLOS, RASTRILLOS,NIVELETES, CARRETILLAS EN LAS ACTIVIDADES A DESAROLLAR DURANTE LA SEMANA. SE LES HACE LA OBSERVACIÓN A LA CUADRILLAS CONFORMADAS QUE SON RESPONSABLES DE LOS ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS CON LA QUE CUENTAN A DIARIO PARA LA REALIZACIÓN DE SUS LABORES DE IGUAL MANERA REPORTAR DAÑOS PARA SU RESPECTIVO CAMBIO O MANTENIMIENTO
	SEÑALIZACION	SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS	SE REALIZA LA UBICACIÓN PERTINENTE EN LOS FRENTES CORRESPONDIENTES DE ACUERDO A LA INTERVENCIÓN (AVENIDA AMBALÁ ENTRE CALLES 25-34, CARRERA 6 ENTRE CALLES 33 Y 41, CALLE 15 CON PRIMERA, AVENIDA GUAVINAL CON 37)
ENTREGA DE EPP	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS	SE REALIZA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL POR REPOSICIÓN EL DÍA 21 DE MAYO DEL **GUANTES TIPO NYLON POLIURETANO**
HIDRATACCION	ENTREGA DE HIDRATACIÓN PESONAL DE OBRA	SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS	SE HACE ENTREGA TODOS LOS DÍAS EN LOS FRENTES DE TRABAJO 2 VECES AL DÍA PARA SU RESPECTIVA HIDRATACIÓN DURANTE SU JORNADA LABORAL , SE LES INDICA A TODO EL PERSONAL LA IMPORTANCIA DE HACERLO PARA EVITAR ENFERMEDADES RELACIONADAS AL CALOR , PREVENCIÓN DE CALAMBRES MUSCULARES ENTRE OTROS.

ACTIVIDAD	FECHA	TEMA	HORAS	No. DE PERSONAS CONVOCADAS	COBERTURA%
CHARLA DE SEGURIDAD PERSONAL QUE INGRESA,PREVENCION EN SEGURIDAD VIAL:	19/05/25	Importancia de la señalización vial, uso adecuado de EPP, y reporte de AT	15 MINUTOS	8	100%

8. ENTREGA DE DOTACION			
TRABAJADORES QUE INGRESARON EN EL PERIODO	TRABAJADORES QUE RECIBIERON DOTACION		COBERTURA %
	NUEVOS	ANTIGUOS	
0	9	17	SE ESTÁ AL DÍA EN LA ENTREGA DE DOTACIÓN CON LOS ANTIGUOS, A LOS NUEVOS SE LES HACE ENTREGA DE BUSO MANGA LARGA Y ANDREAL LEAL BOTAS DE SEGURIDAD EN LA QUINCENA PASADA

CONTROL PROGRAMACIÓN DEL PERIODO			
ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	EJECUTADO	FECHA DD/MM/AA
INGRESO DE OBRA: SE REALIZA VERIFICACIÓN DEL PERSONAL NUEVO, SE VERIFICAN LAS DIFERENTES CUADRILLAS LAS CUALES QUEDARON CONFORMADAS PARA DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO	LLEVAR CONTROL DE ASISTENCIA EN OBRA	SI	16 de mayo al 30 de mayo del 2025 **Verificación personal Nuevo**
CHARLA DE SEGURIDAD PERSONAL QUE INGRESA	PREVENCION EN SEGURIDAD VIAL: Importancia de la señalización vial, uso adecuado de EPP, y reporte de AT	SI	19 de Mayo del 2025
VERIFICACIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES Y MECÁNICAS SEGÚN LA NECESIDAD DE LOS FRENTES DE TRABAJO	VERIFICACIÓN DEL USO DE HERRAMIENTAS	SI	16 de mayo al 30 de mayo del 2025
SE ORGANIZA LOS ELEMENTOS DE SEÑALIZACION.	SE HACE SEÑALIZACION DEL AREA EN OBRA.	SI	16 de mayo al 30 de mayo del 2025
SE REALIZA ORDEN Y ASEO, CARGUE DE SEÑALIZACIÓN Y HERRAMIENTAS EN CADA FRENTE DE TRABAJO.	SE REALIZA JORNADA DE ASEO SE RECOJE EL ESCOMBRO, SE LLEVA AL CENTRO DE ACOPIO	SI	1 de mayo al 15 de mayo del 2025

10. ACTIVIDADES Y/O PROPUESTAS PARA EJECUTAR PROXIMO PERIODO	
ACCIONES Y/O PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL PERIODO SIGUIENTE (En este espacio se deben plasmar las acciones de mejora de acauerdo a su frente de trabajo.)	REVISION
ORGANIZACIÓN Y VERIFICACIÓN EN CADA FRENTE DE TRABAJO DE LOS ELEMENTOS A UTILIZAR TALES COMO: SEÑALIZACION Y HERRAMIENTAS QUE SON UTILIZADAS AL INICIO Y FINAL DE LA JORNADA LABORAL	DIARIO
PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDAD DE CHARLAS DE SEGURIDAD EN CADA FRENTE DE TRABAJO CON LOS LÍDERES DE CUADRILLA Y CUMPLIMIENTO DE LA TAREA ASIGNADA DENTRO DEL PROCESO SST	DIARIO

TEMA: SEÑALIZACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL FRENTE 1








FRENTE 2



FRENTE 3








ELABORADO POR:

ANNA LORENA CAMPOS HERAS
PROFESIONAL SST
Sociedad Tolimense de ingenieros

SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS

CONVENIO Nº 4009 ALCALDIA DE IBAGUE

CUADROS DE CAJEO CUADRILLAS MENSUAL DE MAYO SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS CONVENIO 4009

FECHA	UBICACIÓN	N. CAJA	ANCHO	LARGO	AREA TOTAL	PROFUNDIDADES	VOLUMEN CAJEO
SEMANA DEL 12-17 DE MAYO							
12/05/2025	AV. AMBALA	1	2,56	3,66	9,37	0,09	0,84
			3,45	2,62	9,04	0,09	0,81
		SUB TOTAL			**18,41**		**1,66**
		2	4,7	11	51,70	0,1	5,17
			0,65	1	0,65	0,1	0,07
		SUB TOTAL			**52,35**		**5,24**
	CLL 10 ENTRE CRA 8 Y CRA 9	3	2,16	0,92	1,99	0,1	0,20
		SUB TOTAL			**1,99**		**0,20**
		4	1,86	5,73	10,66	0,1	1,07
		SUB TOTAL			**10,66**		**1,07**
		5	1,93	1,2	2,32	0,1	0,23
		SUB TOTAL			**2,32**		**0,23**
		6	1,85	0,73	1,35	0,1	0,14
			1,12	1,12	1,25	0,1	0,13
		SUB TOTAL			**2,60**		**0,26**
		7	1,34	3,4	4,56	0,1	0,46
		SUB TOTAL			**4,56**		**0,46**
	CRA 6 ENTRE CLL 38 Y CLL 39	8	2,68	0,71	1,90	0,08	0,15
			2,54	3,04	7,72	0,09	0,69
			3,3	4,22	13,93	0,08	1,11
			1,66	1,44	2,39	0,08	0,19
			0,65	3,83	2,49	0,09	0,22
			0,9	0,79	0,71	0,09	0,06
		SUB TOTAL			**29,14**		**2,44**
		9	1,83	0,9	1,65	0,09	0,15
			3,04	7,68	23,35	0,09	2,10
			2,05	6,33	12,98	0,09	1,17
		SUB TOTAL			**37,97**		**3,42**
		10	2,6	4,7	12,22	0,1	1,22
			3,62	3,55	12,85	0,1	1,29
			3,27	4,45	14,55	0,1	1,46
			0,4	1,1	0,44	0,1	0,04
		SUB TOTAL			**40,06**		**4,01**
		11	5,3	1,97	10,44	0,13	1,36
		SUB TOTAL			**10,44**		**1,36**
13/05/2025	AV. AMBALA	12	2,64	11,25	29,70	0,1	2,97
		SUB TOTAL			**29,70**		**2,97**
		13	4,02	10,3	41,41	0,12	4,97
		SUB TOTAL			**41,41**		**4,97**
		14	0,98	1,43	1,40	0,11	0,15
		SUB TOTAL			**1,40**		**0,15**
	CLL 10 ENTRE CRA 8 Y CRA 9	15	1,51	1,65	2,49	0,15	0,37
		SUB TOTAL			**2,49**		**0,37**
		16	2,4	2,07	4,97	0,1	0,50
		SUB TOTAL			**4,97**		**0,50**
		17	1,98	1,02	2,02	0,1	0,20
		SUB TOTAL			**2,02**		**0,20**
	CRA 8 ENTRE CLL 10 Y CLL 11	18	2,7	0,82	2,21	0,12	0,27
			3,92	6,8	26,66	0,12	3,20
			0,96	1,02	0,98	0,12	0,12
		SUB TOTAL			**29,85**		**3,58**
	CLL 10 ENTRE CRA 7 Y CRA 9	19	3,04	1,53	4,65	0,1	0,47
		SUB TOTAL			**4,65**		**0,47**
		20	1,15	2,7	3,11	0,09	0,28
		SUB TOTAL			**3,11**		**0,28**
		21	1,38	6,35	8,76	0,09	0,79
		SUB TOTAL			**8,76**		**0,79**
		22	1,69	7,80	13,18	0,09	1,19
		SUB TOTAL			**13,18**		**1,19**
		23	1,85	1,05	1,94	0,09	0,17
			1,72	1,00	1,72	0,09	0,15
			1,26	1,75	2,21	0,09	0,20
		SUB TOTAL			**5,87**		**0,53**
		24	3,48	2,71	9,43	0,13	1,23
			3,08	8,14	25,07	0,13	3,26
			3,70	10,15	37,56	0,13	4,88
		SUB TOTAL			**72,06**		**9,37**
		25	2,18	5,30	11,55	0,10	1,16
		SUB TOTAL			**11,55**		**1,16**
		26	1,12	1,46	1,64	0,10	0,16
			0,70	0,78	0,55	0,10	0,05
		SUB TOTAL			**2,18**		**0,22**
		27	1,15	3,25	3,74	0,10	0,37
		SUB TOTAL			**3,74**		**0,37**
		28	1,26	0,95	1,20	0,10	0,12
		SUB TOTAL			**1,20**		**0,12**
		29	4,26	10,66	45,41	0,12	5,45

SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS

CONVENIO Nº 4009 ALCALDIA DE IBAGUE

CUADROS DE CAJEO CUADRILLAS MENSUAL DE MAYO SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS CONVENIO 4009

FECHA	UBICACIÓN	N. CAJA	ANCHO	LARGO	AREA TOTAL	PROFUNDIDADES	VOLUMEN CAJEO
14/05/2025	AV. AMBALA	SUB TOTAL			45,41		5,45
		30	1,97	2,90	5,71	0,11	0,63
			3,30	6,36	20,99	0,11	2,31
		SUB TOTAL			26,70		2,94
		31	1,33	1,30	1,73	0,10	0,17
			2,04	1,56	3,18	0,10	0,32
		SUB TOTAL			4,91		0,49
		32	2,08	2,72	5,66	0,10	0,57
		SUB TOTAL			5,66		0,57
		33	2,00	10,20	20,40	0,09	1,84
		SUB TOTAL			20,40		1,84
		34	1,22	1,00	1,22	0,10	0,12
		SUB TOTAL			1,22		0,12
	CLL 38 ENTRE CRA 5 Y CRA 6	35	3,44	3,36	11,56	0,08	0,92
		SUB TOTAL			11,56		0,92
		36	0,74	3,00	2,22	0,08	0,18
		SUB TOTAL			2,22		0,18
		37	1,69	1,26	2,13	0,08	0,17
		SUB TOTAL			2,13		0,17
		38	0,42	1,50	0,63	0,09	0,06
		SUB TOTAL			0,63		0,06
		39	1,61	2,04	3,28	0,08	0,26
		SUB TOTAL			3,28		0,26
		40	1,92	7,45	14,30	0,06	0,86
		SUB TOTAL			14,30		0,86
		41	1,41	1,48	2,09	0,08	0,17
		SUB TOTAL			2,09		0,17
	CRA 6 ENTRE CLL 38 Y CLL 39	42	4,35	10,53	45,81	0,1	4,58
		SUB TOTAL			45,81		4,58
	CRA 6 ENTRE CRA 38 Y CRA 37	43	3,10	6,40	19,84	0,12	2,38
			2,10	0,32	0,67	0,12	0,08
		SUB TOTAL			20,51		2,46
		44	3,05	3,20	9,76	0,10	0,98
		SUB TOTAL			9,76		0,98
15/05/2025	AV. AMBALA	45	2,15	1,70	3,66	0,10	0,37
		SUB TOTAL			3,66		0,37
		46	2,93	12,30	36,04	0,10	3,60
			3,00	12,00	36,00	0,10	3,60
		SUB TOTAL			72,04		7,20
	CRA 6 ENTRE CLL 39 Y CLL 40	47	0,34	2,06	0,70	0,07	0,05
			0,94	5,32	5,00	0,07	0,35
		SUB TOTAL			5,70		0,40
		48	0,69	1,55	1,07	0,09	0,10
			3,10	0,82	2,54	0,09	0,23
			1,40	0,50	0,35	0,09	0,03
		SUB TOTAL			3,96		0,36
16/05/2025	CRA6 ENTRE CLL 40 Y CLL 41	49	2,10	4,27	8,97	0,12	1,08
		SUB TOTAL			8,97		1,08
		50	4,00	5,90	23,60	0,13	3,07
			4,30	4,30	18,49	0,13	2,40
			3,80	3,90	14,82	0,13	1,93
		SUB TOTAL			56,91		7,40
		51	5,30	4,80	25,44	0,12	3,05
		SUB TOTAL			25,44		3,05
		52	2,28	3,68	8,39	0,12	1,01
		SUB TOTAL			8,39		1,01
	CLL 10 ENTRE CRA 7 Y CRA 9	53	1,15	1,44	1,66	0,12	0,20
			2,60	2,50	6,50	0,12	0,78
		SUB TOTAL			8,16		0,98
		54	1,15	2,70	3,11	0,10	0,31
		SUB TOTAL			3,11		0,31
SEMANA DEL 19-24 DE MAYO							
	CRA 6 ENTRE CLL 41 y 42	1	0,78	3,43	2,68	0,08	0,21
		SUB TOTAL			2,68		0,21
		2	0,93	1,00	0,93	0,08	0,07
		SUB TOTAL			0,93		0,07
		3	4,47	11,25	50,29	0,09	4,53
		SUB TOTAL			50,29		4,53
		4	0,40	2,47	0,99	0,13	0,13
			4,40	5,21	22,92	0,13	2,98
			2,30	1,02	2,35	0,14	0,33
			0,42	1,20	0,50	0,13	0,07
		SUB TOTAL			26,76		3,50
		5	2,46	3,04	7,48	0,11	0,82
		SUB TOTAL			7,48		0,82

SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS

CONVENIO Nº 4009 ALCALDIA DE IBAGUE

CUADROS DE CAJEO CUADRILLAS MENSUAL DE MAYO SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS CONVENIO 4009

FECHA	UBICACIÓN	N. CAJA	ANCHO	LARGO	AREA TOTAL	PROFUNDIDADES	VOLUMEN CAJEO
19/05/2025	AV. AMBALÁ CLL 32 y 35	6	2,38	5,76	13,71	0,09	1,23
			3,05	4,32	13,18	0,09	1,19
			2,95	2,80	8,26	0,09	0,74
		SUB TOTAL			**35,14**		**3,16**
		7	2,48	4,55	11,26	0,07	0,79
		SUB TOTAL			**11,26**		**0,79**
		8	2,86	3,70	10,58	0,07	0,74
		SUB TOTAL			**10,58**		**0,74**
		9	3,73	3,34	12,46	0,07	0,87
		SUB TOTAL			**12,46**		**0,87**
		10	3,80	3,15	11,97	0,12	1,44
		SUB TOTAL			**11,97**		**1,44**
		11	1,65	2,35	3,88	0,10	0,39
			4,60	5,20	23,92	0,10	2,39
			3,45	4,30	14,84	0,10	1,48
		SUB TOTAL			**42,63**		**4,26**
	CLL 10 ENTRE CRA 8 Y 9	12	1,26	1,70	2,14	0,07	0,15
					2,14		**0,15**
		13	1,26	0,62	0,78	0,07	0,05
		SUB TOTAL			**0,78**		**0,05**
		14	0,88	1,44	1,27	0,07	0,09
		SUB TOTAL			**1,27**		**0,09**
	CLL 80 ENTRE CRA 4 Y 5	15	1,39	10,50	14,60	0,12	1,75
			1,00	1,39	1,39	0,10	0,14
			2,13	1,60	3,41	0,10	0,34
		SUB TOTAL			**19,39**		**2,23**
		16	0,83	1,01	0,84	0,10	0,08
			4,00	6,20	24,80	0,11	2,73
			3,20	14,60	46,72	0,10	4,67
		SUB TOTAL			**72,36**		**7,48**
20/05/2025	CRA 4 CLL 80	17	2,20	2,58	5,68	0,09	0,51
			1,32	5,17	6,82	0,09	0,61
			2,10	1,29	2,71	0,08	0,22
			3,84	1,56	5,99	0,08	0,48
			3,38	10,70	36,17	0,08	2,89
			1,25	6,40	8,00	0,09	0,72
		SUB TOTAL			**65,37**		**5,43**
	CRA 6 ENTRE CLL 42 y 44	18	2,37	0,98	2,32	0,10	0,23
		SUB TOTAL			**2,32**		**0,23**
		19	1,64	1,05	1,72	0,12	0,21
		SUB TOTAL			**1,72**		**0,21**
		20	1,05	2,60	2,73	0,10	0,27
		SUB TOTAL			**2,73**		**0,27**
		21	1,52	2,67	4,06	0,12	0,49
		SUB TOTAL			**4,06**		**0,49**
		22	0,90	0,81	0,73	0,07	0,05
		SUB TOTAL			**0,73**		**0,05**
		23	2,02	1,46	2,95	0,10	0,29
		SUB TOTAL			**2,95**		**0,29**
		24	1,63	1,38	2,25	0,12	0,27
		SUB TOTAL			**2,25**		**0,27**
		25	0,46	0,81	0,37	0,11	0,04
		SUB TOTAL			**0,37**		**0,04**
		26	0,45	1,00	0,45	0,07	0,03
		SUB TOTAL			**0,45**		**0,03**
		27	0,83	0,90	0,75	0,10	0,07
					0,75		**0,07**
		28	0,84	1,79	1,50	0,12	0,18
		SUB TOTAL			**1,50**		**0,18**
		29	2,00	1,29	2,58	0,12	0,31
		SUB TOTAL			**2,58**		**0,31**
		30	1,30	0,88	1,14	0,12	0,14
		SUB TOTAL			**1,14**		**0,14**
	CRA 6 ENTRE CLL 46 Y 47	31	2,97	4,10	12,18	0,11	1,34
		SUB TOTAL			**12,18**		**1,34**
		32	1,88	0,92	1,73	0,11	0,19
			1,63	4,37	7,12	0,12	0,85
			0,32	1,40	0,45	0,11	0,05
		SUB TOTAL			**9,30**		**1,09**
	CLL 10 ENTRE CRA 7 Y 5	33	3,34	8,50	28,39	0,15	4,26
		SUB TOTAL			**28,39**		**4,26**
		34	4,26	2,02	8,61	0,08	0,69
		SUB TOTAL			**8,61**		**0,69**
		35	7,90	3,20	25,28	0,07	1,77
		SUB TOTAL			**25,28**		**1,77**
		36	5,78	5,98	34,56	0,09	3,11
			1,12	5,29	5,92	0,09	0,53
		SUB TOTAL			**40,49**		**3,64**
	CRA 3 CLL 8	37	1,59	2,87	4,56	0,08	0,37
			1,25	0,92	1,15	0,08	0,09
		SUB TOTAL			**5,71**		**0,46**
			3,70	2,15	7,96	0,15	1,19
			4,23	5,10	21,57	0,15	3,24

Areas de cajeo realizadas por Infibagué

157,12

SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS

CONVENIO Nº 4009 ALCALDIA DE IBAGUE

CUADROS DE CAJEO CUADRILLAS MENSUAL DE MAYO SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS CONVENIO 4009

FECHA	UBICACIÓN	N. CAJA	ANCHO	LARGO	AREA TOTAL	PROFUNDIDADES	VOLUMEN CAJEO
22/05/2025	AV. AMBALÁ CLL 37	38	3,33	0,90	3,00	0,15	0,45
			4,50	2,75	12,38	0,15	1,86
			0,85	4,50	3,83	0,15	0,57
			3,60	2,00	7,20	0,15	1,08
			2,35	1,37	3,22	0,15	0,48
			1,66	1,10	1,83	0,15	0,27
			1,17	3,00	3,51	0,15	0,53
		SUB TOTAL			**64,48**		**9,67**
	CRA 2 SUR	39	0,80	0,60	0,48	0,10	0,05
			2,00	1,40	2,80	0,10	0,28
		SUB TOTAL			**3,28**		**0,33**
	AV. PEDRO TAFUR	40	1,30	1,95	2,54	0,10	0,25
		SUB TOTAL			**2,54**		**0,25**
		41	0,50	1,00	0,50	0,10	0,05

SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS

CONVENIO Nº 4009 ALCALDIA DE IBAGUE

CUADROS DE CAJEO CUADRILLAS MENSUAL DE MAYO SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS CONVENIO 4009

FECHA	UBICACIÓN	N. CAJA	ANCHO	LARGO	AREA TOTAL	PROFUNDIDADES	VOLUMEN CAJEO
23/05/2025		SUB TOTAL			0,50		0,05
	CLL 10 ENTRE CRA 8 Y 9	42	0,68	1,36	0,92	0,12	0,11
		SUB TOTAL			0,92		0,11
		43	1,29	0,93	1,20	0,12	0,14
		SUB TOTAL			1,20		0,14
		44	0,61	2,88	1,76	0,14	0,25
		SUB TOTAL			1,76		0,25
SEMANA DEL 26-31 DE MAYO							
26/05/2025	CRA 6 ENTRE CLL 44 Y 45	1	1,23	3,28	4,03	0,12	0,48
			1,70	4,84	8,23	0,13	1,07
			2,43	8,23	20,00	0,12	2,40
			0,41	0,76	0,31	0,12	0,04
		SUB TOTAL			32,57		3,99
		2	1,10	5,67	6,24	0,15	0,94
		SUB TOTAL			6,24		0,94
		3	3,60	3,30	5,94	0,14	0,83
			3,60	11,32	40,75	0,14	5,71
		SUB TOTAL			46,69		6,54
	AV. AMBALA ENTRE CLL 25 Y 35	4	2,96	10,80	31,97	0,08	2,56
		SUB TOTAL			31,97		2,56
		5	1,45	13,80	20,01	0,06	1,20
			1,80	0,75	1,35	0,06	0,08
			1,15	1,37	1,58	0,06	0,09
		SUB TOTAL			22,94		1,38
		6	3,22	32,15	103,52	0,17	17,60
			3,86	3,07	11,85	0,15	1,78
			3,37	4,89	16,48	0,15	2,47
			1,65	2,85	4,70	0,15	0,71
		SUB TOTAL			136,56		22,55
	CRA 3 ENTRE CLL 5 Y 3	7	1,00	2,24	2,24	0,10	0,22
			1,89	20,57	38,88	0,08	3,11
			0,89	6,27	5,58	0,09	0,50
		SUB TOTAL			46,70		3,84
		8	1,77	3,71	6,57	0,07	0,46
			1,72	1,37	2,36	0,07	0,16
			1,77	2,59	4,58	0,07	0,32
		SUB TOTAL			13,51		0,95
		9	1,21	2,98	3,61	0,10	0,36
		SUB TOTAL			3,61		0,36
		10	1,78	0,95	1,69	0,06	0,10
			2,08	0,65	1,35	0,20	0,27
			1,84	2,10	3,86	0,06	0,23
		SUB TOTAL			6,91		0,60
27/05/2025	CRA 3 ENTRE CLL 10 Y 9	11	1,90	0,94	1,79	0,11	0,20
			0,85	0,85	0,72	0,11	0,08
		SUB TOTAL			2,51		0,28
28/05/2025	CLL 25 ENTRE CRA 5 Y 8	12	1,83	3,73	6,83	0,16	1,09
		SUB TOTAL			6,83		1,09
		13	5,22	5,40	28,19	0,16	4,51
			3,95	4,48	17,70	0,16	2,83
			1,10	2,30	2,53	0,16	0,40
		SUB TOTAL			48,41		7,75
	CLL 60 ENTRE CRA 5 Y 2	14	4,47	2,60	11,62	0,08	0,93
			11,45	6,89	78,89	0,08	6,31
		SUB TOTAL			90,51		7,24
		15	6,56	3,95	25,91	0,08	2,07
		SUB TOTAL			25,91		2,07
		16	0,35	3,50	1,23	0,09	0,11
			0,35	1,50	0,53	0,09	0,05
			1,23	0,60	0,74	0,09	0,07
		SUB TOTAL			2,49		0,22
		17	0,50	0,50	0,25	0,09	0,02
		SUB TOTAL			0,25		0,02
		18	1,12	0,95	1,06	0,15	0,16
		SUB TOTAL			1,06		0,16
		19	1,95	1,30	2,54	0,11	0,28
		SUB TOTAL			2,54		0,28
		20	1,30	2,40	3,12	0,11	0,34
			1,56	1,10	1,72	0,11	0,19
		SUB TOTAL			4,84		0,53
		21	1,40	12,97	18,16	0,10	1,82
			1,80	1,13	2,03	0,10	0,20
		SUB TOTAL			20,19		2,02
		22	1,60	1,21	1,94	0,10	0,19
		SUB TOTAL			1,94		0,19
		23	2,41	2,23	5,37	0,10	0,54
		SUB TOTAL			5,37		0,54
		24	1,58	2,77	4,38	0,12	0,53
		SUB TOTAL			4,38		0,53
		25	1,12	1,00	1,12	0,15	0,17
		SUB TOTAL			1,12		0,17
		26	0,76	0,51	0,39	0,12	0,05

SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS

CONVENIO Nº 4009 ALCALDIA DE IBAGUE

CUADROS DE CAJEO CUADRILLAS MENSUAL DE MAYO SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS CONVENIO 4009

FECHA	UBICACIÓN	N. CAJA	ANCHO	LARGO	AREA TOTAL	PROFUNDIDADES	VOLUMEN CAJEO
	CAR 1 Y 2 ENTRE CLL 15 Y 10	SUB TOTAL			0,39		0,05
		27	0,78	1,32	1,03	0,12	0,12
		SUB TOTAL			1,03		0,12
		28	2,85	2,48	7,07	0,10	0,71
			2,96	4,10	12,14	0,10	1,21
			1,32	2,77	3,66	0,10	0,37
		SUB TOTAL			22,86		2,29
		29	1,00	1,40	1,40	0,09	0,13
		SUB TOTAL			1,40		0,13
		30	1,22	1,80	2,20	0,08	0,18
		SUB TOTAL			2,20		0,18
		31	1,92	2,62	5,03	0,10	0,50
		SUB TOTAL			5,03		0,50
29/05/2025	CLL 60 CRA 6	32	0,50	0,85	0,43	0,12	0,05
		SUB TOTAL			0,43		0,05
		33	1,30	0,35	0,46	0,12	0,05
			1,50	1,65	2,48	0,12	0,30
		SUB TOTAL			2,93		0,35
		34	1,33	1,20	1,60	0,12	0,19
			2,00	0,55	1,10	0,12	0,13
		SUB TOTAL			2,70		0,32
30/05/2025	CLL60 CRA 1	35	3,62	29,00	104,98	0,09	9,45
			2,65	9,20	24,38	0,09	2,19
		SUB TOTAL			129,36		11,64
	CLL 19 CRA 1	36	3,12	5,21	16,26	0,13	2,11
		SUB TOTAL			16,26		2,11
		37	1,92	2,64	5,07	0,12	0,61
		SUB TOTAL			5,07		0,61
		38	2,53	1,42	3,59	0,12	0,43
		SUB TOTAL			3,59		0,43
		39	7,71	0,93	7,17	0,12	0,86
			1,61	1,82	2,93	0,12	0,35
			2,28	2,12	4,83	0,12	0,58
			1,52	0,90	1,37	0,14	0,19
		SUB TOTAL			16,30		1,98
		40	2,01	4,31	8,66	0,05	0,43
			0,70	1,94	1,36	0,05	0,07
		SUB TOTAL			10,02		0,50

SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS

CONVENIO Nº 4009 ALCALDIA DE IBAGUE

CUADROS DE CAJEO CUADRILLAS MENSUAL DE MAYO SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS CONVENIO 4009

FECHA	UBICACIÓN	N. CAJA	ANCHO	LARGO	AREA TOTAL	PROFUNDIDADES	VOLUMEN CAJEO
TOTAL					2091,68455 m2		242,2826795 m3

Total Cajeo 5 semana Mayo (26-31)	785,5778 m2
Total Cajeo 4 semana Mayo (19-24)	444,56245 m2
Total Cajeo 3 semana Mayo (12-17)	861,5443 m2
Total Cajeo 2 semana Mayo (5-10)	233,038 m2
Total Cajeo 1 semana Mayo (1-3)	106,1844 m2
TOTAL CAJEO MES DE ABRIL (m2)	2174,36 m2
TOTAL CAJEO MES DE MARZO (m2)	2455,9646 m2
TOTAL CAJEO MES DE FEBRERO (m2)	2674,78967 m2
TOTAL CAJEO MES DE ENERO (m2)	2677,27496 m2
Total Acumulado	**11627,7184 M2**

FERNANDO SÁNCHEZ CARDOZO

Presidente STI

SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS

CONVENIO Nº 4009 ALCALDIA DE IBAGUE

CUADROS DE ASFALTO CUADRILLAS MENSUAL DE MAYO SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS CONVENIO 4009

FECHA	UBICACIÓN	N. CAJA	AREA TOTAL	VOLUMEN CAJEO	VOLUMEN ASFALTO SUELTO	VOLUMEN INSTALADO
SEMANA DEL 12-17 DE MAYO						
13/05/2025	AV. AMBALA	1	18,41	1,66	2,07	2,07
		2	52,35	5,24	6,54	6,54
		12	29,70	2,97	3,71	3,71
		13	41,41	4,97	6,21	3,11
		14	1,40	0,15	0,19	0,16
	CLL 10 ENTRE CRA 8 Y CRA 9	3	1,99	0,20	0,25	0,25
		4	10,66	1,07	1,33	1,33
		5	2,32	0,23	0,29	0,29
		6	2,60	0,26	0,33	0,33
		7	4,56	0,46	0,57	0,57
		15	2,49	0,37	0,47	0,47
		16	4,97	0,50	0,62	0,62
		17	2,02	0,20	0,25	0,25
		18	29,85	3,58	4,48	3,20
	CRA 6 ENTRE CLL 38 Y CLL 39	8	29,14	2,44	3,05	3,05
		9	37,97	3,42	4,27	4,27
		10	40,06	4,01	5,01	5,01
		11	10,44	1,36	1,70	1,70
15/05/2025	CLL 10 ENTRE CRA 7 Y CRA 9	18	29,85	3,58	4,48	1,28
		19	4,65	0,47	0,58	0,35
		20	3,11	0,28	0,35	0,15
		21	8,76	0,79	0,99	0,66
		22	13,18	1,19	1,48	0,98
		23	5,87	0,53	0,66	0,44
		24	72,06	9,37	11,71	4,05
		25	11,55	1,16	1,44	0,72
	AV. AMBALA	13	41,41	4,97	6,21	3,10
		26	2,18	0,22	0,27	0,27
		27	3,74	0,37	0,47	0,47
		28	1,20	0,12	0,15	0,15
		29	45,41	5,45	6,81	6,81
		30	26,70	2,94	3,67	2,98
		31	4,91	0,49	0,61	0,61
		32	5,66	0,57	0,71	0,71
		45	3,66	0,37	0,46	0,46
	CRA 6 ENTRE CLL 37 Y CLL 39 Y CLL 38 ENTRE CRA 5 Y CRA6	35	11,56	0,92	1,16	1,16
		36	2,22	0,18	0,22	0,22
		37	2,13	0,17	0,21	0,21
		38	0,63	0,06	0,07	0,07
		39	3,28	0,26	0,33	0,33
		40	14,30	0,86	1,07	1,07
		41	2,09	0,17	0,21	0,21
		42	45,81	4,58	5,73	5,73
		43	20,51	2,46	3,08	3,08
		44	9,76	0,98	1,22	1,22
		47	5,70	0,40	0,50	0,50
		48	3,96	0,36	0,45	0,45
16/05/2025	AV. AMBALA	33	20,40	1,84	2,30	2,30
		34	1,22	0,12	0,15	0,09
		46	72,04	7,20	9,00	9,00
	CRA 6 ENTRE CLL 39 Y CLL 40	49	8,97	1,08	1,35	1,35
		50	56,91	7,40	9,25	9,25
		51	25,44	3,05	3,82	3,82
		52	8,39	1,01	1,26	0,68
	CLL 10 ENTRE CRA 7 Y CRA 9	19	4,65	0,47	0,58	0,23
		20	3,11	0,28	0,35	0,20
		21	8,76	0,79	0,99	0,33
		22	13,18	1,19	1,48	0,50
		23	5,87	0,53	0,66	0,22
		24	72,06	9,37	11,71	7,66
		53	8,16	0,98	1,22	1,00
		54	3,11	0,31	0,39	0,39
SEMANA DEL 19-24 DE MAYO						
CAJEO SEMANA 12 - 17 MAYO						
21/05/2025	CLL 10 ENTRE CRA 7 Y CRA 9	53	8,16	0,98	1,22	0,22
	AV. AMBALÁ	30	26,70	2,94	3,67	0,69
		34	1,22	0,12	0,15	0,06
		14	1,40	0,15	0,19	0,03
22/05/2025	CRA 6 ENTRE CLL 39 Y CLL 40	52	8,39	1,01	1,26	0,58

CAJEO SEMANA 19 - 24 MAYO							
21/05/2025	CRA 6 ENTRE CLL 41 y 42	1	2,68	0,21	0,27	0,27	
		2	0,93	0,07	0,09	0,09	
		3	50,29	4,53	5,66	5,66	
		4	26,76	3,50	4,38	4,38	
		5	7,48	0,82	1,03	1,03	
	AV. AMBALÁ CLL 35 Y 34	6	35,14	3,16	3,95	3,95	
		7	11,26	0,79	0,99	0,99	
		8	10,58	0,74	0,93	0,93	
		9	12,46	0,87	1,09	1,09	
		10	11,97	1,44	1,80	1,40	
		11	42,63	4,26	5,33	5,33	
	CLL 10 ENTRE CRA 7 Y CRA 9	33	28,39	4,26	5,32	5,32	
		36	40,49	3,64	4,56	1,80	
	0,00	17	65,37	5,43	6,79	6,79	Asfalto aplicado por Inflbagué
22/05/2025	CRA 6 ENTRE CLL 42 y 44	18	2,32	0,23	0,29	0,29	
		19	1,72	0,21	0,26	0,26	
		20	2,73	0,27	0,34	0,34	
		21	4,06	0,49	0,61	0,61	
		22	0,73	0,05	0,06	0,06	
		23	2,95	0,29	0,37	0,37	
		24	2,25	0,27	0,34	0,34	
		25	0,37	0,04	0,05	0,05	
		26	0,45	0,03	0,04	0,04	
		27	0,75	0,07	0,09	0,09	
		28	2,58	0,18	0,23	0,23	
		29	1,14	0,31	0,39	0,39	
		30	28,39	0,14	0,17	0,17	
	CRA 6 ENTRE CLL 46 Y 47	31	12,18	1,34	1,67	1,67	
		32	9,30	1,09	1,37	1,37	
	CLL 80 ENTRE CRA 4 Y 5	16	72,36	7,48	9,35	6,73	Asfalto aplicado por Inflbagué
23/05/2025	CLL 10 ENTRE CRA 8 Y 9	36	40,49	3,64	4,56	2,76	
		12	2,14	0,15	0,19	0,19	
		13	0,78	0,05	0,07	0,07	
		14	1,27	0,09	0,11	0,11	
		34	8,61	0,69	0,86	0,86	
		35	25,28	1,77	2,21	2,21	
		42	0,92	0,11	0,14	0,14	
		43	1,20	0,14	0,18	0,18	
		44	1,76	0,25	0,31	0,31	
	AV. AMBALÁ CLL 37	38	64,48	9,67	12,09	12,09	
	CLL 80 ENTRE CRA 4 Y 5	15	19,39	2,23	2,79	2,79	
		16	72,36	7,48	9,35	2,62	
		39	3,28	0,33	0,41	0,41	
		40	2,54	0,25	0,32	0,32	
		41	0,50	0,05	0,06	0,06	
SEMANA DEL 26-31 DE MAYO							
27/05/2025	CRA 6 ENTRE CLL 44 Y 45	1	32,57	3,99	4,99	4,99	
		2	6,24	0,94	1,17	1,17	
		3	46,69	6,54	8,17	8,17	
	AV. AMBALA ENTRE CLL 25 Y 35	4	31,97	2,56	3,20	3,20	
		5	22,94	1,38	1,72	1,72	
		6	136,56	22,55	28,19	9,48	
	CRA 3 ENTRE CLL 10 Y 3	7	46,70	3,84	4,80	4,80	
		8	13,51	0,95	1,18	1,18	
		9	3,61	0,36	0,45	0,45	
		10	6,91	0,60	0,75	0,75	
		11	2,51	0,28	0,34	0,34	
29/05/2025	CLL 25 ENTRE CRA 5 Y 8	6	136,56	22,55	28,19	10,64	
		12	6,83	1,09	1,37	0,34	
		13	48,41	7,75	9,68	4,00	
	CLL 60 ENTRE CRA 6 Y 2	14	90,51	7,24	9,05	9,05	
		15	25,91	2,07	2,59	2,59	
		16	2,49	0,22	0,28	0,28	
		17	0,25	0,02	0,03	0,03	
		18	1,06	0,16	0,20	0,20	
		19	2,54	0,28	0,35	0,35	
		20	4,84	0,53	0,66	0,66	
		32	0,43	0,05	0,06	0,06	
		33	2,93	0,35	0,44	0,44	
		34	2,70	0,32	0,40	0,40	
	CAR 1 Y 2 ENTRE CLL 15 Y 10	21	20,19	2,02	2,52	2,52	
		22	1,94	0,19	0,24	0,24	
		23	5,37	0,54	0,67	0,67	
		24	4,38	0,53	0,66	0,66	
		25	1,12	0,17	0,21	0,21	
		26	0,39	0,05	0,06	0,06	
		27	1,03	0,12	0,15	0,15	
		28	22,86	2,29	2,86	2,86	
		29	1,40	0,13	0,16	0,16	
		30	2,20	0,18	0,22	0,22	
		31	5,03	0,50	0,63	0,63	
	CLL60 CRA 1	35	129,36	11,64	14,55	8,67	

	CAJEO SEMANA 19-24					
30/05/2025	AV. AMBALA CLL 35 Y 34	10	11,97	1,44	1,80	0,40
	CLL 25 ENTRE CRA 5 Y 8	6	136,56	22,55	28,19	8,07
		12	6,83	1,09	1,37	1,03
		13	48,41	7,75	9,68	5,68
	CLL 19 CRA 1	36	16,26	2,11	2,64	2,64
		37	5,07	0,61	0,76	0,76
		38	3,59	0,43	0,54	0,54
		39	16,30	1,98	2,48	2,48
		40	10,02	0,50	0,63	0,63
TOTAL			**2947,89185 m3**	**334,7038385 m3**	**418,3797981 m3**	**295,6813231 m3**
Total Cajeo 5 semana Mayo (26-31)			**1125,8977 m2**			
Total Cajeo 4 semana Mayo (19-24)			**781,56895 m2**			
Total Cajeo 3 semana Mayo (12-17)			**1040,4252 m2**			
Total Cajeo 2 semana Mayo (5-10)			**233,038 m2**			
Total Cajeo 1 semana Mayo (1-3)			**146,0553 m2**			
TOTAL MES			**3326,98515 m2**			

	INFORME DE OBRA	FECHA:		
		12	MAYO	2025
		31	MAYO	2025
		VERSIÓN: 01		
		PAGINA: 1 DE		

INFORMACION DEL CONTRATO

CONTRATISTA:	SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS
CONTRATO Nº:	4009
INTERVETOR	
SUPERVISOR :	FREDY RINCON
MES:	MAYO


REGISTRO FOTOGRAFICO

SEMANA DEL 12-17 DE MAYO

1. AV. AMBALA







2. AV. AMBALA








3.CLL 10 ENTRE CRA 8 Y CRA 9








4.CLL 10 ENTRE CRA 8 Y CRA 9








5. CLL 10 ENTRE CRA 8 Y CRA 9








18.CRA 8 ENTRE CLL 10 Y CLL 11






19. CLL 10 ENTRE CRA 7 Y CRA 9






20. CLL 10 ENTRE CRA 7 Y CRA 9



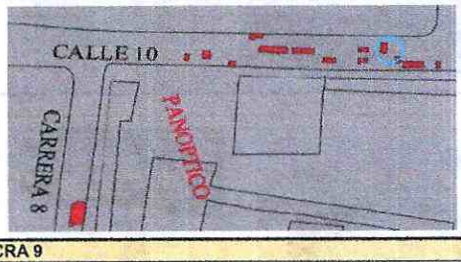


21. CLL 10 ENTRE CRA 7 Y CRA 9






22. CLL 10 ENTRE CRA 7 Y CRA 9





23. CLL 10 ENTRE CRA 7 Y CRA 9






6.CLL 10 ENTRE CRA 8 Y CRA 9






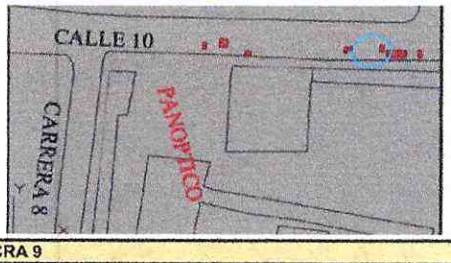

7.CLL 10 ENTRE CRA 8 Y CRA 9






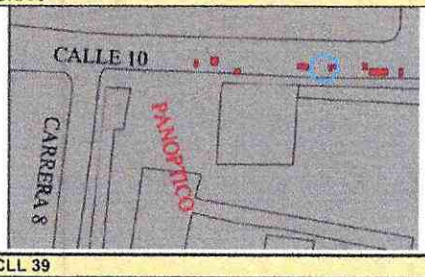

8. CRA 6 ENTRE CLL 38 Y CLL 39




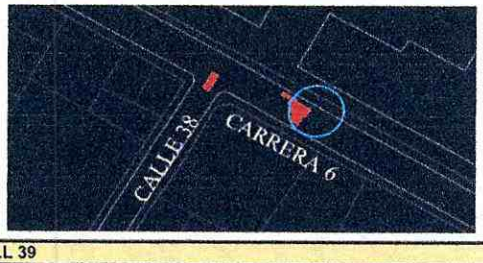

9.CRA 6 ENTRE CLL 38 Y CLL 39








10. CRA 6 ENTRE CLL 38 Y CLL 39








11. CRA 6 ENTRE CLL 38 Y CLL 39









12. AV. AMBALA




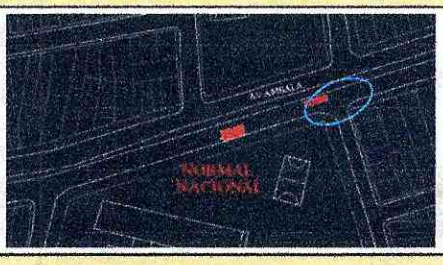

13. AV. AMBALA

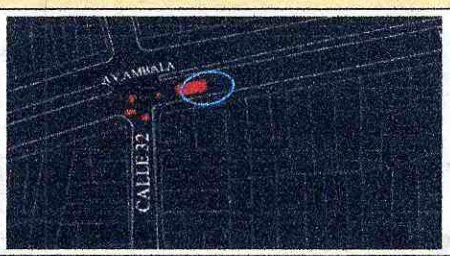



14. AV. AMBALA


15. CLL 10 ENTRE CRA 8 Y CRA 9



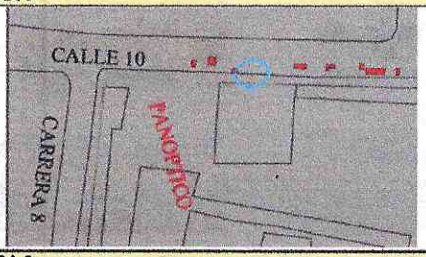


16. CLL 10 ENTRE CRA 8 Y CRA 9



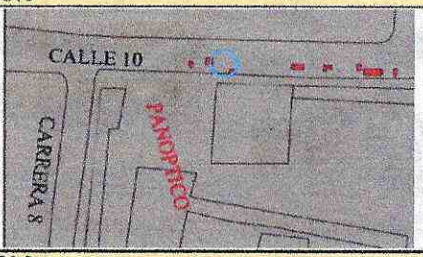

17. CLL 10 ENTRE CRA 8 Y CRA 9



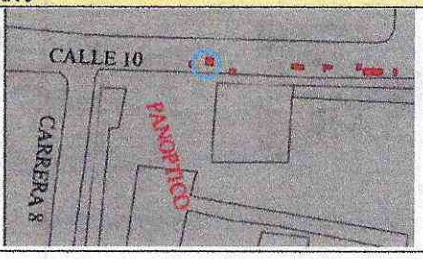


30. AV. AMBALA






31. AV. AMBALA




32. AV. AMBALA






33. AV. AMBALA






34. AV. AMBALA






35. CLL 38 ENTRE CRA 5 Y CRA 6






24. CLL 10 ENTRE CRA 7 Y CRA 9






25. CLL 10 ENTRE CRA 7 Y CRA 9






26. AV. AMBALA



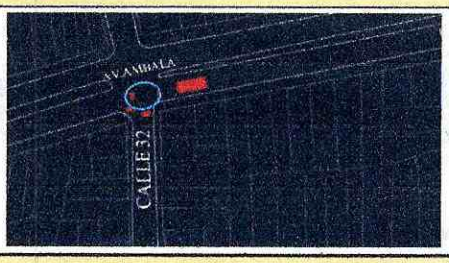


27.AV. AMBALA



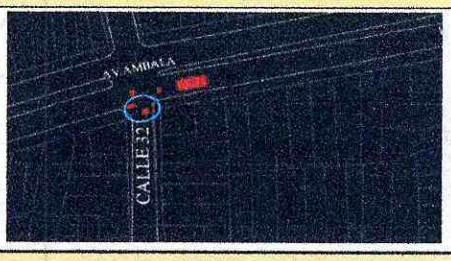


28. AV. AMBALA

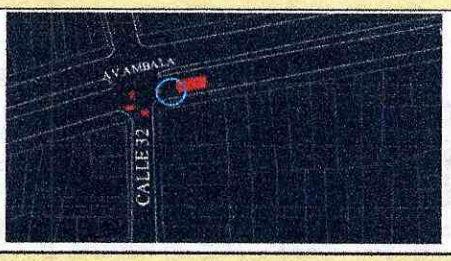
29. AV. AMBALA







42. CRA 6 ENTRE CLL 38 Y CLL 39



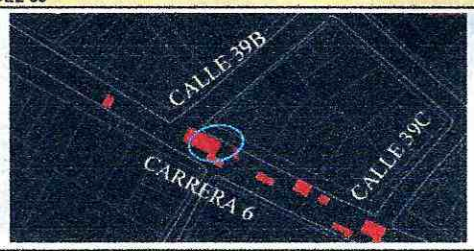

43. CRA 6 ENTRE CRA 38 Y CRA 37

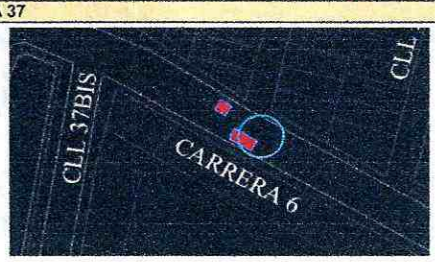
44. CRA 6 ENTRE CRA 38 Y CRA 37






45. AV. AMBALA





46. AV. AMBALA









47. CRA 6 ENTRE CLL 39 Y CLL 40



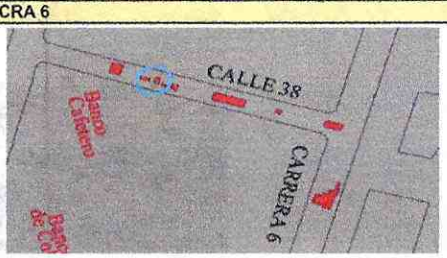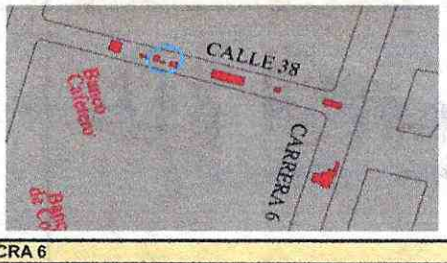

36. CLL 38 ENTRE CRA 5 Y CRA 6		
		
37. CLL 38 ENTRE CRA 5 Y CRA 6		
		
38. CLL 38 ENTRE CRA 5 Y CRA 6		
		
39. CLL 38 ENTRE CRA 5 Y CRA 6		
		
40. CLL 38 ENTRE CRA 5 Y CRA 6		
		
41. CLL 38 ENTRE CRA 5 Y CRA 6		
		

54. CLL 10 ENTRE CRA 7 Y CRA 9






SEMANA DEL 19-24 DE MAYO

1. CRA 6 ENTRE CLL 40 y 41








2. CRA 6 ENTRE CLL 40 y 41








3. CRA 6 ENTRE CLL 40 y 41






4. CRA 6 ENTRE CLL 40 y 41








5. CRA 6 ENTRE CLL 40 y 41








48. CRA 6 ENTRE CLL 39 Y CLL 40






49. CRA6 ENTRE CLL 40 Y CLL 41



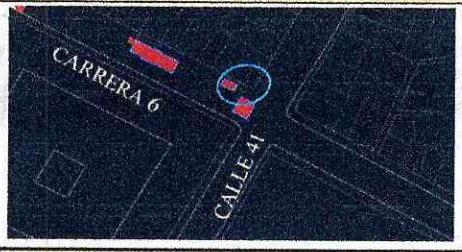


50. CRA6 ENTRE CLL 40 Y CLL 41



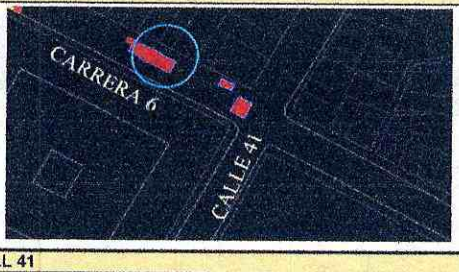

51. CRA6 ENTRE CLL 40 Y CLL 41

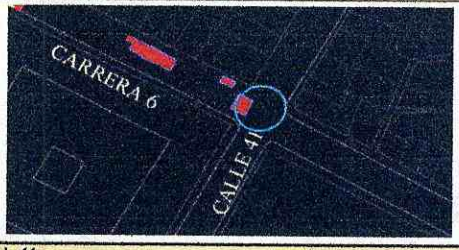
52. CRA6 ENTRE CLL 40 Y CLL 41





53. CLL 10 ENTRE CRA 7 Y CRA 9





12. CLL 10 ENTRE CRA 8 Y 9





13. CLL 10 ENTRE CRA 8 Y 9






14. CLL 10 ENTRE CRA 8 Y 9






15. CLL 80 ENTRE CRA 4 Y 5





16. CLL 80 ENTRE CRA 4 Y 5

17. CRA 4 CLL 80






6. AV. AMBALÁ VLL 35 Y 34






7. AV. AMBALÁ VLL 35 Y 34






8. AV. AMBALÁ VLL 35 Y 34






9. AV. AMBALÁ CLL 32 Y 35






10. AV. AMBALÁ CLL 32 Y 35








11. AV. AMBALÁ CLL 32 Y 35








24. CRA 6 ENTRE CLL 42 y 44		
		







25. CRA 6 ENTRE CLL 42 y 44		
		

26. CRA 6 ENTRE CLL 42 y 44		
		



27. CRA 6 ENTRE CLL 42 y 44		
		

28. CRA 6 ENTRE CLL 42 y 44		
		

29. CRA 6 ENTRE CLL 42 y 44		
		


18. CRA 6 ENTRE CLL 42 y 44		
		
19. CRA 6 ENTRE CLL 42 y 44		
		
20. CRA 6 ENTRE CLL 42 y 44		
		
21. CRA 6 ENTRE CLL 42 y 44		
		
22. CRA 6 ENTRE CLL 42 y 44		
		
23. CRA 6 ENTRE CLL 42 y 44		
		

36. CLL 10 ENTRE CRA 7 Y 5


37. CRA 3 CLL 8






38. AV. AMBALÁ CLL 37






39. CRA 2 SUR






40. AV. PEDRO TAFUR






41. AV. PEDRO TAFUR






30. CRA 6 ENTRE CLL 42 y 44






31. CRA 6 ENTRE CLL 46 Y 47





32. CRA 6 ENTRE CLL 46 Y 47





33. CLL 10 ENTRE CRA 7 Y 5







34. CLL 10 ENTRE CRA 7 Y 5








35. CLL 10 ENTRE CRA 7 Y 5






4. AV. AMBALA ENTRE CLL 25 Y 35





5. AV. AMBALA ENTRE CLL 25 Y 35






6. AV. AMBALA ENTRE CLL 25 Y 35







7. CRA 3 ENTRE CLL 5 Y 3






8. CRA 3 ENTRE CLL 5 Y 3









9. CRA 3 ENTRE CLL 5 Y 3






42. CLL 10 ENTRE CRA 8 Y 9






43. CLL 10 ENTRE CRA 8 Y 9





44. CLL 10 ENTRE CRA 8 Y 9







SEMANA DEL 26-31 DE MAYO

1. CRA 6 ENTRE CLL 44 Y 45





2. CRA 6 ENTRE CLL 44 Y 45






3. CRA 6 ENTRE CLL 44 Y 45






16. CLL 60 ENTRE CRA 5 Y 2



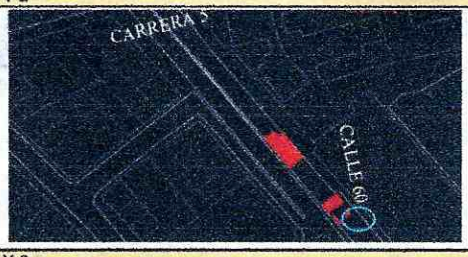

17. CLL 60 ENTRE CRA 5 Y 2



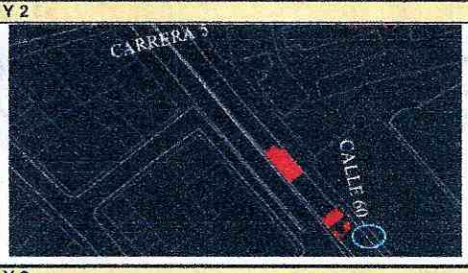

18. CLL 60 ENTRE CRA 5 Y 2






19. CLL 60 ENTRE CRA 5 Y 2






20. CLL 60 ENTRE CRA 5 Y 2



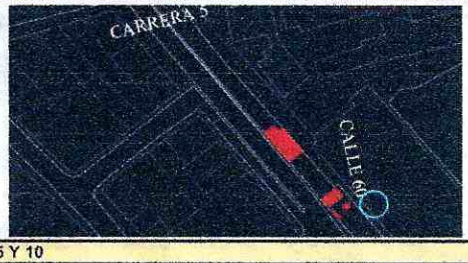


21. CAR 1 Y 2 ENTRE CLL 15 Y 10

10. CRA 3 ENTRE CLL 5 Y 3



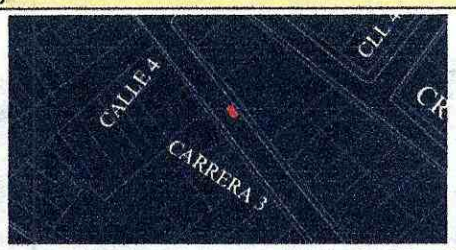

11. CRA 3 ENTRE CLL 10 Y 9








12. CLL 25 ENTRE CRA 5 Y 8






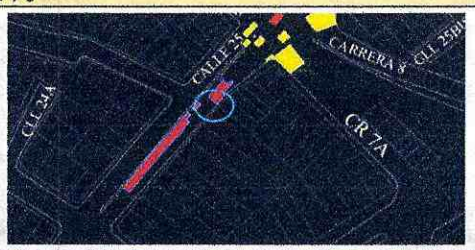

13. CLL 25 ENTRE CRA 5 Y 8








14. CLL 60 ENTRE CRA 5 Y 2





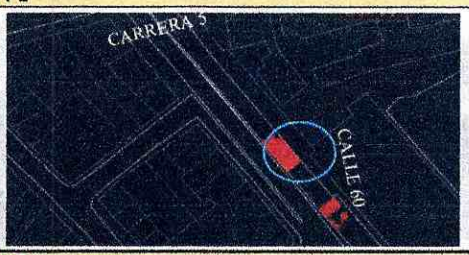

15. CLL 60 ENTRE CRA 5 Y 2








22. CAR 1 Y 2 ENTRE CLL 15 Y 10





23. CAR 1 Y 2 ENTRE CLL 15 Y 10



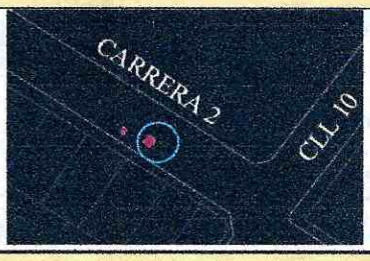


24. CAR 1 Y 2 ENTRE CLL 15 Y 10






25. CAR 1 Y 2 ENTRE CLL 15 Y 10



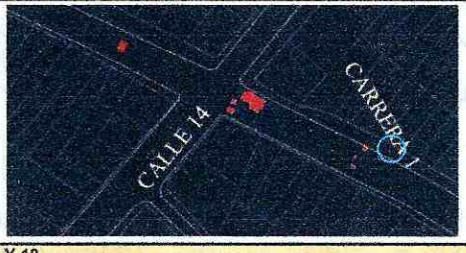

26. CAR 1 Y 2 ENTRE CLL 15 Y 10



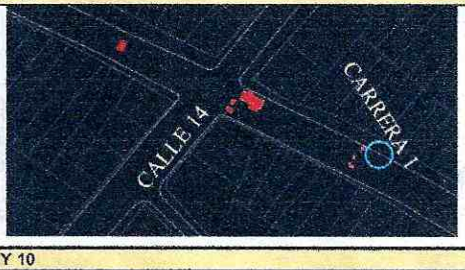

27. CAR 1 Y 2 ENTRE CLL 15 Y 10





22. CAR 1 Y 2 ENTRE CLL 15 Y 10





23. CAR 1 Y 2 ENTRE CLL 15 Y 10






24. CAR 1 Y 2 ENTRE CLL 15 Y 10





25. CAR 1 Y 2 ENTRE CLL 15 Y 10



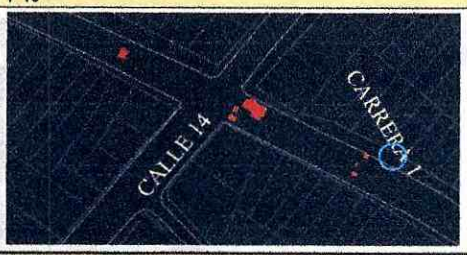

26. CAR 1 Y 2 ENTRE CLL 15 Y 10






27. CAR 1 Y 2 ENTRE CLL 15 Y 10






28. CAR 1 Y 2 ENTRE CLL 15 Y 10







29 y 30. CAR 1 Y 2 ENTRE CLL 15 Y 10



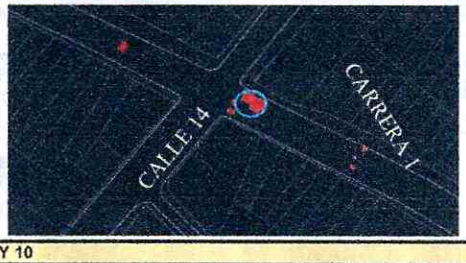

31. CAR 1 Y 2 ENTRE CLL 15 Y 10



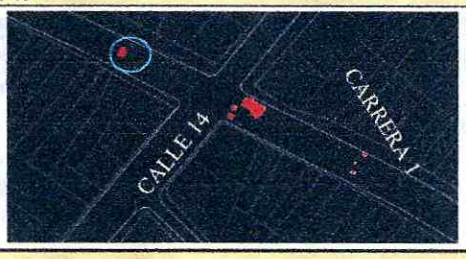
32. CLL 60 CRA 6





33. CLL 60 CRA 6





34. CLL 60 CRA 6






35. CLL60 CRA 1





36. CLL 19 CRA 1






37. CLL 19 CRA 1







38. CLL 19 CRA 1






39. CLL 19 CRA 1





40. CLL 19 CRA 1





	SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS CONVENIO N° 4009 ALCALDIA DE IBAGUE CUADROS DE NIVELACION MENSUAL DE MAYO SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS CONVENIO 4009							
FECHA	**UBICACIÓN**	**N. CAJA**	**ANCHO**	**LARGO**	**AREA**	**PROFUNDIDAD**	**VOLUMEN TOTAL**	**VOLUMEN TOTAL SUELTO**
SEMANA DEL 12-17 DE MAYO								
13/05/2025	CRA 6 ENTRE CLL38 Y CLL 39	1	3,30	3,38	11,15	0,05	0,56	0,70
15/05/2025	CRA 6 ENTRE CLL39 Y CLL40	2	4,46	2,95	13,16	0,05	0,66	0,82
16/05/2025	CLL 1B CRA 10	3	0,44	49,20	21,65	0,05	1,08	1,35
16/05/2025	AV. AMBALA	4	4,05	16,60	67,23	0,05	3,36	4,20
SEMANA DEL 19-24 DE MAYO								
21/05/2025	CLL 1B CRA 10	1	0,44	65,31	28,74	0,05	1,44	1,80
23/05/2025	CRA 2 SUR	2	0,80	2,90	2,32	0,05	0,12	0,15
			0,35	2,90	1,02	0,05	0,05	0,06
			4,20	2,60	10,92	0,05	0,55	0,68
	AV. PEDRO TAFUR	3	2,30	11,95	27,49	0,05	1,37	1,72
		4	1,20	2,57	3,08	0,05	0,15	0,19
	CLL 10 ENTRE CRA 8 Y 9	5	0,61	5,50	3,36	0,04	0,13	0,17
	AV. AMBALÁ CLL 37	6	4,20	10,50	44,10	0,06	2,65	3,31
SEMANA DEL 26-31 DE MAYO								
27/05/2025	CRA 6 ENTRE CLL 44 Y 45	1	2,40	1,75	4,20	0,05	0,21	0,26
		2	1,79	2,10	3,76	0,05	0,19	0,23
		3	2,69	1,80	4,84	0,05	0,24	0,30
		4	1,10	5,70	6,27	0,05	0,31	0,39
29/05/2025	CLL 60 CRA 6	5	7,55	8,40	63,42	0,05	3,17	3,96
TOTAL					**316,6954 m2**		**16,24222 m3**	**20,302775 m3**

Total Nivelacion 5 semana Mayo (26-31)	82,491 m2
Total Nivelacion 4 semana Mayo (19-24)	121,0154 m2
Total Nivelacion 3 semana Mayo (12-15)	113,189 m2
Total Nivelacion 2 semana Mayo (5-10)	4,5884 m2
Total Nivelacion 1 semana Mayo (1-3)	39,5304 m2
TOTAL CAJEO MES DE ABRIL (m2)	327,04 m2
TOTAL CAJEO MES DE MARZO (m2)	443,7416 m2
TOTAL CAJEO MES DE FEBRERO (m2)	1737,37463 m2
TOTAL CAJEO MES DE ENERO (m2)	1001,66155 m2
Total Acumulado	**3667,1256 m2**

	INFORME DE OBRA	FECHA:		
		12	MAYO	2025
		31	MAYO	2025
		VERSIÓN: 01		
		PAGINA: 1 DE		

INFORMACION DEL CONTRATO


CONTRATISTA:	SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS
CONTRATO Nº:	4009
INTERVETOR	
SUPERVISOR :	FREDY RINCON
MES:	MAYO

REGISTRO FOTOGRAFICO

SEMANA DEL 12-17 DE MAYO


1. CRA 6 ENTRE CLL38 Y CLL 39






2. CRA 6 ENTRE CLL39 Y CLL40






3.CLL 1B CRA 10





4. AV. AMBALA





SEMANA DEL 19-24 DE MAYO

1. CLL 1B CRA 10






2. CRA 2 SUR






3. AV PEDRO TAFUR






4. AV. PEDRO TAFUR






5. CLL 10 ENTRE CRA 8 Y 9





6. AV. AMBALÁ CLL 37





SEMANA DEL 26-31 DE MAYO


1. CRA 6 ENTRE CLL 44 Y 45





2. CRA 6 ENTRE CLL 44 Y 45





3. CRA 6 ENTRE CLL 44 Y 45	
	
4. CRA 6 ENTRE CLL 44 Y 45	
	
6. CLL 60 CRA 6	
	

SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS

CONVENIO Nº 4009 ALCALDIA DE IBAGUE

CANTIDAD ASFALTO MENSUAL DE MAYO SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS CONVENIO 4009

FECHA	UBICACIÓN	PLACA	EMULSION	CANTIDAD	TOTAL
SEMANA DEL 12-17 DE MAYO					
13/05/2025	AV. AMBALA	WWA 524	1	15,69	37,71
	CRA 6 ENTRE CLL 28 Y CLL 29	TGN 782	1	14,72	
	CRA 10 ENTRE CRA 8 Y CRA 9	OTE 038	1	7,3	
15/05/2025	AV. AMBALA	SNN 369		15,56	39,29
	CRA 6 ENTRE CLL 28 Y CLL 29	TGN 782		15,09	
	CLL 10 ENTRE CRA8 Y CRA 9	OTE 038		8,64	
16/05/2025	AV. AMBALA	WWA 524	1	15,59	46,81
	CRA 6 ENTRE CLL 28 Y CLL 29	SNN 369		15,09	
	CLL 10 ENTRE CRA8 Y CRA 9	OTD 916	1	7,06	
		OTE 038	1	9,07	
SEMANA DEL 19-24 DE MAYO					
21/05/2025	CLL 10 ENTRE CRA 8 Y 9	OTE038	1	9,34	42,49
	AV. AMBALÁ VLL 35 Y 34	SBV045		14,6	
	CRA 6 ENTRE CLL 41 y 42	TGN781		11,58	
	CLL 80 ENTRE CRA 4 Y 5	OTD916		6,97	
22/05/2025	CRA 6 ENTRE CLL 41 y 42	OTE038		7,04	13,88
	ÉXITO	OTD916		6,84	
23/05/2025	AV. AMBALÁ VLL 35 Y 34	WWA524	1	15,61	30,86
	CLL 10 ENTRE CRA 8 Y 9	OTD916		7,09	
	ÉXITO	OTE038		8,16	
SEMANA DEL 26-31 DE MAYO					
27/05/2025	CRA 6 ENTRE CLL 44 Y 45		1	15,58	37,51
	AV. AMBALA ENTRE CLL 25 Y 35	WWA 524	1	14,4	
	CRA 3 ENTRE CLL 10 Y 3		1	7,53	
29/05/2025	CLL 25 ENTRE CRA 5 Y 8	TGN 781		14,98	38,36
	CLL 60 ENTRE CRA 6 Y 2	OGL 050		7,69	
		EWF 605		7,31	
	CAR 1 Y 2 ENTRE CLL 15 Y 10	OTE 038		8,38	
30/0525	CLL 60 CON CRA 1	OTE 038	1	8,67	30,92
	AV. AMBALA ENTRE CRA 5 Y 8	TGN 781	1	15,21	
	CLL 19 CON CRA 1	OTD 875	1	7,04	
TOTAL M3			**14**		**317,83**

Total Asfalto 5 semana Mayo (26-31)	**106,79**
Total Asfalto 4 semana Mayo (19-24)	**87,23**
Total Asfalto 3 semana Mayo (12-17)	**123,81**
Total Asfalto 2 semana Mayo (5-10)	**29,92**
Total Asfalto 1 semana Mayo (1-3)	**20,74**
TOTAL ASFALTO MES DE ABRIL (m2)	**344,08**
TOTAL ASFALTO MES DE MARZO (m2)	**396,91**
TOTAL ASFALTO MES DE FEBRERO (m2)	**543,91**
TOTAL ASFALTO MES DE ENERO (m2)	**481,73**
Total Acumulado	**2135,12 m3**

SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS

CONVENIO N° 4009 ALCALDIA DE IBAGUE

RECOLECCION ESCOMBRO MENSUAL DE MAYO SOCIEDAD TOLIMENSE DE INGENIEROS CONVENIO 4009

SEMANA DEL 12-17 DE MAYO		
12/05/2025	OTD 875	3
	OTE 038	1
13/05/2025	OGL 050	2
	OTD 875	1
14/05/2025	OTE 038	2
	OTD 875	2
	OGL 050	2
15/05/2025	OTE 038	2
	OTD 875	2
	OGL 050	2
16/05/2025	OTD 875	2
	OGL 050	1
SEMANA DEL 19-24 DE MAYO		
19/05/2025	OTE038	1
	OTD916	2
20/05/2025	OTD875	3
	OTD916	2
SEMANA DEL 26-31 DE MAYO		
26/05/2025	OTE 038	2
	OGL 050	2
	OTD 875	2
29/05/2025	OTE 038	2
	OTD 875	2
	OGL 050	2
31/05/2025	OTD 875	1
	OGL 050	1
TOTAL VIAJES		**44**
Total Escombro 5 semana Mayo (26-31)		**14,00**
Total Escombro 4 semana Mayo (19-24)		**8,00**
Total Escombro 3 semana Mayo (12-15)		**22,00**
Total Escombro 2 semana Mayo (5-10)		**5,00**
Total Escombro 1 semana Mayo (1-3)		**3,00**
TOTAL ESCOMBRO MES DE ABRIL (m2)		**27,00**
TOTAL ESCOMBRO MES DE MARZO (m2)		**44,00**
TOTAL EsSCOMBRO MES DE FEBRERO (m2)		**55,00**
TOTAL ESCOMBRO MES DE ENERO (m2)		**54,00**
Total Acumulado		**232 Viajes**
