CONTRATO No:	157 de 2025	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL. DEPARTAMENTO DE CASANARE		4	8	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR — CODIGO BPIN: 2024005850142

INTERVENTORIA [ ] — APOYO SUPERVISION [X]

Semana Número:	9 y 10	Del:	08/06/2025	Al:	14/07/2025	No:	5

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 2 Meses y 15 Días (Calendario)

Nombre del Contratista: HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL
Nombre del Interventor: N.A.
Nombre del Supervisor: LUIS RENE GRANADOS VARGAS
Nombre Apoyo a la Supervisión: HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL

CONTRATO DE OBRA

OBJETO:	AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE							
CONTRATO No	186 de 2025	NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO ILUMINACION COROZAL					
NOMBRE DEL RUBRO	00AD-2101-1900-2024.00585-0142 00IL-2102-1900-2024-00585-0142 AMPLIACION, MODERNIZACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO A TECNOLOGIA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	RUBRO	00AD-2101-1900-2024.00585-0142 00IL-2102-1900-2024-00585-0142	No. C.D.P.	7525	No R.P.	7525	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.345.991.817,00	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	CUATRO (4) MESES					
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	N/A	PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN	N/A					
FECHA DE INCIO	8 de Abril de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN	7 de Agosto de 2025	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	29/08/2025			

DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA FECHA

CONCEPTO DEL DESEMBOLSO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	VALOR DESEMBOLSADO	% DESEMBOLSO
CONCEPTO DEL DESEMBOLSO	ORDEN DE PAGO "COMPROBANTE"	194871525 - 194869925	$ 1.338.396.727	40%
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL DESEMBOLSADO A LA FECHA			$ 1.338.396.727	40%

PRORROGAS		
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION		
ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
2	Treinta (30) días	29/08/2025

ADICIONES		
CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO
N/A	N/A	N/A

CONTRATO No:	157 de 2025	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE		4	8	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR

CODIGO BPIN: 2024005850142

INTERVENTORIA [ ]

APOYO SUPERVISION [X]

EJECUCIÓN

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
OBRA PROGRAMADA (%)	8,83720%	48,5024%	OBRA EJECUTADA (%)	0,9420%	5,2143%
VALOR DE LA OBRA PROGRAMADA	$ 295.693.875,61	$ 1.622.896.841,61	VALOR DE LA OBRA EJECUTADA	$ 31.519.442,53	$ 174.470.632,85

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA AMPLIACION, MODERNIZACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO A TECNOLOGIA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL DEPARTAMENTO DE CASANARE						
CONTRATO No	188 DE 2025	NOMBRE DEL CONTRATISTA	ELECTRICOM INGENIERIA SAS				
NOMBRE DEL RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0142 AMPLIACION, MODERNIZACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO A TECNOLOGIA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0142	No. C.D.P.	7425	No R.P.	7225
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 348.394.515,00	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	CUATRO (04) MESES				
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	N/A	PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN	N/A				
FECHA DE INCIO	8 de Abril de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN	7 de Agosto de 2025	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	29/08/2025		

DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA FECHA				
CONCEPTO DEL DESEMBOLSO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	VALOR DESEMBOLSADO	% DESEMBOLSO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL DESEMBOLSADO A LA FECHA			$ -	0

PRORROGAS				SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION		
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A		2	Treinta (30) dias	29/08/2025

ADICIONES		
CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO
N/A	N/A	N/A

CONTRATO No:	157 de 2025		DD	MM	AA
OBJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	FECHA	4	8	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR

CODIGO BPIN: 2024005850142

INTERVENTORIA [ ]

APOYO SUPERVISION [X]

PRESTACION DE SERVICIO - APOYO A LA SUPERVISION

OBJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISION PARA LA AMPLIACION, MODERNIZACION Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE						
CONTRATO No	157 de 2025	NOMBRE DEL CONTRATISTA	HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL				
NOMBRE DEL RUBRO	00AD-2102-1900-2024-00585-0142 AMPLIACION, MODERNIZACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO A TECNOLOGIA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	RUBRO	00AD-2102-1900-2024-00585-0142	No. C.D.P.	7625	No R.P.	7125
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 23.200.000,00	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	CINCO (05) MESES				
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	N/A	PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN	N/A				
FECHA DE INCIO	8 de Abril de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN	7 de Septiembre de 2025	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	29/09/2025		

PRORROGAS		
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION		
ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
2	Treinta (30) dias	29/09/2025

ADICIONES		
CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO
N/A	N/A	N/A

CONTRATO No:	157 de 2025	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE		4	8	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR

CODIGO BPIN: 2024005850142


INTERVENTORIA [ ]

APOYO SUPERVISION [X]


RESUMEN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

El día 9 de junio se suscribe acta No 2 de suspensión de obra, interventoría y apoyo a supervisión por treinta (30) días, motivada por retrasos en la entrega de materiales de parte del proveedor debidamente certificada y por fuerte época de invierno. Se superan las circunstancias y se da reinicio mediante el actas No 3 del día 01 de julio. Se retoma la obra con la instalación de postería así como de luminarias y se ha desarrollado comité de obra No 5.


REGISTRO FOTOGRAFICO

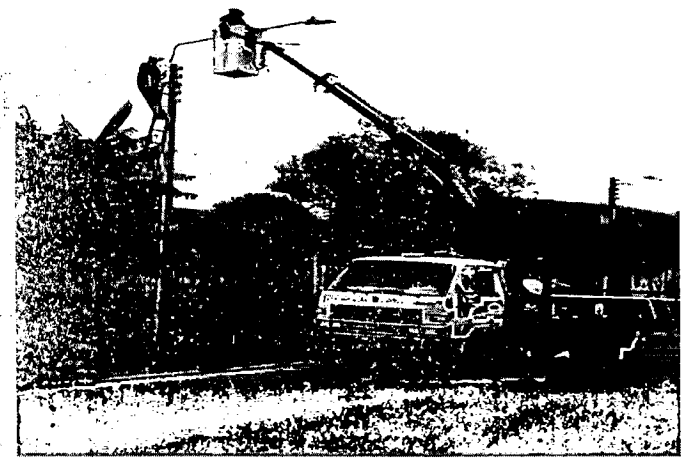


Descripción: Instalación de luminarias

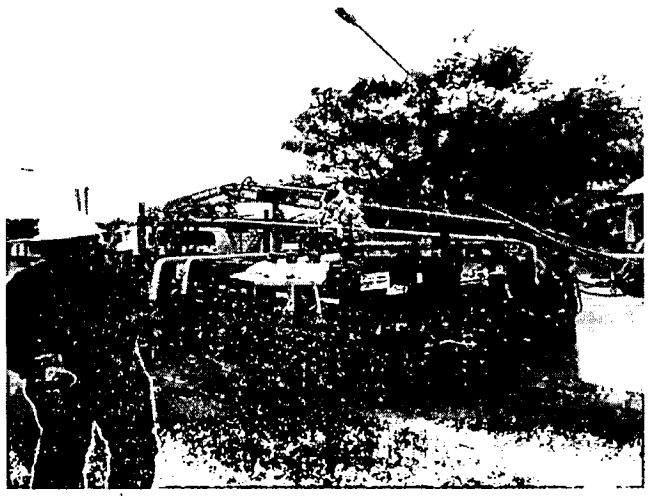

Descripción: Cargue de material en camión grúa



Cimentación de postes y puestas a tierra

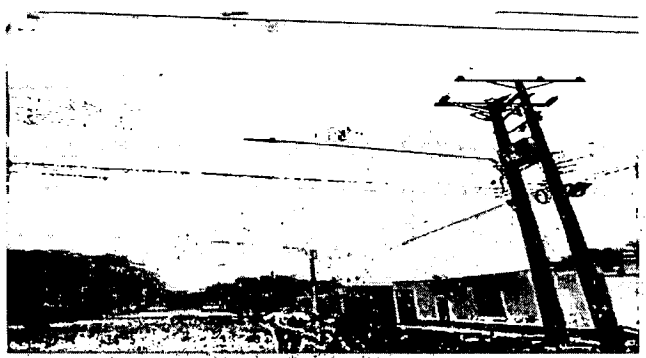

Brazos de 4m

CONTRATO No:	157 de 2025	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE		4	8	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR

CODIGO BPIN: 2024005850142

INTERVENTORIA [ ]

APOYO SUPERVISION [X]

ACTIVIDADES PROYECTADAS PARA LA SIGUIENTE SEMANA/QUINCENA

Continuar con la instalación de brazos y luminarias

OBSERVACIONES

En constancia se firma.

Elaboró

HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL
CONTRATISTA

Recibió

N/A
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Revisó

LUIS RENE GRANADOS VARGAS
SUPERVISOR DEL APOYO A LA SUPERVISION

CONTRATO No.:	157 de 2025	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE		4	8	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR

CODIGO BPIN: 2024005850142

INTERVENTORIA [ ]

APOYO SUPERVISION [X]

Semana Número:	11 y 12	Del:	15/07/2025	Al:	29/07/2025	No:	6

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 3 Meses y 0 Días (Calendario)

Nombre del Contratista: HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL

Nombre del Interventor: N.A.

Nombre del Supervisor: LUIS RENE GRANADOS VARGAS

Nombre Apoyo a la Supervisión: HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL

CONTRATO DE OBRA

OBJETO:	AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE							
CONTRATO No	186 de 2025	NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO ILUMINACION COROZAL					
NOMBRE DEL RUBRO	00AD-2101-1900-2024.00585-0142 00IL-2102-1900-2024-00585-0142 AMPLIACION, MODERNIZACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO A TECNOLOGIA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	RUBRO	00AD-2101-1900-2024.00585-0142 00IL-2102-1900-2024-00585-0142	No. C.D.P.	7525	No R.P.	7525	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.345.991.817,00	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	CUATRO (4) MESES					
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	N/A	PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN	N/A					
FECHA DE INCIO	8 de Abril de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN	7 de Agosto de 2025	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	29/09/2025			

DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA FECHA

CONCEPTO DEL DESEMBOLSO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	VALOR DESEMBOLSADO	% DESEMBOLSO
CONCEPTO DEL DESEMBOLSO	ORDEN DE PAGO "COMPROBANTE"	194871525 - 194869925	$ 1.338.396.727	40%
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL DESEMBOLSADO A LA FECHA			$ 1.338.396.727	40%

PRORROGAS		
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION		
ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
2	Treinta (30) días	29/08/2025

ADICIONES		
CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO
N/A	N/A	N/A

CONTRATO No.:	157 de 2025	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE		4	8	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR

CODIGO BPIN: 2024005850142

INTERVENTORIA [ ]

APOYO SUPERVISION [X]

EJECUCIÓN

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
OBRA PROGRAMADA (%)	16,05930%	46,8873%	OBRA EJECUTADA (%)	56,70733%	59,19560%
VALOR DE LA OBRA PROGRAMADA	$ 493.874.066,16	$ 1.568.698.343,52	VALOR DE LA OBRA EJECUTADA	$ 1.836.761.131,30	$ 1.980.679.327,21

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA AMPLIACION, MODERNIZACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO A TECNOLOGIA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL DEPARTAMENTO DE CASANARE						
CONTRATO No	188 DE 2025	NOMBRE DEL CONTRATISTA	ELECTRICOM INGENIERIA SAS				
NOMBRE DEL RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0142 AMPLIACION, MODERNIZACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO A TECNOLOGIA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0142	No. C.D.P.	7425	No R.P.	7225
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 348.394.515,00	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	CUATRO (04) MESES				
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	N/A	PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN	N/A				
FECHA DE INCIO	8 de Abril de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN	7 de Agosto de 2025	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A		

DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA FECHA

CONCEPTO DEL DESEMBOLSO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	VALOR DESEMBOLSADO	% DESEMBOLSO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL DESEMBOLSADO A LA FECHA			$ -	0

PRORROGAS			SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION		
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A	2	Treinta (30) dias	29/08/2025

ADICIONES		
CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO
N/A	N/A	N/A

CONTRATO No.:	157 de 2025	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE		4	8	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR

CODIGO BPIN: 2024005850142

INTERVENTORIA [ ]

APOYO SUPERVISION [X]

PRESTACION DE SERVICIO - APOYO A LA SUPERVISION

OBJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISION PARA LA AMPLIACION, MODERNIZACION Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE						
CONTRATO No	157 de 2025	NOMBRE DEL CONTRATISTA	HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL				
NOMBRE DEL RUBRO	00AD-2102-1900-2024-00585-0142 AMPLIACION, MODERNIZACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO A TECNOLOGIA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	RUBRO	00AD-2102-1900-2024-00585-0142	No. C.D.P.	7625	No R.P.	7125
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 23.200.000,00	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	CINCO (05) MESES				
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	N/A	PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN	N/A				
FECHA DE INCIO	8 de Abril de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN	7 de Septiembre de 2025	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	29/09/2025		

PRORROGAS		
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION		
ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
2	Treinta (30) dias	29/08/2025

ADICIONES		
CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO
N/A	N/A	N/A

CONTRATO No.:	157 de 2025	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE		4	8	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR

CODIGO BPIN: 2024005850142

INTERVENTORIA [ ]

APOYO SUPERVISION [X]

RESUMEN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

El día 17 de julio se suscribe acta No 3 de modificación de cantidades y acta No 4 de items no previstos previo a las consideraciones estudiadas y avaladas por interventoría sobre solicitud hecha por el contratista de obra, dado que se debian incluir brazos de diferentes longitudes principalmente y otras actividades que no habían quedado establecidas. Se continúan los trabajos de instalación de brazos y luminarias. Se lleva a cabo comité de obra No 6 donde se analizan algunas de las situaciones encontradas y se estima llegar a un avance del 60% al fin de mes.


REGISTRO FOTOGRAFICO




Descripción: Valla Instalada del Proyecto



Actividades de Instalacion de Luminarias

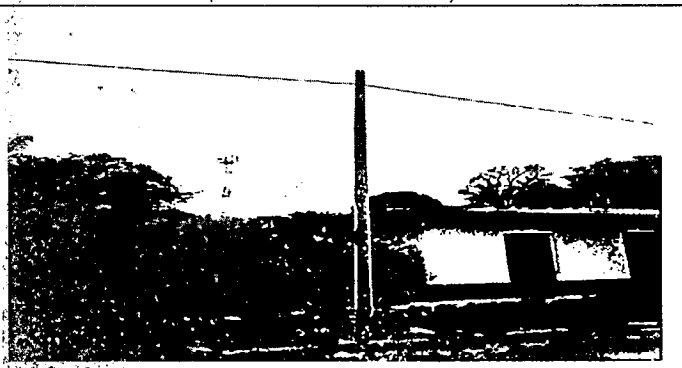

Instalación de Posteria

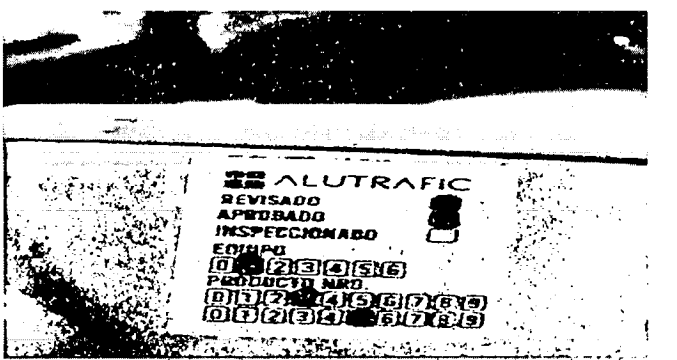

Revisión de Luminarias

CONTRATO No.:	157 de 2025		DD	MM	AA
OBJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	**FECHA**	4	8	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR — CODIGO BPIN: 2024005850142

INTERVENTORIA [ ] — APOYO SUPERVISION [X]

ACTIVIDADES PROYECTADAS PARA LA SIGUIENTE SEMANA/QUINCENA

Se tiene proyectado llegar a más del 60% de avance en ejecución de obra, continuando con las actividades según acta de modificación.

OBSERVACIONES

En constancia se firma.

Elaboró

HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL
CONTRATISTA

Recibió

N/A
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Revisó:

LUIS RENE GRANADOS VARGAS
SUPERVISOR DEL APOYO A LA SUPERVISION

ENERCA S.A E.S.P.

Informe Mensual de Interventoría

CONTRATO No.:	157 de 2025	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.		8	8	2025

INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO SGR CODIGO BPIN: 2024005850142

INTERVENTORIA [ ] APOYO SUPERVISIÓN [X]

Semana Número	12	Del	8/06/2025 y del 01/07/2025	Al:	29/07/2025	Mes No	3

Tiempo transcurrido desde la iniciación del cont 3 Meses y 0 Días (Calendario)

Nombre del Contratista: HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL

Nombre del Interventor: N.A

Nombre del Apoyo a Supervisión: HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL

Nombre del Supervisor: LUIS RENE GRANADOS VARGAS

CONTRATO DE OBRA

OBJETO:	AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL DEPARTAMENTO DE CASANARE						
CONTRATO No	186 de 2025	NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO ILUMINACION COROZAL				
NOMBRE DEL RUBRO	AMPLIACION, MODERNIZACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO A TECNOLOGIA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	RUBRO	00AD-2101-1900-2024 00585-0142 00IL-2102-1900-2024-00585-0142	No. C.D.P.	7525	No R.P.	7525
VALOR INICIAL DEL CONTRA	$ 3.345.991.817,00	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	CUATRO (04) MESES				
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ 3.345.991.817,00	PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN	CUATRO (04) MESES				
FECHA DE INICIO	08/04/2025	FECHA DE TERMINACIÓN	07/08/2025	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	29/08/2025		

DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA FECHA

CONCEPTO DEL DESEMBOLSO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DESEMBOLSADO	% DESEMBOLSO
ANTICIPO	ORDEN DE PAGO "COMPROBANTE"	194871525 -194869925	$ 1.338.396.727	40%
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL DESEMBOLSADO A LA FECHA			$ 1.338.396.727	40%

PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

SUSPENSIONES - AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
2	Treinta (30) dias	29/08/2025
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

CONTRATO No.:	157 de 2025	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.		8	8	2025

EJECUCIÓN

	MENSUAL	ACUMULADO
OBRA PROGRAMADA (%)	16,05930%	46,8873%
VALOR DE LA OBRA PROGRAMADA	$ 493.874.066,16	$ 1.568.698.343,52

	MENSUAL	ACUMULADO
OBRA EJECUTADA (%)	56,70733%	59,19560%
VALOR DE LA OBRA PROGRAMADA	$ 1.836.761.131,30	$ 1.980.679.327,21

CONTRATO DE CONSULTORIA - INTERVENTORIA

OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA AMPLIACION, MODERNIZACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO A TECNOLOGIA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL DEPARTAMENTO DE CASANARE						
CONTRATO No	188 de 2025	NOMBRE DEL CONTRATISTA	ELECTRICOM INGENIERIA SAS				
NOMBRE DEL RUBRO	AMPLIACION, MODERNIZACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO A TECNOLOGIA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0142	No. C.D.P.	7425	No R.P.	7225
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 348.394.515,00	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	CUATRO (04) MESES				
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	N.A.	PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN	N.A.				
FECHA DE INICIO	08/04/2025	FECHA DE TERMINACIÓN	07/08/2025	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	29/08/2025		

DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA FECHA

CONCEPTO DEL DESEMBOLSO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	N° DOCUMENT	VALOR DESEMBOLSADO	% DESEMBOLSO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL DESEMBOLSADO A LA FECHA			$ -	0

PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
2	Treinta (30) dias	29/08/2025
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

CONTRATO No.:	157 de 2025	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.		8	8	2025

PRESTACIÓN DE SERVICIO - APOYO A LA SUPERVISIÓN

OBJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.						
CONTRATO/ORDEN No	157 de 2025	NOMBRE DEL CONTRATISTA	HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL				
NOMBRE DEL RUBRO	AMPLIACION MODERNIZACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO A TECNOLOGIA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	RUBRO	00AD-2102-1900-2024-00585-0142	No. C.D.P.	7625	No R.P.	7125
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 23.200.000,00	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	CINCO (5) MESES				
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	N/A	PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN	N/A				
FECHA DE INICIO	08/04/2025	FECHA DE TERMINACIÓN	07/08/2025	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	29/09/2025		

PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A

SUSPENSIONES - AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
2	Treinta (30) dias	29/09/2025

ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO
N/A	N/A	N/A

RESUMEN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
(Del Consultor o Apoyo a la Supervisión)


Ítem	Nombre de la actividad contractual	Actividad realizada
1	Conocer en todas sus partes el contenido del contrato de la interventoria técnica, ambiental, administrativa, financiera, contable y juridica; Los pliegos de condiciones y demás documentos del proyecto correspondientes a la interventoria.	Se ha revisado el contenido del contrato de Interventoria con todos su pliego de condiciones y anexos.
2	Apoyar al área de Planeación de la Empresa con la información que se debe reportar al sistema de monitoreo GESPROY, y verificar sea enviada oportunamente.	Se ha reportado al sistema de monitoreo GESPROY la información requerida inicialmente asi como el avance a corte del dia 31 de julio de 2025
3	Cumplir con todas las actividades establecidas en el procedimiento de supervisiones e Interventorias PR-MAJ-SI-01 del Sistema Integrado de Gestión (SIG) para apoyar al supervisor de la interventoria.	Se cumple con las actividades establecidas en el procedimiento de supervisiones e interventoria.
4	Entregar los informes mensuales en los tiempos establecidos y la información que sea requerida por el supervisor de la OPS y por el supervisor del contrato de interventoria objeto del proyecto, velando por el cumplimiento de las actividades contractuales conforme a la normatividad vigente.	Se ha hecho entrega de el informe mensual dentro de los tiempos establecidos y se ha apoyado con la información requerida por el supervisor para que se lleve a cabo el cumplimiento de las actividades contractuales.
5	Apoyar a la oficina de contratación y juridica, para registrar todas las actividades de seguimiento y control en el sistema de información que disponga la empresa para tal fin, asi mismo desarrollar las gestiones y servicios a que haya lugar con otras áreas internas y/o externas de la Empresa, para garantizar la adecuada ejecución del proyecto relacionada con la interventoria	Se ha realizado el apoyo a la oficina de contratación y juridica para el seguimiento y control en las plataformas que tiene la empresa para dicho fin.
6	Velar por la aplicación de las Normas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional dispuestas en el proceso MMA-SO establecido en SIG.	Se ha revisado la aplicación y cumplimiento de las normas de seguridad Industrial y Salud Ocupacional de acuerdo con el proceso.
7	Apoyar, recomendar, sugerir medidas y emitir conceptos que considere convenientes y necesarios con la ejecución del objeto contractual.	se ha realizado apoyo en los comités realizados y se han emitido conceptos técnicos de acuerdo con el objeto de la ejecución del contrato

ENERCA S.A E.S.P.

ONTRATO No.:	157 de 2025		DD	MM	AA
OBJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	FECHA	8	8	2025


8	Apoyar en la revisión las actas contractuales de conformidad con los soportes presentados por el contratista e interventor durante la ejecución del proyecto.	En este periodo no se han generado actas de cobro por parte de la interventoria
9	Acopiar la documentación técnica y llevar un estricto control sobre la correspondencia que se produzca; organizar la información y documentos que se generen durante la ejecución del contrato (proyecto)	Se hace acopio de la información técnica y correspondencia generada, y se ha apoyado en la proyección de respuestas de oficios enviados a la supervisión
10	Analizar la consistencia de la información y revisar todas las actas suscritas que se requieran durante el desarrollo del proyecto.	En este periodo no se han generado actas de cobro por parte de interventoria
11	Revisar las actas de liquidación (proyectadas por la interventoria) de cada uno de los contratos derivados del proyecto.	Para este periodo no se tienen aun actas de liquidación proyectadas por parte de la interventoria
12	Desarrollar las actividades establecidas en el Acto de gerencia No. 219 de 12 de septiembre de 2013 por medio del cual se adopta el manual de supervisión e interventoria, actividades señaladas en los capitulos I numeral 5 y 6 y capitulo II al VIII.	Se han desarrollado las actividades de acuerdo con el manual de supervisión e interventoria
13	Apoyar a la supervisión realizando visitas esporádicas al sitio donde se desarrolla el proyecto para verificar la permanencia de la interventoria para el adecuado seguimiento al desarrollo de las obras.	Se ha realizado visita al sitio de las obras en apoyo a la supervisión el día 24 de julio de 2025
14	Asegurar que el interventor adecue la vigencia y/o el valor de las garantías según lo pactado en el contrato.	En este periodo se hizo reinicio de obra y se verificó que la interventoria adecuara la vigencia y valor de las garantias

REGISTRO FOTOGRAFICO

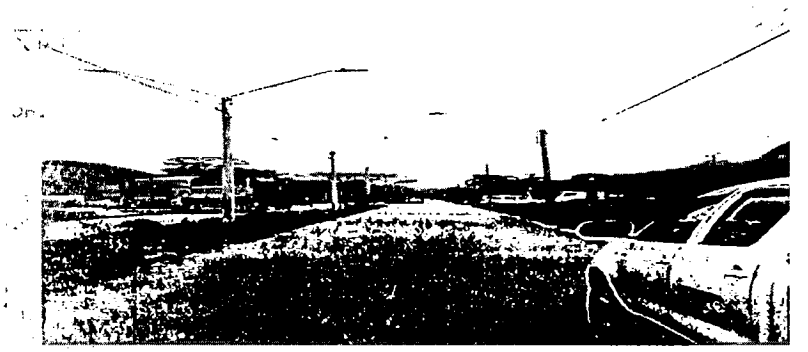





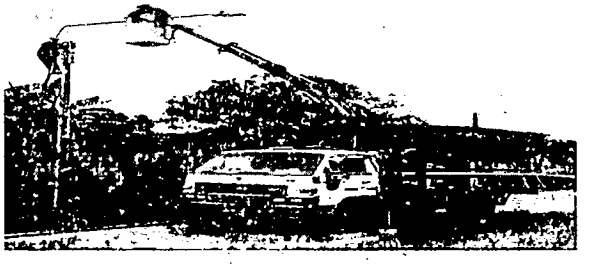

OBRA EJECUTADA A LA FECHA - PROYECTO

		CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE MES			CANTIDADES ACUMULADAS EJECUTADAS		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	RED DE BAJA TENSION												
101	REPLANTEO EN BAJA TENSION	KM	0,84	$ 616 569,00	$ 517 917,96	1,02	$ 628 900,38	0,180	$ 616 569,00	$ 110 982,42	1,020	$ 616 569,00	$ 628 900,38
102	APERTURA DE HUECO PARA POSTE O TEMPLETE DE B.T.	UND	34,00	$ 89 303,00	$ 3 036 302,00	79	$ 7 054 937,00	45,00	$ 89 303,00	$ 4 018 635,00	79	$ 89 303,00	$ 7 054 937,00
103	SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE FERROCONCRETO DE 8MTS X 510 KGF	UND	28,00	$ 1 142 131,47	$ 31 979 681,16	60	$ 68 527 888,20	32,00	$ 1 142 131,47	$ 36 548 207,04	60	$ 1 142 131,47	$ 68 527 888,20
104	SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE FERROCONCRETO DE 8MTS X 1050 KGF	UND	6,00	$ 1 674 070,00	$ 10 044 420,00	19	$ 31 807 330,00	13,00	$ 1 674 070,00	$ 21 762 910,00	19	$ 1 674 070,00	$ 31 807 330,00

CONTRATO No.:	157 de 2025	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.		8	8	2025

105	CIMENTACION POSTE EXTRAREFORZADO DE B.T.	UND	4,00	$ 112.539,00	$ 450.156,00	19	$ 2.138.241,00		15,00	$ 112.539,00	$ 1.688.085,00	19	$ 112.539,00	$ 2.138.241,0
SUBTOTAL					$ 46.028.477,12		$ 110.157.296,58		SUBTOTAL		$ 64.128.819,46	SUBTOTAL		$ 110.157.296,5
2	**CIMENTACION POSTE EXTRAREFORZADO DE B.T.**													
201	ESTRUCTURA DE SUSPENSION LA-320 SIN CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS, SUMINISTRO Y VESTIDA	UND	11,00	$ 106.160,58	$ 1.167.766,38	27	$ 2.866.335,66		14,00	$ 106.160,58	$ 1.486.248,12	25	$ 106.160,58	$ 2.654.014,50
202	ESTRUCTURA DE RETENCION SENCILLA LA-321, SIN CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS SUMINISTRO Y VESTIDA	UND	18,00	$ 124.699,10	$ 2.244.583,80	14	$ 1.745.787,40		11,00	$ 124.699,10	$ 1.371.690,10	14	$ 124.699,10	$ 1.745.787,40
203	ESTRUCTURA DE PASAO CON DERIVACION LA-322 SIN CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS SUMINISTRO Y VESTIDA	UND	2,00	$ 235.586,11	$ 471.172,22	1	$ 235.586,11		1,00	$ 235.586,11	$ 235.586,11	1	$ 235.586,11	$ 235.586,11
204	SUMINISTRO DE RETENCION DOBLE LA-327, SIN CAHA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS, SUMINISTRO Y VESTIDA	UND	2,00	$ 298.007,70	$ 596.015,40	5	$ 1.490.038,50		3,00	$ 298.007,70	$ 894.023,10	5	$ 298.007,70	$ 1.490.038,50
205	RED TRENZADA DE BAJA TENSIÓN 3Ø, 4 H EN CABLE ALUMINIO XLPE (2 X 35 MM2 + 1 X 25 MM2)	M	840,00	$ 23.455,19	$ 19.702.359,60	1020	$ 23.924.293,80		394,00	$ 23.455,19	$ 9.241.344,86	1020	$ 23.455,19	$ 23.924.293,80
206	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT PUESTA A TIERRA EN ACERO INOXIDABLE PARA RED DE BAJA	UND	274,00	$ 559.694,60	$ 153.356.320,40	281	$ 157.274.182,60		120,00	$ 559.694,60	$ 67.163.352,00	120	$ 559.694,60	$ 67.163.352,00
207	ESTRUCTURA LA334 (L3010) DE TRANSICIÓN DE CIRCUITO SECUNDARIO AÉREO DE RED TRENZADA A RED ABIERTA SUMINISTRO Y	UND	18,00	$ 140.639,48	$ 2.531.510,64	9	$ 1.265.755,32		9,00	$ 140.639,48	$ 1.265.755,32	9	$ 140.639,48	$ 1.265.755,32
208	PERCHA GALVANIZADA DE CINCO (5) PUESTOS SUMINISTRO, TRANSPORTE Y	UND	14,00	$ 142.057,77	$ 1.988.808,78	33	$ 4.687.906,41		22,00	$ 142.057,77	$ 3.125.270,94	22	$ 142.057,77	$ 3.125.270,94
SUBTOTAL					$ 182.058.537,22		$ 193.489.885,80		SUBTOTAL		$ 84.783.270,55	SUBTOTAL		$ 101.604.098,57
3	**ALUMBRADO PUBLICO**													
301	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 32 LEDS 300-1000MA NW, POTENCIA 55W, FLUJO LUMINOSO 8412bLM, 4000K, IP66, TENSIÓN NOMINAL 120277V, 50-60HZ, VIDA UTIL 100,000 HORAS, INCLUYE FUSIBLES, DPS Y BASE PARA FOTOCELDA 7 PINES.	UND	23,00	$ 2.007.810,05	$ 46.179.631,15	734	$ 1.473.732.576,70		476,00	$ 2.007.810,05	$ 955.717.583,80	499	$ 2.007.810,05	$ 1.001.897.214,93
302	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 16 LEDS 300-1000MA NW, POTENCIA 55W, FLUJO LUMINOSO 7532 LM, 4000K, IP66, TENSIÓN NOMINAL 120277V, 50-60HZ, VIDA UTIL 100,000 HORAS, INCLUYE FUSIBLES, DPS Y BASE PARA FOTOCELDA 7 PINES	UND	638,00	$ 1.746.413,46	$ 1.114.211.787,48	0	$ -		0,00	$ 1.746.413,46	$ -	0	$ 1.746.413,46	$ -
303	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 16 LEDS 300-1000MA NW, POTENCIA 45W, FLUJO LUMINOSO 6347 LM, 4000K, IP66 TENSIÓN NOMINAL 120-277V, 50-60HZ, VIDA UTIL 100,000 HORAS, INCLUYE FUSIBLES, DPS Y BASE PARA FOTOCELDA 7 PINES.	UND	143,00	$ 1.746.413,46	$ 249.737.124,78	59	$ 103.038.394,14		0,00	$ 1.746.413,46	$ -	0	$ 1.746.413,46	$ -
304	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 16 LEDS 300-1000MA NW,POTENCIA 45W, FLUJO LUMINOSO 6347LM, 4000K, IP66, TENSIÓN NOMINAL 120-277V, 50-60HZ, VIDA UTIL 100,000 HORAS, INCLUYE FUSIBLES, DPS Y BASE PARA FOTOCELDA 7 PINES	UND	91,00	$ 1.623.797,05	$ 147.765.531,55	0	$ -		0,00	$ 1.623.797,05	$ -	0	$ 1.623.797,05	$ -
305	BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 1 1/2" X 3,00 M, ESPESOR 3MM, PARA LUMINARIA HORIZONTAL EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14 AWG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	554,00	$ 476.173,35	$ 263.800.035,90	188	$ 89.520.589,80		185,00	$ 476.173,35	$ 88.092.069,75	185	$ 476.173,35	$ 88.092.069,75
306	BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 1 1/2" X 2,00 M ESPESOR 3MM, PARA LUMINARIA HORIZONTAL EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14 AWG. SUMINISTRO E INSTALACION	UND	277,00	$ 409.145,61	$ 113.333.333,97	369	$ 150.974.730,09		111,00	$ 409.145,61	$ 45.415.162,71	111	$ 409.145,61	$ 45.415.162,71

ENERCA S.A E.S.P.


CONTRATO No.:	157 de 2025												FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.													8	8	2025
307	BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 1 1/2" X 1,00 M, ESPESOR 3MM, PARA LUMINARIA HORIZONTAL EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14 AWG, SUMINISTRO E INSTALA	UND	64,00	$ 337.287,66	$ 21.586.410,24	39	$ 13.154.218,74		4,00	$ 337.287,66	$ 1.349.150,64		4	$ 337.287,66	$ 1.349.150,64
308	BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 1 1/2" X 1,00 M, ESPESOR 3MM, PARA LUMINARIA HORIZONTAL EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14 AWG, SUMINISTRO E INSTALACION	UND	1509,00	$ 62.645,60	$ 94.532.210,40	378	$ 23.680.036,80		166,00	$ 62.645,60	$ 10.399.169,60		166	$ 62.645,60	$ 10.399.169,60
309	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR BIMETÁLICO DE 1 PERNO PARA LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO .	UND	1176,00	$ 42.830,60	$ 50.368.785,60	508	$ 21.757.944,80		120,00	$ 42.830,60	$ 5.139.672,00		120	$ 42.830,60	$ 5.139.672,00
10	DESMONTE LUMINARIA TECNOLOGIADE SODIO Y/O LED DE CUALQUIER POTENCIA, INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL.	UND	645,00	$ 205.820,90	$ 132.754.480,50	693	$ 142.633.883,70		0,00	$ 205.820,90	$ -		0	$ 205.820,90	$
SUBTOTAL					$ 2.234.269.331,57		$ 2.018.492.374,77				$ 1.106.112.808,50				$ 1.152.292.439,65
	NO PREVISTOS															
NP1	BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 2" X 3,5 M ESPESOR 3MM, PARA LUMINARIA HORIZONTAL EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14 AWG, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	0,00	$ 606.707,48	$ -	57	$ 34.582.326,36		56,00	$ 606.707,48	$ 33.975.618,88		56	$ 606.707,48	$ 33.975.618,88
NP2	BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 2" X 4 M, ESPESOR 3MM, PARA LUMINARIA HORIZONTAL EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14 AWG, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	0,00	$ 672.095,47	$ -	101	$ 67.881.642,47		101,00	$ 672.095,47	$ 67.881.642,47		101	$ 672.095,47	$ 67.881.642,47
NP3	BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 2" X 4,5 M, ESPESOR 3MM, PARA LUMINARIA HORIZONTAL EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14 AWG, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND		$ 750.336,51	$ -	25	$ 18.758.412,75		25,00	$ 750.336,51	$ 18.758.412,75		25	$ 750.336,51	$ 18.758.412,75
NP4	BRAZO GALVANIZADO EN CALIENTE DE 2" X 5 M, ESPESOR 3MM, PARA LUMINARIA HORIZONTAL EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE CABLE	UND	0,00	$ 821.834,62	$ -	14	$ 11.505.684,68		13,00	$ 821.834,62	$ 10.683.850,06		13	$ 821.834,62	$ 10.683.850,06
NP5	REUBICACION DE LUMINARIA LED DE ALUMBRADO PUBLICO	UND	0,00	$ 246.674,00	$ -	3	$ 740.022,00		0,00	$ 246.674,00	$ -		0	$ 246.674,00	$ -
NP6	RETIRO DE POSTE DE FERROCONCRETO	UND	0,00	$ 449.233,07	$ -	4	$ 1.796.932,28		0,00	$ 449.233,07	$ -		0	$ 449.233,07	$ -
NP7	DEMONTE DE LUMINARIA EXISTENTE Y ENTREGA A ALCALDIA	UND	0,00	$ 120.927,00	$ -	39	$ 4.716.153,00		0,00	$ 120.927,00	$ -		0	$ 120.927,00	$ -
							$ 139.981.173,54				$ 131.299.524,16				$ 131.299.524,16
SUBTOTAL					$ 2.234.269.331,57				SUBTOTAL		$ 1.386.324.422,67		SUBTOTAL		$ 1.495.353.358,96
	VALOR COSTO DIRECTO				$ 2.462.356.345,91		$ 2.462.120.730,69		VALOR COSTO DIRECTO		$ 1.386.324.422,67		VALOR COSTO DIRECTO		$ 1.495.353.358,96
	ADMINISTRACION	25,00%			$ 615.589.086,48		$ 615.530.182,67		ADMINISTRACION	25,00%	$ 346.581.105,67		ADMINISTRACIO	25,00%	$ 373.838.339,74
	IMPREVISTOS	1,00%			$ 24.623.563,46		$ 24.621.207,31		IMPREVISTOS	1,00%	$ 13.863.244,23		IMPREVISTOS	1,00%	$ 14.953.533,59
	UTILIDAD	6,00%			$ 147.741.380,75		$ 147.727.243,84		UTILIDAD	6,00%	$ 83.179.465,36		UTILIDAD	6,00%	$ 89.721.201,54
	CERTIFICACION RETIE				$ 24.623.563,00		$ 24.623.563,00		CERTIFICACION RETIE				CERTIFICACION RETIE		
	CERTIFICACION RETILAP				$ 44.685.387,00		$ 44.685.387,00		CERTIFICACION RETILAP				CERTIFICACION RETILAP		
	COSTO DE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)				$ 18.490.055,00		$ 18.490.055,00		COSTO DE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)		$ 4.776.597,54		COSTO DE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)		$ 4.776.597,54
	COSTO IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				$ 7.882.435,50		$ 7.882.435,50		COSTO IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL		$ 2.036.295,84		COSTO IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL		$ 2.036.295,84
	AJUSTE AL PESO				$ (0,10)		$ (0,01)		AJUSTE AL PESO				AJUSTE AL PESO		
	VALOR TOTAL				$ 3.345.991.817,00		$ 3.345.680.805,00		VALOR TOTAL EJECUTADO		$ 1.836.761.131,30		VALOR TOTAL ACUMULADO		$ 1.980.679.327,21

Vigilado Superservicios

CONTRATO No.:	157 de 2025	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.		8	8	2025

DIAGRAMA DE PROGRAMACIÓN VRS EJECUCIÓN DE OBRA

CURVA S - CONTRATO 186 a 29 DE JULIO DE 2025



	S9	S10	S11	S12
% Avance Proyectado Acumulado	0,196652	0,485024	0,256044	0,468873
% Avance Ejecutado Acumulado	0,042723	0,052143	0,361679	0,591956

REPORTE DE INDICADORES DE EJECUCION

Proyecto BPIN: 2024005850142

1. EFICIENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN

El indicador determina la eficiencia de los proyectos en ejecución a partir de la medición del cumplimiento del alcance, de acuerdo con la programación registrada, evaluando al corte de la medición avance físico ejecutado frente al avance físico programado

Para los proyectos con cobertura de información igual a cero (0) la eficiencia del proyecto es cero (0).

Cumplimiento de la Programación = Avance físico reportado / Avance físico programado.

Donde,

El avance físico programado corresponde a la sumatoria de las cantidades de las actividades programadas multiplicado por el valor unitario programado de cada actividad, al corte del periodo objeto de medición. El avance físico reportado corresponde a la sumatoria de las cantidades de las actividades ejecutadas multiplicado por el valor unitario programado de cada actividad, al corte del periodo objeto de medición.

	MENSUAL	ACUMULADO
OBRA PROGRAMADA (%)	16,0593%	46,8873%
VALOR DE LA OBRA PROGRAMADA	$ 493.874.066,16	$ 1.568.698.343,52

	MENSUAL	ACUMULADO
OBRA EJECUTADA (%)	56,70733%	59,19560%
VALOR DE LA OBRA EJECUTADA	$ 1.836.761.131,30	$ 1.980.679.327,21

Cumplimiento de la Programación = **1,262626008**

2. EFICIENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL COSTO

El indicador determina la eficiencia de los proyectos en ejecución a partir de la medición del cumplimiento en el costo, de acuerdo con la programación registrada, evaluando a la fecha de la medición, el costo ejecutado frente al costo programado.

Si para el periodo de medición, la interventoría no reporta información el indicador tendrá una puntuación igual a cero.

Cumplimiento del Costo = avance físico reportado (valor ganado) / costo actual (ejecutado) del proyecto

ENERCA S.A E.S.P.

ONTRATO No.:	157 de 2025		DD	MM	AA
BJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	FECHA	8	8	2025

Donde,

El avance físico reportado corresponde a la sumatoria de las cantidades de las actividades ejecutadas multiplicado por el valor unitario programado de cada actividad, al corte del periodo objeto de medición. El costo actual del proyecto corresponde a la sumatoria de las cantidades de las actividades ejecutadas multiplicado por el valor unitario ejecutado de cada actividad reportado por la entidad a la fecha de medición.

	MENSUAL	ACUMULADO
VALOR DE LA OBRA EJECUTADA	$ 1.836.761.131,30	$ 1.980.679.327,21

	MENSUAL	ACUMULADO
VALOR DE LA OBRA (COSTO ACTUAL)	$ 493.874.066,16	$ 1.568.698.343,52

Cumplimiento del Costo = **1,262626008**

3. ATRASO EN LA EJECUCIÓN

El indicador determina la eficiencia de los proyectos en ejecución a partir del cumplimiento del plazo reportada por la entidad, verificando si existen desviaciones en tiempo (retrasos) respecto a los programado a la fecha de corte de medición.

Para el calculo se considera:

La fecha programada en la cual se tenia previsto alcanzar el avance fisico registrado a la fecha del corte de la medición
Plazo transcurrido al corte:

Variación del tiempo = [t1 - fecha programada del avance físico actual] / Plazo transcurrido

Donde,

t1 corresponde a la fecha del corte de la medición.
Fecha programada del avance físico actual, corresponde a la fecha en la cual se tenia previsto alcanzar el avance físico reportado al corte.
Plazo transcurrido corresponde al periodo de tiempo entre el inicio del proyecto y la fecha del corte de la medición.

t1	=	29/07/2025
Fecha programada del avance actual	=	########
Plazo transcurrido	=	90
Variación del Tiempo (atraso en Ejecución)	=	0,00

Nota: Se deben trabajar en dias de acuerdo con la programación reportada en el Gesproy.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

Se presenta un gran avance del proyecto una vez reiniciado y ajustada el acta de modificación y de items no previstos.

En constancia se firma por quienes intervinieron.

HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL
APOYO A LA SUPERVISIÓN

LUIS RENE GRANADOS VARGAS
SUPERVISOR

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: 3				ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	Junio 8 y de Julio 1 a Julio 29 de 2025			PRESTACION DE SERVICIOS No. 157 DE 2025
CDP N° 7625-77	RP N° 7125-71			
CONTRATISTA	HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL			
SUPERVISOR	LUIS RENE GRANADOS VARGAS			
DEPENDENCIA	GERENCIA DE DISTRIBUCION			
Número de contrato	157 de 2025			
Nombre del contratista	HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL			
NIT o Cédula de ciudadanía	7225828			
Dirección	Cra 23 No 14-60 Yopal	Correo Electrónico Personal	hufernandez44@gmail.com	Teléfono: 3124827751
Clase y número de cuenta	Cuenta de: Ahorros	N°: 3552005929	Banco: Scotia Bank Colpatria	
Fecha de Suscripción	13 de marzo de 2025			
Fecha de Legalización	7 de abril de 2025			
Fecha de iniciación	8 de abril de 2025			
Fecha prevista de terminación inicial	7 de septiembre de 2025			
Fecha de terminación actual	29 de septiembre de 2025			
Plazo	Cinco (5) meses			
Objeto del contrato	**REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.**			
Valor	$ 23.200.000			
Adiciones	N.A.		En tiempo N.A.	
Suspensiones	N.A.			
Avance del contrato	Financiero %		60,00%	
	Tiempo de ejecución		Tres (03) meses	
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial del contrato		**$ 23.200.000**	
	Adiciones		$ 0	
	Valor total del contrato		**$ 23.200.000**	
	Anticipo		N/A	
	1er pago		$ 4.640.000	
	2do pago		$ 4.640.000	
	3er pago		$ 4.640.001	
	4o pago		$ 0	
	5o pago		$ 0	
	Inversión básica realizada		**$ 13.920.001**	
	Inversión por ejecutar		**$ 9.279.999**	
VALOR DEL PAGO SOLICITADO	Valor antes de IVA		N/A	
	IVA		N/A	
	Legaliza anticipo		N/A	
	Valor a pagar		**$ 4.640.000**	
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	GARANTIAS			
	CUMPLIMIENTO		POLIZA N°: BY-100050958	
	VIGENCIA DEL : 01/07/2025		HASTA: 5/02/2026	
	CALIDAD DEL SERVICIO		POLIZA N°: BY-100050958	
	VIGENCIA : Un (1) año contado a partir del acta de terminación			
	NOMBRE ASEGURADORA		Compañía Mundial de Seguros S.A.	
PAGO APORTE DE SEGURIDAD SOCIAL	NUMERO DE PLANILLAS:		9487964331 9489293913	
	VALOR PAGO DE SALUD		$ 232.000	
	VALOR PAGO DE PENSIÓN		$ 297.000	
	VALOR PAGO DE ARL		$ 9.700	

AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD

Actividad N°1: Conocer en todas sus partes el contenido del contrato de la interventoría técnica, ambiental, administrativa, financiera, contable y jurídica; Los pliegos de condiciones y demás documentos del proyecto correspondientes a la interventoría.

Se ha revisado el contenido del contrato de Interventoría con todos su pliego de condiciones y anexos.

Actividad N°2: Apoyar al área de Planeación de la Empresa con la información que se debe reportar al sistema de monitoreo GESPROY, y verificar sea enviada oportunamente.

Se ha reportado al sistema de monitoreo GESPROY la información requerida inicialmente así como el avance a corte del día 31 de julio de 2025

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N°: 3		ORDEN DE
PERIODO DE PAGO	Junio 8 y de Julio 1 a Julio 29 de 2025	PRESTACION DE SERVICIOS No. 157 DE 2025
CDP N° 7625-77	RP N° 7125-71	
CONTRATISTA	HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL	
SUPERVISOR	LUIS RENE GRANADOS VARGAS	
DEPENDENCIA	GERENCIA DE DISTRIBUCION	

Actividad N°3: Cumplir con todas las actividades establecidas en el procedimiento de supervisiones e Interventorías PR-MAJ-SI-01 del Sistema Integrado de Gestión (SIG) para apoyar al supervisor de la interventoria.
Se cumple con las actividades establecidas en el procedimiento de supervisiones e interventoría.
Actividad N°4: Entregar los informes mensuales en los tiempos establecidos y la información que sea requerida por el supervisor de la OPS y por el supervisor del contrato de interventoría objeto del proyecto, velando por el cumplimiento de las actividades contractuales conforme a la normatividad vigente.
Se ha hecho entrega de el informe mensual dentro de los tiempos establecidos y se ha apoyado con la información requerida por el supervisor para que se lleve a cabo el cumplimiento de las actividades contractuales.
Actividad N°5: Apoyar a la oficina de contratación y jurídica, para registrar todas las actividades de seguimiento y control en el sistema de información que disponga la empresa para tal fin, así mismo desarrollar las gestiones y servicios a que haya lugar con otras áreas internas y/o externas de la Empresa, para garantizar la adecuada ejecución del proyecto relacionada con la interventoria
Se ha realizado el apoyo a la oficina de contratación y jurídica para el seguimiento y control en las plataformas que tiene la empresa para dicho fin.
Actividad N°6: Velar por la aplicación de las Normas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional dispuestas en el proceso MMA-SO establecido en SIG.
Se ha revisado la aplicación y cumplimiento de las normas de seguridad Industrial y Salud Ocupacional de acuerdo con el proceso.
Actividad N°7: Apoyar, recomendar, sugerir medidas y emitir conceptos que considere convenientes y necesarios con la ejecución del objeto contractual.
Se ha realizado apoyo en los comités realizados y se han emitido conceptos técnicos de acuerdo con el objeto de la ejecución del contrato.
Actividad N°8: Apoyar en la revisión las actas contractuales de conformidad con los soportes presentados por el contratista e Interventor durante la ejecución del proyecto.
En este periodo no se han tramitado actas de cobro parciales de interventoría.
Actividad N°9: Acopiar la documentación técnica y llevar un estricto control sobre la correspondencia que se produzca; organizar la información y documentos que se generen durante la ejecución del contrato (proyecto)
Se hace acopio de la información técnica y correspondencia generada, y se ha apoyado en la proyección de respuestas de oficios enviados a la supervisión.
Actividad N°10: Analizar la consistencia de la Información y revisar todas las actas suscritas que se requieran durante el desarrollo del proyecto.
En este periodo no se han generado actas de cobro por parte de interventoria.
Actividad N°11: Revisar las actas de liquidación (proyectadas por la interventoría) de cada uno de los contratos derivados del proyecto.
Para este periodo no se tienen aún actas de liquidación proyectadas por parte de la interventoría.
Actividad N°12: Desarrollar las actividades establecidas en el Acto de gerencia No. 219 de 12 de septiembre de 2013 por medio del cual se adopta el manual de supervisión e interventoria, actividades señaladas en los capítulos I Numeral 5 y 6 y capitulo II al VIII.
Se han desarrollado las actividades de acuerdo con el manual de supervisión e interventoría
Actividad N°13: Apoyar a la supervisión realizando visitas esporádicas al sitio donde se desarrolla el proyecto para verificar la permanencia de la interventoria para el adecuado seguimiento al desarrollo de las obras.
Se ha realizado visita al sitio de las obras en apoyo a la supervisión el día 24 de julio de 2025
Actividad N°14: Asegurar que el interventor adecue la vigencia y/o el valor de las garantías según lo pactado en el contrato.
En este periodo se hizo reinicio de obra y se verificó que la interventoria adecuara la vigencia y valor de las garantías.
Anexos: 1. Planillas de pago y Recibo de consignación correspondiente a salud, pensión y ARL del mes de Junio y Julio de 2025, en dos (2) folios.
Anexos: 2.

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA	NOMBRE: HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL FIRMA:
SOLICITUD DE PAGO	Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud, pensión y ARL, conforme a las normas vigentes, documentos que revisé y por lo tanto autorizo el pago.
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR	NOMBRE: LUIS RENE GRANADOS VARGAS FIRMA:

Cód. 790.39

TERCER INFORME DE SUPERVISIÓN

Yopal, Agosto de 2025

Elaborado por:

Hugo Alberto Fernández Sandoval
Apoyo a la supervisión OPS 157

Proyecto BPIN 2024005850142

"AMPLIACION, MODERNIZACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO A TECNOLOGIA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"



INTRODUCCIÓN

El Departamento de Casanare designó a la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., como ente ejecutor de asignaciones directas del Sistema General de Regalías acepta la ejecución del proyecto de inversión identificado con el BPIN 2024005850142 de objeto "AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE",

El municipio de Hato Corozal, ubicado en el departamento de Casanare, se presenta un deficiente servicio de alumbrado público urbano, lo que tiene un impacto directo en la vida cotidiana de sus habitantes. Este problema se manifiesta en una iluminación inadecuada o insuficiente en diversas zonas, como calles, avenidas, parques y áreas públicas, que deberían estar bien iluminadas para garantizar la seguridad y movilidad de los ciudadanos.

El mal estado de las luminarias, la falta de mantenimiento y la insuficiencia de cobertura del sistema de alumbrado han ocasionado que varias áreas del municipio permanezcan en penumbra durante la noche, aumentando la percepción de inseguridad entre los habitantes. Esta situación crea un ambiente propicio para el incremento de actividades delictivas, como robos, hurtos, y otros actos violentos, ya que la oscuridad facilita las acciones de los delincuentes y dificulta la respuesta inmediata de las autoridades.

Además, la falta de iluminación adecuada restringe la libre circulación de los ciudadanos, quienes se ven obligados a limitar sus desplazamientos nocturnos por temor a ser víctimas de delitos o accidentes. Este factor afecta especialmente a aquellos que necesitan moverse por la noche para trabajar, estudiar o realizar actividades recreativas y sociales. Las calles mal iluminadas generan una sensación de vulnerabilidad, lo que provoca que muchas personas eviten salir de sus casas después de ciertas horas, reduciendo las interacciones sociales y afectando el dinamismo del municipio. El alto impacto que se genera con la ejecución de este proyecto, lo convierte en uno de los proyectos banderas para el gobierno Municipal y Departamental. Con este proyecto la comunidad beneficiada tendrá disponibilidad de un alumbrado público eficiente como servicio público no domiciliario para sus habitantes. Al prestar un servicio eficiente el municipio cumple metas de su plan de desarrollo, mejorando significativamente la calidad de vida de los diferentes hogares y mejora la percepción de seguridad del mismo.

El presente informe refleja el control administrativo realizado por la supervisión al proyecto BPIN 2024005850142 de objeto "AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE ", y verificación de las actuaciones realizadas por la interventoría para el seguimiento, control y acompañamiento a la ejecución del proyecto.

Las actividades de la supervisión realizada a la interventoría, validan el cumplimiento y calidad de las actividades contratadas y llevadas a cabo por el contratista de interventoría para la ejecución del contrato de obra No. 186 de 2025.

CORTE DEL INFORME: 8 de junio y de 01 de Julio al 29 de julio de 2025

1. GENERALIDADES

1.1 INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO DE OBRA No. 186 DE 2025	
Objeto:	AMPLIACION, MODERNIZACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO A TECNOLOGIA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
Contrato de Obra No.	186-2025
Entidad Contratante:	ENERCA S.A E.S.P.
Contratista :	CONSORCIO ILUMINACION COROZAL
Representante Legal:	GLORIA SOFIA MARTINEZ
Interventoria:	ELECTRICOM INGENIERIA S.A.S.
Representante Legal:	WILSON GILDARDO NOSSA GRANADOS
Supervision:	LUIS RENE GRANADOS VARGAS Lider de Supervision e Interventoría
Director de obra:	JORGE EDUARDO NOCUA
Residente de obra:	VICTOR MANUEL BERNAL LOPEZ
Valor del Contrato:	$ 3.345.991.817,00
Valor del Anticipo:	$ 1.338.396.727,00
Valor Actualizado del Contrato:	$ 3.345.991.817,00
Plazo inicial:	CUATRO (4) MESES
Plazo Actualizado:	CUATRO (4) MESES
Fecha de Iniciación:	08 DE ABRIL DE 2025
Fecha de terminación inicial:	07 DE AGOSTO DE 2025
Fecha de terminación final:	29 DE AGOSTO DE 2025
Valor ejecutado:	$ 1.980.679.327,21

Porcentaje ejecutado:	59.1956%		
Prorroga No. 1:	N/A	FECHA:	
Suspensiones:	Acta No 2	FECHA:	09/06/2025
Reinicio:	Acta No 3 de 1/07/2025		
Adiciones:	N/A		
Modificación mayores y menores cantidades :	N/A		
Otro sí	No 1	FECHA: 31/03/2025	
Pagos Parciales	NA		
Pago parcial No.1:	N/A	Fecha:	
Valor ejecutado Parcial No.1:			
% de ejecucion parcial No.1:			
Valor amortización Anticipo Pago Parcial No. 1			
Valor total pagos Parciales:	$ 0,0		
% de ejecucion total pagos parciales:	0,0%		
Valor total amortización Anticipo	0,0%		
Valor por pagar :	$ 2.007.595.090,00		
% por pagar:	60%		
Saldo por amortizar anticipo	$ 1.338.396.727,00		
% por Amortizar:	100%		

DATOS DE LA EMPRESA	
DIRECCION:	Carrera 29 A N 23-04 Yopal- Casanare
TELEFONOS:	3204181759
CORREO ELECTRONICO:	vimabelo100@hotmail.com

1.2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 188 DE 2025	
INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA AMPLIACION, MODERNIZACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO A TECNOLOGIA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	
3.1.1 INFORMATION GENERAL DEL CONTRATO	
Entidad Contratante:	ENERCA S.A E.S.P.
Supervisión:	LUIS RENE GRANADOS
	HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL
Contratista :	ELECTRICOM INGENIERIA S.A.S.
Representante Legal:	WILSON GILDARDO NOSSA GRANADOS
Director de Interventoria	WILSON GILDARDO NOSSA GRANADOS
Residente Interventoria	RICARDO LEON PULIDO AGUIRRE
Valor del Contrato:	$348.394.515
Valor del Anticipo:	N/A
Plazo inicial:	CUATRO (4) MESES
Plazo Actualizado	CUATRO (4) MESES
Fecha de Iniciación:	08 DE ABRIL DE 2025
Fecha de terminación inicial:	07 DE AGOSTO DE 2025
Fecha de terminación final:	29 DE AGOSTO DE 2025
Prorrogas:	N/A
Ejecución Financiera	$ 00
Suspensiones:	Acta No 2 suscrita el 9 de junio de 2025 por Treinta (30) días
Reinicio:	Acta No 3 suscrita el 1 de julio de 2025

Adiciones:	N/A
Modificaciones:	N/A
Otro si:	N/A
Pagos parciales:	$ 0,0
Valor por pagar	$ 348.394.515,00
% Total por pagar :	100%

DATOS DE LA EMPRESA	
DIRECCION:	Carrera 19 No. 25 – 55 Yopal- Casanare
TELEFONOS:	3144420397-3106258239 (oficina)
CORREO ELECTRONICO:	electricomltda@gmail.com

1.3 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN:

CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°:	157 de 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGÍA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
SUPERVISOR DESIGNADO PARA EL CONTRATO:	ING. LUIS RENE GRANADOS VARGAS
CONTRATISTA:	HUGO ALBERTO FERNANDEZ SANDOVAL
VALOR DEL CONTRATO:	$23.200.000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CINCO (5) MESES.
FECHA DE INICIO:	08 ABRIL DE 2025

FECHA DE TERMINACION INICIAL:	07 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	29 DE SEPTIEMBRE DE 2025
DATOS DE LA EMPRESA	
DIRECCION:	Carrera 23 No 14-60 Yopal, Casanare
TELEFONO:	3124827751
CORREO ELECTRONICO:	hufernandez44@gmail.com

2. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

2.1 ACTUALIZACION DE LAS GARANTÍAS APROBADAS DEL PROYECTO LUEGO DEL REINICIO:

CONTRATO DE OBRA:

GARANTIAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No POLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	OBSERVACIONES
			DESDE	HASTA		
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO	65-45-101091868	08/04/2025	01/01/2026	$334.599.181,70	Acta 2 de suspension 1 del 09/06/2025 Acta 3 de reinicio 1 de 01/07/2025 Anexos 3 y 4
BUEN MANEJO ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO	65-45-101091868	08/04/2025	01/01/2026	$1.338.396.726,80	Acta 2 de suspension 1 del 09/06/2025 Acta 3 de reinicio 1 de 01/07/2025 Anexos 3 y 4
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	SEGUROS DEL ESTADO	65-45-101091868	08/04/2025	01/09/2029	$334.599.181,70	Acta 2 de suspension 1 del 09/06/2025 Acta 3 de reinicio 1 de 01/07/2025 Anexos 3 y 4
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	SEGUROS DEL ESTADO	65-45-101091868	Un (1) año contado a partir de la entrega a satisfacción		$669.198.363,40	
ESTABILIDAD DE LA OBRA	SEGUROS DEL ESTADO	57-45-101002115	Cinco (5) años contados a partir de la		$669.198.363,40	

			entrega a satisfacción			
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRA.	SEGUROS DEL ESTADO	65-40-101081242	08/04/2025	01/01/2026	$334.599.182,00	

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

GARANTIAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No POLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	OBSERVACIONES
			DESDE	HASTA		
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	ASEGURADORA SOLIDARIA	625-47-994000002037	30/11/2025	20/12/2025	$34.839.451,50	Acta de Inicio Anexo 1
ANTICIPO		N/A				
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	ASEGURADORA SOLIDARIA	625-47-994000002037	30/07/2025	19/08/2025	$34.839.451,50	Acta de Inicio Anexo 1
CALIDAD	ASEGURADORA SOLIDARIA	625-47-994000002037	20/07/2025	09/08/2030	$69.678.903,00	Acta de Inicio Anexo 1
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRA.	ASEGURADORA SOLIDARIA	625-74-99400000748	24/11/2025	15/12/2025	$34.839.451,00	Acta de Inicio Anexo 2

CONTRATO APOYO A LA SUPERVISIÓN (OPS) :

GARANTIAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No POLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	OBSERVACIONES
			DESDE	HASTA		
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	SEGUROS MUNDIAL	BY-100050958	01/07/2025	5/02/2026	$2.320.000,00	REINICIO 1ANEXO 3
ANTICIPO	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS MUNDIAL	BY-100050958	UN(1) AÑO CONTADO A PARTIR DEL ACTA DE TERMINACION		$4.640.000,00	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRA.	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

3. INFORMACIÓN FINANCIERO DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR CONTRATO DE OBRA INICIAL	$ 3.345.991.817,00
TOTAL	**$ 3.345.991.817,00**
VALOR CONTRATO INTERVENTORIA CONTRATO INICIAL	$ 348.394.515,00
VALOR TOTAL DE INTERVENTORIA	**$ 348.394.515,00**
VALOR APOYO SUPERVISIÓN	$23.200.000,00
VALOR TOTAL DE APOYO SUPERVISIÓN	**$23.200.000,00**
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$ 3.717.586.332,00**

3.1 INFORME FINANCIERO CONDICIONES ACTUALIZADAS CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCION	VALOR CONTRATADO	Valor Actualizado	VALOR EJECUTADO	VALORES PAGADOS Y/O POR PAGAR
Valor Inicial	$3.345.991.817,00	$3.345.680.805,00	$1.980.679.327.21,00	0
Valor actualizado				0
Valor Anticipo (40 %)				$1.338.396.727,00
Valor Parcial	0		0	0
Saldo por pagar				$2.007.595.090,00
Saldo a favor Empresa		$311.012,00		$311.012,00
Sumas	$3.345.991.817,00	$3.345.991.817,00	$1.980.679.327.21,00	$2.007.595.090,00

3.2 VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

DESCRIPCION	VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO	VALORES PAGADOS Y/O POR PAGAR
Valor contratado Inicialmente	$348.394.515,00	0	0
Valor Anticipo (0 %)	0	0	0
Valor pago parcial No.1	0	0	0
Saldo por pagar			$348.394.515,00
Sumas	$348.394.515,00		$348.394.515,00

3.3 VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$23.200.000,00		
VALOR ANTICIPO			
VALOR FACTURADO		-	$ 4.640.000,00
VALOR POR PAGAR			$18.560.000,00
SUMAS IGUALES	**$23.200.000,00**		**$23.200.000,00**


3.4 PORCENTAJE FÍSICO DEL PROYECTO EJECUTADO


GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA																				
AVANCE	5	10	15	20	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	TOTAL
PROGRAMADO																				46,880%
EJECUTADO																				59,1900%

PORCENTAJE EJECUCIÓN OBRA:

Obra física Programada (%):	46,88730%	Obra física Programada ($):	$ 1.568.698.343,52
Obra física ejecutada (%):	59,1956%	Obra física ejecutada ($):	$1.980.679.327,21

Obra física por ejecutar (%):	40,8044%	Obra física por ejecutar ($)	$ 1.365.001.477,79
Ejecución Financiera (%):	59,1956%		

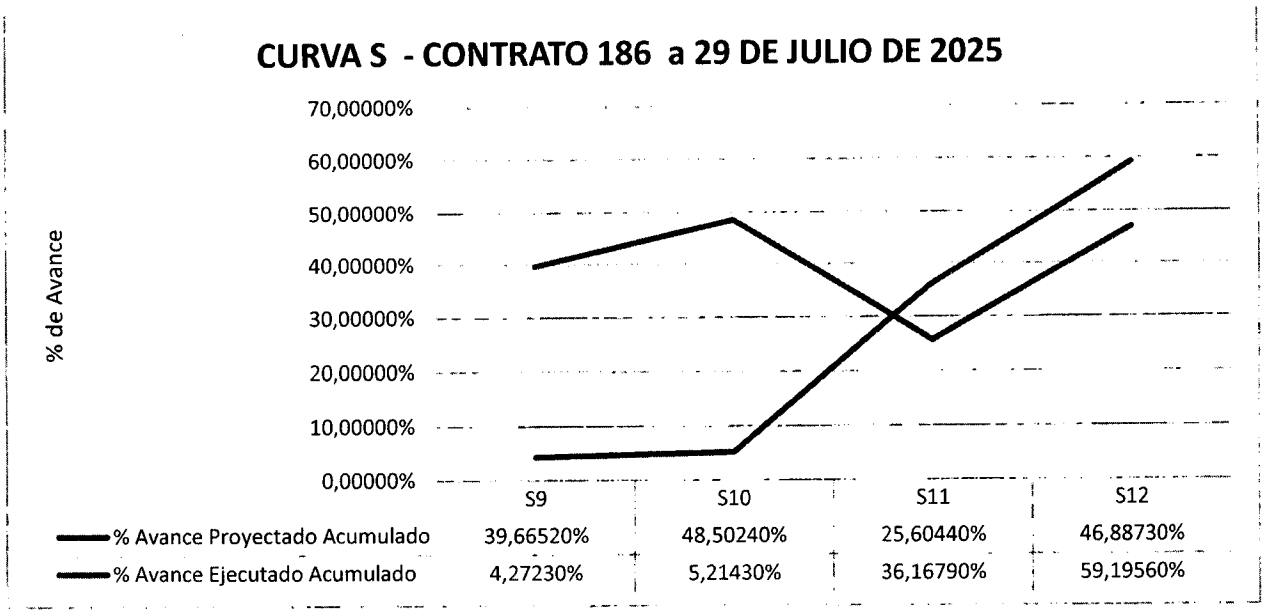

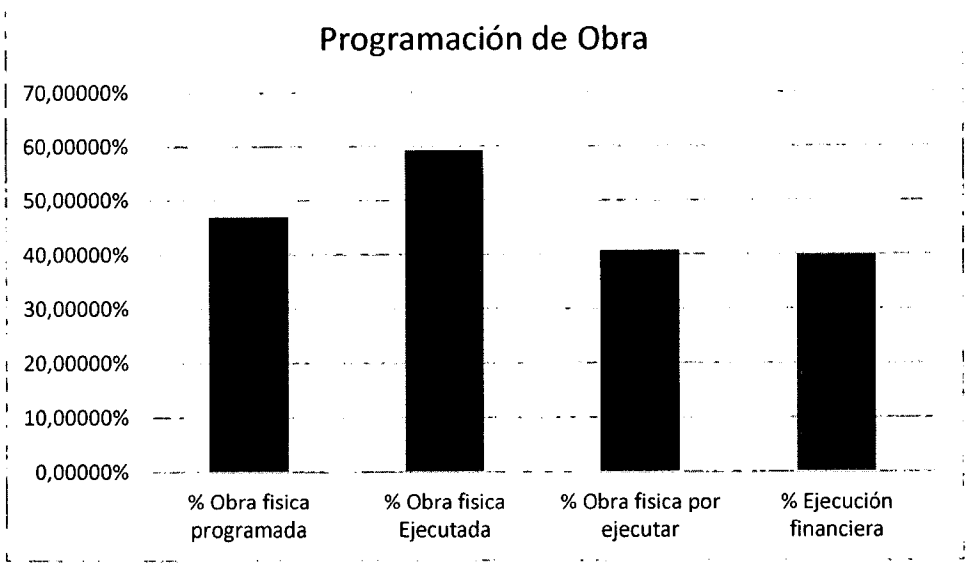



GRÁFICOS PARA EL INFORME GENERAL DE GERENCIA A CORTE DEL INFORME DE SUPERVISIÓN

METAS E INDICADORES DEL PROYECTO SEGÚN MGA.

METAS FISCAS DEL PROYECTO	**Metros de redes de AP**
PROGRAMADO	840
EJECUTADO	840
(%):	**100,0%**

PORCENTAJE PONDERADA POR COMPONENTES Metas del proyecto																					
COMPONENTE	**0 a 5**	**10**	**15**	**20**	**25**	**30**	**35**	**40**	**45**	**50**	**55**	**60**	**65**	**70**	**75**	**80**	**85**	**90**	**95**	**100**	**TOTAL**
PAGO DE IMPUESTOS Y PERMISOS																					**13.71%**
CERTIFICACIÓN RETIE																					**0%**
RED DE BAJA TENSIÓN																					**1.92%**

CERTIFICACIÓN RETILAP																				**0%**
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO																				**0%**
ALUMBRADO PUBLICO																				**38.36%**
RED TRENZADA DE BAJA TENSIÓN																				**5%**
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL																				**0%**

PORCENTAJE EJECUCIÓN FINANCIERA INTERVENTORIA:

EJECUCIÓN (%):	**0%**
POR EJECUTAR (%):	0%

PORCENTAJE EJECUCIÓN FINANCIERA APOYO A LA SUPERVISIÓN:

EJECUCIÓN (%):	**55.33%**
POR EJECUTAR (%):	44.67%

4. ACTOS ADMINISTRATIVOS

4.1 ACTOS ADMINISTRATIVOS GENERADOS OBRA

Relación de Actas generadas Contrato de obra 186 de 2025	
Acta No. 1 de Iniciación:	08 DE ABRIL DE 2025
Acta No 2 de Suspensión	09 DE JUNIO DE 2025
Acta No 3 de Reinicio	01 DE JULIO DE 2025
Acta No 4 de Items no previstos	17 DE JULIO DE 2025
Acta No 5 de Modificación	17 DE JULIO DE 2025



4.2 ACTOS ADMINISTRATIVOS GENERADOS INTERVENTORIA

Relación de Actas generadas Contrato de Consultoria 188 de 2025	
Acta No.5 de comité Técnico:	4 DE JULIO DE 2025
Acta No.6 de comité Técnico:	24 DE JULIO DE 2025

4.3 ACTOS ADMINISTRATIVOS GENERADOS APOYO A LA SUPERVISIÓN

Relación de Actas generadas Contrato de Prestación de Servicios 157 de 2025	
Acta No. 3 de Visita de obra:	24 DE JULIO DE 2025

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE EJECUCIÓN:

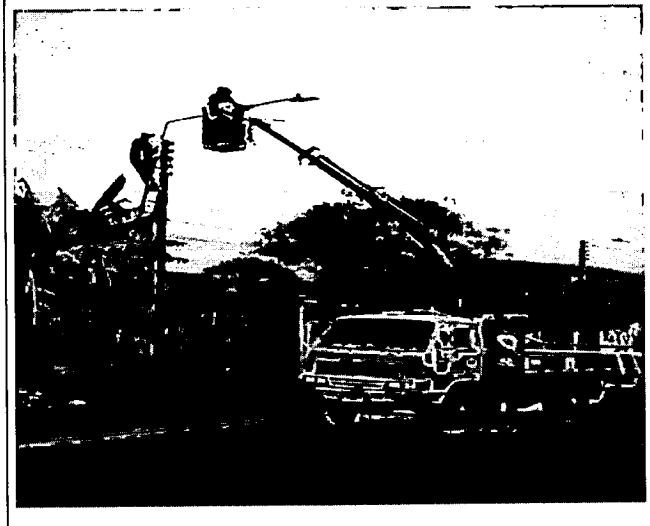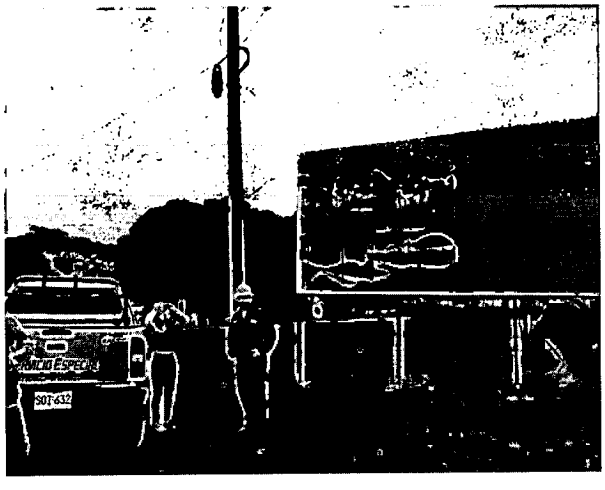	
Instalación de Luminarias	Valla del proyecto

	
Revisión de ejecución de trabajos	Comités Técnicos

CONCLUSIONES (RECOMENDACIONES, SUGERENCIAS, PROPUESTAS)

Durante este periodo se ha realizado visita al sitio de la obra y se verifica un avance significativo en la ejecución de los trabajos. Se verifica el cumplimiento normativo y técnico de las diferentes labores. Se ha solicitado en comité por parte de la supervisión ir adelantando la gestión con el inspector de RETILAP (Resolución 40150 de 3 de mayo de 2024) con el debido tiempo dada la agenda que manejan estos organismos de inspección con el fin de no causar demoras para la entrega final a satisfacción.

Las actividades ejecutadas se realizan cumpliendo con las especificaciones técnicas, Normas, y procedimientos establecidos para este proyecto.

Se recomienda continuar con la ejecución de la obra en la forma en que viene rindiendo y que se cuenten con todos los materiales necesarios que hagan falta para que no se encuentren situaciones por falta de los mismos por parte de los mismos, motivo que llevó a hacer la suspensión 1.

LUIS RENE GRANADOS
Supervisor

Proyectó: Hugo Alberto Fernández Sandoval
Profesional apoyo Supervisión
Contrato 157 de 2025
