INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO MG-IMC-020-2025

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	ESTRUCTURAS PANAMERICANA S.A.S Nit: 901291827-1 R/L: NELSON JAVIER MUÑOZ OCHOA C.C: 7.160.324 de Tunja
Fecha de suscripción del Contrato	29 DE ABRIL DE 2025
Objeto	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE PUNTOS ECOLOGICO EN ACERO INOXIDABLES 304 CALIBRE 20 EN TUBO 1 PARA 3 CANECAS POR PUNTO EN EL MUNICIPIO DE GACHANTIVÁ - BOYACÁ.
PLAZO INICIAL	TREINTA (30) DÍAS
PRORROGA No. 01	DIECISIETE (17) DIAS
PLAZO TOTAL	CUARENTA Y SIETE (47) DIAS
Fecha de Iniciación	29 DE ABRIL DE 2025
Fecha de Finalización	14 DE JUNIO DE 2025

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	$19.992.000
Valor Honorarios mensuales	$ 0
Valor ejecutado	$19.992.000
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	$ 0
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	0%
Estado de la Garantía	N/A
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO DE 2025

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación

se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones establecidas:

OBLIGACIONES.

El contratista suministró los elementos relacionados en la siguiente tabla al Municipio de Gachantivá durante el periodo comprendido entre el 29 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO DE 2025. De acuerdo con la siguiente relación, cantidades, valores unitarios y valor total.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR SUBTOTAL	VALOR IVA 19%
1	FABRICACION Y SUMINISTRO PUNTOS ECOLOGICOS DE 3 CANECAS EN ACERO INOXIDABLE 304 Cal 20 x 0.70m DE ALTO	10	$1.680.000	$16.800.000	$3.192.000
				VALOR TOTAL	$19.992.000

Obligación de pago de seguridad social: Cumplir con el pago de sus obligaciones al sistema general de seguridad social, acreditando el pago de dichas obligaciones en los porcentajes establecidos por la ley.

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en el expediente contractual correspondiente, proceso de contratación No. MG-IMC-020-2025

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. MG-IMC-020-2025, se encuentra EJECUTADO, con un porcentaje de AVANCE del 100%.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA

Durante el presente período no se han presentado llamados de atención al contratista.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.

b) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.

c) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.

d) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.


7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

8. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de estos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

EVIDENCIA DE LAS ACTIVIDADES

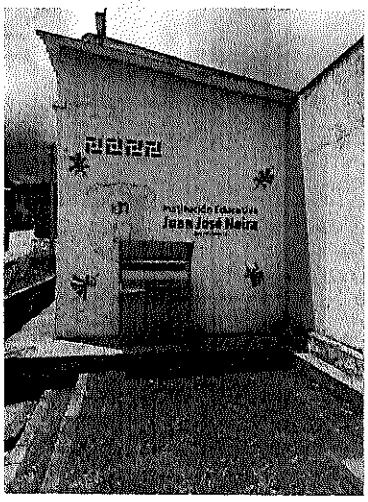






Institución Educativa
Juan José Neira



Institución Educativa
Juan José Neira






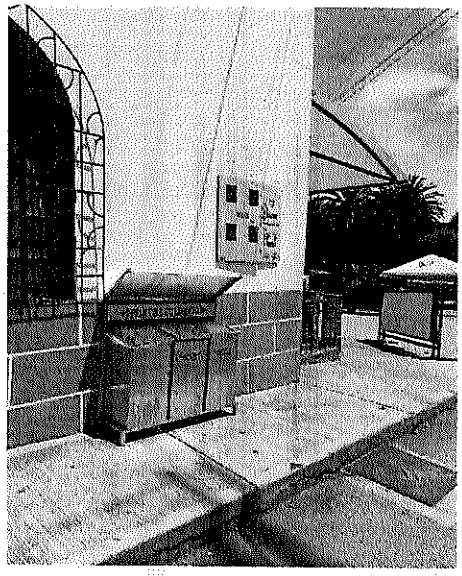

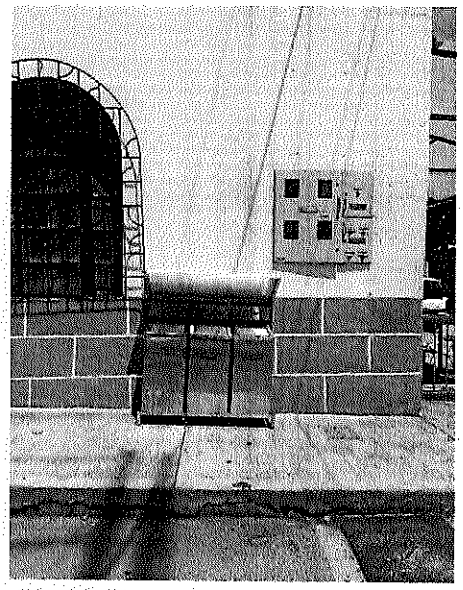


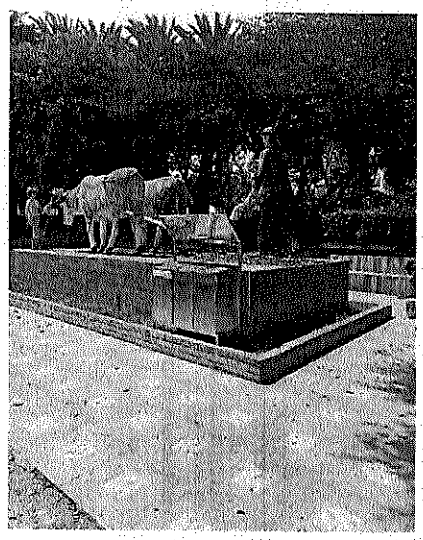


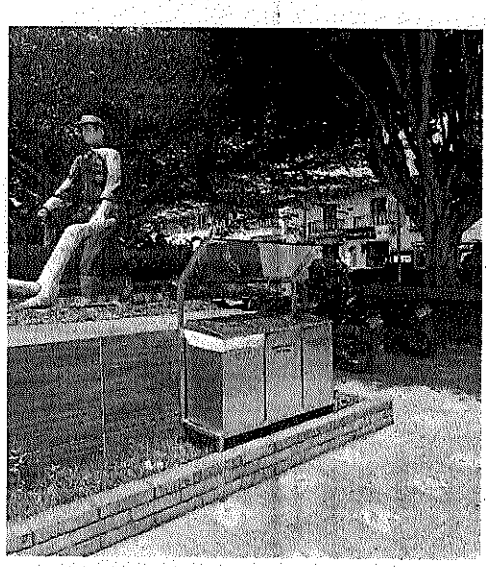





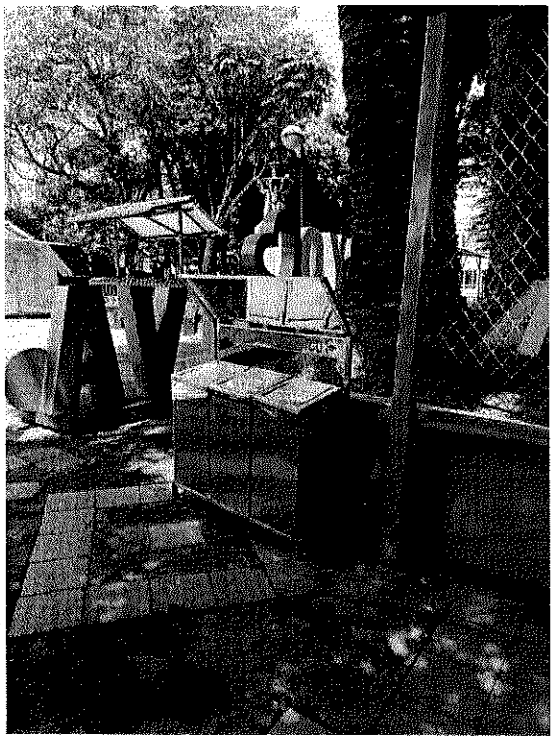

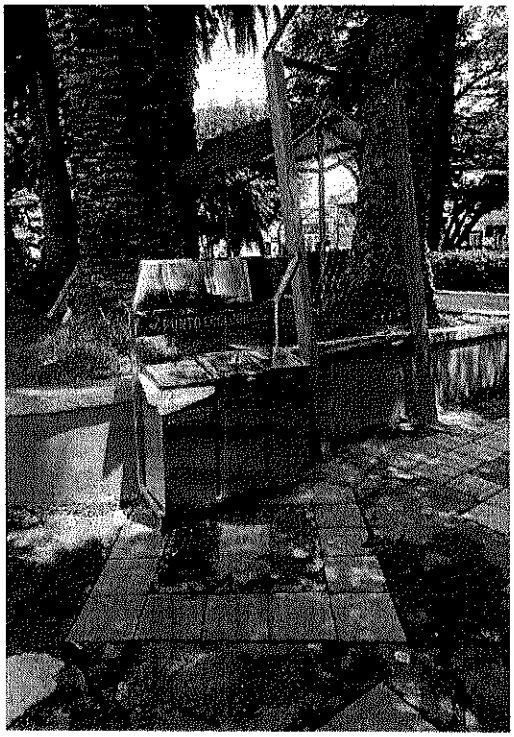






PUNTO ECOLÓGICO




PUNTO ECOLÓGICO

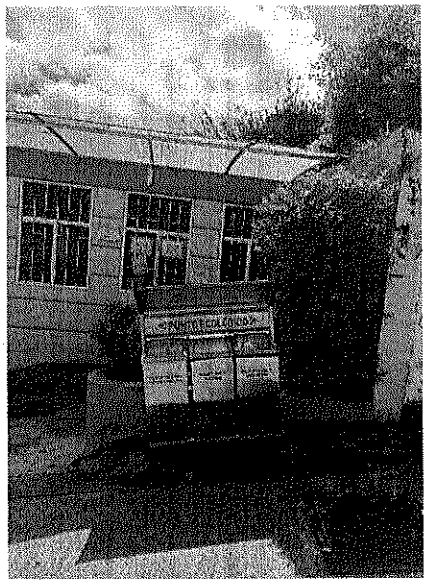

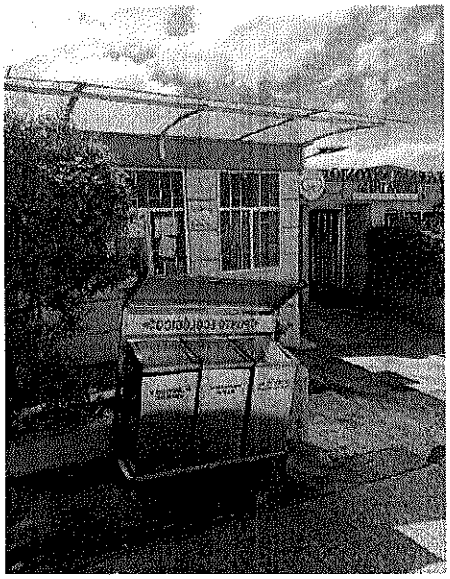

El presente informe se firma en Gachantivá., a los veinticuatro (24) días del mes de Junio de 2025.

Atentamente,

ALVARO MENDOZA PATIÑO
Secretario de Planeación, Desarrollo e Infraestructura
Supervisor del Contrato
