INFORME DE INTERVENTORIA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS Y SUS CORREGIMIENTOS
INFORME N°29 – MAYO/JUNIO 2025

CONTRATANTE: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C.

CONTRATISTA: OPERADOR: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°068 DE 2022

DURACIÓN: 18 MESES DE OPERACIÓN DESDE 06/01/2023 HASTA 06/07/2024

MODIFICATORIO #03 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.068

DURACIÓN: 6 MESES HASTA 31 DE ENERO DICIEMBRE 2024

MODIFICATORIO #05 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.068

DURACIÓN: 6 MESES – DE 14/01/2025 A 14/07/2025

INTERVENTOR: QBM2 INGENIERIA ELECTRICA S.A.
CONTRATO N°SG-CMA-UAC-066-2022

DURACIÓN: 18 MESES A PARTIR DEL 06/01/2023

MODIFICATORIO #01 AL CONTRATO N°SG-CMA-UAC-066-2022

DURACIÓN: 6 MESES HASTA 31 DE DICIEMBRE 20245

MODIFICATORIO #02 AL CONTRATO N°SG-CMA-UAC-066-2022

DURACIÓN: 6 MESES – DE 14/01/2025 A 14/07/2025

AFINIA: CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON DESTINO AL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, N° AMNR – 169-2022 CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.-AFINIA

INDICE

1. ACTIVIDADES GENERALES 5

2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO..... 8

3. SEGUIMIENTO TÉCNICO 9

4. SEGUIMIENTO OPERATIVO 11

5. SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTABLE..... 18

6. SEGUIMIENTO JURIDICO 18

7. CUADROS Y GRAFICOS FINANCIEROS..... 19

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES FINALIZADO ABRIL 2025... 25

A N E X O S 26

LISTADO DE ANEXOS

Anexo 1. AP-DIS-027-2025: Recomendaciones Cartera Fallida N°03 27
Anexo 2. AP-DIS-028-2025: Recomendaciones Cartera Fallida N°04 33
Anexo 3. AP-DIS-029-2025: Recomendaciones Cartera Fallida N°05. 44
Anexo 4. Acta De Comité #06 - 06/06/2025 47
Anexo 5. Registro Fotográfico De Seguridad Y Área De Trabajo 53
Anexo 6. Certificado de Aportes y Seguridad Social del Contratista 54
Anexo 7. Solicitud de Modificación Socorro, Plan 500B Mz. 76 A 80 57
Anexo 8. Solicitud De Modificación Vicente Martínez Martelo, Pie De La Popa 58
Anexo 9. Solicitud de Modificación Refuerzos Barrio Andalucía 59
Anexo 10. Solicitud de Modificación Parque Mirador Alto Bosque Trv. 53B (Escaleras) 60
Anexo 11. Solicitud De Modificación Refuerzos Antonio José De Sucre, Sector La Ceiba. 61
Anexo 12. Solicitud de Modificación Barrio La Paz, Sector Laureles Cra 32-69 62
Anexo 13. Solicitud de Modificación Refuerzos Parque de Chiquinquirá 63
Anexo 14. Solicitud de Modificación Ceballos, Sector Nuevo Oriente 64
Anexo 15. Solicitud de Modificación Pie De La Popa, Sector El Toril 65
Anexo 16. Solicitud de Modificación Refuerzo Caño Lo Amador 66
Anexo 17. Solicitud de Modificación Refuerzo Ingreso Vía A Manzanillo 67
Anexo 18. Solicitud de Modificación Refuerzo San José De Los Campanos 68
Anexo 19. Solicitud De Modificación Parque De La Marina 69
Anexo 20. Solicitud de Modificación Altos Del Campestre Parques y Canchas 70
Anexo 21. Solicitud de Modificación Parque La Florida, San Fernando 71
Anexo 22. Solicitud de Modificación Parque La Carcha De Villa Rubia 72
Anexo 23. Solicitud de Modificación Refuerzo Peaje De Parque América 73
Anexo 24. Seguimiento de Solicitudes De Modificación Mayo/Junio 2025 74
Anexo 25. Registro de Auditoría de la Información de Solicitudes de Mayo 2025 75
Anexo 26. Registro Fotográfico Intervención Avenida Santander 76
Anexo 27. Registro Fotográfico Intervención Refuerzo San José De Los Campanos, Calle 104 79
Anexo 28. Registro Fotográfico Intervención Cancha De Microfutbol Del Pozón, Sector 14 De Febrero. 80
Anexo 29. Registro Fotográfico Intervención Vía Pozón – Villa Estrella – Carrera 92 81

Anexo 30. Registro Fotográfico Intervención Urb. Sevillana 82
Anexo 31. Registro Fotográfico Intervención Cancha Perimetral 84
Anexo 32. Registro Fotográfico Intervención Reposición De Rejillas Galvanizadas Y Recuperadas En Las Murallas. 85
Anexo 33. Registro Fotográfico Intervención Bajos Del Puente Bazurto 86
Anexo 34. Registro Fotográfico Intervención Bajos del Puente Román 87
Anexo 35. Relación de Luminarias Instaladas Barrio Sevillana 88
Anexo 36. Relación de Luminarias Instaladas Av. Santander 91
Anexo 37. Relación De Luminarias Instaladas Bajos Puente Bazurto Y Bajos Puente Román . 94
Anexo 38. Relación de Luminarias Instaladas Proyectos Varios 95
Anexo 39. Registro de Medición de Iluminación Realizada en Abril 2025 96
Anexo 40. Comunicación AP-EPM-007-2025: Ajuste De UCAP's Ejecutadas – Abril 2025 99
Anexo 41. Factura EPM – Correspondiente al Mes de Abril 2025 101
Anexo 42. Certificado de QBM2 a EPM. 103
Anexo 43. Indicadores de Gestión de EPM – Abril 2025 104
Anexo 44. Radicados de Informes Entregados a Distrito. 107
Anexo 45. Seguridad Social De Interventoría - Planilla Integral – SOI **7972364112** 109
Anexo 46. Informe De Facturación Y Recaudo Del Impuesto De Alumbrado Público Del Mes De Febrero 2025 – Liquidado Por AFINIA (Operador Local). 111
Anexo 47. Liquidación De Energía – Mayo 2025 (Correspondiente Al Mes De Abril 2025)..... 112

EJECUCION DEL MES

	1. ACTIVIDADES GENERALES	EJECUTADO EN EL MES
1	**Conocer los términos condiciones del contrato.**	El contratista conoce a la perfección las obligaciones, jurídicas, administrativas, técnicas y financieras asignadas a éste y la ejecución del contrato se hace en cumplimiento irrestricto de éstas, evidenciado con los soportes aportados a Distrito. Los demás documentos relativos al contrato se encuentran publicados en la plataforma SECOP II
2	**Advertir oportunamente los Riesgos que puedan afectar la eficacia de los contratos objeto del servicio de alumbrado público en todos sus componentes de acuerdo con el objeto contractual, tomar las medidas necesarias para mitigarlos.**	Se continúa con las reuniones con funcionarios designados de secretaria de hacienda, revisando los informes de Afinia y los recaudos de los terceros, para validar las acciones que hasta la fecha se han tomado. **Anexo 1.** AP-DIS-027-2025: Recomendaciones cartera fallida N°03 **Anexo 2.** AP-DIS-027-2025: Recomendaciones cartera fallida N°04
3	**Hacer seguimiento del cumplimiento del plazo de los contratos, de los cronogramas previstos en el contrato.**	En el sexto comité, realizado el 06/06/2025, se le hizo seguimiento especial a la programación de modernización dado que EPM, se comprometió a ejecutar 4.350 ucap's aproximadamente; sin embargo, ante la perentoria instrucción de alcaldía de intervenir la Avenida Santander, se postergó la ejecución de varios proyectos. Por lo que se revalidó la programación para lo que resta de junio y julio 2025. Se cumplió con el ejercicio de liquidación de las ucap's de abril 2.025 (735), siendo la base para la facturación de EPM, generada el 16/mayo/25 (**N° DEE17488616**). Ver seguimiento operativo del presente informe.
4	**Identificar las necesidades de cambio o ajuste.**	Contractualmente, todas las obligaciones están claras y al momento no hay lugar a modificaciones o ajustes. Se atendieron los requerimientos de consulta técnica y jurídica en relación con la

		continuidad de la prestación del servicio de alumbrado público para el segundo semestre 2.025.
5	**Manejar la relación con el contratista.**	La relación de Interventoría con EPM se da en buenos términos, en el marco operativo, la liquidación conjunta de las ucap's ejecutadas para soportar de facturación; así como las revisiones y validaciones de las solicitudes de modificación de infraestructura, inspecciones en sitio
6	**Administrar e intentar solucionar las controversias entre las partes.**	No hay controversias.
7	**Organizar y administrar el recibo de bienes, obras, servicios, su cantidad, calidad, especificaciones y demás atributos establecidos en los Documentos del Proceso.**	Se realizó inspección el 04/06/2025 al proyecto de San Sebastián Parque residencial, de Constructora Normandía, levantándose acta y dejando sentada las observaciones o detalles constructivos identificados, para que el constructor tome acciones y una vez superadas se proceda con la recepción de los bienes de alumbrado público.
8	**Revisar si la ejecución del contrato cumple con los términos de este, las necesidades de la Entidad Estatal y actuar en consecuencia de acuerdo con lo establecido en el contrato.**	Se validó la ejecución de las UCAP's en abril/2025; dejándolo expresado en comunicación AP-EPM-007-2025, del 14 de mayo de 2025. Se realizó la supervisión de las intervenciones ejecutadas por EPM, durante el mes de mayo, evidenciado con registro fotográfico. Para más detalle ver las secciones "3. Seguimiento técnico" y "4. Seguimiento operativo" del presente informe
9	**Aprobar, rechazar oportunamente de forma justificada el recibo de bienes y servicios de acuerdo con lo establecido en los documentos del Proceso.**	Al finalizar el periodo actual (14/05 a 14/06), no hay solicitudes recientes de entrega de bienes de alumbrado público construido por terceros.
10	**Informar a la Entidad Estatal de posibles incumplimientos del contratista, elaborar y presentar los soportes correspondientes.**	El desarrollo de las actividades de modernización y reposición, han estado sujeta a los requerimientos particulares, provenientes de la alcaldía. EPM, ha cumplido con la operación y mantenimiento.
11	**Solicitar los informes necesarios para convocar las reuniones requeridas para cumplir con su función.**	Se solicito a EPM la información del Shape (consolidado de ejecuciones de

		modernización por proyecto) con corte a abril 2025: Aportado el 13/05/2025 Con esta información y la tomada por la Interventoría en las inspecciones se verificaron las ucap's liquidadas del mes de abril/2025
12	**Informar y denunciar ante las autoridades competentes cualquier acto u omisión que afecte la moralidad pública, con los soportes correspondientes.**	Desarrollo de actividades contractuales sin afectación de la moralidad pública por parte del operador de EPM durante el mes de abril 2025
13	**Suscribir las actas generadas durante la ejecución del contrato para documentar las reuniones, acuerdos, controversias entre las partes, así como las actas parciales de avance, actas parciales de recibo y actas de recibo final.**	Acta de comité realizado el 06/062025, correspondiente a la evaluación de gestión del mes de mayo y proyectando junio 2025. Ucap's ejecutadas y actas soportes de pago a EPM **Anexo 3.** Acta de Comité #06 – 06/06/2025

	2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO	EJECUTADO EN EL MES
1	**Revisar que el expediente electrónico y físico del contrato esté completo, sea actualizado constantemente y cumpla con la normativa aplicable.**	El expediente contractual (SG-CMA-UAC-066-2022) se encuentra debidamente actualizado. Encontrándose cargado el acta de inicio, la aprobación de la póliza y registro presupuestal. De la misma forma en el expediente contractual de EPM, se encuentra el contrato electrónico suscrito con el respectivo registro presupuestal y póliza aprobada.
2	**Coordinar con el responsable en el Distrito de la revisión aprobación de garantías, la revisión de los soportes de cumplimiento de las obligaciones laborales.**	Revisada la plataforma Secop II, en lo que corresponde al expediente contractual de EPM, se evidencia cargadas las pólizas, así como la aprobación de éstas, del contrato inicial, están faltando las pólizas y aprobación de pólizas del modificatorio No 5. En lo que respecta al expediente electrónico del contrato de interventoría, las pólizas se encuentran cargadas, pero no está cargado el documento de aprobación, tras la celebración del modificatorio No 2 del contrato.
3	**Preparar y entregar los informes previstos que soliciten los organismos de control.**	No se presentaron requerimientos de entes de control en el mes de abril/2025. Pero se cuenta con toda la información que evidencie la gestión y desarrollo de la Interventoría.
4	**Revisar que el Distrito cumpla con los principios de publicidad de los Procesos de Contratación y de los Documentos de los Procesos.**	Se verificó en la Plataforma Secop II el cumplimiento del requisito de publicidad tanto respecto al contrato con EPM como el de interventoría.
5	**Verificar el cumplimiento de las obligaciones de los contratistas en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato.**	El contratista aplicó las medidas de seguridad en vías, delimitación de las zonas de trabajo., Cumplimiento de la seguridad social, aportada el 14/05/2025. Permanentemente, disponen de profesional de HSEQ que hace presencia en los barrios con operativa de modernización, velando que se minimicen los riesgos y accidentes. Esta actividad es constante. **Anexo 4.** Registro fotográfico de seguridad y área de trabajo **Anexo 5.** Certificado de aportes y seguridad social del contratista

	3. SEGUIMIENTO TÉCNICO	EJECUTADO EN EL MES
1	**Verificar el cumplimiento de las normas técnicas aplicables al servicio de alumbrado público en todos sus componentes de acuerdo con el objeto contractual**	Los materiales utilizados por el contratista son homologados y certificados. Los diseños fotométricos de calles y parques continúan realizándolos, con la normativa técnica RETILAP.
2	**Revisar que las personas que conforman el equipo del contratista cumplan las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato, exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario.**	EPM, cumple con las condiciones mínimas para garantizar un trabajo seguro tanto en campo como en oficinas. La supervisión de HSEQ en los proyectos es constante. El grupo de ingenieros a cargo es profesional y siempre aportante de soluciones.
3	**Identificar las necesidades de cambio o ajuste revisar el curso de acción con las partes.**	Se identificó y se superó la necesidad reforzar la iluminación de la zona recuperada aledaña al Puente de la Transversal 54 (Los Caracoles), articulada con secretaria general, Umata y Gerencia de Espacio Público.
4	**Estudiar las solicitudes, requerimientos técnicos de los contratistas, dar recomendaciones a la Entidad Estatal sobre el particular.**	Interventoría revisó y avaló solicitudes de modificación de infraestructuras (SMI) aportadas por EPM, el periodo de mayo a junio 2025: **Anexo 6**. Solicitud de Modificación Socorro, Plan 500B Mz. 76 a 80 **Anexo 7**. Solicitud de Modificación Vicente Martínez Martelo, Pie de la Popa **Anexo 8**. Solicitud De Modificación Refuerzos Barrio Andalucía **Anexo 9**. Solicitud De Modificación Parque Mirador Alto Bosque Trv. 53B (escaleras) **Anexo 10**. Solicitud De Modificación Refuerzos Antonio José de Sucre, Sector La Ceiba **Anexo 11**. Solicitud De Modificación Barrio La Paz, Sector Laureles Cra 32-69 **Anexo 12**. Solicitud De Modificación Refuerzos Parque de Chiquinquirá **Anexo 13**. Solicitud De Modificación Ceballos, Sector Nuevo Oriente **Anexo 14**. Solicitud De Modificación Pie de la Popa, Sector El Toril **Anexo 15**. Solicitud De Modificación Refuerzo Caño Lo Amador **Anexo 16**. Solicitud De Modificación Refuerzo Ingreso Vía a Manzanillo

		Anexo 17. Solicitud De Modificación Refuerzo San José de los Campanos **Anexo 18**. Solicitud De Modificación Parque de la Marina **Anexo 19**. Solicitud De Modificación Altos del Campestre Parques y canchas **Anexo 20**. Solicitud De Modificación Parque La Florida, San Fernando **Anexo 21**. Solicitud De Modificación Parque La Carcha de Villa Rubia **Anexo 22**. Solicitud De Modificación Refuerzo Peaje de Parque américa **Anexo 23.** Seguimiento de solicitudes de modificación abril/mayo 2.025
5	**Elaborar la documentación y el soporte necesario frente la necesidad de hacer efectivas las garantías de los contratos objeto de interventoría**	No se presentaron situaciones que conllevaran a la aplicación las garantías.

	4. SEGUIMIENTO OPERATIVO	EJECUTADO EN EL MES
1	**Supervisar la actualización del Sistema de Información Georreferenciado de la infraestructura del servicio de alumbrado público del Distrito.**	El operador de alumbrado público mantiene su sistema ARCGIS actualizado en tiempo real paralelo con el desarrollo de las modernizaciones. El operador EPM, comparte el SHAPE, que es la información base para actualizar el sistema de información georreferenciado.
2	**Auditar la calidad de la información incluida en la base de datos, de acuerdo con la norma NTC ISO 2859 parte 1, "Planes de muestreo determinado por el nivel aceptable de calidad (NAC o AQL) para inspección lote a lote", y verificar que se realice la correspondiente actualización de la base de datos, para todos los procesos de modernización, expansión, cambio de infraestructura, retiro o cambio de luminarias, inclusión de infraestructura nueva, reubicación de luminarias o de infraestructura y en general de todo proceso que afecte el inventario georreferenciado.**	En el periodo de ejecución (14/05 a 13/06), con relación a la modernización, reposición y expansión se verificó la información soporte de las ejecuciones en los siguientes lugares: 1) Obras ejecutadas por EPM, ● Avenida Santander ● Barrio Sevillana ● San José de los Campanos, Carrera 92 ● SMI de Bajos del Puente Bazurto y Manga. 2) Obras pendientes de ejecutar concertadas en comité de seguimiento del 06/06/2025: ● Palmas de Salamanca ● San Pedro ● Zonas Normalizadas de Antonio José de Sucre – Henequen – Los Girasoles – Villa Rosa ● Vía Barú ● Ruta 90 (Via al Mar - Cordialidad) ● Isla Grande ● Vía La Boquilla desde Hotel Sonesta hasta Hotel Derust ● Vía Pontezuela -Bayunca Vía al Mar (con Concepto Favorable de la ANI, para intervención) ● Las definidas en programación a presentar de EPM Se efectúo auditoria y se registraron los códigos de las luminarias instaladas en los proyectos terminados. De acuerdo con la NTC-ISO-2859, el tamaño de la muestra es n = 80. Sin embargo, Se tomo la totalidad del universo de luminarias instaladas en el mes 14/05 a 13/06 de 2.025.

3	**Monitorear el estado de la infraestructura de alumbrado mediante inspecciones en jornadas diurnas y nocturnas, garantizando el cubrimiento del 100% del área Distrital mensualmente**	Interventoría, realizó recorridos nocturnos verificando eficiencia del sistema, y en especial se visitó las Urbanizaciones Sevillana y Avenida Santander, validando el funcionamiento de la nueva infraestructura. Ver anexo 29 Se generan reporte derivados de las inspecciones nocturnas y diurnas. Reportadas directamente a los coordinadores de EPM para su atención inmediata con las cuadrillas nocturnas. Atención oportuna por el operador de alumbrado público EPM. Se continua con el monitoreo, al tiempo que se generan reportes dirigidos al operador EPM, quienes al tiempo cuentan con cuadrillas nocturnas en permanente recorridos para atender las falencias detectadas en especial en la zona turística. Ver siguiente numeral.
4	**Reportar al Operador las deficiencias encontradas en el servicio.**	Tanto supervisores como ingenieros de Interventoría realizaron reportes de fallas de alumbrado público a través de los canales formales de EPM, y visitas a usuarios, generando reportes a través de los canales telefónicos de atención al usuario y otros reportados directamente a los supervisores. Se realizaron reportes de zonas apagadas directamente a los ingenieros del área operativa de EPM para una ágil atención.
5	**Revisar los reportes de quejas y reclamos por alumbrado público, y verificar el cumplimiento de los trabajos solicitados.**	Actividad recurrente de Interventoría por medio de los supervisores, se cuenta con datos de las solicitudes que evidencian la atención prestada por las cuadrillas de EPM. **Anexo 24.** Registro de auditoría de la información de solicitudes de mayo 2025
6	**Hacer seguimiento a las Comunicación que surjan de la comunidad, el Distrito, organismos de control, operador del servicio de alumbrado público, relacionadas con quejas, reclamos y solicitudes de expansión con el objeto de apoyar al Distrito, en la atención de la preparación de las respuestas.**	Se hizo seguimiento a las quejas de usuarios y se valido su atención Ver numeral 6 del seguimiento operativo
7	**Apoyar al alcalde o a quien él delegue, en la evaluación de los requerimientos de**	Esta es una tarea constante de la interventoría con el operador EPM, se

	expansiones del alumbrado público, en la revisión de los diseños de alumbrado público de tales expansiones	continúa validando la relación de sectores por modernizar para proyectar cobertura al 100%, ya que constantemente, se van sumando zonas con redes eléctricas normalizadas.
8	**Inspeccionar las obras de expansión, modernización, reposición, repotenciación y remodelación de puntos del sistema de alumbrado público, y verificar su total sujeción al diseño aprobado, al cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento Técnico, así como a las normas constructivas y de urbanismo adoptadas por el Distrito.**	Atendiendo a la prioridad de la Alcaldía, se inspeccionaron los proyectos ejecutados en el periodo correspondiente a Av. Santander, Urb. Sevillana y demás descritos en los anexos listados a continuación: **Anexo 25.** Registro fotográfico Intervención Avenida Santander **Anexo 26.** Registro fotográfico Intervención Refuerzo San José de los Campanos, Calle 104 **Anexo 27.** Registro fotográfico Intervención Cancha de microfutbol Pozón, Sector 14 de febrero **Anexo 28.** Registro fotográfico Intervención Vía Pozón – Villa Estrella **Anexo 29.** Registro fotográfico Intervención Urb. Sevillana **Anexo 30.** Registro fotográfico Intervención Cancha Perimetral **Anexo 31.** Registro fotográfico Intervención Reposición de rejillas galvanizadas y recuperadas en las Murallas **Anexo 32.** Registro fotográfico Intervención Bajos del Puente Bazurto **Anexo 33.** Registro fotográfico Intervención Bajos del Puente de Manga
9	**Llevar el control sobre las expansiones programadas en cuanto a ejecución y su relación con los materiales y equipos utilizados.**	Se revisaron y se determinaron las cantidades ejecutadas por los proyectos que se listan a continuación: **Anexo 34.** Relación de luminarias instaladas Urb. Sevillana **Anexo 35.** Relación de luminarias instaladas Av. Santander **Anexo 36.** Relación de luminarias instaladas Bajos Puente Bazurto y Bajos Puente Román **Anexo 37.** Relación de luminarias instaladas Otros Proyectos
10	**Supervisar la actualización de la base de datos del inventario.**	Actividad recurrente de EPM, con cada modernización en barrios. Cada nuevo punto de modernización y expansión queda registrado en el sistema

		ARCGIS. Y lo comparten a través de la carpeta SHAPE, siendo la anterior versión entregada el pasado 13/05/2025
11	**Verificar la aplicación del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público –RETILAP, en las etapas de asignación de requisitos fotométricos a vías y demás espacios públicos, aprobación de diseños, especificación de equipos, construcción y mantenimiento de los proyectos de alumbrado público, así como de las disposiciones contempladas en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE).**	Las ejecuciones están acorde a los diseños y se cumple con los niveles de iluminación. Se mantiene la premisa de instalación de luminarias, brazos, cableado y accesorios homologados y certificados, adecuados para las condiciones climáticas tropicales y salinas de Cartagena. Por parte de Interventoría, se verifico los niveles de iluminación de los sectores evaluados, lo cual se aprecia en el siguiente numeral.
12	**Identificar los sectores que presenten deficiencias en el alumbrado público, mediante la realización de la medición de iluminancia o luminancia, según se aplique o sea conveniente. Para la verificación de los niveles de iluminación (iluminancia) o luminancia de proyectos nuevos y del alumbrado existente, usando equipos de medida con certificado de calibración o verificación vigente. Informar del resultado de las mediciones la interventoría al responsable del servicio de alumbrado público del Distrito, de acuerdo con el alcance que señala el reglamento técnico del servicio.**	Interventoría ejecutó medidas de iluminancia la Urbanización Sevillana. Arrojando unos niveles de iluminación conformes a la exigencia normativa RETILAP, acorde al tipo de vía y espacio a evaluar. **Anexo 38.** Registro de medición de iluminación realizada en mayo 2025
13	**Apoyar al responsable del servicio de alumbrado público en el Distrito en el trabajo conjunto de revisión de diseños de alumbrado público, lo que hará de acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento**	Ídem #7 del Seguimiento operativo. Esta actividad ha sido constante, en la medida que se han presentado las solicitudes de modificación de infraestructuras y expansiones.
14	**Verificar el correcto funcionamiento del sistema de consulta en la Web cuando aplique y la actualización permanente de su información. Será responsabilidad de la Interventoría adecuar sus sistemas de transferencias de datos, información, indicadores y en general, de informes de acuerdo con los formatos y la periodicidad que el Distrito defina para tal efecto.**	El Distrito, mantiene activo su correo institucional para la recepción de solicitudes con las comunidades: alumbradopublico@cartagena.gov.co La Interventoría cuenta con página web: www.qbm2.com A través de la página se pueden recibir solicitudes que son abordadas por los ingenieros del área técnica para darle solución. También se tienen los canales: correspondencia@qbm2.com

		El informe correspondiente a abril 2025 de Interventoría fue ingresado en el SECOP II
15	**Analizar el informe de indicadores de calidad del servicio de energía, DES y FES, que el Operador de Red entregue a la Superintendencia de Servicios Públicos, con el fin de establecer el monto de la energía a descontar o compensar por calidad del servicio; así como la energía descontable por no haber sido suministrada a causa de interrupciones programadas o no programadas en los circuitos que no cuentan con contadores o equipos de medida, imputables al Operador de Red**	Se mantiene la observación en relación con la unificación de la información georreferenciada e inventario del alumbrado público con AFINIA para que se pueda determinar exactamente los indicadores
16	**Verificar para el caso de parques y conjuntos o unidades inmobiliarias con cerramiento, el tipo de cesión que tienen tales áreas con el fin de definir si la infraestructura instalada corresponde al servicio de alumbrado público. Para el caso, verificará la información recibida del operador del servicio de alumbrado público sobre tales áreas, así como de las autoridades de planeación Distrital. Una vez depurada la información, la interventoría debe notificar a las autoridades Distritales acerca de los resultados obtenidos. En la realización de esta función la interventoría deberá consultar entre otros, licencias de construcción, planos de urbanismo, inventarios levantados por el operador del sistema de alumbrado público y por el operador de la red, así como inspección a los sitios en definición.**	No hay requerimiento de consultas recientes.
17	**Verificar el cumplimiento de la normatividad distrital, regional y nacional vigente en materia ambiental; respecto del manejo y disposición de equipos y materiales retirados del sistema de alumbrado público por parte del operador.**	Al cierre de este informe EPM, continúa con el pendiente de aportar soportes de la gestión ambiental, para validación de cumplimiento.
18	**Verificar el cumplimiento de los requisitos del Código Nacional de Tránsito y de las disposiciones de tránsito municipal vigentes, así como el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional por parte de los grupos de trabajo del operador de alumbrado público, en especial sobre la adecuada**	EPM, cuenta con Plan de manejo de tránsito vigente. EPM, trata al máximo de minimizar la ocupación de espacio público sin perturbar la movilidad en los diferentes sectores intervenidos.


	señalización vial de los sitios de trabajo, identificación de vehículos y protección del personal.	La señalización en las áreas de trabajo es permanente en todas las áreas intervenidas evidenciado en los registros fotográficos.
19	**Apoyar en el análisis, revisión, evaluación y valoración del costo del servicio de alumbrado público con base en la facturación que emita el Operador del servicio de alumbrado público que por concepto del servicio le presta al Distrito**	Posterior a la revisión de las obras ejecutadas se conciliaron para mes de abril/25, las ucap's liquidadas en 2.034 y se oficializaron mediante comunicación enviada el 14/05/2025 **Anexo 39.** Comunicación AP-EPM-007-2025: Ajuste de ucap's ejecutadas – abril 2025 EPM, presento factura el 21/05/2025, y en ella se validó las ucap's liquidadas por modernización. **Anexo 40.** Factura de EPM # **N° DEE17488616** - Correspondiente al mes de abril 2025 **Anexo 41.** Certificado de QBM2 a EPM. EPM.
20	**Cumplir con los indicadores de gestión y seguimiento que se establezcan contractualmente, e incluirlos en informes mensuales y en el informe final.**	Los indicadores presentados en este informe corresponden mes de abril 2025, tomando como base reporte presentado por EPM Ordenes de trabajo atendidas: **671** Tiempo de atención promedio**: 46.7** horas Eficiencia del sistema del **98.7%** La meta contractual es del 90% lo que señala una buena prestación del servicio **Anexo 42.** Indicadores de gestión de EPM
21	**Elaborar y presentar los informes mensuales sobre la ejecución de las obligaciones. En los informes, someterá a consideración sus observaciones, conclusiones, recomendaciones, correctivos y demás información que considere pertinente para el buen desempeño en la prestación del servicio, las que deberán estar debidamente soportadas. Los informes deben estar complementados con gráficas, cuadros,**	Informes radicados en el SIGOB el 15/05/2025 AP-DIS-024-2025: Envío Informe de febrero 2025 AP-DIS-026-2025: Envío Informe de supervisión **Anexo 43.** Radicados de informes entregados a Distrito. También cargados en la plataforma SECOPII

	estadísticas, fotografías, tablas, etc., que permitan su correcta comprensión.	
22	**Conciliar el aforo y/o inventario de luminarias con el operador o comercializador que suministra la energía para el alumbrado público al Distrito de Cartagena, a fin de mantenerlo actualizado**	La energía conciliada en nivel 1, con corte a marzo 2025 es de **1.872.589** Kwh-m. Se evidencia un crecimiento del **0.4%,** a razón de la inclusión de obras de expansión Valor anterior de energía: **1.865.059** Kwh-m El Inventario vigente pasó de **62.148** luminarias a de **62.513** luminarias. Próxima conciliación para realizarse en junio/2025
23	**Para legalizar la terminación del contrato de Interventoría, se deberá entregar al Distrito los datos y archivos recopilados durante la ejecución de este, debidamente foliados y almacenados, conforme a las disposiciones de manejo de archivos de la Entidad, así como los programas fuente que se hayan desarrollado o implementado para cumplir con sus obligaciones. Debe entregar manuales de Usuario y Técnicos relacionados con el software y mantenimiento que se le debe dar a dichos aplicativos. Dos meses antes de terminar el contrato, debe suministrar al Distrito las especificaciones del software y hardware utilizado, diseños de bases de datos, y toda la información relacionada.**	Los datos, y archivos recopilados se tienen dispuestos por año


	5. SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTABLE	EJECUTADO EN EL MES
1	**Hacer seguimiento de la gestión financiera de los contratos por parte de la Entidad Estatal, incluyendo el registro presupuestal, la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja.**	Al verificar en la plataforma Secop II se evidencia que se encuentra cargado el registro presupuestal, en lo que corresponde a la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja, el seguimiento se encuentra en cabeza del Distrito, frente a esto la interventoría está en la obligación de orientar para hacerlo de la mejor manera, ante lo que el Distrito le requiera, de la misma forma de la revisión hecha en la Plataforma Secop II se encuentra cargada la cuenta presentada por EPM. En lo que corresponde a la cuenta de QBM también se encuentra cargada.
2	**Elaborar informe sobre el trámite administrativo y contable de la facturación de los servicios prestados como trámite previo para que el Distrito emita las órdenes de pago al operador del alumbrado público en todos sus componentes, conforme esté estipulado en el contrato**	Ver anexo 39 y 41. Se elaboró el Soporte de facturación Contrato Interadministrativo N°068-2022 del mes de abril, que respalda el acta de pago.
3	**Documentar los pagos o ajustes que se hagan y controlar el balance presupuestal para efecto de los pagos y de liquidación de estos.**	Adicional se presentó el acta de pago suscritas juntamente con Distrito correspondiente a la factura de abril 2025
4	**Coordinar las instancias necesarias para adelantar los trámites para la liquidación del contrato del servicio de alumbrado, entregar los documentos soporte que le correspondan para efectuar, así como los correspondientes al contrato de interventoría.**	Se dispone de toda la información soporte como evidencia que demuestre la ejecución del actual contrato de interventoría.
	6. SEGUIMIENTO JURIDICO	**EJECUTADO EN EL MES**
1	**El seguimiento jurídico busca la conformidad de la ejecución de los contratos con el texto de estos, la normativa aplicable a estos.**	Participación y asesoría permanente de parte de Interventoría, buscando el desarrollo favorable del contrato.


7. CUADROS Y GRAFICOS FINANCIEROS

Información financiera, concerniente con el reporte de facturación y recaudo del impuesto de alumbrado público del mes de marzo 2025, aportado por AFINIA En razón a lo dispuesto en el ACUERDO 107 de Dic 14 de 2022, el Operador de Red local (AFINIA) facturaba y recaudaba hasta abril 2023 el IAP de todos los Sujetos Pasivos de dicho acuerdo. A partir de mayo 2023, esa labor pasó a responsabilidad de los Comercializadores diferentes al OR local y/o Autoliquidación de los TERCEROS. Los dineros del IAP de estos sujetos se depositan en la misma cuenta de que dispone Secretaría de Hacienda para el SALP enviándole la información mensual a la Secretaría General-Unidad de Servicios Públicos.

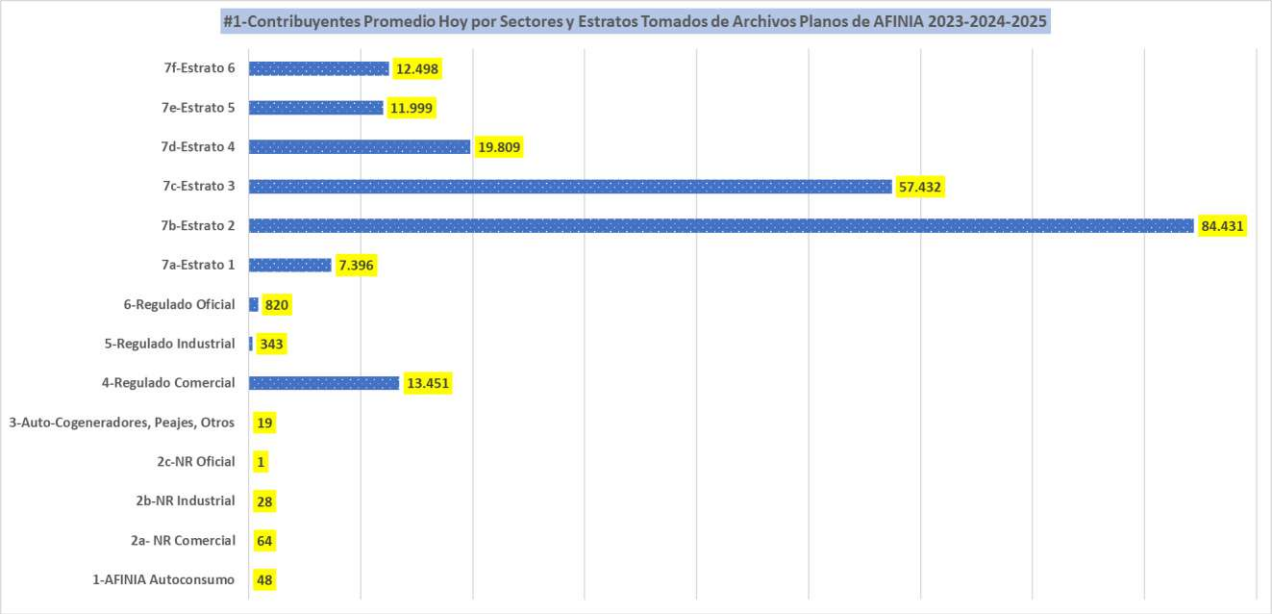


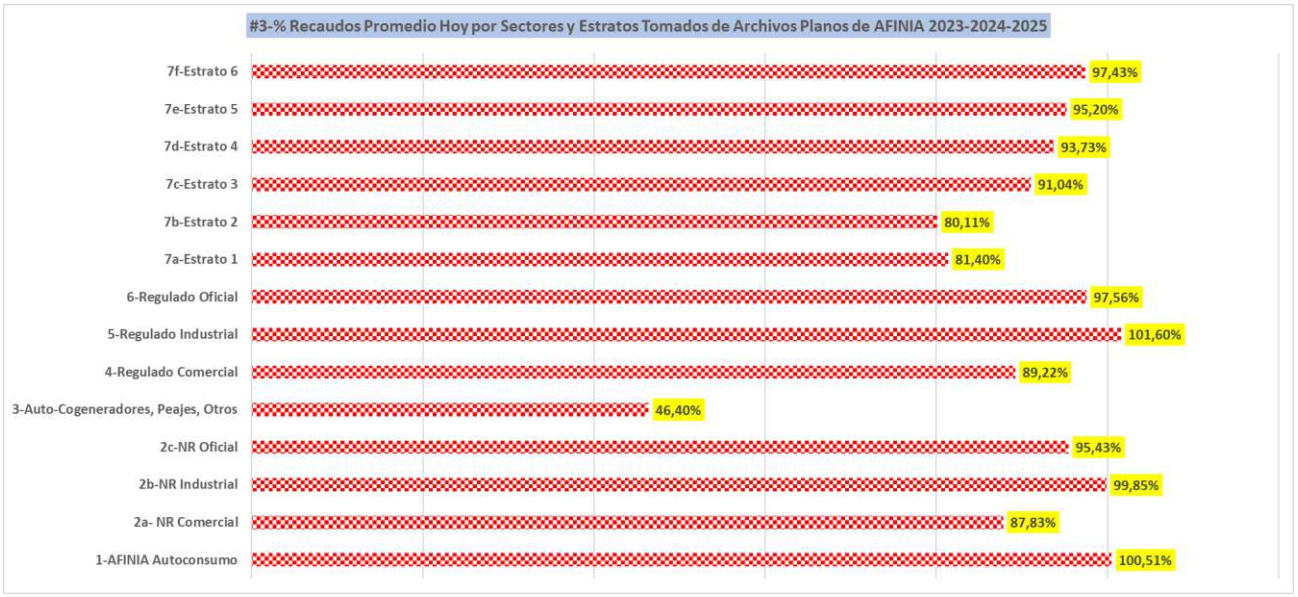




#3-% Recaudos Promedio Hoy por Sectores y Estratos Tomados de Archivos Planos de AFINIA 2023-2024-2025
7f-Estrato 6
97,43%
7e-Estrato 5
95,20%
7d-Estrato 4
93,73%
7c-Estrato 3
91,04%
7b-Estrato 2
80,11%
7a-Estrato 1
81,40%
6-Regulado Oficial
97,56%
5-Regulado Industrial
101,60%
4-Regulado Comercial
89,22%
3-Auto-Cogeneradores, Peajes, Otros
46,40%
2c-NR Oficial
95,43%
2b-NR Industrial
99,85%
2a- NR Comercial
87,83%
1-AFINIA Autoconsumo
100,51%

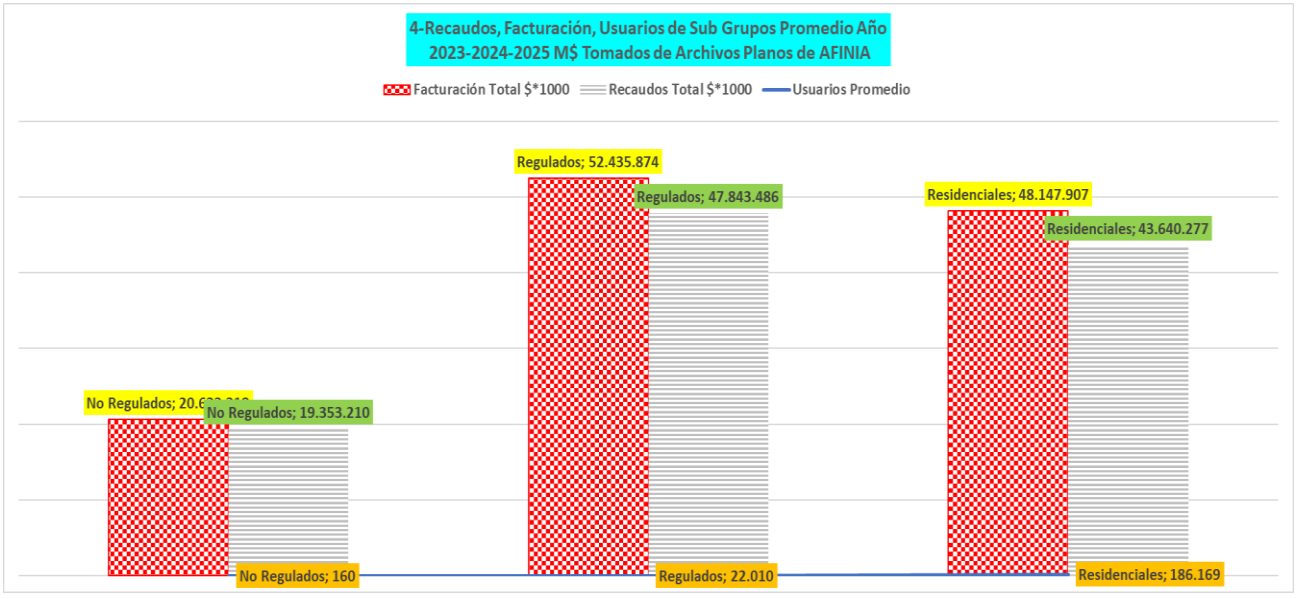

4-Recaudos, Facturación, Usuarios de Sub Grupos Promedio Año 2023-2024-2025 M$ Tomados de Archivos Planos de AFINIA
Facturación Total $*1000
Recaudos Total $*1000
Usuarios Promedio
No Regulados; 19.353.210
No Regulados; 160
Regulados; 52.435.874
Regulados; 47.843.486
Regulados; 22.010
Residenciales; 48.147.907
Residenciales; 43.640.277
Residenciales; 186.169



5-Promedio Facturación y Recaudos Año
2023-2024-2025 M$ Solo AFINIA
Facturación
Recaudos
1
121.217.099
110.836.975

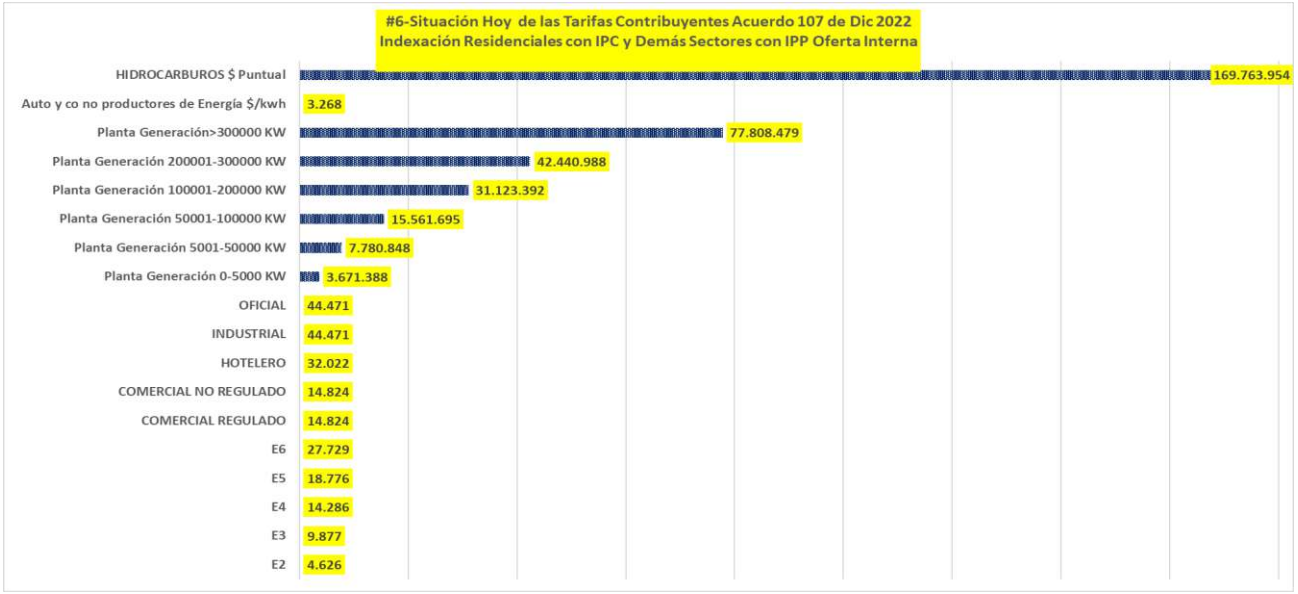
#6-Situación Hoy de las Tarifas Contribuyentes Acuerdo 107 de Dic 2022
Indexación Residenciales con IPC y Demás Sectores con IPP Oferta Interna
HIDROCARBUROS $ Puntual
169.763.954
Auto y co no productores de Energía $/kwh
3.268
Planta Generación>300000 KW
77.808.479
Planta Generación 200001-300000 KW
42.440.988
Planta Generación 100001-200000 KW
31.123.392
Planta Generación 50001-100000 KW
15.561.695
Planta Generación 5001-50000 KW
7.780.848
Planta Generación 0-5000 KW
3.671.388
OFICIAL
44.471
INDUSTRIAL
44.471
HOTELERO
32.022
COMERCIAL NO REGULADO
14.824
COMERCIAL REGULADO
14.824
E6
27.729
E5
18.776
E4
14.286
E3
9.877
E2
4.626

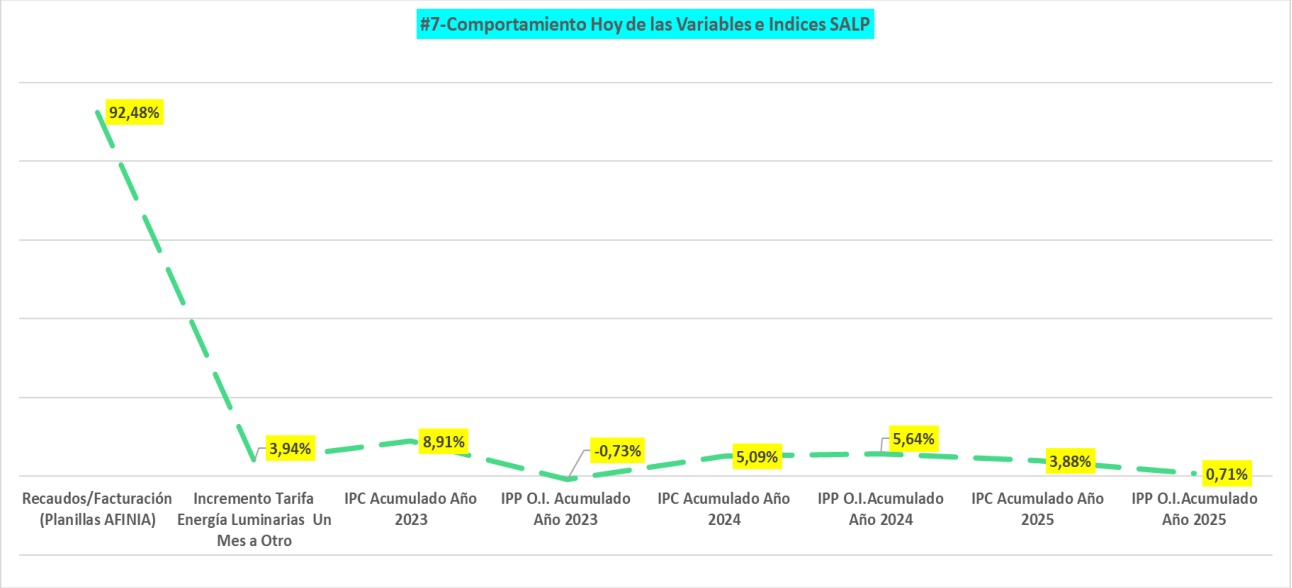
#7-Comportamiento Hoy de las Variables e Indices SALP
92,48%
3,94%
8,91%
-0,73%
5,09%
5,64%
3,88%
0,71%
Recaudos/Facturación (Planillas AFINIA)
Incremento Tarifa Energía Luminarias Un Mes a Otro
IPC Acumulado Año 2023
IPP O.I. Acumulado Año 2023
IPC Acumulado Año 2024
IPP O.I.Acumulado Año 2024
IPC Acumulado Año 2025
IPP O.I.Acumulado Año 2025

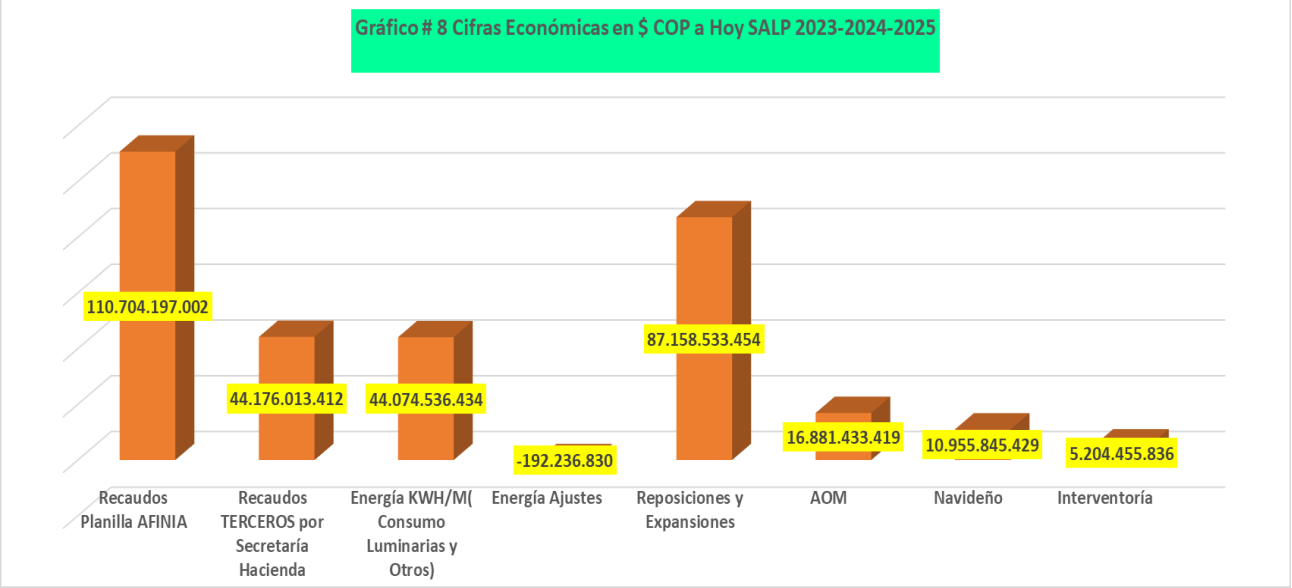
Gráfico # 8 Cifras Económicas en $ COP a Hoy SALP 2023-2024-2025
110.704.197.002
44.176.013.412
44.074.536.434
-192.236.830
87.158.533.454
16.881.433.419
10.955.845.429
5.204.455.836
Recaudos Planilla AFINIA
Recaudos TERCEROS por Secretaría Hacienda
Energía KWH/M(Consumo Luminarias y Otros)
Energía Ajustes
Reposiciones y Expansiones
AOM
Navideño
Interventoría

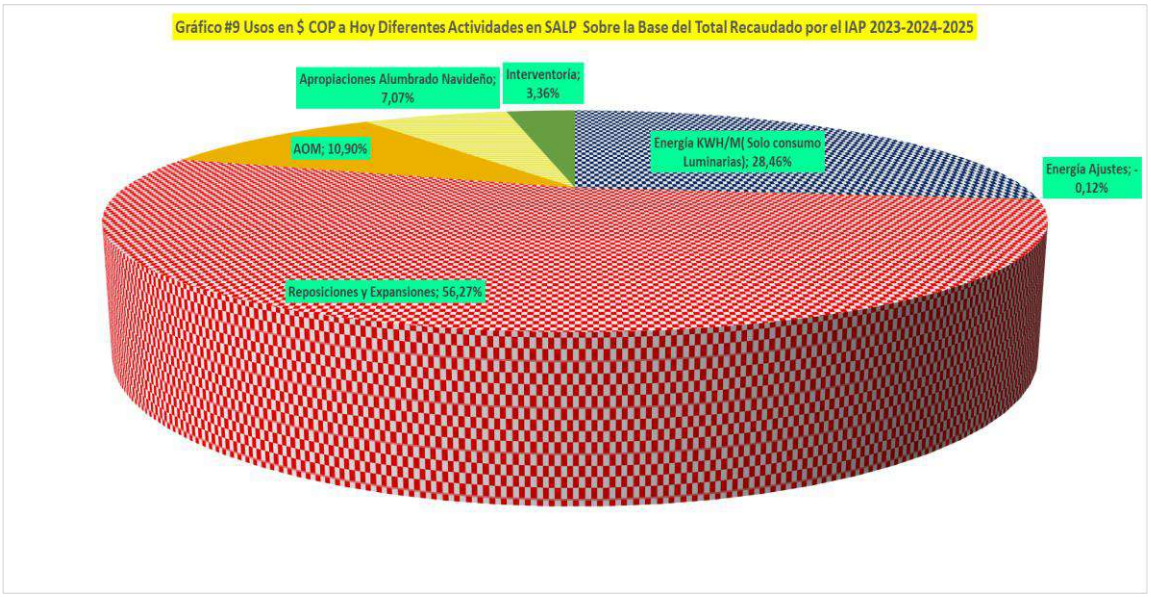

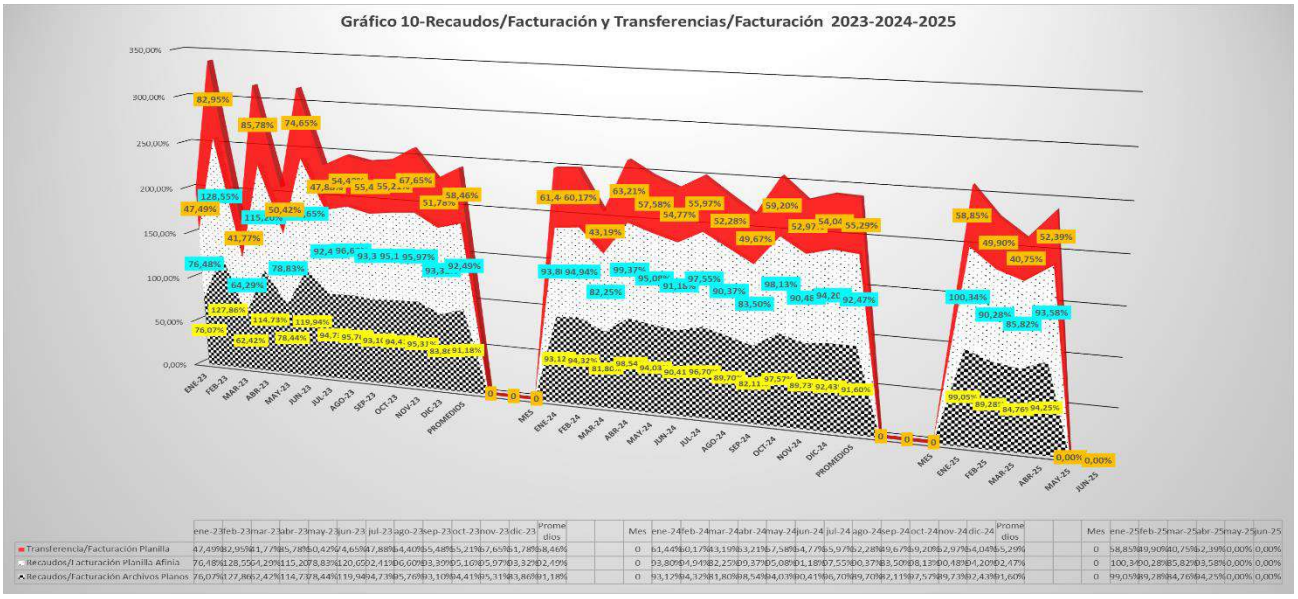

	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Promedios		Mes	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	Promedios		Mes	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25
Transferencia/Facturación Planilla	47,49%	82,95%	41,77%	85,78%	50,42%	74,65%	47,88%	54,40%	55,48%	55,21%	67,65%	51,78%	58,46%		0	61,44%	60,17%	63,21%	57,58%	54,77%	55,97%	52,28%	59,20%	49,67%	52,97%	54,04%	55,29%		0	58,85%	49,90%	40,75%	52,39%	0,00%	0,00%
Recaudos/Facturación Planilla Afinia	76,48%	128,55%	64,29%	115,20%	78,83%	120,65%	92,41%	96,60%	93,30%	95,10%	95,97%	93,18%	92,49%		0	93,80%	94,94%	99,17%	95,08%	91,18%	97,55%	90,37%	98,13%	83,50%	90,48%	94,20%	92,42%		0	100,34%	90,28%	85,82%	93,58%	0,00%	0,00%
Recaudos/Facturación Archivos Planos	76,07%	127,86%	62,42%	114,73%	78,44%	119,94%	94,73%	95,76%	93,10%	94,41%	95,31%	83,86%	91,18%		0	93,12%	94,32%	98,54%	94,03%	90,41%	96,70%	89,70%	97,57%	82,73%	92,49%	91,60%		0	99,08%	89,28%	84,26%	94,25%	0,00%	0,00%

CUADRO 10-DATOS MENSUALES DEL SALP DEL DISTRITO CARTAGENA DE INDIAS A PARTIR ENERO AÑO 2023 HASTA HOY (El AOM y la Modernización para 2024 se reajustaron con el IPP del DANE Año 2023 de acuerdo al Convenio DISTRITO-EPM 068/2022)															Cuadro 11-Información Adicional de Interés por Nueva Regulación $ COP	
Mes	KWHr Solo Luminarias	KWHr Incluye Luminarias y Escenarios y Otros	Tarifa Energía $/kwh Luminarias	Tarifa Energía $/kwh Escenarios y otros	Incremento Tarifa Energía Luminarias un Mes a Otro %	Costo Energía Luminarias + Estadios y Otros Sin Ajustes $ COP	Tarifas AOM $/kwh Luminarias Metodología CREG	Facturación Efectiva MM $ COP Planilla AFINIA	Recaudo Efectivo MM $ COP Planilla AFINIA	Transferencia al Distrito MM$ $ COP	IPC	IPP Oferta Interna	Modernización Expansiones, EPM Operador $COP	Apropiación Alumbrado Navideño $ COP	Ajustes y/o Descuentos en Energía	Valor Final Consumo Energía SALP
ene-23	3.006.004	3.040.305	569,27	759,47		1.737.275.951	155,29	5.725	4.378	2.719	1,7800%	1,8766%	2.748.180.917	469.707.196	-77.940.740	1.659.335.211
feb-23	2.715.101	2.746.950	572,82	790,93	0,62%	1.580.459.100	171,93	3.278	4.214	2.719	1,6600%	1,1610%	2.748.180.917	469.707.196	-10.087.808	1.570.371.292
mar-23	3.006.007	3.048.555	604,64	797,80	5,55%	1.851.497.962	155,29	8.183	5.261	3.418	1,0500%	-0,0166%	2.748.180.917	469.707.196	-8.196.385	1.843.301.577
abr-23	2.909.036	2.945.568	600,10	818,19	-0,75%	1.775.609.431	160,47	6.010	6.923	5.155	0,7800%	-1,0706%	2.748.180.917	469.707.196	-7.964.846	1.767.644.585
may-23	3.006.004	3.043.722	559,88	826,37	-6,70%	1.714.179.902	155,29	6.007	4.736	3.029	0,4300%	-0,9985%	2.748.180.917	469.707.196	-7.329.126	1.706.850.776
jun-23	2.909.036	2.942.466	563,46	833,27	0,64%	1.666.984.661	160,47	3.620	4.368	2.703	0,3000%	-1,3861%	2.748.180.917	469.707.196	-1.626.404	1.665.358.257
jul-23	2.962.464	3.000.301	539,44	810,63	-4,26%	1.628.751.261	157,57	3.655	3.377	1.750	0,5000%	-0,7314%	2.748.180.917	469.707.196	-1.583.945	1.627.167.316
ago-23	2.699.483	2.748.567	544,84	833,99	1,00%	1.511.731.957	172,92	3.583	3.461	1.949	0,7000%	1,3009%	2.748.180.917	469.707.196	-464.258	1.511.267.699
sep-23	2.612.403	2.652.781	522,44	842,32	-4,11%	1.398.840.516	178,69	3.686	3.443	2.045	0,5400%	0,7387%	2.748.180.917	469.707.196	-1.182.782	1.397.657.734
oct-23	2.699.481	2.739.579	527,77	848,12	1,02%	1.458.723.634	172,92	3.648	3.471	2.014	0,2500%	0,2425%	2.748.180.917	469.707.196	1.540.414	1.460.264.048
nov-23	2.612.401	2.645.981	522,79	917,79	-0,94%	1.396.560.635	178,69	4.934	4.735	3.338	0,4700%	-1,0916%	2.748.180.917	469.707.196	1.208.018	1.397.768.653
dic-23	2.584.578	2.621.864	544,12	943,47	4,08%	1.441.503.783	180,61	3.712	3.464	1.922	0,4500%	-0,7509%	2.748.180.917	469.707.196	100.524.618	1.542.028.401
ene-24	2.577.633	2.614.096	549,11	1.053,40	0,92%	1.453.808.630	230,05	3.890	3.649	2.390	0,9200%	0,8139%	3.723.405.820		-194.582.780	1.259.225.850
feb-24	2.411.335	2.453.592	577,24	1.051,24	5,12%	1.436.350.491	245,92	3.744	3.554	2.253	1,0900%	0,9040%	3.723.405.820		-134.651.440	1.301.699.051
mar-24	2.603.570	2.657.993	577,45	1.061,49	0,04%	1.561.196.097	227,76	3.995	3.286	1.726	0,7000%	0,0902%	3.723.405.820		0	1.561.196.097
abr-24	2.519.584	2.566.020	628,16	1.086,33	8,78%	1.633.134.565	235,35	4.004	3.979	2.531	0,5900%	0,3096%	3.723.405.820		185.186.702	1.818.321.267
may-24	2.523.606	2.559.132	597,62	1.106,28	-4,86%	1.547.471.662	234,98	4.127	3.924	2.376	0,4300%	-0,4546%	3.723.405.820		0	1.547.471.662
jun-24	2.442.199	2.488.604	583,40	1.118,89	-2,38%	1.476.694.857	242,81	4.057	3.699	2.222	0,3200%	0,9190%	3.723.405.820		0	1.476.694.857
jul-24	2.429.979	2.474.461	659,78	1.068,63	13,09%	1.650.785.932	244,03	3.970	3.873	2.222	0,2000%	0,1173%	3.723.405.820	886.559.846	0	1.650.785.932
ago-24	2.429.980	2.472.251	621,58	1.111,61	-5,79%	1.557.416.799	244,03	4.090	3.696	2.138	0,0000%	-0,8537%	3.723.405.820	886.559.846	0	1.557.416.799
sep-24	2.351.591	2.399.956	612,38	998,56	-1,48%	1.488.355.418	252,17	4.399	3.673	2.185	0,2400%	0,8442%	3.723.405.820	886.559.846	0	1.488.355.418
oct-24	2.429.978	2.476.867	612,38	986,73	0,00%	1.534.328.821	244,03	3.941	3.867	2.333	-0,1300%	0,7646%	3.723.405.820	886.559.846	0	1.534.328.821
nov-24	2.351.593	2.394.286	607,79	1.006,38	-0,75%	1.472.236.710	252,17	3.924	3.551	2.079	0,2700%	1,2794%	3.723.405.820	886.559.846	0	1.472.236.710
dic-24	2.388.226	2.431.400	622,59	1.041,63	2,43%	1.531.849.552	248,30	3.901	3.675	2.108	0,4600%	0,9078%	3.723.405.820	886.559.846	-35.086.068	1.496.763.484
ene-25	2.388.225	2.428.614	655,83	991,23	5,34%	1.606.295.964	441,28	3.872	3.885	2.279	0,9400%	0,6991%	2.374.873.152		0	1.606.295.964
feb-25	2.204.026	2.241.247	681,69	1.013,77	3,94%	1.540.202.562	478,16	3.815	3.444	1.904	1,1400%	-0,0377%	2.374.873.152		0	1.540.202.562
mar-25	2.388.224	2.436.983	716,95	996,69	5,17%	1.760.831.064	441,28	3.907	3.353	1.592	1,1400%	-0,0808%	2.374.873.152		0	1.760.831.064
abr-25	2.289.509	2.330.967	707,61	998,23	-1,30%	1.661.458.517	460,30	4.023	3.764	2.107	0,6600%	0,1293%	2.374.873.152		0	1.661.458.517
	72.451.256	73.603.107	580,04	946,40		44.074.536.434	204,24	119.700	110.704	67.205	8,91%	5,64%	87.158.533.454	10.955.845.429	-192.236.830	43.882.299.604
			Media	Media			Media				ACUMULADO					
Recaudos Provenientes de TERCEROS a través de Secretaría Hacienda Acuerdo 107/Dic 14 de 2022 MM$									44.176							

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES FINALIZADO ABRIL 2025

A Distrito:

- Actualización del MIDAS, como sistema de información de alumbrado público de la ciudad.
- Seguimiento conjunto don secretaria de hacienda de recuperación de cartera del impuesto de alumbrado público.

Al Operador de Alumbrado Público:

- Superar las observaciones de la ANI, identificadas en reunión virtual el 09/06/2025, presentando los documentos para la posterior obtención del concepto favorable para la Vía Tronca de Occidente
- Disponer de todos los recursos para el desarrollo de las cerca de 4.350 ucap, en el periodo contractual restante.

A N E X O S

Anexo 1. AP-DIS-027-2025: Recomendaciones Cartera Fallida N°03

Interventorías de Obras Eléctricas, Consultorías,
Asesorías, Auditorías, Outsourcing, Estudios Técnicos- Administrativos-Financieros

AP DIS-027-2025

Cartagena de Indias, D. T y C, 09 de junio de 2025

Señores
ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA
Atn: Dr. Haroldo Fortich.
Director Secretaría de Hacienda Distrital
Cartagena

Señores
ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA
Atn: Dra. Helina Maria Castro Angulo
Directora División de Impuestos del Distrito de C/gena
Cartagena

Señores
ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA
Atn: Dra. Gina Patricia Vélez Ortiz
Asesor de despacho Servicios Públicos
Ciudad

Asunto: Recomendaciones cartera fallida No. 3

Cordial saludo,

Mediante comunicación No 2025038100024791 de marzo 10 de 2025 y recibida vía mail el 13 de marzo de 2025 Afinia informó que, a 31 de diciembre de 2023, tiene como reporte de cartera fallida del impuesto de alumbrado público la cifra de $ 5.996´409.595, la cual teniendo en cuenta la responsabilidad de facturación y recaudo del impuesto, es responsabilidad del Distrito de Cartagena a través de su Secretaría de Hacienda Distrital, la gestión y consecuente recuperación de dicha cartera.

La interventoría en cumplimiento de sus obligaciones contractuales de seguimiento financiero de los contratos derivados de la operación del alumbrado público realizó un análisis de la cartera reportada,

De acuerdo con lo expuesto, se adjunta relación de (18) usuarios cuya suma total asciende a $ 268.118.869.oo.

Canapote Calle 20 de Julio N° 16-37 Cartagena
Teléfonos: 605 65 24 715 Celufijo 310-650-2676
Correo Electrónico: presidencia@qbm2.com

Es importante recalcar que la denominada cartera fallida fue dada de baja en el sistema comercial de Afinia por lo que se requiere de revisión minuciosa con cada uno de los clientes en mención para que, en caso de encontrarse al día, solicitarle los respectivos soportes y entrar a solicitar a Afinia el traslado de dichos dineros.

De acuerdo con lo expuesto, se le recomienda al Distrito que proceda de manera inmediata a contactar a cada uno de los (18) clientes relacionados en el cuadro que se adjunta, con el propósito de verificar si realizó o no el pago del impuesto y que en caso afirmativo se remita la constancia respectiva para proceder a la gestión ante Afinia de la transferencia de esos recursos, en caso contrario debe la Secretaría de Hacienda adelantar los procesos de cobro respectivos.

La interventoría se compromete a apoyar al Distrito en las gestiones descritas, así como a la remisión del detalle de los clientes faltantes.

Se adjunta cuadro en Excel.

LUIS MIGUEL MEJIA CHAVEZ
Director Interventoria

Copia: Dra. Maria Patricia Porras Mendoza Secretaria General

RELACION CARTERA FALLIDA REPORTADA POR AFINIA CORTE DICIEMBRE 2023 (MAYOR A $ 5`000.000 y MENOR A $ 10`000.000).

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	1014120	AP Comerciales Nivel 2	1014120025	20230121	20230131	ANDINA S. A. AXALTA POWDER COATING	MAMONAL	CR/56No.KM 13-15/LOC EMG/ZONA FRANCA DE CARTAGENA S.A.	ZONA FRANCA DE CARTAGENA S.A.	$ 6.559.500,00	$ -	$ 6.559.500,00
2			1014120030	20230413	20230427					$ 8.571.382,00	$ -	$ 8.571.382,00
									VALOR TOTAL NIC 1014120			$ 15.130.882,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	1091758	AP Comerciales Nivel 3	1091758005	20230121	20230131	CARTAGENA S.A.S. REFINERIA DE	MAMONAL	CRA56No.KM2-10/ OFI GEC1/REFINERIA DE CARTAGENA SA	CRA56No.KM2-10/MAMONAL VIA ABOCOL	$ 8.140.742,76	$ -	$ 8.140.742,76
									VALOR TOTAL NIC 1091758			$ 8.140.742,76

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	1109358	AP Comerciales Nivel 2	1109358005	20230317	20230330	ENEL COLOMBIA SA ESP	BOCAGRANDE	CR/1No.2-87/ OFI AIR1/Carrera 1 No. 2-87	BOGOTÁ CRA 11 # 82-76	$ 8.896.940,00	$ -	$ 8.896.940,00
									VALOR TOTAL NIC 1109358			$ 8.896.940,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	1264255	AP Comerciales Nivel 2	1264255385	20210303	20210309	CARIBE ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL	ZARAGOCILLA	CR/50No.29-35/ APTO 3/ESE HSPTL UNIVERSITA CARIBE	CRA/50No.29-35//HOSPITAL UNIVERSIT DE CARTAG	$ 7.192.640,00	$ 6.748.365,54	$ 444.274,46
2			1264255386	20210404	20210410					$ 8.646.640,00	$ -	$ 8.646.640,00
3			1264255388	20210601	20210607					$ 9.680.220,00	$ -	$ 9.680.220,00
									VALOR TOTAL NIC 1264255			$ 18.771.134,46

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	1286769	AP Comerciales Nivel 2	1286769013	20231230	20240110	CONSTRUCTORA BOLIVAR	URB. CIUDADELA DEL BICENTENARIO	SECTOR/ETAPA 3No.MZ 22-1/ INT TOT/MACROMEDIDA	SECTOR/ETAPA 3No.MZ 22-1/ INT TOT/MACROMEDIDA	$ 7.977.390,00	$ -	$ 7.977.390,00
									VALOR TOTAL NIC 1286769			$ 7.977.390,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	4317989	AP Comerciales Nivel 2	4317989290	20230228	20230308	HOTEL PELICANOS DEL MAR	BOCA CANOA	CARRT/ANILLO VIAL No. KM 25-3// BOCACANOA	CARRT/ANILLO VIAL No. KM 25-3//	$ 6.849.210,00	$ -	$ 6.849.210,00
									VALOR TOTAL NIC 4317989			$ 6.849.210,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	4899054	AP Comerciales Nivel 2	4899054209	20230317	20230330	SAS MAKRO SUPERMAYORISTA	BUENOS AIRES	CR/59BNo.CL 30D-21/ LOC NREG/MAKRO LOS EJECUTIVOS	CR/59BNo.CLL 30D-21//MAKRO LOS EJECUTIVOS	$ 5.567.528,00	$ 561.370,00	$ 5.006.158,00
2			4899054211	20230413	20230427					$ 5.989.487,00	$ -	$ 5.989.487,00
								VALOR TOTAL NIC 4899054				$ 10.995.645,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	6587631	AP Comerciales Nivel 2	6587631243	20230413	20230421	UNIDAD CLINICA OFTALMOLOGICA DE CARTAGENA	PIE DE LA POPA	CLL/30No.20-71/ LOC NREG/-PIE P	CL/30No.20-71//-PIE P C30 20 71	$ 6.408.310,00	$ 3.381.837,00	$ 3.026.473,00
2			6587631242	20230314	20230323					$ 5.634.240,00	$ 3.259.903,00	$ 2.374.337,00
3			6587631240	20230113	20230124					$ 6.314.620,00	$ 3.734.505,00	$ 2.580.115,00
4			6587631241	20230215	20230223					$ 6.217.370,00	$ 3.542.308,00	$ 2.675.062,00
								VALOR TOTAL NIC 6587631				$ 10.655.987,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	7504204	AP Comerciales Nivel 2	7504204158	20230510	20230529	ZENU S. A. INDUSTRIA DE ALIMENTOS	MAMONAL	CR/56No.KM 9-9/ LOC NRO2/LOGISTICA INTEGRAL	LOC 111 ZONA FRANCA LA CANDELARIA	$ 9.542.081,00	$ -	$ 9.542.081,00
2			7504204153	20230317	20230330					$ 9.520.563,00	$ -	$ 9.520.563,00
								VALOR TOTAL NIC 7504204				$ 19.062.644,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	7678941	AP Comerciales Nivel 2	7678941101	20230121	20230131	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	EL ESPINAL	CR/13No.31-45/ LOC EPM1/FALABELLA EL CASTILLO	FALABELLA EL CASTILLO	$ 5.177.440,00	$ -	$ 5.177.440,00
2			7678941106	20230413	20230427					$ 5.449.650,00	$ -	$ 5.449.650,00
3			7678941104	20230317	20230330					$ 5.448.770,00	$ -	$ 5.448.770,00
								VALOR TOTAL NIC 7678941				$ 16.075.860,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	7720067	AP Comerciales Nivel 2	7720067103	20230413	20230427	ANDERCOL ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE LA COSTA	MAMONAL	CR/56No.KM-16/ LOC EPM/BAYERN CROPSCIENCE S.A.	12 DE OCTUBRE CL/22No.47//	$ 9.249.395,00	$ -	$ 9.249.395,00
								VALOR TOTAL NIC 7720067				$ 9.249.395,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	7828733	AP Comerciales Nivel 2	7828733076	20230317	20230330	EDIFICIO PLAYA MANZANILLO ARQUITECTURA &	URB. PALMA REAL	SECTOR/1No.PROVISIONA-1/ LOC EMG/HOTEL PLAYA MANZANILLO ESTELAR	URB. NUEVA ANDALUCIA DEL MAR	$ 5.875.933,00	$ -	$ 5.875.933,00
2			7828733080	20230510	20230529					$ 5.816.747,00	$ -	$ 5.816.747,00
3			7828733075	20230317	20230330					$ 5.127.134,00	$ -	$ 5.127.134,00
								VALOR TOTAL NIC 7828733				$ 16.819.814,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	7924146	AP Comerciales Nivel 2	7924146051	20230121	20230131	ROSARIO DE CHALJUB	EL BOSQUE	DG/21No.37-179/ LOC EMG/TELMEX HOGAR	DG/21No.37-179/P 01 APTO 04/	$ 5.873.650,00	$ -	$ 5.873.650,00
2			7924146058	20230510	20230529					$ 5.471.273,00	$ -	$ 5.471.273,00
3			7924146063	20230317	20230330					$ 5.270.675,00	$ -	$ 5.270.675,00
4			7924146054	20230317	20230330					$ 5.969.282,00	$ -	$ 5.969.282,00
5			7924146056	20230413	20230427					$ 6.169.945,00	$ -	$ 6.169.945,00
								VALOR TOTAL NIC 7924146				$ 28.754.825,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	7934123	AP Comerciales Nivel 2	7934123063	20230413	20230427	SYNGENTA S.A.	MAMONAL	CRA/56No.KM-6/ LOC EPSA/ MAMONAL KM 6	CR/56No.KM-6//	$ 6.444.739,00	$ -	$ 6.444.739,00
								VALOR TOTAL NIC 7934123				$ 6.444.739,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	7934131	AP Comerciales Nivel 2	7934131053	20230413	20230427	CARULLA - VIVERO ALMACENES	EL CENTRO	CL/PORTOCARRERONo.10-85/ LOC EMG/CRA 38 # 10-85	CRA 68D No. 21 - 35	$ 5.291.148,00	$ -	$ 5.291.148,00
								VALOR TOTAL NIC 7934131				$ 5.291.148,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	7950969	AP Comerciales Nivel 2	7950969044	20230121	20230131	CARULLA - VIVERO ALMACENES	EL CENTRO	CL/35No.9-41/ LOC EMG/AVENIDA VENEZUELA, CLLE 35 # 9-41	CRA 68D No. 21-35	$ 5.653.040,00	$ -	$ 5.653.040,00
2			7950969047	20230317	20230330					$ 5.148.303,00	$ -	$ 5.148.303,00
3			7950969049	20230413	20230427					$ 5.459.461,00	$ -	$ 5.459.461,00
4			7950969051	20230510	20230529					$ 5.057.859,00	$ -	$ 5.057.859,00
								VALOR TOTAL NIC 7950969				$ 21.318.663,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	7950971	AP Comerciales Nivel 2	7950971046	20230317	20230330	ALMACENES ÉXITO	LA CASTELLANA	CL/31No.69-73/ LOC EMG/CASETA DE VIGILANCIA	CR/51BNo.87-50//	$ 6.407.160,00	$ -	$ 6.407.160,00
2			7950971049	20230413	20230427					$ 7.759.152,00	$ -	$ 7.759.152,00
3			7950971051	20230510	20230529					$ 7.328.770,00	$ -	$ 7.328.770,00
4			7950971044	20230121	20230131					$ 6.975.000,00	$ -	$ 6.975.000,00
5			7950971047	20230317	20230330					$ 7.122.443,00	$ -	$ 7.122.443,00
								VALOR TOTAL NIC 7950971				$ 35.592.525,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	7990243	AP Comerciales Nivel 2	7990243029	20230317	20230330	MATILDE JUAN DE G	TORICES	CR/13BNo.36-5/ LOC EMG/Carrera 13 B No. 26-78 edificio Chambac Sector Papayal	CR/6No.CL 5-15//	$ 5.838.572,00	$ -	$ 5.838.572,00
2			7990243028	20230317	20230330					$ 5.175.256,00	$ -	$ 5.175.256,00
3			7990243031	20230413	20230427					$ 5.760.892,00	$ -	$ 5.760.892,00
4			7990243033	20230510	20230529					$ 5.316.605,00	$ -	$ 5.316.605,00
								VALOR TOTAL NIC 6587631				$ 22.091.325,00
						TOTAL MONTO MAYOR A $ 5´000.000 y MENOR A $ 10´000.000)						$ 268.118.869,22

Anexo 2. AP-DIS-028-2025: Recomendaciones Cartera Fallida N°04

Interventorías de Obras Eléctricas, Consultorías,
Asesorías, Auditorías, Outsourcing, Estudios Técnicos- Administrativos-Financieros

AP DIS-028-2025

Cartagena de Indias, D. T y C, 10 de junio de 2025

Señores
ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA
Atn: Dr. Haroldo Fortich.
Director Secretaría de Hacienda Distrital
Cartagena

Señores
ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA
Atn: Dra. Helina Maria Castro Angulo
Directora División de Impuestos del Distrito de C/gena
Cartagena

Señores
ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA
Atn: Dra. Gina Patricia Vélez Ortiz
Asesor de despacho Servicios Públicos
Ciudad

Asunto: Recomendaciones cartera fallida No. 4

Cordial saludo,

Mediante comunicación No 2025038100024791 de marzo 10 de 2025 y recibida vía mail el 13 de marzo de 2025 Afinia informó que, a 31 de diciembre de 2023, tiene como reporte de cartera fallida del impuesto de alumbrado público la cifra de $ 5.996´409.595, la cual teniendo en cuenta la responsabilidad de facturación y recaudo del impuesto, es responsabilidad del Distrito de Cartagena a través de su Secretaría de Hacienda Distrital, la gestión y consecuente recuperación de dicha cartera.

La interventoría en cumplimiento de sus obligaciones contractuales de seguimiento financiero de los contratos derivados de la operación del alumbrado público realizó un análisis de la cartera reportada,

De acuerdo con lo expuesto, se adjunta relación de (88) usuarios cuya suma total asciende a $ 581.496.474.oo.

Canapote Calle 20 de Julio N° 16-37 Cartagena
Teléfonos: 605 65 24 715 Celufijo 310-650-2676
Correo Electrónico: presidencia@qbm2.com

Es importante recalcar que la denominada cartera fallida fue dada de baja en el sistema comercial de Afinia por lo que se requiere de revisión minuciosa con cada uno de los clientes en mención para que, en caso de encontrarse al día, solicitarle los respectivos soportes y entrar a solicitar a Afinia el traslado de dichos dineros.

De acuerdo con lo expuesto, se le recomienda al Distrito que proceda de manera inmediata a contactar a cada uno de los 888) clientes relacionados en el cuadro que se adjunta, con el propósito de verificar si realizó o no el pago del impuesto y que en caso afirmativo se remita la constancia respectiva para proceder a la gestión ante Afinia de la transferencia de esos recursos, en caso contrario debe la Secretaría de Hacienda adelantar los procesos de cobro respectivos.

La interventoría se compromete a apoyar al Distrito en las gestiones descritas, así como a la remisión del detalle de los clientes faltantes.

Se adjunta cuadro en Excel.

LUIS MIGUEL MEJIA CHAVEZ
Director Interventoría

Copia: Dra. Maria Patricia Porras Mendoza Secretaria General

RELACION CARTERA FALLIDA REPORTADA PORAFINIA CORTE DICIEMBRE 2023 (MAYOR A $ 1´000.000 y MENOR A $ 5´000.000).

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	1008286	AP Comerciales Nivel 2	1008286949	20231228	20240109	CONSTRUCTORA MONSERRATE	20 DE JULIO	CL/SNo.CR 96H 24D/TOTH 1 SEGE 1/CONJUNTO RESIDEN NEW PORT	CL/SNo.96H 120	$ 1.481.470,00	$ -	$ 1.481.470,00
									VALOR TOTAL NIC 1008286			$ 1.481.470,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	1014090	AP Comerciales Nivel 1	1014090928	20230413	20230427	COMERPES COMERCIALIZADORA DE PESQUEROS S. A.	EL BOSQUE	TRV 40 No 19 - 51.	TRV 40 No. 130 - 61.	$ 1.268.016,00	$ -	$ 1.268.016,00
2			1014090926	20230317	20230330					$ 1.094.622,00	$ -	$ 1.094.622,00
3			1014090923	20230121	20230131					$ 1.089.880,00	$ -	$ 1.089.880,00
4			1014090930	20230516	20230529					$ 1.101.699,00	$ -	$ 1.101.699,00
									VALOR TOTAL NIC 1014090			$ 4.484.137,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	1014093	AP Comerciales Nivel 2	1014093925	20230317	20230330	ANTENAS LINE	EL BOSQUE	DG 21 No. 49 - 36	DG 21 No. 49 - 36	$ 2.862.640,00	$ -	$ 2.862.640,00
2			1014093928	20230413	20230427					$ 3.436.880,00	$ -	$ 3.436.880,00
3			1014093923	20230121	20230131					$ 3.160.530,00	$ -	$ 3.160.530,00
4			1014093925	20230317	20230330					$ 3.201.847,00	$ -	$ 3.201.847,00
5			1014093930	20230516	20230529					$ 2.555.210,00	$ -	$ 2.555.210,00
									VALOR TOTAL NIC 1014093			$ 15.217.107,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	1014102	AP Comerciales Nivel 2	1014102930	20230516	20230529	NAUTICO FLUVIAL Y PORTUARIO SENA CENTRO INTERNACIONAL	MAMONAL	CRA 56 Ent 4 - 4. (CENTRO NAUTICO PESQUERO).	CRA 56 Ent 4 - 4.	$ 1.242.565,00	$ -	$ 1.242.565,00
2			1014102928	20230413	20230427					$ 1.457.372,00	$ -	$ 1.457.372,00
3			1014102925	20230317	20230330					$ 1.133.049,00	$ -	$ 1.133.049,00
4			1014102923	20230121	20230131					$ 1.085.020,00	$ -	$ 1.085.020,00
									VALOR TOTAL NIC 1014102			$ 4.918.526,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	1014112	AP Comerciales Nivel 2	1014112935	20230317	20230330	SENA	EL CENTRO	SECTOR PLAZA DE LA ADUANA No. 7 - 57.	SECTOR PLAZA DE LA ADUANA No. 7 - 57.	$ 2.982.995,00	$ -	$ 2.982.995,00
2			1014112923	20230121	20230131					$ 2.400.390,00	$ -	$ 2.400.390,00
3			1014112930	20230516	20230529					$ 2.539.490,00	$ -	$ 2.539.490,00
4			1014112926	20230417	20230506					$ 1.691.049,00	$ -	$ 1.691.049,00
5			1014112928	20230413	20230427					$ 3.008.914,00	$ -	$ 3.008.914,00
									VALOR TOTAL NIC 1014112			$ 13.622.804,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	1014113	AP Comerciales Nivel 2	1014113926	20230317	20230330	SENA	ARMENIA	CLL 31 (AVENIDA PEDRO DE HEREDIA) No. 49 - 134.	SECTOR PLAZA DE LA ADUANA No. 7 - 57.	$ 1.958.331,00	$ -	$ 1.958.331,00
2			1014113930	20230516	20230529					$ 1.616.494,00	$ -	$ 1.616.494,00
3			1014113926	20230317	20230330					$ 1.810.666,00	$ -	$ 1.810.666,00
4			1014113928	20230413	20230427					$ 2.719.845,00	$ -	$ 2.719.845,00
									VALOR TOTAL NIC 1014113			$ 7.254.326,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	1019606	AP Comerciales Nivel 2	1019606000	20251102	20251110	CONSTRUCTORA MARVAL S. A.	EL CAMPESTRE	CLL/14 No. 55A - 247 PROYECTO PUNTA ALTA.	CLL/14 No. 55A - 247 PUNTA ALTA TORRE 2.	$ 1.944.090,00	$ -	$ 1.944.090,00
2			1019606000	20251200	20260110					$ 2.224.510,00	$ -	$ 2.224.510,00
									VALOR TOTAL NIC 1019606			$ 4.168.600,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	1027930	AP Comerciales Nivel 1	1027930000	20251120	20251206	PARQUES BOLIVAR CONSTRUCTORA BOLIVAR	[illegible] DEL [illegible]	SECTOR2 No.MZ 35-50 INT PRIV1/PROVISIO 1Y2 PARQUE	SECTOR2 No. MZ 22-50.	$ 1.420.860,00	$ -	$ 1.420.860,00
2			1027930000	20251229	20260110					$ 1.457.340,00	$ -	$ 1.457.340,00
									VALOR TOTAL NIC 1027930			$ 2.913.200,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	1028522	AP Comerciales Nivel 2	1028522922	20230413	20230427	ROBIN HOOD DEL CSCS	EL BOSQUE	DG 21 No. 59 - 37.	DG 21 No. 59 - 37.	$ 1.300.177,00	$ -	$ 1.300.177,00
2			1028522919	20230317	20230330					$ 1.226.935,00	$ -	$ 1.226.935,00
3			1028522924	20230510	20230529					$ 1.571.413,00	$ -	$ 1.571.413,00
4			1028522920	20230317	20230330					$ 1.345.110,00	$ -	$ 1.345.110,00
									VALOR TOTAL NIC 1028522			$ 5.442.935,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	1028523	AP Comerciales Nivel 2	1028523920	20230317	20230330	ANGELA FONTAVO DE H	LA CONCEPCION	CR/71B No. 318 - 109.	CR/71B No. 318 - 109.	$ 1.694.080,00	$ -	$ 1.694.080,00
2			1028523922	20230413	20230427					$ 1.831.535,00	$ -	$ 1.831.535,00
3			1028523919	20230317	20230330					$ 1.537.173,00	$ -	$ 1.537.173,00
4			1028523924	20230510	20230529					$ 1.651.738,00	$ -	$ 1.651.738,00
5			1028523917	20230121	20230131					$ 1.696.540,00	$ -	$ 1.696.540,00
									VALOR TOTAL NIC 1028523			$ 8.411.939,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	1031625	AP Comerciales Nivel 1	1031625006	20251227	20260105	ALEXA YOHANA VALENCIA	SAN ANTONIO	CL/59C No. 70 - 153.	CL/59C No. 70 - 153.	$ 1.011.870,00	$ -	$ 1.011.870,00
									VALOR TOTAL NIC 1031625			$ 1.011.870,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCION	DIRECCIÓN DE ENVIO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1			1033683029	20230510	20230529					$ 4.396.750,00	$ -	$ 4.396.750,00
2	1033083	AP Comerciales Nivel 2	1033683021	20230413	20230427	PROMOTORA KAIMARI S.A.S.	PONTEZUELA	CRA9 No. CLL 5 - 86 HOTEL EL MELIA KAIMARI.	CRA9 No. CLL 5 - 86 HOTEL EL MELIA KAIMARI.	$ 4.020.195,00	$ -	$ 4.020.195,00
3			1033683018	20230317	20230330					$ 3.914.382,00	$ -	$ 3.914.382,00
4			1033683019	20230317	20230330					$ 4.444.800,00	$ -	$ 4.444.800,00
								VALOR TOTAL NIC 1033083				$ 17.286.133,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCION	DIRECCIÓN DE ENVIO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1			1036809018	20230317	20230330					$ 1.247.216,00	$ -	$ 1.247.216,00
2			1036809019	20230317	20230330	CONJUNTO COMERCIAL SUPERCENTRO LOS EJECUTIVOS	LOS EJECUTIVOS	CL 91No. CL 58 118 (AREA COMUN SUPERCENTRO).	CL 91 No. 67 - 106.	$ 1.340.132,00	$ -	$ 1.340.132,00
3	1036809	AP Comerciales Nivel 1	1036809020	20230510	20230529					$ 1.468.326,00	$ -	$ 1.468.326,00
4			1036809016	20230131	20230131					$ 1.439.146,00	$ -	$ 1.439.146,00
5			1036809021	20230413	20230427					$ 1.382.966,00	$ -	$ 1.382.966,00
								VALOR TOTAL NIC 1036809				$ 8.977.777,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCION	DIRECCIÓN DE ENVIO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1			1050652028	20230510	20230529					$ 1.066.364,00	$ -	$ 1.066.364,00
2			1050652013	20230415	20230427					$ 1.103.725,00	$ -	$ 1.103.725,00
3	1050652	AP Comerciales Nivel 1	1050652016	20230317	20230330	EN ENERGIA SA ESP PROFESIONALES	MANGA	CRA 17 No. CL 28 - 26.	CRA 53 No. 1038 - 42 (PASADENA).	$ 1.121.675,00	$ -	$ 1.121.675,00
4			1050652013	20230317	20230330					$ 1.027.894,00	$ -	$ 1.027.894,00
5			1050652013	20230421	20230131					$ 1.078.356,00	$ -	$ 1.078.356,00
								VALOR TOTAL NIC 1050652				$ 5.486.796,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVIO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1			1063800013	20230317	20230330					$ 1.322.394,00	$ -	$ 1.322.394,00
2	1063800	AP Comerciales Nivel 1	1063800015	20230413	20230427	EN ENERGIA SA ESP PROFESIONALES	CIRESPO	CLL 70 No. 1 - 20.	CRA 53 No. 1038 - 42 (PASADENA).	$ 1.383.300,00	$ -	$ 1.383.300,00
3			1063800017	20230510	20230529					$ 1.280.140,00	$ -	$ 1.280.140,00
4			1063800013	20230317	20230330					$ 1.180.786,00	$ -	$ 1.180.786,00
								VALOR TOTAL NIC 1063800				$ 5.148.519,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVIO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1			1075664049	20230731	20230814					$ 1.471.270,00	$ -	$ 1.471.270,00
2	1075964	AP Comerciales Nivel 1	1075664035	20230329	20230410	GUANABANA FIDUCIARIA BOGOTA FIDEICOMISO	VILLA ESTRELLA	CR. 80 CLL 32B - 52S.	CR 90A No. 7TH 54 - 73.	$ 1.040.140,00	$ 1.010.140,00	$ 30.000,00
3			1075664037	20230601	20230630					$ 1.760.980,00	$ -	$ 1.760.980,00
								VALOR TOTAL NIC 1075964				$ 3.212.390,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVIO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	1091744	AP Comerciales Nivel 1	1091744010	20230413	20230427	NFU ENERGY SAS	DANIEL LEMAITRE	CRA 16 No. 65 - 20.	CR 49 No. CL 93B - 145 SABANETA.	$ 1.985.152,00	$ -	$ 1.985.152,00
								VALOR TOTAL NIC 1091744				$ 1.985.152,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCION DE ENVIO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1			1091754007	20230317	20230330					$ 3.972.119,00	$ -	$ 3.972.119,00
2			1091754004	20230121	20230131					$ 2.916.220,00	$ -	$ 2.916.220,00
3	1091754	AP Comerciales Nivel 2	1091754006	20230517	20230530	ALMACENES EXITO	LA CASTELLANA	CL 31 No. 69 - 73	CL 133 No. 67 - 50 (SAN VICENTE).	$ 2.377.627,00	$ -	$ 2.377.627,00
4			1091754009	20230413	20230427					$ 2.984.554,00	$ -	$ 2.984.554,00
5			1091754011	20230610	20230629					$ 3.000.068,00	$ -	$ 3.000.068,00
								VALOR TOTAL NIC 1091754				$ 14.350.588,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCION DE ENVIO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1			1091762007	20230317	20230330					$ 1.200.062,00	$ -	$ 1.200.062,00
2			1091762008	20230517	20230530					$ 1.311.006,00	$ -	$ 1.311.006,00
3	1091762	AP Comerciales Nivel 2	1091762010	20230413	20230427	NEO DOMUS SUCURSAL COLOMBIA	MANZANILLO DEL MAR	TRV 2 No. DG 4 -501 (PROYECTO SERENA DEL MAR).	TRV 2 No. DG 4 -501 (CENTRO HOSPITALARIO SERENA DEL MAR).	$ 1.513.447,00	$ -	$ 1.513.447,00
4			1091762005	20230121	20230131					$ 1.124.990,00	$ -	$ 1.124.990,00
5			1091762012	20230610	20230629					$ 1.601.100,00	$ -	$ 1.601.100,00
								VALOR TOTAL NIC 1091762				$ 8.858.894,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVIO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1			1102386007	20230317	20230330					$ 3.964.814,00	$ -	$ 3.964.814,00
2			1102386006	20230517	20230530	SA COMERCIALIZADORA DE AGREGADOS DEL CARIBE	ARROYOGRANDE	CARRETERA VIA A BARRANQUILLA.	CR 3 No. 46 - 57 EDIF LAGUNA 46 (MARBELLA)	$ 3.646.061,00	$ -	$ 3.646.061,00
3	1102386	AP Comerciales Nivel 2	1102386011	20230610	20230629					$ 3.547.540,00	$ -	$ 3.547.540,00
4			1102386009	20230413	20230427					$ 4.272.123,00	$ -	$ 4.272.123,00
								VALOR TOTAL NIC 1102386				$ 15.430.778,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCION DE ENVIO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1			1109347006	20230317	20230330					$ 1.073.414,00	$ -	$ 1.073.414,00
2	1109347	AP Comerciales Nivel 1	1109347010	20230610	20230629	LCI DEL CARIBE SAS	BOCAGRANDE	CRA 3 No. 8 - 177	CRA 3 No. 8 - 177	$ 1.154.035,00	$ -	$ 1.154.035,00
3			1109347003	20230121	20230131					$ 1.082.520,00	$ -	$ 1.082.520,00
4			1109347005	20230413	20230427					$ 1.227.510,00	$ -	$ 1.227.510,00
								VALOR TOTAL NIC 1109347				$ 4.527.587,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	1109469	AP Comerciales Nivel 2	1109469010	20230510	20230529	CARULLA - VIVERO ALMACENES	URBANIZACION VILLA SANDRA	CL 61 No. 54 - 120 (PASEO LA CASTELLANA)	CRA 68D No. 21 - 35 (BOGOTÁ)	$ 3.071.964,00	$ -	$ 3.071.964,00
2			1109469006	20230817	20230830					$ 2.706.220,00	$ -	$ 2.706.220,00
3			1109469006	20230817	20230830					$ 3.956.008,00	$ -	$ 3.956.008,00
4			1109469003	20230921	20230131					$ 3.256.520,00	$ -	$ 3.256.520,00
5			1109469006	20230413	20230427					$ 3.216.040,00	$ -	$ 3.216.040,00
									VALOR TOTAL NIC 1109469			$ 15.506.752,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	1117623	AP Comerciales Nivel 2	1117623390	20230713	20230731	DILIGENCIA UNION TEMPORAL EDIFICIO [illegible]	EL LAGUITO	CLL 1 No. DG 1A - 33.	CLL 1 No. DG 1A - 33.	$ 1.185.540,00	$ -	$ 1.185.540,00
									VALOR TOTAL NIC 1117623			$ 1.185.540,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	1129392	AP Comerciales Nivel 2	1129392392	20230808	20230814	J. A. SILVAN S EN C	LA BOQUILLA	CRA 9 No. 22 - 629 EDIFICIO SPAGGIA	CRA 9 No. 22 - 629 EDIFICIO SPAGGIA	$ 1.635.610,00	$ -	$ 1.635.610,00
									VALOR TOTAL NIC 1129392			$ 1.635.610,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	1130157	AP Comerciales Nivel 2	1130157365	20231129	20231206	BIENES RECIBIDOS EN PAGO CONAVI	BAYUNCA	LA CORDIALIDAD No. Km 17 - 534	LA CORDIALIDAD No. Km 17 - 534	$ 1.218.380,00	$ -	$ 1.218.380,00
2			1130157357	20231229	20240109					$ 1.347.920,00	$ 10.000,00	$ 1.337.920,00
									VALOR TOTAL NIC 1130157			$ 2.557.300,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	1130761	AP Comerciales Nivel 2	1130761308	20231002	20231009	HOTEL TRES BANDERAS	PUNTA ARENAS	CL 2 No. 6A - 28.	CL 2 No. 6A - 28	$ 1.424.100,00	$ -	$ 1.424.100,00
									VALOR TOTAL NIC 1130761			$ 1.424.100,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	1164934	AP Comerciales Nivel 1	1164934393	20230920	20230927	FLIDA CARDENAS DE	BOCAGRANDE	CL 6 No. CR 3 - 13	CL 6 No. CR 3 - 13	$ 1.445.690,00	$ -	$ 1.445.690,00
									VALOR TOTAL NIC 1164934			$ 1.445.690,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	1166990	AP Comerciales Nivel 1	1166990299	20240109	20240124	UCI DEL CARIBE SAS	BOCAGRANDE	CR 3 No. 8 - 177 MATERNIDAD BOCAGRANDE	CRA 3 No. 8 - 177 MATERNIDAD BOC	$ 1.057.970,00	$ -	$ 1.057.970,00
2			1166990296	20231201	20231214					$ 1.324.290,00	$ -	$ 1.324.290,00
									VALOR TOTAL NIC 1166990			$ 2.382.260,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	1220163	AP Comerciales Nivel 2	1220163307	20231219	20231228	CLINICA GENERAL DEL	LA CASTELLANA	CR 67 No. 91C - 67 // CLINICA DEL	CR 67 No. 91C - 67	$ 4.068.890,00	$ -	$ 4.068.890,00
									VALOR TOTAL NIC 1220163			$ 4.068.890,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	1223112	AP Comerciales Nivel 2	1223112296	20230810	20230817	CLINICA LA NUESTRA CLINICA DEL ROSARIO	LA PROVIDENCIA	TV 71 No. 21-69/ P 1 APTO 2/CLINICA LA NUESTRA ANT EL ROSA	TV 71 No. 21-69/ P 1 APTO 2/	$ 2.770.760,00	$ -	$ 2.770.760,00
									VALOR TOTAL NIC 1223112			$ 2.770.760,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	1254263	AP Comerciales Nivel 1	1254263244	20230810	20230817	GERALD ANTONIO MEZA VALDES	LA PROVIDENCIA	[illegible] 196/URB 238586 000007 DG 92 71A [illegible]	DG 92 No. 71A - 196	$ 1.058.960,00	$ -	$ 1.058.960,00
									VALOR TOTAL NIC 1254263			$ 1.058.960,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	1252868	AP Comerciales Nivel 2	1252868296	20230810	20230825	CLINICA FIDEA IPS SA	AMBIENTES	CRA 41 No. 27 - 92 // CLINICA FIDEA IPS	CRA 41 No. 27 - 92	$ 1.228.970,00	$ -	$ 1.228.970,00
									VALOR TOTAL NIC 1252868			$ 1.228.970,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	1263863	AP Oficiales Nivel 2	1263863379	20230701	20230709	DISTTURIST Y CIA DE CARTAGENA DE INDIAS	EL CENTRO	CL52No.8-13/ DUP 2/PALACIO MUNICIPAL	CL52No.8-13	$ 1.096.760,00	$ -	$ 1.096.760,00
								VALOR TOTAL NIC 1263863				$ 1.096.760,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	1264032	AP Oficiales Nivel 2	1264032341	20230301	20230309	POLICIA NACIONAL	MANGA	CRA 24 No. 25A - 9. DIVISION CANINA POLICIA NACIONAL.	CRA 24 No. 25A - 9. DIVISION CANINA POLICIA NACIONAL.	$ 1.890.470,00	$ 1.879.814,00	$ 11.056,00
2			1264032342	20230402	20230410					$ 2.110.540,00	$ 1.473.477,00	$ 637.155,00
3			1264032345	20230801	20230809					$ 2.218.460,00	$ 2.185.869,00	$ 32.607,00
								VALOR TOTAL NIC 1264032				$ 680.816,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	1264034	AP Oficiales Nivel 2	1264034398	20230701	20230710	POLICIA NACIONAL	MANGA	CL 29 No. CRA 24 - 19 PISO 1 APTO 1 ESTACIÓN MANGA.	CRA 24 No. 25A - 9. DIVISION CANINA POLICIA NACIONAL.	$ 3.976.160,00	$ 3.976.087,00	$ 15,00
2			1264034402	20231025	20231101					$ 3.844.140,00	$ 1.440.643,00	$ 1.683.497,00
3			1264034397	20230825	20230912					$ 3.433.260,00	$ 3.430.361,00	$ 2.899,00
								VALOR TOTAL NIC 1264034				$ 1.686.486,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	1264232	AP Comerciales Nivel 2	1264232338	20230402	20230410	DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO C. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CLINICA	AMBERES	CLL 29 No. 38 - 36. CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO.	CLL 29 No. 38 - 30. CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO.	$ 3.103.000,00	$ -	$ 3.103.000,00
2			1264232341	20230701	20230710					$ 3.340.190,00	$ -	$ 3.340.190,00
3			1264232342	20230801	20230809					$ 2.482.770,00	$ -	$ 2.482.770,00
4			1264232336	20230701	20230709					$ 2.803.970,00	$ -	$ 2.803.970,00
5			1264232343	20230901	20230908					$ 2.543.970,00	$ -	$ 2.543.970,00
6			1264232344	20231002	20231009					$ 2.664.310,00	$ -	$ 2.664.310,00
7			1264232347	20231301	20231314					$ 2.441.280,00	$ -	$ 2.441.280,00
8			1264232330	20240109	20240124					$ 2.825.490,00	$ -	$ 2.825.490,00
9			1264232345	20231101	20231109					$ 2.920.260,00	$ -	$ 2.920.260,00
10			1264232329	20230402	20230409					$ 3.296.330,00	$ -	$ 3.296.330,00
11			1264232340	20230601	20230608					$ 3.644.060,00	$ -	$ 3.644.060,00
								VALOR TOTAL NIC 1264232				$ 31.555.456,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	1264566	AP Industrial Nivel 2	1264566339	20231030	20231107	S.A.S. POLIMIX CONCRETO COLOMBIA	MAMONAL	CR56 No. KM 4 - MZ FRENTE A SENA NAUTICO.	CR56 No. KM 4 - MZ	$ 2.001.220,00	$ -	$ 2.001.220,00
								VALOR TOTAL NIC 1264566				$ 2.001.220,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	1264566	AP Comerciales Nivel 1	1264566335	20230425	20230502	CI ASTURIANA LTDA	EL PRADO	CR32 No 23 - 7 PESCADERIA ASTURIANA	CR32 No. 23 - 7.	$ 1.065.550,00	$ -	$ 1.065.550,00
2			1264566336	20230522	20230529					$ 1.022.340,00	$ -	$ 1.022.340,00
								VALOR TOTAL NIC 1264566				$ 2.077.890,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	1292731	AP Comerciales Nivel 1	1292731009	20231228	20240109	ETAPA 5 Y 6 UNION TEMPORAL CIUDADELA DE LA PAZ	URBANIZACION CIUDADELA DE LA PAZ	SECTOR 1 MZ F-63	CLL 29 No. 21- 03. SECRETARIA DE DESARROLLO - MANGA.	$ 2.200.140,00	$ -	$ 2.200.140,00
								VALOR TOTAL NIC 1292731				$ 2.200.140,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	4317989	AP Comerciales Nivel 2	4317989292	20230429	20230427	HOTEL PELICANOS DEL MAR	BOCAGRANDE	CARRETERA ANILLO VIAL No. KM 25 - 3 BOCAGRANDE	CARRETERA ANILLO VIAL No. KM 25 - 3.	$ 1.093.300,00	$ -	$ 1.093.300,00
								VALOR TOTAL NIC 4317989				$ 1.093.300,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	4890944	AP Comerciales Nivel 2	4890944221	20230317	20230330	ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA	CASTILLOGRANDE	CRA 14 No. CLL 6 - 60 CLUB NAVAL CRA 15 CLL 16	CRA 2 No. 19 - 1 BASE NAVAL BOCAGRANDE	$ 2.153.546,00	$ -	$ 2.153.546,00
2			4890944219	20230121	20230131					$ 2.496.130,00	$ -	$ 2.496.130,00
3			4890944222	20230317	20230330					$ 2.227.857,00	$ -	$ 2.227.857,00
4			4890944224	20230413	20230427					$ 2.636.771,00	$ -	$ 2.636.771,00
								VALOR TOTAL NIC 4890944				$ 9.513.304,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	4890218	AP Comerciales Nivel 2	4890218282	20230313	20230325	CODEGAN CARTAGENA	BOSQUE SECTOR CARTAGENA	DG 21 No. 21 - 86.	DG 21 No. 21 - 86.	$ 3.111.200,00	$ -	$ 3.111.200,00
								VALOR TOTAL NIC 4890218				$ 3.111.200,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	4800869	AP Industriales Nivel 2	4800869764	20230919	20230929	SASAGRINAL COLOMBIA	EL BOSQUE	TRV 54No. 22 - 36.	TRV 54 No. 22 - 36	$ 3.987.932,00	$ -	$ 3.987.932,00
									VALOR TOTAL NIC 4800869			$ 3.987.932,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	6526727	AP Comerciales Nivel 2	6526727344	20231208	20240109	EDIFICIO GRAND BAY	BOCAGRANDE	CR 6 No. 5A - 24 PISO 1.	CR 6 No. 5A - 24 PISO 1.	$ 1.982.810,00	$ -	$ 1.982.810,00
									VALOR TOTAL NIC 6526727			$ 1.982.810,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	6569444	AP Oficiales Nivel 2	6569444268	20240109	20240124	GOBERNACION DE BOLIVAR DEPARTAMENTO	EL CENTRO	CL 34 No. 4 - 50 PALACIO DE PROCLAMACION.	VILLA CADIZ SECTOR 1 EDIFICIO DE LA GOBERNACION	$ 1.627.940,00	$ -	$ 1.627.940,00
									VALOR TOTAL NIC 6569444			$ 1.627.940,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	6593033	AP Comerciales Nivel 1	6593033729	20230802	20230809	CLARA LUZ DIAZ DE MENESES	MANGA	CL 25 No. 25 - 53 EDIFICIO TORRE DEL PUERTO.	CL 20 No. 25 - 17.	$ 1.927.490,00	$ -	$ 1.927.490,00
									VALOR TOTAL NIC 6593033			$ 1.927.490,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	6846250	AP Comerciales Nivel 2	6846250985	20230906	20230914	BANCOLOMBIA EDIFICIO	MANGA	CL 25 No. 25 - 17 EDIFICIO TWINS BAY	CL 25 No. 25 - 17 EDIFICIO TWINS BAY	$ 1.302.760,00	$ -	$ 1.302.760,00
2			6846250986	20230906	20230914					$ 1.285.380,00	$ -	$ 1.285.380,00
									VALOR TOTAL NIC 6846250			$ 2.588.140,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	9648283	AP Comerciales Nivel 2	9648283283	20231003	20231009	SEAWAY 935 CONDO	LA BOQUILLA	CR 9 CL 35 - 154 EDIFICIO SEAWAY	CR 9 No. 13 - 61	$ 3.532.800,00	$ -	$ 3.532.800,00
									VALOR TOTAL NIC 9648283			$ 3.532.800,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	8643614	AP Comerciales Nivel 2	8643614254	20230728	20230804	CENTRO LOGISTIC BLOC 1	BELLAVISTA	CR 30 No. 7C - 59.	CR 30 No. 2F - 35.	$ 1.070.080,00	$ -	$ 1.070.080,00
2			8643614252	20230802	20230809					$ 1.786.340,00	$ -	$ 1.786.340,00
3			8643614256	20231101	20231109					$ 1.601.340,00	$ 1.451.300,00	$ 200.040,00
									VALOR TOTAL NIC 8643614			$ 3.057.030,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	8955270	AP Comerciales Nivel 2	8955270193	20230801	20230808	COMERCIAL LAS RAMBLAS	URB BARCELONA DE INDIAS	SECTOR RAMBLAS CENTRO COMERCIAL.	SECTOR RAMBLAS CENTRO COMERCIAL	$ 1.361.140,00	$ -	$ 1.361.140,00
2			8955270201	20231205	20231214	UNIDAD INMOBILIARIA				$ 1.055.060,00	$ -	$ 1.055.060,00
3			8955270196	20230801	20230808	CERRADA PLAZAS				$ 1.177.300,00	$ -	$ 1.177.300,00
									VALOR TOTAL NIC 8955270			$ 3.593.570,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	7579404	AP Comerciales Nivel 2	7579404137	20230222	20230228	ALMACENES EXITO S.A.	URB BARCELONA DE INDIAS	SECTOR RAMBLAS CENTRO COMERCIAL.	CR 46 No. 359 Ser - 135 LAS VEGAS	$ 1.103.460,00	$ -	$ 1.103.460,00
2			7579404136	20230120	20230130					$ 1.384.200,00	$ -	$ 1.384.200,00
3			7579404138	20230208	20230215					$ 1.781.340,00	$ -	$ 1.781.340,00
									VALOR TOTAL NIC 7579404			$ 3.640.700,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	7584424	AP Comerciales Nivel 1	7584424137	20230113	20230124	S.A. OLIMPICA	EL centro	CRA 2a. No. 35 - 90.	CRA 30 No. 28 - 227 BARRIO ABAJO BQUILLA	$ 1.713.000,00	$ 609.922,00	$ 1.103.458,00
									VALOR TOTAL NIC 7584424			$ 1.103.458,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	7678941	AP Comerciales Nivel 2	7678941101	20230317	20230330	FALABELLA DE COLOMBIA S. A	EL ESPINAL	CLL 13 No. 51 - 45 FALABELLA EL CASTILLO	CLL 13 No. 51 - 45 CCOM EL CASTILLO	$ 4.580.564,00	$ -	$ 4.580.564,00
2			7678941106	20230519	20230529					$ 4.944.906,00	$ -	$ 4.944.906,00
									VALOR TOTAL NIC 7678941			$ 9.525.470,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	7679532	AP Comerciales Nivel 2	7679532088	20230317	20230330	ARCOS DORADOS COLOMBIA SAS	BOCAGRANDE	CR 2 No. 9 - 17.	AV 116 No. 7 - 15 TORRE 1 OF 1401 USAQUEN	$ 1.102.259,00	$ -	$ 1.102.259,00
									VALOR TOTAL NIC 7679532			$ 1.102.259,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	7795746	AP Comerciales Nivel 1	7795746104	20230317	20230330	RCTV LA POPA CONSORCIO INSTROYC SALUM	CERRO LA POPA	CLL 62 No. INVASION 18 CERRO DE LA POPA	CLL 62 No. 4 RCN PISO 1 LOC 1.	$ 1.260.846,00	$ -	$ 1.260.846,00
2			7795746103	20230317	20230330					$ 1.396.068,00	$ -	$ 1.396.068,00
3			7795746106	20230413	20230427					$ 1.683.758,00	$ -	$ 1.683.758,00
4			7795746108	20230519	20230529					$ 1.673.171,00	$ -	$ 1.673.171,00
5			7795746101	20230621	20230703					$ 1.469.210,00	$ -	$ 1.469.210,00
									VALOR TOTAL NIC 7795746			$ 7.743.916,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	7711998	AP Comerciales Nivel 2	7711998117	20231026	20231102	MARDIQUE SAS SOCIEDAD PORTUARIA	ARANCA	CR 7 PUERTO 2 SOCIEDAD PORTUARIA MARDIQUE	CR 7 PUERTO 2 SOCIEDAD PORT MARDIQUE	$ 2.353.120,00	$ -	$ 2.353.120,00
									VALOR TOTAL NIC 7679532			$ 2.353.120,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	7796858	AP Comerciales Nivel 2	7796858104	20230601	20230608	ELITE S.A.S. PROMOTORA	BOCAGRANDE	CR 1 No. 11 - 80 EDIFICIO MURANO	CR 1 No. 11 - 80	$ 1.074.550,00	$ -	$ 1.074.550,00
									VALOR TOTAL NIC 7796858			$ 1.074.550,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	7817065	AP Comerciales Nivel 2	7817065089	20230113	20230124	S. A. OLIMPICA	SAN JOSE DE LOS CAMPANOS	CR 91 No. 31A - 343	Cr 91 No 46-277 CCOM PORTAL DEL PRADO	$ 1.519.590,00	$ 289.930,00	$ 1.238.700,00
									VALOR TOTAL NIC 7817065			$ 1.238.700,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	7871962	AP Comerciales Nivel 2	7871952067	20230317	20230330	COMCEL SA	MARBELLA	CR 3 No. 46B - 60	CL 1 No 1000 NORTE	$ 3.919.010,00	$ -	$ 3.919.010,00
2			7871952066	20230317	20230330					$ 3.432.456,00	$ -	$ 3.432.456,00
3			7871952069	20230413	20230427					$ 3.713.474,00	$ -	$ 3.713.474,00
4			7871952064	20230621	20230703					$ 3.984.850,00	$ -	$ 3.984.850,00
									VALOR TOTAL NIC 7871962			$ 15.049.829,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	7884529	AP Comerciales Nivel 2	7884529066	20230413	20230427	AGUAS DE CARTAGENA AGUACAR S.A.E.S.P.	EL PRADO	DG 23 No. CR 30 - 127.	AV PEDRO DE HEREDIA EDIFICIO INTELIGENTE CHAMBACÚ	$ 1.688.861,00	$ -	$ 1.688.861,00
2			7884529068	20230317	20230330					$ 1.415.913,00	$ -	$ 1.415.913,00
3			7884529065	20230510	20230529					$ 1.504.214,00	$ -	$ 1.504.214,00
4			7884529063	20230317	20230330					$ 1.338.573,00	$ -	$ 1.338.573,00
									VALOR TOTAL NIC 7884529			$ 5.947.561,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	7884530	AP Comerciales Nivel 2	7884530066	20230413	20230427	AGUAS DE CARTAGENA AGUACAR S.A.E.S.P.	URBANIZACION SANTA CLARA	CLL 11 No. 55F - 521 DETRAS DE LA UNI SANTA CLARA.	AV PEDRO DE HEREDIA EDIFICIO INTELIGENTE CHAMBACÚ	$ 3.015.407,00	$ -	$ 3.015.407,00
2			7884530063	20230510	20230529					$ 1.645.586,00	$ -	$ 1.645.586,00
3			7884530064	20230317	20230330					$ 3.338.735,00	$ -	$ 3.338.735,00
4			7884530063	20230317	20230330					$ 2.897.970,00	$ -	$ 2.897.970,00
									VALOR TOTAL NIC 7884530			$ 11.897.698,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	7884531	AP Comerciales Nivel 2	7884531068	20230510	20230529	AGUAS DE CARTAGENA AGUACAR S.A.E.S.P.	CANAPOTE	CRA 4 No. 59 - 16.	AV PEDRO DE HEREDIA EDIFICIO INTELIGENTE CHAMBACÚ	$ 1.928.841,00	$ -	$ 1.928.841,00
2			7884531064	20230317	20230330					$ 2.245.691,00	$ -	$ 2.245.691,00
3			7884531063	20230317	20230330					$ 1.809.712,00	$ -	$ 1.809.712,00
4			7884531066	20230413	20230427					$ 2.231.662,00	$ -	$ 2.231.662,00
									VALOR TOTAL NIC 7884531			$ 8.217.896,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	7684533	AP Comerciales Nivel 2	7684533063	20230317	20230330	AGUAS DE CARTAGENA AQUACARS.A. E.S.P.	URB. SAN PEDRO	TR 54 No. 30B - 1 ESTACION DE BOMBEO SAN PEDRO.	AV PEDRO DE HEREDIA EDIFICIO INTELIGENTE CHAMBACÚ	$ 2.866.491,00	$ -	$ 2.866.491,00
2			7684533064	20230317	20230330					$ 3.009.640,00	$ -	$ 3.009.640,00
3			7684533066	20230510	20230529					$ 2.745.820,00	$ -	$ 2.745.820,00
4			7684533066	20230413	20230427					$ 2.902.567,00	$ -	$ 2.902.567,00
								VALOR TOTAL NIC 7684533				$ 11.164.478,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	7684537	AP Comerciales Nivel 2	7684537063	20230317	20230330	AGUAS DE CARTAGENA AQUACARS.A. E.S.P.	MARTINEZ MARTELO	DG 71 No. 38 - 20.	AV PEDRO DE HEREDIA EDIFICIO INTELIGENTE CHAMBACÚ	$ 2.460.826,00	$ -	$ 2.460.826,00
2			7684537064	20230317	20230330					$ 2.912.155,00	$ -	$ 2.912.155,00
3			7684537066	20230413	20230427					$ 2.768.809,00	$ -	$ 2.768.809,00
4			7684537066	20230510	20230529					$ 2.648.523,00	$ -	$ 2.648.523,00
								VALOR TOTAL NIC 7684537				$ 10.800.313,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	7684549	AP Comerciales Nivel 2	7684549064	20230317	20230330	AGUAS DE CARTAGENA AQUACARS.A. E.S.P.	LA CANDELARIA	CLL 33D No. CR 33 - 244.	AV PEDRO DE HEREDIA EDIFICIO INTELIGENTE CHAMBACÚ	$ 1.539.960,00	$ -	$ 1.539.960,00
2			7684549066	20230413	20230427					$ 1.583.810,00	$ -	$ 1.583.810,00
3			7684549063	20230317	20230330					$ 1.780.495,00	$ -	$ 1.780.495,00
4			7684549066	20230510	20230529					$ 1.437.322,00	$ -	$ 1.437.322,00
								VALOR TOTAL NIC 7684549				$ 6.341.530,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	7684541	AP Comerciales Nivel 2	7684541066	20230413	20230427	AGUAS DE CARTAGENA AQUACARS.A. E.S.P.	OLAYA SECTOR RICAURTE	TR 60 No. 54 - 20 ESTACION DE BOMBEO RICAURTE.	AV PEDRO DE HEREDIA EDIFICIO INTELIGENTE CHAMBACÚ	$ 3.910.396,00	$ -	$ 3.910.396,00
2			7684541068	20230510	20230529					$ 3.912.890,00	$ -	$ 3.912.890,00
3			7684541063	20230317	20230330					$ 3.996.011,00	$ -	$ 3.996.011,00
4			7684541064	20230317	20230330					$ 3.535.071,00	$ -	$ 3.535.071,00
								VALOR TOTAL NIC 7684541				$ 13.354.368,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	7684542	AP Comerciales Nivel 2	7684542068	20230510	20230529	AGUAS DE CARTAGENA AQUACARS.A. E.S.P.	ANILLO VIAL	ANILLO VIAL TANQUE 1	AV PEDRO DE HEREDIA EDIFINTELIGENTE CHAMBACÚ	$ 1.968.358,00	$ -	$ 1.968.358,00
								VALOR TOTAL NIC 7684542				$ 1.968.358,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	7684543	AP Comerciales Nivel 2	7684543064	20230317	20230330	AGUAS DE CARTAGENA AQUACAR S.A. E.S.P.	OLAYA SECTOR 11 DE NOVIEMBRE	CR 54 No. 34 - 23 ESTACIÓN DE BOMBEO TABU.	AV PEDRO DE HEREDIA EDIFICIO INTELIGENTE CHAMBACÚ	$ 2.102.736,00	$ -	$ 2.102.736,00
2			7684543063	20230317	20230330					$ 1.748.715,00	$ -	$ 1.748.715,00
3			7684543066	20230413	20230427					$ 1.667.606,00	$ -	$ 1.667.606,00
4			7684543068	20230510	20230529					$ 1.528.796,00	$ -	$ 1.528.796,00
								VALOR TOTAL NIC 7684543				$ 7.047.756,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCION	DIRECCION DE ENVIO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	7684592	AP Comerciales Nivel 2	7684592067	20230426	20230504	FIDUCIARIA BOGOTA SA	CONJUNTO RESIDENCIAL EL CLUB	DG 38 CR No. 82 - 70 TORRE 1 LA CAROLINA.	TR 54 CLL 39H - 1 TORRE 1	$ 1.276.480,00	$ -	$ 1.276.480,00
2			7684592066	20230329	20230410					$ 1.461.096,00	$ -	$ 1.461.096,00
3			7684592063	20230418	20230428					$ 1.062.436,00	$ -	$ 1.062.436,00
4			7684592065	20230503	20230515					$ 1.333.416,00	$ -	$ 1.333.416,00
5			7684592161	20230804	20230814					$ 1.063.610,00	$ -	$ 1.063.610,00
6			7684592163	20230830	20230906					$ 2.161.776,00	$ -	$ 2.161.776,00
7			7684592064	20230105	20230205					$ 1.730.780,00	$ -	$ 1.730.780,00
8			7684592165	20231030	20231107					$ 1.825.530,00	$ -	$ 1.825.530,00
								VALOR TOTAL NIC 7684592				$ 13.224.156,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	7924133	AP Comerciales Nivel 2	7924133060	20230413	20230427	AGUAS DE CARTAGENA AQUACAR S.A. E.S.P.	PASEO DE BOLIVAR	CLL 41A No. 17 - 182 TANQUE NARIÑO AGUA POTABLE.	AV PEDRO DE HEREDIA EDIFICIO INTELIGENTE CHAMBACÚ	$ 3.572.693,00	$ -	$ 3.572.693,00
2			7924133068	20230510	20230529					$ 3.560.191,00	$ -	$ 3.560.191,00
3			7924133063	20230317	20230330					$ 3.780.861,00	$ -	$ 3.780.861,00
4			7924133064	20230317	20230330					$ 3.926.196,00	$ -	$ 3.926.196,00
								VALOR TOTAL NIC 7924133				$ 14.820.011,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	7924136	AP Comerciales Nivel 2	7924136064	20230317	20230330	FERNAN CABALLERO V	EL CENTRO	CLL DEL CURATO No. 08 - 99.	CLL DEL CURATO No. 08 - 99	$ 2.366.096,00	$ -	$ 2.366.096,00
								VALOR TOTAL NIC 7924136				$ 2.366.096,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	7924158	AP Comerciales Nivel 2	7924158068	20230510	20230529	AGUAS DE CARTAGENA AQUACAR S.A. E.S.P.	NELSON MANDELA (TRUPILLOS)	CLL 25UR No. 89 - 1 ESTACION DE BOMBEO.	AV PEDRO DE HEREDIA EDIFICIO INTELIGENTE CHAMBACÚ	$ 1.093.388,00	$ -	$ 1.093.388,00
2			7924158066	20230413	20230427					$ 1.114.737,00	$ -	$ 1.114.737,00
3			7924158064	20230317	20230330					$ 1.136.613,00	$ -	$ 1.136.613,00
								VALOR TOTAL NIC 7924158				$ 3.344.738,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1			7934126048	20230121	20230131					$ 2.968.000,00	$ -	$ 2.968.000,00
2			7934126053	20230413	20230427	CARULLA - VIVERO ALMACENES	MANGA	CR 29 No. 24A - 117	CR 68D No. 21 - 35 BOGOTÁ	$ 3.006.577,00	$ -	$ 3.006.577,00
3	7934126	AP Comerciales Nivel 2	7934126050	20230317	20230330					$ 2.600.279,00	$ -	$ 2.600.279,00
4			7934126055	20230510	20230529					$ 2.759.692,00	$ -	$ 2.759.692,00
5			7934126051	20230317	20230330					$ 2.996.718,00	$ -	$ 2.996.718,00
								VALOR TOTAL NIC 7934126				$ 14.285.866,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1			7934126050	20230317	20230330					$ 2.864.935,00	$ -	$ 2.864.935,00
2			7934126048	20230121	20230131	CARULLA - VIVERO ALMACENES	URB SANTA LUCIA	CLL 31 No. 09 - 69 CENTRO COMERCIAL SANTA LUCIA	CR 68D No. 21 - 35 BOGOTÁ	$ 3.176.139,00	$ -	$ 3.176.139,00
3	7934129	AP Comerciales Nivel 2	7934126053	20230413	20230427					$ 3.472.071,00	$ -	$ 3.472.071,00
4			7934126054	20230517	20230530					$ 3.182.632,00	$ -	$ 3.182.632,00
5			7934126055	20230510	20230529					$ 3.541.307,00	$ -	$ 3.541.307,00
								VALOR TOTAL NIC 7934129				$ 16.038.273,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1			7934136055	20230510	20230529					$ 4.562.071,00	$ -	$ 4.562.071,00
2			7934136053	20230413	20230427					$ 4.672.225,00	$ -	$ 4.672.225,00
3	7934130	AP Comerciales Nivel 2	7934136048	20230121	20230131	CARULLA - VIVERO ALMACENES	URB VILLA SANDRA	CL 31 No. 64 - 120 PASEO LA CASTELLANA.	CR 68D No. 21 - 35 BOGOTÁ	$ 4.726.760,00	$ -	$ 4.726.760,00
4			7934136050	20230317	20230330					$ 3.997.148,00	$ -	$ 3.997.148,00
5			7934136051	20230317	20230330					$ 4.448.054,00	$ -	$ 4.448.054,00
								VALOR TOTAL NIC 7934130				$ 22.696.240,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1			7934131050	20230317	20230330					$ 4.364.024,00	$ -	$ 4.364.024,00
2	7934131	AP Comerciales Nivel 2	7934131051	20230317	20230330	CARULLA - VIVERO ALMACENES	EL CENTRO	CLL PORTOCARRERO No. 10 - 86.	CR 68D No. 21 - 35 BOGOTÁ	$ 4.687.389,00	$ -	$ 4.687.389,00
3			7934131048	20230121	20230131					$ 4.678.289,00	$ -	$ 4.678.289,00
4			7934131055	20230510	20230529					$ 4.618.056,00	$ -	$ 4.618.056,00
								VALOR TOTAL NIC 7934131				$ 18.346.758,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	7935590	AP Comerciales Nivel 2	7935590064	20231226	20240104	SAS NOM DESARROLLOS	VTE POZON - POLICARPA	VTE POZON - POLICARPA KM12 - 45 PLANTA DE TRITURADOS COLON.	CLL 32 No. 9 - 45 EDF BANCO DEL ESTADO	$ 1.875.220,00	$ -	$ 1.875.220,00
								VALOR TOTAL NIC 7935590				$ 1.875.220,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1			7960960047	20230317	20230330					$ 4.089.794,00	$ -	$ 4.089.794,00
2			7960960048	20230317	20230330	SERVICIOS HOTELEROS DE BOLIVAR LTD	BOCAGRANDE	CR 1 No. 9 - 116.	CR 1 No. 9 - 116.	$ 3.239.256,00	$ -	$ 3.239.256,00
3	7960960	AP Comerciales Nivel 2	7960960049	20230413	20230427					$ 3.501.392,00	$ -	$ 3.501.392,00
4			7960960051	20230510	20230529					$ 4.042.678,00	$ -	$ 4.042.678,00
5			7960960044	20230121	20230131					$ 4.364.720,00	$ -	$ 4.364.720,00
								VALOR TOTAL NIC 7960960				$ 19.237.840,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	7960969	AP Comerciales Nivel 2	7960969046	20230317	20230330	CARULLA - VIVERO ALMACENES	EL CENTRO	CL 35 No. 9 - 41	CR 68D No. 21 - 35 BOGOTÁ	$ 4.507.852,00	$ -	$ 4.507.852,00
								VALOR TOTAL NIC 7960969				$ 4.507.852,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	7960978	AP Comerciales Nivel 1	7960978049	20230413	20230427	BANCO POPULAR	EL CENTRO	AV VENEZUELA No. 8 - 22.	CLL 32 No. 8 - 21	$ 1.078.395,00	$ -	$ 1.078.395,00
								VALOR TOTAL NIC 7960978				$ 1.078.395,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1			7968373049	20230510	20230529					$ 3.717.492,00	$ -	$ 3.717.492,00
2			7968373047	20230413	20230427	ALMACENES ÉXITO SA CC LOS EJECUTIVOS CARTAGENA	LOS EJECUTIVOS	CLL 31 No. 57 - 106.	CLL 31 No. 57 - 106.	$ 4.156.183,00	$ -	$ 4.156.183,00
3	7968373	AP Comerciales Nivel 2	7968373052	20230531	20230331					$ 4.159.660,00	$ -	$ 4.159.660,00
4			7968373044	20230317	20230330					$ 3.334.007,00	$ -	$ 3.334.007,00
5			7968373045	20230317	20230330					$ 3.761.385,00	$ -	$ 3.761.385,00
								VALOR TOTAL NIC 7968373				$ 19.128.727,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1			7968376042	20230121	20230131					$ 2.220.890,00	$ -	$ 2.220.890,00
2			7968376043	20230510	20230529	CARULLA - VIVERO ALMACENES	BOCAGRANDE	CL 15 No. 1 - 28	CR 68D No. 21 - 35 BOGOTÁ	$ 1.901.538,00	$ -	$ 1.901.538,00
3	7968378	AP Comerciales Nivel 1	7968376047	20230413	20230427					$ 2.109.979,00	$ -	$ 2.109.979,00
4			7968376044	20230317	20230330					$ 1.770.423,00	$ -	$ 1.770.423,00
5			7968376045	20230317	20230330					$ 2.016.363,00	$ -	$ 2.016.363,00
								VALOR TOTAL NIC 7968378				$ 10.019.193,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCION	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	7958383	AP Comerciales Nivel 2	7958383645	20230317	20230330	MAGNA SAEN LIQUIDACION PROMOTORA	BOCAGRANDE	CRA.4CL 6 - 29.	CR 41 No. 39 - 48 CENTRO	$ 4.117.137,00	$ -	$ 4.117.137,00
2			7958383644	20230317	20230330					$ 3.400.545,00	$ -	$ 3.400.545,00
3			7958383643	20230410	20230426					$ 4.921.365,00	$ -	$ 4.921.365,00
4			7958383642	20230171	20230131					$ 4.378.500,00	$ -	$ 4.378.500,00
5			7958383647	20230413	20230427					$ 4.302.412,00	$ -	$ 4.302.412,00
									VALOR TOTAL NIC 7958383			$ 20.590.640,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	7979962	AP Comerciales Nivel 2	7979962639	20230317	20230330	JOSEFINA BARRIOS PEREZ	MANGA	CR 27 CLL No. 28 - 35.	CR 27 CLL 28 - 35.	$ 2.493.540,00	$ -	$ 2.493.540,00
2			7979962638	20230317	20230330					$ 2.967.985,00	$ -	$ 2.967.985,00
3			7979962643	20230410	20230426					$ 2.909.038,00	$ -	$ 2.909.038,00
4			7979962630	20230171	20230131					$ 2.301.640,00	$ -	$ 2.301.640,00
5			7979962641	20230413	20230427					$ 2.572.717,00	$ -	$ 2.572.717,00
									VALOR TOTAL NIC 7979962			$ 12.144.423,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	7990239	AP Comerciales Nivel 1	7990739629	20230317	20230330	INDUPOLLO	EL PEGREO	CLL MAMONAL No. SIN No.	CLL MAMONAL No. SIN No.	$ 1.032.202,00	$ -	$ 1.032.202,00
									VALOR TOTAL NIC 7990239			$ 1.032.202,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	7990243	AP Comerciales Nivel 2	7990045625	20230121	20230131	MATILDE JUAN DE D	TORICES	CR 13B No. 35 - 5.	CR 6 No. 5 - 15 BOCAGRANDE	$ 2.216.880,00	$ -	$ 2.216.880,00
									VALOR TOTAL NIC 7990243			$ 2.216.880,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	7990248	AP Comerciales Nivel 2	7990045625	20230121	20230131	JARDIN PLAZA DE SAMO	BELLAVISTA	CLL 9 CR No. 37 - 18	CL 9 No. 3 - 33 PISO 1 LOC 1 BOCAGRANDE	$ 1.159.490,00	$ -	$ 1.159.490,00
									VALOR TOTAL NIC 7990248			$ 1.159.490,00

ITEM	NIC	TARIFA	SIMBOLO VARIABLE	FECHA PUESTA AL COBRO	FECHA VENCIMIENTO	NOMBRE DEL CLIENTE (USUARIO)	BARRIO	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ENVÍO	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	7990294	AP Comerciales Nivel 1	7990294639	20230317	20230330	INTERINDEX S.A.	CHAMBACÚ	CR 13B No. 26 - 76 EDIFICIO INTELIGENTE	CL 12 SUR No. 18 - 168 EL POBLADO.	$ 1.033.955,00	$ -	$ 1.033.955,00
2			7990294625	20230121	20230131					$ 1.025.560,00	$ -	$ 1.025.560,00
3			7990294633	20230410	20230426					$ 1.003.364,00	$ -	$ 1.003.364,00
4			7990294631	20230413	20230427					$ 1.148.480,00	$ -	$ 1.148.480,00
									VALOR TOTAL NIC 7990294			$ 4.210.360,00
									TOTAL MONTO MAYOR A $ 1`000.000 y MENORA $ 5`000.000)			$ 581.408.474,00

Anexo 3. AP-DIS-029-2025: Recomendaciones Cartera Fallida N°05.

Interventorías de Obras Eléctricas, Consultorías,
Asesorías, Auditorías, Outsourcing, Estudios Técnicos- Administrativos-Financieros

AP DIS-029-2025

Cartagena de Indias, D. T y C, 13 de junio de 2025

Señores
ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA
Atn: Dr. Haroldo Fortich.
Director Secretaría de Hacienda Distrital
Cartagena

Señores
ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA
Atn: Dra. Helina Maria Castro Angulo
Directora División de Impuestos del Distrito de C/gena
Cartagena

Señores
ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA
Atn: Dra. Gina Patricia Vélez Ortiz
Asesor de despacho Servicios Públicos
Ciudad

Asunto: Recomendaciones cartera fallida No. 5

Cordial saludo,

Mediante comunicación No 2025038100024791 de marzo 10 de 2025 y recibida vía mail el 13 de marzo de 2025 Afinia informó que, a 31 de diciembre de 2023, tiene como reporte de cartera fallida del impuesto de alumbrado público la cifra de $ 5.996´409.595, la cual teniendo en cuenta la responsabilidad de facturación y recaudo del impuesto, es responsabilidad del Distrito de Cartagena a través de su Secretaría de Hacienda Distrital, la gestión y consecuente recuperación de dicha cartera.

La interventoría en cumplimiento de sus obligaciones contractuales de seguimiento financiero de los contratos derivados de la operación del alumbrado público realizó un análisis de la cartera reportada.

De acuerdo con lo expuesto se adjunta relación de (283282) facturas correspondientes a un apreciable numero de usuarios cuya suma total asciende a $ 2.622.913.240.

Canapote Calle 20 de Julio N° 16-37 Cartagena
Teléfonos: 605 65 24 715 Celufijo 310-650-2676
Correo Electrónico: presidencia@qbm2.com

Es importante recalcar que la denominada cartera fallida fue dada de baja en el sistema comercial de Afinia por lo que se requiere revisión minuciosa con cada una de las facturas en mención para que, en caso de encontrarse al día, solicitar los respectivos soportes y entrar a solicitar al recaudador el traslado de dichos dineros. En el evento de que en la revisión que efectúe el Distrito con los usuarios para verificar si realizó o no el pago resulte positivo debe solicitarse la constancia respectiva para proceder a la gestión ante Afinia de la transferencia de esos recursos. En caso contrario debe la Secretaria de Hacienda adelantar los procesos de cobro respectivos.

La Interventoría se compromete a apoyar al Distrito en lo que este dentro de su competencia.

Se adjunta cuadro en Excel.

LUIS MIGUEL MEJIA CHAVEZ
Director Interventoría

Copia: Dra. Maria Patricia Porras Mendoza Secretaria General

RESUMEN RELACION FACTURAS MENOR M $ 1´000.000 CARTERA FALLIDA CORTE DICIEMBRE 2023					
ITEM	TARIFA	CANT FACTURAS	IMPORTE NETO	IMPORTE A CUENTA (*)	IMPORTE TOTAL
1	AP Comerciales Nivel 1	30985	$ 957.331.730,00	$ 12.292.984,00	$ 945.038.746,00
2	AP Comerciales Nivel 2	428	$ 135.654.012,00	$ 3.457.507,00	$ 132.196.505,00
3	AP Comerciales Nivel 3	4	$ 1.562.325,00	$ -	$ 1.562.325,00
4	AP Industriales Nivel 1	190	$ 14.020.540,00	$ 1.108.963,00	$ 12.911.577,00
5	AP Industriales Nivel 2	111	$ 13.431.850,00	$ 65.000,00	$ 13.366.850,00
6	AP Oficiales Nivel 1	159	$ 20.981.130,00	$ 15.241.227,00	$ 5.739.903,00
7	AP Oficiales Nivel 2	11	$ 6.554.630,00	$ 2.595.507,00	$ 3.959.123,00
8	AP Residenciales Estrato 1	74	$ 341.440,00	$ 12.882,00	$ 328.558,00
9	AP Residenciales Estrato 2	176688	$ 720.607.720,00	$ 3.491.892,00	$ 717.115.828,00
10	AP Residenciales Estrato 3	54049	$ 471.559.670,00	$ 3.692.611,00	$ 467.867.059,00
11	AP Residenciales Estrato 4	12397	$ 157.268.560,00	$ 2.359.565,00	$ 154.908.995,00
12	AP Residenciales Estrato 5	4228	$ 71.416.370,00	$ 892.284,00	$ 70.524.086,00
13	AP Residenciales Estrato 6	3958	$ 98.535.850,00	$ 1.202.165,00	$ 97.333.685,00
TOTAL		283282	$ 2.669.265.827,00	$ 46.412.587,00	$ 2.622.853.240,00

Anexo 4. Acta De Comité #06 - 06/06/2025

QBM2	**ACTA DE COMITÉ DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**	**Versión 4 Vigente desde: 20/02/2023**

Fecha: 06/06/2025	**Lugar:** Oficinas Servicios Públicos - Manga
Hora de Inicio: 09:00 a.m.	**Hora de Finalización:** 10:30 a.m.
Contrato: No. 068 2022 para Distrito Y CT-2022-127001	**Consecutivo Comité:** 05-2025

Participantes:

Contratista, EPM
- Diego Pineda Martínez– Profesional Operaciones Negocios – Unidad Alum Público
- Carlos Andrés Pabón Múnera– Profesional Operaciones Negocios – Unidad Alum Público

Interventora, QBM2 Ingeniería Eléctrica S.A.
- Luis Mejía Chávez – director de interventoría
- Ana Teresa Cortina R – Directora operativa
- Luis Martínez Pardo – Responsable de Modernización y expansión.

Distrito, secretaria general (SG) – Servicios Públicos:
- Gina Patricia Vélez Ortiz– Asesora de Servicios Públicos
- Víctor Elías Raad – Asesor Financiero Externo
- Candelaria Vargas Torres – Asesora Jurídica Externa
- Fabian Gamero Solarte – Ingeniero Asesor Externo
- Valentina Arroyo - Practicante

TEMAS TRATADOS:

Comentarios: Se inicia comité con la revisión de los compromisos pendientes del comité #04 (09/05/2025)

1. **Gestión de Ejecución EPM mayo 2025.**

EPM presenta informe de ejecución de mantenimiento y modernización con corte a abril/25:

- Eficiencia del sistema de alumbrado público: **99.3%.**
- Solicitudes atendidas: **416** en un tiempo promedio de **38.2** horas. Evidenciándose una menor incidencia de fallas respecto a meses anteriores
- El 35.8% de las solicitudes se atendieron en el lapso de las 24 horas.
- El 34.5% de las solicitudes se atendieron en 48 horas, y El 29.7% a 72 horas y más de solución.
- Avance de modernización: **97.72%** del sistema de alumbrado público de la ciudad modernizado. Pendiente por modernizar un **2.28%.** No se evidencia mucho avance ya que las obras ejecutadas en un alto porcentaje han sido por expansión
- Ejecuciones de modernización: Fachada de la alcaldía (14 faroles coloniales a petición de alcaldía), Urbanización Sevillana (pendiente la instalación de tres postes ya que su ubicación está debajo de línea de 220KV, lo cual representa un riesgo eléctrico) r en una condición de riesgo línea de y Av. Santander.
- Otras intervenciones: Bazurto, Vía Troncal del Norte, Paraguay, Av. Del Cabrero.
- En tele gestión, Se han instalado 590 nodos de 600 ofrecidos. Con la aplicación de la tele gestión, se han disminuido las visitas fallidas en campo, al tiempo que las solicitudes. Uno de los beneficios es la optimización operativa.
- Pendiente coordinar reunión de presentación del aplicativo con secretaria general, según disponibilidad
- Se hicieron pruebas de iluminación en Puente Román y Romero Aguirre de Crespo con proyectores RGB dimerizables. No se ha pasado la solicitud de modificación de infraestructura dado que no se tiene la ucap's incorporada al contrato vigente

2. **Requerimientos Varios**

a) Servicios Públicos, invita a reunión virtual concertada con la ANI, lunes 09/06/2025 a las 4:00 pm para tratar el alcance de intervención de la Vía Troncal de Occidente

Página 1 de 6

y permisos de ejecución en esta y otras vías bajo la responsabilidad de la ANI, con requerimientos de alumbrado público.

b) Poste metálico en avanzado estado de deterioro (oxidación) ubicado en Avenida Santander, zona de Las Murallas, se coordina a retiro, por sugerencia de interventoría previniendo riesgo de caída y accidente.
c) Obtención de permiso del IPCC, para el retiro de los postes metálicos e instalación de los postes de fibra, en el sector amurallado de la Av. Santander.
d) Interventoría dio aviso de intervención en anden con posible afectación de las acometidas eléctricas, en la Calle de la Medialuna. EPM, envió a inspección y se evidencio 10 luminarias fuera de servicio, lo cual será coordinado para restablecer operación.
e) Interventoría reporta que, en el alcance del proyecto del Hotel San Francisco, ubicado en Getsemaní sobre la Calle 24 con Cra 8B, se identificó el retiro de tres faroles existentes de alumbrado público y se invita a distrito a generar la consulta para la que se permita la instalación de los tres faroles estilo colonial que armonicen arquitectónicamente con la ornamentación del sector.
f) Pendiente, se reitera a EPM; la posibilidad de reemplazar los brazos de alumbrado público sobre la Avenida Venezuela, desde la Carrera 11 (India Catalina) hasta la Torre del Reloj, que se encuentran en estado de oxidación. Esta acción se haría por mantenimiento.
g) Reforzar iluminación en curva de Ceballos, Corredor de Carga.

3. **Prioridades de ejecución de modernización y expansión junio 2025:**
Teniendo en cuenta que, durante el mes de mayo, se centraron todos los esfuerzos en la intervención de la Av. Santander, postergando la proyección de ejecución descrita en el comité anterior, se le solicita a EPM, aumentar la capacidad del equipo (personal) para dar cumplimiento a las 4.352 ucap's restantes en función al compromiso contractual.
Se sugiere especial atención a los parques de las comunidades y que han sido aprobados mediante las SMI.

4. **Liquidación ucap's del periodo mayo 2025:** Revisión conjunta de QBM2 y EPM, para la determinación de las ucap's a liquidar en el periodo en curso, para soportar facturación de EPM por concepto de modernización.

5. **Avance Compromisos de comité anterior:**
h) EPM, se compromete a presentar las UCAP's correspondientes a: *Murallas etapa 2, *Base del Mástil de iluminación de 24 ms, *Instalación de postes sin incluir sin incluir suministro, Retofil Parque Bolívar, Recuperación estructura ornamental de Plaza del Pozo, de los Coches y Museo Naval.
i) Pendiente entrega de las denuncias de robo de proyectores y rejillas de murallas. Aportarla de soporte a la solicitud de modificación a presentar para liquidación de intervención
j) Seguimiento a documentación de Proyecto Gran Manzana,
k) Con Ciudadela la Paz, Se tiene proyectado hacer levantamiento de los existente y rediseñar el alumbrado público, ya que el estado de la infraestructura actual, no es la mejor

Compromisos	Fecha	Responsable
1. Coordinar reunión de aplicativo de tele gestión, para presentar los beneficios y las rutinas de consulta	15/06/2025	Servicios Públicos
2. Generar la consulta al Proyecto Hotel San Francisco para la instalación de los tres faroles estilo	10/06/2025	Servicios Públicos

colonial que armonicen arquitectónicamente con la ornamentación del sector. Y le sea notificado a EPM, para su ejecución, en caso de ser procedente la acción.		
3. Retiro de poste altamente oxidado en Av. Snatander para eliminar riesgo de caida	10/06/2025	EPM
4. Pendiente de retiro de poste contiguo a Parque Centenario frente al Camellón de los Mártires	15/06/2025	EPM
5. Proyectar y presentar SMI del cambio de brazos en Avenida Venezuela desde la India Catalina hasta la Torres del Reloj	20/06/2025	EPM
6. Manga, Poste #M47 en riego de caída, revisar las acciones con el privado para retiro o reubicación sin afectar la iluminación	20/06/2025	Servicios Públicos
7. Presentar SMI curva de Ceballos, Corredor de Carga, aprovechando mástil de iluminación	30/06/2025	Servicios Públicos
8. Presentar programación de modernización a ejecutar hasta el 14/07/2025	09/06/2025	EPM
9. Liquidación de ucap's de mayo 2025	14/06/2025	QBM2 y EPM
10. Presentación de nuevas ucap's para revisión de la interventoría y aprobación del distrito	30/06/2025	EPM
11. Presentación oficio que autoriza a EPM intervención de alumbrado ornamental	11/06/2025	Servicios Públicos
12. Levantamiento de y diseño de iluminación de Ciudadela La Paz	30/06/2025	EPM
13. Revisión conjunta Centro histórico y Getsemaní	09/06/2025 09:00 a,m.	EPM – QBM – Servicios Públicos
14. Sacar información para nota de prensa: Luminarias, Ahorro, Alcance	13/06/2025	EPM – QBM
15. Presentar Actualización de Inventario, proyectarlo		EPM
16. Reunión con Gerencia de Espacio Publico	13/05/2025 09:00 am	EPM – QBM2 – Servicios Públicos – Gerencia de Espacio Público
17. Compartir relación de requerimientos de iluminación de parques recibidos de reuniones con las comunidades	15/05/2025	Servicios Públicos
18. Plantear rediseño de la iluminación de la Troncal de Occidente, previendo la intervención del Intercambiador Vial	16/05/2025	EPM
19. Liquidación de ucap's de abril 2025	14/05/2025	QBM2 y EPM

GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO - CARTAGENA

ALUMBRADO PÚBLICO



Mercado Bazurto | Vía troncal del norte | Av. Santander | Paraguay



GESTIÓN DEL EJECUCION MODERNIZACIÓN - CARTAGENA

ALUMBRADO PÚBLICO

Fachada de la Alcaldía




Av. Santander | Sevillana





GESTIÓN DEL EJECUCION MODERNIZACIÓN - CARTAGENA

ALUMBRADO PÚBLICO

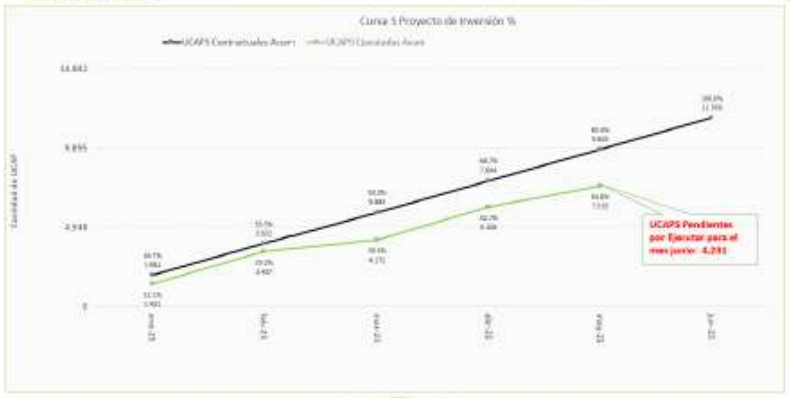


VARIOS - CARTAGENA

ALUMBRADO PÚBLICO

Operación de Telegestión



Registro de asistencia

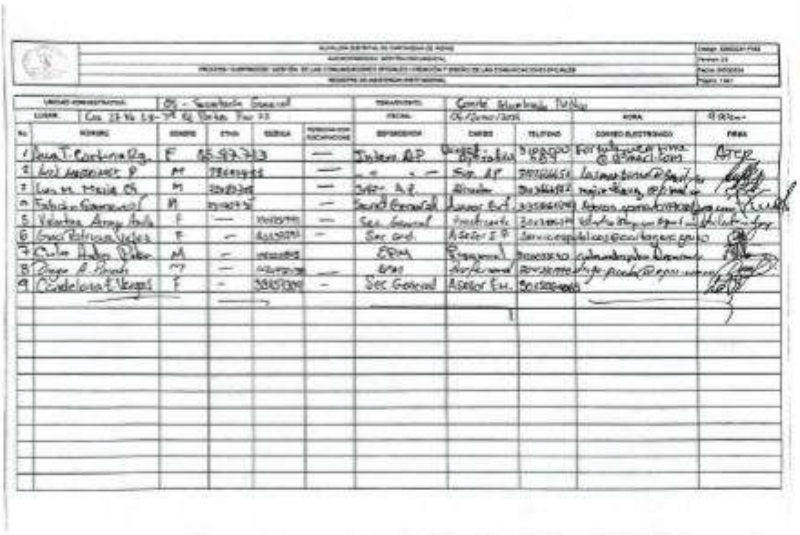

Powered by CamScanner

Anexo 5. Registro Fotográfico De Seguridad Y Área De Trabajo



Intervención en Av. Santander – Con todas las medidas de seguridad y prevención

Anexo 6. Certificado de Aportes y Seguridad Social del Contratista

EL GERENTE GENERAL

20250130079494

CERTIFICA

Que, Empresas Públicas de Medellín E.S.P. ha realizado el pago, de los aportes que corresponden para financiar el sistema de Seguridad Social Integral del periodo de marzo de 2025, definido mediante la ley 100 de 1993, los aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, mediante planillas unificadas N° 9484719063 de Jubilados, N°9485003152 de estudiantes de práctica y N° 9485086558 de Activos, pagadas el 24 de abril de 2025, por intermedio del operador de información Aportes en Línea. Se anexan copias de planillas.

El presente certificado es firmado por el representante legal, dado que Empresas públicas de Medellín E,S,P, por ser una empresa industrial y comercial del Estado, no se encuentra enmarcada dentro de las obligadas por el Código de Comercio para tener Revisor Fiscal.

Este certificado se expide a el 30 de abril de 2025

Atentamente,

JOHN ALBERTO MAYA SALAZAR
Gerente General

JOHN JAIME RODRIGUEZ SOSA
Director Contabilidad y Costos

CAROLINA MARIA URREA ERNOTTE
Jefe (e) Talento Humano

Elaboró: ASTRID VIVIANA TABORDA GAVIRIA.

Por ti, estamos ahí

Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Carrera 58 N° 42-125
Conmutador: 604 380 8080
Medellín - Colombia
www.epm.com.co

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890904996	1	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP	A - 200 O MAS COTIZANTES	ACTIVOS	cra 58 42 125	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3808080	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1430923237	1485086358	E	2025/04/24	2025/04/24	BANCOLOMBIA	0	$25,753,778,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				8,164	$13,756,889,400	$0	$0	$13,756,889,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	528	$783,140,800	$0	$0	$783,140,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5,195	$9,316,990,200	$0	$0	$9,316,990,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	700	$846,936,400	$0	$0	$846,936,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1,399	$2,155,918,500	$0	$0	$2,155,918,500
SKANDIA	230901	800,253,055	2	342	$653,903,500	$0	$0	$653,903,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8,361	$1,777,358,800	$0	$0	$1,777,358,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	8,361	$1,777,358,800	$0	$0	$1,777,358,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				8,165	$3,116,356,600	$0	$0	$3,116,356,600
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	8,155	$3,111,413,900	$0	$0	$3,111,413,900
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	2	$1,418,900	$0	$0	$1,418,900
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	$1,133,300	$0	$0	$1,133,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	5	$2,062,800	$0	$0	$2,062,800
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	$327,700	$0	$0	$327,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 18)				8,611	$5,744,459,600	$0	$0	$5,744,459,600
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	$3,069,800	$0	$0	$3,069,800
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	2	$356,000	$0	$0	$356,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	$5,103,600	$0	$0	$5,103,600
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	11	$4,539,200	$0	$0	$4,539,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	70	$13,911,400	$0	$0	$13,911,400
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN DEPARTAMENTO MEDICO	EAS016	890,904,996	1	767	$595,584,800	$0	$0	$595,584,800
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$178,000	$0	$0	$178,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6,267	$4,458,975,100	$0	$0	$4,458,975,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$2,874,100	$0	$0	$2,874,100
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	17	$12,179,300	$0	$0	$12,179,300
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	$878,200	$0	$0	$878,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	724	$213,179,000	$0	$0	$213,179,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	14	$3,077,700	$0	$0	$3,077,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	292	$138,849,600	$0	$0	$138,849,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	295	$259,101,500	$0	$0	$259,101,500
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	125	$21,508,400	$0	$0	$21,508,400
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	RES011	890,980,040	8	5	$4,214,300	$0	$0	$4,214,300
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	RES008	899,999,063	3	2	$6,879,600	$0	$0	$6,879,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1,310	$815,216,500	$0	$0	$815,216,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1,310	$815,216,500	$0	$0	$815,216,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1,310	$543,497,800	$0	$0	$543,497,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	1,310	$543,497,800	$0	$0	$543,497,800
TOTAL				**8611**	**$25,753,778,700**	**$0**	**$0**	**$25,753,778,700**

Página 1 de 1

2025/04/25 12:07 PM

PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890904996	1	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP	A - 200 O MAS COTIZANTES	ACTIVOS	cra 58 42 125	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3828080	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	1430982868	94850003152	K	2025/04/24	2025/04/24	BANCOLOMBIA	0	$1,496,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				57	$1,496,700	$0	$0	$1,496,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	57	$1,496,700	$0	$0	$1,496,700
TOTAL				**57**	**$1,496,700**	**$0**	**$0**	**$1,496,700**

Página 1 de 1

2025/04/25 12:13 PM

Anexo 7. Solicitud de Modificación Socorro, Plan 500B Mz. 76 A 80

epm

Solicitud de modificación de infraestructura para reparación de daños
Alumbrado Público


Información de la solicitud

N° Solicitud Usuario:	1043933	Fecha de Solicitud Cliente:	
Dirección:	SMI Parque Barrio El Socorro Plan 500 B Mzs 76 a 80	RADICADO EPM:	
Solicitante:		Teléfono contacto:	

Información visita

Por solicitud de la comunidad, se encuentra sector oscuro por deficiencia y/o ausencia de luminarias, se realiza esta solicitud de modificación de infraestructura para garantizar un servicio de alumbrado público de calidad y mejorar las condiciones de seguridad.

Imágenes del sitio

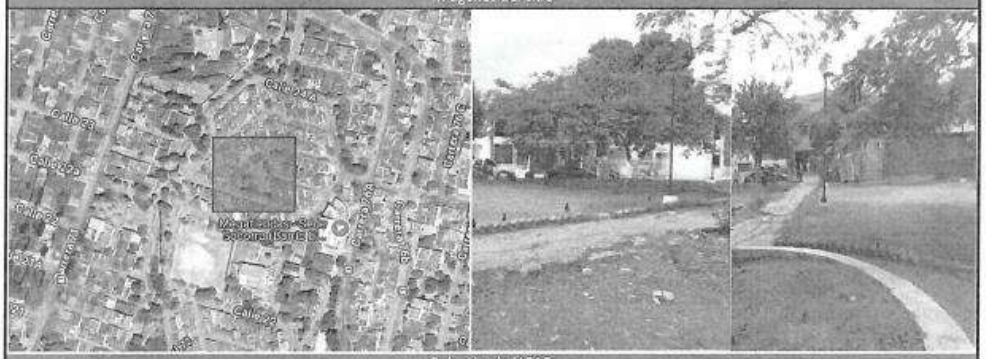

Relación de UCAP

Descripcion UCAP	Factor equivalencia	Unidad	Cantidad	Total UCAP
Luminaria LED M4-1/M4-2 (40W)	1,000	Un	9	9,000
Luminaria LED M4-1/M4-2 (45W)	1,000	Un	1	1,000
Brazo 1500 mm x 1"	0,287	Un	1	0,287
Fotocontrol Larga Vida Individual =Ip65 105-305V 1000W 1800Va	0,039	Un	10	0,394
Desmonte de poste metalico de 3,5m a 9m	0,878	Un	4	3,512
Cable 3x8 AWG XLPE 600V THHN	0,022	ml	150	3,336
Electrodo de puesta a Tierra	0,124	Un	1	0,124
Tablero 2 Ctos + Temporizado + Protecciones	1,380	Un	1	1,380
Luminaria/Proyector 70W	0,000	Un	-12	0,000
			Total UCAP	19,032

Concepto de aprobación de la interventoría

Vo.bo. Interventoría	Observaciones Interventoría:
Fecha concepto aprobación: 21/05/2025	Validado para ejecución, dado que el parque no ha sido modernizado y el estado de la ilumina-nación es deficiente.
Nombre: Luis Miguel Mejía Chávez	
Cargo: Director de Interventoria	
Firma:	ATCR

Aprobación Distrito

Vo.bo. Distrito	Observaciones Distrito:
Fecha aprobación: 21-05-2025	
Nombre: Maria Patricia Porra	
Cargo: Sec General	
Firma:	

Anexo 8. Solicitud De Modificación Vicente Martínez Martelo, Pie De La Popa

epm

Solicitud de modificación de infraestructura para reparación de daños
Alumbrado Público

Información de la solicitud

N° Solicitud Usuario:	10604l7	Fecha de Solicitud Cliente:	
Dirección:	SMI Modernización Vicente Martínez-Pie de la popa	RADICADO EPM:	
Solicitante:		Teléfono contacto:	

Información visita

Por solicitud de la comunidad, se encuentra sector oscuro por deficiencia y/o ausencia de luminarias, se realiza esta solicitud de modificación de infraestructura para garantizar un servicio de alumbrado público de calidad y mejorar las condiciones de seguridad.

Imagenes del sitio



Relación de UCAP

Descripción UCAP	Factor equivalencia	Unidad	Cantidad	Total UCAP
Luminaria LED M4-1/M4-2 (40W)	1,000	Un	4	4,000
Luminaria LED M4-1/M4-2 (45W)	1,000	Un	1	1,000
Brazo 1500 mm x 1"	0,287	Un	1	0,287
Fotocontrol Larga Vida Individual =Ip65 105-305V 1000W 1800Va	0,039	Un	5	0,197
Desmonte de poste metalico de 3,5m a 9m	0,878	Un	2	1,756
Cable 3x8 AWG XLPE 600V THHN	0,022	ml	40	0,890
Electrodo de puesta a Tierra	0,124	Un	2	0,248
Tablero 2 Ctos + Temporizado + Protecciones	1,380	Un	1	1,380
Luminaria/Proyector 40W	0,000	Un	-6	0,000
			Total UCAP	9,757

Concepto de aprobación de la Interventoría

Vo.bo. Interventoría	Observaciones Interventoría:
Fecha concepto aprobación: 21/05/2025	Validado para ejecución, dando cumplimiento a compromiso adquirido con distrito y consignado en comite de seguimiento del 09/05/2025.
Nombre: Luis Miguel Mejía Chávez	
Cargo: Director de Interventoria	
Firma:	ATCR

Aprobación Distrito

Vo.bo. Distrito	Observaciones Distrito:
Fecha aprobación: 21-05-2025	
Nombre: Mario Palacio Portal	
Cargo: Sec General	
Firma:	

Anexo 9. Solicitud de Modificación Refuerzos Barrio Andalucía

epm

Solicitud de modificación de infraestructura para reparación de daños
Alumbrado Público


Información de la solicitud

N° Solicitud Usuario:	1060414	Fecha de Solicitud Cliente:	28/04/2025
Dirección:	SMI Refuerzos Barrio Andalucía	RADICADO EPM:	
Solicitante:		Teléfono contacto:	

Información visita

Por solicitud de la comunidad, se encuentra sector oscuro por deficiencia y/o ausencia de luminarias, se realiza esta solicitud de modificación de infraestructura para garantizar un servicio de alumbrado público de calidad y mejorar las condiciones de seguridad.

Imágenes del sitio

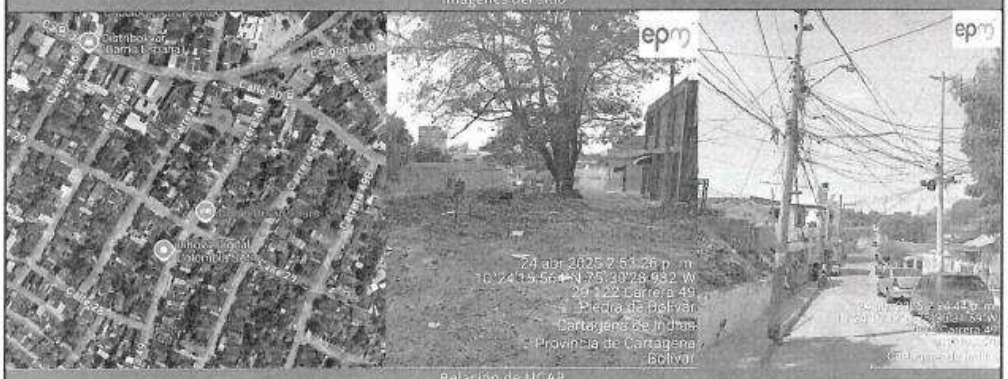

Relación de UCAP

Descripción UCAP	Factor equivalencia	Unidad	Cantidad	Total UCAP
Luminaria LED M4-1/M4-2 (45W)	1,000	Un	8	8,000
Brazo 1500 mm x 1"	0,287	Un	8	2,296
Poste 8 PRFV 510 kgf	1,541	Un	2	3,082
Cable 3x14 THHW	0,010	ml	120	1,238
Adecuacion Secundaria	0,117	Un	4	0,468
Fotocontrol Larga Vida Individual =Ip65 105-305V 1000W 1800Va	0,039	Un	8	0,315
				15,399

Concepto de aprobación de la interventoría

Vo.bo. Interventoría	Observaciones Interventoría:
Fecha concepto aprobación: 21/05/2025	Validado para ejecución, una vez verificado la necesidad de reforzar iluminación de la calle.
Nombre: Luis Miguel Mejía Chávez	
Cargo: Director de Interventoría	
Firma:	ATCR

Aprobación Distrito

Vo.bo. Distrito	Observaciones Distrito:
Fecha aprobación: 21-05-2025	
Nombre: María Fabiola Parra	
Cargo: Sec General	
Firma:	

Anexo 10. Solicitud de Modificación Parque Mirador Alto Bosque Trv. 53B (Escaleras)

epm

Solicitud de modificación de infraestructura para reparación de daños
Alumbrado Público

Información de la solicitud

N° Solicitud Usuario:	1060410	Fecha de Solicitud Cliente:	
Dirección:	SMI parque mirador del Alto Bosque-Transversal 53 B parque mirador en las escaleras	RADICADO EPM:	
Solicitante:		Teléfono contacto:	

Información visita

Por solicitud de la comunidad, se encuentra sector oscuro por deficiencia y/o ausencia de luminarias, se realiza esta solicitud de modificación de infraestructura para garantizar un servicio de alumbrado público de calidad y mejorar las condiciones de seguridad.

Imagenes del sitio







Relación de UCAP

Descripción UCAP	Factor equivalencia	Unidad	Cantidad	Total UCAP
Luminaria LED M4-1/M4-2 (40W)	1,000	Un	5	5,000
Fotocontrol Larga Vida Individual =Ip65 105-305V 1000W 1800Va	0,039	Un	5	0,197
Poste Metalico 2" 4M (Incluye Cimentacion)	2,000	Un	1	2,000
Cable 3x8 AWG XLPE 600V THHN	0,022	ml	50	1,112
Electrodo de puesta a Tierra	0,124	Un	1	0,124
Tablero 2 Ctos + Temporizado + Protecciones	1,380	Un	1	1,380
Luminaria/Proyector 40W	0,000	Un	-3	0,000
			Total UCAP	9,813

Concepto de aprobación de la Interventoría

Vo.bo. Interventoría Fecha concepto aprobación: 21/05/2025 Nombre: Luis Miguel Mejía Chávez Cargo: Director de Interventoría Firma:	Observaciones Interventoría: Validado para ejecución, dado que esa zona carece de iluminación y es un riesgo para vecinos ATCR

Aprobación Distrito

Vo.bo. Distrito Fecha aprobación: 21-05-2025 Nombre: María Patricia Flores Cargo: Sec. General Firma:	Observaciones Distrito:

VF

Anexo 11. Solicitud De Modificación Refuerzos Antonio José De Sucre, Sector La Ceiba.

epm

Solicitud de modificación de infraestructura para reparación de daños
Alumbrado Público


Información de la solicitud

N° Solicitud Usuario:	1060397	Fecha de Solicitud Cliente:	
Dirección:	SMI Sector La Ceiba Barrio San Antonio José de Sucre	RADICADO EPM:	
Solicitante:		Teléfono contacto:	

Información visita

Por solicitud de la comunidad, se encuentra sector oscuro por deficiencia y/o ausencia de luminarias, se realiza esta solicitud de modificación de infraestructura para garantizar un servicio de alumbrado público de calidad y mejorar las condiciones de seguridad.

Imagenes del sitio

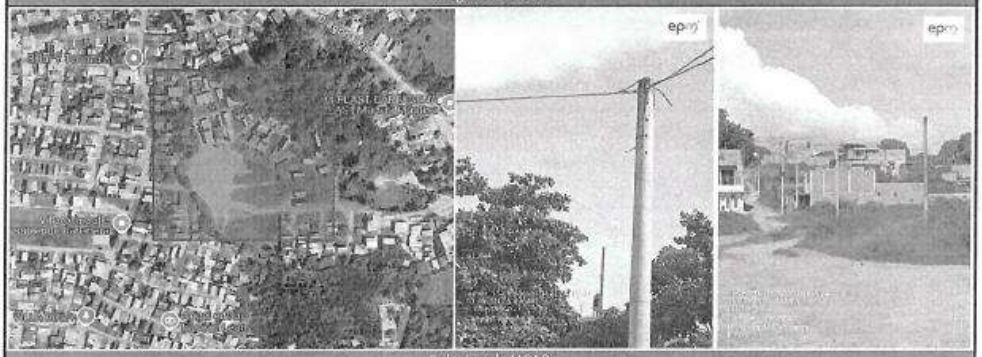

Relacion de UCAP

Descripcion UCAP	Factor equivalencia	Unidad	Cantidad	Total UCAP
Luminaria LED M4-1/M4-2 (45W)	1,000	Un	14	14,0
Brazo 1500 mm x 1"	0,287	Un	14	4,0
Fotocontrol Larga Vida Individual =Ip65 105-305V 1000W 1800Va	0,039	14,000	14	0,6
Poste 8 PRFV 510 kgf	1,541	Un	3	4,6
Cable 3x14 THHW	0,010	ml	90	0,9
Adecuacion Secundaria	0,117	Un	3	0,4
			Total UCAP	24,472

Concepto de aprobacion de la interventoria

Vo.bo. Interventoria Fecha concepto aprobación:21/05/2025 Nombre: Luis Miguel Mejía Chávez Cargo: Director de Interventoria Firma:	Observaciones Interventoria: Validado para ejecución, tras verficiación de disponibilidad de redes eléctricas normalizadas en el sector. La presente SMI, amplia el alcance de cobertura de la solicitud presentada por EPM SS894669 (aun no ejecutada), el pasado 23/09/2024. ATCe

Aprobación Distrito

Vo.bo. Distrito Fecha aprobación: 21-05-2025 Nombre: María Fabiola Ferro Cargo: Sec General Firma:	Observaciones Distrito:

Anexo 12. Solicitud de Modificación Barrio La Paz, Sector Laureles Cra 32-69

epm

Solicitud de modificación de infraestructura para reparación de daños
Alumbrado Público

Información de la solicitud

N° Solicitud Usuario:	1060368	Fecha de Solicitud Cliente:	28/04/2025
Dirección:	SMI Barrio la paz sector Laureles Cra 32-6	RADICADO EPM:	
Solicitante:		Teléfono contacto:	

Información visita

Por solicitud de la comunidad, se encuentra sector oscuro por deficiencia y/o ausencia de luminarias. se realiza esta solicitud de modificación de infraestructura para garantizar un servicio de alumbrado público de calidad y mejorar las condiciones de seguridad.

Imágenes del sitio



Relación de UCAP

Descripcion UCAP	Factor equivalencia	Unidad	Cantidad	Total UCAP
Luminaria LED M4-1/M4-2 (45W)	1,000	Un	5	5,000
Brazo 400 mm x 1"	0,233	Un	5	1,165
Fotocontrol Larga Vida Individual =Ip65 105-305V 1000W 1800Va	0,039	Un	5	0,197
				6,362

Concepto de aprobación de la Interventoría

Vo.bo. Interventoría	Observaciones Interventoría:
Fecha concepto aprobación: 21/05/2025	Validado para ejecución tras verficiación de disponibilidad en el sector de redes eléctricas normalizadas por Afinia.
Nombre: Luis Miguel Mejía Chávez	la presente SMI complementa la SS894680 (30/09/2024)
Cargo: Director de Interventoria	
Firma:	ATCe

Aprobación Distrito

Vo.bo. Distrito	Observaciones Distrito:
Fecha aprobación: 21-05-2025	
Nombre: Alexia Patricia Torres	
Cargo: Sec General	
Firma:	

Anexo 13. Solicitud de Modificación Refuerzos Parque de Chiquinquirá

epm

Solicitud de modificación de infraestructura para reparación de daños
Alumbrado Público

Información de la solicitud

N° Solicitud Usuario:	1060345	Fecha de Solicitud Cliente:	28/04/2025
Dirección:	SMI Refuerzo parque Chiquinquira	RADICADO EPM:	
Solicitante:		Teléfono contacto:	

Información visita

Por solicitud de la comunidad, se encuentra sector oscuro por deficiencia y/o ausencia de luminarias, se realiza esta solicitud de modificación de infraestructura para garantizar un servicio de alumbrado público de calidad y mejorar las condiciones de seguridad.

Imagenes del sitio



Relación de UCAP

Descripción UCAP	Factor equivalencia	Unidad	Cantidad	Total UCAP
Luminaria LED M4-1/M4-2 (40W)	1,000	Un	2	2,000
Poste Metalico 2" 4M (Incluye Cimentacion)	2,000	Un	2	4,000
Desmonte de poste metalico de 3,5m a 9m	0,878	Un	4	3,512
Cable 3x8 AWG XLPE 600V THHN	0,022	ml	25	0,556
Electrodo de puesta a Tierra	0,124	Un	2	0,248
Caja de inspeccion 50x50	0,940	Un	2	1,880
Tablero 2 Ctos + Temporizado + Protecciones	1,380	Un	1	1,380
Fotocontrol Larga Vida Individual =Ip65 105-305V 1000W 1800Va	0,039	Un	2	0,079
Luminaria/Proyector 70W	0,000	Un	4	0,000
				13,654

Concepto de aprobación de la Interventoría

Vo.bo. Interventoría	Observaciones Interventoría:
Fecha concepto aprobación: 21/05/2025	Validado para ejecución, toda vez que el parque continúa con luminarias de sodio en mal estado.
Nombre: Luis Miguel Mejía Chávez	
Cargo: Director de Interventoria	
Firma:	ATCR

Aprobación Distrito

Vo.bo. Distrito	Observaciones Distrito:
Fecha aprobación: 21-05-2025	
Nombre: Maria Patricia Rojas	
Cargo: Sec General	
Firma:	

Anexo 14. Solicitud de Modificación Ceballos, Sector Nuevo Oriente

epm

Solicitud de modificación de infraestructura para reparación de daños
Alumbrado Público


Información de la solicitud

N° Solicitud Usuario:	1060357	Fecha de Solicitud Cliente:	
Dirección:	SMI Ceballos sector Nuevo Oriente	RADICADO EPM:	
Solicitante:		Teléfono contacto:	

Información visita

Por solicitud de la comunidad, se encuentra sector oscuro por deficiencia y/o ausencia de luminarias, se realiza esta solicitud de modificación de infraestructura para garantizar un servicio de alumbrado público de calidad y mejorar las condiciones de seguridad.

Imágenes del sitio

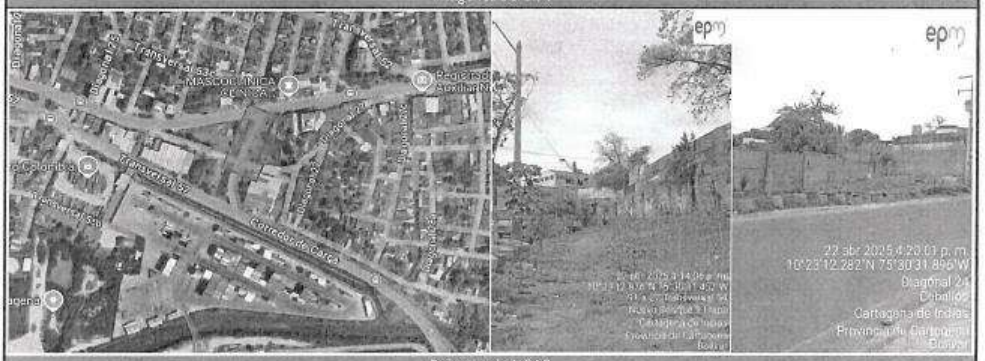

Relación de UCAP

Descripción UCAP	Factor equivalencia	Unidad	Cantidad	Total UCAP
Luminaria LED M3-1/M3-2 (64W)	1,364	Un	3	4,092
Brazo 1500 mm x 1"	0,287	Un	3	0,861
Fotocontrol Larga Vida Individual =Ip65 105-305V 1000W 1800Va	0,039	Un	3	0,118
Poste 8 PRFV 510 kgf	1,541	Un	1	1,541
Cable 3x14 THHW	0,010	ml	20	0,206
			Total UCAP	6,819

Concepto de aprobación de la Interventoría

Vo.bo. Interventoría	Observaciones Interventoría:
Fecha concepto aprobación: 21/05/2025	Validada ejecución, una vez recuperado espacio público, reforzando iluminación y aportando seguridad al tramo que conecta transversal 54 con corredor de carga.
Nombre: Luis Miguel Mejía Chávez	
Cargo: Director de Interventoria	
Firma:	ATCR

Aprobación Distrito

Vo.bo. Distrito	Observaciones Distrito:
Fecha aprobación: 21-05-2025	
Nombre: Maria Fabiola Perez	
Cargo: Sec General	
Firma:	

VR

Anexo 15. Solicitud de Modificación Pie De La Popa, Sector El Toril

epm

Solicitud de modificación de infraestructura para reparación de daños
Alumbrado Público

Información de la solicitud

N° Solicitud Usuario:	1060337	Fecha de Solicitud Cliente:	
Dirección:	SMI Pie de la Popa Sector el Toril	RADICADO EPM:	
Solicitante:		Teléfono contacto:	

Información visita

Por solicitud de la comunidad, se encuentra sector oscuro por deficiencia y/o ausencia de luminarias, se realiza esta solicitud de modificación de infraestructura para garantizar un servicio de alumbrado público de calidad y mejorar las condiciones de seguridad.

Imágenes del sitio



Relación de UCAP

Descripción UCAP	Factor equivalencia	Unidad	Cantidad	Total UCAP
Luminaria LED M4-1/M4-2 (45W)	1,000	Un	1	1,0
Brazo 1500 mm x 1"	0,287	Un	1	0,3
Fotocontrol Larga Vida Individual =Ip65 105-305V 1000W 1800Va	0,039	Un	1	0,0
Poste 8 PRFV 510 kgf	1,541	Un	1	1,5
Cable 3x14 THHW	0,010	ml	20	0,2
Adecuacion Secundaria	0,117	Un	1	0,1
			Total UCAP	3,191

Concepto de aprobación de la interventoría

Vo.bo. Interventoría Fecha concepto aprobación: 21/05/2025 Nombre: Luis Miguel Mejía Chávez Cargo: Director de Interventoria Firma:	Observaciones Interventoría: Validado para ejecución, una vez verificado la necesidad de reforzar iluminación de la calle. ATCR

Aprobación Distrito

Vo.bo. Distrito Fecha aprobación: 21-05-2025 Nombre: [illegible] Cargo: [illegible] Firma:	Observaciones Distrito:

VP

Anexo 16. Solicitud de Modificación Refuerzo Caño Lo Amador

epm

Solicitud de modificación de infraestructura para reparación de daños
Alumbrado Público

Información de la solicitud

N° Solicitud Usuario:	1060332	Fecha de Solicitud Cliente:	28/04/2025
Dirección:	SMI Caño Lo Amador	RADICADO EPM:	
Solicitante:		Teléfono contacto:	

Información visita

Por solicitud de la comunidad, se encuentra sector oscuro por deficiencia y/o ausencia de luminarias, se realiza esta solicitud de modificación de infraestructura para garantizar un servicio de alumbrado público de calidad y mejorar las condiciones de seguridad.

Imágenes del sitio





Relación de UCAP

Descripción UCAP	Factor equivalencia	Unidad	Cantidad	Total UCAP
Luminaria Escenario C1 (212W M)	5,223	Un	2	10,446
Fotocontrol Larga Vida Individual =Ip65 105-305V 1000W 1800Va	0,039	Un	2	0,079
				10,525

Concepto de aprobación de la Interventoría

Vo.bo. Interventoría
Fecha concepto aprobación: 21/05/2025
Nombre: Luis Miguel Mejía Chávez
Cargo: Director de Interventoría
Firma:

Observaciones Interventoría:
Validada intervención. Ejecutada en abril/2025 con prioridad, desde distrito

ATCR

Aprobación Distrito

Vo.bo. Distrito
Fecha aprobación: 21-05-2025
Nombre: María Patricia Pontón
Cargo: Sec General
Firma:

Observaciones Distrito:

Anexo 17. Solicitud de Modificación Refuerzo Ingreso Vía A Manzanillo

epm

Solicitud de modificación de infraestructura para reparación de daños
Alumbrado Público


Información de la solicitud

N° Solicitud Usuario:	1060293	Fecha de Solicitud Cliente:	28/04/2025
Dirección:	SMI Refuerzo ingreso vía Manzanillo	RADICADO EPM:	
Solicitante:		Teléfono contacto:	

Información visita

Por solicitud de la comunidad, se encuentra sector oscuro por deficiencia y/o ausencia de luminarias, se realiza esta solicitud de modificación de infraestructura para garantizar un servicio de alumbrado público de calidad y mejorar las condiciones de seguridad.

Imágenes del sitio

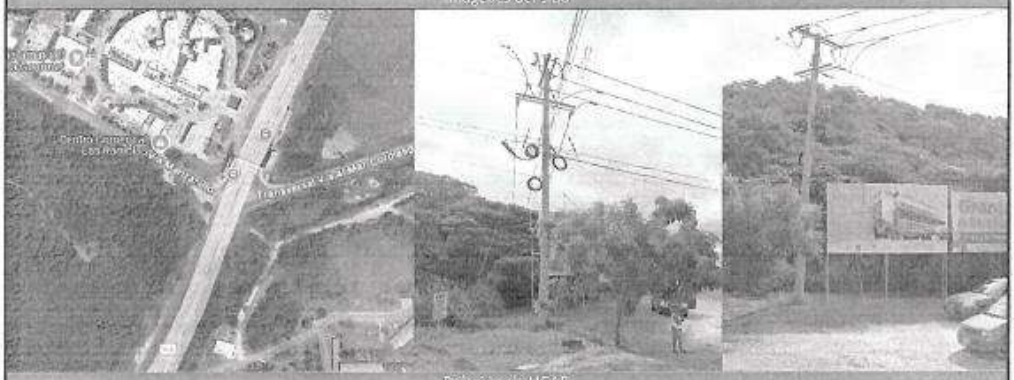

Relación de UCAP

Descripción UCAP	Factor equivalencia	Unidad	Cantidad	Total UCAP
Luminaria LED M2-1/M2-2 (128W)	1,000	Un	1	1,000
Brazo 1500 mm x 1 1/2"	0,283	Un	1	0,283
Cable 3x14 THHW	0,010	ml	20	0,206
Adecuacion Secundaria	0,117	Un	1	0,117
Fotocontrol Larga Vida Individual =Ip65 105-305V 1000W 1800Va	0,039	Un	1	0,039
				1,646

Concepto de aprobación de la interventoría

Vo.bo. Interventoría
Fecha concepto aprobación: 22/05/2025
Nombre: Luis Miguel Mejía Chávez
Cargo: Director de Interventoría
Firma:

Observaciones Interventoría:
Validado para liquidación. Ejecutrado con prioridad (abril/2025) a requerimiento del distrito

ATCe

Aprobación Distrito

Vo.bo. Distrito
Fecha aprobación: 28-05-2025
Nombre: María Patricia Pescas
Cargo: Soc General
Firma:

Observaciones Distrito:

Anexo 18. Solicitud de Modificación Refuerzo San José De Los Campanos

epm

Solicitud de modificación de infraestructura para reparación de daños
Alumbrado Público

Información de la solicitud

N° Solicitud Usuario:	1072200	Fecha de Solicitud Cliente:	
Dirección:	SMI Cl 104 San Jose de los Campanos	RADICADO EPM:	
Solicitante:		Teléfono contacto:	

Información vía

Por solicitud de la comunidad, se encuentra sector oscuro por deficiencia y/o ausencia de luminarias, se realiza esta solicitud de modificación de infraestructura para garantizar un servicio de alumbrado público de calidad y mejorar las condiciones de seguridad.

Imagenes del sitio



Relación de UCAP

Descripción UCAP	Factor equivalencia	Unidad	Cantidad	Total UCAP
Luminaria LED M1 1/M1 2 (16W)	1,000	Un	4	4,0
Brazo 1500 mm x 1"	0,287	Un	4	1,1
Fotocontrol Larga Vida Individual =Ip65 105-305V 1000W 1800Va	0,039	14,000	4	0,2
			Total UCAP	5,300

Concepto de aprobación de la interventoría

Vo.bo. Interventoría	Observaciones Interventoría:
Fecha concepto aprobación: 29/05/2025	Validado para ejecución teniendo en cuenta que a la calle le fue normalizada la red electrica y cercos de iluminación. Aportando a seguridad de los vecinos.
Nombre: Luis Miguel Mejía Chávez	
Cargo: Director de Interventoría	
Firma:	ATCe

Aprobación Distrito

Vo.bo. Distrito	Observaciones Distrito:
Fecha aprobación: 29-05-2025	
Nombre: María Patricia Bedoya	
Cargo: Sec General	
Firma:	

Anexo 19. Solicitud De Modificación Parque De La Marina

epm

Solicitud de modificación de infraestructura para reparación de daños
Alumbrado Público


Información de la solicitud

N° Solicitud Usuario:	1072026	Fecha de Solicitud Cliente:	28/04/2025
Dirección:	Parque de la Marina	RADICADO EPM:	
Solicitante:		Teléfono contacto:	

Descripción visita

Por solicitud de la comunidad, se encuentra sector oscuro por deficiencia y/o ausencia de luminarias, se realiza esta solicitud de modificación de infraestructura para garantizar un servicio de alumbrado público de calidad y mejorar las condiciones de seguridad.

Imágenes Referencia

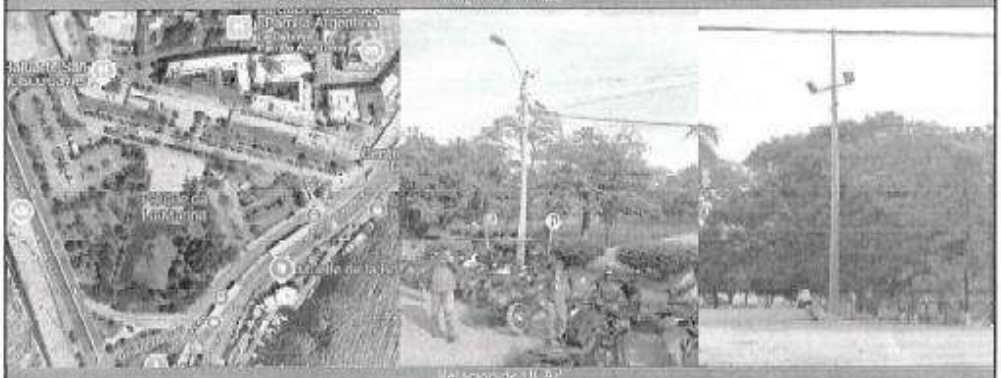

Relación de UCAP

Descripción UCAP	Factor Equivalencia	Unidad	Cantidad	Total UCAP
Luminaria Escenario C1 (212W M)	5,223	Un	10	52,230
Luminaria Escenario C1 (291W M)	5,223	Un	5	26,115
Cable 3x14 THHW	0,010	ml	30	0,310
Fotocontrol Larga Vida Individual =Ip65 105-305V 1000W 1800Va	0,039	Un	15	0,591
Luminaria/Proyector 100W	0,000	Un	1	0,000
Luminaria/Proyector 250W	0,000	Un	5	0,000
Luminaria/Proyector 400W	0,000	Un	13	0,000
				79,246

Concepto de aprobación de Interventoría

Vo.bo. Interventoría
Fecha concepto aprobación: 22/05/2025
Nombre: Luis Miguel Mejía Chávez
Cargo: Director de Interventoría
Firma:

Observaciones Interventoría:
Validada intervención para reforzar iluminación de la Parque de la Marina y aportar mayor seguridad a la zona de gran afluencia de propios y turistas.

ATCB

Aprobación Distrito

Vo.bo. Distrito
Fecha aprobación: 28-05-2025
Nombre: María Victoria Ferrer
Cargo: Sec. General
Firma:

Observaciones Distrito:

Original

VB

Anexo 20. Solicitud de Modificación Altos Del Campestre Parques y Canchas

epm

Solicitud de modificación de infraestructura para reparación de daños
Alumbrado Público

Información de la solicitud

N° Solicitud Usuario:	1075602	Fecha de Solicitud Cliente:	
Dirección:	SMI Altos del campestre parque y cancha	RADICADO EPM:	
Solicitante:		Teléfono contacto:	

Información visita

Por solicitud de la comunidad, se encuentra sector oscuro por deficiencia y/o ausencia de luminarias, se realiza esta solicitud de modificación de infraestructura para garantizar un servicio de alumbrado público de calidad y mejorar las condiciones de seguridad.

Imágenes del sitio



Relación de la UCAP

Descripción UCAP	Factor conversión	Unidad	Cantidad	Total UCAP
Luminaria LED M4-1/M4-2 (45W)	1,000	Un	15	15,000
Luminaria LED M1-1 (210W)	4,020	Un	4	16,080
Luminaria Escenario C1 (150W L)	5,223	Un	1	5,223
Brazo 1500 mm x 1"	0,287	Un	15	4,305
Brazo 1500 mm x 1 1/2"	0,283	Un	4	1,132
Fotocontrol Larga Vida Individual =Ip65 105-305V 1000W 1800Va	0,039	Un	20	0,788
Cable Triplex No 4	0,016	mt	170	2,755
Poste 8 PSF V 9 10 Rgt	1,041	Un	3	3,765
Adecuacion Secundaria	0,117	Un	5	0,585
Luminaria/Proyector 150W	0,000	Un	0	0,000
Luminaria/Proyector 400W	0,000	Un	1	0,000
			Total UCAP	53,573

Concepto de aprobación de la intervención

Vo.bo. Interventoría Fecha concepto aprobación: 22/05/2025 Nombre: Luis Miguel Mejía Chávez Cargo: Director de Interventoría Firma:	Observaciones Interventoría: Validada intervención, al identificarse que la zona recreativa, no ha sido modernizada y se encuentra con iluminación deficiente.

Aprobación Distrito

Vo.bo. Distrito Fecha aprobación: 28-05-2025 Nombre: Maria Patricia Pardo J. Cargo: Sec General Firma:	Observaciones Distrito:

Anexo 21. Solicitud de Modificación Parque La Florida, San Fernando

epm

Solicitud de modificación de infraestructura para reparación de daños
Alumbrado Público

Información de la solicitud

N° Solicitud Usuario:	1077055	Fecha de Solicitud Cliente:	
Dirección:	SMI Parque la Florida - San Fernando	RADICADO EPM:	
Solicitante:		Teléfono contacto:	

Información Social

Por solicitud de la comunidad, se encuentra sector oscuro por deficiencia y/o ausencia de luminarias, se realiza esta solicitud de modificación de infraestructura para garantizar un servicio de alumbrado público de calidad y mejorar las condiciones de seguridad.

Imágenes del sitio



Relación de UCAP

Descripción UCAP	Factor equivalencia	Unidad	Cantidad	Equivalencia
Luminaria LED C3 (30W S 4K)	3,884	Un	2	7,769
Luminaria LED M4-1/M4-2 (40W)	1,000	Un	7	7,000
Fotocontrol Larga Vida Individual =Ip65 105-305V 1000W 1800Va	0,039	Un	8	0,315
Cable 3x8 AWG XLPE 600V THHN	0,022	ml	80	1,779
Cable 3x14 THHW	0,010	ml	20	0,206
Poste Metalico 2" 4M (Incluye Cimentacion)	2,000	Un	7	14,000
Desmonte de poste metalico de 3,6m a 9m	0,878	Un	4	3,512
Ejecución de puesta a Tierra	0,124	Un	2	0,240
Tablero 2 Ctos + Temporizado + Protecciones	1,380	Un	1	1,380
			Equivalencia	36,202

Concepto técnico operativo de la interventoría

Vo.bo. Interventoría Fecha concepto aprobación: 23/05/2025 Nombre: Luis Miguel Mejía Chávez Cargo: Director de Interventoría Firma:	Observaciones Interventoría: Validado para ejecución, al encontrarse el parque con luminarias obsoletas.

Aprobación Distrito

Vo.bo. Distrito Fecha aprobación: 28-05-2025 Nombre: Héctor Rodrigo Torres Cargo: Jefe General Firma:	Observaciones Distrito:

Anexo 22. Solicitud de Modificación Parque La Carcha De Villa Rubia

epm

Solicitud de modificación de infraestructura para reparación de daños
Alumbrado Público

N° Solicitud Usuario:	107/049	Fecha de Solicitud Cliente:	28/04/2025
Dirección:	SMI Parque La Charca Villa Rubia	RADICADO EPM:	
Solicitante:		Teléfono contacto:	

Por solicitud de la comunidad, se encuentra sector oscuro por deficiencia y/o ausencia de luminarias, se realiza esta solicitud de modificación de infraestructura para garantizar un servicio de alumbrado público de calidad y mejorar las condiciones de seguridad.



Descripción UNAV	Cantidad existente	Unidad	Cantidad	TOTALICAS
Luminaria LED M4-1/M4-2 (40W)	1,000	Un	4	4,000
Luminaria LED M4-1/M4-2 (45W)	1,000	Un	2	2,000
Luminaria LED M1-1 (210W)	4,930	Un	4	19,080
Luminaria Escenario C1 (212W M)	5,223	Un	3	20,115
Luminaria Escenario C1 (291W M)	5,223	Un	25	130,575
Brazo 1500 mm x 1"	0,287	Un	2	0,574
Brazo 1500 mm x 1 1/2"	0,283	Un	4	1,132
Poste 8 PRFV 510 kgf	1,541	Un	4	6,164
Poste Metalico 2" 4M (Incluye Cimentacion)	2,000	Un	4	8,000
Cable 3x8 AWG XLPE 600V THHN	0,022	mt	60	1,334
Cable 3x14 THHW	0,010	mt	80	0,819
Adecuacion Secundaria	0,117	Un	5	0,585
Cruceta Y Tirante Galvanizada 1500 Mm	0,155	Un	13	2,009
Electrodo de puesta a Tierra	0,124	Un	3	0,372
Tablero 2 Cbs + Temporizado + Protecciones	1,380	Un	1	1,380
Fotocontrol Larga Vida Individual =fp65 105-305V 1000W 1800Va	0,039	Un	40	1,576
Luminaria/Proyector 250W	0,000	Un	1	0,000
Luminaria/Proyector 400W	0,000	Un	36	0,000
Luminaria/Proyector 1000W	0,000	Un	1	0,000
				202,515

Vo.bo. Interventoría	Observaciones Interventoría:
Fecha concepto aprobación: 22/05/2025	Validarlo para intervención. Cancha de softbol y zona recreativa aledaña con iluminación deficiente.
Nombre: Luis Miguel Mejía Chávez	
Cargo: Director de Interventoría	
Firma:	

Vo.bo. Distrito	Observaciones Distrito:
Fecha aprobación: 28-05-2025	
Nombre: María Patricia Perez	
Cargo: Sec General	
Firma:	

Anexo 23. Solicitud de Modificación Refuerzo Peaje De Parque América

epm


Solicitud de modificación de infraestructura para reparación de daños
Alumbrado Público

N° Solicitud Usuario:	1079689	Fecha de Solicitud Cliente:	
Dirección:	SMI Refuerzo Peaje sector parquiamerica	RADICADO EPM:	
Solicitante:		Teléfono contacto:	

Información visita

Por solicitud de la comunidad, se encuentra sector oscuro por deficiencia y/o ausencia de luminarias, se realiza esta solicitud de modificación de infraestructura para garantizar un servicio de alumbrado publico de calidad y mejorar las condiciones de seguridad

Imagenes del sitio

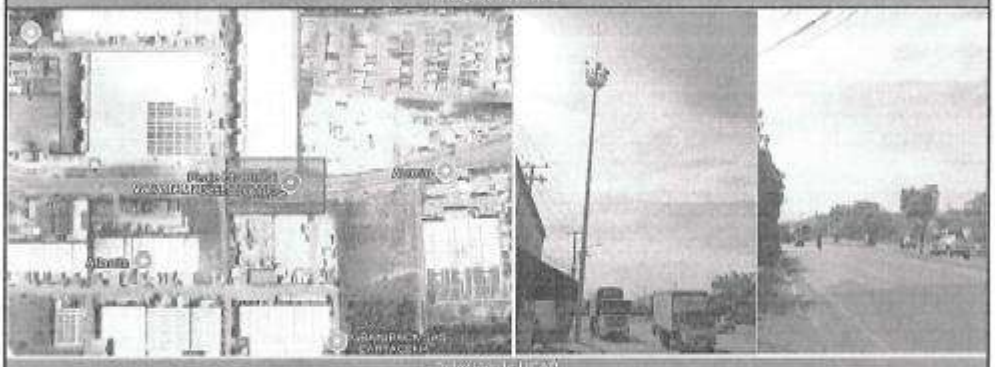

Selección de UCAP

Descripción UCAP	Nueva Especificación	Unidad	Cantidad	Total UCAP
Luminaria LED M1-1 (210W)	4,020	Un	2	8,0
Luminaria Escenario C1 (291W M)	5,223	Un	2	10,4
Brazo 3000 mm	0,676	Un	2	1,4
Fotocontrol Larga Vida Individual =fp65 105-305V 1000W 1800VA	0,039	Un	4	0,2
Poste 12 PRFV 350 kgf	2,537	Un	2	5,1
Cable 3x14 THHW	0,010	mt	90	0,9
Adecuación Secundaria	0,117	Un	2	0,2
Cruceta Y Tirante Galvanizada 1500 Mm	0,155	Un	1	0,2
			Total UCAP	26,307

Concepto de aprobación de la intervención

Vo.bo. Interventoría Fecha concepto aprobación: 22/05/2026 Nombre: Luis Miguel Meila Chávez Cargo: Director de Interventoría Firma:	Observaciones Interventoría: Validado para ejecución, dado que, por la amplitud de la vía se requiere refuerzo de iluminación para mayor seguridad vial de los conductores.

Aprobación Distrito

Vo.bo. Distrito Fecha aprobación: 28-05-2026 Nombre: [illegible] Cargo: Sec General Firma:	Observaciones Distrito:

Anexo 24. Seguimiento de Solicitudes De Modificación Mayo/Junio 2025

Item	Solicitud de modificación	SS	Fecha de remisión EPM	Fecha de validación QBM2	Enviado para aprobación	Fecha de Aprobación DTO	UCAP	Estado de ejecución
1	Socorro, Plan 500B Mz. 76 a 80	1043933	20/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	19,32	pendiente
2	Vicente Martínez Martelo, Pie de la Popa	1060417	20/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	9,76	pendiente
3	Refuerzos Barrio Andalucía	1060414	20/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	15,40	pendiente
4	Parque Mirador Alto Bosque Trv. 53B (escaleras)	1060410	20/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	9,813	pendiente
5	Refuerzos Antonio Jose de Sucre, Sector La Ceiba	1060397	20/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	24,47	pendiente
6	Barrio La Paz, Sector Laureles Cra 32-69	1060368	20/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	6,362	pendiente
7	Refuerzos Parque de Chiquinquirá	1060345	20/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	13,654	pendiente
8	Ceballos, Sector Nuevo Oriente	1060357	20/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	6,819	ejecutado
9	Pie de la Popa, Sector El Toril	1060337	20/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	3,191	pendiente
10	Refuerzo Caño Lo Amador	1060332	20/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	10,52	ejecutado
11	Refuerzo Ingreso Via a Manzanillo	1060293	20/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	28/05/2025	1,65	ejecutado
12	Refuerzo San Jose de los Campanos	1072200	20/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	28/05/2025	5,306	ejecutado
13	Parque de la Marina	1072826	20/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	28/05/2025	79,246	ejecutado
14	Altos del Campestre Parques y Cancha	1075612	20/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	28/05/2025	53,573	pendiente
15	Parque La Florida, San fernando	1077055	20/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	28/05/2025	36,209	pendiente
16	Parque La Charca, Villa Rubia	1077049	20/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	28/05/2025	202,515	pendiente
17	Refuerzo Peaje Parqueiamerica	1076989	20/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	28/05/2025	26,387	ejecutado

Anexo 25. Registro de Auditoría de la Información de Solicitudes de Mayo 2025

QBM

INTERVENTORIA DE ALUMBRADO PÚBLICO

AUDITORIA DE CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DICIEMBRE 2024

Versión 01
Vigente desde: 02/02/2021


Item	Radicado (Canales)	Medio de recepción	#Orden de reporte	Barrio/corregimiento	Dirección	Usuario	Requerimiento de Usuario	Gestión de Revisión Interventoría			Luminarias	Estado Infraestuctura	COMENTARIOS
								Detalle	Fecha	Supervisor (QBM2)	Atendidas		
1	Telefónico	Recorrido	Reportado directamente (Ing.Pineda)	El Cabrerro - Marbella	Via Marginal del Cabrerro	Ana Cortina	Circuito apagado	Desde Parque Apolo hasta Edificio Porto Bahia, Se comparte video	9/05/2025	Ana Teresa Cortina	>10 luminarias	Buen estado, sdocionado	atendido EPM
2	Telefónico	Recorrido	Reportado directamente	Centro	Puero Duro	William Teran	Torre de iluminación encendida permanentemente	3 luminarias, Se comparte registro fotográfico	13/05/2025	Luis Mejia	3	Buen estado, sdocionado	atendido EPM
3	Telefónico	Recorrido	Reportado directamente (Ing. Pineda)	Pie del cerro	Av. Del Lago calle 29 Salida trasera C.C. Portal de San Felipe	William Teran	luminaria encendida permanentemente	Rotulo 285211, Se comparte registro fotográfico	15/05/2025	Ana Teresa Cortina	1	Buen estado, sdocionado	atendido EPM
4	Telefónico	Recorrido	EPM	Pozón	Sector Terraplen, Carrera 92	Comunidad	Poste derribado por vehiculo	Reposición de poste	16/05/2025	Luis Mejia	1	Buen estado, sdocionado	Poste repuiesto immediata,mente por
5	Telefónico	Recorrido	No. 664261	San Jose de Los Campanos	Carrera 102 con Calle 35 - Referencia Megatiendas	William Teran	Luminaria apagada de 50W	Rotulo 397386	20/05/2025	Ana Teresa Cortina	1	Buen estado, sdocionado	atendido EPM
6	Telefónico	Recorrido	No. 664286	San Jose de Los Campanos	Carrera 102 con Calle 35 Esquina	William Teran	Luminaria apagada	Se comparte registro fotográfico	20/05/2025	Ana Teresa Cortina	1	Buen estado, sdocionado	atendido EPM
7	Telefónico	Recorrido	No. 664297	Urb. La Sevillana	Troncal Ruta 90	William Teran	Luminaria apagada 45W - Recien instalada	Rotulo 495677	20/05/2025	Ana Teresa Cortina	1	Buen estado, sdocionado	atendido EPM
8	Telefónico	Recorrido	No. 665596	20 de julio	Calle 7C con Carrera 58A	William Teran	Proyector encendido permanentemente hace dos días	Cancha de futbol	21/05/2025	Ana Teresa Cortina	1	Buen estado, sdocionado	atendido EPM
9	Telefónico	Recorrido	No. 665914	Urb. Los Almendros	Transv. 52 Manzana C Lote 3	William Teran	Luminaria led apagada (50W)	Rotulo 307046	21/05/2025	Ana Teresa Cortina	1	Buen estado, sdocionado	atendido EPM
10	Telefónico	Recorrido	Reportado directamente (Ing. Pabón)	Olaya Herrera	Via Perimetral 1ra. Cancha - Frente a Cra 50A	Ana Cortina	Instalación no autorizada	Poyectores instalados por la comunidad, encendidoos todo el dia. Se comparte registro fotográfico	23/05/2025	Ana Teresa Cortina	2	Buen estado, sdocionado	Proyectores reemplazados
11	Telefónico	Recorrido	Reportado directamente (Ing. Pabón)	La Campiña	Transversal 46 con diagonal 30	Ana Cortina	Luminaria de sodio no modernizada	Luminaria de 250W - NA	23/05/2025	Ana Teresa Cortina	1	Buen estado, sdocionado	Pendiente
12	Telefónico	Recorrido	Reportado directamente (Ing. Pabón)	Via Perimetral	Carrera 49A con #36-11	Ana Cortina	Poste en riesgo	Quema de basura al pie del poste	26/05/2025	Ana Cortina	1 poste - 1 luminaria	Quema, apagada	atendido EPM
13	Telefónico	Recorrido	No. 673888	Nelson Mandela, Sector Villa Gloria	Calle 1ra. Con Carrera 89 - Punto de Referencia: Ferreteria Materiales Portela	Sr. Ernesto Portela Cel: 3053254030	sector apagado	10 luminarias apagads, Se comparte registro fotografico	27/05/2025	Ana Teresa Cortina	>10 luminarias	Buen estado, sdocionado	atendido EPM
14	Telefónico	Recorrido	No. 673898	Nelson Mandela, Sector Los Pinos	carrera 85, Antigua Gallera de Nelson Mandela	Sra. Ana Mendoza, cel: 3023956041	Luminaria apagada de 50W	Rotulo 508985, Se comparte registro fotográfico	27/05/2025	Ana Teresa Cortina	1	Buen estado, sdocionado	atendido EPM
15	Telefónico	Recorrido	No. 674129	Nelson Mandela, Sector Andres Pastrana	Punto de Referencia: Abastos El Nazareno	Sr. Elver Romero 3233307065	3 luminarias apagadas	rótulos no identificados, Se comparte registro fotográfico	28/05/2025	Ana Teresa Cortina	3 luminarias	Buen estado, sdocionado	atendido EPM
16	Telefónico	Recorrido	No. 674121	Barrio Tesca	Camino del Medio, Calle 31A - Cra. 49	Ana Cortina	luminaria encendida permanentemente	Rórulo 288883	28/05/2025	Ana Teresa Cortina	1	Buen estado, sdocionado	atendido EPM
17	Telefónico	Recorrido	Reportado directamente (Ing. Pabón)	Barrio El Reposo	Detrás de institución Educativa Mandela Pino Verde	Ana Cortina	1 luminaria apagada	Rotulo 509875, Se comparte registro fotográfico	28/05/2025	Ana Teresa Cortina	2	Buen estado, sdocionado	atendido EPM
18	Telefónico	Recorrido	Reportado directamente (Ing. Pabón)	Centro	Calle de la Moneda	William Teran	luminaria encendida permanentemente	> 6 faroles, Se comparte registro fotográfico	29/05/2025	Ana Teresa Cortina	> 6 faroles	Buen estado, sdocionado	atendido EPM

Anexo 26. Registro Fotográfico Intervención Avenida Santander







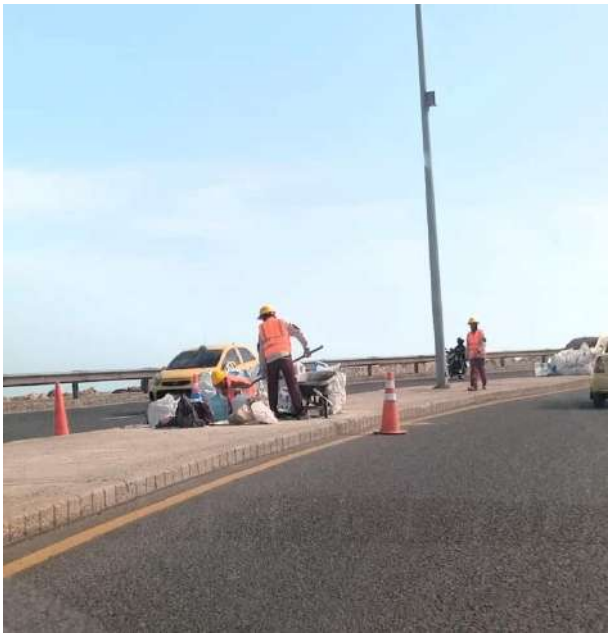

Trabajos de excavación y cimentación









Postes de fibra instalados listos para recibir las luminarias







Instalación de luminarias

Anexo 27. Registro Fotográfico Intervención Refuerzo San José De Los Campanos, Calle 104



Anexo 28. Registro Fotográfico Intervención Cancha De Microfutbol Del Pozón, Sector 14 De Febrero.








Anexo 29. Registro Fotográfico Intervención Vía Pozón – Villa Estrella – Carrera 92



Anexo 30. Registro Fotográfico Intervención Urb. Sevillana



Preparando terreno, para hincar postes y extender nuevas redes.

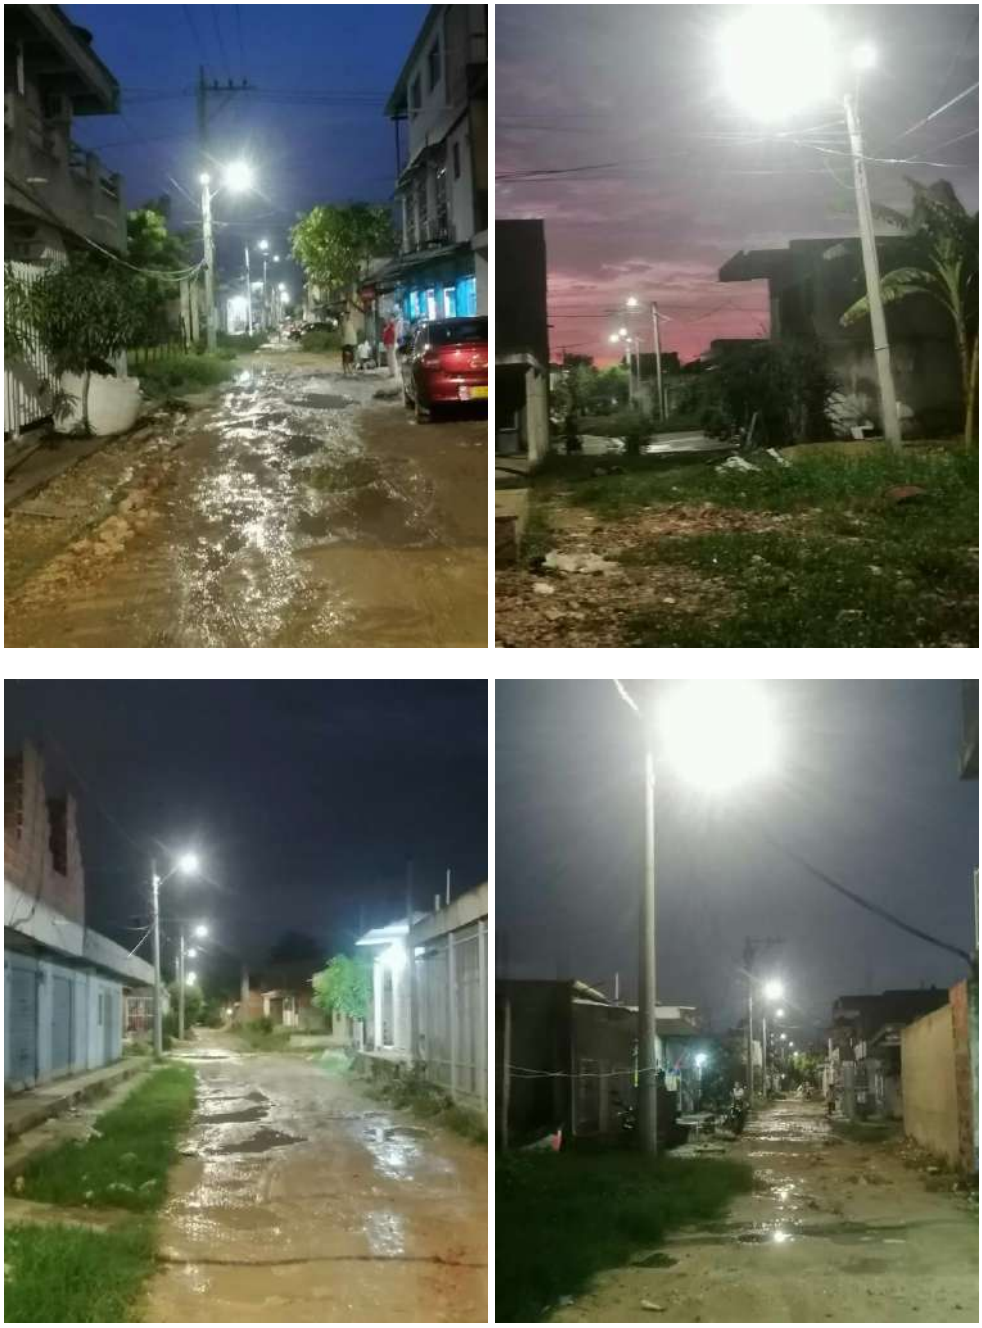

Visual Nocturna de las calles de Urb. Sevillana

Anexo 31. Registro Fotográfico Intervención Cancha Perimetral



Refuerzo de luminarias: retirados dos proyectores instalados por la comunidad y remplazados por 2 luminarias de 64 vatios

Anexo 32. Registro Fotográfico Intervención Reposición De Rejillas Galvanizadas Y Recuperadas En Las Murallas.



Con corte a 29/05/2025, Se han repuesto 30 rejillas.

Anexo 33. Registro Fotográfico Intervención Bajos Del Puente Bazurto





Anexo 34. Registro Fotográfico Intervención Bajos del Puente Román





Anexo 35. Relación de Luminarias Instaladas Barrio Sevillana

	INTERVENTORIA DE ALUMBRADO PÚBLICO RELACIÓN LUMINARIAS INSTALADAS Vs. RETIRADAS	Versión 01 Vigente desde: 02/02/2021

CONCEPTO:	Modernización	x	Reposición	x	Expansión	x	Urb SEVILLANA

Item	Barrio	Dirección	Punto de Referencia	Lumiaria Nueva Instalada W		DISPOSICIÓN EN POSTE			Vehicular	Peatonal	Fecha de Instalación	Lumiaria Retirada		COMENTARIOS
				Código	Potencia	Sencilla	Matil	Doble				Código	Potencia	
1	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480512	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
2	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480509	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
3	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480533	45			x	x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
4	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480490	45				x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
5	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480365	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
6	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480382	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
7	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480556	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
8	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	412268	45			x	x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
9	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480590	45				x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
10	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	410254	45			x	x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
11	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480464	45				x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
12	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480386	45			x	x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
13	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480647	45				x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
14	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480648	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
15	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	470753	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
16	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480642	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
17	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480641	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
18	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480431	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
19	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	399477	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
20	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480413	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
21	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480646	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
22	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480505	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	Poste Nuevo
23	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	481801	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	Poste Nuevo
24	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	495677	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	Poste Nuevo
25	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	406218	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	Poste Nuevo
26	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480525	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	Poste Nuevo
27	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	468728	45				x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
28	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	398870	45			x	x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
29	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	403435	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
30	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480643	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
31	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480429	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
32	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480397	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
33	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480362	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
34	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480415	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
35	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480290	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
36	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	469289	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
37	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	140357	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
38	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480533	45				x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
39	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480491	45			x	x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
40	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480510	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
41	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480616	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
42	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480589	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
43	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480591	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
44	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480595	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
45	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480367	45	x		x	x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
46	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480368	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
47	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480592	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
48	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	399025	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
49	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480619	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
50	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480358	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
51	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480567	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
52	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480384	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
53	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480489	45	x		x	x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
54	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480392	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
55	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480383	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
56	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480611	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
57	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480417	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
58	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480607	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
59	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480351	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
60	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	399853	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
61	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	402067	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
62	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	489275	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
63	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	497311	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
64	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	397968	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
65	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	399267	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
66	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	499396	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
67	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	399819	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
68	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480318	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
69	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480398	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
70	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480461	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	

CONCEPTO:		Modernización	x		Reposición	x			Expansión	x			Urb SEVILLANA		
Item	Barrio	Dirección	Punto de Referencia	Lumiaria Nueva Instalada W		DISPOSICIÓN EN POSTE			Vehicular	Peatonal	Fecha de Instalación	Lumiaria Retirada		COMENTARIOS
				Código	Potencia	Sencilla	Matil	Doble				Código	Potencia	
71	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	482468	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
72	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	404296	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
73	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480432	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
74	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480644	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
75	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480485	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
76	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	469225	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
77	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	397620	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
78	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	479848	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
79	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480469	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
80	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480560	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
81	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	478573	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
82	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480364	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
83	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	397787	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
84	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480486	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
85	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480487	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
86	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480355	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
87	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	403744	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
88	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	404587	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
89	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480355	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
90	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	397625	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
91	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480645	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
92	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480606	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
93	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	500291	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
94	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480610	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
95	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	406144	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
96	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	525158	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
97	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	469722	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
98	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480376	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
99	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	404833	45				x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
100	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480633	45			x	x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
101	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480387	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
102	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480400	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
103	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	497301	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
104	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	402786	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
105	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	408633	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
106	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480472	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
107	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480361	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
108	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	525527	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
109	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480291	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
110	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	467141	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
111	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480608	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
112	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480555	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
113	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480320	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
114	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	469904	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
115	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480580	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
116	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	407258	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
117	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	502064	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
118	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	405357	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
119	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480578	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
120	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480319	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
121	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480388	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
122	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	402082	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
123	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480471	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
124	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480583	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
125	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480605	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
126	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480374	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
127	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480618	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
128	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480352	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
129	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	405695	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
130	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480462	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
131	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	501356	45	x			x		11/05/2025	No Dio	No Dio	
132	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480385	45	x			x		11/09/2025	No Dio	No Dio	
133	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480430	45	x			x		11/09/2025	No Dio	No Dio	
134	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480579	45	x			x		11/09/2025	No Dio	No Dio	
135	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	500848	45	x			x		11/09/2025	No Dio	No Dio	
136	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	410573	45	x			x		11/09/2025	No Dio	No Dio	
137	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480350	45	x			x		11/09/2025	No Dio	No Dio	
138	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	405539	45	x			x		11/09/2025	No Dio	No Dio	
139	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	580624	45	x			x		11/09/2025	No Dio	No Dio	
140	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480609	45	x			x		11/09/2025	No Dio	No Dio	

	INTERVENTORIA DE ALUMBRADO PÚBLICO RELACIÓN LUMINARIAS INSTALADAS Vs. RETIRADAS	Versión 01 Vigente desde: 02/02/2021

CONCEPTO:	Modernización	x	Reposición	x	Expansión	x

Item	Barrio	Dirección	Punto de Referencia	Lumiaria Nueva Instalada W		DISPOSICIÓN EN POSTE			Vehicular	Peatonal	Fecha de Instalación	Urb SEVILLANA		COMENTARIOS
				Código	Potencia	Sencilla	Matil	Doble				Lumiaria Retirada		
												Código	Potencia	
141	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	500288	45	x			x		11/09/2025	No Dio	No Dio	
142	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480559	45	x			x		11/09/2025	No Dio	No Dio	
143	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480499	45	x			x		11/09/2025	No Dio	No Dio	
144	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480500	45	x			x		11/09/2025	No Dio	No Dio	
145	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480359	45	x			x		11/09/2025	No Dio	No Dio	
146	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480498	45	x		x	x		11/09/2025	No Dio	No Dio	
147	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480497	45	x			x		11/09/2025	No Dio	No Dio	
148	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480596	45	x			x		11/09/2025	No Dio	No Dio	
149	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480612	45	x			x		11/09/2025	No Dio	No Dio	
150	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480537	45	x			x		11/09/2025	No Dio	No Dio	
151	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	399817	45	x			x		11/09/2025	No Dio	No Dio	
152	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480540	45	x			x		11/09/2025	No Dio	No Dio	
153	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480539	45	x		x	x		11/09/2025	No Dio	No Dio	
154	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480535	45	x			x		11/09/2025	No Dio	No Dio	
155	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480534	45	x			x		11/09/2025	No Dio	No Dio	
156	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	402485	45	x			x		11/09/2025	No Dio	No Dio	
157	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480477	45	x			x		11/09/2025	No Dio	No Dio	
158	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480622	45	x			x		11/09/2025	No Dio	No Dio	
159	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480565	45	x			x		11/09/2025	No Dio	No Dio	
160	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480536	45	x			x		11/09/2025	No Dio	No Dio	
161	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	482312	45	x			x		11/09/2025	No Dio	No Dio	
162	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480538	45	x			x		11/09/2025	No Dio	No Dio	
163	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	400564	45	x			x		11/09/2025	No Dio	No Dio	
164	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	408894	45	x			x		11/09/2025	No Dio	No Dio	
165	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	482562	45	x			x		11/09/2025	No Dio	No Dio	
166	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480561	45	x			x		11/09/2025	No Dio	No Dio	
167	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480529	45	x			x		11/09/2025	No Dio	No Dio	
168	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480532	45	x			x		11/09/2025	No Dio	No Dio	
169	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480530	45	x			x		11/09/2025	No Dio	No Dio	
170	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480527	45	x			x		11/09/2025	No Dio	No Dio	
171	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480620	45	x			x		11/09/2025	No Dio	No Dio	
172	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	398344	45	x			x		11/09/2025	No Dio	No Dio	
173	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480526	45	x			x		11/09/2025	No Dio	No Dio	
174	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480528	45	x			x		11/09/2025	No Dio	No Dio	
175	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480506	45	x			x		11/09/2025	No Dio	No Dio	
176	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480507	45	x			x		11/09/2025	No Dio	No Dio	
177	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480381	45	x			x		11/09/2025	No Dio	No Dio	
178	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480511	45	x			x		11/09/2025	No Dio	No Dio	
179	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480623	45	x			x		11/09/2025	No Dio	No Dio	
180	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480463	45	x			x		11/09/2025	No Dio	No Dio	
181	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480577	45	x			x		11/09/2025	No Dio	No Dio	
182	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480349	45	x			x		11/09/2025	No Dio	No Dio	
183	Sevillana	calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	410145	45	x			x		11/09/2025	No Dio	No Dio	
184	Sevillana	Calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	397578	45	x			x		11/09/2025	No Dio	No Dio	
185	Sevillana	Calles Secundarias	Troncal de la cordialidad	480563	45	x			x		11/09/2025	No Dio	No Dio	

Anexo 36. Relación de Luminarias Instaladas Av. Santander

	INTERVENTORIA DE ALUMBRADO PÚBLICO RELACIÓN LUMINARIAS INSTALADAS Vs. RETIRADAS	Versión 01 Vigente desde: 02/02/2021

CONCEPTO:	Modernización	x	Reposición	x	Expansión	x

Item	Barrio	Dirección	Punto de Referencia	Lumiaria Nueva Instalada W		DISPOSICIÓN EN POSTE			Vehicular	Peatonal	Fecha de Instalación	Av. SANTANDER Lumiaria Retirada		COMENTARIOS
				Código	Potencia	Sencilla	Matil	Doble				Código	Potencia	
1	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV PESC	520247	210			X	x		30/05/2025	No Dio	No Dio	PLANO 1 - PN
2	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV PESC	520520	210				x		30/05/2025	No Dio	No Dio	
3	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV PESC	524223	210	X			x		30/05/2025	No Dio	No Dio	PLANO 1 - PN
4	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV PESC	520288	210	X			x		30/05/2025	No Dio	No Dio	
5	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV PESC	333358	210	X			x		30/05/2025	No Dio	No Dio	PLANO 1 - PN
6	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	332362	210	X			x		30/05/2025	No Dio	No Dio	PLANO 2 - PN
7	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	334046	210	X			x		30/05/2025	No Dio	No Dio	PLANO 2 - PN
8	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	358603	210	X			x		30/05/2025	No Dio	No Dio	PLANO 2 - PN
9	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	520248	210	X			x		30/05/2025	No Dio	No Dio	PLANO 2 - PN
10	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	333985	210	X			x		30/05/2025	No Dio	No Dio	PLANO 2 - PN
11	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	520252	210			X	x		30/05/2025	No Dio	No Dio	PLANO 2 - PN
12	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	520244	210				x		30/05/2025	No Dio	No Dio	
13	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	524178	210	X			x		30/05/2025	No Dio	No Dio	PLANO 2 - PN
14	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	358687	210	X			x		30/05/2025	No Dio	No Dio	PLANO 2 - PN
15	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	520254	210	X			x		30/05/2025	No Dio	No Dio	PLANO 2 - PN
16	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	358612	210			X	x		30/05/2025	No Dio	No Dio	PLANO 3 - PN
17	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	332448	210				x		30/05/2025	No Dio	No Dio	
18	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	333994	210	X			x		30/05/2025	No Dio	No Dio	PLANO 3 - PN
19	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	358676	210	X			x		30/05/2025	No Dio	No Dio	PLANO 3 - PN
20	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	297572	140			X	x		30/05/2025	No Dio	No Dio	PLANO 3 - PN
21	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	293693	180				x		30/05/2025	No Dio	No Dio	
22	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	358701	210			X	x		30/05/2025	No Dio	No Dio	PLANO 3 - PN
23	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	358703	210				x		30/05/2025	No Dio	No Dio	
24	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	384672	210			X	x		30/05/2025	No Dio	No Dio	PLANO 3 - PN
25	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	438489	210				x		30/05/2025	No Dio	No Dio	
26	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	358704	210	X			x		30/05/2025	No Dio	No Dio	PLANO 3 - PN
27	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	358601	210			X	x		30/05/2025	No Dio	No Dio	PLANO 3 - PN
28	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	293583	210				x		30/05/2025	No Dio	No Dio	
29	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	358706	210	X			x		30/05/2025	No Dio	No Dio	PLANO 3 - PN
30	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	332522	210			X	x		30/05/2025	No Dio	No Dio	PLANO 4 - PN
31	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	293534	210				x		30/05/2025	No Dio	No Dio	
32	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	384470	210			X	x		30/05/2025	No Dio	No Dio	PLANO 4 - PN
33	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	358692	210				x		30/05/2025	No Dio	No Dio	
34	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	334009	210			X	x		30/05/2025	No Dio	No Dio	PLANO 4 - PN
35	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	334165	210				x		30/05/2025	No Dio	No Dio	
36	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	333230	210			X	x		30/05/2025	No Dio	No Dio	PLANO 4 - PN
37	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	297779	140				x		30/05/2025	No Dio	No Dio	
38	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	334133	210			X	x		30/05/2025	No Dio	No Dio	PLANO 4 - PN
39	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	287292	194				x		30/05/2025	No Dio	No Dio	
40	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	287288	194			X	x		30/05/2025	No Dio	No Dio	PLANO 5 - PN
41	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	334161	210				x		30/05/2025	No Dio	No Dio	
42	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	334039	210			X	x		30/05/2025	No Dio	No Dio	PLANO 5 - PN
43	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	332351	210				x		30/05/2025	No Dio	No Dio	
44	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	334180	210			X	x		30/05/2025	No Dio	No Dio	PLANO 5 - PN
45	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	332352	210				x		30/05/2025	No Dio	No Dio	
46	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	358606	210			X	x		30/05/2025	No Dio	No Dio	PLANO 5 - PN
47	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	332354	210				x		30/05/2025	No Dio	No Dio	
48	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	332509	210			X	x		30/05/2025	No Dio	No Dio	PLANO 5 - PN
49	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	332356	210				x		30/05/2025	No Dio	No Dio	
50	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	334036	210			X	x		30/05/2025	No Dio	No Dio	PLANO 5 - PN
51	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	358609	210				x		30/05/2025	No Dio	No Dio	
52	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	358616	210			X	x		30/05/2025	No Dio	No Dio	PLANO 6 - PN
53	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	332422	210				x		30/05/2025	No Dio	No Dio	
54	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	332454	210			X	x		30/05/2025	No Dio	No Dio	PLANO 6 - PN
55	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	358679	210				x		30/05/2025	No Dio	No Dio	
56	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	287291	140			X	x		30/05/2025	No Dio	No Dio	PLANO 6 - PN
57	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	271141	140				x		30/05/2025	No Dio	No Dio	
58	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	271127	140			X	x		30/05/2025	No Dio	No Dio	PLANO 6 - PN
59	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	334124	210				x		30/05/2025	No Dio	No Dio	
60	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	438498	210			X	x		30/05/2025	No Dio	No Dio	PLANO 6 - PN
61	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	334132	180				x		30/05/2025	No Dio	No Dio	

CONCEPTO:	Modernización	x	Reposición	x	Expansión	x	Av. SANTANDER

Item	Barrio	Dirección	Punto de Referencia	Lumiaria Nueva Instalada W		DISPOSICIÓN EN POSTE			Vehicular	Peatonal	Fecha de Instalación	Lumiaria Retirada		COMENTARIOS
				Código	Potencia	Sencilla	Matil	Doble				Código	Potencia	
62	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	293556	180			X	x		30/05/2025	No Dio	No Dio	PLANO 6 - PN
63	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	334145	210				x		30/05/2025	No Dio	No Dio	
64	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	334038	210				x		30/05/2025	No Dio	No Dio	PLANO 7 - PN
65	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	334144	210			X	x		30/05/2025	No Dio	No Dio	
66	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	305865	291				x		30/05/2025	No Dio	No Dio	
67	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	332365	210				x		30/05/2025	No Dio	No Dio	PLANO 7 - PN
68	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	334147	210			X	x		30/05/2025	No Dio	No Dio	
69	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	332513	210				x		30/05/2025	No Dio	No Dio	PLANO 7 - PN
70	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	438505	210			X	x		30/05/2025	No Dio	No Dio	
71	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	338618	210				x		30/05/2025	No Dio	No Dio	PLANO 7 - PN
72	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	334136	210			X	x		30/05/2025	No Dio	No Dio	
73	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	332372	180				x		30/05/2025	No Dio	No Dio	PLANO 7 - PN
74	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	334166	210			X	x		30/05/2025	No Dio	No Dio	
75	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	384673	210				x		30/05/2025	No Dio	No Dio	PLANO 7 - PN
76	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	293641	180			X	x		30/05/2025	No Dio	No Dio	
77	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	293761	180				x		30/05/2025	No Dio	No Dio	PLANO 8 - PN
78	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	293685	180			X	x		30/05/2025	No Dio	No Dio	
79	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	295060	180				x		30/05/2025	No Dio	No Dio	PLANO 8 - PN
80	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	358685	210			X	x		30/05/2025	No Dio	No Dio	
81	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	431194	44				x		30/05/2025	No Dio	No Dio	PLANO 8 - PN
82	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	293798	180			X	x		30/05/2025	No Dio	No Dio	
83	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	295059	180				x		30/05/2025	No Dio	No Dio	PLANO 9 - PN
84	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	358696	210			X	x		30/05/2025	No Dio	No Dio	
85	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	358619	210				x		30/05/2025	No Dio	No Dio	PLANO 9 - PN
86	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	334040	180			X	x		30/05/2025	No Dio	No Dio	
87	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	293799	180				x		30/05/2025	No Dio	No Dio	PLANO 9 - PN
88	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	293696	180			X	x		30/05/2025	No Dio	No Dio	
89	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	285205	210				x		30/05/2025	No Dio	No Dio	PLANO 9 - PN
90	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	334037	210			X	x		30/05/2025	No Dio	No Dio	
91	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	293608	180				x		30/05/2025	No Dio	No Dio	PLANO 9 - PN
92	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	293584	180			X	x		30/05/2025	No Dio	No Dio	
93	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	332366	210				x		30/05/2025	No Dio	No Dio	PLANO 9 - PN
94	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	358605	210			X	x		30/05/2025	No Dio	No Dio	
95	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	334067	210				x		30/05/2025	No Dio	No Dio	PLANO 10 - PN
96	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	332420	210			X	x		30/05/2025	No Dio	No Dio	
97	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	438471	210				x		30/05/2025	No Dio	No Dio	PLANO 10 - PN
98	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	358615	210			X	x		30/05/2025	No Dio	No Dio	
99	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	332367	210				x		30/05/2025	No Dio	No Dio	PLANO 10 - PN
100	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	334109	180			X	x		30/05/2025	No Dio	No Dio	
101	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	332402	210				x		30/05/2025	No Dio	No Dio	PLANO 10 - PN
102	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	263642	180			X	x		30/05/2025	No Dio	No Dio	
103	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	332353	180				x		30/05/2025	No Dio	No Dio	PLANO 11 - PN
104	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	293754	180			X	x		5/06/2025	No Dio	No Dio	
105	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	293539	180				x		5/06/2025	No Dio	No Dio	PLANO 11 - PN
106	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	293588	180			X	x		5/06/2025	No Dio	No Dio	
107	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	293537	180				x		5/06/2025	No Dio	No Dio	PLANO 11 - PN
108	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	293721	180			X	x		5/06/2025	No Dio	No Dio	
109	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	384665	210				x		5/06/2025	No Dio	No Dio	PLANO 11 - PN
110	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	293649	180			X	x		5/06/2025	No Dio	No Dio	
111	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	332455	210				x		5/06/2025	No Dio	No Dio	PLANO 11 - PN
112	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	332328	210			X	x		5/06/2025	No Dio	No Dio	
113	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	332520	210				x		5/06/2025	No Dio	No Dio	PLANO 12 - PN
114	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	293576	180			X	x		5/06/2025	No Dio	No Dio	
115	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	334110	210				x		5/06/2025	No Dio	No Dio	PLANO 12 - PN
116	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	334021	210			X	x		5/06/2025	No Dio	No Dio	
117	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	358700	210				x		5/06/2025	No Dio	No Dio	PLANO 12 - PN
118	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	358694	210			X	x		5/06/2025	No Dio	No Dio	
119	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	293768	210				x		5/06/2025	No Dio	No Dio	PLANO 12 - PN
120	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	293806	210			X	x		5/06/2025	No Dio	No Dio	

	INTERVENTORIA DE ALUMBRADO PÚBLICO RELACIÓN LUMINARIAS INSTALADAS Vs. RETIRADAS	Versión 01 Vigente desde: 02/02/2021

CONCEPTO:	Modernización	x	Reposición	x	Expansión	x

Item	Barrio	Dirección	Punto de Referencia	Lumiaria Nueva Instalada W		DISPOSICIÓN EN POSTE			Vehicular	Peatonal	Fecha de Instalación	Av. SANTANDER		COMENTARIOS
				Código	Potencia	Sencilla	Matil	Doble				Lumiaria Retirada		
												Código	Potencia	
121	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	334141	210			X	x		5/06/2025	No Dio	No Dio	PLANO 13 - PN
122	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	384671	210				x		5/06/2025	No Dio	No Dio	
123	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	293648	180			X	x		5/06/2025	No Dio	No Dio	PLANO 13 - PN
124	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	358597	210				x		5/06/2025	No Dio	No Dio	
125	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	293758	180			X	x		5/06/2025	No Dio	No Dio	PLANO 13 - PN
126	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	293797	180				x		5/06/2025	No Dio	No Dio	
127	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	293569	180			X	x		8/06/2025	No Dio	No Dio	PLANO 13 - PN
128	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	293574	180				x		8/06/2025	No Dio	No Dio	
129	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	334041	180			X	x		8/06/2025	No Dio	No Dio	PLANO 13 - PN
130	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	358613	180				x		8/06/2025	No Dio	No Dio	
131	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	358684	210			X	x		8/06/2025	No Dio	No Dio	PLANO 13 - PN
132	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	332458	210				x		8/06/2025	No Dio	No Dio	
133	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	332463	210			X	x		8/06/2025	No Dio	No Dio	PLANO 13 - PN
134	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	293551	180				x		8/06/2025	No Dio	No Dio	
135	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	334148	210			X	x		8/06/2025	No Dio	No Dio	PLANO 14 - PN
136	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	332502	210				x		8/06/2025	No Dio	No Dio	
137	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	Repetido(334148	210			X	x		8/06/2025	No Dio	No Dio	PLANO 14 - PN
138	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	334047	210				x		8/06/2025	No Dio	No Dio	
139	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	332405	210			X	x		8/06/2025	No Dio	No Dio	PLANO 14 - PN
140	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	358705	210				x		8/06/2025	No Dio	No Dio	
141	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	334070	210			X	x		8/06/2025	No Dio	No Dio	PLANO 14 - PN
142	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	358680	210				x		8/06/2025	No Dio	No Dio	
143	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	332447	210			X	x		8/06/2025	No Dio	No Dio	PLANO 14 - PN
144	Av. SANTANDER	Carrera 1ra	AV. SN	334065	210				x		8/06/2025	No Dio	No Dio	

Anexo 37. Relación De Luminarias Instaladas Bajos Puente Bazurto Y Bajos Puente Román

	INTERVENTORIA DE ALUMBRADO PÚBLICO RELACIÓN LUMINARIAS INSTALADAS Vs. RETIRADAS	Versión 01 Vigente desde: 02/02/2021

CONCEPTO:	Modernización	x	Reposición		Expansión	x

Item	Barrio	Dirección	Punto de Referencia	Puente Bazurto - Av Lago										
				Lumiaria Nueva		DISPOSICIÓN EN POSTE			Vehicular	Peatonal	Fecha de Instalación	Lumiaria Retirada		COMENTARIOS
				Código	Potencia	Sencilla	Matil	Doble				Código	Potencia	
1	Bazurto	Bajos puente Bazurto Av lago	Av Lago	502848	64	x			x		9/06/2025	No Dio	No Dio	Refuerzo de iluminación
2	Bazurto	Bajos puente Bazurto Av lago	Av Lago	509769	64	x			x		9/06/2025	No Dio	No Dio	
3	Bazurto	Bajos puente Bazurto Av lago	Av Lago	509769	64	x			x		9/06/2025	No dio	No dio	

	INTERVENTORIA DE ALUMBRADO PÚBLICO RELACIÓN LUMINARIAS INSTALADAS Vs. RETIRADAS	Versión 01 Vigente desde: 02/02/2021

CONCEPTO:	Modernización	x	Reposición		Expansión	x

Item	Barrio	Dirección	Punto de Referencia	Puente Roman - Manga										
				Lumiaria Nueva		DISPOSICIÓN EN POSTE			Vehicular	Peatonal	Fecha de Instalación	Lumiaria Retirada		COMENTARIOS
				Código	Potencia	Sencilla	Matil	Doble				Código	Potencia	
1	Manga	Bajos puente Roman	Roman	514137	212	x			x		9/06/2025	No Dio	No Dio	Refuerzo de iluminación
2	Manga	Bajos puente Roman	Roman	514139	212	x			x		9/06/2025	No Dio	No Dio	

Anexo 38. Relación de Luminarias Instaladas Proyectos Varios

	INTERVENTORIA DE ALUMBRADO PÚBLICO RELACIÓN LUMINARIAS INSTALADAS Vs. RETIRADAS	Versión 01 Vigente desde: 02/02/2021

CONCEPTO:		Modernización		Reposición		Expansión	x

Item	Barrio	Dirección	Punto de Referencia	Lumiaria Nueva Instalada		DISPOSICIÓN EN POSTE			Vehicular	Peatonal	Fecha de Instalación	Otros Proyectos: Lumiaria Retirada		COMENTARIOS
				Código	Potencia	Sencilla	Matil	Doble				Código	Potencia	
1	San Jose de los campanos con Villa Grande 2	Calle 104	Bomba Petromil	480451	45	x			x		9/05/2025	No Dio	No Dio	
2		Calle 104	Bomba Petromil	480450	45	x			x		9/05/2025	No Dio	No Dio	
3		Calle 104	Bomba Petromil	480452	45	x			x		9/05/2025	No Dio	No Dio	
4		Calle 104	Bomba Petromil	480449	45	x			x		9/05/2025	No Dio	No Dio	
5	Pozón	Cancha	Sector 14 de febrero	524424	210	x				x	9/05/2025	No Dio	No Dio	
6	Pozón	Cancha		524427	210	x				x	9/05/2025	No Dio	No Dio	
7	Pozón	Cancha		524523	210	x				x	9/05/2025	No Dio	No Dio	
8	Pozón	Cancha		520289	210	x				x	9/05/2025	No Dio	No Dio	
9	Pozón	Villa Estrella Cra. 92	Estación de Aguas de Cartagena	395520	64,5	x					9/05/2025	No Dio	No Dio	
10	Pozón	Villa Estrella Cra. 92		507188	64,5	x					9/05/2025	No Dio	No Dio	
11	Pozón	Villa Estrella Cra. 92		507179	64,5	x					9/05/2025	No Dio	No Dio	
12	Pozón	Villa Estrella Cra. 92		443882	64,5	x					9/05/2025	No Dio	No Dio	
13	Pozón	Villa Estrella Cra. 92		507196	64,5	x					9/05/2025	No Dio	No Dio	
14	Pozón	Villa Estrella Cra. 92		407935	64,5	x					9/05/2025	No Dio	No Dio	
15	Pozón	Villa Estrella Cra. 92		410747	64,5	x					9/05/2025	No Dio	No Dio	
16	Pozón	Villa Estrella Cra. 92		407766	64,5	x					9/05/2025	No Dio	No Dio	
17	Pozón	Villa Estrella Cra. 92		401897	64,5	x					9/05/2025	No Dio	No Dio	
18	Pozón	Villa Estrella Cra. 92		400459	64,5	x					9/05/2025	No Dio	No Dio	
19	Pozón	Villa Estrella Cra. 92		410943	64,5	x					9/05/2025	No Dio	No Dio	
20	Pozón	Villa Estrella Cra. 92		403404	64,5	x					9/05/2025	No Dio	No Dio	
21	Pozón	Villa Estrella Cra. 92		309103	64,5	x					9/05/2025	No Dio	No Dio	
22	Olaya Herrera	Carrera 50A	Vía Perimetral	502813	64,5	x					15/05/2025	No Dio	No Dio	
23	Olaya Herrera	Carrera 50A	Vía Perimetral	502861	65,5	x					15/05/2025	No Dio	No Dio	

Anexo 39. Registro de Medición de Iluminación Realizada en Abril 2025

Medida #1: Cancha de Martínez Martelo

MEDIDAS DE NIVELES DE ILUMINANCIA No 1
METODOS DE LOS 9 PUNTOS y/0 Cavidad Zonal dependiendo de la Zona

RESPONSABLE	LUIS MARTINEZ /LUIS MEJIA			**FECHA**	10/06/2025	HORA INICIO 7:30PM
DIRECc DEL SITIO	**CANCHA DEL PARQUE MTZ MARTELO**					
TRAMOS DE VIA CON CONDIC UNIFORMES AL SITIO DE MEDIDA				Parqueadero		
LUXOMETRO	KLEIN TOOLS ET 130					
CONDICIONES ATMOSFERICA DE LA NOCHE			Cielo despejado			
LUMINARIA	CELSA			**PANEL LEDS**	64,5w	
TIPO DE APOYO	Postes de fibra Y/O CONCRETO EXIST			**AVANCE DE LA LUMINARIA SOBRE CALZADA (m) DESTAPADA**	1,3 Y 1,4 APROX	
ANCHO DE CALZADA	7m a 8 m aprox			**ALTURA DE MONTAJE DE LA LUM (m)**	8 m A 7,8M APROX	
SEPARADOR	SI=	NO= X	No DE SEPARADORES			
DISPOSICION DE LUMINARIAS	Normal de vehicular pequeña		0	**TENSION NOMINAL DE LA LUM (VOLT)**	120-250	
INTERDISTANCIA ENTRE LUMINARIA CONSECUTIVAS	33 M APROX		**DISTANCIA DEL FAROL A LA CALZADA (m)**		ES UNA CANCHA ANCHO 16MX27M	
ANGULO DE INCLINACION DE LA LUMINARIA	0° a 0.01° APROX		**TENSION MEDIDA DE LA RED (m)**		240 APROX	
SUCIEDAD DE EL CONJUNTO OPTICO?	La luminaria es totalmente Nueva					

PUNTOS	1	2	3	**OBSERVACIONES**
1	**72**	**69**	**61**	Hay contaminacion de las luminarias de los senderos de el parque
2	**65**	**63**	**56**	
3	**54**	**53**	**45**	

PARQUE Martínez Martelo	**DISTRIBUCION**	Unilateral abajo

Medidas en Campo		
	VIA	**Peatonal**
E1	72	0
E2	65	0
E3	54	0
E4	69	0
E5	63	0
E6	53	0
E7	61	0
E8	56	0
E9	45	0

TIPO DE VIA M4

	1/16	(E1+E3+E7+E9)	(E2+E4+E6+E8)	E5
Eprom	0,063	232	243	63
Eprom	0,063	0	0	
UNIFORMIDAD Peatonal		**0,63**	**OK**	

Medida #2: Barrio Sevillana – Calles internas

MEDIDAS DE NIVELES DE ILUMINANCIA No 2
METODOS DE LOS 9 PUNTOS y/0 Cavidad Zonal dependiendo de la Zona

RESPONSABLE	LUIS MARTINEZ /LUIS MEJIA			**FECHA**	10/06/2025	HORA INICIO	8:05PM
DIRECc DEL SITIO	**BARRIO SEVILLANA**						
TRAMOS DE VIA CON CONDIC UNIFORMES AL SITIO DE MEDIDA			CALLES INTERNAS #1				
LUXOMETRO	KLEIN TOOLS ET 130						
CONDICIONES ATMOSFERICA DE LA NOCHE			Cielo seminublado				
LUMINARIA	CELSA			**PANEL LEDS**	45W		
TIPO DE APOYO	Postes de fibra Y/O CONCRETO EXIST			**AVANCE DE LA LUMINARIA SOBRE CALZADA (m) DESTAPADA**	1,3 Y 1,4 APROX		
ANCHO DE CALZADA	7m a 8 m aprox			**ALTURA DE MONTAJE DE LA LUM (m)**	7,1 m A 7,8M APROX		
SEPARADOR	SI=	NO= X	No DE SEPARADORES				
DISPOSICION DE LUMINARIAS	normal de vehicular pequeña		0	**TENSION NOMINAL DE LA LUM (VOLT)**	120-250		
INTERDISTANCIA ENTRE LUMINARIA CONSECUTIVAS	35 A 34 M APROX		**DISTANCIA DEL FAROL A LA CALZADA (m)**		0,42m Calle de dos carriles		
ANGULO DE INCLINACION DE LA LUMINARIA	0° a 0.01° APROX		**TENSION MEDIDA DE LA RED (m)**		240 APROX		
SUCIEDAD DE EL CONJUNTO OPTICO?	La luminaria es totalmente Nueva						

PUNTOS	1	2	3	**OBSERVACIONES**
1	**9**	**8,1**	**7**	La contaminacion es leve luces de Casas a 30m
2	**6**	**7**	**5**	
3	**4**	**3**	**3,8**	

BARRIO SEVILLANA	**DISTRIBUCION**	Unilateral abajo

Medidas en Campo		
	VIA	**Peatonal**
E1	9	0
E2	6	0
E3	4	0
E4	8,1	0
E5	7	0
E6	3	0
E7	7	0
E8	5	0
E9	3,8	0

TIPO DE VIA M4

	1/16	(E1+E3+E7+E9)	(E2+E4+E6+E8)	E5
Eprom	0,063	24	22	7
Eprom	0,063	0	0	
UNIFORMIDAD Peatonal		**0,42**	OK	

Medida #3:

MEDIDAS DE NIVELES DE ILUMINANCIA No 3
METODOS DE LOS 9 PUNTOS y/0 Cavidad Zonal dependiendo de la Zona

RESPONSABLE	LUIS MARTINEZ /LUIS MEJIA			**FECHA**	10/06/2025	HORA INICIO	8:55PM
DIRECc DEL SITIO	**BARRIO SEVILLANA**						
TRAMOS DE VIA CON CONDIC UNIFORMES AL SITIO DE MEDIDA				CALLES INTERNAS DESTAPADA #2			
LUXOMETRO	KLEIN TOOLS ET 130						
CONDICIONES ATMOSFERICA DE LA NOCHE			Cielo Nublado				
LUMINARIA	CELSA			**PANEL LEDS**	45W		
TIPO DE APOYO	Postes de fibra Y/O CONCRETO EXIST			**AVANCE DE LA LUMINARIA SOBRE CALZADA (m) DESTAPADA**	1,3 Y 1,4 APROX		
ANCHO DE CALZADA	7m a 8 m aprox			**ALTURA DE MONTAJE DE LA LUM (m)**	7,1 m A 7,8M APROX		
SEPARADOR	SI=	NO= X	**No DE SEPARADORES**				
DISPOSICION DE LUMINARIAS	normal de vehicular pequeña		0	**TENSION NOMINAL DE LA LUM (VOLT)**	120-250		
INTERDISTANCIA ENTRE LUMINARIA CONSECUTIVAS	35 A 34 M APROX		**DISTANCIA DEL FAROL A LA CALZADA (m)**		0,42m Calle de dos carriles		
ANGULO DE INCLINACION DE LA LUMINARIA	0° a 0.01° APROX		**TENSION MEDIDA DE LA RED (m)**		240 APROX		
SUCIEDAD DE EL CONJUNTO OPTICO?	La luminaria es totalmente Nueva						

PUNTOS	1	2	3	**OBSERVACIONES**
1	**7**	**6**	**4**	La contaminacion es leve luces de Casas a 30m
2	**5**	**4**	**3,8**	
3	**4**	**3**	**3,1**	

BARRIO SEVILLANA	**DISTRIBUCION**	Unilateral abajo

Medidas en Campo		
	VIA	**Peatonal**
E1	7	0
E2	5	0
E3	4	0
E4	6	0
E5	4	0
E6	3	0
E7	4	0
E8	3,8	0
E9	3,1	0

TIPO DE VIA M4

	1/16	(E1+E3+E7+E9)	(E2+E4+E6+E8)	E5
Eprom	0,063	18	18	4
Eprom	0,063	0	0	

UNIFORMIDAD via **0,44** OK

UNIFORMIDAD Peatonal

Anexo 40. Comunicación AP-EPM-007-2025: Ajuste De UCAP's Ejecutadas – Abril 2025

Interventorías de Obras Eléctricas, Consultorías,
Asesorías, Auditorías, Outsourcing, Estudios Técnicos- Administrativos-Financieros

AP EPM-007-2025

Cartagena de Indias D.T. y C., 14 de mayo de 2025

Señores
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN EPM
Atn: Ing. José David Pulido Correa
Profesional Comercial - Unidad Ofertas Gobierno
Cartagena

Asunto: Ajuste de UCAP's ejecutadas – abril 2025

Cordial saludo

Tras la revisión y conciliación de cantidades de UCAP's ejecutadas durante el mes de abril 2025, juntamente ingenieros del área operativa de EPM e Interventoría QBM2, nos permitimos informar el valor liquidado: **2.034 UCAP's**, correspondiente a las intervenciones desarrolladas en los barrios y corregimientos tal como se describe en detalle a continuación:

Item	Solicitud	Nombre del Proyecto	Ejecuadas
1	177793	Av. Jhon F Kennedy (CR 68) desde la TR 54 hasta la calle 15	1,69
2	329489	Barrio Ciudad Bicentenario	513,89
3	484687	Barrio El Pozón Etapa I	39,38
4	560838	Barrio El Pozón Etapa II	31,20
5	560842	Barrio El Pozón Etapa III	39,00
6	576195	Corregimientos Pontezuela, Bayunca	118,41
7	576199	Corregimiento La Boquilla	709,19
8	751161	SMI Via Arroz Barato-Policarpa Calle 3 hasta (	4,30
9	888847	SMI Bajos del Puente Romero Barrio Crespo	13,85
10	769927	SMI Portales de Alicante	404,41
11	1037005	SMI Costado Occidental Estadio Jaime Moron	33,46
12	1040426	SMI Refuerzos Bajos del Puente Romero Barı	11,80
13	1049697	SMI Letras de cartagena Perimetral_ SS 1049	6,89
14	1055224	SMI Puente de los Gatos TV 54	12,21
15	1060086	SMI Bocagrande-Decorceramica	1,84
16	1060293	SMI Refuerzo ingreso vía Manzanillo	1,76
17	1060326	SMI Refuerzo iluminación Puente Jimenez	5,28
18	1060332	SMI Caño amador	10,52
19	1072826	SMI Parque de la Marina	74,60
Subtotal abril 2025			2034

Canapote Calle 20 de Julio N° 16-37 Cartagena
Teléfonos: 605 65 24 715 Celufijo 310-650-2676
Correo Electrónico: presidencia@qbm2.com

En espera de sus comentarios

Atentamente;

LUIS MIGUEL MEJIA CHAVEZ
Director de Interventoría

Copia: Dra. Gina Patricia Vélez Ortiz - Asesora de Servicios Públicos
Ing. José Adrián Rivera Pérez - Profesional Operaciones Negocios – UAP
Ing. Diego Alberto Pineda Martínez - Profesional Operaciones Negocios – UAP
Dra. Melissa M. Franco Porras - Asesora Jurídica QBM2

Anexo 41. Factura EPM – Correspondiente al Mes de Abril 2025

Documento Equivalente Electrónico SPD
Contrato: 12697794
Cliente: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
CC/NIT: 890480184
Dirección: Diagonal 30 30 - 78 Plaza De La Aduana Cartagena
Documento No: 145 1795038

epm 890.904.996-1

$12.743.466.492
Valor total a pagar

Pagar antes de 20 de junio 2025
Referente de pago 1075768009-97
Ejecución abril 2025

Valor base de liquidación $ 3.590.446.708

CUDE: 2754f05cc431 4d1 1f94701 8829e3 1e92da e9d681 c26e3afa 064481 ddc5 034845 9d4facd7 873637 013556a35 079529e48

FECHA DE GENERACIÓN: 16/05/2025 15:19 **FECHA DE VALIDACIÓN:** 16/05/2025 17:39:00

Resumen facturación Mayo/2025
N° DEE17488616

Concepto de cobro	Mes anterior		Mes actual	
	Consumo	Valor	Consumo	Valor
Estampilla Años Dorados	0,00	-39.160.140,09	0,00	-71.808.934,17
Estampilla Universidad Cartage	0,00	-19.580.070,04	0,00	-35.904.467,08


Energía	$	
Cuentas vencidas	$	9.350.494.353,00
Otros cobros EPM	$	3.392.972.139,04
Ajuste al peso	$	-0,04


Comportamiento histórico de consumos

Mes Consumo	Activa kWh	Exc. Reactiva Inductiva KVarh	Exc. Reactiva Capacitiva kVarth	Días Con Reactiva
Oct-24	,00	,00	,00	0
Nov-24	,00	,00	,00	0
Dic-24	,00	,00	,00	0
Ene-25	,00	,00	,00	0
Feb-25	,00	,00	,00	0
Mar-25	,00	,00	,00	0
Abr-25	,00	,00	,00	0
Activa Promedio	,00			

IPP mes actual: 185,83 Variación IPP con relación al mes anterior: 0,10%







Grandes Contribuyentes - Res. 000200 de 27/12/2024 Autoretenedor Renta - Res. 547 de 25/01/2002, excepto por rendimientos financieros de cuenta de ahorro y contratos de mutuo. Autoretenedor ICA Medellín - Res. 32038 de 22/12/2017

Consulta y paga tu factura en línea a través de https://aplicaciones.epm.com.co/facturawebW

Contrato 12697794

$12.743.466.492

Puedes realizar tu aporte voluntario a través de **www.epm.com.co** - Transacciones rápidas - opción: "Aporte Voluntario Comparto mi Energía - Iniciativa Gobierno Nacional".

(415)7707173981008(8020)107576800997(3900)012743466492(96)20250620

Diagonal 30 30 - 78 Plaza De La A - Cartagena De Indias-Bolívar

Servicios De Ingeniería Ener servicio suscrito 130888664
3 Cuenta(s) Vencida(s) : Servicio Suspendido

Información Básica	Valores Facturados	
	Consumo	Valor
Instalación: 9001300000010007080 - Diagonal 30 30 - 78 Plaza De La A - Cartagena De Indias-bolívar - Plan: Plan Unico - Categoría: Oficial - Nivel De Tensión: 1 - Genérico: Distrito Turistico Y Cultural De Cartagena De Indias - Consumo Del 01 Abr Al 30 Abr - Días De Consumo: 29		
Total Servicios De Ingeniería Ener servicio suscrito 130888664		

Otros Cobros EPM

Descripcion	Servicio	Valor
Montaje	Energia	$ 12.470.892,00
Mantenimiento alumbrado	Energia	$ 1.053.867.367,2
Montaje	Energia	$ 2.536.579.341,2
Tasa pro-deporte y recr	Energia	$ -89.761.167,71
Total Otros Cobros EPM		**$ 3.513.156.432,69**



Empresas Públicas de Medellín E.S.P -NIT.890.904.996-1
Carrera 58#42-125 Edificio Inteligente
Conmutador: (604) 3808080
Medellín-Antioquia

Entidad que nos vigila
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD Número único de registro 4-50010000-1 – www.superservicios.gov.co

Entidades que nos regulan
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA – www.cra.gov.co Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG www.creg.gov.co

Puntos de Pago
Almacenes de Cadena: Almacenes Éxito, Carulla, Surtimax, Jumbo, Metro.
Entidades Bancarias: Bancolombia -Corresponsal Bancario, BBVA, Banco de Bogotá, ScotiaBank Colpatria, Davivienda - Corresponsal Bancario, Sudameris, Itaú, Banco de Occidente, Banco Popular.
Centros de Pago: Gana, PTM, Movilred, Efecty, Súper Giros, Súper Efectivo, Winred, Megared, Practi Red Multibanco.
Electrónicos: Daviplata, Cívica Pay, Claropay, Nequi, Redeban, ATH, Servibanca.
Cooperativas: Cotrafa, Confiar, Juriscoop, CFA, CooSanluis, CoopSuya.

Paga en Línea
https://aplicaciones.epm.com.co/facturaweb/#/
pse
App EPM

Puntos de atención
La explicación de los valores contenidos en esta factura se atiende en la línea empresarial 018000 410 115 a nivel nacional o a través de su Ejecutivo de Cuentas asignado. Para consultar un mayor detalle de los cobros facturados lo invitamos a ingresar www.epm.com.co y luego seleccionar "Clientes Corporativos".

Recuerda que puedes pagar tus facturas por medios electrónicos, con cargo a tu cuenta de ahorros o corriente. No tenemos disponible pago con tarjeta de crédito.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales

epm
NIT 890904 996-1

John Alberto Maya Salazar
Representante legal
Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

La presente factura presta merito ejecutivo en virtud del artículo 130 de La ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001

Software de facturación: Open SmartFlex Fabricante: OPEN SYSTEMS COLOMBIA S.A.S Nit: 900401714-6

Anexo 42. Certificado de QBM2 a EPM.

Interventorías de Obras Eléctricas Consultorías,
Asesorías, Auditorías, Outsourcing, Estudios Técnicos- Administrativos-Financieros

Cartagena de Indias, 22 de Mayo de 2025

Doctora
MARIA PATRICIA PORRAS
Secretaria General
Alcaldía Mayor Cartagena de Indias

ASUNTO: CERTIFICADO DE INTERVENTORIA ALUMBRADO PUBLICO MES ABRIL 2025

Apreciada Doctora:

En cumplimiento de nuestra misión contractual: Ejecutar "La interventoría integral del Contrato Interadministrativo 068-2022 que tiene por objeto la administración, operación, mantenimiento, modernización, reposición, expansión; las actividades de iluminación ornamental y navideña en los espacios públicos y todos los elementos necesarios para la prestación del servicio de alumbrado público del distrito de Cartagena; ..." me permito expedir el presente certificado que da fe del cumplimiento de las obligaciones de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. durante el mes de Abril 2025

Se envió informe general de interventoría en su momento que da cuenta de las actividades desarrolladas por EPM durante el mes de Abril 2025 y se anexan adicionalmente el informe de Ajustes UCAP´S.

Se firma en Cartagena a los 22 días del mes de mayo de 2025.

Cordialmente,

WILLIAM MURRA DIAZGRANADOS
Gerente y Representante Legal
QBM2 Ingenieria Electrica S.A.


WILLIAM ROBERTO MOURRA DIAZGRANADOS
Gerente y Representante Legal
QBM2 Ingeniería Eléctrica S.A.
Interventoría Alumbrado Público

Canapote Calle 20 de Julio N° 16-37 Cartagena
Teléfonos: 666 0174- 666 6219 Telefax: 666 0532 Celufijo 310-650-2676
Correo Electrónico: presidencia@qbm2.com

Anexo 43. Indicadores de Gestión de EPM – Abril 2025

El presente análisis, se realiza con corte al mes de abril 2025, dado que, para la fecha de entrega del informe, aún no se cierra el reporte del mes de abril 2025


Contractualmente el nivel de operación del sistema de alumbrado público exigido es del 90%. La eficiencia del sistema se mantiene en un **98.71%**

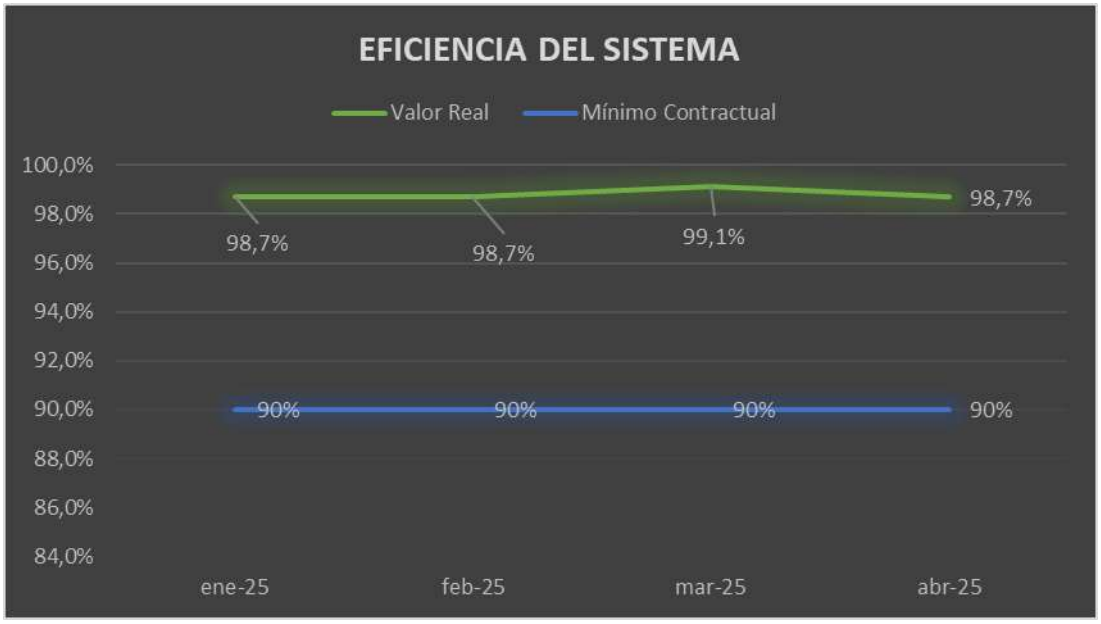

De acuerdo con el reporte de abril 2.025 aportado por EPM, se generaron **671** órdenes de trabajo durante el mes, resultado de las solicitudes de servicio recibida por los diferentes medios, telefónicos (#376 – línea 018000), comunicaciones de los usuarios directamente a EPM y a través del Distrito.


Ordenes de Trabajo año 2025							
	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	Promedio Mensual	Acumulado	
24 H	185	290	231	240	237	946	37%
48 H	179	250	154	231	204	814	32%
72 H	101	77	44	99	80	321	13%
<72H	247	92	32	101	118	472	18%
Acumulado	712	709	461	671	**638**	**2553**	100%

En abril 2.025:
El 35.8% (240) de los reportes se atendieron en 24 horas
El 34.5% (231) se atendieron en 48 horas.
El 14.7% (99) de los reportes se atendieron en 72 horas
El.15% (101) mayor a 72 horas, por la complejidad de la intervención.

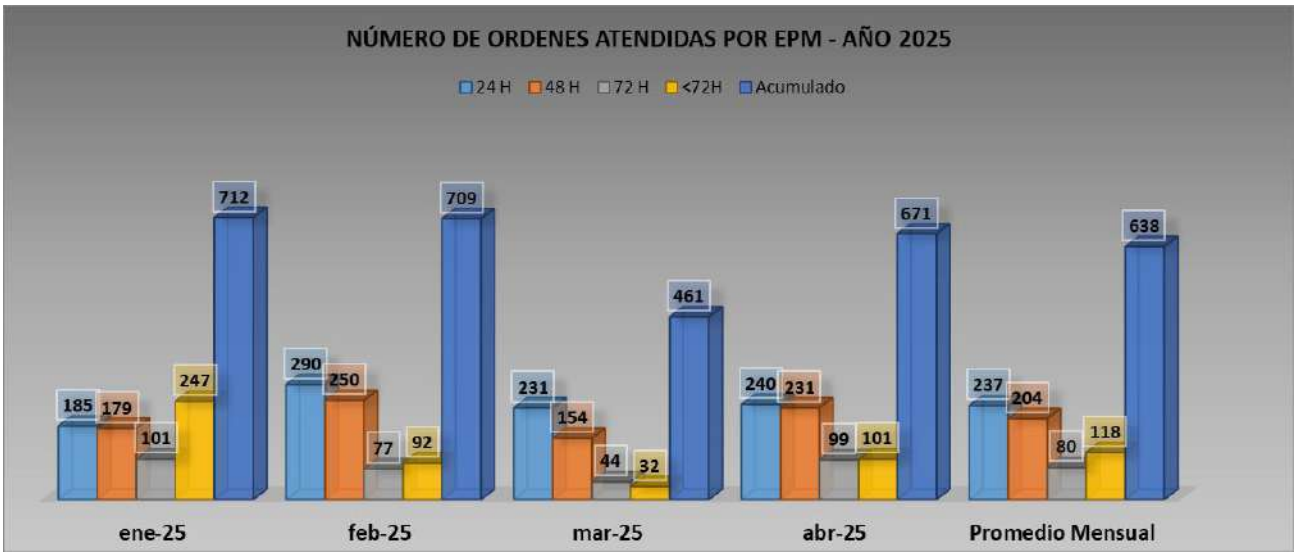

El tiempo de atención de solicitudes se incrementó de 34 a 46.7 horas, pero se disminuyeron las solicitudes en general pasando de 461 a 671 en el mes de abril 2025.

Mes	**ene-25**	**feb-25**	**mar-25**	**abr-25**	**Promedio mensual**
Tiempo (h)	**50**	**26,1**	34	46,7	**39**

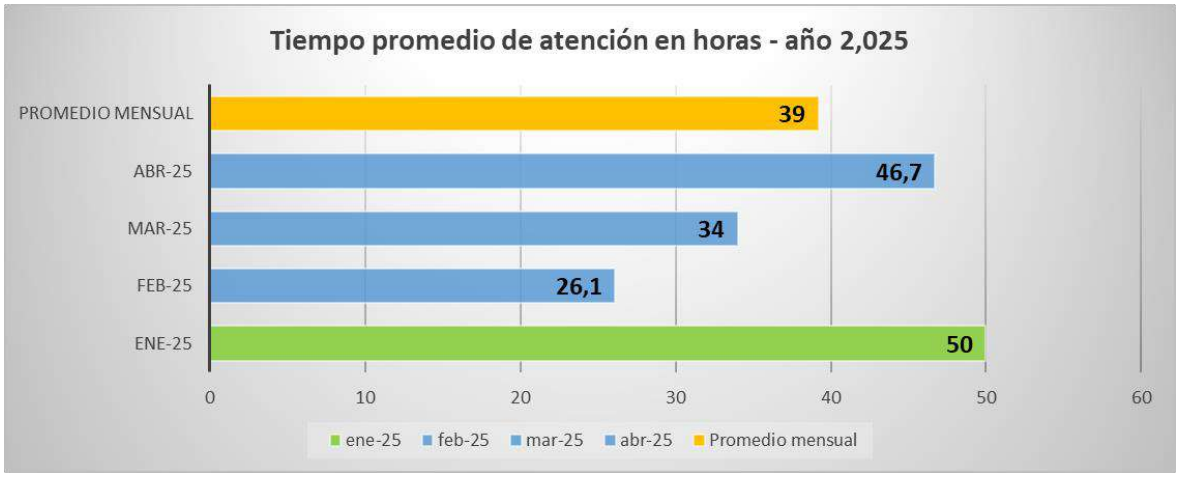

Y en general, la cobertura de atención en el primer trimestre es del 37% en atenciones dentro de las 24 horas.


Cobertura de atención 2025
<72H
18%
24 H
37%
72 H
13%
48 H
32%
24 H
48 H
72 H
<72H

Anexo 44. Radicados de Informes Entregados a Distrito.

AP-DIS-024-2025

Interventorias de Obras Eléctricas, Consultorías,
Asesorías, Auditorías, Outsourcing, Estudios Técnicos- Administrativos-Financieros

AP DIS-024-2025

Cartagena de Indias D.T. y C., 15 de Mayo de 2025

Señores
ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA
Atn: Dra. María Patricia Porras
Secretaria General
Cartagena

Asunto: Envío Informe de Interventoría Abril de 2025.

Cordial saludo

El motivo del presente es enviar por medio de la Ventana de Atención Al Cliente y adjunto al mismo, el informe de interventoría (99 Folios) correspondiente al mes de Abril del año 2025, el cual contiene todo lo concerniente al Alumbrado Público en el Distrito de Cartagena de Indias y sus Corregimientos.

Agradeciendo su colaboración.

LUIS MIGUEL MEJIA CHAVEZ
Director De Interventoria

Copia: Archivos

Canapote Calle 20 de Julio N° 16-37 Cartagena
Teléfonos: 605 65 24 715 Celufijo 310-650-2676
Correo Electrónico: presidencia@qbm2.com

AP DIS-025-2025

Cartagena de Indias D.T. y C., 16 de Mayo de 2025

Señores
ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA
Atn: Dra. Gina Patricia Vélez Ortiz
Asesora de Despacho de Servicios Públicos.
Cartagena

Asunto: Envío Factura de Interventoría.

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta lo descrito en la cláusula séptima del Contrato de Interventoría No. SG-CMA-UAC-066-2022, se hace el envío de la factura No. QBM2-185. A continuación, enumero los documentos que hacen parte de la misma:

1. Factura Electrónica de Venta QBM2-185
2. Certificación de Parafiscales
3. Cédula de Revisor Fiscal
4. Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal
5. RUT de la empresa
6. Constancia de envío electrónico de la factura.

Atentamente,

LUIS MIGUEL MEJIA CHAVEZ
Director De Interventoría

Canapote Calle 20 de Julio N° 16-37 Cartagena
Teléfonos: 605 65 24 715 Celufijo 310-650-2676
Correo Electrónico: presidencia@qbm2.com

Anexo 45. Seguridad Social De Interventoría - Planilla Integral – SOI **7972364112**

Pago: 21/05/2025

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800008788
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			QBM INGENIERIA ELECTRICA SA
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	CANAPOTE CALLE 20 DE JULIO	TELÉFONO:	6660174
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA


NÚMERO PLANILLA:	7972364112		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/05/21		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1497473707

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	3	$ 1.996.500
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 3.343.000
8002248088	230301	230301-PORVENIR	3	$ 1.095.600
		SUBTOTAL:	11	**$ 6.435.100**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3	$ 385.800
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3	$ 343.900
8060083947	EPS048	MUTUAL SER EPS-S	1	$ 198.800
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	4	$ 662.000
		SUBTOTAL:	11	**$ 1.590.500**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8904800237	CCF08	CCF08-COMFENALCO CARTAGENA	11	$ 1.590.500
		SUBTOTAL:	11	**$ 1.590.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002261753	14-25	14-25-COLMENA	11	$ 1.210.800
		SUBTOTAL:	11	**$ 1.210.800**

VALOR SIN MORA:	$ 10.826.900
VALOR MORA:	$ 0
TOTAL PAGADO:	$ 10.826.900

2025/05/21 12:22 PM USUARIO: SOI - CC45452595 PÁGINA 1 DE 1

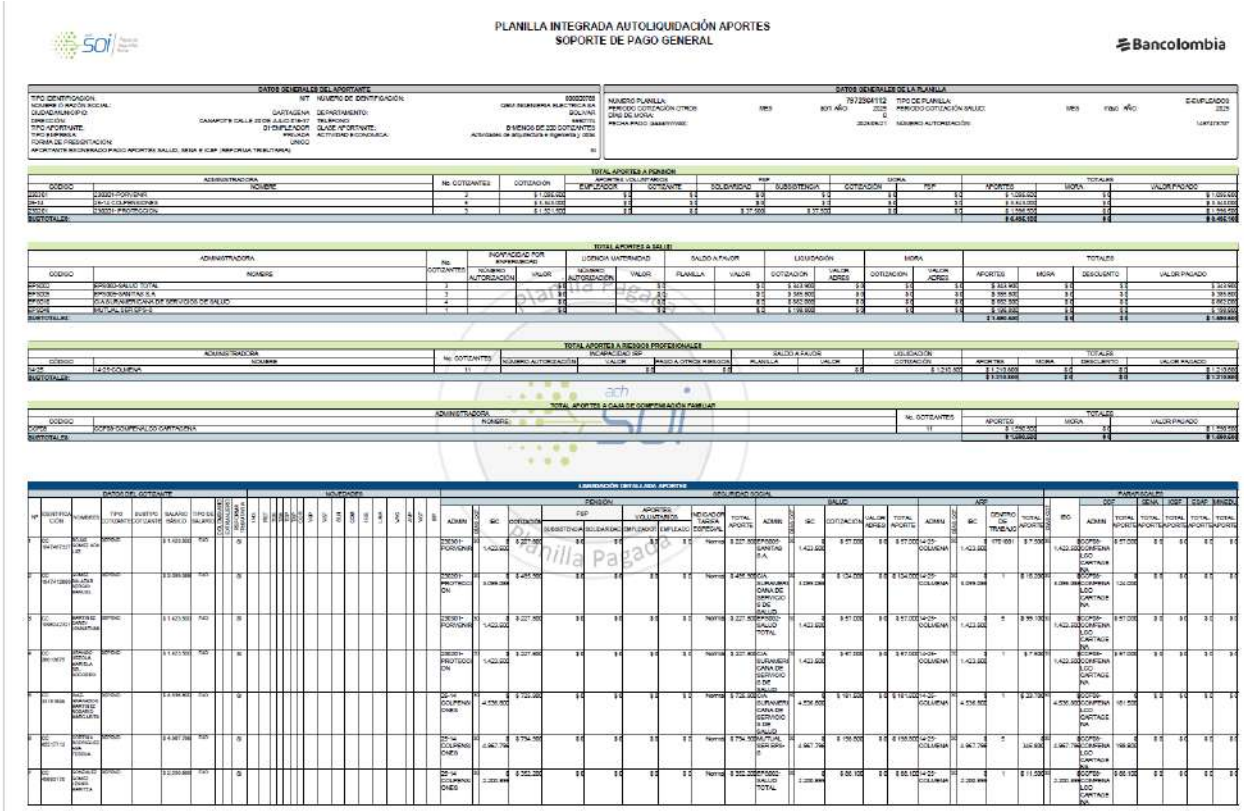

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800020700
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CMH INGENIERIA ELECTRICA SA
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	CAMPOTE CALLE 20 DE JULIO #18-37	TELÉFONO:	6667731
TIPO APORTANTE:	01 EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	5 MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7572364112		TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS CONCEPTOS:	MES 05	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	FIJO	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/05/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				1400473707

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
52201	52201-PORVENIR	2	$ 1.399.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.399.400	$ 0	$ 1.399.400
0414	0414-COLPENSIONES	4	$ 5.343.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.343.000	$ 0	$ 5.343.000
25901	25901-PROTECCIÓN	5	$ 1.521.400	$ 0	$ 0	$ 37.500	$ 37.500	$ 0	$ 0	$ 1.596.400	$ 0	$ 1.596.400
SUBTOTALES:										$ 8.492.100	$ 0	$ 8.492.100

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 603.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 603.900	$ 0	$ 0	$ 603.900
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 395.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 395.500	$ 0	$ 0	$ 395.500
EPS016	EPS016-SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 902.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 902.000	$ 0	$ 0	$ 902.000
47-05	47-05-SALUDMIA E.P.S.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.196.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.196.600	$ 0	$ 0	$ 1.196.600
SUBTOTALES:													$ 3.098.000	$ 0	$ 0	$ 3.098.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD ISP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-25	14-25-COLMENA	11		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.215.600	$ 1.215.600	$ 0	$ 0	$ 1.215.600
SUBTOTALES:									$ 1.215.600	$ 0	$ 0	$ 1.215.600

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF03	CCF03-COMFENALCO CARTAGENA	11	$ 1.580.300	$ 0	$ 1.580.300
SUBTOTALES:			$ 1.580.300	$ 0	$ 1.580.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE													NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
																													PENSIÓN								SALUD					ARP													
ITE	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	DÍAS COTIZADOS	HORAS COTIZADAS	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	SEC ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL PENSIONES	TOTAL APORTE	ADMIN	SEC ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	VALOR AJUSTE	TOTAL APORTE	ADMIN	SEC ADMIN	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	ESAP	TOTAL APORTE	MINEDU	TOTAL APORTE
1	CC 1047407312	ROJAS GARCIA ADA JO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO	30										52501-PORVENIR		$ 227.500		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.500	52501-PORVENIR		$ 227.500		$ 0	$ 227.500	14-SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD		$ 57.000		$ 57.000	14-25-COLMENA		$ 57.000	1	$ 570	001-COMFENALCO CARTAGENA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1042128864	CHICA LOPEZ SERGIO MANUEL	DEPEND		$ 3.399.998	FIJO	30										25901-PROTECCIÓN		$ 3.399.998		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 408.000	25901-PROTECCIÓN		$ 3.399.998		$ 0	$ 408.000	16-SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD		$ 154.000		$ 154.000	14-25-COLMENA		$ 154.000	1	$ 1.540	001-COMFENALCO CARTAGENA	$ 154.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1066042760	MARTINEZ CANO JONATHAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO	30										52501-PORVENIR		$ 227.500		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.500	52501-PORVENIR		$ 227.500		$ 0	$ 227.500	16-SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD TOTAL		$ 57.000		$ 57.000	14-25-COLMENA		$ 57.000	1	$ 570	001-COMFENALCO CARTAGENA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1001139079	ORTEGA MARELA MARIA ALEJANDRA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO	30										25901-PROTECCIÓN		$ 227.500		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.500	25901-PROTECCIÓN		$ 227.500		$ 0	$ 227.500	16-SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD		$ 57.000		$ 57.000	14-25-COLMENA		$ 57.000	1	$ 570	001-COMFENALCO CARTAGENA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1018461808	RUIZ MANCILLA MARTIN DE MOISES MARCELINO	DEPEND		$ 3.399.900	FIJO	30										52-14-COLPENSIONES		$ 720.000		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 720.000	52-14-COLPENSIONES		$ 720.000		$ 0	$ 720.000	16-SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD		$ 181.000		$ 181.000	14-25-COLMENA		$ 181.000	1	$ 1.810	001-COMFENALCO CARTAGENA	$ 181.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1001171121	CORTES LOPEZ ANA TERESA	DEPEND		$ 4.967.796	FIJO	30										52-14-COLPENSIONES		$ 794.500		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 794.500	52-14-COLPENSIONES		$ 794.500		$ 0	$ 794.500	16-SALUD TOTAL		$ 199.000		$ 199.000	14-25-COLMENA		$ 199.000	1	$ 1.990	001-COMFENALCO CARTAGENA	$ 199.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1066001705	ORTEGA LOPEZ ANDRES MARTIN	DEPEND		$ 2.200.899	FIJO	30										52-14-COLPENSIONES		$ 352.200		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 352.200	52501-PORVENIR		$ 352.200		$ 0	$ 352.200	16-SALUD TOTAL		$ 88.100		$ 88.100	14-25-COLMENA		$ 88.100	1	$ 881	001-COMFENALCO CARTAGENA	$ 88.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

2026/05/21 12:23 PM USUARIO: SOI 0044452335 PÁGINA 1 DE 2

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800020700
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CMH INGENIERIA ELECTRICA SA
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	CAMPOTE CALLE 20 DE JULIO #18-37	TELÉFONO:	6667731
TIPO APORTANTE:	01 EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	5 MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7572364112		TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS CONCEPTOS:	MES 05	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	FIJO	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/05/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				1400473707

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE													NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
																													PENSIÓN								SALUD					ARP													
ITE	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	DÍAS COTIZADOS	HORAS COTIZADAS	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	SEC ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL PENSIONES	TOTAL APORTE	ADMIN	SEC ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	VALOR AJUSTE	TOTAL APORTE	ADMIN	SEC ADMIN	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	ESAP	TOTAL APORTE	MINEDU	TOTAL APORTE
8	CC 1067...6	BOLAÑO MERCADO KEITH S	DEPEND		$ 4.219.224	FIJO	30										52-14-COLPENSIONES		$ 479.100		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	NORMAL	$ 479.100	52501-PORVENIR		$ 479.100		$ 0	$ 479.100	16-SALUD TOTAL		$ 184.600		$ 184.600	14-25-COLMENA		$ 184.600	1	$ 1.846	001-COMFENALCO CARTAGENA	$ 184.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 7...4	GONZALEZ PADILLA ALEXIS ESNEIDER	DEPEND		$ 4.000.000	FIJO	30										52501-PORVENIR		$ 400.000		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	NORMAL	$ 400.000	52501-PORVENIR		$ 400.000		$ 0	$ 400.000	16-SALUD TOTAL		$ 160.000		$ 160.000	14-25-COLMENA		$ 160.000	1	$ 471.000	$ 20.000	001-COMFENALCO CARTAGENA	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1...5	MARTINEZ CANO JONATHAN	DEPEND		$ 4.967.796	FIJO	30										52-14-COLPENSIONES		$ 794.500		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	NORMAL	$ 794.500	52501-PORVENIR		$ 794.500		$ 0	$ 794.500	16-SALUD TOTAL		$ 199.000		$ 199.000	14-25-COLMENA		$ 199.000	1	$ 1.990	001-COMFENALCO CARTAGENA	$ 199.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1001139079	ORTEGA LOPEZ ANA TERESA	DEPEND		$ 7.189.722	FIJO	30										25901-PROTECCIÓN		$ 1.197.600	$ 37.500	$ 37.500	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.272.600	16-SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD		$ 1.197.600		$ 0	$ 1.197.600	16-SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD		$ 299.000		$ 299.000	14-25-COLMENA		$ 299.000	1	$ 2.990	001-COMFENALCO CARTAGENA	$ 299.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 10.826.900

Planilla Pagada

2026/05/21 12:23 PM USUARIO: SOI 0044452335 PÁGINA 2 DE 2

Anexo 46. Informe De Facturación Y Recaudo Del Impuesto De Alumbrado Público Del Mes De Febrero 2025 – Liquidado Por AFINIA (Operador Local).

AFINIA - CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.

JEFATURA TERRITORIAL : BOLIVAR NORTE

LIQUIDACIÓN REMANENTE DE IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO A FAVOR DEL MUNICIPIO: **CARTAGENA**

NIT: 89048018-4

SEGÚN CONVENIO DE SUMINISTRO ENERGÍA CON DESTINO AL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

Realizada el: 16/05/2025 Con informes de facturación y recaudo del impuesto correspondientes al mes de: ABRIL_2025

Valor facturación del impuesto de alumbrado público CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., del mes de: ABRIL_2025	$	4.022.716.296
Ajustes Aplicables:		
Concepto Ajuste:		
TOTAL FACTURACIÓN:		**$ 4.022.716.296**
Valor recaudado del impuesto de alumbrado público CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., del mes de: ABRIL 2025	$	3.764.357.185
Ajustes Aplicables:		
Concepto Ajuste:		
TOTAL RECAUDOS		**$ 3.764.357.185**
Valor facturación de energía al servicio de alumbrado público municipio de: CARTAGENA	$	1.615.557.470
Correspondiente al consumo de: ABRIL_2025 NIC: 4900215		
Ajustes Aplicables:		$ 0
Cuota de convenio:		$ 0
Abono a cartera energía:		$ 0
Otros cargos y/o cuota diferimiento:	$	41.384.662
TOTAL FACTURACIÓN DE ENERGÍA Y OTROS CARGOS		**$ 1.656.942.132**
VALOR A CRUZAR CON EL RECAUDO DEL IMPUESTO		**$ 1.656.942.132**

Observacion: **LOS CARGOS DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y AP ZONA NORTE ASCIENDEN A:**

Valor Escenarios Deportivos Cartagena	$ 29.450.420	Alumbrado Público Zona Norte de Cartagena	$ 11.934.242

VALOR A TRASLADAR AL MUNICIPIO / DISTRITO DE: CARTAGENA **$ 2.107.415.053**

DATOS CUENTA DE GIRO

Nombre y Apellidos: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA CARTAGENA - ALUMBRADO PÚBLICO

Banco: BANCO DE OCCIDENTE

Cuenta: Ahorros - No 831-80765-6

NIT: 890.480.184-4

Nombre Autorizante: WILLIAM CORONELL NIETO

Cargo: Subgerente Mercadeo y Ventas (e)

MO.00004.EF-FO.05
Ed. 01

Anexo 47. Liquidación De Energía – Mayo 2025 (Correspondiente Al Mes De Abril 2025).



Información Operador de Red:
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P.
Carrera 13B # 26 - 78 Piso 3
Teléfonos: 018000913737 - 6056502110
Correo Electrónico:
www.afinia.com.co

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A. E.S.P.
NIT: 901.380.949 1
Oficina Telefónica 24 Horas: 018000913737 6056502110
Dirección: Carrera 13B # 26 78 Piso 3 Cartagena
www.afinia.com.co

Información del cliente

Cliente ALUMBRADO PUBLICO CARTAGENA
NIT o C.C.: 8060057684 NIC Cliente: 4900215 NIU: 18119267
Dirección de envío: SECTOR PLAZA DE LA ADUANA, ALUM 1
Dirección de planta:
Municipio: CARTAGENA Departamento BOLIVAR
Contrato N°: OFEAMNR-0111-2022 Ejecutivo de Venta: ANDRES FELIPE NAVARRO MERCADO
Uso: ALUMBRADO PUBLICO Nivel de tensión: II 13.2 KV Propiedad Cliente

Información de este documento

Documento equivalente N°: CA22102504782590
Ciudad y fecha: CARTAGENA / 14 - 05 - 2025
Período facturado: 01 - 04 - 2025 al 30 - 04 - 2025
Días facturados: 30
Pagar antes del: 30 - 05 - 2025
Tasa de interés por mora: 2.20
Id Cobro: 4900215623-47
Interés por mora equivalente a la tasa legal migratoria vigente en la fecha de efectuarse el pago, certificada por la Superintendencia Financiera

Calidad de la energía

Circuito / Transformador
Circuito: BOCA GRANDE 1 Código: Grupo Calidad: 1 DIU: 0 DIUG: 0 FIU: 0 FIUG: 0

Detalle del cobro

Conceptos facturados	Valores
GENERACION	873,264,767.07
COMERCIALIZACION	35,887,588.78
TRANSPORTE NACIONAL	127,389,320.90
TRANSPORTE REGIONAL	320,211,972.23
OTROS CARGOS REGULADOS	172,089,002.99
PERDIDAS RECONOCIDAS	91,231,288.31
Ajuste Tarifa Energia	4,516,473.00
Aproximacion A Decenas Energia	2.72
SUBTOTAL ENERGIA	1,615,557,470
SUBTOTAL COBROS OTRAS ENTIDADES	
FACTURAS ANTERIORES POR PAGAR	
TOTAL FACTURACION MES	1,615,557,470
SALDO ACTUAL	1,615,557,470

Esta factura no incluye valor de la compensación de calidad, la cual será incluida en la próxima facturación

Esto te interesa

Somos grandes contribuyentes según resolución No 010220 del 26 de diciembre de 2022, obteniendo de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta mérito ejecutivo, Art. 130 Ley 142 de 1994. Para todos los efectos el presente se denominará "Documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con lo establecido en el Dur 1625 de 2016 y gozará los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplado en el capítulo VI de la ley 142 de 1994.

SON: UN MIL SEISCIENTOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

Representante legal:

Saldo Actual: UN MIL SEISCIENTOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

Realice sus pagos en Bancolombia o Banco de Bogotá
Cualquier inquietud favor comunicarse al teléfono 018000-913737 con su ejecutivo de ventas

Cliente	NIC	ID. de Cobros	Documento N°.	Período facturado
ALUMBRADO PUBLICO CARTAGENA	4900215	4900215623-47	CA22102504782590	01 - 04 - 2025 al 30 - 04 - 2025

Pagar Antes de
30 - 05 - 2025
Total a pagar mes
1,615,557,470

(415)7709998169074(8020)4900215623047O(3900)1615557470(96)20250530

Consignese a Favor no colocar sellos sobre el código de barras

Documento equivalente electrónico

N. factura: CA22102504782590
Fecha: 2025-05-15
Hora: 10:49:58-10:00
NIT: 901380949
Documentos: 890480184

CUDE: 795aa4a4a77c45f6533dc8e2a05f2f492c3ee1d155ffa4380649d2707c7b1eac6b9f1bf2d2372e1db3f742ce3a39d582

Documento validado por la DIAN

afinia
Grupo-epm

Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P. NIT 901.392.949-1

Formato 1: Detalle de documento equivalente

Información del cliente

Cliente:	ALUMBRADO PUBLICO CARTAGENA
NIT o C.C.	8060057684
NIC Cliente:	4900215

Consumos	G = Generación (Liquidación de Energía)				CO = Comercialización				P = Pérdidas (Reconocidas)	
	Contratada a precio fijo				Contratada a precio fijo					
	0									
Consumo Energía Activa Nivel de Tensión II 13.2 KV	Energía comprada kWh-Mes	Precio corriente actualizado con IPP	Subtotal en pesos ($)	Total a pagar generación ($)	Energía comprada kWh-Mes	Precio corriente actualizado con IPP	Subtotal en pesos ($)	Total a pagar comercialización (CO)	Tarifa	Total
2,289,509	2,289,509	381.4	873,264,767	873,264,767	2,289,509	15.67	35,887,589	35,887,589	39.85	91,231,288

T=Transporte Nacional				D=Transporte Regional			
Franja horaria	Consumo kWh-Mes	Valor del peaje $/kWh	Subtotal a pagar $	Franja horaria	Consumo kWh-Mes	Valor del peaje $/kWh	Subtotal a pagar $
Máxima	572,377	61.82	35,384,984	Máxima	572,377	139.86	80,052,993
Media	763,170	57.37	43,781,715	Media	1717,131	139.86	240,158,979
Mínima	953,962	50.55	48,222,621	Mínima			
Total Transporte Nacional	2289,509	55.64	127,389,320	Total Transporte Nacional	2289,508	139.86	320,211,972

O=Otros cargos regulados				Contribución		R= Cobro Energía Reactiva Inductiva		
Descripción	Consumo horas generación kWh	Valor $/kWh	Subtotal a pagar $	% de Leg	0.00	Energía Activa kWh	Energía Reactiva Kvarh	Penalización Kvarh Cobrado
Restricciones + Cprog	2,289,509	75.16	172,089,003	G+CO+P+T+D+O	0	2,289,509	0	0
						Tarifa por Kvarh:		0.00
Total otros cargos reg.			172,089,003	Total:	0	Total a pagar por Energía Reactiva Inductiva:		0

Registro Histórico

	Promedio (Últimos 6 meses)	2024 - 11	2024 - 12	2025 - 01	2025 - 02	2025 - 03	2025 - 04
Energía Activa kWh/mes	2,334,967	2,351,593	2,388,226	2,388,225	2,204,026	2,388,224	2,289,509
Energía reactiva kVArh	0	0	0	0	0	0	0
Demanda máxima kW	6,452	6,532	6,420	6,420	6,560	6,420	6,360
Factor de Potencia	1.000						
Factor de Cargo	0.000						
Tarifa promedio sin contribución	707.6						
Tarifa promedio ($/kWh)	707.6						
IPP de Referencia	185.83						

Variable M: Variable dada de acuerdo con las resoluciones CREG 015 de 2018 y CREG 199 de 2019. Podrá variar entre 1 y 12, afectando el valor a pagar por Energía reactiva inductiva y capacitiva.

M= 1

El valor de Otros Cargos Regulados (75.16 $/kWh) incluye para el Operador de Red: CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P.
Incluye: RESTRICCIONES: 69,30 $/kWh CPROG: 5,86



RELACION VALORADA ESCENARIOS DEPORTIVOS Y FACTURAS DE ENERGIA AP - ABRIL_2025

NIC	NOMBRE	SIMBOLO VARIABLE	VALORES AP
ESCENARIOS DEPORTIVOS CARTAGENA			
1264090	ESTADIO ARGEMIRO BERMUDEZ	1264090373	$ 5.622.290
4317142	PISTA DE PATINAJE CAMPESTRE 1	4317142354	$ 1.084.560
6504164	ARQ, DE CARTAGENA	6504164303	$ 1.702.420
6528439	ESTADIO DANIEL LEMAITRE	6528439269	$ 208.380
6534632	ESTADIO DE ALAMEDA	6534632301	$ 12.248.510
6560383	PISTA DE PATINAJE CAMPESTRE 2	6560383296	$ 540.820
6595317	CANCHA VILLA RUBIA	6595317293	$ 2.307.070
6610165	ESTADIO DE BLAZ DE LEZO	6610165295	$ 153.530
6621899	PISTA AUXILIAR ATLETISMO	6621899292	$ 204.820
6823300	CANCHA COLOMBIANITOS	6823300259	$ 145.610
7541723	ESTADIO DE PASACABALLO	7541723217	$ 966.100
7809739	PASEO PEATONAL BOCAGRANDE 1	7809739141	$ 1.164.000
7809742	PASEO PEATONAL BOCAGRANDE	7809742139	$ 1.077.720
7809667	CANCHA DE SOFBOLL SAN FRANCISCO	7809667143	$ 14.750
7875503	PROYECTO CIUDAD JARDIN	7875503124	$ 2.009.840
			$ 29.450.420
ALUMBRADOS PÚBLICOS ZONA NORTE CARTAGENA			
7769303	ALUMBRADO PUBLICO ZONA NORTE	7769303165	$ 2.035.760
7769312	ALUMBRADO PUBLICO ZONA NORTE	7769312156	$ 137.710
7769313	ALUMBRADO PUBLICO ZONA NORTE	7769313153	$ 548.122
7769315	ALUMBRADO PUBLICO ZONA NORTE	7769315157	$ 546.820
7769316	ALUMBRADO PUBLICO ZONA NORTE	7769316157	$ 1.043.530
7769317	ALUMBRADO PUBLICO ZONA NORTE	7769317158	$ 671.450
7769320	ALUMBRADO PUBLICO ZONA NORTE	7769320160	$ 2.871.290
7775497	ALUMBRADO PUBLICO ZONA NORTE	7775497158	$ 1.282.060
7775498	ALUMBRADO PUBLICO ZONA NORTE	7775498159	$ 2.133.010
7775499	ALUMBRADO PUBLICO ZONA NORTE	7775499152	$ 664.490
			$ 11.934.242
ENERGIA ALUMBRADOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
4900215	CARTAGENA	4900215622	$ 1.615.557.470
