INFORME DE INTERVENTORIA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS Y SUS CORREGIMIENTOS
INFORME N°30 – JUNIO/JULIO 2025

CONTRATANTE: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C.

CONTRATISTA: OPERADOR: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°068 DE 2022

DURACIÓN: 18 MESES DE OPERACIÓN DESDE 06/01/2023 HASTA 06/07/2024

MODIFICATORIO #03 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.068

DURACIÓN: 6 MESES HASTA 31 DE ENERO DICIEMBRE 2024

MODIFICATORIO #05 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.068

DURACIÓN: 6 MESES – DE 14/01/2025 A 14/07/2025

INTERVENTOR: QBM2 INGENIERIA ELECTRICA S.A.
CONTRATO N°SG-CMA-UAC-066-2022

DURACIÓN: 18 MESES A PARTIR DEL 06/01/2023

MODIFICATORIO #01 AL CONTRATO N°SG-CMA-UAC-066-2022

DURACIÓN: 6 MESES HASTA 31 DE DICIEMBRE 20245

MODIFICATORIO #02 AL CONTRATO N°SG-CMA-UAC-066-2022

DURACIÓN: 6 MESES – DE 14/01/2025 A 14/07/2025

AFINIA: CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CON DESTINO AL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, N° AMNR – 169-2022 CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.-AFINIA

INDICE

1. ACTIVIDADES GENERALES 6

2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO..... 9

3. SEGUIMIENTO TÉCNICO 10

4. SEGUIMIENTO OPERATIVO 12

5. SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTABLE..... 20

6. SEGUIMIENTO JURIDICO 20

7. CUADROS Y GRAFICOS FINANCIEROS..... 21

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES FINALIZADO JUNIO/JULIO 2025 26

A N E X O S 27

LISTADO DE ANEXOS

Anexo 1 Registro De Inspección De Infraestructura De Alumbrado Público Del Proyecto San Sebastián Parque Residencial 28
Anexo 2. Acta De Comité #07 - 04/07/2025 32
Anexo 3. Acta De Comité #08 - 16/07/2025 40
Anexo 4. Registro Fotográfico De Seguridad Y Área De Trabajo 43
Anexo 5. Certificado De Aportes Y Seguridad Social Del Contratista 45
Anexo 6. Solicitud De Modificación Fachada De La Alcaldía - SS1080720 49
Anexo 7. Solicitud De Modificación Puente Las Gaviotas - SS1080341 50
Anexo 8. Solicitud De Modificación Rotonda Puente Manga - SS1085289 51
Anexo 9. Solicitud De Modificación Parque Los Alcatraces, Av. Santander - SS1084738 52
Anexo 10. Solicitud De Modificación Refuerzo Ingreso A Tierra Baja - SS1089580 53
Anexo 11. Solicitud De Modificación Bayunca, Cra. 12 San Antonio, La Posita - SS1091452 .. 54
Anexo 12. Solicitud De Modificación Refuerzo Villa Estrella, Cra. 94 - SS1093030 55
Anexo 13. Solicitud De Modificación Bayunca, Carrera 20 Parque Del Sect. San Rafael - Ss1091448 56
Anexo 14. Solicitud De Modificación Barrio El Country: Puente Y Cancha De Arena - SS1086496 57
Anexo 15. Solicitud De Modificación Curva De Ceballos, Corredor De Carga - SS1097297 58
Anexo 16. Solicitud De Modificación Hurto Y Vandalismo Marzo A Mayo 2025 - SS1099929 ... 59
Anexo 17. Solicitud De Modificación Cancha De Urb. Palmas De Salamancas – SS1080720 60
Anexo 18. Solicitud De Modificación Cancha De Urb. Barú – SS1080341 61
Anexo 19. Solicitud De Modificación Reposición Proyectores Vandalizados En Murallas – SS1085289 62
Anexo 20. Solicitud De Modificación Refuerzo Peaje Coralito Mamonal – SS1114295 63
Anexo 21. Solicitud de Modificación Refuerzo Peaje Manga - SS1114306 64
Anexo 22. Solicitud de Modificación Santana y Ararca - zonas normalizadas - SS1104939 65
Anexo 23. Solicitud de Modificación Puente Román Etapa II - SS1114904 66
Anexo 24. Solicitud de Modificación El Toril, Calle 33 - SS1117766 67
Anexo 25. Seguimiento de solicitudes de modificación junio/julio 2025 Actualizar 68
Anexo 26. Registro de auditoría de la información de solicitudes de junio/julio 2025 69
Anexo 27. Registro fotográfico Intervención Parque del Socorro Plan 500B – SS 1043933 70

Anexo 28. Registro fotográfico Intervención Parque Socorro Cercanos al CAI – SS941858 71
Anexo 29. Registro fotográfico Intervención Parque Socorro Los Coralitos – SS867695..... 74
Anexo 30. Registro fotográfico Intervención Barrio San Pedro 75
Anexo 31. Registro fotográfico Intervención Altos del Campestre y cancha – SS1075612..... 76
Anexo 32. Registro fotográfico Intervención Palmas de Salamancas 77
Anexo 33. Registro fotográfico Intervención Ingreso a Tierra Baja – SS1089580 78
Anexo 34. Registro fotográfico Intervención La Sevillana - SS1003328..... 79
Anexo 35 Registro fotográfico Intervención Parque Vicente Martínez Martelo – SS106417 80
Anexo 36. Registro fotográfico Intervención Parque Alameda, EL Nogal y San Fernando – SS1003334 81
Anexo 37. Registro fotográfico Intervención Ceballos Nuevo Oriente – SS1060397 86
Anexo 38. Registro fotográfico Intervención Hotel San Francisco..... 87
Anexo 39. Registro fotográfico Intervención Vía La Boquilla desde Hotel Sonesta hasta Hotel Derust – SS905933..... 88
Anexo 40. Registro fotográfico Intervención Puente Román 89
Anexo 41. Registro fotográfico Intervención Puente Román, Etapa II – SS11144904 90
Anexo 42. Registro fotográfico Intervención Avenida Santander 91
Anexo 43. Registro fotográfico Intervención Monumento de los Alcatraces..... 92
Anexo 44. Registro fotográfico Intervención Nelson Mandela, Sector Campo Bello 93
Anexo 45. Registro fotográfico Intervención La Boquilla La Bocana Cielo Mar 94
Anexo 46. Relación de luminarias instaladas Palmas de Salamancas..... 95
Anexo 47. Relación de luminarias instaladas Bicentenario 98
Anexo 48. Relación de luminarias instaladas Barrio San Pedro..... 100
Anexo 49. Relación de luminarias instaladas Nelson Mandela,Zonas Normalizadas..... 102
Anexo 50. Relación de luminarias instaladas Puente Román 105
Anexo 51. Relación de luminarias instaladas La Boquilla La Bocana, Cielo Mar 106
Anexo 52. Relación de luminarias instaladas Av. Santander 107
Anexo 53. Relación de luminarias instaladas Otros Proyectos 110
Anexo 54. Registro de medición de iluminación realizada en junio 2025 113
Anexo 55. Comunicación AP-EPM-008-2025: Ajuste de ucap's ejecutadas – mayo 2025..... 116
Anexo 56. Factura junio N°DEE20320765 EPM - Correspondiente al mes de mayo 2025 118
Anexo 57. Certificado de QBM2 a EPM. 120
Anexo 58. Indicadores de gestión de EPM con corte a 15/07/2025 121

Anexo 59. Radicados de informes entregados a Distrito. 124
Anexo 60. Acta de ajuste de energía – 25/06/2025 126
Anexo 61. Seguridad Social de Interventoría - Planilla integral – SOI **7975404778** 128
Anexo 62. Informe de facturación y recaudo del impuesto de alumbrado público del mes de mayo 2025 – liquidado por AFINIA (operador local) 130
Anexo 63. Liquidación de Energía – junio 2025 (correspondiente al mes de mayo 2025) 131
Anexo 64. Informe de facturación y recaudo del impuesto de alumbrado público del mes de junio 2025 – liquidado por AFINIA (operador local) 134
Anexo 65. Liquidación de Energía – julio 2025 (correspondiente al mes de junio 2025) 135
Anexo 66. Seguridad Social de Interventoría - Planilla integral – SOI **7979656641** 137

EJECUCION DEL MES

	1. ACTIVIDADES GENERALES	EJECUTADO EN EL MES
1	**Conocer los términos condiciones del contrato.**	El contratista conoce a la perfección las obligaciones, jurídicas, administrativas, técnicas y financieras asignadas a éste y la ejecución del contrato se hizó en cumplimiento irrestricto de éstas, evidenciado con los soportes aportados a Distrito. Los demás documentos relativos al contrato se encuentran publicados en la plataforma SECOP II
2	**Advertir oportunamente los Riesgos que puedan afectar la eficacia de los contratos objeto del servicio de alumbrado público en todos sus componentes de acuerdo con el objeto contractual, tomar las medidas necesarias para mitigarlos.**	Tras los comunicados presentados por la Interventoría el mes de mayo/2025 anexados en el informe #29, relacionados con la recuperación de cartera del impuesto de alumbrado público de usuarios terceros; desde secretaria de hacienda se encuentran validando la información, previo a presentar un balance de la gestión de cartera.
3	**Hacer seguimiento del cumplimiento del plazo de los contratos, de los cronogramas previstos en el contrato.**	En el séptimo comité, realizado el 04/07/2025, se le hizo seguimiento especial a la programación de modernización dado que el compromiso de EPM es cumplir con la ejecución de 4.231 ucap's. Se cumplió con el ejercicio de liquidación de las ucap's de mayo 2.025 (1328.6), siendo la base para la facturación de EPM, generada el 17/junio/25 (**N° DEE20320765**). Para el corte de junio/julio, se realizará conjuntamente QBm2 y EPM, una vez se aporte la GDB Ver seguimiento operativo del presente informe.
4	**Identificar las necesidades de cambio o ajuste.**	Importante a resaltar es la instalación de alumbrado público en zonas eléctricamente normalizadas por Afinia, como Ararca, Santana, Nelson Mandela, entre otros y la haber superado la necesidad de modernización de diversos parques como como en San Fernando, EL Socorro EL Nogal, Altos del Campestre, Martínez Martelo y otros que se relacionan en los anexos.

		Se atendieron los requerimientos de consulta técnica y jurídica en relación con la continuidad de la prestación del servicio de alumbrado público para el segundo semestre 2.025.
5	**Manejar la relación con el contratista.**	La relación de Interventoría con EPM se da en buenos términos, en el marco operativo, la liquidación conjunta de las ucap's ejecutadas para soportar de facturación; así como las revisiones y validaciones de las solicitudes de modificación de infraestructura, inspecciones en sitio
6	**Administrar e intentar solucionar las controversias entre las partes.**	No hay controversias.
7	**Organizar y administrar el recibo de bienes, obras, servicios, su cantidad, calidad, especificaciones y demás atributos establecidos en los Documentos del Proceso.**	Se realizó inspección el 04/06/2025 al proyecto de San Sebastián Parque residencial, de Constructora Normandía, levantándose acta y dejando sentada las observaciones o detalles constructivos identificados, para que el constructor tome acciones y una vez superadas se proceda con la recepción de los bienes de alumbrado público. Se realizo segunda visita, el 26/06/2025 evidenciándose luminarias pendientes por instalar. Posteriormente, el constructor envió los soportes que validan haber superado todas las observaciones. Así las cosas, desde secretaria general se gestiona el acta de recepción de la infraestructura para ser incorporada al inventario de alumbrado público de la ciudad. **Anexo 1.** Registro de inspección de infraestructura de Alumbrado público del Proyecto San Sebastián Parque Residencial
8	**Revisar si la ejecución del contrato cumple con los términos de este, las necesidades de la Entidad Estatal y actuar en consecuencia de acuerdo con lo establecido en el contrato.**	Se validó la ejecución de las UCAP's en mayo/2025; dejándolo expresado en comunicación AP-EPM-008-2025, del 17 de junio de 2025. Se realizó la supervisión de las intervenciones ejecutadas por EPM, durante el mes de junio y julio, evidenciado con registro fotográfico. Para más detalle ver las secciones "3. Seguimiento técnico" y "4. Seguimiento operativo" del presente informe

9	**Aprobar, rechazar oportunamente de forma justificada el recibo de bienes y servicios de acuerdo con lo establecido en los documentos del Proceso.**	Al finalizar el periodo actual (15/06 a 16/07), no hay solicitudes recientes de entrega de bienes de alumbrado público construido por terceros.
10	**Informar a la Entidad Estatal de posibles incumplimientos del contratista, elaborar y presentar los soportes correspondientes.**	El desarrollo de las actividades de modernización y reposición, se ejecutaron sujetas a los requerimientos particulares, provenientes de la alcaldía, así como los identificados mediante recorridos del operador y de la Interventoría. EPM, ha cumplió con la operación y mantenimiento, durante el periodo
11	**Solicitar los informes necesarios para convocar las reuniones requeridas para cumplir con su función.**	Se solicito a EPM la información del Shape (consolidado de ejecuciones de modernización por proyecto) con corte a 02/07/2025 Con esta información y la tomada por la Interventoría en las inspecciones en campo, se verificaron las ucap's liquidadas del mes de mayo/2025 EPM, se comprometió a entregar corte a 16/07/2025, posterior al 18/07/2025. Con esta información se procederá a liquidar las ucap's de junio y julio 2025
12	**Informar y denunciar ante las autoridades competentes cualquier acto u omisión que afecte la moralidad pública, con los soportes correspondientes.**	Desarrollo de actividades contractuales sin afectación de la moralidad pública por parte del operador de EPM durante el mes de julio 2025
13	**Suscribir las actas generadas durante la ejecución del contrato para documentar las reuniones, acuerdos, controversias entre las partes, así como las actas parciales de avance, actas parciales de recibo y actas de recibo final.**	Acta de comité de seguimiento realizado el 04/072025, correspondiente a la evaluación de gestión del mes de junio 2025. Acta de comité de cierre, realizado el 16/07/2025. Ucap's ejecutadas y actas soportes de pago a EPM **Anexo 2.** Acta de Comité #07 – 04/07/2025 **Anexo 3.** Acta de Comite #08 – 16/07/2025

	2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO	EJECUTADO EN EL MES
1	**Revisar que el expediente electrónico y físico del contrato esté completo, sea actualizado constantemente y cumpla con la normativa aplicable.**	El expediente contractual (SG-CMA-UAC-066-2022) se encuentra debidamente actualizado. Encontrándose cargado el acta de inicio, la aprobación de la póliza y registro presupuestal. De la misma forma en el expediente contractual de EPM, se encuentra el contrato electrónico suscrito con el respectivo registro presupuestal y póliza aprobada.
2	**Coordinar con el responsable en el Distrito de la revisión aprobación de garantías, la revisión de los soportes de cumplimiento de las obligaciones laborales.**	Revisada la plataforma Secop II, en lo que corresponde al expediente contractual de EPM, se evidencia cargadas las pólizas, así como la aprobación de éstas, del contrato inicial, están faltando las pólizas y aprobación de pólizas del modificatorio No 5. En lo que respecta al expediente electrónico del contrato de interventoría, las pólizas se encuentran cargadas, pero no está cargado el documento de aprobación, tras la celebración del modificatorio No 2 del contrato.
3	**Preparar y entregar los informes previstos que soliciten los organismos de control.**	No se presentaron requerimientos de entes de control en el mes de junio y julio 2025. Pero se cuenta con toda la información que evidencie la gestión y desarrollo de la Interventoría.
4	**Revisar que el Distrito cumpla con los principios de publicidad de los Procesos de Contratación y de los Documentos de los Procesos.**	Se verificó en la Plataforma Secop II el cumplimiento del requisito de publicidad tanto respecto al contrato con EPM como el de interventoría.
5	**Verificar el cumplimiento de las obligaciones de los contratistas en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato.**	El contratista aplicó las medidas de seguridad en vías, delimitación de las zonas de trabajo., Cumplimiento de la seguridad social, aportada el 19/06/2025. Permanentemente, disponen de profesional de HSEQ que hace presencia en los barrios con operativa de modernización, velando que se minimicen los riesgos y accidentes. Esta actividad es constante. **Anexo 4.** Registro fotográfico de seguridad y área de trabajo **Anexo 5.** Certificado de aportes y seguridad social del contratista

	3. SEGUIMIENTO TÉCNICO	EJECUTADO EN EL MES
1	**Verificar el cumplimiento de las normas técnicas aplicables al servicio de alumbrado público en todos sus componentes de acuerdo con el objeto contractual**	Los materiales utilizados por el contratista son homologados y certificados. Los diseños fotométricos de calles y parques continúan realizándolos, con la normativa técnica RETILAP.
2	**Revisar que las personas que conforman el equipo del contratista cumplan las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato, exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario.**	EPM, cumple con las condiciones mínimas para garantizar un trabajo seguro tanto en campo como en oficinas. La supervisión de HSEQ en los proyectos es constante. El grupo de ingenieros a cargo es profesional y siempre aportante de soluciones.
3	**Identificar las necesidades de cambio o ajuste revisar el curso de acción con las partes.**	Se identificó y se superó la necesidad reforzar la iluminación de la zona vere debajo del Puente Román. La cual se genero la solicitud de modificación de infraestructura, se valido desde la interventoría, se aprobó desde secretaria general y el operador EPM inició su ejecución.
4	**Estudiar las solicitudes, requerimientos técnicos de los contratistas, dar recomendaciones a la Entidad Estatal sobre el particular.**	Interventoría revisó y avaló solicitudes de modificación de infraestructuras (SMI) aportadas por EPM, el periodo de junio a julio 2025: **Anexo 6**. Solicitud de Modificación Fachada de la Alcaldía - SS1080720 **Anexo 7**. Solicitud de Modificación Puente Las Gaviotas - SS1080341 **Anexo 8**. Solicitud de Modificación Rotonda Puente Manga - SS1085289 **Anexo 9**. Solicitud de Modificación Parque los Alcatraces, Av. Santander - SS1084738 **Anexo 10**. Solicitud de Modificación Refuerzo Ingreso a Tierra Baja - SS1089580 **Anexo 11**. Solicitud de Modificación Bayunca, Cra. 12 san Antonio, La Posita - SS1091452 **Anexo 12**. Solicitud de Modificación Refuerzo Villa Estrella, Cra. 94 - SS1093030 **Anexo 13**. Solicitud de Modificación Bayunca, Carrera 20 Parque del Sector San Rafael - SS1091448 **Anexo 14**. Solicitud de Modificación Barrio El Country: Puente y Cancha de arena - SS1086496

		Anexo 15. Solicitud de Modificación Curva de Ceballos, Corredor de carga - SS1097297 **Anexo 16**. Solicitud de Modificación Hurto y Vandalismo Marzo a mayo 2025 - SS1099929 **Anexo 17**. Solicitud de Modificación Cancha de Urb. Palmas de Salamancas – SS1080720 **Anexo 18**. Solicitud de Modificación Cancha de Urb. Barú – SS1080341 **Anexo 19**. Solicitud de Modificación Reposición proyectores vandalizados en Murallas – SS1085289 **Anexo 20**. Solicitud de Modificación Refuerzo Peaje Coralito Mamonal – SS1114295 **Anexo 21**. Solicitud de Modificación Refuerzo Peaje Manga - SS1114306 **Anexo 22**. Solicitud de Modificación Santana y Ararca - zonas normalizadas - SS1104939 **Anexo 23**. Solicitud de Modificación Puente Román Etapa II - SS1114904 **Anexo 24**. Solicitud de Modificación El Toril, Calle 33 - SS1117766 **Anexo 25.** Seguimiento de solicitudes de modificación junio/julio 2.025
5	**Elaborar la documentación y el soporte necesario frente la necesidad de hacer efectivas las garantías de los contratos objeto de interventoría**	No se presentaron situaciones que conllevaran a la aplicación las garantías.

	4. SEGUIMIENTO OPERATIVO	EJECUTADO EN EL MES
1	**Supervisar la actualización del Sistema de Información Georreferenciado de la infraestructura del servicio de alumbrado público del Distrito.**	El operador de alumbrado público mantiene su sistema ARCGIS actualizado en tiempo real paralelo con el desarrollo de las modernizaciones. El operador EPM, comparte el SHAPE, que es la información base para actualizar el sistema de información georreferenciado.
2	**Auditar la calidad de la información incluida en la base de datos, de acuerdo con la norma NTC ISO 2859 parte 1, "Planes de muestreo determinado por el nivel aceptable de calidad (NAC o AQL) para inspección lote a lote", y verificar que se realice la correspondiente actualización de la base de datos, para todos los procesos de modernización, expansión, cambio de infraestructura, retiro o cambio de luminarias, inclusión de infraestructura nueva, reubicación de luminarias o de infraestructura y en general de todo proceso que afecte el inventario georreferenciado.**	En el periodo de ejecución (15/06 a 16/07), con relación a la modernización, reposición y expansión se verificó la información soporte de las ejecuciones en los siguientes lugares: 1) Obras ejecutadas por EPM, ● Parques del Socorro ● Parques de Alameda, El Nogal y San Fernando ● Parque y Cancha de Altos del Campestre ● Corregimiento La Boquilla ● Zonas normalizadas de Ararca y Santana ● Urbanización Palmas de Salamanca ● La Boquilla, La Bocana Cielo Mar ● Barrio San Pedro ● Ingreso a Corregimiento de Tierra Baja ● Av. Santander y Monumento Los Alcatraces. ● Zona Normalizada en Nelson Mandela Campo Bello ● Isla Grande ● Vía La Boquilla desde Hotel Sonesta hasta Hotel Derust ● Ceballos ● Bayunca Y Otros 2) Obras pendientes de ejecutar ● Vía Barú ● Ruta 90 (Via al Mar - Cordialidad) ● Las definidas en programación a presentar de EPM Se efectúo auditoria y se registraron los códigos de las luminarias instaladas en los proyectos terminados. De acuerdo con la NTC-ISO-2859, el tamaño de la muestra es n = 80. Sin embargo, Se

		tomo la totalidad del universo de luminarias instaladas en el mes 15/06 a 17/06 de 2.025.
3	**Monitorear el estado de la infraestructura de alumbrado mediante inspecciones en jornadas diurnas y nocturnas, garantizando el cubrimiento del 100% del área Distrital mensualmente**	Interventoría, realizó recorridos nocturnos verificando eficiencia del sistema, y en especial se visitó las Urbanizaciones Sevillana y Avenida Santander, validando el funcionamiento de la nueva infraestructura. Ver anexo 29 Se generan reporte derivados de las inspecciones nocturnas y diurnas. Reportadas directamente a los coordinadores de EPM para su atención inmediata con las cuadrillas nocturnas. Atención oportuna por el operador de alumbrado público EPM. También se validó, la ejecución del mantenimiento preventivo ante la salinidad que ataca el sector de la infraestructura ornamental del alumbrado público del centro, lo cual se había expresado en comités de seguimiento. Se continua con el monitoreo, al tiempo que se generan reportes dirigidos al operador EPM, quienes al tiempo cuentan con cuadrillas nocturnas en permanente recorridos para atender las falencias detectadas en especial en la zona turística. Ver siguiente numeral.
4	**Reportar al Operador las deficiencias encontradas en el servicio.**	Tanto supervisores como ingenieros de Interventoría realizaron reportes de fallas de alumbrado público a través de los canales formales de EPM, y visitas a usuarios, generando reportes a través de los canales telefónicos de atención al usuario y otros reportados directamente a los supervisores. Se realizaron reportes de zonas apagadas directamente a los ingenieros del área operativa de EPM para una ágil atención.
5	**Revisar los reportes de quejas y reclamos por alumbrado público, y verificar el cumplimiento de los trabajos solicitados.**	Actividad recurrente de Interventoría por medio de los supervisores, se cuenta con datos de las solicitudes que evidencian la atención prestada por las cuadrillas de EPM. **Anexo 26.** Registro de auditoría de la información de solicitudes de mayo 2025

6	**Hacer seguimiento a las Comunicación que surjan de la comunidad, el Distrito, organismos de control, operador del servicio de alumbrado público, relacionadas con quejas, reclamos y solicitudes de expansión con el objeto de apoyar al Distrito, en la atención de la preparación de las respuestas.**	Se hizo seguimiento a las quejas de usuarios y se validó su atención Ver numeral 6 del seguimiento operativo
7	**Apoyar al alcalde o a quien él delegue, en la evaluación de los requerimientos de expansiones del alumbrado público, en la revisión de los diseños de alumbrado público de tales expansiones**	Esta es una tarea constante de la interventoría con el operador EPM, se continúa validando la relación de sectores por modernizar para proyectar cobertura al 100%, ya que constantemente, se van sumando zonas con redes eléctricas normalizadas.
8	**Inspeccionar las obras de expansión, modernización, reposición, repotenciación y remodelación de puntos del sistema de alumbrado público, y verificar su total sujeción al diseño aprobado, al cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento Técnico, así como a las normas constructivas y de urbanismo adoptadas por el Distrito.**	Atendiendo a la prioridad de la Alcaldía, se inspeccionaron los proyectos ejecutados en el periodo correspondiente a Av. Santander, Urb. Sevillana y demás descritos en los anexos listados a continuación: **Anexo 27.** Registro fotográfico Intervención Parque Socorro Plan 500B – SS 1043933 **Anexo 28.** Registro fotográfico Intervención Parque Socorro Cercanos al CAI – SS941858 **Anexo 29.** Registro fotográfico Intervención Parque Socorro Los Coralitos – SS867695 **Anexo 30.** Registro fotográfico Intervención Barrio San Pedro **Anexo 31.** Registro fotográfico Intervención Altos del Campestre y cancha – SS1075612 **Anexo 32.** Registro fotográfico Intervención Palmas de Salamancas **Anexo 33.** Registro fotográfico Intervención Ingreso a Tierra Baja – SS1089580 **Anexo 34.** Registro fotográfico Intervención La Sevillana - SS1003328 **Anexo 35.** Registro fotográfico Intervención Parque Vicente Martínez Martelo – SS106417 **Anexo 36.** Registro fotográfico Intervención Parque Alameda, EL Nogal y San Fernando – SS1003334 **Anexo 37.** Registro fotográfico Intervención Ceballos Nuevo Oriente – SS1060397 **Anexo 38.** Registro fotográfico Intervención Hotel San Francisco **Anexo 39.** Registro fotográfico Intervención Vía La Boquilla desde Hotel Sonesta hasta Hotel Derust – SS905933

		Anexo 40. Registro fotográfico Intervención Puente Román **Anexo 41.** Registro fotográfico Intervención Puente Román, Etapa II – SS11144904 **Anexo 42.** Registro fotográfico Intervención Avenida Santander **Anexo 43.** Registro fotográfico Intervención Vía La Bocana - SS437551 **Anexo 44.** Registro fotográfico Intervención Nelson Mandela, Campo Bello **Anexo 45.** Registro fotográfico Intervención LA Boquilla, La Bocana, Cielo Mar
9	**Llevar el control sobre las expansiones programadas en cuanto a ejecución y su relación con los materiales y equipos utilizados.**	Se revisaron y se determinaron las cantidades ejecutadas por los proyectos que se listan a continuación: Se evidencia en los comités de seguimiento realizados en julio/2025, al ser tema tratado (Anexos 2 y 3), dejando claro las que se han consumido y las que faltan para completar el compromiso contractual para el presente periodo contractual
10	**Supervisar la actualización de la base de datos del inventario.**	Actividad recurrente de EPM, con cada modernización en barrios. Cada nuevo punto de modernización y expansión quedó registrado en el sistema ARCGIS y el Base de datos georreferenciada (GDB). Queda el compromiso de parte del distrito la actualización de la información en la Plataforma MIDAS.
11	**Verificar la aplicación del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público –RETILAP, en las etapas de asignación de requisitos fotométricos a vías y demás espacios públicos, aprobación de diseños, especificación de equipos, construcción y mantenimiento de los proyectos de alumbrado público, así como de las disposiciones contempladas en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE).**	Las ejecuciones de las modernizaciones y expansiones obedecieron a los diseños fotométricos, velando el cumplimiento de los niveles de iluminación. Se mantiene la premisa de instalación de luminarias, brazos, cableado y accesorios homologados y certificados, adecuados para las condiciones climáticas tropicales y salinas de Cartagena. Por parte de Interventoría, se verifico los niveles de iluminación de los sectores evaluados, lo cual se aprecia en el siguiente numeral.

12	**Identificar los sectores que presenten deficiencias en el alumbrado público, mediante la realización de la medición de iluminancia o luminancia, según se aplique o sea conveniente. Para la verificación de los niveles de iluminación (iluminancia) o luminancia de proyectos nuevos y del alumbrado existente, usando equipos de medida con certificado de calibración o verificación vigente. Informar del resultado de las mediciones la interventoría al responsable del servicio de alumbrado público del Distrito, de acuerdo con el alcance que señala el reglamento técnico del servicio.**	Interventoría ejecutó medidas de iluminancia la Urbanización Palmas de Salamancas. Arrojando unos niveles de iluminación conformes a la exigencia normativa RETILAP, acorde al tipo de vía y espacio a evaluar. **Anexo 46.** Registro de medición de iluminación realizada en junio/julio 2025
13	**Apoyar al responsable del servicio de alumbrado público en el Distrito en el trabajo conjunto de revisión de diseños de alumbrado público, lo que hará de acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento**	Ídem #7 del Seguimiento operativo. Esta actividad ha sido constante, en la medida que se han presentado las solicitudes de modificación de infraestructuras y expansiones.
14	**Verificar el correcto funcionamiento del sistema de consulta en la Web cuando aplique y la actualización permanente de su información. Será responsabilidad de la Interventoría adecuar sus sistemas de transferencias de datos, información, indicadores y en general, de informes de acuerdo con los formatos y la periodicidad que el Distrito defina para tal efecto.**	El Distrito, mantiene activo su correo institucional para la recepción de solicitudes con las comunidades: serviciospublicos@cartagena.gov.co La Interventoría cuenta con página web: www.qbm2.com A través de la página se pueden recibir solicitudes que son abordadas por los ingenieros del área técnica para darle solución. También se tienen los canales: correspondenciaqbm2@gmail.com El informe correspondiente a mayo 2025 de Interventoría fue ingresado en el SECOP II
15	**Analizar el informe de indicadores de calidad del servicio de energía, DES y FES, que el Operador de Red entregue a la Superintendencia de Servicios Públicos, con el fin de establecer el monto de la energía a descontar o compensar por calidad del servicio; así como la energía descontable por no haber sido suministrada a causa de interrupciones programadas o no programadas en los circuitos que no cuentan con contadores o equipos de medida, imputables al Operador de Red**	Se mantiene la observación en relación con la unificación de la información georreferenciada e inventario del alumbrado público con AFINIA para que se pueda determinar exactamente los indicadores

16	**Verificar para el caso de parques y conjuntos o unidades inmobiliarias con cerramiento, el tipo de cesión que tienen tales áreas con el fin de definir si la infraestructura instalada corresponde al servicio de alumbrado público. Para el caso, verificará la información recibida del operador del servicio de alumbrado público sobre tales áreas, así como de las autoridades de planeación Distrital. Una vez depurada la información, la interventoría debe notificar a las autoridades Distritales acerca de los resultados obtenidos. En la realización de esta función la interventoría deberá consultar entre otros, licencias de construcción, planos de urbanismo, inventarios levantados por el operador del sistema de alumbrado público y por el operador de la red, así como inspección a los sitios en definición.**	No hay requerimientos particulares. Sin embargo, dentro de la modernización se arrancó con los parques que son netamente espacios públicos en diversos barrios.
17	**Verificar el cumplimiento de la normatividad distrital, regional y nacional vigente en materia ambiental; respecto del manejo y disposición de equipos y materiales retirados del sistema de alumbrado público por parte del operador.**	Al cierre de este informe EPM, continúa con el pendiente de aportar soportes de la gestión ambiental, para validación de cumplimiento.
18	**Verificar el cumplimiento de los requisitos del Código Nacional de Tránsito y de las disposiciones de tránsito municipal vigentes, así como el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional por parte de los grupos de trabajo del operador de alumbrado público, en especial sobre la adecuada señalización vial de los sitios de trabajo, identificación de vehículos y protección del personal.**	EPM, cuenta con Plan de manejo de tránsito vigente. EPM, trata al máximo de minimizar la ocupación de espacio público sin perturbar la movilidad en los diferentes sectores intervenidos. La señalización en las áreas de trabajo es permanente en todas las áreas intervenidas evidenciado en los registros fotográficos.
19	**Apoyar en el análisis, revisión, evaluación y valoración del costo del servicio de alumbrado público con base en la facturación que emita el Operador del servicio de alumbrado público que por concepto del servicio le presta al Distrito**	Posterior a la revisión de las obras ejecutadas se conciliaron para mes de mayo/25, las ucap's liquidadas en **1.328.6** y se oficializaron mediante comunicación enviada el 13/06/2025 **Anexo 55.** Comunicación AP-EPM-008-2025: Ajuste de ucap's ejecutadas – mayo 2025


		EPM, presento factura el 21/05/2025, y en ella se validó las ucap's liquidadas por modernización. **Anexo 56.** Factura de EPM **N° DEE20320765** - Correspondiente al mes de mayo 2025 **Anexo 57.** Certificado de QBM2 a EPM. EPM.
20	**Cumplir con los indicadores de gestión y seguimiento que se establezcan contractualmente, e incluirlos en informes mensuales y en el informe final.**	Los indicadores presentados en este informe corresponden mes de mayo 2025, tomando como base reporte presentado por EPM Ordenes de trabajo atendidas: **416** Tiempo de atención promedio**: 30.2** horas Eficiencia del sistema del **99.7%** La meta contractual es del 90% lo que señala una buena prestación del servicio **Anexo 58.** Indicadores de gestión de EPM
21	**Elaborar y presentar los informes mensuales sobre la ejecución de las obligaciones. En los informes, someterá a consideración sus observaciones, conclusiones, recomendaciones, correctivos y demás información que considere pertinente para el buen desempeño en la prestación del servicio, las que deberán estar debidamente soportadas. Los informes deben estar complementados con gráficas, cuadros, estadísticas, fotografías, tablas, etc., que permitan su correcta comprensión.**	Informes radicados en el SIGOB el 17/06/2025 AP-DIS-030-2025: Envío Informe de febrero 2025 AP-DIS-031-2025: Envío Informe de supervisión **Anexo 59.** Radicados de informes entregados a Distrito. También cargados en la plataforma SECOPII
22	**Conciliar el aforo y/o inventario de luminarias con el operador o comercializador que suministra la energía para el alumbrado público al Distrito de Cartagena, a fin de mantenerlo actualizado**	El 25 de junio 2025, tras revisión y validación conjunta de las partes interesadas, de las cargas instaladas y desmontadas por modernización en los meses de abril y mayo 2.025, se firmó Acta de ajuste de energía del sistema de alumbrado público de Cartagena. La energía conciliada en nivel 1, con corte a mayo 2025 es de **1.874.576** Kwh-m. Se evidencia un crecimiento del **0.1%,** en el consumo, a razón de la inclusión de obras de expansión Valor anterior de energía: **1.872.589** Kwh-m


		El Inventario vigente pasó de **62.513** luminarias a de **63.381** luminarias. **Anexo 60.** Acta de ajuste de energía – 25/06/2025 Próxima conciliación para realizarse en agosto/2025
23	**Para legalizar la terminación del contrato de Interventoría, se deberá entregar al Distrito los datos y archivos recopilados durante la ejecución de este, debidamente foliados y almacenados, conforme a las disposiciones de manejo de archivos de la Entidad, así como los programas fuente que se hayan desarrollado o implementado para cumplir con sus obligaciones. Debe entregar manuales de Usuario y Técnicos relacionados con el software y mantenimiento que se le debe dar a dichos aplicativos. Dos meses antes de terminar el contrato, debe suministrar al Distrito las especificaciones del software y hardware utilizado, diseños de bases de datos, y toda la información relacionada.**	Los datos, y archivos recopilados se tienen dispuestos por año


	5. SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTABLE	EJECUTADO EN EL MES
1	**Hacer seguimiento de la gestión financiera de los contratos por parte de la Entidad Estatal, incluyendo el registro presupuestal, la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja.**	Al verificar en la plataforma Secop II se evidencia que se encuentra cargado el registro presupuestal, en lo que corresponde a la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja, el seguimiento se encuentra en cabeza del Distrito, frente a esto la interventoría está en la obligación de orientar para hacerlo de la mejor manera, ante lo que el Distrito le requiera, de la misma forma de la revisión hecha en la Plataforma Secop II se encuentra cargada la cuenta presentada por EPM. En lo que corresponde a la cuenta de QBM también se encuentra cargada.
2	**Elaborar informe sobre el trámite administrativo y contable de la facturación de los servicios prestados como trámite previo para que el Distrito emita las órdenes de pago al operador del alumbrado público en todos sus componentes, conforme esté estipulado en el contrato**	Ver anexo 39 y 41. Se elaboró el Soporte de facturación Contrato Interadministrativo N°068-2022 del mes de mayo que respalda el acta de pago.
3	**Documentar los pagos o ajustes que se hagan y controlar el balance presupuestal para efecto de los pagos y de liquidación de estos.**	Adicional se presentó el acta de pago suscritas juntamente con Distrito correspondiente a la factura de mayo 2025
4	**Coordinar las instancias necesarias para adelantar los trámites para la liquidación del contrato del servicio de alumbrado, entregar los documentos soporte que le correspondan para efectuar, así como los correspondientes al contrato de interventoría.**	Se dispone de toda la información soporte como evidencia que demuestre la ejecución del actual contrato de interventoría.
	6. SEGUIMIENTO JURIDICO	**EJECUTADO EN EL MES**
1	**El seguimiento jurídico busca la conformidad de la ejecución de los contratos con el texto de estos, la normativa aplicable a estos.**	Participación y asesoría permanente de parte de Interventoría, buscando el desarrollo favorable del contrato.


7. CUADROS Y GRAFICOS FINANCIEROS

Información financiera, concerniente con el reporte de facturación y recaudo del impuesto de alumbrado público del mes de mayo 2025, aportado por AFINIA En razón a lo dispuesto en el ACUERDO 107 de Dic 14 de 2022, el Operador de Red local (AFINIA) facturaba y recaudaba hasta abril 2023 el IAP de todos los Sujetos Pasivos de dicho acuerdo. A partir de mayo 2023, esa labor pasó a responsabilidad de los Comercializadores diferentes al OR local y/o Autoliquidación de los TERCEROS. Los dineros del IAP de estos sujetos se depositan en la misma cuenta de que dispone Secretaría de Hacienda para el SALP enviándole la información mensual a la Secretaría General-Unidad de Servicios Públicos.

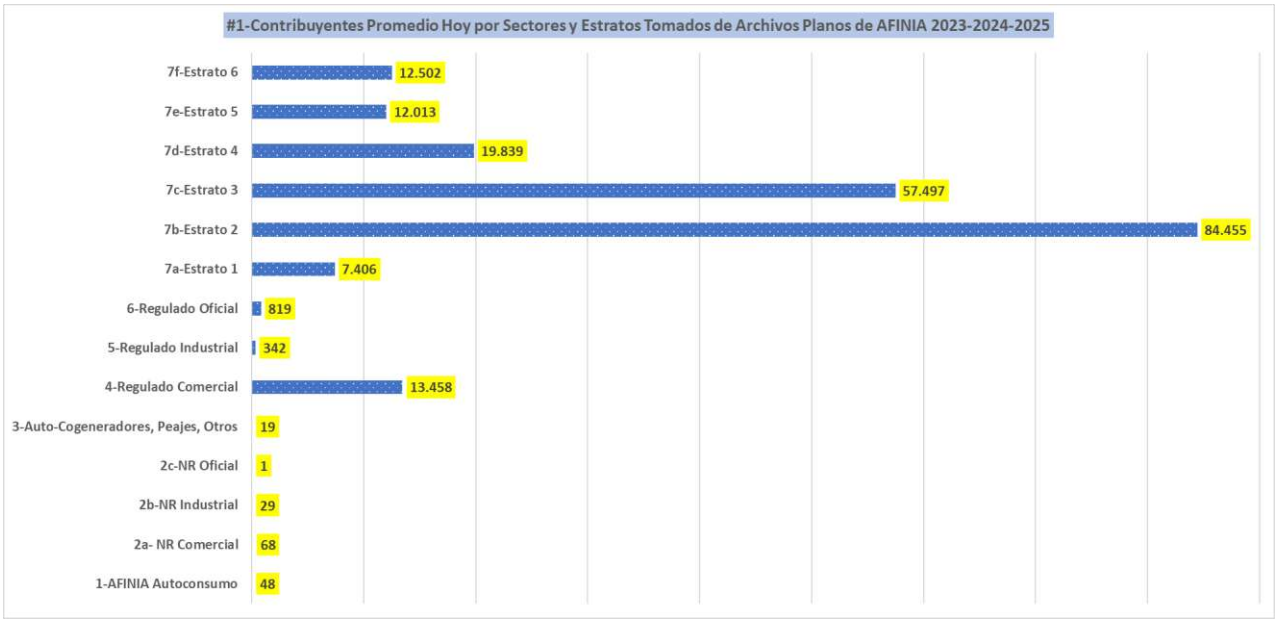


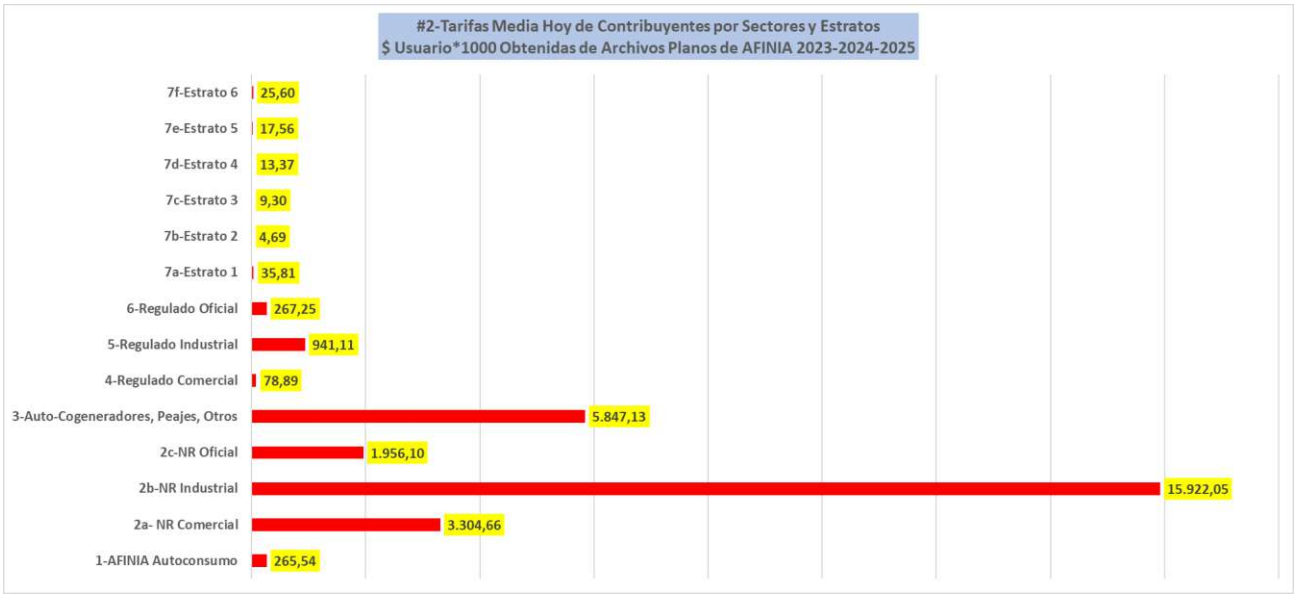


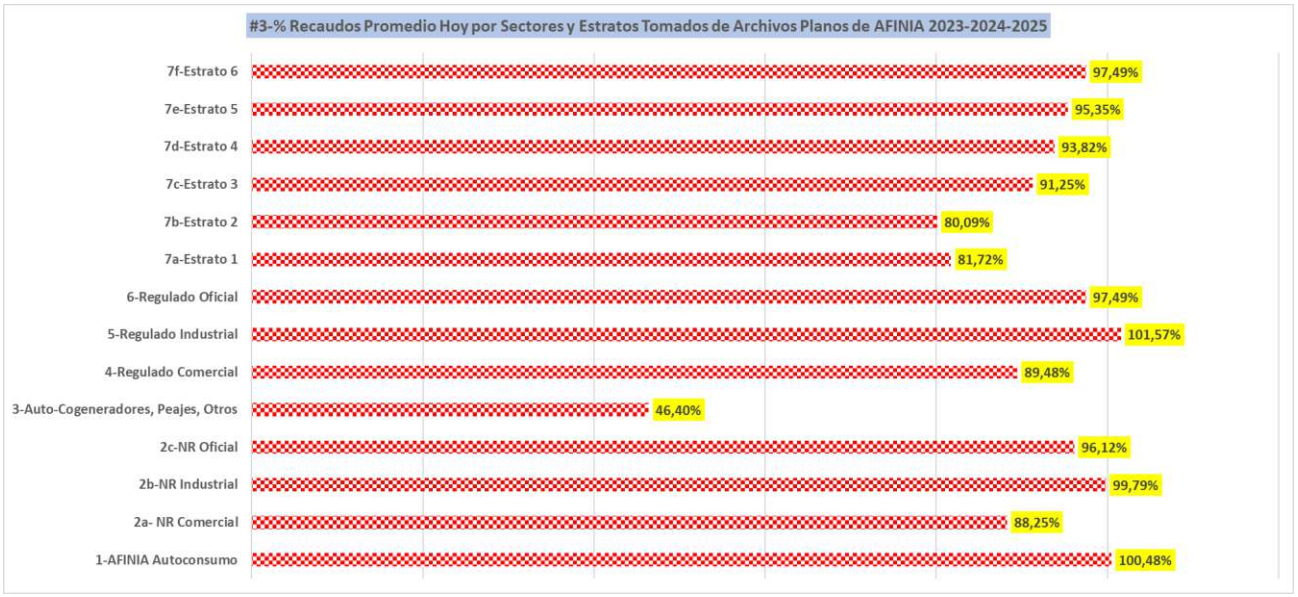

#3-% Recaudos Promedio Hoy por Sectores y Estratos Tomados de Archivos Planos de AFINIA 2023-2024-2025
7f-Estrato 6
97,49%
7e-Estrato 5
95,35%
7d-Estrato 4
93,82%
7c-Estrato 3
91,25%
7b-Estrato 2
80,09%
7a-Estrato 1
81,72%
6-Regulado Oficial
97,49%
5-Regulado Industrial
101,57%
4-Regulado Comercial
89,48%
3-Auto-Cogeneradores, Peajes, Otros
46,40%
2c-NR Oficial
96,12%
2b-NR Industrial
99,79%
2a- NR Comercial
88,25%
1-AFINIA Autoconsumo
100,48%

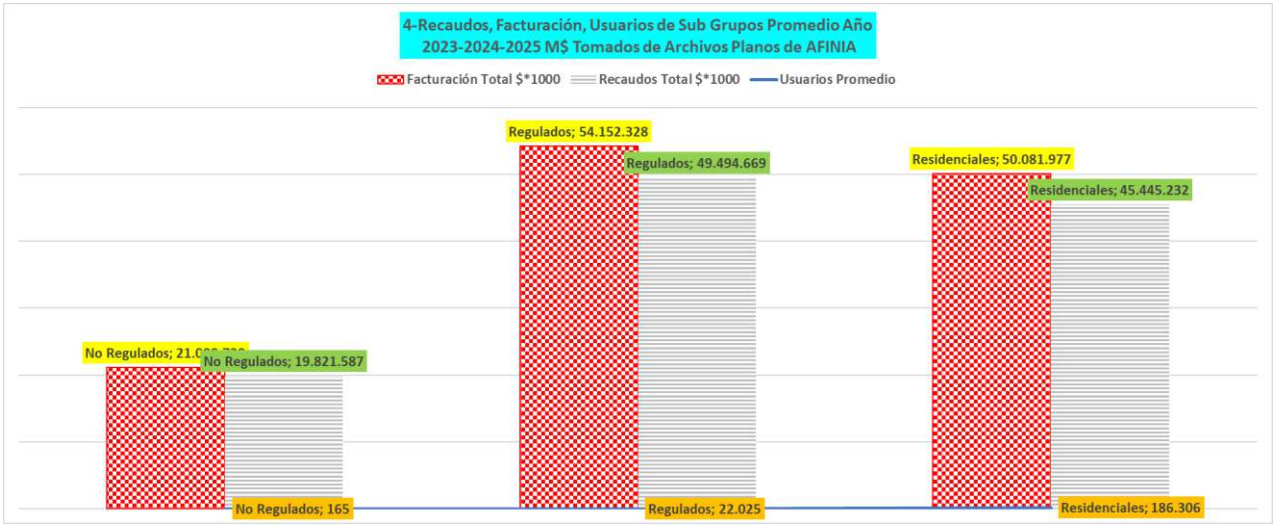

4-Recaudos, Facturación, Usuarios de Sub Grupos Promedio Año 2023-2024-2025 M$ Tomados de Archivos Planos de AFINIA
Facturación Total $*1000
Recaudos Total $*1000
Usuarios Promedio
Regulados; 54.152.328
Regulados; 49.494.669
Residenciales; 50.081.977
Residenciales; 45.445.232
No Regulados; 19.821.587
No Regulados; 165
Regulados; 22.025
Residenciales; 186.306



5-Promedio Facturación y Recaudos Año 2023-2024-2025 M$ Solo AFINIA
Facturación
Recaudos
1
125.334.025

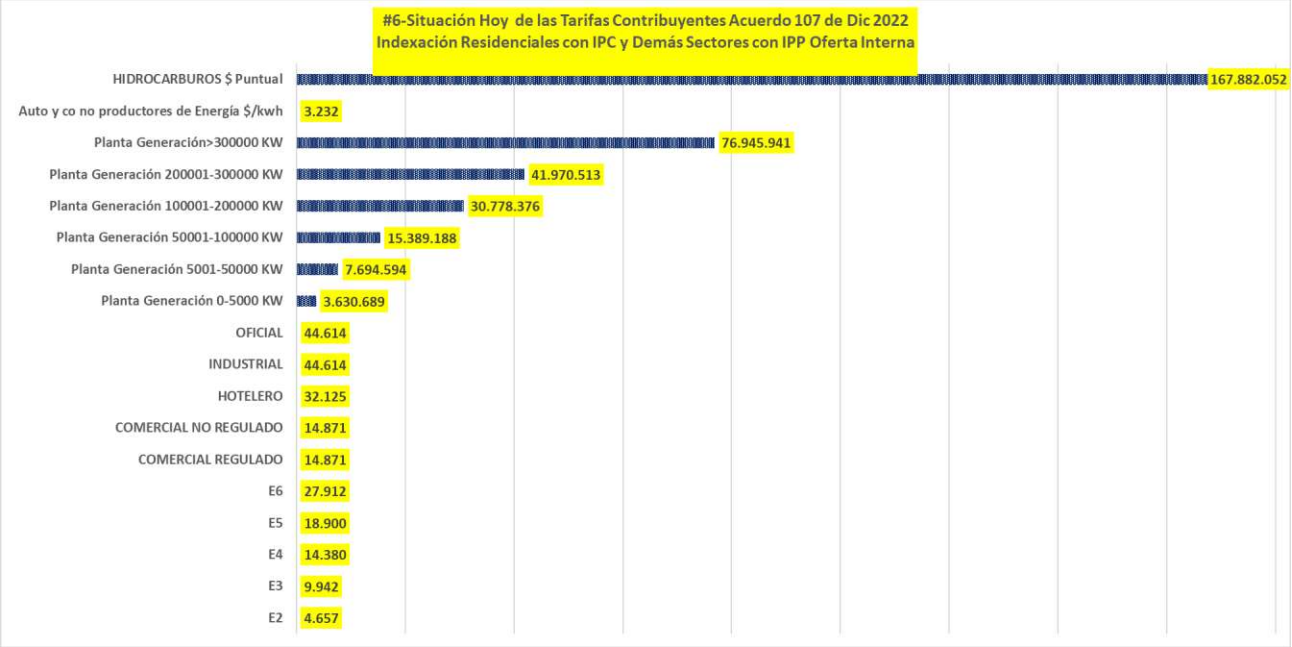
#6-Situación Hoy de las Tarifas Contribuyentes Acuerdo 107 de Dic 2022
Indexación Residenciales con IPC y Demás Sectores con IPP Oferta Interna
HIDROCARBUROS $ Puntual
167.882.052
Auto y co no productores de Energía $/kwh
3.232
Planta Generación>300000 KW
76.945.941
Planta Generación 200001-300000 KW
41.970.513
Planta Generación 100001-200000 KW
30.778.376
Planta Generación 50001-100000 KW
15.389.188
Planta Generación 5001-50000 KW
7.694.594
Planta Generación 0-5000 KW
3.630.689
OFICIAL
44.614
INDUSTRIAL
44.614
HOTELERO
32.125
COMERCIAL NO REGULADO
14.871
COMERCIAL REGULADO
14.871
E6
27.912
E5
18.900
E4
14.380
E3
9.942
E2
4.657

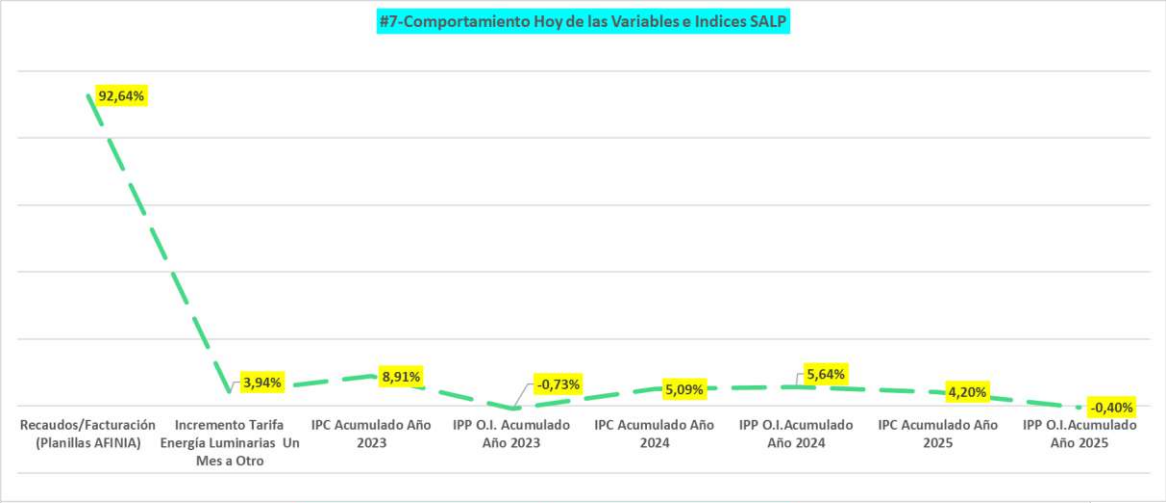
#7-Comportamiento Hoy de las Variables e Indices SALP
92,64%
3,94%
8,91%
-0,73%
5,09%
5,64%
4,20%
-0,40%
Recaudos/Facturación (Planillas AFINIA)
Incremento Tarifa Energía Luminarias Un Mes a Otro
IPC Acumulado Año 2023
IPP O.I. Acumulado Año 2023
IPC Acumulado Año 2024
IPP O.I.Acumulado Año 2024
IPC Acumulado Año 2025
IPP O.I.Acumulado Año 2025

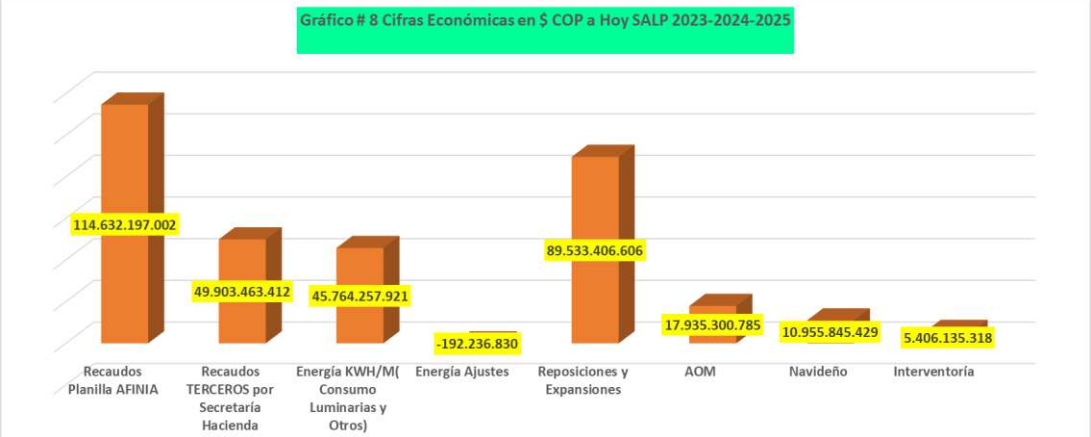
Gráfico # 8 Cifras Económicas en $ COP a Hoy SALP 2023-2024-2025
114.632.197.002
49.903.463.412
45.764.257.921
-192.236.830
89.533.406.606
17.935.300.785
10.955.845.429
5.406.135.318
Recaudos Planilla AFINIA
Recaudos TERCEROS por Secretaría Hacienda
Energía KWH/M(Consumo Luminarias y Otros)
Energía Ajustes
Reposiciones y Expansiones
AOM
Navideño
Interventoría

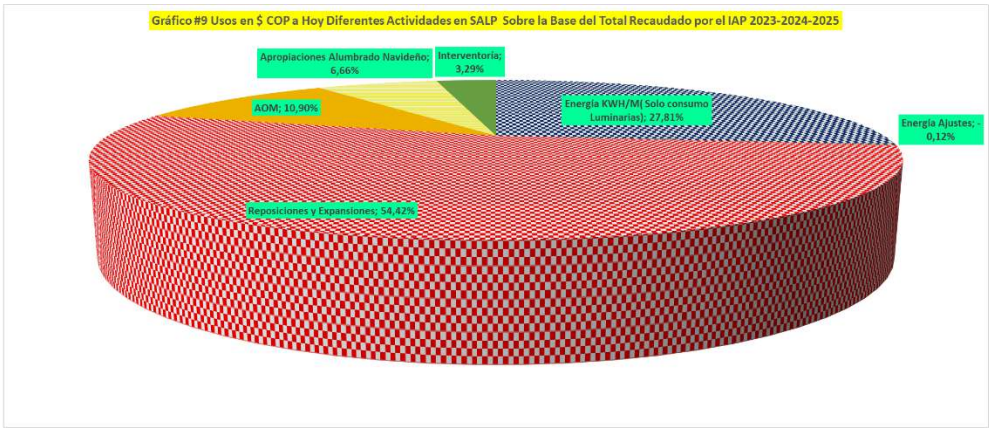

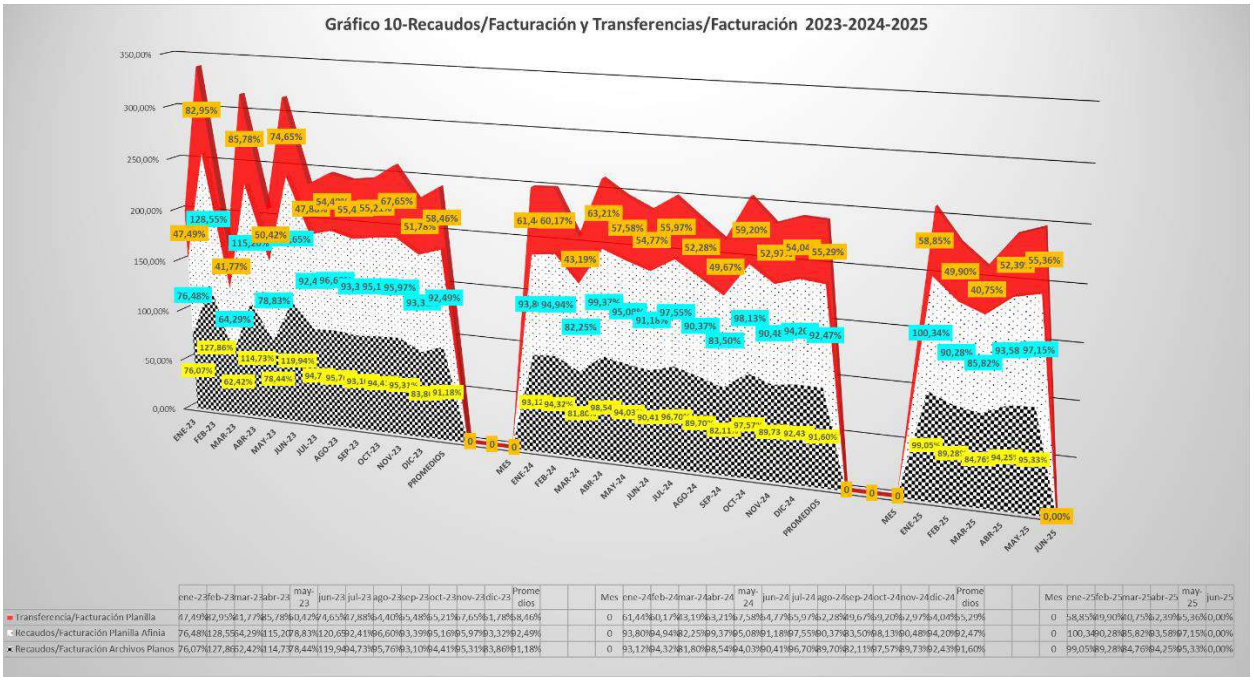

	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	Promedios		Mes	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	Promedios		Mes	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25
Transferencia/Facturación Planilla	47,49%	82,95%	41,77%	85,78%	50,42%	74,65%	47,88%	54,40%	55,48%	65,21%	67,65%	58,46%			0	61,44%	60,17%	63,19%	63,21%	57,58%	54,77%	55,97%	52,28%	59,20%	52,97%	54,04%	55,29%			0	58,85%	49,90%	40,75%	52,39%	55,36%	0,00%
Recaudos/Facturación Planilla Afinia	76,48%	128,55%	64,29%	115,20%	78,83%	120,65%	92,41%	96,60%	93,39%	95,16%	95,97%	93,32%	92,49%		0	93,80%	94,94%	92,25%	99,37%	95,08%	91,18%	97,55%	90,37%	83,50%	98,13%	90,48%	94,20%	92,47%		0	100,34%	90,28%	85,82%	93,58%	97,15%	0,00%
Recaudos/Facturación Archivos Planos	76,07%	127,86%	62,42%	114,73%	78,44%	119,94%	94,73%	95,76%	93,10%	94,41%	95,31%	93,86%	91,18%		0	93,12%	94,32%	91,80%	98,54%	94,03%	90,41%	96,70%	89,70%	82,11%	97,57%	89,78%	92,43%	91,60%		0	99,05%	89,28%	84,76%	94,25%	95,33%	0,00%

CUADRO 10-DATOS MENSUALES DEL SALP DEL DISTRITO CARTAGENA DE INDIAS A PARTIR ENERO AÑO 2023 HASTA HOY (El AOM y la Modernización para 2024 se reajustaron con el IPP del DANE Año 2023 de acuerdo al Convenio DISTRITO-EPM 068/2022)															Cuadro 11-Información Adicional de Interés por Nueva Regulación $ COP		
Mes	KWHr Solo Luminarias	KWHr Incluye Luminarias y Escenarios y Otros	Tarifa Energía $/kwh Luminarias	Tarifa Energía $/kwh Escenarios y otros	Incremento Tarifa Energía Luminarias un Mes a Otro %	Costo Energía Luminarias + Estadios y Otros Sin Ajustes $ COP	Tarifas AOM $/kwh Luminarias Metodología CREG	Facturación Efectiva MM $ COP Planilla AFINIA	Recaudo Efectivo MM $ COP Planilla AFINIA	Transferencia al Distrito MM$ $ COP	IPC	IPP Oferta Interna	Modernización Expansiones, EPM Operador $COP	Apropiación Alumbrado Navideño $ COP	Ajustes y/o Descuentos en Energía	Valor Final Consumo Energía SALP	Recaudo Efectivo MM $ COP TERCEROS
ene-23	3.006.004	3.040.305	569,27	759,47		1.737.275.951	155,29	5.725	4.378	2.719	1,7800%	1,8766%	2.748.180.917	469.707.196	-77.940.740	1.659.335.211	
feb-23	2.715.101	2.746.950	572,82	790,93	0,62%	1.580.459.100	171,93	3.278	4.214	2.719	1,6600%	1,1610%	2.748.180.917	469.707.196	-10.087.808	1.570.371.292	
mar-23	3.006.007	3.048.555	604,64	797,80	5,55%	1.851.497.962	155,29	8.183	5.261	3.418	1,0500%	-0,0166%	2.748.180.917	469.707.196	-8.196.385	1.843.301.577	
abr-23	2.909.036	2.945.568	600,10	818,19	-0,75%	1.775.609.431	160,47	6.010	6.923	5.155	0,7800%	-1,0706%	2.748.180.917	469.707.196	-7.964.846	1.767.644.585	
may-23	3.006.004	3.043.722	559,88	826,37	-6,70%	1.714.179.902	155,29	6.007	4.736	3.029	0,4300%	-0,9985%	2.748.180.917	469.707.196	-7.329.126	1.706.850.776	
jun-23	2.909.036	2.942.466	563,46	833,27	0,64%	1.666.984.661	160,47	3.620	4.368	2.703	0,3000%	-1,3861%	2.748.180.917	469.707.196	-1.626.404	1.665.358.257	
jul-23	2.962.464	3.000.301	539,44	810,63	-4,26%	1.628.751.261	157,57	3.655	3.377	1.750	0,5000%	-0,7314%	2.748.180.917	469.707.196	-1.583.945	1.627.167.316	
ago-23	2.699.483	2.748.567	544,84	833,99	1,00%	1.511.731.957	172,92	3.583	3.461	1.949	0,7000%	1,3009%	2.748.180.917	469.707.196	-464.258	1.511.267.699	
sep-23	2.612.403	2.652.781	522,44	842,32	-4,11%	1.398.840.516	178,69	3.686	3.443	2.045	0,5400%	0,7387%	2.748.180.917	469.707.196	-1.182.782	1.397.657.734	
oct-23	2.699.481	2.739.579	527,77	848,12	1,02%	1.458.723.634	172,92	3.648	3.471	2.014	0,2500%	0,2425%	2.748.180.917	469.707.196	1.540.414	1.460.264.048	
nov-23	2.612.401	2.645.981	522,79	917,79	-0,94%	1.396.560.635	178,69	4.934	4.735	3.338	0,4700%	-1,0916%	2.748.180.917	469.707.196	1.208.018	1.397.768.653	
dic-23	2.584.578	2.621.864	544,12	943,47	4,08%	1.441.503.783	180,61	3.712	3.464	1.922	0,4500%	-0,7509%	2.748.180.917	469.707.196	100.524.618	1.542.028.401	3.533
ene-24	2.577.633	2.614.096	549,11	1.053,40	0,92%	1.453.808.630	230,05	3.890	3.649	2.390	0,9200%	0,8139%	3.723.405.820		-194.582.780	1.259.225.850	1.091
feb-24	2.411.335	2.453.592	577,24	1.051,24	5,12%	1.436.350.491	245,92	3.744	3.554	2.253	1,0900%	0,9040%	3.723.405.820		-134.651.440	1.301.699.051	975
mar-24	2.603.570	2.657.993	577,45	1.061,49	0,04%	1.561.196.097	227,76	3.995	3.286	1.726	0,7000%	0,0902%	3.723.405.820		0	1.561.196.097	888
abr-24	2.519.584	2.566.020	628,16	1.086,33	8,78%	1.633.134.565	235,35	4.004	3.979	2.531	0,5900%	0,3096%	3.723.405.820		185.186.702	1.818.321.267	1.039
may-24	2.523.606	2.559.132	597,62	1.106,28	-4,86%	1.547.471.662	234,98	4.127	3.924	2.376	0,4300%	-0,4546%	3.723.405.820		0	1.547.471.662	0
jun-24	2.442.199	2.488.604	583,40	1.118,89	-2,38%	1.476.694.857	242,81	4.057	3.699	2.222	0,3200%	0,9190%	3.723.405.820		0	1.476.694.857	0
jul-24	2.429.979	2.474.461	659,78	1.068,63	13,09%	1.650.785.932	244,03	3.970	3.873	2.222	0,2000%	0,1173%	3.723.405.820	886.559.846	0	1.650.785.932	3.111
ago-24	2.429.980	2.472.251	621,58	1.111,61	-5,79%	1.557.416.799	244,03	4.090	3.696	2.138	0,0000%	-0,8537%	3.723.405.820	886.559.846	0	1.557.416.799	1.488
sep-24	2.351.591	2.399.956	612,38	998,56	-1,48%	1.488.355.418	252,17	4.399	3.673	2.185	0,2400%	0,8442%	3.723.405.820	886.559.846	0	1.488.355.418	2.249
oct-24	2.429.978	2.476.867	612,38	986,73	0,00%	1.534.328.821	244,03	3.941	3.867	2.333	-0,1300%	0,7646%	3.723.405.820	886.559.846	0	1.534.328.821	12.488
nov-24	2.351.593	2.394.286	607,79	1.006,38	-0,75%	1.472.236.710	252,17	3.924	3.551	2.079	0,2700%	1,2794%	3.723.405.820	886.559.846	0	1.472.236.710	2.936
dic-24	2.388.226	2.431.400	622,59	1.041,63	2,43%	1.531.849.552	248,30	3.901	3.675	2.108	0,4600%	0,9078%	3.723.405.820	886.559.846	-35.086.068	1.496.763.484	5.855
ene-25	2.388.225	2.428.614	655,83	991,23	5,34%	1.606.295.964	441,28	3.872	3.885	2.279	0,9400%	0,6991%	2.374.873.152		0	1.606.295.964	2.100
feb-25	2.204.026	2.241.247	681,69	1.013,77	3,94%	1.540.202.562	478,16	3.815	3.444	1.904	1,1400%	-0,0377%	2.374.873.152		0	1.540.202.562	2.120
mar-25	2.388.224	2.436.983	716,95	996,69	5,17%	1.760.831.064	441,28	3.907	3.353	1.592	1,1400%	-0,0808%	2.374.873.152		0	1.760.831.064	2.086
abr-25	2.289.509	2.330.967	707,61	998,23	-1,30%	1.661.458.517	460,30	4.023	3.764	2.107	0,6600%	-0,0216%	2.374.873.152		0	1.661.458.517	2.216
may-25	2.365.823	2.429.607	687,64	985,79	-2,82%	1.689.721.487	445,45	4.043	3.928	2.238	0,3200%	-0,9593%	2.374.873.152		0	1.689.721.487	5.727
	74.817.079	76.032.714	580,04	946,40		45.764.257.921	204,24	123.743	114.632	69.443	8,91%	5,64%	89.533.406.606	10.955.845.429	-192.236.830	45.572.021.091	49.903
			Media	Media			Media				ACUMULADO						
Recaudos Provenientes de TERCEROS a través de Secretaría Hacienda Acuerdo 107/Dic 14 de 2022 MM$									49.903								

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES FINALIZADO JUNIO/JULIO 2025

A Distrito:

- Velar por la actualización del MIDAS, como sistema de información de alumbrado público de la ciudad. Compromiso de comité de seguimiento.
- Cooperar con EPM ante el Ministerio de Cultura y el IPCC, para que la aprobación de los permisos necesarios para la ejecución del Proyecto de la Muralla Etapa 2, se desarrolle sin contratiempos.

Al Operador de Alumbrado Público:

- Aportar a la ANI, toda la documentación requerida para avanzar con los conceptos favorables que permitan la ejecución de la Vía Troncal de Occidente.
- Completar proceso de certificación RETILAP de los proyectos ejecutados en el primer semestre 2.025
- Presentar cronograma de intervención del Proyecto de las Murallas Etapa 2.
- Disponer de equipo de trabajo en calidad de garantía, atendiendo los reportes de falla que se generen a partir del 17/07/2025.
- Avanzar en el diseño fotométrico de la Urbanización Ciudadela La Paz

A N E X O S

Anexo 1 Registro De Inspección De Infraestructura De Alumbrado Público Del Proyecto San Sebastián Parque Residencial




Ubicado en el Barrio Bicentenario de la Ciudad de Cartagena de indias








Manzana G, Etapa 1

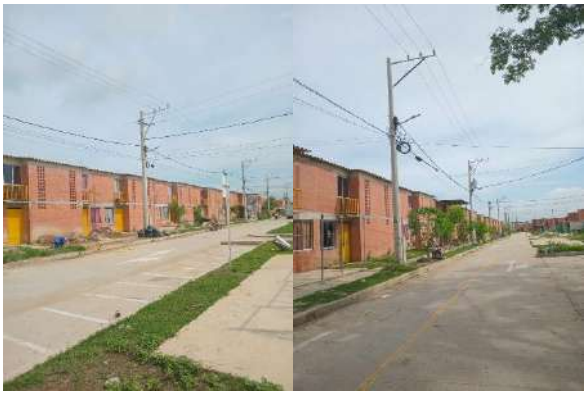


Manzana F – Etapa 1

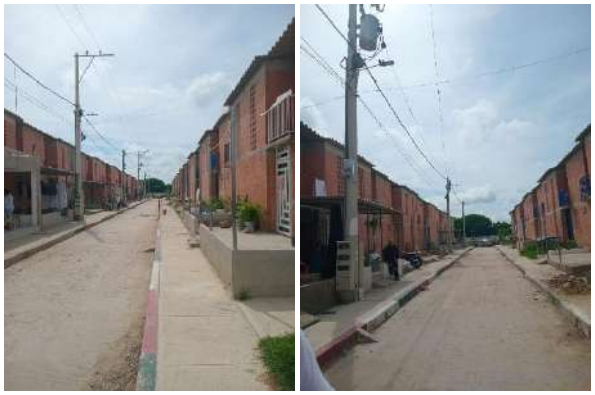

Manzana L – etapa 2



Manzana **N** – etapa 2

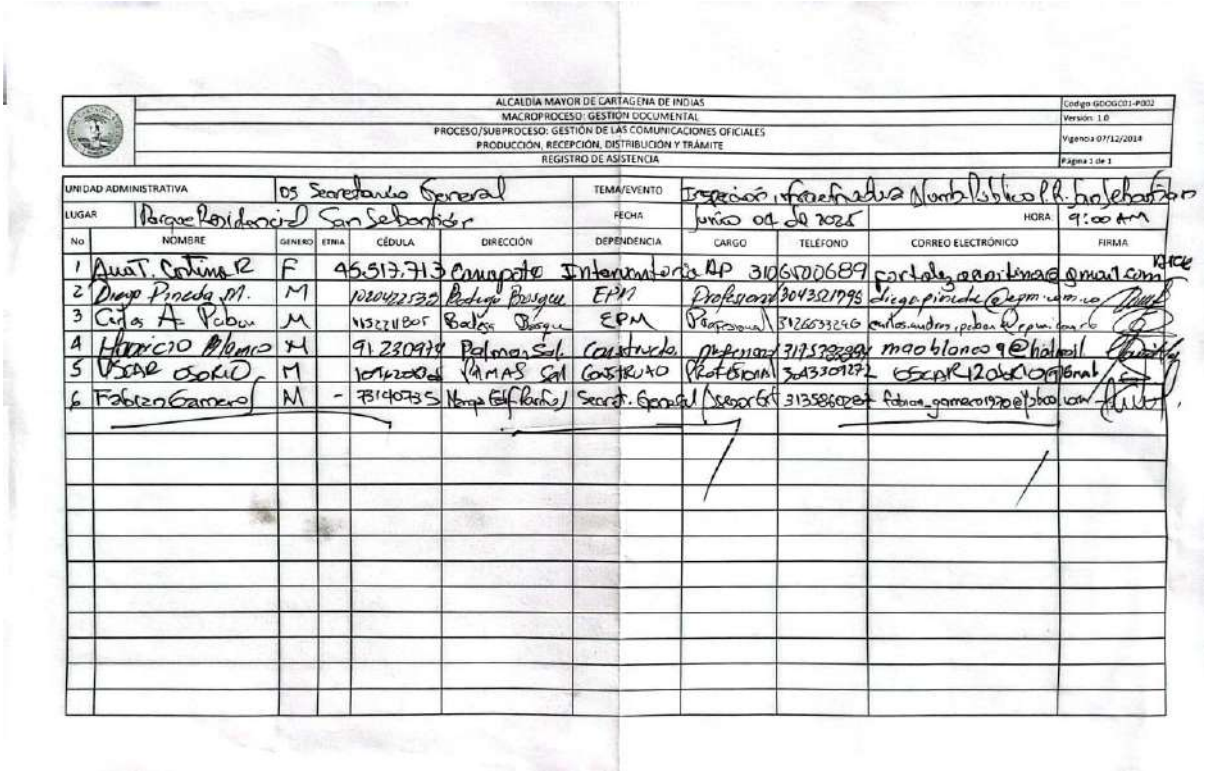

ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS
MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
PROCESO/SUBPROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES
PRODUCCIÓN, RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRÁMITE
REGISTRO DE ASISTENCIA


Codigo: GDOGC01-F002 | Version: 1.0 | Vigencia: 07/12/2018 | Página 1 de 1

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 05 Secretaria General | TEMA/EVENTO: Inspección ... | LUGAR: Parque Residencial San Sebastián | FECHA: junio 04 de 2025 | HORA: 9:00 AM

No	NOMBRE	GENERO	ETNIA	CÉDULA	DIRECCIÓN	DEPENDENCIA	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Anat. Cortina R	F		45.517.713	Campete	Interventoria	AP	3106800689		
2	Diego Pineda M.	M		1020422539	Parque Bosque	EPM	Profesional	3043021795	diego.pineda@epm.com.co	
3	Carlos A. Pabon	M		1152211805	Parque Bosque	EPM	Profesional	3126533246	carlos.andres.pabon@epm.com.co	
4	Horacio Alonso	M		91.230979	Palmar Sol.	Contratado	Profesional	3175782989	maoblonco9@hotmail	
5	OSCAR OSORIO	M		1047200[illegible]	PAMAS Sol	CONTRATO	Profesional	3043309272	OSCAR12OSORIO@gmail	
6	Fabian Gamero	M	-	7814073[illegible]	Parque Bosque	Secret. General	Secretario	3135860284	fabian_gamero1990@yahoo.com	

Entre las observaciones identificadas de la primera inspección estan:

- Eliminar la intermitencia de las luminarias.
- Remplazar las dos luminarias de referencia diferente identificadas en la Manzana C y Manzana D
- Colocar Fotoceldas a las luminarias, carentes de ellas
- Instalar las luminarias faltantes señaladas en el plano
- No son objeto de entrega: Parqueaderos y los 4 parques: Requieren diseño e intervención

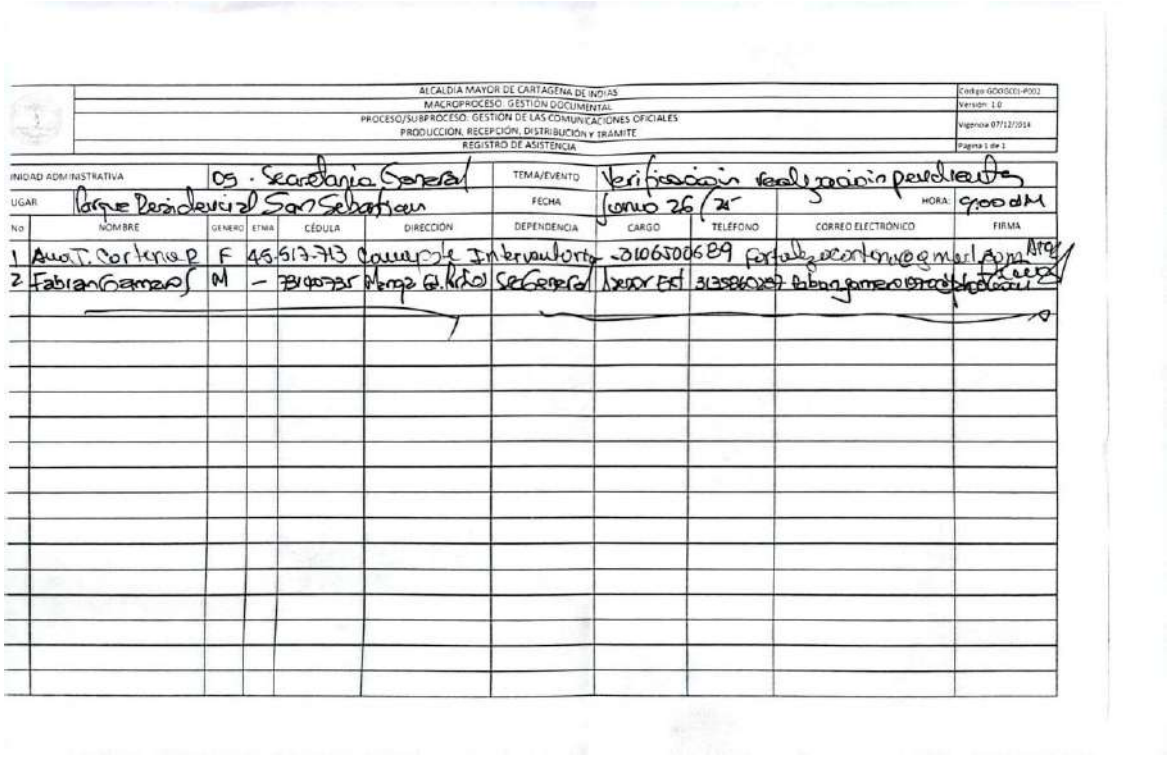

ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS
MACROPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
PROCESO/SUBPROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES
PRODUCCIÓN, RECEPCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRAMITE
REGISTRO DE ASISTENCIA

Código: GDO-GCO-F-002
Versión: 1.0
Vigencia: 07/12/2014
Página 1 de 1

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 05 - Secretaría General
TEMA/EVENTO: Verificación legalización pendientes
LUGAR: Parque Residencial San Sebastián
FECHA: Junio 26 / 25
HORA: 9:00 AM

No	NOMBRE	GENERO	ETNIA	CÉDULA	DIRECCIÓN	DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Ana T. Cortina P	F		45.517.713	Cra 4 # 24	Interventoría		3106500689	fortalezacortina@gmail.com	
2	Fabian Gamero	M		- 78490735	Manga Gl. Rios	Secretaría	Asesor Ext	3135860287	fabiangamero	

Anexo 2. Acta De Comité #07 - 04/07/2025

QBM2 INGENIERÍA ELÉCTRICA S.A.	**ACTA DE COMITÉ DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**	**Versión 4 Vigente desde: 20/02/2023**

Fecha: 04/07/2025	**Lugar:** Oficinas Servicios Públicos - Manga
Hora de Inicio: 09:00 a.m.	**Hora de Finalización:** 10:30 a.m.
Contrato: No. 068 2022 para Distrito Y CT-2022-127001	**Consecutivo Comité:** 05-2025
Participantes:	
Contratista, EPM ▪ José Adrián Rivera Pérez - Profesional Operaciones Negocios – Unidad Alum Público ▪ Diego Pineda Martínez– Profesional Operaciones Negocios – Unidad Alum Público ▪ Jairo Gutiérrez - Profesional Operaciones Negocios – Unidad Alum Público	
Interventora, QBM2 Ingeniería Eléctrica S.A. ▪ Luis Mejía Chávez – director de interventoría ▪ Ana Teresa Cortina R – Directora operativa	
Distrito, secretaria general (SG) – Servicios Públicos: ▪ Gina Patricia Vélez Ortiz– Asesora de Servicios Públicos ▪ Candelaria Vargas Torres – Asesora Jurídica Externa ▪ Fabian Gamero Solarte – Ingeniero Asesor Externo ▪ Valentina Arroyo - Practicante	

TEMAS TRATADOS:

Comentarios: Se inicia comité con la revisión de los compromisos pendientes del comité #04 (06/06/2025)

1) **Revisión de compromisos pendientes del comité anterior**
   a) Desarrollo reunión de tele gestión, Pendiente coordinar e informar, teniendo en cuenta la presencia de la secretaria general.
   b) Faroles coloniales en fachada de Hotel San Francisco (Getsemaní). Tras la solicitud de la secretaria general y no obtener respuesta, se requiere programar visita y acordar la instalación de los faroles.
   c) Pendiente coordinar retiro de poste contiguo al Parque Centenario diagonal al Camellón de los Mártires
   d) Cambio de brazos oxidados en Avenida Venezuela desde India Catalina hasta Torre del Reloj. EPM, manifiesta su cumplir con este compromiso antes del 15/07/2025; se incluirá el cambio de postes en los puntos que lo requieran por su estado.
   e) Retiro de estructuras de alumbrado público (M45 – M47 – M49 – M51) en predio privado. QBM2, propuso rediseñar instalando proyectores desde las estructuras al otro extremo de la vía cuidando respetar los niveles de iluminación, teniendo en cuenta la curvatura de la zona.
   f) Disponer de toda la logística e infraestructura para cumplir con las 4.231 ucap's.
   g) EPM, expresa, estar avanzando en el levantamiento y diseño del alumbrado público de Ciudadela La Paz.
   h) Presentar Nuevas ucap's a incorporar en próximo contrato: EPM están adelantando y se compartirán el próximo comité (16/07/2025)
   i) Puente Román: A petición de Distrito cubrir la totalidad de las barandas del Puente Román con los postes ornamentales y respectivos faroles. Y Adicional, la zona verde alrededor del puente, proyectar diseño de iluminación.
   j) De los recorridos efectuados el 09, 11 y 12 de junio (EPM-QBM2-SP) al Centro, San Diego y Getsemaní, se generaron reportes que fueron compartidos a EPM, detallando los detalles a superar. EPM, informo que están adelantando el listado de detalles para presentar informe el 15/07/2025

2) **Gestión de Ejecución EPM junio 2025.**
   EPM presenta informe de ejecución de mantenimiento y modernización con corte junio/25:

- Eficiencia del sistema de alumbrado público: **99.3%.**
- Solicitudes atendidas: **390** en un tiempo promedio de **28** horas. Estadísticamente, menos fallas atendidas en menor tiempo a los meses anteriores.
- El 36.8% de las solicitudes se atendieron en el lapso de las 24 horas.
- El 39.1% de las solicitudes se atendieron en 48 horas, y El 19.4% a 72 horas y 4.7en un tiempo mayor a las 72 horas
- Avance de modernización: **97.82%** del sistema de alumbrado público de la ciudad modernizado. Pendiente por modernizar un **2.18%.** No se evidencia mucho avance ya que las obras ejecutadas en un alto porcentaje han sido por expansión
- Ejecuciones de modernización: Corregimiento de Bayunca (SMI de sectores normalizados), Bicentenario – etapa 2, Parques del Socorro y Av. Santander.
- Otras intervenciones: Corredor de carga, Cielo Mar – La Bocana, Bocachica (remplazo de proyectores en garantía), Manga
- Actualmente en ejecución: La Boquilla, Palmas de Salamancas. Isla Grande (se encuentran trasladando los postes para proceder con la instalación de éstos y de las luminarias. Lo cual quedará listo antes del 11/07/2025
- Se culmino con la limpieza y mantenimiento preventivo de la infraestructura ornamental de Centro Histórico.
- EPM, expone que reiteradamente han atendido llamados por falta de iluminación en el Parque Espíritu del Manglar, sin embargo, al llegar se encuentran con que las conexiones eléctricas han sido manipuladas por usuarios terceros, que tienen puntos comerciales y que toman de allí extensión para conectar sus cargas; lo cual termina afectando el alumbrado público.
- EPM expresa que ha estado en contracto con el EPA, para solicitar las podas en puntos específicos. Compartirá los registros.

3) **Requerimientos Varios:** Desde Servicios Públicos se traen diversas solicitudes recibidas de la comunidad, a lo cual se le pide a EPM, revisar si ya se encuentran diseñados, de lo contrario se proyecten y presenten las solicitudes de modificación de infraestructura (SMI) para futuras intervenciones
   - **a)** Refuerzo de iluminación den Callejón La Paz del Barrio La Gloria 1 – Petición de la JAC.
   - b) Parque Los Lagos, El Pozón Sector Villa Luna – Peticion del sr. Reinaldo Manjarrez Muñoz
   - c) Vecinos piden iluminación de Vía de acceso de Urb. Aleros del Country, Zona Norte (10.539841, -75.458211).
   - d) Iluminación en zona Verde entre las Gavias y la Floresta (10.396818, -75.491743). Se puso en conocimiento que este parque ya cuenta con una SMI validada del 12/02/2025 identificada como SS1003329, solo resta programar su ejecución.
   - e) Cancha Ciudadela India Catalina, Se solicitó mantenimiento, ya que posterior a vendaval la cancha esta oscura. EPM, ya se contactó con el líder del barrio y programó atención.
   - f) Separador de Marbella: DATT y secretaria de Infraestructura solicitan traslado de poste y registros ante la necesidad ampliar carril que favorezca la movilidad en el semáforo de la Av. Santander con Calle 47.
   - g) Parque de Blas de Lezo (Transversal 54 con Cra. 68): Interventoría, sugiere revisión preventiva de la infraestructura de AP, previa a las celebraciones que se realizan en conmemoración del "16 de julio". También se sugiere modernización de luminarias de sodio que aún existen en el parque y cercanía (proyector de 1000W)
   - h) Iluminación Vía Troncal de Occidente: Entregar toda la información requerida por la ANI y revisar los cambios que ha presentado la vía
   - i) Monumento de los Océanos: Sellar las tapas de las cajas eléctricas en desuso. Proyectar luminarias que resalten el monumento

j) Tramo de vía, ubicado sobre Variante Mamonal Gambote Kilometro 6 entre EDS Distracom Las Olas y el antiguo peaje de Parque América, se encuentra oscuro, carente de iluminación. Fue visitado por la Interventoría el 03/07/2025 se compartieron las fotos y se ratificó que se encuentra en la jurisdicción de Cartagena; por lo que se factible dentro del alcance geográfico atender y aportar iluminación al sector. Le queda a EPM el compromiso de diseñar y presentar SMI.

k) QBM2, compartió registros a Servicios Públicos, de situación identificada con la facturación de energía del circuito exclusivo de alumbrado público en la zona Norte. Que de los 10 NIC registrados en Afinia, 9 están siendo estimados en su consumo. Por lo que se invita a Servicios Públicos presentar requerimiento de revisión y corrección a Afinia, por ser ellos los clientes directos. Así como para el NIC del Estadio de Alameda La Victoria, solicitar cruce de cuentas, ya les descontaron doblemente el valor de la energía de abril y mayo.

4) **Prioridades de ejecución de modernización y expansión junio y julio 2025:** Anexo en esta acta se presenta la relación de los proyectos ejecutados, en curso y programados para completar las 4.231 ucap's del presente contrato.

5) **Liquidación ucap's del periodo junio/julio 2025:** Una vez culminado el actual contrato se hará la verificación y liquidación de las ucap's ejecutadas en el periodo del 01/junio/2025 al 15/julio/2025 Revisión conjunta de QBM2 y EPM

Compromisos	Fecha	Responsable
1. Coordinar Reunión para mostrar avances y resultados del plan piloto de la Tele gestión	16/07/2025	Servicios Públicos
2. Gestionar instalación de los 3 faroles coloniales	16/07/2025	Servicios Públicos
3. Retirar poste contiguo al Parque Centenario diagonal al Camellón de los Mártires	16/07/2025	EPM
4. Presentar SMI del cambio de brazos en Av. Venezuela	15/07/2025	EPM
5. Presentar Rediseño de iluminación con el refuerzo en Manga a la altura de las estructuras 45, 47, 49 y 51 (Antiguo Peaje)	14/07/2025	EPM
6. Ejecutar SMI de curva de Ceballos, validada	14/07/2025	EPM
7. Proyectar el diseño de iluminación de Ciudadela La Paz	16/07/2025	EPM
8. Presentar relación de nuevas ucap's a incorporar próximo semestre	16/07/2025	EPM
9. Culminar intervenciones en Puente Román y alrededores de zona verde – Presentar SMI	16/07/2025	EPM
10. Superar las observaciones indicadas en las revisiones efectuadas en el Centro, San Diego y Centro y compartir resultado	16/07/2025	EPM
11. Aportar las Solicitudes de modificación aprobadas del mes de junio 2025	07/07/2025	Servicios Públicos
12. Enviar reporte a Servicios públicos de las conexiones y derivaciones eléctricas, que usuarios terceros han realizado en el Parque Espíritu del Manglar y que afectan el funcionamiento del alumbrado público	14/07/2025	EPM

13. Programar visita con Logística para contextualizar la situación real y de común acuerdo se tomen las acciones pertinentes	15/07/2025	EPM-QBM2-Servicios Públicos
14. Pasar relación de los puntos a los cuales han solicitado al EPA apoyo en las podas	11/07/2025	EPM
15. Entrega oficial del Proyecto Centro Histórico, una vez culminado el Puente Román	15/07/2025	EPM-QBM2-Servicios Públicos
16. Isla Grande: Instalación de postes y luminarias	11/07/2025	EPM
17. Programar visita de inspección para atender los requerimientos de Barrio la Gloria 1, Parque Los Lagos del Pozón, Cancha de Ciudadela India Catalina	11/07/2025	EPM
18. Inspección en sitio Marbella, separador con calle 47, para atender requerimiento de secretaria de infraestructura y DATT, de traslado de poste y registros en separador. 19. Ejecución de acciones acordadas	04/07/2025 02:30 ppm 04/07/2025	EPM – QBM2 EPM
20. Revisión y mantenimiento a Parque de Blas de Lezo de la Transv. 54 21. Modernización de luminarias de sodio	12/07/2025	EPM
22. Diseñar y presentar SMI del Monumento de los Océanos.	15/07/2025	EPM
23. Diseñar solución de iluminación de tramo de Variante Mamonal Gambote Kilometro 6 y presentar SMI para revisión y validación de la Interventoría y posterior aprobación de Distrito	16/07/2025	EPM
24. Presentar requerimiento a Afinia de revisión del estado de los medidores del circuito exclusivo de AP de Zona Norte.	15/07/2025	Servicios Públicos
25. Comité de cierre contractual	16/07/2025 09:00 am en Sec. Gral.	EPM – QBM2 y Servicios Públicos

GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO - CARTAGENA

ALUMBRADO PÚBLICO



La cantidad de luminarias en funcionamiento al mes de Junio fue del 99,3% aproximadamente, manteniendo un porcentaje de falla inferior al 1% desde el año 2021.

En el mes de Junio se atendieron 390 solicitudes en un promedio de 27,67

La distribución del tiempo en que se dio atención a las 390 solicitudes en el mes de Junio fue de un 35,9% de solicitudes atendidas en 24 horas; 39,1% atendidas en 48 horas; 19,4% atendidas en 72 horas; y 4,7% atendidas en más de 72 horas.

Castillo Grande



Parque Espíritu del manglar



Corredor de Carga



Manga



Bocachica



GESTIÓN DEL EJECUCION MODERNIZACIÓN - CARTAGENA

ALUMBRADO PÚBLICO

Parque El Divino Niño y Parques de la Et. 1 El Socorro





Corregimiento De Bayunca



Bicentenario II



GESTIÓN DEL EJECUCION MODERNIZACIÓN - CARTAGENA

ALUMBRADO PÚBLICO

Culminación De Puente Román.



VARIOS - CARTAGENA

ALUMBRADO PÚBLICO

Limpieza de postes y faroles
Centro Histórico.






Parque Espíritu Del Manglar





REGISTRO DE ASISTENCIA

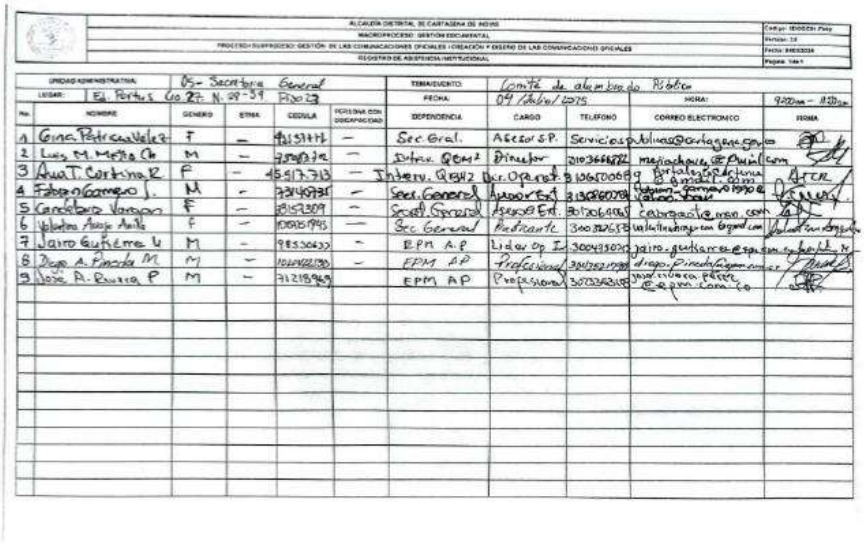

ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
MACROPROCESO: GESTIÓN EDUCATIVA TAL
PROCESO O SUBPROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES / CREACIÓN Y DISEÑO DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES
REGISTRO DE ASISTENCIA INSTITUCIONAL

Código: 1200E01-Proy
Versión: 10
Fecha: 24/03/2016
Página: 1de1

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 05- Secretaria General
LUGAR: Ed. Portal 5 Cra 27 N. 29-59 Piso 3
TEMA/EVENTO: Comité de alumbrado Público
FECHA: 04 Abril 2025
HORA: 9:20am - 11:30am

No.	NOMBRE	GENERO	ETNIA	CEDULA	PERSONA CON DISCAPACIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Gina Patricia Velez T	F	—	45151771	—	Sec Gral.	Asesor S.P.	Servicios	publicos@cartagena.gov.co	
2	Luis M. Mejia Ch	M	—	7598979	—	Subsv. QBM²	Director	3103668782	mejiachaves@hotmail.com	
3	Ana T. Cortina R	F	—	45517313	—	Interv. QBM²	Dir. Operat.	3106700869	Portalesdelaluna@gmail.com	AFER
4	Fabian Gamero J.	M	—	73140935	—	Sec. General	Asesor Ext.	3135860709	fabian.gamero@epm.com.co	
5	Geraldine Vanegas	F	—	1051523097	—	Secret. General	Asesora Ext.	3012069881	calvogeraldine@epm.com	
6	Valentina Arroyo Avila	F	—	1065615995	—	Sec. General	Pasante	3003826578	valentinaarroyo@epm.com	
7	Jairo Guillermo U	M	—	98530633	—	EPM A.P	Lider Op I	3004930370	jairo.gutierrez@epm.com.co	
8	Diego A. Pineda M	M	—	1044422130	—	EPM AP	Profesional	3017521798	diego.pineda@epm.com.co	
9	Jose A. Rivera P	M	—	71218969		EPM AP	Profesional	3013262185	jose.rivera.perez@epm.com.co	

PRIORIDADES DE INTERVENCIÓN JUNIO – JULIO 2025

PROYECTO	PROYECTOS.Proyecto	UCAPS_Arcgis
613942	Reposicion de postes y redes Av Santander	913,79
839931	Via Pontezuela-Bayunca-Via al Mar	769,61
1053954	Diseño Barrio Ciudad Bicentenario Fase II-SS 1053954	304,44
437551	Tramo Vía al Mar desde la Bocana hasta el puente peatonal	268,87
739861	Isla Grande e isla fuerte	252,13
907606	SMI Palmas de Salamanca	192,71
905933	SMI Via Boquilla desde Hotel Sonesta hasta Hotel Derust	173,88
576195	Corregimientos Pontezuela, Bayunca	148,62
271320	Barrio Chino y Martínez Martelo	145,02
941858	SMI Parques Aledaños a CAI (Calle 23A) Barrio El Socorro	111,23
1091452	SMI Sector San Antonio La Posita	58,65
1086496	SMI Barrio el Country	56,89
954527	SMI Parques Aledaños Institución Educativa Soledad Acosta de Samper - Sede Ana María Pérez de Otero Barrio El Socorro	53,45
820718	San Pedro	40,15
1077049	SMI Parque La Charca - Villa Rubia	32,76
1003332	SMI Parques Barrio San Pedro	23,22
1060397	SMI Antonio Jose de Sucre sector la ceiba	18,57
1104939	SMI Ararca y Santana - zona normalizada	17,21
1077055	SMI Parque la Florida - San Fernando	16,64
1079689	SMI Refuerzo Peaje sector parquiamerica	15,62
914454	SMI Entrada Patio Portal	15,38
1060414	SMI REFUERZO barrio Andalucía-SS 1060414	12,23
1091448	SMI parque del sector San Rafael	11,59
1080341	SMI Puente de las Gaviotas	9,98
1060410	SMI parque mirador del Alto Bosque-Transversal 53 B parque mirador en las escaleras	8,56
1084738	SMI Parque de Los Alcatraces Av. Santander	8,22
1043933	SMI Parque Barrio El Socorro Plan 500 B Mzs 76 a 80	7,64
1060357	SMI Ceballos sector Nuevo Oriente	6,94
1060368	SMI Barrio la paz sector Laureles Cra 32-69	6,63
1089580	SMI Refuerzo Ingreso Tierrabaja	4,15
1060417	SMI Modernización Vicentico Martinez-Pie de la popa	3,24
1060337	SMI PIE DE LA POPA SECTOR EL TROLI	3,17
1093030	SMI refuerzo Villa Estrella	0,12
1075612	SMI Altos del campestre parque y cancha	0,12
Total		**3711,43**

Anexo 3. Acta De Comité #08 - 16/07/2025

QBM²	**ACTA DE COMITÉ DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**	**Versión 4 Vigente desde: 20/02/2023**

Fecha: 16/07/2025	**Lugar:** Oficinas Servicios Públicos - Manga
Hora de Inicio: 09:00 a.m.	**Hora de Finalización:** 10:30 a.m.
Contrato: No. 068 2022 para Distrito Y CT-2022-127001	**Consecutivo Comité:** 05-2025

Participantes:

Contratista, EPM
- Juan David Pulido Correa – Profesional Área Oferta Gobierno
- José Adrián Rivera Pérez - Profesional Operaciones Negocios – Unidad Alum Público
- Diego Pineda Martínez– Profesional Operaciones Negocios – Unidad Alum Público
- Carlos Andrés Pabón Múnera– Profesional Operaciones Negocios – Unidad Alum Público

Interventora, QBM2 Ingeniería Eléctrica S.A.
- Luis Mejía Chávez – director de interventoría
- Ana Teresa Cortina R – Directora operativa
- Luis Martínez Pardo – Responsable de Modernización y expansión.
- Melissa Franco Porras – Asesora Jurídica

Distrito, secretaria general (SG) – Servicios Públicos:
- Gina Patricia Vélez Ortiz– Asesora de Servicios Públicos
- Candelaria Vargas Torres – Asesora Jurídica Externa
- Fabian Gamero Solarte – Ingeniero Asesor Externo

TEMAS TRATADOS:

Comentarios: El objeto de este comité es dar cierre al presente contrato de alumbrado público (finalizado hoy 16/07/2025) y fijar compromisos de las partes interesadas, para culminar favorable y exitosamente todos los compromisos contractuales.

1. **Gestión de Ejecución EPM con corte a 15/07/2025.**

EPM presenta informe de ejecución de mantenimiento y modernización con corte a abril/25:
- Eficiencia del sistema de alumbrado público: **98.9%.**
- Solicitudes atendidas: **606** en un tiempo promedio de **28** horas. Evidenciándose una menor incidencia de fallas respecto a meses anteriores
- El 34.8% de las solicitudes se atendieron en el lapso de las 24 horas.
- El 35.8% de las solicitudes se atendieron en 48 horas, y El 29.4% a 72 horas y más de solución.
- Avance de modernización: **97.73%** del sistema de alumbrado público de la ciudad modernizado. Pendiente por modernizar un **2.27%.** No se evidencia mucho avance ya que las obras ejecutadas en un alto porcentaje han sido por expansión
- Ejecuciones de modernización: Av. Santander, Vía Boquilla Playa Azul, Boquilla Cielo Mar, Parques del Socorro, Isla Grande, Parque Alcatraces, Bicentenario, Zonas subnormales Araraca y Santana.
- Otras intervenciones: Arroyo de Piedra, Cetro Histórico, Parque Centenario, Troncal del Norte. Hotel San Francisco, Murallas (entre Plaza de la Aduana y Plaza de Los Coches.

2. **Liquidación ucap's del periodo junio/julio 2025:** Con el aporte de la GDB el 02/07/2025, Se procedió a revisar y validar cantidades ejecutadas, y hasta esa fecha se tenían 1.850 ucap's aproximadamente, las cuales deben ser sumadas con las que se generen del corte a 16 de julio/2025. Para que se complete la liquidación y se tenga el dato consolidado para la facturación de EPM. Próxima entrega de GDB actualizada 18/07/205

Página 1 de 3

3. **Respaldo Operativo:**

Aunque el contrato de alumbrado público finaliza 16/07/2025, EPM, se compromete a:

a) Mantener cuadrillas disponibles para atender las fallas que por alumbrado público se reporten a partir del 17/07 hasta la firma del nuevo contrato que se encuentra en gestión jurídica.
b) Custodiar la infraestructura de alumbrado público, velando su funcionamiento permanente
c) Responder por las garantías de calidad de los materiales con los proveedores, y las obras con el contratista, a que haya lugar; en especial para las recientes intervenciones de modernización y expansión ejecutadas.
d) Realizar los ajustes al proyecto de las Murallas 2da. etapa.
e) Gestionar ante el ministerio de cultura el concepto favorable para la intervención de las Murallas
f) Reparación del alumbrado público afectado en la Torre del Reloj, informando que los elementos requeridos ya fueron adquiridos por EPM.

QBM2, igualmente, se compromete a brindar apoyo, reportando fallos, colaborando con conceptos y consultas que se requieran, mientras se finaliza la gestión contractual en curso.


4. **Proyección de Prioridades de ejecución de modernización y expansión**

- Proyecto de Murallas 2da. etapa: EPM, ha gestionado las compras de los proyectores teniendo en cuenta que, al ser importados, la adquisición y legalización de la mercancía, se hace efectiva en dos a tres meses.
- De parte de Distrito, se le exige a EPM, culminar con la Muralla a más tardar el 01/11/2025; de manera que la Alcaldía, pueda anunciar y hacer entrega a la comunidad públicamente de la nueva infraestructura que busca resaltar el patrimonio histórico.
- Av. Santander. Atendiendo solicitud de la Alcaldía, se viene gestionando el cambio de los postes de 12 metros fibra en la zona frontal de la muralla por postes más esbeltos de 14 metros. Esto conlleva a rediseñar el tramo para mantener los niveles de iluminación exigidos reglamentariamente para la vía.
- Certificaciones RETILAP: EPM, manifiesta contar con un ingeniero al frente de las revisiones en campo y documentación ante el ente certificador, para sacar adelante la certificación de los proyectos ejecutados.

Compromisos	Fecha	Responsable
1. Generar información puntual para nota de prensa resaltando las ejecuciones más significativas del periodo junio/julio y entregar s Servicios Públicos	18/07/2025	EPM
2. Reunión EPM y QBM2, para liquidación y cierre de actividades técnicas y operativas	21/07/2025	EPM Y QBM2
3. Entrega de GDB actualizada al corte de 16/07	18/07/2025	EPM
4. Liquidación de ucap's ejecutadas junio/julio 2025	22/07/2025	EPM Y QBM2
5. Actualización de la plataforma MIDAS con la información de alumbrado público	15/08/2025	Servicios Públicos
6. Cruce de energía (Afinia) con las nuevas cargas de junio y julio	01/08/2025	QBM2 – Afinia - Servicios Públicos

7. Radicación de oficio relacionado con el proyecto de las Murallas ante el Ministerio de Cultura	18/07/2025	EPM
8. Certificaciones RETILAP de proyectos desarrollados en primer semestre 2025	15/08/2025	EPM
9. Avanzar en el cambio de brazos oxidados y postes en la Av. Venezuela	31/07/2025	EPM
10. Diseño y presentación de SMI de tramo Variante Mamonal Gambote Kilometro 6	01/08/2025	EPM
11. Diseño y presentación de SMI de Ciudadela La Paz	01/08/2025	EPM
12. Gestionar tramitología para ejecución de proyectos de Ruta 90, Vía Mamonal Gambote y Troncal de Occidente	01/08/2025	Servicios Públicos
13. Presentación de informe de cierre contractual	31/07/2025	QBM2
14. Reunión de tele gestión con secretaria general	16/07/2025 02:30 p.m.	EPM- QBM2 – Servicios Públicos

Registro de asistencia

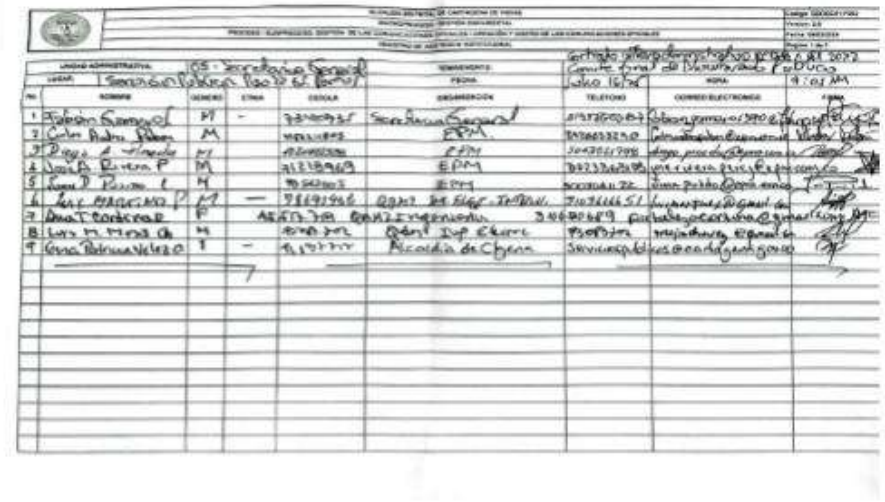

Anexo 4. Registro Fotográfico De Seguridad Y Área De Trabajo



Altos del Campestre – 11/06/2025





Intervención en Av. Santander – 25/06/2025 Con todas las medidas de seguridad y prevención





La Boquilla – Frente a Zona Hotelera 08/07/2025



Bajos del Puente Román – 16/07/2025

Anexo 5. Certificado De Aportes Y Seguridad Social Del Contratista

EL GERENTE GENERAL

20250130098842

CERTIFICA

Que, Empresas Públicas de Medellín E.S.P. ha realizado el pago, de los aportes que corresponden para financiar el sistema de Seguridad Social Integral del periodo de abril de 2025, definido mediante la ley 100 de 1993, los aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, mediante planillas unificadas N°9486378298 de Jubilados, N° 9485898609 de estudiantes de práctica y N°9485898538 de Activos, pagadas el 22 de mayo de 2025, por intermedio del operador de información Aportes en Línea. Se anexan copias de planillas.

El presente certificado es firmado por el representante legal, dado que Empresas públicas de Medellín E,S,P, por ser una empresa industrial y comercial del Estado, no se encuentra enmarcada dentro de las obligadas por el Código de Comercio para tener Revisor Fiscal.

Este certificado se expide el 28 de mayo de 2025

Atentamente,

DIANA OLIVA RUA JARAMILLO
Gerente General (e)

JOHN JAIME RODRIGUEZ SOSA
Jefe Área Contabilidad

LUIS HUMBERTO MARTINEZ GALEANO
Jefe Área Seguridad Social Integral

Elaboró: ASTRID VIVIANA TABORDA GAVIRIA.

Por ti, estamos ahí

Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Carrera 58 N° 42-125
Conmutador: 604 380 8080
Medellín - Colombia
www.epm.com.co

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890904996	1	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP	A - 200 O MAS COTIZANTES	ACTIVOS	cra 58 42 125	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3828080	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1575508461	1485748114	K	2025/06/25	2025/06/24	BANCOLOMBIA	0	$1,412,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				54	$1,412,300	$0	$0	$1,412,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	54	$1,412,300	$0	$0	$1,412,300
TOTAL				**54**	**$1,412,300**	**$0**	**$0**	**$1,412,300**

Página 1 de 1

2025/06/25 10:39 AM

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890904996	1	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP	A - 200 O MAS COTIZANTES	ACTIVOS	cra 58 42 125	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3828080	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1575365206	94870642179	E	2025/06/25	2025/06/24	BANCOLOMBIA	0	$24,963,638,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				8,151	$13,137,742,400	$0	$0	$13,137,742,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	534	$756,033,100	$0	$0	$756,033,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5,195	$8,923,714,900	$0	$0	$8,923,714,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	690	$831,601,100	$0	$0	$831,601,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1,386	$2,022,697,000	$0	$0	$2,022,697,000
SKANDIA	230901	800,253,055	2	346	$603,696,300	$0	$0	$603,696,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8,376	$1,739,211,700	$0	$0	$1,739,211,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	8,376	$1,739,211,700	$0	$0	$1,739,211,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				8,152	$3,346,811,900	$0	$0	$3,346,811,900
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	8,143	$3,342,334,100	$0	$0	$3,342,334,100
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	2	$767,800	$0	$0	$767,800
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	$1,140,100	$0	$0	$1,140,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	4	$2,242,200	$0	$0	$2,242,200
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	$327,700	$0	$0	$327,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 18)				8,611	$5,336,309,700	$0	$0	$5,336,309,700
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$2,612,400	$0	$0	$2,612,400
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$71,200	$0	$0	$71,200
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	$4,511,300	$0	$0	$4,511,300
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	14	$5,409,500	$0	$0	$5,409,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	64	$13,162,200	$0	$0	$13,162,200
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN DEPARTAMENTO MEDICO	EAS016	890,904,996	1	735	$531,674,000	$0	$0	$531,674,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6,293	$4,140,002,300	$0	$0	$4,140,002,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	8	$3,532,600	$0	$0	$3,532,600
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	15	$9,461,800	$0	$0	$9,461,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	$890,000	$0	$0	$890,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	725	$214,151,900	$0	$0	$214,151,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	13	$2,793,100	$0	$0	$2,793,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	298	$134,833,500	$0	$0	$134,833,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	296	$245,882,700	$0	$0	$245,882,700
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	130	$22,876,000	$0	$0	$22,876,000
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	RES011	890,980,040	8	5	$3,808,900	$0	$0	$3,808,900
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	RES008	899,999,063	3	1	$458,300	$0	$0	$458,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1,254	$842,126,100	$0	$0	$842,126,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1,254	$842,126,100	$0	$0	$842,126,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1,254	$561,436,600	$0	$0	$561,436,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	1,254	$561,436,600	$0	$0	$561,436,600
TOTAL				**8611**	**$24,963,638,400**	**$0**	**$0**	**$24,963,638,400**

Página 1 de 1

2025/06/25 10:36 AM

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890904996	1	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	A - 200 O MAS COTIZANTES	JUBILADOS	CRA 58 42-125	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3804053	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	15776209992	94877028806	P	2025/06/25	2025/06/25	BANCOLOMBIA	0	$318,252,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				15	$1,708,000	$0	$0	$1,708,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$373,900	$0	$0	$373,900
FSP - FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	FSP001	800,159,998	0	14	$1,334,100	$0	$0	$1,334,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$128,900	$0	$0	$128,900
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	3	$128,900	$0	$0	$128,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				1,653	$316,415,700	$0	$0	$316,415,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$100,700	$0	$0	$100,700
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$263,200	$0	$0	$263,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	11	$893,800	$0	$0	$893,800
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN DEPARTAMENTO MEDICO	EAS016	890,904,996	1	277	$79,941,800	$0	$0	$79,941,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	717	$146,517,100	$0	$0	$146,517,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$37,400	$0	$0	$37,400
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	10	$2,224,200	$0	$0	$2,224,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	537	$68,051,700	$0	$0	$68,051,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	49	$7,769,300	$0	$0	$7,769,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	37	$7,828,000	$0	$0	$7,828,000
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	8	$1,350,200	$0	$0	$1,350,200
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	RES011	890,980,040	8	3	$1,438,300	$0	$0	$1,438,300
TOTAL				**1653**	**$318,252,600**	**$0**	**$0**	**$318,252,600**

PLANILLA PAGADA

Página 1 de 1

2025/06/25 11:19 AM

Anexo 6. Solicitud De Modificación Fachada De La Alcaldía - SS1080720

epm

Solicitud de modificación de infraestructura para reparación de daños
Alumbrado Público


Información de la solicitud

N° Solicitud Usuario:	1080720	Fecha de Solicitud Cliente:	
Dirección:	SMI Fachada de la Alcaldía	RADICADO EPM:	
Solicitante:		Teléfono contacto:	

Información visita

Por solicitud de la comunidad, se encuentra sector oscuro por deficiencia y/o ausencia de luminarias, se realiza esta solicitud de modificación de infraestructura para garantizar un servicio de alumbrado público de calidad y mejorar las condiciones de seguridad.

Imágenes del sitio

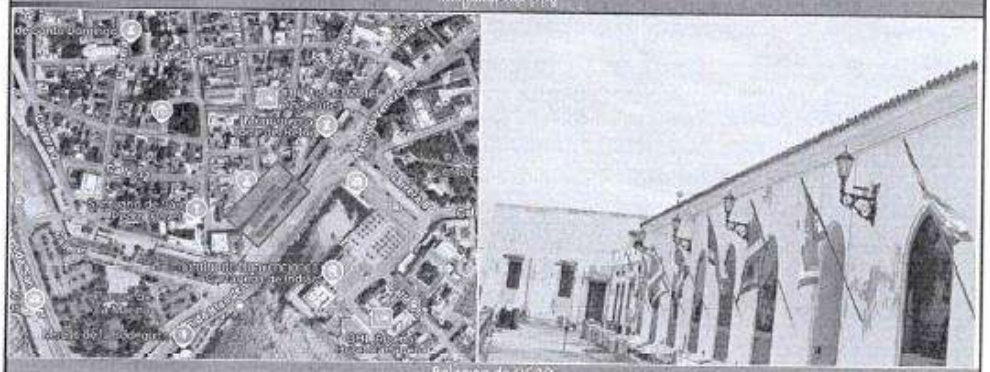

Relación de UCAP

Descripción UCAP	Factor Equivalencia	Unidad	Cantidad	Total UCAP
Farol en aluminio 52W asimetrico largo	2,830	Un	8	22,6
Brazo Ornamental 70 cm	1,746	Un	8	14,0
Fotocontrol Larga Vida Individual =ip65 105-305V 1000W 1800Va	0,039	Un	2	0,1
Cable 3x14 THHW	0,010	ml	27	0,3
			Total UCAP	36,969

Concepto de aprobación de la Interventoría

Vo.bo. Interventoría	Observaciones Interventoría:
Fecha concepto aprobación: 05/06/2025	Validado para incluir en liquidación, teniendo en cuenta que esta solicitud fue ejecutada con prioridad a solicitud del Distrito.
Nombre: Luis Miguel Mejía Chávez	
Cargo: Director de Interventoría	
Firma:	

Aprobación Distrito

Vo.bo. Distrito	Observaciones Distrito:
Fecha aprobación: 09/06/2025	
Nombre: María Patricia Porras	
Cargo: Sec General	
Firma:	

Anexo 7. Solicitud De Modificación Puente Las Gaviotas - SS1080341

epm

Solicitud de modificación de infraestructura para reparación de daños
Alumbrado Público


Información de la solicitud

N° Solicitud Usuario:	1080341	Fecha de Solicitud Cliente:	14/05/2025
Dirección:	SMI Puente de las Gaviotas	RADICADO EPM:	
Solicitante:		Teléfono contacto:	

Información visita

Por solicitud de la comunidad, se encuentra sector oscuro por deficiencia y/o ausencia de luminarias, se realiza esta solicitud de modificación de infraestructura para garantizar un servicio de alumbrado público de calidad y mejorar las condiciones de seguridad.

Imagenes del sitio

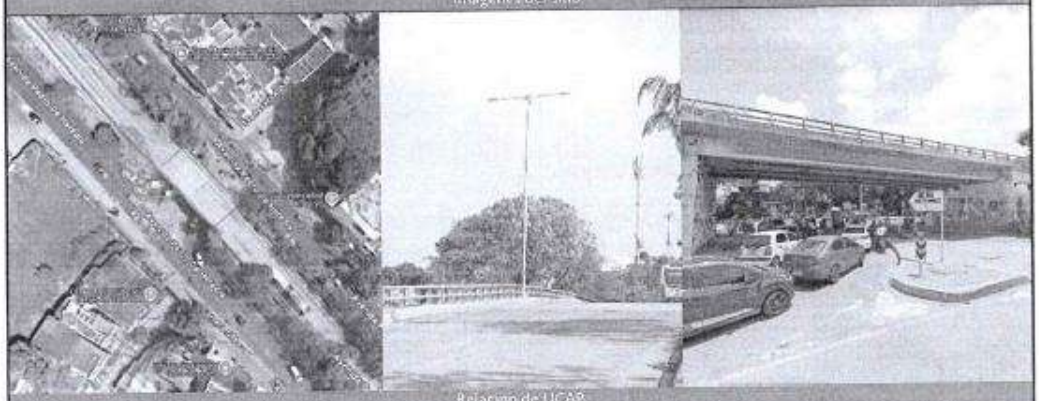

Relacion de UCAP

Descripcion UCAP	Factor equivalencia	Unidad	Cantidad	Total UCAP
Luminaria LED M3-1/M3-2 (64W)	1,364	Un	3	4,092
Brazo 400 mm x 1"	0,233	Un	2	0,466
Brazo 1500 mm x 1"	0,287	Un	1	0,287
Poste 12 PRFV 350 kgf	2,537	Un	1	2,537
Cable 3x14 THHW	0,010	ml	80	0,825
Canalización con 1 ducto	0,082	ml	25	2,050
Caja de inspeccion 50x50	0,940	Un	2	1,880
Fotocontrol Larga Vida Individual =Ip65 105-305V 1000W 1800Va	0,039	Un	3	0,118
				12,256

Concepto de aprobación de la interventoría

Vo.bo. Interventoría
Fecha concepto aprobación 05/06/2025
Nombre: Luis Miguel Mejia Chávez
Cargo: Director de Interventoria
Firma:

Observaciones Interventoría:
Validado para intervención, para reforzar iluminación en la zona de gran afluencia vehicular.

ATCR

Aprobacion Distrito

Vo.bo. Distrito
Fecha aprobación: 9/06/2025
Nombre: Maria Patricia Porras
Cargo: Sec General
Firma:

Observaciones Distrito:

Anexo 8. Solicitud De Modificación Rotonda Puente Manga - SS1085289

epm

Solicitud de modificación de infraestructura para reparación de daños
Alumbrado Público


Información de la solicitud

N° Solicitud Usuario:	1085289	Fecha de Solicitud Cliente:	21/05/2025
Dirección:	SMI Rotonda Puente de Manga	RADICADO EPM:	
Solicitante		Teléfono contacto:	

Información visita

Por solicitud de la comunidad, se encuentra sector oscuro por deficiencia y/o ausencia de luminarias, se realiza esta solicitud de modificación de infraestructura para garantizar un servicio de alumbrado público de calidad y mejorar las condiciones de seguridad.

Imágenes del sitio

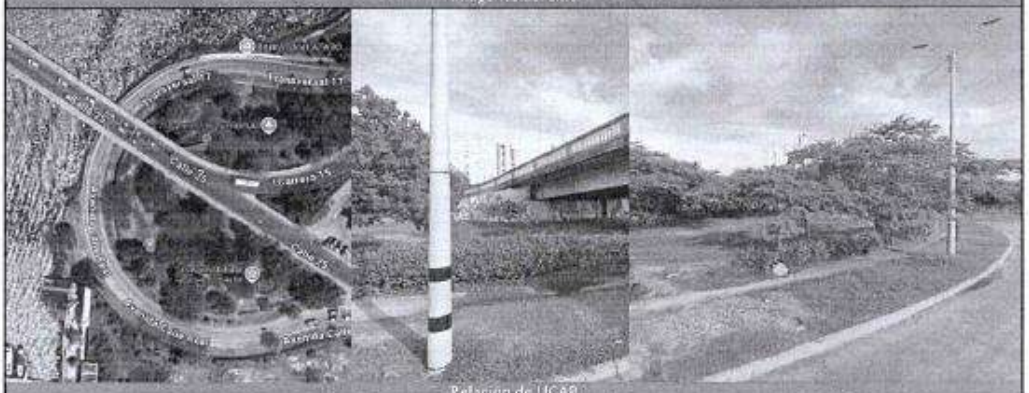

Relación de UCAP

Descripción UCAP	Factor equivalencia	Unidad	Cantidad	Total UCAP
Luminaria Escenario C1 (212W M)	5,223	Un	2	10,446
Fotocontrol Larga Vida Individual =Ip65 105-305V 1000W 1800Va	0,039	Un	2	0,079
				10,525

Concepto de aprobación de la Interventoría

Vo.bo. Interventoría
Fecha concepto aprobación: 05/06/2025
Nombre: Luis Miguel Mejía Chávez
Cargo: Director de Interventoria
Firma:

Observaciones Interventoría:
Validado para ejecución, una vez verificado la necesidad de reforzar iluminación en los alrededores del puente.

ATCe

Aprobación Distrito

Vo.bo. Distrito
Fecha aprobación: 9/06/2025
Nombre: María Patricia Porras
Cargo: Sec. General
Firma:

Observaciones Distrito:

Anexo 9. Solicitud De Modificación Parque Los Alcatraces, Av. Santander - SS1084738

epm

Solicitud de modificación de infraestructura para reparación de daños
Alumbrado Público


Información de la solicitud

N° Solicitud Usuario:	1084738	Fecha de Solicitud Cliente:	
Dirección:	SMI Parque de Los Alcatraces Av. Santander	RADICADO EPM:	
Solicitante:		Teléfono contacto:	

Información visita

Por solicitud de la comunidad, se encuentra sector oscuro por deficiencia y/o ausencia de luminarias, se realiza esta solicitud de modificación de infraestructura para garantizar un servicio de alumbrado público de calidad y mejorar las condiciones de seguridad.

Imagenes del sitio

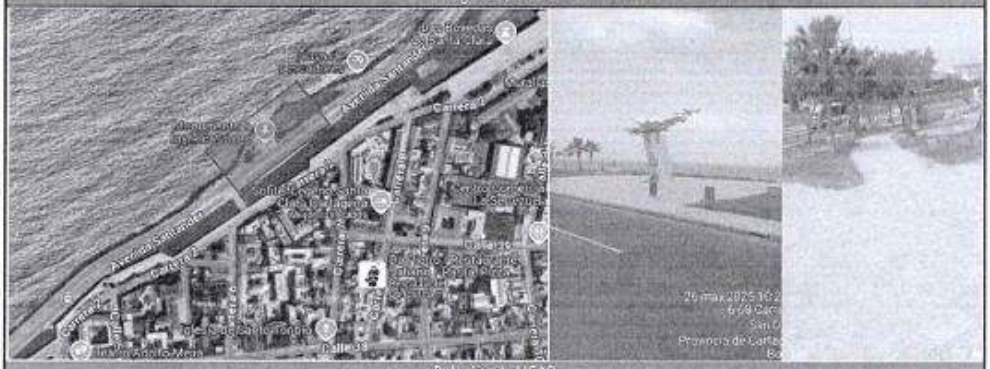

Relación de UCAP

Descripción UCAP	Factor equivalencia	Unidad	Cantidad	Total UCAP
Luminaria LED M4-1/M4-2 (45W)	1,000	Un	7	7,000
Fotocontrol Larga Vida Individual =Ip65 105-305V 1000W 1800Va	0,039	Un	7	0,276
Cable 3x8 AWG XLPE 600V THHN	0,022	ml	150	3,336
Poste Metalico 2" 6M (Incluye Cimentacion)	2,000	Un	7	14,000
Electrodo de puesta a Tierra	0,124	Un	1	0,124
Tablero 2 Ctos + Temporizado + Protecciones	1,380	Un	1	1,380
			Total UCAP	26,115

Concepto de aprobación de la interventoría

Vo.bo. Interventoría	Observaciones Interventoría:
Fecha concepto aprobación: 05/06/2025	Validado para intervención, ya que este monumento, actualmente carece de iluminación. Se encuentra en ejecucuión por EPM.
Nombre: Luis Miguel Mejia Chavez	
Cargo: Director de Interventoria	
Firma:	ATCR

Aprobación Distrito

Vo.bo. Distrito	Observaciones Distrito:
Fecha aprobación: 9/06/2025	
Nombre: Maria Patricia Porras	
Cargo: Sec General	
Firma:	

Anexo 10. Solicitud De Modificación Refuerzo Ingreso A Tierra Baja - SS1089580

epm

Solicitud de modificación de infraestructura para reparación de daños
Alumbrado Público


Información de la solicitud

N° Solicitud Usuario:	1089580	Fecha de Solicitud Cliente:	
Dirección:	SMI Refuerzo ingreso tierra baja	RADICADO EPM:	
Solicitante:		Teléfono contacto:	

Información visita

Por solicitud de la comunidad, se encuentra sector oscuro por deficiencia y/o ausencia de luminarias, se realiza esta solicitud de modificación de infraestructura para garantizar un servicio de alumbrado público de calidad y mejorar las condiciones de seguridad

Imagenes del sitio

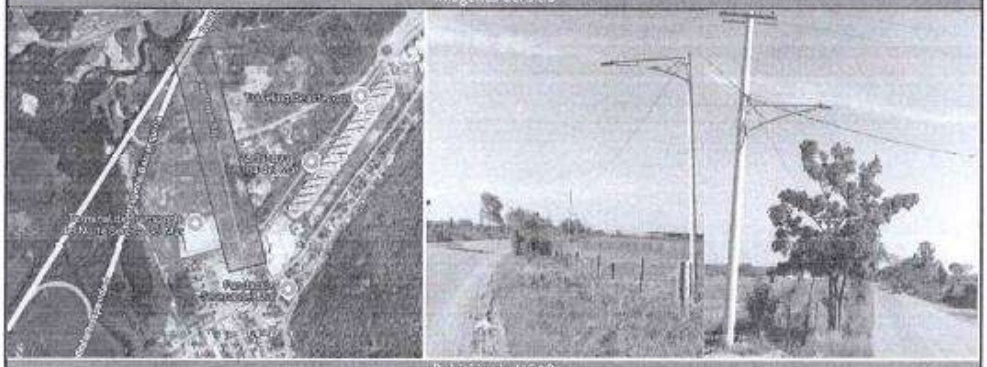

Relación de UCAP

Descripción UCAP	Factor equivalencia	Unidad	Cantidad	Total UCAP
Luminaria LED M3-1/M3-2 (64W)	1,364	Un	22	30,0
Fotocontrol Larga Vida Individual =Ip65 105-305V 1000W 1800Va	0,039	Un	22	0,9
Brazo 1500 mm x 1"	0,287	Un	22	6,3
Poste 8 PRFV 619 hgf	1,041	Un	10	27,7
Adecuación Secundaria	0,117	Un	14	1,6
Cable Triplex No 4	0,016	ml	350	5,7
Electrodo de puesta a Tierra	0,124	Un	4	0,5
Luminaria/Proyector 40W	0,000	Un	0	0,0
			Total UCAP	72,733

Concepto de aprobacion de la Interventoria

Vo.bo. Interventoria
Fecha concepto aprobación: 05/06/2025
Nombre: Luis Miguel Mejia Chávez
Cargo: Director de Interventoria
Firma:

Observaciones Interventoria:
Validado para intervención, ya que esta iluminación, vine siendo un requerimiento de la comunidad, y se hace necesario al incrementarse el flujo vehicular y peatonal en la zona.

ATCe

Aprobacion Distrito

Vo.bo. Distrito
Fecha aprobación: 09/06/2025
Nombre: Maria Patricia Porras
Cargo: Sec General
Firma:

Observaciones Distrito:

Anexo 11. Solicitud De Modificación Bayunca, Cra. 12 San Antonio, La Posita - SS1091452

epm

Solicitud de modificación de infraestructura para reparación de daños
Alumbrado Público


Información de la solicitud

N° Solicitud Usuario:	1091452	Fecha de Solicitud Cliente:	
Dirección:	SMI Sector San antonio La posita	RADICADO EPM:	
Solicitante:		Teléfono contacto:	

Información visita

Por solicitud de la comunidad, se encuentra sector oscuro por deficiencia y/o ausencia de luminarias, se realiza esta solicitud de modificación de infraestructura para garantizar un servicio de alumbrado público de calidad y mejorar las condiciones de seguridad.

Imágenes del sitio

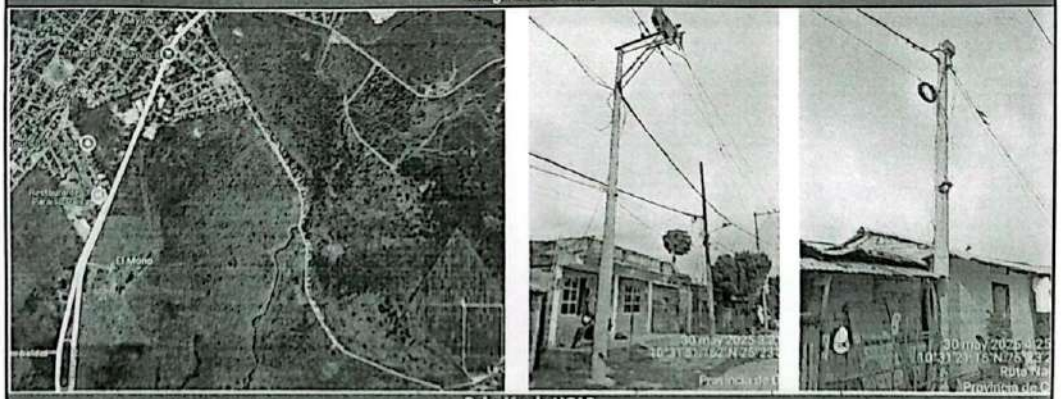

Relación de UCAP

Descripción UCAP	Factor equivalencia	Unidad	Cantidad	Total UCAP
Luminaria LED M4-1/M4-2 (45W)	1,000	Un	43	43,000
Brazo 1500 mm x 1"	0,287	Un	43	12,341
Fotocontrol Larga Vida Individual =Ip65 105-305V 1000W 1800Va	0,039	Un	43	1,695
Poste 8 PRFV 510 kgf	1,541	Un	12	18,492
Adecuacion Secundaria	0,117	Un	12	1,404
Electrodo de puesta a Tierra	0,124	Un	7	0,868
Luminaria/Proyector 70W	0,000	Un	-17	0,000
				77,799

Concepto de aprobación de la Interventoría

Vo.bo. Interventoría
Fecha concepto aprobación: 19/06/2025
Nombre: Luis Miguel Mejia Chávez
Cargo: Director de Interventoria
Firma:

Observaciones Interventoría:
Validado para intervención, sobre la Carrera 12 de Bayunca, teniendo en cuenta la normalización de las redes eléctricas, ya que la iluminación de la vía, se ejecutó parcialmente len marzo de 2023 Con esto se brinda mayor seguridad al sector San Antonio.

ATCR

Aprobación Distrito

Vo.bo. Distrito
Fecha aprobación: 19/6/25
Nombre: Nayla P. Porras
Cargo: Secretaria General
Firma:

Observaciones Distrito:

Ejecutada

Anexo 12. Solicitud De Modificación Refuerzo Villa Estrella, Cra. 94 - SS1093030

epm


Solicitud de modificación de Infraestructura para reparación de daños Alumbrado Público

Información de la solicitud

N° Solicitud Usuario:	1093030	Fecha de Solicitud Cliente:	
Dirección:	SMI Refuerzo villa estrella	RADICADO EPM:	
Solicitante:		Teléfono contacto:	

Información visita

Imágenes del sitio

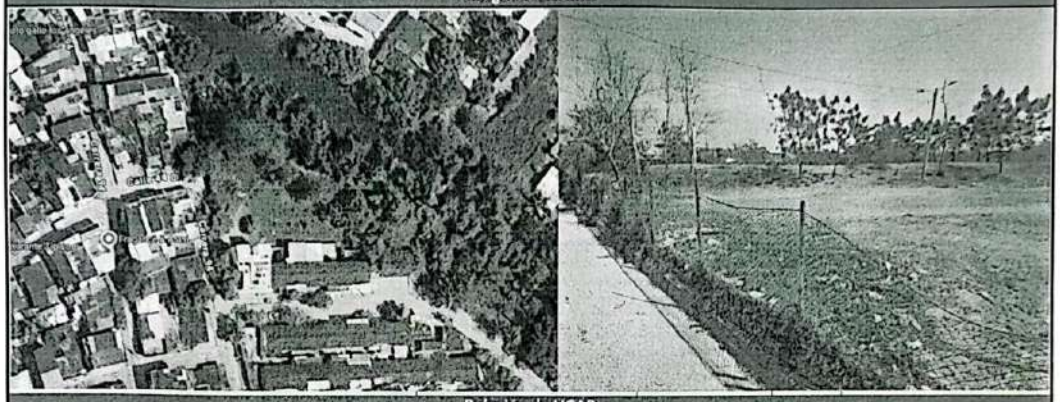

Relación de UCAP

Descripción UCAP	Factor equivalencia	Unidad	Cantidad	Total UCAP
Luminaria LED M4-1/M4-2 (45W)	1,000	Un	1	1,000
Brazo 1500 mm x 1"	0,287	Un	1	0,287
Cable 3x14 THHW	0,010	ml	20	0,206
Poste 8 PRFV 510 kgf	1,541	Un	1	1,541
Adecuacion Secundaria	0,117	Un	1	0,117
Fotocontrol Larga Vida Individual =Ip65 105-305V 1000W 1800Va	0,039	Un	1	0,039
				3,191

Concepto de aprobación de la Interventoría

Vo.bo. Interventoría	Observaciones Interventoría:
Fecha concepto aprobación: 19/06/2025	Validada intervención, atendiendo requerimiento de la comunidad en visita realizada por EPM y QBM2 el pasado 23/05/2025
Nombre: Luis Miguel Mejía Chávez	
Cargo: Director de Interventoría	
Firma:	ATCR

Aprobación Distrito

Vo.bo. Distrito	Observaciones Distrito:
Fecha aprobación: 03/25	
Nombre: Maria P. Parra	
Cargo: Secretaria General	
Firma:	

Anexo 13. Solicitud De Modificación Bayunca, Carrera 20 Parque Del Sect. San Rafael - Ss1091448

epm


Solicitud de modificación de Infraestructura para reparación de daños Alumbrado Público

Información de la solicitud

N° Solicitud Usuario:	1093030	Fecha de Solicitud Cliente:	
Dirección:	SMI Refuerzo villa estrella	RADICADO EPM:	
Solicitante:		Teléfono contacto:	

Información visita

Imágenes del sitio

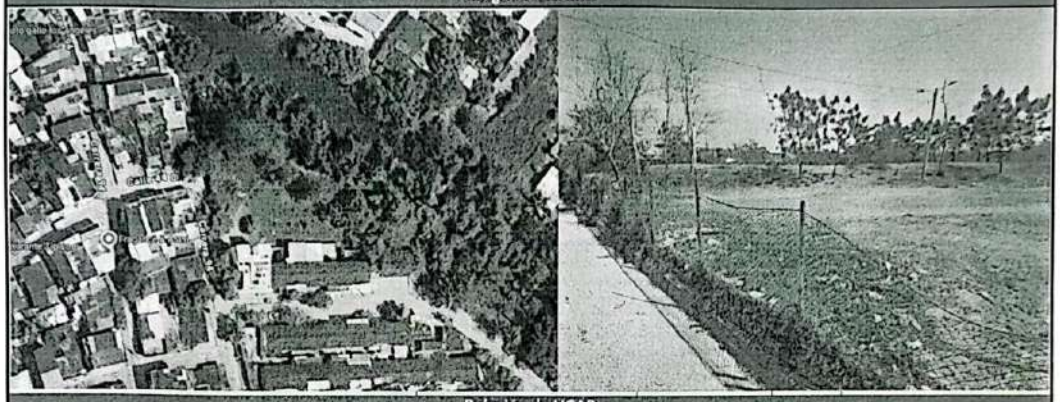

Relación de UCAP

Descripción UCAP	Factor equivalencia	Unidad	Cantidad	Total UCAP
Luminaria LED M4-1/M4-2 (45W)	1,000	Un	1	1,000
Brazo 1500 mm x 1"	0,287	Un	1	0,287
Cable 3x14 THHW	0,010	ml	20	0,206
Poste 8 PRFV 510 kgf	1,541	Un	1	1,541
Adecuacion Secundaria	0,117	Un	1	0,117
Fotocontrol Larga Vida Individual =Ip65 105-305V 1000W 1800Va	0,039	Un	1	0,039
				3,191

Concepto de aprobación de la Interventoría

Vo.bo. Interventoría Fecha concepto aprobación: 19/06/2025 Nombre: Luis Miguel Mejía Chávez Cargo: Director de Interventoria Firma:	Observaciones Interventoría: Validada intervención, atendiendo requerimiento de la comunidad en visita realizada por EPM y QBM2 el pasado 23/05/2025 ATCR

Aprobación Distrito

Vo.bo. Distrito Fecha aprobación: Nombre: Maria P. Parra Cargo: Secretaria General Firma:	Observaciones Distrito:

Anexo 14. Solicitud De Modificación Barrio El Country: Puente Y Cancha De Arena - SS1086496

epm


Solicitud de modificación de Infraestructura para reparación de daños
Alumbrado Público

Información de la solicitud

N° Solicitud Usuario:	1093030	Fecha de Solicitud Cliente:	
Dirección:	SMI Refuerzo villa estrella.	RADICADO EPM:	
Solicitante:		Teléfono contacto:	

Información visita

Imágenes del sitio

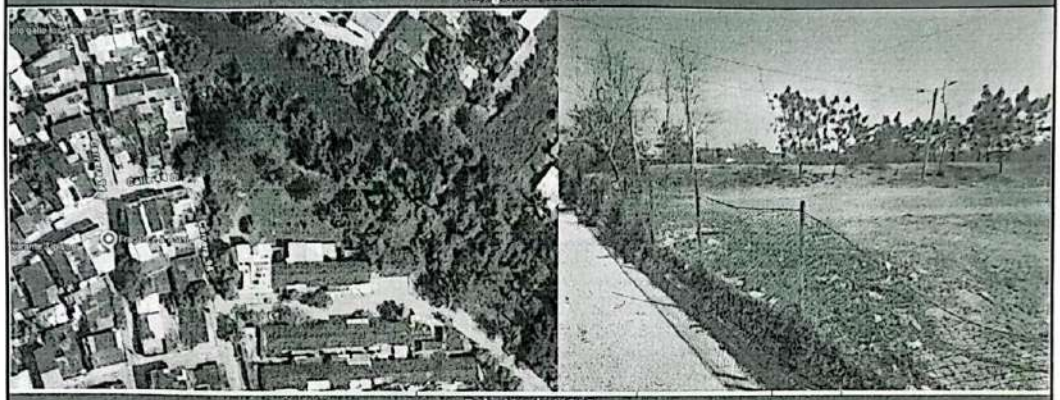

Relación de UCAP

Descripción UCAP	Factor equivalencia	Unidad	Cantidad	Total UCAP
Luminaria LED M4-1/M4-2 (45W)	1,000	Un	1	1,000
Brazo 1500 mm x 1"	0,287	Un	1	0,287
Cable 3x14 THHW	0,010	ml	20	0,206
Poste 8 PRFV 510 kgf	1,541	Un	1	1,541
Adecuacion Secundaria	0,117	Un	1	0,117
Fotocontrol Larga Vida Individual =Ip65 105-305V 1000W 1800Va	0,039	Un	1	0,039
				3,191

Concepto de aprobación de la Interventoria

Vo.bo. Interventoria	Observaciones Interventoría:
Fecha concepto aprobación: 19/06/2025	Validada intervención, atendiendo requerimiento de la comunidad en visita realizada por EPM y QBM2 el pasado 23/05/2025
Nombre: Luis Miguel Mejía Chávez	
Cargo: Director de Interventoria	
Firma:	ATCR

Aprobación Distrito

Vo.bo. Distrito	Observaciones Distrito:
Fecha aprobación: 19/06/25	
Nombre: Laura P. Perea	
Cargo: Secretaria General	
Firma:	

Anexo 15. Solicitud De Modificación Curva De Ceballos, Corredor De Carga - SS1097297

epm

Solicitud de modificación de infraestructura para reparación de daños
Alumbrado Público


Información de la solicitud

N° Solicitud Usuario:	1097297	Fecha de Solicitud Cliente:	
Dirección:	SMI Refuerzo Curva Ceballos - Corredor de carga	RADICADO EPM:	
Solicitante:		Teléfono contacto:	

Información visita

Por solicitud de la comunidad, se encuentra sector oscuro por deficiencia y/o ausencia de luminarias, se realiza esta solicitud de modificación de infraestructura para garantizar un servicio de alumbrado público de calidad y mejorar las condiciones de seguridad.

Imágenes del sitio

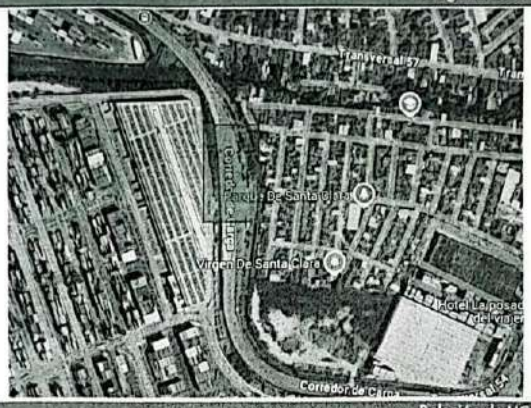



Relación de UCAP

Descripción UCAP	Factor equivalencia	Unidad	Cantidad	Total UCAP
Luminaria Escenario C1 (291W L)	5,223	Un	2	10,4
Fotocontrol Larga Vida Individual =Ip65 105-305V 1000W 1800Va	0,039	Un	2	0,1
Cable 3x14 THHW	0,010	ml	10	0,1
Cruceta Y Tiranta Galvanizada 1500 Mm	0,155	Un	1	0,2
			Total UCAP	10,782

Concepto de aprobación de la Interventoría

Vo.bo. Interventoría Fecha concepto aprobación: 20/06/2025 Nombre: Luis Miguel Mejía Chávez Cargo: Director de Interventoria Firma:	Observaciones Interventoría: Validado para intervención, reforzar la iluminación de la curva ,dada la amplitud de la vía.

Aprobación Distrito

Vo.bo. Distrito Fecha aprobación: Nombre: Cargo: Secretario General Firma:	Observaciones Distrito:

Anexo 16. Solicitud De Modificación Hurto Y Vandalismo Marzo A Mayo 2025 - SS1099929

epm

Solicitud de modificación de infraestructura para reparación de daños
Alumbrado Público


Información de la solicitud

N° Solicitud Usuario:	1097297	Fecha de Solicitud Cliente:	
Dirección:	SMI Refuerzo Curva Ceballos - Corredor de carga	RADICADO EPM:	
Solicitante:		Teléfono contacto:	

Información visita

Por solicitud de la comunidad, se encuentra sector oscuro por deficiencia y/o ausencia de luminarias, se realiza esta solicitud de modificación de infraestructura para garantizar un servicio de alumbrado público de calidad y mejorar las condiciones de seguridad.

Imágenes del sitio

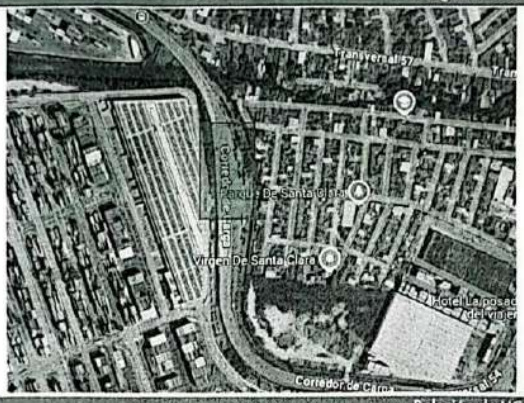



Relación de UCAP

Descripción UCAP	Factor equivalencia	Unidad	Cantidad	Total UCAP
Luminaria Escenario C1 (291W L)	5,223	Un	2	10,4
Fotocontrol Larga Vida Individual =Ip65 105-305V 1000W 1800Va	0,039	Un	2	0,1
Cable 3x14 THHW	0,010	ml	10	0,1
Cruceta Y Tiranta Galvanizada 1500 Mm	0,155	Un	1	0,2
			Total UCAP	10,782

Concepto de aprobación de la Interventoría

Vo.bo. Interventoría Fecha concepto aprobación: 20/06/2025 Nombre: Luis Miguel Mejía Chávez Cargo: Director de Interventoria Firma:	Observaciones Interventoría: Validado para intervención, reforzar la iluminación de la curva ,dada la amplitud de la vía. ATCe

Aprobación Distrito

Vo.bo. Distrito Fecha aprobación: 26/06/25 Nombre: Maria L. Parra Cargo: Secretaria General Firma:	Observaciones Distrito:

Anexo 17. Solicitud De Modificación Cancha De Urb. Palmas De Salamancas – SS1080720

epm

Solicitud de modificación de infraestructura para reparación de daños
Alumbrado Público


Información de la solicitud

N° Solicitud Usuario:	1112568	Fecha de Solicitud Cliente:	07/07/2025
Dirección:	SMI Canchas Palmas de Salamanca	RADICADO EPM:	
Solicitante:	Comunidad	Teléfono contacto:	

Información visita

Por solicitud de la comunidad, se encuentra sector oscuro por deficiencia y/o ausencia de luminarias, se realiza esta solicitud de modificación de infraestructura para garantizar un servicio de alumbrado público de calidad y mejorar las condiciones de seguridad.

Imágenes del sitio

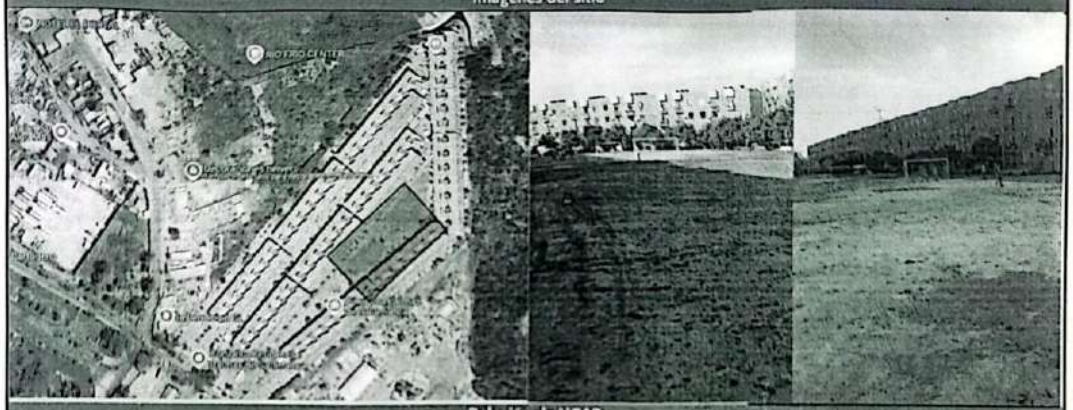

Relación de UCAP

Descripción UCAP	Factor equivalencia	Unidad	Cantidad	Total UCAP
Luminaria LED M1-1 (210W)	4,020	Un	4	16,080
Luminaria Escenario C1 (212W M)	5,223	Un	8	41,784
Brazo 1500 mm x 1 1/2"	0,283	Un	4	1,132
Fotocontrol Larga Vida Individual =Ip65 105-305V 1000W 1800Va	0,039	Un	12	0,473
Poste 8 PRFV 510 kgf	1,541	Un	4	6,164
Poste 12 PRFV 350 kgf	2,537	Un	4	10,148
Adecuacion Secundaria	0,117	Un	4	0,468
Cable 3x14 THHW	0,010	ml	99	1,021
Cruceta Y Tiranta Galvanizada 1500 Mm	0,155	Un	4	0,618
			Total UCAP	77,888

Concepto de aprobación de la Interventoría

Vo.bo. Interventoría
Fecha concepto aprobación: 08/07/2025
Nombre: Luis Miguel Mejía Chávez
Cargo: Director de Interventoria
Firma:

Observaciones Interventoría:
Se valida la intervención de las canchas, para completar toda la infraestructura de la Urb. Palmas de Salamancas

ATCR

Aprobación Distrito

Vo.bo. Distrito
Fecha aprobación: 10/07/25
Nombre: Hardy L. Torres
Cargo: Secretario General
Firma:

Observaciones Distrito:

Anexo 18. Solicitud De Modificación Cancha De Urb. Barú – SS1080341

epm

Solicitud de modificación de infraestructura para reparación de daños
Alumbrado Público


Información de la solicitud

N° Solicitud Usuario:	1113163	Fecha de Solicitud Cliente:	
Dirección:	SMI Cancha Urbanizacion Baru	RADICADO EPM:	
Solicitante:		Teléfono contacto:	

Información visita

Por solicitud de la comunidad, se encuentra sector oscuro por deficiencia y/o ausencia de luminarias, se realiza esta solicitud de modificación de infraestructura para garantizar un servicio de alumbrado público de calidad y mejorar las condiciones de seguridad

Imágenes del sitio

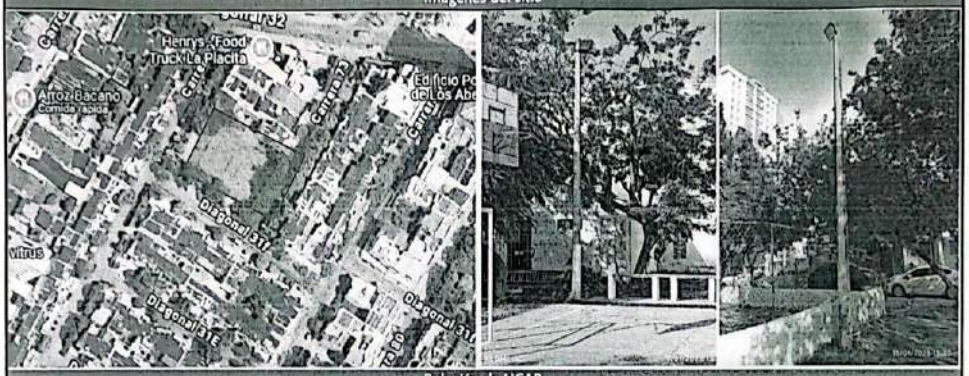

Relación de UCAP

Descripción UCAP	Factor equivalencia	Unidad	Cantidad	Total UCAP
Luminaria LED M2-1/M2-2 (128W)	1,000	Un	4	4,000
Brazo 1500 mm x 1 1/2"	0,283	Un	4	1,132
Fotocontrol Larga Vida Individual =Ip65 105-305V 1000W 1800Va	0,039	Un	4	0,158
Poste 8 PRFV 510 kgf	1,541	Un	4	6,164
Cable 3x14 THHW	0,010	ml	85	0,877
Adecuacion Secundaria	0,117	Un	4	0,468
Luminaria/Proyector 250W	0,000	Un	4	0,000
			Total UCAP	12,798

Concepto de aprobación de la interventoría

Vo.bo. Interventoría Fecha concepto aprobación: 08/07/2025 Nombre: Luis Miguel Mejia Chávez Cargo: Director de Interventoria Firma:	Observaciones Interventoría: Validada intervencón, dado que, durante la modernización de a urbanización, la cancha quedo pendiente, y cuenta con luminarias obsoletas de sodio ATCe

Aprobación Distrito

Vo.bo. Distrito Fecha aprobación: 10/07/25 Nombre: Mariz P. Parras Cargo: Secretaria General Firma:	Observaciones Distrito:

Anexo 19. Solicitud De Modificación Reposición Proyectores Vandalizados En Murallas – SS1085289

epm

Solicitud de modificación de Infraestructura para reparación de daños
Alumbrado Público

Información de la solicitud

N° Solicitud Usuario:	1080815	Fecha de Solicitud Cliente:	
Dirección:	SMI reposicion proyectores SQUARE-L Mueralla	RADICADO EPM:	
Solicitante:	Epm	Teléfono contacto:	

Información visita

Según el registro de hurtos y vandalismo se envian las cantidades respectivas a la reposición de la infraestructura afectada, por lo que se envia solicitud de modificación de infraestructura para garantizar un servicio de alumbrado público de calidad y mejorar las condiciones de seguridad.

Imágenes del sitio



Relación de UCAP

Descripción UCAP	Factor equivalencia	Unidad	Cantidad	Total UCAP
Proyector led RGBW DMX RDM 70W muralla exterior de sobreponer	14,771	Un	12	177,246
			Total UCAP	177,246

Concepto de aprobación de la Interventoría

Vo.bo. Interventoría Fecha concepto aprobación 08/07/2025 Nombre: Luis Miguel Mejía Chávez Cargo: Director de Interventoria / Firma:	Observaciones Interventoría: Validado para reposición, una vez que lasituación de hurto y vandalismoa fue notificada en comités de seguimiento y soportada con denuncia. ATCR

Aprobación Distrito

Vo.bo. Distrito Fecha aprobación: 10/7/25 Nombre: Maria D. Flores Cargo: Secretaria General Firma:	Observaciones Distrito:

Anexo 20. Solicitud De Modificación Refuerzo Peaje Coralito Mamonal – SS1114295

epm

Solicitud de modificación de infraestructura para reparación de daños
Alumbrado Público


Información de la solicitud

N° Solicitud Usuario:	1114295	Fecha de Solicitud Cliente:	
Dirección:	SMI Refuerzo Peaje Coralito Mamonal	RADICADO EPM:	
Solicitante:		Teléfono contacto:	

Información visita

Por solicitud de la comunidad, se encuentra sector oscuro por deficiencia y/o ausencia de luminarias, se realiza esta solicitud de modificación de infraestructura para garantizar un servicio de alumbrado público de calidad y mejorar las condiciones de seguridad.

Imágenes del sitio

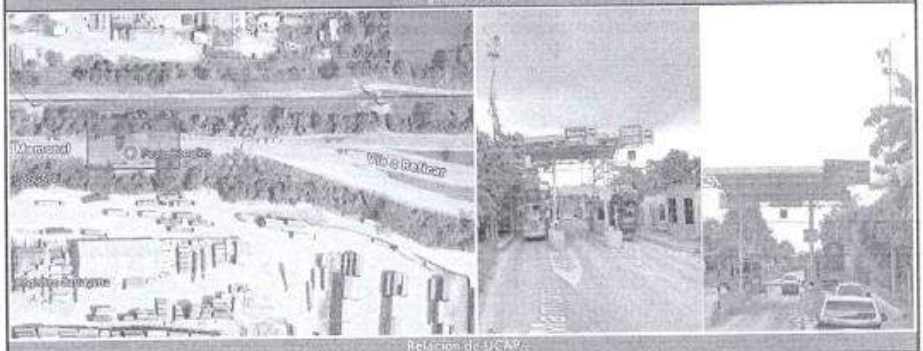

Relación de UCAP

Descripción UCAP	Factor equivalencia	Unidad	Cantidad	Total UCAP
Luminaria Escenario C1 (291W M)	5,223	Un	2	10,4
Fotocontrol Larga Vida Individual =Ip65 105-305V 1000W 1800Va	0,039	Un	2	0,1
Cruceta Y Tirante Galvanizada 1500 Mm	0,155	Un	1	0,2
Luminaria/Proyector 1000W	0,000	Un	3	0,0
			Total UCAP	10,679

Concepto de aprobación de la interventoría

Vo.bo. Interventoría	Observaciones Interventoría:
Fecha concepto aprobación: 14/07/2025	Validado para modificación, haciendo uso de la torre de iluminación existente, modernizando los proyectores existentes; y aportando mayor nivel de iluminación a la zona.
Nombre: Luis Miguel Mejía Chávez	
Cargo: Director de Interventoría	
Firma:	ATCR

Aprobación Distrito

Vo.bo. Distrito	Observaciones Distrito:
Fecha aprobación: 16/07/2025	
Nombre: Maris Patricia Pastrana	
Cargo: Sec General	
Firma:	VR

Anexo 21. Solicitud de Modificación Refuerzo Peaje Manga - SS1114306

epm

Solicitud de modificación de infraestructura para reparación de daños
Alumbrado Público


Información de la solicitud

N° Solicitud Usuario:	1114306	Fecha de Solicitud Cliente:	
Dirección:	SMI Refuerzo Peaje Manga	RADICADO EPM:	
Solicitante:		Teléfono contacto:	

Información visita

Por solicitud de la comunidad, se encuentra sector oscuro por deficiencia y/o ausencia de luminarias, se realiza esta solicitud de modificación de infraestructura para garantizar un servicio de alumbrado público de calidad y mejorar las condiciones de seguridad.

Imágenes del sitio

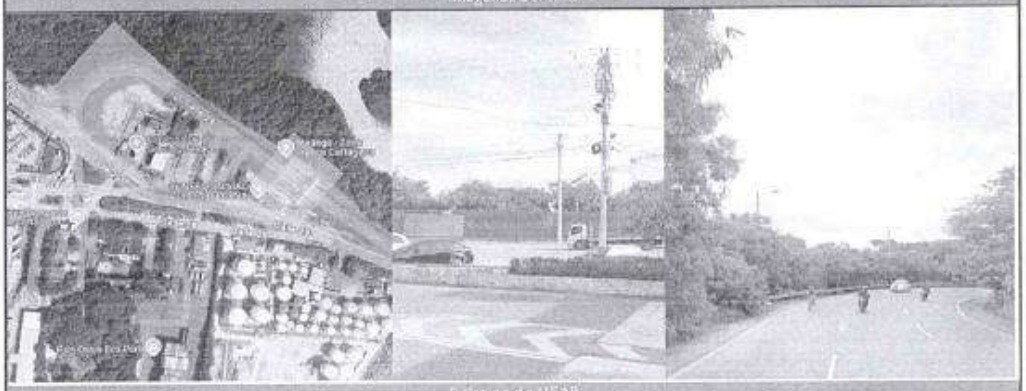

Relación de UCAP

Descripción UCAP	Factor equivalencia	Unidad	Cantidad	Total UCAP
Luminaria Escenario C1 (291W L)	5,223	Un	7	36,561
Fotocontrol Larga Vida Individual =Ip65 105-305V 1000W 1800Va	0,039	Un	7	0,276
Cable 3x14 THHW	0,010	ml	38	0,392
Cruceta Y Tirante Galvanizada 1500 Mm	0,155	Un	1	0,155
Poste 12 PRFV 350 kgf	2,537	Un	2	5,074
			Total UCAP	42,457

Concepto de aprobación de la Interventoría

Vo.bo. Interventoría Fecha concepto aprobación: 14/07/2025 Nombre: Luis Miguel Mejía Chávez Cargo: Director de Interventoría Firma:	Observaciones Interventoría: Validado para intervención. Con las acciones propuestas se elimina la condición de riesgo de caída de 1/4 postes ubicados en predio privado, y se garantiza mantener un nivel de iluminación adecuado para la curva. Al tiempo se utiliza la torre de iluminación existente, modernizando los proyectores obsoletos. Con esto se supera petición presentada en comité de seguimiento. ATCR

Aprobación Distrito

Vo.bo. Distrito Fecha aprobación: 16/07/2025 Nombre: María Patricia Porras Cargo: Sec General Firma:	Observaciones Distrito:

Anexo 22. Solicitud de Modificación Santana y Ararca - zonas normalizadas - SS1104939

epm

Solicitud de modificación de infraestructura para reparación de daños
Alumbrado Público

Información de la solicitud

N° Solicitud Usuario:	1104939	Fecha de Solicitud Cliente:	
Dirección:	SMI Ararca y santana – zona normalizada	RADICADO EPM:	
Solicitante:		Teléfono contacto:	

Información visita

Por solicitud de la comunidad, se encuentra sector oscuro por deficiencia y/o ausencia de luminarias, se realiza esta solicitud de modificación de infraestructura para garantizar un servicio de alumbrado público de calidad y mejorar las condiciones de seguridad

Imágenes del sitio



Relación de UCAP

Descripción UCAP	Factor equivalencia	Unidad	Cantidad	Total UCAP
Luminaria LED M4-1/M4-2 (45W)	1,000	Un	147	147,0
Brazo 1500 mm x 1"	0,287	Un	147	42,2
Poste 8 PRFV 510 kgf	1,541	Un	2	3,1
Cable 3x14 THHW	0,010	ml	55,3	0,6
			Total UCAP	192,842

Concepto de aprobación de la interventoría

Vo.bo. Interventoría
Fecha concepto aprobación: 14/07/2025
Nombre: Luis Miguel Mejia Chavez
Cargo: Director de Interventoria
Firma:

Observaciones Interventoría:
Validada su ejecución, ya que la intervención tiene como alcance las zonas recientemente normalizaas por AFINIA, y carentes de alumbrado público. Con esta expansión, se brinda mayoir seguridad a los sectores.

ATCR

Aprobación Distrito

Vo.bo. Distrito
Fecha aprobación: 16/07/2025
Nombre: Maria Patricia Perez
Cargo: Soc General
Firma:

Observaciones Distrito:

VR

Anexo 23. Solicitud de Modificación Puente Román Etapa II - SS1114904

epm

Solicitud de modificación de infraestructura para reparación de daños Alumbrado Público


Información de la solicitud

N° Solicitud Usuario:	1114904	Fecha de Solicitud Cliente:	
Dirección:	Puente Roman Etapa II	RADICADO EPM:	
Solicitante:		Teléfono contacto:	

Información visita

Por solicitud de la comunidad, se encuentra sector oscuro por deficiencia y/o ausencia de luminarias, se realiza esta solicitud de modificación de infraestructura para garantizar un servicio de alumbrado público de calidad y mejorar las condiciones de seguridad.

Imágenes del sitio

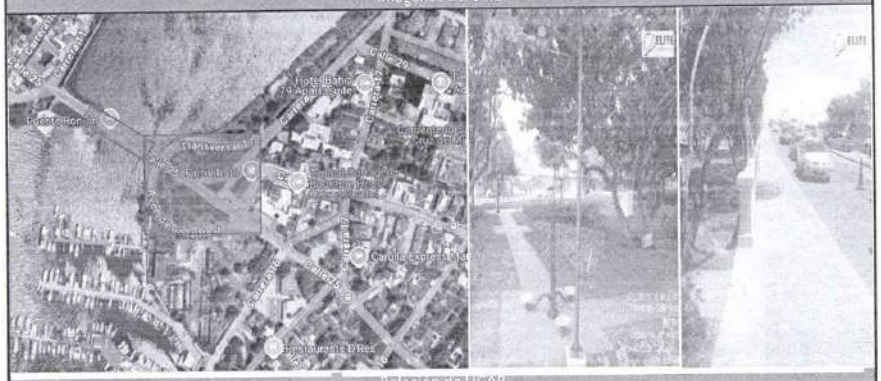

Relación de UCAP

Descripción UCAP	Factor equivalencia	Unidad	Cantidad	Total UCAP
Luminaria LED C3 (30W S 4K)	3,884	Un	10	38,845
Luminaria LED C3 (50W AS 4K)	3,884	Un	15	58,267
Luminaria Tipo Farol Hexagonal (55W A7)	5,664	Un	10	56,639
Brazo Ornamental 70 cm	1,746	Un	2	3,492
Fotocontrol Larga Vida Individual =Ip65 105-305V 1000W 1800V	0,039	Un	35	1,379
Poste Ornamental Colonial 3-5 Metros	6,433	Un	9	57,893
Poste Metalico 2" 4M (Incluye Cimentacion)	2,000	Un	10	20,000
Caja de inspeccion 50x50	0,940	Un	13	12,220
Tablero 2 Ctos + Temporizado + Protecciones	1,380	Un	3	4,139
Electrodo de puesta a Tierra	0,124	Un	7	0,868
Cable 3x14 THHW	0,010	ml	250	2,579
Cable 3X6 Al Aislado	0,016	ml	500	8,103
Canalización con 1 ducto	0,082	ml	640	52,480
Desmonte de poste metalico o concreto de 9m a 12 m	0,878	Un	3	2,634
Luminaria LED M3-1/M3-2 (110W)	1,364	Un	-2	0,000
Luminaria LED M2-1/M2-2 (140W)	1,000	Un	-3	0,000
			Total UCAP	319,538

Concepto de aprobación de la Interventoría

Vo.bo. Interventoría	Observaciones Interventoría: Validado para intervención, ya con esta modificación se atiende requerimiento de la alcaldía, y se le aporta iluminación a la zona verde en los bajos del Puente Román
Fecha concepto aprobación: 14/07/2025	
Nombre: Luis Miguel Mejía Chávez	
Cargo: Director de Interventoria	
Firma:	ATCR

Aprobación Distrito

Vo.bo. Distrito	Observaciones Distrito:
Fecha aprobación: 16/07/2025	
Nombre: MARIA PATRICIA PEREZ	
Cargo: Sec General	
Firma:	VP

Anexo 24. Solicitud de Modificación El Toril, Calle 33 - SS1117766

epm

Solicitud de modificación de infraestructura para reparación de daños
Alumbrado Público


Información de la solicitud

N° Solicitud Usuario:	1117766	Fecha de Solicitud Cliente:	
Dirección:	SMI Cambio poste metalico Sector el Toril	RADICADO EPM:	
Solicitante:		Teléfono contacto:	

Información visita

Por solicitud de la comunidad, se encuentra sector oscuro por deficiencia y/o ausencia de luminarias, se realiza esta solicitud de modificación de infraestructura para garantizar un servicio de alumbrado público de calidad y mejorar las condiciones de seguridad.

Imagenes del sitio

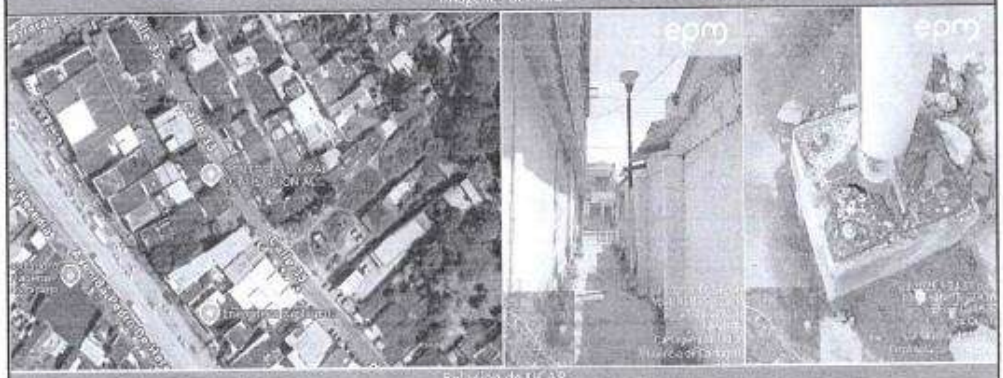

Relación de UCAP

Descripción UCAP	Factor equivalencia	Unidad	Cantidad	Total UCAP
Luminaria LED M4-1/M4-2 (45W)	1,000	Un	1	1,0
Brazo 400 mm x 1"	0,233	Un	1	0,2
Fotocontrol Larga Vida Individual = Ip65 105-305V 1000W 1800Va	0,039	Un	1	0,0
Poste Metalico 2" 4M (Incluye Cimentacion)	2,000	Un	1	2,0
Desmonte de poste metalico de 3,5m a 9m	0,878	Un	1	0,9
Luminaria/Proyector 70W	0,000	Un	1	0,0
			Total UCAP	4,150

Concepto de aprobación de la Interventoría

Vo.bo. Interventoría	Observaciones Interventoría:
Fecha concepto aprobación: 14/07/2025	Validado para intervención, con el fin de eliminar riesgo de caida, y evitar quede la zona oscura.
Nombre: Luis Miguel Mejia Chávez	
Cargo: Director de Interventoria	
Firma:	

Aprobación Distrito

Vo.bo. Distrito	Observaciones Distrito:
Fecha aprobación: 16/07/2025	
Nombre: Maria Patricia Porras	
Cargo: Sec General	
Firma:	

VB

Anexo 25. Seguimiento de solicitudes de modificación junio/julio 2025 Actualizar

SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA JUNIO 2025								
Item	**Solicitud de modificación**	**SS**	**Fecha de remisión EPM**	**Fecha de validación QBM2**	**Enviado para aprobación**	**Fecha de Aprobación DTO**	**UCAP**	**Estado de ejecución**
1	Fachada de la Alcaldía	1080720	5/06/2025	5/06/2025	5/06/2025	9/07/2025	36,969	ejecutado
2	Puente Las Gaviotas	1080341	5/06/2025	5/06/2025	5/06/2025	9/07/2025	12,256	ejecutado
3	Rotonda Puente Manga	1085289	5/06/2025	5/06/2025	5/06/2025	9/07/2025	10,525	ejecutado
4	Parque los Alcatraces, Av. Santander	1084738	5/06/2025	5/06/2025	5/06/2025	9/07/2025	26,115	ejecutado
5	Refuerzo Ingreso a Tierra Baja	1089580	5/06/2025	5/06/2025	5/06/2025	9/07/2025	72,73	ejecutado
1	Bayunca, Cra. 12 San Antonio, La Posita	1091452	19/06/2025	19/06/2025	20/06/2025	03/07/20285	77,79	ejecutado
2	Refuerzo Villa Estrella, Cra. 94	1093030	19/06/2025	19/06/2025	20/06/2025	3/07/2025	3,191	ejecutado
3	Bayunca, Carrera 20 Parque del Sect. San Rafael	1091448	19/06/2025	19/06/2025	20/06/2025	3/07/2025	11,962	pendiente
4	Barrio El Country: Puente y Cancha de arena	1086496	19/06/2025	19/06/2025	20/06/2025	3/07/2025	87,443	pendiente
5	Curva de Ceballos, Corredor de carga	1097297	19/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	3/07/2025	10,78	pendiente
6	Hurto y Vandalismo Marzo a Mayo 2025	1099929	19/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	3/07/2029	39,93	ejecutado

SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA JULIO 2025								
Item	**Solicitud de modificación**	**SS**	**Fecha de remisión EPM**	**Fecha de validación QBM2**	**Enviado para aprobación**	**Fecha de Aprobación DTO**	**UCAP**	**Estado de ejecución**
1	Cancha de Urb. Palmas de Salamancas	1080720	7/07/2025	8/07/2025	8/07/2025	10/07/2025	77,88	pendiente
2	Cancha de Urb. Baru	1080341	7/07/2025	8/07/2025	8/07/2025	10/07/2025	12,798	pendiente
3	Reposición proyectores vandalizados en Murallas	1085289	7/07/2025	8/07/2025	8/07/2025	10/07/2025	177,246	ejecutado
1	Refuerzo Peaje Coralito Mamonal	1114295	11/07/2025	14/07/2025	14/07/20025	16/07/2025	10,679	pendiente
2	Refuerzo Peaje Manga	1114306	11/07/2025	14/07/2025	14/07/20025	16/07/2025	42,457	pendiente
3	Santana y Araraca - zonas normalizadas	1104939	11/07/2025	14/07/2025	14/07/20025	16/07/2025	192,82	ejecutado
4	Puente Roman Etapa II	1114904	11/07/2025	14/07/2025	14/07/20025	16/07/2025	319,538	ejecutado
5	El Toril, Calle 33 -	1117766	11/07/2025	14/07/2025	14/07/20025	16/07/2025	4,15	ejecutado

Anexo 26. Registro de auditoría de la información de solicitudes de junio/julio 2025

INTERVENTORIA DE ALUMBRADO PÚBLICO
AUDITORIA DE CALIDAD DE LA INFORMACIÓN

Versión 01
Vigente desde: 02/02/2021

Radicado (Canales)	Medio de recepción	# Orden de reporte	Barrio/corregimiento	Dirección	Usuario	Requerimiento de Usuario	Gestión de Revisión Interventoría			Luminarias	Estado Infraestuctura	COMENTARIOS
							Detalle	Fecha	Supervisor (QBM2)	Atendidas		
Telefónico	Recorrido	Reportado directamente (Ing Pineda)	Manga	Calle 24 Paseo Peatonal Av. Miramar	Ana Cortina	Luminaria en riesgo de caida	Rotulo 356870	1/07/2025	Ana Teresa Cortina	1 luminaria	En riesgo	
Telefónico	Recorrido	Reportado directamente	Manga	Calle 24 Paseo Peatonal Av. Miramar	Ana Cortina	Proyectores para modernizar	Se identificaron dos proyectores de 1.000W	1/07/2025	Ana Teresa Cortina	2	Obsoleta	Se aporta ubicación
Telefónico	Recorrido	Reportado directamente (Ing. Pineda)	Santa Mónica	Av. Troncal de Occidente - Colgio Goretti	Ana Cortina	Luminaria de sodio encendida todo el dia y abierta	se identifico luminaria en mal estado caparazon abierto y en riesgo	30/06/2025	Ana Teresa Cortina	1	Mal estado	
Telefónico	Recorrido	Reportado directamente (Ing. Pineda)	San Fernando	Av. Troncal de Occidente - Edificio Portal del Caribe, Contiguo a Homcenter	Ana Cortina	Inss talación de luminarias	Calle sin infraestructura	30/06/2025	Ana Teresa Cortina	0	Carente de infraestructura	Prerparar Solicitud de modificación de infraestructura
Telefónico	Recorrido	Reportado directamente (Ing. Pineda)	San fernando	Av. Troncal de Occidente Calle 31 #81-96	Ana Cortina	Luminaria en riesgo de caida	Luminaria de sodio con la bombilla colgando. Sin vidrio protector	30/06/2025	Ana Teresa Cortina	1	Mal estado	
Telefónico	Recorrido	Reportado directamente (Ing. Pineda)	El Cabrero	Parque Apolo	William Teran	Luminaria encendida todo el dia		1/07/2025	Ana Teresa Cortina	1		Se aporta foto
Telefónico	Recorrido	No. 720560	Los Cerezos, Diag. 32 con tranv. 74A	Ref. Centro Cristiano Trono Alto	William Teran	Luminaria encendida todo el dia	Rotulo 305535 - 110W	2/07/2025	Ana Teresa Cortina	1	Buen estado,	
Telefónico	Recorrido	No. 720565	Los Cerezos, Diag. 32 con Calle 32D	Ref. Terraza La Mundial	William Teran	2 Luminaria encendida todo el dia	Rotulo 303437	2/07/2025	Ana Teresa Cortina	2	Buen estado,	
Telefónico	Recorrido	Reportado directamente (Ing. Pineda)	Via Boquilla	Ruta 90A	Ana Cortina	Luminaria encendida todo el dia	Luminaria de 194W	25/06/2025	Ana Teresa Cortina	1	Buen estado,	Se aporta foto y ubicación
Telefónico	Recorrido	Reportado directamente (Ing. Pineda)	Getsemaní, Calle 30	Antiguo Puente Heredia	Ana Cortina	Torre de iluminación encendida	Proyetores encendidos por varios días	25/06/2025	Ana Teresa Cortina	3	Buen estado,	Se aporta foto y ubicación
Telefónico	Recorrido	Reportado directamente (Ing. Pineda)	Bazurto	Av. Pédro de Heredia - Rotonda	Ana Cortina	Torre de iluminación encendida	Proyetores encendidos por varios días	20/06/2025	Ana Teresa Cortina	4	Buen estado,	Se aporta foto y ubicación
Telefónico	Recorrido	Reportado directamente (Ing. Pineda)	El Cabrero	Calle 41; Av. Rafael Núñez	Ana Cortina	Torre de iluminación oxidada	Se requiere su baja debid al riesgo que representa el estado de oxidación de la torre y la canastilla de los proyectores	4/07/2025	Ana Teresa Cortina	4	afectado	Reportado en comité de seguimiento
Telefónico	Recorrido	Reportado directamente (Ing. Pineda)	Blas de Lezo	Frente a Parque de la Virgen: 10.390991944770038,-75.487668893060045	Ana Cortina	Se reporta la existencia de Proyector de 1000 W - Sodio -	Para modernizar	5/07/2025	Ana Teresa Cortina	5	afectado	Reportado en comité de seguimiento. Se aportaron coordenadas de MDAS
Telefónico	Recorrido	Reportado directamente (Ing. Pineda)	Mamonal	Variante Mamonal Gambote	Luis Mejia	Proyectores obsoletos fuera de servicio	Desmontar proyectores y modernizar	3/07/2025	Ana Teresa Cortina	3	afectado	Se aporto foto y ubicacion
Telefónico	Recorrido	Reportado directamente (Ing. Pineda)	Mamonal	Variante Mamonal Gambote Kilometro 6, Entrada a Arroz Barato	Luis Mejia	Zona oscura entre la rotonda de Mamonal Gambote y arroz Barato	Proyectar diseño para futura intervención ejecución	4/07/2025	Ana Teresa Cortina	4	afectado	Reportado en comité de seguimiento
Telefónico	Recorrido	Reportado directamente (Ing. Pineda y Pabón)	Via Zona Norte	Via Zona Norte:	Ana Cortina	Luminarias encendidas todo el dia	Postes 278 - 282 - 303 - 289 - 233 - 232 - 224 - 132 - 134	8/07/2025	Ana Teresa Cortina	9	afectado	Se aporta ubicación
Telefónico	Recorrido	Reportado directamente (Ing. Pabón)	Crespo	Calle 70 con calle 71 - Esquina - Kilometro 0	Ana Cortina	Luminaria intermitente hace varios días	Rotulo: 293712	8/07/2025	Ana Teresa Cortina	1	afectado	Se aporta foto y ubicación
Telefónico	Recorrido	Reportado directamente (Ing. Pineda y Pabón)	Punta Canoa	Tramos via de ingreso y salida	Ana Cortina	Zona carente de iluminación. Oscura	Proyectar diseño para futura intervención ejecución	9/07/2025	Ana Teresa Cortina	n/a	afectado	Se aporta ubicación y videos
Telefónico	Recorrido	No. 733443	Nelson Mandela	Sector Campo Bello, Calle 8 mz 11 - 10	Sra. Francia 3186802301	Luminaria apagada desde que la instalaron	Sector oscuro	14/07/2025	Ana Teresa Cortina	1	Buen estado,	Se aporta foto y ubicación

Anexo 27. Registro fotográfico Intervención Parque del Socorro Plan 500B – SS 1043933



Anexo 28. Registro fotográfico Intervención Parque Socorro Cercanos al CAI – SS941858







Parque #1 – Calle 14ª con Cra. 76ª



Parque #2: Socorro Carrera 71




Parque #4: Socorro Diagonal 22d con Calle 23




Parque #5: Socorro Diagonal 21b con Calle 22







Parques 6 y 7: Socorro, Sobre la Carrera 80

Anexo 29. Registro fotográfico Intervención Parque Socorro Los Coralitos – SS867695









Anexo 30. Registro fotográfico Intervención Barrio San Pedro



Anexo 31. Registro fotográfico Intervención Altos del Campestre y cancha – SS1075612



Anexo 32. Registro fotográfico Intervención Palmas de Salamancas









Anexo 33. Registro fotográfico Intervención Ingreso a Tierra Baja – SS1089580











Anexo 34. Registro fotográfico Intervención La Sevillana - SS1003328








Anexo 35 Registro fotográfico Intervención Parque Vicente Martínez Martelo – SS106417







Anexo 36. Registro fotográfico Intervención Parque Alameda, EL Nogal y San Fernando – SS1003334









Parque #1 – San Fernando sobre Calle 15



Parque # 2 Barrio EL Nogal



Parque #3: San Fernando



Parque #4: San Fernando Calle 20 con Alameda La Victoria



Parque # 5 San Fernando

Anexo 37. Registro fotográfico Intervención Ceballos Nuevo Oriente – SS1060397







Anexo 38. Registro fotográfico Intervención Hotel San Francisco







Anexo 39. Registro fotográfico Intervención Vía La Boquilla desde Hotel Sonesta hasta Hotel Derust – SS905933














Anexo 40. Registro fotográfico Intervención Puente Román

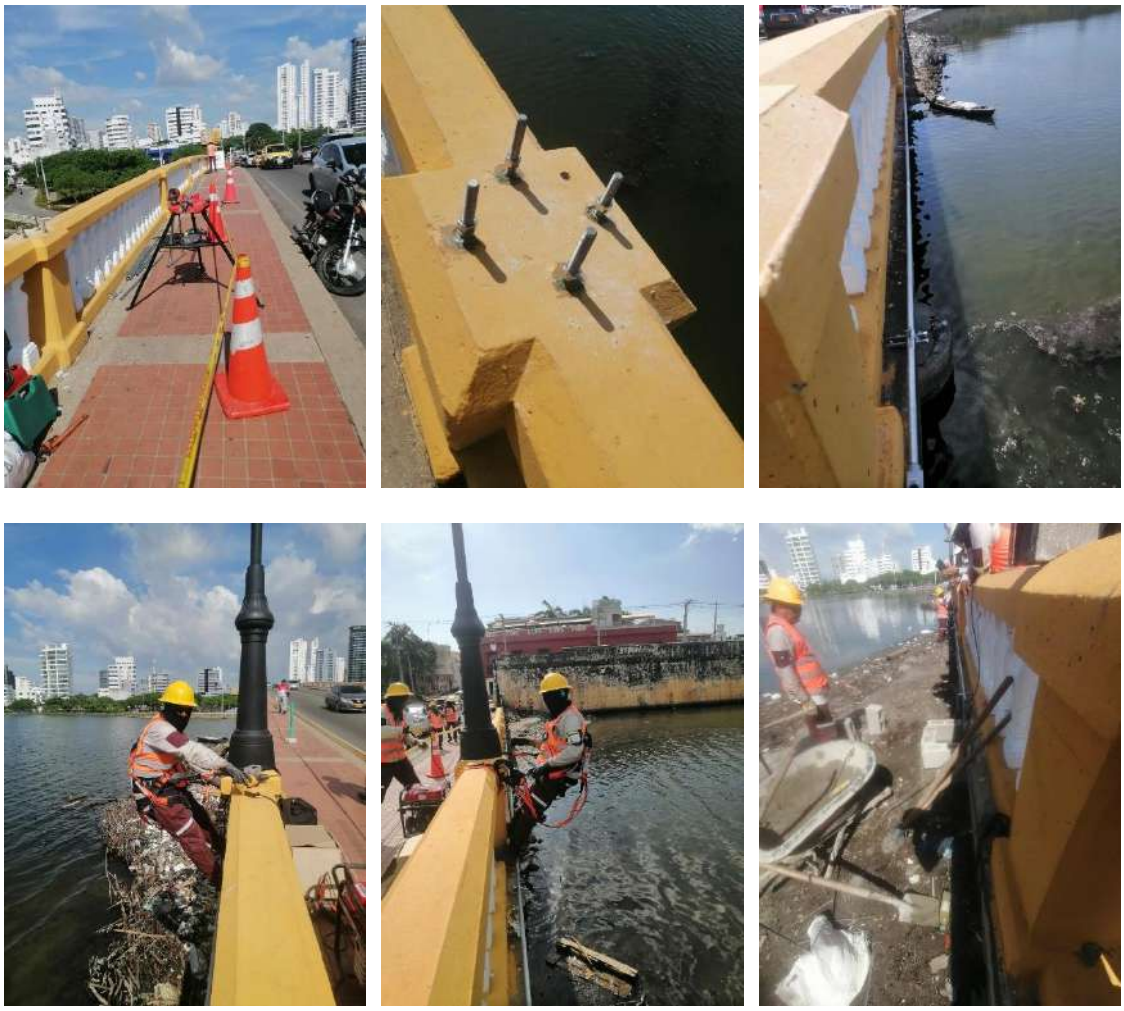

Anexo 41. Registro fotográfico Intervención Puente Román, Etapa II – SS11144904










Anexo 42. Registro fotográfico Intervención Avenida Santander

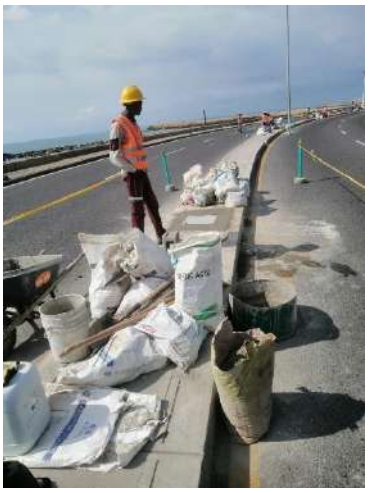








Anexo 43. Registro fotográfico Intervención Monumento de los Alcatraces







Anexo 44. Registro fotográfico Intervención Nelson Mandela, Sector Campo Bello




Anexo 45. Registro fotográfico Intervención La Boquilla La Bocana Cielo Mar







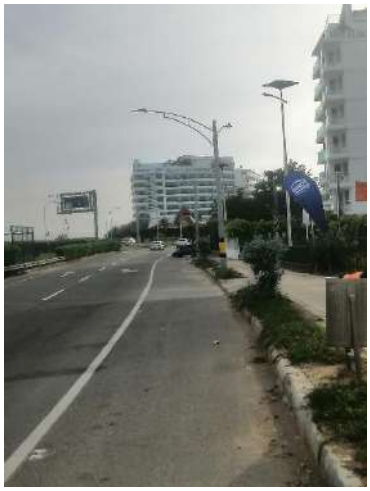


Anexo 46. Relación de luminarias instaladas Palmas de Salamancas

INTERVENTORIA DE ALUMBRADO PÚBLICO
RELACIÓN LUMINARIAS INSTALADAS Vs. RETIRADAS

Versión 01
Vigente desde:
Fecha JUNIO 2025

CONCEPTO:	Modernización	x	Reposición		Expansión	x	Palmas de Salamanca

Item	Barrio	Dirección	Punto de Referencia	Lumiaria Nueva		DISPOSICIÓN EN POSTE			Vehicular	Peatonal	Fecha de Instalación	Lumiaria Retirada		COMENTARIOS
				Código	Potencia	Sencilla	Matil	Doble				Código	Potencia	
1	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	524691	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
2	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	524617	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
3	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	524618	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
4	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	524620	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
5	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	524567	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
6	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	524663	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
7	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	525277	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
8	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	524683	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
9	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	524568	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
10	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	524684	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
11	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	525364	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
12	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	524662	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
13	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	524565	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
14	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	525362	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
15	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	524664	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
16	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	525278	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
17	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	524566	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
18	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	524661	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
19	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	524622	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
20	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	524682	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
21	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	524621	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
22	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	524545	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
23	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	524623	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
24	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	524624	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
25	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	524681	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
26	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	524556	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
27	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	524551	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
28	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	525402	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
29	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	524654	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
30	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	524637	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
31	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	524547	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
32	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	524548	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
33	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	480044	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
34	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	524550	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
35	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	524656	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
36	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	470724	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
37	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	524552	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
38	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	525468	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
39	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	524653	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
40	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	524655	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
41	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	411806	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
42	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	524549	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
43	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	524630	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
44	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	525401	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
45	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	524651	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
46	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	525404	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
47	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	525450	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
48	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	524652	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
49	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	534632	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
50	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	524675	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
51	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	524674	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
52	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	407375	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
53	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	524686	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
54	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	524589	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
55	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	524660	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
56	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	470511	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
57	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	524600	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
58	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	524596	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
59	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	524594	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
60	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	524597	45	x				x	16/06/2025			Plano 1

CONCEPTO:	Modernización	x	Reposición		Expansión	x

Item	Barrio	Dirección	Punto de Referencia	Lumiaria Nueva		DISPOSICIÓN EN POSTE			Vehicular	Peatonal	Fecha de Instalación	Palmas de Salamanca		COMENTARIOS
				Código	Potencia	Sencilla	Matil	Doble				Lumiaria Retirada		
												Código	Potencia	
61	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	525446	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
62	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	525429	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
63	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	525224	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
64	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	525430	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
65	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	525221	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
66	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	525222	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
67	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	524688	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
68	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	525296	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
69	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	525431	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
70	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	525223	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
71	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	524685	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
72	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	525280	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
73	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	525435	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
74	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	525432	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
75	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	525445	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
76	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	525413	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
77	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	525448	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
78	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	524672	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
79	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	525447	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
80	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	480272	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
81	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	525469	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
82	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	524591	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
83	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	524589	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
84	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	480224	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
85	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces perifericas	524592	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
86	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces entre Bloques	524671	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
87	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces entre Bloques	524590	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
88	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces entre Bloques	480196	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
89	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces entre Bloques	524697	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
90	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces entre Bloques	524679	45	x			x		16/06/2025			Plano 1
91	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces entre Bloques	524699	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
92	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces entre Bloques	524640	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
93	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces entre Bloques	524698	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
94	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces entre Bloques	524670	45	x			x		16/06/2025			Plano 1
95	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces entre Bloques	524700	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
96	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces entre Bloques	524687	45				x		16/06/2025			Plano 1
97	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces entre Bloques	524688	45			x	x		16/06/2025			Plano 1
98	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces entre Bloques	524659	45				x		16/06/2025			Plano 1
99	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces entre Bloques	524657	45			x	x		16/06/2025			Plano 1
100	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces entre Bloques	480145	45	x				x	16/06/2025			Plano 1 - PN
101	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces entre Bloques	524690	45				x		16/06/2025			Plano 1
102	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces entre Bloques	524583	45			x	x		16/06/2025			Plano 1
103	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces entre Bloques	469408	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
104	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces entre Bloques	524678	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
105	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces entre Bloques	499602	45	x			x		16/06/2025			Plano 1
106	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces entre Bloques	524560	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
107	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces entre Bloques	524677	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
108	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces entre Bloques	399082	45				x		16/06/2025			Plano 1
109	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces entre Bloques	471420	45			x	x		16/06/2025			Plano 1
110	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces entre Bloques	524629	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
111	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces entre Bloques	525203	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
112	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces entre Bloques	524609	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
113	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces entre Bloques	524584	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
114	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces entre Bloques	525203	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
115	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces entre Bloques	524593	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
116	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces entre Bloques	468222	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
117	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces entre Bloques	524610	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
118	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces entre Bloques	524689	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
119	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces entre Bloques	524612	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
120	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces entre Bloques	524559	45	x				x	16/06/2025			Plano 1

	INTERVENTORIA DE ALUMBRADO PÚBLICO RELACIÓN LUMINARIAS INSTALADAS Vs. RETIRADAS	Versión 01 Vigente desde:

Fecha JUNIO 2025

CONCEPTO:	Modernización	x	Reposición		Expansión	x

Item	Barrio	Dirección	Punto de Referencia	Lumiaria Nueva		DISPOSICIÓN EN POSTE			Vehicular	Peatonal	Fecha de Instalación	Palmas de Salamanca		COMENTARIOS
				Código	Potencia	Sencilla	Matil	Doble				Lumiaria Retirada		
												Código	Potencia	
121	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces entre Bloques	524611	45	x				x	16/06/2025			Plano 1
122	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces entre Bloques	524668	45	x				x	18/06/2025			Plano 1
123	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces entre Bloques	524558	45				x		18/06/2025			Plano 1
124	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces entre Bloques	524595	45			x	x		18/06/2025			Plano 1
125	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces entre Bloques	524668	45	x				x	18/06/2025			Plano 1
126	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces entre Bloques	524571	45	x				x	18/06/2025			Plano 1
127	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces entre Bloques	524673	45	x				x	18/06/2025			Plano 1
128	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces entre Bloques	524666	45	x				x	18/06/2025			Plano 1
129	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces entre Bloques	524557	45	x				x	18/06/2025			Plano 1
130	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces entre Bloques	405128	45	x				x	18/06/2025			Plano 1
131	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces entre Bloques	524665	45	x				x	18/06/2025			Plano 1
132	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces entre Bloques	524599	45	x				x	18/06/2025			Plano 1
133	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces entre Bloques	524570	45	x				x	18/06/2025			Plano 1
134	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces entre Bloques	524667	45	x				x	18/06/2025			Plano 1
135	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces entre Bloques	524542	45	x				x	18/06/2025			Plano 1
136	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces entre Bloques	524581	45	x				x	18/06/2025			Plano 1
137	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces entre Bloques	524541	45	x				x	18/06/2025			Plano 1
138	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces entre Bloques	524543	45	x				x	18/06/2025			Plano 1
139	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces entre Bloques	524692	45	x				x	18/06/2025			Plano 1
140	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces entre Bloques	524695	45	x				x	18/06/2025			Plano 1
141	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces entre Bloques	524680	45	x				x	18/06/2025			Plano 1
142	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces entre Bloques	524544	45	x				x	18/06/2025			Plano 1
143	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces entre Bloques	524694	45	x				x	18/06/2025			Plano 1
144	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces entre Bloques	524582	45	x				x	18/06/2025			Plano 1
145	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces entre Bloques	524696	45	x				x	18/06/2025			Plano 1
146	Palmas de salamanca	cojn residenciaal	luces entre Bloques	524649	45	x				x	18/06/2025			Plano 1

Anexo 47. Relación de luminarias instaladas Bicentenario

	INTERVENTORIA DE ALUMBRADO PÚBLICO RELACIÓN LUMINARIAS INSTALADAS Vs. RETIRADAS	Versión 01 Vigente desde: 02/02/2021

CONCEPTO: Modernización | Reposición | Expansión x

Item	Barrio	Dirección	Punto de Referencia	Lumiaria Nueva		DISPOSICIÓN EN POSTE			Vehicular	Peatonal	Fecha de Instalación	URB. BICENTENARIO		COMENTARIOS
				Código	Potencia	Sencilla	Matil	Doble				Lumiaria Retirada		
												Código	Potencia	
1		Ciudad Bicentenario		478931	45	x					25/06/2025	n/a	0	SS329489
2		Ciudad Bicentenario		525470	45	x					25/06/2025	n/a	0	SS329489
3		Ciudad Bicentenario		293171	194		x				24/06/2025	n/a	0	SS329489
4		Ciudad Bicentenario		293163	194		x				24/06/2025	n/a	0	SS329489
5		Ciudad Bicentenario		293161	194		x				24/06/2025	n/a	0	SS329489
6		Ciudad Bicentenario		293167	194		x				24/06/2025	n/a	0	SS329489
7		Ciudad Bicentenario		266033	194		x				26/06/2025	n/a	0	SS329489
8		Ciudad Bicentenario		302232	194		x				26/06/2025	n/a	0	SS329489
9		Ciudad Bicentenario		293233	194		x				26/06/2025	n/a	0	SS329489
10		Ciudad Bicentenario		280517	194		x				26/06/2025	n/a	0	SS329489
11		Ciudad Bicentenario		248254	194		x				27/06/2025	n/a	0	SS329489
12		Ciudad Bicentenario		292816	194		x				26/06/2025	n/a	0	SS329489
13		Ciudad Bicentenario		295037	194		x				26/06/2025	n/a	0	SS329489
14		Ciudad Bicentenario		293241	194		x				27/06/2025	n/a	0	SS329489
15		Ciudad Bicentenario		525482	45	x					25/06/2025	n/a	0	SS329489
16		Ciudad Bicentenario		525259	45	x					28/06/2025	n/a	70	SS329489
17		Ciudad Bicentenario		525451	45	x					28/06/2025	n/a	70	SS329489
18		Ciudad Bicentenario		280245	194		x				28/06/2025	n/a	250	SS329489
19		Ciudad Bicentenario		292801	194		x				28/06/2025	n/a	250	SS329489
20		Ciudad Bicentenario		292731	194		x				28/06/2025	n/a	250	SS329489
21		Ciudad Bicentenario		302206	194		x				28/06/2025	n/a	250	SS329489
22		Ciudad Bicentenario		265916	194		x				28/06/2025	n/a	250	SS329489
23		Ciudad Bicentenario		293246	194		x				28/06/2025	n/a	250	SS329489
24		Ciudad Bicentenario		302181	194		x				28/06/2025	n/a	250	SS329489
25		Ciudad Bicentenario		292813	194		x				28/06/2025	n/a	250	SS329489
26		Ciudad Bicentenario		525489	45	x					27/06/2025	n/a	0	SS329489
27		Ciudad Bicentenario		525492	45	x					27/06/2025	n/a	0	SS329489
28		Ciudad Bicentenario		525491	45	x					27/06/2025	n/a	0	SS329489
29		Ciudad Bicentenario		525484	45	x					25/06/2025	n/a	0	SS329489
30		Ciudad Bicentenario		480147	45	x					25/06/2025	n/a	0	SS329489
31		Ciudad Bicentenario		525481	45	x					25/06/2025	n/a	0	SS329489
32		Ciudad Bicentenario		480148	45	x					25/06/2025	n/a	0	SS329489
33		Ciudad Bicentenario		525483	45	x					25/06/2025	n/a	0	SS329489
34		Ciudad Bicentenario		400652	45	x					25/06/2025	n/a	0	SS329489
35		Ciudad Bicentenario		478932	45	x					25/06/2025	n/a	0	SS329489
36		Ciudad Bicentenario		469752	45	x					25/06/2025	n/a	0	SS329489
37		Ciudad Bicentenario		398494	45	x					25/06/2025	n/a	0	SS329489
38		Ciudad Bicentenario		480066	45	x					25/06/2025	n/a	0	SS329489
39		Ciudad Bicentenario		480068	45	x					25/06/2025	n/a	0	SS329489
40		Ciudad Bicentenario		525345	45	x					25/06/2025	n/a	0	SS329489
41		Ciudad Bicentenario		525348	45	x					25/06/2025	n/a	0	SS329489
42		Ciudad Bicentenario		525499	45	x					25/06/2025	n/a	0	SS329489
43		Ciudad Bicentenario		525500	45	x					25/06/2025	n/a	0	SS329489
44		Ciudad Bicentenario		525497	45	x					25/06/2025	n/a	0	SS329489
45		Ciudad Bicentenario		525347	45	x					25/06/2025	n/a	0	SS329489
46		Ciudad Bicentenario		525469	45	x					25/06/2025	n/a	0	SS329489
47		Ciudad Bicentenario		525461	45	x					25/06/2025	n/a	0	SS329489
48		Ciudad Bicentenario		525472	45	x					25/06/2025	n/a	0	SS329489
49		Ciudad Bicentenario		525462	45	x					25/06/2025	n/a	0	SS329489
50		Ciudad Bicentenario		525463	45	x					25/06/2025	n/a	0	SS329489
51		Ciudad Bicentenario		525466	45	x					25/06/2025	n/a	0	SS329489
52		Ciudad Bicentenario		525467	45	x					25/06/2025	n/a	0	SS329489
53		Ciudad Bicentenario		525363	45	x					27/06/2025	n/a	0	SS329489
54		Ciudad Bicentenario		525344	45	x					27/06/2025	n/a	0	SS329489
55		Ciudad Bicentenario		525318	45	x					27/06/2025	n/a	0	SS329489
56		Ciudad Bicentenario		525476	45	x					27/06/2025	n/a	0	SS329489
57		Ciudad Bicentenario		525434	45	x					26/06/2025	n/a	0	SS329489
58		Ciudad Bicentenario		525334	45	x					26/06/2025	n/a	0	SS329489
59		Ciudad Bicentenario		525335	45	x					26/06/2025	n/a	0	SS329489
60		Ciudad Bicentenario		398888	45	x					26/06/2025	n/a	0	SS329489

	INTERVENTORIA DE ALUMBRADO PÚBLICO RELACIÓN LUMINARIAS INSTALADAS Vs. RETIRADAS	Versión 01 Vigente desde: 02/02/2021

CONCEPTO: Modernización | Reposición | Expansión x

URB. BICENTENARIO

Item	Barrio	Dirección	Punto de Referencia	Lumiaria Nueva		DISPOSICIÓN EN POSTE			Vehicular	Peatonal	Fecha de Instalación	Lumiaria Retirada		COMENTARIOS
				Código	Potencia	Sencilla	Matil	Doble				Código	Potencia	
61		Ciudad Bicentenario		525473	45	x					27/06/2025	n/a	0	SS329489
62		Ciudad Bicentenario		525342	45	x					27/06/2025	n/a	0	SS329489
63		Ciudad Bicentenario		525474	45	x					27/06/2025	n/a	0	SS329489
64		Ciudad Bicentenario		525452	45	x					27/06/2025	n/a	0	SS329489
65		Ciudad Bicentenario		525316	45	x					27/06/2025	n/a	0	SS329489
66		Ciudad Bicentenario		525361	45	x					27/06/2025	n/a	0	SS329489
67		Ciudad Bicentenario		525449	45	x					27/06/2025	n/a	0	SS329489
68		Ciudad Bicentenario		525313	45	x					27/06/2025	n/a	0	SS329489
69		Ciudad Bicentenario		525315	45	x					27/06/2025	n/a	0	SS329489
70		Ciudad Bicentenario		525194	45	x					27/06/2025	n/a	0	SS329489
71		Ciudad Bicentenario		525403	45	x					25/06/2025	n/a	0	SS329489
72		Ciudad Bicentenario		525229	45	x					25/06/2025	n/a	0	SS329489
73		Ciudad Bicentenario		525232	45	x					25/06/2025	n/a	0	SS329489
74		Ciudad Bicentenario		525465	45	x					25/06/2025	n/a	0	SS329489
75		Ciudad Bicentenario		525317	45	x					27/06/2025	n/a	0	SS329489
76		Ciudad Bicentenario		525319	45	x					27/06/2025	n/a	0	SS329489
77		Ciudad Bicentenario		525314	45	x					27/06/2025	n/a	0	SS329489
78		Ciudad Bicentenario		525450	45	x					27/06/2025	n/a	0	SS329489
79		Ciudad Bicentenario		525336	45	x					26/06/2025	n/a	0	SS329489
80		Ciudad Bicentenario		403323	45	x					26/06/2025	n/a	0	SS329489
81		Ciudad Bicentenario		480067	45	x					25/06/2025	n/a	0	SS329489
82		Ciudad Bicentenario		478934	45	x					25/06/2025	n/a	0	SS329489
83		Ciudad Bicentenario		525193	45	x					27/06/2025	n/a	0	SS329489
84		Ciudad Bicentenario		525464	45	x					25/06/2025	n/a	0	SS329489
85		Ciudad Bicentenario		525471	45	x					25/06/2025	n/a	0	SS329489
86		Ciudad Bicentenario		525320	45	x					27/06/2025	n/a	0	SS329489
87		Ciudad Bicentenario		525196	45	x					27/06/2025	n/a	0	SS329489
88		Ciudad Bicentenario		525341	45	x					27/06/2025	n/a	0	SS329489
89		Ciudad Bicentenario		525232	45	x					26/06/2025	n/a	0	SS329489
90		Ciudad Bicentenario		525498	45	x					25/06/2025	n/a	0	SS329489
91		Ciudad Bicentenario		480145	45	x					19/06/2025	n/a	0	SS329489
92		Ciudad Bicentenario		478933	45	x					25/06/2025	n/a	0	SS329489
93		Ciudad Bicentenario		525231	45	x					25/06/2025	n/a	0	SS329489
94		Ciudad Bicentenario		412059	45	x					26/06/2025	n/a	0	SS329489
95		Ciudad Bicentenario		525257	45	x					28/06/2025	n/a	70	SS329489
96		Ciudad Bicentenario		525490	45	x					27/06/2025	n/a	0	SS329489
97		Ciudad Bicentenario		525343	45	x					27/06/2025	n/a	0	SS329489
98		Ciudad Bicentenario		525333	45	x					27/06/2025	n/a	0	SS329489
99		Ciudad Bicentenario		525230	45	x					25/06/2025	n/a	0	SS329489
100		Ciudad Bicentenario		525195	45	x					25/06/2025	n/a	70	SS329489
101		Ciudad Bicentenario		525346	45	x					25/06/2025	n/a	0	SS329489
102		Ciudad Bicentenario		406518	45	x					25/06/2025	n/a	70	SS329489
103		Ciudad Bicentenario		525475	45	x					27/06/2025	n/a	0	SS329489

Anexo 48. Relación de luminarias instaladas Barrio San Pedro

	INTERVENTORIA DE ALUMBRADO PÚBLICO RELACIÓN LUMINARIAS INSTALADAS Vs. RETIRADAS	Versión 01 Vigente desde: 02/02/2021

CONCEPTO: Modernización | Reposición | Expansión x

Item	Barrio	Dirección	Punto de Referencia	BARRIO SAN PEDRO										
				Lumiaria Nueva		DISPOSICIÓN EN POSTE			Vehicular	Peatonal	Fecha de Instalación	Lumiaria Retirada		COMENTARIOS
				Código	Potencia	Sencilla	Matil	Doble				Código	Potencia	
1	San Pedro	San Pedro	San Pedro	525186	45	X			X		13/06/2025	n/a	0	SS820718
2	San Pedro	San Pedro	San Pedro	287293	194	X			X		12/06/2025	n/a	0	SS820718
3	San Pedro	San Pedro	San Pedro	525390	45	X			X		13/06/2025	n/a	250	SS820718
4	San Pedro	San Pedro	San Pedro	525187	45	X			X		13/06/2025	n/a	70	SS820718
5	San Pedro	San Pedro	San Pedro	525281	45	X			X		13/06/2025	n/a	150	SS820718
6	San Pedro	San Pedro	San Pedro	525372	45	X			X		11/06/2025	n/a	100	SS820718
7	San Pedro	San Pedro	San Pedro	478964	45	X			X		11/06/2025	n/a	70	SS820718
8	San Pedro	San Pedro	San Pedro	509761	64	X			X		16/06/2025	n/a	250	SS820718
9	San Pedro	San Pedro	San Pedro	525217	45	X			X		11/06/2025	n/a	100	SS820718
10	San Pedro	San Pedro	San Pedro	525411	45	X			X		13/06/2025	n/a	70	SS820718
11	San Pedro	San Pedro	San Pedro	525458	45	X			X		13/06/2025	n/a	150	SS820718
12	San Pedro	San Pedro	San Pedro	525524	45	X			X		11/06/2025	n/a	70	SS820718
13	San Pedro	San Pedro	San Pedro	525312	45	X			X		11/06/2025	n/a	150	SS820718
14	San Pedro	San Pedro	San Pedro	509619	64	X			X		16/06/2025	n/a	70	SS820718
15	San Pedro	San Pedro	San Pedro	480166	45	X			X		13/06/2025	n/a	70	SS820718
16	San Pedro	San Pedro	San Pedro	525208	45	X			X		13/06/2025	n/a	250	SS820718
17	San Pedro	San Pedro	San Pedro	478809	45	X			X		17/06/2025	n/a	70	SS820718
18	San Pedro	San Pedro	San Pedro	525392	45	X			X		12/06/2025	n/a	70	SS820718
19	San Pedro	San Pedro	San Pedro	480146	45	X			X		13/06/2025	n/a	70	SS820718
20	San Pedro	San Pedro	San Pedro	525288	45	X			X		12/06/2025	n/a	70	SS820718
21	San Pedro	San Pedro	San Pedro	525350	45	X			X		13/06/2025	n/a	70	SS820718
22	San Pedro	San Pedro	San Pedro	525206	45	X			X		13/06/2025	n/a	70	SS820718
23	San Pedro	San Pedro	San Pedro	525207	45	X			X		16/06/2025	n/a	0	SS820718
24	San Pedro	San Pedro	San Pedro	525218	45	X			X		11/06/2025	n/a	100	SS820718
25	San Pedro	San Pedro	San Pedro	525409	45	X			X		13/06/2025	n/a	150	SS820718
26	San Pedro	San Pedro	San Pedro	480113	45	X			X		16/06/2025	n/a	70	SS820718
27	San Pedro	San Pedro	San Pedro	525309	45	X			X		11/06/2025	n/a	70	SS820718
28	San Pedro	San Pedro	San Pedro	525311	45	X			X		12/06/2025	n/a	70	SS820718
29	San Pedro	San Pedro	San Pedro	509766	64	X			X		16/06/2025	n/a	70	SS820718
30	San Pedro	San Pedro	San Pedro	442627	64	X			X		16/06/2025	n/a	70	SS820718
31	San Pedro	San Pedro	San Pedro	525214	45	X			X		16/06/2025	n/a	70	SS820718
32	San Pedro	San Pedro	San Pedro	480110	45	X			X		16/06/2025	n/a	70	SS820718
33	San Pedro	San Pedro	San Pedro	509759	64	X			X		16/06/2025	n/a	250	SS820718
34	San Pedro	San Pedro	San Pedro	525	45	X			X		12/06/2025	n/a	150	SS820718
35	San Pedro	San Pedro	San Pedro	506468	64	X			X		12/06/2025	n/a	70	SS820718
36	San Pedro	San Pedro	San Pedro	525440	45	X			X		12/06/2025	n/a	70	SS820718
37	San Pedro	San Pedro	San Pedro	480159	45	X			X		13/06/2025	n/a	250	SS820718
38	San Pedro	San Pedro	San Pedro	480119	45	X			X		13/06/2025	n/a	70	SS820718
39	San Pedro	San Pedro	San Pedro	525391	45	X			X		12/06/2025	n/a	70	SS820718
40	San Pedro	San Pedro	San Pedro	525410	45	X			X		12/06/2025	n/a	70	SS820718
41	San Pedro	San Pedro	San Pedro	525349	45	X			X		12/06/2025	n/a	70	SS820718
42	San Pedro	San Pedro	San Pedro	525283	45	X			X		12/06/2025	n/a	70	SS820718
43	San Pedro	San Pedro	San Pedro	506457	64	X			X		12/06/2025	n/a	70	SS820718
44	San Pedro	San Pedro	San Pedro	525310	45	X			X		11/06/2025	n/a	70	SS820718
45	San Pedro	San Pedro	San Pedro	525371	45	X			X		12/06/2025	n/a	250	SS820718
46	San Pedro	San Pedro	San Pedro	525285	45	X			X		16/06/2025	n/a	70	SS820718
47	San Pedro	San Pedro	San Pedro	480078	45	X			X		13/06/2025	n/a	70	SS820718
48	San Pedro	San Pedro	San Pedro	825522	45	X			X		12/06/2025	n/a	0	SS820718
49	San Pedro	San Pedro	San Pedro	480167	45	X			X		13/06/2025	n/a	70	SS820718
50	San Pedro	San Pedro	San Pedro	478919	45	X			X		16/06/2025	n/a	70	SS820718
51	San Pedro	San Pedro	San Pedro	480083	45	X			X		13/06/2025	n/a	150	SS820718
52	San Pedro	San Pedro	San Pedro	450666	64	X			X		16/06/2025	n/a	250	SS820718
53	San Pedro	San Pedro	San Pedro	2580	45	X			X		13/06/2025	n/a	150	SS820718
54	San Pedro	San Pedro	San Pedro	480115	45	X			X		16/06/2025	n/a	150	SS820718
55	San Pedro	San Pedro	San Pedro	525261	45	X			X		17/06/2025	n/a	0	SS820718
56	San Pedro	San Pedro	San Pedro	525460	45	X			X		13/06/2025	n/a	150	SS820718
57	San Pedro	San Pedro	San Pedro	525523	45	X			X		11/06/2025	n/a	150	SS820718
58	San Pedro	San Pedro	San Pedro	525219	45	X			X		11/06/2025	n/a	0	SS820718
59	San Pedro	San Pedro	San Pedro	525286	45	X			X		13/06/2025	n/a	150	SS820718
60	San Pedro	San Pedro	San Pedro	525337	45	X			X		13/06/2025	n/a	150	SS820718

	INTERVENTORIA DE ALUMBRADO PÚBLICO RELACIÓN LUMINARIAS INSTALADAS Vs. RETIRADAS	Versión 01 Vigente desde: 02/02/2021

CONCEPTO: Modernización | Reposición | Expansión x

BARRIO SAN PEDRO

Item	Barrio	Dirección	Punto de Referencia	Lumiaria Nueva		DISPOSICIÓN EN POSTE			Vehicular	Peatonal	Fecha de Instalación	Lumiaria Retirada		COMENTARIOS
				Código	Potencia	Sencilla	Matil	Doble				Código	Potencia	
61	San Pedro	San Pedro	San Pedro	525220	45	X			X		11/06/2025	n/a	150	SS820718
62	San Pedro	San Pedro	San Pedro	525370	45	X			X		11/06/2025	n/a	150	SS820718
63	San Pedro	San Pedro	San Pedro	525521	45	X			X		11/06/2025	n/a	0	SS820718
64	San Pedro	San Pedro	San Pedro	525215	45	X			X		13/06/2025	n/a	150	SS820718
65	San Pedro	San Pedro	San Pedro	525273	45	X			X		12/06/2025	n/a	0	SS820718
66	San Pedro	San Pedro	San Pedro	525369	45	X			X		12/06/2025	n/a	150	SS820718
67	San Pedro	San Pedro	San Pedro	586752	64	X			X		13/06/2025	n/a	150	SS820718
68	San Pedro	San Pedro	San Pedro	525188	45	X			X		12/06/2025	n/a	0	SS820718
69	San Pedro	San Pedro	San Pedro	506302	64	X			X		13/06/2025	n/a	150	SS820718
70	San Pedro	San Pedro	San Pedro	506307	64	X			X		13/06/2025	n/a	0	SS820718
71	San Pedro	San Pedro	San Pedro	480079	45	X			X		13/06/2025	n/a	150	SS820718
72	San Pedro	San Pedro	San Pedro	506463	64	X			X		13/06/2025	n/a	150	SS820718
73	San Pedro	San Pedro	San Pedro	525340	45	X			X		12/06/2025	n/a	0	SS820718
74	San Pedro	San Pedro	San Pedro	525339	45	X			X		12/06/2025	n/a	0	SS820718
75	San Pedro	San Pedro	San Pedro	480111	45	X			X		17/06/2025	n/a	150	SS820718
76	San Pedro	San Pedro	San Pedro	478965	45	X			X		11/06/2025	n/a	150	SS820718
77	San Pedro	San Pedro	San Pedro	480081	45	X			X		16/06/2025	n/a	150	SS820718
78	San Pedro	San Pedro	San Pedro	525412	45	X			X		13/06/2025	n/a	150	SS820718
79	San Pedro	San Pedro	San Pedro	525457	45	X			X		13/06/2025	n/a	150	SS820718
80	San Pedro	San Pedro	San Pedro	525274	45	X			X		13/06/2025	n/a	150	SS820718
81	San Pedro	San Pedro	San Pedro	480139	45	X			X		16/06/2025	n/a	150	SS820718
82	San Pedro	San Pedro	San Pedro	525459	45	X			X		16/06/2025	n/a	150	SS820718
83	San Pedro	San Pedro	San Pedro	478810	45	X			X		16/06/2025	n/a	150	SS820718
84	San Pedro	San Pedro	San Pedro	525515	45	X			X		16/06/2025	n/a	150	SS820718
85	San Pedro	San Pedro	San Pedro	480149	45	X			X		16/06/2025	n/a	150	SS820718
86	San Pedro	San Pedro	San Pedro	478966	45	X			X		11/06/2025	n/a	150	SS820718
87	San Pedro	San Pedro	San Pedro	480116	45	X			X		16/06/2025	n/a	150	SS820718
88	San Pedro	San Pedro	San Pedro	480150	45	X			X		16/06/2025	n/a	0	SS820718
89	San Pedro	San Pedro	San Pedro	525513	45	X			X		13/06/2025	n/a	0	SS820718
90	San Pedro	San Pedro	San Pedro	525264	45	X			X		16/06/2025	n/a	150	SS820718
91	San Pedro	San Pedro	San Pedro	478921	45	X			X		16/06/2025	n/a	150	SS820718
92	San Pedro	San Pedro	San Pedro	480109	45	X			X		16/06/2025	n/a	150	SS820718
93	San Pedro	San Pedro	San Pedro	265990	194	X			X		12/06/2025	n/a	0	SS820718
94	San Pedro	San Pedro	San Pedro	280327	194	X			X		12/06/2025	n/a	0	SS820718
95	San Pedro	San Pedro	San Pedro	525262	45	X			X		16/06/2025	n/a	70	SS820718
96	San Pedro	San Pedro	San Pedro	302067	194	X			X		13/06/2025	n/a	0	SS820718
97	San Pedro	San Pedro	San Pedro	265849	194	X			X		13/06/2025	n/a	0	SS820718
98	San Pedro	San Pedro	San Pedro	293184	194	X			X		17/06/2025	n/a	150	SS820718
99	San Pedro	San Pedro	San Pedro	280405	194	X			X		17/06/2025	n/a	150	SS820718
100	San Pedro	San Pedro	San Pedro	478963	45	X			X		11/06/2025	n/a	0	SS820718
101	San Pedro	San Pedro	San Pedro	525275	45	X			X		12/06/2025	n/a	70	SS820718
102	San Pedro	San Pedro	San Pedro	480080	45	X			X		13/06/2025	n/a	0	SS820718
103	San Pedro	San Pedro	San Pedro	480118	45	X			X		13/06/2025	n/a	0	SS820718
104	San Pedro	San Pedro	San Pedro	525263	45	X			X		13/06/2025	n/a	0	SS820718
105	San Pedro	San Pedro	San Pedro	480168	45	X			X		13/06/2025	n/a	0	SS820718
106	San Pedro	San Pedro	San Pedro	480112	45	X			X		13/06/2025	n/a	0	SS820718
107	San Pedro	San Pedro	San Pedro	480117	45	X			X		13/06/2025	n/a	0	SS820718
108	San Pedro	San Pedro	San Pedro	480120	45	X			X		13/06/2025	n/a	100	SS820718
109	San Pedro	San Pedro	San Pedro	525185	45	X			X		12/06/2025	n/a	70	SS820718
110	San Pedro	San Pedro	San Pedro	480081	45	X			X		16/06/2025	n/a	0	SS820718
111	San Pedro	San Pedro	San Pedro	525389	45	X			X		13/06/2025	n/a	150	SS820718
112	San Pedro	San Pedro	San Pedro	525439	45	X			X		13/06/2025	n/a	150	SS820718
113	San Pedro	San Pedro	San Pedro	525205	45	X			X		13/06/2025	n/a	150	SS820718
114	San Pedro	San Pedro	San Pedro	478920	45	X			X		17/06/2025	n/a	0	SS820718
115	San Pedro	San Pedro	San Pedro	525284	45	X			X		17/06/2025	n/a	0	SS820718
116	San Pedro	San Pedro	San Pedro	480082	45	X			X		17/06/2025	n/a	150	SS820718
117	San Pedro	San Pedro	San Pedro	525287	45	X			X		16/06/2025	n/a	150	SS820718

Anexo 49. Relación de luminarias instaladas Nelson Mandela,Zonas Normalizadas

	INTERVENTORIA DE ALUMBRADO PÚBLICO RELACIÓN LUMINARIAS INSTALADAS Vs. RETIRADAS	Versión 01 Vigente desde:

Fecha JUNIO 2025

CONCEPTO:	Modernización		Reposición		Expansión	x	Normalizado de Mandela SS 820732

Item	Barrio	Dirección	Punto de Referencia	Lumiaria Nueva		DISPOSICIÓN EN POSTE			Vehicular	Peatonal	Fecha de Instalación	Lumiaria Retirada		COMENTARIOS
				Código	Potencia	Sencilla	Matil	Doble				Código	Potencia	
1	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 1 y 2	480173	45	x			x		25/06/2025			Plano 1
2	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 1 y 2	480200	45	x			x		25/06/2025			Plano 1 -. PN
3	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 1 y 2	480259	45	x			x		25/06/2025			Plano 1
4	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 1 y 2	480204	45	x			x		25/06/2025			Plano 1
5	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 1 y 2	524586	45	x			x		25/06/2025			Plano 1
6	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 1 y 2	524562	45	x			x		25/06/2025			Plano 1
7	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 1 y 2	500036	45	x			x		25/06/2025			Plano 1 -. PN
8	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 1 y 2	404372	45	x			x		25/06/2025			Plano 1
9	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 1 y 2	524586	45	x			x		25/06/2025			Plano 1
10	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 1 y 2	524578	45	x			x		25/06/2025			Plano 1
11	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 1 y 2	480337	45	x			x		25/06/2025			Plano 1
12	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 1 y 2	524564	45	x			x		25/06/2025			Plano 1
13	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 1 y 2	480260	45	x			x		25/06/2025			Plano 1
14	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 1 y 2	480235	45	x			x		25/06/2025			Plano 1
15	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 1 y 2	480199	45	x			x		25/06/2025			Plano 1
16	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 1 y 2	480310	45	x			x		25/06/2025			Plano 1
17	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 1 y 2	480176	45	x			x		25/06/2025			Plano 1
18	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 1 y 2	480174	45	x			x		25/06/2025			Plano 1
19	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 1 y 2	480257	45	x			x		25/06/2025			Plano 1
20	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 1 y 2	480187	45	x			x		25/06/2025			Plano 1
21	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 1 y 2	480270	45	x			x		25/06/2025			Plano 1
22	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 1 y 2	480188	45	x			x		25/06/2025			Plano 1
23	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 1 y 2	480269	45	x			x		25/06/2025			Plano 1
24	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 1 y 2	480312	45	x			x		25/06/2025			Plano 1
25	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 1 y 2	524587	45	x			x		25/06/2025			Plano 1 -. PN
26	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 1 y 2	524642	45	x			x		25/06/2025			Plano 1
27	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 1 y 2	480222	45	x			x		25/06/2025			Plano 1
28	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 1 y 2	524883	45	x			x		25/06/2025			Plano 1
29	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 1 y 2	408672	45	x			x		25/06/2025			Plano 1 -. PN
30	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 1 y 2	500517	45	x			x		25/06/2025			Plano 1 -. PN
31	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 1 y 2	500434	45	x			x		25/06/2025			Plano 1 -. PN
32	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 1 y 2	500447	45	x			x		25/06/2025			Plano 1 -. PN
33	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 1 y 2	524542	45	x			x		25/06/2025			Plano 1
34	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 1 y 2	524644	45	x			x		25/06/2025			Plano 1
35	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 1 y 2	524575	45	x			x		25/06/2025			Plano 1
36	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 1 y 2	524616	45	x			x		25/06/2025			Plano 1
37	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 1 y 2	524563	45	x			x		25/06/2025			Plano 1
38	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 1 y 2	525554	45	x			x		25/06/2025			Plano 1
39	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 1 y 2	524613	45	x			x		25/06/2025			Plano 1
40	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 1 y 2	524555	45	x			x		25/06/2025			Plano 1
41	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 1 y 2	480338	45	x			x		25/06/2025			Plano 1
42	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 1 y 2	480186	45	x			x		25/06/2025			Plano 1
43	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 1 y 2	480309	45	x			x		25/06/2025			Plano 1
44	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 1 y 2	480221	45	x			x		25/06/2025			Plano 1
45	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 1 y 2	524647	45	x			x		25/06/2025			Plano 1
46	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 1 y 2	524648	45	x			x		25/06/2025			Plano 1
47	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 1 y 2	524645	45	x			x		25/06/2025			Plano 1
48	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 1 y 2	480311	45	x			x		25/06/2025			Plano 1
49	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 1 y 2	480201	45	x			x		25/06/2025			Plano 2
50	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 3 y 4	524580	45	x			x		25/06/2025			Plano 2 -PN
51	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 3 y 4	524585	45	x			x		25/06/2025			Plano 2 -PN
52	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 3 y 4	524579	45	x			x		25/06/2025			Plano 2 -PN
53	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 3 y 4	524588	45	x			x		25/06/2025			Plano 2 -PN
54	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 3 y 4	524561	45	x			x		25/06/2025			Plano 2
55	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 3 y 4	480266	45	x			x		25/06/2025			Plano 2 -PN
56	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 3 y 4	480326	45	x			x		25/06/2025			Plano 2
57	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 3 y 4	480268	45	x			x		25/06/2025			Plano 2
58	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 3 y 4	480265	45	x			x		25/06/2025			Plano 2
59	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 3 y 4	480267	45	x			x		25/06/2025			Plano 2
60	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 3 y 4	480327	45	x			x		25/06/2025			Plano 2

	INTERVENTORIA DE ALUMBRADO PÚBLICO RELACIÓN LUMINARIAS INSTALADAS Vs. RETIRADAS	Versión 01 Vigente desde:

Fecha JUNIO 2025

CONCEPTO:		Modernización		Reposición		Expansión	x	Normalizado de Mandela SS 820732

Item	Barrio	Dirección	Punto de Referencia	Lumiaria Nueva		DISPOSICIÓN EN POSTE			Vehicular	Peatonal	Fecha de Instalación	Lumiaria Retirada		COMENTARIOS
				Código	Potencia	Sencilla	Matil	Doble				Código	Potencia	
61	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 3 y 4	480195	45	x			x		25/06/2025			Plano 2
62	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 3 y 4	480193	45	x			x		25/06/2025			Plano 2
63	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 3 y 4	480198	45	x			x		25/06/2025			Plano 2
64	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 3 y 4	524641	45	x			x		25/06/2025			Plano 2
65	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 3 y 4	480328	45	x			x		25/06/2025			Plano 2
66	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 3 y 4	480234	45	x			x		25/06/2025			Plano 2
67	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 3 y 4	480197	45	x			x		25/06/2025			Plano 2 -PN
68	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 3 y 4	480233	45	x			x		25/06/2025			Plano 2
69	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 3 y 4	524577	45	x			x		25/06/2025			Plano 2 -PN
70	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 3 y 4	480258	45	x			x		25/06/2025			Plano 2
71	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 3 y 4	480202	45	x			x		25/06/2025			Plano 2 -PN
72	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 3 y 4	480236	45	x			x		25/06/2025			Plano 2 -PN
73	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 3 y 4	480325	45	x			x		25/06/2025			Plano 2
74	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 3 y 4	524556	45	x			x		25/06/2025			Plano 2
75	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 3 y 4	524553	45	x			x		25/06/2025			Plano 2
76	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 3 y 4	480086	45	x			x		25/06/2025			Plano 2
77	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 3 y 4	480334	45	x			x		25/06/2025			Plano 2
78	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 3 y 4	480088	45	x			x		25/06/2025			Plano 2
79	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 3 y 4	480085	45	x			x		25/06/2025			Plano 2
80	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 3 y 4	524615	45	x			x		25/06/2025			Plano 2
81	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 3 y 4	480338	45	x			x		25/06/2025			Plano 2
82	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 3 y 4	524646	45	x			x		25/06/2025			Plano 2
83	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 3 y 4	524614	45	x			x		25/06/2025			Plano 2
84	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 3 y 4	430203	45	x			x		25/06/2025			Plano 2
85	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 3 y 4	499989	45	x			x		25/06/2025			Plano 2 -PN
86	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 3 y 4	524643	45	x			x		25/06/2025			Plano 2
87	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 3 y 4	524608	45	x			x		25/06/2025			Plano 2
88	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 3 y 4	525189	45	x			x		25/06/2025			Plano 2 -PN
89	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 3 y 4	480231	45	x			x		25/06/2025			Plano 2 -PN
90	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 3 y 4	524576	45	x			x		25/06/2025			Plano 2 -PN
91	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 3 y 4	524605	45	x			x		25/06/2025			Plano 2
92	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 3 y 4	524606	45	x			x		25/06/2025			Plano 2
93	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 3 y 4	480230	45	x			x		25/06/2025			Plano 2
94	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 3 y 4	524573	45	x			x		25/06/2025			Plano 2
95	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 3 y 4	480271	45	x			x		25/06/2025			Plano 2
96	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 3 y 4	480175	45	x			x		25/06/2025			Plano 2
97	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 3 y 4	480223	45	x			x		25/06/2025			Plano 2
98	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 3 y 4	524634	45	x			x		25/06/2025			Plano 2
99	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 3 y 4	524574	45	x			x		25/06/2025			Plano 2
100	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 3 y 4	481859	45	x			x		25/06/2025			Plano 2
101	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 3 y 4	480190	45	x			x		25/06/2025			Plano 2
102	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 3 y 4	524635	45	x			x		25/06/2025			Plano 2
103	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 3 y 4	524636	45	x			x		25/06/2025			Plano 2
104	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 3 y 4	480170	45	x			x		25/06/2025			Plano 2
105	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 5,6 y 7	525268	45	x			x		25/06/2025			Plano 2
106	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 5,6 y 7	480191	45	x			x		25/06/2025			Plano 2
107	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 5,6 y 7	480278	45	x			x		25/06/2025			Plano 2
108	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 5,6 y 7	480277	45	x			x		25/06/2025			Plano 2
109	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 5,6 y 7	524605	45	x			x		25/06/2025			Plano 2
110	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 5,6 y 7	524606	45	x			x		25/06/2025			Plano 2
111	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 5,6 y 7	480230	45	x			x		25/06/2025			Plano 2
112	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 5,6 y 7	524573	45	x			x		25/06/2025			Plano 2
113	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 5,6 y 7	524607	45	x			x		25/06/2025			Plano 2
114	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 5,6 y 7	480232	45	x			x		25/06/2025			Plano 2
115	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 5,6 y 7	525190	45	x			x		25/06/2025			Plano 2
116	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 5,6 y 7	480229	45	x			x		25/06/2025			Plano 2
117	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 5,6 y 7	482234	45	x			x		25/06/2025			Plano 2 -PN
118	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 5,6 y 7	480087	45	x			x		25/06/2025			Plano 2
119	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 5,6 y 7	525297	45	x			x		25/06/2025			Plano 2
120	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 5,6 y 7	499987	45	x			x		25/06/2025			Plano 2 -PN

	INTERVENTORIA DE ALUMBRADO PÚBLICO RELACIÓN LUMINARIAS INSTALADAS Vs. RETIRADAS	Versión 01 Vigente desde:

Fecha JUNIO 2025

CONCEPTO:	Modernización		Reposición		Expansión	x	Normalizado de Mandela SS 820732

Item	Barrio	Dirección	Punto de Referencia	Lumiaria Nueva		DISPOSICIÓN EN POSTE			Vehicular	Peatonal	Fecha de Instalación	Lumiaria Retirada		COMENTARIOS
				Código	Potencia	Sencilla	Matil	Doble				Código	Potencia	
121	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 5,6 y 7	500071	45	x			x		25/06/2025			Plano 2
122	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 5,6 y 7	499981	45	x			x		25/06/2025			Plano 2 -PN
123	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 5,6 y 7	500005	45	x			x		25/06/2025			Plano 2
124	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 5,6 y 7	500046	45	x			x		25/06/2025			Plano 2 -PN
125	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 5,6 y 7	480225	45	x			x		25/06/2025			Plano 2
126	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 5,6 y 7	499962	45	x			x		25/06/2025			Plano 2 -PN
127	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 5,6 y 7	524585	45	x			x		25/06/2025			Plano 2
128	Mandela	calles secundarias	primer sector calle 5,6 y 7	525480	45	x			x		25/06/2025			Plano 2 -PN

Anexo 50. Relación de luminarias instaladas Puente Román

	INTERVENTORIA DE ALUMBRADO PÚBLICO RELACIÓN LUMINARIAS INSTALADAS Vs. RETIRADAS	Versión 01 Vigente desde: 02/02/2021

CONCEPTO: Modernización | Reposición | Expansión x

Getsemaní Puente Román - SS601772

Item	Barrio	Dirección	Punto de Referencia	Lumiaria Nueva		DISPOSICIÓN EN POSTE			Vehicular	Peatonal	Fecha de Instalación	Lumiaria Retirada		COMENTARIOS
				Código	Potencia	Sencilla	Matil	Doble				Código	Potencia	
1	Getsemaní	Avenida del Pedregal		533324	53	x			x		19/06/2025	n/a	0	
2	Getsemaní	Puente Román		511946	55	x			x	x	27/06/2025	n/a	0	
3	Getsemaní	Puente Román		511948	55	x			x	x	27/06/2025	n/a	0	
4	Getsemaní	Puente Román		511950	55	x			x	x	27/06/2025	n/a	0	
5	Getsemaní	Puente Román		515440	55	x			x	x	27/06/2025	n/a	0	
6	Getsemaní	Puente Román		512100	55	x			x	x	27/06/2025	n/a	0	
7	Getsemaní	Puente Román		515444	55	x			x	x	27/06/2025	n/a	0	
8	Getsemaní	Puente Román		515580	55	x			x	x	27/06/2025	n/a	0	
9	Getsemaní	Puente Román		515512	55	x			x	x	27/06/2025	n/a	0	
10	Getsemaní	Puente Román		515557	55	x			x	x	26/06/2025	n/a	0	
11	Getsemaní	Puente Román		511988	55	x			x	x	27/06/2025	n/a	0	
12	Getsemaní	Puente Román		515457	55	x			x	x	27/06/2025	n/a	0	
13	Getsemaní	Puente Román		515445	55	x			x	x	28/06/2025	n/a	0	
14	Getsemaní	Puente Román		511981	55	x			x	x	27/06/2025	n/a	0	
15	Getsemaní	Puente Román		515525	55	x			x	x	27/06/2025	n/a	0	
16	Getsemaní	Puente Román		269376	55	x			x	x	27/06/2025	n/a	0	
17	Getsemaní	Puente Román		326913	55	x			x	x	27/06/2025	n/a	0	
18	Getsemaní	Puente Román		515487	55	x			x	x	27/06/2025	n/a	0	
19	Getsemaní	Puente Román		515461	55	x			x	x	27/06/2025	n/a	0	
20	Getsemaní	Puente Román		0	55	x			x	x	27/06/2025	n/a	0	
21	Getsemaní	Puente Román		515502	55	x			x	x	27/06/2025	n/a	0	
22	Getsemaní	Puente Román		512142	55	x			x	x	27/06/2025	n/a	0	
23	Getsemaní	Puente Román		0	55	x			x	x	27/06/2025	n/a	0	
24	Getsemaní	Puente Román		515588	55	x			x	x	27/06/2025	n/a	0	
25	Getsemaní	Puente Román		515497	55	x			x	x	27/06/2025	n/a	0	
26	Getsemaní	Puente Román		511939	55	x			x	x	28/06/2025	n/a	0	
27	Getsemaní	Puente Román		0	55	x			x	x	28/06/2025	n/a	0	
28	Getsemaní	Puente Román		515454	55	x			x	x	28/06/2025	n/a	0	
29	Getsemaní	Puente Román		511941	55	x			x	x	28/06/2025	n/a	0	
30	Getsemaní	Puente Román		512404	55	x			x	x	27/06/2025	n/a	0	
31	Getsemaní	Puente Román		515494	55	x			x	x	27/06/2025	n/a	0	
32	Getsemaní	Puente Román		515459	55	x			x	x	27/06/2025	n/a	0	
33	Getsemaní	Puente Román		512015	55	x			x	x	27/06/2025	n/a	0	
34	Getsemaní	Puente Román		515446	55	x			x	x	27/06/2025	n/a	0	
35	Getsemaní	Puente Román		515540	55	x			x	x	27/06/2025	n/a	0	

Anexo 51. Relación de luminarias instaladas La Boquilla La Bocana, Cielo Mar

INTERVENTORIA DE ALUMBRADO PÚBLICO
RELACIÓN LUMINARIAS INSTALADAS Vs. RETIRADAS

Versión 01
Vigente desde:
Fecha JUNIO 2025

CONCEPTO:	Modernización	x	Reposición		Expansión	x	Boquilla -via cartagena Barranquilla

Item	Barrio	Dirección	Punto de Referencia	Lumiaria Nueva		DISPOSICIÓN EN POSTE			Vehicular	Peatonal	Fecha de Instalación	Lumiaria Retirada		COMENTARIOS
				Código	Potencia	Sencilla	Matil	Doble				Código	Potencia	
1	Boquilla	frente a Playa Azul	Entrada Cielomar	292759	194			x	x	x	20/06/2025			Plano 1 - PN
2	Boquilla	frente a Playa Azul	Entrada Cielomar	525419	45				x	x	20/06/2025			
3	Boquilla	frente a Playa Azul	Entrada Cielomar	593157	194			x	x	x	20/06/2025			Plano 1 - PN
4	Boquilla	frente a Playa Azul	Entrada Cielomar	525417	45				x	x	20/06/2025			
5	Boquilla	frente a Playa Azul	Entrada Cielomar	293156	194			x	x	x	20/06/2025			Plano 1 - PN
6	Boquilla	frente a Playa Azul	Entrada Cielomar	480137	45				x	x	20/06/2025			
7	Boquilla	frente a Playa Azul	Entrada Cielomar	293154	194			x	x	x	20/06/2025			Plano 1 - PN
8	Boquilla	frente a Playa Azul	Entrada Cielomar	480131	45				x	x	20/06/2025			
9	Boquilla	frente a Playa Azul	Entrada Cielomar	292778	194	x			x		20/06/2025			Plano 1 - PN
10	Boquilla	frente a Playa Azul	Entrada Cielomar	293256	64,5	x			x		20/06/2025			Plano 1 - PN
11	Boquilla	frente a Playa Azul	Entrada Cielomar	292764	194			x	x	x	20/06/2025			Plano 1 - PN
12	Boquilla	frente a Playa Azul	Entrada Cielomar	480151	45				x	x	20/06/2025			
13	Boquilla	frente a Playa Azul	Entrada Cielomar	282754	194			x	x	x	20/06/2025			Plano 1 - PN
14	Boquilla	frente a Playa Azul	Entrada Cielomar	480140	45				x	x	20/06/2025			
15	Boquilla	frente a Playa Azul	Entrada Cielomar	292863	194			x	x	x	20/06/2025			Plano 1 - PN
16	Boquilla	frente a Playa Azul	Entrada Cielomar	525323	45				x	x	20/06/2025			
17	Boquilla	frente a Playa Azul	Entrada Cielomar	292757	194			x	x	x	20/06/2025			Plano 2 - PN
18	Boquilla	frente a Playa Azul	Entrada Cielomar	480132	45				x	x	20/06/2025			
19	Boquilla	frente a Playa Azul	Entrada Cielomar	292765	194			x	x	x	20/06/2025			Plano 2 - PN
20	Boquilla	frente a Playa Azul	Entrada Cielomar	525321	45				x	x	20/06/2025			
21	Boquilla	frente a Playa Azul	Entrada Cielomar	292762	194			x	x	x	20/06/2025			Plano 2 - PN
22	Boquilla	frente a Playa Azul	Entrada Cielomar	525322	45				x	x	20/06/2025			
23	Boquilla	frente a Playa Azul	Entrada Cielomar	292752	194			x	x	x	20/06/2025			Plano 2 - PN
24	Boquilla	frente a Playa Azul	Entrada Cielomar	480130	45				x	x	20/06/2025			
25	Boquilla	frente a Playa Azul	Entrada Cielomar	293357	194			x	x	x	20/06/2025			Plano 2
26	Boquilla	frente a Playa Azul	Entrada Cielomar	525420	45				x	x	20/06/2025			
27	Boquilla	frente a Playa Azul	Entrada Cielomar	292760	194			x	x	x	20/06/2025			Plano 2 - PN
28	Boquilla	frente a Playa Azul	Entrada Cielomar	525324	45				x	x	20/06/2025			

Anexo 52. Relación de luminarias instaladas Av. Santander

	INTERVENTORIA DE ALUMBRADO PÚBLICO RELACIÓN LUMINARIAS INSTALADAS Vs. RETIRADAS	Versión 01 Vigente desde: 02/02/2021

Fecha JUNIO 2025

CONCEPTO:	Modernización	x	Reposición		Expansión	x

Item	Barrio	Dirección	Punto de Referencia	AVENIDA SANTANDER										
				Lumiaria Nueva		DISPOSICIÓN EN POSTE			Vehicular	Peatonal	Fecha de Instalación	Lumiaria Retirada		COMENTARIOS
				Código	Potencia	Sencilla	Matil	Doble				Código	Potencia	
1	Av Santander	avenida propiamente	Av sant	293969	180			x	x		17/06/2025			Plano 14
2	Av Santander	avenida propiamente	Av sant	293730	180				x		17/06/2025			Plano 14
3	Av Santander	avenida propiamente	Av sant	293542	180			x	x		17/06/2025			Plano 14
4	Av Santander	avenida propiamente	Av sant	293761	180				x		17/06/2025			Plano 14
5	Av Santander	avenida propiamente	Av sant	293764	180			x	x		17/06/2025			Plano 14
6	Av Santander	avenida propiamente	Av sant	293723	180				x		17/06/2025			Plano 14
7	Av Santander	avenida propiamente	Av sant	293159	180			x	x		17/06/2025			Plano 14
8	Av Santander	avenida propiamente	Av sant	293173	180				x		17/06/2025			Plano 14
9	Av Santander	avenida propiamente	Av sant	438500	180			x	x		17/06/2025			Plano 14
10	Av Santander	avenida propiamente	Av sant	294791	180				x		17/06/2025			Plano 14
11	Av Santander	avenida propiamente	Av sant	335200	180			x	x		17/06/2025			Plano 14
12	Av Santander	avenida propiamente	Av sant	293800	180				x		17/06/2025			Plano 14
13	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	520257	180			x	x		17/06/2025			Plano 13
14	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	332218	180				x		17/06/2025			Plano 13
15	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	293735	180			x	x		17/06/2025			Plano 13
16	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	293750	180				x		17/06/2025			Plano 13
17	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	520421	180			x	x		17/06/2025			Plano 13
18	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	520234	180				x		17/06/2025			Plano 13
19	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	520235	194			x	x		17/06/2025			Plano 13
20	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	520318	194				x		17/06/2025			Plano 13
21	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	334041	140			x	x		17/06/2025			Plano 13
22	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	358614	140				x		17/06/2025			Plano 13
23	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	524179	140			x	x		17/06/2025			Plano 13
24	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	520279	140				x		17/06/2025			Plano 13
25	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	333357	210			x	x		17/06/2025			Plano 13
26	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	334008	210				x		17/06/2025			Plano 13
27	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	293614	210			x	x		17/06/2025			Plano 13
28	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	292598	210				x		17/06/2025			Plano 13
29	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	332368	210			x	x		17/06/2025			Plano 13
30	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	332364	210				x		17/06/2025			Plano 13
31	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	524468	210			x	x		17/06/2025			Plano 13
32	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	520257	210				x		17/06/2025			Plano 13
33	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	358597	210			x	x		17/06/2025			Plano 13
34	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	334061	210				x		17/06/2025			Plano 13
35	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	438461	210			x	x		17/06/2025			Plano 13
36	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	524420	210				x		17/06/2025			Plano 13
37	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	293688	210			x	x		17/06/2025			Plano 12
38	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	384415	210				x		17/06/2025			Plano 12
39	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	332234	210			x	x		17/06/2025			Plano 12
40	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	520310	210				x		17/06/2025			Plano 12
41	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	277959	210			x	x		17/06/2025			Plano 12
42	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	334134	210				x		17/06/2025			Plano 12
43	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	520258	210			x	x		17/06/2025			Plano 12
44	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	520305	210				x		17/06/2025			Plano 12
45	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	384577	210			x	x		17/06/2025			Plano 12
46	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	438538	210				x		17/06/2025			Plano 12
47	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	293168	210			x	x		17/06/2025			Plano 12
48	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	293169	210				x		17/06/2025			Plano 12
49	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	334110	210			x	x		17/06/2025			Plano 12
50	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	334521	210				x		17/06/2025			Plano 12
51	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	332363	210			x	x		17/06/2025			Plano 12
52	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	332520	210				x		17/06/2025			Plano 12
53	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	332455	210			x	x		17/06/2025			Plano 11
54	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	293772	210				x		17/06/2025			Plano 11
55	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	333404	210			x	x		17/06/2025			Plano 11
56	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	520225	210				x		17/06/2025			Plano 11
57	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	384665	210			x	x		17/06/2025			Plano 11
58	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	334162	210				x		17/06/2025			Plano 11
59	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	339993	210			x	x		17/06/2025			Plano 11
60	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	524189	210				x		17/06/2025			Plano 11
61	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	382407	210			x	x		17/06/2025			Plano 11
62	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	384411	210				x		17/06/2025			Plano 11
63	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	332401	210			x	x		17/06/2025			Plano 11
64	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	334011	210				x		17/06/2025			Plano 11
65	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	293186	210			x	x		17/06/2025			Plano 11
66	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	293179	210				x		17/06/2025			Plano 11

Fecha JUNIO 2025

CONCEPTO:		Modernización	x	Reposición		Expansión	x	AVENIDA SANTANDER

Item	Barrio	Dirección	Punto de Referencia	Lumiaria Nueva		DISPOSICIÓN EN POSTE			Vehicular	Peatonal	Fecha de Instalación	Lumiaria Retirada		COMENTARIOS
				Código	Potencia	Sencilla	Matil	Doble				Código	Potencia	
67	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	332353	210			x	x		17/06/2025			Plano 11
68	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	334111	210				x		17/06/2025			Plano 11
69	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	524219	210			x	x		17/06/2025			Plano 10
70	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	233025	210				x		17/06/2025			Plano 10
71	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	333402	210			x	x		17/06/2025			Plano 10
72	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	243066	210				x		17/06/2025			Plano 10
73	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	384641	210			x	x		17/06/2025			Plano 10
74	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	520238	210				x		17/06/2025			Plano 10
75	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	293164	210			x	x		17/06/2025			Plano 10
76	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	293172	210				x		17/06/2025			Plano 10
77	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	293155	210			x	x		17/06/2025			Plano 10
78	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	293177	210				x		17/06/2025			Plano 10
79	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	438471	210			x	x		17/06/2025			Plano 10
80	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	358615	210				x		17/06/2025			Plano 10
81	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	334067	210			x	x		17/06/2025			Plano 10
82	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	332420	210				x		17/06/2025			Plano 10
83	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	293185	210			x	x		17/06/2025			Plano 10
84	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	293182	210				x		17/06/2025			Plano 10
85	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	332666	210			x	x		17/06/2025			Plano 9
86	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	354605	210				x		17/06/2025			Plano 9
87	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	293180	210			x	x		17/06/2025			Plano 9
88	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	293170	210				x		17/06/2025			Plano 9
89	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	293664	210			x	x		17/06/2025			Plano 9
90	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	293558	210				x		17/06/2025			Plano 9
91	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	293181	210			x	x		17/06/2025			Plano 9
92	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	293158	210				x		17/06/2025			Plano 9
93	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	338525	210			x	x		17/06/2025			Plano 9
94	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	334047	210				x		17/06/2025			Plano 9
95	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	524467	210			x	x		17/06/2025			Plano 9
96	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	332205	210				x		17/06/2025			Plano 9
97	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	293566	210			x	x		17/06/2025			Plano 9
98	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	293174	210				x		17/06/2025			Plano 9
99	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	332410	210			x	x		17/06/2025			Plano 9
100	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	334141	210				x		17/06/2025			Plano 9
101	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	334040	210			x	x		17/06/2025			Plano 9
102	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	358619	210				x		17/06/2025			Plano 9
103	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	298133	210			x	x		17/06/2025			Plano 9
104	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	293176	210				x		17/06/2025			Plano 9
105	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	295059	210			x	x		17/06/2025			Plano 9
106	Av Santander	avenida propiamente	Marbella	358696	210				x		17/06/2025			Plano 9
107	Av Santander	avenida propiamente	Tenazas	431194	R44			x	x		17/06/2025			Plano 8
108	Av Santander	avenida propiamente	Tenazas	293798	180				x		17/06/2025			Plano 8
109	Av Santander	avenida propiamente	Tenazas	265060	140			x	x		17/06/2025			Plano 8
110	Av Santander	avenida propiamente	Tenazas	358685	210				x		17/06/2025			Plano 8
111	Av Santander	avenida propiamente	Tenazas	293761	180			x	x		17/06/2025			Plano 8
112	Av Santander	avenida propiamente	Tenazas	293685	180				x		17/06/2025			Plano 8
113	Av Santander	avenida propiamente	Tenazas	293641	180			x	x		17/06/2025			Plano 7
114	Av Santander	avenida propiamente	Tenazas	384673	210				x		17/06/2025			Plano 7
115	Av Santander	avenida propiamente	Tenazas	333272	180			x	x		17/06/2025			Plano 7
116	Av Santander	avenida propiamente	Tenazas	334166	210				x		17/06/2025			Plano 7
117	Av Santander	avenida propiamente	Tenazas	334136	210			x	x		17/06/2025			Plano 7
118	Av Santander	avenida propiamente	Tenazas	358618	210				x		17/06/2025			Plano 7
119	Av Santander	avenida propiamente	Tenazas	438505	210			x	x		17/06/2025			Plano 7
120	Av Santander	avenida propiamente	Tenazas	332513	210				x		17/06/2025			Plano 7
121	Av Santander	avenida propiamente	Tenazas	334147	210			x	x		17/06/2025			Plano 7
122	Av Santander	avenida propiamente	Tenazas	332365	210				x		17/06/2025			Plano 7
123	Av Santander	avenida propiamente	Tenazas	334144	210			x	x		17/06/2025			Plano 7
124	Av Santander	avenida propiamente	Tenazas	305865	210				x		17/06/2025			Plano 7
125	Av Santander	avenida propiamente	Tenazas	293556	180			x	x		17/06/2025			Plano 6
126	Av Santander	avenida propiamente	Tenazas	334145	210				x		17/06/2025			Plano 6
127	Av Santander	avenida propiamente	Tenazas	438498	210			x	x		17/06/2025			Plano 6
128	Av Santander	avenida propiamente	Tenazas	334132	180				x		17/06/2025			Plano 6
129	Av Santander	avenida propiamente	Tenazas	271127	140			x	x		17/06/2025			Plano 6
130	Av Santander	avenida propiamente	Tenazas	334124	210				x		17/06/2025			Plano 6
131	Av Santander	avenida propiamente	Tenazas	287291	140			x	x		17/06/2025			Plano 6
132	Av Santander	avenida propiamente	Tenazas	211141	140				x		17/06/2025			Plano 6

	INTERVENTORIA DE ALUMBRADO PÚBLICO RELACIÓN LUMINARIAS INSTALADAS Vs. RETIRADAS	Versión 01 Vigente desde: 02/02/2021

Fecha JUNIO 2025

CONCEPTO:		Modernización	x		Reposición				Expansión	x		AVENIDA SANTANDER		

Item	Barrio	Dirección	Punto de Referencia	Lumiaria Nueva		DISPOSICIÓN EN POSTE			Vehicular	Peatonal	Fecha de Instalación	Lumiaria Retirada		COMENTARIOS
				Código	Potencia	Sencilla	Matil	Doble				Código	Potencia	
133	Av Santander	avenida propiamente	Tenazas	332454	210			x	x		17/06/2025			Plano 6
134	Av Santander	avenida propiamente	Tenazas	358679	210				x		17/06/2025			Plano 6
135	Av Santander	avenida propiamente	Tenazas	358616	210			x	x		17/06/2025			Plano 6
136	Av Santander	avenida propiamente	Tenazas	332422	210				x		17/06/2025			Plano 6
137	Av Santander	avenida propiamente	centro	334036	210			x	x		18/06/2025			Plano 5
138	Av Santander	avenida propiamente	centro	358609	210				x		18/06/2025			Plano 5
139	Av Santander	avenida propiamente	centro	332509	210			x	x		18/06/2025			Plano 5
140	Av Santander	avenida propiamente	centro	332356	210				x		18/06/2025			Plano 5
141	Av Santander	avenida propiamente	centro	358606	210			x	x		18/06/2025			Plano 5
142	Av Santander	avenida propiamente	centro	332354	210				x		18/06/2025			Plano 5
143	Av Santander	avenida propiamente	centro	332352	210			x	x		18/06/2025			Plano 5
144	Av Santander	avenida propiamente	centro	334180	210				x		18/06/2025			Plano 5
145	Av Santander	avenida propiamente	centro	334039	210			x	x		18/06/2025			Plano 5
146	Av Santander	avenida propiamente	centro	332351	210				x		18/06/2025			Plano 5
147	Av Santander	avenida propiamente	centro	287258	210			x	x		18/06/2025			Plano 5
148	Av Santander	avenida propiamente	centro	334161	210				x		18/06/2025			Plano 5
149	Av Santander	avenida propiamente	centro	334133	210			x	x		18/06/2025			Plano 4
150	Av Santander	avenida propiamente	centro	287292	210				x		18/06/2025			Plano 4
151	Av Santander	avenida propiamente	centro	332330	210			x	x		18/06/2025			Plano 4
152	Av Santander	avenida propiamente	centro	297779	210				x		18/06/2025			Plano 4
153	Av Santander	avenida propiamente	centro	334009	210			x	x		18/06/2025			Plano 4
154	Av Santander	avenida propiamente	centro	334165	210				x		18/06/2025			Plano 4
155	Av Santander	avenida propiamente	centro	384470	210			x	x		18/06/2025			Plano 4
156	Av Santander	avenida propiamente	centro	358692	210				x		18/06/2025			Plano 4
157	Av Santander	avenida propiamente	centro	332522	210			x	x		18/06/2025			Plano 4
158	Av Santander	avenida propiamente	centro	293534	210				x		18/06/2025			Plano 4
159	Av Santander	avenida propiamente	centro	358706	210			x	x		18/06/2025			Plano 3
160	Av Santander	avenida propiamente	centro	358601	210			x	x		18/06/2025			Plano 3
161	Av Santander	avenida propiamente	centro	293583	210				x		18/06/2025			Plano 3
162	Av Santander	avenida propiamente	centro	358704	210			x	x		18/06/2025			Plano 3
163	Av Santander	avenida propiamente	centro	438489	210			x	x		18/06/2025			Plano 3
164	Av Santander	avenida propiamente	centro	384672	210				x		18/06/2025			Plano 3
165	Av Santander	avenida propiamente	centro	358703	210			x	x		18/06/2025			Plano 3
166	Av Santander	avenida propiamente	centro	358701	210				x		18/06/2025			Plano 3
167	Av Santander	avenida propiamente	centro	293693	180			x	x		18/06/2025			Plano 3
168	Av Santander	avenida propiamente	centro	297572	140				x		18/06/2025			Plano 3
169	Av Santander	avenida propiamente	centro	358676	210			x	x		18/06/2025			Plano 3
170	Av Santander	avenida propiamente	centro	333994	180				x		18/06/2025			Plano 3
171	Av Santander	avenida propiamente	centro	332448	210			x	x		18/06/2025			Plano 3
172	Av Santander	avenida propiamente	centro	358612	210				x		18/06/2025			Plano 3
173	Av Santander	avenida propiamente	centro	520254	210			x	x		18/06/2025			Plano 2
174	Av Santander	avenida propiamente	centro	358687	210			x	x		18/06/2025			Plano 2
175	Av Santander	avenida propiamente	centro	524178	210			x	x		18/06/2025			Plano 2
176	Av Santander	avenida propiamente	centro	520244	210			x	x		18/06/2025			Plano 2
177	Av Santander	avenida propiamente	centro	520252	210				x		18/06/2025			Plano 2
178	Av Santander	avenida propiamente	centro	333985	210			x	x		18/06/2025			Plano 2
179	Av Santander	avenida propiamente	centro	520248	210			x	x		18/06/2025			Plano 2
180	Av Santander	avenida propiamente	centro	358603	210			x	x		18/06/2025			Plano 2
181	Av Santander	avenida propiamente	centro	334046	210			x	x		18/06/2025			Plano 2
182	Av Santander	avenida propiamente	centro	332362	210			x	x		18/06/2025			Plano 2
183	Av Santander	avenida propiamente	centro	333358	210			x	x		18/06/2025			Plano 1
184	Av Santander	avenida propiamente	centro	520288	210			x	x		18/06/2025			Plano 1
185	Av Santander	avenida propiamente	centro	524223	210			x	x		18/06/2025			Plano 1
186	Av Santander	avenida propiamente	centro	520247	210			x	x		18/06/2025			Plano 1
187	Av Santander	avenida propiamente	centro	520520	210				x		18/06/2025			Plano 1

Anexo 53. Relación de luminarias instaladas Otros Proyectos

BAYUNCA SS576195

	INTERVENTORIA DE ALUMBRADO PÚBLICO RELACIÓN LUMINARIAS INSTALADAS Vs. RETIRADAS	Versión 01 Vigente desde: 02/02/2021

CONCEPTO: Modernización | Reposición | Expansión x | Corregimiento de Bayunca

Item	Barrio	Dirección	Punto de Referencia	Lumiaria Nueva		DISPOSICIÓN EN POSTE			Vehicular	Peatonal	Fecha de Instalación	Lumiaria Retirada		COMENTARIOS
				Código	Potencia	Sencilla	Matil	Doble				Código	Potencia	
1	Corregimiento de Bayunca			525272	45	x			x		18/06/2025	n/a	0	SS576195
2	Corregimiento de Bayunca			331606	128	x				x	18/06/2025	n/a	0	SS576195
3	Corregimiento de Bayunca			382962	128	x				x	18/06/2025	n/a	0	SS576195
4	Corregimiento de Bayunca			357735	128	x				x	18/06/2025	n/a	0	SS576195
5	Corregimiento de Bayunca			354811	128	x				x	18/06/2025	n/a	0	SS576195
6	Corregimiento de Bayunca			413152	128	x				x	18/06/2025	n/a	250	SS576195
7	Corregimiento de Bayunca			356808	128	x				x	18/06/2025	n/a	0	SS576195
8	Corregimiento de Bayunca			525502	45	x			x		18/06/2025	n/a	70	SS576195
9	Corregimiento de Bayunca			525408	45	x			x		18/06/2025	n/a	0	SS576195
10	Corregimiento de Bayunca			525359	45	x			x		18/06/2025	n/a	0	SS576195
11	Corregimiento de Bayunca			525406	45	x			x		18/06/2025	n/a	0	SS576195
12	Corregimiento de Bayunca			525385	45	x			x		18/06/2025	n/a	0	SS576195
13	Corregimiento de Bayunca			525271	45	x			x		18/06/2025	n/a	0	SS576195
14	Corregimiento de Bayunca			525269	45	x			x		18/06/2025	n/a	0	SS576195
15	Corregimiento de Bayunca			525505	45	x			x		18/06/2025	n/a	0	SS576195
16	Corregimiento de Bayunca			525501	45	x			x		18/06/2025	n/a	0	SS576195
17	Corregimiento de Bayunca			525357	45	x			x		18/06/2025	n/a	0	SS576195
18	Corregimiento de Bayunca			525506	45	x			x		18/06/2025	n/a	0	SS576195
19	Corregimiento de Bayunca			478812	45	x			x		17/06/2025	n/a	0	SS576195
20	Corregimiento de Bayunca			525238	45	x			x		17/06/2025	n/a	0	SS576195
21	Corregimiento de Bayunca			525395	45	x			x		17/06/2025	n/a	0	SS576195
22	Corregimiento de Bayunca			478813	45	x			x		17/06/2025	n/a	0	SS576195
23	Corregimiento de Bayunca			525380	45	x			x		17/06/2025	n/a	0	SS576195
24	Corregimiento de Bayunca			525394	45	x			x		17/06/2025	n/a	0	SS576195
25	Corregimiento de Bayunca			525378	45	x			x		17/06/2025	n/a	0	SS576195
26	Corregimiento de Bayunca			525240	45	x			x		17/06/2025	n/a	0	SS576195
27	Corregimiento de Bayunca			525239	45	x			x		17/06/2025	n/a	0	SS576195
28	Corregimiento de Bayunca			478811	45	x			x		17/06/2025	n/a	0	SS576195
29	Corregimiento de Bayunca			525237	45	x			x		17/06/2025	n/a	0	SS576195
30	Corregimiento de Bayunca			525393	45	x			x		17/06/2025	n/a	0	SS576195
31	Corregimiento de Bayunca			478814	45	x			x		17/06/2025	n/a	0	SS576195
32	Corregimiento de Bayunca			525379	45	x			x		17/06/2025	n/a	0	SS576195
33	Corregimiento de Bayunca			525388	45	x			x		17/06/2025	n/a	0	SS576195
34	Corregimiento de Bayunca			525504	45	x			x		17/06/2025	n/a	0	SS576195
35	Corregimiento de Bayunca			525508	45	x			x		17/06/2025	n/a	0	SS576195
36	Corregimiento de Bayunca			525387	45	x			x		17/06/2025	n/a	0	SS576195
37	Corregimiento de Bayunca			525377	45	x			x		17/06/2025	n/a	0	SS576195
38	Corregimiento de Bayunca			525386	45	x			x		17/06/2025	n/a	0	SS576195
39	Corregimiento de Bayunca			525503	45	x			x		18/06/2025	n/a	0	SS576195
40	Corregimiento de Bayunca			525396	45	x			x		17/06/2025	n/a	0	SS576195

PARQUE Y CANHCA DE MARTINEZ MARTELO – SS735990

	INTERVENTORIA DE ALUMBRADO PÚBLICO RELACIÓN LUMINARIAS INSTALADAS Vs. RETIRADAS	Versión 01 Vigente desde: Fecha JUNIO 2025

CONCEPTO: Modernización x | Reposición | Expansión x | Parque Martinez Martelo

Item	Barrio	Dirección	Punto de Referencia	Lumiaria Nueva Instalada		DISPOSICIÓN EN POSTE			Vehicular	Peatonal	Fecha de Instalación	Lumiaria Retirada		COMENTARIOS
				Código	Potencia	Sencilla	Matil	Doble				Código	Potencia	
1	Martinez martelo	Parque y cancha del barrio	Parque	400053	64,5	x				x	10/06/2025	No Dio		Plano 1
2	Martinez martelo	Parque y cancha del barrio	Parque	400056	64,5			x		x	10/06/2025	No Dio		Plano 1
3	Martinez martelo	Parque y cancha del barrio	Parque	400055	64,5					x	10/06/2025	No Dio		Plano 1
4	Martinez martelo	Parque y cancha del barrio	Parque	480108	64,5	x				x	10/06/2025	No Dio		Plano 1
5	Martinez martelo	Parque y cancha del barrio	Parque	480046	64,5	x				x	10/06/2025	No Dio		Plano 1
6	Martinez martelo	Parque y cancha del barrio	Parque	400048	64,5	x				x	10/06/2025	No Dio		Plano 1
7	Martinez martelo	Parque y cancha del barrio	Parque	480054	64,5					x	10/06/2025	No Dio		Plano 1
8	Martinez martelo	Parque y cancha del barrio	Parque	480045	64,5			x		x	10/06/2025	No Dio		Plano 1
9	Martinez martelo	Parque y cancha del barrio	cancha	396638	194	x				x	10/06/2025	No Dio		Plano 1
10	Martinez martelo	Parque y cancha del barrio	Cancha	293252	194	x				x	10/06/2025	No Dio		Plano 1
11	Martinez martelo	Parque y cancha del barrio	cancha	395147	194	x				x	10/06/2025	No Dio		Plano 1
12	Martinez martelo	Parque y cancha del barrio	Cancha	292727	194	x				x	10/06/2025	No Dio		Plano 1
13	Martinez martelo	Parque y cancha del barrio	Parque	480162	64,5	x				x	10/06/2025	No Dio		Plano 1
14	Martinez martelo	Parque y cancha del barrio	Parque	400106	64,5	x				x	10/06/2025	No Dio		Plano 1
15	Martinez martelo	Parque y cancha del barrio	Parque	480163	64,5					x	10/06/2025	No Dio		Plano 1
16	Martinez martelo	Parque y cancha del barrio	Parque	480164	64,5			x		x	10/06/2025	No Dio		Plano 1

PARQUES DE SAN FERNANDO NOGAL Y SOCORRO - SS1033334 Y SS10439333

	INTERVENTORIA DE ALUMBRADO PÚBLICO RELACIÓN LUMINARIAS INSTALADAS Vs. RETIRADAS	Versión 01 Vigente desde: 02/02/2021

CONCEPTO: Modernización | Reposición | Expansión x

Item	Barrio	Dirección	Punto de Referencia	Lumiaria Nueva		DISPOSICIÓN EN POSTE			Vehicular	Peatonal	Fecha de Instalación	Lumiaria Retirada		COMENTARIOS
				Código	Potencia	Sencilla	Matil	Doble				Código	Potencia	
1	San fernando	Sobre Calle15	Parque 1 - Junto Cai	480089	45	x				x				SS1033334
2	San fernando	Sobre Calle15		480156	45	x				x				SS1033334
3	San fernando	Sobre Calle15		480155	45	x				x				SS1033334
4	San fernando	Sobre Calle15		480105	45	x				x				SS1033334
5	San fernando	Sobre Calle15		480154	45	x				x				SS1033334
6	San fernando	Sobre Calle15		480090	45	x				x				SS1033334
7	San fernando	Sobre Calle15		480092	45	x				x				SS1033334
8	San fernando	Sobre Calle15		480107	45	x				x				SS1033334
9	San fernando	Sobre Calle15		480191	45	x				x				SS1033334
10	San fernando	Sobre Calle15		480124	45	x				x				SS1033334
11	San fernando	Sobre Calle15		480153	45	x				x				SS1033334
12	El Nogal	Ingreso	Parque 2	480122	45	x				x				SS1033334
13	El Nogal	Ingreso		480123	45	x				x				SS1033334
14	El Nogal	Ingreso		480127	45	x				x				SS1033334
15	El Nogal	Ingreso		480125	45	x				x				SS1033334
16	El Nogal	Ingreso		480126	45	x				x				SS1033334
17	El Nogal	Ingreso		480128	45	x				x				SS1033334
18	San fernando	Carrera 80E	Parque 3 - Frente a Colegio	480057	45	x				x				SS1033334
19	San fernando	Carrera 80E		480058	45	x				x				SS1033334
20	San fernando	Carrera 80E		480060	45	x				x				SS1033334
21	San fernando	Carrera 80E		480059	45	x				x				SS1033334
22	San fernando	Carrera 80E		480051	45	x				x				SS1033334
23	San fernando	Carrera 80E		480052	45	x				x				SS1033334
24	San fernando	Carrera 80E		525494	45	x				x				SS1033334
25	San fernando	Carrera 80E		525493	45	x				x				SS1033334
26	San fernando	Carrera 80E		525496	45	x				x				SS1033334
27	San fernando	Carrera 80E		525495	45	x				x				SS1033334
28	San fernando	Calle 20 con Alamaeda	Parque 4	525255	45	x				x				SS1033334
29	San fernando			525454	45	x				x				SS1033334
30	San fernando			525453	45	x				x				SS1033334
31	San fernando			525456	45	x				x				SS1033334
32	San fernando	Car. 80F con Calle 22E	Parque 5 - Urban. San fernando		45	x				x				SS1033334
33	San fernando				45	x				x				SS1033334
34	San fernando				45	x				x				SS1033334
35	San fernando				45	x				x				SS1033334
36	San fernando				45	x				x				SS1033334
37	San fernando				45	x				x				SS1033334
38	Socorro	Calle 22A	Parque Los Coralitos Megatiendas - Iglesia	525302	45	x				x				SS10439333
39	Socorro	Calle 22A		525304	45	x				x				SS10439333
40	Socorro	Calle 22A		525454	45	x				x				SS10439333
41	Socorro	Calle 22A		525204	45	x				x				SS10439333
42	Socorro	Calle 22A		409052	45	x				x				SS10439333
43	Socorro	Calle 22A		480087	45	x				x				SS10439333
44	Socorro	Calle 22A		409052	45	x				x				SS10439333
45	Socorro	Calle 22A		525301	45	x				x				SS10439333
46	Socorro	Calle 22A		525202	45	x				x				SS10439333
47	Socorro	Calle 22A		480049	45	x				x				SS10439333
48	Socorro	Calle 22A		520203	45	x				x				SS10439333
49	Socorro	Calle 22A		525456	45	x				x				SS10439333

SOCORRO – SS877695

	INTERVENTORIA DE ALUMBRADO PÚBLICO RELACIÓN LUMINARIAS INSTALADAS Vs. RETIRADAS	Versión 01 Vigente desde: 02/02/2021

CONCEPTO: Modernización | Reposición | Expansión x

Item	Barrio	Dirección	Punto de Referencia	Lumiaria Nueva		DISPOSICIÓN EN POSTE			Vehicular	Peatonal	Fecha de Instalación	Lumiaria Retirada		COMENTARIOS
				Código	Potencia	Sencilla	Matil	Doble				Código	Potencia	
1	El Socorro			525444	45	x				x	16/06/2025	n/a	70	SS877695
2	El Socorro			525443	45	x				x	16/06/2025	n/a	70	SS867595
3	El Socorro			478807	45	x				x	16/06/2025	n/a	70	SS867595
4	El Socorro			525442	45	x				x	16/06/2025	n/a	70	SS867595
5	El Socorro			525441	45	x				x	17/06/2025	n/a	70	SS867595
6	El Socorro			478808	45	x				x	16/06/2025	n/a	70	SS867595

CEBALLOS - SECTOR NUEVO HORIZONTE SS 1060357

	INTERVENTORIA DE ALUMBRADO PÚBLICO RELACIÓN LUMINARIAS INSTALADAS Vs. RETIRADAS	Versión 01 Vigente desde: 02/02/2021

Fecha JUNIO 2025

CONCEPTO:	Modernización	x	Reposición		Expansión	x

Item	Barrio	Dirección	Punto de Referencia	Lumiaria Nueva		DISPOSICIÓN EN POSTE			Vehicular	Peatonal	Fecha de Instalación	Lumiaria Retirada		COMENTARIOS
				Código	Potencia	Sencilla	Matil	Doble				Código	Potencia	
1	Ceballos	parquecito	sect Nvo Horiz	506755	64	x				x	15/06/2025			Plano 1 parque 1
2	Ceballos	parquecito	sect Nvo Horiz	506765	64	x				x	15/06/2025			Plano 1 parque 1
3	Ceballos	parquecito	sect Nvo Horiz	506442	64	x				x	15/06/2025			Plano 1 parque 1 - PN

CEBALLOS, SECTOR NUEVO HORIZONTE

MURALLAS – SS877008

	INTERVENTORIA DE ALUMBRADO PÚBLICO RELACIÓN LUMINARIAS INSTALADAS Vs. RETIRADAS	Versión 01 Vigente desde: 02/02/2021

CONCEPTO:	Modernización		Reposición		Expansión	x

Item	Barrio	Dirección	Punto de Referencia	Lumiaria Nueva		DISPOSICIÓN EN POSTE			Vehicular	Peatonal	Fecha de Instalación	Lumiaria Retirada		COMENTARIOS
				Código	Potencia	Sencilla	Matil	Doble				Código	Potencia	
1	Centro	Murallas	Cordon amurallado	525530	70	x				x	13/06/2025	0		Proyectores Led RGB
2	Centro	Murallas		525625	70	x				x	13/06/2025	0		
3	Centro	Murallas		525534	70	x				x	13/06/2025	0		
4	Centro	Murallas		525529	70	x				x	13/06/2025	0		

Murallas SS877008

Anexo 54. Registro de medición de iluminación realizada en junio 2025

Medida #1: Urb. Palmas de Salamancas

MEDIDAS DE NIVELES DE ILUMINANCIA No 1
METODOS DE LOS 9 PUNTOS y/0 Cavidad Zonal dependiendo de la Zona

RESPONSABLE	LUIS MARTINEZ /LUIS MEJIA			**FECHA**	27/06/2024	HORA INICIO	7:40PM
DIRECc DEL SITIO	**Urb Palmas de salamanca**						
TRAMOS DE VIA CON CONDIC UNIFORMES AL SITIO DE MEDIDA				entrada zona de Parqueo 2			
LUXOMETRO	KLEIN TOOLS ET 130						
CONDICIONES ATMOSFERICA DE LA NOCHE			Cielo Nublado				
LUMINARIA	CELSA			**PANEL LEDS**	45		
TIPO DE APOYO	postes Existente			**AVANCE DE LA LUMINARIA SOBRE CALZADA (m) DESTAPADA**	0,5 Y 0,72 m APROX		
ANCHO DE CALZADA	7m a 6 m aprox			**ALTURA DE MONTAJE DE LA LUM (m)**	7,8 m A 8M APROX		
SEPARADOR	SI=	NO= X	No DE SEPARADORES				
DISPOSICION DE LUMINARIAS	Normal de vehicular pequeña		0	**TENSION NOMINAL DE LA LUM (VOLT)**	120-250		
INTERDISTANCIA ENTRE LUMINARIA CONSECUTIVAS	22 A 30 M APROX		**DISTANCIA DEL FAROL A LA CALZADA (m)**		0,42m Calle de dos carriles		
ANGULO DE INCLINACION DE LA LUMINARIA	0° a 0.01° APROX		**TENSION MEDIDA DE LA RED (m)**		240		
SUCIEDAD DE EL CONJUNTO OPTICO?	La luminaria es totalmente Nueva						

PUNTOS	1	2	3	**OBSERVACIONES**
1	45	42	26	La contaminacion es leve, luces de casas a 30 metros
2	40	39	24	
3	35	31	22,5	

Urb. Palmas de Salamanca - Zona Parqueo	**DISTRIBUCION**	Unilateral abajo

Medidas en Campo		
	VIA	**Peatonal**
E1	45	0
E2	40	0
E3	35	0
E4	42	0
E5	39	0
E6	31	0
E7	26	0
E8	24	0
E9	22,5	0

TIPO DE VIA M4

	1/16	(E1+E3+E7+E9)	(E2+E4+E6+E8)	E5
Eprom	0,063	129	137	39
Eprom	0,063	0	0	
UNIFORMIDAD Peatonal		**0,50**	**OK**	

Medida #2: Urb. Palmas de Salamancas

NIVELES DE ILUMINANCIA No 2
NTOS y/0 Cavidad Zonal dependiendo de la Zona

RESPONSABLE	LUIS MARTINEZ /LUIS MEJIA			**FECHA**	27/06/2024	HORA INICIO 8:25PM
DIRECc DEL SITIO	**lmas de salamanca**					
TRAMOS DE VIA CON CONDIC UNIFORMES AL SITIO DE MEDIDA	calles secundarias entre Bloques					
LUXOMETRO	IN TOOLS ET 130					
CONDICIONES ATMOSFERICA DE LA NOCHE			Cielo Despejado			
LUMINARIA	SA Koraled 45w			**PANEL LEDS**	45	
TIPO DE APOYO	ostes Metalico			**AVANCE DE LA LUMINARIA SOBRE CALZADA (m) DESTAPADA**	Y 0,62 m APROX	
ANCHO DE CALZADA	alicos Ornamentales			**ALTURA DE MONTAJE DE LA LUM (m)**	m A 5.7M APROX	
SEPARADOR	SI=	NO= X	No DE SEPARADORES			
DISPOSICION DE LUMINARIAS	le Vehicular Pequeña		0	**TENSION NOMINAL DE LA LUM (VOLT)**	120-250	
INTERDISTANCIA ENTRE LUMINARIA CONSECUTIVAS	A 7 M APROX		**DISTANCIA DEL FAROL A LA CALZADA (m)** 0,42m Calle de dos carriles			
ANGULO DE INCLINACION DE LA LUMINARIA	a 0.01° APROX		**TENSION MEDIDA DE LA RED (m)**		240	
SUCIEDAD DE EL CONJUNTO OPTICO?	La luminaria es totalmente Nueva					

PUNTOS	1	2	3	**OBSERVACIONES**
1	24	22	20	La contaminacion es leve luces de las torres cerca a el punto luminoso mirando abajo
2	23	18	17	
3	19	16	14	

Palmas de Salamancas - Calles entre bloques	**DISTRIBUCION**	Unilateral abajo

Medidas en Campo		
	VIA	**Peatonal**
E1	24	0
E2	23	0
E3	19	0
E4	22	0
E5	18	0
E6	16	0
E7	20	0
E8	17	0
E9	14	0

TIPO DE VIA M4

	1/16	(E1+E3+E7+E9)	(E2+E4+E6+E8)	E5
Eprom	0,063	77	78	18
Eprom	0,063	0	0	

UNIFORMIDAD Peatonal	**0,58**	OK

Medida #3: Nelson Mandela, Sector Nuevo Mundo

MEDIDAS DE NIVELES DE ILUMINANCIA No 3
METODOS DE LOS 9 PUNTOS y/0 Cavidad Zonal dependiendo de la Zona

RESPONSABLE	LUIS MARTINEZ /LUIS MEJIA			**FECHA**	28/06/2024	HORA INICIO	9:10PM
DIRECc DEL SITIO	**Mandela sector Nuevo Mundo**						
TRAMOS DE VIA CON CONDIC UNIFORMES AL SITIO DE MEDIDA				calles 1 y 2 hacia la 82 via policarpa			
LUXOMETRO	KLEIN TOOLS ET 130						
CONDICIONES ATMOSFERICA DE LA NOCHE			Cielo Despejado				
LUMINARIA	CELSA			**PANEL LEDS**	45		
TIPO DE APOYO	Postes normal existentes de afinia			**AVANCE DE LA LUMINARIA SOBRE CALZADA (m) DESTAPADA**	0,5 Y 0,72 m APROX		
ANCHO DE CALZADA	7m a 8 m aprox			**ALTURA DE MONTAJE DE LA LUM (m)**	7,8 m A 8M APROX		
SEPARADOR	SI=	NO= X	No DE SEPARADORES				
DISPOSICION DE LUMINARIAS	normal de vehicular pequeña		0	**TENSION NOMINAL DE LA LUM (VOLT)**	120-250		
INTERDISTANCIA ENTRE LUMINARIA CONSECUTIVAS	32 A 35 M APROX		**DISTANCIA DEL FAROL A LA CALZADA (m)**		0,42m Calle de dos carriles		
ANGULO DE INCLINACION DE LA LUMINARIA	0° a 0.01° APROX		**TENSION MEDIDA DE LA RED (m)**		240		
SUCIEDAD DE EL CONJUNTO OPTICO?	La luminaria es totalmente Nueva						

PUNTOS	1	2	3	**OBSERVACIONES**
1	35	31	27	La contaminacion es leve luces de Casas a 30m
2	32	22	17	
3	29	19	16	

Nelson Mandela - Nuevo Mundo	**DISTRIBUCION**	Unilateral abajo

Medidas en Campo		
	VIA	**Peatonal**
E1	35	0
E2	32	0
E3	29	0
E4	31	0
E5	22	0
E6	19	0
E7	27	0
E8	17	0
E9	16	0

TIPO DE VIA M3

	1/16	(E1+E3+E7+E9)	(E2+E4+E6+E8)	E5
Eprom	0,063	107	99	22
Eprom	0,063	0	0	

UNIFORMIDAD via	**0,46**	OK
UNIFORMIDAD Peatonal		

Anexo 55. Comunicación AP-EPM-008-2025: Ajuste de ucap's ejecutadas – mayo 2025

Interventorias de Obras Eléctricas, Consultorias,
Asesorias, Auditorias, Outsourcing, Estudios Técnicos- Administrativos-Financieros

AP EPM-008-2025

Cartagena de Indias D.T. y C., 17 de junio de 2025

Señores
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN EPM
Atn: Ing. José David Pulido Correa
Profesional Comercial - Unidad Ofertas Gobierno
Cartagena

Asunto: Ajuste de UCAP's ejecutadas – mayo 2025

Tras la revisión y conciliación de cantidades de UCAP's ejecutadas durante el mes de mayo 2025, juntamente ingenieros del área operativa de EPM e Interventoría QBM2, nos permitimos informar el valor liquidado: **1.328.6 UCAP's**, correspondiente a las intervenciones desarrolladas en los barrios y corregimientos tal como se describe en detalle a continuación:

Item	Solicitud	Nombre del Proyecto	Ejecuadas
1	613942	Reposicion de postes y redes Av Santander	283,23
2	1003328	SMI La Sevillana	237,21
3	601772	Centro Historico	232,84
4	911772	SMI Expansion Barrio Henequen	126,16
5	576195	Corregimientos Pontezuela, Bayunca	108,39
6	735976	Parque El Divino Niño y parques etapa I Barrio El Socorro	99,43
7	1080720	SMI Fachada de la Alcaldía	64,81
8	945795	SMI Expansion Cra 92 Barrio Villa Estrella	45,50
9	560842	Barrio El Pozón Etapa III	33,78
10	735990	Parque Martínez Martelo y Parque De Los Borrachos	27,57
11	1084738	SMI Parque de Los Alcatraces Av. Santander	16,09
12	1085289	SMI Rotonda Puente de Manga	10,57
13	1049906	SMI Bajos del Puente Bazurto SS 1049906	6,85
14	1072200	SMI Cl 104 San Jose de los Campanos	5,31
15	432391	SMI Via Perimetral	5,07
16	484687	Barrio El Pozón Etapa I	4,52
17	648737	Corredor de Carga	4,08
18	499717	SMI Zonas de esparcimiento de la Perimetral	3,38
19	150354	Vía Perimetral	3,15
20	169774	Barrios El Cabrero y Marbella	1,90

Canapote Calle 20 de Julio N° 16-37 Cartagena
Teléfonos: 605 65 24 715 Celufijo 310-650-2676
Correo Electrónico: presidencia@qbm2.com

Item	Solicitud	Nombre del Proyecto	Ejecuadas
21	484583	Barrios Villas de la Candelaria, Villa Estrella	1,69
22	449693	Barrios Paraguay, Juan XXIII y Junín	1,54
23	908726	SMI Callejon entre Calle 32 y 33 Barrio Olaya St Magdalena	1,45
24	277742	Barrio El Carmelo y Barrio El Milagro	1,33
25	329466	Barrios Las Gaviotas, República de Venezuela, La Floresta, La Castellana, Chipre y San Antonio	1,33
26	484648	Barrio Fredonia	1,33
27	276937	Barrios Blas De Lezo y La Central	0,12
Subtotal mayo 2025			1328,6


En espera de sus comentarios

Atentamente;

LUIS MIGUEL MEJIA CHAVEZ
Director de Interventoría

Copia: Dra. Gina Patricia Vélez Ortiz - Asesora de Servicios Públicos
Ing. José Adrián Rivera Pérez - Profesional Operaciones Negocios – UAP
Ing. Diego Alberto Pineda Martínez - Profesional Operaciones Negocios – UAP
Dra. Melissa M. Franco Porras - Asesora Jurídica QBM2

Anexo 56. Factura junio N°DEE20320765 EPM - Correspondiente al mes de mayo 2025

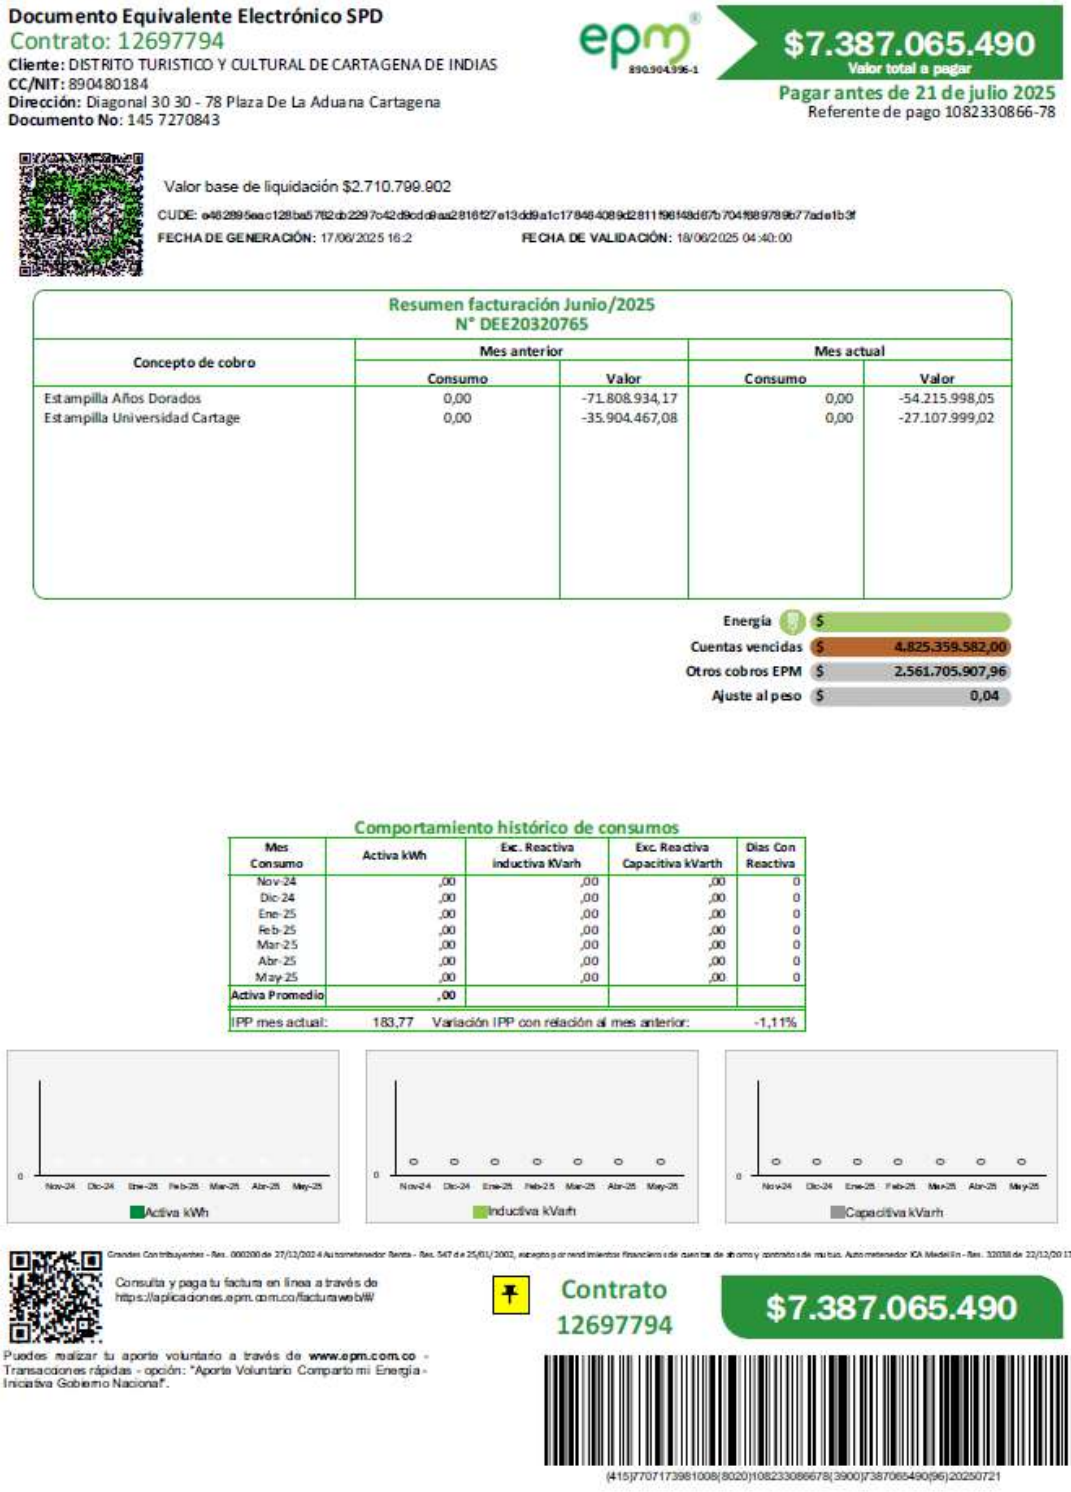

Documento Equivalente Electrónico SPD

Contrato: 12697794

Cliente: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS
CC/NIT: 890480184
Dirección: Diagonal 30 30 - 78 Plaza De La Aduana Cartagena
Documento No: 145 7270843

epm 890.904.996-1

$7.387.065.490
Valor total a pagar

Pagar antes de 21 de julio 2025
Referente de pago 1082330866-78

Valor base de liquidación $2.710.799.902

CUDE: e462895eac128ba5762db2297c42d9cdc8aa2816f27e13dd9a1c17848408 9d2811f96f48d67b7041989789b77ade1b3f

FECHA DE GENERACIÓN: 17/06/2025 16:2 **FECHA DE VALIDACIÓN:** 18/06/2025 04:40:00

Resumen facturación Junio/2025
N° DEE20320765

Concepto de cobro	Mes anterior		Mes actual	
	Consumo	Valor	Consumo	Valor
Estampilla Años Dorados	0,00	-71.808.934,17	0,00	-54.215.998,05
Estampilla Universidad Cartage	0,00	-35.904.467,08	0,00	-27.107.999,02

Energía	$	
Cuentas vencidas	$	4.825.359.582,00
Otros cobros EPM	$	2.561.705.907,96
Ajuste al peso	$	0,04

Comportamiento histórico de consumos

Mes Consumo	Activa kWh	Exc. Reactiva inductiva kVarh	Exc. Reactiva Capacitiva kVarth	Dias Con Reactiva
Nov-24	,00	,00	,00	0
Dic-24	,00	,00	,00	0
Ene-25	,00	,00	,00	0
Feb-25	,00	,00	,00	0
Mar-25	,00	,00	,00	0
Abr-25	,00	,00	,00	0
May-25	,00	,00	,00	0
Activa Promedio	**,00**			

IPP mes actual: 183,77 Variación IPP con relación al mes anterior: -1,11%

Consulta y paga tu factura en línea a través de https://aplicaciones.epm.com.co/facturawebW

Contrato 12697794

$7.387.065.490

Puedes realizar tu aporte voluntario a través de **www.epm.com.co** - Transacciones rápidas - opción: "Aporte Voluntario Comparto mi Energía - Iniciativa Gobierno Nacional".

(415)7707173981008(8020)1082330866 78(3900)7387065490(96)20250721

Diagonal 30 30 - 78 Plaza De La A - Cartagena De Indias-Bolívar

Servicios De Ingeniería Ener servicio suscrito 130888664
1 Cuenta(s) Vencida(s) : Suspensión De Servicios Después Del Día De Vencimiento

Información Básica	Valores Facturados	
	Consumo	Valor
Instalación: 900130000010007080 - Diagonal 30 30 - 78 Plaza De La A - Cartagena De Indias-bolivar - Plan: Plan Unico - Categoría: Oficial - Nivel De Tensión: 1 - Genérico: Distrito Turistico Y Cultural De Cartagena De Indias - Consumo Del 01 May Al 31 May - Días De Consumo: 30		
Total Servicios De Ingeniería Ener servicio suscrito 130888664		

Otros Cobros EPM

Descripcion	Servicio	Valor
Mantenimiento alumbrado	Energia	$ 1.053.867.367,2
Montaje	Energia	$ 1.656.932.535,2
Tasa pro-deporte y recr	Energia	$ -67.769.997,56
Total Otros Cobros EPM		**$ 2.643.029.904,84**



Empresas Públicas de Medellín E.S.P -NIT.890.904.996-1
Carrera 58 #42-125 Edificio Inteligente
Conmutador: (604) 3808080
Medellín-Antioquia

Entidad que nos vigila: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD Número único de registro: 4-50010000-1 – www.superservicios.gov.co

Entidades que nos regulan: Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA – www.cra.gov.co Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG www.creg.gov.co

Puntos de Pago
Almacenes de Cadena: Almacenes Éxito, Carulla, Surtimax, Jumbo, Metro.
Entidades Bancarias: Bancolombia - Corresponsal Bancario, BBVA, Banco de Bogotá, Scotiabank Colpatria, Davivienda - Corresponsal Bancario, Sudameris, Itaú, Banco de Occidente, Banco Popular.
Centros de Pago: Gana, PTM, Movilred, Efecty, Súper Giros, Súper Efectivo, Winred, Megared, Practi Red Multibanco.
Electrónico: Daviplata, Clvica Pay, Claropay, Nequi, Redeban, ATH, Servibanca.
Cooperativas: Cotrafa, Confiar, Juriscoop, CFA, CooSanluis, CoopSuya.

Paga en Línea
https://aplicaciones.epm.com.co/facturaweb/#/
App EPM

Puntos de atención
La explicación de los valores contenidos en esta factura se atiende en la línea empresarial 018000 410 115 a nivel nacional o a través de su Ejecutivo de Cuentas asignado. Para consultar un mayor detalle de los cobros facturados lo invitamos a ingresar www.epm.com.co y luego seleccionar "Clientes Corporativos".

Recuerda que puedes pagar tus facturas por medios electrónicos, con cargo a tu cuenta de ahorros o corriente. No tenemos disponible pago con tarjeta de crédito.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales

epm NIT 890904 996-1

John Alberto Maya Salazar
Representante legal
Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

La presente factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de La ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la ley 689 de 2001

Software de facturación: Open SmartFlex Fabricante: OPEN SYSTEMS COLOMBIA S.A.S Nit: 900401714-8

Anexo 57. Certificado de QBM2 a EPM.

Interventorias de Obras Eléctricas Consultorías,
Asesorías, Auditorías, Outsourcing, Estudios Técnicos- Administrativos-Financieros

Cartagena de Indias, 20 de Junio de 2025

Doctora
MARIA PATRICIA PORRAS
Secretaria General
Alcaldía Mayor Cartagena de Indias

ASUNTO: CERTIFICADO DE INTERVENTORIA ALUMBRADO PUBLICO MES MAYO 2025

Apreciada Doctora:

En cumplimiento de nuestra misión contractual: Ejecutar "La interventoría integral del Contrato Interadministrativo 068-2022 que tiene por objeto la administración, operación, mantenimiento, modernización, reposición, expansión; las actividades de iluminación ornamental y navideña en los espacios públicos y todos los elementos necesarios para la prestación del servicio de alumbrado público del distrito de Cartagena; ..." me permito expedir el presente certificado que da fe del cumplimiento de las obligaciones de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. durante el mes de Mayo 2025

Se envió informe general de interventoría en su momento que da cuenta de las actividades desarrolladas por EPM durante el mes de mayo 2025 y se anexan adicionalmente el informe de Ajustes UCAP´S.

Se firma en Cartagena a los 20 días del mes de junio de 2025.

Cordialmente,

WILLIAM MURRA DIAZGRANADOS
Gerente y Representante Legal
QBM2 Ingenieria Electrica S.A.

WILLIAM ROBERTO MOURRA DIAZGRANADOS
Gerente y Representante Legal
QBM2 Ingeniería Eléctrica S.A.
Interventoría Alumbrado Público

Canapote Calle 20 de Julio N° 16-37 Cartagena
Teléfonos: 666 0174- 666 6219 Telefax: 666 0532 Celufijo 310-650-2676
Correo Electrónico: presidencia@qbm2.com

Anexo 58. Indicadores de gestión de EPM con corte a 15/07/2025

El presente análisis, se realiza con corte al 15 de julio, de acuerdo a informe de gestión presentado por EPM en comité de cierre el 16/07/2025

Contractualmente el nivel de operación del sistema de alumbrado público exigido es del 90%. La eficiencia del sistema se mantiene en promedio, **99%**




En el periodo 01 de junio al 15 de julio 2025, se generaron **996** órdenes de trabajo, resultado de las solicitudes de servicio recibida por los diferentes medios, telefónicos (#376 – línea 018000), comunicaciones de los usuarios directamente a EPM y a través del Distrito.

Ordenes de Trabajo año 2025										
	ene-25	**feb-25**	**mar-25**	**abr-25**	**may-25**	**jun-25**	**jul-25**	**Promedio Mensual**	**Acumulado**	
24 H	185	290	231	240	112,00	144	211	202	1413	36%
48 H	179	250	154	231	158,00	152	217	192	1341	34%
72 H	101	77	44	99	94,00	76	115	87	606	15%
<72H	247	92	32	101	52,00	18	63	86	605	15%
Acumulado	712	709	461	671	416	390	606	**566**	**3965**	100%


En promedio, para todo el semestre, se recibieron 3.965 reportes:

El 36% (1413) de los reportes se atendieron en 24 horas
El 34% (1341) se atendieron en 48 horas.
El 15% (606) de los reportes se atendieron en 72 horas
El 15% (605) mayor a 72 horas, por la complejidad de la intervención.

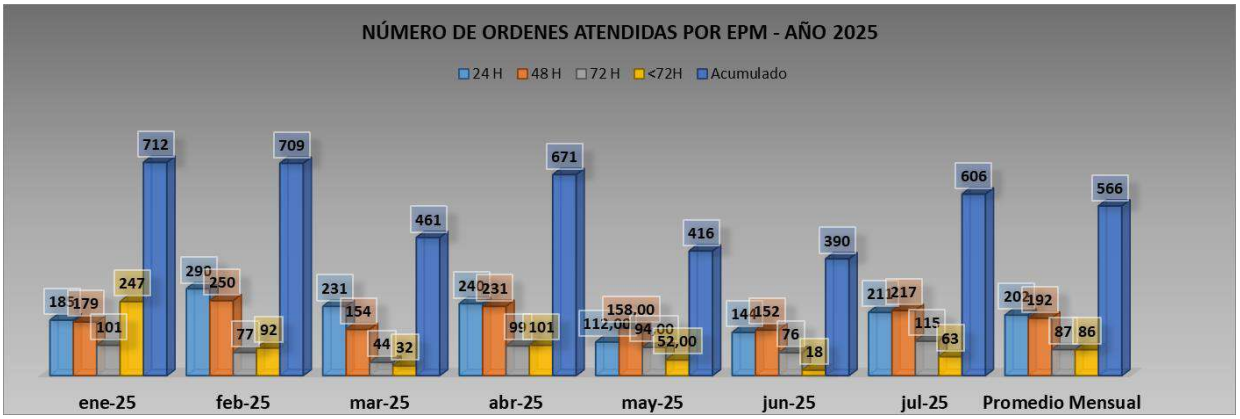

El tiempo de atención de solicitudes de EPM, del semestre se ubicó en 35 horas promedio.

Mes	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	Promedio mensual
Tiempo (h)	**50**	**26,1**	34	46,7	**30,2**	28	28	**35**

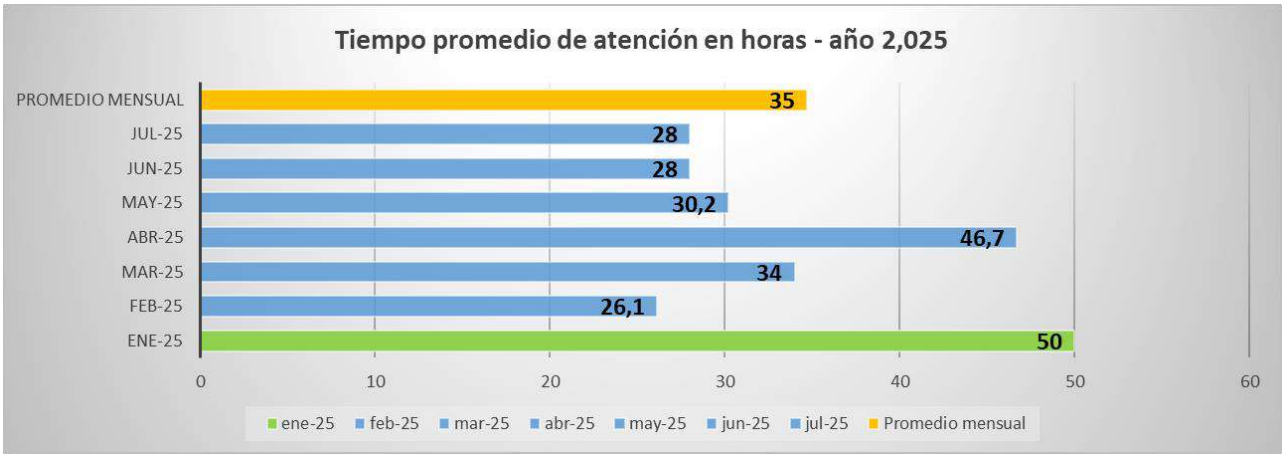

Y en general, la cobertura de atención de las solicitudes en los cinco meses es del 35% en atenciones dentro de las 24 horas.


Cobertura de atención 2025
<72H
15%
24 H
36%
72 H
15%
48 H
34%
24 H
48 H
72 H
<72H

Anexo 59. Radicados de informes entregados a Distrito.

AP-DIS-030-2025

Interventorias de Obras Eléctricas, Consultorías,
Asesorías, Auditorías, Outsourcing, Estudios Técnicos- Administrativos-Financieros

AP DIS-030-2025

Cartagena de Indias D.T. y C., 17 de Junio de 2025

Señores
ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA
Atn: Dra. María Patricia Porras
Secretaria General
Cartagena

Asunto: Envío Informe de Interventoría Mayo de 2025.

Cordial saludo

El motivo del presente es enviar por medio de la Ventana de Atención Al Cliente y adjunto al mismo, el informe de interventoría (114 Folios) correspondiente al mes de Mayo del año 2025, el cual contiene todo lo concerniente al Alumbrado Público en el Distrito de Cartagena de Indias y sus Corregimientos.

Agradeciendo su colaboración.

LUIS MIGUEL MEJIA CHAVEZ
Director De Interventoría

Copia: Archivos

Canapote Calle 20 de Julio N° 16-37 Cartagena
Teléfonos: 605 65 24 715 Celufijo 310-650-2676
Correo Electrónico: presidencia@qbm2.com

AP DIS-031-2025

Cartagena de Indias D.T. y C., 17 de Junio de 2025

Señores
ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA
Atn: Dra. Maria Patricia Porras
Secretaria General
Cartagena

Asunto: Envío Digital de Informes

Cordial saludo

Adjunto al presente se envían de manera Virtual los siguientes informes:

- Informe de Interventoría correspondientes al mes de Mayo de 2025, el cual fue radicado mediante ventanilla de Atención al usuario el día 17-06-2025 a través de comunicación AP-DIS-030-2025.

- Informe de Supervisión Institucional, Firmado por Interventoría.

Esto con el fin de que se proceda a su revisión y aprobación de los documentos entregados; así como la emisión y envío de la Certificación de Cumplimiento expedida por el supervisor del contrato; de acuerdo con lo establecido en la Cláusula séptima del Contrato de Interventoría de alumbrado Público.

Agradeciendo su colaboración.

LUIS MIGUEL MEJIA CHAVEZ
Director De Interventoría

Copia: Archivos

Anexo 60. Acta de ajuste de energía – 25/06/2025

afinia Grupo-epm

RESUMEN DE POTENCIAS Y DEMANDAS DE LUMINARIAS DE CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO

ALIADO COMERCIAL	DEPARTAMENTO: BOLIVAR	FECHA: 25/06/2025
	MUNICIPIO: CARTAGENA	INFORME DE LUMINARIAS DE CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
	CORREGIMIENTO:	

TECNOLOGÍA	POTENCIA (Watt)	PÉRDIDA EN LA REACTANCIA (W)	CANTIDAD DE LUMINARIAS	POTENCIA INSTALADA (W)	POTENCIA INSTALADA (INCLUYENDO REACTANCIA) (W)	DEMANDA PÉRDIDAS (KW-H-MES)	DEMANDA (SIN REACTANCIA) (KW-H-MES)	DEMANDA (CON REACTANCIA) (KW-H-MES)
MERCURIO	125	12	73	9.125	10.001	315	3.285	3.600
	250	19	0	0	0	0	0	0
	400	22	0	0	0	0	0	0
	500	22	0	0	0	0	0	0
	1000	22	0	0	0	0	0	0
SODIO	26	0	0	0	0	0	0	0
	70	11	627	43.890	50.787	2.483	15.800	18.283
	100	11	3	300	333	12	108	120
	150	19	1182	177.300	199.758	8.085	63.828	71.913
	250	29	0	0	0	0	0	0
	400	40	0	0	0	0	0	0
	600	70	0	0	0	0	0	0
	1000	100	4	4.000	4.400	144	1.440	1.584
HALÓGENA	40	0	2	80	80	0	29	29
	125	0	0	0	0	0	0	0
	250	0	0	0	0	0	0	0
	300	0	0	0	0	0	0	0
	500	0	0	0	0	0	0	0
	1000	0	0	0	0	0	0	0
	1500	0	0	0	0	0	0	0
MIXTA	125	0	0	0	0	0	0	0
	160	0	0	0	0	0	0	0
	250	0	0	0	0	0	0	0
	400	0	0	0	0	0	0	0
	500	0	0	0	0	0	0	0
INCANDESCENTE	100	0	0	0	0	0	0	0
	150	0	0	0	0	0	0	0
	200	0	0	0	0	0	0	0
	300	0	0	0	0	0	0	0
METAL HALIDE	70	11	15	1.050	1.215	59	378	437
	150	20	73	10.950	12.410	526	3.942	4.468
	175	58	3	525	699	63	189	252
	250	32	586	146.500	165.252	6.751	52.740	59.491
	400	44	912	364.800	404.928	14.446	131.328	145.774
	1000	80	302	302.000	326.160	8.698	108.720	117.418
	1500	0	0	0	0	0	0	0
LED	8,4	0	16	134	134	0	48	48
	20	0	52	1.040	1.040	0	374	374
	17	0	14	238	238	0	86	86
	24	0	22	528	528	0	190	190
	29	0	1	29	29	0	10	10
	30	0	79	2.370	2.370	0	853	853
	31,3	0	8	250	250	0	90	90
	32	0	66	2.112	2.112	0	760	760
	33,6	0	44	1.478	1.478	0	532	532
	36	0	59	2.124	2.124	0	765	765
	40	0	528	21.120	21.120	0	7.603	7.603
	44	0	2974	130.856	130.856	0	47.108	47.108
	45	0	29479	1.326.555	1.326.555	0	477.560	477.560
	47	0	317	14.899	14.899	0	5.364	5.364
	49	0	86	4.214	4.214	0	1.517	1.517
	50	0	8884	444.200	444.200	0	159.912	159.912
	53	0	481	25.493	25.493	0	9.177	9.177
	55	0	543	29.865	29.865	0	10.751	10.751
	56	0	122	6.832	6.832	0	2.460	2.460
	57	0	216	12.312	12.312	0	4.432	4.432
	59	0	27	1.593	1.593	0	573	573
	60	0	66	3.960	3.960	0	1.426	1.426
	64	0	2852	182.528	182.528	0	65.710	65.710
	68	0	296	20.128	20.128	0	7.246	7.246
	70	0	468	32.760	32.760	0	11.794	11.794
	72	0	10	720	720	0	259	259
	74	0	34	2.516	2.516	0	906	906
	75	0	38	2.850	2.850	0	1.026	1.026
	80	0	25	2.000	2.000	0	720	720
	84	0	4	336	336	0	121	121
	90	0	4	360	360	0	130	130
	95	0	5	475	475	0	171	171

RESUMEN DE POTENCIAS Y DEMANDAS DE LUMINARIAS DE CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO

ALIADO COMERCIAL	DEPARTAMENTO: BOLIVAR	FECHA: 25/06/2025
	MUNICIPIO: CARTAGENA	INFORME DE LUMINARIAS DE CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO
	CORREGIMIENTO:	

TECNOLOGÍA	POTENCIA (Watt)	PÉRDIDA EN LA REACTANCIA (W)	CANTIDAD DE LUMINARIAS	POTENCIA INSTALADA (W)	POTENCIA INSTALADA (INCLUYENDO REACTANCIA) (W)	DEMANDA PÉRDIDAS (KW-H-MES)	DEMANDA (SIN REACTANCIA) (KW-H-MES)	DEMANDA (CON REACTANCIA) (KW-H-MES)
LED	99	0	81	8.019	8.019	0	2.887	2.887
	100	0	524	52.400	52.400	0	18.864	18.864
	102	0	0	0	0	0	0	0
	107	0	352	37.664	37.664	0	13.559	13.559
	110	0	5612	617.320	617.320	0	222.235	222.235
	120	0	13	1.560	1.560	0	562	562
	123	0	2	246	246	0	89	89
	128	0	782	100.096	100.096	0	36.035	36.035
	130	0	1	130	130	0	47	47
	134	0	9	1.206	1.206	0	434	434
	140	0	1190	166.600	166.600	0	59.976	59.976
	150	0	1012	151.800	151.800	0	54.648	54.648
	153	0	1	153	153	0	55	55
	165	0	67	11.055	11.055	0	3.980	3.980
	170	0	16	2.720	2.720	0	979	979
	180	0	118	21.240	21.240	0	7.646	7.646
	194	0	391	75.854	75.854	0	27.307	27.307
	200	0	55	11.000	11.000	0	3.960	3.960
	210	0	517	108.570	108.570	0	39.085	39.085
	212	0	214	45.368	45.368	0	16.332	16.332
	217	0	196	42.532	42.532	0	15.312	15.312
	222	0	73	16.206	16.206	0	5.834	5.834
	250	0	28	7.000	7.000	0	2.520	2.520
	291	0	366	106.506	106.506	0	38.342	38.342
	400	0	81	32.400	32.400	0	11.664	11.664
	505	0	78	39.390	39.390	0	14.180	14.180
TOTALES			**63381**	**4.994.431**	**5.109.934**	**41.581**	**1.797.996**	**1.839.576**

RESUMEN	POTENCIAS Y DEMANDAS
POTENCIA TOTAL (W)	4.994.431
POTENCIA TOTAL - INCLUYÉNDOSE LA REACTANCIA (W)	5.109.934
CONSUMO MENSUAL POR PÉRDIDAS (KW-H-MES)	41.581
PORCENTAJE QUE REPRESENTAN LAS PÉRDIDAS	2%
PORCENTAJE QUE REPRESENTA LA TECNOLOGÍA LED	94%
CONSUMO MENSUAL INCLUIDAS LAS PÉRDIDAS (KW-H-MES)	1.839.576
Consumo de Estadios + Circuitos exclusivos de A.P. Cgena	35.000
Consumo total mensual (KW/MES)	1.874.576

Dias	Kwh/mes
30	1.874.576
31	1.937.062
28	1.749.605

ALCALDÍA DE CARTAGENA
NOMBRE: MARIA PATRICIA PORRAS
CARGO: Secretario General Distrito
P/P:

CARIBEMAR S.A.S E.S.P.
NOMBRE: Ing. FRANCISCO VIOLA R
CARGO: Responsable Control de Energía Territorio

Ana T. Cortina R.
INTERVENTORIA: QBM2
NOMBRE: ANA TERESA CORTINA
CARGO: Directora Operativa
Vobo. 25/06/2025

Anexo 61. Seguridad Social de Interventoría - Planilla integral – SOI **7975404778**

Pago: 17/06/2025

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800008788
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			QBM INGENIERIA ELECTRICA SA
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	CANAPOTE CALLE 20 DE JULIO	TELÉFONO:	6660174
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI


DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	7975404778	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: mayo	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/06/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1560473128	

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	3	$ 1.996.500
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 3.343.000
8002248088	230301	230301-PORVENIR	3	$ 1.095.600
		SUBTOTAL:	11	**$ 6.435.100**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3	$ 385.800
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3	$ 343.900
8060083947	EPS048	MUTUAL SER EPS-S	1	$ 198.800
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	4	$ 662.000
		SUBTOTAL:	11	**$ 1.590.500**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8904800237	CCF08	CCF08-COMFENALCO CARTAGENA	11	$ 1.590.500
		SUBTOTAL:	11	**$ 1.590.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002261753	14-25	14-25-COLMENA	11	$ 1.210.800
		SUBTOTAL:	11	**$ 1.210.800**

VALOR SIN MORA:	$ 10.826.900
VALOR MORA:	$ 0
TOTAL PAGADO:	$ 10.826.900

2025/06/17 9:45 AM USUARIO: SOI - CC45452595 PÁGINA 1 DE 1

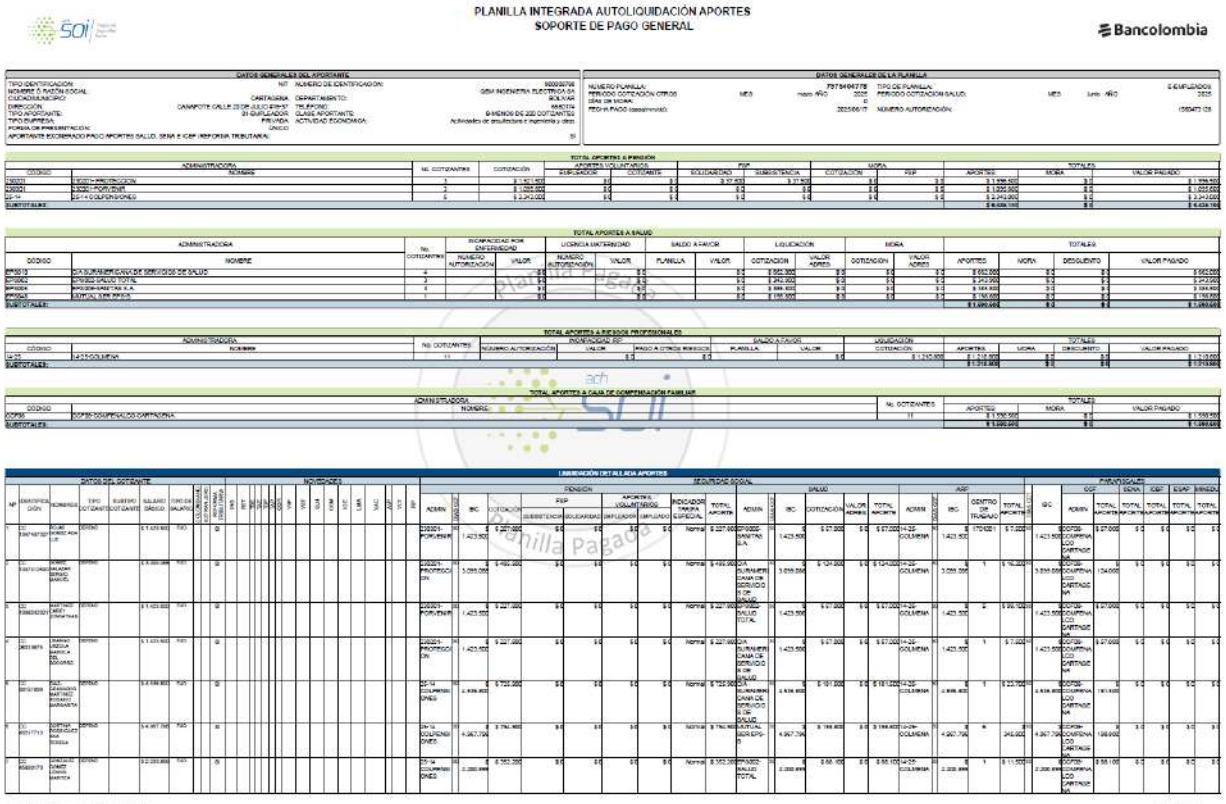

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACION:	900030706
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			GSM INGENIERIA ELECTRICA SA
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCION:	CANAPOTE CALLE 29 DE JULIO #34-37	TELEFONO:	6602174
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	0-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACION:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:	7373494778	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACION OTROS SENA DE SOCIAL:	MES mayo AÑO 2026	PERIODO COTIZACION SALUD:	MES junio AÑO 2026		
DIAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaammdd):	20260617	NUMERO AUTORIZACION:			168471128

TOTAL APORTES A PENSION

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CODIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PROTECCION	1	$ 1.421.500	$ 0	$ 0	$ 27.400	$ 27.400	$ 0	$ 0	$ 1.396.500	$ 0	$ 1.396.500
230201	230201-PORVENIR	1	$ 1.055.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.055.600	$ 0	$ 1.055.600
52-14	52-14-COLPENSIONES	6	$ 2.471.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.471.000	$ 0	$ 2.471.000
SUBTOTALES:										$ 4.439.100	$ 0	$ 4.439.100

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	VALOR APORTE	COTIZACION	VALOR APORTE	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS013	EPS SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 662.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 662.300	$ 0	$ 0	$ 662.300
EPS042	EPS042 SALUD TOTAL	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 474.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 474.300	$ 0	$ 0	$ 474.300
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 399.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 399.400	$ 0	$ 0	$ 399.400
EPS041	COMFAMILIAR HUILA	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 150.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 150.500	$ 0	$ 0	$ 150.500
SUBTOTALES:										$ 1.686.500		$ 0	$ 1.686.500	$ 0	$ 0	$ 1.686.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD EG		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTRO PERIODO	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-03	14-03-COLMENA	11		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.215.000	$ 1.215.000	$ 0	$ 0	$ 1.215.000
SUBTOTALES:									$ 1.215.000	$ 0	$ 0	$ 1.215.000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CODIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF50	CCF50-COMFENALCO CARTAGENA	11	$ 1.550.900	$ 0	$ 1.550.900
SUBTOTALES:			$ 1.550.900	$ 0	$ 1.550.900

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE | NOVEDADES | SEGURIDAD SOCIAL | PARAFISCALES

| NP | IDENTIFICACION | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | DÍAS COTIZADOS | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IBC | PENSIÓN ADMIN | PENSIÓN IBC | PENSIÓN COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | PENSIÓN TOTAL APORTE | SALUD ADMIN | SALUD IBC | SALUD COTIZACIÓN | SALUD VALOR ADRES | SALUD TOTAL APORTE | ARP ADMIN | ARP IBC | ARP CENTRO DE TRABAJO | ARP TOTAL APORTE | PARAFISCALES IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINED TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

Anexo 62. Informe de facturación y recaudo del impuesto de alumbrado público del mes de mayo 2025 – liquidado por AFINIA (operador local)

AFINIA - CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.

JEFATURA TERRITORIAL : BOLIVAR NORTE

LIQUIDACIÓN REMANENTE DE IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO A FAVOR DEL MUNICIPIO: CARTAGENA

NIT: 89048018-4

SEGÚN CONVENIO DE SUMINISTRO ENERGÍA CON DESTINO AL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

Realizada el: 13/06/2025 Con informes de facturación y recaudo del impuesto correspondientes al mes de: MAYO_2025

Valor facturación del impuesto de alumbrado público CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., del mes de: Mayo_2025	$	4.043.133.935
Ajustes Aplicables:		
Concepto Ajuste:		
TOTAL FACTURACIÓN:		$ 4.043.133.935
Valor recaudado del impuesto de alumbrado público CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., del mes de: Mayo 2025	$	3.928.060.007
Ajustes Aplicables:		
Concepto Ajuste:		
TOTAL RECAUDOS		$ 3.928.060.007
Valor facturación de energía al servicio de alumbrado público municipio de: CARTAGENA	$	1.626.844.370
Correspondiente al consumo de: MAYO_2025 NIC: 4900215		
Ajustes Aplicables:		$ 0
Cuota de convenio:		$ 0
Abono a cartera energía:		$ 0
Otros cargos y/o cuota diferimiento:	$	62.877.120
TOTAL FACTURACIÓN DE ENERGÍA Y OTROS CARGOS		$ 1.689.721.490
VALOR A CRUZAR CON EL RECAUDO DEL IMPUESTO		$ 1.689.721.490

Observacion: LOS CARGOS DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y AP ZONA NORTE ASCIENDEN A:

Valor Escenarios Deportivos Cartagena	$ 51.119.090	Alumbrado Público Zona Norte de Cartagena	$ 11.758.030

VALOR A TRASLADAR AL MUNICIPIO / DISTRITO DE: CARTAGENA $ 2.238.338.517

DATOS CUENTA DE GIRO

Nombre y Apellidos: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA CARTAGENA - ALUMBRADO PÚBLICO

Banco: BANCO DE OCCIDENTE

Cuenta: Ahorros - No 831-80765-6

NIT: 890.480.184-4

Nombre Autorizante: WILLIAM CORONELL NIETO

Cargo: Subgerente Mercadeo y Ventas (e)

MO.00004.EF-FO.05
Ed. 01

Anexo 63. Liquidación de Energía – junio 2025 (correspondiente al mes de mayo 2025)



Información Operador de Red:
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P.
Carrera 13B # 26 - 78 Piso 3
Teléfonos: 018000913737 - 6056502110
Correo Electrónico:
www.afinia.com.co

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A. E.S.P.
NIT: 901.380.949 1
Oficina Telefónica 24 Horas: 018000913737 6056502110
Dirección: Carrera 13B # 26 78 Piso 3 Cartagena
www.afinia.com.co

Información del cliente

Cliente ALUMBRADO PUBLICO CARTAGENA
NIT o C.C.: 8060057684 NIC Cliente: 4900215 NIU: 18119267
Dirección de envío: SECTOR PLAZA DE LA ADUANA, ALUM 1
Dirección de planta:
Municipio: CARTAGENA Departamento BOLIVAR
Contrato N°: OFEAMNR-0111-2022 Ejecutivo de Venta ANDRES FELIPE NAVARRO MERCADO
Uso: ALUMBRADO PUBLICO N2 Nivel de tensión: II 13.2 KV Propiedad Cliente

Información de este documento

Documento equivalente N°: CA22102505789811
Ciudad y fecha: CARTAGENA / 11 - 06 - 2025
Período facturado: 01 - 05 - 2025 al 31 - 05 - 2025
Días facturados: 31
Pagar antes del: 27 - 06 - 2025
Tasa de interés por mora: 2.20
Id Cobro: 4900215624-34
Interés por mora equivalente a la tasa legal migratoria vigente en la fecha de efectuarse el pago, certificada por la Superintendencia Financiera

Calidad de la energía

Circuito / Transformador
Circuito: BOCA GRANDE 1 Código: 0 Grupo Calidad: 1 DIU: 0 DIUG: 0 FIU: 0 FIUG: 0

Detalle del cobro

Conceptos facturados	Valores
GENERACION	892,369,567.31
COMERCIALIZACION	24,672,721.30
TRANSPORTE NACIONAL	125,365,334.43
TRANSPORTE REGIONAL	311,611,527.03
OTROS CARGOS REGULADOS	168,442,674.30
PERDIDAS RECONOCIDAS	92,382,544.10
Aproximacion A Decenas Energia	1.33
SUBTOTAL ENERGIA	1,626,844,370
SUBTOTAL COBROS OTRAS ENTIDADES	
FACTURAS ANTERIORES POR PAGAR	
TOTAL FACTURACION MES	1,626,844,370
SALDO ACTUAL	1,626,844,370

Esta factura no incluye valor de la compensación de calidad, la cual será incluida en la próxima facturación

Esto te interesa

Somos grandes contribuyentes según resolución No 00220 del 26 de diciembre de 2022, abstenerse de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta mérito ejecutivo, Art. 130 Ley 143 de 1994. Para todos los efectos el presente se denominará "Documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con lo establecido en el dur 1625 de 2016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplados en el capítulo VI de la ley 142 de 1994.

SON: UN MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE
Saldo Actual: UN MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

Representante legal:

Realice sus pagos en Bancolombia o Banco de Bogotá
Cualquier inquietud favor comunicarse al teléfono 018000-913732 con su ejecutivo de ventas

Cliente	NIC	ID. de Cobros	Documento N°.	Período facturado
ALUMBRADO PUBLICO CARTAGENA	4900215	4900215624-34	CA22102505789811	01-05-2025 al 31-05-2025

Pagar Antes de
27-06-2025
Total a pagar mes
1,626,844,370

(415)7709998169074(8020)4900215624034O(3900)1626844370(96)20250627

Consignese a Favor no colocar sellos sobre el código de barras

Documento equivalente electrónico

N. factura: CA22102505789811
Fecha: 2025-06-11
Hora: 2:29:59-12:00
NIT: 01380949
Documentos: 90480184

CUDE: 4bfa6e317daa73b210909b34e8365ce350fd877312b87f21b65f3a61851b2844345 21869f1694edc959ecaada

Documento validado por la DIAN

afinia
Grupo-epm

Formato 1: Detalle de documento equivalente

Información del cliente	
Cliente:	ALUMBRADO PUBLICO CARTAGENA
NIT o C.C:	8060057684
NIC Cliente:	4900215

Consumos	G = Generación			CO = Comercialización			P = Pérdidas	
	Contratada a precio fijo			Contratada a precio fijo				
Consumo Energía Activa Nivel de Tensión II 13.2 KV	0		Total a pagar generación (G)			Total a pagar comercialización (CO)	Tarifa	Total
	Energía comprada kWh-Mes	Precio contrato actualizado con IPP	Subtotal en pesos ($)	Energía comprada kWh-Mes	Precio contrato actualizado con IPP	Subtotal en pesos ($)		
2,365,823	2,365,823	377.1	892,369,567	2,365,823	15.50	36,672,721	36,672,721	39.05	92,382,544

T=Transporte Nacional				D=Transporte Regional			
Franja horaria	Consumo kWh-Mes	Valor del peaje $/kWh	Subtotal a pagar $	Franja horaria	Consumo kWh-Mes	Valor del peaje $/kWh	Subtotal a pagar $
Máxima	591,456	59.03	34,914,731	Máxima	591,456	131.71	77,902,882
Media	788,608	54.69	43,130,480	Media	1774,367	131.71	233,708,645
Mínima	985,760	48.00	47,320,123	Mínima			
Total Transporte Nacional	2365,824	52.99	125,365,334	Total Transporte Nacional	2365,823	131.71	311,611,527

O=Otros cargos regulados				Contribución		R= Cobro Energía Reactiva Inductiva		
Descripción	Consumo horas generación kWh	Valor $/kwh	Subtotal a pagar $	% de Ley	20.00	Energía Activa kWh	Energía Reactiva kvarh	Penalización Kvarh Cobrado
Restricciones + Cprog	2,365,823	71.19	168,442,675	G+CO+P+T+D+O	0	2,365,823	0	0
						Tarifa por Kvarh		0.00
Total otros cargos reg.			168,442,675	Total	0	Total a pagar por Energía Reactiva Inductiva:		0

Registro Histórico

	Promedio (Últimos 6 meses)	2024 - 12	2025 - 01	2025 - 02	2025 - 03	2025 - 04	2025 - 05
Energía Activa kWh/mes	2,337,338	2,388,226	2,388,225	2,204,026	2,388,224	2,289,509	2,365,823
Energía reactiva kVArh	0	0	0	0	0	0	0
Demanda máxima kW	6,423	6,420	6,420	6,560	6,420	6,360	6,360
Factor de Potencia	1.000						
Factor de Carga	0.000						
Tarifa promedio sin contribución	687.6						
Tarifa promedio ($/kWh)	687.6						
IPP de Referencia	183.77						

Variable M: Variable dada de acuerdo con las resoluciones CREG 015 de 2018 y CREG 199 de 2019. Podrá variar entre 1 y 12, afectando el valor a pagar por Energía reactiva inductiva y capacitiva.
M= 1

El valor de Otros Cargos Regulados (71.19 $/kWh) incluyo para el Operador de Red: CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P.
Incluyo: RESTRICCIONES: 65,38 $/kWh CPROG: 5,82



RELACION VALORADA ESCENARIOS DEPORTIVOS Y FACTURAS DE ENERGIA AP - MAYO_2025

NIC	NOMBRE	SIMBOLO VARIABLE	VALORES AP
ESCENARIOS DEPORTIVOS CARTAGENA			
1264090	ESTADIO ARGEMIRO BERMUDEZ	1264090374	$ 6.018.690
4317142	PISTA DE PATINAJE CAMPESTRE 1	4317142355	$ 1.119.510
6504164	ARQ, DE CARTAGENA	6504164307	$ 1.469.950
6528439	ESTADIO DANIEL LEMAITRE	6528439270	$ 312.250
6534632	ESTADIO DE ALAMEDA	6534632302	$ 33.307.430
6560383	PISTA DE PATINAJE CAMPESTRE 2	6560383297	$ 536.050
6595317	CANCHA VILLA RUBIA	6595317294	$ 1.674.040
6610165	ESTADIO DE BLAZ DE LEZO	6610165296	$ 154.430
6621899	PISTA AUXILIAR ATLETISMO	6621899293	$ 1.022.770
6823300	CANCHA COLOMBIANITOS	6823300260	$ 143.490
7541723	ESTADIO DE PASACABALLO	7541723221	$ 1.546.850
7809739	PASEO PEATONAL BOCAGRANDE 1	7809739142	$ 792.300
7809742	PASEO PEATONAL BOCAGRANDE	7809742140	$ 1.139.140
7809667	CANCHA DE SOFBOLL SAN FRANCISCO	7809667144	$ 198.550
7875503	PROYECTO CIUDAD JARDIN	7875503125	$ 1.683.640
			$ 51.119.090
ALUMBRADOS PÚBLICOS ZONA NORTE CARTAGENA			
7769303	ALUMBRADO PUBLICO ZONA NORTE	7769303166	$ 2.001.840
7769312	ALUMBRADO PUBLICO ZONA NORTE	7769312157	$ 154.530
7769313	ALUMBRADO PUBLICO ZONA NORTE	7769313154	$ 575.710
7769315	ALUMBRADO PUBLICO ZONA NORTE	7769315158	$ 539.190
7769316	ALUMBRADO PUBLICO ZONA NORTE	7769316158	$ 1.026.670
7769317	ALUMBRADO PUBLICO ZONA NORTE	7769317159	$ 620.530
7769320	ALUMBRADO PUBLICO ZONA NORTE	7769320161	$ 2.825.440
7775497	ALUMBRADO PUBLICO ZONA NORTE	7775497159	$ 1.261.000
7775498	ALUMBRADO PUBLICO ZONA NORTE	7775498160	$ 2.097.990
7775499	ALUMBRADO PUBLICO ZONA NORTE	7775499153	$ 655.130
			$ 11.758.030
ENERGIA ALUMBRADOS PUBLICOS MUNICIPALES			
4900215	CARTAGENA	4900215623	$ 1.626.844.370

Anexo 64. Informe de facturación y recaudo del impuesto de alumbrado público del mes de junio 2025 – liquidado por AFINIA (operador local)

AFINIA - CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.

JEFATURA TERRITORIAL : BOLIVAR NORTE

LIQUIDACIÓN REMANENTE DE IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO A FAVOR DEL MUNICIPIO: **CARTAGENA**

NIT: 89048018-4

SEGÚN CONVENIO DE SUMINISTRO ENERGÍA CON DESTINO AL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

Realizada el: 16/07/2025 Con informes de facturación y recaudo del impuesto correspondientes al mes de: JUNIO_2025

Valor facturación del impuesto de alumbrado público CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., del mes de: Junio_2025	$	3.985.123.843
Ajustes Aplicables:		
Concepto Ajuste:		
TOTAL FACTURACIÓN:		**$ 3.985.123.843**
Valor recaudado del impuesto de alumbrado público CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., del mes de: Junio 2025	$	3.656.561.615
Ajustes Aplicables:		
Concepto Ajuste:		
TOTAL RECAUDOS		**$ 3.656.561.615**
Valor facturación de energía al servicio de alumbrado público municipio de: CARTAGENA	$	1.545.771.900
Correspondiente al consumo de: JUNIO_2025 NIC: 4900215		
Ajustes Aplicables:		$ 0
Cuota de convenio:		$ 0
Abono a cartera energía:		$ 0
Otros cargos y/o cuota diferimiento:	$	44.579.700
TOTAL FACTURACIÓN DE ENERGÍA Y OTROS CARGOS		**$ 1.590.351.600**
VALOR A CRUZAR CON EL RECAUDO DEL IMPUESTO		**$ 1.590.351.600**

Observacion: **LOS CARGOS DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y AP ZONA NORTE ASCIENDEN A:**

Valor Escenarios Deportivos Cartagena	$ 32.821.670	Alumbrado Público Zona Norte de Cartagena	$ 11.758.030

VALOR A TRASLADAR AL MUNICIPIO / DISTRITO DE: CARTAGENA **$ 2.066.210.015**

DATOS CUENTA DE GIRO

Nombre y Apellidos: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA CARTAGENA - ALUMBRADO PÚBLICO

Banco: BANCO DE OCCIDENTE

Cuenta: Ahorros - No 831-80765-6


NIT: 890.480.184-4

Nombre Autorizante: WILLIAM CORONELL NIETO

Cargo: Subgerente Mercadeo y Ventas (e)

MO.00004.EF-FO.05
Ed. 01

Anexo 65. Liquidación de Energía – julio 2025 (correspondiente al mes de junio 2025)

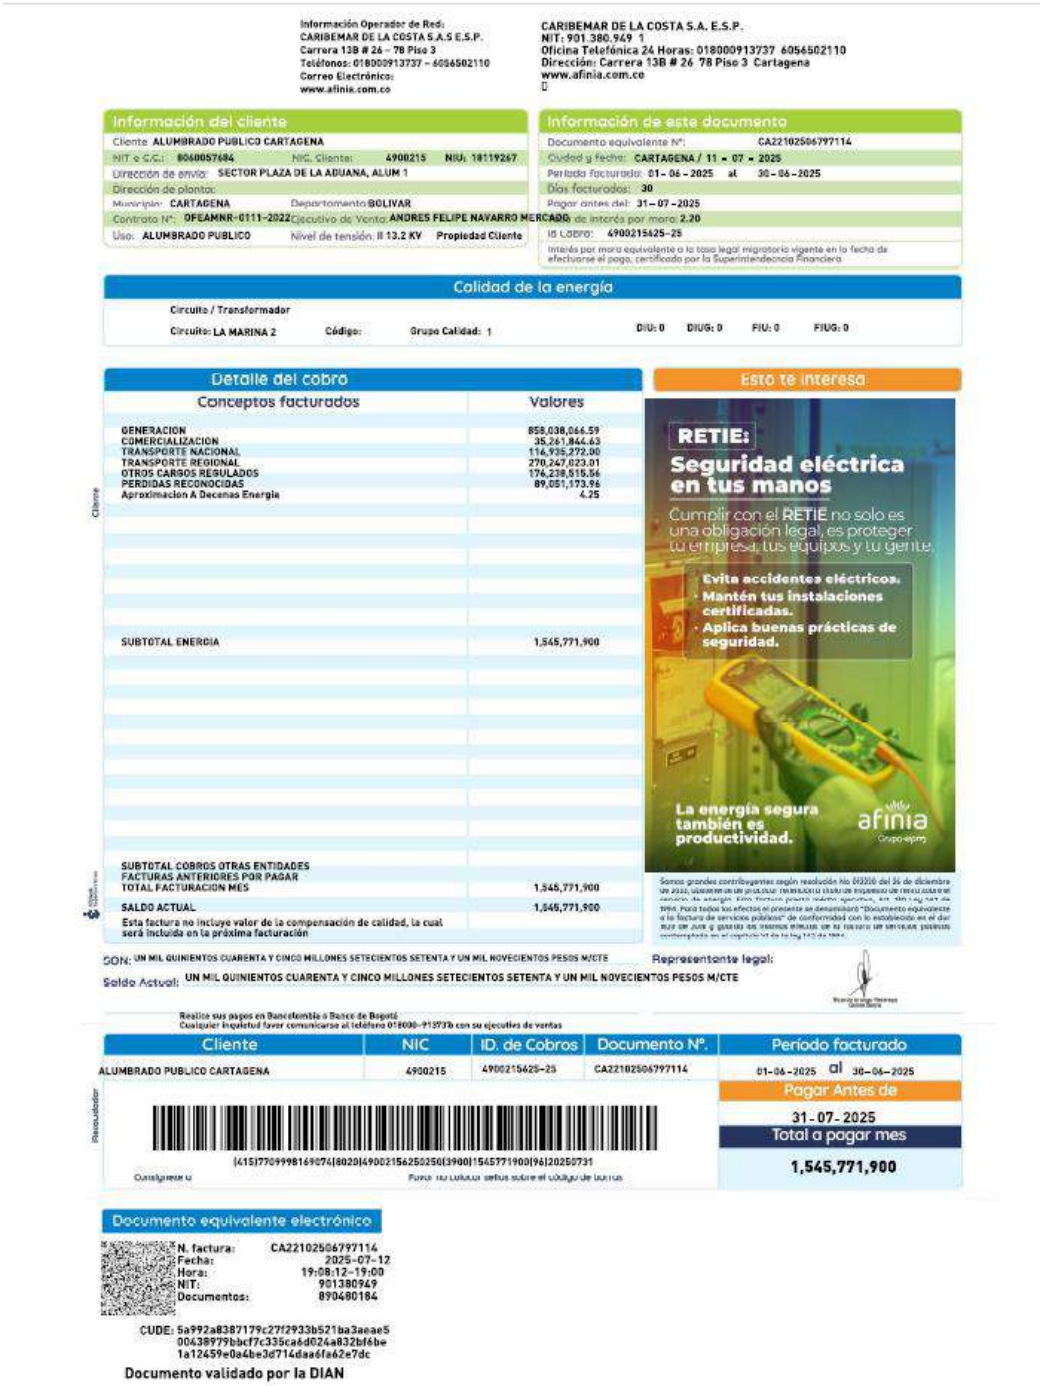

Información Operador de Red:
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P.
Carrera 13B # 26 – 78 Piso 3
Teléfonos: 018000913737 – 6056502110
Correo Electrónico:
www.afinia.com.co

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A. E.S.P.
NIT: 901.380.949 1
Oficina Telefónica 24 Horas: 018000913737 6056502110
Dirección: Carrera 13B # 26 78 Piso 3 Cartagena
www.afinia.com.co

Información del cliente

Cliente: ALUMBRADO PUBLICO CARTAGENA
NIT o C.C.: 8040057684 NIC. Cliente: 4900215 NIU: 18119267
Dirección de envío: SECTOR PLAZA DE LA ADUANA, ALUM 1
Dirección de planta:
Municipio: CARTAGENA Departamento: BOLIVAR
Contrato N°: OFEAMNR-0111-2022 Ejecutivo de Venta: ANDRES FELIPE NAVARRO MERCADO
Uso: ALUMBRADO PUBLICO Nivel de tensión: II 13.2 KV Propiedad Cliente

Información de este documento

Documento equivalente N°: CA22102506797114
Ciudad y Fecha: CARTAGENA / 11 - 07 - 2025
Periodo Facturado: 01 - 06 - 2025 al 30 - 06 - 2025
Días facturados: 30
Pagar antes del: 31 - 07 - 2025
Tasa de interés por mora: 2.20
Id Cobro: 4900215625-25
Interés por mora equivalente a la tasa legal moratoria vigente en la fecha de efectuarse el pago, certificada por la Superintendencia Financiera

Calidad de la energía

Circuito / Transformador
Circuito: LA MARINA 2 Código: Grupo Calidad: 1 DIU: 0 DIUG: 0 FIU: 0 FIUG: 0

Detalle del cobro

Conceptos facturados	Valores
GENERACION	858,038,066.59
COMERCIALIZACION	35,261,844.63
TRANSPORTE NACIONAL	114,935,272.00
TRANSPORTE REGIONAL	270,247,023.01
OTROS CARGOS REGULADOS	174,238,515.56
PERDIDAS RECONOCIDAS	89,051,173.96
Aproximacion A Decenas Energia	4.25
SUBTOTAL ENERGIA	1,545,771,900
SUBTOTAL COBROS OTRAS ENTIDADES	
FACTURAS ANTERIORES POR PAGAR	
TOTAL FACTURACION MES	1,545,771,900
SALDO ACTUAL	1,545,771,900

Esta factura no incluye valor de la compensación de calidad, la cual será incluida en la próxima facturación

Esto te interesa

Somos grandes contribuyentes según resolución No 002200 del 26 de diciembre de 2024, siendo sujetos pasivos responsables del impuesto sobre las ventas IVA en la venta de energía. Esta factura presta mérito ejecutivo, art. 130 Ley 142 de 1994. Para todos los efectos se presente se denominará "Documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con lo establecido en el Decreto 358 de 2020 y demás normas vigentes que lo regulen en servicios públicos contemplado en el capítulo VI de la ley 142 de 1994.

SON: UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

Representante legal:

Saldo Actual: UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

Realice sus pagos en Bancolombia o Banco de Bogotá
Cualquier inquietud favor comunicarse al teléfono 018000-913737b con su ejecutivo de ventas

Cliente	NIC	ID. de Cobros	Documento N°.	Período facturado
ALUMBRADO PUBLICO CARTAGENA	4900215	4900215625-25	CA22102506797114	01-06-2025 al 30-06-2025

Pagar Antes de
31-07-2025
Total a pagar mes
1,545,771,900

(415)7709998169074(8020)4900215625025O(3900)1545771900(96)20250731

Documento equivalente electrónico

N. factura: CA22102506797114
Fecha: 2025-07-12
Hora: 19:08:12-19:00
NIT: 901380949
Documentos: 890480184

CUDE: 5a992a8387179c27f2933b521ba3aeae5
00438979bbcf7c335ca6d024a832bf6be
1a12459e0a4be3d714daa6fa62e7dc

Documento validado por la DIAN

afinia
Grupo·epm

Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. NIT. 901.380.949-1

Formato 1: Detalle de documento equivalente

Información del cliente

Cliente:	ALUMBRADO PUBLICO CARTAGENA
NIT o C.C:	8060057494
NIC Cliente:	4900215

Consumos	G = Generación (Liquidación de Energía)			CO = Comercialización			P = Pérdidas (Reconocidas)	
	Contratada a precio fijo			Contratada a precio fijo				
Consumo Energía Activa Nivel de Tensión II 13.2 KV	0		Total a pagar generación (G)			Total a pagar comercialización (CO)	Tarifa	Total
	Energía comprada kWh-Mes	Precio contrato actualizado con IPP	Subtotal en pesos ($)	Energía comprada kWh-Mes	Precio contrato actualizado con IPP	Subtotal en pesos ($)		
2,289,506	2,289,506	374.7	858,038,067	2,289,506	15.40	35,261,845	38.90	89,051,174

T=Transporte Nacional				D=Transporte Regional			
Franja horaria	Consumo kWh-Mes	Valor del peaje $/kWh	Subtotal a pagar $	Franja horaria	Consumo kWh-Mes	Valor del peaje $/kWh	Subtotal a pagar $
Máxima	572,376	56.90	32,566,787	Máxima	572,376	118.04	67,561,756
Media	763,169	52.71	40,230,316	Media	1717,129	118.04	202,685,267
Mínima	953,961	46.27	44,138,168	Mínima			
Total Transporte Nacional	2289,506	51.07	116,935,271	Total Transporte Nacional	2289,505	118.03	270,247,023

O=Otros cargos regulados				Contribución		R= Cobro Energía Reactiva Inductiva		
Descripción	Consumo Energía generación kWh	Valor $/kWh	Subtotal a pagar $	% de Ley	0.00	Energía Activa kWh	Energía Reactiva kVarh	Penalización kVarh Cobrado
Restricciones + Cprog	2,289,506	76.97	176,238,516	G+CO+P+T+D+O	0	2,289,506	0	0
						Tarifa por kVarh:		0.00
Total otros cargos reg.			176,238,516	Total:	0	Total a pagar por Energía Reactiva Inductiva:		0

Registro Histórico

	Promedio Últimos 6 meses	2025 - 01	2025 - 02	2025 - 03	2025 -04	2025 - 05	2025-06
Energía Activa kWh/mes	2,320,885	2,388,225	2,204,026	2,388,224	2,289,509	2,365,823	2,289,506
Energía reactiva kVArh	0	0	0	0	0	0	0
Demanda máxima kW	6,412	6,420	6,560	6,420	6,360	6,360	6,360
Factor de Potencia	1,000						
Factor de Carga	0,000						
Tarifa promedio sin contribución	675,1						
Tarifa promedio ($/kWh)	675,1						
IPP de Referencia	182,59						

Variable M: Variable dada de acuerdo con las resoluciones CREG 015 de 2018 y CREG 199 de 2019. Podrá variar entre 1 y 12, afectando el valor a pagar por Energía reactiva inductiva y capacitiva.
M= 1

El valor de Otros Cargos Regulados (76.97 $/kWh) incluye para el Operador de Red: CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P.
incluye: RESTRICCIONES: 88.23 $/kWh CPROG: -11.25



Anexo 66. Seguridad Social de Interventoría - Planilla integral – SOI **7979656641**

Pago: 16/07/2025

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800008788
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			QBM INGENIERIA ELECTRICA SA
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	CANAPOTE CALLE 20 DE JULIO	TELÉFONO:	6660174
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI


DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	7979656641	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/07/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1632427563	

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	3	$ 1.996.500
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 3.343.000
8002248088	230301	230301-PORVENIR	3	$ 1.095.600
		SUBTOTAL:	11	**$ 6.435.100**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3	$ 385.800
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3	$ 343.900
8060083947	EPS048	MUTUAL SER EPS-S	1	$ 198.800
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	4	$ 662.000
		SUBTOTAL:	11	**$ 1.590.500**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8904800237	CCF08	CCF08-COMFENALCO CARTAGENA	11	$ 1.590.500
		SUBTOTAL:	11	**$ 1.590.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002261753	14-25	14-25-COLMENA	11	$ 1.210.800
		SUBTOTAL:	11	**$ 1.210.800**

VALOR SIN MORA:	$ 10.826.900
VALOR MORA:	$ 0
TOTAL PAGADO:	$ 10.826.900

2025/07/16 11:49 AM USUARIO: SOI - CC45452595 PÁGINA 1 DE 1

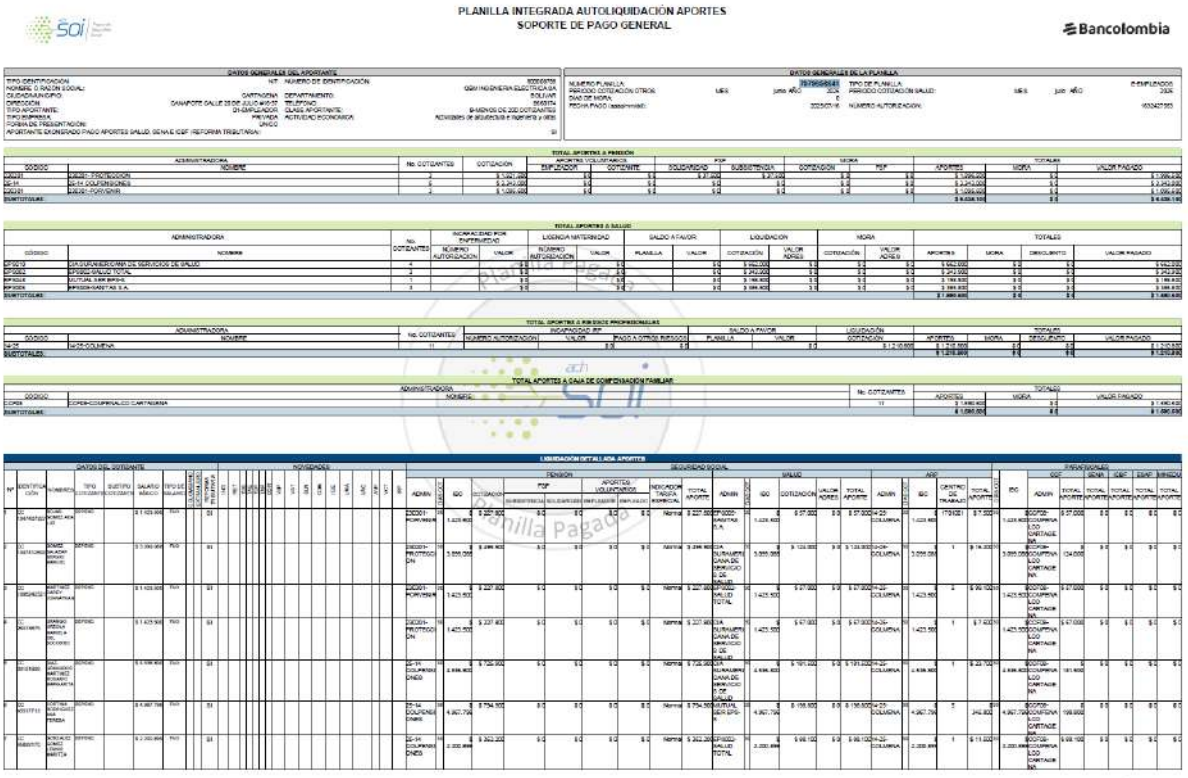

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION	NIT NUMERO DE IDENTIFICACION
NOMBRE O RAZON SOCIAL	GSM INGENIERIA ELECTRICA SA
CIUDAD/MUNICIPIO	CARTAGENA DEPARTAMENTO
DIRECCION	DANAPOTE CALLE 28 DF JULIO #35-57 TELEFONO
TIPO APORTANTE	DI-EMPLEADOR CLASE APORTANTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA
FORMA DE PRESENTACION	UNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA	TIPO DE PLANILLA
PERIODO COTIZACION OTROS	PERIODO COTIZACION SALUD
DIAS DE MORA	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	NUMERO AUTORIZACION

TOTAL APORTES A PENSION

ADMINISTRADORA CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACION	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
14237	14237 - PROTECCION	2	$ 1.047.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 87.400	$ 0	$ 0	$ 1.099.400	$ 0	$ 1.099.400
25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 3.474.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.474.000	$ 0	$ 3.474.000
14237	14237 - PROTECCION	2	$ 1.099.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.099.400	$ 0	$ 1.099.400
SUBTOTALES										$ 5.538.100	$ 0	$ 5.538.100

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACION	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACION	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACION COTIZACION	LIQUIDACION VALOR A PAGAR	MORA COTIZACION	MORA VALOR A PAGAR	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS012	EPS012 - SALUD TOTAL	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 741.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 741.000	$ 0	$ 0	$ 741.000
EPS024	EPS024 - SURA EPS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 189.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 189.900	$ 0	$ 0	$ 189.900
EPS026	EPS026 - NUEVA EPS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 189.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 189.900	$ 0	$ 0	$ 189.900
SUBTOTALES													$ 1.120.800	$ 0	$ 0	$ 1.120.800

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD ATEP NUMERO AUTORIZACION	INCAPACIDAD ATEP VALOR	PAGO A OTROS PERIODOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACION COTIZACION	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES INTERESES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
14-25	14-25 COLMENA	11		$ 0	$ 0			$ 1.210.900	$ 1.210.900	$ 0	$ 0	$ 1.210.900
SUBTOTALES									$ 1.210.900	$ 0	$ 0	$ 1.210.900

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR

ADMINISTRADORA CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF09	CCF09-COMFAMILIAR CARTAGENA	11	$ 1.090.600	$ 0	$ 1.090.600
SUBTOTALES			$ 1.090.600	$ 0	$ 1.090.600

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE | NOVEDADES | PENSION | SEGURIDAD SOCIAL | SALUD | ARP | PARAFISCALES

N°	IDENTIFICACION	NUMERO	TIPO	SUBTIPO	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLABORADOR ACTIVO	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSION ADMIN	PENSION IBC	PENSION COTIZACION	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	PENSION TOTAL APORTE	SEGURIDAD SOCIAL ADMIN	SALUD IBC	SALUD COTIZACION	SALUD VALOR AJUSTE	SALUD TOTAL APORTE	ARP ADMIN	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE	PARAFISCALES IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDUC TOTAL APORTE
1	CC	1047400962	ADAM ALBERTO ACH	3005000		$ 1.025.000	Fijo		SI								230301 - PORVENIR	16	$ 1.025.000	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	23 - SANITAS E.P.S.	16	$ 1.025.000	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	25 - COLMENA	1.025.000	1	173/521	$ 1.025.000	1.025.000	03 - COMFAMILIAR CARTAGENA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC	1051390284	JOHAN ALEXANDER ARIZA MARQUEZ	3005000		$ 3.350.000	Fijo		SI								230201 - PROTECCION	16	$ 3.350.000	$ 298.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 298.900	23 - SANITAS E.P.S.	16	$ 3.350.000	$ 134.000	$ 0	$ 134.000	25 - COLMENA	3.350.000	1	9.14.3001	$ 3.350.000	3.350.000	03 - COMFAMILIAR CARTAGENA	$ 134.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC	1064942152	MARTINEZ GANEM JONATHAN	3005000		$ 1.425.500	Fijo		SI								230301 - PORVENIR	16	$ 1.425.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	23 - SANITAS E.P.S.	16	$ 1.425.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	25 - COLMENA	1.425.500	1	9.14.1001	$ 1.425.500	1.425.500	03 - COMFAMILIAR CARTAGENA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC	1064938870	ZAMBRANO ARIZA MARIA ALEJANDRA	3005000		$ 1.425.500	Fijo		SI								230301 - PROTECCION	16	$ 1.425.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	23 - SANITAS E.P.S.	16	$ 1.425.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	25 - COLMENA	1.425.500	1	$ 17.400	$ 1.425.500	1.425.500	03 - COMFAMILIAR CARTAGENA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC	1001218200	DIAZ ALEJANDRO MARTINEZ	3005000		$ 5.696.800	Fijo		SI								14-21 COLPENSIONES	16	$ 5.696.800	$ 729.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 729.900	23 - SANITAS E.P.S.	16	$ 5.696.800	$ 181.600	$ 0	$ 181.600	25 - COLMENA	5.696.800	1	$ 29.700	$ 5.696.800	5.696.800	03 - COMFAMILIAR CARTAGENA	$ 181.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC	1003177111	CORTES RODRIGUEZ TERESA	3005000		$ 6.957.700	Fijo		SI								25-14 COLPENSIONES	16	$ 6.957.700	$ 754.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 754.900	23 - MUTUAL SER E.P.S.	16	$ 6.957.700	$ 199.600	$ 0	$ 199.600	25 - COLMENA	6.957.700	1	242.800	$ 6.957.700	6.957.700	03 - COMFAMILIAR CARTAGENA	$ 199.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC	1064937511	GONZALEZ CAMEJO MARIA ANGELA	3005000		$ 2.200.000	Fijo		SI								25-14 COLPENSIONES	16	$ 2.200.000	$ 302.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 302.200	23 - SANITAS E.P.S.	16	$ 2.200.000	$ 99.100	$ 0	$ 99.100	25 - COLMENA	2.200.000	1	$ 13.200	$ 2.200.000	2.200.000	03 - COMFAMILIAR CARTAGENA	$ 99.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

2024/07/16 11:50 AM USUARIO: SOI CC:0 NA:0 PAGINA 1 DE 2

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia



TOTAL PAGADO: $ 10.826.900

Planilla Pagada

2024/07/16 11:50 AM USUARIO: SOI CC:0 NA:0 PAGINA 2 DE 2
