AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 6200.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: 1 de 3

UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS			**FECHA:**	11 de agosto de 2025
Semana No.	**56**	**Del :**	2 de agosto de 2025	**al**	8 de agosto de 2025

Plazo total	456	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	388	días	**Tiempo restante**	68 días
Porcentaje transcurrido desde que inicio el contrato	85.09%			
Nombre del Supervisor :	OMAR ESTEVEZ ROJAS			

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE ENERGIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF)

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

A partir del informe 36, se reporta la ejecución presupuestal, teniendo en cuenta el plan de contigencia No. 2, aprobado al contratista, para la nivelación de la ejecución, cuyo plazo de monitoreo se determina hasta el 16 de mayo de 2025. De acuerdo con esto, se ajustaron los porcentajes y valores acumulados, que para el informe semanal 56, reporta lo siguiente:

	Semanal	Acumulado		Semanal		Acumulado
(%) Programado	0.39%	91.64%	**(%) Ejecutado**	0.77%		71.44%
Valor programado ($)	$9,687,327.00	$2,265,082,975.08	**Valor ejecutado ($)**	$18,946,629.00		$1,765,863,486.19
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto/Atraso**		-20.20%
				Valor Adelanto/Atraso		-$ 499,219,488.89

OBSERVACIONES

Teniendo en cuentael plan de contenegia No. 2, aprobadoal contratista, se las actividades que ya se encutrna programadas para ejecución, se reporta el sigueitne estado y porcentaje:

ACTIVIDAD	PROG. ACUM	EJEC. ACUM	DIF.	ESTADO
OBRA CIVIL	**99.66%**	**88.05%**	**-11.62%**	**En ejecución con retrasos**
Estudio de suelos y diseño estructural (área de construcción)	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Revisión de Diseños, Apropiación de los mismos por parte del contratista y Aprobación documental por parte de Interventoría	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Localización y replanteo con equipo topográfico	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Campamento 18 M2	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Descapote manual e prom = 20 cm y apile a 50 metros	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Dia de trasiego - 2 ayudantes	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Excavacion manual en material comun entre 0 - 2 m de profundidad	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Relleno en material tipo recebo o similar -compactado mecanicamente al 95% PM	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Cargue manual, transporte y disposicion final de escombros a una distancia maxima de 10 km	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 2000 psi, e= 0.05 para solado de limpieza	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi, para zapatas, (No incluye refuerzo)	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi, para vigas de amarre , (No incluye refuerzo)	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para placa de piso maciza esp= 10 cm	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Suministro, transporte e instalacion de acero de refuerzo 60.000 psi, incluye corte, flejado y amarre	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Suministro, transporte e instalacion de malla electrosoldada, incluye corte, flejado y amarre	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Corte de losa de piso e= 3 cm	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Sellado de junta de construcción con sikaflex-401 pavement sl. o similar ancho junta 6mm	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Construccion de placa aligerada en concreto de 4000 psi impermeabilizado (Incluye placa superior e= 15 cm, cuantia concreto = 0.31m3/m2 -según diseño) (no incluye	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 4000 psi para vigas aereas. (No incluye refuerzo)	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 4000 psi para columnas. (No incluye refuerzo)	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Pulida de piso con allanadora de concreto tipo helicóptero, incluye acabado con color según diseño y sellador	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Piso en Porcelanato. Artik Blanco Cara Unica, Formato (0,56 M x 0,56 M).	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Bloque de concreto liso gris Dim. 12X19X39 cm o similar	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Remates en concreto de 2500 psi (15x20 cm)	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Bordillo de remate para placa de cubierta en bloque de concreto liso gris Dim. 12X19X39 cm o similar	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Alistado de superficie con mortero impermeabilizado integralmente para cubiertas y terrazas 1:3 e max.=4.0 cm	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Impermeabilizacion con sika manto -1300 flex emulsion bituminosa elastica, e= 2 mm	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Cielo Raso Fibra Mineral NAVI 610x610mm. Incluye suminsitro, transporte, instalacion, perfilería de acero galvanizado, tornillería y todo lo necesario para su correcta	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Pañete liso muros 1:4, e=1.5 cm	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Pintura sobre muro - vinilo tipo 1, a tres manos	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Pintura epoxica, a tres manos (baño)	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Estuco plastico acrilico	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Suministro, transporte e instalación de marco y puerta sencilla batiente, en lamina de triple de 15 mm, entamborado de 5 cm, bisagras en acero inoxidable, cerradura en	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Suministro, transporte e instalación de puerta ventana en vidrio templado de 10 mm, fijada a piso - techo con accesorios en acero inoxidable. Incluye puerta corrediza,	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Suministro, transporte e instalación de espejo en cristal biselado de 4 mm, anclaje con "uñas" en acero inoxidable	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Ventana termoacustica Vidrio templado 8 mm, camara de aire 9 mm y vidrio templado 6 mm.	100.00%	80.00%	**-20.00%**	**En ejecución con retrasos**
Suministro, transporte e instalación de sanitario adriático entrada superior para fluxómetro. REF. O13181001 (incluye sanitario, asiento y demás accesorios para su	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Suministro, transporte e instalación de sanitario báltica entrada posterior para fluxómetro REF. REF 113121001 (incluye sanitario, asiento y demás accesorios para su	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Suministro, transporte e instalación de orinal alongado, conexión superior 0,5 GPD. Importado Toto. 5-AA-UT104E#01. No incluye fluxometro	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Suministro, transporte e instalación de lavamanos PMR Aquajet institucional, con brazos de instalación a muros Ref: 718030001. (No incluye grifería)	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Suministro, transporte e instalación grifería con sensor city - sku: KG25CR048	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Suministro, transporte e instalación de barra de seguridad plegable Referencia 706590001	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Suministro, transporte e instalación de ducha antivandalica con regadera Tubular - REF. 754000001 O SIMILAR	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Suministro, transporte e instalación dispensador de jabón 1.2 LT cuerpo en acero inoxidable REF- 217601 (incluye accesorios de fijación)	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Suministro, transporte e instalación de dispensador de papel higiénico para rollo institucional en acero inoxidable (incluye accesorios de fijación) Ref. 706670001	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Suministro, transporte e instalación de Dispensadores de toallas para manos en acero inoxidable. REF 706150001. (incluye accesorios de fijación)	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Cañuela prefabricada Tipo A-120	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Tapa rejilla prefabricada en concreto A-124 (600x300x100)	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Empradizacion (Incluye 10 cm de tierra negra)	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Suministro e instalación de aire acondicionado Tipo Split Inverter 12.000 Btu/h.	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Suministro e instalación de aire acondicionado Tipo Split Inverter 24.000 Btu/h.	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Suministro e instalación de unidad de extracción tipo plafón de 73 cfm.	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
AVISO LED SILVANIA DIFERENTE SALIDA. Elaborada en acrílico cristal decorada con impresión digital a 1440 Dpi de resolución sobre vinilo adhesivo con luz led y	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Suministro e Instalación de Camara subterranea (Estandar Codensa CS275 Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa)	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Construccion de Canalizacion 4 ductos 4" PVC-TDP (Estandar ENEL CS209, CS205 Y CS209 - incluye demoliciones de elementos existentes, rellenos de norma,	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
Suministro e Instalación de Puerta sencilla corta fuego	100.00%	80.00%	**-20.00%**	**En ejecución con retrasos**
Suministro e Instalación de Instalación de Puerta doble corta fuego	100.00%	80.00%	**-20.00%**	**En ejecución con retrasos**
Mobiliario sala de turno	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Mobiliario Taller	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
Mobiliario de oficina	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	**97.78%**	**77.84%**	**-19.94%**	**En ejecución con retrasos**
TUBERIA PVC-S 2"	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
S/CODO PVC-S 2"	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
CODO PVC-S 2"	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
YEE PVC-S 2"	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
TEE PVC-S 2"	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
UNIÓN PVC-S 2"	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
PUNTO LAVAMANOS 2"	100.00%	25.00%	**-75.00%**	**Terminado**
PUNTO SIFÓN DUCHA 2"	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
PUNTO SIFÓN 2"	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
CAJA DE INSPECCIÓN 60x60	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
VÁLVULA ANTIRETORNO 2"	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
TRAGANTE 4"	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAV.	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
SUMINISTRO Y CONFORMACIÓN CON RECEBO	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
PUNTO SIFÓN 4"	100.00%	100.00%	**0.00%**	**Terminado**
VÁLVULA ANTIRETORNO 2"	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**
VÁLVULA DE CORTE 1"	100.00%	0.00%	**-100.00%**	**Sin iniciar**

BRIDA 1"	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
CHEQUE 1"	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
TUBERIA PVC-P 1"	100.00%	66.89%	-33.11%	En ejecución con retrasos
BUJE PVC-P 3/4" x 1/2"	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
CODO PVC-P 1/2"	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
TEE PVC-P 1/2"	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
ADAPTADOR MACHO 1/2"	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
UNIÓN PVC-P 1/2"	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
PUNTO SANITARIO 1-1/4"	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
PUNTO LAVAMANOS 1/2"	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
PUNTO DUCHA 1/2"	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
OBRA ELECTRICA (Componentes con AIU)	**100.00%**	**74.67%**	**-25.33%**	**En ejecución con retrasos**
Suministro e Instalación de Tablero iluminación y tomacorrientes (T .ILUM), sobreponer 220 V, 225 A, espacio para totalizador, 30 circuitos con puerta. Incluye	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Alimentador 3x4/0F + 2/0N + 2/0T MCM THHN/THNW	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Alimentador Flexible Reguladores 2x2F + 2T AWG HF 105°C 600 V	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e Instalación de Alimentador 3x6F + 6N + 8T MCM THHN/THNW	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e Instalación de Alimentador 3x8F + 8N + 8T MCM THHN/THNW	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e Instalación de Borna Ponchar calibre 4/0 AWG Estañada Cobre Barril Largo Doble Hueco	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e Instalación de Borna Ponchar calibre 2/0 AWG Estañada Cobre Barril Largo Doble Hueco	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e Instalación de Borna Ponchar calibre 2 AWG Estañada Cobre Barril Largo Doble Hueco	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e Instalación de Borna Ponchar calibre 4 AWG Estañada Cobre Barril Largo Doble Hueco	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e Instalación de Borna Ponchar calibre 6 AWG Estañada Cobre Barril Largo Doble Hueco	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e Instalación de Borna Ponchar calibre 8 AWG Estañada Cobre Barril Largo Doble Hueco	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e Instalación de Conductor de puesta a tierra 2/0 AWG Cu	100.00%	57.50%	-42.50%	En ejecución con retrasos
Suministro e instalación de Electrodo de puesta a tierra (cobre-cobre 2,4 m*5/8")	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Soladura de puesta a tierra (cable-cable / cable-varilla)	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Punta captadora apantallamiento 0,6 m	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Alambre apantallamiento Al 8 mm	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Caja de puesta a tierra (sin soldadura, ni electrodo)	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Conductor de puesta a tierra apantallamiento 1/0 AWG CU	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de bandeja portacable tipo escalera en Aluminio, Ancho 50 x alto 10 cm, Incluye tapa, curvas, accesorios y soportes.	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Barraje de puesta a tierra, soportes y aisladores	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Tuberia IMC 3/4" con soportes cada 3 metros (incluye terminal)	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Circuito electrico 3x12 AWG Cu THHN	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e instalación de Conduleta NEMA 4, 3/4".	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e Instalación de Caja Fundición Aluminio 5800	100.00%	23.33%	-76.67%	En ejecución con retrasos
Suministro e Instalación de Luminaria Sylvania Hermetica 40 W	100.00%	68.75%	-31.25%	En ejecución con retrasos
Suministro e Instalación de Tomacorrente doble 15 A 125 V	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Union erickson IMC 3/4"	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e Instalación de Reflector Sylvania IP65 50 W	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Salida para Toma de datos categoria 6, Toma RJ45, Faceplate, Caja aluminio, Marcacion externa y Codificacion de Cable con cinta impresa.	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Tuberia EMT 3/4" con soportes cada 3 metros (incluye terminal)	100.00%	45.33%	-54.67%	En ejecución con retrasos
Suministro e Instalación de Conduleta EMT 3/4"	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e Instalación de Cable UPT Cat 6	100.00%	15.67%	-84.33%	En ejecución con retrasos
Suministro e Instalación de Bandeja portacable tipo canastilla de 200mm x 54mm con accesorios de unión, derivación y montaje.	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Cable 6 AWG Cu Desnudo para puesta a tierra bandeja comunicación, incluye conector cada 1,2 metros	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Sello Cortafuego para ductos y bandejas en Masilla moldeable 3M resistencia al fuego de 3 horas.	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e Instalación de Rack Cerrado 45U, ancho 80 cm, Fondo 1 m, Puerta Frontal y Posterior en malla microperfada, estructura Certificada UL-2416. 2 Paneles	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Patch panel, incluye 24 puertos Cat6 con RJ45, accesorios de montaje, marquillas y amarres	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e instalación de Patch Cord UTP CAT6 LEVITON, 3 m	100.00%	50.00%	-50.00%	En ejecución con retrasos
Suministro e instalación de Switch PoE 24 puertos + 2 puertos SFP 1GB, administrable Ref. RG-ES226GC-P / RUIJIE	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Bandeja fibra optica 12 hilos, incluye placa moldeado precisión SDX y conectorizacion de 12 hilos de fibra.	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Fibra optica OM4 12 hilos, montaje interior y exterior	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e instalacion de Patch Cords Duplex Multimodo OM4 LC-LC 3 metros	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e instalación de camara IP, 2MP o mejor, IP67 o mejor, IK10 o mejor, IR 30m o mejor, alimentación PoE. Resolucion 1920 × 1080.	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e instalación NVR 8CH PoE IP 8MP 2BAHIAS/6TB, SALIDA HDMI/4K.	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e instalación de Disco Duro 8TB 3.5IN	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
ENTREGA SEGUNDA FASE	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
SUMINISTRO DE EQUIPOS Y SISTEMAS (QUE INCLUYE INSTALACION - Componentes sin AIU - Solo IVA)	**99.03%**	**41.89%**	**-57.14%**	**En ejecución con retrasos**
Transformador seco aislamiento tipo F, 75 kVA, Delta / Estrella - 480/220 V, 5 TAP de 2,5%, Celda autosoportada IP 54-IK 10 h=1,6 m	100.00%	85.00%	-15.00%	En ejecución con retrasos
Transformador seco aislamiento tipo F, 75 kVA, Delta / Estrella - 220/480 V, 5 TAP de 2,5%, Celda autosoportada IP 54-10 h=1,6 m	100.00%	85.00%	-15.00%	En ejecución con retrasos
Tablero General Aerocivil 220 V - 500 A (incluye comunicación de totalizador, circuitos parciales y analizador de redes con SCADA) Caracteristicas: Tablero tipo	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
UPS trifásico 220 V - 40 kVA (escalable hasta kVA100 (Banco de baterias con autonomia de 15 min 100% carga), incluye modulo de comunicación con SCADA	100.00%	80.00%	-20.00%	En ejecución con retrasos
Equipo controlador de reactivos 30 kVA - 220 V (Generador activo electronico) incluye comunicación con SCADA, (velocidad <15 mseg, compensacion inductiva y	100.00%	50.00%	-50.00%	En ejecución con retrasos
Tablero General Ayudas Visuales 220 V - 500 A (incluye comunicación de totalizador, circuitos parciales y analizador de redes con SCADA) Caracteristicas: Tablero tipo	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Tablero Reguladores 220 V - 300 A (incluye comunicación de totalizador y circuitos parciales con SCADA) Caracteristicas: Tablero tipo metalclad, Auto soportado, Grado	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Sistema de generación solar 30 Paneles monocristalinos de 545 W, incluye; Soportes mecánicos y eléctricos de todo el sistema, todo el cableado y conexionado DC,	100.00%	50.00%	-50.00%	En ejecución con retrasos
Sistema de comunicación SCADA para el sistema eléctrico.	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e instalación de Sistema de detección y extinción contra incendios con Agente Limpio (incluye diseño, comunicación con sistema SCADA)	100.00%	78.00%	-22.00%	En ejecución con retrasos
Suministro de herramienta electrica para mantenimiento subestacion	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro de herramienta de seguridad electrica para mantenimiento	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro de Tarjeta ingreso	100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Retiro y transporte de infraestructura fuera de servicio; equipos, cables, tubos y demas. (incluye un inventario detallado de cada elemento, (igualmente medidas,	83.33%	0.00%	-83.33%	En ejecución con retrasos
TERMINACIÓN Y ENTREGA	25.00%	25.00%	0.00%	Terminado
ENTREGA PRIMERA FASE	100.00%	100.00%	0.00%	Terminado

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	CONOSRCIO CONSTRUCARIBE 2024	**Contratista:**	CONSORCIO INTERENERGIA AEROPUERTOS
Contrato No:	23001191 H4 DE 2023 -LOTE 2	**Contrato No:**	23001308 H3 DE 2023 - LOTE 2
Valor Inicial:	$ 2,471,685,007.00	**Valor Inicial:**	$ 855,375,978.00
Valor Anticipo:	$ 535,395,600	**Valor Anticipo:**	$ 0.00
Valor Actualizado al modificatorio :		**Valor Actualizado al modificatorio :**	
Valor actualizado 2:		**Valor actualizado 2:**	
Plazo inicial:	15 MESES	**Plazo inicial:**	15 MESES
Plazo actualizado:		**Plazo actualizado:**	
Fecha de iniciación:	17 de julio de 2024	**Fecha de iniciación:**	17 de julio de 2024
Fecha de vencimiento:	16 de octubre de 2025	**Fecha de vencimiento:**	16 de octubre de 2025
Modificatorio No. Prórroga No.		**Modificatorio No. Prórroga No.**	
Fecha de Terminación Según Prórroga No.		**Fecha de Terminación Según Prórroga No.**	
Suspensión No.		**Suspensión No.**	
Periodo de Suspensión No.		**Periodo de Suspensión No.**	
Levantamiento de la suspensión No.		**Levantamiento de la suspensión No.**	
Nueva fecha de terminación		**Nueva fecha de terminación**	
Valor total actual del contrato	$ 2,471,685,007	**Valor total actual del contrato**	$ 855,375,978.00

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

1. TRÁMITES DE INGRESO DE MATERIALES
2. ELABORACIÓN Y ENTREGA DE INFORME SEMANAL 55
3. REVISIÓN INFORMES SEMANALES CONTRATISTA
4. ELABORACIÓN ACTA DE COMITÉ
5. COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 52

ACTIVIDADES DIARIAS		
SABADO 2 de agosto de 2025	TURNO DIURNO 07:00 AM a 12:00 M	1. No se realizan actividades
DOMINGO 3 de agosto de 2025	TURNO DIURNO 7:00 AM a 5:00 PM	DIA NO LABORAL
LUNES 4 de agosto de 2025	TURNO DIURNO 7:00 AM a 5:00 PM	1. Reparación de campanas. 2. Instalación cielo raso-actividad suspendida por diferencias en el material que se venia instalando.
MARTES 5 de agosto de 2025	TURNO DIURNO 7:00 AM a 5:00 PM	1. Reparación de campanas.
MIERCOLES 6 de agosto de 2025	TURNO DIURNO 7:00 AM a 5:00 PM	1. Reparación de campanas. 2. Desmonte de cielo raso en area de oficina taller.
JUEVES 7 de agosto de 2025	TURNO DIURNO 7:00 AM a 17:00 PM	FESTIVO
VIERNES 8 de agosto de 2025	TURNO DIURNO 7:00 AM a 5:00 PM	1. Instalación de cielo raso

Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST

Sabado 02/08/2025
•No se realizo actividades

Domingo 03/08/2025
•Dia no laboral

Lunes 04/08/2025
•Se realiza acompañamiento SST durante la charla d seguridad tema tratado “Proteccion visual y su importancia"
• Se realiza acompañamiento SST durante la actividad reparación de campana
• Se realiza acompañamiento SST durante la actividad de instaalcion de cielo raso

Martes 05/08/2025
•Se realiza acompañamiento SST durante la charla de seguridad tema tratado “Ley 100/93- SG-SS"
• Se realiza acompañamiento SST durante las actividades de instalación de campanas .

Miercoles 06/08/2025
•Se realiza acompañamiento SST durante la charla de seguridad tema tratado “Prioridad en la tarea"
• Se realiza acompañamiento SST durante las actividades de instalación de campanas
• Se realiza acompañamiento SST durante las actividades de trasiego de materiales

Jueves 07/08/2025
•Dias Festivo

Viernes 08/08/2025
•Se realiza acompañamiento SST durante la charla de seguridad tema tratado “Promover el autocuidado en la obra"
• Se realiza acompañamiento SST durante la actividad de instaalcion de cielo raso

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL APLICADAS AL PROYECTO

Actividad en Obra	Programa de manejo ambiental	Seguimiento a la aplicación de Medidas de manejo Ambiental en obra
3. Manejo de Actividades de Construcción y Adecuación.	**MACA 4- Manejo de materiales de construcción** **MACA 6 - Control de la contaminación en la construcción.** **MACA 7 - Señalización de las áreas de construcción**	Con base en las inspecciones diarias realizadas, se verificó el cumplimiento de las siguientes condiciones en el frente de obra: - El material de construcción (Arena y Grava) presente en el frente de obra se encuentra cubierto y demarcado. - Los residuos de construcción y demolición (RCD) permanecen cubiertos en el frente de obra. - No se realizaron actividades de lavado de maquinaria ni de la mezcladora en el frente de obra. - El frente de obra cuenta con contenedores para la clasificación de residuos, conforme a la nueva codificación de colores establecida en la Resolución 2184 de 2019. - Se cuenta con una unidad sanitaria a la espera del respectivo mantenimiento -Los sitios con alto potencial de riesgo y que pueden provocar algún tipo de accidente permanecen debidamente señalizados, estos incluyen puntas expuestas, excavaciones, entre otros. Las áreas se encuentran debidamente señalizadas y demarcadas con cinta de peligro.
4. Acciones desarrolladas por la interventoría Ambiental	**Inspección y seguimiento al cumplimiento del Plan de manejo Ambiental**	En el marco de las funciones de interventoría ambiental, se realizaron inspecciones técnicas diarias en el frente de obra con el propósito de verificar la implementación de las medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) del proyecto y hacer seguimiento a las actividades de gestión ambiental. Se realizó la revisión de informe semanal presentado por el contratista. Se participó en el comité de seguimiento. Se realizó la entrega de observaciones al contratista relacionadas con el Informe de Cumplimiento Ambiental (ICA), con el fin de garantizar el adecuado cumplimiento de las obligaciones ambientales del proyecto. Adicionalmente, se brindó asesoría técnica al residente ambiental del contratista para la correcta interpretación y subsanación de dichas observaciones, orientando el ajuste de la información y la implementación de las acciones requeridas para su entrega a la entidad.


ACTIVIDADES TÉCNICAS


Durante la semana del 2 al 8 de agosto de 2025 se realizaron principalmente actividades de reparación de campanas, desmonte e instalación de cielo raso en área de taller. Se registró el ingreso de materiales como cable #8 XLPE 5kVA, puertas y marcos corta fuegos y ventanas y marcos de ventanas.


Relación de Vehículos	Relación de Equipo mayor- Maquinaria pesada	Relación de Herramienta menor y equipo adicional
Para este perdido no se reporta el ingreso del vehículo de la empresa Sani Public	NA	**Pulidora**: 1 **Sierra Circular**: 1 **Taladro Percutor: 1** **Palas**: 6
Para el periodo no se reportan novedades relacionadas con este componente	Para el periodo no se reportan novedades relacionadas con este componente	Para este periodo se reportan las descritas

Relacion del personal en obra

Personal de Interventoría	6
Personal del Contratista	9
Total Personal	15



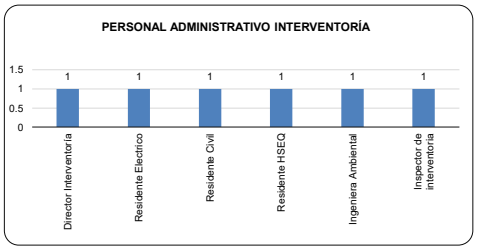



CORRESPONDENCIA ENVIADA

CS. UAAC-INT-518-096-2025 Solicitud de reactivación de obra.
CS. UAAC-INT-518-097-2025 Alcance a comunicación CS. UAAC-INT-518-076-2025 – Estado del proceso por presunto incumplimiento del contratista.
CS. UAAC-INT-518-098-2025 Entrega informe semanal 55 interventoria.

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1	del 17 de julio al 30 de noviembre de 2024	$ 72,340,149.00
2	del 01 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025	$ 234,646,711.00
3	del 1 febrero al 25 marzo de 2025	$ 280,038,868.00
4	del 26 de marzo al 31 de mayo de 2025	$ 80,433,344.00
5	01 de junio al 30 de junio de 2025	$ 251,008,143.00
Total Acumulado	**$ 918,467,215.00**	

Valor Total Contrato Obra
$ 2,471,685,007.00
Valor facturado Contrato Obra
$ 918,467,215.00
% Avance facturado Acumulado
37.16%

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORIA

Acta Parcial de interventoría No.	Periodo	Costo Total
1	del 17 de julio al 16 de agosto de 2024	$ 27,115,133.00
2	del 17 de agoto al 16 de septiembre de 2024	$ 11,466,118.00
3	del 17 de septiembre al 16 de octubre de 2024	$ 11,466,118.00
4	del 17 de octubre al 16 de noviembre de 2024	$ 11,466,118.00
5	del 17 de noviembre al 16 de diciembre de 2024	$ 27,984,159.00
6	del 17 de diciembre de 2024 al 16 de enero de 2025	$ 11,466,118.00
7	del 17 de enero al 16 de febrero de 2025	$ 64,966,531.00
8	del 17 de febrero al 16 de marzo de 2025	$ 11,466,118.00
9	del 17 de marzo al 16 de abril de 2025	$ 75,339,635.00
10	del 17 de abril al 16 de mayo de 2025	$ 11,466,117.67
11	del 17 de mayo al 16 de junio de 2025	$ 11,466,117.67
12	del 17 de junio al 16 de julio de 2025	$ 68,743,694.00
Total Acumulado	**$ 344,411,977.34**	

Valor Total Contrato interventoría
$ 855,375,978.00
Valor facturado Contrato Interventoría
$ 344,411,977.34
% Avance facturado Acumulado
40.26%

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
Acompañamiento SST durante la actividad de traseigo de materiales	Acompañamiento SST durante la actividad de instalación de cielo raso
	
Ingreso cable #8 Cu XLPE 5kV	Desmonte de cielo raso
	
Ingreso de puertas corta-fuego y marcos para puertas	Instalacion de campanas
	

Ingreso de ventanas y marcos.	Instalación de cielo raso area taller
	
Continuidad en el cubrimiento de materiales de construcción y del material RCD	

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Durante la semana se evidenció una baja ejecución de actividades debido a factores laborales, técnicos y festivos. El 2 de agosto se suspendieron las labores de obra civil por incumplimiento en el pago de salarios y seguridad social del personal de WS Obras Civiles, Constructrabie e Ingeniería. El domingo 3 fue día no laboral y el jueves 7 festivo. En los días hábiles restantes se registraron actividades puntuales como la reparación de campanas y la instalación de cielo raso, aunque esta última fue suspendida el 4 de agosto por diferencias en el material suministrado, lo que obligó a detener la tarea y solicitar el cambio. No se evidenció ingreso de personal de obras eléctricas en varias jornadas, lo que afectó el avance en este frente. Se reportaron ingresos parciales de materiales como cable #8 XLPE 5 kV, puertas corta-fuego, marcos para puertas y ventanas, así como el ingreso de algunos miembros del equipo operativo por parte de Skytech el 8 de agosto, quedando pendiente el ingreso del resto del personal. La interventoría solicitó complementar y actualizar la información para su validación. Durante la semana no se evidenció la presencia de la residente ambiental del contratista en el frente de obra, siendo su último ingreso registrado el día 28 de julio de 2025. Esta ausencia prolongada ha generado el incumplimiento en la ejecución y seguimiento de varias actividades ambientales programadas, comprometiendo el adecuado desarrollo del componente ambiental del proyecto. Según información suministrada, la ausencia de la profesional obedece a la falta de aportes a su seguridad social por parte del contratista, situación que no solo infringe la normativa laboral vigente, sino que también afecta directamente el cumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas en el Plan de Manejo Ambiental.	**ING. OMAR TRIGOS LACERA**
