ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE
MOVILIDAD

BOGOTÁ

PROGEN
PRODUCCIONES GENERALES S.A.

SEÑALVIAS S.A.S

Socinter

CONSORCIO SEÑALIZAR BOGOTÁ 2025

REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

ZONA SUR-OCCIDENTE

CONTRATO SDM 2024-3652


INFORME MENSUAL No.1.

23 DE ENERO A 22 DE FEBRERO DE 2025


VERSIÓN 1

FEBRERO DE 2025

CONTRATISTA CONSORCIO SEÑALIZAR BOGOTÁ 2025

ESTADO DE REVISIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
DISEÑÓ Y APROBÓ	Francy Paola Duarte Porras	Directora De Proyecto	
REALIZÓ	Daniela Orejuela Cruz	Ingeniero Residente	
REVISÓ	Kevin Amézquita Saavedra	Coordinador de obra	

INTERVENTORÍA CONSORCIO INTEROBRAS POSSO ALDEIC

ESTADO DE REVISIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
APROBÓ	Hugo Alfredo Posso Moncada	Director de interventoría	HUGO ALFREDO POSSO MONCADA Firmado digitalmente por HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
APROBÓ	Luis Arnaldo Grandas Olarte	Residente de interventoría	
MODIFICACIONES			
6-03-2025	V1	ATENCIÓN A OBSERVACIONES DE INTERVENTORIA	

CONTENIDO

Página

1. INTRODUCCIÓN....8
2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO....9
2.1 PÓLIZAS....10
3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO....11
4. PERIODO DEL INFORME....12
5. COMPONENTE DE OBRA....12
5.1 RECURSO HUMANO....12
5.2 EQUIPOS....14
5.3 ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO....15
5.4 BALANCE ECONÓMICO....20
5.4.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN....20
5.5 REGISTRO FOTOGRÁFICO....21
5.6 GEORREFERENCIACIÓN....35
6. ESTADO Y AVANCE PRESUPUESTAL....36
6.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS....36
7. CALIDAD DE LOS TRABAJOS....38
8. PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO....40
9. ASPECTOS TÉCNICOS....48
9.1 IDS CON GARANTÍAS INFERIORES O IGUALES A 6 MESES....50
10. ENTREGA DE SEÑALIZACIÓN A ALMACÉN....54
10.1 ENTREGA DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y DISPOSITIVOS DE CONTROL IMPLEMENTADOS....54
10.2 ENTREGA DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL RETIRADA....57

11. INFORME DE GESTIÓN SOCIAL.....57

12. INFORME DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y OCUPACIONAL.....57

13. AFECTACIÓN EN REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS.....57

14. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y JURIDICOS.....58

15. MANEJO DEL LIBRO DE OBRA (BITÁCORA) 58

16. HOJA DE VIDA DEL CONTRATO 58

17. CONCLUSIONES Y COMENTARIOS 58

18. ANEXOS 59

LISTA DE TABLAS

Página

Tabla 1. Datos generales del Contrato 9
Tabla 2. Listado de Pólizas 10
Tabla 3. Localidades con UPZ 11
Tabla 4. Equipo de trabajo profesional, tecnólogo y administrativo mínimo 12
Tabla 5. Cuadrillas mínimas para la implementación de señalización 13
Tabla 6. Equipos empleados para la ejecución de las actividades 14
Tabla 7. Instrumentos usados para el control de calidad 15
Tabla 8. Diseños Asignados para Implementación 16
Tabla 9. Cantidades Ejecutadas por ID: 17
Tabla 10. Avance Parcial y Acumulado por mes 19
Tabla 11. Suministro e Instalación de Señalización por ID: 20
Tabla 12. Estado Georreferenciación por ID: 35
Tabla 13. Estado y Avance Presupuestal del Contrato 36
Tabla 14. Actividades Ejecutadas por componente 37
Tabla 15. Planes de manejo de tránsito vigentes 40
Tabla 16. Elementos de Señalización Vertical y Dispositivos de Control Implementados 54

LISTA DE FIGURAS

Página

Figura 1. Localización Zona cuarta (6) Sur- Occidente 11
Figura 2. Ejecución acumulada para los meses 1-5.....18

ABREVIATURAS

SDM	Secretaría Distrital de Movilidad
CSB 2025	Consorcio señalizar Bogotá 2025
PMT	Plan de manejo de transito
UPZ	Unidad de Planificación Zonal

1. INTRODUCCIÓN

Con el propósito de atender las necesidades de señalización de la ciudad de Bogotá, la Secretaría Distrital de Movilidad - SDM, como autoridad de tránsito y en cumplimiento de sus funciones establecidas por el Decreto 672 del 22 de noviembre de 2018[1], se encarga de ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la señalización vertical y horizontal de la ciudad, así como los demás elementos y dispositivos que propendan por garantizar la seguridad vial, el buen uso del espacio público y la gestión del tránsito en la ciudad.

Es así que la SDM generó un programa para implementar las medidas necesarias y realizar el mantenimiento rutinario y correctivo de la señalización de la ciudad, que incluye la señalización de ciclorrutas, medidas de gestión, carriles preferenciales, carriles de alta ocupación vehicular, proyectos de urbanismo táctico, plazas, corredores verdes, distritos verdes, barrios vitales y mantener en condiciones óptimas de señalización para todos los usuarios de la vía; integrando por grupos las veinte (20) localidades y dividiendo el perímetro urbano y rural en siete (7) zonas y en quince (15) corredores principales.

En marco de este programa la SDM celebro el contrato SDM-2024-3652 con el Consorcio señalizar Bogotá 2025, el cual tiene por objeto "*realizar actividades inherentes al suministro e implementación de elementos de señalización y dispositivos de seguridad vial en la ciudad de Bogotá D.C*", para la atención integral de las actividades de implementación de señalización, donde se incluye el suministro e instalación de la señalización vertical de pedestal, la aplicación de señalización horizontal y la implementación de otros dispositivos de señalización horizontal en la malla vial de las localidad de Ciudad Bolívar y Tunjuelito y en los corredores de la AUTOPISTA SUR y AV AMERICAS, o en las zonas diferentes a la asignada en la ciudad, de acuerdo a la definición de puntos o actividades a desarrollarse que establezca el comité técnico.

En el siguiente informe mensual No 1, se presenta un resumen sobre las principales actividades de señalización vertical, horizontal e implementación y/o suministro de dispositivos viales, realizadas por el Consorcio señalizar Bogotá 2025, durante el periodo 23 de enero al 22 de febrero de 2025, en cumplimiento de los compromisos contractuales del contrato de obra SDM-2024-3652.

[1] "Por medio del cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital, de Movilidad y se dictan otras disposiciones"

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Los datos generales del contrato se muestran en la siguiente tabla, se indica que a la fecha del presente informe no se han realizado modificaciones de adición, suspensión o reinicio al contrato.

Tabla 1. Datos generales del Contrato

Número de Contrato de Obra	SDM-2024-3652.
Objeto del Contrato	REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C
Contratante:	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
Contratista	CONSORCIO SEÑALIZAR BOGOTÁ 2025
Plazo de ejecución:	34 meses
Fecha de acta de Inicio:	23 de enero 2025
Fecha de Terminación:	22 de noviembre de 2027
Valor total:	DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($18.771.473.428) suma que se discrimina de la siguiente manera Vigencia 2024: $2.815.721.00 Vigencia 2025: $ 6.209.487.857 Vigencia 2026: $ 6.423.895.143 Vigencia 2027: $ 3.322.369.428
Lugar de Ejecución	Bogotá D.C., Localidades: Ciudad Bolívar y Tunjuelito y en los corredores de la AUTOPISTA SUR y AV AMERICAS
Interventoría:	CONSORCIO INTEROBRAS POSSO-ALDEIC
Número de Contrato de Interventoría	SDM 2024-3667

Fuente: Elaboración propia

Respecto a aspectos del contrato como actas adicionales o modificaciones no se realizaron durante el periodo del presente Informe.

2.1 PÓLIZAS

Una vez firmado el contrato de Obra No. SDM-2024-3652 (del 23 de enero de 2025), entre el consorcio señalizar Bogotá 2025 y la SDM, se remitieron las pólizas emitidas por parte de la compañía Seguros del Estado SA., a la Entidad, conforme las exigencias establecidas en el contrato, las cuales fueron objeto de revisión y aprobación por parte de la SDM.
La ejecución de este contrato está amparada por las siguientes pólizas (las cuales se presentan en el Anexo 2. Pólizas) que cubren los respectivos riesgos, y se actualizaron con el acta de inicio:

Tabla 2. Listado de Pólizas

Amparo	Vigencia		Valor Asegurado	Póliza No.	Aseguradora
	Inicial	Final			
Cumplimiento	23-01-2025	23-11-2030	$ 5,631.442.029	11-44-101245385	Seguros del estado S.A.
Prestaciones sociales	23-01-2025	23-11-2030	$ 3.754.294.686	11-44-101245385	Seguros del estado S.A.
Estabilidad de la obra	Si ampara 5 años, 0 meses y 0 días	Si ampara 5 años, 0 meses y 0 días	$ 5.631.442.029	11-44-101245385	Seguros del estado S.A.
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	Si ampara 0 años, 6 meses y cero días	Si ampara 0 años, 6 meses y cero días	$ 5.631.442.029	11-44-101245385	Seguros del estado S.A.
Amparo básico – predios, labores y operaciones	27-12-2024	27/10/2027	$ 938.573.672	11-40-101072865	Seguros del estado S.A.
Patronal	27-12-2024	27/10/2027	$ 469.286.836	11-40-101072865	Seguros del estado S.A.
Contratistas y subcontratistas	27-12-2024	27/10/2027	$ 469.286.836	11-40-101072865	Seguros del estado S.A.

Fuente: Elaboración propia

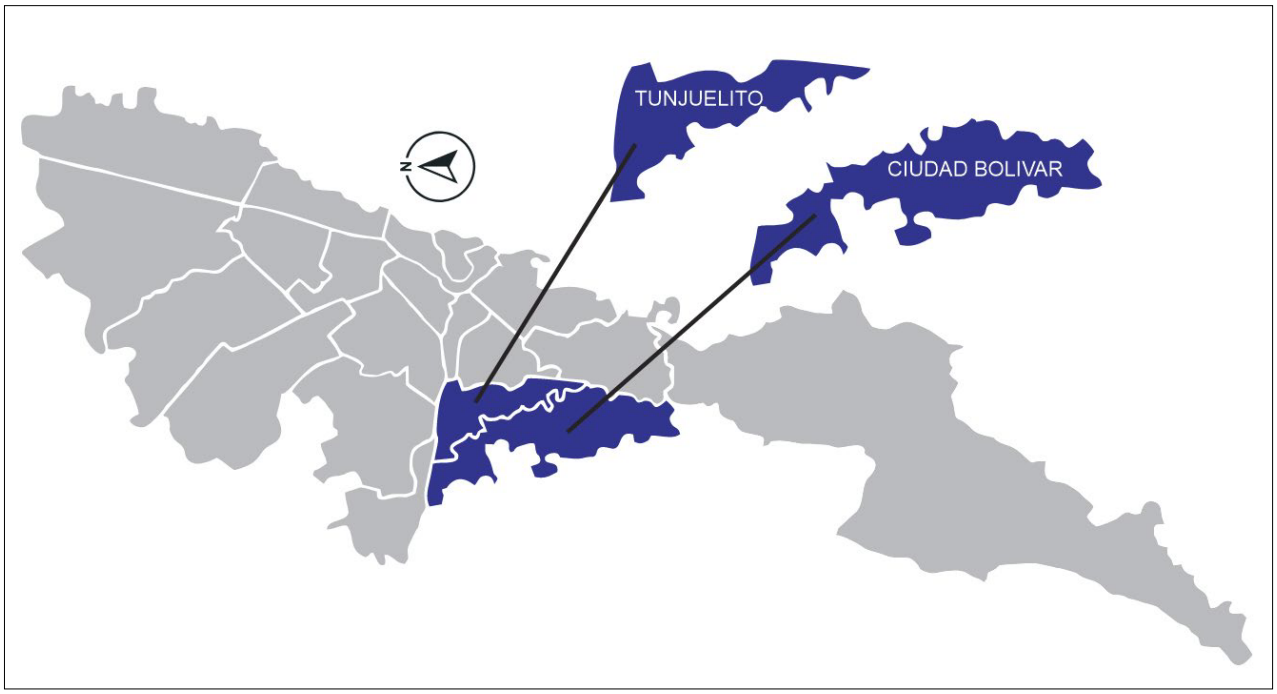
Dada la suscripción del acta de inicio el 23 de febrero de 2025, se remitieron a la interventoría las pólizas correspondientes al contrato SDM-2024-3652, del Consorcio señalizar Bogotá 2025, mediante comunicación SDM-CSB2025-004, en atención a las comunicaciones CINPOSAL-002-2025, CINPOSAL-003-2025 y respuesta al traslado de los

radicados SDM 202531100012811, SDM 202531100026931, con los ajustes a las vigencias, de acuerdo con el acta de inicio del contrato.

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se desarrollará en la ciudad de Bogotá D.C., y se concentra en la ZONA 6, ZONA SUR-OCCIDENTE, conformada por las localidades 19. Ciudad Bolívar, 06. Tunjuelito y en los corredores de la Autopista Sur Y AV Américas, en la siguiente figura, se pueden observar con detalle, las localidades que comprenden la zona 6:

Figura 1. Localización Zona cuarta (6) Sur- Occidente



Fuente: Elaboración propia

Estas localidades se encuentran conformadas por las siguientes Unidades de Planificación Zonal UPZ:

Tabla 3. Localidades con UPZ

19. Ciudad Bolívar	6. Tunjuelito
UPZ 63 El Mochuelo UPZ 64 Monte Blanco UPZ 65 Arborizadora	UPZ 42 Venecia UPZ 62 Tunjuelito

19. Ciudad Bolívar	6. Tunjuelito
UPZ 66 San Francisco UPZ 67 El Lucero UPZ 68 El Tesoro UPZ 69 Ismael Perdomo UPZ 70 Jerusalén	

Fuente: Elaboración propia

No obstante, la anterior localización y conforme lo indica el numeral 2. descripción obra en lote o zona a intervenir, del Anexo No.1 – Anexo Técnico ADENDA 1, se tiene "…*Considerando situaciones extraordinarias y sobrevinientes la entidad podrá asignar implementación inmediata de ID's en zonas diferentes a la adjudicada al contratista, precisando que el valor de las obras de implementación en una zona diferente a la adjudicada no podrá superar el 6% del presupuesto oficial del lote,…*", previa aprobación del Comité técnico y de los responsables de área señalados en el citado numeral.

4. PERIODO DEL INFORME

Este informe presenta el detalle de las actividades de señalización horizontal, señalización vertical e Instalación de dispositivos de tránsito y/o elementos canalizadores del tráfico, realizadas por el consorcio señalizar Bogotá 2025, en cumplimiento del Contrato SDM-2024-3652, para el periodo del 23 de enero al 22 de febrero de 2025.

5. COMPONENTE DE OBRA

Con el objeto de garantizar el cumplimiento del programa de trabajo y como resultado de las actividades de obra ejecutadas se dispuso de los siguientes recursos durante el período del presente informe:

5.1 RECURSO HUMANO

A continuación, se relaciona el equipo de trabajo profesional, tecnólogo y administrativo para el desarrollo del proyecto durante el periodo del presente informe:

Tabla 4. Equipo de trabajo profesional, tecnólogo y administrativo mínimo

Nombres	Apellidos	Cargo
Francy Paola	Duarte Porras	Directora del proyecto

Nombres	Apellidos	Cargo
Felix Leonardo	Pulido Bastidas	Especialista en transito
Daniela	Orejuela Cruz	Residente de obra
David Esteban	Castro Fuentes	Residente de obra
Clara Consuelo	García	Trabajador social
Jeny Natalia	Ramírez Esquivel	Profesional SST
Héctor Iván	Borda Molina	Profesional Georreferenciación
Steven Yesid	Orejuela Cardona	Conductor
Ricardo	Fernández Sáenz	Conductor
Cindy Tatiana	Cristancho Cristancho	Secretaria

Fuente: Elaboración propia

También se relacionan las cuadrillas vinculadas laboralmente para la implementación de los ID de diseño de acuerdo con lo estipulado en el numeral 7.7 del anexo técnico, así:

Tabla 5. Cuadrillas mínimas para la implementación de señalización

N° Cuadrilla	Nombre Cuadrilla	Actividad Principal Por Desarrollar
1	Cuadrilla NM1	Señalización Horizontal
2	Cuadrilla NM2	Señalización Horizontal
3	Cuadrilla NM3	Señalización Horizontal
4	Cuadrilla NM4	Señalización Horizontal
5	Cuadrilla QR 1	Señalización Horizontal
6	Cuadrilla QR 2	Señalización Horizontal
7	Cuadrilla PG 1	Señalización Horizontal
8	Cuadrilla SV 1	Señalización Horizontal
9	Cuadrilla SV 2	Señalización Vertical
10	Cuadrilla SV 3	Emergencias y Compromisos Prioritarios
11	Cuadrilla SI1	Señalización Vertical
12	Cuadrilla SI2	Señalización Vertical

Fuente: Elaboración propia

Igualmente, en el Anexo 8. Informe Sistema de seguridad y salud en el trabajo, se detalla el personal operativo que conforma las cuadrillas que laboraron en la implementación de la señalización durante el periodo del presente informe.

5.2 EQUIPOS

Se emplearon los siguientes equipos para la ejecución de los trabajos del periodo del presente informe:

Tabla 6. Equipos empleados para la ejecución de las actividades

Descripción	Cantidad	Identificación
Vehículo autopropulsado y/o montado para aplicación de pintura líquida que tenga incorporado el equipo delineador, el cual deberá poseer, como mínimo, dos (2) boquillas para la aplicación de pintura y otras dos (2) para la aplicación de microesfera tipo drop - on o sembrado, NTC 4744-2 numeral 5.2	1	WEP027 y TBZ541
Vehículo autopropulsado para aplicación de resina termoplástica que tenga incorporado el equipo delineador, el cual deberá poseer dos (2) boquillas para la aplicación de resina por extrusión o pulverización o spray y dos (2) dispensadores o boquillas para la aplicación de microesfera tipo drop on o sembrado a presión. Incluye caldera. NTC 4744-2 numeral 5.2	1	STIMSONITE TITAN 1000 D
Vehículo autopropulsado y/o montado para aplicación de plástico en frío por el método de extrusión, el cual deberá poseer, como mínimo, dos (2) boquillas para la aplicación de pintura y otras dos (2) para la aplicación de microesfera tipo drop - on o sembrado de acuerdo con la NTC 4744-2 numeral 5.2	1	SPT 943
Máquina manual para pintura líquida NTC 4744-2 numeral 5.1 3	3	TITAN 8900XLT
Máquina manual para aplicación de termoplástico, incluye caldera. NTC 4744-2 numeral 5.1	1	THERMO MARK II FEATHERLITE
Máquina manual para aplicación de plástico en frío por el método Spray. NTC 4744-2 Numeral 5.1	1	HYDRA 4000
Máquina manual para aplicación de plástico en frío por el método extrusión. NTC 4744-2 Numeral 5.1		HYDRA 4000
Camión con capacidad mínima de tres puntos cinco (3,5), modelo superior al año 2015, este vehículo deberá ser el adecuado para el transporte de los materiales a utilizar.	1	WFR172
Vehículo tipo campero o camioneta con placas de servicio público, con cilindraje de 1300 c.c. o superior, modelo 2022 o superior y matriculado en la ciudad de	1	TTZ

Descripción	Cantidad	Identificación
Bogotá D.C., conforme a la normatividad vigente en materia de tránsito y transporte (Acuerdo 352 de 2008).		

Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, se listan los instrumentos usados en los frentes de obra, para el control de calidad de la señalización implementada:

Tabla 7. Instrumentos usados para el control de calidad

Descripción	Cantidad
Velocímetro	1
Galgas para la verificación de espesores húmedos	1
Medidor de espesores secos para tomar lecturas de la demarcación sobre testigos	1
Retrorreflectómetro horizontal	1
Lupa con aumento de 80X	1
Cinta métrica / Odómetro	1
Equipo para medir temperatura ambiente y de la superficie por demarcar.	1
Equipo para medir humedad relativa (Termohigrómetro)	1
Equipo para medir velocidad del viento	1
Equipo para medir punto de rocío	1

Fuente: Elaboración propia

Así mismo, se informa que en el Anexo 3. Equipos mínimos, se relacionan los certificados de calibración y formatos de seguimiento al estado de los equipos y elementos de control de obra mínimos.

5.3 ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta los Identificadores de Diseño (ID) asignados, en la siguiente tabla se expone el estado de los diseños entregados para implementación:

Tabla 8. Diseños Asignados para Implementación

ID Diseño	Fecha de Asignación	Localidad	Estado
MV_AV_BOYACA_941_09_V30_T3	27/01/2025	Ciudad Bolívar y Tunjuelito	EN EJECUCION
MV_AUTO_SUR_643_24_V0	27/01/2025	19_Ciudad Bolívar	POR INSPECCIONAR
MV_19_178_1244_11	27/01/2025	19_Ciudad Bolívar	EN EJECUCION
CPS_941_EM_19_111	27/01/2025	06_Tunjuelito	EN EJECUCION
MV_19_324_943_10	27/01/2025	19_Ciudad Bolívar	EN EJECUCION
EX_19_339_1561_10	27/01/2025	19_Ciudad Bolívar	POR INSPECCIONAR
EX_19_387_1561_10	27/01/2025	19_Ciudad Bolívar	EN EJECUCION
EX_19_142_1244_11	27/01/2025	19_Ciudad Bolívar	POR INSPECCIONAR
EX_19_017_1561_10	27/01/2025	19_Ciudad Bolívar	POR INSPECCIONAR
MV_19_041_1561_10	27/01/2025	19_Ciudad Bolívar	POR INSPECCIONAR
EX_19_001_643_24	27/01/2025	19_Ciudad Bolívar	POR INSPECCIONAR
MV_19_414_937_09	27/01/2025	19_Ciudad Bolívar	POR INSPECCIONAR
EX_19_342_943_10	27/01/2025	19_Ciudad Bolívar	POR INSPECCIONAR
MV_06_054_1561_10	27/01/2025	06_Tunjuelito	POR INSPECCIONAR
MV_19_013	27/01/2025	19_Ciudad Bolívar	POR INSPECCIONAR
EX_19_386_1561_10	27/01/2025	19_Ciudad Bolívar	POR INSPECCIONAR
EX_06_105_1867_12	27/01/2025	06_Tunjuelito	POR INSPECCIONAR
MV_19_080_1561_10	27/01/2025	19_Ciudad Bolívar	POR INSPECCIONAR
EX_19_155_1244_11	27/01/2025	19_Ciudad Bolívar	POR INSPECCIONAR
EX_19_151_1244_11	27/01/2025	19_Ciudad Bolívar	POR INSPECCIONAR
MV_19_292_1561_10	27/01/2025	19_Ciudad Bolívar	POR INSPECCIONAR
MV_19_318_1561_10	27/01/2025	19_Ciudad Bolívar	POR INSPECCIONAR

ID Diseño	Fecha de Asignación	Localidad	Estado
MV_19_176_1244_11	27/01/2025	19_Ciudad Bolívar	POR INSPECCIONAR
EX_19_152_1744_10	27/01/2025	19_Ciudad Bolívar	POR INSPECCIONAR
EX_19_269_1744_10	27/01/2025	19_Ciudad Bolívar	POR INSPECCIONAR
EX_19_202_1867_12	27/01/2025	19_Ciudad Bolívar	POR INSPECCIONAR
EX_19_211_1867_12	27/01/2025	19_Ciudad Bolívar	POR INSPECCIONAR
EX_06_404_1561_10	27/01/2025	06_Tunjuelito	POR INSPECCIONAR
EX_06_385_1561_10	27/01/2025	06_Tunjuelito	POR INSPECCIONAR
PMT CL 68G N° 31A-16	14-02-2024	19_Ciudad Bolívar	EJECUTADO
PMT CL 68H SUR ENTRE KR 19B Y KR 19G	13-02-2025	19_Ciudad Bolívar	EJECUTADO
PMT CL 69I BIS KR 18J - 95	14-02-2024	19_Ciudad Bolívar	EJECUTADO
PMT KR 20 BIS N° 68H-56SUR	13-02-2025	19_Ciudad Bolívar	EJECUTADO
PMT KR 26 C BIS ENTRE KR 72G SUR Y CL 72F SUR	13-02-2025	19_Ciudad Bolívar	EJECUTADO
PMT CL 68C SUR KR 38	14-02-2025	19_Ciudad Bolívar	EN EJECUCION
SUMINISTRO N° 1 (SEÑALES VERTICALE DÍA SIN CARRO)	04-02-2025	N/A	EJECUTADO
SUMINISTRO N° 2 (SEÑALES VERTICALES SI-07A IDIPRON)	03-02-2025	N/A	EJECUTADO

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se resume las cantidades de obra ejecutadas para cada ID:

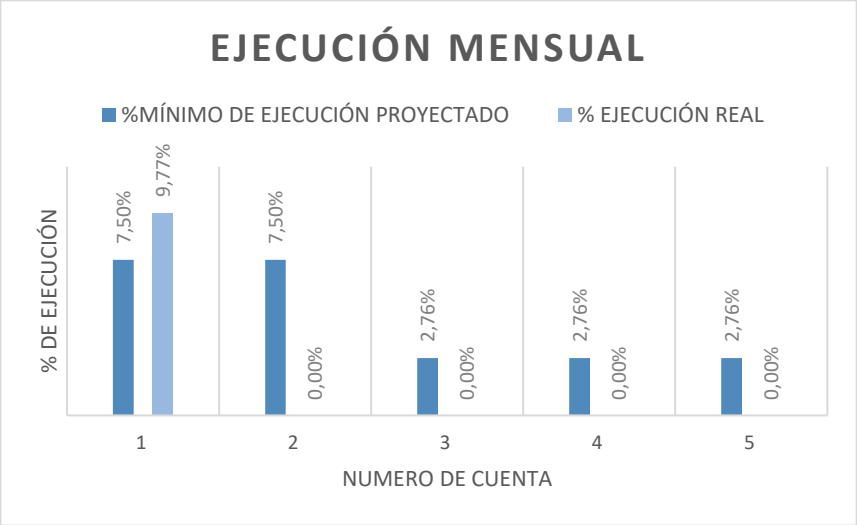
Tabla 9. Cantidades Ejecutadas por ID:

Corredor / Diseños	Localidad	Valor Presupuestado	Ejecutado para Cobro cuenta 1	% Ejecutado
CPS_941_EM_19_111	06_TUNJUELITO	$ 646.411.745	$ 164.983.772,83	25,52%
EX_19_387_1561_10_V4	19_CIUDAD BOLIVAR	$ 934.762.523	$ 726.994.258,59	77,77%
MV_AV_BOYACA_941_09	19_CIUDAD BOLIVAR	$ 1.357.573.324	$ 871.150.248,33	64,17%
PMT CL 68G N° 31A-16	19_CIUDAD BOLIVAR	$ 2.422.810	$ 2.422.809,52	100,00%

Corredor / Diseños	Localidad	Valor Presupuestado	Ejecutado para Cobro cuenta 1	% Ejecutado
PMT CL 68H SUR ENTRE KR 19B Y KR 19G	19_CIUDAD BOLIVAR	$ 3.896.589	$ 3.896.589,32	100,00%
PMT CL 69I BIS KR 18J - 95	19_CIUDAD BOLIVAR	$ 3.738.765	$ 3.738.765,32	100,00%
PMT KR 20 BIS N° 68H-56SUR	19_CIUDAD BOLIVAR	$ 3.438.871	$ 3.438.871,04	100,00%
PMT KR 26 C BIS ENTRE KR 72G SUR Y CL 72F SUR	19_CIUDAD BOLIVAR	$ 2.422.810	$ 2.422.809,52	100,00%
SUMINISTRO N° 1 (SEÑALES VERTICALE DÍA SIN CARRO)	N/A	$ 4.461.086	$ 4.461.085,82	100,00%
SUMINISTRO N° 2 (SEÑALES VERTICALES SI-07A IDIPRON)	N/A	$ 50.887.169	$ 50.887.168,64	100,00%
TOTAL		**$ 3.010.015.691**	**$ 1.834.396.379**	

Fuente: Elaboración propia

Figura 2. Ejecución acumulada para los meses 1-5



Fuente: Elaboración propia

Se evidencia que en la cuenta número 1, comprendida del 23 de enero al 22 de febrero se ejecutó el 9.77 % del valor total del contrato, lo cual representa un 2.27 % superior a la meta mínima de ejecución estipulada en el numeral 3.5 METAS PARA EJECUCIÓN DE OBRA Y ENTREGA DE LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES del ANEXO

1— ANEXO TÉCNICO DEFINITIVO establecido en 7.50 % para el primer mes de ejecución.

Tabla 10. Avance Parcial y Acumulado por mes

MES DE EJECUCIÓN	PROYECTADO		EJECUCIÓN REAL		PROYECTADO VS EJECUCIÓN REAL
	%MINIMO DE EJECUCIÓN PROYECTADO	%ACUMULADO	% EJECUCIÓN REAL	%ACUMULADO	% EJECUCIÓN
1	7,50%	7,50%	9,77%	9,77%	2,27%
2	7,50%	15,00%	0,00%	9,77%	0,00%
3	2,76%	17,76%	0,00%	9,77%	0,00%
4	2,76%	20,52%	0,00%	9,77%	0,00%
5	2,76%	23,28%	0,00%	9,77%	0,00%
6	2,76%	26,04%	0,00%	9,77%	0,00%
7	2,76%	28,80%	0,00%	9,77%	0,00%
8	2,76%	31,56%	0,00%	9,77%	0,00%
9	2,76%	34,32%	0,00%	9,77%	0,00%
10	2,76%	37,08%	0,00%	9,77%	0,00%
11	2,76%	39,84%	0,00%	9,77%	0,00%
12	2,76%	42,60%	0,00%	9,77%	0,00%
13	2,76%	45,36%	0,00%	9,77%	0,00%
14	2,76%	48,12%	0,00%	9,77%	0,00%
15	2,85%	50,97%	0,00%	9,77%	0,00%
16	2,85%	53,82%	0,00%	9,77%	0,00%
17	2,85%	56,67%	0,00%	9,77%	0,00%
18	2,85%	59,52%	0,00%	9,77%	0,00%
19	2,85%	62,37%	0,00%	9,77%	0,00%
20	2,85%	65,22%	0,00%	9,77%	0,00%
21	2,85%	68,07%	0,00%	9,77%	0,00%
22	2,85%	70,92%	0,00%	9,77%	0,00%
23	2,85%	73,77%	0,00%	9,77%	0,00%
24	2,85%	76,62%	0,00%	9,77%	0,00%
25	2,85%	79,47%	0,00%	9,77%	0,00%
26	2,85%	82,32%	0,00%	9,77%	0,00%
27	2,55%	84,87%	0,00%	9,77%	0,00%
28	2,55%	87,42%	0,00%	9,77%	0,00%
29	2,55%	89,97%	0,00%	9,77%	0,00%
30	2,55%	92,52%	0,00%	9,77%	0,00%
31	2,55%	95,07%	0,00%	9,77%	0,00%
32	2,25%	97,32%	0,00%	9,77%	0,00%
33	2,25%	99,57%	0,00%	9,77%	0,00%
34	0,43%	100,00%	0,00%	9,77%	0,00%

Fuente: Elaboración propia

Así mismo, se muestra el avance parcial y acumulado respecto al mes 1 de ejecución, en proporción con los porcentajes mínimos establecidos para ejecutar, de acuerdo con lo estipulado en el numeral 3.5 METAS PARA EJECUCIÓN DE OBRA Y ENTREGA DE LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES del ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO DEFINITIVO, se

tiene acumulado el 9.77 % el cual representa un valor de 2.27 % superior al valor programado que equivale al 7.50 % acumulado para el primer mes del contrato.

5.4 BALANCE ECONÓMICO

El detalle de las cantidades de obra de los puntos que se ejecutaron en el período se presenta en el Anexo 1. Acta Parcial de Obra, complementado con las planillas de obra de los IDs relacionados como ejecutados para el periodo del 23 de enero al 22 de febrero de 2025.

5.4.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN

En el Anexo 1. se presentan las planillas de los puntos o ID ejecutados durante el periododel informe, cuyos totales se relacionan a continuación:

Tabla 11. Suministro e Instalación de Señalización por ID:

Corredor / Diseños	Localidad	Valor Presupuestado	% Cobrado Cuenta 1	Ejecutado para Cobro cuenta 1
CPS_941_EM_19_111	06_TUNJUELITO	$ 646.411.745	25,52%	$ 164.983.773
EX_19_387_1561_10_V4	19_CIUDAD BOLIVAR	$ 934.762.523	77,77%	$ 726.994.259
MV_AV_BOYACA_941_09	19_CIUDAD BOLIVAR	$ 1.357.573.324	64,17%	$ 871.150.248
PMT CL 68G N° 31A-16	19_CIUDAD BOLIVAR	$ 2.422.810	100,00%	$ 2.422.810
PMT CL 68H SUR ENTRE KR 19B Y KR 19G	19_CIUDAD BOLIVAR	$ 3.896.589	100,00%	$ 3.896.589
PMT CL 69I BIS KR 18J - 95	19_CIUDAD BOLIVAR	$ 3.738.765	100,00%	$ 3.738.765
PMT KR 20 BIS N° 68H-56SUR	19_CIUDAD BOLIVAR	$ 3.438.871	100,00%	$ 3.438.871
PMT KR 26 C BIS ENTRE KR 72G SUR Y CL 72F SUR	19_CIUDAD BOLIVAR	$ 2.422.810	100,00%	$ 2.422.810
SUMINISTRO N° 1 (SEÑALES VERTICALE DÍA SIN CARRO)	N/A	$ 4.461.086	100,00%	$ 4.461.086
SUMINISTRO N° 2 (SEÑALES VERTICALES SI-07A IDIPRON)	N/A	$ 50.887.169	100,00%	$ 50.887.169

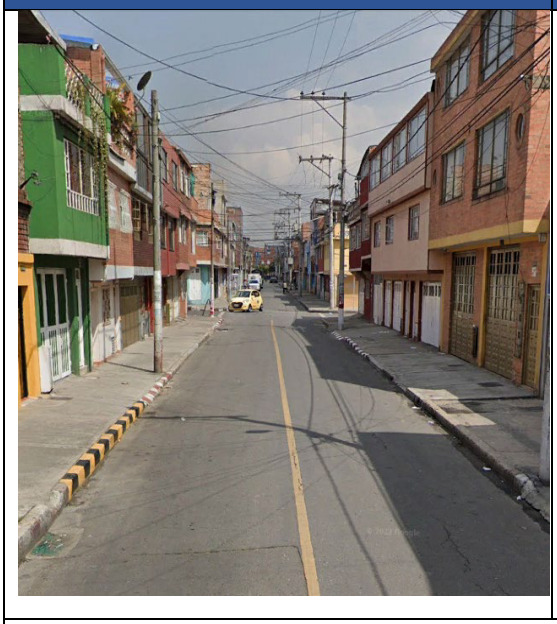
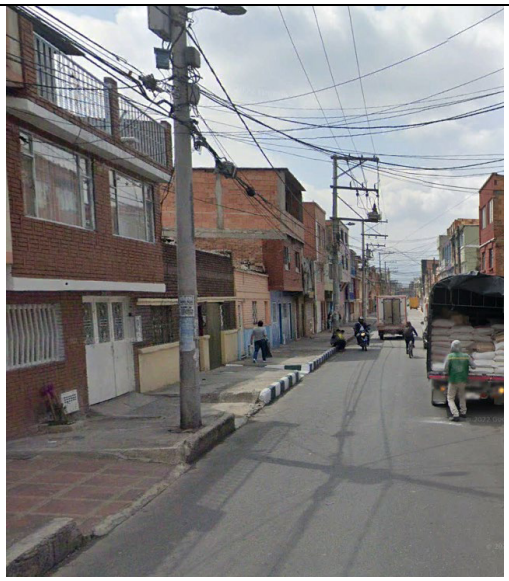
Corredor / Diseños	Localidad	Valor Presupuestado	% Cobrado Cuenta 1	Ejecutado para Cobro cuenta 1
TOTAL		**$ 3.010.015.691**		**$ 1.834.396.379**

Fuente: Elaboración propia

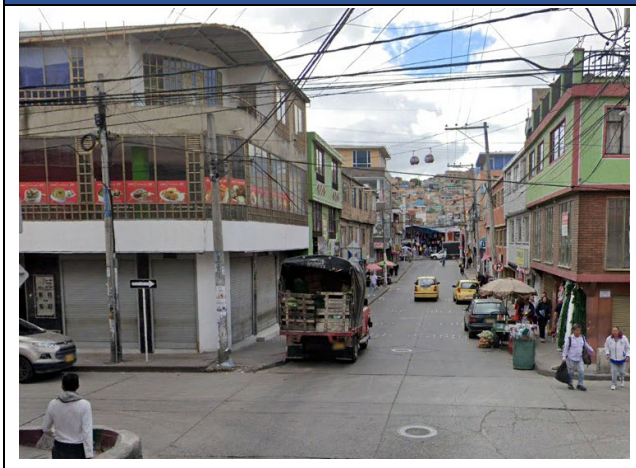
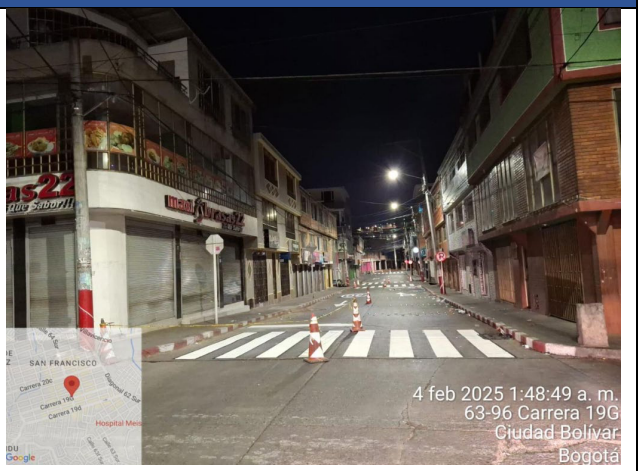
5.5 REGISTRO FOTOGRÁFICO

A continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades ejecutadas en el periodo del 23 de enero al 22 de febrero de 2025:

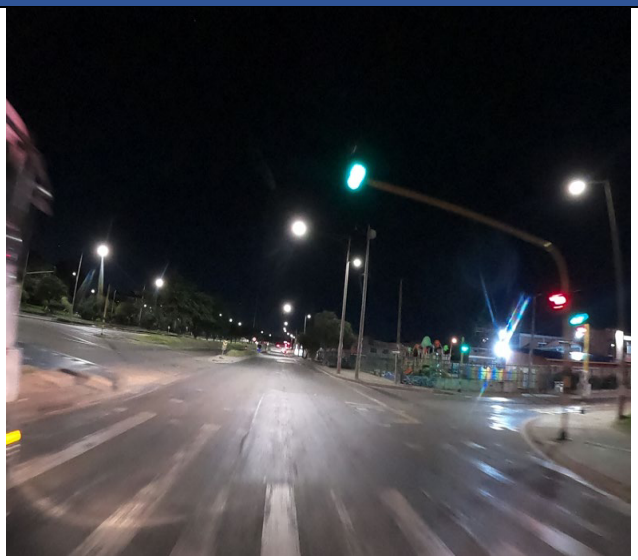
CPS_941_EM_19_111 (HORIZONTAL)	
Antes	**Después**
	
CL 55 S N° 33-04	

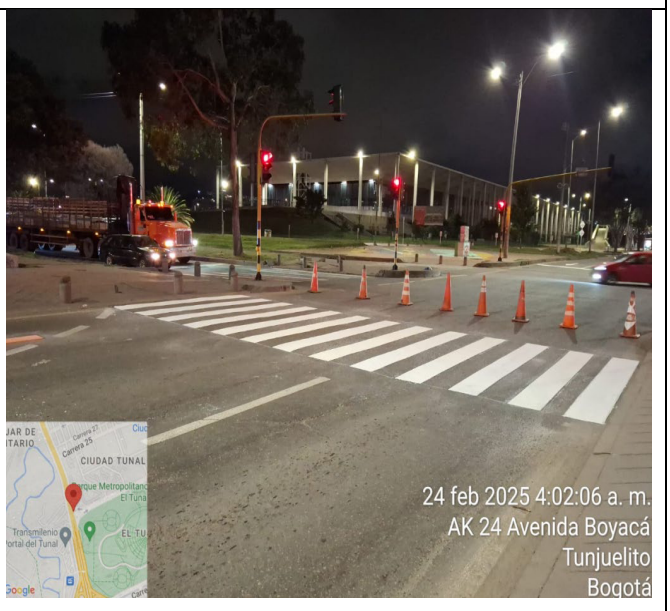
CPS_941_EM_19_111 (HORIZONTAL)	
Antes	**Después**
	
CL 55 S N° 32-62	
	
KR 34 N° 55-16	

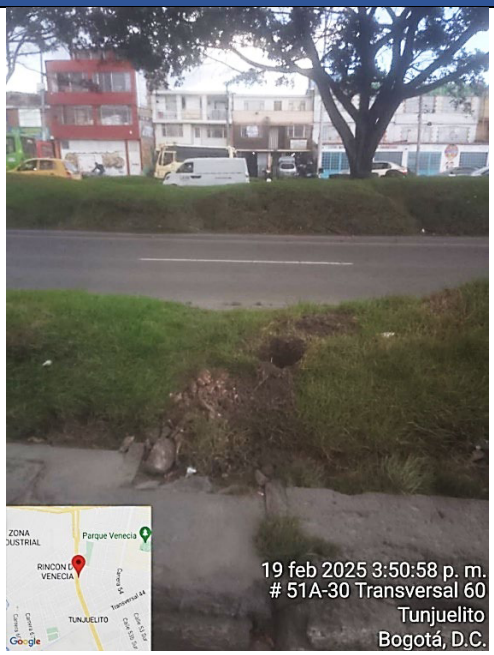
CPS_941_EM_19_111 (HORIZONTAL)	
Antes	**Después**
	
CL 55A S N 32-42	

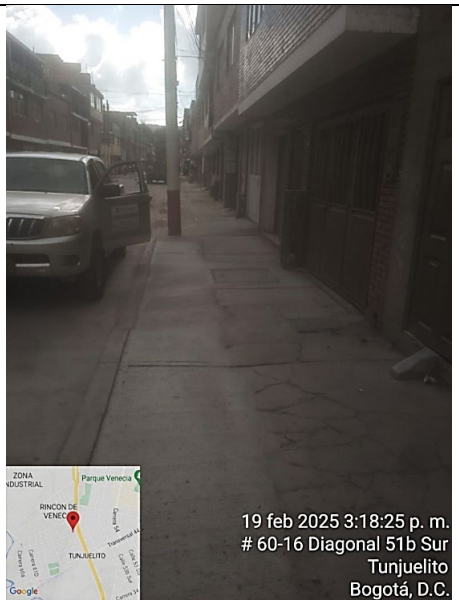
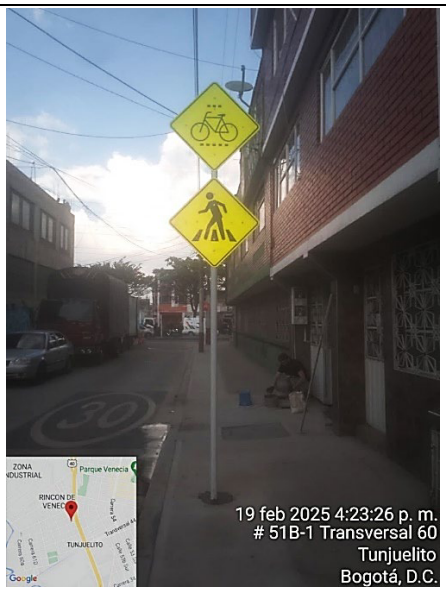
EX_19_387_1561_10 (HORIZONTAL)	
Antes	**Después**
	
KR 19G N° 63-96	

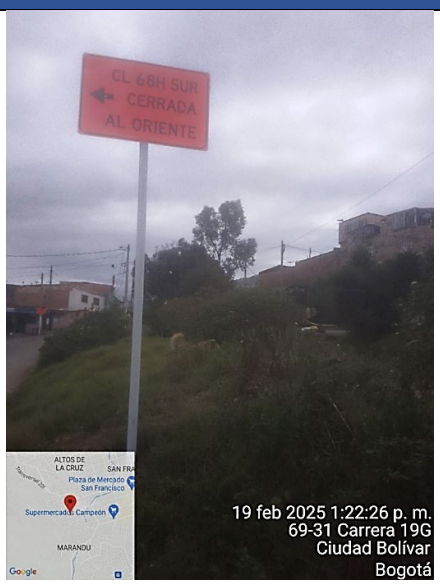
EX_19_387_1561_10 (HORIZONTAL)	
Antes	**Después**
	
KR 19 D CON CL 64 S	
	
KR 20F N° 61B-74	
	
KR 19D N° 61-59	

MV_AV_BOYACA_941_09_V30 (HORIZONTAL)	
Antes	**Después**
	
AV BOYACA CON KR 25	
	
AV BOYACA CON AK 24	

MV_AV_BOYACA_941_09_V30 (HORIZONTAL)	
Antes	**Después**
	
AV BOYACA CON CL 56 S	
	
AV BOYACA CON AK 24	

MV_AV_BOY_941_09 (VERTICAL)	
Antes	**Después**
	
AV BOYACA DIAG 51A	
	

MV_AV_BOY_941_09 (VERTICAL)	
Antes	**Después**
AV BOY CL 51 SUR	
	
DIAG 51BSUR AV BOYACÁ	
	
DIAG 51BSUR AV BOYACÁ	

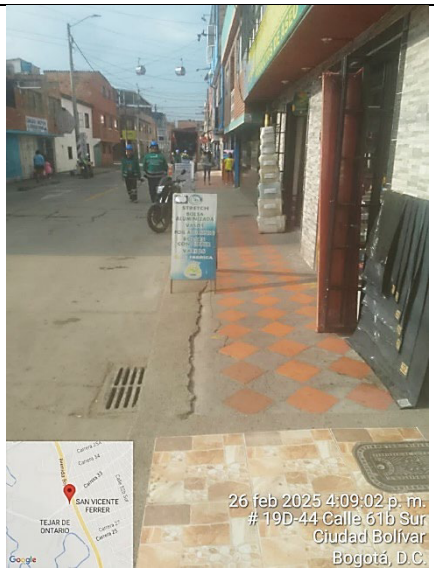
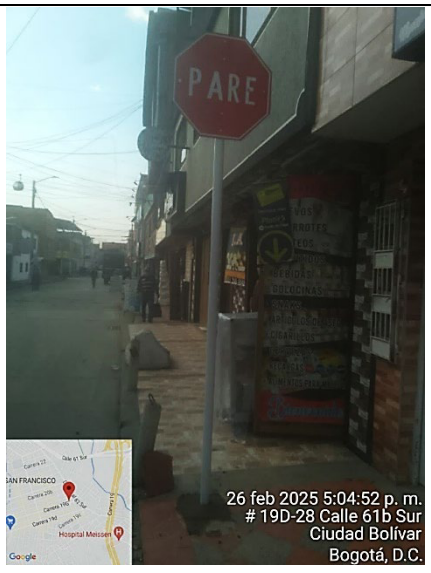
ESQUEMA DE SEÑALIZACIÓN SIRE 5443712 9-DIC-2024 (VERTICAL)	
Antes	**Después**
	
KR 19G CL 66H SUR	**CL 66H SUR KR 20**
	
CALLE 68D KR 19G	**KR 19G CL 68F SUR**

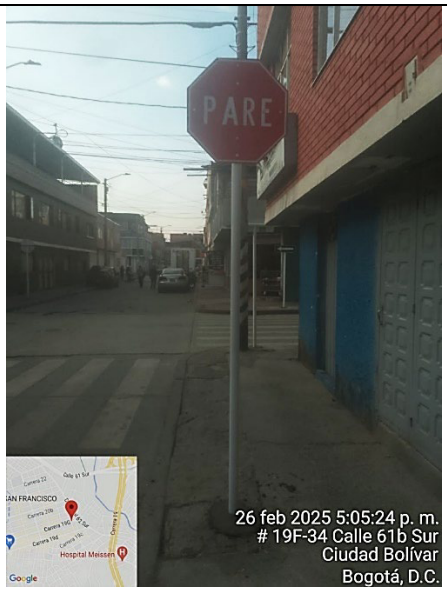
PMT de EMERGENCIA EVENTO-5444050_KR 20 BIS 68H SUR 56 6-DIC-2024 (VERTICAL)	
Antes	**Después**
	
DG 69 SUR KR 20	**DG 69 SUR KR 20A BIS**
	
KR 20 BIS DIAG 69 SUR	**KR 20 DIAG 69 SUR**

ESQUEMA DE SEÑALIZACIÓN CL 68G (VERTICAL)	
Antes	**Después**
	
TV 32 CL 68D SUR	**TV 32 CL 68F SUR**
	
TV 32 CL 68DBIS SUR	**TV 32 CL 68G SUR**

ESQUEMA SEÑALIZACION SIRE 5444338_CIERRE TOTAL (VERTICAL)	
Antes	**Después**
	
DG 69 I BIS SUR DG 69D SUR	**DG 69 I BIS SUR DG 69D SUR**
	
DG 69 I BIS SUR KR 18 J	**KR 18 L CL 69 J SUR**

ESQUEMA SIRE 5442591 (VERTICAL)	
Antes	**Después**
	
CL 68 C SUR KR 39	**CL 68 C SUR KR 39**

EX_19_387_1561_10 (VERTICAL)	
Antes	**Despues**
	

ESQUEMA SIRE 5442591 (VERTICAL)	
Antes	**Después**
CL 61 B KR 19D-28	
	
CL 61B #19F-34	
	

ESQUEMA SIRE 5442591 (VERTICAL)	
Antes	**Después**
KR 19F CL 61B	
	
KR 19F CL 61B	

5.6 GEORREFERENCIACIÓN

Durante el periodo de presentación del informe se realizó la entrega de Georreferenciación perteneciente a la implementación de obra, lo siguiente es el listado de ID's entregados a fecha de corte 22 de febrero de 2025.

Tabla 12. Estado Georreferenciación por ID:

ID	CUENTA	ESTADO	FECHA
PMT CL 68G # 31A-16	1	EN REVISIÓN DE INTERVENTORÍA	28/02/2025
PMT CL 68H SUR ENTRE KR 19B Y KR 19G	1	EN REVISIÓN DE INTERVENTORÍA	28/02/2025
PMT CL 69IBIS KR 18J - 95	1	EN REVISIÓN DE INTERVENTORÍA	28/02/2025
PMT KR 20 BIS # 68H-56SUR	1	EN REVISIÓN DE INTERVENTORÍA	28/02/2025

ID	CUENTA	ESTADO	FECHA
PMT KR 26 C BIS ENTRE KR 72G SUR Y CL 72F SUR	1	EN REVISIÓN DE INTERVENTORÍA	28/02/2025

Fuente: Elaboración propia

6. ESTADO Y AVANCE PRESUPUESTAL

Durante el periodo del 23 de enero al 22 de febrero, el estado de avance presupuestal es el siguiente:

Tabla 13. Estado y Avance Presupuestal del Contrato

VALOR VIGENCIA 2024	$ 2.815.721.000
VALOR VIGENCIA 2025	$ 6.209.487.857
VALOR VIGENCIA 2026	$ 6.423.895.143
VALOR VIGENCIA 2027	$ 3.322.369.428
VALOR TOTAL	**$ 18.771.473.428**

Pagos Efectuados	Periodo	Costos Directos	AIU	Suministros	Valor Total Acta	Retegarantía 5%	Total, a Girar	Estado
Cuenta N° 1	23 enero a 22 de Julio de 2025	$ 1.346.437.694	$ 432.610.431	$ 55.348.254	$ 1.834.396.379	$ 91.719.819	$ 1.742.676.560	EN TRÁMITE
TOTAL		**$ 1.346.437.694**	**$ 432.610.431**	**$ 55.348.254**	**$ 1.834.396.379**	**$ 91.719.819**	**$ 1.742.676.560**	

TOTAL, FACTURADO OBRA + SUMINISTRO ACTA N° 1	$ 1.834.396.379
TOTAL, ACUMULADO	$ 1.834.396.379
SALDO POR FACTURAR	$ 16.937.077.049

Fuente: Elaboración propia

Se presenta para el primer mes de ejecución del contrato, un valor ejecutado de **$ 1.834.396.379** que equivale al **9.77 %** del valor total del contrato y un valor total acumulado ejecutado de **$ 1.834.396.379** equivalente al **9.77 %** del valor total del contrato.

6.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

De acuerdo con la ejecución de las obras durante el periodo se tienen subdividido por componente (señalización vertical y horizontal) de la siguiente forma:

Tabla 14. Actividades Ejecutadas por componente

Corredor / Diseños	Localidad	Señalización Vertical	% Ejecutado en el ID en Señalización vertical del periodo	Señalización Horizontal	% Ejecutado en el ID en Señalización Horizontal del periodo	Total ejecutado en el periodo de informe
CPS_941_EM_19_111	06_TUNJUELITO	$ 0,00	0,00%	$ 164.983.772,83	100,00%	$ 164.983.773
EX_19_387_1561_10_V4	19_CIUDAD BOLIVAR	$ 130.951.373,55	18,01%	$ 596.042.885,04	81,99%	$ 726.994.259
MV_AV_BOYACA_941_09	19_CIUDAD BOLIVAR	$ 72.839.961,08	8,36%	$ 798.310.287,25	91,64%	$ 871.150.248
PMT CL 68G N° 31A-16	19_CIUDAD BOLIVAR	$ 2.422.809,52	100,00%	$ 0,00	0,00%	$ 2.422.810
PMT CL 68H SUR ENTRE KR 19B Y KR 19G	19_CIUDAD BOLIVAR	$ 3.896.589,32	100,00%	$ 0,00	0,00%	$ 3.896.589
PMT CL 69I BIS KR 18J - 95	19_CIUDAD BOLIVAR	$ 3.738.765,32	100,00%	$ 0,00	0,00%	$ 3.738.765
PMT KR 20 BIS N° 68H-56SUR	19_CIUDAD BOLIVAR	$ 3.438.871,04	100,00%	$ 0,00	0,00%	$ 3.438.871
PMT KR 26 C BIS ENTRE KR 72G SUR Y CL 72F SUR	19_CIUDAD BOLIVAR	$ 2.422.809,52	100,00%	$ 0,00	0,00%	$ 2.422.810
SUMINISTRO N° 1 (SEÑALES VERTICALE DÍA SIN CARRO)	N/A	$ 4.461.085,82	100,00%	$ 0,00	0,00%	$ 4.461.086
SUMINISTRO N° 2 (SEÑALES VERTICALES SI-07A IDIPRON)	N/A	$ 50.887.168,64	100,00%	$ 0,00	0,00%	$ 50.887.169
TOTAL		**$ 275.059.434**		**$ 1.559.336.945**		**$ 1.834.396.379**

Fuente: Elaboración propia

Del valor total de señalización ejecutada durante el periodo del informe, el 91% se ejecutó en la localidad 19_CIUDAD BOLIVAR y el 9% en la localidad 06_ TUNJUELITO, de los cuales, el 4% son actividades de suministro, del total de las actividades del periodo comprendido entre 23 de enero y 22 de febrero, el 15% corresponden a señalización vertical y el 85% corresponde a señalización horizontal.

7. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

El plan de Calidad provee de mecanismos para asegurarse que las actividades que afectan la calidad, están siendo registradas usando la documentación necesaria aplicable de un sistema de gestión de la calidad de acuerdo con la norma ISO 9001 de 2015, a fin de cumplir la atención integral en temas de señalización en la zona 6 adjudicada, atención integral que involucra el desarrollo de todas las actividades de implementación de señalización vertical, horizontal y los dispositivos de seguridad vial.

Consiste en la aplicación de los siguientes procesos:

- De Dirección: planificación del servicio
- Operativos o de realización del producto: Ejecución de proyectos con los respectivos soportes de compras, así como gestión del talento humano.
- De seguimiento: Acciones correctivas, preventivas, auditorías internas y análisis de datos.

Conforme al documento de Plan de Calidad presentado, se realizó el respectivo control de calidad en las actividades adelantadas de señalización horizontal, señalización vertical, e implementación de dispositivos en los siguientes ID:

- CPS_941_EM_19_111
- EX_19_387_1561_10
- MV_AV_BOYACA_941_09_V30
- PMT CL 68G # 31A-16
- PMT CL 68H SUR ENTRE KR 19B Y KR 19G
- PMT CL 69IBIS KR 18J – 95
- PMT KR 20 BIS # 68H-56SUR
- PMT KR 26 C BIS ENTRE KR 72G SUR Y CL 72F
- SURSUMINISTRO N° 1 (SEÑALES EVENTO DIA SIN CARRO)
- SUMNISTRO N° 2 (SEÑALES IDIPRON SI-07A)

Para el periodo se realizaron entre otros las siguientes actividades conformes al plan de Calidad:

	RETROREFLECTIVIDAD PARA SEÑALES HORIZONTALES			FECHA JUL 2022
CONSORCIO SEÑALIZAR BOGOTÁ 2025				VERSION 1.1
CONTRATO No. SDM No. 2024- 3652	PRACTICADO A:	SEÑALES HORIZONTALES ID_MV_AV_BOYACA_940_05, CPS_941_EM_10_111 y ES_10_387_1561_10.	FECHA	19/02/2025


OBJETO : REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. ZONA SUR–OCCIDENTE


QUIEN REALIZO EL ENSAYO : CONSORCIO SEÑALIZAR BOGOTA 2025 Y CONSORCIO INTER OBRAS POSSO–ALDEC (INTERVENTORIA)

INFORMACION DEL LABORATORIO

NOMBRE	SEÑALVIAS S.A.S	TELEFONO	7343968
DIRECCION	CARRERA 67 # 12 - 15	EQUIPO	RETROREFLECTOMETRO HORIZONTAL GEOMETRIA 15M SERIE SUS-002

REGISTRO FOTOGRAFICO



RESULTADOS DEL ENSAYO

SEÑAL No.	IDENTIFICACION DE LA SEÑAL			UBICACIÓN DE LA SEÑAL		CARACTERISTICAS DE LA PINTURA RETROREFLECTIVA		ANGULOS DE GEOMETRIA RETROREFLECTOMETRO		LECTURA				
	TIPO DE SEÑAL	CODIGO DE LA SEÑAL	COLOR DE LA SEÑAL	DIRECCION	COSTADO	TIPO DE PINTURA	MARCA DE LA PINTURA	GEOMETRIA 15	GEOMETRIA 30	No 1	No 2	No 3	PROMEDIO	CUMPLE
1	LINEA DE CARRIL	LCA	BLANCO	AV BOYACÁ ENTRE KR 33BIS Y KR 36A	ORIENTE	PLASTICO FRIO EN SPRAY	PINTUCO	X		355	276	302	311	SI
2	LINEA INICIO FIN CARRIL	LIC	BLANCO	AV BOYACÁ ENTRE KR 29 Y KR 31	ORIENTE	PLASTICO FRIO EN SPRAY	PINTUCO	X		296	312	261	290	SI
3	LINEA DE PARADA	LPA	BLANCO	AV BOYACÁ ENTRE KR 33BIS Y KR 33	OCCIDENTE	PLASTICO FRIO EN SPRAY	PINTUCO	X		245	286	290	274	SI
4	LINEA CENTRAL	LC	AMARILLO	CL 51A S ENTRE AK 33 Y KR 32	N.A	PLASTICO FRIO EN SPRAY	PINTUCO	X		241	270	259	257	SI
5	LINEA DE CARRIL	LCA	BLANCO	KR 33A ENTRE CL 56 S Y AV BOYACÁ	N.A	PLASTICO FRIO EN SPRAY	PINTUCO	X		280	264	256	267	SI
6	LINEA DE BORDE	LB	BLANCO	KR 33 ENTRE CL 56 S Y 55A S	N.A	PLASTICO FRIO EN SPRAY	PINTUCO	X		283	295	279	286	SI
7	LINEA DE CARRIL	LCA	BLANCO	CL 67 S ENTRE KR 19F Y KR 19D	N.A	PLASTICO FRIO EN SPRAY	PINTUCO	X		281	277	298	285	SI
8	LINEA CAMELLON	LCM	AMARILLO	DG 62 S ENTRE KR 19 Y KR 19A	N.A	PLASTICO FRIO EN SPRAY	PINTUCO	X		246	271	249	255	SI
9	LINEA CAMELLON	LCM	AMARILLO	DG 62 S ENTRE KR 19C Y KR 19F	N.A	PLASTICO FRIO EN SPRAY	PINTUCO	X		246	271	249	255	SI

OBSERVACIONES

	RETROREFLECTIVIDAD PARA SEÑALES VERTICALES			FECHA FEB 2022
CONSORCIO SEÑALIZAR BOGOTÁ 2025				VERSION 1.1
CONTRATO No. SDM No. 2024- 3652	ES_10_387_1561_10 PRACTICADO A:	STOCK SEÑALES VERTICALES ALMACEN	FECHA	FEBRERO 21 DE 2024

OBJETO : REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. – ZONA 6

QUIEN REALIZO EL ENSAYO : CONSORCIO SEÑALIZAR BOGOTA 2025

INFORMACION DEL LABORATORIO

NOMBRE	SEÑALVIAS S.A.S	TELEFONO	601 790 5286
DIRECCION	KR 67 #12-15	EQUIPO	RETROREFLECTOMETRO VERTICAL RODAVISTA MODELO 932 GT0236

REGISTRO FOTOGRAFICO






RESULTADOS DEL ENSAYO

SEÑAL No.	IDENTIFICACION DE LA SEÑAL			UBICACIÓN DE LA SEÑAL		CARACTERISTICAS DE LA LAMINA RETROREFLECTIVA		ANGULOS DE MEDIDA		LECTURA				
	TIPO DE SEÑAL	CODIGO DE LA SEÑAL	COLOR DE LA SEÑAL	DIRECCION	COSTADO	TIPO DE LAMINA	MARCA DE LAMINA	ANGULO DE OBSERVACION	ANGULO DE ENTRADA	No 1	No 2	No 3	PROMEDIO	CUMPLE
1	CHEVRON		AMARILLO LIMON	ALMACEN		CAL 16 1,5MM	LA CAMPANA	4°		681	679	674	678	SI
2	DOL		AMARILLO LIMON	ALMACEN		CAL 16 1,5MM	LA CAMPANA	4°		741	739	748	743	SI
3	SI-27		BLANCO	ALMACEN		CAL 16 1,5MM	LA CAMPANA	4°		749	734	791	758	SI
4	SP-34		AMARILLO	ALMACEN		CAL 16 1,5MM	LA CAMPANA	4°		601	602	601	601	SI
5	SP-34/SR-30		AMARILLO	ALMACEN		CAL 16 1,5MM	LA CAMPANA	4°		594	597	599	597	SI
6	SP-15		AMARILLO	ALMACEN		CAL 16 1,5MM	LA CAMPANA	4°		608	597	604	603	SI
7	SP-15/SR-30		AMARILLO	ALMACEN		CAL 16 1,5MM	LA CAMPANA	4°		607	604	604	605	SI
8	SP-36/SR-30		AMARILLO	ALMACEN		CAL 16 1,5MM	LA CAMPANA	4°		541	589	566	565	SI
9	SP-44/SR-30		AMARILLO LIMON	ALMACEN		CAL 16 1,5MM	LA CAMPANA	4°		674	676	672	674	SI
10	SP-46A		AMARILLO LIMON	ALMACEN		CAL 16 1,5MM	LA CAMPANA	4°		656	676	642	658	SI
11	SP-46A/SR-30		AMARILLO LIMON	ALMACEN		CAL 16 1,5MM	LA CAMPANA	4°		663	675	621	653	SI
12	SP-46B		AMARILLO LIMON	ALMACEN		CAL 16 1,5MM	LA CAMPANA	4°		680	699	691	690	SI
13	SP-47		AMARILLO LIMON	ALMACEN		CAL 16 1,5MM	LA CAMPANA	4°		679	705	662	682	SI
14	SP-47/SR-30		AMARILLO LIMON	ALMACEN		CAL 16 1,5MM	LA CAMPANA	4°		683	683	673	680	SI
15	SP-47A		AMARILLO LIMON	ALMACEN		CAL 16 1,5MM	LA CAMPANA	4°		729	686	641	685	SI
16	SP-47A/SR-30		AMARILLO LIMON	ALMACEN		CAL 16 1,5MM	LA CAMPANA	4°		705	708	710	708	SI
17	SP-47B		AMARILLO LIMON	ALMACEN		CAL 16 1,5MM	LA CAMPANA	4°		684	681	681	682	SI
18	SP-48/SR-30		AMARILLO LIMON	ALMACEN		CAL 16 1,5MM	LA CAMPANA	4°		678	677	677	677	SI
19	SP-56A		AMARILLO LIMON	ALMACEN		CAL 16 1,5MM	LA CAMPANA	4°		676	686	687	683	SI
20	SP-67		AMARILLO	ALMACEN		CAL 16 1,5MM	LA CAMPANA	4°		597	584	584	588	SI
21	SR-01		ROJO	ALMACEN		CAL 16 1,5MM	LA CAMPANA	4°		141	139	145	142	SI
22	SR-04		ROJO	ALMACEN		CAL 16 1,5MM	LA CAMPANA	4°		140	143	142	142	SI
23	SR-11		BLANCO	ALMACEN		CAL 16 1,5MM	LA CAMPANA	4°		706	780	778	755	SI
24	SR-18		BLANCO	ALMACEN		CAL 16 1,5MM	LA CAMPANA	4°		746	724	680	717	SI
25	SR-20/PLACHETA		BLANCO	ALMACEN		CAL 16 1,5MM	LA CAMPANA	4°		706	687	747	713	SI
26	SR-28		BLANCO	ALMACEN		CAL 16 1,5MM	LA CAMPANA	4°		841	845	816	834	SI
27	SR-28/PLACHETA		BLANCO	ALMACEN		CAL 16 1,5MM	LA CAMPANA	4°		813	815	815	814	SI
28	SR-30		BLANCO	ALMACEN		CAL 16 1,5MM	LA CAMPANA	4°		791	798	812	800	SI
29	SR-31		BLANCO	ALMACEN		CAL 16 1,5MM	LA CAMPANA	4°		805	853	841	820	SI
30	SR-38		BLANCO	ALMACEN		CAL 16 1,5MM	LA CAMPANA	4°		773	826	727	775	SI
31	SR-42		BLANCO	ALMACEN		CAL 16 1,5MM	LA CAMPANA	4°		813	801	812	809	SI
32	SR-43		BLANCO	ALMACEN		CAL 16 1,5MM	LA CAMPANA	4°		818	799	797	805	SI

En constancia de lo anterior se adjuntan los formatos que acreditan el cumplimiento de lo establecido en el plan de calidad, Anexo 4: Plan de calidad / certificados de calidad.

8. PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO

Respecto al Plan de Manejo (PMT) General, se radico en la interventoría el 14 de enero de 2025, a su vez se remitió a la Subdirección de Planes de Manejo de Tránsito SPMT de la secretaria Distrital de Movilidad con radicado SDM - 202561200175182 del 17 de enero de 2025. Posteriormente la SPMT con oficio SPTM 202531200369961 del 30 de enero de 2025, informo que "…*una vez revisado el documento técnico y los esquemas típicos propuestos para el manejo de tráfico durante las actividades de implementación de elementos de señalización vertical, horizontal y dispositivos viales, mediante el Contrato del Asunto, se emite autorización a la propuesta*…" e indica que la vigencia de la autorización es desde *la fecha de la firma del presente Oficio hasta el 01 de enero de 2026*, igualmente dichas comunicaciones se adjuntan en el Anexo 5. Plan de manejo de tránsito (COI).
En el periodo de este informe que comprende desde el 23 de enero hasta el 22 de febrero de 2025, se solicitaron planes de manejo de tránsito, los cuales junto con los PMTs vigentes de los periodos anteriores se relacionan con el respectivo resumen de los COI publicados por la SDM:

Tabla 15. Planes de manejo de tránsito vigentes

COI	Fecha	Dirección de la Obra		Autorización					
		Inicio	Fin	Características	Localidad	Estado	Fecha Inicio	Fecha Fin	Horario Cierre
6	6-feb-25	KR 22B CL 62AS	KR 22B CL 64S	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	14/02/2025	1/05/2025	22:00-05:00
6	6-feb-25	CL 64S KR 22I	CL 64S KR 22B	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	14/02/2025	1/05/2025	22:00-05:00
6	6-feb-25	KR 23A DG 65A S	KR 23A CL 66A S	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	14/02/2025	1/05/2025	24 HORAS
6	6-feb-25	KR 23 CL 65B S	KR 23 CL 67S	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	14/02/2025	1/05/2025	24 HORAS
6	6-feb-25	KR 22B CL 65B S	KR 22B CL 658S	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	14/02/2025	1/05/2025	24 HORAS
6	6-feb-25	KR 22A CL 65S	KR 22A CL 68S	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	14/02/2025	1/05/2025	24 HORAS
6	6-feb-25	KR 22 CL 68S	KR 22 DG 62S	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	14/02/2025	1/05/2025	24 HORAS
6	6-feb-25	KR 22A CL 64S	KR 22A CL 63S	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	14/02/2025	1/05/2025	24 HORAS
6	6-feb-25	KR 21A CL 68S	KR 21A DG 62S	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	14/02/2025	1/05/2025	24 HORAS

COI	Fecha	Dirección de la Obra		Autorización					
		Inicio	Fin	Características	Localidad	Estado	Fecha Inicio	Fecha Fin	Horario Cierre
6	6-feb-25	KR 21 CL 68S	KR 21 DG 62S	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	14/02/2025	1/05/2025	24 HORAS
6	6-feb-25	KR 20F CL 66S	KR 20F DG 62S	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	14/02/2025	1/05/2025	24 HORAS
6	6-feb-25	KR 20D CL 66S	KR 20D DG 62S	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	14/02/2025	1/05/2025	24 HORAS
6	6-feb-25	KR 20C CL 67S	KR 20C DG 62S	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	14/02/2025	1/05/2025	22:00-05:00
6	6-feb-25	KR 20B CL 67S	KR 20B DG 62S	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	14/02/2025	1/05/2025	24 HORAS
6	6-feb-25	KR 20A CL 67S	KR 20A DG 62S	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	14/02/2025	1/05/2025	24 HORAS
6	6-feb-25	KR 20 CL 67S	KR 20 DG 62S	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	14/02/2025	1/05/2025	24 HORAS
6	6-feb-25	CL 67S KR 23	CL 67S KR 20A	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	14/02/2025	1/05/2025	24 HORAS
6	6-feb-25	CL 66A S KR 23	CL 66A S KR 23A	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	14/02/2025	1/05/2025	24 HORAS
6	6-feb-25	CL 66S KR 22A	CL 66S KR 19G	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	14/02/2025	1/05/2025	24 HORAS
6	6-feb-25	CL 65B S KR 23A	CL 65B S KR 22A	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	14/02/2025	1/05/2025	24 HORAS
6	6-feb-25	DG 65A S TV 23	DG 65A S KR 23A	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	14/02/2025	1/05/2025	24 HORAS
6	6-feb-25	CL 65S KR 22H	CL 65S KR 19G	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	14/02/2025	1/05/2025	24 HORAS
6	6-feb-25	CL 64S KR 22B	CL 64S KR 19G	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	14/02/2025	1/05/2025	22:00-05:00
6	6-feb-25	CL 63S KR 22B	CL 63S KR 19G	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	14/02/2025	1/05/2025	24 HORAS
6	6-feb-25	CL 63A S KR 22B	CL 63A S KR 22A	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	14/02/2025	1/05/2025	24 HORAS
6	6-feb-25	CL 62S KR 21A	CL 62S KR 19G	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	14/02/2025	1/05/2025	24 HORAS
6	6-feb-25	CL 61B S KR 20A	CL 61B S KR 19G	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	14/02/2025	1/05/2025	24 HORAS
6	6-feb-25	TV 60 CL 45A S	TV 60 DG 53S	UNIDIRECCIONAL	TUNJUELITO	SI	14/02/2025	1/05/2025	24 HORAS
6	6-feb-25	TV 60 CL 45A S	TV 60 DG 53S	UNIDIRECCIONAL	TUNJUELITO	SI	14/02/2025	1/05/2025	24 HORAS
6	6-feb-25	TV 60 CL 45A S	TV 60 DG 53S	UNIDIRECCIONAL	TUNJUELITO	SI	14/02/2025	1/05/2025	24 HORAS
6	6-feb-25	TV 60 CL 45A S	TV 60 DG 53S	UNIDIRECCIONAL	TUNJUELITO	SI	14/02/2025	1/05/2025	24 HORAS
6	6-feb-25	CL 56A S DG 53S	CL 56A S KR 24	UNIDIRECCIONAL	TUNJUELITO	SI	14/02/2025	1/05/2025	24 HORAS
6	6-feb-25	CL 56A S DG 53S	CL 56A S KR 24	UNIDIRECCIONAL	TUNJUELITO	SI	14/02/2025	1/05/2025	24 HORAS

COI	Fecha	Dirección de la Obra		Autorización					
		Inicio	Fin	Características	Localidad	Estado	Fecha Inicio	Fecha Fin	Horario Cierre
6	6-feb-25	CL 56A S DG 53S	CL 56A S KR 24	UNIDIRECCIONAL	TUNJUELITO	SI	14/02/2025	1/05/2025	24 HORAS
6	6-feb-25	CL 56A S DG 53S	CL 56A S KR 24	UNIDIRECCIONAL	TUNJUELITO	SI	14/02/2025	1/05/2025	24 HORAS
6	6-feb-25	CL 58A S KR 24	CL 58A S KR 19C	UNIDIRECCIONAL	TUNJUELITO	SI	14/02/2025	1/05/2025	22:00-05:00
6	6-feb-25	CL 58A S KR 24	CL 58A S KR 19C	UNIDIRECCIONAL	TUNJUELITO	SI	14/02/2025	1/05/2025	22:00-05:00
7	13-feb-25	CL 67S KR 20B	CL 67S KR 19D	UNIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	15/02/2025	8/05/2025	22:00-05:00
7	13-feb-25	CL 68S KR 20A	CL 68S KR 19D	UNIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	15/02/2025	8/05/2025	22:00-05:00
7	13-feb-25	DG 68S KR 19D	DG 68S KR 19A	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	15/02/2025	8/05/2025	22:00-05:00
7	13-feb-25	CL 66S KR 19G	CL 66S KR 19D	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	15/02/2025	8/05/2025	22:00-05:00
7	13-feb-25	CL 65S KR 19G	CL 65S KR 19D	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	15/02/2025	8/05/2025	24 HORAS
7	13-feb-25	CL 64S KR 19G	CL 64S KR 19D	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	15/02/2025	8/05/2025	22:00-05:00
7	13-feb-25	CL 63S KR 19G	CL 63S KR 19D	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	15/02/2025	8/05/2025	24 HORAS
7	13-feb-25	DG 63S KR 19D	DG 63S TV 19C	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	15/02/2025	8/05/2025	24 HORAS
7	13-feb-25	DG 62D S KR 19D	DG 62D S KR 19C	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	15/02/2025	8/05/2025	24 HORAS
7	13-feb-25	CL 62S KR 19G	CL 62S KR 19D	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	15/02/2025	8/05/2025	24 HORAS
7	13-feb-25	CL 61B S KR 19G	CL 61B S KR 19D	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	15/02/2025	8/05/2025	24 HORAS
7	13-feb-25	CL 61ABIS S KR 19G	CL 61ABIS S KR 19D	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	15/02/2025	8/05/2025	24 HORAS
7	13-feb-25	KR 20A CL 67S	KR 20A CL 68S	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	15/02/2025	8/05/2025	24 HORAS
7	13-feb-25	KR 20 CL 67S	KR 20 CL 68B S	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	15/02/2025	8/05/2025	24 HORAS
7	13-feb-25	KR 19G CL 68H S	KR 19G DG 62S	UNIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	15/02/2025	8/05/2025	22:00-05:00
7	13-feb-25	KR 19F CL 68F S	KR 19F CL 61B S	UNIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	15/02/2025	8/05/2025	24 HORAS
7	13-feb-25	KR 19D CL 68S	KR 19D DG 62S	UNIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	15/02/2025	8/05/2025	22:00-05:00
7	13-feb-25	CL 61A S KR 19D	CL 61A S KR 19B	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	15/02/2025	8/05/2025	24 HORAS
7	13-feb-25	KR 19C CL 61A S	KR 19C DG 62S	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	15/02/2025	8/05/2025	24 HORAS
7	13-feb-25	KR 19B BIS CL 61A S	KR 19B BIS DG 62S	UNIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	15/02/2025	8/05/2025	24 HORAS

COI	Fecha	Dirección de la Obra		Autorización					
		Inicio	Fin	Características	Localidad	Estado	Fecha Inicio	Fecha Fin	Horario Cierre
7	13-feb-25	KR 19B CL 61 BIS S	KR 19B DG 62S	UNIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	15/02/2025	8/05/2025	22:00-05:00
7	13-feb-25	DG 62S KR 19	DG 62S KR 22A	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	15/02/2025	8/05/2025	22:00-05:00
7	13-feb-25	DG 62S KR 22A	DG 62S KR 22B	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	15/02/2025	8/05/2025	22:00-05:00
7	13-feb-25	CL 62S KR 22B	CL 62S KR 23C	UNIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	15/02/2025	8/05/2025	22:00-05:00
7	13-feb-25	KR 22B CL 62A S	KR 22B CL 61S	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	15/02/2025	8/05/2025	22:00-05:00
7	13-feb-25	KR 22A CL 63S	KR 22A DG 62S	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	15/02/2025	8/05/2025	24 HORAS
7	13-feb-25	KR 22 CL 63S	KR 22 DG 62S	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	15/02/2025	8/05/2025	24 HORAS
7	13-feb-25	KR 21A CL 62S	KR 21A DG 62S	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	15/02/2025	8/05/2025	24 HORAS
7	13-feb-25	KR 21 CL 62S	KR 21 DG 62S	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	15/02/2025	8/05/2025	24 HORAS
7	13-feb-25	KR 20F CL 62S	KR 20F DG 62S	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	15/02/2025	8/05/2025	24 HORAS
7	13-feb-25	KR 20D CL 62S	KR 20D DG 62S	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	15/02/2025	8/05/2025	24 HORAS
7	13-feb-25	KR 20C CL 62S	KR 20C DG 62S	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	15/02/2025	8/05/2025	22:00-05:00
7	13-feb-25	KR 20B CL 62S	KR 20B DG 62S	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	15/02/2025	8/05/2025	24 HORAS
7	13-feb-25	TV 20B DG 62S	TV 20B DG 61S	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	15/02/2025	8/05/2025	24 HORAS
7	13-feb-25	KR 20A CL 61B S	KR 20A DG 62S	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	15/02/2025	8/05/2025	24 HORAS
7	13-feb-25	KR 20 CL 61B S	KR 20 DG 62S	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	15/02/2025	8/05/2025	24 HORAS
7	13-feb-25	KR 19H DG 62S	KR 19H CL 59A S	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	15/02/2025	8/05/2025	24 HORAS
7	13-feb-25	KR 19G DG 62S	KR 19G CL 59S	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	15/02/2025	8/05/2025	24 HORAS
7	13-feb-25	KR 19F CL 60A S	KR 19F CL 59S	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	15/02/2025	8/05/2025	24 HORAS
7	13-feb-25	KR 19BBISA CL 60S	KR 19BBISA CL 59A S	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	15/02/2025	8/05/2025	24 HORAS
7	13-feb-25	CL 59B S KR 19BBISA	CL 59B S KR 19F	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	15/02/2025	8/05/2025	24 HORAS
7	13-feb-25	CL 59A S KR 19BBISA	CL 59A S TV 20	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	15/02/2025	8/05/2025	24 HORAS

COI	Fecha	Dirección de la Obra		Autorización					
		Inicio	Fin	Características	Localidad	Estado	Fecha Inicio	Fecha Fin	Horario Cierre
7	13-feb-25	CL 59S KR 19BBISA	CL 59S KR 19H	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	15/02/2025	8/05/2025	24 HORAS
7	13-feb-25	CL 59A S KR 19BBISA	CL 59A S KR 19	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	15/02/2025	8/05/2025	24 HORAS
7	13-feb-25	AV VILLAVICENCIO (AK 70C) CL 57T S	AV VILLAVICENCIO (AC 61 S) TV 42A	UNIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	15/02/2025	8/05/2025	22:00-05:00
7	13-feb-25	AV VILLAVICENCIO (AK 70C) CL 57T S	AV VILLAVICENCIO (AC 61 S) TV 42A	UNIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	15/02/2025	8/05/2025	22:00-05:00
7	13-feb-25	CL 62B S KR 70C	CL 62B S KR 70	UNIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	14/02/2025	8/05/2025	22:00-05:00
7	13-feb-25	CL 62B S KR 70C	CL 62B S KR 70	UNIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	14/02/2025	8/05/2025	22:00-05:00
7	13-feb-25	TV 70C CL 68S	TV 70C DG 67A S	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	14/02/2025	8/05/2025	24 HORAS
7	13-feb-25	TV 70 CL 68S	TV 70 CL 67B S	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	14/02/2025	8/05/2025	24 HORAS
7	13-feb-25	TV 69 CL 68S	TV 69 CL 68B S	UNIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	14/02/2025	8/05/2025	24 HORAS
7	13-feb-25	TV 69 CL 68S	TV 69 CL 68B S	UNIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	14/02/2025	8/05/2025	24 HORAS
7	13-feb-25	TV 64 CL 68S	TV 64 CL 67B S	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	14/02/2025	8/05/2025	22:00-05:00
7	13-feb-25	KR 49 CL 68S	KR 49 CL 68A S	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	14/02/2025	8/05/2025	22:00-05:00
7	13-feb-25	AV JORGE GAITAN CORTES (KR 33) CL 47A S	AV JORGE GAITAN CORTES (KR 33) DG 51B S	UNIDIRECCIONAL	TUNJUELITO	SI	15/02/2025	8/05/2025	22:00-04:30
7	13-feb-25	AV JORGE GAITAN CORTES (KR 33) CL 47A S	AV JORGE GAITAN CORTES (KR 33) DG 51B S	UNIDIRECCIONAL	TUNJUELITO	SI	15/02/2025	8/05/2025	22:00-04:30
7	13-feb-25	AV JORGE GAITAN CORTES	AV JORGE GAITAN CORTES	BIDIRECCIONAL	TUNJUELITO	SI	15/02/2025	8/05/2025	00:00-04:00

COI	Fecha	Dirección de la Obra		Autorización					
		Inicio	Fin	Características	Localidad	Estado	Fecha Inicio	Fecha Fin	Horario Cierre
		(KR 33) DG 51B S	(KR 33) CL 56A S						
7	13-feb-25	KR 32 CL 50 S	KR 32 CL 52B S	BIDIRECCIONAL	TUNJUELITO	SI	15/02/2025	8/05/2025	22:00-04:30
7	13-feb-25	KR 34 CL 50 S	KR 34 CL 51 S	BIDIRECCIONAL	TUNJUELITO	SI	15/02/2025	8/05/2025	24 HORAS
7	13-feb-25	KR 33A CL 53 S	KR 33A CL 56A S	BIDIRECCIONAL	TUNJUELITO	SI	15/02/2025	8/05/2025	24 HORAS
7	13-feb-25	KR 33 BIS CL 53 S	KR 33BIS CL 56A S	BIDIRECCIONAL	TUNJUELITO	SI	15/02/2025	8/05/2025	24 HORAS
7	13-feb-25	CL 49B S KR 34	CL 49B S KR 31	BIDIRECCIONAL	TUNJUELITO	SI	15/02/2025	8/05/2025	24 HORAS
7	13-feb-25	CL 50 S KR 34	CL 50 S KR 31	BIDIRECCIONAL	TUNJUELITO	SI	15/02/2025	8/05/2025	24 HORAS
7	13-feb-25	CL 50A S KR 34	CL 50A S KR 31	BIDIRECCIONAL	TUNJUELITO	SI	15/02/2025	8/05/2025	24 HORAS
7	13-feb-25	CL 50B S KR 35	CL 50B S DG 51 A S	BIDIRECCIONAL	TUNJUELITO	SI	15/02/2025	8/05/2025	22:00-04:30
7	13-feb-25	CL 51 S KR 35	CL 51 S DG 51 A S	UNIDIRECCIONAL	TUNJUELITO	SI	15/02/2025	8/05/2025	22:00-04:30
7	13-feb-25	CL 51A S KR 37	CL 51A S KR 29	BIDIRECCIONAL	TUNJUELITO	SI	15/02/2025	8/05/2025	22:00-04:30
7	13-feb-25	CL 51B S KR 37	CL 51A S KR 28	BIDIRECCIONAL	TUNJUELITO	SI	15/02/2025	8/05/2025	22:00-04:30
7	13-feb-25	CL 52G S KR 34	CL 52G S KR 32	BIDIRECCIONAL	TUNJUELITO	SI	15/02/2025	8/05/2025	22:00-04:30
7	13-feb-25	CL 53 S KR 34	CL 53 S KR 32	BIDIRECCIONAL	TUNJUELITO	SI	15/02/2025	8/05/2025	24 HORAS
7	13-feb-25	CL 53A S KR 34	CL 53A S KR 32	BIDIRECCIONAL	TUNJUELITO	SI	15/02/2025	8/05/2025	22:00-04:30
7	13-feb-25	CL 53B S KR 34	CL 53B S KR 32	BIDIRECCIONAL	TUNJUELITO	SI	15/02/2025	8/05/2025	24 HORAS
7	13-feb-25	CL 54 S KR 34	CL 54 S KR 32	BIDIRECCIONAL	TUNJUELITO	SI	15/02/2025	8/05/2025	24 HORAS
7	13-feb-25	CL 54A S KR 34	CL 54A S KR 31	BIDIRECCIONAL	TUNJUELITO	SI	15/02/2025	8/05/2025	24 HORAS
7	13-feb-25	CL 55 S KR 34	CL 55 S KR 31	BIDIRECCIONAL	TUNJUELITO	SI	15/02/2025	8/05/2025	22:00-04:30
7	13-feb-25	CL 55A S KR 34	CL 55A S KR 31	BIDIRECCIONAL	TUNJUELITO	SI	15/02/2025	8/05/2025	24 HORAS
7	13-feb-25	CL 56 S KR 34	CL 56 S KR 31	BIDIRECCIONAL	TUNJUELITO	SI	15/02/2025	8/05/2025	22:00-04:30
7	13-feb-25	CL 52F S KR 33	CL 52F S KR 32	UNIDIRECCIONAL	TUNJUELITO	SI	15/02/2025	8/05/2025	22:00-04:30

COI	Fecha	Dirección de la Obra		Autorización					
		Inicio	Fin	Características	Localidad	Estado	Fecha Inicio	Fecha Fin	Horario Cierre
7	13-feb-25	DG 52B S KR 32	DG 52B S KR 34	UNIDIRECCIONAL	TUNJUELITO	SI	15/02/2025	8/05/2025	22:00-05:00
7	13-feb-25	DG 52A S KR 32	DG 52A S KR 34	BIDIRECCIONAL	TUNJUELITO	SI	15/02/2025	8/05/2025	24 HORAS
7	13-feb-25	DG 52 S KR 32	DG 52 S KR 34	BIDIRECCIONAL	TUNJUELITO	SI	15/02/2025	8/05/2025	24 HORAS
7	13-feb-25	CL 48B S KR 31	CL 48B S KR 33	BIDIRECCIONAL	TUNJUELITO	SI	15/02/2025	8/05/2025	24 HORAS
7	13-feb-25	CL 48C S KR 31	CL 48C S KR 33	UNIDIRECCIONAL	TUNJUELITO	SI	15/02/2025	8/05/2025	00:00-04:30
7	13-feb-25	CL 49S KR 31	CL 49 S KR 33	BIDIRECCIONAL	TUNJUELITO	SI	15/02/2025	8/05/2025	24 HORAS
7	13-feb-25	CL 49AS KR 31	CL 49 S KR 34	UNIDIRECCIONAL	TUNJUELITO	SI	15/02/2025	8/05/2025	00:00-04:30
8	20-feb-25	CL 62 KR 45B	CL 62 KR 46A	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	27/02/2025	15/05/2025	21:00-05:00
8	20-feb-25	CL 62 KR 45B	CL 62 KR 44D	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	27/02/2025	15/05/2025	24 HORAS
8	20-feb-25	KR 45B CL 62S	KR 45B CL 68B S	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	27/02/2025	15/05/2025	21:00-05:00
8	20-feb-25	CL 68C S KR 45B	CL 68C S KR 38	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	27/02/2025	15/05/2025	21:00-05:00
8	20-feb-25	KR 43BIS CL 68G S	KR 43BIS DG 68D S	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	27/02/2025	15/05/2025	21:00-05:00
8	20-feb-25	CL 68G S KR 43BIS	CL 68G S KR 38	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	27/02/2025	15/05/2025	21:00-05:00
8	20-feb-25	KR 38 CL 68G S	KR 38 DG 69GBISB S	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	27/02/2025	15/05/2025	21:00-05:00
8	20-feb-25	DG 68G S CL 68G S	DG 68G S KR 45B	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	27/02/2025	15/05/2025	24 HORAS
8	20-feb-25	CL 68C S KR 45B	CL 68C S KR 45CBIS	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	27/02/2025	15/05/2025	21:00-05:00
8	20-feb-25	CL 68CBIS S KR 45CBIS	CL 68CBIS S KR 45B	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	27/02/2025	15/05/2025	21:00-05:00
8	20-feb-25	KR 45B CL 68CBIS S	KR 45B DG 68G S	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	27/02/2025	15/05/2025	21:00-05:00
8	20-feb-25	DG 68G S KR 45B	DG 68G S KR 46	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	27/02/2025	15/05/2025	21:00-05:00
8	20-feb-25	KR 46 DG 68G S	KR 46 CL 69I S	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	27/02/2025	15/05/2025	21:00-05:00
8	20-feb-25	CL 69D S KR 46	CL 69D S KR 44A	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	27/02/2025	15/05/2025	21:00-05:00
8	20-feb-25	CL 69GBIS S KR 46	CL 69GBIS S KR 45BIS	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	27/02/2025	15/05/2025	24 HORAS
8	20-feb-25	CL 69FBIS S KR 45BIS	CL 69FBIS S KR 44D	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	27/02/2025	15/05/2025	24 HORAS

COI	Fecha	Dirección de la Obra		Autorización					
		Inicio	Fin	Características	Localidad	Estado	Fecha Inicio	Fecha Fin	Horario Cierre
8	20-feb-25	TV 42C CL 69FBIS S	TV 42CCL 69D S	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	27/02/2025	15/05/2025	21:00-05:00
8	20-feb-25	TV 46A CL 69I S	TV 46A CL 69J S	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	27/02/2025	15/05/2025	21:00-05:00
8	20-feb-25	KR 46A CL 69J S	KR 46A CL 70 S	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	27/02/2025	15/05/2025	21:00-05:00
8	20-feb-25	CL 70 S KR 46A	CL 70 STV 52	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	27/02/2025	15/05/2025	21:00-05:00
8	20-feb-25	TV 50 CL 71 S	TV 50 CL 69D S	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	27/02/2025	15/05/2025	21:00-05:00
8	20-feb-25	DG 70 S TV 52	DG 70 S TV 60	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	27/02/2025	15/05/2025	21:00-05:00
8	20-feb-25	KR 44D CL 69FBIS S	KR 44D CL 69JBIS S	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	21/02/2025	15/05/2025	21:00-05:00
8	20-feb-25	KR 45 CL 69J S	KR 45 DG 69N S	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	21/02/2025	15/05/2025	21:00-05:00
8	20-feb-25	CL 69N S KR 45	CL 69N S CL 69M S	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	21/02/2025	15/05/2025	21:00-05:00
8	20-feb-25	CL 69M S KR 44B	CL 69M S KR 42	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	21/02/2025	15/05/2025	21:00-05:00
8	20-feb-25	CL 69J S KR 44D	CL 69J S TV 22	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	21/02/2025	15/05/2025	21:00-05:00
8	20-feb-25	TV 35 CL 69JBIS S	TV 35 CL 69L S	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	21/02/2025	15/05/2025	21:00-05:00
8	20-feb-25	KR 42 CL 70A S	KR 42 TV 40	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	21/02/2025	15/05/2025	21:00-05:00
8	20-feb-25	CL 71 S KR 44	CL 71 S KR 41A	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	21/02/2025	15/05/2025	21:00-05:00
8	20-feb-25	TV 38B KR 42	TV 38B CL 75B S	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	21/02/2025	15/05/2025	21:00-05:00
8	20-feb-25	KR 40 CL 75B S	KR 40 CL 77 S	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	21/02/2025	15/05/2025	21:00-05:00
8	20-feb-25	KR 37 CL 79A S	KR 37 CL 80 S	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	21/02/2025	15/05/2025	24 HORAS
8	20-feb-25	CL 75B S KR 40	CL 75B S KR 37	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	21/02/2025	15/05/2025	24 HORAS
8	20-feb-25	CL 79 S TV 37	CL 79 S TV 34	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	21/02/2025	15/05/2025	21:00-05:00
8	20-feb-25	TV 34 CL 79 S	TV 34 CL 75 S	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	21/02/2025	15/05/2025	21:00-05:00
8	20-feb-25	TV 34C DG 74ABIS S	TV 34C DG 73A S	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	21/02/2025	15/05/2025	21:00-05:00
8	20-feb-25	DG 73A S TV 34C	DG 73A S TV 36B	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	21/02/2025	15/05/2025	21:00-05:00

COI	Fecha	Dirección de la Obra		Autorización					
		Inicio	Fin	Características	Localidad	Estado	Fecha Inicio	Fecha Fin	Horario Cierre
8	20-feb-25	TV 36B DG 73ABISA S	TV 36B CL 74 S	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	21/02/2025	15/05/2025	21:00-05:00
8	20-feb-25	CL 74ABIS S CL 74 S	CL 74ABIS S DG 74ABIS S	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	21/02/2025	15/05/2025	21:00-05:00
8	20-feb-25	TV 38B DG 74ABIS S	TV 38B CL 74 S	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	21/02/2025	15/05/2025	21:00-05:00
8	20-feb-25	DG 73BBIS S CL 74 S	DG 73BBIS S KR 42	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	21/02/2025	15/05/2025	21:00-05:00
8	20-feb-25	CL 72F S KR 36B	CL 72F S KR 34A	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	21/02/2025	15/05/2025	21:00-05:00
8	20-feb-25	DG 72F S KR 34A	DG 72F S TV 32	BIDIRECCIONAL	CIUDAD BOLIVAR	SI	21/02/2025	15/05/2025	24 HORAS

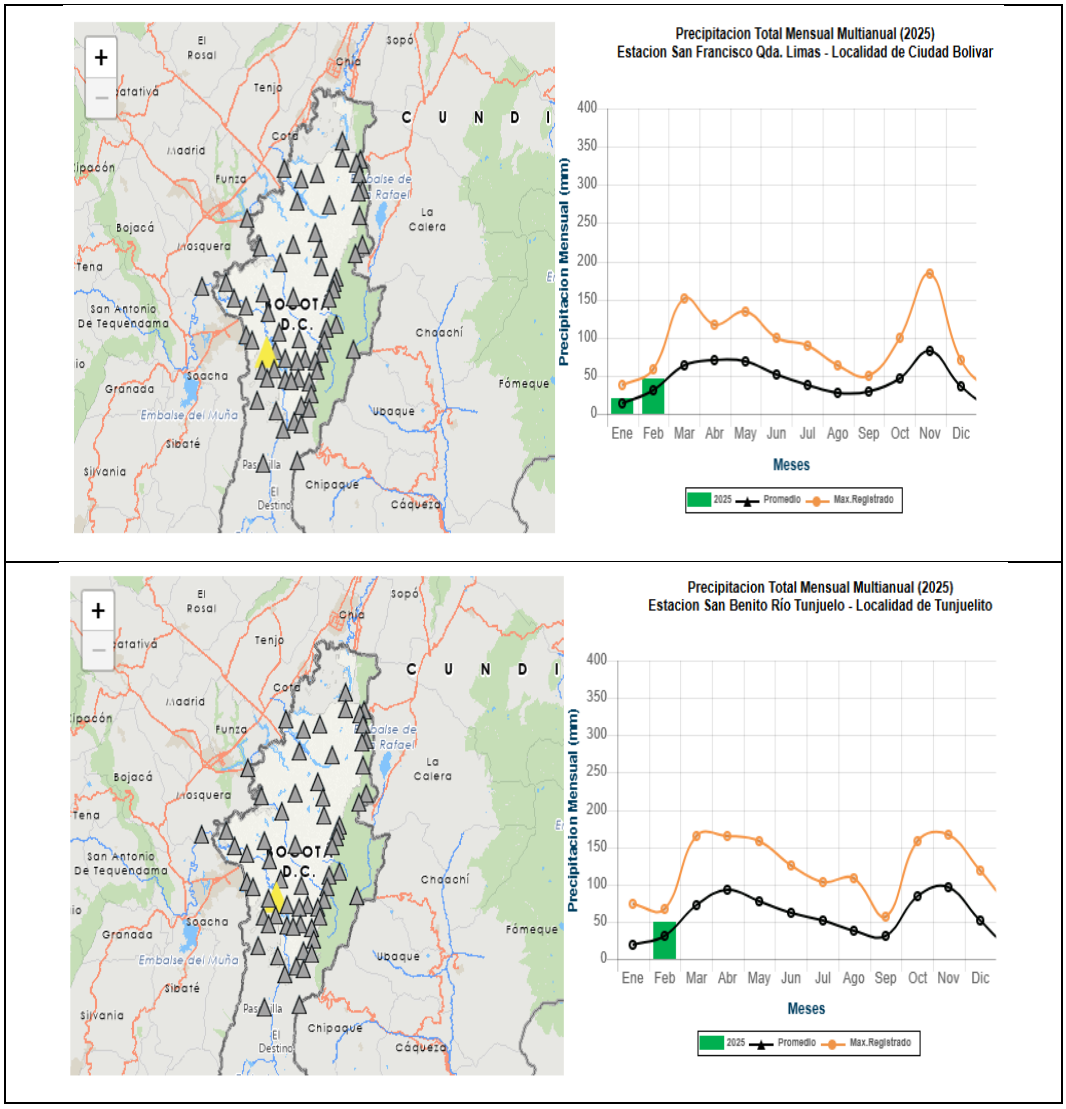
Fuente: Elaboración a partir de la información de los COI de la SPMT de la SDM

Igualmente, en el Anexo 5. se adjuntan los COI mencionados en la tabla anterior, donde se encuentra la información complementaria.

9. ASPECTOS TÉCNICOS

En el periodo del presente informe se presentaron precipitaciones considerables en la zona de ejecución del contrato, lo cual generó afectación sobre las actividades de demarcación vial. En la figura 3, se muestran las estaciones ubicadas en las localidades del proyecto y la figura 4 muestra la distribución espacial de las precipitaciones durante el mes de febrero 2025.

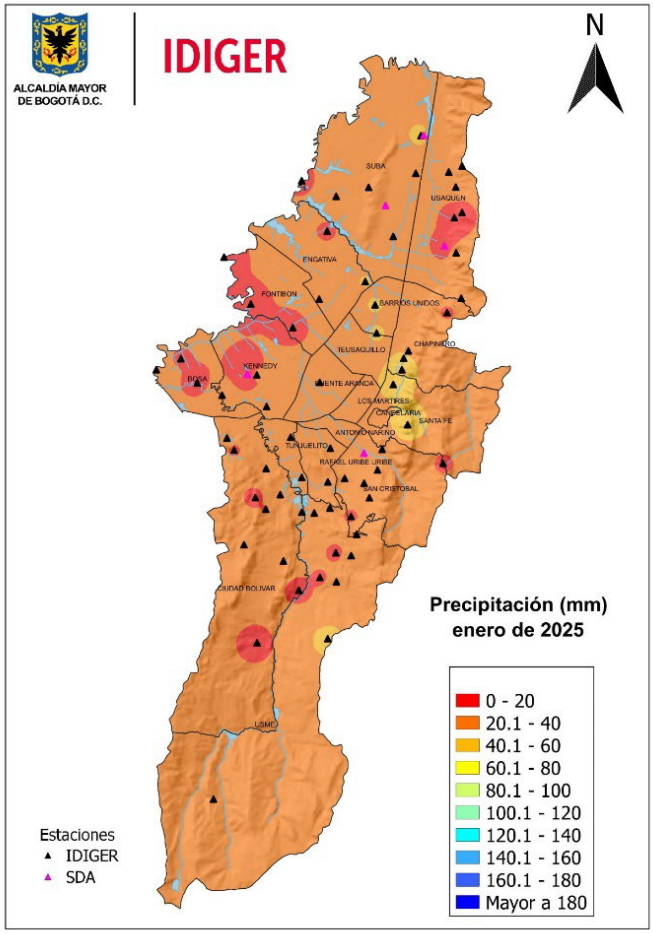
Figura 3. Precipitación mensual de la ciudad (Localidades Proyecto)



Fuente: tomado de IDIGER, febrero de 2025 https://www.sire.gov.co/web/sab

Se puede evidenciar en las gráficas de la figura 3, que para el mes de febrero de 2025 se presentaron en la ciudad de Bogotá precipitaciones por encima de los 50 mm, para las localidades de intervención.

Figura 4. Precipitación mensual de la ciudad



Fuente: tomado de IDIGER, febrero de 2025 https://www.sire.gov.co/web/sab

Se puede evidenciar en las gráficas de la figura 4, que para el mes de febrero de 2025 las precipitaciones en la ciudad de Bogotá estuvieron por debajo de los 60 mm, para las localidades de intervención. Sin embargo, cabe aclarar que las condiciones climáticas no dejan de afectar de manera importante la ejecución de la señalización en los IDs asignados.

9.1 IDS CON GARANTÍAS INFERIORES O IGUALES A 6 MESES

Para el periodo del presente informe, de acuerdo con los IDs inspeccionados en el periodo del 23 de enero al 22 de febrero de 2025, 3 diseños presentaron garantías inferiores o iguales a 6 meses:

- **CPS_941_EM_19_111**

La combinación de la matriz de garantía evaluada en este ID arroja una garantía menor o igual a 6 meses, en pintura de dos componentes (por extrusión) y termoplástico, Pintura de dos componentes por spray, Estoperoles y tachas con espigo, Bandas sonoras reductoras de velocidad en agregado, Hitos y tachones - bordillos traspasables y no traspasables, en los tramos viales de la AK 33 ENTRE CL 44 SUR Y CL 47 BIS SUR - CL 47BIS SUR ENTRE KR 32 Y AK 33 - AK 33 ENTRE CL 47BIS SUR Y CL 47A SUR - AK 33 ENTRE CL 47A SUR Y CL 47B SUR - AK 33 ENTRE CL 47B SUR Y CL 48 SUR - AK 33 ENTRE CL 48 SUR Y CL 48A SUR - AK 33 ENTRE CL 48A SUR Y CL 48B SUR - CL 48B SUR KR 31 Y AK 33 - AK 33 ENTRE CL 48B SUR Y CL 48C SUR - CL 48C SUR ENTRE KR 31 Y AK 33 - AK 33 ENTRE CL 48C SUR Y CL 49 SUR - CL 49 SUR ENTRE KR 31 Y AK 33 - AK 33 ENTRE CL 49 SUR Y CL 49A SUR - CL 49A SUR ENTRE AK 33 Y KR 34 - AK 33 ENTRE CL 49A SUR Y CL 49B SUR - CL 49B SUR ENTRE KR 31 Y AK 33 - CL 50 SUR ENTRE AK 33 Y KR 34 - AK 33 ENTRE CL 49B SUR CL 50 SUR - KR 32 ENTRE AK 33 Y CL 50A SUR - AK 33 ENTRE KR 32 Y CL 50A SUR - KR 34 ENTRE CL 50 SUR Y CL 50A SUR - KR 34 ENTRE CL 50A SUR Y KR 35 - AK 33 ENTRE CL 50A SUR Y CL 50B SUR - KR 32 ENTRE CL 50A SUR Y CL 50B SUR - KR 34 ENTRE CL 50A SUR Y CL 50B SUR - CL 50B SUR ENTRE KR 31 Y KR 32 - CL 50B SUR ENTRE KR 32 Y AK 33 - CL 50B SUR ENTRE AK 33 Y KR 34 - CL 50B SUR ENTRE KR 34 Y KR 35 - AK 33 ENTRE CL 50B SUR Y CL 51 SUR - KR 34 ENTRE CL 50B SUR Y CL 51 SUR - CL 51 SUR ENTRE DG 51A SUR Y KR 32 - KR 32 ENTRE DG 51A SUR Y CL 51 SUR - CL 51 SUR ENTRE KR 32 Y AK 33 - CL 51 SUR ENTRE AK 33 Y KR 34 - CL 51 SUR ENTRE KR 34 Y KR 35 - AK 33 ENTRE CL 51 SUR Y CL 51A SUR - CL 51A SUR ENTRE DG 51A SUR Y AK 33 - AK 33 ENTRE CL 51A SUR Y DG 51A SUR - KR 35 ENTRE CL 51A SUR Y CL 51B SUR - CL 51B SUR ENTRE KR 35 Y KR 36 - CL 51B SUR ENTRE AK 33 Y KR 35 - CL 51B SUR ENTRE CL 51A SUR Y AK 33 - DG 51A SUR ENTRE KR 32 Y CL 51A SUR - DG 51B SUR ENTRE KR 31 Y KR 32 - DG 51B ENTRE CL 51 SUR Y KR 32 - KR 32 ENTRE DG 52 SUR Y DG 51B SUR - KR 33 ENTRE CL 51B SUR Y DG 52 SUR - DG 52 SUR ENTRE KR 32 Y KR 33 - AK 33 ENTRE DG 52 SUR Y DG 52A SUR - DG 52A SUR ENTRE KR 33 Y KR 35 - DG 52A SUR ENTRE KR 32 Y KR 33 - KR 33 ENTRE DG 52A SUR Y DG 52B SUR - DG 52B SUR ENTRE KR 32 Y KR 33 - DG 52B SUR ENTRE KR 33 Y KR 34 - KR 33 ENTRE DG 52B SUR Y CL 52A SUR - CL 52A SUR ENTRE KR 32 Y KR 33 - KR 33 ENTRE CL 52A SUR Y CL 52G SUR - KR 33 ENTRE CL 52G SUR Y CL 53 SUR - CL 53 SUR ENTRE KR 33 Y KR 34 - KR 33 ENTRE CL 53 SUR Y CL 53A SUR - KR 33A ENTRE CL 53 SUR Y CL 53A SUR - CL 53A SUR ENTRE KR 33 Y KR 33A - KR 33A ENTRE CL 53A SUR Y CL 53B SUR - KR 33A ENTRE CL 53A SUR Y CL 53B SUR - KR 33 ENTRE CL 53A SUR Y CL 53B SUR - CL 53B SUR ENTRE KR 33A Y KR 34 - CL 53B SUR ENTRE KR 33 Y KR 33A - CL 53B SUR ENTRE KR 32 Y KR 33 - KR 33 ENTRE CL 53B SUR Y CL 54 SUR - KR 33A ENTRE CL 53B SUR Y CL 54 SUR - CL 54 SUR ENTRE KR 32 Y KR 33 - CL 54 SUR ENTRE KR 33 Y KR 33A - CL 54 SUR ENTRE KR 33A Y KR 34 - KR 33 ENTRE CL 54 SUR Y CL 54A SUR - KR 33A ENTRE CL 54 SUR Y CL 54A SUR - CL 54A SUR ENTRE KR 33 Y KR 33A - KR 33A ENTRE CL 54A SUR Y CL 55 SUR - KR 33 ENTRE CL 54A SUR Y CL 55 SUR - KR 32 ENTRE CL 54A SUR Y CL 55 SUR - CL 55 SUR ENTRE KR 33A Y KR 34 - CL 55 SUR ENTRE KR 33 Y KR 33A - KR 33A ENTRE CL 55 SUR Y CL 55A SUR - KR 33 ENTRE CL 55 SUR Y CL 55A SUR - CL 55A SUR ENTRE KR 31 Y KR 33 - CL 55A SUR ENTRE KR 33BIS Y KR 33A - CL 55A SUR ENTRE KR 33A Y KR 34 - KR 33 ENTRE CL 55A SUR Y CL 56 SUR - KR 33 BIS ENTRE CL 55A SUR Y CL 56 SUR - KR 33A ENTRE CL 55A SUR Y CL 56 SUR - CL 56 SUR ENTRE KR 33A Y CL 54A SUR - CL 56 SUR ENTRE KR 33 BIS Y KR 33A - KR 33 ENTRE CL 56 SUR Y AV. BOYACÁ - KR 33 BIS ENTRE CL 56 DUR Y AV. BOYACÁ - KR 33A ENTRE CL 56 SUR Y AV. BOYACÁ.

- **EX_19_387_1561_10**

La combinación de la matriz de garantía evaluada en este ID arroja una garantía menor o igual a 6 meses, en Pintura de dos componentes (por extrusión) y termoplástico, Pintura de dos componentes por spray , Estoperoles y tachas con espigo , Bandas sonoras reductoras de velocidad en agregado, Hitos y tachones - bordillos traspasables y no traspasables, en los tramos viales de la DG 68 S ENTRE KR 19B Y KR 19C - DG 68 S ENTRE KR 19C Y CL 68 S - DG 68 S ENTRE CL 68 S Y KR 19G - CL 68 S ENTRE KR 19F Y KR 19D - KR 19D ENTRE CL 68 S DG 67B S - KR 19D ENTRE DG 67B S Y DG 67A S - KR 19D ENTRE DG 67A S Y CL 67 S - KR 19D ENTRE CL 67 S Y DG 67 S - KR 19D ENTRE DG 67 S Y DG 66 S - KR 19D ENTRE DG 67 S Y DG 66 S - KR 19D ENTRE DG 67 S Y DG 66A S - KR 19D ENTRE DG 66A S Y DG 66 S - KR 19D ENTRE DG 66 S Y DG 65C S - KR 19D ENTRE DG 66 S Y DG 65C S - KR 19D ENTRE DG 65C S Y DG 65B S - KR 19D ENTRE DG 65B S Y DG 65 S - KR 19D ENTRE CL 65 S Y DG 65 S - KR 19D ENTRE DG 65 S Y DG 64 B S - KR 19D ENTRE DG 64B S Y DG 64 BIS B S - KR 19D ENTRE CL 64 Y DG 64B BIS S - KR 19D ENTRE DG 64 BIS S Y DG 64 BIS A S - KR 19D ENTRE DG 64 BIS A S Y DG 64 BIS S - KR 19D ENTRE DG 64 BIS S Y DG 63 S - KR 19D ENTRE DG 63 S Y DG 62D S - KR 19D ENTRE CL 63 S Y DG 62D S - KR 19D ENTRE DG 62D S Y DG 62C S - KR 19D ENTRE DG 62C S Y DG 62A S - KR 19D ENTRE DG 62A S Y CL 62 S - KR 19D ENTRE CL 62 S Y CL 61B S - KR 19D ENTRE CL 61A BIS S Y CL 61B S - KR 19D ENTRE CL 61 A BIS S Y CL 61A S - KR 19D ENTRE CL 61A BS Y DG 62 S - KR 18T ENTRE CL 61 BIS SY KR 19,KR 19G ENTRE CL 68H S Y CL 68F S - KR 19G ENTRE CL 68F S Y CL 68D S - KR 19G ENTRE CL 68D S Y CL 68D S - KR 20 ENTRE CL 68H S CL 68D S - KR 20 ENTRE CL 68D S Y CL 68C S - KR 20A ENTRE CL 68A S Y CL 68 S - KR 20A ENTRE CL 68 S Y CL 67 S - KR 20 ENTRE CL 67 S Y CL 68 S - KR 19G ENTRE CL 68 S Y CL 67 S - CL 68 S ENTRE KR 19G Y KR 19 F - KR 19F ENTRE CL 68D S Y CL 68 S - KR 19A ENTRE DG 68 S Y CL 68D S - KR 19F ENTRE CL 68 S Y CL 67 S - CL 67 S ENTRE KR 19G Y KR 19F - CL 67 S ENTRE KR 19F Y KR 19D - DG 67B S ENTRE KR 19D Y KR 19C - KR 20A ENTRE CL 67 S Y CL 66 S - KR 20 ENTRE CL 67 S Y CL 66 S - KR 19G ENTRE CL 67 S Y CL 66 S - KR 19F ENTRE CL 67 S Y CL 66 S - DG 67 S ENTRE KR 19D Y KR 19C - CL 66 S ENTRE KR 19D Y KR 19F - CL 66 S ENTRE KR 19F Y KR 19G - KR 19G ENTRE CL 66 S Y CL 65 S - KR 19F ENTRE CL 65 S Y CL 66 S - CL 65 S ENTRE KR 19G Y KR 19F - CL 65 S ENTRE KR 19D Y KR 19D - DG 65 S ENTRE KR 19D Y KR 19B BIS B - DG 64B S ENTRE KR 19D Y KR 19B - KR 19F ENTRE CL 65 S Y CL 64 S - KR 19G ENTRE CL 65 S Y CL 64 S - CL 64 S ENTRE KR 19F Y KR 19D - CL 64 S ENTRE KR 19G Y KR 19F - KR 19G ENTRE CL 64 S Y KR 63 S - KR 19F ENTRE CL 64 S Y KR 63 S - DG 64 BIS S ENTRE KR 19D Y KR 19C - DG 63 S ENTRE KR 19D Y TV 19C - CL 63 S ENTRE KR 19G Y KR 19F - CL 63 S ENTRE KR 19F Y KR 19D - DG 62D S ENTRE KR 19D Y TV 19C - DG 62C S ENTRE KR 19D Y TV 19C - KR 19G ENTRE CL 63 S Y CL 62 S - CL 62 S ENTRE KR 19G Y 19F - KR 19F ENTRE CL 62 S CL 63 S - CL 62 S ENTRE KR 19F Y KR 19D - KR 19G ENTRE CL 62 S Y CL 61B S - KR 19F ENTRE CL 62 S Y CL 61B S - CL 61B S ENTRE KR 19G Y KR 19F - CL 61A BIS S ENTRE KR 19G Y KR 19D - CL 61B S ENTRE KR 19F Y KR 19 D - KR 19G ENTRE CL 61A BIS S Y DG 62 S - KR19B BIS ENTRE CL 61A S Y DG 62 S - DG 62 S ENTRE KR 19 B BIS Y KR 19 B BIS A - KR 19 B BIS ENTRE DG 62 S Y CL 60A S - DG 62 S ENTREKR 19B BIS A Y KR 19 C - DG 62 S ENTRE KR 19B BIS Y KR 19B - DG 62 S ENTRE KR 19B Y KR 19A - DG 62 S ENTRE KR 19A Y KR 19 - DG 62 S ENTRE KR 19 B BIS A Y KR 19C - DG 62 S ENTRE KR 19C Y KR 19F - DG 62 S ENTRE KR 19F Y KR 19G - DG 62 S ENTRE

KR 19G Y KR 19 G - DG 62 S ENTRE KR 19G Y KR 19H - DG 62 S ENTRE KR 19H Y KR 20 - KR 20 ENTRE CL 61B S Y DG 62 S - DG 62 S ENTRE KR 20 Y KR 20A - KR 20A ENTRE CL 61B S Y DG 62 S - DG 62 S ENTRE TV 20B Y KR 20A - KR 20B ENTRE CL 61B S Y DG 62 S - TV 20B ENTRE DG 62 S Y TV 20B - TV 20B ENTRE DG 62 S Y TV 20B - TV 20B ENTRE TV 20B Y DG 61 S - DG 62 S ENTRE TV 20B Y KR 20D - KR 20D ENTRE CL 62 S Y DG 62 S - DG 62 S ENTRE KR 20D Y KR 20F - KR 20F ENTRE CL 62 S Y DG 62 S - DG 62 S ENTRE KR 20F Y KR 21 - KR 21 ENTRE CL 62 S Y DG 62 S - DG 62 S ENTRE KR 21 Y KR 21A - KR 21A ENTRE CL 62 S Y DG 62 S - DG 62 S ENTRE KR 21A Y KR 22 - KR 22 ENTRE DG 62 S Y CL 63 S - DG 62 S ENTRE KR 22 Y KR 22A - KR 22A ENTRE DG 62 S Y CL 62A S - KR 22A ENTRE CL 63 S Y CL 62A - CL 62A S ENTRE KR 22 A Y KR 22 B - KR 22 B ENTRE CL 62A Y DG 62 S - KR 22B ENTRE DG 62 S Y AV VILLAVICENCIO - CL 62 S ENTRE KR 21 Y KR 21A - CL 62 S ENTRE KR 21 Y KR 20F - KR 20 C ENTRE CL 62 S Y DG 62 S - DG 62 S ENTRE TV 20B Y KR 20C, KR 19C ENTRE CL 68BIS S Y DG 68 S - KR 19C ENTRE CL 68D S Y CL 68 BIS S, 'CL 68D S ENTRE KR 20 Y KR 19G - CL 68 S ENTRE KR 20A Y KR 20 - CL 67 S ENTRE KR 20B Y KR 20A - CL 67S ENTRE KR 20A Y KR 20 - CL 68 S ENTRE KR 20 Y KR 19G - CL 68D S ENTRE KR 19G Y KR 19F - CL 68F S ENTRE KR 19G Y KR 19 F - CL 67 S ENTRE KR 20 Y KR 19G - DG 62 S ENTRE KR 22A Y KR 22B - CL 62 S ENTRE KR 22B Y KR 22C - CL 62 S ENTRE KR 22C Y KR 22F - CL 62 S ENTRE KR 22F Y KR 22H - CL 62 S ENTRE KR 22H Y KR 22I - CL 62 S ENTRE KR 22I Y KR 23C.

- **MV_AV_BOYACA_941_09_V30**

La combinación de la matriz de garantía evaluada en este ID arroja una garantía menor o igual a 6 meses, en Pintura de dos componentes (por extrusión) y termoplástico, Pintura de dos componentes por spray, Estoperoles y tachas con espigo, Bandas sonoras reductoras de velocidad en agregado, Hitos y tachones - bordillos traspasables y no traspasables, en los tramos viales de la AC 61S ENTRE KR 38 Y KR 42C - AC 61S ENTRE KR 42C Y TV 42A - AC 61S ENTRE TV 42A Y KR 44 - AC 61S ENTRE KR 44 Y KR 45B - AC 68S ENTRE KR 45B Y KR 45C - AC 68S ENTRE KR 45C Y KR 45D - AC 68S ENTRE KR 45D Y KR 46 - AC 68S ENTRE KR 46 Y KR 46A - AC 68S ENTRE KR 46A Y KR 47 - AC 68S ENTRE KR 47 Y KR 47A - AC 68S ENTRE KR 47A Y KR 48 - AC 68S ENTRE KR 48 Y KR 49 - AC 68S ENTRE KR 49 Y KR 51 - AC 68S ENTRE KR 51 Y TV 69 - AC 68S ENTRE TV 69 Y TV 70 - AC 68S ENTRE TV 70 Y TV 70C - AC 68S ENTRE TV 70 Y KR 69C - AC 68S ENTRE KR 69C Y DG 67AS - AK 70C ENTRE DG 67AS Y CL 64AS - AK 70C ENTRE CL 64AS Y CL 64S - AK 70C ENTRE CL 64S Y CL 63S - AK 70C ENTRE CL 63S Y CL 62B S - AK 70C ENTRE CL 62B S Y CL 62A S - AK 70C ENTRE CL 62A S Y CL 62S - AK 70C ENTRE CL 62S Y CL 61S - AK 70C ENTRE CL 61S Y CL 60BS - AK 70C ENTRE CL 60BS Y CL 60AS - AK 70C ENTRE CL 60AS Y CL 60S - AK 70C ENTRE CL 60S Y AC 57R S - KR 38 ENTRE TV 42 Y CL 61S - TV 42A ENTRE CL 61S Y TV 42 - KR 45B ENTRE CL 61S Y CL 60AS - KR 49 ENTRE CL 68AS Y CL 68S - TV 64 ENTRE CL 67BS Y CL 68S - TV 69 ENTRE CL 68BS Y CL 68S - TV 70 ENTRE CL 68S Y CL 67BS - CL 62BS ENTRE KR 70 Y KR 70C.

10. ENTREGA DE SEÑALIZACIÓN A ALMACÉN

Para el periodo del presente informe, a continuación, se presenta el detalle de la señalización vertical implementada, dispositivos de control al tránsito implementados y entregada al almacén de la SDM.

10.1 ENTREGA DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y DISPOSITIVOS DE CONTROL IMPLEMENTADOS

En el Anexo 6. Acta de entrega de señalización, se presenta el comprobante de ingreso de elementos emitido por la subdirección Administrativa de la Secretaría Distrital de Movilidad, donde se relaciona la señalización vertical y los dispositivos viales instalados en el periodo del 28 de noviembre al 27 de diciembre de 2023:

Tabla 16. Elementos de Señalización Vertical y Dispositivos de Control Implementados

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN A.I.U	A.I.U 33.4%	PRECIO	TOTAL
						UNITARIO	
1	M2	Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	60,3632	$ 338.677	$ 108.817	$ 447.494	$ 27.012.170
2	UN	Fabricación y suministro de pedestal sencillo en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2mm para señales SP-SR-SI (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.	42	$ 107.727	$ 34.613	$ 142.340	$ 5.978.280
3	UN	Fabricación y suministro de pedestal doble en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2mm para señales tipo dúplex SR/SP - SR/SR - SR/Plaqueta - SP/SP - SP/Plaqueta (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.	128	$ 149.063	$ 47.894	$ 196.957	$ 25.210.496
5	UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16, E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.	168	$ 255.557	$ 82.111	$ 337.668	$ 56.728.224

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN A.I.U	A.I.U 33.4%	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 60 cm, material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SP/SR-SI/SR cumpliendo con normatividad vigente.	99	$ 404.556	$ 129.984	$ 534.540	$ 52.919.460
7	UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble SP47 o SP47A/SR de 60 cm, material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm. cumpliendo con normatividad vigente.	16	$ 510.957	$ 164.170	$ 675.127	$ 10.802.032
8	M2	Fabricación de plaquetas, suministro e instalación para señal SR - SP - SI - ST (alto mínimo de 23 cm) material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente.	27,786	$ 356.446	$ 114.526	$ 470.972	$ 13.086.428
9	UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-47 B, material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm. cumpliendo con normatividad vigente.	7	$ 463.715	$ 148.991	$ 612.706	$ 4.288.942
10	UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 75 cm, material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo con normatividad vigente.	13	$ 330.832	$ 106.296	$ 437.128	$ 5.682.664
13	UN	Fabricación, suministro e instalación de delineador de curva horizontal de 51 x 36 cm (figura 5-14 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024), material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm. Cumpliendo normatividad vigente.	48	$ 188.156	$ 60.455	$ 248.611	$ 11.933.328

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN A.I.U	A.I.U 33.4%	PRECIO	TOTAL
						UNITARIO	
15	UN	Fabricación, suministro e instalación de marcador de obstáculo vertical doble plano (figura 5-23 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) 90X45 cm, material reflectivo Tipo XI Amarillo /verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.	40	$ 276.409	$ 88.810	$ 365.219	$ 14.608.760
16	UN	Fabricación, suministro e instalación de marcador de obstáculo vertical sencillo plano (figura 5-23 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) 90X30 cm, material reflectivo Tipo XI Amarillo /verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.	2	$ 218.374	$ 70.163	$ 288.537	$ 577.074
17	UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-46 o SP-46A, material reflectivo Tipo XI amarillo / verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo con normatividad vigente.	37	$ 271.018	$ 87.078	$ 358.096	$ 13.249.552
18	UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-46 B, material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de 2" cumpliendo con normatividad vigente.	15	$ 359.799	$ 115.604	$ 475.403	$ 7.131.045
19	UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal SR-38 o SR-39 de 75 x 25 cm, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.	46	$ 187.502	$ 60.244	$ 247.746	$ 11.396.316
22	UN	Fabricación, suministro e instalación de tablero de 60 cm, señal Reglamentaria, preventiva o informativa, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	17	$ 144.642	$ 46.473	$ 191.115	$ 3.248.955

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN A.I.U	A.I.U 33.4%	PRECIO	TOTAL
						UNITARIO	
26	UN	Instalación de Señales Verticales de Pedestal (incluye Señales Sencillas tipo preventiva, Reglamentaria o informativa, Dúplex, Chevrones y Delineadores de todas las dimensiones) cumpliendo normatividad vigente.	48	$ 40.601	$ 13.045	$ 53.646	$ 2.575.008
73	UN	Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,0 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación. Figura 5-22 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024	16568	$ 10.967	$ 3.524	$ 14.491	$ 240.086.888
TOTAL							**$ 506.515.622**

Fuente: Acta de Recibo a Satisfacción 1

10.2 ENTREGA DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL RETIRADA

Para el periodo del presente informe no se realizó entrega de señales verticales retiradas al patio 4, de la Secretaría Distrital de Movilidad.

11. INFORME DE GESTIÓN SOCIAL

Este documento se incluye en el Anexo 7. y se denomina Informe de gestión social.

12. INFORME DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y OCUPACIONAL

Este documento se incluye en el Anexo 8. y se denomina Informe de sistema de seguridad y salud en el trabajo.

13. AFECTACIÓN EN REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS

Durante el periodo del presente informe no se presentaron afectaciones en redes de servicios públicos.

14. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y JURIDICOS

Durante el periodo del presente informe, se enviaron comunicados a las diferentes entidades observadas en la inspección de reservas, las cuales a la fecha aún no cuentan con respuesta.

15. MANEJO DEL LIBRO DE OBRA (BITÁCORA)

En el Anexo 9. Bitácora de obra, se presenta copia de esta. en cada informe mensual y final, se tomará como evidencia de registro de las situaciones especiales y desarrollo en general del contrato.

16. HOJA DE VIDA DEL CONTRATO

En el Anexo 11. Hoja de vida del contrato, se presenta el formato de la hoja de vida del contrato de obra SDM-2024-3652, actualizado.

17. CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

- Para el primer mes del contrato, se ejecutó el 9.77 % del valor total del contrato, lo cual representa un 2.27 % superior a la meta mínima de ejecución estipulada en el numeral 3.6. METAS PARA EJECUCIÓN DE OBRA Y ENTREGA DE LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES del ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO DEFINITIVO establecido en 7.50% para el primer mes de ejecución.

- El avance parcial y acumulado respecto al mes 1 de ejecución, en proporción con los porcentajes mínimos establecidos para ejecutar, de acuerdo con lo estipulado en el numeral 3.5 3.6. METAS PARA EJECUCIÓN DE OBRA Y ENTREGA DE LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES del ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO DEFINITIVO, se tiene acumulado el 9.77 % el cual representa un valor de 2.27 % superior al valor programado que equivale al 7.50 % acumulado para el primer mes del contrato.

- Durante el periodo de informe se realizó seguimiento a la vigencia de los PMT actuales y se gestionó la respectiva autorización por parte de la SPMT para los diseños que se asignaron y se programaron para ejecución, con el fin de que las implementaciones cuenten con los respectivos permisos de ejecución.

- A la fecha de corte del presente informe, se hizo la entrega de un total de 5 planos desarrollados en la CUENTA 1, pendiente por aprobación de la interventoría y la secretaria de movilidad.

18. ANEXOS

Anexo 1. Acta de obra y documentos para desembolso

Anexo 2. Pólizas

Anexo 3. Equipos mínimos

Anexo 4. Plan de Calidad

Anexo 5. Plan de manejo de Transito (COI)

Anexo 6. Comprobante ingreso a almacén y entrega de señalización retirada

Anexo 7. Informe de gestión social

Anexo 8. Informe sistema de seguridad y salud en el trabajo

Anexo 9. Bitácora de obra

Anexo 10. Informe Ejecutivo Mensual 1

Anexo 11. Hoja de vida del contrato
