2364-2024 SNR-010

Bogotá, 27 de noviembre de 2024

Señores
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
Atn. Apoyo a la Supervisión
Arq. GILLAND RODOLFO LÓPEZ SANTAMARIA - Grupo de Infraestructura
Con copia a contratista de Obra
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato No. 2342-2024
Objeto: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

Asunto: APROBACION INFORMES SEMANALES DE AVANCE DE OBRA, SEMANA 1, SEMANA 2 y SEMANA 3.

Respetados señores:
Nos permitimos presentar los Informes aprobados al Contratista de obra del proyecto indicado en la Referencia.

Conforme a las correcciones solicitadas el contratista de obra en la Semana No.3 incorpora los requerimientos plenos de los Informes de Avance de Obra.

La Interventoría avala los Informes presentados por el Contratista de Obra, Soluciones Integrales Unión y no presenta observaciones a los mismos.

Atentamente,



YAMIL FABIAN CASTRILLON
RL. Interventoría
CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS intermantenimientos@gmail.com

Informe Semanal
CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
NIT 901.878.919-1 Contrato 2364 DE 2024

	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL

Semana Número: 1 Del: 28 DE OCTUBRE DE 2024 Al: 3 DE NOVIEMBRE DE 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días

ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE: ORIP CHAPARRAL SUPERVISOR: Dr. Cesar Augusto Burgos

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)		
Valor básico de la Obra	$ 70.125.884,00	$

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)		
Valor básico de la Obra Ejecutada:		

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	**CONSORCIO SAN MIGUEL**
Contrato No.	2342-2024
Valor Inicial:	70.125.884,00
Valor Actualizado:	70.125.884,00
Plazo Inicial:	28 DE OCTUBRE DE 2024
Plazo Actualizado:	0
Fecha de Iniciación:	28 DE OCTUBRE DE 2024
Fecha de Vencimiento:	31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS**
Contrato No.	2364 DE 2024
Valor Inicial:	$ 141.110.914,00
Valor Actualizado:	$ 141.110.914,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
Fecha de Iniciación:	28 DE OCTUBRE DE 2024
Fecha de Vencimiento:	31 DE DICIEMBRE DE 2024

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA




AVANCE

EN LA SEMANA NUMERO UNO SE HA AVANZADO Y TRABAJADO EN LO QUE TIENE QUE VER CON LOS PROCESOS ADMINISTRATVIOS COMO LO ES LA RADICACION DE LA DOCUMENTACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO, VISITA TECNICA PARADAR ALCANCE A LAS ACTIVIDADES DEL PRESUPUESTO INCIAL Y SIGUIENTE A ESTO ELABORAR INVENTARIOS Y ACTAS DE VECINDAD QUE APLIQUEN A LAS AREAS POR INTERVENIR, ADICIONALMENTE SE REMITIERON LAS POLIZAS DEL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA Y SE SOLICITARON LOS FORMATOS Y PLANOS PARA EMPEZAR A TRABAJAR EN LAS MEMORIAS DE CALULO DE CADA UNAS DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES.


IMAGENES AVANCE



Comentario: Verificacion del estado actual de la cubierta

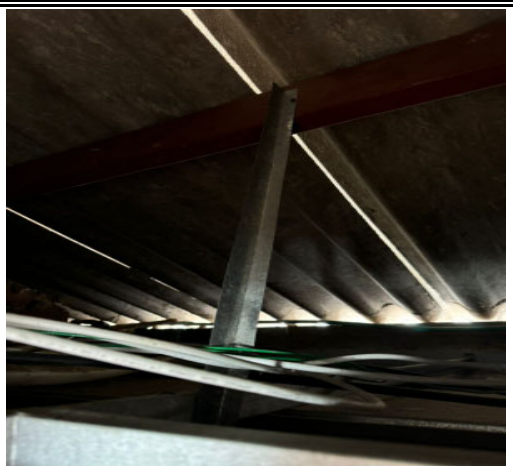

Comentario: Verificacion de estructura de Cielo raso

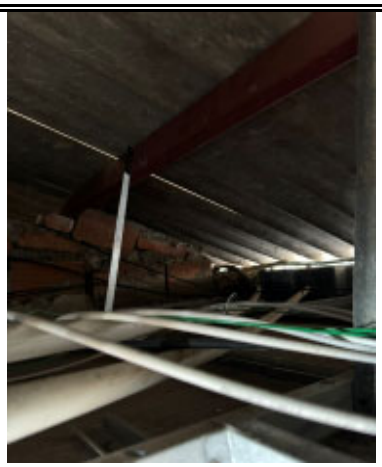

Comentario: Verifiacion del estado actual de la cubierta y estructura existente



Comentario: Verificacion de estructura de Cielo raso en salon de archivo

OBSERVACIONES

La interventoria recibe, revisa, verifica y avala el informe presentado por el contratista.

CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA

CONSORCIO SAN MIGUEL
Kimberly Johana Ruiz
Residente de Obra
Matrícula 25202-423091CND

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
Yamil Fabian Castrillón
Representante Legal
Matrícula A25202001-79742098

Informe Semanal
CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
NIT 901.878.919-1 Contrato 2364 DE 2024

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL

Semana Número: 1 Del: 28 DE OCTUBRE DE 2024 Al: 3 DE NOVIEMBRE DE 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días

ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE: ORIP CAJAMARCA SUPERVISOR: Dr. Cesar Augusto Burgos

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)		
Valor básico de la Obra	$ 143.039.111,00	$

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)		
Valor básico de la Obra Ejecutada:		

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	**CONSORCIO SAN MIGUEL**
Contrato No.	2342-2024
Valor Inicial:	143.039.111,00
Valor Actualizado:	143.039.111,00
Plazo Inicial:	28 DE OCTUBRE DE 2024
Plazo Actualizado:	0
Fecha de Iniciación:	28 DE OCTUBRE DE 2024
Fecha de Vencimiento:	31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS**
Contrato No.	2364 DE 2024
Valor Inicial:	$ 141.110.914,00
Valor Actualizado:	$ 141.110.914,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
Fecha de Iniciación:	28 DE OCTUBRE DE 2024
Fecha de Vencimiento:	31 DE DICIEMBRE DE 2024

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



AVANCE

EN LA SEMANA NUMERO UNO SE HA AVANZADO Y TRABAJADO EN LO QUE TIENE QUE VER CON LOS PROCESOS ADMINISTRATVIOS COMO LO ES LA RADICACION DE LA DOCUMENTACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO, VISITA TECNICA PARADAR ALCANCE A LAS ACTIVIDADES DEL PRESUPUESTO INCIAL Y SIGUIENTE A ESTO ELABORAR INVENTARIOS Y ACTAS DE VECINDAD QUE APLIQUEN A LAS AREAS POR INTERVENIR, ADICIONALMENTE SE REMITIERON LAS POLIZAS DEL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA Y SE SOLICITARON LOS FORMATOS Y PLANOS PARA EMPEZAR A TRABAJAR EN LAS MEMORIAS DE CALULO DE CADA UNAS DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES.

IMAGENES AVANCE



Comentario: Verificacion del estado actual de la cubierta



Comentario: Verificacion del estado actual del Cielo raso



Comentario: Verifiacion del estado actual de la cubierta y estructura existente



Comentario: Verificacion de demolicion de meson y demolicion de enchape



Comentario: Verificacion de Cambio de cubierta Traslucida



Comentario: Verificacion de Adecuacion Baños

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
La Interventoria recibe, revisa, verifica y avala el informe presentado por el contratista.	CONSORCIO SAN MIGUEL Kimberly Johana Ruiz Residente de Obra Matrícula 25202-423091CND CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS Yamil Fabian Castrillón Representante Legal Matrícula A25202001-79742098

Informe Semanal
CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
NIT 901.878.919-1 Contrato 2364 DE 2024

	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL

Semana Número: 1 Del: 28 DE OCTUBRE DE 2024 Al: 3 DE NOVIEMBRE DE 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días

ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE: ORIP AMBALEMA SUPERVISOR: Dr. Cesar Augusto Burgos

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)		
Valor básico de la Obra	$ 94.537.458,00	$

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)		
Valor básico de la Obra Ejecutada:		

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	**CONSORCIO SAN MIGUEL**
Contrato No.	2342-2024
Valor Inicial:	94.537.458,00
Valor Actualizado:	94.537.458,00
Plazo Inicial:	28 DE OCTUBRE DE 2024
Plazo Actualizado:	0
Fecha de Iniciación:	28 DE OCTUBRE DE 2024
Fecha de Vencimiento:	31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS**
Contrato No.	2364 DE 2024
Valor Inicial:	$ 141.110.914,00
Valor Actualizado:	$ 141.110.914,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
Fecha de Iniciación:	28 DE OCTUBRE DE 2024
Fecha de Vencimiento:	31 DE DICIEMBRE DE 2024

IMAGEN OFICINA




IMAGEN OFICINA




AVANCE

EN LA SEMANA NUMERO UNO SE HA AVANZADO Y TRABAJADO EN LO QUE TIENE QUE VER CON LOS PROCESOS ADMINISTRATVIOS COMO LO ES LA RADICACION DE LA DOCUMENTACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO, VISITA TECNICA PARADAR ALCANCE A LAS ACTIVIDADES DEL PRESUPUESTO INCIAL Y SIGUIENTE A ESTO ELABORAR INVENTARIOS Y ACTAS DE VECINDAD QUE APLIQUEN A LAS AREAS POR INTERVENIR, ADICIONALMENTE SE REMITIERON LAS POLIZAS DEL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA Y SE SOLICITARON LOS FORMATOS Y PLANOS PARA EMPEZAR A TRABAJAR EN LAS MEMORIAS DE CALULO DE CADA UNAS DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES.

IMAGENES AVANCE

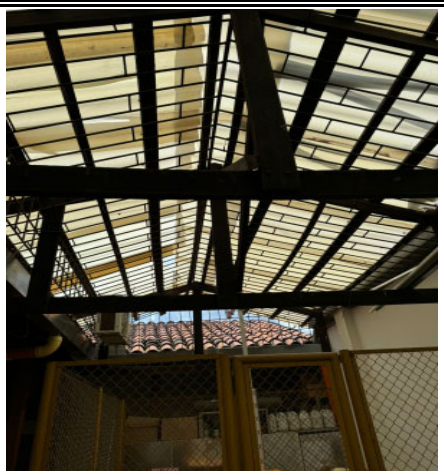

Comentario: Verificacion del estado actual de la cubierta TRASLUCIDA

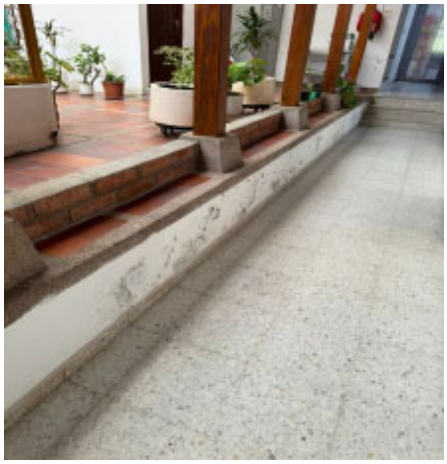

Comentario: Verificacion de zonas con presencia de humedad



Comentario: Verificacion de zonas con presencia de humedad



Comentario: Verificacion de Desmanchado y Pulida de piso



Comentario: Verificacion de Resane y Pintura de fachada



Comentario: Verificacion de aplicación de pintura tipo 1

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
La Interventoria recibe, revisa, verifica y avala el informe presentado por el contratista.	CONSORCIO SAN MIGUEL Kimberly Johana Ruiz Residente de Obra Matrícula 25202-423091CND CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS Yamil Fabian Castrillón Representante Legal Matrícula A25202001-79742098

Informe Semanal
CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
NIT 901.878.919-1 Contrato 2364 DE 2024

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL

Semana Número: 1 Del: 28 DE OCTUBRE DE 2024 Al: 3 DE NOVIEMBRE DE 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días

ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE: ORIP GIRARDOT SUPERVISOR: Dr. Cesar Augusto Burgos

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)		
Valor básico de la Obra	$ 84.392.071,00	$

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)		
Valor básico de la Obra Ejecutada:		

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	**CONSORCIO SAN MIGUEL**
Contrato No.	2342-2024
Valor Inicial:	84.392.071,00
Valor Actualizado:	84.392.071,00
Plazo Inicial:	28 DE OCTUBRE DE 2024
Plazo Actualizado:	0
Fecha de Iniciación:	28 DE OCTUBRE DE 2024
Fecha de Vencimiento:	31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS**
Contrato No.	2364 DE 2024
Valor Inicial:	$ 141.110.914,00
Valor Actualizado:	$ 141.110.914,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
Fecha de Iniciación:	28 DE OCTUBRE DE 2024
Fecha de Vencimiento:	31 DE DICIEMBRE DE 2024

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



AVANCE

EN LA SEMANA NUMERO UNO SE HA AVANZADO Y TRABAJADO EN LO QUE TIENE QUE VER CON LOS PROCESOS ADMINISTRATVIOS COMO LO ES LA RADICACION DE LA DOCUMENTACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO, VISITA TECNICA PARADAR ALCANCE A LAS ACTIVIDADES DEL PRESUPUESTO INCIAL Y SIGUIENTE A ESTO ELABORAR INVENTARIOS Y ACTAS DE VECINDAD QUE APLIQUEN A LAS AREAS POR INTERVENIR, ADICIONALMENTE SE REMITIERON LAS POLIZAS DEL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA Y SE SOLICITARON LOS FORMATOS Y PLANOS PARA EMPEZAR A TRABAJAR EN LAS MEMORIAS DE CALULO DE CADA UNAS DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES.

IMAGENES AVANCE



Comentario: Verificacion retiro e instalacion de marco metalico, puerta proncipal



Comentario: Verificacion de mantenimiento en cielo raso



Comentario: Verificacion de aplicación de pintura tipo 1



Comentario: Verificacion de demolicion y suministro poceta



Comentario: Verificacion de impermeabilizacion y pintura muro de archivo



Comentario: Verificacion de demolicion de enchape

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
La interventoria recibe, revisa, verifica y avala el informe presentado por el contratista.	CONSORCIO SAN MIGUEL Kimberly Johana Ruiz Residente de Obra Matrícula 25202-423091CND CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS Yamil Fabian Castrillón Representante Legal Matrícula A25202001-79742098

Informe Semanal
CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
NIT 901.878.919-1 Contrato 2364 DE 2024

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL

Semana Número: 1 Del: 28 DE OCTUBRE DE 2024 Al: 3 DE NOVIEMBRE DE 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días

ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE: ORIP FUSAGASUGA SUPERVISOR: Dr. Cesar Augusto Burgos

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)		
Valor básico de la Obra	$ 65.848.884,00	$

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)		
Valor básico de la Obra Ejecutada:		

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	**CONSORCIO SAN MIGUEL**
Contrato No.	2342-2024
Valor Inicial:	65.848.884,00
Valor Actualizado:	65.848.884,00
Plazo Inicial:	28 DE OCTUBRE DE 2024
Plazo Actualizado:	0
Fecha de Iniciación:	28 DE OCTUBRE DE 2024
Fecha de Vencimiento:	31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS**
Contrato No.	2364 DE 2024
Valor Inicial:	$ 141.110.914,00
Valor Actualizado:	$ 141.110.914,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
Fecha de Iniciación:	28 DE OCTUBRE DE 2024
Fecha de Vencimiento:	31 DE DICIEMBRE DE 2024

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



AVANCE

EN LA SEMANA NUMERO UNO SE HA AVANZADO Y TRABAJADO EN LO QUE TIENE QUE VER CON LOS PROCESOS ADMINISTRATVIOS COMO LO ES LA RADICACION DE LA DOCUMENTACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO, VISITA TECNICA PARADAR ALCANCE A LAS ACTIVIDADES DEL PRESUPUESTO INCIAL Y SIGUIENTE A ESTO ELABORAR INVENTARIOS Y ACTAS DE VECINDAD QUE APLIQUEN A LAS AREAS POR INTERVENIR, ADICIONALMENTE SE REMITIERON LAS POLIZAS DEL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA Y SE SOLICITARON LOS FORMATOS Y PLANOS PARA EMPEZAR A TRABAJAR EN LAS MEMORIAS DE CALULO DE CADA UNAS DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES.

IMAGENES AVANCE



Comentario: Verificacion reparacion graniplast y pintura



Comentario: Verificacion de cambio de orinal



Comentario: Verificacion de mantenimiento cielo raso



Comentario: Verificacion de instalacion cinta antideslizante



Comentario: Demolicion de mesones



Comentario: Verificacion de Limpieza de viga Canales

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
La interventoria recibe, revisa, verifica y avala el informe presentado por el contratista.	CONSORCIO SAN MIGUEL Kimberly Johana Ruiz Residente de Obra Matrícula 25202-423091CND CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS Yamil Fabian Castrillón Representante Legal Matrícula A25202001-79742098
