Alcaldía Municipal de Envigado	FORMATO	Código: PT-F-028
	INFORME MENSUAL DE SUPERVISION	Versión: 001
		Pagina: 1 de 3

INFORME DE SUPERVISION No.:	1	FECHA DEL INFORME:	jueves, 14 de agosto de 2025

CONTRATO DE OBRA

Contrato No:	ENV-09-09-1546-25	Objeto:	Urgencia manifiesta mediante resolución 20250018013 del 09-05-2025 para la estabilización de taludes y obras accesorias en el Sector de Santa Catalina en el Municipio de Envigado
Contratista:	CONSTRUVERTICAL S.A.S.		
NIT:	900494143-9		

DATOS CONTRATO PRINCIPAL:	Valor Inicial:	$ 2.981.333.162	Plazo Inicial:	149	dias	Fecha suscripción:	01-08-25
DATOS ADICIÓN / MODIFICACIÓN No.1:	Valor:		Plazo:			Fecha suscripción:	
DATOS ADICIÓN / MODIFICACIÓN No.2:	Valor:		Plazo:			Fecha suscripción:	
DATOS ADICIÓN / MODIFICACIÓN No.3:	Valor:		Plazo:			Fecha suscripción:	
DATOS ADICIÓN / MODIFICACIÓN No.3:	Valor:		Plazo:			Fecha suscripción:	
ACTA DE SUSPENSIÓN No.1:	ACTA DE REINICIO No.1:		ACTA DE SUSPENSIÓN No.2:			ACTA DE REINICIO No.2:	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 2.981.333.162		PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	5	Meses		
Fecha de iniciación:	lunes, 4 de agosto de 2025		Fecha de vencimiento:	martes, 30 de diciembre de 2025			


POLIZAS DEL CONTRATO

COMPAÑÍA	CLASE GARANTIA	POLIZA No.	VALOR	VENCIMIENTO		
				DIA	MES	AÑO
Liberty Seguros	Cumplimiento	2071875	$ 596.266.632,00	30	6	2026
Liberty Seguros	Garantía de pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	2071875	$ 596.266.632,00	30	12	2028
Liberty Seguros	Estabilidad y calidad de la obra	2071875	$ 596.266.632,00	30	12	2030
Liberty Seguros	Responsabilidad Civil Extracontractual	2071886	$ 569.400.000,00	30	12	2025

AVANCES DEL CONTRATO

GRAFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	%PROGRAMADO	%EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	0,00%	0,00%	**0,00%**
Durante el periodo	20,00%	22,09%	**2,09%**
Acumulad Actual	20,00%	22,09%	**2,09%**

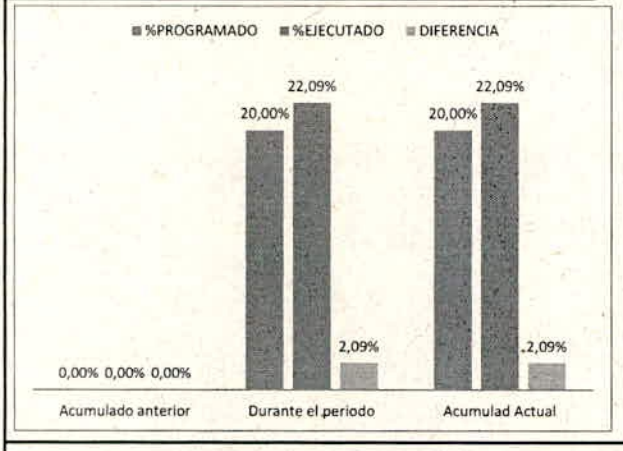

PROGRAMADO

	Mensual	Acumulado
Obra Programada (%)	20,00%	20,00%
Valor de la Obra	$ 596.266.632	$ 596.266.632

EJECUTADO

	Mensual	Acumulado
Obra física ejecutada (%)	22,09%	22,09%
Valor de la Obra	$ 658.447.203	$ 658.447.203

DATOS FINANCIEROS

V.r CONTRATO:	$ 2.981.333.162
Vr. TOTAL PAGADO EN ACTAS:	$ 658.447.203
SALDO POR PAGAR CONTRATO:	$ 2.322.885.959
Vr. ANTICIPO:	$ 0
TOTAL AMORTIZADO ANTICIPO:	$ 0
SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO:	$ 0

ACTA No.	TOTAL BRUTO	AMORTIZ. ANTICIPO	TOTAL NETO	% EJECUCIÓN	FECHA DEL ACTA
1	$ 658.447.203	$ 0	$ 658.447.203	22,09%	14-08-25
TOTALES	$ 658.447.203	$ -	$ 658.447.203	22,09%	

SEGUIMIENTO DOCUMENTACIÓN Y REQUERIMIENTOS TECNICOS Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Responder si se cuenta con la documentación al dia:				
Estudios y diseños:	SI		Se realizan reuniones de seguimiento al Contrato y se encuentran debidamente documentadas?	SI
Planos de obra:	SI		Se da cumplimiento a los requerimientos establecidos por la autoridad ambiental?	SI
Especificaciones técnicas	SI		La autoridad ambiental competente emitió los permisos necesarios para el inicio de las obras?	N.A.
Permisos y Licencias:	SI		Se da cumplimiento a las Normas de salud Ocupacional y Seguridad Industrial?	SI
Bitácora:	SI		Se da cumplimiento a las Normas de Trabajo en altura?	SI
			El personal se encuentra afiliado al Sistema de Seguridad Social?	SI

SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES AL DESARROLLO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

PENDIENTES POR PARTE DEL CONTRATISTA:

Se realizaron actividades según los diseños presentados, continuar con actividades de obra, presentar programación de actividades.

PENDIENTES POR PARTE DEL MUNICIPIO Y/O OTRAS ENTIDADES

Tramitar la presente cuenta de cobro.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Estudios y diseños (Geotecnico, Hidraulico e Hidroligico y estructural)
Localización, trazado y replanteo de áreas a intervenir.
Instalación y seguimiento a centinelas para alerta temprana.
Sellado temporal con cal y suelo local y seguimientos, incluye rocería.
Limpieza y televisación de redes de aguas lluvias externas.
Excavación de canales principales y ramales, incluye rocería.
Instalación de geomembrana en canales principales.
Construcción de filtros.
Entibados en madera.
Ejecución de obra transversal.
Perforación y demolición de rocas.
Construcción de sendero peatonales y señalización del mismo.
Excavación de pilas drenantes, incluye demolición de roca.
Intalación de acero de pilas drenantes.
Llenos

ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SIGUIENTE MES

Se realizaron actividades según los diseños presentados, continuar con actividades de obra.

OBSERVACIONES GENERALES:
Avance, retrasos, decisiones, compromisos, logros, dificultades, aspectos administrativos, jurídicos, técnicos o financieros

Se inicia y realiza entrega de los diseños.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO


Se legalizo el contrato y se da inicio a las actividades preliminares del contrato.

DATOS DEL SUPERVISOR		FIRMA:
TIPO DE SUPERVISOR:	INTERNO	
NOMBRES Y APELLIDOS:	GUSTAVO ADOLFO RENDON RODAS	
CARGO:	SUPERVISOR SALIENTE	
DEPENDENCIA / EMPRESA:	OBRAS PUBLICAS	
TIPO DE SUPERVISOR:	INTERNO	
NOMBRES Y APELLIDOS:	JUAN JOSÉ ROJAS OCHOA	
CARGO:	CONTRATISTA	
DEPENDENCIA / EMPRESA:	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	


REGISTRO FOTOGRAFICO





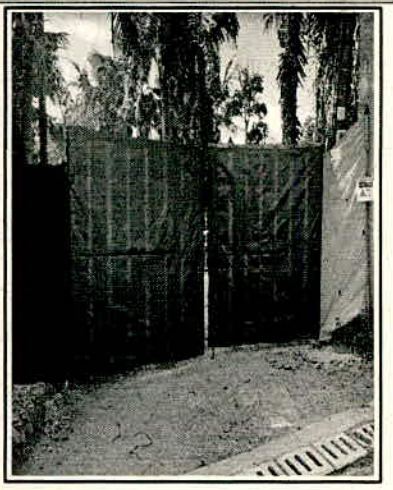

Fecha: JULIO 2025
Descripción: Cerramientos.

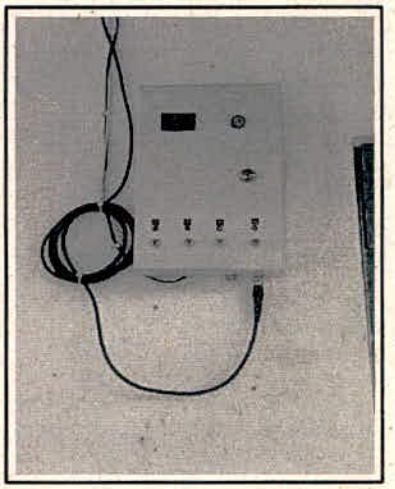



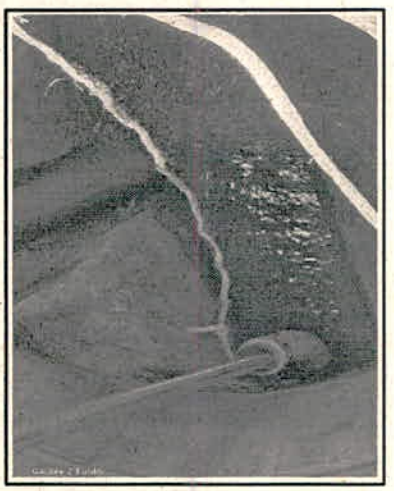

Fecha: JULIO 2025
Descripción: Instalación y seguimiento a centinelas para alerta temprana.







Fecha: JULIO 2025
Descripción: Sellado temporal con cal y suelo local y seguimientos, incluye rocería.

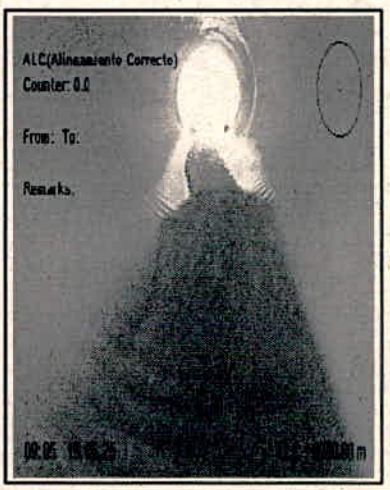





Fecha: JULIO 2025
Descripción: Limpieza y televisación de redes de aguas lluvias externas.

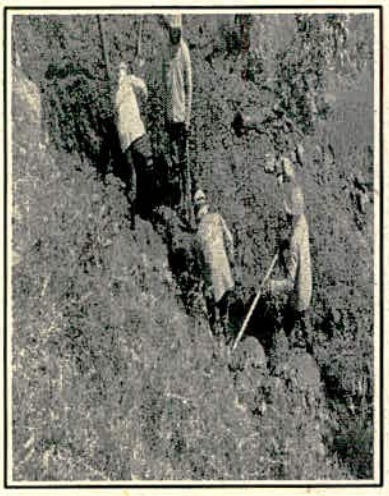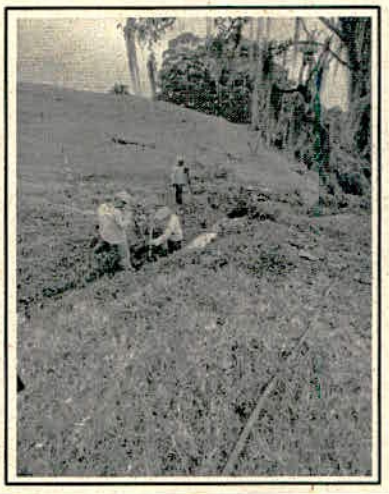


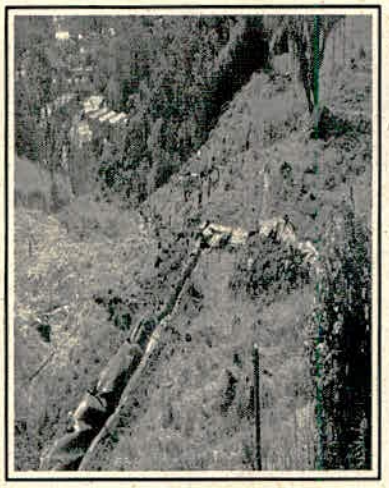

Fecha: JULIO 2025
Descripción: Excavación de canales principales y ramales, incluye rocería.


Fecha: JULIO 2025
Descripción: Instalación de geomembrana en canales principales.



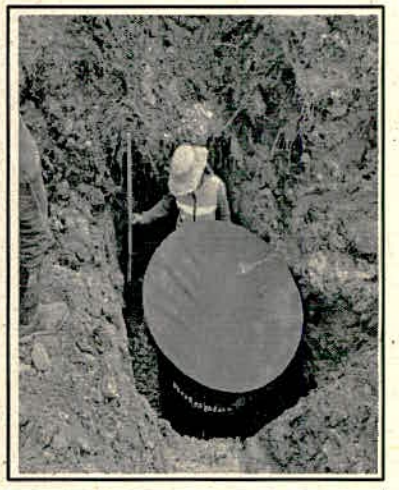



Fecha: JULIO 2025
Descripción: Instalación de 2 pozos







Fecha: JULIO 2025
Descripción: Construcción de filtros.

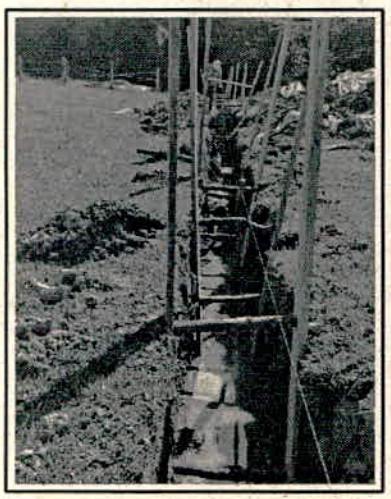


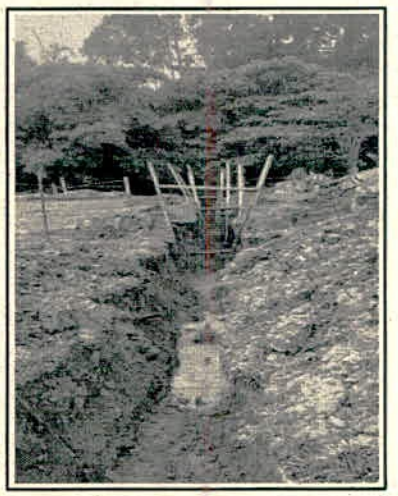

Fecha: JULIO 2025
Descripción: Entibados en madera.

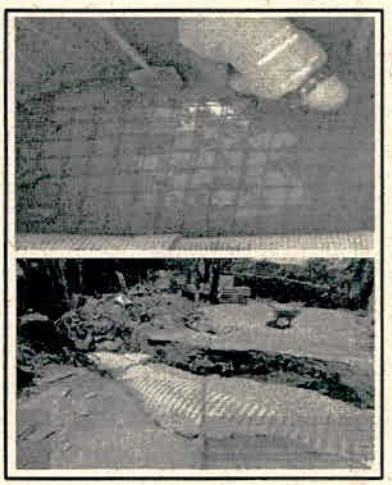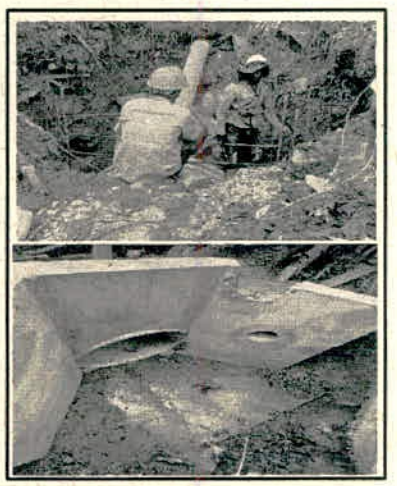Fecha: JULIO 2025
Descripción: Ejecución de obra transversal (demolición de pavimento, excavación, desviación de cauce, figurado e insalación de acero y vaciado de concretos).


Fecha: JULIO 2025
Descripción: Topografia.

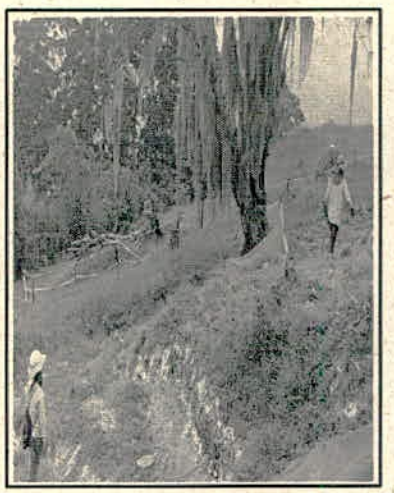



Fecha: JULIO 2025
Descripción: Perforación y demolición de rocas.







Fecha: JULIO 2025
Descripción: Construcción de sendero peatonales y señalización del mismo.






Fecha: JULIO 2025
Descripción: Excavación de pilas drenantes, incluye demolición de roca.

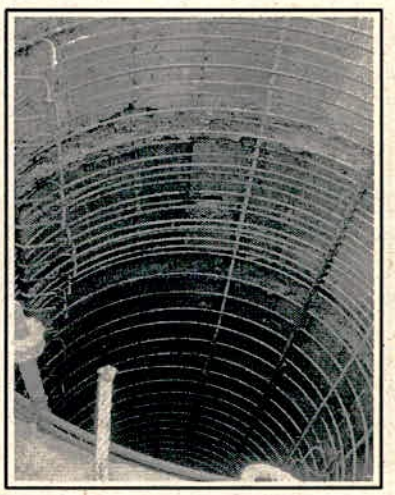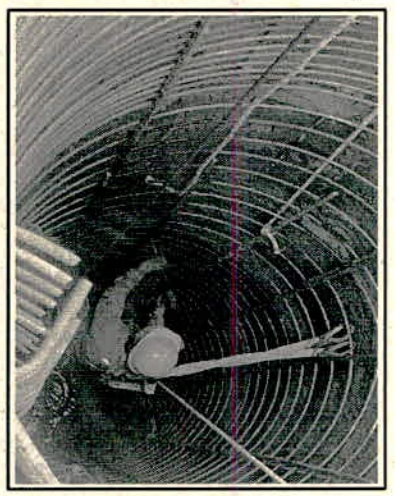Fecha: JULIO 2025
Descripción: Intalación de acero de pilas drenantes.



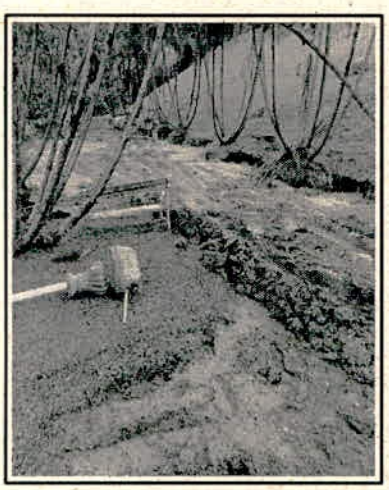

Fecha: JULIO 2025
Descripción: Llenos
