CONTRATO DE INTERVENTORIA No. _ **CIHCM410 de 2023**_

INFORME DE INTERVENTORIA No. 9

MENSUAL [X] **FINAL** [ ]



OBJETO DEL CONTRATO : INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A TRES (03) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADO EN LA VEREDA ONDINA, SAN JOSE DE BELEN Y VEREDA ALTO BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DEL AGRADO – DEPARTAMENTO DEL HUILA.

MUNICIPIO: **EL AGRADO – VEREDA LA ONDINA.**

DEPARTAMENTO: **HUILA**

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIHCM410 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA" Y CONSORCIO WF

APOYO A LA SUPERVISIÓN	NATALIA BUSTOS BOTERO	**ENTIDAD**	INDERHUILA
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO INTERVENTORIA			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	___ **CIHCM410**____ DE 2023___		
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A TRES (03) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADO EN LA VEREDA ONDINA, SAN JOSE DE BELEN Y VEREDA ALTO BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DEL AGRADO – DEPARTAMENTO DEL HUILA	**PERIODO DEL INFORME**	01 DE ENERO al 31 DE ENERO 2025.
CONTRATISTA	CONSORCIO WF	**NIT:**	901.767.496-1
REPRESENTANTE LEGAL:	FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	**C.C:**	7.711.430

FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	1 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO (D/M/A):	08 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL.
ACTA DE JUSTIFICACIÓN OTROSI NO. 1:	28 DE DICIEMBRE DE 2023
OTROSI NO. 1: 28/12/2023	MODIFICACIÓN CLAUSULA SEPTIMA – CAMBIO FUENTE DE FINANCIACIÓN
ACTA DE JUSTIFICACIÓN NO.1 DE SUSPENSIÓN	28 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE SUSPENSION NO. 1	28 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE JUSTIFICACIÓN NO.2 DE REINICIO	15 DE MAYO DE 2024
ACTA DE REINICIO NO. 1	16 DE MAYO DE 2024
OTROSI NO. 2: 16/05/2024	MODIFICACIÓN A LA CLÁUSULA CUARTA, PLAZO DEL CONTRATO – VIGENCIA FISCAL-
ACTA DE JUSTIFICACIÓN NO. 03 OTROSI NO. 3	24 DE JUNIO DE 2024
OTROSI NO. 3: 24/06/2024	MODIFICACIÓN A LA CLÁUSULA CUARTA, PLAZO DEL CONTRATO - PRÓRROGA DE UN (1) MES.
ACTA DE JUSTIFICACIÓN NO. 04 DE OTROSI NO.4	23 DE JULIO DE 2024
OTROSI NO. 4: 23/07/2024	MODIFICACIÓN A LA CLÁUSULA CUARTA, PLAZO DEL CONTRATO - PRÓRROGA DE UN (1) MES Y DIEZ (10) DÍAS.
ACTA DE JUSTIFICACIÓN NO. 05 DE OTROSI NO.5	28 DE AGOSTO DE 2024
OTROSI NO. 5: 28/08/2024	MODIFICACIÓN A LA CLÁUSULA CUARTA, PLAZO DEL CONTRATO - PRÓRROGA DE UN (1) MES.
FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	1 DE NOVIEMBRE DE 2023

ACTA DE JUSTIFICACIÓN NO. 06 DE OTROSI NO.6	04 DE OCTUMBRE DE 2024
OTROSI NO. 6: 04/10/2024	MODIFICACIÓN A LA CLÁUSULA CUARTA, PLAZO DEL CONTRATO - PRÓRROGA DE UN (1) MES. **ADICIÓN:** CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINIDÓS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS ($ 5.622.839,00) M/CTE. IVA INCLUIDO.
ACTA DE JUSTIFICACIÓN NO. 07 DE OTROSI NO.7	30 DE OCTUMBRE DE 2024
OTROSI NO. 7: 30/10/2024	MODIFICACIÓN A LA CLÁUSULA CUARTA, PLAZO DEL CONTRATO - PRÓRROGA DE UN (1) MES.
ACTA DE JUSTIFICACIÓN NO. 08 DE OTROSI NO.8	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
OTROSI NO. 8: 27/11/2024	MODIFICACIÓN A LA CLÁUSULA CUARTA, PLAZO DEL CONTRATO - PRÓRROGA DE DIECINUEVE (19) DIAS CALENDARIO.
ACTA DE JUSTIFICACIÓN NO. 09 DE OTROSI NO.9	20 DE DICIEMBRE DE 2024
OTROSI NO. 9: 20/12/2024	MODIFICACIÓN A LA CLÁUSULA CUARTA, PLAZO DEL CONTRATO - PRÓRROGA DE UN (1) MES.
ACTA DE JUSTIFICACIÓN NO. 10 DE OTROSI NO.10	21 DE ENERO DE 2025
OTROSI NO. 10: 21/01/2025	MODIFICACIÓN A LA CLÁUSULA CUARTA, PLAZO DEL CONTRATO - PRÓRROGA DE QUINCE (15) DIAS CALENDARIO.
PLAZO ADICIONAL (NO.1) (24/06/2024):	UN (1) MESES
PLAZO ADICIONAL (NO.2) (23/07/2024):	UN (1) MESES Y (10) DIEZ DIAS
PLAZO ADICIONAL (NO.3) (28/08/2024):	UN (1) MESES
PLAZO ADICIONAL (NO.4) (04/10/2024):	UN (1) MESES
PLAZO ADICIONAL (NO.5) (04/10/2024):	UN (1) MESES
PLAZO ADICIONAL (NO.6) (27/11/2024):	DIECINUEVE (19) DÍAS
PLAZO ADICIONAL (NO.7) (20/12/2024):	UN (1) MESES
PLAZO ADICIONAL (NO.8) (21/01/2024):	QUINCE (15) DÍAS
PLAZO TOTAL:	DIEZ (10) MESES Y CATORCE (14) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN, Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL 2025..
VALOR INICIAL:	CIENTO VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL ONCE PESOS ($129.699.011) M/CTE.
VALOR ADICIONAL:	CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINIDÓS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS ($ 5.622.839,00) M/CTE.
VALOR CORRESPONDIENTE A LA VEREDA ONDINA	CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE ($46.858.939) M/CTE.
VALOR TOTAL:	CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 135.321.850,00) M/CTE. IVA INCLUIDO.


2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No.	CLPIH397 DE 2023		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA **VEREDA LA ONDINA** DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO - DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
CONTRATISTA	CONSORCIO WIN	**NIT:**	901.756.252-2
REPRESENTANTE LEGAL:	NORMA PATRICIA LUNA HERNÁNDEZ	**C.C:**	40.441.590

FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	30 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE INICIO (D/M/A):	14 DE NOVIEMBRE DE 2023
OTROSI 1 – FUENTE DE FINANCIACIÓN	28 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN (D/M/A):	28 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO (D/M/A):	17 DE JULIO 2024
OTROSI 2 – VIGENCIA FISCAL	17 DE JULIO 2024
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL.
OTROSI 3 PLAZO ADICIONAL (No.1) (27/08/2024)	UN (1) MES
OTROSI 4 MODIFICACIÓN MAYORES Y MENORES CANTIDADES Y CREACIÓN DE ÍTEMS NUEVOS	**Adición:** DIECIOCHO MILLONES SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS ($ 18.061.646,00) M/CTE.
OTROSI 4 PLAZO ADICIONAL (No.1) (30/09/2024)	UN (1) MES.
OTROSI 5 PLAZO ADICIONAL (No.3) (30/10/2024)	1 MES
OTROSI 6 PLAZO ADICIONAL (No.4) (27/11/2024)	22 DIAS
OTROSI 7 PLAZO ADICIONAL (No.4) (20/12/2024)	1 MES
OTROSÍ N°8: 21/01/2025	15 DÍAS
PLAZO TOTAL:	**OCHO (8) MESES Y SIETE (7) DIAS CALENDARIO**, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN, Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL 2025.
VALOR INICIAL:	$ 494.305.625.00
VALOR ADICIONAL (SI APLICA):	$ 18.061.646.00
VALOR FINAL	$ 512.367.271.00

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto Cubierta Autoportante con Iluminación se encuentra localizado en la Vereda La Ondina de la Zona Rural del Municipio Del Agrado - Departamento Del Huila

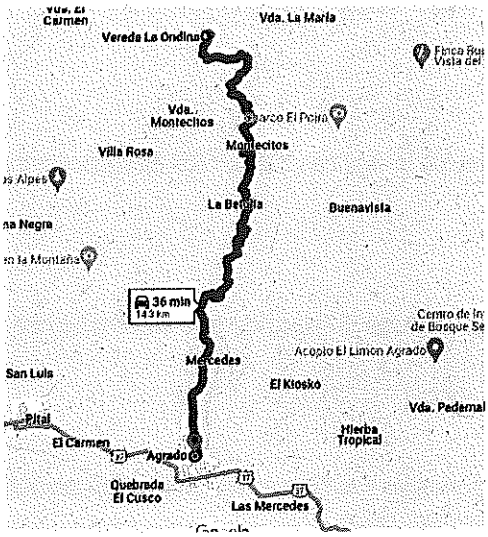

Ruta y localización Proyecto



localización proyecto – Planta

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto arquitectónico y estructural contempla la construcción de la Cubierta Autoportante con Iluminación para la Vereda La Ondina la Zona Rural del Municipio Del Agrado - Departamento Del Huila, la cual tiene una destinación de uso recreativo, deportivo y cultural, correspondientes a estructura cubierta, iluminación, y sistema hidráulico para el manejo de aguas lluvias. La cubierta será un sistema autoportante, sostenida con columnas vigas aéreas en concreto reforzado de 3000 PSI y una cimentación tipo zapata, vigas de cimentación y viga canal, placa contrapiso en concreto reforzado de 3000 PSI.

5. DESCRIPCION DEL AVANCE MENSUAL DE OBRA

Durante el mes de enero y conforme a las actividades realizadas en el mes de diciembre las cuales quedaron en pausa y no se laboró en obra por las fechas de festividades, se retoma el seguimiento a los siguientes Ítems:

- **3.03 Construcción de Viga Canal en Concreto**

Se inspeccionaron nuevamente la instalación de formaleta de la viga canal en el eje A y se verifico la fundición de la viga canal en concreto de 3000 PSI una vez finalizada la fundición en el eje A se procedió a supervisar la fundición de la viga canal en el eje B.

- **6.1 Bajantes en PVC-S de 4"**

Se verificaron las instalaciones de los bajantes en tubería PVC-S de 4" con sus respectivos accesorios, en los ejes A1, A3, A4, A6 para los bajantes de aguas lluvias, según los planos.

- **3.05 Manto Zetal en Viga Canal**

Se verifico el suministro e instalación del manto asfáltico Zetal sobre la viga canal en ambos ejes, asegurando protección adicional contra las filtraciones y agentes externos.

- **5.03 Placa de Piso en Concreto**

Se hizo seguimiento a la instalación de malla electro soldada y fundición de placa de piso en concreto de 3000 PSI, de espesor de 0.10 cm, faltante entre el eje A y B.

- **5.05 Cuneta en Concreto**

Se verificaron que las excavaciones no hubieran sido afectadas por lluvias y se hizo seguimiento a la instalación de formaleta y construcción de cuneta en concreto de 3000 PSI, según diseño establecido.

- **6.4 Caja de Inspección en Concreto**

Se verificaron la formaleta y construcción de una caja de inspección, en el eje del talud con su respectiva tapa según diseño.

- **6.2 Tubería PVC-S de 6" para Desagües**

Se rectifica la instalación de tubería PVC-S de 6" con accesorios, para el sistema de desagües de la caja de inspección 1 hacia la caja de inspección 2.

- **6.3 Tubería PVC-S de 8" para Salida**

Se verifica la instalación de tubería PVC-S de 8" que va de la cajilla 2 (faltante por construir), destinada a la salida principal del sistema de drenaje, cumpliendo con los caudales proyectados.

- **7.03 Excavación Manual**

Se verifican las excavaciones manuales para las instalaciones eléctricas subterráneas y para las transiciones aéreo subterráneas.

- **7.02 Caja de Inspección para Alumbrado Público**

Se rectificó la construcción e instalación de una caja de inspección del eje A.

- **7.04 Canalización en Ductos Conduit PVC**

Se verifico la correcta canalización en ductos de PVC pesado de 1½" para baja tensión, garantizando protección mecánica del cableado.

- **7.05 y 7.06 Transición Aérea-Subterránea**

Se verifico las transiciones con tubería IMC de 1½" y 1", conectando tramos aéreos y subterráneos para continuidad del sistema eléctrico.

- **7.15 Hincado de Postes de Concreto**

Se inspecciono la excavación, hincado y plomada de un poste de concreto de 8 m y 510 kg, armados y centrifugados.

- **7.07 Cableado Medida Directa en Poste**

Se verificaron la instalación de tubo metálico galvanizado de 1" MT, caja de polipropileno panorámica para contador, instalación de cable e interruptor bifásico para sistema de medida directa en poste, cumpliendo con normas de distribución eléctrica.

- **7.09 Cableado para Red de Distribución**

Se revisó el tendió de cableado subterráneo en ductos, utilizando conductores 2x6 AWG SER 8000 + 6 AWG SER 8000 + 1x8 AWG CU, según diseño de red principal.

- **7.10 Brazo Sencillo para Reflector**

Se inspecciono las instalaciones de brazo galvanizado según diseño, con acabado en pintura en polvo poliéster, para el soporte de los reflectores en los dos ejes.

- **8.01 Transporte de materiales pétreos**

Se verifico el material allegado en el sitio para la continuación de las fundiciones faltantes en concreto.

- **4.1 Cubierta Autoportante**

Se verifico las láminas de acero en paneles engargolados de una sola pieza y correcta instalación de la cubierta auto portante.

Conclusión: Todas las actividades fueron ejecutadas conforme a especificaciones técnicas, normativa vigente y planos de diseño. Se recomienda continuar con el seguimiento de garantías y mantenimientos preventivos.

6. HISTORIA CRONOLOGICA DEL PROYECTO

ACTIVIDAD	FECHA (dd/mm/aaaa)	DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACION (dd/mm/aaaa)
Iniciación	14/11/2023			
Suspensión No. 1	28/12/2023	44		
Reiniciación No. 1	17/07/2024		202	
Otrosi No. 3	27/08/2024	42		
Otrosi No. 4	30/09/2024	33		
Otrosi No. 5	30/10/2024	30		
Otrosi No. 6	27/11/2024	27		
Otrosi No. 7	20/12/2024	23		
Otrosi No. 8	21/01/2025	31		
TERMINACIÓN Cto.		10		7/02/2025
TOTAL DIAS		**240**	202	

7. ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de Inicio, acta de Suspensión, acta de Reinicio, actas de Modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No.	Fecha
	CLPIH397 DE 2023	
ACTA DE INICIO	1	14 DE NOVIEMBRE DE 2023
ACTA DE JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACION	1	28 DE DICIEMBRE DE 2023
OTROSÍ NO.01	1	28 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE JUSTIFICACIÓN - SUSPENSIÓN	1	28 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE SUSPENSIÓN	1	28 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE JUSTIFICACIÓN - REINICIO	2	17 DE JULIO DE 2024
ACTA DE REINICIO	1	17 DE JULIO DE 2024
ACTA DE JUSTIFICACIÓN	3	17 DE JULIO DE 2024

OTROSÍ	2	17 DE JULIO DE 2024
ACTA DE JUSTIFICACIÓN	4	28 DE AGOSTODE 2024
OTRO SI MODIFICATORIO N.03	3	28 DE AGOSTODE 2024
ACTA DE JUSTIFICACIÓN	5	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
OTRO SI MODIFICATORIO N.04	4	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
ACTA DE JUSTIFICACIÓN	6	30 DE OCTUBRE DE 2024
OTRO SI MODIFICATORIO N.05	5	30 DE OCTUBRE DE 2024
ACTA DE JUSTIFICACIÓN	7	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
OTRO SI MODIFICATORIO N.06	6	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
ACTA DE JUSTIFICACIÓN	8	20 DE DICIEMBRE DE 2024
OTRO SI MODIFICATORIO N.07	7	20 DE DICIEMBRE DE 2024
ACTA DE JUSTIFICACIÓN	9	21 DE ENERO DE 2025
OTRO SI MODIFICATORIO N.08	8	21 DE ENERO DE 2025

8. ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PARA EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA DURANTE EL PERIODO

(Cumplimiento Obligaciones del contrato).

a). **Obligaciones de Carácter General.**	1. Se radica la proyección del balance de Mayores y Menores cantidades. 2. Se realiza control de PDT de avance de obra 3. Se he realizado la entrega de documentación en papel reciclado. 4. Se realizó los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales y se dio cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social (Salud, Pensión y riesgos), que corresponden de acuerdo con el personal que se empleó. 5. De acuerdo a la demora del fabricante de la cubierta y problemas con la maquina roladora, se requirió de solicitar más tiempo de ejecución con el fin de finalizar las actividades y seguimiento de obra, por lo cual se suscribió con el contratista de obra el acta de justificación N°9 y otrosí N°8 el día 21 de enero del 2025. 6. Se realizó revisión de pólizas de acuerdo al otrosí N°7 del contratista de obra, el cual se tramitó a la entidad para su aprobación. 7. Se realizaron comités de obra

	8. Se verifican pólizas cargadas en la plataforma secop II. 9. Se suscribió con la entidad el acta de justificación No. 8 y otro si No. 8 en la ampliación de tiempo para la interventoría.
b).**Actividades Administrativas.**	1. Se realiza control y seguimiento del personal que ejecuta la obra

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PERSONAL	CARGO
Marco Tulio Yañez Villamizar	Director de Obra
Jaime Alejandro Ramírez Franco	Residente de Obra
Pedro Nel Ospina Bermeo	Residente SISO
ARQUIMMIDEZ VELA TRUJILLO.	Maestro De Obra
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE EQUIPOS	Herramienta menos para mínimo dos (2) cuadrillas Vibrador a gasolina Mescladora para concreto
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES	Se realiza seguimiento de los certificados de calidad de Materiales utilizados por el contratista Materiales pétreos, Cemento, Acero de refuerzo.
CONTROL Y SEGUIMIENTO A APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	**Planilla relacionada** **NRO. DE PLANILLA 7958510671** Hernán Jaramillo Morera – Subcontratista 03/02/2025 **Planilla relacionada** **NRO. DE PLANILLA 9481137811** Hernán Jaramillo Morera – Personal operativo 03/02/2025 **Planilla relacionada** **NRO. DE PLANILLA 32901489** ARQUIMMIDEZ VELA TRUJILLO - Personal operativo **Planilla relacionada** **NRO. DE PLANILLA 7963553182** Consorcio Win – Residente de obra Jaime Alejandro Ramírez Franco **Planilla relacionada**

	NRO. DE PLANILLA 7963553182 Consorcio Win – Siso obra OSPINA BERMEO PEDRO NEL **Planilla relacionada** **NRO. DE PLANILLA 7963553182** Consorcio Win – Maestro VELA TRUJILLO ARQUIMEDES **Planilla relacionada** **NRO. DE PLANILLA 7960320160** Inversiones estelares – Director de obra Marco tulio Yañez Fecha de pago: 12/02/2025 **Planilla relacionada** **NRO. DE PLANILLA 7960320160** Inversiones estelar – R.L Norma Patricia Luna Fecha de pago: 12/02/2025 **Planilla relacionada** **NRO. DE PLANILLA 1070161389** Consorciado- Ismael Enrique Gutiérrez Fecha de pago: 05/02/2025

1. Se verificaron las solicitudes por el contratista de obra y se suscribieron las actas respectivas para el contrato de obra.

c).Actividades Operativas.

- Se verificaron las calidades de los materiales empleados.
- Se realizó control y seguimiento de las actividades operativas del contrato, se aprueba las actividades:

	ACTIVIDADES		cant
3.03	Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI impermeabilizado.	M3	16.68
3.05	Suministro e instalación de manto zetal viga canal.	M2	60.80
4.1	Suministro, fabricación e instalación de cubierta autoportante a base de lámina de acero cal. 22, en paneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz.	M2	469.68
5.03	Placa de piso en concreto de 3000 PSI, e=0,10 cm.	M2	26.40
5.05	Cuneta en concreto de 3000 PSI, según diseño	ML	60.80
6.1	Bajantes en tubería PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para desagües y bajantes de aguas lluvias.	ML	23.20

	6.2	Suministro e instalación de tubería PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagües.	ML	14.30
	6.3	Suministro e instalación de tubería PVC-S de 8", con accesorios de conexión; para salida.	ML	20.00
	6.4	Caja de inspección en concreto de F´c=2500 PSI, de sección 0.70*0.70, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts.segun diseño	UND	1.00
	7.02	Caja de inspección de alumbrado público de 40x40x70 cm, fundida en concreto de 3000 psi y tapa en lamina alfajor.	UND	1.00
	7.03	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	3.52
	7.04	Canalización en ductos conduit pvc tipo pesado, dos ductos de 1 1/2" para baja tensión. Incluye compactación y tapada de brecha. a=0,40 mts.	ML	22.00
	7.05	Transición aérea-subterránea tubería IMC 1 1/2"	UND	2.00
	7.06	Transición aérea-subterránea tubería IMC 1"	UND	2.00
	7.07	Suministro - instalación y cableado de medida directa en poste.	UND	1.00
	7.09	Suministro e instalación de cableado para red de distribución principal en ducto subterráneo en conductor 2x6 al ser8000 + 6 al ser8000 + 1x8 cu.	ML	14.00
	7.10	Instalación brazo sencillo según diseño de 3,5 mts. Galvanizado y acabado en pintura polvo poliéster, para anclar el reflector.	UND	12.00
	7.15	Excavación, hincada y plomada de postes de concreto de 8 mts x 510 kg armado y centrifugado	UND	1.00
	8.01	Transporte de materiales pétreos	M3-Km	145,3947

d). **Actividades Logísticos.**	1. Se realiza la revisión diaria de los avances de la bitácora de obra. 2. Se realiza la medición de las actividades realizadas en la ejecución y se aprueban las cantidades descritas
e). **Obligaciones de Carácter Ambiental.**	1. Se hace control y seguimiento al sistema de seguridad y salud en el trabajo de entregado por el contratista para verificar su cumplimiento en obra.
f). **Actividades Financieras.**	1. Se avala y se presenta balance Acta de modificación No. 2 de Mayores y Menores cantidades.
g). **Actividades Jurídicos.**	1. La interventoría realizó seguimiento a pólizas y garantías del contrato de obra e interventoría.

Póliza legalización del CONTRATO:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210747	0	03/11/2023	Cumplimiento del contrato	30/10/2023	30/07/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	30/10/2023	30/012024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	30/10/2023	30/01/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Se ampara 5 años 0 meses y 1 días	

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-40-101056559	0	03/11/2023	30/10/2023	30/01/2024

Póliza actualizada x ACTA DE INICIO:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210747	1 anulada 2	06/12/2023	Cumplimiento del contrato	14/11/2023	14/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	14/11/2023	14/02/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	14/11/2023	14/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Se ampara 5 años 0 meses y 1 días	

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-40-101058559	1 anulada 2	06/12/2023	14/11/2023	14/02/2024

Póliza actualizada x ACTA DE SUSPENSION Y REINICIO No. 1:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210747	3	24/07/2024	Cumplimiento del contrato	14/11/2023	14/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	14/11/2023	03/09/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	14/11/2023	03/09/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Se ampara 5 años 0 meses y 1 días	

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-40-101056559	3	24/07/2024	14/11/2023	03/09/2024

Póliza actualizada OTROSÍ No. 2

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210747	4	30/07/2024	Cumplimiento del contrato	14/11/2023	03/03/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	14/11/2023	03/09/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	14/11/2023	03/09/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Se ampara 5 años 0 meses y 1 días	

Póliza actualizada ACLARACIÓN OTROSÍ No. 2

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210747	5	30/07/2024	Cumplimiento del contrato	14/11/2023	03/03/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	14/11/2023	03/03/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	14/11/2023	03/09/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Se ampara 5 años 0 meses y 1 días	

Póliza actualizada x OTROSÍ No. 3

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210747	6	02/09/2024	Cumplimiento del contrato	14/11/2023	03/04/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	14/11/2023	03/04/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	14/11/2023	03/10/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Acta de recibo final 5 años desde acta de recibo	

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-40-101056559	4	02/09/2024	14/11/2023	03/10/2024

Póliza actualizada x OTROSÍ No. 4

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210747	7	10/10/2024	Cumplimiento del contrato	14/11/2023	03/04/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	14/11/2023	03/04/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	14/11/2023	03/10/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Acta de recibo final 5 años desde acta de recibo	

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-40-101056559	5	10/10/2024	14/11/2023	03/10/2024

Póliza actualizada x ACLARACION OTROSÍ No. 4

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210747	8	10/10/2024	Cumplimiento del contrato	14/11/2023	03/05/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	14/11/2023	03/05/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	14/11/2023	03/11/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Se ampara 5 años 0 meses y 1 días	

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-40-101056559	6	10/10/2024	14/11/2023	03/11/2024

Póliza actualizada x OTROSÍ No. 5

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210747	9	01/11/2024	Cumplimiento del contrato	14/11/2023	03/06/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	14/11/2023	03/06/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	14/11/2023	03/12/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Se ampara 5 años 0 meses y 1 días	

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-40-101056559	7	01/11/2024	14/11/2023	03/01/2025

Póliza actualizada x OTROSÍ No. 6

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210747	10	04/12/2024	Cumplimiento del contrato	14/11/2023	25/06/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	14/11/2023	25/06/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	14/11/2023	25/12/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Se ampara 5 años 0 meses y 1 días	

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)


ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-40-101056559	8	04/12/2024	14/11/2023	03/01/2025

Póliza actualizada x OTROSÍ No. 7						
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210747	11	26/12/2024	Cumplimiento del contrato	14/11/2023	25/07/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	14/11/2023	25/07/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	14/11/2023	25/01/2028
				Estabilidad y Calidad de Obras	Se ampara 5 años 0 meses y 1 días	
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)		VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-40-101058559	9	26/12/2024		14/11/2023	25/01/2025

9. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL TIEMPO

Durante el mes de enero se pronosticaron lluvias en horas de la mañana y noche esporádicamente, lo que no genero mayor afectación para el desarrollo de las actividades.

Las temperaturas máximas diarias son alrededor de 29 °C, rara vez bajan a menos de 27 °C o exceden 31 °C.

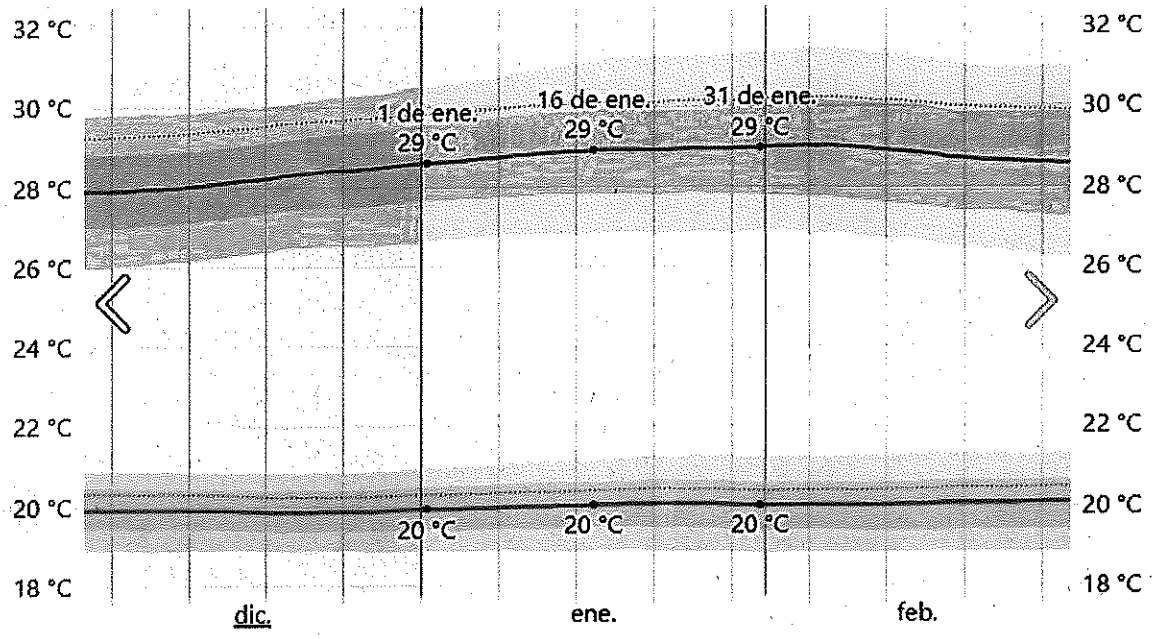

https://es.weatherspark.com/m/22372/12/Tiempo-promedio-en-diciembre-en-Agrado-Colombia#Figures-Temperature

10. ENSAYOS DE LABORATORIO

N/A

11. CONTROL DE ANTICIPO DE OBRA

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha (dd/mm/aaaa)	Valor Acta	Amortización	Valor pagado
Valor Anticipo (25%)	8 de agosto 2024	$123.576.406.25		$123.576.406.25
Acta Parcial No. 1		$	$	$
Acta Parcial No. 2		$	$	$
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$494.305.625	$ 18.061.646,00	$512.367.271,00	$0	$ $512.367.271,00

12. COMITES DE OBRA

Fecha de Realización (dd/mm/aaaa)	Lugar	Resultado del Comité (Describir)
07/1/2025	Ondina	**Comité de obra - 11**
20/1/2025	Ondina	**Comité de obra - 12**

13. RELACION DE DOCUMENTOS YA ENTREGADOS

TIPO DOCUMENTO	FECHA DE ENTREGA A LA ENTIDAD (dd/mm/aaaa)	No. RADICADO (Emitido por INDERHUILA)	FORMATO (Físico/Digital)
Copias de Bitácora de Obra (periodo del (01/1/2025) al (31/01/2025)	10/02/2025		Digital
Informe SG-SST (periodo del (01/1/2025) al (31/01/2025)	10/02/2025		Digital
Planillas de aportes a seguridad social integral (EPS-ARP-AFP) (periodo del (01/1/2025) al (31/01/2025)	10/02/2025		Digital
Correspondencia (periodo del (periodo del (01/1/2025) al (31/01/2025)	10/02/2025		Digital

14. RELACION DE PERSONAL (Profesional Interventoría)

NOMBRE YAPELLIDOS	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	MODALIDAD DE CONTRATACION
FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	7.711.430	REPRESENTANTE LEGAL (CONSORCIADO)	PRESTACIÓN DE SERVICIO
JOSE WILMER CHILITO	76.320.749	CONSORCIADO	PRESTACIÓN DE SERVICIO
CRISTIAN FABIAN JUNCO AVILA	1.012.354.706	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONTRATO POR OBRA O LABOR

15. RELACIÓN DE PAGOS DURANTE EL PERIODO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

PERSONAL	PENSIÓN	SALUD	ARL	CCF	PARAFISCALES	N° PLANILLA
RESIDENTE: CRISTIAN FABIAN JUNCO AVILA	$360.000	$90.000	$158.600	$90.000	$0	**1071703234**
R.L FAIVER EDUARDO PERDOMO	$692.900	$439.800	$85.700	$0	$0	**7960848319**
CONSORCIADO JOSE WILMER CHILITO	$227.800	$178.000	$0	$0	$0	**9480816069**

16. RELACIÓN DE POLIZAS DE GARANTIA

Póliza legalización del CONTRATO:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100009719	0	02-11-2023	Cumplimiento del contrato	01/11/2023	01/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/11/2023	01/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	01/02/2024	01/02/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100001951	0	02/11/2023	01/11/2023	01/02/2024

Póliza legalización del ACTA DE INCIO:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100009719	1 (ANULADO) 2	15/11/2023	Cumplimiento del contrato	08/11/2023	08/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	08/11/2023	08/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	08/02/2024	08/02/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100001951	1 (ANULADO) 2	15/11/2023	08/11/2023	08/02/2024

Póliza legalización del OTROSI No. 1:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100009719	3	17/05/2024	Cumplimiento del contrato	08/11/2023	08/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	08/11/2023	08/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	08/02/2024	08/02/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100001951	3	17/05/2024	08/11/2023	08/02/2024

Póliza legalización del ACTA DE SUSPENSION Y REINICIO No.1 :

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
				Cumplimiento del contrato	16/05/2024	31/12/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A

SEGUROS MUNDIAL	CHU-100009719	4	18/05/2024	Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	16/05/2024	30/06/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	30/06/2024	30/06/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100001951	4	18/05/2024	08/11/2023	30/06/2024

Póliza actualizada x OTROSI No.2:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100009719	5	18/05/2024	Cumplimiento del contrato	16/05/2024	31/12/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	16/05/2024	30/06/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	30/06/2024	30/06/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100001951	5	18/05/2024	08/11/2023	30/06/2024

Póliza actualizada x OTROSI No. 3:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100009719	6	03/07/2024	Cumplimiento del contrato	27/06/2024	31/01/2025
				Buen Manejo y correcta Inversión del anticipo	N/A	N/A
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	27/06/2024	31/07/2027
				Cumplimiento del contrato	30/07/2024	30/07/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100001951	6	03/07/2024	08/11/2023	31/07/2024

Póliza actualizada x OTROSI No. 4:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
				Cumplimiento del contrato	24/07/2024	13/03/2025

SEGUROS MUNDIAL	CHU-100009719	7	25/07/2024	Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	24/07/2024	13/09/2027
				Cumplimiento del contrato	13/09/2024	13/09/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA	
				DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100001951	7	25/07/2024	08/11/2023	13/09/2024

Póliza actualizada x OTROSI No. 5:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100009719	8	05/09/2024	Cumplimiento del contrato	28/08/2024	13/04/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	28/08/2024	13/10/2027
				Cumplimiento del contrato	13/10/2024	13/10/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA	
				DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100001951	8,9 (ANULADO) 10	06/09/2024	08/11/2023	13/10/2024

Póliza actualizada x OTROSI No. 6:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100009719	9	11/10/2024	Cumplimiento del contrato	04/10/2024	13/05/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	04/10/2024	13/11/2027
				Cumplimiento del contrato	13/11/2024	13/11/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100001951	11	11/10/2024	08/11/2023	13/11//2024

Póliza actualizada x OTROSI No. 7:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100009719	10	12/11/2024	Cumplimiento del contrato	30/10/2024	13/06/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	30/10/2024	13/12/2027
				Cumplimiento del contrato	13/12/2024	13/12/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100001951	12	12/11/2024	08/11/2023	13/12//2024

Póliza actualizada x OTROSI No. 8:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100009719	11	2/12/2024	Cumplimiento del contrato	27/11/2024	03/07/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	27/11/2024	03/01/2028
				Cumplimiento del contrato	04/01/2025	04/01/2030

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100001951	13	2/12/2024	08/11/2023	03/01//2025

Póliza actualizada x OTROSI No. 9:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)


ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
				Cumplimiento del contrato	20/12/2024	03/08/2025

SEGUROS MUNDIAL	CHU-100009719	12	23/12/2024	Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	20/12/2024	03/02/2028
				Cumplimiento del contrato	13/12/2024	04/02/2030


POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA	
				DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100001951	14	23/12/2024	08/11/2023	03/02//2025


17. PLANO y/o ESQUEMAS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

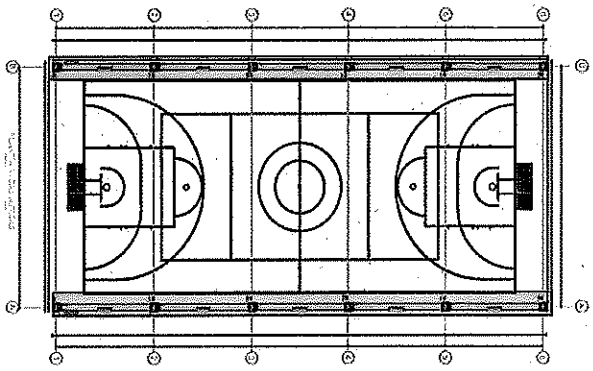


Esquema 1. Construcción de viga canal y suministro e Instalación de manto zetal para viga canal

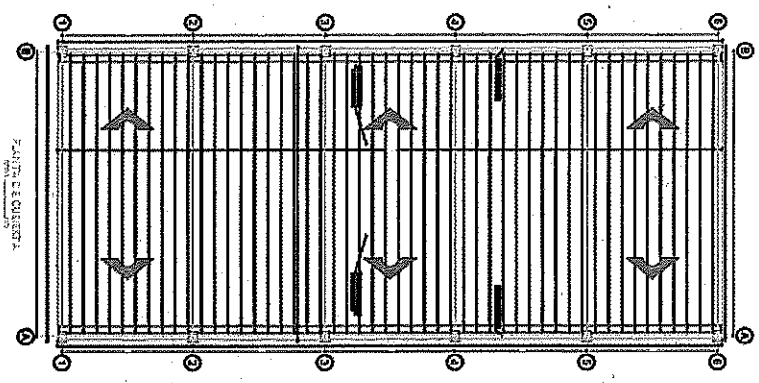


Esquema 2. Instalación de cubierta autoportante

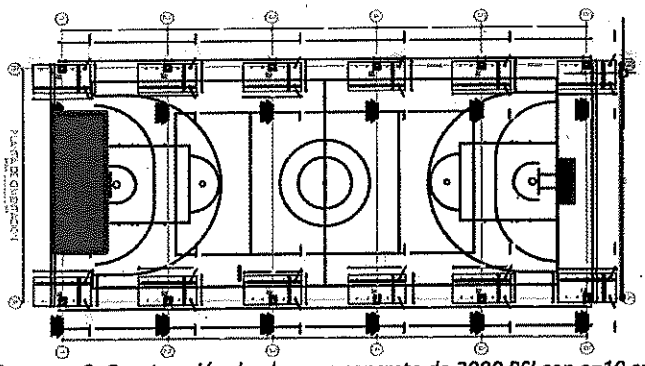


Esquema 3. Construcción de placa en concreto de 3000 PSI con e=10 cm

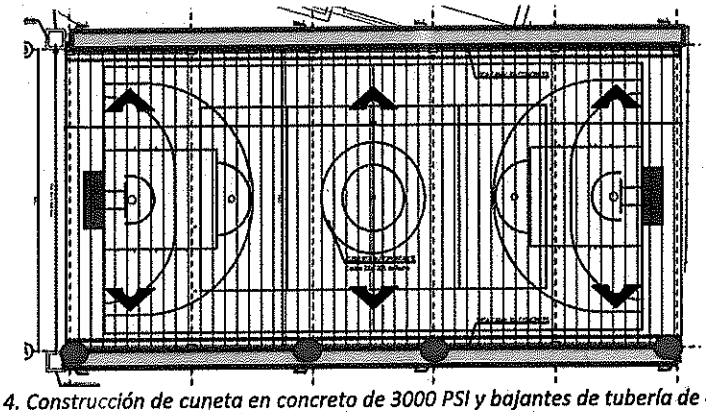


Esquema 4. Construcción de cuneta en concreto de 3000 PSI y bajantes de tubería de 4" en PVC-S

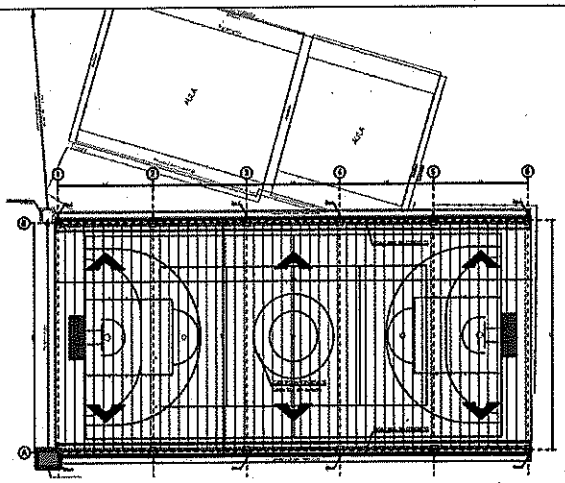


Esquema 5. Suministro e instalación de tubería PVC-S de 6" para desagüe, caja de inspección en concreto de 2500 PSI y tubería de de 8" para salida

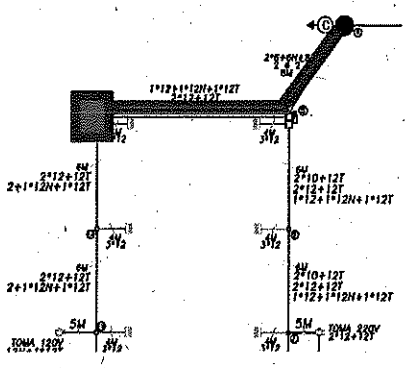


Esquema 6. Caja de inspección de alumbrado público en concreto y tapa en lamina alfajor, excavaciones y canalización de ductos conduit.

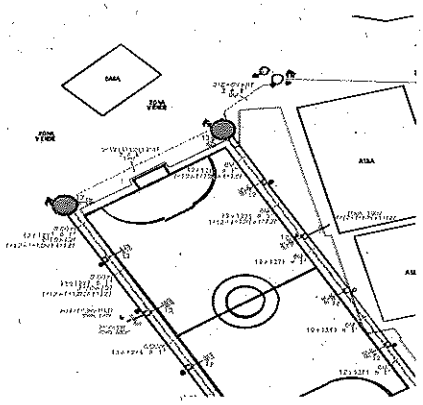


Esquema 7. Instalación de Transición aérea- subterránea tubería IMC 1 1/2" y tubería de 1"

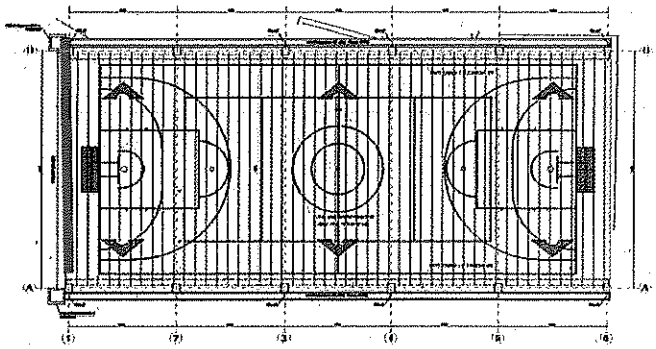

Esquema 8. Suministro e instalación de cableado para red de distribución principal en ducto subterráneo

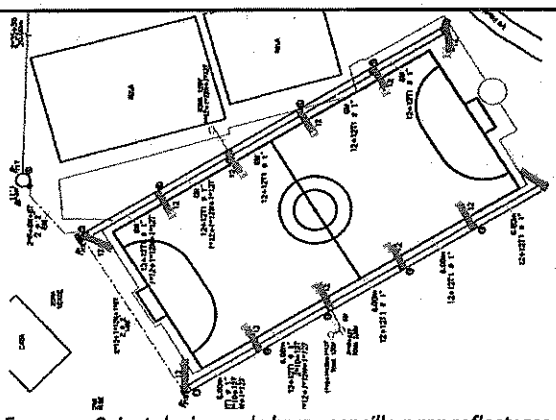

Esquema 9. Instalaciones de brazo sencillo para reflectores.

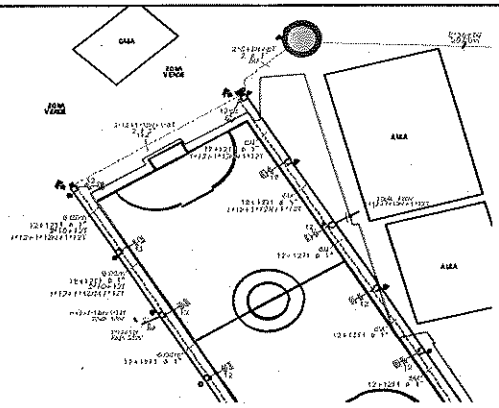

Esquema 10. Excavación, hincada y plomada de postes de concreto y Suministro - instalación y cableado de medida directa en poste.

18. AVANCE DE OBRA

Porcentajes y cantidades actualizados según Acta de modificación No.2

CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICION ACTUALIZADA ACTA DE MODIFICACION No.2		Filtro			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR/TOTAL	1/01/2025 - 30/01/2025			
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES				cant	vl	%	Acumulado
1.01	Localización y replanteo.	M2	738,43	$ 2.636.934,00		$ -	0,000%	0,649%
1.02	Demolición cuneta existente.	ML	1,20	$ 9.109,00		$ -	0,000%	0,002%
1.03	Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante.	M2	94,25	$ 2.485.561,00		$ -	0,000%	0,612%
1.04	Demolición de cerramiento perimetral existente (muro, malla, cimentación) hasta, H= 3 mt. Incluye retiro de material sobrante.	ML	12,00	$ 251.196,00		$ -	0,000%	0,062%
1.05	Demolición de anden existente hata e= 0,10 mts incluye retiro del material sobrante.	M2	1,91	$ 41.709,00		$ -	0,000%	0,010%
1.06	Desmonte marcos canchas existentes.	UND	2,00	$ 234.272,00		$ -	0,000%	0,058%
1.07	Corte de Placa de concreto e= 0.10 mts.	ML	58,00	$ 626.632,00		$ -	0,000%	0,154%
1.08	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	249,67	$ 11.526.016,00		$ -	0,000%	2,838%
1.09	Relleno en recebo seleccionado y compactado mecanicamente.	M3	101,59	$ 8.548.291,00		$ -	0,000%	2,105%
N.P 1,10	Excavación mecanica incluye retiro	M3	964,87	$ 28.142.363,00		$ -	0,000%	6,929%
2	CIMENTACIÓN					$ -	0,000%	0,000%
2.1	Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0.05 mts	M2	10,80	$ 368.636,00		$ -	0,000%	0,091%
2.2	Concreto ciclópeo - 2500 PSI (175 KG/CM2) 60% Concreto 2.500 PSI + 40% Piedra media zonga	M3	33,66	$ 12.160.483,00		$ -	0,000%	2,994%

2.3	Construcción zapatas en concreto 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño.	M3	47,12	$ 29.273.253,00		$ -	0,000%	7,208%
2.4	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. zapatas	KG	3.824,88	$ 27.317.293,00		$ -	0,000%	6,726%
2.5	Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño	M3	11,20	$ 8.340.203,00		$ -	0,000%	2,054%
2.6	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. viga de cimentación	KG	1.267,18	$ 9.050.200,00		$ -	0,000%	2,228%
3	ESTRUCTURA EN CONCRETO					$ -	0,000%	0,000%
3.01	Construcción en columnas en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI.	M3	13,93	$ 12.872.434,00		$ -	0,000%	3,170%
3.02	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. columnas	KG	4.303,10	$ 30.732.740,00		$ -	0,000%	7,567%
3.03	Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI impermeabilizado.	M3	16,68	$ 16.820.512,00	16,68	$ 16.820.512,00	4,104%	4,142%
3.04	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. Viga Canal	KG	2.078,20	$ 14.842.504,00		$ -	0,000%	3,655%
3.05	Suministro e instalación de manto zetal viga canal.	M2	60,80	$ 2.461.792,00	60,80	$ 2.461.792,00	0,601%	0,606%
4	CUBIERTA					$ -	0,000%	0,000%
4.1	Suministro, fabricación e instalación de cubierta autoportante a base de lámina de acero cal. 22, en páneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz.	M2	469,68	$ 99.715.412,00	469,68	$ 99.715.412,00	24,327%	24,552%
5	ACABADOS - PLACA EN CONCRETO					$ -	0,000%	0,000%
5.01	Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto.	ML	315,13	$ 4.679.681,00		$ -	0,000%	0,000%
5.02	Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo 3" tipo pesado y tubo AN 2" Cal 16 Futbol de Salón, Baloncesto, Tablero en fibra de vidrio 20MM de 1,8 * 1,05 M , Incluye: aro, malla, demarcado, logos, anticorrosivo y pintura	UND	0,00	$ -		$ -	0,000%	0,000%
5.03	Placa de piso en concreto de 3000 PSI, e=0,10 cm.	M2	188,54	$ 16.032.310,00	26,40	$ 2.244.898,00	0,548%	3,948%

5.04	Placa de anden en concreto de 3000 PSI hasta e=1,10 mts	M2	2,90	$ 215.192,00		$ -	0,000%	0,000%
5.05	Cuneta en concreto de 3000 PSI, según diseño	ML	60,80	$ 5.116.198,00	60,80	$ 5.116.198,00	1,248%	1,260%
NP 5.6	Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo de 3" y tubo de 2", tablero en fibra de vidrio 20mm de 1,8*1,05m (marcado con logos administracción). incluye marco, aro, malla, anticorrosivo y pintura	UND	2,00	$ 5.707.384,00		$ -	0,000%	0,000%
6	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					$ -	0,000%	0,000%
6.1	Bajantes en tubería PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para desagues y bajantes de aguas lluvias.	ML	46,40	$ 3.731.859,00	23,20	$ 1.865.930,00	0,455%	0,459%
6.2	Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagues.	ML	14,30	$ 1.536.807,00	14,30	$ 1.536.807,00	0,375%	0,378%
6.3	Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 8", con accesorios de conexión; para salida.	ML	20,00	$ 4.396.520,00	20,00	$ 4.396.520,00	1,073%	1,083%
6.4	Caja de inspeccion en concreto de F´c=2500 PSI, de seccion 0.70*0.70, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts.segun diseño	UND	2,00	$ 702.450,00	1,00	$ 351.225,00	0,086%	0,086%
NP 6.5	Canal para conduccion de aguas lluvias en sacos trinchera con suelo cemento	ml	62,00	$ 3.776.358,00		$ -	0,000%	0,930%
7	PLACA POLIDEPORTIVO					$ -	0,000%	0,000%
7.01	Desmonte de Postes de iluminación; Incl. Retiro de luminarias, clabeado y demolición de machón en concreto.	UND	4,00	$ 1.177.552,00		$ -	0,000%	0,290%
7.02	Caja de inspección de alumbrado público de 40x40x70 cm, fundida en concreto de 3000 psi y tapa en lamina alfajor.	UND	3,00	$ 1.923.474,00	1,00	$ 641.158,00	0,156%	0,158%
7.03	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	3,52	$ 162.501,00	3,52	$ 162.501,00	0,040%	0,040%
7.04	Canalización en ductos conduit pvc tipo pesado, dos ductos de 1 1/2" para baja tensión. Incluye compactación y tapada de brecha. a=0,40 mts.	ML	22,00	$ 1.089.352,00	22,00	$ 1.089.352,00	0,266%	0,268%
7.05	Transición aérea-subterránea tubería IMC 1 1/2"	UND	2,00	$ 611.156,00	2,00	$ 611.156,00	0,149%	0,150%

7.06	Transición aérea-subterránea tubería IMC 1"	UND	2,00	$ 566.546,00	2,00	$ 566.546,00	0,138%	0,139%
7.07	Suministro - instalación y cableado de medida directa en poste.	UND	1,00	$ 1.020.417,00	1,00	$ 1.020.417,00	0,249%	0,251%
7.08	Suministro - instalación y cableado de caja de distribución colocada en columna.	UND	1,00	$ 4.717.814,00		$ -	0,000%	0,000%
7.09	Suministro e instalación de cableado para red de distribución principal en ducto subterráneo en conductor 2x6 al ser8000 + 6 al ser8000 + 1x8 cu.	ML	14,00	$ 1.243.872,00	14,00	$ 1.243.872,00	0,303%	0,306%
7.10	Instalación brazo sencillo según diseño de 3,5 mts. Galvanizado y acabado en pintura polvo poliéster, para anclar el reflector.	UND	12,00	$ 4.443.264,00	12,00	$ 4.443.264,00	1,084%	1,094%
7.11	Suministro e instalación de cableado para redes internas para montaje de reflectores.	ML	60,00	$ 3.501.480,00		$ -	0,000%	0,000%
7.12	Suministro e instalación de reflector led de 150 w	UND	12,00	$ 12.268.644,00		$ -	0,000%	0,000%
7.13	Suministro e instalación de tomacorriente a 120 v.	UND	1,00	$ 978.457,00		$ -	0,000%	0,000%
7.14	Suministro e instalación de tomacorriente a 240v y tomacorriente a 120 v.	UND	1,00	$ 1.039.024,00		$ -	0,000%	0,000%
7.15	Excavación, hincada y plomada de postes de concreto de 8 mts x 510 kg armado y centrifugado	UND	1,00	$ 2.260.862,00	1,00	$ 2.260.862,00	0,552%	0,557%
8	TRANSPORTE					$ -	0,000%	0,000%
8.01	Transporte de materiales petreos	M3-Km	4.326,914	$ 4.776.913,00	145,39	$ 160.516,00	0,039%	1,176%
	TOTAL COSTO DIRECTO			$406.133.632		$ 146.708.938,00	35,792%	90,986%

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en el presente informe, son netamente responsabilidad del contratista quien las cuantificaron y constataron en el terreno.

ARQ.CRISTIAN JUNCO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ARQ. MARCO TULIO YAÑEZ
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

19. REGISTRO FOTOGRAFICO



IMAGEN 1– TRANPOTE DE MATERIAL PETREO



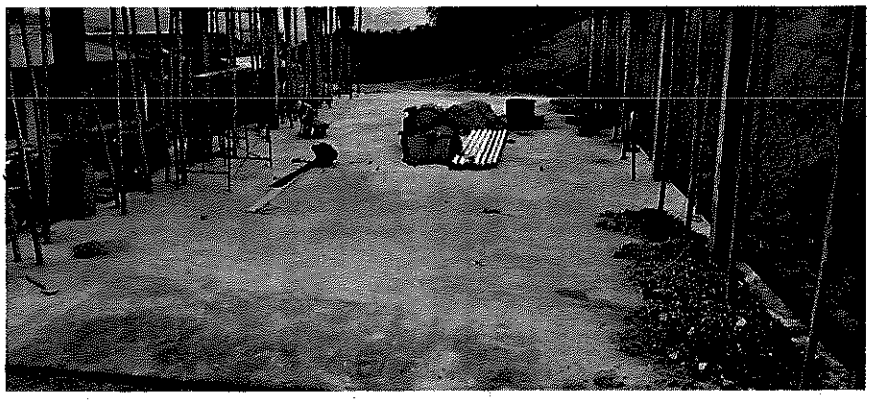


IMAGEN 2 Y 3 – CONSTRUCCION DE PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE E=10 CM

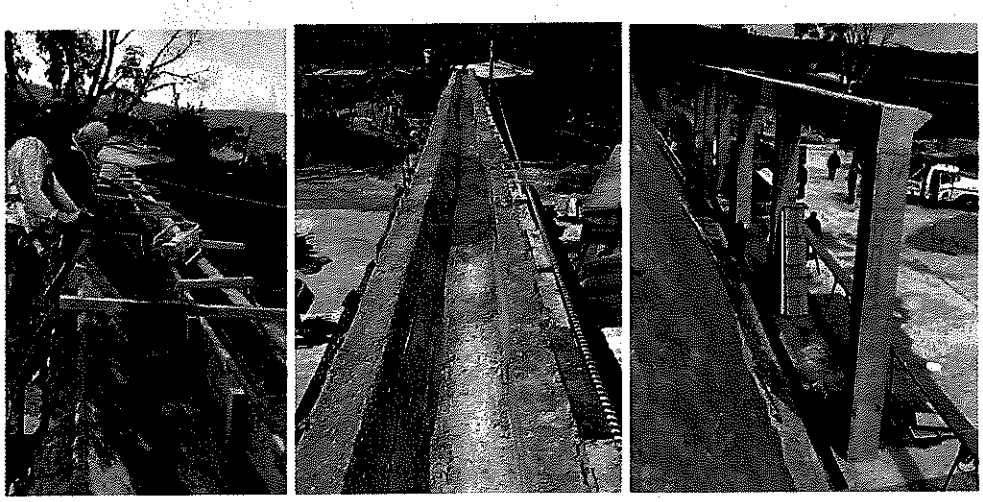




IMAGEN 4, 5, 6 Y 7 – CONSTRUCCION DE VIGA CANAL EN CONCRETO DE 3000 PSI



IMAGEN 8, 9 Y 10 – SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ZETAL PARA VIGA CANAL

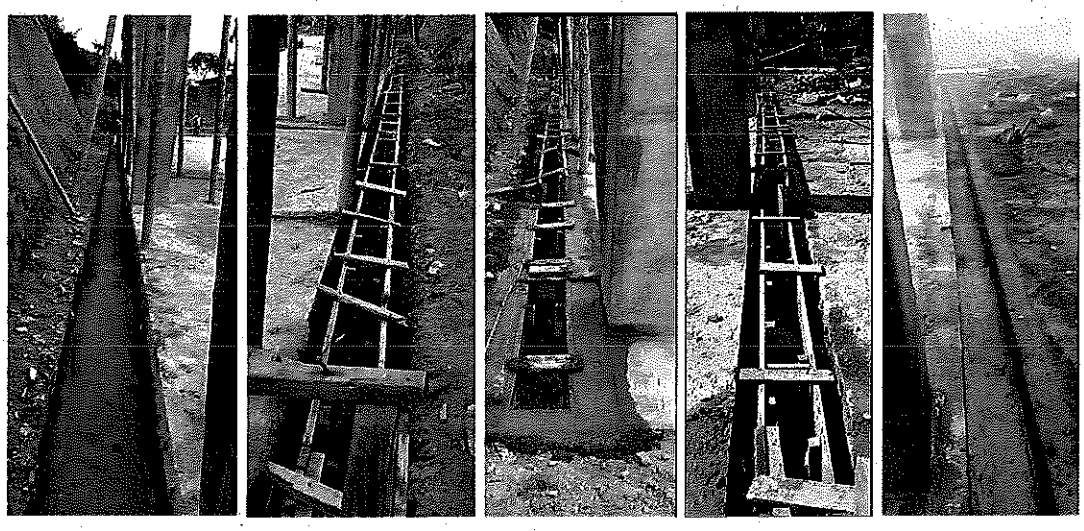


IMAGEN 11, 12, 13, 14 Y 15 – CONSTRUCCION DE CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI

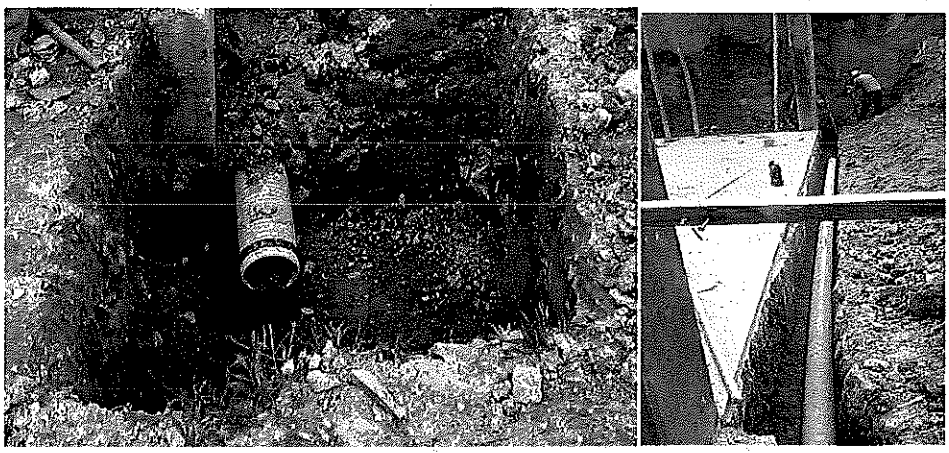


IMAGEN 16– SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN PVC-S DE 4"





IMAGEN 17 Y 18– CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO



MAGEN 19 Y 20 – SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN PVC-S DE 6" PARA DESAGUE

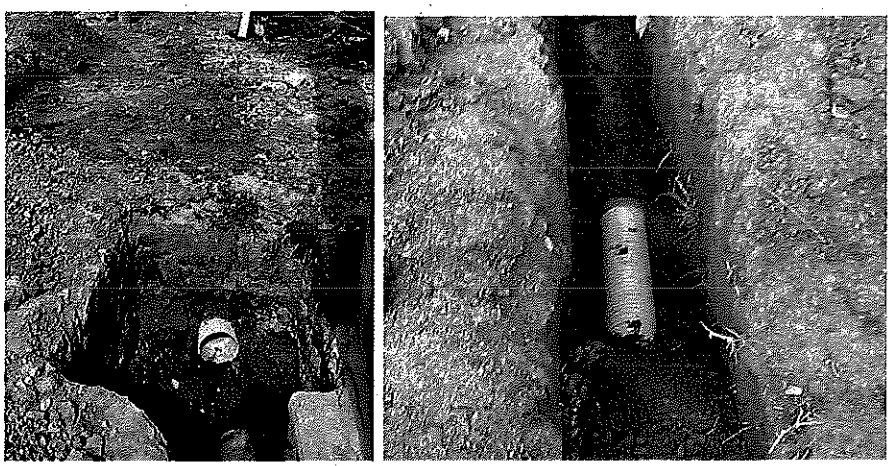


IMAGEN 21 Y 22 – SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN PVC-S DE 8" PARA SALIDA



IMAGEN 23 – CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION DE ALUMBRADO PUBLICO

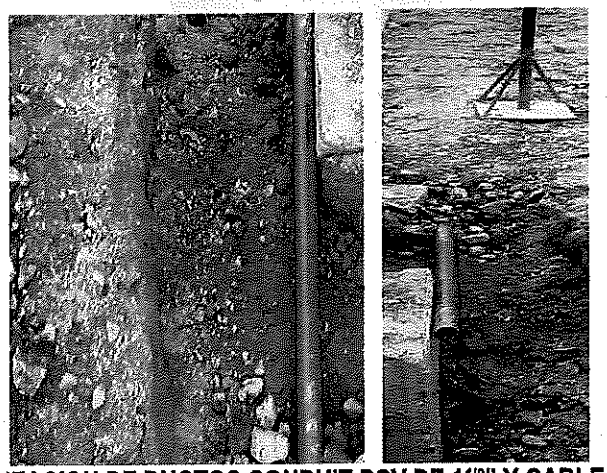


IMAGEN 24– CANALIZACION DE DUCTOS CONDUIT PCV DE 1 1/2" Y CABLEADO PARA RED DE DISTRIBUCION PRINCIPAL

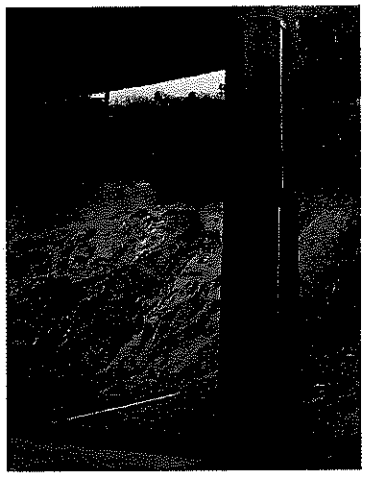


IMAGEN 25 – TRANSICION AEREA –SUBTERRANEA TUBERIA IMC DE 1 1/2" Y 1"

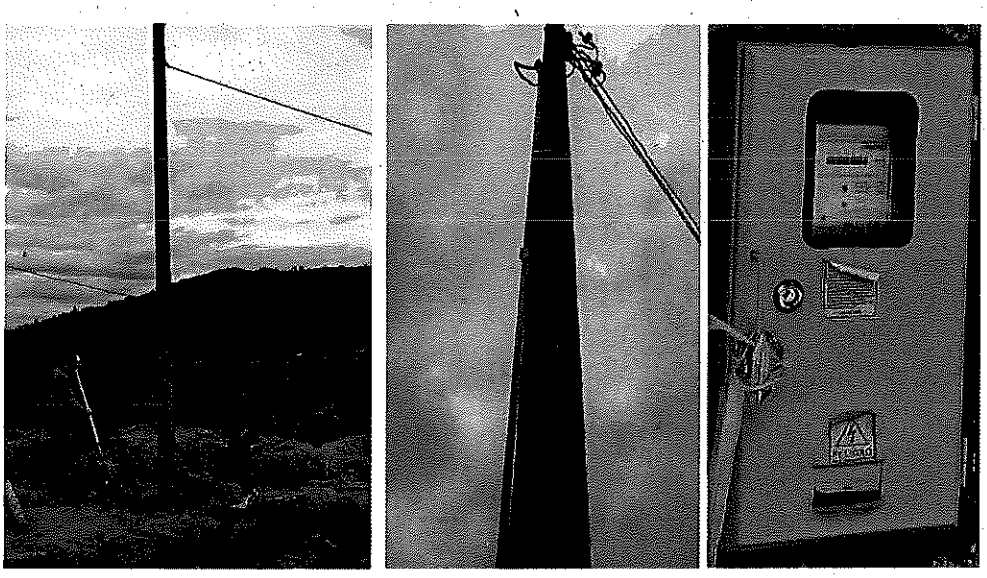


IMAGEN 26, 27 Y 28 – EXCAVACION, HINCADA Y PLOIMADA DE POSTE EN CONCRETO Y SUMINISTRO, INSTALACION Y CABLEADO DE MEDIA DIRECTA EN POSTE

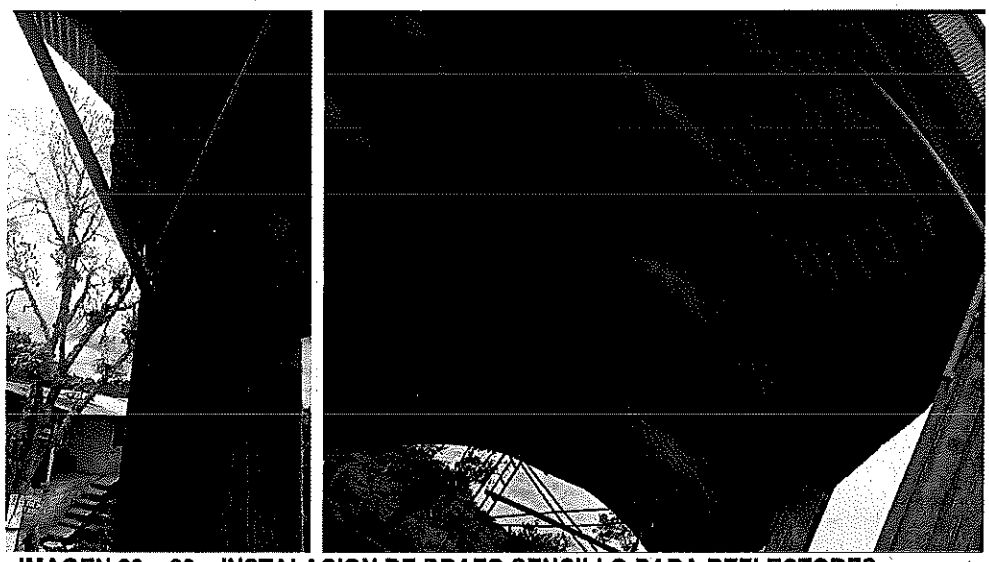
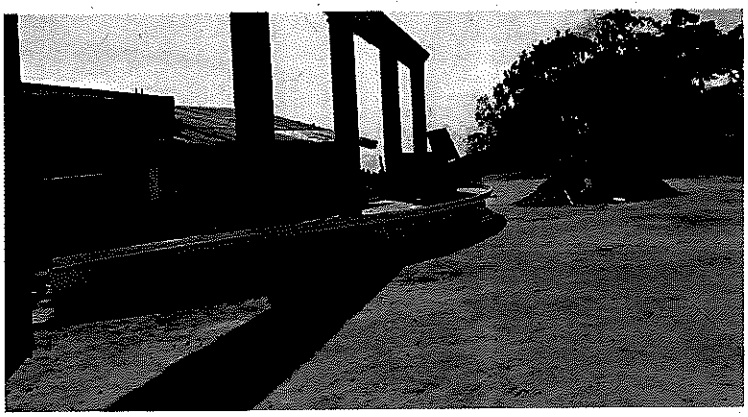


IMAGEN 29 y 30 – INSTALACION DE BRAZO SENCILLO PARA REFLECTORES



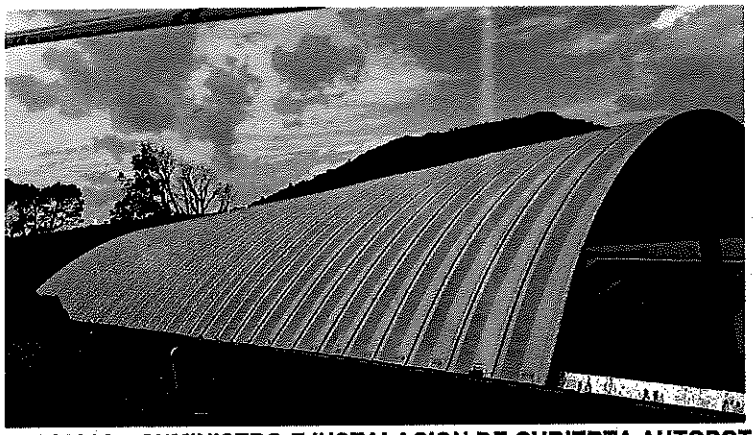


IMAGEN 31 Y 32 – SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA AUTOPOTANTE

20. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

- El suministro e instalación de la cubierta tuvo retrasos por el material con el proveedor, por lo cual se necesitó de prorrogar el tiempo al contrato de obra como de interventoría para su seguimiento, toda vez que sin la instalación de la mismo retraso el proceso de demarcación, instalación de marcos, instalación de reflectores entre otras actividades.

- Aunque la ampliación de los frentes de trabajo constituye una estrategia favorable que, en circunstancias ideales, debería acelerar el progreso de la obra, el impacto de las condiciones climáticas ha generado que no todos los frentes puedan avanzar de manera homogénea. Además, aunque el aumento de personal podría generar la percepción de un avance más rápido, la realidad es que las condiciones climáticas desfavorables limitan significativamente las posibilidades de trabajo en campo, lo que provoca que la productividad no se corresponde con el esfuerzo adicional en mano de obra.

21. ANEXOS

- BITACORA DE OBRA
- MEMORIAS DE CANTIDADES
- SOPORTES DE PAGO A APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (EPS-ARP-AFP) INTERVENTORIA.

ING. FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	(10/02/2025)	ING.NATALIA BUSTOS BOTERO
FIRMA ORIGINAL **R.L. INTERVENTORIA**	**FECHA DE ENTREGA**	FIRMA ORIGINAL **Vo.Bo APOYO SUPERVISION**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7711430
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL:			FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	NSIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CR 4 9 25 OF 507	TELÉFONO:	8868020
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7960848319	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero	AÑO 2025
			0				
			2025/02/07				1471622116

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCIÓN	1	$ 562,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 562,900	$ 0	$ 562,900
SUBTOTALES:										$ 562,900	$ 0	$ 562,900

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 439,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 439,800	$ 0	$ 0	$ 439,800
SUBTOTALES:													$ 439,800	$ 0	$ 0	$ 439,800

Planilla Pagada

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 85,700	$ 85,700	$ 0	$ 0	$ 85,700
SUBTOTALES:									$ 85,700	$ 0	$ 0	$ 85,700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE FISCAL	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	DCI	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SALUD				ARP					CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 7711430	PERDOMO POLANIA FAIVER EDUARDO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 3,517,850				NO																		230201-PROTECCION	30	$ 3,517,850	$ 562,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 562,900	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3,517,850	$ 439,800	$ 0	$ 439,800	14-11 - ARL SURA	30	$ 3,517,850	7711430	$ 85,700		$ 0																							

TOTAL PAGADO: $ 1.088.400

Planilla Pagada

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-02-10, 09:34:23 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 1071703234

Periodo Cotización: enero de 2025 **Periodo Servicio:** febrero de 2025

Fecha límite de pago: 2025-02-24

PAGADA 10/02/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO WF				
Documento	NI901767496	**Dirección**	CR 4 #9 - 25 OFICINA 507		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8608020		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	NEIVA	**Departamento**	HUILA		
Representante Legal	PERDOMO POLANIA FAIVER EDUARDO	**Identificación**	CC7711430		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades															Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Minterior	Total
CC 1012354706	JUNCO AVILA CRISTIAN FABIAN	01	00																0	30	30	30	30	COLFONDOS	$ 2.250.000	$ 360.000	EPS SANITAS	$ 2.250.000	$ 90.000	ARL SURA	$ 2.250.000	$ 156.600	COMFAMILIAR HUILA	$ 2.250.000	$ 90.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 696.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 2.250.000	$ 2.250.000	$ 2.250.000	$ 2.250.000	$ 360.000	$ 0	$ 0	$ 90.000	$ 156.600	$ 90.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 696.600	$ 0	$ 696.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76320749		CHILITO RIVADENEIRA JOSE WILMER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 25N Cra 8 Torres del Rio 305G	POPAYAN-CAUCA	3122879619	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-01	2025-01	1304834030	9480816069	I	2025/02/12	2025/03/03	NEQUI	19	$411,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	76320749	CHILITO JOSE							X											230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS018	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$405,800
Total	Afiliados(1)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$405,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76320749		CHILITO RIVADENEIRA JOSE WILMER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 25N Cra 8 Torres del Rio 305G	POPAYAN-CAUCA	3122879619	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	1304834030	9480816069	I	2025/02/12	2025/03/03	NEQUI	19	$411,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$2,900	$0	$230,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$2,900	$0	$230,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$2,300	$0	$180,300
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$178,000	$2,300	$0	$180,300
TOTAL				1	$405,800	$5,200	$0	$411,000

2025/03/02 10:18 AM

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código	DIH-CGID-F22
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Versión:	2
			Página 1 de 1	


OBJETO:	CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LA ONDINA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CLPIH397 DE 2023
LOCALIZACION:	VEREDA LA ONDINA MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	PERIODO COMPRENDIDO:	INFORME
CONTRATISTA:	CONSORCIO WIN	Desde: 1/01/2025	9
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF	Hasta: 31/01/2025	

CAPÍTULO:	3	ESTRUCTURA EN CONCRETO		
ITEM:	3.03	Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI impermeabilizado.	UNIDAD:	M3

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Medida Total
Viga canal Eje A1 - A6 y eje B1 - B6		30,40	0,35	0,400	2,00	8,51
Aleta Inclinada		30,40	0,18	0,580	2,00	6,35
Aleta Vertical		30,40	0,10	0,300	2,00	1,82
TOTAL						16,68

ESQUEMAS:

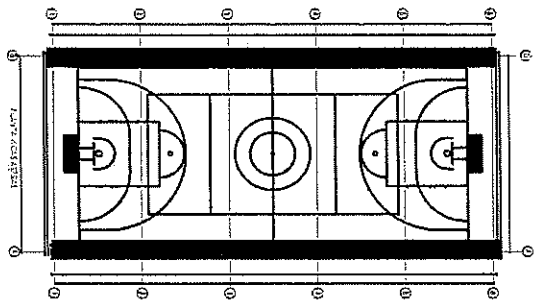

Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Arq. Jaime Alejandro Ramirez Franco RESIDENTE DE OBRA	Arq. Marco Tulio Yañez Villamizar DIRECTOR DE OBRA	Arq. Cristian Junco RESIDENTE DE INTERVENTORIA	


	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código	DIH-CGID-F22
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Versión:	2
			Página 1 de 1	

OBJETO:	CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LA ONDINA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CLPIH397 DE 2023
LOCALIZACION:	VEREDA LA ONDINA MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	PERIODO COMPRENDIDO:	INFORME
CONTRATISTA:	CONSORCIO WIN	Desde: 1/01/2025	9
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF	Hasta: 31/01/2025	
CAPÍTULO:	3 ESTRUCTURA EN CONCRETO	UNIDAD:	M2
ITEM:	3.05 Suministro e instalación de manto zetal viga canal.		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Medida Total
Suministro e instalación de manto zetal viga canal EJE A.		30,40			1,00	30,40
Suministro e instalación de manto zetal viga canal EJE B.		30,40			1,00	30,40
TOTAL						60,80

ESQUEMAS:

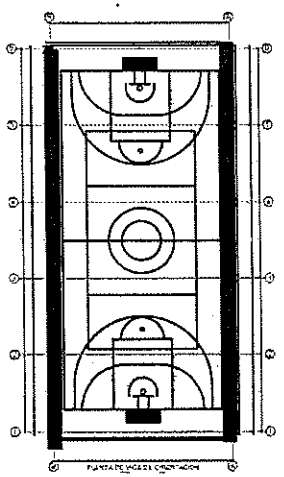

Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Arq. Jaime Alejandro Ramirez Franco RESIDENTE DE OBRA	Arq. Marco Tulio Yañez Villamizar DIRECTOR DE OBRA	Arq. Cristian Junco RESIDENTE DE INTERVENTORIA


	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código: DIH-CGID-F22
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Versión: 2
			Página 1 de 1

OBJETO:	CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LA ONDINA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CLPIH397 DE 2023
LOCALIZACION:	VEREDA LA ONDINA MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	PERIODO COMPRENDIDO:	INFORME
CONTRATISTA:	CONSORCIO WIN	Desde: 1/01/2025	9
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF	Hasta: 31/01/2025	
CAPÍTULO:	4 CUBIERTA	UNIDAD:	M2
ITEM:	4.1 Suministro, fabricación e instalación de cubierta autoportante a base de		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Medida Total
Suministro, fabricación e instalación de cubierta autoportante a base de lámina de acero cal. 22, en páneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz.		15,45	30,40			469,68
TOTAL						469,68

ESQUEMAS:

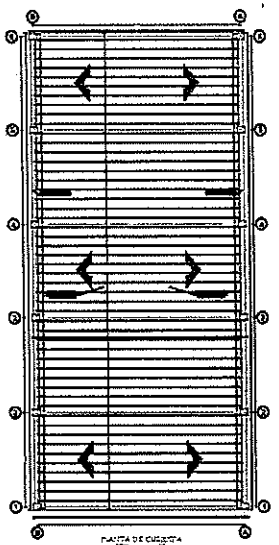

Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y corrobaron en el terreno.

Arq. Jaime Alejandro Ramirez Franco RESIDENTE DE OBRA	Arq. Marco Tulio Yañez Villamizar DIRECTOR DE OBRA	Arq. Cristian Junco RESIDENTE DE INTERVENTORIA


	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código: DIH-CGID-F22
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Versión: 2
			Página 1 de 1

OBJETO:	CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LA ONDINA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CLPIH397 DE 2023
LOCALIZACION:	VEREDA LA ONDINA MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	PERIODO COMPRENDIDO:	INFORME
CONTRATISTA:	CONSORCIO WIN	Desde: 1/01/2025	9
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF	Hasta: 31/01/2025	
CAPÍTULO: 5	ACABADOS - PLACA EN CONCRETO	UNIDAD:	M2
ÍTEM: 5.03	Placa de piso en concreto de 3000 PSI, e=0,10 cm.		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Medida Total
Placa de piso en concreto de 3000 PSI, e=0,10 cm, entre EJE A-B		3,00	9,20		1,00	27,60
Plaquita		-3,00	0,40		1,00	-1,20
TOTAL						26,40

ESQUEMAS:

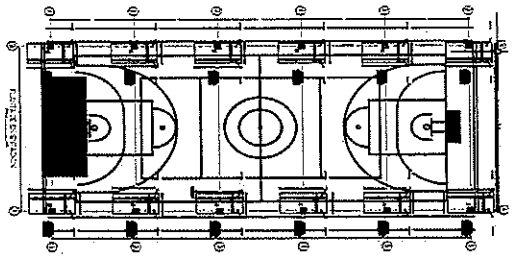

Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Arq. Jaime Alejandro Ramirez Franco RESIDENTE DE OBRA	Arq. Marco Tullo Yañez Villamizar DIRECTOR DE OBRA	Arq. Cristian Junco RESIDENTE DE INTERVENTORIA


	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código: DIH-CGID-F22
			Versión: 2
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Página 1 de 1

OBJETO:	CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LA ONDINA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CLPIH397 DE 2023
LOCALIZACION:	VEREDA LA ONDINA MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	PERIODO COMPRENDIDO:	INFORME
CONTRATISTA:	CONSORCIO WIN	Desde: 1/01/2025	9
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF	Hasta: 31/01/2025	
CAPÍTULO:	5 ACABADOS - PLACA EN CONCRETO	UNIDAD:	ML
ITEM:	5.05 Cuneta en concreto de 3000 PSI, según diseño		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Medida Total
CUNETA EN CONCRETO EJE A ENTRE 1 Y 6		30,40				30,40
CUNETA EN CONCRETO EJE B ENTRE 1 Y 6		30,40				30,40
TOTAL						60,80

ESQUEMAS:

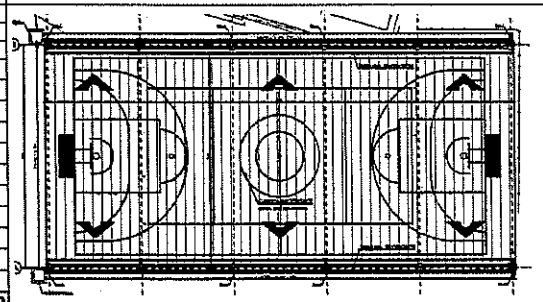

Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Arq. Jaime Alejandro Ramirez Franco RESIDENTE DE OBRA	Arq. Marco Tulio Yañez Villamizar DIRECTOR DE OBRA	Arq. Cristian Junco RESIDENTE DE INTERVENTORIA


	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código: DIH-CGID-F22
			Versión: 2
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Página 1 de 1

OBJETO:	CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LA ONDINA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CLPIH397 DE 2023
LOCALIZACION:	VEREDA LA ONDINA MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	PERIODO COMPRENDIDO:	INFORME
CONTRATISTA:	CONSORCIO WIN	Desde: 1/01/2025	9
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF	Hasta: 31/01/2025	
CAPÍTULO: 6	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	UNIDAD:	ML
ITEM: 6.1	Bajantes en tuberia PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Medida Total
Eje A1 - A3 - A4 - A6		5,80			4,00	23,20
TOTAL						23,20

ESQUEMAS:

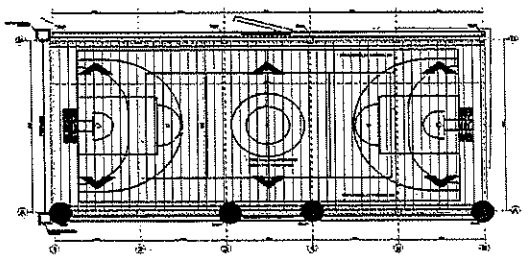

Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Arq. Jaime Alejandro Ramirez Franco RESIDENTE DE OBRA	Arq. Marco Tulio Yañez Villamizar DIRECTOR DE OBRA	Arq. Cristian Junco RESIDENTE DE INTERVENTORIA	


	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código	DIH-CGID-F22
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Versión:	2
			Página 1 de 1	

OBJETO:	CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LA ONDINA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CLPIH397 DE 2023
LOCALIZACION:	VEREDA LA ONDINA MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	PERIODO COMPRENDIDO:	INFORME
CONTRATISTA:	CONSORCIO WIN	Desde: 1/01/2025	9
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF	Hasta: 31/01/2025	
CAPÍTULO:	6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	UNIDAD:	ML
ITEM:	6.2 Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desaques.		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Medida Total
Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desaques.		14,30				14,30
TOTAL						14,30

ESQUEMAS:

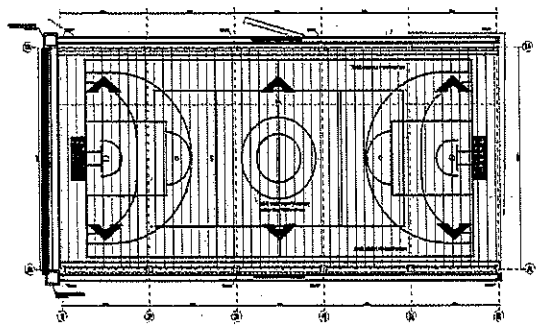

Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.


Arq. Jaime Alejandro Ramirez Franco RESIDENTE DE OBRA	Arq. Marco Tullo Yañez Villamizar DIRECTOR DE OBRA	Arq. Cristian Junco RESIDENTE DE INTERVENTORIA	

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código: DIH-CGID-F22
			Versión: 2
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Página 1 de 1

OBJETO:	CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LA ONDINA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CLPIH397 DE 2023
LOCALIZACION:	VEREDA LA ONDINA MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	PERIODO COMPRENDIDO:	INFORME
CONTRATISTA:	CONSORCIO WIN	Desde: 1/01/2025	9
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF	Hasta: 31/01/2025	
CAPÍTULO:	6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	UNIDAD:	ML
ITEM:	6.3 Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 8", con accesorios de		

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Medida Total
Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 8", con accesorios de conexión; para salida.		20,00				20,00
TOTAL						20,00

ESQUEMAS:

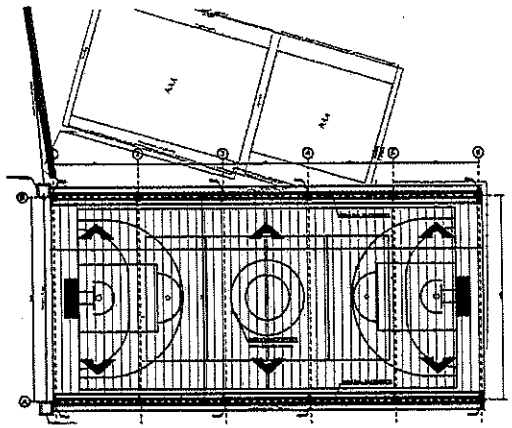

Observaciones:


NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Arq. Jaime Alejandro Ramírez Franco RESIDENTE DE OBRA	Arq. Marco Tulio Yañez Villamizar DIRECTOR DE OBRA	Arq. Cristian Junco RESIDENTE DE INTERVENTORIA

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código	DIH-CGID-F22
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Versión:	2
			Página 1 de 1	

OBJETO:	CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LA ONDINA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CLPIH397 DE 2023
LOCALIZACION:	VEREDA LA ONDINA MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	PERIODO COMPRENDIDO:	INFORME
CONTRATISTA:	CONSORCIO WIN	Desde: 1/01/2025	9
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF	Hasta: 31/01/2025	
CAPÍTULO:	6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	UNIDAD:	UND
ITEM:	6.4 Caja de inspeccion en concreto de F´c=2500 PSI, de seccion 0.70*0.70, H: 1M		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

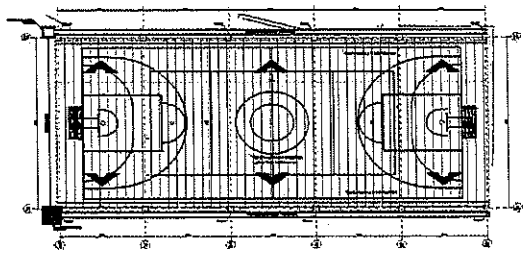DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Medida Total	ESQUEMAS:
Caja de inspeccion en concreto de F´c=2500 PSI, de seccion 0.70*0.70, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts.segun diseño. Eje A					1,00	1,00	
TOTAL						1,00	

Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Arq. Jaime Alejandro Ramirez Franco RESIDENTE DE OBRA	Arq. Marco Tulio Yañez Villamizar DIRECTOR DE OBRA	Arq. Cristian Junco RESIDENTE DE INTERVENTORIA

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código	DIH-CGID-F22
			Versión:	2
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Página 1 de 1	


OBJETO:	CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LA ONDINA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CLPIH397 DE 2023
LOCALIZACION:	VEREDA LA ONDINA MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	PERIODO COMPRENDIDO:	INFORME
CONTRATISTA:	CONSORCIO WIN	Desde: 1/01/2025	9
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF	Hasta: 31/01/2025	

CAPÍTULO:	7	PLACA POLIDEPORTIVO	UNIDAD:	UND
ITEM:	7.02	Caja de inspección de alumbrado público de 40x40x70 cm, fundida en		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Medida Total
Caja de inspección de alumbrado público de 40x40x70 cm, fundida en concreto de 3000 psi y tapa en lamina alfajor. Eje A					1,00	1,00
TOTAL						1,00

ESQUEMAS:

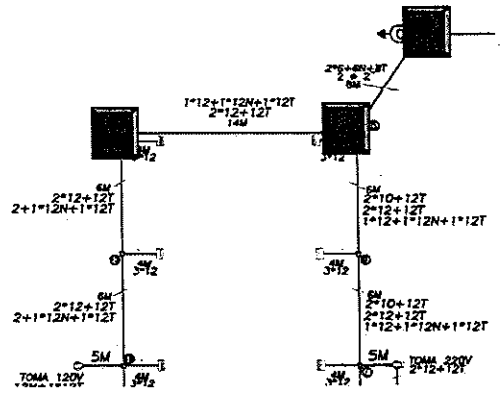

Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron se constataron en el terreno y planos.

Arq. Jaime Alejandro Ramirez Franco RESIDENTE DE OBRA	Arq. Marco Tulio Yañez Villamizar DIRECTOR DE OBRA	Arq. Cristian Junco RESIDENTE DE INTERVENTORIA

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		Código	DIH-CGID-F22
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	INDERHUILA	Versión:	2
			Página 1 de 1	


OBJETO:	CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LA ONDINA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CLPIH397 DE 2023
LOCALIZACION:	VEREDA LA ONDINA MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	PERIODO COMPRENDIDO:	INFORME
CONTRATISTA:	CONSORCIO WIN	Desde: 1/01/2025	9
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF	Hasta: 31/01/2025	

CAPÍTULO:	7	PLACA POLIDEPORTIVO		
ITEM:	7.03	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	UNIDAD:	M3

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Medida Total
Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.		22,00	0,40	0,400		3,52
TOTAL						3,52

ESQUEMAS:

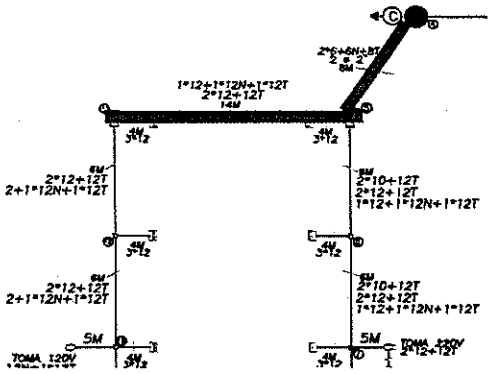

Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron se constataron en el terreno y planos.

Arq. Jaime Alejandro Ramirez Franco RESIDENTE DE OBRA	Arq. Marco Tulio Yañez Villamizar DIRECTOR DE OBRA	Arq. Cristian Junco RESIDENTE DE INTERVENTORIA	


	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código	DIH-CGID-F22
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Versión:	2
			Página 1 de 1	

OBJETO:	CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LA ONDINA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CLPIH397 DE 2023
LOCALIZACION:	VEREDA LA ONDINA MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	PERIODO COMPRENDIDO:	INFORME
CONTRATISTA:	CONSORCIO WIN	Desde: 1/01/2025	9
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF	Hasta: 31/01/2025	
CAPÍTULO:	7 PLACA POLIDEPORTIVO	UNIDAD:	ML
ITEM:	7.04 Canalización en ductos conduit pvc tipo pesado, dos ductos de 1 1/2" para		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Medida Total
Canalización en ductos conduit pvc tipo pesado, dos ductos de 1 1/2" para baja tensión. Incluye compactación y tapada de brecha. a=0,40 mts.		22,00				22,00
TOTAL						22,00

ESQUEMAS:

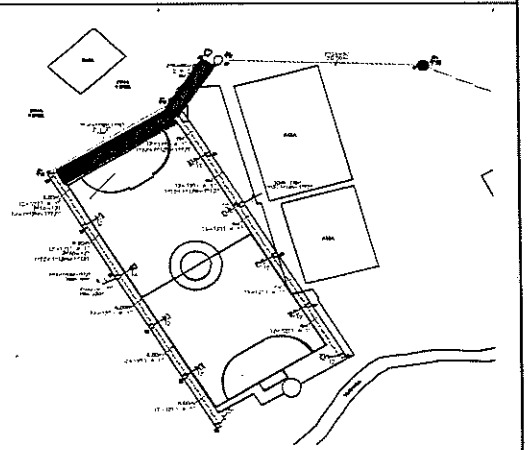

Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron se constataron en el terreno y planos.

Arq. Jaime Alejandro Ramirez Franco RESIDENTE DE OBRA	Arq. Marco Tulio Yañez Villamizar DIRECTOR DE OBRA	Arq. Cristian Dunco RESIDENTE DE INTERVENTORIA


	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código	DIH-CGID-F22
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Versión:	2
			Página 1 de 1	

OBJETO:	CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LA ONDINA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CLPIH397 DE 2023
LOCALIZACION:	VEREDA LA ONDINA MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	PERIODO COMPRENDIDO:	INFORME
CONTRATISTA:	CONSORCIO WIN	Desde: 1/01/2025	9
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF	Hasta: 31/01/2025	
CAPÍTULO:	7 PLACA POLIDEPORTIVO	UNIDAD:	UND
ITEM:	7.05 Transición aérea-subterránea tubería IMC 1 1/2"		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Medida Total
Transición aérea-subterránea tubería IMC 1 1/2"					2,00	2,00
TOTAL						2,00

ESQUEMAS:

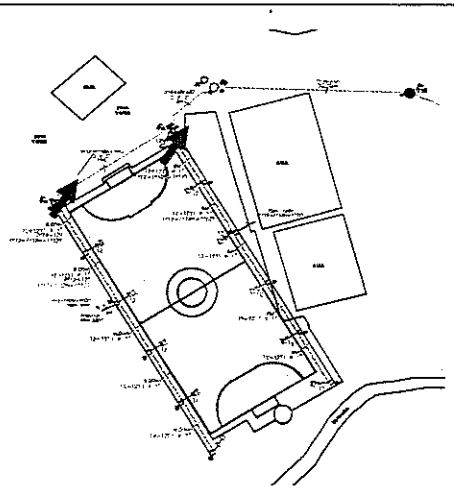

Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron se constataron en el terreno y plano.

Arq. Jaime Alejandro Ramirez Franco RESIDENTE DE OBRA	Arq. Marco Tulio Yañez Villamizar DIRECTOR DE OBRA	Arq. Cristian Junco RESIDENTE DE INTERVENTORIA	


	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código	DIH-CGID-F22
			Versión:	2
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Página 1 de 1	

OBJETO:	CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LA ONDINA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CLPIH397 DE 2023
LOCALIZACION:	VEREDA LA ONDINA MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	PERIODO COMPRENDIDO:	INFORME
CONTRATISTA:	CONSORCIO WIN	Desde: 1/01/2025	9
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF	Hasta: 31/01/2025	
CAPÍTULO:	7 PLACA POLIDEPORTIVO	UNIDAD:	UND
ITEM:	7.06 Transición aérea-subterránea tubería IMC 1"		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS
Transición aérea-subterránea tubería IMC 1"				2,000	2,00
TOTAL					2,00

ESQUEMAS:

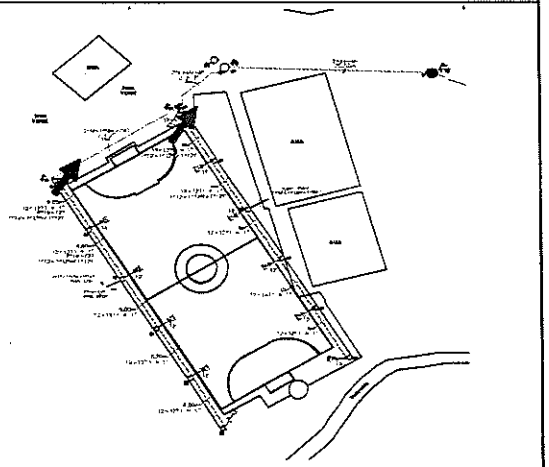

Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron se constataron en el terreno y plano.

Arq. Jaime Alejandro Ramirez Franco RESIDENTE DE OBRA	Arq. Marco Tulio Yañez Villamizar DIRECTOR DE OBRA	Arq. Cristian Junco RESIDENTE DE INTERVENTORIA	


	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código: DIH-CGID-F22
			Versión: 2
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Página 1 de 1

OBJETO:	CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LA ONDINA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CLPIH397 DE 2023
LOCALIZACION:	VEREDA LA ONDINA MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	PERIODO COMPRENDIDO:	INFORME
CONTRATISTA:	CONSORCIO WIN	Desde: 1/01/2025	9
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF	Hasta: 31/01/2025	
CAPÍTULO: 7	PLACA POLIDEPORTIVO	UNIDAD:	UND
ITEM: 7.07	Suministro - instalación y cableado de medida directa en poste.		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Medida Total
Suministro - instalación y cableado de medida directa en poste.					1,00	1,00
TOTAL						1,00

ESQUEMAS:

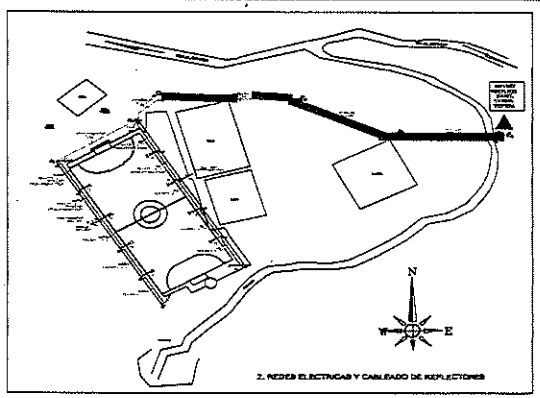

Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron se constataron en el terreno y plano.

Arq. Jaime Alejandro Ramirez Franco RESIDENTE DE OBRA	Arq. Marco Tulio Yañez Villamizar DIRECTOR DE OBRA	Arq. Cristian Junco RESIDENTE DE INTERVENTORIA	


	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código: DIH-CGID-F22
			Versión: 2
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Página 1 de 1

OBJETO:	CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LA ONDINA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CLPIH397 DE 2023
LOCALIZACION:	VEREDA LA ONDINA MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	PERIODO COMPRENDIDO:	INFORME
CONTRATISTA:	CONSORCIO WIN	Desde: 1/01/2025	
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF	Hasta: 31/01/2025	9
CAPÍTULO:	7 PLACA POLIDEPORTIVO		
ITEM:	7.09 Suministro e instalación de cableado para red de distribución principal en	UNIDAD:	ML

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Medida Total
Suministro e instalación de cableado para red de distribución principal en ducto subterráneo en conductor 2x6 al ser8000 + 6 al ser8000 + 1x8 cu.		14,00				14,00
TOTAL						14,00

ESQUEMAS:



Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Arq. Jaime Alejandro Ramirez Franco RESIDENTE DE OBRA	Arq. Marco Tulio Yañez Villamizar DIRECTOR DE OBRA	Arq. Cristian Junco RESIDENTE DE INTERVENTORIA


	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código: DIH-CGID-F22
			Versión: 2
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Página 1 de 1

OBJETO:	CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LA ONDINA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CLPIH397 DE 2023
LOCALIZACION:	VEREDA LA ONDINA MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	PERIODO COMPRENDIDO:	INFORME
CONTRATISTA:	CONSORCIO WIN	Desde: 1/01/2025	
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF	Hasta: 31/01/2025	9
CAPÍTULO: 7	PLACA POLIDEPORTIVO		
ITEM: 7.10	Instalación brazo sencillo según diseño de 3,5 mts. Galvanizado y acabado	UNIDAD:	UND

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Medida Total
Instalación brazo sencillo según diseño de 3,5 mts. Galvanizado y acabado en pintura polvo poliéster, para anclar el reflector.					12,00	12,00
TOTAL						12,00

ESQUEMAS:

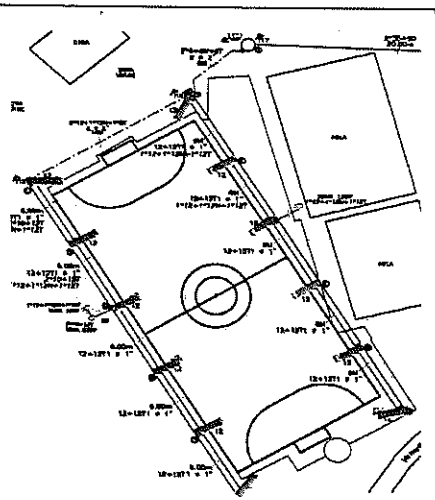

Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Arq. Jaime Alejandro Ramirez Franco RESIDENTE DE OBRA	Arq. Marco Tulio Yañez Villamizar DIRECTOR DE OBRA	Arq. Cristian Junco RESIDENTE DE INTERVENTORIA


	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código: DIH-CGID-F22
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Versión: 2
			Página 1 de 1

OBJETO:	CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LA ONDINA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CLPIH397 DE 2023
LOCALIZACION:	VEREDA LA ONDINA MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	PERIODO COMPRENDIDO:	INFORME
CONTRATISTA:	CONSORCIO WIN	Desde: 1/01/2025	
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF	Hasta: 31/01/2025	9
CAPITULO:	7 PLACA POLIDEPORTIVO		
ITEM:	7.15 Excavación, hincada y plomada de postes de concreto de 8 mts x 510 kg armado y centrifugado	UNIDAD:	UND

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Medida Total
Excavación, hincada y plomada de postes de concreto de 8 mts x 510 kg armado y centrifugado					1,00	1,00
TOTAL						1,00

ESQUEMAS:

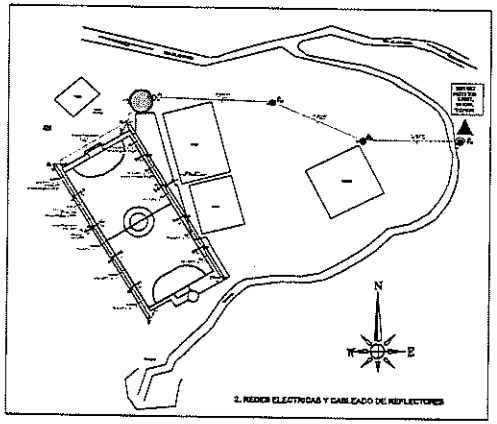

Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presente acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Arq. Jaime Alejandro Ramirez Franco RESIDENTE DE OBRA	Arq. Marco Tulio Yañez Villamizar DIRECTOR DE OBRA	Arq. Cristian Junco RESIDENTE DE INTERVENTORIA

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código: DIH-CGID-F95
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Versión: 2
			Página 1 de 1

OBJETO:	CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LA ONDINA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CLPIH397 DE 2023
LOCALIZACION:	VEREDA LA ONDINA MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	PERIODO COMPRENDIDO:	INFORME
CONTRATISTA:	CONSORCIO WIN	Desde: 1/01/2025	
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF	Hasta: 31/01/2025	9
CAPITULO:	8 TRANSPORTE		
ITEM:	8.01 Transporte de materiales petreos	UNIDAD:	M3-Km

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	KILOMETRO	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Medida Total	ESQUEMAS:
MATERIALES CONCRETO 3000 PSI PARA CUNETA ANDEN (0,57m3 arena - 0,84m3 grava)	1,41	5,155840	20,00			145,3947	
TOTAL						145,3947	

Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Arq. Jaime Alejandro Ramirez Franco RESIDENTE DE OBRA	Arq. Marco Tulio Yañez Villamizar DIRECTOR DE OBRA	Arq. Cristian Junco RESIDENTE DE INTERVENTORIA
