CONTRATO DE INTERVENTORIA No. _ **CIHCM410 de 2023**_

INFORME DE INTERVENTORIA No. 10

MENSUAL [X] **FINAL** [ ]

OBJETO DEL CONTRATO : INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A TRES (03) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADO EN LA VEREDA ONDINA, SAN JOSE DE BELEN Y VEREDA ALTO BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DEL AGRADO – DEPARTAMENTO DEL HUILA.



MUNICIPIO: **EL AGRADO – VEREDA LA ONDINA.**

DEPARTAMENTO: **HUILA**

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIHCM410 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA" Y CONSORCIO WF

APOYO A LA SUPERVISIÓN	NATALIA BUSTOS BOTERO	**ENTIDAD**	INDERHUILA
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO INTERVENTORIA			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	___ **CIHCM410**____ DE 2023___		
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A TRES (03) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADO EN LA VEREDA ONDINA, SAN JOSE DE BELEN Y VEREDA ALTO BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DEL AGRADO – DEPARTAMENTO DEL HUILA	**PERIODO DEL INFORME**	01 DE FEBRERO al 07 DE FEBRERO 2025.
CONTRATISTA	CONSORCIO WF	**NIT:**	901.767.496-1
REPRESENTANTE LEGAL:	FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	**C.C:**	7.711.430

FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	1 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO (D/M/A):	08 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL.
ACTA DE JUSTIFICACIÓN OTROSI NO. 1:	28 DE DICIEMBRE DE 2023
OTROSI NO. 1: 28/12/2023	MODIFICACIÓN CLAUSULA SEPTIMA – CAMBIO FUENTE DE FINANCIACIÓN
ACTA DE JUSTIFICACIÓN NO.1 DE SUSPENSIÓN	28 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE SUSPENSION NO. 1	28 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE JUSTIFICACIÓN NO.2 DE REINICIO	15 DE MAYO DE 2024
ACTA DE REINICIO NO. 1	16 DE MAYO DE 2024
OTROSI NO. 2: 16/05/2024	MODIFICACIÓN A LA CLÁUSULA CUARTA, PLAZO DEL CONTRATO – VIGENCIA FISCAL-
ACTA DE JUSTIFICACIÓN NO. 03 OTROSI NO. 3	24 DE JUNIO DE 2024
OTROSI NO. 3: 24/06/2024	MODIFICACIÓN A LA CLÁUSULA CUARTA, PLAZO DEL CONTRATO - PRÓRROGA DE UN (1) MES.
ACTA DE JUSTIFICACIÓN NO. 04 DE OTROSI NO.4	23 DE JULIO DE 2024
OTROSI NO. 4: 23/07/2024	MODIFICACIÓN A LA CLÁUSULA CUARTA, PLAZO DEL CONTRATO - PRÓRROGA DE UN (1) MES Y DIEZ (10) DÍAS.
ACTA DE JUSTIFICACIÓN NO. 05 DE OTROSI NO.5	28 DE AGOSTO DE 2024
OTROSI NO. 5: 28/08/2024	MODIFICACIÓN A LA CLÁUSULA CUARTA, PLAZO DEL CONTRATO - PRÓRROGA DE UN (1) MES.
FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	1 DE NOVIEMBRE DE 2023

ACTA DE JUSTIFICACIÓN NO. 06 DE OTROSI NO.6	04 DE OCTUMBRE DE 2024
OTROSI NO. 6: 04/10/2024	MODIFICACIÓN A LA CLÁUSULA CUARTA, PLAZO DEL CONTRATO - PRÓRROGA DE UN (1) MES. **ADICIÓN:** CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINIDÓS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS ($ 5.622.839,00) M/CTE. IVA INCLUIDO.
ACTA DE JUSTIFICACIÓN NO. 07 DE OTROSI NO.7	30 DE OCTUMBRE DE 2024
OTROSI NO. 7: 30/10/2024	MODIFICACIÓN A LA CLÁUSULA CUARTA, PLAZO DEL CONTRATO - PRÓRROGA DE UN (1) MES.
ACTA DE JUSTIFICACIÓN NO. 08 DE OTROSI NO.8	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
OTROSI NO. 8: 27/11/2024	MODIFICACIÓN A LA CLÁUSULA CUARTA, PLAZO DEL CONTRATO - PRÓRROGA DE DIECINUEVE (19) DIAS CALENDARIO.
ACTA DE JUSTIFICACIÓN NO. 09 DE OTROSI NO.9	20 DE DICIEMBRE DE 2024
OTROSI NO. 9: 20/12/2024	MODIFICACIÓN A LA CLÁUSULA CUARTA, PLAZO DEL CONTRATO - PRÓRROGA DE UN (1) MES.
ACTA DE JUSTIFICACIÓN NO. 10 DE OTROSI NO.10	21 DE ENERO DE 2025
OTROSI NO. 10: 21/01/2025	MODIFICACIÓN A LA CLÁUSULA CUARTA, PLAZO DEL CONTRATO - PRÓRROGA DE QUINCE (15) DIAS CALENDARIO.
PLAZO ADICIONAL (NO.1) (24/06/2024):	UN (1) MESES
PLAZO ADICIONAL (NO.2) (23/07/2024):	UN (1) MESES Y (10) DIEZ DIAS
PLAZO ADICIONAL (NO.3) (28/08/2024):	UN (1) MESES
PLAZO ADICIONAL (NO.4) (04/10/2024):	UN (1) MESES
PLAZO ADICIONAL (NO.5) (04/10/2024):	UN (1) MESES
PLAZO ADICIONAL (NO.6) (27/11/2024):	DIECINUEVE (19) DÍAS
PLAZO ADICIONAL (NO.7) (20/12/2024):	UN (1) MESES
PLAZO ADICIONAL (NO.8) (21/01/2024):	QUINCE (15) DÍAS
PLAZO TOTAL:	DIEZ (10) MESES Y CATORCE (14) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN, Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL 2025..
VALOR INICIAL:	CIENTO VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL ONCE PESOS ($129.699.011) M/CTE.
VALOR ADICIONAL (SI APLICA):	CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINIDÓS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS ($ 5.622.839,00) M/CTE.
VALOR CORRESPONDIENTE A LA VEREDA ONDINA	CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE ($46.858.939) M/CTE.
VALOR TOTAL:	CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 135.321.850,00) M/CTE. IVA INCLUIDO.
FECHA DE TERMINACIÓN:	7 DE FEBRERO DE 2025


2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No.	CLPIH397 DE 2023		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA **VEREDA LA ONDINA** DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO - DEPARTAMENTO DEL HUILA.		
CONTRATISTA	CONSORCIO WIN	**NIT:**	901.756.252-2
REPRESENTANTE LEGAL:	NORMA PATRICIA LUNA HERNÁNDEZ	**C.C:**	40.441.590

FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	30 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE INICIO (D/M/A):	14 DE NOVIEMBRE DE 2023
OTROSI 1 – FUENTE DE FINANCIACIÓN	28 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN (D/M/A):	28 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO (D/M/A):	17 DE JULIO 2024
OTROSI 2 – VIGENCIA FISCAL	17 DE JULIO 2024
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL.
OTROSI 3 PLAZO ADICIONAL (No.1) (27/08/2024)	UN (1) MES
OTROSI 4 MODIFICACIÓN MAYORES Y MENORES CANTIDADES Y CREACIÓN DE ÍTEMS NUEVOS	**Adición:** DIECIOCHO MILLONES SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS ($ 18.061.646,00) M/CTE.
OTROSI 4 PLAZO ADICIONAL (No.1) (30/09/2024)	UN (1) MES.
OTROSI 5 PLAZO ADICIONAL (No.3) (30/10/2024)	1 MES
OTROSI 6 PLAZO ADICIONAL (No.4) (27/11/2024)	22 DIAS
OTROSI 7 PLAZO ADICIONAL (No.4) (20/12/2024)	1 MES
OTROSÍ N°8: 21/01/2025	15 DÍAS
PLAZO TOTAL:	**OCHO (8) MESES Y SIETE (7) DIAS CALENDARIO,** CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN, Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL 2025.
VALOR INICIAL:	$ 494.305.625.00
VALOR ADICIONAL (SI APLICA):	$ 18.061.646.00
VALOR FINAL	$ 512.367.271.00
FECHA DE TERMINACIÓN:	7 DE FEBRERO DE 2025

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto Cubierta Autoportante con Iluminación se encuentra localizado en la Vereda La Ondina de la Zona Rural del Municipio Del Agrado - Departamento Del Huila

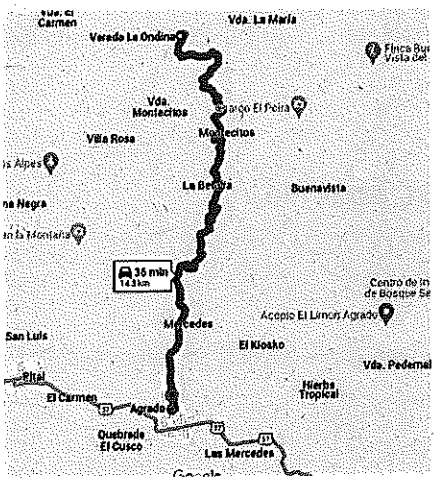

Ruta y localización Proyecto



localización proyecto – Planta

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto arquitectónico y estructural contempla la construcción de la Cubierta Autoportante con Iluminación para la Vereda La Ondina la Zona Rural del Municipio Del Agrado - Departamento Del Huila, la cual tiene una destinación de uso recreativo, deportivo y cultural, correspondientes a estructura cubierta, iluminación, y sistema hidráulico para el manejo de aguas lluvias. La cubierta será un sistema autoportante, sostenida con columnas vigas aéreas en concreto reforzado de 3000 PSI y una cimentación tipo zapata, vigas de cimentación y viga canal, placa contrapiso en concreto reforzado de 3000 PSI.

5. DESCRIPCION DEL AVANCE MENSUAL DE OBRA

La interventoría realizo el seguimiento a las siguientes actividades:

- **5.01 Demarcación de Cancha:**

Se verifico la pintura para tráfico pesado de las tres disciplinas deportivas (microfútbol, voleibol y baloncesto), mediante el cual se rectificó la adherencia y visibilidad de las líneas de demarcación teniendo en cuenta las dimensiones reglamentarias.

- **5.04 Placa de Andén en concreto:**

Se comprobó la construcción de la placa de anden en concreto de 3000 PSI con espesor de 10cm.

- **NP 5.6 Cancha Multifuncional:**

Se verificaron la instalación de dos canchas multifuncionales con estructura en tubos de 3" y 2" con tratamiento anticorrosivo y su debida pintura a 3 manos, cada uno con tableros en fibra de vidrio de 1.8x1.05m, ve comprobó la instalación de los aros y redes.

- **6.1 Bajantes PVC-S 4":**

Se verifico la instalación de 4 bajantes en tubería de 4" sobre el eje B1 , B3, B4 y B6.

- **6.4 Caja de Inspección en Concreto**

Se verificaron la formaleta y construcción de una caja de inspección, en el eje del colegio con su respectiva tapa según diseño.

- **7.02 Caja de Inspección para Alumbrado Público**

Se rectificó la construcción e instalación de una caja de inspección del eje B y otra en el poste instalado.

- **7.08 Suministro - instalación y cableado de caja de distribución colocada en columna.**

Se revisó el cableado a caja de distribución eléctrica montada en columna, para su funcionamiento y cumpliendo con las normas de seguridad eléctrica.

- **7.11 Suministro e instalación de cableado para redes internas para montaje de reflectores.:**

Se hizo seguimiento a la instalación del cableado respectivo en tubería conduit con conductores THWN-2 calibre 12 AWG, para el montaje de los reflectores.

- **7.12 Suministro e instalación de reflector led de 150 w:**

Se verificó la instalación de 12 luminarias de 150W, 6 en cada eje.

- **7.13 Suministro e instalación de tomacorriente a 120 v.**

Se verifico los tomacorrientes a 120 V.

- **7.14 Suministro e instalación de tomacorriente a 240v y tomacorriente a 120 v.**

Se revisó la instalación de tomacorrientes a 240 V y 120 V.

6. HISTORIA CRONOLOGICA DEL PROYECTO (obra)

ACTIVIDAD	FECHA (dd/mm/aaaa)	DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACION (dd/mm/aaaa)
Iniciación	14/11/2023			
Suspensión No. 1	28/12/2023	44		
Reiniciación No. 1	17/07/2024		202	
Otrosi No. 3	27/08/2024	42		
Otrosi No. 4	30/09/2024	33		
Otrosi No. 5	30/10/2024	30		
Otrosi No. 6	27/11/2024	27		
Otrosi No. 7	20/12/2024	23		
Otrosi No. 8	21/01/2025	31		
TERMINACIÓN Cto.		17		7/02/2025
TOTAL DIAS		247	202	

7. ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de Inicio, acta de Suspensión, acta de Reinicio, actas de Modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No.	Fecha
	CLPIH397 DE 2023	
ACTA DE INICIO	1	14 DE NOVIEMBRE DE 2023
ACTA DE JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACION	1	28 DE DICIEMBRE DE 2023
OTROSÍ NO.01	1	28 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE JUSTIFICACIÓN - SUSPENSIÓN	1	28 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE SUSPENSIÓN	1	28 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE JUSTIFICACIÓN - REINICIO	2	17 DE JULIO DE 2024
ACTA DE REINICIO	1	17 DE JULIO DE 2024
ACTA DE JUSTIFICACIÓN	3	17 DE JULIO DE 2024

OTROSÍ	2	17 DE JULIO DE 2024
ACTA DE JUSTIFICACIÓN	4	28 DE AGOSTODE 2024
OTRO SI MODIFICATORIO N.03	3	28 DE AGOSTODE 2024
ACTA DE JUSTIFICACIÓN	5	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
OTRO SI MODIFICATORIO N.04	4	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
ACTA DE JUSTIFICACIÓN	6	30 DE OCTUBRE DE 2024
OTRO SI MODIFICATORIO N.05	5	30 DE OCTUBRE DE 2024
ACTA DE JUSTIFICACIÓN	7	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
OTRO SI MODIFICATORIO N.06	6	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
ACTA DE JUSTIFICACIÓN	8	20 DE DICIEMBRE DE 2024
OTRO SI MODIFICATORIO N.07	7	20 DE DICIEMBRE DE 2024
ACTA DE JUSTIFICACIÓN	9	21 DE ENERO DE 2025
OTRO SI MODIFICATORIO N.08	8	21 DE ENERO DE 2025
ACTA DE MODIFICACION MAYORES Y MENORES CANTIDADES No.02	2	27 DE ENERO DE 2025
ACTA DE JUSTIFICACIÓN No.10	10	27 DE ENERO DE 2025
ACTA DE TERMINACIÓN	1	7 DE FEBRERO DE 2025

8. ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PARA EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA DURANTE EL PERIODO

a). **Obligaciones de Carácter General.**	1. Se he realizado la entrega de documentación en papel reciclado. 2. Se realizó los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales y se dio cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social (Salud, Pensión y riesgos), que corresponden de acuerdo con el personal que se empleó de interventoría. 3. Se suscribió con el contratista de obra el acta de recibo final. 4. Se suscribió el acta de terminación con el contratista de obra. 5. Se realizó revisión de pólizas de acuerdo al otrosí N°8 del contratista de obra, el cual se tramitó a la entidad para su aprobación. 6. Se realizaron comités de obra 7. Se verifican pólizas cargadas en la plataforma secop II.

b).Actividades Administrativas.

1. Se realiza control y seguimiento del personal que ejecuta la obra

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PERSONAL	CARGO
Marco Tulio Yañez Villamizar	Director de Obra
Jaime Alejandro Ramírez Franco	Residente de Obra
Pedro Nel Ospina Bermeo	Residente SISO
ARQUIMMIDEZ VELA TRUJILLO.	Maestro De Obra
HERNAN JARAMILLO MORERA	Subcontratista
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE EQUIPOS	Herramienta menor Vibrador a gasolina Mescladora para concreto
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES	Se realiza seguimiento de los certificados de calidad de Materiales utilizados por el contratista Materiales pétreos, Cemento, Acero de refuerzo, tuberías eléctricas, luminaria.

CONTROL Y SEGUIMIENTO A APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	**Planilla relacionada** **NRO. DE PLANILLA 7962856955** Hernán Jaramillo Morera – Subcontratista 10/03/2025 **Planilla relacionada** **NRO. DE PLANILLA 9482809836** Hernán Jaramillo Morera – Personal operativo 10/03/2025 **Planilla relacionada** **NRO. DE PLANILLA 32901517** ARQUIMMIDEZ VELA TRUJILLO - Personal operativo Fecha de pago: 20/03/2025 **Planilla relacionada** **NRO. DE PLANILLA 7963582018** Consorcio Win – Residente de obra Jaime Alejandro Ramírez Franco Fecha de pago: 13/03/2025

		Planilla relacionada **NRO. DE PLANILLA 7963582018** Consorcio Win – Siso obra OSPINA BERMEO PEDRO NEL Fecha de pago: 13/03/2025 **Planilla relacionada** **NRO. DE PLANILLA 7963582018** Consorcio Win – Maestro VELA TRUJILLO ARQUIMEDES Fecha de pago: 13/03/2025 **Planilla relacionada** **NRO. DE PLANILLA 7964056859** Inversiones estelar – Director de obra Marco tulio Yañez Fecha de pago: 14/03/2025 **Planilla relacionada** **NRO. DE PLANILLA 7964056859** Inversiones estelar – R.L Norma Patricia Luna Fecha de pago: 14/03/2025 **Planilla relacionada** **NRO. DE PLANILLA 1070989266** Consorciado- Ismael Enrique Gutiérrez Fecha de pago: 07/03/2025

c). Actividades Operativas.

- Se verificaron las calidades de los materiales empleados.
- Se realizó control y seguimiento de las actividades operativas del contrato, se aprueba las actividades:

5.01	Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto.	ML	315.13
5.04	Placa de anden en concreto de 3000 PSI hasta e=1,10 mts	M2	2.90
NP 5.6	Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo de 3" y tubo de 2", tablero en fibra de vidrio 20mm de 1,8*1,05m (marcado con logos administracción). incluye marco, aro, malla, anticorrosivo y pintura	UND	2.00
6.1	Bajantes en tuberia PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para desagues y bajantes de aguas lluvias.	ML	23.20

	6.4	Caja de inspeccion en concreto de F´c=2500 PSI, de seccion 0.70*0.70, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts.segun diseño	UND	1.00
	7.02	Caja de inspección de alumbrado público de 40x40x70 cm, fundida en concreto de 3000 psi y tapa en lamina alfajor.	UND	2
	7.08	Suministro - instalación y cableado de caja de distribución colocada en columna.	UND	1.00
	7.11	Suministro e instalación de cableado para redes internas para montaje de reflectores.	ML	60.00
	7.12	Suministro e instalación de reflector led de 150 w	UND	12.00
	7.13	Suministro e instalación de tomacorriente a 120 v.	UND	1.00
	7.14	Suministro e instalación de tomacorriente a 240v y tomacorriente a 120 v.	UND	1.00

- Se revisan los Informes Siso y planes de gerencia de proyectos.

d). Actividades Logísticos.

1. Se realiza la revisión diaria de los avances de la bitácora de obra.
2. Se realiza la medición de las actividades realizadas en la ejecución y se aprueban las cantidades descritas

e). Obligaciones de Carácter Ambiental.

1. Se hace control y seguimiento al sistema de seguridad y salud en el trabajo de entregado por el contratista para verificar su cumplimiento en obra.

f). Actividades Financieras.

1. Se firma acta de terminación
2. Se firma acta de recibo final

g). Actividades Jurídicos.

1. La interventoría realizó seguimiento a pólizas y garantías del contrato de obra e interventoría.

Póliza legalización del CONTRATO:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210747	0	03/11/2023	Cumplimiento del contrato	30/10/2023	30/07/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	30/10/2023	30/012024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	30/10/2023	30/01/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Se ampara 5 años 0 meses y 1 días	

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-40-101056559	0	03/11/2023	30/10/2023	30/01/2024

Póliza actualizada x ACTA DE INICIO:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210747	1 anulada 2	06/12/2023	Cumplimiento del contrato	14/11/2023	14/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	14/11/2023	14/02/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	14/11/2023	14/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Se ampara 5 años 0 meses y 1 días	

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-40-101056559	1 anulada 2	06/12/2023	14/11/2023	14/02/2024

Póliza actualizada x ACTA DE SUSPENSION Y REINICIO No. 1:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210747	3	24/07/2024	Cumplimiento del contrato	14/11/2023	14/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	14/11/2023	03/09/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	14/11/2023	03/09/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Se ampara 5 años 0 meses y 1 días	

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-40-101056559	3	24/07/2024	14/11/2023	03/09/2024

Póliza actualizada OTROSÍ No. 2

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210747	4	30/07/2024	Cumplimiento del contrato	14/11/2023	03/03/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	14/11/2023	03/09/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	14/11/2023	03/09/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Se ampara 5 años 0 meses y 1 días	

Póliza actualizada ACLARACIÓN OTROSÍ No. 2

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210747	5	30/07/2024	Cumplimiento del contrato	14/11/2023	03/03/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	14/11/2023	03/03/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	14/11/2023	03/09/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Se ampara 5 años 0 meses y 1 días	

Póliza actualizada x OTROSÍ No. 3

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210747	6	02/09/2024	Cumplimiento del contrato	14/11/2023	03/04/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	14/11/2023	03/04/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	14/11/2023	03/10/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Acta de recibo final 5 años desde acta de recibo	

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-40-101056559	4	02/09/2024	14/11/2023	03/10/2024

Póliza actualizada x OTROSÍ No. 4

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210747	7	10/10/2024	Cumplimiento del contrato	14/11/2023	03/04/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	14/11/2023	03/04/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	14/11/2023	03/10/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Acta de recibo final 5 años desde acta de recibo	

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-40-101056559	5	10/10/2024	14/11/2023	03/10/2024

Póliza actualizada x ACLARACION OTROSÍ No. 4

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210747	8	10/10/2024	Cumplimiento del contrato	14/11/2023	03/05/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	14/11/2023	03/05/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	14/11/2023	03/11/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Se ampara 5 años 0 meses y 1 días	

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-40-101056559	6	10/10/2024	14/11/2023	03/11/2024

Póliza actualizada x OTROSÍ No. 5

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210747	9	01/11/2024	Cumplimiento del contrato	14/11/2023	03/08/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	14/11/2023	03/08/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	14/11/2023	03/12/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Se ampara 5 años 0 meses y 1 días	

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-40-101056559	7	01/11/2024	14/11/2023	03/01/2025

Póliza actualizada x OTROSÍ No. 6

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210747	10	04/12/2024	Cumplimiento del contrato	14/11/2023	25/06/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	14/11/2023	25/06/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	14/11/2023	25/12/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Se ampara 5 años 0 meses y 1 días	

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-40-101056559	8	04/12/2024	14/11/2023	03/01/2025

Póliza actualizada x OTROSÍ No. 7

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210747	11	26/12/2024	Cumplimiento del contrato	14/11/2023	25/07/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	14/11/2023	25/07/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	14/11/2023	25/01/2028
				Estabilidad y Calidad de Obras	Se ampara 5 años 0 meses y 1 días	

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-40-101056559	9	26/12/2024	14/11/2023	25/01/2025

Póliza actualizada x OTROSÍ No. 8

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101210747	12	13/02/2025	Cumplimiento del contrato	14/11/2023	10/08/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	14/11/2023	10/08/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	14/11/2023	10/02/2028
				Estabilidad y Calidad de Obras	Se ampara 5 años 0 meses y 1 días	

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)


ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-40-101056559	10	13/02/2025	14/11/2023	10/02/2025

9. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL TIEMPO

Las temperaturas máximas diarias son alrededor de 29 °C, rara vez bajan a menos de 26 °C o exceden 31 °C. La temperatura máxima promedio diaria más alta es 29 °C el 6 de febrero.

Las temperaturas mínimas diarias son alrededor de 20 °C, rara vez bajan a menos de 19 °C o exceden 21 °C.

El día más despejado del mes es el 1 de febrero, con condiciones despejadas, mayormente despejadas o parcialmente nubladas el 18 % del tiempo.

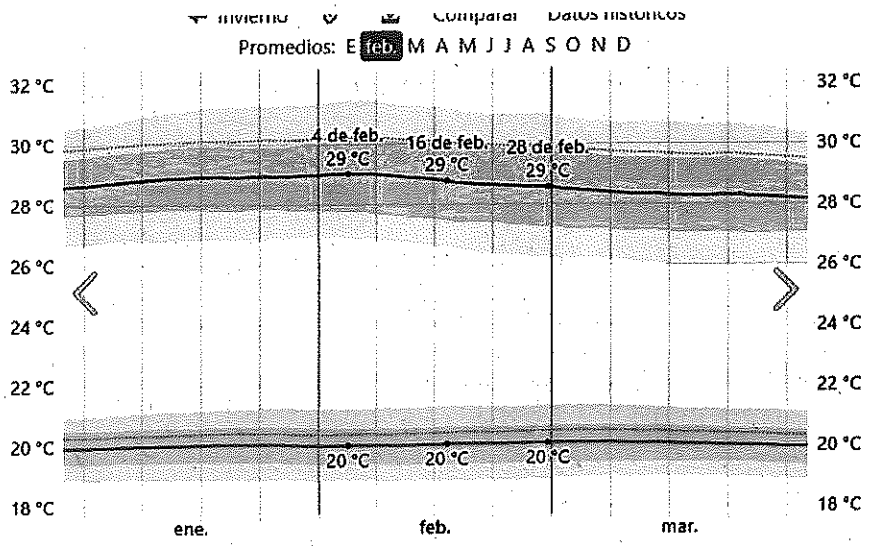

https://es.weatherspark.com/m/22372/2/Tiempo-promedio-en-febrero-en-Agrado-Colombia#Figures-Temperature

10. ENSAYOS DE LABORATORIO

N.A

11. CONTROL DE ANTICIPO DE OBRA

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha (dd/mm/aaaa)	Valor Acta	Amortización	Valor pagado
Valor Anticipo (25%)	8 de agosto 2024	$123.576.406.25		$123.576.406.25
Acta Parcial No. 1		$	$	$
Acta Parcial No. 2		$	$	$
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$494.305.625	$ 18.061.646,00	$512.367.271,00	$0	$ $512.367.271,00

Nota: el contratista de obra no ha pasado cuentas parciales, por ende, la interventoría tampoco ha realizado cuentas parciales.

12. COMITES DE OBRA

Fecha de Realización (dd/mm/aaaa)	Lugar	Resultado del Comité (Describir)
3/2/2025	Ondina	**Comité de obra - 13**

13. RELACION DE DOCUMENTOS YA ENTREGADOS

TIPO DOCUMENTO	FECHA DE ENTREGA A LA ENTIDAD (dd/mm/aaaa)	No. RADICADO (Emitido por INDERHUILA)	FORMATO (Físico/Digital)
Copias de Bitácora de Obra (periodo del (01/2/2025) al (7/02/2025)	20/03/2025		Digital
Informe SG-SST (periodo del (01/2/2025) al (7/02/2025)	20/03/2025		Digital
Planillas de aportes a seguridad social integral (EPS-ARP-AFP) (periodo del (01/2/2025) al (7/02/2025)	20/03/2025		Digital
Correspondencia (periodo del (periodo del (01/02/2025) al (07/02/2025)	20/03/2025		Digital

14. RELACION DE PERSONAL (Profesional Interventoría)

NOMBRE YAPELLIDOS	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	MODALIDAD DE CONTRATACION
FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	7.711.430	REPRESENTANTE LEGAL (CONSORCIADO)	PRESTACIÓN DE SERVICIO
JOSE WILMER CHILITO	76.320.749	CONSORCIADO	PRESTACIÓN DE SERVICIO
CRISTIAN FABIAN JUNCO AVILA	1.012.354.706	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONTRATO POR OBRA O LABOR

15. RELACIÓN DE PAGOS DURANTE EL PERIODO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

PERSONAL	PENSIÓN	SALUD	ARL	CCF	PARAFISCALES	N° PLANILLA
RESIDENTE: CRISTIAN FABIAN JUNCO AVILA	$84.000	$21.000	$36.600	$21.000	$0	**1071710868**
R.L FAIVER EDUARDO PERDOMO	$562.900	$439.800	$85.700	$0	$0	**7965577178**
CONSORCIADO JOSE WILMER CHILITO	$227.800	$178.000	$0	$0	$0	**9482447346**

16. RELACIÓN DE POLIZAS DE GARANTIA

Póliza legalización del CONTRATO:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100009719	0	02-11-2023	Cumplimiento del contrato	01/11/2023	01/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/11/2023	01/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	01/02/2024	01/02/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100001951	0	02/11/2023	01/11/2023	01/02/2024

Póliza legalización del ACTA DE INCIO:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100009719	1 (ANULADO) 2	15/11/2023	Cumplimiento del contrato	08/11/2023	08/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	08/11/2023	08/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	08/02/2024	08/02/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100001951	1 (ANULADO) 2	15/11/2023	08/11/2023	08/02/2024

Póliza legalización del OTROSI No. 1:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100009719	3	17/05/2024	Cumplimiento del contrato	08/11/2023	08/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
				Pago salarios, prestaciones sociales e	08/11/2023	08/02/2027

				Indemnizaciones laborales		
				Estabilidad y Calidad de Obras	08/02/2024	08/02/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA	
				DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100001951	3	17/05/2024	08/11/2023	08/02/2024

Póliza legalización del ACTA DE SUSPENSION Y REINICIO No.1 :

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100009719	4	18/05/2024	Cumplimiento del contrato	16/05/2024	31/12/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	16/05/2024	30/06/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	30/06/2024	30/06/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA	
				DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100001951	4	18/05/2024	08/11/2023	30/06/2024

Póliza actualizada x OTROSI No.2:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100009719	5	18/05/2024	Cumplimiento del contrato	16/05/2024	31/12/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	16/05/2024	30/06/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	30/06/2024	30/06/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA	
				DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100001951	5	18/05/2024	08/11/2023	30/06/2024

Póliza actualizada x OTROSI No. 3:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
				Cumplimiento del contrato	27/06/2024	31/01/2025

SEGUROS MUNDIAL	CHU-100009719	6	03/07/2024	Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	27/06/2024	31/07/2027
				Cumplimiento del contrato	30/07/2024	30/07/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100001951	6	03/07/2024	08/11/2023	31/07/2024

Póliza actualizada x OTROSI No. 4:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100009719	7	25/07/2024	Cumplimiento del contrato	24/07/2024	13/03/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	24/07/2024	13/09/2027
				Cumplimiento del contrato	13/09/2024	13/09/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100001951	7	25/07/2024	08/11/2023	13/09/2024

Póliza actualizada x OTROSI No. 5:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100009719	8	05/09/2024	Cumplimiento del contrato	28/08/2024	13/04/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	28/08/2024	13/10/2027
				Cumplimiento del contrato	13/10/2024	13/10/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100001951	8,9 (ANULADO)	06/09/2024	08/11/2023	13/10/2024

		10			

Póliza actualizada x OTROSI No. 6:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100009719	9	11/10/2024	Cumplimiento del contrato	04/10/2024	13/05/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	04/10/2024	13/11/2027
				Cumplimiento del contrato	13/11/2024	13/11/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100001951	11	11/10/2024	08/11/2023	13/11//2024

Póliza actualizada x OTROSI No. 7:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100009719	10	12/11/2024	Cumplimiento del contrato	30/10/2024	13/06/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	30/10/2024	13/12/2027
				Cumplimiento del contrato	13/12/2024	13/12/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100001951	12	12/11/2024	08/11/2023	13/12//2024

Póliza actualizada x OTROSI No. 8:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100009719	11	2/12/2024	Cumplimiento del contrato	27/11/2024	03/07/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
				Pago salarios, prestaciones sociales e	27/11/2024	03/01/2028

				indemnizaciones laborales		
				Cumplimiento del contrato	04/01/2025	04/01/2030

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA	
				DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100001951	13	2/12/2024	08/11/2023	03/01//2025

Póliza actualizada x OTROSI No. 9:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100009719	12	23/12/2024	Cumplimiento del contrato	20/12/2024	03/08/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	20/12/2024	03/02/2028
				Cumplimiento del contrato	13/12/2024	04/02/2030

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA	
				DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100001951	14	23/12/2024	08/11/2023	03/02//2025

Póliza actualizada x OTROSI No. 10:


POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100009719	13	24/01/2025	Cumplimiento del contrato	21/01/2025	18/08/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	21/01/2025	18/02/2028
				Cumplimiento del contrato	1702/2025	17/02/2030


POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA	
				DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100001951	15	21/01/2025	08/11/2023	18/02//2025


17. PLANO y/o ESQUEMAS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

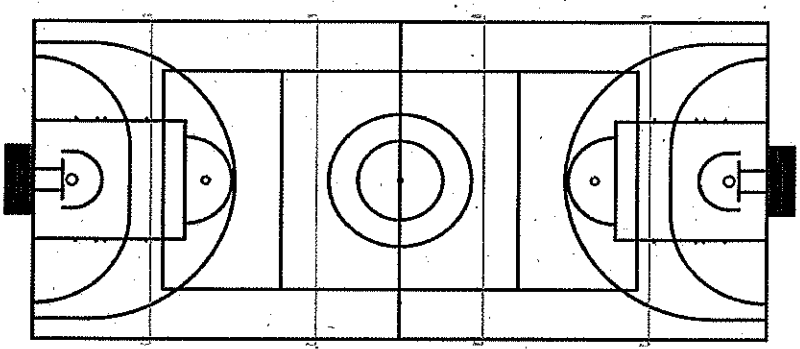


Esquema 1. Demarcación de cancha para microfútbol, voleibol y baloncesto

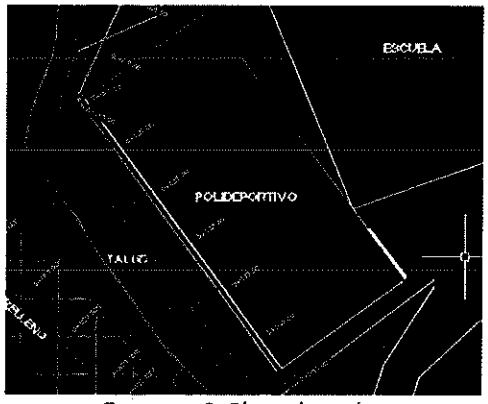


Esquema 2. Placa de anden

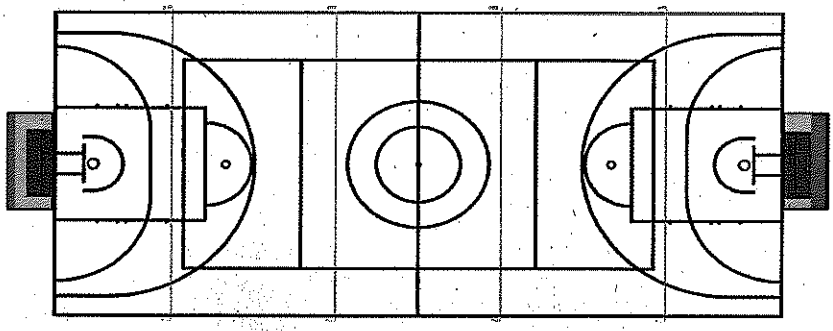


Esquema 3. Suministro e instalación de cancha multifuncional

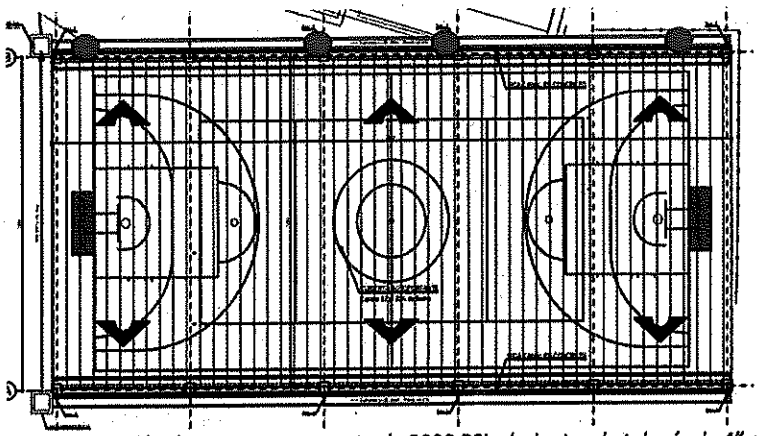


Esquema 4. Construcción de cuneta en concreto de 3000 PSI y bajantes de tubería de 4" en PVC-S

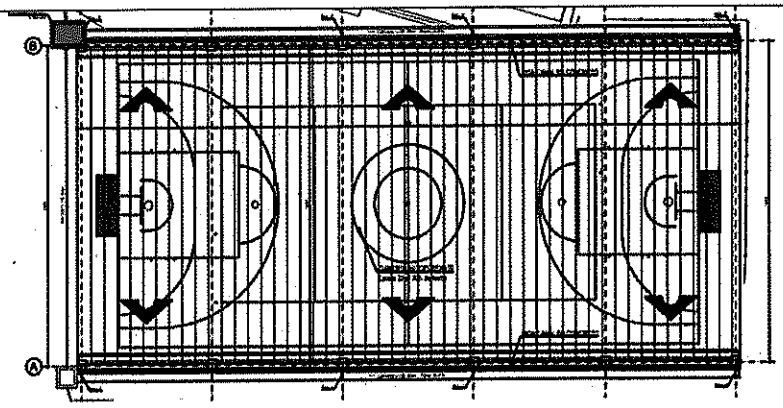


Esquema 5. caja de inspección en concreto de 2500 PSI

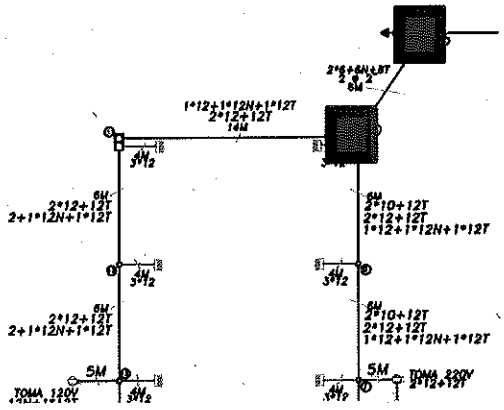


Esquema 6. Caja de Inspección de alumbrado público en concreto y tapa en lamina alfajor.

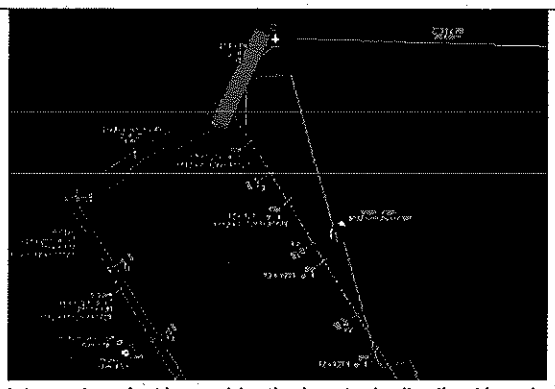


Esquema 7. Suministro - Instalación y cableado de caja de distribución colocada en columna

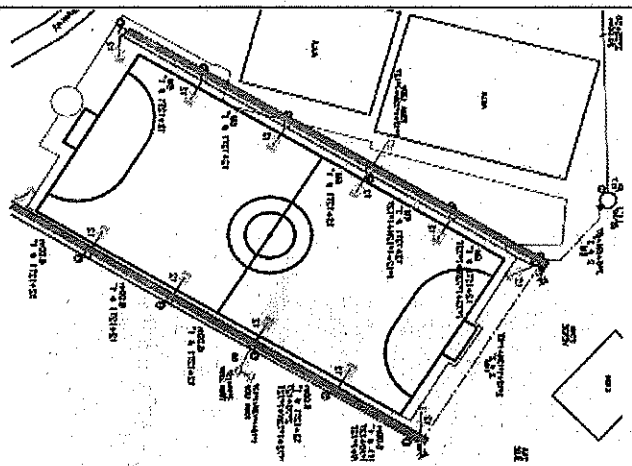


Esquema 8. Suministro e instalación de cableado para redes internas para montaje de reflectores.

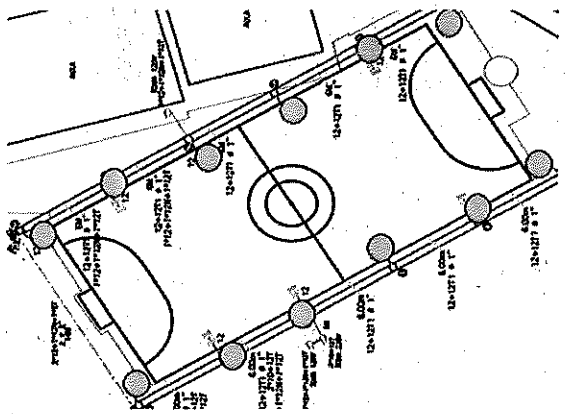

Esquema 9. Suministro e instalación de reflector led de 150 w

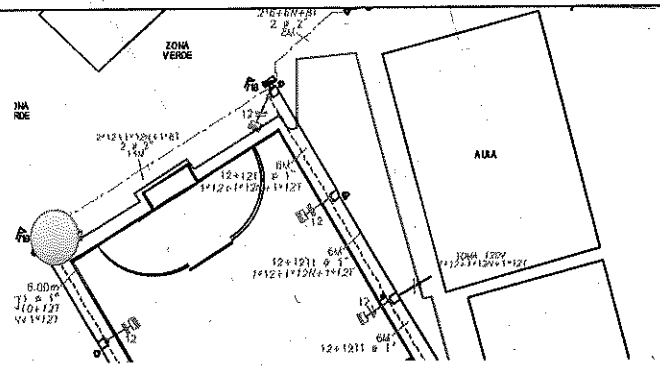

Esquema 10. Suministro e instalación de tomacorriente a 120 v.

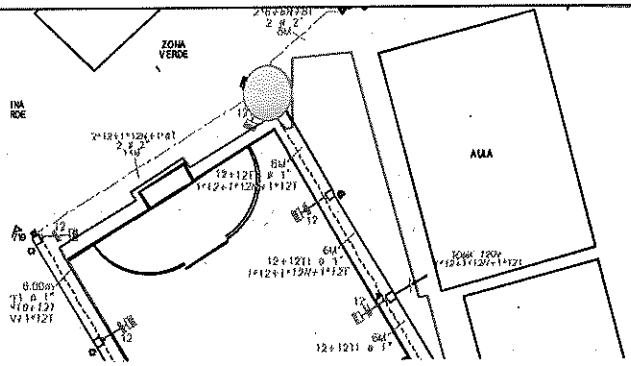

Esquema 11. Suministro e instalación de tomacorriente a 240v y tomacorriente a 120 v.

18. AVANCE DE OBRA

CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICION ACTUALIZADA ACTA DE MODIFICACION No.2		Parcial			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTD	VR/TOTAL	1/02/2025 - 07/02/2025			
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES				cant	vl	%	Acumulado
1.01	Localización y replanteo.	M2	738,43	$ 2.636.934,00		$ -	0,00000%	0,649%
1.02	Demolición cuneta existente.	ML	1,20	$ 9.109,00		$ -	0,00000%	0,002%
1.03	Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante.	M2	94,25	$ 2.485.561,00		$ -	0,00000%	0,612%
1.04	Demolición de cerramiento perimetral existente (muro, malla, cimentación) hasta, H= 3 mt. Incluye retiro de material sobrante.	ML	12,00	$ 251.196,00		$ -	0,00000%	0,062%
1.05	Demolición de anden existente hata e= 0,10 mts incluye retiro del material sobrante.	M2	1,91	$ 41.709,00		$ -	0,00000%	0,010%
1.06	Desmonte marcos canchas existentes.	UND	2,00	$ 234.272,00		$ -	0,00000%	0,058%
1.07	Corte de Placa de concreto e= 0.10 mts.	ML	58,00	$ 626.632,00		$ -	0,00000%	0,154%
1.08	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	249,67	$ 11.526.016,00		$ -	0,00000%	2,838%
1.09	Relleno en recebo seleccionado y compactado mecanicamente.	M3	101,59	$ 8.548.291,00		$ -	0,00000%	2,105%
N.P 1,10	Excavación mecanica incluye retiro	M3	964,87	$ 28.142.363,00		$ -	0,00000%	6,929%
2	CIMENTACIÓN					$ -	0,00000%	0,000%
2.1	Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0.05 mts	M2	10,80	$ 368.636,00		$ -	0,00000%	0,091%
2.2	Concreto ciclópeo - 2500 PSI (175 KG/CM2) 60% Concreto 2.500 PSI + 40% Piedra media zonga	M3	33,66	$ 12.160.483,00		$ -	0,00000%	2,994%
2.3	Construcción zapatas en concreto 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño.	M3	47,12	$ 29.273.253,00		$ -	0,00000%	7,208%

2.4	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. zapatas	KG	3.824,88	$ 27.317.293,00		$ -	0,00000%	6,726%
2.5	Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño	M3	11,20	$ 8.340.203,00		$ -	0,00000%	2,054%
2.6	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. viga de cimentación	KG	1.267,18	$ 9.050.200,00		$ -	0,00000%	2,228%
3	ESTRUCTURA EN CONCRETO					$ -	0,00000%	0,000%
3.01	Construcción en columnas en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI.	M3	13,93	$ 12.872.434,00		$ -	0,00000%	3,170%
3.02	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. columnas	KG	4.303,10	$ 30.732.740,00		$ -	0,00000%	7,567%
3.03	Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI impermeabilizado.	M3	16,68	$ 16.820.512,00		$ -	0,00000%	4,142%
3.04	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. Viga Canal	KG	2.078,20	$ 14.842.504,00		$ -	0,00000%	3,655%
3.05	Suministro e instalación de manto zetal viga canal.	M2	60,80	$ 2.461.792,00		$ -	0,00000%	0,606%
4	CUBIERTA					$ -	0,00000%	0,000%
4.1	Suministro, fabricación e instalación de cubierta autoportante a base de lámina de acero cal. 22, en páneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz.	M2	469,68	$ 99.715.412,00		$ -	0,00000%	24,552%
5	ACABADOS - PLACA EN CONCRETO					$ -	0,00000%	0,000%
5.01	Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto.	ML	315,13	$ 4.679.681,00	315,13	$ 4.679.681,00	1,15225%	1,152%
5.02	Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo 3" tipo pesado y tubo AN 2" Cal 16 Futbol de Salón, Baloncesto, Tablero en fibra de vidrio 20MM de 1,8 * 1,05 M , Incluye: aro, malla, demarcado, logos, anticorrosivo y pintura	UND	0,00	$ -		$ -	0,00000%	0,000%
5.03	Placa de piso en concreto de 3000 PSI, e=0,10 cm.	M2	188,54	$ 16.032.310,00		$ -	0,00000%	3,948%
5.04	Placa de anden en concreto de 3000 PSI hasta e=1,10 mts	M2	2,90	$ 215.192,00	2,90	$ 215.192,00	0,05299%	0,053%

5.05	Cuneta en concreto de 3000 PSI, según diseño	ML	60,80	$ 5.116.198,00		$ -	0,00000%	1,260%
NP 5.6	Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo de 3" y tubo de 2", tablero en fibra de vidrio 20mm de 1,8*1,05m (marcado con logos administracción). incluye marco, aro, malla, anticorrosivo y pintura	UND	2,00	$ 5.707.384,00	2,00	$ 5.707.384,00	1,40530%	1,405%
6	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					$ -	0,00000%	0,000%
6.1	Bajantes en tuberia PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para desagues y bajantes de aguas lluvias.	ML	46,40	$ 3.731.859,00	23,20	$ 1.865.930,00	0,45944%	0,919%
6.2	Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagues.	ML	14,30	$ 1.536.807,00		$ -	0,00000%	0,378%
6.3	Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 8", con accesorios de conexión; para salida.	ML	20,00	$ 4.396.520,00		$ -	0,00000%	1,083%
6.4	Caja de inspeccion en concreto de F´c=2500 PSI, de seccion 0.70*0.70, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts.segun diseño	UND	2,00	$ 702.450,00	1,00	$ 351.225,00	0,08648%	0,173%
NP 6.5	Canal para conduccion de aguas lluvias en sacos trinchera con suelo cemento	ml	62,00	$ 3.776.358,00		$ -	0,00000%	0,930%
7	PLACA POLIDEPORTIVO					$ -	0,00000%	0,000%
7.01	Desmonte de Postes de iluminación; Incl. Retiro de luminarias, clabeado y demolición de machón en concreto.	UND	4,00	$ 1.177.552,00		$ -	0,00000%	0,290%
7.02	Caja de inspección de alumbrado público de 40x40x70 cm, fundida en concreto de 3000 psi y tapa en lamina alfajor.	UND	3,00	$ 1.923.474,00	2,00	$ 1.282.316,00	0,31574%	0,474%
7.03	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	3,52	$ 162.501,00		$ -	0,00000%	0,040%
7.04	Canalización en ductos conduit pvc tipo pesado, dos ductos de 1 1/2" para baja tensión. Incluye compactación y tapada de brecha. a=0,40 mts.	ML	22,00	$ 1.089.352,00		$ -	0,00000%	0,268%
7.05	Transición aérea-subterránea tubería IMC 1 1/2"	UND	2,00	$ 611.156,00		$ -	0,00000%	0,150%
7.06	Transición aérea-subterránea tubería IMC 1"	UND	2,00	$ 566.546,00		$ -	0,00000%	0,139%

7.07	Suministro - instalación y cableado de medida directa en poste.	UND	1,00	$ 1.020.417,00		$ -	0,00000%	0,251%
7.08	Suministro - instalación y cableado de caja de distribución colocada en columna.	UND	1,00	$ 4.717.814,00	1,00	$ 4.717.814,00	1,16164%	1,162%
7.09	Suministro e instalación de cableado para red de distribución principal en ducto subterráneo en conductor 2x6 al ser8000 + 6 al ser8000 + 1x8 cu.	ML	14,00	$ 1.243.872,00		$ -	0,00000%	0,306%
7.10	Instalación brazo sencillo según diseño de 3,5 mts. Galvanizado y acabado en pintura polvo poliéster, para anclar el reflector.	UND	12,00	$ 4.443.264,00		$ -	0,00000%	1,094%
7.11	Suministro e instalación de cableado para redes internas para montaje de reflectores.	ML	60,00	$ 3.501.480,00	60,00	$ 3.501.480,00	0,86215%	0,862%
7.12	Suministro e instalación de reflector led de 150 w	UND	12,00	$ 12.268.644,00	12,00	$ 12.268.644,00	3,02084%	3,021%
7.13	Suministro e instalación de tomacorriente a 120 v.	UND	1,00	$ 978.457,00	1,00	$ 978.457,00	0,24092%	0,241%
7.14	Suministro e instalación de tomacorriente a 240v y tomacorriente a 120 v.	UND	1,00	$ 1.039.024,00	1,00	$ 1.039.024,00	0,25583%	0,256%
7.15	Excavación, hincada y plomada de postes de concreto de 8 mts x 510 kg armado y centrifugado	UND	1,00	$ 2.260.862,00		$ -	0,00000%	0,557%
8	**TRANSPORTE**					$ -	0,00000%	0,000%
8.01	Transporte de materiales petreos	M3-Km	4.326,914	$ 4.776.913,00		$ -	0,00000%	1,176%
	TOTAL COSTO DIRECTO			**$406.133.632**		**$ 36.507.147,00**	**9,01%**	**100,00%**

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en el presente informe, son netamente responsabilidad del contratista quien las cuantificaron y constataron en el terreno.

ARQ CRISTIAN JUNCO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ARQ. MARCO TULIO YAÑEZ
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

19. REGISTRO FOTOGRAFICO



IMAGEN 1 Y 2– BAJANTES EN TUBERIA PVC-S DE 4" EJE DEL COLEGIO



IMAGEN 3– DEMARCACION DE LA CANCHA EN PINTURA TRAFICO PESADO

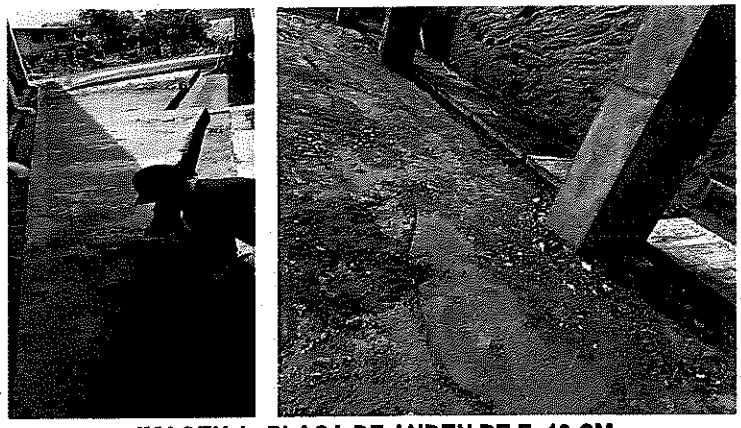


IMAGEN 4– PLACA DE ANDEN DE E=10 CM

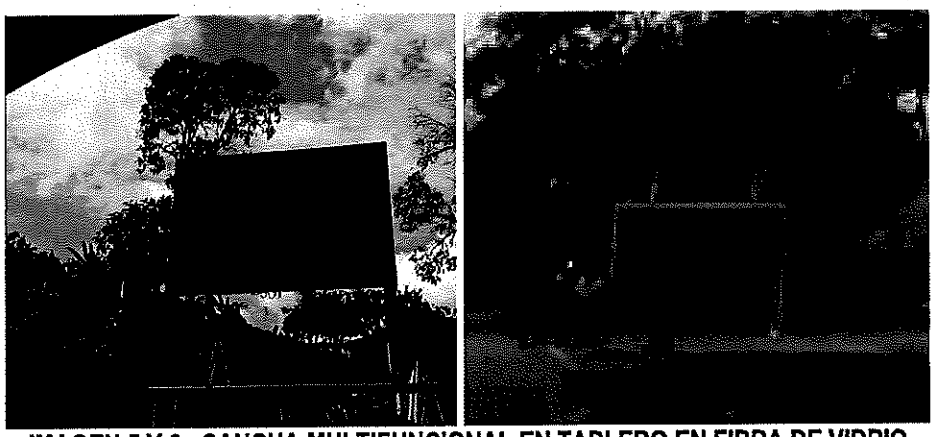


IMAGEN 5 Y 6– CANCHA MULTIFUNCIONAL EN TABLERO EN FIBRA DE VIDRIO

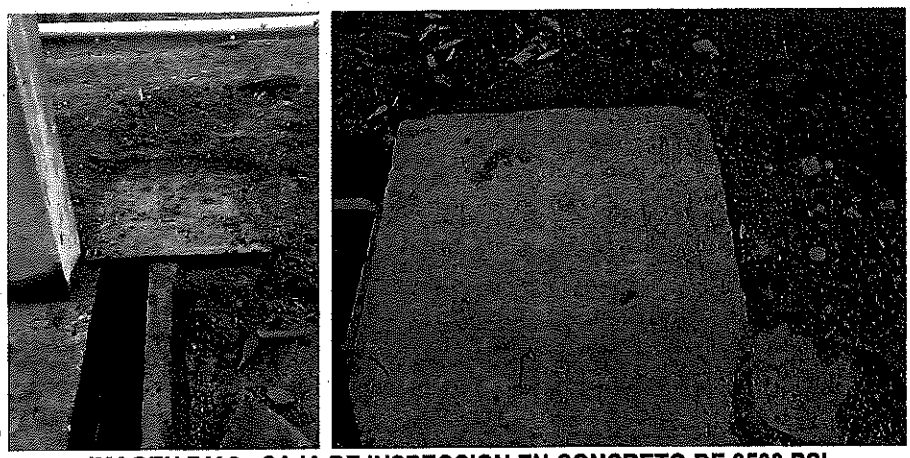


IMAGEN 7 Y 8– CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO DE 2500 PSI

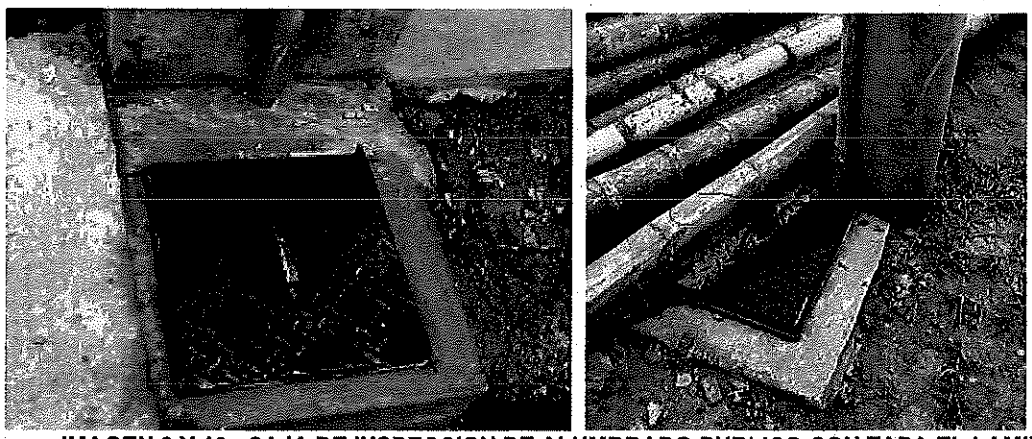


IMAGEN 9 Y 10– CAJA DE INSPECCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON TAPA EL LAMINA ALFAJOR

IMAGEN 11– CABLEADO CAJA DE DISTRIBUCION COLOCADA EN COLUMNA

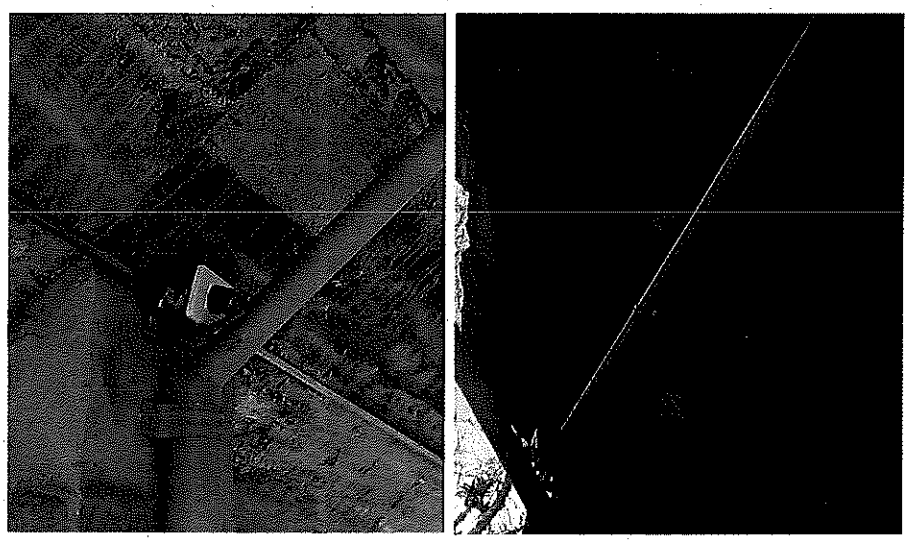


IMAGEN 12 Y 13– CABLEADO PARA REDES INTERNAS DE REFLECTORES



IMAGEN 14– INSTALACION DE REFLECTORES LED DE 150 W

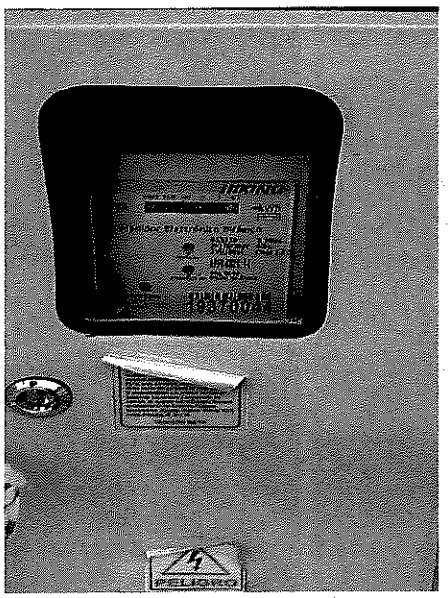


IMAGEN 15 Y 16– TOMACORRIENTE 120 V E INTALACION DE TOMACORRIENTE A 220 V Y 120V

20. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

- El contratista debe ejecutar un plan integral para resolver las observaciones técnicas pendientes, con especial énfasis en las instalaciones eléctricas, los remates de construcción y los mejoramientos requeridos, garantizando el cumplimiento de normativas, plazos y estándares de calidad.

21. ANEXOS

- BITACORA DE OBRA
- MEMORIAS DE CANTIDADES
- SOPORTES DE PAGO A APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (EPS-ARP-AFP) INTERVENTORIA.

ING. FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	(20/03/2025)	ING.NATALIA BUSTOS BOTERO
FIRMA ORIGINAL **R.L. INTERVENTORIA**	**FECHA DE ENTREGA**	FIRMA ORIGINAL **Vo.Bo APOYO SUPERVISION**

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-03-10, 05:15:21 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 1071710868

Periodo Cotización: febrero de 2025 **Periodo Servicio:** marzo de 2025

Fecha limite de pago: 2025-03-25

PAGADA 10/03/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO WF				
Documento	NI901767496	**Dirección**	CR 4 #9 - 25 OFICINA 507		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8608020		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	NEIVA	**Departamento**	HUILA		
Representante Legal	PERDOMO POLANIA FAIVER EDUARDO	**Identificación**	CC7711430		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1012354706	JUNCO AVILA CRISTIAN FABIAN	01	00		X														0	7	7	7	7	COLFONDOS	$ 525.000	$ 84.000	EPS SANITAS	$ 525.000	$ 21.000	ARL SURA	$ 525.000	$ 36.600	COMFAMILIAR HUILA	$ 525.000	$ 21.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 525.000	$ 525.000	$ 525.000	$ 525.000	$ 84.000	$ 0	$ 0	$ 21.000	$ 36.600	$ 21.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.600	$ 0	$ 162.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7711430
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CR 4 9 25 OF 507	TELÉFONO:	8668026
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7965577178	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			21		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/03/31	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1370581720

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201 - PROTECCION	1	$ 562,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7,500	$ 0	$ 562,900	$ 7,500	$ 570,400
SUBTOTALES:										$ 562,900	$ 7,500	$ 570,400

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 439,800	$ 0	$ 5,800	$ 0	$ 439,800	$ 5,800	$ 0	$ 445,600
SUBTOTALES:													$ 439,800	$ 5,800	$ 0	$ 445,600

Planilla Pagada

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 85,700	$ 85,700	$ 1,200	$ 0	$ 86,900
SUBTOTALES:									$ 85,700	$ 1,200	$ 0	$ 86,900

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN							SALUD						ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 7711430	PERDOMO POLANIA FAIVER EDUARDO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 3,517,850				NO																		230201-PROTECCION	30	$ 3,517,850	$ 562,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 562,900	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3,517,850	$ 439,800	$ 0	$ 439,800	14-11 - ARL SURA	30	$ 3,517,850	7711430	$ 85,700		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.102.900

Planilla Pagada

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76320749		CHILITO RIVADENEIRA JOSE WILMER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 25N Cra 8 Torres del Rio 305G	POPAYAN-CAUCA	3122879619	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1337327127	9482447346	I	2025/03/12	2025/03/17	NEQUI	5	$506,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$800	$0	$228,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$800	$0	$228,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$400	$0	$99,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$99,100	$400	$0	$99,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$600	$0	$178,600
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$178,000	$600	$0	$178,600
TOTAL				1	$504,900	$1,800	$0	$506,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76320749		CHILITO RIVADENEIRA JOSE WILMER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 25N Cra 8 Torres del Rio 305G	POPAYAN-CAUCA	3122879619	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1337327127	9482447346	I	2025/03/12	2025/03/17	NEQUI	5	$506,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	76320749	CHILITO JOSE																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS018	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$504,900
Total	Afiliados(1)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$99,100		$0	$0		$504,900

2025/04/15 03:56 PM


	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código	DIH-CGID-F22
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Versión:	2
			Página 1 de 1	

OBJETO:	CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LA ONDINA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CLPIH397 DE 2023
LOCALIZACION:	VEREDA LA ONDINA MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	PERIODO COMPRENDIDO:	INFORME
CONTRATISTA:	CONSORCIO WIN	Desde: 1/02/2025	10
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF	Hasta: 7/02/2025	
CAPÍTULO: 5	ACABADOS - PLACA EN CONCRETO		
ITEM: 5.01	Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto.	UNIDAD:	ML

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Medida Total
Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto.		26,50			2,00	53,00
		12,40			2,00	24,80
		8,50			2,00	17,00
		17,00			2,00	34,00
		8,45			2,00	16,90
		12,30			1,00	12,30
		5,50			4,00	22,00
		4,50			2,00	9,00
		3,02	3,1416		1,00	9,49
		5,10	3,1416		1,00	16,02
		2,20	3,1416		2,00	13,82
		23,80			2,00	47,60
		19,60			2,00	39,20
TOTAL						315,13

ESQUEMAS:



Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Arq. Jaime Alejandro Ramirez Franco RESIDENTE DE OBRA	Arq. Marco Tulio Yañez Villamizar DIRECTOR DE OBRA	Arq. Cristian Junco RESIDENTE DE INTERVENTORIA	

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código	DIH-CGID-F22
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Versión:	2
			Página 1 de 1	


OBJETO:	CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LA ONDINA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CLPIH397 DE 2023
LOCALIZACION:	VEREDA LA ONDINA MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	PERIODO COMPRENDIDO:	INFORME
CONTRATISTA:	CONSORCIO WIN	Desde: 1/02/2025	10
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF	Hasta: 7/02/2025	

CAPÍTULO:	5	ACABADOS - PLACA EN CONCRETO		
ITEM:	5.04	Placa de anden en concreto de 3000 PSI hasta e=1,10 mts	UNIDAD:	M2

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Medida Total
Placa de anden en concreto de 3000 PSI hasta e=1,10 mts		1,00	2,90			2,90
TOTAL						2,90

ESQUEMAS:

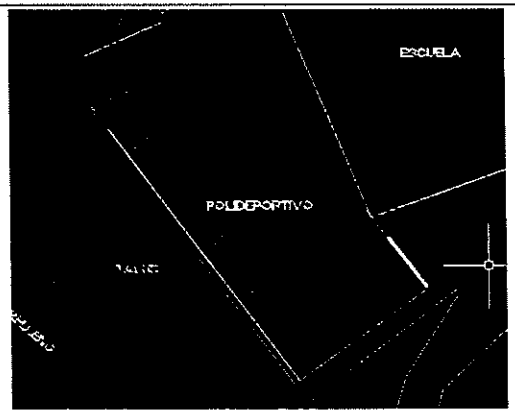

Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Arq. Jaime Alejandro Ramirez Franco RESIDENTE DE OBRA	Arq. Marco Tulio Yañez Villamizar DIRECTOR DE OBRA	Arq. Cristian Junco RESIDENTE DE INTERVENTORIA


	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código: DIH-CGID-F22
			Versión: 2
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Página 1 de 1

OBJETO:	CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LA ONDINA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CLPIH397 DE 2023
LOCALIZACION:	VEREDA LA ONDINA MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	PERIODO COMPRENDIDO:	INFORME
CONTRATISTA:	CONSORCIO WIN	Desde: 1/02/2025	10
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF	Hasta: 7/02/2025	
CAPITULO:	5 ACABADOS - PLACA EN CONCRETO		
ITEM:	5.02 Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo de 3" y tubo de 2", tablero en fibra de vidrio 20mm de 1,8*1,05m (marcado con logos administracción). incluye marco, aro, malla, anticorrosivo y pintura	UNIDAD:	UND

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Medida Total
COSTADO NORTE					1,00	1,00
COSTADO SUR					1,00	1,00
TOTAL						2,00

ESQUEMAS:



Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Arq. Jaime Alejandro Ramirez Franco RESIDENTE DE OBRA	Arq. Marco Tulio Yañez Villamizar DIRECTOR DE OBRA	Arq. Cristian Junco RESIDENTE DE INTERVENTORIA


	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código: DIH-CGID-F22
			Versión: 2
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Página 1 de 1

OBJETO:	CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LA ONDINA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CLPIH397 DE 2023
LOCALIZACION:	VEREDA LA ONDINA MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	PERIODO COMPRENDIDO:	INFORME
CONTRATISTA:	CONSORCIO WIN	Desde: 1/02/2025	10
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF	Hasta: 7/02/2025	
CAPÍTULO:	6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		
ITEM:	6.1 Bajantes en tuberia PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para desagues y bajantes de aguas lluvias.	UNIDAD:	ML

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Medida Total
Eje B1 - B3 - B4 - B6		5,80			4,00	23,20
TOTAL						23,20

ESQUEMAS:



Observaciones:


NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Arq. Jaime Alejandro Ramirez Franco RESIDENTE DE OBRA	Arq. Marco Tulio Yañez Villamizar DIRECTOR DE OBRA	Arq. Cristian Junco RESIDENTE DE INTERVENTORIA	

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código: DIH-CGID-F22
			Versión: 2
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Página 1 de 1

OBJETO:	CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LA ONDINA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CLPIH397 DE 2023
LOCALIZACION:	VEREDA LA ONDINA MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	PERIODO COMPRENDIDO:	INFORME
CONTRATISTA:	CONSORCIO WIN	Desde: 1/02/2025	10
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF	Hasta: 7/02/2025	
CAPITULO:	6	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	
ITEM:	6.4	Caja de inspeccion en concreto de F´c=2500 PSI, de seccion 0.70*0.70, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts.segun diseño	UNIDAD: UND

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Medida Total	ESQUEMAS:
Caja de inspeccion en concreto de F´c=2500 PSI, de seccion 0.70*0.70, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts.segun diseño. EJE B					1,00	1,00	
TOTAL						1,00	

Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Arq. Jaime Alejandro Ramirez Franco RESIDENTE DE OBRA	**Arq. Marco Tulio Yañez Villamizar** DIRECTOR DE OBRA	**Arq. Cristian Junco** RESIDENTE DE INTERVENTORIA	


	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		Código	DIH-CGID-F22
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	INDERHUILA	Versión:	2
			Página 1 de 1	

OBJETO:	CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LA ONDINA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CLPIH397 DE 2023
LOCALIZACION:	VEREDA LA ONDINA MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	PERIODO COMPRENDIDO:	INFORME
CONTRATISTA:	CONSORCIO WIN	Desde: 1/02/2025	10
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF	Hasta: 7/02/2025	
CAPÍTULO:	7	PLACA POLIDEPORTIVO	
ITEM:	7.02	Caja de inspección de alumbrado público de 40x40x70 cm, fundida en concreto de 3000 psi y tapa en lamina alfajor.	UNIDAD: UND

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Medida Total
Caja de inspección de alumbrado público de 40x40x70 cm, fundida en concreto de 3000 psi y tapa en lamina alfajor.					2,00	2,00
TOTAL						2,00

ESQUEMAS:

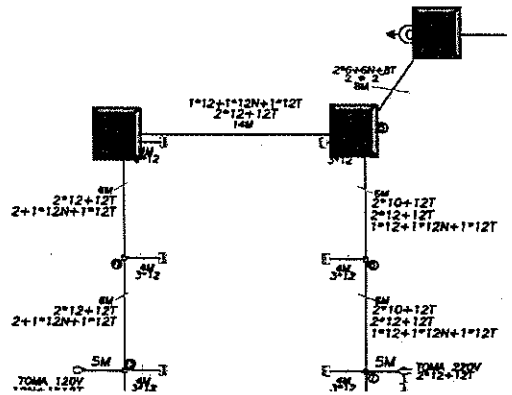

Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron se constataron en el terreno y planos.

Arq. Jaime Alejandro Ramirez Franco RESIDENTE DE OBRA	Arq. Marco Tulio Yañez Villamizar DIRECTOR DE OBRA	Arq. Cristian Junco RESIDENTE DE INTERVENTORIA


	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código	DIH-CGID-F22
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Versión:	2
			Página 1 de 1	

OBJETO:	CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LA ONDINA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CLPIH397 DE 2023
LOCALIZACION:	VEREDA LA ONDINA MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	PERIODO COMPRENDIDO:	INFORME
CONTRATISTA:	CONSORCIO WIN	Desde: 1/02/2025	10
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF	Hasta: 7/02/2025	
CAPÍTULO: 7	PLACA POLIDEPORTIVO		
ITEM: 7.08	Suministro - instalación y cableado de caja de distribución colocada en columna.	UNIDAD:	UND

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Medida Total
Suministro - instalación y cableado de caja de distribución colocada en columna.					1,00	1,00
TOTAL						1,00

ESQUEMAS:

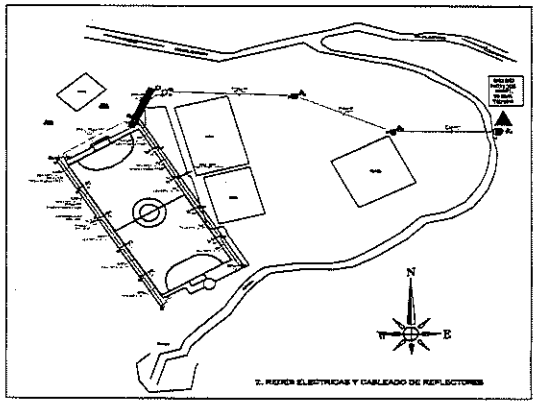

Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Arq. Jaime Alejandro Ramirez Franco RESIDENTE DE OBRA	Arq. Marco Tulio Yañez Villamizar DIRECTOR DE OBRA	Arq. Cristian Junco RESIDENTE DE INTERVENTORIA	


	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código	DIH-CGID-F22
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Versión:	2
			Página 1 de 1	

OBJETO:	CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LA ONDINA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CLPIH397 DE 2023	
LOCALIZACION:	VEREDA LA ONDINA MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	PERIODO COMPRENDIDO:	INFORME	
CONTRATISTA:	CONSORCIO WIN	Desde:	1/02/2025	
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF	Hasta:	7/02/2025	10
CAPÍTULO:	7	PLACA POLIDEPORTIVO		
ITEM:	7.11	Suministro e instalación de cableado para redes internas para montaje de reflectores.	UNIDAD:	ML

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Medida Total
Suministro e instalación de cableado para redes internas para montaje de reflectores.		60,00				60,00
TOTAL						60,00

ESQUEMAS:

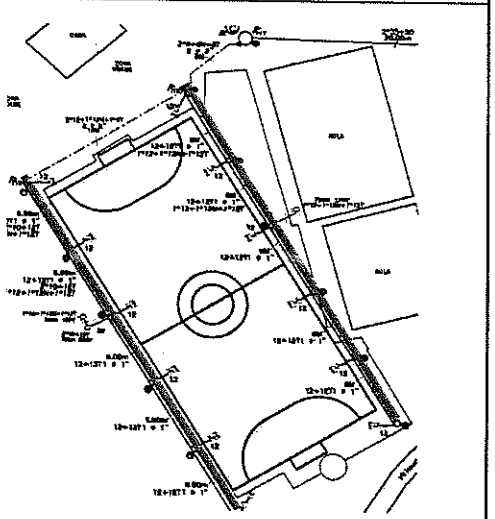

Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Arq. Jaime Alejandro Ramirez Franco RESIDENTE DE OBRA	Arq. Marco Tulio Yañez Villamizar DIRECTOR DE OBRA	Arq. Cristian Junco RESIDENTE DE INTERVENTORIA	


	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código: DIH-CGID-F22
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Versión: 2
			Página 1 de 1

OBJETO:	CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LA ONDINA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CLPIH397 DE 2023
LOCALIZACION:	VEREDA LA ONDINA MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	PERIODO COMPRENDIDO:	INFORME
CONTRATISTA:	CONSORCIO WIN	Desde: 1/02/2025	
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF	Hasta: 7/02/2025	10
CAPITULO: 7	PLACA POLIDEPORTIVO		
ITEM: 7.12	Suministro e instalación de reflector led de 150 w	UNIDAD:	UND

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Medida Total
Suministro e instalación de reflector led de 150 w					12,00	12,00
TOTAL						12,00

ESQUEMAS:

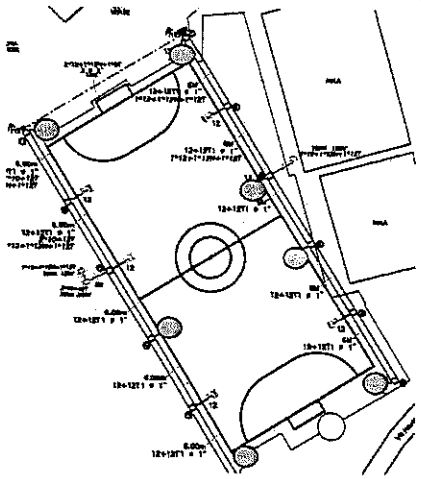

Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Arq. Jaime Alejandro Ramirez Franco RESIDENTE DE OBRA	Arq. Marco Tulio Yañez Villamizar DIRECTOR DE OBRA	Arq. Cristian Junco RESIDENTE DE INTERVENTORIA	


	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código: DIH-CGID-F22
			Versión: 2
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Página 1 de 1

OBJETO:	CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LA ONDINA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CLPIH397 DE 2023
LOCALIZACION:	VEREDA LA ONDINA MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	PERIODO COMPRENDIDO:	INFORME
CONTRATISTA:	CONSORCIO WIN	Desde: 1/02/2025	
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF	Hasta: 7/02/2025	10
CAPÍTULO: 7	PLACA POLIDEPORTIVO		
ITEM: 7.13	Suministro e instalación de tomacorriente a 120 v.	UNIDAD:	UND

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Medida Total
Suministro e instalación de tomacorriente a 120 v.					1,00	1,00
TOTAL						1,00

ESQUEMAS:

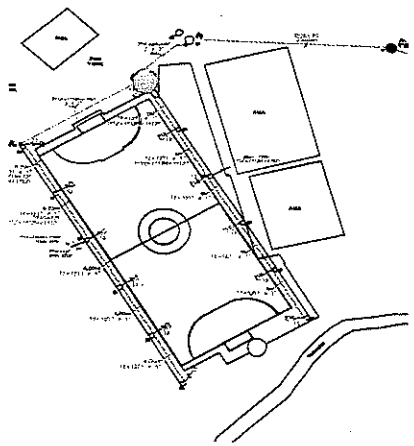

Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Arq. Jaime Alejandro Ramírez Franco RESIDENTE DE OBRA	Arq. Marco Tulio Yañez Villamizar DIRECTOR DE OBRA	Arq. Cristian Junco RESIDENTE DE INTERVENTORIA


	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	INDERHUILA	Código	DIH-CGID-F22
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Versión:	2
			Página 1 de 1	

OBJETO:	CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA LA ONDINA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CLPIH397 DE 2023
LOCALIZACION:	VEREDA LA ONDINA MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA	PERIODO COMPRENDIDO:	INFORME
CONTRATISTA:	CONSORCIO WIN	Desde:	1/02/2025
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF	Hasta:	7/02/2025
CAPÍTULO:	7 PLACA POLIDEPORTIVO		10
ITEM:	7.14 Suministro e instalación de tomacorriente a 240v y tomacorriente a 120 v.	UNIDAD:	UND

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Medida Total
Suministro e instalación de tomacorriente a 240v y tomacorriente a 120 v.					1,00	1,00
TOTAL						1,00

ESQUEMAS:

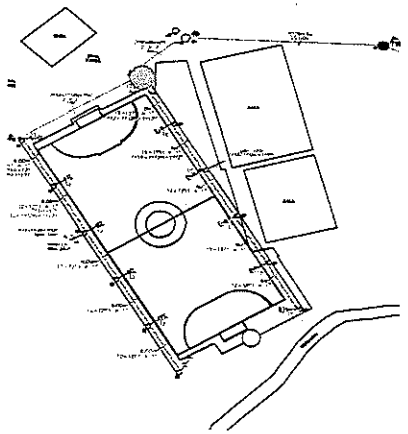

Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Arq. Jaime Alejandro Ramirez Franco RESIDENTE DE OBRA	Arq. Marco Tulio Yañez Villamizar DIRECTOR DE OBRA	Arq. Cristian Junco RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
