	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	Código: GDM-F-03
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 01
		Fecha: 28/05/2025
	FORMATO HOJA DE CONTROL DOCUMENTAL	Página **1** de **1**

CONTROL DE DILIGENCIAMIENTO	**Hoja No.**	**De**

IDENTIFICACIÓN	
Código y nombre de la unidad administrativa	1000 DESPACHO DEL ALCALDE
Código y nombre de la oficina productora	1030 – OFICINA DE CONTRATACIÓN
Código y nombre de la serie documental	1030 – 19 CONTRATOS
Código y nombre de la subserie documental	1030 – 19.07 CONTRATO DE OBRA
Nombre del expediente	MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS R.L CARLOS AUGUSTO GIRALDO RENGIFO

CONTENIDO

Ítem	Fecha de incorporación al expediente (AAAA-MM-DD)	Fecha del documento (AAAA-MM-DD)	Tipo documental (Descripción)	Folios	Funcionario que ingresa el documento (Nombres y Apellidos)	Observaciones
1	2025/08/15	2025/08/18	NOTA INTERNA	289	MAX LAVERDE	
2	2025/08/15	2025/08/18	FORMATO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL	290	MAX LAVERDE	
3	2025/08/15	2025/08/19	INFORME CONTRATISTA	291-303	MAX LAVERDE	
4	2025/08/15	2025/08/20	ACTA DE SOLICITUD DE PRÓRROGA	304-306	MAX LAVERDE	
5	2025/08/15	2025/06/05	PROGRAMACIÓN DE OBRA	307-311		
6	2025/08/15	2025/08/13	INFORME DEL SUPERVISOR (1010-F-GCT-22)	312-316	MAX LAVERDE	
7	2025/08/15	2025/08/20	ACTA DE SOLICITUD DE PRÓRROGA	317	MAX LAVERDE	

RESPONSABLES			
Elaborado por		**Responsable del área u oficina productora**	
Nombres y apellidos:		**Nombres y apellidos:**	
Cargo:		**Cargo:**	
Firma:		**Firma:**	
Fecha de cierre del expediente (AAAA-MM-DD)			

NOTA INTERNA

1402/0438	
FECHA	15 de agosto de 2025
PARA:	Dra. ALBA AURORA COLINA Jefe Oficina de Contratación
DE:	Arq. DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE Director de Obras Civiles

Ref.: **CONTRATO N°1692 DE 2025 No. DEL PROCESO EN SECOP: SMC-066 DE 2025**

Asunto: ENVÍO DE DOCUMENTOS SOLICITUD DE PRORROGA No 1

Cordial saludo,

De manera atenta envío en archivo adjunto, los siguientes documentos:

1. Documentos solicitud de prorroga No1 del contrato 1692 de 2025

Lo anterior para su información, aprobación y archivo en el expediente contractual correspondiente

Sin otro en particular, muy atentamente

FIRMA REMITENTE	FIRMA DESTINATARIO/RECIBIDO
	ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO OFICINA DE CONTRATACIÓN RECIBIDO 15 AGO 2025 HORA 4:20 RADICADO No: 6601 FECHA:
DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE	FECHA: HORA:
Director Obras Civiles	RADICADO No:

Anexos: Folios 1 carpeta
Copias: NA

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
V°B°: NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Revisó:	NO APLICA	NO APLICA
Elaboró: Max Laverde Mosquera	Técnico Operativo	

Municipio de Villavicenc

Fecha ____18___/__08_____/_____2025_____/ D/M/A.

DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA	SI	NO	N.A.
Informe del contratista			
Solicitud del contratista al interventor de la suspensión/Prorroga			
DOCUMENTOS DEL INTERVENTOR/SUPERVISOR			
Informe del Interventor (1010-F-GCT-69-V3) y/o supervisor (1010-F-GCT-22)			
Acta de Solicitud de Adición y/o Prórroga (1010-F-GCT-115)			
Numero de folios, foliado en lápiz en la esquina superior derecha			

Observaciones: _____

Nombre y firma del profesional que revisó: _____

INFORME CONTRATISTA PRORROGA

CONTRATO DE OBRA No. 1692 del 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

"Mantenimiento, Adecuación Y Reformas A Las Instalaciones De Los Puntos Vive Digital Del Municipio De Villavicencio"

"MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REFORMAS A LAS INSTALACIONES DE LOS PUNTOS VIVE DIGITAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"

VILLA FABIOLA



LA MADRID



NOMBRE DE LA EMPRESA:
MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS

NIT:
901744193

DIRECCIÓN DEL PROYECTO:
CL. 42ª # 17b – 27, Villa Fabiola

DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:
CL. 47ª # 29ª - 46, El Caudal

CORREO ELECTRÓNICO:
megaproyectosei@gmail.com

VILLAVICENCIO, 2025

Contenido

INTRODUCCIÓN 3
OBJETIVO GENERAL DEL PRESENTE INFORME 3
GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA 3
DATOS GENERALES DEL CONTRATO 3
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 4
AVANCE EN TIEMPO 5
AVANCE FÍSICO 5
GRAFICA DEL AVANCE 6
PROBLEMÁTICAS PRESENTADAS 6
PRONOSTICO MES DE JUNIO 8
PRONOSTICO MES DE JULIO 9
CONDICIONES ACTUALIZADAS DEL PROYECTO 9
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES 10
RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS 10
CONTROL DE POLIZAS 10
VALOR DEL CONTRATO 11
REGISTRO PRESUPUESTAL 11
FORMA DE PAGO 11
AVANCE FINANCIERO 12
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 12
Mes de junio 12
Mes de julio 12
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES 13
ACTA DE SOLICITUD DE PRÓRROGA 13

INTRODUCCIÓN

La alcaldía de Villavicencio requería contratar las obras de la SMC -066 de 2025, de acuerdo a las exigencias de la implementación optimización y sostenibilidad operativa de los puntos digital en el municipio de Villavicencio Meta, con el fin de mejorar los espacios para que goce, disfrute la sociedad, por tal motivo se procedió a realizar la aceptación de oferta No 1692 de 2025 el cual fue adjudicado a la empresa MEGA PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S, con Nit 901.744.193-4.

El presente informe se realiza con el fin, de exponer los inconvenientes presentados en los últimos días de la ejecución del presente contrato, los cuales dan lugar a solicitar una Prórroga No 1 por un termino de 30 días a partir del 20 de agosto de 2025 al 19 septiembre de 2025.

OBJETIVO GENERAL DEL PRESENTE INFORME

Presentar informe para solicitud de Prórroga No. 1 del Contrato 1692 de 2025


GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA N.º 1692 de 2025	
OBJETO: "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REFORMAS A LAS INSTALACIONES DE LOS PUNTOS VIVE DIGITAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"	
CONTRATISTA	MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
NIT. N°	901.744.193-4
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS AUGUSTO GIRALDO RENGIFO
PLAZO INICIAL	SETENTA Y CINCO (75) DÍAS
FECHA DEL CONTRATO	03 DE JUNIO DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO	05 DE JUNIO DE 2025

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	19 DE AGOSTO DE 2025
VALOR CONTRATADO	CIENTO VEINTE MILLONES SETECIENTOS VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($ 120.721.957,42)
PLAZO DEL CONTRATO ACTUALIZADO	
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	CIENTO VEINTE MILLONES SETECIENTOS VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($ 120.721.957,42)
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADO	

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

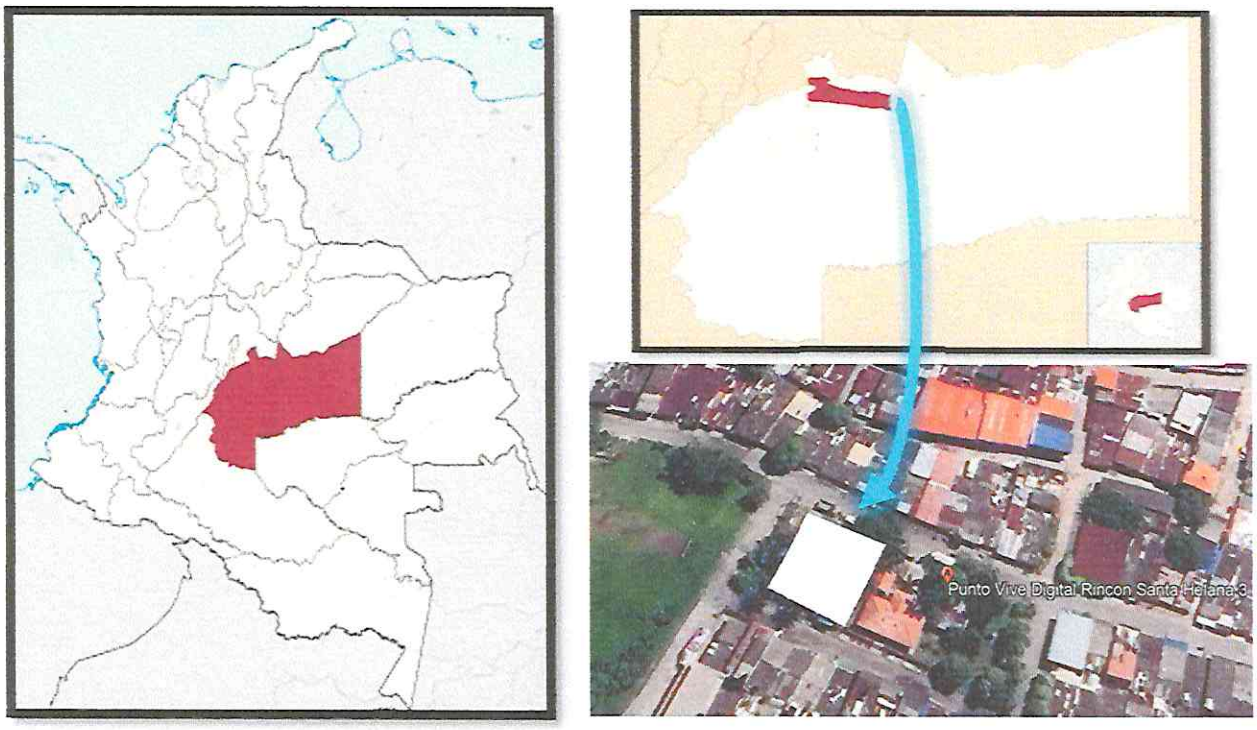

El proyecto a ejecutar dentro del objeto del contrato de obra N°1692 de 2025 se encuentra ubicado en la zona urbana en la calle 42ª # 17b-27, Vive Digital Villa Fabiola, en el Municipio de Villavicencio.

AVANCE EN TIEMPO


A la fecha de presentación del presente informe ha transcurrido un total de SESENTA Y NUEVE (69) días, equivalente al 92% de tiempo transcurrido a partir de la suscripción del acta de inicio de las actividades del proyecto de No de Contrato 1692 de 2025 como objeto del Contrato "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REFORMAS A LAS INSTALACIONES DE LOS PUNTOS VIVE DIGITAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO".

OBJETO	PLAZO ACTUAL	ACTA DE INICIO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE TIEMPO TRANSCURRIDO
"MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REFORMAS A LAS INSTALACIONES DE LOS PUNTOS VIVE DIGITAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"	SETENTA Y CINCO DÍAS	05/06/2025	75 DÍAS	92,31%

AVANCE FÍSICO

RESUMEN DE AVANCE		
Valor inicial del contrato	$	120,721,957,42
Valor actual del contrato	$	120,721,957,42
Valor ejecutado del contrato (acumulado)	$	25.734.936,80
Valor ejecutado programado (acumulado)	$	34.490.263,23
Tiempo de ejecución (acumulado)	69 días	
Porcentaje programado del contrato (acumulado)	45%	
Porcentaje ejecutado del contrato (acumulado)	28,57%	

GRAFICA DEL AVANCE

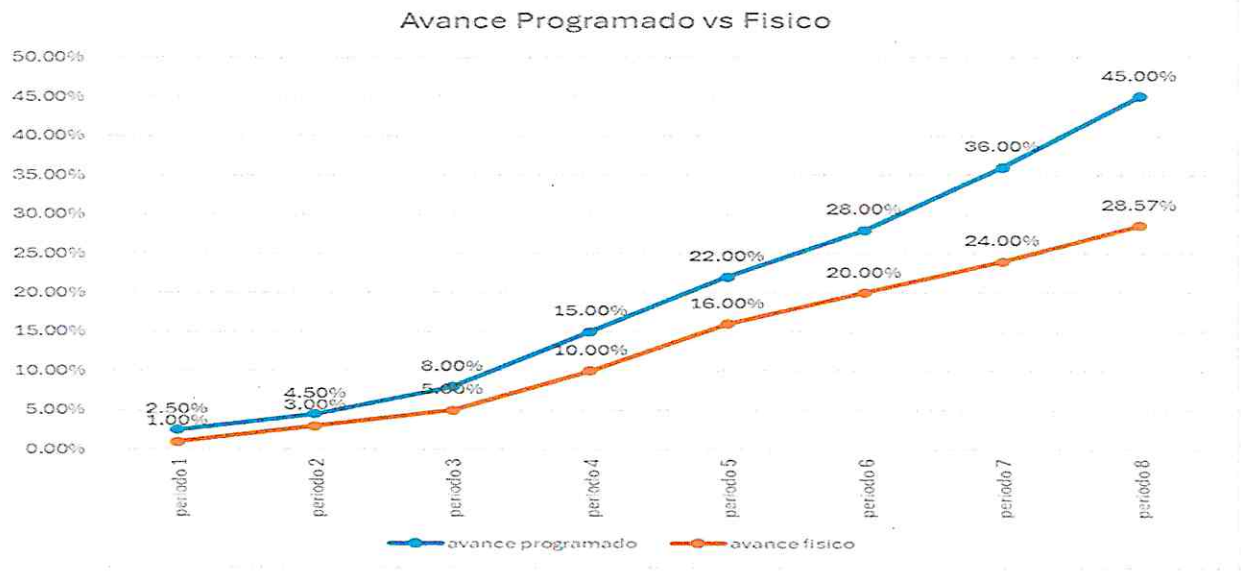


PROBLEMÁTICAS PRESENTADAS

A la fecha el contrato de obra presenta un avance físico del 28,57%, pese a las intermitencias en las actividades operativas que se presentan por las actividades que desarrollan los estudiantes en el lugar de ejecución de la obra y las fuertes lluvias que se presentan en la región las cuales han generado atrasos en el mes de junio y julio. Dado a los procesos constructivos que requieren de una condición seca en el espacio requerido a la hora de intervenir actividades puntuales como instalación de elementos metálicos, localización y replanteo, desmontes, instalación de cielo raso, demolición de muros, aplicación de estuco plástico, pintura, transporte de escombros y demoliciones, la ejecución no ha sido continua en la jornada completa.








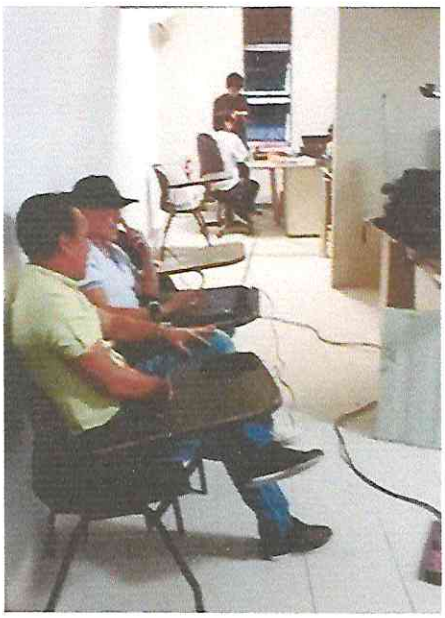



Como evidencia se da a conocer que, durante la ejecución de las actividades programadas dentro de la institución, se han presentado condiciones operativas que han incidido en el rendimiento y en la secuencia constructiva prevista. En primera instancia, la ocupación de determinadas áreas por parte de los estudiantes durante sus jornadas académicas hecho imposible la intervención directa en dichos frentes de trabajo. Esta restricción ha obligado a reprogramar las labores y redistribuir los recursos hacia sectores donde la interferencia con las actividades institucionales sea mínima, optimizando así el uso del personal y las herramientas a utilizar.

Por otra parte, las actividades en fachadas, lavado de cubiertas y demás frentes expuestos a la intemperie se han visto afectadas por las condiciones meteorológicas adversas. La presencia de precipitaciones ha generado la suspensión temporal de estas labores, tanto

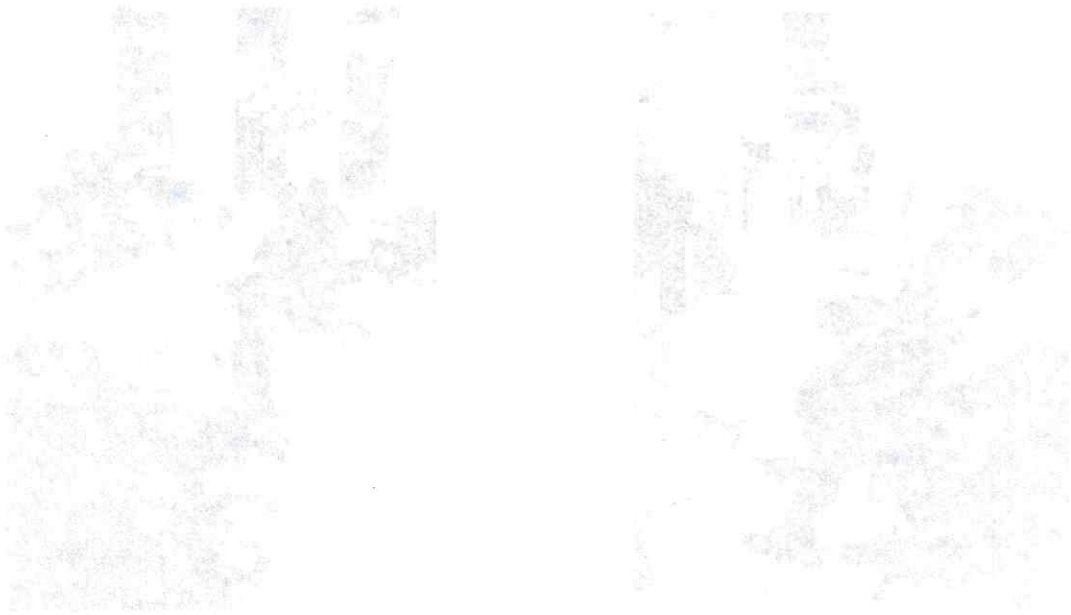

por criterios de seguridad industrial como para garantizar la calidad y durabilidad de los procesos constructivos.

De igual manera se informa que se han tenido que adelantar actividades administrativas como el ajuste al presupuesto, dado que no había actividades contempladas inicialmente.

PRONOSTICO MES DE JUNIO

Duramente el mes de junio del 2025 Villavicencio experimentara temperaturas mínimas de 11° C y Máximas hasta de 26 °C.

Puedes esperar lluvias durante la mitad del mes de junio en Villavicencio, se esperan de 8 a 15 días de lluvia.



ILUSTRACIÓN 1 *METEUM. FUENTE PREVISIÓN METEOROLÓGICA PARA EL MES DE JUNIO*

PRONOSTICO MES DE JULIO



ILUSTRACIÓN 2 *METEUM. FUENTE PREVISIÓN METEOROLÓGICA PARA EL MES DE JULIO*

Es necesario aclarar que como contratistas estamos comprometidos con la culminación de la obra, por estas razones se ve necesario solicitar una prorroga No 1 al contrato 1692 de 2025 por un término de treinta (30) días a partir del 20 de agosto de 2025 al 18 de septiembre de 2025, con el fin de superar los inconvenientes manifestados y así cumplir con el objeto con tratado.

CONDICIONES ACTUALIZADAS DEL PROYECTO

El contrato a la fecha cuenta con un tiempo de ejecución de setenta y cinco (75) días de ejecución.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS

Desde la suscripción del contrato hasta la fecha de corte se han generado los siguientes actos administrativos:

ACTA	FECHA	OBSERVACIÓN
ACEPTACIÓN DE OFERTA SMC CONTRATO	3/06/2025	Se suscribe Contrato 1692 de 2025 entre el municipio de Villavicencio - Meta, Mega Proyectos E Inversiones SAS (contratante), representado legalmente por Carlos Augusto Giraldo Rengifo.
ACTA DE INICIO	5/06/2025	Firma del acta de inicio del Contrato No. 1692 de 2025 por parte de Carlos Augusto Giraldo Rengifo (contratista), Alba Aurora Colina (supervisora TIC) y Diego Orlando Barbosa (supervisor)

CONTROL DE POLIZAS

El contrato de obra 1692 DE 2025, se encuentra amparado por la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A con las pólizas 30-44-101064160 y 30-40-101024067 a favor de entidades estatales (Ley 80 de 1993) para garantizar cumplimiento del contrato, calidad del servicio, en desarrollo del contrato de OBRA No.1692 de 2025 referente a la "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REFORMAS A LAS INSTALACIONES DE LOS PUNTOS VIVE DIGITAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO". El amparo de estabilidad y calidad de la obra otorgado mediante la presente póliza tiene vigencia de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Final.

Las pólizas aprobadas corresponden a la compañía aseguradora seguros mundiales las cuales están a favor del MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, las siguientes pólizas fueron expedidas con la firma del contrato.

A continuación, se presentan las fechas de vigencia de las pólizas actualizadas según la suscripción del contrato de obra No. 1692 de 2025, junto con el valor asegurado.

ASEGURADORA	No POLIZA CERTIFICADO	AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	VIGENTE
			DESDE	HASTA		
SEGUROS DEL ESTADO S. A	30-44-101064160	Cumplimiento del contrato	5/06/2025	19/12/2025	$ 24.144.391,49	SI
		Prestaciones Sociales Legales	5/06/2025	19/08/2028	$ 6.036.097,87	SI
		Estabilidad y calidad de la obra	SI AMPARA 5 AÑOS ,0 MESES Y 1 DIAS		$ 24.144.391,48	SI
	30-40-101024067	Responsabilidad Civil Extracontractual	5/06/2025	189/08/2025	$ 284.700.000,00	SI
TOTAL ASEGURADO					$ 339.024.880,84	

VALOR DEL CONTRATO

El valor Inicial del Contrato de Obra es la suma de CIENTO VEINTE MILLONES SETECIENTOS VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($120.721.957,42).

REGISTRO PRESUPUESTAL

RP.No	FECHA	DENOMINACIÓN	VIGENCIA	RUBRO	PRESUPUESTO ASIGNADO
3047	3/06/2025	IMPLEMENTACION, OPTIMIZACION Y SOSTENIBILIDAD OPERATIVA DE LOS PUNTOS VIVE DIGITAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META	Libre Destinación	0401-2-3,23,01,0400,011	120.721.957,42

FORMA DE PAGO

FORMA DE PAGO	
PAGO ANTICIPADO	Sin anticipo

FORMA DE PAGO	Un único pago total por el valor correspondiente a la operación entre la cantidad final ejecutada por el precio unitario establecido en la propuesta seleccionada, previo informe de actividades del contratista y la entrega de soportes de pago de seguridad social correspondiente al mes ejecutado cuenta de cobro o factura e informe del supervisor donde da cumplimiento a cabalidad de las obligaciones a cargo del contratista. El pago se realizará con acta de terminación y liquidación.

AVANCE FINANCIERO

CONCEPTO	ANTICIPO	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	N.A	$ 120.721.957,42
VALOR PAGADO	N.A	$ 0.00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR	N.A	$ 120.721.957,42

AVANCE DE OBRA	
%AVANCE FINANCIERO	**28,57 %**

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Mes de junio

APELLIDO	NOMBRE	CEDULA	PLANILLA No	PLANILLA CORRECION No	SALARIO	DIAS	TOTAL DIAS
ALVAREZ	ANDRES	1121869136	9488397882		$ 284.700,00	6	6
ARGUELLO	JHON	1121888157	9488397882		$ 284.700,00	6	6
GIRALDO	CARLOS	14214578	9488397882		$ 1.423.500,00	30	30
GONZALEZ	RICHAR	86079067	9488397882		$ 284.700,00	6	6

Mes de julio

APELLIDO	NOMBRE	CEDULA	PLANILLA No	PLANILLA CORRECION No	SALARIO	DIAS	TOTAL DIAS
ALVAREZ	ANDRES	1121869136	9489924152		$ 1.423.500,00	30	30
ARGUELLO	JHON	1121888157	9489924152		$ 1.423.500,00	30	30
BLANCO	DANIEL	1006454183	9489924152		$ 759.200,00	16	16
GIRALDO	CARLOS	14214578	9489924152		$ 189.800,00	4	4
GONZALEZ	RICHAR	86079067	9489924152		$ 1.423.500,00	30	30

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

Una vez expuestos los inconvenientes que presenta el contratista MEGAPROYECTOS E INVERSIONES SAS, se ve la necesidad de solicitar una prórroga No 01 al contrato de obra No 1692 de 2025; por un término de 30 días contados a partir del 20 de agosto de 2025 al 18 de septiembre de 2025, con el fin de superar los inconvenientes manifestados y así cumplir con el objeto contratado.

Cabe resaltar que como contratista de obra se mantiene el compromiso de llegar a feliz termino el presente contrato de obra, el cual beneficiara a la comunidad del sector de Villa Fabiola y la Madrid; mejorando así su calidad de vida.

Anexos

- Solicitud de prorroga
- Acta de solicitud de prorroga
- Reprogramación de obra

Para la constancia de lo anterior se firma el presente informe el día _____

Firma
MEGA PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S
CARLOS AUGUSTO GIRALDO RENGIFO
Contratista

Firma
Residente de Obra
Jesús Gregorio Cuyares Rodríguez
TP: A172015-1121851569

Esta circunstancia ha generado:

- Reducción del tiempo efectivo de trabajo en algunos frentes.
- Necesidad de trasladar al personal y los equipos hacia otros puntos disponibles, generando tiempos improductivos por desplazamiento interno.
- Reprogramación constante de tareas, lo que afecta la secuencia lógica de ejecución y el rendimiento global del proyecto.

3. Condiciones climáticas adversas

Durante los meses de junio y julio del presente año, el municipio de Villavicencio ha experimentado un régimen de lluvias intensas y frecuentes, especialmente en horas de la tarde. Estas precipitaciones han limitado o impedido la ejecución de actividades en exteriores tales como:

- Lavado y limpieza de senderos y cubiertas.
- Aplicación de pintura en fachadas y elementos expuestos.
- Trabajos de impermeabilización y sellado de juntas.

Ante estas condiciones, la programación se ha adaptado para concentrar esfuerzos en labores internas no afectadas por la lluvia, aunque esto no siempre ha permitido compensar los retrasos acumulados en los trabajos exteriores.

4. Impacto de los factores identificados en el cronograma

La concurrencia de los factores antes descritos ha ocasionado que, si bien las metas parciales se han ido alcanzando, el ritmo general de avance no se ajuste al plan original. La ejecución ha debido reorganizarse en múltiples ocasiones, generando un esquema de trabajo no lineal que, aunque funcional, no permite concluir la totalidad de las intervenciones dentro del plazo contractual vigente.

5. Fundamentación de la solicitud

Técnica y administrativamente, resulta procedente la solicitud de prórroga del Contrato de Obra No. 1692 de 2025, dado que:

- Las restricciones de acceso y uso de espacios son ajenas a la voluntad del contratista.
- Las condiciones meteorológicas son imprevisibles y constituyen un factor de fuerza mayor.
- Las actividades adicionales responden a la necesidad de asegurar el cumplimiento pleno del objeto contractual y la calidad de la obra.

Una extensión en el plazo permitirá culminar las intervenciones con la calidad y seguridad requeridas, sin sacrificar los estándares técnicos establecidos ni generar afectaciones a los usuarios de los Puntos Vive Digital.

En virtud de lo anterior, solicito muy respetuosamente la autorización de una prórroga en el plazo contractual por el término de 30 días calendario, a partir del 20 de agosto del año 2025 hasta el 18 de septiembre del año 2025, a fin de culminar las obras conforme a las especificaciones técnicas y contractuales, asegurando la entrega en óptimas condiciones.

Agradezco la atención prestada y quedo atento a la respuesta que se sirva emitir.

Cordialmente,



CARLOS AUGUSTO GIRALDO RENGIFO


Representante Legal

MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS


Anexo:

Informe justificación prorroga


	Duration	Start	Finish	Cost	Predecessors
JACION Y ACIONES DE LOS L MUNICIPIO DE	**73.22 days**	**Thu 05/06/25**	**Sat 30/08/25**	**$ 104,382,462.78**	
	0 days	Thu 05/06/25	Thu 05/06/25	$ 0.00	
IID	**23 days?**	**Sat 23/08/25**	**Thu 18/09/25**	**$ 28,999,281.50**	
	8 days	**Sat 23/08/25**	**Tue 02/09/25**	**$ 1,922,772.50**	
EPLANTEO BRA (M2) NO N TOPOGRAFICA	2 days	Sat 23/08/25	Tue 26/08/25	$ 648,862.50	
IUAL EN H= 0 - 2.00 M	2 days	Tue 26/08/25	Thu 28/08/25	$ 682,550.00	5
IUAL BALDOSA CLUYE JE MANUAL	2 days	Thu 28/08/25	Fri 29/08/25	$ 135,360.00	6
SPOSICIÓN FINAL SOBRANTES	2 days	Fri 29/08/25	Tue 02/09/25	$ 456,000.00	7
	22.44 days?	**Sun 24/08/25**	**Thu 18/09/25**	**$ 20,819,847.00**	
COCIDO COMUN MORTERO TIPO	2 days	Tue 02/09/25	Wed 03/09/25	$ 1,087,366.00	
TALACIÓN CORRIDO LAMINA COLL 0.80 M	2 days	Thu 11/09/25	Fri 12/09/25	$ 561,000.00	15
TALACIÓN REJA RADO 1" CAL 18	3 days	Sun 24/08/25	Wed 27/08/25	$ 4,208,454.00	
GRO 100X100X4	2 days	Mon 25/08/25	Tue 26/08/25	$ 933,100.00	

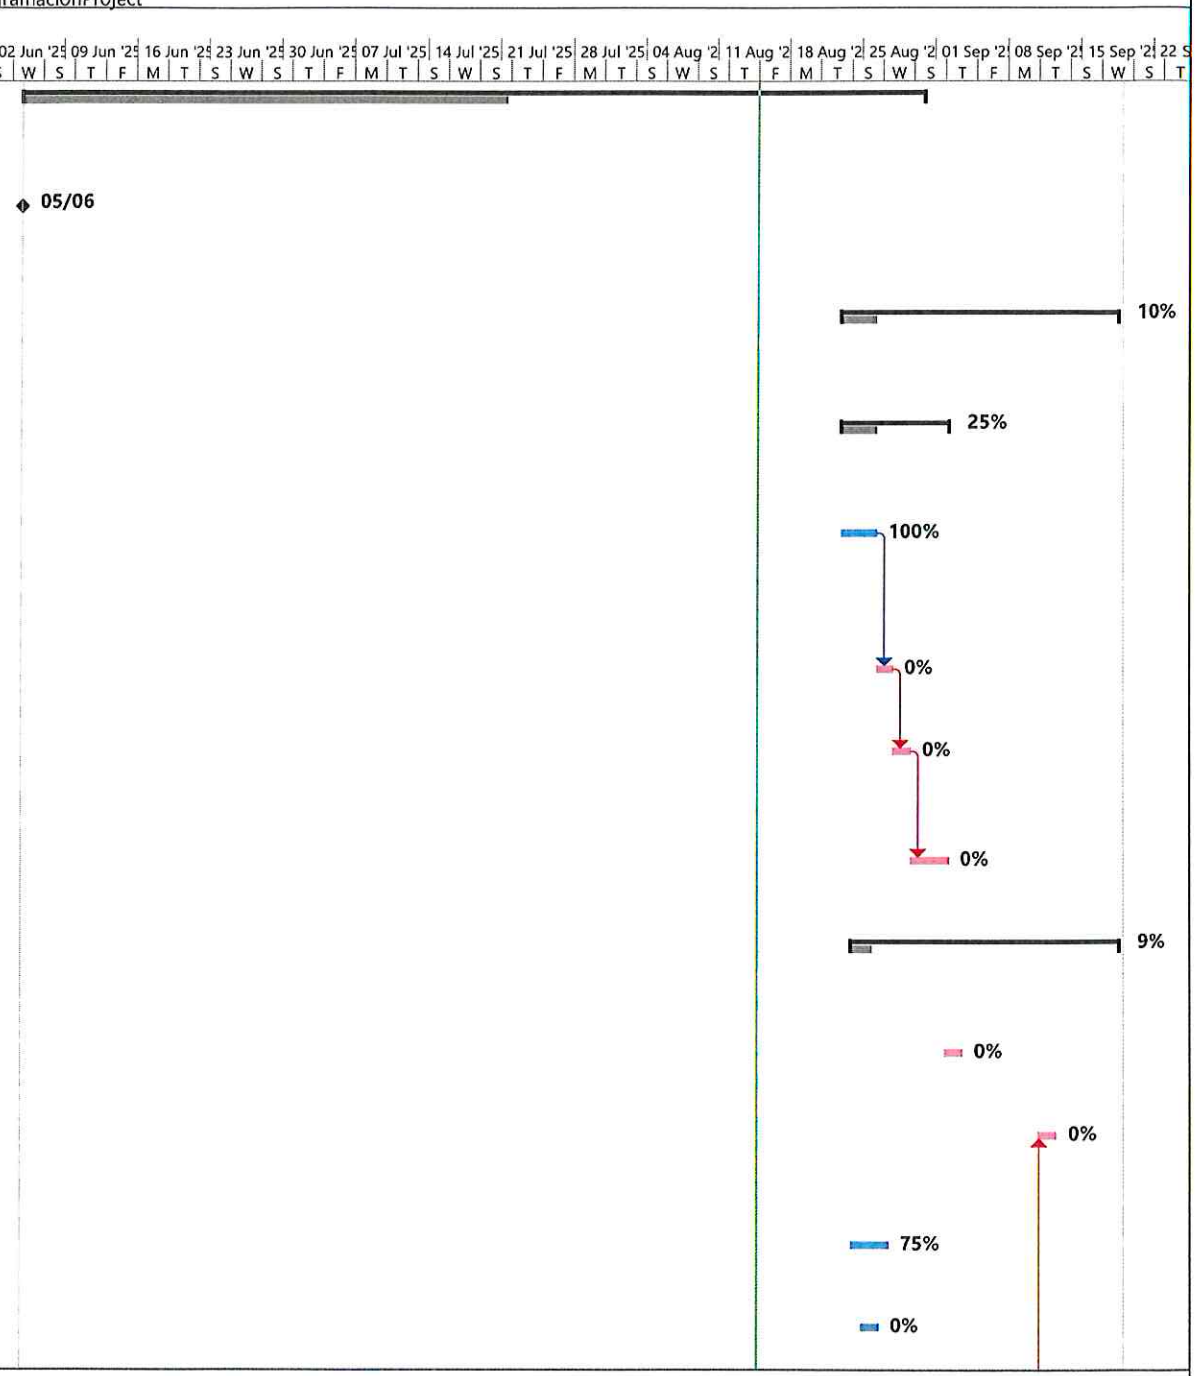


	Duration	Start	Finish	Cost	Predecessors
TALACIÓN) CORREDIZA,	2 days	Sat 13/09/25	Tue 16/09/25	$ 4,680,798.00	
RD DOBLE AL 8 MM,	3 days	Sat 06/09/25	Wed 10/09/25	$ 2,639,142.00	
UMINISTRO E	1 day	Mon 15/09/25	Mon 15/09/25	$ 127,800.00	
SIFON DE PISO	1 day?	Mon 15/09/25	Mon 15/09/25	$ 270,800.00	
SANITARIO 4" TALACIÓN	1 day?	Mon 15/09/25	Mon 15/09/25	$ 165,800.00	
UMINISTRO E	1 day?	Mon 15/09/25	Mon 15/09/25	$ 920,835.00	
' SUMINISTRO E	1 day?	Mon 15/09/25	Mon 15/09/25	$ 2,294,792.00	
CORTINA 1/2" TALACIÓN	1 day?	Mon 15/09/25	Mon 15/09/25	$ 135,600.00	
ER BLANCO	1 day?	Tue 16/09/25	Tue 16/09/25	$ 779,200.00	18
EPONER R INCLUYE)RIOS	1 day?	Tue 16/09/25	Tue 16/09/25	$ 1,041,600.00	20
LISO 0.20X0.20	2 days	Tue 16/09/25	Thu 18/09/25	$ 973,560.00	23
	4.33 days?	**Tue 09/09/25**	**Fri 12/09/25**	**$ 3,234,045.00**	
A	1 day?	Thu 11/09/25	Thu 11/09/25	$ 1,096,585.00	
AL 3 No6+1 'C SUMINISTRO	2 days	Tue 09/09/25	Wed 10/09/25	$ 975,460.00	
ACORRIENTE A TIERRA TALACION	1 day?	Thu 11/09/25	Thu 11/09/25	$ 471,600.00	
0W IP 65 TALACIÓN TALACIÓN	1 day?	Fri 12/09/25	Fri 12/09/25	$ 690,400.00	

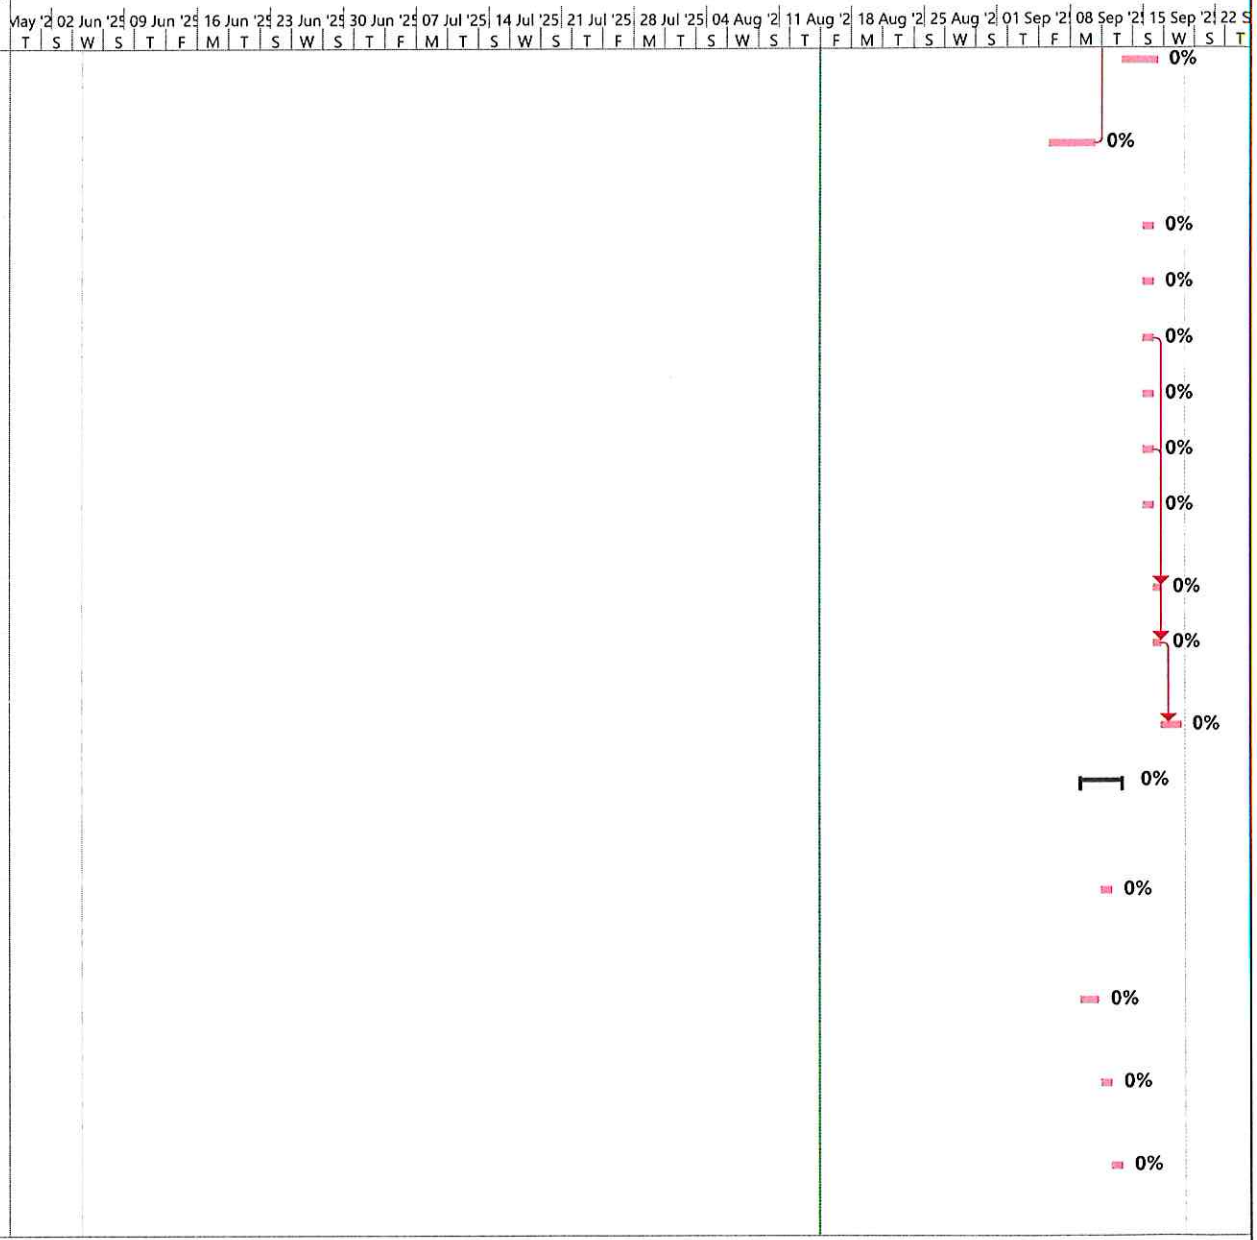

	Duration	Start	Finish	Cost	Predecessors
S	**14.33 days?**	**Mon 01/09/2**	**Tue 16/09/2**	**$ 3,022,617.00**	
IUAL MURO INCLUYE JE MANUAL	1 day?	Mon 01/09/25	Mon 01/09/25	$ 3,579.00	
TALACIÓN INA ALVEOLAR 6MM	1 day?	Thu 04/09/25	Thu 04/09/25	$ 233,642.00	
TERIAL MIXTO SAR TAMAÑO RO, ACIÓN,) Y MANUAL CON	2 days	Mon 01/09/25	Fri 05/09/25	$ 90,476.00	
ÓN DE 0,60 X MPOSTERÍA COMÚN, CONCRETO RCO EN ÁNGULO ISTRO Y	1 day?	Mon 08/09/25	Mon 08/09/25	$ 1,738,449.00	
LISO 0.20X0.20	1 day?	Tue 16/09/25	Tue 16/09/25	$ 956,471.00	
HOLA	**50.78 days?**	**Thu 05/06/2**	**Tue 05/08/2**	**$ 75,383,181.28**	
	13 days	**Thu 05/06/2**	**Thu 19/06/2**	**$ 3,229,155.50**	
EPLANTEO BRA (M2) NO Y TOPOGRAFICA	2 days	Thu 05/06/25	Fri 06/06/25	$ 940,387.50	
LO RASO EN NCLUYE SITIO DE ACENAMIENTO	3 days	Fri 06/06/25	Wed 11/06/25	$ 1,550,000.00	38

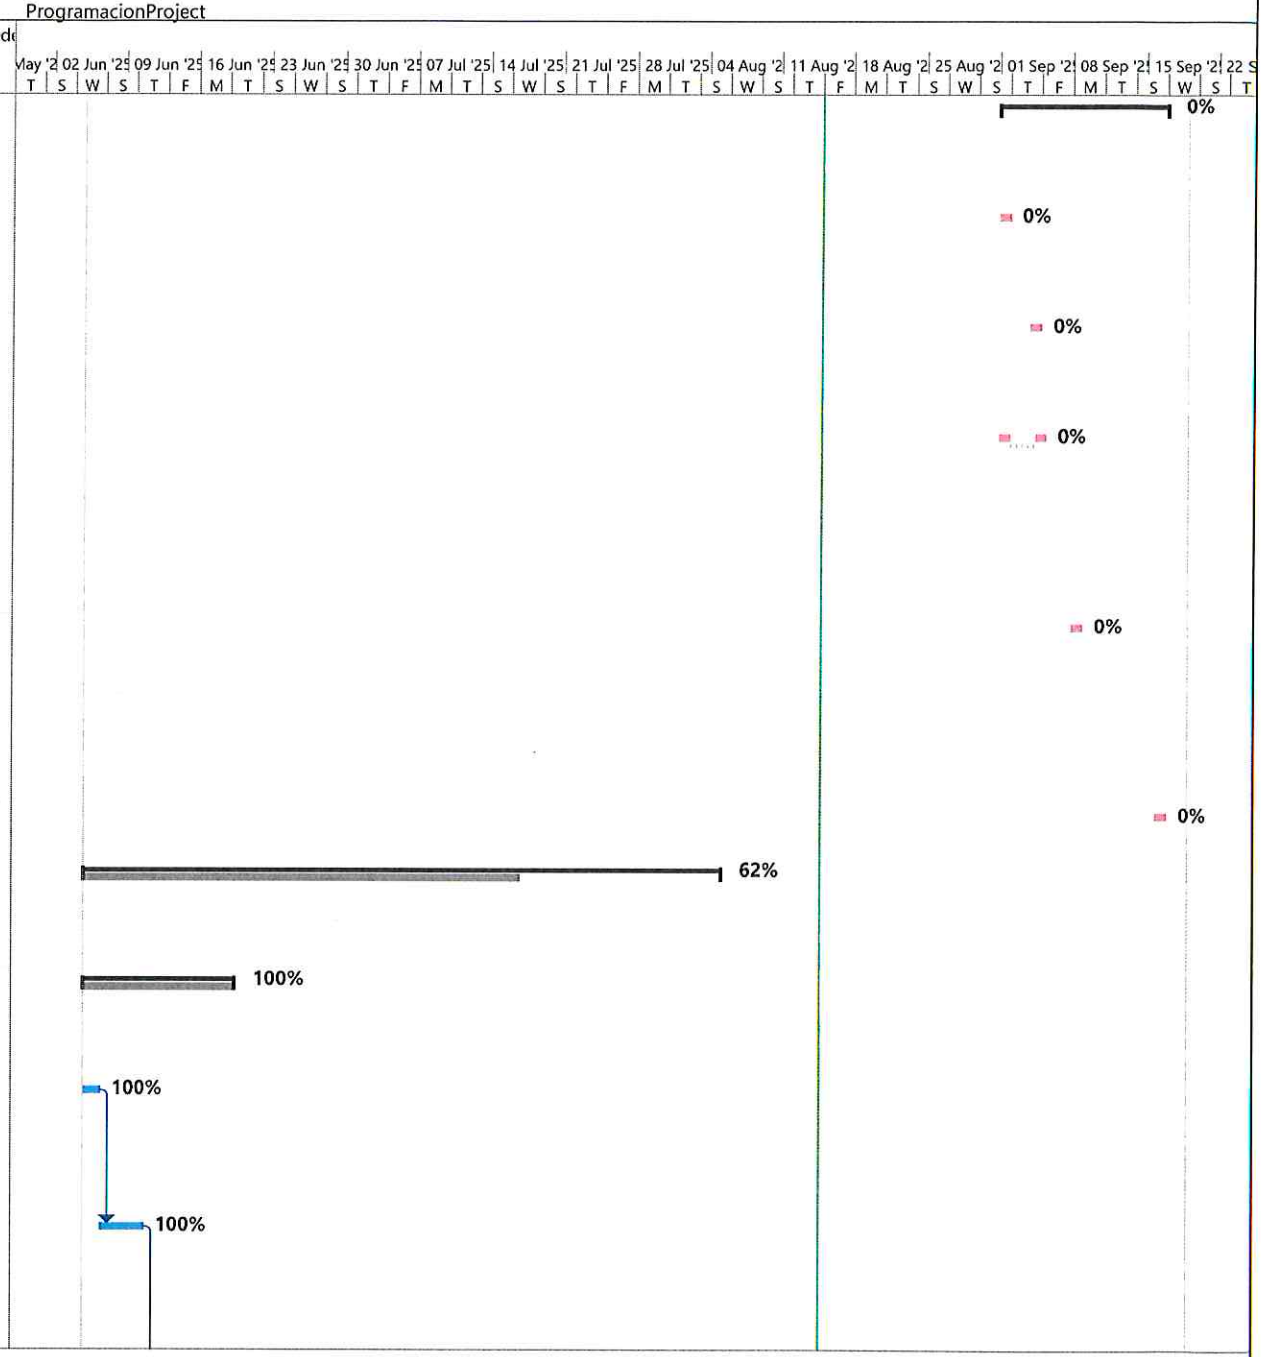


	Duration	Start	Finish	Cost	Prede
SPOSICIÓN FINAL SOBRANTES	5 days	Fri 13/06/25	Thu 19/06/25	$ 456,000.00	41
IUAL MURO E DE ARCILLA.) Y CARGUE	3 days	Wed 11/06/25	Fri 13/06/25	$ 282,768.00	39
TERIOR	**39.56 days**	**Thu 05/06/2**	**Wed 23/07/2**	**$ 55,321,415.78**	
TALACION DE C	5 days	Thu 05/06/25	Wed 11/06/25	$ 30,243,978.00	
CORAZA S	3 days	Sat 19/07/25	Wed 23/07/25	$ 5,091,264.00	
FLEXA No. 4 MORTERO TIPO	1 day	Thu 19/06/25	Fri 20/06/25	$ 96,707.00	40
TERIORES UYE FILOS Y MINISTRO Y	4 days	Fri 20/06/25	Thu 26/06/25	$ 431,460.00	45
	6 days	Tue 01/07/2	Mon 07/07/2	$ 5,664,925.00	46
TALACIÓN CORREDIZA,	2 days	Thu 05/06/25	Fri 06/06/25	$ 2,941,763.78	
RD DOBLE AL 8 MM,	3 days	Wed 25/06/25	Tue 01/07/25	$ 6,894,558.00	
PO 1 S/MURO	10 days	Mon 07/07/25	Fri 18/07/25	$ 2,847,960.00	47
ACERO) ASTM A500 RO E	2 days	Sat 19/07/25	Tue 22/07/25	$ 1,108,800.00	
	3 days?	**Fri 01/08/25**	**Tue 05/08/2**	**$ 16,832,610.00**	
A KA MULTISEAL	1 day?	Fri 01/08/25	Fri 01/08/25	$ 141,115.00	

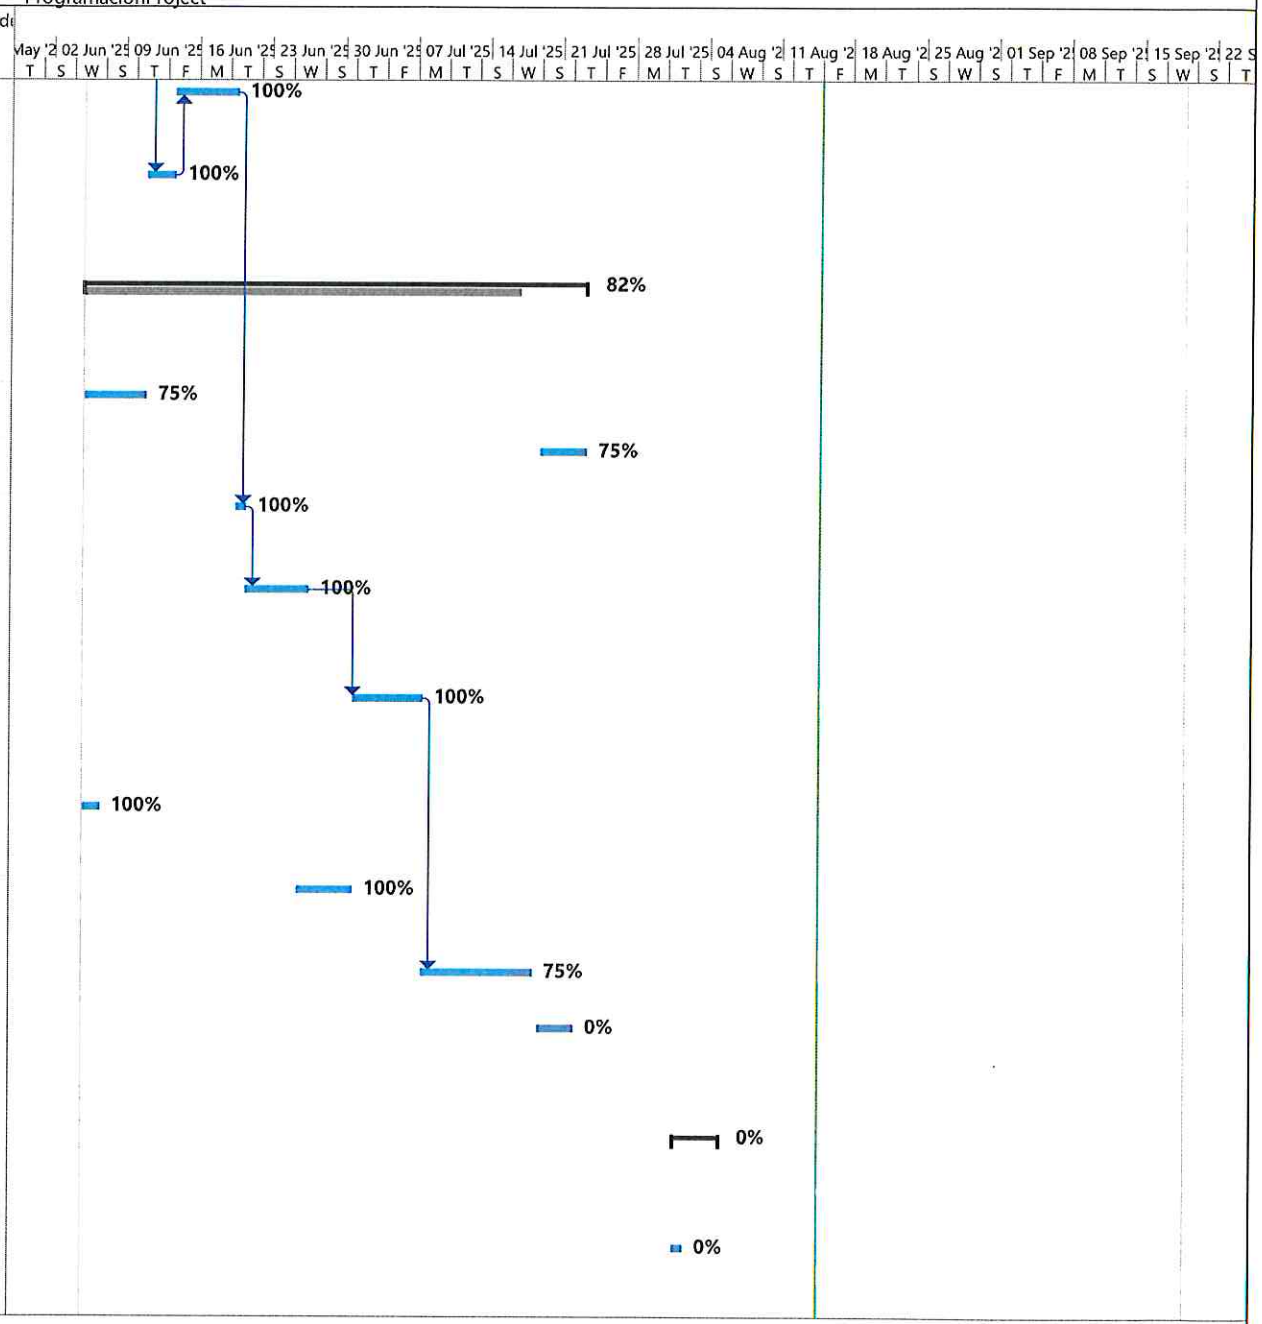

310

	Duration	Start	Finish	Cost	Pred
IDO 18 WATTS	2 days	Fri 01/08/25	Mon 04/08/2	$ 2,415,398.00	
RA LED TALACIÓN	3 days	Fri 01/08/25	Tue 05/08/25	$ 6,577,117.00	
O 20.7 MPa EN OBRA.	1 day	Fri 01/08/25	Fri 01/08/25	$ 854,497.00	
ICRETO 20.7 ZCLA EN OBRA.	1 day	Fri 01/08/25	Fri 01/08/25	$ 886,417.00	
ERTA CON DE ALTA ROJET	2 days	Fri 01/08/25	Mon 04/08/25	$ 3,291,270.00	
, SENDEROS O OJET	2 days	Fri 01/08/25	Mon 04/08/25	$ 1,176,224.00	
UAL ENCHAPE S. INCLUYE JE MANUAL	2 days	Fri 01/08/25	Mon 04/08/25	$ 73,564.00	
ICACIÓN O A CANAL EN Pa (3000 PSI)	2 days	Fri 01/08/25	Mon 04/08/25	$ 342,543.00	
ICACIÓN AMINA 18,LD=0.30 M	1 day?	Fri 01/08/25	Fri 01/08/25	$ 578,201.00	
TALACIÓN CORRIDO LAMINA COLL 0,80 M	2 days	Fri 01/08/25	Mon 04/08/25	$ 280,614.00	
PULIDO	1 day?	Fri 01/08/25	Fri 01/08/25	$ 215,650.00	
	0 days	Sat 30/08/25	Sat 30/08/25	$ 0.00	

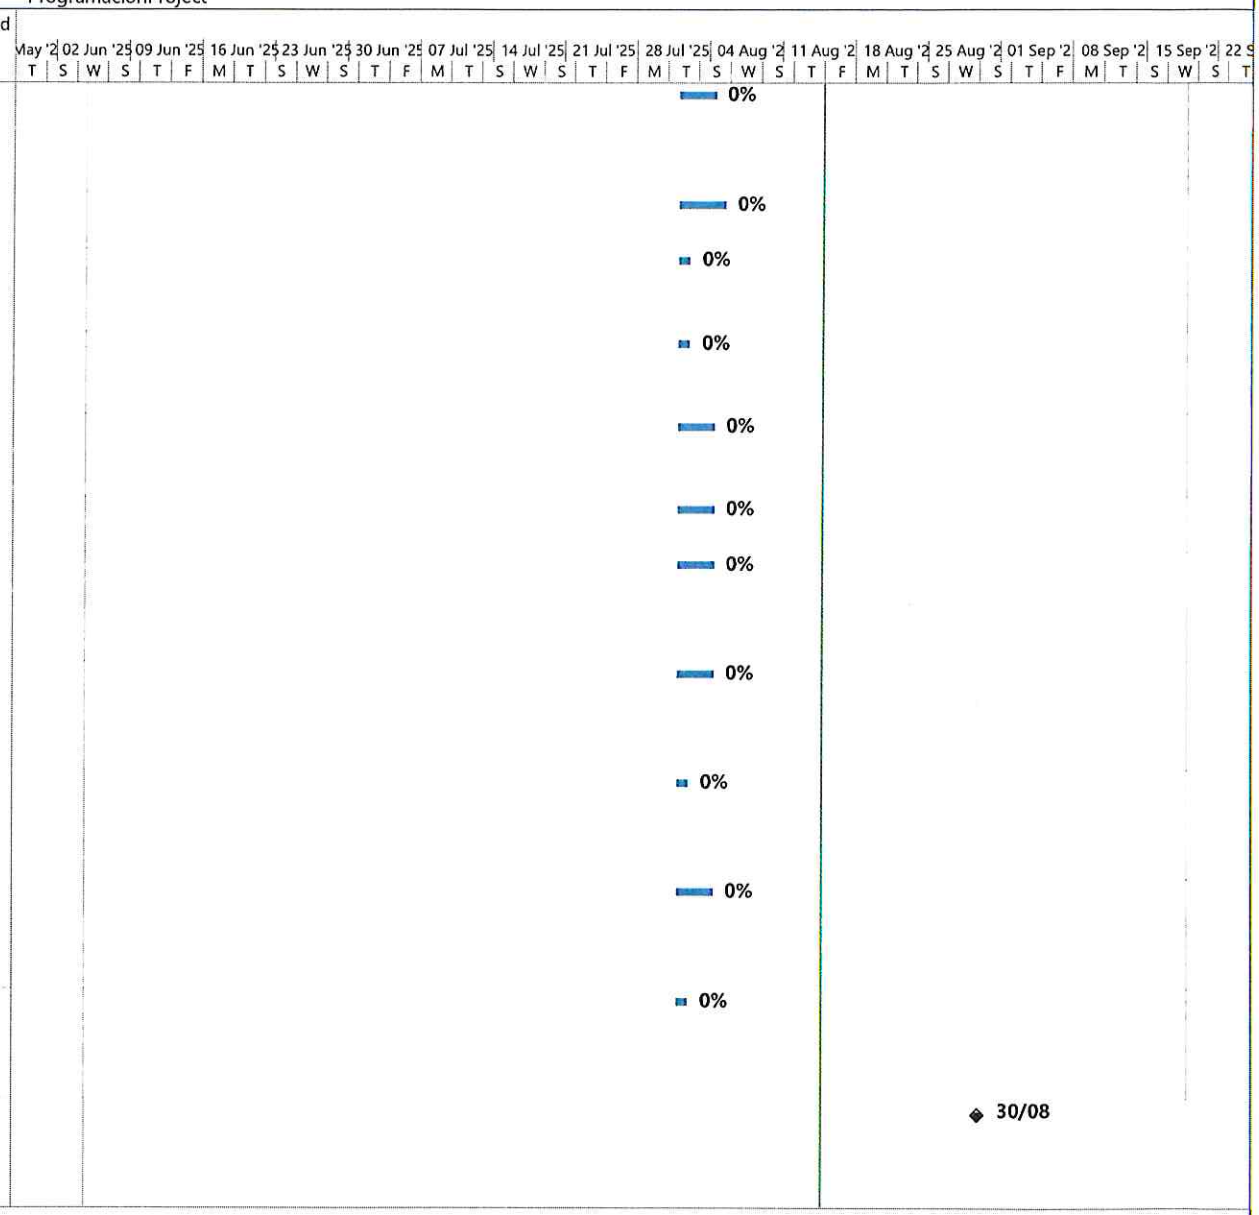

RIO CUYARES RODRIGUEZ
de obra

217

CONDICIONES HIDROMETEOROLÓGICAS ACTUALES

IDEAM comunica al Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) y al Sistema Nacional Ambiental (SINA).

Bogotá D.C., 12 de agosto de 2025
Hora de actualización 18:00 HLC

Boletín No.

0615

CONTENIDO

- Condiciones Meteorológicas.
- Pronóstico de precipitación para las próximas seis (6) horas.
- Alertas Hidrológicas.
- Seguimiento y Pronóstico de las Amenazas por Deslizamientos
- Seguimiento y Pronóstico de las Amenazas por Incendios Alertas.
- Meteomarinas vigentes Mar Caribe Colombiano.
- Meteomarinas vigentes Océano Pacífico Nacional.

Alerta ROJA

PARA TOMAR ACCIÓN Advierte a los sistemas de prevención y atención de desastres sobre la amenaza que puede ocasionar un fenómeno con efectos adversos sobre la población, el cual requiere la atención inmediata por parte de la población y de los cuerpos de atención y socorro. Se emite una alerta sólo cuando la identificación de un evento extraordinario indique la probabilidad de amenaza inminente y cuando la gravedad del fenómeno implique la movilización de personas y equipos, interrumpiendo el normal desarrollo de sus actividades cotidianas.

Alerta NARANJA

PARA PREPARARSE Indica la presencia de un fenómeno. No implica amenaza inmediata y como tanto es catalogado como un mensaje para informarse y prepararse. El aviso implica vigilancia continua ya que las condiciones son propicias para el desarrollo de un fenómeno, sin que se requiera permanecer alerta.

Alerta AMARILLA

PARA INFORMARSE Es un mensaje oficial por el cual se difunde información. Por lo regular se refiere a eventos observados, registrados o registrados y puede contener algunos elementos de pronóstico a manera de orientación. Por sus características pretéritas y futuras difiere del aviso y de la alerta, y por lo general no está encaminado a alertar sino a informar


CONDICIONES NORMALES La información que se suministra se encuentra dentro de los rangos normales.

Alertas vigentes hasta: 13 de agosto de 2025 00:00 HLC

www.ideam.gov.co

Área Hidrográfica del Orinoco


Actualización: 12 de agosto de 2025 18:00 HLC

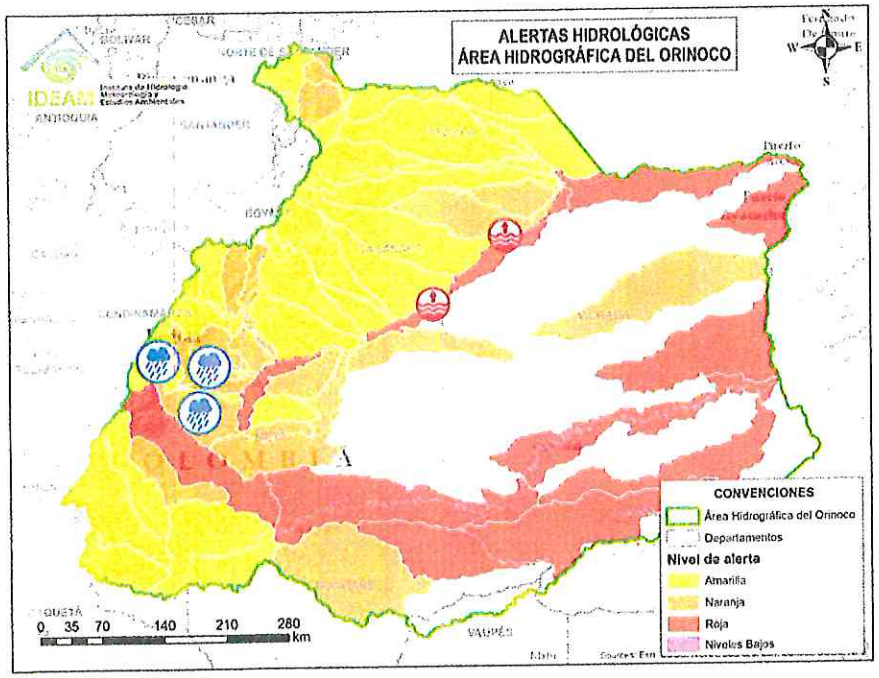

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Meta	Cuencas de los ríos Metica, Guamal y Humadea	Probabilidad de crecientes súbitas en las cuencas de los ríos Metica, Guamal y Humadea y sus afluentes, aportantes a la cuenca alta del río Meta. Se recomienda prestar atención a los municipios de Castilla la Nueva, Guamal y Acacías del departamento de Meta. **Nota**: Creciente súbita del río Guamal, generando afectaciones en la vereda La Isla del municipio de Guamal (03/08/2025).
⚠	Meta	Cuenca río Guayuriba	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Guayuriba y sus afluentes, especialmente en la quebrada Blanca, quebrada Las Jotas y en el río Negro a la altura de Quetame, Gutierrez y Guayabetal (Cundinamarca). Se recomienda especial atención en los municipios de Une, Fómeque, Gutierrez y Guayabetal (Cundinamarca), Villavicencio, Acacias, San Carlos de Guaroa y Puerto López (Meta).
⚠	Meta	Cuenca del río Guatiquía	Probabilidad de creciente súbita en el río Guatiquía y sus afluentes, especialmente los caños Maizaro, Grande, quebrada Salina y el río Ocoa. Se recomienda especial atención a la altura de Restrepo, Villavicencio y el municipio El Calvario (Meta). **Nota**: Se reporta creciente y desbordamiento del rio Ocoa a la altura de Villavicencio (Meta) (08/08/2025).
⚠	Meta	Cuenca del río Guacavía	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Guacavía y sus afluentes, se recomienda especial atención a la altura del municipio Cumaral (Meta).
⚠	Meta	Cuenca del río Negro	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Negro y sus afluentes, se recomienda especial atención en Villavicencio (Meta).

Área Hidrográfica del Orinoco


Actualización: 12 de agosto de 2025 18:00 HLC

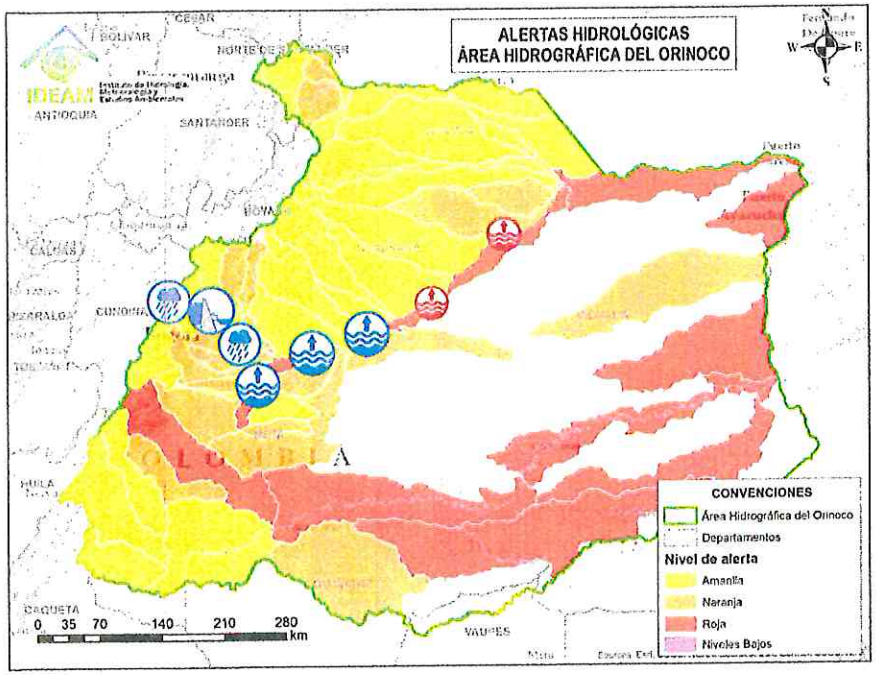

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona ó Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Meta	Cuenca río Humea	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Humea y sus afluentes, especialmente el río San Juanito. Especial atención en los municipios de Paratebueno y Medina (Cundinamarca).
	Meta	Directos al Meta entre ríos Guayuriba y Yucao	Niveles altos del río Meta entre los municipios de Puerto López (Meta) y Orocué (Casanare). Se recomienda especial atención a las comunidades ribereñas localizadas en su recorrido por los municipios de Puerto López, Cabuyaro (Meta), Villanueva, Tauramena y Orocué (Casanare).
	Meta	Directos al río Meta entre los ríos Guatiquía y Upía	Probabilidad de crecientes súbitas de los tributarios al río Meta entre los ríos Guatiquía y Upía. Especial atención a la altura de los municipios de Paratebueno, Barranca de Upía y Cabuyaro.
	Meta	Cuenca del río Guavio	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Guavio y sus afluentes, especialmente el río Sueva y Chivor. Especial atención en el municipio de Gachetá (Cundinamarca).

Área Hidrográfica del Orinoco

Actualización: 12 de agosto de 2025 18:00 HLC

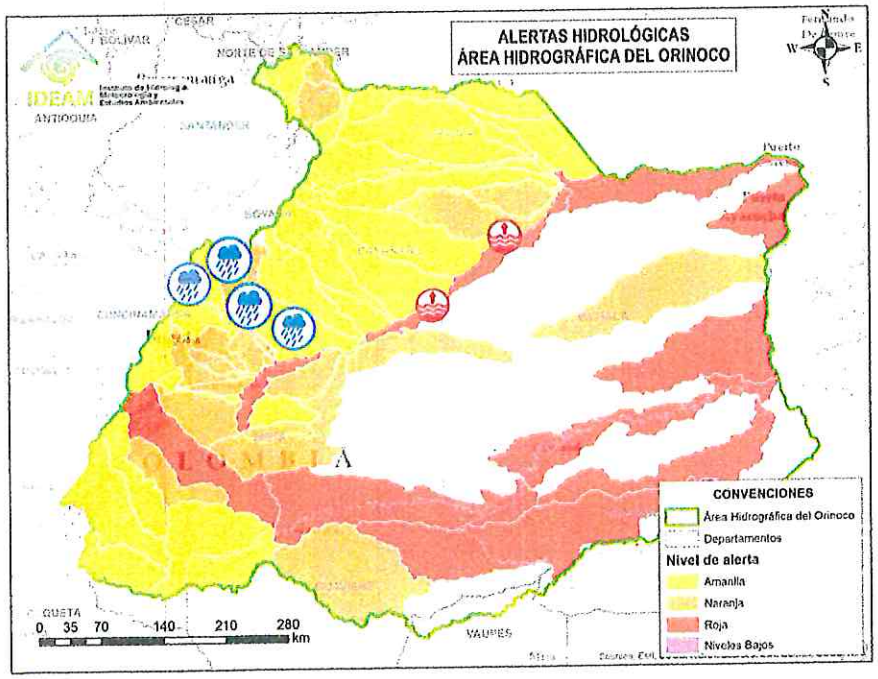

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Meta	Cuenca del río Garagoa	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Garagoa y sus afluentes, especialmente el río Bata, Machetá y Teatinos. Especial atención en los municipios de Almeida, Chivor, Garagoa, Jenesano, Macanal, Santa María, Somondoco y Tibirita (Boyacá). **Nota:** Se reportó creciente súbita del río Teatinos a la altura del municipio de Jenesano (Boyacá) (29/07/2025).
⚠	Meta	Cuenca del río Lengupá	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Lengupá y sus aportantes. Especial atención en los municipios de Santa María, Rondón, Zetaquirá, Campohermoso y San Luis de Gaceno (Boyacá).
⚠	Meta	Cuenca del río Upía	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Upía y sus afluentes. Se recomienda especial atención en los municipios de San Luis de Gaceno (Boyacá); Sabanalarga, Villanueva (Casanare); Barranca de Upía y Cabuyaro (Meta).
⚠	Meta	Cuenca del río Túa	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Túa y sus afluentes especialmente el caño Arietes, se recomienda especial atención sobre los municipios de Monterrey, Tauramena y Villanueva (Casanare).

CONDICIONES HIDROMETEOROLÓGICAS ACTUALES

IDEAM comunica al Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) y al Sistema Nacional Ambiental (SINA).

Bogotá D.C., 11 de agosto de 2025
Hora de actualización 00:00 HLC

Boletín No.

0610

CONTENIDO

- Condiciones Meteorológicas.
- Pronóstico de precipitación para las próximas seis (6) horas.
- Alertas Hidrológicas.
- Seguimiento y Pronóstico de las Amenazas por Deslizamientos
- Seguimiento y Pronóstico de las Amenazas por Incendios Alertas.
- Meteomarinas vigentes Mar Caribe Colombiano.
- Meteomarinas vigentes Océano Pacífico Nacional.

Alerta ROJA

PARA TOMAR ACCIÓN Advierte a los sistemas de prevención y atención de desastres sobre la amenaza que puede ocasionar un fenómeno con efectos adversos sobre la población, el cual requiere la atención inmediata por parte de la población y de los cuerpos de atención y socorro. Se emite una alerta sólo cuando la identificación de un evento extraordinario indique la probabilidad de amenaza inminente y cuando la gravedad del fenómeno implique la movilización de personas y equipos, interrumpiendo el normal desarrollo de sus actividades cotidianas.

Alerta NARANJA

PARA PREPARARSE Indica la presencia de un fenómeno. No implica amenaza inmediata y como tanto es catalogado como un mensaje para informarse y prepararse. El aviso implica vigilancia continua ya que las condiciones son propicias para el desarrollo de un fenómeno, sin que se requiera permanecer alerta.

Alerta AMARILLA

PARA INFORMARSE Es un mensaje oficial por el cual se difunde información. Por lo regular se refiere a eventos observados, registrados o registrados y puede contener algunos elementos de pronóstico a manera de orientación. Por sus características pretéritas y futuras difiere del aviso y de la alerta, y por lo general no está encaminado a alertar sino a informar

CONDICIONES NORMALES La información que se suministra se encuentra dentro de los rangos normales.

Alertas vigentes hasta: 11 de agosto de 2025 06:00 HLC

www.ideam.gov.co

Condiciones Hidrometeorológicas


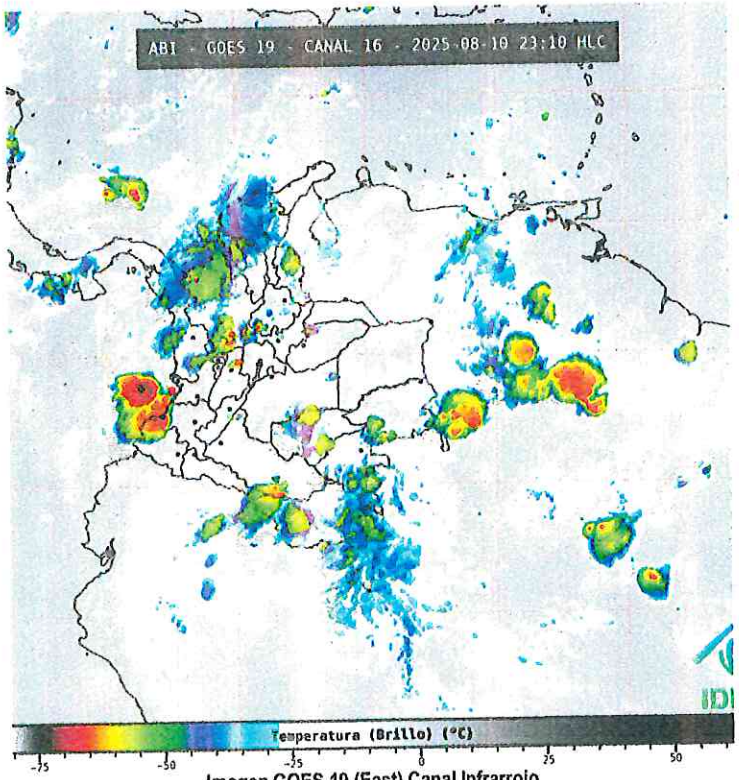


Imagen GOES 19 (East) Canal Infrarrojo
10 de agosto de 2025 – Hora 23:10 HLC
Fuente: IDEAM – GOES 19

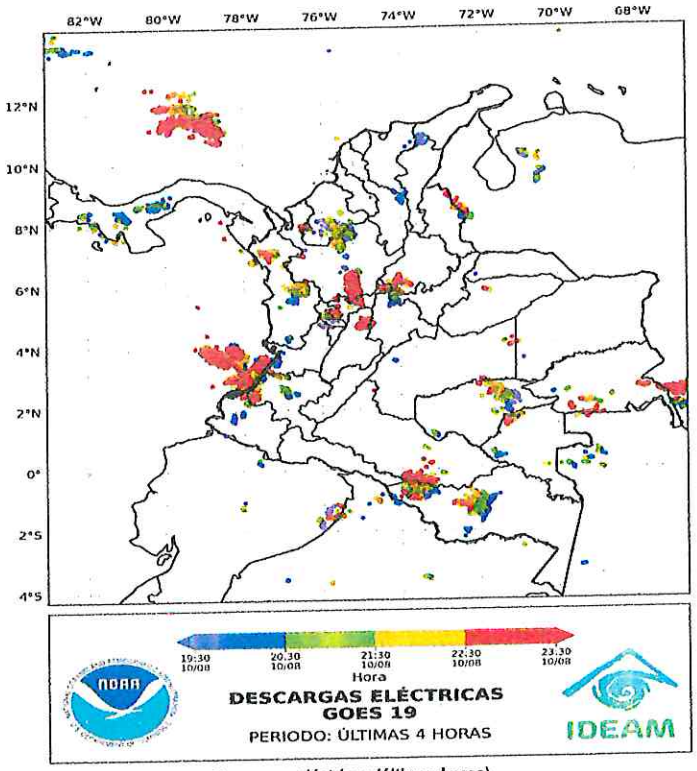


Descargas eléctricas (últimas horas)
10 de agosto de 2025 – Hora 23:05 HLC
Fuente: NOAA - IDEAM

- La imagen del canal infrarrojo (10.3 µm) permite identificar nubes en cualquier periodo temporal a partir de la temperatura de brillo de la nube (ver escala de colores). De esta forma, se puede identificar, clasificar y caracterizar la nubosidad en una zona determinada.
- La imagen de las descargas eléctricas muestra los rayos nube-tierra que se han descargado en una zona en las últimas 4 horas (ver escala de colores)

Área Hidrográfica del Orinoco


Actualización: 11 de agosto de 2025 00:00 HLC

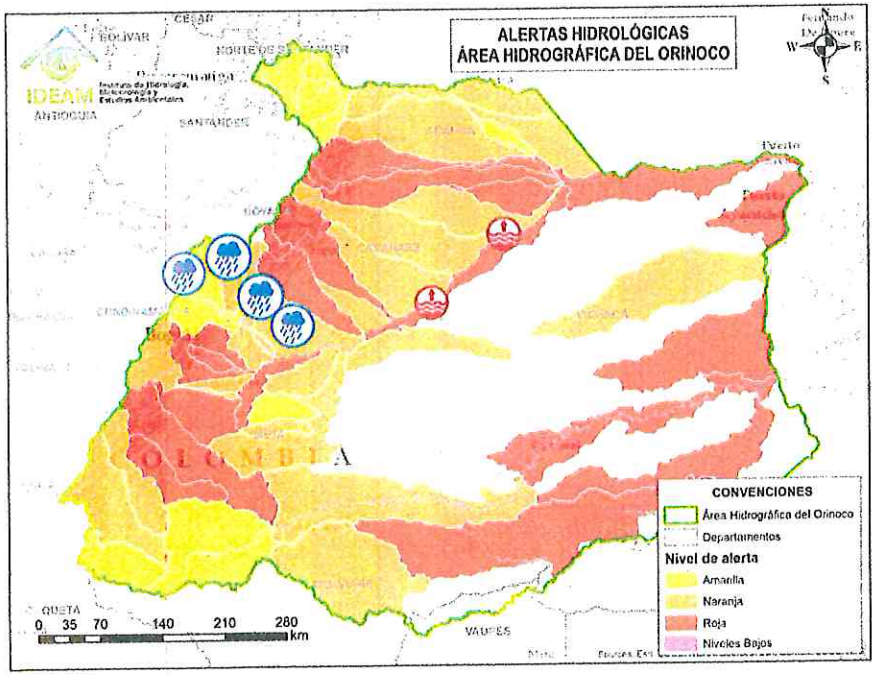

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Meta	Cuenca del río Garagoa	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Garagoa y sus afluentes, especialmente el río Bata, Machetá y Teatinos. Especial atención en los municipios de Almeida, Chivor, Garagoa, Jenesano, Macanal, Santa María, Somondoco y Tibirita (Boyacá). **Nota:** Se reportó creciente súbita del río Teatinos a la altura del municipio de Jenesano (Boyacá) (29/07/2025).
⚠	Meta	Cuenca del río Lengupá	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Lengupá y sus aportantes. Especial atención en los municipios de Santa María, Rondón, Zetaquirá, Campohermoso y San Luis de Gaceno (Boyacá).
⚠	Meta	Cuenca del río Upía	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Upía y sus afluentes. Se recomienda especial atención en los municipios de San Luis de Gaceno (Boyacá); Sabanalarga, Villanueva (Casanare); Barranca de Upía y Cabuyaro (Meta).
⚠	Meta	Cuenca del río Túa	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Túa y sus afluentes especialmente el caño Arietes, se recomienda especial atención sobre los municipios de Monterrey, Tauramena y Villanueva (Casanare).

Área Hidrográfica del Orinoco

Actualización: 11 de agosto de 2025 00:00 HLC

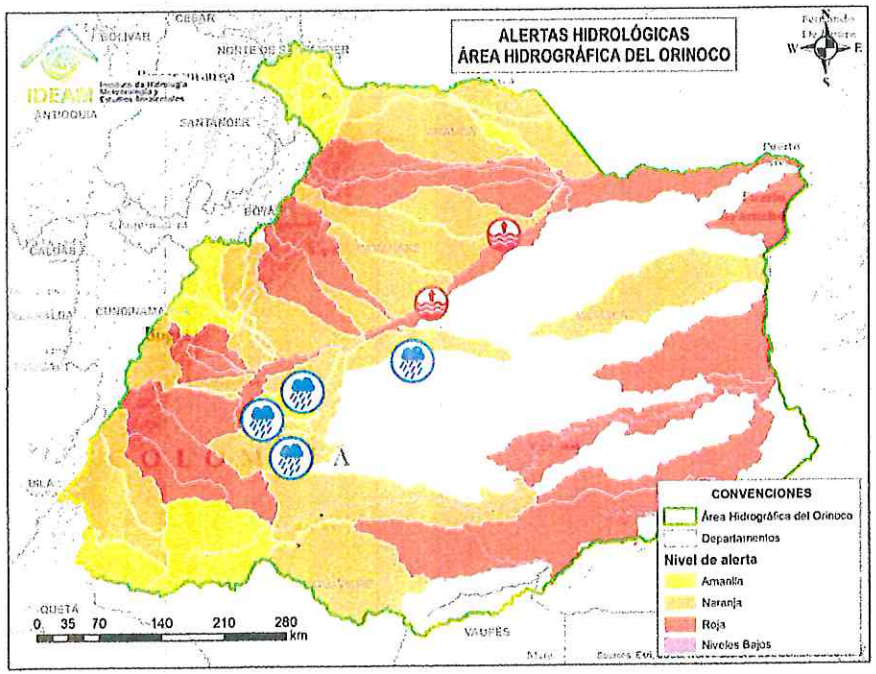

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Meta	Cuenca del río Manacacías	Niveles altos del río Manacacías, aportante a la cuenca alta del río Meta. Especial atención en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
⚠	Meta	Cuenca del caño Cumaral	Probabilidad de incrementos súbitos en las cuencas de los ríos caño Cumaral y sus afluentes, especial atención en el municipio de San Martín (Meta) .
⚠	Meta	Cuenca del río Melúa	Probabilidad de incrementos súbitos en las cuencas de los ríos Melúa y sus afluentes, especial atención en el municipio de San Martín (Meta) .
⚠	Meta	Cuenca del río Yucao	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Yucao. Especial atención en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
⚠	Vichada	Cuenca río Muco	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Muco y sus afluentes, especial atención en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).

CONDICIONES HIDROMETEOROLÓGICAS ACTUALES

IDEAM comunica al Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) y al Sistema Nacional Ambiental (SINA).

Bogotá D.C., 07 de agosto de 2025
Hora de actualización 18:00 HLC

Boletín No.

0600

CONTENIDO

- Condiciones Meteorológicas.
- Pronóstico de precipitación para las próximas seis (6) horas.
- Alertas Hidrológicas.
- Seguimiento y Pronóstico de las Amenazas por Deslizamientos
- Seguimiento y Pronóstico de las Amenazas por Incendios Alertas.
- Meteomarinas vigentes Mar Caribe Colombiano.
- Meteomarinas vigentes Océano Pacífico Nacional.

Alerta ROJA

PARA TOMAR ACCIÓN Advierte a los sistemas de prevención y atención de desastres sobre la amenaza que puede ocasionar un fenómeno con efectos adversos sobre la población, el cual requiere la atención inmediata por parte de la población y de los cuerpos de atención y socorro. Se emite una alerta sólo cuando la identificación de un evento extraordinario indique la probabilidad de amenaza inminente y cuando la gravedad del fenómeno implique la movilización de personas y equipos, interrumpiendo el normal desarrollo de sus actividades cotidianas.

Alerta NARANJA

PARA PREPARARSE Indica la presencia de un fenómeno. No implica amenaza inmediata y como tanto es catalogado como un mensaje para informarse y prepararse. El aviso implica vigilancia continua ya que las condiciones son propicias para el desarrollo de un fenómeno, sin que se requiera permanecer alerta.

Alerta AMARILLA

PARA INFORMARSE Es un mensaje oficial por el cual se difunde información. Por lo regular se refiere a eventos observados, registrados o registrados y puede contener algunos elementos de pronóstico a manera de orientación. Por sus características pretéritas y futuras difiere del aviso y de la alerta, y por lo general no está encaminado a alertar sino a informar


CONDICIONES NORMALES La información que se suministra se encuentra dentro de los rangos normales.

Alertas vigentes hasta: 08 de agosto de 2025 00:00 HLC

www.ideam.gov.co

Área Hidrográfica del Orinoco


Actualización: 07 de agosto de 2025 18:00 HLC

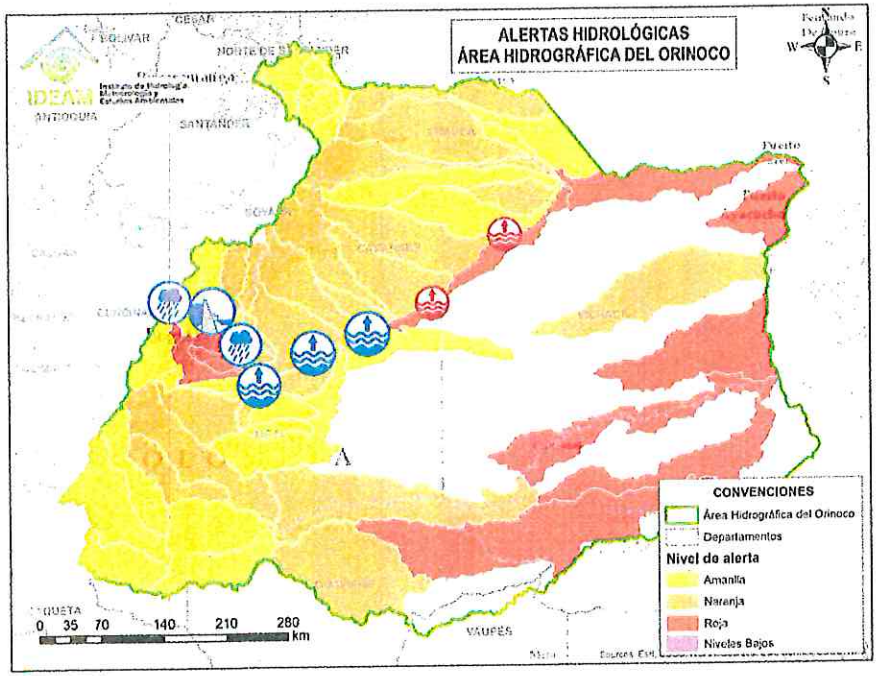

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Meta	Cuenca río Humea	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Humea y sus afluentes, especialmente el río San Juanito. Especial atención en los municipios de Paratebueno y Medina (Cundinamarca).
	Meta	Directos al Meta entre ríos Guayuriba y Yucao	Niveles altos del río Meta entre los municipios de Puerto López (Meta) y Orocué (Casanare). Se recomienda especial atención a las comunidades ribereñas localizadas en su recorrido por los municipios de Puerto López, Cabuyaro (Meta), Villanueva, Tauramena y Orocué (Casanare).
	Meta	Directos al río Meta entre los ríos Guatiquía y Upía	Probabilidad de crecientes súbitas de los tributarios al río Meta entre los ríos Guatiquía y Upía. Especial atención a la altura de los municipios de Paratebueno, Barranca de Upía y Cabuyaro.
	Meta	Cuenca del río Guavio	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Guavio y sus afluentes, especialmente el río Sueva y Chivor. Especial atención en el municipio de Gachetá (Cundinamarca).

Área Hidrográfica del Orinoco


Actualización: 07 de agosto de 2025 18:00 HLC

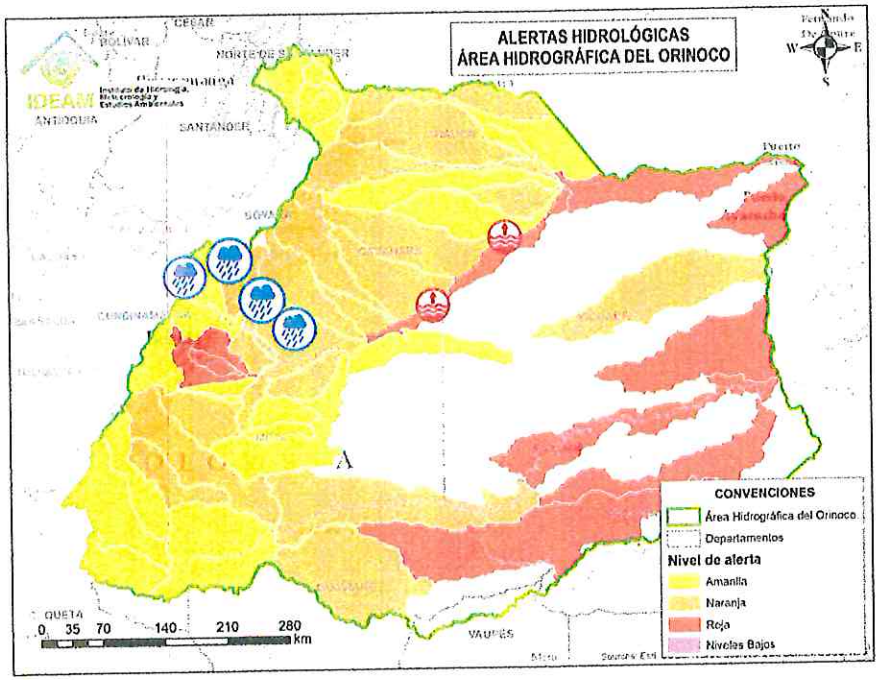

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Meta	Cuenca del río Garagoa	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Garagoa y sus afluentes, especialmente el río Bata, Machetá y Teatinos. Especial atención en los municipios de Almeida, Chivor, Garagoa, Jenesano, Macanal, Santa María, Somondoco y Tibirita (Boyacá). **Nota:** Se reportó creciente súbita del río Teatinos a la altura del municipio de Jenesano (Boyacá) (29/07/2025).
	Meta	Cuenca del río Lengupá	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Lengupá y sus aportantes. Especial atención en los municipios de Santa María, Rondón, Zetaquirá, Campohermoso y San Luis de Gaceno (Boyacá).
	Meta	Cuenca del río Upía	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Upía y sus afluentes. Se recomienda especial atención en los municipios de San Luis de Gaceno (Boyacá); Sabanalarga, Villanueva (Casanare); Barranca de Upía y Cabuyaro (Meta).
	Meta	Cuenca del río Túa	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Túa y sus afluentes especialmente el caño Arietes, se recomienda especial atención sobre los municipios de Monterrey, Tauramena y Villanueva (Casanare).

Área Hidrográfica del Orinoco

Actualización: 07 de agosto de 2025 18:00 HLC

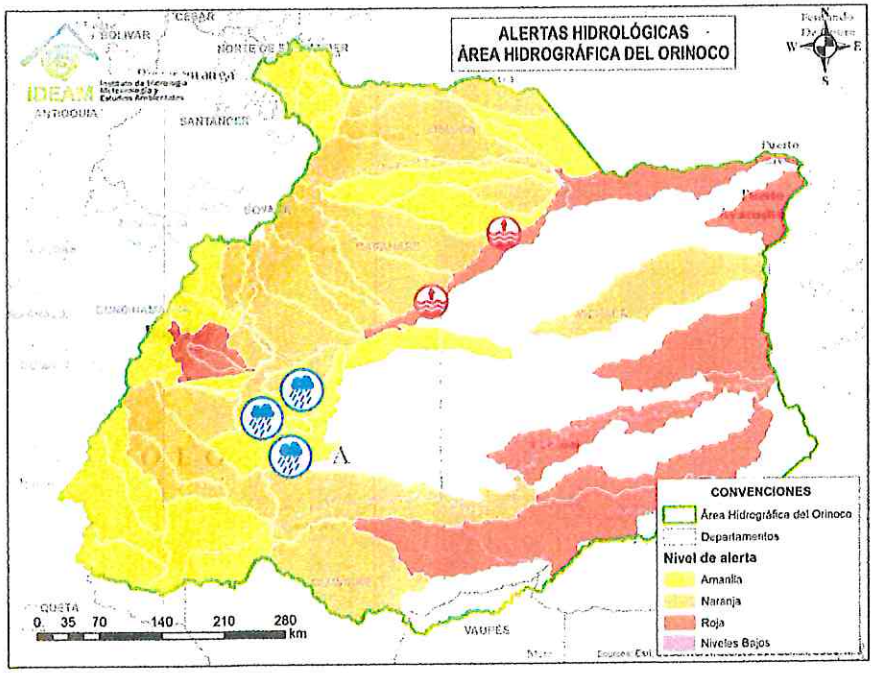

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Meta	Cuenca del río Manacacías	Niveles altos del río Manacacías, aportante a la cuenca alta del río Meta. Especial atención en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
⚠	Meta	Cuenca del caño Cumaral	Probabilidad de incrementos súbitos en las cuencas de los ríos caño Cumaral y sus afluentes, especial atención en el municipio de San Martín (Meta) .
⚠	Meta	Cuenca del río Melúa	Probabilidad de incrementos súbitos en las cuencas de los ríos Melúa y sus afluentes, especial atención en el municipio de San Martín (Meta) .
⚠	Meta	Cuenca del río Yucao	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Yucao. Especial atención en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
⚠	Vichada	Cuenca río Muco	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Muco y sus afluentes, especial atención en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).

CONDICIONES HIDROMETEOROLÓGICAS ACTUALES

IDEAM comunica al Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) y al Sistema Nacional Ambiental (SINA).

Bogotá D.C., 04 de agosto de 2025
Hora de actualización 06:00 HLC

Boletín No.

0590

CONTENIDO

- Condiciones Meteorológicas.
- Pronóstico de precipitación para las próximas seis (6) horas.
- Alertas Hidrológicas.
- Seguimiento y Pronóstico de las Amenazas por Deslizamientos
- Seguimiento y Pronóstico de las Amenazas por Incendios Alertas.
- Meteomarinas vigentes Mar Caribe Colombiano.
- Meteomarinas vigentes Océano Pacífico Nacional.



PARA TOMAR ACCIÓN Advierte a los sistemas de prevención y atención de desastres sobre la amenaza que puede ocasionar un fenómeno con efectos adversos sobre la población, el cual requiere la atención inmediata por parte de la población y de los cuerpos de atención y socorro. Se emite una alerta sólo cuando la identificación de un evento extraordinario indique la probabilidad de amenaza inminente y cuando la gravedad del fenómeno implique la movilización de personas y equipos, interrumpiendo el normal desarrollo de sus actividades cotidianas.



PARA PREPARARSE Indica la presencia de un fenómeno. No implica amenaza inmediata y como tanto es catalogado como un mensaje para informarse y prepararse. El aviso implica vigilancia continua ya que las condiciones son propicias para el desarrollo de un fenómeno, sin que se requiera permanecer alerta.



PARA INFORMARSE Es un mensaje oficial por el cual se difunde información. Por lo regular se refiere a eventos observados, registrados o registrados y puede contener algunos elementos de pronóstico a manera de orientación. Por sus características pretéritas y futuras difiere del aviso y de la alerta, y por lo general no está encaminado a alertar sino a informar


CONDICIONES NORMALES La información que se suministra se encuentra dentro de los rangos normales.

Alertas vigentes hasta: 04 de agosto de 2025 12:00 HLC

www.ideam.gov.co

Área Hidrográfica del Orinoco


Actualización: 04 de agosto de 2025 06:00 HLC

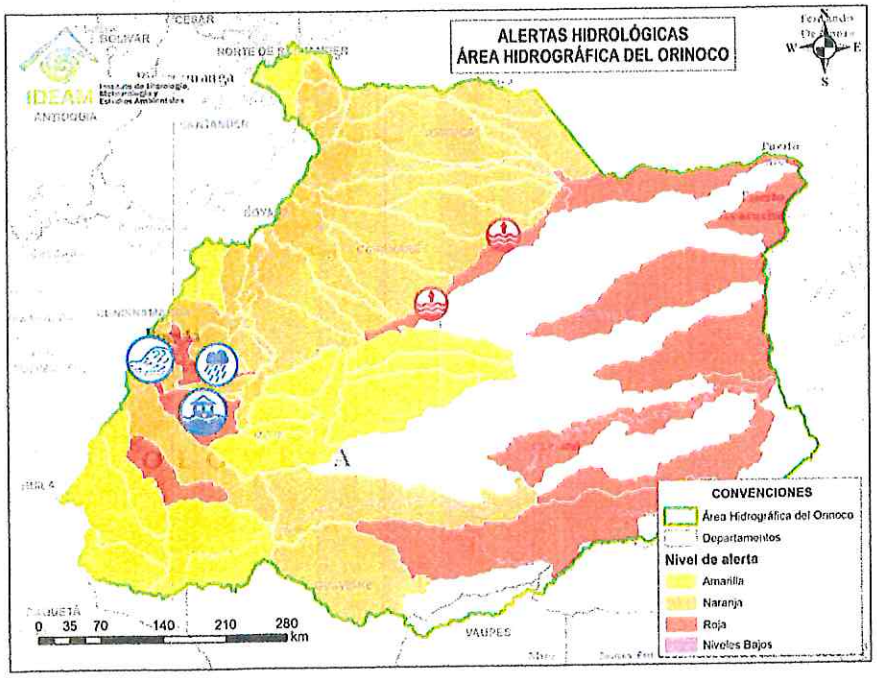

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Meta	Cuencas de los ríos Metica, Guamal y Humadea	Probabilidad de crecientes súbitas en las cuencas de los ríos Metica, Guamal y Humadea y sus afluentes, aportantes a la cuenca alta del río Meta. Se recomienda prestar atención a los municipios de Castilla la Nueva, Guamal y Acacías del departamento de Meta. **Nota**: Creciente súbita del río Guamal, generando afectaciones en la vereda La Isla del municipio de Guamal (03/08/2025).
	Meta	Cuenca río Guayuriba	Crecientes súbitas en el río Guayuriba y sus afluentes, especialmente en la quebrada Blanca, quebrada Las Jotas y en el río Negro a la altura de Quetame, Gutierrez y Guayabetal (Cundinamarca). Se recomienda especial atención en los municipios de Une, Fómeque, Gutierrez y Guayabetal (Cundinamarca), Villavicencio, Acacias, San Carlos de Guaroa y Puerto López (Meta).
	Meta	Cuenca del río Guatiquía	Probabilidad de creciente súbita en el río Guatiquía y sus afluentes, especialmente los caños Maizaro, Grande, quebrada Salina y el río Ocoa. Se recomienda especial atención a la altura de Restrepo, Villavicencio y el municipio El Calvario (Meta).
	Meta	Cuenca del río Guacavía	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Guacavía y sus afluentes, se recomienda especial atención a la altura del municipio Cumaral (Meta).
	Meta	Cuenca del río Negro	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Negro y sus afluentes, se recomienda especial atención en Villavicencio (Meta).

Área Hidrográfica del Orinoco

Actualización: 04 de agosto de 2025 06:00 HLC

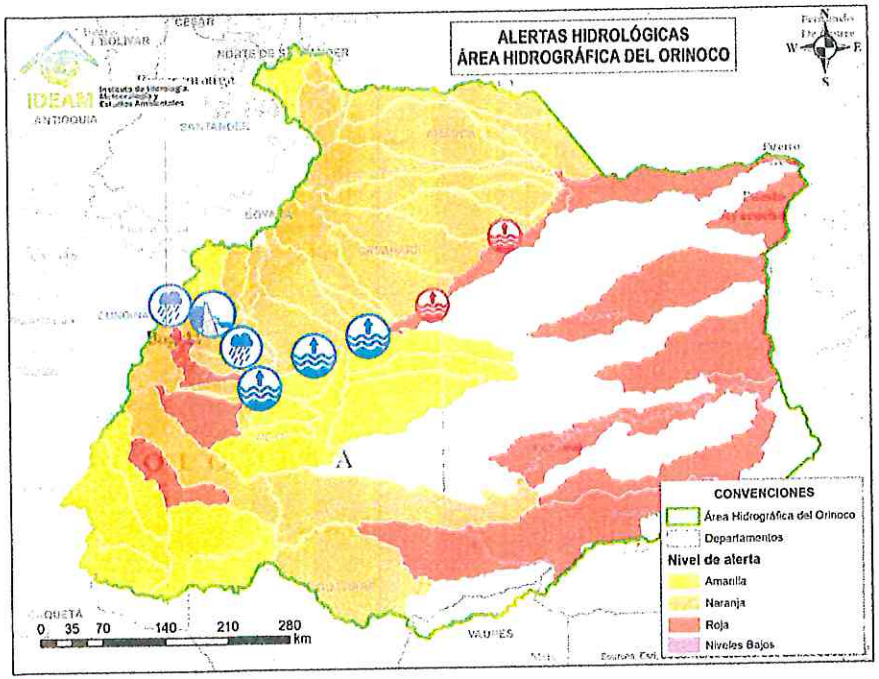

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Meta	Cuenca río Humea	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Humea y sus afluentes, especialmente el río San Juanito. Especial atención en los municipios de Paratebueno y Medina (Cundinamarca).
⚠	Meta	Directos al Meta entre ríos Guayuriba y Yucao	Niveles altos del río Meta entre los municipios de Puerto López (Meta) y Orocué (Casanare). Se recomienda especial atención a las comunidades ribereñas localizadas en su recorrido por los municipios de Puerto López, Cabuyaro (Meta), Villanueva, Tauramena y Orocué (Casanare).
⚠	Meta	Directos al río Meta entre los ríos Guatiquía y Upía	Probabilidad de crecientes súbitas de los tributarios al río Meta entre los ríos Guatiquía y Upía. Especial atención a la altura de los municipios de Paratebueno, Barranca de Upía y Cabuyaro.
⚠	Meta	Cuenca del río Guavio	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Guavio y sus afluentes, especialmente el río Sueva y Chivor. Especial atención en el municipio de Gachetá (Cundinamarca).

CONDICIONES HIDROMETEOROLÓGICAS ACTUALES

IDEAM comunica al Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) y al Sistema Nacional Ambiental (SINA).

Bogotá D.C., 01 de agosto de 2025
Hora de actualización 00:00 HLC

Boletín No.

0580

CONTENIDO

- Condiciones Meteorológicas.
- Pronóstico de precipitación para las próximas seis (6) horas.
- Alertas Hidrológicas.
- Seguimiento y Pronóstico de las Amenazas por Deslizamientos
- Seguimiento y Pronóstico de las Amenazas por Incendios Alertas.
- Meteomarinas vigentes Mar Caribe Colombiano.
- Meteomarinas vigentes Océano Pacífico Nacional.



PARA TOMAR ACCIÓN Advierte a los sistemas de prevención y atención de desastres sobre la amenaza que puede ocasionar un fenómeno con efectos adversos sobre la población, el cual requiere la atención inmediata por parte de la población y de los cuerpos de atención y socorro. Se emite una alerta sólo cuando la identificación de un evento extraordinario indique la probabilidad de amenaza inminente y cuando la gravedad del fenómeno implique la movilización de personas y equipos, interrumpiendo el normal desarrollo de sus actividades cotidianas.



PARA PREPARARSE Indica la presencia de un fenómeno. No implica amenaza inmediata y como tanto es catalogado como un mensaje para informarse y prepararse. El aviso implica vigilancia continua ya que las condiciones son propicias para el desarrollo de un fenómeno, sin que se requiera permanecer alerta.



PARA INFORMARSE Es un mensaje oficial por el cual se difunde información. Por lo regular se refiere a eventos observados, registrados o registrados y puede contener algunos elementos de pronóstico a manera de orientación. Por sus características pretéritas y futuras difiere del aviso y de la alerta, y por lo general no está encaminado a alertar sino a informar


CONDICIONES NORMALES La información que se suministra se encuentra dentro de los rangos normales.

Alertas vigentes hasta: 01 de agosto de 2025 06:00 HLC

www.ideam.gov.co

Área Hidrográfica del Orinoco


Actualización: 01 de agosto de 2025 00:00 HLC

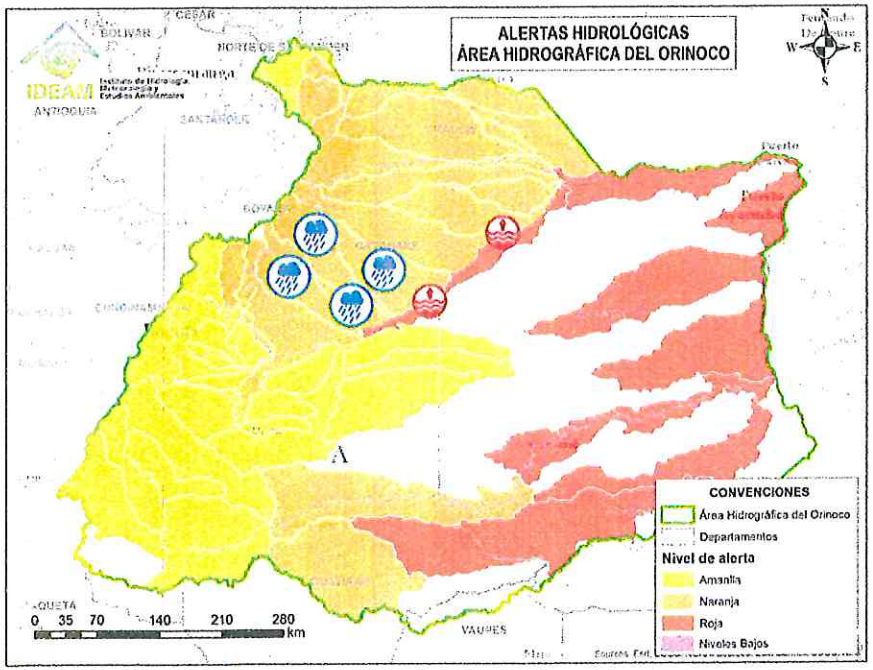

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Meta	Cuenca del río Cusiana	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Cusiana y sus tributarios, especialmente el río Unete y el río Charte. Se recomienda especial atención en los municipios de Pajarito y Aquitania (Boyacá), Tauramena, Recetor, Aguazul y Maní (Casanare). **Nota**: Se reportó creciente súbita del río Charte, en el sector San Rafael de Morichal, en el municipio de Yopal (Casanare) (29/07/2025).
⚠	Meta	Directos al Meta entre Cusiana y Cravo Sur	Probabilidad de crecientes súbitas en los ríos afluentes al río Meta en el sector comprendido entre los ríos Cusiana y Cravo Sur.
⚠	Meta	Cuenca del río Cravo Sur	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Cravo Sur y sus afluentes. Especial atención en los municipios de Labranzagrande (Boyacá), Yopal, Nunchía y Orocué (Casanare).
⚠	Meta	Caño Guanápalo	Probabilidad de crecientes súbitas en el caño Guanápalo. Especial atención a la altura de los municipios de Nunchía, San Luis de Palenque y Orocué (Casanare).

Área Hidrográfica del Orinoco

Actualización: 01 de agosto de 2025 00:00 HLC

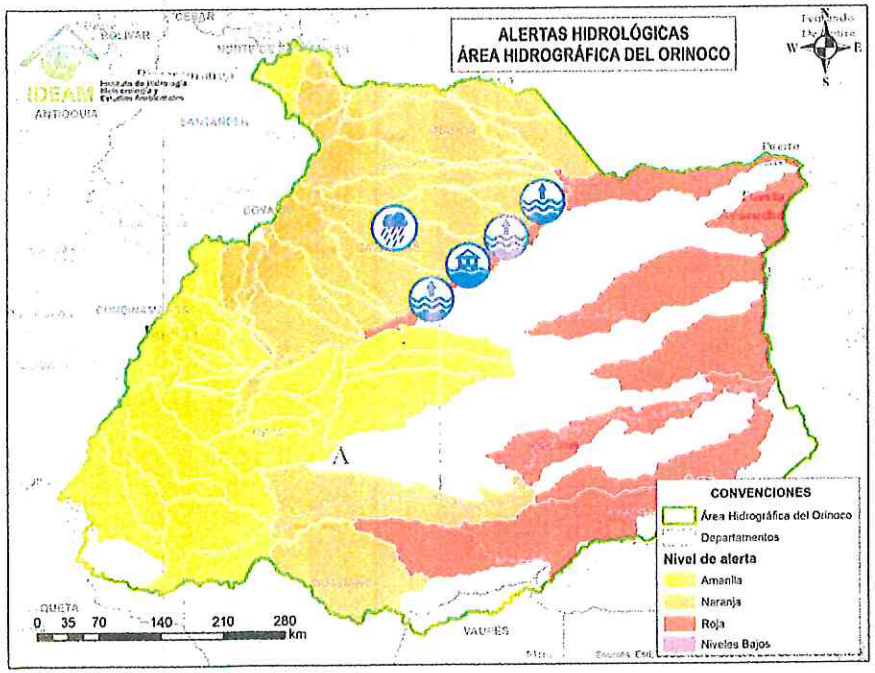

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Meta	Cuenca del río Pauto	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Pauto y sus aportantes, como Quebrada Cañaverales, Quebrada El Oso y el río Pore. Igual condición, se espera en el río Guachiría y sus aportantes. Especial atención en los municipios de Chita, Pisba, Socotá (Boyacá), Támara, Pore, San Luis de Palenque y Trinidad (Casanare).
	Meta	Directos al río Meta entre ríos Cusiana y Casanare	Niveles altos en la parte media del río Meta, entre los municipios de Orocué hasta Paz de Ariporo (Casanare). Se recomienda especial atención en los municipios de Santa Rosalía, Paz de Ariporo (Casanare) y La Primavera (Vichada). **Notas: 1)** Se reportaron inundaciones en zona urbana y rural del municipio de Santa Rosalía (Vichada) (22/06/2025). **2)** Se reportaron inundaciones en zona Urbana y Rural del municipio de La Primavera (Vichada) (22/06/2025). **3)** Inundación en la vereda Caracaro del municipio de Orocué - Casanare por desbordamiento del río Meta (14-21/05/2025). **4)** Inundación afectando varias viviendas de la cabecera municipal y zona rural del municipio de Santa Rosalía – Vichada (06/06/2025). **5)** Inundación por el río Meta en las veredas El Carrao, Vuelta Mala y Puerto Esperanza del municipio La Primavera, Vichada (06/06/2025).

CONDICIONES HIDROMETEOROLÓGICAS ACTUALES

IDEAM comunica al Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) y al Sistema Nacional Ambiental (SINA).

Bogotá D.C., 25 de julio de 2025
Hora de actualización 06:00 HLC

Boletín No.

0560

CONTENIDO

- Condiciones Meteorológicas.
- Pronóstico de precipitación para las próximas seis (6) horas.
- Alertas Hidrológicas.
- Seguimiento y Pronóstico de las Amenazas por Deslizamientos
- Seguimiento y Pronóstico de las Amenazas por Incendios Alertas.
- Meteomarinas vigentes Mar Caribe Colombiano.
- Meteomarinas vigentes Océano Pacífico Nacional.

Alerta ROJA

PARA TOMAR ACCIÓN Advierte a los sistemas de prevención y atención de desastres sobre la amenaza que puede ocasionar un fenómeno con efectos adversos sobre la población, el cual requiere la atención inmediata por parte de la población y de los cuerpos de atención y socorro. Se emite una alerta sólo cuando la identificación de un evento extraordinario indique la probabilidad de amenaza inminente y cuando la gravedad del fenómeno implique la movilización de personas y equipos, interrumpiendo el normal desarrollo de sus actividades cotidianas.

Alerta NARANJA

PARA PREPARARSE Indica la presencia de un fenómeno. No implica amenaza inmediata y como tanto es catalogado como un mensaje para informarse y prepararse. El aviso implica vigilancia continua ya que las condiciones son propicias para el desarrollo de un fenómeno, sin que se requiera permanecer alerta.

Alerta AMARILLA

PARA INFORMARSE Es un mensaje oficial por el cual se difunde información. Por lo regular se refiere a eventos observados, registrados o registrados y puede contener algunos elementos de pronóstico a manera de orientación. Por sus características pretéritas y futuras difiere del aviso y de la alerta, y por lo general no está encaminado a alertar sino a informar


CONDICIONES NORMALES La información que se suministra se encuentra dentro de los rangos normales.

Alertas vigentes hasta: 25 de julio de 2025 12:00 HLC

www.ideam.gov.co

Área Hidrográfica del Orinoco


Actualización: 25 de julio de 2025 06:00 HLC

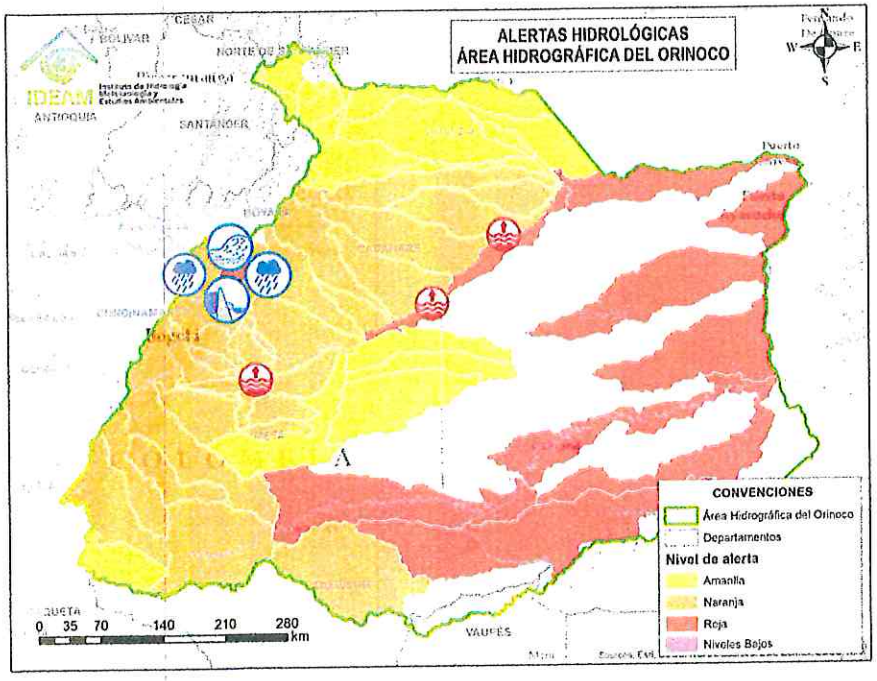

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Meta	Cuenca del río Garagoa	Probabilidad de creciente súbita en la cuenca del río Garagoa y sus afluentes, especialmente el río Bata y Macheta. Especial atención en los municipios de Chivor, Macanal, Tiribata, Somondoco, Garagoa, Almeida y Santa María (Boyacá). **Notas: 1)** CDGRD Boyacá informa creciente súbita afectando la ruta vial entre Macanal y Santa María (14/07/2025) **2)** Se reportó rebose controlado en la central Hidroeléctrica de Chivor (14/07/2025). **3)** el operador de La Central Hidroeléctrica de Chivor mantiene una alerta amarilla (24/07/2025).
	Meta	Cuenca del río Lengupá	Crecientes súbitas en el río Lengupá y sus aportantes. Especial atención en los municipios de Santa María, Rondón, Zetaquirá, Campohermoso y San Luis de Gaceno (Boyacá). **Notas: 1)** CORPOCHIVOR reporta remoción en masa, a la altura de la vereda Planadas del municipio de Santa María generando represamiento del rio Lengupá, se observan incrementos de niveles aguas arriba hacia ribera del rio Tunjita y Lengupá y riesgo de avenida torrencial aguas abajo ribera área Santa María y San Luis De Gaceno. Se mantiene llamado a la comunidad ribereña estar atentos a las alertas actuales por precipitaciones y crecientes súbitas en la cuenca (27/06/2025). **2)** CORPOCHIVOR mantiene la alerta por probabilidad de avenida torrencial latente ante el represamiento del río Lengupá en el municipio de Santa María, continúa monitoreo de la situación (08/07/2025). **3)** desbordamiento de las quebradas Reventónera y La Mona del centro poblado de Santa Teresa del municipio de San Luis de Gaceno, Boyacá (20/07/2025).
	Meta	Cuenca del río Upía	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Upía y sus afluentes. Especial atención en los municipios de Sabanalarga, Villanueva (Casanare), Barranca de Upía y Cabuyaro (Meta). **Nota:** Se reporta desbordamiento del río Upía en el municipio de Villanueva – Casanare (16/07/2025).

Área Hidrográfica del Orinoco

Actualización: 25 de julio de 2025 06:00 HLC

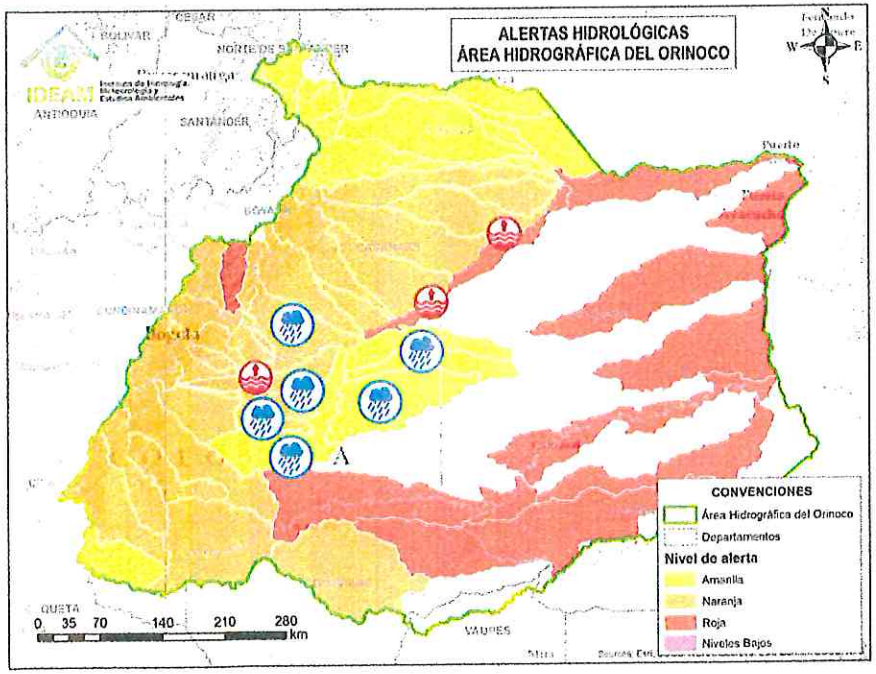

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Meta	Cuenca del río Túa	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Túa y sus afluentes especialmente el caño Arietes, se recomienda especial atención sobre los municipios de Monterrey, Tauramena y Villanueva (Casanare).
⚠	Meta	Cuenca del río Manacacías	Niveles altos del río Manacacías, aportante a la cuenca alta del río Meta. Especial atención en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
⚠	Meta	Cuenca del caño Cumaral	Probabilidad de incrementos súbitos en las cuencas de los ríos caño Cumaral y sus afluentes, especial atención en el municipio de San Martín (Meta) .
⚠	Meta	Cuenca del río Melúa	Probabilidad de incrementos súbitos en las cuencas de los ríos Melúa y sus afluentes, especial atención en el municipio de San Martín (Meta) .
⚠	Meta	Cuenca del río Yucao	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Yucao. Especial atención en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
⚠	Vichada	Cuenca alto río Vichada	Probabilidad de crecientes súbitas en la parte alta del río Vichada y sus afluentes, especial atención en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
⚠	Vichada	Cuenca río Guarrojo	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Guarrojo y sus afluentes, especial atención en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
⚠	Vichada	Cuenca río Muco	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Muco y sus afluentes, especial atención en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).

CONDICIONES HIDROMETEOROLÓGICAS ACTUALES

IDEAM

IDEAM comunica al Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) y al Sistema Nacional Ambiental (SINA).

Bogotá D.C., 22 de julio de 2025
Hora de actualización 00:00 HLC

Boletín No.

0550

CONTENIDO

- Condiciones Meteorológicas.
- Pronóstico de precipitación para las próximas seis (6) horas.
- Alertas Hidrológicas.
- Seguimiento y Pronóstico de las Amenazas por Deslizamientos
- Seguimiento y Pronóstico de las Amenazas por Incendios Alertas.
- Meteomarinas vigentes Mar Caribe Colombiano.
- Meteomarinas vigentes Océano Pacífico Nacional.

Alerta ROJA

PARA TOMAR ACCIÓN Advierte a los sistemas de prevención y atención de desastres sobre la amenaza que puede ocasionar un fenómeno con efectos adversos sobre la población, el cual requiere la atención inmediata por parte de la población y de los cuerpos de atención y socorro. Se emite una alerta sólo cuando la identificación de un evento extraordinario indique la probabilidad de amenaza inminente y cuando la gravedad del fenómeno implique la movilización de personas y equipos, interrumpiendo el normal desarrollo de sus actividades cotidianas.

Alerta NARANJA

PARA PREPARARSE Indica la presencia de un fenómeno. No implica amenaza inmediata y como tanto es catalogado como un mensaje para informarse y prepararse. El aviso implica vigilancia continua ya que las condiciones son propicias para el desarrollo de un fenómeno, sin que se requiera permanecer alerta.

Alerta AMARILLA

PARA INFORMARSE Es un mensaje oficial por el cual se difunde información. Por lo regular se refiere a eventos observados, registrados o registrados y puede contener algunos elementos de pronóstico a manera de orientación. Por sus características pretéritas y futuras difiere del aviso y de la alerta, y por lo general no está encaminado a alertar sino a informar


CONDICIONES NORMALES La información que se suministra se encuentra dentro de los rangos normales.

Alertas vigentes hasta: 22 de julio de 2025 06:00 HLC

www.ideam.gov.co

Área Hidrográfica del Orinoco


Actualización: 22 de julio de 2025 00:00 HLC

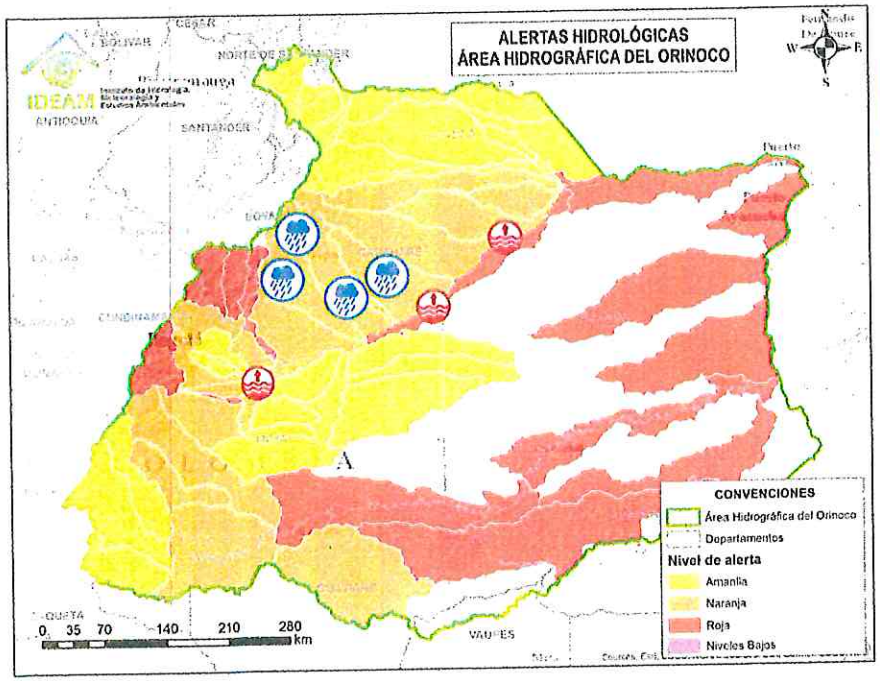

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Meta	Cuenca del río Cusiana	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Cusiana y sus tributarios, especialmente el río Unete y el río Charte. Se recomienda especial atención en los municipios de Pajarito y Aquitania (Boyacá), Tauramena, Recetor, Aguazul y Maní (Casanare).
⚠	Meta	Directos al Meta entre Cusiana y Cravo Sur	Probabilidad de crecientes súbitas en los ríos afluentes al río Meta en el sector comprendido entre los ríos Cusiana y Cravo Sur.
⚠	Meta	Cuenca del río Cravo Sur	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Cravo Sur y sus afluentes. Especial atención en los municipios de Labranzagrande (Boyacá), Yopal, Nunchía y Orocué (Casanare).
⚠	Meta	Caño Guanápalo	Probabilidad de crecientes súbitas en el caño Guanápalo. Especial atención a la altura de los municipios de Nunchía, San Luis de Palenque y Orocué (Casanare).

Área Hidrográfica del Orinoco

Actualización: 22 de julio de 2025 00:00 HLC

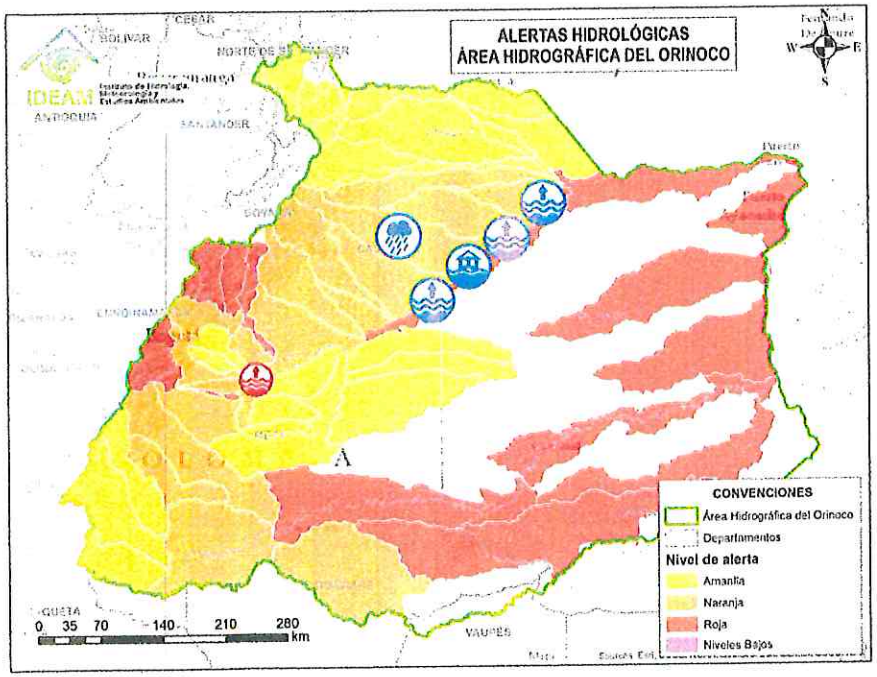

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Meta	Cuenca del río Pauto	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Pauto y sus aportantes, como Quebrada Cañaverales, Quebrada El Oso y el río Pore. Igual condición, se espera en el río Guachiría y sus aportantes. Especial atención en los municipios de Chita, Pisba, Socotá (Boyacá), Támara, Pore, San Luis de Palenque y Trinidad (Casanare).
⚠	Meta	Directos al río Meta entre ríos Cusiana y Casanare	Niveles altos en la parte media del río Meta, entre los municipios de Orocué hasta Paz de Ariporo (Casanare). Se recomienda especial atención en los municipios de Santa Rosalía, Paz de Ariporo (Casanare) y La Primavera (Vichada). **Notas: 1)** Se reportaron inundaciones en zona urbana y rural del municipio de Santa Rosalía (Vichada) (22/06/2025). **2)** Se reportaron inundaciones en zona Urbana y Rural del municipio de La Primavera (Vichada) (22/06/2025). **3)** Inundación en la vereda Caracaro del municipio de Orocué - Casanare por desbordamiento del río Meta (14-21/05/2025). **4)** Inundación afectando varias viviendas de la cabecera municipal y zona rural del municipio de Santa Rosalía – Vichada (06/06/2025). **5)** Inundación por el río Meta en las veredas El Carrao, Vuelta Mala y Puerto Esperanza del municipio La Primavera, Vichada (06/06/2025).

CONDICIONES HIDROMETEOROLÓGICAS ACTUALES

IDEAM comunica al Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) y al Sistema Nacional Ambiental (SINA).

Bogotá D.C., 18 de julio de 2025
Hora de actualización 18:00 HLC

Boletín No.

0540

CONTENIDO

- Condiciones Meteorológicas.
- Pronóstico de precipitación para las próximas seis (6) horas.
- Alertas Hidrológicas.
- Seguimiento y Pronóstico de las Amenazas por Deslizamientos
- Seguimiento y Pronóstico de las Amenazas por Incendios Alertas.
- Meteomarinas vigentes Mar Caribe Colombiano.
- Meteomarinas vigentes Océano Pacífico Nacional.

Alerta ROJA

PARA TOMAR ACCIÓN Advierte a los sistemas de prevención y atención de desastres sobre la amenaza que puede ocasionar un fenómeno con efectos adversos sobre la población, el cual requiere la atención inmediata por parte de la población y de los cuerpos de atención y socorro. Se emite una alerta sólo cuando la identificación de un evento extraordinario indique la probabilidad de amenaza inminente y cuando la gravedad del fenómeno implique la movilización de personas y equipos, interrumpiendo el normal desarrollo de sus actividades cotidianas.

Alerta NARANJA

PARA PREPARARSE Indica la presencia de un fenómeno. No implica amenaza inmediata y como tanto es catalogado como un mensaje para informarse y prepararse. El aviso implica vigilancia continua ya que las condiciones son propicias para el desarrollo de un fenómeno, sin que se requiera permanecer alerta.

Alerta AMARILLA

PARA INFORMARSE Es un mensaje oficial por el cual se difunde información. Por lo regular se refiere a eventos observados, registrados o registrados y puede contener algunos elementos de pronóstico a manera de orientación. Por sus características pretéritas y futuras difiere del aviso y de la alerta, y por lo general no está encaminado a alertar sino a informar


CONDICIONES NORMALES La información que se suministra se encuentra dentro de los rangos normales.

Alertas vigentes hasta: 19 de julio de 2025 00:00 HLC

www.ideam.gov.co

Área Hidrográfica del Orinoco


Actualización: 18 de julio de 2025 18:00 HLC

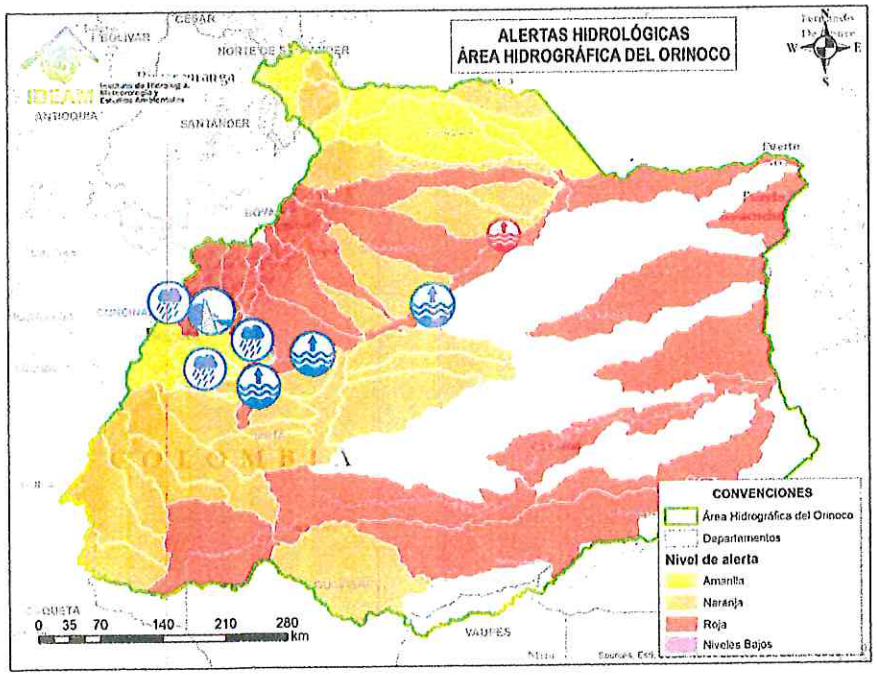

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Meta	Cuenca del río Guacavía	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Guacavía y sus afluentes, se recomienda especial atención a la altura del municipio Cumaral (Meta).
⚠	Meta	Cuenca del río Negro	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Negro y sus afluentes, se recomienda especial atención en Villavicencio (Meta).
⚠	Meta	Cuenca río Humea	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Humea y sus afluentes, especialmente el río San Juanito. Especial atención en los municipios de Paratebueno y Medina (Cundinamarca).
⚠	Meta	Directos al Meta entre ríos Guayuriba y Yucao	Niveles altos del río Meta entre los municipios de Puerto López (Meta) y Orocué (Casanare). Se recomienda especial atención a las comunidades ribereñas localizadas en su recorrido por los municipios de Puerto López, Cabuyaro (Meta), Villanueva, Tauramena y Orocué (Casanare).
⚠	Meta	Directos al río Meta entre los ríos Guatiquía y Upía	Probabilidad de crecientes súbitas de los tributarios al río Meta entre los ríos Guatiquía y Upía. Especial atención a la altura de los municipios de Paratebueno, Barranca de Upía y Cabuyaro.
⚠	Meta	Cuenca del río Guavio	ENEL, informa que debido a la temporada invernal que se presenta en la zona de la cuenca del embalse El Guavio, se tiene previsto realizar descargas controladas de agua durante los meses de julio y agosto de 2025. Enel recomienda a las comunidades y a los habitantes de las zonas ribereñas de los ríos Guavio y Upía, localizados aguas abajo del embalse El Guavio, estar atentos a las recomendaciones de seguridad emitidas por parte de la compañía (18/07/2025).
⚠	Meta	Cuenca del río Guavio	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Guavio y sus afluentes, especialmente el río Sueva y Chivor. Especial atención en el municipio de Gachetá (Cundinamarca).

Área Hidrográfica del Orinoco

Actualización: 18 de julio de 2025 18:00 HLC

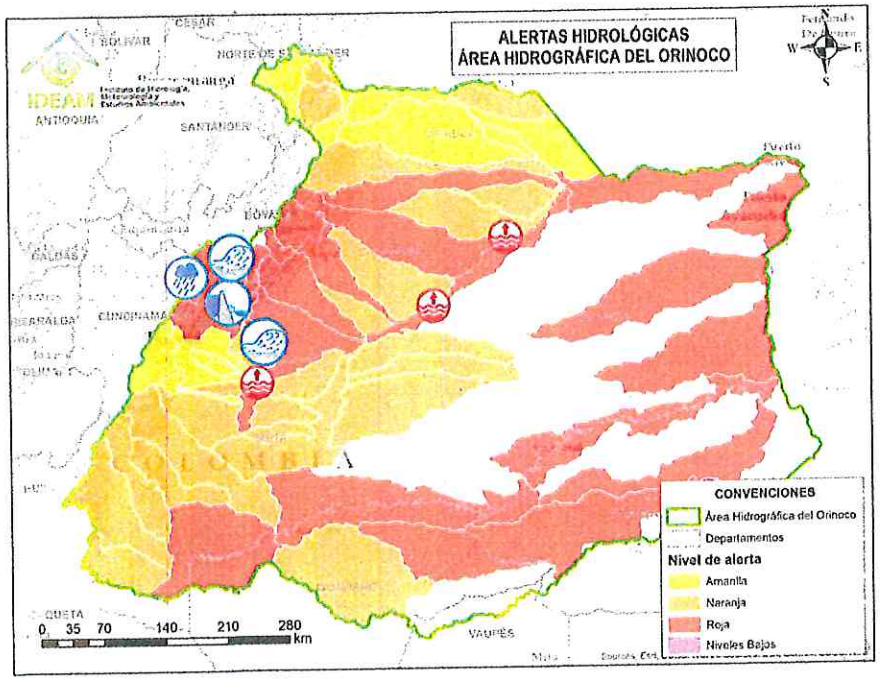

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Meta	Cuenca del río Garagoa	Probabilidad de creciente súbita en la cuenca del río Garagoa y sus afluentes, especialmente el río Bata y Macheta. Especial atención en los municipios de Chivor, Macanal, Tiribata, Somondoco, Garagoa, Almeida y Santa María (Boyacá). **Notas: 1)** CDGRD Boyacá informa creciente súbita afectando la ruta vial entre Macanal y Santa María (14/07/2025) **2)** Se reportó rebose controlado en la central Hidroeléctrica de Chivor (14/07/2025).
⚠	Meta	Cuenca del río Lengupá	Crecientes súbitas en el río Lengupá y sus aportantes. Especial atención en los municipios de Santa María, Rondón, Zetaquirá, Campohermoso y San Luis de Gaceno (Boyacá). **Nota: 1)** CORPOCHIVOR reporta remoción en masa, a la altura de la vereda Planadas del municipio de Santa María generando represamiento del rio Lengupá, se observan incrementos de niveles aguas arriba hacia ribera del rio Tunjita y Lengupá y riesgo de avenida torrencial aguas abajo ribera área Santa María y San Luis De Gaceno. Se mantiene llamado a la comunidad ribereña estar atentos a las alertas actuales por precipitaciones y crecientes súbitas en la cuenca (27/06/2025). **2)** CORPOCHIVOR mantiene la alerta por probabilidad de avenida torrencial latente ante el represamiento del río Lengupá en el municipio de Santa María, continúa monitoreo de la situación (08/07/2025).
⚠	Meta	Cuenca del río Upía	Crecientes súbitas en el río Upía y sus afluentes. Especial atención en los municipios de Sabanalarga, Villanueva (Casanare), Barranca de Upía y Cabuyaro (Meta). **Nota:** Se reporta desbordamiento del río Upía en el municipio de Villanueva – Casanare (16/07/2025).

CONDICIONES HIDROMETEOROLÓGICAS ACTUALES

IDEAM comunica al Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) y al Sistema Nacional Ambiental (SINA).

Bogotá D.C., 16 de julio de 2025
Hora de actualización 00:00 HLC

Boletín No.

0532

CONTENIDO

- Condiciones Meteorológicas.
- Pronóstico de precipitación para las próximas seis (6) horas.
- Alertas Hidrológicas.
- Seguimiento y Pronóstico de las Amenazas por Deslizamientos
- Seguimiento y Pronóstico de las Amenazas por Incendios Alertas.
- Meteomarinas vigentes Mar Caribe Colombiano.
- Meteomarinas vigentes Océano Pacífico Nacional.

Alerta ROJA

PARA TOMAR ACCIÓN Advierte a los sistemas de prevención y atención de desastres sobre la amenaza que puede ocasionar un fenómeno con efectos adversos sobre la población, el cual requiere la atención inmediata por parte de la población y de los cuerpos de atención y socorro. Se emite una alerta sólo cuando la identificación de un evento extraordinario indique la probabilidad de amenaza inminente y cuando la gravedad del fenómeno implique la movilización de personas y equipos, interrumpiendo el normal desarrollo de sus actividades cotidianas.

Alerta NARANJA

PARA PREPARARSE Indica la presencia de un fenómeno. No implica amenaza inmediata y como tanto es catalogado como un mensaje para informarse y prepararse. El aviso implica vigilancia continua ya que las condiciones son propicias para el desarrollo de un fenómeno, sin que se requiera permanecer alerta.

Alerta AMARILLA

PARA INFORMARSE Es un mensaje oficial por el cual se difunde información. Por lo regular se refiere a eventos observados, registrados o registrados y puede contener algunos elementos de pronóstico a manera de orientación. Por sus características pretéritas y futuras difiere del aviso y de la alerta, y por lo general no está encaminado a alertar sino a informar


CONDICIONES NORMALES La información que se suministra se encuentra dentro de los rangos normales.

Alertas vigentes hasta: 16 de julio de 2025 06:00 HLC

www.ideam.gov.co

Área Hidrográfica del Orinoco


Actualización: 16 de julio de 2025 00:00 HLC

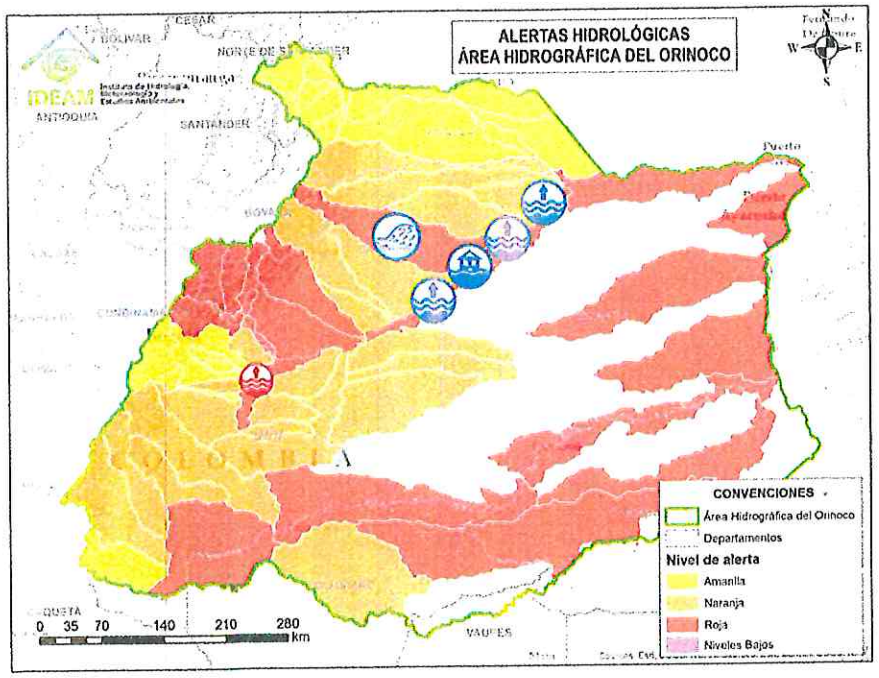

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Meta	Cuenca del río Pauto	Crecientes súbitas en la cuenca del río Pauto y sus aportantes, como Quebrada Cañaverales, Quebrada El Oso y el río Pore. Igual condición, se espera en el río Guachiría y sus aportantes. Especial atención en los municipios de Chita, Pisba, Socotá (Boyacá), Támara, Pore, San Luis de Palenque y Trinidad (Casanare).
⚠	Meta	Directos al río Meta entre ríos Cusiana y Casanare	Niveles altos en la parte media del río Meta, entre los municipios de Orocué hasta Paz de Ariporo (Casanare). Se recomienda especial atención en los municipios de Santa Rosalía, Paz de Ariporo (Casanare) y La Primavera (Vichada). **Notas: 1)** Se reportaron inundaciones en zona urbana y rural del municipio de Santa Rosalía (Vichada) (22/06/2025). **2)** Se reportaron inundaciones en zona Urbana y Rural del municipio de La Primavera (Vichada) (22/06/2025). **3)** Inundación en la vereda Caracaro del municipio de Orocué - Casanare por desbordamiento del río Meta (14-21/05/2025). **4)** Inundación afectando varias viviendas de la cabecera municipal y zona rural del municipio de Santa Rosalía – Vichada (06/06/2025). **5)** Inundación por el río Meta en las veredas El Carrao, Vuelta Mala y Puerto Esperanza del municipio La Primavera, Vichada (06/06/2025).

Área Hidrográfica del Orinoco

Actualización: 16 de julio de 2025 00:00 HLC

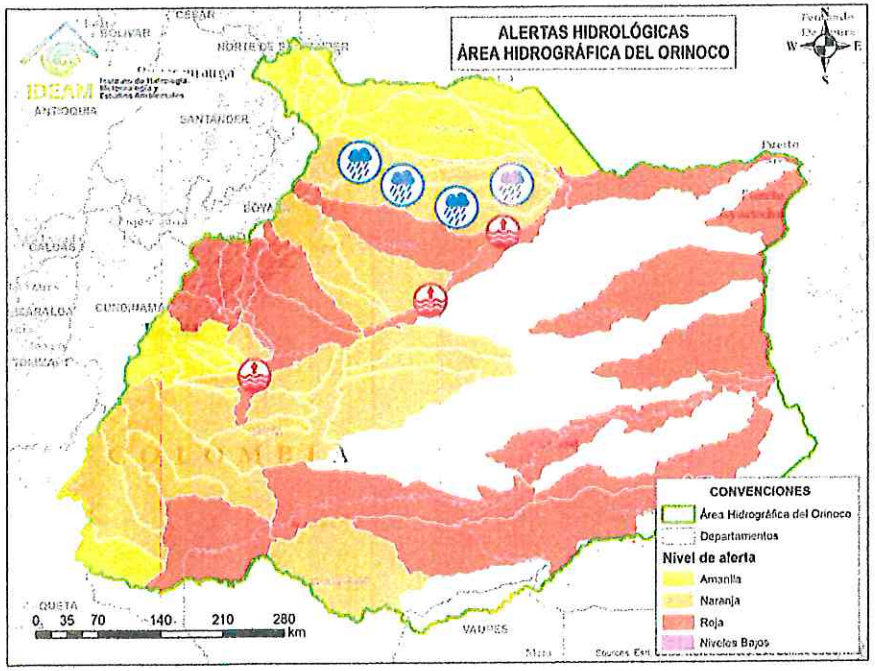

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Meta	Directos al río Meta entre ríos Pauto y Agua Clara (mi)	Probabilidad de crecientes súbitas en los ríos directos al río Meta entre ríos Pauto y Agua Clara (mi).
⚠	Casanare	Caño Agua Clara	Probabilidad de crecientes súbitas en el caño Agua Clara y sus afluentes.
⚠	Casanare	Cuenca del río Ariporo	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Ariporo y sus aportantes, como el río Muese y caño Barrosa. Especial atención en los municipios de Paz de Ariporo y Hato Corozal.
⚠	Casanare	Cuenca del río Casanare	Probabilidad de crecientes súbitas en la parte alta del río Casanare y sus afluentes, especialmente la quebrada Las Guamas. Especial atención en los municipios de Chita (Boyacá), Hato Corozal, La Salina, Sácama (Casanare) y Tame (Arauca).

CONDICIONES HIDROMETEOROLÓGICAS ACTUALES

IDEAM comunica al Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) y al Sistema Nacional Ambiental (SINA).

Bogotá D.C., 14 de julio de 2025
Hora de actualización 18:00 HLC

Boletín No.

0528

CONTENIDO

- Condiciones Meteorológicas.
- Pronóstico de precipitación para las próximas seis (6) horas.
- Alertas Hidrológicas.
- Seguimiento y Pronóstico de las Amenazas por Deslizamientos
- Seguimiento y Pronóstico de las Amenazas por Incendios Alertas.
- Meteomarinas vigentes Mar Caribe Colombiano.
- Meteomarinas vigentes Océano Pacífico Nacional.

Alerta ROJA

PARA TOMAR ACCIÓN Advierte a los sistemas de prevención y atención de desastres sobre la amenaza que puede ocasionar un fenómeno con efectos adversos sobre la población, el cual requiere la atención inmediata por parte de la población y de los cuerpos de atención y socorro. Se emite una alerta sólo cuando la identificación de un evento extraordinario indique la probabilidad de amenaza inminente y cuando la gravedad del fenómeno implique la movilización de personas y equipos, interrumpiendo el normal desarrollo de sus actividades cotidianas.

Alerta NARANJA

PARA PREPARARSE Indica la presencia de un fenómeno. No implica amenaza inmediata y como tanto es catalogado como un mensaje para informarse y prepararse. El aviso implica vigilancia continua ya que las condiciones son propicias para el desarrollo de un fenómeno, sin que se requiera permanecer alerta.

Alerta AMARILLA

PARA INFORMARSE Es un mensaje oficial por el cual se difunde información. Por lo regular se refiere a eventos observados, registrados o registrados y puede contener algunos elementos de pronóstico a manera de orientación. Por sus características pretéritas y futuras difiere del aviso y de la alerta, y por lo general no está encaminado a alertar sino a informar


CONDICIONES NORMALES La información que se suministra se encuentra dentro de los rangos normales.

Alertas vigentes hasta: 15 de julio de 2025 00:00 HLC

www.ideam.gov.co

Área Hidrográfica del Orinoco


Actualización: 14 de julio de 2025 18:00 HLC

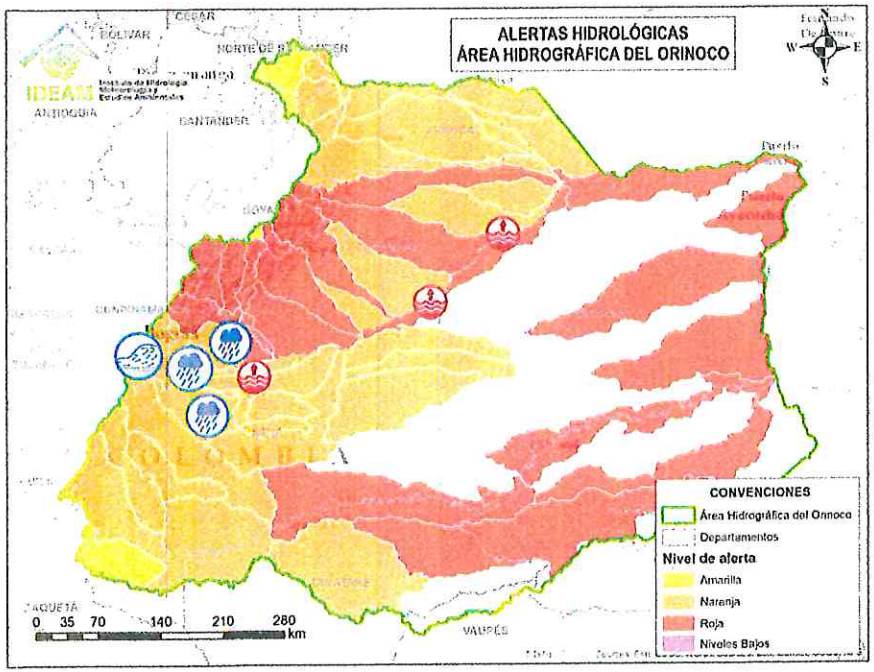

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Meta	Cuencas de los ríos Metica, Guamal y Humadea	Probabilidad de crecientes súbitas en las cuencas de los ríos Metica, Guamal y Humadea y sus afluentes, aportantes a la cuenca alta del río Meta. Se recomienda prestar atención a los municipios de Castilla la Nueva, Guamal y Acacías del departamento de Meta. **Notas: 1)** se reportó una creciente súbita del río Guamal en la vereda La Isla del municipio Guamal, Meta (01/07/2025). **2)** Se reportó creciente súbita de los ríos Humadea y Guamal, veredas El Centro, Y San Agustín, Arenales, El Turuy y San Antonio, en el municipio de Castilla La Nueva (Meta) (14/06/2025). **3)** Se reportó creciente súbita de los ríos Guamal, Humadea, Orotoy, Caño Camelias, en el municipio de Guamal (Meta) (14/06/2025). **4)** Se reportó inundaciones en los municipios de Guamal y Acacías-Meta (14/06/2025).
	Meta	Cuenca río Guayuriba	Crecientes súbitas en el río Guayuriba y sus afluentes, especialmente en la quebrada Blanca, quebrada Las Jotas y en el río Negro a la altura de Quetame, Gutierrez y Guayabetal (Cundinamarca). Se recomienda especial atención en los municipios de Une, Fómeque, Gutierrez y Guayabetal (Cundinamarca), Villavicencio, Acacias, San Carlos de Guaroa y Puerto López (Meta). **Notas: 1)** Desbordamiento de la quebrada La Envidia, generando afectaciones en el sector Abasticos del municipio de Chipaque, Cundinamarca (11/07/2025). **2)** Desbordamiento de la quebrada Puente Guara, generando afectaciones en la urbanización Hoya del Cedro del municipio de Une, Cundinamarca (11/07/2025).
	Meta	Cuenca del río Guatiquía	Creciente súbita en el río Guatiquía y sus afluentes, especialmente los caños Maizaro, Grande, quebrada Salina y el río Ocoa. Se recomienda especial atención a la altura de Restrepo, Villavicencio y el municipio El Calvario (Meta). **Notas: 1)** Rompimiento del dique en el río Guatiquia, a la altura del sector del Dique, parcelas del Progreso Quintas del Llano municipio de Villavicencio, Meta (11/07/2025). **2)** Inundaciones por el desbordamiento del río Ocoa generando afectaciones en zona rural y urbana del municipio de Villavicencio, Meta (01/07/2025).

Área Hidrográfica del Orinoco


Actualización: 14 de julio de 2025 18:00 HLC

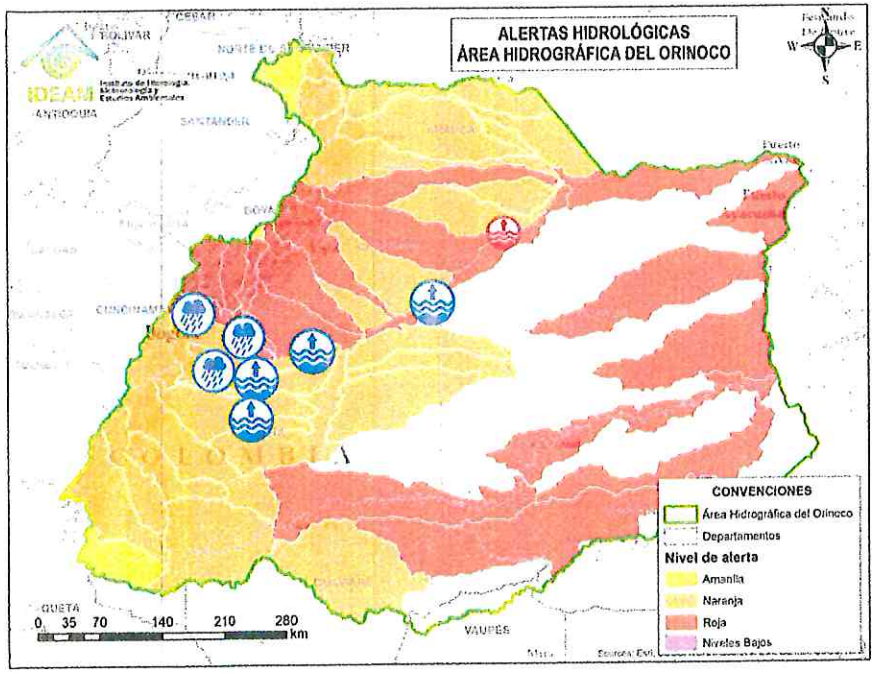

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Meta	Cuenca del río Guacavía	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Guacavía y sus afluentes, se recomienda especial atención a la altura del municipio Cumaral (Meta).
	Meta	Cuenca del río Negro	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Negro y sus afluentes, se recomienda especial atención en Villavicencio (Meta).
	Meta	Cuenca río Humea	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Humea y sus afluentes, especialmente el río San Juanito. Especial atención en los municipios de Paratebueno y Medina (Cundinamarca).
	Meta	Directos al Meta entre ríos Guayuriba y Yucao	Niveles altos del río Meta entre los municipios de Puerto López (Meta) y Orocué (Casanare). Se recomienda especial atención a las comunidades ribereñas localizadas en su recorrido por los municipios de Puerto López, Cabuyaro (Meta), Villanueva, Tauramena y Orocué (Casanare).
	Meta	Directos al río Meta entre los ríos Guatiquía y Upía	Probabilidad de crecientes súbitas de los tributarios al río Meta entre los ríos Guatiquía y Upía. Especial atención a la altura de los municipios de Paratebueno, Barranca de Upía y Cabuyaro.
	Meta	Cuenca del río Guavio	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Guavio y sus afluentes, especialmente el río Sueva y Chivor. Especial atención en el municipio de Gachetá (Cundinamarca).
	Meta	Cuenca del río Guavio	**ENEL**, informa que debido a la temporada invernal que se presenta en la zona de la cuenca del embalse El Guavio, se tiene previsto realizar descargas controladas de agua durante los meses de julio y agosto de 2025. Enel recomienda a las comunidades y a los habitantes de las zonas ribereñas de los ríos Guavio y Upía, localizados aguas abajo del embalse El Guavio, estar atentos a las recomendaciones de seguridad emitidas por parte de la compañía.

Área Hidrográfica del Orinoco

Actualización: 14 de julio de 2025 18:00 HLC

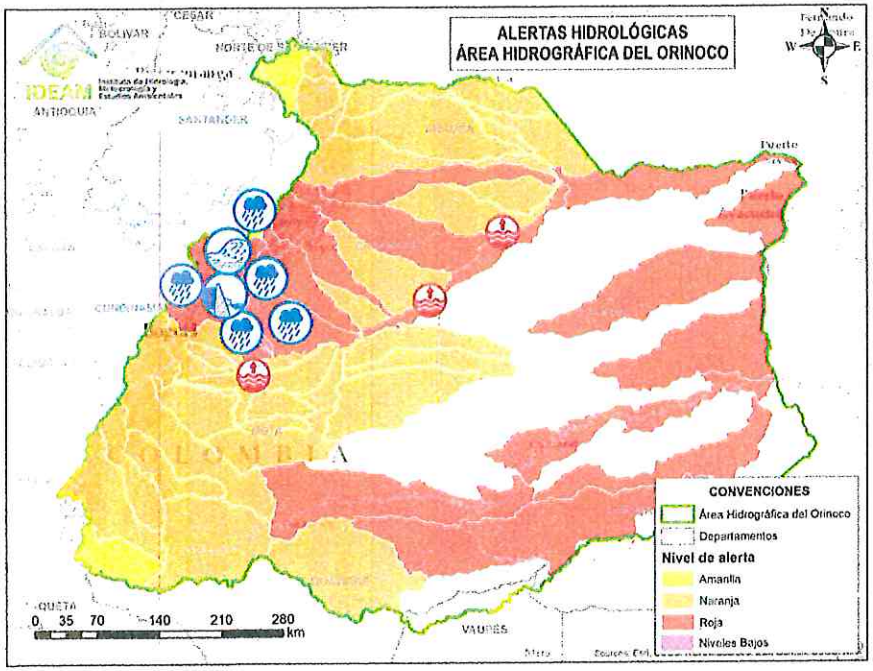

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Meta	Cuenca del río Garagoa	Probabilidad de creciente súbita en la cuenca del río Garagoa y sus afluentes, especialmente el río Bata y Macheta. Especial atención en los municipios de Chivor, Macanal, Tiribata, Somondoco, Garagoa, Almeida y Santa María (Boyacá).
	Meta	Cuenca del río Lengupá	Crecientes súbitas en el río Lengupá y sus aportantes. Especial atención en los municipios de Santa María, Rondón, Zetaquirá, Campohermoso y San Luis de Gaceno (Boyacá). **Nota: 1)** CORPOCHIVOR reporta remoción en masa, a la altura de la vereda Planadas del municipio de Santa María generando represamiento del rio Lengupá, se observan incrementos de niveles aguas arriba hacia ribera del rio Tunjita y Lengupá y riesgo de avenida torrencial aguas abajo ribera área Santa María y San Luis De Gaceno. Se mantiene llamado a la comunidad ribereña estar atentos a las alertas actuales por precipitaciones y crecientes súbitas en la cuenca (27/06/2025). **2)** CORPOCHIVOR mantiene la alerta por probabilidad de avenida torrencial latente ante el represamiento del río Lengupá en el municipio de Santa María, continúa monitoreo de la situación (08/07/2025).
	Meta	Cuenca del río Upía	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Upía y sus afluentes. Especial atención en los municipios de Sabanalarga, Villanueva (Casanare), Barranca de Upía y Cabuyaro (Meta).
	Meta	Lago de Tota	Probabilidad de crecientes súbitas en los ríos aportantes al Lago de Tota, especial atención en los municipios de Aquitania y Cuitiva (Boyacá).
	Meta	Cuenca del río Túa	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Túa y sus afluentes especialmente el caño Arietes, se recomienda especial atención sobre los municipios de Monterrey, Tauramena y Villanueva (Casanare).

CONDICIONES HIDROMETEOROLÓGICAS ACTUALES

IDEAM comunica al Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) y al Sistema Nacional Ambiental (SINA).

Bogotá D.C., 10 de julio de 2025
Hora de actualización 00:00 HLC

Boletín No.

514

CONTENIDO

- Condiciones Meteorológicas.
- Pronóstico de precipitación para las próximas seis (6) horas.
- Alertas Hidrológicas.
- Seguimiento y Pronóstico de las Amenazas por Deslizamientos
- Seguimiento y Pronóstico de las Amenazas por Incendios Alertas.
- Meteomarinas vigentes Mar Caribe Colombiano.
- Meteomarinas vigentes Océano Pacífico Nacional.

Alerta ROJA

PARA TOMAR ACCIÓN Advierte a los sistemas de prevención y atención de desastres sobre la amenaza que puede ocasionar un fenómeno con efectos adversos sobre la población, el cual requiere la atención inmediata por parte de la población y de los cuerpos de atención y socorro. Se emite una alerta sólo cuando la identificación de un evento extraordinario indique la probabilidad de amenaza inminente y cuando la gravedad del fenómeno implique la movilización de personas y equipos, interrumpiendo el normal desarrollo de sus actividades cotidianas.

Alerta NARANJA

PARA PREPARARSE Indica la presencia de un fenómeno. No implica amenaza inmediata y como tanto es catalogado como un mensaje para informarse y prepararse. El aviso implica vigilancia continua ya que las condiciones son propicias para el desarrollo de un fenómeno, sin que se requiera permanecer alerta.

Alerta AMARILLA

PARA INFORMARSE Es un mensaje oficial por el cual se difunde información. Por lo regular se refiere a eventos observados, registrados o registrados y puede contener algunos elementos de pronóstico a manera de orientación. Por sus características pretéritas y futuras difiere del aviso y de la alerta, y por lo general no está encaminado a alertar sino a informar


CONDICIONES NORMALES La información que se suministra se encuentra dentro de los rangos normales.

Alertas vigentes hasta: 10 de julio de 2025 06:00 HLC

www.ideam.gov.co

Área Hidrográfica del Orinoco


Actualización: 10 de julio de 2025 00:00 HLC

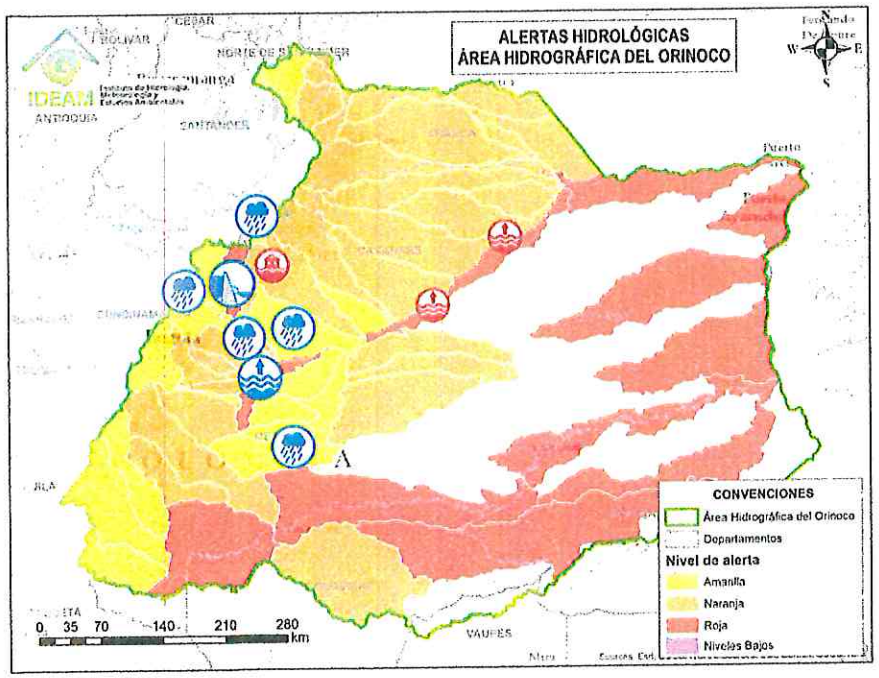

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Meta	Cuenca del río Garagoa	Probabilidad de creciente súbita en la cuenca del río Garagoa y sus afluentes, especialmente el río Bata y Macheta. Especial atención en los municipios de Chivor, Macanal, Tiribata, Somondoco, Garagoa, Almeida y Santa María (Boyacá).
	Meta	Cuenca del río Lengupá	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Lengupá y sus aportantes. Especial atención en los municipios de Santa María, Rondón, Zetáquirá, Campohermoso y San Luis de Gaceno (Boyacá). **Nota:** CORPOCHIVOR reporta remoción en masa, a la altura de la vereda Planadas del municipio de Santa María generando represamiento del rio Lengupá, se observan incrementos de niveles aguas arriba hacia ribera del rio Tunjita y Lengupá y riesgo de avenida torrencial aguas abajo ribera área Santa María y San Luis De Gaceno. Se mantiene llamado a la comunidad ribereña estar atentos a las alertas actuales por precipitaciones y crecientes súbitas en la cuenca (27/06/2025).
	Meta	Cuenca del río Upía	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Upía y sus afluentes. Especial atención en los municipios de Sabanalarga, Villanueva (Casanare), Barranca de Upía y Cabuyaro (Meta).
	Meta	Lago de Tota	Probabilidad de crecientes súbitas en los ríos aportantes al Lago de Tota, especial atención en los municipios de Aquitania y Cuitiva (Boyacá).
	Meta	Cuenca del río Túa	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Túa y sus afluentes especialmente el caño Arietes, se recomienda especial atención sobre los municipios de Monterrey, Tauramena y Villanueva (Casanare).
	Meta	Cuenca del río Manacacías	Niveles altos del río Manacacías, aportante a la cuenca alta del río Meta. Especial atención en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).

Área Hidrográfica del Orinoco


Actualización: 10 de julio de 2025 00:00 HLC

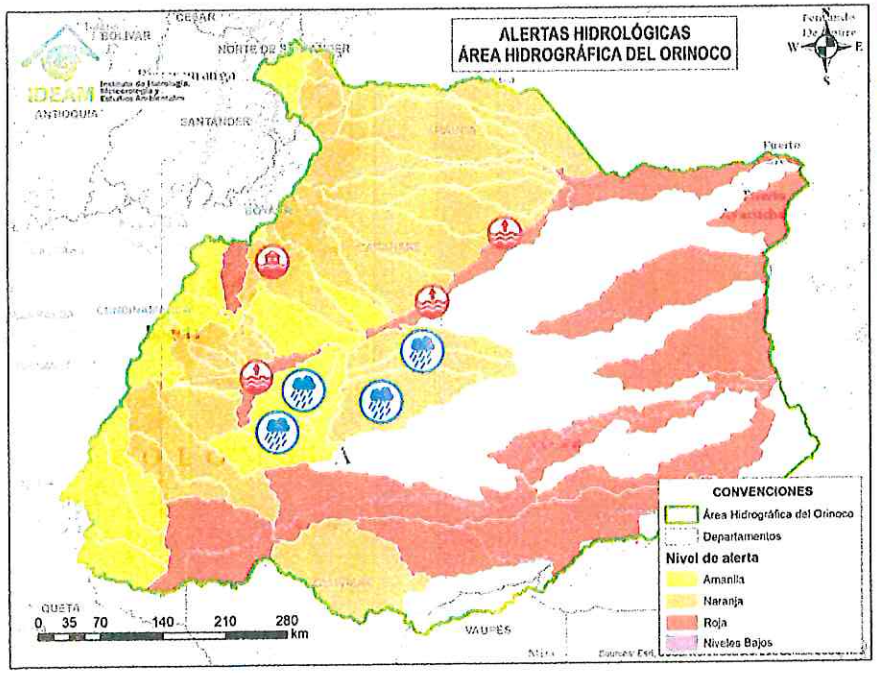

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Meta	Cuenca del caño Cumaral	Probabilidad de incrementos súbitos en las cuencas de los ríos caño Cumaral y sus afluentes, especial atención en el municipio de San Martín (Meta) .
	Meta	Cuenca del río Melúa	Probabilidad de incrementos súbitos en las cuencas de los ríos Melúa y sus afluentes, especial atención en el municipio de San Martín (Meta) .
	Meta	Cuenca del río Yucao	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Yucao. Especial atención en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
	Vichada	Cuenca alto río Vichada	Probabilidad de crecientes súbitas en la parte alta del río Vichada y sus afluentes, especial atención en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
	Vichada	Cuenca río Guarrojo	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Guarrojo y sus afluentes, especial atención en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
	Vichada	Cuenca río Muco	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Muco y sus afluentes, especial atención en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).

Área Hidrográfica del Orinoco

Actualización: 10 de julio de 2025 00:00 HLC

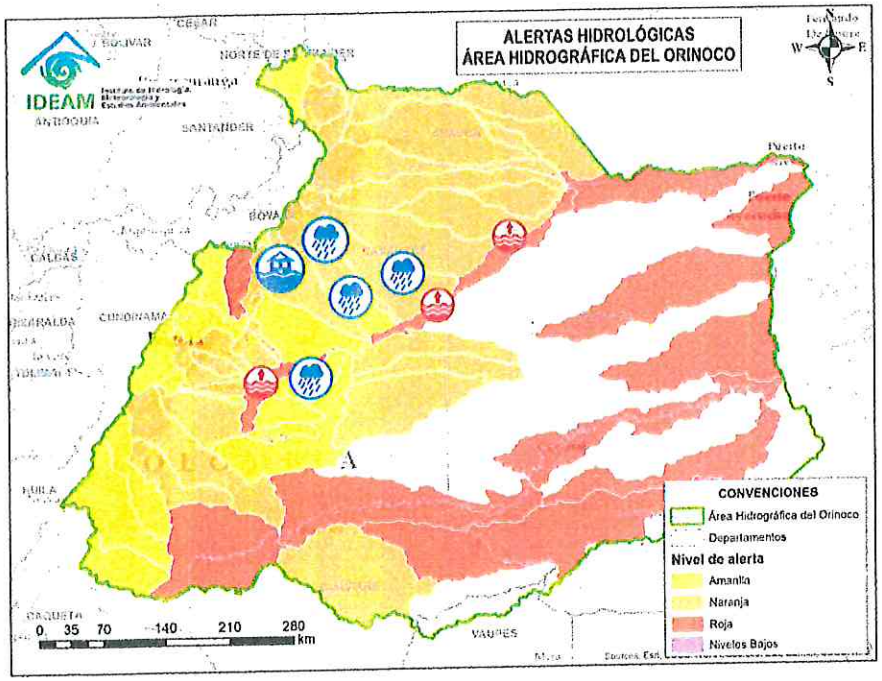

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Meta	Cuenca del río Cusiana	Probabilidad de Crecientes súbitas en el río Cusiana y sus tributarios, especialmente el río Unete y el río Charte. Se recomienda especial atención en los municipios de Pajarito y Aquitania (Boyacá), Tauramena, Recetor, Aguazul y Maní (Casanare).
⚠	Meta	Cuenca del río Cusiana	**Alerta Puntual** por desbordamiento del Caño la Vega en el centro Poblado Pueblo Nuevo que ocasiona el cierre de la vía Recetor - Chámeza (08/07/2025)
⚠	Meta	Directos al Meta entre Cusiana y Cravo Sur	Probabilidad de crecientes súbitas en los ríos afluentes al río Meta en el sector comprendido entre los ríos Cusiana y Cravo Sur.
⚠	Meta	Cuenca del río Cravo Sur	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Cravo Sur y sus afluentes. Especial atención en los municipios de Labranzagrande (Boyacá), Yopal, Nunchía y Orocué (Casanare).
⚠	Meta	Caño Guanápalo	Probabilidad de crecientes súbitas en el caño Guanápalo. Especial atención a la altura de los municipios de Nunchía, San Luis de Palenque y Orocué (Casanare).

CONDICIONES HIDROMETEOROLÓGICAS ACTUALES

IDEAM comunica al Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) y al Sistema Nacional Ambiental (SINA).

Bogotá D.C., 08 de julio de 2025
Hora de actualización 00:00 HLC

Boletín No.

0508

CONTENIDO

- Condiciones Meteorológicas.
- Pronóstico de precipitación para las próximas seis (6) horas.
- Alertas Hidrológicas.
- Seguimiento y Pronóstico de las Amenazas por Deslizamientos
- Seguimiento y Pronóstico de las Amenazas por Incendios Alertas.
- Meteomarinas vigentes Mar Caribe Colombiano.
- Meteomarinas vigentes Océano Pacífico Nacional.



PARA TOMAR ACCIÓN Advierte a los sistemas de prevención y atención de desastres sobre la amenaza que puede ocasionar un fenómeno con efectos adversos sobre la población, el cual requiere la atención inmediata por parte de la población y de los cuerpos de atención y socorro. Se emite una alerta sólo cuando la identificación de un evento extraordinario indique la probabilidad de amenaza inminente y cuando la gravedad del fenómeno implique la movilización de personas y equipos, interrumpiendo el normal desarrollo de sus actividades cotidianas.



PARA PREPARARSE Indica la presencia de un fenómeno. No implica amenaza inmediata y como tanto es catalogado como un mensaje para informarse y prepararse. El aviso implica vigilancia continua ya que las condiciones son propicias para el desarrollo de un fenómeno, sin que se requiera permanecer alerta.



PARA INFORMARSE Es un mensaje oficial por el cual se difunde información. Por lo regular se refiere a eventos observados, registrados o registrados y puede contener algunos elementos de pronóstico a manera de orientación. Por sus características pretéritas y futuras difiere del aviso y de la alerta, y por lo general no está encaminado a alertar sino a informar


CONDICIONES NORMALES La información que se suministra se encuentra dentro de los rangos normales.

Alertas vigentes hasta: 08 de julio de 2025 06:00 HLC

www.ideam.gov.co

Área Hidrográfica del Orinoco


Actualización: 08 de julio de 2025 00:00 HLC

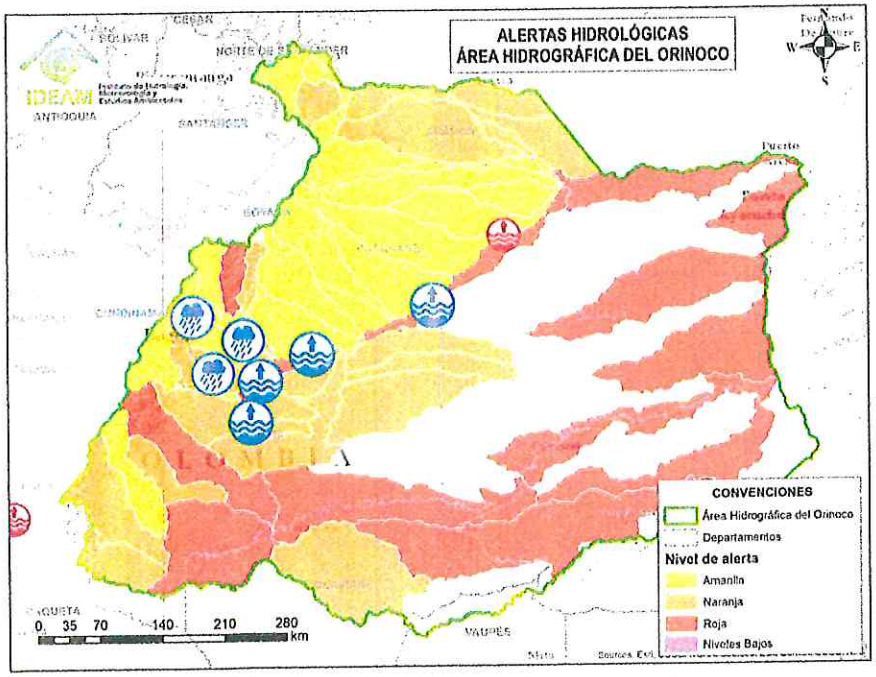

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Meta	Cuenca del río Negro	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Negro y sus afluentes, se recomienda especial atención en Villavicencio (Meta).
	Meta	Cuenca río Humea	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Humea y sus afluentes, especialmente el río San Juanito. Especial atención en los municipios de Paratebueno y Medina (Cundinamarca).
	Meta	Directos al Meta entre ríos Guayuriba y Yucao	Niveles altos del río Meta entre los municipios de Puerto López (Meta) y Orocué (Casanare). Se recomienda especial atención a las comunidades ribereñas localizadas en su recorrido por los municipios de Puerto López, Cabuyaro (Meta), Villanueva, Tauramena y Orocué (Casanare).
	Meta	Directos al río Meta entre los ríos Guatiquía y Upía	Probabilidad de crecientes súbitas de los tributarios al río Meta entre los ríos Guatiquía y Upía. Especial atención a la altura de los municipios de Paratebueno, Barranca de Upía y Cabuyaro.
	Meta	Cuenca del río Guavio	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Guavio y sus afluentes, especialmente el río Sueva y Chivor. Especial atención en el municipio de Gachetá (Cundinamarca).

Área Hidrográfica del Orinoco


Actualización: 08 de julio de 2025 00:00 HLC

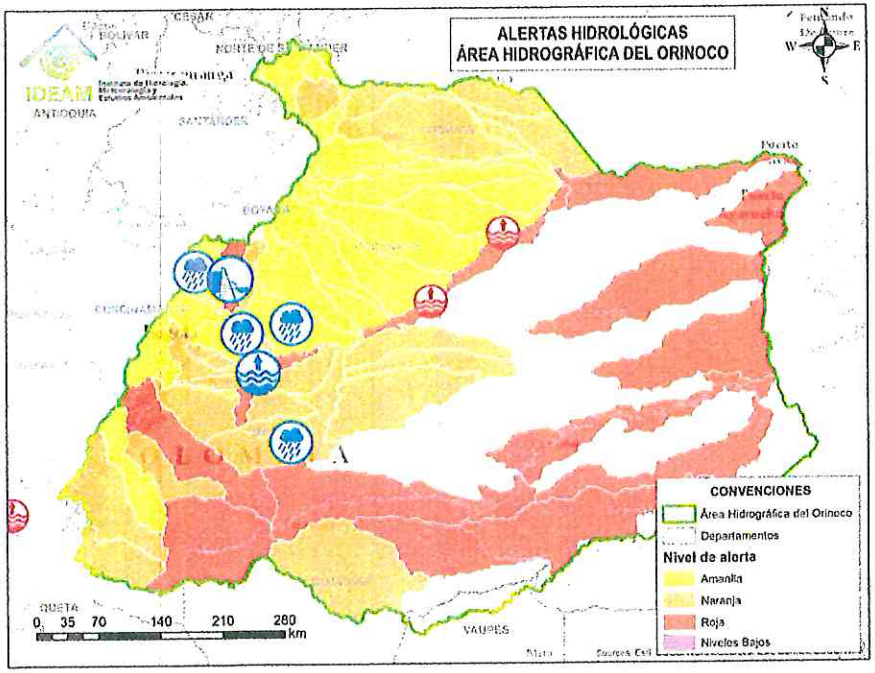

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Meta	Cuenca del río Garagoa	Probabilidad de creciente súbita en la cuenca del río Garagoa y sus afluentes, especialmente el río Bata y Macheta. Especial atención en los municipios de Chivor, Macanal, Tiribata, Somondoco, Garagoa, Almeida y Santa María (Boyacá).
	Meta	Cuenca del río Lengupá	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Lengupá y sus aportantes. Especial atención en los municipios de Santa María, Rondón, Zetaquirá, Campohermoso y San Luis de Gaceno (Boyacá). **Nota:** CORPOCHIVOR reporta remoción en masa, a la altura de la vereda Planadas del municipio de Santa María generando represamiento del rio Lengupá, se observan incrementos de niveles aguas arriba hacia ribera del rio Tunjita y Lengupá y riesgo de avenida torrencial aguas abajo ribera área Santa María y San Luis De Gaceno. Se mantiene llamado a la comunidad ribereña estar atentos a las alertas actuales por precipitaciones y crecientes súbitas en la cuenca (27/06/2025).
	Meta	Cuenca del río Upía	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Upía y sus afluentes. Especial atención en los municipios de Sabanalarga, Villanueva (Casanare), Barranca de Upía y Cabuyaro (Meta).
	Meta	Cuenca del río Túa	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Túa y sus afluentes especialmente el caño Arietes, se recomienda especial atención sobre los municipios de Monterrey, Tauramena y Villanueva (Casanare).
	Meta	Cuenca del río Manacacías	Niveles altos del río Manacacías, aportante a la cuenca alta del río Meta. Especial atención en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).

Área Hidrográfica del Orinoco

Actualización: 08 de julio de 2025 00:00 HLC

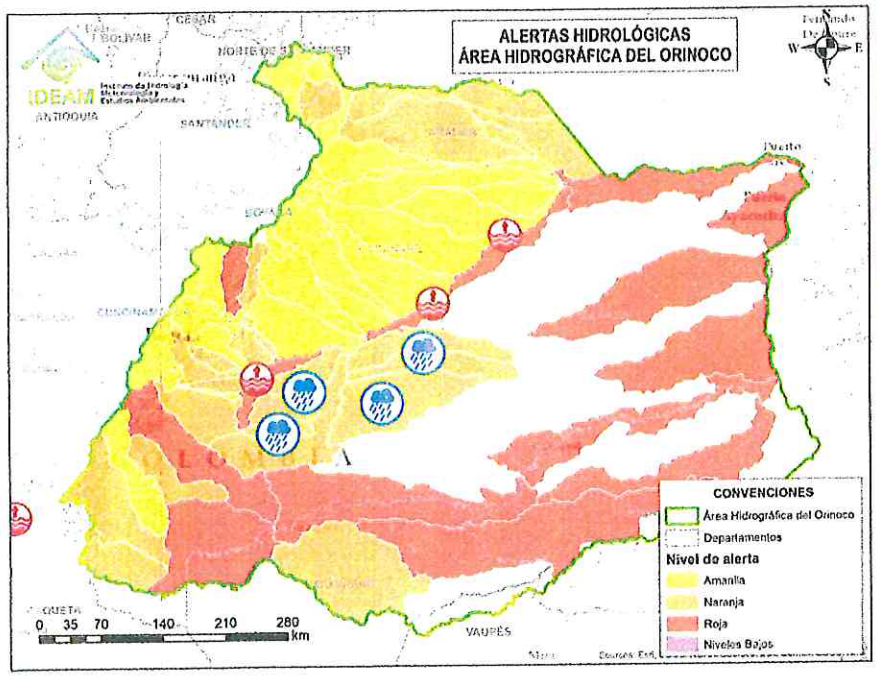

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Meta	Cuenca del caño Cumaral	Probabilidad de incrementos súbitos en las cuencas de los ríos caño Cumaral y sus afluentes, especial atención en el municipio de San Martín (Meta) .
⚠	Meta	Cuenca del río Melúa	Probabilidad de incrementos súbitos en las cuencas de los ríos Melúa y sus afluentes, especial atención en el municipio de San Martín (Meta) .
⚠	Meta	Cuenca del río Yucao	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Yucao. Especial atención en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
⚠	Vichada	Cuenca alto río Vichada	Probabilidad de crecientes súbitas en la parte alta del río Vichada y sus afluentes, especial atención en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
⚠	Vichada	Cuenca río Guarrojo	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Guarrojo y sus afluentes, especial atención en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
⚠	Vichada	Cuenca río Muco	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Muco y sus afluentes, especial atención en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).

CONDICIONES HIDROMETEOROLÓGICAS ACTUALES

IDEAM comunica al Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) y al Sistema Nacional Ambiental (SINA).

Bogotá D.C., 1 de julio de 2025
Hora de actualización 18:00 HLC

Boletín No.

0489

CONTENIDO

- Condiciones Meteorológicas.
- Pronóstico de precipitación para las próximas seis (6) horas.
- Alertas Hidrológicas.
- Seguimiento y Pronóstico de las Amenazas por Deslizamientos
- Seguimiento y Pronóstico de las Amenazas por Incendios Alertas.
- Meteomarinas vigentes Mar Caribe Colombiano.
- Meteomarinas vigentes Océano Pacífico Nacional.

Alerta ROJA

PARA TOMAR ACCIÓN Advierte a los sistemas de prevención y atención de desastres sobre la amenaza que puede ocasionar un fenómeno con efectos adversos sobre la población, el cual requiere la atención inmediata por parte de la población y de los cuerpos de atención y socorro. Se emite una alerta sólo cuando la identificación de un evento extraordinario indique la probabilidad de amenaza inminente y cuando la gravedad del fenómeno implique la movilización de personas y equipos, interrumpiendo el normal desarrollo de sus actividades cotidianas.

Alerta NARANJA

PARA PREPARARSE Indica la presencia de un fenómeno. No implica amenaza inmediata y como tanto es catalogado como un mensaje para informarse y prepararse. El aviso implica vigilancia continua ya que las condiciones son propicias para el desarrollo de un fenómeno, sin que se requiera permanecer alerta.

Alerta AMARILLA

PARA INFORMARSE Es un mensaje oficial por el cual se difunde información. Por lo regular se refiere a eventos observados, registrados o registrados y puede contener algunos elementos de pronóstico a manera de orientación. Por sus características pretéritas y futuras difiere del aviso y de la alerta, y por lo general no está encaminado a alertar sino a informar


CONDICIONES NORMALES La información que se suministra se encuentra dentro de los rangos normales.

Alertas vigentes hasta: 02 de julio de 2025 00:00 HLC

www.ideam.gov.co

Área Hidrográfica del Orinoco


Actualización: 1 de julio de 2025 18:00 HLC

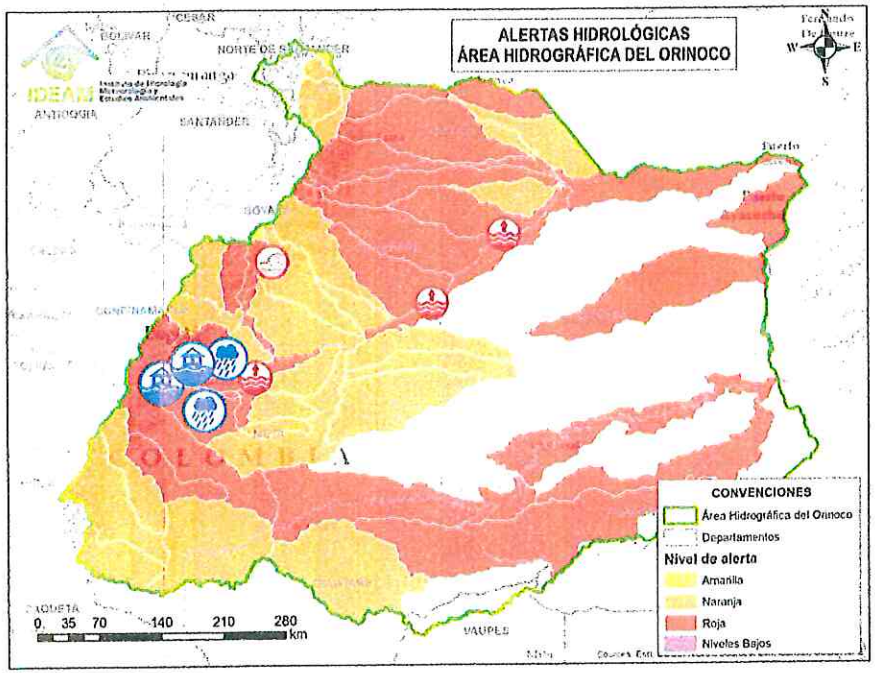

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
⚠	Meta	Cuencas de los ríos Metica, Guamal y Humadea	Probabilidad de crecientes súbitas en las cuencas de los ríos Metica, Guamal y Humadea y sus afluentes, aportantes a la cuenca alta del río Meta. **Notas: 1)** Se reportó creciente súbita de los ríos Humadea y Guamal, veredas El Centro, Y San Agustín, Arenales, El Turuy y San Antonio, en el municipio de Castilla La Nueva (Meta) (14/06/2025). **2)** Se reportó creciente súbita de los ríos Guamal, Humadea, Orotoy, Caño Camelias, en el municipio de Guamal (Meta) (14/06/2025). **3)** Se reportó inundaciones en los municipios de Guamal y Acacías-Meta (14/06/2025).
⚠	Meta	Cuenca río Guayuriba	Crecientes súbitas en el río Guayuriba y sus afluentes, especialmente en la quebrada Blanca, quebrada Las Jotas y en el río Negro a la altura de Quetame, Gutierrez y Guayabetal (Cundinamarca). Se recomienda especial atención en los municipios de Une, Fómeque, Gutierrez y Guayabetal (Cundinamarca), Villavicencio, Acacias, San Carlos de Guaroa y Puerto López (Meta). **Notas: 1)** Creciente súbita del caño La Pedregosa generando afectaciones en la vereda río Negrito del municipio de Villavicencio-Meta (28/06/2025). **2)** Creciente súbita y desbordamiento del río Guayuriba generando afectaciones, a la altura del municipio de Villavicencio, Meta (01/07/2025).
⚠	Meta	Cuenca del río Guatiquía	Probabilidad de creciente súbita en el río Guatiquía y sus afluentes, especialmente los caños Maizaro, Grande, quebrada Salina y el río Ocoa. Se recomienda especial atención a la altura de Restrepo, Villavicencio y el municipio El Calvario (Meta). **Nota**: Inundaciones por el desbordamiento del Caño Ocoa generando afectaciones, a la altura del municipio de Villavicencio, Meta (01/07/2025).
⚠	Meta	Cuenca del río Guacavía	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Guacavía y sus afluentes, se recomienda especial atención a la altura del municipio Cumaral (Meta).

Área Hidrográfica del Orinoco

Actualización: 1 de julio de 2025 18:00 HLC

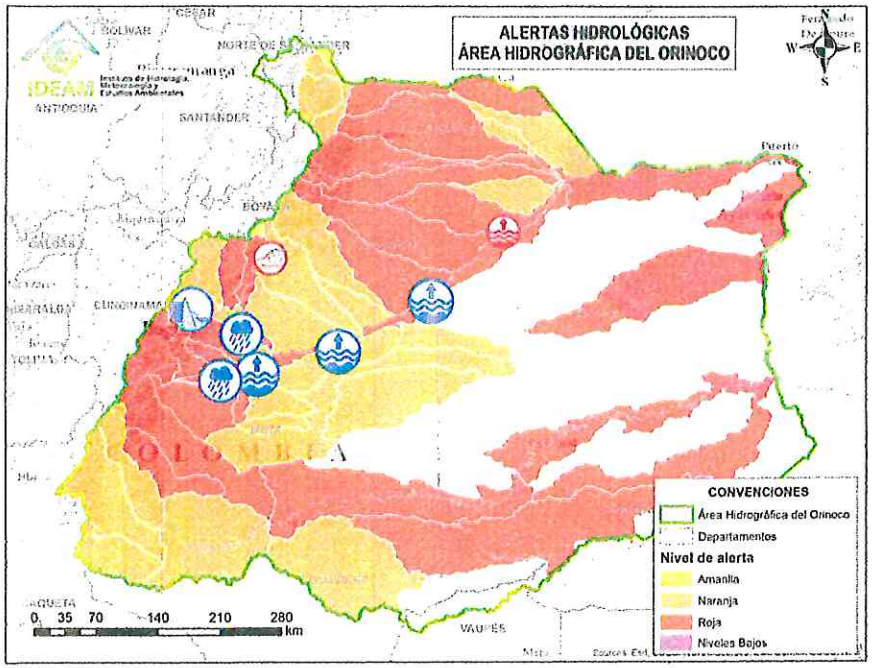

Alerta	Zona Hidrográfica	Subzona o Cuenca Hidrográfica	Descripción de la alerta hidrológica
	Meta	Cuenca del río Negro	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Negro y sus afluentes, se recomienda especial atención en Villavicencio (Meta).
	Meta	Cuenca río Humea	Probabilidad de crecientes súbitas en el río Humea y sus afluentes, especialmente el río San Juanito. Especial atención en los municipios de Paratebueno y Medina (Cundinamarca).
	Meta	Directos al Meta entre ríos Guayuriba y Yucao	Niveles altos del río Meta entre los municipios de Puerto López (Meta) y Orocué (Casanare). Se recomienda especial atención a las comunidades ribereñas localizadas en su recorrido por los municipios de Puerto López, Cabuyaro (Meta), Villanueva, Tauramena y Orocué (Casanare).
	Meta	Directos al río Meta entre los ríos Guatiquía y Upía	Probabilidad de crecientes súbitas de los tributarios al río Meta entre los ríos Guatiquía y Upía. Especial atención a la altura de los municipios de Paratebueno, Barranca de Upía y Cabuyaro.
	Meta	Cuenca del río Guavio	Probabilidad de crecientes súbitas en la cuenca del río Guavio y sus afluentes, especialmente el río Sueva y Chivor. Especial atención en el municipio de Gachetá (Cundinamarca).
	Meta	Cuenca del río Guavio	**ALERTA AMARILLA:** Recomendaciones emitidas por ENEL para el embalse del Guavio: *"ENEL, informa que debido a la temporada invernal que se presenta en la zona de la cuenca del embalse El Guavio, e tiene previsto realizar descargas controladas de agua durante el mes de Junio de 2025. ENEL recomienda a las comunidades y a los habitantes de las zonas ribereñas de los ríos Guavio y Upía, localizados aguas abajo del embalse El Guavio, estar atentos a las recomendaciones de seguridad emitidas por parte de la compañía."*

IDEAM

Reporte de información Hidrometeorológica de DHIME generado (16/08/2025 15:41)

Nombre estacion:	AEROPUERTO VANGUARDIA [35035020]	**Corriente:**		**Categoría de estación:**	Sinóptica Principal
Latitud:	4.161917	**Longitud:**	-73.617583	**Elevación:**	420
Entidad:	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	**Area Operativa:**	Area Operativa 03 - Meta-Guaviare-Guainía	**Departamento:**	Meta
Municipio:	Villavicencio	**Fecha instalacion:**	15/10/1924 00:00	**Fecha suspensión:**	
Variable:	PRECIPITACION	**Frecuencia:**	Diaria	**Fecha consulta:**	19/07/2025 00:00-16/08/2025 00:00
Parametro:	Día pluviométrico (convencional),Precipitación total mensual	**Unidad medida:**	mm		

Fecha	Valor:	Nivel de Aprobación
2025-07-19 00:00	8.7	Preliminar
2025-07-21 00:00	0.5	Preliminar
2025-07-22 00:00	5.8	Preliminar
2025-07-23 00:00	0.2	Preliminar
2025-07-24 00:00	35.8	Preliminar
2025-07-25 00:00	58.4	Preliminar
2025-07-26 00:00	13.6	Preliminar
2025-07-27 00:00	21.1	Preliminar
2025-07-28 00:00	13.9	Preliminar
2025-07-29 00:00	5.4	Preliminar
2025-07-31 00:00	54.8	Preliminar
2025-08-01 00:00	17.4	Preliminar
2025-08-02 00:00	114.4	Preliminar
2025-08-03 00:00	0.2	Preliminar
2025-08-06 00:00	77.4	Preliminar
2025-08-07 00:00	1.2	Preliminar
2025-08-08 00:00	110.7	Preliminar
2025-08-09 00:00	2.8	Preliminar
2025-08-10 00:00	1.8	Preliminar
2025-08-11 00:00	35.4	Preliminar
2025-08-12 00:00	1.7	Preliminar
2025-08-13 00:00	8.9	Preliminar
2025-08-14 00:00	20.6	Preliminar
2025-08-01 00:00	392.5	Preliminar

IDEAM

Reporte de Información Hidrometeorológica de DHIME generado (16/08/2025 15:30)

Nombre estacion:	ALCALDIA [35030100]	**Corriente:**		**Categoría de estación:**	Pluviográfica
Latitud:	4.152260	**Longitud:**	-73.639785	**Elevación:**	476
Entidad:	INSTITUTO DE HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS	**Area Operativa:**	Area Operativa 03 - Meta-Guaviare-Guainía	**Departamento:**	Meta
Municipio:	Villavicencio	**Fecha Instalacion:**	15/08/1993 00:00	**Fecha suspensión:**	
Variable:	PRECIPITACIÓN	**Frecuencia:**	Diaria	**Fecha consulta:**	19/07/2025 00:00-16/08/2025 00:00
Parametro:	Día pluviométrico (convencional)	**Unidad medida:**	mm		

Fecha	Valor:	Nivel de Aprobación
2025-07-19 00:00	7.6	Preliminar
2025-07-20 00:00	0.1	Preliminar
2025-07-21 00:00	0.4	Preliminar
2025-07-22 00:00	9.6	Preliminar
2025-07-23 00:00	0.2	Preliminar
2025-07-24 00:00	49.9	Preliminar
2025-07-25 00:00	29.5	Preliminar
2025-07-26 00:00	9.3	Preliminar
2025-07-27 00:00	30.8	Preliminar
2025-07-28 00:00	8	Preliminar
2025-07-29 00:00	5.6	Preliminar
2025-07-30 00:00	0.1	Preliminar
2025-07-31 00:00	19.5	Preliminar

IDEAM

Reporte de información Hidrometeorológica de DHIME generado (15/08/2025 12:25)

Nombre estacion:	AEROPUERTO VANGUARDIA	**Corriente:**		**Categoría de estación:**	Sinóptica Principal
Latitud:	4.161917	**Longitud:**	-73.617583	**Elevación:**	420
Entidad:	INSTITUTO DE HIDROLOGIA M	**Area Operativa:**	Area Operativa 03 - Meta-Gu	**Departamento:**	Meta
Municipio:	Villavicencio	**Fecha instalacíon:**	15/10/1924 00:00	**Fecha suspensión:**	
Variable:	PRECIPITACION	**Frecuencia:**	Diaria	**Fecha consulta:**	01/06/2025 00:00-15/08/2025 00:00
Parametro:	Día pluviométrico (convencio	**Unidad medida:**	mm		

Fecha	Valor:	Nivel de Aprobación
2025-06-01 00:00	22.4	Preliminar
2025-06-02 00:00	27.2	Preliminar
2025-06-03 00:00	0.2	Preliminar
2025-06-04 00:00	1.2	Preliminar
2025-06-05 00:00	14.2	Preliminar
2025-06-06 00:00	54.2	Preliminar
2025-06-07 00:00	0.2	Preliminar
2025-06-08 00:00	66.4	Preliminar
2025-06-09 00:00	57.8	Preliminar
2025-06-10 00:00	6.7	Preliminar
2025-06-11 00:00	9.1	Preliminar
2025-06-12 00:00	15.6	Preliminar
2025-06-13 00:00	0.5	Preliminar
2025-06-14 00:00	62.2	Preliminar
2025-06-15 00:00	1.8	Preliminar
2025-06-16 00:00	6.5	Preliminar
2025-06-17 00:00	19.4	Preliminar
2025-06-18 00:00	11.8	Preliminar
2025-06-19 00:00	18.3	Preliminar
2025-06-20 00:00	2.8	Preliminar
2025-06-21 00:00	9	Preliminar
2025-06-22 00:00	1.2	Preliminar
2025-06-23 00:00	32.4	Preliminar
2025-06-24 00:00	29.6	Preliminar
2025-06-25 00:00	0	Preliminar
2025-06-26 00:00	4.1	Preliminar
2025-06-27 00:00	36.1	Preliminar
2025-06-28 00:00	15.1	Preliminar
2025-06-29 00:00	15.2	Preliminar
2025-06-30 00:00	135.2	Preliminar
2025-07-01 00:00	0.4	Preliminar
2025-07-02 00:00	13.1	Preliminar
2025-07-03 00:00	4.6	Preliminar
2025-07-04 00:00	3.4	Preliminar
2025-07-05 00:00	0.4	Preliminar
2025-07-06 00:00	4.6	Preliminar
2025-07-08 00:00	9.8	Preliminar
2025-07-09 00:00	31.8	Preliminar
2025-07-10 00:00	33.4	Preliminar
2025-07-11 00:00	26.2	Preliminar
2025-07-12 00:00	13.2	Preliminar
2025-07-13 00:00	26.6	Preliminar
2025-07-14 00:00	8	Preliminar
2025-07-17 00:00	5.1	Preliminar
2025-07-18 00:00	6.7	Preliminar
2025-07-19 00:00	8.7	Preliminar
2025-07-21 00:00	0.5	Preliminar
2025-07-22 00:00	5.8	Preliminar
2025-07-23 00:00	0.2	Preliminar
2025-07-24 00:00	35.8	Preliminar
2025-07-25 00:00	58.4	Preliminar
2025-07-26 00:00	13.6	Preliminar
2025-07-27 00:00	21.1	Preliminar
2025-07-28 00:00	13.9	Preliminar
2025-07-29 00:00	5.4	Preliminar
2025-07-31 00:00	54.8	Preliminar
2025-08-01 00:00	17.4	Preliminar
2025-08-02 00:00	114.4	Preliminar
2025-08-03 00:00	0.2	Preliminar
2025-08-06 00:00	77.4	Preliminar
2025-08-07 00:00	1.2	Preliminar
2025-08-08 00:00	110.7	Preliminar
2025-08-09 00:00	2.8	Preliminar
2025-08-10 00:00	1.8	Preliminar
2025-08-11 00:00	35.4	Preliminar
2025-08-12 00:00	1.7	Preliminar

SECRETARÍA
DE LAS TIC
ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO

SECRETARIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)
CALLE 40 No. 33 – 64 Centro
(57+8) 671 58 59
15/08/2025

Señores
Supervisión de infraestructura
Villavicencio – Meta

Asunto: Autorización de uso de las instalaciones para actividades académicas del SENA

Respetados señores,

Por medio de la presente, nos permitimos informar que la SECRETARIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC), ha dispuesto sus instalaciones para que el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA), desarrolle clases de formación académica en nuestras aulas.

Esta colaboración tiene como propósito apoyar los procesos de capacitación y fortalecimiento educativo, brindando un espacio adecuado para el desarrollo de las actividades programadas por el SENA, en beneficio de la comunidad y de los estudiantes que reciben formación en diferentes áreas del conocimiento.

De esta manera, dejamos constancia de la disponibilidad y el acompañamiento institucional por parte de nuestra entidad, en ara de contribuir al mejoramiento de la educación y el acceso a nuevas oportunidades de formación.

Con ello adjuntamos las clases programadas de lunes a viernes:

- Técnico en sistemas teleinformáticas – Grupo 1 Horario de 2:00 pm a 5:00 pm
- Técnico en sistemas teleinformáticas – Grupo 2 Horario de 2:00 pm a 5:00 pm

Atentamente,

EMIRSON BELTRAN ACOSTA
Técnico operativo grado 5
Dirección, trámites y servicios en línea
Secretaria TIC alcaldía de Villavicencio

Scanned with CamScanner

312

Villavicencio, 15/08/2025

Doctor(a):
ALBA AURORA COLINA
Jefe Oficina de Contratación
Alcaldía Municipal de Villavicencio
Ciudad.

Ref.: SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL CONTRATO N°1692 DE 2025, N°. DEL PROCESO EN SECOP: SMC-066 DE 2025

OBJETIVO DEL INFORME: Informe para la solicitud de prorroga No 1. Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al municipio de Villavicencio acerca del desarrollo del mismo verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la Ley 1474 de 2011 y demás normativa aplicable.

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No. Y FECHA DEL CONTRATO (incluir el número del proceso en SECOP)	1692 DE 2025 No PROCESO EN SECOP II: (066 DE 2025)
PUBLICADO EN (Marque con X)	SECOP I _____ Ó SECOP II ____X____
CLASE DE CONTRATO:	SMC (OBRA)
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS R/L CARLOS AUGUSTO GIRALDO RENGIFO
No. DE IDENTIFICACIÓN	Nit. 901.744.193-4
OBJETO:	"MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REFORMAS A LAS INSTALACIONES DE LOS PUNTOS VIVE DIGITAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"
NOMBRE DEL SUPERVISOR CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: (De todos los que haya tenido, empezando por el vigente)	Arq. DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN: (De todos los que haya tenido, en orden empezando por el vigente)	03/06/2025
CONDICIONES INICIALES	
VALOR DEL CONTRATO (letras y número):	CIENTO VEINTE MILLONES SETECIENTOS VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS $ 120.721.957,42
PLAZO DE EJECUCIÓN:	75 DIAS
FECHA DE INICIO:	5/06/2025

FECHA DE TERMINACIÓN:	19/08/2025		
MODIFICACIONES:			
CESIÓN:	N.A. O NOMBRE DEL NUEVO CONTRATISTA	FECHA:	DIA/MES/AÑO
VALOR DE ADICIÓN:	$_____ Ó N. A.	FECHA:	DIA/MES/AÑO
NUEVO VALOR DEL CONTRATO: (INICIAL + ADICIÓN)	$		
PRORROGAS	____ MESES Ó DÍAS	FECHA:	DIA/MES/AÑO
TOTAL PLAZO DE EJECUCIÓN (INICIAL + PRÓRROGAS)			
SUSPENSIONES	FECHA:		
REINICIOS:	____MESES Ó N. A.	FECHA:	DIA/MES/AÑO
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	DD/MM/AAAA		

2. **DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** Teniendo en cuenta que mediante acto administrativo del 11/06/2025, notificado personalmente 03/06/2025 y en plataforma SECOP II del 13/06/2025, se me designó como SUPERVISOR del contrato de la referencia, me permito presentar el informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente a la Solicitud de modificación No.1 con adición y prorroga No 1 de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Interventoría y Supervisión adoptado mediante Decreto No. 1000-21/293, vigente desde el 19 de julio de 2016.

3 GARANTIA DE POLIZAS

Las pólizas aprobadas corresponden a la compañía aseguradora seguros mundiales las cuales están a favor del MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, las siguientes pólizas fueron expedidas con la firma del contrato:

ASEGURADORA	No POLIZA CERTIFICADO	AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	VIGENTE
			DESDE	HASTA		
SEGUROS DEL ESTADO S. A	30-44-101064160	Cumplimiento del contrato	5/06/2025	19/12/2025	$ 24.144.391,49	SI
		Prestaciones Sociales Legales	5/06/2025	19/08/2028	$ 6.036.097,87	SI
		Estabilidad y calidad de la obra	SI AMPARA 5 AÑOS ,0 MESES Y 1 DIAS		$ 24.144.391,48	SI
	30-40-101024067	Responsabilidad Civil Extracontractual	5/06/2025	189/08/2025	$ 284.700.000,00	SI
TOTAL ASEGURADO					$ 339.024.880,84	

313

4 LOCALIZACIÓN DE LA OBRA OBJETO DE INTERVENTORÍA

El municipio de Villavicencio está ubicado al noroccidente del departamento del Meta, en el piedemonte de la cordillera Oriental, en la margen izquierda del río Guatiquía. Geográficamente localizado en 4°08'33" N y 73°97'46" O, con temperatura promedio de 27°C

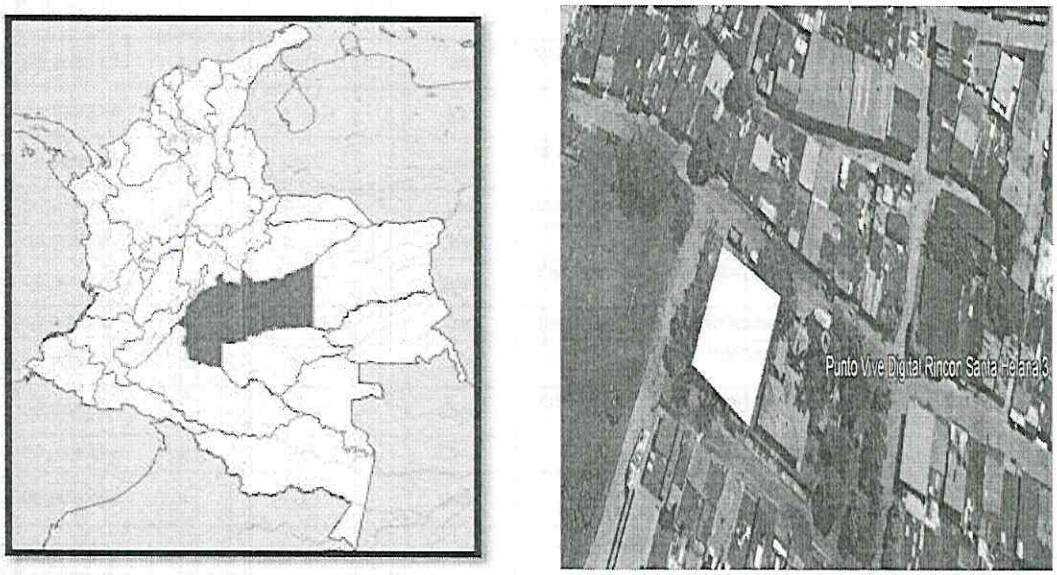


Ilustración 01 *Calle 42ª # 17b-27 Imagen tomada de la aplicación Google earth pro*

El proyecto a ejecutar dentro del objeto del contrato de obra N°1692 de 2025 se encuentra ubicado en la zona urbana en la calle 42ª # 17b-27, Vive Digital Villa Fabiola, en el Municipio de Villavicencio.

5. CONDICIONES CONTRACTUALES

Condiciones contractuales iniciales

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PUNTO VIVE DIGITAL LA MADRID					
1	PRELIMINARES				
1,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	178,75	$ 3.630,00	$ 648.862,50
1,02	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	69,34	$ 73.000,00	$ 5.061.820,00
1,03	DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E= 0.07 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	9,69	$ 23.500,00	$ 227.715,00
1,04	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	2,00	$ 228.000,00	$ 456.000,00
	SUBTOTAL				$ 6.394.397,50

2	OBRAS INTERIORES						
2,01	MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1:3	M2	24,42	$	76.900,00	$	1.877.898,00
2,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO MARCO, PASADOR LAMINA COLL ROLLED CAL 20 2 X 0.80 M	UND	2,00	$	280.500,00	$	561.000,00
2,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA TIPO BANCO CUADRADO 1" CAL 18	M2	15,10	$	127.800,00	$	1.929.780,00
2,04	PERFIL CUADR. NEGRO 100X100X4 MM ASTM A-500	ML	7,00	$	133.300,00	$	933.100,00
2,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO CORREDIZA, CON VIDRIO 4 MM	M2	4,71	$	993.800,00	$	4.680.798,00
2,06	MURO SUPER BOARD DOBLE CARA, E=0.11 M, CAL 8 MM, INCLUYE PINTURA	M2	7,49	$	178.200,00	$	1.334.718,00
2,07	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	4,50	$	28.400,00	$	127.800,00
2,08	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2"	UND	2,00	$	67.700,00	$	135.400,00
2,09	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	2,00	$	82.900,00	$	165.800,00
2,10	TUBERIA PVCL 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	21,00	$	35.900,00	$	753.900,00
2,11	TUBERÍA CPVC 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	7,50	$	63.200,00	$	474.000,00
2,12	VALVULA CHEQUE CORTINA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	2,00	$	67.800,00	$	135.600,00
2,13	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UND	2,00	$	389.600,00	$	779.200,00
2,14	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UND	2,00	$	520.800,00	$	1.041.600,00
2,15	PISO EN CERAMICA LISO 0.20X0.20 LINEA DUROTECH	M2	14,80	$	66.500,00	$	984.200,00
	SUBTOTAL					$	15.914.794,00

3	OBRAS ELECTRICAS						
3,01	CANALETA PLASTICA	ML	16,15	$	67.900,00	$	1.096.585,00
3,02	ACOMETIDA PARCIAL 3 No6+1 No12 DUCTO 1" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	16,15	$	60.400,00	$	975.460,00
3,03	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	4,00	$	117.900,00	$	471.600,00
3,04	REFLECTOR LED 200W IP 65 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	2,00	$	345.200,00	$	690.400,00
					SUBTOTAL	$	3.234.045,00
	PUNTO VIVE DIGITAL VILAL FABIOLA						
4	PRELIMINARES						
4,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	363,95	$	3.630,00	$	1.321.138,50
4,02	DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	356,00	$	6.200,00	$	2.207.200,00
4,03	TRANSPORTE Y DISPOSICI Ó N FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	2,00	$	228.000,00	$	456.000,00
4,04	DEMOLICION MANUAL MURO DIVISORIO BLOQUE DE ARCILLA. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	21,92	$	12.900,00	$	282.768,00
4,05	DESMONTE DE TEJA ASBESTO CEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	90,00	$	20.600,00	$	1.854.000,00
					SUBTOTAL	$	6.121.106,50

Página 1
Página 2

B14


5	OBRA INTERIOR Y EXTERIOR				
5,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC	M2	157,98	$ 114.900,00	$ 18.151.902,00
5,02	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	194,88	$ 14.400,00	$ 2.806.272,00
5,03	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	M2	12,46	$ 55.900,00	$ 696.514,00
5,04	PA Ñ ETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	24,92	$ 27.000,00	$ 672.840,00
5,05	ESTUCO PLASTICO	M2	24,92	$ 17.500,00	$ 436.100,00
5,06	SUMINISTRO E INSTALACI Ó N PUERTA ALUMINIO CORREDIZA, CON VIDRIO 4 MM	M2	2,80	$ 993.800,00	$ 2.782.640,00
5,07	MURO SUPER BOARD DOBLE CARA, E=0.11 M, CAL 8 MM, INCLUYE PINTURA	M2	37,51	$ 178.200,00	$ 6.684.282,00
5,08	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	125,86	$ 12.000,00	$ 1.510.320,00
5,09	SUMINISTRO E INSTALACI Ó N CUBIERTA TIPO SANDWICH 333C CAL. 26 PREPINTADA. INCLUYE POLIURETANO O MATERIAL SIMILAR. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	90,00	$ 222.300,00	$ 20.007.000,00
5,10	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	36,00	$ 30.800,00	$ 1.108.800,00
5,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS EN MADERA INMUNIZADA DE 0.14X0.04X3M INCLUYE TORNILLERIA ROTHOBLAAS Y ACCESORIOS DE INSTALACION	UND	30,00	$ 119.000,00	$ 3.570.000,00
				SUBTOTAL	$ 58.426.670,00
				COSTO DIRECTO	$ 90.091.013,00

6. INFORME TÉCNICO

AVANCE FÍSICO CONTRATO DE OBRA NO 1692 DE 2025

PROGRAMADO	EJECUTADO	ATRASO
45 %	28.57 %	16.43 %

El cuadro anterior relaciona el valor y avance programado con corte a 13 de agosto de 2025, avance ejecutado de obra, de mostrando con ello que mientras la línea de programación empieza a tener una pendiente mayor, la ejecución va disminuyendo, presentando un atraso en obra cercano al 16.43 %

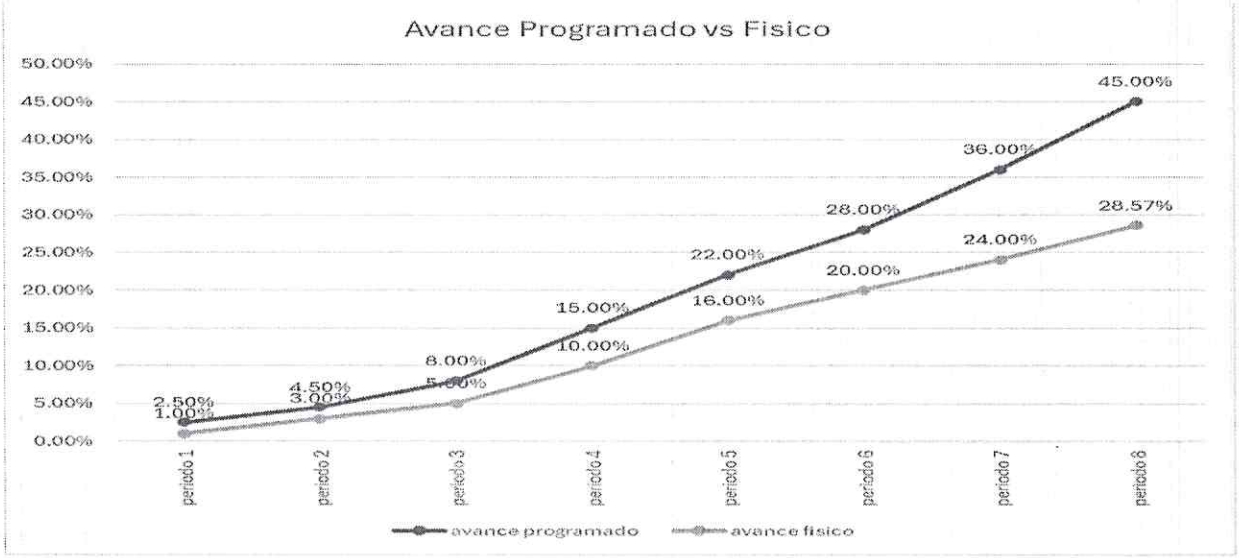

7. AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA NO 1692 DE 2025

Valor inicial del contrato	**$ 120.721.957,42**
Valor actual del contrato	**$ 120.721.957,42**
Valor ejecutado del contrato (acumulado)	**$ 25.734.936,80**
Valor ejecutado programado	**$ 34.490.263,23**
Porcentaje programado acumulado del contrato	**45%**
Porcentaje ejecutado del contrato (acumulado)	**28,57 %**

Control presupuestal

El valor del contrato se encuentra amparado de acuerdo con el certificado de disponibilidad presupuestal No 2123 del 11 de abril de 2025 y registro presupuestal No 3047 de 3 de junio de 2025

CDP.No	FECHA	DENOMINACIÓN	VIGENCIA	RUBRO	PRESUPUESTO ASIGNADO
2123	11/04/2025	Implementación, optimización y sostenibilidad operativa de los puntos vive digital en el municipio de Villavicencio meta.	libre destinación	0401-2-3,23,01,0400,011	$ 120.882.609,60

315

RP.No	FECHA	DENOMINACIÓN	VIGENCIA	RUBRO	PRESUPUESTO ASIGNADO
3047	3/06/2025	Implementación, optimización y sostenibilidad operativa de los puntos vive digital en el municipio de Villavicencio meta.	libre destinación	0401-2-3,23,01,0400,011	$ 120.721.957,42

8. SOLICITUD DE PRORROGA No. 1

El contratista del contrato 1692 de 2025, el señor Carlos Augusto Giraldo Rengifo, radico el 15 de agosto de 2025 en la secretaria de Infraestructura, los documentos para la solicitud de prorroga No 1 por treinta (30) días, requería para continuar con su gestión y garantizar la calidad del proceso constructivo de la obra y demás factores de carácter técnico, legal, administrativo y financiero.
La solicitud de prorroga No 1 presentada por el contratista de obra fue revisada y avalada por la supervisión, con base en las siguientes consideraciones:

1. Situación actual del proyecto
Al corte de este informe, el avance físico del contrato refleja un progreso significativo en varios ítems, pero este ha sido alcanzado bajo un esquema de trabajo intermitente y adaptativo. La ejecución ha estado condicionada por la disponibilidad real de los espacios de intervención, por las condiciones climáticas y por la incorporación de actividades no previstas en el alcance inicial. En términos operativos, se han presentado jornadas de trabajo en las que ha sido necesario reorganizar los frentes de obra de manera constante para optimizar el uso del tiempo disponible y evitar interferencias con el funcionamiento de las instituciones educativas y comunitarias que operan en los Puntos Vive Digital.
2. Justificación técnica y operativa de la prórroga
A continuación, se describen de manera detallada los factores que justifican la necesidad de una prórroga en el plazo de ejecución:

3. Uso de las instalaciones por parte de estudiantes y usuarios
Las áreas objeto de intervención en los Puntos Vive Digital cumplen funciones académicas y comunitarias. En especial, durante las horas de la tarde se desarrollan clases y talleres, lo que obliga a suspender temporalmente las labores en ciertos espacios para evitar afectaciones en las actividades educativas.

Esta circunstancia ha generado:

- Reducción del tiempo efectivo de trabajo en algunos frentes.
- Necesidad de trasladar al personal y los equipos hacia otros puntos disponibles, generando tiempos improductivos por desplazamiento interno.
- Reprogramación constante de tareas, lo que afecta la secuencia lógica de ejecución y el rendimiento global del proyecto.

4. Condiciones climáticas adversas
Durante los meses de junio y julio del presente año, el municipio de Villavicencio ha experimentado un régimen de lluvias intensas y frecuentes, especialmente en horas de la tarde. Estas precipitaciones han limitado o impedido la ejecución de actividades en exteriores tales como:

- Lavado y limpieza de senderos y cubiertas.
- Aplicación de pintura en fachadas y elementos expuestos.
- Trabajos de impermeabilización y sellado de juntas.

Ante estas condiciones, la programación se ha adaptado para concentrar esfuerzos en labores internas no afectadas por la lluvia, aunque esto no siempre ha permitido compensar los retrasos acumulados en los trabajos exteriores.

5. Impacto de los factores identificados en el cronograma
La concurrencia de los factores antes descritos ha ocasionado que, si bien las metas parciales se han ido alcanzando, el ritmo general de avance no se ajuste al plan original. La ejecución ha debido reorganizarse en múltiples ocasiones, generando un esquema de trabajo no lineal que, aunque funcional, no permite concluir la totalidad de las intervenciones dentro del plazo contractual vigente.

6. Fundamentación de la solicitud
Técnica y administrativamente, resulta procedente la solicitud de prórroga del Contrato de Obra No. 1692 de 2025, dado que:

- Las restricciones de acceso y uso de espacios son ajenas a la voluntad del contratista.
- Las condiciones meteorológicas son imprevisibles y constituyen un factor de fuerza mayor.
- Las actividades adicionales responden a la necesidad de asegurar el cumplimiento pleno del objeto contractual y la calidad de la obra.

9. JUSTIFICACIÓN DE LA PRORROGA

En consideración del contexto anteriormente expuesto, en el cual el contratista relaciona los motivos técnicos, legales, administrativos y financieros para solicitar la prorroga al contrato de obra No 1692 de 2025, con la finalidad de promover la ejecución satisfactoria del contrato, evitando perjuicios a la entidad.

Esta solicitud de prorroga No 1 por un tiempo de treinta (30) días para el contrato de obra No 1692 de 2025 cuyo objeto es : "MANTENIMIENTO , ADECUACIONES Y REFORMAS A LAS INSTALACIONES DE LOS PUNTOS VIVE DIGITAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO " fue estudiada por la SUPERVISION , quien teniendo en cuenta las causales expuestas por el contratista y la correspondiente justificación , considera pertinente solicitar al ordenador del gasto la aprobación de la prorroga No 1 por treinta (30) días al contrato de obra No 1692 de

316

2025 , a partir del 20 de mayo de 2025, teniendo como nueva fecha prevista de terminación el 18 de septiembre de 2025.

10. CONCLUSIONES

1. La supervisión estudio la solicitud de la prorroga No 1 por treinta (30) días al contrato de obra No 1692 de 2025, presentada el 15 de agosto de 2025 por el contratista Carlos Augusto Giraldo Rengifo, teniendo en cuenta las causales expuestas en si informe de solicitud y la correspondiente justificación.

2. Con el fin de dar continuidad a las labores de control y seguimiento al contrato de obra, fundamentalmente para poder garantizar el cumplimiento del objeto contractual y poder entregar el proyecto ejecutado en su totalidad a la entidad contratante, cumpliendo con los estándares de calidad establecidos, se requiere continuar con la ejecución por parte del contratista Carlos Augusto Giraldo Rengifo a través del contrato 1692 de 2025.

3. Por lo anterior expuesto, esta SUPERVISION solicita al ordenador del gasto la aprobación de la Prorroga No 1 por treinta (30) días al contrato de obra No 1692 de 2025, a partir del 20 de agosto de 2025, teniendo como nueva fecha prevista de terminación el 18 de septiembre de 2025.

4. El contratista debe ampliar los plazos del amparo de la garantía única de cumplimiento y del anexo de re4sponsabilidad civil extracontractual.

ANEXOS:
Soportes de pago de la planilla seguridad social
CD. (si aplica, si no, eliminar)
Otros que considere necesarios.

SUPERVISOR: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
CARGO DEL SUPERVISOR: DIRECTOR DE OBRAS CIVILES
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
TELÉFONO DEL SUPERVISOR: 3208613106

Nota: Los datos completos del supervisor son obligatorios, ya que será la persona contacto en caso de alguna modificación al informe.

ADICIÓN ☐ PRÓRROGA ☑

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de solicitud de adición o prórroga N°. 01 , el contratista e interventor (y/o supervisor cuando aplique) asumen plena responsabilidad por la veracidad de la
- Avance físico ejecutado de la obra
- Valor actual del contrato
- Valor facturado hasta la fecha
- Valor anticipo, si lo hubo
- Valor anticipo amortizado
- Valor anticipo por amortizar
- Condiciónes técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de la adición o prórroga del contrato.

2) El secretario o jefe del sector solicitante y el Supervisor de Contrato velará porque las razones por las cuales se solicita la adición o prórroga del contrato, estén plenamente justificadas ante la
3) El Responsable de la dependencia respectiva revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar estar

A. ANTECEDENTES

CONTRATO No. 1692 DE 2025
(Número de contrato) (Año de suscripción)

NÚMERO DEL PROCESO EN SECOP SMC-066
(Indique en este espacio la identificación de la licitación pública o contratación directa efectuada)

OBJETO DEL CONTRATO:
MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REFORMAS A LAS INSTALACIONES DE LOS PUNTOS VIVE DIGITAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 75 días
(Indique en este espacio el numero de dias o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 5 (Día) DE Junio (Mes) DE 2025 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO 19 (Día) DE Agosto (Mes) DE 2025 (Año)

PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA DEL CONTRATO 19 (Día) DE Agosto (Mes) DE 2025 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 120.721.957,42
(Indique el valor del contrato suscrito en numeros)

VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR (S)

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 120.721.957,42
(Indique el valor del contrato suscrito en numeros)

CONTRATISTA MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N.A.
(Escriba el nombre o razón social del interventor del contrato)

SUPERVISOR DELEGADO DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
(Indique el nombre del funcionario designado para ser Supervisor del contrato)

SECRETARIO O JEFE SECTOR SOLICITANTE JUAN CARLOS AGUILAR VASQUEZ
(Escriba el nombre del secretario)

B. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar al Municipio de Villavicencio, una prorroga al contrato anteriormente citado de 30 DÍAS y una adicion de recursos de N/A

NUEVO PLAZO DE EJECUCION SEGÚN SOLICITUD 105 días
(Indique el tiempo segun plazo solicitado)

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 18 de Septiembre de 2025
(Indique la nueva fecha de terminación del contrato segun solicitud)

NUEVO VALOR SEGÚN SOLICITUD $ 120.721.957,42
(Indique el nuevo valor del contrato según solicitud)

C. ESTADO FISICO

Hasta el 13 (Dia de corte) del mes agosto del 2025 el contrato presentaba un avance fisico ejecutado del 28,57% % contra un avance fisico programado del 7 45 %

D. ESTADO FINANCIERO

Valor actual del contrato	$ 120.721.957	Valor anticipo	$ -
Valor facturado a la fecha	$ -	Valor anticipo amortizado	$ -
Valor por facturar	$ 120.721.957	Valor anticipo por amortizar	

E. CAUSALES DE LA SOLICITUD

Las áreas objeto de intervención en los puntos Vive Digital cumplen funciones académicas y comunitarias. En especial, durante las horas de la tarde se desarrollan clases y talleres, lo que obliga a suspender temporalmente las labores en ciertos espacios para evitar afectaciones en las actividades educativas. Esta circunstancia ha generado reducción de tiempo efectivo de trabajo en algunos frentes, necesidad de trasladar al personal y los equipos hacia otros puntos disponibles generando tiempos improductivos por desplazamiento interno, reprogramación constante d etareas, lo que afecta la secuencia lógica de ejecución y el rendimiento global del proyecto. seguido a ello, durante los meses de junio y julio de 2025, el municipio de Villavicencio ha experimentado un régimen de lluvias intensas y frecuentes, especialmente en horas de la tarde. estas precipitaciones han limitado o impedido la ejecución de actividades en exteriores tales como el lavado y la limpieza de senderos y cubiertas, aplicación de pintura en fachadas y elementos expuestos y trabajo de impermeabilización y sellado de juntas.

Nota: Cuando se trate de solicitud de adición, debe colocarse en el anexo el acta de modificación de cantidades de obra, el análisis de precios unitarios, el acta de fijacion de precios no previstos, las memorias de calculo de cantidades y el informe de modificatoria todo debidamente suscrito y viabilizado por interventoria y supervision; cuando se trate de solicitud, de prórroga, la reprogramación de obra, los oficios de viabilidad de interventoria e informes. Asi como todos los documentos que sean considerados necesarios por el Municipio y/o supervisor y/o Interventor.

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORIA ACERCA DE LA SOLICITUD
N.A.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los _____

Firma
Nombre MEGA PROYECTOS E INVERSIONES SAS
R/L. CARLOS AUGUSTO GIRALDO RENGIFO
Contratista

Firma
Nombre N.A.
R/L.
Interventor

Firma
Nombre JUAN CARLOS AGUILAR VASQUEZ
Secretario de despacho

Firma
Nombre DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
Supervisor
