DIRECCIÓN TERRITORIAL DE CUNDINAMARCA
GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 3661-2024
Periodo:	DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	4622 del 02 de OCTUBRE de 2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

01. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CURAL DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Caparrapí del departamento de Cundinamarca en la vereda el Cural, en el corredor vial denominado Vía vereda el Cural – Utica (Vía que comunica del municipio de Caparrapí – Utica – Sector Vereda Puente Río Pata hasta el tramo El cascajal en la vereda El Cural) que tiene una longitud de atención 0,23 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 Vía que comunica del municipio de Caparrapí – Utica – Sector Vereda Puente Río Pata, y el punto final de referencia es PR0+230 El cascajal en la vereda El Cural, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

02. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CORDOBA DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Caparrapí del departamento de Cundinamarca en la vereda Córdoba, en el corredor vial denominado vía Córdoba, sector obra los Viejitos hasta la Quebrada la Morena municipio de Caparrapí, con una longitud de atención de 0.16km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 Vía Córdoba sector los Viejitos, y el punto final de referencia es PR0+160 vía Córdoba, sector

Quebrada la Morena, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

03. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PEÑALOSA DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Caparrapí del departamento de Cundinamarca en la vereda Peñaloza, en el corredor vial denominado Vía vereda Peñaloza-Utica, tramo comprendido en la vía que comunica del municipio de Caparrapí-Utica, sector vereda Peñaloza, que tiene una longitud de atención de 0,40km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 Vía vereda Peñaloza Utica, y el punto final de referencia es PR0+400 en la Vía vereda Peñaloza-Utica, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

04. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TATI DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Caparrapí del departamento de Cundinamarca en la vereda Tati, en el corredor vial denominado Vía San Carlos – Tati – Sector capote sitio Clavijo, siete vueltas intermedio, sitio donde la señora Nohora y quebrada de los indios municipio Caparrapí tiene una longitud de atención de 0,15km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 vía San Carlos, y el punto final de referencia es PR0+150 en la parte de la quebrada de los indios , conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

05. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ENCANTADO DEL MUNICIPIO DE EL PEÑON: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de el Peñón del departamento de Cundinamarca en la vereda ENCANTADO, en el corredor vial denominado la vía El Florido, vía que comunica El Encantado al Florido, que tiene una longitud de atención de 0,26km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 Tubo del acueducto veredal, y el punto final de referencia es PR0+260 en la parte de la vía el florido, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

06. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA AGUADAD DEL MUNICIPIO DE EL PEÑON: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de El Peñón del departamento de Cundinamarca en la vereda la Aguada, en el corredor vial denominado Vía la Aguada entrada Talauta a la vereda curiche que tiene una longitud de atención de 0,30km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 Finca sr Benjamín y el punto final de referencia es PR0+300 en la parte de Benjamín Bustos terminando la finca, conforme

a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

07. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIO FRIODEL MUNICIPIO DE LA PALMA: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio la Palma del departamento de Cundinamarca en la vereda Rio Frio, en el corredor vial denominado Rio Frio y Naranjal, vía que comunica vereda Rio Frio con vereda Naranjal, que tiene una longitud de atención de 0,29km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 en la alcantarilla, y el punto final de referencia es PR0+290 en la parte entrada a la vereda Rio Frio, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

08. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL BARRANCON DEL MUNICIPIO DE LA PALMA: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio la Palma del departamento de Cundinamarca en la vereda el Barrancón, en el corredor vial denominado vía vereda de El Barrancón Alto de Cañas, tramo comprendido entre la vereda de El Barrancón con la vereda Alto de Cañas la cual conduce a la vía Central del municipio; especialmente el tramo entre el predio de la señora Janeth Mahecha hasta el predio del señor Raúl Marroquín, que tiene una longitud de atención de 0,22km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 predio señora Yanet Mahecha, y el punto final de referencia es PR0+220 en la parte de la predio del señor Raúl Marroquín, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

09. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOMA MEDIO DEL MUNICIPIO DE LA PALMA: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio la Palma del departamento de Cundinamarca en la vereda Loma en medio, en el corredor vial denominado vía que comunica la vereda de Loma en Medio con la Vía central del municipio, específicamente el tramo desde el sector conocido como las monas hasta la loma de cabao que tiene una longitud de atención de 3km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 casa de las monas, y el punto final de referencia es PR0+3000 en la parte que tiene inicio del ramal, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

10. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SIRIA DEL MUNICIPIO DE PAIME: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Paime del departamento de Cundinamarca en la vereda Siria, en el corredor vial denominado Vía interna vereda siria, en el tramo conocido como "La Laja" que tiene una longitud de atención de 0,25km, tomando como punto de inicio

de referencia el PR0+00 Escuela rural de Siria, y el punto final de referencia es PR0+250 en la parte baja de la Vía interna vereda siria, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

11. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PALMAR DEL MUNICIPIO DE PAIME: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Paime del departamento de Cundinamarca en la vereda palmar, en el corredor vial denominado Inspección de Cuatro Caminos a la Vereda el Palmar sector "Curva de Don Adán" tiene una longitud de atención de 0.2km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 Inspección de Cuatro Caminos, y el punto final de referencia es PR0+200 en la parte de la Vereda el Palmar sector "Curva de Don Adán, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

12. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TERMINOS DEL MUNICIPIO DE TOPAIPI: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Topaipí del departamento de Cundinamarca en la vereda Términos, en el corredor vial denominado vía Honduras, vía que comunica las veredas de Honduras a Términos que tiene una longitud de atención de 0,34km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 Vía Honduras, y el punto final de referencia es PR0+340 en la vía Honduras, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

13. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA NARANJAL DEL MUNICIPIO DE TOPAIPI: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Topaipí del departamento de Cundinamarca en la vereda Naranjal, en el corredor vía Capira denominado vereda Naranjal con el sector Capira y Loma Finca de los Andes que tiene una longitud de atención de 0,17km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 vereda Naranjal con el sector Capira, y el punto final de referencia es PR0+170 en la vía Capira Loma Finca de los Andes, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías

14. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PAPATAS DEL MUNICIPIO DE TOPAIPI: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Topaipí del departamento de Cundinamarca en la vereda de Patatas, en el corredor vial denominado vía Patatas Guayabal en el sector (Loma esquina del colegio – hasta frente de don Chivagocha, placa huella con cunetas 0.2 km Vda Patatas) que comunica las veredas de Patatas, Pisco Chiquito, Alto de Micos,

Inspección de Guayabal del Peñón y Pisco Grande con el casco urbano (Vía alterna de la zona) que tiene una longitud de atención de 0,24km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 Vía el colegio, y el punto final de referencia es PR0+240 en la Vía el colegio, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

15. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAQUIAN DEL MUNICIPIO DE TOPAIPI: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Topaipí del departamento de Cundinamarca en la vereda Caquian, en el corredor vial denominado Vía Caquian alto, en la via que comunica las veredas de Caquian y San Antonio de Aguilera que tiene una longitud de atención de 0,20km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 Vía Caquian alto, y el punto final de referencia es PR0+200 en la vía Caquian alto, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

16. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MUCHIPAY DEL MUNICIPIO DE TOPAIPI: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Topaipí del departamento de Cundinamarca en la vereda Muchipay, en el corredor vial denominado Vía de la vereda Muchipay, que tiene una longitud de atención de 0,20km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 Vía vereda Muchipay, y el punto final de referencia es PR0+200 en la vía vereda Muchipay, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

17. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PURAY DEL MUNICIPIO DE YACOPI: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Yacopí del departamento de Cundinamarca en la vereda Puray, en el corredor vial denominado Yacopí - Llano Mateo Sector PURAY que tiene una longitud de 1.92 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 Entrada de Eulisis, y el punto final de referencia es PR 1+920 Casa de Italo conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

18. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA GLORIETA DEL MUNICIPIO DE YACOPI: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Yacopí del departamento de Cundinamarca en la vereda La Glorieta, en el corredor vial denominado Yacopí-Ye Glorieta, vía que comunica el casco urbano de Yacopi con la inspección de Ibama, que tiene una longitud de atención de 2.5 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 Casco Urbano, y el punto final de referencia es PR 2+500 Inspección de Ibama, conforme

a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

19. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE YACOPI: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Yacopí del departamento de Cundinamarca en la vereda la chapa, en el corredor vial denominado cruce vía ático-Escuela Chapa (Vía que comunica el casco urbano de Yacopí con la Inspección de Llano Mateo) que tiene una longitud de atención de 0,22km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 casa de la señora Raquel, y el punto final de referencia es PR0+220 en la vereda la chapa, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

20. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MORAY DEL MUNICIPIO DE YACOPI: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Yacopí del departamento de Cundinamarca en la vereda Moray, en el corredor vial denominado Moray - Rio Ático sector placa huella Chapa -Rio Ático, vía que comunica el casco urbano de Yacopí con la inspección de Aposentos que tiene una longitud de atención de 0.45 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 Casco Urbano Yacopí, y el punto final de referencia es PR 0+450 Inspección rio negro, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías

21. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LIMONAL DEL MUNICIPIO DE YACOPI: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Yacopí del departamento de Cundinamarca en la vereda limonal, en el corredor vial denominado la vía que comunica el casco urbano de Yacopí con la inspección de lbama que tiene una longitud de atención de 1,62km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 Vía Yacopí-ibama, y el punto final de referencia es PR1+620 en la Vía Yacopí Corregimiento Ibama sector Limonal, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

22. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAGUNETA DEL MUNICIPIO DE YACOPI: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Yacopí del departamento de Cundinamarca en la vereda Laguneta, en el corredor vial denominado Vía Yacopí-corregimiento Ibama vía que comunica el casco urbano de Yacopí con la inspección de lbama que tiene una longitud de atención de 0,31km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 Vía Yacopí-Corregimiento Ibama, y el punto final de referencia es PR0+310 en la Vía Yacopí-Corregimiento Ibama sector la Escuela, conforme a la información

levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

23. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA IBAMA DEL MUNICIPIO DE YACOPI: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Yacopí del departamento de Cundinamarca en la INSPECCIÓN DE IBAMA, en el corredor Vía Yacopí-corregimiento Ibama sector vía llanadas, en la vía que comunica el casco urbano de Yacopí con Ibama, que tiene una longitud de atención1.26 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+000 Casco urbano Yacopí, y el punto final de referencia es PR 1+260 Inspección de Ibama, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

24. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ARGENTINA – MUNICIPIO DE QUIPILE: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Quipile del departamento de Cundinamarca en la vereda La Argentina, en el corredor vial denominado Cuatro Caminos - La Joya, vía que comunica de la vereda Guadalupe sector 4 caminos a la vereda la Joya, que tiene una longitud de atención de 0.45 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 + 000 vereda Guadalupe sector 4 caminos, y el punto final de referencia es PR 0 + 450 Vereda la Joya, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

25. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL IMPARAL – MUNICIPIO DE SUPATÁ: El proyecto a desarrollar, se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Supatá del departamento de Cundinamarca en la vereda El Imparal, en el corredor vial denominado Vía Imparal (Vía que comunica El Colegio El Imparal con la Vereda Girón), con una longitud de recorrido de atención de 1.89 km, el punto de inicio de referencia PR 0 + 00 es la vía Vereda Girón y el punto final de referencia es el PR 1 + 089 en el Sector Colegio El Imparal; conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

26. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PULISITO – MUNICIPIO DE PULÍ: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Pulí del Departamento de Cundinamarca en la vereda Pulisito, en el corredor vial denominado Vía Sector Villamarta – Vía que de la planta de gas conduce a la vía el chocho, tiene una longitud de 1.5 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 + 00 vía sector Villamarta y el punto final de referencia el PR 1 + 500 en la parte de la vía el chocho, conforme a la información levantada en campo

por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

27. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SABANETA – MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de San Francisco del Departamento de Cundinamarca en la Vereda Sabaneta, en el corredor vial denominado Vía Sabaneta Sector Los Nocua (Vía que comunica a Sabaneta Alto Sector Los Nocua), con una longitud de atención de 0.22 km, el punto de referencia de inicio es el PR 0 + 00 Sector Los Nocua y el punto final de referencia es el PR 0 + 220 Vía Nacional Autopista Medellín (Bogotá – La Vega), conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

28. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANADAS CENTRO – MUNICIPIO DE CHAGUANÍ: El proyecto a desarrollar, se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Chaguaní del Departamento de Cundinamarca en la Vereda Llanadas Centro, en el corredor vial denominado Vía hacía Guaduas, que comunica las Veredas de Llanadas Chaguaní y Campeona Guaduas y Hatillo Guaduas con las vías principales que van desde Chaguaní a Guaduas, con una longitud de atención de 3.0 km, donde el punto de inicio de referencia es el PR 0 +00 Finca Los Naranjitos y el punto final de referencia es el PR 3 + 000 Sector Rosalito, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

29. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMANCHA – MUNICIPIO DE SAN CAYETANO: El proyecto a desarrollar, se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de San Cayetano del Departamento de Cundinamarca en la Vereda Camancha, en el corredor vial denominado Vía Camancha Sector Los Pirineos, con una longitud de atención de 1 km, el punto de inicio de referencia es el PR 0 + 00 en la Finca Laura Arias y el punto final de referencia es el PR 1 + 00 Vía Vereda Santa Isabel, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

30. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TIERRA GRATA – MUNICIPIO DE FACATATIVÁ: El proyecto a desarrollar, se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Facatativá del Departamento de Cundinamarca en la Vereda Tierra Grata, en el corredor vial denominado Vía Tierra Grata Baja hacía Tierra Grata Alta Sector Camino Al Cielo, tramo comprendido en la Vía Transversal Medellín KM 21 + 500 Entrada Norte destapada Ruta Camino Al Cielo – Bogotá, que tiene una longitud de atención de 0.207 km, tomando como punto de inicio de

referencia el PR 0 + 00 Vía Tierra Grata Baja, y el punto final de referencia el PR 0 + 207 en la Vereda Tierra Grata, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

31. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CABRERA – MUNICIPIO DE PULÍ: El proyecto a desarrollar, se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Pulí del Departamento de Cundinamarca en la Vereda La Cabrera, en el corredor vial entre sucesión Quiroga y la Finca del señor Solio Rojas, límites de la Vereda La Hamaca, con una longitud de 0.27 km, el punto de inicio de referencia es el PR 0 + 00 sucesión Quiroga Ismael Gómez y Solio Rojas, y el punto final de referencia es el PR 0 + 270 límites de la Vereda La Hamaca, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

32. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LIRIA – MUNICIPIO DE SAN CAYETANO: El proyecto a desarrollar, se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de San Cayetano del Departamento de Cundinamarca en la Vereda Liria, en el corredor vial denominado Vía Vereda Liria Sector La Escuela Vereda Las Mercedes, con una longitud de atención de 1 km, el punto de inicio de referencia es el PR 0 + 00 en Vía Liria y el punto final de referencia es el PR 1 + 00 Vía Vereda Las Mercedes, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

33. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUADALUPE – MUNICIPIO DE QUIPILE: El proyecto a desarrollar, se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Quipile del Departamento de Cundinamarca en la Vereda el Guadalupe, en el corredor vial denominado Vía Veredal Guadalupe Alto, tramo comprendido en la vía principal La Sierra con la Vereda Guadalupe Alto, que tiene una longitud de atención de 0.44 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 + 00 Vía principal La Sierra, y el punto final de referencia el PR 0 + 440 Vereda Guadalupe Alto, conforma a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

34. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CENTRO ANTIGUO DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO: El proyecto a desarrollar, se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de San Cayetano del Departamento de Cundinamarca en la Vereda Centro Antiguo, en el corredor vial denominado Vía Vereda Centro San Cayetano vía a la Vereda Canutillal, con una longitud de atención de 1 km, el punto de inicio de referencia es el PR 0 + 00 Vía Centro, y el punto final de referencia es el PR 1+ 00 Vía Vereda Canutillal, conforme a la información levantada en campo

por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

35. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ROBLEDAL - MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SIQUIMA: El proyecto a desarrollar, se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Guayabal de Síquima del Departamento de Cundinamarca en la Vereda El Robledal, en el corredor vial denominado Vereda El Robledal (Vía Principal y Camino de la Vereda Robledal), con una longitud de atención de 0.2 km, el punto de inicio de referencia es el PR 0 + 00 Vía Principal, y el punto final de referencia es el PR 0 + 200 Camino 1 Vereda Robledal, conforma a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

36. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MANANTIAL – MUNICIPIO DE PULÍ: El proyecto a desarrollar, se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Pulí del Departamento de Cundinamarca en la Vereda Manantial, en el corredor vial denominado Vía El Prado y El Congo, con una longitud de atención de 20 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 + 00 Vía al Prado, y el punto final de referencia es el PR 20 + 000 en la parte de la Vía El Congo, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

37. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TRIGO – MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SÍQUIMA: El proyecto a desarrollar, se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Guayabal de Síquima del Departamento de Cundinamarca en la Vereda El Trigo, en el corredor vial denominado El Retén, vía que comunica La Vereda El Trigo con el Casco Urbano del Municipio de Guayabal de Síquima, con una longitud de atención de 0.89 km, el punto de inicio de referencia es el PR 0 + 00 vía que comunica La Vereda El Trigo, y el punto final de referencia es el PR 0 + 890 tramo del Casco Urbano del Municipio de Guayabal de Síquima, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

38. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MODELIA – MUNICIPIO DE VIOTÁ: El proyecto a desarrollar, se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Viotá del Departamento de Cundinamarca en la Vereda Modelia, en el corredor vial denominado Vía Jasminia San Gabriel, tramo que comunica la Vereda Modelia a la Vereda California, con una longitud de atención de 0.18 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 + 00 Vía de la Vereda Modelia, y el punto final de referencia es el PR 0 + 180 Vía a la Vereda California, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

39. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUEBRADA GRANDE – MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA: El proyecto a desarrollar, se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de San Antonio del Tequendama del Departamento de Cundinamarca en la Vereda Quebrada Grande, en el corredor vial denominado Vía Quebrada Grande (Tramo comprendido en la vía que comunica la Entrada Pantano Rico Sector Milán Vía Santandercito Vereda Quebrada Grande), con una longitud de atención de 1 km, el punto de inicio de referencia es el PR 0 + 00 Finca Milán, y el punto final de referencia es el PR 1 + 00 Pantano Rico, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

40. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PALMAR – MUNICIPIO DE VERGARA: El proyecto a desarrollar, se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Vergara del Departamento de Cundinamarca en la Vereda El Palmar, en el corredor vial denominado Vías El Palmar, La Vistosa, y El Vergel, La Paz, Sector Colegio Fidel León Triana, que tiene una longitud de atención de 0.2 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 + 00 Vía El Palmar – La Vistosa, y el punto final de referencia es el PR 0 + 200 Vía El Vergel – La Paz Sector El Colegio Fidel León Triana, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico del Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

41. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA HONDURAS ALTO – MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO: El proyecto a desarrollar, se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de San Juan de Río Seco del Departamento de Cundinamarca en la Vereda Honduras Alto, en el corredor vial denominado Vía Honduras Alto a San Nicolás, vía que comunica la Vereda Honduras Alto con la Inspección de San Nicolás, Municipio de San Juan de Río Seco, con una longitud de atención de 0.25 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 + 00 Vía Honduras Alto, y el punto final de referencia en el PR 0 + 250 Vía Honduras Alto a la Inspección San Nicolás, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

42. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MARCELLA – MUNICIPIO DE EL COLEGIO: El proyecto a desarrollar, se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de El Colegio del Departamento de Cundinamarca en la Vereda Marcella, en el corredor vial denominado Vía Cansaperros KM 10 Vía La Victoria, tramo comprendido en la vía que comunica Marsella Baja al Km 10 Vía la Victoria, que tiene una longitud de atención de 0.2 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 + 00 Finca Salomón, y el punto final de referencia es el PR 0 + 200 Finca de Javier, conforme la información levantada en campo por parte del

equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

43. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ALIANZA – MUNICIPIO DE LA VEGA: El proyecto a desarrollar, se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de La Vega del Departamento de Cundinamarca en la Vereda La Alianza, en el corredor vial denominado Río Cañas a Chilín en la Vereda La Alianza del Municipio de La Vega, que tiene una longitud de atención de 0.22 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 0 + 00 Sector Río Cañas, y el punto final de referencia es el PR 0 + 220 Sector Santa Teresita, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

44. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA MONTAÑA – MUNICIPIO DE UTICA: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Útica del Departamento de Cundinamarca en la Vereda La Montaña, en el corredor vial denominado La Montaña vía que comunica al municipio de Útica con el tramo El Caliche, que tiene una longitud de atención de 0.2 km, tomando como punto de referencia el PR 0 + 000 el Tramo el Caliche, y el punto final de referencia es el PR 0 + 200 vía que comunica al Municipio de Útica, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

46. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA BARBARA ALTA – MUNICIPIO DE ARBELÁEZ: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Arbeláez del departamento de Cundinamarca en la vereda de Santa Barbara alta, en el corredor vial denominado Vía Santa Barbara Sector Casa Blanca en el punto Calamar Hasta quebrada La Legía, comprendido que tiene una longitud de atención de 0,2km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 Vía santa bárbara, y el punto final de referencia es PR0+200 en la Vía santa Bárbara, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

47. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS ÁGUILAS – MUNICIPIO DE CABRERA: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Cabrera del departamento de Cundinamarca en la vereda Las Águilas, en el corredor vial denominado vía Escuela águilas-Cabrera con una longitud de 0.315 km, el punto de inicio de referencia PR 0+00 en curva de la finca de Yesid Delgado y el punto final de referencia es PR0 + 315 después de la alcantarilla, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

48. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CABRERA: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Cabrera del departamento de Cundinamarca en la vereda Zona Urbana, en el corredor vial denominado Vía veredas de Peñas blancas, Pueblo viejo, Paquilo, Canadá, La Playa, Hoyerías, La Cascada, Las Águilas hacia el casco urbano del municipio de Cabrera, en el tramo conocido como "las brisas - vías peñas blancas" que tiene una longitud de atención de 0,65km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 las brisas, y el punto final de referencia es PR0+650 en la parte baja de la Vías peñas blancas, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

49. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PLAYA -MUNICIPIO DE CABRERA: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Cabrera del departamento de Cundinamarca en la vereda La Playa, en el corredor vial denominado vía Puente Sumapaz -La Playa, punto de referencia inicial en el puente Sumapaz y punto de referencia final Segunda Placa huella sector rio-Caserío. tiene una longitud de atención de 0,74km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 punto de referencia inicial en el puente Sumapaz, y el punto final de referencia es PR0+740 punto de referencia final Segunda Placa huella sector rio-Caserío, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

50. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA RITA PARTE BAJA - MUNICIPIO DE CABRERA: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Cabrera del departamento de Cundinamarca en la vereda Santa Rita parte baja, en el corredor vial denominado Sector El Corral vía que comunica de la vereda las Águilas hacia el casco urbano del municipio de Cabrera con una longitud de atención de 0.70km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 vía que comunica de la vereda las Águilas, y el punto final de referencia es PR0+700 vía que comunica de la vereda las Águilas, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

51. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAVIO BAJO - MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Fusagasugá del departamento de Cundinamarca en la vereda Guavio Bajo, en el corredor vial denominado Guavio Bajo - Guavio Alto, tramo comprendido en la vía que comunica de la vereda Guavio bajo a la vereda Guavio Alto que tiene una longitud de atención de 1,04km, tomando como punto de inicio de referencia el

PR0+00 Vía Guavio Bajo – Guavio alto, y el punto final de referencia es PR1+04 en la Vía Guavio Bajo – Guavio alto, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

52. ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL-ASORURAL - MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Fusagasugá del departamento de Cundinamarca en la vereda La Trinidad, en el corredor vial denominado Vía de la vereda La Trinidad, sector el Trapiche, trayecto desde el sitio Villa Inés hasta finca Sergio Mendoza tiene una longitud de atención de 0.16km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 vía vereda La Trinidad (Sitio Villa Inés), y el punto final de referencia es PR0+160 Vía vereda La Trinidad hasta la finca Sergio Mendoza, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

53. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LIMONCITOS - MUNICIPIO DE GUAYABETAL: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Guayabetal del departamento de Cundinamarca en la vereda el Limoncitos, en el corredor vial denominado vía antigua Bogotá Villavicencio hasta casa de Víctor Romero que tiene una longitud de atención de 0,20km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 vía antigua Villavicencio, y el punto final de referencia es PR0+200 en la parte de la casa de Víctor Romero, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

54. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN ANTONIO - MUNICIPIO DE GUAYABETAL : El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Guayabetal del departamento de Cundinamarca en la vereda San Antonio, en el corredor vial denominado Sector vía paramo, vía que comunica la casa el caliche hasta mata grande que tiene una longitud de atención de 0,20km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 casa el caliche, y el punto final de referencia es PR0+200 en la parte de la mata grande, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

55. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE PEÑAS - MUNICIPIO DE MANTA: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Manta del departamento de Cundinamarca en la vereda Peñas, en el corredor vial denominado Vía que conduce de Puente Berlín al sitio La Escuela de la Vereda Peñas sector Potrero que tiene una longitud de atención de 1.15 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR 00+000 Puente Berlín, y el punto

final de referencia es PR 1+150 La Escuela, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

56. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS ALPES - MUNICIPIO DE MEDINA: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Medina departamento de Cundinamarca en la vereda de Los Alpes, en el corredor vial denominado vía la inspección de los Alpes sector monumento de la Paz (Tramo comprendido en la vía que comunica a la inspección de los Alpes), con una longitud de atención de 1.40 km, el punto de inicio de referencia PR0+00 es la vía que comunica a la vereda de los Alpes sector monumento de la Paz y el punto final de referencia es PR1 +040 es caño Blanco, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

57. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL INSPECCIÓN LA ESMERALDA - MUNICIPIO DE MEDINA: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Medina del departamento de Cundinamarca en la vereda La Esmeralda, en el corredor vial denominado Inspección de San Pedro de Guajaray a la Inspección de la Esmeralda en el sitio Puerto Masato, que tiene una longitud de atención de 1,3km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 Inspección de San Pedro de Guajaray, y el punto final de referencia es PR1+300 en la parte de la Inspección de la Esmeralda, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

58. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JOSE ALTO REDONDO - MUNICIPIO DE MEDINA: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Medina del departamento de Cundinamarca en la vereda San José de Alto Redondo, en el corredor vial denominado, Vía inspección el engaño en vereda San José Alto Redondo, vía que conduce desde la Inspección de Maya a la Vereda San José de Alto Redondo, en el sitio Alto el Algarrobo tiene una longitud de atención de 0,24km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 Inspección de Maya a la Vereda San José, y el punto final de referencia es PR0+240 en la parte del sitio Alto el Algarrobo, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

59. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN PEDRO DE GUAJARAY - MUNICIPIO DE MEDINA: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Medina del departamento de Cundinamarca en la vereda Guarajay, en el corredor vial denominado sector borrachero vía San Pedro Guarajay, con una

longitud de atención de 1,77 km, el punto de inicio de referencia PR00+0 vía San Pedro Guajaray y el punto final de referencia PR1+77 es vía San Pedro Guajaray, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

60. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JUANITO - MUNICIPIO DE MEDINA: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Medina del departamento de Cundinamarca en la vereda San Juanito, en el corredor vial denominado Vía San Juanito – Gasatavena sector de Libertad que tiene una longitud de atención de 0,94km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 Vía San Juanito, y el punto final de referencia es PR0+094 en el sector la Libertad, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

61. ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE JUNTAS COMUNALES DE MEDINA: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Medina del departamento de Cundinamarca en la vereda Los Alpes centro, en el corredor vial denominado Vía Marginal de la Selva a la Vía Los Alpes Sector La Loma de Los Morenos, vía que comunica la Inspección de San Pedro de Guajaray a la Inspección de los Alpes sector Alto de los Moreno, tiene una longitud de atención de 0.23km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 la Inspección de San Pedro de Guajaray, y el punto final de referencia es PR0+230 Inspección de los Alpes sector Alto de los Moreno, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

62. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL ENGAÑO - MUNICIPIO DE PARATEBUENO: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Paratebueno del departamento de Cundinamarca en la vereda el Engaño, en el corredor vial denominado Vía maya el engaño sector la Y san pedro de jagua que tiene una longitud de atención de 0,22km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 Finca Gilberto, y el punto final de referencia es PR0+220 en el chamizo, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

63. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JESÚS DE PALOMAS - MUNICIPIO DE PARATEBUENO: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Paratebueno del departamento de Cundinamarca en la vereda San Jesús de Palomas, en el corredor vial denominado Vía Maña sector los Líos que conduce a la Vereda San Jesús de Palomas (tramo comprendido en la vía que conduce a la vereda San Jesús de Palomas), con una longitud de atención

de 1.56 km, el punto de inicio de referencia PR0+00 es la vía Maña y el punto final de referencia es PR1 +56 es Sector los Líos, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

64. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENAVISTA DE ALTO REDONDO - MUNICIPIO DE PARATEBUENO: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Paratebueno del departamento de Cundinamarca en la vereda Buenavista alto Redondo, en el corredor vial denominado Vía Maya el Engaño, vía que conduce a la vereda Buenavista de alto redondo que tiene una longitud de atención de 0,20km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 sector la H, y el punto final de referencia es PR0+200 frente a la casa de Jairo Reyes en la vía que comunica a la Vereda Buenavista de Alto Redondo, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

65. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA RASGATA - MUNICIPIO DE TAUSA: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Tausa del departamento de Cundinamarca en la vereda Rasgata, en el corredor vial denominado vía principal troncal del carbón, vía que comunica Troncal del carbón sector Pantano Redondo, tiene una longitud de atención de 0,40km, tomando como punto de inicio de referencia el PR0+00 en la troncal del carbón, y el punto final de referencia es PR0+400 sector Pantano Redondo, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

66. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ROMERO - MUNICIPIO DE UBAQUE: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Ubaque del departamento de Cundinamarca en la vereda Romero, en el corredor vial denominado Vía alterna sector el Sobandero (Via Alterna Sector el Sobandero, inicia Finca Pedro Saray Lavado y Termina en La Via Principal Ubaque - Fomeque - Vereda ROMERO Municipio de UBAQUE), bajo con una longitud de corredor de atención de 0.32 km, el punto de inicio de referencia finca Pedro Saray Lavado y el punto final de referencia es PR 00+320 vía principal Ubaque – Fomeque – Vereda Romero, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cundinamarca del Instituto Nacional de Vías.

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

Convenio 2585 DE 2024 EL CURAL;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2585 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CURAL DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPÍ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CURAL EN EL MUNICIPIO CAPARRAPÍ DEL DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA.
NIT.	900.592.212-9
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	201.072.692,00 (DOSCIENTOS UN MILLONES SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE)
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORIA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	FINALIZADO
FECHA ACTA DE INICI0:	30 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01/01/2025
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:	31/03/2025
FECHA DE INICIO PRORROGA No.2:	01/04/2025
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.2:	31/05/2025

Convenio 2690 DE 2024 CÓRDOBA;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2690 de 2024
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE CORDOBA DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE CORDOBA MUNICIPIO DE CAPARRAPI
NIT.	832.007.302-1
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$201.049.181,00 (DOSCIENTOS UN MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS M/CTE)
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORIA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	FINALIZADO
FECHA ACTA DE INICI0:	4 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01/01/2025
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:	31/03/2025

Convenio 2390 DE 2024 PEÑALOSA;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2390 de 2024
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PEÑALOZA CAPARRAPI DEL MUNICIPIO CAPARRAPI, DEL DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PEÑALOZA DEL MUNICIPIO CAPARRAPI
NIT.	901.017.574-9
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 201.089.987 (DOSCIENTOS UN MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE)
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORIA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
FECHA ACTA DE INICIO:	SIN INFORMACION
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO DE SUSPENSIÓN No. 1:	16/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 1:	11/04/2025
FECHA DE INICIO PRORROGA No. 1:	26/04/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	31/07/2025

Convenio 2332 DE 2024 TATI;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2332 de 2024
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO TATI MUNICIPIO DE CAPARRAPI, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO TATI MUNICIPIO DE CAPARRAPI
NIT.	900.592.212-9
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$200.955.709,00 (DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE)
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORIA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	FINAIZADO
FECHA ACTA DE INICI0:	30 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01/01/2025
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:	31/03/2025

Convenio 2525 DE 2024 ENCANTADO;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2525 de 2024
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DEACCIÓN COMUNAL DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ENCANTADO DEL MUNICIPIO DE EL PEÑON, DEL DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ENCANTADO DEL MUNICIPIO DE EL PEÑON
NIT.	900.784.449-1
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 201.043.481,00 (DOSCIENTOS UN MILLONES CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE)
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORIA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	FINALIZADO
FECHA ACTA DE INICIO:	2 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01/01/2025
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:	31/03/2025

Convenio 2353 DE 2024 LA AGUADA;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2353 de 2024
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE LA AGUADA DEL MUNICIPIO EL PEÑON DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE LA AGUADA DEL MUNICIPIO EL PEÑON
NIT.	900.592.212-9
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$200.867.389,00 (DOSCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE)
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORIA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	FINALIZADO
FECHA ACTA DE INICIO:	2 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01/01/2025
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:	31/03/2025

Convenio 2393 DE 2024 RIO FRIO;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2393 de 2024
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE RIO FRIO DEL MUNICIPIO DE LA PALMA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE RIO FRIO DEL MUNICIPIO DE LA PALMA
NIT.	901.274.670-9
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$200.961.874,00 (DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE)
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORIA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	FINALIZADO
FECHA ACTA DE INICI0:	5 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01/01/2025
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:	31/03/2025

Convenio 2834 DE 2024 EL BARRANCON;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2834 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JAC VEREDA DE EL BARRANCON DEL MUNICIPIO DE LA PALMA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE EL BARRANCON DEL MUNICIPIO DE LA PALMA
NIT.	901.130.029-9
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$200.964.505,00 (DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS M/CTE)
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORIA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	FINALIZADO
FECHA ACTA DE INICIO:	2 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01/01/2025
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:	31/03/2025

Convenio 2321 DE 2024 LOMA MEDIO;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2321 de 2024
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOMA EN MEDIO DEL MUNICIPIO DE LA PALMA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOMA EN MEDIO DEL MUNICIPIO DE LA PALMA
NIT.	901.099.545-6
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$200.982.165,00 (DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE)
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORIA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	FINALIZADO
FECHA ACTA DE INICI0:	2 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01/01/2025
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:	31/03/2025

Convenio 2164 DE 2024 SIRIA;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2164 de 2024
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL JAC DE LA VDA DE SIRIA DEL MUNICIPIO DE PAIME, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL JAC DE LA VDA DE SIRIA DEL MUNICIPIO DE PAIME
NIT.	901.277.978-5
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 200.208.920,00 (DOSCIENTOS MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE)
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORIA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	FINALIZADO
FECHA ACTA DE INICI0:	2 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01/01/2025
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:	31/03/2025
FECHA DE INICIO PRORROGA No.2:	01/04/2025
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.2:	31/05/2025
FECHA DE INICIO PRORROGA No.:	01/06/2025

No. CONVENIO SOLIDARIO	2164 de 2024
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.3:	30/06/2025

Convenio 2747 DE 2024 EL PALMAR;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2747 de 2024
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL JAC DE VDA. EL PALMAR DEL MUNICIPIO DE PAIME DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL JAC DE VDA. EL PALMAR DEL MUNICIPIO DE PAIME
NIT.	901.277.963-5
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 201.060.720,00 (DOSCIENTOS UN MILLONES SESENTA MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE)
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORIA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	FINALIZADO
FECHA ACTA DE INICI0:	2 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01/01/2025
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:	31/03/2025
FECHA DE INICIO PRORROGA No.2:	01/04/2025
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.2:	31/05/2025

Convenio 2296 DE 2024 TERMINOS;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2296 de 2024
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE TERMINOS DEL MUNICIPIO DE TOPAIPÍ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE TERMINOS DEL MUNICIPIO DE TOPAIPÍ
NIT.	900.592.212-9
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$201.010.045,00 (DOSCIENTOS UN MILLONES DIEZ MIL CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE)
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORIA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
FECHA ACTA DE INICI0:	5 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO DE SUSPENSIÓN No. 1:	16/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 1:	11/04/2025
FECHA DE INICIO PRORROGA No. 1:	26/04/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	31/07/2025

Convenio 2429 DE 2024 NARANJAL;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2429 de 2024
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA NARANJAL DEL MUNICIPIO DE TOPAIPI, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA NARANJAL DEL MUNICIPIO DE TOPAIPI
NIT.	900.184.436-1
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 200.531.208,00 (DOSCIENTOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS M/CTE)
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORIA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	FINALIZADO
FECHA ACTA DE INICIO:	2 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01/01/2025
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:	31/03/2025
FECHA DE INICIO PRORROGA No.2:	01/04/2025
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.2:	31/06/2025
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.3:	31/07/2025

Convenio 2586 DE 2024 PAPATAS;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2586 de 2024
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE PAPATAS DEL MUNICIPIO DE TOPAIPÍ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE PAPATAS DEL MUNICIPIO DE TOPAIPÍ
NIT.	900.184.430-8
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 200.935.282,00 (DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE)
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORIA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
FECHA ACTA DE INICIO:	30 DE SEPTIEMBRE
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO DE SUSPENSIÓN No. 1:	16/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 1:	11/04/2025
FECHA DE INICIO PRORROGA No. 1:	26/04/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	31/07/2025

Convenio 2400 DE 2024 CAQUIAN;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2400 de 2024
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CAQUIAN DEL MUNICIPIO DE TOPAIPÍ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CAQUIAN DEL MUNICIPIO DE TOPAIPÍ
NIT.	900.184.811-0
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 200.935.282,00 (DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE)
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORIA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	SUSPENDIDO
FECHA ACTA DE INICIO:	30 DE SEPTIEMBRE
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO DE SUSPENSION No.1:	16/12/2024
FECHA DE TERMINACION DE SUSPENSION No.1:	14/03/2024
FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSION No.1:	14/05/2024

Convenio 2394 DE 2024 MUCHIPAY;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2394 de 2024
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MUCHIPAY DEL MUNICIPIO DE TOPAIPÍ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MUCHIPAY DEL MUNICIPIO DE TOPAIPÍ
NIT.	900.184.420-4
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 201.032.018,00 (DOSCIENTOS UN MILLONES TREINTA Y DOS MIL DIECIOCHO PESOS M/CTE)
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORIA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
FECHA ACTA DE INICIO:	SIN INFORMACION
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01/01/2025
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:	31/03/2025
FECHA DE INICIO PRORROGA No.2:	01/04/2025
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.2:	31/05/2025

Convenio 2129 DE 2024 PURAY;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2129 de 2024
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL PURAY DEL MUNICIPIO YACOPÍ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN ELMARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL PURAY DEL MUNICIPIO YACOPÍ
NIT.	901.277.113-1
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 200.997.327,00 (DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE)
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORIA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	FINALIZADO
FECHA ACTA DE INICI0:	30 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01/01/2025
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:	31/03/2025

Convenio 2223 DE 2024 LA GLORIETA;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2223 de 2024
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA GLORIETA DEL MUNICIPIO YACOPÍ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA GLORIETA DEL MUNICIPIO YACOPÍ
NIT.	901.277.247-1
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 200.929.009,00 (DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL NUEVE PESOS M/CTE)
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORIA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	FINALIZADO
FECHA ACTA DE INICI0:	2 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01/01/2025
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:	31/03/2025

Convenio 2383 DE 2024 LA CHAPA;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2383 de 2024
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE YACOPÍ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE YACOPÍ
NIT.	901.515.683-1
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 200.799.504,00 (DOSCIENTOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS M/CTE)
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORIA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	FINALIZADO
FECHA ACTA DE INICI0:	2 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01/01/2025
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:	31/03/2025

Convenio 2214 DE 2024 MORAY;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2214 de 2024
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DEACCION COMUNAL DE VEREDA MORAY DEL MUNICIPIO YACOPÍ, DELDEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN ELMARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DEACCION COMUNAL DE VEREDA MORAY DEL MUNICIPIO YACOPÍ
NIT.	900.042.762-9
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 201.061.288,00 (DOSCIENTOS UN MILLONES SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE)
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORIA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	FINALIZADO
FECHA ACTA DE INICI0:	2 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01/01/2025
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:	31/03/2025

Convenio 2779 DE 2024 LIMONAL;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2779 de 2024
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LIMONAL DEL MUNICIPIO DE YACOPI DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LIMONAL DEL MUNICIPIO DE YACOPÍ
NIT.	901487525-3
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 200.871.439,00 (DOSCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE)
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORIA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	FINALIZADO
FECHA ACTA DE INICIO:	30 DE SEPTIEMBRE
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01/01/2025
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:	31/03/2025

Convenio 2241 DE 2024 LAGUNETA;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2241 de 2024
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAGUNETA DEL MUNICIPIO DE YACOPÍ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAGUNETA DEL MUNICIPIO DE YACOPÍ
NIT.	807.002.146-3
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 201.086.476,00 (DOSCIENTOS UN MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE)
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORIA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	FINALIZADO
FECHA ACTA DE INICI0:	2 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01/01/2025
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No.1:	31/03/2025

Convenio 2281 DE 2024 IBAMA;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2281 de 2024
OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JAC INSPECCION DE IBAMA MUNICIPIO YACOPÍ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JAC INSPECCION DE IBAMA MUNICIPIO YACOPÍ
NIT.	901.121.418-2
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 200.917.714,00 (DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE)
INTERVENTORIA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORIA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	FINALIZADO
FECHA ACTA DE INICI0:	5 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO DE SUSPENSIÓN No. 1:	16/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DE SUSPENSIÓN No. 1:	11/04/2025
FECHA DE INICIO PRORROGA No. 1:	26/04/2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	31/07/2025

Convenio 2222 DE 2024 ARGENTINA;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2222 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE LA ARGENTINA DEL MUNICIPIO QUIPILE, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VDA. LA ARGENTINA DEL MUNICIPIO DE QUIPILE
NIT.	901.013.320-7
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 200.970.578,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	FINALIZADO
FECHA DE INICIACIÓN:	08 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.1:	31 DE MARZO DE 2025
FECHA DE INICIO PRÓRROGA No.1:	01 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL (PRÓRROGA No.2):	31 DE MAYO DE 2025

Convenio 2226 DE 2024 EL IMPARAL;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2226 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL IMPARAL DEL MUNICIPIO DE SUPATÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL IMPARAL DEL MUNICIPIO DE SUPATÁ EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
NIT.	832.006.991-1
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 200.893.500,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	FINALIZADO
FECHA DE INICIACIÓN:	02 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.1:	31 DE MARZO DE 2025
FECHA DE INICIO PRÓRROGA No.2:	01 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL (PRÓRROGA No.2):	31 DE MAYO DE 2025

Convenio 2226 DE 2024 PULISITO;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2253 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PULISITO DEL MUNICIPIO DE PULÍ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PULISITO DEL MUNICIPIO DE PULÍ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
NIT.	900.994.281-2
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 200.893.500,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No. 1:	01 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	31 DE MARZO DE 2025

Convenio 2298 DE 2024 SABANETA ;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2298 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JAC DE SABANETA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SABANETA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
NIT.	901.003.772-1
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 200.911.938,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No. 1:	01 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	31 DE MARZO DE 2025

Convenio 2302 DE 2024 LLANADAS CENTRO;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2302 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LLANADAS CENTRO DEL MUNICIPIO DE CHAGUANÍ CUNDINAMARCA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LLANADAS CENTRO DEL MUNICIPIO DE CHAGUANÍ CUNDINAMARCA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
NIT.	901.767.959-8
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 201.000.611,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
FECHA DE INICIACIÓN:	01 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1:	16 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACIÓN A SUSPENSIÓN No. 1:	13 DE MARZO DE 2025
FECHA ESTIMADA DE REINICIO No. 1:	14 DE MAYO DE 2025
FECHA DE ACTA DE REANUDACIÓN No. 1:	11 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE PRORROGA No. 1:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRÓRROGA No. 1 (ACTUAL):	31 DE JULIO DE 2025

Convenio 2307 DE 2024 LLANADAS CAMNCHA;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2307 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CAMANCHA DEL MUNICIPIO SAN CAYETANO, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CAMANCHA DEL MUNICIPIO SAN CAYETANO, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
NIT.	901.046.566-3
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 200.994.658,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No. 1:	01 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	31 DE MARZO DE 2025
FECHA DE INICIO PRÓRROGA No.2:	01 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL (PRÓRROGA No.2):	31 DE MAYO DE 2025

Convenio 2308 DE 2024 TIERRA GRATA;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2308 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JAC VEREDA TIERRA GRATA DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TIERRA GRATA DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
No. CONVENIO SOLIDARIO	2308 de 2024
NIT.	900.040.926-0
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 200.987.421,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No. 1:	01 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	31 DE MARZO DE 2025

Convenio 2345 DE 2024 CABRERA;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2345 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CABRERA DEL MUNICIPIO DE PULÍ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CABRERA DEL MUNICIPIO DE PULÍ EN CUNDINAMARCA
NIT.	808.002.466-9
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 200.994.250,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No. 1:	01 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	31 DE MARZO DE 2025
FECHA DE INICIO PRÓRROGA No.2:	01 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL (PRÓRROGA No.2):	31 DE MAYO DE 2025

Convenio 2351 DE 2024 LIRIA;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2351 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL, VEREDA LIRIA, MUNICIPIO DE SAN CAYETANO CUNDINAMARCA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL, VEREDA LIRIA DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
NIT.	901.577.185-9
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 200.994.658,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN No 1:	16 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA AMPLIACIÓN No 1 A SUSPENSIÓN No 1:	13 DE MARZO DE 2025
FECHA ESTIMADA DE REINICIO No 1:	14 DE MAYO DE 2025
FECHA ACTA DE REANUDACIÓN No. 1:	11 DE ABRIL DE 2025
FECHA PRÓRROGA No. 1:	16 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL PRORROGA No. 1:	31 DE JULIO DE 2025

Convenio 2371 DE 2024 ALTO VEREDA GUADALUPE;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2371 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL ORGANISMO DE ACCIÓN COMUNAL Y/O ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL: SECTOR ALTO VEREDA GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE QUIPILE, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL: SECTOR ALTO VEREDA GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE QUIPILE
NIT.	901.003.063-6
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 201.069.084,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIACIÓN:	20 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN No 1:	24 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACIÓN No 1 A SUSPENSIÓN No 1:	13 DE MARZO DE 2024
FECHA ESTIMADA DE REINICIO No 1:	14 DE MAYO DE 2025
FECHA ACTA REANUDACIÓN No. 1:	11 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE PRÓRROGA No. 1:	16 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL PRORROGA No. 1:	31 DE JULIO DE 2025

Convenio 2378 DE 2024 ALTO VEREDA CENTRO ANTIGUO SAN CAYETANO;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2378 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CENTRO ANTIGUO SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CENTRO ANTIGUO SAN CAYETANO
NIT.	901.529.117-3.
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 200.944.344,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN No 1:	16 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACIÓN No 1 A SUSPENSIÓN No 1:	13 DE MARZO DE 2025
FECHA ESTIMADA DE REINICIO No 1:	14 DE MAYO DE 2025
FECHA ACTA DE REANUDACIÓN No 1:	11 DE ABRIL DE 2025
FECHA PRÓRROGA No 1:	16 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL PRORROGA No. 1:	31 DE JULIO DE 2025

Convenio 2380 DE 2024 ALTO VEREDA ROBLEDAL;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2380 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL ROBLEDAL DEL MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SÍQUIMA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL ROBLEDAL DEL MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SÍQUIMA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
NIT.	900.813.471-1
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 200.908.091,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
FECHA DE INICIACIÓN:	02 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No. 1:	01 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	31 DE MARZO DE 2025
FECHA DE INICIO PRÓRROGA No.2:	01 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL (PRÓRROGA No.2):	31 DE MAYO DE 2025

Convenio 2399 DE 2024 ALTO VEREDA MANANTIAL;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2399 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MANANTIAL MUNICIPIO PULÍ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MANANTIAL DEL MUNICIPIO DE PULÍ EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
NIT.	901.049.328-0
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 201.006.282,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No. 1:	01 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	31 DE MARZO DE 2025

Convenio 2624 DE 2024 ALTO VEREDA EL TRIGO;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2624 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JAC EL TRIGO DEL MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SÍQUIMA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL TRIGO MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SÍQUIMA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
NIT.	900.114.191-3
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 201.030.732,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
FECHA DE INICIACIÓN:	04 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No. 1:	01 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	31 DE MARZO DE 2025

Convenio 2755 DE 2024 ALTO VEREDA MODELIA;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2755 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MODELIA DEL MUNICIPIO DE VIOTÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MODELIA DEL MUNICIPIO DE VIOTÁ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
NIT.	808.002.214-1
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 201.000.813,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No. 1:	01 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	31 DE MARZO DE 2025
FECHA DE INICIO PRÓRROGA No.2:	01 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL (PRÓRROGA No.2):	31 DE MAYO DE 2025

Convenio 3018 DE 2024 ALTO VEREDA QUEBRADAGRANDE;

No. CONVENIO SOLIDARIO	3018 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE QUEBRADAGRANDE DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE QUEBRADAGRANDE DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
NIT.	800.029.337-5
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 200.962.899,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No. 1:	01 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	31 DE MARZO DE 2025

Convenio 3482 DE 2024 ALTO VEREDA VERGARA;

No. CONVENIO SOLIDARIO	3482 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URBANA DE VERGARA DEL MUNICIPIO DE VERGARA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URBANA DE VERGARA
NIT.	901.113.133-5
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 200.933.953,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIACIÓN:	06 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN No 1:	16 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACIÓN No 1 A SUSPENSIÓN No 1:	13 DE MARZO DE 2025
FECHA ESTIMADA DE REINICIO No 1:	14 DE MAYO DE 2025
FECHA ACTA DE REANUDACIÓN No. 1:	11 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE PRÓRROGA No. 1:	16 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL PRORROGA No. 1:	31 DE JULIO DE 2025

Convenio 3499 DE 2024 ALTO VEREDA HONDURAS ALTO;

No. CONVENIO SOLIDARIO	3499 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA HONDURAS ALTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA HONDURAS ALTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
No. CONVENIO SOLIDARIO	3499 de 2024
NIT.	901.018.330-3
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 200.900.694,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	SUSPENDIDO
FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN No 1:	16 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACIÓN No 1 A SUSPENSIÓN No 1:	13 DE MARZO DE 2025
FECHA DE AMPLIACIÓN No 2 A SUSPENSIÓN No 1:	13 DE MAYO DE 2025
FECHA ESTIMADA DE REINICIO No 1:	1 DE JULIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	15 DE JULIO DE 2025
FECHA DE INICIO PRORROGA No. 1:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	N/A

Convenio 3542 DE 2024 ALTO VEREDA MARCELLA;

No. CONVENIO SOLIDARIO	3542 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE MARCELLA DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE MARCELLA
NIT.	900.732.003-8
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 200.954.396,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN No 1:	16 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACIÓN No 1 A SUSPENSIÓN No 1:	13 DE MARZO DE 2025
FECHA ESTIMADA DE REINICIO No 1:	14 DE MAYO DE 2025
FECHA ACTA DE REANUDACIÓN No 1:	11 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE PRÓRROGA No 1:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL PRORROGA No. 1:	31 DE JULIO DE 2025

Convenio 3873 DE 2024 ALTO VEREDA LA ALIANZA;

No. CONVENIO SOLIDARIO	3873 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ALIANZA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ALIANZA DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
NIT.	900.790.862-5
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 201.164.639,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIACIÓN:	06 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN No 1:	16 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACIÓN No 1 A SUSPENSIÓN No 1:	13 DE MARZO DE 2025
FECHA ESTIMADA DE REINICIO No 1:	14 DE MAYO DE 2025
FECHA ACTA DE REANUDACIÓN No 1:	11 DE ABRIL DE 2025
FECHA PRÓRROGA No 1:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL PRORROGA No. 1:	31 DE JULIO DE 2025

Convenio 3978 DE 2024 ALTO VEREDA LA MONTAÑA;

No. CONVENIO SOLIDARIO	3978 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE UTICA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE ÚTICA
NIT.	900.906.291-0
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 200.942.212,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIACIÓN:	06 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN No 1:	16 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACIÓN No 1 A SUSPENSIÓN No 1:	13 DE MARZO DE 2025
FECHA ESTIMADA DE REINICIO No 1:	14 DE MAYO DE 2025
FECHA ACTA DE REANUDACIÓN No 1:	11 DE ABRIL DE 2025
FECHA PRÓRROGA No 1:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL PRORROGA No. 1:	31 DE JULIO DE 2025

Convenio 4018 DE 2024 ALTO VEREDA LA ANTIOQUEÑITA;

No. CONVENIO SOLIDARIO	4018 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ANTIOQUEÑITA DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ANTIOQUEÑITA DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
NIT.	808.003.174-8
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 200.771.798,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIACIÓN:	06 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN No 1:	16 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE AMPLIACIÓN No 1 A SUSPENSIÓN No 1:	13 DE MARZO DE 2025
FECHA ESTIMADA DE REINICIO No 1:	14 DE MAYO DE 2025
FECHA ACTA DE REANUDACIÓN No 1:	11 DE ABRIL DE 2025
FECHA PRÓRROGA No 1:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL PRORROGA No. 1:	31 DE JULIO DE 2025

Convenio 2203 DE 2024 ALTO VEREDA SANTA BARBARA;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2203 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA BARBARA ALTA MUNICIPIO DE ARBELAEZ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA BARBARA ALTA, MUNICIPIO DE ARBELÁEZ
NIT.	901.070.188-3.
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 200.979.179,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
FECHA DE INICIACIÓN:	01 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.1:	31 DE MARZO DE 2025
FECHA DE INICIO PRORROGA No.2:	01 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.2:	31 DE MAYO DEL 2025

Convenio 2125 DE 2024 ALTO VEREDA LAS AGUILAS;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2125 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS ÁGUILAS DEL MUNICIPIO DE CABRERA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS ÁGUILAS, MUNICIPIO DE CABRERA.
NIT.	900.569.331-0.
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 200.956.701,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.1:	31 DE MARZO DE 2025
FECHA DE INICIO PRORROGA No.2:	01 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.2:	31 DE MAYO DEL 2025

Convenio 2526 DE 2024 ALTO VEREDA ZONA URBANA;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2526 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ZONA URBANA MUNICIPIO DE CABRERA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CABRERA
NIT.	900.272.654-8.
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 201.077.617,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
FECHA DE INICIACIÓN:	04 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.1:	31 DE MARZO DE 2025

Convenio 2533 DE 2024 ALTO VEREDA LA PLAYA;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2533 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LA PLAYA DEL MUNICIPIO DE CABRERA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PLAYA, MUNICIPIO DE CABRERA.
NIT.	900.608.122-6.
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 201.026.599
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.1:	31 DE MARZO DE 2025
FECHA DE INICIO PRORROGA No.2:	01 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.2:	31 DE MAYO DEL 2025

Convenio 2710 DE 2024 ALTO VEREDA SANTA RITA;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2710 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA RITA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE CABRERA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA RITA PARTE BAJA, MUNICIPIO DE CABRERA
NIT.	900.588.475-3.
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 201.057.392,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.1:	31 DE MARZO DE 2025

Convenio 2436 DE 2024 ALTO VEREDA GUAVIO BAJO;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2436 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUAVIO BAJO DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAVIO BAJO, MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.
NIT.	808.003.459-1.
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 201.033.054,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
FECHA DE INICIACIÓN:	02 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.1:	31 DE MARZO DE 2025

Convenio 2946 DE 2024 ALTO VEREDA ASORURAL;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2946 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN RURAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL - ASORURAL DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL- ASORURAL, MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ
NIT.	901.031.866-2
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 201.060.582,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIACIÓN:	01 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO SUSPENSIÓN No. 1:	16 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN SUSPENSION No. 1:	14 DE MARZO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSIÓN No. 1:	15 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN AMPLIACION SUSPENSION No. 1:	15 DE MAYO DE 2025
FECHA DE REINICIO:	28 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	13 DE MAYO DE 2025
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	14 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.1:	31 DE JULIO DE 2025

Convenio 2389 DE 2024 ALTO VEREDA LIMONCITOS;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2389 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE LIMONCITOS DEL MUNICIPIO DE GUAYABETAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LIMONCITOS, MUNICIPIO DE GUAYABETAL
NIT.	901.028.437-5.
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 200.802.790,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
FECHA DE INICIACIÓN:	02 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.1:	31 DE MARZO DE 2025

Convenio 2800 DE 2024 ALTO VEREDA SAN ANTONIO;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2800 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE GUAYABETAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE GUAYABETAL
NIT.	901.028.032-6.
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 200.965.694,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.1:	31 DE MARZO DE 2025

Convenio 2259 DE 2024 ALTO VEREDA DE PEÑAS;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2259 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LA VEREDA DE PEÑAS DEL MUNICIPIO DE MANTA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE PEÑAS, MUNICIPIO DE MANTA
NIT.	900.809.556-1
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 200.995.403,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.1:	31 DE MARZO DE 2025
FECHA DE INICIO PRORROGA No.2:	01 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.2:	31 DE MAYO DE 2025

Convenio 2252 DE 2024 ALTO VEREDA LOS ALPES;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2252 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LOS ALPES DEL MUNICIPIO DE MEDINA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS ALPES, MUNICIPIO DE MEDINA
NIT.	900.304.999-2.
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 200.895.912,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.1:	31 DE MARZO DE 2025
FECHA DE INICIO PRORROGA No.2:	01 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.2:	31 DE MAYO DE 2025

Convenio 2279 DE 2024 ALTO VEREDA LA ESMERALDA;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2279 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL INSPECCION LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE MEDINA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL INSPECCION LA ESMERALDA, MUNICIPIO DE MEDINA
NIT.	900.715.676-2.
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 200.895.356,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.1:	31 DE MARZO DE 2025

Convenio 2315 DE 2024 ALTO VEREDA SAN JOSE ALTO REDONDO;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2315 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA SAN JOSE DE ALTO REDONDO DEL MUNICIPIO DE MEDINA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JOSE ALTO REDONDO, MUNICIPIO DE MEDINA
NIT.	900.247.104-3.
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 201.007.463,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.1:	31 DE MARZO DE 2025

Convenio 2518 DE 2024 ALTO VEREDA SAN PEDRO DE GUAJARAY;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2518 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN PEDRO DE GUAJARAY DEL MUNICIPIO DE MEDINA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN PEDRO DE GUAJARAY, MUNICIPIO DE MEDINA
NIT.	900.294.931-8.
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 201.052.494,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.1:	31 DE MARZO DE 2025
FECHA DE INICIO PRORROGA No.2:	01 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.2:	31 DE MAYO DE 2025

Convenio 2547 DE 2024 ALTO VEREDA SAN JUANITO;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2547de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA SAN JUANITO DEL MUNICIPIO DE MEDINA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JUANITO, MUNICIPIO DE MEDINA
NIT.	900.298.850-8.
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 201.068.440,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO SUSPENSION No. 1:	26 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN SUSPENSION No. 1:	14 DE MARZO DE 2025
FECHA DE AMPLIACION SUSPENSIÓN No. 1:	15 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN AMPLIACION SUSPENSION No. 1:	15 DE MAYO DE 2025
FECHA DE REINICIO:	11 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	16 DE ABRIL DEL 2025
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	17 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.1:	31 DE JULIO DE 2025

Convenio 2571 DE 2024 ALTO VEREDA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE MEDINA;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2571 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE JUNTAS COMUNALES DE MEDINA, CUNDINAMARCA DEL MUNICIPIO DE MEDINA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ASOCIACION DE JAC MEDINA CUNDINAMARCA, MUNICIPIO DE MEDINA
NIT.	901.662.959-6.
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 201.006.282,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
FECHA DE INICIACIÓN:	03 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.1:	31 DE MARZO DE 2025

Convenio 2221 DE 2024 ALTO VEREDA JUNTA EL ENGAÑO;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2221 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE EL ENGAÑO DEL MUNICIPIO DE PARATEBUENO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL ENGAÑO, MUNICIPIO DE PARATEBUENO
NIT.	901.116.838-2.
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 201.014.808,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No. 1:	01 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	31 DE MARZO DE 2025

Convenio 2268 DE 2024 ALTO VEREDA SAN JESUS DE PALOMAS;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2268 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN JESÚS DE PALOMAS DEL MUNICIPIO DE PARATEBUENO, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JESÚS DE PALOMAS, MUNICIPIO DE PARATEBUENO
NIT.	901.030.694-8.
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 200.960.298,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.1:	31 DE MARZO DE 2025

Convenio 2322 DE 2024 ALTO VEREDA BUENA VISTA DE ALTORREDONDO;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2322 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL BUENA VISTA ALTO REDONDO DEL MUNICIPIO DE PARATEBUENO, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENAVISTA DE ALTOREDONDO, MUNICIPIO DE PARATEBUENO
NIT.	900.757.703-3.
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 201.094.670,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.1:	31 DE MARZO DE 2025

Convenio 2669 DE 2024 ALTO VEREDA RASGATA ALTA;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2669 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASGATA DEL MUNICIPIO DE TAUSA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA RASGATA, MUNICIPIO DE TAUSA
NIT.	900.668.935-3.
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 200.947.390,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCIÓN
FECHA DE INICIACIÓN:	06 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO SUSPENSION No. 1:	26 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN SUSPENSION No. 1:	14 DE MARZO DE 2025
FECHA DE INICIO SUSPENSION No. 2:	19 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN SUSPENSION No. 2:	15 DE MAYO DE 2025
FECHA DE REINICIO:	11 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE JULIO DEL 2025

Convenio 2309 DE 2024 ALTO VEREDA ROMERO;

No. CONVENIO SOLIDARIO	2309 de 2024
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL JAC DE LA VDA. DE ROMERO DEL MUNICIPIO DE UBAQUE, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ROMERO, MUNICIPIO DE UBAQUE
NIT.	900.308.926-3
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 200.843.748,00
INTERVENTORÍA	CONSORCIO VIAL FR
No. CONTRATO INTERVENTORÍA	3661 DE 2024
ESTADO DEL CONTRATO	TERMINADO
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO PRORROGA No.1:	01 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No.1:	31 DE MARZO DE 2025

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Convenio	REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR DESEMBOLSADO
2585	687824	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200.072.692	$200.072.692
2690	692024	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200.049.181	$200.049.181
2390	958424	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200.089.987	$200.089.987
2332	637824	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$199.955.709	$199.955.709
2525	687724	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200.043.481	$200.043.481
2353	683824	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$199.867.389	$199.867.389
2393	671524	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$199.961.874	$199.961.874
2834	710724	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$199.964.505	$199.964.505
2321	674424	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$199.982.165	$199.982.165
2164	666224	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$199.208.920	$199.208.920
2747	710924	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200.060.720	$200.060.720

2296	670124	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200.010.045	$200.010.045
2429	698824	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$199.531.208	$199.531.208
2586	692424	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$199.935.282	$199.935.282
2400	664924	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$199.935.282	$ 0.00
2394	698824	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200.032.018	$200.032.018
2129	606624	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$199.997.327	$199.997.327
2223	631924	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$199.929.009	$199.929.009
2383	672624	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$199.799.504	$199.799.504
2214	636724	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200.061.288	$200.061.288
2779	711124	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$199.871.439	$199.871.439
2241	671324	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200.086.476	$200.086.476
2281	636724	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$199.917.714	$199.917.714
2222	637024	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$199,970,578.00	$199,970,578.00

2226	665924	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$199,893,500.00	$199,893,500.00
2253	665124	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200,006,282.00	$200,006,282.00
2298	637324	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$199,911,938.00	$199,911,938.00
2302	953324	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200,000,611.00	$200,000,611.00
2307	665324	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$199,994,658.00	$199,994,658.00
2308	641424	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$199,987,421.00	$199,987,421.00
2345	671924	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$199,994,250.00	$199,994,250.00
2351	676924	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$199,994,658.00	$199,994,658.00
2371	1160824	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 200.069.084	$ 200.069.084
2378	691724	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$199,944,344.00	$199,944,344.00
2380	673224	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$199,908,091.00	$199,908,091.00
2399	665024	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200,006,282.00	$200,006,282.00
2624	686024	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200,030,732.00	$200,030,732.00

2755	711024	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200,000,813.00	$200,000,813.00
3018	740624	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$199,962,899.00	$199,962,899.00
3482	865624	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$199,933,953.00	$199,933,953.00
3499	861924	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$199,900,694.00	$ 0.00
3542	928324	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$199,954,396.00	$199,954,396.00
3873	960924	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200,164,639.00	$200,164,639.00
3978	989324	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$199,942,212.00	$199,942,212.00
4018	1022324	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$199,771,798.00	$199,771,798.00
2203	684024	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200,979,179.00	$200,979,179.00
2125	634024	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200,956,701.00	$200,956,701.00
2526	700424	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$201,077,617.00	$201,077,617.00
2533	700624	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$201,026,599.00	$201,026,599.00
2710	693424	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$201,057,392.00	$201,057,392.00

2436	681124	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$201,033,054.00	$201,033,054.00
2946	1024824	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$201,060,582.00	$201,060,582.00
2389	672524	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200,802,790.00	$200,802,790.00
2800	710624	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200,965,694.00	$200,965,694.00
2259	673524	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200,995,403.00	$200,995,403.00
2252	675024	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200,895,912.00	$200,895,912.00
2279	666524	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200,895,356.00	$200,895,356.00
2315	665624	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$201,007,463.00	$201,007,463.00
2518	687624	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$201,052,494.00	$201,052,494.00
2547	687524	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$201,068,440.00	$201,068,440.00
2571	687424	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$201,006,282.00	$201,006,282.00
2221	687624	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$201,014,808.00	$201,014,808.00
2268	676124	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200,960,298.00	$200,960,298.00

2322	665224	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$201,094,670.00	$201,094,670.00
2669	958624	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200,947,390.00	$200,947,390.00
2309	671024	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200,843,748.00	$200,843,748.00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. __	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste ___ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 9 de fecha 30 DE jUNIO 2025, para el periodo JUNIO, se reporta un avance para el convenio, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Convenio 2585 DE 2024 EL CURAL;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 201.072.692,00	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 201.072.692,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 201.072.692,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2690 DE 2024 CORDOBA;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$201.049.181,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$201.049.181,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$201.049.181,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2390 DE 2024 PEÑALOSA;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 201.089.987,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$84.457.794.51,8	42%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$70.381.495,45	35%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2332 DE 2024 TATI;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	**$** 200.955.709,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	**$** 200.955.709,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**$** 200.955.709,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2525 DE 2024 ENCANTADO;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 201.043.481,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 201.043.481,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 201.043.481,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2353 DE 2024 LA AGUADA;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$200.867.389,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$200.867.389,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$200.867.389,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2393 DE 2024 RIO FRIO;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$200.961.874,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$200.961.874,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$200.961.874,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2834 DE 2024 EL BARRANCON;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$200.964.505,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$200.964.505,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$200.964.505,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2321 DE 2024 LOMA MEDIO;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$200.982.165,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$200.982.165,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$200.982.165,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2164 DE 2024 SIRIA;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$200.208.920,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$190.198.474,00	95%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$170.177.582,00	85%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2747 DE 2024 EL PALMAR;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 201.060.720,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 201.060.720,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 201.060.720,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2296 DE 2024 TERMINOS;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 201.010.045,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$60.303.013,00	30%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$50.252.511,00	25%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2429 DE 2024 NARANJAL;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 200.531.208,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 200.531.208,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 200.531.208,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2586 DE 2024 PAPATAS;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 200.935.282,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$80.374.112,80	40%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$76.355.407,16	38%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2400 DE 2024 CAQUIAN;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 200.935.282,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2394 DE 2024 MUCHIPAY;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 201.032.018,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 201.032.018,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 201.032.018,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2129 DE 2024 PURAY;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 200.997.327,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 200.997.327,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 200.997.327,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2223 DE 2024 LA GLORIETA;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 200.929.009,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 200.929.009,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 200.929.009,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2383 DE 2024 LA CHAPA;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 200.799.504,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 200.799.504,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 200.799.504,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2214 DE 2024 MORAY;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 201.061.288,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 201.061.288,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 201.061.288,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2779 DE 2024 LIMONAL;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 200.871.439,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 200.871.439,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 200.871.439,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2241 DE 2024 LAGUNETA;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 201.086.476,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 201.086.476,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 201.086.476,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2281 DE 2024 IBAMA;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 201.917.714,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 201.917.714,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 201.917.714,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2222-2024 LA ARGENTINA:

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 200.970.578,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$200.970.578,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$200.970.578,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0%

Convenio 2226-2024 EL IMPARAL;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$200.893.500,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$200.893.500	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$200.893.500	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0%

Convenio 2253-2024 PULISITO;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$201.006.282,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$201.006.282	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$201.006.282	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0%

Convenio 2298-2024 SABANETA;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$200.911.938,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$200.911.938	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$200.911.938	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0%

Convenio 2302-2024 LLANADAS;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$201.000.611,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$100,5000.305,50	50%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$36.180.109,98	18%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0%

Convenio 2307-2024 CAMANCHA;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$200.994.658,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$200.994.658	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$200.994.658	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0%

Convenio 2308-2024 TIERRA GRATA;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$200.987.421,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$200.987.421	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$200.987.421	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0%

Convenio 2345-2024 CABRERA;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$200.994.250,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$200.994.250	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$200.994.250	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0%

Convenio 2351-2024 LIRIA;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$200.994.658,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$120.596.794,80	60%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$110.547.061,90	55%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0%

Convenio 2371-2024 GUADALUPE;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$201.069.084,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$134.716.288,28	67%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$150.801.813,00	75%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0%

Convenio 2378-2024 CENTRO ANTIGUO;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 200.944.344,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$116,547.719,52	58%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$110,519.389,2	55%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0%

Convenio 2380-2024 ROBLEDAL;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 200.908.091,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$200.908.091	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$200.908.091	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0%

Convenio 2399-2024 MANANTIAL;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 201.006.282,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 201.006.282	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$201.006.282	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0%

Convenio 2624-2024 EL TRIGO;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 201.030.732,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$201.030.732	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$201.030.732	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0%

Convenio 2755-2024 MODELIA;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 201.000.813,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 201.000.813,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 201.000.813,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0%

Convenio 3018-2024 QUEBRADA GRANDE;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 200.962.899,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$200.962.899	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$200.962.899	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0%

Convenio 3482-2024 URBANA;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 200.933.953,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$80.373.581,20	40%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$52,242.827,78	26%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0%

Convenio 3499-2024 HONDURAS ALTO;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 200.900.694,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0%

Convenio 3542-2024 MARSELLA;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 200.954.396,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$80.381.758,40	40%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$8.038.175,84	4%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0%

Convenio 3873-2024 LA ALIANZA;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 201.164.639,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$126.733.722,57	63%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$104.605.612,28	52%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0%

Convenio 3978-2024 LA MONTAÑA;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 200.942.212,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$80.376.884,80	40%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$10.047.110,60	5%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0%

Convenio 4018-2024 ANTIOQUEÑITA;

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 200.771.798,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$80.308.719,20	40%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$16.061.743,84	8%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0%

Convenio 2203-2024; SANTA BARBARA

ITEM	**VALOR (MILLONES)**	**%**
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 200.979.179,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 200.979.179,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 200.979.179,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2125-2024; LAS AGUILAS

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$200.956.701,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$200.956.701,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$200.956.701,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2526-2024; ZONA URBANA

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$201.077.617,00	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$201.077.617,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$201.077.617,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2533-2024; LA PLAYA

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$201.026.599,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$201.026.599,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$201.026.599,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2710-2024; SANTA RITA

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$201.057.392,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$201.057.392,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$201.057.392,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2436-2024; GUAVIO BAJO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$201.033.054,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$201.033.054,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$201.033.054,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2946-2024; ASORURAL

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$201.060.582,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$156.827.253,96	78%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$88.466.656,08	44%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2389-2024; LIMONCITOS

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$200.802.790,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$200.802.790,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$200.802.790,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2800-2024; SAN ANTONIO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$200.965.694,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$200.965.694,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$200.965.694,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2259-2024; PEÑAS

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$200.995.403,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$200.995.403,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$200.995.403,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2252-2024; LOS ALPES

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 200.895.912,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 200.895.912,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 200.895.912,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2279-2024; ESMERALDA

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 200.895.356,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 200.895.356,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 200.895.356,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2315-2024; SAN JOSE DE ALTO REDONDO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 201.007.463,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 201.007.463,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 201.007.463,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2518-2024; SAN PEDRO GUJARAY

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 201.052.494,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 201.052.494,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 201.052.494,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2547-2024; SAN JUANITO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 201.068.440,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 104.555.588,80	52%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$184.982.964,80	92%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2571-2024; ASOJUNTAS MEDINA

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 201.006.282,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 201.006.282,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 201.006.282,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2221-2024; EL ENGAÑO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 201.014.808,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 201.014.808,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 201.014.808,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2268-2024; SAN JESUS DE PALOMA

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 200.960.298,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 200.960.298,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 200.960.298,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2322-2024; BUENA VISTA DE ALTO REDONDO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 201.094.670,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 201.094.670,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 201.094.670,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2669-2024; RASGATA ALTO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 200.947.390,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$100.473.695,00	50%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$134.634.751,30	67%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

Convenio 2309-2024; ROMERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONVENIO	$ 200.843.748,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 200.843.748,00	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 200.843.748,00	100%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Convenio 2585 DE 2024 EL CURAL;

Meta física programada %100.00
Meta física ejecutada %: 100.00

Convenio 2690 DE 2024 CORDOBA;

Meta física programada %:100.00
Meta física ejecutada %: 100.00

Convenio 2390 DE 2024 PEÑALOSA;

Meta física programada %:42.00
Meta física ejecutada %: 35.00

Convenio 2332 DE 2024 TATI;

Meta física programada %:100.00
Meta física ejecutada %:100.00

Convenio 2525 DE 2024 ENCANTADO;

Meta física programada %:100.00
Meta física ejecutada %:100.00

Convenio 2353 DE 2024 LA AGUADA;

Meta física programada %:100.00
Meta física ejecutada %:100.00

Convenio 2393 DE 2024 RIO FRIO;

Meta física programada %:100.00
Meta física ejecutada %:100.00

Convenio 2834 DE 2024 EL BARRANCON;

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %:100.00

Convenio 2321 DE 2024 LOMA MEDIO;

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %:100.00

Convenio 2164 DE 2024 SIRIA;

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %:100.00

Convenio 2747 DE 2024 EL PALMAR;

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %:100.00

Convenio 2296 DE 2024 TERMINOS;

Meta física programada %: 46.00
Meta física ejecutada %:42.00

Convenio 2429 DE 2024 NARANJAL;

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %:100.00

Convenio 2586 DE 2024 PAPATAS;

Meta física programada %: 40.00
Meta física ejecutada %: 38.00

Convenio 2400 DE 2024 CAQUIAN;

Meta física programada %:0.00
Meta física ejecutada %:0.00

Convenio 2394 DE 2024 MUCHIPAY;

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %:100.00

Convenio 2129 DE 2024 PURAY;

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %:100.00

Convenio 2223 DE 2024 LA GLORIETA;

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %:100.00

Convenio 2383 DE 2024 LA CHAPA;

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %100.00

Convenio 2214 DE 2024 MORAY;

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %:100.00

Convenio 2779 DE 2024 LIMONAL;

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %:100.00

Convenio 2241 DE 2024 LAGUNETA;

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %:100.00

Convenio 2281 DE 2024 IBAMA;

Meta física programada %: 30.00
Meta física ejecutada %:40.00

Convenio 2222-2024; LA ARGENTINA

Meta física programada %: 98.00%
Meta física ejecutada %: 100.00%

Convenio 2226-2024; IMPARAL

Meta física programada %: 99.00%
Meta física ejecutada %: 100.00%

Convenio 2253-2024; PULISITO

Meta física programada %: 100.00%
Meta física ejecutada %: 100.00%

Convenio 2298-2024; PEÑAS

Meta física programada %: 100.00%
Meta física ejecutada %: 100.00%

Convenio 2302-2024;LLANADAS

Meta física programada %: 50.00%
Meta física ejecutada %: 18.00%

Convenio 2307-2024; CAMANCHA

Meta física programada %: 100.00%
Meta física ejecutada %: 100.00%

Convenio 2308-2024; TIERRA GRATA

Meta física programada %: 100.00%
Meta física ejecutada %: 100.00%

Convenio 2345-2024; CABRERA

Meta física programada %: 99.00%
Meta física ejecutada %: 100.00%

Convenio 2351-2024; LIRIA

Meta física programada %: 0.00%
Meta física ejecutada %: 0.00%

Convenio 2371-2024; GUADALUPE ALTO

Meta física programada %: 67.00%
Meta física ejecutada %: 75.00%

Convenio 2378-2024; CENTRO ANTIGUO

Meta física programada %: 58.00%
Meta física ejecutada %: 55.00%

Convenio 2380-2024; ROBLEDAL

Meta física programada %: 100.00%
Meta física ejecutada %: 100.00%

Convenio 2399-2024; MANANTIAL

Meta física programada %: 100.00%
Meta física ejecutada %: 100.00%

Convenio 2624-2024; EL TRIGO

Meta física programada %: 100.00%
Meta física ejecutada %: 100.00%

Convenio 2755-2024; MODELIA

Meta física programada %: 100.00%
Meta física ejecutada %: 100.00%

Convenio 3018-2024; QUEBRADA GRANDE

Meta física programada %: 100.00%
Meta física ejecutada %: 100.00%

Convenio 3482-2024; URBANA

Meta física programada %: 26.00%
Meta física ejecutada %: 40.00%

Convenio 3499-2024; HONDURAS ALTO

Meta física programada %: 0.00%
Meta física ejecutada %: 0.00%

Convenio 3542-2024; MARCELLA

Meta física programada %: 40.00%
Meta física ejecutada %: 4.00%

Convenio 3873-2024; ALIANZA

Meta física programada %: 52.00%
Meta física ejecutada %: 63.00%

Convenio 3978-2024; MONTAÑA

Meta física programada %: 40.00%
Meta física ejecutada %: 5.00%

Convenio 4018-2024; ANTIOQUEÑITA

Meta física programada %: 40.00%
Meta física ejecutada %: 8.00%

Convenio 2203-2024; SANTA BARBARA

Meta física programada %:90.00
Meta física ejecutada %: 100.00

Convenio 2125-2024; LAS AGUILAS

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %: 100.00

Convenio 2526-2024; ZONA URBANA

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %: 100.00

Convenio 2533-2024; LA PLAYA

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %:100.00

Convenio 2710-2024; SANTA RITA

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %:100.00

Convenio2436-2024; GUAVIO BAJO

Meta física programada %:100.00
Meta física ejecutada %:100.00

Convenio 2946-2024; ASORURAL

Meta física programada %: 44.00
Meta física ejecutada %:78.00

Convenio 2389-2024; LIMONCITOS

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %:100.00

Convenio2800-2024; SAN ANTONIO

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %:100.00

Convenio2259-2024; PEÑAS

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %:100.00

Convenio2252-2024; LOS ALPES

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %:100.00

Convenio2279-2024; LA ESMERALDA

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %:100.00

Convenio 2315-2024; SAN JOSE DE ALTO REDONDO

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %:100.00

Convenio 2518-2024; SAN PEDRO DE GUAJARAY

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %:100.00

Convenio 2547-2024; SAN JUANITO

Meta física programada %: 28.00
Meta física ejecutada %:62.00

Convenio 2571-2024; ASOJUNTAS MEDINA

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %:100.00

Convenio 2221-2024; EL ENGAÑO

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %:100.00

Convenio2268-2024; SAN JESUS DE PALOMAS

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %: 100.00

Convenio 2322-2024; BUENA VISTA DE ALTO REDONDO

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %: 100.00

Convenio 2669-2024; RASGATA ALTO

Meta física programada %: 50.00
Meta física ejecutada %:67.00

Convenio 2309-2024; ROMERO

Meta física programada %: 100.00
Meta física ejecutada %:100.00

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

A la fecha ninguna Junta de Acción Comunal a tramitado Ítems No Previstos.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se han generado reprogramaciones para ninguna JAC en el presente periodo.

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

A la fecha se encuentran en suspensión los convenios
2400-2024 Junta de acción comunal vereda Caquian, Topaipi.
3499-2024 Junta de acción comunal vereda Honduras alto, San Juan de Rio seco.

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

A la fecha no se han tramitado Adiciones, prorrogas y/o modificaciones en el presente periodo.

CONVENIO	FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

Convenio 2585 DE 2024 EL CURAL;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 25/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	22/07/2024	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios				

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.107.270,00	0	22/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.053.636,00	0	22/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.214.539,00	0	31/12/24	31/12/29

Convenio 2690 DE 2024 CORDOBA;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 25/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	22/07/2024	31/12/24
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios				

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.104.919,00	0	25/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.052.460,00	0	25/07/24	31/10/27
Estabilidad de la Obra	40.209.837,00	0	31/12/24	31/12/29

Convenio 2390 DE 2024 PEÑALOSA;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 23/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	16/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**

Cumplimiento	20.108.999,00	0	16/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.054.500,00	0	16/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.217.998,00	0	16/12/24	31/12/29

Convenio 2332 DE 2024 TATI;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 18/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	11/07/24	31/12/24
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.095.571,00	0	11/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.047.786,00	0	11/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.191.142,00	0	31/12/24	31/12/29

Convenio 2525 DE 2024 ENCANTADO;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 25/07/24
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	22/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.104.349,00	0	22/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.052.175,00	0	22/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.208.697,00	0	31/12/24	31/12/29

Convenio 2353 DE 2024 LA AGUADA;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 18/07/24
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	12/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.086.739,00	0	12/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.043.370,00	0	12/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.173.478,00	0	31/12/24	31/12/29

Convenio 2393 DE 2024 RIO FRIO;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 25/07/24
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	16/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.096.188,00	0	16/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.048.094,00	0	16/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.192.375,00	0	31/12/24	31/12/29

Convenio 2834 DE 2024 EL BARRANCON;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 06/08/24
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	30/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.096.451,00	0	30/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.048.226,00	0	30/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.192.901,00	0	31/12/24	31/12/29

Convenio 2321 DE 2024 LOMA MEDIO;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 16/07/24
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	11/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.098.217,00	0	11/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.049.109,00	0	11/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.196.433,00	0	31/12/24	31/12/29

Convenio 2164 DE 2024 SIRIA;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 05/07/24
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	03/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.020.892,00	0	03/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.010.446,00	0	03/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.041.784,00	0	31/12/24	31/12/29

Convenio 2747 DE 2024 EL PALMAR;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 06/08/24
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	26/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.106.072,00	0	26/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.053.036,00	0	26/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.212.144,00	0	31/12/24	31/12/29

Convenio 2296 DE 2024 TERMINOS;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 13/07/24
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	11/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.101.005,00	0	10/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.050.503,00	0	10/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.202.009,00	0	31/12/24	31/12/29

Convenio 2429 DE 2024 NARANJAL;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 06/08/24
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	17/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.053.121,00	0	17/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.026.561,00	0	17/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.106.242,00	0	31/12/24	31/12/29

Convenio 2586 DE 2024 PAPATAS;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/07/24
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	22/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.093.529,00	0	22/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.046.765,00	0	22/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.187.057,00	0	31/12/24	31/12/29

Convenio 2400 DE 2024 CAQUIAN;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 23/07/24
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	16/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.093.529,00	0	16/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.046.765,00	0	16/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.187.057,00	0	31/12/24	31/12/29

Convenio 2394 DE 2024 MUCHIPAY;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/08/24
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	16/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.103.202,00	0	16/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.051.601,00	0	16/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.206.404,00	0	31/12/24	31/12/29

Convenio 2129 DE 2024 PURAY;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 04/07/24
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	02/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.099.733,00	0	02/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.049.867,00	0	02/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.199.466,00	0	31/12/24	31/12/29

Convenio 2223 DE 2024 LA GLORIETA;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 12/07/24
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	08/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.092.901,00	0	08/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.046.451,00	0	08/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.185.802,00	0	31/12/24	31/12/29

Convenio 2383 DE 2024 LA CHAPA;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 23/07/24
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	16/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.079.951,00	0	16/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.039.976,00	0	16/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.159.901,00	0	31/12/24	31/12/29

Convenio 2214 DE 2024 MORAY;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 22/07/24
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	10/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.106.129,00	0	10/07/24	31/12/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.053.065,00	0	10/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.212.258,00	0	31/12/24	31/12/29

Convenio 2779 DE 2024 LIMONAL;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 08/08/24
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	11/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.087.144,00	0	29/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.043.572,00	0	29/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.174.288,00	0	31/12/24	31/12/29

Convenio 2241 DE 2024 LAGUNETA;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 10/07/24
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	05/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.108.648,00	0	05/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.054.324,00	0	05/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.217.296,00	0	31/12/24	31/12/29

Convenio 2281 DE 2024 IBAMA;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 18/07/24
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	10/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.191.772,00	0	10/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.095.886,00	0	10/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.383.543,00	0	31/12/24	31/12/29

Convenio 2281 DE 2024 IBAMA;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 18/07/24
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	1	11/07/24	31/12/2024
Patronal		1		
Contratistas y Subcontratista		1		
Vehículos Propios y No Propios		1		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.084.375,00	0	11/07/24	31/12/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.042.188,00	0	11/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.168.750,00	0	31/12/24	31/12/29

Convenio 2222-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 08/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: RCE** **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	360-74-994000008826	08/07/2024	31/12/2024
Patronal				
Contratistas y Subcontratista				
Vehículos Propios y No Propios				

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO** **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20,097,059.00	360-47-994000032060	08/07/2024	31/10/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10,048,530.00		08/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	40,194,117.00		31/12/2024	31/12/2029

Convenio 2226-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 8/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: RCE** **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	260,000,000.00	360-74-994000008792	08/07/2024	31/12/2024
Patronal				
Contratistas y Subcontratista				
Vehículos Propios y No Propios				

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO** **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20,089,351.00	360-47-994000031989	08/07/2024	31/10/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10,044,676.00		08/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	40,178,701.00		31/12/2024	31/12/2029

Convenio 2253-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 09/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: RCE** **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	260,000,000.00	360-74-994000008804	09/07/2024	31/12/2024
Patronal				
Contratistas y Subcontratista				
Vehículos Propios y No Propios				

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO** **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20,100,629.00	360-47-994000032028	09/07/2024	31/10/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10,050,315.00		09/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	40,201,257.00		31/12/2024	31/12/2029

Convenio 2298-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 11/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: RCE** **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	260,000,000.00	360-74-994000008807	11/07/2024	31/12/2024
Patronal				
Contratistas y Subcontratista				
Vehículos Propios y No Propios				

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO** **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20,091,195.00	360-47-994000032030	11/07/2024	31/10/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10,045,598.00		11/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	40,182,389.00		31/12/2024	31/12/2029

Convenio 2302-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 11/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: RCE** **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	260,000,000.00	360-74-994000008808	11/07/2024	31/12/2024
Patronal				
Contratistas y Subcontratista				
Vehículos Propios y No Propios				

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO** **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20,100,062.00	360-47-994000032031	11/07/2024	31/10/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10,050,032.00		11/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	40,200,123.00		31/12/2024	31/12/2029

Convenio 2307 -2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 11/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: RCE** **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	260,000,000.00	360-74-994000008809	11/07/2024	31/12/2024
Patronal				
Contratistas y Subcontratista				
Vehículos Propios y No Propios				

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO** **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20,099,466.00	360-47-994000032032	11/07/2024	31/10/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10,049,733.00		11/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	40,198,932.00		31/12/2024	31/12/2029

Convenio 2308-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 11/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: RCE** **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	260,000,000.00	360-74-994000008822	11/07/2024	31/12/2024
Patronal				
Contratistas y Subcontratista				
Vehículos Propios y No Propios				

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO** **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20,098,743.00	360-47-994000032055	11/07/2024	31/10/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10,049,372.00		11/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	40,197,485.00		31/12/2024	31/12/2029

Convenio 2345-2024

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 12/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: RCE** **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	260,000,000.00	360-74-994000008820	12/07/2024	31/12/2024
Patronal				
Contratistas y Subcontratista				
Vehículos Propios y No Propios				

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO** **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20,099,425.00	360-47-994000032053	12/07/2024	31/10/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10,049,713.00		12/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	40,198,850.00		31/12/2024	31/12/2029

Convenio 2351-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 12/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: RCE** **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	260,000,000.00	NB-100085749	12/07/2024	31/12/2024
Patronal				
Contratistas y Subcontratista				
Vehículos Propios y No Propios				

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO** **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20,099,466.00	NB-100338209	12/07/2024	31/10/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10,049,733.00		12/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	40,198,932.00		31/12/2024	31/12/2029

Convenio 2371-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 16/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: RCE** **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	260,000,000.00	360-74-994000008831	16/07/2024	31/12/2024
Patronal				
Contratistas y Subcontratista				
Vehículos Propios y No Propios				

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO** **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20,106,909.00	360-47-994000032079	16/07/2024	31/10/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10,053,455.00		16/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	40,213,818.00		31/12/2024	31/12/2029

Convenio 2378-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 23/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: RCE** **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	260,000,000.00	360-74-994000008863	23/07/2024	31/12/2024
Patronal				
Contratistas y Subcontratista				
Vehículos Propios y No Propios				

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO** **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20,094,435.00	360-47-994000032152	23/07/2024	31/10/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10,047,218.00		23/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	40,188,870.00		31/12/2024	31/12/2029

Convenio 2380-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 16/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: RCE** **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	260,000,000.00	360-74-994000008832	16/07/2024	31/12/2024
Patronal				
Contratistas y Subcontratista				
Vehículos Propios y No Propios				

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO** **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20,090,810.00	360-47-994000032080	16/07/2024	31/10/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10,045,405.00		16/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	40,181,619.00		31/12/2024	31/12/2029

Convenio 2399-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 16/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: RCE** **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	260,000,000.00	360-74-994000008837	16/07/2024	31/12/2024
Patronal				
Contratistas y Subcontratista				
Vehículos Propios y No Propios				

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO** **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20,100,629.00	360-47-994000032085	16/07/2024	31/10/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10,050,315.00		16/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	40,201,257.00		31/12/2024	31/12/2029

Convenio 2624-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 23/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: RCE** **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	260,000,000.00	360-74-994000008864	23/07/2024	31/12/2024
Patronal				
Contratistas y Subcontratista				
Vehículos Propios y No Propios				

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO** **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20,103,074.00	360-47-994000032153	23/07/2024	31/10/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10,051,538.00		23/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	40,206,147.00		31/12/2024	31/12/2029

Convenio 2755-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: RCE** **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	260,000,000.00	360-74-994000008879	26/07/2024	31/12/2024
Patronal				
Contratistas y Subcontratista				
Vehículos Propios y No Propios				

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO** **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20,100,082.00	360-47-994000032315	26/07/2024	31/10/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10,050,042.00		26/07/2024	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	40,200,163.00		31/12/2024	31/12/2029

Convenio 3018-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 06/08/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: RCE** **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	260,000,000.00	360-74-994000008926	06/08/2024	31/12/2024
Patronal				
Contratistas y Subcontratista				
Vehículos Propios y No Propios				

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO** **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20,096,290.00	360-47-994000032638	06/08/2024	31/10/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10,048,146.00		06/08/2024	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	40,192,580.00		31/12/2024	31/12/2029

Convenio 3482-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 04/09/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: RCE** **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	260,000,000.00	360-74-994000009075	04/09/2024	31/12/2024
Patronal				
Contratistas y Subcontratista				
Vehículos Propios y No Propios				

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO** **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20,093,396.00	360-47-994000033590	04/09/2024	31/10/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10,046,699.00		04/09/2024	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	40,186,791.00		31/12/2024	31/12/2029

Convenio 3499-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 03/09/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: RCE** **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	260,000,000.00	360-74-9940000090555	03/09/2024	31/12/2024
Patronal				
Contratistas y Subcontratista				
Vehículos Propios y No Propios				

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO** **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20,090,070.00	360-47-994000033451	03/09/2024	31/10/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10,045,036.00		03/09/2024	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	40,180,140.00		31/12/2024	31/12/2029

Convenio 3542-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 05/09/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: RCE** **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	260,000,000.00	360-74-994000009074	05/09/2024	31/12/2024
Patronal				
Contratistas y Subcontratista				
Vehículos Propios y No Propios				

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO** **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20,095,441.00	360-47-994000033589	05/09/2024	31/10/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10,047,721.00		05/09/2024	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	40,190,880.00		31/12/2024	31/12/2029

Convenio 3873-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 20/09/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: RCE** **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	260,000,000.00	360-74-994000009135	20/09/2024	31/12/2024
Patronal				
Contratistas y Subcontratista				
Vehículos Propios y No Propios				

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO** **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20,116,465.00	360-47-994000033966	20/09/2024	31/10/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10,058,233.00		20/09/2024	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	40,232,928.00		31/12/2024	31/12/2029

Convenio 3978-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 27/09/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: RCE** **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	260,000,000.00	360-74-994000009186	27/09/2024	31/12/2024
Patronal				
Contratistas y Subcontratista				
Vehículos Propios y No Propios				

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO** **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20,094,222.00	360-47-994000034203	27/09/2024	31/10/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10,047,112.00		27/09/2024	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	40,188,443.00		31/12/2024	31/12/2029

Convenio 4018-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/10/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI **X** O NO

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: RCE** **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	260,000,000.00	360-74-994000009185	01/10/2024	31/12/2024
Patronal				
Contratistas y Subcontratista				
Vehículos Propios y No Propios				

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO** **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20,077,181.00	360-47-994000034204	01/10/2024	31/10/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10,038,591.00		01/10/2024	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	40,154,361.00		31/12/2024	31/12/2029

Convenio 2203-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 08/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	5/07/2024	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.097.918,00	0	5/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.048.959,00	0	5/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.195.836,00	0	5/07/24	31/12/29

Convenio 2125-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 5/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	3/07/24	31/12/24
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.095.671,00	0	3/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.047.836,00	0	3/07/24	31/10/27
Estabilidad de la Obra	40.191.341,00	0	3/07/24	31/10/29

Convenio 2526-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	19/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.107.762,00	0	19/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.053.881,00	0	19/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.215.524,00	0	19/07/24	31/12/29

Convenio 2533-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 1/08/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	22/07/24	31/12/24
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.102.660,00	0	22/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.051.330,00	0	22/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.205.320,00	0	22/07/24	31/12/29

Convenio 2710-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 6/08/24
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	25/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.103.306,00	0	17/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.051.653,00	0	17/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.206.611,00	0	17/07/24	31/12/29

Convenio 2946 -2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 08/08/24
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	02/08/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.106.059,00	0	02/08/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.053.030,00	0	02/08/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.212.117,00	0	02/08/24	31/12/29

Convenio 2389-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 06/08/24
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	16/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.080.280,00	0	16/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.040.141,00	0	16/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.160.559,00	0	16/07/24	31/12/29

Convenio 2800-2024

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 06/08/24
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	29/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.096.570,00	0	29/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.048.286,00	0	29/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.193.140,00	0	29/07/24	31/12/29

Convenio 2259-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 08/08/24
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	10/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.099.541,00	0	10/07/24	31/12/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.049.771,00	0	10/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.199.081,00	0	31/12/24	31/12/29

Convenio 2252-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 16/07/24
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	10/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.089.592,00	0	10/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.044.796,00	0	10/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.179.183,00	0	10/07/24	31/12/29

Convenio 2279-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 17/07/24
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	10/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.089.536,00	0	10/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.044.768,00	0	10/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.179.072,00	0	10/07/24	31/12/29

Convenio 2315-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 17/07/24
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	11/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.100.747,00	0	11/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.050.374,00	0	11/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.201.493,00	0	11/07/24	31/12/29

Convenio 2518-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/08/24
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	22/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.105.250,00	0	22/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.052.625,00	0	22/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.210.499,00	0	22/07/24	31/12/29

Convenio 2547-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26/07/24
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	22/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.106.844,00	0	22/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.053.422,00	0	22/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.213.688,00	0	22/07/24	31/12/29

Convenio 2571-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 05/08/24
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	22/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.100.629,00	0	22/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.050.315,00	0	22/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.201.257,00	0	22/07/24	31/12/29

Convenio 2221-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 08/07/24
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	5/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.101.481,00	0	5/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.050.741,00	0	5/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.202.962,00	0	5/07/24	31/12/29

Convenio 2268-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 19/07/24
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	16/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.096.030,00	0	16/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.048.015,00	0	16/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.192.060,00	0	16/07/24	31/12/29

Convenio 2322-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 17/07/24
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	11/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.109.467,00	0	11/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.054.734,00	0	11/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.218.934,00	0	11/07/24	31/12/29

Convenio 2669-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 08/08/24
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	26/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.094.740,00	0	26/07/24	31/10/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.047.371,00	0	26/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.189.479,00	0	26/07/24	31/12/29

Convenio 2309-2024;

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: APROBADA
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 18/07/24
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO **X**

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: RCE Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Amparo Básico – Predios, Laborares y Operacionales	$260.000.000	0	11/07/24	31/12/2024
Patronal		0		
Contratistas y Subcontratista		0		
Vehículos Propios y No Propios		0		

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	20.084.375,00	0	11/07/24	31/12/25
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	10.042.188,00	0	11/07/24	31/12/27
Estabilidad de la Obra	40.168.750,00	0	31/12/24	31/12/29

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…					…

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

ENVIADA:

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	3661-2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL FR	NIT:	901.865.971-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	FJB INGENIERIA SAS (90%) R&Q INGENIERIA COLOMBIA SA (10%)		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O		

	MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 1		
FECHA DE INICIO:	02/10/2024	2024S-VBOG-071656	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
VALOR INICIAL:	DOS MIL MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS ($2.908.466.591), MONEDA CORRIENTE, IVA INCLUIDO.		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	DOS MIL MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS ($2.908.466.591), MONEDA CORRIENTE, IVA INCLUIDO.		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DICIEMBRE 2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1:	HASTA 31 DE MARZO 2024		
PRÓRROGA 2:	HASTA 31 JULIO MARZO 2024		
SUSPENSIÓN 1:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
916924	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	2.908.466.591,00	$0,00	2.908.466.591,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 1 OCT	$ 85.073.280	$ 16.163.923	$0	$ 101.237.203,20
Acta Mensual de Costos No. 2 NOV	$145.680.440	$ 27.679.284	$0	$ 173.359.724,60
Acta Mensual de Costos No. 3 DIC	$190.546.400,38	$ 36.203.815,62	$0	$ 226.750.216,00
Acta Mensual de Costos No. 4 ENE	$204.748.880,24	$38.902.286,76	$0	$243.651.167,20
Acta Mensual de Costos No. 5 FEB	$376.488.500,74	$71.532.814,26	$0	$448.021.313,81
Acta Mensual de Costos No. 6 MAR	$254.677.630,50	$48.388.749,20	$0	$303.066.379,70
Acta Mensual de Costos No. 7 ABR	$236.033.630,00	$45.743.189,70	$0	$280.880.019,70
Acta Mensual de Costos No. 8 MAY	$262.789.245,52	$49.929.956,03	$0	$312.719.201,55
Acta Mensual de Costos No. 9 JUN	$234.625.658,72	$44.578.875,16	$0	$279.204.533,88

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 9 De fecha 30 de JUNIO para el período el contrato reporta un avance de 83.15 %:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 2.908.466.591,00 (100.00%)

Total inversión ejecutada: $ 1.990.663.662,72 (68.4%)

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…27/12/2024	…01
…17/03/2025	…02

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.10 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO		ASUNTO
No. Consecutivo	FECHA	
CO-VIALFR-047- 541-2025	3/06/2025	Certificado de disposición de residuos sólidos y RCD del convenio solidario 2586 vereda Papatas, Municipio de Topaipí, contrato interventoría 3661.
CO-VIALFR-047- 542-2025	3/06/2025	INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE CIERRE JUNTA DE ACCION COMUNAL PULISITO MUNICIPIO DE PULI. CONVENIO SOLIDARIO SUSCRITO No. 2800-JAC VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO GUAYABETAL.
CO-VIALFR-047- 543-2025	3/06/2025	INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE CIERRE CONVENIO SOLIDARIO SUSCRITO No. 2800-JAC VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO GUAYABETAL
CO-VIALFR-047- 544-2025	3/06/2025	Certificación de baja complejidad del proyecto.

CO-VIALFR-047- 545-2025	3/06/2025	INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE CIERRE JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE ROMERO.
CO-VIALFR-047- 546-2025	3/06/2025	SOLICITUD DE ENTREGA DE DOCUMENTOS FINALES DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL CONVENIO
CO-VIALFR-047- 547-2025	3/06/2025	INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE CIERRE JUNTA DE ACCION COMUNAL QUEBRADA GRANDE MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA.
CO-VIALFR-047- 548-2025	3/06/2025	INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE CIERRE JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CAMANCHA MUNICIPIO DE SAN CAYETANO.
CO-VIALFR-047- 549-2025	3/06/2025	INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE CIERRE JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MODELIA MUNICIPIO DE VIOTA.
CO-VIALFR-047- 550-2025	3/06/2025	SOLICITUD DE ENTREGA DE DOCUMENTOS FINALES DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL CONVENIO

CO-VIALFR-047- 551-2025	3/06/2025	SEGUNDA SOLICITUD DE ENTREGA DE DOCUMENTOS FINALES DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL CONVENIO
CO-VIALFR-047- 552-2025	3/06/2025	SOLICITUD DE ENTREGA DE DOCUMENTOS FINALES DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL CONVENIO
CO-VIALFR-047- 553-2025	3/06/2025	Entrega documentación gestión inicial CONVENIO 3482 – 2024 Junta De Acción Comunal Urbana, municipio Vergara.
CO-VIALFR-047- 554-2025	3/06/2025	Certificación de No Siniestro – Póliza No NB-100333218 y NB-100084188 Convenio Solidario 2390-2024
CO-VIALFR-047- 555-2025	3/06/2025	Certificación de No Siniestro – Póliza No NB-100330779 y NB 100083347 Convenio Solidario 2164-2024
CO-VIALFR-047- 556-2025	3/06/2025	Certificación de No Siniestro – Póliza No NB-100332261 y NB-100083868 Convenio Solidario 2259-2024

CO-VIALFR-047- 557-2025	3/06/2025	Certificación de No Siniestro – Póliza No NB-100332228 y NB-100083857 Convenio Solidario 2281-2024
CO-VIALFR-047- 558-2025	3/06/2025	Certificación de No Siniestro – Póliza No CSC-100046017 y CSC-100011734 Convenio Solidario 2309-2024
CO-VIALFR-047- 559-2025	3/06/2025	Certificación de No Siniestro – Póliza No NB-100338209 y NB-100085749 Convenio Solidario 2351-2024
CO-VIALFR-047- 560-2025	3/06/2025	SEGUNDA SOLICITUD DE ENTREGA DE DOCUMENTOS FINALES DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL CONVENIO
CO-VIALFR-047- 561-2025	3/06/2025	SEGUNDA SOLICITUD DE ENTREGA DE DOCUMENTOS FINALES DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL CONVENIO
CO-VIALFR-047- 562-2025	3/06/2025	Respuesta a comunicado del 22 de mayo vía email y solicitud de . modificación de prorrogas

CO-VIALFR-047- 563-2025	4/06/2025	ENTREGA CHECK LIST Y ANEXOS PARA ETAPA DE LIQUIDACION. CONVENIO SOLIDARIO 2164 DE 2024
CO-VIALFR-047- 564-2025	5/06/2025	Convenio Solidario Número 2302 De 2024 – AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LLANADAS CENTRO DEL MUNICIPIO DE CHAGUANI DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – Entrega Inicial de Documentos Área Social.
CO-VIALFR-047- 565-2025	5/06/2025	Convenio Solidario Número 3482 De 2024 – AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANA DEL MUNICIPIO DE VERGARA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – Entrega Inicial de Documentos Área Social.
CO-VIALFR-047- 566-2025	5/06/2025	Convenio Solidario Número 2624 De 2024 – AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL EL TRIGO DEL MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SIQUIMA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL

		MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – Entrega de cierre de Documentos Área Social.
CO-VIALFR-047- 567-2025	5/06/2025	Convenio Solidario Número 2380 De 2024 – AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL EL ROBLEDAL DEL MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SIQUIMA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – Entrega de cierre de Documentos Área Social.
CO-VIALFR-047- 568-2025	5/06/2025	FALTANTES DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL FINAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS COVENIOS SOLIDARIOS
CO-VIALFR-047- 569-2025	5/06/2025	Convenio Solidario Número 2345 De 2024 – AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL CABRERA DEL MUNICIPIO DE PULI, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – Entrega de cierre de Documentos Área Social.

CO-VIALFR-047- 570-2025	5/06/2025	Reiteración entrega de documentación final ambiental para liquidación de los convenios solidarios.
CO-VIALFR-047- 571-2025	5/06/2025	Convenio Solidario Número 2223 De 2024 – AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LA GLORIETA DEL MUNICIPIO DE YACOPI, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – Entrega de cierre de Documentos Área Social.
CO-VIALFR-047- 572-2025	6/06/2025	RADICADO FACTURA No. VFR 9 – ACTA DE COSTOS No.6 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025
CO-VIALFR-047- 573-2025	9/06/2025	SOLICITUD DE ENTREGA PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL. CONVENIO SOLIDARIO 2946 DE 2024
CO-VIALFR-047- 574-2025	9/06/2025	SOLICITUD DE ENTREGA PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL. CONVENIO SOLIDARIO 2669 DE 2024

CO-VIALFR-047- 575-2025	9/06/2025	INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE CIERRE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL VEREDAS LAS ÁGUILAS, LA PLAYA, SANTA RITA Y LA ZONA URBANA DE CABRERA.
CO-VIALFR-047- 576-2025	9/06/2025	INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE CIERRE CONVENIO SOLIDARIO SUSCRITO No. 2526-JAC ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CABRERA.
CO-VIALFR-047- 577-2025	9/06/2025	INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE CIERRE CONVENIO SOLIDARIO SUSCRITO No. 2710-JAC VEREDA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE CABRERA.
CO-VIALFR-047- 578-2025	9/06/2025	INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE CIERRE CONVENIO SOLIDARIO SUSCRITO No. 2125-JAC VEREDA LAS ÁGUILAS DEL MUNICIPIO DE CABRERA
CO-VIALFR-047- 579-2025	9/06/2025	INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE CIERRE CONVENIO SOLIDARIO SUSCRITO No. 2533-JAC LA PLAYA DEL MUNICIPIO DE CABRERA.
CO-VIALFR-047- 580-2025	10/06/2025	RADICADO ACTA DE COSTOS No.8 MES DE MAYO DE 2025
CO-VIALFR-047- 581-2025	10/06/2025	INFORME ESTADO DE POLIZAS EN LA PLATAFORMA SECOP II DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS VIGENCIA 2024.

CO-VIALFR-047- 582-2025	10/06/2025	Convenio Solidario Número 2222 De 2024 – AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LA ARGENTINA DEL MUNICIPIO DE QUIPILE, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – Entrega de cierre de Documentos Área Social.
CO-VIALFR-047- 583-2025	10/06/2025	SOLICITUD DE CERTIFICACION DE NO PASIVOS AMBIENTALES
CO-VIALFR-047- 584-2025	10/06/2025	Convenio Solidario Número 3018 De 2024 – AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL QUEBRADA GRANDE DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – Entrega de cierre de Documentos Área Social.

CO-VIALFR-047- 585-2025	10/06/2025	Convenio Solidario Número 2307 De 2024 – AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL CAMANCHA DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – Entrega de cierre de Documentos Área Social.
CO-VIALFR-047- 586-2025	10/06/2025	SUSPENSIÓN SOCIALIZACIONES DE CIERRE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL VEREDAS LAS ÁGUILAS, LA PLAYA, SANTA RITA Y LA ZONA URBANA DE CABRERA.
CO-VIALFR-047- 587-2025	10/06/2025	SUSPENSIÓN SOCIALIZACIONES DE CIERRE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL VEREDAS LAS ÁGUILAS, LA PLAYA, SANTA RITA Y LA ZONA URBANA DE CABRERA.
CO-VIALFR-047- 588-2025	11/06/2025	NFORME ESTADO DE POLIZAS EN LA PLATAFORMA SECOP II DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS VIGENCIA 2024.
CO-VIALFR-047- 589-2025	11/06/2025	INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE CIERRE CONVENIO SOLIDARIO SUSCRITO No. 2259-2024 JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS PEÑAS DEL MUNICIPIO DE MANTA.

CO-VIALFR-047- 590-2025	11/06/2025	INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE CIERRE CONVENIO SOLIDARIO SUSCRITO No. 2259-2024 JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS PEÑAS DEL MUNICIPIO DE MANTA.
CO-VIALFR-047- 591-2025	12/06/2025	INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE CIERRE CONVENIO SOLIDARIO SUSCRITO No. 2710-2024 JAC VEREDA SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE CABRERA.
CO-VIALFR-047- 592-2025	12/06/2025	INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE CIERRE CONVENIO SOLIDARIO SUSCRITO No. 2436-2024 JAC VEREDA GUAVIO BAJO DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.
CO-VIALFR-047- 593 y 594-2025	17/06/2025	Certificación de baja complejidad del proyecto.
CO-VIALFR-047- 595-2025	17/06/2025	Respuesta solicitud de información sobre liquidación del convenio 2690-2024 junta De Acción Comunal Vda Córdoba, municipio de Caparrapí
CO-VIALFR-047- 596-2025	18/06/2025	INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE CIERRE CONVENIO SOLIDARIO SUSCRITO No. 2834-JAC VEREDA BARRANCON DEL MUNICIPIO LA PALMA.
CO-VIALFR-047- 597-2025	18/06/2025	RADICACIÓN DE LA GESTION AMBIENTAL FINAL DEL CONVENIO SOLIDARIO CITADO EN LA REFERENCIA 2129
CO-VIALFR-047- 598-2025	18/06/2025	INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE CIERRE CONVENIO SOLIDARIO SUSCRITO No. 2321-JAC VEREDA

		LOMA EN MEDIO DEL MUNICIPIO LA PALMA.
CO-VIALFR-047- 599-2025	18/06/2025	INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE CIERRE CONVENIO SOLIDARIO SUSCRITO No. 2393-JAC VEREDA RIO FRIO DEL MUNICIPIO LA PALMA.
CO-VIALFR-047- 600-2025	18/06/2025	Reiteración Entrega de documentación final ambiental para liquidación de los convenios solidarios.
CO-VIALFR-047- 601-2025	18/06/2025	Convenio Solidario Número 2755 De 2024 – AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MODELIA DEL MUNICIPIO DE VIOTA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – Entrega de cierre de Documentos Área Social.
CO-VIALFR-047- 602-2025	19/06/2025	Entrega Inicial de Documentos Área Social convenio Solidario Número 2281 De 2024
CO-VIALFR-047- 603-2025	19/06/2025	SOLICITUD DE CERTIFICACION DE NO PASIVOS AMBIENTALES
CO-VIALFR-047- 604-2025	20/06/2025	GESTION AMBIENTAL INICIAL DEL CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2586 DE 2024

CO-VIALFR-047- 605-2025	24/06/2025	APROBACION DE SUSPENSIOSUSPENSIÓN CONVENIO 2400 – 2024 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA CAQUIAN DEL MUNICIPIO DE TOPAIPI DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CO-VIALFR-047- 606-2025	24/06/2025	AMPLIACIÓN 3 A LA SUSPENSIÓN No.1 CONVENIO 3499 – 2024 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA HONDURAS ALTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIO SECO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CO-VIALFR-047- 607 y 608-2025	24/06/2025	Entrega documentación gestión inicial CONVENIO 4018 – 2024 Junta De Acción Comunal Antioqueñita, municipio El Colegio.

CO-VIALFR-047- 609-2025	26/06/2025	LLAMADO DE ATENCIÓN POR AVANCE EN ETAPA DE ALISTAMIENTO. CONVENIO SOLIDARIO 3542 DE 2024 VEREDA MARCELLA DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIO
CO-VIALFR-047- 610-2025	26/06/2025	LLAMADO DE ATENCIÓN POR AVANCE EN ETAPA DE ALISTAMIENTO. CONVENIO SOLIDARIO 4018 DE 2024 VEREDA ANTIOQUEÑITA DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIO
CO-VIALFR-047- 611-2025	27/06/2025	INFORME ESTADO DE POLIZAS EN LA PLATAFORMA SECOP II DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS VIGENCIA 2024.
CO-VIALFR-047- 612-2025	27/06/2025	SOLICITUD AUTORIZACION INGRESO INSPECTORES DE INTERVENTORIA
CO-VIALFR-047- 613-2025	27/06/2025	INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE CIERRE CONVENIO SOLIDARIO 2221-2024 JUNTA DE ACIÓN COMUNAL VEREDA EL ENGAÑO DEL MUNICIPIO DE PARATEBUENO
CO-VIALFR-047- 614-2025	27/06/2025	INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE CIERRE CONVENIO SOLIDARIO 2322-2024 JUNTA DE ACIÓN COMUNAL VEREDA BUENA VISTA ALTO REDONDO DEL MUNICIPIO DE PARATEBUENO
CO-VIALFR-047- 615-2025	27/06/2025	INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE CIERRE CONVENIO SOLIDARIO 2315-2024

		JUNTA DE ACIÓN COMUNAL VEREDA SAN JOSÉ ALTO REDONDO DEL MUNICIPIO DE MEDINA.
CO-VIALFR-047- 616-2025	27/06/2025	INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN DE CIERRE CONVENIO SOLIDARIO 2268 DE 2024 SAN JESÚS DE PALOMAS DEL MUNICIPIO DE PARATEBUENO.

2.11 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Se continua a la espera de dos juntas que aun no tiene el Durante el inicio de ejecución de los convenios, se presentan demoras en los tramites de cotizaciones por parte de las JAC. Para desembolsos.

Siguen juntas de acción sin recibir desembolsos del valor total del contrato a las cuentas suscritas en las entidades bancarias.

Dificultades en la metodología para afiliaciones de personal de obra.

Deficiencias en la presentación de información técnica y compromisos contractuales por parte de los profesionales de las jac.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Perfiles profesionales para la ejecución de la obra no cumplen o envían sin certificaciones.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS. N/A

Demoras en trámites de las JAC.

Inconvenientes en la práctica de legalización en aspectos financieros para aplicar retenciones a los insumos.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD N/A.

Las juntas de acción comunal han informado inconformidades para tramitar aprobación de materiales de agregados de cantera, debido a que se solicita documentación legal de explotación minera de estos agregados y las licencias ambientales.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO.

Durante el periodo en mención en realizaron las visitas correspondientes por parte de la interventoría en aras de garantizar la supervisión de los convenios a cargo.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

La supervisión del INVIAS se encarga de monitorear la ejecución de los convenios solidarios. Durante el período del informe, se llevaron a cabo actividades sociales y visitas técnicas con el objetivo de asegurar una adecuada ejecución por parte de las juntas de acción comunal. Además, se proporcionaron asesorías y se identificaron los requisitos necesarios para el cumplimiento de cada convenio solidario:

JUNTA DE ACCION COMUNAL EL CURAL DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI:

Durante el periodo mencionado, Se continua con las actividades requeridas dentro del desarrollo del programa obteniendo un avance significativo durante este mes, se sigue trabajando de la misma forma como se hace en el mes anterior, realizando el mejoramiento de la vía por medio de la construcción de estructura de pavimento tipo placa huella, utilizando concreto de huellas, cunetas y viga riostras de 3000psi, concreto ciclópeo de 2000psi, y se funde modularmente viga a viga de 3mts de separación, a la finalización de este informe la OAC presenta un avance del 100% al ejecutar 120. mts de 6.8 mts y se espera poder terminar labores físicas finalizando el mes de marzo, se han presentado alguno inconvenientes por el cierre vial por parte de las autoridades, se ha explicado el convenio y se ha dado paso a un solo carril de vehículos livianos entendiendo que hay una vía alterna para la circulación de los vehículos pesados.







JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL <u>CORDOBA</u> DEL MUNICIPIO DE CAPARRAPI:

Durante el periodo mencionado, La junta de acción comunal se encuentra en etapa de liquidación, se están enviando los pagos para proveedores finales y de esta manera se empiezan a recolectar los documentos que se requirió por parte de la interventoría para proceder hacer la liquidación ante el Instituto Nacional de Vías INVIAS.





JUNTA DE ACCION COMUNAL PEÑALOSA MUNICIPIO DE CAPARRAPI:

Durante el periodo mencionado, La junta inicia labores de conformación y replanteo de la vía, junto con actividades de extendida de material para posterior iniciar proceso de armado de aceros, se espera iniciar fundida de concretos la primera semana de julio, puesto que los tiempos son cortos se implementara jornadas mas largas para cumplir con los tiempos





JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL TATI DEL MUNICIPIO CAPARRAPI:

Durante el periodo mencionado, La junta de acción comunal se encuentra en etapa de liquidación, se están enviando los pagos para proveedores finales y de esta manera se empiezan a recolectar los documentos que se requirió por parte de la interventoría para proceder hacer la liquidación ante el Instituto Nacional de Vías INVIAS.



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ENCANTADO DEL MUNICIPIO EL PEÑON:

Durante el periodo mencionado, La junta de acción comunal se encuentra en etapa de liquidación, se están enviando los pagos para proveedores finales y de esta manera se empiezan a recolectar los documentos que se requirió por parte de la interventoría para proceder hacer la liquidación ante el Instituto Nacional de Vías INVIAS.



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA AGUADA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑON:

Durante el periodo mencionado, se encuentra en etapa de finalización y liquidación, se están enviando los pagos para proveedores finales y de esta manera se empiezan a recolectar los documentos que se requirió por parte de la interventoría para proceder hacer la liquidación ante el Instituto Nacional de Vías INVIAS.



JUNTA DE ACCION COMUNAL DE <u>RIO FRIO</u> DEL MUNICIPIO DE LA PALMA:

Durante el periodo mencionado, La junta de acción comunal se encuentra en etapa de liquidación, se están enviando los pagos para proveedores finales y de esta manera se empiezan a recolectar los documentos que se requirió por parte de la interventoría para proceder hacer la liquidación ante el Instituto Nacional de Vías INVIAS.



JUNTA DE ACCION COMUNAL DE EL BARRANCON DEL MUNICIPIO DE LA PALMA:

Durante el periodo mencionado, La junta de acción comunal se encuentra en etapa de liquidación, se están enviando los pagos para proveedores finales y de esta manera se empiezan a recolectar los documentos que se requirió por parte de la interventoría para proceder hacer la liquidación ante el Instituto Nacional de Vías INVIAS.



JUNTA DE ACCION COMUNAL DE <u>LOMA MEDIO</u> DEL <u>MUNICIPIO LA PALMA:</u>

Durante el periodo mencionado, La junta de acción comunal se encuentra en etapa de liquidación, se están enviando los pagos para proveedores finales y de esta manera se empiezan a recolectar los documentos que se requirió por parte de la interventoría para proceder hacer la liquidación ante el Instituto Nacional de Vías INVIAS.









JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA SIRIA DEL MUNICIPIO PAIME:

Durante el periodo mencionado, Se continua con las actividades requeridas dentro del desarrollo del programa obteniendo un avance significativo durante este mes, se sigue trabajando de la misma forma como se hace en el mes anterior, realizando el mejoramiento de la vía por medio de la construcción de estructura de pavimento tipo placa huella, utilizando concreto de huellas, cunetas y viga riostras de 3000psi, concreto ciclópeo de 2000psi, y se funde modularmente viga a viga de 3mts de separación, a la finalización de este informe la OAC presenta un avance del 100% al ejecutar 193 mts de 4.1 mts y se espera poder terminar labores físicas a mitad del mes de Mayo por tanto es necesario contemplar un prórroga para poder ejecutar todas las actividades contractuales.





JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL PALMAR DEL MUNICIPIO PAIME:

Durante el periodo mencionado, Se continua con las actividades requeridas dentro del desarrollo del programa obteniendo un avance significativo durante este mes, se sigue trabajando de la misma forma como se hace en el mes anterior, realizando el mejoramiento de la vía por medio de la construcción de estructura de pavimento tipo placa huella, utilizando concreto de huellas, cunetas y viga riostras de 3000psi, concreto ciclópeo de 2000psi, y se funde modularmente viga a viga de 3mts de separación, a la finalización de este informe la OAC presenta un avance del 100% al ejecutar 131 mts en media calzada de 5 mts.





JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE <u>TERMINOS</u> DEL MUNICIPIO TOPAIPI:

Durante el periodo mencionado, Se continua con las actividades requeridas dentro del desarrollo del programa obteniendo un avance significativo durante este mes, se sigue trabajando de la misma forma como se hace en el mes anterior, realizando el mejoramiento de la vía por medio de la construcción de estructura de pavimento tipo placa huella, utilizando concreto de huellas, cunetas y viga riostras de 3000psi, concreto ciclópeo de 2000psi, y se funde modularmente viga a viga de 3mts de separación, a la finalización de este informe la OAC presenta un avance del 42% al ejecutar 58 mts en media calzada de 4.1 mts y se espera poder terminar labores físicas a finales del mes de julio.





JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE <u>NARANJAL</u> DEL MUNICIPIO TOPAIPI:

Durante el periodo mencionado, Se continua con las actividades requeridas dentro del desarrollo del programa obteniendo un avance significativo durante este mes, se sigue trabajando de la misma forma como se hace en el mes anterior, realizando el mejoramiento de la vía por medio de la construcción de estructura de pavimento tipo placa huella, utilizando concreto de huellas, cunetas y viga riostras de 3000psi, concreto ciclópeo de 2000psi, y se funde modularmente viga a viga de 3mts de separación, a la finalización de este informe la OAC presenta un avance del 95% al ejecutar 164 mts en media calzada de 4.1 mts y se espera poder terminar labores la primera semana de julio.





JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE PAPATAS DEL MUNICIPIO TOPAIPI:

Durante el periodo mencionado, Se continua con las actividades requeridas dentro del desarrollo del programa obteniendo un avance significativo durante este mes, se sigue trabajando de la misma forma como se hace en el mes anterior, realizando el mejoramiento de la vía por medio de la construcción de estructura de pavimento tipo placa huella, utilizando concreto de huellas, cunetas y viga riostras de 3000psi, concreto ciclópeo de 2000psi, y se funde modularmente viga a viga de 3mts de separación, a la finalización de este informe la OAC presenta un avance del 38% al ejecutar 30 mts en media calzada de 4.1 mts y 1 alcantarilla se espera poder terminar labores físicas a finales del mes de julio





JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CAQUIAN DEL MUNICIPIO TOPAIPI:

Durante el periodo mencionado, La junta recibe información por parte del INVIAS sobre el estado del desembolso el cual difícilmente llegaría para este mes, por tal motivo se inició un proceso de ampliación de suspensión de convenio ante la entidad puesto que sin desembolso no se podrán adelantar procesos de obras, por tal motivo se envió solicitud a la interventoría para dar aprobación ante el Invias justificando la suspensión en la carencia de PAC de la entidad lo cual no ha permitido el desembolso de recursos del programa caminos comunitarios de la paz total. Dicha solicitud que fue avalada con fecha de ampliación de suspensión hasta 14 de mayo de, esperando que a esta fecha los recursos ya estén en las cuentas de cada junta.

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE MUCHIPAY DEL MUNICIPIO TOPAIPI:

Durante el periodo mencionado, Se continua con las actividades requeridas dentro del desarrollo del programa obteniendo un avance significativo durante este mes, se sigue trabajando de la misma forma como se hace en el mes anterior, realizando el mejoramiento de la vía por medio de la construcción de estructura de pavimento tipo placa huella, utilizando concreto de huellas, cunetas y viga riostras de 3000psi, concreto ciclópeo de 2000psi, y se funde modularmente viga a viga de 3mts de separación, a la finalización de este informe la OAC presenta un avance del 100% al ejecutar 149 mts de 4.1 mts y una alcantarilla, habiendo culminado labores de obra físicas 8 de abril.

A la finalización de este mes se proyectó una prórroga de dos meses entendiendo que el clima ha jugado un papel desfavorable en los retrasos de las labores por eso se aprueba por parte de interventoría conceder una prórroga de 2 meses a 31 de mayo para finalizar las labores de obra.





JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE PURAY DEL MUNICIPIO YACOPI:

Durante el periodo mencionado, La junta de acción comunal se encuentra en etapa de liquidación, se están enviando los pagos para proveedores finales y de esta manera se empiezan a recolectar los documentos que se requirió por parte de la interventoría para proceder hacer la liquidación ante el Instituto Nacional de Vías INVIAS.









JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE <u>LA GLORIETA</u> DEL MUNICIPIO YACOPI:

Durante el periodo mencionado, La junta de acción comunal se encuentra en etapa de liquidación, se están enviando los pagos para proveedores finales y de esta manera se empiezan a recolectar los documentos que se requirió por parte de la interventoría para proceder hacer la liquidación ante el Instituto Nacional de Vías INVIAS.









JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CHAPA DEL MUNICIPIO YACOPI:

Durante el periodo mencionado, La junta de acción comunal se encuentra en etapa de liquidación, se están enviando los pagos para proveedores finales y de esta manera se empiezan a recolectar los documentos que se requirió por parte de la interventoría para proceder hacer la liquidación ante el Instituto Nacional de Vías INVIAS.



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MORAY DEL MUNICIPIO YACOPI:

Durante el periodo mencionado, se encuentra en etapa de finalización y liquidación, se están enviando los pagos para proveedores finales y de esta manera se empiezan a recolectar los

documentos que se requirió por parte de la interventoría para proceder hacer la liquidación ante el Instituto Nacional de Vías INVIAS.









JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE <u>LIMONAL</u> DEL MUNICIPIO YACOPI:

Durante el periodo mencionado, se encuentra en etapa de finalización y liquidación, se están enviando los pagos para proveedores finales y de esta manera se empiezan a recolectar los documentos que se requirió por parte de la interventoría para proceder hacer la liquidación ante el Instituto Nacional de Vías INVIAS.



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE <u>LAGUNETA</u> DEL MUNICIPIO YACOPI:

Durante el periodo mencionado, comunal se encuentra en etapa de finalización y liquidación, se están enviando los pagos para proveedores finales y de esta manera se empiezan a recolectar los documentos que se requirió por parte de la interventoría para proceder hacer la liquidación ante el Instituto Nacional de Vías INVIAS.







JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE IBAMA DEL MUNICIPIO YACOPI:

Durante el periodo mencionado, La junta recibe información por parte de la entidad bancaria sobre el desembolso otorgado por el Instituto Nacional de Vías INVIAS, una vez allegada la información a la interventoría se procede a reunir los documentos necesarios y las aprobaciones justificadas del reinicio de actividades, y se inicia nuevamente la búsqueda de profesionales y búsqueda de cotizaciones para la realización del comité operativo y poder superar la tapa de alistamiento de la forma más rápida y de esta forma empezar la etapa de construcción de así como el análisis del tiempo otorgado para una prórroga suficiente en tiempo que permita concluir el objeto contractual. se da inicio a las actividades de obra realizando el mejoramiento de la vía por medio de la construcción de estructura de pavimento tipo placa huella, utilizando concreto de huellas, cunetas y viga riostras de 3000psi, concreto ciclópeo de 2000psi, y se funde modularmente viga a viga de 3mts de separación, a la finalización de este informe la OAC presenta un avance del 40% se espera poder terminar labores en el mes de junio con personal y maquinaria. se da la aprobación de la prórroga hasta el 31 de junio para lograr llevar a cabo todas las actividades necesarias de ejecución.





JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL IMPARAL – MUNICIPIO DE SUPATÁ.

- ✓ Durante el mes de abril de 2025, se continuó con la realización de trámites de cartas de desembolso por concepto de gastos incurridos por la Junta de Acción Comunal en desarrollo del convenio.
- ✓ Actividades de obra desarrolladas durante el mes:
  - Vaciados de concreto de elementos de la placa huella, tales como: huellas, centros, sobreanchos, cunetas y bordillos.
- ✓ A la fecha de corte del presente informe, se terminó la ejecución y alcance del mejoramiento vial, con la construcción de **145 metros lineales de placa huella**.
- ✓ Se estima que en las próximas semanas, se adelanten los trámites de la liquidación del convenio solidario, teniendo en cuenta la culminación de actividades constructivas de la obra física. Sin embargo, se está a la espera que se ejecuten las actividades en el marco de la obra social, las cuales consistirán en adecuaciones y construcción de baterías sanitarias en el polideportivo veredal.
- ✓ A la fecha de corte del presente informe, con las actividades de la etapa de obras de mejoramiento adelantadas, se tienen construidos un total de **145 metros lineales de placa huella,** correspondiente a un avance físico de obra del **100%.**
- ✓ A la fecha de corte del presente informe, no se han iniciado las actividades en el marco del plan de inversión social previstas con las adecuaciones en las baterías sanitarias del polideportivo veredal, sin embargo, se estima que durante el mes de mayo de 2025 sean ejecutadas y se lleve a cabo el cierre social del convenio solidario.







JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PULISITO – MUNICIPIO DE PULÍ.

- ✓ A la fecha de corte del presente informe se terminó la ejecución y alcance físico del mejoramiento vial, con la construcción de 182 metros lineales de placa huella.
- ✓ Durante el mes de abril, se realizó la autorización de pagos y desembolso de recursos a proveedores para la ejecución de actividades en el marco del plan de inversión social, el cual consistió en el suministro y conformación de material de cantera en tramo adicional de la placa huella construida.
- ✓ Durante las próximas semanas, se adelantarán los trámites tendientes a la liquidación del convenio solidario.
- ✓ Se estima que a principios del mes de mayo de 2025, se realice la socialización de cierre del proyecto, teniendo en cuenta la culminación de las actividades constructivas de la obra física y el plan de inversión social.
- ✓ A la fecha de corte del presente informe, con las actividades de la etapa de obras de mejoramiento adelantadas, se tienen construidos un total de **182 metros lineales de placa huella,** correspondiente a un avance físico de obra del **100%.**
- ✓ Estado contractual: **Terminado.**








JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SABANETA – MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO.

- ✓ A la fecha de corte del presente informe se terminó la ejecución y alcance físico del mejoramiento vial, con la construcción de 201 metros lineales de placa huella.
- ✓ En las próximas semanas, se adelantarán los trámites de la liquidación del convenio solidario, teniendo en cuenta la culminación de las actividades constructivas de la obra física y el plan de inversión social.
- ✓ A la fecha de corte del presente informe, con las actividades de la etapa de obras de mejoramiento adelantadas, se tienen construidos un total de **201 metros lineales de placa huella,** correspondiente a un avance físico de obra del **100%.**
- ✓ A la fecha de corte del presente informe, se realizaron la totalidad de actividades en el marco del plan de inversión social, con el **suministro e instalación de 30 luminarias LED solares** en diferentes sectores de influencia de la vereda: (8) Sector Alto del Vino, (8) Sector Villamizar Prospero, (3) Sector Carlos Orjuela, (5) Sector Becerra/Gómez, (6) Sector Los Novia-Placa Huella.
- ✓ Previamente, en el mes de enero de 2025 se había realizado la socialización de cierre del convenio en conjunto con la comunidad, JAC e Interventoría.
- ✓ Estado contractual: **Terminado.**







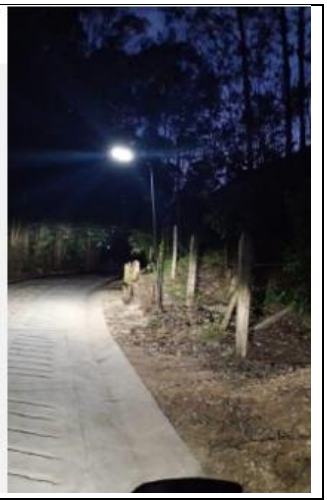

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LLANADAS CENTRO – MUNICIPIO DE CHAGUANÍ

- ✓ Actualmente, se encuentra adelantando las etapas conformación de la calzada existente, se remitan la documentación contable y financiera, junto con las cartas de autorización de desembolso, para llevar a cabo el trámite de revisión, autorización, suscripción y radicación en entidad bancaria, con el fin de que haga el giro directo al respectivo proveedor; todo ello con el fin de continuar la etapa de obras de mejoramiento mediante placa huella.
- ✓ Posterior a la reanudación del convenio solidario, se han venido adelantando actividades por parte de la Junta de Acción Comunal de la etapa de alistamiento del convenio, con la consecución de cotizaciones de proveedores de materiales e insumos, balance de obra y materiales requeridos, con el fin de que en el mes de junio de 2025 se inicien las actividades de la etapa de obras de mejoramiento
- ✓ Estado actual del convenio solidario: **En Ejecución.**

Se realiza capacitación nuevamente acerca del proyecto sus alcances y requerimientos.

Para responder cite este código

Bogotá D.C., 21 de abril de 2025

Señores:
JAC VEREDA LLANADAS CENTRO – CHAGUANÍ
Atención: **ADÁN MARTÍNEZ GARAY**
Representante Legal
jacaccioncomunallanadas@gmail.com

REF: **Contrato de Interventoría No 3661 de 2024**

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 1.

ASUNTO: **REVISIÓN DE HOJAS DE VIDA EVALUABLES CONVENIO SOLIDARIO 2302 DE 2024**

Respetado presidente:

En atención a la remisión de las hojas de vida por su parte, evaluables por la interventoría relacionadas para el convenio mencionado en el asunto, de manera atenta le informo que una vez revisada la documentación soporte y teniendo en cuenta los requisitos de experiencia exigidos según el anexo técnico y la minuta del convenio 2302 de 2024, el cual tiene por objeto: "*AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LLANADAS CENTRO DEL MUNICIPIO DE CHAGUANÍ CUNDINAMARCA, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL*", esta interventoría la encuentra ajustada a los requerimientos, por tal razón **APRUEBA** el siguiente personal:

CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CONTADOR PÚBLICO	MAESTRO DE OBRA
NOMBRE	EFREN FERNANDO MORENO ZAMORA	CARLOS JULIO CASTELLANOS	JEISSON FERNEY GÓMEZ GUAYAZAN

Cordialmente,

OSCAR JAVIER LUNA NAVAS
Director de Interventoría
CONSORCIO VIAL FR

cc. Ing. Gustavo Cepeda Ocampo- Supervisor – gcepeda@invias.gov.co
Ing. Rodrigo Osorio-Apoyo Territorial Cundinamarca- rosorio@invias.gov.co

INVIAS

CLAUSULAS ADICIONALES
CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2302 DE 2024
PRÓRROGA NÚMERO UNO (01) DE 2025

CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo del Convenio Solidario No. 2302 del 2024, hasta el 31 de julio del 2025. La presente ampliación del plazo del convenio se concede conforme a los documentos que soportan la solicitud de trámite de prórroga y no implica sobrecostos para **EL INSTITUTO**.

PARÁGRAFO PRIMERO: La presente prórroga se concede sin perjuicio de las acciones que **EL INSTITUTO** pueda adelantar por el incumplimiento en que se incurra durante la ejecución del convenio.

CLÁUSULA SEGUNDA: NUEVO CRONOGRAMA Y PROGRAMA DE INVERSIÓN. – Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, **EL OAC** se obliga a ceñirse a un Nuevo cronograma y programa de Inversión, el cual deberá ser presentado para aprobación de **EL INSTITUTO**.

CLÁUSULA TERCERA: GARANTÍA ÚNICA Y SEGURO. – EL OAC se obliga a modificar en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles, el mecanismo de cobertura de conformidad con las condiciones pactadas en el contrato electrónico.

CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes todas las estipulaciones del Convenio Solidario que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.

CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente documento se entiende perfeccionado e inicia su ejecución con la firma electrónica de las partes a través de la Plataforma Transaccional SECOP II.

Proyectó: Abogado SGCPA
Revisó: Abogado SGCPA
Vo. Bo. Subdirectora de Gestión Contractual y Procesos Administrativos
Revisó: Abogado Gerencia Caminos Comunitarios de la Paz Total
Revisó: Subgerente Caminos Comunitarios de la Paz Total
Revisó: Abogado SVR

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CAMANCHA – MUNICIPIO DE SAN CAYETANO.

- ✓ Durante el mes de abril de 2025, se continuó con la realización de trámites de cartas de desembolso por concepto de gastos incurridos por la Junta de Acción Comunal en desarrollo del convenio.
- ✓ Actividades de obra desarrolladas durante el mes:
  - Vaciados de concreto de elementos de la placa huella, tales como: huellas, centros, sobreanchos, cunetas y bordillos.
- ✓ A la fecha de corte del presente informe, se terminó la ejecución y alcance del mejoramiento vial, con la construcción de **125 metros lineales de placa huella**, construcción de **150 metros lineales de filtro de drenaje,** y mejoramiento de **(1) alcantarilla** en el tramo vial.
- ✓ Se estima que en las próximas semanas, se adelanten los trámites de la liquidación del convenio solidario, teniendo en cuenta la culminación de actividades constructivas de la obra física. Sin embargo, se está a la espera que se ejecuten las actividades en el marco de la obra social, las cuales consistirán en actividades de mejoramiento en el parque principal.
- ✓ A la fecha de corte del presente informe, con las actividades de la etapa de obras de mejoramiento adelantadas, se tienen construidos un total de **125 metros lineales de placa huella, 150 metros lineales de filtro de drenaje y 1 alcantarilla,** correspondiente a un avance físico de obra del **100%.**
- ✓ A la fecha de corte del presente informe, no se han iniciado las actividades en el marco del plan de inversión social previstas con el mejoramiento del parque principal, sin embargo, se estima que durante el mes de mayo de 2025 sean ejecutadas y se lleve a cabo el cierre social del convenio solidario.





JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TIERRA GRATA – MUNICIPIO DE FACATATIVÁ.

- ✓ A la fecha de corte del presente informe se terminó la ejecución y alcance físico del mejoramiento vial, con la construcción de 219,5 metros lineales de placa huella.
- ✓ En las próximas semanas, se adelantarán los trámites de la liquidación del convenio solidario, teniendo en cuenta la culminación de las actividades constructivas de la obra física y el plan de inversión social.
- ✓ A la fecha de corte del presente informe, con las actividades de la etapa de obras de mejoramiento adelantadas, se tienen construidos un total de **219,5 metros lineales de placa huella,** correspondiente a un avance físico de obra del **100%.**
- ✓ A la fecha de corte del presente informe, se realizaron la totalidad de actividades en el marco del plan de inversión social, con las actividades de remodelación, mejoramiento y ampliación de carácter locativo en la sede del acueducto veredal.
- ✓ El 28-febrero-2025, se realizó la socialización de cierre del convenio solidario, en conjunto con la comunidad, JAC e Interventoría.
- ✓ Estado contractual: **Terminado.**







JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CABRERA – MUNICIPIO DE PULÍ.

- ✓ Durante el mes de abril de 2025, se continuó con la realización de trámites de cartas de desembolso por concepto de gastos incurridos por la Junta de Acción Comunal en desarrollo del convenio.
- ✓ Actividades de obra desarrolladas durante el mes:
  - Vaciados de concreto de elementos de la placa huella, tales como: huellas, centros, sobreanchos, cunetas y bordillos.
- ✓ A la fecha de corte del presente informe, se terminó la ejecución y alcance del mejoramiento vial, con la construcción de **201,3 metros lineales de placa huella**.
- ✓ Se estima que en las próximas semanas, se adelanten los trámites de la liquidación del convenio solidario, teniendo en cuenta la culminación de actividades constructivas de la obra física y el plan de inversión social con la adecuación e instalación del parque infantil.
- ✓ A la fecha de corte del presente informe, con las actividades de la etapa de obras de mejoramiento adelantadas, se tienen construidos un total de **201,3 metros lineales de placa huella,** correspondiente a un avance físico de obra del **100%.**
- ✓ A la fecha de corte del presente informe, una vez ejecutado el alcance físico de la placa huella y la instalación del parque infantil en el marco del plan de inversión social, se estima que a principios del mes de mayo de 2025 se lleve a cabo la socialización de cierre del convenio solidario.



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LIRIA – MUNICIPIO DE SAN CAYETANO.

- ✓ Una vez realizado el Comité Operativo del convenio solidario, a finales del pasado mes de abril de 2025, durante el mes de mayo de 2025 se remitió por parte de la Junta de Acción Comunal, las cartas de autorización de desembolso con los soportes contables y financieros respectivos, para el trámite de revisión, autorización, suscripción y radicación de las cartas en entidad bancaria para el giro directo a cada proveedor.
- ✓ El 28 de mayo de 2025 se inició la conformación, extensión y compactación del tramo vial objeto de intervención.
- ✓ A la fecha de corte del presente informe, se han adelantado las siguientes de la etapa de obras de mejoramiento:
    - Extensión, conformación y compactación del tramo vial objeto de intervención.
    - Armado y figurado del acero de refuerzo de elementos estructurales de la placa huella.
    - Testereo de elementos para alistamiento del vaciado de concreto en la placa huella.

- ✓ A la fecha de corte del presente informe, se tiene un avance físico ejecutado de las actividades de la etapa de obras de mejoramiento del 7%.
- ✓ Estado actual del convenio solidario: **En Ejecución.**
  - ✓ convenio, con la consecución de cotizaciones de proveedores de materiales e insumos, balance de obra y materiales requeridos, con el fin de que en el mes de mayo de 2025 se inicien las actividades de la etapa de obras de mejoramiento.
  - ✓ Estado actual del convenio solidario: **En Ejecución.**



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUADALUPE- MUNICIPIO DE QUIPILE

- ✓ A la fecha de corte del presente informe se han realizado las siguientes actividades correspondientes a la etapa de obras de mejoramiento:
  - Extensión, conformación y compactación del tramo vial objeto de intervención.
  - Armado y figurado de acero de refuerzo de elementos estructurales.
  - Vaciados de concreto de elementos de la placa huella.
  - Se tienen construidos un total de **100 metros lineales de placa huella,** representando un avance físico de obra del 75%.
- ✓ Estado actual del convenio solidario: **En Ejecución.**



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CENTRO ANTIGUO DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO:

- ✓ Posterior al Comité Operativo realizado a finales del mes de abril de 2025, se remitió por parte de la Junta de Acción Comunal las cartas de autorización de desembolso, junto con los soportes documentales de carácter financiero y contable, para dar trámite a la revisión, autorización, suscripción y radicación ante entidad bancaria de dichas cartas con el fin de realizar el giro directo a cada uno de los proveedores.
- ✓ Se continua las actividades de la etapa de obras de mejoramiento con la conformación y compactación del tramo vial objeto de intervención.
- ✓ A la fecha de corte del presente informe, se han desarrollado las siguientes actividades de la etapa de obras de mejoramiento:
    - Extensión, conformación y compactación del tramo vial objeto de intervención.
    - Armado y figurado de acero de refuerzo de elementos estructurales de la placa huella.
    - Testereo y alistamiento para vaciado de concreto de elementos de la placa huella.

- Se tiene un avance físico de obra del 58%

✓ Estado actual del convenio solidario: **En Ejecución**.



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ROBLEDAL - MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SIQUIMA:

- ✓ Durante el mes de abril de 2025, se continuó con la realización de trámites de cartas de desembolso por concepto de gastos incurridos por la Junta de Acción Comunal en desarrollo del convenio.
- ✓ Actividades de obra desarrolladas durante el mes:
  - Vaciados de concreto de elementos de la placa huella, tales como: huellas, centros, sobreanchos, cunetas y bordillos.
- ✓ A la fecha de corte del presente informe, se terminó la ejecución y alcance del mejoramiento vial, con la construcción de **160 metros lineales de placa huella** y **mejoramiento de (1) alcantarilla** en el tramo vial.
- ✓ Se estima que en las próximas semanas, se adelanten los trámites de la liquidación del convenio solidario, teniendo en cuenta la culminación de actividades constructivas de la obra física y el plan de inversión social con la adecuación e instalación del parque infantil.
- ✓ A la fecha de corte del presente informe, con las actividades de la etapa de obras de mejoramiento adelantadas, se tienen construidos un total de **160 metros lineales de placa huella** y **mejoramiento de (1) alcantarilla** del tramo vial**,** correspondiente a un avance físico de obra del **100%.**

A la fecha de corte del presente informe, una vez ejecutado el alcance físico de la placa huella y la instalación de luminarias solar LED en área de influencia de la placa huella en el marco del plan de inversión social, se estima que a principios del mes de mayo de 2025 se lleve a cabo la socialización de cierre del convenio solidario.



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MANANTIAL – MUNICIPIO DE PULÍ:

- ✓ A la fecha de corte del presente informe se terminó la ejecución y alcance físico del mejoramiento vial, con la construcción de 175 metros lineales de placa huella.
- ✓ En las próximas semanas, se adelantarán los trámites de la liquidación del convenio solidario, teniendo en cuenta la culminación de la obra física y actividades.
- ✓ A la fecha de corte del presente informe, con las actividades de la etapa de obras de mejoramiento adelantadas, se tienen construidos un total de **175 metros lineales de placa huella,** correspondiente a un avance físico de obra del **100%.**
- ✓ A la fecha de corte del presente informe, se realizaron la totalidad de actividades en el marco del plan de inversión social, con las actividades de adecuaciones y mejoramiento de las condiciones físico ambientales de la Escuela Rural Manantial.
- ✓ Se estima que en los primeros días del mes de mayo de 2025, se realice la socialización de cierre del convenio con la Junta de Acción Comunal y la comunidad.
- ✓ Estado contractual: **Terminado.**



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TRIGO – MUNICIPIO DE GUAYABAL DE SÍQUIMA:

- ✓ A la fecha de corte del presente informe se terminó la ejecución y alcance físico del mejoramiento vial, con la construcción de 180 metros lineales de placa huella.
- ✓ En las próximas semanas, se adelantarán los trámites de la liquidación del convenio solidario, teniendo en cuenta la culminación de la obra física y actividades del plan de inversión social.
- ✓ A la fecha de corte del presente informe, con las actividades de la etapa de obras de mejoramiento adelantadas, se tienen construidos un total de **180 metros lineales de placa huella,** correspondiente a un avance físico de obra del **100%.**
- ✓ A la fecha de corte del presente informe, se realizó la ejecución de las actividades en el marco del plan de inversión social, en el cual se realizó la dotación de sillas y mesas en el salón comunal de la vereda, cuya actividad a la fecha ya está ejecutada en su totalidad.
- ✓ Se estima que en los primeros días del mes de mayo de 2025, se realice la socialización de cierre del convenio con la Junta de Acción Comunal y la comunidad.
- ✓ Estado contractual: **Terminado.**



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MODELIA – MUNICIPIO DE VIOTÁ:

- ✓ Durante el mes de mayo de 2025, se continuó con la realización de trámites de cartas de desembolso por concepto de gastos incurridos por la Junta de Acción Comunal en desarrollo del convenio.
- ✓ Actividades de obra desarrolladas durante el mes:
  - Extensión, conformación y compactación de material de cantera en el tramo objeto de intervención de la placa huella.
  - Armado y figurado de acero de refuerzo de elementos estructurales de la placa huella.
  - Armado de formaletas y alistamiento para vaciados de concreto.
  - Vaciados de concreto de elementos de la placa huella, tales como: huellas, centros, sobreanchos, cunetas y bordillos.
  - A la fecha de corte del presente informe, con las actividades de la etapa de obras de mejoramiento adelantadas, se tienen construidos un total de **110 metros lineales de placa huella,** correspondiente a un avance físico de obra del **55%.**
  - En el presente mes, los rendimientos de la obra sufrieron retrasos, principalmente por cuenta de las condiciones climáticas de lluvia adversas en el sector del Municipio de Viotá.







JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA QUEBRADA GRANDE – MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA:

- ✓ A la fecha de corte del presente informe se terminó la ejecución y alcance físico del mejoramiento vial, con la construcción de 188 metros lineales de placa huella.
- ✓ En las próximas semanas, se adelantarán los trámites de la liquidación del convenio solidario, teniendo en cuenta la culminación de la obra física y actividades.
- ✓ A la fecha de corte del presente informe, con las actividades de la etapa de obras de mejoramiento adelantadas, se tienen construidos un total de **188 metros lineales de placa huella,** correspondiente a un avance físico de obra del **100%.**
- ✓ A la fecha de corte del presente informe, se realizaron las actividades establecidas en el marco del plan de inversión social.
- ✓ Se estima que en las próximas semanas, se realicen las gestiones para llevar a cabo la socialización de cierre del convenio.







JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL URBANA – MUNICIPIO DE VERGARA:

- ✓ A la fecha de corte del presente informe, se encuentran en ejecución de obra mediante las labores de conformación de la calzada existente, figurado y armado de aceros de refuerzo, y suministros de concretos ciclópeo y reforzados, para un avance físico de la obra del 26%.
- ✓ Estado actual del convenio solidario: **En Ejecución**.

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CLAUSULAS ADICIONALES
CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3482 DE 2024
PRÓRROGA NÚMERO UNO (01) DE 2025

CLÁUSULA PRIMERA: **PRORROGAR** el plazo del Convenio Solidario No. 3482 del 2024, hasta el 31 de julio del 2025. La presente ampliación del plazo del convenio se concede conforme a los documentos que soportan la solicitud de trámite de prórroga y no implica sobrecostos para **EL INSTITUTO**.

PARÁGRAFO PRIMERO: La presente prórroga se concede sin perjuicio de las acciones que **EL INSTITUTO** pueda adelantar por el incumplimiento en que se incurra durante la ejecución del convenio.

CLÁUSULA SEGUNDA: NUEVO CRONOGRAMA Y PROGRAMA DE INVERSIÓN. – Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, **EL OAC** se obliga a ceñirse a un Nuevo cronograma y programa de inversión, el cual deberá ser presentado para aprobación de **EL INSTITUTO**.

CLÁUSULA TERCERA: GARANTÍA ÚNICA Y SEGURO. – EL OAC se obliga a modificar en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles, el mecanismo de cobertura de conformidad con las condiciones pactadas en el contrato electrónico.

CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes todas las estipulaciones del Convenio Solidario que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.


CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente documento se entiende perfeccionado e inicia su ejecución con la firma electrónica de las partes a través de la Plataforma Transaccional SECOP II.

Proyectó: Abogado SGCPA
Revisó: Abogada SGCPA
Vo. Bo. Subdirectora de Gestión Contractual y Procesos Administrativos
Revisó: Abogado Gerencia Caminos Comunitarios de la Paz Total
Revisó: Subgerente Caminos Comunitarios de la Paz Total
Revisó: Abogado SVR

Prórroga No. 1 del convenio solidario. Vda Urbana, Vergara


JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE LAS HONDURAS – MUNICIPIO SAN JUAN DE RIOSECO:

- ✓ A la fecha de corte del presente informe, la entidad contratante no ha realizado el desembolso de recursos para el convenio solidario, con el fin de reanudar e iniciar la ejecución de las obras de mejoramiento.
- ✓ No se han realizado actividades, toda vez que durante el periodo que abarca el presente informe, el convenio solidario estuvo suspendido.
- ✓ Estado actual del convenio solidario: **SUSPENDIDO**

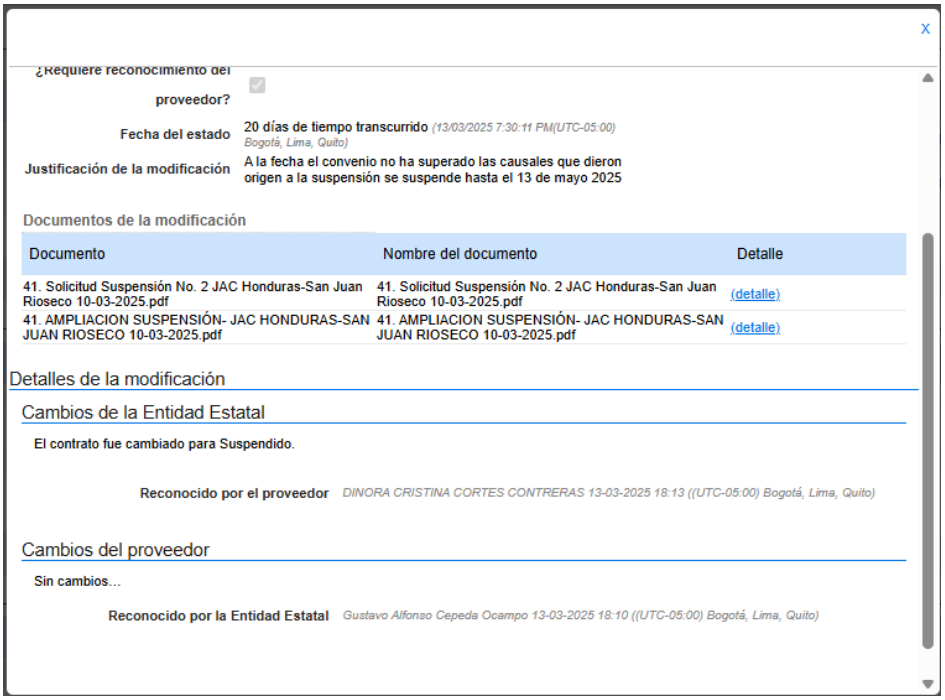

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA MARCELLA – MUNICIPIO DE EL COLEGIO:

1. Estado actual del convenio solidario: **En Ejecución**
2. Durante el mes de junio de 2025, se ha remitido por parte de la Junta de Acción Comunal cotizaciones previas de proveedores de insumos y materiales, por lo cual se realiza conformación e la calzada existente para un avance de obra del 4%.

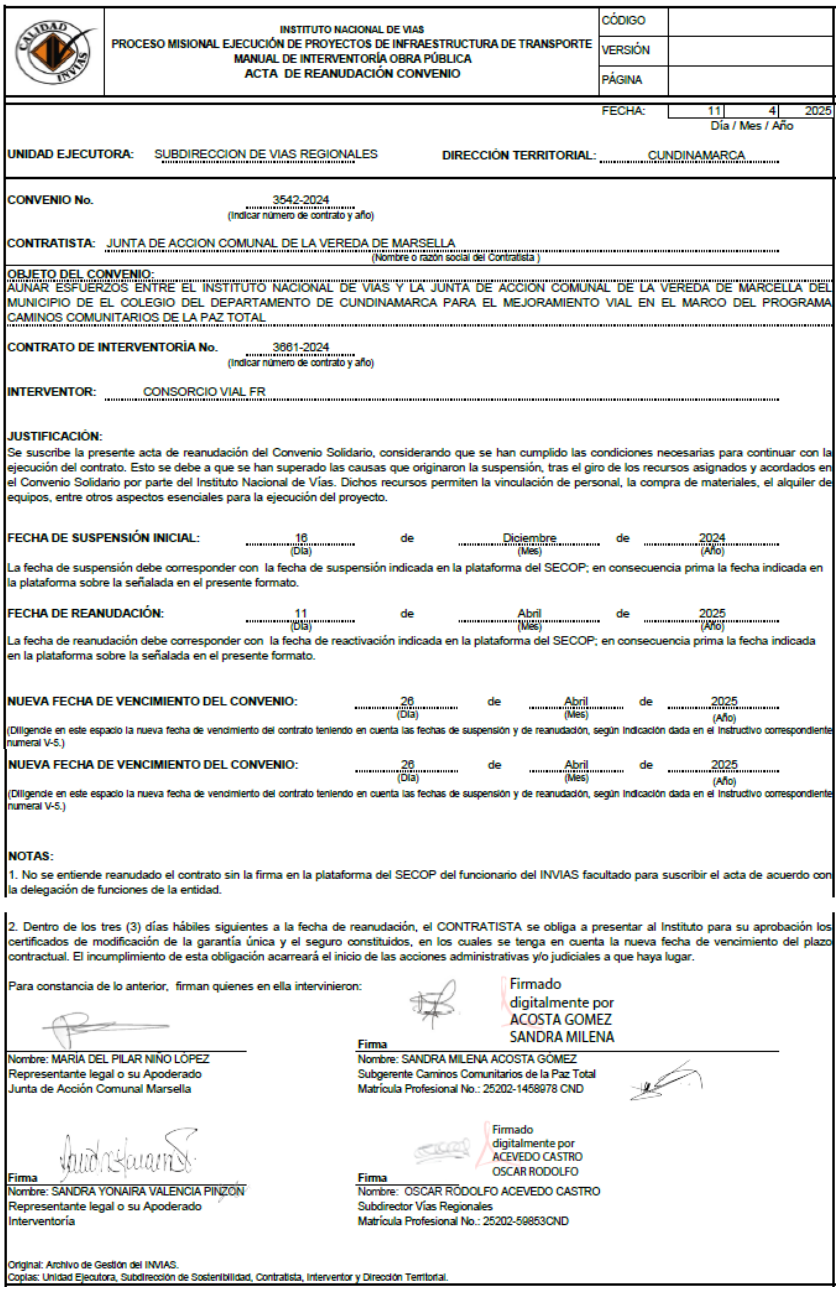

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REANUDACIÓN CONVENIO

CÓDIGO
VERSIÓN
PÁGINA

FECHA: 11 (Día) 4 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

CONVENIO No. 3542-2024 (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE MARSELLA (Nombre o razon social del Contratista)

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE MARCELLA DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3661-2024 (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL FR

JUSTIFICACIÓN:
Se suscribe la presente acta de reanudación del Convenio Solidario, considerando que se han cumplido las condiciones necesarias para continuar con la ejecución del contrato. Esto se debe a que se han superado las causas que originaron la suspensión, tras el giro de los recursos asignados y acordados en el Convenio Solidario por parte del Instituto Nacional de Vías. Dichos recursos permiten la vinculación de personal, la compra de materiales, el alquiler de equipos, entre otros aspectos esenciales para la ejecución del proyecto.

FECHA DE SUSPENSIÓN INICIAL: 16 (Día) de Diciembre (Mes) de 2024 (Año)

La fecha de suspensión debe corresponder con la fecha de suspensión indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

FECHA DE REANUDACIÓN: 11 (Día) de Abril (Mes) de 2025 (Año)

La fecha de reanudación debe corresponder con la fecha de reactivación indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO: 26 (Día) de Abril (Mes) de 2025 (Año)

(Diligencie en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta las fechas de suspensión y de reanudación, según indicación dada en el Instructivo correspondiente numeral V-5.)

NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO: 26 (Día) de Abril (Mes) de 2025 (Año)

(Diligencie en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta las fechas de suspensión y de reanudación, según indicación dada en el Instructivo correspondiente numeral V-5.)

NOTAS:
1. No se entiende reanudado el contrato sin la firma en la plataforma del SECOP del funcionario del INVIAS facultado para suscribir el acta de acuerdo con la delegación de funciones de la entidad.

2. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el CONTRATISTA se obliga a presentar al Instituto para su aprobación los certificados de modificación de la garantía única y el seguro constituidos, en los cuales se tenga en cuenta la nueva fecha de vencimiento del plazo contractual. El incumplimiento de esta obligación acarreará el inicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar.

Para constancia de lo anterior, firman quienes en ella intervinieron:

Firmado digitalmente por ACOSTA GOMEZ SANDRA MILENA

Nombre: MARIA DEL PILAR NIÑO LÓPEZ
Representante legal o su Apoderado
Junta de Acción Comunal Marsella

Firma
Nombre: SANDRA MILENA ACOSTA GÓMEZ
Subgerente Caminos Comunitarios de la Paz Total
Matrícula Profesional No.: 25202-1458978 CND

Firma
Nombre: SANDRA YONAIRA VALENCIA PINZON
Representante legal o su Apoderado
Interventoría

Firmado digitalmente por ACEVEDO CASTRO OSCAR RODOLFO

Firma
Nombre: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
Subdirector Vías Regionales
Matrícula Profesional No.: 25202-59853CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Acta de reanudación del convenio de fecha 11-abril-2025. Vda Marsella, El Colegio

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ALIANZA– MUNICIPIO DE LA VEGA:

- ✓ A la fecha de corte del presente informe, se han realizado las siguientes actividades de la etapa de las obras de mejoramiento:
  - Extensión, conformación y compactación del tramo vial objeto de intervención.
  - Armado de acero de refuerzo de elementos de la placa huella.
  - Suministros de concreto en obra.
- ✓ Estado actual del convenio solidario: **En Ejecución**





JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA MONTAÑA – MUNICIPIO DE UTICA:

- ✓ Durante el presente mes de junio de 2025, una vez realizados los giros directos a cada proveedor, se inician las actividades de la etapa de obras de mejoramiento vial en el corredor.
- ✓ Se realizan acopios de material sobre el tramo vial objeto de mejoramiento mediante placa huella.
- ✓ Estado actual del convenio solidario: **En Ejecución**



INVIAS

Al contestar cite este radicado: 2025S-VBOG-040925
Fecha: 2025-06-17 18:05:30

SEÑOR(A):
BLANCA INÉS SORACÁ REYES
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
CONSORCIO VIAL FR
CALLE 7 # 37-25
consorciovial.fr@jyrg.cl
BOGOTÁ, D.C., BOGOTA

ASUNTO: Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-058690. No Objeción etapa de inicio caminos comunitarios de la paz total. Convenio 3978 de 2024. Municipio de Utica, Departamento de Cundinamarca.

Respetada Ingeniera Soracá,

En atención al radicado Invias 2025E-VUVRAZ-058690 mediante el cual la Interventoría del contrato de la referencia remite documentos relacionados con la etapa inicial de la gestión social del convenio 3978 de 2024 celebrado con la Junta de Acción Comunal de la Montaña, municipio Utica, la Subdirección de Sostenibilidad recibe a conformidad los formatos y soportes mencionados a continuación:

- Acta de Radicación y Actualización Social del Proyecto MASPS-MN1-IN-3-FR-1. Diligenciada y con la totalidad de las firmas
- Plan de Inversión Social versión 1, MASPS-MN1-IN-3- FR-S. Por un valor de $ 4.552.444 participación comunitaria (Dotaciones inmobiliario)
- Certificación de Interventoría indicando que no se requiere de la elaboración el PAGA.
- Proyecto de inversión social "DOTACIÓN DE SILLAS Y MESAS, CON FINES DE ACTIVIDADES SOCIALES" con cotizaciones correspondientes.
- Anexos. Soportes de reunión de Socialización de inicio, plan de gestión social, fichas de caracterización socioeconómicas, protocolo para el servicio de atención al usuario.


Conforme con lo mencionado, esta Subdirección considera que la documentación allegada cumple con lo establecido para emitir **NO OBJECIÓN** a la etapa de inicio del convenio 3978 de 2024, aclarando que los conceptos generados por la SS no constituyen aprobación sino la verificación y cumplimiento en la entrega de documentación relacionada con la etapa inicial.

Lo anterior se manifiesta en ejercicio de las funciones establecidas en el Manual de Interventoría, Manual de Contratación y las demás actividades delegadas que le competen a esta Subdirección y Gestores adscritos, sin perjuicio de las acciones que desde la supervisión de la Interventoría y Contratista se requiera realizar en el marco de su competencia.

Cordialmente,

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ANTIOQUEÑITA – MUNICIPIO DE EL COLEGIO:

1. Estado actual del convenio solidario: **En Ejecución**
2. En este sentido, durante el trascurso del mes de junio de 2025 se remitió por parte de la Junta de Acción Comunal, las cartas de autorización de desembolso junto con soportes contables y financieros para la adquisición de materiales, y posterior acopio de los mismos sobre la via objeto de mejoramiento.
3. Seguimiento a las gestiones que se han venido adelantando por parte de la Junta de Acción Comunal de la etapa de alistamiento del convenio, con la consecución de cotizaciones de proveedores de materiales e insumos, balance de obra y materiales requeridos, con el fin de que en el mes de junio de 2025 se inicien las actividades de la etapa de obras de mejoramiento.

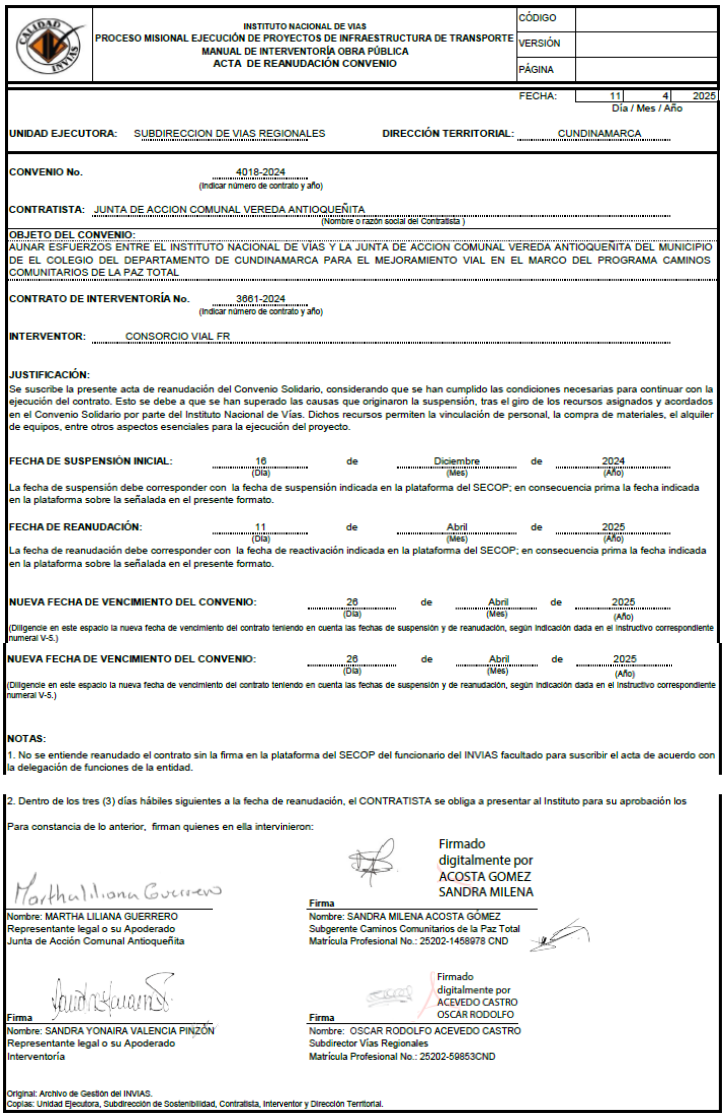

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REANUDACIÓN CONVENIO

CÓDIGO
VERSIÓN
PÁGINA

FECHA: 11 / 4 / 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

CONVENIO No. 4018-2024 (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ANTIOQUEÑITA (Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ANTIOQUEÑITA DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3861-2024 (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL FR

JUSTIFICACIÓN:
Se suscribe la presente acta de reanudación del Convenio Solidario, considerando que se han cumplido las condiciones necesarias para continuar con la ejecución del contrato. Esto se debe a que se han superado las causas que originaron la suspensión, tras el giro de los recursos asignados y acordados en el Convenio Solidario por parte del Instituto Nacional de Vías. Dichos recursos permiten la vinculación de personal, la compra de materiales, el alquiler de equipos, entre otros aspectos esenciales para la ejecución del proyecto.

FECHA DE SUSPENSIÓN INICIAL: 16 (Día) de Diciembre (Mes) de 2024 (Año)

La fecha de suspensión debe corresponder con la fecha de suspensión indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

FECHA DE REANUDACIÓN: 11 (Día) de Abril (Mes) de 2025 (Año)

La fecha de reanudación debe corresponder con la fecha de reactivación indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO: 26 (Día) de Abril (Mes) de 2025 (Año)

(Diligencie en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta las fechas de suspensión y de reanudación, según indicación dada en el instructivo correspondiente numeral V-5.)

NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO: 26 (Día) de Abril (Mes) de 2025 (Año)

(Diligencie en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta las fechas de suspensión y de reanudación, según indicación dada en el instructivo correspondiente numeral V-5.)

NOTAS:
1. No se entiende reanudado el contrato sin la firma en la plataforma del SECOP del funcionario del INVIAS facultado para suscribir el acta de acuerdo con la delegación de funciones de la entidad.

2. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el CONTRATISTA se obliga a presentar al Instituto para su aprobación los

Para constancia de lo anterior, firman quienes en ella intervinieron:

Firma
Nombre: MARTHA LILIANA GUERRERO
Representante legal o su Apoderado
Junta de Acción Comunal Antioqueñita

Firmado digitalmente por ACOSTA GOMEZ SANDRA MILENA
Firma
Nombre: SANDRA MILENA ACOSTA GÓMEZ
Subgerente Caminos Comunitarios de la Paz Total
Matrícula Profesional No.: 25202-1458978 CND

Firma
Nombre: SANDRA YONAIRA VALENCIA PINZÓN
Representante legal o su Apoderado
Interventoría

Firmado digitalmente por ACEVEDO CASTRO OSCAR RODOLFO
Firma
Nombre: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
Subdirector Vías Regionales
Matrícula Profesional No.: 25202-59853CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Colegio

INVIAS

CLAUSULAS ADICIONALES
CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 4018 DE 2024
PRÓRROGA NÚMERO UNO (01) DE 2025

CLÁUSULA PRIMERA: **PRORROGAR** el plazo del Convenio Solidario No. 4018 del 2024, hasta el 31 de julio de 2025. La presente ampliación del plazo del convenio se concede conforme a los documentos que soportan la solicitud de trámite de prórroga y no implica sobrecostos para **EL INSTITUTO**.

PARÁGRAFO PRIMERO: La presente prórroga se concede sin perjuicio de las acciones que **EL INSTITUTO** pueda adelantar por el incumplimiento en que se incurra durante la ejecución del convenio.

CLÁUSULA SEGUNDA: NUEVO CRONOGRAMA Y PROGRAMA DE INVERSIÓN. – Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, **EL OAC** se obliga a ceñirse a un Nuevo cronograma y programa de Inversión, el cual deberá ser presentado para aprobación de **EL INSTITUTO**.

CLÁUSULA TERCERA: GARANTÍA ÚNICA Y SEGURO. – **EL OAC** se obliga a modificar en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles, el mecanismo de cobertura de conformidad con las condiciones pactadas en el contrato electrónico.

CLÁUSULA CUARTA: **VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES**. - Continúan vigentes todas las estipulaciones del Convenio Solidario que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.

CLÁUSULA QUINTA: **PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN**. - El presente documento se entiende perfeccionado e inicia su ejecución con la firma electrónica de las partes a través de la Plataforma Transaccional SECOP II.

Proyectó: Abogado SGCPA
Revisó: Abogada SGCPA
Vo. Bo. Subdirectora de Gestión Contractual y Procesos Administrativos
Revisó: Abogado Gerencia Caminos Comunitarios de la Paz Total
Revisó: Subgerente Caminos Comunitarios de la Paz Total
Revisó: Abogado SVR

Minuta de prórroga No. 1 del convenio solidario. Vda Antioqueñita, El Colegio

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA BARBARA – MUNICIPIO DE ARBELÁEZ:

Durante el periodo mencionado, La junta continua con la etapa de ejecución, algunas de las actividades realizadas en obra son: la instalación del concreto, figurado, amarre y empotrado del acero, a su vez el encofrado para las huellas, ciclópeo, cunetas, sobreanchos y vigas. Adicionalmente, se radica el 10 de marzo la prórroga No.2 desde el 01 de abril al 31 de julio del 2025.





JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS ÁGUILAS – MUNICIPIO DE CABRERA:

Durante el periodo mencionado, La junta finalizó etapa de ejecución de obra, se finalizó encofrado y fundición de concreto ciclópeo central en los dos tramos de placa huella; se finalizó encofrado, instalación de acero y fundición de huellas, vigas riostras, sobreanchos en curvas, losas de aproximación y cunetas en los tramos de placa huella; se finalizó construcción de los dos tramos de placa huella, primer tramo de placa huella: 136 metros y segundo tramo de placa huella: 103 metros, para un total de 239 metros de placa huella en este convenio solidario.





JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CABRERA:

Durante el periodo mencionado, El convenio solidario 2526-2024 se encuentra en etapa de liquidación; interventoría adelanta solicitud para la socialización de cierre.





JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PLAYA -MUNICIPIO DE CABRERA:

Durante el periodo mencionado, La junta finalizó etapa de ejecución de obra, se finalizó encofrado y fundición de concreto ciclópeo central en los dos tramos de placa huella; se finalizó encofrado, instalación de acero y fundición de huellas, vigas riostras, sobreanchos en curvas, losas de aproximación y cunetas en los tramos de placa huella; se finalizó construcción de los dos tramos de placa huella, primer tramo de placa huella: 100 metros y segundo tramo de placa huella: 136 metros, para un total de 236 metros de placa huella en este convenio solidario.



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA RITA PARTE BAJA - MUNICIPIO DE CABRERA:

Durante el periodo mencionado, La junta finalizó etapa de ejecución de obra en el mes de marzo de 2025, se finalizó encofrado y fundición de concreto ciclópeo central en los dos tramos de placa huella; se finalizó encofrado, instalación de acero y fundición de huellas, vigas riostras y cunetas en los tramos de placa huella; se realizó jornada de aseo y limpieza en obra; se finalizó construcción de los dos tramos de placa huella, primer tramo de placa huella: 151 metros y segundo tramo de placa huella: 119 metros, para un total de 270 metros de placa huella en este convenio solidario.
El convenio solidario 2710-2024 se encuentra en etapa de liquidación; interventoría adelanta solicitud para la socialización de cierre.



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAVIO BAJO - MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ:


Durante el periodo mencionado, La junta finalizó etapa de ejecución de obra en el mes de marzo de 2025, se finalizó encofrado y fundición de concreto ciclópeo (franja central y sobreanchos); encofrado, instalación de acero de refuerzo y fundición de huellas, vigas riostras y cunetas; se finalizó construcción del filtro de drenaje; se finalizó corte y figurado de acero; se realizó jornada de aseo y limpieza en obra.
Para este convenio solidario se obtuvo una meta física de 200 metros de placa huella y 70 metros de filtro.
El convenio solidario 2436-2024 se encuentra en etapa de liquidación, adicionalmente se prepara la socialización de cierre.



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ASORURAL - MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ:

Durante el periodo mencionado, Se reinició el convenio solidario el 28 de abril de 2025, dado que INVIAS realizó el desembolso de los recursos a la JAC; se realizó comité operativo, donde se expone y aprueba el plan de compras junto con las cotizaciones correspondientes;

la JAC debe entregar las cartas de transferencias para proceder con el inicio de las actividades de obra.

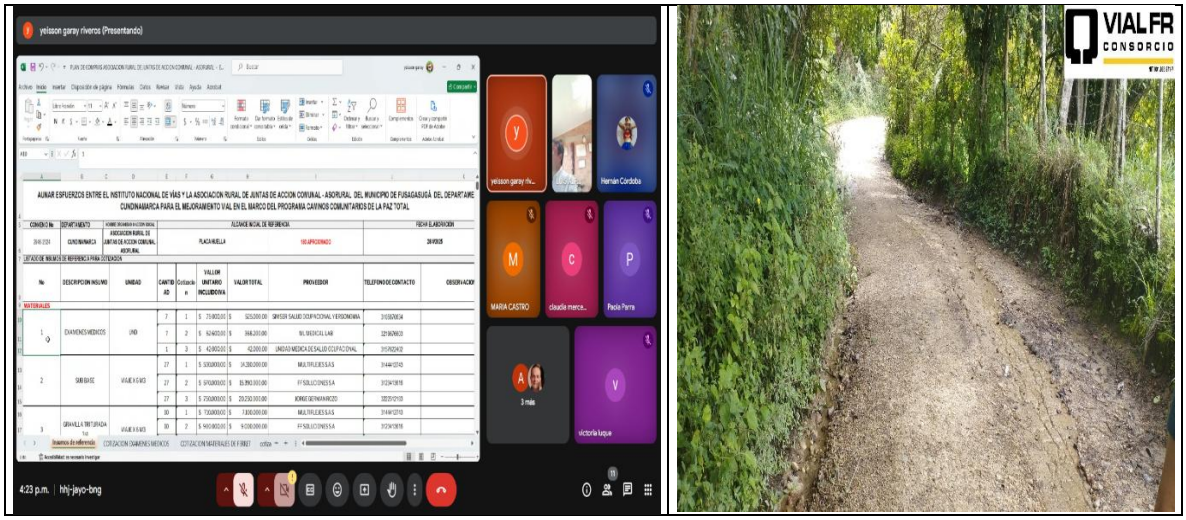

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LIMONCITOS - MUNICIPIO DE GUAYABETAL:

Durante el periodo mencionado, El convenio solidario 2389-2024 se encuentra en etapa de liquidación; se adelanta gestión para la socialización de cierre.



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN ANTONIO - MUNICIPIO DE GUAYABETAL:

Durante el periodo mencionado, El convenio solidario finaliza etapa de ejecución de obra, se finalizó corte y figurado de acero; se finalizó encofrado y fundición de placa huella (losa de aproximación, vigas riostras, cunetas y bordillos); se realizó limpieza y aseo en obra. Este convenio solidario logro un alcance de 225 metros de placa huella.
El convenio solidario 2800-2024 se encuentra en etapa de liquidación; se adelanta gestión para la socialización de cierre.



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LAS PEÑAS - MUNICIPIO DE MANTA:

Durante el periodo mencionado, la junta finalizó etapa de ejecución de obra, se finalizó encofrado y fundición de concreto ciclópeo central en los dos tramos de placa huella; se finalizó encofrado, instalación de acero y fundición de huellas, sobreanchos en curvas, vigas riostras y cunetas en los tramos de placa huella; se finalizó construcción de los dos tramos de placa huella, primer tramo de placa huella: 109 metros y segundo tramo de placa huella: 130 metros, para un total de 239 metros de placa huella en este convenio solidario. el proyecto de inversión social, el cual es una obra civil, no se ha ejecutado.
El convenio solidario 2259-2024 se encuentra en etapa de liquidación; se realiza la gestión documental para la socialización de cierre.





JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS ALPES - MUNICIPIO DE MEDINA:

Durante el periodo mencionado, La junta finalizó etapa de ejecución de obra, se finalizó encofrado y fundición de concreto ciclópeo central y sobreanchos; se finalizó encofrado, instalación de acero y fundición de huellas, vigas riostras, losas de aproximación, cunetas y bordillos en el tramo de placa huella; se finalizó construcción del tramo de placa huella, logrando un alcance de 190 metros de placa huella en este convenio solidario: El proyecto de inversión social, el cual es una obra civil, no se ha ejecutado.
El convenio solidario 2252-2024 se encuentra en etapa de liquidación; se gestiona el proceso documental para la socialización de cierre.





JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL INSPECCIÓN LA ESMERALDA - MUNICIPIO DE MEDINA:

Durante el periodo mencionado, La junta de acción comunal finaliza etapa de ejecución de obra; se finalizó con el encofrado y fundición de concreto ciclópeo (franja central y sobreanchos); se finalizó el encofrado, instalación de acero de refuerzo y fundición de huellas, vigas riostras, losas de aproximación, cunetas y bordillos. El convenio solidario logro un alcance de 180 metros de placa huella.
El convenio solidario 2279-2024 se encuentra en etapa de liquidación; se gestiona el proceso documental para la socialización de cierre.



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JOSE ALTO REDONDO - MUNICIPIO DE MEDINA:

Durante el periodo mencionado, La Junta de Acción comunal finalizó etapa de ejecución de obra en el mes de febrero de 2025, logrando una longitud de placa huella de 147.9 metros; Se deben diligenciar todos los formatos correspondientes a la entrega final del componente social y ambiental, se debe realizar la socialización de cierre y diligenciar todos los formatos correspondientes para el proceso de liquidación.
El convenio solidario 2315-2024 se encuentra en etapa de liquidación; se gestiona el proceso documental para la socialización de cierre.



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN PEDRO DE GUAJARAY - MUNICIPIO DE MEDINA:

Durante el periodo mencionado, La junta de acción comunal continuó etapa de ejecución de obra, se continuó encofrado y fundición de concreto ciclópeo (franja central y sobreanchos); se continuó encofrado, instalación de acero y fundición de huellas, vigas riostras, cunetas, bordillos y losa de aproximación; se continuó corte y figurado de acero; se continuó acopio de materiales. Se tiene programado terminar la ejecución de obra, los primeros días del mes de mayo; se debe ir gestionando la documentación para la liquidación del convenio.



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JUANITO - MUNICIPIO DE MEDINA:

Durante el periodo mencionado, Se reinició el convenio solidario el 11 de abril de 2025 y se prorrogó hasta el 31 de julio, dado que INVIAS realizó el desembolso de los recursos a la JAC; se realizó comité operativo, donde se expone y aprueba el plan de compras junto con las cotizaciones correspondientes; Se finaliza la etapa de alistamiento y se inicia la etapa de ejecución de obra, con la conformación e instalación de subbase granular; se inició encofrado y fundición de concreto ciclópeo (franja central y sobreanchos); se inició encofrado, instalación de acero y fundición de huellas, vigas riostras, cunetas y bordillos; se inició corte y figurado de acero; se inició acopio de materiales.





ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE JUNTAS COMUNALES DE MEDINA:

Durante el periodo mencionado, La Junta de Acción comunal finalizó etapa de ejecución de obra en el mes de febrero, logrando una longitud de placa huella de 183.1 metros; Se deben diligenciar todos los formatos correspondientes a la entrega final del componente social y ambiental, se debe realizar la socialización de cierre y diligenciar todos los formatos correspondientes para el proceso de liquidación.
El convenio solidario 2571-2024 se encuentra en etapa de liquidación; se adelanta la gestión para la socialización de cierre.



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL ENGAÑO - MUNICIPIO DE PARATEBUENO:

Durante el periodo mencionado, La Junta de Acción comunal se encuentra en etapa de liquidación del convenio solidario 2221-2024.
Se realiza revisión documental de la etapa de liquidación y se programa socialización de cierre.



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JESÚS DE PALOMAS - MUNICIPIO DE PARATEBUENO:

Durante el periodo mencionado, El convenio solidario 2268-2024 se encuentra en etapa de liquidación; se solicita la documentación requerida para la programación de la socialización de cierre.




JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENAVISTA DE ALTO REDONDO - MUNICIPIO DE PARATEBUENO:

Durante el periodo mencionado, La Junta de Acción comunal se encuentra en etapa de liquidación del convenio solidario 2322-2024. Revisión documental de la etapa de liquidación y programación para la socialización de cierre.



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA RASGATA- MUNICIPIO DE TAUSA:

Durante el periodo mencionado, Se reinició el convenio solidario el 11 de abril de 2025 y se prorrogó hasta el 31 de julio, dado que INVIAS realizó el desembolso de los recursos a la JAC.
El convenio solidario continua en etapa de alistamiento, no se ha realizado comité operativo, debido a que la JAC no ha enviado la documentación requerida.

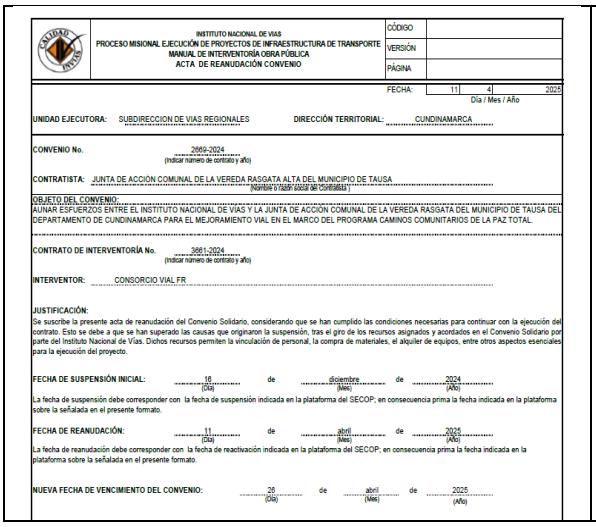

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REANUDACIÓN CONVENIO

CÓDIGO
VERSIÓN
PÁGINA

FECHA: 11 | 4 | 2025
Día / Mes / Año

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

CONVENIO No. 2669-2024
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASGATA ALTA DEL MUNICIPIO DE TAUSA
(Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RASGATA DEL MUNICIPIO DE TAUSA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3661-2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL FR

JUSTIFICACIÓN:
Se suscribe la presente acta de reanudación del Convenio Solidario, considerando que se han cumplido las condiciones necesarias para continuar con la ejecución del contrato. Esto se debe a que se han superado las causas que originaron la suspensión, tras el giro de los recursos asignados y acordados en el Convenio Solidario por parte del Instituto Nacional de Vías. Dichos recursos permiten la vinculación de personal, la compra de materiales, el alquiler de equipos, entre otros aspectos esenciales para la ejecución del proyecto.

FECHA DE SUSPENSIÓN INICIAL: 16 (Día) de diciembre (Mes) de 2024 (Año)
La fecha de suspensión debe corresponder con la fecha de suspensión indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

FECHA DE REANUDACIÓN: 11 (Día) de abril (Mes) de 2025 (Año)
La fecha de reanudación debe corresponder con la fecha de reactivación indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO: 28 (Día) de abril (Mes) de 2025 (Año)



JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ROMERO - MUNICIPIO DE UBAQUE:

Durante el periodo mencionado, La Junta de Acción comunal se encuentra en etapa de liquidación del convenio solidario 2309-2024. Revisión documental de la etapa de liquidación y programación para la socialización de cierre.





6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,



GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
DIRECTOR DE LA TERRITORIAL DE CUNDINAMARCA (E)
