INFORME DE AVANCE DE JULIO DE 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

CONVENIO Nº COID - 846 DE 2024 SUSCRITO ENTRE COLDEPORTES Y MUNICIPIO DE SAN DIEGO.

Objeto del Convenio:	ERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DI								
Valor del Convenio:	$ 13.958.651.555,00		Aporte de Coldeportes:		$ 13.958.651.555,00		Aporte del Municipio:		$ 0,00
Valor Adición:	$ 0,00								
Valor Total:	$ 13.958.651.555,00								
Plazo de Ejecución:	14 MESES Y 24 DIAS		Suspensión 1		Reinicio:		Prórroga Nº 1		31/03/2025
Fecha de Inicio:	6/11/2024		Suspensión 2		Reinicio:		Prórroga Nº 2		31/12/2025
Vencimiento:	31/12/2025						Plazo Actualizado		14 MESES Y 24 DIAS
Póliza de garantía única:	Vigencia póliza (Fechas)				Valor		Modificación fecha		Modificación Valor
LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SE	Desde	16/10/2024	Hasta	30/06/2026	$ 2.791.730.311,00				

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe Nº	9	Período comprendido entre el	10 DE JULIO DEL 2025	y el	9 DE AGOSTO DEL 2025
Proyecto	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO, CESAR				
Localización	SAN DIEGO, CESAR / latitud : 10°20´19.20¨ N , longitud : 73° 10´49.54¨ O				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
Objeto:	INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO - CESAR	Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO - CESAR
Contrato Nº:	004-2024	Contrato Nº:	033-2025
Contratista:	CONSORCIO INTER - ESCENARIO SD 25	Contratista:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS
Plazo Inicial:	SEIS (6) MESES	Plazo Inicial:	SEIS (6) MESES
Fecha de Inicio:	10 de marzo de 2025	Fecha de Inicio:	10 de marzo de 2025
*Fecha de Suspensión:		*Fecha de Suspensión:	
*Fecha de Reinicio:		*Fecha de Reinicio:	
Fecha de Terminación inicial:	9 de septiembre del 2025	Fecha de Terminación inicial:	9 de septiembre del 2025
Fecha de terminacion con prorrogas:	9 de febrero del 2025	Fecha de terminacion con prorrogas:	9 de febrero del 2025
Prórrogas 1 :	CINCO (5) MESES	Prórrogas 1 :	CINCO (5) MESES
Fecha prorroga 1:	30 de abril de 2025	Fecha prorroga 1:	30 de abril de 2025
Plazo Actualizado:	ONCE (11) MESES	Plazo Actualizado:	ONCE (11) MESES
Valor Inicial:	$ 518,496,955	Valor Inicial:	$ 13,358,523,629,68
Valor Adiciones:	-	Valor Adiciones:	-
Valor Actualizado:	$ 518,496,955	Valor Actualizado:	$ 13,358,523,629,68
Valor pagado:	0	Valor pagado:	0
Valor por pagar:	$ 518,496,955	Valor por pagar:	$ 13,358,523,629,68
Nombre Supervisor:	UBEIMAN SOCARRAS RUEDA	Nombre Interventor:	CONSORCIO INTER - ESCENARIO SD 25

ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº 004-2024

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	VIGENTE (Fechas) HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/03/2025	10/08/2026	51.849.695,50
IOS,PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIOI	31/03/2025	10/02/2029	51.849.696,50
CALIDAD DEL SERVICIO	8/09/2025	8/09/2030	51.849.697,50
Nombre de la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A	Póliza N°		21-44-1014-68251

CONTRATO DE OBRA Nº 033-2025

CONCEPTO	N° POLIZAS	VIGENTE (Fechas) DESDE	VIGENTE (Fechas) HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO	NB-100368636	30/04/2025	7/08/2026	2.671.704.725,94
PRESTACIONES SOCIALES	NB-100368636	30/04/2025	7/02/2026	667.926.181,48
ESTABILIDAD DE LA OBRA	NB-100368636	7/02/2026	7/02/2031	4.007.557.088,90
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	NB-100368636	7/02/2026	7/02/2028	2.671.704.725,94
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL	NB - 100095284	10/03/2025	7/02/2026	771.750.000,00
Nombre de la Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL				

RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº	**CONTRATO DE OBRA Nº**

Scanned with CamScanner

a la fecha no se han realizado pagos a los contratos derivados del convenio.

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO		FECHA DE PAGO	VALOR

SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%)

CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO
% Programado	20,87%	35,46%	56,33%
% Ejecutado	15,43%	21,08%	36,51%
Diferencia	5,44%	14,38%	19,82%

AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)

CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	%
% Programado	0,00%	0,00%	0,00%	
% Ejecutado	0,00%	0,00%	0,00%	
Diferencia	0,00%	0,00%	0,00%	

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO

1. Actividades preliminares de localización y replanteo:
El contratista continua con las labores de localización y replanteo del área de intervención, utilizando para ello equipos topográficos especializados, asegurando el correcto posicionamiento del proyecto conforme a los planos técnicos aprobados.

2. excavaciones manuales para cerramiento perimetral:
La excavación manual para cerramiento consiste en cavar la tierra con herramientas como palas, picos y barretas, para abrir zanjas o huecos donde se construirá la base que sostendrá la estructura de la gradería. Es un trabajo que se hace de forma cuidadosa y siguiendo medidas específicas para asegurar que la cimentación sea firme y segura.

3.Instalación de relleno seleccionado en la zona de parque infantil y de juegos biosaludables: consiste en la colocación de un material granular limpio, libre de piedras, escombros y elementos cortantes, previamente compactado y nivelado, con el fin de generar una base uniforme, estable y segura que facilite la correcta instalación de los elementos de juego, mejore el drenaje y garantice la seguridad de los usuarios.

4 .fundida de solado para vigas de cimentación de cerramiento perimetral consiste en la colocación de una capa de concreto, generalmente pobre o de limpieza, sobre el terreno previamente nivelado y compactado, con el fin de crear una superficie firme, nivelada y libre de impurezas donde se instalarán las vigas de cimentación que soportarán el cerramiento perimetral.

5. armado de acero de refuerzo para cerramiento perimetral, vigas superiores y columnas de gradería: consiste en la colocación y amarre de barras de acero corrugado conforme a los planos estructurales, con el fin de garantizar la resistencia y estabilidad de la estructura. Este proceso incluye el corte, doblado y posicionamiento del acero, asegurando el recubrimiento de concreto necesario y la correcta disposición de traslapes y anclajes para soportar las cargas previstas.

6. fundida de zapatas de columnas para la rampa de acceso a graderías: consiste en la elaboración y vaciado de elementos de cimentación de concreto, diseñados para soportar y distribuir las cargas de las columnas que sostendrán la estructura de la rampa. Este proceso incluye la excavación en el sitio, colocación de acero de refuerzo, nivelación y posterior vertido del concreto, garantizando resistencia, estabilidad y durabilidad de la obra.

7. fundida de vigas de cimentación para el cerramiento perimetral de la cancha: consiste en la construcción de una base continua de concreto reforzado sobre la cual se fijará la estructura del cerramiento. Estas vigas se elaboran a nivel de cimentación, proporcionando estabilidad, resistencia y soporte adecuado para los elementos verticales (columnas o muros) que conformarán el perímetro de la cancha, garantizando su durabilidad y seguridad.

8. fundida de columnas de rampa y columnas de graderías: es el proceso constructivo mediante el cual se vierte concreto en los encofrados previamente armados con acero de refuerzo, con el fin de conformar los elementos verticales que soportarán la estructura de la rampa de acceso y las graderías.
Este procedimiento garantiza la resistencia y estabilidad necesarias para transmitir las cargas de la superestructura hacia la cimentación, siguiendo las especificaciones técnicas y de diseño estructural establecidas en el proyecto.

9. levantamiento de muro en bloque abujardado en el cuarto eléctrico de los camerinos, ubicado debajo de las graderías, consiste en la construcción de una pared con bloques de acabado rugoso (abujardado), que brinda resistencia estructural y un acabado estético y duradero. Esta actividad incluye el replanteo del área, nivelación, colocación de bloques con mortero, alineación y plomo, garantizando la estabilidad, seguridad y funcionalidad del espacio.

10. pañete de muros internos en un cuarto eléctrico consiste en aplicar una mezcla de mortero (cemento, arena y agua) sobre las paredes interiores, con el fin de nivelar, alisar y proteger la superficie. Esta actividad mejora la resistencia mecánica y la durabilidad del muro, evita filtraciones de humedad, facilita la limpieza y proporciona un acabado adecuado para posteriores trabajos de pintura o instalación de equipos eléctricos

11. cerramiento perimetral de cancha en malla: consiste en la instalación de una estructura alrededor del área de juego, conformada generalmente por postes metálicos y malla galvanizada o plástica, con el fin de delimitar el espacio, garantizar la seguridad de los jugadores y espectadores, evitar la salida de balones y proteger el entorno.

12. suministro de estructura de cubierta de gradería dispuesta en obra: consiste en la provisión, transporte y entrega en el sitio de construcción de todos los elementos estructurales necesarios para conformar la cubierta de las graderías.

Esta actividad incluye el suministro de materiales (como acero estructural, perfiles, uniones y herrajes), su corte y preparación según planos, así como la disposición ordenada y segura en el área de obra para su posterior montaje, garantizando que cumplan con

13. suministro de tubería sanitaria de 4" y 6": consiste en la adquisición y entrega de tuberías de PVC (u otro material especificado) de diámetros nominales 4 y 6 pulgadas, diseñadas para la conducción de aguas residuales o pluviales. Esta actividad incluye la selección, transporte y disposición en sitio del material, garantizando que cumpla con las especificaciones técnicas y normas de calidad exigidas para instalaciones sanitarias.


14. suministro e instalación de acometida eléctrica subterránea: consiste en proporcionar los materiales y realizar la instalación del sistema que conecta la red de distribución eléctrica con el punto de suministro de un inmueble, mediante ductos y cableado enterrado.

15. construcción de registros eléctricos SB300 consiste en la instalación de cajas o cámaras de inspección subterráneas, de aproximadamente 300 mm de diámetro, utilizadas para alojar, proteger y facilitar el acceso a empalmes, derivaciones o conexiones de redes eléctricas. Estas estructuras permiten realizar mantenimientos, reparaciones y ampliaciones del sistema sin necesidad de excavar nuevamente, garantizando la seguridad y organización del tendido eléctrico.


16. suministro e instalación de postes en concreto consiste en la provisión y montaje de postes prefabricados de 12 metros de altura, con capacidades de carga nominal de 735 DaN, 1.030 DaN y 1.600 DaN, según los requerimientos técnicos del proyecto. Incluye el transporte hasta el sitio de obra, excavación de bases, instalación y aseguramiento de los postes, así como las labores necesarias para garantizar su correcta alineación, verticalidad y estabilidad estructural conforme a las normas vigentes.

17. Plan de Gestión Integral de Obras : En términos generales, es una actividad o instrumento de planificación que define cómo se van a organizar, ejecutar y supervisar las obras de infraestructura o proyectos constructivos.

3. BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO - CURVA "S"



Scanned with CamScanner

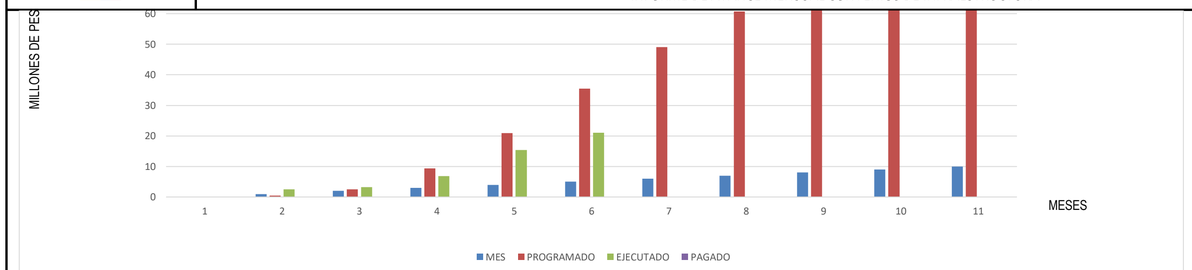

4. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Durante la ejecución de las labores en el mes del presente informe, Interventoría realizó seguimiento a los trabajos realizados por el Contratista de Obra, y se evidencia que para el quinto mes de ejecución, se lleva un atraso del 14,39%, por lo tanto se empieza a reflejar los atrasos por la falta de fluidez en los suministros de materiales, la escasa ejecución de los capítulos hidrosanitarios, eléctricos y estructuras en concreto; que según la programación, muestran el mayor atraso. El Contratista presentó la seguridad social del mes de Junio-Julio 2025, la cual se anexa al presente informe.

5. RELACIÓN DE ANEXOS

	DESCRIPCIÓN DOCUMENTO ANEXO	S/N/N.A.	Nº Folios		DESCRIPCIÓN DOCUMENTO ANEXO	S/N/N.A.	Nº Folios
1.	Balance Presupuestal de la obra	N.A	0	8.	Copia certificado de pago a contratistas	N.A	0
2.	Registro Fotográfico		1	9.	Seguimiento plan de manejo ambiental	N.A	0
3.	Mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos	N.A	0	10.	Control pagos seguridad social y parafiscales contratistas	N.A	0
4.	Seguimiento ejecución/cronograma/control ruta critica	N.A	0	11.	Control programa de seguridad industrial	N.A	0
5.	Copia último informe de interventoría	N.A	4	12.	Control maquinaria y equipo	N.A	0
6.	Copia actas de comité de obra	N.A	20	13.	Control de calidad / inspecciones / ensayos	N.A	0
7.	Copia libro de obra/bitácora	N.A	19	14.	Extracto bancario de la cuenta de uso exclusivo del convenio		3

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	
LUIS EDUARDO ARZUAGA OROZCO	LUIS EDUARDO ARZUAGA OROZCO	LUIS EDUARDO ARZUAGA OROZCO	Elaborado: 20/08/2025
Secretario de planeacion e infraestructura	Secretario de planeacion e infraestructura	Secretario de planeacion e infraestructura	Total de Páginas: 3

Scanned with CamScanner

Deporte	**PROCESO** APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	**Versión: 1**
	FORMATO INFORME DE AVANCE MENSUAL CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURA	**CÓDIGO:** ATC-FR-003 Página 1 de 1

A N E X O N º 2: REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONVENIO COID - 846 DE 2024 SUSCRITO ENTRE COLDEPORTES Y MUNICIPIO DE SAN DIEGO, CESAR.

REGISTRO FOTOGRÁFICO - PROYECTO "CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO, CESAR"

Proyecto	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEG, CESAR	Localización	SAN DIEGO, CESAR / latitud : 10°20´19.20¨ N , longitud : 73° 10´49.54¨ O
Contratista:	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS	Director de obra:	JEISON ALEXANDER ZEQUEDA SANJUAN
Interventor:	CONSORCIO INTER - ESCENARIO SD 25	Director Interventoría:	JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS
Fecha del registro fotográfico:	17/06/2025		

FOTOGRAFÍA Nº 1	FOTOGRAFÍA Nº 2	FOTOGRAFÍA Nº 3
		
Las imágenes muestran el proceso de fundida de zapatas ejecutado en sitio, incluyendo el armado de acero de refuerzo, colocación de formaletas y vaciado de concreto. Se evidencia el cumplimiento de alineación, nivelación y especificaciones técnicas según los planos estructurales del proyecto.	Las imágenes muestran el proceso de fundida de zapatas ejecutado en sitio, incluyendo el armado de acero de refuerzo, colocación de formaletas y vaciado de concreto. Se evidencia el cumplimiento de alineación, nivelación y especificaciones técnicas según los planos estructurales del proyecto.	La imagen muestra la toma de muestra de concreto fresco para la elaboración de cilindros destinados a la prueba de compresión. Los moldes reposan sobre una superficie firme y nivelada, listos para su curado inicial.

FOTOGRAFÍA Nº 4	FOTOGRAFÍA Nº 5	FOTOGRAFÍA Nº 6
		
Las imágenes muestran el proceso de colocación y nivelación del acero de refuerzo para columnas, siguiendo el diseño estructural. Se observa la correcta distribución y alineación de las armaduras verticales y estribos, así como el uso de separadores y nivelación con herramientas adecuadas	Se observa la ejecución del solado de concreto pobre como base nivelada y limpia para el apoyo de la zapata. La superficie ha sido vaciada y afinada para garantizar una correcta distribución de cargas y evitar el contacto directo de la zapata con el terreno natural.	Se identificaron y marcaron los puntos de referencia principales (hitos), incluyendo esquinas, ejes estructurales, líneas de cimentación, y zonas de circulación. Estas marcas fueron verificadas con precisión y señalizadas con estacas, cal y pintura, además de ser referenciadas con coordenadas para su posterior seguimiento.

Deporte	PROCESO:	Versión:1
	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	CÓDIGO: ATC-FR-045
	FORMATO: INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA	Fecha: 19/11/2021

FECHA DE ENTREGA DEL INFORME	sábado, 9 de agosto de 2025	MES No.	5	INFORME DEL	10/07/2025	AL	9/08/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO - CESAR
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE SAN DIEGO, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA				CONTRATO DE OBRA PUBLICA			
CONTRATO No.:	004 DE 2024			CONTRATO No.:	033 DE 2025		
PLAZO INICIAL (DIAS):	183,00			PLAZO INICIAL (DIAS):	183,00		
FECHA DE INICIO:	10 de marzo de 2025			FECHA DE INICIO:	lunes, 10 de marzo de 2025		
SUSPENSIÓN No. Y FECHA:	N/A			SUSPENSIÓN No. Y FECHA:	N/A		
PRÓRROGA No. 1 :	30 abril de 2025			PRÓRROGA No. 1:	30 abril de 2025		
REINICIO No. Y FECHA:	N/A			REINICIO No. Y FECHA:	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	9 de febrero de 2026			FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	9 de febrero de 2026		
PLAZO ACTUALIZADO (DIAS):	336,00			PLAZO ACTUALIZADO:	336,00		
PLAZO TRANSCURRIDO:	152	EQUIVALE AL:	45%	PLAZO TRANSCURRIDO:	152	EQUIVALE AL:	45%
VALOR INICIAL :	$ 518.496.955,00			VALOR INICIAL :	$ 13.358.523.629,68		
VALOR ANTICIPO :(SI APLICA)	N/A			VALOR ANTICIPO :(SI APLICA)	N/A		
VALOR ADICION(ES) MINDEPORTE:	$ -			VALOR ADICION(ES) MINDEPORTE:	$ -		
VALOR ADICION(ES) ENTE TERRITORIAL:	$ -			VALOR ADICION(ES) ENTE TERRITORIAL:	$ -		
VALOR ACTUALIZADO:	$ 518.496.955,00			VALOR ACTUALIZADO:			
VALOR PAGADO:	$ -			VALOR PAGADO:	$ -		
VALOR POR PAGAR:	$ 518.496.955,0			VALOR POR PAGAR:	$ 13.358.523.629,68		
INTERVENTOR O CONSULTOR:	CONSORCIO INTER-ESCENARIO SD 25			CONTRATISTA OBRA	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS		

2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA					CONTRATO DE OBRA PUBLICA				
AMPARO	No. PÓLIZA	VIGENTE (Fechas) DESDE	HASTA	VALOR	AMPARO	No. PÓLIZA	VIGENTE (Fechas) DESDE	HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21-44-101460909	27/12/2024	27/12/2025	$ 51.849.695,50	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	NB-100368636	28/01/2025	28/01/2026	$ 2.671.704.725,94
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	21-44-101460909	27/12/2024	27/06/2028	$ 51.849.695,50	PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	NB-100368636	28/01/2025	28/07/2028	$ 667.926.181,48
CALIDAD DEL SERVICIO	21-44-101460909	27/06/2025	27/06/2030	$ 51.849.695,50	ESTABILIDAD DE LA OBRA	NB-100368636	28/07/2025	28/07/2030	$ 4.007.557.088,90
					CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	NB-100368636	28/07/2025	28/07/2027	$ 2.671.704.725,94
					RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	NB-100095284	28/01/2025	28/07/2025	$ 771.750.000,00

2.1 ACTUALIZACION ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
SEGÚN: ADICIONAL No. 01 DEL 30 DE ABRIL 2025		SEGÚN: ADICIONAL No. 01 DEL 30 DE ABRIL 2025	
SUSPENSIÓN No.:	DE FECHA:	SUSPENSIÓN NO.:	DE FECHA:
PRÓRROGA No.: 01	DE FECHA: 30/04/2025	PRÓRROGA No.: 01	DE FECHA: 30/04/2025
MODIFICACIÓN No.: ANEXO 2	DE FECHA: 11/03/2025	MODIFICACIÓN No.: ANEXO 2	DE FECHA: 13-03-2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA					CONTRATO DE OBRA				
AMPARO	No. PÓLIZA	VIGENTE (Fechas) DESDE	HASTA	VALOR	AMPARO	No. PÓLIZA	VIGENTE (Fechas) DESDE	HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21-44-101460909	31/03/2025	10/08/2026	$ 51.849.695,50	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	NB-100368636	30/04/2025	7/08/2026	$ 2.671.704.725,94
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	21-44-101460909	31/03/2025	10/02/2029	$ 51.849.695,50	PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	NB-100368636	30/04/2025	7/02/2029	$ 667.926.181,48
CALIDAD DEL SERVICIO	21-44-101460909	8/09/2025	8/09/2030	$ 51.849.695,50	ESTABILIDAD DE LA OBRA	NB-100368636	7/02/2026	7/02/2031	$ 4.007.557.088,90
					CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	NB-100368636	7/02/2026	7/02/2028	$ 2.671.704.725,94
					RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	NB-100095284	10/03/2025	7/02/2026	$ 771.750.000,00

3. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
CONCEPTO	VALOR	%	FECHA DE PAGO	CONCEPTO	VALOR	%	FECHA DE PAGO
TOTAL PAGADO				TOTAL PAGADO			

4. PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME

1. El contratista continúa con las actividades preliminares de localización y replanteo con equipos topográficos
2. Excavación manual para cimentación de cerramiento perimetral
3. Instalación de relleno seleccionado en zona de parque infantil y zona de juegos biosaludable
4. Se realiza fundida de solado para vigas de cimentación de cerramiento perimetral
5. Armado de acero de refuerzo de cerramiento perimetral, vigas de superiores y columnas de gradería.
6. Fundida de zapatas de columnas de la rampa de acceso a graderias
7. Fundida de vigas de cimentación para cerramiento perimetral de la cancha
8. Fundida de columnas de rampa y columnas de graderias
9. Levante de muro en bloque abujardado en cuarto eléctrico camerinos debajo de graderias
10. Pañete de muros internos en cuarto eléctrico
11. Cerramiento perimetral de cancha en malla
12. Suministro de estructura de cubierta de gradería dispuesta en obra
13. Suministro de tubería sanitaria de 4" y 6"
14. Suministro e instalación de acometida eléctrica subterránea
15. Construcción de registros eléctricos SB300
16. Suministro e instalación de postes en concreto 12 m x 735 Dan, 12 m x 1.030 Dan y 12 m x 1.600 Dan.
17. PGIO

4.1. PROGRAMACIÓN OBRA

% DE AVANCE OBRA PROGRAMADO	ACUMULADO		% DE AVANCE OBRA EJECUTADO			ACUMULADO		% DE ATRASO ACUMLADO	
	35,46%					21,08%		14,39%	
CAPITULOS	INICIO	FIN	DURACIÓN (DIAS)	% TOTAL	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% ATRASO	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE ATRASO
OBRAS PRELIMINARES	lunes, 10 de marzo de 2025	miércoles, 5 de noviembre de 2025	240	0,76%	**0,47%**	0,66%	-0,19%	EN EJECUCIÓN	0
MOVIMIENTO DE TIERRAS	domingo, 30 de marzo de 2025	sábado, 6 de septiembre de 2025	160	13,05%	**10,02%**	8,01%	2,02%	EN EJECUCIÓN	0
ESTRUCTURAS EN CONCRETO	miércoles, 9 de abril de 2025	domingo, 25 de enero de 2026	291	17,59%	**7,39%**	4,24%	3,14%	EN EJECUCIÓN	0
MAMPOSTERIA	jueves, 21 de agosto de 2025	martes, 3 de febrero de 2026	166	0,60%	**0,00%**	0,18%	-0,18%	EN EJECUCIÓN	0
CARPINTERIA METALICA	martes, 8 de julio de 2025	domingo, 18 de enero de 2026	194	19,76%	**3,51%**	6,54%	-3,02%	EN EJECUCIÓN	0
OBRAS DE URBANISMO	martes, 29 de julio de 2025	martes, 3 de febrero de 2026	189	12,10%	**0,46%**	0,00%	0,46%	NO HA INICIADO	0
ACABADOS	lunes, 6 de octubre de 2025	domingo, 25 de enero de 2026	111	2,30%	**0,00%**	0,00%	0,00%	NO HA INICIADO	0
SISTEMA DE RIEGO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	viernes, 9 de mayo de 2025	domingo, 11 de enero de 2026	247	20,73%	**10,69%**	0,12%	10,58%	EN EJECUCIÓN	0
INSTALACIONES ELECTRICAS	miércoles, 30 de abril de 2025	domingo, 11 de enero de 2026	256	10,50%	**1,86%**	0,41%	1,46%	EN EJECUCIÓN	0
CERTIFICACION Y TRATAMIENTOS ELECTRICOS	miércoles, 26 de noviembre de 2025	martes, 3 de febrero de 2026	69	0,31%	**0,00%**	0,00%	0,00%	NO HA INICIADO	0
PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO)	lunes, 10 de marzo de 2025	martes, 3 de febrero de 2026	330	2,31%	**1,05%**	0,92%	0,13%	EN EJECUCIÓN	0
TOTAL				**100,00%**	**35,46%**	**21,08%**	**14,39%**		0

ESTADO DE LA PROGRAMACIÓN		ACTIVIDADES QUE ESTAN GENERANDO RETRASO Y MEDIDAS A TOMAR AL RESPECTO
FECHA DE TERMINACIÓN:	9 de febrero de 2026	El grueso del atraso se continúa evidenciando en el capítulo de sistema de riego e instalaciones hidrosanitarias, con un 10,58% de atraso en ese capítulo, teniendo en cuenta que tales actividades debieron iniciar en la semana 11 y a la fecha del presente informe nos encontramos en la semana 25 y el Contratista presenta un escaso avance del 0,12%. Por lo tanto la Interventoría solicita al Contratista disponer del personal hidrosanitario que ejecutará los trabajos, así como los materiales y herramientas de manera inmediata con el fin de superar lo más pronto posible los atrasos generados y cumplir con la programación de obra presentada.
ATRASO (DIAS):	48	
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN:	9 de febrero de 2026	

OBSERVACIONES:


Durante la ejecución de las labores en el mes del presente informe, Interventoría realizó seguimiento a los trabajos realizados por el Contratista de Obra, y se evidencia que para el quinto mes de ejecución, se lleva un atraso del 14,39%, por lo tanto se empieza a reflejar los atrasos por la falta de fluidez en los suministros de materiales, la escasa ejecución de los capítulos hidrosanitarios, eléctricos y estructuras en concreto; que según la programación, muestran el mayor atraso. El Contratista presentó la seguridad social del mes de Junio-Julio 2025, la cual se anexa al presente informe.

Deporte	**PROCESO:**	**Versión:1**
	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	**CÓDIGO: ATC-FR-045**
	FORMATO:	**Fecha: 19/11/2021**
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA	

FECHA DE ENTREGA DEL INFORME	sábado, 9 de agosto de 2025	**MES No.**	5	INFORME DEL	10/07/2025	AL	9/08/2025

***** INSERTE LAS FILAS QUE REQUIERA, TODOS LOS CAMPOS DEBEN SER DILIGENCIADOS EN CASO DE NO TENER OBSERVACIONES, INDICARLO O COLOCA N/A SEGÚN SEA EL CASO.**

CURVA DE AVANCE

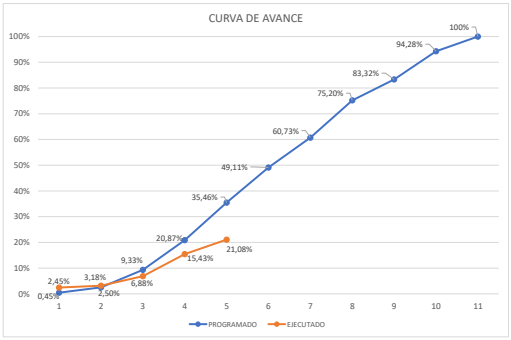

5. RIESGOS E IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES POR COMPONENTE Y ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre el riesgo o la situación problemática identificada por cada uno de los siguientes componentes y describa las causas que estan originando dicha situación: a.Programación (cronograma de actividades), b. Calidad de los trabajos, c. Aspectos administrativos. d. Disponibilidad de los recursos, materiales e insumos. e. Ejecución Financiera del Contrato. f. Seguridad y Salud en el Trabajo con el reporte de los indicadores. g.Manejo ambiental con relación a su cumplimiento. h. Aspectos sociales. i.Aspecto Jurídico.

a. CRONOGRAMA:

A la fecha el contratista presenta un atraso en el cronograma de obra del 14,39%.

b. CALIDAD DE LOS TRABAJOS:

El Contratista ha ejecutado las actividades con personal capacitado y tecnicamente bien ejecutados. Las muestras de concreto cumplen con la resistencia de los elementos fundidos según diseño.

c. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

En lo correspondiente a la parte administrativa del contrato, el contratista realizó la entrega de la seguridad social de los empleados administrativos y mano de obra no calificada.

d. DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS, MATERIALES E INSUMOS:

El contratista cuenta con la disponibilidad del recurso humano neceario para la ejecucion del contrato y sin embargo se evidencia que requiere mayor fluidez en los suministros de materiales civiles e hidrosanitarios necesarios para el correcto desarrollo del contrato.

e. EJECUCIÓN FINANCIERA:

A la fecha no se registra avance financiero del contrato

f. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

No. DE INCIDENTES:	0	**No. ACCIDENTES:**	0

FECHA Y REPORTE DE EVENTOS

g. ASPECTO AMBIENTAL:

Se le solicito al contratista los permisos y licencias de las canteras que suministraran los materiales petreos, con la finalidad de verificar que estas esten debidamente autorizaras por la autoridad competente para ejercer su operación, los cuales fueron entregados por el Contratista el 30 de junio de 225 mediante oficio OF_CEDUSD_N.009. El Contratista realizó charlas al personal sobre la disposición de los residuos generados en obra y los puntos de recolección y acopio.

h. ASPECTO SOCIAL:

El Contratista realizó la entrega de las actas de vecindad el día 18 de junio de 2025 vía correo eléctronico.

i. ASPECTO JURIDICO:

Se encuentra pendiente la aprobación por parte del Municipio de las pólizas de obra e interventoría, de acuerdo al Adicional No. 01

6. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE LOS RIESGOS E IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA O RIESGO.

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO

7. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

A la fecha no se han identificado actividades no previstas

8. RECURSOS DE INTERVENTORÍA O CONSULTOR

Nota: (Relacionar todo el personal y recursos utilizados durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal y recursos efectivamente utilizados. Adjuntar los debidos soportes para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).

ENSAYOS / ANÁLISIS / LABORATORIOS / EQUIPOS / OTROS	OBSERVACIONES / RESULTADO	PERSONAL DE INTERVENTORÍA	CARGO	CANTIDAD
		JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1
		NICOLAS SALAS BARON	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1
		HILLARY CARRILLO	COORDINADOR DE INTERVENTORIA	1
		LUIS FELIPE VEGA PEDROZO	PROFESIONAL SST	1
		JOSE JAIRO BRITO BRITO	TOPOGRAFO	1
		MARIO CUJIA BARRERA	CADENERO	1
		MICHELLE MURGAS	APOYO SST	1

9. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR Y/O FIRMA DE CONSULTORIA:

Se le solicitó al Contratista presentar plan de choque con el fin de recuperar el atraso que se evidencia en obra y se le continúa recomendado disponer en obra recursos y personal de manera oportuna con el fin de superar los atrasos presentados y cumplir la programación de obra.

10. Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe mensual, bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones y/o actividades desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de supervisión e interventoría, en San Diego - Cesar, a los 9 días del mes de agosto de 2025

FIRMA INTERVENTOR O CONSULTOR

NOMBRE: EDUARDO CARLOS HERNANDEZ FRAGOZO

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

No. DE RADICADO DEL INFORME A LA ENTIDAD TERRITORIAL: _____

FECHA DE RADICADO A LA ENTIDAD TERRITORIAL: (dd/mm/aaaa)

NOMBRE SUPERVISOR DESIGNADO POR EL E.T : _____

CARGO SUPERVISOR DESIGNADO POR EL E.T: _____

Deporte	PROCESO:		Versión: 1
	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA		Código: ATC-FR-045
	FORMATO:	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA	Fecha: 19/11/2021

MUNICIPIO DE SAN DIEGO, DEPARTAMENTO DEL CESAR	**OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO - CESAR**	
MES No. 5	**DE: 11 MESES**	**CONTRATISTA INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTER-ESCENARIO SD 25**
	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:	**lunes, 9 de febrero de 2026**


11. REGISTRO FOTOGRÁFICO

		
INSTALACIÓN DE PERNOS DE ANCLAJE EN ACERO DEL PEDESTAL DE LA RAMPA	TRAZADO Y MEDICIÓN DE CONEXIÓN DE RED DE MEDIA TENSIÓN	INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA
		
EXCAVACIÓN DE CUARTO DE MÁQUINAS	FUNDIDA DE SOLADO DE TANQUE SUBTERRANEO	SOLADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y CUARTO DE MÁQUINAS
		
INSTALACIÓN DE ACERO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA CANCHA	DESENCOFRADO DE VIGA CIMIENTO DE CERRAMIENTO	FUNDIDA DE DESCANSO ESCALERA DE GRADERÍA
		
FUNDIDA DE VIGAS SUPERIORES DE GRADERÍAS	FUNDIDA DE COLUMNAS DE GRADERÍA	FUNDIDA DE PEDESTALES DE RAMPA

FIRMA: R/LEGAL DE INTERVENTORÍA
EDUARDO CARLOS HERNANDEZ FRAGOZO
CONSORCIO INTER-ESCENARIO SD 25

MUNICIPIO DE SAN DIEGO, DEPARTAMENTO DEL CESAR	OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO - CESAR	
MES No. 5	DE: 11 MESES	CONTRATISTA INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTER-ESCENARIO SD 25
	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:	lunes, 9 de febrero de 2026

REGISTRO FOTOGRÁFICO
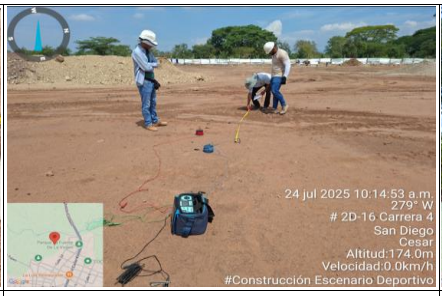
<table>
<tr><td></td><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>REGISTRO ELÉCTRICO DE POSTE DE MEDIA TENSIÓN AL LADO DE PARQUEADERO</td><td>PRUEBA DIAGNOSTICA DE RESISTIVIDAD DEL TERRENO EN CANCHA</td><td>INSTALACIÓN DE POSTE DE MEDIA TENSIÓN</td></tr>
<tr><td></td><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA</td><td>REUNIÓN CON PLANEACIÓN MUNICIPAL, INSPECTOR Y EMPOSANDIEGO</td><td>PAÑETE EN MUROS INTERNOS DEL CUARTO ELÉCTRICO</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>INSTALACIÓN DE ESTRIBOS EN COLUMNA DE GRADERIA</td><td>FUNDIDA DE COLUMNAS DE GRADERÍA</td><td>FUNDIDA DE PEDESTALES DE RAMPATO ELÉCTRICO</td></tr>
<tr><td></td><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>EXCAVACIÓN DE RED SANITARIA FRENTE A GRADERIAS</td><td>INSTALACIÓN DE RELLENO SELECCIONADO EN CAMERINOS</td><td>EXCAVACIÓN DE RED SANITARIA INTERNA GRADERIAS</td></tr>
</table>

FIRMA: R/LEGAL DE INTERVENTORÍA
EDUARDO CARLOS HERNANDEZ FRAGOZO
CONSORCIO INTER-ESCENARIO SD 25

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: MUNICIPIO DE SAN DIEGO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800096623
Generado por: ELVIA ELENA SOTO ISEDA

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Pagos Virtuales PSE - Pagar

✓ **¡Autorización aprobada!**

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO4677
No. Producto	*****4677
Valor a Pagar	$17,842,637.00
Factura	92570
Referencia de Pago 1	0
Empresa	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO -
Fecha Transacción	2025/08/13

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.**

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URB
CR 9 # 2 C - 71 BR CENTRO
SAN DIEGO - CESAR

EVD061225

CUENTA No. 900-88467-7
FECHA DE CORTE: 31/07/2025

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,05%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0.10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 31 de Julio del 2025.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	6,997,040,998.34
+ 31 CREDITOS	17,842,636.89
- 3 DEBITOS	17,930,737.00
SALDO ACTUAL	6,996,952,898.23
SALDO PROMEDIO	6,995,027,708.37

Señor contribuyente de Valledupar, le recordamos el pago del impuesto ReteICA hasta el 27 de agosto correspondiente al mes de julio. Lo invitamos a realizar el pago en nuestra red de oficinas banco a nivel nacional o a través del botón PSE.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
01	CUOTA DE MANEJO RED PUBLICA INTERNET	A872910	85,000.00	0.00	6,996,955,998.34
01	IVA COBRADO	A872992	16,150.00	0.00	6,996,939,848.34
02	INTERESES LIQUIDADOS	A552368	0.00	594,260.64	6,997,534,108.98
03	INTERESES LIQUIDADOS	A381282	0.00	575,139.79	6,998,109,248.77
04	INTERESES LIQUIDADOS	A337528	0.00	575,187.06	6,998,684,435.83
07	INTERESES LIQUIDADOS	A546412	0.00	575,234.34	6,999,259,670.17
07	INTERESES LIQUIDADOS	A546442	0.00	575,281.62	6,999,834,951.79
07	INTERESES LIQUIDADOS	A546332	0.00	575,328.90	7,000,410,280.69
08	INTERESES LIQUIDADOS	A832014	0.00	575,376.19	7,000,985,656.88
09	INTERESES LIQUIDADOS	A730644	0.00	575,423.48	7,001,561,080.36
10	INTERESES LIQUIDADOS	A572989	0.00	575,470.77	7,002,136,551.13
11	INTERESES LIQUIDADOS	A462286	0.00	575,518.07	7,002,712,069.20
14	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A231098	17,829,587.00	0.00	6,984,882,482.20
14	INTERESES LIQUIDADOS	A228924	0.00	575,565.38	6,985,458,047.58
14	INTERESES LIQUIDADOS	A228660	0.00	575,612.68	6,986,033,660.26
14	INTERESES LIQUIDADOS	A228970	0.00	575,659.99	6,986,609,320.25
15	INTERESES LIQUIDADOS	A607092	0.00	574,241.86	6,987,183,562.11
16	INTERESES LIQUIDADOS	A441058	0.00	574,289.06	6,987,757,851.17
17	INTERESES LIQUIDADOS	A245278	0.00	574,336.26	6,988,332,187.43
18	INTERESES LIQUIDADOS	A075087	0.00	574,383.47	6,988,906,570.90
21	INTERESES LIQUIDADOS	A085629	0.00	574,430.68	6,989,481,001.58
21	INTERESES LIQUIDADOS	A085770	0.00	574,477.89	6,990,055,479.47
21	INTERESES LIQUIDADOS	A085873	0.00	574,525.11	6,990,630,004.58
22	INTERESES LIQUIDADOS	A121381	0.00	574,572.33	6,991,204,576.91
23	INTERESES LIQUIDADOS	A852560	0.00	574,619.55	6,991,779,196.46
24	INTERESES LIQUIDADOS	A523200	0.00	574,666.78	6,992,353,863.24
25	INTERESES LIQUIDADOS	A292974	0.00	574,714.02	6,992,928,577.26
28	INTERESES LIQUIDADOS	A207150	0.00	574,761.25	6,993,503,338.51
28	INTERESES LIQUIDADOS	A207094	0.00	574,808.49	6,994,078,147.00
28	INTERESES LIQUIDADOS	A207096	0.00	574,855.74	6,994,653,002.74
29	INTERESES LIQUIDADOS	A431263	0.00	574,902.99	6,995,227,905.73
30	INTERESES LIQUIDADOS	A333957	0.00	574,950.24	6,995,802,855.97
31	INTERESES LIQUIDADOS	A381208	0.00	574,997.50	6,996,377,853.47
31	INTERESES LIQUIDADOS	A443077	0.00	575,044.76	6,996,952,898.23

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT 860.028.580-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.,** al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113,** Medellín **604 6052020,** Barranquilla **605 3869772,** URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

CONVENIO COID-846-2024 - MIN DEPORTE

NIT. 800086623

CONCILIACIÓN BANCARIA JUNIO -2025

BANCO: **BANCO DE OCCIDENTE** CUENTA CORRIENTE: 900000-88457-7 VALOR A CONCILIAR: 0,00

SALDO ANTERIOR EXTRACTO:	6.997.040.998,34	SALDO ANTERIOR LIBROS:	6.997.040.998,34
SALDO ACTUAL EXTRACTO:	6.996.952.898,23	SALDO ACTUAL LIBROS:	6.996.952.898,23
SALDO CONCILIADO EXTRACTO:	6.996.952.898,23	SALDO CONCILIADO LIBROS:	6.996.864.798,12

Abonos del banco no contabilizados en libros

Fecha	Detalle	Valor
31-jul	ABONO INTERES	17.842.636,89

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO
MOVIMIENTO DEL LIBRO DE BANCOS

CUENTA N°:	900-88467-7 - CONSTRUCCION ESCENARIO DEPORTIVO
BANCO:	OCCIDENTE

MES DE JULIO DE 2025

Fecha	Comp	item	tipo	DETALLE	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
30/06/2025				Saldo que viene a 30 de Junio 2025	0	0	6.997.040.998,34
14/07/2025				Devolucion de Rendimientos Financieros		17.829.587,00	17.829.587,00
31/07/2025			NT	intereses	17.842.636,89		17.842.636,89
01/07/2025				Cobro Cuota de Manejo e IVA		101.150,00	101.150,00
SALDO A FIN DE MES					**17.842.636,89**	**17.930.737,00**	**6.996.952.898,23**

Luis Felipe S

Contador
Tp : 340495-T

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901905262	6	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 6 13 25 P2	VALLEDUPAR-CESAR	5726179	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	88189621	9488189621	E	2025/07/14	2025/07/09	BANCO AV VILLAS	0	$2,367,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	80226542	AROCA JORGE																		25-14	30	$1,600,000	$256,000	EPS002	30	$1,600,000	$200,000	CCF15	30	$1,600,000	$64,000	14-4	30	$1,600,000	$111,400	30	$1,600,000	$80,000	No	$711,400
2	CC	1065840898	DIAZ JORGE																		230201	30	$2,300,000	$368,000	EPS005	30	$2,300,000	$287,500	CCF15	30	$2,300,000	$92,000	14-4	30	$2,300,000	$160,100	30	$2,300,000	$115,000	No	$1,022,600
3	CC	15172905	ZEQUEDA JEISSON																		231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
Total	**Afiliados(3)**																						$5,323,500	$851,800			$5,323,500	$665,500			$5,323,500	$213,000			$5,323,500	$370,600		$5,323,500	$266,300		$2,367,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901905262	6	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 6 13 25 P2	VALLEDUPAR-CESAR	5726179	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	88189621	9488189621	E	2025/07/14	2025/07/09	BANCO AV VILLAS	0	$2,367,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$851,800	$0	$0	$851,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$256,000	$0	$0	$256,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$368,000	$0	$0	$368,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$370,600	$0	$0	$370,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	3	$370,600	$0	$0	$370,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$213,000	$0	$0	$213,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	$213,000	$0	$0	$213,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$665,500	$0	$0	$665,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$378,000	$0	$0	$378,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$287,500	$0	$0	$287,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$159,800	$0	$0	$159,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$159,800	$0	$0	$159,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$106,500	$0	$0	$106,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$106,500	$0	$0	$106,500
TOTAL				**3**	**$2,367,200**	**$0**	**$0**	**$2,367,200**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1062399401		MENDOZA RAMOS HECTOR DANIEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 11 B 11 A 39	SAN DIEGO-CESAR	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	87777674	9487777674	I	2025/07/02	2025/07/09	BANCO AV VILLAS	7	$507,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1062399401	MENDOZA HECTOR																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$504,900
Total	**Afiliados(1)**																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$99,100		$0	$0		$504,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1062399401		MENDOZA RAMOS HECTOR DANIEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 11 B 11 A 39	SAN DIEGO-CESAR	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	87777674	9487777674	I	2025/07/02	2025/07/09	BANCO AV VILLAS	7	$507,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$1,000	$0	$228,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$1,000	$0	$228,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$500	$0	$99,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$99,100	$500	$0	$99,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$800	$0	$178,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$800	$0	$178,800
TOTAL				**1**	**$504,900**	**$2,300**	**$0**	**$507,200**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1120749698		AMAYA ALARZA HIMELDA KARINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 3 4 - 79	FONSECA-LA GUAJIRA	3014740509	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	87778186	9487778186	I	2025/07/22	2025/07/09	BANCO AV VILLAS	0	$504,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1120749698	AMAYA HIMELDA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$504,900
Total	**Afiliados(1)**																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$99,100		$0	$0		$504,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1120749698		AMAYA ALARZA HIMELDA KARINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 3 4 - 79	FONSECA-LA GUAJIRA	3014740509	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	87778186	9487778186	I	2025/07/22	2025/07/09	BANCO AV VILLAS	0	$504,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$0	$0	$99,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$99,100	$0	$0	$99,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$504,900**	**$0**	**$0**	**$504,900**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7574877		SERNA CASTILLEJO JEISSON DANIEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 11 CR 6	VALLEDUPAR-CESAR	5601438	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	25103214	9489974087	I	2025/07/17	2025/08/04	BANCO DE OCCIDENTE	18	$510,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	7574877	SERNA JEISON	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**	**$99,100**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$2,600	$0	$230,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$2,600	$0	$230,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$1,200	$0	$100,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$99,100	$1,200	$0	$100,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$2,100	$0	$180,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$178,000	$2,100	$0	$180,100
TOTAL				**1**	**$504,900**	**$5,900**	**$0**	**$510,800**

2025/08/04 02:27 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1007326337		BARBOSA ARIAS LUIS FELIPE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 5 A CL 13 SUR	CHIRIGUANA-CESAR	3023934480	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	25093230	9487810807	I	2025/07/09	2025/07/14	BANCO DE OCCIDENTE	5	$506,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1007326337	BARBOSA LUIS																		231001	30	$1,423,500	$227,800	CCFC55	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$504,900
Total	**Afiliados(1)**																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$99,100		$0	$0		$504,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1007326337		BARBOSA ARIAS LUIS FELIPE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 5 A CL 13 SUR	CHIRIGUANA-CESAR	3023934480	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	25093230	9487810807	I	2025/07/09	2025/07/14	BANCO DE OCCIDENTE	5	$506,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$800	$0	$228,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$800	$0	$228,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$400	$0	$99,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$99,100	$400	$0	$99,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$600	$0	$178,600
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$178,000	$600	$0	$178,600
TOTAL				**1**	**$504,900**	**$1,800**	**$0**	**$506,700**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 12724380		NIEVES JIMENEZ ANIBAL RAFAEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 8 # 17 -22	VILLAVICENCIO-META	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	87777839	9487777839	I	2025/07/17	2025/07/22	BANCO AV VILLAS	5	$278,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	12724380	NIEVES ANIBAL																			0	$0	$0	CCFC55	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$277,100
Total	**Afiliados(1)**																						$0	$0			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$99,100		$0	$0		$277,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 12724380		NIEVES JIMENEZ ANIBAL RAFAEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 8 # 17 -22	VILLAVICENCIO-META	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	87777839	9487777839	I	2025/07/17	2025/07/22	BANCO AV VILLAS	5	$278,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$400	$0	$99,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$99,100	$400	$0	$99,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$600	$0	$178,600
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$178,000	$600	$0	$178,600
TOTAL				**1**	**$277,100**	**$1,000**	**$0**	**$278,100**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 36677049		MOJICA ARRIETA MARIA DEL CARMEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cll 5A No. 2-48	CHIRIGUANA-CESAR	5760290	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	88187984	9488187984	I	2025/07/10	2025/07/09	BANCO AV VILLAS	0	$504,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	36677049	MOJICA MARIA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$504,900
Total	**Afiliados(1)**																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$99,100		$0	$0		$504,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 36677049		MOJICA ARRIETA MARIA DEL CARMEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cll 5A No. 2-48	CHIRIGUANA-CESAR	5760290	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	88187984	9488187984	I	2025/07/10	2025/07/09	BANCO AV VILLAS	0	$504,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$0	$0	$99,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$99,100	$0	$0	$99,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$504,900**	**$0**	**$0**	**$504,900**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 12724380	5	ANIBAL RAFAEL NIEVES JIMENEZ	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ANIBAL NIEVES	CL 8 17 22 SAN JOAQUIN	VALLEDUPAR-CESAR	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	88589060	9488589060	E	2025/07/17	2025/07/22	BANCO AV VILLAS	5	$2,123,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	77169302	BERMUDEZ JOSE																		231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
2	CC	1003284121	CACERES JAIRO	X	X																25-14	3	$142,350	$22,800	EPS041	3	$142,350	$5,700	CCF15	3	$142,350	$5,700	14-4	3	$142,350	$10,000	3	$0	$0	Si	$44,200
3	CC	77161261	GUERRA ANTONIO	X																	230301	26	$1,233,700	$197,400	CCFC55	26	$1,233,700	$49,400	CCF15	26	$1,233,700	$49,400	14-4	26	$1,233,700	$85,900	26	$0	$0	Si	$382,100
4	CC	1062403206	MENDOZA WAINNER	X																	230301	26	$1,233,700	$197,400	EPS041	26	$1,233,700	$49,400	CCF15	26	$1,233,700	$49,400	14-4	26	$1,233,700	$85,900	26	$0	$0	Si	$382,100
5	CC	1062396833	MISAT JAIME		X																230301	3	$142,350	$22,800	EPS041	3	$142,350	$5,700	CCF15	3	$142,350	$5,700	14-4	3	$142,350	$10,000	3	$0	$0	Si	$44,200
6	CC	1094350582	MISAT JHON	X	X																230301	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$5,700	CCF15	3	$142,350	$5,700	14-4	3	$142,350	$10,000	3	$0	$0	Si	$44,200
7	CC	1007365195	OÑATE ALCIDES	X	X																230201	1	$47,450	$7,600	EPS041	1	$47,450	$1,900	CCF15	1	$47,450	$1,900	14-4	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0	Si	$14,800
8	CC	77193293	RIVERA DAGER	X																	230301	26	$1,233,700	$197,400	ESSC24	26	$1,233,700	$49,400	CCF15	26	$1,233,700	$49,400	14-4	26	$1,233,700	$85,900	26	$0	$0	Si	$382,100
9	CC	12490974	VILLERO ELMER	X																	230301	26	$1,233,700	$197,400	EPS041	26	$1,233,700	$49,400	CCF15	26	$1,233,700	$49,400	14-4	26	$1,233,700	$85,900	26	$0	$0	Si	$382,100
Total	**Afiliados(9)**																						$6,832,800	$1,093,400			$6,832,800	$273,600			$6,832,800	$273,600			$6,832,800	$476,100		$0	$0		$2,116,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 12724380	5	ANIBAL RAFAEL NIEVES JIMENEZ	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ANIBAL NIEVES	CL 8 17 22 SAN JOAQUIN	VALLEDUPAR-CESAR	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	88589060	9488589060	E	2025/07/17	2025/07/22	BANCO AV VILLAS	5	$2,123,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$1,093,400	$3,600	$0	$1,097,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$800	$0	$228,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$22,800	$100	$0	$22,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$835,200	$2,600	$0	$837,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$7,600	$100	$0	$7,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$476,100	$1,500	$0	$477,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	9	$476,100	$1,500	$0	$477,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$273,600	$900	$0	$274,500
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	9	$273,600	$900	$0	$274,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$273,600	$1,000	$0	$274,600
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$49,400	$200	$0	$49,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$49,400	$200	$0	$49,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$62,700	$200	$0	$62,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	$112,100	$400	$0	$112,500
TOTAL				**9**	**$2,116,700**	**$7,000**	**$0**	**$2,123,700**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 77105684		DAJIL URREA YANELITH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 8 A N 4 113	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3217500042	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	87799986	9487799986	I	2025/07/18	2025/07/09	BANCO AV VILLAS	0	$504,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	77105684	DAJIL YANELITH																		231001	30	$1,423,500	$227,800	CCFC55	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$504,900
Total	**Afiliados(1)**																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$99,100		$0	$0		$504,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 77105684		DAJIL URREA YANELITH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 8 A N 4 113	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3217500042	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	87799986	9487799986	I	2025/07/18	2025/07/09	BANCO AV VILLAS	0	$504,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$0	$0	$99,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$99,100	$0	$0	$99,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$504,900**	**$0**	**$0**	**$504,900**

	ALCALDIA MUNICIPAL SAN DIEGO - CESAR	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
	ACTA DE REUNIÓN	PÁGINA	1	DE	3
		FECHA	24	07	2025

ACTA DE REUNIÓN No. 11

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN DIEGO - CESAR **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR

CONTRATO DE OBRA No. 033 DE 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO - CESAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 004 **DE** 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER-ESCENARIOS SD 25

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Jeisson Zequeda	Representante Legal	CONTRATISTA
Hillary Carrillo Reyes	Coordinador	INTERVENTORIA
Erwin Bermudez Badillo	Ingeniero Eléctrico	DEPE SOLUCIONES (Subcontratista)
Jose Orozco Garcia	Ingeniero Eléctrico	DEPE SOLUCIONES (Subcontratista)
Ingrid Murgas Calderon	Ingeniera de apoyo	ALCALDÍA MUNICIPAL

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Definir cambios en luminarias de zona de parques por cambios en normatividad eléctrica

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. Cambio de luminarias eléctricas en zona de parques

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Cambio de luminarias eléctricas en zona de parques: El Contratista en apoyo con el equipo de ingenieros eléctricos que se enciuentran ejecutando el proyecto manifiesta que en la zona de parques infantil y biosaludable se encuentra contemplado lámparas de 40 W solares con autonomía de 12 horas, y teniendo en cuenta que la zona se encuentra muy arbolizada, no se brindaría garantía de carga para las lámparas y además en cuanto a normatividad retilap 2024 en su ultima actualizazión, que inició a regir el 5 de mayo 2025, indica que las lamparas solares deben tener una autonomía de 36 horas. Por lo tanto se requiere cambio del tipo de lámpara.

El Municipio, en representación de la Ingeniera Ingrid indica que el Contratista haga la solicitud formal mediante oficio, justificando la solicitud a la Interventoría, y ésta a su vez emitir concepto y remitir a la Secretaría de Planeación Municipal, para que el Municipio evalúe si el cambio requiere aprobación ante el Ministerio y definir el paso a seguir para el cambio solicitado.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Remitir oficio de solicitud y justificación de cambio de luminarias del parque	28/07/2025	CONTRATISTA

	ALCALDIA MUNICIPAL SAN DIEGO - CESAR ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	3
		FECHA	24	07	2025

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 04 (Día) 08 (Mes) 2025 (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en la presente reunión no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
JEISSON ZEQUEDA	
HILLARY CARRILLO REYES	
ERWIN BERMUDEZ BADILLO	
JOSE OROZCO GARCIA	
INGRID MURGAS CALDERON	

ACTA DE REUNION	
ASUNTO: Comite de seguimiento del contrato "construcción de escenarios deportivo"	
CITADA POR: Secretaria de Planeación e Infraestructura, Municipal	**Fecha:** 8 de julio de 2025
	Hora inicio: **Hora terminación:**
	Lugar:

PARTICIPANTES Y/O ASISTENTES		
No.	**Nombre**	**Cargo**
	Hillary Carrillo Reyes.	Coordinadora de Interventoría.
	Ingrid Johana Murgas C.	Ing. Apoyo Sec. Planación
	Luis Mario Rivera Guerra	Pasante
	JEISSON ZEQUEDA S.	CONTRATISTA
	Martin Padilla Rodriguez	Residente. Pier. (JAC)
	Luis Eduardo Arzuaga Orozco	Sec planeacion

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 9:40 Am del dia 8 de julio de 2024, se da inicio al comité de seguimiento, realizando un recorrido en compañia de la residente de interventoria, residente de obra, Apoyo a la supervision, Ing Ingrid murgas, pasante luis mario Rivera, morador y presidente de JAC Martin padilla y el secretario de planeacion luis eduardo Arzuaga.

Con relación a las conexiones hidrosanitarias, se le socializó al JAC dicho tema para claridad en los el proceso de ejecución, posterior comenta que estu en la disposición y colaboración en todo lo que se presente.

Queda como un compromiso realizar un recorrido con un ing electrico para realizar una evaluación y el resultado sea preciso. para las postes y cableados instalados para avanzar en las actividades de instalaciones sanitarios y hacer la conexión en el poto final que se encuentra aledaño al predio del presidente de JAC.

Con respecto al compromiso anterior, el contratista se encuentra realizando las gestiones para la conexión provisional con aguas, el municipio hizo entrega de los documentos para que avanzaron con el tramite.

Con respecto a las instalaciones hidiosanitarias internas, se tiene contemplado iniciarlo la semana que está contemplada del 16 al 19 de Julio.

Ya se encuentran realizando los cortes y excavación para la viga de cimentación para el cerramiento de la cancha

COMPROMISOS DE LAS PARTES

El contratista: Se compromete a iniciar los trabajos hidrosanitarios, Con el fin de disminuir el atraso en la Programación.

Adelantar las gestiones para cumplir la solicitud realizada Por el señor Martin Padilla presidente de la JAC, para la autorización de conexión de red sanitaria al man Hole aledaño al predio del señor Martín



FIRMA ASISTENTES

Hillary Carrillo Reyes

ACTA DE REUNION	
ASUNTO: Comite de seguimiento del contrato "construcción de escenarios deportivo"	
CITADA POR: Secretaria de Planeación e Infraestructura, Municipal	**Fecha:** 8 de julio de 2025
	Hora inicio: **Hora terminación:**
	Lugar:

PARTICIPANTES Y/O ASISTENTES		
No.	**Nombre**	**Cargo**
	Hillary Carrillo Reyes.	Coordinadora de Interventoría.
	Ingrid Johana Murgas C.	Ing. Apoyo Sec. Planación
	Luis Mario Rivera Guerra	Pasante
	JEISSON ZEQUEDA S.	CONTRATISTA
	Martin Padilla Rodriguez	Residente. Pier. (JAC)
	Luis Eduardo Arzuaga Orozco	Sec planeacion

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 9:40 Am del dia 8 de julio de 2024, se da inicio al comité de seguimiento, realizando un recorrido en compañia de la residente de interventoria, residente de obra, Apoyo a la supervision, Ing Ingrid murgas, pasante luis mario Rivera, morador y presidente de JAC Martin padilla y el secretario de planeacion luis eduardo Arzuaga.

Con relación a las conexiones hidrosanitarias, se le socializó al JAC dicho tema para claridad en los el proceso de ejecución, posterior comenta que estu en la disposición y colaboración en todo lo que se presente.

Queda como un compromiso realizar un recorrido con un ing electrico para realizar una evaluación y el resultado sea preciso. para las postes y cableados instalados para avanzar en las actividades de instalaciones sanitarios y hacer la conexión en el poto final que se encuentra aledaño al predio del presidente de JAC.

Con respecto al compromiso anterior, el contratista se encuentra realizando las gestiones para la conexión provisional con aguas, el municipio hizo entrega de los documentos para que avanzaron con el tramite.

Con respecto a las instalaciones hidiosanitarias internas, se tiene contemplado iniciarlo la semana que está contemplada del 16 al 19 de Julio.

Ya se encuentran realizando los cortes y excavación para la viga de cimentación para el cerramiento de la cancha

COMPROMISOS DE LAS PARTES

El contratista: Se compromete a iniciar los trabajos hidrosanitarios, Con el fin de disminuir el atraso en la Programación.

Adelantar las gestiones para cumplir la solicitud realizada Por el señor Martin Padilla presidente de la JAC, para la autorización de conexión de red sanitaria al man Hole aledaño al predio del señor Martín



FIRMA ASISTENTES

Hillary Carrillo Reyes

ACTA DE REUNION	
ASUNTO: Mesa de concertación sobre otro sí En formas de pago	
CITADA POR: Secretaria de Planeación e Infraestructura, Municipal	**Fecha:** 18-07-2025
	Hora inicio: 9:32 Am **Hora terminación:** 9:52 Am
	Lugar: Alcaldía

PARTICIPANTES Y/O ASISTENTES		
No.	**Nombre**	**Cargo**
1	Hilbary Carrillo Reyes	Coordinador Interventoria
2	JEISSON ZEQUEDA S.	Rep. LEGAL CONTRATISTA O.
3	Luis Eduardo Arzuaga Orozco	Sec. planeación

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 9:32 am en las instalaciones del palacio municipal, asisten representantes legales y/o delegados de los contratos derivados del convenio 0010-846-2024, donde se les socializo y se les puso en conocimientos las razones por el cual, hoy que realizar un otro sí a los formas de pago donde el convenio menciona lo siguiente "En las condiciones de la forma de pago de los contratos derivado, El ente ejecutor se compromete a pactar en el contrato de obra e interventoria, que se pagara el ultimo diez por ciento (10%) del valor del contrato de obra e interventoria, ona vez se suscriba el acta de liquidación de los mismos en sus anexos" pero en los contratos quedo del 5%, por lo tanto se hace necesaria realizar dicho otro si, para darle complimiento a los condiciones establecidos en el item 8.3.14 del convenio 0010-846-2024.

COMPROMISOS DE LAS PARTES

*Suscripción y firma del otro sí

ACTA DE REUNION	
ASUNTO: Comité de Seguimiento del Contrato "Construcción de Escenario deportivo"	
Citada por: Secretaria de Planeación e Infraestructura, Municipal	**Fecha:** 6 de Agosto de 2025
	Hora inicio: 9:30 am **Hora terminación**: 10:55 am
	Lugar: Obra

PARTICIPANTES		
No.	**Nombre**	**Cargo**
1	Hillary Carrillo Reyes	Coordinadora de Interventoria
2	Jeisson Zequeda	Contratista
3	Ingrid Murgas Calderon	Ing. Apoyo Sec. Planeación E Infraestructura.
4		
6		
7		
8		
9		
10		

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 9:30 am del día 6 de Agosto de 2025, se da inicio al comité de seguimiento realizando una inspección de obras adelantadas, de acuerdo a lo informado por la Coordinadora de interventoría, donde se expresa que las labores adelantadas son fundida de columnas de gradas, se continua fundiendo viga de cerramiento de cancha, y excavaciones eléctricas, excavaciones de la red sanitaria, construcción de tanques de almacenamiento de agua y cuarto de máquinas donde se avanzó en la excavación, y la fundida de solado; De acuerdo al compromiso del acta anterior se han realizado avances del capítulo hidrosanitario, el contratista informa que está a la espera de un pedido para comenzar a instalar en la otra semana.

Respecto al compromiso de las gestiones para cumplir la solicitud del señor Martin Padilla, se informa que se realizó visita el día 15 de julio por parte de los eléctricos de la obra, en donde en campo se trabajó con el plano y posterior se informó de los materiales requeridos para dicha conexión, para la instalación de postes, se requiere que se tenga la excavación previa a la coordinación de la instalación de estos.

Se informa por parte de interventoría, que el porcentaje programado al día de hoy es de **32,43%** contra un **19%** de avance ejecutado, respecto a lo anterior por parte de la entidad contratante se ofició para solicitar un plan de choque para recuperar el atraso, se informa que la actividad representativa en el atraso es el tema hidrosanitario, en los concretos de gradería se atrasó el tema de fundida pero se está nivelando el atraso con jornadas continuas.

COMPROMISOS DE LAS PARTES

- **CONTRATISTA:** presentar el **plan de choque** para recuperar atraso, reprogramar y nivelar programación. (11 de Agosto). Se adelantará presentación de Apu nuevos, para revisión y aprobación de interventoría para posterior modificatoria. Queda a la espera del compromiso con los postes de lo solicitado por el señor Martin para que se coordine la excavación para la instalación de los postes.

- **INTERVENTORIA:** Dar instrucciones para tomar medidas para recuperar el atraso, hacer seguimiento minucioso al cumplimiento del plan de choque, estar al pendiente de coordinar el inicio de actividades que están en rezago.

- **MUNICIPIO:** Solicitar al sr Martin se realice la excavación para instalación de postes, realizar seguimiento del cumplimiento del plan presentado.

Julio 10 de 2025 - Jueves.

- Estado del tiempo: Soleado.
- Hora inicio: 7:00 Am. Hora final: 5:00pm
- Personal obra: (1) Residente, (1) Inspector, (1) SISO, (1) Almacenista, (1) Maestro, (1) oficial, (9) Ayudantes, (1) topógrafo, (1) cadenero, (1) operador.
- Personal Interventoría: (1) Ing. Residente, (1) SISO, (1) topógrafo, (1) Cadenero, (1) coordinador.
- Equipos: Equipos de topografía, (1) Retroexcavadora, (1) miniexcavadora, (2) mezcladoras, (1) vibrador de concreto, (1) minicargador, (1) dquero,
- Actividades:
  - Excavación de tanque subterraneo para almacenamiento y riego de cancha.
  - Levante de muros en bloque abujardado en cuarto eléctrico
  - Instalación de tubos de cerramiento perimetral
  - Ingresa acero de refuerzo de tanque subterraneo.

Firma V°B°
Interventoría.

Julio 11 de 2025 - Viernes.

- Estado del tiempo: Nublado, llovizna leve 3:30pm y 6:30pm
- Hora inicio: 7:00 Am. Hora final: 5:00pm
- Personal obra: (1) Ing. Residente, (1) Inspector, (1) almacenista, (1) SISO, (1) Maestro, (9) Ayudantes, (1) topógrafo, (1) cadenero, (1) operador.
- Personal Interventoría: (1) Ing. Residente, (1) topógrafo, (1) cadenero, (1) SISO, (1) coordinador.
- Equipos: Equipos de topografía, (2) mezcladoras, (1) vibrador de concreto, (1) Retroexcavadora, (1) minicargador, (1) minicerroexcavadora.
- Actividades:
  - Instalación de tubería para cerramiento perimetral de cancha.
  - Levante de muro en bloque abujardado en cuarto eléctrico.
  - Instalación de acero de refuerzo de viga de cimiento cerramiento
  - Excavación de tanque subterraneo y extensión de material excavado en zona de área libre cerca al tanque.
  - Instalación de formaleta en viga de cimiento cerramiento.

Firma V°B°
Interventoría.

Powered by CamScanner

Julio 12 de 2025 - sábado.

- Estado del tiempo: mañana soleado, tarde nublado, lluvia intensa 1:00pm
- Hora inicio: 7:00Am. - Hora final: 12:00pm.
- Personal obra: (1) Ing. Residente, (1) Inspector, (1) Almacenista, (1) SISO, (1) Maestro, (9) Ayudantes, (1) Topógrafo, (1) cadenero, (1) operador, (1) Ambiental, (1) Social
- Personal Interventoría: (1) Ing. Residente, (1) Topógrafo, (1) cadenero, (1) coordinador, (1) SISO.
- Equipos: Equipos de topografía, (2) mezcladoras, (1) vibrador de concreto, (1) Retroexcavadora, (1) minicargador, (1) mini excavadora.
- Actividades: * Instalación de tubería para cerramiento perimetral de cancha, e instalación de formaleta de viga cimiento.
  * Levante de muro en bloque abujardado en cuarto eléctrico
  * Instalación de relleno en zona de cerramiento lateral de la cancha.
  * Ambiental y social realizan charla a los trabajadores.

V°B° Interventoría

Julio 13 de 2025 - domingo.

Estado del tiempo: Soleado.

No se realizan labores.

V°B° Interventoría.

Julio 14 de 2025 - Lunes.

- Estado del tiempo: soleado.
- Hora inicio: 7:00 AM - Hora final: 5:00 pm
- Personal Interventoría: (1) Ing. Residente, (1) topógrafo, (1) cadenero, (1) SISO, (1) coordinador.
- Personal obra: (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) Inspector, (1) Almacenista, (1) SISO, (1) Maestro, (8) Ayudantes, (1) topógrafo, (1) cadenero, (1) operador.
  * Subcontratista Eléctrico: (1) coordinador, (1) Residente, (2) oficial.
  * Subcontratista Estructura metálica: (1) coordinador, (2) soldadores.
- Equipos: Equipos de topografía, (2) mezcladoras, (1) vibrador de concreto, (1) Retroexcavadora, (1) minicargador, (1) mini excavadora
- Actividades: * Excavación de viga de cerramiento perimetral de cancha.

Powered by CamScanner

* Instalación de tubería de cerramiento perimetral de cancha
* Levante de muro en bloque abajardado en cuarto eléctrico.
* Fundida de zapatas de rampa de 1,80 x 1,80 x 0,40 m. se toman 3 cilindros de muestra del concreto.
* Instalación de acero de refuerzo de vigas superiores gradas.

Vº Bº
Interventoría.

Julio 15 de 2025 - Martes
- Estado del tiempo: Soleado. llovió leve 3:00pm
- Hora inicio: 7:00 Am. Hora final: 5:00pm.
- Personal obra: (1) Director, (1) Residente, (1) Inspector, (1) SISO, (1) Almacenista, (1) Maestro, (1) Topógrafo, (1) cadenero, (9) Ayudantes, (1) operador, (1) oficial.
- Personal Eléctrico: (1) coordinador, (1) Ing. Residente, (2) oficial.
- Personal Estructura metálica: (1) coordinador, (2) soldadores.
- Personal Interventoría: (1) Ing. Residente, (1) Director, (1) topógrafo (1) cadenero, (1) SISO, (1) coordinador.
- Equipos: Equipo de topografía, (2) mezcladoras, (1) retroexcavadora, (1) minicargador, (1) minicxcavadora, (1) vibrador de concreto, (1) Equipo de soldadura.
- Actividades: * Levante de muro 1 hilada en losa superior de cuarto eléctrico en bloque abajardado.
* Instalación de tubo de cerramiento perimetral de cancha.
* Excavación lateral en tanque de cuarto de máquina. para cimiento.
* Localización con topografía de cerramiento perimetral en zona lateral.
* se realiza instalación de planchas con pernos, soldados en acero de columnas de rampa.
* Se realiza recorrido con personal subcontratista eléctrico para la verificación del trazado de línea de media tensión desde la calle 3 hasta la obra.
* Se realiza excavación de registro de ingreso de acometida de baja tensión al cuarto eléctrico.
* Se realiza instalación de tubos pasantes de cableado eléctrico en vigas superiores de graderia

Powered by CamScanner

* Se realiza recorrido en predio del sr Mario padilla presidente de JAC, para revisar el tema eléctrico, en compañía del Contratista, Interventoría y Subcontratista Eléctrico. para evaluar cantidad de postes y cableado a suministrar entre el Municipio y el contratista.
* Se realiza excavación del tanque que incluye desarenador y se realiza sobreexcavación en tanque de agua para facilidad de los trabajos del personal a nivel interno y externo del tanque.

V°B° Interventoría

Julio 16 de 2025 - Miercoles.
- Estado del tiempo: soleado.
- Hora inicio: 7:00 Am. - Hora final: 5:30 pm
- Personal obra: (1) Director, (1) Residente, (1) Inspector, (1) SISO, (1) Almacenista, (1) Maestro, (1) Topógrafo, (1) cadenero, (8) ayudantes, (1) oficial.
- Personal eléctrico: (2) oficiales
- Personal Interventoría: (1) Director, (1) Residente, (1) Topógrafo, (1) cadenero, (1) SISO, (1) coordinador.
- Equipos: Equipo de topografía, (2) mezcladoras, (1) Retroexcavadora, (1) vibrador de concreto, (1) minicargador, (1) miniexcavadora,
- Actividades: * Continua excavación de registro de acometida de baja tensión que ingresa al cuarto eléctrico.
  * Excavación de huecos para instalación de tubería de cerramiento perimetral de la cancha.
  * Instalación de formaleta de viga perimetral del cerramiento de la cancha.
  * Se realiza recorrido de obra con el Alcalde Municipal Osvaldo Rocha, en compañía del secretario de Planeación, contratista e interventoría para mirar el avance físico en obra.
  * Se realiza fundida de las vigas superiores de las gradas, vibrado del concreto y se realiza toma de 3 muestras de cilindros de concreto.
  * Ingreso de planchas de anclaje circulares de la

rampa de acceso a las gradas.
- Ingresan (07 postes) de cerramiento metálico.
- Fundida de solado en registro de ingreso acometida de baja tensión al cuarto eléctrico.
- Se realiza figurado de acero de refuerzo de caja de registro de acometida de baja tensión.
- Se realiza fundida de viga de cimiento de cerramiento perimetral de cancha.

V°B° Interventoría

Julio 17 de 2025 - jueves.
- Estado del tiempo: Soleado, tarde nublada lluvia intensa 5:30 Pm.
- Hora inicio: 7:00 Am. - Hora final: 5:00 pm.
- Personal obra: (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) Inspector, (1) Siso, (1) Almacenista, (1) Maestro, (1) oficial, (6) Ayudantes, (1) operador, (1) Topografo, (1) Cadenero.
- Personal eléctrico: (2) oficiales.
- Personal Interventoría: (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) Topógrafo, (1) Cadenero (1) Siso, (1) Coordinador.
- Equipos: (1) Retroexcavadora, Equipo de topografía, ~~tenso~~ miniexcavadora, (1) Minicargador, (1) vibrador de concreto, (2) mezcladoras
- Actividades: * Instalación de tubería del cerramiento perimetral.
  * Instalación de formaleta en vigas de cimiento de cerramiento perimetral.
  - Fundida de vigas de cimiento de cerramiento perimetral.
  * Excavación de acometida de media baja tensión en cuarto eléctrico.
  - Desencofrado de las vigas superiores de graderías, fundidas el día de ayer.
  * Instalación de formaleta de registro de acometida baja tensión.

V°B° Interventoría

Julio 18 de 2025 - Viernes

- Estado del tiempo: Soleado.
- Hora inicio: 7:00 Am. Hora final: 5:00pm.
- Personal obra: (1) Ing. Residente, (1) Inspector, (1) Social, (1) SISO, (1) Almacenista, (1) Maestro, (1) oficial, (1) Topógrafo (1) Cadenero, (8) Ayudantes
- Personal electrico: (1) Ingeniero, (2) oficiales
- Personal Interventoria: (1) Director, (1) Ing Residente, (1) Topógrafo, (1) cadenero, (1) SISO, (1) Coordinador.
- Equipos: (1) Retroexcavadora, Equipos de topografia, miniexcavadora, (1) Minicargador, (1) vibrador de concreto, (2) mezcladoras.
- Actividades: * Instalación de formaleta de columnas de rampa de acceso graderia.
  * Excavación de huecos para postes de cerramiento perimetral.
  * Instalación de formaleta para viga de cimiento de cerramiento perimetral.
  * Excavación de registro de ingreso de acometida de media tensión
  * Fundida de registro de ingreso de acometida de baja tensión.
  * Desencofrado de viga de cimiento de cerramiento perimetral fundido el dia de ayer.
  * Encofrado de pedestales de rampa de graderia.

Firma V°B° Interventoria

Julio 19 de 2025 - sábado.

- Estado del tiempo: Soleado.
- Hora inicio: 7:00Am. Hora final: 12:00pm
- Personal obra: (1) Ing. Residente, (1) Inspector, (1) Social, (1) SISO, (1) Almacenista, (1) Maestro, (1) oficial, (1) Topógrafo, (1) cadenero, (8) Ayudantes.
- Personal electrico: (2) Oficiales
- Personal Interventoria: (1) Ing Residente, (1) Topógrafo, (1) cadenero, (1) SISO, (1) coordinador.
- Equipos: (1) Retroexcavadora, Equipos de topografia, Miniexcavadora, (1) Minicargador (1) vibrador de concreto, (2) mezcladoras.

Powered by CamScanner

Actividades: * Armado de Acero de refuerzo de caja de registro de ingreso de acometida de media tensión en zona posterior de cuarto eléctrico.
* Excavación de huecos para postes de cerramiento perimetral de cancha.
* Instalación de formaleta en vigas de cerramiento de cancha.
* Inicia instalación de formaleta de placa de gradería.

Hbm V°B° Interventoría.

Julio 20 de 2025. - Domingo.
No se realizan labores. Estado del tiempo: Soleado.

Hbm V°B° Interventoría.

Julio 21 de 2025 - Lunes.
•Estado del tiempo: soleado.
•Hora inicio: 7:00Am. Hora final: 5:00pm
•Personal obra: (1) Ing. Residente, (1) Inspector, (1) Social, (1) Almacenista (1) Maestro, (1) operador, (1) SISO, (1) Aux SISO, (1) Oficial, (1) Topógrafo, (1) Cadenero, (6) Ayudantes. •Electrico: (2) oficiales.
•Personal Interventoría: (1) Ing. Residente, (1) topógrafo, (1) cadenero, (1) SISO, (1) Coordinador.
•Equipos: (1) Retroexcavadora, Equipos de topografía, minicargador, mini excavadora, (1) vibrador de concreto, (2) mezcladoras.
•Actividades: * Excavación de Tanque de agua subterraneo que incluye desarenador.
* Continua excavación de cimiento de postes del cerramiento perimetral.
* Instalación de formaleta en vigas de cimiento de cerramiento.
* Armado de plataforma para placa de gradería
* Encofrado de 2 cajas registro de ingreso de acometida de media tensión, y se realiza fundida de una caja.
* Encofrado de columnas de gradería.

Hbm V°B° Interventoría.

Julio 22 de 2025 - Martes

- Estado del tiempo: Soleado.
- Hora inicio: 7:00 Am. - Hora final: 5:00 pm.
- Personal obra: (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) Inspector, (1) Social, (1) Almacenista, (1) SISO, (1) Aux SISO, (1) Maestro, (1) operador, (1) topografo, (1) Cadenero, (2) oficial, (7) Ayudantes.
- Personal eléctrico: (2) oficiales.
- Personal Interventoria: (1) director, (1) topógrafo, (1) cadenero, (1) Ing. Residente, (1) SISO, (1) coordinador.
- Equipos: Equipos de topografia, (1) Retroexcavadora, (1) miniexcavadora, (2) Mezcladoras (1) minicargador, (1) vibrador de concreto,
- Actividades: * Fundida de un registro de inspección de acometida de media tensión
  * Desencofrado de un registro electrico de media tensión fundido ayer.
  * Encofrado de columnas de gradería.
  * Excavación de pozque subterraneo con desarenador.
  * Excavación de cimiento de poste de cerramiento.
  * Instalación de formaleta de viga cimiento de cerramiento.
  * Instalación de relleno en cuarto eléctrico.
  * Ingresa tubería eléctrica, accesorios, tuberia conduit. y cachas metálicas

Vº Bº Interventoria.

Julio 23 de 2025 - Miercoles

- Estado del tiempo: Soleado.
- Hora inicio: 7:00 Am. - Hora final:
- Personal obra: (1) Director, (1) Ing. Residente, (1) Inspector, (1) Social, (1) Almacenista, (1) SISO, (1) Aux SISO, (1) Maestro, (1) operador, (1) topógrafo, (1) cadenero, (2) oficial, (8) Ayudantes
- Personal eléctrico: (2) Ing. Eléctrico, (2) oficiales.
- Personal Interventoria: (1) Director, (1) topógrafo, (1) cadenero, (1) Ing. Residente, (1) SISO, (1) coordinador.
- Equipos: Equipos de topografia, (1) Retroexcavadora, (1) miniexcavadora, (2) mezcladoras, (1) minicargador, (1) vibrador de concreto., herramientas menores.

Powered by CamScanner

•Actividades: * Excavación para soporte de ruberta de cerramiento perimetral.
* Instalación de formaleta de viga cimiento de cerramiento.
* Excavación de cimiento de poste eléctrico para ingreso de acometida de media tensión. desde la calle 3. hasta la obra, donde había sido socializado la instalación de postes.
* Desencofrado de registro de acometida de media tensión. fundido (de m) el día anterior.
* Instalación de esmbol en columnas de gradería. se instala formaleta de encofrado y se nivela con gatos para fundida.
* Fundida de solado de viga de cerramiento con acero instalado.

V°B°
INTERVENTORIA

Julio 24 de 2025 - Jueves.
•Estado del tiempo: Mañana soleado, tarde nublada, lluvia leve 4:00 pm
• Hora inicio: 7:00 Am. • Hora final: 5:00 pm
•Personal obra: (1) Ing. Residente, (1) SISO, (1) Ax SISO, (1) Inspector, (1) Almacenista, (1) Maestro, (3) oficiales, (8) Ayudantes, (1) operador, (1) topógrafo, (1) Cadenero,
•Personal eléctrico: (2) Ing. eléctrico, (2) oficiales
Personal Interventoría: (1) topógrafo, (1) cadenero, (1) SISO, (1) coordinador, (1) Ing. Residente.
•Equipos: Equipos de topografía, (1) lleno excavadora, (2) mezcladoras, (1) vibrador de concreto, (1) minicargador, (1) miniexcavadora, (1) retroexcavadora.
•Actividades: * Se realiza excavación para instalación de postes de ingreso de línea de media tensión al proyecto, en el hueco del poste inicial (frente a Uy que rico. se presenta afectación a ruberta de 3" en concreto de agua potable. Se realiza contención del daño con neumático, esperando arreglo definitivo con la empresa Emposandiego.
* Se realiza colocación de poñete en muros internos del cuarto eléctrico.
* Instalación de postes para cerramiento perimetral de cancha.

* Se realiza corte de excavación de viga para colocación de solado en el tramo de los laterales de cancha.
* Excavación de tanque subterráneo de almacenamiento de agua, con retroexcavadora.
* colocación de estribos en columnas de gradería.
* Instalación de formaleta en columnas de gradería.
* Instalación de formaleta en viga de cerramiento perimetral de la cancha.
* Se realiza toma de resistividad del suelo a 1m, 3m y 5m en zona de cancha sobre el campo de juego, como una medición preliminar, por parte de los ingenieros eléctricos, que se encuentran ejecutando el proyecto.

Firma Vº Bº
Interventoría

Julio 25 de 2025 - Viernes
- Estado del tiempo: mañana soleado.
- Hora inicio: 7:00Am, - Hora final: 5:00Pm
- Personal obra: (1) Ing. Residente, (1) SISO, (1) Aux. SISO, (1) Inspector, (1) Maestro, (1) Almacenista, (3) oficiales, (7) Ayudantes, (1) operador, (1) Topógrafo, (1) cadenero.
- Personal eléctrico: (2) Ing. Eléctricos, (2) oficiales.
- personal Interventoría: (1) Ing. Residente, (1) Topógrafo, (1) cadenero, (1) SISO, (1) coordinador.
- Equipos: Equipos de topografía, (1) Retroexcavadora, (2) mezcladoras, (1) vibrador de concreto, (1) minicargador, (1) miniexcavadora, (1) grua.
- Actividades: * Se realiza instalación de 3 postes de energía, de media tensión, con grúa, y se repara tubería con bridas en 4 huecos.
  * Se realiza parrete de muros internos de cuarto eléctrico,
  * continua instalación de formaleta en viga de cerramiento perimetral,
  * colocación de solado de viga cimiento de cerramiento.
  * limpieza de zona debajo de gradería e instalación de relleno seleccionado.
  * limpieza de material de demolición en zona de cancha.

Powered by CamScanner

* Trazado de parte interior de anques (para) con topografía para colocación de solado.
* Instalación de formaleta en columna de graderia.

V°B° Interventoría.

Julio 26 de 2025 - sábado.

- Estado del tiempo: mañana soleado, tarde nublado, lluvia leve 4:50 pm
- Hora inicio: 7:00 Am. - Hora final: 12:00 pm
- Personal obra: (1) Ing. Residente, (1) Inspector, (1) SISO, (1) Almacenista, (1) Maestro, (1) operador, (1) topógrafo, (1) Cadenero, (9) Ayudantes, (2) oficiales,
- Personal eléctrico: (2) oficiales
- personal Interventoría: (1) topógrafo (1) cadenero, (1) Ing. Residente, (1) SISO, (1) coordinador.
- (Act) Equipos: Equipos de topografía, (1) Retroexcavadora, (1) minicargador, (1) miniexcavadora, (2) mezcladoras, (1) vibrador de concreto, (1) vibrocompactador, (1) grúa, (1) compactador tipo rana.
- Actividades: * Se continua colocación de pantere en cuarto eléctrico a nivel interno.
* Excavación de caja registro de poste de media tensión en zona posterior al parqueadero.
* Instalación de formaleta metálica en vigas de cerramiento perimetral de la cancha.
* Instalación de formaleta en columna de graderia, nivelada con gatos. en las 4 caras.
* Colocación de relleno en zona de cameria y bordos.
* Extensión de material de relleno seleccionado en zona de cancha con retroexcavadora tipo pajarita.
* Instalación de poste frente a calle 3 sobre anden, donde el dia de ayer fue realizada la reparación de tubería de suministro de agua de 3" por parte de la empresa Emposandoño.
* Ingresa vibrocompactador Ingersoll Rand de 10 Ton.

V°B° Interventoría.

Julio 27 de 2025 - Domingo.
- Estado del tiempo: Mañana Soleado, tarde nublado.
- No se realizan labores.

Hora V°B° Interventoría

Julio 28 de 2025 - Lunes.
- Estado del tiempo: Mañana soleado., tarde nublada
- Hora inicio: 7:00 Am - Hora final: 5:00 pm.
- Personal obra: (1) Ing. Residente, (1) Inspector, (1) SISO, (1) Aux SISO, (1) Almacenista, (1) Maestro, (1) operador, (1) Topógrafo, (1) cadenero, (3) oficiales, (8) Ayudantes.
- Personal eléctrico: (2) oficiales.
- Personal Interventoría: (1) Ing. Residente, (1) Topógrafo, (1) cadenero, (1) SISO, (1) coordinador.
- Equipos: Equipos de topografía, (1) Retroexcavadora, (1) minicargador, (1) vibrador de concreto, (1) mini excavadora, (2) mezcladoras, vibrocompactador
- Actividades: * Se realiza parrete de muros interno de cuarto eléctrico y placa superior interna
  * levante de muros en zona de camerinos, debajo de graderia.
  * Fundida de solado de tanque de abastecimiento y cuarto de máquina
  * Colocación y extensión de relleno en camerinos de visitante.
  * Extensión de relleno seleccionado en cancha.
  * Instalación de formaleta en viga de cerramiento perimetral de cancha.
  * Excavación de registro eléctrico de poste de media tensión detras del parqueadero.
  * Figurado de acero para registro eléctrico. detras del poste de-parte de atras del parqueadero.

Hora V°B° Interventoría

•Julio 29 de 2025 - Martes
•Estado del tiempo: Nublado.
•Hora inicio: 7:00Am. •Hora final: 5:00 pm
•personal obra: (1)Ing. Residente, (1)Inspector, (1)SISO, (1)Aux siso, (1)Almacenista, (1)Maestro, (3)oficiales, (8)Ayudantes, (1)topografo (1)cadenero, (1)operador
•Personal Eléctrico: (2)oficiales.
•Personal Interventoria: (1)Ing. Residente, (1)Topografo, (1)cadenero, (1)SISO, (1)coordinador.
•Equipos: (1)Retroexcavadora, Equipos de topografia, (1)Miniexcavadora, (1)vibrador de concreto, (2)mezcladoras, (1)vibrocompactador, (1)miniexcavadora, (1)compactador rpo rana.
•Actividades: * Poñete de placa superior interna de cuarto eléctrico.
* Instalación de acero de refuerzo y fundida de registro electrico de poste de media tensión detras del parqueadero.
* Fundida de solado en tanques de almacenamiento de agua.
* levante de muros en zona de comercial debajo de gradas.
* Instalación de formaleta de viga de cerramiento perimetral de la cancha.
* Excavación mecanica de red hidrosanitaria en zona externa de graderia.
* Extensión de relleno seleccionado debajo de graderias.

Firma Vº Bº Interventoria

Julio 30 de 2025 - Miercoles.
•Estado del tiempo: Parcialmente nublado.
•Hora inicio: 7:00 Am •Hora final: 5:00 pm
•Personal obra: (1)Ing. Residente, (1)Inspector, (1)SISO, (1)Aux SISO, (1)Almacenista, (1)Maestro, (3)oficiales., (7)ayudantes, (1)Topógrafo (1)Cadenero, (1)operador.
•Personal eléctrico: (2)oficiales.
•Personal Interventoria: (1)Ing. Residente, (1) Topógrafo, (1)cadenero, (1) SISO, (1)coordinador.

Powered by CamScanner

- Equipos: (1) Retroexcavadora, equipos de topografía, (1) miniexcavadora, (1) vibrador de concreto, (2) mezcladoras, (1) vibrocompactador, (1) minicargador, (1) pana.
- Actividades: • Levante de muros en camerinos, con bloque abujardado.
  - Continua fundida de solado dentro de excavación de tanques subterráneos.
  - Instalación de formaleta de viga de cerramiento perimetral de cancha.
  - Excavación de red sanitaria interna de camerinos.
  - Excavación de acometida eléctrica desde el cuarto eléctrico.
  - (Fundida de solado)

Firma, Ing. Diego
Interventoría

Julio 31 de 2025 - Jueves

- Estado del tiempo: Mañana soleado, tarde nublada, lluvia intensa 4:30 pm a 7:00 pm.
- Hora inicio: 7:00 Am. - Hora final: 4:30 pm por lluvia
- Personal obra: (1) Ing. Residente, (1) Inspector, (1) SISO, (1) Aux SISO, (1) Almacenista, (1) Maestro, (2) oficiales, (6) Ayudantes, (1) topografo, (1) cadenero, (1) operador
- Personal eléctrico: (2) oficiales
- Personal Interventoría: (1) Ing Residente, (1) topógrafo, (1) cadenero, (1) coordinador, (1) SISO.
- Equipos: (1) Retroexcavadora, equipos de topografía, (1) miniexcavadora, (1) vibrador de concreto, (2) mezcladoras, (1) vibrocompactador, (1) minicargador, (1) pana.
- Actividades: • Excavación e instalación de tubería eléctrica que sale del cuarto eléctrico, hacia cancha y gradas, se instalan 18 ml de: 4 tubos de 1 1/2", 2 tubos de 1" y 1 tubo de 3/4".
  - Instalación de tuberías que ingresan al cuarto eléctrico.
  - Levante de muros en camerinos y baños
  - Fundida de solado en tanques de agua subterráneos.
  - Se realiza trazado sobre el solado, de los tanques de almacenamiento y cuarto de máquinas., con topografía.
  - Se realiza extensión de material de excavación en zona de juego biosaludable.
  - Excavación de redes sanitarias internas en camerinos y baños

Powered by CamScanner

debajo de gaderas

*Se realiza visita de obra de la supervisión municipal, emposandiego, inspector y ambiental de planeación, con el fin de evaluar reubicación de mangueras y poste de energía que se encuentran actualmente en la zona de intervensión del proyecto, que suiten a zona de invasión aledaña al proyecto.

Por parte de la inspección se convocará a comisaria de familia y personería para socializar los traslados con personal de la invasión para la próxima semana. y se evaluará con gestión del riesgo 2 árboles de trupillo.

*Compactación de material de relleno sobre zona de juegos biosaludables.

Atm V°B°
Interventoría

Agosto 01 de 2025 - viernes

*Estado del tiempo: soleado.

*Hora inicio: 7:00 Am. *Hora final: 5:00pm.

*Personal obra: (1) Ing. Residente, (1) SISO, (1) Aux SISO, (1) inspector, (1) topógrafo (1) cadenero, (1) Almacenista, (1) operador

*Personal eléctrico: (1) oficial eléctrico., (1) Ing. Eléctrico.

*Personal Interventoría: (1) Ing. Residente, (1) topógrafo, (1) cadenero, (1) SISO, (1) coordinador.

*Equipos: (1) Retroexcavadora, (1) minicargador, (1) mini excavadora, (1) vibrocompactador, Equipos de topografía, (2) mezcladoras, (1) vibrador de concreto, (1) cama.

*Actividades: * Se realiza limpieza general con minicargador en zona alrededor del cuarto eléctrico por retiro de lodo producto de la lluvia del día de ayer.

* Instalación de tubería eléctrica en cuarto eléctrico y registros fuera del cuarto eléctrico.

* No se realizan labores civiles, se evidencia suspensión de estas actividades por parte del maestro y su personal por falta de pago de nómina.

Atm V°B°
Interventoría.

Agosto 02 de 2025 - Sábado.
- Estado del tiempo: mañana soleado, tarde nublada lluvia 5:00pm - 6:00pm.
- Hora inicio: 7:00 Am • Hora final: 12:00pm
- Personal obra: (1) Ing. Residente, (1) Inspector, (1) SISO, (1) Almacenista, (1) topografo, (1) Cadenero, (1) operador
- Personal eléctrico: (2) oficiales.
- Personal Interventoría: (1) Ing. Residente, (1) topografo, (1) cadenero, (1) coordinador, (1) SISO
- Equipos: (1) Retroexcavadora, Equipos de topografía, (1) Minicargador, (1) vibrocompactador, (1) minexcavadora, (1) vibrador de concreto, (2) Mezcladoras, (1) Rana.
- Actividades: * Extensión de relleno en zona de juegos biosaludables con minicargador.
* Excavación para acometida eléctrica hacia gradería.

V°B° Interventoría

Agosto 03 de 2025 - Domingo.
Estado del tiempo: soleado, lluvia 11:30 Am a 12:30 Pm.
No se realizan labores.

V°B° Interventoría

Agosto 04 de 2025 - Lunes.
- Estado del tiempo: Soleado.
- Hora inicio: 7:00 Am • Hora final: 5:00pm.
- Personal obra: (1) Ing. Residente, (1) SISO, (1) Aux SISO, (1) Inspector, (1) Almacenista, (1) Maestro, (1) oficial, (1) Ayudante, (1) operador, (1) topógrafo, (1) cadenero,
- Personal Eléctrico: (2) oficiales.
- Personal Interventoría: (1) Ing. Residente, (1) topógrafo, (1) cadenero, (1) SISO, (1) coordinador.
- Equipos: (1) Retroexcavadora, Equipos de topografía, (1) Minicargador, (1) Rana, (1) vibrocompactador, (1) minexcavadora, (1) vibrador de concreto, (2) mezcladoras.
- Actividades: * Levante de muro en bloque alojerado en zona de camerino, debajo de gradería.

Powered by CamScanner

* Extensión de material de relleno en zona de parque Biosaludable
* Excavación e instalación de 2 tuberías de 1" de acometida eléctrica y 1 de 3/4"
* El día de hoy se realiza pago de nómina a los trabajadores del Maestro.

Firma V°B°
Interventoría.

Agosto 05 de 2025 - Martes
- Estado del tiempo: Nublado.
- Hora inicio: 7:00 Am. - Hora final: 4:00 Pm
- Personal obra: (1) Ing. Residente, (1) Director, (1) SISO, (1) Aux SISO, (1) Almacenista, (1) topógrafo, (1) cadenero, (1) Maestro, (1) operador, (1) oficial, (6) Ayudantes, (1) Inspector,
- Personal eléctrico: (2) oficiales.
- Personal Interventoría: (1) Ing. Residente, (1) topógrafo, (1) cadenero, (1) SISO, (1) coordinador.
- Equipos: Equipos de topografía, (1) Retroexcavadora, (1) mini excavadora, (1) vibrocompactador, (1) minicargador, (2) mezcladoras, (1) vibrador de concreto, (1) Rana.
- Actividades: * Fundida de 7 columnas de 1,29 cm de alto en graderías eje B. con diseño de mezcla de 3500 psi. Fundido en obra.
  * Excavación de acometida eléctrica desde registro hacia rampa de graderías.
  * Se toman 3 cilindros de muestra de la fundida de columnas de graderías. y pedestales de rampa.
  * Fundida de 4 pedestales de 70 x 70 cm x 1m de alto.

Firma V°B°
Interventoría.

Agosto 06 de 2025 - Miercoles
- Estado del tiempo: Nublado.
- Hora inicio: 7:00 Am - Hora final:
- Personal obra: (1) Ing Residente, (1) Director, (1) SISO, (1) Aux SISO, (1) Almacenista,

(1)topógrafo, (1)cadenero, (1)Maestro, (1)operador, (2)oficiales, (1)Ing. ambiental, (6) Ayudantes, (1)Inspector.

- Personal eléctrico: (2) oficiales.
- Personal Interventoría: (1)Ing. Residente, (1)topógrafo, (1) cadenero, (1)SISO, (1)coordinador.
- Equipos: Equipos de topografía. (1) minicargador, (1) vibrocompactador, (1) rana, (1) miniexcavadora, (2) mezcladoras, (1) vibrador de concreto
- Actividades: * Continua excavación de acometida eléctrica detrás de graderías.
  * Colocación, nivelación, extensión y compactación de relleno seleccionado en zona de juegos biosaludables.
  * Descapotado de columnas de graderías fundidas el día de ayer
  * Descapotado de pedestales de rampa graderia fundidos el día de ayer.
  * Fundida de viga de cerramiento perimetral de cancha, se toman 3 cilindros de muestra.
  * Ingresan 40 bolsas de 6" sanitaria y 14 tubos de 4" sanitaria.

Vº Bº
Interventoría

Agosto 07 de 2025 - Jueves (FESTIVO)

- Estado del tiempo: Nublado.
- No se realizan labores

Vº Bº
Interventoría.

Agosto 08 de 2025 - Viernes.

Estado del tiempo: Soleado.

- Hora inicio: 7:00 AM. Hora final: 5:00 pm
- Personal obra: (1)Ing. Residente, (1) Director, (1)SISO, (1) aux. SISO, (1)Almacenista, (1)topógrafo, (1)cadenero, (1)Maestro, (1)operador, (1)Inspector, (2) oficial, (8) Ayudantes.
- Personal Eléctrico: (2) oficiales, (1)Ing. eléctrico
- Personal Interventoría: (1)Ing. Residente, (1)Director, (1) topógrafo, (1)cadenero, (1)coordinador, (1) SISO.

•Equipos: (1)Minicargador, Equipos de topografía, (1)Mini excavadora, (1)vibrocompactador, (2)Mezcladoras, (1)pala, (1)vibrador de concreto.
•Actividades: * Nivelación de formaleta de columnas de gradas B2 y B11
* Armado de plataforma para vigas de gradas en el eje B.
* Excavación de red sanitaria en gradas.
* Excavación de acometida eléctrica detras de gradería.
* Extensión y nivelación de relleno seleccionado detras de casa existente, en zona de juegos infantiles.
* Excavación de bordillo externo de zona de juegos biosaludables.

Firma V°B°
Interventoría

Agosto 09 de 2025 - Sábado.
•Estado del tiempo: Nublado.
•Hora inicio: 7:00Am •Hora final: 12:00Pm
•Personal obra: (1)Ing. Residente, (1)Inspector, (1)Almacenista, (1)SISO, (1)Maestro, (1)Operador, (1)topografo, (1)cadenero, (2)oficial, (8)Ayudantes,
•Personal eléctrico: (2)oficiales.
•Personal Interventoría: (1)Ing. Residente, (1)SISO, (1) topógrafo, (1)cadenero, (1)coordinador.
•Equipos: Equipos de topografía, (1)Minicargador, (1)vibrocompactador, (1) vibrador de concreto, (2)mezcladoras, (1) miniexcavadora, (1)pala.
•Actividades: * Se realizo fundida de viga de cerramiento perimetral.
* Colocación y nivelación de relleno seleccionado en zona de parque infantil.
* Excavación de bordillo perimetral en parque Biosaludable.
* Desencofrado de vigas perimetrales de cerramiento.
* Armado de acero de refuerzo de vigas superiores de gradería, y fundida de columnas B2 y B11 graderas
* levante de muros en zona de camerinos
* Disposición de acometida eléctrica detras de gradería.

Firma V°B°
Interventoría

Powered by CamScanner
