
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 1
AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ
VALLEDUPAR-CESAR

OBJETO:
REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE LA SUBESTACION DE ENERGIA; Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES PAPI DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR (VF) – LOTE 1



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 13
VERSION 1

BOGOTÁ. D.C.-JULIO-2025

	NOMBRE	FIRMA
ELABORÓ	**NICOLAS COBOS** RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
REVISÓ	**ALEJANDRO FAVIO RUIZ GARCES** DIRECTOR INTERVENTORIA	
APROBÓ	**ALFREDO JOSE LEPESQUEUR MARTINEZ** REPRESENTANTE LEGAL	

CONTROL DE CAMBIOS	
VERSION /FECHA	**DESCRIPCION**
VERSION 0 10/08/2025	Creación del Documento

CONTENIDO DEL INFORME

1. INTRODUCCION

2 DESCRIPCION DEL PROYECTO

a. Localización
b. Área de influencia y beneficios
c. Estado inicial
d. Características técnicas del proyecto

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

3.1 Información general contrato de obra
a. Seguimiento pólizas
b. Seguimiento jurídico
3.2 Información contrato de interventoría
c. Seguimiento pólizas
d. Seguimiento jurídico
3.3 Actividades ejecutadas en el mes
3.4 Seguimiento ítems no previstos

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 Cumplimiento obligaciones
4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra
4.3 Personal, Control Aporte Legales y Seguridad Social Contrato de Obra
4.4 Informe Financiero y Presupuestal
4.5 Estado General del Tiempo
4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio
4.7 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra
4.8 Seguimiento a la inversión del Anticipo
4.9 Seguimiento Programa de Inversión
4.10 Seguimiento Programa de Obra
4.11.1 Etapa 1
4.11.2 Etapa 2
4.11.3 Etapa 3
-Atrasos/Adelantos
-Ruta Critica
-Planes de Contingencia

5. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1 Cumplimiento Obligaciones
5.2. Personal, Control Aporte Legales y Seguridad Social Contrato de Obra
5.3 Informe Financiero y Presupuestal.
5.4 Informe esepcialista y profesionales.

6. INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA-PAC

7. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA.

8. ACTAS DE REUNIÓN

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

10. ANEXOS

INDICE DE TABLAS

TABLA 1 INFORMACION DE CONTRATO DE OBRA *10*
TABLA 2 POLIZAS DE OBRA *10*
TABLA 3 INFORMACION DE CONTRATO DE INTERVENTORIA *11*
TABLA 4 ANEXO 0 ..... *11*
TABLA 5 ANEXO 1 ..... *12*
TABLA 6 ANEXO 2 ..... *12*
TABLA 7 ANEXO 3 ..... *12*
TABLA 8 MANEJO DEL ANTICIPO. *13*
TABLA 9 CANTIDADES CIVILES EJECUTADA. ..... ***¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.***
TABLA 10 CANTIDADES ELÉCTRICAS EJECUTADAS *14*
TABLA 11 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS. *15*
TABLA 12 RESUMEN DE OBLIGACIONES DE PRIMERA ETAPA. *16*
TABLA 13 RESUMEN DE INFORMES SEMANALES *17*
TABLA 14 MAQUINARIA INGRESADA *17*
TABLA 15 RELACION PERSONAL PROFESIONAL *18*
TABLA 16 RELACION PERSONAL TÉCNICO DE OBRA. *18*
TABLA 17 RELACION DEL PERSONAL OPERATIVO DE OBRA. ..... ***¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.***
TABLA 18 RELACION INFORMACIÓN FINANCIERO SEMANALMENTE *18*
TABLA 19 RESUMEN DE AVANCE FINANCIERO Y PERSONAL. *18*
TABLA 20 RELACION DE ACTAS PARCIALES DE OBRA. *19*
TABLA 21 RELACION DE TIEMPO DE LLUVIAS. *20*
TABLA 22 RESUMEN DE FICHAS TÉCNICAS EN EL PERIODO. ..... ***¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.***
TABLA 23 RESUMEN DE AVANCE PROCENTUAL SEMANALMENTE. *22*
TABLA 24 RESUMEN MENSUAL PORCENTUAL Y FINANCIERO. *23*
TABLA 25 RESUMEN PERSONAL PROFESIONAL DE INTERVENTORIA. *25*
TABLA 26 RESUMEN ACTAS PARCIALES DE INTERVENTORIA. *26*
TABLA 27 RESUMEN DE COMITÉS RELIZADOS. *26*
TABLA 28 RESUMEN DE ACTAS DE REUNIÓN REALIZADAS. *26*

INDICE DE ILUSTRACIONES

ILUSTRACIÓN 1 LOCALIZAION PROYECTO. 8
ILUSTRACIÓN 2 ZONA DE LA SUUBESTACION PROYECTO 9
ILUSTRACIÓN 3 DIAGRAMA DE BARRRAS DE AVANCES MENSUALES. 19
ILUSTRACIÓN 4 DIAGRAMA AVANCE PORCENTUAL SEMANALMENTE. 23
ILUSTRACIÓN 5 DIAGRAMA AVANCE PORCENTUAL Y FINANCIERO MENSUAL. 24

1. INTRODUCCION

La interventoría ejercerá sus funciones mediante el contrato 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 1, haciendo el seguimiento al contrato de obra Nº 23001191 H4 DE 2023 - Lote 1 cuyo objeto es *REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACION DE ENERGÍA; Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES PAPI DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR (VF) – LOTE 1*. Proyecto por desarrollarse en el aeropuerto Alfonso López del municipio de Valledupar en el departamento del César.

Desde comienzos de diciembre de 2010 la terminal aérea es operada por el concesionario Aeropuertos del Oriente S.A.S. el cual se encarga de su administración.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

De acuerdo con el anexo Nº 1 del contrato de obra el proyecto contempla la estandarización y modernización de las instalaciones eléctricas internas de la Aerocivil en el aeropuerto de Valledupar, que no están concesionadas, esta modernización inicia estableciendo una modernización del Tablero General para la Aerocivil y una nueva subestación eléctrica interna para distribución a áreas no concesionadas como Ayudas Visuales de pista, torre de control y edificio SEI. La subestación proyectada contará con equipos estandarizados, cumpliendo la legislación aplicable, la normatividad RAC. Igualmente se dotará de un área suficiente para la operación técnica, áreas para taller y oficina, sistema SCADA de comunicación y seguimiento (independiente del sistema de control de Ayudas Visuales), sistema contra incendio y un sistema de generación de energía solar sobre la cubierta.

Adicionalmente se estandarizará la infraestructura de suministro eléctrico para Ayudas Visuales de pista, se trasladarán los sistemas existentes, se instalará un nuevo sistema de control y se reemplazaran las luces PAPI, los equipos existentes se encuentran ubicados en el cuarto eléctrico existente contiguo a la subestación de la concesión.

a. LOCALIZACIÓN

El Aeropuerto Alfonso López Pumarejo (código IATA: VUP, código OACI: SKVP) se encuentra localizado en el departamento del Cesar, a aproximadamente 7 Km del centro de la ciudad de Valledupar su capital, con una población aproximada de 490.075 y un clima que oscila entre 30 y 35° C.

El aeropuerto se ubica a una altura promedio de 148 msnm y unas coordenadas La siguiente imagen (*Ilustración 1*) se presenta la ubicación general de la terminal.

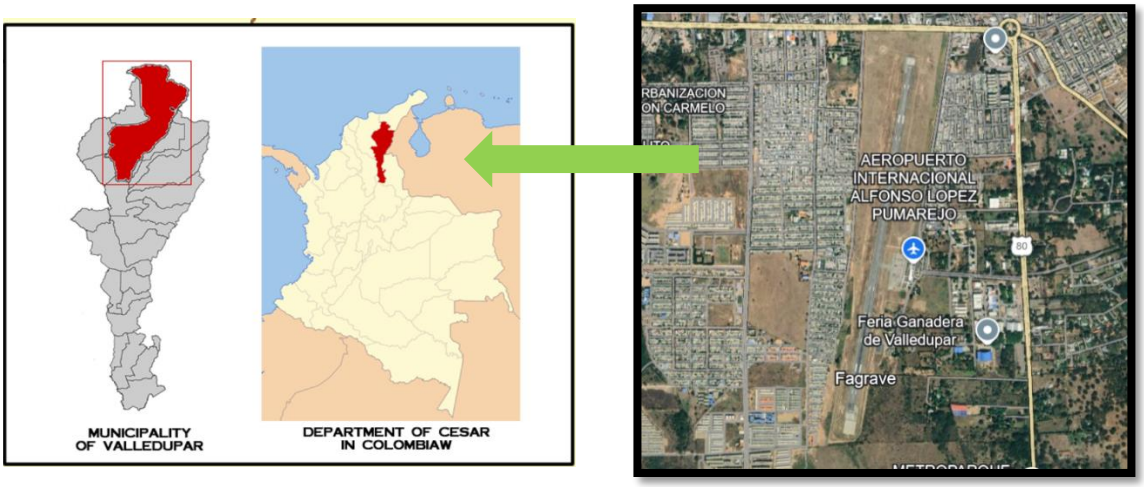


Ilustración 1 localizaion proyecto.

b. ÁREA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS

El proyecto por ejecutar como se indica es directamente en el aeropuerto Alfonso López Pumarejo (código IATA: VUP, código OACI: SKVP) ubicado en la ciudad de Valledupar departamento del Cesar, así las cosas, el proyecto tiene como área de influencia los 25 municipio s el departamento y los potenciales usuarios de las mejoras del aeropuerto son los 1.395.486 habitantes del departamento.

c. ESTADO INICIAL

El estado inicial del sitio de ejecución del proyecto se describe así:

- Construcción existente de 150 m2 ubicada de manera contigua al aeropuerto, área en la cual actualmente se encuentra un cuarto técnico con elementos en desuso y que será objeto de demolición, para en este sitio construir el nuevo cuarto técnico.

- Área anexa a la subestación en donde actualmente se encuentran tableros y reguladores que van a ser reubicados.

- Pista de aterrizaje va a ser intervenida con el cambio de las luces PAPI. De igual forma se va a intervenir la canalización de las luces de borde de pista que va a servir para conducir el nuevo cableado de las luces PAPI, así como un segmento en la pista donde se va a realizar una canalización nueva. (Anexo 1 Anexo fotográfico)



Ilustración 2 zona de la suubestacion proyecto

d. Características técnicas del proyecto y actividades a ejecutar

De acuerdo con el anexo técnico del contrato, las siguientes son las actividades para ejecutar en el desarrollo del contrato, sin embargo, estas pueden variar de acuerdo con las posibles modificaciones que puedan surgir de las revisiones realizadas en la etapa de preconstrucción.

- ✓ Reconocimiento general de la subestación, revisión de planos y diseños eléctricos y arquitectónicos, replanteo, topografía, estudio de suelos y diseño estructural.
- ✓ Demolición de estructura existente.
- ✓ Solicitud y trámite ante la electrificadora los permisos para modificar la red eléctrica de llegada que afecta la futura construcción, coordinación de las tareas y ejecución del traslado.
- ✓ Presentación de planos de taller y aprobación de interventoría para los planos de tableros.
- ✓ Orden de pedido de equipos.
- ✓ Construcción de las obras civiles y canalizaciones. (incluida puesta a tierra)
- ✓ Sistema de protección contra incendios y SIPRA.
- ✓ Salidas eléctricas, tomas eléctricas, alumbrado y datos.
- ✓ Instalación de equipos
- ✓ Cableados de potencia y control.
- ✓ Instalación e integración al sistema de monitoreo y control.
- ✓ Traslado de equipos de ayudas visuales e instalación de las luces PAPI.
- ✓ Capacitación
- ✓ Conexión y pruebas.

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE OBRA

NÚMERO DE CONTRATO	23001191 H4 DE 2023 - Lote 1
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	CONSORCIO AEREO SAFKA
OBJETO	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACION DE ENERGÍA; Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES PAPI DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR (VF) – LOTE 1.
VALOR	$3.205.801.629
PLAZO	DIECISEIS (16) MESES
CDP	7824 DEL 2024-01-12
RP	178424 DEL 2024-06-26
FECHA LEGALIZACIÓN	26 DE JUNIO DE 2024
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	CONSORCIO ALMOBRAS 1

Tabla 1 informacion de contrato de obra

a. Seguimiento pólizas

Las pólizas fueron radicadas por el contratista de obra ante la entidad, las cuales fueron aprobadas y la siguiente es la tabla de las pólizas presentadas:

GARANTIA DE CUMPLIMENTO	
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO
No DE POLIZAS	14-44-101212718
CERTIFICADO DE ANEXO	ANEXO 4
FECHA EXPEDICION	07/09/2024

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO
No DE POLIZAS	14-40-101065431
CERTIFICADO DE ANEXO	ANEXO 1
FECHA EXPEDICION	06/08/2024

Tabla 2 polizas de obra

b. Seguimiento jurídico

A la fecha del presente informe no se han presentado modificaciones contractuales al contrato.

3.2 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

NÚMERO DE CONTRATO	23001308 H3 DE 2023 - LOTE 1
CLASE DE CONTRATO	INTERVENTORIA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	CONSORCIO ALMOBRA 1
OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE LA SUBESTACION DE ENERGIA; Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES PAPI DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR (VF) – LOTE 1.
VALOR	$936.709.300
PLAZO	DIECISÉIS (16) MESES
CDP	6924 DEL 11 DE ENERO DE 2024
RP	179524 DEL 27 DE JUNIO DE 2024
FECHA LEGALIZACIÓN	03 DE JULIO DE 2024
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	OMAR ESTEVEZ ROJAS

Tabla 3 informacion de contrato de interventoria

c. Seguimiento pólizas

Para el contrato de interventoría se presentó la Póliza N° 21-44-101444081 - ANEXO 0, de Seguros del Estado, con los siguientes amparos:

NOMBRE DEL AMPÁRO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR PRIMA	APROBACIÓN
Cumplimiento del contrato.	30/05/2024	09/03/2026	$ 641.160.325,80	Pendiente
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	30/09/2025	09/11/2027	$ 641.160.325,80	Pendiente
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	30/05/2024	09/11/2028	$ 641.160.325,80	Pendiente
Buen manejo y correcta inversión del anticipo.	30/05/2024	09/03/2026	$ 698.996.640,00	Pendiente
Estabilidad y calidad de la obra.	09/11/2024	09/11/2030	$ 641.160.325,80	Pendiente

Tabla 4 ANEXO 0

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR PRIMA
Cumplimiento del contrato	18/06/2024	18/02/2026	$ 281.012.790,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones.	18/06/2024	18/10/2028	$ 187.341.860,00
Calidad del Servicio	18/10/2025	18/10/2028	$ 187.341.860,00

Tabla 5 ANEXO 1

POLIZA N° 21-40-101235043-RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR PRIMA
Predios Labores y operaciones	9/07/2024	8/11/2025	$ 260.000.000,00
Contratistas y subcontratistas	9/07/2024	8/11/2025	$ 260.000.000,00
Vehículos propios y no propios	9/07/2024	8/11/2025	$ 260.000.000,00

Tabla 6 ANEXO 2

POLIZA N° 21-44-101444081

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR PRIMA
Cumplimiento del contrato	9/07/2024	11/03/2026	$ 281.012.790,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones.	9/07/2024	8/11/2028	$ 187.341.860,00
Calidad del Servicio	8/11/2025	8/11/2028	$ 187.341.860,00

Tabla 7 ANEXO 3

Anexo N° 2 Pólizas Contrato de Interventoría

d. Seguimiento jurídico

A la fecha del presente informe no se han presentado modificaciones contractuales.

3.3 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades efectuadas durante el mes de diciembre del 2024 obedecen a la fase 1 y a la fase 2, durante este periodo se destacan:

FASE 1, Revisión y/o complementación sobre los diseños eléctricos y arquitectónicos:
El contratista de obra dentro del periodo de ejecución del mes (01/12/24, hasta el 31/12/24) avanzó en la entrega de toda la documentación relacionada dentro de la Fase 1 establecida dentro del "ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO VALLEDUPAR LOTE 1" y una vez se entreguen todos los documentos, por parte de interventoría y de la supervisión se dará el visto bueno de la revisión y

aprobación de los diseños eléctricos y arquitectónicos, el levantamiento topográfico, los estudios de suelos y los diseños estructurales de la edificación proyectada.

Cronograma de actividades

Durante el mes de junio del 2025 no se efectuaron modificaciones a la Programación de Obra.

Flujo de fondos para la inversión del anticipo

El día el 09 de octubre de 2024, se realizó el desembolso del anticipo de la entidad (Aero civil) a la fiducia (Fidupopular) y en el siguiente cuadro se resume el estado actual de esta inversion del anticipo el cual a la fecha se encuentra liquidado.

Valor del Anticipo (21.8%)	$698.996.640,00
Retenciones AEROCIVIL	$0,00
Valor neto de anticipo Girado	$698.996.640,00
Fecha de Desembolso del Anticipo	3/10/2024
Entidad Fiduciaria	Fiduciaria popular
Numero de Fideicomiso	311328
Nombre del Fideicomiso	P.A. ANT. CONSORCIO AEREO SAFKA VALLEDUPAR
Rendimientos financieros mes de octubre de 2024	$ 690.228,71
Rendimientos financieros mes de noviembre de 2024	$ 685.452,68
Rendimientos financieros mes de diciembre de 2024	$ 528.048,25
Rendimientos financieros mes de enero de 2025	$ 507.532,25
Rendimientos financieros mes de febrero de 2025	$ 193.620,25
Total, rendimientos consignados	$2.604.882,14
Girado 3 al 31 de octubre de 2024	$0,00
Girado 1 al 30 de noviembre de 2024	$51.195.553,00
Girado 1 al 31 de diciembre de 2024	$25.000.000,00
Girado 1 al 31 de enero de 2025	$259.637.977,66
Girado 1 al 28 de febrero de 2025	$363.163.109,34
Consolidado Giros a la fecha	$698.996.640,00
Saldo a la Fecha del Corte del Periodo	$0,00

Tabla 8 Manejo del anticipo.

Plan de Seguridad Operacional.

Durante el periodo correspondiente al mes de junio del 2025, se desarrollaron las actividades programadas de acuerdo con el cronograma establecido en el Plan de Seguridad Operacional (PSO). Se aseguraron las medidas de protección personal mediante el uso adecuado de:

- Gafas de protección
- Guantes
- Botas
- Casco
- Protectores auditivos
- Protección respiratoria
- Equipos de protección contra caídas
- Visor facial.

Las actividades de obra civil se ejecutaron dentro de los horarios estipulados en el numeral ***"20.7 Horarios en que se realizarán los trabajos"***. Además, se cumplió con las directrices del FOD, utilizando elementos de barrido manual para garantizar la limpieza en la obra.

Plan de gestión de la calidad.

Durante el periodo de julio del 2025 la interventoría realiza seguimiento al plan de gestión de calidad presentado por el contratista, como parte de este seguimiento se les realiza seguimiento a los materiales ingresados en la obra, que cuenten con sus respectivas fichas técnicas, certificado de extracción de canterías para los materiales pétreos y seguimiento al plan de inspección y ensayo el cual hace parte integral del plan de gestión de calidad.

FASE 2, Construcción de obras civiles, incluidas canalizaciones y la demolición de la pequeña edificación existente:

Durante este periodo no se ejecutan actividades de obra civil correspondientes a la fase 2 del proyecto.

FASE 3, Suministro e instalación de equipos e infraestructura eléctrica y de comunicaciones:

Para esta fase del proyecto que corresponde a la obras eléctricas del proyecto se empiza a ejecutar desde el 27 de enero del 2025 y para el periodo de junio se ejcutaron las siguientes actividades:

SUMINISTRO DE EQUIPOS Y SISTEMAS (QUE INCLUYE INSTALACION - Componentes evaluados sin AIU - Solo IVA)

- Suministro e instalación de Sistema de detección y extinción contra incendios con Agente Limpio (incluye diseño, comunicación con sistema SCADA)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT. EJECUTADA	VALOR EJECUTADO
	SUMINISTRO DE EQUIPOS Y SISTEMAS (QUE INCLUYE INSTALACION - Componentes evaluados sin AIU - Solo IVA)			
1,8	Suministro e instalación de Sistema de detección y extinción contra incendios con Agente Limpio (incluye diseño, comunicación con sistema SCADA)	**UND**	0,2	$ 22.663.322,80
	SUBTOTAL OBRAS			**$ 22.663.322,80**
	IVA			**$ 4.306.031,33**
	SUBTOTAL OBRAS+IVA			**$ 26.969.354,13**
	OBRA ELECTRICA (Componentes con AIU)			

Tabla 9 cantidades eléctricas ejecutadas

FASE 4, Traslado de los equipos y sistemas eléctricos de ayudas visuales. Suministro de luces PAPI y el sistema de control de todas las ayudas visuales:
No se ejecutan actividades de obra correspondientes a esta fase.

3.4 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

OFICIO	FECHA	ASUNTO	REMITENTE	ENVIADO A
OFICIO No. 262 AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024.	02/07/2025	RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES SOBRE EL MODIFICATORIO	CONSORCIO AEREO SAFKA	CONSORCIO ALMOBRAS 1
OFICIO No. 268 - AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024	21/07/2025	MODIFICATORIA DEL CONTRATO DE OBRA No. 23001191 H4 DE 2023.	CONSORCIO AEREO SAFKA	CONSORCIO ALMOBRAS 1
CALMO1-232-2024	29/07/2025	REMISION AJUSTADA SOLICITUD MODIFICATORIO N° 1 Y ANEXOS.	CONSORCIO ALMOBRAS 1	CONSORCIO AEREO SAFKA

Tabla 10 seguimiento a ítems no previstos.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES

PRIMERA ETAPA

Las obligaciones iniciales del contratista y que se ejecutaron durante la primera etapa corresponden a las mencionadas en la tabla 7, están en proceso de ajuste final los siguientes:

- Diseño Estructural, se dio concepto de aprobación por parte de la interventoría mediante comunicado CALM01-104-2024 remitido el día 12 de noviembre de 2024, como respuesta al oficio No. 083 -AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024 – DISEÑO ESTRUCTURAL.
- Plan de seguridad Operacional, La interventoría envía el día 26/11/24 el comunicado CALMO1-111-2024_ AVAL PLAN DE SEGURIDAD OPERACIONAL -SISTEMA SST, con el cual se aprueba este documento y se le copia a la entidad para su respectiva revisión y aprobación.
- Presentación y aprobación de proyecto ante la Electrificadora, se está a la espera que la entidad remita la autorización al funcionario de la empresa constructora que va a realizar los trámites y entregue los documentos requeridos para este proceso.
- Plan de Manejo Ambiental, se presentaron observaciones por parte de la interventoría, remitidas el día 17 de octubre de 2024 mediante comunicado CALM01-075-2024 / RESPUESTA OFICIO No. 043-AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL y el constructor se encuentra en proceso de subsanarlas.

OBLIGACION	ESTADO	OBSERVACIONES
Cronograma de actividades.	Ejecutado	CALMO1-056-2024
Flujo de fondos para la inversión del anticipo (en caso de que aplique).	Ejecutado	CALMO1-056-2024
Plan de Gestión del alcance del proyecto	Ejecutado	CALM01-046-2024
Estructura de Trabajo (EDT)	Ejecutado	CALM01-046-2024

Plan de gestión de la calidad.	Ejecutado	CALM01-048-2024
Plan de gestión de riesgos	Ejecutado	CALM01-048-2024
Identificación y caracterización de los grupos de interés.	Ejecutado	CALM01-028-2024
Plan de adquisiciones.	Ejecutado	CALM01-028-2024
Reconocimiento del aeropuerto.	Ejecutado	Acta de visita de obra del 14 de agosto de 2024.
Levantamiento topográfico utilizando coordenadas WGS84.	Ejecutado	CALM01-031-2024
Diseño Estructural	Ejecutado	CALM01-104-2024
Presentación y aprobación de proyecto ante la Electrificadora.	En ejecución	Confirmación de Aerocivil de trámite en la electrificadora por parte del concesionario.
Plan de gestión de recursos humanos	Ejecutado	CALM01-026-2024
Plan de gestión de comunicaciones	Ejecutado	CALM01-048-2024
Relación de documentación técnica para entrega y aprobación, incluyendo los planos correspondientes.	Ejecutado	Presente lista
Entrega de planos y diseño definitivo para aprobación por parte del interventor y/o supervisor.	Ejecutado	CALM01-054-2024
Plan de Seguridad Operacional.	Ejecutado	CALM01-111-2024
Plan para la dirección del proyecto	Ejecutado	CALM01-046-2024
Plan de Manejo Ambiental	Ejecutado	CALM01-113-2024
Balance de cantidades de obra	En ejecución	

Tabla 11 resumen de obligaciones de primera etapa.

SEGUNDA ETAPA

Durante el mes de julio del 2025 para la segunda etapa no se realizan actividades.

TERCERA ETAPA

Durante el mes de junio del 2025 para esta estapa se realizan trabajos correspondientes a la obra eléctrica: Construccion de Camara subterranea (Estandar Codensa CS276), Suministro e Instalación de Tablero iluminación y tomacorrientes (T .ILUM), sobreponer 220 V, 225 A, espacio para totalizador, 30 circuitos con puerta. Incluye totalizador Breaker regulable 50 A, 25 kA -220 V, 12 interruptores de 20 A, 2 interruptores de 2x30, Suministro e instalación de alimentador 2x(3x350 + 350N + 1/0T) Cu MCM THHN/THNW ,Suministro e Instalación de Tuberia IMC 3/4" con soportes cada 3 metros (incluye terminal), Suministro e Instalación de Circuito electrico 3x12 AWG Cu THHN, Suministro e Instalación de Caja Fundición Aluminio 5800, Suministro e Instalación de Reflector Sylvania IP65 50 W, Suministro e Instalación de Tuberia EMT 3/4" con soportes cada 3 metros (incluye terminal).

CUARTA ETAPA

En esta etapa se hará el traslado de los equipos y sistemas eléctricos de ayudas visuales. Suministro de luces PAPI y el sistema de control de todas las ayudas visuales. Pruebas a todos los sistemas,

capacitaciones al personal de la Aerocivil y entrega del proyecto, esta etapa tendrá una duración de tres (3) meses.

La presente etapa no se ha iniciado.

INFORMES SEMANALES

A la fecha del presente informe se han presentado por parte de contratista los siguientes informes, los cuales han sido observados por parte de la interventoría y ajustados por el contratista de obra.

INFORME SEMANAL	PERIODO	RADICACIÓN	APROBACIÓN
Informe semanal No. 52	30/06/2025-06/07/2025	09/07/2025	10/07/2025
Informe semanal No. 53	07/07/2025-13/07/2025	16/07/2025	17/07/2025
Informe semanal No. 54	14/07/2025-20/07/2025	22/07/2025	23/07/2025
Informe semanal No. 55	21/07/2025-27/07/2025	30/07/2025	08/08/2025
Informe semanal No. 56	28/07/2025-03/08/2025	04/08/2025	05/08/2025

Tabla 12 resumen de informes semanales

Anexo Nº 3 Informes semanales de contrato de obra.

BITACORA DE OBRA

Dando cumplimiento al manual de interventoría, se realiza la verificación de todas las actividades ejecutadas mediante el libro de bitácora que se mantiene permanente en la obra y en el cual se consigna con una periodicidad diaria todas las actividades realizadas e igualmente la interventoría consigna sus recomendaciones e indicaciones, así como la complementación del caso que sea necesaria para llevar registros completos.

Anexo Nº 4 Copia bitácora periodo correspondiente.

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

Duran el periodo evaluado el contratista de obra no cuenta con maquinarias y equipos permanentes en obra.

VEHÍCULO	MARCA	PLACA	OPERADOR

Tabla 13 Maquinaria ingresada

A parte de esto se hace uso de herramientas y equipos menores como andamios, tronzadora, pulidora, vibrador de concreto, para la ejecución de actividades según se necesite.

4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

Relación de los profesionales del contrato de obra:

PROFESIONAL	CARGO	RADICACIÓN HV	APROBACIÓN HV
Mario Alexander Londoño	Coordinador de obra	24/07/2024	06/08/2024
Karina Paola Mina Centena	Coordinador HSEQ	24/07/2024	06/08/2024

Nydia Cristina Durante Pretelt	Directora de obra	11/12/2024	14/12/2024
Jhonny Andrés Turizo Garizado	Residente de obra	27/07/2024	06/08/2024

Tabla 14 relacion personal profesional

En el informe SST ptresentando mensualmente por el consorcio aéreo safka se adjunta la documentación de los aportes a seguridad social del personal de obra, asi mismo para el personal técnico y operativo.

RELACION DEL PERSONAL TECNICO DEL CONTRATO DE OBRA:

PROFESIONAL	CARGO	RADICACIÓN HV	APROBACIÓN HV
Rosember García Torres	Técnico 1	12/08/2024	02/09/2024
José De Jesús García Ramírez	Técnico 2	12/08/2024	02/09/2024

Tabla 15 relacion personal técnico de obra.

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

De acuerdo con lo presentado en la programación de obra y su flujo de fondos presentada por el contratista y según el análisis financiero ejecutado durante este periodo, se presenta el siguiente desglose financiero presupuestado y ejecutado semanalmente durante este periodo.

- **INFORME PRESUPUESTAL OBRA**

SEMANA	FECHA		PROGRAMADO EN LA SEMANA ($)	PROGRAMADO ACUMULADO ($)	EJECUTADO EN LA SEMANA ($)	EJECUTADO ACUMULADO ($)	ADELANTO (+) O ATRASO (-)
	DEL	AL					
S52	30/06/2025	06/07/2025	$ 12,067,489.03	$2,086,732,145.94	$ -	$1,077,115,129.00	-$1,009,617,017.44
S53	07/07/2025	13/07/2025	$ 4,837,965.66	$2,091,570,111.60	$ 26,969,354.13	$1,104,084,483.00	-$ 987,485,628.97
S54	14/07/2025	20/07/2025	$ 1,484,746.76	$2,093,054,858.36	$ -	$1,104,084,483.00	-$ 988,970,375.73
S55	21/07/2025	27/07/2025	$ 1,484,746.76	$2,094,539,605.12	$ -	$1,104,084,483.00	-$ 990,455,122.49
S56	28/07/2025	03/08/2025	$ 10,975,241.17	$2,105,514,846.29	$ -	$1,104,084,483.00	-$1,001,430,363.66

Tabla 16 relacion información financiero semanalmente

DESCRIPCION	AVANCE FINANCIERO	AVANCE EN PORCENTAJE %
INVERSION TOTAL CONTRATADA	$ 3.205.801.629,00	100%
INVERSION TOTAL PROGRAMADA MES	$30.850.189,38	0,96%
INVERSION TOTAL EJECUTADA MES	$26.969.354,13	0,84%

Tabla 17 resumen de avance financiero y personal.

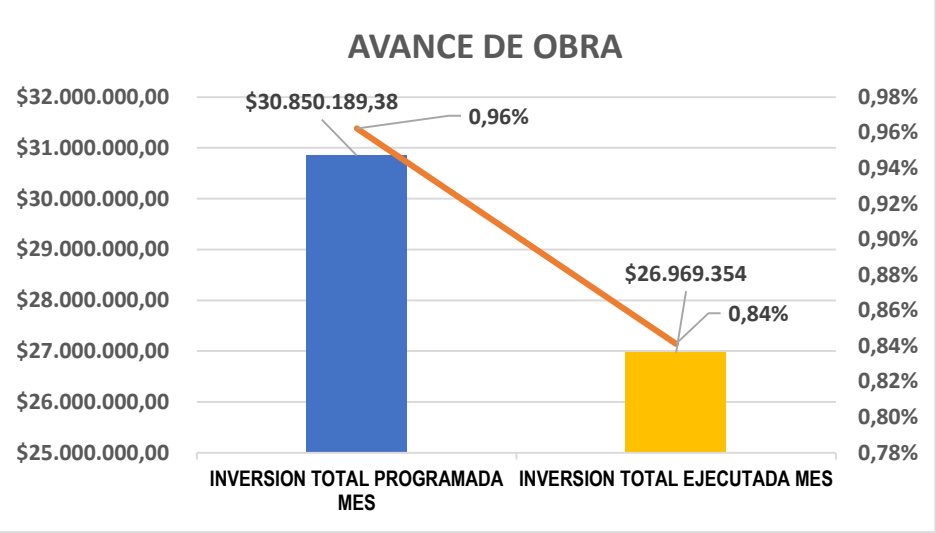


Ilustración 3 diagrama de barrras de avances mensuales.

De acuerdo con los diagramas y tablas presentadas se muestra que el contratista de obra consorcio AEREO SAFKA, para el periodo 01 de julio al 31 de julio del 2025 genero un avance financiero de **$26.969.354,00** y lo programado financieramente para este periodo es de **$30.850.189,38**.

- **INFORME FINANCIERO OBRA**

ACTAS DE OBRA	VALOR BRUTO ACTA	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	VALOR NETO (AMORTIZADO ANTICIPO)	ESTADO	% AVANCE		PAGOS
					PERIODO	ACUMULADO	
ACTA PARCIAL DE OBRA No.01	$110.808.545,00	$ 24.160.822,00	$ 86.647.723,00	PAGADO	3,46%	3,46%	PAGADO
ACTA PARCIAL DE OBRA No.02	$ 132.097.426,00	$ 28.802.674,00	$ 103.294.752,00	PAGADO	4,12%	7,58%	PAGADO
ACTA PARCIAL DE OBRA No.03	$ 248.847.088,00	$ 54.258.903,00	$ 195.833.008,00	PAGADO	9,41%	16.99%	PAGADO
ACTA PARCIAL DE OBRA No.04	$ 217,346,096.00	$ 47,390,390.00	$ 169,955,706.00	PENDIENTE	5,13%	22,12%	PENDIENTE
TOTALES	**$493.344.991,00**	**$107.569.505,00**	**$385.775.484,00**			**22,48%**	

Tabla 18 relacion de actas parciales de obra.

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Durante el mes de julio se presentaron temperaturas promedio máxima de 34°C y mínima de 24°C, con una humedad promedio baja. Durante el periodo se presentaron cinco horas de lluvias en los horarios mostrados por tanto, esto no genero retrasos en las actividades realizadas durante el mes por condiciones climáticas.

REPORTE DE LLUVIAS JULIO 2025										
AEREOPUERTO VALLEDUPAR										
Jornada Laboral	A.M				P.M				Cantidad horas	
	8:00	9:00	10:00	11:00	2:00	3:00	4:00	5:00	Horas Lluvia	Horas trabajadas
01/07/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
02/07/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
03/07/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
04/07/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
05/07/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.LL	T.LL	T.LL	T.LL	0	6
06/07/2025	DOMINGO									
7/07/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
8/07/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
9/07/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
10/07/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
11/07/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
12/07/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.LL	T.LL	T.LL	T.LL	0	6
13/07/2025	DOMINGO									
14/07/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
15/07/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
16/07/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
17/07/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
18/07/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
19/07/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.LL	T.LL	T.LL	T.LL	0	6
20/07/2025	DOMINGO									
21/07/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
22/07/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
23/07/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
24/07/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
25/07/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
26/07/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.LL	T.LL	T.LL	T.LL	0	6
27/07/2025	DOMINGO									
28/07/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
29/07/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
30/07/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
31/07/2025	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	T.S	0	8
TOTAL TIEMPO SECO/HORAS TRABAJADAS										208
TOTAL HORAS DE LLUVIA/ HORAS NO TRABAJADAS										0
PORCENTAJE DE INCIDENCIA										0%

Tabla 19 relacion de tiempo de lluvias.

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante el período del informe en mención, se llevó a cabo la validación del Plan de Inspección de Ensayos, determinando que este no aplica para las actividades ejecutadas en dicho lapso, dado que las labores realizadas no requieren los ensayos contemplados en el plan. No obstante, se continuará con el seguimiento y aplicación de los controles de calidad conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

4.7 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

El día 16/09/24 remite el oficio CALMO1-048-2024_RESPUESTA AL OFICIO No 024 – DOCUMENTOS ADICIONALES PLAN DE GESTION DE CALIDAD, donde se envía por parte de interventoría la aprobación a él Plan en mención.

Teniendo en cuenta que para la fecha ya el plan de Calidad está aprobado durante el periodo de julio del 2025 la interventoría realiza seguimiento al plan de gestión de calidad presentado por el contratista, se implementó durante este periodo con los siguientes componentes:

- ✓ Durante este periodo se implementó el Plan de Inspección y Ensayos de acuerdo con lo presentado por el contratista de obra y se describe la metodología de implementación en el capitulo de resumen de ensayos.
- ✓ Seguimiento se les realiza seguimiento a los materiales ingresados en la obra, que cuenten con sus respectivas fichas técnicas
- ✓ Para el Plan de gestión de comunicaciones durante este periodo se dio cumplimiento al plan de gestión de las comunicaciones mediante los siguientes canales:

  - Participación en comité de obras.
  - Envío de documentación formal de acuerdo con los oficios enviados.
  -Realizacion de mesas de tarabajo constantes entre contratsita de obra e inteventoria.

- ✓ Para el mes de junio se realiza la evaluación de la Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, y se verifica que durante este periodo no se presentó ningún incidente o accidente que vulnere la establecido dentro de los riesgos evaluados por actividades realizadas.

Anexo Nº 5 Fichas técnicas de los materiales.

4.9 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

Durante el mes de noviembre del 2024 la interventoría aprobó dos desembolsos por valor de **$51.195.553,00** correspondiente al **7,32%** del total del anticipo.

Durante el mes de diciembre del 2024 la interven|oria aprobó dos desemobolsos por valor de **$25.000.000**, correspondiente al **3,58%** del total del anticipo.

Durante el mes de enero del 2025 la interventoria aprobó tres desembolsos por valor de **$622.801.087,00** correspondiente al **89,10%** del total del anticipo**.**

Es decir que para el mes de enero el anticipo del contratista de obra hasta la fecha lleva un valor de desembolsos acumulado del **$698.996.649,00** correspondiente al **100%** del total del anticipo.

Para la fecha de este informe el anticipo se encuentra liquidado para el contratista de obra.

4.10 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIÓN

No aplica para el periodo.

4.11 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA

4.11.1 ETAPA 1

La ejecución de esta etapa ya concluyó el día 19 de septiembre de 2024, se está a la espera de la revisión Plan de Seguridad Operacional y la entrega de documentos por parte de la Aerocivil para que el contratista efectúe presentación y aprobación de proyecto ante la Electrificadora y la presentación del balance de cantidades de obra por parte del contratista para proceder con la firma del acta de apropiación del diseño.

4.11.2 ETAPA 2

De acuerdo con la programación se presenta el siguiente cuadro donde relacionan los porcentajes de avance semanales proyectados y ejecutados por el contratista durante el periodo evaluado.

SEMANA	FECHA		PROGRAMADO EN LA SEMANA %	PROGRAMADO ACUMULADO %	EJECUTADO EN LA SEMANA %	EJECUTADO ACUMULADO %	ADELANTO (+) O ATRASO (-)
	DEL	AL					
S52	30/06/2025	06/07/2025	0.38%	65.09%	0.00%	33.60%	-31.49%
S53	07/07/2025	13/07/2025	0.15%	65.24%	0.84%	34.44%	-30.80%
S54	14/07/2025	20/07/2025	0.05%	65.29%	0.00%	34.44%	-30.85%
S55	21/07/2025	27/07/2025	0.05%	65.34%	0.00%	34.44%	-30.90%
S56	28/07/2025	03/08/2025	0.34%	65.68%	0.00%	34.44%	-31.24%

Tabla 20 resumen de avance procentual semanalmente.

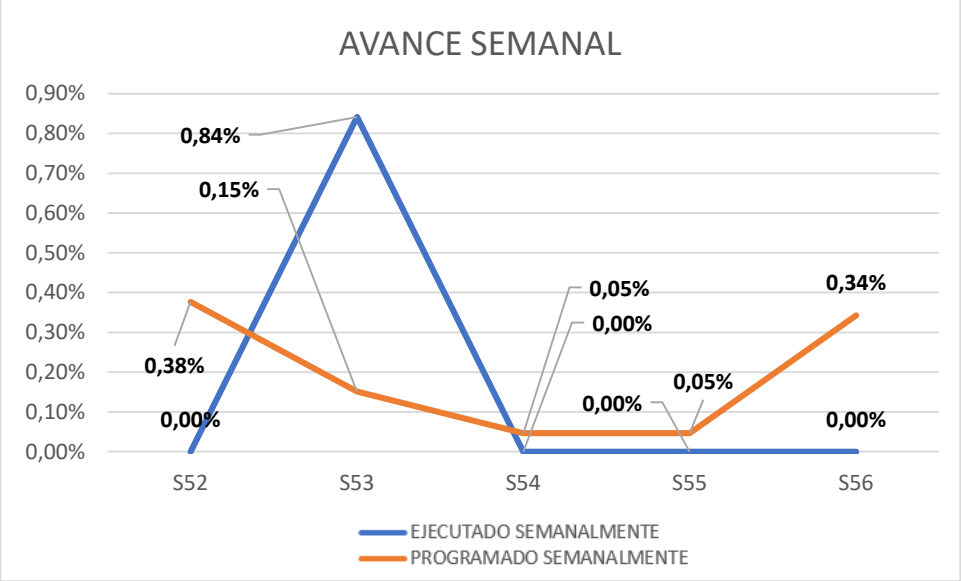


Ilustración 4 diagrama avance porcentual semanalmente.

La gráfica nos presenta el comportamiento de los avances ejecutados y programados semanales mostrando un comportamiento descendente en los avances ejecutados con respecto al avance programado.

- A continuacion se presenta en resumen el avance mensual a la fecha del contrato de obra:

CUADRO DE AVANCE PORCENTUAL MENSUAL		AVANCE MENSUAL FINACIERO
TOTAL CONTRATO	100%	$3.205.801.629,00
AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO	65,68%	$2.105.514.846,29
AVANCE EJECUTADO ACUMULADO	34,44%	$1.104.059.027,57
ATRASO(-) / ADELANTO (+) ACUMULADO	-31,12%	-$997.574.983,47

Tabla 21 resumen mensual porcentual Y financiero.

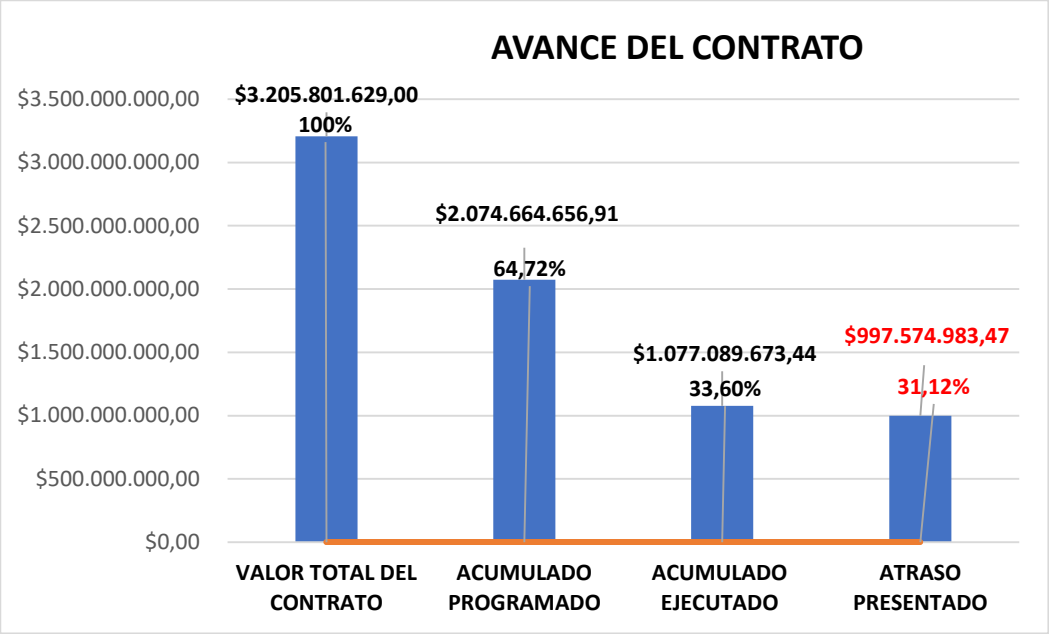


Ilustración 5 diagrama avance porcentual y financiero mensual.

4.11.3 ETAPA 3

No se ha iniciado esta etapa.

5. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1 CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES

Las siguientes son las obligaciones de la interventoría en cada una de las etapas de desarrollo del proyecto:

ETAPA 1 DE APROPIACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS

Durante el mes de diciembre de 2024, la interventoría realizó el seguimiento de los estudios y diseños que estaban en trámite, de los cuales están todos aprobados, a excepción de: Presentación y aprobación de proyecto ante la Electrificadora y el balance de cantidades de obra, adicionalmente falta la aprobación del Plan de seguridad Operacional por parte de la entidad. Ver Tabla 7 de las páginas 15 y 16.

ETAPA 2 DE CONSTRUCCION

El proceso constructivo inició el 20 de septiembre de 2024, al cual la interventoría ha venido realizando seguimiento para la aprobación de las obras de construcción y ejecución de actividades de obra, esta etapa será el tiempo restante del plazo de ejecución después de la etapa de apropiación.

ETAPA 3 DOCUMENTACIÓN

Dentro de la etapa de construcción, la interventoría realizará el seguimiento y control a la entrega de planos récord, diagnósticos, carteras, memorias, manual de mantenimiento y demás documentos soporte, para el recibo a satisfacción de las obras, antes de la terminación del plazo contractual del contrato de interventoría.

5.2. PERSONAL, CONTROL APORTE LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Mediante la comunicación CALM01-053-2024 del 24 de septiembre de 2024 se presentaron subsanadas las hojas de vida de plantilla mínima para el contrato de interventoría, de las cuales se encuentran aprobados el director de interventoría, el especialista, el residente, la residente civil, en estudio el inspector. Se presentó la novedad del retiro del profesional SST dentro del periodo de prueba, a quien se le cancelaron todos los servicios prestados a el consorcio.

CONTRATO DE INTERVENTORIA 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 1				
No. orden	**CARGO**	**NOMBRE Y APELLIDOS**	**PROFESION**	**DEDICACION**
PERSONAL PROFESIONAL				
1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	ALEJANDRO FAVIO RUIZ GARCES	INGENIERO ELECTRICO	20%
2	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	NICOLAS COBOS	INGENIERO ELECTRICO	100%
3	RESIDENTE SST-AMBIENTAL	LAURA MURILLO	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	100%
4	RESIDENTE CIVIL	ADRIANA SOTO CARDENAS	ARQUITECTA	47%
5	INGENIERO ESPECIALISTA	ALEJANDRO FAVIO RUIZ GARCES	INGENIERO ELECTRICO	63%
PERSONAL TECNICO				
6	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	FABIAN GRANADOS MONTES	TECNOLOGO	60%

Tabla 22 resumen personal profesional de interventoria.

5.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

- El día 29 de noviembre de 2024, la interventoría radico una cuenta de cobro parcial correspondiente al cobro de la parte 1, la etapa de apropiación y parte 2 la etapa de construcción, por el corte del 9 de agosto de 2024 al 9 de noviembre de 2024, cargos fijos y costos indirectos entre el 9 de julio al 8 de noviembre de 2024 y gastos reembolsables por un valor de **$ 71.788.311,99**, hasta la fecha esta acta parcial ya se enuentra pagada por la entidad.

- Durante el mes de marzo; el día 20 de marzo del 2025, la interventoría radico una cuenta de cobro parcial correspondiente al cobro de la parte 2 la etapa de construcción, por el corte del 9 de noviembre

del 2024 al 8 de marzo del 2025, cargos fijos y costos indirectos y gastos reembolsables por un valor de **$108.646.374,00**.

- Durante este periodo el dia 14 de junio del 2025, la interventoría radico una cuenta de cobro parcial correspondiente al cobro de la parte 2 la etapa de construcción, por el corte del 9 de marzo del 2024 al 8 de junio del 2025, cargos fijos y costos indirectos y gastos reembolsables por un valor **$102.974.646,00** hasta la fecha se encuentra radicada en espera de aprobación por parte de la entidad contratante.

ACTAS PARCIALES	VALOR BRUTO	VALOR A PAGAR	ESTADO	PERIODO
ACTA PARCIAL No.01	$60.326.313	$71.788.311,99	PAGADA	9 de julio al 8 de noviembre de 2024
ACTA PARCIAL No.02	$91.299.473,95	$108.646.374,000	PAGADA	9 de noviembre de 2024 al 8 de marzo de 2025.
ACTA PARCIAL No.03	$86.533.315,97	$102.974.646,00	PAGADA	Del 9 de marzo de 2025 al 8 de junio del 2025
TOTALES	**$238.159.102,92**	**$283.409.331,99**		

Tabla 23 resumen actas parciales de interventoria.

5.4 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

A la fecha no se han presentado informes de especialistas toda vez que no aplican.

6. INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

Contrato de Obra

Contrato de interventoría

A la fecha no aplica este ítem, ni para el contrato de obra ni para el contrato de interventoría.

7. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

COMITÉ	FECHA	OBSERVACIÓN
COMITÉ DE OBRA No. 42	02/07/2025	N/A
COMITÉ DE OBRA No. 43	08/07/2025	N/A
COMITÉ DE OBRA No. 44	25/07/2025	N/A

Tabla 24 resumen de comités relizados.

Anexo N° 6 Actas de comité.

8. ACTAS DE REUNIÓN/MESAS DE TRABAJO

REUNIONES	FECHA	OBSERVACIÓN
		N/A

Tabla 25 resumen de actas de reunión realizadas.

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

- Durante este periodo y como seguimiento al cronograma y flujo de fondos presentados por el contratista, se evidencio un retraso correspondiente al -**3124%,** lo que implica un déficit de inversión del **$1.001.455.18,72** Lo cual es de gran preoucpacion para esta interventoria.
- Para este periodo se esta en revisión por parte de las partes los INP,APUS civiles y eléctricos para asi tener un balance final de mayores y menores cantidades para la ejecución del proyecto.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda que los trámites donde participe el concesionario del aeropuerto se hagan con suficiente antelación, para poder cumplir con programación del proyecto.
- Se recomienda realizar un plan de acción para poder mitigar el atraso presentando actualemente para que asi se puede superar dicho atraso y el contrato siga avazando conforme al cronograma.

10. ANEXOS

ANEXO N° 1
REGISTRO FOTOGRAFICO

SEMANA 53 (DEL 07 DE JULIO AL 13 DE JULIO)







ANEXO N° 2
POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101464081	0

FECHA EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
21	06	2024	10	06	2024	00:00	10	10	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO ALMOBRA I	NIT. 901.639.761-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 6 NRO. 66 - 36 OF 308	MONTERIA, CORDOBA	3004396974

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	NIT. 830.800.326-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO NRO. 103 - 15	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	4251000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE NO SUFRAN ENMIENDA, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN ESTA CARÁTULA, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL USO DE LOS ANTICIPOS ENTREGADO DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES NOTADAS EN EL CONTRATO NO. 23001308 H3 DE 2023 – LOTE 1 QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE LA SUBESTACION DE ENERGIA; Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES PAPI DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR (VF).

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/06/2024	10/01/2030	$281,913,790.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	10/06/2024	10/10/2030	$187,941,860.00
CALIDAD DEL SERVICIO	10/10/2025	10/10/2030	$187,941,860.00

ACLARACIONES

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
CONSORCIO ALMOBRA I	901639761-4	70.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	830800326-1	30.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ****3,688,301.80	$ ******20,000.00	$ ******704,776.00	$ ********4,414,128.00	$ ******656,666,510.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ROSALIA ISABEL PEREZ OJEDA	320424	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASSEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-617983 - BOGOTA, D.C.


21-44-101464081

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 601-2188877, 601-6616000

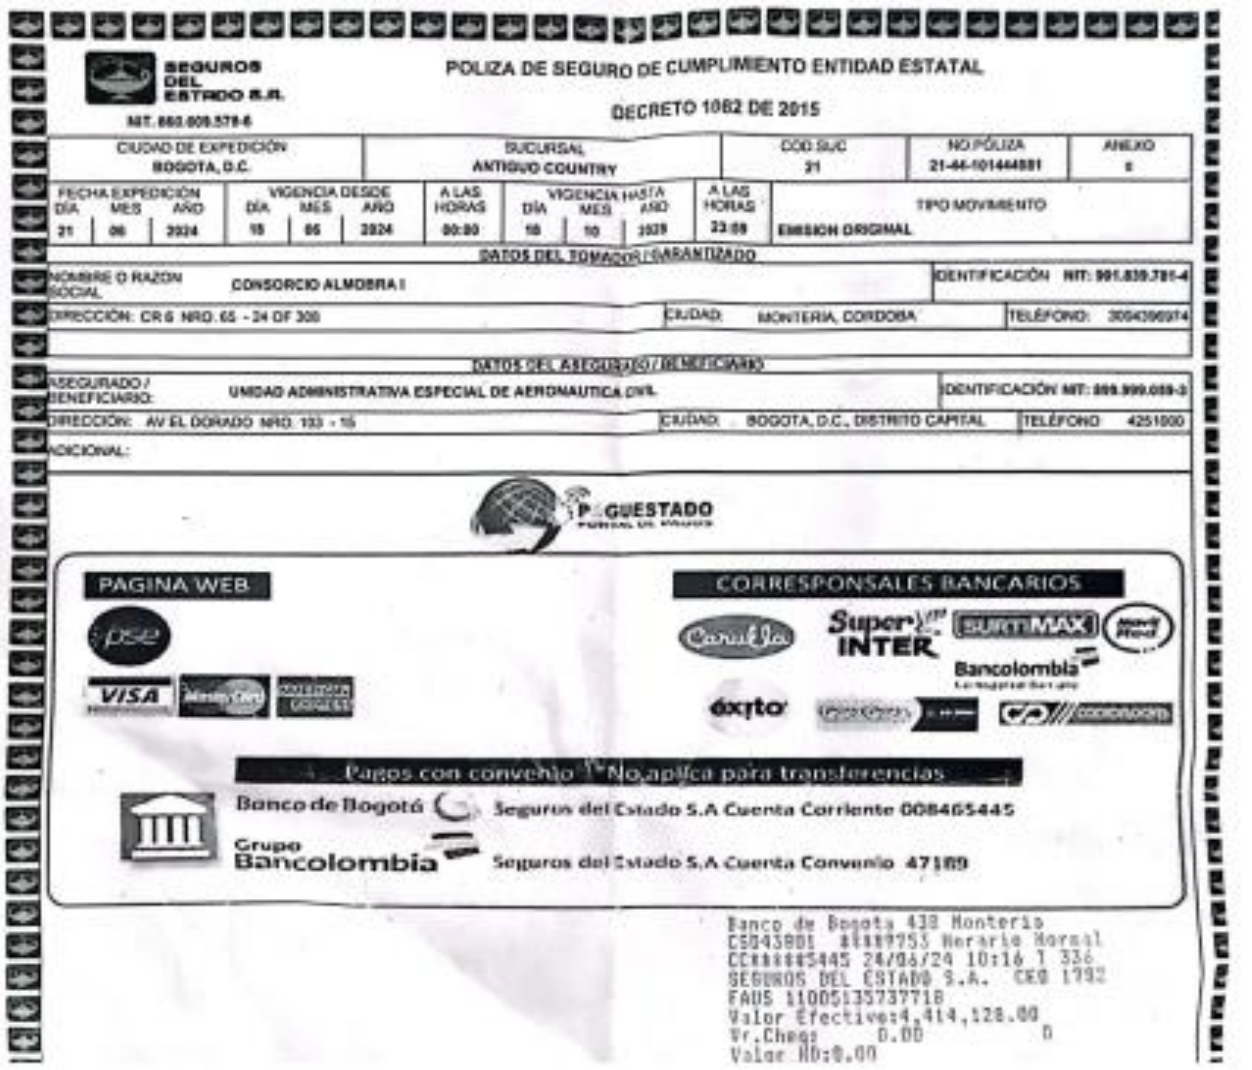

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	31	21-46-101444881	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
21	06	2024	15	06	2024	00:00	15	10	2029	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR/GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO ALMOBRA I	NIT: 901.839.781-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 6 NRO. 65 - 24 OF 300	MONTERIA, CORDOBA	3004396974

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	NIT: 830.999.059-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO NRO. 103 - 15	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	4251000

ADICIONAL:

PAGUESTADO

PAGINA WEB


CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio * No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogota 438 Monteria
CS043001 ##889753 Horario Normal
CC######5445 24/06/24 10:16 T 336
SEGUROS DEL ESTADO S.A. CE0 1792
FAUS 1100513573718
Valor Efectivo:4,414,128.00
Vr.Cheq: 0.00 0
Valor ND:0.00

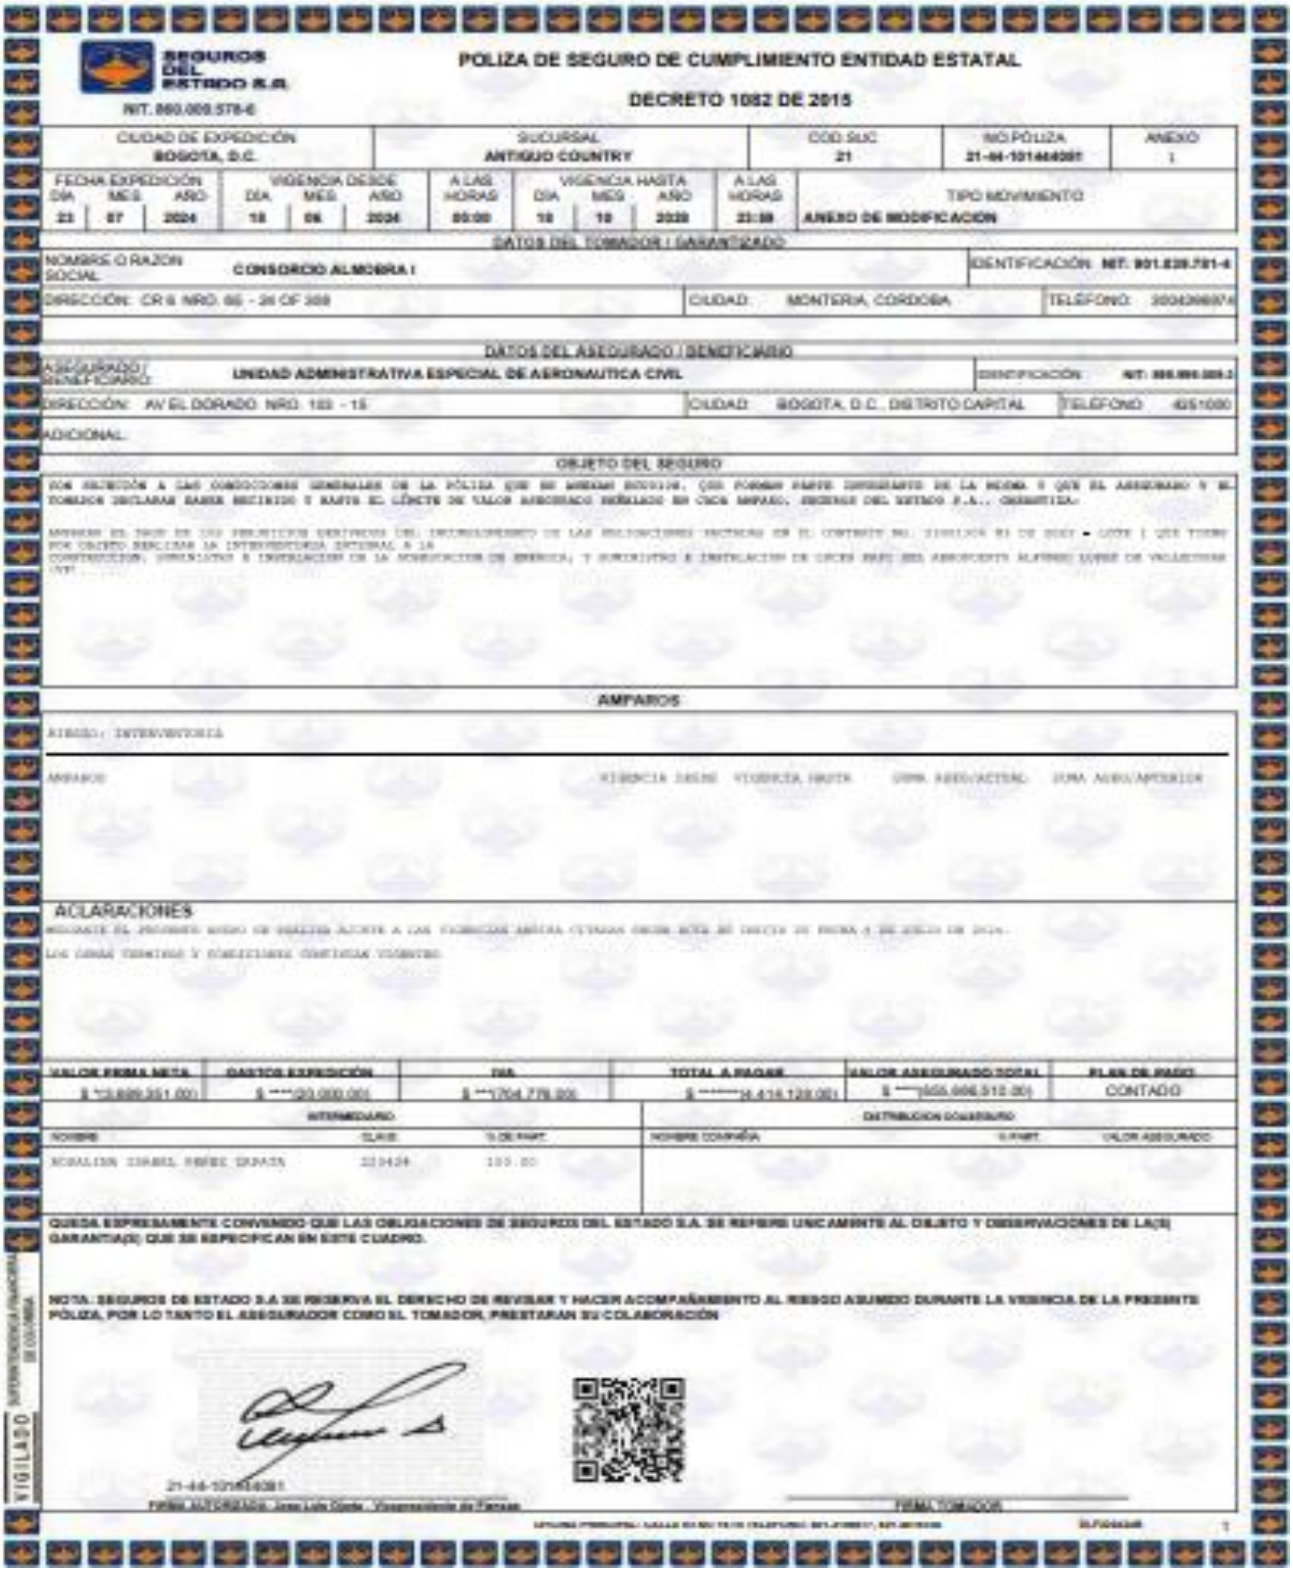

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101464081	1

FECHA EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	07	2024	10	06	2024	00:00	10	10	2028	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CONSORCIO ALMOBRA I — IDENTIFICACIÓN: NIT. 901.639.781-6

DIRECCIÓN: CR 6 NRO. 65 - 26 OF 308 — CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA — TELEFONO: 3004306974

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL — IDENTIFICACIÓN: NIT. 800.094.329-2

DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15 — CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELEFONO: 4251000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

SIN PERJUICIO A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN DOBLAN, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO No. 23001308 H3 DE 2023 – LOTE 1 QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE LA SUBESTACION DE ENERGIA; Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES PAPI DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR (VF).

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/APERTURA

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICA ACORDE A LAS CONDICIONES ANTES CITADAS DESDE ESTA FECHA Y HASTA EL 10 DE OCTUBRE DE 2028.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ROSALIA ISABEL PEREZ OJEDA	231424	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

21-44-101464081

FIRMA AUTORIZADA: Juan Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101466851	1

FECHA EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	07	2024	19	06	2024	00:00	19	10	2025	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO ALMOBRA I	NIT. 901.639.761-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 6 NRO. 65 - 24 OF 308	MONTERIA, CORDOBA	3008396974

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	NIT. 830.800.038-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELEFONO
AV EL DORADO NRO. 103 - 15	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	4251000

ADICIONAL:

PAGUESTADO

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *(3.688.351.00)	$ ***(20.800.00)	$ ***(704.776.00)	$ ******(4.414.138.00)	$ ****(665.686.510.00)	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ROSALDO GABRIEL PEREZ GARCIA	220429	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO CUAL EL ASEGURADO COMO EL TOMADOR PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO 4-917963 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101225043	1

FECHA EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	07	2024	10	06	2024	00:00	10	10	2025	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO ALMOBRA I	NIT. 901.829.781-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 6 NRO. 65 - 24 OF 209	MONTERIA, CORDOBA	[illegible]

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	NIT. 830.000.396-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO NRO. 103 - 15	BOGOTA, D.C. DISTRITO CAPITAL	6251000

BENEFICIARIO: [illegible] - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

OBJETO DEL SEGURO

[illegible]

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
[illegible]					

ACLARACIONES

[illegible]

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *(1.840.712.00)	$ ****(20.000.00)	$ ***(301.536.00)	$ *******(1.362.247.08)	$ ****(240.000.000.00)	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
ROSALINA ISABEL PEREZ DAVILA	333434	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CONDRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN


PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 82 NO 19-70 - TELEFONO: 8-917663 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

21-40-101225043

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

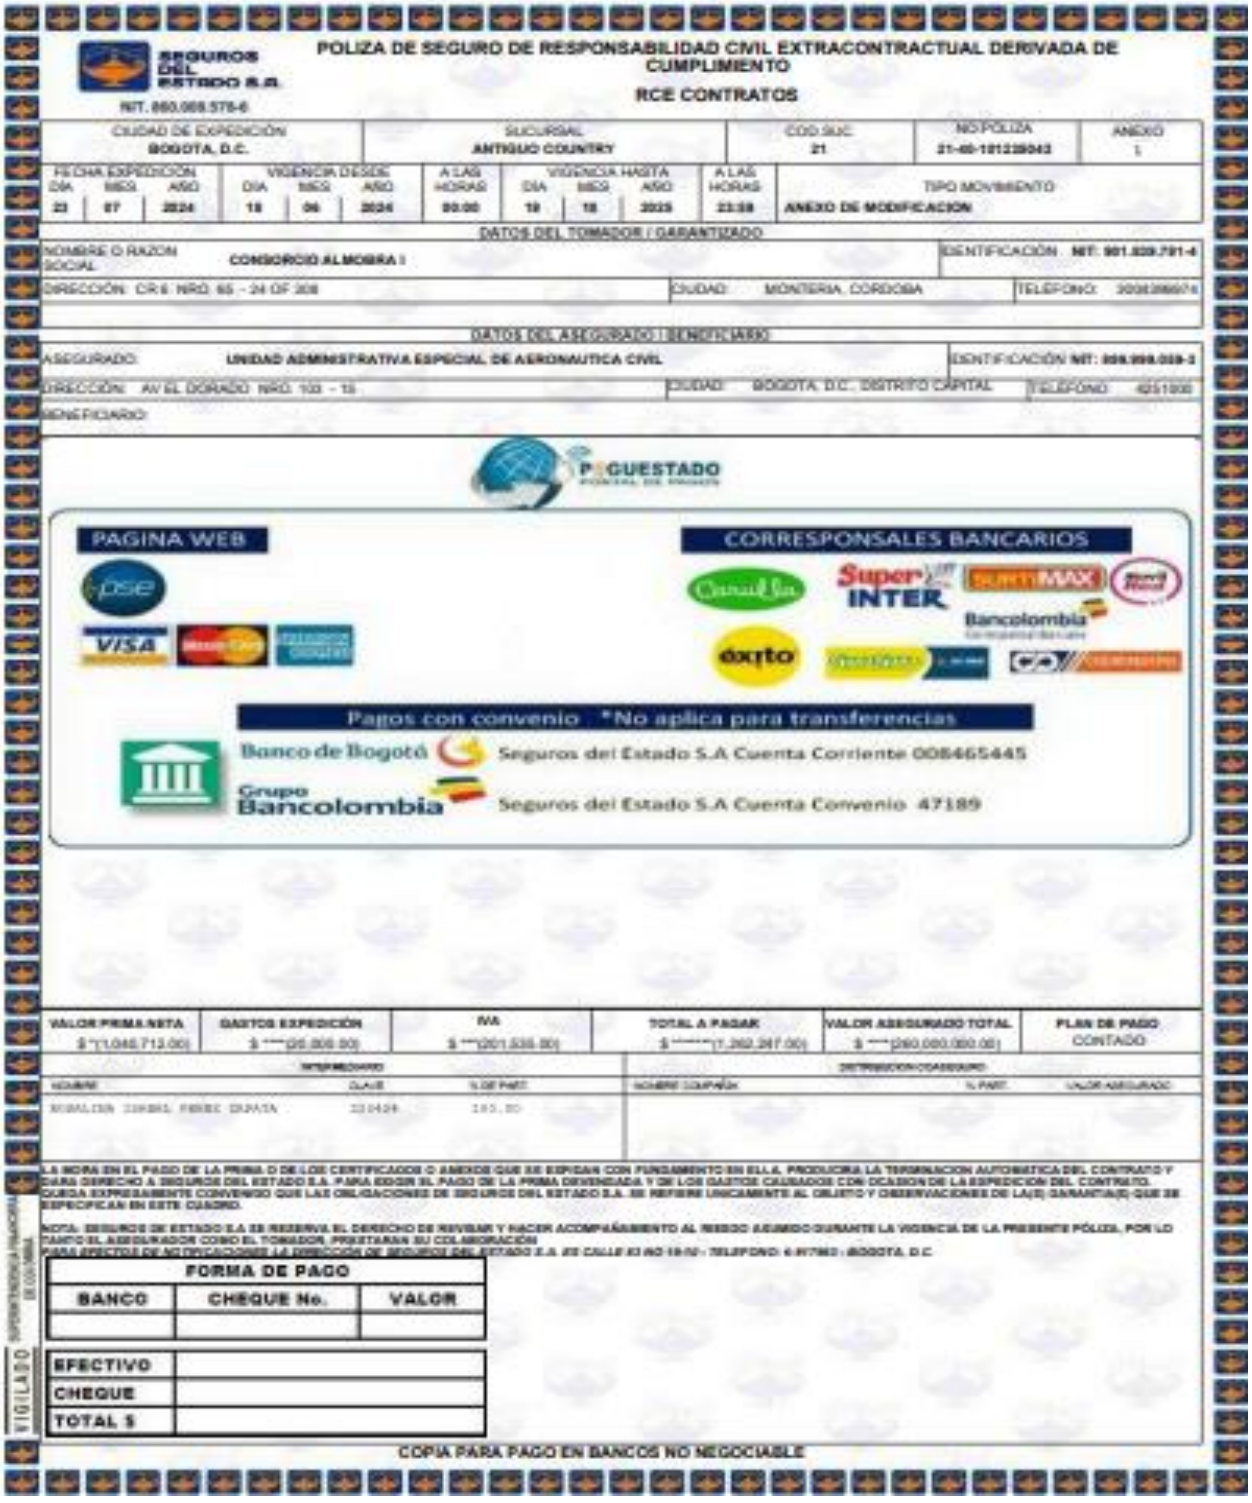

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101239043	1

FECHA EXPEDICION DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	07	2024	18	06	2024	00:00	19	10	2025	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CONSORCIO ALMOBRA I — IDENTIFICACIÓN: NIT. 901.639.791-4

DIRECCIÓN: CR 6 NRO. 65 - 24 OF 308 — CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA — TELEFONO: 3008388674

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL — IDENTIFICACIÓN: NIT: 830.999.059-3

DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15 — CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELEFONO: 4251000

BENEFICIARIO:

PAGUESTADO

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *(1.046.713.00)	$ ***(26.806.00)	$ ***(201.536.00)	$ ******(1.262.247.00)	$ ***(260.000.000.00)	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ROSALBA ISABEL PEREZ OJEDA	22428	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN


PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-52 - TELEFONO: 6-917983 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

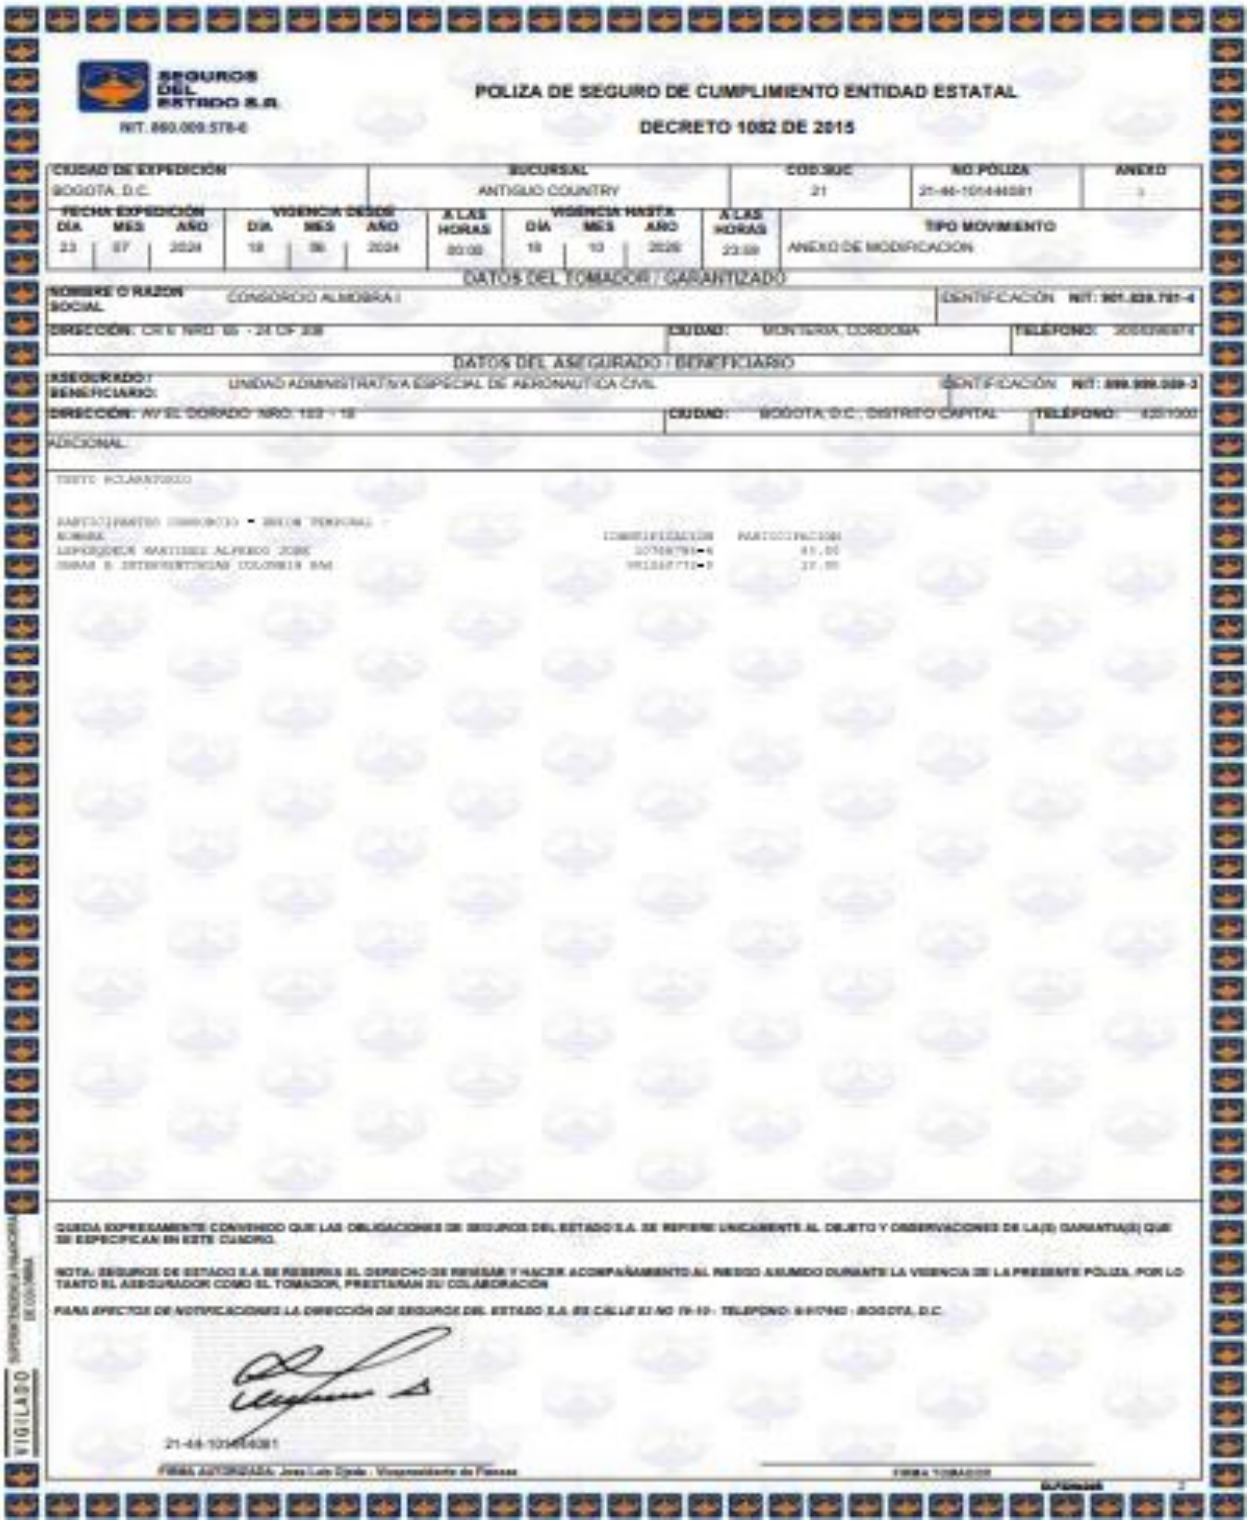

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101446081	1

FECHA EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	07	2024	19	06	2024	00:00	19	10	2026	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CONSORCIO ALMOBRA I — IDENTIFICACIÓN NIT: 901.639.781-4

DIRECCIÓN: CR 6 NRO. 65 - 24 OF 308 — CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA — TELEFONO: 3005296974

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL — IDENTIFICACIÓN NIT: 830.999.089-3

DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15 — CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELEFONO: 4201000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
LEOPOLDO MARTINEZ ALFARO JOSE	1076878[illegible]-6	49.00
OHMAS S INTERVENTORIAS COLOMBIA SAS	9012687[illegible]-9	51.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN


PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 67 NO 7A-37 - TELEFONO: 6-917460 - BOGOTA, D.C.

21-44-101446081

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

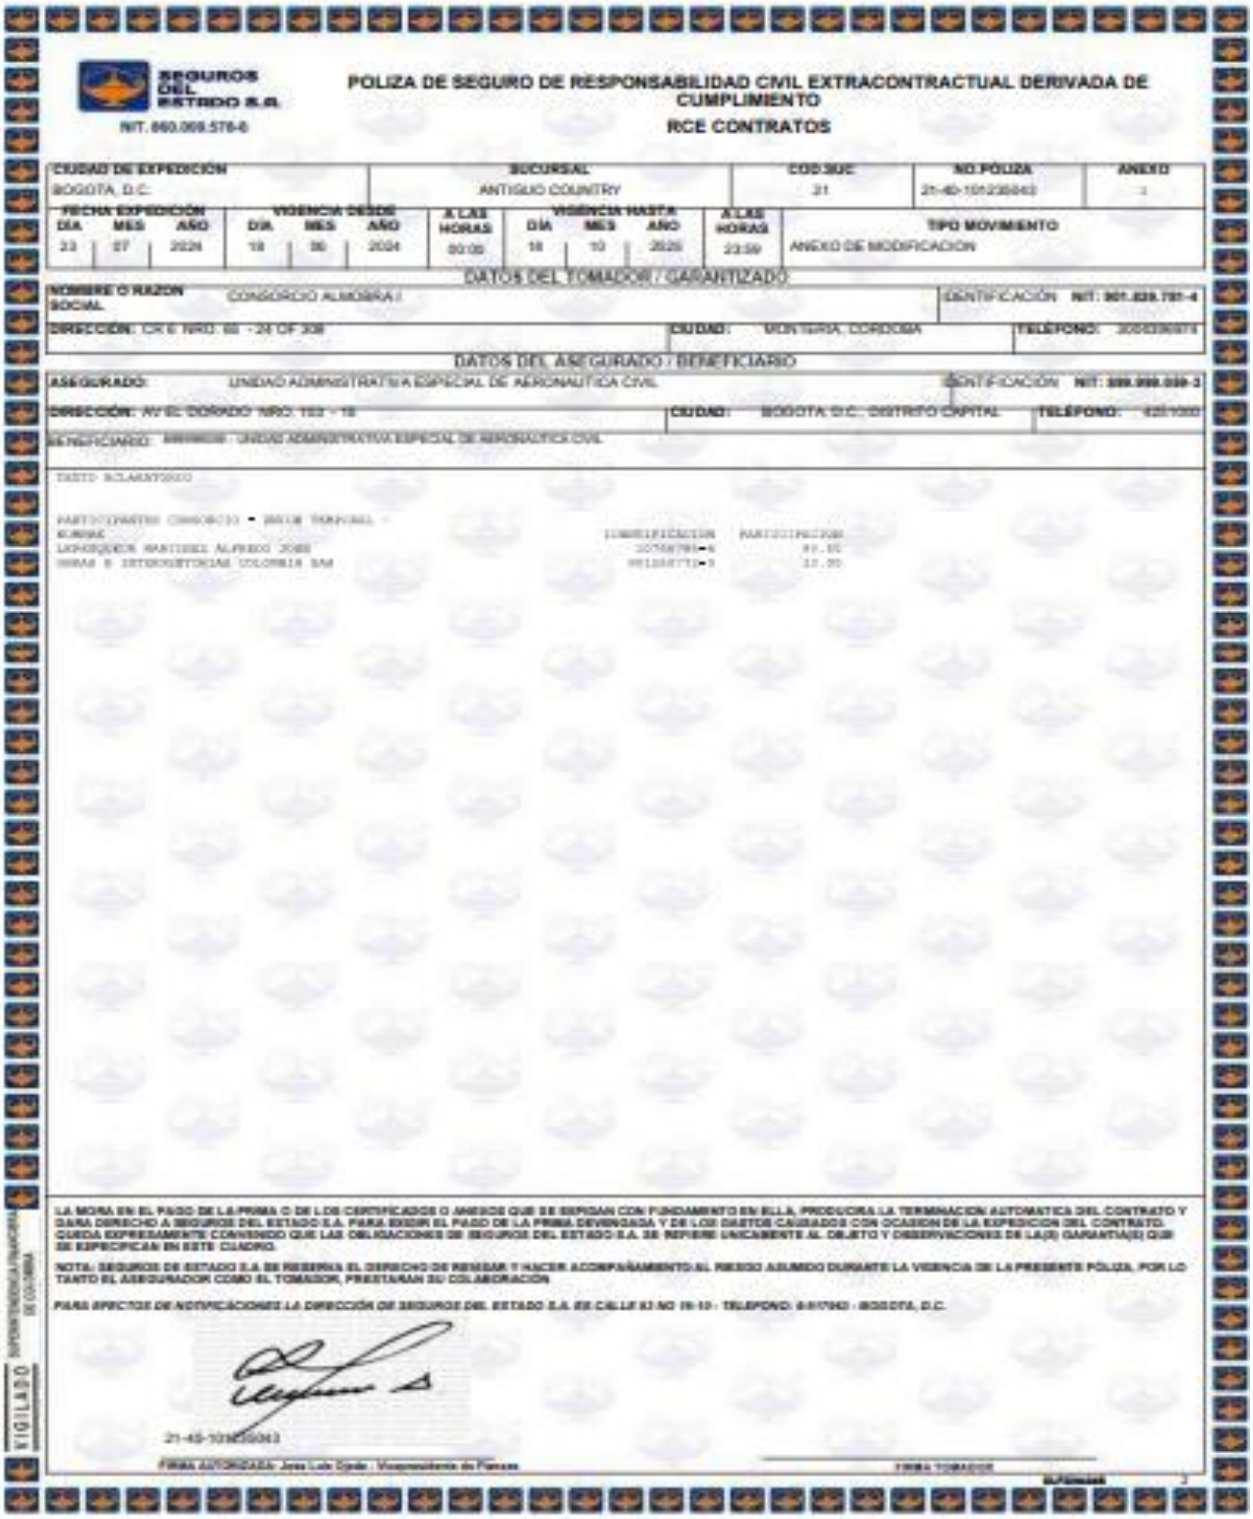

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	31	21-40-101230043	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	07	2024	18	06	2024	00:00	18	10	2025	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CONSORCIO ALMOBRA I — IDENTIFICACIÓN: NIT. 901.628.781-4

DIRECCIÓN: CR 6 NRO. 60 - 24 OF 308 — CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA — TELÉFONO: 3006390878

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL — IDENTIFICACIÓN: NIT. 830.000.030-3

DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15 — CIUDAD: BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO: 4251000

BENEFICIARIO: [redacted] - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

OBJETO: ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - PARTIC PORCENTUAL

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
CONSORCIO ALMOBRA ALFONSO LOPEZ	1075678[illegible]-5	51.00
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA SAS	901[illegible]-3	49.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN


PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 16-10 - TELEFONO: 6-017043 - BOGOTA, D.C.

21-40-101230043

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Planeas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

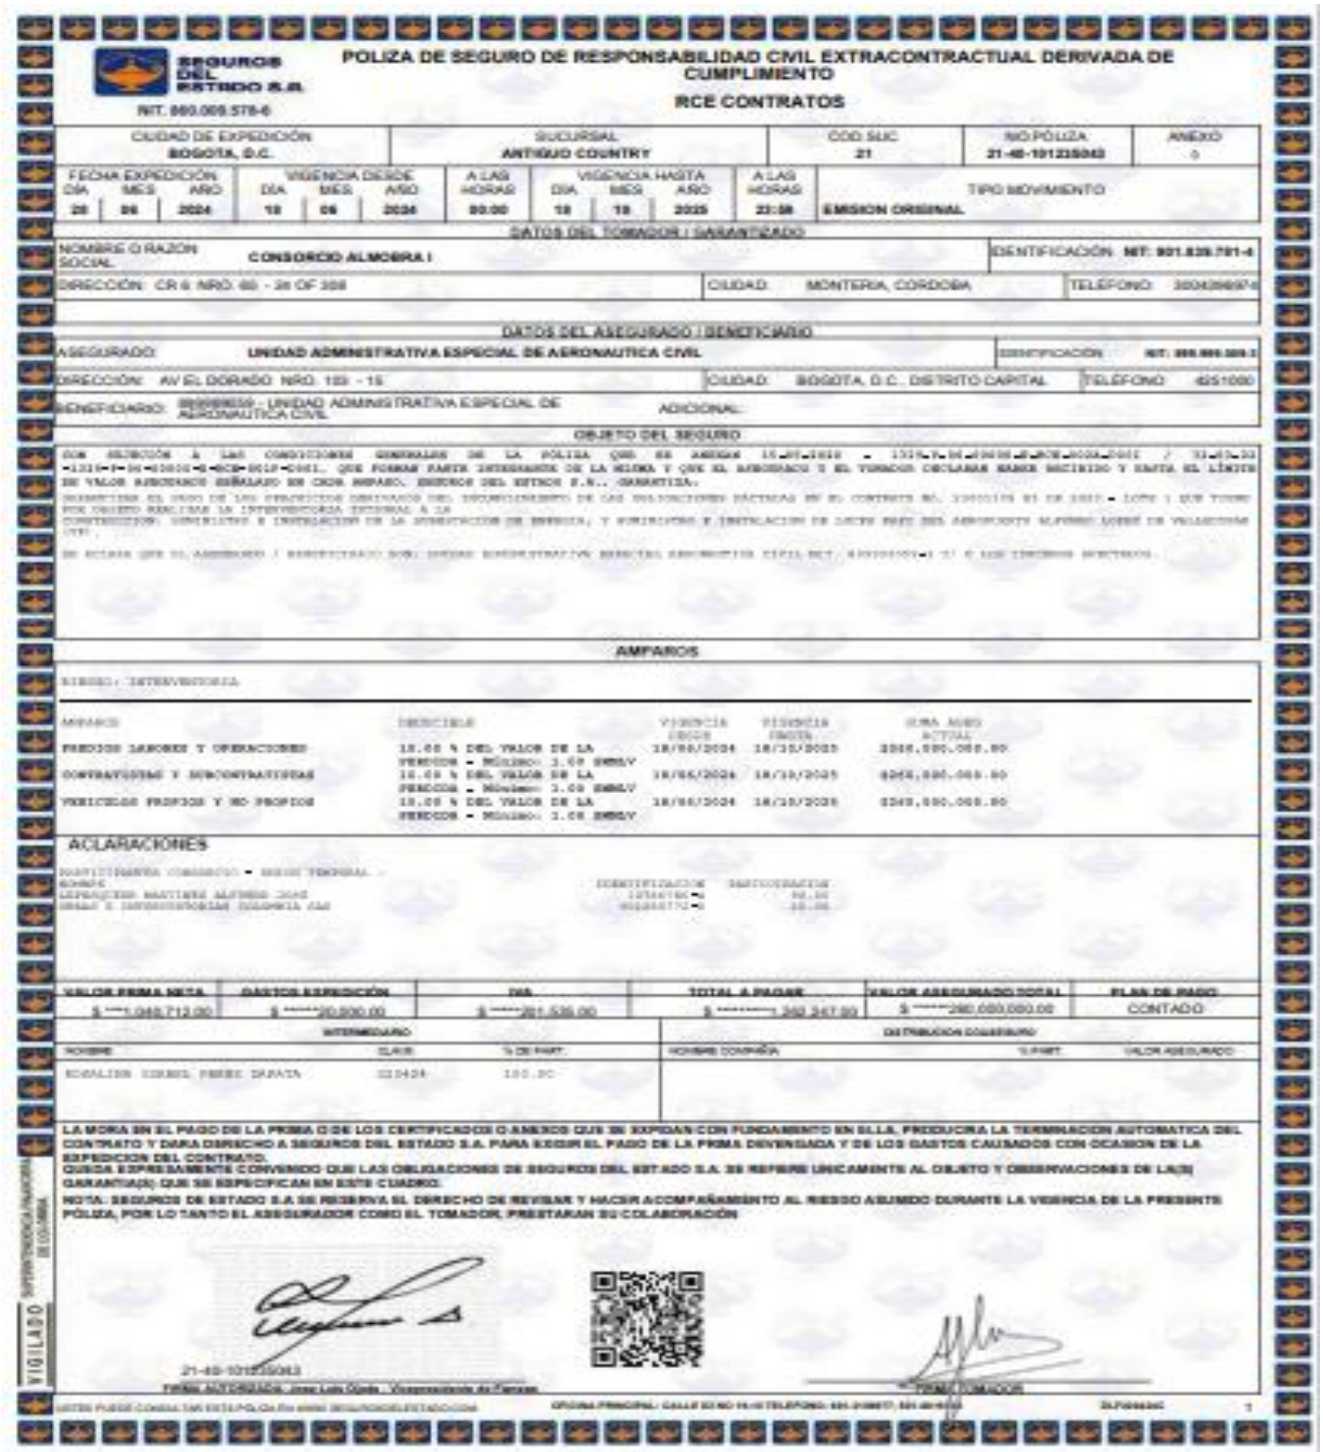

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101235043	0

FECHA EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	06	2024	18	06	2024	00:00	18	10	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CONSORCIO ALMOBRA I — IDENTIFICACIÓN: NIT. 901.639.791-4

DIRECCIÓN: CR 6 NRO. 65 - 36 OF 308 — CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA — TELÉFONO: 3004286974

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL — IDENTIFICACIÓN: NIT. 800.999.329-3

DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15 — CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO: 4251000

BENEFICIARIO: [illegible] - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL — ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA QUE SE ANEXAN 18-07-2024 - 1320-7-99-20000-4-CCB-0012-0001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y SANTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN ESTE AMPARO, EXCESO DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS OBTENIDOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO No. 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 1 QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE LA SUBESTACION DE ENERGIA, Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES PAPI DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR (VF).

SE ACLARA QUE EL ASEGURADO / BENEFICIARIO ES LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL NIT. 800.999.329-3 Y A LOS TERCEROS AFECTADOS.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPARO	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PERDIDAS SALARIOS Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 3.00 SMMLV	18/06/2024	18/10/2025	$260,000,000.00
CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 3.00 SMMLV	18/06/2024	18/10/2025	$260,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 3.00 SMMLV	18/06/2024	18/10/2025	$260,000,000.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ [illegible]1.048.712,00	$ [illegible]20.000,00	$ [illegible]201.535,00	$ [illegible]1.269.247,00	$ [illegible]260.000.000,00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ECHALUX COMEX FREE ZONAS	03434	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN


21-40-101235043

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 33 NO 14-10 TELEFONO: 601-3180877, 601-4814000

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

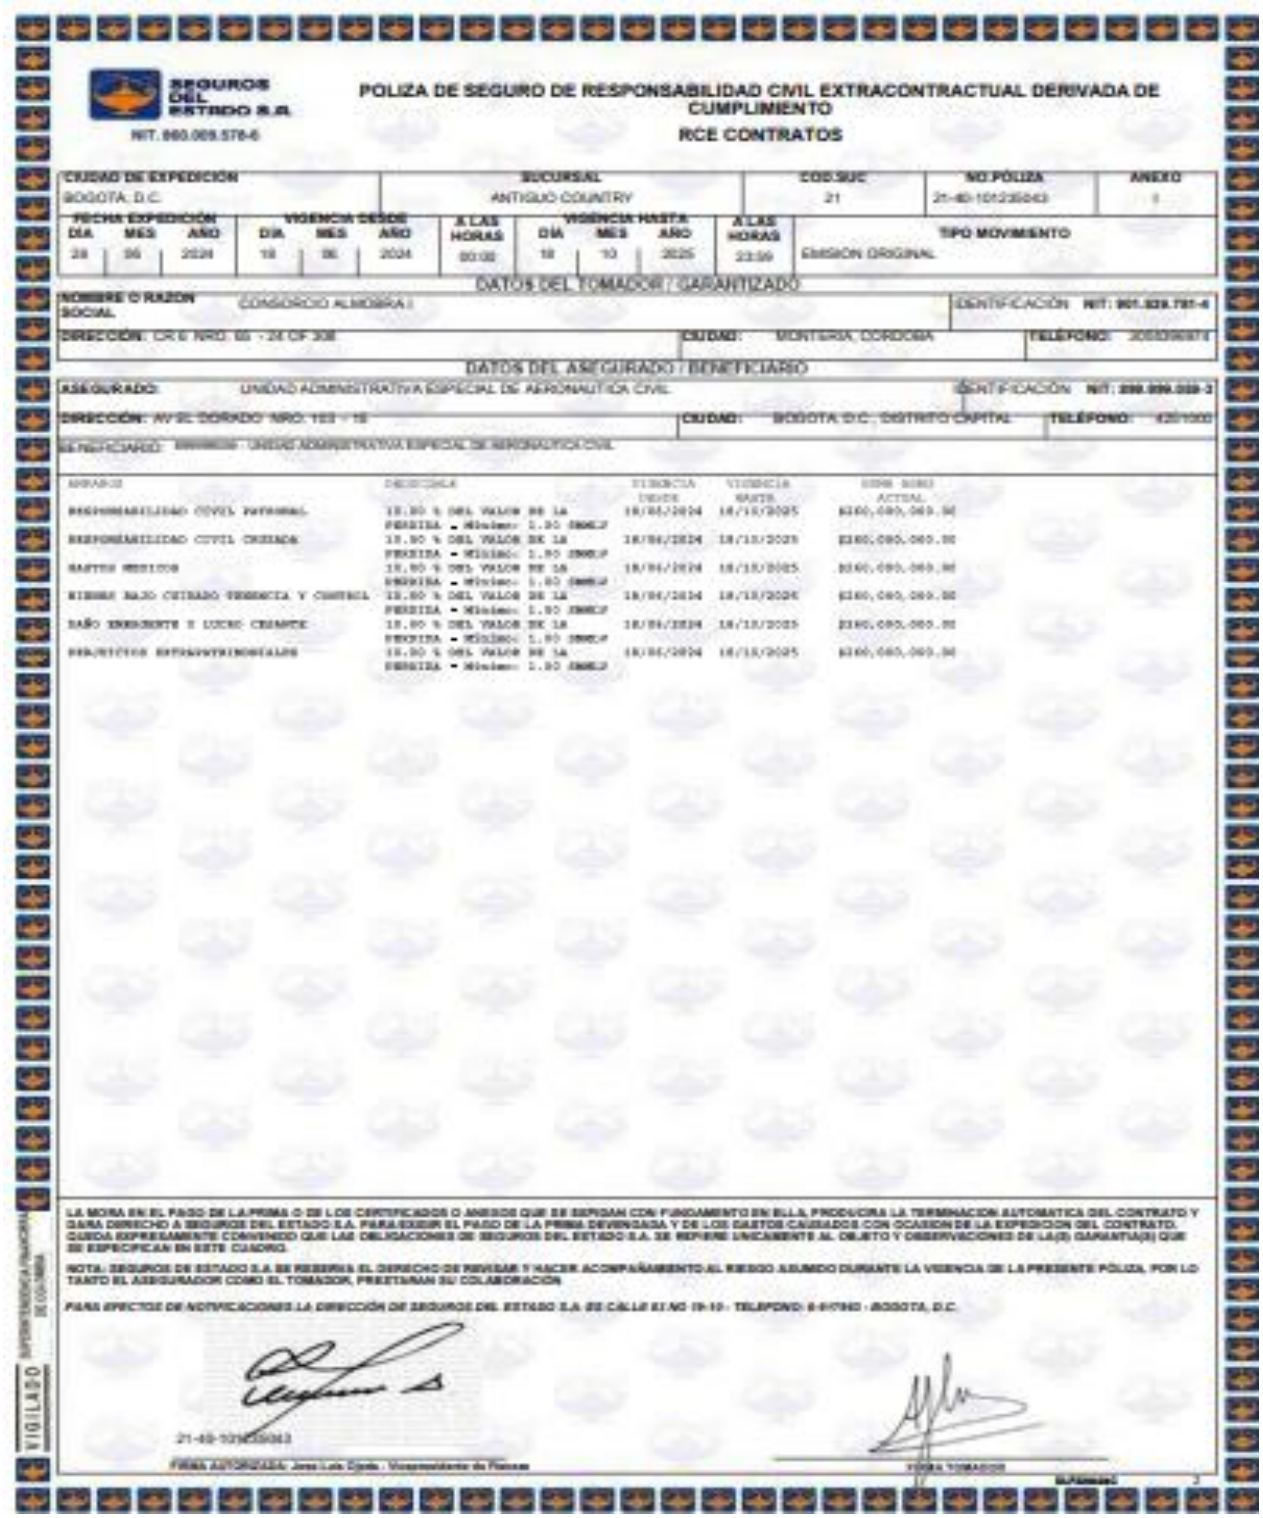

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101235043	0

FECHA EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	06	2024	18	06	2024	00:00	18	10	2025	23:59	EMISIÓN ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CONSORCIO ALMOBRA I — IDENTIFICACIÓN: NIT: 901.529.791-6

DIRECCIÓN: CR 6 NRO. 65 - 24 OF 308 — CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA — TELÉFONO: 2053090871

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL — IDENTIFICACIÓN: NIT: 830.059.038-3

DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15 — CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO: 4201000

BENEFICIARIO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

AMPARO	DESCRIPCIÓN	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG. ACTUAL
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV	18/06/2024	18/10/2025	$260,000,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV	18/06/2024	18/10/2025	$260,000,000.00
GASTOS MEDICOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV	18/06/2024	18/10/2025	$260,000,000.00
BIENES BAJO CUIDADO TENENCIA Y CONTROL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV	18/06/2024	18/10/2025	$260,000,000.00
DAÑO AMBIENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV	18/06/2024	18/10/2025	$260,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV	18/06/2024	18/10/2025	$260,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION


PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 81 NO 19-18 - TELEFONO: 6-917940 - BOGOTA, D.C.

21-40-101235043

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Planeas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

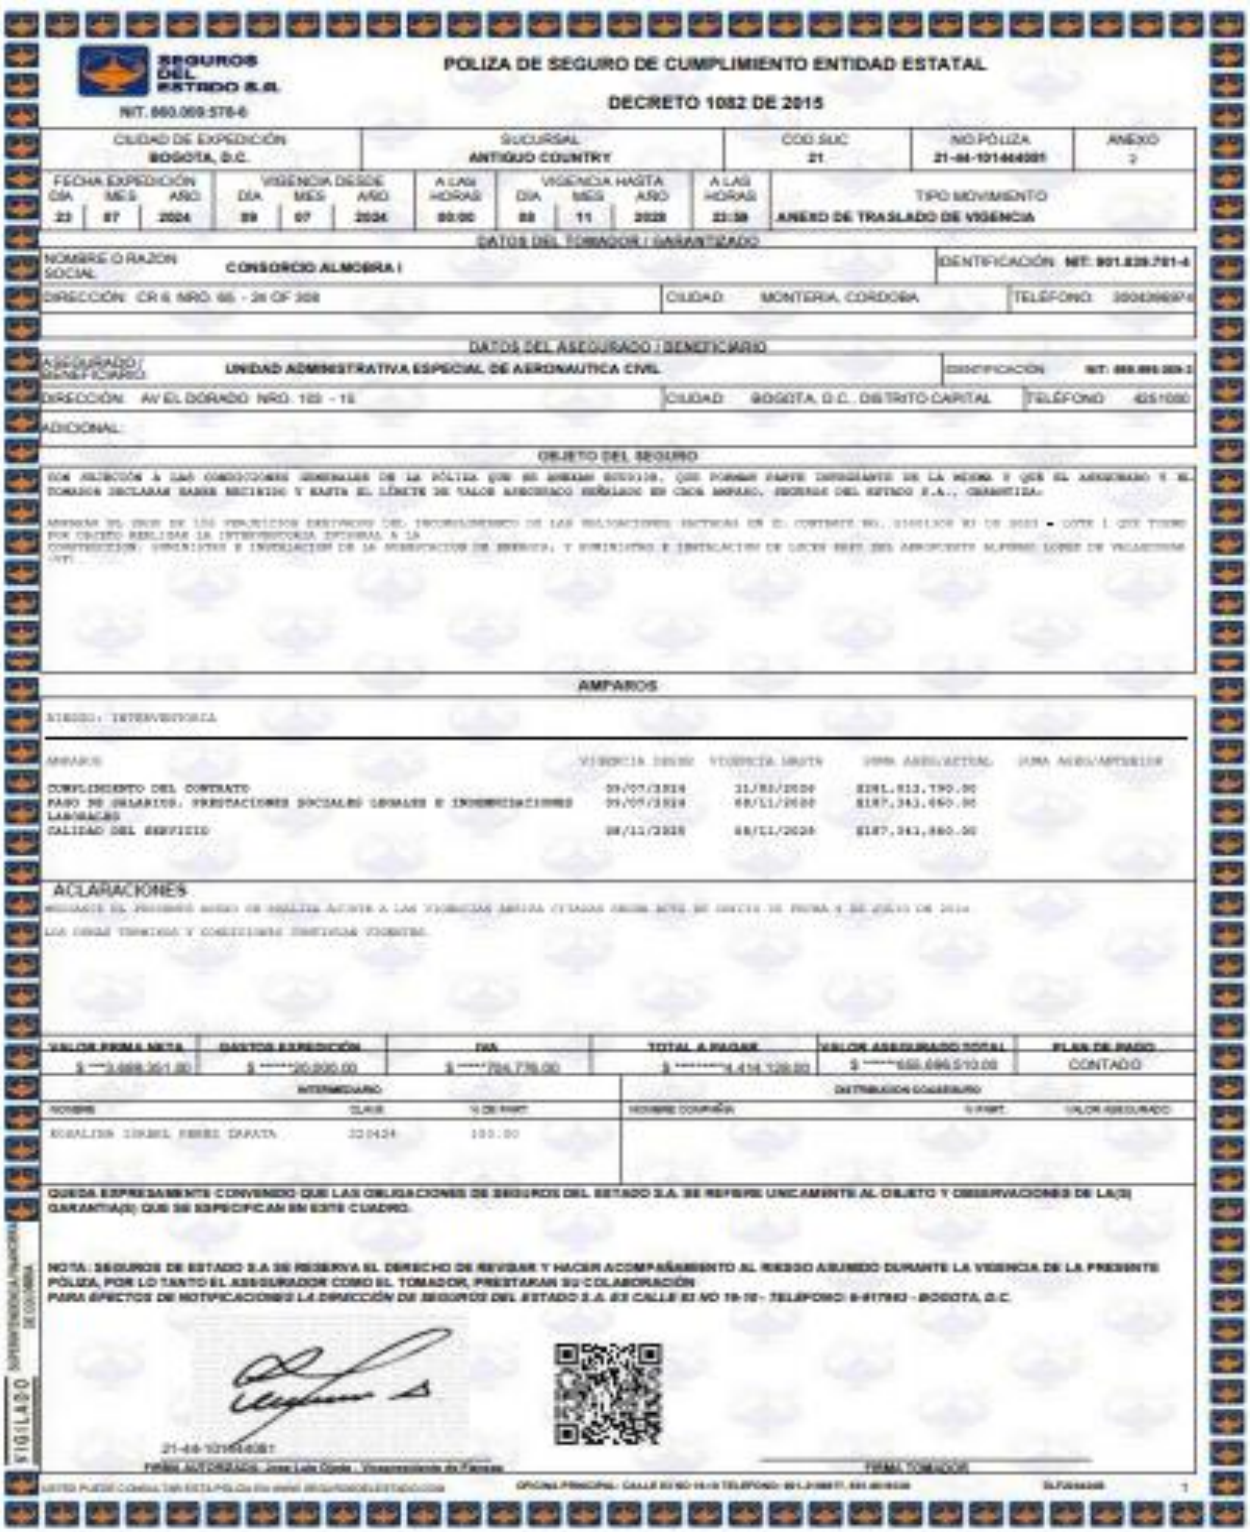

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101444001	2

FECHA EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	07	2024	09	07	2024	00:00	08	11	2028	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO ALMOBRA I — IDENTIFICACIÓN: NIT. 901.639.701-4

DIRECCIÓN: CR 6 NRO. 66 - 36 OF 308 — CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA — TELÉFONO: 3003069974

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL — IDENTIFICACIÓN: NIT. 800.096.809-2

DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15 — CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO: 4251000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE NO AMPARA BOSQUE, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO INDICADO EN ESTA CARÁTULA, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO No. 23001308 H3 DE 2023 – LOTE 1 QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE LA SUBESTACION DE ENERGIA; Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES PAPI DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR (VF).

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA/TOTAL	SUMA ASEGURADA/PARCIAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09/07/2024	31/03/2030	$281,913,790.00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	09/07/2024	08/11/2030	$187,941,860.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	08/11/2028	08/11/2030	$187,941,860.00	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICA ACORDE A LAS VIGENCIAS ARRIBA CITADAS DESDE ACTA DE INICIO DE OBRA Y SE AMPLIA EL PLAZO DE 2024

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ----3,668,361.00	$ -----20,000.00	$ ----784,776.00	$ --------4,414,139.00	$ -----656,696,510.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ROSALIDIS ISABEL FREGE DARATA	220424	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 16-18 - TELEFONO: 6-617843 - BOGOTA, D.C.

21-44-101444001

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT 860.009.578-6 OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 16-18 TELEFONO: 601-2188877, 601-8918528 1

9 90 230901 EMVCO

Redeban

JUN 24 2024 09:56:57 REMDES 9.90

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
PAGAFACIL EDS FATIMA
CL 29 N 14 14 ESTACION
Caja_01
C.UNICO: 3007062627 TER: NA000882
RECIBO: 079163 RRN: 120635
APRO: 568407

RECAUDO
CONVENIO: 47189
SEGUROS DEL ESTADO S
REF: 0000000000011005135730624

VALOR $ 1.262.247

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***



SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101466021	2

FECHA EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE: DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA: DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	07	2024	09	07	2024	00:00	08	11	2028	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CONSORCIO ALMOBRA I — IDENTIFICACIÓN: NIT. 901.839.781-4

DIRECCIÓN: CR 6 NRO. 65 - 24 OF 308 — CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA — TELEFONO: 3006396974

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL — IDENTIFICACIÓN NIT: 800.800.039-3

DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15 — CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELEFONO: 4261000

ADICIONAL:

PAGUESTADO

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***3.689.251.00	$ ******20.000.00	$ *****784.776.00	$ ********4.474.126.00	$ ******655.696.510.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ROSALIA ISABEL PEREZ DARATA	32424	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 16-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

REFERENCIA PAGO: 1180013987389-7

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101444081	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	07	2024	09	07	2024	00:00	08	11	2026	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CONSORCIO ALMOBRA I — IDENTIFICACIÓN: NIT. 901.628.781-4

DIRECCION: CR 6 NRO. 65 - 24 OF 308 — CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA — TELEFONO: 3005696878

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL — IDENTIFICACIÓN: NIT. 830.000.030-3

DIRECCION: AV EL DORADO NRO. 103 - 15 — CIUDAD: BOGOTA, D.C. DISTRITO CAPITAL — TELEFONO: 4201000

ADICIONAL

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - SEGUROS TRIMODAL

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
LICITACION NACIONAL ALFREDO LOPEZ	3076678[illegible]	51.00
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA SAS	9012687[illegible]	12.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 67 NO 16-10 - TELEFONO: 6-917040 - BOGOTA, D.C.

21-44-101444081

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

1/1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101235343	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	07	2024	09	07	2024	00:00	08	11	2025	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO ALMOBRA I	NIT. 901.639.751-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 6 NRO. 66 - 28 OF 308	MONTERIA, CORDOBA	3006396914

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	NIT. 800.960.569-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO NRO. 103 - 15	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	4251000

BENEFICIARIO: [illegible] - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

OBJETO DEL SEGURO

[illegible]

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPARO	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG. ACTUAL	SUMA ASEG. ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 3.00 SMMLV	09/07/2024	08/11/2025	$260,000,000.00	
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 3.00 SMMLV	09/07/2024	08/11/2025	$260,000,000.00	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 3.00 SMMLV	09/07/2024	08/11/2025	$260,000,000.00	

ACLARACIONES

[illegible]

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ [illegible]1.048.712,00	$ [illegible]20.000,00	$ [illegible]201.535,00	$ [illegible]1.249.247,00	$ [illegible]260.000.000,00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
ROSALIA [illegible] PEREZ DAZA	320434	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO


LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-017643 - BOGOTA, D.C.

21-40-101235343

FIRMA AUTORIZADA: [illegible]

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

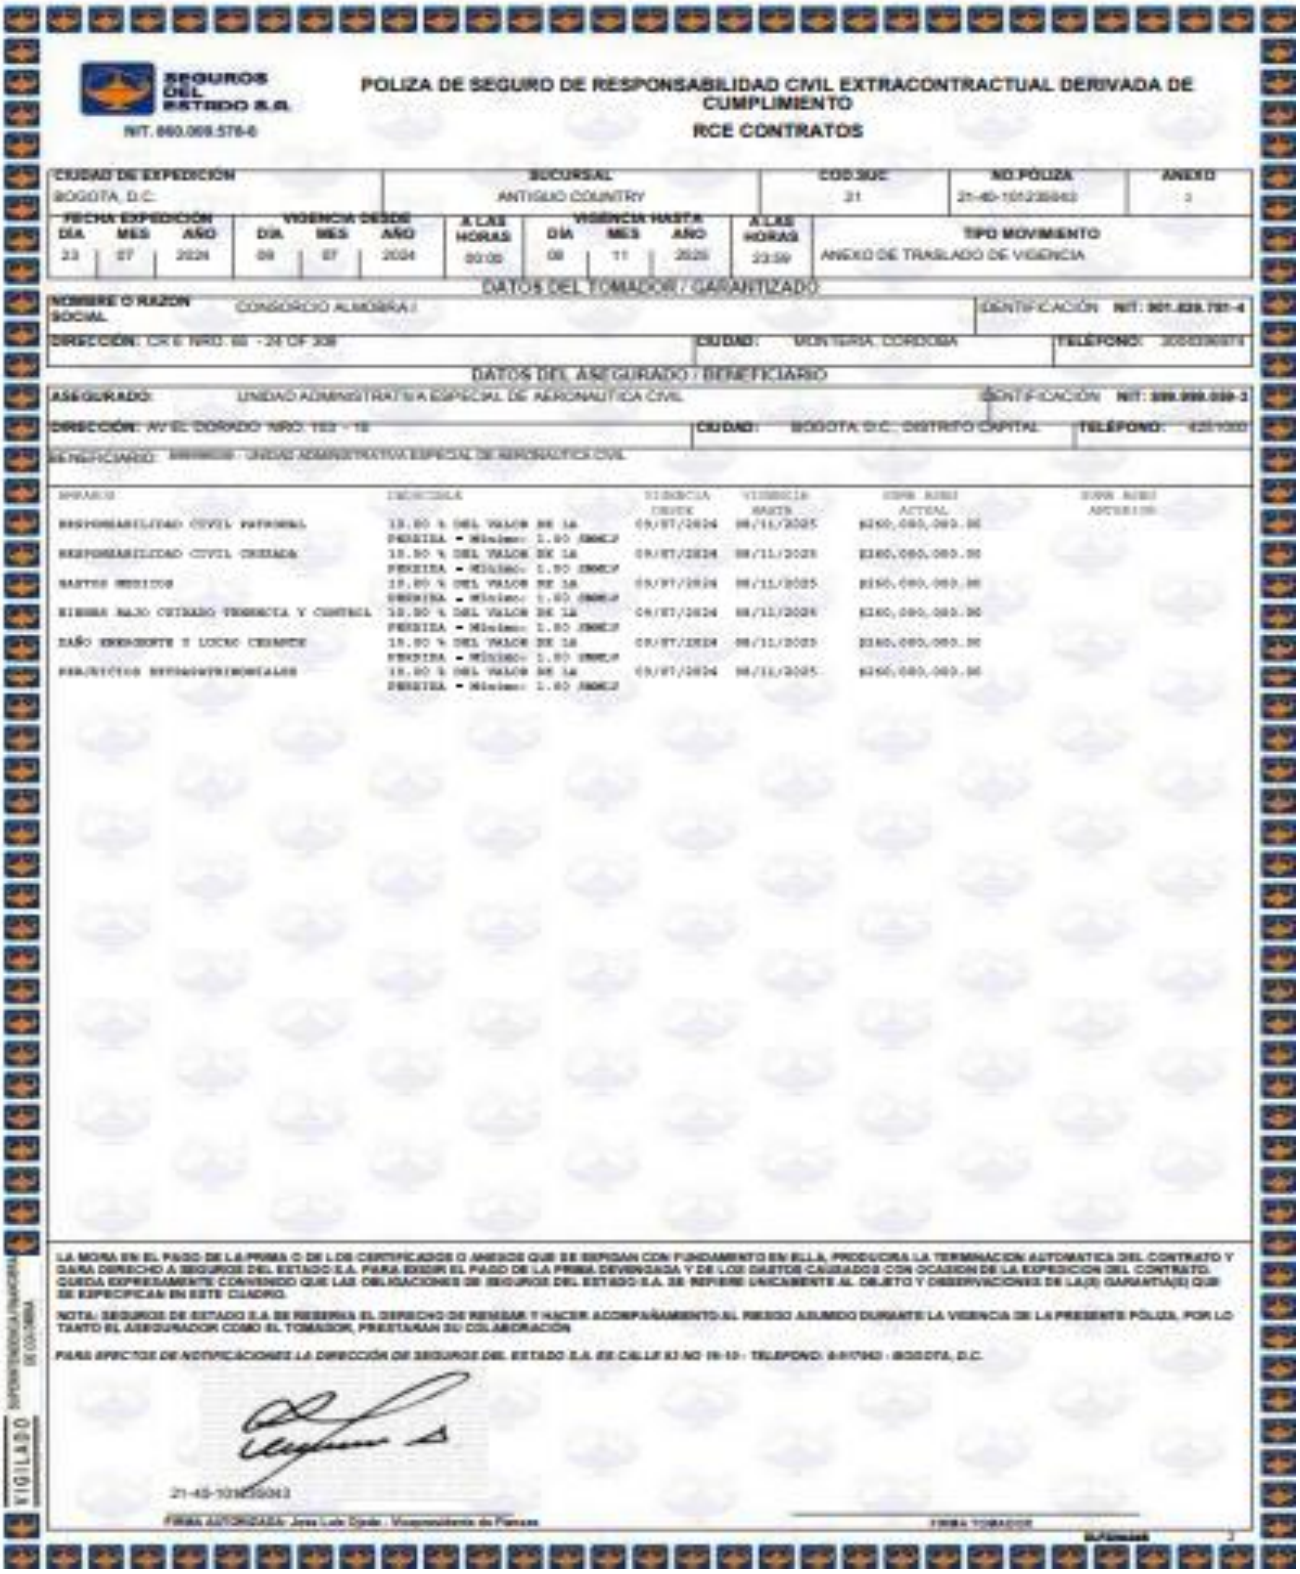

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	31	21-40-101239943	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	07	2024	09	07	2024	00:00	09	11	2025	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO ALMOBRA I	NIT. 901.639.791-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 6 NRO. 60 - 26 OF 308	MONTERIA, CORDOBA	3005390974

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	NIT. 830.000.030-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO NRO. 103 - 15	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	4201000

BENEFICIARIO: [redacted] - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

AMPARO	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	09/07/2024	08/11/2025	$260,000,000.00	
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	09/07/2024	08/11/2025	$260,000,000.00	
GASTOS MEDICOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	09/07/2024	08/11/2025	$260,000,000.00	
BIENES BAJO CUIDADO TENENCIA Y CONTROL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	09/07/2024	08/11/2025	$260,000,000.00	
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	09/07/2024	08/11/2025	$260,000,000.00	
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	09/07/2024	08/11/2025	$260,000,000.00	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 16-10 - TELEFONO: 6-017043 - BOGOTA, D.C.

21-40-101239943

FIRMA AUTORIZADA: Jesus Lulo Ojeda - Vicepresidente de Planeas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101238043	2

FECHA EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE: DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	07	2024	09	07	2024	00:00	08	11	2025	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO ALMOBRA I	NIT. 901.639.781-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELEFONO
CR 6 NRO. 65 - 24 OF 308	MONTERIA, CORDOBA	3006386974

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	NIT. 899.999.039-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELEFONO
AV EL DORADO NRO. 103 - 15	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	4231000

BENEFICIARIO:

PAGUESTADO

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1.040.712.00	$ *****30.000.00	$ *****201.335.00	$ *********1.282.247.00	$ *****280.000.000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ROSALIA ISABEL PEREZ DURAN	221424	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CLAUSIO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADO O CUALQUIER TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 33 NO 19-10 - TELEFONO: 4-917963 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

REFERENCIA PAGO: 1130513397481-1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	CODIGO	NO PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101230043	2

FECHA EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	07	2024	09	07	2024	00:00	08	11	2025	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CONSORCIO ALMOBRA I — IDENTIFICACIÓN: NIT. 901.628.787-4

DIRECCIÓN: CR 6 NRO. 65 - 24 OF 308 — CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA — TELÉFONO: 3005598974

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL — IDENTIFICACIÓN: NIT. 830.800.039-3

DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15 — CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO: 4201000

BENEFICIARIO: [redacted] - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
LEPERGUER MATTHES ALFREDO JOSE	1078879[illegible]-5	45.00
OHMAS S INTERVENTORIAS COLOMBIA SAS	9013667[illegible]-9	55.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917460 - BOGOTA, D.C.

21-40-101230043

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas — FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO N° 3
INFORMES SEMANALES OBRA

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE CONTRATISTA

Principio de Procedencia: 6200.375	Clave: APOY-9.0-12-037	Versión: 02	Fecha: 15/JUL/2024	Página: 1 de 3

UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS			**FECHA:**	7 de julio de 2025
Semana No.	52	**Del :**	30 de junio de 2025	**al**	6 de julio de 2025
Plazo total		487	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		362	días	**Tiempo restante**	125 días
Porcentaje transcurrido desde que inicio el contrato		74,33%			
Nombre del Supervisor :		OMAR ESTEVEZ ROJAS			

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACION DE ENERGÍA; Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES PAPI DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR (VF) – LOTE 1.

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	0,376%	65,092%	**(%) Ejecutado**	0,000%	33,599%
Valor programado ($)	$ 12.067.489,03	$ 2.086.732.145,94	**Valor ejecutado ($)**	$ -	$1.077.115.129
			Evaluación — **Porcentaje Adelanto/Atraso**		-31,493%
			Valor Adelanto/Atraso		-$ 1.009.617.017,44

OBSERVACIONES

El proyecto se encuentra en:
•FASE 2 correspondiente a la OBRA CIVIL.
•FASE 3 correspondiente a la OBRA ELÉCTRICA.
•suministro de equipos eléctricos y sistemas que incluye instalación fase 3.

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	CONSORCIO AEROSAKFA	**Contratista:**	CONSORCIO ALMOBRAS 1
Contrato No:	23001191 H4 DE 2023	**Contrato No:**	23001308 H3 DE 2023
Valor Inicial:	$ 3.205.801.629,00	**Valor Inicial:**	$ 936.709.300,00
Valor Anticipo:	$ 698.996.640	**Valor Anticipo:**	$ 0
Valor Actualizado al modificatorio :	N/A	**Valor Actualizado al modificatorio :**	N/A
Valor actualizado 2:	N/A	**Valor actualizado 2:**	N/A
Plazo inicial:	16 MESES	**Plazo inicial:**	16 MESES
Plazo actualizado:	N/A	**Plazo actualizado:**	N/A
Fecha de iniciación:	9-jul-24	**Fecha de iniciación:**	9-jul-24
Fecha de vencimiento:	8-nov-25	**Fecha de vencimiento:**	8-nov-25
Modificatorio No. Prórroga No.	N/A	**Modificatorio No. Prórroga No.**	N/A
Fecha de Terminación Según Prórroga No.	N/A	**Fecha de Terminación Según Prórroga No.**	N/A
Suspensión No.	N/A	**Suspensión No.**	N/A
Periodo de Suspensión No.	N/A	**Periodo de Suspensión No.**	N/A
Levantamiento de la suspensión No.	N/A	**Levantamiento de la suspensión No.**	N/A
Nueva fecha de terminación	N/A	**Nueva fecha de terminación**	N/A
Valor total actual del contrato	$ 3.205.801.629	**Valor total actual del contrato**	$ 936.709.300

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE ESTUDIO DE DISEÑOS Y PRESUPUESTOS

Durante el presente periodo no se llevó a cabo mesa de trabajo con la interventoría ni con la entidad contratante.

CONTROL DE EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO RUTA CRITICA

	DESCRIPCION DEL ITEM	PROGRAMADO			REAL EJECUTADO			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha inicial por actividad	Fecha final por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Dia		
1,7	Sistema de comunicación SCADA para el sistema eléctrico.	18/04/2025	18/05/2025	30	x	x	x	79	x

** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

CONTROL DE PROGRAMACION


AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	64,72%	33,60%	-31,12%
Durante el periodo	0,38%	0,00%	-0,38%
Acumulado Actual	65,09%	33,60%	-31,49%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
487 días	362	125	125 días

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO


AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR ($)
Acumulado anterior	$ 2.074.664.656,91	$ 1.077.115.128,50	$ 997.549.528,41
Durante el periodo	$ 12.067.489,03	$ -	-$ 12.067.489,03
Acumulado Actual	$ 2.086.732.145,94	$ 1.077.115.128,50	-$ 1.009.617.017,44

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-$ 1.009.617.017,44

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO



AVANCE CONTROL ANTICIPO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 76.195.553,00	$ 76.195.553,00	10,90%
Durante el periodo	$ 622.801.087,00	$ 622.801.087,00	89,10%
Acumulado Actual	$ 698.996.640,00	$ 698.996.640,00	100,00%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

$ 698.996.640,00

SEGUIMIENTO DEL MANEJO DEL ANTICIPO

ORDEN DE COMPRA	BENEFICIARIO	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR NETO PAGADO
N / A	CONSORCIO AEREO SAFKA	22/11/2024	$ 51.195.553,00
OC - 006 - 24	AMPERLED S.A.S.	3/12/2024	$ 25.000.000,00
OC - 002 - 25	ING LATAM SAS	30/01/2025	$ 91.842.559,66
OC - 003 - 25	RAPIDEXXUS S.A.	30/01/2025	$ 167.795.418,00
OC-004 - 25	SKYTECH S.A.S	30/01/2025	$ 363.163.109,34
$			**698.996.640,00**

OBRAS SUBESTACION ELECTRICA Y OBRA DE PISTA LUCES PAPI Y CABLEADO

Se inicia el día 19/09/24 la FASE 2 que corresponde a la construcción de obras civiles, incluidas canalizaciones, demolición de la pequeña edificación existente y construcciones la nueva subestación eléctrica. La cual se encuentra en 95% de ejecución básicamente culminada e inicia la fase 3 correspondiente a la obra eléctrica donde se ejecuta la estructura eléctrica del cuarto técnico y el sistema de luces papi.

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO.	CANT PROGRAMADA SEMANA	CANT PROGRAMADA ACULUMADA	VALOR TOTAL PROGRAMADO	CANT EJECUTADA SEMANA	CANT EJECUTADA ACUMULADA	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMUALDO

*Se relaciona la CANTIDAD EJECUTA SEMANA, en la memoria de cálculo de las hoja en Excel MEMORIA ÍTEM

AREA AMBIENTAL

• Se relacionan las actividades ambientales de la semana:

1.**Señalización y delimitación de las áreas de construcción:** El cerramiento en tela verde, instalado contractualmente para la delimitación de las zonas de trabajo, fue retirado en su totalidad el día 24 de abril de 2025, atendiendo a la solicitud realizada durante el comité de obra por parte de los supervisores del contrato, ingenieros Aldemar Rozo y Omar Estévez.
2.Limpieza de obra : Se efectuó la limpieza general en las areas de trabajo, las cuales fueron depositadas en los puntos de centro de acopio de residuos

AREA SST

• Se adjunta "INFORME SST DE LA SEMANA 30-06-2025 HASTA EL 06-07-2025..", donde se contempla el componente SST ejecutado en la semana del presente informe.

PLAN DE CALIDAD

• Se relacionan componentes a aplicar del Plan de Calidad, aprobado el día 16/09/24 por la interventoría mediante el oficio CALMO1-048-2024_RESPUESTA AL OFICIO No 024 – DOCUMENTOS ADICIONALES PLAN DE GESTION DE CALIDAD:

1.Control del Cronograma de Trabajo:
•El seguimiento al cronograma de actividades se realiza de manera mensual desde la fecha de aprobación (16 de septiembre de 2024). Hasta la fecha, no se reportan modificaciones al cronograma establecido.

2.Materiales:
•Durante este periodo no se ingresan materiales

3.Maquinaria y Equipos:
•Ingreso de maquinaria: No aplica
•Ingreso de equipos menores: No aplica

4.Equipos de Medición:
•No se utilizaron equipos de medición durante el periodo de este informe.
5.Inspección y Ensayo:
•Durante este periodo no se realizó ensayos de ninguna índole

CORRESPONDENCIA

ENVIADOS

OFICIOS ENVIADOS:
•OFICIO No. 259- AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024 REMISION PLAN DE TRABAJO RED DE MEDIA TENSION
•OFICIO No. 260 - ENVIO DEL ACTA No.4-V3 RESPUESTA AL COMUNICADO CALM01-224-2024 OBSERVACIONES AL ACTA NUMERO 4 DE OBRA V2.
•OFICIO No. 261 - RESPUESTA AL COMUNICADO CALM01-223-2024 SOLICITUD DOCUMENTACION REAJUSTE – CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO.
•OFICIO No. 262 - RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES SOBRE EL MODIFICATORIO.
•OFICIO No. 263 RADICACIÓN HOJA DE VIDA INGENIERO RESIDENTE
E-MAIL ENVIADOS:
•Remisión ítem no previsto Paralelo UPS con modificación
•INFORME SEMANAL DE OBRA No. 51

RECIBIDOS

OFICIOS RECIBIDOS:
•CALM01-223-2024 SOLICITUD DOCUMENTACION REAJUSTE – CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO
•CALM01-224-2024 OBSERVACIONES AL ACTA NUMERO 4 DE OBRA V2

OBSERVACIONES	RESIDENTE DE OBRA
Durante el periodo correspondiente a este informe no se ejecutaron actividades físicas de obra, dado que las labores desarrolladas fueron exclusivamente de carácter administrativo. Las actividades pendientes de ejecución se encuentran supeditadas a la aprobación de la modificatoria contractual, motivo por el cual la ejecución física y económica durante la presente semana fue nula.	**ING JHONNY ANDRES TURIZO**

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE CONTRATISTA

Principio de Procedencia: 6200.375	Clave: APOY-9.0-12-037	Versión: 02	Fecha: 15/JUL/2024	Página: 1 de 3

UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS			**FECHA:**	14 de julio de 2025
Semana No.	53	**Del :**	7 de julio de 2025	**al**	13 de julio de 2025
Plazo total	487 días				
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	369 días		**Tiempo restante**	118 días	
Porcentaje transcurrido desde que inicio el contrato	75,77%				
Nombre del Supervisor :	OMAR ESTEVEZ ROJAS				

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACION DE ENERGÍA; Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES PAPI DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR (VF) – LOTE 1.

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	0,151%	65,243%	**(%) Ejecutado**	0,841%	34,440%
Valor programado ($)	$ 4.837.965,66	$ 2.091.570.111,60	**Valor ejecutado ($)**	$ 26.969.354,13	$1.104.084.483
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto/Atraso**	-30,803%
				Valor Adelanto/Atraso	-$ 987.485.628,97

OBSERVACIONES

El proyecto se encuentra en:
•FASE 2 correspondiente a la OBRA CIVIL.
•FASE 3 correspondiente a la OBRA ELÉCTRICA.
•suministro de equipos eléctricos y sistemas que incluye instalación fase 3.

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	CONSORCIO AEROSAKFA	**Contratista:**	CONSORCIO ALMOBRAS 1
Contrato No:	23001191 H4 DE 2023	**Contrato No:**	23001308 H3 DE 2023
Valor Inicial:	$ 3.205.801.629,00	**Valor Inicial:**	$ 936.709.300,00
Valor Anticipo:	$ 698.996.640	**Valor Anticipo:**	$ 0
Valor Actualizado al modificatorio :	N/A	**Valor Actualizado al modificatorio :**	N/A
Valor actualizado 2:	N/A	**Valor actualizado 2:**	N/A
Plazo inicial:	16 MESES	**Plazo inicial:**	16 MESES
Plazo actualizado:	N/A	**Plazo actualizado:**	N/A
Fecha de iniciación:	9-jul-24	**Fecha de iniciación:**	9-jul-24
Fecha de vencimiento:	8-nov-25	**Fecha de vencimiento:**	8-nov-25
Modificatorio No. Prórroga No.	N/A	**Modificatorio No. Prórroga No.**	N/A
Fecha de Terminación Según Prórroga No.	N/A	**Fecha de Terminación Según Prórroga No.**	N/A
Suspensión No.	N/A	**Suspensión No.**	N/A
Periodo de Suspensión No.	N/A	**Periodo de Suspensión No.**	N/A
Levantamiento de la suspensión No.	N/A	**Levantamiento de la suspensión No.**	N/A
Nueva fecha de terminación	N/A	**Nueva fecha de terminación**	N/A
Valor total actual del contrato	$ 3.205.801.629	**Valor total actual del contrato**	$ 936.709.300

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE ESTUDIO DE DISEÑOS Y PRESUPUESTOS

Durante el periodo correspondiente al presente informe, se llevó a cabo una mesa de trabajo con la participación de la interventoría, la supervisión del contrato y el contratista, en la cual se revisaron en detalle las observaciones relacionadas con la modificatoria contractual. Como resultado de dicha reunión, se dejaron plenamente aclarados todos los aspectos técnicos en discusión, y se aprobó de manera verbal que la actividad correspondiente al tendido de tubería IMC de 4" ubicada en el canal de la zona aire será reconocida a través de un ítem no previsto, el cual deberá ser medido y pagado por metro lineal (ml). Asimismo, se acordó que la actividad relacionada con el bajante en la subestación de la concesión será considerada como una unidad independiente y facturada por unidad (und). Estas decisiones fueron aprobadas verbalmente durante la sesión por el ingeniero Aldemar Rozo, quien actúa como supervisor del contrato.

CONTROL DE EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO RUTA CRITICA

	DESCRIPCION DEL ITEM	PROGRAMADO			REAL EJECUTADO			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha inicial por actividad	Fecha final por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Dia		
1,7	Sistema de comunicación SCADA para el sistema eléctrico.	18/04/2025	18/05/2025	30	x	x	x	86	x

** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

CONTROL DE PROGRAMACION


AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	65,09%	33,60%	-31,49%
Durante el periodo	0,15%	0,84%	0,69%
Acumulado Actual	65,24%	34,44%	-30,80%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
487 días	369	118	118 días

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO


AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR ($)
Acumulado anterior	$ 2.086.732.145,94	$ 1.077.115.128,50	$ 1.009.617.017,44
Durante el periodo	$ 4.837.965,66	$ 26.969.354,13	$ 22.131.388,47
Acumulado Actual	$ 2.091.570.111,60	$ 1.104.084.482,63	-$ 987.485.628,97

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-$ 987.485.628,97

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO



AVANCE CONTROL ANTICIPO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 76.195.553,00	$ 76.195.553,00	10,90%
Durante el periodo	$ 622.801.087,00	$ 622.801.087,00	89,10%
Acumulado Actual	$ 698.996.640,00	$ 698.996.640,00	100,00%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

$ 698.996.640,00

SEGUIMIENTO DEL MANEJO DEL ANTICIPO

ORDEN DE COMPRA	BENEFICIARIO	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR NETO PAGADO
N / A	CONSORCIO AEREO SAFKA	22/11/2024	$ 51.195.553,00
OC - 006 - 24	AMPERLED S.A.S.	3/12/2024	$ 25.000.000,00
OC - 002 - 25	ING LATAM SAS	30/01/2025	$ 91.842.559,66
OC - 003 - 25	RAPIDEXXUS S.A.	30/01/2025	$ 167.795.418,00
OC-004 - 25	SKYTECH S.A.S	30/01/2025	$ 363.163.109,34
$			**698.996.640,00**

OBRAS SUBESTACION ELECTRICA Y OBRA DE PISTA LUCES PAPI Y CABLEADO

Se inicia el día 19/09/24 la FASE 2 que corresponde a la construcción de obras civiles, incluidas canalizaciones, demolición de la pequeña edificación existente y construcciones la nueva subestación eléctrica. La cual se encuentra en 95% de ejecución básicamente culminada e inicia la fase 3 correspondiente a la obra eléctrica donde se ejecuta la estructura eléctrica del cuarto técnico y el sistema de luces papi.

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO.	CANT PROGRAMADA SEMANA	CANT PROGRAMADA ACULUMADA	VALOR TOTAL PROGRAMADO	CANT EJECUTADA SEMANA	CANT EJECUTADA ACUMULADA	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMUALDO
1,8	Suministro e instalación de Sistema de detección y extinción contra incendios con Agente Limpio (incluye diseño, comunicación con sistema SCADA)	GBL	1,00	$ 134.846.770,66	0,00	1,00	$ 0,00	0,20	1,00	$ 26.969.354,13	$ 134.846.770,66

*Se relaciona la CANTIDAD EJECUTA SEMANA, en la memoria de cálculo de las hoja en Excel MEMORIA ÍTEM

AREA AMBIENTAL

• Se relacionan las actividades ambientales de la semana:

1.**Señalización y delimitación de las áreas de construcción:** El cerramiento en tela verde, instalado contractualmente para la delimitación de las zonas de trabajo, fue retirado en su totalidad el día 24 de abril de 2025, atendiendo a la solicitud realizada durante el comité de obra por parte de los supervisores del contrato, ingenieros Aldemar Rozo y Omar Estévez.
2.Limpieza de obra : Se efectuó la limpieza general en las areas de trabajo, las cuales fueron depositadas en los puntos de centro de acopio de residuos

AREA SST

• Se adjunta "INFORME SST DE LA SEMANA 07-07-2025 HASTA EL 13-07-2025..", donde se contempla el componente SST ejecutado en la semana del presente informe.

PLAN DE CALIDAD

• Se relacionan componentes a aplicar del Plan de Calidad, aprobado el día 16/09/24 por la interventoría mediante el oficio CALMO1-048-2024_RESPUESTA AL OFICIO No 024 – DOCUMENTOS ADICIONALES PLAN DE GESTION DE CALIDAD:

1.Control del Cronograma de Trabajo:
•El seguimiento al cronograma de actividades se realiza de manera mensual desde la fecha de aprobación (16 de septiembre de 2024). Hasta la fecha, no se reportan modificaciones al cronograma establecido.

2.Materiales:
•Durante este periodo no se ingresan materiales

3.Maquinaria y Equipos:
•Ingreso de maquinaria: No aplica
•Ingreso de equipos menores: No aplica

4.Equipos de Medición:
•No se utilizaron equipos de medición durante el periodo de este informe.
5.Inspección y Ensayo:
•Durante este periodo no se realizó ensayos de ninguna índole

CORRESPONDENCIA

ENVIADOS	RECIBIDOS
OFICIOS ENVIADOS: •OFICIO No. 264 - RESPUESTA AL COMUNICADO "CALMO1-215-2024_ITEM 2.128. Suministro e instalación de Puerta sencilla corta fuego y 2.129. Suministro e instalación de Puerta doble corta fuego" **E-MAIL ENVIADOS:** •INFORME SEMANAL DE OBRA No. 52 •RESPUESTA OBSERVACIONES ACTA DE COBRO No. 04-V3	**OFICIOS RECIBIDO:** •CALM01-225-2024 RESPUESTA A OFICIO No. 263 RADICACIÓN HOJA DE VIDA INGENIERO RESIDENTE •CALMO1-226-2024 RESPUESTA A CORREO SUBNACIONES DEL INFORME MENSUAL N°11-V2. •CALMO1-227-2024 INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRAACTUALES-APREMIO NUMERO 1 **E-MAIL RECIBIDO:** •Fwd: Acta de obra numero 4-V3 contrato 23001191 Lote 1 Sub Valledupar •Aprobación informe semanal numero 51 •Aprobación de informe semanal numero 52

REGISTRO FOTOGRÁFICO

OBRA ELECTRICA FASE 3





Suministro e instalación de Sistema de detección y extinción contra incendios con Agente Limpio (incluye diseño, comunicación con sistema SCADA)

OBSERVACIONES	RESIDENTE DE OBRA
Durante el periodo correspondiente a este informe se llevó a cabo la terminación del sistema de protección contra incendios, la cual incluyó la instalación de equipos, módulos, programación y demás componentes requeridos para la correcta operación del sistema, conforme a las especificaciones técnicas establecidas.	**ING JHONNY ANDRES TURIZO**

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE CONTRATISTA

Principio de Procedencia: 6200.375	Clave: APOY-9.0-12-037	Versión: 02	Fecha: 15/JUL/2024	Página: 1 de 3

UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS		**FECHA:**		21 de julio de 2025
Semana No.	54	**Del :**	14 de julio de 2025	**al**	20 de julio de 2025
Plazo total	487 días				
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	376 días	**Tiempo restante**	111 días		
Porcentaje transcurrido desde que inicio el contrato	77,21%				
Nombre del Supervisor :	OMAR ESTEVEZ ROJAS				

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACION DE ENERGÍA; Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES PAPI DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR (VF) – LOTE 1.

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	0,046%	65,290%	**(%) Ejecutado**	0,000%	34,440%
Valor programado ($)	$ 1.484.746,76	$ 2.093.054.858,36	**Valor ejecutado ($)**	$ -	$1.104.084.483
			Evaluación — **Porcentaje Adelanto/Atraso**		-30,849%
			Evaluación — **Valor Adelanto/Atraso**		-$ 988.970.375,73

OBSERVACIONES

El proyecto se encuentra en:
•FASE 2 correspondiente a la OBRA CIVIL.
•FASE 3 correspondiente a la OBRA ELÉCTRICA.
•suministro de equipos eléctricos y sistemas que incluye instalación fase 3.

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	CONSORCIO AEROSAKFA	**Contratista:**	CONSORCIO ALMOBRAS 1
Contrato No:	23001191 H4 DE 2023	**Contrato No:**	23001308 H3 DE 2023
Valor Inicial:	$ 3.205.801.629,00	**Valor Inicial:**	$ 936.709.300,00
Valor Anticipo:	$ 698.996.640	**Valor Anticipo:**	$ 0
Valor Actualizado al modificatorio :	N/A	**Valor Actualizado al modificatorio :**	N/A
Valor actualizado 2:	N/A	**Valor actualizado 2:**	N/A
Plazo inicial:	16 MESES	**Plazo inicial:**	16 MESES
Plazo actualizado:	N/A	**Plazo actualizado:**	N/A
Fecha de iniciación:	9-jul-24	**Fecha de iniciación:**	9-jul-24
Fecha de vencimiento:	8-nov-25	**Fecha de vencimiento:**	8-nov-25
Modificatorio No. Prórroga No.	N/A	**Modificatorio No. Prórroga No.**	N/A
Fecha de Terminación Según Prórroga No.	N/A	**Fecha de Terminación Según Prórroga No.**	N/A
Suspensión No.	N/A	**Suspensión No.**	N/A
Periodo de Suspensión No.	N/A	**Periodo de Suspensión No.**	N/A
Levantamiento de la suspensión No.	N/A	**Levantamiento de la suspensión No.**	N/A
Nueva fecha de terminación	N/A	**Nueva fecha de terminación**	N/A
Valor total actual del contrato	$ 3.205.801.629	**Valor total actual del contrato**	$ 936.709.300

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE ESTUDIO DE DISEÑOS Y PRESUPUESTOS

Durante el periodo correspondiente al presente informe no se reaizo mesas de trabajos

CONTROL DE EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO RUTA CRITICA

	DESCRIPCION DEL ITEM	PROGRAMADO			REAL EJECUTADO			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha inicial por actividad	Fecha final por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Dia		
1,7	Sistema de comunicación SCADA para el sistema eléctrico.	18/04/2025	18/05/2025	30	x	x	x	93	x
1,13	Certificación RETIE de uso final bajo resolución de Agosto de 2013 por organismo de certificación avalada por la ONAC	12/06/2025	3/08/2025	52	x	x	x	38	x

** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

CONTROL DE PROGRAMACION


AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	65,24%	34,44%	-30,80%
Durante el periodo	0,05%	0,00%	-0,05%
Acumulado Actual	65,29%	34,44%	-30,85%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
487 días	376	111	111 días

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO


AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR ($)
Acumulado anterior	$ 2.091.570.111,60	$ 1.104.084.482,63	$ 987.485.628,97
Durante el periodo	$ 1.484.746,76	$ -	-$ 1.484.746,76
Acumulado Actual	$ 2.093.054.858,36	$ 1.104.084.482,63	-$ 988.970.375,73

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-$	988.970.375,73

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO



AVANCE CONTROL ANTICIPO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 76.195.553,00	$ 76.195.553,00	10,90%
Durante el periodo	$ 622.801.087,00	$ 622.801.087,00	89,10%
Acumulado Actual	$ 698.996.640,00	$ 698.996.640,00	100,00%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

$	**698.996.640,00**

SEGUIMIENTO DEL MANEJO DEL ANTICIPO

ORDEN DE COMPRA	BENEFICIARIO	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR NETO PAGADO
N / A	CONSORCIO AEREO SAFKA	22/11/2024	$ 51.195.553,00
OC - 006 - 24	AMPERLED S.A.S.	3/12/2024	$ 25.000.000,00
OC - 002 - 25	ING LATAM SAS	30/01/2025	$ 91.842.559,66
OC - 003 - 25	RAPIDEXXUS S.A.	30/01/2025	$ 167.795.418,00
OC-004 - 25	SKYTECH S.A.S	30/01/2025	$ 363.163.109,34
$			**698.996.640,00**

OBRAS SUBESTACION ELECTRICA Y OBRA DE PISTA LUCES PAPI Y CABLEADO

Se inicia el día 19/09/24 la FASE 2 que corresponde a la construcción de obras civiles, incluidas canalizaciones, demolición de la pequeña edificación existente y construcciones la nueva subestación eléctrica. La cual se encuentra en 95% de ejecución básicamente culminada e inicia la fase 3 correspondiente a la obra eléctrica donde se ejecuta la estructura eléctrica del cuarto técnico y el sistema de luces papi.

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO.	CANT PROGRAMADA SEMANA	CANT PROGRAMADA ACULUMADA	VALOR TOTAL PROGRAMADO	CANT EJECUTADA SEMANA	CANT EJECUTADA ACUMULADA	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMUALDO

*Se relaciona la CANTIDAD EJECUTA SEMANA, en la memoria de cálculo de las hoja en Excel MEMORIA ÍTEM

AREA AMBIENTAL

• Se relacionan las actividades ambientales de la semana:

1.**Señalización y delimitación de las áreas de construcción:** El cerramiento en tela verde, instalado contractualmente para la delimitación de las zonas de trabajo, fue retirado en su totalidad el día 24 de abril de 2025, atendiendo a la solicitud realizada durante el comité de obra por parte de los supervisores del contrato, ingenieros Aldemar Rozo y Omar Estévez.
2.Limpieza de obra : Se efectuó la limpieza general en las areas de trabajo, las cuales fueron depositadas en los puntos de centro de acopio de residuos

AREA SST

• Se adjunta "INFORME SST DE LA SEMANA 14-07-2025 HASTA EL 20-07-2025..", donde se contempla el componente SST ejecutado en la semana del presente informe.

PLAN DE CALIDAD

• Se relacionan componentes a aplicar del Plan de Calidad, aprobado el día 16/09/24 por la interventoría mediante el oficio CALMO1-048-2024_RESPUESTA AL OFICIO No 024 – DOCUMENTOS ADICIONALES PLAN DE GESTION DE CALIDAD:

1.Control del Cronograma de Trabajo:
•El seguimiento al cronograma de actividades se realiza de manera mensual desde la fecha de aprobación (16 de septiembre de 2024). Hasta la fecha, no se reportan modificaciones al cronograma establecido.

2.Materiales:
•Durante este periodo no se ingresan materiales

3.Maquinaria y Equipos:
•Ingreso de maquinaria: No aplica
•Ingreso de equipos menores: No aplica

4.Equipos de Medición:
•No se utilizaron equipos de medición durante el periodo de este informe.
5.Inspección y Ensayo:
•Durante este periodo no se realizó ensayos de ninguna índole

CORRESPONDENCIA

ENVIADOS	RECIBIDOS
OFICIOS ENVIADOS: •OFICIO No. 265 - INFORME TECNICO DE OBRA MENSUAL No. 12. •OFICIO No. 266 - PRESUPUESTO COSTO TOTAL AJUSTADO (CIERRE PRIMER AÑO A LA ADJUDICACIÓN) **E-MAIL ENVIADOS:** •INFORME SEMANAL DE OBRA No. 53 •ACTA DE COMITE DEL MES DE JUNIO 20253	**OFICIOS RECIBIDO:** •CALM01-230-2024 INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRAACTUALES-APREMIO NUMERO 2 •CALM01-231-2024 INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRAACTUALES-APREMIO NUMERO 1 •CALM01-232-2024 RESPUESTA A OFICIO No. 265 - INFORME TECNICO DE OBRA MENSUAL No. 12. •CALM01-233-2024 INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRAACTUALES-APREMIO NUMERO 1 •CALM01-234-2024 INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRAACTUALES-APREMIO NUMERO 1 **E-MAIL RECIBIDO:** •Aprobación informe semanal # 53

OBSERVACIONES	RESIDENTE DE OBRA
	ING JHONNY ANDRES TURIZO

AFRONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE CONTRATISTA

Principio de Procedencia: 6200.375	Clave: APOY-9.0-12-037	Versión: 02	Fecha: 15/JUL/2024	Página: 1 de 3

UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS			**FECHA:**	28 de julio de 2025
Semana No.	55	**Del :**	21 de julio de 2025	**al**	27 de julio de 2025
Plazo total		487	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		383	días	**Tiempo restante**	104 días
Porcentaje transcurrido desde que inicio el contrato		78,64%			
Nombre del Supervisor :		OMAR ESTEVEZ ROJAS			

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACION DE ENERGÍA; Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES PAPI DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR (VF) – LOTE 1.

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	0,046%	65,336%	**(%) Ejecutado**	0,000%	34,440%
Valor programado ($)	$ 1.484.746,76	$ 2.094.539.605,12	**Valor ejecutado ($)**	$ -	$1.104.084.483
Evaluación			**Porcentaje Adelanto/Atraso**		-30,896%
			Valor Adelanto/Atraso		-$ 990.455.122,49

OBSERVACIONES

El proyecto se encuentra en:
•FASE 2 correspondiente a la OBRA CIVIL.
•FASE 3 correspondiente a la OBRA ELÉCTRICA.
•suministro de equipos eléctricos y sistemas que incluye instalación fase 3.

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	CONSORCIO AEROSAKFA	**Contratista:**	CONSORCIO ALMOBRAS 1
Contrato No:	23001191 H4 DE 2023	**Contrato No:**	23001308 H3 DE 2023
Valor Inicial:	$ 3.205.801.629,00	**Valor Inicial:**	$ 936.709.300,00
Valor Anticipo:	$ 698.996.640	**Valor Anticipo:**	$ 0
Valor Actualizado al modificatorio :	N/A	**Valor Actualizado al modificatorio :**	N/A
Valor actualizado 2:	N/A	**Valor actualizado 2:**	N/A
Plazo inicial:	16 MESES	**Plazo inicial:**	16 MESES
Plazo actualizado:	N/A	**Plazo actualizado:**	N/A
Fecha de iniciación:	9-jul-24	**Fecha de iniciación:**	9-jul-24
Fecha de vencimiento:	8-nov-25	**Fecha de vencimiento:**	8-nov-25
Modificatorio No. Prórroga No.	N/A	**Modificatorio No. Prórroga No.**	N/A
Fecha de Terminación Según Prórroga No.	N/A	**Fecha de Terminación Según Prórroga No.**	N/A
Suspensión No.	N/A	**Suspensión No.**	N/A
Periodo de Suspensión No.	N/A	**Periodo de Suspensión No.**	N/A
Levantamiento de la suspensión No.	N/A	**Levantamiento de la suspensión No.**	N/A
Nueva fecha de terminación	N/A	**Nueva fecha de terminación**	N/A
Valor total actual del contrato	$ 3.205.801.629	**Valor total actual del contrato**	$ 936.709.300

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE ESTUDIO DE DISEÑOS Y PRESUPUESTOS

Durante el periodo correspondiente al presente informe no se reaizo mesas de trabajos

CONTROL DE EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO RUTA CRITICA

	DESCRIPCION DEL ITEM	PROGRAMADO			REAL EJECUTADO			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha inicial por actividad	Fecha final por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Dia		
1,7	Sistema de comunicación SCADA para el sistema eléctrico.	18/04/2025	18/05/2025	30	x	x	x	100	x
1,13	Certificación RETIE de uso final bajo resolución de Agosto de 2013 por organismo de certificación avalada por la ONAC	12/06/2025	3/08/2025	52	x	x	x	45	x

** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

CONTROL DE PROGRAMACION


AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	65,29%	34,44%	-30,85%
Durante el periodo	0,05%	0,00%	-0,05%
Acumulado Actual	65,34%	34,44%	-30,90%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
487 días	383	104	104 días

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO


AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR ($)
Acumulado anterior	$ 2.093.054.858,36	$ 1.104.084.482,63	$ 988.970.375,73
Durante el periodo	$ 1.484.746,76	$ -	-$ 1.484.746,76
Acumulado Actual	$ 2.094.539.605,12	$ 1.104.084.482,63	-$ 990.455.122,49

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-$	990.455.122,49

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO



AVANCE CONTROL ANTICIPO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 76.195.553,00	$ 76.195.553,00	10,90%
Durante el periodo	$ 622.801.087,00	$ 622.801.087,00	89,10%
Acumulado Actual	$ 698.996.640,00	$ 698.996.640,00	100,00%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

$	**698.996.640,00**

SEGUIMIENTO DEL MANEJO DEL ANTICIPO

ORDEN DE COMPRA	BENEFICIARIO	FECHA DE DESEMBOLSO	VALOR NETO PAGADO
N / A	CONSORCIO AEREO SAFKA	22/11/2024	$ 51.195.553,00
OC - 006 - 24	AMPERLED S.A.S.	3/12/2024	$ 25.000.000,00
OC - 002 - 25	ING LATAM SAS	30/01/2025	$ 91.842.559,66
OC - 003 - 25	RAPIDEXXUS S.A.	30/01/2025	$ 167.795.418,00
OC-004 - 25	SKYTECH S.A.S	30/01/2025	$ 363.163.109,34
$			**698.996.640,00**

OBRAS SUBESTACION ELECTRICA Y OBRA DE PISTA LUCES PAPI Y CABLEADO

Se inicia el día 19/09/24 la FASE 2 que corresponde a la construcción de obras civiles, incluidas canalizaciones, demolición de la pequeña edificación existente y construcciones la nueva subestación eléctrica. La cual se encuentra en 95% de ejecución básicamente culminada e inicia la fase 3 correspondiente a la obra eléctrica donde se ejecuta la estructura eléctrica del cuarto técnico y el sistema de luces papi.

ÍTEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO.	CANT PROGRAMADA SEMANA	CANT PROGRAMADA ACULUMADA	VALOR TOTAL PROGRAMADO	CANT EJECUTADA SEMANA	CANT EJECUTADA ACUMULADA	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMUALDO

*Se relaciona la CANTIDAD EJECUTA SEMANA, en la memoria de cálculo de las hoja en Excel MEMORIA ÍTEM

AREA AMBIENTAL

• Se relacionan las actividades ambientales de la semana:

1.**Señalización y delimitación de las áreas de construcción:** El cerramiento en tela verde, instalado contractualmente para la delimitación de las zonas de trabajo, fue retirado en su totalidad el día 24 de abril de 2025, atendiendo a la solicitud realizada durante el comité de obra por parte de los supervisores del contrato, ingenieros Aldemar Rozo y Omar Estévez.
2.Limpieza de obra : Se efectuó la limpieza general en las areas de trabajo, las cuales fueron depositadas en los puntos de centro de acopio de residuos

AREA SST

• Se adjunta "INFORME SST DE LA SEMANA 21-07-2025 HASTA EL 27-07-2025..", donde se contempla el componente SST ejecutado en la semana del presente informe.

PLAN DE CALIDAD

• Se relacionan componentes a aplicar del Plan de Calidad, aprobado el día 16/09/24 por la interventoría mediante el oficio CALMO1-048-2024_RESPUESTA AL OFICIO No 024 – DOCUMENTOS ADICIONALES PLAN DE GESTION DE CALIDAD:

1.Control del Cronograma de Trabajo:
•El seguimiento al cronograma de actividades se realiza de manera mensual desde la fecha de aprobación (16 de septiembre de 2024). Hasta la fecha, no se reportan modificaciones al cronograma establecido.

2.Materiales:
•Durante este periodo no se ingresan materiales

3.Maquinaria y Equipos:
•Ingreso de maquinaria: No aplica
•Ingreso de equipos menores: No aplica

4.Equipos de Medición:
•No se utilizaron equipos de medición durante el periodo de este informe.
5.Inspección y Ensayo:
•Durante este periodo no se realizó ensayos de ninguna índole

CORRESPONDENCIA

ENVIADOS	RECIBIDOS
OFICIOS ENVIADOS: •OFICIO No. 267 - INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTA-PRIMER SEMESTRE 2025 •OFICIO No. 268 - MODIFICATORIA DEL CONTRATO DE OBRA No. 23001191 H4 DE 2023. •OFICIO No. 269 - REMISIÓN DE VALOR AJUSTADO DEL CONTRATO – CIERRE PRIMER AÑO •OFICIO No. 270 - REMISIÓN DE ACTA DE COBRO PARCIAL No. 4-V5. •OFICIO No. 265 - INFORME TECNICO DE OBRA MENSUAL No. 12. **E-MAIL ENVIADOS:** •INFORME SEMANAL DE OBRA No. 54	**OFICIOS RECIBIDO:** •CALM01-235-2024 INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRAACTUALES-APREMIO NUMERO 2 **E-MAIL RECIBIDO:** •RESPUESTA AL OFICIO 269 - REMISIÓN DE VALOR AJUSTADO DEL CONTRATO – CIERRE PRIMER AÑO. •Aprobación informe semanal numero 54

OBSERVACIONES	RESIDENTE DE OBRA
Durante el periodo correspondiente al presente informe no se llevaron a cabo actividades de obra física en el proyecto, debido a que se encuentra en espera de la aprobación del modificatorio del contrato. En consecuencia, las labores desarrolladas han sido de carácter netamente administrativo, orientadas a la atención y subsanación de las observaciones formuladas respecto a las actas y al documento del modificatorio en trámite.	 **ING JHONNY ANDRES TURIZO**

ANEXO N° 4
COPIA DE LA BITACORA

ANEXO N° 5
FICHAS TECNICAS

1. Controlador de reactivos

Intertek

PROGRAM ADMINISTRATOR
DEPARTMENT ALECP
INTERTEK
3933 U.S. ROUTE 11
CORTLAND, NY 13045-0950

REVISION DATE: December 4, 2019

ORIGINAL ISSUE DATE: April 06, 2018

Recertification due: October 2025

An Activity Sponsored and Administered by Intertek

HUGHEY & PHILLIPS, LLC
240 W. Twain Ave.
Urbana, OH 43078

AIRPORT LIGHTING EQUIPMENT CERTIFICATION PROGRAM

CERTIFICATE OF CONFORMANCE

The product described below is hereby approved for listing in the next issue of the Federal Aviation Administration (FAA) Advisory Circular (AC) 150/5345-53, Appendix 3 Addendum "Airport Lighting Equipment Certification Program. The approval is based on successful completion of tests in accordance with the specifications listed in, and the requirements for approval described in the Advisory Circular, and the reporting to the Program Administrator the results of such tests, accompanied by related documents by an Intertek recognized testing laboratory. This Certificate is only confirmable in conjunction with equipment being listed in AC 150/5345-53, Appendix 3, Addendum, as currently published by the FAA. The certification is not valid for a product modified with non-OEM replacement parts or non-production components.

L-829 – Constant Current Regulators with Monitoring (AC 150/5345-10H)

Manufacturer	Rating (kW)	Class	Style	Manufacturer's Catalog Number
Hughey & Phillips, LLC Fort Lauderdale, FL	1kW	1	1,2	L-829-7-X-1-1-2-X-1-X-X-X
	2kW	1	1,2	L-829-8-X-1-1-2-X-1-X-X-X
	4kW	1	1,2	L-829-1-X-1-1-2-X-1-X-X-X
	5kW	1	1,2	L-829-9-X-1-1-2-X-1-X-X-X
	7.5kW	1	1,2	L-829-2-X-1-1-2-X-1-X-X-X
	10kW	1	1,2	L-829-3-X-1-1-2-X-1-X-X-X
	15kW	1	1,2	L-829-4-X-1-1-2-X-1-X-X-X
	20kW	1	1,2	L-829-5-X-1-1-2-X-1-X-X-X
	30kW	1	1,2	L-829-6-X-1-1-2-X-1-X-X-X

1. This Equipment requires continuing validation in accordance with the requirements of AC 150/5345-53, and the Intertek Airport Lighting Equipment Certification Program.
2. Product tested and Report issued by: Intertek; KEMA

(A) Report No: 17252-D; 103253249CRT-001; 103253249CRT-002; 103253249MIN-027.1; 103253249CRT-003; 103253249BOX-044.1; 103253249BOX-036.1; 18038-D; 104095764CRT-001

(B) Date of Report: 11/2017; 1/2018; 3/2018; 3/2018; 8/2018; 8/2018; 6/2018; 3/2018; 10/2019

NOTE: PLEASE REVIEW, AND ADVISE ADMINISTRATOR AT INTERTEK IMMEDIATELY IF DATA, AS SHOWN, NEED TO BE CORRECTED.

Approved for Certification by:

Jeremy N. Downs, PE, Program Administrator
Date: December 4, 2019

Form AL-3 1/2006

NAVIGATE SERIES

L-828/ L-829 Constant Current Regulator

Ferroresonant

POWER & CONTROL EQUIPMENT - 4.11



COMPLIANCES

FAA AC 150/5345-10 (Current edition)

ETL Certified

Meets "Buy American" requirements

ICAO Annex 14

PRODUCT APPLICATION

The Navigate Series® L-828/ L-829 Constant Current Regulator is used to provide power to airfield lighting systems. It provides a selectable AC constant current to change the airfield lighting intensity according to existing visibility conditions.

THEORY OF OPERATION

The CCR regulates the output current using a Ferroresonant transformer. The Ferroresonant transformer allows for a low distortion sinusoidal output that is not easily affected by input line transients or disturbances. This style of transformer will also naturally regulate the output current without any controls at all, albeit a higher current than what is desired. With an auxiliary control winding, energy can be removed from the output, thus lowering the output current to the desired regulated value. A resonant tank circuit is formed between another set of transformer windings and an external capacitor bank. This tank circuit helps to maintain a sinusoid of a desired frequency as well as facilitate the transfer of energy away from the output.

A microcontroller module (DCMU) receives system feedback and provides closed-loop control of the transformer output through the Firing Card (FC) and a Solid-State Relay (SSR) via the control coil of the transformer. Output voltage is sensed through a transformer sense winding, while input and output current are sensed through chassis-mounted current sense transformers.

FEATURES

- Enclosure has provisions for floor mounting, and the 4kW and 7.5kW types are stackable to save space. Castors are available separately.
- Digital precision control of waveform, high-speed response, and local data storage.
- Digital Display may monitor output power, input voltage, input current, output voltage, VA, load VA changes, power factor, efficiency, number of failed lamps, programmable warning and alarm levels, accumulated operating time, as well as field circuit insulation resistance to earth ground (automatic megger as an option).
- Membrane keys with tactile response give maintenance workers immediate feedback and ease of menu navigation.
- Ferroresonant design provides a stable output current that is not affected by flashing loads.
- All CCRs are user configurable, including selection of 1 to 5 brightness steps, output current adjustment, selection of monitoring features, operational parameters and alarm setpoints.
- Diagnostic Data & User settings are accessible via RS-232 PC connection.

CONTROL CONFIGURATIONS

System may be operated locally (via keypad) or remotely (from tower control system). Output is configurable for 1, 3, or 5 brightness steps.

Remote control accepts 24VDC/48VDC, or 120VAC depending on which model of DCMU is ordered; control power may be supplied internally from CCR or externally from control system.

ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS

- Operating Temperature: -40 ºC to +55 ºC
- Elevation: Up to 6,600 feet (2,000 meters)
- Humidity: Up to 95%

ELECTRICAL REQUIREMENTS

Power Input	50/60Hz, 208/240/480VAC

HUGHEY H&P PHILLIPS

POWER & CONTROL EQUIPMENT - 4.11

ORDERING INFORMATION

CCR Order Number: L-82X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X

Type:
L-828
L-829

kW Output:
1 = 4kW
2 = 7.5kW
3 = 10kW
4 = 15kW
5 = 20kW
6 = 30kW
7 = 1kW
8 = 2kW
9 = 5kW

Input Voltage Options:
1 = 208V
2 = 240V
3 = 480V

S1 Cutout Options:
1 = None
2 = S1 External
3 = S1 Internal

Frequency:
1 = 60Hz
2 = 50Hz

Megger Options:
1 = Megger
2 = No Megger

DCMU Voltage Options:
1 = 120V
2 = 24/48V

Circuit Breaker Options:
1 = No Circuit Breaker
2 = 208V Circuit Breaker
3 = 240V Circuit Breaker
4 = 480V Circuit Breaker

Caster Options:
1 = Casters
2 = No Casters

Brightness Options:
1 = 1-Step
3 = 3-Step
5 = 5-Step

Current Sense Transformer Options:
0 = No Transformer
1 = With Transformer

RENEWAL PARTS

Description	Part Number
Capacitor, 50uF, 600VAC	A1-02-0176-002
Interlock Switch	A1-12-0126-001
Fuse, 1A	A1-21-0033-004
Fuse, 3A, 600V	A1-21-0039-003
Firing Card	A3-06-1502-001
S1 Internal Cutout Kit	A3-06-3177-001
S1 External Cutout Kit DCMU,	A3-06-3177-002
120/24V	A3-06-3178-001
DCMU, 120V	A3-06-3178-002
MOV, 820V, 10kA	A3-06-3181-001
MOV, 205V, 6kA	A3-06-3181-002
Snubber	A3-06-3181-003
MOV, 23VRSMS, 1kA Megger	A3-06-3181-004
Card Kit	K1-02-0033-001
Megger Resistor Assy Kit	K1-02-0033-002
5.25" Plastic Housing Kit	K1-02-0033-003
Lightning Arrestors 2.55 KV Kit	K1-02-0034-001
Lightning Arrestors 5.10 KV	K1-02-0034-002
Kit 480V-120VAC Transformer	K1-02-0038-001
Kit 120V-12VAC Transformer	K1-02-0038-002
Kit Power Transformer Kit	K1-02-0038-003
Contactor, 25A, 600V Kit	K1-02-0039-001
Contactor, 40A, 600V Kit	K1-02-0039-002
Contactor, 60/75A, 600V Kit	K1-02-0039-003
Contactor, 90A, 600V Kit	K1-02-0039-004
Contactor, 185A, 600V Kit	K1-02-0039-005
Contactor, 225A, 600V Kit	K1-02-0039-006
Display Kit	K1-02-0040-001
SSR Kit	K1-02-0044-001
Circuit Breaker, 15A, 600V Kit	K1-02-0046-001
Circuit Breaker, 25A, 600V Kit	K1-02-0046-002
Circuit Breaker, 30A, 600V Kit	K1-02-0046-003
Circuit Breaker, 50A, 600V Kit	K1-02-0046-004
Circuit Breaker, 60A, 600V Kit	K1-02-0046-005
Circuit Breaker, 70A, 600V Kit	K1-02-0046-006
Circuit Breaker, 90A, 600V Kit	K1-02-0046-007
Circuit Breaker, 110A, 600V Kit	K1-02-0046-008
Circuit Breaker, 125A, 600V Kit	K1-02-0046-009
Circuit Breaker, 160A, 600V Kit	K1-02-0046-010
Circuit Breaker, 185A, 600V Kit	K1-02-0046-011

WEIGHT AND DIMENSIONS

Size(kW)	Dimensions in Inches	Weight in lbs. (kg)
1	40x24x24	285 (129)
2	40x24x24	320 (145)
4	40x24x24	345 (156)
5	40x24x24	395 (179)
7.5	40x24x24	465 (211)
10	40x24x24	565 (256)
15	40x30x36	965 (438)
20	40x30x36	1065 (483)
30	40x30x36	1350 (612)

6830 NW 16th Terrace • Ft. Lauderdale, FL 33309 USA
Phone: 1.937.652.3500 • E-mail: AFLsales@HugheyAndPhillips.com • www.HugheyAndPhillips.com

Actual product specifications may have changed since the printing of this brochure.
Brochure specifications are not binding. Confirm current specifications at time of order.

2. Sistema de sistema contra incêndio RCI

UL Product iQ®

UL Solutions

Audible-signal Appliances

COMPANY

System Sensor Unincorporated, Div of Honeywell International Inc
3825 Ohio Ave
Saint Charles, IL 60174-5467 United States

S4011

Bells, vibrating, Models SSM24-6, SSM24-8, SSM24-10, SSV120-6, SSV120-8, SSV120-10 for outdoor use when used with NEMA 3R weather resistant back box, Model WBB.

Chimes, Model CH12/24 for indoor use private mode only; Model WBB for outdoor use.

Models CHR, CHW, CHRA, CHWA. For indoor use, private mode use only.

Chimes/strobes, Models CH24MC, CH24MCW. For wall mount, indoor use.

Models CHSR, CHSW. For indoor use only, private mode use only.

Horns, Model PA400W with or without suffix -F. For indoor use only.

Models HR, HW. Intended for indoor use mounted on the wall or ceiling.

Models MHR, MHW. For indoor use only.

Tones 1, 2, 3 and 4 are Public Mode at 24V DC/FWR.

Tone 3 is Public Mode at 12V DC.

Tones 1, 2 and 4 are Private Mode at 12V DC.

Tones 1, 2, 3 and 4 are Private Mode at 12V FWR.

Model APA151. For indoor use only. Public mode.

Mini-Horn, Model MHR1, Input: 8 - 33 Vdc, 8 - 33 Vfwr; for indoor use only.

Sounder/strobes, Model P2475RL . May employ "W" or "Z" suffix. For indoor wall mount only.

Model P12015K for indoor or outdoor use.

Directional sounders, Model PF24V for supplemental fire alarm use. Indoor use only.

520 Hz Low frequency sounders, Models HR-LF, HW-LF. Intended for indoor use only and may be mounted on the wall or the ceiling.

520 Hz Low frequency sounders/strobes, Models P2RH-LF, P2WH-LF. Intended for indoor use only and may be mounted on the wall or the ceiling.

SPECTRALERT ADVANCE SERIES HORNS, CHIMES AND COMBOS

***General** - Models with "K" in the suffix are suitable for indoor or outdoor use with an operating temperature rating of -40°C to +66°C (-40°F to +151°F) and have a NEMA Type 3, 3R and 4X enclosure ratings only when used with the Listed Plastic models SA-WBB and SA-WBBW (wall) or the Plastic models SA-WBBC and SA-WBBCW (ceiling) weatherproof back boxes. Models with "-P" in the suffix have plain housings with no lettering on the enclosure. Models not containing either "-P", in the suffix have English lettering reading "FIRE" on the housing. Models with the "-SP" suffix have Spanish lettering reading "FUEGO" on the housing. Models with the "-PG" suffix have Portuguese lettering reading "FOGO" on the housing.

Horns - Models HR, HW. Intended for indoor use mounted on the wall or ceiling, Models HRK, and HWK, intended for indoor or outdoor use, mounted on the wall or ceiling. *

Horns, Models HWL-LF(a), HRL-LF(a), HGWL-LF(a), HGRL-LF(a) Intended for indoor use mounted on the wall.

Horns, Models HCWL-LF(a), HCRL-LF(a) Intended for indoor use mounted on the ceiling.

Chimes - Models CHR, CHW are intended for private mode only. Intended for indoor use mounted on the wall or ceiling.

Chime/Strobes - Models CHSR, CHSW are intended for private mode only. Intended for indoor use mounted on the wall or ceiling.

Horn/Strobes - Two-wire type, rectangular enclosure, Models P2R, P2W, P2RH, P2WH. Intended for indoor use mounted on the wall or ceiling, Models P2RK, P2RK-R, P2RK-P, P2WK, P2WK-R, P2WK-P, P2RHK, P2RHK-R, P2RHK-P, P2WHK, P2WHK-R, P2WHK-P, intended for indoor and outdoor use, mounted on the wall or ceiling *.

Horn/Strobes - Two-wire type, round enclosure, Models PC2R, PC2W, PC2RH, PC2WH. Intended for indoor use mounted on the wall or ceiling, Models PC2RK, PC2RK-R, PC2RK-P, PC2WK, PC2WK-R, PC2WK-P, PC2RHK, PC2RHK-R, PC2RHK-P, PC2WHK, PC2WHK-R, PC2WHK-P, intended for indoor and outdoor use, mounted on the wall or ceiling *.

Horn/Strobes, Two-wire type, rectangular enclosure, Models P2WL-LF(a) and P2RL-LF(a) Intended for indoor use mounted on the wall. Round enclosure , Models PC2RL-LF and PC2WL-LF intended for indoor use mounted on the ceiling.

Horn/Strobes - Four-wire type, rectangular enclosure, Models P4R, P4W, P4RH, P4WH. Intended for indoor use mounted on the wall or ceiling, Models P4RK, P4WK, P4RHK and P4WHK, intended for outdoor use, mounted on the wall or ceiling *.

Horn/Strobes - Four-wire type, round enclosure, Models PC4R, PC4W, PC4RH, PC4WH. Intended for indoor use mounted on the wall or ceiling, Models PC4RK, PC4WK, PC4RHK, P4WHK-P and PC4WHK, intended for outdoor use, mounted on the wall or ceiling *.

GLOBAL AV COMBO PRODUCT SERIES HORNS, STROBES AND COMBOS:

General - Models for indoor wall and ceiling mount only and for use with an operating temperature of 0°C to +49°C (32°F to +120°F). Models with "R" in the suffix implement a red strobe lens.

Horn/Strobes - Two-wire type, rectangular enclosure, Models SYS-HS, SYS-HSR, SYS-HSR-FIRE, SYS-HSW, SYS-HSRW, SYS-HSRW-FIRE. Intended for indoor use mounted on the wall or ceiling.

Accessories:

Back box, Model WBBF for indoor/outdoor use.

Models SA-WBB, SA-WBBC (Back boxes for Spectralert Advance Series) for indoor/outdoor use.

Weatherproof plates, Models WTP, WTPW, WTP-SP, WTP-SPW, with a NEMA Type 3R and IP22 enclosure ratings. May be used in place of the listed weatherproof back boxes as follows:

Models WTP (Red), WTPW (White) Weatherproof Plates used with horn and horn/strobes models with "K" suffix, suitable for indoor or outdoor flush mount usage, wall or ceiling, with an extended operating temperature range of -40 degrees F to 151 degrees F (-40 degrees C to 66 degrees C). They can be mounted to 2 inch by 4 inch or 4 inch by 4 inch back boxes, with a 1-1/2 inch minimum depth.

Models WTP-SP (Red), WTP-SPW (White) Weatherproof Plates used with speakers and speaker/strobes models with "K" suffix, suitable for indoor or outdoor use flush mount usage, wall or ceiling, with an operating temperature rating of -40 degrees F to 151 degrees F (-40 degrees C to 66 degrees C). They can only be mounted to a 4 inch by 4 inch by 2-1/8 inch back box.

Sync modules, Models MDL3R, MDL3W, MDL, MDLW.

Models MDL3R, MDL3W are also Listed under Audible-signal Appliances (ULSZ).

120 VAC adapter mounting plate, Model MP120K may be used with Models P2R, P2RH, P2RK, P2RHK, P2W, P2WH, SR, SRH, SRK, SRHK, SW, SWH, PC2R, PC2RH, PC2RK, PC2RHK, PC2W, PC2WH, SCR, SCRH, SCRK, SCRHK, SCW, SCWH, HR, HRK, HW, SR-P, SW-P, SRH-P, SWH-P, P2R-P, P2W-P, P2RH-P, P2WH-P, SCR-P, SCW-P, SCRH-P, SCWH-P, PC2R-P, PC2W-P, PC2RH-P, PC2WH-P, SR-SP, SRH-SP, P2R-SP, P2RH-SP, SCW-SP, SCWH-SP, PC2W-SP, PC2WH-SP, CHR, CHW, CHSR, CHSW.

Smoke detector audible bases, Models B501BH, B501BHT, B501BH-2, B501BHT-2.

Wireless AV Base, Ceiling, Models WAV-CRL and WAV-CWL (***); and Wall, Models WAV-RL and WA-WL (***) .

Audible signal appliance accessories, accessory retrofit trim plates, Models RFP, RFPW. Optional with Series H horns, Series CH Chimes, Series CHS Chime/Strobes, Series P2 Horn/Strobes, Series PC2 Horn/Strobes, Series P4 Horn/Strobes, and Series PC4 Horn/Strobes.

Audible signal appliance accessories, accessory trim rings, Models TR-HS, TRW-HS, TRC-HS, TRCW-HS. Optional with Series H horns, Series CH Chimes, Series CHS Chime/Strobes, Series P2 Horn/Strobes, Series PC2 Horn/Strobes, Series P4 Horn/Strobes, and Series PC4 Horn/Strobes.

Ceiling trim ring, Optional with Models SYS-HS, SYS-HSR, SYS-HSR-FIRE, SYS-ST, SYS-STR.

Ceiling trim plates, Models SYS-CTP, SYS-CTPR, SYS-CTPR-FIRE, SYS-CTPW, SYS-CTPRW, SYS-CTPRW-FIRE.

Horns*, Models HWL**, HRL**, HGRL**, HGWL**.

Chimes*, Models CHWL**, CHRL**.

Horn Strobes*, Models P2RL, P4RL, P2WL, P4WL, P2GRL, P2GWL, P2RL-P, P2WL-P, P2RL-SP, P2WL-SP, PC2RL, PC4RL, PC2WL, PC4WL.

Chime Strobes*, Models CHSRL, CHSWL, CHSCRL, CHSCWL.

Horn Strobes, Models P2RLED, P2WLED, P2RLED-B, P2RLED-B, P2RLED-P, P2WLED-P, P2RLED-SP, P2WLED-SP, PC2RLED, PC2WLED, PC2RLED-B, PC2WLED-B, P2GRLED, P2GWLED, P2GRLED-B, P2GWLED-B

Horns (**) (b) (c), Models HGRKL, HGRKL-B.

Low Frequency Sounder – HRL2-LF, HWL2-LF, HGRL2-LF, HGWL2-LF, HRLA-LF, HWLA-LF intended for Wall Mount, indoor use.

Low Frequency Sounder – HCRL2-LF, HCWL2-LF, HCRLA-LF, HCWLA-LF intended for Ceiling Mount, indoor use.

Horn Strobes (b) (c), Models P2GRKLED, P2GRKLED-P, P2GRKLED-B, P2GWKLED, P2GWKLED-P, P2GWKLED-B. Intended for Wall Mount.

Horn Strobes (b) (c), Models PC2RKLED, PC2RKLED-P, PC2RKLED-B, PC2WKLED, PC2WKLED-P, PC2WKLED-B. Intended for Ceiling Mount.

Chime/Strobes - Models CHSRLED, CHSRLED-B, CHSWLED, CHSWLED-B are intended for private mode only. Intended for indoor use mounted on the wall.

Chime/Strobes - Models CHSCRLED, CHSCRLED-B, CHSCWLED, CHSCWLED-B are intended for private mode only. Intended for indoor use mounted on the Ceiling.

Low Frequency Sounder/Strobes – Models P2RLED-LF, P2WLED-LF, P2RLED-B-LF, P2WLED-B-LF intended for Wall Mount, indoor use.

Low Frequency Sounder/Strobes – Models PC2RLED-LF, PC2WLED-LF, PC2RLED-B-LF, PC2WLED-B-LF intended for Ceiling Mount, indoor use.

(*) May be used with accessory models; TR-2, TR-2W, TRC-2, and TRC-2W, installed on compatible enclosure models SBBRL, SBBWL, SBBGRL, SBBGWL, SBBCRL, and SBBCWL, and used with AC adapter mounting plate models MP120KL & MP120KLA.

(**) Suitable for use on wall & ceiling.

(***) Compatible only with Listed Models PC2RL, PC2WL, P2RL, P2WL, P2WL-P, P2WL-SP, P2RL-P, P2RL-SP, CHSCRL, CHRL, CHWL, CHSCWL, CHSRL, CHSWL, HRL, HWL, HRL-LF, HWL-LF, P2RL-LF, P2WL-LF, HCRL-LF, HCWL-LF, HGRL-LF, HGWL-LF, CHSCRL, CHSCWL, PC2RL, PC2WL.

(a) Devices may be bulk-packed with System Sensor added internal control number suffix -BP10 on master shipping carton.

(b) Intended for outdoor wet use.

(c) Rated Type 4X and IP56 as standalone devices (without the backbox).

Last Updated on 2025-06-26

The appearance of a company's name or product in this database does not in itself assure that products so identified have been manufactured under UL Solutions' Follow - Up Service. Only those products bearing the UL Mark should be considered to be Certified and covered under UL Solutions' Follow - Up Service. Always look for the Mark on the product.

UL Solutions permits the reproduction of the material contained in Product iQ subject to the following conditions: 1. The Guide Information, Assemblies, Constructions, Designs, Systems, and/or Certifications (files) must be presented in their entirety and in a non-misleading manner, without any manipulation of the data (or drawings). 2. The statement "Reprinted from Product iQ with permission from UL Solutions" must appear adjacent to the extracted material. In addition, the reprinted material must include a copyright notice in the following format: "©2025 UL LLC."

UL Product iQ®

UL Solutions

Boxes, Noncoded Certified for Canada

COMPANY

Edwards/Kidde Commercial
8985 Town Center Pkwy
Bradenton, FL 34202 United States

S2318

Trademark and/or Tradename: "Dukane" , "E in a Shield" , "Edwards" , "Edwards Co Inc" , "Edwards Company Inc." , "Edwards Signaling" , "Edwards System Technology" , "ESL" , "FAST" , "Fire Alarm Systems Technology" , "FireworX" , "G.S. Building Systems Corp." , "GE Security" , "GE Security Inc" , "GS" , "GSBS" , "Inc." , "Interlogix Inc" , "KIDDE" , "Kidde Commercial”" , "Mirtone" , "S2318" , "Sentrol" , "Vigilant" , "Walter Kidde Portable Equipment" , "Walter Kidde Portable Equipment Inc." , "Ziton" ,

Note: For additional marking information, refer to the Guide Information Page.

View model for additional information

Non coded, addressable manual stations, Model(s): GSA-M278, SIGA-278, SIGI-278

Non-coded manually activated fire alarm manual stations, Model(s): 276B-1120, 278B-1120, 278B-2320, K-276B-1120, K-278B-1120, K-278B-2320

Non-coded manually activated release stations, Model(s): 276A-REL, 278A-REL, K-276A-REL, K-278A-REL

Non-coded, Addressable Manual Stations, Model(s): GSA-M270, GSA-M270P, SIGA-270, SIGA-270L, SIGA-270P, SIGC-270B, SIGC270BC, SIGC270C, SIGC-270F, SIGC-270PB, SIGC270PBC, SIGC270PC, SIGI-270, SIGI-270L

Non-coded, Manual Stations, Model(s): 270-DOC with or without suffix B or F., 270-GAO with or without suffix B or F., 270-SPO with or without suffix B or F., 270-SPOW with or without suffix B or F., K-270-DOC with or without suffix B or F., K-270-SPO with or without suffix B or F.

Non-coded, Manual Stations, Model(s): 270-DOC-CA with or without suffix B or F.

Non-coded, Manual Stations, Model(s): 270-GAO-120 with or without suffix B or F.

Non-coded, Manual Stations, Model(s): 270-GAO-DOC with or without suffix B or F.

Non-coded, Manual Stations, Model(s): 270-SPO-120 with or without suffix B or F.

Pulll Station, Model(s): E-270, E-278, FX-270, FX-278

Last Updated on 2025-06-19

UL Product iQ®

UL Solutions

Smoke Detectors for Fire Alarm Systems

COMPANY

SECURITON AG
Alpenstrasse 20
Zollikofen, 3052 Switzerland

S25264

Investigated to UL 268 (7th ed.)
Products Suitable for Ducts, D(I) and D(ST) are investigated to UL 268A

Detector Model	Application	Type	Compatibility Restrictions	Velocity Range (fpm) Min	Max	date of Manufacture	Time of Manufacture Firmware Version	Firmware Version Update
ASD 533-1 (a)(b)(c),, ASD 533-2 (a)(b)(c), ASD 535-1 (a)(b)(c), ASD 535-1 China (a)(b)(c), ASD 535-2 (a)(b)(c), ASD 535-2 China (a)(b)(c), ASD 535-3 (a)(b)(c), ASD 535-3HD (a)(b)(c), ASD 535A-3CN (a)(b)(c), ASD 535A-3HD CN (a)(b)(c), ASD 535-4 (a)(b)(c), ASD 535-4HD (a)(b)(c), ASD 535A-4CN (a)(b)(c), ASD 535A-4HD CN (a)(b)(c)	OAP, AS	P	None	0	4000	-	-	-

Investigated to UL 268 (previous editions)
Products Suitable for Ducts, D(I) and D(ST) are investigated to UL 268A

Detector Model	Application	Type	Compatibility Restrictions	Velocity Range (fpm) Min	Max	date of Manufacture	Time of Manufacture Firmware Version	Firmware Version Update

ASD 531 (a)(c), ASD 531China (a)(c), ASD 532 (a)(b)(c), ASD 532China (a)(b)(c),	OAP, AS	P	None	0	4000	-	-	-

OAP - Open Area Protection

AS - Air Sampling

P - Photoelectric

date of Manufacture identifies the manufacturing start date of all product models that will use the specific Time of Manufacture Firmware Version. The date of manufacture is noncoded and in the format YEAR (in 4 digits), MONTH (in letters), DAY (in 2 digits).

Time of Manufacture Firmware Version identifies a numerical and/or alphabetic series designation that is product and date-code specific and will only identify the Firmware Version at the time the product was manufactured. The numeric and/or alphabetic sequence is defined by the manufacturer.

Firmware Version Update is a numerical and/or alphabetic sequential identification that is product and date-code specific and sequentially identifies the Firmware Version Update from the previous version of firmware. The numerical and/or alphabetic sequence is defined by the manufacturer.

(a) - Suitable for open area protection with limits as described in the installation instruction manual.

(b) - Suitable for air duct installations with limits as described in the installation instruction manual.

(c) - Suitable for special application installations with limits as described in the installation instruction manual.

Last Updated on 2024-06-13

The appearance of a company's name or product in this database does not in itself assure that products so identified have been manufactured under UL Solutions' Follow - Up Service. Only those products bearing the UL Mark should be considered to be Certified and covered under UL Solutions' Follow - Up Service. Always look for the Mark on the product.

UL Solutions permits the reproduction of the material contained in Product iQ subject to the following conditions: 1. The Guide Information, Assemblies, Constructions, Designs, Systems, and/or Certifications (files) must be presented in their entirety and in a non-misleading manner, without any manipulation of the data (or drawings). 2. The statement "Reprinted from Product iQ with permission from UL Solutions" must appear adjacent to the extracted material. In addition, the reprinted material must include a copyright notice in the following format: "©2025 UL LLC."

Certificate of Compliance

Certificate Number:
UL-US-2326418-1

Report Reference:
EX6174-20110511

Issue Date:
2024-03-06

Issued to:

SEVO SYSTEMS INC
14335 W 97TH TER LENEXA, KS 66215-1150
United States

This certificate confirms that representative samples of:
GAQF - Clean-agent Extinguishing System Units

See Addendum Page for Product Designation(s).

Have been evaluated by UL in accordance with the Standard(s) indicated on this Certificate.

ANSI/CAN/UL/ULC 2166, 3rd Ed, Issue Date: 2017-5-10, Revision Date: 2021-12-8

Additional Information:
See UL Product iQ® at https://iq.ulprospector.com for additional information.

This Certificate of Compliance indicates that representative samples of the product described in the certification report have met the requirements for UL certification. It does not provide authorization to apply the UL Mark. Only the Authorization Page that references the Follow-Up Services Procedure for ongoing surveillance provides authorization to apply the UL Mark.

Only those products bearing the UL Mark should be considered as being UL Certified and covered under UL's Follow-Up Services.

Look for the UL Certification Mark on the product.

David Piecuch
UL Mark Certification Program Manager

Any information and documentation involving UL Mark services are provided on behalf of UL LLC (UL) or any authorized licensee of UL. For questions, please contact UL Solutions Customer Service at https://www.ul.com/contact-us.

Page 1 of 3

© 2024 UL LLC. All rights reserved.
Form-ULID-013925-CoCa – ver 1.0

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Certificate number UL-US-2326418-1
Report reference EX6174-20110511
Date 2024-03-06

This is to certify that representative samples of the product as specified on this certificate were tested according to the current UL requirements.

Model	Product Description
Sevo Series, FK-5-1-12 Fire Protection Fluid engineered extinguishing system units with seamless cylinders, 34.5 bar (500 psig)	Engineered, Halocarbon
Sevo Series, FK-5-1-12 Fire Protection Fluid engineered extinguishing system units with welded cylinders, 34.5 bar (500 psig)	Engineered, Halocarbon
Sevo Series, Force 500 FFT 1230 Fire Protection Fluid engineered extinguishing system units with welded cylinders, 34.5 bar (500 psig)	Engineered, Halocarbon

Clean Agent Extinguishing System Units		Value
Extinguishing Agent (ASHRAE Designation)		FK-5-1-12
Manuals and Bulletins		
Part No.	Description	Date/Rev
SE 1230 – 500 ENG	Force 500 Design, Installation, Operation, & Maintenance Manual	Issued April 2009, revised 01-25-2023
SE 1230 – 500 ENG	Design, Installation, Operation, & Maintenance Manual	Issued April 2009, revised 11-11-2023
SE 1230 – 500 ENG Seamless	Design, Installation, Operation, & Maintenance Manual	Issued April 2009, revised 11-08-2023
System Unit Information		
Operating Pressure at Temperature	Minimum Operating Temperature	Maximum Operating Temperature
34.5 bar (500 psig)	0 °F (-17.8 °C)	130 °F (54.4 °C)
These installations require the use of the Listee's flow calculation software:		
Sevo VDS software Novec – Calculation Program Versions 7.2 or 7.6		

David Piecuch
UL Mark Certification Program Manager

Any information and documentation involving UL Mark services are provided on behalf of UL LLC (UL) or any authorized licensee of UL. For questions, please contact UL Solutions Customer Service at https://www.ul.com/contact-us.

UL Solutions

Page 2 of 3

© 2024 UL LLC. All rights reserved.
Form ULID 013925 CoCa ver 1.0

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Certificate number UL-US-2326418-1
Report reference EX6174-20110511
Date 2024-03-06

Model	Product Description
Sevo Series, 3M™ Novec™ 1230 Fire Protection Fluid engineered extinguishing system units with FFT welded cylinders, 34.5 bar (500 psig)	Engineered, Halocarbon
Sevo Series, 3M™ Novec™ 1230 Fire Protection Fluid engineered extinguishing system units with seamless cylinders, 34.5 bar (500 psig)	Engineered, Halocarbon
Sevo Series, 3M™ Novec™ 1230 Fire Protection Fluid engineered extinguishing system units with welded cylinders, 34.5 bar (500 psig)	Engineered, Halocarbon

Clean Agent Extinguishing System Units		Value
Extinguishing Agent (ASHRAE Designation)		FK-5-1-12mmy2
Manuals and Bulletins		
Part No.	Description	Date/Rev
SE 1230 – 500 ENG	Design, Installation, Operation, & Maintenance Manual, welded cylinders	Issued April 2009, revised 01-05-2016
SE 1230 – 500 ENG Seamless	Design, Installation, Operation, & Maintenance Manual, seamless cylinders	Issued April 2009, revised 01-05-2016
SE 1230 - 500 ENG	Design, Installation, Operation, & Maintenance Manual With FFT cylinder sizes	Issued April 2009, revised 01-06-2016
System Unit Information		
Operating Pressure at Temperature	Minimum Operating Temperature	Maximum Operating Temperature
34.5 bar (500 psig)	0 °F (-17.8 °C)	130 °F (54.4 °C)
These installations require the use of the Listee's flow calculation software:		
Sevo VDS software Novec – Calculation Program Versions 7.2 or 7.6		

David Piecuch
UL Mark Certification Program Manager

Any information and documentation involving UL Mark services are provided on behalf of UL LLC (UL) or any authorized licensee of UL. For questions, please contact UL Solutions Customer Service at https://www.ul.com/contact-us.

UL Solutions

Page 3 of 3

© 2024 UL LLC. All rights reserved.
Form-ULID-013925-CoCa – ver 1.0

UL Product iQ®

UL Solutions

Control Unit Accessories, System

COMPANY

NOTIFIER
12 Clintonville Rd
Northford, CT 06472-1610 United States

S635

View model for additional information

Model(s): ABF-4@, ACM-8R, BB-XP, PRN-6

"Control modules, supply voltage 15-32 Vdc, 6.5 mA maximum", Model(s): FCM-1

Amplifier - subassembly, Model(s): NFC-BDA-25, NFC-BDA-70V

Annunciator Loop Repeaters, Model(s): RPT-485W, RPT-485WF

Audio Transformer, Model(s): NFC-XRM-70V

Backbox, Model(s): AFAWS-BX

Battery box Model, Model(s): BB-25

Cellular Transmitter, Model(s): CELL-CAB-N

Circuit Expander - subassembly, Model(s): NFC-CE6

Control Module, Model(s): FTM-1A (a)

Control modules, Model(s): FRM-1, JKM-FCM-1C

Digital Alarm Communicator Transmitter, Model(s): UDACT, UDACT-2

Direct Panel Interface, Model(s): DPI-232

Distributed Audio Panel, Model(s): FireVoice-25/50DA, FireVoice-25/50DAZS

Doors, Model(s): AFAWS-KR, AFAWS-KS, AFAWS-LR, AFAWS-LS

Dual monitor modules, Model(s): FDM-1, FTM-1[@]

Emergency Command Center - ACU, Model(s): NFC-50/100, NFC-50/100E

Enclosure, Model(s): CAB-RM, CAB-RMR

Fault Isolator Module, Model(s): ISO-101

Fire fighter telephone station, Model(s): NFC-FFT

Fire fighters phones, Model(s): AFAWS-TELA, AFAWS-TELC

Input monitor modules, Model(s): XP10-M

Input/Output Module, Model(s): FDRM-1

Local Operator Console, Model(s): NFC-LOC

Monitor module, Model(s): FMM-1[#]

Monitor modules, Model(s): FMM-101, FZM1[@], NMM-100P, NMM-100P, NZM-100, NZM-100

Network control annunciators, Model(s): NCA-2

Quad Intelligent Audio Transponder, Model(s): XPIQ

Relay Module, Model(s): XP6-R

Remote annunciators, Model(s): N-ANN-I/O

Remote Microphone, Model(s): RM-1, RM-1SA

Remote microphone modules, Model(s): NFC-RM

Remote Notification Circuit Expander/Battery Charger, Model(s): FCPS-24FS6E

Remote paging unit, Model(s): NFC-RPU

Remote Repeater Modules, Model(s): RPT-F, RPT-W, RPT-WF

Serial/parallel interfaces, Model(s): N-ANN-S/PG

Six Zone Interface Module, Model(s): XP6-MA

Subassembly, Model(s): ABF-1B [a], ABF-1D, ABF-1DB [a], ABF-2@, ABF-2B [a], ABF-2DB [a], ABF-4B [a], ABS-1@, ABS-1T@, ABS-1TB [a], ABS-2@, ABS-2D [a], ABS-2DR [a], ABS-4DR [a], ABS-8R@, ACM-16AT, ACM-16ATG, ACM-16ATY, ACM-32A, ACM-32AG, ACM-32AY, ADDR-B4 [a], ADDR-B4R [a], ADDR-C4 [a], ADDR-C4R [a], ADDR-D4 [a], ADDR-D4R [a], AEM-16AT, AEM-16ATG, AEM-16ATY, AEM-32A, BP2-4 [a], BP-4 [a], CAB-3, CAB-3B, CAB-RP [a], CAB-RPR [a], DR- C4R [a], DR-A4B [a], DR-A4BR [a], DR-A4R [a], DR-B4B [a], DR-B4BR [a], DR-B4R [a], DR-C4B [a], DR-C4BR [a], DR-D4B [a], DR-D4BR [a], DR-D4R [a], NFS-LBB [a], NFS-LBBR [a], XPIQ-AA2270, XPIQ-AA25, XPIQ-AIB1, XPIQ-AIB4, XPIQ-CA, XPIQ-MB, XPIQ-MBPCB, XPIQ-PS, XPIQ-PSE, XPIQ-RMI, XPIQ-SLI

Supervising Control Module, Model(s): XP6-C

Investigated to UL 864 (10th edition)
Model(s): AMPS-24/E

Annunciator control modules, remote, input 24 V dc, 56 mA, Model(s): ACM-24AT (f14), ACM-48A (f14)

Annunciator expander modules, remote, input 24 V dc, 18 mA, Model(s): AEM-24AT (f14), AEM-48A (f14)

Annunciator Keyswitch, Model(s): AKS-1, AKS-1B

Backbox Series, Model(s): CAB-AA4, CAB-AA4(a)

Battery boxes, Model(s): BB-17, BB-55, NFS-LBB, NFS-LBBR

End of line resistors, Model(s): 401-4901, 401-4902, 75603, ELR-47K, R-10K, R-47K

End of line supervision devices, Model(s): REL-2.2K, REL-3.3K, REL-4.7K, REL-47K

Lamp driver annunciator modules, Model(s): LDM-32(f03), LDM-E32(f03), LDM-R32(f03)

Network control annunciators, input 24 V dc, 483 mA, Model(s): NCA-2-HE, NCA-2-KO, NCA-2-PO, NCA-2-RU, NCA-2-SC, NCA-2-SP, NCA-2-TC, NCA-2-TH

Network Control Display, Model(s): NCD

Power supply expander, Model(s): PSE-10, PSE-10E, PSE-6, PSE-6E

Remote annunciators, Model(s): FDU-80, LCD-160(f11), LCD-160-HE(f11)&, LCD-160-KO(f11)&, LCD-160-PO(f11)&, LCD-160-RU(f11)&, LCD-160-SC(f11)&, LCD-160-SP(f11)&, LCD-160-TC(f11)&, LCD-160-TH(f11)&

Remote annunciators, input 18.8-38.2 VDC, 48 mA, Model(s): N-ANN-80W

Remote annunciators, 24 V dc 100 mA, Model(s): LCD2-80, with ABS-1T and ABF-1 backboxes and AKS-1 key switch, the ABF-1 may include the AKS-1 key switch

Remote annunciators, input 18.8-38.2 VDC, 48 mA, Model(s): N-ANN-80

Subassembly, Model(s): ABM-32A dress panel

Subassembly, Backbox, Model(s): SBB-A4+, SBB-B4+, SBB-C4+, SBB-D4+

Subassembly, battery holder chassis, Model(s): CHS-BH1

Subassembly, chassis, Model(s): CHS-2D, CHS-4L

Subassembly, Class A converter, Model(s): ZNAC-PS

Subassembly, CPU board, Model(s): CPU-NCD-RB

Subassembly, Door, Model(s): ADDR-B4+, ADDR-C4+, ADDR-D4+, DR-A4+, DR-AA4, DR-AA4BR, DR-AA4R, DR-B4+, DR-C4+, DR-D4+, EQDR-B4+, EQDR-C4+, EQDR-D4+

Subassembly, dress panel, Model(s): DPA-1, DPA-2, DP-GDIS1, DP-GDIS2

Subassembly, enclosure, Model(s): ABF-1, ABF-1/B, ABF-1/D, ABF-1/F, ABF-1/R, ABF-2, ABF-2/B, ABF-2/D, ABF-2/F, ABF-2/R, ABF-4, ABF-4/B, ABF-4/F, ABF-4/R, ABS-1, ABS-1/B, ABS-1/F, ABS-1/R, ABS-1T, ABS-1T/B, ABS-1T/F, ABS-1T/R, ABS-2, ABS-2/B, ABS-2/F, ABS-2/R, ABS-2D(+), ABS-2D/B, ABS-2D/F, ABS-2D/R, ABS-4D(+), ABS-4D/B, ABS-4D/F, ABS-4D/R, ABS-8R, ABS-8RB, ABS-8RF, ABS-TD, BB-100, BB-100R, BB-200, BB-200R, BB-UZC, CA-1, CA-2, CAB-A4+, CAB-B4+, CAB-C4+, CAB-D4+, CAB-PS1, CAB-RP, CAB-RPR, EQBB-B4+, EQBB-C4+, EQBB-D4+, SBB-AA4, SBB-AA4B, SBB-AA4R

Subassembly, High speed network communication module, Model(s): HS-NCM-MFSF, HS-NCM-SF, HS-NCM-W, HS-NCM-W-2, HS-NCM-WMF, HS-NCM-WMF-2, HS-NCM-WSF, HS-NCM-WSF-2

Subassembly, microphone chassis, Model(s): CMIC-1

Subassembly, Power Supply, Model(s): APS2-6RE

Subassembly, Retrofit Adapter Plate, Model(s): DP-ADP, DP-NCD-2D, RLD-1DB-RTO

Supervised isolated relay module, Model(s): FRM-1-ISO

Universal zone coder module, Model(s): UZC-256

Wireless driver, Model(s): FWUI-DD

Wireless gateway, Model(s): FWSG

Investigated to UL 864 (10th edition), ULC S527

Addressable charger/power supplies, input 120 Vac, 50/60Hz 5.0A, Model(s): ACPS-610

Addressable charger/power supplies, input 220-240 Vac 50/60 Hz, 2.5A, for use with ULC listed notifier control units, Model(s): ACPS-610E

Annunciator, Model(s): RLD

End of line device, Model(s): ELRD-2.2K

High Level Interface (HLI) network card, Model(s): VHX-1420-HFS

Power supply expander, Model(s): PSE-10C, PSE-10R, PSE-6C, PSE-6R

Remote Ancillary display/ Remote Annunciator, Model(s): N-ANN-100, N-ANN-100R

Subassembly, Annunciator control module, Model(s): ACM-30

Subassembly, Dress panel, Model(s): DP-4A-CB4, DP-T2A-CB4

Subassembly, Enclosure, Model(s): ABB-1, ABB-2

Subassembly, High speed networkcommunication module, Model(s): HS-NCM-MF

Subassembly, Lamp Driver Module, Model(s): LDM2-32, LDM2-60

Subassembly, Power Supply, Model(s): APS2-6R

Subassembly, Retrofit Adapter Plate, Model(s): ACM-1DB-RTO

Subassembly, Transmitter Module, Model(s): TM-8

Investigated to UL 864 (9th edition)
Audio fiber modules, Model(s): AFL-R, AFL-RM, AFL-RS, AFL-T, AFL-TM, AFL-TS

Control modules, Model(s): FCM-1-REL, NC-100, NC-100, NC-100R, NC-100R

Control modules, supply voltage 15-32 Vdc, 6.5 mA maximum, Model(s): FCM-1 (f13), JKM-FCM-1 (f13), JKM-FCM-1C (f13)

Dual Monitor Module, Model(s): NDM-100

Enclosures, Model(s): DR-PS1, ROME-B

End of line resistors, Model(s): A2143-00

Fault Isolator Module, Model(s): ISO-9G, N100-ISO, TC961A1006

Fault isolator modules, Model(s): ISO-X

Fire alarm subassemblies, Model(s): ACC-EPM, ACC-ZSM, NFV-FFT, NFV-ZPMK

Firefighter phone jacks, Model(s): N-FPJ

Input monitor modules, Model(s): NMM-100, NMM-100-10, NMM-100-10

Input/output relay modules, 15-32 Vdc, 2 mA, Model(s): JSKM-CMM-9G

Interface Module, Model(s): KM-FZM-9G, KM-TC962A

Liquid crystal display remote annunciators, 24 V 100 mA, Model(s): LCD-80(f07)

Monitor Module, Model(s): JSM-FMM-9G, JSM-TC959A1059, MMX-101 (a) (a) - UOXX only

Monitor modules, 15-32 Vdc, 5.0 mA max, Model(s): JSM-FMM-1, JSM-FMM-1C

Monitor modules, 15-32 Vdc, 5.1 mA max, Model(s): KM-FZM-1C

Monitor modules, 15-32 Vdc, 600 uA max, Model(s): JSM-FMM-101C

Power supply circuit extender and battery chargers, Model(s): FCPS-24FS6, FCPS-24FS8, FCPS-24FS8E

Relay modules, input 24 V dc, 75 mA, individual relay contacts rated 30 Vac, 0.5 A resistive, 30 V dc, 2 A resistive, Model(s): N-ANN-RLY

Remote annunciators, Model(s): N-ANN-RLED

Remote annunciators, input 18-28V dc, 68mA, Model(s): N-ANN-LED

Remote microphone modules, Model(s): VEC-RM

Remote paging jacks, Model(s): N-RPJ, RPJ-1

Remote zone annunciators, Model(s): RZA-4X, RZA-4X, RZA-4X

Six Zone interface modules, Model(s): NZM-100-6, NZM-100-6

Subassemblies, Model(s): ACC-AAM25

Supervised Control Module, Model(s): IKM-FCM-9G, IKM-TC960A1066

Voice evacuation control panels, Model(s): FireVoice 25/50ZST, FireVoice-25/50, FireVoice-25/50ZS

Wireless driver, Model(s): FWUI-DD

Wireless gateway, Model(s): FWSG

Wireless monitor module, Model(s): FW-MM, FW-MM

Wireless relay module, Model(s): FW-RM

Last Updated on 2025-06-27

The appearance of a company's name or product in this database does not in itself assure that products so identified have been manufactured under UL Solutions' Follow - Up Service. Only those products bearing the UL Mark should be considered to be Certified and covered under UL Solutions' Follow - Up Service. Always look for the Mark on the product.

UL Solutions permits the reproduction of the material contained in Product iQ subject to the following conditions: 1. The Guide Information, Assemblies, Constructions, Designs, Systems, and/or Certifications (files) must be presented in their entirety and in a non-misleading manner, without any manipulation of the data (or drawings). 2. The statement "Reprinted from Product iQ with permission from UL Solutions" must appear adjacent to the extracted material. In addition, the reprinted material must include a copyright notice in the following format: "©2025 UL LLC."

FM APPROVED

Certificate of Compliance

This certificate is issued for the following:

SEVO 1230 Clean Agent Fire Suppression Systems
Pre-Engineered, Balanced and Engineered, Unbalanced
500 psi (34.5 bar)

Prepared for:

SEVO Systems, Inc.
14335 W 97th Terrace
Lenexa KS 66215
USA

Manufactured at:

SEVO Systems, Inc
14335 97th Terrace
Lenexa KS 66215
USA.

FM Approvals Class: 5612

Approval Identification: 0003037217 Approval Granted: 06 June 2011

Said Approval is subject to satisfactory field performance, continuing follow-up Facilities and Procedures Audits, and strict conformity to the constructions as shown in the Approval Guide, an online resource of FM Approvals.

For more than 160 years FM Approvals has partnered with business and industry to reduce property losses.

Richard B. Dunne
Group Manager –Fire Protection
FM Approvals
1151 Boston-Providence Turnpike
Norwood, MA 02062

FM Approvals
Member of the FM Global Group

FM Approvals

CERTIFICATE OF CONFORMITY

1. **FIRE PROTECTION EQUIPMENT**

2. **Certificate No:** **FM23FPUS0061**

3. **Equipment:** **KEC5112**
   (Type Reference and Name)

4. **Name of Listing Company:** **Hangzhou Kec Fire Chemical Co Ltd**

5. **Address of Listing Company:** **2107-1-1,**
   Xihu International Building,
   391 Wener Road,
   Hangzhou,
   Zhejiang Sheng, China,

6. The examination and test results are recorded in confidential report number:

   PR465478 dated 12 June 2023

7. FM Approvals LLC, certifies that the equipment described has been found to comply with the following Approval Standards and other documents:

   FM 5600:2023

8. This certificate relates to the design, examination and testing of the products specified herein. The FM Approvals surveillance audit program has further determined that the manufacturing processes and quality control procedures in place are satisfactory to manufacture the product as examined, tested and Approved.

9. Approval Guide Listing Category:

   Clean Extinguishing Agents

Certificate issued by:

J.E. Marquedant
VP, Manager - Electrical Systems

12 June 2023
Date

To verify the availability of the Approved product, please refer to www.approvalguide.com

THIS CERTIFICATE MAY ONLY BE REPRODUCED IN ITS ENTIRETY AND WITHOUT CHANGE

FM Approvals LLC. 1151 Boston-Providence Turnpike, Norwood, MA 02062 USA
T: +1 (1) 781 762 4300 F: +1 (1) 781 762 9375 E-mail: information@fmapprovals.com www.fmapprovals.com

F 320 (Jan 23)

Page 1 of 2

CERTIFICATE OF CONFORMITY

US Certificate of Conformity No: FM23FPUS0061

FM Approvals
Member of the FM Global Group

10. **Description of Equipment:**

Trade Name:	KEC5112
Chemical Identification:	dodecafluoro-2-methylpentan-3-one, CF3CF2C(O)CF(CF3)2
Designation:	FK-5-1-12
Minimum Extinguishing Concentrations:	Class A – 3.35% Class B – 4.5%
ALC	>10%
NOAEL:	10%
LOAEL:	>10%
Uses:	For use in FM Approved fire extinguishing systems that have been tested expressly for use with FK-5-1-12 agent. Class A (surface burning only), Class B, and Class C extinguishing capabilities

11. **Test and Assessment Procedure and Conditions:**

This Certificate has been issued in accordance with FM Approvals US Certification Requirements.

12. **Schedule Drawings**

A copy of the technical documentation has been kept by FM Approvals.

13. **Certificate History**

Details of the supplements to this certificate are described below:

Date	Description
12 June 2023	Original Issue.

To verify the availability of the Approved product, please refer to www.approvalguide.com

THIS CERTIFICATE MAY ONLY BE REPRODUCED IN ITS ENTIRETY AND WITHOUT CHANGE

FM Approvals LLC. 1151 Boston-Providence Turnpike, Norwood, MA 02062 USA
T: +1 (1) 781 762 4300 F: +1 (1) 781 762 9375 E-mail: information@fmapprovals.com www.fmapprovals.com

ANEXO N° 6
ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 12 MESA DE TRABAJO

Clave: APOY-9.0-12-024	**Versión:** 1	**Fecha de aprobación:** 12/10/2022

OBJETO DEL PROCESO O ÍTEM: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACION DE ENERGÍA; Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES PAPI DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR (VF) – LOTE 1.

LUGAR: COMITE VIRTUAL

FECHA: 1/07/2025 **COMITÉ NÚMERO:** 42

ACUERDOS Y COMPROMISOS

ACTIVIDADES

AGENDA

1. Verifcación del quorum
2. Revisión de compromisos del acta anterior .
3. Estado de ejecución del Proyecto
   - Avance fisico
   - Avance financiero
   - Ejecución Anticipo
   - Actividades realizadas en la semana
4. Poposiciones y varios.
5. Compromisos.

1. VERIFICACION DEL QUORUM.

Participantes del contratista: LUIS MOLINA, ALEJANDRO GRAJALES
Participantes de la interventoría: ALEJANDRO RUIZ, ADRIANA SOTO Y SILVIA OSORIO.
Participantes de aerocivil: ING. ALDEMAR ROZO

2. REVISION COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

N°	COMPROMISOS	ESTADO - OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIDO
1	ENVIO DEL BALANCE AJUSTADO JUNTO CON LOS DOCUMENTOS ANEXOS - MESA DE TRABAJO	SE CUMPLE CON EL COMPROMISO EL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025 Y SE REALIZA LA MESA DE TRABAJO PARA REVISION DEL MODIFICATORIO,EL CONTRATISTA NO HA ENVIADO LAS SUBSANACIONES HECHAS EN DICHA MESA DE TRABAJO	CONTRATISTA-INTERVENTORIA	25/06/2025	SI
2	REUNION PARA REVISAR EL APU NP DEL TABLERO DE UPS	SE CUMPLE CON EL COMPROMISO EL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025 Y SE REALIZA LA MESA DE TRABAJO Y SE ENVIA EL APU REVISADO DE ESTE ITEM EL DIA DE HOY 1 DE JULIO	CONTRATISTA-INTERVENTORIA- AEROCIVIL	26/06/2025	SI
3	ENVIO DE LAS COTIZACIONES DE MEDIA TENSION AJUSTADAS A LA INTERVENTORIA	SE LE HACEN OBSERVACIONES AL CONTRATISTA PARA QUE HAGA EL CORRECTO ENVIO DE LOS FORMATOS DE LAS COTIZACIONES YA QUE VUELVEN Y ADJUNTAS LAS MISMAS	CONTRATISTA		SI
5	ENVIO PLAN DE TRABAJO MEDIA TENSION A LA INTERVENTORIA PARA APROBACION Y TRASLADO A LA ENTIDAD.	SE CUMPLE CON EL CONMPROMISO EL DIA 1 DE JULIO DEL 2025 POR MEDIO DEL OFICIO OFICIO No. 259- AEREOSAFKA-VALLEDUPAR-2024 REMISION PLAN DE TRABAJO RED DE MEDIA TENSION Y ENTRA EN REVISION POR LA INTERVENTORIA	CONTRATISTA	2/07/2025	SI
6	ENVIO DEL PAC CONTRATISTA	SE CUMPLE CON EL COMPROMISO EL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025, SE DEVUELVEN EL MISMO DIA CON OBSERVACIONES Y SON RESPONDIDAS POR EL CONTRATISTA Y SE ENVIAN A LA ENTIDAD EL DIA 01 JULIO DEL 2025 POR LA INTERVENTORIA	CONTRATISTA	2/07/2025	SI
7	ENVIO PAC INTERVENTORIA	SE ENVIO EL DIA 1 DE JULIO DEL 2025 A LA ENTIDAD	INTERVENTORIA	2/07/2025	SI
9					

3. ESTADO DE EJECUCION DEL PROYECTO

Avance fisico: Ejecutado semanal: 0,0%, programado semanal: 0,399%, acumulado ejecutado: 31,916%, acumulado programado: 64,33%, atraso : -32,413%

Avance financiero: Ejecutado semanal: $0 Programado semanal: $13.978.681,01 Ejecutado acumulado:$1.023.176.420 acumulado programado: $2.049.494.923,25 , con un atraso acumulado financero de - $1.039,103,013,40

Ejecución Anticipo: El día 18 de enero del 2025 la interventoría aprobó un desembolso por $91.842.559,66 para el SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN CONTRA INCENDIOS CON AGENTE LIMPIO (INCLUYE DISEÑO, COMUNICACIÓN CON SISTEMA SCADA. el dia 18 de enero se aprueba un desembolo por el valor de $167.795.418,00 **SUMINISTRO E INSTALACIÓN A 0 METROS SISTEMA PAPI FAAL-880, ACNO.150/5345-28 (ÚLTIMA EDICIÓN), ESTILO B, CLASE I, TIPO LED.**
Se realiza otra aprobacion por valor de $363.103.109,34 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL 220V -750 A (INCLUYE COMUNICACIÓN DE TOTALIZADOR, CIRCUITOS PARCIALES Y ANALIZADOR DE REDES CON SCADA) CARACTERÍSTICAS

ACTVIDADES REALIZADAS: 1.OBRA CIVIL:
•construcción de Cámara subterránea (estándar Codensa CS276)
•Suministro e Instalación de Tablero iluminación y tomacorrientes (T .ILUM), sobreponer 220 V, 225 A□

4. PROPOSICIONES Y VARIOS

1. SE INFORMA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE SE SOLICITO AL CONTRATISTA LA COMUNICACAIÓN SOLICITANDO EL AJUSTE DE ACUERDO LA CLAUSULA DE AJUSTE PARA REVISISÓN DE LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA ENVIA DICHO DOCUMENTO
2. SE INFORMA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE SE REALIZO A LA INSPECCIÓN DEL CABLE DE RESERVA EN LAS CAJAS, SIN EMBARGO NO ES POSIBLE NI POR EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORIA INDICAR QUE CANTIDAD DE METRAJE SE ENCUENTRA EN LAS CAJAS, TODA VEZ QUE DEBE SER UN TRABAJO MAS DETALLADO.
3. LA ENTIDAD INFORMA QUE SE VA REVISAR AL INTERIOR DE LA ENTIDAD COMO SE PUEDE MANEJAR LA ACTIVIDAD

5. COMPROMISOS

N°	COMPROMISOS	FECHA	RESPONSABLE
	SUBSANACIONES BALANCE Y DOCUMENTACION SUBSANADOS	1/07/2025	CONTRTAISTA- INTERVENTORIA ADJUNTAR OFICIO DE LAS LIMPIEZA DE LAS CAJAS.
	AJUSTAR EL VALOR DEL TRANSPORTE EN EL APU DE TABLERO DE UPS	1/07/2025	CONTRATISTA
	RESPUESTA PLAN DE TRABAJO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA PARA EL TRASLADO DE LA RED DE MEDIA TENSION	3/07/2025	INTERVENTORIA
	MESA DE TRABAJO REVISISÓN PORGRAMACION	3/07/2025	CONTRATISTA - INTERVENTORIA
	ACTA DE LIQUIDACION DEL ANTICIPO	9/07/2025	INTERVENTORIA CONTRATISTA
	ENVIO DOCUMENTO SOLICITANDO EL AJUSTE DEL VALOR DEL CONTRATO DE OBRA DE ACUERDO CON LA CLAUSULA DE AJUSTE PARA REVISIÓN DE LA INTERVENTORIA	1/07/2025	CONTRATISTA
	ENVIO DOCUMENTO SOLICITANDO EL AJUSTE DEL VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA ACUERDO CON LA CLAUSULA DE AJUSTE, ALA ENTIDAD	2/07/2025	INTERVENTORIA
	LA ENTIDAD REVISARA COMO SE PUEDE HACER EL MANEJO DE REVISIÓN DE CABLE DE RESERVA EN LAS CAJAS	3/07/2025	AEROCIVIL
	ENTREGA ACTA PARCIAL DE OBRA N° 4 AJUSTADA DE ACUERDO CON OBSERVACIONES	2/07/2025	CONTRATISTA

OBSERVACIONES:
No se presentaron observaciones.

FIRMAS:

ING. ALDEMAR ROZO

ALEJANDRO GRAJALES

LUIS MOLINA

ADRIANA SOTO

ALEJANDRO RUIZ

SILVIA OSORIO

Nota : Solo se diligencia en caso de establecer acuerdos y compromisos en las reuniones

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 12 MESA DE TRABAJO

Clave: APOY-9.0-12-024	**Versión:** 1	**Fecha de aprobación:** 12/10/2022

OBJETO DEL PROCESO O ÍTEM: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACION DE ENERGÍA; Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES PAPI DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR (VF) – LOTE 1.

LUGAR: COMITE VIRTUAL

FECHA: 8/07/2025 **COMITÉ NÚMERO:** 43

ACUERDOS Y COMPROMISOS

ACTIVIDADES

AGENDA

1. Verifcación del quorum
2. Revisión de compromisos del acta anterior .
3. Estado de ejecución del Proyecto
   - Avance fisico
   - Avance financiero
   - Ejecución Anticipo
   - Actividades realizadas en la semana
4. Poposiciones y varios.
5. Compromisos.

1. VERIFICACION DEL QUORUM.

Participantes del contratista: LUIS MOLINA, ALEJANDRO GRAJALES,NYDIA DURANTE

Participantes de la interventoría: ALEJANDRO RUIZ, Y SILVIA OSORIO.

Participantes de aerocivil: ING. ALDEMAR ROZO, ING OMAR ESTEVEZ

2. REVISION COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

N°	COMPROMISOS		RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIDO
1	SUBSANACIONES BALANCE Y DOCUMENTACION SUBSANADOS	SE CUMPLE CON EL COMPORMISO EL DIA 07 DE JULIO POR MEDIO DEL CORREO ENVIANDAS A LA ENTIDAD	CONTRTAISTA-INTERVENTORIA	7/07/2025	
2	AJUSTAR EL VALOR DEL TRANSPORTE EN EL APU DE TABLERO DE UPS	EL CONTRATISTA CUMPLE CON EL COMPROMISO EL DIA 2 DE JULIO POR MEDIO DEL CORREO Remision item no previsto Paralelo UPS con modificacion	CONTRATISTA	2/07/2025	
3	RESPUESTA PLAN DE TRABAJO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA PARA EL TRASLADO DE LA RED DE MEDIA TENSION	SE ENCUENTRA EN REVISION POR LA INTERVENTORIA	INTERVENTORIA		
5	MESA DE TRABAJO REVISISÓN PORGRAMACION	NO SE CUMPLE EL COMPROMISO	CONTRATISTA - INTERVENTORIA		X
6	ACTA DE LIQUIDACION DEL ANTICIPO	ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO JUNTO CON EL CONTRATISTA DE OBRA	INTERVENTORIA CONTRATISTA		
7	ENVIO DOCUMENTO SOLICITANDO EL AJUSTE DEL VALOR DEL CONTRATO DE OBRA DE ACUERDO CON LA CLAUSULA DE AJUSTE PARA REVISIÓN DE LA INTERVENTORIA	SE CUMPLE CON EL COMPROMISO EL DIA 2 DE JULIO DEL 2025 POR MEDIO DEL OFICIO No. 261 - RESPUESTA AL COMUNICADO CALM01-223-2024 SOLICITUD DOCUMENTACION REAJUSTE – CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO.	CONTRATISTA	2/07/2025	SI
9	LA ENTIDAD REVISARA COMO SE PUEDE HACER EL MANEJO DE REVISIÓN DE CABLE DE RESERVA EN LAS CAJAS		AEROCIVIL		
10	ENTREGA ACTA PARCIAL DE OBRA N° 4 AJUSTADA DE ACUERDO CON OBSERVACIONES	EL CONTRATISTA ENVIA EL ACTA NUMERO 4 CON LAS OBSERVACIONES SUBSANADAS EL DIA 1 DE JULIO Y DESPUES ED REVISADO POR LA INTERVENTORIA SE ENVIA EL BORRAODR A LA ENTIDAD EL DIA 07 DE JULIO.	CONTRATISTA	1/07/2025	SI

3. ESTADO DE EJECUCION DEL PROYECTO

Avance fisico: Ejecutado semanal: 1,68%, programado semanal: 0,386%, acumulado ejecutado: 33,599%, acumulado programado: 64,716%, atraso : -31,117%

Avance financiero: Ejecutado semanal: $53.938.708,26 Programado semanal: $12.385.223,27 Ejecutado acumulado:$1.077.115.129 acumulado programado: $2.074.664.656,91 , con un atraso acumulado financero de - $997.549.528,41

Ejecución Anticipo: El día 18 de enero del 2025 la interventoría aprobó un desembolso por $91.842.559,66 para el SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN CONTRA INCENDIOS CON AGENTE LIMPIO (INCLUYE DISEÑO, COMUNICACIÓN CON SISTEMA SCADA. el dia 18 de enero se aprueba un desembolo por el valor de $167.795.418,00 **SUMINISTRO E INSTALACIÓN A 0 METROS SISTEMA PAPI FAAL-880, ACNO.150/5345-28 (ÚLTIMA EDICIÓN), ESTILO B, CLASE I, TIPO LED.**
Se realiza otra aprobacion por valor de $363.103.109,34 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL 220V -750 A (INCLUYE COMUNICACIÓN DE TOTALIZADOR, CIRCUITOS PARCIALES Y ANALIZADOR DE REDES CON SCADA) CARACTERÍSTICAS

ACTVIDADES REALIZADAS: 1.SUMINISTRO
DE EQUIPOS ELECTRICOS Y SISTEMAS QUE INCLUYE INSTALACION FASE 3
• Suministro e instalación de Sistema de detección y extinción contra incendios con Agente Limpio (incluye diseño, comunicación con sistema SCADA)

4. PROPOSICIONES Y VARIOS

1. SOLICITUD DE VERSION FINAL DEL MODIFICATORIO POR PARTE DE LA ENTIDAD ENVIARLA AL CORREO EN SU VERSION FINAL PARA SU REVISION.
LA AEROCIVIL HACE LA ACLRACION DE TENER EN CUENTA LAS OBSERVACIONES DEL DISEÑO DEL SISTEMA DE DETECCION QUE SE HICIERON EN SU MOMENTO

5. COMPROMISOS

Nº	COMPROMISOS	FECHA	RESPONSABLE
1	MESA DE TRABAJO PARA REVISION DEL TODO PAQUETE DE MODFICIACION DE BALANCE E INP	10/07/2025	CONTRTAISTA- INTERVENTORIA-AEROCIVIL
2	ENVIO DEL PLAN DE TRABAJO DE MEDIA TENSION A LA ENTIDAD	9/07/2025	INTERVENTORIA
3	MESA DE TRABAJO REVISISÓN PORGRAMACION	9/07/2025	INTERVENTORIA-CONTRATSITA
4	REVISION DE REAJUSTE ENVIADO POR EL CONTRATISTA PARA DAR RESPUESTA A LA OBSERVACION DE LA AEROCIIVL	9/07/2025	INTERVENTORIA
5	ENVIO DE LA REVISION DEL BORRADOR DEL ACTA NUMERO 4 REVISADA POR LA ENTIDAD PARA ADJUNTAR LOS DOC FINALES	9/07/2025	AEROCIVIL
6	ENTREGA DE SEMANAL NUMERO 51 DE LA INTERVENTORIA	1/07/2025	INTERVENTORIA
7	LLEGADA DEL TABLERO	18/07/2025	CONTRATSITA
8	ENVIO DE LA NORMA DE LA RSPUESTA DE LA ENTREGA FINAL DE LAS PUERTAS CORTAFUEGOS	9/07/2025	CONTRATISTA

OBSERVACIONES:
No se presentaron observaciones.

FIRMAS:

ING. ALDEMAR ROZO

NYDIA DURANTE

ALEJANDRO GRAJALES

LUIS MOLINA

ALEJANDRO RUIZ

NICOLAS COBOS

SILVIA OSORIO

Nota : Solo se diligencia en caso de establecer acuerdos y compromisos en las reuniones

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 12 MESA DE TRABAJO

Clave: APOY-9.0-12-024	**Versión:** 1	**Fecha de aprobación:** 12/10/2022

OBJETO DEL PROCESO O ÍTEM: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACION DE ENERGÍA; Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES PAPI DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR (VF) – LOTE 1.

LUGAR: COMITE VIRTUAL

FECHA: 25/07/2025 **COMITÉ NÚMERO:** 44

ACUERDOS Y COMPROMISOS

ACTIVIDADES

AGENDA
1. Verifcación del quorum
2. Revisión de compromisos del acta anterior .
3. Estado de ejecución del Proyecto
   - Avance fisico
   - Avance financiero
   - Ejecución Anticipo
   - Actividades realizadas en la semana
4. Poposiciones y varios.
5. Compromisos.

1. VERIFICACION DEL QUORUM.

Participantes del contratista: LUIS MOLINA, ALEJANDRO GRAJALES

Participantes de la interventoría: ALEJANDRO RUIZ, Y SILVIA OSORIO.

Participantes de aerocivil: ING. ALDEMAR ROZO.

2. REVISION COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

N°	COMPROMISOS		RESPONSABLE	FECHA	CUMPLIDO
1	MESA DE TRABAJO PARA REVISION DEL TODO PAQUETE DE MODFICIACION DE BALANCE E INP	SE CUMPLE CON EL COMPORMISO EL DIA 10 DE JULIO Y SE REALIZA MESA DE TRABAJO CON LA ENTIDAD CONTRATISTA E INTERVENTORIA QUEDANDO COMPROMISOS PARA EL CONTRATSITA, LOS CUALES ENVIARON POR CORREO EL DIA 21 DE JULIO	CONTRTAISTA-INTERVENTORIA-AEROCIVIL	10/07/2025	SI
2	ENVIO DEL PLAN DE TRABAJO DE MEDIA TENSION A LA ENTIDAD	SE CUMPLE CON EL COMPROMISO POR MEDIO DEL CORREO ENVIANDOLO A LA ENTIDAD	INTERVENTORIA	9/07/2025	SI
3	MESA DE TRABAJO REVISISÓN PORGRAMACION	NO SE CUMPLE CON EL COMPROMISO TODA VEZ QUE A LA FECHA EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO LA PROGRAMACION CORESPONDEINTE.	INTERVENTORIA-CONTRATISTA	X	NO
5	REVISION DE REAJUSTE ENVIADO POR EL CONTRATISTA PARA DAR RESPUESTA A LA OBSERVACION DE LA AEROCIIVL	SE CUMPLE CON EL COMPROMISO Y SE DA RESPUESTA DEL REAJUSTE POR MEDIO DEL CORREO, EL CONTRATISTA ENVIA EL DIA DE HOY LA SUBSANACION Y SERA REVISADA Y POSTERIORMENTE ENVIADA A LA ENTIDAD PARA SU REVISION Y APROBACION	INTERVENTORIA	10/07/2025	SI
6	ENVIO DE LA REVISION DEL BORRADOR DEL ACTA NUMERO 4 REVISADA POR LA ENTIDAD PARA ADJUNTAR LOS DOC FINALES	SE CUMPLE CON EL COMPROMISO EL DIA DIA 09 DE JULIO POR MEDIO DEL CORREO Y SE HACE EL TRASLADO AL CONTRATISTA DE OBRA	AEROCIVIL	9/07/2025	SI
7	ENTREGA DE SEMANAL NUMERO 51 DE LA INTERVENTORIA	SE CUMPLE CON EL COMPRMISO Y SE HACE ENTREGA DEL SEMANAL DE LA INTERVENTORIA #51 EL 10 DE JULIO	INTERVENTORIA	10/07/2025	SI
9	LLEGADA DEL TABLERO	A LA FECHA NO SE CUMPLE CON EL COMPROMISO	CONTRATISTA	X	X
10	ENVIO DE LA NORMA DE LA RESPUESTA DE LA ENTREGA FINAL DE LAS PUERTAS CORTAFUEGOS	A LA FECHA NO SE CUMPLE CON EL COMPROMISO	CONTRATISTA	X	NO

3. ESTADO DE EJECUCION DEL PROYECTO

Avance fisico: Ejecutado semanal: 0,841%, programado semanal: 0,151%, acumulado ejecutado: 34,44%, acumulado programado: 65,243%, atraso : -30,803%

Avance financiero: Ejecutado semanal: $26.969.354,13 Programado semanal: $4.837.965,66 Ejecutado acumulado:$1.104.084.483 acumulado programado: $2.091.570.111,60 , con un atraso acumulado financero de - $987.485.628,97

Ejecución Anticipo: El día 18 de enero del 2025 la interventoría aprobó un desembolso por $91.842.559,66 para el SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN CONTRA INCENDIOS CON AGENTE LIMPIO (INCLUYE DISEÑO, COMUNICACIÓN CON SISTEMA SCADA. el dia 18 de enero se aprueba un desembolso por el valor de $167.795.418,00 **SUMINISTRO E INSTALACIÓN A 0 METROS SISTEMA PAPI FAAL-880, ACNO.150/5345-28 (ÚLTIMA EDICIÓN), ESTILO B, CLASE I, TIPO LED.**
Se realiza otra aprobacion por valor de $363.103.109,34 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL 220V -750 A (INCLUYE COMUNICACIÓN DE TOTALIZADOR, CIRCUITOS PARCIALES Y ANALIZADOR DE REDES CON SCADA) CARACTERÍSTICAS

ACTVIDADES REALIZADAS: 1.SUMINISTRO
DE EQUIPOS ELECTRICOS Y SISTEMAS QUE INCLUYE INSTALACION FASE 3
• Suministro e instalación de Sistema de detección y extinción contra incendios con Agente Limpio (incluye diseño, comunicación con sistema SCADA)

4. PROPOSICIONES Y VARIOS

SE DEJA LA CLARIDAD DE LOS APUS PARA LOS INP EN CUANTO A LAS OBSERVACIONES QUE HIZO LA INTERVENTORIA EN MESA DE TRABAJO REZALIZADA EL DIA 23 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, LA ENTIDAD CORRESPONDE A ESTAS OBSERVACIONES HACIENDO LA CLARIDAD DE QUE SI SE DEBEN CORREGIR LOS NOMBRES PRESENTADOS DE LOS INP ELECTRICOS.

LA ENTIDAD TAMBIEN HACE SUS APORTES ACERCA DEL NUEVO INP PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y SE HACEN LAS DEBIDAD CORRECIONES A ESTE DE ACUERDO A LO OBSERVADO POR EL ING ALDEMAR APOYO A LA SUPERVISION ASI MISMO EL ING HACE LA CLARIDAD QUE QUIEN APRUEBA ESTOS INPS FINALMETE ES EL ING OMAR ESTEVEZ QUIEN ES EL SUEPRVISOR DLE CONTRATO POR PARTE DE LA AEROCIVIL

SE HACE LA REVISION CONJUNTA DE EL REAJUSTE ENVIADO POR EL CONTRATISTA Y SE HACEN OBSERVACIONES A ESTE

5. COMPROMISOS

N°	COMPROMISOS	FECHA	RESPONSABLE
1	ENVIO DE LA DOCUMENTACION DE MODIFICATORIO A LA ENTIDAD	26/07/2025	INTERVENTORIA
2	ENTREGA DE LA SUBSNACION DEL REAJUSTE DE OBRA	25/07/2025	CONTRATISTA

OBSERVACIONES:
No se presentaron observaciones.

FIRMAS:

ING. ALDEMAR ROZO

ALEJANDRO GRAJALES

LUIS MOLINA

ALEJANDRO RUIZ

SILVIA OSORIO

Nota : Solo se diligencia en caso de establecer acuerdos y compromisos en las reuniones
