
CUADRO DE AVANCE EJECUTADO VS PROGRAMADO

SEMANA	mar-08	mar-15	mar-22	mar-29	abr-05	abr-12	abr-19	abr-26	may-03	may-10	may-17	may-24	may-31	jun-07	jun-14	jun-21	jun-28	jul-05	jul-12	jul-15	
	Sem 10	Sem 11	Sem 12	Sem 13	Sem 14	Sem 15	Sem 16	Sem 17	Sem 18	Sem 19	Sem 20	Sem 21	Sem 22	Sem 23	Sem 24	Sem 25	Sem 26	Sem 27	Sem 28	Sem 29	
TIPO DE AVANCE (%)	OBRA	OBRA	OBRA	OBRA	OBRA	OBRA	OBRA	OBRA	OBRA	OBRA	OBRA	OBRA	OBRA	OBRA							
PROGRAMADO FINANCIERO	0,00%	0,00%	0,71%	1,54%	5,39%	8,28%	14,77%	18,28%	21,66%	25,04%	34,82%	38,11%	47,47%	51,63%	65,64%	74,33%	80,42%	87,11%	91,27%	100,00%	
REAL FINANCIERO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%								
REAL FISICO	0,00%	0,00%	0,00%	1,57%	6,51%	7,55%	15,19%	29,07%	29,32%	29,32%	42,90%	47,51%	55,69%								
PROGRAMADO FISICO	0,47%	1,05%	2,34%	3,76%			-0,41%	10,79%	-7,66%	-4,27%	42,90%	-9,40%	-8,22%								
ATRASO FISICO	0,0%	-1,1%	-2,3%	-2,2%	6,5%	7,5%	15,6%	18,3%	37,0%	33,6%	-8,076%	56,9%	63,9%	0,00%							
LINEAL	26,3%	30,3%	34,3%	38,3%	42,3%	46,3%	50,3%	54,3%	58,3%	62,3%	66,3%	70,3%	74,3%	78,3%	82,3%	86,3%	90,3%	94,3%	98,3%	100,0%	

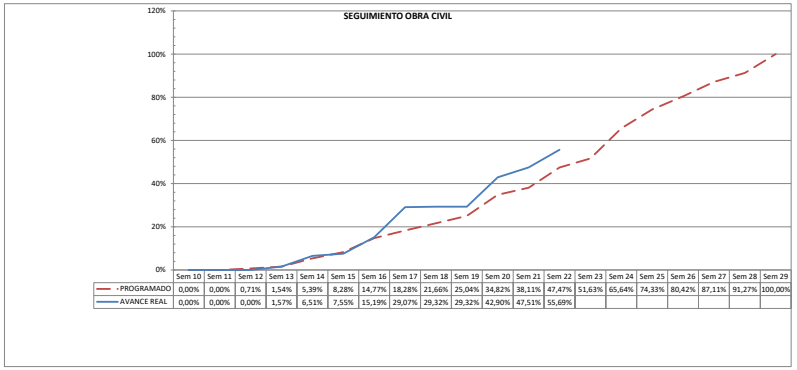

	Sem 10	Sem 11	Sem 12	Sem 13	Sem 14	Sem 15	Sem 16	Sem 17	Sem 18	Sem 19	Sem 20	Sem 21	Sem 22	Sem 23	Sem 24	Sem 25	Sem 26	Sem 27	Sem 28	Sem 29
PROGRAMADO	0,00%	0,00%	0,71%	1,54%	5,39%	8,28%	14,77%	18,28%	21,66%	25,04%	34,82%	38,11%	47,47%	51,63%	65,64%	74,33%	80,42%	87,11%	91,27%	100,00%
AVANCE REAL	0,00%	0,00%	0,00%	1,57%	6,51%	7,55%	15,19%	29,07%	29,32%	29,32%	42,90%	47,51%	55,69%							

FLUJO DE FONDOS POR CAPITULO Y EXPRESADO EN PORCENTAJE

SEMANA	VALOR CAPITULO	Sem 10	Sem 11	Sem 12	Sem 13	Sem 14	Sem 15	Sem 16	Sem 17	Sem 18	Sem 19	Sem 20	Sem 21	Sem 22	Sem 23	Sem 24	Sem 25	Sem 26	Sem 27	Sem 28	Sem 29
		mar-08	mar-15	mar-22	mar-29	abr-05	abr-12	abr-19	abr-26	may-03	may-10	may-17	may-24	may-31	jun-07	jun-14	jun-21	jun-28	jul-05	jul-12	jul-15
TIPO DE AVANCE (%)		OBRA	OBRA	OBRA	OBRA	OBRA	OBRA	OBRA	OBRA	OBRA	OBRA	OBRA	OBRA	OBRA	OBRA	OBRA					
PRELIMINARES	$ 13.091.580,02	0,00%	0,00%	25,90%	30,82%	36,46%	6,35%	0,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MANEJO DE AGUAS	$ 5.722.096,04	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,63%	7,04%	7,04%	7,04%	7,04%	7,04%	7,04%	7,04%	7,04%	7,04%	7,04%	7,04%	7,04%	7,04%	2,82%	0,00%
RETIROS Y DEMOLICIONES	$ 17.988.541,97	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	62,75%	36,18%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%
EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA	$ 43.676.365,05	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,64%	4,24%	7,46%	6,06%	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	1,87%	0,37%	34,70%
LLENOS	$ 42.678.201,97	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,39%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	58,00%	33,19%
CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA	$ 40.787.218,08	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,39%	6,94%	6,94%	6,94%	6,94%	6,94%	6,94%	6,94%	6,94%	6,94%	6,94%	6,94%	6,94%	6,94%	6,94%	1,39%
CONCRETOS	$ 131.053.969,98	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,63%	13,45%	0,00%	0,00%	0,00%	23,75%	0,13%	0,13%	15,38%	7,76%	17,71%	2,39%	11,96%	5,20%	1,51%
ACERO	$ 110.308.368,95	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,08%	8,47%	8,47%	8,47%	8,47%	8,47%	8,47%	8,47%	8,47%	8,47%	8,47%	8,47%	1,69%	0,00%
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	$ 27.706.982,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,02%	0,00%	0,00%	0,00%	32,13%	50,85%	14,99%
VIAS	$ 8.800.308,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PAISAJISMO Y SILVICULTURA	$ 2.503.800,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	66,67%
CARPINTERIA METALICA	$ 11.292.510,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	66,67%
OBRAS EXTRAS	$ 4.944.114,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
OTROS	$ 20.221.602,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
																0,00%					

ALBERTO TEJERA HIGGINS
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
