FECHA DE PRESENTACIÓN: Abril 2025 **PERIODO: Desde** 01/03/2025 **al** 31/03/2025

CONVENIO INTERADMINSTRATIVO No. 2806257-2021 **Suscrito** entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE y el Fondo Financiero Distrital de Salud – FFDS.

1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

1.1 GENERALIDADES:

Convenio Nro.:	CO1.PCCNTR.2806257 del 13 de septiembre 2021			
Objeto:	Aunar esfuerzos, recursos administrativos, económicos y técnicos, que permitan efectuar las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto "Adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de Urgencias, Hospitalarios, Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal".			
Valor del Convenio inicial:	$100.092.959.400	**Valor**	**Fuente**	**Registro Presupuestal**
		$99.101.940.000	FFDS	RP #3601 de 31/08/2021 por valor de $23.610.024.440 CDP VF 2023 por $75.491.915.560
		$991.019.400	ESE	
Adiciones: () – Fecha Excedentes al Convenio 2806257 de 2022. Autorizado por el FFDS el 20/04/2024	MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.647.224.934,00), para respaldar la mayor permanencia del personal de la interventoría de obra, por 5 meses y 5 días calendario.			
Excedentes al Convenio 2806257 de 2022. Autorizado por el FFDS el 22/11/2024	CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE. - **($4.144.363.094)**, para respaldar la mayor permanencia del personal de la interventoría, por trece (13) meses hasta el 26 de diciembre del año 2025.			
Valor actual del convenio:	$ 100.092.959.400 valor inicial + $6.144.055.345. indexación de vigencias futuras, Valor actual: **$106.237.014.745**			
Fecha Suscripción:	31/08/2021			
Fecha de inicio:	13/09/2021	**Plazo de ejecución Inicial:**	43 meses: Fase I Preconstrucción: 20 meses Fase II Construcción: 18 meses Fase II Alistamiento y puesta en servicio: 5 meses	
		Plazo de ejecución- Modificatorio No. 1:	48 meses y 5 días Fase I: 20 meses Fase II: 18 meses + 5 meses y 5 días= 23 meses y 5 días	

Convenio Nro.:	CO1.PCCNTR.2806257 del 13 de septiembre 2021		
			Fase II: 5 meses
		Plazo de ejecución actual- Modificatorio No. 2:	**57 meses y 13 días** Fase I: 18 meses + 8 dias Fase II: (23 meses +5 días +11 meses)=34 meses + 5 días Fase III: 5 meses
Fecha de terminación inicial:	12/04/2025	**Prórrogas acumuladas:**	**Fecha**
	No meses: **57 meses y 13 días** (fase I,II y III)	Del _____Al_____	AA-MM-DD
Prorroga No 1	**14 meses y 13 días**	Del 13/04/2025 Al 26/06/2026	**2024/11/22**
Fecha de terminación actual:	26/06/2026 (Fecha de terminación de la Fase de Estudios y Diseños: 24/11/2023)		
Estado del convenio:	*Vigente*		
Descripción estado del Convenio.	El Convenio se encuentra en ejecución de la Fase II-Construcción: Fecha de Suscripción de Contratos No. 5008 de 2022 de obra e Interventoría de Obra No. 5009 de 2022, el 20/05/2022 Firma de Actas de inicio del Contrato obra No. 5008 de 2022 y de Interventoría de obra No 5009 de 2022, el 20/05/2022 Como se registra en los ítems correspondientes a cada uno de estos contratos, estos fueron suspendidos por gestión de Cesión del Contrato 5008 de 2022. El día 21 de febrero 2024, se reiniciaron los contratos 5008-22 y 5009-22. El día 26 de febrero 2024, se firmó la cesión del contrato 5008-2022 al Cesionario DAVID LEONARDO MORALES GALÁN Representante legal del CONSORCIO HOSPITAL conformado por: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUIA S.A.S NIT:900497601-4 y ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S NIT 901438268-6		
Modificaciones / aclaraciones / otrosí			
Aclaraciones	*Nota aclaratoria: Teniendo en cuenta que el proceso licitatorio inicial (Convocatoria Abierta CA 003 de 2021), se declaró desierto y debido a que el proceso de interventoría, es accesorio del proceso de obra: "lo accesorio sigue la suerte de lo principal", mediante la Resolución 0059 del 21 de enero de 2022 se suspende temporalmente la Convocatoria Meritoria CM 004 de 2021 (a Cargo de la EGAT), para contratar la Interventoría. Posteriormente, se adelantó un segundo proceso licitatorio (Convocatoria abierta CA-001-2022) y el 6 de abril de 2022, se emitió la Resolución de adjudicación No. 385 por medio de la cual se adjudica la Convocatoria Abierta CA-001-2022 Obra, se reinicia la Convocatoria Meritoria No. CM -004 de 2021, culminando con la Resolución No. 386 por medio de la cual se adjudica la Convocatoria Meritoria No. CM -004 de 2021. Iniciando los contratos el 20 mayo de 2022. El 16 de noviembre 2023, se radica actualización del proyecto "Adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de Urgencias, Hospitalarios, Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal", con radicado No. 2023ER39226. La actualización en mención se realiza con el fin se hacer uso de excedentes del Convenio, para cubrir la mayor permanencia de la firma interventora por efecto de la autorización de la prórroga del contrato de Interventoría No. 5009-2021 (por parte de la Subred Sur después de evaluadas las solicitudes presentadas por el Contratista de Obra y la Interventoría, se autoriza prórroga de los contratos No. 5008-		

Convenio Nro.:	CO1.PCCNTR.2806257 del 13 de septiembre 2021	
	2022 de Obra y No. 5009-2022 de Interventoría, así como la adición de este último contrato 5009 de 2022). El día 17 de noviembre de 2023, por ajuste en el valor de adición a interventoría, mediante oficio con Rad No. 2023ER, se hace entrega del alcance al Rad No. 2023ER39226 Por la intención de Cesión del contrato de Obra se revierte la necesidad presentada a la SDS de uso de excedentes y se devuelve el proceso por parte de la SDS. El 21 de diciembre 2023 se suspendieron los contratos de obra e interventoría dado que no se ha conseguido un cesionario que cumplan con los requerimientos iniciales del pliego de condiciones, la suspensión se realizó por un término de 2 meses contados desde el 21 de diciembre. El 14 de febrero del 2024, mediante el Comité de Contratación de la Subred Sur, se aprobó la cesión del Contrato No. 5008 de 2022, del CONSORCIO TUNAL 2022 al CONSORCIO HOSPITAL, cuyo representante legal DAVID LEONARDO MORALES GALÁN, se identifica con la Cédula de Ciudadanía No. 1.121.952.959. El CONSORCIO HOSPITAL está conformado por: INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUÍA S.A.S NIT:900497601-4 (90%) y ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S NIT 901438268-6 (10%), dicha aprobación se realiza una vez verificado que cumple con los requerimientos exigidos por la EGAT en la Convocatoria Inicial CA 001 de 2022 Previo a la Cesión del Contrato No. 5008 de 2022 y su aprobación el 26 de febrero 2024 en SECOP 2, se dio reinició a este Contrato el día 21 de febrero de 2024. El mismo día 21 de febrero de 2024, se reinició el contrato No 5009 de 2022 de Interventoría. La gestión de los contratos de obra No. 5008 de 2022 y de Interventoría de Obra No 5009 de 2022, se continúa describiendo en el Numeral 2. Contratación derivada del Convenio.	
Modificatorio No. 1	20/04/2024	MODIFICAR la CLÁUSULA SEGUNDA – ALCANCE DEL OBJETO del convenio interadministrativo No. 2806257-2021, respecto a prorrogar el PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA FASE DE CONSTRUCCION DEL CONVENIO en un término de en cinco (5) meses y cinco (5) días calendario, con el fin de ampliar la fase de construcción a veintitrés (23) meses y 5 días calendario, o hasta recibir a satisfacción por parte de la Subred la Obra y la dotación hospitaliza instalada lista para su operación y funcionamiento acorde con los requerimientos normativos vigentes para la utilización segura de los equipos biomédicos.
Modificatorio No. 2	22/11/2024	CLÁUSULAS: PRIMERA: MODIFICAR la CLÁUSULA SEGUNDA – ALCANCE DEL OBJETO del convenio interadministrativo No. 2806257-2021, respecto a prorrogar el PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA FASE DE CONSTRUCCION DEL CONVENIO en un término de ONCE (11) MESES, con el fin de ampliar la fase de construcción a treinta y cuatro (34) meses, o hasta recibir a satisfacción por parte de la Subred la Obra y la dotación hospitalaria instalada lista para su operación y funcionamiento acorde con los requerimientos normativos vigentes para la utilización segura de los equipos biomédicos. SEGUNDA: MODIFICAR LA CLAUSULA SEPTIMA DEL CONVENIO – PLAZO DEL CONVENIO: PRORROGAR El plazo del convenio interadministrativo por CATORCE (14) MESES Y TRECE (13) DÍAS, es decir del TRECE (13) DE ABRIL DEL 2025 HASTA EL VEINTISEIS (26) DE JUNIO DE 2026, conforme con lo anterior quedara así: CLAUSULA SÉPTIMA: PLAZO DEL CONVENIO: El plazo de ejecución para el presente convenio es de CINCUENTA Y SIETE (57) MESES Y TRECE (13) DÍAS, contados a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del convenio.

Convenio Nro.:	CO1.PCCNTR.2806257 del 13 de septiembre 2021	
AUTORIZACIÓN DE USO DE EXCEDENTES No. 1	20/04/2024	AUTORIZAR EL USO DE EXCEDENTES por valor de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.647.224.934,00), resultante de la suma de los valores a adicionar al contrato de interventoría de Obra, para respaldar la mayor permanencia del personal de la interventoría, por 5 meses y 5 días calendario, requeridos y avalados por la Interventoría.
AUTORIZACIÓN DE USO DE EXCEDENTES No. 2	22/11/2024	AUTORIZAR EL USO DE EXCEDENTES por valor de CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE. - **($4.144.363.094)** resultante de la suma de los valores a adicionar al contrato de interventoría de Obra, para respaldar la mayor permanencia del personal de la interventoría, por trece (13) meses hasta el 26 de diciembre del año 2025.

1.2 SUPERVISIÓN

NOMBRE	CARGO	TELÉFONO
Viviana Marcela Clavijo	Gerente Subred Integrada de Servicios de Salud Sur	7300000
Claudia Esperanza Amézquita Sandoval	Directora de Infraestructura y Tecnología	3649090

1.2.1 Conformación del Comité Operativo y comités que exige el desarrollo del convenio.

NOMBRE	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO
Viviana Marcela Clavijo	Gerente Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	subredsur@saludcapital.gov.co
María Elena Restrepo García	Médico especialista proyectos- Subred Sur	De la líder: liderproyectos@subredsur.gov.co
Claudia Esperanza Amézquita Sandoval (Integrante 1)	Directora de Infraestructura y Tecnología	Cesamezquita@saludcapital.gov.co
Carlos Cardeño (Integrante 2)	Referente del proyecto- Dirección de Infraestructura y Tecnología SDS	Cacardeno@saludcapital.gov.co
Camilo Vanegas (Suplente del Integrante 2)	Referente del proyecto- Dirección de Infraestructura y Tecnología SDS	Cavanegas@saludcapital.gov.co

1.2.2 Seguimiento a obligaciones de la Subred

Enumerar cada una de las obligaciones generales descritas en el convenio	Cumplimiento				Avance de actividades (desarrolladas en el periodo objeto del informe-referente a la obligación)	Evidencias y soporte (Especificar ruta de ubicación en el CD digital)
	SI	NO	PARCIAL	NO APLICA		
1. Cumplir a cabalidad con el objeto del convenio, observando en todo momento, el régimen de contratación; acatando la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes.	x				El cumplimiento del objeto del convenio se registra en el desarrollo de hitos y de las obligaciones específicas del Convenio	Informes de seguimiento mensual
2. Reportar cualquier novedad o anomalía, de manera inmediata al supervisor y/o interventor del convenio.	x				Las novedades se han reportado y gestionado oportunamente (entre otras Modificatorios, prórrogas)	Informes de seguimiento mensual
3. Acatar las directrices que durante el desarrollo del convenio le imparta la Secretaria Distrital de Salud - Fonda Financiero Distrital de Salud, a través del supervisor.	x				Se ha acatado las directrices que durante el desarrollo del convenio ha dado la Secretaria Distrital de Salud en Comités Operativos y mesas de trabajo	Informes de seguimiento mensual
4. Realizar los aportes del convenio en la forma pactada.	x				Los aportes del convenio se realizaron en la forma pactada, y en su momento hasta completar lo pactado se adjuntó la matriz de cofinanciación en informes de seguimiento mensual. Es importante aclarar que esta matriz se alimenta con base en la información que aporta Talento Humano, debido a que el costo registrado en ella, corresponde al valor de las horas utilizadas por el personal correspondiente en el desarrollo de las actividades de apoyo al Convenio.	Informes de seguimiento mensual
5. Salvaguardar la información confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo de sus actividades, salvo requerimiento expreso de autoridad competente	x				El archivo documental del Convenio se encuentra organizado en medio magnético y físico, de acuerdo a las normas archivísticas. La estructura funcional del Subproceso Gestión de Proyectos, incluye a la Jefe del Subproceso y personal de apoyo como el Gerente de Proyectos, Líder de Proyectos y Gestores de Proyectos. Este equipo de trabajo maneja diferentes niveles de complejidad de la información que se archiva en equipos de cómputo con claves de acceso que siguen las directrices de seguridad de la información.	
6. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a la Secretaria Distrital de				x	No se han presentado peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley	

Enumerar cada una de las obligaciones generales descritas en el convenio	Cumplimiento				Avance de actividades (desarrolladas en el periodo objeto del informe- referente a la obligación)	Evidencias y soporte (Especificar ruta de ubicación en el CD digital)
	SI	NO	PARCIAL	NO APLICA		
Salud - Fonda Financiero Distrital de Salud, a través de la persona responsable del control en la ejecución del convenio, acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes, para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.						
7. Pagar por su cuenta las salarios, subsidios, prestaciones sociales, afiliación y pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social - EPS, Pensión y ARL- y de las Aportes Parafiscales - SENA, ICBF, Cajas de Compensación-, y Subsidio Familiar, a que hubiere lugar, de todos sus empleados, en especial del personal destinado para el cumplimiento del objeto del presente convenio, de acuerdo con las disposiciones del Régimen Laboral Colombiano, debiendo presentar en su oportunidad, la respectiva certificaci6n de cumplimiento, expedida por el Revisor Fiscal o su representante legal - según el caso.	x				La Subred ha pagado los salarios, subsidios, prestaciones sociales, afiliación y pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social - EPS, Pensión y ARL- y de las Aportes Parafiscales - SENA, ICBF, Cajas de Compensación-, y Subsidio Familiar, a que hubiere lugar,	Central de pagos de la Subred Sur
8. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables.				x	No se han presentado los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables	
9. Desempeñar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y adecuado cumplimiento de sus compromisos, aunque no estén específicamente señaladas y que sean de la naturaleza del convenio.	x				Las actividades necesarias para el cumplimiento de compromisos del convenio, se registra en el desarrollo de hitos y de las obligaciones específicas del Convenio	Informes de seguimiento mensual
10. Utilizar los mecanismos que sean necesarios para poder garantizar la autenticidad, integridad y conservación de los documentos electrónicos, cuando a ello hubiere lugar	x				El archivo documental del Convenio se encuentra organizado en medio magnético y físico, de acuerdo a las normas archivísticas	Archivo y equipos de cómputo de la Oficina Asesora Desarrollo Institucional Subred Sur
11. Contar con sus equipos de cómputo y herramientas de trabajo para la correcta ejecución del objeto del convenio, cuando a ello hubiere lugar.	x				Cada profesional cuenta con sus equipos de cómputo y herramientas de trabajo para la correcta ejecución del objeto del convenio, cuando a ello hubiere lugar	Puestos de trabajo de la Oficina Asesora Desarrollo Institucional Subred Sur

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	PLANEACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO CONVENIOS INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE			
	Código:	SDS-GTS-FT-034	Versión:	1
Elaborado por: Cristian Suarez Bohórquez / Revisado por: Rudy Esteban Prieto - Claudia E Amezquita Sandoval / Aprobado por: Liliana Sofía Cepeda Amaris				

Enumerar cada una de las obligaciones generales descritas en el convenio	Cumplimiento				Avance de actividades (desarrolladas en el periodo objeto del informe-referente a la obligación)	Evidencias y soporte (Especificar ruta de ubicación en el CD digital)
	SI	NO	PARCIAL	NO APLICA		
12. Garantizar que los compromisos, productos, acciones, intervenciones y demás aspectos técnicos, se ejecuten dando pleno cumplimiento a los Lineamientos y políticas establecidos por la Secretaria Distrital de Salud-Fondo Financiero Distrital de Salud y a las instrucciones que se impartan a través del supervisor y/o interventor.	x				La ejecución del Convenio se realiza dando cumplimiento a los Lineamientos y políticas establecidos por la Secretaria Distrital de Salud-Fondo Financiero Distrital de Salud ya las instrucciones que se impartan a través del supervisor y/o interventor, como se registra en hitos y en las obligaciones específicas.	Informes de seguimiento mensual
13. Constituir la garantía única, si a ello hubiere lugar, de conformidad con lo establecido en el Estudio Previo y el convenio, y mantenerla vigente hasta su liquidación, según lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993.	x				Se cuenta con Póliza de Responsabilidad Civil Profesionales de Instituciones Médicas la cual se ha estado actualizando desde 2017. En el informe No 30, se adjunta Póliza en mención No. 33-03-101027154 con vigencia del 31 de enero al 29 de febrero de 2024 y la No. 33-03-101031734 con vigencia del 29 de febrero al 03 de enero de 2025. En el informe No 39, se adjunta Póliza en mención No. 33-03-101031734 con vigencia del 3 de enero al 22 de febrero de 2025 En el informe No 41, se adjunta Póliza en mención No. 33-03-101031734 con vigencia del 22 de febrero de 2025 al 22 de abril 2025	Archivo de Pólizas bajo custodia del área de inventarios de la Subred Sur
14. Los demás compromisos que se deriven de las características técnicas, estudios previos, anexo técnico, insumos y de la propuesta presentada, documentos que forman parte integral del presente convenio y aquellas que estén directamente relacionadas con el objeto del convenio.				x		

Enumerar cada una de las obligaciones específicas del convenio	SI	NO	PARCIAL	NO APLICA	Avance de actividades (desarrolladas en el periodo objeto del informe-referente a la obligación)	Evidencias y soporte (Especificar ruta de ubicación en el CD digital)
1. Incorporar los recursos recibidos del FFDS realizando todos los trámites administrativos, financieros y logísticos que permitan ejecutar	x				El 30 de noviembre de 2021, el CONFIS Distrital en sesión No 20, autorizó vigencias excepcionales 2022-2023 a la Subred Sur.	Archivo Gestión de Proyectos-Desarrollo

Enumerar cada una de las obligaciones específicas del convenio	SI	NO	PARCIAL	NO APLICA	Avance de actividades (desarrolladas en el periodo objeto del informe-referente a la obligación)	Evidencias y soporte (Especificar ruta de ubicación en el CD digital)
las fases precontractuales, contractual y post contractual para el desarrollo del proyecto					El 15/03/2022 con radicado de SDS No 2022EE30243 se emite Concepto Técnico de Viabilidad para la Ejecución de Proyectos de Inversión: Favorable. Se solicitó al FFDS giro de recursos al convenio, los recursos ingresan a la Subred el día 17 de julio de 2022, con recibo de caja No 286203 por valor de $6.487.805.450 y recibo de caja No 286175 por valor de $56.955.328.560. El 25/04/2023 ingresan recursos a la Subred con el recibo de caja No 367950 por un valor de $12.048.781.000. El 25/04/2023 ingresan recursos a la Subred con el recibo de caja No 367957 por un valor de $550. De esta forma se tiene el total girado de $12.048.781.550 El 22/08/2023 ingresan recursos a la Subred con el recibo de caja No 401689 por un valor de $2.578.551.214.	Institucional y adjunto en los informes del periodo correspondiente al cual se realiza el Seguimiento periódico de Convenios de infraestructura
2. Adelantar la fase de pre construcción, construcción y alistamiento - puesta en funcionamiento.	x				El 31 de marzo de 2022, se realizó Audiencia Pública de determinación del orden de elegibilidad, revisión del sobre de la oferta económica y adjudicación del proceso de selección por convocatoria abierta ca-001-2022, cuyo objeto es "ELABORACION, ACTUALIZACION Y AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y ADECUACION, AMPLIACIÓN CONSTRUCCION DEMOLICIÓN REFORZAMIENTO REORDENAMIENTO DOTACIÓN Y ALISTAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS HOSPITALARIOS QUIRÚRGICOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPEUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL". Se adjudica dicho proceso al proponente CONSORCIO TUNAL 2022, representado legalmente por el señor CARLOS ANDRES NARANJO DUARTE, identificado con cédula de ciudadanía No. 5.820.653, conformada por C&C ARQUITECTURA E NGENIERIA SA EN REORGANIZACIÓN con un porcentaje de	Archivo Gestión de Proyectos-Desarrollo Institucional y adjunto en los informes del periodo correspondiente al cual se realiza el Seguimiento periódico de Convenios de infraestructura

Enumerar cada una de las obligaciones específicas del convenio	SI	NO	PARCIAL	NO APLICA	Avance de actividades (desarrolladas en el periodo objeto del informe-referente a la obligación)	Evidencias y soporte (Especificar ruta de ubicación en el CD digital)
					participación del 50%, ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGENIEROS SAS con un porcentaje de participación del 45% y YELSIN EMILSON REINOSO PEREZ con un porcentaje de participación del 5% por un valor de OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS ($89.323.181.304,00) Incluido todos los costos directos e indirectos, por un plazo inicial de veinte (20) Meses. El 31 de marzo de 2022, el Representante Legal de la Entidad de Gestión Administrativa y Técnica – EGAT emite acta de recomendación de adjudicación convocatoria abierta EGAT-CA No. 001 de 2022, recomienda adjudicar el proceso de selección por Convocatoria Abierta No. CA-001-2022, al proponente CONSORCIO TUNAL 2022. El 05 de abril de 2022, el Representante Legal de la Entidad de Gestión Administrativa y Técnica – EGAT emite acta de recomendación de adjudicación convocatoria meritoria No. CM-004-2021, recomienda adjudicar el proceso al proponente CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA, conformado por PLANHO CONSULTORES SLP CIF con un porcentaje de participación del 30% y TALLER DE ARQUITECTURA SANCHEZHORNEROS SLP SUCURSAL COLOMBIA con un porcentaje de participación del 70%, representado legalmente por el señor LUIS SANCHEZ HORNEROS VIVER-SANCHEZ, identificado con cédula de extranjería No. 437.592, por un valor de SIETE MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS ($7.214.261.155.00) M/CTE Incluido todos los costos directos e indirectos, por un plazo inicial de veinte (20) meses El 6 de abril de 2022, se emite la Resolución de adjudicación No. 385 por medio de la cual se adjudica la Convocatoria Abierta CA-001-	

Enumerar cada una de las obligaciones específicas del convenio	SI	NO	PARCIAL	NO APLICA	Avance de actividades (desarrolladas en el periodo objeto del informe-referente a la obligación)	Evidencias y soporte (Especificar ruta de ubicación en el CD digital)
					2022 y la Resolución No. 386 por medio de la cual se adjudica la Convocatoria Meritoria No. CM -004 de 2021. Iniciando la fase de construcción con la firma de acta de inicio de los contratos el 20 mayo de 2022. El 24/10/2023, se firma Acta de constancia de cierre de la Fase I de Estudios y Diseños La fase de preconstrucción termina el día 24/11/2023, con la Licencia ejecutoriada, con la solicitud de revalidación y modificación de la licencia inicial. El Contratista de obra, manifestó la intención de ceder el contrato de obra, se suspendieron los contratos de obra 5008-22 e interventoría 5009-22 y se iniciaron las evaluaciones de los posibles cesionarios de dicho contrato. El día 21 de febrero 2024, se reiniciaron los contratos 5008-22 y 5009-22. El día 26 de febrero 2024, se firmó la cesión del contrato 5008 En el mes de marzo 2024, se realizó prórroga por un (1) mes, contado desde el 21 de marzo hasta el 20 de abril del 2024, a los contratos 5008-22 de obra y 5009-22 de interventoría de obra. En el mes de abril, se realizó prórroga 2 y 3 a los contratos derivados, la primera por un término de 8 días contados desde el 21 de abril hasta el 28 de abril del 2024 y la segunda por un término de 5 meses y 5 días, contados desde el 29 de abril hasta el 4 de octubre del 2024, junto a esta prórroga al contrato 5009 se realizó una adición por un valor de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($1.647.224.934) M/CTE. Respecto a la obra, con corte a septiembre 2024, se inició con el armado del fenólico y los puntales para la placa del primer piso, además se adelantó el 80% de los micropilotes para la estabilización del talud, se fundió la placa de los ejes 14 a 11. En el mes de octubre del 2024 se realizó la fundida de la placa de zona A, sumado a las	

Enumerar cada una de las obligaciones específicas del convenio	SI	NO	PARCIAL	NO APLICA	Avance de actividades (desarrolladas en el periodo objeto del informe-referente a la obligación)	Evidencias y soporte (Especificar ruta de ubicación en el CD digital)
					columnas del piso 1 de la misma zona, la terminación de los micropilotes para la estabilización del talud y se dio inicio al movimiento de tierras para los tanques y la planta de tratamiento. En el mes de noviembre 2024; se continuó con la construcción de la estructura del proyecto, realizándose el armado de aceros y formaletería para la fundición de columnas del piso 2 de la zona A, de igual forma en la zona B. Las columnas de la Zona A estarían fundidas para principios del mes de Diciembre 2024, y la Zona B para finales de Diciembre, inicios de enero de 2025. En diciembre de 2024 se logró la fundición parcial en las zonas A y B de la placa de segundo piso, así como los tramos centrales de la placa de primer piso. Con el fin de cumplir con la programación del proyecto, y en calidad de plan de contingencia, el contratista se comprometió a incorporar un nuevo subcontratista de estructura, con un mínimo de 30 personas. En enero 2025 se hace intervención en el eje C-1 excavación manual en la cimentación; instalación de tuberías de desagüe entre los ejes 1 C-D;. Se amarra el hierro para el muro 1 y 2 piso 1 en la zona A; formatear, amarado de hierro y fundición de la placa del piso 2 zona B entre los ejes 2-7, A-E; fundición del dado en concreto ciclópeo para el dado de la torre grúa; amarado de formaleta placa piso 2 zona A ejes A-J 8-12. Entre otras actividades se encuentran iluminación provisional, manejo de material de excavación, acopio de materiales. En el mes de febrero 2025: se hace intervención en el eje 1 parte norte haciendo la cimentación, y dos secciones de placas flotantes, dos secciones de muros de contención, una sección de la placa a nivel piso No.1. en la zona A se funden las	

Enumerar cada una de las obligaciones específicas del convenio	SI	NO	PARCIAL	NO APLICA	Avance de actividades (desarrolladas en el periodo objeto del informe-referente a la obligación)	Evidencias y soporte (Especificar ruta de ubicación en el CD digital)
					columnas del piso do 2 a 3, y se arma camilla para la placa del piso No. 3. En la zona B se terminan las columnas del piso 2 al 3. Se inicia muros de mampostería del sótano. Otras actividades: construcción de la torre grúa, almacenamiento de material, manejo de agua saturación. En el mes de marzo 2025 se interviene el eje No. 1 fundiendo la placa del primer piso, el muro de contención con la entrada, en la zona a se funden la placa del 3 piso las columnas del tercer al cuarto piso y se arma el hierro y la formaleta para la placa del 4 piso, en la zona B se e funde la placa del 3 piso y columnas del 3 al cuarto piso, se funden dos escaleras del sótano al primer piso.	
3. Elaborar un plan de trabajo que incluya las actividades, productos, responsables y cronograma requeridos en el cumplimiento del objeto contractual y presentarlo a aprobación del Comité Operativo dentro de las diez (1O) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio del Convenio.	x				El 22 de junio de 2022 se realizó Comité Operativo Extraordinario del Convenio para presentación del Plan de Trabajo, se socializó respecto a los ajustes propuestos, sin embargo, se decide que una vez el contratista de obra entregue el cronograma del proyecto, se presentará nuevamente el plan de trabajo ante el Comité Operativo para su aprobación. En el informe No 20 se anexó Plan de Trabajo para revisión y aprobación en Comité Operativo. SDS. Sin embargo, debido a que el PMA tuvo que ser actualizado conforme a los requerimientos recibidos, para cubrir el área en m2 de espacio asistencial. Debido a esto la huella del edificio a diseñar por el consorcio tuvo que ser replanteada; huella que fue aprobada por la entidad mediante oficio 2022030000209701 con fecha 27 de septiembre de 2022. Dado que no se cumplieron los compromisos pactados con la Subred Sur (terminar los cimientos y sótano al 30 de noviembre de 2023), el Contratista manifestó la intención de ceder el contrato de obra, para esto se iniciaron las evaluaciones de los posibles cesionarios del contrato, una vez se realicen y aprueben dichas evaluaciones se procederá con la actualización del plan de trabajo teniendo como punto de partida la programación de	Archivo Gestión de Proyectos-Desarrollo Institucional y adjunto en los informes del periodo correspondiente al cual se realiza el Seguimiento periódico de Convenios de infraestructura

Enumerar cada una de las obligaciones específicas del convenio	SI	NO	PARCIAL	NO APLICA	Avance de actividades (desarrolladas en el periodo objeto del informe-referente a la obligación)	Evidencias y soporte (Especificar ruta de ubicación en el CD digital)
					obra que entregue el cesionario a quien se le adjudique el contrato. En el mes de enero 2024, se recibió la propuesta de una unión temporal conformada por 3 empresas, se realizó la evaluación técnica y no cumplen con el pliego de condiciones dado que cada integrante de la propuesta debe aportar experiencia, luego de esto se recibió otra propuesta de dos empresas y se está evaluando los documentos entregados, que inicialmente cumplen con los pliegos de condiciones a la espera de la subsanación de las observaciones realizadas. El 14 de febrero del 2024, mediante el Comité de Contratación de la Subred Sur, se aprobó la cesión del Contrato No. 5008 de 2022, del CONSORCIO TUNAL 2022 al CONSORCIO HOSPITAL, cuyo representante legal DAVID LEONARDO MORALES GALÁN, se identifica con la Cédula de Ciudadanía No. 1.121.952.959. El CONSORCIO HOSPITAL está conformado por: INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUÍA S.A.S NIT:900497601-4 (90%) y ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S NIT 901438268-6 (10%), dicha aprobación se realiza una vez verificado que cumple con los requerimientos exigidos por la EGAT en la Convocatoria Inicial CA 001 de 2022 Previo a la Cesión del Contrato No. 5008 de 2022 y su aprobación el 26 de febrero 2024 en SECOP 2, se dio reinició a éste, Contrato el día 21 de febrero de 2024. Con esto el día 27 de febrero se presentó a la interventoría la programación y el porcentaje de ajuste al valor del contrato para su evaluación y posterior aprobación. En el mes de marzo 2024, se iniciaron las actividades de verificación del estado de las obras ejecutadas por el consorcio anterior, en cuanto a las excavaciones de las vigas de cimentación, estado y capacidad del suelo, estado y distribución del acero, estado de los diseños, verificación del talud, levantamiento de ejes y verificación de los mismos, junto a lo anterior se realizó la	

Enumerar cada una de las obligaciones específicas del convenio	SI	NO	PARCIAL	NO APLICA	Avance de actividades (desarrolladas en el periodo objeto del informe-referente a la obligación)	Evidencias y soporte (Especificar ruta de ubicación en el CD digital)
					entrega de las hojas de vida de los profesionales y programación de obra. En Comité Operativo del 24 de abril 2024, se presenta y aprueba el Plan de Trabajo del Convenio 2806257-2021, en este mes se adelantaron las actividades de fundida de vigas y zapatas de cimentación, armado de acero, formaleta. Dentro del comité del 29 de mayo del 2024 se realizó el seguimiento al Plan de Trabajo del Convenio, donde se explicó que tanto la fase de obra como la fase de dotación están en ejecución. Dentro del comité del 26 de junio del 2024 se realizó el seguimiento al Plan de Trabajo del Convenio el cual fue aprobado en el mes de abril del 2024, donde se explicó que tanto la fase de obra como la fase de dotación están en ejecución. En julio 2024 se realizó el seguimiento al Plan de Trabajo del Convenio el cual fue aprobado en el mes de abril del 2024, donde se explicó que tanto la fase de obra como la fase de dotación están en ejecución. El seguimiento al plan de trabajo se viene haciendo con el que se avaló en el mes de abril, no se ha presentado un plan de trabajo nuevo hasta que no se haga efectivo el uso de excedentes para la adición al contrato de interventoría. En el mes de septiembre 2024, se realizó l Comité Operativo extraordinario, el 16 de septiembre del 2024 con el fin de autorizar el uso de excedentes del Convenio 2806257-21, para adicionar el contrato 5009-2022, en este Comité, se dio aval por los supervisores del Convenio a la solicitud realizada por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur el dia13 de septiembre del 2024. En este mismo mes, se realizó el Comité Operativo el día 25 de septiembre del 2024, donde se dio parte del avance en la ejecución de los contratos derivados.	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	PLANEACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO CONVENIOS INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE			
	Código:	SDS-GTS-FT-034	Versión:	1
Elaborado por: Cristian Suarez Bohórquez / Revisado por: Rudy Esteban Prieto - Claudia E Amezquita Sandoval / Aprobado por: Liliana Sofía Cepeda Amaris				

Enumerar cada una de las obligaciones específicas del convenio	SI	NO	PARCIAL	NO APLICA	Avance de actividades (desarrolladas en el periodo objeto del informe-referente a la obligación)	Evidencias y soporte (Especificar ruta de ubicación en el CD digital)
					El comité de octubre se reprogramó para el día 1 de noviembre 2024, donde se socializó el avance de los contratos derivados y se expuso la solicitud de adición al convenio 2806257-21, con las condiciones solicitadas por la Secretaria Distrital de Salud En noviembre 2024, al actualizar el proyecto, en el componente dotación equipos biomédicos extracontractuales, con radicado No.2024ER42012 del 26/11/2024, se realizó Plan de trabajo de este componente. El Contratista presentó una solicitud de reprogramación teniendo en cuenta las supuestas afectaciones por la suspensión del contrato de obra e interventoría, sin embargo, la Interventoría conceptuó que el tiempo suspendido no generó afectaciones importantes como para realizar una reprogramación 1.5 meses. El Contratista manifestó que daría alcance a su solicitud, frente al concepto emitido por la Interventoría A diciembre de 2024 el Plan de Trabajo del Convenio se encuentra vigente y debidamente aprobado por el Comité Operativo. En enero y febrero 2025, continúa vigente el último Plan de Trabajo del Convenio mencionado previamente, debidamente aprobado por el Comité Operativo, del cual, más adelante, se presenta pantallazo en "Reporte gráfico del avance del Plan de Trabajo de la etapa en desarrollo" En el mes de marzo 2025 Se hacen ajustes a las actividades corriendo las fechas de entrega sin alterar el plan de contingencia, sin embargo, es evidente el atraso que llevan y la necesidad de solicitar una prórroga, tema que se ha tomado en los comités de seguimiento.	

Enumerar cada una de las obligaciones específicas del convenio	SI	NO	PARCIAL	NO APLICA	Avance de actividades (desarrolladas en el periodo objeto del informe-referente a la obligación)	Evidencias y soporte (Especificar ruta de ubicación en el CD digital)
4. Incorporar las Directrices Anticorrupción de MIGA (Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones) en sus pliegos de licitación y acatar las todas normas y documentos de desempeño establecidos por dicha entidad.	X				Se incorporaron a los pliegos de licitación las Directrices Anticorrupción de MIGA (Organismo Multilateral de Garantía de inversiones) y se acataron las todas normas y documentos de desempeño establecidos por dicha entidad. Se anexaron en el informe No. 8 copia de los pliegos y adendas. La Subred Sur, en comunicado del 01 de agosto del 2022, radicado en la SDS, registra que se ha cumplido con estas directrices, quedando pactado que los documentos de desempeño que fueron remitidos al constructor para su cumplimiento. Se adjunta: soporte de las comunicaciones a través de las cuales se certifica el cumplimiento de esta obligación para el mes de enero de 2025. Oficios NºCTSF-620-OBR-2025 En el mes de febrero 2025, Se adjunta: soporte de las comunicaciones a través de las cuales se certifica el cumplimiento de esta obligación para el mes de febrero de 2025. Oficios NºCTSF-641- OBRA 2025. Se adjunta: soporte de las comunicaciones a través de las cuales se certifica el cumplimiento de esta obligación para el mes marzo de 2025. Oficios NºCTSF-651-OBR-2025	Archivo Gestión de Proyectos-Desarrollo Institucional y adjunto en los informes del periodo correspondiente al cual se realiza el Seguimiento periódico de Convenios de infraestructura
5. Adelantar los procedimientos de selección de los contratistas, en armonía con lo dispuesto por el parágrafo 3° del artículo 98 del Plan de Desarrollo, que se requieran para el logro del objeto y alcance del convenio, previo concepto técnico favorable del Comité Operativo de Seguimiento al Proceso Contractual en lo que respecta a las pliegos, evaluaciones y recomendaciones al Gerente de conformidad con las normas que en materia de contratación apliquen. Se debe tener en cuenta lo señalado en el Decreto 2090 de 1989 el artículo 1.1.4 Propiedad intelectual del proyecto arquitectónico "El anteproyecto y proyecto arquitectónico son de propiedad intelectual del arquitecto, y, por consiguiente, solamente pueden usarse en la construcción del edificio para el cual	X				Los documentos fueron elaborados y fue la EGAT quien adelanto el proceso de selección para la Construcción del proyecto, se adelantaron teniendo en cuenta el d cumplimiento a lo dispuesto Plan de Desarrollo Se firmó el contrato respectivo No 5008 de 2022, del día 21 de abril de 2022 El Contratista de obra, manifestó la intención de ceder el contrato de obra, se suspendieron los contratos de obra 5008-22 e interventoría 5009-22 y se iniciaron las evaluaciones de los posibles cesionarios de dicho contrato. El día 21 de febrero 2024, se reiniciaron los contratos 5008-22 y 5009-22. El día 26 de febrero 2024, se firmó la cesión del contrato 5008	Archivo Gestión de Proyectos-Desarrollo Institucional y adjunto en los informes del periodo correspondiente al cual se realiza el Seguimiento periódico de Convenios de infraestructura

Enumerar cada una de las obligaciones específicas del convenio	SI	NO	PARCIAL	NO APLICA	Avance de actividades (desarrolladas en el periodo objeto del informe-referente a la obligación)	Evidencias y soporte (Especificar ruta de ubicación en el CD digital)
fueron elaborados. Ninguna persona podrá desarrollar anteproyectos ni cambiar proyectos, so pena de violar las disposiciones de la Ley 23 de 1982, sobre derechos de autor, excepto en el caso que el anteproyecto haya sido elaborado directamente par la entidad contratante. No se podrán utilizar anteproyectos y proyectos en obras diferentes a aquellas para las cuales fueron contratados".					En el mes de marzo 2024, se realizó prórroga por un (1) mes, contado desde el 21 de marzo hasta el 20 de abril del 2024, a los contratos 5008-22 de obra y 5009-22 de interventoría de obra. En el mes de marzo 2024, se realizó prórroga por un (1) mes, contado desde el 21 de marzo hasta el 20 de abril del 2024, a los contratos 5008-22 de obra y 5009-22 de interventoría de obra En el mes de marzo 2024, se iniciaron las actividades de verificación del estado de las obras ejecutadas por el consorcio anterior, en cuanto a las excavaciones de las vigas de cimentación, estado y capacidad del suelo, estado y distribución del acero, estado de los diseños, verificación del talud, levantamiento de ejes y verificación de los mismos, junto a lo anterior se realizó la entrega de las hojas de vida de los profesionales y programación de obra. En el mes de abril, se realizó prórroga 2 y 3 a los contratos derivados, la primera por un término de 8 días contados desde el 21 de abril hasta el 28 de abril del 2024 y la segunda por un término de 5 meses y 5 días, contados desde el 29 de abril hasta el 4 de octubre del 2024, junto a esta prórroga al contrato 5009 se realizó una adición por un valor de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($1.647.224.934) M/CTE. Durante los meses de mayo 2024 a marzo 2025, no se adelantaron actividades relacionadas con esta obligación.	
6. Adelantar el proceso de selección de la interventoría requerida y designar el supervisor necesario y adecuado para el correcto seguimiento y control del cumplimiento de las obligaciones adquiridas en virtud de los contratos que se celebren en desarrollo del presente convenio, de conformidad con las normas que sobre contratación se apliquen y en armonía con lo	X				Se firmó el contrato respectivo No 5009 de 2022, del día 21 de abril de 2022 Debido a que el Contratista de obra, manifestó la intención de ceder el contrato de obra, se suspendieron los contratos tanto de obra 5008-22 como el de interventoría 5009-22 y se iniciaron las evaluaciones de los posibles cesionarios de dicho contrato.	Archivo Gestión de Proyectos-Desarrollo Institucional y adjunto en los informes del periodo correspondiente al cual se realiza el

Enumerar cada una de las obligaciones específicas del convenio	SI	NO	PARCIAL	NO APLICA	Avance de actividades (desarrolladas en el periodo objeto del informe-referente a la obligación)	Evidencias y soporte (Especificar ruta de ubicación en el CD digital)
dispuesto por el parágrafo 3° del artículo 98 del Plan de Desarrollo.					El día 21 de febrero 2024, se reiniciaron los contratos 5008-22 y 5009-22. El día 26 de febrero 2024, se firmó la cesión del contrato 5008 En el mes de marzo 2024, se realizó prórroga por un (1) mes, contado desde el 21 de marzo hasta el 20 de abril del 2024, a los contratos 5008-22 de obra y 5009-22 de interventoría de obra. En el mes de abril, se realizó prórroga 2 y 3 a los contratos derivados, la primera por un término de 8 días contados desde el 21 de abril hasta el 28 de abril del 2024 y la segunda por un término de 5 meses y 5 días, contados desde el 29 de abril hasta el 4 de octubre del 2024, junto a esta prórroga al contrato 5009 se realizó una adición por un valor de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($1.647.224.934) M/CTE. Durante los meses de mayo 2024 a marzo del 2025, no se adelantaron actividades relacionadas con esta obligación	Seguimiento periódico de Convenios de infraestructura
7. Descalificar del proceso de selección a cualquier proveedor que se encuentre en la Lista de Empresas e Individuos No Elegibles de la WBG (World Bank Group).(https://www.worldbank.org/en/project ooperations/procuremenUdebarred-firm. s).	x				La EGAT dio cumplimiento a esta obligación en el proceso de contratación. La Subred Sur, en comunicado del 01 de agosto del 2022, radicado en la SDS, registra que se ha cumplido con estas directrices, quedando pactado que los documentos de desempeño que fueron remitidos al constructor para su cumplimiento.	
8. Presentar a la SDS para revisión y aprobación los procesos de contratación y ejecución para proyectos que se encuentren en y/o por encima cinco (5) millones de dólares (US$5.000.000), para lo cual la Subred presentará los estudios previos, análisis de sector y los demás documentos inherente al proceso de selección. Sin dicha aprobación la Subred no podrá publicar los documentos precontractuales.	X				Este paso se surtió con anterioridad al proceso de selección, la Secretaría Distrital de Salud-FFDS, validó, aprobó y asignó los recursos respectivos.	Archivo Gestión de Proyectos-Desarrollo Institucional y adjunto en los informes del periodo correspondiente al cual se realiza el Seguimiento periódico de

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	PLANEACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO CONVENIOS INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE			
	Código:	SDS-GTS-FT-034	Versión:	1
Elaborado por: Cristian Suarez Bohórquez / Revisado por: Rudy Esteban Prieto - Claudia E Amezquita Sandoval / Aprobado por: Liliana Sofía Cepeda Amaris				

Enumerar cada una de las obligaciones específicas del convenio	SI	NO	PARCIAL	NO APLICA	Avance de actividades (desarrolladas en el periodo objeto del informe-referente a la obligación)	Evidencias y soporte (Especificar ruta de ubicación en el CD digital)
						Convenios de infraestructura
9. La Subred notificará y garantizará a la SDS que el proceso de contratación se completó de acuerdo con la normatividad vigente y los estándares de desempeño (Norma de Desempeño 1: Evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales; Norma de Desempeño 2: Trabajo y condiciones laborales; Norma de Desempeño 3: Eficiencia del uso de los recursos y prevención de la contaminación; Norma de Desempeño 4: Salud y seguridad de la comunidad; Norma de Desempeño 5: Adquisición de tierras y reasentamiento involuntario; Norma de Desempeño 6: Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales vivos; Norma de Desempeño 7: Pueblos indígenas; Norma de Desempeño 8: Patrimonio cultura) que harán parte integral del presente convenio, y que el adjudicatario ha aceptado acatarlas.	X				El proceso de contratación se encuentra debidamente surtido, notificado a la SDS y publicado en el SECOP II, atendiendo la normatividad para este tipo de contratación.	Archivo Gestión de Proyectos-Desarrollo Institucional y adjunto en los informes del periodo correspondiente al cual se realiza el Seguimiento periódico de Convenios de infraestructura
10. Proporcionar mensualmente a la SDS un informe consolidado de adquisición y contratación derivada con todos los soportes necesarios (contratos, actas de corte, facturas, soporte de pago, soporte del pago de los aportes al sistema general de seguridad social de los empleados, soporte de SENA-Fondo de apoyo de la industria a la construcción) y demás documentos necesarios e inherentes a la ejecución.	X				La interventoría certifica que el contratista ha cumplido con sus obligaciones parafiscales. El informe No. 41 correspondiente a la ejecución del mes de febrero de 2025, dando cumplimiento a la última directriz de la SDS, fue cargado el día 17 de marzo 2025, en DRIVE: sharepoint en el link: https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FAnlisisdeDatosSDS%2Fsubplaneacion%2FDocumentos%20compartidos%2FDIT%2FPROYECTOS%2FSUBRED%20SUR%2FSOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO&p=true&ga=1, con el fin de recibir las observaciones correspondientes por parte de la SDS, y después proceder al ajuste de las mismas y realizar la radicación del informe ajustado en medio físico, en SDS. Actualmente, en espera de observaciones por parte de la SDS.	

Enumerar cada una de las obligaciones específicas del convenio	SI	NO	PARCIAL	NO APLICA	Avance de actividades (desarrolladas en el periodo objeto del informe-referente a la obligación)	Evidencias y soporte (Especificar ruta de ubicación en el CD digital)
11. Cumplir con la normatividad que regula la construcción para las instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, entre ellas los estándares de habilitación de acuerdo con la Resolución 3100 de 2019 del Ministerio de Salud y Protección Social , "por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud y se adopta el Manual de inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud" y/o demás normas que la deroguen, modifiquen adicionen o complementen.	X				Los estudios y diseños que se vienen ejecutando, cumplen con los estándares de habilitación de acuerdo con la Resolución 3100 de 2019 del Ministerio de Salud y Protección Social El día 24 de octubre del 2023 se firmó el acta de cierre de los diseños donde se aclara que los únicos trámites pendientes son los correspondientes por entidades externas.	
12. Realizar las acciones necesarias que permitan garantizar la sujeción de las diferentes fases para el proceso de adecuación, reforzamiento y reorganización de los servicios de la UMHES en la edificación actual como de las intervenciones a ejecutar, conforme a la normatividad vigente.	x				El proyecto durante su etapa precontractual se sujetó a la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios y a los manuales de contratación de la EGAT. Así mismo durante las siguientes etapas continuará realizando las acciones que sean necesarias para continuar garantizando la sujeción de las diferentes fases.	Archivo Gestión de Proyectos-Desarrollo Institucional y adjunto en los informes del periodo correspondiente al cual se realiza el Seguimiento periódico de Convenios de infraestructura
13. Abrir una cuenta única para el manejo de los recursos del Convenio.	x				El 17 de septiembre de 2021, se realiza apertura de la cuenta de ahorros No. 0550004800460919 Davivienda, para recursos del presente convenio.	Archivo Gestión de Proyectos-Desarrollo Institucional y adjunto en los informes del periodo correspondiente al cual se realiza el Seguimiento periódico de Convenios de infraestructura
14. No hacer unidad de caja con los recursos girados.	x				Se adjunta Certificado expedido por el Subgerente Corporativo, la Líder de Presupuesto, la Tesorera y el Profesional Universitario de Contabilidad de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, en el cual se registra que Contabilidad evidenció que la cuenta aperturada de este convenio,	Archivo Gestión de Proyectos-Desarrollo Institucional y adjunto en los informes del periodo correspondiente al

Enumerar cada una de las obligaciones específicas del convenio	SI	NO	PARCIAL	NO APLICA	Avance de actividades (desarrolladas en el periodo objeto del informe-referente a la obligación)	Evidencias y soporte (Especificar ruta de ubicación en el CD digital)
					no hace unidad de caja con los recursos girados.	cual se realiza el Seguimiento periódico de Convenios de infraestructura
15. Mantener separada la contabilidad de los recursos desembolsados a través del presente Convenio por parte de la Secretaría Distrital de Salud de la contabilidad propia de la Subred. - Fondo Financiero Distrital de Salud y reembolsar al Fondo Financiero Distrital de Salud los saldos no ejecutados al finalizar el plazo de ejecución del Convenio.	x				Se adjunta Certificado expedido por el Subgerente Corporativo, la Líder de Presupuesto, la Tesorera y el Profesional Universitario de Contabilidad de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, en el cual registra que se mantiene separada la contabilidad de los recursos desembolsados a través del presente Convenio por parte de la Secretaria Distrital de Salud de la contabilidad propia de la Subred. - Fondo Financiero Distrital de Salud.	Archivo Gestión de Proyectos-Desarrollo Institucional y adjunto en los informes del periodo correspondiente al cual se realiza el Seguimiento periódico de Convenios de infraestructura
16.Invertir los recursos destinados en el presente convenio de forma exclusiva para el cumplimiento de su objeto, de tal manera que conlleven al desarrollo de las acciones requeridas para el logro de los objetivos establecidos en el presente Convenio y de conformidad con lo establecido en el proyecto de inversión viabilizado y aprobado.				X	Los recursos destinados en el presente Convenio se han invertido de forma exclusiva para el cumplimiento de su objeto de dicho Convenio 2806257 de 2021.	
17. Presentar al Comité Operativo los informes de seguimiento de ejecución del Convenio dentro de los diez (10) primeros días calendario de cada mes, durante la ejecución del mismo.	x				La interventoría certifica que el contratista ha cumplido con sus obligaciones parafiscales. El informe No. 41 correspondiente a la ejecución del mes de febrero de 2025, dando cumplimiento a la última directriz de la SDS, fue cargado el día 17 de marzo 2025, en DRIVE: SharePoint en el link: https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FAnlisisdeDatosSDS%2Fsubplaneacion%2FDocumentos%20compartidos%2FDIT%2FPROYECTOS%2FSUBRED%20SUR%2FSOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO&p=true&ga=1, con el fin de recibir las observaciones correspondientes por parte de la SDS, y después proceder al ajuste de las mismas y realizar la radicación del informe ajustado en medio físico, en SDS.	Archivo Gestión de Proyectos-Desarrollo Institucional y adjunto en los informes del periodo correspondiente al cual se realiza el Seguimiento periódico de Convenios de infraestructura

Enumerar cada una de las obligaciones específicas del convenio	SI	NO	PARCIAL	NO APLICA	Avance de actividades (desarrolladas en el periodo objeto del informe-referente a la obligación)	Evidencias y soporte (Especificar ruta de ubicación en el CD digital)
					Actualmente, en espera de observaciones por parte de la SDS.	
18. Informar al FONDO dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la finalización del Convenio sobre la ejecución a través de quienes ejerzan la vigilancia y control de seguimiento en el cumplimiento de las obligaciones contraídas y reintegrar los valores no ejecutados dentro del plazo anterior.				X	No aplica para el periodo evaluado.	
19. Presentar a quien ejerce la vigilancia y control de la ejecución del Convenio por parte del FONDO dentro de las treinta (30) días siguientes a la terminación del convenio, el informe final, respecto al desarrollo, ejecución y alcance del objeto, especificando los compromisos u obligaciones.				X	No aplica para el periodo evaluado.	
20. Designar el responsable del seguimiento a la ejecución del convenio que se encargue de coordinar las acciones propias de la ejecución y presentar los informes de requeridos por EL FONDO.	x				El 14 de septiembre de 2021 la Subred Sur, designa responsable del seguimiento a la ejecución del Convenio CO1.PCCNTR.2806257 de 2021 mediante oficio con N° de radicado 202103000036053 a la Médica Especialista de Gestión de Proyectos	Archivo Gestión de Proyectos-Desarrollo Institucional y adjunto en los informes del periodo correspondiente al cual se realiza el Seguimiento periódico de Convenios de infraestructura
21. Cumplir con las normas legales de protección al media ambiente vigente en Colombia, así coma con los procedimientos establecidos por la Empresa Social del Estado, relacionadas con el deber de protección al media ambiente y de los recursos naturales, en especial con la Resolución 1115 de 2012 expedida por la Secretaria Distrital de Ambiente y demás normas que apliquen, igualmente implementar las medidas necesarias para la mitigación del impacto ambiental negativo generado por la ejecución de las obras tales coma ruidos, material particulado, manejo de escombros, señalización, emisión de gases, seguridad industrial y seguridad ocupacional entre otros.	X				En Estudios Previos y Pliegos de Condiciones, se han tenido en cuenta las normas legales vigente en Colombia, referentes a la protección al medio ambiente, así coma con los procedimientos establecidos por la Empresa Social del Estado, relacionadas con el deber de protección al medio ambiente Obligación incluida en pliegos del contrato de consultoría de estudios y diseños faltantes y de obra.	Archivo Gestión de Proyectos-Desarrollo Institucional y adjunto en los informes del periodo correspondiente al cual se realiza el Seguimiento periódico de Convenios de infraestructura

Enumerar cada una de las obligaciones específicas del convenio	SI	NO	PARCIAL	NO APLICA	Avance de actividades (desarrolladas en el periodo objeto del informe-referente a la obligación)	Evidencias y soporte (Especificar ruta de ubicación en el CD digital)
22. Acatar las recomendaciones y aprobaciones del Comité Operativo Contractual	X				El 4 de abril de 2022, se realizó Comité Operativo del Convenio CO1.PCCNTR.2806257-2021, en donde se realizó presentación de la Recomendaciones de adjudicación de obra e interventoría, acatando las recomendaciones correspondientes. El último miércoles de cada mes se asiste a Comité de Convenios de Infraestructura y dotación de la Subred Sur, de forma virtual, y se acatan las recomendaciones que correspondan. El 24/04/2024, se realizó Comité Operativo de Convenios donde se dio a conocer el estado de los Convenios, se realizó socialización del Plan de Trabajo y las modificaciones en las fases del Convenio, quedando la fase de obra de 23 meses y 5 días El 29 de mayo 2024, se realizó el comité operativo de Convenios donde se dio a conocer el estado de los Convenios y se realizó seguimiento al Plan de Trabajo de las fases de dotación y obra Dentro del comité del 26 de junio del 2024 se realizó el seguimiento al Plan de Trabajo del Convenio el cual fue aprobado en el mes de abril del 2024, donde se explicó que tanto la fase de obra como la fase de dotación están en ejecución. Dentro del comité del 31 de julio del 2024 se realizó, seguimiento al Plan de Trabajo del Convenio, el cual fue aprobado en el mes de abril del 2024, donde se explicó que tanto la fase de obra como la fase de dotación se encuentran en ejecución Dentro del comité del 28 de agosto del 2024 se realizó, seguimiento al Plan de Trabajo del Convenio, de parte de SDS se aclaró el paso a seguir para prorrogar el convenio y los contratos derivados	Archivo Gestión de Proyectos-Desarrollo Institucional y adjunto en los informes del periodo correspondiente al cual se realiza el Seguimiento periódico de Convenios de infraestructura

Enumerar cada una de las obligaciones específicas del convenio	SI	NO	PARCIAL	NO APLICA	Avance de actividades (desarrolladas en el periodo objeto del informe-referente a la obligación)	Evidencias y soporte (Especificar ruta de ubicación en el CD digital)
					Dentro del Comité del 25 de septiembre del 2024 se realizó, seguimiento al Plan de Trabajo del Convenio, de parte de SDS se aclaró el paso a seguir para prorrogar el Convenio y los contratos derivados El Comité del mes de octubre 2024, se reprogramó para el día 1 de noviembre 2024, donde se socializó el avance de los contratos derivados y se expuso la solicitud de adición al convenio 2806257-21con las condiciones solicitadas por la Secretaria Distrital de Salud. Durante el mes de noviembre 2024, se presentó al Comité Operativo la solicitud de prórroga y uso de excedentes para adición al contrato de Interventoría, obteniéndose la modificación 2 del Convenio, y la suscripción de la prórroga con fecha final del Convenio 26/06/2026 y uso de excedentes para la adición del contrato de interventoría, para respaldar la mayor permanencia de dicha interventoría. En cumplimiento de esta obligación, se realizó el respectivo Comité operativo el 23 de diciembre de 2024, y se han acatado las recomendaciones del mismo. El 29 de enero 2025, se realizó el respectivo Comité operativo, en donde se hizo seguimiento a los diferentes Convenios incluido este Convenio 2806257-21, y se han acatado las recomendaciones del mismo. El 19 de febrero 2025, se realizó el respectivo Comité operativo, en donde se hizo seguimiento a los diferentes Convenios incluido este Convenio 2806257-21, y se han acatado las recomendaciones del mismo. El 13 de marzo de 2025, se realizó Comité Operativo Extraordinario CV 2906257 – 2021 de Urgencias Tunal, con tema solicitud de inclusión para la administración Tesoral de recursos del Convenio. Se aprueba la	

Enumerar cada una de las obligaciones específicas del convenio	SI	NO	PARCIAL	NO APLICA	Avance de actividades (desarrolladas en el periodo objeto del informe-referente a la obligación)	Evidencias y soporte (Especificar ruta de ubicación en el CD digital)
					solicitud de modificación y la inclusión en el Convenio interadministrativo 2806257-21, el trámite para la administración tesoral de recursos. El 25 de marzo 2025, se realizó el respectivo Comité operativo, en donde se hizo seguimiento a los diferentes Convenios incluido este Convenio 2806257-21, y se han acatado las recomendaciones del mismo.	
23. Adelantar todos los trámites que se requieran para la ejecución del objeto del presente Convenio.	x				Gestión para autorización de vigencias futuras. El 30 de noviembre de 2021: El CONFIS autorizó vigencias excepcionales 2022-2023 a la Subred Sur Gestión para Concepto Técnico de Viabilidad para la Ejecución de Proyectos de Inversión: El 15/03/2022 con radicado de SDS No 2022EE30243 se emite Concepto Técnico de Viabilidad para la Ejecución de Proyectos de Inversión: Favorable. En el mes de agosto no se adelantaron tramites El día 13 de septiembre del 2024 la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur realizo la radicación de autorización de uso de excedentes del convenio No. 2806257-21 mediante el radicado 2024300-025778-1 donde se solicitaba prórroga de dicho Convenio, modificación de las fases del Convenio y la autorización del uso de excedentes para adicionar el contrato de interventoría, lo anterior con el fin de que realiza la supervisión y control del contrato 5008 del 2022 hasta el mes de noviembre del 2025. En el mes de octubre 2024, se sigue avanzando en la gestión para el uso de excedentes del Convenio 2806257-21. Durante el mes de noviembre 2024, se presentó al Comité Operativo la solicitud de prórroga y uso de excedentes para adición al contrato de Interventoría, obteniéndose la modificación 2 del Convenio, y la suscripción	Archivo Gestión de Proyectos-Desarrollo Institucional y adjunto en los informes del periodo correspondiente al cual se realiza el Seguimiento periódico de Convenios de infraestructura

Enumerar cada una de las obligaciones específicas del convenio	SI	NO	PARCIAL	NO APLICA	Avance de actividades (desarrolladas en el periodo objeto del informe-referente a la obligación)	Evidencias y soporte (Especificar ruta de ubicación en el CD digital)
					de la prórroga y uso de excedentes para la adición del contrato de interventoría, para respaldar la mayor permanencia de dicha interventoría. Durante el mes de febrero del 2025; quedó proyectada la solicitud para la licencia de construcción, para radicar en la curaduría No. 1. En el seguimiento del mes de marzo 2025 se anexará radicado de dicha solicitud, adicionalmente, se gestiona con la EAAB lo correspondiente para contar con las conexiones definitivas, con ENEL presentando solicitud relacionada con las conexiones eléctricas provisionales y definitivas. ENEL registra las siguientes razones del rechazo de la solicitud: 1. Por favor diligenciar en su totalidad el formato E1, (Coordenada X, Coordenada Y, Distancia actual del predio a la red más cercana, Carga existente en kVA, Carga máxima requerida en kVA, Nivel de tensión solicitado). 2. Documento legal del propietario que aparece en el certificado de tradición y libertad (DISTRITO CAPITAL DE SANTAFE DE BOGOTA). 3. Volver a enviar toda la documentación completa Se espera que, para el mes de marzo 2025, se presente el formato ajustado con los soportes solicitados. En marzo 2025 queda la prórroga de la licencia de construcción con la curaduría No. 1. Se gestiona con la EAAB lo correspondiente para contar con las conexiones definitivas; con ENEL presentando solicitud relacionada con las conexiones eléctricas provisionales y definitivas. ENEL registra las siguientes razones del rechazo de la solicitud. *ENEL: El Consorcio Hospital informó que la solicitud radicada anteriormente se rechazó por parte de ENEL con observaciones. Se está recopilando la información para radicar nuevamente. *Provisional de acueducto TPO: El Consorcio Hospital se ha tomado hasta el mes de marzo para realizar los ajustes a las observaciones que fueron remitidos a la	

Enumerar cada una de las obligaciones específicas del convenio	SI	NO	PARCIAL	NO APLICA	Avance de actividades (desarrolladas en el periodo objeto del informe-referente a la obligación)	Evidencias y soporte (Especificar ruta de ubicación en el CD digital)
					Interventoría el 06 de marzo, donde nuevamente se dejaron recomendaciones sobre la visita de EAAB. El 19 de marzo el Consorcio Hospital envió por correo al Ing. de la EAAB los diseños ajustados, quien respondió el mismo día preguntando por las obras necesarias de adecuación (nicho medidor), para instalación del servicio. A la fecha el Consorcio Hospital no ha realizado las adecuaciones correspondientes a la construcción de la cajilla en piso para totalizadora de la provisional. *Definitiva de Energía: Se requiere adelantar el trámite de radicación del proyecto Serie 3 de subestación Enel Codensa. si bien se cuenta con los planos del serie 3, el Consorcio Hospital no ha realizado la gestión administrativa del trámite. Se tiene pendiente respuesta de ENEL sobre confirmación del punto de conexión. Continúa sin respuesta del Consorcio Hospital sobre la evaluación con su diseñador para determinar la pertinencia del proyecto Serie 1 o Serie 3. *Definitiva Acueducto: Se cuenta con concepto técnico de redes. Se tramitará cuando el proyecto cuente con un avance del 70% según consultó el Consorcio Hospital con la EAAB.. *Definitiva Gas Natural: El Consorcio Hospital no ha entregado respuesta en comité de obra sobre el avance con este trámite. *Inventario forestal: Durante el mes de marzo se han realizado dos reuniones entre el contratista, la Interventoría y el ingeniero forestal, donde la Interventoría ha dejado observaciones sobre el número de individuos identificados para tala, requiriendo que solo se definan los que estén interfiriendo con el proyecto. El Consorcio Hospital ha realizado los ajustes y espera presentar nuevamente una versión 3 a comienzos de abril para aval de la Interventoría y aprobación para radicación de la solicitud en la Secretaría Distrital de Ambiente.	

Enumerar cada una de las obligaciones específicas del convenio	SI	NO	PARCIAL	NO APLICA	Avance de actividades (desarrolladas en el periodo objeto del informe-referente a la obligación)	Evidencias y soporte (Especificar ruta de ubicación en el CD digital)
					*Licencia de Construcción: Licencia de Construcción: Se cuenta con licencia hasta el 17 de abril de 2025. LIC: 11001-1-23-2576. El Consorcio Hospital informó que radicó el 03 de marzo la solicitud de prórroga y se encuentra en revisión de la curaduría No.1 la solicitud. *PMT: Se tramitó prórroga y se cuenta con plan de manejo de tránsito actualizado hasta el 31 de julio de 2025, COI No. 26725. Licencia de intervención de espacio público: El Consorcio Hospital ha informado al cierre del mes de marzo que ya cuenta con la copia de planos con sello de licencia solicitados a la curaduría.	
24. Analizar y de ser el caso acatar las observaciones que le formule la Secretaria Distrital de Salud - Fondo Financiero Distrital de Salud en el marco del Comité Operativo, subsanando de inmediato cualquier deficiencia en la ejecución del Convenio Interadministrativo.	x				En el marco del Comité Operativo y la ejecución del Convenio Interadministrativo, se han acatado las sugerencias por parte de la SDS-Secretaria Distrital de Salud y EGAT.	Archivo Gestión de Proyectos-Desarrollo Institucional y adjunto en los informes del periodo correspondiente al cual se realiza el Seguimiento periódico de Convenios de infraestructura
25. Asistir a las reuniones de coordinación planteadas por la Secretaria Distrital de Salud de acuerdo con las fechas y sitios que se programen	x				A la fecha se ha asistido a las reuniones virtuales que programa la Secretaría Distrital de Salud. El último miércoles de cada mes, se asiste a Comité de Convenios de Infraestructura y dotación de la Subred Sur, de forma virtual, y se acatan las recomendaciones que correspondan. El 29 de mayo 2024, se realizó el Comité Operativo de Convenios, donde se dio a conocer el estado de los Convenios y se realizó seguimiento al Plan de Trabajo de las fases de dotación y obra. Dentro del comité del 26 de junio del 2024 se realizó el seguimiento al Plan de Trabajo del Convenio el cual fue aprobado en el mes	Archivo Gestión de Proyectos-Desarrollo Institucional y adjunto en los informes del periodo correspondiente al cual se realiza el Seguimiento periódico de Convenios de infraestructura

Enumerar cada una de las obligaciones específicas del convenio	SI	NO	PARCIAL	NO APLICA	Avance de actividades (desarrolladas en el periodo objeto del informe-referente a la obligación)	Evidencias y soporte (Especificar ruta de ubicación en el CD digital)
					de abril del 2024, donde se explicó que tanto la fase de obra como la fase de dotación están en ejecución. Dentro del comité del 31 de julio del 2024 se realizó, seguimiento al Plan de Trabajo del Convenio, el cual fue aprobado en el mes de abril del 2024, donde se explicó que tanto la fase de obra como la fase de dotación se encuentran en ejecución En el mes de agosto 2024, se programaron reuniones para definir los recursos necesarios para la prórroga del convenio y los contratos derivados, junto con el comité operativo del día 28. En el mes de septiembre 2024, se realizó el Comité Operativo extraordinario, el 16 de septiembre del 2024 con el fin de autorizar el uso de excedentes del Convenio 2806257-21, para adicionar el contrato 5009-2022, en este Comité, se dio aval por los supervisores del Convenio a la solicitud realizada por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur el día 13 de septiembre del 2024. En este mismo mes, se realizó el Comité Operativo el día 25 de septiembre del 2024, donde se dio parte del avance en la ejecución de los contratos derivados. El comité de octubre se reprogramó para el día 1 de noviembre 2024, donde se socializó el avance de los contratos derivados y se expuso la solicitud de adición al convenio 2806257-21, con las condiciones solicitadas por la Secretaria Distrital de Salud Durante el mes de noviembre 2024, se atendieron las reuniones solicitadas por la SDS, entre ellas la asistencia virtual al Comité Operativo de seguimiento a Convenios de fecha 27 de noviembre 2024 En cumplimiento de esta obligación, se realizó el respectivo Comité operativo el 23	

Enumerar cada una de las obligaciones específicas del convenio	SI	NO	PARCIAL	NO APLICA	Avance de actividades (desarrolladas en el periodo objeto del informe-referente a la obligación)	Evidencias y soporte (Especificar ruta de ubicación en el CD digital)
					de diciembre de 2024, y se han acatado las recomendaciones del mismo. El 29 de enero 2025, se realizó el respectivo Comité operativo, en donde se hizo seguimiento a los diferentes Convenios incluido este Convenio 2806257-21, y se han acatado las recomendaciones del mismo. El 19 de febrero 2025, se realizó el respectivo Comité operativo, en donde se hizo seguimiento a los diferentes Convenios incluido este Convenio 2806257-21, y se han acatado las recomendaciones del mismo. El 13 de marzo de 2025, se realizó Comité Operativo Extraordinario CV 2906257 – 2021 de Urgencias Tunal, con tema solicitud de inclusión para la administración Tesoral de recursos del Convenio. Se aprueba la solicitud de modificación y la inclusión en el Convenio interadministrativo 2806257-21, el trámite para la administración Tesoral de recursos. El 25 de marzo 2025, se realizó el respectivo Comité operativo, en donde se hizo seguimiento a los diferentes Convenios incluido este Convenio 2806257-21, y se han acatado las recomendaciones del mismo.	
26. Atender los requerimientos u observaciones que le presente la Secretaria Distrital de Salud por conducto del Supervisor.	x				En atención del radicado 2023EE111176 del 30 de agosto de 2023, correspondiente a la solicitud de información del convenio interadministrativo No.2806257 de 2021, cuyo objetivo es "Aunar esfuerzos ,recursos administrativos, económicos y técnicos, que permitan efectuar las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto adecuación , ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de urgencias hospitalarios , quirúrgicos y de apoyo de diagnóstico y terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud en Tunal ; Se genera respuesta por medio del radicado 2023-ER19149 el 11 de	Archivo Gestión de Proyectos-Desarrollo Institucional y adjunto en los informes del periodo correspondiente al cual se realiza el Seguimiento periódico de Convenios de infraestructura

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	PLANEACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO CONVENIOS INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE			
	Código:	SDS-GTS-FT-034	Versión:	1
Elaborado por: Cristian Suarez Bohórquez / Revisado por: Rudy Esteban Prieto - Claudia E Amezquita Sandoval / Aprobado por: Liliana Sofía Cepeda Amaris				

Enumerar cada una de las obligaciones específicas del convenio	SI	NO	PARCIAL	NO APLICA	Avance de actividades (desarrolladas en el periodo objeto del informe-referente a la obligación)	Evidencias y soporte (Especificar ruta de ubicación en el CD digital)
					septiembre de 2023 a cada uno de los puntos mencionados En el mes de noviembre 2023, se realizó mesa de trabajo en la cual participó el personal asistencial de la Subred, en la cual se definió la dotación total de equipos biomédicos contractuales y no contractuales, se adjunta acta. En el mes de enero 2024, se realizó reunión en la Secretaria Distrital de Salud con la Ingeniera Biomédica, referente para la Subred Sur, en la cual se validó el PMA actual para el proyecto. El 24 de abril de 2024, se realizó Comité de Convenios donde se dio a conocer el estado de los Convenios. El 29 de mayo de 2024, se realizó el Comité Operativo de Convenios, donde se dio a conocer el estado de los Convenios y se realizó seguimiento al Plan de Trabajo de las fases de dotación y obra. Dentro del comité del 26 de junio del 2024 se realizó el seguimiento al Plan de Trabajo del Convenio el cual fue aprobado en el mes de abril del 2024, donde se explicó que tanto la fase de obra como la fase de dotación están en ejecución. Dentro del comité del 31 de julio del 2024 se realizó, seguimiento al Plan de Trabajo del Convenio, el cual fue aprobado en el mes de abril del 2024, donde se explicó que tanto la fase de obra como la fase de dotación se encuentran en ejecución En el mes de agosto 2024, se programaron reuniones para definir los recursos necesarios para la prórroga del convenio y los contratos derivados, junto con el comité operativo del día 28. En el mes de septiembre 2024, se realizó l Comité Operativo extraordinario, el 16 de	

Enumerar cada una de las obligaciones específicas del convenio	SI	NO	PARCIAL	NO APLICA	Avance de actividades (desarrolladas en el periodo objeto del informe-referente a la obligación)	Evidencias y soporte (Especificar ruta de ubicación en el CD digital)
					septiembre del 2024 con el fin de autorizar el uso de excedentes del Convenio 2806257-21, para adicionar el contrato 5009-2022, en este Comité, se dio aval por los supervisores del Convenio a la solicitud realizada por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur el dia13 de septiembre del 2024. En este mismo mes, se realizó el Comité Operativo el día 25 de septiembre del 2024, donde se dio parte del avance en la ejecución de los contratos derivados El comité de octubre se reprogramó para el día 1 de noviembre 2024, donde se socializó el avance de los contratos derivados. Así mismo el 27 de noviembre 2024, se realizó el Comité Operativo, donde se socializó el avance de los contratos derivados (corte noviembre 2024) y se expuso la solicitud de adición al convenio 2806257-21, con las condiciones solicitadas por la Secretaria Distrital de Salud En cumplimiento de esta obligación, se realizó el respectivo Comité operativo el 23 de diciembre de 2024, y se han acatado las recomendaciones del mismo. El 29 de enero 2025, se realizó el respectivo Comité operativo, en donde se hizo seguimiento a los diferentes Convenios incluido este Convenio 2806257-21, y se han acatado las recomendaciones del mismo. El 19 de febrero 2025, se realizó el respectivo Comité operativo, en donde se hizo seguimiento a los diferentes Convenios incluido este Convenio 2806257-21, y se han acatado las recomendaciones del mismo. El 13 de marzo de 2025, se realizó Comité Operativo Extraordinario CV 2906257 – 2021 de Urgencias Tunal, con tema solicitud de inclusión para la administración Tesoral	

Enumerar cada una de las obligaciones específicas del convenio	SI	NO	PARCIAL	NO APLICA	Avance de actividades (desarrolladas en el periodo objeto del informe-referente a la obligación)	Evidencias y soporte (Especificar ruta de ubicación en el CD digital)
					de recursos del Convenio. Se aprueba la solicitud de modificación y la inclusión en el Convenio interadministrativo 2806257-21, el trámite para la administración Tesoral de recursos. El 25 de marzo 2025, se realizó el respectivo Comité operativo, en donde se hizo seguimiento a los diferentes Convenios incluido este Convenio 2806257-21, y se han acatado las recomendaciones del mismo	
27. Solicitar y adelantar los trámites necesarios para obtener los permisos, licencias o autorizaciones a que haya lugar.	x				Se gestionó ante Curaduría No 1 la revalidación de la Licencia y el 31 de enero de 2023 la Curaduría Urbana 1, emitió el acto administrativo 11001-1-23-0540, la cual concede Revalidación de la Licencia de Construcción aprobada mediante Acto Administrativo 11001-1-20-0270 del 24 de enero de 2020. En el mes de septiembre 2023, se pagaron las expensas de la licencia y se estuvo a la espera de la emisión de la licencia, a la cual se realizó una modificación y revalidación ante la Curaduría Urbana No1. La modificación consistió en la actualización de los diseños arquitectónicos, debido a la articulación del sótano y los pisos 1 y 2 con los estudios y diseños de los pisos 3,4 y 5. El 3 de octubre 2023, la Curaduría Urbana No 1, expide Licencia con fecha de Ejecutoria 24 de noviembre 2023 (Modificación de Licencia Vigente No. 11001-1-23-2576, con No de Radicación 11001-1-23-0069 y fecha de Radicación 07 de febrero 2023. Esta última licencia tiene vigencia hasta el 17 de abril del 2025. En el mes de febrero 2025, quedó proyectada la solicitud para radicar en la curaduría No. 1. En el seguimiento del mes de marzo 2025 se anexará radicado de dicha solicitud.	Archivo Gestión de Proyectos-Desarrollo Institucional y adjunto en los informes del periodo correspondiente al cual se realiza el Seguimiento periódico de Convenios de infraestructura

Enumerar cada una de las obligaciones específicas del convenio	SI	NO	PARCIAL	NO APLICA	Avance de actividades (desarrolladas en el periodo objeto del informe-referente a la obligación)	Evidencias y soporte (Especificar ruta de ubicación en el CD digital)
					En marzo 2025 queda la prórroga de la licencia de construcción con la curaduría No. 1. se cuenta con licencia hasta el 17 de abril de 2025. LIC: 11001-1-23-2576. El Consorcio Hospital informó que radicó el 03 de marzo la solicitud de prórroga y se encuentra en revisión de la curaduría No.1 la solicitud.	
28. Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia técnica y profesional para atender sus obligaciones.	x				La Subred Sur ha mantenido los niveles de eficiencia técnica y profesional para atender sus obligaciones.	Archivo Gestión de Proyectos-Desarrollo Institucional y adjunto en los informes del periodo correspondiente al cual se realiza el Seguimiento periódico de Convenios de infraestructura
29. Reportar en caso de cualquier anomalía o novedad, la situación de forma inmediata, al supervisor del Convenio, por escrito.	x				En el periodo evaluado dado que no se presentan observaciones por parte del consorcio Tunal 2022, con las fichas técnicas realizadas por parte de la Subred en conjunto con la interventoría de los equipos contractuales, se da aval para iniciar estudio de mercado de los equipos contractuales. Debido a que no se presentaron observaciones, no se reporta al Supervisor del Convenio por parte de la SDS. Dado que no se cumplieron los compromisos pactados con la Alcaldía Mayor de Bogotá (terminar los cimientos y sótano al 30 de noviembre de 2023), el Contratista manifestó la intención de ceder el contrato de obra, el día 28 de noviembre de 2023 iniciando las evaluaciones de los posibles cesionarios del contrato, una vez se realicen y aprueben dichas evaluaciones se procederá con la actualización del plan de trabajo teniendo como punto de partida la programación de obra que entregue el cesionario a quien se le adjudique el contrato. En el mes de enero se recibió la propuesta de una unión temporal conformada por 3 empresas, se realizó la	Archivo Gestión de Proyectos-Desarrollo Institucional y adjunto en los informes del periodo correspondiente al cual se realiza el Seguimiento periódico de Convenios de infraestructura

Enumerar cada una de las obligaciones específicas del convenio	SI	NO	PARCIAL	NO APLICA	Avance de actividades (desarrolladas en el periodo objeto del informe-referente a la obligación)	Evidencias y soporte (Especificar ruta de ubicación en el CD digital)
					evaluación técnica y no cumplen con el pliego de condiciones dado que cada integrante de la propuesta debe aportar experiencia, luego de esto se recibió otra propuesta de dos empresas y se está evaluando los documentos entregados, que inicialmente cumplen con los pliegos de condiciones a la espera de la subsanación de las observaciones realizadas. El 14 de febrero del 2024, mediante el Comité de Contratación de la Subred Sur, se aprobó la cesión del Contrato No. 5008 de 2022, del CONSORCIO TUNAL 2022 al CONSORCIO HOSPITAL, cuyo representante legal DAVID LEONARDO MORALES GALÁN, se identifica con la Cédula de Ciudadanía No. 1.121.952.959. El CONSORCIO HOSPITAL está conformado por: INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUÍA S.A.S NIT:900497601-4 (90%) y ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S NIT 901438268-6 (10%), dicha aprobación se realiza una vez verificado que cumple con los requerimientos exigidos por la EGAT en la Convocatoria Inicial CA 001 de 2022 Previo a la Cesión del Contrato No. 5008 de 2022 y su aprobación el 26 de febrero 2024 en SECOP 2, se dio reinició a éste, Contrato el día 21 de febrero de 2024. Con esto el día 27 de febrero se presentó a la interventoría la programación y el porcentaje de ajuste al valor del contrato para su evaluación y posterior aprobación. En el mes de marzo 2024, se iniciaron las actividades de verificación del estado de las obras ejecutadas por el consorcio anterior, en cuanto a las excavaciones de las vigas de cimentación, estado y capacidad del suelo, estado y distribución del acero, estado de los diseños, verificación del talud, levantamiento de ejes y verificación de los mismos, junto a lo anterior se realizó la entrega de las hojas de vida de los profesionales y programación de obra. En Comité Operativo del 24 de abril 2024, se presenta y aprueba el Plan de Trabajo del Convenio 2806257-202, en este mes se	

Enumerar cada una de las obligaciones específicas del convenio	SI	NO	PARCIAL	NO APLICA	Avance de actividades (desarrolladas en el periodo objeto del informe-referente a la obligación)	Evidencias y soporte (Especificar ruta de ubicación en el CD digital)
					adelantaron las actividades de fundida de vigas y zapatas de cimentación, armado de acero, formaleta. Además, se realizó prórrogas 2 y 3 a los contratos derivados la primera por un término de 8 días contados desde el 21 de abril hasta el 28 de abril del 2024 y la segunda por un término de 5 meses y 5 días, contados desde el 29 de abril hasta el 4 de octubre del 2024, junto a esta prórroga al contrato 5009 se realizó una adición por un valor de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($1.647.224.934) M/CTE. En el mes de mayo 2024 no se realizaron actividades relacionadas con esta obligación. En el mes de julio 2024, no se realizaron actividades relacionadas con esta obligación. En el mes de agosto 2024, no se realizaron actividades relacionadas con esta obligación El día 13 de septiembre del 2024 la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur realizo la radicación de autorización de uso de excedentes del Convenio No. 2806257-21 mediante el radicado 2024300-025778-1 donde se solicitaba prórroga del Convenio, modificación de las fases del convenio y la autorización del uso de excedentes para adicionar el contrato de interventoría, lo anterior con el fin de que realiza la supervisión y control del contrato 5008 del 2022 hasta el mes de noviembre del 2025 El día 28 de octubre 2024, la Subred realizo alcance a la solicitud anterior con el siguiente radicado 2024300-030914-1 y el día 31 de octubre mediante oficio 2024300-031555-1 se realizó la solicitud de adición al Convenio 2806257-21, por la suma de $19,969,971,252, de acuerdo con la	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	PLANEACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO CONVENIOS INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE			
	Código:	SDS-GTS-FT-034	Versión:	1
Elaborado por: Cristian Suarez Bohórquez / Revisado por: Rudy Esteban Prieto - Claudia E Amezquita Sandoval / Aprobado por: Liliana Sofía Cepeda Amaris				

Enumerar cada una de las obligaciones específicas del convenio	SI	NO	PARCIAL	NO APLICA	Avance de actividades (desarrolladas en el periodo objeto del informe-referente a la obligación)	Evidencias y soporte (Especificar ruta de ubicación en el CD digital)
					justificación realizada por parte de la Secretaria Distrital de Salud ante el CONFIS, con el fin de adicionar el listado de equipos biomédicos. En los meses de noviembre a diciembre 2024, y de enero a febrero 2025, no se presentó anomalía alguna que debiera reportarse al Supervisor del Convenio. Durante los meses de enero a marzo de 2025, no se adelantaron actividades relacionadas con esta obligación.	
30. Llevar debidamente organizado y actualizado de conformidad con las normas archivísticas, el archivo documental (físico y digital), de todos los antecedentes y demás actuaciones desarrolladas en ejecución del Convenio y del proyecto objeto del mismo.	x				El archivo documental del convenio se encuentra organizado en medio físico, de acuerdo a las normas archivísticas, así como de forma magnética.	Archivo Gestión de Proyectos-Desarrollo Institucional y adjunto en los informes del periodo correspondiente al cual se realiza el Seguimiento periódico de Convenios de infraestructura
31. Proyectar y presentar oportunamente, las respuestas a los requerimientos que en relación con el Convenio y el proyecto objeto del mismo, se formulen por los organismos de control o por cualquier otra autoridad o persona natural o jurídica.	x				En el periodo evaluado, respecto al radicado 2023REE111176 del 30 de agosto de 2023, se continúa con los mismos avances presentados en el mes de noviembre 2023, cuando se realizó mesa de trabajo en la cual participó el personal asistencial de la Subred, en la cual se definió la dotación total de equipos biomédicos contractuales y no contractuales, se adjunta acta. El 2 de enero de 2024 se remitió respuesta a solicitud hecha por Contraloría, relacionada con avance del proyecto, en el marco del programa Vamos a la Obra, con corte 31 de diciembre de 2023. Durante los meses de febrero 2024 a septiembre 2024, se ha dado respuesta a la solicitud de Contraloría frente al avance del proyecto, en el marco del programa Vamos a la Obra	Archivo Gestión de Proyectos-Desarrollo Institucional y adjunto en los informes del periodo correspondiente al cual se realiza el Seguimiento periódico de Convenios de infraestructura

Enumerar cada una de las obligaciones específicas del convenio	SI	NO	PARCIAL	NO APLICA	Avance de actividades (desarrolladas en el periodo objeto del informe-referente a la obligación)	Evidencias y soporte (Especificar ruta de ubicación en el CD digital)
					Durante los meses de febrero 2024 a octubre 2024, se ha dado respuesta a la solicitud de Contraloría frente al avance del proyecto, en el marco del programa Vamos a la Obra, en octubre 2024 se entregó a la entidad de control el día 4 de este mes, con recibido 1-2024-24681. El 25 de noviembre de 2024 mediante el oficio CTSF-584-OBR-2024, la Interventoría de obra, da traslado al oficio recibido del Consorcio Hospital, el día 18 de noviembre de 2024, para solicitud de información biomédica del proyecto. La Subred se encuentra en revisión de lo correspondiente para emitir respuesta En diciembre de 2024 se entregaron las fichas mensuales que solicita la Contraloría de Bogotá D.C., respecto a la ejecución de los contratos derivados. Se adjuntan. En marzo de 2025 se entregaron las fichas mensuales que solicita la Contraloría de Bogotá D.C., manos a la obra con radicado agilsalud No. 2025300-006032-1.	
32. Dar estricto cumplimiento a la normatividad aplicable para el logro del objeto contractual.	x				La Subred Sur ha dado cumplimiento a la normatividad aplicable para el logro del objeto contractual.	Archivo Gestión de Proyectos-Desarrollo Institucional y adjunto en los informes del periodo correspondiente al cual se realiza el Seguimiento periódico de Convenios de infraestructura
33. Contar, en caso de requerirse, con el concepto técnico favorable de la Secretaria Distrital de Salud, adelantar los trámites y demás requisitos exigidos para la ejecución de la obra.				X	No aplica para el periodo evaluado. Proceso no iniciado	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	PLANEACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO CONVENIOS INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE			
	Código:	SDS-GTS-FT-034	Versión:	1
Elaborado por: Cristian Suarez Bohórquez / Revisado por: Rudy Esteban Prieto - Claudia E Amezquita Sandoval / Aprobado por: Liliana Sofía Cepeda Amaris				

Enumerar cada una de las obligaciones específicas del convenio	SI	NO	PARCIAL	NO APLICA	Avance de actividades (desarrolladas en el periodo objeto del informe-referente a la obligación)	Evidencias y soporte (Especificar ruta de ubicación en el CD digital)
34. Deberá contar con los estudios respectivos que exige las normas legales vigentes de acuerdo con numeral III. Aspecto Legal del Sector del análisis del sector, el cual hace parte integral del estudio previo y demás normativa vigente que se encuentre al momento de la ejecución de los estudios y diseños y adicionalmente con: a) Programa médico arquitectónico b) Certificado de tradición del inmueble objeto de la obra actualizado, c) Los permisos y respuestas a las consultas previas emitidas por las entidades competentes tales coma Planeación, Empresa de Teléfonos de Bogotá, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Empresa de Energía de Bogotá y/o Codensa, Gas Natural (en caso que aplique), Curadurías Urbanas y demás (en caso que aplique), d) Cuadro General de Áreas, e) Pianos arquitectónicos actualizados (Localización , plantas, fachadas y cortes, detalles constructivos), f) Lista de materiales que se van a utilizar y precios de mercado, g) Pianos de ingeniería coma: Pianos eléctricos, pianos de red contra incendio, pianos de red de voz y datos, pianos CCTV, y pianos de redes hidrosanitarias.	X				Para adelantar el proceso de contratación se dio cumplimiento a esta obligación, toda vez que se cuenta con los Estudios, Diseños, Licencia y Permisos necesarios para dar inicio a la ejecución del proyecto. El contrato es de tipo llave en mano e incluye la totalidad de obligaciones descritas en este numeral.	Archivo Gestión de Proyectos-Desarrollo Institucional y adjunto en los informes del periodo correspondiente al cual se realiza el Seguimiento periódico de Convenios de infraestructura
35. Dar cumplimiento a lo establecido por la Secretaria Distrital de Planeación en el marco del instrumento de planeamiento - Plan de Regularización y Manejo - según Resolución N°0467 del 9 de abril de 2021-PRM.	x				La Subred da cumplimiento a lo establecido por la Secretaria Distrital de Planeación en el marco del instrumento de planeamiento - Plan de Regularización y Manejo, Resolución N°0467 del 9 de abril de 2021-PRM, al contratar y ejecutar las obras contempladas en dicho instrumento de planeamiento. La fase 1 del PRM se venció el 9 de abril de 2023, y para la solicitud de la prórroga de esta fase 1, El 3 de octubre 2023, la Curaduría Urbana No 1, expide Licencia con fecha de Ejecutoria 24 de noviembre 2023 (Modificación de Licencia Vigente No. 11001-1-23-2576, con No de Radicación 11001-1-23-0069 y fecha de Radicación 07 de febrero 2023. En el mes de noviembre 2023, dadas las condiciones actuales de contrato se solicitó la cesión del contrato.	Archivo Gestión de Proyectos-Desarrollo Institucional y adjunto en los informes del periodo correspondiente al cual se realiza el Seguimiento periódico de Convenios de infraestructura

Enumerar cada una de las obligaciones específicas del convenio	SI	NO	PARCIAL	NO APLICA	Avance de actividades (desarrolladas en el periodo objeto del informe-referente a la obligación)	Evidencias y soporte (Especificar ruta de ubicación en el CD digital)
					En el mes de diciembre 2023, dado que no se concretó el cesionario que cumpla con los requerimientos técnicos, financieros y jurídicos, se procedió a realizar la suspensión de los contratos tanto de obra como de interventoría, por un término de 2 meses o hasta que se realice la cesión del contrato, válida hasta el 20 de febrero de 2024 En el mes de enero 2024, se recibió la propuesta de una unión temporal conformada por 3 empresas, se realizó la evaluación técnica y no cumplen con el pliego de condiciones dado que cada integrante de la propuesta debe aportar experiencia, luego de esto se recibió otra propuesta de dos empresas y se está evaluando los documentos entregados, que inicialmente cumplen con los pliegos de condiciones a la espera de la subsanación de las observaciones realizadas. El 14 de febrero del 2024, mediante el Comité de Contratación de la Subred Sur, se aprobó la cesión del Contrato No. 5008 de 2022, del CONSORCIO TUNAL 2022 al CONSORCIO HOSPITAL, cuyo representante legal DAVID LEONARDO MORALES GALÁN, se identifica con la Cédula de Ciudadanía No. 1.121.952.959. El CONSORCIO HOSPITAL está conformado por: INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUÍA S.A.S NIT:900497601-4 (90%) y ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S NIT 901438268-6 (10%), dicha aprobación se realiza una vez verificado que cumple con los requerimientos exigidos por la EGAT en la Convocatoria Inicial CA 001 de 2022 Previo a la Cesión del Contrato No. 5008 de 2022 y su aprobación el 26 de febrero 2024 en SECOP 2, se dio reinició a éste, Contrato el día 21 de febrero de 2024. Con esto el día 27 de febrero se presentó a la interventoría la programación y el porcentaje de ajuste al valor del contrato para su evaluación y posterior aprobación En el mes de marzo, 2024, se iniciaron las actividades de verificación del estado de las	

Enumerar cada una de las obligaciones específicas del convenio	SI	NO	PARCIAL	NO APLICA	Avance de actividades (desarrolladas en el periodo objeto del informe-referente a la obligación)	Evidencias y soporte (Especificar ruta de ubicación en el CD digital)
					obras ejecutadas por el consorcio anterior, en cuanto a las excavaciones de las vigas de cimentación, estado y capacidad del suelo, estado y distribución del acero, estado de los diseños, verificación del talud, levantamiento de ejes y verificación de los mismos, junto a lo anterior se realizó la entrega de las hojas de vida de los profesionales y programación de obra. además de realizar todos los trámites correspondientes ante empresas externas, como lo es la actualización del PMR, que se espera para el 30 de mayo radicar la solicitud de actualización del mismos, con base en la programación del proyecto, que actualmente se encuentra ultimando detalles. En Comité Operativo del 24 de abril 2024, se presenta y aprueba el Plan de Trabajo del Convenio 2806257-202, en este mes se adelantaron las actividades de fundida de vigas y zapatas de cimentación, armado de acero, formaleta. Además, se realizó prorrogas 2 y 3 a los contratos derivados la primera por un término de 8 días contados desde el 21 de abril hasta el 28 de abril del 2024 y la segunda por un término de 5 meses y 5 días, contados desde el 29 de abril hasta el 4 de octubre del 2024, junto a esta prórroga al contrato 5009 se realizó una adición por un valor de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($1.647.224.934) M/CTE. En el mes de julio 2024, se realizó la radicación ante la secretaria de planeación para la prórroga del PRM del proyecto con radicado N° 2024300-021604-1 (actualización de todas fases). En el mes de agosto 2024, se tuvo respuesta por parte de la secretaria de planeación mediante oficio 2-2024-47772 donde solicitan adjuntar certificado de tradición y libertad, decreto de	

Enumerar cada una de las obligaciones específicas del convenio	SI	NO	PARCIAL	NO APLICA	Avance de actividades (desarrolladas en el periodo objeto del informe-referente a la obligación)	Evidencias y soporte (Especificar ruta de ubicación en el CD digital)
					nombramiento y acta de posesión de la Dra Viviana y plan de trabajo para las fases del PMR En el mes de septiembre 2024, no se tuvo respuesta por parte de la secretaria de planeación. En el mes de octubre 2024, ante la Secretaría de Planeación, se radico alcance a la solicitud mediante oficio 2024300-029893-1 solicitar la prórroga del plazo total hasta el año 2032, tiempo en el cual se cumplirán las fases 1, 2 y 3 del Plan de Regularización y Manejo (PRM) del proyecto. Durante el mes de noviembre 2024, se solicitó apoyo a la Dirección de Planes Maestros de la SDP respecto a este trámite, mediante oficio con radicado de entrada SDP N° 1-2024-40797 del 30 de julio de 2024, mediante el cual la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. solicita la ampliación del cronograma de ejecución del Plan de Regularización y Manejo del Equipamiento de Salud Hospital El Tunal - hoy "Unidad de Servicios de Salud El Tunal" otorgado mediante la Resolución No. 0467 del 09 de abril de 2021 El 24 de diciembre de 2024, se recibe respuesta de la SDP al radicado de entrada SDP N° 1-2024-40797 del 30 de julio de 2024, mediante el oficio con No. Radicación: 2-2024-73520 y con asunto: Modificación del Cronograma de Ejecución del Plan de Regularización y Man ejo del Equipamiento de Salud Hospital El Tunal - hoy "Unidad de Servicios de Salud El Tunal" ubicado en la localidad de Tunjuelito. En el oficio de respuesta en mención, se decide: *Modificar el artículo 7 de la Resolución No. 0467 del 09 de abril de 2021, en cuanto a prorrogar en dos (2) años el plazo de ejecución del cronograma para el*	

Enumerar cada una de las obligaciones específicas del convenio	SI	NO	PARCIAL	NO APLICA	Avance de actividades (desarrolladas en el periodo objeto del informe-referente a la obligación)	Evidencias y soporte (Especificar ruta de ubicación en el CD digital)
					cumplimiento de las acciones y obras de mitigación previstas en el Plan de Regularización y Manejo del Equipamiento de Salud Hospital El Tunal - hoy "Unidad de Servicios de Salud El Tunal", plazo que se contará a partir del vencimiento del término inicialmente concedido. Con numero de radicado 2-2024-73520, No. Proceso 2462144 y con fecha de 2024-12-24 el cual se prorrogo en dos (2) años, hasta el 2026-12-24.	
36. Socializar del proyecto a la comunidad en general, conforme a lo señalado en el Artículo 8 de la Ley 1437 de 2011.	x				El 12 de marzo 2025, se realizó reunión de veedores del proyecto, donde se realizó recorrido por la obra del proyecto Urgencias-Reordenamiento Tunal, recibiendo además información de avances de la misma.	En el CD que se adjunta a cada informe de ejecución del Convenio, se anexa copia del acta de reunión con los veedores
37. Adelantar acciones de prevención en la ejecución de los contratos derivados del presente Convenio para que no se presenten conductas que atenten o promuevan la violencia de género, incluyendo acoso sexual; de igual forma implementara mecanismos tales como buzones de quejas de fácil acceso a los empleados y/o contratistas y/o interesados, realizando seguimiento continuo para garantizar el restablecimiento de los derechos afectados.	X				La supervisión e interventoría de contratos amparados por el Convenio, realizan seguimiento mensual, sin recibir hasta el momento, quejas al respecto contratos derivados suspendidos	Informes de supervisión e interventoría
38. Desarrollar acciones de prevención en la ejecución de los contratos derivados del presente convenio para que no se presenten situaciones de trabajo infantil, trabajo forzoso; de igual forma implementara mecanismos tal coma buzones de quejas de fácil acceso a los a los empleados y/o contratistas y/o interesados, realizando seguimiento continuo para garantizar el restablecimiento de los derechos afectados.	X				La supervisión e interventoría de contratos amparados por el Convenio, realizan seguimiento mensual Contratos suspendidos En la revisión diaria de personal y reporte diario que entrega la interventoría a la Subred, en la obra no hay evidencia de trabajo infantil.	Informes de supervisión e interventoría

Enumerar cada una de las obligaciones específicas del convenio	SI	NO	PARCIAL	NO APLICA	Avance de actividades (desarrolladas en el periodo objeto del informe-referente a la obligación)	Evidencias y soporte (Especificar ruta de ubicación en el CD digital)
					El informe No. 41 correspondiente a la ejecución del mes de febrero de 2025, dando cumplimiento a la última directriz de la SDS, fue cargado el día 17 de marzo 2025, en DRIVE: sharepoint en el link: https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FAnlisisdeDatosSDS%2Fsubplaneacion%2FDocumentos%20compartidos%2FDIT%2FPROYECTOS%2FSUBRED%20SUR%2FSOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO&p=true&ga=1, con el fin de recibir las observaciones correspondientes por parte de la SDS, y después proceder al ajuste de las mismas y realizar la radicación del informe ajustado en medio físico, en SDS. Actualmente, en espera de observaciones por parte de la SDS. En el presente mes, se emite oficio por parte de la interventoría, informando que no se han presentado situaciones de trabajo infantil, trabajo forzoso. Se adjunta: soporte de las comunicaciones a través de las cuales se certifica el cumplimiento de esta obligación para el mes de febrero 2025 Oficio **CTSF-639-OBR-2025** -Obra anexo comunicado En el presente mes, se emite oficio por parte de la interventoría, informando que no se han presentado situaciones de trabajo infantil, trabajo forzoso. Se adjunta: soporte de las comunicaciones a través de las cuales se certifica el cumplimiento de esta obligación para el mes de marzo 2025 Oficio CTSF-651-OBR-2025-Obra, del 2 de abril 2025, anexo comunicado	
39. Recibir la totalidad de documentos que garanticen el paz y salvo y liquidación de obligaciones contraídas por la Subred.				X	No aplica para el periodo evaluado. Proceso no iniciado	
40. La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur deberá presentar ante la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC de la Subsecretaria				X	No aplica para el periodo evaluado. Proceso no iniciado	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	PLANEACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO CONVENIOS INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE			
	Código:	SDS-GTS-FT-034	Versión:	1
Elaborado por: Cristian Suarez Bohórquez / Revisado por: Rudy Esteban Prieto - Claudia E Amezquita Sandoval / Aprobado por: Liliana Sofía Cepeda Amaris				

Enumerar cada una de las obligaciones específicas del convenio	SI	NO	PARCIAL	NO APLICA	Avance de actividades (desarrolladas en el periodo objeto del informe-referente a la obligación)	Evidencias y soporte (Especificar ruta de ubicación en el CD digital)
Corporativa el proyecto de inversión actualizado del equipamiento tecnológico para su revisión y aprobación y adelantar los procesos de contratación correspondientes.						
41. Estructurar y presentar la implementación del "Plan de Contingencia de la Prestación de Servicios de Salud" de acuerdo al Numeral 5 de la Circular No.028 del 2017 - Plan de Contingencia - Traslado o Cierre de Servicios.	x				Plan de Contingencia de la Prestación de Servicios de Salud, ajustado de acuerdo a observaciones por parte de SDS, radicado para su revisión y aval, con No. 2022ER17191 del 25 de abril de 2022. Actualmente el Plan de Contingencia se encuentra en ejecución. El 15 de junio de 2022, la SDS mediante el radicado No. 2022EE71012, da respuesta al radicado 2022ER17191 del 25 de abril de 2022 en mención, en el cual registran que las observaciones fueron subsanadas. Se adjunta respuesta en el informe No 12 de seguimiento al Convenio 2806257 de 2021.	
42. Recibir la totalidad de documentos que garanticen la paz y salvo y liquidación de obligaciones contraídas por la Subred.				X	No aplica para el periodo evaluado. Proceso no iniciado	
43. Adelantar consulta ante la EGAT de manera previa al inicio de cada fase y de ser el caso suscribir contrato interadministrativo con la EGAT (Entidad de Gestión Administrativa y Técnica) con el fin de adelantar objeto y alcance del Convenio en cumplimiento del Acuerdo Distrital No.761 de 2020.	x				El 29/10/2021 se realiza suscripción del contrato 7801 con EGAT para etapa Pre-Contractual. (Acuerdo de adhesión No. 7801 de 2021 al Acuerdo marco Interadministrativo No. 7407 de 2021, celebrado entre la Entidad de Gestión Administrativa y Técnica – EGAT y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.), cuyo objeto consiste en: "REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL Y APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL PARA CONTRATAR LA OBRA LLAVE EN MANO Y LA INTERVENTORÍA DE OBRA PARA LA ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, HOSPITALARIOS, QUIRÚRGICOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICO DE LA USS EL TUNAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E."	
44. Vincular y mantener dentro del equipo que se disponga para la ejecución del presente Convenio, mujeres conforme al porcentaje indicado en el artículo 3° del Decreto 332 de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, garantizando que la vinculación se realizara con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables, para lo cual se deberá remitir a la Supervisión una manifestación semestral bajo juramento	X				La Subred instruyó al contratista e interventor para que adopten las medidas necesarias para dar cumplimiento a esta observación, la cual es revisada diariamente y registrada en el reporte que entrega la interventoría a la Subred.	

Enumerar cada una de las obligaciones específicas del convenio	SI	NO	PARCIAL	NO APLICA	Avance de actividades (desarrolladas en el periodo objeto del informe-referente a la obligación)	Evidencias y soporte (Especificar ruta de ubicación en el CD digital)
del facultado,,, donde se indique el personal vinculado, para corroborar la contratación de las mujeres durante el periodo de ejecución del Convenio en los porcentajes indicados.						
45. Garantizar el reporte establecido en el parágrafo 6° del artículo 3° del Decreto Distrital 332 de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá.	X				La Subred instruyó al contratista e interventor para que adopten las medidas necesarias para dar cumplimiento a esta observación.	
46. Adoptar medidas para prevenir, corregir y denunciar el hostigamiento sexual, la violencia y la discriminación contra las mujeres, en sus actividades empresariales y cadena de suministro en el marco de la ejecución del presente Convenio. En caso de ser testigo de / alguna de las situaciones enunciadas deberá informar de manera inmediata a la Supervisión quien dará traslado a la autoridad competente.	X				La Subred instruyó al contratista e interventor para que adopten las medidas necesarias para dar cumplimiento a esta observación. A la fecha la interventoría no ha reportado situaciones descritas en la presente obligación. Con corte al mes de octubre 2024, se emite oficio por parte de la interventoría, informando, que no se ha presentado hostigamiento sexual, ni violencia ni discriminación contra las mujeres. Mediante oficio CTSF-591-OBR-2024 la interventoría certifico que durante el mes de noviembre de 2024 se adoptaron las medidas para prevenir, corregir y denunciar el hostigamiento sexual, la violencia y la discriminación contra las mujeres. Se adjunta: soporte de las comunicaciones a través de las cuales se certifica el cumplimiento de esta obligación para el mes de febrero de 2025. Oficios N°CTSF—652 - OBR-2025 del 2 de abril de 2025.	
47. Las demás que sean necesarias para el cabal cumplimiento del objeto del Convenio				X	PROYECTO DOTACIÓN URENCI / PRESENTACIÓN AVANCES 22-08-202 Estos documentos se incluyen en anexos del informe No 34 y No 35 Durante el mes de octubre 2024, la Subred gestionó recursos para la inclusión al proyecto Urgencias Tunal, dando como resultado la aprobación en el CONFIS Distrital realizado en el mismo octubre 2024, por lo que la Subred, solicitó adición al	

Enumerar cada una de las obligaciones específicas del convenio	SI	NO	PARCIAL	NO APLICA	Avance de actividades (desarrolladas en el periodo objeto del informe-referente a la obligación)	Evidencias y soporte (Especificar ruta de ubicación en el CD digital)
					convenio No 2806257-21 por la suma de $4.637.794.907, con el fin de incluir al contrato 5008-2022 dotación biomédica requerida, se anexó en el informe No 37 archivos en carpeta digital de Nombre: Documentos gestión prórroga y adición, la cual incluye 1. Certificado_Aprop_\ 2. Comunicacion Secretaria de Confis 3. Alcance_JUSTIFICAC 4. acta13_2024 - 24 SEPTIEMBRE DE 202	

1.3 MANEJO DE RECURSOS DEL CONVENIO

1.3.1 Giros del FFDS a ESE

DESCRIPCIÓN	VALOR	REGISTRO Nro.	FECHA	OBSERVACIONES
Giro No. 1	$23.610.024.440	3601	31/08/2021	Contrapartida 2020
Giro No 2	$56.955.328.560	300	1/06/2022	Vigencia futura 2022
Giro No 3	$6.487.805.450	301	1/06/2022	Vigencia futura 2022
Giro No 4	$1.662.209.309	2810	7/12/2022	
	$1.708.659.857	2811	7/12/2022	
	$194.634.165	2812	7/12/2022	
	$800	5375	7/12/2022	
Total, Giro No 4	$3.565.504.131			Indexación de la vigencia futura 2022 $63.443.134.010
Giro No.5	$12.048.781.550		25/04/2023	
Giro No, 6	$2.578.551.214		22/08/2023	Indexación de la vigencia futura 2023 $12.048.781.550
Total, General	$ 105.245.995.345			

1.3.2 REPORTE EJECUCIÓN APORTES SUBRED MENSUAL Y ACUMULADO

EJECUTADO ACUMULADO AL PERIODO ANTERIOR	VALOR ($)	PORCENTAJE (%)
	$319.503.074	32,24%
OBSERVACIONES: Se adjunta matriz (Cuadro Cofinanciación Reordenamiento) con valor y porcentaje ejecutado.		

DESCRIPCIÓN PRESENTE PERIODO	VALOR/MES	EJECUCIÓN PERIODO (%)	SUBTOTAL
EJECUTADO MES MARZO 2025	$10.075.433	1.02	$10.075.433
TOTAL	$ 10.075.433	1.02	$10.075.433

OBSERVACIONES: Se ajusta el valor de la cofinanciación a partir de los ajustes salariales y de honorarios, aplicados a partir de enero de 2023

TOTAL, ACUMULADO A LA FECHA DE CORTE	VALOR ($)	PORCENTAJE (%)
	$329.578.506	33,26%

OBSERVACIONES: En el informe No 31, se ajusta el valor acumulado a partir del ajuste de los salarios y honorarios, aplicados a partir de abril de 2024, retroactivo para enero a marzo 2024.

Nota: Inicialmente se ajustó la cofinanciación del 2022 (personal de contrato incrementa en 3% y el de planta en 7.12%) Decreto 056/2022 Alcaldía de Bogotá, D.C. del 8 de febrero de 2022. A partir del informe No 20 correspondiente al mes de mayo 2023, se actualiza la cofinanciación de acuerdo con el incremento salarial para la vigencia 2023.

En el mes de abril 2024, se ajusta la matriz de cofinanciación, teniendo presente que los salarios de los perfiles asociados a dicha cofinanciación sufrieron variación a partir del 1º de enero de 2024, por lo que en el informe No 31, correspondiente al mes de abril 2024, se anexa la matriz en mención, actualizada con retroactivo a enero 2024.

1.4 SEGUIMIENTO PLAN DE TRABAJO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO:

1.4.1 Relación de Hitos del Convenio:

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD/HITO	FECHA			
	PROGRAMADA		EJECUTADA	
	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL
Concepto técnico favorable e inscripción en el BPP de la SDS		Primera semana de julio de 2021		El proyecto se inscribe en el BPP de SDS con el código No. 2021 20 02 35, el 2 de julio de 2021.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C, SECRETARÍA DE SALUD	PLANEACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO CONVENIOS INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE			
	Código:	SDS-GTS-FT-034	Versión:	1
Elaborado por: Cristian Suarez Bohórquez / Revisado por: Rudy Esteban Prieto - Claudia E Amezquita Sandoval / Aprobado por: Liliana Sofía Cepeda Amaris				

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD/HITO	FECHA			
	PROGRAMADA		EJECUTADA	
	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL
Suscripción de Convenio	Primera semana de agosto 2021	Cuarta semana de agosto 2021		31/08/2021
Firma acta de inicio de convenio		Segunda semana de septiembre 2021		El 13 de septiembre de 2021
Perfeccionamiento del convenio (Pólizas- apertura de cuenta)	Tercera semana de septiembre 2021	Primera semana de octubre 2021	Tercera semana de septiembre 2021	El 17 de septiembre de 2021, se realiza apertura de la cuenta de ahorros No. 0550004800460919 para recursos del presente convenio.
Presentación de Plan de Trabajo ante comité operativo del convenio y aprobación del mismo		Tercera semana de septiembre 2021		El 22 de septiembre de 2021, se aprobó el Plan de trabajo en Comité Operativo del Convenio
Presentación del proyecto y el convenio ante Junta Directiva para aprobación de Solicitud de Vigencias Futuras		Tercera semana de octubre 2021	El 24 /09/2021, Acuerdo 103 de 2021, para solicitud de apalancar 15%. La Secretaria Distrital de Hacienda no viabilizó	El 21/10/2021, Acuerdo 113 de 2021, para aprobación de solicitud de Vigencias Futuras Excepcionales.
Solicitud de Aval Fiscal ante CONFIS para Vigencias Futuras	Cuarta semana de octubre 2021	Segunda semana de noviembre 2021		El 01/10/2021, mediante el radicado No. 2021ER17294. Se radicó solicitud de aval fiscal para autorización de VF 2022-2023 por $99.101.940.000
Aval Fiscal del CONFIS para Vigencias Futuras		última semana de noviembre 2021		El 30 de noviembre de 2021, el CONFIS Distrital en sesión No 20, autorizó vigencias excepcionales 2022-2023 a la Subred Sur.
Suscripción de contrato con EGAT para etapa pre-contractual		Última semana de octubre 2021		05/10/2021 se firma Acuerdo Marco 7407 de 2021 El 29/10/2021 se realiza suscripción del contrato 7801 con EGAT para etapa Pre-Contractual.
Elaboración de Estudios y Pliegos para Consultoría e	Primera semana de	Segunda semana de diciembre 2021	Última semana de noviembre 2021 se entrega a EGAT el	El 29 de diciembre de 2021 se realizó Comité Operativo

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD/HITO	FECHA			
	PROGRAMADA		EJECUTADA	
	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL
Interventoría y aprobación de Estudios y Pliegos por SDS	noviembre 2021		borrador de Estudios y Pliegos para Consultoría e Interventoría	del Convenio CO1.PCCNTR. 2806257-2021, para la presentación y aprobación de los pliegos definitivos para la interventoría del proyecto amparado por el Convenio en mención. Se adjunta pantallazo de invitación al comité. Acta en firmas. Respecto a los pliegos definitivos para la Obra hubo modificación en dichos pliegos definitivos que se publicaron el 24 de diciembre y dichos cambios fueron avisados a la SDS de carácter informativo en el comité del 29 de diciembre 2021.
Apertura proceso pre contractual - recepción ofertas- Evaluación de ofertas, validación por comité operativo del convenio y comité de contratación	Primera semana de noviembre 2021	Última semana de marzo 2022	La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., a través de la Entidad de Gestión Administrativa y Técnica – EGAT, realiza el proceso de selección EGAT-CA-001-2022, para la adjudicación del contrato de obra, por valor estimado de $90.401.149.745. El cronograma inicia con: •Publicación del Aviso: 28 de enero de 2022.	El cronograma continúa con: •Publicación de estudios previos: 28 de enero de 2022. •Plazo observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones: 04 de febrero de 2022. •Respuesta observaciones Pliego de Condiciones: 14 de febrero de 2022. •Publicación de estudios previos y proyecto de pliego de condiciones: 15 de febrero de 2022. •Presentación de Ofertas: 07 de marzo de 2022. •Apertura del sobre 1: 07 de marzo de 1022. •Publicación del informe de verificación o evaluación: 15 de marzo de 2022.
Proceso de Adjudicación	Primera semana de noviembre 2021	Última semana de marzo 2022	El 31 de marzo de 2022, se adjudica proceso de selección por convocatoria abierta CA-001-2022, al proponente CONSORCIO TUNAL 2022, representado legalmente por el señor CARLOS ANDRES NARANJO DUARTE, conformada por: *C&C ARQUITECTURA E	Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto: 01 de abril de 2022. El 6 de abril de 2022, se emite la Resolución de adjudicación No. 385 por medio de la cual se adjudica la Convocatoria Abierta CA-001-2022 y la Resolución No. 386 por medio de la cual se adjudica la

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	PLANEACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO CONVENIOS INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE			
	Código:	SDS-GTS-FT-034	Versión:	1
Elaborado por: Cristian Suarez Bohórquez / Revisado por: Rudy Esteban Prieto - Claudia E Amezquita Sandoval / Aprobado por: Liliana Sofía Cepeda Amaris				

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD/HITO	FECHA			
	PROGRAMADA		EJECUTADA	
	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL
			INGENIERIA SA EN REORGANIZACIÓN con un porcentaje de participación del 50%, *ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGENIEROS SAS con un porcentaje de participación del 45% y * YELSIN EMILSON REINOSO PEREZ con un porcentaje de participación del 5% por un valor de OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS ($89.323.181.304,00) Incluido todos los costos directos e indirectos, por un plazo inicial de veinte (20) Meses. El 31 de marzo de 2022, el Representante Legal de la Entidad de Gestión Administrativa y Técnica – EGAT emite acta de recomendación de adjudicación convocatoria abierta EGAT-CA No. 001 de 2022, recomienda adjudicar el proceso de selección por Convocatoria Abierta No. CA-001-2022, al proponente CONSORCIO TUNAL 2022. El 05 de abril de 2022, el Representante Legal de la Entidad de Gestión Administrativa y Técnica – EGAT emite acta de recomendación de adjudicación convocatoria meritoria No. CM-004-2021, recomienda adjudicar el proceso al proponente CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA, conformado por PLANHO	Convocatoria Meritoria No. CM -004 de 2021. Firma del Contrato obra No. 5008 de 2022: 21/04/2022 Firma de Acta de inicio del Contrato obra No. 5008 de 2022: 20/05/2022 Firma del Contrato Interventoría No. 5009 de 2022: 21/04/2022 Firma de Acta de inicio del Contrato Interventoría No. 5009 de 2022: 20/05/2022

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD/HITO	FECHA			
	PROGRAMADA		EJECUTADA	
	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL
			CONSULTORES SLP CIF con un porcentaje de participación del 30% y TALLER DE ARQUITECTURA SANCHEZHORNEROS SLP SUCURSAL COLOMBIA con un porcentaje de participación del 70%, representado legalmente por el señor LUIS SANCHEZ HORNEROS VIVER-SANCHEZ, identificado con cédula de extranjería No. 437.592, por un valor de SIETE MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS ($7.214.261.155.00) M/CTE Incluido todos los costos directos e indirectos, por un plazo inicial de veinte (20) meses.	
Legalización de contratos		Primera y segunda semana de abril 2022		20/05/2022
Apropiación de Estudios y Diseños	Última semana de mayo 2022	Tercera semana julio 2022	21 de mayo de 2022	31 mayo de 2022
Ejecución de Estudios y Diseños complementarios	Cuarta semana de mayo 2022	Última semana de mayo 2023	21 de mayo 2022	El porcentaje de ejecución de los diseños es del 98,53% teniendo en cuenta que la certificación LEED, la integración en la plataforma BIM y los trámites de las acometidas definitivas de servicios públicos, se alcanzan en su totalidad durante la etapa de construcción y dotación. Es decir, aún falta la culminación certificación LEED y modelo BIM, como está consignado en el acta de cierre de la fase I.

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD/HITO	FECHA			
	PROGRAMADA		EJECUTADA	
	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL
Licencias	Última semana de septiembre 2022	Última semana de junio 2023	El 15 de noviembre 2022, mediante el radicado No. 11001-1-22-3304, en Curaduría Urbana No 1, se presentó la solicitud de prórroga o revalidación de licencia y adicionalmente, solicitud de licencia nueva como lo pidió curaduría. El 10 de noviembre de 2022, mediante el radicado 11001-1-22-3256, en Curaduría Urbana No 1, se pagó expensas por valor de $1.131.523 el 31 de enero de 2023 la Curaduría Urbana 1, emitió el acto administrativo 11001-1-23-0540, la cual concede Revalidación de la Licencia de Construcción aprobada mediante Acto Administrativo 11001-1-20-0270 del 24 de enero de 2020.	El día 24 de noviembre 2023, salió ejecutoriada la Licencia con la solicitud de revalidación y modificación de la licencia inicial.
Aprobación de Productos		Última semana junio 2023		El 24 de octubre del 2023 se realizó la firma del acta de cierre de fase 1 (Estudios y Diseños)
Inicio de Demoliciones	Primera semana de julio 2022	Última semana de diciembre 2022	6 junio 2022	31 de diciembre de 2022
Ejecución de Obra Etapa 1 (Edificio A que Incluye entre otros: Urgencia, Hospitalización, UCI, QX. Obra e interventoría de obra	Cuarta semana de octubre 2022	Última semana de agosto 2025	En febrero del 2024 se cambió la propuesta por un consorcio conformado en su 90% construcciones de la Orinoquia y el 10% por consultorías, diseños y obras, una vez evaluada la propuesta de este consorcio se	NA

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD/HITO	FECHA			
	PROGRAMADA		EJECUTADA	
	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL
			determinó que cumplen con los requerimientos exigidos por la EGAT, por lo que el 14 de febrero 2024, mediante comité de contratación de la subred se aprobó la cesión del contrato al CONSORCIO HOSPITAL, para realizar la cesión se reinició el contrato el día 21 de febrero y el día 26 de febrero 2024, se firmó en el SECOP 2 la cesión. Con esto el día 27 de febrero se presentó a la interventoría la programación y el porcentaje de ajuste al valor del contrato para su evaluación y posterior aprobación. En el mes de marzo se iniciaron las actividades de verificación del estado de las obras ejecutadas por el consorcio anterior, en cuanto a las excavaciones de las vigas de cimentación, estado y capacidad del suelo, estado y distribución del acero, estado de los diseños, verificación del talud, levantamiento de ejes y verificación de los mismos, junto a lo anterior se realizó la entrega de las hojas de vida de los	


DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD/HITO	FECHA			
	PROGRAMADA		EJECUTADA	
	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL
			profesionales y programación de obra. En el mes de abril 2024, se adelantaron las actividades de fundida de vigas y zapatas de cimentación, armado de acero, formaleta. Además, como se describió previamente, se realizó prórrogas 2 y 3 a los contratos derivados de obra e interventoría de obra y adición a este último por valor $1.647.224.934 En septiembre 2024 se inició con el armado del fenólico y los puntales para la placa del primer piso, además se adelantó el 80% de los micropilotes para la estabilización del talud, se fundió la placa de los ejes 14 a 11 En el mes de octubre 2024 se realizó la fundida de la pasa de la zona A junto con las columnas de la misma zona y se dio inicio al movimiento de tierras para los tanques de almacenamiento y la planta de tratamiento En el mes de noviembre 2024; se continuó con la construcción de la estructura del proyecto, realizándose el armado de aceros y formaletería para la	

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD/HITO	FECHA			
	PROGRAMADA		EJECUTADA	
	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL
			fundición de columnas del piso 2 de la zona A, de igual forma en la zona B. Las columnas de la Zona A estarían fundidas para principios del mes de diciembre 2024, y la Zona B para finales de diciembre 2024, inicios de enero de 2025 En diciembre de 2024 se logró la fundición parcial en las zonas A y B de la placa de segundo piso, así como los tramos centrales de la placa de primer piso. Con el fin de cumplir con la programación del proyecto, y en calidad de plan de contingencia, el contratista se comprometió a incorporar un nuevo subcontratista de estructura, con un mínimo de 30 personas. Con el fin de cumplir con el plan de contingencia del contratista, se tiene un promedio de 45 operarios, dos máquinas un minicargador, y una retro pajarita, se hace la instalación de la torre grúa.	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	PLANEACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO CONVENIOS INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE			
	Código:	SDS-GTS-FT-034	Versión:	1
Elaborado por: Cristian Suarez Bohórquez / Revisado por: Rudy Esteban Prieto - Claudia E Amezquita Sandoval / Aprobado por: Liliana Sofía Cepeda Amaris				

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD/HITO	FECHA			
	PROGRAMADA		EJECUTADA	
	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL
			Marzo 2025 para el cumplimiento con el plan de contingencia del contratista, se tiene un promedio de 55 operarios, dos máquinas un minicargador, y una retro pajarita, y una torre grúa.	
Entrega de Obra		Última semana de agosto 2025	En la propuesta del contratista se planteó un plazo por 18 meses, con esto se espera que la fecha de terminación del proyecto sea el 26 de agosto del 2025	N/A para el periodo
Dotación	Mayo 2025	Última semana de agosto 2025	el mes de diciembre 2024, se retoma la actualización del componente de dotación con las contrapartes, con el fin de ajustar y dejar el cronograma definitivo de este componente, que establezca en detalle cada una de las actividades.	N/A
Habilitación de los Servicios: Acreditar los documentos necesarios donde conste el cumplimiento de la norma	Primera semana de octubre 2023	Cuarta semana de junio 2026	En la propuesta del contratista se planteó un plazo por 18 meses, por lo que la fecha de entrega del proyecto sería en septiembre del 2025.	N/A para el periodo
* Amerita ajuste al Plan de trabajo SI __ NO _x___ Nota: Se ajusta Plan de Trabajo, el cual se presentó y aprobó en el Comité Operativo realizado el 24 de abril de 2024. Se anexa dicho Plan de Trabajo, en el informe No 31, con prórrogas del contrato obra y prórrogas y adición No. 1 del contrato de interventoría de obra. Desde el comité operativo del mes de abril 2024., después de ajustar lo solicitado por SDS, quedó aprobado el Plan de Trabajo a marzo 2025.				

Reporte gráfico del avance del Plan de Trabajo de la etapa en desarrollo.

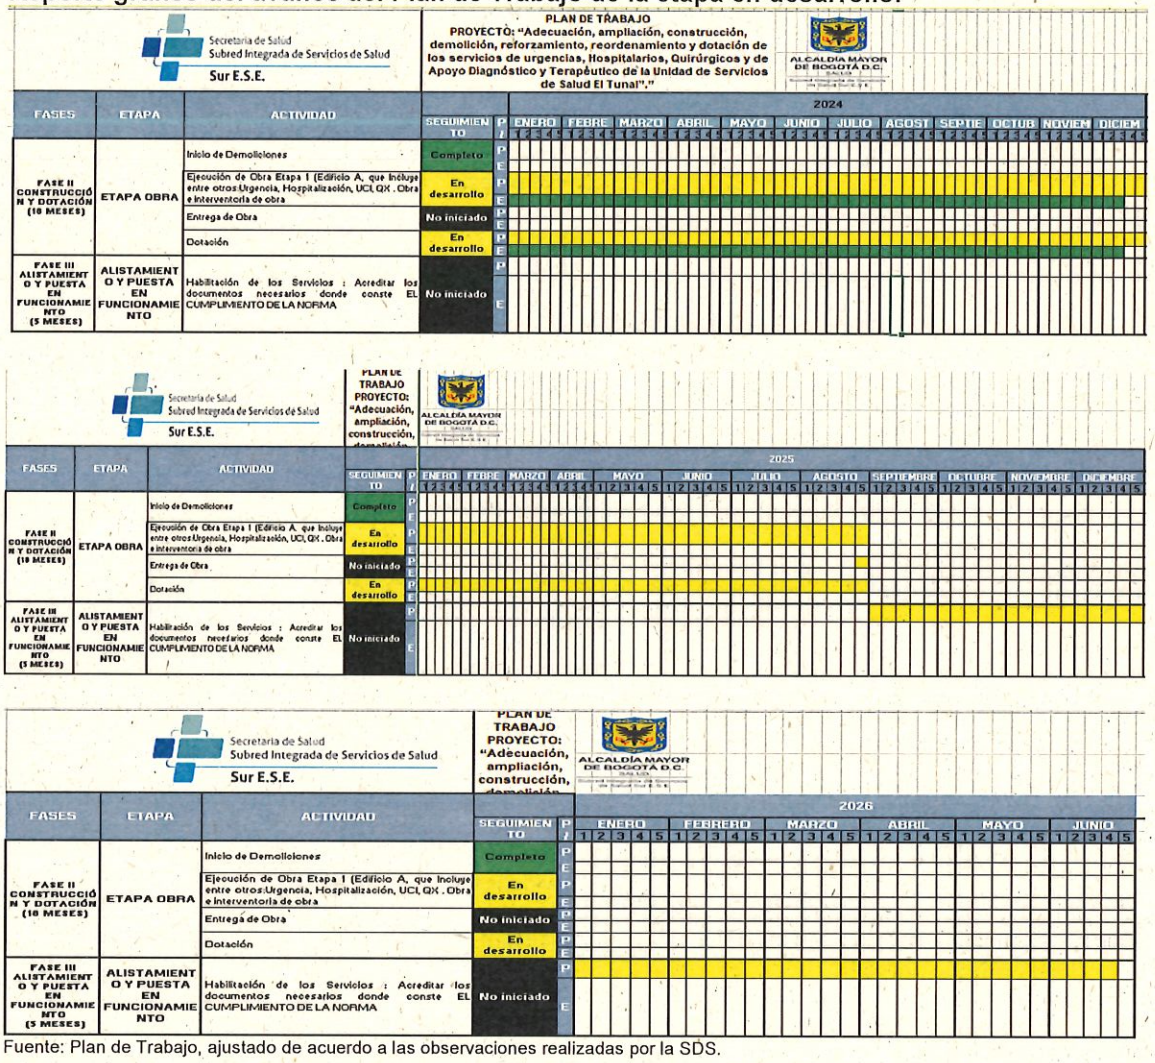


Fuente: Plan de Trabajo, ajustado de acuerdo a las observaciones realizadas por la SDS.

1.5 DESCRIPCIÓN

Acciones Realizadas en el Periodo
Obra En el mes de marzo 2025 se interviene el eje No. 1 fundiendo la placa del primer piso, el muro de contención con la entrada, en la zona a se funden la placa del 3 piso las columnas del tercer al cuarto piso y se arma el hierro y la formaleta para la placa del 4 piso, en la zona B se e funde la placa del 3 piso y columnas del 3 al cuarto piso, se funden dos escaleras del sótano al primer piso.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	PLANEACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO CONVENIOS INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE			
	Código:	SDS-GTS-FT-034	Versión:	1
Elaborado por: Cristian Suarez Bohórquez / Revisado por: Rudy Esteban Prieto - Claudia E Amezquita Sandoval / Aprobado por: Liliana Sofía Cepeda Amaris				

Biomédica:
En el mes de marzo 2025, se continuó con las mesas de trabajo donde se verificó nuevamente el listado de equipos necesarios para el proyecto que se incluirían dentro del rubro contractual para este componente, por valor de $13.085´717.484. El 26 de marzo de 2025 se realizó una nueva reunión citada por la Subred Sur, con asistencia de la Interventoría y el Consorcio Hospital, donde se dejó claridad nuevamente de la responsabilidad de interventor y contratista en la definición y avance con el listado de equipos de este componente. Posterior a dicha reunión, el mismo día se realizó reunión entre los ingenieros biomédicos de la entidad, contratista e interventoría, donde se socializó la matriz que se dejó definida en el año 2023 con el listado de equipos necesarios para la operación del proyecto, siguiendo la revisión del componente de dotación, para los equipos biomédicos en articulación con el grupo asistencial, Calidad-Habilitación, Dir. Administrativo (apoyo ingeniería biomédica) y Desarrollo Institucional, estableciendo la necesidad acorde al proyecto Urgencias-Reordenamiento USS El Tunal




Seguimiento de articulación sobre la dotación de las USS de Tunal...
Jueves, 6 marzo · 10:00 – 11:30am

Auditorio grande - Sede administrativa de la Subred ...

19 invitados
2 sí, 17 pendiente(s)

Buena tarde para todos,.
De acuerdo a los compromisos de socialización de equipos en la reunión de día 17 de febrero, envío la convocatoria al seguimiento de los mismo la cual se realizará el día 06 de marzo de 2025 a las 10:00 am.
Cordialmente,

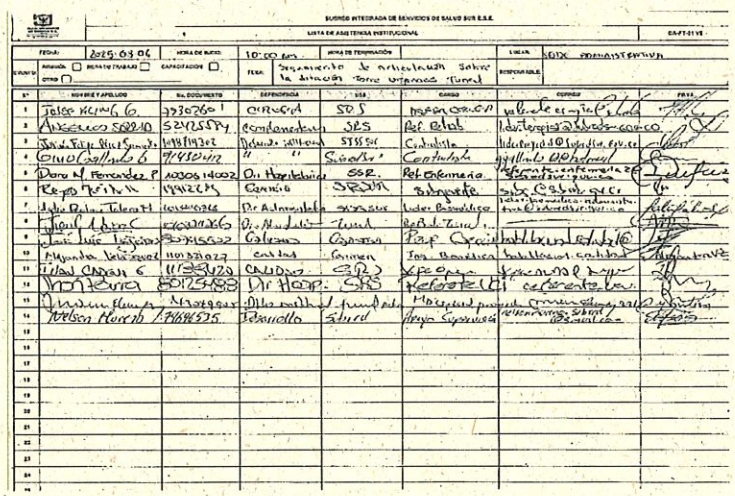

Mobiliario:

En el mes de marzo 2025, al igual que en el mes anterior, no se realizó visita referente a tema Tics a ser usado en el proyecto, sin embargo, se le solicita a la Interventoría que, a partir del mes de abril del presente año, se presente informe de avances de este componente, dentro del informe de seguimiento semanal.

Acciones a Realizar en el Siguiente Periodo

Obra: En el mes de abril 2025 se tiene programado dar continuidad con el cronograma de obra, como lo es: Fundida de concreto zona B muro de contención, fundida concreto zona A columnas, Fundida concreto Zona B placa de contrapiso piso 4, Fundida concreto Zona B cimentación placa cimentación eje C-A, armado de aceros de refuerzo, mampostería zona A, cimbrado de ejes para vigas y viguetas formaleta, descimbre formaleta placa piso 3 ZB E-F a 2-7, descimbre formaleta placa piso 4 ZA A-J a 13-8, descimbre de casetón placa piso 3 y 4 ZB E-F a 2-13 y ZA A-J a 13-8, excavación de zapatas y vigas zona B por eje B, llegada de equipos de fabricación HVAC, llegada de materiales para construcción de redes de desagües sótanos, provisional de alimentación eléctrico, instalación de colgantes para desagües piso 1 red patógenas eje 14, instalación de pase sanitario en viga cimentación en eje B2 Y A2 zona B, apertura de núcleos de 4" en piso 1 en ejes J12-A10, inicio de fabricación de ductos de extracción en lamina 24 de aluminio.

Dotación:
Biomédica:
En el mes de Abril 2025 y debido a que se tiene identificada la necesidad de equipos biomédicos requeridos para la puesta en funcionamiento de la primera etapa del proyecto Urgencias Reordenamiento USS El Tunal, se seguirá con las mesas de trabajo con las contrapartes del proceso: interventoría para realizar seguimiento y viabilidad del componente de dotación, y Consorcio encargado de otorgar la relación del Componente dotacional Plan de Trabajo y cronograma detallando las actividades que competen la adquisición de este componente.

Mobiliario:
En el mes de abril 2025, una vez se cuente con el seguimiento del mobiliario por parte de Interventoría, se continuará con el seguimiento al proveedor adjudicado, en lo correspondiente al proceso de elaboración y almacenamiento del mobiliario contratado.

1.6 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Acumulados al Presente Periodo	$8.035.170.422,36	**Periodo Reportado**	
Cuenta No. 0550004800460919	**Tipo de Cuenta:** Ahorros	Mes: marzo 2025	Rendimiento: mes $ 225.934.198,26

2. CONTRATACIÓN DERIVADA DEL CONVENIO

2.1. Ejecución del componente consultoría y/o estudios: Ejecución del Contrato Llave en Mano:

2.1.1. Información básica diseño: Información básica del Contrato Llave en Mano:

Proceso de selección No.	**Convocatoria Abierta- CA- 001-2022**		
Número del contrato	**5008-2022**		
Estado actual del Contrato:	*Vigente*		
Objeto	Elaboración, actualización y ajuste a los estudios y diseños y adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento, dotación y alistamiento de los servicios de Urgencias, Hospitalarios, Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal.		
Contratista	Inicialmente el contratista fue CONSORCIO TUNAL 2022, CONFORMADO POR; C & C ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. EN REORGANIZACIO NIT 890.324.384-3. ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGENIEROS S.A.S NIT 822.006.084-8 YELSIN EMILSON REINOSO PEREZ NIT 72.180.977-3 Surtido el proceso de cesión del contrato el contratista actual es Cesionario: **CONSORCIO HOSPITAL**, cuyo representante legal DAVID LEONARDO MORALES GALÁN, se identifica con la Cédula de Ciudadanía No. 1.121.952.959. El CONSORCIO HOSPITAL está conformado por: INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUÍA S.A.S NIT:900497601-4 (90%) y ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S NIT 901438268-6 (10%),		
Supervisor	Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional		
Valor	$89.323.181.304	**Duración inicial (meses)**	20 meses
Fecha de iniciación: (Con fecha de suscripción 21/04/2022)	20/05/2022	**Fecha de terminación inicial:**	19/01/2024
Prórrogas. 1	Desde el 21 de marzo de 2024 hasta el 20 de abril del 2024		
Prórrogas No. 2	Desde el 21 de abril de 2024 hasta el 28 de abril de 2024		
Prórrogas No. 3	Desde el 29 de abril de 2024 al 4 de octubre de 2024		
Prórrogas No. 4	Desde el 5 de octubre de 2024 hasta el 12 de abril de 2025		
Prórrogas No. 5	Desde el 13 de abril de 2025 hasta el 25 de agosto de 2025		
Suspensiones: (1)21/12/2023	Del 21/12/2023 al 20/02/2024 (En aras de poder obtener una solución de cesión de contrato con posibles cesionarios que se ajusten a las reglas de participación emitidas en su momento en la etapa precontractual)		
Reinicio (1) 20/02/2024	Reinicio del contrato a partir del Veintiuno (21) de febrero de 2024.		
Adiciones:1) - Fecha	NA		
Modificaciones / aclaraciones / otrosí (1) 20/02/2024	Otrosí Modificatorio No.01, se realizó el cambio del Representante Legal conforme a solicitud presentada por el Supervisor No del Contrato. El 14 de febrero del 2024, mediante el Comité de Contratación de la Subred Sur, se aprobó la cesión del Contrato No. 5008 de 2022, del CONSORCIO TUNAL 2022 al CONSORCIO HOSPITAL, cuyo representante legal DAVID LEONARDO MORALES GALÁN, se identifica con la Cédula de Ciudadanía No. 1.121.952.959. El CONSORCIO HOSPITAL está conformado por: INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DE LA ORINOQUÍA S.A.S NIT:900497601-4 (90%) y ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S NIT 901438268-6 (10%), dicha aprobación se realiza una vez verificado que cumple con los requerimientos exigidos por la EGAT en la Convocatoria Inicial CA 001 de 2022		

Proceso de selección No.	Convocatoria Abierta- CA- 001-2022
	Previo a la Cesión del Contrato No. 5008 de 2022 y su aprobación el 26 de febrero 2024 en SECOP 2, se dio reinició a éste, Contrato el día 21 de febrero de 2024. Tanto el contrato de obra 5008-22 como el contrato de interventoría 5009-22, se prorrogaron por 1 (un) mes contado desde el 21 de marzo hasta el 20 de abril del 2024
Otrosí Aclaratorio No. 01	ACLARAR: La parte resolutiva de la Cesión del Contrato, en el sentido de aclarar que el valor objeto de la cesión es por la suma de SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($75.639.706.285) M/CTE., de conformidad con las consideraciones expuestas por el Supervisor del Contrato.
Fecha Actual Terminación	25/08/2025
Valor Actual Contrato	$89.323.181.304

2.1.2. Relación de pagos e indicadores de avance

Valor contrato: $ 89.323.181.304

ACTA No	FECHA	FACTURA	VALOR Factura (Valor bruto)	SALDO POR EJECUTAR	% AVANCE FÍSICO PROGRAMADO	% AVANCE FÍSICO EJECUTADO
1	29/09/2022	CT1	$ 1.154.233.376	$ 88.168.947.928	49,81%	34.88%
2	11/11/2022	CT4	$ 960.272.433	$ 87.208.675.495		
3	14/12/2022	CT5	$754.058.482	$ 86.454.617.013		
4	14/12/2022	CT6	$478.869.098	$ 85.975.747.915		
5	1/03/2023	CT7	$ 618.676.495	$ 85.357.071.420		
6	25/05/2023	CT10	$ 2.495.163.918	$ 82.861.907.502		
8	28/06/2023	CT12	$1.919.647.789	$ 80.942.259.713		
9	27/07/2023	CT13	$1.956.237.104	$ 78.986.022.609		
10	29/08/2023	CT15	$ 1.228.326.752	$ 77.757.695.857		
11	28/09/2023	CT17	$ 613.008.378	$ 77.144.687.479		
12	28/09/2023	CT18	$ 252.141.930	$ 76.892.545.549		
13	21/05/2024	CH1	$419.020.007	$ 76.473.525.542		
14	14/06/2024	CH4	$1.032.746.022	$ 75.440.779.520		
15	04/07/2024	CH5	$253.803.354	$75.186.976.168		
16	11/07/2024	CH6	$998.113.744	$74.188.862.422		
17	15/08/2024	CH7	$320.000.000	$ 73.868.862.422		
18	15/08/2024	CH8	$876.849.101	$ 72.992.013.321		
19	9/09/2024	CH9	$ 283.470.225	$ 72.708.543.096		
20	12/09/2024	CH11	$ 873.829.704	$ 71.834.713.392		
21	19/09/2024	CH12	$ 261.431.793	$ 71.573.281.599		
22	7/10/2024	CH13	$812.150.711	$ 70.761.130.888		
23	28/11/2024	CH15	$1.114.960.190	$ 69.646.170.698		
	19/11/2024	Res. 1202	$1.252.839.264	$68.393.331.434		
24	28/11/2024	CH16	$504.118.124	$ 67.889.213.310		
25	18/12/2024	CH17	$659.813.764	$ 67.229.399.546		
26	27/12/2024	CH18	$448.252.075	$ 66.781.147.471		
27	28/01/2025	CH19	$876.598.115	$65.904.558.356		
28	28/01/2025	CH20	$549.925.576	$65.354.623.780		
29	20/02/2025	CH01	$2.609.700.200	$62.744.923.580		
		CH02				
30	13/03/2025	CH03	$2.697.298.920	$60.047.624.660		
		CHO4				

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	PLANEACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO CONVENIOS INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE			
	Código:	SDS-GTS-FT-034	Versión:	1
Elaborado por: Cristian Suarez Bohórquez / Revisado por: Rudy Esteban Prieto - Claudia E Amezquita Sandoval / Aprobado por: Liliana Sofía Cepeda Amaris				

ACTA No	FECHA	FACTURA	VALOR Factura (Valor bruto)	SALDO POR EJECUTAR	% AVANCE FÍSICO PROGRAMADO	% AVANCE FÍSICO EJECUTADO
31	31/03/2025	CHO5	$1.176.468.897	$ 58.871.155.763		
TOTAL			**$30.452.025.541**			

Nota:

1. El porcentaje de avance físico programado y ejecutado, está de acuerdo a la reprogramación del Plan de contingencia

2. El 9/10/2024, se emite Resolución con Comprobante de egreso No 573673 con facturas afectadas (reserva) C1 y C6 por valor de $197.648.901

COMPROBANTE DE EGRESO	FACTURA	VALOR FINAL FACTURA	IVA	RETENCION	RETEIVA	RETEICA	TOTAL, GIRADO
416946	CT1	$ 1.154.233.376,00	-	$ 23.084.668,00	-	$ 8.218.142,00	$ 944.024.392,00
428596	CT4	$ 960.272.433,00	-	$ 19.205.449,00	-	$ 6.837.140,00	$ 35.993.624,00
428597							$ 749.393.993,00
434806	CT5	$ 754.058.482,00	-	$ 15.081.170,00	-	$ 5.368.896,00	$ 616.729.352,00
435729	CT6	$ 478.869.098,00	-	$ 9.577.382,00	-	$ 3.409.548,00	$ 391.657.458,00
447848	CT7	$ 618.676.495,00	-	$ 12.373.530,00	-	$ 4.553.459,00	$ 505.854.649,00
467177	CT10	$ 2.495.163.918,00	-	$ 49.903.278,00	-	$ 18.364.406,00	$ 1.122.080.204,00
473265	CT10	EMBARGO	-	-	-	-	$ 918.065.622,00
473260	CT12	$ 1.919.647.789,00	-	$ 38.392.956,00	-	$ 14.128.608,00	$ 1.569.580.818,00
479460	CT13	$ 1.956.237.104,00	-	$ 39.124.742,00	-	$ 14.397.905,00	$ 1.599.497.706,00
485698	CT 15	$ 1.228.326.752,00	-	$ 24.566.535,00	-	$ 9.040.485,00	$ 1.004.329.085,00
491954	CT 17	$ 613.008.378,00	-	$ 12.260.168,00	-	$ 4.511.742,00	$ 501.220.169,00
	CT 18	$ 252.141.930,00	-	$ 5.042.839,00	-	$ 1.855.765,00	$ 206.161.326,00
546353	CH1	$ 419,020,007	-	$ 8.380.400,00	-	$ 3.184.552,00	$ 342.506.954,00
551710	CH4	$ 1.032.746.022,00	-	$ 20.654.920,00	-	$ 7.848.870,00	$ 947.441.201,00
552815	CH5	$ 253.803.354,00	-	$ 5.076.067,00	$ 1.928.905,00	$ 1.269.017,00	$ 232.839.197,00
57577	CH6	$ 998.113.744,00	-	$ 19.962.275,00	$ 7.585.664,00	$ 4.990.569,00	$ 815.858.175,00
562978	CH 7	$ 320.000.000,00	-	$ 6.400.000,00	-	$ 2.432.000,00	$ 293.568.000,00
562979	CH 8	$ 876.849.101,00	-	$ 17.536.982,00	-	$ 6.664.053,00	$ 716.736.455,00
564026	CH9	$ 283.470.225,00	-	$ 5.669.405,00	-	$ 2.154.374,00	$ 231.708.561,00
568351	CH11	$ 873.829.704,00	-	$ 17.476.594,00	-	$ 6.641.106,00	$ 801.651.370,00
568584	CH12	$ 261.431.793,00	-	$ 5.228.636,00	-	$ 1.986.882,00	$ 213.694.347,00
573680	CH13	$ 812.150.711,00	-	$ 16.243.014,00	-	$ 6.172.345,00	$ 663.851.992,00
574830	CH15	$ 1.114.960.190,00	-	$ 22.299.204,00	-	$ 8.473.697,00	$ 911.368.459,00

COMPROBANTE DE EGRESO	FACTURA	VALOR FINAL FACTURA	IVA	RETENCION	RETEIVA	RETEICA	TOTAL, GIRADO
579993	Res. 1202	$ 1.252.839.264,00	-	$ 25.056.785,00	-	$ 9.521.578,00	$ 1.149.354.742,00
580812	CH16	$ 504.118.124,00	-	$ 10.082.362,00	-	$ 3.831.298,00	$ 412.066.155,00
585341	CH17	$ 659.813.764,00	-	$ 13.196.275,00	-	$ 5.014.585,00	$ 539.331.771,00
590411	CH18	$ 448.252.075,00	-	$ 8.965.042,00	-	$ 3.406.716,00	$ 366.401.245,00
596461	CH19	$ 876.598.115,00	-	$ 17.531.962,00	-	$ 6.662.146,00	$ 716.531.498,00
	CH20	$ 549.925.576,00	-	$ 10.998.512,00	-	$ 4.179.434,00	$ 449.509.165,00
604254	CH01	$ 2.609.700.200,00	-	$ 19.626.878,00	-	$ 7.458.213,00	$ 802.150.487,00
	CH02		-	$ 32.567.126,00	-	$ 12.375.508,00	$ 1.331.018.457,00
608637	CH03	$ 258.359.172,00	-	$ 5.167.183,00	-	$ 1.963.530,00	$ 211.182.787,00
	CHO4	$ 2.438.939.748,00	-	$ 48.778.795,00	-	$ 18.535.942,00	$ 1.993.589.350,00
609731	CHO5	$ 1.176.468.897,00	-	$ 23.529.378,00	-	$ 8.941.164,00	$ 961.645.676,00

(Agregue a información de los pagos realizados durante el periodo reportado)

2.1.3. Pólizas suscritas por el contratista *(Agregue la totalidad de pólizas, incluyendo las de modificaciones contractuales).*

DESCRIPCIÓN	ASEGURADORA	PÓLIZA No.	VIGENCIA		CUANTÍA	Validación de las Pólizas		
			Desde	Hasta		Fecha de la modificación contractual (dd/mm/aa)	Fecha de aprobación de la póliza (dd/mm/aa)	Fecha de publicación póliza (dd/mm/aa)
Calidad del servicio	Nacional de Seguros	400040130	22/12/2022	22/12/2025	$859.574.760,00		2/5/22	28/4/22
Cumplimiento del contrato			22/04/2022	22/06/2023	$573.049.840,00		2/5/22	28/4/22
Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales			22/04/2022	22/12/2025	$143.262.460,00		2/5/22	28/4/22
Póliza de Responsabilidad Civil		400040134	22/04/2022	22/12/2023	$141.896.900,62		2/5/22	28/4/22

DESCRIPCIÓN	ASEGURADORA	PÓLIZA No.	VIGENCIA		CUANTÍA	Validación de las Pólizas		
			Desde	Hasta		Fecha de la modificación contractual (dd/mm/aa)	Fecha de aprobación de la póliza (dd/mm/aa)	Fecha de publicación póliza (dd/mm/aa)
Cumplimiento del contrato	Nacional de Seguros	400040133	22/04/2022	22/06/2024	$20.376.403.531,20		2/5/22	28/4/22
Pago de Salarios, prestaciones sociales e			22/04/2022	22/12/2026	$3.396.067.255,20		2/5/22	28/4/22

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	PLANEACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO CONVENIOS INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE			
	Código:	SDS-GTS-FT-034	Versión:	1
Elaborado por: Cristian Suarez Bohórquez / Revisado por: Rudy Esteban Prieto - Claudia E Amezquita Sandoval / Aprobado por: Liliana Sofía Cepeda Amaris				

DESCRIPCIÓN	ASEGURADORA	PÓLIZA No.	VIGENCIA		CUANTÍA	Validación de las Pólizas		
			Desde	Hasta		Fecha de la modificación contractual (dd/mm/aa)	Fecha de aprobación de la póliza (dd/mm/aa)	Fecha de publicación póliza (dd/mm/aa)
indemnizaciones laborales								
Suministro de repuestos			22/12/2023	22/12/2028	$3.707.317.400,00		2/5/22	28/4/22
Estabilidad de la obra			29/12/2023	22/12/2028	$33.960.672.552,00		2/5/22	28/4/22
Calidad y correcto funcionamiento de los Bienes y equipos suministrados			22/12/2023	22/12/2024	$3.707.317.400,00		2/5/22	28/4/22
OBSERVACIONES: (Registre toda la información necesaria respecto a las pólizas, modificaciones en valor en vigencia etc.)								

Se anexan los documentos y soportes del contrato antes mencionado en __ folios.

RCE

ESCRIPCIÓN	ASEGURADORA	PÓLIZA No.	VIGENCIA		CUANTÍA	Validación de las Pólizas		
			Desde	Hasta		Fecha de la modificación contractual (dd/mm/aa)	Fecha de aprobación de la póliza (dd/mm/aa)	Fecha de publicación póliza (dd/mm/aa)
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Derivada de Cumplimiento		400040134	09/09/ 2022	22/12/ 2023	$17.864.636.261,00			

DESCRIPCIÓN	ASEGURADORA	PÓLIZA No.	VIGENCIA		CUANTÍA	Validación de las Pólizas		
			Desde	Hasta		Fecha de la modificación contractual (dd/mm/aa)	Fecha de aprobación de la póliza (dd/mm/aa)	Fecha de publicación póliza (dd/mm/aa)
Cumplimiento del contrato	Nacional de Seguros	400040130	8/09/2022	22/06/2023	$ 573.049.840,00			
Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales			8/09/2022	22/12/2025	$ 143.262.460,00			
Calidad del servicio			22/12/2022	22/12/2025	$ 859.574.760,00			
OBSERVACIONES: MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA Y SE DEJA CONSTANCIA QUE SE INCLUYE DENTRO DEL AMPARO LO ESTABLECIDO EN EL OTROSI DE CESION DE DERECHOS ECONOMICOS PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA LLAVE EN MANO N 5008 DE 2022 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE Y EL CONSORCIO TUNAL 2022. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR								

2.1.4. Cuadro de consolidación de información de los contratos del componente consultoría y/o estudios: Cuadro de consolidación de información del Contrato Llave en Mano:

CONTRATO NO.	OBJETO	VALOR	FÍSICA	
			% DE EJECUCIÓN	% POR EJECUTAR
5008 de 2022	Elaboración, actualización y ajuste a los estudios y diseños y adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento, dotación y alistamiento de los servicios de Urgencias, Hospitalarios, Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal.	$89.323.181.304	34,88%	65,12%
OBSERVACIONES: **el Consorcio Tunal 2022, realizó un avance del 15% en la fase de obra, antes de la cesión del contrato**				

2.1. 5. Descripción

Acciones Realizadas en el Periodo de reporte
En el mes de marzo 2025, se interviene el eje No. 1 fundiendo la placa del primer piso, el muro de contención con la entrada, en la zona a se funden la placa del 3 piso las columnas del tercer al cuarto piso y se arma el hierro y la formaleta para la placa del 4 piso, en la zona B se e funde la placa del 3 piso y columnas del 3 al cuarto piso, se funden dos escaleras del sótano al primer piso.
Acciones a Realizar en el Siguiente Periodo
Obra: en el mes de abril 2025 se tiene programado: Zona A hacer la fundición de columnas, fundida de concreto zona B cimentación placa de cimentación eje C-A y la plaza de contrapiso piso 4 eje B-C, fundida concreto zona B muro de contención tipo 1 eje 3-2, cimbrado de ejes para vigas y viguetas formaleta placa piso 4, descimbre formaleta y casetón placa piso 3 y 4 zonas A y B. Mampostería zona A sótano localización y replanteo para muros en bloque de concreto e=14cm entre ejes A-H y ejes 8-10 bloque concreto 4=14cm entre ejes J-I y ejes 8-10 bloque concreto e=19cm entre ejes I-J y ejes 12-14, fundida de dovelas y viga dintel.so No. 3.

2.1.6. Información básica Interventoría:

Proceso de selección No.	**Invitación Pública Meritoria CM-004-2021**		
Número del contrato	**5009-2022**		
Estado actual del Contrato:	*Vigente*		
Objeto	Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera y Ambiental para la elaboración, actualización y ajuste a los estudios y diseños y adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento, dotación y alistamiento de los servicios de Urgencias, Hospitalarios, Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal.		
Contratista	CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA. Conformado por; PLANHO CONSULTORES SLP CIF B - 41879701 PARTICIPACION 30% Y TALLER DE ARQUITECTURA SANCHEZ – HORNEROS SLP SUCURSAL COLOMBIA NIT 900.635.213-2 PARTICIPACION 70%		
Supervisor	Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional		
Valor	$7.214.261.155	**Duración inicial (meses)**	20 meses
Fecha de iniciación: (Con fecha de suscripción 21/04/2022)	20/05/2022	**Fecha de terminación inicial:**	19/01/2024
Prórrogas No 1 (20/03/2024)	Desde el 21 de marzo 2024 hasta el 20 de abril del 2024		
Prórrogas No 2 (19/04/2024)	Desde el 21 de abril al 28 de abril de 2024		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	PLANEACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO CONVENIOS INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE			
	Código:	SDS-GTS-FT-034	Versión:	1
Elaborado por: Cristian Suarez Bohórquez / Revisado por: Rudy Esteban Prieto - Claudia E Amezquita Sandoval / Aprobado por: Liliana Sofía Cepeda Amaris				

Proceso de selección No.	**Invitación Pública Meritoria CM-004-2021**
Número del contrato	**5009-2022**
Prórrogas No 3 (25/04/2024)	Desde el 29 de abril al 4 de octubre de 2024. (cinco (5) meses y cinco (5) días
Prórrogas No 4 (4/10/2024)	Desde el 5 de octubre del 2024 hasta el 12 de octubre del 2024.
Prórrogas No 5 (12/10/2024)	Desde el 13 de octubre del 2024 hasta el 20 de octubre del 2024.
Prórrogas No 6 (19/10/2024)	Desde el 21 de octubre del 2024 hasta el 25 de octubre del 2024.
Prórrogas No 7 (25/10/2024)	Desde el 26 de octubre del 2024 hasta el 31 de octubre del 2024.
Prórrogas No 8 (6/11/2024)	Desde el 1 de noviembre del 2024 hasta el 7 de noviembre del 2024.
Prórrogas No 9 (7/11/2024)	Desde el 8 de noviembre del 2024 hasta el 14 de noviembre del 2024.
Prórrogas No 10 (14/11/2024)	Desde el 15 de noviembre del 2024 hasta el 19 de noviembre del 2024.
Prórrogas No 11 (22/11/2024)	Desde el 23 de noviembre del 2024 hasta el 22 de diciembre del 2025
Suspensiones: (1) 21/12/2023	Del 21/12/2023 al 20/02/2024 (En aras de poder obtener una solución de cesión de contrato con posibles que se ajusten a las reglas de participación emitidas en su momento en la etapa precontractual)
Suspensiones: (2) 19/11/2024	Del 19/11/2024 al 25/11/2024
Reinicio (1) 20/02/2024	Reinicio del contrato a partir del Veintiuno (21) de febrero de 2024.
Reinicio (2) 22/11/2024	Reinicio del contrato a partir del Veintidós (22) de noviembre de 2024.
Adición No 1 (25/04/2024) (Uso excedentes CV 2806257-22)	$1.647.224.934 cesionarios
Adición No 2 (22/11/2024) (Uso excedentes CV 2806257-22)	$4.144.363.094
Modificaciones / aclaraciones / otrosí (1) 25/04/2024	Otrosí 1: MODIFICACIÓN No. 1 Y AUTORIZACIÓN DE USO DE EXCEDENTES No. 1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO en mención, (...) AUTORIZAR EL USO DE EXCEDENTES por valor de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.647.224.934,00). El 25/04/2024, la Subred Sur realiza adición 1 y prórroga No 3, al Contrato de Interventoría de Obra No 5009-2022: PRORROGAR el contrato de interventoría Nro. 5009 de 2022. por el termino de cinco (5) meses y cinco (5) días, desde el 29 de abril al 4 de octubre de 2024. ADICIONAR el contrato de interventoría No 5009 de 2022 por un valor de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE ($1.647.224.934,00)".
Modificaciones / aclaraciones / otrosí (2) 22/11/2024	Otrosí 2: MODIFICACIÓN No. 2 El 22/11/2024, la Subred Sur realiza adición 2 y prórroga No 11, al Contrato de Interventoría de Obra No 5009-2022: ADICIONAR el valor del contrato la suma de CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($4.144.363.094,00). PRORROGAR el plazo de ejecución del presente contrato a partir del veintitrés (23) de noviembre de 2024 hasta el veintidós (22) de diciembre de 2025
Fecha Actual Terminación	22/12/2025 (prórroga No 11)
Valor Actual Contrato	$13.005.849.183

Nota: El 20/04/2024, la SDS-FFDS, autoriza el uso de excedentes al Convenio 2806257 de 2022, mediante MODIFICACIÓN No. 1 Y AUTORIZACIÓN DE USO DE EXCEDENTES No. 1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO en mención, (...) AUTORIZAR EL USO DE EXCEDENTES por valor de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.647.224.934,00), resultante de la suma de los valores a adicionar al contrato de interventoría de Obra, para respaldar la mayor permanencia del personal de la interventoría, por 5 meses y 5 días calendario, requeridos y avalados por la Interventoría.

El 25/04/2024, la Subred Sur realiza adición 1 y prórroga No 3, al Contrato de Interventoría de Obra No 5009-2022: PRORROGAR el contrato de interventoría Nro. 5009 de 2022. por el termino de cinco (5) meses y cinco (5) días, desde el 29 de abril al 4 de octubre de 2024. ADICIONAR el contrato de interventoría No 5009 de 2022 por un valor de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE ($1.647.224.934,00)".

2.1.7. Relación de pagos e indicadores de avance

Valor: $13.005.849.183

ACTA No	FECHA	FACTURA	VALOR Factura (Valor bruto)	SALDO POR EJECUTAR	% AVANCE FÍSICO PROGRAMADO	% AVANCE FÍSICO EJECUTADO
1	27/07/2022	FE 5	$ 132.142.459	$ 7.082.118.696		
2	11/08/2022	FE 6	$ 360.713.059	$ 6.721.405.637		
3	30/08/2022	FE 7	$ 360.713.059	$ 6.360.692.578		
4	27/09/2022	FE 8	$ 360.713.059	$ 5.999.979.519		
5	1/11/2022	FE 9	$ 360.713.059	$ 5.639.266.460		
6	14/12/2022	FE 10	$ 312.954.648	$ 5.326.311.812		
7	14/12/2022	FE 12	$ 312.954.648	$ 5.013.357.164		
8	17/02/2023	FE 14	$ 297.663.988	$ 4.715.693.176		
9	24/02/2023	FE 17	$ 305.329.174	$ 4.410.364.002		
10	24/03/2023	FE 19	$ 330.372.707	$ 4.079.991.295		
11	28/04/2023	FE 20	$ 275.820.264	$ 3.804.171.031		
12	16/05/2023	FE 23	$ 231.696.853	$ 3.572.474.178		
13	28/06/2023	FE 24	$224.026.033	$ 3.348.448.145		
14	28/07/2023	FE 25	$224.869.345	$ 3.123.578.800		
15	29/08/2023	FE 27	$ 216.966.601	$ 2.906.612.199		
16	28/09/2023	FE 28	$ 206.564.139	$ 2.700.048.060		
17	30/10/2023	FE29	$185.392.590	$ 2.514.655.470		
18	21/11/2023	FE-31	$213.949.778	$ 2.300.705.692		
19	21/11/2023	FE-32	$181.737.326	$ 2.118.96a8.366	49,81%	34,88%
20	6/12/2023	FE-33	$179.669.530	$ 1.939.298.836		
21	3/01/2024	FE-36	$124.820.036	$ 1.814.478.800		
22	27/03/2024	FE-38	$ 1.477.694.301	$ $336.784.499		
23	15/04/2024	FE-39	$144.285.227	$ 192.499.272		
ADICION N°1 (25/04/2024)				$1.647.224.934		
				NUEVO SALDO		
				$ 1.839.724.206		
24	9/05/2024	FE-41	$31.881.772	$ 1.807.842.434		
25	22/05/2024	FE-42	$192.499.273	$ 1.615.343.161		
26	06/07/2024	FE-44	$314.241.396	$ 1.301.101.765		
27	08/07/2024	FE-45	$310.760.243	$ 990.341.522		
28	27/08/2024	FE-46	$302.411.084	$ 687.930.438		
29	20/09/2024	FE-47	$ 293.775.456	$ 394.154.982		
30	21/10/2024	FE 48	$317.120.383	$ 77.034.599		
ADICION N°2 (22/11/2024				$4.144.363.094		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	PLANEACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO CONVENIOS INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE			
	Código:	SDS-GTS-FT-034	Versión:	1
Elaborado por: Cristian Suarez Bohórquez / Revisado por: Rudy Esteban Prieto - Claudia E Amezquita Sandoval / Aprobado por: Liliana Sofía Cepeda Amaris				

ACTA No	FECHA	FACTURA	VALOR Factura (Valor bruto)	SALDO POR EJECUTAR	% AVANCE FÍSICO PROGRAMADO	% AVANCE FÍSICO EJECUTADO
				NUEVO SALDO		
				$ 4.221.397.693		
31	18/12/2024	FE50	$101.968.702	$4.119.428.991		
		FE52				
32	28/02/2025	FE54	$609.352.202	$ 3.510.076.789		
		FE55				
33	31/03/2025	FE057	$270.226.262	$ 3.239.850.527		
TOTAL			$9.765.998.656			

COMPROBANTE DE EGRESO	FACTURA	VALOR FINAL FACTURA	IVA	RETENCION	RETEIVA	RETEICA	TOTAL GIRADO
404985	FE-5	$ 111.044.083,00	$ 21.098.376,00	$ 6.662.645,00	$ 3.164.756,00	$ 961.642,00	$ 107.583.950,00
410029	FE-6	$ 303.120.218,00	$ 57.592.841,00	$ 18.187.213,00	$ 8.638.926,00	$ 2.625.021,00	$ 293.674.992,00
411064	FE-7	$ 303.120.218,00	$ 57.592.841,00	$ 18.187.213,00	$ 8.638.926,00	$ 2.625.021,00	$ 293.674.992,00
416935	FE-8	$ 303.120.218,00	$ 57.592.841,00	$ 18.187.213,00	$ 8.638.926,00	$ 2.625.021,00	$ 293.674.992,00
423748	FE-9	$ 303.120.218,00	$ 57.592.841,00	$ 18.187.213,00	$ 8.638.926,00	$ 2.625.021,00	$ 293.674.992,00
434784	FE-10	$ 262.987.099,00	$ 49.967.549,00	$ 15.779.226,00	$ 7.495.132,00	$ 2.277.468,00	$ 254.792.421,00
434805	FE-12	$ 262.987.099,00	$ 49.967.549,00	$ 15.779.226,00	$ 7.495.132,00	$ 2.277.468,00	$ 254.792.421,00
447005	FE-14	$ 250.137.805,00	$ 47.526.183,00	$ 15.008.268,00	$ 7.128.927,00	$ 2.166.193,00	$ 242.343.511,00
447807	FE-17	$ 256.579.138,00	$ 48.750.036,00	$ 15.394.748,00	$ 7.312.505,00	$ 2.221.975,00	$ 248.584.132,00
453935	FE-19	$ 277.624.123,00	$ 52.748.583,00	$ 16.657.447,00	$ 7.912.288,00	$ 2.404.225,00	$ 268.973.355,00
460213	FE-20	$ 231.781.734,00	$ 44.038.529,00	$ 13.906.904,00	$ 6.605.779,00	$ 2.007.230,00	$ 224.559.415,00
467169	FE-23	$ 194.703.238,00	$ 36.993.615,00	$ 11.682.194,00	$ 5.549.042,00	$ 1.686.130,00	$ 188.636.286,00
473261	FE-24	$ 188.257.171,00	$ 35.768.862,00	$ 11.295.430,00	$ 5.365.329,00	$ 1.630.307,00	$ 182.391.078,00
479485	FE25	$ 188.965.836,00	$ 35.903.509,00	$ 11.337.950,00	$ 5.385.526,00	$ 1.636.444,00	$ 183.077.661,00
485699	FE27	$ 182.324.875,00	$ 34.641.726,00	$ 10.939.493,00	$ 5.196.259,00	$ 1.578.933,00	$ 176.643.632,00
491992	FE28	$ 173.583.310,00	$ 32.980.829,00	$ 10.414.999,00	$ 4.947.124,00	$ 1.503.231,00	$ 168.174.454,00
498342	FE-29	$ 155.792.092,00	$ 29.600.498,00	$ 11.475.646,00	$ 4.440.075,00	$ 1.349.160,00	$ 150.937.609,00
503829	FE-31	$ 213.949.778,00	$ 40.650.459,00	$ 7.723.587,00	$ 5.124.007,00	$ 1.556.979,00	$ 174.187.481,00
503829	FE-32	$ 181.737.326,00	$ 34.530.093,00	$ 6.560.718,00	$ 4.352.533,00	$ 1.322.559,00	$ 147.961.672,00
509874	FE-33	$ 179.669.530,00	$ 28.686.732,00	$ 9.058.968,00	$ 4.303.010,00	$ 1.307.511,00	$ 146.278.174,00
521965	FE-36	$ 124.820.036,00	$ 19.929.250,00	$ 6.293.447,00	$ 2.989.387,00	$ 908.354,00	$ 101.622.390,00
534166	FE-38	$ 1.477.694.301,00	$ 235.934.384,00	$ 74.505.595,00	$ 35.390.158,00	$ 10.753.641,00	$ 1.203.066.667,00
540324	FE39	$ 121.248.089,00	$ 23.037.137,00	$ 7.274.885,00	$ 3.455.571,00	$ 1.050.008,00	$ 117.469.999,00
546543	FE41	$ 26.791.405,00	$ 5.090.367,00	$ 1.607.484,00	$ 763.555,00	$ 232.014,00	$ 156.723.525,00
546543	FE42	$ 161.764.094,00	$ 30.735.178,00	$ 9.705.846,00	$ 4.610.277,00	$ 1.400.877,00	$ 156.723.525,00
557578	FE44	$ 314.241.396,00	$ 50.172.996,00	$ 15.844.104,00	$ 7.525.949,00	$ 2.286.832,00	$ 255.840.029,00
557578	FE45	$ 310.760.243,00	$ 49.617.182,00	$ 15.668.584,00	$ 7.442.577,00	$ 2.261.499,00	$ 253.005.844,00
563850	FE 46	$ 254.126.961,00	$ 48.284.123,00	$ 15.247.618,00	$ 7.242.618,00	$ 2.200.739,00	$ 246.208.366,00
568583	FE-47	$ 293.775.456,00	$ 46.905.325,00	$ 14.812.208,00	$ 7.035.799,00	$ 2.137.895,00	$ 239.177.657,00
573826	FE 48	$ 317.120.383,00	$ 50.632.666,00	$ 15.989.263,00	$ 7.594.900,00	$ 2.307.784,00	$258.183.959,00
585342	FE 50	$ 67.827.048,00	$ 12.887.139,00	$ 4.069.623,00	$ 1.933.071,00	$ 587.382,00	$ 65.713.557,00
	FE 52	$ 17.860.937,00	$ 3.393.578,00	$ 1.071.656,00	$ 509.037,00	$ 154.676,00	$ 17.304.389,00
604255	FE 54	$ 609.352.202,00	$ 46.565.524,00	$ 14.704.902,00	$ 6.984.829,00	$ 2.122.408,00	$ 237.444.957,00

COMPROBANTE DE EGRESO	FACTURA	VALOR FINAL FACTURA	IVA	RETENCION	RETEIVA	RETEICA	TOTAL GIRADO
	FE 55		$ 50.726.004,00	$ 16.018.738,00	$ 7.608.901,00	$ 2.312.038,00	$ 258.659.905,00
609728	FE057	$ 270.226.262,00	$ 43.145.370,00	$ 13.624.854,00	$ 6.471.805,00	$ 1.966.521,00	$ 220.005.051,00

(Agregue a información de los pagos realizados durante el periodo reportado)

2.1.8. Pólizas suscritas por el contratista *(Agregue la totalidad de pólizas, incluyendo las de modificaciones*

DESCRIPCIÓN	ASEGURADORA	PÓLIZA No.	VIGENCIA		CUANTÍA	Validación de las Pólizas		
			Desde	Hasta		Fecha de la modificación contractual (dd/mm/aa)	Fecha de aprobación de la póliza (dd/mm/aa)	Fecha de publicación póliza (dd/mm/aa)
Cumplimiento del contrato	Seguros del Estado	15-44-101261758	21/04/2022	21/06/2024	$2.164.278.346.50		2/05/2022	30/04/2022
Estabilidad y calidad de la obra			21/12/2023	21/12/2028	$ 1.607.130.577,50		2/05/2022	30/04/2022
Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales			21/04/2022	21/12/2026	$ 360.713.057,75		2/05/2022	30/04/2022
Calidad y correcto funcionamiento de los Bienes y equipos suministrados			21/12/2023	21/12/2024	$ 1.442.852.231,00		2/05/2022	30/04/2022
Provisiones de Repuestos			21/12/2023	21/12/2028	$ 1.442.852.231,00		2/05/2022	30/04/2022

RCE

DESCRIPCIÓN	ASEGURADORA	PÓLIZA No.	VIGENCIA		CUANTÍA	Validación de las Pólizas		
			Desde	Hasta		Fecha de la modificación contractual (dd/mm/aa)	Fecha de aprobación de la póliza (dd/mm/aa)	Fecha de publicación póliza (dd/mm/aa)
Predios laborales y operaciones	Seguros del Estado	15-40-101078316	21/04/2022	21/12/2023	$1.442.852.231,00		2/5/22	30/4/22
Contratistas y Subcontratistas			21/14/2022	21/12/2023	$1.442.852.231,00		2/5/22	30/4/22
Vehículos propios y no propio			21/04/2022	21/12/2023	$1.442.852.231,00		2/5/22	30/4/22
OBSERVACIONES: (Registre toda la información necesaria respecto a las pólizas, modificaciones en valor en vigencia etc.)								

Se anexan los documentos y soportes del contrato antes mencionados

Nota: Las pólizas entre otras de: PRÓRROGA 1, POLIZA PRÓRROGA 2, POLIZA PRÓRROGA 3, OTROSI ACLARATORIO No.01, la actualización, se encuentran en revisión por parte de la Dirección de Contratación de la Subred Sur. En el mes de febrero 2025, se informa que 3 pólizas presentadas fueron rechazadas por diferentes motivos (por parte de Contratación Subred Sur), los cuales de ajustaron y enviaron a Contratación para revisión y aprobación, serán registradas y anexadas en el seguimiento del mes de marzo 2025.

2.1.9. Cuadro de consolidación de información de los contratos del componente consultoría y/o estudios: Cuadro de consolidación de información del contrato de Interventoría del Contrato de obra Llave en Mano:

CONTRA-TO NO.	OBJETO	VALOR	FÍSICO	
			% DE EJECUCIÓN	% POR EJECUTAR
5009-2022	Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera y Ambiental para la elaboración, actualización y ajuste a los estudios y diseños y adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento, dotación y alistamiento de los servicios de Urgencias, Hospitalarios, Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal.	$13.005.849.183	34,88%	65,12%
OBSERVACIONES:				

2.1.10. Descripción actividades Interventoría

Acciones Realizadas en el Período
Obra En el mes de marzo de 2025, la interventoría realizara la supervisión, seguimiento y control de las intervenciones en el eje 1 en la placa del primer piso. en la zona A se funden las columnas del piso do 3 a 4, y se arma camilla para la placa del piso No. 4. En la zona B se terminan piso las columnas del 3 al 4. Se continua muros de mampostería del sótano, instalaciones de las redes sanitarias en el primer piso. Otras actividades, almacenamiento de material, manejo de agua saturación.
Acciones a Realizar en el Siguiente Periodo
Obra: En el mes de abril de 2025, la interventoría realizara la supervisión, seguimiento y control al cumplimiento del cronograma de obra con las actividades programadas para el mes que son: Zona A hacer la fundición de columnas, fundida de concreto zona B cimentación placa de cimentación eje C-A y la plaza de contrapiso piso 4 eje B-C, fundida concreto zona B muro de contención tipo 1 eje 3-2, cimbrado de ejes para vigas y viguetas formaleta placa piso 4, descimbre formaleta y casetón placa piso 3 y 4 zonas A y B. Mampostería zona A sótano localización y replanteo para muros en bloque de concreto e=14cm entre ejes A-H y ejes 8-10 bloque concreto 4=14cm entre ejes J-I y ejes 8-10 bloque concreto e=19cm entre ejes I-J y ejes 12-14, fundida de dovelas y viga dintel.so No. 3.

2.2 Ejecución del componente obra hasta 2.2.10. Descripción. Esta información NA, toda vez que está incluida en Contrato Llave en Mano, y en el de interventoría a dicho contrato, descrito previamente.


2.3 Ejecución del componente dotación: Debido a que, como se registró anteriormente, en la ejecución del presente Convenio, se suscribió contrato Llave en Mano que incluye dotación, no se registra la información correspondiente **desde en numeral 2.3.1. hasta 2.3.4., la cual NA** para la Interventoría.

2.3.5. Descripción, Dotación:

Acciones Realizadas en el Periodo

Biomédica:

En el mes de marzo 2025, se continuó con las mesas de trabajo, siguiendo la revisión del componente de dotación, para los equipos biomédicos en articulación con el grupo asistencial, Calidad-Habilitación, Dir. Administrativo (apoyo ingeniería biomédica) y Desarrollo Institucional, estableciendo la necesidad acorde al proyecto Urgencias-Reordenamiento USS El Tunal. Donde se verificó nuevamente el listado de equipos necesarios para el proyecto que se incluirían dentro del rubro contractual para este componente, por valor de $13.085´717.484. El 26 de marzo de 2025 se realizó una nueva reunión citada por la Subred Sur, con asistencia de la Interventoría y el Consorcio Hospital, donde se dejó claridad nuevamente de la responsabilidad de interventor y contratista en la definición y avance con el listado de equipos de este componente. Posterior a dicha reunión, el mismo día se realizó reunión entre los ingenieros biomédicos de la entidad, contratista e interventoría, donde se socializó la matriz que se dejó definida en el año 2023 con el listado de equipos necesarios para la operación del proyecto, siguiendo la revisión del componente de dotación, para los equipos biomédicos en articulación con el grupo asistencial, Calidad-Habilitación, Dir. Administrativo (apoyo ingeniería biomédica) y Desarrollo Institucional, estableciendo la necesidad acorde al proyecto Urgencias-Reordenamiento USS El Tunal




Seguimiento de articulación sobre la dotación de las USS de Tunal...
Jueves, 6 marzo · 10:00 – 11:30am

Auditorio grande - Sede administrativa de la Subred ...

19 invitados
2 sí, 17 pendiente(s)

Buena tarde para todos,
De acuerdo a los compromisos de socialización de equipos en la reunión de día 17 de febrero, envío la convocatoria al seguimiento de los mismo la cual se realizará el día 06 de marzo de 2025 a las 10:00 am.
Cordialmente,

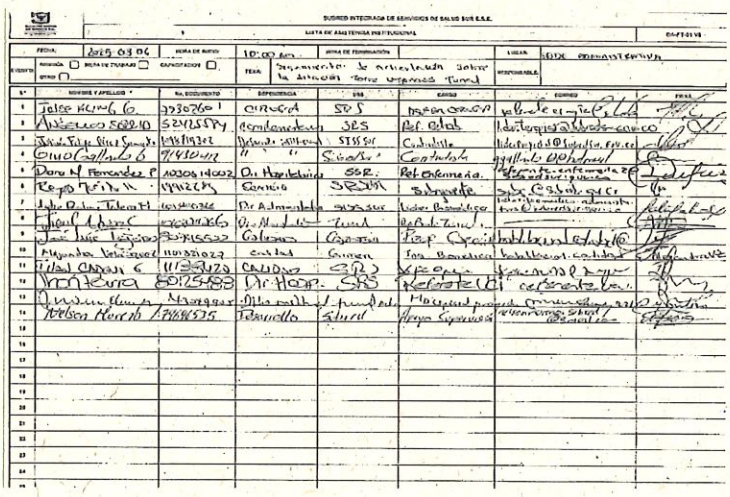

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	PLANEACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	INFORME DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO CONVENIOS INFRAESTRUCTURA - PRESENTADO POR LA ESE			
	Código:	SDS-GTS-FT-034	Versión:	1
Elaborado por: Cristian Suarez Bohórquez / Revisado por: Rudy Esteban Prieto - Claudia E Amezquita Sandoval / Aprobado por: Liliana Sofía Cepeda Amaris				

Mobiliario:

En el mes de marzo 2025, al igual que en el mes anterior, no se realizó visita del comercializador equipos Tics sin embargo, se le solicita a la Interventoría que, a partir del mes de abril del presente año, se presente informe de avances de este componente, dentro del informe de seguimiento semanal.

Acciones a Realizar en el Siguiente Periodo

Dotación:

Biomédica:

En el mes de Abril 2025, respecto al Contrato Llave en Mano No 5008-22, una vez identificada la necesidad de equipos biomédicos requeridos para la puesta en funcionamiento de la primera etapa del proyecto Urgencias Reordenamiento USS El Tunal, se define que en el mes de abril 2025, se realizará mesa de trabajo con las contrapartes del proceso: interventoría para realizar seguimiento y viabilidad del componente de dotación, y Consorcio encargado de otorgar la relación del Componente dotacional Plan de Trabajo y cronograma detallando las actividades que competen la adquisición de este componente.

Mobiliario:

En el mes de abril 2025, una vez se cuente con el seguimiento del mobiliario por parte de Interventoría, se continuará con el seguimiento al proveedor adjudicado, en lo correspondiente al proceso de elaboración y almacenamiento del mobiliario contratado.

3. EJECUCIÓN

3.1 Resumen de la ejecución del Convenio a la fecha:

Detalle de componentes del convenio interadministrativo No.	Fecha de compromiso (RP)	Valor Compromiso (RP)	Valor Físico Facturado	Valor Físico Ejecutado Pagado	Porcentaje Físico Ejecución a la fecha
Valor del convenio (FFDS) (Incluye vr de Indexación de VF)	RP #3601 del 31/08/2021 por valor de $23.610.024.440 CDP VF 2023 por $75.491.915.560	$ 105.245.995.345			
Gastos del convenio					
Contrato Llave en mano: (No 5008/2022) 1. **Estudios y diseños** 2. **Obra** 3. **Dotación**	CRP #13925 del 21/04/2022	$89.323.181.304	$1.980.799.089 $25.990.847.372 2.480.379.080 TOTAL (EyD, Obra y Dotación) $30.452.025.541	$1.980.799.089 $25.990.847.372. 2.480.379.080 TOTAL (EyD, Obra y Dotación) $30.452.025.541	34,88%
Interventoría (No 5009/2022)	CRP #13903 del 20/04/2022	$13.005.849.183	$9.765.998.656	$9.765.998.656	34,88%
Otros (discriminar el objeto del gasto)					NA

Detalle de componentes del convenio interadministrativo No.	Fecha de compromiso (RP)	Valor Compromiso (RP)	Valor Físico Facturado	Valor Físico Ejecutado Pagado	Porcentaje Físico Ejecución a la fecha
Gastos administrativos para contratación estudios diseños, obras e interventoría (EGAT)					
Gastos administrativos para contratación de Dotación y mobiliario (EGAT)		$1.723.193.348	$1.723.193.348	$1.723.193.348	100%
Total, gastos del convenio		**$104.052.223.835**	**$41.941.217.545**	**$41.941.217.545**	34,88%
Saldo del convenio		**$1.193.771.510**			
Rendimientos financieros acumulados	**$ 8.035.170.422,36**	**Devolución de rendimientos financieros.**		**NA**	
OBSERVACIONES: El porcentaje total registrado, corresponde al promedio de los dos componentes del Convenio (contrato llave en mano e Interventoría) y refiere el avance en la ejecución física del proyecto.					

3.2 REPORTE DEL PROYECTO EN LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO:

Indicador N°3: Avanzar en 85% en la Culminación de la construcción de 5 infraestructuras de Unidades de Servicios de Salud.

CRITERIOS DE INDICADOR	Adjudicación de obra (%)	Ejecución en Obra (%)	Adjudicación dotación (%)	Dotación Entregada (%)	Cálculo del indicador (%)
Programado	100%	49,81	0%	0%	
Ejecutado *	100%	34.88	0%	0%	

*Línea base Segplan 15%

***Nota:** Es importante aclarar que el Consorcio Tunal 2022, tiene una diferencia del 15% en el avance total de la obra con la ejecución programada y lo ejecutado.

4. OTROS:

4.1. Relación de visitas de entes de control: *A continuación, deberá relacionar las visitas recibidas por estos organismos durante el periodo de tiempo informado, agregue las filas que sean necesarias*

Ente de control	Fecha de visita	Hallazgos	Resumen del plan de acción adoptado o acciones adelantadas
NA	NA	NA	NA

(NOTA: si no se recibieron visitas de entes de control registrar los espacios con no aplica).

- El informe No. 41 correspondiente a la ejecución del mes de febrero de 2025, dando cumplimiento a la última directriz de la SDS, fue cargado el día 17 de marzo 2025, en DRIVE: sharepoint en el link: https://saludcapitalgovco.sharepoint.com/sites/AnlisisdeDatosSDS/subplaneacion/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FAnlisisdeDatosSDS%2Fsubplaneacion%2FDocumentos%20compartidos%2FDIT%2FPROYECTOS%2FSUBRED%20SUR%2FSOPORTES%20SUBRED%20EJECUCION%20CONVENIO&p=true&ga=1, con el fin de recibir las observaciones correspondientes por parte de la SDS, y después proceder al ajuste de las mismas y realizar la radicación del informe ajustado en medio físico, en SDS. Actualmente, en espera de observaciones por parte de la SDS.

- El 12 de marzo 2025, se realizó reunión de veedores del proyecto, donde se realizó recorrido por la obra del proyecto Urgencias-Reordenamiento Tunal, recibiendo además información de avances de la misma.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

A continuación, se presenta avances en la ejecución del Convenio 2806257 de 2021. marzo 2025:





Avances en la ejecución el Convenio 2806257 de 2021. Marzo 2025.

VIVIANA MARCELA CLAVIJO
Gerente
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR POR LA ESE

Anexos
Apoyo técnico para el seguimiento y cumplimiento del Convenio: María Elena Restrepo García - Médico Especialista Proyectos.

	Nombre	Firma	Fecha
Elaborado por: *(Añadir filas abajo según necesidad)*	María Elena Restrepo García- Médico Especialista Proyectos		11/08/2025
Elaborado por Profesional SISS ESE. (Componente Técnico dotación):	Heinny Cadena Oyuela-Ingeniera Biomédica		11/08/2025
Elaborado por Profesional SISS ESE. Componente Técnico (infraestructura):	Andrés García Melo-Arquitecto Gestión de Proyectos		11/08/2025
Revisado por Profesional *SISS ESE (Componente Técnico nfraestructura y/o dotación)*	Claudia Grimaldo– Gerente Proyectos		11/08/2025
Revisado por Profesional *SISS ESE (Componente Financiero):* *(Añadir filas abajo según necesidad)*	Luis Alfredo Pérez Martín– Asesor Financiero Proyectos		11/08/2025
Revisado por Profesional *SISS ESE*	Julián Felipe Pérez Sarmiento. – Referente Gestión de proyectos		11/08/2025
Revisado por Profesional *SISS ESE (Componente Jurídico):)*	NA		11/08/2025
Aprobado por: *(Añadir filas abajo según necesidad).*	Fredy Orlando Corredor Camargo- Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional		11/08/2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma			

	Nombre	Firma	Fecha
Revisado por Profesional *SDS-DIYT (Componente Técnico (infraestructura y/o dotación) :(Añadir filas abajo según necesidad)*	Camilo A. Vanegas R. Gloria S. Garrido L.		12-agosto-2025 12-agosto-2025
Revisado por Profesional *SDS-DIYT (Componente Financiero):* (*Añadir filas abajo según necesidad)*			
Revisado por Profesional *SDS-DIYT (Componente Jurídico). Añadir filas abajo según necesidad)*			

(NOTA: El informe debe radicarse en original anexando todos los soportes impresos correspondientes al cumplimiento de los compromisos y en un CD. En el caso que corresponda al informe final, adicionalmente se debe radicar un informe ejecutivo.)

DAVIVIENDA

Fogafín Seguridad para tu dinero | el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

CUENTA DE AHORROS
0048 0046 0919

INFORME DEL MES: MARZO /2025

Apreciado Cliente
CONVENIO 2806257-2021 USS TUNAL
tesoreria@subredsur.gov.co

Saldo Anterior	$78,680,144,402.10
Más Créditos	$225,934,198.26
Menos Débitos	$3,772,126,878.00
Nuevo Saldo	$75,133,951,722.36
Saldo Promedio	$77,216,062,291.97

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
13 03	$ 2,204,772,137.00-	2326	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
26 03	$ 385,704,014.00-	6402	Dcto por Transferencia de Fondos	PORTAL-EMPRESARIAL
31 03	$ 961,645,676.00-	8684	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
31 03	$ 220,005,051.00-	8716	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL-EMPRESARIAL INTERB
31 03	$ 225,934,198.26+	0000	Ganancia Intereses Adicionales.	0000

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

EL DIRECTOR FINANCIERO, LA TESORERA Y LA PROFESIONAL UNIVERSITARIA DE CONTABILIDAD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

CERTIFICAN:

Que dando cumplimiento a las obligaciones contractuales de los convenios de Inversión No.1153-17, No. 1210-17, No 1223-17, y los Convenios Nº CO1.PCCNTR. 676500-18, No 2058936-2020, No.2806257-2021, No 2980595 -2021, N° 4187767-2022, 5141999-2023, suscritos por la Subred Sur E.S.E en la vigencia 2017, 2018, 2019,2020, 2021, 2022, 2023 y 2024 se han realizado las siguientes acciones:

- El Área de Presupuesto adelanto los trámites pertinentes para la incorporación al Presupuesto de la Entidad los valores viabilizados de los Convenios de Inversión; para lo cual se detalla los actos administrativos expedidos:

Vigencia 2018

No. CONVENIO	No. ACUERDO	No. RESOLUCIÓN	VALOR ADICIONADO
1153-17	No 009 del 12 Febrero 2018	No 238 del 26 Febrero 2018	470.868.567.00
1171-17	No 008 del 12 Febrero 2018	No 241 del 26 Febrero 2018	442.045.171.00
1186-17	No 007 del 12 Febrero 2018	No 237 del 26 Febrero 2018	1.333.099.994.00
1210-17	No 006 del 12 Febrero 2018	No 240 del 26 Febrero 2018	531.736.874.00
1211-17	No 005 del 12 Febrero 2018	No 236 del 26 Febrero 2018	860.799.290.00
1223-17	No 003 del 12 Febrero 2018	No 239 del 26 Febrero 2018	855.829.785.00

Los Convenios fueron incorporados en el Presupuesto de Gastos de Inversión en el rubro de **Construcción, reforzamiento, adecuación y ampliación de hospitales,** a excepción del convenio No 1213-17 que se incorporó en el rubro de **Dotación de Infraestructura hospitalaria del distrito capital.**

Vigencia 2019

No. CONVENIO	No. ACUERDO	No. RESOLUCIÓN	VALOR ADICIONADO
Nº CO1.PCCNTR. 676500-18	No 013 del 14 Febrero 2019	No 291 del 12 Marzo 2019	57.672.000.000

Según el radicado 2-2019-60954 de Secretaria Distrital de Planeación, comunica que el CONFIS Distrital en sesión No 16 celebrada el día 9 de septiembre de 2019, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 del Decreto Distrital 662 de 2018, autorizo a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, asumir compromisos con cargo a vigencias futuras ordinarias 2020-2022 por valor de $238.624.088.800 pesos constantes junio 2019.

No. CONVENIO	VIGENCIAS			Total Vigencias Futuras
	2020	2021	2022	
Nº CO1.PCCNTR. 676500-18	38.900.385.400	95.434.023.600	104.289.679.800	238.624.088.800

Vigencia 2020

Incorporación de la cuenta por pagar de inversión de los contratos suscritos para la ejecución de los convenios de infraestructura, dotación hospitalaria y plataforma tecnológica por valor de $14.736.873.120, fue incorporado al presupuesto en su totalidad en el mes de Febrero de la vigencia 2020, conforme a las modificaciones presupuestales resultados del cierre presupuestal de la vigencia fiscal 2019.

No. CONVENIO	No. ACUERDO	No. RESOLUCIÓN	TRASLADO INTERNO
No 1153-2017 No 1171-2017 No 1186-2017	No 067 del 27 Noviembre 2020	No 1397 del 30 noviembre 2020	28.506.479.231

- Se efectúa una reducción en el Presupuesto de Gastos e Inversión de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, para la vigencia fiscal 2020 por valor de CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECISÉIS PESOS M/CTE ($14.496.954.116), incorporado al Presupuesto médiate Resolución No 1566 del 23 de diciembre de 2020, aprobado mediante acuerdo N° 061 del 30 de octubre de 2020 y Resolución del CONFIS 20 del 18 de diciembre de 2020.

Vigencia 2021

Incorporación de la cuenta por pagar de inversión de los contratos suscritos para la ejecución de los convenios de infraestructura, dotación hospitalaria y plataforma tecnológica por valor de $145.325.337.160, fue incorporado al presupuesto en su totalidad en el mes de marzo de la vigencia 2021, conforme a las modificaciones presupuestales resultados del cierre presupuestal de la vigencia fiscal 2020.

No. CONVENIO	No. ACUERDO	No. RESOLUCIÓN	VALOR ADICIONADO
No 2058936-2020	No 042 del 26 Marzo 2021	No 434 del 12 Abril 2021	134.283.510
No 2055128-2020	No 043 del 26 Marzo 2021	No 435 del 12 Abril 2021	179.408.165
No. CONVENIO	**No. ACUERDO**	**No. RESOLUCIÓN**	**TRASLADO INTERNO**
No 1153-2017 No 1171-2017	No 049 del 30 Abril 2021	No 534 del 30 Abril 2021	4.979.362.232
No. CONVENIO	**No. ACUERDO**	**No. RESOLUCIÓN**	**VALOR ADICIONADO**
No 1186-2017	No 053 del 18 Mayo 2021	No 639 del 27 Mayo 2021	11.488.092.429
No. CONVENIO	**No. ACUERDO**	**No. RESOLUCIÓN**	**VALOR ADICIONADO**
No 1223-2017	No 056 del 28 Mayo 2021	No 740 del 16 Junio 2021	1.499.913.335
No. CONVENIO	**No. ACUERDO**	**No. RESOLUCIÓN**	**VALOR ADICIONADO**
No 1186-2017	No 057 del 28 Mayo 2021	No 713 del 10 Junio 2021	3.037.700.531

No. CONVENIO	No. ACUERDO	No. RESOLUCIÓN	VALOR ADICIONADO
No 2055128-2020	No 073 del 30 de Julio 2021	No 1124 del 07 Septiembre 2021	3.752.046.500
No. CONVENIO	**No. ACUERDO**	**No. RESOLUCIÓN**	**VALOR ADICIONADO**
No 2058936-2020	No 074 del 30 de Julio 2021	No 1125 del 07 Septiembre 2021	2.675.832.500
No. CONVENIO	**No. ACUERDO**	**No. RESOLUCIÓN**	**VALOR ADICIONADO**
No 1210-2017	No 125 del 29 de Octubre 2021	No 1486 del 1 Diciembre 2021	3.444.641.986

El Área de Presupuesto adelanto los trámites pertinentes para que mediante Acuerdo 113 del 21 octubre 2021 la Junta Directiva de la Entidad Autorizo al Gerente de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. para que se adelante el trámite correspondiente ante el CONFIS Distrital para solicitar la aprobación de vigencias futuras excepcionales por la suma de **NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($99.101.940.000),** conforme al siguiente detalle:

Vigencia futura 2022, en la suma **VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIEZ MILLONES VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($23.610.024.440).**

Vigencia futura 2023, en la suma **SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS /CTE ($75.491.915.560).**

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E mediante radicado externo No 2021ER42614O1 del 25 de octubre de 2021, solicita ante Dirección de Análisis de Entidades Públicas Distritales del Sector Salud la Aprobación Vigencias Futuras excepcionales por valor de $99.101.940.000 del Convenio 2806257-2021, autorizadas mediante radicado del CONFIS No 2-2021-110117 del 1 de diciembre de 2021.

Vigencia 2022

Incorporación de la cuenta por pagar de inversión de los contratos suscritos para la ejecución de los convenios de infraestructura, dotación y honorarios por valor de $199.909.999.382, fue incorporado al presupuesto en su totalidad en el mes de Enero de la vigencia 2022, conforme a las modificaciones presupuestales resultados del cierre presupuestal de la vigencia fiscal 2021.

No. CONVENIO	No. ACUERDO	No. RESOLUCIÓN	VALOR
No 2980595-2021	No 008 del 28 de Enero 2022	No 102 del 07 Febrero 2022	10.471.170.225
No. CONVENIO	**No. ACUERDO**	**No. RESOLUCIÓN**	**VALOR**
No 1210-2017	No 014 del 17 de Febrero 2022	No 175 del 25 Febrero 2022	3.506.400.914
No. CONVENIO	**No. ACUERDO**	**No. RESOLUCIÓN**	**VALOR**
No 1186-2017	No 013 del 21 de Febrero 2022	No 176 del 25 Febrero 2022	300.236.524

No. CONVENIO	No. ACUERDO	No. RESOLUCIÓN	VALOR
No 1153-2017	No 065 del 30 de Septiembre 2022	No 1155 del 13 Octubre 2022	4.304.943.008
No. CONVENIO	**No. ACUERDO**	**No. RESOLUCIÓN**	**VALOR**
No 1210-2017	No 066 del 30 de Septiembre 2022	No 1156 del 13 Octubre 2022	286.958.748
No. CONVENIO	**No. ACUERDO**	**No. RESOLUCIÓN**	**VALOR**
No 1223-2017	No 070 del 14 de Octubre 2022	No 1228 del 31 Octubre 2022	1.914.122.218
No. CONVENIO	**No. ACUERDO**	**No. RESOLUCIÓN**	**VALOR**
No 4187767-2022	No 074 del 21 de Noviembre 2022	No 1381 del 06 Diciembre 2022	110.035.288

Vigencia 2023

Incorporación de la cuenta por pagar de inversión de los contratos suscritos para la ejecución de los convenios de infraestructura, dotación hospitalaria y plataforma tecnológica por valor de $ 271.161.679.319, fue incorporada al presupuesto en su totalidad, en el mes de marzo vigencia 2023, conforme a las modificaciones presupuestales resultados del cierre presupuestal y de tesorería de la vigencia fiscal 2022.

Para el convenio 1153 de 2017 con el Presupuesto Vigente de Inversión de la Entidad se registra la adición No 5 del Convenio N° 1153 de 2017 por valor de $2.921.791.392.

Para el convenio 5141999 de 2023 con el Presupuesto Vigente de Inversión de la Entidad se registra el movimiento del Convenio Nº 5141999 de 2023 por valor de $ 847.955.047 valor pactado en el acta de inicio del Convenio N° 5141999 de 2023.

Para el convenio 2980595 de 2021 con el Presupuesto Vigente de Inversión de la Entidad se registra el movimiento del Convenio Nº 2980595 de 2021 por valor de $ 4.836.940.052 valor pactado en el Modificatorio del Convenio.

Vigencia 2024

Incorporación de la cuenta por pagar de inversión de los contratos suscritos para la ejecución de los convenios de infraestructura, dotación hospitalaria y plataforma tecnológica por valor de $ 203.746.057.018, fue incorporada al presupuesto en su totalidad, en el mes de abril de 2024 conforme a las modificaciones presupuestales resultados del cierre presupuestal y de tesorería de la vigencia fiscal 2023.

- El Área de Tesorería aperturó las siguientes cuentas bancarias para el manejo de los recursos recibidos, relacionamos información con corte al 31 de marzo del 2025:

BOGOTÁ | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

No. CONVENIO	No. CUENTA BANCARIA	SALDOS AL 1 DE MARZO 2025	RECAUDO	RENDIMIENTOS	GIROS	SALDOS AL 31 DE MARZO 2025
1153-2017	4800416622	1.179.055.764,74	-	3.449.917,16	-	1.182.505.681,90
1210-2017	4800417505	2.645.750.569,41	-	7.741.466,16	-	2.653.492.035,57
1223-2017	4800417497	561.358.260,77	-	1.642.534,27	-	563.000.795,04
2055128-2020	4800455224	3.862.042.799,54	-	11.300.337,23	-	3.873.343.136,77
2058936-2020	4800455216	2.762.664.705,25	-	8.083.556,92	-	2.770.748.262,17
2806257-2021	4800460919	78.680.144.402,10	-	225.934.198,26	3.772.126.878,00	75.133.951.722,36
2980595-2021	4800463475	3.927.422.926,74	-	11.468.951,05	40.062.731,00	3.898.829.146,79
5141999-2023	48280031551	655.307.572,14	-	1.917.429,95	-	657.225.002,09
7134316-2024	482800045080	3.534.917.424,44	-	300.467,98	-	3.535.217.892,42
7162712-2024	482800045528	4.132.147.236,24	-	351.232,51	-	4.132.498.468,75
TOTAL		101.940.811.661,37	-	272.190.091,49	3.812.189.609,00	98.400.812.143,86

Los siguientes recursos se encuentran en administración por parte de la Dirección Distrital de tesorería para el proyecto de obra Usme de acuerdo al siguiente detalle:

No. CONVENIO	No. CUENTA BANCARIA	SALDOS AL 1 DE FEBRERO 2025	ABONOS	RENDIMIENTOS	GIROS	SALDOS AL 28 DE FEBRERO 2025
Nº. 676500-18	13030900020004200042372	77.480.970.741,97	-	515.247.821,00	5.903.987.924,00	72.092.230.638,97

El Área de Contabilidad, evidenció que las cuentas aperturadas de los convenios anteriormente relacionados llevan contabilidades separadas y no hace unidad de caja con corte al Treinta y uno (31) de marzo de 2025.

Esta certificación se expide en Bogotá D.C. a los ocho (8) días del mes de abril de 2025.

ANGELICA SÁNCHEZ
Tesorera
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur

YOLANDA BAENA RIVERA
Profesional Universitario- Contabilidad
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur

JORGE HERNANDO CABRERA ROJAS
Director Financiero
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur.

Proyectado por: Christian David Toro Mora – Profesional administrativo
Revisado por: Luis Fernando Arévalo Duarte – Profesional universitario de Contabilidad
