ACTA No 2

COP-711-2024

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA FONDO DE DESARROLLO LOCAL ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN								CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024				
OBJETO DE LA LICITACION :	"CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO, DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 440 DE 2022, EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, BOGOTÁ D.C".							COP-711-2024				
OFERTA ECONOMICA (PROPONENTE)								ACTA No. 2				11/07/2025
COD IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VR. UNITARIO (OFERTADO)	VR. UNITARIO MÁS A.I.U.	VALOR PARCIAL (OFERTADO) = VR. UNITARIO MÁS A.I.U. X CANTIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO (OFERTADO)	VALOR TOTAL (OFERTADO)	VR. UNITARIO (MÁS A.I.U.)	VALOR TOTAL (MAS A.I.U)
		1. PRELIMINARES										
3.007	1	REPLANTEO GENERAL	M2	6.501,16	820	1.076	6.995.748	852,69	820	699.210	1.076	917.643
3.022	1	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M3	378,69	52.266	68.594	25.975.862	49,67	52.266	2.596.007	68.594	3.407.000
3.155	1	DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UN	42,00	171.223	224.713	9.437.946	13,00	171.223	2.225.899	224.713	2.921.270
4.613	1	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	12.256,36	52.087	68.359	837.832.513	1.823,38	52.087	94.974.190	68.359	124.644.127
4.859	1	DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB, COMPRESOR Y CARGUE)	M3	187,29	267.084	350.521	65.649.078	-	267.084	-	350.521	-
		2. REDES HUMEDAS (ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO)										
3.045	2	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	298,08	146.440	192.188	57.287.399	95,30	146.440	13.955.732	192.188	18.315.503
3.225	2	TUBERIA PVC D=3" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	527,33	49.510	64.977	34.264.321	-	49.510	-	64.977	-
3.226	2	TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	73,50	62.791	82.410	6.057.135	-	62.793	-	82.410	-
3.227	2	TUBERIA PVC D=6" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	726,38	125.685	164.949	119.815.655	-	125.685	-	164.949	-
3.252	2	TEE HD EXTREMO LISO 6"X3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	2,00	479.282	629.010	1.258.020	-	479.282	-	629.010	-
3.253	2	TEE HD EXTREMO LISO 6"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	2,00	523.454	686.981	1.373.962	-	523.454	-	686.981	-
3.293	2	CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	18,00	277.882	364.692	6.564.456	-	277.882	-	364.692	-
3.471	2	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEABL)	ML	115,00	666.677	874.947	100.618.905	14,93	666.677	9.953.488	874.947	13.062.957
3.478	2	RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA 1/2" (SUMINISTRO, DISPOSICIÓN Y EXTENDIDO MANUAL)	M3	1.067,80	139.924	183.636	195.168.341	223,25	139.924	31.252.337	183.636	41.015.567
3.708	2	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	10.308,86	5.137	6.742	69.502.334	1.568,65	5.137	8.058.151	6.742	10.575.517
3.723	2	LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN	47,00	91.140	119.612	5.621.764	4,00	91.140	364.560	119.612	478.449
3.776	2	ENTIBADO TIPO ED1, DISCONTINUO EN MADERA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	6.359,22	42.673	56.004	356.141.757	914,96	42.673	39.044.003	56.004	51.241.950
3.878	2	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)	UN	50,00	1.736.437	2.278.900	113.945.000	6,00	1.736.437	10.418.622	2.278.900	13.673.400
3.879	2	PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCL. SUMIN. INST.)	UN	50,00	1.041.729	1.367.165	68.358.250	6,00	1.041.729	6.250.374	1.367.165	8.202.991
3.882	2	SUMIDERO LATERAL SL 100, H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA, INCL. SUMIN, FORM, REF. Y CONST. INCL. TAPA)	UN	40,00	2.725.318	3.576.707	143.068.280	14,00	2.725.318	38.154.452	3.576.707	50.073.903
3.919	2	TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=24" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	150,63	624.230	819.239	123.401.971	-	624.230	-	819.239	-
4.144	2	TUBERIA PVC SANITARIA D=6" TIPO U.S. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	658,20	78.605	103.161	67.900.570	91,64	78.605	7.203.362	103.161	9.453.693
4.262	2	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 3.5M (INCLUYE CARGUE)	M3	6.557,73	5.100	6.693	43.890.887	1.488,19	5.100	7.589.793	6.693	9.960.844
4.792	2	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM).	M3	3.763,41	88.909	116.684	439.129.732	957,81	88.909	85.157.813	116.684	111.761.114
4.839	2	EMPATES DE TUBERIA EN PVC A PVC 6" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACCESORIOS).	UN	59,00	547.635	718.716	42.404.244	42,00	547.635	23.000.670	718.716	30.186.079
4.840	2	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 3" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	118,00	169.497	222.448	26.248.864	-	169.497	-	222.448	-
4.842	2	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A AC 4" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACCESORIOS).	UN	2,00	384.126	504.127	1.008.254	-	384.126	-	504.127	-
4.843	2	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A AC 3" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACCESORIOS).	UN	2,00	285.616	374.842	749.684	-	285.616	-	374.842	-
4.878	2	CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	172,00	120.549	158.209	27.211.948	42,00	120.549	5.063.058	158.209	6.644.757
4.984	2	RELOCALIZACIÓN DE MEDIDOR DE ACUEDUCTO D= 1/2" (INCLUYE 1.0M TUBERÍA GALVANIZADA D= 1/2", SOLDADURA, CINTA DE TEFLON, Y REPOSICIÓN DE CAJILLA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA CON TAPA, NO INCLUYE MEDIDOR.).	UN	180,00	361.479	474.405	85.392.900	-	361.479	-	474.405	-
4.988	2	CONCRETO GRAVA COMÚN 4000 PSI (280 KG/CM2) PARA CÁMARAS ESPECIALES DE INTERCONEXIÓN DE ALCANTARILLADO (PREMEZCLADO, INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y COLOCACIÓN. NO INCLUYE REFUERZO NI CURADO).	M3	128,88	895.013	1.174.615	151.384.381	12,25	895.013	10.966.773	1.174.615	14.392.793
5.015	2	CAJA DE INSPECCION 0.80X0.8M. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (H=0.6M. INCLUYE MARCO Y TAPA, NO INCLUYE BASE Y CAÑUELA).	UN	168,00	558.905	733.507	123.229.176	28,00	558.905	15.649.340	733.507	20.538.194
5.171	2	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 3" A 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF, REPOSICIÓN DE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR, REGISTROS Y ACCESORIOS. LONGITUD PROMEDIO =6.5 MT).	UN	118,00	474.273	622.436	73.447.448	-	474.273	-	622.436	-
5.173	2	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 6" A 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF REPOSICIÓN DE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR, REGISTROS Y ACCESORIOS. LONGITUD PROMEDIO=6.5 MT).	UN	62,00	353.435	463.848	28.758.576	-	353.435	-	463.848	-

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA								CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024				
FONDO DE DESARROLLO LOCAL												
ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN								COP-711-2024				
OBJETO DE LA LICITACION :	"CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO, DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 440 DE 2022, EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, BOGOTÁ D.C.".											
OFERTA ECONOMICA (PROPONENTE)								ACTA No. 2				11/07/2025
COD IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VR. UNITARIO (OFERTADO)	VR. UNITARIO MÁS A.I.U.	VALOR PARCIAL (OFERTADO) = VR. UNITARIO MÁS A.I.U. X CANTIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO (OFERTADO)	VALOR TOTAL (OFERTADO)	VR. UNITARIO (MÁS A.I.U.)	VALOR TOTAL (MAS A.I.U)
5.467	2	TUBERIA PVC SANITARIA D=8'' TIPO U.S. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	ML	888,38	135.115	177.325	157.531.984	-	135.115	-	177.325	-
6.538	2	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=14" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	12,84	215.108	282.308	3.624.835	-	215.108	-	282.308	-
7.830	2	CONEXIONES KIT SILLA YEE 250 X 200 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	26,00	228.486	299.865	7.796.490	-	228.486	-	299.865	-
7.831	2	CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 X 200 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	311.718	409.099	818.198	-	311.718	-	409.099	-
8.350	2	YEE PVC SANITARIA D=6"X 8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	30,00	296.241	388.787	11.663.610	42,00	296.241	12.442.122	388.787	16.329.041
8.646	2	EMPATE DE TUBERÍA EN PVC A PVC 6"X4" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023, INCLUYE REDUCCIÓN U.M PVC 6"X4" (Suministro e instalación)	UN	15,00	310.105	406.982	6.104.730	-	310.105	-	406.982	-
8.792	2	TUBERÍA PVC SANITARIA D=10" TIPO U.S. (Incluye suministro e instalación)	ML	131,66	202.280	265.472	34.957.044	132,90	202.280	26.883.012	265.472	35.281.265
9.109	2	CONCRETO 2000 PSI GRAVA COMÚN 14 MPA (140 Kg/Cm2) PARA SOLADOS (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN).	M3	64,53	564.209	740.468	47.782.400	9,82	564.209	5.540.532	740.468	7.271.395
										-		-
		3.PAVIMENTOS								-		-
										-		-
3.454	3	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL. NO INCLUYE MATERIAL DE SELLO)	M3	1.008,53	107.184	140.668	141.867.898	-	107.184	-	140.668	-
3.710	3	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	2.853,53	5.100	6.693	19.098.676	-	5.100	-	6.693	-
4.015	3	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	3.625,29	12.090	15.867	57.522.476	-	12.090	-	15.867	-
4.159	3	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	293,95	142.531	187.058	54.985.699	230,76	142.531	32.890.191	187.058	43.165.087
4.394	3	ADOQUIN DE CONCRETO TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	M2	3.625,29	104.289	136.869	496.189.817	-	104.289	-	136.869	-
8.616	3	BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) o (BGB_BG25) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	842,46	178.752	234.594	197.636.061	109,48	178.752	19.569.798	234.594	25.683.402
										-		-

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
FONDO DE DESARROLLO LOCAL	
ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN	

OBJETO DE LA LICITACION :	"CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO, DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 440 DE 2022, EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, BOGOTÁ D.C.".

OFERTA ECONOMICA (PROPONENTE)

COD IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VR. UNITARIO (OFERTADO)	VR. UNITARIO MÁS A.I.U.	VALOR PARCIAL (OFERTADO) = VR. UNITARIO MÁS A.I.U. X CANTIDAD
		4. ESPACIO PUBLICO					
3.394	4	LOSA DE CONCRETO MR41 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS)	M3	118,76	734.681	964.195	114.507.798
3.454	4	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL. NO INCLUYE MATERIAL DE SELLO)	M3	811,56	107.184	140.668	114.160.522
3.464	4	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	M3	2.184,85	39.693	52.093	113.815.391
3.548	4	BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI, HECHO EN OBRA)	UN	400,00	199.245	261.489	104.595.600
3.745	4	PISO EN ADOQUIN DE CONCRETO A25 20X10X6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 3CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	M2	865,22	91.738	120.397	104.169.892
4.015	4	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	3.644,97	12.090	15.867	57.834.739
4.054	4	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML	1.884,48	74.368	97.601	183.927.132
4.159	4	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	608,68	142.531	187.058	113.858.463
4.232	4	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15M, D=5MM, 5MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	KG	1.371,63	6.740	8.846	12.133.039
4.909	4	RAMPA VEHICULAR FUNDIDA EN EL SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (GRAVA COMUN) SUM, CONSTR. E INSTALACIÓN. INCLUYE ACABADO EN ADOQUIN DE ARCILLA TIPO TRÁFICO PESADO O SIMILAR, BASE DE 4CM EN MORTERO DE 2000 PSI.	M2	659,59	170.586	223.877	147.667.030
5.017	4	ADOQUIN EN CONCRETO COLOR OCRE A25 (20X10X6cm) (Suministro e instalación. Incluye base 4cm mortero 2000 PSI y arena de sello)	M2	987,90	112.794	148.031	146.239.825
6.475	4	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE PEGA 2000 PSI Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN).	ML	397,00	68.087	89.357	35.474.729
8.166	4	CENEFA EN LOSETA PREFABRICADA A58 GUIA (200X20X6) CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO)	M2	92,34	100.890	132.408	12.226.555
8.169	4	CENEFA EN LOSETA PREFABRICADA A57 TACTIL ALERTA (20X20X6) CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO)	M2	447,74	100.890	132.408	59.284.358
8.225	4	CONTENEDOR DE RAICES (1.40X1.80X1.20M. INC. SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN Y FILTRO EN GRAVILLA. NO INC. TIERRA)	UN	24,00	1.602.982	2.103.754	50.490.096
8.464	4	BORDILLO EN CONCRETO GRAVA COMÚN 1" 2000 PSI, FUNDIDO EN SITIO, A LA VISTA, DE 10CM X 35CM. REFUERZO SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, SIMILAR O EQUIVALENTE. (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO E INSTALACIÓN).	ML	1.389,21	52.141	68.430	95.063.640
		5. DEMARCACION Y SEÑALIZACIÓN					
3.431	5	SEÑAL VERTICAL GRUPO I (75X75CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	48,00	524.047	687.759	33.012.432
4.248	5	DEMARCACION PASO PEATONAL CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	M2	296,52	140.185	183.979	54.553.453
7.959	5	DEMARCACIÓN LINEA CONTINUA BLANCA O AMARILLA A=0.12 M (E=2.3 MM, TERMOPLÁSTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS)	ML	1.715,85	16.823	22.079	37.884.252
		6. REDES SECAS					
4.342	6	CANALIZACION VIA PUBLICA DOS (2) DUCTOS PVC TIPO DB-60 (60" EPM NORMA RS1-002 INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENOS EN ARENA DE PEÑA Y EN SUB-BASE GRANULAR TIPO B-400 Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS. NO INCLUYE: DEMOLICIÓN NI RECONSTRUCCIÓN DE ANDEN O PAVIMENTO, ENTIBADOS.	ML	1.513,03	293.260	384.874	582.325.908
		SUBTOTAL OBRAS INICIALES (INCLUYE A.I.U.) (A):					**6.909.895.033**

	PORCENTAJE	PESOS
COMPONENTE AMBIENTAL Y SST OBRAS INICIALES Y ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS (INCLUIDO A.I.U. COMPONENTE) (B)	0,07028	387.903.707
PLAN DE MANEJO DE TRASITO OBRAS ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS (INCLUIDO A.I.U. COMPONENTE) (C)	0,01579	87.894.244
COMPONENTE SOCIAL OBRAS INICIALES Y COMPLEMENTARIAS (INCLUIDO A.I.U. COMPONENTE) (D)	0,02303	120.552.941
TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA (CON ESTE VALOR SE EVALUARÁN LAS OFERTAS ECONÓMICAS DE ACUERDO A LAS FÓRMULAS DEL PLIEGO TIPO). (E) = (A) + (B) + (C) + (D):		**7.446.245.925**
PROVISIÓN PARA OBRAS ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS (F):		**599.411.381**

CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

COP-711-2024

ACTA No. 2				11/07/2025
CANTIDAD	VR. UNITARIO (OFERTADO)	VALOR TOTAL (OFERTADO)	VR. UNITARIO (MÁS A.I.U.)	VALOR TOTAL (MAS A.I.U)
-		-		-
-	734.681	-	964.195	-
87,02	107.184	9.327.131	140.668	12.240.927
234,25	39.693	9.297.932	52.093	12.202.606
-	199.245	-	261.489	-
-	91.738	-	120.397	-
377,36	12.090	4.562.300	15.867	5.987.562
459,08	74.368	34.140.607	97.601	44.806.133
127,52	142.531	18.175.808	187.058	23.853.930
162,80	6.740	1.097.287	8.846	1.440.079
-	170.586	-	223.877	-
-	112.794	-	148.031	-
81,93	68.087	5.578.153	89.357	7.320.769
6,98	100.890	704.186	132.408	924.173
-	100.890	-	132.408	-
-	1.602.982	-	2.103.754	-
228,40	52.141	11.908.976	68.430	15.629.340
-		-		-
	524.047	-	687.759	
	140.185	-	183.979	
	16.823	-	22.079	
		-		
		-		
	293.260	-	384.874	
		-		
		604.695.870		**793.602.860**
administracion	**25,24%**	152.625.238		
imprevisto	**1,00%**	6.046.959		
utilidad	**4,20%**	25.407.389		
		786.775.456		**793.602.860**
IVA	**19%**	4.827.404		
		793.602.860		**793.602.860**
componente B	7,0283%	42.499.840	componente B	42.499.840
componente C	1,6791%	10.153.448	componente C	10.153.448
componente D	2,3080%	13.926.146	componente D	13.926.146

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	
FONDO DE DESARROLLO LOCAL	
ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN	
OBJETO DE LA LICITACION :	"CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO, DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 440 DE 2022, EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, BOGOTÁ D.C.".

CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024				
COP-711-2024				
ACTA No. 2				11/07/2025
CANTIDAD	VR. UNITARIO (OFERTADO)	VALOR TOTAL (OFERTADO)	VR. UNITARIO (MÁS A.I.U.)	VALOR TOTAL (MAS A.I.U)
		860.182.294		860.182.294

OFERTA ECONOMICA (PROPONENTE)

COD IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VR. UNITARIO (OFERTADO)	VR. UNITARIO MÁS A.I.U.	VALOR PARCIAL (OFERTADO) = VR. UNITARIO MÁS A.I.U. X CANTIDAD
VALOR TOTAL CONTRATO PROPUESTO A EJECUTAR (E) + F):							8.045.657.306

AIU % PROPUESTO	PORCENTAJE	FIRMA DEL PROPONENTE
Administración (% de los CD)	25,24%	
Imprevistos (%de los CD)	1,00%	
Utilidad (%de los CD)	5,00%	
AIU %	31,24%	

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

NOTA 4: Diligencie la totalidad de los valores unitarios solicitados en este Anexo, incluidos los que no tengan cantidad.
NOTA 5: No se podrá modificar los valores fijos.
NOTA 6: La casilla en verde corresponden a la sumatoria a tener en cuenta para la evaluación de la oferta economica
NOTA 7: Diligencie la totalidad de los valores porcentuales de Administración, Imprevistos y Utilidad solicitados en este Anexo.
NOTA 8: El porcentaje total de A.I.U. ofertado debe ser menor o igual al porcentaje total de A.I.U. oficial.
NOTA 9: Los valores porcentuales de Administración, Imprevistos, Utilidad y el Porcentaje Total de A.I.U. deben presentarse hasta con máximo cinco (5) cifras decimales.
NOTA 10: La Entidad entenderá que el porcentaje ofertado como utilidad dentro del AIU incluye el IVA.

Nombre	Nombre	Nombre
VoBo Residente de obra	VoBo Director de obra	VoBo Interventoria

CONSORCIO VIAS FONTIBON

CONTRATO DE OBRA VIAS-711-2024

CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO, DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 440 DE 2022, EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, BOGOTÁ D.C

INTERVENTORIA: ING INGENIERIA

CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

COP-711-2024

CVI 9000362 REFUGIO 2

							ACTA No. 2				11/07/2025
COD IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VR. UNITARIO (MÁS A.I.U.)	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VR. UNITARIO (OFERTADO)	VALOR TOTAL	VR. UNITARIO (MÁS A.I.U.)	VALOR PARCIAL
		1. PRELIMINARES									
3007	1,001	REPLANTEO GENERAL	M2	406,66	$ 1.076,00	$ 437.568,84	406,66	$ 820	$ 333.463	$ 1.076	$ 437.637,16
3022	1,002	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M3	23,69	$ 68.594,00	$ 1.624.849,72	23,69	$ 52.266	$ 1.238.073	$ 68.594	$ 1.624.847,32
3155	1,003	DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UN	3,00	$ 224.713,00	$ 674.139,00	3,00	$ 171.223	$ 513.669	$ 224.713	$ 674.139,20
4613	1,004	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	766,66	$ 68.359,00	$ 52.408.344,86	780,78	$ 52.087	$ 40.668.488	$ 68.359	$ 53.373.323,47
4850	1,005	DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB, COMPRESOR Y CARGUE).	M3	11,72	$ 350.521,00	$ 4.106.500,37		$ 267.084	$ -	$ 350.521	$ -
		2. REDES HÚMEDAS (ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO)									
3045	2,001	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	96,44	$ 192.188,00	$ 18.534.610,72	49,90	$ 146.440	$ 7.307.356,00	$ 192.188	$ 9.590.174,01
3225	2,002	TUBERIA PVC D=3" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 64.977,00	$ -		$ 49.510	$ -	$ 64.977	$ -
3226	2,003	TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 82.410,00	$ -		$ 62.793	$ -	$ 82.410	$ -
3227	2,004	TUBERIA PVC D=6" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 164.949,00	$ -		$ 125.685	$ -	$ 164.949	$ -
3252	2,005	TEE HD EXTREMO LISO 6"X3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$ 629.010,00	$ -		$ 479.282	$ -	$ 629.010	$ -
3253	2,006	TEE HD EXTREMO LISO 6"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$ 686.981,00	$ -		$ 523.454	$ -	$ 686.981	$ -
3293	2,007	CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$ 364.692,00	$ -		$ 277.882	$ -	$ 364.692	$ -
3471	2,008	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.)	ML	11,50	$ 874.947,00	$ 10.061.890,50		$ 666.677	$ -	$ 874.947	$ -
3478	2,009	RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA 1/2" (SUMINISTRO, DISPOSICIÓN Y EXTENDIDO MANUAL)	M3	66,48	$ 183.636,00	$ 12.208.227,24	66,48	$ 139.924	$ 9.302.228,26	$ 183.636	$ 12.208.244,36
3708	2,010	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	644,84	$ 6.742,00	$ 4.347.530,37		$ 5.137	$ -	$ 6.742	$ -
3723	2,011	LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN	5,00	$ 119.612,00	$ 598.060,00		$ 91.140	$ -	$ 119.612	$ -
3776	2,012	ENTIBADO TIPO ED1, DISCONTINUO EN MADERA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	397,78	$ 56.004,00	$ 22.277.483,53	397,78	$ 42.673	$ 16.974.627,79	$ 56.004	$ 22.277.501,51
3878	2,013	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)	UN	5,00	$ 2.278.900,00	$ 11.394.500,00		$ 1.736.437	$ -	$ 2.278.900	$ -
3879	2,014	PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCL. SUMIN, INST.)	UN	5,00	$ 1.367.165,00	$ 6.835.825,00		$ 1.041.729	$ -	$ 1.367.165	$ -
3882	2,015	SUMIDERO LATERAL SL-100, H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA. INCL. SUMIN, FORM, REF. Y CONST. INCL. TAPA)	UN	2,00	$ 3.576.707,00	$ 7.153.414,00	4,00	$ 2.725.318	$ 10.901.272,00	$ 3.576.707	$ 14.306.829,37
3919	2,016	TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=24" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 819.239,00	$ -		$ 624.230	$ -	$ 819.239	$ -
4144	2,017	TUBERIA PVC SANITARIA D=6" TIPO U.S. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 103.161,00	$ -	10,60	$ 78.605	$ 833.213,00	$ 103.161	$ 1.093.508,74
4262	2,018	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 3.5M (INCLUYE CARGUE)	M3	410,20	$ 6.693,00	$ 2.745.475,62	410,20	$ 5.100	$ 2.092.025,35	$ 6.693	$ 2.745.574,07

4792	2,019	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM).	M3	235,41	$ 116.684,00	$ 27.468.571,69	235,41	$ 88.909	$ 20.930.061,02	$ 116.684	$ 27.468.612,09
4839	2,020	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 6" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACCESORIOS).	UN		$ 718.716,00	$ -	14,00	$ 547.635	$ 7.666.890,00	$ 718.716	$ 10.062.026,44
4840	2,021	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 3" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 222.448,00	$ 222.448,00		$ 169.497	$ -	$ 222.448	$ -
4842	2,022	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A AC 4" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACCESORIOS).	UN		$ 504.127,00	$ -		$ 384.126	$ -	$ 504.127	$ -
4843	2,023	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A AC 3" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACCESORIOS).	UN		$ 374.842,00	$ -		$ 285.616	$ -	$ 374.842	$ -
4878	2,024	CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	14,00	$ 158.209,00	$ 2.214.926,00	14,00	$ 120.549	$ 1.687.686,00	$ 158.209	$ 2.214.919,11
4984	2,025	RELOCALIZACIÓN DE MEDIDOR DE ACUEDUCTO D= 1/2" (INCLUYE 1.0M TUBERÍA GALVANIZADA D= 1/2", SOLDADURA, CINTA DE TEFLON, Y REPOSICIÓN DE CAJILLA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA CON TAPA, NO INCLUYE MEDIDOR.).	UN	28,00	$ 474.405,00	$ 13.283.340,00		$ 361.479	$ -	$ 474.405	$ -
4986	2,026	CONCRETO GRAVA COMÚN 4000 PSI (280 KG/CM2) PARA CÁMARAS ESPECIALES DE INTERCONEXIÓN DE ALCANTARILLADO (PREMEZCLADO, INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y COLOCACIÓN. NO INCLUYE REFUERZO NI CURADO).	M3	8,06	$ 1.174.615,00	$ 9.469.440,17		$ 895.013	$ -	$ 1.174.615	$ -
5015	2,027	CAJA DE INSPECCION 0.80X0.8M. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (H=0.6M. INCLUYE MARCO Y TAPA, NO INCLUYE BASE Y CAÑUELA).	UN	14,00	$ 733.507,00	$ 10.269.098,00		$ 558.905	$ -	$ 733.507	$ -
5171	2,028	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 3" A 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF, REPOSICIÓN DE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR, REGISTROS Y ACCESORIOS. LONGITUD PROMEDIO =6.5MT).	UN		$ 622.436,00	$ -		$ 474.273	$ -	$ 622.436	$ -
5173	2,029	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 6" A 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF REPOSICIÓN DE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR, REGISTROS Y ACCESORIOS. LONGITUD PROMEDIO=6.5 MT).	UN		$ 463.848,00	$ -		$ 353.435	$ -	$ 463.848	$ -
5467	2,030	TUBERIA PVC SANITARIA D=8'' TIPO U.S. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	ML	49,80	$ 177.325,00	$ 8.830.785,00		$ 135.115	$ -	$ 177.325	$ -
6538	2,031	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=14" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	7,26	$ 282.308,00	$ 2.049.556,08		$ 215.108	$ -	$ 282.308	$ -
7830	2,032	CONEXIONES KIT SILLA YEE 250 X 200 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$ 299.865,00	$ -		$ 228.486	$ -	$ 299.865	$ -
7831	2,033	CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 X 200 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$ 409.099,00	$ -		$ 311.718	$ -	$ 409.099	$ -
8350	2,034	TEE PVC SANITARIA D=6" X 6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$ 388.787,00	$ -	14,00	$ 296.241	$ 4.147.374,00	$ 388.787	$ 5.443.013,64
8646	2,035	EMPATE DE TUBERÍA EN PVC A PVC 6"X4" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023, INCLUYE REDUCCIÓN U.M PVC 6"X4" (Suministro e instalación)	UN		$ 406.982,00	$ -		$ 310.105	$ -	$ 406.982	$ -
8792	2,036	TUBERÍA PVC SANITARIA D=10" TIPO U.S. (Incluye suministro e instalación)	ML		$ 265.472,00	$ -		$ 202.280	$ -	$ 265.472	$ -
9109	2,037	CONCRETO 2000 PSI GRAVA COMÚN 14 MPA (140 Kg/Cm2) PARA SOLADOS (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN).	M3	4,04	$ 740.468,00	$ 2.988.898,69		$ 564.209	$ -	$ 740.468	$ -
		3.PAVIMENTOS				-					
3454	3,001	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL. NO INCLUYE MATERIAL DE SELLO)	M3	70,50	$ 140.668,00	$ 9.917.575,58		$ 107.184	$ -	$ 140.668	$ -
3710	3,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	157,83	$ 6.693,00	$ 1.056.369,58		$ 5.100	$ -	$ 6.693	$ -
4015	3,003	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	177,85	$ 15.867,00	$ 2.822.042,21		$ 12.090	$ -	$ 15.867	$ -
4159	3,004	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	42,14	$ 187.058,00	$ 7.882.605,41		$ 142.531	$ -	$ 187.058	$ -
4394	3,005	ADOQUIN DE CONCRETO TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	M2		$ 136.869,00	$ -		$ 104.289	$ -	$ 136.869	$ -

8616	3,006	BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) o (BGB_BG25) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	36,78	$ 234.594,00			$ 178.752	$ -	$ 234.594	$ -
		4. ESPACIO PUBLICO				-					
3394	4,001	LOSA DE CONCRETO MR41 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS)	M3	7,01	$ 964.195,00	$ 6.756.581,84		$ 734.681	$ -	$ 964.195	$ -
3454	4,002	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL. NO INCLUYE MATERIAL DE SELLO)	M3	47,88	$ 140.668,00	$ 6.734.859,43		$ 107.184	$ -	$ 140.668	$ -
3464	4,003	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	M3	128,87	$ 52.093,00	$ 6.713.268,98		$ 39.693	$ -	$ 52.093	$ -
3548	4,004	BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI, HECHO EN OBRA)	UN	25,45	$ 261.489,00	$ 6.654.060,07		$ 199.245	$ -	$ 261.489	$ -
3745	4,005	PISO EN ADOQUIN DE CONCRETO A25 20X10X6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 3CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	M2	50,75	$ 120.397,00	$ 6.109.923,13		$ 91.738	$ -	$ 120.397	$ -
4015	4,006	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	202,40	$ 15.867,00	$ 3.211.543,02		$ 12.090	$ -	$ 15.867	$ -
4054	4,007	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML	113,72	$ 97.601,00	$ 11.098.916,19	99,8	$ 74.368	$ 7.421.926	$ 97.601	$ 9.740.536,21
4159	4,008	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	35,90	$ 187.058,00	$ 6.715.962,60		$ 142.531	$ -	$ 187.058	$ -
4232	4,009	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15M, D=5MM, 5MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	KG	39,89	$ 8.846,00	$ 352.836,26		$ 6.740	$ -	$ 8.846	$ -
4909	4,010	RAMPA VEHICULAR FUNDIDA EN EL SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (GRAVA COMUN) SUM, CONSTR. E INSTALACIÓN. INCLUYE ACABADO EN ADOQUIN DE ARCILLA TIPO TRÁFICO PESADO O SIMILAR, BASE DE 4CM EN MORTERO DE 2000 PSI.	M2	39,44	$ 223.877,00	$ 8.830.768,37		$ 170.586	$ -	$ 223.877	$ -
5047	4,011	ADOQUIN EN CONCRETO COLOR OCRE A25 (20X10X6cm) (Suministro e instalación. Incluye base 4cm mortero 2000 PSI y arena de sello)	M2	59,05	$ 148.031,00	$ 8.741.493,52		$ 112.794	$ -	$ 148.031	$ -
6475	4,012	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE PEGA 2000 PSI Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN).	ML	20,29	$ 89.357,00	$ 1.812.884,61		$ 68.087	$ -	$ 89.357	$ -
8166	4,013	CENEFA EN LOSETA PREFABRICADA A58 GUIA (20X20X6) CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO)	M2	2,71	$ 132.408,00	$ 358.654,03		$ 100.890	$ -	$ 132.408	$ -
8169	4,014	CENEFA EN LOSETA PREFABRICADA A57 TÁCTIL ALERTA (20X20X6) CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO)	M2	24,94	$ 132.408,00	$ 3.302.227,53		$ 100.890	$ -	$ 132.408	$ -
8225	4,015	CONTENEDOR DE RAICES (1.40X1.80X1.20M. INC. SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN Y FILTRO EN GRAVILLA. NO INC. TIERRA)	UN		$ 2.103.754,00	$ -		$ 1.602.982	$ -	$ 2.103.754	$ -
8464	4,016	BORDILLO EN CONCRETO GRAVA COMÚN 1" 2000 PSI, FUNDIDO EN SITIO, A LA VISTA, DE 10CM X 35CM. REFUERZO SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, SIMILAR O EQUIVALENTE. (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO E INSTALACIÓN).	ML	80,96	$ 68.430,00	$ 5.540.302,53		$ 52.141	$ -	$ 68.430	$ -
		5. DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN				-					
3.431	5,001	SEÑAL VERTICAL GRUPO I (75X75CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	3,00	$ 687.759,00	$ 2.063.277,00		$ 524.047	$ -	$ 687.759	$ -
4.248	5,002	DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	M2	18,55	$ 183.979,00	$ 3.412.443,58		$ 140.185	$ -	$ 183.979	$ -
7.959	5,003	DEMARCACIÓN LINEA CONTINUA BLANCA O AMARILLA A=0.12 M (E=2.3 MM, TERMOPLÁSTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS)	ML	107,33	$ 22.079,00	$ 2.369.746,84		$ 16.823	$ -	$ 22.079	$ -
		6. REDES SECAS				-					

4342	6,001	CANALIZACION VIA PUBLICA DOS (2) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø6" EPM NORMA RS1-002. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENOS EN ARENA DE PEÑA Y EN SUB-BASE GRANULAR TIPO B-400 Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS. NO INCLUYE: DEMOLICIÓN NI RECONSTRUCCIÓN DE ANDEN O PAVIMENTO, ENTIBADOS.	ML	86,09	$ 384.874,00	$ 33.132.398,08		$ 293.260	$ -	$ 384.874	$ -
SUBTOTAL OBRAS INICIALES (INCLUYE A.I.U.) (A):						$ 377.796.223,78			132.018.353		173.260.887
							Adminis	25,24%	33.321.432		
							imprevisto	1,00%	1.320.184		
							utilidad	4,20%	5.546.990		
									172.206.959		173.260.887
							IVA	19%	1.053.928		
									173.260.887		173.260.887
							componente B	7,0283%	9.278.646	componente B	9.278.646
							componente C	1,6791%	2.216.720	componente C	2.216.720
							componente D	2,3030%	3.040.383	componente D	3.040.383
									187.796.635		187.796.635

	PORCENTAJE	PESOS
COMPONENTE AMBIENTAL Y SST OBRAS INICIALES Y ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS (INCLUIDO A.I.U. COMPONENTE) (B)	7,0283%	
PLAN DE MANEJO DE TRASITO OBRAS ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS (INCLUIDO A.I.U. COMPONENTE) (C)	1,6791%	
COMPONENTE SOCIAL OBRAS INICIALES Y COMPLEMENTARIAS (INCLUIDO A.I.U. COMPONENTE) (D)	2,3030%	

TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA (CON ESTE VALOR SE EVALUARÁN LAS OFERTAS ECONÓMICAS DE	$ 377.796.223,78
PROVISIÓN PARA OBRAS ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS (F):	$ 599.411.381,00
VALOR TOTAL CONTRATO PROPUESTO A EJECUTAR (E) + F):	$ 8.045.657.306,00

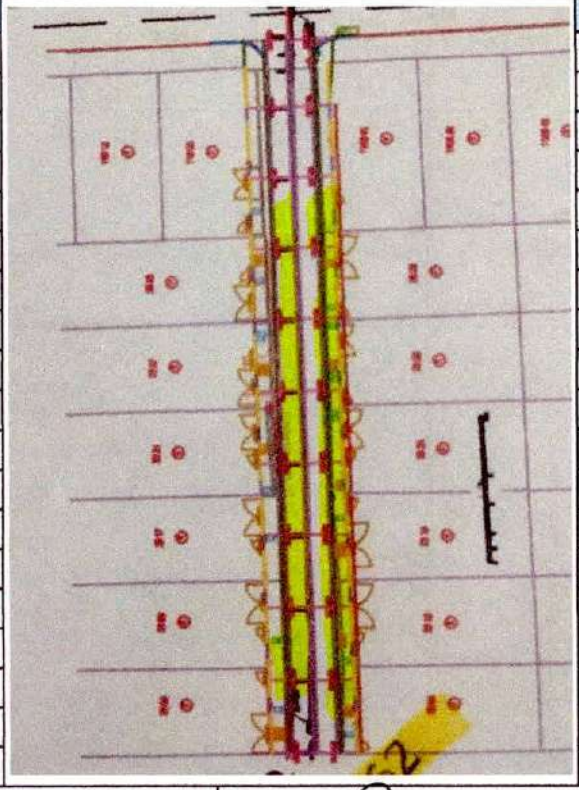
AIU % PROPUESTO	PORCENTAJE	FIRMA DEL PROPONENTE
Administración (% de los CD)	25,24%	
Imprevistos (%de los CD)	1,00%	
Utilidad (%de los CD)	5,00%	
AIU %	31,24%	

Nombre	Nombre	Nombre
VoBo Residente de obra	VoBo Director de obra	VoBo Interventoria

CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

CONTRATO 711-2024	INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS	DIRECCION:	LOCALIDAD DE FONTIBON
PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO DEL 2025	HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025		ACTA DE OBRA N° 2

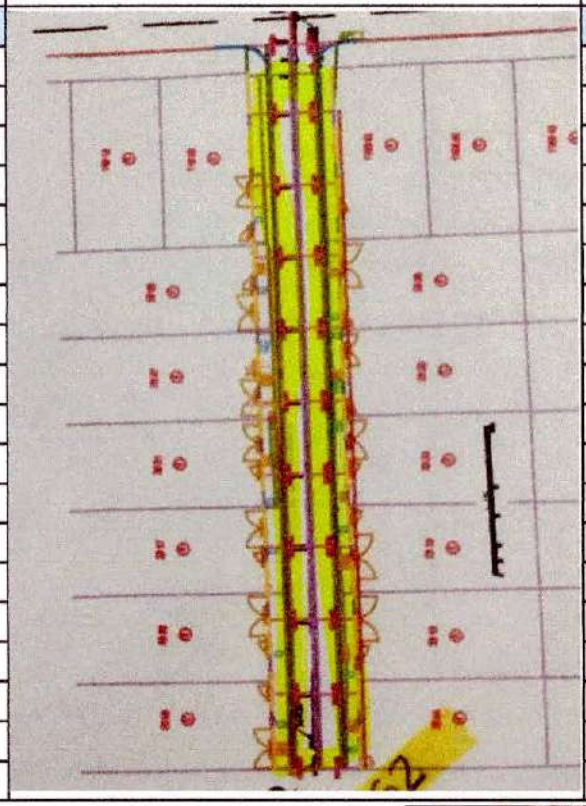
CODIGO	UNIDAD	ACTIVIDAD EJECUTADA
1,002	M3	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

UBICACIÓN	ESQUEMA	MEDIDAS				ELEMENTOS	CANTIDAD
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
CIV							
9000362		39,48	6,00	0,10		23,69	23,69

CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

CONTRATO 711-2024	INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS	DIRECCION:	LOCALIDAD DE FONTIBON
PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO DEL 2025	HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025		ACTA DE OBRA N° 2

CODIGO	UNIDAD	ACTIVIDAD EJECUTADA
1,001	M2	REPLANTEO GENERAL

UBICACIÓN	ESQUEMA	MEDIDAS				ELEMENTOS	CANTIDAD
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
CIV							
9000362		67,78	6,00			406,66	406,66
		total					406,66

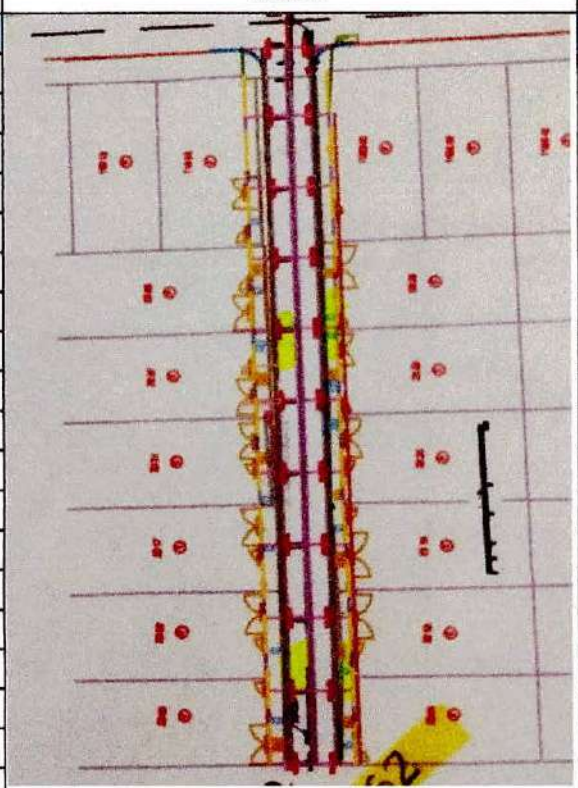


Nombre	Nombre	Nombre
VoBo Residente de obra	VoBo Director de obra	VoBo Interventoria

CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

CONTRATO 711-2024	INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS	DIRECCION:	LOCALIDAD DE FONTIBON
PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO DEL 2025	HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025		ACTA DE OBRA N° 2

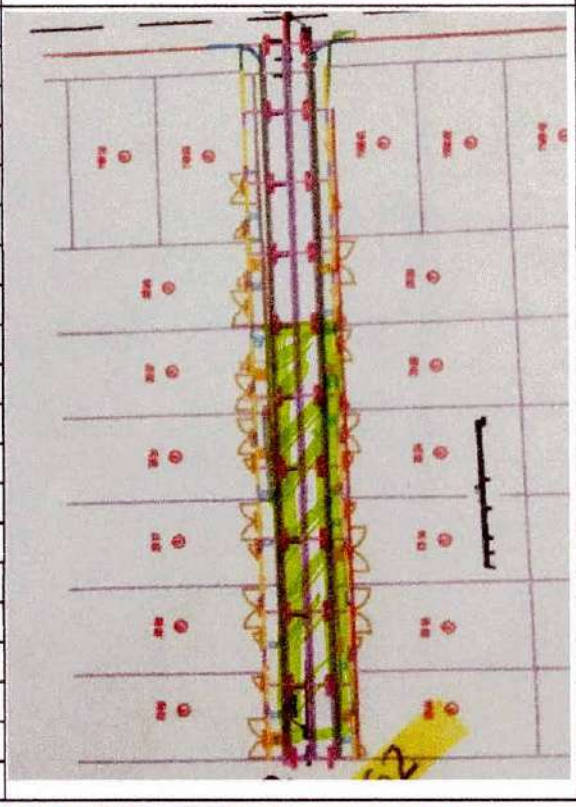
CODIGO	UNIDAD	ACTIVIDAD EJECUTADA
1,003	M3	DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)

UBICACIÓN	ESQUEMA	MEDIDAS				ELEMENTOS	CANTIDAD
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
CIV							
9000362						3,00	3,00

CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

CONTRATO 711-2024	INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS	DIRECCION:	LOCALIDAD DE FONTIBON
PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO DEL 2025	HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025		ACTA DE OBRA N° 2

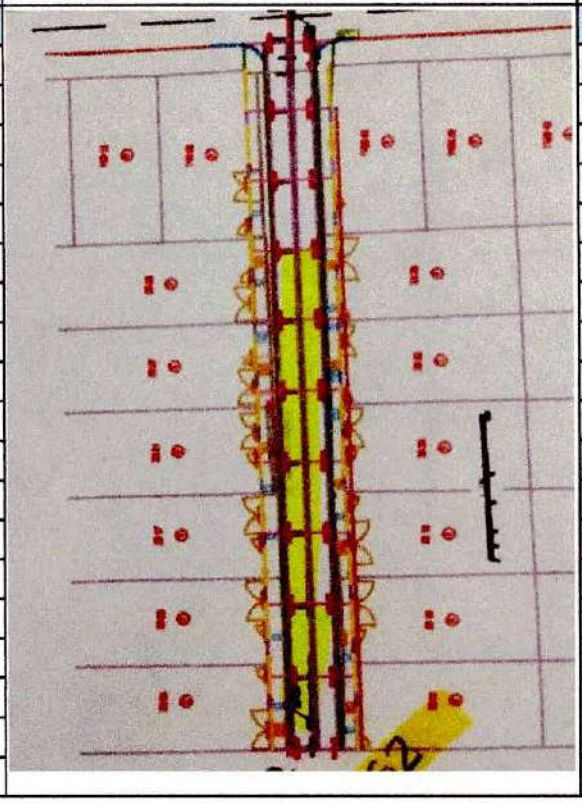
CODIGO	UNIDAD	ACTIVIDAD EJECUTADA
1,004	m3	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)

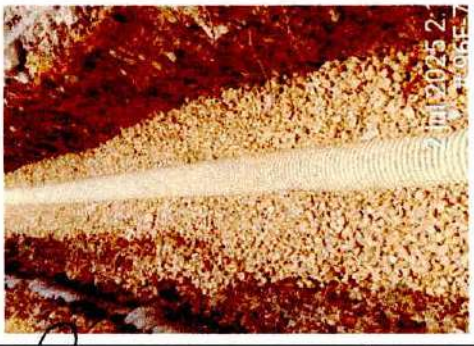
UBICACIÓN	ESQUEMA	MEDIDAS				ELEMENTOS	CANTIDAD
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
CIV							
9000362		86,75	5	1,8		1,00	780,78

CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

CONTRATO 711-2024	INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS	DIRECCION:	LOCALIDAD DE FONTIBON
PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO DEL 2025	HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025		ACTA DE OBRA N° 2

CODIGO	UNIDAD	ACTIVIDAD EJECUTADA
2,001	ML	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

UBICACIÓN	ESQUEMA	MEDIDAS				ELEMENTOS	CANTIDAD
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
CIV							
9000362		49,90					49,90
		TOTAL					49,90

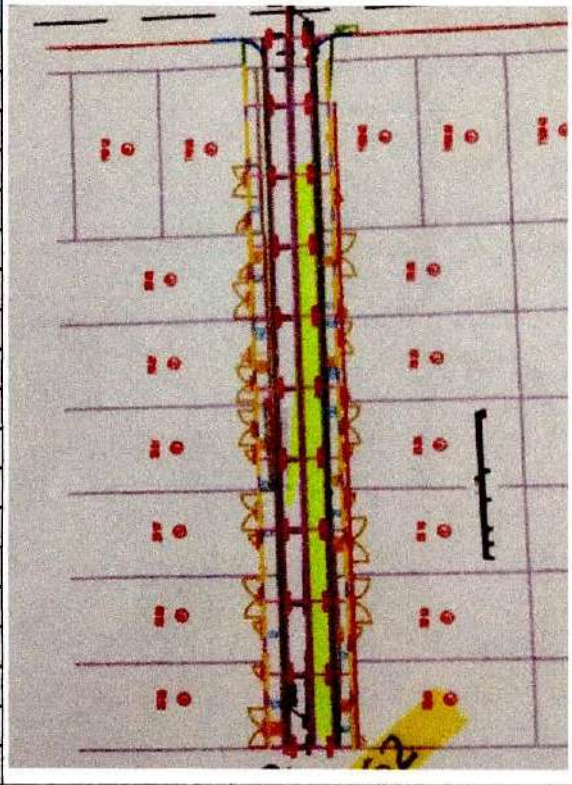


Nombre	Nombre	Nombre
VoBo Residente de obra	VoBo Director de obra	VoBo Interventoria

CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

CONTRATO 711-2024	INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS	DIRECCION:	LOCALIDAD DE FONTIBON
PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO DEL 2025	HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025		ACTA DE OBRA N° 2

CODIGO	UNIDAD	ACTIVIDAD EJECUTADA
2,009	M3	RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA 1/2" (SUMINISTRO, DISPOSICIÓN Y EXTENDIDO MANUAL)

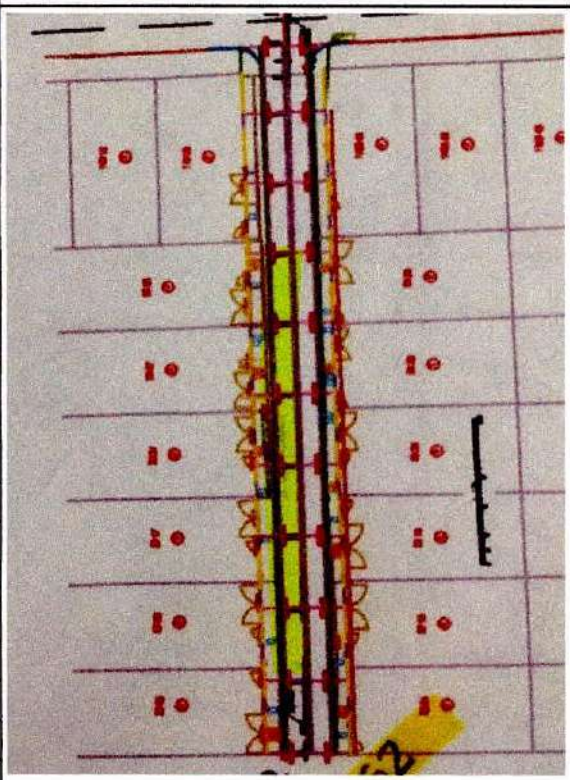
UBICACIÓN	ESQUEMA	MEDIDAS				ELEMENTOS	CANTIDAD
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
CIV							
9000362		55,4	1,2	1		66,48	66,48
					TOTAL		66,48

Nombre	Nombre	Nombre
VoBo Residente de obra	VoBo Director de obra	VoBo Interventoria

CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

CONTRATO 711-2024	INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS	DIRECCION:	LOCALIDAD DE FONTIBON
PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO DEL 2025	HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025		ACTA DE OBRA N° 2

CODIGO	UNIDAD	ACTIVIDAD EJECUTADA
2,012	M2	ENTIBADO TIPO ED1, DISCONTINUO EN MADERA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

UBICACIÓN	ESQUEMA	MEDIDAS				ELEMENTOS	CANTIDAD
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
CIV							
9000362		79,556	5		397,78		397,78
		TOTAL					397,78

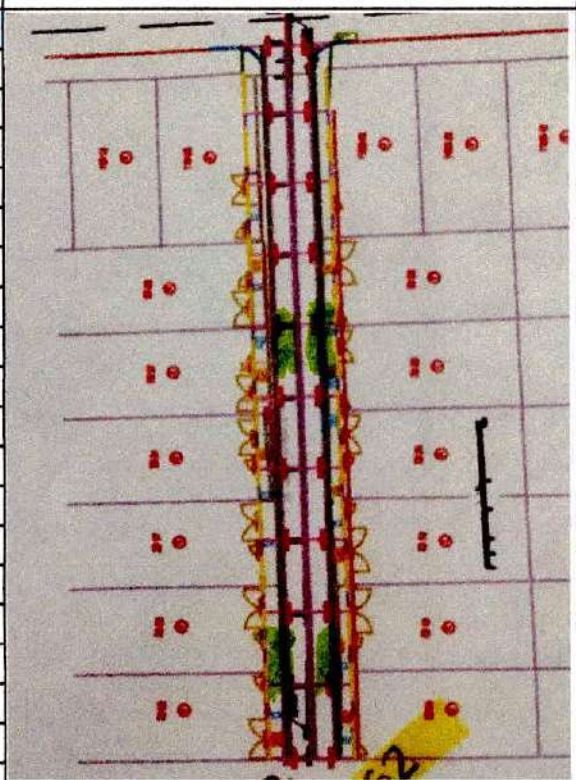
Nombre	Nombre	Nombre
VoBo Residente de obra	VoBo Director de obra	VoBo Interventoria

V

CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

CONTRATO 711-2024	INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS	DIRECCION:	LOCALIDAD DE FONTIBON
PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO DEL 2025	HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025		ACTA DE OBRA N° 2

CODIGO	UNIDAD	ACTIVIDAD EJECUTADA
2,015	UN	SUMIDERO LATERAL SL-100, H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA. INCL. SUMIN. FORM, REF. Y CONST. INCL. TAPA)

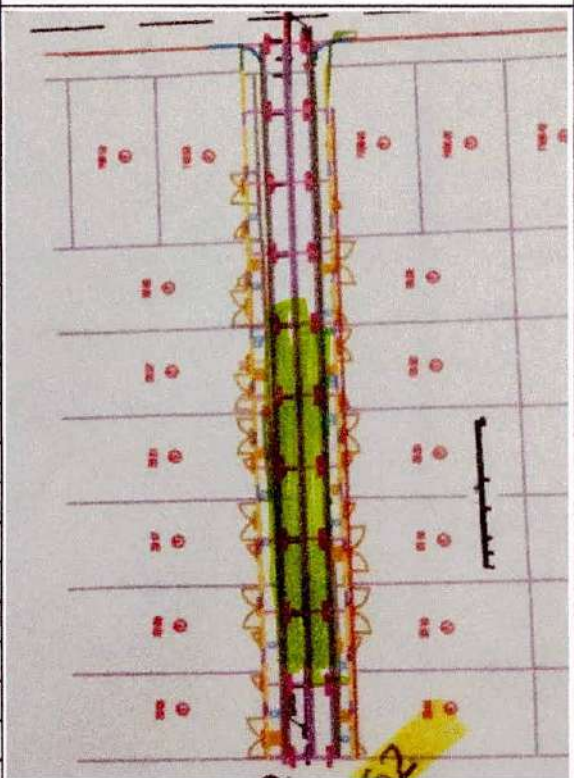
UBICACIÓN	ESQUEMA	MEDIDAS				ELEMENTOS	CANTIDAD
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
CIV							
9000362						4,00	4,00
		TOTAL					4

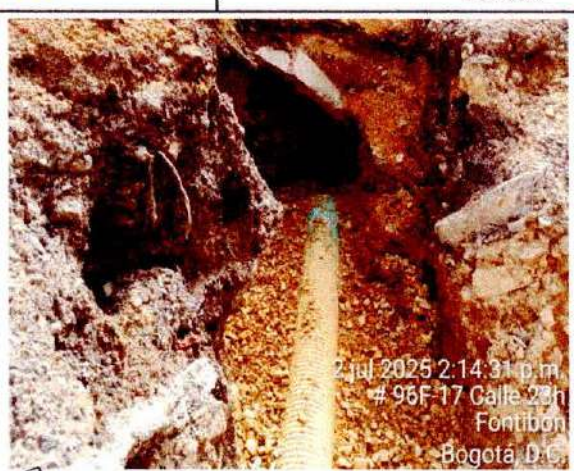
Nombre	Nombre	Nombre
VoBo Residente de obra	VoBo Director de obra	VoBo Interventoria

CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

CONTRATO 711-2024	INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS	DIRECCION:	LOCALIDAD DE FONTIBON
PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO DEL 2025	HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025		ACTA DE OBRA N° 2

CODIGO	UNIDAD	ACTIVIDAD EJECUTADA
2,017	ML	TUBERIA PVC SANITARIA D=6" TIPO U.S. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

UBICACIÓN	ESQUEMA	MEDIDAS				ELEMENTOS	CANTIDAD
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
CIV							
9000362		10,6				10,60	10,60
		TOTAL					10,60

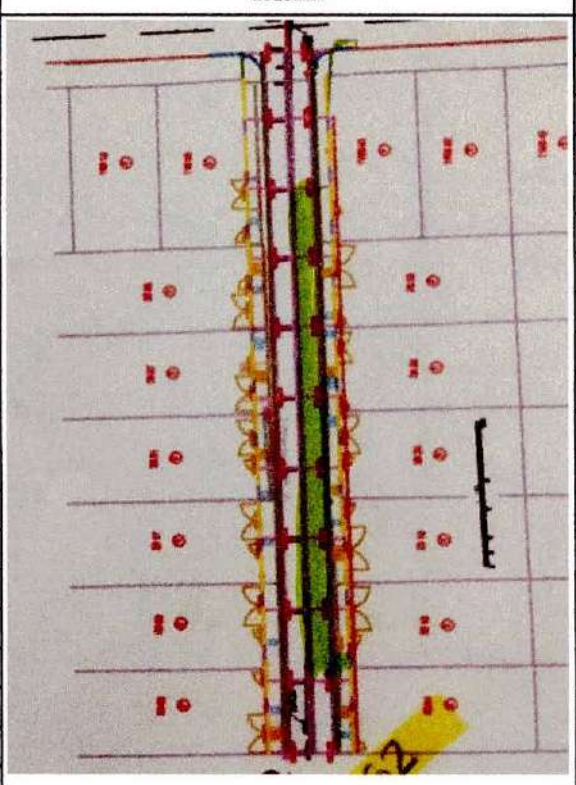


Nombre	Nombre	Nombre
VoBo Residente de obra	VoBo Director de obra	VoBo Interventoria

CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

CONTRATO 711-2024	INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS	DIRECCION:	LOCALIDAD DE FONTIBON
PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO DEL 2025	HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025		ACTA DE OBRA N° 2

CODIGO	UNIDAD	ACTIVIDAD EJECUTADA
2,018	M3	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 3.5M (INCLUYE CARGUE)

UBICACIÓN	ESQUEMA	MEDIDAS				ELEMENTOS	CANTIDAD
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
CIV							
9000362		178,35	1,2	1,9			410,2
				TOTAL			410,20

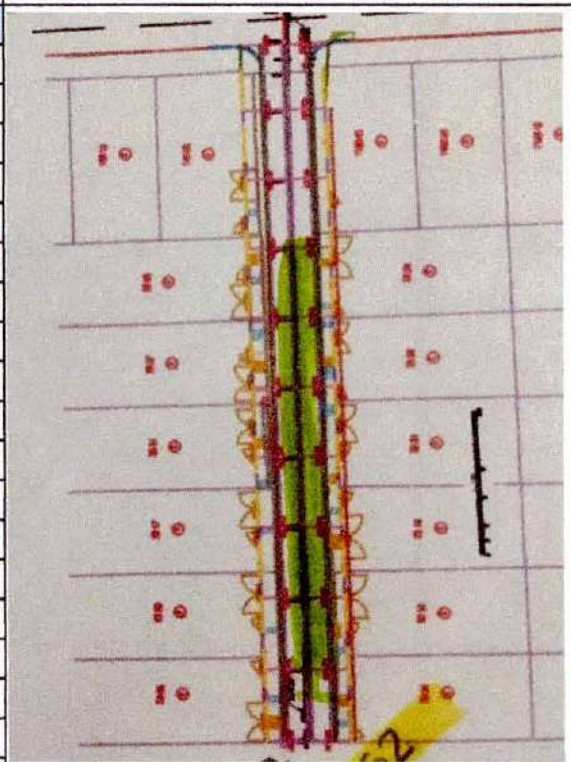


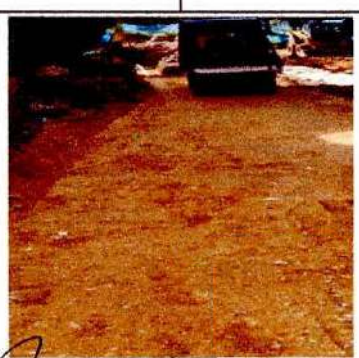
Nombre	Nombre	Nombre
VoBo Residente de obra	VoBo Director de obra	VoBo Interventoria

CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

CONTRATO 711-2024	INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS	DIRECCION:	LOCALIDAD DE FONTIBON
PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO DEL 2025	HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025		ACTA DE OBRA N° 2

CODIGO	UNIDAD	ACTIVIDAD EJECUTADA
2,019	M3	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACION EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM).

UBICACIÓN	ESQUEMA	MEDIDAS				ELEMENTOS	CANTIDAD
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
CIV							
9000362		102,35	1,2	1,9			235,41
		235,41					
		TOTAL					235,41

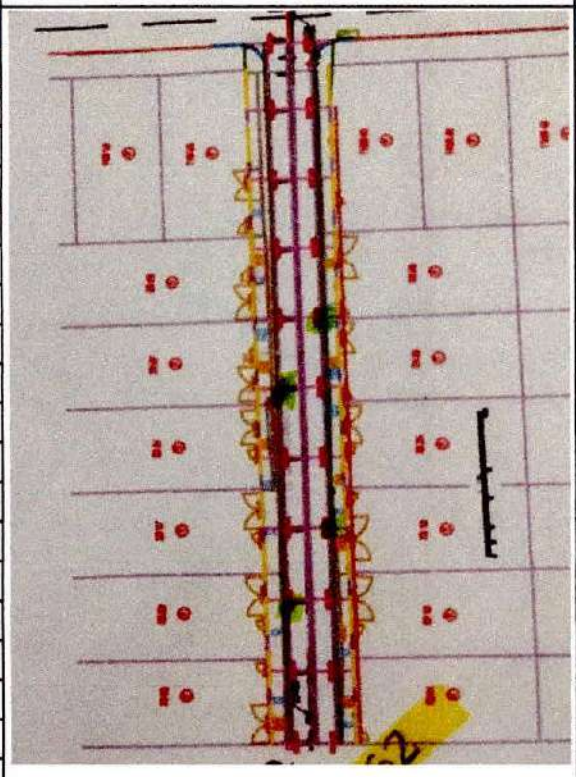


Nombre	Nombre	Nombre
VoBo Residente de obra	VoBo Director de obra	VoBo Interventoria

CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

CONTRATO 711-2024	INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS	DIRECCION:	LOCALIDAD DE FONTIBON
PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO DEL 2025	HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025		ACTA DE OBRA N° 2

CODIGO	UNIDAD	ACTIVIDAD EJECUTADA
2,020	UN	EMPATES DE TUBERIA EN PVC A PVC 6" LINEAL SEGUN NORMA NS-023. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACCESORIOS).

UBICACIÓN	ESQUEMA	MEDIDAS				ELEMENTOS	CANTIDAD
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
CIV							
9000362						14	24
				TOTAL			24,00

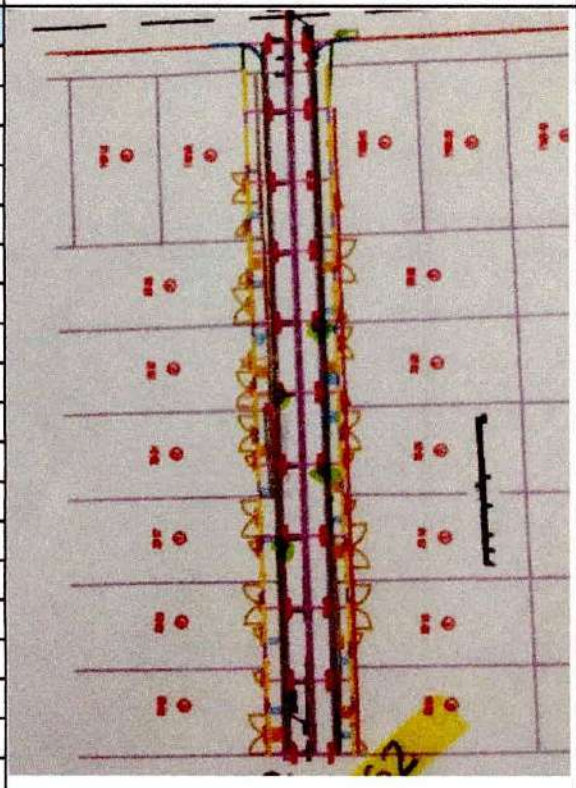


Nombre	Nombre	Nombre
VoBo Residente de obra	VoBo Director de obra	VoBo Interventoria

CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

CONTRATO 711-2024	INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS	DIRECCION:	LOCALIDAD DE FONTIBON
PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO DEL 2025	HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025		ACTA DE OBRA N° 2

CODIGO	UNIDAD	ACTIVIDAD EJECUTADA
2,015	UN	SUMIDERO LATERAL SL-100, H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA. INCL. SUMIN, FORM, REF. Y CONST. INCL. TAPA)

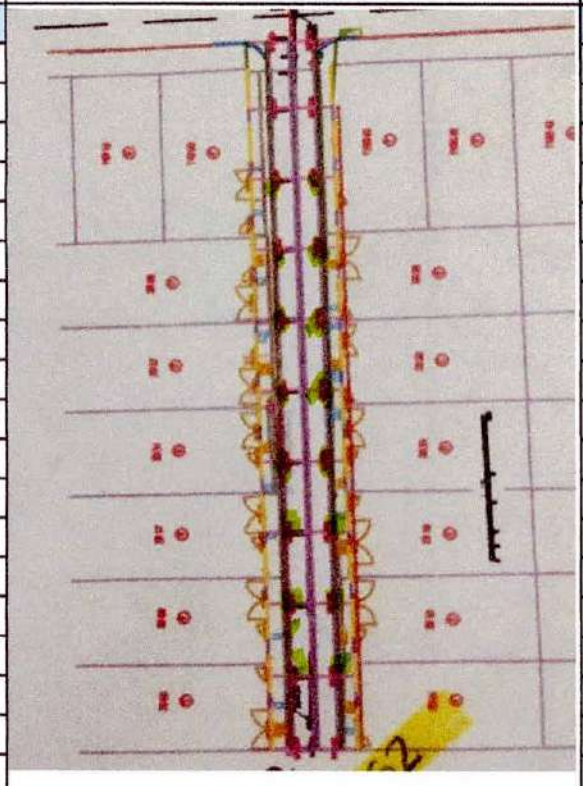
UBICACIÓN	ESQUEMA	MEDIDAS				ELEMENTOS	CANTIDAD
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
CIV							
9000362						4,00	4,00
					TOTAL		4

Nombre	Nombre	Nombre
VoBo Residente de obra	VoBo Director de obra	VoBo Interventoria

CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

CONTRATO 711-2024	INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS	DIRECCION:	LOCALIDAD DE FONTIBON
PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO DEL 2025	HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025		ACTA DE OBRA N° 2

CODIGO	UNIDAD	ACTIVIDAD EJECUTADA
2,024	UN	CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

UBICACIÓN	ESQUEMA	MEDIDAS				ELEMENTOS	CANTIDAD
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
CIV							
9000362						14	14
					TOTAL		14,00

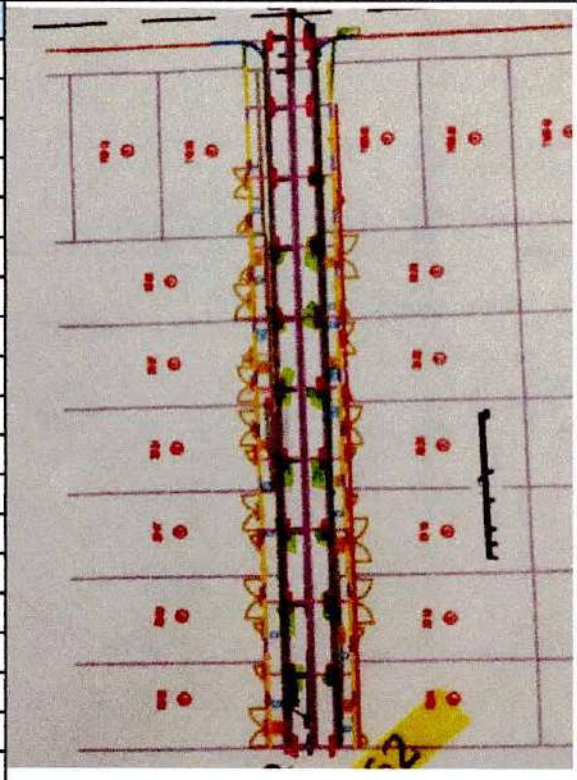


Nombre	Nombre	Nombre
VoBo Residente de obra	VoBo Director de obra	VoBo Interventoria

CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

CONTRATO 711-2024	INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS	DIRECCION:	LOCALIDAD DE FONTIBON
PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO DEL 2025	HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025		ACTA DE OBRA N° 2

CODIGO	UNIDAD	ACTIVIDAD EJECUTADA
2,034	UN	YEE PVC SANITARIA D=6"X 8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).

UBICACIÓN	ESQUEMA	MEDIDAS				ELEMENTOS	CANTIDAD
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
CIV							
9000362						14,00	14,00
		TOTAL					14,00

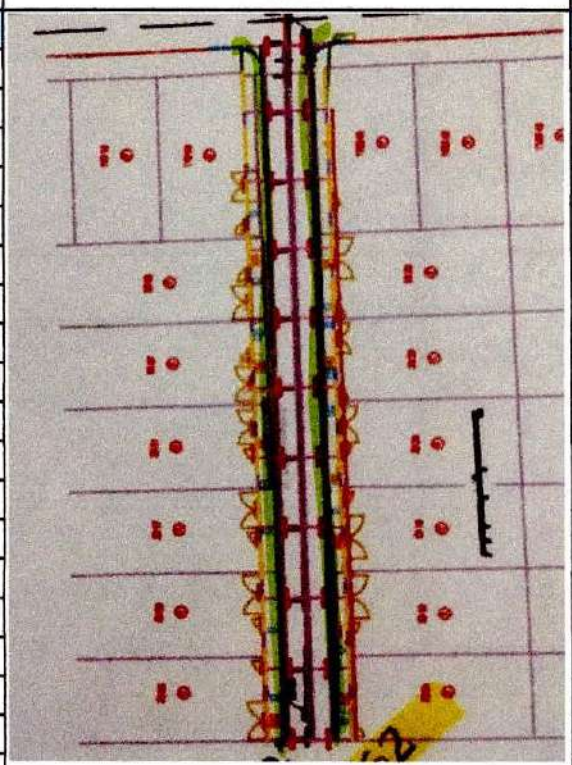


Nombre	Nombre	Nombre
VoBo Residente de obra	VoBo Director de obra	VoBo Interventoria

CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

CONTRATO 711-2024	INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS	DIRECCION:	LOCALIDAD DE FONTIBON
PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO DEL 2025	HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025		ACTA DE OBRA N° 2

CODIGO	UNIDAD	ACTIVIDAD EJECUTADA
4,007	ML	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)

UBICACIÓN	ESQUEMA	MEDIDAS				ELEMENTOS	CANTIDAD
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
CIV							
9000362		99,80				99,80	99,80
		TOTAL					99,80



Nombre	Nombre	Nombre
VoBo Residente de obra	VoBo Director de obra	VoBo Interventoria

ACTA CIV 9000204 MEMORIAS

CONSORCIO VIAS FONTIBON

CONTRATO DE OBRA VIAS-711-2024

CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO, DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 440 DE 2022, EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, BOGOTÁ D.C

INTERVENTORIA: ING INGENIERIA

CVI 9000204 CASANDRA

CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

COP-711-2024

							ACTA No. 1				18/06/2025
COD IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VR. UNITARIO (MÁS A.I.U.)	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VR. UNITARIO (OFERTADO)	VR. TOTAL (OFERTADO)	VR. UNITARIO (MÁS A.I.U.)	VR. TOTAL (MÁS A.I.U.)
		1. PRELIMINARES									
3007	1,001	REPLANTEO GENERAL	M2	721,76	$ 1.076,00	$ 776.613,76		$ 820	$ -	$ 1.076	$ -
3022	1,002	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M3	42,04	$ 68.594,00	$ 2.883.844,84	-	$ 52.266	$ -	$ 68.594	$ -
3155	1,003	DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UN	3,00	$ 224.713,00	$ 674.139,00	3	$ 171.223	$ 513.669	$ 224.713	$ 674.139,20
4613	1,004	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	1.360,70	$ 68.359,00	$ 93.016.315,63	143,03	$ 52.087	$ 7.449.899	$ 68.359	$ 9.777.248,02
4850	1,005	DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB, COMPRESOR Y CARGUE).	M3	20,79	$ 350.521,00	$ 7.288.372,41		$ 267.084	$ -	$ 350.521	$ -
		2. REDES HÚMEDAS (ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO)									
3045	2,001	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	54,53	$ 192.188,00	$ 10.480.011,64	-	$ 146.440	$ -	$ 192.188	$ -
3225	2,002	TUBERIA PVC D=3" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	92,00	$ 64.977,00	$ 5.977.884,00		$ 49.510	$ -	$ 64.977	$ -
3226	2,003	TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 82.410,00	$ -		$ 62.793	$ -	$ 82.410	$ -
3227	2,004	TUBERIA PVC D=6" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 164.949,00	$ -		$ 125.685	$ -	$ 164.949	$ -
3252	2,005	TEE HD EXTREMO LISO 6"X3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$ 629.010,00	$ -		$ 479.282	$ -	$ 629.010	$ -
3253	2,006	TEE HD EXTREMO LISO 6"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$ 686.981,00	$ -		$ 523.454	$ -	$ 686.981	$ -
3293	2,007	CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$ 364.692,00	$ -		$ 277.882	$ -	$ 364.692	$ -
3471	2,008	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST. ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.)	ML	9,20	$ 874.947,00	$ 8.049.512,40		$ 666.677	$ -	$ 874.947	$ -
3478	2,009	RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA 1/2" (SUMINISTRO, DISPOSICIÓN Y EXTENDIDO MANUAL)	M3	117,99	$ 183.636,00	$ 21.667.624,14	67,78	$ 139.924	$ 9.483.898,30	$ 183.636	$ 12.446.668,13
3708	2,010	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	1.144,49	$ 6.742,00	$ 7.716.161,58		$ 5.137	$ -	$ 6.742	$ -
3723	2,011	LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN	4,00	$ 119.612,00	$ 478.448,00	4	$ 91.140	$ 364.560,00	$ 119.612	$ 478.448,54
3776	2,012	ENTIBADO TIPO ED1, DISCONTINUO EN MADERA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	706,00	$ 56.004,00	$ 39.538.921,62	0	$ 42.673	$ -	$ 56.004	$ -
3878	2,013	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)	UN	4,00	$ 2.278.900,00	$ 9.115.600,00	3	$ 1.736.437	$ 5.209.311,00	$ 2.278.900	$ 6.836.699,76
3879	2,014	PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCL. SUMIN, INST.)	UN	4,00	$ 1.367.165,00	$ 5.468.660,00	3	$ 1.041.729	$ 3.125.187,00	$ 1.367.165	$ 4.101.495,42
3882	2,015	SUMIDERO LATERAL SL-100, H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA. INCL. SUMIN, FORM, REF. Y CONST. INCL. TAPA)	UN	4,00	$ 3.576.707,00	$ 14.306.828,00	6	$ 2.725.318	$ 16.351.908,00	$ 3.576.707	$ 21.460.244,06
3919	2,016	TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=24" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 819.239,00	$ -		$ 624.230	$ -	$ 819.239	$ -
4144	2,017	TUBERIA PVC SANITARIA D=6" TIPO U.S. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 103.161,00	$ -	70,44	$ 78.605	$ 5.536.936,20	$ 103.161	$ 7.266.675,07
4262	2,018	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 3.5M (INCLUYE CARGUE)	M3	728,04	$ 6.693,00	$ 4.872.774,12	345,00	$ 5.100	$ 1.759.500,00	$ 6.693	$ 2.309.167,80
4792	2,019	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM).	M3	417,81	$ 116.684,00	$ 48.752.261,53	262,98229	$ 88.909	$ 23.381.487,00	$ 116.684	$ 30.685.863,54
4839	2,020	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 6" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACCESORIOS).	UN		$ 718.716,00	$ -	24	$ 547.635	$ 13.143.240,00	$ 718.716	$ 17.249.188,18
4840	2,021	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 3" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$ 222.448,00	$ -		$ 169.497	$ -	$ 222.448	$ -
4842	2,022	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A AC 4" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACCESORIOS).	UN		$ 504.127,00	$ -		$ 384.126	$ -	$ 504.127	$ -
4843	2,023	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A AC 3" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACCESORIOS).	UN		$ 374.842,00	$ -		$ 285.616	$ -	$ 374.842	$ -
4878	2,024	CONEXIONES IOT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	24,00	$ 158.209,00	$ 3.797.016,00	24	$ 120.549	$ 2.893.176,00	$ 158.209	$ 3.797.004,18
4984	2,025	RELOCALIZACIÓN DE MEDIDOR DE ACUEDUCTO D= 1/2" (INCLUYE 1.0M TUBERÍA GALVANIZADA D= 1/2", SOLDADURA, CINTA DE TEFLON, Y REPOSICIÓN DE CAJILLA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA CON TAPA, NO INCLUYE MEDIDOR.).	UN	41,00	$ 474.405,00	$ 19.450.605,00		$ 361.479	$ -	$ 474.405	$ -
4986	2,026	CONCRETO GRAVA COMÚN 4000 PSI (280 KG/CM2) PARA CÁMARAS ESPECIALES DE INTERCONEXIÓN DE ALCANTARILLADO (PREMEZCLADO, INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y COLOCACIÓN. NO INCLUYE REFUERZO NI CURADO).	M3	14,31	$ 1.174.615,00	$ 16.806.721,11		$ 895.013	$ -	$ 1.174.615	$ -
5015	2,027	CAJA DE INSPECCION 0.80X0.8M. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (H=0.6M, INCLUYE MARCO Y TAPA, NO INCLUYE BASE Y CAÑUELA).	UN	24,00	$ 733.507,00	$ 17.604.168,00	24,00	$ 558.905	$ 13.413.720,00	$ 733.507	$ 17.604.166,13

5171	2,028	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 3" A 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF, REPOSICIÓN DE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR, REGISTROS Y ACCESORIOS. LONGITUD PROMEDIO =6.5MT).	UN	26,00	$ 622.436,00	$ 16.183.336,00	0,00	$ 474.273	$ -	$ 622.436	$ -			
5173	2,029	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 6" A 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF REPOSICIÓN DE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR, REGISTROS Y ACCESORIOS. LONGITUD PROMEDIO=6.5 MT).	UN		$ 463.848,00	$ -		$ 353.435	$ -	$ 463.848	$ -			
5467	2,030	TUBERIA PVC SANITARIA D=8" TIPO U.S. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	ML	74,43	$ 177.325,00	$ 13.198.299,75	-	$ 135.115	$ -	$ 177.325	$ -			
6538	2,031	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=14" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 282.308,00	$ -		$ 215.108	$ -	$ 282.308	$ -			
7830	2,032	CONEXIONES KIT SILLA YEE 250 X 200 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	26,00	$ 299.865,00	$ 7.796.490,00		$ 228.486	$ -	$ 299.865	$ -			
7831	2,033	CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 X 200 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 409.099,00	$ 409.099,00		$ 311.718	$ -	$ 409.099	$ -			
8390	2,034	YEE PVC SANITARIA D=6"X 4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN		$ 388.787,00	$ -	24	$ 296.241	$ 7.109.784,00	$ 388.787	$ 9.330.890,52			
8646	2,035	EMPATE DE TUBERÍA EN PVC A PVC 6"X4" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023. INCLUYE REDUCCIÓN U.M PVC 6"X4" (Suministro e instalación)	UN		$ 406.982,00	$ -		$ 310.105	$ -	$ 406.982	$ -			
8792	2,036	TUBERÍA PVC SANITARIA D=10" TIPO U.S. (Incluye suministro e instalación)	ML		$ 265.472,00	$ -	87	$ 202.280	$ 17.598.360,00	$ 265.472	$ 23.096.087,66			
9109	2,037	CONCRETO 2000 PSI GRAVA COMÚN 14 MPA (140 Kg/Cm2) PARA SOLADOS (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN).	M3	7,16	$ 740.468,00	$ 5.304.810,61		$ 564.209	$ -	$ 740.468	$ -			
		3.PAVIMENTOS												
3454	3,001	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL. NO INCLUYE MATERIAL DE SELLO)	M3	126,122	$ 140.668,00	$ 17.741.331,30		$ 107.184	$ -	$ 140.668	$ -			
3710	3,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	228,375	$ 6.693,00	$ 1.528.513,88		$ 5.100	$ -	$ 6.693	$ -			
4015	3,003	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	392,967	$ 15.867,00	$ 6.235.208,45		$ 12.090	$ -	$ 15.867	$ -			
4159	3,004	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	60,777	$ 187.058,00	$ 11.368.861,48	121,228	$ 142.531	$ 17.285.874,62	$ 187.058	$ 22.685.981,85			
4394	3,005	ADOQUIN DE CONCRETO TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	M2		$ 136.869,00	$ -		$ 104.289	$ -	$ 136.869	$ -			
8616	3,006	BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) o (BGB_BG25) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3		$ 234.594,00	$ -		$ 178.752	$ -	$ 234.594	$ -			
		4. ESPACIO PUBLICO												
3394	4,001	LOSA DE CONCRETO MR41 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS)	M3	12,74	$ 964.195,00	$ 12.279.456,52		$ 734.681	$ -	$ 964.195	$ -			
3454	4,002	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL. NO INCLUYE MATERIAL DE SELLO)	M3	87,02	$ 140.668,00	$ 12.240.902,41	87,020	$ 107.184	$ 9.327.131	$ 140.668	$ 12.240.927			
3464	4,003	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	M3	234,25	$ 52.093,00	$ 12.202.584,07	234,246	$ 39.593	$ 9.297.932	$ 52.093	$ 12.202.606			
3548	4,004	BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI, HECHO EN OBRA)	UN	42,34	$ 261.489,00	$ 11.072.296,88		$ 199.245	$ -	$ 261.489	$ -			
3745	4,005	PISO EN ADOQUIN DE CONCRETO A25 20X10X6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 3CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	M2	92,46	$ 120.397,00	$ 11.131.741,44		$ 91.738	$ -	$ 120.397	$ -			
4015	4,006	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	377,36	$ 15.867,00	$ 5.987.593,73	377,36	$ 12.090	$ 4.562.300	$ 15.867	$ 5.987.562			
4054	4,007	SARDINEL TIPO A1D (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML	204,78	$ 97.601,00	$ 19.986.898,98	204,78	$ 74.868	$ 15.328.825	$ 97.601	$ 19.986.310			
4159	4,008	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	65,26	$ 187.058,00	$ 12.207.365,27	65,26	$ 142.531	$ 9.301.543	$ 187.058	$ 12.207.345			
4232	4,009	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15M. D=5MM. 5MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	KG	103,31	$ 8.846,00	$ 913.842,52		$ 6.740	$ -	$ 8.846	$ -			
4909	4,010	RAMPA VEHICULAR FUNDIDA EN EL SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (GRAVA COMUN) SUM. CONSTR. E INSTALACIÓN. INCLUYE ACABADO EN ADOQUIN DE ARCILLA TIPO TRÁFICO PESADO O SIMILAR, BASE DE 4CM EN MORTERO DE 2000 PSI.	M2	71,29	$ 223.877,00	$ 15.960.800,98		$ 170.586	$ -	$ 223.877	$ -			
5047	4,011	ADOQUIN EN CONCRETO COLOR OCRE A25 (20X10X6cm) (Suministro e instalación. Incluye base 4cm mortero 2000 PSI y arena de sello)	M2	106,75	$ 148.031,00	$ 15.802.352,50		$ 112.794	$ -	$ 148.031	$ -			
6475	4,012	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE PEGA 2000 PSI Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN).	ML	39,23	$ 89.357,00	$ 3.505.193,67	39,23	$ 68.087	$ 2.670.839	$ 89.357	$ 3.505.209			
8166	4,013	CENEFA EN LOSETA PREFABRICADA A58 GUIA (20X20X6) CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO)	M2	6,98	$ 132.408,00	$ 924.172,96	6,98	$ 100.890	$ 704.186	$ 132.408	$ 924.173			
8169	4,014	CENEFA EN LOSETA PREFABRICADA A57 TÁCTIL ALERTA (20X20X6) CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO)	M2	46,44	$ 132.408,00	$ 6.148.538,70		$ 100.890	$ -	$ 132.408	$ -			
8225	4,015	CONTENEDOR DE RAICES (1.40X1.80X1.20M. INC. SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN Y FILTRO EN GRAVILLA. NO INC. TIERRA)	UN		$ 2.103.754,00	$ -		$ 1.602.982	$ -	$ 2.103.754	$ -			
8464	4,016	BORDILLO EN CONCRETO GRAVA COMÚN 1" 2000 PSI, FUNDIDO EN SITIO, A LA VISTA, DE 10CM X 35CM. REFUERZO SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, SIMILAR O EQUIVALENTE. (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO E INSTALACIÓN).	ML	147,90	$ 68.430,00	$ 10.120.759,81	147,90	$ 52.141	$ 7.711.626	$ 68.430	$ 10.120.737			
		5. DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN												

3.431	5,001	SEÑAL VERTICAL GRUPO I (75X75CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	6,00	$ 687.759,00	$ 4.126.554,00
4.248	5,002	DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICRODESFERAS)	M2	32,92	$ 183.979,00	$ 6.056.534,13
7.959	5,003	DEMARCACIÓN LINEA CONTINUA BLANCA O AMARILLA A=0.12 M (E=2.3 MM, TERMOPLÁSTICA, INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS)	ML	190,49	$ 22.079,00	$ 4.205.916,46
		6. REDES SECAS				
4342	6,001	CANALIZACION VIA PUBLICA DOS (2) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø6" EPM NORMA RS1-002. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENOS EN ARENA DE PEÑA Y EN SUB-BASE GRANULAR TIPO B-400 Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS. NO INCLUYE: REMOLICIÓN NI RECONSTRUCCIÓN DE ANDEN O PAVIMENTO, ENTIBADOS.	ML	159,42	$ 384.874,00	$ 61.356.583,85
		SUBTOTAL OBRAS INICIALES (INCLUYE A.I.U.) (A):				$ 644.717.942,11

	PORCENTAJE	PESOS
COMPONENTE AMBIENTAL Y SST OBRAS INICIALES Y ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS (INCLUIDO A.I.U. COMPONENTE) (B)	7,0283%	
PLAN DE MANEJO DE TRASITO OBRAS ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS (INCLUIDO A.I.U. COMPONENTE) (C)	1,6791%	
COMPONENTE SOCIAL OBRAS INICIALES Y COMPLEMENTARIAS (INCLUIDO A.I.U. COMPONENTE) (D)	2,3030%	

TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA (CON ESTE VALOR SE EVALUARAN LAS OFERTAS ECONÓMICAS DE ACUERDO A LAS	$ 644.717.942,11
PROVISIÓN PARA OBRAS ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS (F):	$ 599.411.381,00
VALOR TOTAL CONTRATO PROPUESTO A EJECUTAR (E) + F):	$ 8.045.657.306,00

AIU % PROPUESTO	PORCENTAJE	FIRMA DEL PROPONENTE
Administración (% de los CD)	25,24%	
Imprevistos (%de los CD)	1,00%	
Utilidad (%de los CD)	5,00%	
AIU %	31,24%	

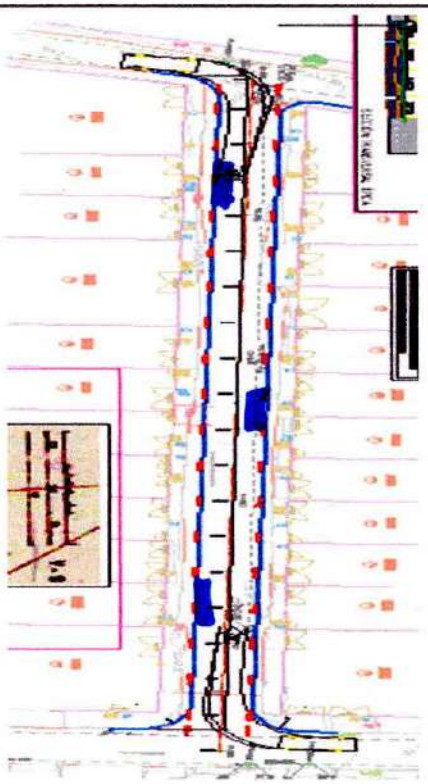
	$ 524.047	$ -	$ 687.759	$ -	
	$ 140.185	$ -	$ 183.979	$ -	
	$ 16.823	$ -	$ 22.079	$ -	
	$ 293.260	$ -	$ 384.874	$ -	
		203.424.890			266.974.826
Adminis	25,24%	51.344.442			
imprevisto	1,00%	2.034.249			
utilidad	4,20%	8.547.264			
		265.350.846			266.974.826
IVA	19%	1.623.980			
		266.974.826			266.974.826
componente B	7,0283%	14.297.312	componente B		14.297.312
componente C	1,6791%	3.415.707	componente C		3.415.707
componente D	2,3030%	4.684.875	componente D		4.684.875
		289.372.720			289.372.720

Nombre	Nombre	Nombre Alejandro Galindo
VoBo Residente de obra	VoBo Director de obra	VoBo Interventoria

CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

CONTRATO 711-2024	INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS	DIRECCION:	LOCALIDAD DE FONTIBON
PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO DEL 2025	HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025		ACTA DE OBRA N° 2

CODIGO	UNIDAD	ACTIVIDAD EJECUTADA
3155	UNIDAD	DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)

UBICACIÓN	ESQUEMA	MEDIDAS				ELEMENTOS	CANTIDAD
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
CIV							
9000204						3,00	3,00
		total					3,00

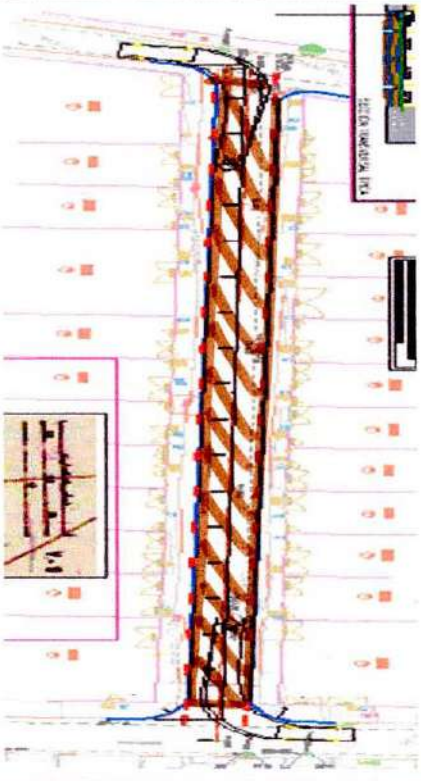


Nombre	Nombre	Nombre
VoBo Residente de obra	VoBo Director de obra	VoBo Interventoria

CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

CONTRATO 711-2024	INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS	DIRECCION:	LOCALIDAD DE FONTIBON
PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO DEL 2025	HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025		ACTA DE OBRA N° 2

CODIGO	UNIDAD	ACTIVIDAD EJECUTADA
4613	m3	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)

UBICACIÓN	ESQUEMA	MEDIDAS				ELEMENTOS	CANTIDAD
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
CIV							
9000204		87,00	1,2	1,37		1,00	143,03
					total		143,03





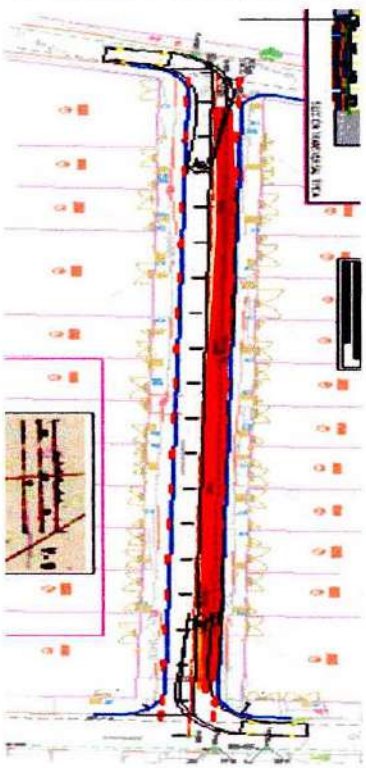


Nombre	Nombre	Nombre
VoBo Residente de obra	VoBo Director de obra	VoBo Interventoria

CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

CONTRATO 711-2024	INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS	DIRECCION:	LOCALIDAD DE FONTIBON
PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO DEL 2025	HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025		ACTA DE OBRA N° 2

CODIGO	UNIDAD	ACTIVIDAD EJECUTADA
2,009	m3	RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA 1/2" (SUMINISTRO, DISPOSICIÓN Y EXTENDIDO MANUAL)

UBICACIÓN	ESQUEMA	MEDIDAS				ELEMENTOS	CANTIDAD
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
CIV							
9000204		248,73	1,09	0,25			67,778925
						TOTAL	67,78

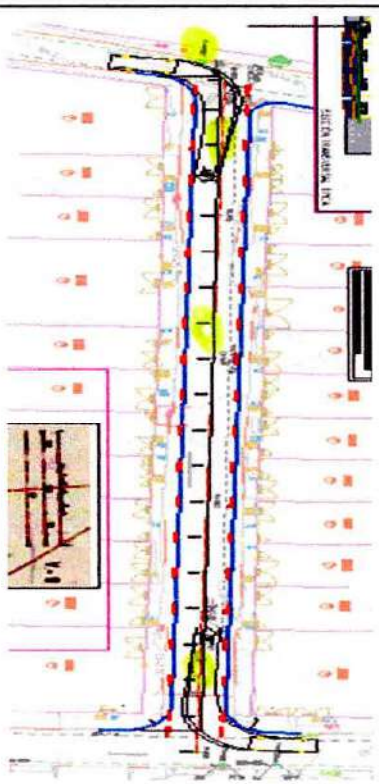


Nombre	Nombre	Nombre
VoBo Residente de obra	VoBo Director de obra	VoBo Interventoria

CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

CONTRATO 711-2024	INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS	DIRECCION:	LOCALIDAD DE FONTIBON
PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO DEL 2025	HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025		ACTA DE OBRA N° 2

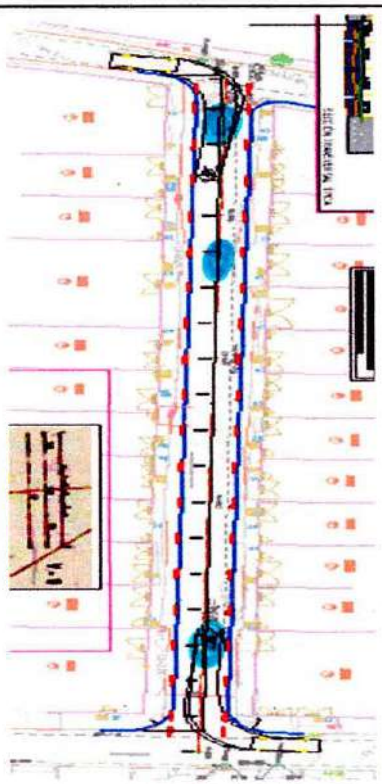
CODIGO	UNIDAD	ACTIVIDAD EJECUTADA
2,011	UN	LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)

UBICACIÓN	ESQUEMA	MEDIDAS				ELEMENTOS	CANTIDAD
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
CIV							
9000204						4,00	4,00

CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

CONTRATO 711-2024	INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS	DIRECCION:	LOCALIDAD DE FONTIBON
PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO DEL 2025	HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025		ACTA DE OBRA N° 2

CODIGO	UNIDAD	ACTIVIDAD EJECUTADA
2,013	UN	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)

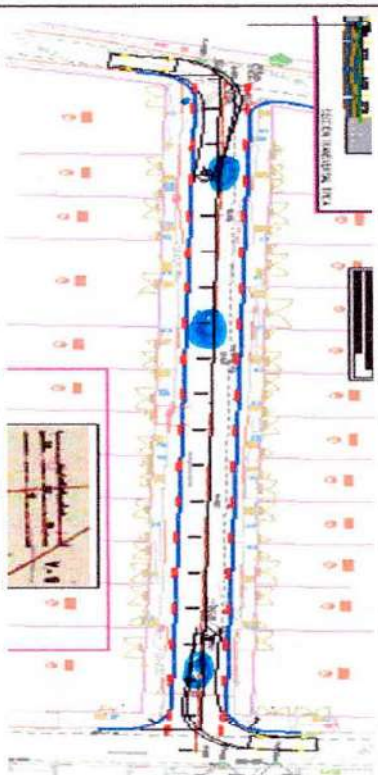
UBICACIÓN	ESQUEMA	MEDIDAS				ELEMENTOS	CANTIDAD
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
CIV							
9000204						3,00	3,00
		TOTAL					3

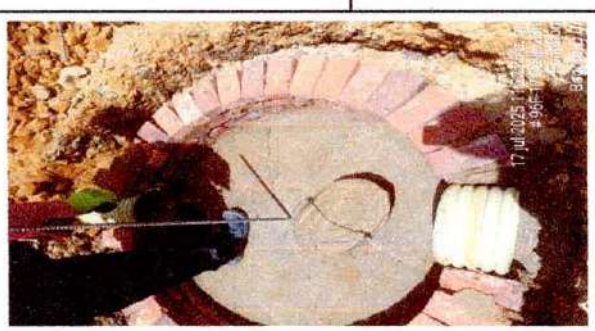
Nombre	Nombre	Nombre
VoBo Residente de obra	VoBo Director de obra	VoBo Interventoria

CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

CONTRATO 711-2024	INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS	DIRECCION:	LOCALIDAD DE FONTIBON
PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO DEL 2025	HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025		ACTA DE OBRA N° 2

CODIGO	UNIDAD	ACTIVIDAD EJECUTADA
2,014	UN	PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCL. SUMIN, INST.)

UBICACIÓN	ESQUEMA	MEDIDAS				ELEMENTOS	CANTIDAD
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
CIV							
9000204						3,00	3,00
		TOTAL					3

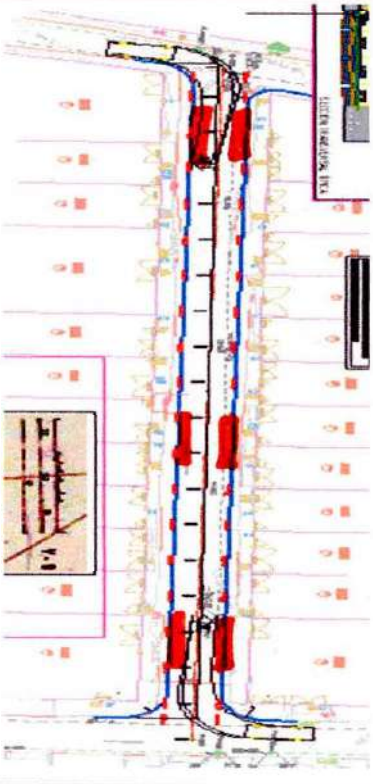


Nombre	Nombre	Nombre
VoBo Residente de obra	VoBo Director de obra	VoBo Interventoria

CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

CONTRATO 711-2024	INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS	DIRECCION:	LOCALIDAD DE FONTIBON
PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO DEL 2025	HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025		ACTA DE OBRA N° 2

CODIGO	UNIDAD	ACTIVIDAD EJECUTADA
2,015	UN	SUMIDERO LATERAL SL-100, H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA. INCL. SUMIN, FORM, REF. Y CONST. INCL. TAPA)

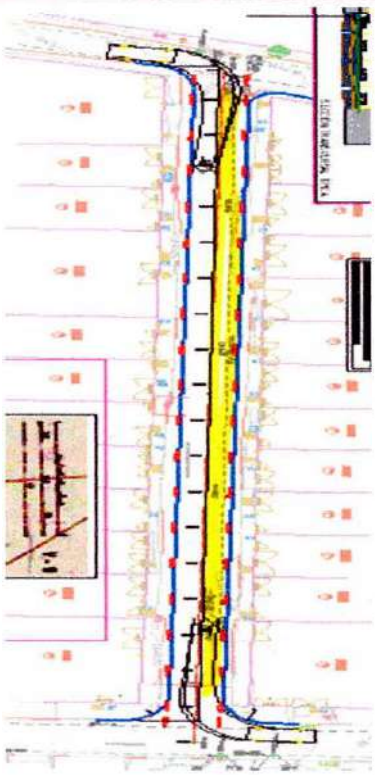
UBICACIÓN	ESQUEMA	MEDIDAS				ELEMENTOS	CANTIDAD
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
CIV							
9000204						6,00	6,00
					TOTAL		6

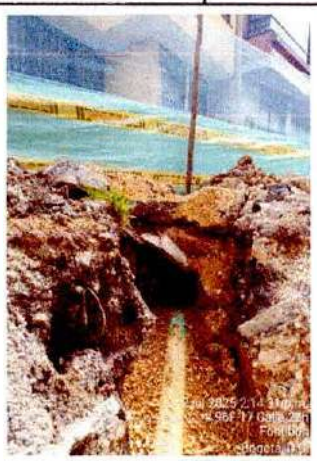
Nombre	Nombre	Nombre
VoBo Residente de obra	VoBo Director de obra	VoBo Interventoria

CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

CONTRATO 711-2024	INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS	DIRECCION:	LOCALIDAD DE FONTIBON
PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO DEL 2025	HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025		ACTA DE OBRA N° 2

CODIGO	UNIDAD	ACTIVIDAD EJECUTADA
2,017	ML	TUBERIA PVC SANITARIA D=6" TIPO U.S. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

UBICACIÓN	ESQUEMA	MEDIDAS				ELEMENTOS	CANTIDAD
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
CIV							
9000204		42				42,00	42,00
		28,44				28,44	28,44
		TOTAL					70,44

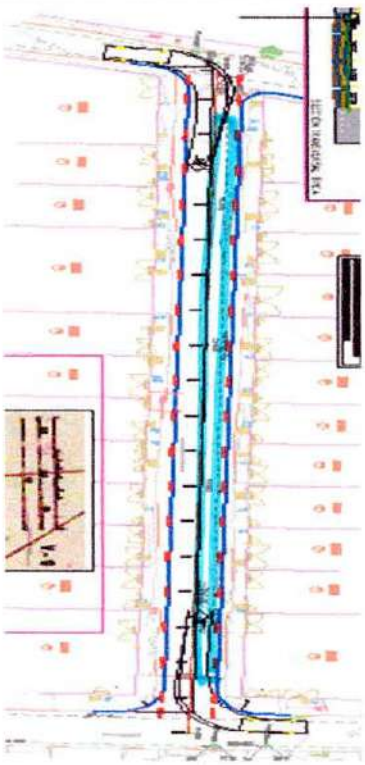


Nombre	Nombre	Nombre
VoBo Residente de obra	VoBo Director de obra	VoBo Interventoria

CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

CONTRATO 711-2024	INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS	DIRECCION:	LOCALIDAD DE FONTIBON
PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO DEL 2025	HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025		ACTA DE OBRA N° 2

CODIGO	UNIDAD	ACTIVIDAD EJECUTADA
2,018	M3	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 3.5M (INCLUYE CARGUE)

UBICACIÓN	ESQUEMA	MEDIDAS				ELEMENTOS	CANTIDAD
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
CIV							
9000204		150,00	1,2	1,9			345
						TOTAL	345,00

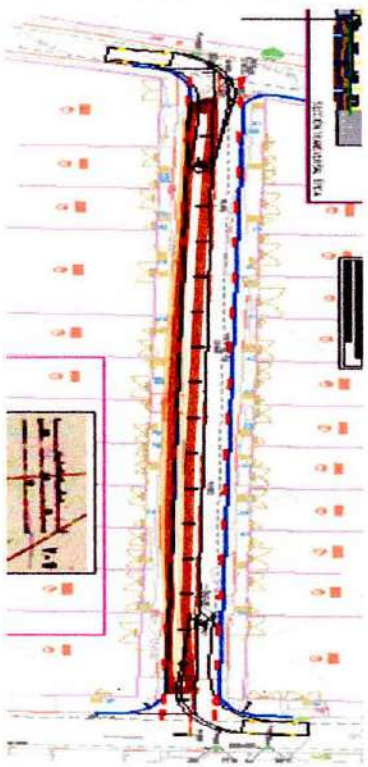


Nombre	Nombre	Nombre
VoBo Residente de obra	VoBo Director de obra	VoBo Interventoria

CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

CONTRATO 711-2024	INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS	DIRECCION:	LOCALIDAD DE FONTIBON
PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO DEL 2025	HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025		ACTA DE OBRA N° 2

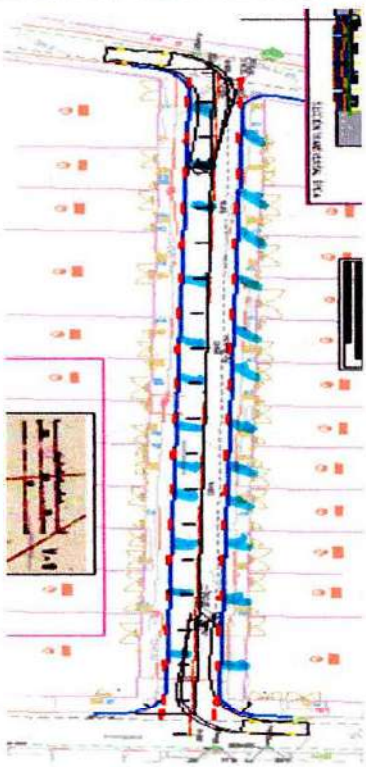
CODIGO	UNIDAD	ACTIVIDAD EJECUTADA
2,019	M3	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACION EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM).

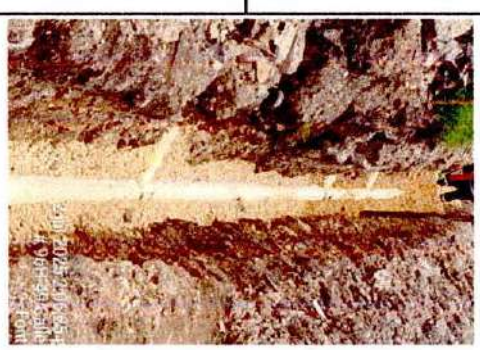
UBICACIÓN	ESQUEMA	MEDIDAS				ELEMENTOS	CANTIDAD
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
CIV							
9000204		248,73	1,09	0,97			262,982229

CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

CONTRATO 711-2024	INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS	DIRECCION:	LOCALIDAD DE FONTIBON
PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO DEL 2025	HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025		ACTA DE OBRA N° 2

CODIGO	UNIDAD	ACTIVIDAD EJECUTADA
2,020	UN	EMPATES DE TUBERIA EN PVC A PVC 6" LINEAL SEGUN NORMA NS-023. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACCESORIOS).

UBICACIÓN	ESQUEMA	MEDIDAS				ELEMENTOS	CANTIDAD
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
CIV							
9000204						24	24
		TOTAL					24,00

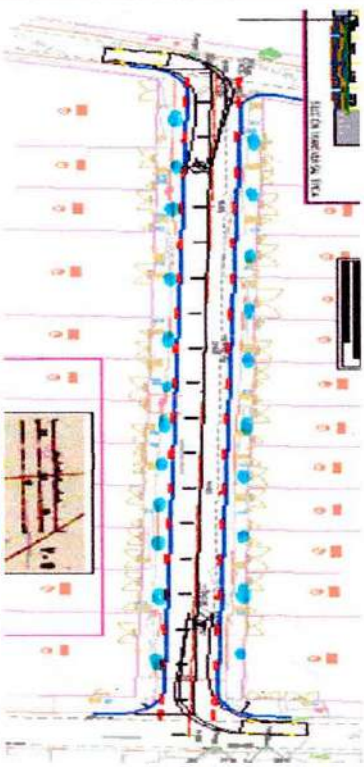


Nombre	Nombre	Nombre
VoBo Residente de obra	VoBo Director de obra	VoBo Interventoria

CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

CONTRATO 711-2024	INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS	DIRECCION:	LOCALIDAD DE FONTIBON
PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO DEL 2025	HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025		ACTA DE OBRA N° 2

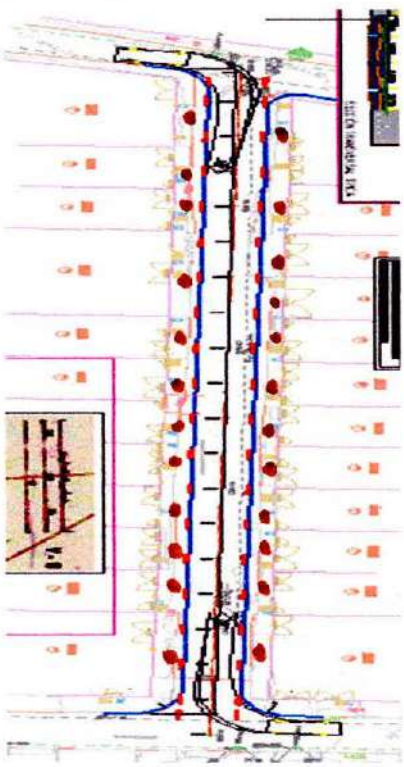
CODIGO	UNIDAD	ACTIVIDAD EJECUTADA
2,024	UN	CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

UBICACIÓN	ESQUEMA	MEDIDAS				ELEMENTOS	CANTIDAD
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
CIV							
9000204						24	24

CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

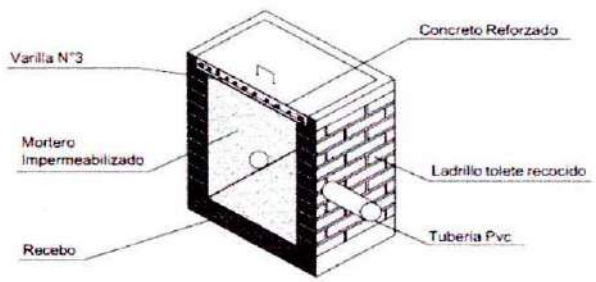
CONTRATO 711-2024	INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS	DIRECCION:	LOCALIDAD DE FONTIBON
PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO DEL 2025	HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025		ACTA DE OBRA N° 2

CODIGO	UNIDAD	ACTIVIDAD EJECUTADA
2,027	UN	CAJA DE INSPECCION 0.80X0.8M. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (H=0.6M. INCLUYE MARCO Y TAPA, NO INCLUYE BASE Y CAÑUELA).

UBICACIÓN	ESQUEMA	MEDIDAS				ELEMENTOS	CANTIDAD
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
CIV							
9000204						24,00	24,00
		TOTAL					24,00



MATERIALES

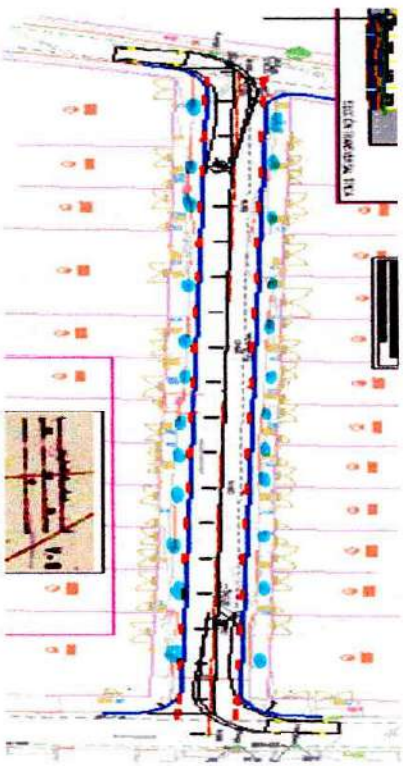


Nombre	Nombre	Nombre
VoBo Residente de obra	VoBo Director de obra	VoBo Interventoria

CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

CONTRATO 711-2024	INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS	DIRECCION:	LOCALIDAD DE FONTIBON
PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO DEL 2025	HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025		ACTA DE OBRA N° 2

CODIGO	UNIDAD	ACTIVIDAD EJECUTADA
2,034	UN	YEE PVC SANITARIA D=6"X 8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).

UBICACIÓN	ESQUEMA	MEDIDAS				ELEMENTOS	CANTIDAD
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
CIV							
9000204						24,00	24,00
		TOTAL					24,00

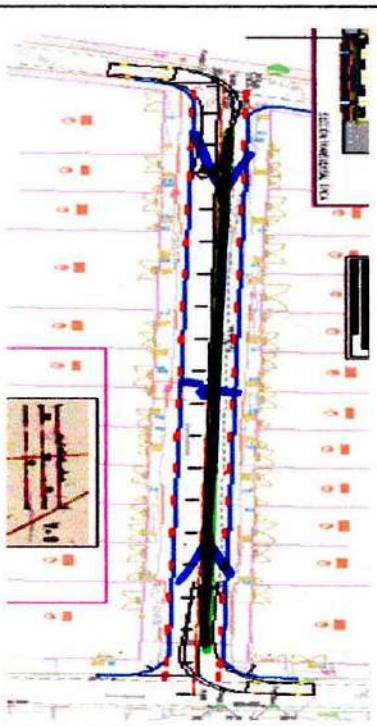


Nombre	Nombre	Nombre
VoBo Residente de obra	VoBo Director de obra	VoBo Interventoria

CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

CONTRATO 711-2024	INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS	DIRECCION:	LOCALIDAD DE FONTIBON
PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO DEL 2025	HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025		ACTA DE OBRA N° 2

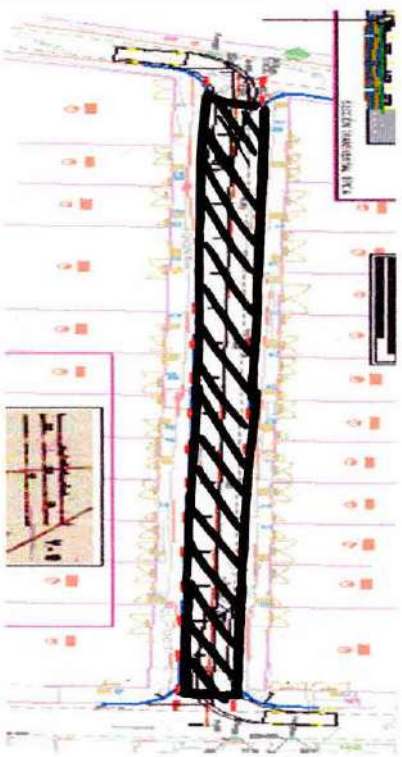
CODIGO	UNIDAD	ACTIVIDAD EJECUTADA
2,036	UN	TUBERÍA PVC SANITARIA D=10" TIPO U.S. (Incluye suministro e instalación)

UBICACIÓN	ESQUEMA	MEDIDAS				ELEMENTOS	CANTIDAD
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
CIV							
9000204		87				87,00	87,00

CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

CONTRATO 711-2024	INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS	DIRECCION:	LOCALIDAD DE FONTIBON
PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO DEL 2025	HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025		ACTA DE OBRA N° 2

CODIGO	UNIDAD	ACTIVIDAD EJECUTADA
3,004	M3	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)

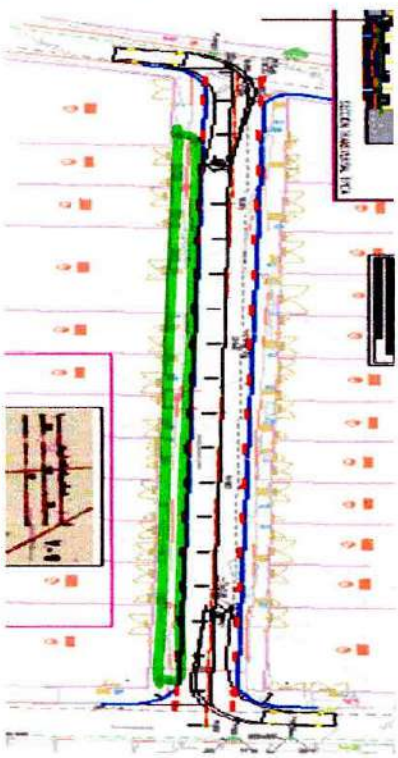
UBICACIÓN	ESQUEMA	MEDIDAS				ELEMENTOS	CANTIDAD
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
CIV							
9000204		87	8,2	0,17		121,28	121,28
					TOTAL		121,28

Nombre	Nombre	Nombre
VoBo Residente de obra	VoBo Director de obra	VoBo Interventoria

CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

CONTRATO 711-2024	INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS	DIRECCION:	LOCALIDAD DE FONTIBON
PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO DEL 2025	HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025		ACTA DE OBRA N° 2

CODIGO	UNIDAD	ACTIVIDAD EJECUTADA
4,002	M3	ESTABILIZACION DE SUBRASANTE CON RAJON (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACIÓN MANUAL. NO INCLUYE MATERIAL DE SELLO)

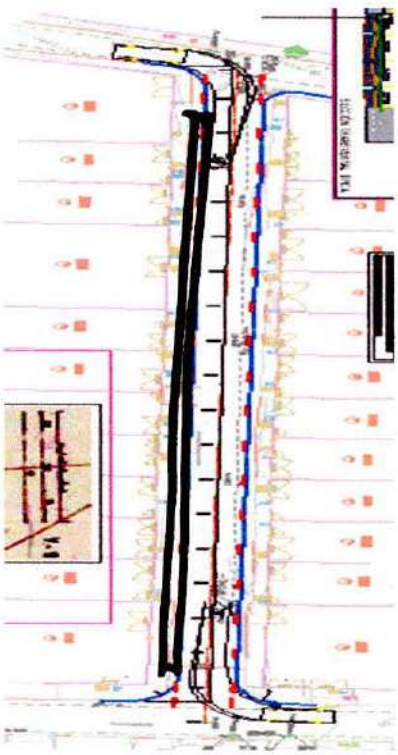
UBICACIÓN	ESQUEMA	MEDIDAS				ELEMENTOS	CANTIDAD
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
CIV							
9000204		95	6,1	0,15		87,02	87,02
					TOTAL		87,02

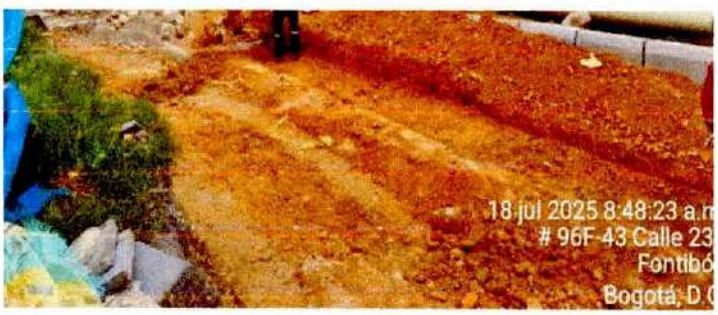
Nombre	Nombre	Nombre
VoBo Residente de obra	VoBo Director de obra	VoBo Interventoria

CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

CONTRATO 711-2024	INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS	DIRECCIÓN:	LOCALIDAD DE FONTIBON
PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO DEL 2025	HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025		ACTA DE OBRA N° 2

CODIGO	UNIDAD	ACTIVIDAD EJECUTADA
4,003	M3	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.

UBICACIÓN	ESQUEMA	MEDIDAS				ELEMENTOS	CANTIDAD
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
CIV							
9000204		57,41	6,0	0,68		234,25	234,25
		TOTAL					234,25

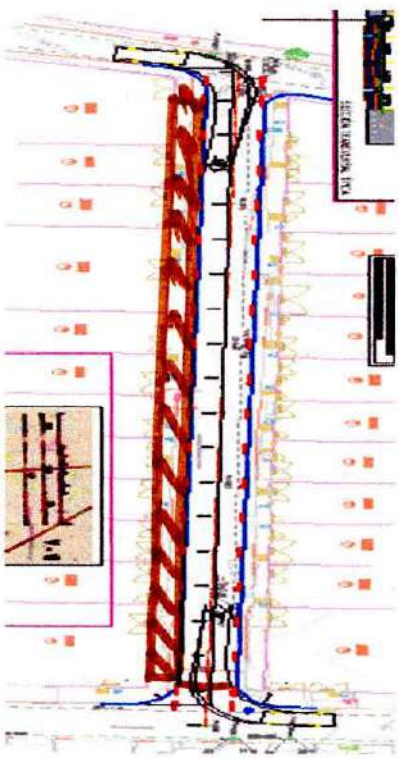


Nombre	Nombre	Nombre
VoBo Residente de obra	VoBo Director de obra	VoBo Interventoria

CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

CONTRATO 711-2024	INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS	DIRECCION:	LOCALIDAD DE FONTIBON
PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO DEL 2025	HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025		ACTA DE OBRA N° 2

CODIGO	UNIDAD	ACTIVIDAD EJECUTADA
4,006	M2	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

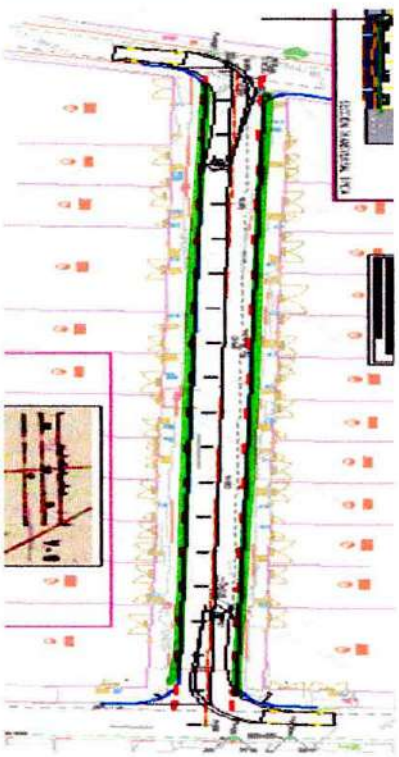
UBICACIÓN	ESQUEMA	MEDIDAS				ELEMENTOS	CANTIDAD
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
CIV							
9000204		62,89	6,0			377,36	377,36
		TOTAL					377,36

Nombre	Nombre	Nombre
VoBo Residente de obra	VoBo Director de obra	VoBo Interventoria

CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

CONTRATO 711-2024	INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS	DIRECCION:	LOCALIDAD DE FONTIBON
PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO DEL 2025	HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025		ACTA DE OBRA N° 2

CODIGO	UNIDAD	ACTIVIDAD EJECUTADA
4,007	ML	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)

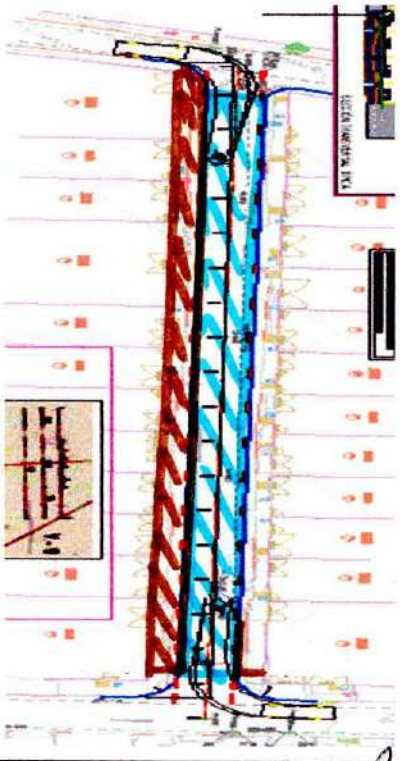
UBICACIÓN	ESQUEMA	MEDIDAS				ELEMENTOS	CANTIDAD
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
CIV							
9000204		204,78				204,78	204,78
		TOTAL					204,78

Nombre	Nombre	Nombre
VoBo Residente de obra	VoBo Director de obra	VoBo Interventoria

CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

CONTRATO 711-2024	INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS	DIRECCION:	LOCALIDAD DE FONTIBON
PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO DEL 2025	HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025		ACTA DE OBRA N° 2

CODIGO	UNIDAD	ACTIVIDAD EJECUTADA
4,008	M3	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)

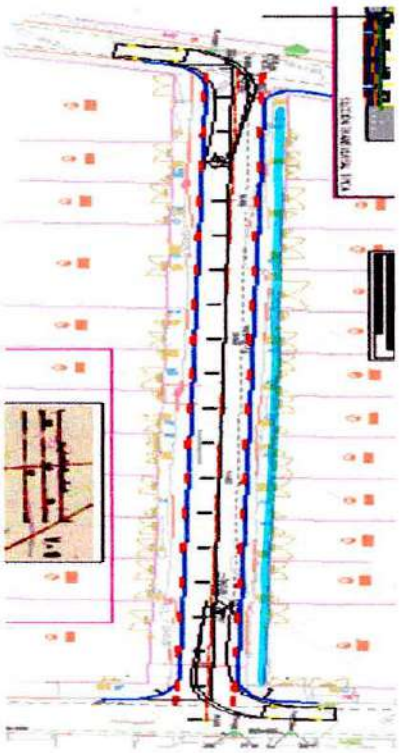
UBICACIÓN	ESQUEMA	MEDIDAS				ELEMENTOS	CANTIDAD
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
CIV							
9000204		54,38	6,0	0,2		65,26	65,26
					TOTAL		65,26

Nombre	Nombre	Nombre
VoBo Residente de obra	VoBo Director de obra	VoBo Interventoria

CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

CONTRATO 711-2024	INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS	DIRECCION:	LOCALIDAD DE FONTIBON
PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO DEL 2025	HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025		ACTA DE OBRA N° 2

CODIGO	UNIDAD	ACTIVIDAD EJECUTADA
4,012	ML	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE PEGA 2000 PSI Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN).

UBICACIÓN	ESQUEMA	MEDIDAS				ELEMENTOS	CANTIDAD
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
CIV							
9000204		39,23				39,23	39,23
					TOTAL		39,23

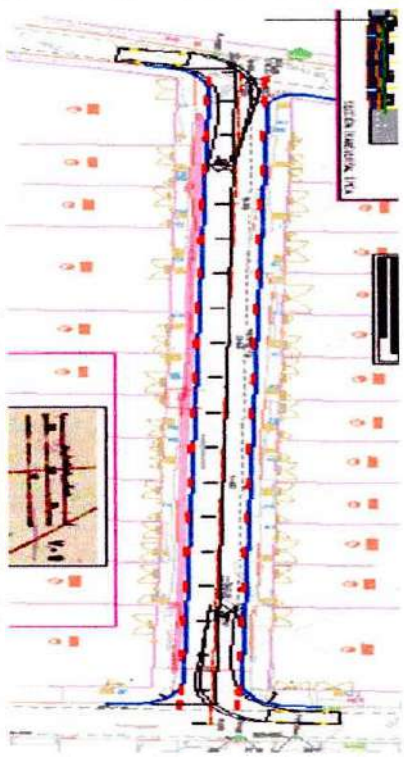


Nombre	Nombre	Nombre
VoBo Residente de obra	VoBo Director de obra	VoBo Interventoria

CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

CONTRATO 711-2024	INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS	DIRECCION:	LOCALIDAD DE FONTIBON
PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO DEL 2025	HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025		ACTA DE OBRA N° 2

CODIGO	UNIDAD	ACTIVIDAD EJECUTADA
4,013	M2	CENEFA EN LOSETA PREFABRICADA A58 GUIA (20X20X6) CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO)

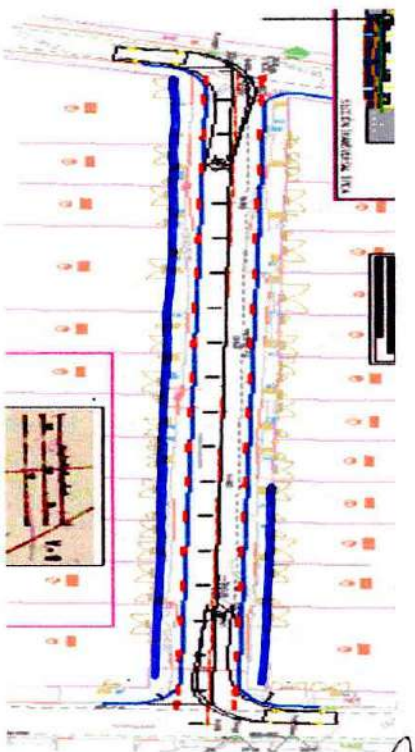
UBICACIÓN	ESQUEMA	MEDIDAS				ELEMENTOS	CANTIDAD
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
CIV							
9000204		3,88	1,8			6,98	6,98
					TOTAL		6,98

Nombre	Nombre	Nombre
VoBo Residente de obra	VoBo Director de obra	VoBo Interventoria

CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

CONTRATO 711-2024	INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS	DIRECCION:	LOCALIDAD DE FONTIBON
PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO DEL 2025	HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025		ACTA DE OBRA N° 2

CODIGO	UNIDAD	ACTIVIDAD EJECUTADA
4,016	ML	BORDILLO EN CONCRETO GRAVA COMÚN 1" 2000 PSI, FUNDIDO EN SITIO, A LA VISTA, DE 10CM X 35CM. REFUERZO SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, SIMILAR O EQUIVALENTE. (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO E INSTALACIÓN).

UBICACIÓN	ESQUEMA	MEDIDAS				ELEMENTOS	CANTIDAD
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
CIV							
9000204		147,90				147,90	147,90
		TOTAL					147,90

Nombre	Nombre	Nombre
VoBo Residente de obra	VoBo Director de obra	VoBo Interventoria

ACTA CIV
9002043
MEMORIAS

CONSORCIO VIAS FONTIBON

CONTRATO DE OBRA VIAS-711-2024

CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO, DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 440 DE 2022, EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, BOGOTÁ D.C

INTERVENTORIA: ING INGENIERIA

CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

COP-711-2024

CVI 9002043 RINCON SANTOS

							ACTA No. 2				11/07/2025
COD IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VR. UNITARIO (MÁS A.I.U.)	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VR. UNITARIO (OFERTADO)	VALOR TOTAL	VR. UNITARIO (MÁS A.I.U.)	VALOR PARCIAL
		1. PRELIMINARES									
3007	1,001	REPLANTEO GENERAL	M2	989,25	$ 1.076,00	$ 1.064.433,00		$ 820	$ -	$ 1.076	$ -
3022	1,002	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M3	57,62	$ 68.594,00	$ 3.952.620,68		$ 52.266	$ -	$ 68.594	$ -
3155	1,003	DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UN	3,00	$ 224.713,00	$ 674.139,00	3	$ 171.223	$ 513.669	$ 224.713	$ 674.139,20
4613	1,004	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	1.864,99	$ 68.359,00	$ 127.488.902,48	118,79	$ 52.087	$ 6.187.315	$ 68.359	$ 8.120.232,53
4850	1,005	DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB, COMPRESOR Y CARGUE).	M3	28,50	$ 350.521,00	$ 9.989.501,22	-	$ 267.084	$ -	$ 350.521	$ -
		2. REDES HÚMEDAS (ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO)									
3045	2,001	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 192.188,00	$ -		$ 146.440	$ -	$ 192.188	$ -
3225	2,002	TUBERIA PVC D=3" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	113,01	$ 64.977,00	$ 7.343.050,77		$ 49.510	$ -	$ 64.977	$ -
3226	2,003	TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 82.410,00	$ -		$ 62.793	$ -	$ 82.410	$ -
3227	2,004	TUBERIA PVC D=6" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 164.949,00	$ -		$ 125.685	$ -	$ 164.949	$ -
3252	2,005	TEE HD EXTREMO LISO 6"X3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$ 629.010,00	$ -		$ 479.282	$ -	$ 629.010	$ -
3253	2,006	TEE HD EXTREMO LISO 6"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$ 686.981,00	$ -		$ 523.454	$ -	$ 686.981	$ -
3293	2,007	CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$ 364.692,00	$ -		$ 277.882	$ -	$ 364.692	$ -
3471	2,008	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.)	ML	6,90	$ 874.947,00	$ 6.037.134,30	14,93	$ 666.677	$ 9.953.487,61	$ 874.947	$ 13.062.957,14
3478	2,009	RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA 1/2" (SUMINISTRO, DISPOSICIÓN Y EXTENDIDO MANUAL)	M3	161,72	$ 183.636,00	$ 29.697.818,09	16,18	$ 139.924	$ 2.263.410,62	$ 183.636	$ 2.970.500,10
3708	2,010	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	1.568,65	$ 6.742,00	$ 10.575.832,47	1.568,65	$ 5.137	$ 8.058.150,61	$ 6.742	$ 10.575.516,86
3723	2,011	LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN	3,00	$ 119.612,00	$ 358.836,00		$ 91.140	$ -	$ 119.612	$ -
3776	2,012	ENTIBADO TIPO ED1, DISCONTINUO EN MADERA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	967,65	$ 56.004,00	$ 54.192.360,64	80,88	$ 42.673	$ 3.451.392,24	$ 56.004	$ 4.529.607,18
3878	2,013	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)	UN	3,00	$ 2.278.900,00	$ 6.836.700,00	3	$ 1.736.437	$ 5.209.311,00	$ 2.278.900	$ 6.836.699,76
3879	2,014	PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCL. SUMIN, INST.)	UN	3,00	$ 1.367.165,00	$ 4.101.495,00	3	$ 1.041.729	$ 3.125.187,00	$ 1.367.165	$ 4.101.495,42
3882	2,015	SUMIDERO LATERAL SL-100, H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA. INCL. SUMIN, FORM, REF. Y CONST. INCL. TAPA)	UN	4,00	$ 3.576.707,00	$ 14.306.828,00		$ 2.725.318	$ -	$ 3.576.707	$ -
3919	2,016	TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=24" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 819.239,00	$ -		$ 624.230	$ -	$ 819.239	$ -
4144	2,017	TUBERIA PVC SANITARIA D=6" TIPO U.S. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 103.161,00	$ -		$ 78.605	$ -	$ 103.161	$ -
4262	2,018	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 3.5M (INCLUYE CARGUE)	M3	997,86	$ 6.693,00	$ 6.678.662,99	283,08	$ 5.100	$ 1.443.708,00	$ 6.693	$ 1.894.722,38
4792	2,019	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM).	M3	572,66	$ 116.684,00	$ 66.820.237,64	201,22	$ 88.909	$ 17.889.913,34	$ 116.684	$ 23.478.722,27
4839	2,020	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 6" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACCESORIOS).	UN		$ 718.716,00	$ -		$ 547.635	$ -	$ 718.716	$ -
4840	2,021	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 3" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$ 222.448,00	$ -		$ 169.497	$ -	$ 222.448	$ -
4842	2,022	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A AC 4" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACCESORIOS).	UN		$ 504.127,00	$ -		$ 384.126	$ -	$ 504.127	$ -
4843	2,023	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A AC 3" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACCESORIOS).	UN		$ 374.842,00	$ -		$ 285.616	$ -	$ 374.842	$ -
4878	2,024	CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	8,00	$ 158.209,00	$ 1.265.672,00	-	$ 120.549	$ -	$ 158.209	$ -

4984	2,025	RELOCALIZACIÓN DE MEDIDOR DE ACUEDUCTO D= 1/2" (INCLUYE 1.0M TUBERÍA GALVANIZADA D= 1/2", SOLDADURA, CINTA DE TEFLON, Y REPOSICIÓN DE CAJILLA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA CON TAPA. NO INCLUYE MEDIDOR.)	UN	12,00	$ 474.405,00	$ 5.692.860,00		$ 361.479	$ -	$ 474.405	$ -
4986	2,026	CONCRETO GRAVA COMÚN 4000 PSI (280 KG/CM2) PARA CÁMARAS ESPECIALES DE INTERCONEXIÓN DE ALCANTARILLADO (PREMEZCLADO, INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y COLOCACIÓN. NO INCLUYE REFUERZO NI CURADO).	M3	19,61	$ 1.174.615,00	$ 23.035.425,71	12,25	$ 895.013	$ 10.966.773,29	$ 1.174.615	$ 14.392.793,27
5015	2,027	CAJA DE INSPECCION 0.80X0.8M. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (H=0.6M. INCLUYE MARCO Y TAPA, NO INCLUYE BASE Y CAÑUELA).	UN	8,00	$ 733.507,00	$ 5.868.056,00		$ 558.905	$ -	$ 733.507	$ -
5171	2,028	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 3" A 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF, REPOSICIÓN DE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR, REGISTROS Y ACCESORIOS. LONGITUD PROMEDIO =6.5MT).	UN		$ 622.436,00	$ -		$ 474.273	$ -	$ 622.436	$ -
5173	2,029	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 6" A 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF REPOSICIÓN DE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR, REGISTROS Y ACCESORIOS. LONGITUD PROMEDIO=6.5 MT).	UN		$ 463.848,00	$ -		$ 353.435	$ -	$ 463.848	$ -
5467	2,030	TUBERIA PVC SANITARIA D=8" TIPO U.S. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	ML	41,56	$ 177.325,00	$ 7.367.853,75		$ 135.115	$ -	$ 177.325	$ -
6538	2,031	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=14" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 282.308,00	$ -		$ 215.108	$ -	$ 282.308	$ -
7830	2,032	CONEXIONES KIT SILLA YEE 250 X 200 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$ 299.865,00	$ -		$ 228.486	$ -	$ 299.865	$ -
7831	2,033	CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 X 200 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	2,00	$ 409.099,00	$ 818.198,00		$ 311.718	$ -	$ 409.099	$ -
8350	2,034	YEE PVC SANITARIA D=6"X 8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	8,00	$ 388.787,00	$ 3.110.296,00		$ 296.241	$ -	$ 388.787	$ -
8646	2,035	EMPATE DE TUBERÍA EN PVC A PVC 6"X4" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023, INCLUYE REDUCCIÓN U.M PVC 6"X4" (Suministro e instalación)	UN		$ 406.982,00	$ -		$ 310.105	$ -	$ 406.982	$ -
8792	2,036	TUBERÍA PVC SANITARIA D=10" TIPO U.S. (Incluye suministro e instalación)	ML		$ 265.472,00	$ -		$ 202.280	$ -	$ 265.472	$ -
9109	2,037	CONCRETO 2000 PSI GRAVA COMÚN 14 MPA (140 Kg/Cm2) PARA SOLADOS (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN).	M3	9,82	$ 740.468,00	$ 7.270.815,64	9,82	$ 564.209	$ 5.540.532,38	$ 740.468	$ 7.271.394,70
		3.PAVIMENTOS				-					
3454	3,001	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL. NO INCLUYE MATERIAL DE SELLO)	M3	62,83	$ 140.668,00	$ 8.838.301,96		$ 107.184	$ -	$ 140.668	$ -
3710	3,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	266,20	$ 6.693,00	$ 1.781.673,92		$ 5.100	$ -	$ 6.693	$ -
4015	3,003	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	416,09	$ 15.867,00	$ 6.602.101,09		$ 12.090	$ -	$ 15.867	$ -
4159	3,004	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	86,12	$ 187.058,00	$ 16.110.070,96	109,48	$ 142.531	$ 15.604.316,68	$ 187.058	$ 20.479.105,22
4394	3,005	ADOQUIN DE CONCRETO TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	M2		$ 136.869,00	$ -		$ 104.289	$ -	$ 136.869	$ -
8616	3,006	BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) o (BGB_BG25) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	93,95	$ 234.594,00		109,48	$ 178.752	$ 19.569.797,56	$ 234.594	$ 25.683.402,32
		4. ESPACIO PUBLICO				-					
3394	4,001	LOSA DE CONCRETO MR41 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS)	M3	17,65	$ 964.195,00	$ 17.017.951,75		$ 734.681	$ -	$ 964.195	$ -
3454	4,002	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL. NO INCLUYE MATERIAL DE SELLO)	M3	120,60	$ 140.668,00	$ 16.965.108,94		$ 107.184	$ -	$ 140.668	$ -
3464	4,003	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	M3	324,66	$ 52.093,00	$ 16.912.590,31		$ 39.693	$ -	$ 52.093	$ -
3548	4,004	BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI, HECHO EN OBRA)	UN	59,45	$ 261.489,00	$ 15.544.686,07		$ 199.245	$ -	$ 261.489	$ -
3745	4,005	PISO EN ADOQUIN DE CONCRETO A25 20X10X6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 3CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	M2	128,28	$ 120.397,00	$ 15.444.883,86		$ 91.738	$ -	$ 120.397	$ -
4015	4,006	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	529,04	$ 15.867,00	$ 8.394.278,70		$ 12.090	$ -	$ 15.867	$ -
4054	4,007	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML	282,59	$ 97.601,00	$ 27.581.150,35	70,9	$ 74.368	$ 5.272.691	$ 97.601	$ 6.919.879,93
4159	4,008	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	90,45	$ 187.058,00	$ 16.919.143,77	62,262	$ 142.531	$ 8.874.265	$ 187.058	$ 11.646.585,55
4232	4,009	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15XD.15M, D=5MM, 5MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	KG	162,80	$ 8.846,00	$ 1.440.148,28	162,807	$ 6.740	$ 1.097.287	$ 8.846	$ 1.440.079,25
4909	4,010	RAMPA VEHICULAR FUNDIDA EN EL SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (GRAVA COMUN) SUM, CONSTR. E INSTALACIÓN. INCLUYE ACABADO EN ADOQUIN DE ARCILLA TIPO TRÁFICO PESADO O SIMILAR, BASE DE 4CM EN MORTERO DE 2000 PSI.	M2	98,55	$ 223.877,00	$ 22.063.681,52		$ 170.586	$ -	$ 223.877	$ -
5047	4,011	ADOQUIN EN CONCRETO COLOR OCRE A25 (20X10X6cm) (Suministro e instalación. Incluye base 4cm mortero 2000 PSI y arena de sello)	M2	147,58	$ 148.031,00	$ 21.846.460,71		$ 112.794	$ -	$ 148.031	$ -

6475	4,012	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE PEGA 2000 PSI Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN).	ML	55,86	$ 89.357,00	$ 4.991.876,11	42,70	$ 68.087	$ 2.907.315	$ 89.357	$ 3.815.560,07			
8166	4,013	CENEFA EN LOSETA PREFABRICADA A58 GUIA (20X20X6) CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO)	M2	10,98	$ 132.408,00	$ 1.454.310,42		$ 100.890	$ -	$ 132.408	$ -			
8169	4,014	CENEFA EN LOSETA PREFABRICADA A57 TACTIL ALERTA (20X20X6) CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO)	M2	65,06	$ 132.408,00	$ 8.614.867,68		$ 100.890	$ -	$ 132.408	$ -			
8225	4,015	CONTENEDOR DE RAICES (1.40X1.80X1.20M. INC. SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN Y FILTRO EN GRAVILLA. NO INC. TIERRA)	UN	19,81	$ 2.103.754,00	$ 41.668.936,02		$ 1.602.982	$ -	$ 2.103.754	$ -			
8464	4,016	BORDILLO EN CONCRETO GRAVA COMÚN 1" 2000 PSI, FUNDIDO EN SITIO, A LA VISTA, DE 10CM X 35CM. REFUERZO SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, SIMILAR O EQUIVALENTE. (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO E INSTALACIÓN).	ML	205,45	$ 68.430,00	$ 14.059.226,08	80,5	52.141	$ 4.197.351	$ 68.430	$ 5.508.602,80			
		5. DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN.				-								
3.431	5,001	SEÑAL VERTICAL GRUPO I (75X75CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	7,00	$ 687.759,00	$ 4.814.313,00		$ 524.047	$ -	$ 687.759	$ -			
4.248	5,002	DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	M2	45,12	$ 183.979,00	$ 8.301.133,88		$ 140.185	$ -	$ 183.979	$ -			
7.959	5,003	DEMARCACIÓN LINEA CONTINUA BLANCA O AMARILLA A=0.12 M (E=2.3 MM, TERMOPLÁSTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS)	ML	261,09	$ 22.079,00	$ 5.764.662,57		$ 16.823	$ -	$ 22.079	$ -			
		6. REDES SECAS				-								
4342	6,001	CANALIZACIÓN VIA PUBLICA DOS (2) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø6" EPM NORMA RS1-002. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENOS EN ARENA DE PEÑA Y EN SUB-BASE GRANULAR TIPO B-400 Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS. NO INCLUYE: DEMOLICIÓN NI RECONSTRUCCIÓN DE ANDEN O PAVIMENTO, ENTIBADOS.	ML	221,67	$ 384.874,00	$ 85.316.281,15		$ 293.260	$ -	$ 384.874	$ -			
		SUBTOTAL OBRAS INICIALES (INCLUYE A.I.U.) (A):				$ 792.995.518,47			132.125.873		173.401.996			
								Adminis	25,24%	33.348.570				
								imprevisto	1,00%	1.321.259				
								utilidad	4,20%	5.551.507				
										172.347.210			173.401.996	
								IVA	19%	1.054.786				
										173.401.996			173.401.996	
								componente B	7,0283%	9.286.203	componente B		9.286.203	
								componente C	1,6791%	2.218.526	componente C		2.218.526	
								componente D	2,3030%	3.042.859	componente D		3.042.859	
										187.949.583			187.949.583	

	PORCENTAJE	PESOS
COMPONENTE AMBIENTAL Y SST OBRAS INICIALES Y ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS (INCLUIDO A.I.U. COMPONENTE) (B)	7,0283%	
PLAN DE MANEJO DE TRASITO OBRAS ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS (INCLUIDO A.I.U. COMPONENTE) (C)	1,6791%	
COMPONENTE SOCIAL OBRAS INICIALES Y COMPLEMENTARIAS (INCLUIDO A.I.U. COMPONENTE) (D)	2,3030%	

TOTAL PROPUESTA ECONOMICA (CON ESTE VALOR SE EVALUARAN LAS OFERTAS ECONOMICAS DE ACUERDO A LAS	$ 792.995.518,47
PROVISION PARA OBRAS ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS (F):	$ 599.411.381,00
VALOR TOTAL CONTRATO PROPUESTO A EJECUTAR (E) + F):	$ 8.045.657.306,00

AIU % PROPUESTO	PORCENTAJE	FIRMA DEL PROPONENTE
Administración (% de los CD)	25,24%	
Imprevistos (%de los CD)	1,00%	
Utilidad (%de los CD)	5,00%	
AIU %	31,24%	

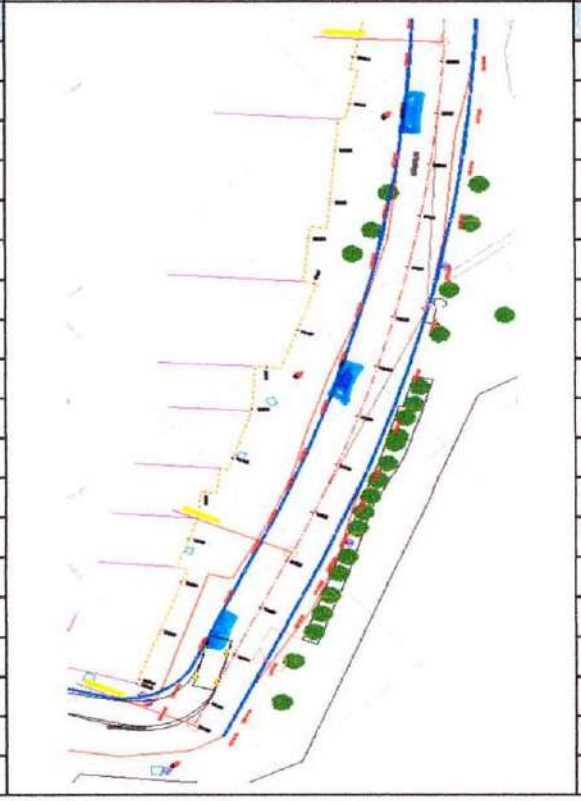
Nombre	Nombre	Nombre
VoBo Residente de obra	VoBo Director de obra	VoBo Interventoria

(94)

CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

CONTRATO 711-2024	INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS	DIRECCION:	LOCALIDAD DE FONTIBON
PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO 2025	HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025		ACTA DE OBRA N° 2

CODIGO	UNIDAD	ACTIVIDAD EJECUTADA
3155	UNIDAD	DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)

UBICACIÓN	ESQUEMA	MEDIDAS				ELEMENTOS	CANTIDAD
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
CIV							
9002043						3,00	3
						total	3



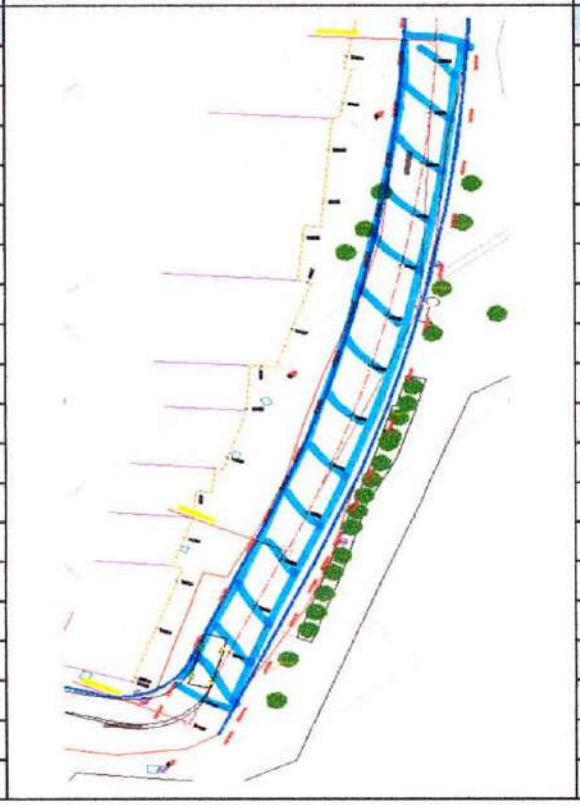


Nombre	Nombre	Nombre
VoBo Residente de obra	VoBo Director de obra	VoBo Interventoria

CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

CONTRATO 711-2024	INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS	DIRECCION:	LOCALIDAD DE FONTIBON
PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO 2025	HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025		ACTA DE OBRA N° 2

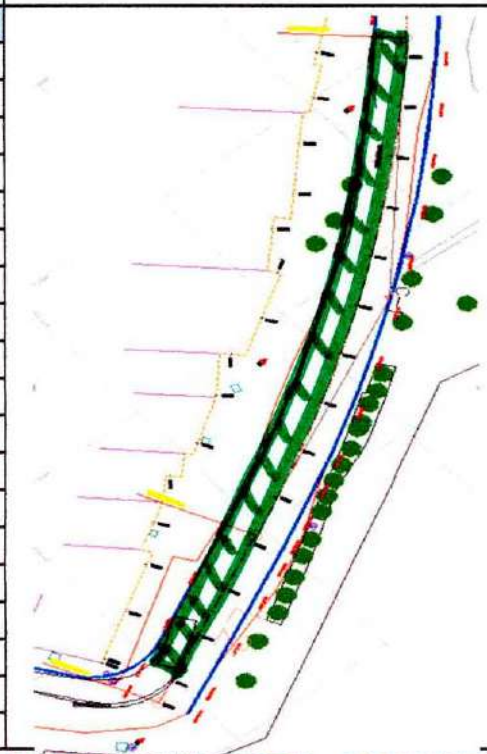
CODIGO	UNIDAD	ACTIVIDAD EJECUTADA
4613	m3	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)

UBICACIÓN	ESQUEMA	MEDIDAS				ELEMENTOS	CANTIDAD
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
CIV							
9002043		77,78	1,3	0,81		1,00	81,90
		15,78	2,75	0,85		1,00	36,89

	CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

CONTRATO 711-2024	INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS	DIRECCION:	LOCALIDAD DE FONTIBON
PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO 2025	HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025		ACTA DE OBRA N° 2

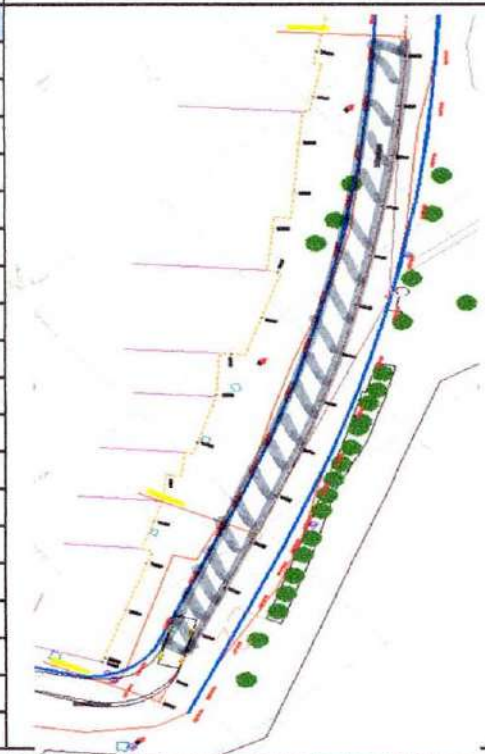
CODIGO	UNIDAD	ACTIVIDAD EJECUTADA
3471	M3	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.)

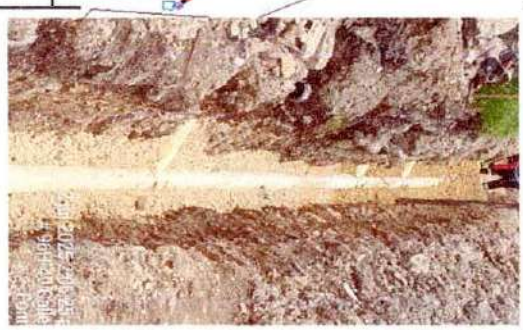
UBICACIÓN	ESQUEMA	MEDIDAS				ELEMENTOS	CANTIDAD
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
CIV							
9002043		7,40				1	7,4
		7,53				1	7,53

CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

CONTRATO 711-2024	INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS	DIRECCION:	LOCALIDAD DE FONTIBON
PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO 2025	HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025		ACTA DE OBRA N° 2

CODIGO	UNIDAD	ACTIVIDAD EJECUTADA
3478	M3	RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA 1/2" (SUMINISTRO, DISPOSICION Y EXTENDIDO MANUAL)

UBICACIÓN	ESQUEMA	MEDIDAS				ELEMENTOS	CANTIDAD
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
CIV							
9002043		40,40	1,2	0,2			9,696
		12,00	1,2	0,2			2,88
		15,00	1,2	0,2			3,6
						TOTAL	16,18





Nombre	Nombre	Nombre
VoBo Residente de obra	VoBo Director de obra	VoBo Interventoria

CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

CONTRATO 711-2024	INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS	DIRECCION:	LOCALIDAD DE FONTIBON
PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO 2025	HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025		ACTA DE OBRA N° 2

CODIGO	UNIDAD	ACTIVIDAD EJECUTADA
3738	KG	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACION. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60.

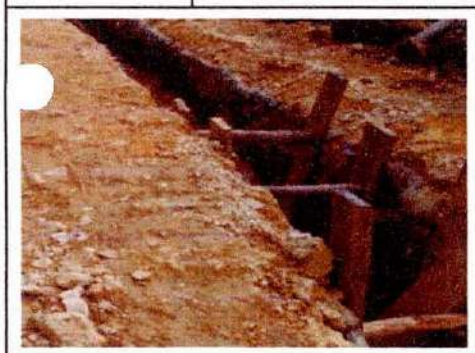
UBICACIÓN	ESQUEMA	MEDIDAS				ELEMENTOS	CANTIDAD
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
CIV							
9002043							1.568,65

CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

CONTRATO 711-2024	INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS	DIRECCION:	LOCALIDAD DE FONTIBON
PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO 2025	HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025		ACTA DE OBRA N° 2

CODIGO	UNIDAD	ACTIVIDAD EJECUTADA
3776	M2	ENTIBADO TIPO ED1, DISCONTINUO EN MADERA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

UBICACIÓN	ESQUEMA	MEDIDAS				ELEMENTOS	CANTIDAD
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
CIV							
9002043		40,40	1,2			1,00	48,48
		12,00	1,2			1,00	14,4
		15,00	1,2			1	18
		TOTAL					80,88







Nombre	Nombre	Nombre
VoBo Residente de obra	VoBo Director de obra	VoBo Interventoria

CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

CONTRATO 711-2024	INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS	DIRECCION:	LOCALIDAD DE FONTIBON
PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO 2025	HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025		ACTA DE OBRA N° 2

CODIGO	UNIDAD	ACTIVIDAD EJECUTADA
3878	UNIDAD	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)

UBICACIÓN	ESQUEMA	MEDIDAS				ELEMENTOS	CANTIDAD
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
CIV							
9002043						3,00	3
						TOTAL	3





Nombre	Nombre	Nombre
VoBo Residente de obra	VoBo Director de obra	VoBo Interventoria

CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

CONTRATO 711-2024	INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS	DIRECCIÓN:	LOCALIDAD DE FONTIBON
PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO 2025	HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025		ACTA DE OBRA N° 2

CODIGO	UNIDAD	ACTIVIDAD EJECUTADA
3879	UNIDAD	PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCL. SUMIN, INST.)

UBICACIÓN	ESQUEMA	MEDIDAS				ELEMENTOS	CANTIDAD
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
CIV							
9002043						3,00	3
		TOTAL					3



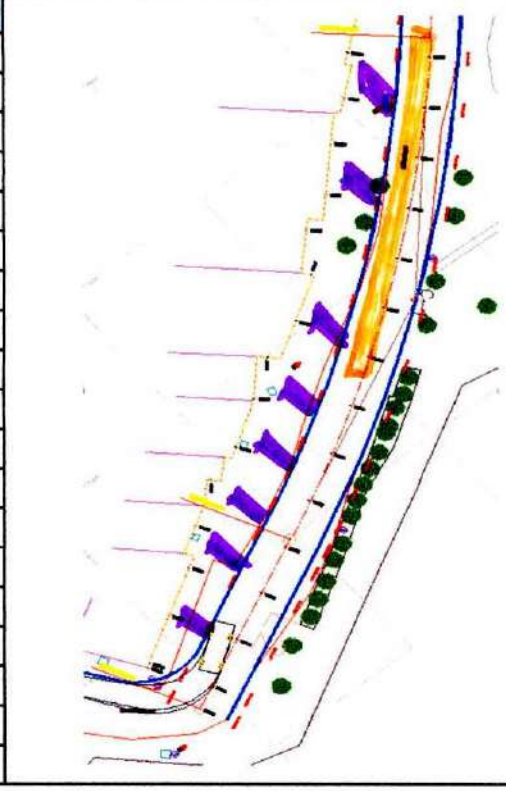


Nombre	Nombre	Nombre
VoBo Residente de obra	VoBo Director de obra	VoBo Interventoria

CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

CONTRATO 711-2024	INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS	DIRECCION:	LOCALIDAD DE FONTIBON
PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO 2026	HASTA: 11 DE JULIO DEL 2026		ACTA DE OBRA N° 2

CODIGO	UNIDAD	ACTIVIDAD EJECUTADA
4262	m3	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 3.5M (INCLUYE CARGUE)

UBICACIÓN	ESQUEMA	MEDIDAS				ELEMENTOS	CANTIDAD
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
CIV							
9002043		40,40	1,2	3,5			169,68
		12,00	1,2	3,5			50,40
		15,00	1,2	3,5			63,00
		TOTAL					283,08



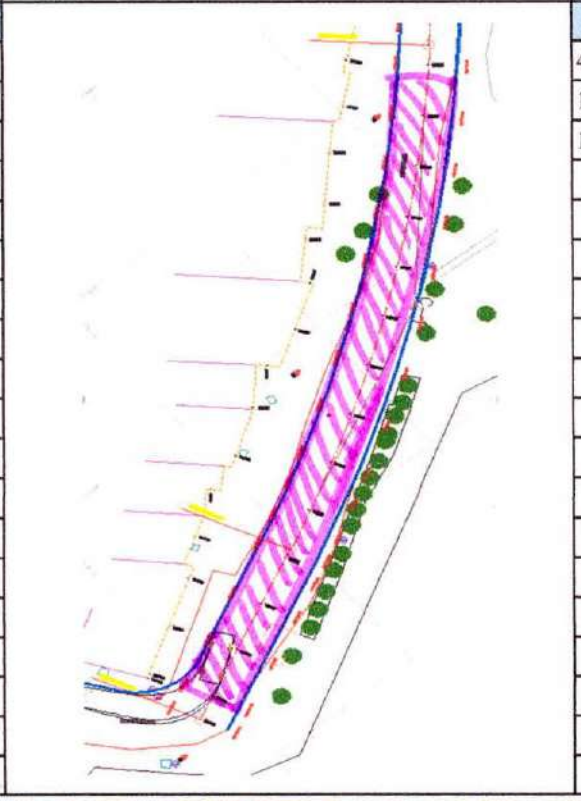


Nombre	Nombre	Nombre
VoBo Residente de obra	VoBo Director de obra	VoBo Interventoria

CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

CONTRATO 711-2024	INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS	DIRECCION:	LOCALIDAD DE FONTIBON
PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO 2025	HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025		ACTA DE OBRA N° 2

CODIGO	UNIDAD	ACTIVIDAD EJECUTADA
4792	M3	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACION EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM).

UBICACIÓN	ESQUEMA	MEDIDAS				ELEMENTOS	CANTIDAD
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
CIV							
9002043		40,40	1,2	3,2			155,14
		12,00	1,2	3,2			46,08
		15,00	1,2	3,2			57,60
					TOTAL		201,22



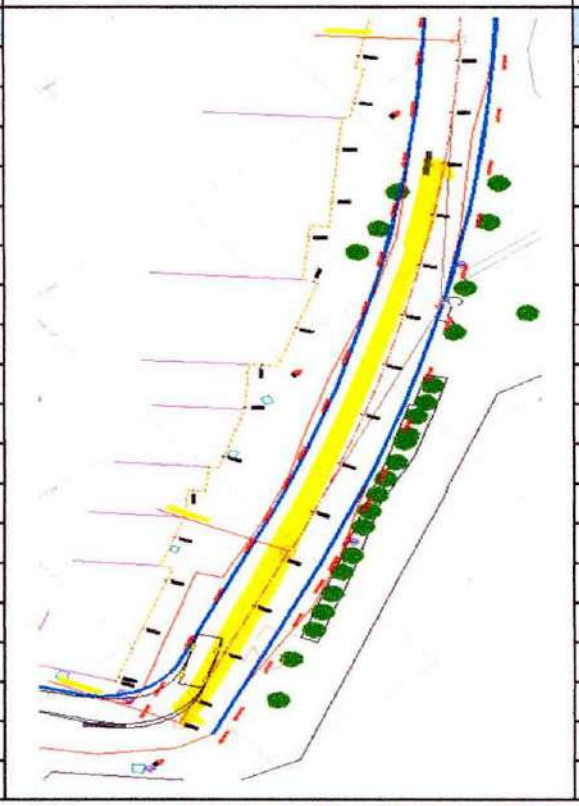


Nombre	Nombre	Nombre
VoBo Residente de obra	VoBo Director de obra	VoBo Interventoria

CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

CONTRATO 711-2024	INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS	DIRECCIÓN:	LOCALIDAD DE FONTIBON
PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO 2025	HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025		ACTA DE OBRA N° 2

CODIGO	UNIDAD	ACTIVIDAD EJECUTADA
4878	UNIDAD	CONCRETO GRAVA COMUN 4000 PSI (280 KG/CM2) PARA CAMARAS ESPECIALES DE INTERCONEXIÓN DE ALCANTARILLADO (PREMEZCLADO, INCLUYE SUMINISTRO,

UBICACIÓN	ESQUEMA	MEDIDAS				ELEMENTOS	CANTIDAD
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
CIV							
9002043		24	1,95	0,15		7,02	7,02
		17,8	1,96	0,15		5,23	5,23
		TOTAL					12,25

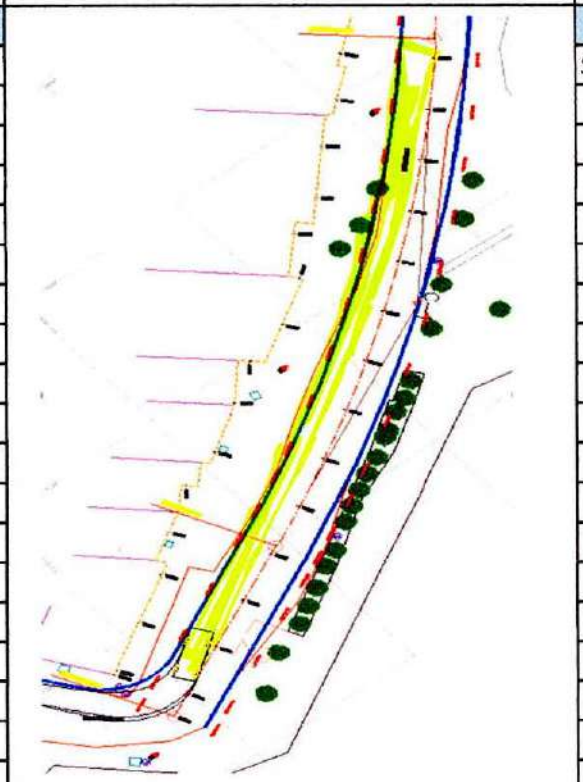


Nombre	Nombre	Nombre
VoBo Residente de obra	VoBo Director de obra	VoBo Interventoria

CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

CONTRATO 711-2024	INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS	DIRECCION:	LOCALIDAD DE FONTIBON
PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO 2025	HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025		ACTA DE OBRA N° 2

CODIGO	UNIDAD	ACTIVIDAD EJECUTADA
2,037	M3	CONCRETO 2000 PSI GRAVA COMUN 14 MPA (140 Kg/Cm2) PARA SOLADOS (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN).

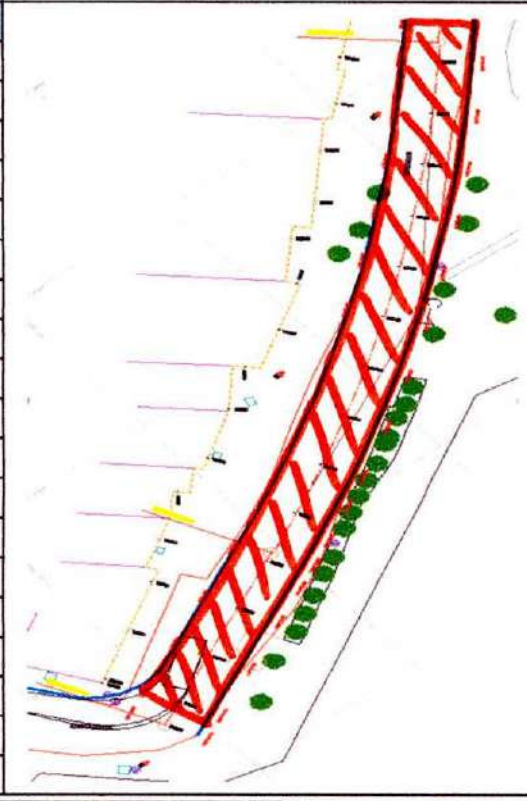
UBICACIÓN	ESQUEMA	MEDIDAS				ELEMENTOS	CANTIDAD
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
CIV							
9002043		51,68	1,9	0,1			9,82
		TOTAL					9,82

Nombre	Nombre	Nombre
VoBo Residente de obra	VoBo Director de obra	VoBo Interventoria

CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

CONTRATO 711-2024	INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS	DIRECCION:	LOCALIDAD DE FONTIBON
PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO 2025	HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025		ACTA DE OBRA N° 2

CODIGO	UNIDAD	ACTIVIDAD EJECUTADA
3454	M3	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)

UBICACIÓN	ESQUEMA	MEDIDAS				ELEMENTOS	CANTIDAD
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
CIV							
9002043		77,8	7,036	0,2			109,48
		TOTAL					109,48





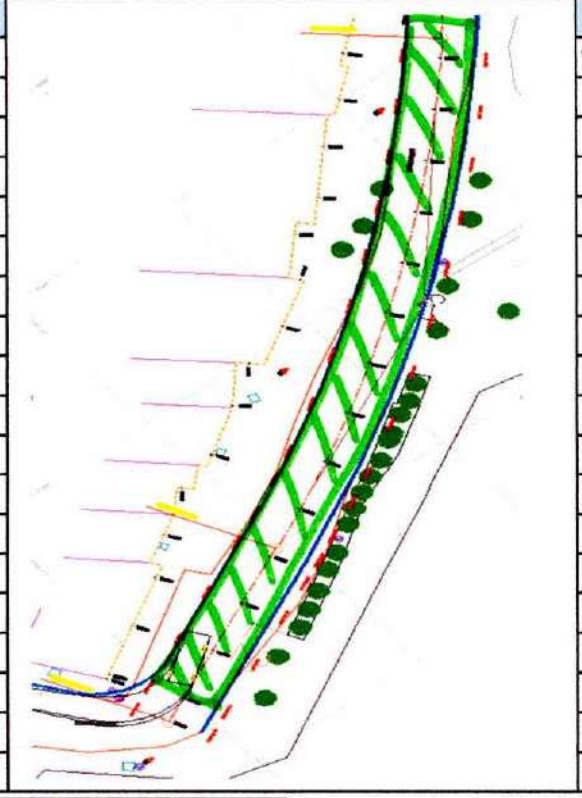


Nombre	Nombre	Nombre
VoBo Residente de obra	VoBo Director de obra	VoBo Interventoria

CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

CONTRATO 711-2024	INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS	DIRECCION:	LOCALIDAD DE FONTIBON
PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO 2025	HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025		ACTA DE OBRA N° 2

CODIGO	UNIDAD	ACTIVIDAD EJECUTADA
3454	M3	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)

UBICACIÓN	ESQUEMA	MEDIDAS				ELEMENTOS	CANTIDAD
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
CIV							
9002043		77,8	7,036	0,2			109,48
		TOTAL					109,48





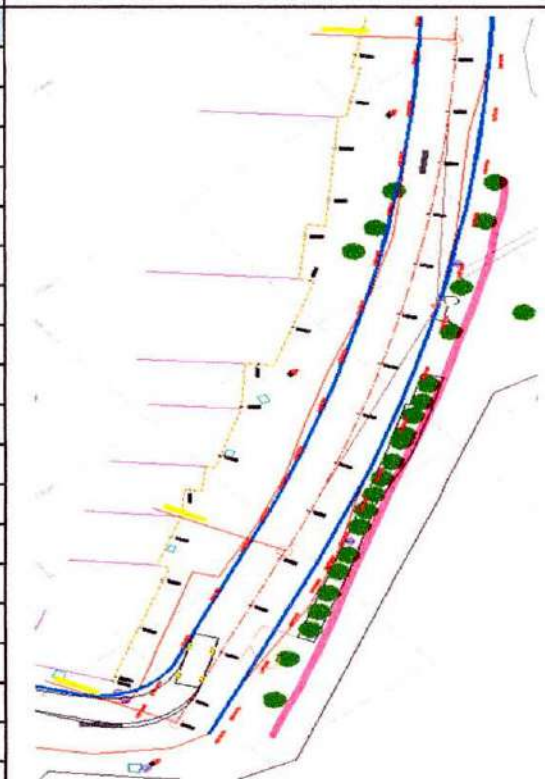


Nombre	Nombre	Nombre
VoBo Residente de obra	VoBo Director de obra	VoBo Interventoria

CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

CONTRATO 711-2024	INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS	DIRECCION:	LOCALIDAD DE FONTIBON
PERIODO DESDE: 12 DE JULIO 2025	HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025		ACTA DE OBRA N° 2

CODIGO	UNIDAD	ACTIVIDAD EJECUTADA
4054	ML	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)

UBICACIÓN	ESQUEMA	MEDIDAS				ELEMENTOS	CANTIDAD
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
CIV							
9002043		70,9				1,00	70,9
		TOTAL					70,9

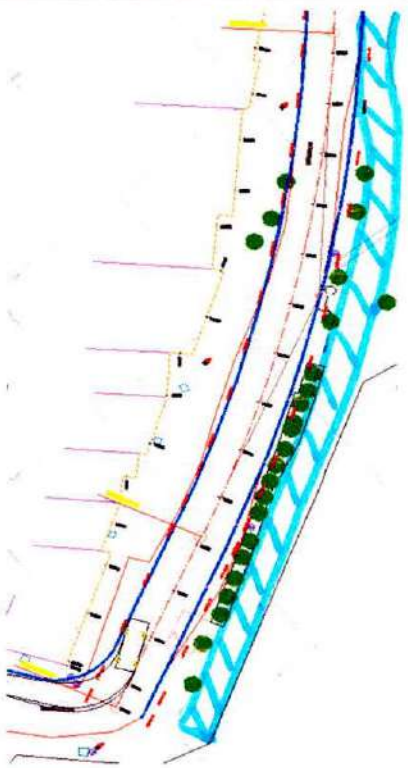


Nombre	Nombre	Nombre
VoBo Residente de obra	VoBo Director de obra	VoBo Interventoria

CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

CONTRATO 711-2024	INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS	DIRECCION:	LOCALIDAD DE FONTIBON
PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO 2025	HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025		ACTA DE OBRA N° 2

CODIGO	UNIDAD	ACTIVIDAD EJECUTADA
3454	M3	ESTABILIZACION DE SUBRASANTE CON RAJON (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACIÓN MANUAL. NO INCLUYE MATERIAL DE SELLO)

UBICACIÓN	ESQUEMA	MEDIDAS				ELEMENTOS	CANTIDAD
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
CIV							
9002043		69,18	4,5	0,2		1,00	62,262
		TOTAL					62,262





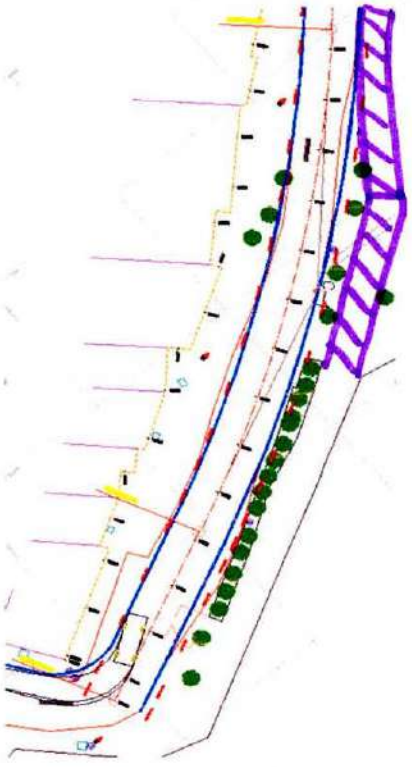


Nombre	Nombre	Nombre
VoBo Residente de obra	VoBo Director de obra	VoBo Interventoria

CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

CONTRATO 711-2024	INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS	DIRECCION:	LOCALIDAD DE FONTIBON
PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO 2025	HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025		ACTA DE OBRA N° 2

CODIGO	UNIDAD	ACTIVIDAD EJECUTADA
4232	KG	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15M, D=5MM, 5MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACION E INSTALACIÓN)

UBICACIÓN	ESQUEMA	MEDIDAS				ELEMENTOS	CANTIDAD
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
CIV							
9002043						162,80	162,80

CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

CONTRATO 711-2024	INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS	DIRECCION:	LOCALIDAD DE FONTIBON
PERIODO DESDE: 12 DE JULIO 2025	HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025		ACTA DE OBRA N° 2

CODIGO	UNIDAD	ACTIVIDAD EJECUTADA
6475	M3	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE 3CM MORTERO DE PEGA 2000 PSI Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO

UBICACIÓN	ESQUEMA	MEDIDAS				ELEMENTOS	CANTIDAD
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
CIV							
9002043		42,7				1,00	42,7
		TOTAL					42,7





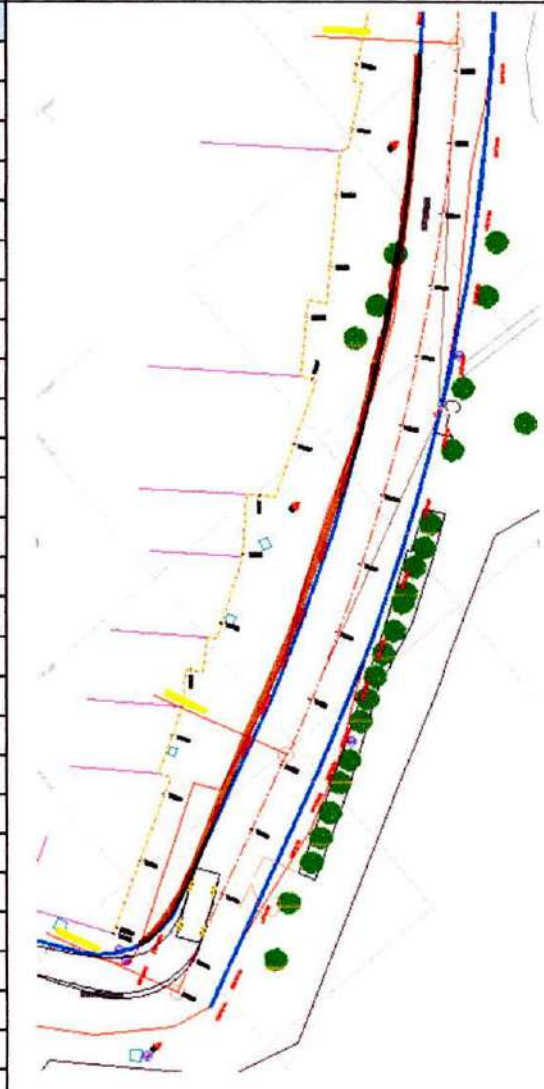


Nombre	Nombre	Nombre
VoBo Residente de obra	VoBo Director de obra	VoBo Interventoria

CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

CONTRATO 711-2024	INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS	DIRECCION:	LOCALIDAD DE FONTIBON
PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO 2025	HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025		ACTA DE OBRA N° 2

CODIGO	UNIDAD	ACTIVIDAD EJECUTADA
4054	ML	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)

UBICACIÓN	ESQUEMA	MEDIDAS				ELEMENTOS	CANTIDAD
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
CIV							
9002043		80,5				1,00	80,5

CONSORCIO VIAS FONTIBON

CONTRATO DE OBRA VIAS-711-2024

CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO, DERIVADOS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 440 DE 2022, EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, BOGOTÁ D.C

INTERVENTORIA: ING INGENIERIA

CVI 9000181 REFUGIO

COD IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VR. UNITARIO (MÁS A.I.U.)	VALOR PARCIAL
		1. PRELIMINARES				
3007	1,001	REPLANTEO GENERAL	M2	446,03	$ 1.076,00	$ 479.930,96
3022	1,002	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M3	25,98	$ 68.594,00	$ 1.782.155,43
3155	1,003	DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UN	4,00	$ 224.713,00	$ 898.852,00
4613	1,004	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	840,89	$ 68.359,00	$ 57.482.126,10
4850	1,005	DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB, COMPRESOR Y CARGUE).	M3	12,85	$ 350.521,00	$ 4.504.060,81
		2. REDES HÚMEDAS (ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO)				
3045	2,001	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 5722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	8,90	$ 192.188,00	$ 1.710.473,20
3225	2,002	TUBERIA PVC D=3" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 64.977,00	$ -
3226	2,003	TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 82.410,00	$ -
3227	2,004	TUBERIA PVC D=6" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 164.949,00	$ -
3252	2,005	TEE HD EXTREMO LISO 6"X3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$ 629.010,00	$ -
3253	2,006	TEE HD EXTREMO LISO 6"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$ 686.981,00	$ -
3293	2,007	CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$ 364.692,00	$ -
3471	2,008	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST. ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.)	ML	6,00	$ 874.947,00	$ 6.037.134,30
3478	2,009	RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA 1/2" (SUMINISTRO, DISPOSICIÓN Y EXTENDIDO MANUAL)	M3	72,92	$ 183.636,00	$ 13.390.155,85
3708	2,010	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO POR 60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (GRO) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	707,27	$ 6.742,00	$ 4.768.425,52
3723	2,011	LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES)	UN	3,00	$ 119.612,00	$ 358.836,00
3726	2,012	ENTIBADO TIPO ED1, DISCONTINUO EN MADERA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	436,29	$ 56.004,00	$ 24.434.221,70
3878	2,013	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE TAPA)	UN	3,00	$ 2.278.900,00	$ 6.836.700,00
3879	2,014	PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA, INCL. SUMIN. INST.)	UN	3,00	$ 1.367.165,00	$ 4.101.495,00
3882	2,015	SUMIDERO LATERAL SL-100, H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA. INCL. SUMIN, FORM, REF. Y CONST. INCL. TAPA)	UN	2,00	$ 3.576.707,00	$ 7.153.414,00
3919	2,016	TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=24" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 819.239,00	$ -
4144	2,017	TUBERIA PVC SANITARIA D=6" TIPO U.S. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 103.161,00	$ -
4767	2,018	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD OM - 3.5M (INCLUYE CARGUE)	M3	449,91	$ 6.693,00	$ 3.011.271,89
4792	2,019	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN. TRANSPORTE A 28 KM)	M3	258,20	$ 116.684,00	$ 30.127.871,92
4939	2,020	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 6" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACCESORIOS).	UN		$ 718.716,00	$ -
4840	2,021	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 2" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	2,00	$ 222.448,00	$ 444.896,00
4842	2,022	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A AC 4" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACCESORIOS).	UN		$ 504.127,00	$ -
4843	2,023	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A AC 3" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACCESORIOS).	UN		$ 374.842,00	$ -
4878	2,024	CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	5,00	$ 158.209,00	$ 791.045,00
4984	2,025	RELOCALIZACIÓN DE MEDIDOR DE ACUEDUCTO D= 1/2" (INCLUYE 1.0M TUBERÍA GALVANIZADA D= 1/2", SOLDADURA, CINTA DE TEFLON, Y REPOSICIÓN DE CAJILLA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA CON TAPA. NO INCLUYE MEDIDOR.).	UN	11,00	$ 474.405,00	$ 5.218.455,00

CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

COP-711-2024

ACTA No. 2				11/02/2025
CANTIDAD	VR. UNITARIO (OFERTADO)	VALOR TOTAL	VR. UNITARIO (MÁS A.I.U.)	VALOR PARCIAL
446,03	$ 820	$ 365.747	$ 1.076	$ 480.005,90
25,98	$ 52.266	$ 1.357.934	$ 68.594	$ 1.782.152,80
4,00	$ 171.233	$ 684.892	$ 224.713	$ 898.852,26
780,78	$ 52.087	$ 40.668.488	$ 68.359	$ 53.373.373,47
	$ 267.084	$ -	$ 350.521	$ -
45,40	$ 146.440	$ 6.648.376,00	$ 192.188	$ 8.725.328,56
	$ 49.510	$ -	$ 64.977	$ -
	$ 62.793	$ -	$ 82.410	$ -
	$ 125.685	$ -	$ 164.949	$ -
	$ 479.282	$ -	$ 629.010	$ -
	$ 523.454	$ -	$ 686.981	$ -
	$ 277.882	$ -	$ 364.692	$ -
	$ 666.677	$ -	$ 874.947	$ -
72,92	$ 139.924	$ 10.202.799,34	$ 183.636	$ 13.390.154,64
	$ 5.137	$ -	$ 6.742	$ -
	$ 91.140	$ -	$ 119.612	$ -
436,29	$ 42.673	$ 18.617.983,41	$ 56.004	$ 24.434.241,42
	$ 1.736.437	$ -	$ 2.278.900	$ -
	$ 1.041.729	$ -	$ 1.367.165	$ -
4,00	$ 2.725.318	$ 10.901.272,00	$ 3.576.707	$ 14.306.829,37
	$ 624.230	$ -	$ 819.239	$ -
10,60	$ 78.605	$ 833.213,00	$ 103.161	$ 1.093.505,74
449,91	$ 5.100	$ 2.294.559,48	$ 6.693	$ 3.011.379,87
258,20	$ 88.909	$ 22.956.351,90	$ 116.684	$ 30.127.916,23
4,00	$ 547.695	$ 2.190.540,00	$ 718.716	$ 2.874.864,70
	$ 169.497	$ -	$ 222.448	$ -
	$ 384.126	$ -	$ 504.127	$ -
	$ 285.616	$ -	$ 374.842	$ -
4,00	$ 120.549	$ 482.196,00	$ 158.209	$ 632.834,03
	$ 361.479	$ -	$ 474.405	$ -

4985	2,026	CONCRETO GRAVA COMÚN 4000 PSI (280 KG/CM2) PARA CÁMARAS ESPECIALES DE INTERCONEXIÓN DE ALCANTARILLADO (PREMEZCLADO, INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETA Y COLOCACIÓN. NO INCLUYE REFUERZO NI CURADO).	M3	8,84	$ 1.174.815,00	$ 10.385.200,05		$ 895.013	$ -	$ 1.174.815	$ -
5015	2,027	CAJA DE INSPECCION 0.80X0.8M, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (H=0.6M. INCLUYE MARCO Y TAPA, NO INCLUYE BASE Y CAÑUELA).	UN	5,00	$ 733.507,00	$ 3.667.535,00	4,00	$ 558.905	$ 2.235.620,00	$ 733.507	$ 2.934.027,69
5171	2,028	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 3" A 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF, REPOSICIÓN DE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR, REGISTROS Y ACCESORIOS. LONGITUD PROMEDIO =6 SMT).	UN		$ 622.436,00	$ -		$ 474.273	$ -	$ 622.436	$ -
5173	2,029	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 6" A 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF REPOSICIÓN DE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR, REGISTROS Y ACCESORIOS. LONGITUD PROMEDIO=6.5 MT).	UN		$ 463.844,00	$ -		$ 353.435	$ -	$ 463.844	$ -
5467	2,030	TUBERIA PVC SANITARIA D=8" TIPO U.S. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	ML		$ 177.325,00	$ -		$ 135.115	$ -	$ 177.325	$ -
9538	2,031	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=14" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 282.308,00	$ -		$ 215.108	$ -	$ 282.308	$ -
7830	2,032	CONEXIONES KIT SILLA YEE 250 X 200 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$ 299.865,00	$ -		$ 228.486	$ -	$ 299.865	$ -
7831	2,033	CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 X 200 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$ 409.099,00	$ -		$ 311.718	$ -	$ 409.099	$ -
8350	2,034	TEE PVC SANITARIA D=8 X 8" (INCLUYE SUMINISTRO E [illegible]	UN		$ 388.787,00	$ -	4,00	$ 296.241	$ 1.184.964,00	$ 388.787	$ 1.555.148,75
8646	2,035	EMPATE DE TUBERÍA EN PVC A PVC 6"X4" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023, INCLUYE REDUCCIÓN U.M PVC 6"X6" (Suministro e instalación)	UN		$ 406.982,00	$ -		$ 310.105	$ -	$ 406.982	$ -
8792	2,036	TUBERIA PVC SANITARIA D=10" TIPO U.S. (Incluye suministro e instalación)	ML	45,90	$ 265.472,00	$ 12.185.164,80	45,90	$ 202.280	$ 9.284.652,00	$ 265.472	$ 12.185.177,28
9309	2,037	CONCRETO 2000 PSI GRAVA COMÚN 14 MPA (140 Kg/Cm2) PARA SOLADOS (PREMEZCLADO, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN).	M3	4,43	$ 740.468,00	$ 3.278.261,35		$ 564.209	$ -	$ 740.468	$ -
		5 PAVIMENTOS				-					
3454	3,001	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL. NO INCLUYE MATERIAL DE SELLO)	M3	76,17	$ 140.668,00	$ 10.714.295,56		$ 107.184	$ -	$ 140.668	$ -
3710	3,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	170,51	$ 6.698,00	$ 1.141.230,12		$ 5.100	$ -	$ 6.698	$ -
4015	3,003	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	190,17	$ 15.867,00	$ 3.017.349,11		$ 12.090	$ -	$ 15.867	$ -
4159	3,004	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	45,50	$ 187.058,00	$ 8.511.213,82		$ 142.531	$ -	$ 187.058	$ -
4394	3,005	ADOQUIN DE CONCRETO TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	M2		$ 136.869,00	$ -		$ 104.289	$ -	$ 136.869	$ -
8616	3,006	BASE GRANULAR CLASE A (BGA_B638) o (BGB_B625) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	39,73	$ 234.594,00			$ 178.752	$ -	$ 234.594	$ -
		6. ESPACIO PUBLICO				-					
3394	4,001	LOSA DE CONCRETO MR41 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS)	M3	7,73	$ 964.195,00	$ 7.450.022,96		$ 734.681	$ -	$ 964.195	$ -
3454	4,002	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL. NO INCLUYE MATERIAL DE SELLO)	M3	52,79	$ 140.668,00	$ 7.426.197,50		$ 107.184	$ -	$ 140.668	$ -
3464	4,003	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	M3	142,10	$ 52.093,00	$ 7.402.516,99		$ 39.693	$ -	$ 52.093	$ -

3548	4,004	BOLARDO EN HIERRO TIPO M53 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI, HECHO EN OBRA)	UN	25,45	$ 261.489,00	$ 6.654.060,07		$ 199.245	$ -	$ 261.489	$ -
3745	4,005	PISO EN ADOQUIN DE CONCRETO A25 20X10X6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 3CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	M2	55,99	$ 120.397,00	$ 6.740.759,53		$ 91.738	$ -	$ 120.397	$ -
4015	4,006	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	224,48	$ 15.867,00	$ 3.561.781,05		$ 12.090	$ -	$ 15.867	$ -
4054	4,007	SARDINEL TIPO A30 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML	125,13	$ 97.601,00	$ 12.212.769,81	83,6	$ 74.368	$ 6.217.165	$ 97.601	$ 8.159.407,09
4159	4,008	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG -C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	39,59	$ 187.058,00	$ 7.405.471,45		$ 142.531	$ -	$ 187.058	$ -
4232	4,009	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15M, D4.5MM, 5MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	KG	48,19	$ 8.846,00	$ 426.314,45		$ 6.740	$ -	$ 8.846	$ -
4909	4,010	RAMPA VEHICULAR FUNDIDA EN EL SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (GRAVA COMUN) SUM, CONSTR. E INSTALACIÓN. INCLUYE ACABADO EN ADOQUIN DE ARCILLA TIPO TRÁFICO PESADO O SIMILAR, BASE DE 4CM EN MORTERO DE 2000 PSI	M2	43,44	$ 223.877,00	$ 9.725.016,56		$ 170.586	$ -	$ 223.877	$ -
5047	4,011	ADOQUIN EN CONCRETO COLOR OCRE A25 (20X10X6cm) (Suministro e instalación. Incluye base 4cm mortero 2000 PSI y arena de sello)	M2	65,05	$ 148.031,00	$ 9.627.098,78		$ 112.794	$ -	$ 148.031	$ -
6475	4,012	BORDILLO PREFABRICADO A30 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE PEGA 2000 PSI Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN).	ML	77,69	$ 89.357,00	$ 7.027.713,96		$ 68.087	$ -	$ 89.357	$ -
8166	4,013	CENEFA EN LOSETA PREFABRICADA A58 GUIA (20X20X5) CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO)	M2	3,27	$ 132.408,00	$ 432.696,11		$ 100.890	$ -	$ 132.408	$ -
8169	4,014	CENEFA EN LOSETA PREFABRICADA A57 TÁCTIL ALERTA (20X20X6) CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO)	M2	27,65	$ 132.408,00	$ 3.661.244,22		$ 100.890	$ -	$ 132.408	$ -
8225	4,015	CONTENEDOR DE RAICES (1.40X1.80X1.20M. INC. SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN Y FILTRO EN GRAVILLA. NO INC. TIERRA)	UN		$ 2.103.754,00	$ -		$ 1.602.982	$ -	$ 2.103.754	$ -
8464	4,016	BORDILLO EN CONCRETO GRAVA COMÚN 1" 2000 PSI, FUNDIDO EN SITIO, A LA VISTA, DE 10CM X 35CM. REFUERZO SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, SIMILAR O EQUIVALENTE. (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO E INSTALACIÓN).	ML	89,35	$ 68.430,00	$ 6.115.992,91		$ 52.141	$ -	$ 68.430	$ -
		5. DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN				-					
3.431	5,001	SEÑAL VERTICAL GRUPO I (75X75CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	3,00	$ 687.759,00	$ 2.063.277,00		$ 524.047	$ -	$ 687.759	$ -
4.248	5,002	DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	M2	20,84	$ 183.979,00	$ 3.742.810,67		$ 140.185	$ -	$ 183.979	$ -
7.959	5,003	DEMARCACIÓN LINEA CONTINUA BLANCA O AMARILLA A=0.12 M (E=2.3 MM, TERMOPLÁSTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS)	ML	112,22	$ 22.079,00	$ 2.599.167,88		$ 16.823	$ -	$ 22.079	$ -
		6. REDES SECAS				-					
6342	6,001	CANALIZACION VIA PUBLICA DOS (2) DUCTOS PVC TIPO DB-60 @6" EPM NORMA RSI 002. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENOS EN ARENA DE PEÑA Y EN SUB-BASE GRANULAR TIPO B-400 Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS. NO INCLUYE: DEMOLICIÓN NI RECONSTRUCCIÓN DE ANDEN O PAVIMENTO, ENTIBADOS.	ML	95,25	$ 384.874,00	$ 36.658.871,71		$ 293.260	$ -	$ 384.874	$ -
		SUBTOTAL OBRAS INICIALES (INCLUYE A.I.U.) (A):				$ 142.266.533,95					
									137.136.753		179.965.152
									25,24%	34.610.793	
									1,00%	1.371.268	
									4,20%	5.761.628	
										178.870.441	179.965.151
									19%	1.094.709	
										179.965.151	179.965.151
									componente B	7,0283%	9.637.680	componente B	9.637.680
									componente C	1,6791%	2.302.495	componente C	2.302.495
									componente D	2,3050%	3.158.029	componente D	3.158.029
											195.063.355		195.063.355

	PORCENTAJE	PESOS
COMPONENTE AMBIENTAL Y SST OBRAS INICIALES Y ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS (INCLUIDO A.I.U. COMPONENTE) (B)	7,0283%	
PLAN DE MANEJO DE TRASITO OBRAS ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS (INCLUIDO A.I.U. COMPONENTE) (C)	1,6791%	
COMPONENTE SOCIAL OBRAS INICIALES Y COMPLEMENTARIAS (INCLUIDO A.I.U. COMPONENTE) (D)	2,3030%	
TOTAL PROPUESTA ECONOMICA (CON ESTE VALOR SE EVALUARAN LAS OFERTAS ECONOMICAS DE		$ 142.266.533,95
PROVISIÓN PARA OBRAS ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS (F):		$ 509.411.381,00
VALOR TOTAL CONTRATO PROPUESTO A EJECUTAR (E) + (F:		$ 8.045.657.306,00

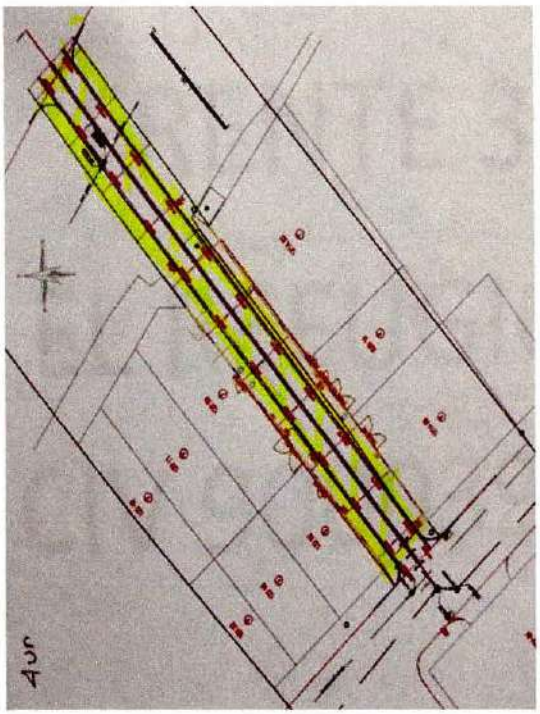
AIU % PROPUESTO	PORCENTAJE	FIRMA DEL PROPONENTE
Administración (% de los CD)	25,24%	
Imprevistos (%de los CD)	1,00%	
Utilidad (%de los CD)	5,00%	
AIU %	31,24%	

Nombre	Nombre	Nombre
VoBo Residente de obra	VoBo Director de obra	VoBo Interventoria

CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

CONTRATO 711-2024	INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS	DIRECCION:	LOCALIDAD DE FONTIBON
PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO DEL 2025	HASTA: 11 DE JULIO DEL 2026		ACTA DE OBRA N° 2

CODIGO	UNIDAD	ACTIVIDAD EJECUTADA
1,001	M2	REPLANTEO GENERAL

UBICACIÓN	ESQUEMA	MEDIDAS				ELEMENTOS	CANTIDAD
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
CIV							
9000181		74,34	6,00			446,03	446,03
					total		446,03

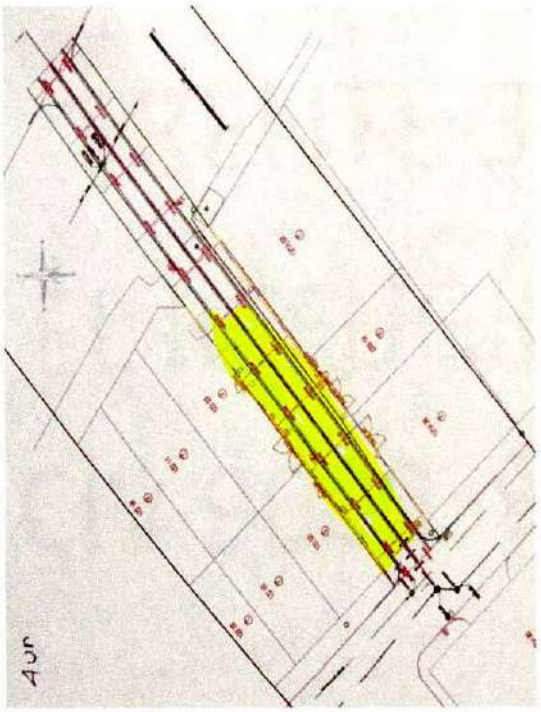


Nombre	Nombre	Nombre
VoBo Residente de obra	VoBo Director de obra	VoBo Interventoria

CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

CONTRATO 711-2024	INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS	DIRECCION:	LOCALIDAD DE FONTIBON
PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO DEL 2025	HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025		ACTA DE OBRA N° 2

CODIGO	UNIDAD	ACTIVIDAD EJECUTADA
1,002	M3	DEMOLICION PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

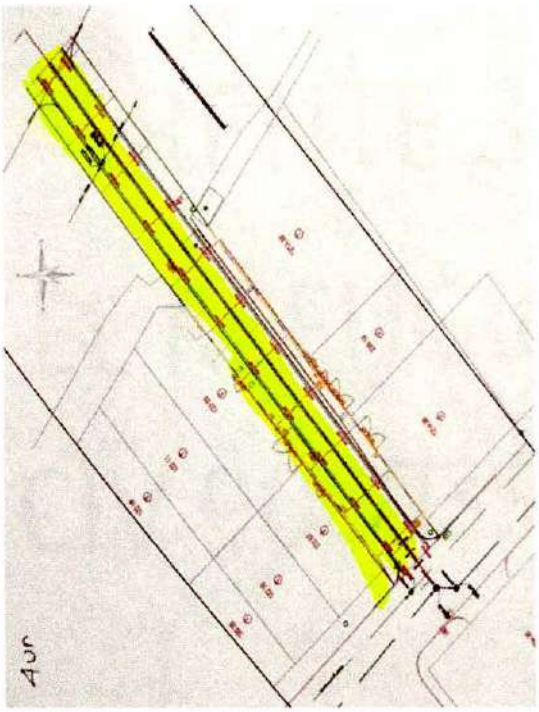
UBICACIÓN	ESQUEMA	MEDIDAS				ELEMENTOS	CANTIDAD
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
CIV							
PERIODO DESDE: 12 DE		43,30	6,00	0,10		25,98	25,98
		total					25,98

Nombre	Nombre	Nombre
	Michael Rivera	Alejandro Galindo
VoBo Residente de obra	VoBo Director de obra	VoBo Interventoria

CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

CONTRATO 711-2024	INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS	DIRECCION:	LOCALIDAD DE FONTIBON
PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO DEL 2025	HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025		ACTA DE OBRA N° 2

CODIGO	UNIDAD	ACTIVIDAD EJECUTADA
4613	m3	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)

UBICACIÓN	ESQUEMA	MEDIDAS				ELEMENTOS	CANTIDAD
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
CIV							
9000181		86,75	5	1,8		1,00	780,78
		total					780,78





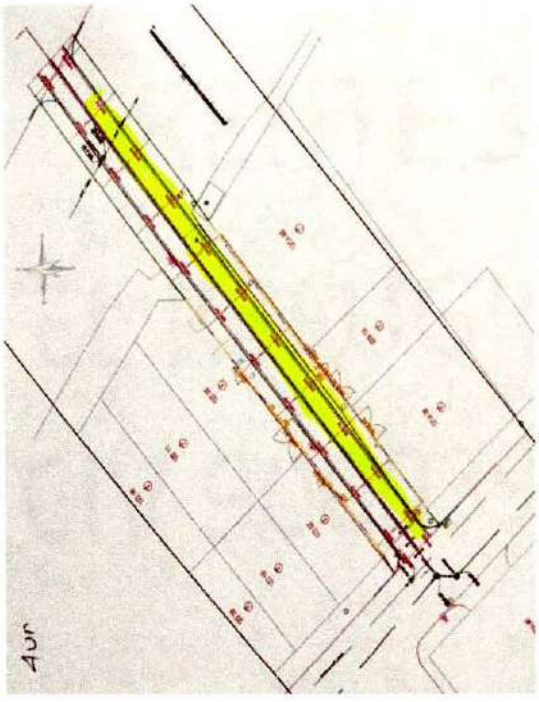


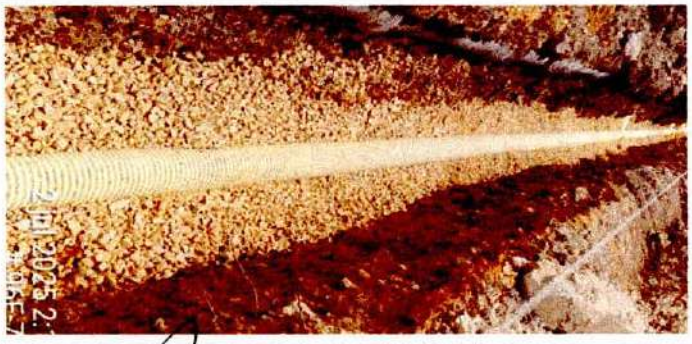
Nombre	Nombre	Nombre
VoBo Residente de obra	VoBo Director de obra	VoBo Interventoria

CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

CONTRATO 711-2024	INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS	DIRECCION:	LOCALIDAD DE FONTIBON
PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO DEL 2025	HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025		ACTA DE OBRA N° 2

CODIGO	UNIDAD	ACTIVIDAD EJECUTADA
2,001	ML	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

UBICACIÓN	ESQUEMA	MEDIDAS				ELEMENTOS	CANTIDAD
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
CIV							
9000181		45,40					45,40
		TOTAL					45,40

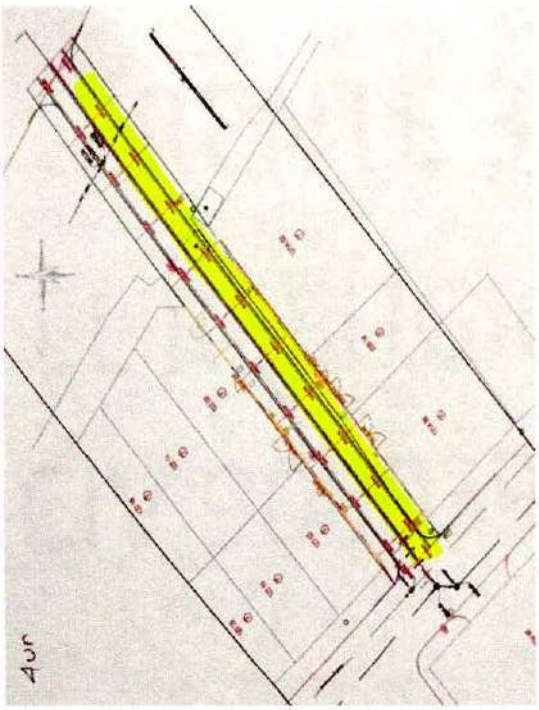


Nombre	Nombre	Nombre
VoBo Residente de obra	VoBo Director de obra	VoBo Interventoria

CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

CONTRATO 711-2024	INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS	DIRECCION:	LOCALIDAD DE FONTIBON
PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO DEL 2025	HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025		ACTA DE OBRA N° 2

CODIGO	UNIDAD	ACTIVIDAD EJECUTADA
2,009	M3	RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA 1/2" (SUMINISTRO, DISPOSICIÓN Y EXTENDIDO MANUAL)

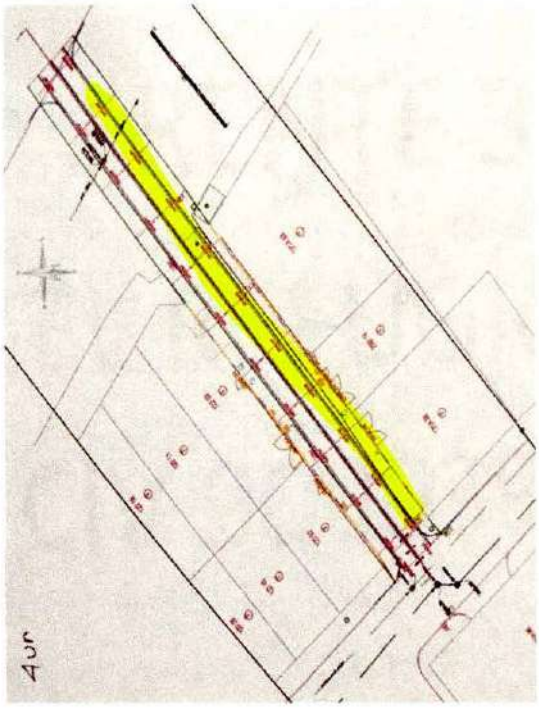
UBICACIÓN	ESQUEMA	MEDIDAS				ELEMENTOS	CANTIDAD
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
CIV							
9000181		60,76667	1,2	1		72,92	72,92
					TOTAL		72,92

Nombre	Nombre	Nombre
VoBo Residente de obra	VoBo Director de obra	VoBo Interventoria

CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

CONTRATO 711-2024	INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS	DIRECCION:	LOCALIDAD DE FONTIBON
PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO DEL 2025	HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025		ACTA DE OBRA N° 2

CODIGO	UNIDAD	ACTIVIDAD EJECUTADA
2,012	M2	ENTIBADO TIPO ED1, DISCONTINUO EN MADERA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

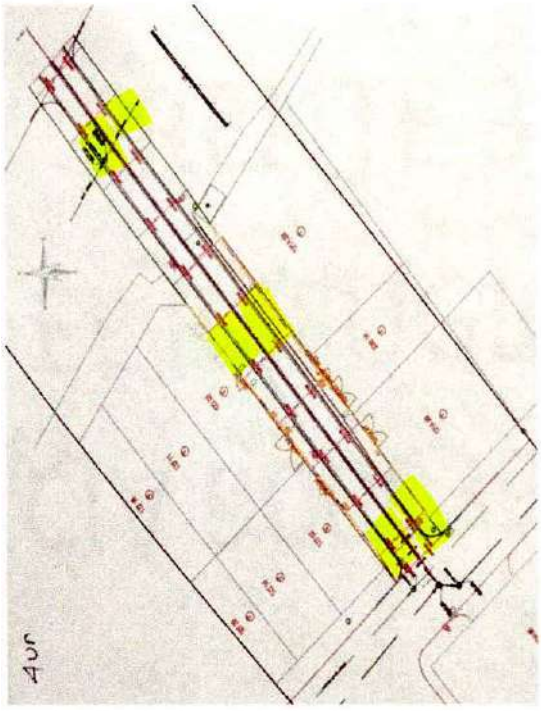
UBICACIÓN	ESQUEMA	MEDIDAS				ELEMENTOS	CANTIDAD
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
CIV							
9000181		87,258	5		436,29		436,29
		TOTAL					436,29

Nombre	Nombre	Nombre
VoBo Residente de obra	VoBo Director de obra	VoBo Interventoria

CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

CONTRATO 711-2024	INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS	DIRECCION:	LOCALIDAD DE FONTIBON
PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO DEL 2025	HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025		ACTA DE OBRA N° 2

CODIGO	UNIDAD	ACTIVIDAD EJECUTADA
2,015	UN	SUMIDERO LATERAL SL-100, H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA. INCL. SUMIN, FORM, REF. Y CONST. INCL. TAPA)

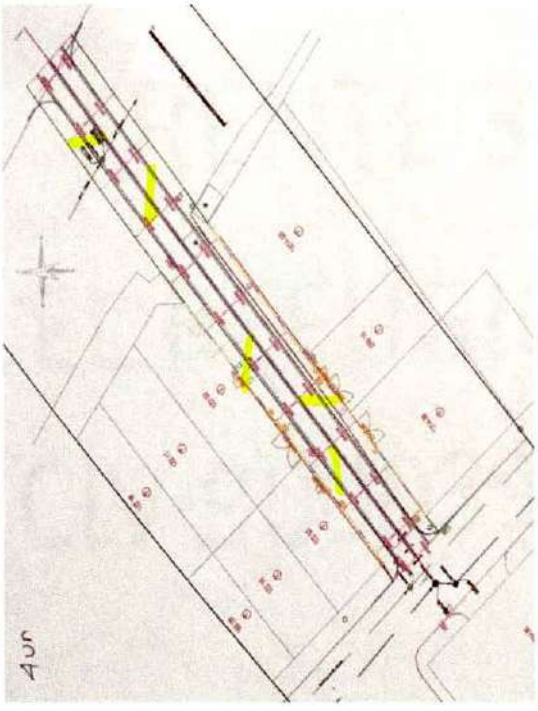
UBICACIÓN	ESQUEMA	MEDIDAS				ELEMENTOS	CANTIDAD
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
CIV							
9000181						4,00	4,00
		TOTAL					4

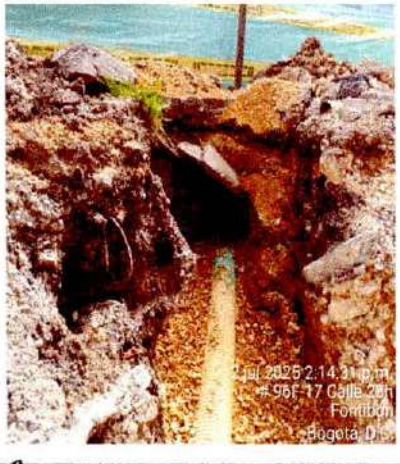
Nombre	Nombre	Nombre
VoBo Residente de obra	VoBo Director de obra	VoBo Interventoria

CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

CONTRATO 711-2024	INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS	DIRECCION:	LOCALIDAD DE FONTIBON
PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO DEL 2025	HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025		ACTA DE OBRA N° 2

CODIGO	UNIDAD	ACTIVIDAD EJECUTADA
2,017	ML	TUBERIA PVC SANITARIA D=6" TIPO U.S. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

UBICACIÓN	ESQUEMA	MEDIDAS				ELEMENTOS	CANTIDAD
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
CIV							
9000181		10,6				10,60	10,60
		TOTAL					10,60

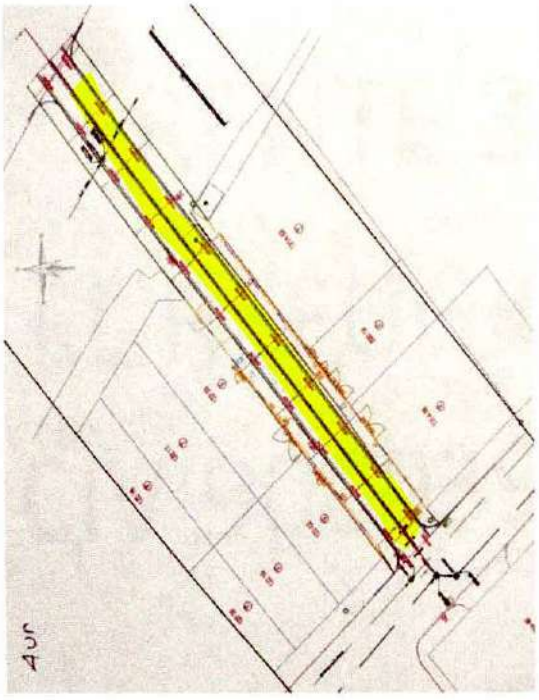


Nombre	Nombre	Nombre
VoBo Residente de obra	VoBo Director de obra	VoBo Interventoria

CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

CONTRATO 711-2024	INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS	DIRECCION:	LOCALIDAD DE FONTIBON
PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO DEL 2025	HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025		ACTA DE OBRA N° 2

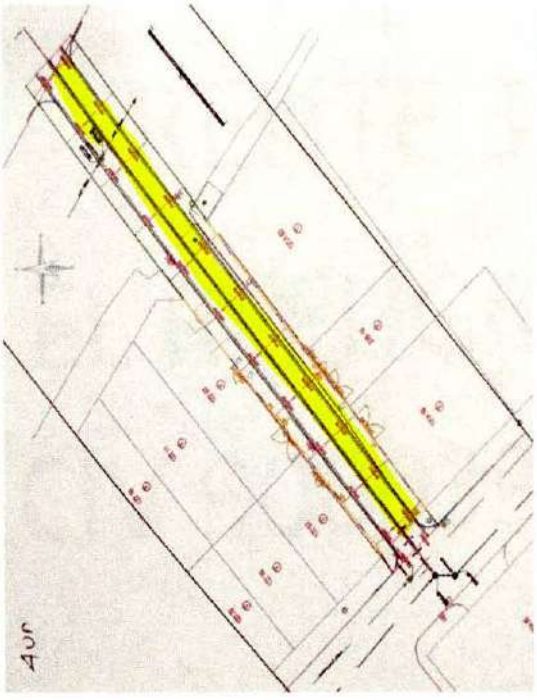
CODIGO	UNIDAD	ACTIVIDAD EJECUTADA
2,018	M3	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 3.5M (INCLUYE CARGUE)

UBICACIÓN	ESQUEMA	MEDIDAS				ELEMENTOS	CANTIDAD
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
CIV							
9000181		195,61	1,2	1,9			449,91

CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

CONTRATO 711-2024	INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS	DIRECCION:	LOCALIDAD DE FONTIBON
PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO DEL 2025	HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025		ACTA DE OBRA N° 2

CODIGO	UNIDAD	ACTIVIDAD EJECUTADA
2,019	M3	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACION EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM).

UBICACIÓN	ESQUEMA	MEDIDAS				ELEMENTOS	CANTIDAD
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
CIV							
9000181		112,26	1,2	1,9			258,2
		TOTAL					258,20

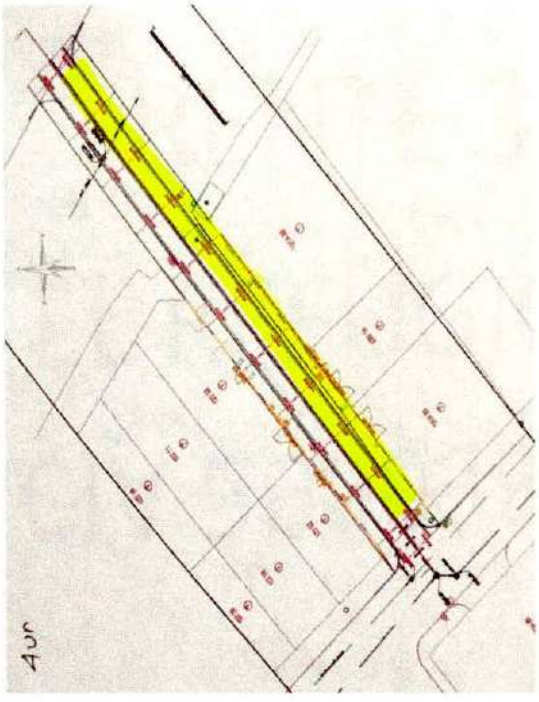


Nombre	Nombre	Nombre
VoBo Residente de obra	VoBo Director de obra	VoBo Interventoria

CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

CONTRATO 711-2024	INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS	DIRECCION:	LOCALIDAD DE FONTIBON
PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO DEL 2025	HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025		ACTA DE OBRA N° 2

CODIGO	UNIDAD	ACTIVIDAD EJECUTADA
2,020	UN	EMPATES DE TUBERIA EN PVC A PVC 6" LINEAL SEGUN NORMA NS-023. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACCESORIOS).

UBICACIÓN	ESQUEMA	MEDIDAS				ELEMENTOS	CANTIDAD
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
CIV							
9000181						4	4
		TOTAL					4,00

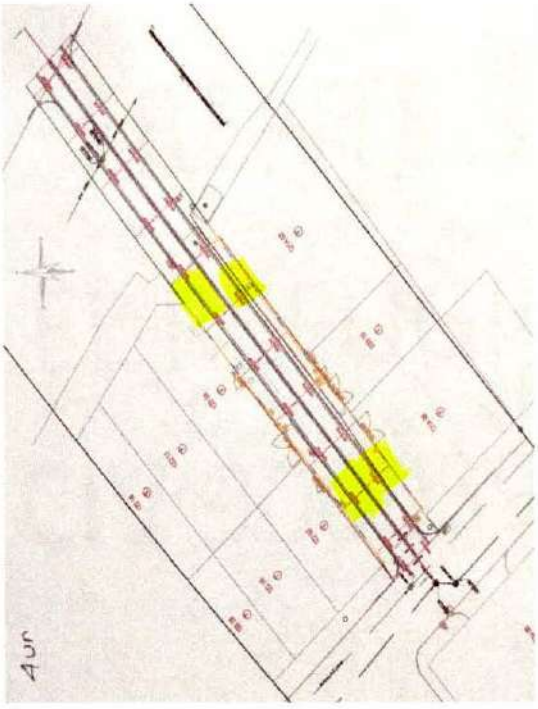


Nombre	Nombre	Nombre
VoBo Residente de obra	VoBo Director de obra	VoBo Interventoria

CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

CONTRATO 711-2024	INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS	DIRECCION:	LOCALIDAD DE FONTIBON
PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO DEL 2025	HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025		ACTA DE OBRA N° 2

CODIGO	UNIDAD	ACTIVIDAD EJECUTADA
1,003	M3	DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)

UBICACIÓN	ESQUEMA	MEDIDAS				ELEMENTOS	CANTIDAD
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
CIV							
9000181						4,00	4,00
		total					4,00

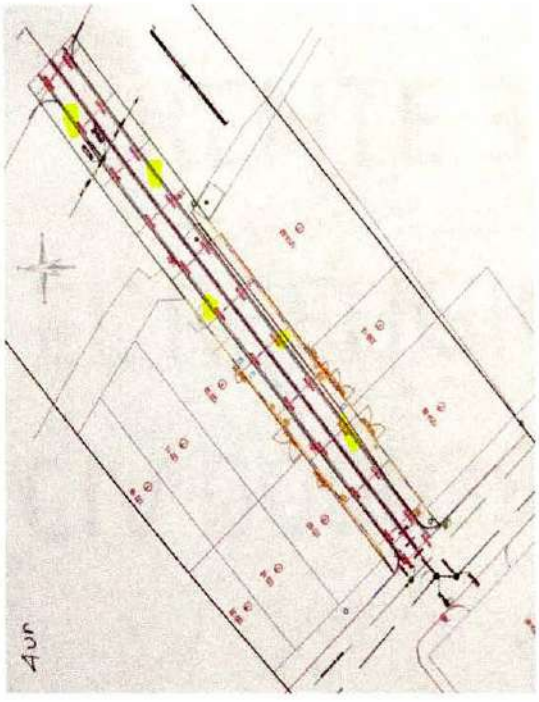


Nombre	Nombre	Nombre
VoBo Residente de obra	VoBo Director de obra	VoBo Interventoria

CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

CONTRATO 711-2024	INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS	DIRECCION:	LOCALIDAD DE FONTIBON
PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO DEL 2025	HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025		ACTA DE OBRA N° 2

CODIGO	UNIDAD	ACTIVIDAD EJECUTADA
2,024	UN	CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

UBICACIÓN	ESQUEMA	MEDIDAS				ELEMENTOS	CANTIDAD
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
CIV							
9000181						4	4
		TOTAL					4,00

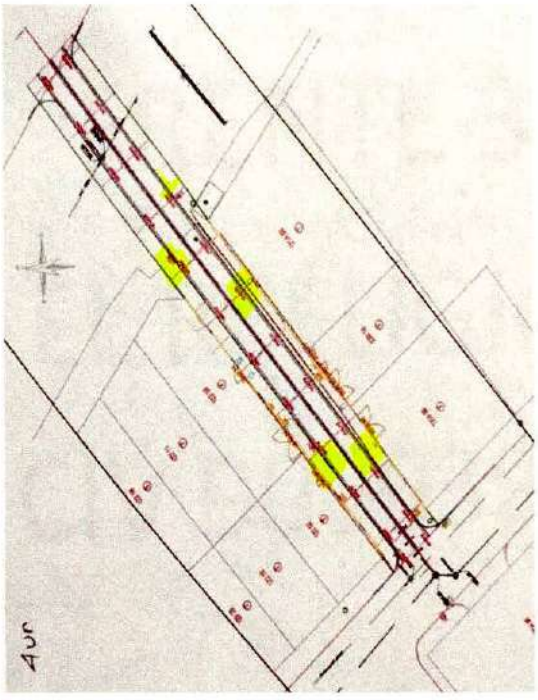


Nombre	Nombre	Nombre
VoBo Residente de obra	VoBo Director de obra	VoBo Interventoria

CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

CONTRATO 711-2024	INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS	DIRECCION:	LOCALIDAD DE FONTIBON
PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO DEL 2025	HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025		ACTA DE OBRA N° 2

CODIGO	UNIDAD	ACTIVIDAD EJECUTADA
2,027	UN	CAJA DE INSPECCION 0.80X0.8M. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (H=0.6M. INCLUYE MARCO Y TAPA, NO INCLUYE BASE Y CAÑUELA).

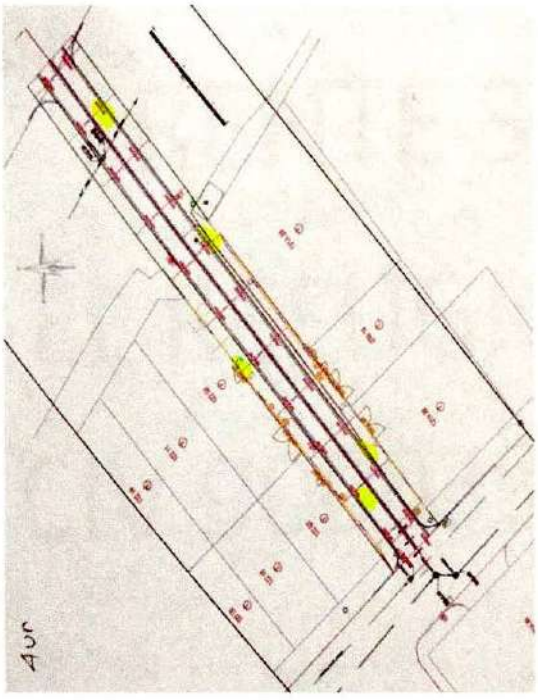
UBICACIÓN	ESQUEMA	MEDIDAS				ELEMENTOS	CANTIDAD
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
CIV							
9000181						4	4
		TOTAL					4,00

Nombre	Nombre	Nombre
VoBo Residente de obra	VoBo Director de obra	VoBo Interventoria

CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

CONTRATO 711-2024	INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS	DIRECCION:	LOCALIDAD DE FONTIBON
PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO DEL 2025	HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025		ACTA DE OBRA N° 2

CODIGO	UNIDAD	ACTIVIDAD EJECUTADA
2,034	UN	YEE PVC SANITARIA D=6"X 8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).

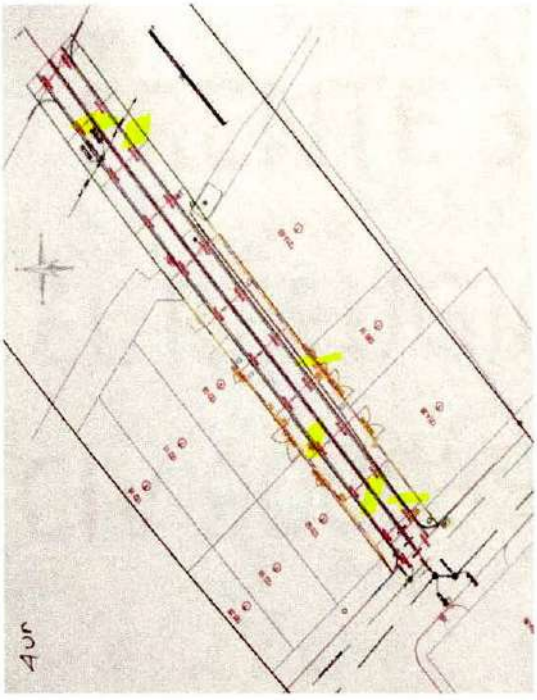
UBICACIÓN	ESQUEMA	MEDIDAS				ELEMENTOS	CANTIDAD
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
CIV							
9000181						4	4
		TOTAL					4,00

Nombre	Nombre	Nombre
VoBo Residente de obra	VoBo Director de obra	VoBo Interventoria

CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

CONTRATO 711-2024	INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS	DIRECCION:	LOCALIDAD DE FONTIBON
PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO DEL 2025	HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025		ACTA DE OBRA N° 2

CODIGO	UNIDAD	ACTIVIDAD EJECUTADA
2,036	ML	TUBERÍA PVC SANITARIA D=10" TIPO U.S. (Incluye suministro e instalación)

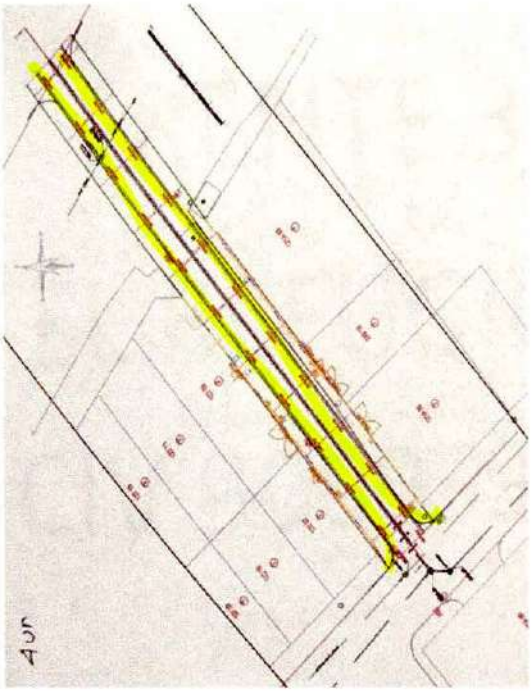
UBICACIÓN	ESQUEMA	MEDIDAS				ELEMENTOS	CANTIDAD
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
CIV							
9000181		45,9				45,90	45,90
					TOTAL		45,90

Nombre	Nombre	Nombre
VoBo Residente de obra	VoBo Director de obra	VoBo Interventoria

CONTRATISTA :CONSORCIO VIAS FONTIBON 2024

CONTRATO 711-2024	INFORME DE CANTIDADES EJECUTADAS	DIRECCION:	LOCALIDAD DE FONTIBON
PERIODO DESDE: 12 DE JUNIO DEL 2025	HASTA: 11 DE JULIO DEL 2025		ACTA DE OBRA N° 2

CODIGO	UNIDAD	ACTIVIDAD EJECUTADA
4,007	ML	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)

UBICACIÓN	ESQUEMA	MEDIDAS				ELEMENTOS	CANTIDAD
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA		
CIV							
9000181		83,60				83,60	83,60
