Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Bogotá D.C.,

Ingeniera
**DIANA MILENA MALDONADO TORRES**
Supervisora del Contrato Ministerio de Educación Nacional - MEN
dmaldonado@mineducacion.gov.co
Calle 43 # 57-14 Piso 3
Bogotá D.C.

**Ref:** **Contrato No. NO. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER**. Cuyo Objeto es "BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES PRIORITARIAS EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR DE LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS QUE SEAN DEFINIDAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN"

**Asunto**: Remisión Informe Mensual No. 19 / Contrato No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023

Estimada Doctora:

Me permito remitir el Informe de Gestión y ejecución No. 19 correspondiente al periodo de 02 de diciembre al 01 de enero de 2025, en cumplimiento de las obligaciones descritas en el anexo al contrato de la referencia.

Así mismo, y en caso de estar de acuerdo solicitamos amablemente emitir la aprobación de éste para soporte al Patrimonio Autónomo FINDETER MEN Aulas Móviles por Ola Invernal (Fiduciaria POPULAR S.A) con la siguiente información:

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MEN
AULAS MÓVILES POR OLA INVERNAL
Fiduciaria Popular S.A.
Carrera 13A No. 29-24 Pisos 20, 21 y 24
Bogotá

Cordialmente,

**HERNÁN PARDO BOTERO**
Gerente de Infraestructura GB

*Anexo lo enunciado*
*Elaboró: Geraldine Lorena Prada Pimiento- Profesional de la Gerencia de Infraestructura*
*Revisó: Jesús Alberto Cañas Páez – Gestor de la Gerencia de Infraestructura*

# CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023

## ATENCIÓN DE NECESIDADES PRIORITARIAS EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR DE LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS

**Periodo comprendido entre el 02 de diciembre al 01 de enero de 2025**

**Bogotá D.C.**

## TABLA DE CONTENIDO


1. **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO MARCO**
2. **ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO**
   - 2.1 OBLIGACIONES GENERALES
   - 2.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS
   - 2.3 ACTIVIDADES PRECONTRACTUALES
     - 2.3.1 Obligaciones
   - 2.4 ACTIVIDADES CONTRACTUALES
     - 2.4.1 Obligaciones
   - 2.5 ACTIVIDADES DE CIERRE Y LIQUIDACIÓN
     - 2.5.1 Obligaciones
3. **RESUMEN GENERAL DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL CONTRATO**
4. **ANEXOS**

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO MARCO

| | | |
|---|---|---|
| Objeto General: | Brindar Asistencia Técnica y Administración de Recursos para atender las necesidades prioritarias en infraestructura y dotación de mobiliario escolar de las sedes educativas afectadas por la temporada de lluvias que sean definidas por el Ministerio de Educación. | |
| Numero de Contrato: | CO1.PCCNTR. 4917031 | |
| Integrantes: | MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - MEN Y LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER | |
| Fecha de suscripción: | 05 de mayo de 2023 | |
| Perfeccionamiento | Póliza garantía aprobada 26 de mayo de 2023<br>Registro Presupuestal 02 de junio de 2023 | |
| Fecha de Inicio: | 02 de junio de 2023 | |
| Fecha de Terminación: | 01 de julio de 2025 | |
| Modificaciones: | Modificatorio No. 1.<br>Modificar la cláusula cuarta - plazo de ejecución del contrato, la cual quedará de la siguiente manera:<br>"El plazo previsto para la ejecución del Contrato Interadministrativo será a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, hasta el 01 de noviembre de 2024, plazo en el que se debe llevar a cabo la ejecución física del contrato y la liquidación de la contratación derivada que suscriba FINDETER." | |
| | Modificatorio No. 2.<br>"Prorrogar el plazo de ejecución del contrato número CO1.PCCNTR.4917031 de 2023, hasta el 01 de julio de 2025, plazo en el que se debe culminar la ejecución física de las obras de infraestructura educativa, dotación de aulas nuevas por reposición, y la liquidación de la contratación derivada suscrita por FINDETER." | |
| Aportes: | Valor de los recursos a administrar para la ejecución de los proyectos | $ 59.485.981.308 |
| | Porcentaje de Asistencia Técnica y Administración de Recursos a reconocer a FINDETER (7%) | $ 4.164.018.692 |
| Valor final del Contrato: | | $ 63.650.000.000 |
| Sociedad Fiduciaria: | FIDUCIARIA POPULAR S.A. | |

## 1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO

### 1.1 OBLIGACIONES GENERALES

1. *Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas en este contrato.*

En el transcurso del periodo actual, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. (FINDETER) asume con responsabilidad la tarea integral de estructurar, desarrollar y dar seguimiento a todas las actividades derivadas de la ejecución de las diversas obligaciones estipuladas en el contrato vigente. En virtud de su compromiso, FINDETER se esfuerza por cumplir con cada una de las responsabilidades asignadas, garantizando que cada etapa del contrato sea llevada a cabo de manera exitosa y en plena conformidad con los términos y condiciones acordadas previamente.

Es importante destacar que el compromiso de FINDETER no se limita únicamente a la ejecución técnica del contrato, sino que abarca también la garantía de la calidad y la excelencia en cada una de las etapas del proceso. La entidad se esfuerza por mantener altos estándares de rendimiento, asegurando que los resultados obtenidos sean de la más alta calidad posible y estén alineados con los objetivos y metas establecidas.

2. *Participar y apoyar al Ministerio de Educación Nacional en todas las reuniones periódicas a las que este lo convoque relacionadas con la ejecución del contrato que permitan realizar seguimiento integral a los avances de los proyectos.*

Durante el presente periodo FINDETER participó activamente y brindó el pleno apoyo al Ministerio de Educación Nacional en todas las reuniones periódicas a las que se convocaron, especialmente, aquellas relacionadas con la ejecución del contrato. FINDETER está comprometido con realizar un seguimiento integral y detallado de los avances del proyecto, por lo que se establecieron reuniones cada martes en la tarde a través del aplicativo Teams, reuniones programadas por FINDETER sobre las que realizan grabaciones y se informa los avances semanales.

Las fechas de las reuniones de seguimiento del periodo, sobre las cuales se realiza el acta correspondiente, la cual se adjunta al presente informe:

1. 02 de diciembre del 2024
2. 30 de diciembre del 2024

3. *Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la información objeto del presente contrato.*

FINDETER ha dispuesto todos los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la información objeto del presente contrato. La seguridad y confidencialidad de la información son de suma importancia, y se ha implementado medidas sólidas para garantizar su protección. Esto incluye la implementación de sistemas de almacenamiento seguro, protocolos de acceso restringido y medidas de respaldo que aseguran que la información esté resguardada de manera adecuada en todo momento. La prioridad es mantener la integridad de la información involucrada en el contrato, así mismo se habilitó los espacios adecuados en la Calle 103 No. 19-20 y en la segunda sede localizada en la Calle 104 # 18ª-65, piso 6 para tal fin.

4. *Entregar a EL MINISTERIO, periódicamente y al finalizar el contrato, o cuando el supervisor o interventor lo solicite, todos los documentos y archivos (físicos y electrónicos) a su cargo y que se produzcan en ejecución de sus obligaciones, lo anterior, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes en el Ministerio de Educación Nacional.*

Durante este periodo, FINDETER ha cumplido rigurosamente con la entrega de todos los documentos y archivos electrónicos que el MEN ha solicitado durante la ejecución del contrato. Esta entrega se realiza de manera periódica y al finalizar el contrato, tal como establecen las normas y disposiciones vigentes en el Ministerio de Educación Nacional. Además, en concordancia con las regulaciones vigentes, también se proporcionará dicha documentación cuando el supervisor o interventor así lo solicite. La prioridad es asegurar que todas las partes involucradas tengan acceso a la información necesaria y que cumplan con todas las obligaciones contractuales en cuanto a la entrega y custodia de documentación.

5. *Colaborar en el suministro y respuesta de la información correspondiente a los requerimientos efectuados por los organismos de control del Estado Colombiano o cualquier otra autoridad, en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato y de asuntos relacionados con el mismo.*

   En este periodo, FINDETER ha colaborado plenamente en el suministro y respuesta de toda la información correspondiente a los requerimientos efectuados por los Entes de Control del Estado Colombiano y cualquier otra autoridad pertinente. La cooperación en este sentido es absoluta y FINDETER está comprometido en proporcionar toda la información necesaria relacionada con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato, así como en asuntos relacionados con el mismo.

   Cumplir con los requisitos de los Entes de Control y las autoridades es fundamental para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en todas las acciones. La disposición a colaborar asegura que el proceso se realice de manera adecuada y en línea con las regulaciones y requerimientos establecidos por las autoridades correspondientes.

6. *Utilizar la imagen del Ministerio de Educación Nacional de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorización expresa y escrita de las partes ningún funcionario, podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole.*

   FINDETER ha seguido rigurosamente los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional en relación con el uso de su imagen. FINDETER es consciente de que, salvo autorización expresa y escrita de las partes involucradas, ningún funcionario puede utilizar el nombre, emblema o sello oficial del Ministerio con fines publicitarios o de cualquier otra índole. La colaboración se adhiere estrictamente a estas directrices para asegurar el respeto mutuo y la integridad en la utilización de la imagen y la identidad del Ministerio. Durante este periodo no se realizaron trámites que contengan la imagen del Ministerio de Educación Nacional.

7. *Guardar estricta confidencialidad sobre toda la información y los documentos obtenidos del MEN.*

   FINDETER ha mantenido una estricta confidencialidad sobre toda la información y los documentos obtenidos del Ministerio de Educación Nacional (MEN). Reconoce la importancia de salvaguardar la información confidencial y sensible proporcionada por el MEN, y se ha implementado medidas rigurosas para garantizar su protección. Se cumple con todas las regulaciones y acuerdos de confidencialidad establecidos para asegurar que la información no sea divulgada ni utilizada de manera inapropiada. El compromiso de FINDETER es mantener la integridad y confidencialidad de la información en todo momento.

8. *Realizar los pagos al SISS (salud, pensión y riesgos laborales), de acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago correspondientes.*

En el presente periodo, se han realizado los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral (SISS), incluyendo Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de acuerdo con la normatividad vigente.

Además, se pueden proporcionar los soportes de pago correspondientes como parte del compromiso con la legalidad y el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales. Cumplir con los requerimientos del SISS es fundamental para asegurar el bienestar de los colaboradores y garantizar el cumplimiento de las regulaciones pertinentes, lideradas por el área de gestión respectiva y validadas por la revisoría fiscal, soportes que serán presentados en el momento en el que se requiera.

## 1.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

a. *Presentar ante EL MINISTERIO dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes Al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (inicio SECOP), el cronograma de ejecución del objeto del Contrato Interadministrativo.*

FINDETER presentó en el periodo pasado ante el Ministerio de Educación Nacional, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (inicio SECOP), el cronograma actualizado de ejecución del objeto del Contrato Interadministrativo. FINDETER reconoce la importancia de establecer un cronograma claro y detallado para la ejecución de las actividades contractuales, y se ha cumplido con este requisito de manera oportuna. La intención es garantizar una planificación efectiva y transparente de las actividades a llevar a cabo, en consonancia con las regulaciones y directrices establecidas por el Ministerio.

b. *Crear una vez suscrito y legalizado el Contrato Interadministrativo, una cuenta contable para manejo exclusivo de los recursos de este Contrato Interadministrativo dentro del Patrimonio Autónomo constituido para tal fin por FINDETER.*

Una vez suscrito y legalizado el Contrato Interadministrativo, FINDETER ha creado una cuenta contable exclusiva para el manejo de los recursos de este contrato dentro del Patrimonio Autónomo constituido por FINDETER para tal fin. Se da cumplimiento a todos los requisitos y medidas establecidas para asegurar la correcta gestión financiera de los recursos relacionados con el Contrato Interadministrativo. La creación de esta cuenta contable específica en el Patrimonio Autónomo garantiza una administración transparente y adecuada de los recursos, en línea con las normativas y regulaciones pertinentes.

Por lo anteriormente mencionado, se crea la Cuenta de Ahorros No. 500-80465045-0 del Banco Popular para manejo exclusivo de los recursos de este contrato y respectivos reportes contables. Cabe recordar que, se adjuntó al Informe de Gestión N° 1 la Certificación de la Cuenta Bancaria.

Mediante correo electrónico del 24 de octubre de 2023, el MEN remitió oficio por parte del Ministerio de Hacienda, mediante el cual se oficializó la exención de gravamen financiero (GMF) de la cuenta del Patrimonio Autónomo. El cual se adjuntó en informes pasados.

c. *Administrar los recursos que transfiera EL MINISTERIO a través del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres- FNGRD a FINDETER a través del Patrimonio Autónomo constituido para cumplir con el objeto del presente contrato.*

FINDETER ha administrado de manera responsable los recursos que EL MINISTERIO ha transferido a través del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) a FINDETER, utilizando

el PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN AULAS MÓVILES POR OLA INVERNAL constituido por la Fiducia Mercantil FIDUCIARIA POPULAR S.A. para cumplir con el objeto del presente contrato.

El enfoque ha sido garantizar una gestión eficiente y transparente de los recursos para cumplir con los objetivos establecidos en el contrato. El uso adecuado de estos recursos es esencial para asegurar la ejecución exitosa de las actividades y proyectos acordados, en línea con las regulaciones y directrices establecidas por todas las partes involucradas.

d. *Presentar Informes mensuales y un informe final de ejecución financiera y técnica del presente Contrato, conforme los recursos aportados por EL FNGRD,*

Para el presente periodo, se presentará un informe mensual de ejecución financiera por el área de Negocios Fiduciarios de FINDETER y se ha presentado un informe técnico del presente contrato, conforme a los recursos aportados por el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD).

Estos informes son una parte integral de la transparencia y rendición de cuentas en la ejecución del contrato. A través de estos informes, se ha proporcionado una visión detallada de la utilización de los recursos, los avances técnicos logrados y otros aspectos relevantes de la ejecución del contrato. Cumplir con la presentación de estos informes es esencial para mantener una comunicación clara y abierta con EL MINISTERIO y garantizar que todas las partes estén informadas sobre el progreso y los resultados del contrato.

e. *El Patrimonio Autónomo — FINDETER deberá reintegrar mensualmente los rendimientos financieros (si los hubiere) a la Dirección del Tesoro Nacional o en los términos que establezca la normatividad aplicable, es decir, que no ingresan ni hacen parte del Patrimonio Autónomo constituido por FINDETER.*

El Patrimonio Autónomo - FINDETER reintegrará mensualmente los rendimientos financieros a la Dirección del Tesoro Nacional o en los términos que establezca la normatividad aplicable. Estos rendimientos financieros no ingresan ni hacen parte del Patrimonio Autónomo constituido por FINDETER, y la gestión de reintegro se realizará previa solicitud al Ministerio con el fin de que se informe la cuenta bancaria a la cual se debe realizar el mismo.

Este proceso de reintegro asegura la correcta gestión de los rendimientos generados por los recursos aportados y garantiza que estos sean manejados de acuerdo con las regulaciones y normativas pertinentes. De esta manera, se cumple con los requerimientos legales y se mantiene la transparencia en la administración financiera.

Para lo anterior, el 28 de agosto de 2023 se informa por el MEN la cuenta bancaria para el reintegro de rendimientos financieros del Contrato No. CO1.PCCNTR.4917031 la cual se indica a continuación:

| | |
|---|---|
| Entidad Financiera: | **Banco BBVA** |
| Tipo de Cuenta: | **Ahorros** |
| Número de Cuenta: | **309-054583** |
| Nombre de la cuenta: | **FIDUPREVISORA S.A FNGRD – COLOMBIA VITAL** |

## 1.3 ACTIVIDADES PRECONTRACTUALES

### 1.3.1 Obligaciones:

a. *Realizar la viabilización técnica y jurídica de los predios priorizados por EL MINISTERIO, cuando sea necesario y sea solicitado por el MEN.*

Durante el presente periodo, se llevó a cabo la viabilización técnica y jurídica priorizada por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) cada vez que ha sido necesario y solicitado por el MEN. La colaboración en este aspecto es esencial para asegurar que los predios sean evaluados y viabilizados de manera adecuada para cumplir con los requisitos técnicos necesarios. El compromiso es facilitar un proceso fluido y eficiente para que los predios sean utilizados de acuerdo con los objetivos y necesidades de cada Institución Educativa, siempre en línea con las regulaciones y disposiciones vigentes.

Durante el periodo, se finalizó la evaluación técnica y predial y que en resumen se describe a continuación en las siguientes tablas:

**RESUMEN EVALUACIÓN TÉCNICA DE SEDES**

| UNIFICACIÓN DE LISTADOS: INICIAL (150) + ADICIONALES (42) | |
|---|---|
| **SEDES VIABLES TÉCNICAMENTE** | **150** |

**RESUMEN EVALUACIÓN JURÍDICA DE SEDES**

| SEDES TOTAL (150) | |
|---|---|
| SIN DOCUMENTOS | 1 * |
| POSIBLE VIABILIDAD | 0 ** |
| NO VIABLE | 9 |
| **VIABLES TÉCNICA Y JURÍDICAMENTE** | **140** |
| TOTAL | 150 |

* Sin Documentos:

- Falta de documentos para evidenciar la propiedad y reciprocidad en la revisión y remisión de documentos por la ETC y/o rectores

** Posible Viabilidad:

- Falta documentación soporte para continuar con revisión
- Pendientes gestiones con terceros para saneamiento predial
- Trámites para obtención de sana posesión

Asimismo, en el presente periodo, el listado actualizado de sedes focalizadas son las siguientes:

| Consecutivo | ID MEN No. | Departamento | ETC | Municipio | IE | SEDE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | **Nariño** | PASTO | **Pasto** | I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE | I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - SEDE PRINCIPAL |
| 2 | 2 | **Córdoba** | CORDOBA | **Tuchín** | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ALVARO ULCUE CHOCUE | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ALVARO ULCUE CHOCUE |
| 3 | 3 | **Cauca** | CAUCA | **Bolívar** | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA NUESTRA SENORA DE LOS REMEDIOS | COLEGIO DEPARTAMENTAL NUESTRA SENORA DE LOS REMEDIOS |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | Cesar | VALLEDUPAR | Valledupar | INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ | IE ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ |
| 5 | 6 | Bolívar | BOLIVAR | Barranco de Loba | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR | I.E.T.A. LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR - SEDE PRINCIPAL |
| 6 | 7 | Santander | SANTANDER | Vélez | COLEGIO UNIVERSITARIO | COLEGIO UNIVERSITARIO |
| 7 | 8 | Nariño | NARIÑO | El Rosario | CENTRO EDUCATIVO LA CLAUDIA | CENTRO EDUCATIVO LA CLAUDIA |
| 8 | 9 | Bolívar | BOLIVAR | Barranco de Loba | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR | ATASCOZA |
| 9 | 10 | Bolívar | BOLIVAR | Barranco de Loba | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR | LOS CERRITOS |
| 10 | 11 | Guajira | LA GUAJIRA | Manaure | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | ESCUELA RURAL INDÍGENA KARALOUTAMANA |
| 11 | 12 | Cauca | CAUCA | Toribío | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PLAYA | CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO LA PLAYA - SEDE PRINCIPAL |
| 12 | 13 | Magdalena | MAGDALENA | Concordia | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE BASICA Y MEDIA SANTA CRUZ DE BALSAMO | ERM DE BALSAMO |
| 13 | 14 | Magdalena | MAGDALENA | Concordia | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE BASICA Y MEDIA SANTA CRUZ DE BALSAMO | JAR INF MIS PRIMEROS SUEÑOS |
| 14 | 16 | Cauca | CAUCA | Santander de Quilichao | INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO | DOMINGUILLO (sede principal) |
| 15 | 17 | Santander | SANTANDER | Betulia | INSTITUCION EDUCATIVA EL RAMO | CENTRO EDUCATIVO SANTA BARBARA |
| 16 | 18 | Atlántico | SOLEDAD | Soledad | INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO | INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE PRINCIPAL |
| 17 | 20 | Bolívar | BOLIVAR | Morales | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PALMA | LA ARCADIA |
| 18 | 22 | Cauca | CAUCA | El Tambo | I.E. HUISITO | HUISITO (sede principal) |
| 19 | 24 | Magdalena | MAGDALENA | El Banco | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ANTONIO NARIÑO | CENT EDUC RUR MIX JOSE DE LA PAZ VANEGA ORTIZ |
| 20 | 26 | Huila | HUILA | Acevedo | INSTITUCION EDUCATIVA BATEAS | BATEAS |
| 21 | 27 | Cauca | CAUCA | Piamonte | CENTRO EDUCATIVO PUERTO GUAYUYACO | ESCUELA RURAL MIXTA LA ESPANOLA |
| 22 | 28 | Córdoba | CORDOBA | Cotorra | INSTITUCION EDUCATIVA LOS AGUACATES | CENT EDUC LOS AGUACATES |
| 23 | 29 | Bolívar | BOLIVAR | Mompós | INSTITUCIÒN EDUCATIVA TÈCNICA AMBIENTAL DE TIERRA FIRME | I.E.T.A. AMBIENTAL DE TIERRA FIRME - SEDE PRINCIPAL |
| 24 | 30 | Cesar | CESAR | Curumaní | INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES | INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES |
| 25 | 32 | Magdalena | MAGDALENA | El Banco | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL SILVIA COTES DE BISWELL | ERM SANTA TERESA DE ISLITA |
| 27 | 34 | Guajira | RIOHACHA | Riohacha | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA #7 | APÜNIMA´ANA1 |
| 28 | 36 | Nariño | NARIÑO | Cumbal | INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCION DE TALLAMBI | INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCION DE TALLAMBI |
| 29 | 41 | Putumayo | PUTUMAYO | Puerto Asís | I. E. RUR CAUCACIA | ESC RUR MIX EL JARDIN ALTO TETEYE |
| 30 | 42 | Antioquia | ANTIOQUIA | Ciudad Bolívar | I. E. JOSE MARIA HERRAN | C. E. R. PAULINA PUERTA |
| 31 | 43 | Bolívar | BOLIVAR | San Martín de Loba | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA PESQUERA LEONIDAS ORTIZ ALVEAR DE CHIMÍ | PLAN BONITO |
| 32 | 44 | Cauca | CAUCA | La Vega | INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA SANTA RITA | INSTITUCION EDUCATIVA SANTA RITA (sede principal) |
| 33 | 45 | Cesar | CESAR | La Paz(Robles) | CENTRO EDUCATIVO INDIGENA CAÑO PADILLA YUKPA | SEDE EL COSO |
| 34 | 46 | Cauca | CAUCA | Balboa | C.E. BUENOS AIRES | CAPITANES |
| 35 | 48 | Cesar | VALLEDUPAR | Valledupar | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ | INSTITUTO TECNICO COMERCIAL JOSE EUGENIO MARTINEZ |
| 36 | 49 | Bolívar | BOLIVAR | Mompós | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DEL CHICAGUA | SAN LUIS |
| 37 | 50 | Guajira | MAICAO | Maicao | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2 | SEDE LA CAMPANA |
| 38 | 51 | Guajira | MAICAO | Maicao | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6 | YAMAIN - SEDE PRINCIPAL |
| 39 | 53 | Guajira | MAICAO | Maicao | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2 | SEDE KASICHE |
| 40 | 54 | Guajira | MAICAO | Maicao | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2 | SEDE WAYUUMA ANA |
| 41 | 56 | Arauca | ARAUCA | Saravena | CENTRO EDUCATIVO LA PAVA. | LA PAVA |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 57 | Putumayo | PUTUMAYO | Puerto Asís | I. E. RUR CAUCACIA | ESC RUR MIX EL PROGRESO |
| 43 | 58 | Cauca | CAUCA | Bolívar | INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO NUESTRA SENORA DEL CARMEN | CORRAL VIEJO |
| 44 | 59 | Cauca | CAUCA | Bolívar | INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO NUESTRA SENORA DEL CARMEN | NUESTRA SENORA DEL CARMEN (sede principal) |
| 45 | 60 | Guajira | RIOHACHA | Riohacha | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN | COOPERATIVO |
| 46 | 62 | Valle del Cauca | BUGA | Guadalajara de Buga | INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE | JHON F. KENNEDY |
| 47 | 64 | Atlántico | ATLANTICO | Galapa | INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA | INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA |
| 48 | 65 | Cauca | CAUCA | Balboa | I.E. OLAYA (ANTES C.E. OLAYA) | OLAYA (sede principal) |
| 49 | 66 | Antioquia | APARTADO | Apartadó | INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS | INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS |
| 50 | 67 | Tolima | TOLIMA | Santa Isabel | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BOLIVAR | LA HUMAREDA |
| 51 | 69 | Córdoba | CORDOBA | Planeta Rica | INSTITUCION EDUCATIVA LOMA AZUL | LOS CERROS |
| 52 | 70 | Córdoba | CORDOBA | Puerto Libertador | INSTITUCION EDUCATIVA PICA PICA VIEJO | ESC NVA LA SOLITA |
| 53 | 73 | Bolívar | BOLIVAR | Córdoba | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE TACAMOCHO | NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE TACAMOCHITO |
| 54 | 74 | Cesar | CESAR | El Paso | INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN | SEDE LA ESPERANZA |
| 55 | 75 | Cesar | CESAR | El Paso | INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN | SEDE EL VALLITO |
| 56 | 77 | Cesar | CESAR | El Paso | INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN | SEDE SAN ANGEL |
| 57 | 79 | Cesar | CESAR | El Paso | INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN | SEDE LA ESTACION |
| 58 | 83 | Atlántico | ATLANTICO | Repelón | INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS | INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS - SEDE PRINCIPAL |
| 59 | 84 | Atlántico | ATLANTICO | Repelón | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE VILLA ROSA | SEDE LA LOMA |
| 60 | 85 | Valle del Cauca | BUGA | Guadalajara de Buga | INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE | LA PLANTA |
| 61 | 86 | Antioquia | APARTADO | Apartadó | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO |
| 62 | 87 | Nariño | NARIÑO | BARBACOAS | INSTITUCION EDCUATIVA TERAIMBE | SEDE 9 CUMAINDE |
| 63 | 88 | Putumayo | PUTUMAYO | Puerto Leguízamo | IE RUR LUIS VIDALES DEL PIÑUÑA NEGRO | ESC RUR MIX PUERTO PRINCIPE DOS |
| 64 | 90 | Cauca | CAUCA | Bolívar | CENTRO EDUCATIVO EL TAMBO | LA FUENTE |
| 65 | 92 | Atlántico | ATLANTICO | Repelón | INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS | PITA |
| 66 | 93 | Cauca | CAUCA | Bolívar | INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CARMEN | EL CARMEN (sede principal) |
| 67 | 94 | Chocó | CHOCO | Carmen del Darién | CE PUEBLO NUEVO | CE PUEBLO NUEVO - SEDE PRINCIPAL |
| 68 | 95 | Guajira | RIOHACHA | Riohacha | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN | JOSE ANTONIO GALAN |
| 69 | 96 | Meta | VILLAVICENCIO | Villavicencio | INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO FRANCISCO ARANGO | ESCUELA SIETE DE AGOSTO |
| 70 | 97 | Cesar | CESAR | Curumaní | INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES | SEDE CHINELA |
| 71 | 98 | Cesar | CESAR | Curumaní | INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES | SEDE GUAIMARAL |
| 72 | 100 | Tolima | TOLIMA | Santa Isabel | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BOLIVAR | EL BRASIL |
| 73 | 101 | Cesar | CESAR | Curumaní | INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES | SEDE LOS SERRENOS |
| 74 | 103 | Córdoba | CORDOBA | Ayapel | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO | ESC NVA PARCELAS LONDRES |
| 75 | 104 | Cundinamarca | CUNDINAMARCA | Anolaima | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE HUGO ENCISO | ESCUELA RURAL EL DESCANSO |
| 76 | 105 | Chocó | CHOCO | Bahía Solano (Mutis) | IE LUIS LOPEZ DE MESA | SEDE DE SAN JOSE (HUACA) |
| 77 | 106 | Chocó | CHOCO | Bahía Solano (Mutis) | IE LUIS LOPEZ DE MESA | SEDE SIRENA DEL MAR |
| 78 | 107 | Chocó | CHOCO | Bahía Solano (Mutis) | IE LUIS LOPEZ DE MESA | SEDE SECUNDINO RIVAS |
| 79 | 110 | Nariño | NARIÑO | BARBACOAS | INSTITUCION EDUCATIVA TERAIMBE | SEDE 2 BOMBÓN |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 111 | Magdalena | MAGDALENA | Pueblo viejo | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS | ERM ISLA DE CATAQUITA |
| 81 | 112 | Magdalena | MAGDALENA | El Retén | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE | COL MPAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE |
| 82 | 113 | Magdalena | MAGDALENA | San Sebastián de Buenavista | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA | ERM MARIA AUXILIADORA |
| 83 | 114 | Magdalena | MAGDALENA | San Sebastián de Buenavista | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA | ERM LA PACHA |
| 84 | 117 | Guajira | RIOHACHA | Riohacha | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA #7 | WAKUAPAMANA |
| 85 | 118 | Antioquia | APARTADO | Apartadó | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO |
| 86 | 119 | Córdoba | CORDOBA | Montelíbano | INSTITUCION EDUCATIVA EL PALMAR | INSTITUCION EDUCATIVA EL PALMAR SEDE PRINCIPAL |
| 87 | 121 | Cauca | CAUCA | Piamonte | CENTRO EDUCATIVO PUERTO GUAYUYACO | ESC RUR MIX SAN ANDRESITO |
| 88 | 122 | Antioquia | TURBO | Turbo | I.E. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | E.U. JESUS MORA |
| 89 | 123 | Bolívar | BOLIVAR | Simití | INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CERRO DE VERACRUZ | CAMPO PAYARES |
| 90 | 124 | Bolívar | BOLIVAR | Simití | INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CERRO DE VERACRUZ | I.E. DEL CERRO DE VERACRUZ - SEDE PRINCIPAL |
| 91 | 125 | Cauca | CAUCA | Piamonte | INST EDUC AGRIC PIAMONTE | PIAMONTE (sede principal) |
| 92 | 126 | Magdalena | MAGDALENA | Pueblo viejo | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS | ERM EL TRIUNFO |
| 93 | 127 | Putumayo | PUTUMAYO | Orito | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL UMADA WUARRARA | ESC RUR MIX ALTO ORITO |
| 94 | 128 | Valle del Cauca | BUGA | Guadalajara de Buga | INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE | MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE - SEDE PRINCIPAL |
| 95 | 129 | Valle del Cauca | BUGA | Guadalajara de Buga | INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE | JULIAN MENDOZA GUERRERO |
| 96 | 130 | Valle del Cauca | BUGA | Guadalajara de Buga | INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE | LA HONDA |
| 97 | 132 | Norte de Santander | NORTE SANTANDER | La Playa | CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN PEDRO | SEDE LA PEÑA |
| 98 | 133 | Magdalena | MAGDALENA | El Banco | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL OSCAR PISCIOTTI NUMA | ERM INMACULADA CONCEPCION |
| 99 | 134 | Bolívar | BOLIVAR | María la Baja | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA | BUENOS AIRES |
| 100 | 135 | Bolívar | BOLIVAR | María la Baja | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA | I.E.T. AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA |
| 102 | 138 | Arauca | ARAUCA | Arauca | CENTRO EDUCATIVO MONSERRATE | CEAR MONSERRATE |
| 104 | 142 | Nariño | IPIALES | Ipiales | INSTITUCION EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL LOS PASTOS | ESCUELA LAS CRUCES |
| 105 | 143 | Guajira | LA GUAJIRA | Barrancas | CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL PROVINCIAL | CENTRO ETNOEDUCATIVO PROVINCIAL |
| 106 | 144 | Atlántico | SOLEDAD | Soledad | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE |
| 107 | 146 | Cesar | CESAR | Chimichagua | CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO | SEDE TRONCONAL |
| 108 | 147 | Cesar | CESAR | Chimichagua | CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO | SEDE PUERTO LA ESTANCIA |
| 109 | 148 | Cesar | CESAR | Chimichagua | CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO | SEDE TORRECILLA |
| 110 | 149 | Nariño | NARIÑO | Mallama (Piedrancha) | CENTRO EDUCATIVO MALLAMA | CENTRO EDUCATIVO DE MALLAMA |
| 111 | 150 | Chocó | CHOCO | Tadó | IE TECNICO AGROAMBIENTAL - MARIA AUXILIADORA | SEDE MARÍA AUXILIADORA DE MANUNGARA |
| 112 | 151 | Guajira | LA GUAJIRA | Maicao | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2 | SEDE LA ESTRELLA |
| 113 | 152 | Guajira | MAICAO | Maicao | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6 | YAMAIN - KASPOLIMANA |
| 114 | 153 | Guajira | LA GUAJIRA | Maicao | ESCUELA RURAL MIXTA TALOULUMA'ANA | ESCUELA RURAL MIXTA TALOULUMA'ANA |
| 115 | 154 | Magdalena | CIENAGA | Ciénaga | INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO |
| 116 | 156 | Magdalena | MAGDALENA | El Retén | INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE | SEDE CONC.ESC GENERAL GREGORIO GARZON |
| 117 | 158 | Valle del Cauca | BUGA | Guadalajara de Buga | INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE | SEDE CRISTOBAL COLON |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **118** | **161** | **Antioquia** | APARTADO | **Apartadó** | INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL GUINEO | CENTRO EDUCATIVO RURAL EL OSITO |
| **119** | **163** | **Cauca** | CAUCA | **La Vega** | I.E AGROPECUARIA SAN FRANCISCO JAVIER SEDE GARAY | I.E AGROPECUARIA SAN FRANCISCO JAVIER SEDE GARAY |
| **120** | **164** | **Cauca** | CAUCA | **Santander de Quilichao** | IE DOMINGUILLO | SEDE DOMINGO LASSO |
| **121** | **165** | **Cauca** | CAUCA | **Popayán** | IE COMUNEROS | Sede Principal |
| **122** | **172** | **Putumayo** | PUTUMAYO | **Puerto Asís** | E. RUR CAUCACIA - SEDE PRINCIPAL | Sede Principal |
| **123** | **173** | **Cauca** | CAUCA | **Piamonte** | ESC RUR MIX FRAY EZEQUIEL | ESC RUR MIX FRAY EZEQUIEL |
| **124** | **174** | **Cauca** | CAUCA | **Piamonte** | E.D.R PORTO GUAYUYACO SEDE PRINCIPAL | E.D.R PORTO GUAYUYACO SEDE PRINCIPAL |
| **125** | **175** | **Cauca** | CAUCA | **Rosas** | INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA | SANTA TERESITA (sede principal) |
| **126** | **178** | **Cauca** | CAUCA | **Rosas** | INSTITUCION EDUCATIVA MADRE CARIDAD BRADER | MADRE CARIDAD BRADER (sede principal) |
| **127** | **182** | **Cauca** | CAUCA | **Rosas** | INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO CORDOBA | LAS YERBAS |
| **128** | **183** | **Cauca** | CAUCA | **Rosas** | CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO LEON VALENCIA | LA DESPENSA |
| **129** | **184** | **Cauca** | CAUCA | **Rosas** | INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO CORDOBA | EL RETIRO |
| **130** | **186** | **Cauca** | CAUCA | **Rosas** | CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO LEON VALENCIA | EL ALTILLO |
| **131** | **187** | **Cauca** | CAUCA | **Rosas** | INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO CORDOBA | BELLAVISTA |
| **132** | **188** | **Cauca** | CAUCA | **Suarez** | IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA | Sede Principal |
| **133** | **189** | **Cauca** | CAUCA | **Suarez** | IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA | SEDE MARIA INMACULADA |
| **134** | **190** | **Cauca** | CAUCA | **Suarez** | IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA | SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER |
| **135** | **192** | **Atlántico** | SOLEDAD | **Soledad** | INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO | INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE CABICA |
| **136** | **194** | **Bolívar** | Bolívar | **Maria la Baja** | INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA AGROINDUSTRIAL DE FLAMENCO | EL NISPERO |
| **137** | **196** | **Atlántico** | Atlántico | **Malambo** | INSTITUCIÓN EDUCATIVA MESOLANDIA | Sede Principal |
| **138** | **202** | **Chocó** | CHOCO | **Tadó** | IE NORMAL SUPERIOR DEMETRIO SALAZAR CASTILLO | CENTRO EDUCATIVO ESCUELA FRANCISCO MIRANDA |
| **139** | **203** | **Antioquia** | TURBO | **Turbo** | IE SAN MARTIN DE PORRES | SEDE GONZALO MEJIA |

En este periodo es importante resaltar que, bajo este listado de sedes focalizadas para intervención técnica, ya se adelantó la verificación predial, la cual da como resultado 136 sedes a intervenir.

**Sedes despriorizar técnicamente:** se tuvo que despriorizar las siguientes 9 instituciones educativas de los siguientes grupos:

| GRUPO | ID MEN | Departamento | ETC | Municipio | IE | SEDE | OBERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **55** | Chocó | **CHOCO** | Tadó | **IE TECNICO AGROAMBIENTAL** | SEDE CAMPO ALEGRE | En un principio, la sede priorizada en el municipio de Tadó era la sede la sede Campo Alegre. Esta perteneciente a la IE Técnico Agroambiental, la cual actualmente cuenta con una matrícula según el Sistema Integrado de Matricula -Simat de 40 estudiantes; no obstante, en la etapa de viabilidad técnica y jurídica adelantada por el contratista designado por Findeter determinó que esta sede presentaba limitaciones técnicas, normativas y |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | administrativas por estar en zona de riesgo por inundación, por lo que se recomendó no efectuar intervención alguna. |
| | **120** | Antioquia | **TURBO** | Turbo | **I.E. DE DESARROLLO RURAL DE TURBO** | E.U. SANTISIMA TRINIDAD | Se tramito la exclusión del anexo "Listado de Instituciones Educativas Priorizadas por el MEN" a la sede IE. DE DESARROLLO RURAL DE TURBO EU SANTÍSIMA TRINIDAD., reemplazándola por la SEDE GONZALO MEJIA perteneciente a la IE. SAN MARTIN DE PORRES, ubicada en el municipio de Turbo, Antioquia en el marco del contrato de obra No. PAF-MENAM-O-049-2023 y contrato de interventoría No. PAF-MENAM-I-052-2023<br><br>Frente a lo anterior, es importante indicar en el presente concepto que, la solicitud se realiza enmarcada en el lineamiento dado por el Ministerio de Educación Nacional – MEN en Comité Técnico No. 30 No. CO1.PCCNTR.4917031 DE 2023 PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN AULAS MÓVILES POR OLA INVERNAL, de fecha 24 de enero de 2024 |
| **2** | **91** | Atlántico | **ATLANTICO** | Palmar de Varela | **INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL DE PALMAR DE VARELA** | JOSE MARIA CORDOBA | Esta institución Educativa se tuvo que despriorizar porque ya estaba intervenida por la gobernación de Atlántico |
| | **191** | Atlántico | **ATLANTICO** | Luruaco | **IE CORREGIMIENTO DE SAN JUAN DE TOCAGUA** | CORREGIMIENTO DE SAN JUAN DE TOCAGUA | Se despriorizo esta institución educativa, debido a que el MEN define que esta IE seria intervenida por el FFIE |
| **4** | **71** | Bolívar | **BOLIVAR** | Córdoba | **INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE TACAMOCHO** | TACAMOCHO (SEDE PRIMARIA) | Esta sede tuvo que ser despriorizada, debido a que en el año 2015 ante esta situación la Corporación autónoma ambiental Cormagdalena, mediante Contrato Interadministrativo 0-0019 de 2015 suscrito con la Universidad Nacional de Colombia, elabora un estudio del cual se destaca la siguiente consideración general: "A partir de este análisis se puede considerar que Tocomocho se encuentra ubicado, prácticamente en la |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | mitad del río, bajo la amenaza de inundaciones y procesos erosivos que se pueden activar en cualquier época". |
| | **139** | Magdalena | **MAGDALENA** | San Sebastián de Buenavista | **INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE TRONCOSO** | ERM DE JAIME | Esta sede tuvo que ser despriorizada, conforme a una recopilación de datos realizada por el contratista, JASA LTDA propone tener en cuenta que la ERM Jaime requiere una altura de palafito de 1,7 m, lo cual genera la construcción de acceso al aula, definida en el alcance contractual, de una infraestructura que debe contemplar el ingreso a toda la institución, siendo necesario la construcción de toda la sede con el fin de poder hacer funcional su ingreso.<br>La interventoría, CONSORCIO INTER EDUCATIVO G4 considera que no se deben realizar obras de infraestructura de mejoramiento y/o construcción, debido a lo planteado por el contratista y a que los mejoramientos no tendrían estabilidad por efectos de los daños que ocasionará la inundación y la construcción debe ser de toda la institución con palafitos de 1,70 m, lo cual supera el alcance contractual. |
| **9** | **33** | Capital Bogotá, D.C | BOGOTA | Bogotá, D.C. | **COLEGIO LA CHUCUA (IED)** | CENT EDUC DIST LA CHUCUA | Sede retirada mediante comité técnico No. 70 y comité fiduciario No. 45. |
| | **136** | Capital Bogotá, D.C. | BOGOTA | Bogotá, D.C. | **COLEGIO ESTRELLA DEL SUR (IED)** | COL DIST ESTRELLA DEL SUR | Sede retirada mediante comité técnico No. 70 y comité fiduciario No. 45. |
| | **141** | Santander | BARRANCABERMEJA | Barrancabermeja | **CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN** | CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN | Sede retirada mediante comité técnico No. 70 y comité fiduciario No. 45. |

De acuerdo con lo anterior se hace la inclusión de las siguientes 4 sedes educativas para tener un resultado total de intervención de 136 sedes educativas:

| ID MEN | Departamento | ETC | Municipio | IE | SEDE |
|---|---|---|---|---|---|
| 202 | Chocó | CHOCO | Tadó | IE NORMAL SUPERIOR DEMETRIO SALAZAR CASTILLO | CENTRO EDUCATIVO ESCUELA FRANCISCO MIRANDA |
| 203 | Antioquia | TURBO | Turbo | IE SAN MARTIN DE PORRES | SEDE GONZALO MEJIA |
| 196 | Atlántico | Atlántico | Malambo | INSTITUCIÓN EDUCATIVA MESOLANDIA | Sede Principal |
| 194 | Bolívar | Bolívar | Maria la Baja | INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA AGROINDUSTRIAL DE FLAMENCO | EL NISPERO |

La viabilización jurídica de los predios priorizados por el Ministerio se realiza de manera eficiente, siempre que sea necesario y solicitado por el Ministerio de Educación Nacional (MEN). Es un paso fundamental para garantizar el adecuado desarrollo de proyectos educativos y el cumplimiento de los objetivos establecidos por el MEN, de acuerdo con lo anterior, en este periodo quedo la verificación predial y técnica así:

| SEDES TOTAL INICIAL (150) | |
|---|---|
| SIN DOCUMENTOS | 1 * |
| POSIBLE VIABILIDAD | 0 ** |
| NO VIABLE | 9 |
| **VIABLES TÉCNICA Y JURÍDICAMENTE** | **140** |
| TOTAL | 150 |

| SEDES NUEVAS A PRIORIZAR (9) | |
|---|---|
| POSIBLE VIABILIDAD | 1 * |
| **VIABLES JURÍDICAMENTE** | 8 |
| TOTAL | 9 |

| SEDES PRIORIZACIÓN ACTUALIZADA (136) | |
|---|---|
| SEDES INICIALMENTE PRIORIZADAS | 141 |
| SEDES DESPRIORIZADAS | 9 |
| SEDES NUEVAS INCLUIDAS | 4 |
| **TOTAL** | **136** |

b. *En consideración a que los proyectos a atender por este contrato se ejecutaran en el marco del Decreto de Emergencia, FINDETER debe acudir a lo establecido en su manual de contratación que permita que los procesos de selección sean eficientes y puedan ser proyectos de respuesta rápida.*

FINDETER implementa en el marco de lo establecido en el Manual Operativo la contratación que permita la ejecución eficiente de los procesos de selección que permita pluralidad de oferentes, asimismo, durante el proceso de ejecución, se ha establecido en la estructuración, la necesidad de optimizar tiempos de respuesta rápidos con sistemas constructivos industrializados.

c. *Elaborar los Estudios Previos e insumos precontractuales para la contratación de las obras y suministros necesarios para atender las necesidades prioritarias en infraestructura y dotación de mobiliario escolar de las sedes educativas afectadas por la temporada de lluvias que sean definidas por el Ministerio de Educación. Así como las interventorías correspondientes, solicitando que se*

*acaten los principios que rigen la contratación pública, incluyendo la solicitud de las respectivas garantías que ampare cada contrato con siguientes riesgos: anticipo (si lo hubiere), calidad, cumplimiento, estabilidad de la obra, salarios y prestaciones sociales, responsabilidad civil extracontractual y todo riesgo de construcción, según sea aplicable.*

## Proyectos en proceso de estructuración

Se han elaborado los Estudios Previos e insumos precontractuales necesarios para la contratación de obras y suministros dirigidos a atender las necesidades prioritarias en infraestructura y dotación de mobiliario escolar en las sedes educativas afectadas por la temporada de lluvias, para apertura de las diferentes convocatorias, tal como ha sido definido por el Ministerio de Educación. Estos estudios y documentos precontractuales son esenciales para establecer las bases de las futuras contrataciones y asegurar la correcta ejecución de los proyectos.

Además, se ha solicitado que, en la contratación de las obras y suministros, así como en las interventorías correspondientes, se respeten los principios que rigen la contratación pública. Esto garantiza la transparencia, la igualdad de oportunidades y la eficiencia en los procesos de contratación.

Asimismo, se ha requerido la inclusión de las garantías correspondientes para amparar los diferentes riesgos asociados a cada contrato. Estas garantías incluyen aspectos como el anticipo, la calidad de la obra, el cumplimiento de los plazos, la estabilidad de la construcción, los salarios y prestaciones sociales de los trabajadores, la responsabilidad civil extracontractual y los posibles riesgos de construcción. Esto proporciona seguridad tanto para la entidad contratante como para los contratistas y contribuye a la adecuada ejecución de los proyectos en línea con las normativas y estándares requeridos.

En el presente periodo se establece definitivamente la estructuración y la contratación de los grupos de contratación de acuerdo con el siguiente listado:

| GRUPO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | ID MEN No. | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SEDE | VR. TOTAL AULAS Y MEJORAMIENTO | VR. INTERVENTORÍA | VR. TOTAL OBRA + INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antioquia | Apartadó | 66 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS | INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS | 624.000.000 | 46.800.000 | 670.800.000 |
| | | | 86 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO | 291.200.000 | 21.840.000 | 313.040.000 |
| | | | 118 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO | 661.678.027 | 49.625.852 | 711.303.879 |
| | | | 161 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL GUINEO | CENTRO EDUCATIVO RURAL EL OSITO | 403.329.013 | 30.249.676 | 433.578.689 |
| | | Turbo | 120 | I.E. DE DESARROLLO RURAL DE TURBO | E.U. SANTISIMA TRINIDAD | 312.000.000 | 23.400.000 | 335.400.000 |
| | | | 122 | I.E. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | E.U. JESUS MORA | 499.200.000 | 37.440.000 | 536.640.000 |
| | | Ciudad Bolívar | 42 | I. E. JOSE MARIA HERRAN | C. E. R. PAULINA PUERTA | 124.800.000 | 9.360.000 | 134.160.000 |
| | Chocó | Carmen del Darién | 94 | CE PUEBLO NUEVO | CE PUEBLO NUEVO - SEDE PRINCIPAL | 522.668.285 | 39.200.121 | 561.868.406 |
| | | Tadó | 55 | IE TECNICO AGROAMBIENTAL | SEDE CAMPO ALEGRE | 266.693.962 | 20.002.047 | 286.696.010 |
| | | | 150 | IE TECNICO AGROAMBIENTAL | SEDE MARÍA AUXILIADORA DE MANUNGARA | 124.800.000 | 9.360.000 | 134.160.000 |
| 2 | Atlántico | Galapa | 64 | INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA | INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA | 624.000.000 | 46.800.000 | 670.800.000 |

| GRUPO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | ID MEN No. | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SEDE | VR. TOTAL AULAS Y MEJORAMIENTO | VR. INTERVENTORÍA | VR. TOTAL OBRA + INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Palmar de Varela | 91 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL DE PALMAR DE VARELA | JOSE MARIA CORDOBA | 561.600.000 | 42.120.000 | 603.720.000 |
| | | Repelón | 83 | INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS | INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS - SEDE PRINCIPAL | 332.800.000 | 24.960.000 | 357.760.000 |
| | | | 84 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE VILLA ROSA | SEDE LA LOMA | 229.439.280 | 17.207.946 | 246.647.226 |
| | | | 92 | INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS | PITA | 220.727.086 | 16.554.531 | 237.281.617 |
| | | Soledad | 18 | INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO | INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE PRINCIPAL | 665.600.000 | 49.920.000 | 715.520.000 |
| | | | 144 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE | 915.200.000 | 68.640.000 | 983.840.000 |
| | | | 192 | INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO | INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE CABICA | 372.384.464 | 27.928.835 | 400.313.298 |
| | | Luruaco | 191 | IE CORREGIMIENTO DE SAN JUAN DE TOCAGUA | CORREGIMIENTO DE SAN JUAN DE TOCAGUA | 249.600.000 | 18.720.000 | 268.320.000 |
| 3 | Magdalena | Ciénaga | 154 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO | 1.414.400.000 | 106.080.000 | 1.520.480.000 |
| | | El Retén | 112 | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE | COL MPAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE | 2.801.018.341 | 210.076.376 | 3.011.094.717 |
| | | | 156 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE | SEDE CONC.ESC GENERAL GREGORIO GARZON | 436.800.000 | 32.760.000 | 469.560.000 |
| | | Pueblovieljo | 111 | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS | ERM ISLA DE CATAQUITA | 83.200.000 | 6.240.000 | 89.440.000 |
| | | | 126 | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS | ERM EL TRIUNFO | 166.400.000 | 12.480.000 | 178.880.000 |
| 4 | Bolívar | Córdoba | 71 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE TACAMOCHO | TACAMOCHO (SEDE PRIMARIA) | 447.519.640 | 33.563.973 | 481.083.613 |
| | | | 73 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE TACAMOCHO | NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE TACAMOCHITO | 493.484.507 | 37.011.338 | 530.495.845 |
| | | Mompós | 29 | INSTITUCIÒN EDUCATIVA TÈCNICA AMBIENTAL DE TIERRA FIRME | I.E.T.A. AMBIENTAL DE TIERRA FIRME - SEDE PRINCIPAL | 1.125.688.392 | 84.426.629 | 1.210.115.022 |
| | | | 49 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DEL CHICAGUA | SAN LUIS | 340.577.024 | 25.543.277 | 366.120.301 |
| | Magdalena | San Sebastián de Buenavista | 113 | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA | ERM MARIA AUXILIADORA | 488.073.254 | 36.605.494 | 524.678.748 |
| | | | 114 | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA | ERM LA PACHA | 623.194.392 | 46.739.579 | 669.933.972 |
| | | | 139 | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE TRONCOSO | ERM DE JAIME | 161.669.820 | 12.125.237 | 173.795.057 |
| 5 | Bolívar | Barranco de Loba | 6 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR | I.E.T.A. LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR - SEDE PRINCIPAL | 468.319.640 | 35.123.973 | 503.443.613 |
| | | | 9 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR | ATASCOZA | 364.668.644 | 27.350.148 | 392.018.792 |
| | | | 10 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR | LOS CERRITOS | 296.559.820 | 22.241.987 | 318.801.807 |
| | | San Martín de Loba | 43 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA PESQUERA LEONIDAS ORTIZ ALVEAR DE CHIMÍ | PLAN BONITO | 233.285.404 | 17.496.405 | 250.781.809 |
| | Cesar | Chimichagua | 146 | CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO | SEDE TRONCONAL | 133.346.981 | 10.001.024 | 143.348.005 |
| | | | 147 | CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO | SEDE PUERTO LA ESTANCIA | 130.159.820 | 9.761.987 | 139.921.807 |
| | | | 148 | CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO | SEDE TORRECILLA | 124.800.000 | 9.360.000 | 134.160.000 |

| GRUPO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | ID MEN No. | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SEDE | VR. TOTAL AULAS Y MEJORAMIENTO | VR. INTERVENTORÍA | VR. TOTAL OBRA + INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Curumaní | 30 | INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES | INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES | 603.200.000 | 45.240.000 | 648.440.000 |
| | | | 97 | INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES | SEDE CHINELA | 83.200.000 | 6.240.000 | 89.440.000 |
| | | | 98 | INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES | SEDE GUAIMARAL | 124.800.000 | 9.360.000 | 134.160.000 |
| | | | 101 | INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES | SEDE LOS SERRENOS | 83.200.000 | 6.240.000 | 89.440.000 |
| | Magdalena | Concordia | 13 | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE BASICA Y MEDIA SANTA CRUZ DE BALSAMO | ERM DE BALSAMO | 485.009.460 | 36.375.710 | 521.385.170 |
| | | | 14 | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE BASICA Y MEDIA SANTA CRUZ DE BALSAMO | JAR INF MIS PRIMEROS SUEÑOS | 161.669.820 | 12.125.237 | 173.795.057 |
| | | El Banco | 24 | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ANTONIO NARIÑO | CENT EDUC RUR MIX JOSE DE LA PAZ VANEGA ORTIZ | 546.091.802 | 40.956.885 | 587.048.688 |
| | | | 32 | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL SILVIA COTES DE BISWELL | ERM SANTA TERESA DE ISLITA | 244.487.366 | 18.336.552 | 262.823.918 |
| | | | 133 | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL OSCAR PISCIOTTI NUMA | ERM INMACULADA CONCEPCION | 192.455.361 | 14.434.152 | 206.889.513 |
| 6 | Cesar | El Paso | 74 | INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN | SEDE LA ESPERANZA | 291.200.000 | 21.840.000 | 313.040.000 |
| | | | 75 | INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN | SEDE EL VALLITO | 145.600.000 | 10.920.000 | 156.520.000 |
| | | | 77 | INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN | SEDE SAN ANGEL | 65.079.910 | 4.880.993 | 69.960.903 |
| | | | 79 | INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN | SEDE LA ESTACION | 132.643.683 | 9.948.276 | 142.591.959 |
| | | La Paz (Robles) | 45 | CENTRO EDUCATIVO INDIGENA CAÑO PADILLA YUKPA | SEDE EL COSO | 150.447.043 | 11.283.528 | 161.730.571 |
| | | Valledupar | 4 | INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ | IE ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ | 457.600.000 | 34.320.000 | 491.920.000 |
| | | | 48 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ | INSTITUTO TECNICO COMERCIAL JOSE EUGENIO MARTINEZ | 956.800.000 | 71.760.000 | 1.028.560.000 |
| 7 | Guajira | Barrancas | 143 | CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL PROVINCIAL | CENTRO ETNOEDUCATIVO PROVINCIAL | 249.600.000 | 18.720.000 | 268.320.000 |
| | | Maicao | 50 | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2 | SEDE LA CAMPANA | 499.200.000 | 37.440.000 | 536.640.000 |
| | | | 51 | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6 | YAMAIN - SEDE PRINCIPAL | 62.400.000 | 4.680.000 | 67.080.000 |
| | | | 53 | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2 | SEDE KASICHE | 339.830.481 | 25.487.286 | 365.317.767 |
| | | | 54 | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2 | SEDE WAYUUMA ANA | 127.479.910 | 9.560.993 | 137.040.903 |
| | | | 151 | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2 | SEDE LA ESTRELLA | 314.679.910 | 23.600.993 | 338.280.903 |
| | | | 152 | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6 | YAMAIN - KASPOLIMANA | 252.966.903 | 18.972.518 | 271.939.421 |
| | | | 153 | ESCUELA RURAL MIXTA TALOULUMA'ANA | ESCUELA RURAL MIXTA TALOULUMA'ANA | 857.226.526 | 64.291.989 | 921.518.516 |
| | | Manaure | 11 | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | ESCUELA RURAL INDÍGENA KARALOUTAMANA | 190.566.903 | 14.292.518 | 204.859.421 |
| | | Riohacha | 34 | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA #7 | APÜNIMA´ANA1 | 252.279.910 | 18.920.993 | 271.200.903 |
| | | | 60 | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN | COOPERATIVO | 416.000.000 | 31.200.000 | 447.200.000 |
| | | | 95 | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN | JOSE ANTONIO GALAN | 374.400.000 | 28.080.000 | 402.480.000 |
| | | | 117 | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA #7 | WAKUAPAMANA | 224.079.460 | 16.805.960 | 240.885.420 |
| 8 | Bolívar | María la Baja | 134 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA | BUENOS AIRES | 249.600.000 | 18.720.000 | 268.320.000 |
| | | | 135 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA | I.E.T. AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA | 1.800.127.638 | 135.009.573 | 1.935.137.211 |

| GRUPO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | ID MEN No. | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SEDE | VR. TOTAL AULAS Y MEJORAMIENTO | VR. INTERVENTORÍA | VR. TOTAL OBRA + INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Córdoba | Ayapel | 103 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO | ESC NVA PARCELAS LONDRES | 220.984.367 | 16.573.828 | 237.558.194 |
| | | Cotorra | 28 | INSTITUCION EDUCATIVA LOS AGUACATES | CENT EDUC LOS AGUACATES | 124.800.000 | 9.360.000 | 134.160.000 |
| | | Montelíbano | 119 | INSTITUCION EDUCATIVA EL PALMAR | ESCUELA NUEVA MIXTA DIVINO SALVADOR | 745.087.893 | 55.881.592 | 800.969.485 |
| | | Planeta Rica | 69 | INSTITUCION EDUCATIVA LOMA AZUL | LOS CERROS | 430.464.507 | 32.284.838 | 462.749.345 |
| | | Puerto Libertador | 70 | INSTITUCION EDUCATIVA PICA PICA VIEJO | ESC NVA LA SOLITA | 254.085.404 | 19.056.405 | 273.141.809 |
| | | Tuchín | 2 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ALVARO ULCUE CHOCUE | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ALVARO ULCUE CHOCUE | 1.074.838.830 | 80.612.912 | 1.155.451.742 |
| 9 | Arauca | Arauca | 138 | CENTRO EDUCATIVO MONSERRATE | CEAR MONSERRATE | 299.239.730 | 22.442.980 | 321.682.710 |
| | | Saravena | 56 | CENTRO EDUCATIVO LA PAVA. | LA PAVA | 83.200.000 | 6.240.000 | 89.440.000 |
| | Bolívar | Morales | 20 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PALMA | LA ARCADIA | 83.200.000 | 6.240.000 | 89.440.000 |
| | | Simití | 123 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CERRO DE VERACRUZ | CAMPO PAYARES | 232.352.784 | 17.426.459 | 249.779.243 |
| | | | 124 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CERRO DE VERACRUZ | I.E. DEL CERRO DE VERACRUZ - SEDE PRINCIPAL | 595.799.550 | 44.684.966 | 640.484.516 |
| | Capital Bogotá, D.C. | Bogotá, D.C. | 33 | COLEGIO LA CHUCUA (IED) | CENT EDUC DIST LA CHUCUA | 332.800.000 | 24.960.000 | 357.760.000 |
| | | | 136 | COLEGIO ESTRELLA DEL SUR (IED) | COL DIST ESTRELLA DEL SUR | 166.400.000 | 12.480.000 | 178.880.000 |
| | Cundinamarca | Anolaima | 104 | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE HUGO ENCISO | ESCUELA RURAL EL DESCANSO | 190.313.503 | 14.273.513 | 204.587.016 |
| | Meta | Villavicencio | 96 | INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO FRANCISCO ARANGO | ESCUELA SIETE DE AGOSTO | 924.437.134 | 69.332.785 | 993.769.919 |
| | Norte de Santander | La Playa | 132 | CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN PEDRO | SEDE LA PEÑA | 41.600.000 | 3.120.000 | 44.720.000 |
| | Santander | Barrancabermeja | 141 | CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN | CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN | 494.421.269 | 37.081.595 | 531.502.864 |
| | | Betulia | 17 | INSTITUCION EDUCATIVA EL RAMO | CENTRO EDUCATIVO SANTA BARBARA | 62.400.000 | 4.680.000 | 67.080.000 |
| | | Vélez | 7 | COLEGIO UNIVERSITARIO | COLEGIO UNIVERSITARIO | 926.718.332 | 69.503.875 | 996.222.206 |
| | Tolima | Santa Isabel | 67 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BOLIVAR | LA HUMAREDA | 188.797.003 | 14.159.775 | 202.956.778 |
| | | | 100 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BOLIVAR | EL BRASIL | 188.797.003 | 14.159.775 | 202.956.778 |
| 10 | Cauca | Santander de Quilichao | 16 | INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO | DOMINGUILLO (sede principal) | 1.235.282.193 | 92.646.164 | 1.327.928.358 |
| | | | 164 | IE DOMINGUILLO | SEDE DOMINGO LASSO | 124.800.000 | 9.360.000 | 134.160.000 |
| | | Suarez | 188 | IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA | SEDE PRINCIPAL | 790.400.000 | 59.280.000 | 849.680.000 |
| | | | 189 | IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA | SEDE MARIA INMACULADA | 1.225.093.375 | 91.882.003 | 1.316.975.378 |
| | | | 190 | IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA | SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | 374.400.000 | 28.080.000 | 402.480.000 |
| | | Toribío | 12 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PLAYA | CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO LA PLAYA - SEDE PRINCIPAL | 338.159.820 | 25.361.987 | 363.521.807 |
| | Chocó | Bahía Solano (Mutis) | 105 | IE LUIS LOPEZ DE MESA | SEDE DE SAN JOSE (HUACA) | 148.792.381 | 11.159.429 | 159.951.810 |
| | | | 106 | IE LUIS LOPEZ DE MESA | SEDE SIRENA DEL MAR | 41.600.000 | 3.120.000 | 44.720.000 |
| | | | 107 | IE LUIS LOPEZ DE MESA | SEDE SECUNDINO RIVAS | 291.200.000 | 21.840.000 | 313.040.000 |
| | Valle del Cauca | Guadalajara de Buga | 62 | INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE | JHON F. KENNEDY | 540.800.000 | 40.560.000 | 581.360.000 |
| | | | 85 | INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE | LA PLANTA | 204.237.183 | 15.317.789 | 219.554.972 |
| | | | 128 | INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE | MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE - SEDE PRINCIPAL | 166.400.000 | 12.480.000 | 178.880.000 |
| | | | 129 | INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE | JULIAN MENDOZA GUERRERO | 208.000.000 | 15.600.000 | 223.600.000 |

| GRUPO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | ID MEN No. | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SEDE | VR. TOTAL AULAS Y MEJORAMIENTO | VR. INTERVENTORÍA | VR. TOTAL OBRA + INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 130 | INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE | LA HONDA | 164.153.683 | 12.311.526 | 176.465.209 |
| | | | 158 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE | SEDE CRISTOBAL COLON | 162.637.183 | 12.197.789 | 174.834.972 |
| 11 | Cauca | Balboa | 46 | C.E. BUENOS AIRES | CAPITANES | 83.200.000 | 6.240.000 | 89.440.000 |
| | | | 65 | I.E. OLAYA (ANTES C.E. OLAYA) | OLAYA (sede principal) | 416.000.000 | 31.200.000 | 447.200.000 |
| | | Bolívar | 3 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA NUESTRA SENORA DE LOS REMEDIOS | COLEGIO DEPARTAMENTAL NUESTRA SENORA DE LOS REMEDIOS | 436.800.000 | 32.760.000 | 469.560.000 |
| | | | 58 | INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO NUESTRA SENORA DEL CARMEN | CORRAL VIEJO | 127.479.910 | 9.560.993 | 137.040.903 |
| | | | 59 | INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO NUESTRA SENORA DEL CARMEN | NUESTRA SENORA DEL CARMEN (sede principal) | 299.239.730 | 22.442.980 | 321.682.710 |
| | | | 90 | CENTRO EDUCATIVO EL TAMBO | LA FUENTE | 191.162.093 | 14.337.157 | 205.499.250 |
| | | | 93 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CARMEN | EL CARMEN (sede principal) | 62.400.000 | 4.680.000 | 67.080.000 |
| | | El Tambo | 22 | I.E. HUISITO | HUISITO (sede principal) | 1.041.842.757 | 78.138.207 | 1.119.980.964 |
| | | La Vega | 44 | INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA SANTA RITA | INSTITUCION EDUCATIVA SANTA RITA (sede principal) | 166.400.000 | 12.480.000 | 178.880.000 |
| | | | 163 | I.E AGROPECUARIA SAN FRANCISCO JAVIER SEDE GARAY | I.E AGROPECUARIA SAN FRANCISCO JAVIER SEDE GARAY | 177.904.227 | 13.342.817 | 191.247.044 |
| | | Popayán | 165 | IE COMUNEROS | SEDE PRINCIPAL | 457.600.000 | 34.320.000 | 491.920.000 |
| | | Rosas | 175 | INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA | SANTA TERESITA (sede principal) | 790.400.000 | 59.280.000 | 849.680.000 |
| | | | 178 | INSTITUCION EDUCATIVA MADRE CARIDAD BRADER | MADRE CARIDAD BRADER (sede principal) | 124.800.000 | 9.360.000 | 134.160.000 |
| | | | 182 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO CORDOBA | LAS YERBAS | 83.200.000 | 6.240.000 | 89.440.000 |
| | | | 183 | CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO LEON VALENCIA | LA DESPENSA | 62.400.000 | 4.680.000 | 67.080.000 |
| | | | 184 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO CORDOBA | EL RETIRO | 83.200.000 | 6.240.000 | 89.440.000 |
| | | | 186 | CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO LEON VALENCIA | EL ALTILLO | 62.400.000 | 4.680.000 | 67.080.000 |
| | | | 187 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO CORDOBA | BELLAVISTA | 62.400.000 | 4.680.000 | 67.080.000 |
| 12 | Cauca | Piamonte | 27 | CENTRO EDUCATIVO PUERTO GUAYUYACO | ESCUELA RURAL MIXTA LA ESPANOLA | 62.400.000 | 4.680.000 | 67.080.000 |
| | | | 121 | CENTRO EDUCATIVO PUERTO GUAYUYACO | ESC RUR MIX SAN ANDRESITO | 41.600.000 | 3.120.000 | 44.720.000 |
| | | | 125 | INST EDUC AGRIC PIAMONTE | PIAMONTE (sede principal) | 1.553.938.473 | 116.545.386 | 1.670.483.859 |
| | | | 173 | ESC RUR MIX FRAY EZEQUIEL | ESC RUR MIX FRAY EZEQUIEL | 195.752.201 | 14.681.415 | 210.433.616 |
| | | | 174 | E.D.R PORTO GUAYUYACO SEDE PRINCIPAL | E.D.R PORTO GUAYUYACO SEDE PRINCIPAL | 166.400.000 | 12.480.000 | 178.880.000 |
| | Huila | Acevedo | 26 | INSTITUCION EDUCATIVA BATEAS | BATEAS | 310.453.360 | 23.284.002 | 333.737.362 |
| | Nariño | BARBACOAS | 87 | INSTITUCION EDCUATIVA TERAIMBE | SEDE 9 CUMAINDE | 62.400.000 | 4.680.000 | 67.080.000 |
| | | | 110 | INSTITUCION EDUCATIVA TERAIMBE | SEDE 2 BOMBON | 124.800.000 | 9.360.000 | 134.160.000 |
| | | Cumbal | 36 | INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCION DE TALLAMBI | INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCION DE TALLAMBI | 764.787.529 | 57.359.065 | 822.146.593 |
| | | El Rosario | 8 | CENTRO EDUCATIVO LA CLAUDIA | CENTRO EDUCATIVO LA CLAUDIA | 62.400.000 | 4.680.000 | 67.080.000 |
| | | Ipiales | 142 | INSTITUCION EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL LOS PASTOS | ESCUELA LAS CRUCES | 208.000.000 | 15.600.000 | 223.600.000 |

| GRUPO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | ID MEN No. | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SEDE | VR. TOTAL AULAS Y MEJORAMIENTO | VR. INTERVENTORÍA | VR. TOTAL OBRA + INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Mallama (Piedrancha) | 149 | CENTRO EDUCATIVO MALLAMA | CENTRO EDUCATIVO DE MALLAMA | 62.400.000 | 4.680.000 | 67.080.000 |
| | | Pasto | 1 | I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE | I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - SEDE PRINCIPAL | 436.800.000 | 32.760.000 | 469.560.000 |
| | Putumayo | Orito | 127 | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL UMADA WUARRARA | ESC RUR MIX ALTO ORITO | 127.913.503 | 9.593.513 | 137.507.016 |
| | | Puerto Asís | 172 | E. RUR CAUCACIA - SEDE PRINCIPAL | SEDE PRINCIPAL | 249.600.000 | 18.720.000 | 268.320.000 |
| | | Puerto Asís | 41 | I. E. RUR CAUCACIA | ESC RUR MIX EL JARDIN ALTO TETEYE | 197.100.201 | 14.782.515 | 211.882.716 |
| | | | 57 | I. E. RUR CAUCACIA | ESC RUR MIX EL PROGRESO | 167.997.003 | 12.599.775 | 180.596.778 |
| | | Puerto Leguizamo | 88 | IE RUR LUIS VIDALES DEL PIÑUÑA NEGRO | ESC RUR MIX PUERTO PRINCIPE DOS | 124.800.000 | 9.360.000 | 134.160.000 |
| Total general | | | | | | 52.593.871.997 | 3.944.540.400 | 56.538.412.397 |

d. *Evaluar los proponentes, así como las propuestas presentadas para la construcción de las obras de infraestructura educativa e interventorías correspondientes y realizar la adjudicación y contratación de dichos procesos.*

Una vez concluidos los procesos de convocatoria y realizadas las evaluaciones exhaustivas de los proponentes y sus respectivas propuestas para la construcción de las obras de infraestructura educativa y las interventorías correspondientes, nos complace informar en este periodo que dichos procesos han llegado a su fin. Se ha llevado a cabo una rigurosa revisión bajo los parámetros establecidos en los Términos de Referencia, asegurando que se cumplan los lineamientos de contratación pública en términos de transparencia y equidad.

Gracias a este esfuerzo, se ha procedido con éxito a la adjudicación de los contratos, seleccionando a los proponentes que demostraron las mejores capacidades técnicas, financieras y operativas. Todos los grupos han sido debidamente contratados, lo que asegura que las obras se desarrollarán dentro de los plazos previstos y bajo los más altos estándares de calidad.

Nuestro compromiso con la excelencia en la ejecución de las obras y el adecuado control mediante las interventorías asegurará que estas infraestructuras aporten un valor significativo a la comunidad educativa, garantizando su correcto desarrollo y el bienestar de los beneficiarios.

## 1.4 ACTIVIDADES CONTRACTUALES

### 1.4.1 Obligaciones:

a. *Ejecutar a través de los contratistas seleccionados y hacer seguimiento a la calidad y entrega de las obras de infraestructura educativa diseñadas para atender las afectaciones a las sedes educativas priorizadas por el MEN.*

FINDETER, en concordancia con la naturaleza de los proyectos a abordar bajo el marco del Decreto de Emergencia, ha adelantado en el presente periodo la ejecución de diversas sedes educativas. Estos proyectos se han llevado a cabo mediante la colaboración de contratistas que fueron rigurosamente seleccionados a través de procedimientos transparentes y estructurados, conforme a lo estipulado en el Manual de Contratación de FINDETER.

La selección de contratistas no fue un proceso aleatorio, sino que siguió una serie de etapas bien definidas, que incluyeron la evaluación de capacidades técnicas, experiencia previa en proyectos similares, y solidez financiera. Este enfoque metodológico garantiza que los proyectos se ejecuten con altos estándares de calidad y dentro de los plazos establecidos, lo cual es crucial en contextos de emergencia donde la eficiencia y la efectividad son primordiales.

Adicionalmente, la supervisión y el monitoreo continuo de los avances de las obras permiten asegurar que se cumplan todas las normativas vigentes y que los recursos asignados se utilicen de manera óptima. FINDETER ha implementado mecanismos de control y seguimiento que incluyen auditorías periódicas y la utilización de tecnología para el seguimiento en tiempo real de las obras. Esto no solo brinda transparencia al proceso, sino que también facilita la identificación temprana de posibles inconvenientes y la implementación de medidas correctivas oportunas.

b. *Ejercer la vigilancia de los contratos de obra contratando las respectivas interventorías y ejercer la supervisión a los contratos de interventoría que se deriven del presente contrato.*

FINDETER adelantó en el presente periodo un riguroso ejercicio de vigilancia de los contratos de obra mediante la contratación de las respectivas interventorías. Esta medida se implementó con el objetivo de asegurar el adecuado desarrollo de los proyectos de infraestructura, en línea con los estándares de calidad y los plazos establecidos.

La contratación de interventorías y la posterior supervisión de sus actividades permitirán crear un sistema de verificación y seguimiento continuo, asegurando la transparencia en el proceso de ejecución de las obras y proporcionando un mecanismo de retroalimentación para la garantía de la calidad, la eficiencia y el cumplimiento de los estándares requeridos en las obras de infraestructura educativa, quedando así el resumen de este periodo:

| GRUPO | TIPO DE CONTRATO | CÓDIGO | DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS | FECHA DE ADJUDICACIÓN | CONTRATISTA | VALOR OFERTADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTERVENTORÍA | PAF-MENAM-I-052-2023 | Antioquia - Apartadó Antioquia - Turbo Antioquia - Ciudad Bolívar Chocó - Carmen del Darién Chocó - Tadó | 03/10/2023 | INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S | $271.455.247 | Entregado el 29 de octubre del 2024 |
| 1 | OBRA | PAF-MENAM-O-049-2023 | | 06/10/2023 | OBRAS CAPITAL S. A | $3.447.332.359 | Entregado el 22 de octubre del 2024 |
| 2 | INTERVENTORÍA | PAF-MENAM-I-053-2023 | Atlántico - Repelón Atlántico - Galapa Atlántico – Soledad - Atlántico - Palmar De Varela Atlántico - Luruaco | 26/09/2023 | RM INGENIEROS S.A.S. | $295.715.000 | Terminado el 15 de noviembre del 2024 |
| 2 | OBRA | PAF-MENAM-O-050-2023 | | 06/10/2023 | CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 | $4.044.124.630 | Terminado el 15 de noviembre del 2024 |
| 3 | INTERVENTORÍA | PAF-MENAM-I-054-2023 | Magdalena - Ciénaga Magdalena - El Retén Magdalena - Pueblo viejo | 26/09/2023 | CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3 | $351.774.412 | Entregado el 30 de abril del 2024 |
| 3 | OBRA | PAF-MENAM-O-051-2023 | | 06/10/2023 | CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA | $4.744.960.153 | Entregado el 30 de abril del 2024 |
| 4 | OBRA | PAF-MENAM-O-052-2023 | Bolívar - Córdoba Bolívar - Mompós Magdalena - San Sebastián de Buenavista | 20/09/2023 | JASA LTDA | $3.566.467.466 | Entregado 22 de marzo del 2024 |
| 4 | INTERVENTORÍA | PAF-MENAM-I-055-2023 | | 26/09/2023 | CONSORCIO INTER EDUCATIVO G4 | $264.974.745 | Entregado 22 de marzo del 2024 |
| 5 | OBRA | PAF-MENAM-O-053-2023 | Bolívar - Barranco De Loba Magdalena - Concordia Magdalena - El Banco Cesar - Curumaní Bolívar - San Martín De Loba Cesar - Chimichagua | 03/10/2023 | CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5 | $4.102.044.984 | Terminado el 14 de diciembre del 2024 |
| 5 | INTERVENTORÍA | PAF-MENAM-I-056-2023 | | 06/10/2023 | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5 | $300.856.990 | Terminado el 14 de diciembre del 2024 |

| GRUPO | TIPO DE CONTRATO | CÓDIGO | DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS | FECHA DE ADJUDICACIÓN | CONTRATISTA | VALOR OFERTADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | OBRA | PAF-MENAM-O-056-2023 | Cesar - Valledupar<br>Cesar - La Paz<br>Cesar - El paso | 29/09/2023 | DAR ARQUITECTURA S.A. S | $2.102.352.000 | Entregado 17 de mayo del 2024 |
| 6 | INTERVENTORÍA | PAF-MENAM-I-058-2023 | | 03/10/2023 | CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023 | $155.543.411 | Entregado 17 de mayo del 2024 |
| 8 | OBRA | PAF-MENAM-O-055-2023 | Córdoba – Tuchín Córdoba – Cotorra Córdoba - Planeta Rica Córdoba - Puerto Libertador Córdoba – Ayapel Córdoba - Montelíbano Bolívar - María la Baja | 29/09/2023 | DAR ARQUITECTURA S.A. S | $4.706.470.280 | Entregado 21 de agosto del 2024 |
| 8 | INTERVENTORÍA | PAF-MENAM-I-057-2023 | | 13/10/2023 | LUIS GUILLERMO NARVÁEZ RICARDO | $297.097.668 | Entregado 21 de agosto del 2024 |
| 7 | OBRA | PAF-ATMEN5-O-036-2024 | Guajira – Manaure Guajira – Rioacha Guajira - Maicao Guajira - Barrancas | 19/03/2024 | Consorcio Guajira 7 | 4.158.777.879 | Etapa 2 |
| 7 | INTERVENTORÍA | PAF-MENAM-I-059-2023 | | 17/04/2024 | GERMÁN ADOLFO PERDOMO PACHÓN | 295.239.000 | Etapa 2 |
| 9 | OBRA | PAF-ATMEN5-O-037-2024 | Santander - Vélez, Betulia, Barrancabermeja Bolívar – Morales Bogotá Arauca - Saravena -Arauca Tolima - Santa Isabel Meta – Villavicencio Cundinamarca – Anolaima Bolívar – Simiti Norte de Santander - La Playa | 19/03/2024 | CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9 | 4.810.476.306 | Etapa 2 |
| 9 | INTERVENTORÍA | PAF-ATMEN5-I-064-2024 | | 28/06/2023 | CONSORCIO SAN GABRIEL | 313.800.000 | Etapa 2 |
| 10 | OBRA | PAF-MENAM-O-080-2023 | Cauca - Suárez<br>Cauca - Santander De Quilichao<br>Chocó - Bahía Solano<br>Cauca – Toribío<br>Valle Del Cauca - Guadalajara De Buga | 23/11/2023 | CONSORCIO FIN GRUPO 10 | $6.014.978.800 | Etapa 2 |
| 10 | INTERVENTORÍA | PAF-MENAM-I-062-2023 | | 15/12/2023 | CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO | $327.496.568 | Etapa 2 |
| 11 | OBRA | PAF-MENAM-O-079-2023 | Cauca - El Tambo<br>Cauca - La Vega<br>Cauca - Balboa<br>Cauca - Popayán<br>Cauca - Rosas | 27/11/2023 | CONSORCIO FIN GRUPO 11 | $ 4.728.021.810 | Terminado el 27 de noviembre del 2024 |
| 11 | INTERVENTORÍA | PAF-MENAM-I-063-2023 | | 22/12/2023 | CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO | $312.927.160,00 | Etapa 2 |
| 12 | OBRA | PAF-MENAM-O-076-2023 | Nariño – Pasto Putumayo - Puerto Asís Cauca – Piamonte Nariño – Ipiales Nariño - Mallama | 27/11/2023 | CONSORCIO FIN GRUPO 12 | $ 4.918.276.400 | Etapa 2 |
| 12 | INTERVENTORÍA | PAF-MENAM-I-064-2023 | | 22/12/2023 | CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO | $ 351.774.412 | Etapa 2 |

**Nota:** Según el informe previo sobre el estado de los grupos de contratación y de cada institución educativa, se comunica que **el Grupo 4 ha sido entregado el 22 de marzo de 2024, el Grupo 3 ha sido entregado el 30 de abril de 2024, Grupo 6 ha sido entregado el 17 de mayo de 2024, el Grupo 8 ha sido entregado el 21 de agosto de 2024**, **el Grupo 1 ha sido entregado el 29 de octubre de 2024**,satisfacción entre rectores, estudiantes y familias. Además, se está avanzando en el proceso de estructuración de los estudios preliminares para equipar las nuevas aulas construidas, con el objetivo de entregarlas completamente dotadas.

c. *Conformar un Comité Fiduciario y un Comité Técnico Operativo al interior del PATRIMONIO AUTÓNOMO administrado por la FIDUCIARIA contratada, de acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo que para el efecto se adopte.*

Durante este periodo se realizaron los siguientes comités:

*Comités Técnicos*

| FECHA | OBJETO | LUGAR DE LA REUNIÓN | TEMAS ABORDADOS |
|---|---|---|---|
| 6 - 9 de diciembre del 2024 | Comité Técnico No. 78 | PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-MEN - CI CO1.PCCNTR. 4917031 de 2023 | 1. Verificación del quorum<br>2. Solicitud: Prorroga a la suspensión No.1, por el término de cuarenta y cinco días (45) días al contrato de suministro No. PAF-ATMEN5-S-041-2024 cuyo objeto es EL SUMINISTRO, ENTREGA E INSTALACIÓN DE DOTACIÓN DEL MOBILIARIO ESCOLAR EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS".<br>3. Proposiciones y varios |
| 13 de diciembre del 2024 | Comité Técnico No. 79 | PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-MEN - CI CO1.PCCNTR. 4917031 de 2023 | 1. Verificación del quorum<br>2. Solicitud: PRÓRROGA No.2 AL CONTRATO DE OBRA No. PAF-ATMEN5-O-036-2024 POR EL TÉRMINO DE TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO CUYO OBJETO ES: "ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 7".<br>3. SOLICITUD: PRÓRROGA No.2 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. PAF-MENAM-I-059-2023 POR EL TÉRMINO DE TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO CUYO OBJETO ES: "INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 7; PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER"<br>4. Proposiciones y varios |
| 18 – 19 de diciembre del 2024 | Comité Técnico No. 80 | PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-MEN - CI CO1.PCCNTR. 4917031 de 2023 | 1. Verificación del quorum<br>2. SOLICITUD DE APROBACIÓN PRÓRROGA No. 3 POR UN PLAZO DE TRES (3) MESES AL CONTRATO OBRA No. PAF-MENAM-O-080-2023 cuyo objeto ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 10:<br>• Prórroga No. 3 por un plazo de TRES (3) MESES para la ejecución del componente 2 del contrato de obra PAF-MENAM-O-080-2023, para ejecutar, terminar y entregar las actividades diagnosticadas y programadas como alcance de intervención para las 4 sedes que se encuentran en ejecución de las 15 sedes priorizadas por el MEN dentro del contrato Grupo 10 del programa Aulas Móviles afectadas por la temporada de lluvias.<br>3.SOLICITUD DE APROBACIÓN DE PRÓRROGA No. 3 POR UN PLAZO DE TRES (3) MESES Y ADICIÓN DE RECURSOS POR VALOR DE CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($42.588.850,50) INCLUIDA IVA AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. PAF-MENAM-I-062-2023 cuyo objeto INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 10<br>• Prórroga No. 3 por un plazo de TRES (3) MESES al componente 2 del contrato de interventoría PAF-MENAM-I-062-2023 para el seguimiento a la ejecución, terminación y entrega de las 4 sedes que se encuentran en ejecución de las 15 sedes priorizadas por el MEN dentro del contrato Grupo 10 del programa Aulas Móviles afectadas por la temporada de lluvias. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | • Adición No. 3 por la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($42.588.850,50) incluida IVA al valor de ejecución del componente 2 del contrato de interventoría PAF-MENAM-I-062-2023, de los cuales, el valor de VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($29.812.195,35) incluido IVA, que corresponde al (70%) del valor adicionar, será cubierto con los saldos disponibles del Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 de 2023, y el valor de DOCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON QUINCE CENTAVOS M/CTE ($12.776.655,15) incluido IVA, que corresponden al (30%) del saldo adicionar, serán cubiertos por el contratista de obra CONSORCIO FIN GRUPO 10 y los mismos, serán descontados de la cuenta de cobro siguiente a la legalización del modificatorio tramitado.<br>4. Proposiciones y varios |

*Comités Fiduciarios*

| FECHA | OBJETO | LUGAR DE LA REUNIÓN | TEMAS ABORDADOS |
|---|---|---|---|
| 3- 5 de diciembre del 2024 | Comité Fiduciario No. 48 | PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-MEN - CI CO1.PCCNTR. 4917031 de 2023 | 1. Verificación del quorum.<br>2. SOLICITUD DE PRÓRROGA POR EL TÉRMINO DE TRES (3) MESES AL CONTRATO DE OBRA No. PAF-ATMEN5- O-037-2024 suscrito con el CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9 CUYO OBJETO CONSISTE EN "ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 9".<br>3. SOLICITUD DE PRÓRROGA POR EL TÉRMINO DE TRES (3) MESES Y ADICIÓN DE RECURSOS POR VALOR DE CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON TREINTA CENTAVOS ($165.685.393,30) AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. PAFATMEN5-I-064-2024 suscrito con el CONSORCIO SAN GABRIEL CUYO OBJETO CONSISTE EN "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 9", ACLARANDO QUE, EL VALOR DE $91.213.418,06 SERÁN ASUMIDOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA Y EL VALOR DE $74.471.975,24 SERÁN CON CARGO AL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN AULAS MÓVILES POR OLA INVERNAL del Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.4917031 de 2023<br>4. Proposiciones y varios |
| 10- 12 de diciembre del 2024 | Comité Fiduciario No. 49 | PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-MEN - CI CO1.PCCNTR. 4917031 de 2023 | 1. Verificación del quorum.<br>2. Solicitud: Prorroga a la suspensión No.1, por el término de cuarenta y cinco días (45) días al contrato de suministro No. PAF-ATMEN5-S-041-2024 cuyo objeto es EL SUMINISTRO, ENTREGA E INSTALACIÓN DE DOTACIÓN DEL MOBILIARIO ESCOLAR EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS".<br>3. Proposiciones y varios |
| 18- 19 de diciembre del 2024 | Comité Fiduciario No. 50 | PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-MEN - CI CO1.PCCNTR. 4917031 de 2023 | 1. Verificación del quorum.<br>2. SOLICITUD DE PRÓRROGA No.2 AL CONTRATO DE OBRA No. PAF-ATMEN5-O-036-2024 POR EL TÉRMINO DE TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO CUYO OBJETO ES: "ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 7".<br><br>3. SOLICITUD DE PRÓRROGA No.2 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. PAF-MENAM-I-059-2023 POR EL TÉRMINO DE TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO CUYO OBJETO ES: "INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 7; PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER" |
| 23- 26 de diciembre del 2024 | Comité Fiduciario No. 51 | PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-MEN - CI CO1.PCCNTR. 4917031 de 2023 | 1. Verificación del quorum.<br><br>2. SOLICITUD DE APROBACIÓN PRÓRROGA No. 3 POR UN PLAZO DE TRES (3) MESES AL CONTRATO OBRA No. PAF-MENAM-O-080-2023 cuyo objeto ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 10:<br><br>• Prórroga No. 3 por un plazo de TRES (3) MESES para la ejecución del componente 2 del contrato de obra PAF-MENAM-O-080-2023, para ejecutar, terminar y entregar las actividades diagnosticadas y programadas como alcance de intervención para las 4 sedes qu4 se encuentran en ejecución de las 15 sedes priorizadas por el MEN dentro del contrato Grupo 10 del programa Aulas Móviles afectadas por la temporada de lluvias.<br><br>3. SOLICITUD DE APROBACIÓN DE PRÓRROGA No. 3 POR UN PLAZO DE TRES (3) MESES Y ADICIÓN DE RECURSOS POR VALOR DE CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($42.588.850,50) INCLUIDA IVA AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. PAF-MENAM-I-062-2023 cuyo objeto INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 10<br><br>• Prórroga No. 3 por un plazo de TRES (3) MESES al componente 2 del contrato de interventoría PAF-MENAM-I-062-2023 para el seguimiento a la ejecución, terminación y entrega de las 4 sedes que se encuentran en ejecución de las 15 sedes priorizadas por el MEN dentro del contrato Grupo 10 del programa Aulas Móviles afectadas por la temporada de lluvias.<br><br>• Adición No. 3 por la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($42.588.850,50) incluida IVA al valor de ejecución del componente 2 del contrato de interventoría PAF-MENAM-I-062-2023, de los cuales, el valor de VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($29.812.195,35) incluido IVA, que corresponde al (70%) del valor adicionar, será cubierto con los saldos disponibles del Contrato Interadministrativo No CO1.PCCNTR. 4917031 de 2023, y el valor de DOCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON QUINCE CENTAVOS M/CTE ($12.776.655,15) incluido IVA, que corresponden al (30%) del saldo adicionar, serán cubiertos por el contratista de obra CONSORCIO FIN GRUPO 10 y los mismos, serán descontados de la cuenta de cobro siguiente a la legalización del modificatorio tramitado.<br><br>4. Proposiciones y varios |

## a. ACTIVIDADES DE CIERRE Y LIQUIDACIÓN

### i. Obligaciones:

a. *Adelantar la liquidación o cierre de los contratos derivados para la ejecución de los proyectos y del Contrato Interadministrativo una vez estos hayan finalizado.*

*De la contratación derivada*

En el presente periodo se ha planificado anticipadamente la liquidación o cierre de los contratos derivados con el propósito de asegurar una ejecución eficiente de los proyectos. Esta estrategia no solo facilitó una gestión financiera más efectiva, sino que también permitió cumplir con los objetivos establecidos dentro de los plazos previstos, optimizando así los recursos disponibles y garantizando la correcta finalización de las obligaciones contractuales, así mismo se adelantaron las siguientes liquidaciones:

| GRUPO | TIPO DE CONTRATO | CÓDIGO | DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS | FECHA INCIO | FECHA TERMINACIÓN | CONTRATISTA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTERVENTORÍA | PAF-MENAM-I-052-2023 | Antioquia - Apartadó Antioquia - Turbo Antioquia - Ciudad Bolívar Chocó - Carmen del Darién Chocó - Tadó | 14/11/2023 | 29/10/2024 | INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S | Liquidación radicada el 2 de diciembre de 2024, mediante prisa INC 2024-002246 |
| 1 | OBRA | PAF-MENAM-O-049-2023 | | 14/11/2023 | 14/08/2024 | OBRAS CAPITAL S. A | Liquidación radicada el 2 de diciembre de 2024, mediante prisa INC 2024-002245. |
| 3 | INTERVENTORÍA | PAF-MENAM-I-054-2023 | Magdalena - Ciénaga Magdalena - El Retén Magdalena - Puebloviejo | 14/11/2023 | 30/04/2024 | CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3 | Se remitió a la Fiduciaria Popular para revisión final 01/12/2024 en espera de remisión para firmas |
| 3 | OBRA | PAF-MENAM-O-051-2023 | | 14/11/2023 | 30/04/2024 | CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA | Liquidado el día 01/10/2024 |
| 4 | OBRA | PAF-MENAM-O-052-2023 | Bolívar - Córdoba Bolívar - Mompós Magdalena - San Sebastián de Buenavista | 24/10/2023 | 22/03/2024 | JASA LTDA | Liquidado el día 30/09/2024 |
| 4 | INTERVENTORÍA | PAF-MENAM-I-055-2023 | | 24/10/2023 | 22/03/2024 | CONSORCIO INTER EDUCATIVO G4 | En espera de aprobación de pólizas por parte de la Fiducia. |
| 6 | OBRA | PAF-MENAM-O-056-2023 | Cesar - Valledupar Cesar - La Paz Cesar - El paso | 29/09/2023 | 17/05/2024 | DAR ARQUITECTURA S.A. S | Se suscriben y se fechan las actas de liquidación para el contrato de obra el 20 de noviembre |
| 6 | INTERVENTORÍA | PAF-MENAM-I-058-2023 | | 03/10/2023 | 17/05/2024 | CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023 | Se suscriben y se fechan las actas de liquidación para el contrato de obra el 27 de noviembre. |
| 8 | OBRA | PAF-MENAM-O-055-2023 | Córdoba – Tuchín Córdoba – Cotorra Córdoba - Planeta Rica Córdoba - Puerto Libertador Córdoba – Ayapel Córdoba - Montelíbano Bolívar - María la Baja | 29/09/2023 | DAR ARQUITECTURA S.A. S | $4.706.470.280 | Se encuentra en proceso de recopilación y soportes de liquidación en la semana del 25 al 30 de noviembre de 2024 |
| 8 | INTERVENTORÍA | PAF-MENAM-I-057-2023 | | 13/10/2023 | LUIS GUILLERMO NARVÁEZ RICARDO | $297.097.668 | Se encuentra en proceso de recopilación y soportes de liquidación en la semana del 25 al 30 de noviembre de 2024 |

*Del Contrato Interadministrativo*

Para el presente periodo no se adelantan actividades de este tipo.

## 2. RESUMEN GENERAL DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL CONTRATO

| CONTRATO No CO1.PCCNTR. 4917031 de 2023 | |
|---|---|
| **Valor inicial del Contrato** (CO1.PCCNTR. 4917031 de fecha 2023) | 63.650.000.000 |
| **Valor del Contrato a la fecha de corte del Informe** | **63.650.000.000** |
| Descuentos / Impuestos Estampilla Pro-Universidad Nacional / Tasas y Contribuciones (Correspondiente al 2% aplicado al valor Inicial del Contrato) | - |
| Asistencia Técnica No. 1 (Porcentaje de Asistencia Técnica y Administración de Recursos a reconocer a FINDETE, 7%) | 4.164.018.692 |
| **Valor disponible para ejecutar los proyectos de acuerdo con el objeto del contrato y el plan operativo.** | **59.485.981.308** |

## *3.* ANEXOS

Se remiten anexos de acuerdo con las actividades realizadas durante el periodo así:

1. 02 de diciembre del 2024
2. 30 de diciembre del 2024

**HERNÁN PARDO BOTERO**
*Gerente de Infraestructura*
*FINDETER*

***JESUS ALBERTO CAÑAS PÁEZ***
*Gestor del Contrato Interadministrativo*
*FINDETER*

*Elaboró: Geraldine Lorena Prada Pimiento – Profesional de la Gerencia de Infraestructura*



Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

# Seguimiento CI No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023

## AULAS MOVILES

Hacienda

Diciembre 04 de 2024


# Contrato No. 4917031-2023

**136** **sedes educativas**
[instalación de aulas y mejoramientos]

**$ 63.650**
Millones de pesos

Fecha inicio: 2/06/2023
Fecha Fin Actual: 01/07/2025

| Grupo | Departamentos / Municipios | Etapa Actual del grupo/% de avance de contrato<br>Fecha de Inicio –Fecha de Terminación |
|---|---|---|
| G1 [10 sedes] | Antioquia \| Chocó | Entregado[100,00%]<br>14/11/2023 - 14/08/2024 |
| G2 [8 sedes] | Atlántico | Entregado[100,00%]<br>27/11/2023 -06/09/2024 |
| G3 [5 sedes] | Magdalena | Entregado [100,00%]<br>14/11/2023 - 30/04/2024 |
| G4 [5 sedes] | Bolívar | Entregado [100,00%]<br>26/10/2023 - 23/03/2024 |
| G5 [16 sedes] | Bolívar \| Magdalena \| Cesar | Terminado [98,00%]<br>14/11/2023 – 08/11/2024 |
| G6 [7 sedes] | Cesar | Entregado [100,00%]<br>15/11/2023 - 17/05/2024 |
| G7 [13 sedes] | Guajira | Suspendido[81,32%]<br>31/05/2024 - 18/12/2024 |
| G8 [9 sedes] | Córdoba \| Bolívar | En Obra [100,00%]<br>08/11/2023 - 23/08/2024 |
| G9 [12 sedes] | Santander \| Bolívar \| Bogotá \| Arauca \| Tolima \| Meta \| Cundinamarca \| Nte de Santander | En obra[6,19%]<br>23/08/2024 - 08/12/2024 |
| G10 [15 sedes] | Cauca \| Chocó \| Valle Del Cauca | En Obra [62,20%]<br>19/02/2023 - 30/12/2024 |
| G11 [18 sedes] | Cauca | En Obra [91,86%]<br>12/02/2023 - 27/11/2024 |
| G12 [18 sedes] | Nariño \| Putumayo \| Cauca | En Obra [90,97%]<br>20/02/2023 - 04/12/2024 |
| Dotación | 46 Sedes a dotar - 99 aulas | En Ejecución [33%]<br>03/10/2024 – 03/12/2024 |

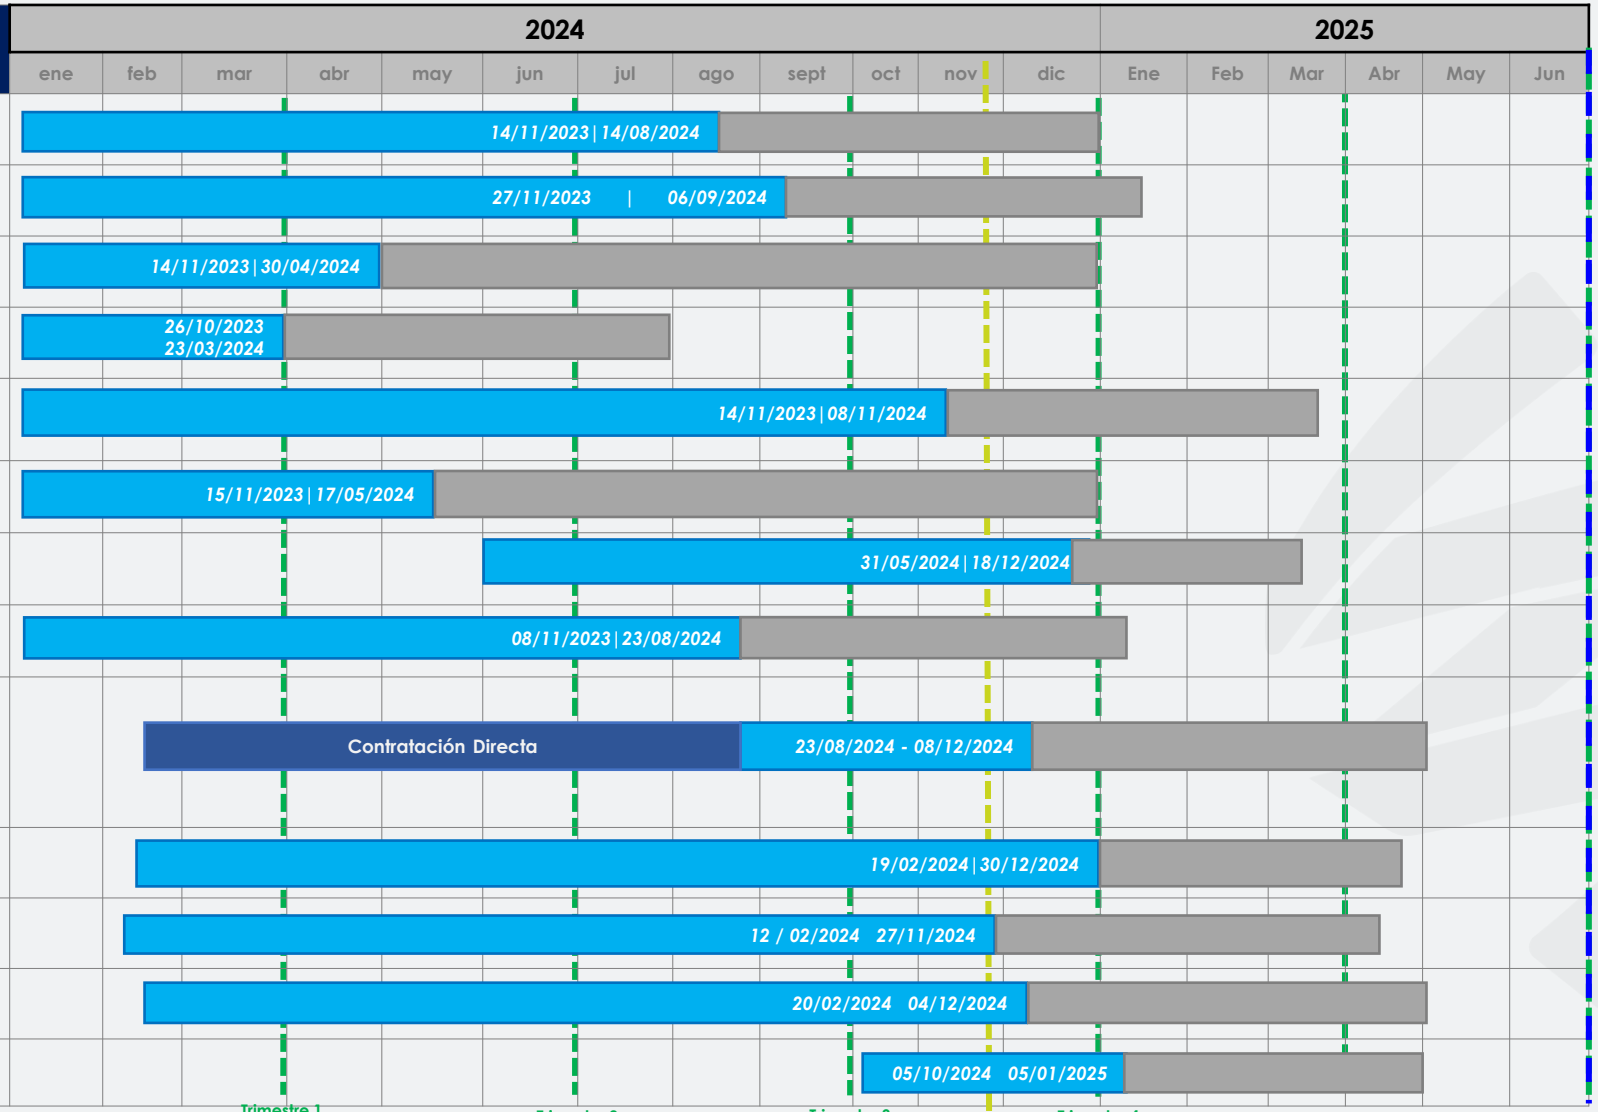


Convocatoria | Llegalización | Ejecución | Liquidación

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

# Estado de entrega y ejecución de Sedes

**136** **sedes educativas**
[instalación de aulas y mejoramientos]

**$ 63.650**
Millones de pesos

Fecha inicio: 2/06/2023
Fecha Fin: 01/11/2024

*01 julio 25 –*
*Fin Interadministrativo*

| ENTREGADAS | TERMINADAS | EN EJECUCIÓN | SUSPENDIDO |
|---|---|---|---|
| 91 sedes<br>66,91% | 19 sedes<br>13,97% | 19 sedes<br>13,97% | 7 sedes<br>5,15% |
| Grupo 1 - 10<br>Grupo 2 - 8<br>Grupo 3 - 5<br>Grupo 4 - 5<br>Grupo 5 - 15<br>Grupo 6 - 7<br>Grupo 8 - 9<br>Grupo 10 - 5<br>Grupo 11 - 10<br>Grupo 12 - 17 | Grupo 5 - 1<br>Grupo 7 - 6<br>Grupo 10 - 5<br>Grupo 11 - 7 | Grupo 9 - 12<br>Grupo 10 - 5<br>Grupo 11 - 1<br>Grupo 12 - 1 | Grupo 7 - 7 |

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

# PAGOS ASISTENCIA TECNICA

**136** **sedes educativas**
[instalación de aulas y mejoramientos]

**$ 63.650**
Millones de pesos

Fecha inicio: 2/06/2023
Fecha Fin: 01/11/2024

*01 nov 24 – Fin Interadministrativo*

| VALOR AT | Cobrado (a noviembre de 2024) | Pagado(a noviembre de 2024) | SALDO |
|---|---|---|---|
| $ 4.164.018.692,00 | $3.740.455.626,21 | $3.740.455.626,21 | $ 423.563.065,80 |

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

# **Resumen Informe Financiero –** Corte 31 de octubre de 2024

**136** **sedes educativas**
[instalación de aulas y mejoramientos]

**$ 63.650**
Millones de pesos

Fecha inicio: 2/06/2023
Fecha Fin: 01/11/2024

*01 nov 24 –*
*Fin Interadministrativo*

| VALOR EJECUTADO | VALOR POR EJECUTAR | VALOR COMPROMETIDO | SALDO |
|---|---|---|---|
| $ 43.546 mll | $ 20.102 mll | $ 59.411 mll | $ 279,6 mll |

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

# Estado Entrega de Dotación

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**PAF-ATMEN5-S-041-2024**

Publicada
17 DE JULIO DE 2024.

Informe Definitivo:
Comité Fiduciario No 41 del 25 de agosto.

Adjudicado:
DOTAESCOL SAS
Valor $ **$ 584.310.000,00**

Acta de Inicio: 3 de octubre de 2024
2 meses de ejecución

- 16 DEPARTAMENTOS
- 38 MUNICIPIOS
- 99 AULAS NUEVAS CON DOTACIÓN

| GRUPO | Departamento | Municipio | INSTITUCION EDUCATIVA | SEDE | TOTAL AULAS NUEVAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chocó | Carmen del Darién | CE PUEBLO NUEVO | CE PUEBLO NUEVO - SEDE PRINCIPAL | 3 |
| 1 | Antioquia | Apartadó | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO | CENTRO EDUCATIVO RURAL EL OSITO | 1 |
| 2 | Atlántico | Repelón | INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS | PITA | 1 |
| 2 | Atlántico | Soledad | INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO | INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE CABICA | 3 |
| 3 | Magdalena | El Retén | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE | COL MPAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE | 9 |
| 4 | Bolívar | Mompós | INSTITUCIÒN EDUCATIVA TÈCNICA AMBIENTAL DE TIERRA FIRME | I.E.T.A. AMBIENTAL DE TIERRA FIRME - SEDE PRINCIPAL | 6 |
| 4 | Magdalena | San Sebastían de Buenavista | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA | ERM MARIA AUXILIADORA | 4 |
| 4 | Magdalena | San Sebastían de Buenavista | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA | ERM LA PACHA | 3 |
| 5 | Bolívar | Barranco de Loba | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR | ATASCOZA | 1 |
| 5 | Bolívar | San Martín de Loba | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA PESQUERA LEONIDAS ORTIZ ALVEAR DE CHIMÍ | PLAN BONITO | 1 |
| 6 | Cesar | La Paz(Robles) | CENTRO EDUCATIVO INDIGENA CAÑO PADILLA YUKPA | SEDE EL COSO | 1 |
| 6 | Cesar | El Paso | INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN | SEDE LA ESTACION | 1 |
| 8 | Córdoba | Planeta Rica | INSTITUCION EDUCATIVA LOMA AZUL | LOS CERROS | 1 |
| 8 | Córdoba | Puerto Libertador | INSTITUCION EDUCATIVA PICA PICA VIEJO | ESC NVA LA SOLITA | 1 |
| 8 | Córdoba | Ayapel | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO | ESC NVA PARCELAS LONDRES | 1 |
| 8 | Córdoba | Montelíbano | INSTITUCION EDUCATIVA EL PALMAR | ESCUELA NUEVA MIXTA DIVINO SALVADOR | 2 |
| 8 | Bolívar | María la Baja | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA | I.E.T. AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA | 2 |
| 10 | Cauca | Santander de Quilichao | INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO | SEDE DOMINGO LASSO | 8 |
| 11 | Cauca | El Tambo | I.E. HUISITO | SEDE HUISITÓ | 6 |
| 11 | Cauca | Bolivar | INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO NUESTRA SENORA DEL CARMEN | SEDE CORRAL VIEJO | 1 |
| 11 | Cauca | Bolivar | CENTRO EDUCATIVO EL TAMBO | SEDE LA FUENTE | 1 |
| 11 | Cauca | La Vega | I.E AGROPECUARIA SAN FRANCISCO JAVIER SEDE GARAY | IE AGROPECUARIA SAN FRANCISCO JAVIER - SEDE GARAY | 1 |
| 11 | Cauca | Rosas | INSTITUCION EDUCATIVA MADRE CARIDAD BRADER | MADRE CARIDAD BRADER | 1 |

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado Entrega de Dotación



**CENTRO EDUCATIVO INDIGENA CAÑO PADILLA YUKPA**
Sede El Coso La Paz – Cesar



**INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO**
Sede Escuela Nueva Parcelas Londres
Ayapel - Córdoba



**INSTITUCION EDUCATIVA EL PALMAR**
Escuela Nueva Mixta Divino Salvador
Monte Líbano - Córdoba



**INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO**
Sede Principal Santander de Quilichao - Cauca



**INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA ERM MARIA AUXILIADORA** Sede
Sebastián de Buenavista - Magdalena



**INSTITUCION EDUCATIVA TIERRA FIRME**
Mompox - Bolivar

# Rendimientos Financieros – Relación de Pagos

Educación

**CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023**
**MINISTERIO DE EDUCACION**
**Financiera del Desarrollo S.A.**
**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**
**Fecha: Octubre 31 de 2024**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**Contrato No.CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023**

**Cuenta de Ahorros Popular No. 309-055200**

| Fecha | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | GIRO DE RENDIMIENTOS | Fecha de Giro | SALDO POR GIRAR |
|---|---|---|---|---|
| ene-23 | | | | $ - |
| feb-23 | $ - | $ - | | $ - |
| mar-23 | $ - | $ - | | $ - |
| abr-23 | $ - | $ - | | $ - |
| may-23 | $ - | $ - | | $ - |
| jun-23 | $ - | $ - | | $ - |
| jul-23 | $ - | $ - | | $ - |
| ago-23 | $ 82.351.406,35 | $ - | | $ 82.351.406,35 |
| sep-23 | $ 108.927.246,74 | $ - | | $ 191.278.653,09 |
| oct-23 | $ 131.902.760,66 | $ - | | $ 323.181.413,75 |
| nov-23 | $ 144.907.033,92 | $ - | | $ 468.088.447,67 |
| dic-23 | $ 143.221.271,36 | $ 468.088.448,00 | 13/12/2023 | $ 143.221.271,03 |
| ene-24 | $ 133.626.379,48 | $ 143.221.271,36 | 10/01/2024 | $ 133.626.379,15 |
| feb-24 | $ 120.547.529,88 | $ 133.626.379,15 | 12/02/2024 | $ 120.547.529,88 |
| mar-24 | $ 117.745.976,50 | $ 120.547.529,88 | 12/03/2024 | $ 117.745.976,50 |
| abr-24 | $ 100.331.907,69 | $ 117.745.976,50 | 10/04/2024 | $ 100.331.907,69 |
| may-24 | $ 89.374.457,56 | $ 100.331.907,69 | 11/05/2024 | $ 89.374.457,56 |
| jun-24 | $ 76.820.331,89 | $ 89.374.457,56 | 13/06/2024 | $ 76.820.331,89 |
| jul-24 | $ 68.012.790,67 | $ 76.820.331,89 | 15/07/2024 | $ 68.012.790,67 |
| ago-24 | $ 21.741.419,32 | $ 68.012.790,67 | 14/08/2024 | $ 21.741.419,32 |
| sep-24 | $ 20.861.120,00 | $ 21.741.419,32 | 10/09/2024 | $ 20.861.120,00 |
| oct-24 | $ 27.022.756,52 | $ 20.861.120,00 | 18/10/2024 | $ 27.022.756,52 |
| **TOTALES** | **$ 1.387.394.388,54** | **$ 1.360.371.632,02** | | |

**Contrato No.CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023**

**Fondo de Inversión Colectiva Alta Liquidez No. 70083604683-6**

| Fecha | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | GIRO DE RENDIMIENTOS | Fecha de Giro | SALDO POR GIRAR |
|---|---|---|---|---|
| ene-23 | | $ - | | $ - |
| feb-23 | $ - | $ - | | $ - |
| mar-23 | $ - | $ - | | $ - |
| abr-23 | $ - | $ - | | $ - |
| may-23 | $ - | $ - | | $ - |
| jun-23 | $ - | $ - | | $ - |
| jul-23 | $ - | $ - | | $ - |
| ago-23 | $ 443.947.650,01 | $ - | | $ 443.947.650,01 |
| sep-23 | $ 548.880.836,71 | $ - | | $ 992.828.486,72 |
| oct-23 | $ 436.008.307,20 | $ - | | $ 1.428.836.793,92 |
| nov-23 | $ 718.224.229,49 | $ - | | $ 2.147.061.023,41 |
| dic-23 | $ 788.090.860,63 | $ 2.147.061.024,00 | 13/12/2023 | $ 788.090.860,04 |
| ene-24 | $ 427.858.051,59 | $ 788.090.860,63 | 10/01/2024 | $ 427.858.051,00 |
| feb-24 | $ 474.970.095,24 | $ 427.858.051,00 | 12/02/2024 | $ 474.970.095,24 |
| mar-24 | $ 478.495.863,61 | $ 474.970.095,24 | 12/03/2024 | $ 478.495.863,61 |
| abr-24 | $ 259.736.382,70 | $ 478.495.863,61 | 10/04/2024 | $ 259.736.382,70 |
| may-24 | $ 353.632.163,66 | $ 259.736.382,70 | 11/05/2024 | $ 353.632.163,66 |
| jun-24 | $ 266.323.590,41 | $ 353.632.163,66 | 13/06/2024 | $ 266.323.590,41 |
| jul-24 | $ 294.233.627,01 | $ 266.323.590,41 | 15/07/2024 | $ 294.233.627,01 |
| ago-24 | $ 313.006.436,96 | $ 294.233.627,01 | 14/08/2024 | $ 313.006.436,96 |
| sep-24 | $ 192.185.501,19 | $ 313.006.436,96 | 10/09/2024 | $ 192.185.501,19 |
| oct-24 | $ 71.175.915,03 | $ 192.185.501,19 | 18/10/2024 | $ 71.175.915,03 |
| **TOTALES** | **$ 6.066.769.511,44** | **$ 5.995.593.596,41** | | |
| **SALDO POR GIRAR** | **$ 98.198.671,55** | | | |

# Rendimientos Financieros – Comprobante de pago

Fecha Actual: 2024/10/21 | Hora: 11:39 | IP: 190.144.253.210

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

**Archivos Cargados**

Estimado (a): CINDY JHANNYN CHIMBI BARATO

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

| Tipo Archivo | Nombre Archivo | Nombre Técnico Archivo | Fecha Envío | Valor Total Archivo | No. Registros Enviados | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagos | 33455 | PJQE01RMWO | 2024/10/18 | $213,046,621.19 | 2 | Procesado |

**Información Adicional**

| Fecha Carga | Hora Carga | Hora Envío | Usuario Creador | Fecha Actualización | Hora Actualización | Valor Total Archivo | Valor Archivo Enviado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/10/17 | 18:13:53 | 05:00:24 | ANDRES FORERO PEREZ | 2024/10/18 | 22:10:07 | $213,046,621.19 | $213,046,621.19 |

| Valor Registros | Valor Registros Errados | No. Total Registros | No. Registros | No. Registros | No. Registros en | Usuario Aprueba/Rechaza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | | 2 | 0 | | 0 | JORGE LINARES CIFUENTES |

Detalle de pago

| Producto Originador | Fecha Efectiva | Valor Transacción | No. Identificación Receptor | Nombre Receptor | No. Ruta | Entidad Financiera | No. Dígito Chequeo | Tipo Transacción | No. Identificación Originador | Propósito de la Transacción | Descripción Causal Rechazo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500804650450 | 2024/10/18 | $20,861,120.00 | 900978341 | FONDO NACIONAL DEL RIE | 00001 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. | 9 | Crédito Cuenta Ahorros | 000000830053691 | PAGOS | | Procesado |
| 500804650450 | 2024/10/18 | $192,185,501.19 | 900978341 | FONDO NACIONAL DEL RIE | 00001 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. | 9 | Crédito Cuenta Ahorros | 000000830053691 | PAGOS | | Procesado |

**NOTA: Teniendo en cuenta el contrato MEN-4917031 2023 -TEMPORADA DE LLUVIAS, y en atención a la obligación descrita en la cláusula tercera, Obligaciones específicas del contratista, Numeral 8 el cual dice:**

*"8. El Patrimonio Autónomo — Findeter deberá reintegrar mensualmente los rendimientos financieros (si los hubiere) a la Dirección del Tesoro Nacional o en los términos que establezca la normatividad aplicable, es decir, que no ingresan ni hacen parte del Patrimonio Autónomo constituido por Findeter."*

**Se han consignado los rendimientos financieros a la siguiente cuenta:**

- **Banco:** BBVA
- **Tipo:** Ahorros
- **No. Cuenta:** 309-054583
- **Nombre de la Cuenta:** FIDUPREVISORA S.A FNGRD – COLOMBIA VITAL

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

# AULAS MOVILES
# INFORME DETALLADO POR GRUPO DE INTERVENCION

Diciembre 04 de 2024



UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Educación

Colombia Vital

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA


CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# GRUPO 1, Departamentos de Antioquia – Chocó

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**10**
**Proyectos**

- 2 Departamentos
- 5 Municipios
- 10 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total, estudiantes SIMAT 2023 - 4347 estudiantes.
- $ 3.945.124.339,32 Inversión MEN

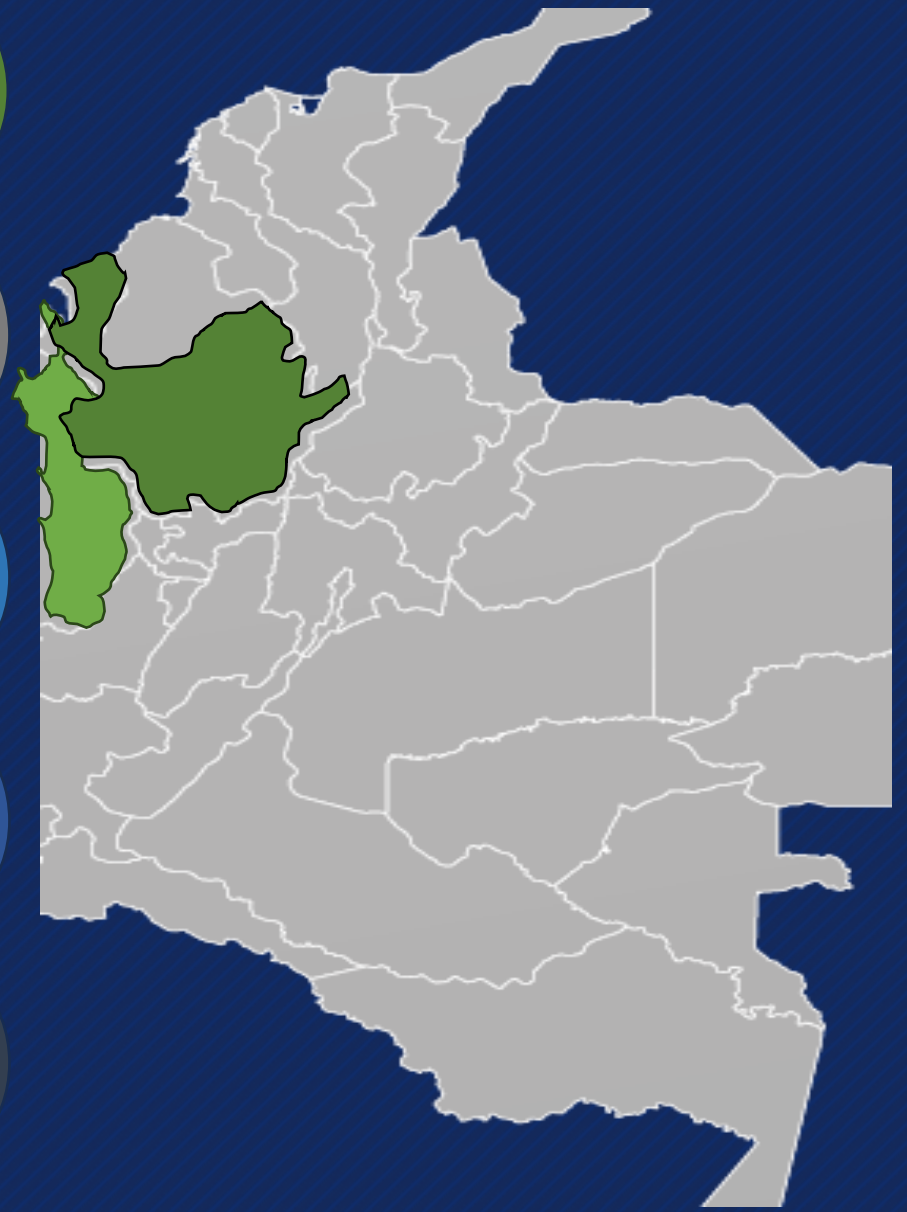

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# GRUPO 1, Departamentos de Antioquia – Chocó

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## SEDES INTERVENIDAS:

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | IE | SEDE | ALCANCE TOTAL DE INTERVENCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | AULAS NUEVAS | AULAS MEJORADAS | BATERIAS SANITARIAS | FECHA DE ENTREGA |
| Antioquia | Ciudad Bolívar | I. E. JOSE MARIA HERRAN | C. E. R. PAULINA PUERTA | | 6 | 3 MEJ | 27/2/2024 |
| Antioquia | Apartadó | INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS | INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS | | 14 | 5 MEJ | 21/3/2024 |
| Antioquia | Apartadó | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO | | 9 | 5 MEJ | 30/5/2024 |
| Antioquia | Apartadó | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO | | 23 | 8 MEJ | 30/5/2024 |
| Antioquia | Turbo | I.E. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | E.U. JESUS MORA | | 4 | | 14/3/2024 |
| Antioquia | Apartadó | INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL GUINEO | CENTRO EDUCATIVO RURAL EL OSITO | | 3 | 2 MEJ | 30/5/2024 |
| Antioquia | Turbo | IE SAN MARTIN DE PORRES | SEDE GONZALO MEJIA | | 4 | 5 MEJ | 20/5/2024 |
| Chocó | Carmen del Darién | CE PUEBLO NUEVO | CE PUEBLO NUEVO - SEDE PRINCIPAL | 2 | | 4 BS NUEVAS | 14/8/2024 |
| Chocó | Tadó | IE TECNICO AGROAMBIENTAL - MARIA AUXILIADORA | SEDE MARÍA AUXILIADORA DE MANUNGARA | | 2 | 4 MEJ | 30/5/2024 |
| Chocó | Tadó | IE NORMAL SUPERIOR DEMETRIO SALAZAR CASTILLO | CENTRO EDUCATIVO ESCUELA FRANCISCO MIRANDA | | 6 | 3 BS NUEVAS 5 MEJ | 22/10/2024 |

## PORCENTAJES DE AVANCE:

**100%**
Porcentaje Programado

**100%**
**Porcentaje de avance**

## ESTADO ACTUAL CIERRE Y LIQUIDACION CONTRATOS DERIVADOS

**AERS COMPONENTE 2:**

- Contrato de Obra, en proceso de firma por parte de la Fiduciaria Popular, una vez se tenga el AERS suscrita se procederá a solicitar la actualización de pólizas.
- Contrato de Interventoría, suscrita el 18 de Noviembre de 2024, pólizas en proceso de expedición por parte de la aseguradora para presentar a la Fiduciaria para revisión y aprobación

DOCUMENTOS DE CIERRE Y LIQUIDACION

Recibidos por parte del interventor el 22 de noviembre de 2024 parcialmente ya que faltan las AERS y Pólizas, de igual forma se adelanta el proceso de revisión por parte de la supervisión técnica a los documentos entregados, una vez se tengan los soportes se procederá ha radicar a liquidaciones.

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# GRUPO 1, Departamentos de Antioquia – Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL GUINEO - SEDE CE EL OSITO - ID No. 161




## INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO ID No. 118




## INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS ID No. 66




## INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO ID No. 86




## INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS SEDE EU JESÚS MORA ID No. 112




## INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MARTÍN DE PORRES SEDE EU GONZALO MEJÍA




# GRUPO 1, Departamentos de Antioquia – Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA HERRÁN SEDE CER PAULINA PUERTA
ID No. 42






## INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROAMBIENTAL SEDE MARÍA AUXILIADORA DE MANUNGARA
ID No. 150





## INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR DEMETRIO SALAZAR CASTILLO SEDE CE ESCUELA FRANCISCO MIRANDA





## CENTRO EDUCATIVO PUEBLO NUEVO SEDE PRINCIPAL
ID No. 94








# Estado GRUPO 2, Departamento de Atlántico

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-050-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-053-2023 – RM INGENIEROS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**8**
**Proyectos**

- 1 Departamentos
- 5 Municipios
- 8 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT 2023 - 6398 estudiantes.
- $ 4.044.124.630 Inversión

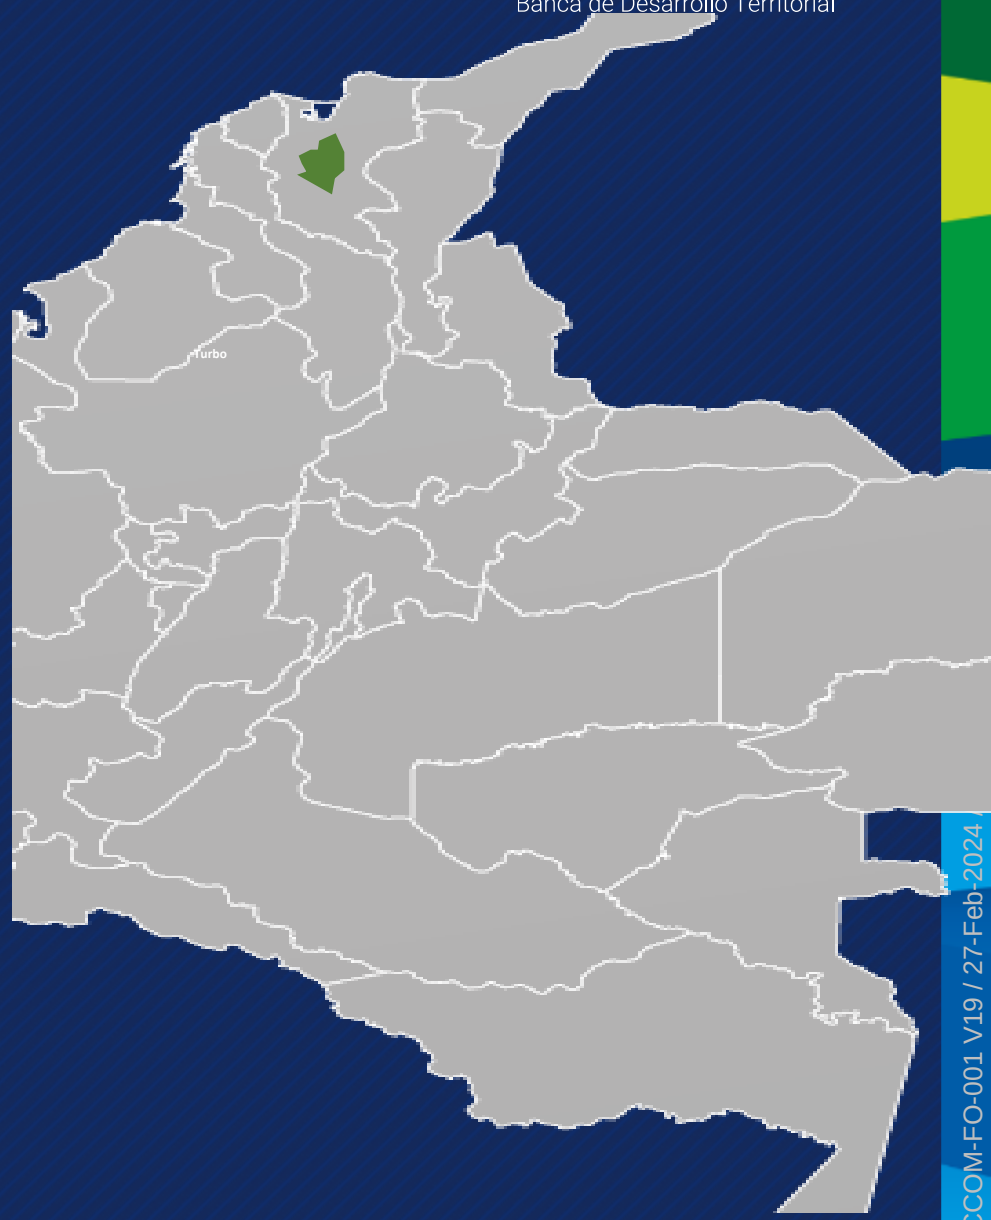

# GRUPO 2, Departamentos de Atlántico


Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## SEDES INTERVENIDAS:

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | IE | SEDE |
|---|---|---|---|
| Atlántico | Repelón | IE CIEN PESOS Y LAS TABLAS | PITA |
| Atlántico | Soledad | IE JOSEFA DONADO | SEDE CABICA |
| Atlántico | Galapa | IE MARIA AUXILIADORA | IE MARIA AUXILIADORA |
| Atlántico | Repelón | IE CIEN PESOS Y LAS TABLAS | SEDE PRINCIPAL |
| Atlántico | | IE TECNICA AGROPECUARIA DE VILLA ROSA | SEDE LA LOMA |
| Atlántico | Soledad | IE JOSEFA DONADO | SEDE PRINCIPAL |
| Atlántico | | IE TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE | IE TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE |
| Atlántico | Malambo | INSTITUCIÓN EDUCATIVA MESOLANDIA | SEDE MESOLANDIA |

| ALCANCE TOTAL DE INTERVENCIÓN | | | |
|---|---|---|---|
| AULAS NUEVAS | AULAS MEJORADAS | BATERIAS SANITARIAS | FECHA DE ENTREGA |
| 1 | | 2 | 16/09/2024 |
| 3 | | 1 | 13/09/2024 |
| | 15 | | 16/08/2024 |
| | 8 | | 18/07/2024 |
| | 5 | 8 | 11/07/2024 |
| | 16 | 8 | 16/07/2024 |
| | 22 | | 15/11/2024 |
| | 8 | | 4/09/2024 |

## PORCENTAJES DE AVANCE:







**ESTADO ACTUAL CIERRE Y LIQUIDACION CONTRATOS DERIVADOS**

**AERS COMPONENTE 1 y 2:**

- Contrato de Obra, en proceso de firma por parte de la Fiduciaria Popular, una vez se tenga el AERS suscrita se procederá a solicitar la actualización de pólizas.
- Contrato de Interventoría, en proceso de firma por parte de la Fiduciaria Popular, una vez se tenga el AERS suscrita se procederá a solicitar la actualización de pólizas

DOCUMENTOS DE CIERRE Y LIQUIDACION

En recopilación documental entre el contratista e interventoría.

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

**Contratista de Diseño y Obra:** PAF-MENAM-O-050-2023 CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 - G2
**Contratista interventor:** PAF-MENAM-I-053-2023 RM INGENIEROS S A S

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE PRINCIPAL - ID EN 018




## INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE PRINCIPAL - ID EN 018




## INSTITUCION EDUCATIVA BLAS TORRES DE LA TORRE (ITIDA) - ID MEN 144




## INSTITUCION EDUCATIVA DE MESOLANDIA - ID MEN 197




## INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS, LAS TABLAS Y PITA, SEDE PITA - ID MEN 092




## INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS, LAS TABLAS Y PITA, SEDE LAS TABLAS - ID MEN 083




CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

## INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE VILLA ROSA, SEDE LA LOMA - ID MEN 084






## INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA DE GALAPA - ID MEN 064







# Estado GRUPO 3, Departamento Magdalena

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-051-2023 – CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-054-2023 – CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**5**
**Proyectos**

- 1 Departamentos
- 3 Municipios
- 5 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT 2023 - 2630 estudiantes.
- Consultoría y obra $ 4.744.960.153
  Interventoría $ 351.774.412
  **Inversión Total**
  **$ 5.096.734.565**

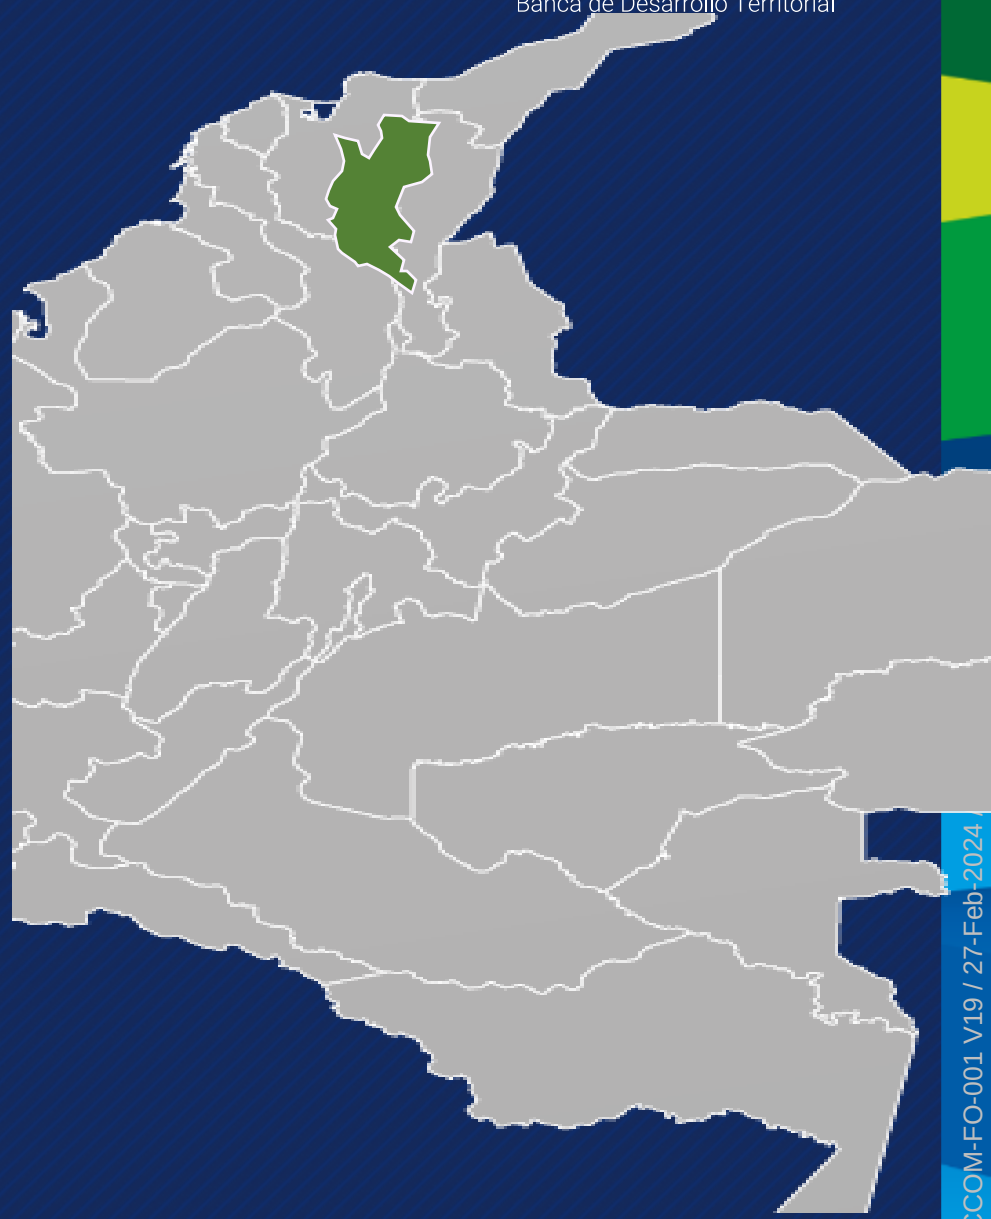

# Estado GRUPO 3, Departamentos de Magdalena

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-051-2023 – CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-054-2023 – CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3

| VALOR EJECUCION | FECHA INICIO C1 | FECHA FIN C1 | FECHA INICIO C2 | FECHA FIN C2 | PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **O:** $4.744.960.153<br>**I:** $ 371.774.412 | 14/11/2023 | 28/12/2023 | 18/12/2023 | 12/04/2024 | **Progr** | 100% | 100% |
| **AVANCE POR COMPONENTE** | **Programado** | 100% | **Programado** | 100% | **Ejecut** | 100% | |
| | **Ejecutado** | 100% | **Ejecutado** | 100% | **% Financiero G3:** 99,15%<br>**Obra:** 100%<br>**Interventoría:** 88,35% | | |

| MUNICIPIO | INSTITUCIONES EDUCATIVAS | SEDE | Aulas Nuevas | Aulas Mejoradas | BATERÍA SANITARIA |
|---|---|---|---|---|---|
| El Retén | Institución Educativa Departamental Roque de Los Rios Valle | Col Mpal Roque de Los Rios Valle | 9 | 11 | 11 N |
| El Retén | Institución Educativa Departamental Roque de Los Rios Valle | Institución Educativa Enoc Mendoza Riazco | N/A | 7 | 15 N |
| Ciénaga | Institución Educativa Enoc Mendoza Riazco | Institución Educativa Enoc Mendoza Riazco | N/A | 24 | N/A |
| Puebloviejo | Institucion Educativa Departamental San Juan de Palos Prietos | ERM El Triunfo | N/A | 4 | N/A |
| Puebloviejo | Institucion Educativa Departamental San Juan de Palos Prietos | ERM Isla de Cataquita | N/A | 2 | N/A |

**Avance General:** En proceso de liquidación.

**COMPONENTE 1:** Entregado 30/01/2024 – 100%

**COMPONENTE 2:** Entregado 29/04/2024 al 30/04/2024 – 100% con acompañamiento del MEN y UNGRD.

| Estado | Proyectos |
|---|---|
| Entregados | 5 |
| Terminados | 0 |
| Ejecución | 0 |
| Sin iniciar | 0 |

**LIQUIDACIÓN Contrato de Obra No. PAF-MENAM-O-051-2023:** Suscrita Acta de liquidación de fecha 01/10/2024 y pagado 100%.

**LIQUIDACIÓN Contrato de Interventoría No. PAF-MENAM-I-054-2023:**Radicada carpeta de liquidación a Findeter el 28/10/2024 bajo el Código: INC 2024-001916, aprobadas pólizas contra entrega y recibo por Fiduciaria Popular de fecha 05/11/2024 y remitidas subsanaciones de observaciones 21/11/2024, se encuentra en revisión de la Fiduciaria Popular balance económico y pagado 88,35%. Posible fecha de liquidación 31/12/2024

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 3, Departamentos de Magdalena

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-051-2023 – CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-054-2023 – CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3

## ID112 IE. RIOS VALLE, El Retén (Bachillerato) - ENTREGADO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Reten - Magdalena |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 2.346.192.202 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 731 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aulas | 11 | • Mejoramiento y cambio de cubiertas, mampostería (estructura principal y de confinamiento), mejoramiento de pañete y pinturas externas e internas, mejoramiento de pisos en general, carpintería metálica y red eléctrica general. |
| Aulas nuevas | 9 | • Sistema en estructura metálica, envolvente en WPC con teja UPVC, red eléctrica y piso en concreto. |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | N.A. | |
| Baterías sanitarias nuevas | 11 | Sistema en estructura metálica, envolvente en WPC con teja UPVC, red eléctrica y piso en concreto. |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 29 de abril de 2024 |

### Antes





### Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 3, Departamentos de Magdalena

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-051-2023 – CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-054-2023 – CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3

## ID156 IE. GREGORIO GARZÓN, El Retén (Primaria) - ENTREGADO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Reten - Magdalena |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 527.020.099 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 515 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aulas | 7 | • Mejoramiento y mantenimiento de cubiertas, mampostería (estructura principal y de confinamiento), pisos en general, carpintería metálica y red eléctrica general. |
| Aulas nuevas | N.A. | |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | 15 | |
| Baterías sanitarias nuevas | N.A. | |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 29 de abril de 2024 |


### Antes





### Después



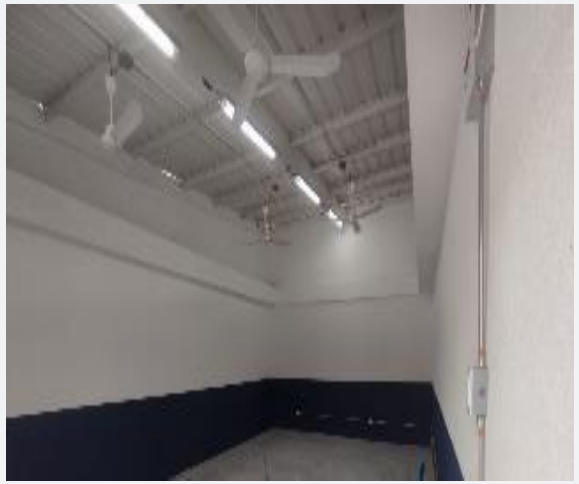





CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 3, Departamentos de Magdalena

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-051-2023 – CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-054-2023 – CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3

## ID154 IE. ENOC MENDOZA, Ciénaga - ENTREGADO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Ciénaga – Magdalena |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 1.649.361.282 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 870 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aulas | 24 | • Mejoramiento y mantenimiento de cubiertas, mampostería (estructura principal y de confinamiento), pisos en general, carpintería metálica y red eléctrica general.<br>• Construcción de circulaciones entre aulas, rampas y escaleras. |
| Aulas nuevas | N.A. | N.A. |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | N.A. | |
| Baterías sanitarias nuevas | N.A. | |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 29 de abril de 2024 |

Antes





Después









# Estado GRUPO 3, Departamentos de Magdalena

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-051-2023 – CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-054-2023 – CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3

## ID126 IE. EL TRIUNFO, Puebloviejo - ENTREGADO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Puebloviejo – Magdalena |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 153.545.059 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 98 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aulas | 4 | • Mejoramiento y mantenimiento de mampostería (estructura principal y de confinamiento), pisos en general, carpintería metálica y red eléctrica general, cambio de cubiertas, canalización de aguas lluvias y mejoramiento de la circulación. |
| Aulas nuevas | N.A. | |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | N.A. | |
| Baterías sanitarias nuevas | N.A. | |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 30 de abril de 2024 |

### Antes





### Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 3, Departamentos de Magdalena

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-051-2023 – CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-054-2023 – CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3

## ID111 IE. CATAQUITA, Puebloviejo - ENTREGADO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Puebloviejo – Magdalena |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 68.841.509 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 115 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aulas | 2 | • Mejoramiento y mantenimiento de mampostería (estructura principal y de confinamiento), pisos en general, carpintería metálica y red eléctrica general, cambio de cubiertas y mejoramiento de la circulación. |
| Aulas nuevas | N.A. | |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | N.A. | |
| Baterías sanitarias nuevas | N.A. | |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 30 de abril de 2024 |

Antes





Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada


# Estado GRUPO 4, Departamentos de Magdalena y Bolívar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-052-2023 – JASA LTDA
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-055-2023 – CONSORCIO INTER EDUCATIVO G4

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**7**
**Proyectos**

- 2 Departamentos
- 3 Municipios
- 7 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT 2023 - 1302 estudiantes.
- $ 3.831.442.211.00 Inversión

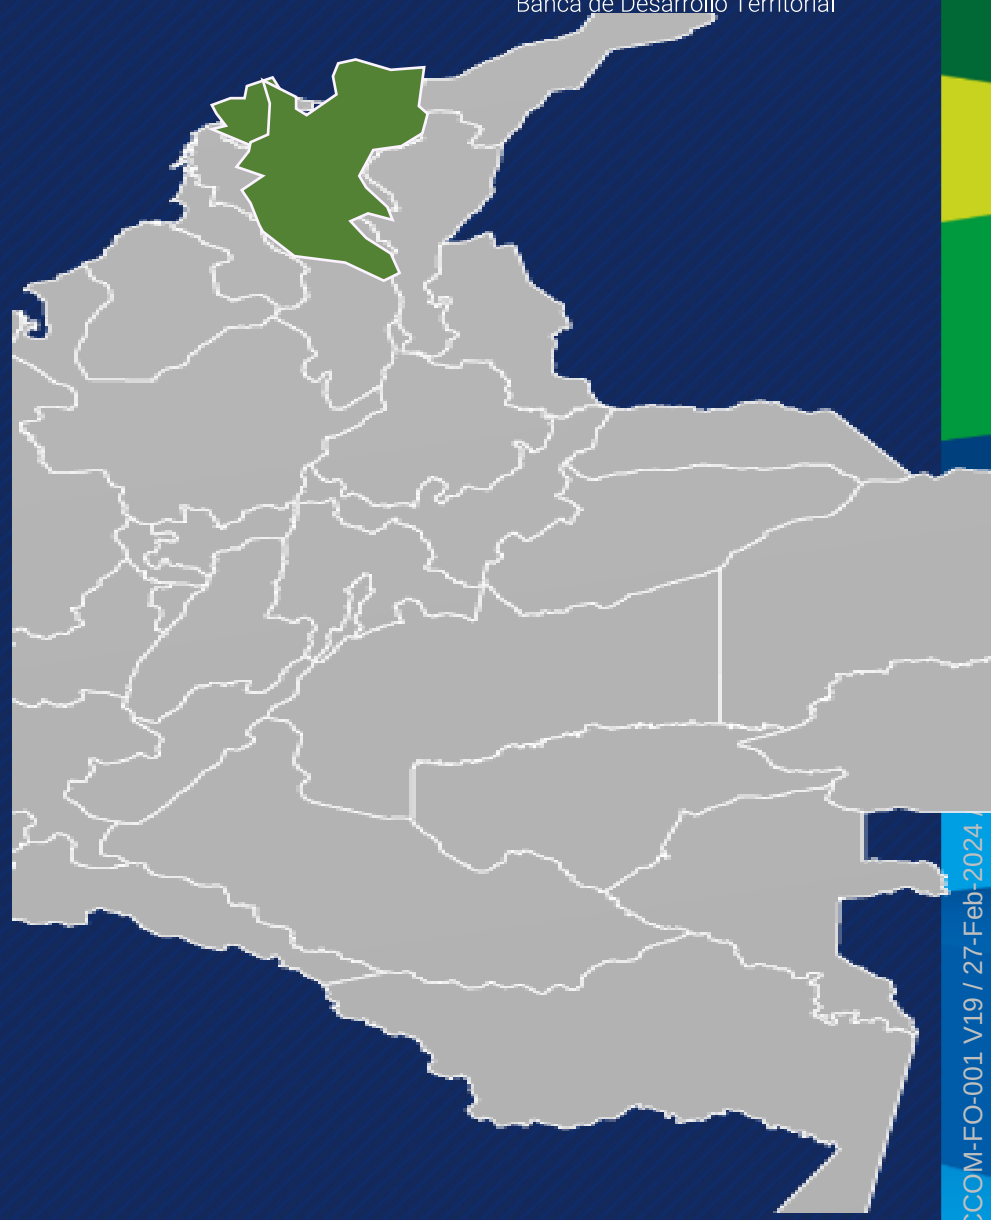

# Estado GRUPO 4, Departamentos de Magdalena y Bolívar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-052-2023 – JASA LTDA

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-055-2023 – CONSORCIO INTER EDUCATIVO G4

| VALOR EJECUCIÓN | FECHA INICIO Proyectada C1 | FECHA FIN Proyectada C1 | FECHA INICIO Proyectada C2 | FECHA FIN Proyectada C2 | PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.744.960.153 | 24/10/2023 | 08-12-2023 | 08-12-2023 | 07-02-2024 | **Programado** | 100% | 0% |
| **AVANCE POR COMPONENTE** | **Programado** | 100% | **Programado** | 100% | **Ejecutado** | 100% | |
| | **Ejecutado** | 100% | **Ejecutado** | 100% | | | |

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SEDE | AULAS NUEVAS | AULAS MEJORADAS | APARATOS SANITARIO | ÁREA DESARROLLADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolívar | Mompós | INSTITUCIÒN EDUCATIVA TÈCNICA AMBIENTAL DE TIERRA FIRME | I.E.T.A. AMBIENTAL DE TIERRA FIRME - SEDE PRINCIPAL | 3 | 13 | 4 | 4.224 M2 |
| Bolívar | Mompós | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DEL CHICAGUA | SAN LUIS | 1 | 2 | 2 | |
| Bolívar | Córdoba | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE TACAMOCHO | TACAMOCHO (SEDE PRIMARIA) | 0 | 9 | 4 | |
| Bolívar | Córdoba | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE TACAMOCHO | NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE TACAMOCHITO | 1 | 7 | 4 | |
| Magdalena | San Sebastían de Buenavista | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA | ERM MARIA AUXILIADORA | 3 | 2 | 1 | |
| Magdalena | San Sebastián de Buenavista | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA | ERM LA PACHA | 2 | 6 | 1 | |
| Magdalena | San Sebastián de Buenavista | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE TRONCOSO | ERM DE JAIME | 0 | 2 | 2 | |

Se encuentra liquidado el contrato de obra. El contrato de interventoría iniciará su trámite de liquidación una vez que quede desembolsado el último pago, lo cuál se tiene estipulado se haga para…..

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# GRUPO 4: LIQUIDADO

## LA PACHA












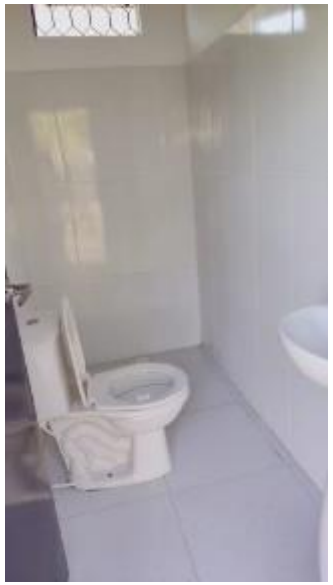










# Estado GRUPO 5, Departamentos de Magdalena y Bolívar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**16**
**Proyectos**

- 3 Departamentos
- 3 Municipios
- 16 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total, estudiantes SIMAT 2023 - 1177 estudiantes.
- $ 4.102.044.984 Inversión

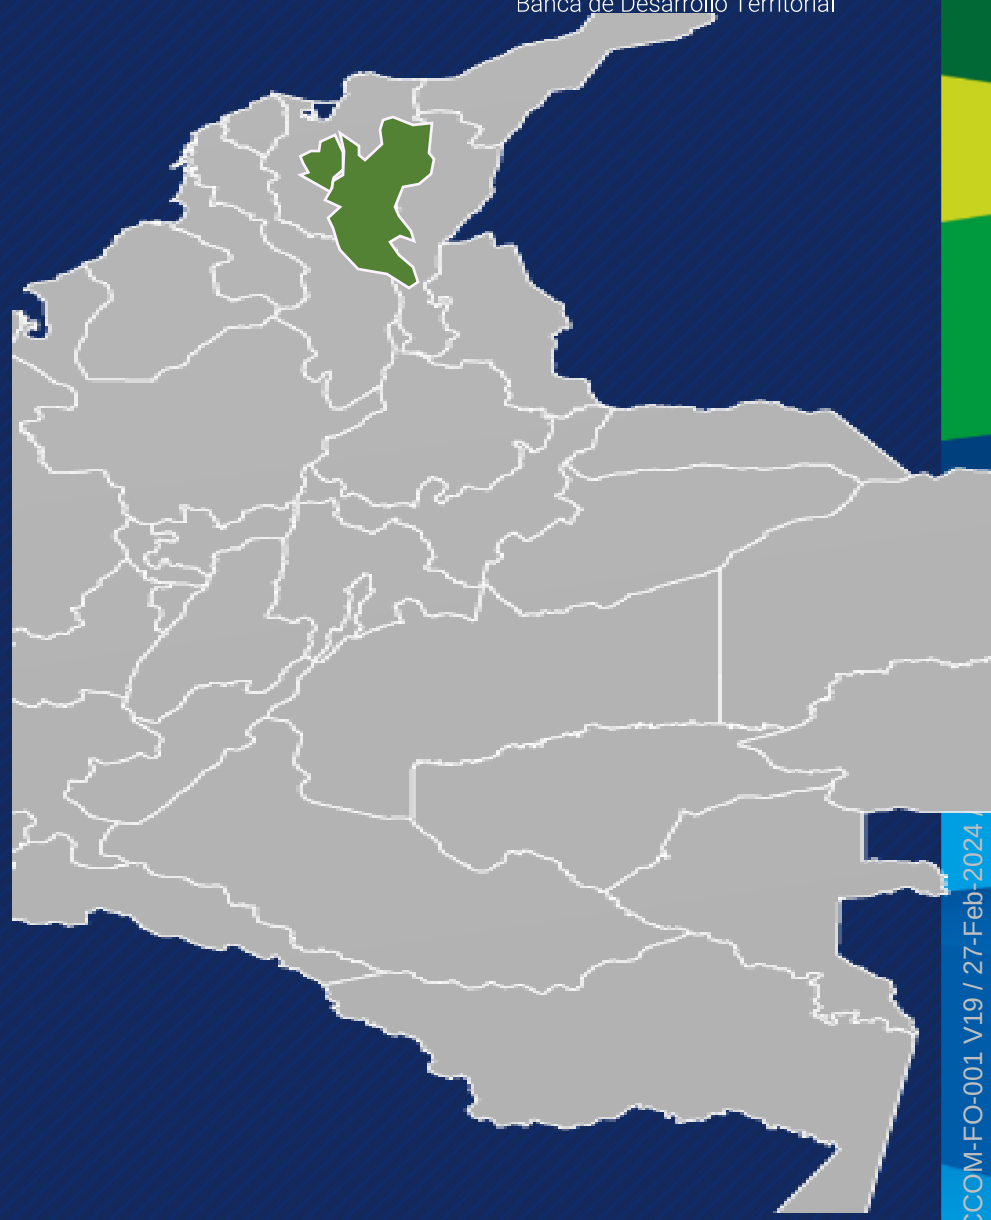

# GRUPO 5, Departamentos de Cesar, Magdalena y Bolívar.

**SEDES INTERVENIDAS:**

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | IE | SEDE | ALCANCE TOTAL DE INTERVENCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | AULAS NUEVAS | AULAS MEJORADAS | BATERIAS SANITARIAS | FECHA DE ENTREGA |
| Bolívar | Barranco de Loba | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR | I.E.T.A. LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR - SEDE PRINCIPAL | | 10 | | 19/11/2024 |
| Bolívar | Barranco de Loba | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR | ATASCOZA | 1 | 3 | | 07/11/2024 |
| Bolívar | Barranco de Loba | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR | LOS CERRITOS | | 7 | | 19/11/2024 |
| Magdalena | Concordia | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE BASICA Y MEDIA SANTA CRUZ DE BALSAMO | ERM DE BALSAMO | | 6 | | 30/11/2024 |
| Magdalena | Concordia | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE BASICA Y MEDIA SANTA CRUZ DE BALSAMO | JAR INF MIS PRIMEROS SUEÑOS | | 2 | | 30/11/2024 |
| Magdalena | El Banco | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ANTONIO NARIÑO | CENT EDUC RUR MIX JOSE DE LA PAZ VANEGA ORTIZ | 1 | 6 | 1 Bs, 11 aparatos | 13/11/2024 |
| Cesar | Curumaní | INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES | INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES | | 11 | | 28/06/2024 |
| Magdalena | El Banco | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL SILVIA COTES DE BISWELL | ERM SANTA TERESA DE ISLITA | | 2 | | 5/06/2024 |
| Bolívar | San Martín de Loba | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA PESQUERA LEONIDAS ORTIZ ALVEAR DE CHIMÍ | PLAN BONITO | 1 | 0 | | 2/06/2024 |
| Cesar | Curumaní | INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES | SEDE CHINELA | 1 | 0 | 1 Bs, 4 aparatos | 12/11/2024 |
| Cesar | Curumaní | INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES | SEDE GUAIMARAL | | 3 | | 30/07/2024 |
| Cesar | Curumaní | INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES | SEDE LOS SERRENOS | | 2 | | 21/06/2024 |
| Magdalena | El Banco | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL OSCAR PISCIOTTI NUMA | ERM INMACULADA CONCEPCION | | 2 | | 5/06/2024 |
| Cesar | Chimichagua | CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO | SEDE TRONCONAL | 1 | 0 | 3 Bs, 3 aparatos | 30/11/2024 |
| Cesar | Chimichagua | CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO | SEDE PUERTO LA ESTANCIA | | 2 | | 30/07/2024 |
| Cesar | Chimichagua | CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO | SEDE TORRECILLA | | 3 | | 30/07/2024 |

**PORCENTAJES DE AVANCE:**

100% Programado

98% Ejecutado

**ESTADO ACTUAL CIERRE Y LIQUIDACION CONTRATOS DERIVADOS**

**AERS COMPONENTE 1 y 2:**

- En proceso de proyección para revisión y firma por parte de la Fiduciaria Popular, Contrato de Interventoría, en proceso de firma por parte de la Fiduciaria Popular, una vez se tenga el AERS suscrita se procederá a solicitar la actualización de pólizas

# GRUPO 5, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES SEDE PRINCIPAL
ID No. 30





## INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES SEDE SERENOS
ID No. 101




## INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES SEDE SERENOS
ID No. 101




## INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRISTIAN MORENO SEDE CHINELA
ID No. 97




## INSTITUCION EDUCATIVA EL PUEBLITO SEDE PUERTO LA ESTANCIA
ID No. 147




## INSTITUCION EDUCATIVA EL PUEBLITO SEDE TORRECILLA
ID No. 148





CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# GRUPO 5, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PUEBLITO SEDE TRONCONAL
ID No. 146




## INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL SILVIA COTES DE BISWELL SEDE ISLITA
ID No. 32




## INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL OSCAR PISCIOTTI NUMA SEDE INMACULADA CONCEPCION




## INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ANTONIO NARIÑO SEDE JOSE DE LA PAZ VANEGAS




## INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA CRUZ DE BALSAMO SEDE PRIMARIA
ID No. 13




## INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA CRUZ DE BALSAMO SEDE JARDIN INFANTIL
ID No. 14




# GRUPO 5, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR SEDE PRINCIPAL
ID No. 06




INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR SEDE CERRITO
ID No. 10




INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR SEDE ATASCOZA
ID No. 09




INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA PESQUERA LEONIDAS ORTIZ ALVEAR SEDE PLAN BONITO
ID No. 43





# Estado GRUPO 6, Departamento de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-056-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-058-2023 – CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**7**
**Proyectos**

- 1 Departamentos
- 3 Municipios
- 7 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT 2023 - 3388 estudiantes.
- $ 2.697.151.413,44 Inversión



CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 6, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-056-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-058-2023 – CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| VALOR EJECUCION | FECHA INICIO | FECHA FIN | FECHA INICIO | FECHA FIN | PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C1 | C1 | C2 | C2 | | | |
| O: $2.496.849.571,44<br>I: $200.301.842,00 | 15-nov-23 | 30-dic-23 | 30-nov-23 | 29-abr-2024 | **Programado** | 100% | 0,00% |
| **AVANCE POR COMPONENTE** | **Programado** | 100,00% | **Programado** | 100,00% | **Ejecutado** | 100% | |
| | **Ejecutado** | 100,00% | **Ejecutado** | 100,00% | **En proceso de liquidación.** | | |

**ALCANCE DEFINIDO**

| DPTO | MUNICIPIO | INSTITUCION EDUCATIVA | SEDE | AULAS NUEVAS | AULAS MEJORADAS | BATERÍAS SANITARIAS | ID MEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar | El Paso | IE OCTAVIO MENDOZA DURAN | SEDE LA ESTACION | 1 | 1 | 1 - Mejorada | 79 |
| | La Paz(Robles) | CENTRO EDUCATIVO INDIGENA CAÑO PADILLA YUKPA | SEDE EL COSO | 1 | 0 | N.A. | 45 |
| | El Paso | IE OCTAVIO MENDOZA DURAN | SEDE EL VALLITO | N.A. | 3 | N.A. | 75 |
| | | | SEDE LA ESPERANZA | N.A. | 8 | 1 - Mejorada | 74 |
| | | | SEDE SAN ANGEL | N.A. | 1 | 1 - Nueva | 77 |
| | Valledupar | IE ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ | IE ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ | N.A. | 11 | N.A. | 4 |
| | | IE TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ | INSTITUTO TECNICO COMERCIAL JOSE EUGENIO MARTINEZ | N.A. | 23 | N.A. | 48 |

**Avance General:** En proceso de liquidación.

**COMPONENTE I:** Entregado 02/02/2024 – 100%

**COMPONENTE II:** Entregado 15/04/2024 al 17/05/2024– 100%

**LIQUIDACIÓN Contrato de Obra No. PAF-MENAM-O-056-2023:** Suscrita Acta de liquidación el 20/11/2024 y en proceso de trámite de pago.

**LIQUIDACIÓN Contrato de Interventoría No. PAF-MENAM-I-058-2023:** En proceso de firmas del acta por parte de la fiduciaria. A la fecha se encuentra revisada y con visto bueno por todas las partes.

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# GRUPO 6, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-056-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-058-2023 – CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN – SEDE EL VALLITO

| MUNICIPIO | | El Paso |
|---|---|---|
| POBLACIÓN BENEFICIADA | | 105 estudiantes |
| ALCANCE | | |
| Aulas mejoradas | 3 | • Cambio de cubierta<br>• Cambio de red eléctrica<br>• Instalación de canales tipo amazonas.<br>• Instalación de bajantes.<br>• Reparación de grietas en aulas 1, 2 y 3.<br>• Reparación de muros con desprendimiento de pañetes en el aula 1.<br>• Raspado de pintura existente en aulas 1, 2 y 3.<br>• Acabado en estuco y pintura para muros del aula 1, 2 y 3.<br>• Mantenimiento de rejas metálicas de aulas 1, 2 y 3. |
| Baterías sanitarias | N.A. | N.A. |
| FECHA DE ENTREGA | | 15/04/2024 |

## REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ANTES





## REGISTRO FOTOGRAFICO DEL DESPUES






CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# GRUPO 6, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-056-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-058-2023 – CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN – SEDE LA ESTACION

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | El Paso |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 65 estudiantes |
| **ALCANCE** | | |
| Aulas nuevas | 1 | Aula prefabricada - Material WPC |
| Aulas mejoradas | 1 | * Cambio de cubierta<br>* Cambio de red eléctrica |
| Baterías sanitarias | Mejoramiento | * Cambio de enchape por la calidad de instalación del existente y limpieza y mantenimiento de sanitarios existentes<br>* Mantenimiento de carpintería metálica<br>* Cambio de cubierta y red eléctrica<br>* Suministro de tanque de agua potable 2000 L<br>* Construcción de poza séptica con campos de infiltración. |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 02/05/2024 |

## REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ANTES






## REGISTRO FOTOGRAFICO DEL DESPUES





# GRUPO 6, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-056-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-058-2023 – CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## CENTRO EDUCATIVO INDIGENA CAÑO PADILLA YUKPA – SEDE EL COSO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | La Paz (Robles) |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 65 estudiantes |
| **ALCANCE** | | |
| Aulas nuevas | 1 | • Suministro e instalación de aula de 45 M2 tipo multigrado, prefabricada.<br>• Instalación de un sistema de panel solar con sus respectivos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento |
| Baterías sanitarias | N.A. | N.A. |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 04/05/2024 |

## REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ANTES





## REGISTRO FOTOGRAFICO DEL DESPUES









# GRUPO 6, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-056-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-058-2023 – CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN – SEDE LA ESPERANZA

| MUNICIPIO | | El Paso |
|---|---|---|
| POBLACIÓN BENEFICIADA | | 225 estudiantes |
| ALCANCE | | |
| Aulas mejoradas | 9 | ✓ 7 AULAS:<br>• Cambio de cubierta<br>• Cambio de red eléctrica<br>• Instalación de canales tipo amazonas.<br>• Instalación de bajantes.<br>• Reparación de grietas en bloque 1 y aula 6<br>• Reparación de muros con desprendimiento de pañetes.<br>• Raspado de pintura existente en bloque 1, aula 5 y 6<br>• Acabado en estuco y pintura para muros del bloque 1, aula 5 y 6.<br>• Mantenimiento de pintura a marcos y hoja de puertas del bloque 1, aula 5, 6<br><br>✓ 2 AULAS<br>• Cambio de cubierta<br>• Subida de nivel<br>• Cambio de red eléctrica<br>• Mejoramiento en muros y en carpintería metálica<br>✓ OBRAS HIDRÁULICAS EN LA SEDE |
| Baterías sanitarias | SI | • Cambio de cubierta<br>• Cambio de red eléctrica<br>• Mantenimiento de pintura a marcos y hoja de puertas |
| FECHA DE ENTREGA | | 10/05/2024 |

## REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ANTES





## REGISTRO FOTOGRAFICO DEL DESPUES







CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# GRUPO 6, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-056-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-058-2023 – CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN – SEDE SAN ANGEL

| MUNICIPIO | | El Paso |
|---|---|---|
| POBLACIÓN BENEFICIADA | | 8 estudiantes |
| ALCANCE | | |
| Aulas mejoradas | 1 | • Mantenimiento y limpieza de cubierta<br>• Cambio de puerta de acceso principal<br>• Mejoramiento de ventanas el cual incluye lijado, anticorrosivo y pintura. |
| Baterías sanitarias | SI | • Suministro e instalación de batería sanitaria prefabricada.<br>• Instalación de sistema séptico.<br>• Instalación de tanque plástico 500 L para contención de agua potable. |
| FECHA DE ENTREGA | | 15/05/2024 |

## REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ANTES





## REGISTRO FOTOGRAFICO DEL DESPUES





CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# GRUPO 6, Departamentos de Cesar


Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-056-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-058-2023 – CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ – IE ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ

| MUNICIPIO | | Valledupar |
|---|---|---|
| POBLACIÓN BENEFICIADA | | 385 estudiantes |
| ALCANCE | | |
| Aulas mejoradas | 11 | • Cambio de cubierta<br>• Cambio de red eléctrica<br>• Cambio de pisos en aulas 1, 2 y 3 del bloque 1.<br>• Aseo manual de muros con ácido muriático en el bloque 5.<br>• Desmonte manual de muro divisorio en aulas del bloque 2.<br>• Instalación de muro divisorio en sistema drywall para aulas del bloque 2 .<br><br>En sala de informática y las 2 aulas del bloque 2.<br>• Desmonte de cielo raso.<br>• Instalación de cielo raso en lamina PVC. |
| Baterías sanitarias | N.A. | N.A. |
| FECHA DE ENTREGA | | 16/05/2024 |

## REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ANTES

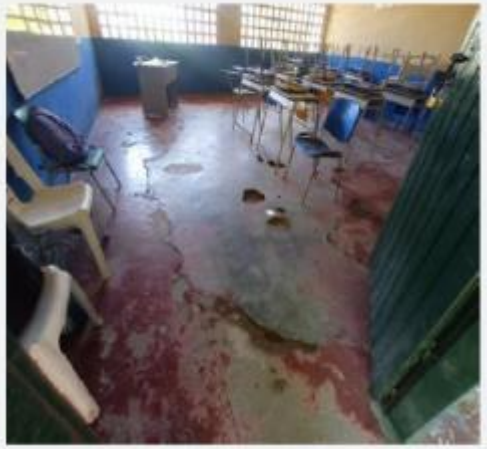
## REGISTRO FOTOGRAFICO DEL DESPUES





# GRUPO 6, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-056-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-058-2023 – CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ– SEDE INSTITUTO TECNICO COMERCIAL JOSE EUGENIO MARTINEZ


| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Valledupar |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 805 estudiantes |
| **ALCANCE** | | |
| Aulas mejoradas | 23 | * Cambio de cubierta para bloque 1, 2, 3, 4 y 5- correspondiente a las 23 aulas.<br>* Cambio de red eléctrica para bloque 1, 2, 3, 4 y 5 por cambio de cubierta - correspondiente a las 23 aulas.<br>* Instalación de canales tipo amazonas.<br>* Instalación de bajantes.<br>* Pintura interna para los bloques 1, 2, 3, 4 y 5 por cambio de cubierta - correspondiente a las 23 aulas. |
| Baterías sanitarias | N.A. | N.A. |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 17/05/2024 |

## REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ANTES





## REGISTRO FOTOGRAFICO DEL DESPUES

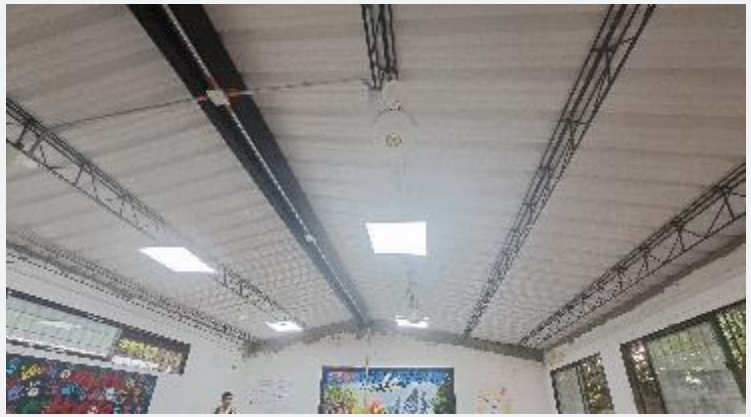

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 7, Departamento de La Guajira

Contratista de Diseño y Obra PAF-ATMEN5-O-036-2024 – CONSORCIO GUAJIRA 7 (Máxima Solutions sas 50% Gancar Distribuciones sas 50%)
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-059-2023 – GERMÁN ADOLFO PERDOMO PACHÓN

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**13**
**Proyectos**

- 1 Departamento
- 4 Municipios
- 9 Instituciones
  13 Sedes
- Total estudiantes SIMAT 2024 - 2585 estudiantes.
- $4.454.016.879
  Inversión




CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 7,Departamento de La Guajira

Contratista de Diseño y Obra PAF-ATMEN5-O-036-2024 – CONSORCIO GUAJIRA 7 ( Maxima Solutions sas 50% Gancar Distribuciones sas 50%)

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-059-2023 – GERMÁN ADOLFO PERDOMO PACHÓN

| VALOR EJECUCION | FECHA INICIO C1 | FECHA FIN C1 | FECHA INICIO C2 | FECHA FIN C2 | PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O: $4.158.777.879<br>I: $295.239.000 | 31/05/2024 | 15/07/2024 | 15/07/2024 | 18/12/2024 | Progr | 94,12% | -12,79% |
| AVANCE POR COMPONENTE | Programado | 100,00% | Programado | 93,66% | Ejecut | 81,32% | |
| | Ejecutado | 100,00% | Ejecutado | 79,88% | | | |

| DPTO | MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SEDE | AULAS NUEVAS | AULAS MEJORAD | APARAT SANIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guajira | Maicao | I.E. INDÍGENA No. 2 | KASICHE | 1 | 0 | 2 |
| Guajira | Maicao | I.E. INDÍGENA No. 6 | YAMAIN KASPOLIMANA | 1 | 1 | 2 |
| Guajira | Maicao | ESC. RURAL MIXTA TALOULUMAANA | ESC. RURAL MIXTA TALOULUMAANA | 2 | 0 | 6 |
| Guajira | Manaure | I. ETNOEDUCATIVA NTRA. SRA. DE FÁTIMA | ESC. RURAL INDÍGENA KARALOUTAMANA | 1 | 0 | 2 |
| Guajira | Barrancas | CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL PROVINCIAL | CENTRO ETNOEDUCATIVO PROVINCIAL | 1 | 0 | 0 |
| Guajira | Maicao | I.E. INDÍGENA No. 2 | LA CAMPANA | 0 | 9 | 0 |
| Guajira | Maicao | I.E. INDÍGENA No. 2 | WAYUUMAANA | 0 | 2 | 0 |
| Guajira | Maicao | I.E. INDÍGENA No. 2 | LA ESTRELLA | 1 | 0 | 0 |
| Guajira | Maicao | I.E. INDÍGENA No. 6 | YAMAIN PRINCIPAL | 1 | 0 | 0 |
| Guajira | Riohacha | I.E. JOSÉ ANTONIO GALÁN | COOPERATIVO | 0 | 7 | 0 |
| Guajira | Riohacha | I.E. JOSÉ ANTONIO GALÁN | JOSÉ ANTONIO GALÁN | 0 | 0 | 6 |
| Guajira | Riohacha | I. ETNOEDUCATIVA No. 7 | APUNIMAANA1 | 0 | 8 | 0 |
| Guajira | Riohacha) | I. ETNOEDUCATIVA No. 7 | WAKUAPAMANA | 0 | 9 | 6 |
| TOTALES | | | | 8 | 36 | 24 |

**Avance General: Suspendido x 20d desde el 28oct24 hasta 16nov24; se reinició 17 y 18nov24 y se suspendió nuevamente x 30d (aumento ola invernal) del 18nov al 18dic24.**

**Avance general Componente I: 100%**

**Avance general por Sede Componente II: - 13,78%**

**ID53 Maicao, I.E. Indígena No.2, Sede Kasiche: 76,91%**
**ID152 Maicao, I.E. Indígena No.6, Sede Yamain Kaspolimana: 67.91%**
**ID153 Maicao, E.R. Mixta Taloulumaana, Sede E.R. Mixta Taloulumaana: 88.48%**
**ID11 Manaure, I. Etnoeducativa Ntra Sra Fátima, Sede E.R. Indígena Karaloutamana: 81.82%**
**ID143 Barrancas, C. Etnoeducativo Rural provncial, Sede C. Etnoeducativo Provincial: 73.48%**
**ID50 Maicao, I.E. Indígena No.2, Sede La Campana: 100%**
**ID54 Maicao, I.E. Indígena No.2, Sede Wayuumaana: 100%**
**ID151 Maicao, I.E. Indígena No.2, Sede La Estrella: 84.02%**
**ID51 Maicao, I.E. Indígena No.6, Sede Yamain principal: 86.96%**
**ID60 Riohacha, I.E. José Antonio Galán, Sede Cooperativo: 100%**
**ID95 Riohacha, I.E. José Antonio Galán, Sede José Antonio Galán: 82.52%**
**ID34 Riohacha, I.Etnoeducativa No.7, Sede Apunimaana1: 100%**
**ID117 Riohacha, I.Etnoeducativa No.7, Sede Wakuapamana: 74,05%**

# REGISTRO FOTOGRAFICO

I.E. JOSE ANTONIO GALAN- SEDE COOPERATIVO -060-(RIOHACHA)





INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #7 - 034-APÜNIMA´ANA1 -(RIOHACHA)





ESCUELA ETNOEDUCATIVA LA CAMPANA -050--(MAICAO)







ESCUELA ETNOEDUCATIVA WAYUMA'ANA -054- (MAICAO)





# REGISTRO FOTOGRAFICO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #7 - 117-WAKUAPAMANA -(RIOHACHA)







I.E. JOSE ANTONIO GALAN- SEDE PRINCIPAL -060-(RIOHACHA)






INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #6 - 051-TALOULUMA `ANA -(MAICAO)






INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO RURAL PROVINCIAL - 0143-PROVINCIAL -(BARRANCAS)




CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# REGISTRO FOTOGRAFICO

INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA - 011- ESCUELA RURAL INDIGENA KARALOUTAMANA -(MANAURE)





ESCUELA ETNOEDUCATIVA SEDE KASICHE -053- (MAICAO)






INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #6 - 151-LA ESTRELLA -(MAICAO)




INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #6 - 051- YAMAIN SEDE PRINCIPAL -(MAICAO)




INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #6 - 152- YAMAIN KASPOLIMANA -(MAICAO)



# REGISTRO FOTOGRAFICO

AFECTACIONES A LOS AVANCES DE OBRA POR LA FUERTES LLUVIAS CONSTANTES EN LAS ZONAS DE EJECUCIÓN DE LAS SEDES










# REGISTRO FOTOGRAFICO

AFECTACIONES A LOS AVANCES DE OBRA POR LA FUERTES LLUVIAS CONSTANTES EN LAS ZONAS DE EJECUCIÓN DE LAS SEDES










CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 8, Departamentos de Bolívar - Córdoba

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-055-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S.
Contratita Interventor PAF-MENAM-I-057-2023 – LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO

**9**
**Proyectos**

- 2 Departamentos
- 7 Municipios
- 8 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT 2023 - 3710 estudiantes.
- $ 6.602.674.825 Inversión



CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 - Clasificada

# REGISTRO FOTOGRAFICO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## Sede principal I. E. El Palmar - Montelíbano





## Sede Téc. Agrop. De Desarrollo Rural De María la baja - María La Baja





# REGISTRO FOTOGRAFICO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## Sede Buenos Aires - María La Baja






## Sede Esc. Nueva Parcelas Londres - Ayapel





# REGISTRO FOTOGRAFICO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## Sede Esc. Nueva La Solita - Puerto Libertador







## Sede Los Aguacates - Cotorra







# REGISTRO FOTOGRAFICO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## Sede Los Cerros - Planeta Rica





## Sede Técnica Álvaro Ulcue Chocue - Tuchín





# REGISTRO FOTOGRAFICO

## Sede Níspero-María La Baja













CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 9, Departamentos de Arauca, Bolívar, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima y Bogotá D.C.

Contratista de Diseño y Obra PAF-ATMEN5-O-037-2024 – CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9
Contratista Interventor PAF-ATMEN5-I-064-2024 – CONSORCIO SAN GABRIEL

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**15**
**Proyectos**

- 8 Departamentos
- 12 Municipios
- 13 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT 2024 - 3351 estudiantes.
- $ 5.124.276.306 Inversión



CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 9, Departamentos de Arauca, Bolívar, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima y Bogotá D.C.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Contratista de Diseño y Obra PAF-ATMEN5-O-037-2024 – CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9

Contratista Interventor PAF-ATMEN5-I-064-2024 – CONSORCIO SAN GABRIEL

| VALOR EJECUCION | FECHA INICIO C1 | FECHA FIN C1 | FECHA INICIO C2 | FECHA FIN C2 | PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O: $4.810.476.306,00<br>I: $313.800.000 | 23-Ago-24 | 08-oct-24 | 09-oct-24 | 08-dic-24 | **Programado** | 52,84% | -46,78% |
| **AVANCE POR COMPONENTE** | **Programado** | 100,00% | **Programado** | 12,00% | **Ejecutado** | 6,19% | |
| | **Ejecutado** | 100,00% | **Ejecutado** | 0,50% | **En inicio de obras** | | |

| DPTO | MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SEDE | AULAS NUEVAS | AULAS MEJORAD | APARATOS SANITARIOS | ID MEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santander | Vélez | COLEGIO UNIVERSITARIO | COLEGIO UNIVERSITARIO | 4 | 9 | Si aplica | 7 |
| | Betulia | INSTITUCION EDUCATIVA EL RAMO | CENTRO EDUCATIVO SANTA BARBARA | NA | 1 | Si aplica | 17 |
| | Barrancabermeja | CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN | CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN | Sede retirada | | | 141 |
| Bolívar | Morales | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PALMA | LA ARCADIA | NA | 2 | Si aplica | 20 |
| | Simití | INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CERRO DE VERACRUZ | CAMPO PAYARES | 1 | 1 | Si aplica | 123 |
| | | | I.E. DEL CERRO DE VERACRUZ - SEDE PRINCIPAL | NA | 12 | 5 | 124 |
| Bogotá, D.C. | Bogotá, D.C. | COLEGIO LA CHUCUA (IED) | CENT EDUC DIST LA CHUCUA | Sede retirada | | | 33 |
| | | COLEGIO ESTRELLA DEL SUR (IED) | COL DIST ESTRELLA DEL SUR | Sede retirada | | | 136 |
| Arauca | Saravena | CENTRO EDUCATIVO LA PAVA | LA PAVA | NA | 2 | 1 | 56 |
| | Arauca | CENTRO EDUCATIVO MONSERRATE | CEAR MONSERRATE | NA | 7 | 3 | 138 |
| Tolima | Santa Isabel | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BOLIVAR | LA HUMAREDA | 1 | 1 | 2 | 67 |
| | | | EL BRASIL | 1 | 1 | 2 | 100 |
| Meta | Villavicencio | INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO FRANCISCO ARANGO | ESCUELA SIETE DE AGOSTO | 5 | 2 | 8 | 96 |
| Cundinamarca | Anolaima | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE HUGO ENCISO | ESCUELA RURAL EL DESCANSO | 1 | 1 | 2 | 104 |
| Norte de Santander | La Playa | CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN PEDRO | SEDE LA PEÑA | NA | 1 | Si aplica | 132 |

**Avance General:** Se aprobó el de retiro de las 3 sedes educativas mediante comité técnico No. 70 y comité fiduciario No. 45. Por el atraso presentado y la evidencia de no terminación de las obras en el plazo contractual, se solicitará prórroga para el contrato de obra por actividades adicionales en las sedes de Tolima y Villavicencio y por los atrasos presentados en las demás sedes y prórroga y adición para el contrato de interventoría.

**Avance por sede:**

**ID No. 56:** Las obras dieron inicio el 05/11/2024, y desde entonces se han realizado varias actividades, como la reparación de los pasillos, retiro de la cubierta de los baños y desmonte del cielo raso en el aula de informática.

**ID No. 132:** Se encuentran en ejecución de obras.

**ID No. 138:** En esta sede se prorrogó el inicio de las obras ya que el rector manifestó que se realizarían unas olimpiadas en la escuela y hasta el día 19 noviembre finalizan.

**ID No. 7 y 17:** En esta sede se llevó a cabo la socialización el 07/11/2024, y se había proyectado el inicio de las obras. Sin embargo, se indicó que actualmente se están trasladando los materiales necesarios para dar inicio a las actividades,

**ID No. 20:** En esta sede se llevó a cabo la socialización el 06/11/2024, y se había proyectado el inicio de las obras. Sin embargo, se indicó que actualmente se están trasladando los materiales necesarios para dar inicio a las actividades,

**ID No. 123:** En esta sede se llevó a cabo la socialización el 06/11/2024, y se había proyectado el inicio de las obras. Sin embargo, se indicó que actualmente se están trasladando los materiales necesarios para dar inicio a las actividades.

**ID No. 124:** En esta sede se llevó a cabo la socialización el 06/11/2024, y se había proyectado el inicio de las obras. Sin embargo, se indicó que actualmente se están trasladando los materiales necesarios para dar inicio a las actividades.

**ID No. 104:** Se realizó socialización el 15/11/2024, en la que participaron la Rectora y padres de familia, lo cuales manifestaron que se diera inicio a las obras después del 23/11/2024.

**ID No. 67 y 100:** Se han presentado inconvenientes por condiciones climáticas en la zona, por lo cual, no han podido iniciar la ejecución de las obras.

**ID No. 96:** En esta sede se realizó la socialización 12/11/2024. Durante la reunión, manifestaron su preocupación sobre el inicio de las obras, señalando que, debido a las actividades que se deben ejecutar, implican un alto riesgo para la seguridad de los estudiantes. Por lo tanto, indicaron que lo más adecuado sería iniciar las obras después del 23/11/2024, cuando los alumnos se encuentren en periodo de vacaciones.

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada


# Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca – Valle del Cauca y Choco

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**15**
**Proyectos**

- 3 Departamentos
- 5 Municipios
- 15 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total, estudiantes SIMAT 2023 - 3198 estudiantes.
- 6.753.158.527,2 Inversión - MEN

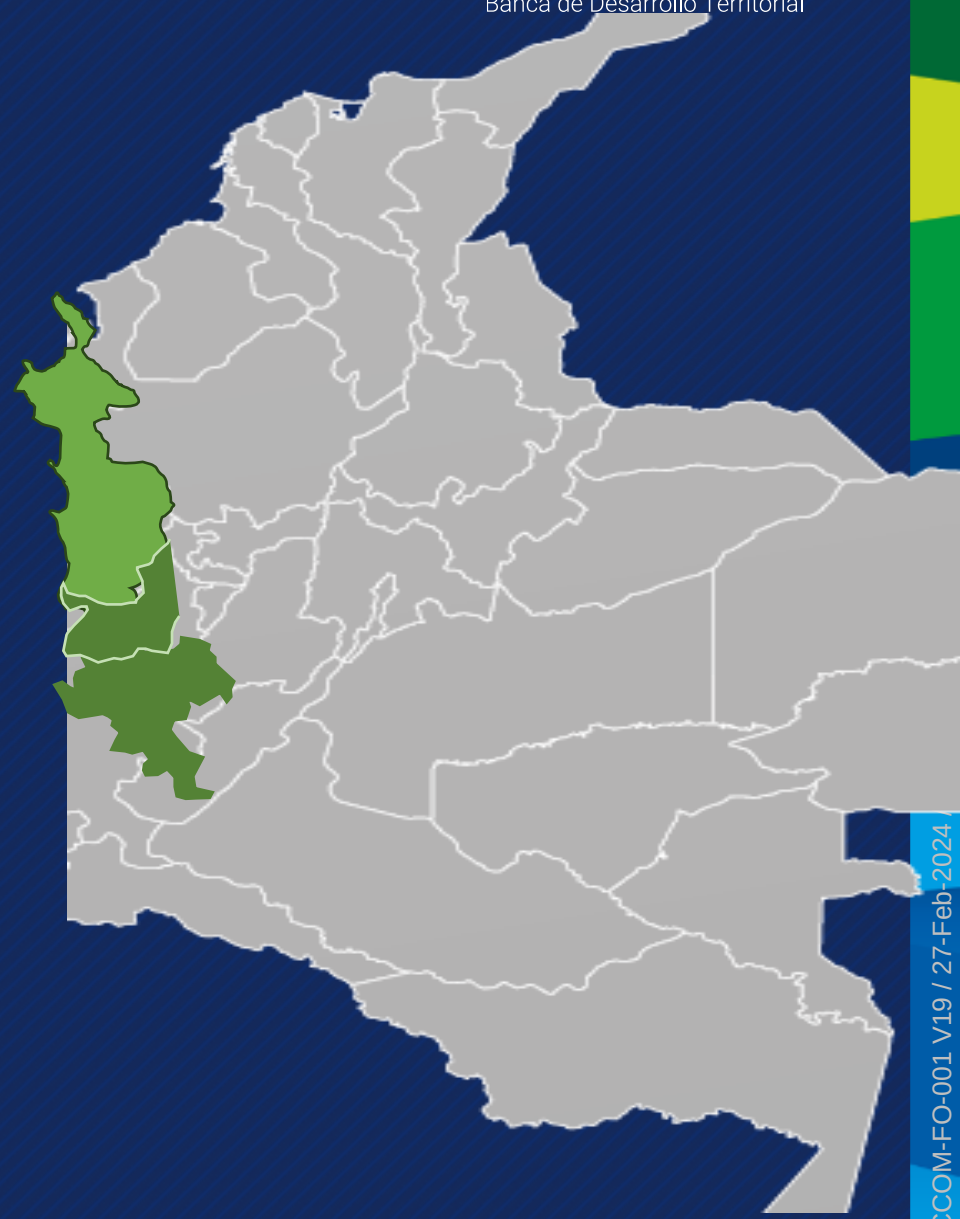

# Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca – Valle del Cauca y Choco

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratita Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO

**SEDES INTERVENIDAS:**

| | | | | ALCANCE TOTAL DE INTERVENCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | IE | SEDE | AULAS NUEVAS | AULAS MEJ | BSANITARIAS | FECHA DE ENTREGA |
| CAUCA | SUAREZ | ID188. IE TECNICA AGRICOLA | SEDE PRINCIPAL | | 9 | 24 MEJORAM | 30/11/2024 |
| CAUCA | SUAREZ | ID189. IE TECNICA AGRICOLA | MARIA INMACULADA | 6 | 7 | 9 NUEVAS 7 MEJORAM | 30/12/2024 |
| CAUCA | SUAREZ | ID190. IE TECNICA AGRICOLA | FRANCISCO PAULA SANTANDER | | 13 | 10 MEJORAM | 30/12/2024 |
| CAUCA | TORIBIO | ID12. IE LA PLAYA | CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO LA PLAYA | | 9 | | 3/9/2024 |
| CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | ID16. IE DOMINGUILLO | SEDE PRINCIPAL | 8 | | 8 NUEVAS | 30/12/2024 |
| CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | ID164. IE DOMINGUILLO | SEDE DOMINGO LASSO | | 4 | 3 MEJORAM | 30/7/2024 |
| CHOCO | BAHIA SOLANO | ID105. IE LUIS LOPEZ DE MESA | SEDE DE SAN JOSE (HUACA) | 1 | | 2 NUEVAS | 30/12/2024 |
| CHOCO | BAHIA SOLANO | ID106. IE LUIS LOPEZ DE MESA | SEDE SIRENA DEL MAR | | 1 | 2 MEJORAM | 27/11/2024 |
| CHOCO | BAHIA SOLANO | ID107. IE LUIS LOPEZ DE MESA | SEDE SECUNDINO RIVAS | | 7 | 4 MEJORAM | 27/11/2024 |
| V DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA | ID128. IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE | SEDE PRINCIPAL | | 9 | 14 MEJORAM | 30/11/2024 |
| V DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA | ID130. IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE | SEDE LA HONDA | | 1 | 2 MEJORAM | 3/8/2024 |
| V DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA | ID85. IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE | SEDE LA PLANTA | 1 | 2 | 2 | 30/12/2024 |
| V DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA | ID158. IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE | SEDE CRISTOBAL COLON | 1 | | 2 MEJORAM | 30/10/2024 |
| V DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA | ID62. IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE | SEDE JHN F KENNEDY | | 11 | 14 MEJORAM | 30/11/2024 |
| V DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA | ID129. IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE | SEDE JULIAN MENDOZA GUERRERO | | 5 | 10 MEJORAM | 17/9/2024 |

| Estado | Proyectos |
|---|---|
| Entregados | 5 |
| Terminados | 5 |
| Ejecución | 5 |

**PORCENTAJES DE AVANCE:**

**74,68%**
Porcentaje Programado

**66,69%**
Porcentaje de avance

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCION E.TECNICA AGRARIA SEDE PRINCIPAL ID MEN. 188.




INSTITUCION E.TECNICA AGRARIA SEDE PRINCIPAL ID MEN. 188.




INSTITUCION E.TECNICA AGRARIA SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ID MEN. 190




INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PLAYA ID MEN: 12. MUNICIPIO DE TORIBIO ID MEN: 12.




INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO SEDE DOMINGO LASSO.




INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO SEDE PRINCIPAL




CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó


Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE JOHN F. KENNEDY




INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDEJULIAN MENDOZA GUERRERO

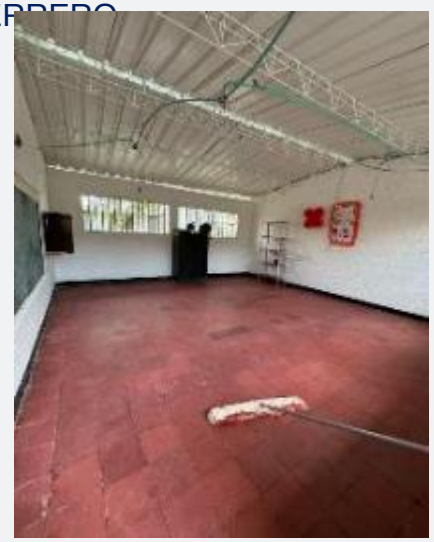INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE PRINCIPAL




INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE LA HONDA .




INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE LA PLANTA .




INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE CRISTOBAL COLÓN




CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCION EDUCATIVA LUIS LOPEZ DE MESA
SEDE SAN JOSE (HUACA)





INSTITUCION EDUCATIVA LUIS LOPEZ DE MESA
SEDE SIRENA DEL MAR





INSTITUCION EDUCATIVA LUIS LOPEZ DE MESA
SEDE SECUNDINO RIVAS





CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**18**
**Proyectos**

- 1 Departamento
- 6 Municipios
- 18 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT 2023 - 3170 Estudiantes
- $ 5.086.054.713 Inversión



# Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| VALOR EJECUCION | FECHA INICIO C1 | FECHA FIN C1 | FECHA INICIO C2 | FECHA FIN C2 | PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **O:** $4.728.021.810<br>**I:** $ 358.032.903 | 12/02/2024 | 27/03/2024 | 18/03/2024 | 27/11/2024 | **Progr** | 100% | -0,42% |
| **AVANCE POR COMPONENTE** | **Programado** | 100% | **Programado** | 100% | **Ejecut** | 99,58% | |
| | **Ejecutado** | 100% | **Ejecutado** | 99,56% | | | |

| MUNICIPIO | INSTITUCIONES EDUCATIVAS | SEDE | Aulas Nuevas | Aulas Mejoradas | BATERÍA SANITARIA |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolívar | Centro Educativo el Tambo | La Fuente | 1 | 0 | 1 M |
| El Tambo | I.E. Huisitó | Huisitó (sede principal) | 6 | 0 | 6 N |
| La Vega | I.E Agropecuaria San Francisco Javier sede Garay | I.E Agropecuaria San Francisco Javier sede Garay | 1 | 0 | 1 N |
| Balboa | C.E. Buenos Aires | Capitanes | NA | 2 | 0 |
| | I.E. Olaya (antes C.E. Olaya) | Olaya (sede principal) | NA | 13 | 6 M |
| Bolívar | Institución Educativa Agropecuario Nuestra Señora del Carmen | Corral Viejo | 1 | 0 | 2 M |
| | | Nuestra Señora del Carmen (sede principal) | NA | 13 | 8 M |
| | Institución Educativa el Carmen | El Carmen (sede principal) | NA | 2 | 1 M |
| | Institución Educativa Técnica Agropecuaria Nuestra Señora de los Remedios | Colegio Departamental Nuestra Señora de los Remedios | NA | 10 | 8 M |
| La Vega | Institución Educativa Agropecuaria Santa Rita | Institución Educativa Santa Rita (sede principal) | NA | 6 | 0 |
| Popayán | I.E. Comuneros | sede principal | NA | 6 | 0 |
| Rosas | Institución Educativa Santa Teresita | Santa Teresita (sede principal) | NA | 17 | 8 M |
| | Institución Educativa Madre Caridad Brader | Madre Caridad Brader (sede principal) | 1 | 0 | 0 |
| | Centro Educativo Guillermo León Valencia | La Despensa | NA | 3 | 2 M |
| | | El Altillo | NA | 1 | 2 M |
| | Institución Educativa Alfonso Córdoba | Las Yerbas | NA | 2 | 2 M |
| | | El Retiro | NA | 1 | 1 M |
| | | Bellavista | NA | 1 | 0 |

**COMPONENTE 1**

El componente 1 del contrato de obra, correspondiente a los diagnósticos, estudios y diseños de las 18 sedes educativas priorizadas por el Ministerio de Educación Nacional, se encuentra actualmente concluido y recibido a satisfacción por parte de la interventoría al contrato de obra.

**COMPONENTE 2**

| Estado | Proyectos |
|---|---|
| Entregados | 14 |
| Terminados | 3 |
| Terminados – en Subsanación | 1 |
| Sin iniciar | 0 |

- 14 proyectos se encuentran terminados al 100%, recibidos a satisfacción por interventoría, y entregados a Directivos de cada sede.
- 3 proyectos se encuentran terminados al 100%, recibidos a satisfacción por interventoría, y en gestión de entrega a Directivos de cada sede.
- 1 proyecto se encuentra terminado, en subsanación de observaciones informadas por interventoría para el recibo a satisfacción. Sede Huisitó.

Contrato de obra terminado. Contratista avanza en subsanación de observaciones informadas por la interventoría para el recibo a satisfacción de la sede Huisitó, y finalmente del contrato de obra.

Contratista avanza en las gestiones de entrega a Directivos de las sedes terminadas y recibidas por interventoría. En algunas de estas sedes los Directivos están solicitando actividades por fuera del alcance contractual. Se avanza en gestión para obtener el recibo de estas sedes.

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO




I.E. Agropecuaria Santa Rita – Sede principal
La vega




C.E. Buenos Aires – Sede Capitanes
Balboa




C.E. Guillermo León Valencia – Sede La Despensa
Rosas





C.E. Guillermo León Valencia – El Altillo
Rosas

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial




I.E. El Carmen – Sede principal
Bolívar





I.E. Alfonso Córdoba – Sede Las Yerbas
Rosas




I.E. Alfonso Córdoba – Sede Bellavista
Rosas




I.E. Técnica Agropecuaria Nuestra Señora de los
Remedios - Bolívar

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial






I.E. Alfonso Córdoba – Sede El Retiro
Rosas





I.E. Nuestra Señora del Carmen – Sede Principal
Bolívar





I.E. Olaya – Sede principal
Balboa





C.E. El Tambo – Sede La Fuente
Bolívar

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial




I.E. Madre Caridad Brader – Sede principal Rosas




I.E. Nuestra Señora del Carmen – Sede Corral viejo Bolívar




I.E. Agropecuaria San Francisco Javier – Sede Garay La Vega




I.E. Santa Teresita – Sede principal Rosas

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO









I.E. Los Comuneros – Sede principal
Popayán





I.E. Huisitó – Sede principal
El Tambo

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada


# Estado GRUPO 12, Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julian Lizandro Gonzalez Casas 50% Jorge Andrés Chacón Ordoñez 50%)
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**18**
**Proyectos**

- 4 Departamentos
- 11 Municipios
- 18 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT 2023 - 3219 estudiantes.
- $5.236.381.488 Inversión

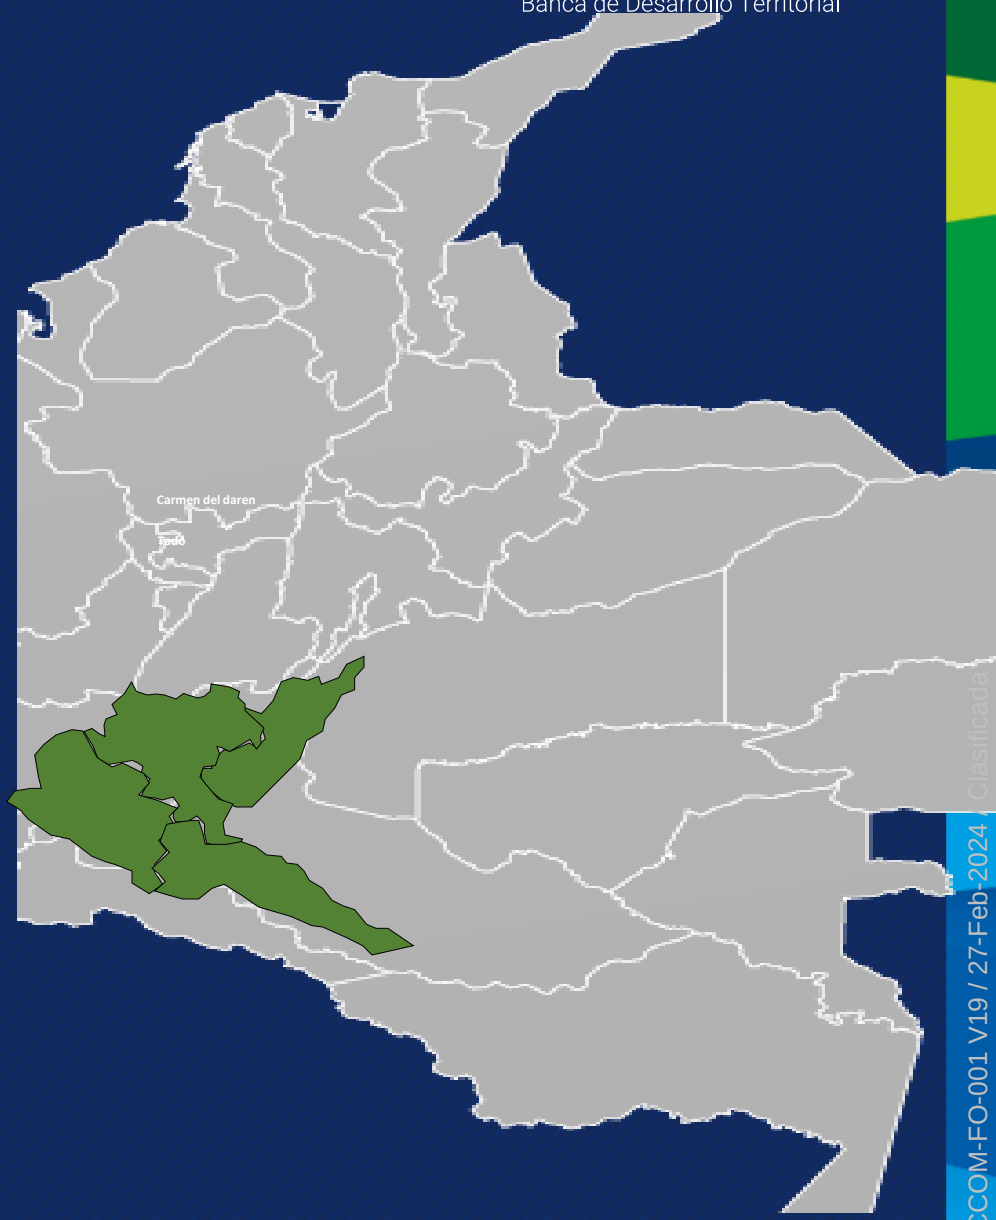


Clasificada
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024

# Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

| VALOR EJECUCION | FECHA INICIO C1 | FECHA FIN C1 | FECHA INICIO C2 | FECHA FIN C2 | PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **O:**$4.918.276.400 **I:** $418.988.095 | 20/02/2024 | 4/04/2024 | 05/04/2024 | 04/12/2024 | **Programado** | 100,00% | -3,05% |
| **AVANCE POR COMPONENTE** | **Programado** | 100,00% | **Programado** | 100,00% | **Ejecutado** | 98,00% | |
| | **Ejecutado** | 100,00% | **Ejecutado** | 98,00% | **% Financiero G12:** 86,03%<br>**Obra:** 86,13%<br>**Interventoría:** 75,58% | | |

| DPTO | MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SEDE | AULAS NUEVAS | AULAS MEJORAD | APARATOS SANITARIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cauca | Piamonte | ID27. Centro Educativo Puerto Guayuyaco | Escuela Rural Mixta La Espanola | 0 | 1 | 1 |
| Cauca | Piamonte | ID121. Centro Educativo Puerto Guayuyaco | Esc Rur Mix San Andresito | 0 | 1 | 1 |
| Cauca | Piamonte | ID125. Inst Educ Agric Piamonte | PIAMONTE (Sede Principal) | 0 | 28 | 1 |
| Cauca | Piamonte | ID173. Esc Rur Mix Fray Ezequiel | Esc Rur Mix Fray Ezequiel | 0 | 1 | 1 |
| Cauca | Piamonte | ID174. E.D.R Porto Guayuyaco Sede Principal | E.D.R Porto Guayuyaco Sede Principal | 0 | 4 | 1 |
| Huila | Acevedo | ID26. Institución Educativa Bateas | Bateas | 0 | 5 | 5 |
| Nariño | Pasto | ID1. I.E.M. Nuestra Señora De Guadalupe | I.E.M. Nuestra Señora De Guadalupe - Sede Principal | 0 | 5 | 0 |
| Nariño | El Rosario | ID8. Centro Educativo La Claudia | Centro Educativo La Claudia | 0 | 1 | 0 |
| Nariño | Cumbal | ID36. Institución Educativa Inmaculada Concepción De Tallambi | Institución Educativa Inmaculada Concepcion De Tallambi | 5 | 0 | 7 |
| Nariño | Barbacoas | ID87. Institución Educativa Teraimbe | Sede 9 Cumainde | 0 | 1 | 2 |
| Nariño | Barbacoas | ID110. Institución Educativa Teraimbe | Sede 2 Bombón | 0 | 2 | 1 |
| Nariño | Ipiales | ID142. Institución Educativa Agroindustrial Los Pastos | Escuela Las Cruces | 0 | 5 | 1 |
| Nariño | Mallama (Piedrancha) | ID149. Centro Educativo Mallama | Centro Educativo De Mallama | 0 | 1 | 1 |
| Putumayo | Puerto Asís | ID41.I. E. Rur Caucacia | Esc Rur Mix El Jardin Alto Teteye | 1 | 0 | 1 |
| Putumayo | Puerto Asís | ID57. I. E. Rur Caucacia | Esc Rur Mix El Progreso | 1 | 0 | 1 |
| Putumayo | Pto Leguízamo | ID88. IE Rur Luis Vidales Del Piñuña Negro | ESC RUR MIX PUERTO PRINCIPE DOS | 0 | 1 | 1 |
| Putumayo | Orito | ID127. Institucion Etnoeducativa Rural Umada Wuarrara | ESC RUR MIX ALTO ORITO | 1 | 0 | 1 |
| Putumayo | Puerto Asís | ID172. IE. Rur Caucacia - Sede Principal | SEDE PRINCIPAL | 0 | 6 | 12 |

- **Avance General Componente I:** Terminado 04/04/2024 y recibido
- **Avance General Componente II:** En Ejecución, con inicio 18 de 18.

| Estado | Proyectos |
|---|---|
| Entregados | 17 |
| Terminados | 0 |
| Ejecución | 1 |
| Sin iniciar | 0 |

- **Sede ID36. Tallambi (Nariño),** En remate de pisos, repellos de las 5 aulas, en baterías sanitarias se avanza con enchapes, hay stock de materiales en sitio.

# Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

## ID1 Pasto, I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - ENTREGADO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Pasto - Nariño |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 262.132.882 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 986 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aulas | 5 | • Mejoramiento y mantenimiento de cubiertas, mampostería (estructura principal y de confinamiento), pisos en general, carpintería metálica y red eléctrica general.<br>• construcción de dos cubiertas para protección de losas existentes y cambio de cubierta en tres aulas de clase, reemplazo de canales. |
| Aulas nuevas | N.A. | N.A. |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | N.A. | |
| Baterías sanitarias nuevas | N.A. | |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 15 de agosto de 2024 |

## Antes





## Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

## ID8 El Rosario, CENTRO EDUCATIVO LA CLAUDIA - ENTREGADO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | El Rosario - Nariño |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 66.208.426 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 8 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aulas | 1 | • Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general.<br>• construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias. |
| Aulas nuevas | N.A. | N.A. |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | N.A. | |
| Baterías sanitarias nuevas | N.A. | |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 24 de junio de 2024 |

## Antes







## Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

## ID26 Acevedo, INSTITUCION EDUCATIVA BATEAS - ENTREGADO

| MUNICIPIO | | Acevedo - Huila |
|---|---|---|
| VALOR DE INVERSIÓN | | $ 278.705.701 |
| POBLACIÓN BENEFICIADA | | 193 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aulas | 5 | • Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general.<br>• construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias.<br>• Mejoramiento de restaurante escolar |
| Aulas nuevas | N.A. | N.A. |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | 1 | • Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general.<br>• construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias. |
| Baterías sanitarias nuevas | N.A. | |
| FECHA DE ENTREGA | | 4 de octubre de 2024 – en proceso de posventas y entrega |

## Antes







## Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

## ID27 Piamonte, ESCUELA RURAL MIXTA LA ESPANOLA - ENTREGADO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Piamonte - Cauca |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 82.111.341 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 9 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aulas | 1 | • Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general.<br>• construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias. |
| Aulas nuevas | N.A. | N.A. |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | 1 | • Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general.<br>• construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias. |
| Baterías sanitarias nuevas | N.A. | |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 5 de julio de 2024 |

## Antes





## Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

## ID88 Puerto Leguízamo, ESC RUR MIX PUERTO PRINCIPE DOS - ENTREGADO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Puerto Leguizamo - Putumayo |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 117.694.769 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 5 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aulas | 1 | • Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general.<br>• construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias. |
| Aulas nuevas | N.A. | N.A. |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | 1 | • Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general.<br>• construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias. |
| Baterías sanitarias nuevas | N.A. | |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 1 de agosto de 2024 |

## Antes





## Después











CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

## ID121 Piamonte, ESC RUR MIX SAN ANDRESITO - ENTREGADO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Puerto Leguizamo - Putumayo |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 117.694.769 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 5 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aulas | 1 | • Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general.<br>• construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias. |
| Aulas nuevas | N.A. | N.A. |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | 1 | • Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general.<br>• construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias. |
| Baterías sanitarias nuevas | N.A. | |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 1 de agosto de 2024 |

## Antes





## Después









# Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

## ID142 Ipiales, ESCUELA LAS CRUCES - ENTREGADO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Ipiales - Nariño |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 112.235.014 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 173 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aulas | 5 | • Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general.<br>• construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias. |
| Aulas nuevas | N.A. | N.A. |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | 1 | • Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general.<br>• construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias. |
| Baterías sanitarias nuevas | N.A. | |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 22 de julio de 2024 |

### Antes



### Después







CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

## ID149 Mallama (Piedrancha), CENTRO EDUCATIVO DE MALLAMA - ENTREGADO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Ipiales - Nariño |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 57.066.573 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 9 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aulas | 1 | • Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general.<br>• construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias + muro de cerramiento |
| Aulas nuevas | N.A. | N.A. |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | 1 | • Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica. |
| Baterías sanitarias nuevas | N.A. | |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 19 de junio de 2024 |

### Antes



### Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

## ID174 Piamonte, E.D.R PORTO GUAYUYACO SEDE PRINCIPAL - ENTREGADO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Piamonte - Cauca |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 214.447.888 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 33 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aulas | 4 | • Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general.<br>• construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias + aula múltiple |
| Aulas nuevas | N.A. | N.A. |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | 1 | • Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica. |
| Baterías sanitarias nuevas | N.A. | |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 16 de agosto de 2024 |

### Antes





### Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

## ID87 Barbacoas, SEDE 9 CUMAINDE - ENTREGADO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Barbacoas - Nariño |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 97.200.260 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 15 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aulas | 1 | • Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general.<br>• construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias + aula múltiple |
| Aulas nuevas | N.A. | N.A. |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | 1 | • Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica. |
| Baterías sanitarias nuevas | N.A. | |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 17 de septiembre de 2024 |

### Antes





### Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

## ID110 Barbacoas, SEDE 2 BOMBON - ENTREGADO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Barbacoas - Nariño |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 135.500.591 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 39 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aulas | 2 | • Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general.<br>• construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias + aula múltiple |
| Aulas nuevas | N.A. | N.A. |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | 1 | • Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica. |
| Baterías sanitarias nuevas | N.A. | |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 17 de septiembre de 2024 |

## Antes





## Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

## ID173 Piamonte, ESC RUR MIX FRAY EZEQUIEL - ENTREGADO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Piamonte - Cauca |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 193.112.465 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 24 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aula múltiple | 1 | • Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general.<br>• construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias |
| Aulas nuevas | N.A. | N.A. |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | N.A | |
| Baterías sanitarias nuevas | 1 | • Ejecutada dentro del aula |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 6 de septiembre de 2024 |

### Antes





### Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID36 Cumbal, INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCION DE TALLAMBI – EN EJECUCIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Cumbal - Nariño |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 818.394.560 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 171 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aula | N.A. | |
| Aulas nuevas | 5 | |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | N.A | |
| Baterías sanitarias nuevas | 7 | |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 3 de diciembre de 2024 |

## Antes






## Después











CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID41 Puerto Asís, I. E. RUR CAUCACIA, ESC RUR MIX EL JARDIN ALTO TETEYE – EN EJECUCIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Puerto Asís - Putumayo |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 184.632.555 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 5 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aula | N.A. | |
| Aulas nuevas | 1 | Instalación eléctrica fotovoltaica |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | N.A | |
| Baterías sanitarias nuevas | 1 | |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 3 de diciembre de 2024 |

## Antes





## Después











CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID57 Puerto Asís, I. E. RUR CAUCACIA, ESC RUR MIX EL PROGRESO – EN EJECUCIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Puerto Asís - Putumayo |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 197.031.005 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 6 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aula | N.A. | |
| Aulas nuevas | 1 | Instalación eléctrica fotovoltaica |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | N.A | |
| Baterías sanitarias nuevas | 1 | |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 3 de diciembre de 2024 |

## Antes





## Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID125 Piamonte, INST EDUC AGRIC PIAMONTE (sede principal) – EN EJECUCIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Piamonte - Cauca |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 1.339.389.729 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 850 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aula | 28 | Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general. construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias. |
| Aulas nuevas | N.A | |
| Mejoramientos Baterías sanitarias + 1 ducha | 3 | Mejoramiento en preescolar + circulación, cerramiento y cubierta en domo |
| Baterías sanitarias nuevas | N.A | |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 3 de diciembre de 2024 |

## Antes





## Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID127 Orito, INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL UMADA WUARRARA, MIX ALTO ORITO – EN EJECUCIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Orito - Putumayo |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 206.821.177 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 13 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aula | N.A | |
| Aulas nuevas | 1 | Instalación eléctrica fotovoltaica |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | N.A | |
| Baterías sanitarias nuevas | 1 | |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 3 de diciembre de 2024 |

## Antes





## Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID172 Puerto Asís, IE. RUR CAUCACIA - SEDE PRINCIPAL– EN EJECUCIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Puerto Asís - Putumayo |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 224.052.916 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 161 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aulas (2 internado + 4 aulas) | 6 | |
| Aulas nuevas | N.A | |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | 12 | • Se incluyo estructura de tanques para mejorar la columna de agua en zonas húmedas en internado por solicitud de comunidad. |
| Baterías sanitarias nuevas | N.A | |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 3 de diciembre de 2024 |

## Antes






## Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# COMPROMISOS:

- REMITIR EL LISTADO DE ENTREGA DE LAS SEDES QUE CULMINARÁN ACTIVIDADES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024.

- REMITIR LA MATRIZ DE  INFORMACIÓN DE ESTIMACIÓN DE LOS COBROS DE ASISTENCIA TÉCNICA, DESDE SU PRIMER COBRO AL ACTUAL.

- COMPARTIR CARPETA CON LOS COBROS DE ASISTENCIA REALIZADOS POR FINDETER, CON LOS SOPORTES QUE HACEN PARTE DEL PAGO RESPECTIVO.

- SUBIR LAS ACTAS DE LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS CUYO TRÁMITE YA HA SIDO TERMINADO.

- RELACIONAR LAS SEDES CUYA DOTACIÓN YA HA SIDO ENTREGADA, CON SU RESPECTIVA ACTA.

- REMITIR EL INFORME DEL MES OCTUBRE A LA SUPERVISIÓN DEL MEN.

- REMITIR FOTOS Y AVANCE ACTUALIZADO DE LOS AVANCES EN LA SEDES DE MARIA INMACULADA Y ACTUALIZAR LOS REPORTES DEL CAUCA



Findeter

Banca de Desarrollo Territorial

# GRACIAS

www.findeter.gov.co

@findetercol @findetercol

@findeter linkedin.com/company/findeter

VIGILADO

Hacienda

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada



Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

# Seguimiento CI No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023

## AULAS MOVILES

Hacienda

Diciembre 30 de 2024


# Contrato No. 4917031-2023

**136** **sedes educativas**
[instalación de aulas y mejoramientos]

**$ 63.650**
Millones de pesos

Fecha inicio: 2/06/2023
Fecha Fin Actual: 01/07/2025

| Grupo | Departamentos / Municipios | Etapa Actual del grupo/% de avance de contrato<br>Fecha de Inicio –Fecha de Terminación |
|---|---|---|
| G1 [10 sedes] | Antioquia \| Chocó | Entregado[100,00%]<br>14/11/2023 - 14/08/2024 |
| G2 [8 sedes] | Atlántico | Entregado[100,00%]<br>27/11/2023 -06/09/2024 |
| G3 [5 sedes] | Magdalena | Liquidado [100,00%]<br>14/11/2023 - 30/04/2024 |
| G4 [5 sedes] | Bolívar | Entregado [100,00%]<br>26/10/2023 - 23/03/2024 |
| G5 [16 sedes] | Bolívar \| Magdalena \| Cesar | Terminado [100,00%]<br>14/11/2023 – 08/11/2024 |
| G6 [7 sedes] | Cesar | Entregado [100,00%]<br>15/11/2023 - 17/05/2024 |
| G7 [13 sedes] | Guajira | En ejecución[93,09%]<br>31/05/2024 - 17/01/2025 |
| G8 [9 sedes] | Córdoba \| Bolívar | En Obra [100,00%]<br>08/11/2023 - 23/08/2024 |
| G9 [12 sedes] | Santander \| Bolívar \| Bogotá \| Arauca \| Tolima \| Meta \| Cundinamarca \| Nte de Santander | En obra[6,19%]<br>23/08/2024 - 08/03/2025 |
| G10 [15 sedes] | Cauca \| Chocó \| Valle Del Cauca | En Obra [66,69%]<br>19/02/2023 - 30/12/2024 |
| G11 [18 sedes] | Cauca | Terminado [100,00%]<br>12/02/2023 - 27/11/2024 |
| G12 [18 sedes] | Nariño \| Putumayo \| Cauca | Terminado [100,00%]<br>20/02/2023 - 04/12/2024 |
| Dotación | 46 Sedes a dotar - 99 aulas | Suspendido[100,00%]<br>03/10/2024 – 03/12/2024 |

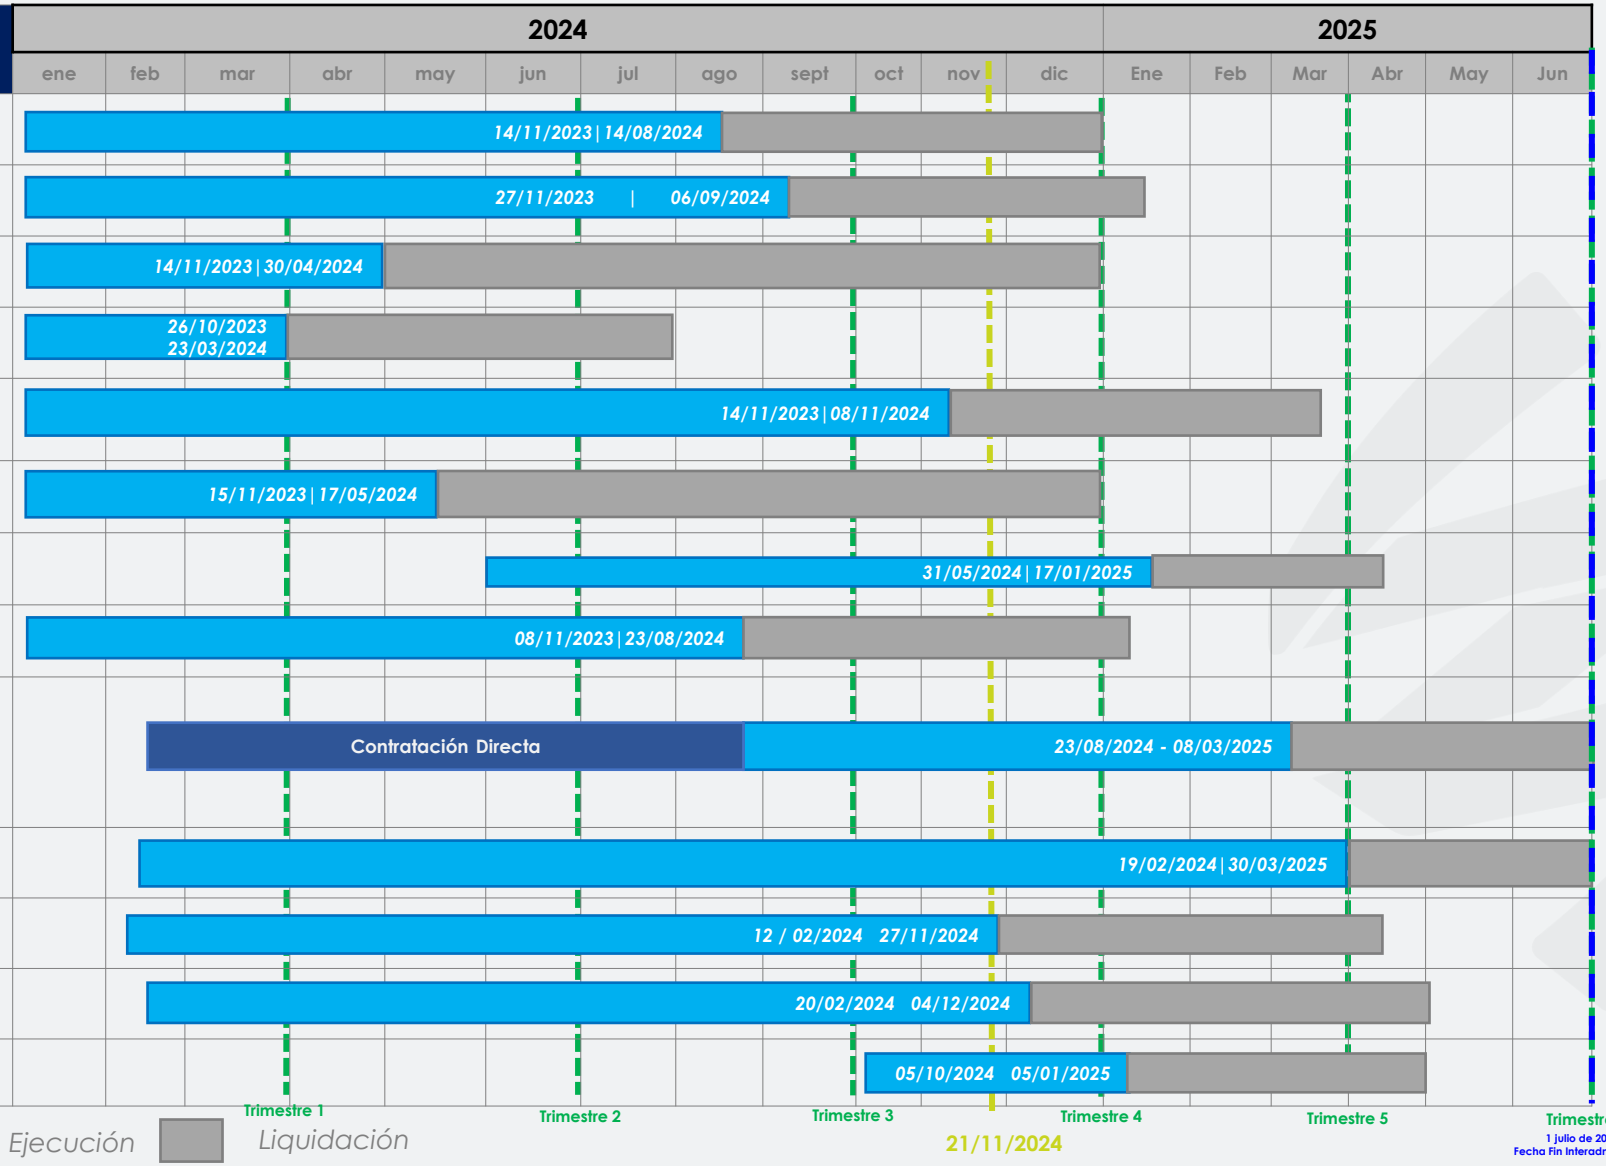


Convocatoria | Llegalización | Ejecución | Liquidación

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

# Estado de entrega y ejecución de Sedes

**136** **sedes educativas**
[instalación de aulas y mejoramientos]

**$ 63.650**
Millones de pesos

Fecha inicio: 2/06/2023
Fecha Fin: 01/11/2024

*01 julio 25 –*
*Fin Interadministrativo*

| ENTREGADAS | TERMINADAS | EN EJECUCIÓN | SUSPENDIDO |
|---|---|---|---|
| 102 sedes<br>75,00% | 9 sedes<br>5,88% | 25 sedes<br>19,11% | 0 sedes<br>0,00% |
| Grupo 1 - 10<br>Grupo 2 - 8<br>Grupo 3 - 5<br>Grupo 4 - 5<br>Grupo 5 - 16<br>Grupo 6 - 7<br>Grupo 8 - 9<br>Grupo 10 - 10<br>Grupo 11 - 15<br>Grupo 12 - 17 | Grupo 7 - 4<br>Grupo 10 - 1<br>Grupo 11 - 3<br>Grupo 12 - 1 | Grupo 7- 9<br>Grupo 9 - 12<br>Grupo 10 - 4 | |

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

# PAGOS ASISTENCIA TECNICA

**136** **sedes educativas**
[instalación de aulas y mejoramientos]

**$ 63.650**
Millones de pesos

Fecha inicio: 2/06/2023
Fecha Fin: 01/11/2024

| VALOR AT | Cobrado (a noviembre de 2024) | Pagado (a noviembre de 2024) | SALDO |
|---|---|---|---|
| $ 4.164.018.692,00 | $3.585.749.431,31 | $3.585.749.431, 31 | $ 578.269.260,69 |

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

# Resumen Informe Financiero – Corte 31 de octubre de 2024

**136** **sedes educativas**
[instalación de aulas y mejoramientos]

**$ 63.650**
Millones de pesos

Fecha inicio: 2/06/2023
Fecha Fin: 01/11/2024

*01 nov 24 – Fin Interadministrativo*

| VALOR EJECUTADO | VALOR POR EJECUTAR | VALOR COMPROMETIDO | SALDO |
|---|---|---|---|
| $ 43.546 mll | $ 20.102 mll | $ 59.411 mll | $ 279,6 mll |

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

# Estado Entrega de Dotación

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**PAF-ATMEN5-S-041-2024**

Publicada

17 DE JULIO DE 2024.

Informe Definitivo:

Comité Fiduciario No 41 del 25 de agosto.

Adjudicado:

DOTAESCOL SAS

Valor $ **$ 584.310.000,00**

Acta de Inicio: 3 de octubre de 2024

2 meses de ejecución.

Entregado 100%.

➡ 16 DEPARTAMENTOS

➡ 38 MUNICIPIOS

➡ 99 AULAS NUEVAS CON DOTACIÓN

| GRUPO | Departamento | Municipio | INSTITUCION EDUCATIVA | SEDE | TOTAL AULAS NUEVAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chocó | Carmen del Darién | CE PUEBLO NUEVO | CE PUEBLO NUEVO - SEDE PRINCIPAL | 3 |
| 1 | Antioquia | Apartadó | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO | CENTRO EDUCATIVO RURAL EL OSITO | 1 |
| 2 | Atlántico | Repelón | INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS | PITA | 1 |
| 2 | Atlántico | Soledad | INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO | INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE CABICA | 3 |
| 3 | Magdalena | El Retén | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE | COL MPAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE | 9 |
| 4 | Bolívar | Mompós | INSTITUCIÒN EDUCATIVA TÈCNICA AMBIENTAL DE TIERRA FIRME | I.E.T.A. AMBIENTAL DE TIERRA FIRME - SEDE PRINCIPAL | 6 |
| 4 | Magdalena | San Sebastían de Buenavista | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA | ERM MARIA AUXILIADORA | 4 |
| 4 | Magdalena | San Sebastían de Buenavista | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA | ERM LA PACHA | 3 |
| 5 | Bolívar | Barranco de Loba | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR | ATASCOZA | 1 |
| 5 | Bolívar | San Martín de Loba | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA PESQUERA LEONIDAS ORTIZ ALVEAR DE CHIMÍ | PLAN BONITO | 1 |
| 6 | Cesar | La Paz(Robles) | CENTRO EDUCATIVO INDIGENA CAÑO PADILLA YUKPA | SEDE EL COSO | 1 |
| 6 | Cesar | El Paso | INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN | SEDE LA ESTACION | 1 |
| 8 | Córdoba | Planeta Rica | INSTITUCION EDUCATIVA LOMA AZUL | LOS CERROS | 1 |
| 8 | Córdoba | Puerto Libertador | INSTITUCION EDUCATIVA PICA PICA VIEJO | ESC NVA LA SOLITA | 1 |
| 8 | Córdoba | Ayapel | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO | ESC NVA PARCELAS LONDRES | 1 |
| 8 | Córdoba | Montelíbano | INSTITUCION EDUCATIVA EL PALMAR | ESCUELA NUEVA MIXTA DIVINO SALVADOR | 2 |
| 8 | Bolívar | María la Baja | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA | I.E.T. AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA | 2 |
| 10 | Cauca | Santander de Quilichao | INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO | SEDE DOMINGO LASSO | 8 |
| 11 | Cauca | El Tambo | I.E. HUISITO | SEDE HUISITÓ | 6 |
| 11 | Cauca | Bolivar | INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO NUESTRA SENORA DEL CARMEN | SEDE CORRAL VIEJO | 1 |
| 11 | Cauca | Bolivar | CENTRO EDUCATIVO EL TAMBO | SEDE LA FUENTE | 1 |
| 11 | Cauca | La Vega | I.E AGROPECUARIA SAN FRANCISCO JAVIER SEDE GARAY | IE AGROPECUARIA SAN FRANCISCO JAVIER - SEDE GARAY | 1 |
| 11 | Cauca | Rosas | INSTITUCION EDUCATIVA MADRE CARIDAD BRADER | MADRE CARIDAD BRADER | 1 |

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado Entrega de Dotación



**CENTRO EDUCATIVO INDIGENA CAÑO PADILLA YUKPA**
Sede El Coso La Paz – Cesar



**INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO**
Sede Escuela Nueva Parcelas Londres
Ayapel - Córdoba



**INSTITUCION EDUCATIVA EL PALMAR**
Escuela Nueva Mixta Divino Salvador
Monte Líbano - Córdoba



**INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO**
Sede Principal Santander de Quilichao - Cauca



**INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA ERM MARIA AUXILIADORA** Sede
Sebastián de Buenavista - Magdalena



**INSTITUCION EDUCATIVA TIERRA FIRME**
Mompox - Bolivar

# Rendimientos Financieros – Relación de Pagos

Educación

**CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023**
**MINISTERIO DE EDUCACION**
**Financiera del Desarrollo S.A.**
**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**
**Fecha: Octubre 31 de 2024**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**Contrato No.CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023**

**Cuenta de Ahorros Popular No. 309-055200**

| Fecha | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | GIRO DE RENDIMIENTOS | Fecha de Giro | SALDO POR GIRAR |
|---|---|---|---|---|
| ene-23 | | | | $ - |
| feb-23 | $ - | $ - | | $ - |
| mar-23 | $ - | $ - | | $ - |
| abr-23 | $ - | $ - | | $ - |
| may-23 | $ - | $ - | | $ - |
| jun-23 | $ - | $ - | | $ - |
| jul-23 | $ - | $ - | | $ - |
| ago-23 | $ 82.351.406,35 | $ - | | $ 82.351.406,35 |
| sep-23 | $ 108.927.246,74 | $ - | | $ 191.278.653,09 |
| oct-23 | $ 131.902.760,66 | $ - | | $ 323.181.413,75 |
| nov-23 | $ 144.907.033,92 | $ - | | $ 468.088.447,67 |
| dic-23 | $ 143.221.271,36 | $ 468.088.448,00 | 13/12/2023 | $ 143.221.271,03 |
| ene-24 | $ 133.626.379,48 | $ 143.221.271,36 | 10/01/2024 | $ 133.626.379,15 |
| feb-24 | $ 120.547.529,88 | $ 133.626.379,15 | 12/02/2024 | $ 120.547.529,88 |
| mar-24 | $ 117.745.976,50 | $ 120.547.529,88 | 12/03/2024 | $ 117.745.976,50 |
| abr-24 | $ 100.331.907,69 | $ 117.745.976,50 | 10/04/2024 | $ 100.331.907,69 |
| may-24 | $ 89.374.457,56 | $ 100.331.907,69 | 11/05/2024 | $ 89.374.457,56 |
| jun-24 | $ 76.820.331,89 | $ 89.374.457,56 | 13/06/2024 | $ 76.820.331,89 |
| jul-24 | $ 68.012.790,67 | $ 76.820.331,89 | 15/07/2024 | $ 68.012.790,67 |
| ago-24 | $ 21.741.419,32 | $ 68.012.790,67 | 14/08/2024 | $ 21.741.419,32 |
| sep-24 | $ 20.861.120,00 | $ 21.741.419,32 | 10/09/2024 | $ 20.861.120,00 |
| oct-24 | $ 27.022.756,52 | $ 20.861.120,00 | 18/10/2024 | $ 27.022.756,52 |
| **TOTALES** | **$ 1.387.394.388,54** | **$ 1.360.371.632,02** | | |

**Contrato No.CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023**

**Fondo de Inversión Colectiva Alta Liquidez No. 70083604683-6**

| Fecha | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | GIRO DE RENDIMIENTOS | Fecha de Giro | SALDO POR GIRAR |
|---|---|---|---|---|
| ene-23 | | $ - | | $ - |
| feb-23 | $ - | $ - | | $ - |
| mar-23 | $ - | $ - | | $ - |
| abr-23 | $ - | $ - | | $ - |
| may-23 | $ - | $ - | | $ - |
| jun-23 | $ - | $ - | | $ - |
| jul-23 | $ - | $ - | | $ - |
| ago-23 | $ 443.947.650,01 | $ - | | $ 443.947.650,01 |
| sep-23 | $ 548.880.836,71 | $ - | | $ 992.828.486,72 |
| oct-23 | $ 436.008.307,20 | $ - | | $ 1.428.836.793,92 |
| nov-23 | $ 718.224.229,49 | $ - | | $ 2.147.061.023,41 |
| dic-23 | $ 788.090.860,63 | $ 2.147.061.024,00 | 13/12/2023 | $ 788.090.860,04 |
| ene-24 | $ 427.858.051,59 | $ 788.090.860,63 | 10/01/2024 | $ 427.858.051,00 |
| feb-24 | $ 474.970.095,24 | $ 427.858.051,00 | 12/02/2024 | $ 474.970.095,24 |
| mar-24 | $ 478.495.863,61 | $ 474.970.095,24 | 12/03/2024 | $ 478.495.863,61 |
| abr-24 | $ 259.736.382,70 | $ 478.495.863,61 | 10/04/2024 | $ 259.736.382,70 |
| may-24 | $ 353.632.163,66 | $ 259.736.382,70 | 11/05/2024 | $ 353.632.163,66 |
| jun-24 | $ 266.323.590,41 | $ 353.632.163,66 | 13/06/2024 | $ 266.323.590,41 |
| jul-24 | $ 294.233.627,01 | $ 266.323.590,41 | 15/07/2024 | $ 294.233.627,01 |
| ago-24 | $ 313.006.436,96 | $ 294.233.627,01 | 14/08/2024 | $ 313.006.436,96 |
| sep-24 | $ 192.185.501,19 | $ 313.006.436,96 | 10/09/2024 | $ 192.185.501,19 |
| oct-24 | $ 71.175.915,03 | $ 192.185.501,19 | 18/10/2024 | $ 71.175.915,03 |
| **TOTALES** | **$ 6.066.769.511,44** | **$ 5.995.593.596,41** | | |
| **SALDO POR GIRAR** | **$ 98.198.671,55** | | | |

# Rendimientos Financieros – Comprobante de pago

Fecha Actual: 2024/10/21 | Hora: 11:39 | IP: 190.144.253.210

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

**Archivos Cargados**

Estimado (a): CINDY JHANNYN CHIMBI BARATO

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

| Tipo Archivo | Nombre Archivo | Nombre Técnico Archivo | Fecha Envío | Valor Total Archivo | No. Registros Enviados | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagos | 33455 | PJQE01RMWO | 2024/10/18 | $213,046,621.19 | 2 | Procesado |

**Información Adicional**

| Fecha Carga | Hora Carga | Hora Envío | Usuario Creador | Fecha Actualización | Hora Actualización | Valor Total Archivo | Valor Archivo Enviado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/10/17 | 18:13:53 | 05:00:24 | ANDRES FORERO PEREZ | 2024/10/18 | 22:10:07 | $213,046,621.19 | $213,046,621.19 |

| Valor Registros | Valor Registros Errados | No. Total Registros | No. Registros | No. Registros | No. Registros en | Usuario Aprueba/Rechaza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | | 2 | 0 | | 0 | JORGE LINARES CIFUENTES |

Detalle de pago

| Producto Originador | Fecha Efectiva | Valor Transacción | No. Identificación Receptor | Nombre Receptor | No. Ruta | Entidad Financiera | No. Dígito Chequeo | Tipo Transacción | No. Identificación Originador | Propósito de la Transacción | Descripción Causal Rechazo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500804650450 | 2024/10/18 | $20,861,120.00 | 900978341 | FONDO NACIONAL DEL RIE | 00001 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. | 9 | Crédito Cuenta Ahorros | 000000830053691 | PAGOS | | Procesado |
| 500804650450 | 2024/10/18 | $192,185,501.19 | 900978341 | FONDO NACIONAL DEL RIE | 00001 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. | 9 | Crédito Cuenta Ahorros | 000000830053691 | PAGOS | | Procesado |

**NOTA: Teniendo en cuenta el contrato MEN-4917031 2023 -TEMPORADA DE LLUVIAS, y en atención a la obligación descrita en la cláusula tercera, Obligaciones específicas del contratista, Numeral 8 el cual dice:**

*"8. El Patrimonio Autónomo — Findeter deberá reintegrar mensualmente los rendimientos financieros (si los hubiere) a la Dirección del Tesoro Nacional o en los términos que establezca la normatividad aplicable, es decir, que no ingresan ni hacen parte del Patrimonio Autónomo constituido por Findeter."*

**Se han consignado los rendimientos financieros a la siguiente cuenta:**

- **Banco:** BBVA
- **Tipo:** Ahorros
- **No. Cuenta:** 309-054583
- **Nombre de la Cuenta:** FIDUPREVISORA S.A FNGRD – COLOMBIA VITAL

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

# AULAS MOVILES
# INFORME DETALLADO POR GRUPO DE INTERVENCION

Diciembre 30 de 2024



UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Educación

Colombia Vital

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA


CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# GRUPO 1, Departamentos de Antioquia – Chocó

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**10**
**Proyectos**

- 2 Departamentos
- 5 Municipios
- 10 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total, estudiantes SIMAT 2023 - 4347 estudiantes.
- $ 3.945.124.339,32 Inversión MEN

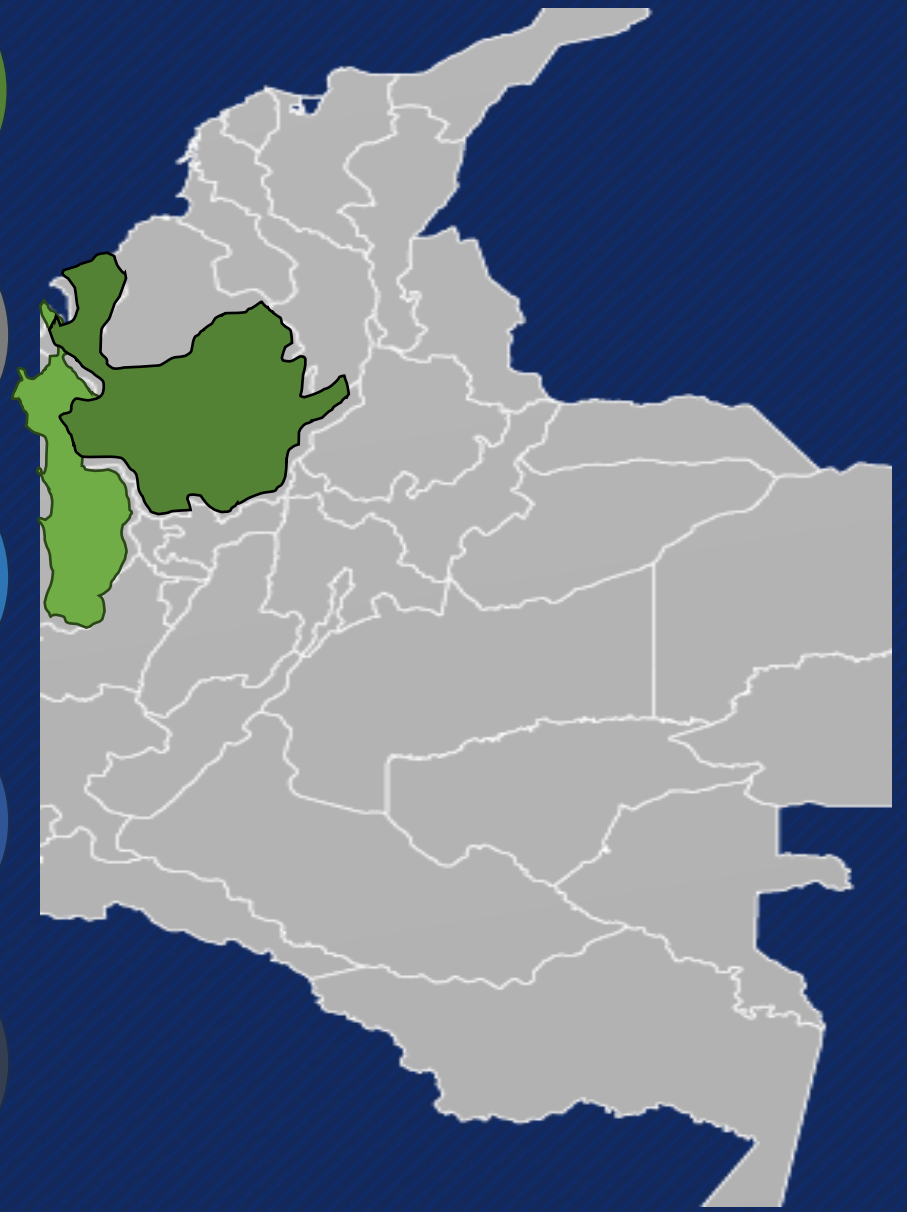

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# GRUPO 1, Departamentos de Antioquia – Chocó

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## SEDES INTERVENIDAS:

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | IE | SEDE | ALCANCE TOTAL DE INTERVENCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | AULAS NUEVAS | AULAS MEJORADAS | BATERIAS SANITARIAS | FECHA DE ENTREGA |
| Antioquia | Ciudad Bolívar | I. E. JOSE MARIA HERRAN | C. E. R. PAULINA PUERTA | | 6 | 3 MEJ | 27/2/2024 |
| Antioquia | Apartadó | INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS | INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS | | 14 | 5 MEJ | 21/3/2024 |
| Antioquia | Apartadó | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO | | 9 | 5 MEJ | 30/5/2024 |
| Antioquia | Apartadó | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO | | 23 | 8 MEJ | 30/5/2024 |
| Antioquia | Turbo | I.E. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | E.U. JESUS MORA | | 4 | | 14/3/2024 |
| Antioquia | Apartadó | INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL GUINEO | CENTRO EDUCATIVO RURAL EL OSITO | | 3 | 2 MEJ | 30/5/2024 |
| Antioquia | Turbo | IE SAN MARTIN DE PORRES | SEDE GONZALO MEJIA | | 4 | 5 MEJ | 20/5/2024 |
| Chocó | Carmen del Darién | CE PUEBLO NUEVO | CE PUEBLO NUEVO - SEDE PRINCIPAL | 2 | | 4 BS NUEVAS | 14/8/2024 |
| Chocó | Tadó | IE TECNICO AGROAMBIENTAL - MARIA AUXILIADORA | SEDE MARÍA AUXILIADORA DE MANUNGARA | | 2 | 4 MEJ | 30/5/2024 |
| Chocó | Tadó | IE NORMAL SUPERIOR DEMETRIO SALAZAR CASTILLO | CENTRO EDUCATIVO ESCUELA FRANCISCO MIRANDA | | 6 | 3 BS NUEVAS 5 MEJ | 22/10/2024 |

## PORCENTAJES DE AVANCE:

**100%**
Porcentaje Programado

**100%**
**Porcentaje de avance**

## ESTADO ACTUAL CIERRE Y LIQUIDACION CONTRATOS DERIVADOS

En cumplimiento al alcance se tienen las 10 sedes entregadas

- CONTRATO PAF-MENAM-O-049-2023: Liquidación radicada el 2 de diciembre de 2024, mediante prisa INC 2024-002245, asignación liquidador Mireya Artunduaga quien se encuentra en proceso de revisión
- CONTRATO PAF-MENAM-I-052-2023: Liquidación radicada el 2 de diciembre de 2024, mediante prisa INC 2024-002246, asignación liquidador Mireya Artunduaga quien se encuentra en proceso de revisión

.

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# GRUPO 1, Departamentos de Antioquia – Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL GUINEO - SEDE CE EL OSITO - ID No. 161




## INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO ID No. 118




## INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS ID No. 66




## INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO ID No. 86




## INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS SEDE EU JESÚS MORA ID No. 112




## INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MARTÍN DE PORRES SEDE EU GONZALO MEJÍA




# GRUPO 1, Departamentos de Antioquia – Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA HERRÁN SEDE CER PAULINA PUERTA
ID No. 42






## INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROAMBIENTAL SEDE MARÍA AUXILIADORA DE MANUNGARA
ID No. 150





## INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR DEMETRIO SALAZAR CASTILLO SEDE CE ESCUELA FRANCISCO MIRANDA





## CENTRO EDUCATIVO PUEBLO NUEVO SEDE PRINCIPAL
ID No. 94








# Estado GRUPO 2, Departamento de Atlántico

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-050-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-053-2023 – RM INGENIEROS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**8**
**Proyectos**

- 1 Departamentos
- 5 Municipios
- 8 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT 2023 - 6398 estudiantes.
- $ 4.044.124.630 Inversión

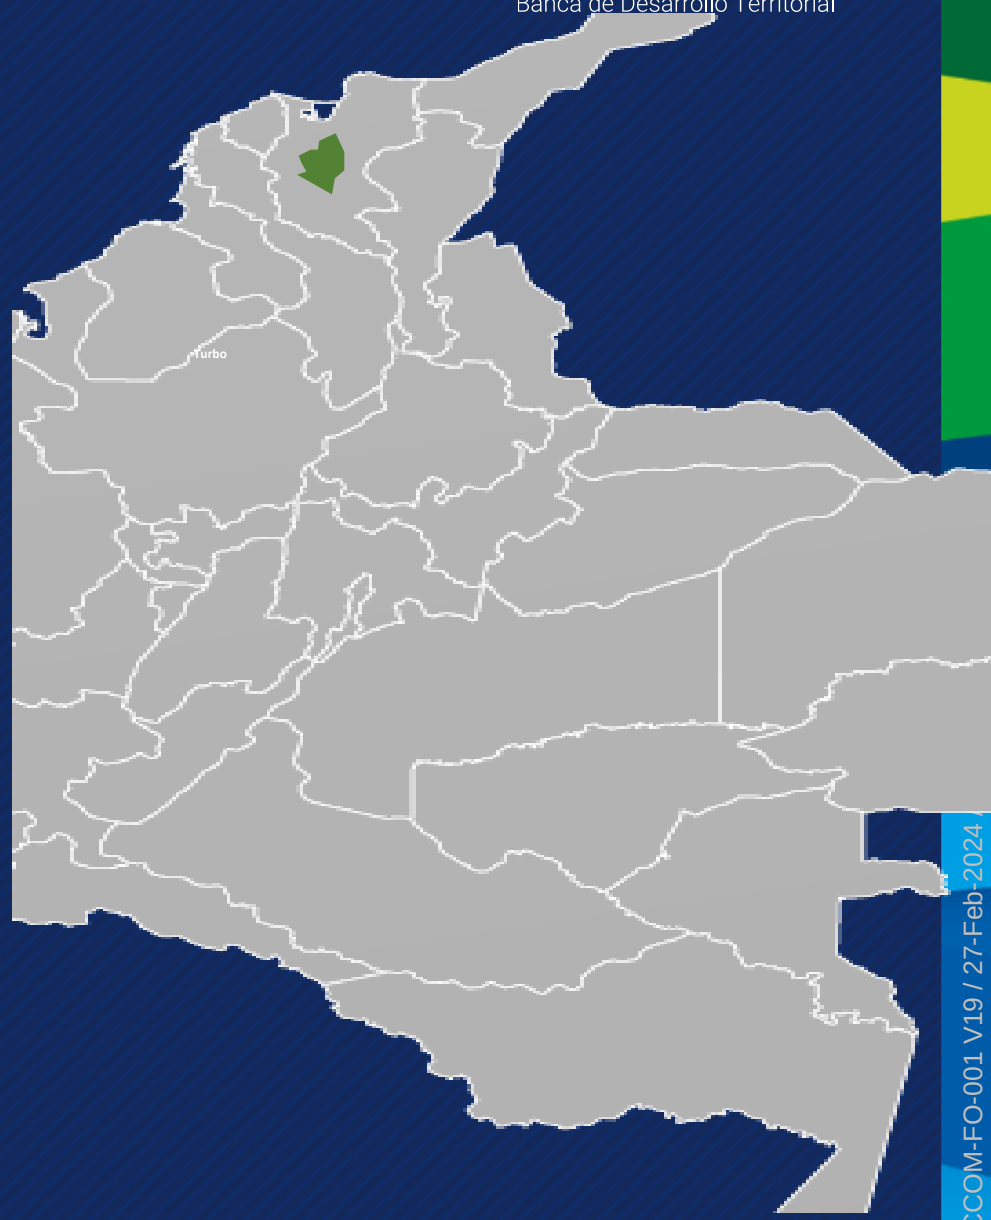

# GRUPO 2, Departamentos de Atlántico

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**SEDES INTERVENIDAS:**

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | IE | SEDE |
|---|---|---|---|
| Atlántico | Repelón | IE CIEN PESOS Y LAS TABLAS | PITA |
| Atlántico | Soledad | IE JOSEFA DONADO | SEDE CABICA |
| Atlántico | Galapa | IE MARIA AUXILIADORA | IE MARIA AUXILIADORA |
| Atlántico | Repelón | IE CIEN PESOS Y LAS TABLAS | SEDE PRINCIPAL |
| Atlántico | | IE TECNICA AGROPECUARIA DE VILLA ROSA | SEDE LA LOMA |
| Atlántico | Soledad | IE JOSEFA DONADO | SEDE PRINCIPAL |
| Atlántico | | IE TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE | IE TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE |
| Atlántico | Malambo | INSTITUCIÓN EDUCATIVA MESOLANDIA | SEDE MESOLANDIA |

| ALCANCE TOTAL DE INTERVENCIÓN | | | |
|---|---|---|---|
| AULAS NUEVAS | AULAS MEJORADAS | BATERIAS SANITARIAS | FECHA DE ENTREGA |
| 1 | | 2 | 16/09/2024 |
| 3 | | 1 | 13/09/2024 |
| | 15 | | 16/08/2024 |
| | 8 | | 18/07/2024 |
| | 5 | 8 | 11/07/2024 |
| | 16 | 8 | 16/07/2024 |
| | 22 | | 15/11/2024 |
| | 8 | | 4/09/2024 |

**PORCENTAJES DE AVANCE:**







**ESTADO ACTUAL CIERRE Y LIQUIDACION CONTRATOS DERIVADOS**

**AERS COMPONENTE 1:** Suscrita el 5 de diciembre de 2024

**AERS COMPONENTE 2:**

- Contrato de Obra, en proceso de firma por parte de la Fiduciaria Popular, una vez se tenga el AERS suscrita se procederá a solicitar la actualización de pólizas.
- Contrato de Interventoría, en proceso de firma por parte de la Fiduciaria Popular, una vez se tenga el AERS suscrita se procederá a solicitar la actualización de pólizas

DOCUMENTOS DE CIERRE Y LIQUIDACION

En recopilación documental entre el contratista e interventoría.

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

**Contratista de Diseño y Obra:** PAF-MENAM-O-050-2023 CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 - G2
**Contratista interventor:** PAF-MENAM-I-053-2023 RM INGENIEROS S A S

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE PRINCIPAL - ID EN 018




## INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE PRINCIPAL - ID EN 018




## INSTITUCION EDUCATIVA BLAS TORRES DE LA TORRE (ITIDA) - ID MEN 144




## INSTITUCION EDUCATIVA DE MESOLANDIA - ID MEN 197




## INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS, LAS TABLAS Y PITA, SEDE PITA - ID MEN 092




## INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS, LAS TABLAS Y PITA, SEDE LAS TABLAS - ID MEN 083




## INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE VILLA ROSA, SEDE LA LOMA - ID MEN 084






## INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA DE GALAPA - ID MEN 064







# Estado GRUPO 3, Departamento Magdalena

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-051-2023 (Liquidado) – CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-054-2023 (Liquidado) – CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**5**
**Proyectos**

- 1 Departamentos
- 3 Municipios
- 5 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT 2023 - 2630 estudiantes.
- Consultoría y obra $ 4.744.960.153 Interventoría $ 351.774.412 **Inversión Total $ 5.096.734.565**

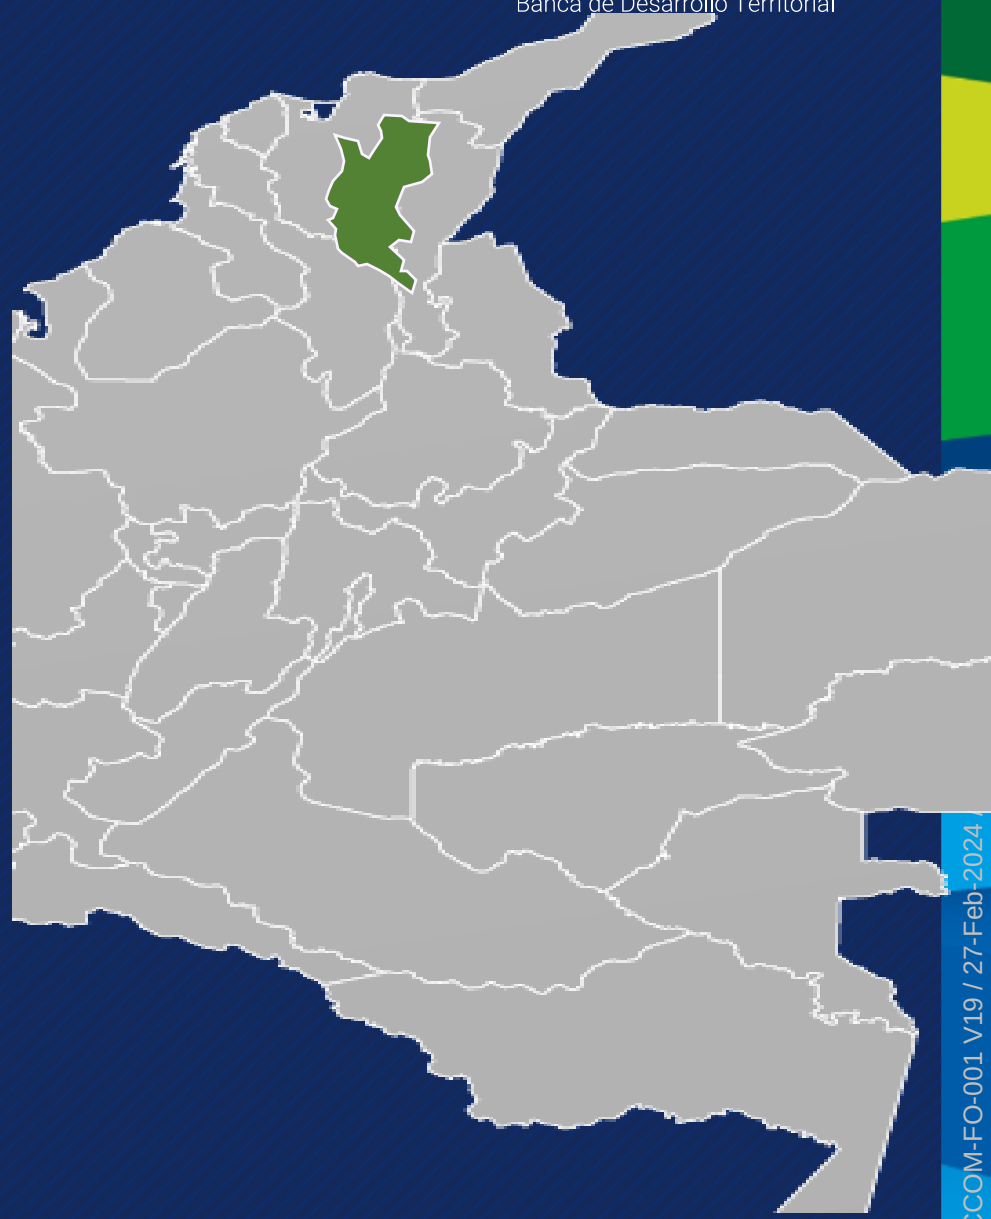

# Estado GRUPO 3, Departamentos de Magdalena

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-051-2023 (Liquidado)– CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-054-2023 (Liquidado) – CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3

| VALOR EJECUCION | FECHA INICIO C1 | FECHA FIN C1 | FECHA INICIO C2 | FECHA FIN C2 | PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **O:** $4.744.960.153<br>**I:** $ 371.774.412 | 14/11/2023 | 28/12/2023 | 18/12/2023 | 12/04/2024 | **Progr** | 100% | 100% |
| **AVANCE POR COMPONENTE** | **Programado** | 100% | **Programado** | 100% | **Ejecut** | 100% | |
| | **Ejecutado** | 100% | **Ejecutado** | 100% | **% Financiero G3:** 99,15%<br>**Obra:** 100%<br>**Interventoría:** 88,35% | | |

| MUNICIPIO | INSTITUCIONES EDUCATIVAS | SEDE | Aulas Nuevas | Aulas Mejoradas | BATERÍA SANITARIA |
|---|---|---|---|---|---|
| El Retén | Institución Educativa Departamental Roque de Los Rios Valle | Col Mpal Roque de Los Rios Valle | 9 | 11 | 11 N |
| El Retén | Institución Educativa Departamental Roque de Los Rios Valle | Institución Educativa Enoc Mendoza Riazco | N/A | 7 | 15 N |
| Ciénaga | Institución Educativa Enoc Mendoza Riazco | Institución Educativa Enoc Mendoza Riazco | N/A | 24 | N/A |
| Puebloviejo | Institucion Educativa Departamental San Juan de Palos Prietos | ERM El Triunfo | N/A | 4 | N/A |
| Puebloviejo | Institucion Educativa Departamental San Juan de Palos Prietos | ERM Isla de Cataquita | N/A | 2 | N/A |

**Avance General:** En proceso de liquidación.

**COMPONENTE 1:** Entregado 30/01/2024 – 100%

**COMPONENTE 2:** Entregado 29/04/2024 al 30/04/2024 – 100% con acompañamiento del MEN y UNGRD.

| Estado | Proyectos |
|---|---|
| Entregados | 5 |
| Terminados | 0 |
| Ejecución | 0 |
| Sin iniciar | 0 |

**LIQUIDACIÓN Contrato de Obra No. PAF-MENAM-O-051-2023:** Suscrita Acta de liquidación de fecha 01/10/2024 y pagado 100%.

**LIQUIDACIÓN Contrato de Interventoría No. PAF-MENAM-I-054-2023:**Suscrita Acta de liquidación de fecha 20/12/2024, en trámite de pago enero de 2025, pagado 88,35%

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 3, Departamentos de Magdalena

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-051-2023 – CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-054-2023 – CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3

## ID112 IE. RIOS VALLE, El Retén (Bachillerato) - ENTREGADO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Reten - Magdalena |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 2.346.192.202 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 731 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aulas | 11 | • Mejoramiento y cambio de cubiertas, mampostería (estructura principal y de confinamiento), mejoramiento de pañete y pinturas externas e internas, mejoramiento de pisos en general, carpintería metálica y red eléctrica general. |
| Aulas nuevas | 9 | • Sistema en estructura metálica, envolvente en WPC con teja UPVC, red eléctrica y piso en concreto. |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | N.A. | |
| Baterías sanitarias nuevas | 11 | Sistema en estructura metálica, envolvente en WPC con teja UPVC, red eléctrica y piso en concreto. |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 29 de abril de 2024 |

### Antes





### Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 3, Departamentos de Magdalena

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-051-2023 – CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-054-2023 – CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3

## ID156 IE. GREGORIO GARZÓN, El Retén (Primaria) - ENTREGADO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Reten - Magdalena |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 527.020.099 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 515 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aulas | 7 | • Mejoramiento y mantenimiento de cubiertas, mampostería (estructura principal y de confinamiento), pisos en general, carpintería metálica y red eléctrica general. |
| Aulas nuevas | N.A. | |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | 15 | |
| Baterías sanitarias nuevas | N.A. | |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 29 de abril de 2024 |


### Antes





### Después



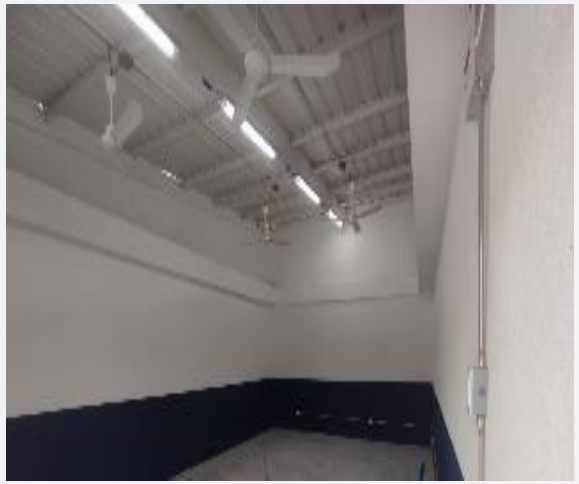





CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 3, Departamentos de Magdalena

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-051-2023 – CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-054-2023 – CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3

## ID154 IE. ENOC MENDOZA, Ciénaga - ENTREGADO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Ciénaga – Magdalena |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 1.649.361.282 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 870 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aulas | 24 | • Mejoramiento y mantenimiento de cubiertas, mampostería (estructura principal y de confinamiento), pisos en general, carpintería metálica y red eléctrica general.<br>• Construcción de circulaciones entre aulas, rampas y escaleras. |
| Aulas nuevas | N.A. | N.A. |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | N.A. | |
| Baterías sanitarias nuevas | N.A. | |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 29 de abril de 2024 |

Antes





Después









# Estado GRUPO 3, Departamentos de Magdalena

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-051-2023 – CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-054-2023 – CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3

## ID126 IE. EL TRIUNFO, Puebloviejo - ENTREGADO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Puebloviejo – Magdalena |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 153.545.059 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 98 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aulas | 4 | • Mejoramiento y mantenimiento de mampostería (estructura principal y de confinamiento), pisos en general, carpintería metálica y red eléctrica general, cambio de cubiertas, canalización de aguas lluvias y mejoramiento de la circulación. |
| Aulas nuevas | N.A. | |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | N.A. | |
| Baterías sanitarias nuevas | N.A. | |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 30 de abril de 2024 |

### Antes





### Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 3, Departamentos de Magdalena

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-051-2023 – CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-054-2023 – CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3

## ID111 IE. CATAQUITA, Puebloviejo - ENTREGADO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Puebloviejo – Magdalena |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 68.841.509 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 115 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aulas | 2 | • Mejoramiento y mantenimiento de mampostería (estructura principal y de confinamiento), pisos en general, carpintería metálica y red eléctrica general, cambio de cubiertas y mejoramiento de la circulación. |
| Aulas nuevas | N.A. | |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | N.A. | |
| Baterías sanitarias nuevas | N.A. | |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 30 de abril de 2024 |

Antes





Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada


# Estado GRUPO 4, Departamentos de Magdalena y Bolívar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-052-2023 – JASA LTDA
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-055-2023 – CONSORCIO INTER EDUCATIVO G4

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**7**
**Proyectos**

- 2 Departamentos
- 3 Municipios
- 7 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT 2023 - 1302 estudiantes.
- $ 3.831.442.211.00 Inversión

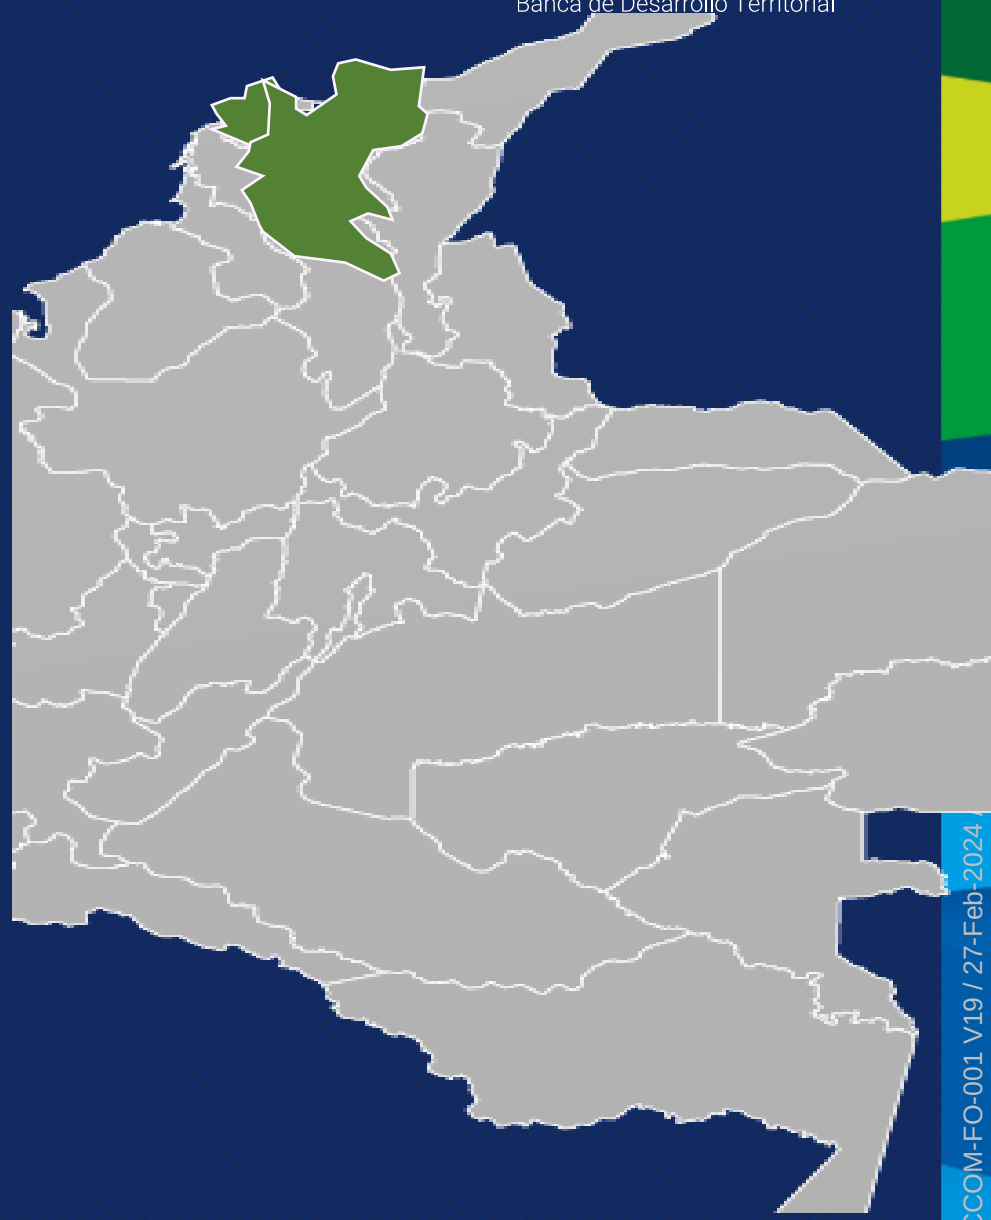

# Estado GRUPO 4, Departamentos de Magdalena y Bolívar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-052-2023 – JASA LTDA

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-055-2023 – CONSORCIO INTER EDUCATIVO G4

| VALOR EJECUCIÓN | FECHA INICIO Proyectada C1 | FECHA FIN Proyectada C1 | FECHA INICIO Proyectada C2 | FECHA FIN Proyectada C2 | PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.744.960.153 | 24/10/2023 | 08-12-2023 | 08-12-2023 | 07-02-2024 | **Programado** | 100% | 0% |
| **AVANCE POR COMPONENTE** | **Programado** | 100% | **Programado** | 100% | **Ejecutado** | 100% | |
| | **Ejecutado** | 100% | **Ejecutado** | 100% | | | |

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SEDE | AULAS NUEVAS | AULAS MEJORADAS | APARATOS SANITARIO | ÁREA DESARROLLADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolívar | Mompós | INSTITUCIÒN EDUCATIVA TÈCNICA AMBIENTAL DE TIERRA FIRME | I.E.T.A. AMBIENTAL DE TIERRA FIRME - SEDE PRINCIPAL | 3 | 13 | 4 | 4.224 M2 |
| Bolívar | Mompós | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DEL CHICAGUA | SAN LUIS | 1 | 2 | 2 | |
| Bolívar | Córdoba | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE TACAMOCHO | TACAMOCHO (SEDE PRIMARIA) | 0 | 9 | 4 | |
| Bolívar | Córdoba | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE TACAMOCHO | NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE TACAMOCHITO | 1 | 7 | 4 | |
| Magdalena | San Sebastían de Buenavista | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA | ERM MARIA AUXILIADORA | 3 | 2 | 1 | |
| Magdalena | San Sebastián de Buenavista | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA | ERM LA PACHA | 2 | 6 | 1 | |
| Magdalena | San Sebastián de Buenavista | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE TRONCOSO | ERM DE JAIME | 0 | 2 | 2 | |

Se encuentra liquidado el contrato de obra. El contrato de interventoría iniciará su trámite de liquidación una vez que quede desembolsado el último pago, lo cuál se tiene estipulado se haga para…..

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# GRUPO 4: LIQUIDADO

## LA PACHA












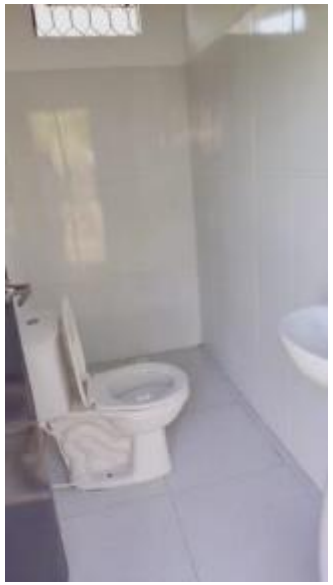










# Estado GRUPO 5, Departamentos de Magdalena y Bolívar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**16**
**Proyectos**

- 3 Departamentos
- 3 Municipios
- 16 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total, estudiantes SIMAT 2023 - 1177 estudiantes.
- $ 4.102.044.984 Inversión

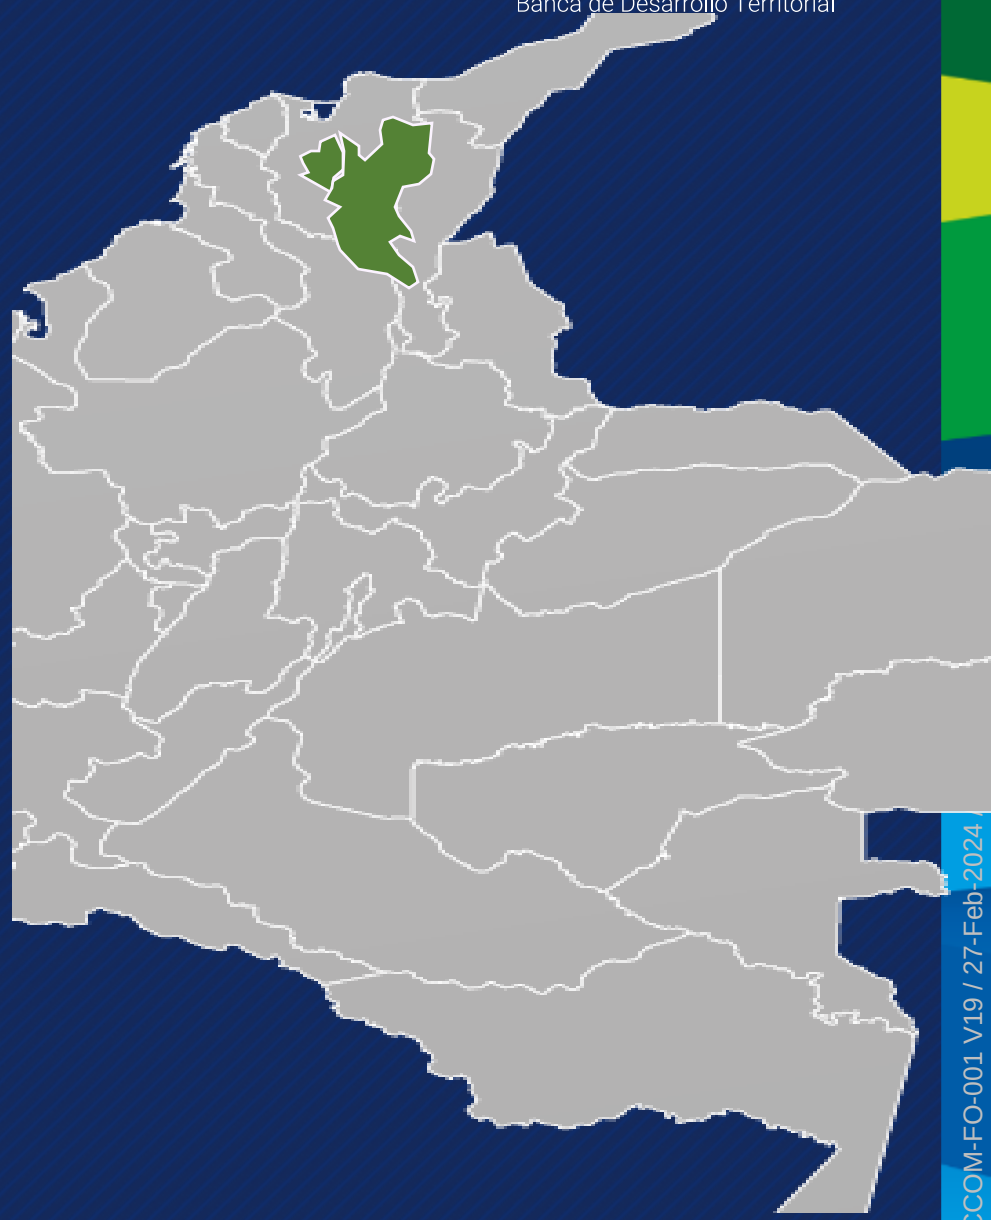

# GRUPO 5, Departamentos de Cesar, Magdalena y Bolívar.

**SEDES INTERVENIDAS:**

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | IE | SEDE | ALCANCE TOTAL DE INTERVENCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | AULAS NUEVAS | AULAS MEJORADAS | BATERIAS SANITARIAS | FECHA DE ENTREGA |
| Bolívar | Barranco de Loba | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR | I.E.T.A. LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR - SEDE PRINCIPAL | | 10 | | 19/11/2024 |
| Bolívar | Barranco de Loba | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR | ATASCOZA | 1 | 3 | | 07/11/2024 |
| Bolívar | Barranco de Loba | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR | LOS CERRITOS | | 7 | | 19/11/2024 |
| Magdalena | Concordia | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE BASICA Y MEDIA SANTA CRUZ DE BALSAMO | ERM DE BALSAMO | | 6 | | 02/12/2024 |
| Magdalena | Concordia | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE BASICA Y MEDIA SANTA CRUZ DE BALSAMO | JAR INF MIS PRIMEROS SUEÑOS | | 2 | | 02/12/2024 |
| Magdalena | El Banco | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ANTONIO NARIÑO | CENT EDUC RUR MIX JOSE DE LA PAZ VANEGA ORTIZ | 1 | 6 | 1 Bs, 11 aparatos | 13/11/2024 |
| Cesar | Curumaní | INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES | INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES | | 11 | | 28/06/2024 |
| Magdalena | El Banco | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL SILVIA COTES DE BISWELL | ERM SANTA TERESA DE ISLITA | | 2 | | 5/06/2024 |
| Bolívar | San Martín de Loba | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA PESQUERA LEONIDAS ORTIZ ALVEAR DE CHIMÍ | PLAN BONITO | 1 | 0 | | 2/06/2024 |
| Cesar | Curumaní | INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES | SEDE CHINELA | 1 | 0 | 1 Bs, 4 aparatos | 12/11/2024 |
| Cesar | Curumaní | INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES | SEDE GUAIMARAL | | 3 | | 30/07/2024 |
| Cesar | Curumaní | INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES | SEDE LOS SERRENOS | | 2 | | 21/06/2024 |
| Magdalena | El Banco | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL OSCAR PISCIOTTI NUMA | ERM INMACULADA CONCEPCION | | 2 | | 5/06/2024 |
| Cesar | Chimichagua | CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO | SEDE TRONCONAL | 1 | 0 | 3 Bs, 3 aparatos | 27/12/2024 |
| Cesar | Chimichagua | CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO | SEDE PUERTO LA ESTANCIA | | 2 | | 30/07/2024 |
| Cesar | Chimichagua | CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO | SEDE TORRECILLA | | 3 | | 30/07/2024 |

**PORCENTAJES DE AVANCE:**

100% Programado

100% Ejecutado

**ESTADO ACTUAL CIERRE Y LIQUIDACION CONTRATOS DERIVADOS**

**AERS COMPONENTE 1 y 2:**

- En proceso de proyección para revisión y firma por parte de la Fiduciaria Popular, Contrato de Interventoría, en proceso de firma por parte de la Fiduciaria Popular, una vez se tenga el AERS suscrita se procederá a solicitar la actualización de pólizas

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# GRUPO 5, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES SEDE PRINCIPAL
ID No. 30





## INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES SEDE SERENOS
ID No. 101




## INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES SEDE SERENOS
ID No. 101




## INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRISTIAN MORENO SEDE CHINELA
ID No. 97





## INSTITUCION EDUCATIVA EL PUEBLITO SEDE PUERTO LA ESTANCIA
ID No. 147




## INSTITUCION EDUCATIVA EL PUEBLITO SEDE TORRECILLA
ID No. 148





# GRUPO 5, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PUEBLITO SEDE TRONCONAL
ID No. 146




## INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL SILVIA COTES DE BISWELL SEDE ISLITA
ID No. 32




## INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL OSCAR PISCIOTTI NUMA SEDE INMACULADA CONCEPCION




## INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ANTONIO NARIÑO SEDE JOSE DE LA PAZ VANEGAS




## INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA CRUZ DE BALSAMO SEDE PRIMARIA
ID No. 13




## INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA CRUZ DE BALSAMO SEDE JARDIN INFANTIL
ID No. 14




# GRUPO 5, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR SEDE PRINCIPAL
ID No. 06




INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR SEDE CERRITO
ID No. 10




INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR SEDE ATASCOZA
ID No. 09




INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA PESQUERA LEONIDAS ORTIZ ALVEAR SEDE PLAN BONITO
ID No. 43





# Estado GRUPO 6, Departamento de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-056-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-058-2023 – CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**7**
**Proyectos**

- 1 Departamentos
- 3 Municipios
- 7 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT 2023 - 3388 estudiantes.
- $ 2.697.151.413,44 Inversión



CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 6, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-056-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-058-2023 – CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| VALOR EJECUCION | FECHA INICIO C1 | FECHA FIN C1 | FECHA INICIO C2 | FECHA FIN C2 | PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O: $2.496.849.571,44<br>I: $200.301.842,00 | 15-nov-23 | 30-dic-23 | 30-nov-23 | 29-abr-2024 | **Programado** | 100% | 0,00% |
| **AVANCE POR COMPONENTE** | **Programado** | 100,00% | **Programado** | 100,00% | **Ejecutado** | 100% | |
| | **Ejecutado** | 100,00% | **Ejecutado** | 100,00% | **En proceso de liquidación.** | | |

**ALCANCE DEFINIDO**

| DPTO | MUNICIPIO | INSTITUCION EDUCATIVA | SEDE | AULAS NUEVAS | AULAS MEJORADAS | BATERÍAS SANITARIAS | ID MEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar | El Paso | IE OCTAVIO MENDOZA DURAN | SEDE LA ESTACION | 1 | 1 | 1 - Mejorada | 79 |
| | La Paz(Robles) | CENTRO EDUCATIVO INDIGENA CAÑO PADILLA YUKPA | SEDE EL COSO | 1 | 0 | N.A. | 45 |
| | El Paso | IE OCTAVIO MENDOZA DURAN | SEDE EL VALLITO | N.A. | 3 | N.A. | 75 |
| | | | SEDE LA ESPERANZA | N.A. | 8 | 1 - Mejorada | 74 |
| | | | SEDE SAN ANGEL | N.A. | 1 | 1 - Nueva | 77 |
| | Valledupar | IE ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ | IE ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ | N.A. | 11 | N.A. | 4 |
| | | IE TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ | INSTITUTO TECNICO COMERCIAL JOSE EUGENIO MARTINEZ | N.A. | 23 | N.A. | 48 |

**Avance General:** En proceso de liquidación.

**COMPONENTE I:** Entregado 02/02/2024 – 100%

**COMPONENTE II:** Entregado 15/04/2024 al 17/05/2024– 100%

**LIQUIDACIÓN Contrato de Obra No. PAF-MENAM-O-056-2023:** Suscrita Acta de liquidación el 20/11/2024 y pagado al 100%.

**LIQUIDACIÓN Contrato de Interventoría No. PAF-MENAM-I-058-2023:** Suscrita Acta de liquidación el 27/11/2024 y pagado al 100%.

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# GRUPO 6, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-056-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-058-2023 – CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN – SEDE EL VALLITO

| MUNICIPIO | | El Paso |
|---|---|---|
| POBLACIÓN BENEFICIADA | | 105 estudiantes |
| ALCANCE | | |
| Aulas mejoradas | 3 | • Cambio de cubierta<br>• Cambio de red eléctrica<br>• Instalación de canales tipo amazonas.<br>• Instalación de bajantes.<br>• Reparación de grietas en aulas 1, 2 y 3.<br>• Reparación de muros con desprendimiento de pañetes en el aula 1.<br>• Raspado de pintura existente en aulas 1, 2 y 3.<br>• Acabado en estuco y pintura para muros del aula 1, 2 y 3.<br>• Mantenimiento de rejas metálicas de aulas 1, 2 y 3. |
| Baterías sanitarias | N.A. | N.A. |
| FECHA DE ENTREGA | | 15/04/2024 |

## REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ANTES





## REGISTRO FOTOGRAFICO DEL DESPUES






CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# GRUPO 6, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-056-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-058-2023 – CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN – SEDE LA ESTACION

| MUNICIPIO | | El Paso |
|---|---|---|
| POBLACIÓN BENEFICIADA | | 65 estudiantes |
| ALCANCE | | |
| Aulas nuevas | 1 | Aula prefabricada - Material WPC |
| Aulas mejoradas | 1 | * Cambio de cubierta<br>* Cambio de red eléctrica |
| Baterías sanitarias | Mejoramiento | * Cambio de enchape por la calidad de instalación del existente y limpieza y mantenimiento de sanitarios existentes<br>* Mantenimiento de carpintería metálica<br>* Cambio de cubierta y red eléctrica<br>* Suministro de tanque de agua potable 2000 L<br>* Construcción de poza séptica con campos de infiltración. |
| FECHA DE ENTREGA | | 02/05/2024 |

## REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ANTES






## REGISTRO FOTOGRAFICO DEL DESPUES






CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# GRUPO 6, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-056-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-058-2023 – CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## CENTRO EDUCATIVO INDIGENA CAÑO PADILLA YUKPA – SEDE EL COSO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | La Paz (Robles) |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 65 estudiantes |
| **ALCANCE** | | |
| Aulas nuevas | 1 | • Suministro e instalación de aula de 45 M2 tipo multigrado, prefabricada.<br>• Instalación de un sistema de panel solar con sus respectivos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento |
| Baterías sanitarias | N.A. | N.A. |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 04/05/2024 |

## REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ANTES





## REGISTRO FOTOGRAFICO DEL DESPUES









# GRUPO 6, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-056-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-058-2023 – CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN – SEDE LA ESPERANZA

| MUNICIPIO | | El Paso |
|---|---|---|
| POBLACIÓN BENEFICIADA | | 225 estudiantes |
| ALCANCE | | |
| Aulas mejoradas | 9 | ✓ 7 AULAS:<br>• Cambio de cubierta<br>• Cambio de red eléctrica<br>• Instalación de canales tipo amazonas.<br>• Instalación de bajantes.<br>• Reparación de grietas en bloque 1 y aula 6<br>• Reparación de muros con desprendimiento de pañetes.<br>• Raspado de pintura existente en bloque 1, aula 5 y 6<br>• Acabado en estuco y pintura para muros del bloque 1, aula 5 y 6.<br>• Mantenimiento de pintura a marcos y hoja de puertas del bloque 1, aula 5, 6<br><br>✓ 2 AULAS<br>• Cambio de cubierta<br>• Subida de nivel<br>• Cambio de red eléctrica<br>• Mejoramiento en muros y en carpintería metálica<br>✓ OBRAS HIDRÁULICAS EN LA SEDE |
| Baterías sanitarias | SI | • Cambio de cubierta<br>• Cambio de red eléctrica<br>• Mantenimiento de pintura a marcos y hoja de puertas |
| FECHA DE ENTREGA | | 10/05/2024 |

## REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ANTES





## REGISTRO FOTOGRAFICO DEL DESPUES







# GRUPO 6, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-056-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-058-2023 – CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN – SEDE SAN ANGEL

| MUNICIPIO | | El Paso |
|---|---|---|
| POBLACIÓN BENEFICIADA | | 8 estudiantes |
| ALCANCE | | |
| Aulas mejoradas | 1 | • Mantenimiento y limpieza de cubierta<br>• Cambio de puerta de acceso principal<br>• Mejoramiento de ventanas el cual incluye lijado, anticorrosivo y pintura. |
| Baterías sanitarias | SI | • Suministro e instalación de batería sanitaria prefabricada.<br>• Instalación de sistema séptico.<br>• Instalación de tanque plástico 500 L para contención de agua potable. |
| FECHA DE ENTREGA | | 15/05/2024 |

## REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ANTES





## REGISTRO FOTOGRAFICO DEL DESPUES





CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# GRUPO 6, Departamentos de Cesar


Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-056-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-058-2023 – CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ – IE ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ

| MUNICIPIO | | Valledupar |
|---|---|---|
| POBLACIÓN BENEFICIADA | | 385 estudiantes |
| ALCANCE | | |
| Aulas mejoradas | 11 | • Cambio de cubierta<br>• Cambio de red eléctrica<br>• Cambio de pisos en aulas 1, 2 y 3 del bloque 1.<br>• Aseo manual de muros con ácido muriático en el bloque 5.<br>• Desmonte manual de muro divisorio en aulas del bloque 2.<br>• Instalación de muro divisorio en sistema drywall para aulas del bloque 2 .<br><br>En sala de informática y las 2 aulas del bloque 2.<br>• Desmonte de cielo raso.<br>• Instalación de cielo raso en lamina PVC. |
| Baterías sanitarias | N.A. | N.A. |
| FECHA DE ENTREGA | | 16/05/2024 |

## REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ANTES

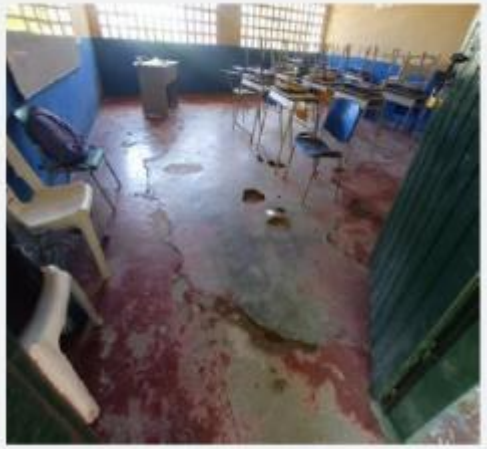
## REGISTRO FOTOGRAFICO DEL DESPUES





CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# GRUPO 6, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-056-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-058-2023 – CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ– SEDE INSTITUTO TECNICO COMERCIAL JOSE EUGENIO MARTINEZ

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Valledupar |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 805 estudiantes |
| **ALCANCE** | | |
| Aulas mejoradas | 23 | * Cambio de cubierta para bloque 1, 2, 3, 4 y 5- correspondiente a las 23 aulas.<br>* Cambio de red eléctrica para bloque 1, 2, 3, 4 y 5 por cambio de cubierta - correspondiente a las 23 aulas.<br>* Instalación de canales tipo amazonas.<br>* Instalación de bajantes.<br>* Pintura interna para los bloques 1, 2, 3, 4 y 5 por cambio de cubierta - correspondiente a las 23 aulas. |
| Baterías sanitarias | N.A. | N.A. |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 17/05/2024 |

## REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ANTES





## REGISTRO FOTOGRAFICO DEL DESPUES






CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 7, Departamento de La Guajira

Contratista de Diseño y Obra PAF-ATMEN5-O-036-2024 – CONSORCIO GUAJIRA 7 (Máxima Solutions sas 50% Gancar Distribuciones sas 50%)
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-059-2023 – GERMÁN ADOLFO PERDOMO PACHÓN

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**13**
**Proyectos**

- 1 Departamento
- 4 Municipios
- 9 Instituciones
  13 Sedes
- Total estudiantes SIMAT 2024 - 2585 estudiantes.
- $4.454.016.879
  Inversión




CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 7,Departamento de La Guajira

Contratista de Diseño y Obra PAF-ATMEN5-O-036-2024 – CONSORCIO GUAJIRA 7 ( Maxima Solutions sas 50% Gancar Distribuciones sas 50%)

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-059-2023 – GERMÁN ADOLFO PERDOMO PACHÓN

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| VALOR EJECUCION | FECHA INICIO C1 | FECHA FIN C1 | FECHA INICIO C2 | FECHA FIN C2 | PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O: $4.158.777.879<br>I: $295.239.000 | 31/05/2024 | 15/07/2024 | 15/07/2024 | 17/01/2025 | Progr | 96,43% | -3,34% |
| AVANCE POR COMPONENTE | Programado | 100,00% | Programado | 96,16% | Ejecut | 93,09% | |
| | Ejecutado | 100,00% | Ejecutado | 92,56% | | | |

| DPTO | MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SEDE | AULAS NUEVAS | AULAS MEJORAD | APARAT SANIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guajira | Maicao | I.E. INDÍGENA No. 2 | KASICHE | 1 | 0 | 2 |
| Guajira | Maicao | I.E. INDÍGENA No. 6 | YAMAIN KASPOLIMANA | 1 | 1 | 2 |
| Guajira | Maicao | ESC. RURAL MIXTA TALOULUMAANA | ESC. RURAL MIXTA TALOULUMAANA | 2 | 0 | 6 |
| Guajira | Manaure | I. ETNOEDUCATIVA NTRA. SRA. DE FÁTIMA | ESC. RURAL INDÍGENA KARALOUTAMANA | 1 | 0 | 2 |
| Guajira | Barrancas | CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL PROVINCIAL | CENTRO ETNOEDUCATIVO PROVINCIAL | 1 | 0 | 0 |
| Guajira | Maicao | I.E. INDÍGENA No. 2 | LA CAMPANA | 0 | 9 | 0 |
| Guajira | Maicao | I.E. INDÍGENA No. 2 | WAYUUMAANA | 0 | 2 | 0 |
| Guajira | Maicao | I.E. INDÍGENA No. 2 | LA ESTRELLA | 1 | 0 | 0 |
| Guajira | Maicao | I.E. INDÍGENA No. 6 | YAMAIN PRINCIPAL | 1 | 0 | 0 |
| Guajira | Riohacha | I.E. JOSÉ ANTONIO GALÁN | COOPERATIVO | 0 | 7 | 0 |
| Guajira | Riohacha | I.E. JOSÉ ANTONIO GALÁN | JOSÉ ANTONIO GALÁN | 0 | 0 | 6 |
| Guajira | Riohacha | I. ETNOEDUCATIVA No. 7 | APUNIMAANA1 | 0 | 8 | 0 |
| Guajira | Riohacha) | I. ETNOEDUCATIVA No. 7 | WAKUAPAMANA | 0 | 9 | 6 |
| TOTALES | | | | 8 | 36 | 24 |

**Avance General: se reinició 18dic24**

**Avance general Componente I: 100%**

**Avance general por Sede Componente II: - 3,60%**

**ID53 Maicao, I.E. Indígena No.2, Sede Kasiche: 93,10%**
**ID152 Maicao, I.E. Indígena No.6, Sede Yamain Kaspolimana: 90.53%**
**ID153 Maicao, E.R. Mixta Taloulumaana, Sede E.R. Mixta Taloulumaana: 94.19%**
**ID11 Manaure, I. Etnoeducativa Ntra Sra Fátima, Sede E.R. Indígena Karaloutamana: 93.50%**
**ID143 Barrancas, C. Etnoeducativo Rural provncial, Sede C. Etnoeducativo Provincial: 91.97%**
**ID50 Maicao, I.E. Indígena No.2, Sede La Campana: 100%**
**ID54 Maicao, I.E. Indígena No.2, Sede Wayuumaana: 100%**
**ID151 Maicao, I.E. Indígena No.2, Sede La Estrella: 94.52%**
**ID51 Maicao, I.E. Indígena No.6, Sede Yamain principal: 95.65%**
**ID60 Riohacha, I.E. José Antonio Galán, Sede Cooperativo: 100%**
**ID95 Riohacha, I.E. José Antonio Galán, Sede José Antonio Galán: 97.97%**
**ID34 Riohacha, I.Etnoeducativa No.7, Sede Apunimaana1: 100%**
**ID117 Riohacha, I.Etnoeducativa No.7, Sede Wakuapamana: 94,86%**

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# REGISTRO FOTOGRAFICO

I.E. JOSE ANTONIO GALAN- SEDE COOPERATIVO -060-(RIOHACHA)





INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #7 - 034-APÜNIMA´ANA1 -(RIOHACHA)





ESCUELA ETNOEDUCATIVA LA CAMPANA -050--(MAICAO)







ESCUELA ETNOEDUCATIVA WAYUMA'ANA -054- (MAICAO)





# REGISTRO FOTOGRAFICO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #7 - 117-WAKUAPAMANA -(RIOHACHA)








I.E. JOSE ANTONIO GALAN- SEDE PRINCIPAL -060-(RIOHACHA)






INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #6 - 051-TALOULUMA `ANA -(MAICAO)





INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO RURAL PROVINCIAL - 0143-PROVINCIAL -(BARRANCAS)




# REGISTRO FOTOGRAFICO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA - 011- ESCUELA RURAL INDIGENA KARALOUTAMANA -(MANAURE)






ESCUELA ETNOEDUCATIVA SEDE KASICHE -053- (MAICAO)









INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #6 - 151-LA ESTRELLA -(MAICAO)




INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #6 - 051- YAMAIN SEDE PRINCIPAL -(MAICAO)




INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #6 - 152- YAMAIN KASPOLIMANA -(MAICAO)






# Estado GRUPO 8, Departamentos de Bolívar - Córdoba

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-055-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S.
Contratita Interventor PAF-MENAM-I-057-2023 – LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO

**9**
**Proyectos**

- 2 Departamentos
- 7 Municipios
- 8 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT 2023 - 3710 estudiantes.
- $ 6.602.674.825 Inversión



CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 - Clasificada

# REGISTRO FOTOGRAFICO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## Sede principal I. E. El Palmar - Montelíbano





## Sede Téc. Agrop. De Desarrollo Rural De María la baja - María La Baja





# REGISTRO FOTOGRAFICO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## Sede Buenos Aires - María La Baja






## Sede Esc. Nueva Parcelas Londres - Ayapel





# REGISTRO FOTOGRAFICO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## Sede Esc. Nueva La Solita - Puerto Libertador







## Sede Los Aguacates - Cotorra







# REGISTRO FOTOGRAFICO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## Sede Los Cerros - Planeta Rica





## Sede Técnica Álvaro Ulcue Chocue - Tuchín





# REGISTRO FOTOGRAFICO

## Sede Níspero-María La Baja













CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 9, Departamentos de Arauca, Bolívar, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima y Bogotá D.C.

Contratista de Diseño y Obra PAF-ATMEN5-O-037-2024 – CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9
Contratista Interventor PAF-ATMEN5-I-064-2024 – CONSORCIO SAN GABRIEL

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**15**
**Proyectos**

- 8 Departamentos
- 12 Municipios
- 13 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT 2024 - 3351 estudiantes.
- $ 5.124.276.306 Inversión



CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 9, Departamentos de Arauca, Bolívar, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima y Bogotá D.C.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Contratista de Diseño y Obra PAF-ATMEN5-O-037-2024 – CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9

Contratista Interventor PAF-ATMEN5-I-064-2024 – CONSORCIO SAN GABRIEL

| VALOR EJECUCION | FECHA INICIO C1 | FECHA FIN C1 | FECHA INICIO C2 | FECHA FIN C2 | PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O: $4.810.476.306,00<br>I: $313.800.000 | 23-Ago-24 | 08-oct-24 | 09-oct-24 | 08-mar-25 | **Programado** | 31,98%% | -9,62% |
| **AVANCE POR COMPONENTE** | **Programado** | 100,00% | **Programado** | 27,92% | **Ejecutado** | 22,36% | |
| | **Ejecutado** | 100,00% | **Ejecutado** | 14,3% | **En ejecución de obras** | | |

| DPTO | MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SEDE | AULAS NUEVAS | AULAS MEJORAD | APARATOS SANITARIOS | ID MEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santander | Vélez | COLEGIO UNIVERSITARIO | COLEGIO UNIVERSITARIO | 4 | 9 | Si aplica | 7 |
| | Betulia | INSTITUCION EDUCATIVA EL RAMO | CENTRO EDUCATIVO SANTA BARBARA | NA | 1 | Si aplica | 17 |
| | Barrancabermeja | CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN | CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN | Sede retirada | | | 141 |
| Bolívar | Morales | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PALMA | LA ARCADIA | NA | 2 | Si aplica | 20 |
| | Simití | INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CERRO DE VERACRUZ | CAMPO PAYARES | 1 | 1 | Si aplica | 123 |
| | | | I.E. DEL CERRO DE VERACRUZ - SEDE PRINCIPAL | NA | 12 | 5 | 124 |
| Bogotá, D.C. | Bogotá, D.C. | COLEGIO LA CHUCUA (IED) | CENT EDUC DIST LA CHUCUA | Sede retirada | | | 33 |
| | | COLEGIO ESTRELLA DEL SUR (IED) | COL DIST ESTRELLA DEL SUR | Sede retirada | | | 136 |
| Arauca | Saravena | CENTRO EDUCATIVO LA PAVA | LA PAVA | NA | 2 | 1 | 56 |
| | Arauca | CENTRO EDUCATIVO MONSERRATE | CEAR MONSERRATE | NA | 7 | 3 | 138 |
| Tolima | Santa Isabel | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BOLIVAR | LA HUMAREDA | 1 | 1 | 2 | 67 |
| | | | EL BRASIL | 1 | 1 | 2 | 100 |
| Meta | Villavicencio | INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO FRANCISCO ARANGO | ESCUELA SIETE DE AGOSTO | 5 | 2 | 8 | 96 |
| Cundinamarca | Anolaima | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE HUGO ENCISO | ESCUELA RURAL EL DESCANSO | 1 | 1 | 2 | 104 |
| Norte de Santander | La Playa | CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN PEDRO | SEDE LA PEÑA | NA | 1 | Si aplica | 132 |

**Avance General:**

- Se aprobó el de retiro de las 3 sedes educativas mediante comité técnico No. 70 y comité fiduciario No. 45.
- Se realizó prórroga por tres (3) meses para la culminación de las obras, mediante otrosí No. 2 el 05/12/2024.
- Se iniciaron obras en algunas sedes educativas.

**Avance por sede:**

**ID No. 56:** En ejecución de obras, sede próxima a finalizar actividades y realizar entrega.
**ID No. 132:** En ejecución de obras.
**ID No. 138:** En ejecución de obras.
**ID No. 7:** En ejecución de obras.
**ID No. 17:** No se han iniciado actividades, contratista manifiesta que se han presentado inconvenientes con mano de obra de la región y transporte de materiales. Se han realizado las advertencias pertinentes por la mora en el inicio y los atrasos presentados.
**ID No. 20:** No se han iniciado actividades, contratista manifiesta que se han presentado inconvenientes con transporte de materiales. Se han realizado las advertencias pertinentes por la mora en el inicio y los atrasos presentados.
**ID No. 123:** No se han iniciado actividades, contratista manifiesta que se han presentado inconvenientes con transporte de materiales. Se han realizado las advertencias pertinentes por la mora en el inicio y los atrasos presentados.
**ID No. 124:** En ejecución de obras
**ID No. 104:** No se han iniciado actividades, contratista manifiesta que se han presentado inconvenientes con transporte de materiales. Se han realizado las advertencias pertinentes por la mora en el inicio y los atrasos presentados.
**ID No. 67 y 100:** No se han iniciado actividades, contratista manifiesta que se han presentado inconvenientes con lluvias presentadas en la zona que han impedido el transporte a la sede. Se han realizado las advertencias pertinentes por la mora en el inicio y los atrasos presentados.
**ID No. 96:** En ejecución de obras de las actividades de aulas prefabricadas.

El contratista manifiesta que las sedes faltantes se iniciarán obras en la segunda semana de enero; así mismo, se encuentra en coordinación de transporte, materiales y mano de obra con el fin de no tener retrasos por estas situaciones.

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 9, Departamentos de Arauca, Bolívar, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima y Bogotá D.C.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Contratista de Diseño y Obra PAF-ATMEN5-O-037-2024 – CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9
Contratista Interventor PAF-ATMEN5-I-064-2024 – CONSORCIO SAN GABRIEL

## COLEGIO UNIVERSITARIO - ID No. 7




## INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CERRO DE VERACRUZ ID No. 124




## CENTRO EDUCATIVO LA PAVA ID No. 56






## CENTRO EDUCATIVO MONSERRATE ID No. 138




## ESCUELA SIETE DE AGOSTO ID No. 96






## SEDE LA PEÑA – ID No. 132




CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada


# Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca – Valle del Cauca y Choco

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**15**
**Proyectos**

- 3 Departamentos
- 5 Municipios
- 15 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total, estudiantes SIMAT 2023 - 3198 estudiantes.
- 7.063.483.948,76 Inversión - MEN

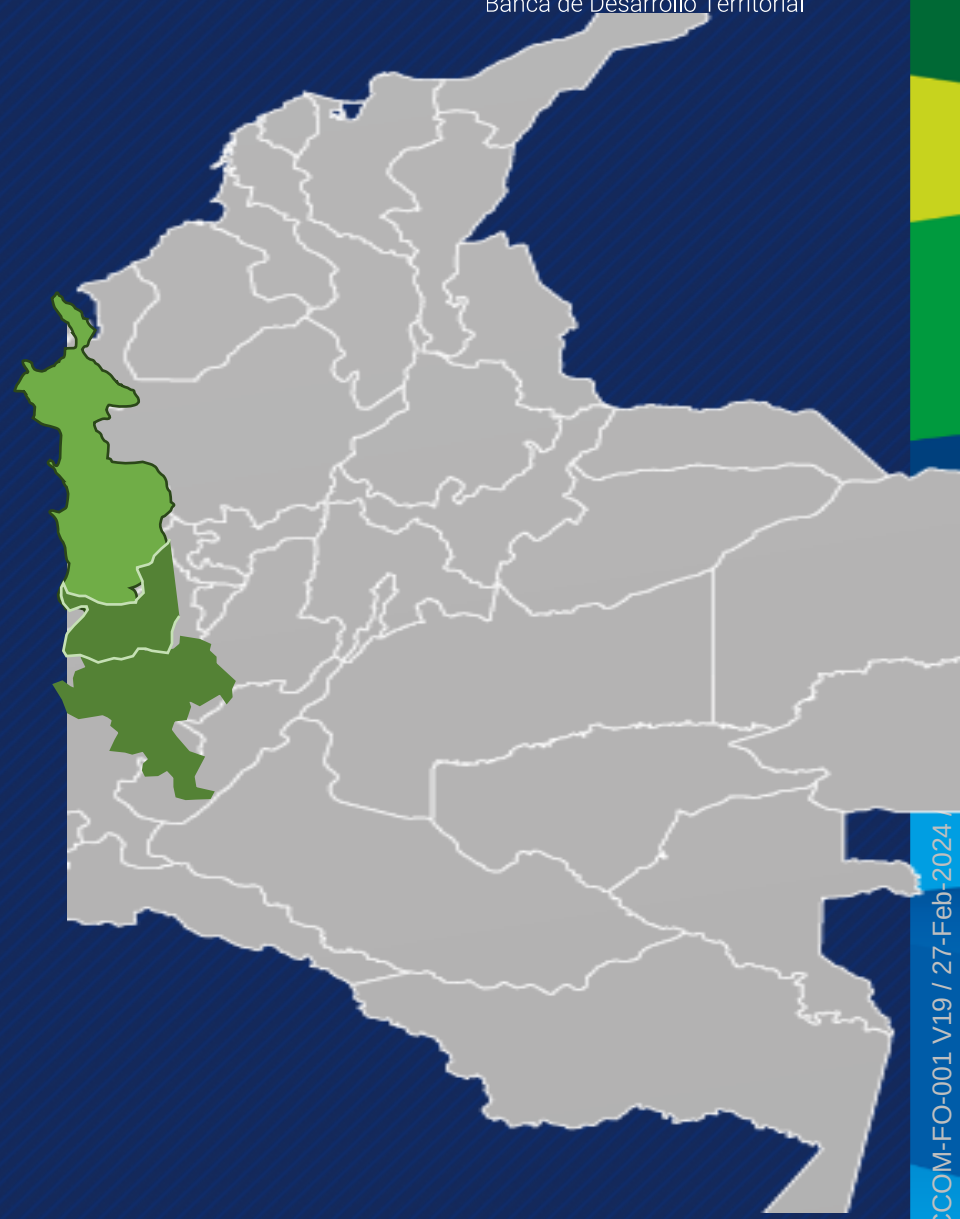

# Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca – Valle del Cauca y Choco

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO


Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## SEDES INTERVENIDAS:

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | IE | SEDE | ALCANCE TOTAL DE INTERVENCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | AULAS NUEVAS | AULAS MEJ | BSANITARIAS | FECHA DE ENTREGA |
| CAUCA | SUAREZ | ID188. IE TECNICA AGRICOLA | SEDE PRINCIPAL | | 9 | 24 MEJORAM | 30/12/2024 |
| CAUCA | SUAREZ | ID189. IE TECNICA AGRICOLA | MARIA INMACULADA | 6 | 7 | 9 NUEVAS 7 MEJORAM | 30/03/2025 |
| CAUCA | SUAREZ | ID190. IE TECNICA AGRICOLA | FRANCISCO PAULA SANTANDER | | 13 | 10 MEJORAM | 30/03/2025 |
| CAUCA | TORIBIO | ID12. IE LA PLAYA | CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO LA PLAYA | | 9 | | 14/08/2024 |
| CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | ID16. IE DOMINGUILLO | SEDE PRINCIPAL | 8 | | 8 NUEVAS | 30/03/2025 |
| CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | ID164. IE DOMINGUILLO | SEDE DOMINGO LASSO | | 4 | 3 MEJORAM | 28/05/2024 |
| CHOCO | BAHIA SOLANO | ID105. IE LUIS LOPEZ DE MESA | SEDE DE SAN JOSE (HUACA) | 1 | | 2 NUEVAS | 28/02/2025 |
| CHOCO | BAHIA SOLANO | ID106. IE LUIS LOPEZ DE MESA | SEDE SIRENA DEL MAR | | 1 | 2 MEJORAM | 03/12/2024 |
| CHOCO | BAHIA SOLANO | ID107. IE LUIS LOPEZ DE MESA | SEDE SECUNDINO RIVAS | | 7 | 4 MEJORAM | 03/12/2024 |
| V DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA | ID128. IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE | SEDE PRINCIPAL | | 9 | 14 MEJORAM | 26/11/2024 |
| V DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA | ID130. IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE | SEDE LA HONDA | | 1 | 2 MEJORAM | 08/08/2024 |
| V DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA | ID85. IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE | SEDE LA PLANTA | 1 | 2 | 2 | 03/12/2024 |
| V DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA | ID158. IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE | SEDE CRISTOBAL COLON | 1 | | 2 MEJORAM | 17/09/2024 |
| V DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA | ID62. IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE | SEDE JHN F KENNEDY | | 11 | 14 MEJORAM | 26/11/2024 |
| V DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA | ID129. IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE | SEDE JULIAN MENDOZA GUERRERO | | 5 | 10 MEJORAM | 17/09/2024 |

| Estado | Proyectos |
|---|---|
| Entregados | 10 |
| Terminados | 1 |
| Ejecución | 4 |

## PORCENTAJES DE AVANCE:




## ESTADO ACTUAL EJECUCIÓN CONTRATOS DERIVADOS

En cumplimiento al alcance se tienen 10 sedes entregadas y AEP&SC suscritas, 1 sede terminada programada entregar a rectora el 30.12.2024 y 4 sedes en ejecución, (2 Suarez, 1 Santander de Quilichao, 1 Bahía Solano)

Derivado de la necesidad de los 4 proyectos en ejecución, se tramito prórroga de 3 meses compartida, ante comité técnico No. 80 y Comité Fiduciario No. 51, derivado de lo anterior el informe corte 29.12.2024 se ajusta a la reprogramación aprobada.

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCION E.TECNICA AGRARIA SEDE PRINCIPAL ID MEN. 188.




INSTITUCION E.TECNICA AGRARIA SEDE PRINCIPAL ID MEN. 188.




INSTITUCION E.TECNICA AGRARIA SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ID MEN. 190




INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PLAYA ID MEN: 12. MUNICIPIO DE TORIBIO ID MEN: 12.




INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO SEDE DOMINGO LASSO.




INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO SEDE PRINCIPAL




# Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó


Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE JOHN F. KENNEDY




INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDEJULIAN MENDOZA GUERRERO

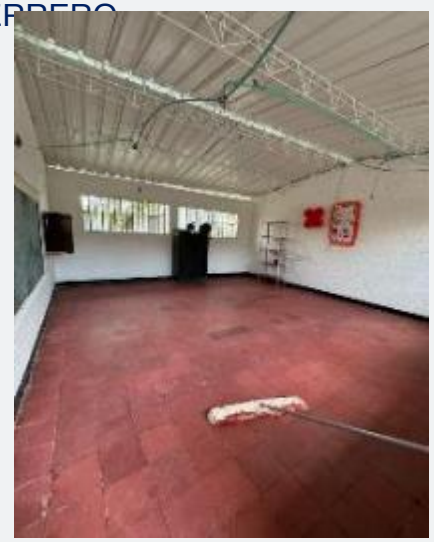INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE PRINCIPAL




INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE LA HONDA .




INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE LA PLANTA .




INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE CRISTOBAL COLÓN




CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCION EDUCATIVA LUIS LOPEZ DE MESA
SEDE SAN JOSE (HUACA)





INSTITUCION EDUCATIVA LUIS LOPEZ DE MESA
SEDE SIRENA DEL MAR





INSTITUCION EDUCATIVA LUIS LOPEZ DE MESA
SEDE SECUNDINO RIVAS





CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**18**
**Proyectos**

- 1 Departamento
- 6 Municipios
- 18 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT 2023 - 3170 Estudiantes
- $ 5.086.054.713 Inversión



# Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

| VALOR EJECUCION | FECHA INICIO C1 | FECHA FIN C1 | FECHA INICIO C2 | FECHA FIN C2 | PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **O:** $4.728.021.810<br>**I:** $ 358.032.903 | 12/02/2024 | 27/03/2024 | 18/03/2024 | 27/11/2024 | **Progr** | 100% | 0% |
| **AVANCE POR COMPONENTE** | **Programado** | 100% | **Programado** | 100% | **Ejecut** | 100% | |
| | **Ejecutado** | 100% | **Ejecutado** | 100% | | | |

| MUNICIPIO | INSTITUCIONES EDUCATIVAS | SEDE | Aulas Nuevas | Aulas Mejoradas | BATERÍA SANITARIA |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolívar | Centro Educativo el Tambo | La Fuente | 1 | 0 | 1 M |
| El Tambo | I.E. Huisitó | Huisitó (sede principal) | 6 | 0 | 6 N |
| La Vega | I.E Agropecuaria San Francisco Javier sede Garay | I.E Agropecuaria San Francisco Javier sede Garay | 1 | 0 | 1 N |
| Balboa | C.E. Buenos Aires | Capitanes | NA | 2 | 0 |
| | I.E. Olaya (antes C.E. Olaya) | Olaya (sede principal) | NA | 13 | 6 M |
| Bolívar | Institución Educativa Agropecuario Nuestra Señora del Carmen | Corral Viejo | 1 | 0 | 2 M |
| | | Nuestra Señora del Carmen (sede principal) | NA | 13 | 8 M |
| | Institución Educativa el Carmen | El Carmen (sede principal) | NA | 2 | 1 M |
| | Institución Educativa Técnica Agropecuaria Nuestra Señora de los Remedios | Colegio Departamental Nuestra Señora de los Remedios | NA | 10 | 8 M |
| La Vega | Institución Educativa Agropecuaria Santa Rita | Institución Educativa Santa Rita (sede principal) | NA | 6 | 0 |
| Popayán | I.E. Comuneros | sede principal | NA | 6 | 0 |
| Rosas | Institución Educativa Santa Teresita | Santa Teresita (sede principal) | NA | 17 | 8 M |
| | Institución Educativa Madre Caridad Brader | Madre Caridad Brader (sede principal) | 1 | 0 | 0 |
| | Centro Educativo Guillermo León Valencia | La Despensa | NA | 3 | 2 M |
| | | El Altillo | NA | 1 | 2 M |
| | Institución Educativa Alfonso Córdoba | Las Yerbas | NA | 2 | 2 M |
| | | El Retiro | NA | 1 | 1 M |
| | | Bellavista | NA | 1 | 0 |

**COMPONENTE 1**

El componente 1 del contrato de obra, correspondiente a los diagnósticos, estudios y diseños de las 18 sedes educativas priorizadas por el Ministerio de Educación Nacional, se encuentra actualmente concluido y recibido a satisfacción por parte de la interventoría al contrato de obra.

**COMPONENTE 2**

| Estado | Proyectos |
|---|---|
| Entregados | 15 |
| Terminados | 3 |
| Terminados – en Subsanación | 0 |
| Sin iniciar | 0 |

- 15 proyectos se encuentran terminados al 100%, recibidos a satisfacción por interventoría, y entregados a Directivos de cada sede.
- 3 proyectos se encuentran terminados al 100%, recibidos a satisfacción por interventoría, y en gestión de entrega a Directivos de cada sede. Los Directivos informaron que reciben en enero 2025.

Contrato de obra terminado. Contratista avanza en las gestiones de entrega a Directivos de las sedes terminadas y recibidas por interventoría. En algunas de estas sedes los Directivos están solicitando actividades por fuera del alcance contractual.

# Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO




I.E. Agropecuaria Santa Rita – Sede principal
La vega




C.E. Buenos Aires – Sede Capitanes
Balboa




C.E. Guillermo León Valencia – Sede La Despensa
Rosas





C.E. Guillermo León Valencia – El Altillo
Rosas

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial




I.E. El Carmen – Sede principal
Bolívar





I.E. Alfonso Córdoba – Sede Las Yerbas
Rosas




I.E. Alfonso Córdoba – Sede Bellavista
Rosas




I.E. Técnica Agropecuaria Nuestra Señora de los
Remedios - Bolívar

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial






I.E. Alfonso Córdoba – Sede El Retiro
Rosas





I.E. Nuestra Señora del Carmen – Sede Principal
Bolívar





I.E. Olaya – Sede principal
Balboa





C.E. El Tambo – Sede La Fuente
Bolívar

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial




I.E. Madre Caridad Brader – Sede principal Rosas




I.E. Nuestra Señora del Carmen – Sede Corral viejo Bolívar




I.E. Agropecuaria San Francisco Javier – Sede Garay La Vega




I.E. Santa Teresita – Sede principal Rosas

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial






I.E. Los Comuneros – Sede principal
Popayán







I.E. Huisitó – Sede principal
El Tambo

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada


# Estado GRUPO 12, Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julian Lizandro Gonzalez Casas 50% Jorge Andrés Chacón Ordoñez 50%)
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**18**
**Proyectos**

- 4 Departamentos
- 11 Municipios
- 18 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT 2023 - 3219 estudiantes.
- $5.236.381.488 Inversión

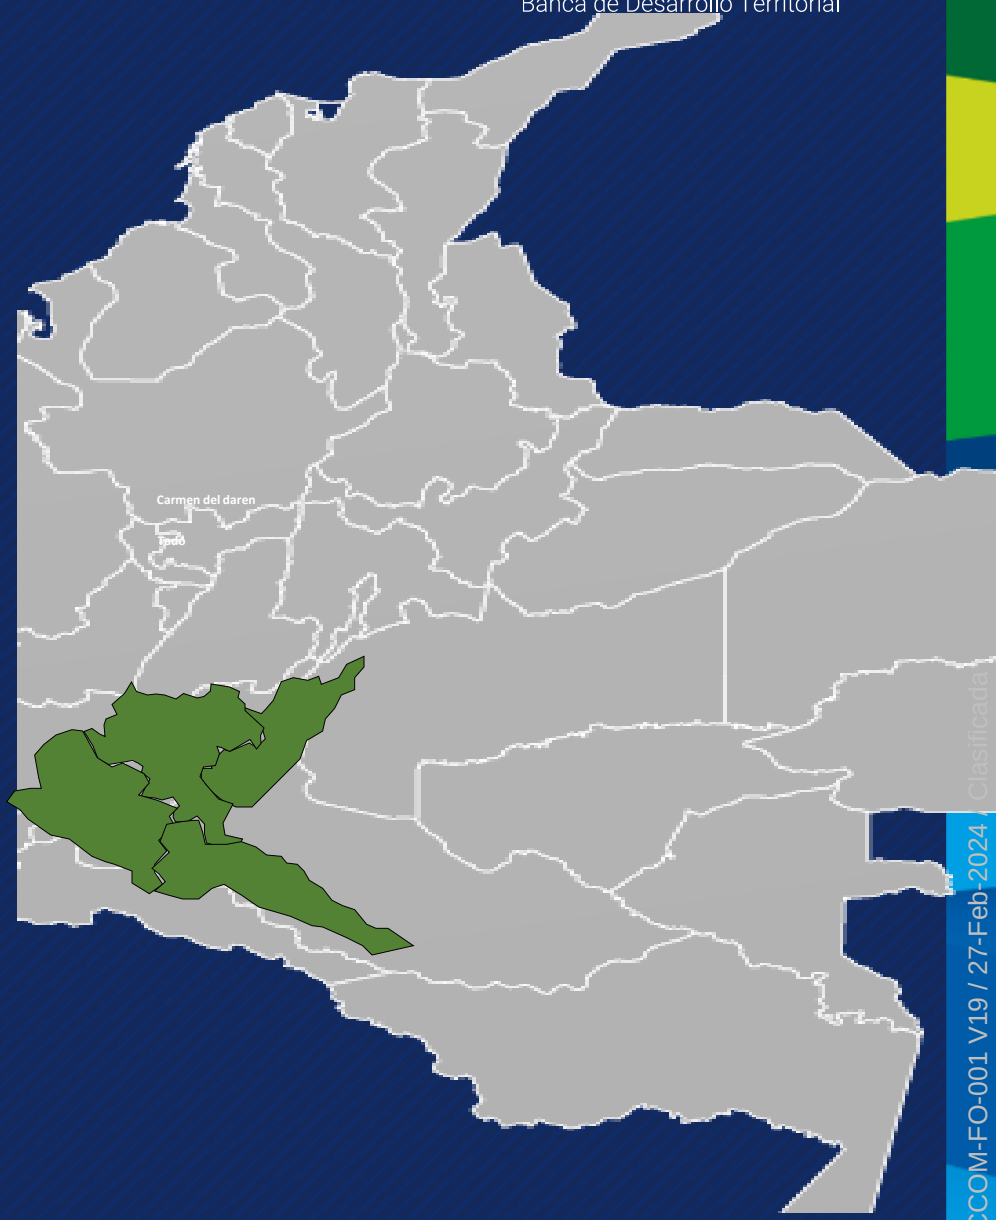


Clasificada
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024

# Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO


| VALOR EJECUCION | FECHA INICIO C1 | FECHA FIN C1 | FECHA INICIO C2 | FECHA FIN C2 | PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **O:**$4.918.276.400 **I:** $418.988.095 | 20/02/2024 | 4/04/2024 | 05/04/2024 | 04/12/2024 | **Programado** | 100,00% | -3,05% |
| **AVANCE POR COMPONENTE** | **Programado** | 100,00% | **Programado** | 100,00% | **Ejecutado** | 98,00% | |
| | **Ejecutado** | 100,00% | **Ejecutado** | 98,00% | **% Financiero G12:** 86,03%<br>**Obra:** 86,13%<br>**Interventoría:** 75,58% | | |

| DPTO | MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SEDE | AULAS NUEVAS | AULAS MEJORAD | APARATOS SANITARIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cauca | Piamonte | ID27. Centro Educativo Puerto Guayuyaco | Escuela Rural Mixta La Espanola | 0 | 1 | 1 |
| Cauca | Piamonte | ID121. Centro Educativo Puerto Guayuyaco | Esc Rur Mix San Andresito | 0 | 1 | 1 |
| Cauca | Piamonte | ID125. Inst Educ Agric Piamonte | PIAMONTE (Sede Principal) | 0 | 28 | 1 |
| Cauca | Piamonte | ID173. Esc Rur Mix Fray Ezequiel | Esc Rur Mix Fray Ezequiel | 0 | 1 | 1 |
| Cauca | Piamonte | ID174. E.D.R Porto Guayuyaco Sede Principal | E.D.R Porto Guayuyaco Sede Principal | 0 | 4 | 1 |
| Huila | Acevedo | ID26. Institución Educativa Bateas | Bateas | 0 | 5 | 5 |
| Nariño | Pasto | ID1. I.E.M. Nuestra Señora De Guadalupe | I.E.M. Nuestra Señora De Guadalupe - Sede Principal | 0 | 5 | 0 |
| Nariño | El Rosario | ID8. Centro Educativo La Claudia | Centro Educativo La Claudia | 0 | 1 | 0 |
| Nariño | Cumbal | ID36. Institución Educativa Inmaculada Concepción De Tallambi | Institución Educativa Inmaculada Concepcion De Tallambi | 5 | 0 | 7 |
| Nariño | Barbacoas | ID87. Institución Educativa Teraimbe | Sede 9 Cumainde | 0 | 1 | 2 |
| Nariño | Barbacoas | ID110. Institución Educativa Teraimbe | Sede 2 Bombón | 0 | 2 | 1 |
| Nariño | Ipiales | ID142. Institución Educativa Agroindustrial Los Pastos | Escuela Las Cruces | 0 | 5 | 1 |
| Nariño | Mallama (Piedrancha) | ID149. Centro Educativo Mallama | Centro Educativo De Mallama | 0 | 1 | 1 |
| Putumayo | Puerto Asís | ID41.I. E. Rur Caucacia | Esc Rur Mix El Jardin Alto Teteye | 1 | 0 | 1 |
| Putumayo | Puerto Asís | ID57. I. E. Rur Caucacia | Esc Rur Mix El Progreso | 1 | 0 | 1 |
| Putumayo | Pto Leguízamo | ID88. IE Rur Luis Vidales Del Piñuña Negro | ESC RUR MIX PUERTO PRINCIPE DOS | 0 | 1 | 1 |
| Putumayo | Orito | ID127. Institucion Etnoeducativa Rural Umada Wuarrara | ESC RUR MIX ALTO ORITO | 1 | 0 | 1 |
| Putumayo | Puerto Asís | ID172. IE. Rur Caucacia - Sede Principal | SEDE PRINCIPAL | 0 | 6 | 12 |

- **Avance General Componente I:** Terminado 04/04/2024 y recibido
- **Avance General Componente II:** En Ejecución, con inicio 18 de 18.

| Estado | Proyectos |
|---|---|
| Entregados | 17 |
| Terminados | 1 |
| Ejecución | 0 |
| Sin iniciar | 0 |

- **Sede ID125. Piamonte (Cauca),** En energización (ampliación de carga por baja tensión) por la empresa ENERGIA DEL PUTUMAYO, revisión técnica desde el 17/12/2024, reiteración 27/12/2024.

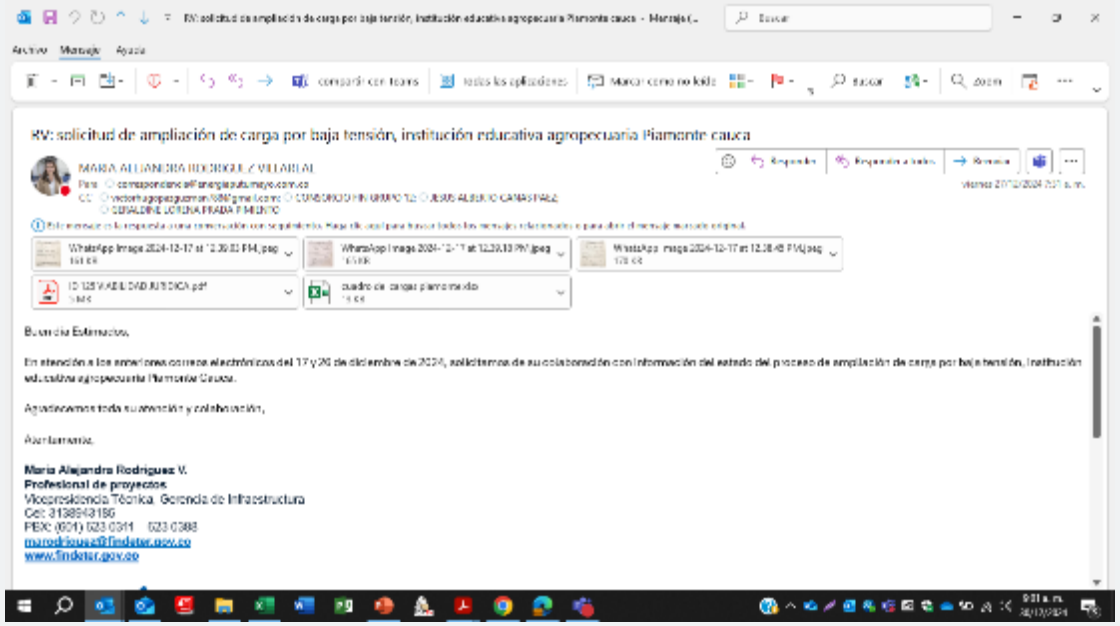


- **Sede ID36. Tallambi (Nariño),** Entregada al rector y comunidad el 26/12/2024

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

## ID1 Pasto, I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - ENTREGADO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Pasto - Nariño |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 262.132.882 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 986 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aulas | 5 | • Mejoramiento y mantenimiento de cubiertas, mampostería (estructura principal y de confinamiento), pisos en general, carpintería metálica y red eléctrica general.<br>• construcción de dos cubiertas para protección de losas existentes y cambio de cubierta en tres aulas de clase, reemplazo de canales. |
| Aulas nuevas | N.A. | N.A. |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | N.A. | |
| Baterías sanitarias nuevas | N.A. | |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 15 de agosto de 2024 |

## Antes





## Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

## ID8 El Rosario, CENTRO EDUCATIVO LA CLAUDIA - ENTREGADO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | El Rosario - Nariño |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 66.208.426 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 8 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aulas | 1 | • Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general.<br>• construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias. |
| Aulas nuevas | N.A. | N.A. |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | N.A. | |
| Baterías sanitarias nuevas | N.A. | |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 24 de junio de 2024 |

## Antes







## Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

## ID26 Acevedo, INSTITUCION EDUCATIVA BATEAS - ENTREGADO

| MUNICIPIO | | Acevedo - Huila |
|---|---|---|
| VALOR DE INVERSIÓN | | $ 278.705.701 |
| POBLACIÓN BENEFICIADA | | 193 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aulas | 5 | • Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general.<br>• construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias.<br>• Mejoramiento de restaurante escolar |
| Aulas nuevas | N.A. | N.A. |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | 1 | • Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general.<br>• construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias. |
| Baterías sanitarias nuevas | N.A. | |
| FECHA DE ENTREGA | | 4 de octubre de 2024 – en proceso de posventas y entrega |

## Antes







## Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

## ID27 Piamonte, ESCUELA RURAL MIXTA LA ESPANOLA - ENTREGADO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Piamonte - Cauca |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 82.111.341 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 9 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aulas | 1 | • Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general.<br>• construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias. |
| Aulas nuevas | N.A. | N.A. |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | 1 | • Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general.<br>• construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias. |
| Baterías sanitarias nuevas | N.A. | |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 5 de julio de 2024 |

## Antes





## Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

## ID88 Puerto Leguízamo, ESC RUR MIX PUERTO PRINCIPE DOS - ENTREGADO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Puerto Leguizamo - Putumayo |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 117.694.769 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 5 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aulas | 1 | • Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general.<br>• construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias. |
| Aulas nuevas | N.A. | N.A. |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | 1 | • Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general.<br>• construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias. |
| Baterías sanitarias nuevas | N.A. | |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 1 de agosto de 2024 |

## Antes





## Después











CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

## ID121 Piamonte, ESC RUR MIX SAN ANDRESITO - ENTREGADO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Puerto Leguizamo - Putumayo |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 117.694.769 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 5 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aulas | 1 | • Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general.<br>• construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias. |
| Aulas nuevas | N.A. | N.A. |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | 1 | • Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general.<br>• construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias. |
| Baterías sanitarias nuevas | N.A. | |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 1 de agosto de 2024 |

## Antes





## Después









# Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

## ID142 Ipiales, ESCUELA LAS CRUCES - ENTREGADO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Ipiales - Nariño |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 112.235.014 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 173 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aulas | 5 | • Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general.<br>• construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias. |
| Aulas nuevas | N.A. | N.A. |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | 1 | • Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general.<br>• construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias. |
| Baterías sanitarias nuevas | N.A. | |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 22 de julio de 2024 |

### Antes



### Después







CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

## ID149 Mallama (Piedrancha), CENTRO EDUCATIVO DE MALLAMA - ENTREGADO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Ipiales - Nariño |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 57.066.573 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 9 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aulas | 1 | • Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general.<br>• construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias + muro de cerramiento |
| Aulas nuevas | N.A. | N.A. |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | 1 | • Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica. |
| Baterías sanitarias nuevas | N.A. | |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 19 de junio de 2024 |

### Antes



### Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

## ID174 Piamonte, E.D.R PORTO GUAYUYACO SEDE PRINCIPAL - ENTREGADO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Piamonte - Cauca |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 214.447.888 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 33 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aulas | 4 | • Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general.<br>• construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias + aula múltiple |
| Aulas nuevas | N.A. | N.A. |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | 1 | • Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica. |
| Baterías sanitarias nuevas | N.A. | |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 16 de agosto de 2024 |

### Antes





### Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

## ID87 Barbacoas, SEDE 9 CUMAINDE - ENTREGADO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Barbacoas - Nariño |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 97.200.260 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 15 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aulas | 1 | • Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general.<br>• construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias + aula múltiple |
| Aulas nuevas | N.A. | N.A. |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | 1 | • Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica. |
| Baterías sanitarias nuevas | N.A. | |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 17 de septiembre de 2024 |

### Antes





### Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

## ID110 Barbacoas, SEDE 2 BOMBON - ENTREGADO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Barbacoas - Nariño |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 135.500.591 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 39 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aulas | 2 | • Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general.<br>• construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias + aula múltiple |
| Aulas nuevas | N.A. | N.A. |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | 1 | • Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica. |
| Baterías sanitarias nuevas | N.A. | |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 17 de septiembre de 2024 |

## Antes





## Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

## ID173 Piamonte, ESC RUR MIX FRAY EZEQUIEL - ENTREGADO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Piamonte - Cauca |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 193.112.465 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 24 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aula múltiple | 1 | • Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general.<br>• construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias |
| Aulas nuevas | N.A. | N.A. |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | N.A | |
| Baterías sanitarias nuevas | 1 | • Ejecutada dentro del aula |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 6 de septiembre de 2024 |

## Antes





## Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID36 Cumbal, INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCION DE TALLAMBI – ENTREGADO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Cumbal - Nariño |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 818.394.560 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 171 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aula | N.A. | |
| Aulas nuevas | 5 | |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | N.A | |
| Baterías sanitarias nuevas | 7 | |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 26 de diciembre de 2024 |

## Antes






## Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID41 Puerto Asís, I. E. RUR CAUCACIA, ESC RUR MIX EL JARDIN ALTO TETEYE – ENTREGADO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Puerto Asís - Putumayo |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 184.632.555 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 5 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aula | N.A. | |
| Aulas nuevas | 1 | Instalación eléctrica fotovoltaica |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | N.A | |
| Baterías sanitarias nuevas | 1 | |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 3 de diciembre de 2024 |

## Antes





## Después











CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID57 Puerto Asís, I. E. RUR CAUCACIA, ESC RUR MIX EL PROGRESO – ENTREGADO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Puerto Asís - Putumayo |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 197.031.005 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 6 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aula | N.A. | |
| Aulas nuevas | 1 | Instalación eléctrica fotovoltaica |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | N.A | |
| Baterías sanitarias nuevas | 1 | |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 3 de diciembre de 2024 |

## Antes





## Después









# Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID125 Piamonte, INST EDUC AGRIC PIAMONTE (sede principal) – TERMINADO


| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Piamonte - Cauca |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 1.339.389.729 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 850 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aula | 28 | Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general. construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias. |
| Aulas nuevas | N.A | |
| Mejoramientos Baterías sanitarias + 1 ducha | 3 | Mejoramiento en preescolar + circulación, cerramiento y cubierta en domo |
| Baterías sanitarias nuevas | N.A | |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 3 de diciembre de 2024 |

## Antes





## Después

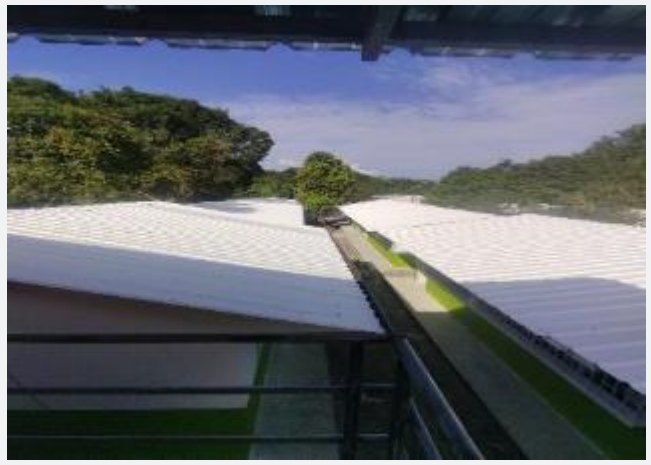







# Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID127 Orito, INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL UMADA WUARRARA, MIX ALTO ORITO – ENTREGADO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Orito - Putumayo |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 206.821.177 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 13 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aula | N.A | |
| Aulas nuevas | 1 | Instalación eléctrica fotovoltaica |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | N.A | |
| Baterías sanitarias nuevas | 1 | |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 3 de diciembre de 2024 |

## Antes





## Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID172 Puerto Asís, IE. RUR CAUCACIA - SEDE PRINCIPAL– ENTREGADO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Puerto Asís - Putumayo |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 224.052.916 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 161 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aulas (2 internado + 4 aulas) | 6 | |
| Aulas nuevas | N.A | |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | 12 | • Se incluyo estructura de tanques para mejorar la columna de agua en zonas húmedas en internado por solicitud de comunidad. |
| Baterías sanitarias nuevas | N.A | |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 3 de diciembre de 2024 |

## Antes






## Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Compromisos



Findeter

Banca de Desarrollo Territorial

# GRACIAS

www.findeter.gov.co

@findetercol @findetercol

@findeter linkedin.com/company/findeter

VIGILADO

Hacienda

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Bogotá D.C.,

Ingeniera
**DIANA MILENA MALDONADO TORRES**
Supervisora del Contrato Ministerio de Educación Nacional - MEN
dmaldonado@mineducacion.gov.co
Calle 43 # 57-14 Piso 3
Bogotá D.C.

**Ref:** **Contrato No. NO. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER**. Cuyo Objeto es "BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES PRIORITARIAS EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR DE LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS QUE SEAN DEFINIDAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN"

**Asunto**: Remisión Informe Mensual No. 20 / Contrato No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023

Estimada Doctora:

Me permito remitir el Informe de Gestión y ejecución No. 20 correspondiente al periodo de 02 de enero al 01 de febrero de 2025, en cumplimiento de las obligaciones descritas en el anexo al contrato de la referencia.

Así mismo, y en caso de estar de acuerdo solicitamos amablemente emitir la aprobación de éste para soporte al Patrimonio Autónomo FINDETER MEN Aulas Móviles por Ola Invernal (Fiduciaria POPULAR S.A) con la siguiente información:

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MEN
AULAS MÓVILES POR OLA INVERNAL
Fiduciaria Popular S.A.
Carrera 13A No. 29-24 Pisos 20, 21 y 24
Bogotá

Cordialmente,

**HERNÁN PARDO BOTERO**
Gerente de Infraestructura[GB]

*Anexo lo enunciado*
*Elaboró: Geraldine Lorena Prada Pimiento- Profesional de la Gerencia de Infraestructura*
*Revisó: Jesús Alberto Cañas Páez – Gestor de la Gerencia de Infraestructura*

# CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023

## ATENCIÓN DE NECESIDADES PRIORITARIAS EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR DE LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS

**Periodo comprendido entre el 02 de enero al 01 de febrero de 2025**

**Bogotá D.C.**

## TABLA DE CONTENIDO


1. **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO MARCO**
2. **ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO**
   - 2.1 OBLIGACIONES GENERALES
   - 2.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS
   - 2.3 ACTIVIDADES PRECONTRACTUALES
     - 2.3.1 Obligaciones
   - 2.4 ACTIVIDADES CONTRACTUALES
     - 2.4.1 Obligaciones
   - 2.5 ACTIVIDADES DE CIERRE Y LIQUIDACIÓN
     - 2.5.1 Obligaciones
3. **RESUMEN GENERAL DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL CONTRATO**
4. **ANEXOS**

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO MARCO

| | | |
|---|---|---|
| Objeto General: | Brindar Asistencia Técnica y Administración de Recursos para atender las necesidades prioritarias en infraestructura y dotación de mobiliario escolar de las sedes educativas afectadas por la temporada de lluvias que sean definidas por el Ministerio de Educación. | |
| Numero de Contrato: | CO1.PCCNTR. 4917031 | |
| Integrantes: | MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - MEN Y LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER | |
| Fecha de suscripción: | 05 de mayo de 2023 | |
| Perfeccionamiento | Póliza garantía aprobada 26 de mayo de 2023<br>Registro Presupuestal 02 de junio de 2023 | |
| Fecha de Inicio: | 02 de junio de 2023 | |
| Fecha de Terminación: | 01 de julio de 2025 | |
| Modificaciones: | Modificatorio No. 1.<br>Modificar la cláusula cuarta - plazo de ejecución del contrato, la cual quedará de la siguiente manera:<br>"El plazo previsto para la ejecución del Contrato Interadministrativo será a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, hasta el 01 de noviembre de 2024, plazo en el que se debe llevar a cabo la ejecución física del contrato y la liquidación de la contratación derivada que suscriba FINDETER." | |
| | Modificatorio No. 2.<br>"Prorrogar el plazo de ejecución del contrato número CO1.PCCNTR.4917031 de 2023, hasta el 01 de julio de 2025, plazo en el que se debe culminar la ejecución física de las obras de infraestructura educativa, dotación de aulas nuevas por reposición, y la liquidación de la contratación derivada suscrita por FINDETER." | |
| Aportes: | Valor de los recursos a administrar para la ejecución de los proyectos | $ 59.485.981.308 |
| | Porcentaje de Asistencia Técnica y Administración de Recursos a reconocer a FINDETER (7%) | $ 4.164.018.692 |
| Valor final del Contrato: | | $ 63.650.000.000 |
| Sociedad Fiduciaria: | FIDUCIARIA POPULAR S.A. | |

## 1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO

### 1.1 OBLIGACIONES GENERALES

1. *Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas en este contrato.*

En el transcurso del periodo actual, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. (FINDETER) asume con responsabilidad la tarea integral de estructurar, desarrollar y dar seguimiento a todas las actividades derivadas de la ejecución de las diversas obligaciones estipuladas en el contrato vigente. En virtud de su compromiso, FINDETER se esfuerza por cumplir con cada una de las responsabilidades asignadas, garantizando que cada etapa del contrato sea llevada a cabo de manera exitosa y en plena conformidad con los términos y condiciones acordadas previamente.

Es importante destacar que el compromiso de FINDETER no se limita únicamente a la ejecución técnica del contrato, sino que abarca también la garantía de la calidad y la excelencia en cada una de las etapas del proceso. La entidad se esfuerza por mantener altos estándares de rendimiento, asegurando que los resultados obtenidos sean de la más alta calidad posible y estén alineados con los objetivos y metas establecidas.

2. *Participar y apoyar al Ministerio de Educación Nacional en todas las reuniones periódicas a las que este lo convoque relacionadas con la ejecución del contrato que permitan realizar seguimiento integral a los avances de los proyectos.*

Durante el presente periodo FINDETER participó activamente y brindó el pleno apoyo al Ministerio de Educación Nacional en todas las reuniones periódicas a las que se convocaron, especialmente, aquellas relacionadas con la ejecución del contrato. FINDETER está comprometido con realizar un seguimiento integral y detallado de los avances del proyecto, por lo que se establecieron reuniones cada martes en la tarde a través del aplicativo Teams, reuniones programadas por FINDETER sobre las que realizan grabaciones y se informa los avances semanales.

Las fechas de las reuniones de seguimiento del periodo, sobre las cuales se realiza el acta correspondiente, la cual se adjunta al presente informe:

1. 23 de enero del 2025

3. *Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la información objeto del presente contrato.*

FINDETER ha dispuesto todos los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la información objeto del presente contrato. La seguridad y confidencialidad de la información son de suma importancia, y se ha implementado medidas sólidas para garantizar su protección. Esto incluye la implementación de sistemas de almacenamiento seguro, protocolos de acceso restringido y medidas de respaldo que aseguran que la información esté resguardada de manera adecuada en todo momento. La prioridad es mantener la integridad de la información involucrada en el contrato, así mismo se habilitó los espacios adecuados en la Calle 103 No. 19-20 y en la segunda sede localizada en la Calle 104 # 18ª-65, piso 6 para tal fin.

4. *Entregar a EL MINISTERIO, periódicamente y al finalizar el contrato, o cuando el supervisor o interventor lo solicite, todos los documentos y archivos (físicos y electrónicos) a su cargo y que se produzcan en ejecución de sus obligaciones, lo anterior, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes en el Ministerio de Educación Nacional.*

Durante este periodo, FINDETER ha cumplido rigurosamente con la entrega de todos los documentos y archivos electrónicos que el MEN ha solicitado durante la ejecución del contrato. Esta entrega se realiza de manera periódica y al finalizar el contrato, tal como establecen las normas y disposiciones vigentes en el Ministerio de Educación Nacional. Además, en concordancia con las regulaciones vigentes, también se proporcionará dicha documentación cuando el supervisor o interventor así lo solicite. La prioridad es asegurar que todas las partes involucradas tengan acceso a la información necesaria y que cumplan con todas las obligaciones contractuales en cuanto a la entrega y custodia de documentación.

5. *Colaborar en el suministro y respuesta de la información correspondiente a los requerimientos efectuados por los organismos de control del Estado Colombiano o cualquier otra autoridad, en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato y de asuntos relacionados con el mismo.*

   En este periodo, FINDETER ha colaborado plenamente en el suministro y respuesta de toda la información correspondiente a los requerimientos efectuados por los Entes de Control del Estado Colombiano y cualquier otra autoridad pertinente. La cooperación en este sentido es absoluta y FINDETER está comprometido en proporcionar toda la información necesaria relacionada con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato, así como en asuntos relacionados con el mismo.

   Cumplir con los requisitos de los Entes de Control y las autoridades es fundamental para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en todas las acciones. La disposición a colaborar asegura que el proceso se realice de manera adecuada y en línea con las regulaciones y requerimientos establecidos por las autoridades correspondientes.

6. *Utilizar la imagen del Ministerio de Educación Nacional de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorización expresa y escrita de las partes ningún funcionario, podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole.*

   FINDETER ha seguido rigurosamente los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional en relación con el uso de su imagen. FINDETER es consciente de que, salvo autorización expresa y escrita de las partes involucradas, ningún funcionario puede utilizar el nombre, emblema o sello oficial del Ministerio con fines publicitarios o de cualquier otra índole. La colaboración se adhiere estrictamente a estas directrices para asegurar el respeto mutuo y la integridad en la utilización de la imagen y la identidad del Ministerio. Durante este periodo no se realizaron trámites que contengan la imagen del Ministerio de Educación Nacional.

7. *Guardar estricta confidencialidad sobre toda la información y los documentos obtenidos del MEN.*

   FINDETER ha mantenido una estricta confidencialidad sobre toda la información y los documentos obtenidos del Ministerio de Educación Nacional (MEN). Reconoce la importancia de salvaguardar la información confidencial y sensible proporcionada por el MEN, y se ha implementado medidas rigurosas para garantizar su protección. Se cumple con todas las regulaciones y acuerdos de confidencialidad establecidos para asegurar que la información no sea divulgada ni utilizada de manera inapropiada. El compromiso de FINDETER es mantener la integridad y confidencialidad de la información en todo momento.

8. *Realizar los pagos al SISS (salud, pensión y riesgos laborales), de acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago correspondientes.*

En el presente periodo, se han realizado los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral (SISS), incluyendo Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de acuerdo con la normatividad vigente.

Además, se pueden proporcionar los soportes de pago correspondientes como parte del compromiso con la legalidad y el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales. Cumplir con los requerimientos del SISS es fundamental para asegurar el bienestar de los colaboradores y garantizar el cumplimiento de las regulaciones pertinentes, lideradas por el área de gestión respectiva y validadas por la revisoría fiscal, soportes que serán presentados en el momento en el que se requiera.

## 1.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

a. *Presentar ante EL MINISTERIO dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes Al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (inicio SECOP), el cronograma de ejecución del objeto del Contrato Interadministrativo.*

FINDETER presentó en el periodo pasado ante el Ministerio de Educación Nacional, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (inicio SECOP), el cronograma actualizado de ejecución del objeto del Contrato Interadministrativo. FINDETER reconoce la importancia de establecer un cronograma claro y detallado para la ejecución de las actividades contractuales, y se ha cumplido con este requisito de manera oportuna. La intención es garantizar una planificación efectiva y transparente de las actividades a llevar a cabo, en consonancia con las regulaciones y directrices establecidas por el Ministerio.

b. *Crear una vez suscrito y legalizado el Contrato Interadministrativo, una cuenta contable para manejo exclusivo de los recursos de este Contrato Interadministrativo dentro del Patrimonio Autónomo constituido para tal fin por FINDETER.*

Una vez suscrito y legalizado el Contrato Interadministrativo, FINDETER ha creado una cuenta contable exclusiva para el manejo de los recursos de este contrato dentro del Patrimonio Autónomo constituido por FINDETER para tal fin. Se da cumplimiento a todos los requisitos y medidas establecidas para asegurar la correcta gestión financiera de los recursos relacionados con el Contrato Interadministrativo. La creación de esta cuenta contable específica en el Patrimonio Autónomo garantiza una administración transparente y adecuada de los recursos, en línea con las normativas y regulaciones pertinentes.

Por lo anteriormente mencionado, se crea la Cuenta de Ahorros No. 500-80465045-0 del Banco Popular para manejo exclusivo de los recursos de este contrato y respectivos reportes contables. Cabe recordar que, se adjuntó al Informe de Gestión N° 1 la Certificación de la Cuenta Bancaria.

Mediante correo electrónico del 24 de octubre de 2023, el MEN remitió oficio por parte del Ministerio de Hacienda, mediante el cual se oficializó la exención de gravamen financiero (GMF) de la cuenta del Patrimonio Autónomo. El cual se adjuntó en informes pasados.

c. *Administrar los recursos que transfiera EL MINISTERIO a través del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres- FNGRD a FINDETER a través del Patrimonio Autónomo constituido para cumplir con el objeto del presente contrato.*

FINDETER ha administrado de manera responsable los recursos que EL MINISTERIO ha transferido a través del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) a FINDETER, utilizando

el PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN AULAS MÓVILES POR OLA INVERNAL constituido por la Fiducia Mercantil FIDUCIARIA POPULAR S.A. para cumplir con el objeto del presente contrato.

El enfoque ha sido garantizar una gestión eficiente y transparente de los recursos para cumplir con los objetivos establecidos en el contrato. El uso adecuado de estos recursos es esencial para asegurar la ejecución exitosa de las actividades y proyectos acordados, en línea con las regulaciones y directrices establecidas por todas las partes involucradas.

d. *Presentar Informes mensuales y un informe final de ejecución financiera y técnica del presente Contrato, conforme los recursos aportados por EL FNGRD,*

Para el presente periodo, se presentará un informe mensual de ejecución financiera por el área de Negocios Fiduciarios de FINDETER y se ha presentado un informe técnico del presente contrato, conforme a los recursos aportados por el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD).

Estos informes son una parte integral de la transparencia y rendición de cuentas en la ejecución del contrato. A través de estos informes, se ha proporcionado una visión detallada de la utilización de los recursos, los avances técnicos logrados y otros aspectos relevantes de la ejecución del contrato. Cumplir con la presentación de estos informes es esencial para mantener una comunicación clara y abierta con EL MINISTERIO y garantizar que todas las partes estén informadas sobre el progreso y los resultados del contrato.

e. *El Patrimonio Autónomo — FINDETER deberá reintegrar mensualmente los rendimientos financieros (si los hubiere) a la Dirección del Tesoro Nacional o en los términos que establezca la normatividad aplicable, es decir, que no ingresan ni hacen parte del Patrimonio Autónomo constituido por FINDETER.*

El Patrimonio Autónomo - FINDETER reintegrará mensualmente los rendimientos financieros a la Dirección del Tesoro Nacional o en los términos que establezca la normatividad aplicable. Estos rendimientos financieros no ingresan ni hacen parte del Patrimonio Autónomo constituido por FINDETER, y la gestión de reintegro se realizará previa solicitud al Ministerio con el fin de que se informe la cuenta bancaria a la cual se debe realizar el mismo.

Este proceso de reintegro asegura la correcta gestión de los rendimientos generados por los recursos aportados y garantiza que estos sean manejados de acuerdo con las regulaciones y normativas pertinentes. De esta manera, se cumple con los requerimientos legales y se mantiene la transparencia en la administración financiera.

Para lo anterior, el 28 de agosto de 2023 se informa por el MEN la cuenta bancaria para el reintegro de rendimientos financieros del Contrato No. CO1.PCCNTR.4917031 la cual se indica a continuación:

| | |
|---|---|
| Entidad Financiera: | **Banco BBVA** |
| Tipo de Cuenta: | **Ahorros** |
| Número de Cuenta: | **309-054583** |
| Nombre de la cuenta: | **FIDUPREVISORA S.A FNGRD – COLOMBIA VITAL** |

## 1.3 ACTIVIDADES PRECONTRACTUALES

### 1.3.1 Obligaciones:

a. *Realizar la viabilización técnica y jurídica de los predios priorizados por EL MINISTERIO, cuando sea necesario y sea solicitado por el MEN.*

Durante el presente periodo, se llevó a cabo la viabilización técnica y jurídica priorizada por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) cada vez que ha sido necesario y solicitado por el MEN. La colaboración en este aspecto es esencial para asegurar que los predios sean evaluados y viabilizados de manera adecuada para cumplir con los requisitos técnicos necesarios. El compromiso es facilitar un proceso fluido y eficiente para que los predios sean utilizados de acuerdo con los objetivos y necesidades de cada Institución Educativa, siempre en línea con las regulaciones y disposiciones vigentes.

Durante el periodo, se finalizó la evaluación técnica y predial y que en resumen se describe a continuación en las siguientes tablas:

**RESUMEN EVALUACIÓN TÉCNICA DE SEDES**

| UNIFICACIÓN DE LISTADOS: INICIAL (150) + ADICIONALES (42) | |
|---|---|
| **SEDES VIABLES TÉCNICAMENTE** | **150** |

**RESUMEN EVALUACIÓN JURÍDICA DE SEDES**

| SEDES TOTAL (150) | |
|---|---|
| SIN DOCUMENTOS | 1 * |
| POSIBLE VIABILIDAD | 0 ** |
| NO VIABLE | 9 |
| **VIABLES TÉCNICA Y JURÍDICAMENTE** | **140** |
| TOTAL | 150 |

* Sin Documentos:

- Falta de documentos para evidenciar la propiedad y reciprocidad en la revisión y remisión de documentos por la ETC y/o rectores

** Posible Viabilidad:

- Falta documentación soporte para continuar con revisión
- Pendientes gestiones con terceros para saneamiento predial
- Trámites para obtención de sana posesión

Asimismo, en el presente periodo, el listado actualizado de sedes focalizadas son las siguientes:

| Consecutivo | ID MEN No. | Departamento | ETC | Municipio | IE | SEDE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | **Nariño** | PASTO | **Pasto** | I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE | I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - SEDE PRINCIPAL |
| 2 | 2 | **Córdoba** | CORDOBA | **Tuchín** | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ALVARO ULCUE CHOCUE | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ALVARO ULCUE CHOCUE |
| 3 | 3 | **Cauca** | CAUCA | **Bolívar** | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA NUESTRA SENORA DE LOS REMEDIOS | COLEGIO DEPARTAMENTAL NUESTRA SENORA DE LOS REMEDIOS |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | Cesar | VALLEDUPAR | Valledupar | INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ | IE ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ |
| 5 | 6 | Bolívar | BOLIVAR | Barranco de Loba | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR | I.E.T.A. LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR - SEDE PRINCIPAL |
| 6 | 7 | Santander | SANTANDER | Vélez | COLEGIO UNIVERSITARIO | COLEGIO UNIVERSITARIO |
| 7 | 8 | Nariño | NARIÑO | El Rosario | CENTRO EDUCATIVO LA CLAUDIA | CENTRO EDUCATIVO LA CLAUDIA |
| 8 | 9 | Bolívar | BOLIVAR | Barranco de Loba | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR | ATASCOZA |
| 9 | 10 | Bolívar | BOLIVAR | Barranco de Loba | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR | LOS CERRITOS |
| 10 | 11 | Guajira | LA GUAJIRA | Manaure | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | ESCUELA RURAL INDÍGENA KARALOUTAMANA |
| 11 | 12 | Cauca | CAUCA | Toribío | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PLAYA | CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO LA PLAYA - SEDE PRINCIPAL |
| 12 | 13 | Magdalena | MAGDALENA | Concordia | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE BASICA Y MEDIA SANTA CRUZ DE BALSAMO | ERM DE BALSAMO |
| 13 | 14 | Magdalena | MAGDALENA | Concordia | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE BASICA Y MEDIA SANTA CRUZ DE BALSAMO | JAR INF MIS PRIMEROS SUEÑOS |
| 14 | 16 | Cauca | CAUCA | Santander de Quilichao | INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO | DOMINGUILLO (sede principal) |
| 15 | 17 | Santander | SANTANDER | Betulia | INSTITUCION EDUCATIVA EL RAMO | CENTRO EDUCATIVO SANTA BARBARA |
| 16 | 18 | Atlántico | SOLEDAD | Soledad | INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO | INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE PRINCIPAL |
| 17 | 20 | Bolívar | BOLIVAR | Morales | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PALMA | LA ARCADIA |
| 18 | 22 | Cauca | CAUCA | El Tambo | I.E. HUISITO | HUISITO (sede principal) |
| 19 | 24 | Magdalena | MAGDALENA | El Banco | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ANTONIO NARIÑO | CENT EDUC RUR MIX JOSE DE LA PAZ VANEGA ORTIZ |
| 20 | 26 | Huila | HUILA | Acevedo | INSTITUCION EDUCATIVA BATEAS | BATEAS |
| 21 | 27 | Cauca | CAUCA | Piamonte | CENTRO EDUCATIVO PUERTO GUAYUYACO | ESCUELA RURAL MIXTA LA ESPANOLA |
| 22 | 28 | Córdoba | CORDOBA | Cotorra | INSTITUCION EDUCATIVA LOS AGUACATES | CENT EDUC LOS AGUACATES |
| 23 | 29 | Bolívar | BOLIVAR | Mompós | INSTITUCIÒN EDUCATIVA TÈCNICA AMBIENTAL DE TIERRA FIRME | I.E.T.A. AMBIENTAL DE TIERRA FIRME - SEDE PRINCIPAL |
| 24 | 30 | Cesar | CESAR | Curumaní | INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES | INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES |
| 25 | 32 | Magdalena | MAGDALENA | El Banco | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL SILVIA COTES DE BISWELL | ERM SANTA TERESA DE ISLITA |
| 27 | 34 | Guajira | RIOHACHA | Riohacha | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA #7 | APÜNIMA´ANA1 |
| 28 | 36 | Nariño | NARIÑO | Cumbal | INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCION DE TALLAMBI | INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCION DE TALLAMBI |
| 29 | 41 | Putumayo | PUTUMAYO | Puerto Asís | I. E. RUR CAUCACIA | ESC RUR MIX EL JARDIN ALTO TETEYE |
| 30 | 42 | Antioquia | ANTIOQUIA | Ciudad Bolívar | I. E. JOSE MARIA HERRAN | C. E. R. PAULINA PUERTA |
| 31 | 43 | Bolívar | BOLIVAR | San Martín de Loba | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA PESQUERA LEONIDAS ORTIZ ALVEAR DE CHIMÍ | PLAN BONITO |
| 32 | 44 | Cauca | CAUCA | La Vega | INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA SANTA RITA | INSTITUCION EDUCATIVA SANTA RITA (sede principal) |
| 33 | 45 | Cesar | CESAR | La Paz(Robles) | CENTRO EDUCATIVO INDIGENA CAÑO PADILLA YUKPA | SEDE EL COSO |
| 34 | 46 | Cauca | CAUCA | Balboa | C.E. BUENOS AIRES | CAPITANES |
| 35 | 48 | Cesar | VALLEDUPAR | Valledupar | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ | INSTITUTO TECNICO COMERCIAL JOSE EUGENIO MARTINEZ |
| 36 | 49 | Bolívar | BOLIVAR | Mompós | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DEL CHICAGUA | SAN LUIS |
| 37 | 50 | Guajira | MAICAO | Maicao | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2 | SEDE LA CAMPANA |
| 38 | 51 | Guajira | MAICAO | Maicao | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6 | YAMAIN - SEDE PRINCIPAL |
| 39 | 53 | Guajira | MAICAO | Maicao | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2 | SEDE KASICHE |
| 40 | 54 | Guajira | MAICAO | Maicao | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2 | SEDE WAYUUMA ANA |
| 41 | 56 | Arauca | ARAUCA | Saravena | CENTRO EDUCATIVO LA PAVA. | LA PAVA |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 57 | Putumayo | PUTUMAYO | Puerto Asís | I. E. RUR CAUCACIA | ESC RUR MIX EL PROGRESO |
| 43 | 58 | Cauca | CAUCA | Bolívar | INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO NUESTRA SENORA DEL CARMEN | CORRAL VIEJO |
| 44 | 59 | Cauca | CAUCA | Bolívar | INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO NUESTRA SENORA DEL CARMEN | NUESTRA SENORA DEL CARMEN (sede principal) |
| 45 | 60 | Guajira | RIOHACHA | Riohacha | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN | COOPERATIVO |
| 46 | 62 | Valle del Cauca | BUGA | Guadalajara de Buga | INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE | JHON F. KENNEDY |
| 47 | 64 | Atlántico | ATLANTICO | Galapa | INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA | INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA |
| 48 | 65 | Cauca | CAUCA | Balboa | I.E. OLAYA (ANTES C.E. OLAYA) | OLAYA (sede principal) |
| 49 | 66 | Antioquia | APARTADO | Apartadó | INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS | INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS |
| 50 | 67 | Tolima | TOLIMA | Santa Isabel | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BOLIVAR | LA HUMAREDA |
| 51 | 69 | Córdoba | CORDOBA | Planeta Rica | INSTITUCION EDUCATIVA LOMA AZUL | LOS CERROS |
| 52 | 70 | Córdoba | CORDOBA | Puerto Libertador | INSTITUCION EDUCATIVA PICA PICA VIEJO | ESC NVA LA SOLITA |
| 53 | 73 | Bolívar | BOLIVAR | Córdoba | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE TACAMOCHO | NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE TACAMOCHITO |
| 54 | 74 | Cesar | CESAR | El Paso | INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN | SEDE LA ESPERANZA |
| 55 | 75 | Cesar | CESAR | El Paso | INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN | SEDE EL VALLITO |
| 56 | 77 | Cesar | CESAR | El Paso | INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN | SEDE SAN ANGEL |
| 57 | 79 | Cesar | CESAR | El Paso | INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN | SEDE LA ESTACION |
| 58 | 83 | Atlántico | ATLANTICO | Repelón | INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS | INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS - SEDE PRINCIPAL |
| 59 | 84 | Atlántico | ATLANTICO | Repelón | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE VILLA ROSA | SEDE LA LOMA |
| 60 | 85 | Valle del Cauca | BUGA | Guadalajara de Buga | INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE | LA PLANTA |
| 61 | 86 | Antioquia | APARTADO | Apartadó | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO |
| 62 | 87 | Nariño | NARIÑO | BARBACOAS | INSTITUCION EDCUATIVA TERAIMBE | SEDE 9 CUMAINDE |
| 63 | 88 | Putumayo | PUTUMAYO | Puerto Leguízamo | IE RUR LUIS VIDALES DEL PIÑUÑA NEGRO | ESC RUR MIX PUERTO PRINCIPE DOS |
| 64 | 90 | Cauca | CAUCA | Bolívar | CENTRO EDUCATIVO EL TAMBO | LA FUENTE |
| 65 | 92 | Atlántico | ATLANTICO | Repelón | INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS | PITA |
| 66 | 93 | Cauca | CAUCA | Bolívar | INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CARMEN | EL CARMEN (sede principal) |
| 67 | 94 | Chocó | CHOCO | Carmen del Darién | CE PUEBLO NUEVO | CE PUEBLO NUEVO - SEDE PRINCIPAL |
| 68 | 95 | Guajira | RIOHACHA | Riohacha | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN | JOSE ANTONIO GALAN |
| 69 | 96 | Meta | VILLAVICENCIO | Villavicencio | INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO FRANCISCO ARANGO | ESCUELA SIETE DE AGOSTO |
| 70 | 97 | Cesar | CESAR | Curumaní | INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES | SEDE CHINELA |
| 71 | 98 | Cesar | CESAR | Curumaní | INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES | SEDE GUAIMARAL |
| 72 | 100 | Tolima | TOLIMA | Santa Isabel | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BOLIVAR | EL BRASIL |
| 73 | 101 | Cesar | CESAR | Curumaní | INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES | SEDE LOS SERRENOS |
| 74 | 103 | Córdoba | CORDOBA | Ayapel | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO | ESC NVA PARCELAS LONDRES |
| 75 | 104 | Cundinamarca | CUNDINAMARCA | Anolaima | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE HUGO ENCISO | ESCUELA RURAL EL DESCANSO |
| 76 | 105 | Chocó | CHOCO | Bahía Solano (Mutis) | IE LUIS LOPEZ DE MESA | SEDE DE SAN JOSE (HUACA) |
| 77 | 106 | Chocó | CHOCO | Bahía Solano (Mutis) | IE LUIS LOPEZ DE MESA | SEDE SIRENA DEL MAR |
| 78 | 107 | Chocó | CHOCO | Bahía Solano (Mutis) | IE LUIS LOPEZ DE MESA | SEDE SECUNDINO RIVAS |
| 79 | 110 | Nariño | NARIÑO | BARBACOAS | INSTITUCION EDUCATIVA TERAIMBE | SEDE 2 BOMBÓN |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 111 | Magdalena | MAGDALENA | Pueblo viejo | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS | ERM ISLA DE CATAQUITA |
| 81 | 112 | Magdalena | MAGDALENA | El Retén | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE | COL MPAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE |
| 82 | 113 | Magdalena | MAGDALENA | San Sebastián de Buenavista | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA | ERM MARIA AUXILIADORA |
| 83 | 114 | Magdalena | MAGDALENA | San Sebastián de Buenavista | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA | ERM LA PACHA |
| 84 | 117 | Guajira | RIOHACHA | Riohacha | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA #7 | WAKUAPAMANA |
| 85 | 118 | Antioquia | APARTADO | Apartadó | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO |
| 86 | 119 | Córdoba | CORDOBA | Montelíbano | INSTITUCION EDUCATIVA EL PALMAR | INSTITUCION EDUCATIVA EL PALMAR SEDE PRINCIPAL |
| 87 | 121 | Cauca | CAUCA | Piamonte | CENTRO EDUCATIVO PUERTO GUAYUYACO | ESC RUR MIX SAN ANDRESITO |
| 88 | 122 | Antioquia | TURBO | Turbo | I.E. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | E.U. JESUS MORA |
| 89 | 123 | Bolívar | BOLIVAR | Simití | INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CERRO DE VERACRUZ | CAMPO PAYARES |
| 90 | 124 | Bolívar | BOLIVAR | Simití | INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CERRO DE VERACRUZ | I.E. DEL CERRO DE VERACRUZ - SEDE PRINCIPAL |
| 91 | 125 | Cauca | CAUCA | Piamonte | INST EDUC AGRIC PIAMONTE | PIAMONTE (sede principal) |
| 92 | 126 | Magdalena | MAGDALENA | Pueblo viejo | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS | ERM EL TRIUNFO |
| 93 | 127 | Putumayo | PUTUMAYO | Orito | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL UMADA WUARRARA | ESC RUR MIX ALTO ORITO |
| 94 | 128 | Valle del Cauca | BUGA | Guadalajara de Buga | INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE | MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE - SEDE PRINCIPAL |
| 95 | 129 | Valle del Cauca | BUGA | Guadalajara de Buga | INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE | JULIAN MENDOZA GUERRERO |
| 96 | 130 | Valle del Cauca | BUGA | Guadalajara de Buga | INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE | LA HONDA |
| 97 | 132 | Norte de Santander | NORTE SANTANDER | La Playa | CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN PEDRO | SEDE LA PEÑA |
| 98 | 133 | Magdalena | MAGDALENA | El Banco | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL OSCAR PISCIOTTI NUMA | ERM INMACULADA CONCEPCION |
| 99 | 134 | Bolívar | BOLIVAR | María la Baja | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA | BUENOS AIRES |
| 100 | 135 | Bolívar | BOLIVAR | María la Baja | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA | I.E.T. AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA |
| 102 | 138 | Arauca | ARAUCA | Arauca | CENTRO EDUCATIVO MONSERRATE | CEAR MONSERRATE |
| 104 | 142 | Nariño | IPIALES | Ipiales | INSTITUCION EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL LOS PASTOS | ESCUELA LAS CRUCES |
| 105 | 143 | Guajira | LA GUAJIRA | Barrancas | CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL PROVINCIAL | CENTRO ETNOEDUCATIVO PROVINCIAL |
| 106 | 144 | Atlántico | SOLEDAD | Soledad | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE |
| 107 | 146 | Cesar | CESAR | Chimichagua | CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO | SEDE TRONCONAL |
| 108 | 147 | Cesar | CESAR | Chimichagua | CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO | SEDE PUERTO LA ESTANCIA |
| 109 | 148 | Cesar | CESAR | Chimichagua | CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO | SEDE TORRECILLA |
| 110 | 149 | Nariño | NARIÑO | Mallama (Piedrancha) | CENTRO EDUCATIVO MALLAMA | CENTRO EDUCATIVO DE MALLAMA |
| 111 | 150 | Chocó | CHOCO | Tadó | IE TECNICO AGROAMBIENTAL - MARIA AUXILIADORA | SEDE MARÍA AUXILIADORA DE MANUNGARA |
| 112 | 151 | Guajira | LA GUAJIRA | Maicao | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2 | SEDE LA ESTRELLA |
| 113 | 152 | Guajira | MAICAO | Maicao | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6 | YAMAIN - KASPOLIMANA |
| 114 | 153 | Guajira | LA GUAJIRA | Maicao | ESCUELA RURAL MIXTA TALOULUMA'ANA | ESCUELA RURAL MIXTA TALOULUMA'ANA |
| 115 | 154 | Magdalena | CIENAGA | Ciénaga | INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO |
| 116 | 156 | Magdalena | MAGDALENA | El Retén | INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE | SEDE CONC.ESC GENERAL GREGORIO GARZON |
| 117 | 158 | Valle del Cauca | BUGA | Guadalajara de Buga | INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE | SEDE CRISTOBAL COLON |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **118** | **161** | **Antioquia** | APARTADO | **Apartadó** | INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL GUINEO | CENTRO EDUCATIVO RURAL EL OSITO |
| **119** | **163** | **Cauca** | CAUCA | **La Vega** | I.E AGROPECUARIA SAN FRANCISCO JAVIER SEDE GARAY | I.E AGROPECUARIA SAN FRANCISCO JAVIER SEDE GARAY |
| **120** | **164** | **Cauca** | CAUCA | **Santander de Quilichao** | IE DOMINGUILLO | SEDE DOMINGO LASSO |
| **121** | **165** | **Cauca** | CAUCA | **Popayán** | IE COMUNEROS | Sede Principal |
| **122** | **172** | **Putumayo** | PUTUMAYO | **Puerto Asís** | E. RUR CAUCACIA - SEDE PRINCIPAL | Sede Principal |
| **123** | **173** | **Cauca** | CAUCA | **Piamonte** | ESC RUR MIX FRAY EZEQUIEL | ESC RUR MIX FRAY EZEQUIEL |
| **124** | **174** | **Cauca** | CAUCA | **Piamonte** | E.D.R PORTO GUAYUYACO SEDE PRINCIPAL | E.D.R PORTO GUAYUYACO SEDE PRINCIPAL |
| **125** | **175** | **Cauca** | CAUCA | **Rosas** | INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA | SANTA TERESITA (sede principal) |
| **126** | **178** | **Cauca** | CAUCA | **Rosas** | INSTITUCION EDUCATIVA MADRE CARIDAD BRADER | MADRE CARIDAD BRADER (sede principal) |
| **127** | **182** | **Cauca** | CAUCA | **Rosas** | INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO CORDOBA | LAS YERBAS |
| **128** | **183** | **Cauca** | CAUCA | **Rosas** | CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO LEON VALENCIA | LA DESPENSA |
| **129** | **184** | **Cauca** | CAUCA | **Rosas** | INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO CORDOBA | EL RETIRO |
| **130** | **186** | **Cauca** | CAUCA | **Rosas** | CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO LEON VALENCIA | EL ALTILLO |
| **131** | **187** | **Cauca** | CAUCA | **Rosas** | INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO CORDOBA | BELLAVISTA |
| **132** | **188** | **Cauca** | CAUCA | **Suarez** | IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA | Sede Principal |
| **133** | **189** | **Cauca** | CAUCA | **Suarez** | IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA | SEDE MARIA INMACULADA |
| **134** | **190** | **Cauca** | CAUCA | **Suarez** | IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA | SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER |
| **135** | **192** | **Atlántico** | SOLEDAD | **Soledad** | INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO | INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE CABICA |
| **136** | **194** | **Bolívar** | Bolívar | **Maria la Baja** | INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA AGROINDUSTRIAL DE FLAMENCO | EL NISPERO |
| **137** | **196** | **Atlántico** | Atlántico | **Malambo** | INSTITUCIÓN EDUCATIVA MESOLANDIA | Sede Principal |
| **138** | **202** | **Chocó** | CHOCO | **Tadó** | IE NORMAL SUPERIOR DEMETRIO SALAZAR CASTILLO | CENTRO EDUCATIVO ESCUELA FRANCISCO MIRANDA |
| **139** | **203** | **Antioquia** | TURBO | **Turbo** | IE SAN MARTIN DE PORRES | SEDE GONZALO MEJIA |

En este periodo es importante resaltar que, bajo este listado de sedes focalizadas para intervención técnica, ya se adelantó la verificación predial, la cual da como resultado 136 sedes a intervenir.

**Sedes despriorizar técnicamente:** se tuvo que despriorizar las siguientes 9 instituciones educativas de los siguientes grupos:

| GRUPO | ID MEN | Departamento | ETC | Municipio | IE | SEDE | OBERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **55** | Chocó | **CHOCO** | Tadó | **IE TECNICO AGROAMBIENTAL** | SEDE CAMPO ALEGRE | En un principio, la sede priorizada en el municipio de Tadó era la sede la sede Campo Alegre. Esta perteneciente a la IE Técnico Agroambiental, la cual actualmente cuenta con una matrícula según el Sistema Integrado de Matricula -Simat de 40 estudiantes; no obstante, en la etapa de viabilidad técnica y jurídica adelantada por el contratista designado por Findeter determinó que esta sede presentaba limitaciones técnicas, normativas y |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | administrativas por estar en zona de riesgo por inundación, por lo que se recomendó no efectuar intervención alguna. |
| | **120** | Antioquia | **TURBO** | Turbo | **I.E. DE DESARROLLO RURAL DE TURBO** | E.U. SANTISIMA TRINIDAD | Se tramito la exclusión del anexo "Listado de Instituciones Educativas Priorizadas por el MEN" a la sede IE. DE DESARROLLO RURAL DE TURBO EU SANTÍSIMA TRINIDAD., reemplazándola por la SEDE GONZALO MEJIA perteneciente a la IE. SAN MARTIN DE PORRES, ubicada en el municipio de Turbo, Antioquia en el marco del contrato de obra No. PAF-MENAM-O-049-2023 y contrato de interventoría No. PAF-MENAM-I-052-2023<br><br>Frente a lo anterior, es importante indicar en el presente concepto que, la solicitud se realiza enmarcada en el lineamiento dado por el Ministerio de Educación Nacional – MEN en Comité Técnico No. 30 No. CO1.PCCNTR.4917031 DE 2023 PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN AULAS MÓVILES POR OLA INVERNAL, de fecha 24 de enero de 2024 |
| **2** | **91** | Atlántico | **ATLANTICO** | Palmar de Varela | **INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL DE PALMAR DE VARELA** | JOSE MARIA CORDOBA | Esta institución Educativa se tuvo que despriorizar porque ya estaba intervenida por la gobernación de Atlántico |
| | **191** | Atlántico | **ATLANTICO** | Luruaco | **IE CORREGIMIENTO DE SAN JUAN DE TOCAGUA** | CORREGIMIENTO DE SAN JUAN DE TOCAGUA | Se despriorizo esta institución educativa, debido a que el MEN define que esta IE seria intervenida por el FFIE |
| **4** | **71** | Bolívar | **BOLIVAR** | Córdoba | **INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE TACAMOCHO** | TACAMOCHO (SEDE PRIMARIA) | Esta sede tuvo que ser despriorizada, debido a que en el año 2015 ante esta situación la Corporación autónoma ambiental Cormagdalena, mediante Contrato Interadministrativo 0-0019 de 2015 suscrito con la Universidad Nacional de Colombia, elabora un estudio del cual se destaca la siguiente consideración general: "A partir de este análisis se puede considerar que Tocomocho se encuentra ubicado, prácticamente en la |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | mitad del río, bajo la amenaza de inundaciones y procesos erosivos que se pueden activar en cualquier época". |
| | **139** | Magdalena | **MAGDALENA** | San Sebastián de Buenavista | **INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE TRONCOSO** | ERM DE JAIME | Esta sede tuvo que ser despriorizada, conforme a una recopilación de datos realizada por el contratista, JASA LTDA propone tener en cuenta que la ERM Jaime requiere una altura de palafito de 1,7 m, lo cual genera la construcción de acceso al aula, definida en el alcance contractual, de una infraestructura que debe contemplar el ingreso a toda la institución, siendo necesario la construcción de toda la sede con el fin de poder hacer funcional su ingreso.<br>La interventoría, CONSORCIO INTER EDUCATIVO G4 considera que no se deben realizar obras de infraestructura de mejoramiento y/o construcción, debido a lo planteado por el contratista y a que los mejoramientos no tendrían estabilidad por efectos de los daños que ocasionará la inundación y la construcción debe ser de toda la institución con palafitos de 1,70 m, lo cual supera el alcance contractual. |
| **9** | **33** | Capital Bogotá, D.C | BOGOTA | Bogotá, D.C. | **COLEGIO LA CHUCUA (IED)** | CENT EDUC DIST LA CHUCUA | Sede retirada mediante comité técnico No. 70 y comité fiduciario No. 45. |
| | **136** | Capital Bogotá, D.C. | BOGOTA | Bogotá, D.C. | **COLEGIO ESTRELLA DEL SUR (IED)** | COL DIST ESTRELLA DEL SUR | Sede retirada mediante comité técnico No. 70 y comité fiduciario No. 45. |
| | **141** | Santander | BARRANCABERMEJA | Barrancabermeja | **CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN** | CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN | Sede retirada mediante comité técnico No. 70 y comité fiduciario No. 45. |

De acuerdo con lo anterior se hace la inclusión de las siguientes 4 sedes educativas para tener un resultado total de intervención de 136 sedes educativas:

| ID MEN | Departamento | ETC | Municipio | IE | SEDE |
|---|---|---|---|---|---|
| 202 | Chocó | CHOCO | Tadó | IE NORMAL SUPERIOR DEMETRIO SALAZAR CASTILLO | CENTRO EDUCATIVO ESCUELA FRANCISCO MIRANDA |
| 203 | Antioquia | TURBO | Turbo | IE SAN MARTIN DE PORRES | SEDE GONZALO MEJIA |
| 196 | Atlántico | Atlántico | Malambo | INSTITUCIÓN EDUCATIVA MESOLANDIA | Sede Principal |
| 194 | Bolívar | Bolívar | Maria la Baja | INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA AGROINDUSTRIAL DE FLAMENCO | EL NISPERO |

La viabilización jurídica de los predios priorizados por el Ministerio se realiza de manera eficiente, siempre que sea necesario y solicitado por el Ministerio de Educación Nacional (MEN). Es un paso fundamental para garantizar el adecuado desarrollo de proyectos educativos y el cumplimiento de los objetivos establecidos por el MEN, de acuerdo con lo anterior, en este periodo quedo la verificación predial y técnica así:

| SEDES TOTAL INICIAL (150) | |
|---|---|
| SIN DOCUMENTOS | 1 * |
| POSIBLE VIABILIDAD | 0 ** |
| NO VIABLE | 9 |
| **VIABLES TÉCNICA Y JURÍDICAMENTE** | **140** |
| TOTAL | 150 |

| SEDES NUEVAS A PRIORIZAR (9) | |
|---|---|
| POSIBLE VIABILIDAD | 1 * |
| **VIABLES JURÍDICAMENTE** | 8 |
| TOTAL | 9 |

| SEDES PRIORIZACIÓN ACTUALIZADA (136) | |
|---|---|
| SEDES INICIALMENTE PRIORIZADAS | 141 |
| SEDES DESPRIORIZADAS | 9 |
| SEDES NUEVAS INCLUIDAS | 4 |
| **TOTAL** | **136** |

b. *En consideración a que los proyectos a atender por este contrato se ejecutaran en el marco del Decreto de Emergencia, FINDETER debe acudir a lo establecido en su manual de contratación que permita que los procesos de selección sean eficientes y puedan ser proyectos de respuesta rápida.*

FINDETER implementa en el marco de lo establecido en el Manual Operativo la contratación que permita la ejecución eficiente de los procesos de selección que permita pluralidad de oferentes, asimismo, durante el proceso de ejecución, se ha establecido en la estructuración, la necesidad de optimizar tiempos de respuesta rápidos con sistemas constructivos industrializados.

c. *Elaborar los Estudios Previos e insumos precontractuales para la contratación de las obras y suministros necesarios para atender las necesidades prioritarias en infraestructura y dotación de mobiliario escolar de las sedes educativas afectadas por la temporada de lluvias que sean definidas por el Ministerio de Educación. Así como las interventorías correspondientes, solicitando que se*

*acaten los principios que rigen la contratación pública, incluyendo la solicitud de las respectivas garantías que ampare cada contrato con siguientes riesgos: anticipo (si lo hubiere), calidad, cumplimiento, estabilidad de la obra, salarios y prestaciones sociales, responsabilidad civil extracontractual y todo riesgo de construcción, según sea aplicable.*

## Proyectos en proceso de estructuración

Se han elaborado los Estudios Previos e insumos precontractuales necesarios para la contratación de obras y suministros dirigidos a atender las necesidades prioritarias en infraestructura y dotación de mobiliario escolar en las sedes educativas afectadas por la temporada de lluvias, para apertura de las diferentes convocatorias, tal como ha sido definido por el Ministerio de Educación. Estos estudios y documentos precontractuales son esenciales para establecer las bases de las futuras contrataciones y asegurar la correcta ejecución de los proyectos.

Además, se ha solicitado que, en la contratación de las obras y suministros, así como en las interventorías correspondientes, se respeten los principios que rigen la contratación pública. Esto garantiza la transparencia, la igualdad de oportunidades y la eficiencia en los procesos de contratación.

Asimismo, se ha requerido la inclusión de las garantías correspondientes para amparar los diferentes riesgos asociados a cada contrato. Estas garantías incluyen aspectos como el anticipo, la calidad de la obra, el cumplimiento de los plazos, la estabilidad de la construcción, los salarios y prestaciones sociales de los trabajadores, la responsabilidad civil extracontractual y los posibles riesgos de construcción. Esto proporciona seguridad tanto para la entidad contratante como para los contratistas y contribuye a la adecuada ejecución de los proyectos en línea con las normativas y estándares requeridos.

En el presente periodo se establece definitivamente la estructuración y la contratación de los grupos de contratación de acuerdo con el siguiente listado:

| GRUPO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | ID MEN No. | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SEDE | VR. TOTAL AULAS Y MEJORAMIENTO | VR. INTERVENTORÍA | VR. TOTAL OBRA + INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antioquia | Apartadó | 66 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS | INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS | 624.000.000 | 46.800.000 | 670.800.000 |
| | | | 86 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO | 291.200.000 | 21.840.000 | 313.040.000 |
| | | | 118 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO | 661.678.027 | 49.625.852 | 711.303.879 |
| | | | 161 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL GUINEO | CENTRO EDUCATIVO RURAL EL OSITO | 403.329.013 | 30.249.676 | 433.578.689 |
| | | Turbo | 120 | I.E. DE DESARROLLO RURAL DE TURBO | E.U. SANTISIMA TRINIDAD | 312.000.000 | 23.400.000 | 335.400.000 |
| | | | 122 | I.E. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | E.U. JESUS MORA | 499.200.000 | 37.440.000 | 536.640.000 |
| | | Ciudad Bolívar | 42 | I. E. JOSE MARIA HERRAN | C. E. R. PAULINA PUERTA | 124.800.000 | 9.360.000 | 134.160.000 |
| | Chocó | Carmen del Darién | 94 | CE PUEBLO NUEVO | CE PUEBLO NUEVO - SEDE PRINCIPAL | 522.668.285 | 39.200.121 | 561.868.406 |
| | | Tadó | 55 | IE TECNICO AGROAMBIENTAL | SEDE CAMPO ALEGRE | 266.693.962 | 20.002.047 | 286.696.010 |
| | | | 150 | IE TECNICO AGROAMBIENTAL | SEDE MARÍA AUXILIADORA DE MANUNGARA | 124.800.000 | 9.360.000 | 134.160.000 |
| 2 | Atlántico | Galapa | 64 | INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA | INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA | 624.000.000 | 46.800.000 | 670.800.000 |

| GRUPO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | ID MEN No. | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SEDE | VR. TOTAL AULAS Y MEJORAMIENTO | VR. INTERVENTORÍA | VR. TOTAL OBRA + INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Palmar de Varela | 91 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL DE PALMAR DE VARELA | JOSE MARIA CORDOBA | 561.600.000 | 42.120.000 | 603.720.000 |
| | | Repelón | 83 | INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS | INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS - SEDE PRINCIPAL | 332.800.000 | 24.960.000 | 357.760.000 |
| | | | 84 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE VILLA ROSA | SEDE LA LOMA | 229.439.280 | 17.207.946 | 246.647.226 |
| | | | 92 | INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS | PITA | 220.727.086 | 16.554.531 | 237.281.617 |
| | | Soledad | 18 | INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO | INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE PRINCIPAL | 665.600.000 | 49.920.000 | 715.520.000 |
| | | | 144 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE | 915.200.000 | 68.640.000 | 983.840.000 |
| | | | 192 | INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO | INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE CABICA | 372.384.464 | 27.928.835 | 400.313.298 |
| | | Luruaco | 191 | IE CORREGIMIENTO DE SAN JUAN DE TOCAGUA | CORREGIMIENTO DE SAN JUAN DE TOCAGUA | 249.600.000 | 18.720.000 | 268.320.000 |
| 3 | Magdalena | Ciénaga | 154 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO | 1.414.400.000 | 106.080.000 | 1.520.480.000 |
| | | El Retén | 112 | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE | COL MPAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE | 2.801.018.341 | 210.076.376 | 3.011.094.717 |
| | | | 156 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE | SEDE CONC.ESC GENERAL GREGORIO GARZON | 436.800.000 | 32.760.000 | 469.560.000 |
| | | Puebloviejo | 111 | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS | ERM ISLA DE CATAQUITA | 83.200.000 | 6.240.000 | 89.440.000 |
| | | | 126 | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS | ERM EL TRIUNFO | 166.400.000 | 12.480.000 | 178.880.000 |
| 4 | Bolívar | Córdoba | 71 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE TACAMOCHO | TACAMOCHO (SEDE PRIMARIA) | 447.519.640 | 33.563.973 | 481.083.613 |
| | | | 73 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE TACAMOCHO | NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE TACAMOCHITO | 493.484.507 | 37.011.338 | 530.495.845 |
| | | Mompós | 29 | INSTITUCIÒN EDUCATIVA TÈCNICA AMBIENTAL DE TIERRA FIRME | I.E.T.A. AMBIENTAL DE TIERRA FIRME - SEDE PRINCIPAL | 1.125.688.392 | 84.426.629 | 1.210.115.022 |
| | | | 49 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DEL CHICAGUA | SAN LUIS | 340.577.024 | 25.543.277 | 366.120.301 |
| | Magdalena | San Sebastián de Buenavista | 113 | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA | ERM MARIA AUXILIADORA | 488.073.254 | 36.605.494 | 524.678.748 |
| | | | 114 | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA | ERM LA PACHA | 623.194.392 | 46.739.579 | 669.933.972 |
| | | | 139 | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE TRONCOSO | ERM DE JAIME | 161.669.820 | 12.125.237 | 173.795.057 |
| 5 | Bolívar | Barranco de Loba | 6 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR | I.E.T.A. LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR - SEDE PRINCIPAL | 468.319.640 | 35.123.973 | 503.443.613 |
| | | | 9 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR | ATASCOZA | 364.668.644 | 27.350.148 | 392.018.792 |
| | | | 10 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR | LOS CERRITOS | 296.559.820 | 22.241.987 | 318.801.807 |
| | | San Martín de Loba | 43 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA PESQUERA LEONIDAS ORTIZ ALVEAR DE CHIMÍ | PLAN BONITO | 233.285.404 | 17.496.405 | 250.781.809 |
| | Cesar | Chimichagua | 146 | CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO | SEDE TRONCONAL | 133.346.981 | 10.001.024 | 143.348.005 |
| | | | 147 | CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO | SEDE PUERTO LA ESTANCIA | 130.159.820 | 9.761.987 | 139.921.807 |
| | | | 148 | CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO | SEDE TORRECILLA | 124.800.000 | 9.360.000 | 134.160.000 |

| GRUPO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | ID MEN No. | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SEDE | VR. TOTAL AULAS Y MEJORAMIENTO | VR. INTERVENTORÍA | VR. TOTAL OBRA + INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Curumaní | 30 | INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES | INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES | 603.200.000 | 45.240.000 | 648.440.000 |
| | | | 97 | INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES | SEDE CHINELA | 83.200.000 | 6.240.000 | 89.440.000 |
| | | | 98 | INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES | SEDE GUAIMARAL | 124.800.000 | 9.360.000 | 134.160.000 |
| | | | 101 | INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES | SEDE LOS SERRENOS | 83.200.000 | 6.240.000 | 89.440.000 |
| | Magdalena | Concordia | 13 | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE BASICA Y MEDIA SANTA CRUZ DE BALSAMO | ERM DE BALSAMO | 485.009.460 | 36.375.710 | 521.385.170 |
| | | | 14 | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE BASICA Y MEDIA SANTA CRUZ DE BALSAMO | JAR INF MIS PRIMEROS SUEÑOS | 161.669.820 | 12.125.237 | 173.795.057 |
| | | El Banco | 24 | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ANTONIO NARIÑO | CENT EDUC RUR MIX JOSE DE LA PAZ VANEGA ORTIZ | 546.091.802 | 40.956.885 | 587.048.688 |
| | | | 32 | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL SILVIA COTES DE BISWELL | ERM SANTA TERESA DE ISLITA | 244.487.366 | 18.336.552 | 262.823.918 |
| | | | 133 | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL OSCAR PISCIOTTI NUMA | ERM INMACULADA CONCEPCION | 192.455.361 | 14.434.152 | 206.889.513 |
| 6 | Cesar | El Paso | 74 | INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN | SEDE LA ESPERANZA | 291.200.000 | 21.840.000 | 313.040.000 |
| | | | 75 | INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN | SEDE EL VALLITO | 145.600.000 | 10.920.000 | 156.520.000 |
| | | | 77 | INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN | SEDE SAN ANGEL | 65.079.910 | 4.880.993 | 69.960.903 |
| | | | 79 | INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN | SEDE LA ESTACION | 132.643.683 | 9.948.276 | 142.591.959 |
| | | La Paz (Robles) | 45 | CENTRO EDUCATIVO INDIGENA CAÑO PADILLA YUKPA | SEDE EL COSO | 150.447.043 | 11.283.528 | 161.730.571 |
| | | Valledupar | 4 | INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ | IE ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ | 457.600.000 | 34.320.000 | 491.920.000 |
| | | | 48 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ | INSTITUTO TECNICO COMERCIAL JOSE EUGENIO MARTINEZ | 956.800.000 | 71.760.000 | 1.028.560.000 |
| 7 | Guajira | Barrancas | 143 | CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL PROVINCIAL | CENTRO ETNOEDUCATIVO PROVINCIAL | 249.600.000 | 18.720.000 | 268.320.000 |
| | | Maicao | 50 | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2 | SEDE LA CAMPANA | 499.200.000 | 37.440.000 | 536.640.000 |
| | | | 51 | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6 | YAMAIN - SEDE PRINCIPAL | 62.400.000 | 4.680.000 | 67.080.000 |
| | | | 53 | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2 | SEDE KASICHE | 339.830.481 | 25.487.286 | 365.317.767 |
| | | | 54 | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2 | SEDE WAYUUMA ANA | 127.479.910 | 9.560.993 | 137.040.903 |
| | | | 151 | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2 | SEDE LA ESTRELLA | 314.679.910 | 23.600.993 | 338.280.903 |
| | | | 152 | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6 | YAMAIN - KASPOLIMANA | 252.966.903 | 18.972.518 | 271.939.421 |
| | | | 153 | ESCUELA RURAL MIXTA TALOULUMA'ANA | ESCUELA RURAL MIXTA TALOULUMA'ANA | 857.226.526 | 64.291.989 | 921.518.516 |
| | | Manaure | 11 | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | ESCUELA RURAL INDÍGENA KARALOUTAMANA | 190.566.903 | 14.292.518 | 204.859.421 |
| | | Riohacha | 34 | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA #7 | APÜNIMA´ANA1 | 252.279.910 | 18.920.993 | 271.200.903 |
| | | | 60 | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN | COOPERATIVO | 416.000.000 | 31.200.000 | 447.200.000 |
| | | | 95 | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN | JOSE ANTONIO GALAN | 374.400.000 | 28.080.000 | 402.480.000 |
| | | | 117 | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA #7 | WAKUAPAMANA | 224.079.460 | 16.805.960 | 240.885.420 |
| 8 | Bolívar | María la Baja | 134 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA | BUENOS AIRES | 249.600.000 | 18.720.000 | 268.320.000 |
| | | | 135 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA | I.E.T. AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA | 1.800.127.638 | 135.009.573 | 1.935.137.211 |

| GRUPO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | ID MEN No. | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SEDE | VR. TOTAL AULAS Y MEJORAMIENTO | VR. INTERVENTORÍA | VR. TOTAL OBRA + INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Córdoba | Ayapel | 103 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO | ESC NVA PARCELAS LONDRES | 220.984.367 | 16.573.828 | 237.558.194 |
| | | Cotorra | 28 | INSTITUCION EDUCATIVA LOS AGUACATES | CENT EDUC LOS AGUACATES | 124.800.000 | 9.360.000 | 134.160.000 |
| | | Montelíbano | 119 | INSTITUCION EDUCATIVA EL PALMAR | ESCUELA NUEVA MIXTA DIVINO SALVADOR | 745.087.893 | 55.881.592 | 800.969.485 |
| | | Planeta Rica | 69 | INSTITUCION EDUCATIVA LOMA AZUL | LOS CERROS | 430.464.507 | 32.284.838 | 462.749.345 |
| | | Puerto Libertador | 70 | INSTITUCION EDUCATIVA PICA PICA VIEJO | ESC NVA LA SOLITA | 254.085.404 | 19.056.405 | 273.141.809 |
| | | Tuchín | 2 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ALVARO ULCUE CHOCUE | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ALVARO ULCUE CHOCUE | 1.074.838.830 | 80.612.912 | 1.155.451.742 |
| 9 | Arauca | Arauca | 138 | CENTRO EDUCATIVO MONSERRATE | CEAR MONSERRATE | 299.239.730 | 22.442.980 | 321.682.710 |
| | | Saravena | 56 | CENTRO EDUCATIVO LA PAVA. | LA PAVA | 83.200.000 | 6.240.000 | 89.440.000 |
| | Bolívar | Morales | 20 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PALMA | LA ARCADIA | 83.200.000 | 6.240.000 | 89.440.000 |
| | | Simití | 123 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CERRO DE VERACRUZ | CAMPO PAYARES | 232.352.784 | 17.426.459 | 249.779.243 |
| | | | 124 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CERRO DE VERACRUZ | I.E. DEL CERRO DE VERACRUZ - SEDE PRINCIPAL | 595.799.550 | 44.684.966 | 640.484.516 |
| | Capital Bogotá, D.C. | Bogotá, D.C. | 33 | COLEGIO LA CHUCUA (IED) | CENT EDUC DIST LA CHUCUA | 332.800.000 | 24.960.000 | 357.760.000 |
| | | | 136 | COLEGIO ESTRELLA DEL SUR (IED) | COL DIST ESTRELLA DEL SUR | 166.400.000 | 12.480.000 | 178.880.000 |
| | Cundinamarca | Anolaima | 104 | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE HUGO ENCISO | ESCUELA RURAL EL DESCANSO | 190.313.503 | 14.273.513 | 204.587.016 |
| | Meta | Villavicencio | 96 | INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO FRANCISCO ARANGO | ESCUELA SIETE DE AGOSTO | 924.437.134 | 69.332.785 | 993.769.919 |
| | Norte de Santander | La Playa | 132 | CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN PEDRO | SEDE LA PEÑA | 41.600.000 | 3.120.000 | 44.720.000 |
| | Santander | Barrancabermeja | 141 | CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN | CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN | 494.421.269 | 37.081.595 | 531.502.864 |
| | | Betulia | 17 | INSTITUCION EDUCATIVA EL RAMO | CENTRO EDUCATIVO SANTA BARBARA | 62.400.000 | 4.680.000 | 67.080.000 |
| | | Vélez | 7 | COLEGIO UNIVERSITARIO | COLEGIO UNIVERSITARIO | 926.718.332 | 69.503.875 | 996.222.206 |
| | Tolima | Santa Isabel | 67 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BOLIVAR | LA HUMAREDA | 188.797.003 | 14.159.775 | 202.956.778 |
| | | | 100 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BOLIVAR | EL BRASIL | 188.797.003 | 14.159.775 | 202.956.778 |
| 10 | Cauca | Santander de Quilichao | 16 | INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO | DOMINGUILLO (sede principal) | 1.235.282.193 | 92.646.164 | 1.327.928.358 |
| | | | 164 | IE DOMINGUILLO | SEDE DOMINGO LASSO | 124.800.000 | 9.360.000 | 134.160.000 |
| | | Suarez | 188 | IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA | SEDE PRINCIPAL | 790.400.000 | 59.280.000 | 849.680.000 |
| | | | 189 | IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA | SEDE MARIA INMACULADA | 1.225.093.375 | 91.882.003 | 1.316.975.378 |
| | | | 190 | IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA | SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | 374.400.000 | 28.080.000 | 402.480.000 |
| | | Toribío | 12 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PLAYA | CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO LA PLAYA - SEDE PRINCIPAL | 338.159.820 | 25.361.987 | 363.521.807 |
| | Chocó | Bahía Solano (Mutis) | 105 | IE LUIS LOPEZ DE MESA | SEDE DE SAN JOSE (HUACA) | 148.792.381 | 11.159.429 | 159.951.810 |
| | | | 106 | IE LUIS LOPEZ DE MESA | SEDE SIRENA DEL MAR | 41.600.000 | 3.120.000 | 44.720.000 |
| | | | 107 | IE LUIS LOPEZ DE MESA | SEDE SECUNDINO RIVAS | 291.200.000 | 21.840.000 | 313.040.000 |
| | Valle del Cauca | Guadalajara de Buga | 62 | INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE | JHON F. KENNEDY | 540.800.000 | 40.560.000 | 581.360.000 |
| | | | 85 | INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE | LA PLANTA | 204.237.183 | 15.317.789 | 219.554.972 |
| | | | 128 | INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE | MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE - SEDE PRINCIPAL | 166.400.000 | 12.480.000 | 178.880.000 |
| | | | 129 | INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE | JULIAN MENDOZA GUERRERO | 208.000.000 | 15.600.000 | 223.600.000 |

| GRUPO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | ID MEN No. | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SEDE | VR. TOTAL AULAS Y MEJORAMIENTO | VR. INTERVENTORÍA | VR. TOTAL OBRA + INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 130 | INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE | LA HONDA | 164.153.683 | 12.311.526 | 176.465.209 |
| | | | 158 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE | SEDE CRISTOBAL COLON | 162.637.183 | 12.197.789 | 174.834.972 |
| 11 | Cauca | Balboa | 46 | C.E. BUENOS AIRES | CAPITANES | 83.200.000 | 6.240.000 | 89.440.000 |
| | | | 65 | I.E. OLAYA (ANTES C.E. OLAYA) | OLAYA (sede principal) | 416.000.000 | 31.200.000 | 447.200.000 |
| | | Bolívar | 3 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA NUESTRA SENORA DE LOS REMEDIOS | COLEGIO DEPARTAMENTAL NUESTRA SENORA DE LOS REMEDIOS | 436.800.000 | 32.760.000 | 469.560.000 |
| | | | 58 | INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO NUESTRA SENORA DEL CARMEN | CORRAL VIEJO | 127.479.910 | 9.560.993 | 137.040.903 |
| | | | 59 | INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO NUESTRA SENORA DEL CARMEN | NUESTRA SENORA DEL CARMEN (sede principal) | 299.239.730 | 22.442.980 | 321.682.710 |
| | | | 90 | CENTRO EDUCATIVO EL TAMBO | LA FUENTE | 191.162.093 | 14.337.157 | 205.499.250 |
| | | | 93 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CARMEN | EL CARMEN (sede principal) | 62.400.000 | 4.680.000 | 67.080.000 |
| | | El Tambo | 22 | I.E. HUISITO | HUISITO (sede principal) | 1.041.842.757 | 78.138.207 | 1.119.980.964 |
| | | La Vega | 44 | INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA SANTA RITA | INSTITUCION EDUCATIVA SANTA RITA (sede principal) | 166.400.000 | 12.480.000 | 178.880.000 |
| | | | 163 | I.E AGROPECUARIA SAN FRANCISCO JAVIER SEDE GARAY | I.E AGROPECUARIA SAN FRANCISCO JAVIER SEDE GARAY | 177.904.227 | 13.342.817 | 191.247.044 |
| | | Popayán | 165 | IE COMUNEROS | SEDE PRINCIPAL | 457.600.000 | 34.320.000 | 491.920.000 |
| | | Rosas | 175 | INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA | SANTA TERESITA (sede principal) | 790.400.000 | 59.280.000 | 849.680.000 |
| | | | 178 | INSTITUCION EDUCATIVA MADRE CARIDAD BRADER | MADRE CARIDAD BRADER (sede principal) | 124.800.000 | 9.360.000 | 134.160.000 |
| | | | 182 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO CORDOBA | LAS YERBAS | 83.200.000 | 6.240.000 | 89.440.000 |
| | | | 183 | CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO LEON VALENCIA | LA DESPENSA | 62.400.000 | 4.680.000 | 67.080.000 |
| | | | 184 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO CORDOBA | EL RETIRO | 83.200.000 | 6.240.000 | 89.440.000 |
| | | | 186 | CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO LEON VALENCIA | EL ALTILLO | 62.400.000 | 4.680.000 | 67.080.000 |
| | | | 187 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO CORDOBA | BELLAVISTA | 62.400.000 | 4.680.000 | 67.080.000 |
| 12 | Cauca | Piamonte | 27 | CENTRO EDUCATIVO PUERTO GUAYUYACO | ESCUELA RURAL MIXTA LA ESPANOLA | 62.400.000 | 4.680.000 | 67.080.000 |
| | | | 121 | CENTRO EDUCATIVO PUERTO GUAYUYACO | ESC RUR MIX SAN ANDRESITO | 41.600.000 | 3.120.000 | 44.720.000 |
| | | | 125 | INST EDUC AGRIC PIAMONTE | PIAMONTE (sede principal) | 1.553.938.473 | 116.545.386 | 1.670.483.859 |
| | | | 173 | ESC RUR MIX FRAY EZEQUIEL | ESC RUR MIX FRAY EZEQUIEL | 195.752.201 | 14.681.415 | 210.433.616 |
| | | | 174 | E.D.R PORTO GUAYUYACO SEDE PRINCIPAL | E.D.R PORTO GUAYUYACO SEDE PRINCIPAL | 166.400.000 | 12.480.000 | 178.880.000 |
| | Huila | Acevedo | 26 | INSTITUCION EDUCATIVA BATEAS | BATEAS | 310.453.360 | 23.284.002 | 333.737.362 |
| | Nariño | BARBACOAS | 87 | INSTITUCION EDCUATIVA TERAIMBE | SEDE 9 CUMAINDE | 62.400.000 | 4.680.000 | 67.080.000 |
| | | | 110 | INSTITUCION EDUCATIVA TERAIMBE | SEDE 2 BOMBON | 124.800.000 | 9.360.000 | 134.160.000 |
| | | Cumbal | 36 | INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCION DE TALLAMBI | INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCION DE TALLAMBI | 764.787.529 | 57.359.065 | 822.146.593 |
| | | El Rosario | 8 | CENTRO EDUCATIVO LA CLAUDIA | CENTRO EDUCATIVO LA CLAUDIA | 62.400.000 | 4.680.000 | 67.080.000 |
| | | Ipiales | 142 | INSTITUCION EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL LOS PASTOS | ESCUELA LAS CRUCES | 208.000.000 | 15.600.000 | 223.600.000 |

| GRUPO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | ID MEN No. | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SEDE | VR. TOTAL AULAS Y MEJORAMIENTO | VR. INTERVENTORÍA | VR. TOTAL OBRA + INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Mallama (Piedrancha) | 149 | CENTRO EDUCATIVO MALLAMA | CENTRO EDUCATIVO DE MALLAMA | 62.400.000 | 4.680.000 | 67.080.000 |
| | | Pasto | 1 | I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE | I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - SEDE PRINCIPAL | 436.800.000 | 32.760.000 | 469.560.000 |
| | Putumayo | Orito | 127 | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL UMADA WUARRARA | ESC RUR MIX ALTO ORITO | 127.913.503 | 9.593.513 | 137.507.016 |
| | | Puerto Asís | 172 | E. RUR CAUCACIA - SEDE PRINCIPAL | SEDE PRINCIPAL | 249.600.000 | 18.720.000 | 268.320.000 |
| | | Puerto Asís | 41 | I. E. RUR CAUCACIA | ESC RUR MIX EL JARDIN ALTO TETEYE | 197.100.201 | 14.782.515 | 211.882.716 |
| | | | 57 | I. E. RUR CAUCACIA | ESC RUR MIX EL PROGRESO | 167.997.003 | 12.599.775 | 180.596.778 |
| | | Puerto Leguizamo | 88 | IE RUR LUIS VIDALES DEL PIÑUÑA NEGRO | ESC RUR MIX PUERTO PRINCIPE DOS | 124.800.000 | 9.360.000 | 134.160.000 |
| Total general | | | | | | 52.593.871.997 | 3.944.540.400 | 56.538.412.397 |

d. *Evaluar los proponentes, así como las propuestas presentadas para la construcción de las obras de infraestructura educativa e interventorías correspondientes y realizar la adjudicación y contratación de dichos procesos.*

Una vez concluidos los procesos de convocatoria y realizadas las evaluaciones exhaustivas de los proponentes y sus respectivas propuestas para la construcción de las obras de infraestructura educativa y las interventorías correspondientes, nos complace informar en este periodo que dichos procesos han llegado a su fin. Se ha llevado a cabo una rigurosa revisión bajo los parámetros establecidos en los Términos de Referencia, asegurando que se cumplan los lineamientos de contratación pública en términos de transparencia y equidad.

Gracias a este esfuerzo, se ha procedido con éxito a la adjudicación de los contratos, seleccionando a los proponentes que demostraron las mejores capacidades técnicas, financieras y operativas. Todos los grupos han sido debidamente contratados, lo que asegura que las obras se desarrollarán dentro de los plazos previstos y bajo los más altos estándares de calidad.

Nuestro compromiso con la excelencia en la ejecución de las obras y el adecuado control mediante las interventorías asegurará que estas infraestructuras aporten un valor significativo a la comunidad educativa, garantizando su correcto desarrollo y el bienestar de los beneficiarios.

## 1.4 ACTIVIDADES CONTRACTUALES

### 1.4.1 Obligaciones:

a. *Ejecutar a través de los contratistas seleccionados y hacer seguimiento a la calidad y entrega de las obras de infraestructura educativa diseñadas para atender las afectaciones a las sedes educativas priorizadas por el MEN.*

FINDETER, en concordancia con la naturaleza de los proyectos a abordar bajo el marco del Decreto de Emergencia, ha adelantado en el presente periodo la ejecución de diversas sedes educativas. Estos proyectos se han llevado a cabo mediante la colaboración de contratistas que fueron rigurosamente seleccionados a través de procedimientos transparentes y estructurados, conforme a lo estipulado en el Manual de Contratación de FINDETER.

La selección de contratistas no fue un proceso aleatorio, sino que siguió una serie de etapas bien definidas, que incluyeron la evaluación de capacidades técnicas, experiencia previa en proyectos similares, y solidez financiera. Este enfoque metodológico garantiza que los proyectos se ejecuten con altos estándares de calidad y dentro de los plazos establecidos, lo cual es crucial en contextos de emergencia donde la eficiencia y la efectividad son primordiales.

Adicionalmente, la supervisión y el monitoreo continuo de los avances de las obras permiten asegurar que se cumplan todas las normativas vigentes y que los recursos asignados se utilicen de manera óptima. FINDETER ha implementado mecanismos de control y seguimiento que incluyen auditorías periódicas y la utilización de tecnología para el seguimiento en tiempo real de las obras. Esto no solo brinda transparencia al proceso, sino que también facilita la identificación temprana de posibles inconvenientes y la implementación de medidas correctivas oportunas.

b. *Ejercer la vigilancia de los contratos de obra contratando las respectivas interventorías y ejercer la supervisión a los contratos de interventoría que se deriven del presente contrato.*

FINDETER adelantó en el presente periodo un riguroso ejercicio de vigilancia de los contratos de obra mediante la contratación de las respectivas interventorías. Esta medida se implementó con el objetivo de asegurar el adecuado desarrollo de los proyectos de infraestructura, en línea con los estándares de calidad y los plazos establecidos.

La contratación de interventorías y la posterior supervisión de sus actividades permitirán crear un sistema de verificación y seguimiento continuo, asegurando la transparencia en el proceso de ejecución de las obras y proporcionando un mecanismo de retroalimentación para la garantía de la calidad, la eficiencia y el cumplimiento de los estándares requeridos en las obras de infraestructura educativa, quedando así el resumen de este periodo:

| GRUPO | TIPO DE CONTRATO | CÓDIGO | DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS | FECHA DE ADJUDICACIÓN | CONTRATISTA | VALOR OFERTADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTERVENTORÍA | PAF-MENAM-I-052-2023 | Antioquia - Apartadó Antioquia - Turbo Antioquia - Ciudad Bolívar Chocó - Carmen del Darién Chocó - Tadó | 03/10/2023 | INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S | $271.455.247 | Entregado el 29 de octubre del 2024 |
| 1 | OBRA | PAF-MENAM-O-049-2023 | | 06/10/2023 | OBRAS CAPITAL S. A | $3.447.332.359 | Liquidado el 31 de enero del 2025 |
| 2 | INTERVENTORÍA | PAF-MENAM-I-053-2023 | Atlántico - Repelón Atlántico - Galapa Atlántico – Soledad - Atlántico - Palmar De Varela Atlántico - Luruaco | 26/09/2023 | RM INGENIEROS S.A.S. | $295.715.000 | Entregado el 15 de noviembre del 2024 |
| 2 | OBRA | PAF-MENAM-O-050-2023 | | 06/10/2023 | CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 | $4.044.124.630 | Entregado el 15 de noviembre del 2024 |
| 3 | INTERVENTORÍA | PAF-MENAM-I-054-2023 | Magdalena - Ciénaga Magdalena - El Retén Magdalena - Pueblo viejo | 26/09/2023 | CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3 | $351.774.412 | Liquidado el 20 de diciembre del 2024 |
| 3 | OBRA | PAF-MENAM-O-051-2023 | | 06/10/2023 | CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA | $4.744.960.153 | Liquidado el 01 de noviembre del 2024 |
| 4 | OBRA | PAF-MENAM-O-052-2023 | Bolívar - Córdoba Bolívar - Mompós Magdalena - San Sebastián de Buenavista | 20/09/2023 | JASA LTDA | $3.566.467.466 | Liquidado el 30 de septiembre del 2024 |
| 4 | INTERVENTORÍA | PAF-MENAM-I-055-2023 | | 26/09/2023 | CONSORCIO INTER EDUCATIVO G4 | $264.974.745 | Entregado 22 de marzo del 2024 |
| 5 | OBRA | PAF-MENAM-O-053-2023 | Bolívar - Barranco De Loba Magdalena - Concordia Magdalena - El Banco Cesar - Curumaní Bolívar - San Martín De Loba Cesar - Chimichagua | 03/10/2023 | CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5 | $4.102.044.984 | Terminado el 08 de noviembre del 2024 |
| 5 | INTERVENTORÍA | PAF-MENAM-I-056-2023 | | 06/10/2023 | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5 | $300.856.990 | Terminado el 08 de enero del 2025 |

| GRUPO | TIPO DE CONTRATO | CÓDIGO | DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS | FECHA DE ADJUDICACIÓN | CONTRATISTA | VALOR OFERTADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | OBRA | PAF-MENAM-O-056-2023 | Cesar - Valledupar<br>Cesar - La Paz<br>Cesar - El paso | 29/09/2023 | DAR ARQUITECTURA S.A. S | $2.102.352.000 | Liquidado el 20 de noviembre del 2024 |
| 6 | INTERVENTORÍA | PAF-MENAM-I-058-2023 | | 03/10/2023 | CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023 | $155.543.411 | Liquidado el 27 de noviembre del 2024 |
| 8 | OBRA | PAF-MENAM-O-055-2023 | Córdoba – Tuchín Córdoba – Cotorra Córdoba - Planeta Rica Córdoba - Puerto Libertador Córdoba – Ayapel Córdoba - Montelíbano Bolívar - María la Baja | 29/09/2023 | DAR ARQUITECTURA S.A. S | $4.706.470.280 | Entregado 21 de agosto del 2024 |
| 8 | INTERVENTORÍA | PAF-MENAM-I-057-2023 | | 13/10/2023 | LUIS GUILLERMO NARVÁEZ RICARDO | $297.097.668 | Entregado 21 de agosto del 2024 |
| 7 | OBRA | PAF-ATMEN5-O-036-2024 | Guajira – Manaure Guajira – Rioacha Guajira - Maicao Guajira - Barrancas | 19/03/2024 | Consorcio Guajira 7 | 4.158.777.879 | Terminado el 17 de enero del 2025 |
| 7 | INTERVENTORÍA | PAF-MENAM-I-059-2023 | | 17/04/2024 | GERMÁN ADOLFO PERDOMO PACHÓN | 295.239.000 | Terminado el 17 de enero del 2025 |
| 9 | OBRA | PAF-ATMEN5-O-037-2024 | Santander - Vélez, Betulia, Barrancabermeja Bolívar – Morales Bogotá Arauca - Saravena -Arauca Tolima - Santa Isabel Meta – Villavicencio Cundinamarca – Anolaima Bolívar – Simiti Norte de Santander - La Playa | 19/03/2024 | CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9 | 4.810.476.306 | Etapa 2 |
| 9 | INTERVENTORÍA | PAF-ATMEN5-I-064-2024 | | 28/06/2023 | CONSORCIO SAN GABRIEL | 313.800.000 | Etapa 2 |
| 10 | OBRA | PAF-MENAM-O-080-2023 | Cauca - Suárez<br>Cauca - Santander De Quilichao<br>Chocó - Bahía Solano<br>Cauca – Toribío<br>Valle Del Cauca - Guadalajara De Buga | 23/11/2023 | CONSORCIO FIN GRUPO 10 | $6.014.978.800 | Etapa 2 |
| 10 | INTERVENTORÍA | PAF-MENAM-I-062-2023 | | 15/12/2023 | CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO | $327.496.568 | Etapa 2 |
| 11 | OBRA | PAF-MENAM-O-079-2023 | Cauca - El Tambo<br>Cauca - La Vega<br>Cauca - Balboa<br>Cauca - Popayán<br>Cauca - Rosas | 27/11/2023 | CONSORCIO FIN GRUPO 11 | $ 4.728.021.810 | Terminado el 27 de noviembre del 2024 |
| 11 | INTERVENTORÍA | PAF-MENAM-I-063-2023 | | 22/12/2023 | CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO | $312.927.160,00 | Terminado el 27 de noviembre del 2024 |
| 12 | OBRA | PAF-MENAM-O-076-2023 | Nariño – Pasto Putumayo - Puerto Asís Cauca – Piamonte Nariño – Ipiales Nariño - Mallama | 27/11/2023 | CONSORCIO FIN GRUPO 12 | $ 4.918.276.400 | Terminado el 05 de diciembre del 2024 |
| 12 | INTERVENTORÍA | PAF-MENAM-I-064-2023 | | 22/12/2023 | CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO | $ 351.774.412 | Terminado el 05 de diciembre del 2024 |
| Dotación | SUMINISTRO | PAF-ATMEN5-S-041-2024 | Choco - Carmen del Darién, Tadó<br>Antioquia – Apartadó<br>Atlántico – Repelón, Soledad<br>Bolívar – Mompós, Barranco de Loba, San Martín de Loba, María la Baja<br>Cauca - Santander de Quilichao, Suarez, El Tambo, Bolívar, La Vega, Rosas<br>Cesar - La Paz (Robles), El Paso<br>Córdoba - Planeta Rica, Puerto Libertador, Ayapel, Montelíbano<br>Magdalena - El Retén, San Sebastián de Buenavista | 22/08/2024 | DOTAESCOL SAS | $ 584.310.000 | Suspendido el día 26 de noviembre del 2024 |

**Nota:** Según el informe previo sobre el estado de los grupos de contratación y de cada institución educativa, se comunica que **el Grupo 4 ha sido entregado el 22 de marzo de 2024, el Grupo 3 ha sido entregado el 30 de abril de 2024, Grupo 6 ha sido entregado el 17 de mayo de 2024, el Grupo 8 ha sido entregado el 21 de agosto de 2024**, **el Grupo 1 ha sido entregado el 29 de octubre de 2024**, satisfacción entre rectores, estudiantes y familias. Además, se está avanzando en el proceso de estructuración de los estudios preliminares para equipar las nuevas aulas construidas, con el objetivo de entregarlas completamente dotadas.

c. *Conformar un Comité Fiduciario y un Comité Técnico Operativo al interior del PATRIMONIO AUTÓNOMO administrado por la FIDUCIARIA contratada, de acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo que para el efecto se adopte.*

Durante este periodo se realizaron los siguientes comités:

*Comités Técnicos*

| FECHA | OBJETO | LUGAR DE LA REUNIÓN | TEMAS ABORDADOS |
|---|---|---|---|
| 24 – 27 de enero del 2025 | Comité Técnico No. 81 | PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-MEN - CI CO1.PCCNTR. 4917031 de 2023 | 1. Verificación del quorum<br>2. Solicitud: Prorroga N.2 a la suspensión No.1, por el término de un mes (1) y quince días (15) días al contrato de suministro No. PAF-ATMEN5-S-041-2024 cuyo objeto es EL SUMINISTRO, ENTREGA E INSTALACIÓN DE DOTACIÓN DEL MOBILIARIO ESCOLAR EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS".<br>3. Proposiciones y varios |

*Comités Fiduciarios*

| FECHA | OBJETO | LUGAR DE LA REUNIÓN | TEMAS ABORDADOS |
|---|---|---|---|
| 28 - 30 de enero del 2025 | Comité Fiduciario No. 52 | PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-MEN - CI CO1.PCCNTR. 4917031 de 2023 | 1. Verificación del quorum.<br>2. Solicitud: Prorroga N.2 a la suspensión No.1, por el término de un mes (1) y quince días (15) días al contrato de suministro No. PAF-ATMEN5-S-041-2024 cuyo objeto es EL SUMINISTRO, ENTREGA E INSTALACIÓN DE DOTACIÓN DEL MOBILIARIO ESCOLAR EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS".<br>3. Proposiciones y varios |

## a. ACTIVIDADES DE CIERRE Y LIQUIDACIÓN

### i. Obligaciones:

a. *Adelantar la liquidación o cierre de los contratos derivados para la ejecución de los proyectos y del Contrato Interadministrativo una vez estos hayan finalizado.*

*De la contratación derivada*

En el presente periodo se ha planificado anticipadamente la liquidación o cierre de los contratos derivados con el propósito de asegurar una ejecución eficiente de los proyectos. Esta estrategia no solo facilitó una gestión financiera más efectiva, sino que también permitió cumplir con los objetivos

establecidos dentro de los plazos previstos, optimizando así los recursos disponibles y garantizando la correcta finalización de las obligaciones contractuales, así mismo se adelantaron las siguientes liquidaciones:

| GRUPO | TIPO DE CONTRATO | CÓDIGO | DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS | FECHA INCIO | FECHA TERMINACIÓN | CONTRATISTA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTERVENTORÍA | PAF-MENAM-I-052-2023 | Antioquia - Apartadó Antioquia - Turbo Antioquia - Ciudad Bolívar Chocó - Carmen del Darién Chocó - Tadó | 14/11/2023 | 29/10/2024 | INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S | Radicada el 2 de diciembre de 2024, mediante prisa INC 2024-002246 |
| 1 | OBRA | PAF-MENAM-O-049-2023 | | 14/11/2023 | 14/08/2024 | OBRAS CAPITAL S. A | Liquidado el día 31/01/2025 |
| 3 | INTERVENTORÍA | PAF-MENAM-I-054-2023 | Magdalena - Ciénaga Magdalena - El Retén Magdalena - Puebloviejo | 14/11/2023 | 30/04/2024 | CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3 | Liquidado el día 20/12/2024 |
| 3 | OBRA | PAF-MENAM-O-051-2023 | | 14/11/2023 | 30/04/2024 | CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA | Liquidado el día 01/10/2024 |
| 4 | OBRA | PAF-MENAM-O-052-2023 | Bolívar - Córdoba Bolívar - Mompós Magdalena - San Sebastián de Buenavista | 24/10/2023 | 22/03/2024 | JASA LTDA | Liquidado el día 30/09/2024 |
| 4 | INTERVENTORÍA | PAF-MENAM-I-055-2023 | | 24/10/2023 | 22/03/2024 | CONSORCIO INTER EDUCATIVO G4 | Inicia su trámite de liquidación una vez que quede desembolsado el último pago. |
| 6 | OBRA | PAF-MENAM-O-056-2023 | Cesar - Valledupar Cesar - La Paz Cesar - El paso | 29/09/2023 | 17/05/2024 | DAR ARQUITECTURA S.A. S | Liquidado el día 20/11/2024 |
| 6 | INTERVENTORÍA | PAF-MENAM-I-058-2023 | | 03/10/2023 | 17/05/2024 | CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023 | Liquidado el día 27/11/2024 |
| 8 | OBRA | PAF-MENAM-O-055-2023 | Córdoba – Tuchín Córdoba – Cotorra Córdoba - Planeta Rica Córdoba - Puerto Libertador Córdoba – Ayapel Córdoba - Montelíbano Bolívar - María la Baja | 29/09/2023 | DAR ARQUITECTURA S.A. S | $4.706.470.280 | Se encuentra en revisión de la fiducia. |
| 8 | INTERVENTORÍA | PAF-MENAM-I-057-2023 | | 13/10/2023 | LUIS GUILLERMO NARVÁEZ RICARDO | $297.097.668 | En consolidación y revisión documentos por la supervisión para el inicio del proceso de liquidación. |

*Del Contrato Interadministrativo*

Para el presente periodo no se adelantan actividades de este tipo.

## 2. RESUMEN GENERAL DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL CONTRATO

| CONTRATO No CO1.PCCNTR. 4917031 de 2023 | |
|---|---|
| **Valor inicial del Contrato** (CO1.PCCNTR. 4917031 de fecha 2023) | 63.650.000.000 |
| **Valor del Contrato a la fecha de corte del Informe** | **63.650.000.000** |
| Descuentos / Impuestos Estampilla Pro-Universidad Nacional / Tasas y Contribuciones (Correspondiente al 2% aplicado al valor Inicial del Contrato) | - |

| | |
|---|---|
| Asistencia Técnica No. 1 (Porcentaje de Asistencia Técnica y Administración de Recursos a reconocer a FINDETE, 7%) | 4.164.018.692 |
| **Valor disponible para ejecutar los proyectos de acuerdo con el objeto del contrato y el plan operativo.** | **59.485.981.308** |

## *3.* ANEXOS

Se remiten anexos de acuerdo con las actividades realizadas durante el periodo así:

1. 23 de enero del 2025

**HERNÁN PARDO BOTERO**
*Gerente de Infraestructura*
*FINDETER*

***JESÚS ALBERTO CAÑAS PÁEZ***
*Gestor del Contrato Interadministrativo*
*FINDETER*

*Elaboró: Geraldine Lorena Prada Pimiento – Profesional de la Gerencia de Infraestructura*



Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

# Seguimiento CI No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023

## AULAS MOVILES

Hacienda

Enero 23 de 2025


# Contrato No. 4917031-2023

**136** **sedes educativas**
[instalación de aulas y mejoramientos]

**$ 63.650**
Millones de pesos

Fecha inicio: 2/06/2023
Fecha Fin Actual: 01/07/2025

| Grupo | Departamentos / Municipios | Etapa Actual del grupo/% de avance de contrato<br>Fecha de Inicio –Fecha de Terminación |
|---|---|---|
| G1 [10 sedes] | Antioquia \| Chocó | Entregado [100,00%]<br>14/11/2023 - 14/08/2024 |
| G2 [8 sedes] | Atlántico | Entregado [100,00%]<br>27/11/2023 -06/09/2024 |
| G3 [5 sedes] | Magdalena | Liquidado [100,00%]<br>14/11/2023 - 30/04/2024 |
| G4 [5 sedes] | Bolívar | Entregado [100,00%]<br>26/10/2023 - 23/03/2024 |
| G5 [16 sedes] | Bolívar \| Magdalena \| Cesar | Entregado [100,00%]<br>14/11/2023 – 08/11/2024 |
| G6 [7 sedes] | Cesar | Entregado [100,00%]<br>15/11/2023 - 17/05/2024 |
| G7 [13 sedes] | Guajira | Terminado [100,00%]<br>31/05/2024 - 17/01/2025 |
| G8 [9 sedes] | Córdoba \| Bolívar | Entregado [100,00%]<br>08/11/2023 - 23/08/2024 |
| G9 [12 sedes] | Santander \| Bolívar \| Bogotá \| Arauca \| Tolima \| Meta \| Cundinamarca \| Nte de Santander | En obra[33,97%]<br>23/08/2024 - 08/03/2025 |
| G10 [15 sedes] | Cauca \| Chocó \| Valle Del Cauca | En Obra [90,22%]<br>19/02/2023 - 30/12/2024 |
| G11 [18 sedes] | Cauca | Terminado [100,00%]<br>12/02/2023 - 27/11/2024 |
| G12 [18 sedes] | Nariño \| Putumayo \| Cauca | Terminado [100,00%]<br>20/02/2023 - 04/12/2024 |
| Dotación | 46 Sedes a dotar - 99 aulas | Suspendido[100,00%]<br>03/10/2024 – 03/12/2024 |

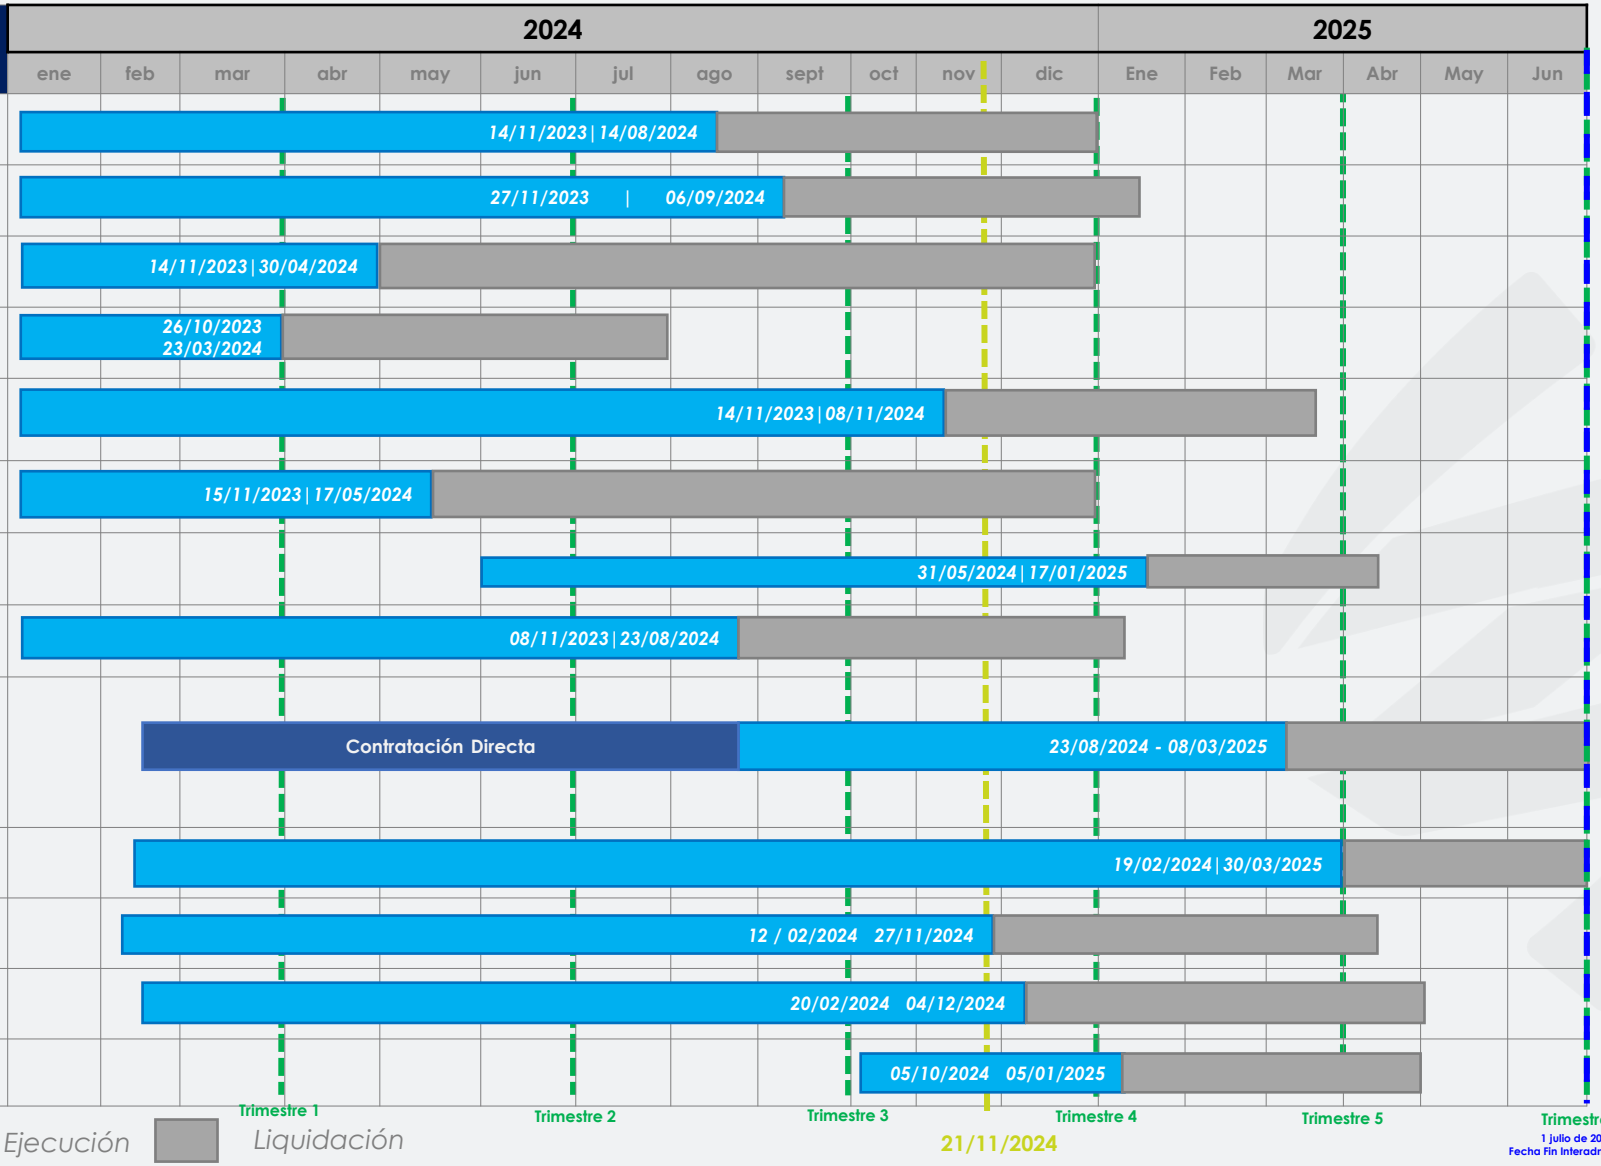


Convocatoria | Llegalización | Ejecución | Liquidación

# Aulas Móviles
# Contrato No. 4917031-2023

**136** **sedes educativas**
[instalación de aulas y mejoramientos]

**$ 63.650**
Millones de pesos

Fecha inicio: 02/06/2023
Fecha Fin: 01/07/2025

**ENTREGADAS** 102 sedes 75,00%


**TERMINADAS** 18 sedes 13,24%

*Físicamente culminadas. A la espera de firma de actas para ser entregadas*

**EN EJECUCIÓN** 16 sedes 11,76%

**POR INICIAR** 0 sedes 0,00%

**Estado de entrega y ejecución de Sedes**

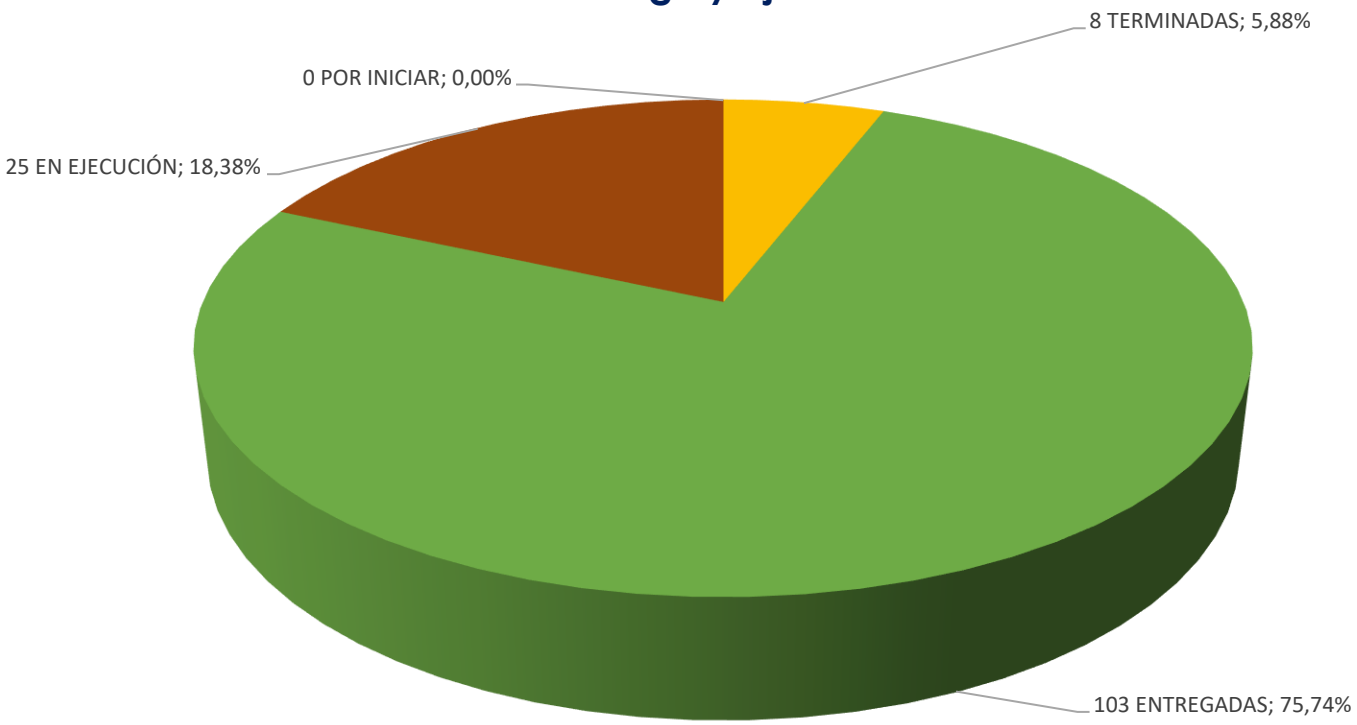

# Estado de entrega y ejecución de Sedes

**136** **sedes educativas**
[instalación de aulas y mejoramientos]

**$ 63.650**
Millones de pesos

Fecha inicio: 02/06/2023
Fecha Fin: 01/07/2025

| ENTREGADAS | TERMINADAS | EN EJECUCIÓN | POR INICIAR |
|---|---|---|---|
| 102 sedes<br>75,00% | 18 sedes<br>13,24% | 16 sedes<br>11,76% | 0 sedes<br>0,00% |
| Grupo 1 - 10<br>Grupo 2 - 8<br>Grupo 3 - 5<br>Grupo 4 - 5<br>Grupo 5 - 16<br>Grupo 6 - 7<br>Grupo 8 - 9<br>Grupo 10 - 10<br>Grupo 11 - 15<br>Grupo 12 - 17 | Grupo 7 - 13<br>Grupo 10 - 1<br>Grupo 11 - 3<br>Grupo 12 - 1 | Grupo 9 - 12<br>Grupo 10 - 4 | |

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

# PAGOS ASISTENCIA TECNICA

**136** **sedes educativas**
[instalación de aulas y mejoramientos]

**$ 63.650**
Millones de pesos

Fecha inicio: 02/06/2023
Fecha Fin: 01/07/2025

## VALOR AT

$ 4.164.018.692

| Cobrado (a dic de 2024) | Pagado (a dic de 2024) | SALDO |
|---|---|---|
| $3.585.749.431,31 | $3.585.749.431, 31 | $ 578.269.260,69 |

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

# Resumen Informe Financiero – Corte 31 de diciembre de 2024

**136** **sedes educativas**
[instalación de aulas y mejoramientos]

**$ 63.650**
Millones de pesos

Fecha inicio: 02/06/2023
Fecha Fin: 01/07/2025

## VALOR EJECUTADO

$ 49.435 mll

## VALOR POR EJECUTAR

$ 14.573 mll

## VALOR COMPROMETIDO

$ 59.515 mll

## SALDO

$ 175,3 mll

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

# Estado Entrega de Dotación

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**PAF-ATMEN5-S-041-2024**

Publicada

17 DE JULIO DE 2024.

Informe Definitivo:

Comité Fiduciario No 41 del 25 de agosto.

Adjudicado:

DOTAESCOL SAS

Valor $ **$ 584.310.000,00**

Acta de Inicio: 3 de octubre de 2024

2 meses de ejecución.

Entregado 100%.

➡ 16 DEPARTAMENTOS

➡ 38 MUNICIPIOS

➡ 99 AULAS NUEVAS CON DOTACIÓN

| GRUPO | Departamento | Municipio | INSTITUCION EDUCATIVA | SEDE | TOTAL AULAS NUEVAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chocó | Carmen del Darién | CE PUEBLO NUEVO | CE PUEBLO NUEVO - SEDE PRINCIPAL | 3 |
| 1 | Antioquia | Apartadó | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO | CENTRO EDUCATIVO RURAL EL OSITO | 1 |
| 2 | Atlántico | Repelón | INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS | PITA | 1 |
| 2 | Atlántico | Soledad | INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO | INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE CABICA | 3 |
| 3 | Magdalena | El Retén | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE | COL MPAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE | 9 |
| 4 | Bolívar | Mompós | INSTITUCIÒN EDUCATIVA TÈCNICA AMBIENTAL DE TIERRA FIRME | I.E.T.A. AMBIENTAL DE TIERRA FIRME - SEDE PRINCIPAL | 6 |
| 4 | Magdalena | San Sebastían de Buenavista | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA | ERM MARIA AUXILIADORA | 4 |
| 4 | Magdalena | San Sebastían de Buenavista | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA | ERM LA PACHA | 3 |
| 5 | Bolívar | Barranco de Loba | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR | ATASCOZA | 1 |
| 5 | Bolívar | San Martín de Loba | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA PESQUERA LEONIDAS ORTIZ ALVEAR DE CHIMÍ | PLAN BONITO | 1 |
| 6 | Cesar | La Paz(Robles) | CENTRO EDUCATIVO INDIGENA CAÑO PADILLA YUKPA | SEDE EL COSO | 1 |
| 6 | Cesar | El Paso | INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN | SEDE LA ESTACION | 1 |
| 8 | Córdoba | Planeta Rica | INSTITUCION EDUCATIVA LOMA AZUL | LOS CERROS | 1 |
| 8 | Córdoba | Puerto Libertador | INSTITUCION EDUCATIVA PICA PICA VIEJO | ESC NVA LA SOLITA | 1 |
| 8 | Córdoba | Ayapel | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO | ESC NVA PARCELAS LONDRES | 1 |
| 8 | Córdoba | Montelíbano | INSTITUCION EDUCATIVA EL PALMAR | ESCUELA NUEVA MIXTA DIVINO SALVADOR | 2 |
| 8 | Bolívar | María la Baja | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA | I.E.T. AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA | 2 |
| 10 | Cauca | Santander de Quilichao | INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO | SEDE DOMINGO LASSO | 8 |
| 11 | Cauca | El Tambo | I.E. HUISITO | SEDE HUISITÓ | 6 |
| 11 | Cauca | Bolivar | INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO NUESTRA SENORA DEL CARMEN | SEDE CORRAL VIEJO | 1 |
| 11 | Cauca | Bolivar | CENTRO EDUCATIVO EL TAMBO | SEDE LA FUENTE | 1 |
| 11 | Cauca | La Vega | I.E AGROPECUARIA SAN FRANCISCO JAVIER SEDE GARAY | IE AGROPECUARIA SAN FRANCISCO JAVIER - SEDE GARAY | 1 |
| 11 | Cauca | Rosas | INSTITUCION EDUCATIVA MADRE CARIDAD BRADER | MADRE CARIDAD BRADER | 1 |

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado Entrega de Dotación



**CENTRO EDUCATIVO INDIGENA CAÑO PADILLA YUKPA**
Sede El Coso La Paz – Cesar



**INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO**
Sede Escuela Nueva Parcelas Londres
Ayapel - Córdoba



**INSTITUCION EDUCATIVA EL PALMAR**
Escuela Nueva Mixta Divino Salvador
Monte Líbano - Córdoba



**INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO**
Sede Principal Santander de Quilichao - Cauca



**INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA ERM MARIA AUXILIADORA** Sede
Sebastián de Buenavista - Magdalena



**INSTITUCION EDUCATIVA TIERRA FIRME**
Mompox - Bolivar

# Rendimientos Financieros – Relación de Pagos

Educación


**Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031**
**Ministerio de Educación Nacional**
**Financiera del Desarrollo S.A.**
**7. RENDIMIENTOS FINANCIEROS**
**01 de diciembre al 31 de diciembre de 2024**

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| FECHA | RENDIMIENTOS CAUSADOS CUENTA DE AHORRO | VALORACIÓN /DESVALORIZACION CAUSADOS FONDO DE INVERSION COLECTIVA - FIC | TOTAL RENDIMIENTOS, VALORACION DEVALORIZACION CAUSADOS | FECHA TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS | VALOR TRASLADO RENDIMIENTOS | AJUSTES / RETENCIONES | SALDO PENDIENTE POR TRASLADAR RENDIMIENTOS | DESVALORIZACION ACUMULADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ago-23 | 82.351.406,35 | 443.947.650,01 | **526.299.056,36** | | | | - | - |
| sep-23 | 108.927.246,74 | 548.880.836,71 | **657.808.083,45** | | | | - | - |
| oct-23 | 131.902.760,66 | 436.008.307,20 | **567.911.067,86** | | | | - | - |
| nov-23 | 144.907.033,92 | 718.224.229,49 | **863.131.263,41** | | | | - | - |
| dic-23 | 143.221.271,36 | 788.090.860,63 | **931.312.131,99** | 13/12/2023 | **2.615.149.472,00** | | - | - |
| ene-24 | 133.626.379,48 | 427.858.051,59 | **561.484.431,07** | 10/01/2024 | **931.312.131,99** | | - | - |
| feb-24 | 120.547.529,88 | 474.970.095,24 | **595.517.625,12** | 12/02/2024 | **561.484.430,15** | | - | - |
| mar-24 | 117.745.976,50 | 478.495.863,61 | **596.241.840,11** | 12/03/2024 | **595.517.625,12** | | - | - |
| abr-24 | 100.331.907,69 | 259.736.382,70 | **360.068.290,39** | 10/04/2024 | **596.241.840,11** | | - | - |
| may-24 | 89.374.457,56 | 353.632.163,66 | **443.006.621,22** | 11/05/2024 | **360.068.290,39** | | - | - |
| jun-24 | 76.820.331,89 | 266.323.590,41 | **343.143.922,30** | 13/06/2024 | **443.006.621,22** | | - | - |
| jul-24 | 68.012.790,67 | 294.233.627,01 | **362.246.417,68** | 15/07/2024 | **343.143.922,30** | | - | - |
| ago-24 | 21.741.419,32 | 313.006.436,96 | **334.747.856,28** | 14/08/2024 | **362.246.417,68** | | - | - |
| sep-24 | 20.861.120,00 | 192.185.501,19 | **213.046.621,19** | 10/09/2024 | **334.747.856,28** | | - | - |
| oct-24 | 27.022.756,52 | 71.175.915,03 | **98.198.671,55** | 18/10/2024 | **213.046.621,19** | | - | - |
| nov-24 | 21.729.373,21 | 129.213.183,82 | **150.942.557,03** | 13/11/2024 | **98.198.671,55** | | - | - |
| dic-24 | 19.252.522,64 | 66.886.746,40 | **86.139.269,04** | 10/12/2024 | **150.942.557,03** | | **86.139.269,04** | - |
| **TOTAL** | **1.428.376.284,39** | **6.262.869.441,66** | **7.691.245.726,05** | | **7.605.106.457,01** | - | **86.139.269,04** | - |

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

# Rendimientos Financieros – Comprobante de pago

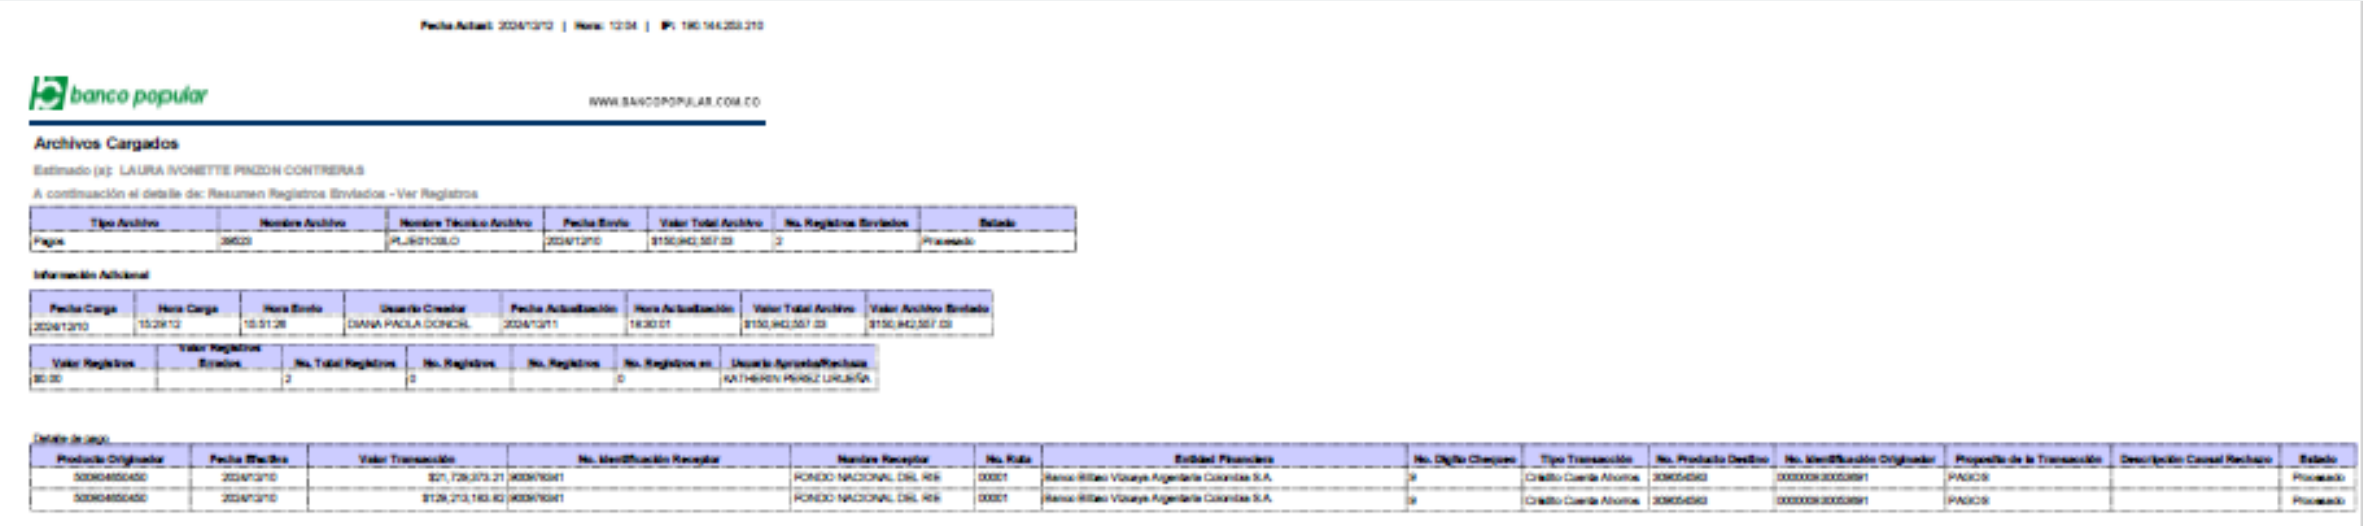

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

**Archivos Cargados**

Estimado (a): LAURA IVONETTE PINZON CONTRERAS

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

| Tipo Archivo | Nombre Archivo | Nombre Técnico Archivo | Fecha Envío | Valor Total Archivo | No. Registros Enviados | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagos | 39520 | PLJ921C08.O | 2024/12/10 | $150,842,557.03 | 2 | Procesado |

Información Adicional

| Fecha Carga | Hora Carga | Hora Envío | Usuario Creador | Fecha Actualización | Hora Actualización | Valor Total Archivo | Valor Archivo Enviado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/10 | 15:29:12 | 15:51:26 | DIANA PAOLA DONCEL | 2024/12/11 | 14:30:01 | $150,842,557.03 | $150,842,557.03 |

| Valor Registros | Valor Registros Enviados | No. Total Registros | No. Registros | No. Registros | No. Registros en | Usuario Aprueba/Rechaza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | | 2 | 0 | | 0 | KATHERIN PEREZ URUEÑA |

Detalle de pago

| Producto Originador | Fecha Efectiva | Valor Transacción | No. Identificación Receptor | Nombre Receptor | No. Rubi | Entidad Financiera | No. Digito Chequeo | Tipo Transacción | No. Producto Destino | No. Identificación Originador | Propósito de la Transacción | Descripción Causal Rechazo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309054650450 | 2024/12/10 | $21,728,073.21 | 900976041 | FONDO NACIONAL DEL RIE | 00001 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. | 9 | Crédito Cuenta Ahorros | 309054583 | 0000009300536891 | PAGOS | | Procesado |
| 309054650450 | 2024/12/10 | $128,213,183.82 | 900976041 | FONDO NACIONAL DEL RIE | 00001 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. | 9 | Crédito Cuenta Ahorros | 309054583 | 0000009300536891 | PAGOS | | Procesado |

**NOTA: Teniendo en cuenta el contrato MEN-4917031 2023 -TEMPORADA DE LLUVIAS, y en atención a la obligación descrita en la cláusula tercera, Obligaciones específicas del contratista, Numeral 8 el cual dice:**

*"8. El Patrimonio Autónomo — Findeter deberá reintegrar mensualmente los rendimientos financieros (si los hubiere) a la Dirección del Tesoro Nacional o en los términos que establezca la normatividad aplicable, es decir, que no ingresan ni hacen parte del Patrimonio Autónomo constituido por Findeter."*

**Se han consignado los rendimientos financieros a la siguiente cuenta:**

- **Banco:** BBVA
- **Tipo:** Ahorros
- **No. Cuenta:** 309-054583
- **Nombre de la Cuenta:** FIDUPREVISORA S.A FNGRD – COLOMBIA VITAL

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

# AULAS MOVILES
# INFORME DETALLADO POR GRUPO DE INTERVENCION

Enero 23 de 2025



NGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Educación

Colombia Vital

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA


CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# GRUPO 1, Departamentos de Antioquia – Chocó

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**10**
**Proyectos**

- 2 Departamentos
- 5 Municipios
- 10 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total, estudiantes SIMAT 2023 - 4347 estudiantes.
- $ 3.945.124.339,32 Inversión MEN

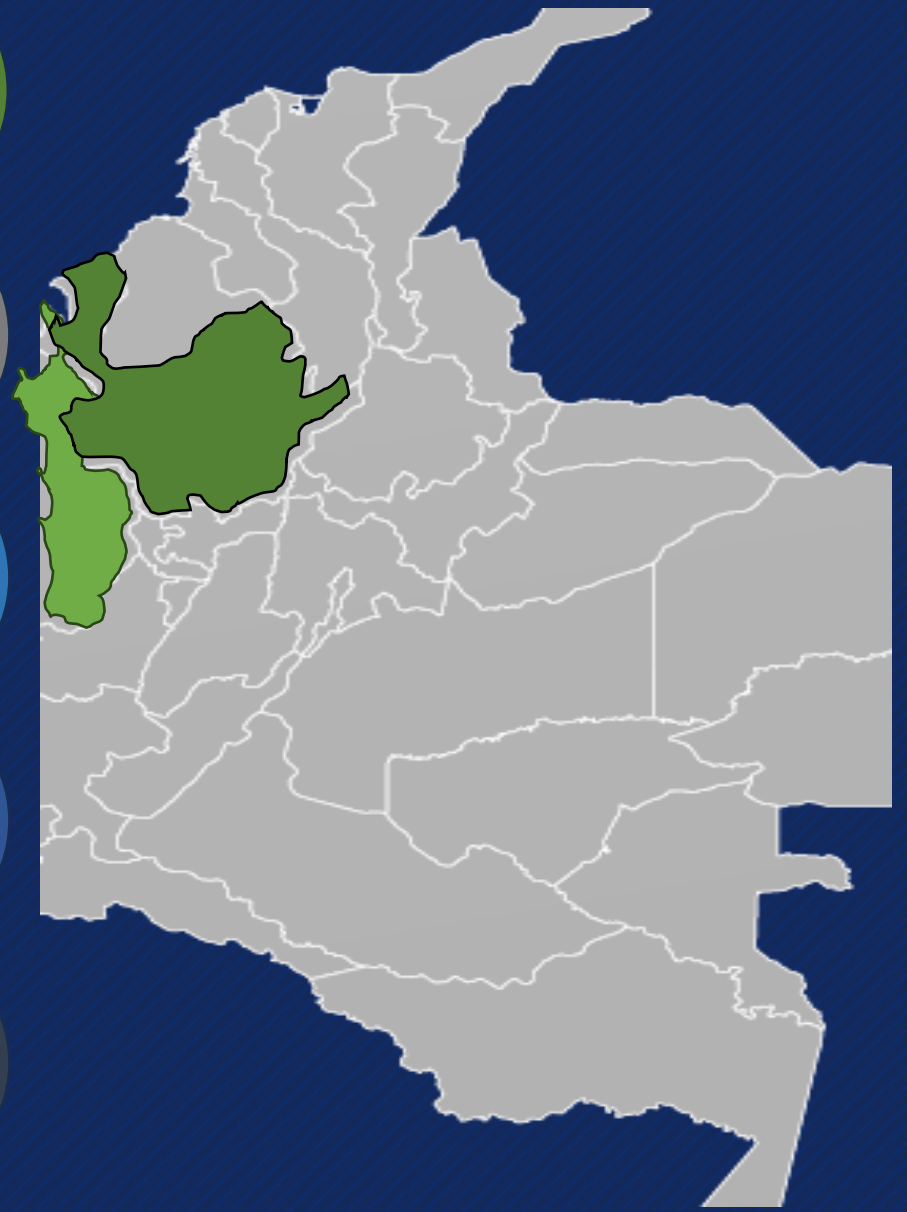

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# GRUPO 1, Departamentos de Antioquia – Chocó

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## SEDES INTERVENIDAS:

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | IE | SEDE | ALCANCE TOTAL DE INTERVENCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | AULAS NUEVAS | AULAS MEJORADAS | BATERIAS SANITARIAS | FECHA DE ENTREGA |
| Antioquia | Ciudad Bolívar | I. E. JOSE MARIA HERRAN | C. E. R. PAULINA PUERTA | | 6 | 3 MEJ | 27/2/2024 |
| Antioquia | Apartadó | INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS | INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS | | 14 | 5 MEJ | 21/3/2024 |
| Antioquia | Apartadó | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO | | 9 | 5 MEJ | 30/5/2024 |
| Antioquia | Apartadó | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO | | 23 | 8 MEJ | 30/5/2024 |
| Antioquia | Turbo | I.E. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | E.U. JESUS MORA | | 4 | | 14/3/2024 |
| Antioquia | Apartadó | INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL GUINEO | CENTRO EDUCATIVO RURAL EL OSITO | | 3 | 2 MEJ | 30/5/2024 |
| Antioquia | Turbo | IE SAN MARTIN DE PORRES | SEDE GONZALO MEJIA | | 4 | 5 MEJ | 20/5/2024 |
| Chocó | Carmen del Darién | CE PUEBLO NUEVO | CE PUEBLO NUEVO - SEDE PRINCIPAL | 2 | | 4 BS NUEVAS | 14/8/2024 |
| Chocó | Tadó | IE TECNICO AGROAMBIENTAL - MARIA AUXILIADORA | SEDE MARÍA AUXILIADORA DE MANUNGARA | | 2 | 4 MEJ | 30/5/2024 |
| Chocó | Tadó | IE NORMAL SUPERIOR DEMETRIO SALAZAR CASTILLO | CENTRO EDUCATIVO ESCUELA FRANCISCO MIRANDA | | 6 | 3 BS NUEVAS 5 MEJ | 22/10/2024 |

## PORCENTAJES DE AVANCE:

**100%**
Porcentaje Programado

**100%**
**Porcentaje de avance**

## ESTADO ACTUAL CIERRE Y LIQUIDACION CONTRATOS DERIVADOS

En cumplimiento al alcance se tienen las 10 sedes entregadas

- CONTRATO PAF-MENAM-O-049-2023: Terminado el 14.08.2024 - Liquidación radicada el 2 de diciembre de 2024, mediante prisa INC 2024-002245, asignación liquidador Mireya Artunduaga, el 21.01.2025 se traslada a la Fiduciaria Popular para revisión y VoBo para firmas.

- CONTRATO PAF-MENAM-I-052-2023: Terminado el 29.10.2024 - Liquidación radicada el 2 de diciembre de 2024, mediante prisa INC 2024-002246, asignación liquidador Mireya Artunduaga, el 20.01.2025 se traslada a revisión jurídica para VoBo y enviar a coordinación de liquidaciones para VoBo y remitir a la Fiduciaria

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# GRUPO 1, Departamentos de Antioquia – Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL GUINEO - SEDE CE EL OSITO - ID No. 161




## INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO ID No. 118




## INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS ID No. 66




## INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO ID No. 86




## INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS SEDE EU JESÚS MORA ID No. 112




## INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MARTÍN DE PORRES SEDE EU GONZALO MEJÍA




# GRUPO 1, Departamentos de Antioquia – Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA HERRÁN SEDE CER PAULINA PUERTA
ID No. 42






## INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROAMBIENTAL SEDE MARÍA AUXILIADORA DE MANUNGARA
ID No. 150





## INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR DEMETRIO SALAZAR CASTILLO SEDE CE ESCUELA FRANCISCO MIRANDA





## CENTRO EDUCATIVO PUEBLO NUEVO SEDE PRINCIPAL
ID No. 94








# Estado GRUPO 2, Departamento de Atlántico

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-050-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-053-2023 – RM INGENIEROS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**8**
**Proyectos**

- 1 Departamentos
- 5 Municipios
- 8 Instituciones
  Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT
  2023 - 6398 estudiantes.
- $ 4.395.730.538,40
  Inversión

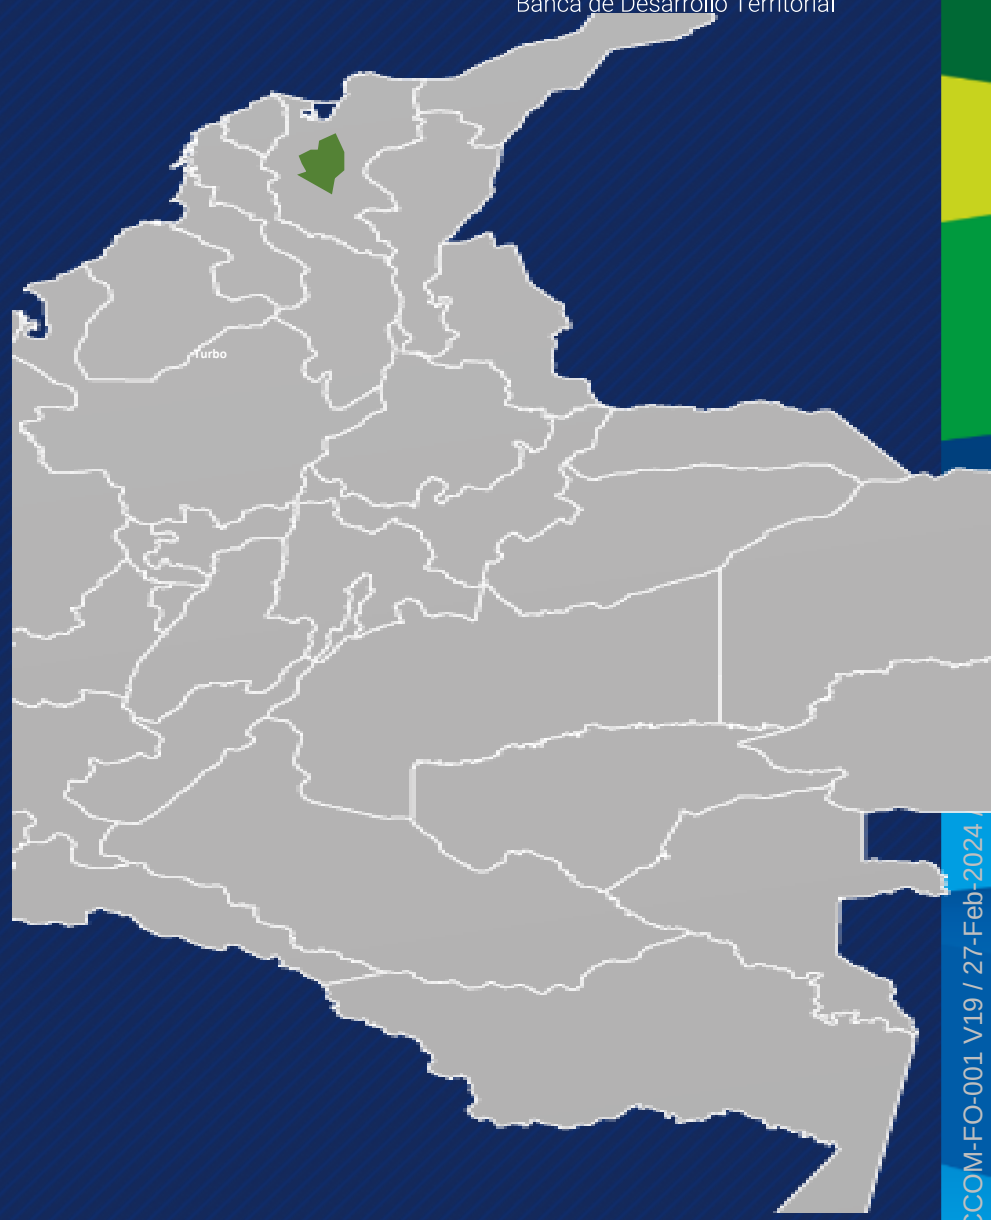

# GRUPO 2, Departamentos de Atlántico

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**SEDES INTERVENIDAS:**

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | IE | SEDE |
|---|---|---|---|
| Atlántico | Repelón | IE CIEN PESOS Y LAS TABLAS | PITA |
| Atlántico | Soledad | IE JOSEFA DONADO | SEDE CABICA |
| Atlántico | Galapa | IE MARIA AUXILIADORA | IE MARIA AUXILIADORA |
| Atlántico | Repelón | IE CIEN PESOS Y LAS TABLAS | SEDE PRINCIPAL |
| Atlántico | | IE TECNICA AGROPECUARIA DE VILLA ROSA | SEDE LA LOMA |
| Atlántico | Soledad | IE JOSEFA DONADO | SEDE PRINCIPAL |
| Atlántico | | IE TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE | IE TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE |
| Atlántico | Malambo | INSTITUCIÓN EDUCATIVA MESOLANDIA | SEDE MESOLANDIA |

| ALCANCE TOTAL DE INTERVENCIÓN | | | |
|---|---|---|---|
| AULAS NUEVAS | AULAS MEJORADAS | BATERIAS SANITARIAS | FECHA DE ENTREGA |
| 1 | | 2 | 16/09/2024 |
| 3 | | 1 | 13/09/2024 |
| | 15 | | 16/08/2024 |
| | 8 | | 18/07/2024 |
| | 5 | 8 | 11/07/2024 |
| | 16 | 8 | 16/07/2024 |
| | 22 | | 15/11/2024 |
| | 8 | | 4/09/2024 |

**PORCENTAJES DE AVANCE:**




**ESTADO ACTUAL CIERRE Y LIQUIDACION CONTRATOS DERIVADOS**

**AERS COMPONENTE 2:**

- Contrato de Obra e Interventoría, en proceso de revisión por parte de la Fiduciaria Popular, una vez se tenga las AERS suscritas se procederá a solicitar la actualización de pólizas.

DOCUMENTOS DE CIERRE Y LIQUIDACION

CONTRATO PAF-MENAM-O-050-2023: Terminado el 05.09.2024
CONTRATO PAF-MENAM-I-053-2023: Terminado el 05.11.2024

En recopilación documental, cierre de balances y memorias entre el contratista e interventoría, se proyecta radicar la liquidación del contrato de obra la 15 de febrero de 2025 y posterior la de interventoría.

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

**Contratista de Diseño y Obra:** PAF-MENAM-O-050-2023 CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 - G2
**Contratista interventor:** PAF-MENAM-I-053-2023 RM INGENIEROS S A S

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE PRINCIPAL - ID EN 018




## INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE PRINCIPAL - ID EN 018




## INSTITUCION EDUCATIVA BLAS TORRES DE LA TORRE (ITIDA) - ID MEN 144




## INSTITUCION EDUCATIVA DE MESOLANDIA - ID MEN 197




## INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS, LAS TABLAS Y PITA, SEDE PITA - ID MEN 092




## INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS, LAS TABLAS Y PITA, SEDE LAS TABLAS - ID MEN 083




## INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE VILLA ROSA, SEDE LA LOMA - ID MEN 084






## INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA DE GALAPA - ID MEN 064







# Estado GRUPO 3, Departamento Magdalena

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-051-2023 (Liquidado) – CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-054-2023 (Liquidado) – CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**5**
**Proyectos**

- 1 Departamentos
- 3 Municipios
- 5 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT 2023 - 2630 estudiantes.
- Consultoría y obra $ 4.744.960.153 Interventoría $ 351.774.412 **Inversión Total $ 5.096.734.565**

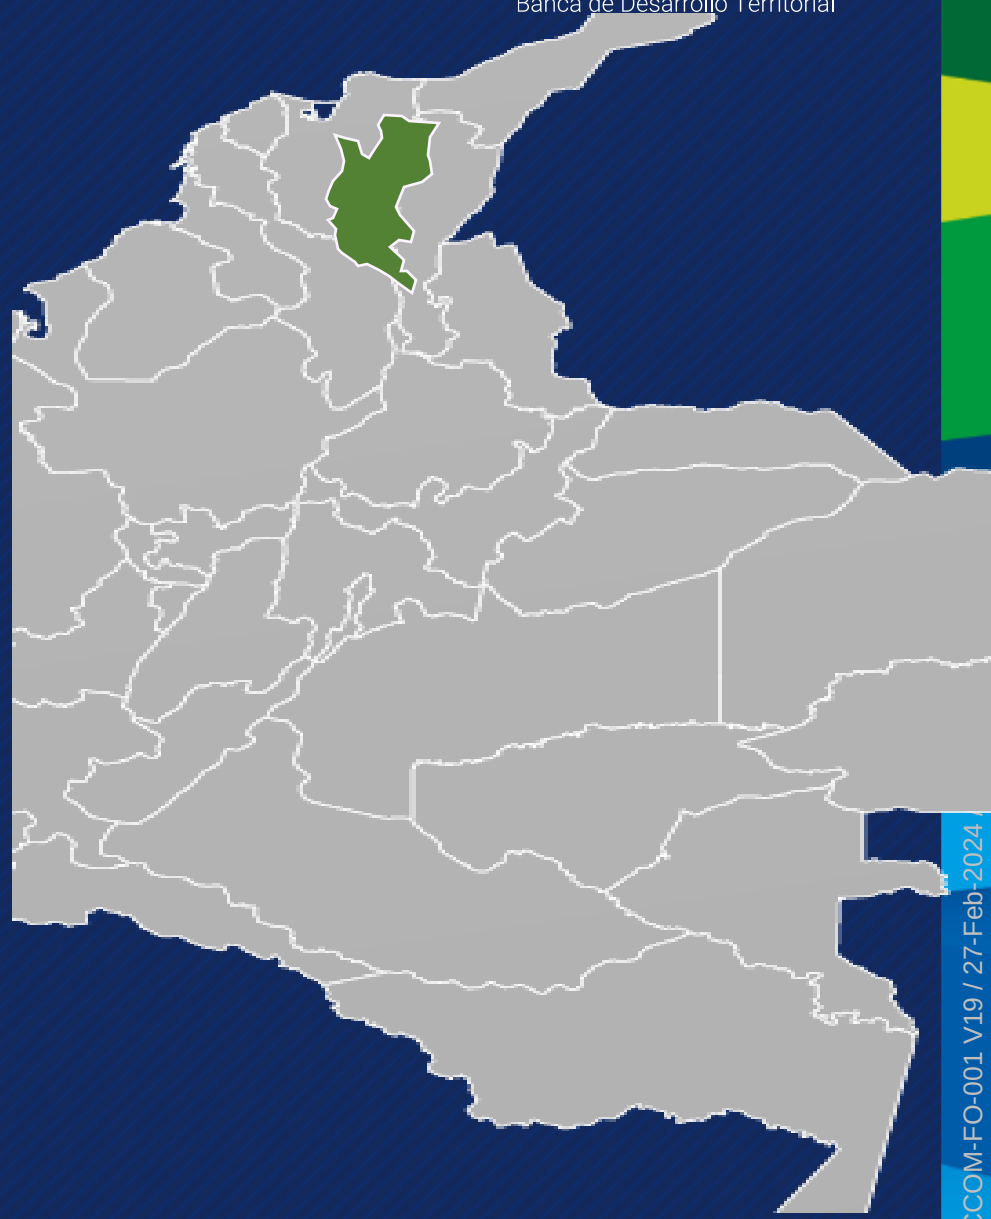

# Estado GRUPO 3, Departamentos de Magdalena

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-051-2023 (Liquidado)– CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-054-2023 (Liquidado) – CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3

| VALOR EJECUCION | FECHA INICIO C1 | FECHA FIN C1 | FECHA INICIO C2 | FECHA FIN C2 | PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **O:** $4.744.960.153<br>**I:** $ 371.774.412 | 14/11/2023 | 28/12/2023 | 18/12/2023 | 12/04/2024 | **Progr** | 100% | 100% |
| **AVANCE POR COMPONENTE** | **Programado** | 100% | **Programado** | 100% | **Ejecut** | 100% | |
| | **Ejecutado** | 100% | **Ejecutado** | 100% | **% Financiero G3:** 99,15%<br>**Obra:** 100%<br>**Interventoría:** 88,35% | | |

| MUNICIPIO | INSTITUCIONES EDUCATIVAS | SEDE | Aulas Nuevas | Aulas Mejoradas | BATERÍA SANITARIA |
|---|---|---|---|---|---|
| El Retén | Institución Educativa Departamental Roque de Los Rios Valle | Col Mpal Roque de Los Rios Valle | 9 | 11 | 11 N |
| El Retén | Institución Educativa Departamental Roque de Los Rios Valle | Institución Educativa Enoc Mendoza Riazco | N/A | 7 | 15 N |
| Ciénaga | Institución Educativa Enoc Mendoza Riazco | Institución Educativa Enoc Mendoza Riazco | N/A | 24 | N/A |
| Puebloviejo | Institucion Educativa Departamental San Juan de Palos Prietos | ERM El Triunfo | N/A | 4 | N/A |
| Puebloviejo | Institucion Educativa Departamental San Juan de Palos Prietos | ERM Isla de Cataquita | N/A | 2 | N/A |

**Avance General:** En proceso de liquidación.

**COMPONENTE 1:** Entregado 30/01/2024 – 100%

**COMPONENTE 2:** Entregado 29/04/2024 al 30/04/2024 – 100% con acompañamiento del MEN y UNGRD.

| Estado | Proyectos |
|---|---|
| Entregados | 5 |
| Terminados | 0 |
| Ejecución | 0 |
| Sin iniciar | 0 |

**LIQUIDACIÓN Contrato de Obra No. PAF-MENAM-O-051-2023:** Suscrita Acta de liquidación de fecha 01/10/2024 y pagado 100%.

**LIQUIDACIÓN Contrato de Interventoría No. PAF-MENAM-I-054-2023:**Suscrita Acta de liquidación de fecha 20/12/2024, en trámite de pago enero de 2025, pagado 88,35%

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 3, Departamentos de Magdalena

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-051-2023 – CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-054-2023 – CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3

## ID112 IE. RIOS VALLE, El Retén (Bachillerato) - ENTREGADO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Reten - Magdalena |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 2.346.192.202 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 731 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aulas | 11 | • Mejoramiento y cambio de cubiertas, mampostería (estructura principal y de confinamiento), mejoramiento de pañete y pinturas externas e internas, mejoramiento de pisos en general, carpintería metálica y red eléctrica general. |
| Aulas nuevas | 9 | • Sistema en estructura metálica, envolvente en WPC con teja UPVC, red eléctrica y piso en concreto. |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | N.A. | |
| Baterías sanitarias nuevas | 11 | Sistema en estructura metálica, envolvente en WPC con teja UPVC, red eléctrica y piso en concreto. |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 29 de abril de 2024 |

### Antes





### Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 3, Departamentos de Magdalena

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-051-2023 – CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-054-2023 – CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3

## ID156 IE. GREGORIO GARZÓN, El Retén (Primaria) - ENTREGADO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Reten - Magdalena |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 527.020.099 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 515 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aulas | 7 | • Mejoramiento y mantenimiento de cubiertas, mampostería (estructura principal y de confinamiento), pisos en general, carpintería metálica y red eléctrica general. |
| Aulas nuevas | N.A. | |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | 15 | |
| Baterías sanitarias nuevas | N.A. | |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 29 de abril de 2024 |


### Antes





### Después



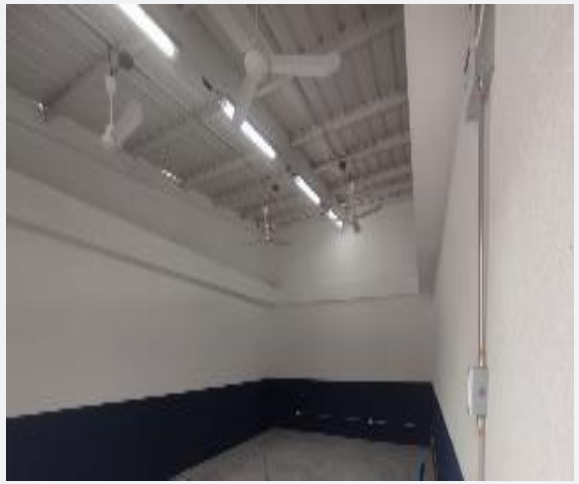





CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 3, Departamentos de Magdalena

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-051-2023 – CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-054-2023 – CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3

## ID154 IE. ENOC MENDOZA, Ciénaga - ENTREGADO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Ciénaga – Magdalena |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 1.649.361.282 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 870 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aulas | 24 | • Mejoramiento y mantenimiento de cubiertas, mampostería (estructura principal y de confinamiento), pisos en general, carpintería metálica y red eléctrica general.<br>• Construcción de circulaciones entre aulas, rampas y escaleras. |
| Aulas nuevas | N.A. | N.A. |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | N.A. | |
| Baterías sanitarias nuevas | N.A. | |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 29 de abril de 2024 |

Antes





Después









# Estado GRUPO 3, Departamentos de Magdalena

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-051-2023 – CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-054-2023 – CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3

## ID126 IE. EL TRIUNFO, Puebloviejo - ENTREGADO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Puebloviejo – Magdalena |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 153.545.059 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 98 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aulas | 4 | • Mejoramiento y mantenimiento de mampostería (estructura principal y de confinamiento), pisos en general, carpintería metálica y red eléctrica general, cambio de cubiertas, canalización de aguas lluvias y mejoramiento de la circulación. |
| Aulas nuevas | N.A. | |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | N.A. | |
| Baterías sanitarias nuevas | N.A. | |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 30 de abril de 2024 |

### Antes





### Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 3, Departamentos de Magdalena

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-051-2023 – CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-054-2023 – CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3

## ID111 IE. CATAQUITA, Puebloviejo - ENTREGADO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Puebloviejo – Magdalena |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 68.841.509 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 115 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aulas | 2 | • Mejoramiento y mantenimiento de mampostería (estructura principal y de confinamiento), pisos en general, carpintería metálica y red eléctrica general, cambio de cubiertas y mejoramiento de la circulación. |
| Aulas nuevas | N.A. | |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | N.A. | |
| Baterías sanitarias nuevas | N.A. | |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 30 de abril de 2024 |

Antes





Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada


# Estado GRUPO 4, Departamentos de Magdalena y Bolívar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-052-2023 – JASA LTDA
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-055-2023 – CONSORCIO INTER EDUCATIVO G4

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**7**
**Proyectos**

- 2 Departamentos
- 3 Municipios
- 7 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT 2023 - 1302 estudiantes.
- $ 3.831.442.211.00 Inversión

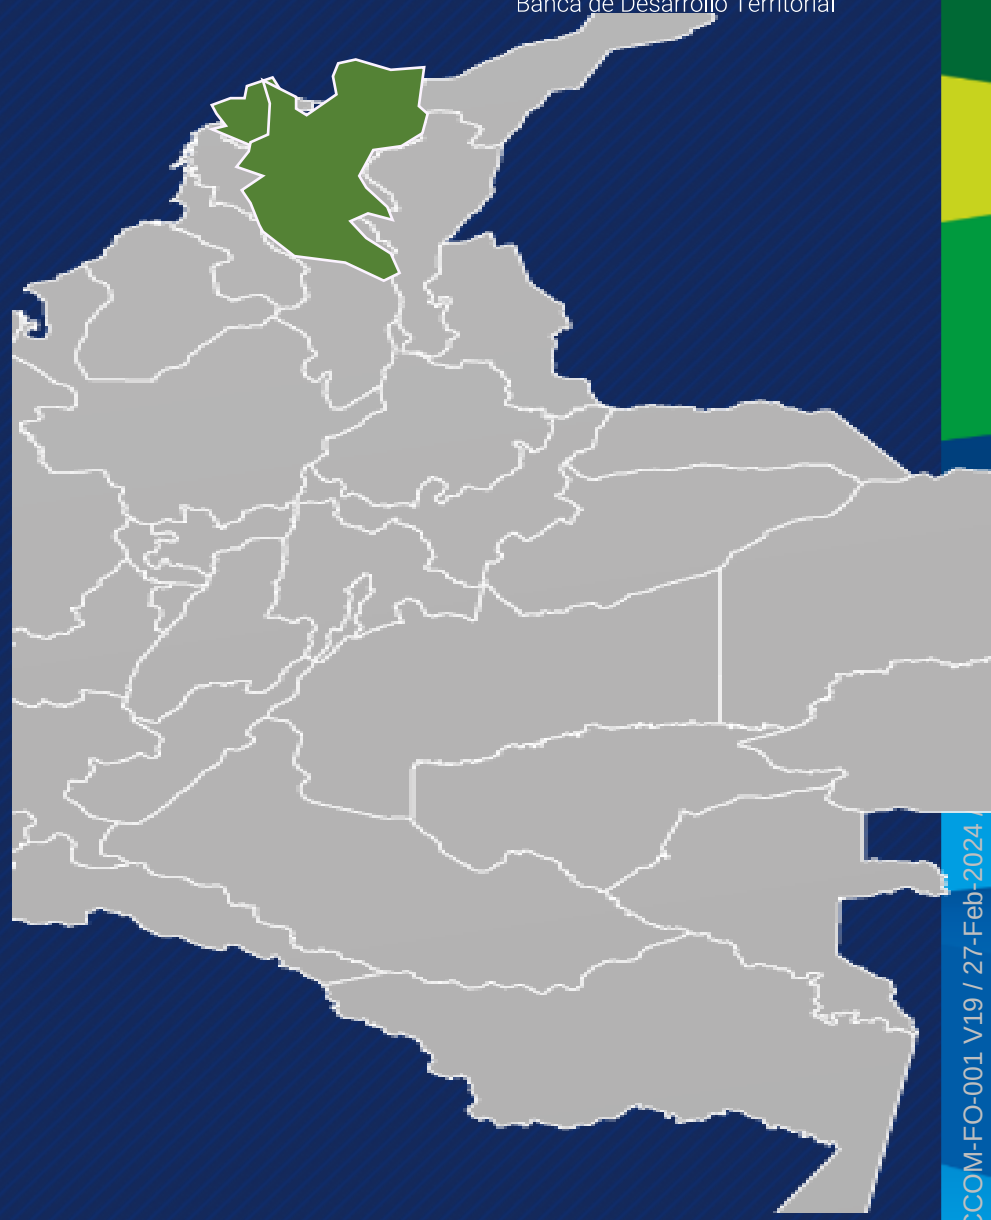

# Estado GRUPO 4, Departamentos de Magdalena y Bolívar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-052-2023 – JASA LTDA

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-055-2023 – CONSORCIO INTER EDUCATIVO G4

| VALOR EJECUCIÓN | FECHA INICIO Proyectada C1 | FECHA FIN Proyectada C1 | FECHA INICIO Proyectada C2 | FECHA FIN Proyectada C2 | PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.744.960.153 | 24/10/2023 | 08-12-2023 | 08-12-2023 | 07-02-2024 | **Programado** | 100% | 0% |
| **AVANCE POR COMPONENTE** | **Programado** | 100% | **Programado** | 100% | **Ejecutado** | 100% | |
| | **Ejecutado** | 100% | **Ejecutado** | 100% | | | |

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SEDE | AULAS NUEVAS | AULAS MEJORADAS | APARATOS SANITARIO | ÁREA DESARROLLADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolívar | Mompós | INSTITUCIÒN EDUCATIVA TÈCNICA AMBIENTAL DE TIERRA FIRME | I.E.T.A. AMBIENTAL DE TIERRA FIRME - SEDE PRINCIPAL | 7 | 0 | 6 | 4.224 M2 |
| Bolívar | Mompós | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DEL CHICAGUA | SAN LUIS | 0 | 2 | 2 | |
| Bolívar | Córdoba | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE TACAMOCHO | TACAMOCHO (SEDE PRIMARIA) | 0 | 9 | 4 | |
| Bolívar | Córdoba | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE TACAMOCHO | NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE TACAMOCHITO | 0 | 0 | 0 | |
| Magdalena | San Sebastían de Buenavista | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA | ERM MARIA AUXILIADORA | 3 | 2 | 1 | |
| Magdalena | San Sebastián de Buenavista | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA | ERM LA PACHA | 3 | 6 | 1 | |
| Magdalena | San Sebastián de Buenavista | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE TRONCOSO | ERM DE JAIME | 0 | 0 | 0 | |

Se encuentra liquidado el contrato de obra. El contrato de interventoría iniciará su trámite de liquidación una vez que quede desembolsado el último pago, lo cuál se tiene estipulado se haga para…..

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# GRUPO 4: LIQUIDADO

## LA PACHA












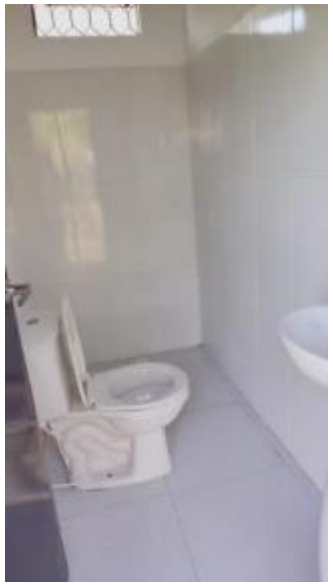










# Estado GRUPO 5, Departamentos de Magdalena y Bolívar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**16**
**Proyectos**

- 3 Departamentos
- 3 Municipios
- 16 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total, estudiantes SIMAT 2023 - 1177 estudiantes.
- $ 5.262.999.681 Inversión

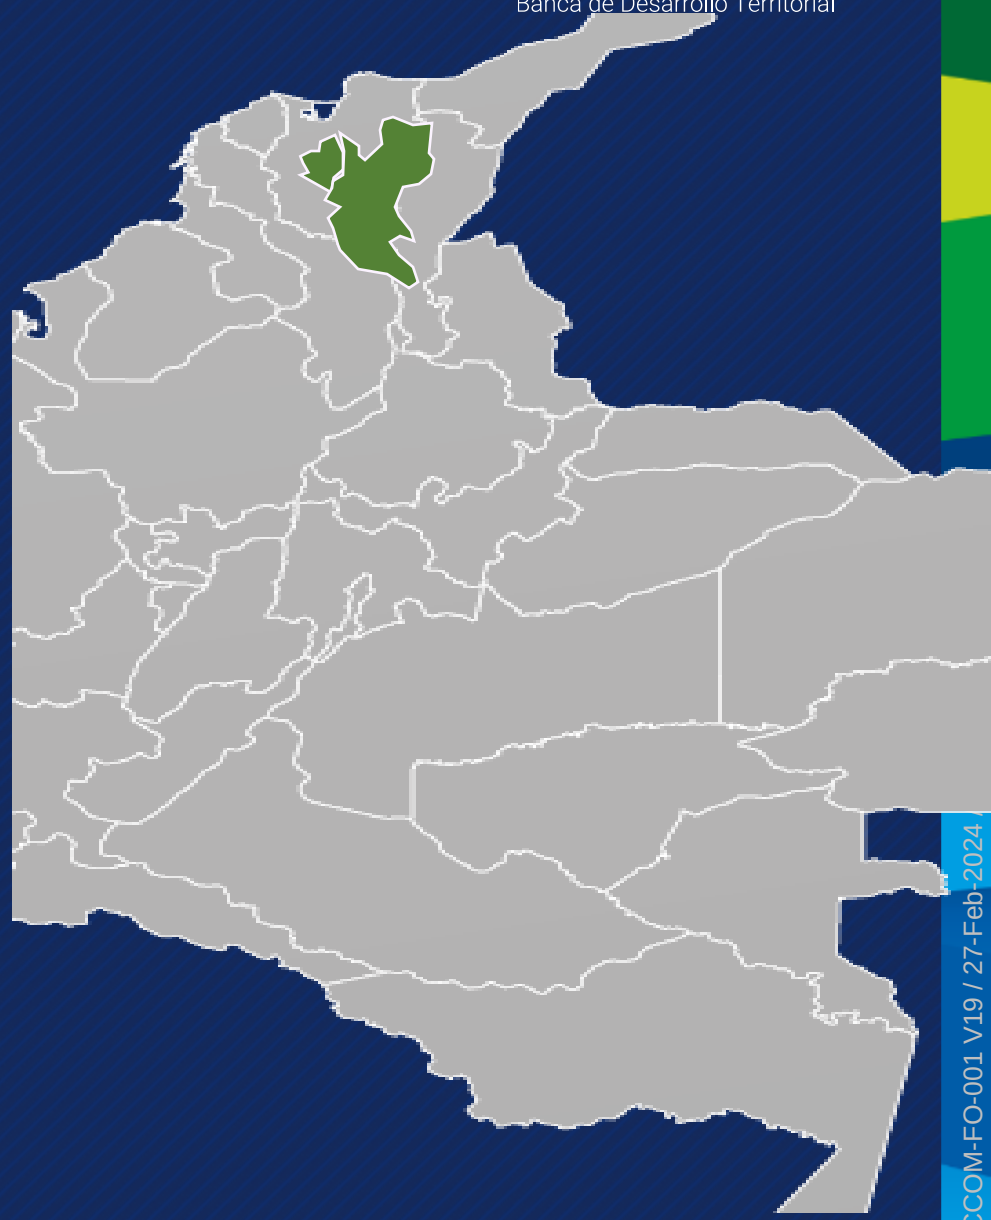

# GRUPO 5, Departamentos de Cesar, Magdalena y Bolívar.


**SEDES INTERVENIDAS:**

| DEPT | MUNICIPIO | IE | SEDE |
|---|---|---|---|
| Bolívar | Barranco de Loba | IE. TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR | I.E.T.A. LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR - SEDE PRINCIPAL |
| Bolívar | Barranco de Loba | IE. TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR | ATASCOZA |
| Bolívar | Barranco de Loba | IE. TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR | LOS CERRITOS |
| Magdalena | Concordia | IE. DEPARTAMENTAL DE BASICA Y MEDIA SANTA CRUZ DE BALSAMO | ERM DE BALSAMO |
| Magdalena | Concordia | INSTITUCION IE. SANTA CRUZ DE BALSAMO | JAR INF MIS PRIMEROS SUEÑOS |
| Magdalena | El Banco | IE. DEPARTAMENTAL ANTONIO NARIÑO | CENT EDUC RUR MIX JOSE DE LA PAZ VANEGA ORTIZ |
| Cesar | Curumaní | IE. CRISTIAN MORENO PALLARES | INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES |
| Magdalena | El Banco | IE. DEPARTAMENTAL RURAL SILVIA COTES DE BISWELL | ERM SANTA TERESA DE ISLITA |
| Bolívar | San Martín de Loba | IE. TÉCNICA PESQUERA LEONIDAS ORTIZ ALVEAR DE CHIMÍ | PLAN BONITO |
| Cesar | Curumaní | IE. CRISTIAN MORENO PALLARES | SEDE CHINELA |
| Cesar | Curumaní | IE. CRISTIAN MORENO PALLARES | SEDE GUAIMARAL |
| Cesar | Curumaní | IE. CRISTIAN MORENO PALLARES | SEDE LOS SERRENOS |
| Magdalena | El Banco | IE. DEPARTAMENTAL OSCAR PISCIOTTI NUMA | ERM INMACULADA CONCEPCION |
| Cesar | Chimichagua | CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO | SEDE TRONCONAL |
| Cesar | Chimichagua | CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO | SEDE PUERTO LA ESTANCIA |
| Cesar | Chimichagua | CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO | SEDE TORRECILLA |

**ALCANCE TOTAL DE INTERVENCIÓN**

| AULAS NUEVAS | AULAS MEJORADAS | BATERIAS SANITARIAS | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|---|---|
| | 10 | | 19/11/2024 |
| 1 | 3 | | 07/11/2024 |
| | 7 | | 19/11/2024 |
| | 6 | | 02/12/2024 |
| | 2 | | 02/12/2024 |
| 1 | 6 | 1 Bs, 11 ap | 13/11/2024 |
| | 11 | | 28/06/2024 |
| | 2 | | 5/06/2024 |
| 1 | 0 | | 2/06/2024 |
| 1 | 0 | 1 Bs, 4 ap | 12/11/2024 |
| | 3 | | 30/07/2024 |
| | 2 | | 21/06/2024 |
| | 2 | | 5/06/2024 |
| 1 | 0 | 3 Bs, 3 ap | 27/12/2024 |
| | 2 | | 30/07/2024 |
| | 3 | | 30/07/2024 |

**PORCENTAJES DE AVANCE:**




**ESTADO ACTUAL CIERRE Y LIQUIDACION CONTRATOS DERIVADOS**

**AERS COMPONENTE 2:**

- Contrato de Obra e Interventoría, en proceso de revisión por parte de la Fiduciaria Popular, una vez se tenga las AERS suscritas se procederá a solicitar la actualización de pólizas.

DOCUMENTOS DE CIERRE Y LIQUIDACION

CONTRATO PAF-MENAM-O-053-2023: Terminado el 08.11.2024
CONTRATO PAF-MENAM-I-056-2023: Terminado el 08.01.2025

En recopilación documental, cierre de balances y memorias entre el contratista e interventoría, se proyecta radicar la liquidación del contrato de obra la 28 de febrero de 2025 y posterior la de interventoría.

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# GRUPO 5, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES SEDE PRINCIPAL
ID No. 30





## INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES SEDE SERENOS
ID No. 101




## INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES SEDE SERENOS
ID No. 101




## INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRISTIAN MORENO SEDE CHINELA
ID No. 97





## INSTITUCION EDUCATIVA EL PUEBLITO SEDE PUERTO LA ESTANCIA
ID No. 147




## INSTITUCION EDUCATIVA EL PUEBLITO SEDE TORRECILLA
ID No. 148





# GRUPO 5, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PUEBLITO SEDE TRONCONAL
ID No. 146




## INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL SILVIA COTES DE BISWELL SEDE ISLITA
ID No. 32




## INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL OSCAR PISCIOTTI NUMA SEDE INMACULADA CONCEPCION




## INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ANTONIO NARIÑO SEDE JOSE DE LA PAZ VANEGAS




## INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA CRUZ DE BALSAMO SEDE PRIMARIA
ID No. 13




## INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA CRUZ DE BALSAMO SEDE JARDIN INFANTIL
ID No. 14




# GRUPO 5, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR SEDE PRINCIPAL
ID No. 06




INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR SEDE CERRITO
ID No. 10




INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR SEDE ATASCOZA
ID No. 09




INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA PESQUERA LEONIDAS ORTIZ ALVEAR SEDE PLAN BONITO
ID No. 43





# Estado GRUPO 6, Departamento de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-056-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-058-2023 – CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**7**
**Proyectos**

- 1 Departamentos
- 3 Municipios
- 7 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT 2023 - 3388 estudiantes.
- $ 2.697.151.413,44 Inversión



CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 6, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-056-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-058-2023 – CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| VALOR EJECUCION | FECHA INICIO C1 | FECHA FIN C1 | FECHA INICIO C2 | FECHA FIN C2 | PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O: $2.496.849.571,44<br>I: $200.301.842,00 | 15-nov-23 | 30-dic-23 | 30-nov-23 | 29-abr-2024 | **Programado** | 100% | 0,00% |
| **AVANCE POR COMPONENTE** | **Programado** | 100,00% | **Programado** | 100,00% | **Ejecutado** | 100% | |
| | **Ejecutado** | 100,00% | **Ejecutado** | 100,00% | **Liquidado** | | |

**ALCANCE DEFINIDO**

| DPTO | MUNICIPIO | INSTITUCION EDUCATIVA | SEDE | AULAS NUEVAS | AULAS MEJORADAS | BATERÍAS SANITARIAS | ID MEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar | El Paso | IE OCTAVIO MENDOZA DURAN | SEDE LA ESTACION | 1 | 1 | 1 - Mejorada | 79 |
| | La Paz(Robles) | CENTRO EDUCATIVO INDIGENA CAÑO PADILLA YUKPA | SEDE EL COSO | 1 | 0 | N.A. | 45 |
| | El Paso | IE OCTAVIO MENDOZA DURAN | SEDE EL VALLITO | N.A. | 3 | N.A. | 75 |
| | | | SEDE LA ESPERANZA | N.A. | 8 | 1 - Mejorada | 74 |
| | | | SEDE SAN ANGEL | N.A. | 1 | 1 - Nueva | 77 |
| | Valledupar | IE ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ | IE ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ | N.A. | 11 | N.A. | 4 |
| | | IE TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ | INSTITUTO TECNICO COMERCIAL JOSE EUGENIO MARTINEZ | N.A. | 23 | N.A. | 48 |

**Avance General:** Liquidado.

**COMPONENTE I:** Entregado 02/02/2024 – 100%

**COMPONENTE II:** Entregado 15/04/2024 al 17/05/2024– 100%

**LIQUIDACIÓN Contrato de Obra No. PAF-MENAM-O-056-2023:** Suscrita Acta de liquidación el 20/11/2024 y pagado al 100%.

**LIQUIDACIÓN Contrato de Interventoría No. PAF-MENAM-I-058-2023:** Suscrita Acta de liquidación el 27/11/2024 y pagado al 100%.

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# GRUPO 6, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-056-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-058-2023 – CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN – SEDE EL VALLITO

| MUNICIPIO | | El Paso |
|---|---|---|
| POBLACIÓN BENEFICIADA | | 105 estudiantes |
| ALCANCE | | |
| Aulas mejoradas | 3 | • Cambio de cubierta<br>• Cambio de red eléctrica<br>• Instalación de canales tipo amazonas.<br>• Instalación de bajantes.<br>• Reparación de grietas en aulas 1, 2 y 3.<br>• Reparación de muros con desprendimiento de pañetes en el aula 1.<br>• Raspado de pintura existente en aulas 1, 2 y 3.<br>• Acabado en estuco y pintura para muros del aula 1, 2 y 3.<br>• Mantenimiento de rejas metálicas de aulas 1, 2 y 3. |
| Baterías sanitarias | N.A. | N.A. |
| FECHA DE ENTREGA | | 15/04/2024 |

## REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ANTES





## REGISTRO FOTOGRAFICO DEL DESPUES






CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# GRUPO 6, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-056-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-058-2023 – CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN – SEDE LA ESTACION

| MUNICIPIO | | El Paso |
|---|---|---|
| POBLACIÓN BENEFICIADA | | 65 estudiantes |
| ALCANCE | | |
| Aulas nuevas | 1 | Aula prefabricada - Material WPC |
| Aulas mejoradas | 1 | * Cambio de cubierta<br>* Cambio de red eléctrica |
| Baterías sanitarias | Mejoramiento | * Cambio de enchape por la calidad de instalación del existente y limpieza y mantenimiento de sanitarios existentes<br>* Mantenimiento de carpintería metálica<br>* Cambio de cubierta y red eléctrica<br>* Suministro de tanque de agua potable 2000 L<br>* Construcción de poza séptica con campos de infiltración. |
| FECHA DE ENTREGA | | 02/05/2024 |

## REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ANTES






## REGISTRO FOTOGRAFICO DEL DESPUES






CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# GRUPO 6, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-056-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-058-2023 – CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## CENTRO EDUCATIVO INDIGENA CAÑO PADILLA YUKPA – SEDE EL COSO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | La Paz (Robles) |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 65 estudiantes |
| **ALCANCE** | | |
| Aulas nuevas | 1 | • Suministro e instalación de aula de 45 M2 tipo multigrado, prefabricada.<br>• Instalación de un sistema de panel solar con sus respectivos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento |
| Baterías sanitarias | N.A. | N.A. |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 04/05/2024 |

## REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ANTES





## REGISTRO FOTOGRAFICO DEL DESPUES









# GRUPO 6, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-056-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-058-2023 – CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN – SEDE LA ESPERANZA

| MUNICIPIO | | El Paso |
|---|---|---|
| POBLACIÓN BENEFICIADA | | 225 estudiantes |
| ALCANCE | | |
| Aulas mejoradas | 9 | ✓ 7 AULAS:<br>• Cambio de cubierta<br>• Cambio de red eléctrica<br>• Instalación de canales tipo amazonas.<br>• Instalación de bajantes.<br>• Reparación de grietas en bloque 1 y aula 6<br>• Reparación de muros con desprendimiento de pañetes.<br>• Raspado de pintura existente en bloque 1, aula 5 y 6<br>• Acabado en estuco y pintura para muros del bloque 1, aula 5 y 6.<br>• Mantenimiento de pintura a marcos y hoja de puertas del bloque 1, aula 5, 6<br><br>✓ 2 AULAS<br>• Cambio de cubierta<br>• Subida de nivel<br>• Cambio de red eléctrica<br>• Mejoramiento en muros y en carpintería metálica<br>✓ OBRAS HIDRÁULICAS EN LA SEDE |
| Baterías sanitarias | SI | • Cambio de cubierta<br>• Cambio de red eléctrica<br>• Mantenimiento de pintura a marcos y hoja de puertas |
| FECHA DE ENTREGA | | 10/05/2024 |

## REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ANTES





## REGISTRO FOTOGRAFICO DEL DESPUES







# GRUPO 6, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-056-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-058-2023 – CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN – SEDE SAN ANGEL

| MUNICIPIO | | El Paso |
|---|---|---|
| POBLACIÓN BENEFICIADA | | 8 estudiantes |
| ALCANCE | | |
| Aulas mejoradas | 1 | • Mantenimiento y limpieza de cubierta<br>• Cambio de puerta de acceso principal<br>• Mejoramiento de ventanas el cual incluye lijado, anticorrosivo y pintura. |
| Baterías sanitarias | SI | • Suministro e instalación de batería sanitaria prefabricada.<br>• Instalación de sistema séptico.<br>• Instalación de tanque plástico 500 L para contención de agua potable. |
| FECHA DE ENTREGA | | 15/05/2024 |

## REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ANTES





## REGISTRO FOTOGRAFICO DEL DESPUES





CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# GRUPO 6, Departamentos de Cesar


Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-056-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-058-2023 – CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ – IE ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ

| MUNICIPIO | | Valledupar |
|---|---|---|
| POBLACIÓN BENEFICIADA | | 385 estudiantes |
| ALCANCE | | |
| Aulas mejoradas | 11 | • Cambio de cubierta<br>• Cambio de red eléctrica<br>• Cambio de pisos en aulas 1, 2 y 3 del bloque 1.<br>• Aseo manual de muros con ácido muriático en el bloque 5.<br>• Desmonte manual de muro divisorio en aulas del bloque 2.<br>• Instalación de muro divisorio en sistema drywall para aulas del bloque 2 .<br><br>En sala de informática y las 2 aulas del bloque 2.<br>• Desmonte de cielo raso.<br>• Instalación de cielo raso en lamina PVC. |
| Baterías sanitarias | N.A. | N.A. |
| FECHA DE ENTREGA | | 16/05/2024 |

## REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ANTES

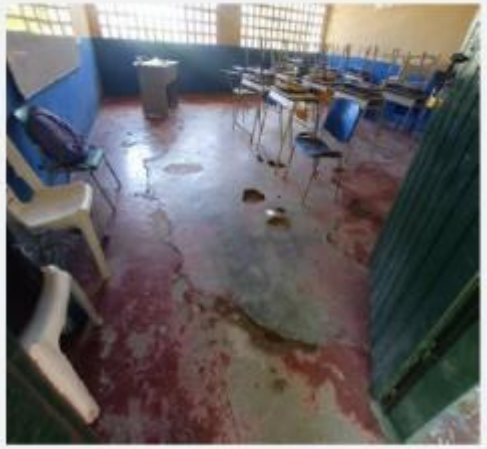
## REGISTRO FOTOGRAFICO DEL DESPUES





CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# GRUPO 6, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-056-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-058-2023 – CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ– SEDE INSTITUTO TECNICO COMERCIAL JOSE EUGENIO MARTINEZ

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Valledupar |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 805 estudiantes |
| **ALCANCE** | | |
| Aulas mejoradas | 23 | * Cambio de cubierta para bloque 1, 2, 3, 4 y 5- correspondiente a las 23 aulas.<br>* Cambio de red eléctrica para bloque 1, 2, 3, 4 y 5 por cambio de cubierta - correspondiente a las 23 aulas.<br>* Instalación de canales tipo amazonas.<br>* Instalación de bajantes.<br>* Pintura interna para los bloques 1, 2, 3, 4 y 5 por cambio de cubierta - correspondiente a las 23 aulas. |
| Baterías sanitarias | N.A. | N.A. |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 17/05/2024 |

## REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ANTES





## REGISTRO FOTOGRAFICO DEL DESPUES






CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 7, Departamento de La Guajira

Contratista de Diseño y Obra PAF-ATMEN5-O-036-2024 – CONSORCIO GUAJIRA 7 (Máxima Solutions sas 50% Gancar Distribuciones sas 50%)
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-059-2023 – GERMÁN ADOLFO PERDOMO PACHÓN

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**13**
**Proyectos**

- 1 Departamento
- 4 Municipios
- 9 Instituciones
  13 Sedes
- Total estudiantes SIMAT 2024 - 2585 estudiantes.
- $4.454.016.879
  Inversión




CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 7,Departamento de La Guajira

Contratista de Diseño y Obra PAF-ATMEN5-O-036-2024 – CONSORCIO GUAJIRA 7 ( Maxima Solutions sas 50% Gancar Distribuciones sas 50%)

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-059-2023 – GERMÁN ADOLFO PERDOMO PACHÓN

| VALOR EJECUCION | FECHA INICIO C1 | FECHA FIN C1 | FECHA INICIO C2 | FECHA FIN C2 | PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O: $4.158.777.879<br>I: $295.239.000 | 31/05/2024 | 15/07/2024 | 15/07/2024 | 17/01/2025 | Progr | 100,00% | 0,00% |
| AVANCE POR COMPONENTE | Programado | 100,00% | Programado | 100,00% | Ejecut | 100,00% | |
| | Ejecutado | 100,00% | Ejecutado | 100,00% | | | |

| DPTO | MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SEDE | AULAS NUEVAS | AULAS MEJORAD | APARAT SANIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guajira | Maicao | I.E. INDÍGENA No. 2 | KASICHE | 1 | 0 | 2 |
| Guajira | Maicao | I.E. INDÍGENA No. 6 | YAMAIN KASPOLIMANA | 1 | 1 | 2 |
| Guajira | Maicao | ESC. RURAL MIXTA TALOULUMAANA | ESC. RURAL MIXTA TALOULUMAANA | 2 | 0 | 6 |
| Guajira | Manaure | I. ETNOEDUCATIVA NTRA. SRA. DE FÁTIMA | ESC. RURAL INDÍGENA KARALOUTAMANA | 1 | 0 | 2 |
| Guajira | Barrancas | CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL PROVINCIAL | CENTRO ETNOEDUCATIVO PROVINCIAL | 1 | 0 | 0 |
| Guajira | Maicao | I.E. INDÍGENA No. 2 | LA CAMPANA | 0 | 9 | 0 |
| Guajira | Maicao | I.E. INDÍGENA No. 2 | WAYUUMAANA | 0 | 2 | 0 |
| Guajira | Maicao | I.E. INDÍGENA No. 2 | LA ESTRELLA | 1 | 0 | 0 |
| Guajira | Maicao | I.E. INDÍGENA No. 6 | YAMAIN PRINCIPAL | 1 | 0 | 0 |
| Guajira | Riohacha | I.E. JOSÉ ANTONIO GALÁN | COOPERATIVO | 0 | 7 | 0 |
| Guajira | Riohacha | I.E. JOSÉ ANTONIO GALÁN | JOSÉ ANTONIO GALÁN | 0 | 0 | 6 |
| Guajira | Riohacha | I. ETNOEDUCATIVA No. 7 | APUNIMAANA1 | 0 | 8 | 0 |
| Guajira | Riohacha) | I. ETNOEDUCATIVA No. 7 | WAKUAPAMANA | 0 | 9 | 6 |
| TOTALES | | | | 8 | 36 | 24 |

**Avance General: se reinició 18dic24**

**Avance general Componente I: 100%**

**Avance general por Sede Componente II: 100,00%**

**ID53 Maicao, I.E. Indígena No.2, Sede Kasiche: 100,00%**
**ID152 Maicao, I.E. Indígena No.6, Sede Yamain Kaspolimana: 100.00%**
**ID153 Maicao, E.R. Mixta Taloulumaana, Sede E.R. Mixta Taloulumaana: 100.00%**
**ID11 Manaure, I. Etnoeducativa Ntra Sra Fátima, Sede E.R. Indígena Karaloutamana: 100.00%**
**ID143 Barrancas, C. Etnoeducativo Rural provncial, Sede C. Etnoeducativo Provincial: 100.00%**
**ID50 Maicao, I.E. Indígena No.2, Sede La Campana: 100,00%**
**ID54 Maicao, I.E. Indígena No.2, Sede Wayuumaana: 100,00%**
**ID151 Maicao, I.E. Indígena No.2, Sede La Estrella: 100.00%**
**ID51 Maicao, I.E. Indígena No.6, Sede Yamain principal: 100.00%**
**ID60 Riohacha, I.E. José Antonio Galán, Sede Cooperativo: 100,00%**
**ID95 Riohacha, I.E. José Antonio Galán, Sede José Antonio Galán: 100.00%**
**ID34 Riohacha, I.Etnoeducativa No.7, Sede Apunimaana1: 100,00%**
**ID117 Riohacha, I.Etnoeducativa No.7, Sede Wakuapamana: 100,00%**

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# REGISTRO FOTOGRAFICO

I.E. JOSE ANTONIO GALAN- SEDE COOPERATIVO -060-(RIOHACHA)





INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #7 - 034-APÜNIMA´ANA1 -(RIOHACHA)





ESCUELA ETNOEDUCATIVA LA CAMPANA -050--(MAICAO)







ESCUELA ETNOEDUCATIVA WAYUMA'ANA -054- (MAICAO)





# REGISTRO FOTOGRAFICO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #7 - 117-WAKUAPAMANA -(RIOHACHA)








I.E. JOSE ANTONIO GALAN- SEDE PRINCIPAL -060-(RIOHACHA)






INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #6 - 051-TALOULUMA `ANA -(MAICAO)





INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO RURAL PROVINCIAL - 0143-PROVINCIAL -(BARRANCAS)




# REGISTRO FOTOGRAFICO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA - 011- ESCUELA RURAL INDIGENA KARALOUTAMANA -(MANAURE)




ESCUELA ETNOEDUCATIVA SEDE KASICHE -053- (MAICAO)








INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #6 - 151-LA ESTRELLA -(MAICAO)




INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #6 - 051- YAMAIN SEDE PRINCIPAL -(MAICAO)




INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #6 - 152- YAMAIN KASPOLIMANA -(MAICAO)






# Estado GRUPO 8, Departamentos de Bolívar - Córdoba

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-055-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S.
Contratita Interventor PAF-MENAM-I-057-2023 – LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO

**9**
**Proyectos**

- 2 Departamentos
- 7 Municipios
- 8 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT 2023 - 3710 estudiantes.
- $ 6.602.674.825 Inversión



CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 - Clasificada

# Estado GRUPO 8, Departamentos de Córdoba y Bolívar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-055-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-057-2023 – LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO

| VALOR EJECUCION | FECHA INICIO C1 | FECHA FIN C1 | FECHA INICIO C2 | FECHA FIN C2 | PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **O:**$6.161.470.280 **I:** $441.204.280 | 08/11/2023 | 23/12/2023 | 24/12/2023 | 08/07/2024 | **Progr** | 100% | 0,00% |
| **AVANCE POR COMPONENTE** | **Programado** | 100% | **Programado** | 100,00% | **Ejecut** | 100% | |
| | **Ejecutado** | 100% | **Ejecutado** | 100,00% | | | |

| DPTO | MUNICIPIO | I.E. | SEDE | AULAS NUEVAS | AULAS MEJORAD | APARATOS SANITARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolívar | María la Baja | Técnica Agropecuaria de Desarrollo Rural de Marialabaja | T. Agropecuaria De Desarrollo Rural De Marialabaja | 2 | 22 | 0 |
| Bolívar | María la Baja | Técnica Agropecuaria De Desarrollo Rural De Marialabaja | Buenos Aires | 0 | 6 | 6 |
| Bolívar | María la Baja | Técnica Agroindustrial de Flamenco | Níspero | 0 | 8 | 8 |
| Córdoba | Ayapel | San Jerónimo | Esc Nva Parcelas Londres | 1 | 0 | 1 |
| Córdoba | Montelíbano | El Palmar | El Palmar Sed Ppal | 2 | 5 | 8 |
| Córdoba | Planeta Rica | Loma Azul | Los Cerros | 1 | 7 | 0 |
| Córdoba | Puerto Libertador | Pica Pica Viejo | Esc Nva La Solita | 1 | 0 | 1 |
| Córdoba | Cotorra | Los Aguacates | Centro Educativo Los Aguacates | 0 | 2 | 0 |
| Córdoba | Tuchín | Técnica Álvaro Ulcue Chocue | Técnica Álvaro Ulcue Chocue | 0 | 22 | 0 |

**Avance General:** En expedición el acta de liquidación del contrato. En consolidación la información del contrato de interventoría. Se proyecta su liquidación en el mes de marzo

**Avance general por Sede Componente 2:**

1. **Sede Los Aguacates - Cotorra** Entrega técnica el 22 de mayo 2024.
2. **Sede Los Cerros - Planeta Rica:** Entrega técnica el 14 de junio 2024.
3. **Sede Técnica Agropecuaria De Desarrollo Rural De María la baja - María La Baja**: Entrega técnica el 28 de junio 2024.
4. **Sede Buenos Aires - María La Baja:** Entrega técnica el 22 de mayo 2024.
5. **Sede Esc. Nueva Parcelas Londres - Ayapel:** Entrega técnica el 21 de mayo 2024.
6. **Sede principal I. E. El Palmar - Montelíbano:** Entrega técnica el 21 de mayo 2024.
7. **Sede Esc. Nueva La Solita - Puerto Libertador:** Entrega técnica el 21 de mayo 2024.
8. **I.E. Técnica Álvaro Ulcue Chocue - Tuchín:** Entrega técnica el 30 de julio 2024.
9. **IE Agroindustrial de Flamenco Sede Níspero-María La Baja**: Entrega técnica el 21 de agosto 2024.

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# REGISTRO FOTOGRAFICO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## Sede principal I. E. El Palmar - Montelíbano





## Sede Téc. Agrop. De Desarrollo Rural De María la baja - María La Baja





# REGISTRO FOTOGRAFICO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## Sede Buenos Aires - María La Baja






## Sede Esc. Nueva Parcelas Londres - Ayapel





# REGISTRO FOTOGRAFICO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## Sede Esc. Nueva La Solita - Puerto Libertador







## Sede Los Aguacates - Cotorra







# REGISTRO FOTOGRAFICO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## Sede Los Cerros - Planeta Rica





## Sede Técnica Álvaro Ulcue Chocue - Tuchín





# REGISTRO FOTOGRAFICO

## Sede Níspero-María La Baja













CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 9, Departamentos de Arauca, Bolívar, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima y Bogotá D.C.

Contratista de Diseño y Obra PAF-ATMEN5-O-037-2024 – CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9
Contratista Interventor PAF-ATMEN5-I-064-2024 – CONSORCIO SAN GABRIEL

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**15**
**Proyectos**

- 8 Departamentos
- 12 Municipios
- 13 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT 2024 - 3351 estudiantes.
- $ 5.124.276.306 Inversión



CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 9, Departamentos de Arauca, Bolívar, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima y Bogotá D.C.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Contratista de Diseño y Obra PAF-ATMEN5-O-037-2024 – CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9

Contratista Interventor PAF-ATMEN5-I-064-2024 – CONSORCIO SAN GABRIEL

| VALOR EJECUCION | FECHA INICIO C1 | FECHA FIN C1 | FECHA INICIO C2 | FECHA FIN C2 | PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O: $4.810.476.306,00<br>I: $313.800.000 | 23-Ago-24 | 08-oct-24 | 09-oct-24 | 08-mar-25 | **Programado** | 62,35% | -21,70% |
| **AVANCE POR COMPONENTE** | **Programado** | 100,00% | **Programado** | 60,12% | **Ejecutado** | 40,65% | |
| | **Ejecutado** | 100,00% | **Ejecutado** | 33,7% | **En ejecución de obras** | | |

| DPTO | MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SEDE | AULAS NUEVAS | AULAS MEJORAD | APARATOS SANITARIOS | ID MEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santander | Vélez | COLEGIO UNIVERSITARIO | COLEGIO UNIVERSITARIO | 4 | 9 | Si aplica | 7 |
| | Betulia | INSTITUCION EDUCATIVA EL RAMO | CENTRO EDUCATIVO SANTA BARBARA | NA | 1 | Si aplica | 17 |
| | Barrancabermeja | CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN | CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN | Sede retirada | | | 141 |
| Bolívar | Morales | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PALMA | LA ARCADIA | NA | 2 | Si aplica | 20 |
| | Simití | INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CERRO DE VERACRUZ | CAMPO PAYARES | 1 | 1 | Si aplica | 123 |
| | | | I.E. DEL CERRO DE VERACRUZ - SEDE PRINCIPAL | NA | 12 | 5 | 124 |
| Bogotá, D.C. | Bogotá, D.C. | COLEGIO LA CHUCUA (IED) | CENT EDUC DIST LA CHUCUA | Sede retirada | | | 33 |
| | | COLEGIO ESTRELLA DEL SUR (IED) | COL DIST ESTRELLA DEL SUR | Sede retirada | | | 136 |
| Arauca | Saravena | CENTRO EDUCATIVO LA PAVA | LA PAVA | NA | 2 | 1 | 56 |
| | Arauca | CENTRO EDUCATIVO MONSERRATE | CEAR MONSERRATE | NA | 7 | 3 | 138 |
| Tolima | Santa Isabel | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BOLIVAR | LA HUMAREDA | 1 | 1 | 2 | 67 |
| | | | EL BRASIL | 1 | 1 | 2 | 100 |
| Meta | Villavicencio | INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO FRANCISCO ARANGO | ESCUELA SIETE DE AGOSTO | 5 | 2 | 8 | 96 |
| Cundinamarca | Anolaima | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE HUGO ENCISO | ESCUELA RURAL EL DESCANSO | 1 | 1 | 2 | 104 |
| Norte de Santander | La Playa | CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN PEDRO | SEDE LA PEÑA | NA | 1 | Si aplica | 132 |

**Avance General:**

- Se presenta un atraso por el no inicio de ejecución de obras en todas las sedes educativas; se solicitará inicio de proceso de apremio por los atrasos del contratista de obra.

**Avance por sede:**

**ID No. 56:** Sede por entregar – En coordinación de lo requerido para realizar la socialización final y firma del acta de entrega al cliente.
**ID No. 132:** Se realizó instalación de cubierta, se encuentran instalando cielo raso y luminarias y actividades de manejo de aguas lluvias.
**ID No. 138:** Se está realizando la instalación de la estructura metálica y la cubierta.
**ID No. 7:** Continúan con actividades de mejoramiento de las aulas existentes, se contempla finalizar actividades el 28/02/2025 y se iniciaron actividades de cimentación para la instalación de las aulas nuevas.
**ID No. 17:** El contratista manifiesta que iniciará actividades el 03/02/2025.
**ID No. 20:** El contratista informa que se tiene material en obra y se iniciarán actividades en la presente semana.
**ID No. 123:** Se iniciaron actividades el 20/01/2025.
**ID No. 124:** Se realizó el cambio de cubierta y estructura metálica y se encuentran en actividades en los muros existentes.
**ID No. 104:** Se encuentran en coordinación de transporte de materiales para los mejoramientos y cimentación del aula nueva y el contratista manifiesta que se inició fabricación del aula nueva. Adicionalmente, informa que iniciarán actividades el 28/01/2025.
**ID No. 67 y 100:** No se han iniciado actividades, contratista manifiesta que se han presentado inconvenientes con el transporte de los materiales dado que las lluvias que se presentaron a finales del 2024 deterioraron la vía de acceso. Se encuentran trasladando los materiales a lomo de mula.
**ID No. 96:** Se encuentran finalizando las actividades de las aulas nuevas y en ejecución del muro de cerramiento y obras de manejo de aguas lluvias. Sede programada a entregar el 06/02/2025.

Se realizará solicitud de aprobación de ítems no previstos y modificación del valor del contrato por los suministros de las aulas de las sedes retiradas.

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 9, Departamentos de Arauca, Bolívar, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima y Bogotá D.C.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Contratista de Diseño y Obra PAF-ATMEN5-O-037-2024 – CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9
Contratista Interventor PAF-ATMEN5-I-064-2024 – CONSORCIO SAN GABRIEL

## COLEGIO UNIVERSITARIO - ID No. 7





## IE DEL CERRO DE VERACRUZ -ID No. 124




## CENTRO EDUCATIVO MONSERRATE - ID No. 138




## INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BOLIVAR - ID No. 100 Y 67




CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 9, Departamentos de Arauca, Bolívar, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima y Bogotá D.C.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Contratista de Diseño y Obra PAF-ATMEN5-O-037-2024 – CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9
Contratista Interventor PAF-ATMEN5-I-064-2024 – CONSORCIO SAN GABRIEL

## CENTRO EDUCATIVO LA PAVA - ID No. 56





## SEDE LA PEÑA – ID No. 132





## ESCUELA SIETE DE AGOSTO - ID No. 96









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada


# Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca – Valle del Cauca y Choco

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**15**
**Proyectos**

- 3 Departamentos
- 5 Municipios
- 15 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total, estudiantes SIMAT 2023 - 3198 estudiantes.
- 7.063.483.948,76 Inversión - MEN

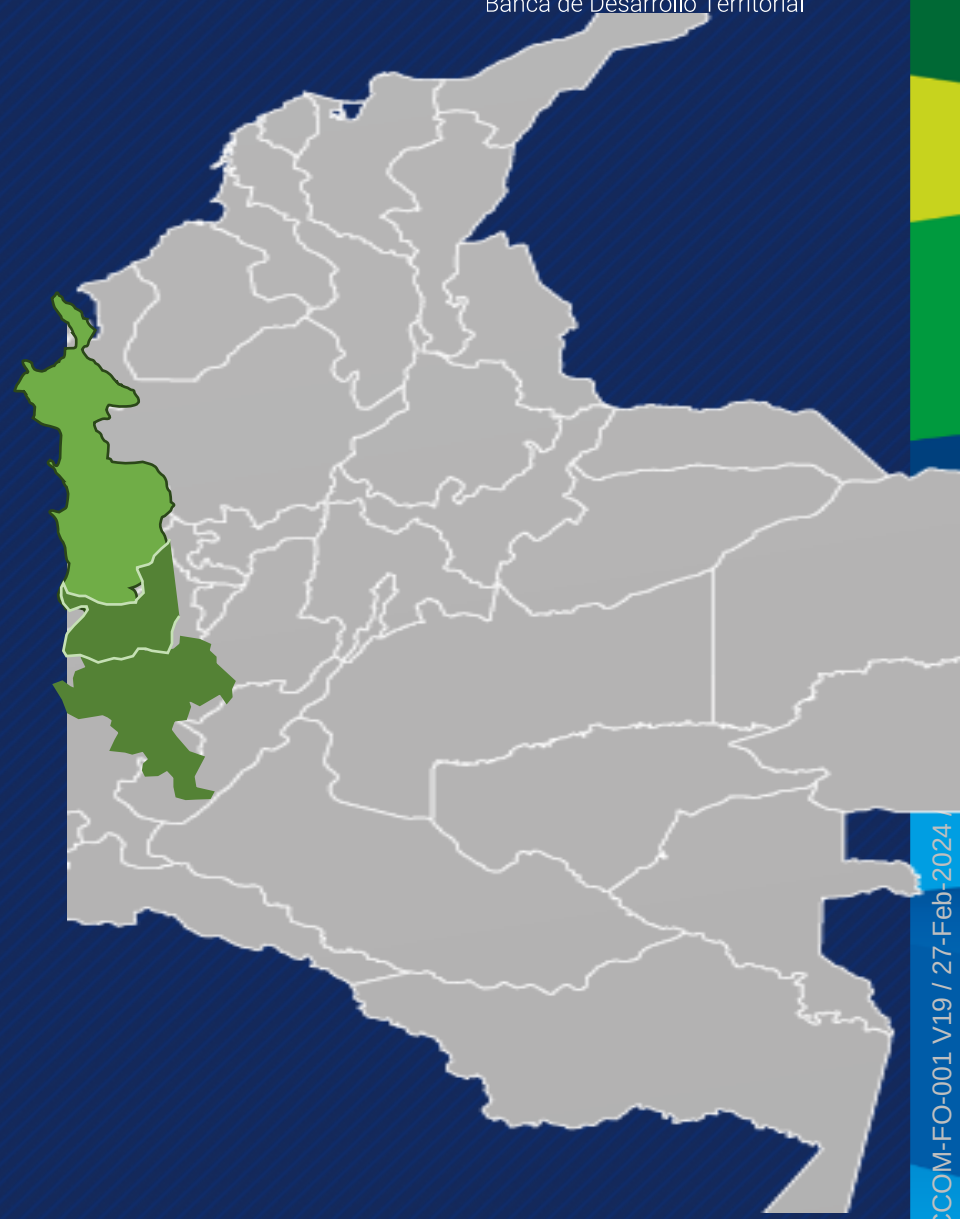

# Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca – Valle del Cauca y Choco


Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratita Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO

**SEDES INTERVENIDAS:**

| | | | | ALCANCE TOTAL DE INTERVENCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | IE | SEDE | AULAS NUEVAS | AULAS MEJ | BSANITARIAS | FECHA DE ENTREGA |
| CAUCA | SUAREZ | ID188. IE TECNICA AGRICOLA | SEDE PRINCIPAL | | 9 | 24 MEJORAM | 30/01/2025 |
| CAUCA | SUAREZ | ID189. IE TECNICA AGRICOLA | MARIA INMACULADA | 6 | 7 | 9 NUEVAS<br>7 MEJORAM | 30/03/2025 |
| CAUCA | SUAREZ | ID190. IE TECNICA AGRICOLA | FRANCISCO PAULA SANTANDER | | 13 | 10 MEJORAM | 30/03/2025 |
| CAUCA | TORIBIO | ID12. IE LA PLAYA | CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO LA PLAYA | | 9 | | 14/08/2024 |
| CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | ID16. IE DOMINGUILLO | SEDE PRINCIPAL | 8 | | 8 NUEVAS | 30/03/2025 |
| CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | ID164. IE DOMINGUILLO | SEDE DOMINGO LASSO | | 4 | 3 MEJORAM | 28/05/2024 |
| CHOCO | BAHIA SOLANO | ID105. IE LUIS LOPEZ DE MESA | SEDE DE SAN JOSE (HUACA) | 1 | | 2 NUEVAS | 28/02/2025 |
| CHOCO | BAHIA SOLANO | ID106. IE LUIS LOPEZ DE MESA | SEDE SIRENA DEL MAR | | 1 | 2 MEJORAM | 03/12/2024 |
| CHOCO | BAHIA SOLANO | ID107. IE LUIS LOPEZ DE MESA | SEDE SECUNDINO RIVAS | | 7 | 4 MEJORAM | 03/12/2024 |
| V DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA | ID128. IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE | SEDE PRINCIPAL | | 9 | 14 MEJORAM | 26/11/2024 |
| V DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA | ID130. IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE | SEDE LA HONDA | | 1 | 2 MEJORAM | 08/08/2024 |
| V DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA | ID85. IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE | SEDE LA PLANTA | 1 | 2 | 2 | 03/12/2024 |
| V DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA | ID158. IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE | SEDE CRISTOBAL COLON | 1 | | 2 MEJORAM | 17/09/2024 |
| V DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA | ID62. IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE | SEDE JHN F KENNEDY | | 11 | 14 MEJORAM | 26/11/2024 |
| V DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA | ID129. IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE | SEDE JULIAN MENDOZA GUERRERO | | 5 | 10 MEJORAM | 17/09/2024 |

**PORCENTAJES DE AVANCE:**




| Estado | Proyectos |
|---|---|
| Entregados | 10 |
| Terminados | 1 |
| Ejecución | 4 |

**ESTADO ACTUAL EJECUCIÓN CONTRATOS DERIVADOS**

En cumplimiento al alcance se tienen 10 sedes entregadas y AEP&SC suscritas, 1 sede terminada programada entregar a rectora el 30.12.2024 y 4 sedes en ejecución, (2 Suarez, 1 Santander de Quilichao, 1 Bahía Solano)

Derivado de la necesidad de los 4 proyectos en ejecución, se tramito prórroga de 3 meses compartida, ante comité técnico No. 80 y Comité Fiduciario No. 51.

CONTRATO PAF-MENAM-O-080-2023: Termina el 30.03.2025
CONTRATO PAF-MENAM-I-062-2023: Termina el 30.05.2025

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## INSTITUCION E.TECNICA AGRARIA SEDE PRINCIPAL ID MEN. 188.




## INSTITUCION E.TECNICA AGRARIA SEDE INMACULADA ID MEN. 189.




## INSTITUCION E.TECNICA AGRARIA SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ID MEN. 190




## INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PLAYA ID MEN: 12. MUNICIPIO DE TORIBIO ID MEN: 12.




## INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO SEDE DOMINGO LASSO ID 164.




## INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO SEDE PRINCIPAL ID 16




CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó


Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE JOHN F. KENNEDY




## IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDEJULIAN MENDOZA GUERRERO
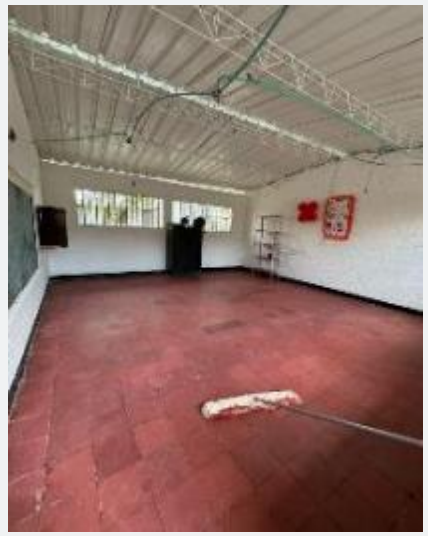
## IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE PRINCIPAL




## IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE LA HONDA .




## IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE LA PLANTA .




## IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE CRISTOBAL COLÓN




CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## IE. LUIS LOPEZ DE MESA SEDE SAN JOSE (HUACA)





## IE. LUIS LOPEZ DE MESA SEDE SECUNDINO RIVAS




## IE. LUIS LOPEZ DE MESA SEDE SIRENA DEL MAR




CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**18**
**Proyectos**

- 1 Departamento
- 6 Municipios
- 18 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT 2023 - 3170 Estudiantes
- $ 5.086.054.713 Inversión



# Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

| VALOR EJECUCION | FECHA INICIO C1 | FECHA FIN C1 | FECHA INICIO C2 | FECHA FIN C2 | PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **O:** $4.728.021.810<br>**I:** $ 358.032.903 | 12/02/2024 | 27/03/2024 | 18/03/2024 | 27/11/2024 | **Progr** | 100% | 0% |
| **AVANCE POR COMPONENTE** | **Programado** | 100% | **Programado** | 100% | **Ejecut** | 100% | |
| | **Ejecutado** | 100% | **Ejecutado** | 100% | | | |

| MUNICIPIO | INSTITUCIONES EDUCATIVAS | SEDE | Aulas Nuevas | Aulas Mejoradas | BATERÍA SANITARIA |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolívar | Centro Educativo el Tambo | La Fuente | 1 | 0 | 1 M |
| El Tambo | I.E. Huisitó | Huisitó (sede principal) | 6 | 0 | 6 N |
| La Vega | I.E Agropecuaria San Francisco Javier sede Garay | I.E Agropecuaria San Francisco Javier sede Garay | 1 | 0 | 1 N |
| Balboa | C.E. Buenos Aires | Capitanes | NA | 2 | 0 |
| | I.E. Olaya (antes C.E. Olaya) | Olaya (sede principal) | NA | 13 | 6 M |
| Bolívar | Institución Educativa Agropecuario Nuestra Señora del Carmen | Corral Viejo | 1 | 0 | 2 M |
| | | Nuestra Señora del Carmen (sede principal) | NA | 13 | 8 M |
| | Institución Educativa el Carmen | El Carmen (sede principal) | NA | 2 | 1 M |
| | Institución Educativa Técnica Agropecuaria Nuestra Señora de los Remedios | Colegio Departamental Nuestra Señora de los Remedios | NA | 10 | 8 M |
| La Vega | Institución Educativa Agropecuaria Santa Rita | Institución Educativa Santa Rita (sede principal) | NA | 6 | 0 |
| Popayán | I.E. Comuneros | sede principal | NA | 6 | 0 |
| Rosas | Institución Educativa Santa Teresita | Santa Teresita (sede principal) | NA | 17 | 8 M |
| | Institución Educativa Madre Caridad Brader | Madre Caridad Brader (sede principal) | 1 | 0 | 0 |
| | Centro Educativo Guillermo León Valencia | La Despensa | NA | 3 | 2 M |
| | | El Altillo | NA | 1 | 2 M |
| | Institución Educativa Alfonso Córdoba | Las Yerbas | NA | 2 | 2 M |
| | | El Retiro | NA | 1 | 1 M |
| | | Bellavista | NA | 1 | 0 |

**COMPONENTE 1**

El componente 1 del contrato de obra, correspondiente a los diagnósticos, estudios y diseños de las 18 sedes educativas priorizadas por el Ministerio de Educación Nacional, se encuentra actualmente concluido y recibido a satisfacción por parte de la interventoría al contrato de obra.

**COMPONENTE 2**

| Estado | Proyectos |
|---|---|
| Entregados | 16 |
| Terminados | 2 |
| Terminados – en Subsanación | 0 |
| Sin iniciar | 0 |

- 16 proyectos se encuentran terminados al 100%, recibidos a satisfacción por interventoría, y entregados a Directivos de cada sede.
- 2 proyectos se encuentran terminados al 100%, recibidos a satisfacción por interventoría, y en gestión de entrega a Directivos de cada sede.

Contrato de obra terminado. Contratista avanza en las gestiones de entrega a Directivos de las sedes terminadas y recibidas por interventoría. En algunas de estas sedes los Directivos están solicitando actividades por fuera del alcance contractual, razón por la cual se han gestionado y se siguen gestionando reuniones para aclarar nuevamente los alcances de cada intervención. Este aspecto se viene presentando en la IE Agropecuaria San Francisco Javier sede Garay de la Vega.

# Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO




I.E. Agropecuaria Santa Rita – Sede principal
La vega




C.E. Buenos Aires – Sede Capitanes
Balboa




C.E. Guillermo León Valencia – Sede La Despensa
Rosas





C.E. Guillermo León Valencia – El Altillo
Rosas

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial




I.E. El Carmen – Sede principal
Bolívar





I.E. Alfonso Córdoba – Sede Las Yerbas
Rosas




I.E. Alfonso Córdoba – Sede Bellavista
Rosas




I.E. Técnica Agropecuaria Nuestra Señora de los
Remedios - Bolívar

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial






I.E. Alfonso Córdoba – Sede El Retiro
Rosas





I.E. Nuestra Señora del Carmen – Sede Principal
Bolívar





I.E. Olaya – Sede principal
Balboa





C.E. El Tambo – Sede La Fuente
Bolívar

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial




I.E. Madre Caridad Brader – Sede principal Rosas




I.E. Nuestra Señora del Carmen – Sede Corral viejo Bolívar




I.E. Agropecuaria San Francisco Javier – Sede Garay La Vega




I.E. Santa Teresita – Sede principal Rosas

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial






I.E. Los Comuneros – Sede principal
Popayán







I.E. Huisitó – Sede principal
El Tambo

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada


# Estado GRUPO 12, Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julian Lizandro Gonzalez Casas 50% Jorge Andrés Chacón Ordoñez 50%)
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**18**
**Proyectos**

- 4 Departamentos
- 11 Municipios
- 18 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT 2023 - 3219 estudiantes.
- $5.236.381.488 Inversión

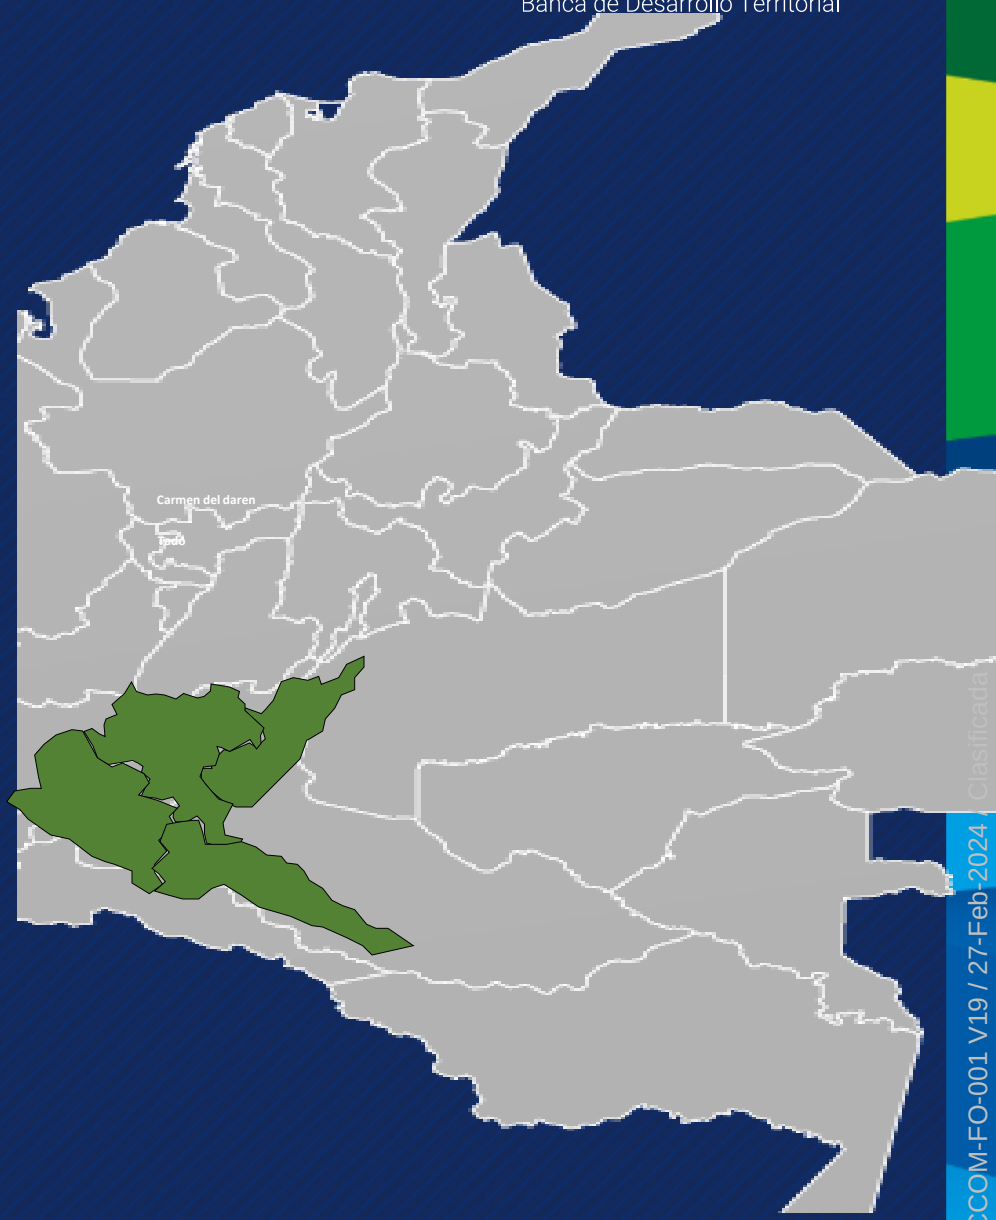


Clasificada
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024

# Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO


| VALOR EJECUCION | FECHA INICIO C1 | FECHA FIN C1 | FECHA INICIO C2 | FECHA FIN C2 | PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **O:**$4.918.276.400 **I:** $418.988.095 | 20/02/2024 | 4/04/2024 | 05/04/2024 | 04/12/2024 | **Programado** | 100,00% | 0% |
| **AVANCE POR COMPONENTE** | **Programado** | 100,00% | **Programado** | 100,00% | **Ejecutado** | 100,00% | |
| | **Ejecutado** | 100,00% | **Ejecutado** | 100,00% | **% Financiero G12: Obra:** 99,76% **Interventoría:** 85,22% | | |

| DPTO | MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SEDE | AULAS NUEVAS | AULAS MEJORAD | APARATOS SANITARIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cauca | Piamonte | ID27. Centro Educativo Puerto Guayuyaco | Escuela Rural Mixta La Espanola | 0 | 1 | 1 |
| Cauca | Piamonte | ID121. Centro Educativo Puerto Guayuyaco | Esc Rur Mix San Andresito | 0 | 1 | 1 |
| Cauca | Piamonte | ID125. Inst Educ Agric Piamonte | PIAMONTE (Sede Principal) | 0 | 28 | 1 |
| Cauca | Piamonte | ID173. Esc Rur Mix Fray Ezequiel | Esc Rur Mix Fray Ezequiel | 0 | 1 | 1 |
| Cauca | Piamonte | ID174. E.D.R Porto Guayuyaco Sede Principal | E.D.R Porto Guayuyaco Sede Principal | 0 | 4 | 1 |
| Huila | Acevedo | ID26. Institución Educativa Bateas | Bateas | 0 | 5 | 5 |
| Nariño | Pasto | ID1. I.E.M. Nuestra Señora De Guadalupe | I.E.M. Nuestra Señora De Guadalupe - Sede Principal | 0 | 5 | 0 |
| Nariño | El Rosario | ID8. Centro Educativo La Claudia | Centro Educativo La Claudia | 0 | 1 | 0 |
| Nariño | Cumbal | ID36. Institución Educativa Inmaculada Concepción De Tallambi | Institución Educativa Inmaculada Concepcion De Tallambi | 5 | 0 | 7 |
| Nariño | Barbacoas | ID87. Institución Educativa Teraimbe | Sede 9 Cumainde | 0 | 1 | 2 |
| Nariño | Barbacoas | ID110. Institución Educativa Teraimbe | Sede 2 Bombón | 0 | 2 | 1 |
| Nariño | Ipiales | ID142. Institución Educativa Agroindustrial Los Pastos | Escuela Las Cruces | 0 | 5 | 1 |
| Nariño | Mallama (Piedrancha) | ID149. Centro Educativo Mallama | Centro Educativo De Mallama | 0 | 1 | 1 |
| Putumayo | Puerto Asís | ID41.I. E. Rur Caucacia | Esc Rur Mix El Jardin Alto Teteye | 1 | 0 | 1 |
| Putumayo | Puerto Asís | ID57. I. E. Rur Caucacia | Esc Rur Mix El Progreso | 1 | 0 | 1 |
| Putumayo | Pto Leguízamo | ID88. IE Rur Luis Vidales Del Piñuña Negro | ESC RUR MIX PUERTO PRINCIPE DOS | 0 | 1 | 1 |
| Putumayo | Orito | ID127. Institucion Etnoeducativa Rural Umada Wuarrara | ESC RUR MIX ALTO ORITO | 1 | 0 | 1 |
| Putumayo | Puerto Asís | ID172. IE. Rur Caucacia - Sede Principal | SEDE PRINCIPAL | 0 | 6 | 12 |

- **Avance General Componente I:** Terminado 04/04/2024 y recibido
- **Avance General Componente II:** En Ejecución, con inicio 18 de 18.

| Estado | Proyectos |
|---|---|
| Entregados | 17 |
| Terminados | 1 |
| Ejecución | 0 |
| Sin iniciar | 0 |

- **Sede ID125. Piamonte (Cauca),** En ampliación de energización bifásica a trifásica (ampliación de carga por baja tensión) por la empresa ENERGIA DEL PUTUMAYO, revisión técnica desde el 17/12/2024, se dio respuesta parcial 21/01/2025 y se espera finalización proceso la primera semana de febrero. Por otro lado, el rector solicito recorrido con alcaldía para el día 23/01/2025, por lo cual, la supervisión solicito la entrega y suscripción del acta y realizar en paralelo trámite de energización.

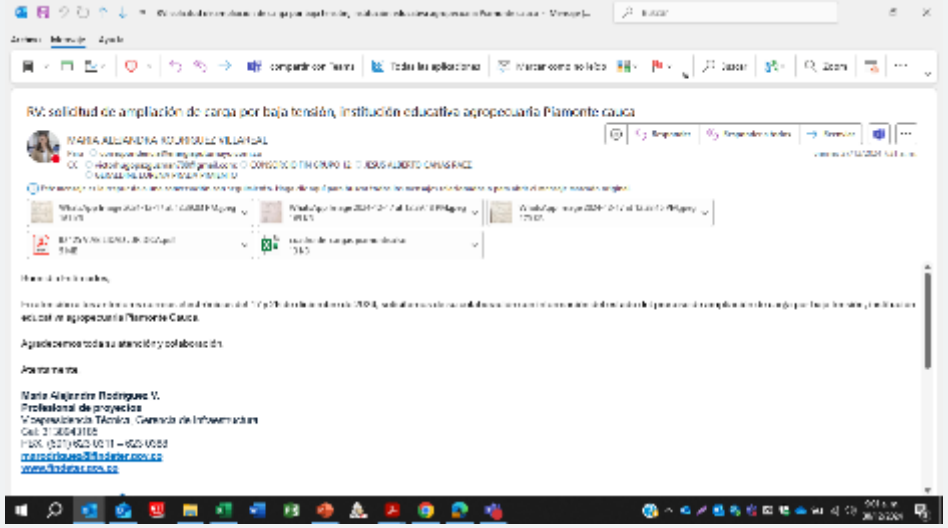


- **Sede ID36. Tallambi (Nariño),** Entregada al rector y comunidad el 26/12/2024

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

## ID1 Pasto, I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - ENTREGADO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Pasto - Nariño |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 262.132.882 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 986 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aulas | 5 | • Mejoramiento y mantenimiento de cubiertas, mampostería (estructura principal y de confinamiento), pisos en general, carpintería metálica y red eléctrica general.<br>• construcción de dos cubiertas para protección de losas existentes y cambio de cubierta en tres aulas de clase, reemplazo de canales. |
| Aulas nuevas | N.A. | N.A. |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | N.A. | |
| Baterías sanitarias nuevas | N.A. | |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 15 de agosto de 2024 |

## Antes





## Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID8 El Rosario, CENTRO EDUCATIVO LA CLAUDIA - ENTREGADO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | El Rosario - Nariño |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 66.208.426 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 8 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aulas | 1 | • Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general.<br>• construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias. |
| Aulas nuevas | N.A. | N.A. |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | N.A. | |
| Baterías sanitarias nuevas | N.A. | |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 24 de junio de 2024 |

## Antes







## Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID26 Acevedo, INSTITUCION EDUCATIVA BATEAS - ENTREGADO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Acevedo - Huila |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 278.705.701 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 193 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aulas | 5 | • Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general.<br>• construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias.<br>• Mejoramiento de restaurante escolar |
| Aulas nuevas | N.A. | N.A. |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | 1 | • Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general.<br>• construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias. |
| Baterías sanitarias nuevas | N.A. | |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 4 de octubre de 2024 – en proceso de posventas y entrega |

## Antes







## Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

## ID27 Piamonte, ESCUELA RURAL MIXTA LA ESPANOLA - ENTREGADO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Piamonte - Cauca |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 82.111.341 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 9 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aulas | 1 | • Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general.<br>• construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias. |
| Aulas nuevas | N.A. | N.A. |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | 1 | • Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general.<br>• construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias. |
| Baterías sanitarias nuevas | N.A. | |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 5 de julio de 2024 |

## Antes





## Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID88 Puerto Leguízamo, ESC RUR MIX PUERTO PRINCIPE DOS - ENTREGADO

| MUNICIPIO | | Puerto Leguizamo - Putumayo |
|---|---|---|
| VALOR DE INVERSIÓN | | $ 117.694.769 |
| POBLACIÓN BENEFICIADA | | 5 |
| ALCANCE | | |
| Mejoramientos Aulas | 1 | • Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general.<br>• construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias. |
| Aulas nuevas | N.A. | N.A. |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | 1 | • Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general.<br>• construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias. |
| Baterías sanitarias nuevas | N.A. | |
| FECHA DE ENTREGA | | 1 de agosto de 2024 |

## Antes





## Después











CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID121 Piamonte, ESC RUR MIX SAN ANDRESITO - ENTREGADO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Puerto Leguizamo - Putumayo |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 117.694.769 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 5 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aulas | 1 | • Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general.<br>• construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias. |
| Aulas nuevas | N.A. | N.A. |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | 1 | • Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general.<br>• construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias. |
| Baterías sanitarias nuevas | N.A. | |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 1 de agosto de 2024 |

## Antes





## Después









# Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

## ID142 Ipiales, ESCUELA LAS CRUCES - ENTREGADO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Ipiales - Nariño |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 112.235.014 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 173 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aulas | 5 | • Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general.<br>• construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias. |
| Aulas nuevas | N.A. | N.A. |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | 1 | • Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general.<br>• construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias. |
| Baterías sanitarias nuevas | N.A. | |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 22 de julio de 2024 |

### Antes



### Después







CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

## ID149 Mallama (Piedrancha), CENTRO EDUCATIVO DE MALLAMA - ENTREGADO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Ipiales - Nariño |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 57.066.573 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 9 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aulas | 1 | • Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general.<br>• construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias + muro de cerramiento |
| Aulas nuevas | N.A. | N.A. |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | 1 | • Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica. |
| Baterías sanitarias nuevas | N.A. | |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 19 de junio de 2024 |

### Antes



### Después









# Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

## ID174 Piamonte, E.D.R PORTO GUAYUYACO SEDE PRINCIPAL - ENTREGADO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Piamonte - Cauca |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 214.447.888 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 33 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aulas | 4 | • Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general.<br>• construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias + aula múltiple |
| Aulas nuevas | N.A. | N.A. |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | 1 | • Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica. |
| Baterías sanitarias nuevas | N.A. | |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 16 de agosto de 2024 |

### Antes





### Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

## ID87 Barbacoas, SEDE 9 CUMAINDE - ENTREGADO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Barbacoas - Nariño |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 97.200.260 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 15 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aulas | 1 | • Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general.<br>• construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias + aula múltiple |
| Aulas nuevas | N.A. | N.A. |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | 1 | • Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica. |
| Baterías sanitarias nuevas | N.A. | |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 17 de septiembre de 2024 |

## Antes





## Después









# Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

## ID110 Barbacoas, SEDE 2 BOMBON - ENTREGADO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Barbacoas - Nariño |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 135.500.591 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 39 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aulas | 2 | • Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general.<br>• construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias + aula múltiple |
| Aulas nuevas | N.A. | N.A. |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | 1 | • Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica. |
| Baterías sanitarias nuevas | N.A. | |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 17 de septiembre de 2024 |

## Antes





## Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)
Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO
ID173 Piamonte, ESC RUR MIX FRAY EZEQUIEL - ENTREGADO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Piamonte - Cauca |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 193.112.465 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 24 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aula múltiple | 1 | • Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general.<br>• construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias |
| Aulas nuevas | N.A. | N.A. |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | N.A | |
| Baterías sanitarias nuevas | 1 | • Ejecutada dentro del aula |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 6 de septiembre de 2024 |

## Antes





## Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID36 Cumbal, INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCION DE TALLAMBI – ENTREGADO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Cumbal - Nariño |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 818.394.560 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 171 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aula | N.A. | |
| Aulas nuevas | 5 | |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | N.A | |
| Baterías sanitarias nuevas | 7 | |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 26 de diciembre de 2024 |

## Antes






## Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID41 Puerto Asís, I. E. RUR CAUCACIA, ESC RUR MIX EL JARDIN ALTO TETEYE – ENTREGADO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Puerto Asís - Putumayo |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 184.632.555 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 5 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aula | N.A. | |
| Aulas nuevas | 1 | Instalación eléctrica fotovoltaica |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | N.A | |
| Baterías sanitarias nuevas | 1 | |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 3 de diciembre de 2024 |

## Antes





## Después











CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID57 Puerto Asís, I. E. RUR CAUCACIA, ESC RUR MIX EL PROGRESO – ENTREGADO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Puerto Asís - Putumayo |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 197.031.005 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 6 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aula | N.A. | |
| Aulas nuevas | 1 | Instalación eléctrica fotovoltaica |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | N.A | |
| Baterías sanitarias nuevas | 1 | |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 3 de diciembre de 2024 |

## Antes





## Después









# Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID125 Piamonte, INST EDUC AGRIC PIAMONTE (sede principal) – TERMINADO


| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Piamonte - Cauca |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 1.339.389.729 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 850 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aula | 28 | Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general. construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias. |
| Aulas nuevas | N.A | |
| Mejoramientos Baterías sanitarias + 1 ducha | 3 | Mejoramiento en preescolar + circulación, cerramiento y cubierta en domo |
| Baterías sanitarias nuevas | N.A | |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 23 de enero de 2025 |

## Antes





## Después

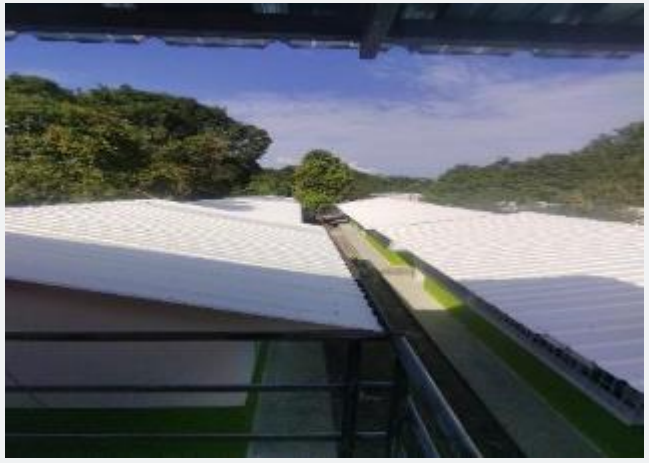







# Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID127 Orito, INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL UMADA WUARRARA, MIX ALTO ORITO – ENTREGADO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Orito - Putumayo |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 206.821.177 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 13 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aula | N.A | |
| Aulas nuevas | 1 | Instalación eléctrica fotovoltaica |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | N.A | |
| Baterías sanitarias nuevas | 1 | |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 3 de diciembre de 2024 |

## Antes





## Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID172 Puerto Asís, IE. RUR CAUCACIA - SEDE PRINCIPAL– ENTREGADO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Puerto Asís - Putumayo |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 224.052.916 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 161 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aulas (2 internado + 4 aulas) | 6 | |
| Aulas nuevas | N.A | |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | 12 | • Se incluyo estructura de tanques para mejorar la columna de agua en zonas húmedas en internado por solicitud de comunidad. |
| Baterías sanitarias nuevas | N.A | |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 3 de diciembre de 2024 |

## Antes






## Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Comité de seguimiento atención temporada lluvias MEN -FINDETER

**CONCLUSIONES/DECISIONES/RECOMENDACIONES/COMENTARIOS GENERALES:**

| | |
|---|---|
| **1** | **Grupo 11:** Se le informa al MEN el estado del Grupo 11, informando un avance del 100%, se le informo al MEN las sedes que se encuentra ya terminadas y entregadas, únicamente hacen falta 2 sedes por entregar. |
| **2** | **Grupo 3:** Se le informa al MEN<br>**LIQUIDACIÓN Contrato de Obra No. PAF-MENAM-O-051-2023:** Suscrita Acta de liquidación de fecha 01/10/2024 y pagado 100%.<br>**LIQUIDACIÓN Contrato de Interventoría No. PAF-MENAM-I-054-2023:**Suscrita Acta de liquidación de fecha 20/12/2024, en trámite de pago enero de 2025, |
| **3** | **Grupo 4:** Se le informa al MEN que el contrato de obra ya se encuentra liquidado, y en contrato de interventoría esta en tramite de recopilación de información. |
| **4** | **Grupo 7:**Se informa al MEN que el grupo ya tiene un avance del 100% se encuentran en procesos de entrega. |
| **5** | **Observaciones Generales**: MEN recomienda que las sedes tienen que ser intervenidas de manera simultanea en lo posible en el grupo 9 |
| **6** | **Compromisos**: Findeter se compromete a entregar la ficha con cada sede de las aulas nuevas entregadas. |
| **7** | **Compromisos**: Findeter se compromete a entregar la ruta de liquidación con fechas de cada grupo. |

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada



Findeter

Banca de Desarrollo Territorial

# GRACIAS

www.findeter.gov.co

@findetercol @findetercol

@findeter linkedin.com/company/findeter

VIGILADO

Hacienda

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Bogotá D.C.,

Ingeniera
**DIANA MILENA MALDONADO TORRES**
Supervisora del Contrato Ministerio de Educación Nacional - MEN
dmaldonado@mineducacion.gov.co
Calle 43 # 57-14 Piso 3
Bogotá D.C.

**Ref:** **Contrato No. NO. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER**. Cuyo Objeto es "BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES PRIORITARIAS EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR DE LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS QUE SEAN DEFINIDAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN"

**Asunto**: Remisión Informe Mensual No. 21 / Contrato No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023

Estimada Doctora:

Me permito remitir el Informe de Gestión y ejecución No. 21 correspondiente al periodo de 02 de febrero al 01 de marzo de 2025, en cumplimiento de las obligaciones descritas en el anexo al contrato de la referencia.

Así mismo, y en caso de estar de acuerdo solicitamos amablemente emitir la aprobación de éste para soporte al Patrimonio Autónomo FINDETER MEN Aulas Móviles por Ola Invernal (Fiduciaria POPULAR S.A) con la siguiente información:

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MEN
AULAS MÓVILES POR OLA INVERNAL
Fiduciaria Popular S.A.
Carrera 13A No. 29-24 Pisos 20, 21 y 24
Bogotá

Cordialmente,

**HERNÁN PARDO BOTERO**
Gerente de Infraestructura

*Anexo lo enunciado*
*Elaboró: Geraldine Lorena Prada Pimiento- Profesional de la Gerencia de Infraestructura*
*Revisó: Jesús Alberto Cañas Páez – Gestor de la Gerencia de Infraestructura*

# CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023

## ATENCIÓN DE NECESIDADES PRIORITARIAS EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR DE LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS

**Periodo comprendido entre el 02 de febrero al 01 de marzo de 2025**

**Bogotá D.C.**

## TABLA DE CONTENIDO


1. **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO MARCO**
2. **ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO**
   - 2.1 OBLIGACIONES GENERALES
   - 2.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS
   - 2.3 ACTIVIDADES PRECONTRACTUALES
     - 2.3.1 Obligaciones
   - 2.4 ACTIVIDADES CONTRACTUALES
     - 2.4.1 Obligaciones
   - 2.5 ACTIVIDADES DE CIERRE Y LIQUIDACIÓN
     - 2.5.1 Obligaciones
3. **RESUMEN GENERAL DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL CONTRATO**
4. **ANEXOS**

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO MARCO

| | | |
|---|---|---|
| Objeto General: | Brindar Asistencia Técnica y Administración de Recursos para atender las necesidades prioritarias en infraestructura y dotación de mobiliario escolar de las sedes educativas afectadas por la temporada de lluvias que sean definidas por el Ministerio de Educación. | |
| Numero de Contrato: | CO1.PCCNTR. 4917031 | |
| Integrantes: | MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - MEN Y LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER | |
| Fecha de suscripción: | 05 de mayo de 2023 | |
| Perfeccionamiento | Póliza garantía aprobada 26 de mayo de 2023<br>Registro Presupuestal 02 de junio de 2023 | |
| Fecha de Inicio: | 02 de junio de 2023 | |
| Fecha de Terminación: | 01 de julio de 2025 | |
| Modificaciones: | Modificatorio No. 1.<br>Modificar la cláusula cuarta - plazo de ejecución del contrato, la cual quedará de la siguiente manera:<br>"El plazo previsto para la ejecución del Contrato Interadministrativo será a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, hasta el 01 de noviembre de 2024, plazo en el que se debe llevar a cabo la ejecución física del contrato y la liquidación de la contratación derivada que suscriba FINDETER." | |
| | Modificatorio No. 2.<br>"Prorrogar el plazo de ejecución del contrato número CO1.PCCNTR.4917031 de 2023, hasta el 01 de julio de 2025, plazo en el que se debe culminar la ejecución física de las obras de infraestructura educativa, dotación de aulas nuevas por reposición, y la liquidación de la contratación derivada suscrita por FINDETER." | |
| Aportes: | Valor de los recursos a administrar para la ejecución de los proyectos | $ 59.485.981.308 |
| | Porcentaje de Asistencia Técnica y Administración de Recursos a reconocer a FINDETER (7%) | $ 4.164.018.692 |
| Valor final del Contrato: | | $ 63.650.000.000 |
| Sociedad Fiduciaria: | FIDUCIARIA POPULAR S.A. | |

## 1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO

### 1.1 OBLIGACIONES GENERALES

1. *Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas en este contrato.*

En el transcurso del periodo actual, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. (FINDETER) asume con responsabilidad la tarea integral de estructurar, desarrollar y dar seguimiento a todas las actividades derivadas de la ejecución de las diversas obligaciones estipuladas en el contrato vigente. En virtud de su compromiso, FINDETER se esfuerza por cumplir con cada una de las responsabilidades asignadas, garantizando que cada etapa del contrato sea llevada a cabo de manera exitosa y en plena conformidad con los términos y condiciones acordadas previamente.

Es importante destacar que el compromiso de FINDETER no se limita únicamente a la ejecución técnica del contrato, sino que abarca también la garantía de la calidad y la excelencia en cada una de las etapas del proceso. La entidad se esfuerza por mantener altos estándares de rendimiento, asegurando que los resultados obtenidos sean de la más alta calidad posible y estén alineados con los objetivos y metas establecidas.

2. *Participar y apoyar al Ministerio de Educación Nacional en todas las reuniones periódicas a las que este lo convoque relacionadas con la ejecución del contrato que permitan realizar seguimiento integral a los avances de los proyectos.*

Durante el presente periodo FINDETER participó activamente y brindó el pleno apoyo al Ministerio de Educación Nacional en todas las reuniones periódicas a las que se convocaron, especialmente, aquellas relacionadas con la ejecución del contrato. FINDETER está comprometido con realizar un seguimiento integral y detallado de los avances del proyecto, por lo que se establecieron reuniones cada martes en la tarde a través del aplicativo Teams, reuniones programadas por FINDETER sobre las que realizan grabaciones y se informa los avances semanales.

Las fechas de las reuniones de seguimiento del periodo, sobre las cuales se realiza el acta correspondiente, la cual se adjunta al presente informe:

1. 14 de febrero del 2025

3. *Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la información objeto del presente contrato.*

FINDETER ha dispuesto todos los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la información objeto del presente contrato. La seguridad y confidencialidad de la información son de suma importancia, y se ha implementado medidas sólidas para garantizar su protección. Esto incluye la implementación de sistemas de almacenamiento seguro, protocolos de acceso restringido y medidas de respaldo que aseguran que la información esté resguardada de manera adecuada en todo momento. La prioridad es mantener la integridad de la información involucrada en el contrato, así mismo se habilitó los espacios adecuados en la Calle 103 No. 19-20 y en la segunda sede localizada en la Calle 104 # 18ª-65, piso 6 para tal fin.

4. *Entregar a EL MINISTERIO, periódicamente y al finalizar el contrato, o cuando el supervisor o interventor lo solicite, todos los documentos y archivos (físicos y electrónicos) a su cargo y que se produzcan en ejecución de sus obligaciones, lo anterior, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes en el Ministerio de Educación Nacional.*

Durante este periodo, FINDETER ha cumplido rigurosamente con la entrega de todos los documentos y archivos electrónicos que el MEN ha solicitado durante la ejecución del contrato. Esta entrega se realiza de manera periódica y al finalizar el contrato, tal como establecen las normas y disposiciones vigentes en el Ministerio de Educación Nacional. Además, en concordancia con las regulaciones vigentes, también se proporcionará dicha documentación cuando el supervisor o interventor así lo solicite. La prioridad es asegurar que todas las partes involucradas tengan acceso a la información necesaria y que cumplan con todas las obligaciones contractuales en cuanto a la entrega y custodia de documentación.

5. *Colaborar en el suministro y respuesta de la información correspondiente a los requerimientos efectuados por los organismos de control del Estado Colombiano o cualquier otra autoridad, en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato y de asuntos relacionados con el mismo.*

   En este periodo, FINDETER ha colaborado plenamente en el suministro y respuesta de toda la información correspondiente a los requerimientos efectuados por los Entes de Control del Estado Colombiano y cualquier otra autoridad pertinente. La cooperación en este sentido es absoluta y FINDETER está comprometido en proporcionar toda la información necesaria relacionada con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato, así como en asuntos relacionados con el mismo.

   Cumplir con los requisitos de los Entes de Control y las autoridades es fundamental para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en todas las acciones. La disposición a colaborar asegura que el proceso se realice de manera adecuada y en línea con las regulaciones y requerimientos establecidos por las autoridades correspondientes.

6. *Utilizar la imagen del Ministerio de Educación Nacional de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorización expresa y escrita de las partes ningún funcionario, podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole.*

   FINDETER ha seguido rigurosamente los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional en relación con el uso de su imagen. FINDETER es consciente de que, salvo autorización expresa y escrita de las partes involucradas, ningún funcionario puede utilizar el nombre, emblema o sello oficial del Ministerio con fines publicitarios o de cualquier otra índole. La colaboración se adhiere estrictamente a estas directrices para asegurar el respeto mutuo y la integridad en la utilización de la imagen y la identidad del Ministerio. Durante este periodo no se realizaron trámites que contengan la imagen del Ministerio de Educación Nacional.

7. *Guardar estricta confidencialidad sobre toda la información y los documentos obtenidos del MEN.*

   FINDETER ha mantenido una estricta confidencialidad sobre toda la información y los documentos obtenidos del Ministerio de Educación Nacional (MEN). Reconoce la importancia de salvaguardar la información confidencial y sensible proporcionada por el MEN, y se ha implementado medidas rigurosas para garantizar su protección. Se cumple con todas las regulaciones y acuerdos de confidencialidad establecidos para asegurar que la información no sea divulgada ni utilizada de manera inapropiada. El compromiso de FINDETER es mantener la integridad y confidencialidad de la información en todo momento.

8. *Realizar los pagos al SISS (salud, pensión y riesgos laborales), de acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago correspondientes.*

En el presente periodo, se han realizado los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral (SISS), incluyendo Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de acuerdo con la normatividad vigente.

Además, se pueden proporcionar los soportes de pago correspondientes como parte del compromiso con la legalidad y el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales. Cumplir con los requerimientos del SISS es fundamental para asegurar el bienestar de los colaboradores y garantizar el cumplimiento de las regulaciones pertinentes, lideradas por el área de gestión respectiva y validadas por la revisoría fiscal, soportes que serán presentados en el momento en el que se requiera.

## 1.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

a. *Presentar ante EL MINISTERIO dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes Al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (inicio SECOP), el cronograma de ejecución del objeto del Contrato Interadministrativo.*

FINDETER presentó en el periodo pasado ante el Ministerio de Educación Nacional, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (inicio SECOP), el cronograma actualizado de ejecución del objeto del Contrato Interadministrativo. FINDETER reconoce la importancia de establecer un cronograma claro y detallado para la ejecución de las actividades contractuales, y se ha cumplido con este requisito de manera oportuna. La intención es garantizar una planificación efectiva y transparente de las actividades a llevar a cabo, en consonancia con las regulaciones y directrices establecidas por el Ministerio.

b. *Crear una vez suscrito y legalizado el Contrato Interadministrativo, una cuenta contable para manejo exclusivo de los recursos de este Contrato Interadministrativo dentro del Patrimonio Autónomo constituido para tal fin por FINDETER.*

Una vez suscrito y legalizado el Contrato Interadministrativo, FINDETER ha creado una cuenta contable exclusiva para el manejo de los recursos de este contrato dentro del Patrimonio Autónomo constituido por FINDETER para tal fin. Se da cumplimiento a todos los requisitos y medidas establecidas para asegurar la correcta gestión financiera de los recursos relacionados con el Contrato Interadministrativo. La creación de esta cuenta contable específica en el Patrimonio Autónomo garantiza una administración transparente y adecuada de los recursos, en línea con las normativas y regulaciones pertinentes.

Por lo anteriormente mencionado, se crea la Cuenta de Ahorros No. 500-80465045-0 del Banco Popular para manejo exclusivo de los recursos de este contrato y respectivos reportes contables. Cabe recordar que, se adjuntó al Informe de Gestión N° 1 la Certificación de la Cuenta Bancaria.

Mediante correo electrónico del 24 de octubre de 2023, el MEN remitió oficio por parte del Ministerio de Hacienda, mediante el cual se oficializó la exención de gravamen financiero (GMF) de la cuenta del Patrimonio Autónomo. El cual se adjuntó en informes pasados.

c. *Administrar los recursos que transfiera EL MINISTERIO a través del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres- FNGRD a FINDETER a través del Patrimonio Autónomo constituido para cumplir con el objeto del presente contrato.*

FINDETER ha administrado de manera responsable los recursos que EL MINISTERIO ha transferido a través del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) a FINDETER, utilizando

el PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN AULAS MÓVILES POR OLA INVERNAL constituido por la Fiducia Mercantil FIDUCIARIA POPULAR S.A. para cumplir con el objeto del presente contrato.

El enfoque ha sido garantizar una gestión eficiente y transparente de los recursos para cumplir con los objetivos establecidos en el contrato. El uso adecuado de estos recursos es esencial para asegurar la ejecución exitosa de las actividades y proyectos acordados, en línea con las regulaciones y directrices establecidas por todas las partes involucradas.

d. *Presentar Informes mensuales y un informe final de ejecución financiera y técnica del presente Contrato, conforme los recursos aportados por EL FNGRD,*

Para el presente periodo, se presentará un informe mensual de ejecución financiera por el área de Negocios Fiduciarios de FINDETER y se ha presentado un informe técnico del presente contrato, conforme a los recursos aportados por el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD).

Estos informes son una parte integral de la transparencia y rendición de cuentas en la ejecución del contrato. A través de estos informes, se ha proporcionado una visión detallada de la utilización de los recursos, los avances técnicos logrados y otros aspectos relevantes de la ejecución del contrato. Cumplir con la presentación de estos informes es esencial para mantener una comunicación clara y abierta con EL MINISTERIO y garantizar que todas las partes estén informadas sobre el progreso y los resultados del contrato.

e. *El Patrimonio Autónomo — FINDETER deberá reintegrar mensualmente los rendimientos financieros (si los hubiere) a la Dirección del Tesoro Nacional o en los términos que establezca la normatividad aplicable, es decir, que no ingresan ni hacen parte del Patrimonio Autónomo constituido por FINDETER.*

El Patrimonio Autónomo - FINDETER reintegrará mensualmente los rendimientos financieros a la Dirección del Tesoro Nacional o en los términos que establezca la normatividad aplicable. Estos rendimientos financieros no ingresan ni hacen parte del Patrimonio Autónomo constituido por FINDETER, y la gestión de reintegro se realizará previa solicitud al Ministerio con el fin de que se informe la cuenta bancaria a la cual se debe realizar el mismo.

Este proceso de reintegro asegura la correcta gestión de los rendimientos generados por los recursos aportados y garantiza que estos sean manejados de acuerdo con las regulaciones y normativas pertinentes. De esta manera, se cumple con los requerimientos legales y se mantiene la transparencia en la administración financiera.

Para lo anterior, el 28 de agosto de 2023 se informa por el MEN la cuenta bancaria para el reintegro de rendimientos financieros del Contrato No. CO1.PCCNTR.4917031 la cual se indica a continuación:

| | |
|---|---|
| Entidad Financiera: | **Banco BBVA** |
| Tipo de Cuenta: | **Ahorros** |
| Número de Cuenta: | **309-054583** |
| Nombre de la cuenta: | **FIDUPREVISORA S.A FNGRD – COLOMBIA VITAL** |

## 1.3 ACTIVIDADES PRECONTRACTUALES

### 1.3.1 Obligaciones:

a. *Realizar la viabilización técnica y jurídica de los predios priorizados por EL MINISTERIO, cuando sea necesario y sea solicitado por el MEN.*

Durante el presente periodo, se llevó a cabo la viabilización técnica y jurídica priorizada por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) cada vez que ha sido necesario y solicitado por el MEN. La colaboración en este aspecto es esencial para asegurar que los predios sean evaluados y viabilizados de manera adecuada para cumplir con los requisitos técnicos necesarios. El compromiso es facilitar un proceso fluido y eficiente para que los predios sean utilizados de acuerdo con los objetivos y necesidades de cada Institución Educativa, siempre en línea con las regulaciones y disposiciones vigentes.

Durante el periodo, se finalizó la evaluación técnica y predial y que en resumen se describe a continuación en las siguientes tablas:

**RESUMEN EVALUACIÓN TÉCNICA DE SEDES**

| UNIFICACIÓN DE LISTADOS: INICIAL (150) + ADICIONALES (42) | |
|---|---|
| **SEDES VIABLES TÉCNICAMENTE** | **150** |

**RESUMEN EVALUACIÓN JURÍDICA DE SEDES**

| SEDES TOTAL (150) | |
|---|---|
| SIN DOCUMENTOS | 1 * |
| POSIBLE VIABILIDAD | 0 ** |
| NO VIABLE | 9 |
| **VIABLES TÉCNICA Y JURÍDICAMENTE** | **140** |
| TOTAL | 150 |

* Sin Documentos:

- Falta de documentos para evidenciar la propiedad y reciprocidad en la revisión y remisión de documentos por la ETC y/o rectores

** Posible Viabilidad:

- Falta documentación soporte para continuar con revisión
- Pendientes gestiones con terceros para saneamiento predial
- Trámites para obtención de sana posesión

Asimismo, en el presente periodo, el listado actualizado de sedes focalizadas son las siguientes:

| Consecutivo | ID MEN No. | Departamento | ETC | Municipio | IE | SEDE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | **Nariño** | PASTO | **Pasto** | I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE | I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - SEDE PRINCIPAL |
| 2 | 2 | **Córdoba** | CORDOBA | **Tuchín** | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ALVARO ULCUE CHOCUE | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ALVARO ULCUE CHOCUE |
| 3 | 3 | **Cauca** | CAUCA | **Bolívar** | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA NUESTRA SENORA DE LOS REMEDIOS | COLEGIO DEPARTAMENTAL NUESTRA SENORA DE LOS REMEDIOS |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | Cesar | VALLEDUPAR | Valledupar | INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ | IE ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ |
| 5 | 6 | Bolívar | BOLIVAR | Barranco de Loba | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR | I.E.T.A. LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR - SEDE PRINCIPAL |
| 6 | 7 | Santander | SANTANDER | Vélez | COLEGIO UNIVERSITARIO | COLEGIO UNIVERSITARIO |
| 7 | 8 | Nariño | NARIÑO | El Rosario | CENTRO EDUCATIVO LA CLAUDIA | CENTRO EDUCATIVO LA CLAUDIA |
| 8 | 9 | Bolívar | BOLIVAR | Barranco de Loba | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR | ATASCOZA |
| 9 | 10 | Bolívar | BOLIVAR | Barranco de Loba | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR | LOS CERRITOS |
| 10 | 11 | Guajira | LA GUAJIRA | Manaure | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | ESCUELA RURAL INDÍGENA KARALOUTAMANA |
| 11 | 12 | Cauca | CAUCA | Toribío | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PLAYA | CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO LA PLAYA - SEDE PRINCIPAL |
| 12 | 13 | Magdalena | MAGDALENA | Concordia | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE BASICA Y MEDIA SANTA CRUZ DE BALSAMO | ERM DE BALSAMO |
| 13 | 14 | Magdalena | MAGDALENA | Concordia | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE BASICA Y MEDIA SANTA CRUZ DE BALSAMO | JAR INF MIS PRIMEROS SUEÑOS |
| 14 | 16 | Cauca | CAUCA | Santander de Quilichao | INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO | DOMINGUILLO (sede principal) |
| 15 | 17 | Santander | SANTANDER | Betulia | INSTITUCION EDUCATIVA EL RAMO | CENTRO EDUCATIVO SANTA BARBARA |
| 16 | 18 | Atlántico | SOLEDAD | Soledad | INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO | INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE PRINCIPAL |
| 17 | 20 | Bolívar | BOLIVAR | Morales | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PALMA | LA ARCADIA |
| 18 | 22 | Cauca | CAUCA | El Tambo | I.E. HUISITO | HUISITO (sede principal) |
| 19 | 24 | Magdalena | MAGDALENA | El Banco | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ANTONIO NARIÑO | CENT EDUC RUR MIX JOSE DE LA PAZ VANEGA ORTIZ |
| 20 | 26 | Huila | HUILA | Acevedo | INSTITUCION EDUCATIVA BATEAS | BATEAS |
| 21 | 27 | Cauca | CAUCA | Piamonte | CENTRO EDUCATIVO PUERTO GUAYUYACO | ESCUELA RURAL MIXTA LA ESPANOLA |
| 22 | 28 | Córdoba | CORDOBA | Cotorra | INSTITUCION EDUCATIVA LOS AGUACATES | CENT EDUC LOS AGUACATES |
| 23 | 29 | Bolívar | BOLIVAR | Mompós | INSTITUCIÒN EDUCATIVA TÈCNICA AMBIENTAL DE TIERRA FIRME | I.E.T.A. AMBIENTAL DE TIERRA FIRME - SEDE PRINCIPAL |
| 24 | 30 | Cesar | CESAR | Curumaní | INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES | INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES |
| 25 | 32 | Magdalena | MAGDALENA | El Banco | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL SILVIA COTES DE BISWELL | ERM SANTA TERESA DE ISLITA |
| 27 | 34 | Guajira | RIOHACHA | Riohacha | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA #7 | APÜNIMA´ANA1 |
| 28 | 36 | Nariño | NARIÑO | Cumbal | INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCION DE TALLAMBI | INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCION DE TALLAMBI |
| 29 | 41 | Putumayo | PUTUMAYO | Puerto Asís | I. E. RUR CAUCACIA | ESC RUR MIX EL JARDIN ALTO TETEYE |
| 30 | 42 | Antioquia | ANTIOQUIA | Ciudad Bolívar | I. E. JOSE MARIA HERRAN | C. E. R. PAULINA PUERTA |
| 31 | 43 | Bolívar | BOLIVAR | San Martín de Loba | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA PESQUERA LEONIDAS ORTIZ ALVEAR DE CHIMÍ | PLAN BONITO |
| 32 | 44 | Cauca | CAUCA | La Vega | INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA SANTA RITA | INSTITUCION EDUCATIVA SANTA RITA (sede principal) |
| 33 | 45 | Cesar | CESAR | La Paz(Robles) | CENTRO EDUCATIVO INDIGENA CAÑO PADILLA YUKPA | SEDE EL COSO |
| 34 | 46 | Cauca | CAUCA | Balboa | C.E. BUENOS AIRES | CAPITANES |
| 35 | 48 | Cesar | VALLEDUPAR | Valledupar | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ | INSTITUTO TECNICO COMERCIAL JOSE EUGENIO MARTINEZ |
| 36 | 49 | Bolívar | BOLIVAR | Mompós | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DEL CHICAGUA | SAN LUIS |
| 37 | 50 | Guajira | MAICAO | Maicao | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2 | SEDE LA CAMPANA |
| 38 | 51 | Guajira | MAICAO | Maicao | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6 | YAMAIN - SEDE PRINCIPAL |
| 39 | 53 | Guajira | MAICAO | Maicao | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2 | SEDE KASICHE |
| 40 | 54 | Guajira | MAICAO | Maicao | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2 | SEDE WAYUUMA ANA |
| 41 | 56 | Arauca | ARAUCA | Saravena | CENTRO EDUCATIVO LA PAVA. | LA PAVA |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 57 | Putumayo | PUTUMAYO | Puerto Asís | I. E. RUR CAUCACIA | ESC RUR MIX EL PROGRESO |
| 43 | 58 | Cauca | CAUCA | Bolívar | INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO NUESTRA SENORA DEL CARMEN | CORRAL VIEJO |
| 44 | 59 | Cauca | CAUCA | Bolívar | INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO NUESTRA SENORA DEL CARMEN | NUESTRA SENORA DEL CARMEN (sede principal) |
| 45 | 60 | Guajira | RIOHACHA | Riohacha | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN | COOPERATIVO |
| 46 | 62 | Valle del Cauca | BUGA | Guadalajara de Buga | INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE | JHON F. KENNEDY |
| 47 | 64 | Atlántico | ATLANTICO | Galapa | INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA | INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA |
| 48 | 65 | Cauca | CAUCA | Balboa | I.E. OLAYA (ANTES C.E. OLAYA) | OLAYA (sede principal) |
| 49 | 66 | Antioquia | APARTADO | Apartadó | INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS | INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS |
| 50 | 67 | Tolima | TOLIMA | Santa Isabel | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BOLIVAR | LA HUMAREDA |
| 51 | 69 | Córdoba | CORDOBA | Planeta Rica | INSTITUCION EDUCATIVA LOMA AZUL | LOS CERROS |
| 52 | 70 | Córdoba | CORDOBA | Puerto Libertador | INSTITUCION EDUCATIVA PICA PICA VIEJO | ESC NVA LA SOLITA |
| 53 | 73 | Bolívar | BOLIVAR | Córdoba | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE TACAMOCHO | NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE TACAMOCHITO |
| 54 | 74 | Cesar | CESAR | El Paso | INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN | SEDE LA ESPERANZA |
| 55 | 75 | Cesar | CESAR | El Paso | INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN | SEDE EL VALLITO |
| 56 | 77 | Cesar | CESAR | El Paso | INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN | SEDE SAN ANGEL |
| 57 | 79 | Cesar | CESAR | El Paso | INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN | SEDE LA ESTACION |
| 58 | 83 | Atlántico | ATLANTICO | Repelón | INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS | INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS - SEDE PRINCIPAL |
| 59 | 84 | Atlántico | ATLANTICO | Repelón | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE VILLA ROSA | SEDE LA LOMA |
| 60 | 85 | Valle del Cauca | BUGA | Guadalajara de Buga | INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE | LA PLANTA |
| 61 | 86 | Antioquia | APARTADO | Apartadó | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO |
| 62 | 87 | Nariño | NARIÑO | BARBACOAS | INSTITUCION EDCUATIVA TERAIMBE | SEDE 9 CUMAINDE |
| 63 | 88 | Putumayo | PUTUMAYO | Puerto Leguízamo | IE RUR LUIS VIDALES DEL PIÑUÑA NEGRO | ESC RUR MIX PUERTO PRINCIPE DOS |
| 64 | 90 | Cauca | CAUCA | Bolívar | CENTRO EDUCATIVO EL TAMBO | LA FUENTE |
| 65 | 92 | Atlántico | ATLANTICO | Repelón | INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS | PITA |
| 66 | 93 | Cauca | CAUCA | Bolívar | INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CARMEN | EL CARMEN (sede principal) |
| 67 | 94 | Chocó | CHOCO | Carmen del Darién | CE PUEBLO NUEVO | CE PUEBLO NUEVO - SEDE PRINCIPAL |
| 68 | 95 | Guajira | RIOHACHA | Riohacha | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN | JOSE ANTONIO GALAN |
| 69 | 96 | Meta | VILLAVICENCIO | Villavicencio | INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO FRANCISCO ARANGO | ESCUELA SIETE DE AGOSTO |
| 70 | 97 | Cesar | CESAR | Curumaní | INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES | SEDE CHINELA |
| 71 | 98 | Cesar | CESAR | Curumaní | INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES | SEDE GUAIMARAL |
| 72 | 100 | Tolima | TOLIMA | Santa Isabel | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BOLIVAR | EL BRASIL |
| 73 | 101 | Cesar | CESAR | Curumaní | INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES | SEDE LOS SERRENOS |
| 74 | 103 | Córdoba | CORDOBA | Ayapel | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO | ESC NVA PARCELAS LONDRES |
| 75 | 104 | Cundinamarca | CUNDINAMARCA | Anolaima | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE HUGO ENCISO | ESCUELA RURAL EL DESCANSO |
| 76 | 105 | Chocó | CHOCO | Bahía Solano (Mutis) | IE LUIS LOPEZ DE MESA | SEDE DE SAN JOSE (HUACA) |
| 77 | 106 | Chocó | CHOCO | Bahía Solano (Mutis) | IE LUIS LOPEZ DE MESA | SEDE SIRENA DEL MAR |
| 78 | 107 | Chocó | CHOCO | Bahía Solano (Mutis) | IE LUIS LOPEZ DE MESA | SEDE SECUNDINO RIVAS |
| 79 | 110 | Nariño | NARIÑO | BARBACOAS | INSTITUCION EDUCATIVA TERAIMBE | SEDE 2 BOMBÓN |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 111 | Magdalena | MAGDALENA | Pueblo viejo | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS | ERM ISLA DE CATAQUITA |
| 81 | 112 | Magdalena | MAGDALENA | El Retén | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE | COL MPAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE |
| 82 | 113 | Magdalena | MAGDALENA | San Sebastián de Buenavista | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA | ERM MARIA AUXILIADORA |
| 83 | 114 | Magdalena | MAGDALENA | San Sebastián de Buenavista | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA | ERM LA PACHA |
| 84 | 117 | Guajira | RIOHACHA | Riohacha | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA #7 | WAKUAPAMANA |
| 85 | 118 | Antioquia | APARTADO | Apartadó | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO |
| 86 | 119 | Córdoba | CORDOBA | Montelíbano | INSTITUCION EDUCATIVA EL PALMAR | INSTITUCION EDUCATIVA EL PALMAR SEDE PRINCIPAL |
| 87 | 121 | Cauca | CAUCA | Piamonte | CENTRO EDUCATIVO PUERTO GUAYUYACO | ESC RUR MIX SAN ANDRESITO |
| 88 | 122 | Antioquia | TURBO | Turbo | I.E. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | E.U. JESUS MORA |
| 89 | 123 | Bolívar | BOLIVAR | Simití | INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CERRO DE VERACRUZ | CAMPO PAYARES |
| 90 | 124 | Bolívar | BOLIVAR | Simití | INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CERRO DE VERACRUZ | I.E. DEL CERRO DE VERACRUZ - SEDE PRINCIPAL |
| 91 | 125 | Cauca | CAUCA | Piamonte | INST EDUC AGRIC PIAMONTE | PIAMONTE (sede principal) |
| 92 | 126 | Magdalena | MAGDALENA | Pueblo viejo | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS | ERM EL TRIUNFO |
| 93 | 127 | Putumayo | PUTUMAYO | Orito | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL UMADA WUARRARA | ESC RUR MIX ALTO ORITO |
| 94 | 128 | Valle del Cauca | BUGA | Guadalajara de Buga | INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE | MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE - SEDE PRINCIPAL |
| 95 | 129 | Valle del Cauca | BUGA | Guadalajara de Buga | INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE | JULIAN MENDOZA GUERRERO |
| 96 | 130 | Valle del Cauca | BUGA | Guadalajara de Buga | INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE | LA HONDA |
| 97 | 132 | Norte de Santander | NORTE SANTANDER | La Playa | CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN PEDRO | SEDE LA PEÑA |
| 98 | 133 | Magdalena | MAGDALENA | El Banco | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL OSCAR PISCIOTTI NUMA | ERM INMACULADA CONCEPCION |
| 99 | 134 | Bolívar | BOLIVAR | María la Baja | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA | BUENOS AIRES |
| 100 | 135 | Bolívar | BOLIVAR | María la Baja | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA | I.E.T. AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA |
| 102 | 138 | Arauca | ARAUCA | Arauca | CENTRO EDUCATIVO MONSERRATE | CEAR MONSERRATE |
| 104 | 142 | Nariño | IPIALES | Ipiales | INSTITUCION EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL LOS PASTOS | ESCUELA LAS CRUCES |
| 105 | 143 | Guajira | LA GUAJIRA | Barrancas | CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL PROVINCIAL | CENTRO ETNOEDUCATIVO PROVINCIAL |
| 106 | 144 | Atlántico | SOLEDAD | Soledad | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE |
| 107 | 146 | Cesar | CESAR | Chimichagua | CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO | SEDE TRONCONAL |
| 108 | 147 | Cesar | CESAR | Chimichagua | CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO | SEDE PUERTO LA ESTANCIA |
| 109 | 148 | Cesar | CESAR | Chimichagua | CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO | SEDE TORRECILLA |
| 110 | 149 | Nariño | NARIÑO | Mallama (Piedrancha) | CENTRO EDUCATIVO MALLAMA | CENTRO EDUCATIVO DE MALLAMA |
| 111 | 150 | Chocó | CHOCO | Tadó | IE TECNICO AGROAMBIENTAL - MARIA AUXILIADORA | SEDE MARÍA AUXILIADORA DE MANUNGARA |
| 112 | 151 | Guajira | LA GUAJIRA | Maicao | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2 | SEDE LA ESTRELLA |
| 113 | 152 | Guajira | MAICAO | Maicao | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6 | YAMAIN - KASPOLIMANA |
| 114 | 153 | Guajira | LA GUAJIRA | Maicao | ESCUELA RURAL MIXTA TALOULUMA'ANA | ESCUELA RURAL MIXTA TALOULUMA'ANA |
| 115 | 154 | Magdalena | CIENAGA | Ciénaga | INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO |
| 116 | 156 | Magdalena | MAGDALENA | El Retén | INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE | SEDE CONC.ESC GENERAL GREGORIO GARZON |
| 117 | 158 | Valle del Cauca | BUGA | Guadalajara de Buga | INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE | SEDE CRISTOBAL COLON |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 161 | Antioquia | APARTADO | Apartadó | INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL GUINEO | CENTRO EDUCATIVO RURAL EL OSITO |
| 119 | 163 | Cauca | CAUCA | La Vega | I.E AGROPECUARIA SAN FRANCISCO JAVIER SEDE GARAY | I.E AGROPECUARIA SAN FRANCISCO JAVIER SEDE GARAY |
| 120 | 164 | Cauca | CAUCA | Santander de Quilichao | IE DOMINGUILLO | SEDE DOMINGO LASSO |
| 121 | 165 | Cauca | CAUCA | Popayán | IE COMUNEROS | Sede Principal |
| 122 | 172 | Putumayo | PUTUMAYO | Puerto Asís | E. RUR CAUCACIA - SEDE PRINCIPAL | Sede Principal |
| 123 | 173 | Cauca | CAUCA | Piamonte | ESC RUR MIX FRAY EZEQUIEL | ESC RUR MIX FRAY EZEQUIEL |
| 124 | 174 | Cauca | CAUCA | Piamonte | E.D.R PORTO GUAYUYACO SEDE PRINCIPAL | E.D.R PORTO GUAYUYACO SEDE PRINCIPAL |
| 125 | 175 | Cauca | CAUCA | Rosas | INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA | SANTA TERESITA (sede principal) |
| 126 | 178 | Cauca | CAUCA | Rosas | INSTITUCION EDUCATIVA MADRE CARIDAD BRADER | MADRE CARIDAD BRADER (sede principal) |
| 127 | 182 | Cauca | CAUCA | Rosas | INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO CORDOBA | LAS YERBAS |
| 128 | 183 | Cauca | CAUCA | Rosas | CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO LEON VALENCIA | LA DESPENSA |
| 129 | 184 | Cauca | CAUCA | Rosas | INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO CORDOBA | EL RETIRO |
| 130 | 186 | Cauca | CAUCA | Rosas | CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO LEON VALENCIA | EL ALTILLO |
| 131 | 187 | Cauca | CAUCA | Rosas | INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO CORDOBA | BELLAVISTA |
| 132 | 188 | Cauca | CAUCA | Suarez | IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA | Sede Principal |
| 133 | 189 | Cauca | CAUCA | Suarez | IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA | SEDE MARIA INMACULADA |
| 134 | 190 | Cauca | CAUCA | Suarez | IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA | SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER |
| 135 | 192 | Atlántico | SOLEDAD | Soledad | INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO | INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE CABICA |
| 136 | 194 | Bolívar | Bolívar | Maria la Baja | INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA AGROINDUSTRIAL DE FLAMENCO | EL NISPERO |
| 137 | 196 | Atlántico | Atlántico | Malambo | INSTITUCIÓN EDUCATIVA MESOLANDIA | Sede Principal |
| 138 | 202 | Chocó | CHOCO | Tadó | IE NORMAL SUPERIOR DEMETRIO SALAZAR CASTILLO | CENTRO EDUCATIVO ESCUELA FRANCISCO MIRANDA |
| 139 | 203 | Antioquia | TURBO | Turbo | IE SAN MARTIN DE PORRES | SEDE GONZALO MEJIA |

En este periodo es importante resaltar que, bajo este listado de sedes focalizadas para intervención técnica, ya se adelantó la verificación predial, la cual da como resultado 136 sedes a intervenir.

**Sedes despriorizar técnicamente:** se tuvo que despriorizar las siguientes 9 instituciones educativas de los siguientes grupos:

| GRUPO | ID MEN | Departamento | ETC | Municipio | IE | SEDE | OBERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Chocó | CHOCO | Tadó | IE TECNICO AGROAMBIENTAL | SEDE CAMPO ALEGRE | En un principio, la sede priorizada en el municipio de Tadó era la sede la sede Campo Alegre. Esta perteneciente a la IE Técnico Agroambiental, la cual actualmente cuenta con una matrícula según el Sistema Integrado de Matricula -Simat de 40 estudiantes; no obstante, en la etapa de viabilidad técnica y jurídica adelantada por el contratista designado por Findeter determinó que esta sede presentaba limitaciones técnicas, normativas y |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | administrativas por estar en zona de riesgo por inundación, por lo que se recomendó no efectuar intervención alguna. |
| | **120** | Antioquia | **TURBO** | Turbo | **I.E. DE DESARROLLO RURAL DE TURBO** | E.U. SANTISIMA TRINIDAD | Se tramito la exclusión del anexo "Listado de Instituciones Educativas Priorizadas por el MEN" a la sede IE. DE DESARROLLO RURAL DE TURBO EU SANTÍSIMA TRINIDAD., reemplazándola por la SEDE GONZALO MEJIA perteneciente a la IE. SAN MARTIN DE PORRES, ubicada en el municipio de Turbo, Antioquia en el marco del contrato de obra No. PAF-MENAM-O-049-2023 y contrato de interventoría No. PAF-MENAM-I-052-2023<br><br>Frente a lo anterior, es importante indicar en el presente concepto que, la solicitud se realiza enmarcada en el lineamiento dado por el Ministerio de Educación Nacional – MEN en Comité Técnico No. 30 No. CO1.PCCNTR.4917031 DE 2023 PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN AULAS MÓVILES POR OLA INVERNAL, de fecha 24 de enero de 2024 |
| **2** | **91** | Atlántico | **ATLANTICO** | Palmar de Varela | **INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL DE PALMAR DE VARELA** | JOSE MARIA CORDOBA | Esta institución Educativa se tuvo que despriorizar porque ya estaba intervenida por la gobernación de Atlántico |
| | **191** | Atlántico | **ATLANTICO** | Luruaco | **IE CORREGIMIENTO DE SAN JUAN DE TOCAGUA** | CORREGIMIENTO DE SAN JUAN DE TOCAGUA | Se despriorizo esta institución educativa, debido a que el MEN define que esta IE seria intervenida por el FFIE |
| **4** | **71** | Bolívar | **BOLIVAR** | Córdoba | **INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE TACAMOCHO** | TACAMOCHO (SEDE PRIMARIA) | Esta sede tuvo que ser despriorizada, debido a que en el año 2015 ante esta situación la Corporación autónoma ambiental Cormagdalena, mediante Contrato Interadministrativo 0-0019 de 2015 suscrito con la Universidad Nacional de Colombia, elabora un estudio del cual se destaca la siguiente consideración general: "A partir de este análisis se puede considerar que Tocomocho se encuentra ubicado, prácticamente en la |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | mitad del río, bajo la amenaza de inundaciones y procesos erosivos que se pueden activar en cualquier época". |
| | **139** | Magdalena | **MAGDALENA** | San Sebastián de Buenavista | **INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE TRONCOSO** | ERM DE JAIME | Esta sede tuvo que ser despriorizada, conforme a una recopilación de datos realizada por el contratista, JASA LTDA propone tener en cuenta que la ERM Jaime requiere una altura de palafito de 1,7 m, lo cual genera la construcción de acceso al aula, definida en el alcance contractual, de una infraestructura que debe contemplar el ingreso a toda la institución, siendo necesario la construcción de toda la sede con el fin de poder hacer funcional su ingreso.<br>La interventoría, CONSORCIO INTER EDUCATIVO G4 considera que no se deben realizar obras de infraestructura de mejoramiento y/o construcción, debido a lo planteado por el contratista y a que los mejoramientos no tendrían estabilidad por efectos de los daños que ocasionará la inundación y la construcción debe ser de toda la institución con palafitos de 1,70 m, lo cual supera el alcance contractual. |
| **9** | **33** | Capital Bogotá, D.C | BOGOTA | Bogotá, D.C. | **COLEGIO LA CHUCUA (IED)** | CENT EDUC DIST LA CHUCUA | Sede retirada mediante comité técnico No. 70 y comité fiduciario No. 45. |
| | **136** | Capital Bogotá, D.C. | BOGOTA | Bogotá, D.C. | **COLEGIO ESTRELLA DEL SUR (IED)** | COL DIST ESTRELLA DEL SUR | Sede retirada mediante comité técnico No. 70 y comité fiduciario No. 45. |
| | **141** | Santander | BARRANCABERMEJA | Barrancabermeja | **CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN** | CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN | Sede retirada mediante comité técnico No. 70 y comité fiduciario No. 45. |

De acuerdo con lo anterior se hace la inclusión de las siguientes 4 sedes educativas para tener un resultado total de intervención de 136 sedes educativas:

| ID MEN | Departamento | ETC | Municipio | IE | SEDE |
|---|---|---|---|---|---|
| 202 | Chocó | CHOCO | Tadó | IE NORMAL SUPERIOR DEMETRIO SALAZAR CASTILLO | CENTRO EDUCATIVO ESCUELA FRANCISCO MIRANDA |
| 203 | Antioquia | TURBO | Turbo | IE SAN MARTIN DE PORRES | SEDE GONZALO MEJIA |
| 196 | Atlántico | Atlántico | Malambo | INSTITUCIÓN EDUCATIVA MESOLANDIA | Sede Principal |
| 194 | Bolívar | Bolívar | Maria la Baja | INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA AGROINDUSTRIAL DE FLAMENCO | EL NISPERO |

La viabilización jurídica de los predios priorizados por el Ministerio se realiza de manera eficiente, siempre que sea necesario y solicitado por el Ministerio de Educación Nacional (MEN). Es un paso fundamental para garantizar el adecuado desarrollo de proyectos educativos y el cumplimiento de los objetivos establecidos por el MEN, de acuerdo con lo anterior, en este periodo quedo la verificación predial y técnica así:

| SEDES TOTAL INICIAL (150) | |
|---|---|
| SIN DOCUMENTOS | 1 * |
| POSIBLE VIABILIDAD | 0 ** |
| NO VIABLE | 9 |
| **VIABLES TÉCNICA Y JURÍDICAMENTE** | **140** |
| TOTAL | 150 |

| SEDES NUEVAS A PRIORIZAR (9) | |
|---|---|
| POSIBLE VIABILIDAD | 1 * |
| **VIABLES JURÍDICAMENTE** | 8 |
| TOTAL | 9 |

| SEDES PRIORIZACIÓN ACTUALIZADA (136) | |
|---|---|
| SEDES INICIALMENTE PRIORIZADAS | 141 |
| SEDES DESPRIORIZADAS | 9 |
| SEDES NUEVAS INCLUIDAS | 4 |
| **TOTAL** | **136** |

b. *En consideración a que los proyectos a atender por este contrato se ejecutaran en el marco del Decreto de Emergencia, FINDETER debe acudir a lo establecido en su manual de contratación que permita que los procesos de selección sean eficientes y puedan ser proyectos de respuesta rápida.*

FINDETER implementa en el marco de lo establecido en el Manual Operativo la contratación que permita la ejecución eficiente de los procesos de selección que permita pluralidad de oferentes, asimismo, durante el proceso de ejecución, se ha establecido en la estructuración, la necesidad de optimizar tiempos de respuesta rápidos con sistemas constructivos industrializados.

c. *Elaborar los Estudios Previos e insumos precontractuales para la contratación de las obras y suministros necesarios para atender las necesidades prioritarias en infraestructura y dotación de mobiliario escolar de las sedes educativas afectadas por la temporada de lluvias que sean definidas por el Ministerio de Educación. Así como las interventorías correspondientes, solicitando que se*

*acaten los principios que rigen la contratación pública, incluyendo la solicitud de las respectivas garantías que ampare cada contrato con siguientes riesgos: anticipo (si lo hubiere), calidad, cumplimiento, estabilidad de la obra, salarios y prestaciones sociales, responsabilidad civil extracontractual y todo riesgo de construcción, según sea aplicable.*

## Proyectos en proceso de estructuración

Se han elaborado los Estudios Previos e insumos precontractuales necesarios para la contratación de obras y suministros dirigidos a atender las necesidades prioritarias en infraestructura y dotación de mobiliario escolar en las sedes educativas afectadas por la temporada de lluvias, para apertura de las diferentes convocatorias, tal como ha sido definido por el Ministerio de Educación. Estos estudios y documentos precontractuales son esenciales para establecer las bases de las futuras contrataciones y asegurar la correcta ejecución de los proyectos.

Además, se ha solicitado que, en la contratación de las obras y suministros, así como en las interventorías correspondientes, se respeten los principios que rigen la contratación pública. Esto garantiza la transparencia, la igualdad de oportunidades y la eficiencia en los procesos de contratación.

Asimismo, se ha requerido la inclusión de las garantías correspondientes para amparar los diferentes riesgos asociados a cada contrato. Estas garantías incluyen aspectos como el anticipo, la calidad de la obra, el cumplimiento de los plazos, la estabilidad de la construcción, los salarios y prestaciones sociales de los trabajadores, la responsabilidad civil extracontractual y los posibles riesgos de construcción. Esto proporciona seguridad tanto para la entidad contratante como para los contratistas y contribuye a la adecuada ejecución de los proyectos en línea con las normativas y estándares requeridos.

En el presente periodo se establece definitivamente la estructuración y la contratación de los grupos de contratación de acuerdo con el siguiente listado:

| GRUPO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | ID MEN No. | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SEDE | VR. TOTAL AULAS Y MEJORAMIENTO | VR. INTERVENTORÍA | VR. TOTAL OBRA + INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antioquia | Apartadó | 66 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS | INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS | 624.000.000 | 46.800.000 | 670.800.000 |
| | | | 86 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO | 291.200.000 | 21.840.000 | 313.040.000 |
| | | | 118 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO | 661.678.027 | 49.625.852 | 711.303.879 |
| | | | 161 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL GUINEO | CENTRO EDUCATIVO RURAL EL OSITO | 403.329.013 | 30.249.676 | 433.578.689 |
| | | Turbo | 120 | I.E. DE DESARROLLO RURAL DE TURBO | E.U. SANTISIMA TRINIDAD | 312.000.000 | 23.400.000 | 335.400.000 |
| | | | 122 | I.E. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | E.U. JESUS MORA | 499.200.000 | 37.440.000 | 536.640.000 |
| | | Ciudad Bolívar | 42 | I. E. JOSE MARIA HERRAN | C. E. R. PAULINA PUERTA | 124.800.000 | 9.360.000 | 134.160.000 |
| | Chocó | Carmen del Darién | 94 | CE PUEBLO NUEVO | CE PUEBLO NUEVO - SEDE PRINCIPAL | 522.668.285 | 39.200.121 | 561.868.406 |
| | | Tadó | 55 | IE TECNICO AGROAMBIENTAL | SEDE CAMPO ALEGRE | 266.693.962 | 20.002.047 | 286.696.010 |
| | | | 150 | IE TECNICO AGROAMBIENTAL | SEDE MARÍA AUXILIADORA DE MANUNGARA | 124.800.000 | 9.360.000 | 134.160.000 |
| 2 | Atlántico | Galapa | 64 | INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA | INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA | 624.000.000 | 46.800.000 | 670.800.000 |

| GRUPO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | ID MEN No. | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SEDE | VR. TOTAL AULAS Y MEJORAMIENTO | VR. INTERVENTORÍA | VR. TOTAL OBRA + INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Palmar de Varela | 91 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL DE PALMAR DE VARELA | JOSE MARIA CORDOBA | 561.600.000 | 42.120.000 | 603.720.000 |
| | | Repelón | 83 | INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS | INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS - SEDE PRINCIPAL | 332.800.000 | 24.960.000 | 357.760.000 |
| | | | 84 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE VILLA ROSA | SEDE LA LOMA | 229.439.280 | 17.207.946 | 246.647.226 |
| | | | 92 | INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS | PITA | 220.727.086 | 16.554.531 | 237.281.617 |
| | | Soledad | 18 | INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO | INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE PRINCIPAL | 665.600.000 | 49.920.000 | 715.520.000 |
| | | | 144 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE | 915.200.000 | 68.640.000 | 983.840.000 |
| | | | 192 | INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO | INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE CABICA | 372.384.464 | 27.928.835 | 400.313.298 |
| | | Luruaco | 191 | IE CORREGIMIENTO DE SAN JUAN DE TOCAGUA | CORREGIMIENTO DE SAN JUAN DE TOCAGUA | 249.600.000 | 18.720.000 | 268.320.000 |
| 3 | Magdalena | Ciénaga | 154 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO | 1.414.400.000 | 106.080.000 | 1.520.480.000 |
| | | El Retén | 112 | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE | COL MPAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE | 2.801.018.341 | 210.076.376 | 3.011.094.717 |
| | | | 156 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE | SEDE CONC.ESC GENERAL GREGORIO GARZON | 436.800.000 | 32.760.000 | 469.560.000 |
| | | Puebloviejo | 111 | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS | ERM ISLA DE CATAQUITA | 83.200.000 | 6.240.000 | 89.440.000 |
| | | | 126 | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS | ERM EL TRIUNFO | 166.400.000 | 12.480.000 | 178.880.000 |
| 4 | Bolívar | Córdoba | 71 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE TACAMOCHO | TACAMOCHO (SEDE PRIMARIA) | 447.519.640 | 33.563.973 | 481.083.613 |
| | | | 73 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE TACAMOCHO | NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE TACAMOCHITO | 493.484.507 | 37.011.338 | 530.495.845 |
| | | Mompós | 29 | INSTITUCIÒN EDUCATIVA TÈCNICA AMBIENTAL DE TIERRA FIRME | I.E.T.A. AMBIENTAL DE TIERRA FIRME - SEDE PRINCIPAL | 1.125.688.392 | 84.426.629 | 1.210.115.022 |
| | | | 49 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DEL CHICAGUA | SAN LUIS | 340.577.024 | 25.543.277 | 366.120.301 |
| | Magdalena | San Sebastián de Buenavista | 113 | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA | ERM MARIA AUXILIADORA | 488.073.254 | 36.605.494 | 524.678.748 |
| | | | 114 | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA | ERM LA PACHA | 623.194.392 | 46.739.579 | 669.933.972 |
| | | | 139 | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE TRONCOSO | ERM DE JAIME | 161.669.820 | 12.125.237 | 173.795.057 |
| 5 | Bolívar | Barranco de Loba | 6 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR | I.E.T.A. LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR - SEDE PRINCIPAL | 468.319.640 | 35.123.973 | 503.443.613 |
| | | | 9 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR | ATASCOZA | 364.668.644 | 27.350.148 | 392.018.792 |
| | | | 10 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR | LOS CERRITOS | 296.559.820 | 22.241.987 | 318.801.807 |
| | | San Martín de Loba | 43 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA PESQUERA LEONIDAS ORTIZ ALVEAR DE CHIMÍ | PLAN BONITO | 233.285.404 | 17.496.405 | 250.781.809 |
| | Cesar | Chimichagua | 146 | CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO | SEDE TRONCONAL | 133.346.981 | 10.001.024 | 143.348.005 |
| | | | 147 | CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO | SEDE PUERTO LA ESTANCIA | 130.159.820 | 9.761.987 | 139.921.807 |
| | | | 148 | CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO | SEDE TORRECILLA | 124.800.000 | 9.360.000 | 134.160.000 |

| GRUPO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | ID MEN No. | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SEDE | VR. TOTAL AULAS Y MEJORAMIENTO | VR. INTERVENTORÍA | VR. TOTAL OBRA + INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Curumaní | 30 | INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES | INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES | 603.200.000 | 45.240.000 | 648.440.000 |
| | | | 97 | INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES | SEDE CHINELA | 83.200.000 | 6.240.000 | 89.440.000 |
| | | | 98 | INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES | SEDE GUAIMARAL | 124.800.000 | 9.360.000 | 134.160.000 |
| | | | 101 | INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES | SEDE LOS SERRENOS | 83.200.000 | 6.240.000 | 89.440.000 |
| | Magdalena | Concordia | 13 | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE BASICA Y MEDIA SANTA CRUZ DE BALSAMO | ERM DE BALSAMO | 485.009.460 | 36.375.710 | 521.385.170 |
| | | | 14 | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE BASICA Y MEDIA SANTA CRUZ DE BALSAMO | JAR INF MIS PRIMEROS SUEÑOS | 161.669.820 | 12.125.237 | 173.795.057 |
| | | El Banco | 24 | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ANTONIO NARIÑO | CENT EDUC RUR MIX JOSE DE LA PAZ VANEGA ORTIZ | 546.091.802 | 40.956.885 | 587.048.688 |
| | | | 32 | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL SILVIA COTES DE BISWELL | ERM SANTA TERESA DE ISLITA | 244.487.366 | 18.336.552 | 262.823.918 |
| | | | 133 | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL OSCAR PISCIOTTI NUMA | ERM INMACULADA CONCEPCION | 192.455.361 | 14.434.152 | 206.889.513 |
| 6 | Cesar | El Paso | 74 | INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN | SEDE LA ESPERANZA | 291.200.000 | 21.840.000 | 313.040.000 |
| | | | 75 | INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN | SEDE EL VALLITO | 145.600.000 | 10.920.000 | 156.520.000 |
| | | | 77 | INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN | SEDE SAN ANGEL | 65.079.910 | 4.880.993 | 69.960.903 |
| | | | 79 | INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN | SEDE LA ESTACION | 132.643.683 | 9.948.276 | 142.591.959 |
| | | La Paz (Robles) | 45 | CENTRO EDUCATIVO INDIGENA CAÑO PADILLA YUKPA | SEDE EL COSO | 150.447.043 | 11.283.528 | 161.730.571 |
| | | Valledupar | 4 | INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ | IE ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ | 457.600.000 | 34.320.000 | 491.920.000 |
| | | | 48 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ | INSTITUTO TECNICO COMERCIAL JOSE EUGENIO MARTINEZ | 956.800.000 | 71.760.000 | 1.028.560.000 |
| 7 | Guajira | Barrancas | 143 | CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL PROVINCIAL | CENTRO ETNOEDUCATIVO PROVINCIAL | 249.600.000 | 18.720.000 | 268.320.000 |
| | | Maicao | 50 | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2 | SEDE LA CAMPANA | 499.200.000 | 37.440.000 | 536.640.000 |
| | | | 51 | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6 | YAMAIN - SEDE PRINCIPAL | 62.400.000 | 4.680.000 | 67.080.000 |
| | | | 53 | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2 | SEDE KASICHE | 339.830.481 | 25.487.286 | 365.317.767 |
| | | | 54 | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2 | SEDE WAYUUMA ANA | 127.479.910 | 9.560.993 | 137.040.903 |
| | | | 151 | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2 | SEDE LA ESTRELLA | 314.679.910 | 23.600.993 | 338.280.903 |
| | | | 152 | INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6 | YAMAIN - KASPOLIMANA | 252.966.903 | 18.972.518 | 271.939.421 |
| | | | 153 | ESCUELA RURAL MIXTA TALOULUMA'ANA | ESCUELA RURAL MIXTA TALOULUMA'ANA | 857.226.526 | 64.291.989 | 921.518.516 |
| | | Manaure | 11 | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | ESCUELA RURAL INDÍGENA KARALOUTAMANA | 190.566.903 | 14.292.518 | 204.859.421 |
| | | Riohacha | 34 | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA #7 | APÜNIMA´ANA1 | 252.279.910 | 18.920.993 | 271.200.903 |
| | | | 60 | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN | COOPERATIVO | 416.000.000 | 31.200.000 | 447.200.000 |
| | | | 95 | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN | JOSE ANTONIO GALAN | 374.400.000 | 28.080.000 | 402.480.000 |
| | | | 117 | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA #7 | WAKUAPAMANA | 224.079.460 | 16.805.960 | 240.885.420 |
| 8 | Bolívar | María la Baja | 134 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA | BUENOS AIRES | 249.600.000 | 18.720.000 | 268.320.000 |
| | | | 135 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA | I.E.T. AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA | 1.800.127.638 | 135.009.573 | 1.935.137.211 |

| GRUPO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | ID MEN No. | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SEDE | VR. TOTAL AULAS Y MEJORAMIENTO | VR. INTERVENTORÍA | VR. TOTAL OBRA + INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Córdoba | Ayapel | 103 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO | ESC NVA PARCELAS LONDRES | 220.984.367 | 16.573.828 | 237.558.194 |
| | | Cotorra | 28 | INSTITUCION EDUCATIVA LOS AGUACATES | CENT EDUC LOS AGUACATES | 124.800.000 | 9.360.000 | 134.160.000 |
| | | Montelíbano | 119 | INSTITUCION EDUCATIVA EL PALMAR | ESCUELA NUEVA MIXTA DIVINO SALVADOR | 745.087.893 | 55.881.592 | 800.969.485 |
| | | Planeta Rica | 69 | INSTITUCION EDUCATIVA LOMA AZUL | LOS CERROS | 430.464.507 | 32.284.838 | 462.749.345 |
| | | Puerto Libertador | 70 | INSTITUCION EDUCATIVA PICA PICA VIEJO | ESC NVA LA SOLITA | 254.085.404 | 19.056.405 | 273.141.809 |
| | | Tuchín | 2 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ALVARO ULCUE CHOCUE | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ALVARO ULCUE CHOCUE | 1.074.838.830 | 80.612.912 | 1.155.451.742 |
| 9 | Arauca | Arauca | 138 | CENTRO EDUCATIVO MONSERRATE | CEAR MONSERRATE | 299.239.730 | 22.442.980 | 321.682.710 |
| | | Saravena | 56 | CENTRO EDUCATIVO LA PAVA. | LA PAVA | 83.200.000 | 6.240.000 | 89.440.000 |
| | Bolívar | Morales | 20 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PALMA | LA ARCADIA | 83.200.000 | 6.240.000 | 89.440.000 |
| | | Simití | 123 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CERRO DE VERACRUZ | CAMPO PAYARES | 232.352.784 | 17.426.459 | 249.779.243 |
| | | | 124 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CERRO DE VERACRUZ | I.E. DEL CERRO DE VERACRUZ - SEDE PRINCIPAL | 595.799.550 | 44.684.966 | 640.484.516 |
| | Capital Bogotá, D.C. | Bogotá, D.C. | 33 | COLEGIO LA CHUCUA (IED) | CENT EDUC DIST LA CHUCUA | 332.800.000 | 24.960.000 | 357.760.000 |
| | | | 136 | COLEGIO ESTRELLA DEL SUR (IED) | COL DIST ESTRELLA DEL SUR | 166.400.000 | 12.480.000 | 178.880.000 |
| | Cundinamarca | Anolaima | 104 | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE HUGO ENCISO | ESCUELA RURAL EL DESCANSO | 190.313.503 | 14.273.513 | 204.587.016 |
| | Meta | Villavicencio | 96 | INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO FRANCISCO ARANGO | ESCUELA SIETE DE AGOSTO | 924.437.134 | 69.332.785 | 993.769.919 |
| | Norte de Santander | La Playa | 132 | CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN PEDRO | SEDE LA PEÑA | 41.600.000 | 3.120.000 | 44.720.000 |
| | Santander | Barrancabermeja | 141 | CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN | CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN | 494.421.269 | 37.081.595 | 531.502.864 |
| | | Betulia | 17 | INSTITUCION EDUCATIVA EL RAMO | CENTRO EDUCATIVO SANTA BARBARA | 62.400.000 | 4.680.000 | 67.080.000 |
| | | Vélez | 7 | COLEGIO UNIVERSITARIO | COLEGIO UNIVERSITARIO | 926.718.332 | 69.503.875 | 996.222.206 |
| | Tolima | Santa Isabel | 67 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BOLIVAR | LA HUMAREDA | 188.797.003 | 14.159.775 | 202.956.778 |
| | | | 100 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BOLIVAR | EL BRASIL | 188.797.003 | 14.159.775 | 202.956.778 |
| 10 | Cauca | Santander de Quilichao | 16 | INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO | DOMINGUILLO (sede principal) | 1.235.282.193 | 92.646.164 | 1.327.928.358 |
| | | | 164 | IE DOMINGUILLO | SEDE DOMINGO LASSO | 124.800.000 | 9.360.000 | 134.160.000 |
| | | Suarez | 188 | IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA | SEDE PRINCIPAL | 790.400.000 | 59.280.000 | 849.680.000 |
| | | | 189 | IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA | SEDE MARIA INMACULADA | 1.225.093.375 | 91.882.003 | 1.316.975.378 |
| | | | 190 | IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA | SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | 374.400.000 | 28.080.000 | 402.480.000 |
| | | Toribío | 12 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PLAYA | CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO LA PLAYA - SEDE PRINCIPAL | 338.159.820 | 25.361.987 | 363.521.807 |
| | Chocó | Bahía Solano (Mutis) | 105 | IE LUIS LOPEZ DE MESA | SEDE DE SAN JOSE (HUACA) | 148.792.381 | 11.159.429 | 159.951.810 |
| | | | 106 | IE LUIS LOPEZ DE MESA | SEDE SIRENA DEL MAR | 41.600.000 | 3.120.000 | 44.720.000 |
| | | | 107 | IE LUIS LOPEZ DE MESA | SEDE SECUNDINO RIVAS | 291.200.000 | 21.840.000 | 313.040.000 |
| | Valle del Cauca | Guadalajara de Buga | 62 | INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE | JHON F. KENNEDY | 540.800.000 | 40.560.000 | 581.360.000 |
| | | | 85 | INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE | LA PLANTA | 204.237.183 | 15.317.789 | 219.554.972 |
| | | | 128 | INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE | MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE - SEDE PRINCIPAL | 166.400.000 | 12.480.000 | 178.880.000 |
| | | | 129 | INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE | JULIAN MENDOZA GUERRERO | 208.000.000 | 15.600.000 | 223.600.000 |

| GRUPO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | ID MEN No. | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SEDE | VR. TOTAL AULAS Y MEJORAMIENTO | VR. INTERVENTORÍA | VR. TOTAL OBRA + INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 130 | INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE | LA HONDA | 164.153.683 | 12.311.526 | 176.465.209 |
| | | | 158 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE | SEDE CRISTOBAL COLON | 162.637.183 | 12.197.789 | 174.834.972 |
| 11 | Cauca | Balboa | 46 | C.E. BUENOS AIRES | CAPITANES | 83.200.000 | 6.240.000 | 89.440.000 |
| | | | 65 | I.E. OLAYA (ANTES C.E. OLAYA) | OLAYA (sede principal) | 416.000.000 | 31.200.000 | 447.200.000 |
| | | Bolívar | 3 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA NUESTRA SENORA DE LOS REMEDIOS | COLEGIO DEPARTAMENTAL NUESTRA SENORA DE LOS REMEDIOS | 436.800.000 | 32.760.000 | 469.560.000 |
| | | | 58 | INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO NUESTRA SENORA DEL CARMEN | CORRAL VIEJO | 127.479.910 | 9.560.993 | 137.040.903 |
| | | | 59 | INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO NUESTRA SENORA DEL CARMEN | NUESTRA SENORA DEL CARMEN (sede principal) | 299.239.730 | 22.442.980 | 321.682.710 |
| | | | 90 | CENTRO EDUCATIVO EL TAMBO | LA FUENTE | 191.162.093 | 14.337.157 | 205.499.250 |
| | | | 93 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CARMEN | EL CARMEN (sede principal) | 62.400.000 | 4.680.000 | 67.080.000 |
| | | El Tambo | 22 | I.E. HUISITO | HUISITO (sede principal) | 1.041.842.757 | 78.138.207 | 1.119.980.964 |
| | | La Vega | 44 | INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA SANTA RITA | INSTITUCION EDUCATIVA SANTA RITA (sede principal) | 166.400.000 | 12.480.000 | 178.880.000 |
| | | | 163 | I.E AGROPECUARIA SAN FRANCISCO JAVIER SEDE GARAY | I.E AGROPECUARIA SAN FRANCISCO JAVIER SEDE GARAY | 177.904.227 | 13.342.817 | 191.247.044 |
| | | Popayán | 165 | IE COMUNEROS | SEDE PRINCIPAL | 457.600.000 | 34.320.000 | 491.920.000 |
| | | Rosas | 175 | INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA | SANTA TERESITA (sede principal) | 790.400.000 | 59.280.000 | 849.680.000 |
| | | | 178 | INSTITUCION EDUCATIVA MADRE CARIDAD BRADER | MADRE CARIDAD BRADER (sede principal) | 124.800.000 | 9.360.000 | 134.160.000 |
| | | | 182 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO CORDOBA | LAS YERBAS | 83.200.000 | 6.240.000 | 89.440.000 |
| | | | 183 | CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO LEON VALENCIA | LA DESPENSA | 62.400.000 | 4.680.000 | 67.080.000 |
| | | | 184 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO CORDOBA | EL RETIRO | 83.200.000 | 6.240.000 | 89.440.000 |
| | | | 186 | CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO LEON VALENCIA | EL ALTILLO | 62.400.000 | 4.680.000 | 67.080.000 |
| | | | 187 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO CORDOBA | BELLAVISTA | 62.400.000 | 4.680.000 | 67.080.000 |
| 12 | Cauca | Piamonte | 27 | CENTRO EDUCATIVO PUERTO GUAYUYACO | ESCUELA RURAL MIXTA LA ESPANOLA | 62.400.000 | 4.680.000 | 67.080.000 |
| | | | 121 | CENTRO EDUCATIVO PUERTO GUAYUYACO | ESC RUR MIX SAN ANDRESITO | 41.600.000 | 3.120.000 | 44.720.000 |
| | | | 125 | INST EDUC AGRIC PIAMONTE | PIAMONTE (sede principal) | 1.553.938.473 | 116.545.386 | 1.670.483.859 |
| | | | 173 | ESC RUR MIX FRAY EZEQUIEL | ESC RUR MIX FRAY EZEQUIEL | 195.752.201 | 14.681.415 | 210.433.616 |
| | | | 174 | E.D.R PORTO GUAYUYACO SEDE PRINCIPAL | E.D.R PORTO GUAYUYACO SEDE PRINCIPAL | 166.400.000 | 12.480.000 | 178.880.000 |
| | Huila | Acevedo | 26 | INSTITUCION EDUCATIVA BATEAS | BATEAS | 310.453.360 | 23.284.002 | 333.737.362 |
| | Nariño | BARBACOAS | 87 | INSTITUCION EDCUATIVA TERAIMBE | SEDE 9 CUMAINDE | 62.400.000 | 4.680.000 | 67.080.000 |
| | | | 110 | INSTITUCION EDUCATIVA TERAIMBE | SEDE 2 BOMBON | 124.800.000 | 9.360.000 | 134.160.000 |
| | | Cumbal | 36 | INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCION DE TALLAMBI | INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCION DE TALLAMBI | 764.787.529 | 57.359.065 | 822.146.593 |
| | | El Rosario | 8 | CENTRO EDUCATIVO LA CLAUDIA | CENTRO EDUCATIVO LA CLAUDIA | 62.400.000 | 4.680.000 | 67.080.000 |
| | | Ipiales | 142 | INSTITUCION EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL LOS PASTOS | ESCUELA LAS CRUCES | 208.000.000 | 15.600.000 | 223.600.000 |

| GRUPO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | ID MEN No. | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SEDE | VR. TOTAL AULAS Y MEJORAMIENTO | VR. INTERVENTORÍA | VR. TOTAL OBRA + INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Mallama (Piedrancha) | 149 | CENTRO EDUCATIVO MALLAMA | CENTRO EDUCATIVO DE MALLAMA | 62.400.000 | 4.680.000 | 67.080.000 |
| | | Pasto | 1 | I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE | I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - SEDE PRINCIPAL | 436.800.000 | 32.760.000 | 469.560.000 |
| | Putumayo | Orito | 127 | INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL UMADA WUARRARA | ESC RUR MIX ALTO ORITO | 127.913.503 | 9.593.513 | 137.507.016 |
| | | Puerto Asís | 172 | E. RUR CAUCACIA - SEDE PRINCIPAL | SEDE PRINCIPAL | 249.600.000 | 18.720.000 | 268.320.000 |
| | | Puerto Asís | 41 | I. E. RUR CAUCACIA | ESC RUR MIX EL JARDIN ALTO TETEYE | 197.100.201 | 14.782.515 | 211.882.716 |
| | | | 57 | I. E. RUR CAUCACIA | ESC RUR MIX EL PROGRESO | 167.997.003 | 12.599.775 | 180.596.778 |
| | | Puerto Leguizamo | 88 | IE RUR LUIS VIDALES DEL PIÑUÑA NEGRO | ESC RUR MIX PUERTO PRINCIPE DOS | 124.800.000 | 9.360.000 | 134.160.000 |
| Total general | | | | | | 52.593.871.997 | 3.944.540.400 | 56.538.412.397 |

d. *Evaluar los proponentes, así como las propuestas presentadas para la construcción de las obras de infraestructura educativa e interventorías correspondientes y realizar la adjudicación y contratación de dichos procesos.*

Una vez concluidos los procesos de convocatoria y realizadas las evaluaciones exhaustivas de los proponentes y sus respectivas propuestas para la construcción de las obras de infraestructura educativa y las interventorías correspondientes, nos complace informar en este periodo que dichos procesos han llegado a su fin. Se ha llevado a cabo una rigurosa revisión bajo los parámetros establecidos en los Términos de Referencia, asegurando que se cumplan los lineamientos de contratación pública en términos de transparencia y equidad.

Gracias a este esfuerzo, se ha procedido con éxito a la adjudicación de los contratos, seleccionando a los proponentes que demostraron las mejores capacidades técnicas, financieras y operativas. Todos los grupos han sido debidamente contratados, lo que asegura que las obras se desarrollarán dentro de los plazos previstos y bajo los más altos estándares de calidad.

Nuestro compromiso con la excelencia en la ejecución de las obras y el adecuado control mediante las interventorías asegurará que estas infraestructuras aporten un valor significativo a la comunidad educativa, garantizando su correcto desarrollo y el bienestar de los beneficiarios.

## 1.4 ACTIVIDADES CONTRACTUALES

### 1.4.1 Obligaciones:

a. *Ejecutar a través de los contratistas seleccionados y hacer seguimiento a la calidad y entrega de las obras de infraestructura educativa diseñadas para atender las afectaciones a las sedes educativas priorizadas por el MEN.*

FINDETER, en concordancia con la naturaleza de los proyectos a abordar bajo el marco del Decreto de Emergencia, ha adelantado en el presente periodo la ejecución de diversas sedes educativas. Estos proyectos se han llevado a cabo mediante la colaboración de contratistas que fueron rigurosamente seleccionados a través de procedimientos transparentes y estructurados, conforme a lo estipulado en el Manual de Contratación de FINDETER.

La selección de contratistas no fue un proceso aleatorio, sino que siguió una serie de etapas bien definidas, que incluyeron la evaluación de capacidades técnicas, experiencia previa en proyectos similares, y solidez financiera. Este enfoque metodológico garantiza que los proyectos se ejecuten con altos estándares de calidad y dentro de los plazos establecidos, lo cual es crucial en contextos de emergencia donde la eficiencia y la efectividad son primordiales.

Adicionalmente, la supervisión y el monitoreo continuo de los avances de las obras permiten asegurar que se cumplan todas las normativas vigentes y que los recursos asignados se utilicen de manera óptima. FINDETER ha implementado mecanismos de control y seguimiento que incluyen auditorías periódicas y la utilización de tecnología para el seguimiento en tiempo real de las obras. Esto no solo brinda transparencia al proceso, sino que también facilita la identificación temprana de posibles inconvenientes y la implementación de medidas correctivas oportunas.

b. *Ejercer la vigilancia de los contratos de obra contratando las respectivas interventorías y ejercer la supervisión a los contratos de interventoría que se deriven del presente contrato.*

FINDETER adelantó en el presente periodo un riguroso ejercicio de vigilancia de los contratos de obra mediante la contratación de las respectivas interventorías. Esta medida se implementó con el objetivo de asegurar el adecuado desarrollo de los proyectos de infraestructura, en línea con los estándares de calidad y los plazos establecidos.

La contratación de interventorías y la posterior supervisión de sus actividades permitirán crear un sistema de verificación y seguimiento continuo, asegurando la transparencia en el proceso de ejecución de las obras y proporcionando un mecanismo de retroalimentación para la garantía de la calidad, la eficiencia y el cumplimiento de los estándares requeridos en las obras de infraestructura educativa, quedando así el resumen de este periodo:

| GRUPO | TIPO DE CONTRATO | CÓDIGO | DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS | FECHA DE ADJUDICACIÓN | CONTRATISTA | VALOR OFERTADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTERVENTORÍA | PAF-MENAM-I-052-2023 | Antioquia - Apartadó Antioquia - Turbo Antioquia - Ciudad Bolívar Chocó - Carmen del Darién Chocó - Tadó | 03/10/2023 | INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S | $271.455.247 | Liquidado el 25 de febrero del 2025 |
| 1 | OBRA | PAF-MENAM-O-049-2023 | | 06/10/2023 | OBRAS CAPITAL S. A | $3.447.332.359 | Liquidado el 31 de enero del 2025 |
| 2 | INTERVENTORÍA | PAF-MENAM-I-053-2023 | Atlántico - Repelón Atlántico - Galapa Atlántico – Soledad - Atlántico - Palmar De Varela Atlántico - Luruaco | 26/09/2023 | RM INGENIEROS S.A.S. | $295.715.000 | Entregado el 15 de noviembre del 2024 |
| 2 | OBRA | PAF-MENAM-O-050-2023 | | 06/10/2023 | CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 | $4.044.124.630 | Entregado el 15 de noviembre del 2024 |
| 3 | INTERVENTORÍA | PAF-MENAM-I-054-2023 | Magdalena - Ciénaga Magdalena - El Retén Magdalena - Pueblo viejo | 26/09/2023 | CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3 | $351.774.412 | Liquidado el 20 de diciembre del 2024 |
| 3 | OBRA | PAF-MENAM-O-051-2023 | | 06/10/2023 | CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA | $4.744.960.153 | Liquidado el 01 de noviembre del 2024 |
| 4 | OBRA | PAF-MENAM-O-052-2023 | Bolívar - Córdoba Bolívar - Mompós Magdalena - San Sebastián de Buenavista | 20/09/2023 | JASA LTDA | $3.566.467.466 | Liquidado el 30 de septiembre del 2024 |
| 4 | INTERVENTORÍA | PAF-MENAM-I-055-2023 | | 26/09/2023 | CONSORCIO INTER EDUCATIVO G4 | $264.974.745 | Entregado 22 de marzo del 2024 |
| 5 | OBRA | PAF-MENAM-O-053-2023 | Bolívar - Barranco De Loba Magdalena - Concordia Magdalena - El Banco Cesar - Curumaní Bolívar - San Martín De Loba Cesar - Chimichagua | 03/10/2023 | CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5 | $4.102.044.984 | Terminado el 08 de noviembre del 2024 |
| 5 | INTERVENTORÍA | PAF-MENAM-I-056-2023 | | 06/10/2023 | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5 | $300.856.990 | Terminado el 08 de enero del 2025 |

| GRUPO | TIPO DE CONTRATO | CÓDIGO | DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS | FECHA DE ADJUDICACIÓN | CONTRATISTA | VALOR OFERTADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | OBRA | PAF-MENAM-O-056-2023 | Cesar - Valledupar<br>Cesar - La Paz<br>Cesar - El paso | 29/09/2023 | DAR ARQUITECTURA S.A. S | $2.102.352.000 | Liquidado el 20 de noviembre del 2024 |
| 6 | INTERVENTORÍA | PAF-MENAM-I-058-2023 | | 03/10/2023 | CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023 | $155.543.411 | Liquidado el 27 de noviembre del 2024 |
| 8 | OBRA | PAF-MENAM-O-055-2023 | Córdoba – Tuchín Córdoba – Cotorra Córdoba - Planeta Rica Córdoba - Puerto Libertador Córdoba – Ayapel Córdoba - Montelíbano Bolívar - María la Baja | 29/09/2023 | DAR ARQUITECTURA S.A. S | $4.706.470.280 | Entregado 21 de agosto del 2024 |
| 8 | INTERVENTORÍA | PAF-MENAM-I-057-2023 | | 13/10/2023 | LUIS GUILLERMO NARVÁEZ RICARDO | $297.097.668 | Entregado 21 de agosto del 2024 |
| 7 | OBRA | PAF-ATMEN5-O-036-2024 | Guajira – Manaure Guajira – Rioacha Guajira - Maicao Guajira - Barrancas | 19/03/2024 | Consorcio Guajira 7 | 4.158.777.879 | Entregado el 28 de febrero del 2025 |
| 7 | INTERVENTORÍA | PAF-MENAM-I-059-2023 | | 17/04/2024 | GERMÁN ADOLFO PERDOMO PACHÓN | 295.239.000 | Terminado el 17 de enero del 2025 |
| 9 | OBRA | PAF-ATMEN5-O-037-2024 | Santander - Vélez, Betulia, Barrancabermeja Bolívar – Morales Bogotá Arauca - Saravena -Arauca Tolima - Santa Isabel Meta – Villavicencio Cundinamarca – Anolaima Bolívar – Simiti Norte de Santander - La Playa | 19/03/2024 | CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9 | 4.810.476.306 | Etapa 2 |
| 9 | INTERVENTORÍA | PAF-ATMEN5-I-064-2024 | | 28/06/2023 | CONSORCIO SAN GABRIEL | 313.800.000 | Etapa 2 |
| 10 | OBRA | PAF-MENAM-O-080-2023 | Cauca - Suárez<br>Cauca - Santander De Quilichao<br>Chocó - Bahía Solano<br>Cauca – Toribío<br>Valle Del Cauca - Guadalajara De Buga | 23/11/2023 | CONSORCIO FIN GRUPO 10 | $6.014.978.800 | Etapa 2 |
| 10 | INTERVENTORÍA | PAF-MENAM-I-062-2023 | | 15/12/2023 | CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO | $327.496.568 | Etapa 2 |
| 11 | OBRA | PAF-MENAM-O-079-2023 | Cauca - El Tambo<br>Cauca - La Vega<br>Cauca - Balboa<br>Cauca - Popayán<br>Cauca - Rosas | 27/11/2023 | CONSORCIO FIN GRUPO 11 | $ 4.728.021.810 | Terminado el 27 de noviembre del 2024 |
| 11 | INTERVENTORÍA | PAF-MENAM-I-063-2023 | | 22/12/2023 | CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO | $312.927.160,00 | Terminado el 27 de noviembre del 2024 |
| 12 | OBRA | PAF-MENAM-O-076-2023 | Nariño – Pasto Putumayo - Puerto Asís Cauca – Piamonte Nariño – Ipiales Nariño - Mallama | 27/11/2023 | CONSORCIO FIN GRUPO 12 | $ 4.918.276.400 | Terminado el 05 de diciembre del 2024 |
| 12 | INTERVENTORÍA | PAF-MENAM-I-064-2023 | | 22/12/2023 | CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO | $ 351.774.412 | Terminado el 05 de diciembre del 2024 |
| Dotación | SUMINISTRO | PAF-ATMEN5-S-041-2024 | Choco - Carmen del Darién, Tadó<br>Antioquia – Apartadó<br>Atlántico – Repelón, Soledad<br>Bolívar – Mompós, Barranco de Loba, San Martín de Loba, María la Baja<br>Cauca - Santander de Quilichao, Suarez, El Tambo, Bolívar, La Vega, Rosas<br>Cesar - La Paz (Robles), El Paso<br>Córdoba - Planeta Rica, Puerto Libertador, Ayapel, Montelíbano<br>Magdalena - El Retén, San Sebastián de Buenavista | 22/08/2024 | DOTAESCOL SAS | $ 584.310.000 | Suspendido el día 26 de noviembre del 2024 |

**Nota:** Según el informe previo sobre el estado de los grupos de contratación y de cada institución educativa, se comunica que **el Grupo 4 ha sido entregado el 22 de marzo de 2024, el Grupo 3 ha sido entregado el 30 de abril de 2024, Grupo 6 ha sido entregado el 17 de mayo de 2024, el Grupo 8 ha sido entregado el 21 de agosto de 2024**, **el Grupo 1 ha sido entregado el 29 de octubre de 2024**, satisfacción entre rectores, estudiantes y familias. Además, se está avanzando en el proceso de estructuración de los estudios preliminares para equipar las nuevas aulas construidas, con el objetivo de entregarlas completamente dotadas.

c. *Conformar un Comité Fiduciario y un Comité Técnico Operativo al interior del PATRIMONIO AUTÓNOMO administrado por la FIDUCIARIA contratada, de acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo que para el efecto se adopte.*

Durante este periodo se realizaron los siguientes comités:

*Comités Técnicos*

Para el presente periodo no se adelantan actividades de este tipo.

*Comités Fiduciarios*

Para el presente periodo no se adelantan actividades de este tipo.

## a. ACTIVIDADES DE CIERRE Y LIQUIDACIÓN

### i. Obligaciones:

a. *Adelantar la liquidación o cierre de los contratos derivados para la ejecución de los proyectos y del Contrato Interadministrativo una vez estos hayan finalizado.*

*De la contratación derivada*

En el presente periodo se ha planificado anticipadamente la liquidación o cierre de los contratos derivados con el propósito de asegurar una ejecución eficiente de los proyectos. Esta estrategia no solo facilitó una gestión financiera más efectiva, sino que también permitió cumplir con los objetivos establecidos dentro de los plazos previstos, optimizando así los recursos disponibles y garantizando la correcta finalización de las obligaciones contractuales, así mismo se adelantaron las siguientes liquidaciones:

| GRUPO | TIPO DE CONTRATO | CÓDIGO | DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS | FECHA INCIO | FECHA TERMINACIÓN | CONTRATISTA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTERVENTORÍA | PAF-MENAM-I-052-2023 | Antioquia - Apartadó Antioquia - Turbo Antioquia - Ciudad Bolívar Chocó - Carmen del Darién Chocó - Tadó | 14/11/2023 | 29/10/2024 | INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S | Liquidado el 25 de febrero del 2025 |
| 1 | OBRA | PAF-MENAM-O-049-2023 | | 14/11/2023 | 14/08/2024 | OBRAS CAPITAL S. A | Liquidado el día 31/01/2025 |
| 2 | INTERVENTORÍA | PAF-MENAM-I-053-2023 | Atlántico - Repelón Atlántico - Galapa Atlántico – Soledad - Atlántico - Palmar De Varela Atlántico - Luruaco | 26/09/2023 | 05/11/2024 | RM INGENIEROS S.A.S. | Radicado el 27/02/2025 a través PRISA INC 2025-000621 |
| 2 | OBRA | PAF-MENAM-O-050-2023 | | 06/10/2023 | 05/09/2024 | CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 | Radicado el 27/02/2025 a través PRISA INC 2025-000620 |
| 3 | INTERVENTORÍA | PAF-MENAM-I-054-2023 | Magdalena - Ciénaga Magdalena - El Retén Magdalena - Pueblo viejo | 14/11/2023 | 30/04/2024 | CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3 | Liquidado el día 20/12/2024 |
| 3 | OBRA | PAF-MENAM-O-051-2023 | | 14/11/2023 | 30/04/2024 | CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA | Liquidado el día 01/10/2024 |

| GRUPO | TIPO DE CONTRATO | CÓDIGO | DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS | FECHA INCIO | FECHA TERMINACIÓN | CONTRATISTA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTERVENTORÍA | PAF-MENAM-I-052-2023 | Antioquia - Apartadó Antioquia - Turbo Antioquia - Ciudad Bolívar Chocó - Carmen del Darién Chocó - Tadó | 14/11/2023 | 29/10/2024 | INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S | Liquidado el 25 de febrero del 2025 |
| 1 | OBRA | PAF-MENAM-O-049-2023 | | 14/11/2023 | 14/08/2024 | OBRAS CAPITAL S. A | Liquidado el día 31/01/2025 |
| 2 | INTERVENTORÍA | PAF-MENAM-I-053-2023 | Atlántico - Repelón Atlántico - Galapa Atlántico – Soledad - Atlántico - Palmar De Varela Atlántico - Luruaco | 26/09/2023 | 05/11/2024 | RM INGENIEROS S.A.S. | Radicado el 27/02/2025 a través PRISA INC 2025-000621 |
| 2 | OBRA | PAF-MENAM-O-050-2023 | | 06/10/2023 | 05/09/2024 | CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 | Radicado el 27/02/2025 a través PRISA INC 2025-000620 |
| 4 | OBRA | PAF-MENAM-O-052-2023 | Bolívar - Córdoba Bolívar - Mompós Magdalena - San Sebastián de Buenavista | 24/10/2023 | 22/03/2024 | JASA LTDA | Liquidado el día 30/09/2024 |
| 4 | INTERVENTORÍA | PAF-MENAM-I-055-2023 | | 24/10/2023 | 22/03/2024 | CONSORCIO INTER EDUCATIVO G4 | Inicia su trámite de liquidación una vez que quede desembolsado el último pago. |
| 6 | OBRA | PAF-MENAM-O-056-2023 | Cesar - Valledupar Cesar - La Paz Cesar - El paso | 29/09/2023 | 17/05/2024 | DAR ARQUITECTURA S.A. S | Liquidado el día 20/11/2024 |
| 6 | INTERVENTORÍA | PAF-MENAM-I-058-2023 | | 03/10/2023 | 17/05/2024 | CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023 | Liquidado el día 27/11/2024 |
| 8 | OBRA | PAF-MENAM-O-055-2023 | Córdoba – Tuchín Córdoba – Cotorra Córdoba - Planeta Rica Córdoba - Puerto Libertador Córdoba – Ayapel Córdoba - Montelíbano Bolívar - María la Baja | 29/09/2023 | DAR ARQUITECTURA S.A. S | $4.706.470.280 | Se encuentra en revisión de la fiducia. |
| 8 | INTERVENTORÍA | PAF-MENAM-I-057-2023 | | 13/10/2023 | LUIS GUILLERMO NARVÁEZ RICARDO | $297.097.668 | En consolidación y revisión documentos por la supervisión para el inicio del proceso de liquidación. |

*Del Contrato Interadministrativo*

Para el presente periodo no se adelantan actividades de este tipo.

## 2. RESUMEN GENERAL DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL CONTRATO

**CONTRATO No CO1.PCCNTR. 4917031 de 2023**

| | |
|---|---|
| **Valor inicial del Contrato** (CO1.PCCNTR. 4917031 de fecha 2023) | 63.650.000.000 |
| **Valor del Contrato a la fecha de corte del Informe** | **63.650.000.000** |
| Descuentos / Impuestos Estampilla Pro-Universidad Nacional / Tasas y Contribuciones (Correspondiente al 2% aplicado al valor Inicial del Contrato) | - |
| Asistencia Técnica No. 1 (Porcentaje de Asistencia Técnica y Administración de Recursos a reconocer a FINDETE, 7%) | 4.164.018.692 |
| **Valor disponible para ejecutar los proyectos de acuerdo con el objeto del contrato y el plan operativo.** | **59.485.981.308** |

## 3. ANEXOS

Se remiten anexos de acuerdo con las actividades realizadas durante el periodo así:

1. 14 de febrero del 2025

**HERNÁN PARDO BOTERO**
*Gerente de Infraestructura*
*FINDETER* GB

***JESÚS ALBERTO CAÑAS PÁEZ***
*Gestor del Contrato Interadministrativo*
*FINDETER*

*Elaboró: Geraldine Lorena Prada Pimiento – Profesional de la Gerencia de Infraestructura*



Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

# MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

## Contrato No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023

**14 FEBRERO DE 2025**

Hacienda

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública


# Contrato No. 4917031-2023

**136** **sedes educativas**
[instalación de aulas y mejoramientos]

**$ 63.650**
Millones de pesos

Fecha inicio: 2/06/2023
Fecha Fin Actual: 01/07/2025

| Grupo | Departamentos / Municipios | Etapa Actual del grupo/% de avance de contrato<br>Fecha de Inicio –Fecha de Terminación |
|---|---|---|
| G1 [10 sedes] | Antioquia \| Chocó | Entregado [100,00%]<br>14/11/2023 - 14/08/2024 |
| G2 [8 sedes] | Atlántico | Entregado [100,00%]<br>27/11/2023 -06/09/2024 |
| G3 [5 sedes] | Magdalena | Liquidado [100,00%]<br>14/11/2023 - 30/04/2024 |
| G4 [5 sedes] | Bolívar | Entregado [100,00%]<br>26/10/2023 - 23/03/2024 |
| G5 [16 sedes] | Bolívar \| Magdalena \| Cesar | Entregado [100,00%]<br>14/11/2023 – 08/11/2024 |
| G6 [7 sedes] | Cesar | Entregado [100,00%]<br>15/11/2023 - 17/05/2024 |
| G7 [13 sedes] | Guajira | Terminado [100,00%]<br>31/05/2024 - 17/01/2025 |
| G8 [9 sedes] | Córdoba \| Bolívar | Entregado [100,00%]<br>08/11/2023 - 23/08/2024 |
| G9 [12 sedes] | Santander \| Bolívar \| Bogotá \| Arauca \| Tolima \| Meta \| Cundinamarca \| Nte de Santander | En obra[33,97%]<br>23/08/2024 - 08/03/2025 |
| G10 [15 sedes] | Cauca \| Chocó \| Valle Del Cauca | En Obra [90,22%]<br>19/02/2023 - 30/12/2024 |
| G11 [18 sedes] | Cauca | Terminado [100,00%]<br>12/02/2023 - 27/11/2024 |
| G12 [18 sedes] | Nariño \| Putumayo \| Cauca | Terminado [100,00%]<br>20/02/2023 - 04/12/2024 |
| Dotación | 46 Sedes a dotar - 99 aulas | Suspendido[100,00%]<br>03/10/2024 – 03/12/2024 |

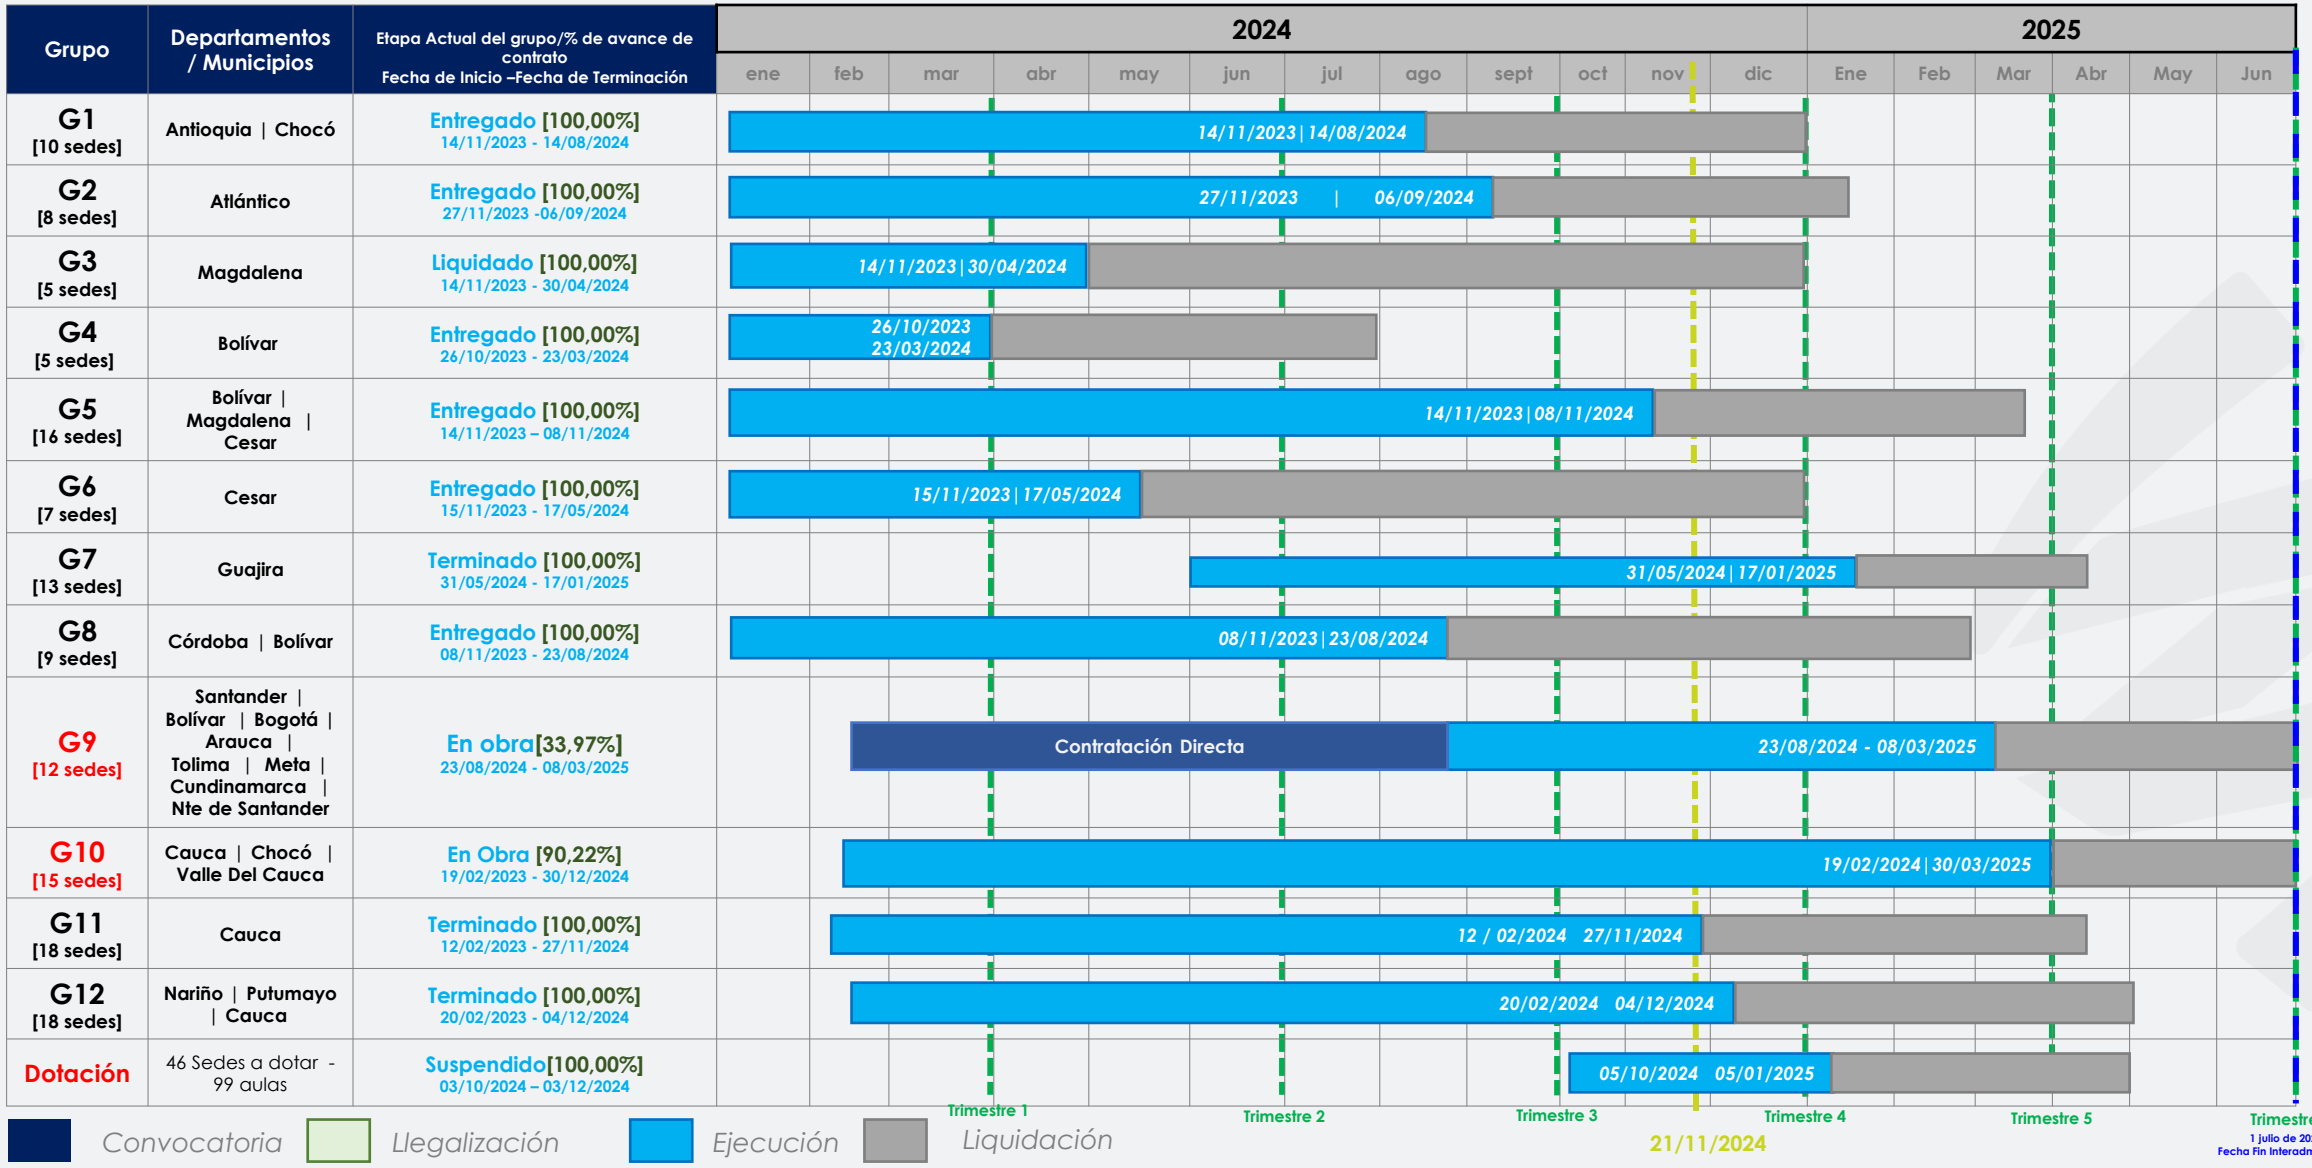


Convocatoria | Llegalización | Ejecución | Liquidación

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

# Aulas Móviles
# Contrato No. 4917031-2023

Educación

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**136** **sedes educativas**
[instalación de aulas y mejoramientos]

**$ 63.650**
Millones de pesos

Fecha inicio: 02/06/2023
Fecha Fin: 01/07/2025

**ENTREGADAS** 116 sedes 85,29%


**TERMINADAS** 5 sedes 3,68%

*Físicamente culminadas. A la espera de firma de actas para ser entregadas*

**EN EJECUCIÓN** 15 sedes 9,56%

**POR INICIAR** 2 sedes 1,47%

## Estado de entrega y ejecución de Sedes

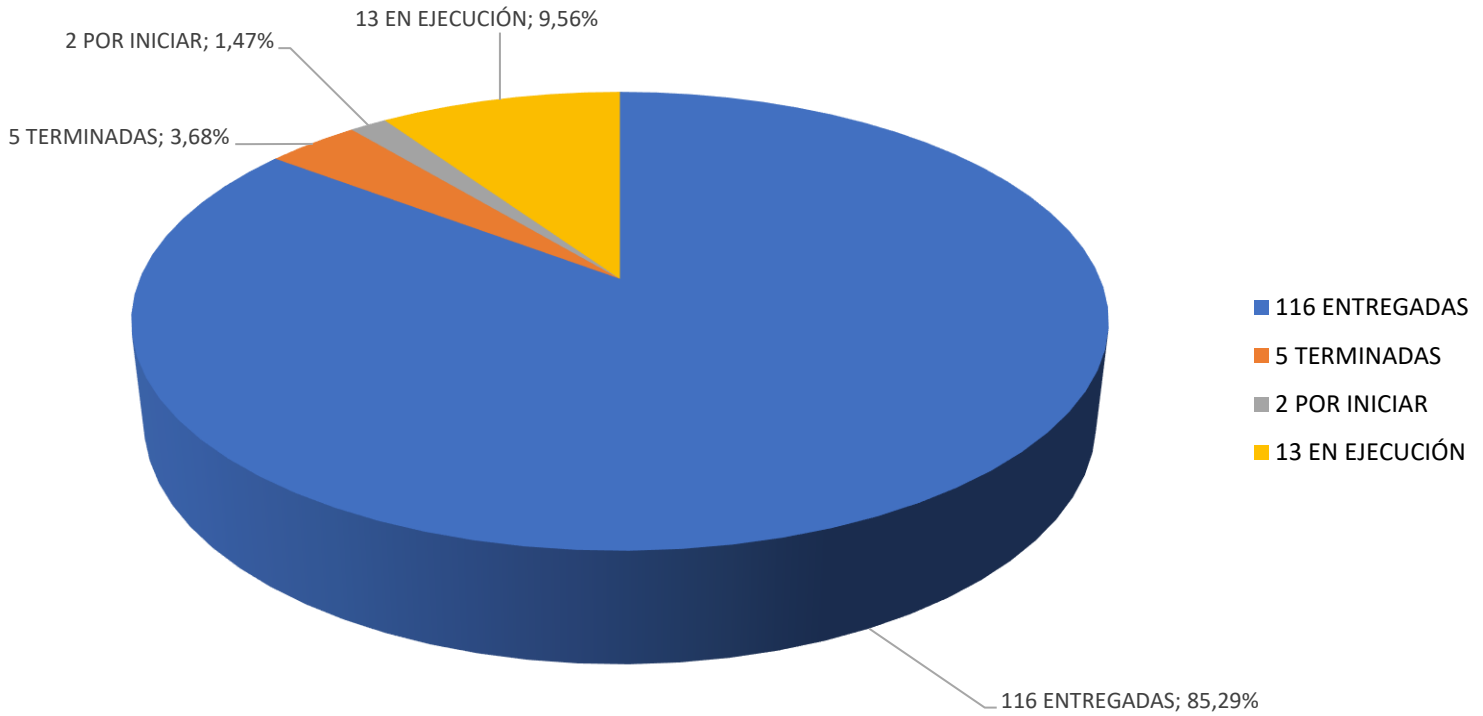


CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Estado de entrega y ejecución de Sedes

**136** **sedes educativas**
[instalación de aulas y mejoramientos]

**$ 63.650**
Millones de pesos

Fecha inicio: 02/06/2023
Fecha Fin: 01/07/2025

| ENTREGADAS | TERMINADAS | EN EJECUCIÓN | POR INICIAR |
|---|---|---|---|
| 116 sedes<br>85,29% | 5 sedes<br>3,68% | 13 sedes<br>9,56% | 2 sedes<br>1,47% |
| Grupo 1 - 10<br>Grupo 2 - 8<br>Grupo 3 - 5<br>Grupo 4 - 5<br>Grupo 5 - 16<br>Grupo 6 - 7<br>Grupo 7- 13<br>Grupo 8 - 9<br>Grupo 10 - 10<br>Grupo 11 - 16<br>Grupo 12 - 17 | Grupo 9 - 1<br>Grupo 10 - 1<br>Grupo 11 - 2<br>Grupo 12 - 1 | Grupo 9 - 9<br>Grupo 10 - 4 | Grupo 9 - 2<br>Grupo 10 - 4 |

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

# PAGOS ASISTENCIA TECNICA

**136** **sedes educativas**
[instalación de aulas y mejoramientos]

**$ 63.650**
Millones de pesos

Fecha inicio: 02/06/2023
Fecha Fin: 01/07/2025

## VALOR AT

$ 4.164.018.692

| Cobrado (a dic de 2024) | Pagado (a dic de 2024) | SALDO |
|---|---|---|
| $3.585.749.431,31 | $3.585.749.431, 31 | $ 578.269.260,69 |

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

# Resumen Informe Financiero – Corte 31 de diciembre de 2024

**136** **sedes educativas**
[instalación de aulas y mejoramientos]

**$ 63.650**
Millones de pesos

Fecha inicio: 02/06/2023
Fecha Fin: 01/07/2025

## VALOR EJECUTADO

$ 49.435 mll

## VALOR POR EJECUTAR

$ 14.573 mll

## VALOR COMPROMETIDO

$ 59.515 mll

## SALDO

$ 398,2 mll*

*El saldo es a corte de 09 de febrero de 2025

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

# Rendimientos Financieros – Relación de Pagos

Educación


**Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031**
**Ministerio de Educación Nacional**
**Financiera del Desarrollo S.A.**
**7. RENDIMIENTOS FINANCIEROS**
**01 de diciembre al 31 de diciembre de 2024**

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| FECHA | RENDIMIENTOS CAUSADOS CUENTA DE AHORRO | VALORACIÓN /DESVALORIZACION CAUSADOS FONDO DE INVERSION COLECTIVA - FIC | TOTAL RENDIMIENTOS, VALORACION DEVALORIZACION CAUSADOS | FECHA TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS | VALOR TRASLADO RENDIMIENTOS | AJUSTES / RETENCIONES | SALDO PENDIENTE POR TRASLADAR RENDIMIENTOS | DESVALORIZACION ACUMULADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ago-23 | 82.351.406,35 | 443.947.650,01 | **526.299.056,36** | | | | - | - |
| sep-23 | 108.927.246,74 | 548.880.836,71 | **657.808.083,45** | | | | - | - |
| oct-23 | 131.902.760,66 | 436.008.307,20 | **567.911.067,86** | | | | - | - |
| nov-23 | 144.907.033,92 | 718.224.229,49 | **863.131.263,41** | | | | - | - |
| dic-23 | 143.221.271,36 | 788.090.860,63 | **931.312.131,99** | 13/12/2023 | **2.615.149.472,00** | | - | - |
| ene-24 | 133.626.379,48 | 427.858.051,59 | **561.484.431,07** | 10/01/2024 | **931.312.131,99** | | - | - |
| feb-24 | 120.547.529,88 | 474.970.095,24 | **595.517.625,12** | 12/02/2024 | **561.484.430,15** | | - | - |
| mar-24 | 117.745.976,50 | 478.495.863,61 | **596.241.840,11** | 12/03/2024 | **595.517.625,12** | | - | - |
| abr-24 | 100.331.907,69 | 259.736.382,70 | **360.068.290,39** | 10/04/2024 | **596.241.840,11** | | - | - |
| may-24 | 89.374.457,56 | 353.632.163,66 | **443.006.621,22** | 11/05/2024 | **360.068.290,39** | | - | - |
| jun-24 | 76.820.331,89 | 266.323.590,41 | **343.143.922,30** | 13/06/2024 | **443.006.621,22** | | - | - |
| jul-24 | 68.012.790,67 | 294.233.627,01 | **362.246.417,68** | 15/07/2024 | **343.143.922,30** | | - | - |
| ago-24 | 21.741.419,32 | 313.006.436,96 | **334.747.856,28** | 14/08/2024 | **362.246.417,68** | | - | - |
| sep-24 | 20.861.120,00 | 192.185.501,19 | **213.046.621,19** | 10/09/2024 | **334.747.856,28** | | - | - |
| oct-24 | 27.022.756,52 | 71.175.915,03 | **98.198.671,55** | 18/10/2024 | **213.046.621,19** | | - | - |
| nov-24 | 21.729.373,21 | 129.213.183,82 | **150.942.557,03** | 13/11/2024 | **98.198.671,55** | | - | - |
| dic-24 | 19.252.522,64 | 66.886.746,40 | **86.139.269,04** | 10/12/2024 | **150.942.557,03** | | **86.139.269,04** | - |
| **TOTAL** | **1.428.376.284,39** | **6.262.869.441,66** | **7.691.245.726,05** | | **7.605.106.457,01** | - | **86.139.269,04** | - |

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

# Rendimientos Financieros – Comprobante de pago

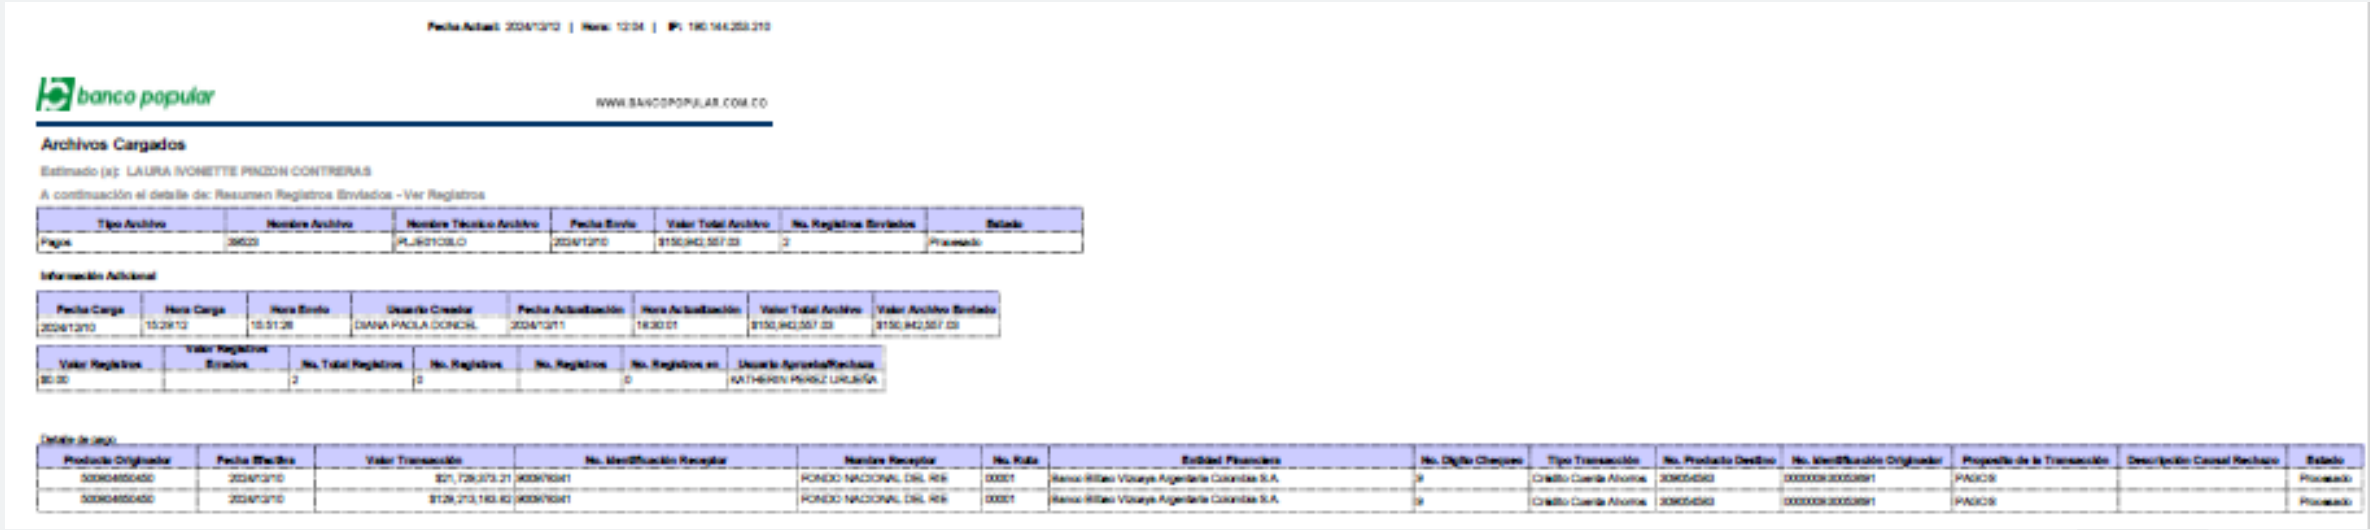

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

**Archivos Cargados**

Estimado (a): LAURA IVONETTE PINZON CONTRERAS

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

| Tipo Archivo | Nombre Archivo | Nombre Técnico Archivo | Fecha Envío | Valor Total Archivo | No. Registros Enviados | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagos | 39520 | PLJ521C08.O | 2024/12/10 | $150,842,557.03 | 2 | Procesado |

Información Adicional

| Fecha Carga | Hora Carga | Hora Envío | Usuario Creador | Fecha Actualización | Hora Actualización | Valor Total Archivo | Valor Archivo Enviado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/10 | 15:29:12 | 15:51:26 | DIANA PAOLA DONCEL | 2024/12/11 | 18:30:01 | $150,842,557.03 | $150,842,557.03 |

| Valor Registros | Valor Registros Enviados | No. Total Registros | No. Registros | No. Registros | No. Registros en | Usuario Aprueba/Rechaza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | | 2 | 0 | | 0 | KATHERIN PEREZ URUEÑA |

Detalle de pago

| Producto Originador | Fecha Efectiva | Valor Transacción | No. Identificación Receptor | Nombre Receptor | No. Rubi | Entidad Financiera | No. Digito Chequeo | Tipo Transacción | No. Producto Destino | No. Identificación Originador | Propósito de la Transacción | Descripción Causal Rechazo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50090455450 | 2024/12/10 | $21,728,073.21 | 900976041 | FONDO NACIONAL DEL RIE | 00001 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. | 9 | Crédito Cuenta Ahorros | 309054583 | 0000009300536891 | PAGOS | | Procesado |
| 50090455450 | 2024/12/10 | $128,213,183.82 | 900976041 | FONDO NACIONAL DEL RIE | 00001 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. | 9 | Crédito Cuenta Ahorros | 309054583 | 0000009300536891 | PAGOS | | Procesado |

**NOTA: Teniendo en cuenta el contrato MEN-4917031 2023 -TEMPORADA DE LLUVIAS, y en atención a la obligación descrita en la cláusula tercera, Obligaciones específicas del contratista, Numeral 8 el cual dice:**

*"8. El Patrimonio Autónomo — Findeter deberá reintegrar mensualmente los rendimientos financieros (si los hubiere) a la Dirección del Tesoro Nacional o en los términos que establezca la normatividad aplicable, es decir, que no ingresan ni hacen parte del Patrimonio Autónomo constituido por Findeter."*

**Se han consignado los rendimientos financieros a la siguiente cuenta:**

- **Banco:** BBVA
- **Tipo:** Ahorros
- **No. Cuenta:** 309-054583
- **Nombre de la Cuenta:** FIDUPREVISORA S.A FNGRD – COLOMBIA VITAL

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

# AULAS MOVILES
# INFORME DETALLADO POR GRUPO DE INTERVENCION

Febrero 14 de 2025



NGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres

Educación

Colombia Vital

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# CONTRATOS EN EJECUCION

| GRUPO | Departamento | No SEDES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | % PROGRAMADO | % EJECUTADO | ALERTAS, ASUNTOS PENDIENTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUPO 9** | Arauca, Bolívar, Cundinamarca Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima y Bogotá D.C. | **12** | 23/08/2024 | 08/03/2025 | 82,61% | 47,90% | Se han presentado inconvenientes por precipitaciones para los proyectos ubicados en el Tolima, lo cual está generando que se tenga que solicitar una prórroga por dos (2) meses y quince (15) días calendario para la culminación de actividades en estas sedes.<br><br>Se han presentado demoras en la ejecución de actividades e inicio de obras en algunas sedes educativas, lo cual a la fecha genera un alto atraso; por lo anterior, se inició proceso de apremio el cual fue notificado por la fiduciaria el 03 de febrero de 2025 y se presentaron descargos el día 11/02/2024, los cuales están siendo analizados por la interventoría para la continuación del mismo. |
| **GRUPO 10** | Cauca, Valle del Cauca y Choco | **15** | 19/02/2024 | 30/03/2025 | 89,07% | 86,23% | Los proyectos del Cauca se han visto afectados por temas de orden público en los últimos días de enero y primeros de febrero, lo cual han generando suspensión actividades parciales y retiro de personal trabajador por temor a la situación, hechos que han afectado los avances de los proyectos y actualmente están generando atrasos frente a la programación. Adicional el proyecto de Santander de Quilichao se encuentra en avance a su programación pero pendiente de que la administración municipal construya las acometidas para realizar las conexiones pertinentes por parte del proyecto, se ha reiterado al solicitud y necesidad de la misma, sobre la cual informan que se encuentran adelantando los tramites para abrir la convocatoria y adjudicar el contrato, ya que en el mes de diciembre adelantaron este proceso pero el mismo se declaro desierto. |

CCOM-FO-005 V1 / 05-Ago-2024 / Publica

# Grupo 09

Fecha inicio: 23/08/2024
Fecha Fin: 08/03/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | |
|---|---|
| ***Departamento*** | **Arauca, Bolívar, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima y Bogotá D.C.** |
| **$** | **Valor Inicial**<br>Obra: $ 4.810.476.306,00<br>Interventoría: $ 313.800.000 |
| | **Adiciones**<br>Obra: $ 0<br>Interventoría: $165.685.393,30 |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: CI- $245.711.234,70<br>CII - $ 1.177.717.523,99<br>Interventoría: CI - $0<br>CII - $ 96.927.168,55 |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | Otrosí No. 1: Retiro de tres (3) sedes del alcance<br>Otrosí No. 2: Prórroga tres (3) meses obra e interventoría, adición interventoría por $165.685.393,30 |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | El contratista se retrasó en el inicio de las obras en todas las sedes educativas; se han iniciado actividades en algunas sedes educativas faltantes, sin embargo, esto no mitiga los atrasos que tiene el contrato. A la fecha se tienen en ejecución 10 de las 12 sedes educativas.<br><br>Se encuentra en espera de presentación de descargos por parte del contratista e informe de la interventoría para continuación de aplicación de apremio.<br>Se presenta la necesidad de hacer una prórroga por 2,5 meses para las sedes ubicadas en el departamento del Tolima por los inconvenientes en transporte que se han presentado. |

**47,90%**
**Porcentaje de avance**

**82,61%**
**Porcentaje Programado**

| | |
|---|---|
| **Sedes:** | **12** |
| En ejecución: | 10 |
| Por iniciar: | 2 |

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Grupo 09


## COLEGIO UNIVERSITARIO - ID No. 7




## IE DEL CERRO DE VERACRUZ -ID No. 124




## CENTRO EDUCATIVO MONSERRATE - ID No. 138
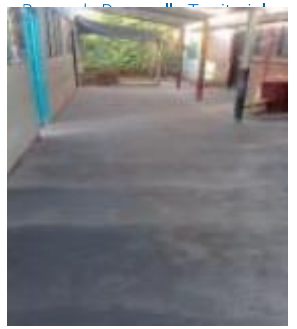
## CENTRO EDUCATIVO LA PAVA - ID No. 56




## ESCUELA SIETE DE AGOSTO - ID No. 96




## SEDE LA PEÑA – ID No. 132




## EL DESCANSO - ID No. 104




## CAMPO PAYARES -ID No. 123




CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Grupo 10

**Fecha inicio:** 19/02/2024
**Fecha Fin:** 30/03/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | |
|---|---|
| *Departamento* | **Cauca, Valle del Cauca y Choco** |
| **$** | **Valor Inicial**<br>Obra: $6.014.978.800<br>Interventoría: $327.496.568 |
| | **Adiciones**<br>Obra: $602.576.550<br>Interventoría: $197.588.004,15<br>($79.155.973,39 asumidos por el contrato de obra)<br>($118.432.030,76 asumidos por el contrato interadministrativo) |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $5.620.758.289,00<br>Interventoría: $394.815.767,36 |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | 3 otrosíes obra: Prórrogas (9 meses y 27 dias)<br>3 otrosíes interventoría: Prórrogas (9 meses y 27 dias)<br>y adiciones ($197.588.004,15) |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | En cumplimiento al alcance se tienen 11 sedes entregadas y AEP&SC suscritas, y 4 sedes en ejecución, (2 Suarez, 1 Santander de Quilichao, 1 Bahía Solano). Se adelanta programa para realizar la entrega de la sede la Huaca en Bahía solano de la semana del 18 al 21 si se logra coordinar la agenda con el rector, frente a las obras de Suarez y Santander de Quilichao se continua con el avance de actividades con un personal mínimo derivado de los temas de orden publico que están afectando los avances de los proyectos y se evalúa una no posible terminación dentro de los tiempos contractuales. |

**86,23%**
**Porcentaje de avance**

**89,07%**
**Porcentaje Programado**

| | |
|---|---|
| **Sedes:** | **15** |
| En ejecución: | 4 |
| Por iniciar: | 0 |
| Entregadas: | 11 |

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## INSTITUCION E.TECNICA AGRARIA SEDE PRINCIPAL ID MEN. 188.






## INSTITUCION E.TECNICA AGRARIA SEDE INMACULADA ID MEN. 189.




## INSTITUCION E.TECNICA AGRARIA SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ID MEN. 190
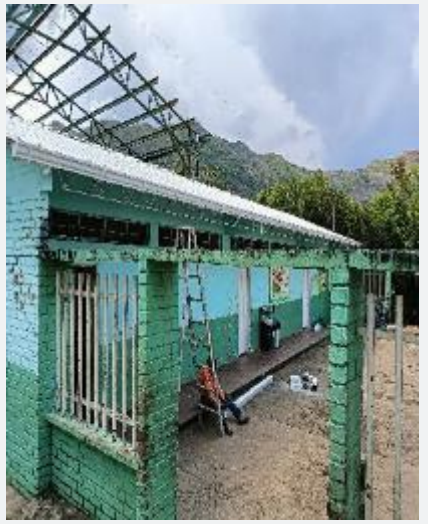
## INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PLAYA ID MEN: 12. MUNICIPIO DE TORIBIO ID MEN: 12.




## INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO SEDE DOMINGO LASSO ID 164.




## INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO SEDE PRINCIPAL ID 16




CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE JOHN F. KENNEDY




## IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDEJULIAN MENDOZA GUERRERO




## IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE PRINCIPAL




## IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE LA HONDA .




## IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE LA PLANTA .




## IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE CRISTOBAL COLÓN




lica

# Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## IE. LUIS LOPEZ DE MESA SEDE SAN JOSE (HUACA)





## IE. LUIS LOPEZ DE MESA SEDE SECUNDINO RIVAS




## IE. LUIS LOPEZ DE MESA SEDE SIRENA DEL MAR




CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# CONTRATOS SUSPENDIDOS

| GRUPO | Departamento | No SEDES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **DOTACIÓN** | Antioquia, Atlántico, Bolivar, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Putumayo, Santander, Tolima, Valle del Cauca | **46** | 03/10/2024 | 02/12/2024 | Valor del contrato inicial de $584.310.000,00 y otro sí proyectado de $364.000.000 y adición de 3 meses por las condiciones de accesibilidad de las nuevas sedes. Contrato Suspendido para la incorporación de los recursos. Se realiza el Otro Sí y se citará a comité la 3era semana del mes de febrero.<br><br>Dotación entregada en los grupos 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 y 11 y, pendiente la entrega de los grupos 5, 7, 9, 10 y 12.<br><br>La ejecución se realiza en 16 departamentos, 38 municipios y se realiza la dotación de 99 aulas nuevas construidas. |

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Estado Entrega de Dotación



**CENTRO EDUCATIVO INDIGENA CAÑO PADILLA YUKPA**
Sede El Coso La Paz – Cesar



**INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO**
Sede Escuela Nueva Parcelas Londres
Ayapel - Córdoba



**INSTITUCION EDUCATIVA EL PALMAR**
Escuela Nueva Mixta Divino Salvador
Monte Líbano - Córdoba



**INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO**
Sede Principal Santander de Quilichao - Cauca



**INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA ERM MARIA AUXILIADORA** Sede
Sebastián de Buenavista - Magdalena



**INSTITUCION EDUCATIVA TIERRA FIRME**
Mompox - Bolivar

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# CONTRATOS TERMINADOS

| GRUPO | Departamento | No SEDES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **GRUPO 11** | Cauca | **18** | 12/02/2024 | 27/11/2024 | Contratista avanza en las gestiones de entrega a Directivos de las sedes terminadas y recibidas por interventoría, las cuales son Santa Teresita en el municipio de Rosas y Francisco Javier sede Garay en el municipio de la Vega. Inicialmente el recibo de estas sedes se atrasó debido al periodo de vacaciones de los Directivos, y una vez reanudado el año escolar se informaron posventas en algunos espacios. En la IE Francisco Javier sede Garay las posventas ya fueron atendidas y se esta gestionando la firma del acta de recibo por parte del Rector. En la IE Santa Teresita están próximos a terminar la subsanación de las posventas informadas. |
| **GRUPO 12** | Cauca, Huila, Nariño y Putumayo | **1** | 20/02/2024 | 05/12/2024 | Contratista avanza en las gestiones de entrega a Directivos de las sedes terminadas y recibidas por interventoría, las cuales son Santa Teresita en el municipio de Rosas y Francisco Javier sede Garay en el municipio de la Vega. Inicialmente el recibo de estas sedes se atrasó debido al periodo de vacaciones de los Directivos, y una vez reanudado el año escolar se informaron posventas en algunos espacios. En la IE Francisco Javier sede Garay las posventas ya fueron atendidas y se esta gestionando la firma del acta de recibo por parte del Rector. En la IE Santa Teresita están próximos a terminar la subsanación de las posventas informadas. |

CCOM-FO-005-V1.1/05-Ago-2024/-Pública

# Grupo 11

Fecha inicio: 12/02/2024
Fecha Fin: 27/11/2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | |
|---|---|
| ***Departamento*** | **Cauca** |
| **$** | **Valor Inicial**<br>Obra: $ 4.728.021.810<br>Interventoría: $ 312.927.160 |
| | **Adiciones**<br>Obra: $ 0<br>Interventoría: $ 99.972.853,00<br>($ 54.867.110,00 asumidos por el contrato de obra)<br>($ 45.105.743,00 asumidos por el contrato interadministrativo) |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $ 4.721.624.076,00<br>Interventoría: $ 379.820.020,17 |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | 3 otrosíes obra: Prórrogas (6 meses)<br>3 otrosíes interventoría: Prórrogas y adiciones (6 meses - $ 99.972.853,00) |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | Contratista avanza en las gestiones de entrega a Directivos de las sedes terminadas y recibidas por interventoría, las cuales son Santa Teresita en el municipio de Rosas y Francisco Javier sede Garay en el municipio de la Vega. Inicialmente el recibo de estas sedes se atrasó debido al periodo de vacaciones de los Directivos, y una vez reanudado el año escolar se informaron posventas en algunos espacios. En la IE Francisco Javier sede Garay las posventas ya fueron atendidas y se esta gestionando la firma del acta de recibo por parte del Rector. En la IE Santa Teresita están próximos a terminar la subsanación de las posventas informadas. |







CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO




I.E. Agropecuaria Santa Rita – Sede principal
La vega




C.E. Buenos Aires – Sede Capitanes
Balboa




C.E. Guillermo León Valencia – Sede La Despensa
Rosas





C.E. Guillermo León Valencia – El Altillo
Rosas

CCOM-FO-005 V1 / 05 - Ago-2024 / Pública
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO




I.E. El Carmen – Sede principal
Bolívar




I.E. Alfonso Córdoba – Sede Las Yerbas
Rosas




I.E. Alfonso Córdoba – Sede Bellavista
Rosas




I.E. Técnica Agropecuaria Nuestra Señora de los
Remedios - Bolívar

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada
CCOM-FO-005 V1 / 05 - Ago-2024 / Pública

# Grupo 12

Fecha inicio: 12/02/2024
Fecha Fin: 05/12/2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | |
|---|---|
| ***Departamento*** | **Cauca, Huila, Nariño y Putumayo** |
| **$** | **Valor Inicial**<br>Obra: $ 4.918.276.400,00<br>Interventoría: $ 318.105.088,00 |
| | **Adiciones**<br>Obra: $ 0<br>Interventoría: $ 152,015,642,00 |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $ 4.906.706.463,00<br>Interventoría: $ 413.123.412 |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | 2 otrosíes obra: Prórrogas (6 meses)<br>2 otrosíes interventoría: Prórrogas y adiciones (6 meses - $ 152,015,642,00) |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | Total de 18 sedes, entregadas a satisfacción con recibo de interventoría y rectores de 17 sedes y pendiente la entrega de 1 sede en Piamonte ID 125. Inst Educ Agric Piamonte – Cauca, se encuentra pendiente recibo por el rector, se solicitó acompañamiento a Cobertura, Secretaria de Educación del Cauca y MEN para realizar la suscripción el día 14/02/2025. Se solicitó a la empresa de energía del Putumato y Alcaldía realizar los trámites necesarios sobre la ampliación de carga de la institución, dado que las obras realizadas por este contrato son de mejoramiento y no afecto la carga actual de la institución. Se solicita compromiso para realizar trámite por la Secretaria de Planeación de Piamonte – Cauca y reunión seguimiento 18/02/2025. |







CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Estado GRUPO 12, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO




ID1 Pasto, Nariño - I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE




ID8 El Rosario - Nariño, CENTRO EDUCATIVO LA CLAUDIA




ID26 Acevedo, Huila - INSTITUCION EDUCATIVA BATEAS




ID27 Piamonte - Cauca, ESCUELA RURAL MIXTA LA ESPANOLA

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada
CCOM-FO-005 V1 / 05 - Ago-2024 / Pública

# CONTRATOS ENTREGADOS

| GRUPO | Departamento | No SEDES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Grupo 1** | Antioquia, Chocó | **10** | 14/11/2023 | 14/08/2024 | • CONTRATO PAF-MENAM-O-049-2023: Liquidación realizada el 31.01.2025.<br>• CONTRATO PAF-MENAM-I-052-2023: Terminado el 29.10.2024 - Liquidación radicada el 2 de diciembre de 2024, mediante prisa INC 2024-002246, asignación liquidador Mireya Artunduaga, el 11.02.2025 se traslada a revisión y VoBo de la Fiduciaria Popular para solicitar Firmas, proceso que se proyecta se de en la semana al 15 de febrero de 2025. |
| **Grupo 2** | Atlántico | **8** | 27/11/2023 | 05/09/2024 | CONTRATO PAF-MENAM-O-050-2023: Terminado el 05.09.2024<br>CONTRATO PAF-MENAM-I-053-2023: Terminado el 05.11.2024<br>**AERS COMPONENTE 2:**<br>• Contrato de obra suscrita el 10.02.2025 y en proceso de actualización de pólizas para revisión y aprobación por parte de la Fiduciaria Popular.<br>• Contrato de interventoría en proceso de revisión para presentar a firmas, proceso que se espera se de en la semana del 17 al 21 de febrero de 2025<br>En recopilación documental, cierre de balances y memorias entre el contratista e interventoría, se proyecta radicar la liquidación del contrato de obra al 28 de febrero de 2025 y posterior la de interventoría. |

CCOM-FO-005 V1 / 05 Ago 2024 / Pública

# CONTRATOS ENTREGADOS

| GRUPO | Departamento | No SEDES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Grupo 4** | Magdalena y Bolívar | **7** | 24/10/2023 | 07/02/2024 | Se encuentra liquidado el contrato de obra. El contrato de interventoría iniciará su trámite de liquidación una vez que quede desembolsado el último pago. |
| **Grupo 5** | Magdalena y Bolívar | **16** | 14/11/2023 | 08/11/2024 | CONTRATO PAF-MENAM-O-053-2023: Terminado el 08.11.2024<br>CONTRATO PAF-MENAM-I-056-2023: Terminado el 08.01.2025<br>**AERS COMPONENTE 2:**<br>• Contrato de Obra e Interventoría, en proceso de revisión y VoBo por parte de la Fiduciaria Popular, para pasar a firmas, una vez se tenga las AERS suscritas se procederá a solicitar la actualización de pólizas.<br>En recopilación documental, cierre de balances y memorias entre el contratista e interventoría, se proyecta radicar la liquidación del contrato de obra al 15 de marzo de 2025 y posterior la de interventoría. |
| **Grupo 7** | La Guajira | **13** | 31/05/2024 | 17/01/2025 | Se encuentra en elaboración por parte de la interventoría el AERS del componente II para tramitar firma ante fidupopular. El contrato de obra iniciará su trámite de liquidación una vez que quede desembolsado el último pago; el cual deben facturar a inicios de marzo y pagado a finales de marzo 2025. Con respecto a la interventoría le falta facturar casi un 60% y se estima si liquidación para iniciar a finales de abril 2025. |
| **Grupo 8** | Córdoba y Bolívar | **9** | 08/11/2023 | 08/07/2024 | En expedición el acta de liquidación del contrato. En consolidación la información del contrato de interventoría. Se proyecta su liquidación en el mes de marzo |

CCOM-FO-005-V1.1/05-Ago-2024/ Pública

# Grupo 1

**Fecha inicio:** 14/11/2023
**Fecha Fin:** 14/08/2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | |
|---|---|
| ***Departamento*** | **Antioquia, Chocó** |
| **$** | **Valor Inicial**<br>Obra: $3.447.332.359<br>Interventoría: $271.455.247 |
| | **Adiciones**<br>Obra: $201.152.963<br>Interventoría: $53.764.065,32<br>($28.580.295 asumidos por el contrato de obra)<br>($25.183.770,32 asumidos por el contrato interadministrativo) |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $3.425.566.080,21<br>Interventoría: $300.482.403,41 |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | 2 otrosíes obra: Prórrogas (5 meses y 15 dias) y adición ($$201.152.963)<br>2 otrosíes interventoría: Prórrogas (6 meses) y adiciones ($53.764.065,32) |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | • CONTRATO PAF-MENAM-O-049-2023: Liquidación realizada el 31.01.2025.<br>• CONTRATO PAF-MENAM-I-052-2023: Terminado el 29.10.2024 - Liquidación radicada el 2 de diciembre de 2024, mediante prisa INC 2024-002246, asignación liquidador Mireya Artunduaga, el 11.02.2025 se traslada a revisión y VoBo de la Fiduciaria Popular para solicitar Firmas, proceso que se proyecta se de en la semana al 15 de febrero de 2025. |

**100%**
**Porcentaje de avance**

**100%**
**Porcentaje Programado**

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Publica

# GRUPO 1, Departamentos de Antioquia – Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL GUINEO - SEDE CE EL OSITO - ID No. 161




## INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO ID No. 118




## INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS ID No. 66




## INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO ID No. 86




## INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS SEDE EU JESÚS MORA ID No. 112




## INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MARTÍN DE PORRES SEDE EU GONZALO MEJÍA




CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# GRUPO 1, Departamentos de Antioquia – Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA HERRÁN SEDE CER PAULINA PUERTA
ID No. 42






## INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROAMBIENTAL SEDE MARÍA AUXILIADORA DE MANUNGARA
ID No. 150





## INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR DEMETRIO SALAZAR CASTILLO SEDE CE ESCUELA FRANCISCO MIRANDA





## CENTRO EDUCATIVO PUEBLO NUEVO SEDE PRINCIPAL
ID No. 94








CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Grupo 2

**Fecha inicio:** 27/11/2023
**Fecha Fin:** 05/09/2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| *Departamento* | **Atlántico** |
|---|---|
| **$** | **Valor Inicial**<br>Obra: $4.044.124.630<br>Interventoría: $295.715.000 |
| | **Adiciones**<br>Obra: $ 0,00<br>Interventoría: $113.699.014<br>($57.808.105,6 asumidos por el contrato de obra)<br>($55.890.908,4 asumidos por el contrato interadministrativo) |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $4.028.747.780,96<br>Interventoría: $374.270.637,53 |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | 3 otrosíes obra: Prórrogas (5 meses y 5 dias)<br>3 otrosíes interventoría: Prórrogas (5 meses y 5 dias) y adiciones ($113.699.014) |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | CONTRATO PAF-MENAM-O-050-2023: Terminado el 05.09.2024<br>CONTRATO PAF-MENAM-I-053-2023: Terminado el 05.11.2024<br><br>AERS COMPONENTE 2:<br>• Contrato de obra suscrita el 10.02.2025 y en proceso de actualización de pólizas para revisión y aprobación por parte de la Fiduciaria Popular.<br>• Contrato de interventoría en proceso de revisión para presentar a firmas, proceso que se espera se de en la semana del 17 al 21 de febrero de 2025<br><br>En recopilación documental, cierre de balances y memorias entre el contratista e interventoría, se proyecta radicar la liquidación del contrato de obra al 28 de febrero de 2025 y posterior la de interventoría. |

**100%**
**Porcentaje de avance**

**100%**
**Porcentaje Programado**

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

**Contratista de Diseño y Obra:** PAF-MENAM-O-050-2023 CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 - G2
**Contratista interventor:** PAF-MENAM-I-053-2023 RM INGENIEROS S A S

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE PRINCIPAL - ID EN 018




## INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE PRINCIPAL - ID EN 018




## INSTITUCION EDUCATIVA BLAS TORRES DE LA TORRE (ITIDA) - ID MEN 144




## INSTITUCION EDUCATIVA DE MESOLANDIA - ID MEN 197




## INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS, LAS TABLAS Y PITA, SEDE PITA - ID MEN 092




## INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS, LAS TABLAS Y PITA, SEDE LAS TABLAS - ID MEN 083




## INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE VILLA ROSA, SEDE LA LOMA - ID MEN 084






## INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA DE GALAPA - ID MEN 064






# Grupo 4

**Fecha inicio:** 24/10/2023
**Fecha Fin:** 07/02/2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | |
|---|---|
| ***Departamento*** | **Magdalena y Bolívar** |
| **$** | **Valor Inicial Obra: $3.566.467.466.00**<br><br>**Valor inicial Interventoria: $264.974.745,00** |
| | **Adiciones**<br>Obra: $ 0<br><br>Interventoría: $20.000.000.00<br>(El contratista pago $10.000.000.00 y el convenio $10.000.000.00)<br>**Valor final Interventoria $ 284.974.745,00** |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $3.361.652.674.57<br>Valor Liberado contrato de obra: $204.814.791.43<br><br>Interventoría: $279.439.929.41<br>Valor a Liberar:$5.534.815.59 |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | Otro Sí 1: Prorroga un (1) y quince (15) días.<br>Otro Sí 2: Exclusion de dos (2) (TACAMOCHO y EDM JAIME) por la imposiblidad técnica para ejecutar. |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | Contrato de Obra Liquidado y culminado.<br>Se inicia tramite de liquidación de la interventoría el 17 de febrero 2025. |

**100%**
**Porcentaje de avance**

**100%**
**Porcentaje Programado**

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Grupo 5

**Fecha inicio:** 14/11/2023
**Fecha Fin:** 08/11/2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | |
|---|---|
| ***Departamento*** | **Magdalena y Bolívar** |
| **$** | **Valor Inicial**<br>Obra: $4.102.044.984<br>Interventoría: $300.856.990 |
| | **Adiciones**<br>Obra: $778.973.616<br>Interventoría: $172.224.091<br>($91.100.000 asumidos por el contrato de obra)<br>($81.124.091 asumidos por el contrato interadministrativo) |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $4.745.371.433<br>Interventoría: $420.967.384,31 |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | 5 otrosíes obra: Prórrogas (7 meses y 20 dias) y adiciones ($778.973.616)<br>5 otrosíes interventoría: Prórrogas (7 meses y 20 dias) y adiciones ($172.224.091) |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | CONTRATO PAF-MENAM-O-053-2023: Terminado el 08.11.2024<br>CONTRATO PAF-MENAM-I-056-2023: Terminado el 08.01.2025<br><br>AERS COMPONENTE 2:<br><br>• Contrato de Obra e Interventoría, en proceso de revisión y VoBo por parte de la Fiduciaria Popular, para pasar a firmas, una vez se tenga las AERS suscritas se procederá a solicitar la actualización de pólizas.<br><br>En recopilación documental, cierre de balances y memorias entre el contratista e interventoría, se proyecta radicar la liquidación del contrato de obra al 15 de marzo de 2025 y posterior la de interventoría. |







CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# GRUPO 5, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES SEDE PRINCIPAL
ID No. 30





INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES SEDE SERENOS
ID No. 101




INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES SEDE SERENOS
ID No. 101




INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRISTIAN MORENO SEDE CHINELA
ID No. 97




INSTITUCION EDUCATIVA EL PUEBLITO SEDE PUERTO LA ESTANCIA
ID No. 147




INSTITUCION EDUCATIVA EL PUEBLITO SEDE TORRECILLA
ID No. 148





CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# GRUPO 5, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PUEBLITO SEDE TRONCONAL
ID No. 146




## INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL SILVIA COTES DE BISWELL SEDE ISLITA
ID No. 32




## INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL OSCAR PISCIOTTI NUMA SEDE INMACULADA CONCEPCION




## INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ANTONIO NARIÑO SEDE JOSE DE LA PAZ VANEGAS




## INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA CRUZ DE BALSAMO SEDE PRIMARIA
ID No. 13




## INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA CRUZ DE BALSAMO SEDE JARDIN INFANTIL
ID No. 14




CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# GRUPO 5, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR SEDE PRINCIPAL
ID No. 06




INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR SEDE CERRITO
ID No. 10




INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR SEDE ATASCOZA
ID No. 09




INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA PESQUERA LEONIDAS ORTIZ ALVEAR SEDE PLAN BONITO
ID No. 43





CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Grupo 7

**Fecha inicio:** 31/05/2024
**Fecha Fin:** 17/01/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | |
|---|---|
| ***Departamento*** | **La Guajira** |
| **$** | **Valor Inicial**<br>Obra: $**4.158.777.879**<br>Interventoría: $**295.239.000** |
| | **Adiciones**<br>Obra: $ 0 Interventoría: $0 |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $ 3.738.535.259,01 (89,89%)<br>Interventoría: $121.499.000 (41,15%) |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | Suspensión 1 por 20 días 28 de oct de 2024<br>Prórroga 1 por 45 días 13 de sep de 2024<br>Suspensión 2 por 30 días 18 de nov de 2024<br>Prórroga 2 por 30 días 19 de dic de 2024 |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | CONTRATO PAF-ATMEN5-O-036-2024: Terminado el 17.01.2025<br>CONTRATO PAF-MENAM-I-059-2023: Fecha de Terminación el 17.03.2025<br><br>Actualmente el contrato de obra está en elaboración del AERS del componente II por parte de la interventoría para firma en fidupopular. |







CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# REGISTRO FOTOGRAFICO

I.E. JOSE ANTONIO GALAN- SEDE COOPERATIVO -060-(RIOHACHA)





INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #7 - 034-APÜNIMA´ANA1 -(RIOHACHA)





ESCUELA ETNOEDUCATIVA LA CAMPANA -050--(MAICAO)







ESCUELA ETNOEDUCATIVA WAYUMA'ANA -054- (MAICAO)





CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# REGISTRO FOTOGRAFICO

INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #7 - 117-WAKUAPAMANA -(RIOHACHA)






I.E. JOSE ANTONIO GALAN- SEDE PRINCIPAL -060-(RIOHACHA)






INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #6 - 051-TALOULUMA `ANA -(MAICAO)




INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO RURAL PROVINCIAL - 0143-PROVINCIAL -(BARRANCAS)




CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Publica
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# REGISTRO FOTOGRAFICO

INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA - 011-
ESCUELA RURAL INDIGENA KARALOUTAMANA -(MANAURE)





ESCUELA ETNOEDUCATIVA SEDE KASICHE -053- (MAICAO)













INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #6 - 151-LA
ESTRELLA -(MAICAO)



INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #6 - 051-
YAMAIN SEDE PRINCIPAL -(MAICAO)



INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #6 - 152-
YAMAIN KASPOLIMANA -(MAICAO)









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Grupo 8

**Fecha inicio:** 08/11/2023
**Fecha Fin:** 08/07/2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | |
|---|---|
| ***Departamento*** | **Córdoba y Bolívar** |
| **$** | **Valor Inicial**<br>Obra: $$4.706.470.280 M/CTE<br>Interventoría: $297.097.668,00 M/CTE |
| | **Adiciones**<br>Obra: $1.455.000.000<br>Interventoría: $144.106.877 |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $6.161.470.280<br>Interventoría: $277.437.804 |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | Prorroga 1: 2 meses y 15 días<br>Prorroga 1: 2 meses |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | Contrato de obra: liquidado.<br>Contrato de interventoría: En consolidación y revisión documentos por la supervisión para el inicio del proceso de liquidación. |







CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# REGISTRO FOTOGRAFICO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## Sede principal I. E. El Palmar - Montelíbano



## Sede Buenos Aires - María La Baja



## Sede Los Cerros - Planeta Rica



## Sede Téc. Agrop. De Desarrollo Rural De María la baja - María La Baja



## Sede Esc. Nueva Parcelas Londres - Ayapel



## Sede Técnica Álvaro Ulcue Chocue - Tuchín



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# REGISTRO FOTOGRAFICO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## Sede Esc. Nueva La Solita - Puerto Libertador



## Sede Los Aguacates - Cotorra



## Sede Níspero-María La Baja





CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# CONTRATOS LIQUIDADOS

| GRUPO | Departamento | No SEDES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Grupo 3** | Magdalena | **5** | 14/11/2023 | 12/04/2024 | **LIQUIDACIÓN Contrato de Obra No. PAF-MENAM-O-051-2023**: Suscrita Acta de liquidación de fecha 01/10/2024, pagado 100%.<br><br>**LIQUIDACIÓN Contrato de Interventoría No. PAF-MENAM-I-054-2023:**Suscrita Acta de liquidación de fecha 20/12/2024, pagado 100%. |
| **Grupo 6** | Cesar | **7** | 15/11/2023 | 29/04/2024 | **LIQUIDACIÓN Contrato de Obra No. PAF-MENAM-O-056-2023:** Suscrita Acta de liquidación el 20/11/2024 y pagado al 100%.<br><br>**LIQUIDACIÓN Contrato de Interventoría No. PAF-MENAM-I-058-2023:** Suscrita Acta de liquidación el 27/11/2024 y pagado al 100%. |

CCOM-FO-005 V1 / 05-Ago-2024 / Pública

# COMPROMISOS

- Definir por parte de Findeter el valor de la posible adición para el grupo 9.

- Revisar por parte de Findeter el cronograma general de ejecución del convenio teniendo en cuenta que aún no ha iniciado las actividades de 2 sedes en el grupo 9. Tiempos de liquidación será muy corto.

- Agilizar por parte de Findeter el Otro Sí de la dotación y su firma con base en los comité técnicos y fiduciarios a citar.

- Remitir por parte de Findeter el informe de avance de las sedes de Grupo 10, sobre todo de las sedes ejecutadas en Suárez.

- Compartir desde Findeter las actas de entregas de las sedes del Cauca al ing. Juan Carlos Folleco Olave de la secretaria de Educación del Cauca.

- Revisar y confirmar por parte de Findeter que el seguimiento con la Fiduprevisora se ha realizado permanentemente y que la información en la carpeta compartida se encuentra al día.

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública



Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

# GRACIAS

www.findeter.gov.co

@findetercol @findetercol
@findeter linkedin.com/company/findeter

Gobierno de Colombia

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública



Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

# Seguimiento CI No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023

## AULAS MOVILES

Hacienda

Diciembre 30 de 2024


# Contrato No. 4917031-2023

**136** sedes educativas
[instalación de aulas y mejoramientos]

**$ 63.650**
Millones de pesos

Fecha inicio: 2/06/2023
Fecha Fin Actual: 01/07/2025

| Grupo | Departamentos / Municipios | Etapa Actual del grupo/% de avance de contrato<br>Fecha de Inicio –Fecha de Terminación |
|---|---|---|
| G1 [10 sedes] | Antioquia \| Chocó | Entregado[100,00%]<br>14/11/2023 - 14/08/2024 |
| G2 [8 sedes] | Atlántico | Entregado[100,00%]<br>27/11/2023 -06/09/2024 |
| G3 [5 sedes] | Magdalena | Liquidado [100,00%]<br>14/11/2023 - 30/04/2024 |
| G4 [5 sedes] | Bolívar | Entregado [100,00%]<br>26/10/2023 - 23/03/2024 |
| G5 [16 sedes] | Bolívar \| Magdalena \| Cesar | Terminado [100,00%]<br>14/11/2023 – 08/11/2024 |
| G6 [7 sedes] | Cesar | Entregado [100,00%]<br>15/11/2023 - 17/05/2024 |
| G7 [13 sedes] | Guajira | En ejecución[93,09%]<br>31/05/2024 - 17/01/2025 |
| G8 [9 sedes] | Córdoba \| Bolívar | En Obra [100,00%]<br>08/11/2023 - 23/08/2024 |
| G9 [12 sedes] | Santander \| Bolívar \| Bogotá \| Arauca \| Tolima \| Meta \| Cundinamarca \| Nte de Santander | En obra[6,19%]<br>23/08/2024 - 08/03/2025 |
| G10 [15 sedes] | Cauca \| Chocó \| Valle Del Cauca | En Obra [66,69%]<br>19/02/2023 - 30/12/2024 |
| G11 [18 sedes] | Cauca | Terminado [100,00%]<br>12/02/2023 - 27/11/2024 |
| G12 [18 sedes] | Nariño \| Putumayo \| Cauca | Terminado [100,00%]<br>20/02/2023 - 04/12/2024 |
| Dotación | 46 Sedes a dotar - 99 aulas | Suspendido[100,00%]<br>03/10/2024 – 03/12/2024 |

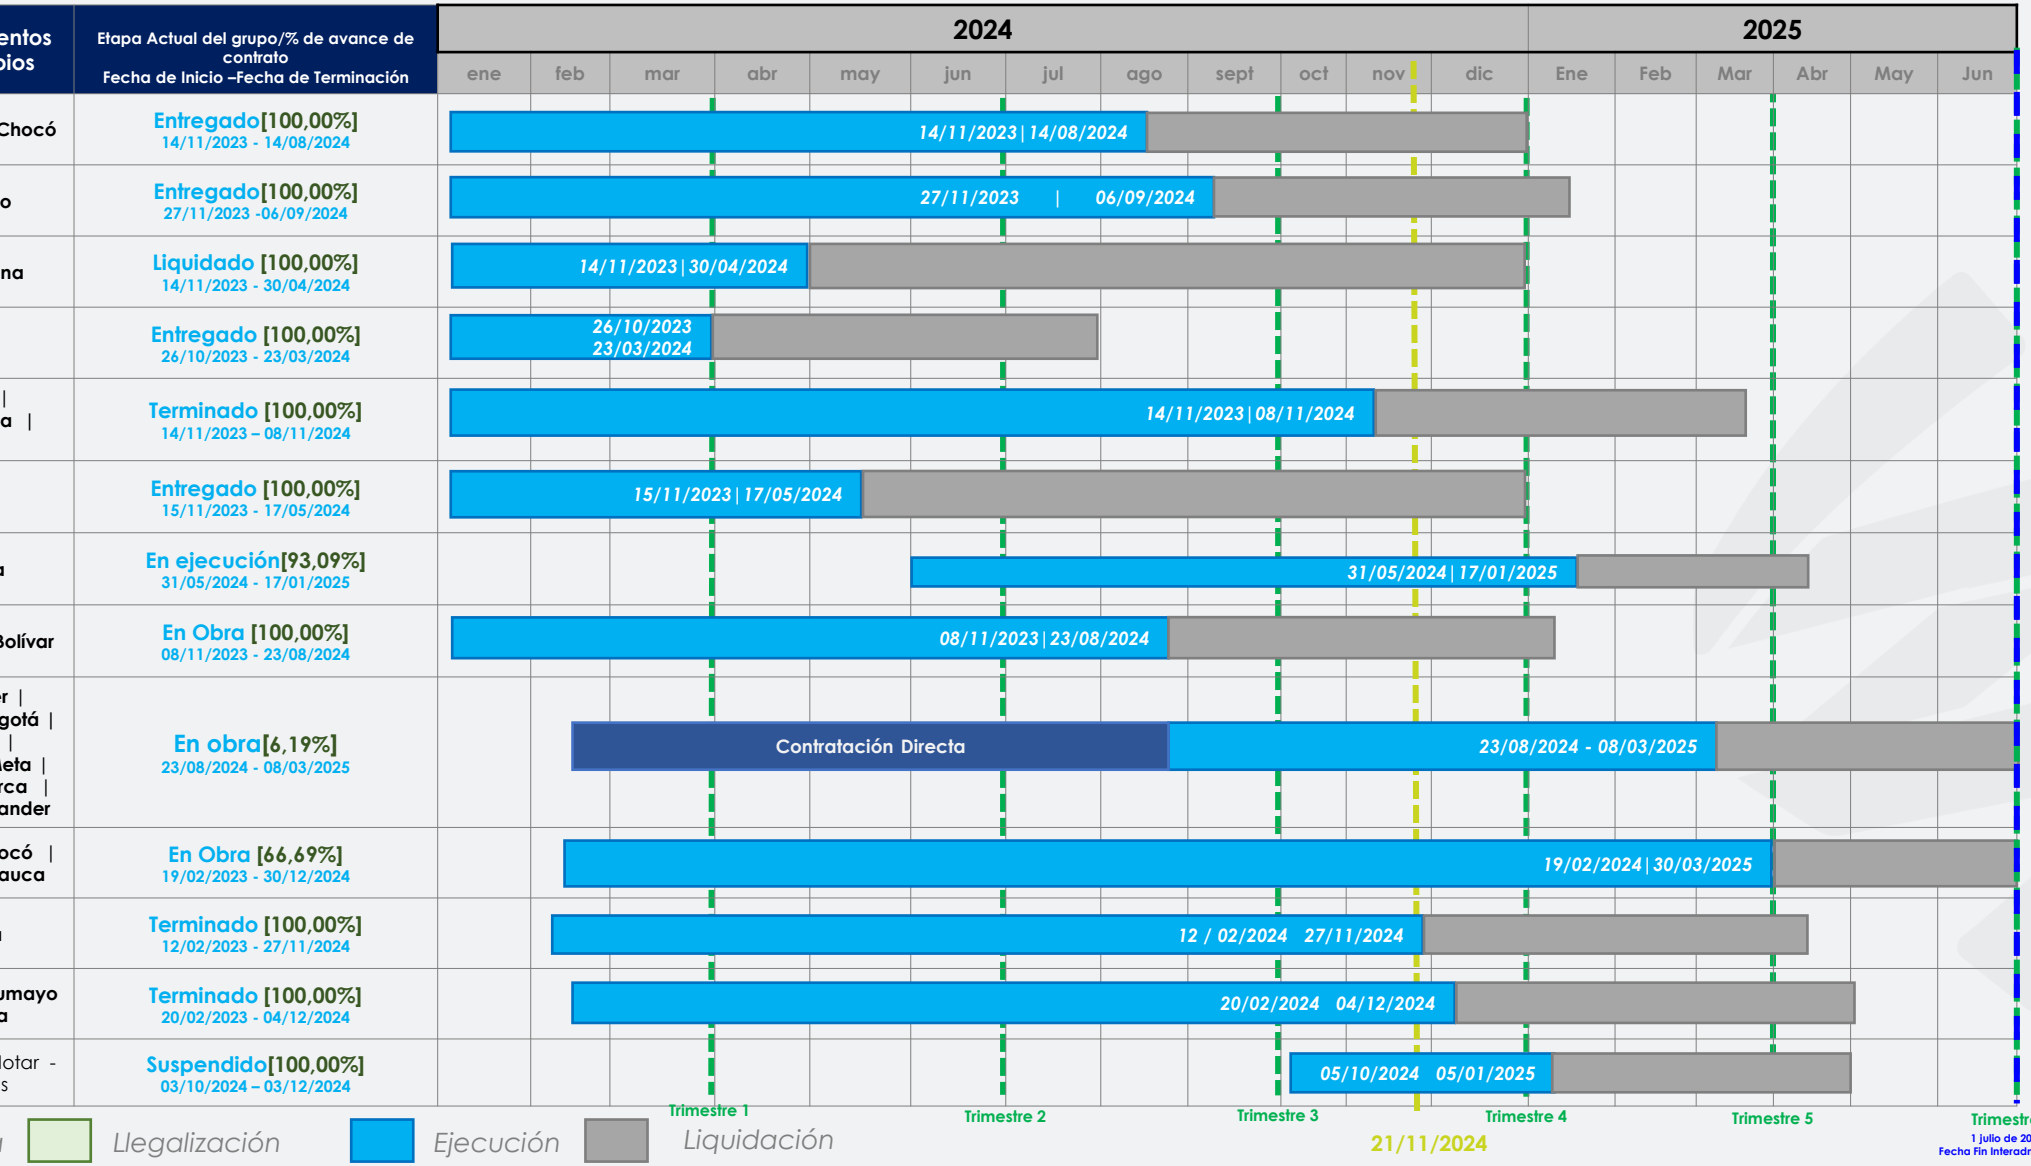


Convocatoria | Llegalización | Ejecución | Liquidación

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

# Estado de entrega y ejecución de Sedes

**136** **sedes educativas**
[instalación de aulas y mejoramientos]

**$ 63.650**
Millones de pesos

Fecha inicio: 2/06/2023
Fecha Fin: 01/11/2024

*01 julio 25 –*
*Fin Interadministrativo*

| ENTREGADAS | TERMINADAS | EN EJECUCIÓN | SUSPENDIDO |
|---|---|---|---|
| 102 sedes<br>75,00% | 9 sedes<br>5,88% | 25 sedes<br>19,11% | 0 sedes<br>0,00% |
| Grupo 1 - 10<br>Grupo 2 - 8<br>Grupo 3 - 5<br>Grupo 4 - 5<br>Grupo 5 - 16<br>Grupo 6 - 7<br>Grupo 8 - 9<br>Grupo 10 - 10<br>Grupo 11 - 15<br>Grupo 12 - 17 | Grupo 7 - 4<br>Grupo 10 - 1<br>Grupo 11 - 3<br>Grupo 12 - 1 | Grupo 7- 9<br>Grupo 9 - 12<br>Grupo 10 - 4 | |

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

# PAGOS ASISTENCIA TECNICA

**136** **sedes educativas**
[instalación de aulas y mejoramientos]

**$ 63.650**
Millones de pesos

Fecha inicio: 2/06/2023
Fecha Fin: 01/11/2024

| VALOR AT | Cobrado (a noviembre de 2024) | Pagado (a noviembre de 2024) | SALDO |
|---|---|---|---|
| $ 4.164.018.692,00 | $3.585.749.431,31 | $3.585.749.431, 31 | $ 578.269.260,69 |

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

# Resumen Informe Financiero – Corte 31 de octubre de 2024

**136** **sedes educativas**
[instalación de aulas y mejoramientos]

**$ 63.650**
Millones de pesos

Fecha inicio: 2/06/2023
Fecha Fin: 01/11/2024

*01 nov 24 – Fin Interadministrativo*

| VALOR EJECUTADO | VALOR POR EJECUTAR | VALOR COMPROMETIDO | SALDO |
|---|---|---|---|
| $ 43.546 mll | $ 20.102 mll | $ 59.411 mll | $ 279,6 mll |

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

# Estado Entrega de Dotación

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**PAF-ATMEN5-S-041-2024**

Publicada

17 DE JULIO DE 2024.

Informe Definitivo:

Comité Fiduciario No 41 del 25 de agosto.

Adjudicado:

DOTAESCOL SAS

Valor $ **$ 584.310.000,00**

Acta de Inicio: 3 de octubre de 2024

2 meses de ejecución.

Entregado 100%.

➡ 16 DEPARTAMENTOS

➡ 38 MUNICIPIOS

➡ 99 AULAS NUEVAS CON DOTACIÓN

| GRUPO | Departamento | Municipio | INSTITUCION EDUCATIVA | SEDE | TOTAL AULAS NUEVAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chocó | Carmen del Darién | CE PUEBLO NUEVO | CE PUEBLO NUEVO - SEDE PRINCIPAL | 3 |
| 1 | Antioquia | Apartadó | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO | CENTRO EDUCATIVO RURAL EL OSITO | 1 |
| 2 | Atlántico | Repelón | INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS | PITA | 1 |
| 2 | Atlántico | Soledad | INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO | INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE CABICA | 3 |
| 3 | Magdalena | El Retén | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE | COL MPAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE | 9 |
| 4 | Bolívar | Mompós | INSTITUCIÒN EDUCATIVA TÈCNICA AMBIENTAL DE TIERRA FIRME | I.E.T.A. AMBIENTAL DE TIERRA FIRME - SEDE PRINCIPAL | 6 |
| 4 | Magdalena | San Sebastían de Buenavista | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA | ERM MARIA AUXILIADORA | 4 |
| 4 | Magdalena | San Sebastían de Buenavista | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA | ERM LA PACHA | 3 |
| 5 | Bolívar | Barranco de Loba | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR | ATASCOZA | 1 |
| 5 | Bolívar | San Martín de Loba | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA PESQUERA LEONIDAS ORTIZ ALVEAR DE CHIMÍ | PLAN BONITO | 1 |
| 6 | Cesar | La Paz(Robles) | CENTRO EDUCATIVO INDIGENA CAÑO PADILLA YUKPA | SEDE EL COSO | 1 |
| 6 | Cesar | El Paso | INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN | SEDE LA ESTACION | 1 |
| 8 | Córdoba | Planeta Rica | INSTITUCION EDUCATIVA LOMA AZUL | LOS CERROS | 1 |
| 8 | Córdoba | Puerto Libertador | INSTITUCION EDUCATIVA PICA PICA VIEJO | ESC NVA LA SOLITA | 1 |
| 8 | Córdoba | Ayapel | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO | ESC NVA PARCELAS LONDRES | 1 |
| 8 | Córdoba | Montelíbano | INSTITUCION EDUCATIVA EL PALMAR | ESCUELA NUEVA MIXTA DIVINO SALVADOR | 2 |
| 8 | Bolívar | María la Baja | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA | I.E.T. AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA | 2 |
| 10 | Cauca | Santander de Quilichao | INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO | SEDE DOMINGO LASSO | 8 |
| 11 | Cauca | El Tambo | I.E. HUISITO | SEDE HUISITÓ | 6 |
| 11 | Cauca | Bolivar | INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO NUESTRA SENORA DEL CARMEN | SEDE CORRAL VIEJO | 1 |
| 11 | Cauca | Bolivar | CENTRO EDUCATIVO EL TAMBO | SEDE LA FUENTE | 1 |
| 11 | Cauca | La Vega | I.E AGROPECUARIA SAN FRANCISCO JAVIER SEDE GARAY | IE AGROPECUARIA SAN FRANCISCO JAVIER - SEDE GARAY | 1 |
| 11 | Cauca | Rosas | INSTITUCION EDUCATIVA MADRE CARIDAD BRADER | MADRE CARIDAD BRADER | 1 |

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado Entrega de Dotación



**CENTRO EDUCATIVO INDIGENA CAÑO PADILLA YUKPA**
Sede El Coso La Paz – Cesar



**INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO**
Sede Escuela Nueva Parcelas Londres
Ayapel - Córdoba



**INSTITUCION EDUCATIVA EL PALMAR**
Escuela Nueva Mixta Divino Salvador
Monte Líbano - Córdoba



**INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO**
Sede Principal Santander de Quilichao - Cauca



**INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA ERM MARIA AUXILIADORA** Sede
Sebastián de Buenavista - Magdalena



**INSTITUCION EDUCATIVA TIERRA FIRME**
Mompox - Bolivar

# Rendimientos Financieros – Relación de Pagos

Educación

**CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023**
**MINISTERIO DE EDUCACION**
**Financiera del Desarrollo S.A.**
**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**
**Fecha: Octubre 31 de 2024**

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**Contrato No.CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023**

**Cuenta de Ahorros Popular No. 309-055200**

| Fecha | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | GIRO DE RENDIMIENTOS | Fecha de Giro | SALDO POR GIRAR |
|---|---|---|---|---|
| ene-23 | | | | $ - |
| feb-23 | $ - | $ - | | $ - |
| mar-23 | $ - | $ - | | $ - |
| abr-23 | $ - | $ - | | $ - |
| may-23 | $ - | $ - | | $ - |
| jun-23 | $ - | $ - | | $ - |
| jul-23 | $ - | $ - | | $ - |
| ago-23 | $ 82.351.406,35 | $ - | | $ 82.351.406,35 |
| sep-23 | $ 108.927.246,74 | $ - | | $ 191.278.653,09 |
| oct-23 | $ 131.902.760,66 | $ - | | $ 323.181.413,75 |
| nov-23 | $ 144.907.033,92 | $ - | | $ 468.088.447,67 |
| dic-23 | $ 143.221.271,36 | $ 468.088.448,00 | 13/12/2023 | $ 143.221.271,03 |
| ene-24 | $ 133.626.379,48 | $ 143.221.271,36 | 10/01/2024 | $ 133.626.379,15 |
| feb-24 | $ 120.547.529,88 | $ 133.626.379,15 | 12/02/2024 | $ 120.547.529,88 |
| mar-24 | $ 117.745.976,50 | $ 120.547.529,88 | 12/03/2024 | $ 117.745.976,50 |
| abr-24 | $ 100.331.907,69 | $ 117.745.976,50 | 10/04/2024 | $ 100.331.907,69 |
| may-24 | $ 89.374.457,56 | $ 100.331.907,69 | 11/05/2024 | $ 89.374.457,56 |
| jun-24 | $ 76.820.331,89 | $ 89.374.457,56 | 13/06/2024 | $ 76.820.331,89 |
| jul-24 | $ 68.012.790,67 | $ 76.820.331,89 | 15/07/2024 | $ 68.012.790,67 |
| ago-24 | $ 21.741.419,32 | $ 68.012.790,67 | 14/08/2024 | $ 21.741.419,32 |
| sep-24 | $ 20.861.120,00 | $ 21.741.419,32 | 10/09/2024 | $ 20.861.120,00 |
| oct-24 | $ 27.022.756,52 | $ 20.861.120,00 | 18/10/2024 | $ 27.022.756,52 |
| **TOTALES** | **$ 1.387.394.388,54** | **$ 1.360.371.632,02** | | |

**Contrato No.CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023**

**Fondo de Inversión Colectiva Alta Liquidez No. 70083604683-6**

| Fecha | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | GIRO DE RENDIMIENTOS | Fecha de Giro | SALDO POR GIRAR |
|---|---|---|---|---|
| ene-23 | | $ - | | $ - |
| feb-23 | $ - | $ - | | $ - |
| mar-23 | $ - | $ - | | $ - |
| abr-23 | $ - | $ - | | $ - |
| may-23 | $ - | $ - | | $ - |
| jun-23 | $ - | $ - | | $ - |
| jul-23 | $ - | $ - | | $ - |
| ago-23 | $ 443.947.650,01 | $ - | | $ 443.947.650,01 |
| sep-23 | $ 548.880.836,71 | $ - | | $ 992.828.486,72 |
| oct-23 | $ 436.008.307,20 | $ - | | $ 1.428.836.793,92 |
| nov-23 | $ 718.224.229,49 | $ - | | $ 2.147.061.023,41 |
| dic-23 | $ 788.090.860,63 | $ 2.147.061.024,00 | 13/12/2023 | $ 788.090.860,04 |
| ene-24 | $ 427.858.051,59 | $ 788.090.860,63 | 10/01/2024 | $ 427.858.051,00 |
| feb-24 | $ 474.970.095,24 | $ 427.858.051,00 | 12/02/2024 | $ 474.970.095,24 |
| mar-24 | $ 478.495.863,61 | $ 474.970.095,24 | 12/03/2024 | $ 478.495.863,61 |
| abr-24 | $ 259.736.382,70 | $ 478.495.863,61 | 10/04/2024 | $ 259.736.382,70 |
| may-24 | $ 353.632.163,66 | $ 259.736.382,70 | 11/05/2024 | $ 353.632.163,66 |
| jun-24 | $ 266.323.590,41 | $ 353.632.163,66 | 13/06/2024 | $ 266.323.590,41 |
| jul-24 | $ 294.233.627,01 | $ 266.323.590,41 | 15/07/2024 | $ 294.233.627,01 |
| ago-24 | $ 313.006.436,96 | $ 294.233.627,01 | 14/08/2024 | $ 313.006.436,96 |
| sep-24 | $ 192.185.501,19 | $ 313.006.436,96 | 10/09/2024 | $ 192.185.501,19 |
| oct-24 | $ 71.175.915,03 | $ 192.185.501,19 | 18/10/2024 | $ 71.175.915,03 |
| **TOTALES** | **$ 6.066.769.511,44** | **$ 5.995.593.596,41** | | |
| **SALDO POR GIRAR** | **$ 98.198.671,55** | | | |

# Rendimientos Financieros – Comprobante de pago

Fecha Actual: 2024/10/21 | Hora: 11:39 | IP: 190.144.253.210

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

**Archivos Cargados**

Estimado (a): CINDY JHANNYN CHIMBI BARATO

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

| Tipo Archivo | Nombre Archivo | Nombre Técnico Archivo | Fecha Envío | Valor Total Archivo | No. Registros Enviados | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagos | 33455 | PJQE01RMWO | 2024/10/18 | $213,046,621.19 | 2 | Procesado |

**Información Adicional**

| Fecha Carga | Hora Carga | Hora Envío | Usuario Creador | Fecha Actualización | Hora Actualización | Valor Total Archivo | Valor Archivo Enviado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/10/17 | 18:13:53 | 05:00:24 | ANDRES FORERO PEREZ | 2024/10/18 | 22:10:07 | $213,046,621.19 | $213,046,621.19 |

| Valor Registros | Valor Registros Errados | No. Total Registros | No. Registros | No. Registros | No. Registros en | Usuario Aprueba/Rechaza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | | 2 | 0 | | 0 | JORGE LINARES CIFUENTES |

Detalle de pago

| Producto Originador | Fecha Efectiva | Valor Transacción | No. Identificación Receptor | Nombre Receptor | No. Ruta | Entidad Financiera | No. Dígito Chequeo | Tipo Transacción | No. Identificación Originador | Propósito de la Transacción | Descripción Causal Rechazo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500804650450 | 2024/10/18 | $20,861,120.00 | 900978341 | FONDO NACIONAL DEL RIE | 00001 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. | 9 | Crédito Cuenta Ahorros | 000000830053691 | PAGOS | | Procesado |
| 500804650450 | 2024/10/18 | $192,185,501.19 | 900978341 | FONDO NACIONAL DEL RIE | 00001 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. | 9 | Crédito Cuenta Ahorros | 000000830053691 | PAGOS | | Procesado |

**NOTA: Teniendo en cuenta el contrato MEN-4917031 2023 -TEMPORADA DE LLUVIAS, y en atención a la obligación descrita en la cláusula tercera, Obligaciones específicas del contratista, Numeral 8 el cual dice:**

*"8. El Patrimonio Autónomo — Findeter deberá reintegrar mensualmente los rendimientos financieros (si los hubiere) a la Dirección del Tesoro Nacional o en los términos que establezca la normatividad aplicable, es decir, que no ingresan ni hacen parte del Patrimonio Autónomo constituido por Findeter."*

**Se han consignado los rendimientos financieros a la siguiente cuenta:**

- **Banco:** BBVA
- **Tipo:** Ahorros
- **No. Cuenta:** 309-054583
- **Nombre de la Cuenta:** FIDUPREVISORA S.A FNGRD – COLOMBIA VITAL

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

# AULAS MOVILES
# INFORME DETALLADO POR GRUPO DE INTERVENCION

Diciembre 30 de 2024



UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Educación

Colombia Vital

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA


CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# GRUPO 1, Departamentos de Antioquia – Chocó

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**10**
**Proyectos**

- 2 Departamentos
- 5 Municipios
- 10 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total, estudiantes SIMAT 2023 - 4347 estudiantes.
- $ 3.945.124.339,32 Inversión MEN

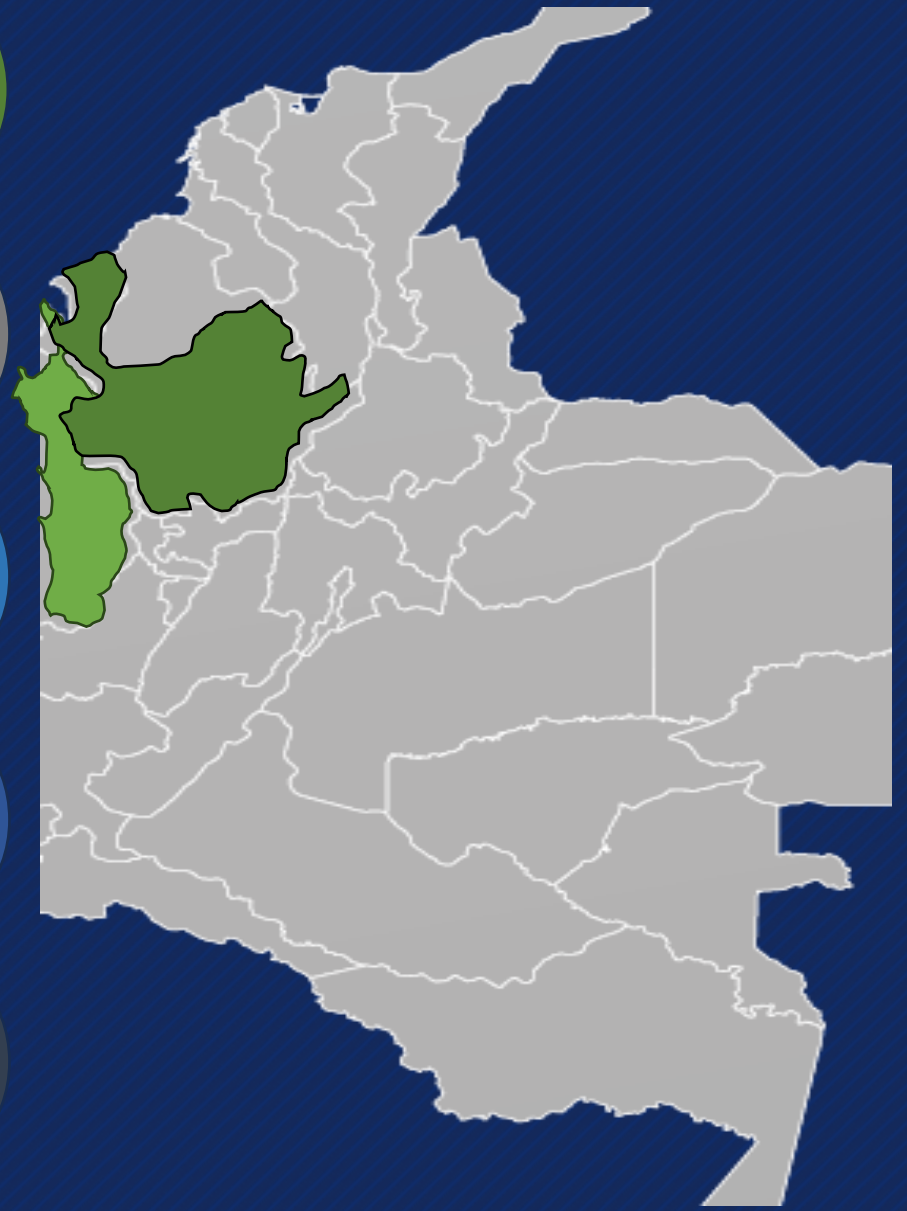

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# GRUPO 1, Departamentos de Antioquia – Chocó

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## SEDES INTERVENIDAS:

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | IE | SEDE | ALCANCE TOTAL DE INTERVENCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | AULAS NUEVAS | AULAS MEJORADAS | BATERIAS SANITARIAS | FECHA DE ENTREGA |
| Antioquia | Ciudad Bolívar | I. E. JOSE MARIA HERRAN | C. E. R. PAULINA PUERTA | | 6 | 3 MEJ | 27/2/2024 |
| Antioquia | Apartadó | INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS | INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS | | 14 | 5 MEJ | 21/3/2024 |
| Antioquia | Apartadó | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO | | 9 | 5 MEJ | 30/5/2024 |
| Antioquia | Apartadó | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO | | 23 | 8 MEJ | 30/5/2024 |
| Antioquia | Turbo | I.E. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS | E.U. JESUS MORA | | 4 | | 14/3/2024 |
| Antioquia | Apartadó | INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL GUINEO | CENTRO EDUCATIVO RURAL EL OSITO | | 3 | 2 MEJ | 30/5/2024 |
| Antioquia | Turbo | IE SAN MARTIN DE PORRES | SEDE GONZALO MEJIA | | 4 | 5 MEJ | 20/5/2024 |
| Chocó | Carmen del Darién | CE PUEBLO NUEVO | CE PUEBLO NUEVO - SEDE PRINCIPAL | 2 | | 4 BS NUEVAS | 14/8/2024 |
| Chocó | Tadó | IE TECNICO AGROAMBIENTAL - MARIA AUXILIADORA | SEDE MARÍA AUXILIADORA DE MANUNGARA | | 2 | 4 MEJ | 30/5/2024 |
| Chocó | Tadó | IE NORMAL SUPERIOR DEMETRIO SALAZAR CASTILLO | CENTRO EDUCATIVO ESCUELA FRANCISCO MIRANDA | | 6 | 3 BS NUEVAS 5 MEJ | 22/10/2024 |

## PORCENTAJES DE AVANCE:

**100%**
Porcentaje Programado

**100%**
**Porcentaje de avance**

## ESTADO ACTUAL CIERRE Y LIQUIDACION CONTRATOS DERIVADOS

En cumplimiento al alcance se tienen las 10 sedes entregadas

- CONTRATO PAF-MENAM-O-049-2023: Liquidación radicada el 2 de diciembre de 2024, mediante prisa INC 2024-002245, asignación liquidador Mireya Artunduaga quien se encuentra en proceso de revisión
- CONTRATO PAF-MENAM-I-052-2023: Liquidación radicada el 2 de diciembre de 2024, mediante prisa INC 2024-002246, asignación liquidador Mireya Artunduaga quien se encuentra en proceso de revisión

.

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# GRUPO 1, Departamentos de Antioquia – Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL GUINEO - SEDE CE EL OSITO - ID No. 161




## INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO ID No. 118




## INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS ID No. 66




## INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO ID No. 86




## INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS SEDE EU JESÚS MORA ID No. 112




## INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MARTÍN DE PORRES SEDE EU GONZALO MEJÍA




# GRUPO 1, Departamentos de Antioquia – Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA HERRÁN SEDE CER PAULINA PUERTA
ID No. 42






## INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROAMBIENTAL SEDE MARÍA AUXILIADORA DE MANUNGARA
ID No. 150





## INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR DEMETRIO SALAZAR CASTILLO SEDE CE ESCUELA FRANCISCO MIRANDA





## CENTRO EDUCATIVO PUEBLO NUEVO SEDE PRINCIPAL
ID No. 94








# Estado GRUPO 2, Departamento de Atlántico

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-050-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-053-2023 – RM INGENIEROS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**8**
**Proyectos**

- 1 Departamentos
- 5 Municipios
- 8 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT 2023 - 6398 estudiantes.
- $ 4.044.124.630 Inversión

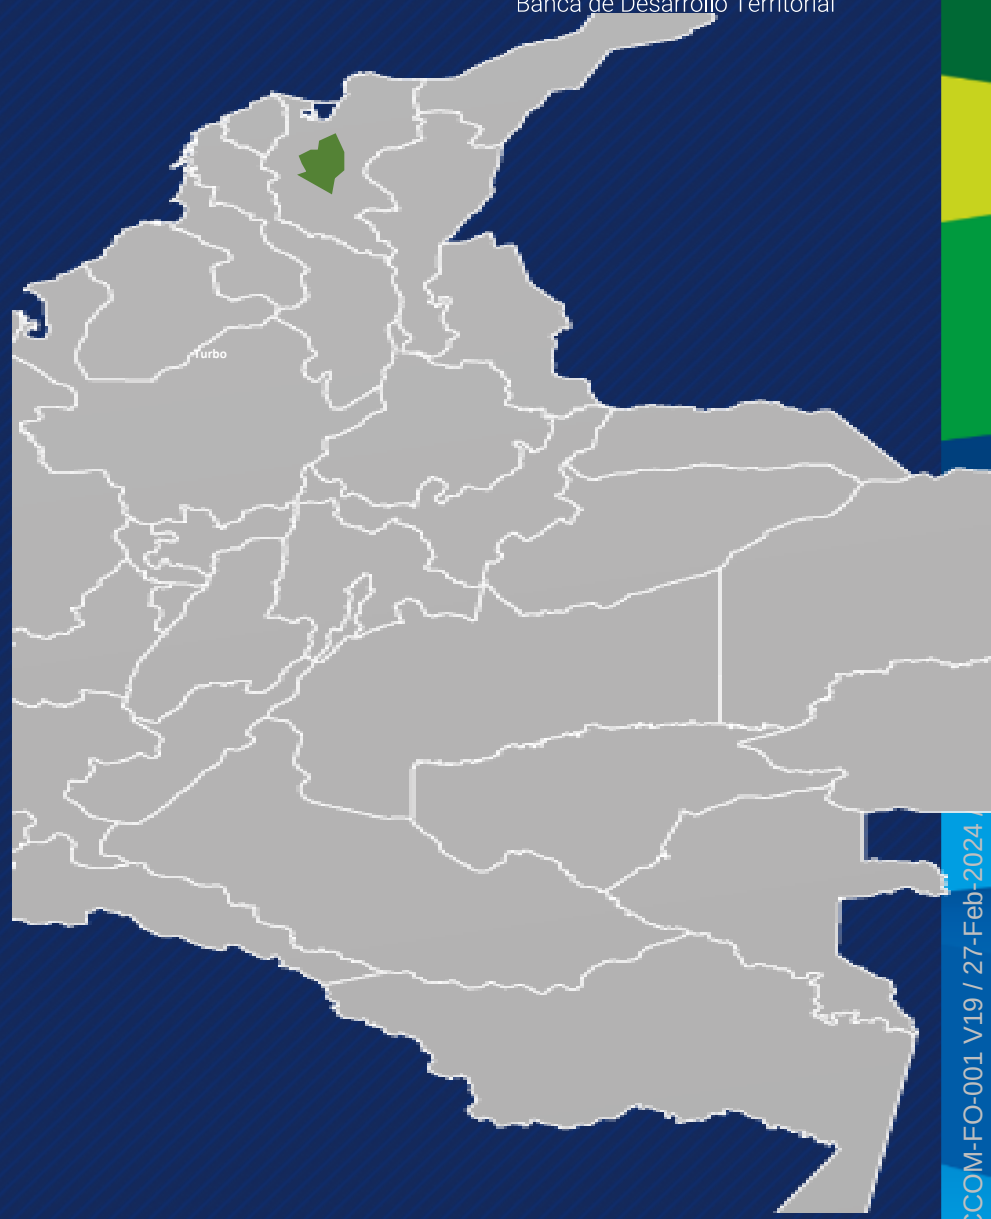

# GRUPO 2, Departamentos de Atlántico

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**SEDES INTERVENIDAS:**

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | IE | SEDE |
|---|---|---|---|
| Atlántico | Repelón | IE CIEN PESOS Y LAS TABLAS | PITA |
| Atlántico | Soledad | IE JOSEFA DONADO | SEDE CABICA |
| Atlántico | Galapa | IE MARIA AUXILIADORA | IE MARIA AUXILIADORA |
| Atlántico | Repelón | IE CIEN PESOS Y LAS TABLAS | SEDE PRINCIPAL |
| Atlántico | | IE TECNICA AGROPECUARIA DE VILLA ROSA | SEDE LA LOMA |
| Atlántico | Soledad | IE JOSEFA DONADO | SEDE PRINCIPAL |
| Atlántico | | IE TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE | IE TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE |
| Atlántico | Malambo | INSTITUCIÓN EDUCATIVA MESOLANDIA | SEDE MESOLANDIA |

| ALCANCE TOTAL DE INTERVENCIÓN | | | |
|---|---|---|---|
| AULAS NUEVAS | AULAS MEJORADAS | BATERIAS SANITARIAS | FECHA DE ENTREGA |
| 1 | | 2 | 16/09/2024 |
| 3 | | 1 | 13/09/2024 |
| | 15 | | 16/08/2024 |
| | 8 | | 18/07/2024 |
| | 5 | 8 | 11/07/2024 |
| | 16 | 8 | 16/07/2024 |
| | 22 | | 15/11/2024 |
| | 8 | | 4/09/2024 |

**PORCENTAJES DE AVANCE:**







**ESTADO ACTUAL CIERRE Y LIQUIDACION CONTRATOS DERIVADOS**

**AERS COMPONENTE 1:** Suscrita el 5 de diciembre de 2024

**AERS COMPONENTE 2:**

- Contrato de Obra, en proceso de firma por parte de la Fiduciaria Popular, una vez se tenga el AERS suscrita se procederá a solicitar la actualización de pólizas.
- Contrato de Interventoría, en proceso de firma por parte de la Fiduciaria Popular, una vez se tenga el AERS suscrita se procederá a solicitar la actualización de pólizas

DOCUMENTOS DE CIERRE Y LIQUIDACION

En recopilación documental entre el contratista e interventoría.

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

**Contratista de Diseño y Obra:** PAF-MENAM-O-050-2023 CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 - G2
**Contratista interventor:** PAF-MENAM-I-053-2023 RM INGENIEROS S A S

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE PRINCIPAL - ID EN 018




## INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE PRINCIPAL - ID EN 018




## INSTITUCION EDUCATIVA BLAS TORRES DE LA TORRE (ITIDA) - ID MEN 144




## INSTITUCION EDUCATIVA DE MESOLANDIA - ID MEN 197




## INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS, LAS TABLAS Y PITA, SEDE PITA - ID MEN 092




## INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS, LAS TABLAS Y PITA, SEDE LAS TABLAS - ID MEN 083




## INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE VILLA ROSA, SEDE LA LOMA - ID MEN 084






## INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA DE GALAPA - ID MEN 064







# Estado GRUPO 3, Departamento Magdalena

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-051-2023 (Liquidado) – CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-054-2023 (Liquidado) – CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**5**
**Proyectos**

- 1 Departamentos
- 3 Municipios
- 5 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT 2023 - 2630 estudiantes.
- Consultoría y obra $ 4.744.960.153 Interventoría $ 351.774.412 **Inversión Total $ 5.096.734.565**

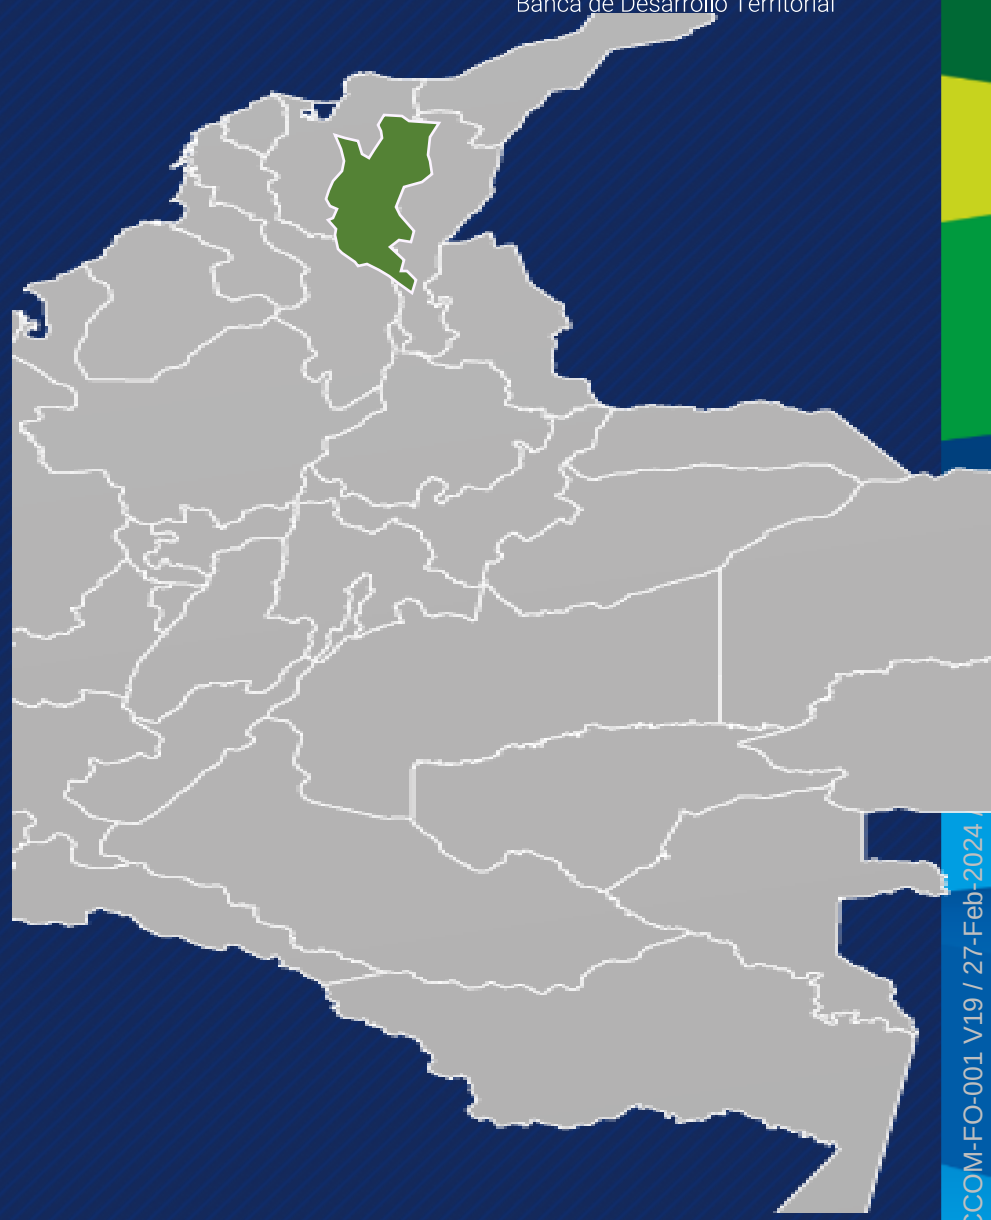

# Estado GRUPO 3, Departamentos de Magdalena

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-051-2023 (Liquidado)– CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-054-2023 (Liquidado) – CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3

| VALOR EJECUCION | FECHA INICIO C1 | FECHA FIN C1 | FECHA INICIO C2 | FECHA FIN C2 | PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **O:** $4.744.960.153<br>**I:** $ 371.774.412 | 14/11/2023 | 28/12/2023 | 18/12/2023 | 12/04/2024 | **Progr** | 100% | 100% |
| **AVANCE POR COMPONENTE** | **Programado** | 100% | **Programado** | 100% | **Ejecut** | 100% | |
| | **Ejecutado** | 100% | **Ejecutado** | 100% | **% Financiero G3:** 99,15%<br>**Obra:** 100%<br>**Interventoría:** 88,35% | | |

| MUNICIPIO | INSTITUCIONES EDUCATIVAS | SEDE | Aulas Nuevas | Aulas Mejoradas | BATERÍA SANITARIA |
|---|---|---|---|---|---|
| El Retén | Institución Educativa Departamental Roque de Los Rios Valle | Col Mpal Roque de Los Rios Valle | 9 | 11 | 11 N |
| El Retén | Institución Educativa Departamental Roque de Los Rios Valle | Institución Educativa Enoc Mendoza Riazco | N/A | 7 | 15 N |
| Ciénaga | Institución Educativa Enoc Mendoza Riazco | Institución Educativa Enoc Mendoza Riazco | N/A | 24 | N/A |
| Puebloviejo | Institucion Educativa Departamental San Juan de Palos Prietos | ERM El Triunfo | N/A | 4 | N/A |
| Puebloviejo | Institucion Educativa Departamental San Juan de Palos Prietos | ERM Isla de Cataquita | N/A | 2 | N/A |

**Avance General:** En proceso de liquidación.

**COMPONENTE 1:** Entregado 30/01/2024 – 100%

**COMPONENTE 2:** Entregado 29/04/2024 al 30/04/2024 – 100% con acompañamiento del MEN y UNGRD.

| Estado | Proyectos |
|---|---|
| Entregados | 5 |
| Terminados | 0 |
| Ejecución | 0 |
| Sin iniciar | 0 |

**LIQUIDACIÓN Contrato de Obra No. PAF-MENAM-O-051-2023:** Suscrita Acta de liquidación de fecha 01/10/2024 y pagado 100%.

**LIQUIDACIÓN Contrato de Interventoría No. PAF-MENAM-I-054-2023:**Suscrita Acta de liquidación de fecha 20/12/2024, en trámite de pago enero de 2025, pagado 88,35%

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 3, Departamentos de Magdalena

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-051-2023 – CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-054-2023 – CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3

## ID112 IE. RIOS VALLE, El Retén (Bachillerato) - ENTREGADO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Reten - Magdalena |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 2.346.192.202 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 731 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aulas | 11 | • Mejoramiento y cambio de cubiertas, mampostería (estructura principal y de confinamiento), mejoramiento de pañete y pinturas externas e internas, mejoramiento de pisos en general, carpintería metálica y red eléctrica general. |
| Aulas nuevas | 9 | • Sistema en estructura metálica, envolvente en WPC con teja UPVC, red eléctrica y piso en concreto. |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | N.A. | |
| Baterías sanitarias nuevas | 11 | Sistema en estructura metálica, envolvente en WPC con teja UPVC, red eléctrica y piso en concreto. |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 29 de abril de 2024 |

## Antes





## Después









# Estado GRUPO 3, Departamentos de Magdalena

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-051-2023 – CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-054-2023 – CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3

## ID156 IE. GREGORIO GARZÓN, El Retén (Primaria) - ENTREGADO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Reten - Magdalena |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 527.020.099 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 515 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aulas | 7 | • Mejoramiento y mantenimiento de cubiertas, mampostería (estructura principal y de confinamiento), pisos en general, carpintería metálica y red eléctrica general. |
| Aulas nuevas | N.A. | |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | 15 | |
| Baterías sanitarias nuevas | N.A. | |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 29 de abril de 2024 |


### Antes





### Después



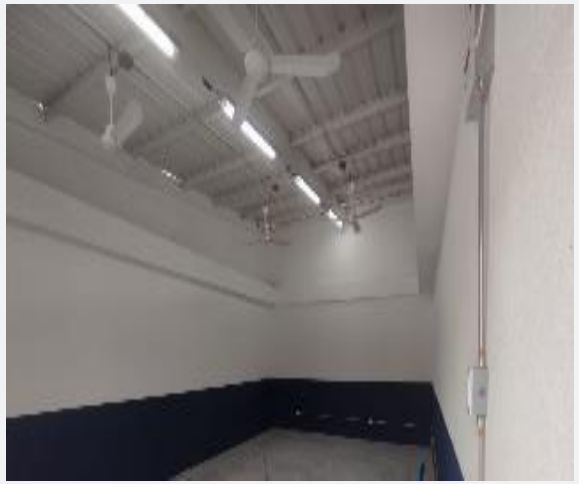





CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 3, Departamentos de Magdalena

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-051-2023 – CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-054-2023 – CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3

## ID154 IE. ENOC MENDOZA, Ciénaga - ENTREGADO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Ciénaga – Magdalena |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 1.649.361.282 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 870 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aulas | 24 | • Mejoramiento y mantenimiento de cubiertas, mampostería (estructura principal y de confinamiento), pisos en general, carpintería metálica y red eléctrica general.<br>• Construcción de circulaciones entre aulas, rampas y escaleras. |
| Aulas nuevas | N.A. | N.A. |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | N.A. | |
| Baterías sanitarias nuevas | N.A. | |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 29 de abril de 2024 |

### Antes





### Después









# Estado GRUPO 3, Departamentos de Magdalena

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-051-2023 – CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-054-2023 – CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3

## ID126 IE. EL TRIUNFO, Puebloviejo - ENTREGADO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Puebloviejo – Magdalena |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 153.545.059 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 98 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aulas | 4 | • Mejoramiento y mantenimiento de mampostería (estructura principal y de confinamiento), pisos en general, carpintería metálica y red eléctrica general, cambio de cubiertas, canalización de aguas lluvias y mejoramiento de la circulación. |
| Aulas nuevas | N.A. | |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | N.A. | |
| Baterías sanitarias nuevas | N.A. | |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 30 de abril de 2024 |

### Antes





### Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 3, Departamentos de Magdalena

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-051-2023 – CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-054-2023 – CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3

## ID111 IE. CATAQUITA, Puebloviejo - ENTREGADO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Puebloviejo – Magdalena |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 68.841.509 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 115 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aulas | 2 | • Mejoramiento y mantenimiento de mampostería (estructura principal y de confinamiento), pisos en general, carpintería metálica y red eléctrica general, cambio de cubiertas y mejoramiento de la circulación. |
| Aulas nuevas | N.A. | |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | N.A. | |
| Baterías sanitarias nuevas | N.A. | |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 30 de abril de 2024 |

Antes





Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada


# Estado GRUPO 4, Departamentos de Magdalena y Bolívar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-052-2023 – JASA LTDA
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-055-2023 – CONSORCIO INTER EDUCATIVO G4

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**7**
**Proyectos**

- 2 Departamentos
- 3 Municipios
- 7 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT 2023 - 1302 estudiantes.
- $ 3.831.442.211.00 Inversión

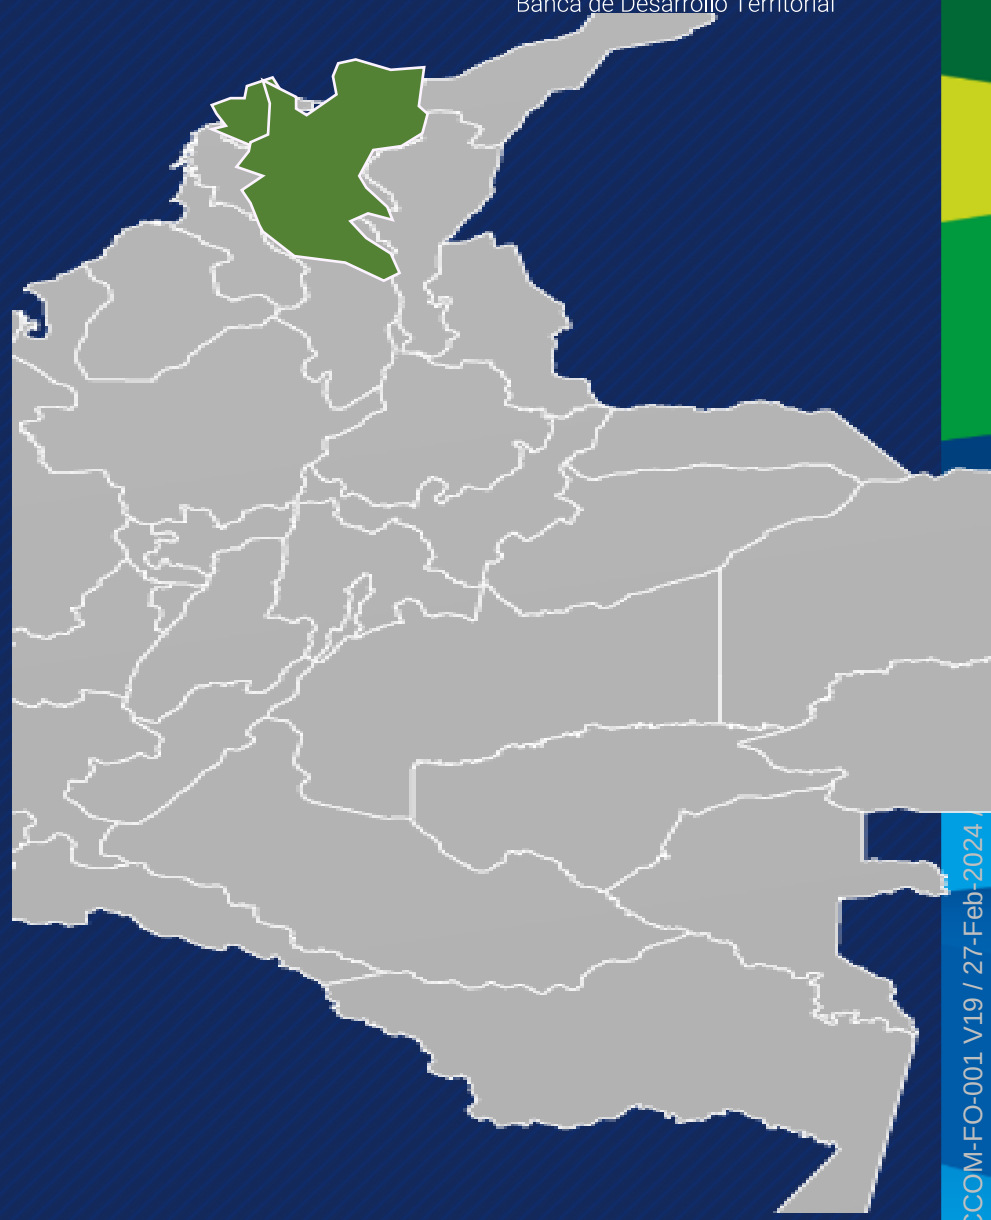

# Estado GRUPO 4, Departamentos de Magdalena y Bolívar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-052-2023 – JASA LTDA

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-055-2023 – CONSORCIO INTER EDUCATIVO G4

| VALOR EJECUCIÓN | FECHA INICIO Proyectada C1 | FECHA FIN Proyectada C1 | FECHA INICIO Proyectada C2 | FECHA FIN Proyectada C2 | PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.744.960.153 | 24/10/2023 | 08-12-2023 | 08-12-2023 | 07-02-2024 | **Programado** | 100% | 0% |
| **AVANCE POR COMPONENTE** | **Programado** | 100% | **Programado** | 100% | **Ejecutado** | 100% | |
| | **Ejecutado** | 100% | **Ejecutado** | 100% | | | |

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SEDE | AULAS NUEVAS | AULAS MEJORADAS | APARATOS SANITARIO | ÁREA DESARROLLADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolívar | Mompós | INSTITUCIÒN EDUCATIVA TÈCNICA AMBIENTAL DE TIERRA FIRME | I.E.T.A. AMBIENTAL DE TIERRA FIRME - SEDE PRINCIPAL | 3 | 13 | 4 | 4.224 M2 |
| Bolívar | Mompós | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DEL CHICAGUA | SAN LUIS | 1 | 2 | 2 | |
| Bolívar | Córdoba | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE TACAMOCHO | TACAMOCHO (SEDE PRIMARIA) | 0 | 9 | 4 | |
| Bolívar | Córdoba | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE TACAMOCHO | NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE TACAMOCHITO | 1 | 7 | 4 | |
| Magdalena | San Sebastían de Buenavista | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA | ERM MARIA AUXILIADORA | 3 | 2 | 1 | |
| Magdalena | San Sebastián de Buenavista | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA | ERM LA PACHA | 2 | 6 | 1 | |
| Magdalena | San Sebastián de Buenavista | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE TRONCOSO | ERM DE JAIME | 0 | 2 | 2 | |

Se encuentra liquidado el contrato de obra. El contrato de interventoría iniciará su trámite de liquidación una vez que quede desembolsado el último pago, lo cuál se tiene estipulado se haga para…..

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# GRUPO 4: LIQUIDADO

## LA PACHA












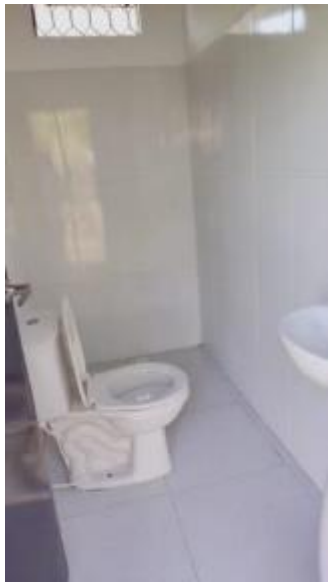










# Estado GRUPO 5, Departamentos de Magdalena y Bolívar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**16**
**Proyectos**

- 3 Departamentos
- 3 Municipios
- 16 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total, estudiantes SIMAT 2023 - 1177 estudiantes.
- $ 4.102.044.984 Inversión

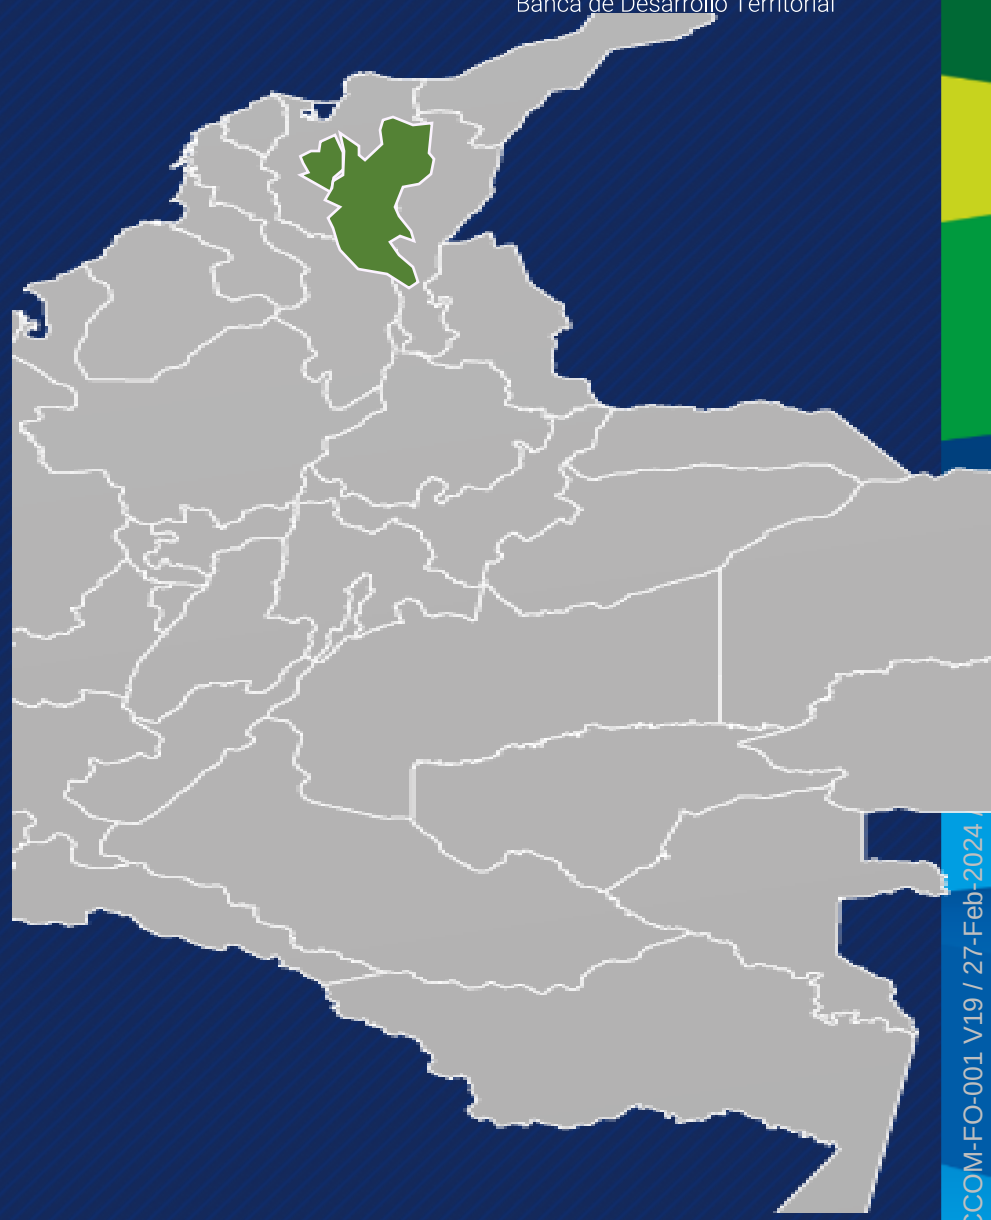

# GRUPO 5, Departamentos de Cesar, Magdalena y Bolívar.

**SEDES INTERVENIDAS:**

| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | IE | SEDE | ALCANCE TOTAL DE INTERVENCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | AULAS NUEVAS | AULAS MEJORADAS | BATERIAS SANITARIAS | FECHA DE ENTREGA |
| Bolívar | Barranco de Loba | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR | I.E.T.A. LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR - SEDE PRINCIPAL | | 10 | | 19/11/2024 |
| Bolívar | Barranco de Loba | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR | ATASCOZA | 1 | 3 | | 07/11/2024 |
| Bolívar | Barranco de Loba | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR | LOS CERRITOS | | 7 | | 19/11/2024 |
| Magdalena | Concordia | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE BASICA Y MEDIA SANTA CRUZ DE BALSAMO | ERM DE BALSAMO | | 6 | | 02/12/2024 |
| Magdalena | Concordia | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE BASICA Y MEDIA SANTA CRUZ DE BALSAMO | JAR INF MIS PRIMEROS SUEÑOS | | 2 | | 02/12/2024 |
| Magdalena | El Banco | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ANTONIO NARIÑO | CENT EDUC RUR MIX JOSE DE LA PAZ VANEGA ORTIZ | 1 | 6 | 1 Bs, 11 aparatos | 13/11/2024 |
| Cesar | Curumaní | INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES | INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES | | 11 | | 28/06/2024 |
| Magdalena | El Banco | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL SILVIA COTES DE BISWELL | ERM SANTA TERESA DE ISLITA | | 2 | | 5/06/2024 |
| Bolívar | San Martín de Loba | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA PESQUERA LEONIDAS ORTIZ ALVEAR DE CHIMÍ | PLAN BONITO | 1 | 0 | | 2/06/2024 |
| Cesar | Curumaní | INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES | SEDE CHINELA | 1 | 0 | 1 Bs, 4 aparatos | 12/11/2024 |
| Cesar | Curumaní | INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES | SEDE GUAIMARAL | | 3 | | 30/07/2024 |
| Cesar | Curumaní | INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES | SEDE LOS SERRENOS | | 2 | | 21/06/2024 |
| Magdalena | El Banco | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL OSCAR PISCIOTTI NUMA | ERM INMACULADA CONCEPCION | | 2 | | 5/06/2024 |
| Cesar | Chimichagua | CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO | SEDE TRONCONAL | 1 | 0 | 3 Bs, 3 aparatos | 27/12/2024 |
| Cesar | Chimichagua | CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO | SEDE PUERTO LA ESTANCIA | | 2 | | 30/07/2024 |
| Cesar | Chimichagua | CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO | SEDE TORRECILLA | | 3 | | 30/07/2024 |

**PORCENTAJES DE AVANCE:**

100% Programado

100% Ejecutado

**ESTADO ACTUAL CIERRE Y LIQUIDACION CONTRATOS DERIVADOS**

**AERS COMPONENTE 1 y 2:**

- En proceso de proyección para revisión y firma por parte de la Fiduciaria Popular, Contrato de Interventoría, en proceso de firma por parte de la Fiduciaria Popular, una vez se tenga el AERS suscrita se procederá a solicitar la actualización de pólizas

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# GRUPO 5, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES SEDE PRINCIPAL
ID No. 30





INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES SEDE SERENOS
ID No. 101




INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES SEDE SERENOS
ID No. 101




INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRISTIAN MORENO SEDE CHINELA
ID No. 97




INSTITUCION EDUCATIVA EL PUEBLITO SEDE PUERTO LA ESTANCIA
ID No. 147




INSTITUCION EDUCATIVA EL PUEBLITO SEDE TORRECILLA
ID No. 148





# GRUPO 5, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PUEBLITO SEDE TRONCONAL
ID No. 146




## INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL SILVIA COTES DE BISWELL SEDE ISLITA
ID No. 32




## INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL OSCAR PISCIOTTI NUMA SEDE INMACULADA CONCEPCION




## INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ANTONIO NARIÑO SEDE JOSE DE LA PAZ VANEGAS




## INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA CRUZ DE BALSAMO SEDE PRIMARIA
ID No. 13




## INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA CRUZ DE BALSAMO SEDE JARDIN INFANTIL
ID No. 14




# GRUPO 5, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR SEDE PRINCIPAL
ID No. 06




INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR SEDE CERRITO
ID No. 10




INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR SEDE ATASCOZA
ID No. 09




INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA PESQUERA LEONIDAS ORTIZ ALVEAR SEDE PLAN BONITO
ID No. 43





CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 6, Departamento de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-056-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-058-2023 – CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**7**
**Proyectos**

- 1 Departamentos
- 3 Municipios
- 7 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT 2023 - 3388 estudiantes.
- $ 2.697.151.413,44 Inversión



CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 6, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-056-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-058-2023 – CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| VALOR EJECUCION | FECHA INICIO | FECHA FIN | FECHA INICIO | FECHA FIN | PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C1 | C1 | C2 | C2 | | | |
| O: $2.496.849.571,44<br>I: $200.301.842,00 | 15-nov-23 | 30-dic-23 | 30-nov-23 | 29-abr-2024 | **Programado** | 100% | 0,00% |
| **AVANCE POR COMPONENTE** | **Programado** | 100,00% | **Programado** | 100,00% | **Ejecutado** | 100% | |
| | **Ejecutado** | 100,00% | **Ejecutado** | 100,00% | **En proceso de liquidación.** | | |

**ALCANCE DEFINIDO**

| DPTO | MUNICIPIO | INSTITUCION EDUCATIVA | SEDE | AULAS NUEVAS | AULAS MEJORADAS | BATERÍAS SANITARIAS | ID MEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar | El Paso | IE OCTAVIO MENDOZA DURAN | SEDE LA ESTACION | 1 | 1 | 1 - Mejorada | 79 |
| | La Paz(Robles) | CENTRO EDUCATIVO INDIGENA CAÑO PADILLA YUKPA | SEDE EL COSO | 1 | 0 | N.A. | 45 |
| | El Paso | IE OCTAVIO MENDOZA DURAN | SEDE EL VALLITO | N.A. | 3 | N.A. | 75 |
| | | | SEDE LA ESPERANZA | N.A. | 8 | 1 - Mejorada | 74 |
| | | | SEDE SAN ANGEL | N.A. | 1 | 1 - Nueva | 77 |
| | Valledupar | IE ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ | IE ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ | N.A. | 11 | N.A. | 4 |
| | | IE TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ | INSTITUTO TECNICO COMERCIAL JOSE EUGENIO MARTINEZ | N.A. | 23 | N.A. | 48 |

**Avance General:** En proceso de liquidación.

**COMPONENTE I:** Entregado 02/02/2024 – 100%

**COMPONENTE II:** Entregado 15/04/2024 al 17/05/2024– 100%

**LIQUIDACIÓN Contrato de Obra No. PAF-MENAM-O-056-2023:** Suscrita Acta de liquidación el 20/11/2024 y pagado al 100%.

**LIQUIDACIÓN Contrato de Interventoría No. PAF-MENAM-I-058-2023:** Suscrita Acta de liquidación el 27/11/2024 y pagado al 100%.

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# GRUPO 6, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-056-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-058-2023 – CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN – SEDE EL VALLITO

| MUNICIPIO | | El Paso |
|---|---|---|
| POBLACIÓN BENEFICIADA | | 105 estudiantes |
| ALCANCE | | |
| Aulas mejoradas | 3 | • Cambio de cubierta<br>• Cambio de red eléctrica<br>• Instalación de canales tipo amazonas.<br>• Instalación de bajantes.<br>• Reparación de grietas en aulas 1, 2 y 3.<br>• Reparación de muros con desprendimiento de pañetes en el aula 1.<br>• Raspado de pintura existente en aulas 1, 2 y 3.<br>• Acabado en estuco y pintura para muros del aula 1, 2 y 3.<br>• Mantenimiento de rejas metálicas de aulas 1, 2 y 3. |
| Baterías sanitarias | N.A. | N.A. |
| FECHA DE ENTREGA | | 15/04/2024 |

## REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ANTES





## REGISTRO FOTOGRAFICO DEL DESPUES






CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# GRUPO 6, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-056-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-058-2023 – CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN – SEDE LA ESTACION

| MUNICIPIO | | El Paso |
|---|---|---|
| POBLACIÓN BENEFICIADA | | 65 estudiantes |
| ALCANCE | | |
| Aulas nuevas | 1 | Aula prefabricada - Material WPC |
| Aulas mejoradas | 1 | * Cambio de cubierta<br>* Cambio de red eléctrica |
| Baterías sanitarias | Mejoramiento | * Cambio de enchape por la calidad de instalación del existente y limpieza y mantenimiento de sanitarios existentes<br>* Mantenimiento de carpintería metálica<br>* Cambio de cubierta y red eléctrica<br>* Suministro de tanque de agua potable 2000 L<br>* Construcción de poza séptica con campos de infiltración. |
| FECHA DE ENTREGA | | 02/05/2024 |

## REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ANTES






## REGISTRO FOTOGRAFICO DEL DESPUES






CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# GRUPO 6, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-056-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-058-2023 – CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## CENTRO EDUCATIVO INDIGENA CAÑO PADILLA YUKPA – SEDE EL COSO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | La Paz (Robles) |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 65 estudiantes |
| **ALCANCE** | | |
| Aulas nuevas | 1 | • Suministro e instalación de aula de 45 M2 tipo multigrado, prefabricada.<br>• Instalación de un sistema de panel solar con sus respectivos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento |
| Baterías sanitarias | N.A. | N.A. |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 04/05/2024 |

## REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ANTES





## REGISTRO FOTOGRAFICO DEL DESPUES









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# GRUPO 6, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-056-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-058-2023 – CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN – SEDE LA ESPERANZA

| MUNICIPIO | | El Paso |
|---|---|---|
| POBLACIÓN BENEFICIADA | | 225 estudiantes |
| ALCANCE | | |
| Aulas mejoradas | 9 | ✓ 7 AULAS:<br>• Cambio de cubierta<br>• Cambio de red eléctrica<br>• Instalación de canales tipo amazonas.<br>• Instalación de bajantes.<br>• Reparación de grietas en bloque 1 y aula 6<br>• Reparación de muros con desprendimiento de pañetes.<br>• Raspado de pintura existente en bloque 1, aula 5 y 6<br>• Acabado en estuco y pintura para muros del bloque 1, aula 5 y 6.<br>• Mantenimiento de pintura a marcos y hoja de puertas del bloque 1, aula 5, 6<br><br>✓ 2 AULAS<br>• Cambio de cubierta<br>• Subida de nivel<br>• Cambio de red eléctrica<br>• Mejoramiento en muros y en carpintería metálica<br>✓ OBRAS HIDRÁULICAS EN LA SEDE |
| Baterías sanitarias | SI | • Cambio de cubierta<br>• Cambio de red eléctrica<br>• Mantenimiento de pintura a marcos y hoja de puertas |
| FECHA DE ENTREGA | | 10/05/2024 |

## REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ANTES





## REGISTRO FOTOGRAFICO DEL DESPUES







CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# GRUPO 6, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-056-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-058-2023 – CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN – SEDE SAN ANGEL

| MUNICIPIO | | El Paso |
|---|---|---|
| POBLACIÓN BENEFICIADA | | 8 estudiantes |
| ALCANCE | | |
| Aulas mejoradas | 1 | • Mantenimiento y limpieza de cubierta<br>• Cambio de puerta de acceso principal<br>• Mejoramiento de ventanas el cual incluye lijado, anticorrosivo y pintura. |
| Baterías sanitarias | SI | • Suministro e instalación de batería sanitaria prefabricada.<br>• Instalación de sistema séptico.<br>• Instalación de tanque plástico 500 L para contención de agua potable. |
| FECHA DE ENTREGA | | 15/05/2024 |

## REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ANTES





## REGISTRO FOTOGRAFICO DEL DESPUES





CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# GRUPO 6, Departamentos de Cesar


Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-056-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-058-2023 – CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ – IE ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ

| MUNICIPIO | | Valledupar |
|---|---|---|
| POBLACIÓN BENEFICIADA | | 385 estudiantes |
| ALCANCE | | |
| Aulas mejoradas | 11 | • Cambio de cubierta<br>• Cambio de red eléctrica<br>• Cambio de pisos en aulas 1, 2 y 3 del bloque 1.<br>• Aseo manual de muros con ácido muriático en el bloque 5.<br>• Desmonte manual de muro divisorio en aulas del bloque 2.<br>• Instalación de muro divisorio en sistema drywall para aulas del bloque 2 .<br><br>En sala de informática y las 2 aulas del bloque 2.<br>• Desmonte de cielo raso.<br>• Instalación de cielo raso en lamina PVC. |
| Baterías sanitarias | N.A. | N.A. |
| FECHA DE ENTREGA | | 16/05/2024 |

## REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ANTES

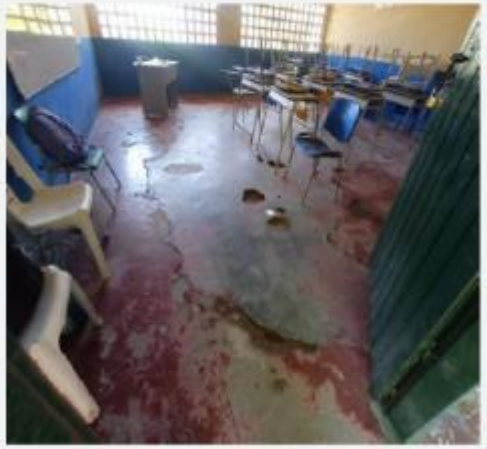
## REGISTRO FOTOGRAFICO DEL DESPUES





CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# GRUPO 6, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-056-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-058-2023 – CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ– SEDE INSTITUTO TECNICO COMERCIAL JOSE EUGENIO MARTINEZ

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Valledupar |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 805 estudiantes |
| **ALCANCE** | | |
| Aulas mejoradas | 23 | * Cambio de cubierta para bloque 1, 2, 3, 4 y 5- correspondiente a las 23 aulas.<br>* Cambio de red eléctrica para bloque 1, 2, 3, 4 y 5 por cambio de cubierta - correspondiente a las 23 aulas.<br>* Instalación de canales tipo amazonas.<br>* Instalación de bajantes.<br>* Pintura interna para los bloques 1, 2, 3, 4 y 5 por cambio de cubierta - correspondiente a las 23 aulas. |
| Baterías sanitarias | N.A. | N.A. |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 17/05/2024 |

## REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ANTES





## REGISTRO FOTOGRAFICO DEL DESPUES






CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 7, Departamento de La Guajira

Contratista de Diseño y Obra PAF-ATMEN5-O-036-2024 – CONSORCIO GUAJIRA 7 (Máxima Solutions sas 50% Gancar Distribuciones sas 50%)
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-059-2023 – GERMÁN ADOLFO PERDOMO PACHÓN

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**13**
**Proyectos**

- 1 Departamento
- 4 Municipios
- 9 Instituciones
  13 Sedes
- Total estudiantes SIMAT 2024 - 2585 estudiantes.
- $4.454.016.879
  Inversión




CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 7,Departamento de La Guajira

Contratista de Diseño y Obra PAF-ATMEN5-O-036-2024 – CONSORCIO GUAJIRA 7 ( Maxima Solutions sas 50% Gancar Distribuciones sas 50%)

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-059-2023 – GERMÁN ADOLFO PERDOMO PACHÓN

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| VALOR EJECUCION | FECHA INICIO C1 | FECHA FIN C1 | FECHA INICIO C2 | FECHA FIN C2 | PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O: $4.158.777.879<br>I: $295.239.000 | 31/05/2024 | 15/07/2024 | 15/07/2024 | 17/01/2025 | Progr | 96,43% | -3,34% |
| AVANCE POR COMPONENTE | Programado | 100,00% | Programado | 96,16% | Ejecut | 93,09% | |
| | Ejecutado | 100,00% | Ejecutado | 92,56% | | | |

| DPTO | MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SEDE | AULAS NUEVAS | AULAS MEJORAD | APARAT SANIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guajira | Maicao | I.E. INDÍGENA No. 2 | KASICHE | 1 | 0 | 2 |
| Guajira | Maicao | I.E. INDÍGENA No. 6 | YAMAIN KASPOLIMANA | 1 | 1 | 2 |
| Guajira | Maicao | ESC. RURAL MIXTA TALOULUMAANA | ESC. RURAL MIXTA TALOULUMAANA | 2 | 0 | 6 |
| Guajira | Manaure | I. ETNOEDUCATIVA NTRA. SRA. DE FÁTIMA | ESC. RURAL INDÍGENA KARALOUTAMANA | 1 | 0 | 2 |
| Guajira | Barrancas | CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL PROVINCIAL | CENTRO ETNOEDUCATIVO PROVINCIAL | 1 | 0 | 0 |
| Guajira | Maicao | I.E. INDÍGENA No. 2 | LA CAMPANA | 0 | 9 | 0 |
| Guajira | Maicao | I.E. INDÍGENA No. 2 | WAYUUMAANA | 0 | 2 | 0 |
| Guajira | Maicao | I.E. INDÍGENA No. 2 | LA ESTRELLA | 1 | 0 | 0 |
| Guajira | Maicao | I.E. INDÍGENA No. 6 | YAMAIN PRINCIPAL | 1 | 0 | 0 |
| Guajira | Riohacha | I.E. JOSÉ ANTONIO GALÁN | COOPERATIVO | 0 | 7 | 0 |
| Guajira | Riohacha | I.E. JOSÉ ANTONIO GALÁN | JOSÉ ANTONIO GALÁN | 0 | 0 | 6 |
| Guajira | Riohacha | I. ETNOEDUCATIVA No. 7 | APUNIMAANA1 | 0 | 8 | 0 |
| Guajira | Riohacha) | I. ETNOEDUCATIVA No. 7 | WAKUAPAMANA | 0 | 9 | 6 |
| TOTALES | | | | 8 | 36 | 24 |

**Avance General: se reinició 18dic24**

**Avance general Componente I: 100%**

**Avance general por Sede Componente II: - 3,60%**

**ID53 Maicao, I.E. Indígena No.2, Sede Kasiche: 93,10%**
**ID152 Maicao, I.E. Indígena No.6, Sede Yamain Kaspolimana: 90.53%**
**ID153 Maicao, E.R. Mixta Taloulumaana, Sede E.R. Mixta Taloulumaana: 94.19%**
**ID11 Manaure, I. Etnoeducativa Ntra Sra Fátima, Sede E.R. Indígena Karaloutamana: 93.50%**
**ID143 Barrancas, C. Etnoeducativo Rural provncial, Sede C. Etnoeducativo Provincial: 91.97%**
**ID50 Maicao, I.E. Indígena No.2, Sede La Campana: 100%**
**ID54 Maicao, I.E. Indígena No.2, Sede Wayuumaana: 100%**
**ID151 Maicao, I.E. Indígena No.2, Sede La Estrella: 94.52%**
**ID51 Maicao, I.E. Indígena No.6, Sede Yamain principal: 95.65%**
**ID60 Riohacha, I.E. José Antonio Galán, Sede Cooperativo: 100%**
**ID95 Riohacha, I.E. José Antonio Galán, Sede José Antonio Galán: 97.97%**
**ID34 Riohacha, I.Etnoeducativa No.7, Sede Apunimaana1: 100%**
**ID117 Riohacha, I.Etnoeducativa No.7, Sede Wakuapamana: 94,86%**

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# REGISTRO FOTOGRAFICO

I.E. JOSE ANTONIO GALAN- SEDE COOPERATIVO -060-(RIOHACHA)





INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #7 - 034-APÜNIMA´ANA1 -(RIOHACHA)





ESCUELA ETNOEDUCATIVA LA CAMPANA -050--(MAICAO)







ESCUELA ETNOEDUCATIVA WAYUMA'ANA -054- (MAICAO)





# REGISTRO FOTOGRAFICO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #7 - 117-WAKUAPAMANA -(RIOHACHA)








I.E. JOSE ANTONIO GALAN- SEDE PRINCIPAL -060-(RIOHACHA)






INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #6 - 051-TALOULUMA `ANA -(MAICAO)





INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO RURAL PROVINCIAL - 0143-PROVINCIAL -(BARRANCAS)




# REGISTRO FOTOGRAFICO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA - 011- ESCUELA RURAL INDIGENA KARALOUTAMANA -(MANAURE)






ESCUELA ETNOEDUCATIVA SEDE KASICHE -053- (MAICAO)









INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #6 - 151-LA ESTRELLA -(MAICAO)




INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #6 - 051- YAMAIN SEDE PRINCIPAL -(MAICAO)




INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #6 - 152- YAMAIN KASPOLIMANA -(MAICAO)






# Estado GRUPO 8, Departamentos de Bolívar - Córdoba

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-055-2023 – DAR ARQUITECTURA S.A.S.
Contratita Interventor PAF-MENAM-I-057-2023 – LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO

**9**
**Proyectos**

- 2 Departamentos
- 7 Municipios
- 8 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT 2023 - 3710 estudiantes.
- $ 6.602.674.825 Inversión



CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 - Clasificada

# REGISTRO FOTOGRAFICO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## Sede principal I. E. El Palmar - Montelíbano





## Sede Téc. Agrop. De Desarrollo Rural De María la baja - María La Baja





# REGISTRO FOTOGRAFICO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## Sede Buenos Aires - María La Baja






## Sede Esc. Nueva Parcelas Londres - Ayapel





# REGISTRO FOTOGRAFICO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## Sede Esc. Nueva La Solita - Puerto Libertador







## Sede Los Aguacates - Cotorra







# REGISTRO FOTOGRAFICO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## Sede Los Cerros - Planeta Rica





## Sede Técnica Álvaro Ulcue Chocue - Tuchín





# REGISTRO FOTOGRAFICO

## Sede Níspero-María La Baja













# Estado GRUPO 9, Departamentos de Arauca, Bolívar, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima y Bogotá D.C.

Contratista de Diseño y Obra PAF-ATMEN5-O-037-2024 – CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9
Contratista Interventor PAF-ATMEN5-I-064-2024 – CONSORCIO SAN GABRIEL

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**15**
**Proyectos**

- 8 Departamentos
- 12 Municipios
- 13 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT 2024 - 3351 estudiantes.
- $ 5.124.276.306 Inversión



CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 9, Departamentos de Arauca, Bolívar, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima y Bogotá D.C.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Contratista de Diseño y Obra PAF-ATMEN5-O-037-2024 – CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9

Contratista Interventor PAF-ATMEN5-I-064-2024 – CONSORCIO SAN GABRIEL

| VALOR EJECUCION | FECHA INICIO C1 | FECHA FIN C1 | FECHA INICIO C2 | FECHA FIN C2 | PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O: $4.810.476.306,00<br>I: $313.800.000 | 23-Ago-24 | 08-oct-24 | 09-oct-24 | 08-mar-25 | **Programado** | 31,98%% | -9,62% |
| **AVANCE POR COMPONENTE** | **Programado** | 100,00% | **Programado** | 27,92% | **Ejecutado** | 22,36% | |
| | **Ejecutado** | 100,00% | **Ejecutado** | 14,3% | **En ejecución de obras** | | |

| DPTO | MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SEDE | AULAS NUEVAS | AULAS MEJORAD | APARATOS SANITARIOS | ID MEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santander | Vélez | COLEGIO UNIVERSITARIO | COLEGIO UNIVERSITARIO | 4 | 9 | Si aplica | 7 |
| | Betulia | INSTITUCION EDUCATIVA EL RAMO | CENTRO EDUCATIVO SANTA BARBARA | NA | 1 | Si aplica | 17 |
| | Barrancabermeja | CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN | CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN | Sede retirada | | | 141 |
| Bolívar | Morales | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PALMA | LA ARCADIA | NA | 2 | Si aplica | 20 |
| | Simití | INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CERRO DE VERACRUZ | CAMPO PAYARES | 1 | 1 | Si aplica | 123 |
| | | | I.E. DEL CERRO DE VERACRUZ - SEDE PRINCIPAL | NA | 12 | 5 | 124 |
| Bogotá, D.C. | Bogotá, D.C. | COLEGIO LA CHUCUA (IED) | CENT EDUC DIST LA CHUCUA | Sede retirada | | | 33 |
| | | COLEGIO ESTRELLA DEL SUR (IED) | COL DIST ESTRELLA DEL SUR | Sede retirada | | | 136 |
| Arauca | Saravena | CENTRO EDUCATIVO LA PAVA | LA PAVA | NA | 2 | 1 | 56 |
| | Arauca | CENTRO EDUCATIVO MONSERRATE | CEAR MONSERRATE | NA | 7 | 3 | 138 |
| Tolima | Santa Isabel | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BOLIVAR | LA HUMAREDA | 1 | 1 | 2 | 67 |
| | | | EL BRASIL | 1 | 1 | 2 | 100 |
| Meta | Villavicencio | INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO FRANCISCO ARANGO | ESCUELA SIETE DE AGOSTO | 5 | 2 | 8 | 96 |
| Cundinamarca | Anolaima | INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE HUGO ENCISO | ESCUELA RURAL EL DESCANSO | 1 | 1 | 2 | 104 |
| Norte de Santander | La Playa | CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN PEDRO | SEDE LA PEÑA | NA | 1 | Si aplica | 132 |

**Avance General:**

- Se aprobó el de retiro de las 3 sedes educativas mediante comité técnico No. 70 y comité fiduciario No. 45.
- Se realizó prórroga por tres (3) meses para la culminación de las obras, mediante otrosí No. 2 el 05/12/2024.
- Se iniciaron obras en algunas sedes educativas.

**Avance por sede:**

**ID No. 56:** En ejecución de obras, sede próxima a finalizar actividades y realizar entrega.
**ID No. 132:** En ejecución de obras.
**ID No. 138:** En ejecución de obras.
**ID No. 7:** En ejecución de obras.
**ID No. 17:** No se han iniciado actividades, contratista manifiesta que se han presentado inconvenientes con mano de obra de la región y transporte de materiales. Se han realizado las advertencias pertinentes por la mora en el inicio y los atrasos presentados.
**ID No. 20:** No se han iniciado actividades, contratista manifiesta que se han presentado inconvenientes con transporte de materiales. Se han realizado las advertencias pertinentes por la mora en el inicio y los atrasos presentados.
**ID No. 123:** No se han iniciado actividades, contratista manifiesta que se han presentado inconvenientes con transporte de materiales. Se han realizado las advertencias pertinentes por la mora en el inicio y los atrasos presentados.
**ID No. 124:** En ejecución de obras
**ID No. 104:** No se han iniciado actividades, contratista manifiesta que se han presentado inconvenientes con transporte de materiales. Se han realizado las advertencias pertinentes por la mora en el inicio y los atrasos presentados.
**ID No. 67 y 100:** No se han iniciado actividades, contratista manifiesta que se han presentado inconvenientes con lluvias presentadas en la zona que han impedido el transporte a la sede. Se han realizado las advertencias pertinentes por la mora en el inicio y los atrasos presentados.
**ID No. 96:** En ejecución de obras de las actividades de aulas prefabricadas.

El contratista manifiesta que las sedes faltantes se iniciarán obras en la segunda semana de enero; así mismo, se encuentra en coordinación de transporte, materiales y mano de obra con el fin de no tener retrasos por estas situaciones.

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 9, Departamentos de Arauca, Bolívar, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima y Bogotá D.C.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Contratista de Diseño y Obra PAF-ATMEN5-O-037-2024 – CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9
Contratista Interventor PAF-ATMEN5-I-064-2024 – CONSORCIO SAN GABRIEL

## COLEGIO UNIVERSITARIO - ID No. 7




## INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CERRO DE VERACRUZ ID No. 124




## CENTRO EDUCATIVO LA PAVA ID No. 56






## CENTRO EDUCATIVO MONSERRATE ID No. 138




## ESCUELA SIETE DE AGOSTO ID No. 96






## SEDE LA PEÑA – ID No. 132




CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada


# Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca – Valle del Cauca y Choco

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**15**
**Proyectos**

- 3 Departamentos
- 5 Municipios
- 15 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total, estudiantes SIMAT 2023 - 3198 estudiantes.
- 7.063.483.948,76 Inversión - MEN

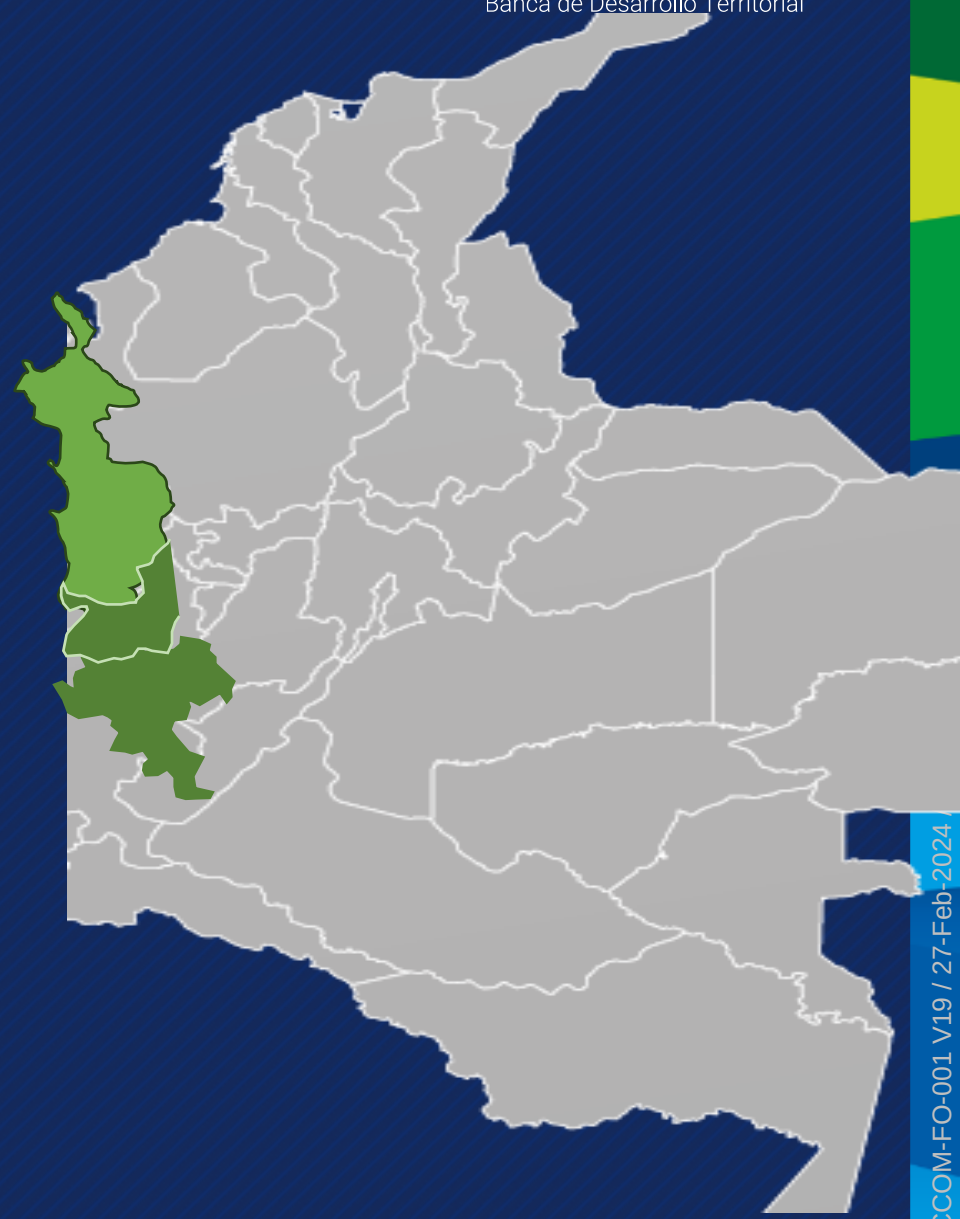

# Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca – Valle del Cauca y Choco

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial


Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratita Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO

**SEDES INTERVENIDAS:**

| | | | | ALCANCE TOTAL DE INTERVENCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | IE | SEDE | AULAS NUEVAS | AULAS MEJ | BSANITARIAS | FECHA DE ENTREGA |
| CAUCA | SUAREZ | ID188. IE TECNICA AGRICOLA | SEDE PRINCIPAL | | 9 | 24 MEJORAM | 30/12/2024 |
| CAUCA | SUAREZ | ID189. IE TECNICA AGRICOLA | MARIA INMACULADA | 6 | 7 | 9 NUEVAS 7 MEJORAM | 30/03/2025 |
| CAUCA | SUAREZ | ID190. IE TECNICA AGRICOLA | FRANCISCO PAULA SANTANDER | | 13 | 10 MEJORAM | 30/03/2025 |
| CAUCA | TORIBIO | ID12. IE LA PLAYA | CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO LA PLAYA | | 9 | | 14/08/2024 |
| CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | ID16. IE DOMINGUILLO | SEDE PRINCIPAL | 8 | | 8 NUEVAS | 30/03/2025 |
| CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | ID164. IE DOMINGUILLO | SEDE DOMINGO LASSO | | 4 | 3 MEJORAM | 28/05/2024 |
| CHOCO | BAHIA SOLANO | ID105. IE LUIS LOPEZ DE MESA | SEDE DE SAN JOSE (HUACA) | 1 | | 2 NUEVAS | 28/02/2025 |
| CHOCO | BAHIA SOLANO | ID106. IE LUIS LOPEZ DE MESA | SEDE SIRENA DEL MAR | | 1 | 2 MEJORAM | 03/12/2024 |
| CHOCO | BAHIA SOLANO | ID107. IE LUIS LOPEZ DE MESA | SEDE SECUNDINO RIVAS | | 7 | 4 MEJORAM | 03/12/2024 |
| V DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA | ID128. IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE | SEDE PRINCIPAL | | 9 | 14 MEJORAM | 26/11/2024 |
| V DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA | ID130. IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE | SEDE LA HONDA | | 1 | 2 MEJORAM | 08/08/2024 |
| V DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA | ID85. IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE | SEDE LA PLANTA | 1 | 2 | 2 | 03/12/2024 |
| V DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA | ID158. IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE | SEDE CRISTOBAL COLON | 1 | | 2 MEJORAM | 17/09/2024 |
| V DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA | ID62. IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE | SEDE JHN F KENNEDY | | 11 | 14 MEJORAM | 26/11/2024 |
| V DEL CAUCA | GUADALAJARA DE BUGA | ID129. IE MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE | SEDE JULIAN MENDOZA GUERRERO | | 5 | 10 MEJORAM | 17/09/2024 |

| Estado | Proyectos |
|---|---|
| Entregados | 10 |
| Terminados | 1 |
| Ejecución | 4 |

**PORCENTAJES DE AVANCE:**




**ESTADO ACTUAL EJECUCIÓN CONTRATOS DERIVADOS**

En cumplimiento al alcance se tienen 10 sedes entregadas y AEP&SC suscritas, 1 sede terminada programada entregar a rectora el 30.12.2024 y 4 sedes en ejecución, (2 Suarez, 1 Santander de Quilichao, 1 Bahía Solano)
Derivado de la necesidad de los 4 proyectos en ejecución, se tramito prórroga de 3 meses compartida, ante comité técnico No. 80 y Comité Fiduciario No. 51, derivado de lo anterior el informe corte 29.12.2024 se ajusta a la reprogramación aprobada.

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCION E.TECNICA AGRARIA SEDE PRINCIPAL ID MEN. 188.




INSTITUCION E.TECNICA AGRARIA SEDE PRINCIPAL ID MEN. 188.




INSTITUCION E.TECNICA AGRARIA SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ID MEN. 190




INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PLAYA ID MEN: 12. MUNICIPIO DE TORIBIO ID MEN: 12.




INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO SEDE DOMINGO LASSO.




INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO SEDE PRINCIPAL




# Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó


Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE JOHN F. KENNEDY




INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDEJULIAN MENDOZA GUERRERO

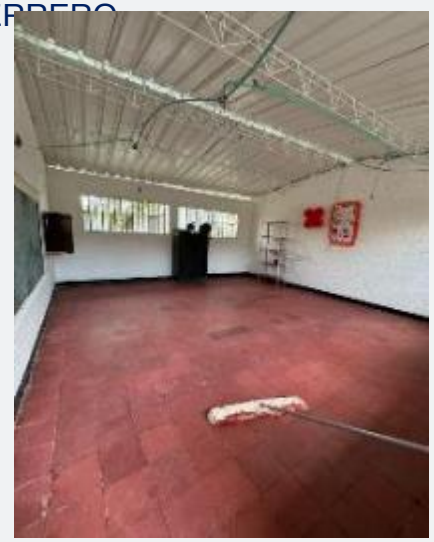INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE PRINCIPAL




INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE LA HONDA .




INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE LA PLANTA .




INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE CRISTOBAL COLÓN




CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCION EDUCATIVA LUIS LOPEZ DE MESA
SEDE SAN JOSE (HUACA)





INSTITUCION EDUCATIVA LUIS LOPEZ DE MESA
SEDE SIRENA DEL MAR





INSTITUCION EDUCATIVA LUIS LOPEZ DE MESA
SEDE SECUNDINO RIVAS





CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**18**
**Proyectos**

- 1 Departamento
- 6 Municipios
- 18 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT 2023 - 3170 Estudiantes
- $ 5.086.054.713 Inversión



# Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| VALOR EJECUCION | FECHA INICIO C1 | FECHA FIN C1 | FECHA INICIO C2 | FECHA FIN C2 | PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **O:** $4.728.021.810<br>**I:** $ 358.032.903 | 12/02/2024 | 27/03/2024 | 18/03/2024 | 27/11/2024 | **Progr** | 100% | 0% |
| **AVANCE POR COMPONENTE** | **Programado** | 100% | **Programado** | 100% | **Ejecut** | 100% | |
| | **Ejecutado** | 100% | **Ejecutado** | 100% | | | |

| MUNICIPIO | INSTITUCIONES EDUCATIVAS | SEDE | Aulas Nuevas | Aulas Mejoradas | BATERÍA SANITARIA |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolívar | Centro Educativo el Tambo | La Fuente | 1 | 0 | 1 M |
| El Tambo | I.E. Huisitó | Huisitó (sede principal) | 6 | 0 | 6 N |
| La Vega | I.E Agropecuaria San Francisco Javier sede Garay | I.E Agropecuaria San Francisco Javier sede Garay | 1 | 0 | 1 N |
| Balboa | C.E. Buenos Aires | Capitanes | NA | 2 | 0 |
| | I.E. Olaya (antes C.E. Olaya) | Olaya (sede principal) | NA | 13 | 6 M |
| Bolívar | Institución Educativa Agropecuario Nuestra Señora del Carmen | Corral Viejo | 1 | 0 | 2 M |
| | | Nuestra Señora del Carmen (sede principal) | NA | 13 | 8 M |
| | Institución Educativa el Carmen | El Carmen (sede principal) | NA | 2 | 1 M |
| | Institución Educativa Técnica Agropecuaria Nuestra Señora de los Remedios | Colegio Departamental Nuestra Señora de los Remedios | NA | 10 | 8 M |
| La Vega | Institución Educativa Agropecuaria Santa Rita | Institución Educativa Santa Rita (sede principal) | NA | 6 | 0 |
| Popayán | I.E. Comuneros | sede principal | NA | 6 | 0 |
| Rosas | Institución Educativa Santa Teresita | Santa Teresita (sede principal) | NA | 17 | 8 M |
| | Institución Educativa Madre Caridad Brader | Madre Caridad Brader (sede principal) | 1 | 0 | 0 |
| | Centro Educativo Guillermo León Valencia | La Despensa | NA | 3 | 2 M |
| | | El Altillo | NA | 1 | 2 M |
| | Institución Educativa Alfonso Córdoba | Las Yerbas | NA | 2 | 2 M |
| | | El Retiro | NA | 1 | 1 M |
| | | Bellavista | NA | 1 | 0 |

**COMPONENTE 1**

El componente 1 del contrato de obra, correspondiente a los diagnósticos, estudios y diseños de las 18 sedes educativas priorizadas por el Ministerio de Educación Nacional, se encuentra actualmente concluido y recibido a satisfacción por parte de la interventoría al contrato de obra.

**COMPONENTE 2**

| Estado | Proyectos |
|---|---|
| Entregados | 15 |
| Terminados | 3 |
| Terminados – en Subsanación | 0 |
| Sin iniciar | 0 |

- 15 proyectos se encuentran terminados al 100%, recibidos a satisfacción por interventoría, y entregados a Directivos de cada sede.
- 3 proyectos se encuentran terminados al 100%, recibidos a satisfacción por interventoría, y en gestión de entrega a Directivos de cada sede. Los Directivos informaron que reciben en enero 2025.

Contrato de obra terminado. Contratista avanza en las gestiones de entrega a Directivos de las sedes terminadas y recibidas por interventoría. En algunas de estas sedes los Directivos están solicitando actividades por fuera del alcance contractual.

# Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO




I.E. Agropecuaria Santa Rita – Sede principal
La vega




C.E. Buenos Aires – Sede Capitanes
Balboa




C.E. Guillermo León Valencia – Sede La Despensa
Rosas





C.E. Guillermo León Valencia – El Altillo
Rosas

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial




I.E. El Carmen – Sede principal
Bolívar





I.E. Alfonso Córdoba – Sede Las Yerbas
Rosas




I.E. Alfonso Córdoba – Sede Bellavista
Rosas




I.E. Técnica Agropecuaria Nuestra Señora de los
Remedios - Bolívar

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial






I.E. Alfonso Córdoba – Sede El Retiro
Rosas





I.E. Nuestra Señora del Carmen – Sede Principal
Bolívar





I.E. Olaya – Sede principal
Balboa





C.E. El Tambo – Sede La Fuente
Bolívar

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial




I.E. Madre Caridad Brader – Sede principal Rosas




I.E. Nuestra Señora del Carmen – Sede Corral viejo Bolívar




I.E. Agropecuaria San Francisco Javier – Sede Garay La Vega




I.E. Santa Teresita – Sede principal Rosas

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial






I.E. Los Comuneros – Sede principal
Popayán







I.E. Huisitó – Sede principal
El Tambo

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada


# Estado GRUPO 12, Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julian Lizandro Gonzalez Casas 50% Jorge Andrés Chacón Ordoñez 50%)
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**18**
**Proyectos**

- 4 Departamentos
- 11 Municipios
- 18 Instituciones Rurales y urbanas.
- Total estudiantes SIMAT 2023 - 3219 estudiantes.
- $5.236.381.488 Inversión

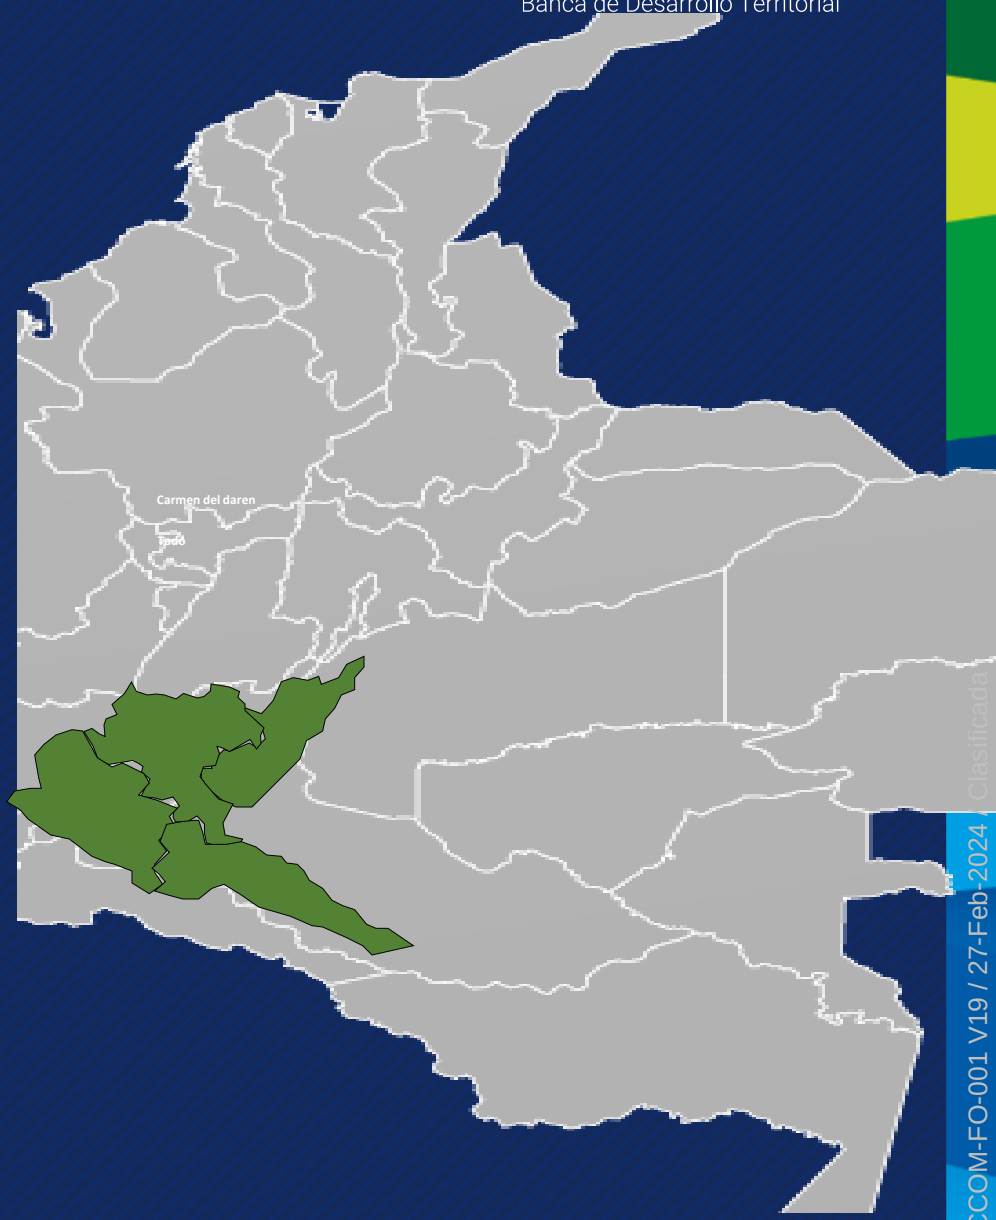


Clasificada
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024

# Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO


| VALOR EJECUCION | FECHA INICIO C1 | FECHA FIN C1 | FECHA INICIO C2 | FECHA FIN C2 | PORCENTAJES DE AVANCE GENERAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **O:**$4.918.276.400 **I:** $418.988.095 | 20/02/2024 | 4/04/2024 | 05/04/2024 | 04/12/2024 | **Programado** | 100,00% | -3,05% |
| **AVANCE POR COMPONENTE** | **Programado** | 100,00% | **Programado** | 100,00% | **Ejecutado** | 98,00% | |
| | **Ejecutado** | 100,00% | **Ejecutado** | 98,00% | **% Financiero G12:** 86,03%<br>**Obra:** 86,13%<br>**Interventoría:** 75,58% | | |

| DPTO | MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SEDE | AULAS NUEVAS | AULAS MEJORAD | APARATOS SANITARIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cauca | Piamonte | ID27. Centro Educativo Puerto Guayuyaco | Escuela Rural Mixta La Espanola | 0 | 1 | 1 |
| Cauca | Piamonte | ID121. Centro Educativo Puerto Guayuyaco | Esc Rur Mix San Andresito | 0 | 1 | 1 |
| Cauca | Piamonte | ID125. Inst Educ Agric Piamonte | PIAMONTE (Sede Principal) | 0 | 28 | 1 |
| Cauca | Piamonte | ID173. Esc Rur Mix Fray Ezequiel | Esc Rur Mix Fray Ezequiel | 0 | 1 | 1 |
| Cauca | Piamonte | ID174. E.D.R Porto Guayuyaco Sede Principal | E.D.R Porto Guayuyaco Sede Principal | 0 | 4 | 1 |
| Huila | Acevedo | ID26. Institución Educativa Bateas | Bateas | 0 | 5 | 5 |
| Nariño | Pasto | ID1. I.E.M. Nuestra Señora De Guadalupe | I.E.M. Nuestra Señora De Guadalupe - Sede Principal | 0 | 5 | 0 |
| Nariño | El Rosario | ID8. Centro Educativo La Claudia | Centro Educativo La Claudia | 0 | 1 | 0 |
| Nariño | Cumbal | ID36. Institución Educativa Inmaculada Concepción De Tallambi | Institución Educativa Inmaculada Concepcion De Tallambi | 5 | 0 | 7 |
| Nariño | Barbacoas | ID87. Institución Educativa Teraimbe | Sede 9 Cumainde | 0 | 1 | 2 |
| Nariño | Barbacoas | ID110. Institución Educativa Teraimbe | Sede 2 Bombón | 0 | 2 | 1 |
| Nariño | Ipiales | ID142. Institución Educativa Agroindustrial Los Pastos | Escuela Las Cruces | 0 | 5 | 1 |
| Nariño | Mallama (Piedrancha) | ID149. Centro Educativo Mallama | Centro Educativo De Mallama | 0 | 1 | 1 |
| Putumayo | Puerto Asís | ID41.I. E. Rur Caucacia | Esc Rur Mix El Jardin Alto Teteye | 1 | 0 | 1 |
| Putumayo | Puerto Asís | ID57. I. E. Rur Caucacia | Esc Rur Mix El Progreso | 1 | 0 | 1 |
| Putumayo | Pto Leguízamo | ID88. IE Rur Luis Vidales Del Piñuña Negro | ESC RUR MIX PUERTO PRINCIPE DOS | 0 | 1 | 1 |
| Putumayo | Orito | ID127. Institucion Etnoeducativa Rural Umada Wuarrara | ESC RUR MIX ALTO ORITO | 1 | 0 | 1 |
| Putumayo | Puerto Asís | ID172. IE. Rur Caucacia - Sede Principal | SEDE PRINCIPAL | 0 | 6 | 12 |

- **Avance General Componente I:** Terminado 04/04/2024 y recibido
- **Avance General Componente II:** En Ejecución, con inicio 18 de 18.

| Estado | Proyectos |
|---|---|
| Entregados | 17 |
| Terminados | 1 |
| Ejecución | 0 |
| Sin iniciar | 0 |

- **Sede ID125. Piamonte (Cauca),** En energización (ampliación de carga por baja tensión) por la empresa ENERGIA DEL PUTUMAYO, revisión técnica desde el 17/12/2024, reiteración 27/12/2024.

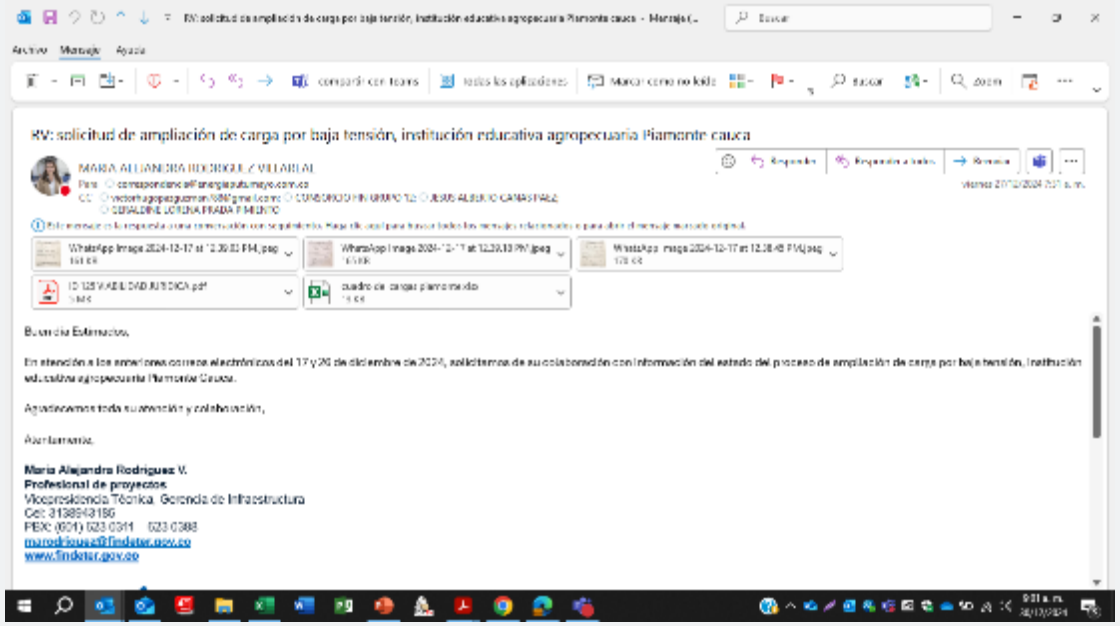


- **Sede ID36. Tallambi (Nariño),** Entregada al rector y comunidad el 26/12/2024

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

## ID1 Pasto, I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - ENTREGADO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Pasto - Nariño |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 262.132.882 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 986 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aulas | 5 | • Mejoramiento y mantenimiento de cubiertas, mampostería (estructura principal y de confinamiento), pisos en general, carpintería metálica y red eléctrica general.<br>• construcción de dos cubiertas para protección de losas existentes y cambio de cubierta en tres aulas de clase, reemplazo de canales. |
| Aulas nuevas | N.A. | N.A. |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | N.A. | |
| Baterías sanitarias nuevas | N.A. | |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 15 de agosto de 2024 |

## Antes





## Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

## ID8 El Rosario, CENTRO EDUCATIVO LA CLAUDIA - ENTREGADO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | El Rosario - Nariño |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 66.208.426 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 8 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aulas | 1 | • Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general.<br>• construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias. |
| Aulas nuevas | N.A. | N.A. |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | N.A. | |
| Baterías sanitarias nuevas | N.A. | |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 24 de junio de 2024 |

## Antes







## Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

## ID26 Acevedo, INSTITUCION EDUCATIVA BATEAS - ENTREGADO

| MUNICIPIO | | Acevedo - Huila |
|---|---|---|
| VALOR DE INVERSIÓN | | $ 278.705.701 |
| POBLACIÓN BENEFICIADA | | 193 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aulas | 5 | • Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general.<br>• construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias.<br>• Mejoramiento de restaurante escolar |
| Aulas nuevas | N.A. | N.A. |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | 1 | • Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general.<br>• construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias. |
| Baterías sanitarias nuevas | N.A. | |
| FECHA DE ENTREGA | | 4 de octubre de 2024 – en proceso de posventas y entrega |

## Antes







## Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

## ID27 Piamonte, ESCUELA RURAL MIXTA LA ESPANOLA - ENTREGADO

| MUNICIPIO | | Piamonte - Cauca |
|---|---|---|
| VALOR DE INVERSIÓN | | $ 82.111.341 |
| POBLACIÓN BENEFICIADA | | 9 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aulas | 1 | • Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general.<br>• construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias. |
| Aulas nuevas | N.A. | N.A. |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | 1 | • Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general.<br>• construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias. |
| Baterías sanitarias nuevas | N.A. | |
| FECHA DE ENTREGA | | 5 de julio de 2024 |

## Antes





## Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

## ID88 Puerto Leguízamo, ESC RUR MIX PUERTO PRINCIPE DOS - ENTREGADO

| MUNICIPIO | | Puerto Leguizamo - Putumayo |
|---|---|---|
| VALOR DE INVERSIÓN | | $ 117.694.769 |
| POBLACIÓN BENEFICIADA | | 5 |
| ALCANCE | | |
| Mejoramientos Aulas | 1 | • Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general.<br>• construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias. |
| Aulas nuevas | N.A. | N.A. |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | 1 | • Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general.<br>• construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias. |
| Baterías sanitarias nuevas | N.A. | |
| FECHA DE ENTREGA | | 1 de agosto de 2024 |

Antes





Después











CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

## ID121 Piamonte, ESC RUR MIX SAN ANDRESITO - ENTREGADO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Puerto Leguizamo - Putumayo |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 117.694.769 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 5 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aulas | 1 | • Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general.<br>• construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias. |
| Aulas nuevas | N.A. | N.A. |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | 1 | • Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general.<br>• construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias. |
| Baterías sanitarias nuevas | N.A. | |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 1 de agosto de 2024 |

## Antes





## Después









# Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

## ID142 Ipiales, ESCUELA LAS CRUCES - ENTREGADO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Ipiales - Nariño |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 112.235.014 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 173 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aulas | 5 | • Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general.<br>• construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias. |
| Aulas nuevas | N.A. | N.A. |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | 1 | • Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general.<br>• construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias. |
| Baterías sanitarias nuevas | N.A. | |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 22 de julio de 2024 |

### Antes



### Después







CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

## ID149 Mallama (Piedrancha), CENTRO EDUCATIVO DE MALLAMA - ENTREGADO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Ipiales - Nariño |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 57.066.573 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 9 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aulas | 1 | • Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general.<br>• construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias + muro de cerramiento |
| Aulas nuevas | N.A. | N.A. |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | 1 | • Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica. |
| Baterías sanitarias nuevas | N.A. | |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 19 de junio de 2024 |

### Antes



### Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

## ID174 Piamonte, E.D.R PORTO GUAYUYACO SEDE PRINCIPAL - ENTREGADO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Piamonte - Cauca |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 214.447.888 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 33 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aulas | 4 | • Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general.<br>• construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias + aula múltiple |
| Aulas nuevas | N.A. | N.A. |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | 1 | • Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica. |
| Baterías sanitarias nuevas | N.A. | |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 16 de agosto de 2024 |

### Antes





### Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

## ID87 Barbacoas, SEDE 9 CUMAINDE - ENTREGADO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Barbacoas - Nariño |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 97.200.260 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 15 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aulas | 1 | • Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general.<br>• construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias + aula múltiple |
| Aulas nuevas | N.A. | N.A. |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | 1 | • Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica. |
| Baterías sanitarias nuevas | N.A. | |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 17 de septiembre de 2024 |

## Antes





## Después









# Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

## ID110 Barbacoas, SEDE 2 BOMBON - ENTREGADO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Barbacoas - Nariño |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 135.500.591 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 39 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aulas | 2 | • Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general.<br>• construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias + aula múltiple |
| Aulas nuevas | N.A. | N.A. |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | 1 | • Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica. |
| Baterías sanitarias nuevas | N.A. | |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 17 de septiembre de 2024 |

## Antes





## Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

## ID173 Piamonte, ESC RUR MIX FRAY EZEQUIEL - ENTREGADO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Piamonte - Cauca |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 193.112.465 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 24 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aula múltiple | 1 | • Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general.<br>• construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias |
| Aulas nuevas | N.A. | N.A. |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | N.A | |
| Baterías sanitarias nuevas | 1 | • Ejecutada dentro del aula |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 6 de septiembre de 2024 |

### Antes





### Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID36 Cumbal, INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCION DE TALLAMBI – ENTREGADO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Cumbal - Nariño |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 818.394.560 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 171 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aula | N.A. | |
| Aulas nuevas | 5 | |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | N.A | |
| Baterías sanitarias nuevas | 7 | |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 26 de diciembre de 2024 |

## Antes






## Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID41 Puerto Asís, I. E. RUR CAUCACIA, ESC RUR MIX EL JARDIN ALTO TETEYE – ENTREGADO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Puerto Asís - Putumayo |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 184.632.555 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 5 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aula | N.A. | |
| Aulas nuevas | 1 | Instalación eléctrica fotovoltaica |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | N.A | |
| Baterías sanitarias nuevas | 1 | |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 3 de diciembre de 2024 |

## Antes





## Después











CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID57 Puerto Asís, I. E. RUR CAUCACIA, ESC RUR MIX EL PROGRESO – ENTREGADO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Puerto Asís - Putumayo |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 197.031.005 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 6 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aula | N.A. | |
| Aulas nuevas | 1 | Instalación eléctrica fotovoltaica |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | N.A | |
| Baterías sanitarias nuevas | 1 | |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 3 de diciembre de 2024 |

## Antes





## Después









# Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID125 Piamonte, INST EDUC AGRIC PIAMONTE (sede principal) – TERMINADO


| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Piamonte - Cauca |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 1.339.389.729 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 850 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aula | 28 | Mejoramiento y mantenimiento de muros, carpintería metálica y red eléctrica general. construcción de cubierta, sistema de drenaje de aguas lluvias. |
| Aulas nuevas | N.A | |
| Mejoramientos Baterías sanitarias + 1 ducha | 3 | Mejoramiento en preescolar + circulación, cerramiento y cubierta en domo |
| Baterías sanitarias nuevas | N.A | |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 3 de diciembre de 2024 |

## Antes





## Después

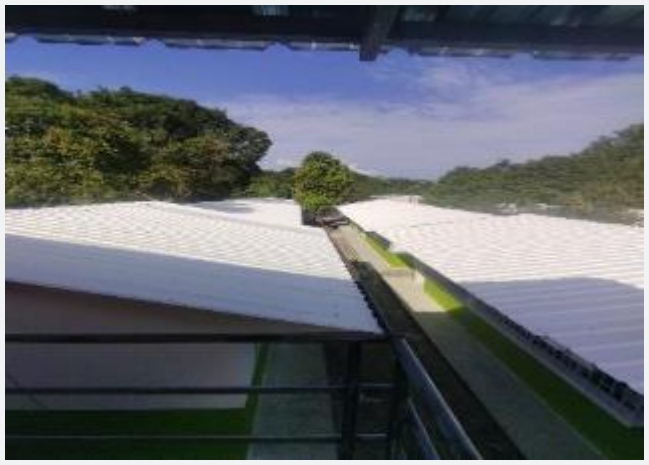







# Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

ID127 Orito, INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL UMADA WUARRARA, MIX ALTO ORITO – ENTREGADO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Orito - Putumayo |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 206.821.177 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 13 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aula | N.A | |
| Aulas nuevas | 1 | Instalación eléctrica fotovoltaica |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | N.A | |
| Baterías sanitarias nuevas | 1 | |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 3 de diciembre de 2024 |

## Antes





## Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 12,Departamentos de Cauca, Huila, Nariño y Putumayo

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 (Julián González 50% Jorge Andrés Chacón 50%)

Contratita Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

## ID172 Puerto Asís, IE. RUR CAUCACIA - SEDE PRINCIPAL– ENTREGADO

| | | |
|---|---|---|
| **MUNICIPIO** | | Puerto Asís - Putumayo |
| **VALOR DE INVERSIÓN** | | $ 224.052.916 |
| **POBLACIÓN BENEFICIADA** | | 161 |
| **ALCANCE** | | |
| Mejoramientos Aulas (2 internado + 4 aulas) | 6 | |
| Aulas nuevas | N.A | |
| Mejoramientos Baterías sanitarias | 12 | • Se incluyo estructura de tanques para mejorar la columna de agua en zonas húmedas en internado por solicitud de comunidad. |
| Baterías sanitarias nuevas | N.A | |
| **FECHA DE ENTREGA** | | 3 de diciembre de 2024 |

## Antes






## Después









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada



Findeter

Banca de Desarrollo Territorial

# GRACIAS

www.findeter.gov.co

@findetercol @findetercol

@findeter linkedin.com/company/findeter

VIGILADO

Hacienda

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada



Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

# MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

## Contrato No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023

**14 FEBRERO DE 2025**

Hacienda

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública


# Contrato No. 4917031-2023

**136** **sedes educativas**
[instalación de aulas y mejoramientos]

**$ 63.650**
Millones de pesos

Fecha inicio: 2/06/2023
Fecha Fin Actual: 01/07/2025

| Grupo | Departamentos / Municipios | Etapa Actual del grupo/% de avance de contrato<br>Fecha de Inicio –Fecha de Terminación |
|---|---|---|
| G1 [10 sedes] | Antioquia \| Chocó | Entregado [100,00%]<br>14/11/2023 - 14/08/2024 |
| G2 [8 sedes] | Atlántico | Entregado [100,00%]<br>27/11/2023 -06/09/2024 |
| G3 [5 sedes] | Magdalena | Liquidado [100,00%]<br>14/11/2023 - 30/04/2024 |
| G4 [5 sedes] | Bolívar | Entregado [100,00%]<br>26/10/2023 - 23/03/2024 |
| G5 [16 sedes] | Bolívar \| Magdalena \| Cesar | Entregado [100,00%]<br>14/11/2023 – 08/11/2024 |
| G6 [7 sedes] | Cesar | Entregado [100,00%]<br>15/11/2023 - 17/05/2024 |
| G7 [13 sedes] | Guajira | Terminado [100,00%]<br>31/05/2024 - 17/01/2025 |
| G8 [9 sedes] | Córdoba \| Bolívar | Entregado [100,00%]<br>08/11/2023 - 23/08/2024 |
| G9 [12 sedes] | Santander \| Bolívar \| Bogotá \| Arauca \| Tolima \| Meta \| Cundinamarca \| Nte de Santander | En obra[33,97%]<br>23/08/2024 - 08/03/2025 |
| G10 [15 sedes] | Cauca \| Chocó \| Valle Del Cauca | En Obra [90,22%]<br>19/02/2023 - 30/12/2024 |
| G11 [18 sedes] | Cauca | Terminado [100,00%]<br>12/02/2023 - 27/11/2024 |
| G12 [18 sedes] | Nariño \| Putumayo \| Cauca | Terminado [100,00%]<br>20/02/2023 - 04/12/2024 |
| Dotación | 46 Sedes a dotar - 99 aulas | Suspendido[100,00%]<br>03/10/2024 – 03/12/2024 |

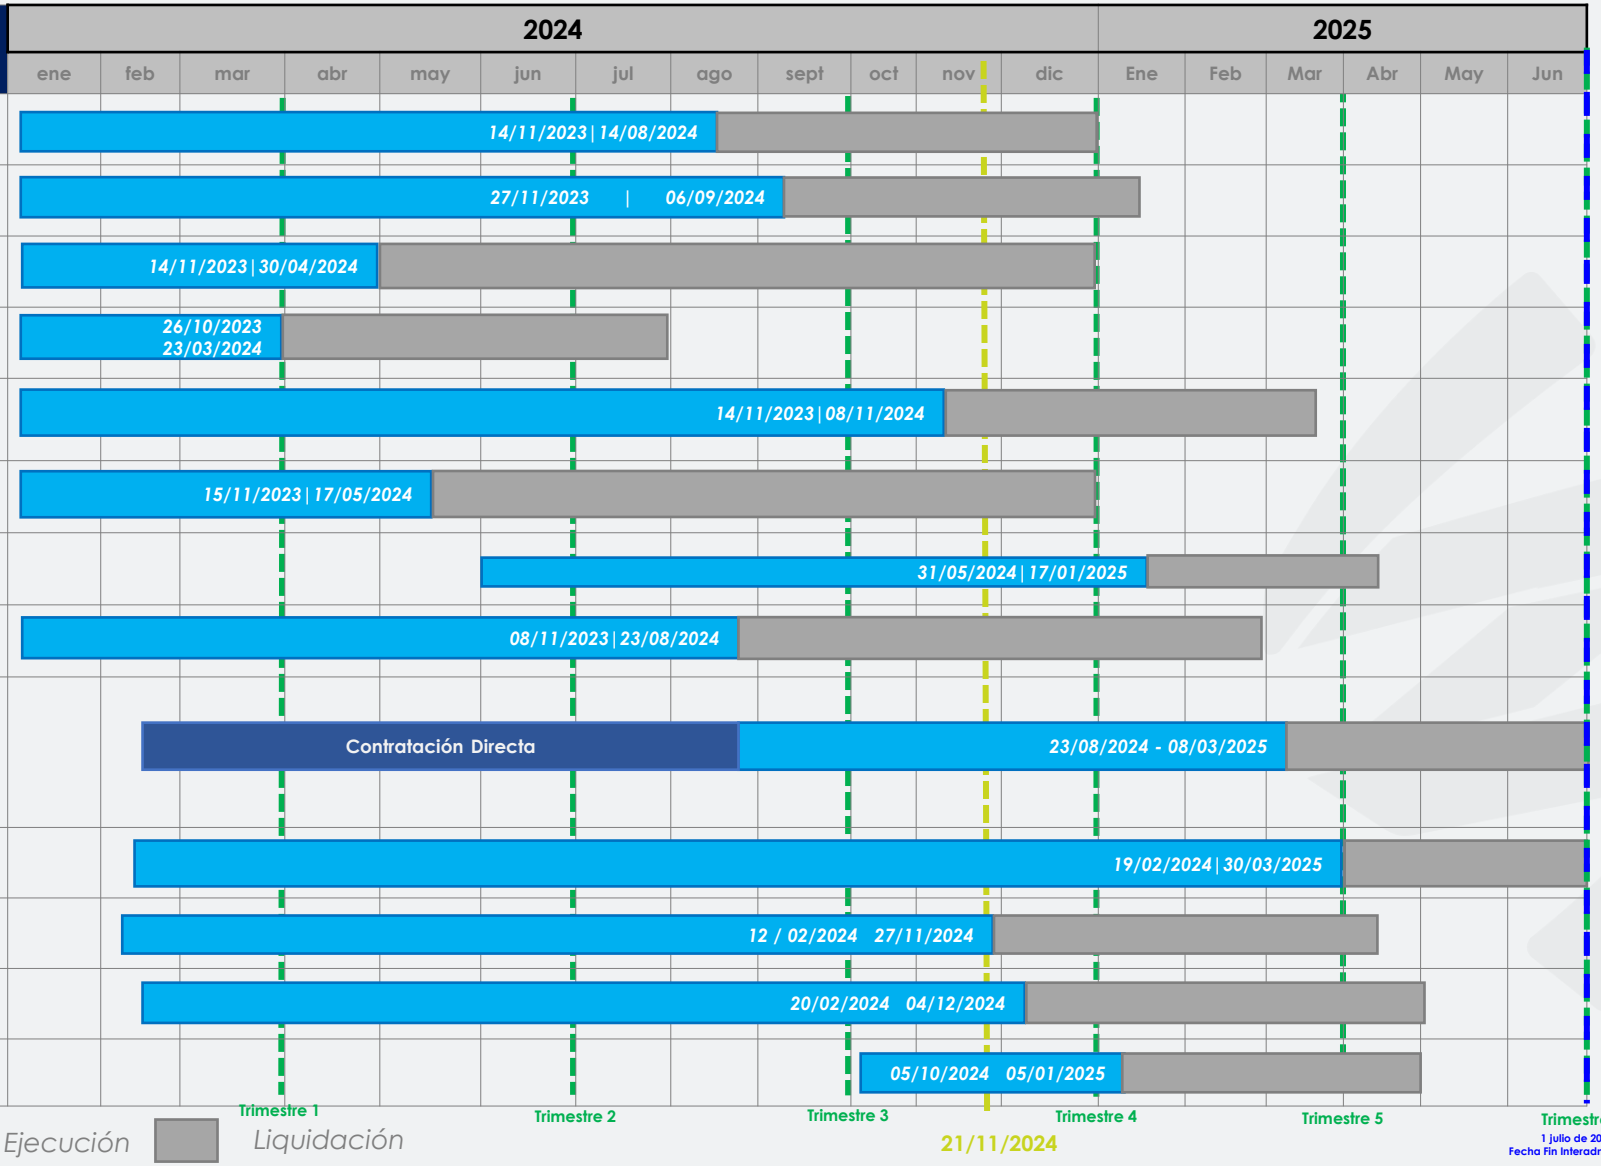


Convocatoria | Llegalización | Ejecución | Liquidación

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

# Aulas Móviles
# Contrato No. 4917031-2023

Educación

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**136** **sedes educativas**
[instalación de aulas y mejoramientos]

**$ 63.650**
Millones de pesos

Fecha inicio: 02/06/2023
Fecha Fin: 01/07/2025

**ENTREGADAS** 116 sedes 85,29%


**TERMINADAS** 5 sedes 3,68%

*Físicamente culminadas. A la espera de firma de actas para ser entregadas*

**EN EJECUCIÓN** 15 sedes 9,56%

**POR INICIAR** 2 sedes 1,47%

## Estado de entrega y ejecución de Sedes

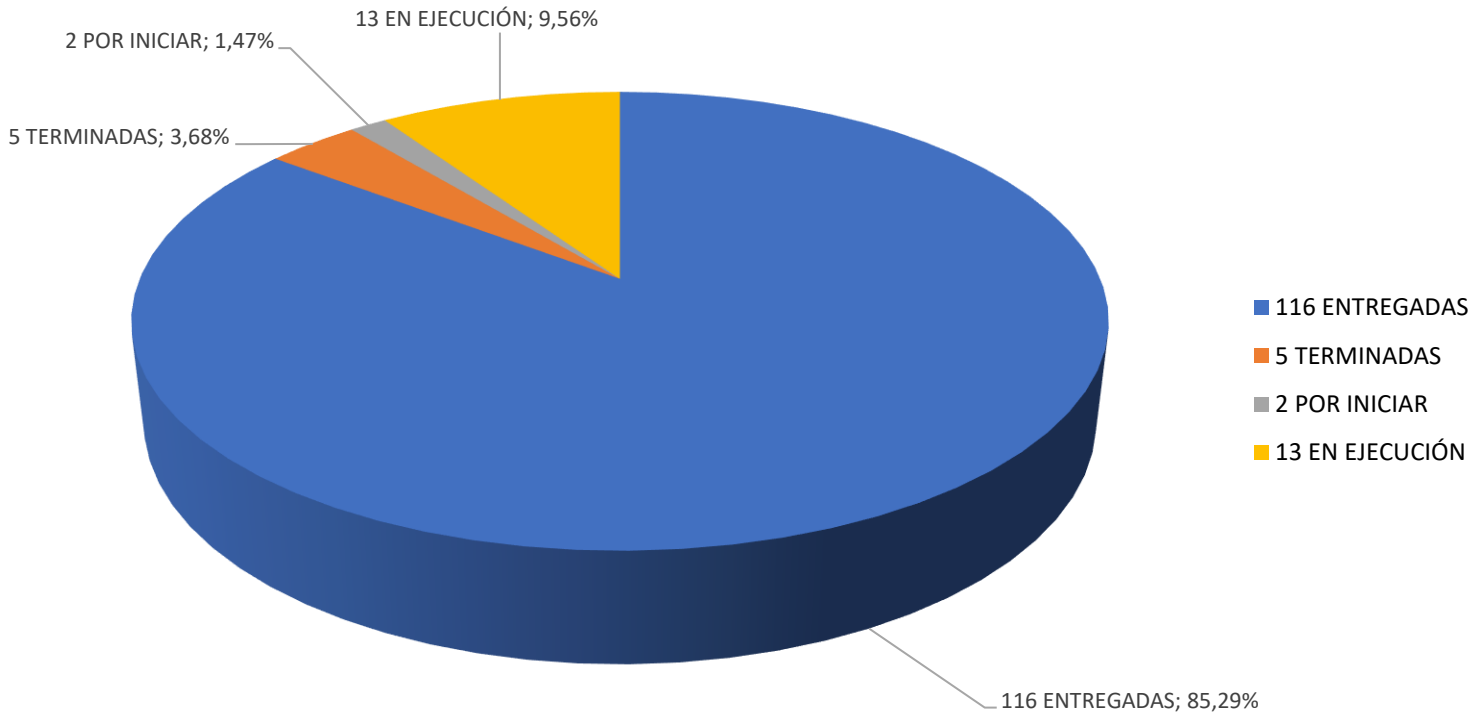


CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Estado de entrega y ejecución de Sedes

**136** **sedes educativas**
[instalación de aulas y mejoramientos]

**$ 63.650**
Millones de pesos

Fecha inicio: 02/06/2023
Fecha Fin: 01/07/2025

| ENTREGADAS | TERMINADAS | EN EJECUCIÓN | POR INICIAR |
|---|---|---|---|
| 116 sedes<br>85,29% | 5 sedes<br>3,68% | 13 sedes<br>9,56% | 2 sedes<br>1,47% |
| Grupo 1 - 10<br>Grupo 2 - 8<br>Grupo 3 - 5<br>Grupo 4 - 5<br>Grupo 5 - 16<br>Grupo 6 - 7<br>Grupo 7- 13<br>Grupo 8 - 9<br>Grupo 10 - 10<br>Grupo 11 - 16<br>Grupo 12 - 17 | Grupo 9 - 1<br>Grupo 10 - 1<br>Grupo 11 - 2<br>Grupo 12 - 1 | Grupo 9 - 9<br>Grupo 10 - 4 | Grupo 9 - 2<br>Grupo 10 - 4 |

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

# PAGOS ASISTENCIA TECNICA

**136** **sedes educativas**
[instalación de aulas y mejoramientos]

**$ 63.650**
Millones de pesos

Fecha inicio: 02/06/2023
Fecha Fin: 01/07/2025

## VALOR AT

$ 4.164.018.692

| Cobrado (a dic de 2024) | Pagado (a dic de 2024) | SALDO |
|---|---|---|
| $3.585.749.431,31 | $3.585.749.431, 31 | $ 578.269.260,69 |

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

# Resumen Informe Financiero – Corte 31 de diciembre de 2024

**136** **sedes educativas**
[instalación de aulas y mejoramientos]

**$ 63.650**
Millones de pesos

Fecha inicio: 02/06/2023
Fecha Fin: 01/07/2025

## VALOR EJECUTADO

$ 49.435 mll

## VALOR POR EJECUTAR

$ 14.573 mll

## VALOR COMPROMETIDO

$ 59.515 mll

## SALDO

$ 398,2 mll*

*El saldo es a corte de 09 de febrero de 2025

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

# Rendimientos Financieros – Relación de Pagos

Educación


**Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031**
**Ministerio de Educación Nacional**
**Financiera del Desarrollo S.A.**
**7. RENDIMIENTOS FINANCIEROS**
**01 de diciembre al 31 de diciembre de 2024**

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| FECHA | RENDIMIENTOS CAUSADOS CUENTA DE AHORRO | VALORACIÓN /DESVALORIZACION CAUSADOS FONDO DE INVERSION COLECTIVA - FIC | TOTAL RENDIMIENTOS, VALORACION DEVALORIZACION CAUSADOS | FECHA TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS | VALOR TRASLADO RENDIMIENTOS | AJUSTES / RETENCIONES | SALDO PENDIENTE POR TRASLADAR RENDIMIENTOS | DESVALORIZACION ACUMULADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ago-23 | 82.351.406,35 | 443.947.650,01 | **526.299.056,36** | | | | - | - |
| sep-23 | 108.927.246,74 | 548.880.836,71 | **657.808.083,45** | | | | - | - |
| oct-23 | 131.902.760,66 | 436.008.307,20 | **567.911.067,86** | | | | - | - |
| nov-23 | 144.907.033,92 | 718.224.229,49 | **863.131.263,41** | | | | - | - |
| dic-23 | 143.221.271,36 | 788.090.860,63 | **931.312.131,99** | 13/12/2023 | **2.615.149.472,00** | | - | - |
| ene-24 | 133.626.379,48 | 427.858.051,59 | **561.484.431,07** | 10/01/2024 | **931.312.131,99** | | - | - |
| feb-24 | 120.547.529,88 | 474.970.095,24 | **595.517.625,12** | 12/02/2024 | **561.484.430,15** | | - | - |
| mar-24 | 117.745.976,50 | 478.495.863,61 | **596.241.840,11** | 12/03/2024 | **595.517.625,12** | | - | - |
| abr-24 | 100.331.907,69 | 259.736.382,70 | **360.068.290,39** | 10/04/2024 | **596.241.840,11** | | - | - |
| may-24 | 89.374.457,56 | 353.632.163,66 | **443.006.621,22** | 11/05/2024 | **360.068.290,39** | | - | - |
| jun-24 | 76.820.331,89 | 266.323.590,41 | **343.143.922,30** | 13/06/2024 | **443.006.621,22** | | - | - |
| jul-24 | 68.012.790,67 | 294.233.627,01 | **362.246.417,68** | 15/07/2024 | **343.143.922,30** | | - | - |
| ago-24 | 21.741.419,32 | 313.006.436,96 | **334.747.856,28** | 14/08/2024 | **362.246.417,68** | | - | - |
| sep-24 | 20.861.120,00 | 192.185.501,19 | **213.046.621,19** | 10/09/2024 | **334.747.856,28** | | - | - |
| oct-24 | 27.022.756,52 | 71.175.915,03 | **98.198.671,55** | 18/10/2024 | **213.046.621,19** | | - | - |
| nov-24 | 21.729.373,21 | 129.213.183,82 | **150.942.557,03** | 13/11/2024 | **98.198.671,55** | | - | - |
| dic-24 | 19.252.522,64 | 66.886.746,40 | **86.139.269,04** | 10/12/2024 | **150.942.557,03** | | **86.139.269,04** | - |
| **TOTAL** | **1.428.376.284,39** | **6.262.869.441,66** | **7.691.245.726,05** | | **7.605.106.457,01** | - | **86.139.269,04** | - |

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

# Rendimientos Financieros – Comprobante de pago

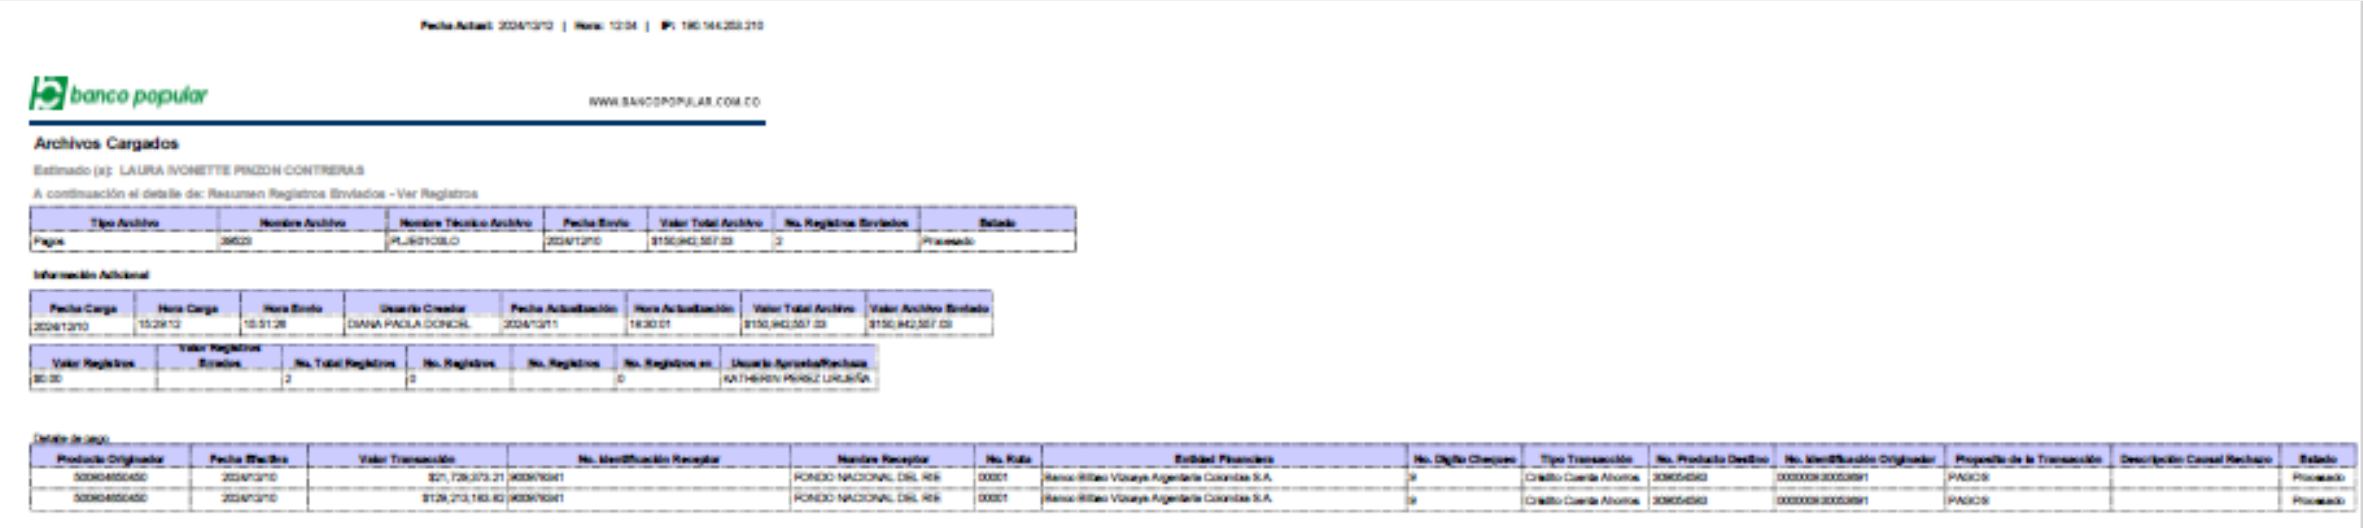

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

**Archivos Cargados**

Estimado (a): LAURA IVONETTE PINZON CONTRERAS

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

| Tipo Archivo | Nombre Archivo | Nombre Técnico Archivo | Fecha Envío | Valor Total Archivo | No. Registros Enviados | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagos | 39520 | PLJ521C08.O | 2024/12/10 | $150,842,557.03 | 2 | Procesado |

Información Adicional

| Fecha Carga | Hora Carga | Hora Envío | Usuario Creador | Fecha Actualización | Hora Actualización | Valor Total Archivo | Valor Archivo Enviado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/10 | 15:29:12 | 15:51:26 | DIANA PAOLA DONCEL | 2024/12/11 | 18:30:01 | $150,842,557.03 | $150,842,557.03 |

| Valor Registros | Valor Registros Enviados | No. Total Registros | No. Registros | No. Registros | No. Registros en | Usuario Aprueba/Rechaza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | | 2 | 0 | | 0 | KATHERIN PEREZ URUEÑA |

Detalle de pago

| Producto Originador | Fecha Efectiva | Valor Transacción | No. Identificación Receptor | Nombre Receptor | No. Rubi | Entidad Financiera | No. Dígito Chequeo | Tipo Transacción | No. Producto Destino | No. Identificación Originador | Propósito de la Transacción | Descripción Causal Rechazo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309054650450 | 2024/12/10 | $21,728,073.21 | 900976041 | FONDO NACIONAL DEL RIE | 00001 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. | 9 | Crédito Cuenta Ahorros | 309054583 | 0000009300539891 | PAGOS | | Procesado |
| 309054650450 | 2024/12/10 | $128,213,183.82 | 900976041 | FONDO NACIONAL DEL RIE | 00001 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. | 9 | Crédito Cuenta Ahorros | 309054583 | 0000009300539891 | PAGOS | | Procesado |

**NOTA: Teniendo en cuenta el contrato MEN-4917031 2023 -TEMPORADA DE LLUVIAS, y en atención a la obligación descrita en la cláusula tercera, Obligaciones específicas del contratista, Numeral 8 el cual dice:**

*"8. El Patrimonio Autónomo — Findeter deberá reintegrar mensualmente los rendimientos financieros (si los hubiere) a la Dirección del Tesoro Nacional o en los términos que establezca la normatividad aplicable, es decir, que no ingresan ni hacen parte del Patrimonio Autónomo constituido por Findeter."*

**Se han consignado los rendimientos financieros a la siguiente cuenta:**

- **Banco:** BBVA
- **Tipo:** Ahorros
- **No. Cuenta:** 309-054583
- **Nombre de la Cuenta:** FIDUPREVISORA S.A FNGRD – COLOMBIA VITAL

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

# AULAS MOVILES
# INFORME DETALLADO POR GRUPO DE INTERVENCION

Febrero 14 de 2025



NGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Educación

Colombia Vital

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# CONTRATOS EN EJECUCION

| GRUPO | Departamento | No SEDES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | % PROGRAMADO | % EJECUTADO | ALERTAS, ASUNTOS PENDIENTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRUPO 9** | Arauca, Bolívar, Cundinamarca Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima y Bogotá D.C. | **12** | 23/08/2024 | 08/03/2025 | 82,61% | 47,90% | Se han presentado inconvenientes por precipitaciones para los proyectos ubicados en el Tolima, lo cual está generando que se tenga que solicitar una prórroga por dos (2) meses y quince (15) días calendario para la culminación de actividades en estas sedes.<br><br>Se han presentado demoras en la ejecución de actividades e inicio de obras en algunas sedes educativas, lo cual a la fecha genera un alto atraso; por lo anterior, se inició proceso de apremio el cual fue notificado por la fiduciaria el 03 de febrero de 2025 y se presentaron descargos el día 11/02/2024, los cuales están siendo analizados por la interventoría para la continuación del mismo. |
| **GRUPO 10** | Cauca, Valle del Cauca y Choco | **15** | 19/02/2024 | 30/03/2025 | 89,07% | 86,23% | Los proyectos del Cauca se han visto afectados por temas de orden público en los últimos días de enero y primeros de febrero, lo cual han generando suspensión actividades parciales y retiro de personal trabajador por temor a la situación, hechos que han afectado los avances de los proyectos y actualmente están generando atrasos frente a la programación. Adicional el proyecto de Santander de Quilichao se encuentra en avance a su programación pero pendiente de que la administración municipal construya las acometidas para realizar las conexiones pertinentes por parte del proyecto, se ha reiterado al solicitud y necesidad de la misma, sobre la cual informan que se encuentran adelantando los tramites para abrir la convocatoria y adjudicar el contrato, ya que en el mes de diciembre adelantaron este proceso pero el mismo se declaro desierto. |

CCOM-FO-005 V1 / 05-Ago-2024 / Publica

# Grupo 09

Fecha inicio: 23/08/2024
Fecha Fin: 08/03/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | |
|---|---|
| ***Departamento*** | **Arauca, Bolívar, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima y Bogotá D.C.** |
| **$** | **Valor Inicial**<br>Obra: $ 4.810.476.306,00<br>Interventoría: $ 313.800.000 |
| | **Adiciones**<br>Obra: $ 0<br>Interventoría: $165.685.393,30 |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: CI- $245.711.234,70<br>CII - $ 1.177.717.523,99<br>Interventoría: CI - $0<br>CII - $ 96.927.168,55 |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | Otrosí No. 1: Retiro de tres (3) sedes del alcance<br>Otrosí No. 2: Prórroga tres (3) meses obra e interventoría, adición interventoría por $165.685.393,30 |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | El contratista se retrasó en el inicio de las obras en todas las sedes educativas; se han iniciado actividades en algunas sedes educativas faltantes, sin embargo, esto no mitiga los atrasos que tiene el contrato. A la fecha se tienen en ejecución 10 de las 12 sedes educativas.<br><br>Se encuentra en espera de presentación de descargos por parte del contratista e informe de la interventoría para continuación de aplicación de apremio.<br>Se presenta la necesidad de hacer una prórroga por 2,5 meses para las sedes ubicadas en el departamento del Tolima por los inconvenientes en transporte que se han presentado. |

**47,90%**
**Porcentaje de avance**

**82,61%**
**Porcentaje Programado**

| | |
|---|---|
| **Sedes:** | **12** |
| En ejecución: | 10 |
| Por iniciar: | 2 |

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Grupo 09


## COLEGIO UNIVERSITARIO - ID No. 7




## IE DEL CERRO DE VERACRUZ -ID No. 124




## CENTRO EDUCATIVO MONSERRATE - ID No. 138
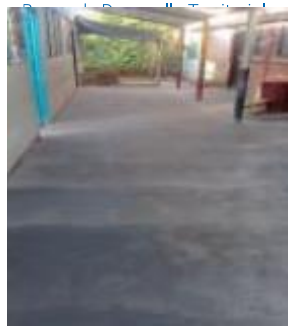
## CENTRO EDUCATIVO LA PAVA - ID No. 56




## ESCUELA SIETE DE AGOSTO - ID No. 96




## SEDE LA PEÑA – ID No. 132




## EL DESCANSO - ID No. 104




## CAMPO PAYARES -ID No. 123




CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Grupo 10

**Fecha inicio:** 19/02/2024
**Fecha Fin:** 30/03/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | |
|---|---|
| *Departamento* | **Cauca, Valle del Cauca y Choco** |
| **$** | **Valor Inicial**<br>Obra: $6.014.978.800<br>Interventoría: $327.496.568 |
| | **Adiciones**<br>Obra: $602.576.550<br>Interventoría: $197.588.004,15<br>($79.155.973,39 asumidos por el contrato de obra)<br>($118.432.030,76 asumidos por el contrato interadministrativo) |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $5.620.758.289,00<br>Interventoría: $394.815.767,36 |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | 3 otrosíes obra: Prórrogas (9 meses y 27 dias)<br>3 otrosíes interventoría: Prórrogas (9 meses y 27 dias)<br>y adiciones ($197.588.004,15) |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | En cumplimiento al alcance se tienen 11 sedes entregadas y AEP&SC suscritas, y 4 sedes en ejecución, (2 Suarez, 1 Santander de Quilichao, 1 Bahía Solano). Se adelanta programa para realizar la entrega de la sede la Huaca en Bahía solano de la semana del 18 al 21 si se logra coordinar la agenda con el rector, frente a las obras de Suarez y Santander de Quilichao se continua con el avance de actividades con un personal mínimo derivado de los temas de orden publico que están afectando los avances de los proyectos y se evalúa una no posible terminación dentro de los tiempos contractuales. |

**86,23%**
**Porcentaje de avance**

**89,07%**
**Porcentaje Programado**

| | |
|---|---|
| **Sedes:** | **15** |
| En ejecución: | 4 |
| Por iniciar: | 0 |
| Entregadas: | 11 |

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## INSTITUCION E.TECNICA AGRARIA SEDE PRINCIPAL ID MEN. 188.






## INSTITUCION E.TECNICA AGRARIA SEDE INMACULADA ID MEN. 189.




## INSTITUCION E.TECNICA AGRARIA SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ID MEN. 190
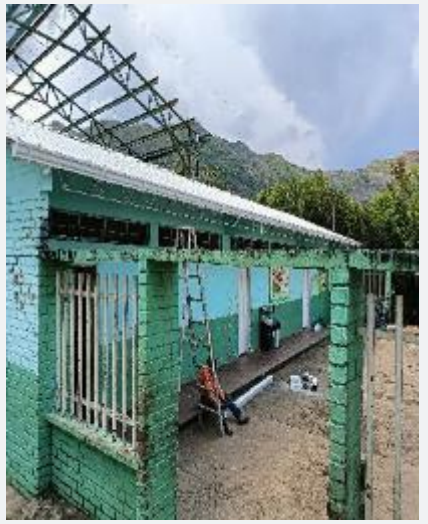
## INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PLAYA ID MEN: 12. MUNICIPIO DE TORIBIO ID MEN: 12.




## INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO SEDE DOMINGO LASSO ID 164.




## INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO SEDE PRINCIPAL ID 16




CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE JOHN F. KENNEDY




## IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDEJULIAN MENDOZA GUERRERO




## IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE PRINCIPAL




## IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE LA HONDA .




## IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE LA PLANTA .




## IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE CRISTOBAL COLÓN




lica

# Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## IE. LUIS LOPEZ DE MESA SEDE SAN JOSE (HUACA)





## IE. LUIS LOPEZ DE MESA SEDE SECUNDINO RIVAS




## IE. LUIS LOPEZ DE MESA SEDE SIRENA DEL MAR




CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# CONTRATOS SUSPENDIDOS

| GRUPO | Departamento | No SEDES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **DOTACIÓN** | Antioquia, Atlántico, Bolivar, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Putumayo, Santander, Tolima, Valle del Cauca | **46** | 03/10/2024 | 02/12/2024 | Valor del contrato inicial de $584.310.000,00 y otro sí proyectado de $364.000.000 y adición de 3 meses por las condiciones de accesibilidad de las nuevas sedes. Contrato Suspendido para la incorporación de los recursos. Se realiza el Otro Sí y se citará a comité la 3era semana del mes de febrero.<br><br>Dotación entregada en los grupos 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 y 11 y, pendiente la entrega de los grupos 5, 7, 9, 10 y 12.<br><br>La ejecución se realiza en 16 departamentos, 38 municipios y se realiza la dotación de 99 aulas nuevas construidas. |

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Estado Entrega de Dotación



**CENTRO EDUCATIVO INDIGENA CAÑO PADILLA YUKPA**
Sede El Coso La Paz – Cesar



**INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO**
Sede Escuela Nueva Parcelas Londres
Ayapel - Córdoba



**INSTITUCION EDUCATIVA EL PALMAR**
Escuela Nueva Mixta Divino Salvador
Monte Líbano - Córdoba



**INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO**
Sede Principal Santander de Quilichao - Cauca



**INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA ERM MARIA AUXILIADORA** Sede
Sebastián de Buenavista - Magdalena



**INSTITUCION EDUCATIVA TIERRA FIRME**
Mompox - Bolivar

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# CONTRATOS TERMINADOS

| GRUPO | Departamento | No SEDES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **GRUPO 11** | Cauca | **18** | 12/02/2024 | 27/11/2024 | Contratista avanza en las gestiones de entrega a Directivos de las sedes terminadas y recibidas por interventoría, las cuales son Santa Teresita en el municipio de Rosas y Francisco Javier sede Garay en el municipio de la Vega. Inicialmente el recibo de estas sedes se atrasó debido al periodo de vacaciones de los Directivos, y una vez reanudado el año escolar se informaron posventas en algunos espacios. En la IE Francisco Javier sede Garay las posventas ya fueron atendidas y se esta gestionando la firma del acta de recibo por parte del Rector. En la IE Santa Teresita están próximos a terminar la subsanación de las posventas informadas. |
| **GRUPO 12** | Cauca, Huila, Nariño y Putumayo | **1** | 20/02/2024 | 05/12/2024 | Contratista avanza en las gestiones de entrega a Directivos de las sedes terminadas y recibidas por interventoría, las cuales son Santa Teresita en el municipio de Rosas y Francisco Javier sede Garay en el municipio de la Vega. Inicialmente el recibo de estas sedes se atrasó debido al periodo de vacaciones de los Directivos, y una vez reanudado el año escolar se informaron posventas en algunos espacios. En la IE Francisco Javier sede Garay las posventas ya fueron atendidas y se esta gestionando la firma del acta de recibo por parte del Rector. En la IE Santa Teresita están próximos a terminar la subsanación de las posventas informadas. |

CCOM-FO-005-V1.1/05-Ago-2024/-Pública

# Grupo 11

Fecha inicio: 12/02/2024
Fecha Fin: 27/11/2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | |
|---|---|
| ***Departamento*** | **Cauca** |
| **$** | **Valor Inicial**<br>Obra: $ 4.728.021.810<br>Interventoría: $ 312.927.160 |
| | **Adiciones**<br>Obra: $ 0<br>Interventoría: $ 99.972.853,00<br>($ 54.867.110,00 asumidos por el contrato de obra)<br>($ 45.105.743,00 asumidos por el contrato interadministrativo) |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $ 4.721.624.076,00<br>Interventoría: $ 379.820.020,17 |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | 3 otrosíes obra: Prórrogas (6 meses)<br>3 otrosíes interventoría: Prórrogas y adiciones (6 meses - $ 99.972.853,00) |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | Contratista avanza en las gestiones de entrega a Directivos de las sedes terminadas y recibidas por interventoría, las cuales son Santa Teresita en el municipio de Rosas y Francisco Javier sede Garay en el municipio de la Vega. Inicialmente el recibo de estas sedes se atrasó debido al periodo de vacaciones de los Directivos, y una vez reanudado el año escolar se informaron posventas en algunos espacios. En la IE Francisco Javier sede Garay las posventas ya fueron atendidas y se esta gestionando la firma del acta de recibo por parte del Rector. En la IE Santa Teresita están próximos a terminar la subsanación de las posventas informadas. |







CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial




I.E. Agropecuaria Santa Rita – Sede principal
La vega




C.E. Buenos Aires – Sede Capitanes
Balboa




C.E. Guillermo León Valencia – Sede La Despensa
Rosas





C.E. Guillermo León Valencia – El Altillo
Rosas

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada
CCOM-FO-005 V1 / 05 - Ago-2024 / Pública

# Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO




I.E. El Carmen – Sede principal
Bolívar





I.E. Alfonso Córdoba – Sede Las Yerbas
Rosas




I.E. Alfonso Córdoba – Sede Bellavista
Rosas




I.E. Técnica Agropecuaria Nuestra Señora de los
Remedios - Bolívar

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada
CCOM-FO-005 V1 / 05 - Ago-2024 / Pública

# Grupo 12

Fecha inicio: 12/02/2024
Fecha Fin: 05/12/2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | |
|---|---|
| ***Departamento*** | **Cauca, Huila, Nariño y Putumayo** |
| **$** | **Valor Inicial**<br>Obra: $ 4.918.276.400,00<br>Interventoría: $ 318.105.088,00 |
| | **Adiciones**<br>Obra: $ 0<br>Interventoría: $ 152,015,642,00 |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $ 4.906.706.463,00<br>Interventoría: $ 413.123.412 |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | 2 otrosíes obra: Prórrogas (6 meses)<br>2 otrosíes interventoría: Prórrogas y adiciones (6 meses - $ 152,015,642,00) |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | Total de 18 sedes, entregadas a satisfacción con recibo de interventoría y rectores de 17 sedes y pendiente la entrega de 1 sede en Piamonte ID 125. Inst Educ Agric Piamonte – Cauca, se encuentra pendiente recibo por el rector, se solicitó acompañamiento a Cobertura, Secretaria de Educación del Cauca y MEN para realizar la suscripción el día 14/02/2025. Se solicitó a la empresa de energía del Putumato y Alcaldía realizar los trámites necesarios sobre la ampliación de carga de la institución, dado que las obras realizadas por este contrato son de mejoramiento y no afecto la carga actual de la institución. Se solicita compromiso para realizar trámite por la Secretaria de Planeación de Piamonte – Cauca y reunión seguimiento 18/02/2025. |







CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Estado GRUPO 12, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO




ID1 Pasto, Nariño - I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE




ID8 El Rosario - Nariño, CENTRO EDUCATIVO LA CLAUDIA




ID26 Acevedo, Huila - INSTITUCION EDUCATIVA BATEAS




ID27 Piamonte - Cauca, ESCUELA RURAL MIXTA LA ESPANOLA

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada
CCOM-FO-005 V1 / 05 - Ago-2024 / Pública

# CONTRATOS ENTREGADOS

| GRUPO | Departamento | No SEDES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Grupo 1** | Antioquia, Chocó | **10** | 14/11/2023 | 14/08/2024 | • CONTRATO PAF-MENAM-O-049-2023: Liquidación realizada el 31.01.2025.<br>• CONTRATO PAF-MENAM-I-052-2023: Terminado el 29.10.2024 - Liquidación radicada el 2 de diciembre de 2024, mediante prisa INC 2024-002246, asignación liquidador Mireya Artunduaga, el 11.02.2025 se traslada a revisión y VoBo de la Fiduciaria Popular para solicitar Firmas, proceso que se proyecta se de en la semana al 15 de febrero de 2025. |
| **Grupo 2** | Atlántico | **8** | 27/11/2023 | 05/09/2024 | CONTRATO PAF-MENAM-O-050-2023: Terminado el 05.09.2024<br>CONTRATO PAF-MENAM-I-053-2023: Terminado el 05.11.2024<br>**AERS COMPONENTE 2:**<br>• Contrato de obra suscrita el 10.02.2025 y en proceso de actualización de pólizas para revisión y aprobación por parte de la Fiduciaria Popular.<br>• Contrato de interventoría en proceso de revisión para presentar a firmas, proceso que se espera se de en la semana del 17 al 21 de febrero de 2025<br>En recopilación documental, cierre de balances y memorias entre el contratista e interventoría, se proyecta radicar la liquidación del contrato de obra al 28 de febrero de 2025 y posterior la de interventoría. |

CCOM-FO-005 V1 / 05 Ago 2024 / Pública

# CONTRATOS ENTREGADOS

| GRUPO | Departamento | No SEDES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Grupo 4** | Magdalena y Bolívar | **7** | 24/10/2023 | 07/02/2024 | Se encuentra liquidado el contrato de obra. El contrato de interventoría iniciará su trámite de liquidación una vez que quede desembolsado el último pago. |
| **Grupo 5** | Magdalena y Bolívar | **16** | 14/11/2023 | 08/11/2024 | CONTRATO PAF-MENAM-O-053-2023: Terminado el 08.11.2024<br>CONTRATO PAF-MENAM-I-056-2023: Terminado el 08.01.2025<br>**AERS COMPONENTE 2:**<br>• Contrato de Obra e Interventoría, en proceso de revisión y VoBo por parte de la Fiduciaria Popular, para pasar a firmas, una vez se tenga las AERS suscritas se procederá a solicitar la actualización de pólizas.<br>En recopilación documental, cierre de balances y memorias entre el contratista e interventoría, se proyecta radicar la liquidación del contrato de obra al 15 de marzo de 2025 y posterior la de interventoría. |
| **Grupo 7** | La Guajira | **13** | 31/05/2024 | 17/01/2025 | Se encuentra en elaboración por parte de la interventoría el AERS del componente II para tramitar firma ante fidupopular. El contrato de obra iniciará su trámite de liquidación una vez que quede desembolsado el último pago; el cual deben facturar a inicios de marzo y pagado a finales de marzo 2025. Con respecto a la interventoría le falta facturar casi un 60% y se estima si liquidación para iniciar a finales de abril 2025. |
| **Grupo 8** | Córdoba y Bolívar | **9** | 08/11/2023 | 08/07/2024 | En expedición el acta de liquidación del contrato. En consolidación la información del contrato de interventoría. Se proyecta su liquidación en el mes de marzo |

CCOM-FO-005-V1.1-05-Ago-2024-Publica

# Grupo 1

**Fecha inicio:** 14/11/2023
**Fecha Fin:** 14/08/2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | |
|---|---|
| ***Departamento*** | **Antioquia, Chocó** |
| **$** | **Valor Inicial**<br>Obra: $3.447.332.359<br>Interventoría: $271.455.247 |
| | **Adiciones**<br>Obra: $201.152.963<br>Interventoría: $53.764.065,32<br>($28.580.295 asumidos por el contrato de obra)<br>($25.183.770,32 asumidos por el contrato interadministrativo) |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $3.425.566.080,21<br>Interventoría: $300.482.403,41 |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | 2 otrosíes obra: Prórrogas (5 meses y 15 dias) y adición ($$201.152.963)<br>2 otrosíes interventoría: Prórrogas (6 meses) y adiciones ($53.764.065,32) |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | • CONTRATO PAF-MENAM-O-049-2023: Liquidación realizada el 31.01.2025.<br>• CONTRATO PAF-MENAM-I-052-2023: Terminado el 29.10.2024 - Liquidación radicada el 2 de diciembre de 2024, mediante prisa INC 2024-002246, asignación liquidador Mireya Artunduaga, el 11.02.2025 se traslada a revisión y VoBo de la Fiduciaria Popular para solicitar Firmas, proceso que se proyecta se de en la semana al 15 de febrero de 2025. |

**100%**
**Porcentaje de avance**

**100%**
**Porcentaje Programado**

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Publica

# GRUPO 1, Departamentos de Antioquia – Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL GUINEO - SEDE CE EL OSITO - ID No. 161




## INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO ID No. 118




## INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS ID No. 66




## INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO ID No. 86




## INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS SEDE EU JESÚS MORA ID No. 112




## INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MARTÍN DE PORRES SEDE EU GONZALO MEJÍA




CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# GRUPO 1, Departamentos de Antioquia – Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA HERRÁN SEDE CER PAULINA PUERTA
ID No. 42






## INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROAMBIENTAL SEDE MARÍA AUXILIADORA DE MANUNGARA
ID No. 150





## INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR DEMETRIO SALAZAR CASTILLO SEDE CE ESCUELA FRANCISCO MIRANDA





## CENTRO EDUCATIVO PUEBLO NUEVO SEDE PRINCIPAL
ID No. 94








CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Grupo 2

**Fecha inicio:** 27/11/2023
**Fecha Fin:** 05/09/2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| *Departamento* | **Atlántico** |
|---|---|
| **$** | **Valor Inicial**<br>Obra: $4.044.124.630<br>Interventoría: $295.715.000 |
| | **Adiciones**<br>Obra: $ 0,00<br>Interventoría: $113.699.014<br>($57.808.105,6 asumidos por el contrato de obra)<br>($55.890.908,4 asumidos por el contrato interadministrativo) |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $4.028.747.780,96<br>Interventoría: $374.270.637,53 |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | 3 otrosíes obra: Prórrogas (5 meses y 5 dias)<br>3 otrosíes interventoría: Prórrogas (5 meses y 5 dias) y adiciones ($113.699.014) |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | CONTRATO PAF-MENAM-O-050-2023: Terminado el 05.09.2024<br>CONTRATO PAF-MENAM-I-053-2023: Terminado el 05.11.2024<br><br>AERS COMPONENTE 2:<br>• Contrato de obra suscrita el 10.02.2025 y en proceso de actualización de pólizas para revisión y aprobación por parte de la Fiduciaria Popular.<br>• Contrato de interventoría en proceso de revisión para presentar a firmas, proceso que se espera se de en la semana del 17 al 21 de febrero de 2025<br><br>En recopilación documental, cierre de balances y memorias entre el contratista e interventoría, se proyecta radicar la liquidación del contrato de obra al 28 de febrero de 2025 y posterior la de interventoría. |







CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

**Contratista de Diseño y Obra:** PAF-MENAM-O-050-2023 CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 - G2
**Contratista interventor:** PAF-MENAM-I-053-2023 RM INGENIEROS S A S

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE PRINCIPAL - ID EN 018




## INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE PRINCIPAL - ID EN 018




## INSTITUCION EDUCATIVA BLAS TORRES DE LA TORRE (ITIDA) - ID MEN 144




## INSTITUCION EDUCATIVA DE MESOLANDIA - ID MEN 197




## INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS, LAS TABLAS Y PITA, SEDE PITA - ID MEN 092




## INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS, LAS TABLAS Y PITA, SEDE LAS TABLAS - ID MEN 083




## INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE VILLA ROSA, SEDE LA LOMA - ID MEN 084






## INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA DE GALAPA - ID MEN 064






# Grupo 4

**Fecha inicio:** 24/10/2023
**Fecha Fin:** 07/02/2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | |
|---|---|
| ***Departamento*** | **Magdalena y Bolívar** |
| **$** | **Valor Inicial Obra: $3.566.467.466.00**<br><br>**Valor inicial Interventoria: $264.974.745,00** |
| | **Adiciones**<br>Obra: $ 0<br><br>Interventoría: $20.000.000.00<br>(El contratista pago $10.000.000.00 y el convenio $10.000.000.00)<br>**Valor final Interventoria $ 284.974.745,00** |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $3.361.652.674.57<br>Valor Liberado contrato de obra: $204.814.791.43<br><br>Interventoría: $279.439.929.41<br>Valor a Liberar:$5.534.815.59 |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | Otro Sí 1: Prorroga un (1) y quince (15) días.<br>Otro Sí 2: Exclusion de dos (2) (TACAMOCHO y EDM JAIME) por la imposiblidad técnica para ejecutar. |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | Contrato de Obra Liquidado y culminado.<br>Se inicia tramite de liquidación de la interventoría el 17 de febrero 2025. |

**100%**
**Porcentaje de avance**

**100%**
**Porcentaje Programado**

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# Grupo 5

**Fecha inicio:** 14/11/2023
**Fecha Fin:** 08/11/2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | |
|---|---|
| ***Departamento*** | **Magdalena y Bolívar** |
| **$** | **Valor Inicial**<br>Obra: $4.102.044.984<br>Interventoría: $300.856.990 |
| | **Adiciones**<br>Obra: $778.973.616<br>Interventoría: $172.224.091<br>($91.100.000 asumidos por el contrato de obra)<br>($81.124.091 asumidos por el contrato interadministrativo) |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $4.745.371.433<br>Interventoría: $420.967.384,31 |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | 5 otrosíes obra: Prórrogas (7 meses y 20 dias) y adiciones ($778.973.616)<br>5 otrosíes interventoría: Prórrogas (7 meses y 20 dias) y adiciones ($172.224.091) |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | CONTRATO PAF-MENAM-O-053-2023: Terminado el 08.11.2024<br>CONTRATO PAF-MENAM-I-056-2023: Terminado el 08.01.2025<br><br>AERS COMPONENTE 2:<br><br>• Contrato de Obra e Interventoría, en proceso de revisión y VoBo por parte de la Fiduciaria Popular, para pasar a firmas, una vez se tenga las AERS suscritas se procederá a solicitar la actualización de pólizas.<br><br>En recopilación documental, cierre de balances y memorias entre el contratista e interventoría, se proyecta radicar la liquidación del contrato de obra al 15 de marzo de 2025 y posterior la de interventoría. |







CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Publica

# GRUPO 5, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES SEDE PRINCIPAL
ID No. 30





## INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES SEDE SERENOS
ID No. 101




## INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES SEDE SERENOS
ID No. 101




## INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRISTIAN MORENO SEDE CHINELA
ID No. 97




## INSTITUCION EDUCATIVA EL PUEBLITO SEDE PUERTO LA ESTANCIA
ID No. 147




## INSTITUCION EDUCATIVA EL PUEBLITO SEDE TORRECILLA
ID No. 148





CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# GRUPO 5, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PUEBLITO SEDE TRONCONAL
ID No. 146




## INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL SILVIA COTES DE BISWELL SEDE ISLITA
ID No. 32




## INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL OSCAR PISCIOTTI NUMA SEDE INMACULADA CONCEPCION




## INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ANTONIO NARIÑO SEDE JOSE DE LA PAZ VANEGAS




## INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA CRUZ DE BALSAMO SEDE PRIMARIA
ID No. 13




## INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA CRUZ DE BALSAMO SEDE JARDIN INFANTIL
ID No. 14




CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# GRUPO 5, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR SEDE PRINCIPAL
ID No. 06




INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR SEDE CERRITO
ID No. 10




INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR SEDE ATASCOZA
ID No. 09




INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA PESQUERA LEONIDAS ORTIZ ALVEAR SEDE PLAN BONITO
ID No. 43





CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# Grupo 7

**Fecha inicio:** 31/05/2024
**Fecha Fin:** 17/01/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | |
|---|---|
| ***Departamento*** | **La Guajira** |
| **$** | **Valor Inicial**<br>Obra: $**4.158.777.879**<br>Interventoría: $**295.239.000** |
| | **Adiciones**<br>Obra: $ 0 Interventoría: $0 |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $ 3.738.535.259,01 (89,89%)<br>Interventoría: $121.499.000 (41,15%) |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | Suspensión 1 por 20 días 28 de oct de 2024<br>Prórroga 1 por 45 días 13 de sep de 2024<br>Suspensión 2 por 30 días 18 de nov de 2024<br>Prórroga 2 por 30 días 19 de dic de 2024 |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | CONTRATO PAF-ATMEN5-O-036-2024: Terminado el 17.01.2025<br>CONTRATO PAF-MENAM-I-059-2023: Fecha de Terminación el 17.03.2025<br><br>Actualmente el contrato de obra está en elaboración del AERS del componente II por parte de la interventoría para firma en fidupopular. |







CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# REGISTRO FOTOGRAFICO

I.E. JOSE ANTONIO GALAN- SEDE COOPERATIVO -060-(RIOHACHA)





INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #7 - 034-APÜNIMA´ANA1 -(RIOHACHA)





ESCUELA ETNOEDUCATIVA LA CAMPANA -050--(MAICAO)







ESCUELA ETNOEDUCATIVA WAYUMA'ANA -054- (MAICAO)





CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# REGISTRO FOTOGRAFICO

INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #7 - 117-WAKUAPAMANA -(RIOHACHA)






I.E. JOSE ANTONIO GALAN- SEDE PRINCIPAL -060-(RIOHACHA)






INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #6 - 051-TALOULUMA `ANA -(MAICAO)




INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO RURAL PROVINCIAL - 0143-PROVINCIAL -(BARRANCAS)




CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Publica
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# REGISTRO FOTOGRAFICO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA - 011-
ESCUELA RURAL INDIGENA KARALOUTAMANA -(MANAURE)





ESCUELA ETNOEDUCATIVA SEDE KASICHE -053- (MAICAO)













INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #6 - 151-LA
ESTRELLA -(MAICAO)



INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #6 - 051-
YAMAIN SEDE PRINCIPAL -(MAICAO)



INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #6 - 152-
YAMAIN KASPOLIMANA -(MAICAO)









# Grupo 8

**Fecha inicio:** 08/11/2023
**Fecha Fin:** 08/07/2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

| | |
|---|---|
| ***Departamento*** | **Córdoba y Bolívar** |
| **$** | **Valor Inicial**<br>Obra: $$4.706.470.280 M/CTE<br>Interventoría: $297.097.668,00 M/CTE |
| | **Adiciones**<br>Obra: $1.455.000.000<br>Interventoría: $144.106.877 |
| | **Valor Pagado**<br>Obra: $6.161.470.280<br>Interventoría: $277.437.804 |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES** | Prorroga 1: 2 meses y 15 días<br>Prorroga 1: 2 meses |
| **OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL** | Contrato de obra: liquidado.<br>Contrato de interventoría: En consolidación y revisión documentos por la supervisión para el inicio del proceso de liquidación. |







CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

# REGISTRO FOTOGRAFICO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Sede principal I. E. El Palmar - Montelíbano



Sede Buenos Aires - María La Baja



Sede Los Cerros - Planeta Rica



Sede Téc. Agrop. De Desarrollo Rural De María la baja - María La Baja



Sede Esc. Nueva Parcelas Londres - Ayapel



Sede Técnica Álvaro Ulcue Chocue - Tuchín



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# REGISTRO FOTOGRAFICO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

## Sede Esc. Nueva La Solita - Puerto Libertador



## Sede Los Aguacates - Cotorra



## Sede Níspero-María La Baja





CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

# CONTRATOS LIQUIDADOS

| GRUPO | Departamento | No SEDES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **Grupo 3** | Magdalena | **5** | 14/11/2023 | 12/04/2024 | **LIQUIDACIÓN Contrato de Obra No. PAF-MENAM-O-051-2023**: Suscrita Acta de liquidación de fecha 01/10/2024, pagado 100%.<br><br>**LIQUIDACIÓN Contrato de Interventoría No. PAF-MENAM-I-054-2023:**Suscrita Acta de liquidación de fecha 20/12/2024, pagado 100%. |
| **Grupo 6** | Cesar | **7** | 15/11/2023 | 29/04/2024 | **LIQUIDACIÓN Contrato de Obra No. PAF-MENAM-O-056-2023:** Suscrita Acta de liquidación el 20/11/2024 y pagado al 100%.<br><br>**LIQUIDACIÓN Contrato de Interventoría No. PAF-MENAM-I-058-2023:** Suscrita Acta de liquidación el 27/11/2024 y pagado al 100%. |

CCOM-FO-005 V1 / 05-Ago-2024 / Pública

# COMPROMISOS

- Definir por parte de Findeter el valor de la posible adición para el grupo 9.

- Revisar por parte de Findeter el cronograma general de ejecución del convenio teniendo en cuenta que aún no ha iniciado las actividades de 2 sedes en el grupo 9. Tiempos de liquidación será muy corto.

- Agilizar por parte de Findeter el Otro Sí de la dotación y su firma con base en los comité técnicos y fiduciarios a citar.

- Remitir por parte de Findeter el informe de avance de las sedes de Grupo 10, sobre todo de las sedes ejecutadas en Suárez.

- Compartir desde Findeter las actas de entregas de las sedes del Cauca al ing. Juan Carlos Folleco Olave de la secretaria de Educación del Cauca.

- Revisar y confirmar por parte de Findeter que el seguimiento con la Fiduprevisora se ha realizado permanentemente y que la información en la carpeta compartida se encuentra al día.

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública



Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

# GRACIAS

www.findeter.gov.co

@findetercol @findetercol
@findeter linkedin.com/company/findeter

Gobierno de Colombia

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública
