Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Bogotá D.C.,

Ingeniera
DIANA MILENA MALDONADO TORRES
Supervisora del Contrato Ministerio de Educación Nacional - MEN
dmaldonado@mineducacion.gov.co
Calle 43 # 57-14 Piso 3
Bogotá D.C.

Ref: **Contrato No. NO. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER**. Cuyo Objeto es "BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES PRIORITARIAS EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR DE LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS QUE SEAN DEFINIDAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN"

Asunto: Remisión Informe Mensual No. 21 / Contrato No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023

Estimada Doctora:

Me permito remitir el Informe de Gestión y ejecución No. 21 correspondiente al periodo de 02 de febrero al 01 de marzo de 2025, en cumplimiento de las obligaciones descritas en el anexo al contrato de la referencia.

Así mismo, y en caso de estar de acuerdo solicitamos amablemente emitir la aprobación de éste para soporte al Patrimonio Autónomo FINDETER MEN Aulas Móviles por Ola Invernal (Fiduciaria POPULAR S.A) con la siguiente información:

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MEN
AULAS MÓVILES POR OLA INVERNAL
Fiduciaria Popular S.A.
Carrera 13A No. 29-24 Pisos 20, 21 y 24
Bogotá

Cordialmente,

HERNÁN PARDO BOTERO
Gerente de Infraestructura

Anexo lo enunciado
Elaboró: Geraldine Lorena Prada Pimiento- Profesional de la Gerencia de Infraestructura
Revisó: Jesús Alberto Cañas Páez – Gestor de la Gerencia de Infraestructura

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Bogotá D.C.,

Ingeniera
DIANA MILENA MALDONADO TORRES
Supervisora del Contrato Ministerio de Educación Nacional - MEN
dmaldonado@mineducacion.gov.co
Calle 43 # 57-14 Piso 3
Bogotá D.C.

Ref: **Contrato No. NO. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER**. Cuyo Objeto es "BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES PRIORITARIAS EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR DE LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS QUE SEAN DEFINIDAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN"

Asunto: Remisión Informe Mensual No. 21 / Contrato No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023

Estimada Doctora:

Me permito remitir el Informe de Gestión y ejecución No. 21 correspondiente al periodo de 02 de febrero al 01 de marzo de 2025, en cumplimiento de las obligaciones descritas en el anexo al contrato de la referencia.

Así mismo, y en caso de estar de acuerdo solicitamos amablemente emitir la aprobación de éste para soporte al Patrimonio Autónomo FINDETER MEN Aulas Móviles por Ola Invernal (Fiduciaria POPULAR S.A) con la siguiente información:

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MEN
AULAS MÓVILES POR OLA INVERNAL
Fiduciaria Popular S.A.
Carrera 13A No. 29-24 Pisos 20, 21 y 24
Bogotá

Cordialmente,

HERNÁN PARDO BOTERO
Gerente de Infraestructura

Anexo lo enunciado
Elaboró: Geraldine Lorena Prada Pimiento- Profesional de la Gerencia de Infraestructura
Revisó: Jesús Alberto Cañas Páez – Gestor de la Gerencia de Infraestructura

CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023

ATENCIÓN DE NECESIDADES PRIORITARIAS EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR DE LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS

Periodo comprendido entre el 02 de febrero al 01 de marzo de 2025

Bogotá D.C.

TABLA DE CONTENIDO

1. **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO MARCO**
2. **ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO**
   - 2.1 OBLIGACIONES GENERALES
   - 2.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS
   - 2.3 ACTIVIDADES PRECONTRACTUALES
     - 2.3.1 Obligaciones
   - 2.4 ACTIVIDADES CONTRACTUALES
     - 2.4.1 Obligaciones
   - 2.5 ACTIVIDADES DE CIERRE Y LIQUIDACIÓN
     - 2.5.1 Obligaciones
3. **RESUMEN GENERAL DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL CONTRATO**
4. **ANEXOS**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO MARCO

Objeto General:	Brindar Asistencia Técnica y Administración de Recursos para atender las necesidades prioritarias en infraestructura y dotación de mobiliario escolar de las sedes educativas afectadas por la temporada de lluvias que sean definidas por el Ministerio de Educación.	
Numero de Contrato:	CO1.PCCNTR. 4917031	
Integrantes:	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - MEN Y LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER	
Fecha de suscripción:	05 de mayo de 2023	
Perfeccionamiento	Póliza garantía aprobada 26 de mayo de 2023 Registro Presupuestal 02 de junio de 2023	
Fecha de Inicio:	02 de junio de 2023	
Fecha de Terminación:	01 de julio de 2025	
Modificaciones:	Modificatorio No. 1. Modificar la cláusula cuarta - plazo de ejecución del contrato, la cual quedará de la siguiente manera: "El plazo previsto para la ejecución del Contrato Interadministrativo será a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, hasta el 01 de noviembre de 2024, plazo en el que se debe llevar a cabo la ejecución física del contrato y la liquidación de la contratación derivada que suscriba FINDETER."	
	Modificatorio No. 2. "Prorrogar el plazo de ejecución del contrato número CO1.PCCNTR.4917031 de 2023, hasta el 01 de julio de 2025, plazo en el que se debe culminar la ejecución física de las obras de infraestructura educativa, dotación de aulas nuevas por reposición, y la liquidación de la contratación derivada suscrita por FINDETER."	
Aportes:	Valor de los recursos a administrar para la ejecución de los proyectos	$ 59.485.981.308
	Porcentaje de Asistencia Técnica y Administración de Recursos a reconocer a FINDETER (7%)	$ 4.164.018.692
Valor final del Contrato:		$ 63.650.000.000
Sociedad Fiduciaria:	FIDUCIARIA POPULAR S.A.	

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO

1.1 OBLIGACIONES GENERALES

1. *Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas en este contrato.*

En el transcurso del periodo actual, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. (FINDETER) asume con responsabilidad la tarea integral de estructurar, desarrollar y dar seguimiento a todas las actividades derivadas de la ejecución de las diversas obligaciones estipuladas en el contrato vigente. En virtud de su compromiso, FINDETER se esfuerza por cumplir con cada una de las responsabilidades asignadas, garantizando que cada etapa del contrato sea llevada a cabo de manera exitosa y en plena conformidad con los términos y condiciones acordadas previamente.

Es importante destacar que el compromiso de FINDETER no se limita únicamente a la ejecución técnica del contrato, sino que abarca también la garantía de la calidad y la excelencia en cada una de las etapas del proceso. La entidad se esfuerza por mantener altos estándares de rendimiento, asegurando que los resultados obtenidos sean de la más alta calidad posible y estén alineados con los objetivos y metas establecidas.

2. *Participar y apoyar al Ministerio de Educación Nacional en todas las reuniones periódicas a las que este lo convoque relacionadas con la ejecución del contrato que permitan realizar seguimiento integral a los avances de los proyectos.*

Durante el presente periodo FINDETER participó activamente y brindó el pleno apoyo al Ministerio de Educación Nacional en todas las reuniones periódicas a las que se convocaron, especialmente, aquellas relacionadas con la ejecución del contrato. FINDETER está comprometido con realizar un seguimiento integral y detallado de los avances del proyecto, por lo que se establecieron reuniones cada martes en la tarde a través del aplicativo Teams, reuniones programadas por FINDETER sobre las que realizan grabaciones y se informa los avances semanales.

Las fechas de las reuniones de seguimiento del periodo, sobre las cuales se realiza el acta correspondiente, la cual se adjunta al presente informe:

1. 14 de febrero del 2025

3. *Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la información objeto del presente contrato.*

FINDETER ha dispuesto todos los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la información objeto del presente contrato. La seguridad y confidencialidad de la información son de suma importancia, y se ha implementado medidas sólidas para garantizar su protección. Esto incluye la implementación de sistemas de almacenamiento seguro, protocolos de acceso restringido y medidas de respaldo que aseguran que la información esté resguardada de manera adecuada en todo momento. La prioridad es mantener la integridad de la información involucrada en el contrato, así mismo se habilitó los espacios adecuados en la Calle 103 No. 19-20 y en la segunda sede localizada en la Calle 104 # 18ª-65, piso 6 para tal fin.

4. *Entregar a EL MINISTERIO, periódicamente y al finalizar el contrato, o cuando el supervisor o interventor lo solicite, todos los documentos y archivos (físicos y electrónicos) a su cargo y que se produzcan en ejecución de sus obligaciones, lo anterior, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes en el Ministerio de Educación Nacional.*

Durante este periodo, FINDETER ha cumplido rigurosamente con la entrega de todos los documentos y archivos electrónicos que el MEN ha solicitado durante la ejecución del contrato. Esta entrega se realiza de manera periódica y al finalizar el contrato, tal como establecen las normas y disposiciones vigentes en el Ministerio de Educación Nacional. Además, en concordancia con las regulaciones vigentes, también se proporcionará dicha documentación cuando el supervisor o interventor así lo solicite. La prioridad es asegurar que todas las partes involucradas tengan acceso a la información necesaria y que cumplan con todas las obligaciones contractuales en cuanto a la entrega y custodia de documentación.

5. *Colaborar en el suministro y respuesta de la información correspondiente a los requerimientos efectuados por los organismos de control del Estado Colombiano o cualquier otra autoridad, en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato y de asuntos relacionados con el mismo.*

   En este periodo, FINDETER ha colaborado plenamente en el suministro y respuesta de toda la información correspondiente a los requerimientos efectuados por los Entes de Control del Estado Colombiano y cualquier otra autoridad pertinente. La cooperación en este sentido es absoluta y FINDETER está comprometido en proporcionar toda la información necesaria relacionada con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato, así como en asuntos relacionados con el mismo.

   Cumplir con los requisitos de los Entes de Control y las autoridades es fundamental para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en todas las acciones. La disposición a colaborar asegura que el proceso se realice de manera adecuada y en línea con las regulaciones y requerimientos establecidos por las autoridades correspondientes.

6. *Utilizar la imagen del Ministerio de Educación Nacional de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorización expresa y escrita de las partes ningún funcionario, podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole.*

   FINDETER ha seguido rigurosamente los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional en relación con el uso de su imagen. FINDETER es consciente de que, salvo autorización expresa y escrita de las partes involucradas, ningún funcionario puede utilizar el nombre, emblema o sello oficial del Ministerio con fines publicitarios o de cualquier otra índole. La colaboración se adhiere estrictamente a estas directrices para asegurar el respeto mutuo y la integridad en la utilización de la imagen y la identidad del Ministerio. Durante este periodo no se realizaron trámites que contengan la imagen del Ministerio de Educación Nacional.

7. *Guardar estricta confidencialidad sobre toda la información y los documentos obtenidos del MEN.*

   FINDETER ha mantenido una estricta confidencialidad sobre toda la información y los documentos obtenidos del Ministerio de Educación Nacional (MEN). Reconoce la importancia de salvaguardar la información confidencial y sensible proporcionada por el MEN, y se ha implementado medidas rigurosas para garantizar su protección. Se cumple con todas las regulaciones y acuerdos de confidencialidad establecidos para asegurar que la información no sea divulgada ni utilizada de manera inapropiada. El compromiso de FINDETER es mantener la integridad y confidencialidad de la información en todo momento.

8. *Realizar los pagos al SISS (salud, pensión y riesgos laborales), de acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago correspondientes.*

En el presente periodo, se han realizado los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral (SISS), incluyendo Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de acuerdo con la normatividad vigente.

Además, se pueden proporcionar los soportes de pago correspondientes como parte del compromiso con la legalidad y el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales. Cumplir con los requerimientos del SISS es fundamental para asegurar el bienestar de los colaboradores y garantizar el cumplimiento de las regulaciones pertinentes, lideradas por el área de gestión respectiva y validadas por la revisoría fiscal, soportes que serán presentados en el momento en el que se requiera.

1.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

a. *Presentar ante EL MINISTERIO dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes Al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (inicio SECOP), el cronograma de ejecución del objeto del Contrato Interadministrativo.*

FINDETER presentó en el periodo pasado ante el Ministerio de Educación Nacional, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (inicio SECOP), el cronograma actualizado de ejecución del objeto del Contrato Interadministrativo. FINDETER reconoce la importancia de establecer un cronograma claro y detallado para la ejecución de las actividades contractuales, y se ha cumplido con este requisito de manera oportuna. La intención es garantizar una planificación efectiva y transparente de las actividades a llevar a cabo, en consonancia con las regulaciones y directrices establecidas por el Ministerio.

b. *Crear una vez suscrito y legalizado el Contrato Interadministrativo, una cuenta contable para manejo exclusivo de los recursos de este Contrato Interadministrativo dentro del Patrimonio Autónomo constituido para tal fin por FINDETER.*

Una vez suscrito y legalizado el Contrato Interadministrativo, FINDETER ha creado una cuenta contable exclusiva para el manejo de los recursos de este contrato dentro del Patrimonio Autónomo constituido por FINDETER para tal fin. Se da cumplimiento a todos los requisitos y medidas establecidas para asegurar la correcta gestión financiera de los recursos relacionados con el Contrato Interadministrativo. La creación de esta cuenta contable específica en el Patrimonio Autónomo garantiza una administración transparente y adecuada de los recursos, en línea con las normativas y regulaciones pertinentes.

Por lo anteriormente mencionado, se crea la Cuenta de Ahorros No. 500-80465045-0 del Banco Popular para manejo exclusivo de los recursos de este contrato y respectivos reportes contables. Cabe recordar que, se adjuntó al Informe de Gestión N° 1 la Certificación de la Cuenta Bancaria.

Mediante correo electrónico del 24 de octubre de 2023, el MEN remitió oficio por parte del Ministerio de Hacienda, mediante el cual se oficializó la exención de gravamen financiero (GMF) de la cuenta del Patrimonio Autónomo. El cual se adjuntó en informes pasados.

c. *Administrar los recursos que transfiera EL MINISTERIO a través del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres- FNGRD a FINDETER a través del Patrimonio Autónomo constituido para cumplir con el objeto del presente contrato.*

FINDETER ha administrado de manera responsable los recursos que EL MINISTERIO ha transferido a través del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) a FINDETER, utilizando

el PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN AULAS MÓVILES POR OLA INVERNAL constituido por la Fiducia Mercantil FIDUCIARIA POPULAR S.A. para cumplir con el objeto del presente contrato.

El enfoque ha sido garantizar una gestión eficiente y transparente de los recursos para cumplir con los objetivos establecidos en el contrato. El uso adecuado de estos recursos es esencial para asegurar la ejecución exitosa de las actividades y proyectos acordados, en línea con las regulaciones y directrices establecidas por todas las partes involucradas.

d. *Presentar Informes mensuales y un informe final de ejecución financiera y técnica del presente Contrato, conforme los recursos aportados por EL FNGRD,*

Para el presente periodo, se presentará un informe mensual de ejecución financiera por el área de Negocios Fiduciarios de FINDETER y se ha presentado un informe técnico del presente contrato, conforme a los recursos aportados por el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD).

Estos informes son una parte integral de la transparencia y rendición de cuentas en la ejecución del contrato. A través de estos informes, se ha proporcionado una visión detallada de la utilización de los recursos, los avances técnicos logrados y otros aspectos relevantes de la ejecución del contrato. Cumplir con la presentación de estos informes es esencial para mantener una comunicación clara y abierta con EL MINISTERIO y garantizar que todas las partes estén informadas sobre el progreso y los resultados del contrato.

e. *El Patrimonio Autónomo — FINDETER deberá reintegrar mensualmente los rendimientos financieros (si los hubiere) a la Dirección del Tesoro Nacional o en los términos que establezca la normatividad aplicable, es decir, que no ingresan ni hacen parte del Patrimonio Autónomo constituido por FINDETER.*

El Patrimonio Autónomo - FINDETER reintegrará mensualmente los rendimientos financieros a la Dirección del Tesoro Nacional o en los términos que establezca la normatividad aplicable. Estos rendimientos financieros no ingresan ni hacen parte del Patrimonio Autónomo constituido por FINDETER, y la gestión de reintegro se realizará previa solicitud al Ministerio con el fin de que se informe la cuenta bancaria a la cual se debe realizar el mismo.

Este proceso de reintegro asegura la correcta gestión de los rendimientos generados por los recursos aportados y garantiza que estos sean manejados de acuerdo con las regulaciones y normativas pertinentes. De esta manera, se cumple con los requerimientos legales y se mantiene la transparencia en la administración financiera.

Para lo anterior, el 28 de agosto de 2023 se informa por el MEN la cuenta bancaria para el reintegro de rendimientos financieros del Contrato No. CO1.PCCNTR.4917031 la cual se indica a continuación:

Entidad Financiera:	**Banco BBVA**
Tipo de Cuenta:	**Ahorros**
Número de Cuenta:	**309-054583**
Nombre de la cuenta:	**FIDUPREVISORA S.A FNGRD – COLOMBIA VITAL**

1.3 ACTIVIDADES PRECONTRACTUALES

1.3.1 Obligaciones:

a. *Realizar la viabilización técnica y jurídica de los predios priorizados por EL MINISTERIO, cuando sea necesario y sea solicitado por el MEN.*

Durante el presente periodo, se llevó a cabo la viabilización técnica y jurídica priorizada por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) cada vez que ha sido necesario y solicitado por el MEN. La colaboración en este aspecto es esencial para asegurar que los predios sean evaluados y viabilizados de manera adecuada para cumplir con los requisitos técnicos necesarios. El compromiso es facilitar un proceso fluido y eficiente para que los predios sean utilizados de acuerdo con los objetivos y necesidades de cada Institución Educativa, siempre en línea con las regulaciones y disposiciones vigentes.

Durante el periodo, se finalizó la evaluación técnica y predial y que en resumen se describe a continuación en las siguientes tablas:

RESUMEN EVALUACIÓN TÉCNICA DE SEDES

UNIFICACIÓN DE LISTADOS: INICIAL (150) + ADICIONALES (42)	
SEDES VIABLES TÉCNICAMENTE	**150**

RESUMEN EVALUACIÓN JURÍDICA DE SEDES

SEDES TOTAL (150)	
SIN DOCUMENTOS	1 *
POSIBLE VIABILIDAD	0 **
NO VIABLE	9
VIABLES TÉCNICA Y JURÍDICAMENTE	**140**
TOTAL	150

* Sin Documentos:

- Falta de documentos para evidenciar la propiedad y reciprocidad en la revisión y remisión de documentos por la ETC y/o rectores

** Posible Viabilidad:

- Falta documentación soporte para continuar con revisión
- Pendientes gestiones con terceros para saneamiento predial
- Trámites para obtención de sana posesión

Asimismo, en el presente periodo, el listado actualizado de sedes focalizadas son las siguientes:

Consecutivo	ID MEN No.	Departamento	ETC	Municipio	IE	SEDE
1	1	**Nariño**	PASTO	**Pasto**	I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE	I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - SEDE PRINCIPAL
2	2	**Córdoba**	CORDOBA	**Tuchín**	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ALVARO ULCUE CHOCUE	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ALVARO ULCUE CHOCUE
3	3	**Cauca**	CAUCA	**Bolívar**	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA NUESTRA SENORA DE LOS REMEDIOS	COLEGIO DEPARTAMENTAL NUESTRA SENORA DE LOS REMEDIOS

4	4	Cesar	VALLEDUPAR	Valledupar	INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ	IE ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ
5	6	Bolívar	BOLIVAR	Barranco de Loba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR	I.E.T.A. LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR - SEDE PRINCIPAL
6	7	Santander	SANTANDER	Vélez	COLEGIO UNIVERSITARIO	COLEGIO UNIVERSITARIO
7	8	Nariño	NARIÑO	El Rosario	CENTRO EDUCATIVO LA CLAUDIA	CENTRO EDUCATIVO LA CLAUDIA
8	9	Bolívar	BOLIVAR	Barranco de Loba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR	ATASCOZA
9	10	Bolívar	BOLIVAR	Barranco de Loba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR	LOS CERRITOS
10	11	Guajira	LA GUAJIRA	Manaure	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	ESCUELA RURAL INDÍGENA KARALOUTAMANA
11	12	Cauca	CAUCA	Toribío	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PLAYA	CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO LA PLAYA - SEDE PRINCIPAL
12	13	Magdalena	MAGDALENA	Concordia	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE BASICA Y MEDIA SANTA CRUZ DE BALSAMO	ERM DE BALSAMO
13	14	Magdalena	MAGDALENA	Concordia	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE BASICA Y MEDIA SANTA CRUZ DE BALSAMO	JAR INF MIS PRIMEROS SUEÑOS
14	16	Cauca	CAUCA	Santander de Quilichao	INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO	DOMINGUILLO (sede principal)
15	17	Santander	SANTANDER	Betulia	INSTITUCION EDUCATIVA EL RAMO	CENTRO EDUCATIVO SANTA BARBARA
16	18	Atlántico	SOLEDAD	Soledad	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE PRINCIPAL
17	20	Bolívar	BOLIVAR	Morales	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PALMA	LA ARCADIA
18	22	Cauca	CAUCA	El Tambo	I.E. HUISITO	HUISITO (sede principal)
19	24	Magdalena	MAGDALENA	El Banco	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ANTONIO NARIÑO	CENT EDUC RUR MIX JOSE DE LA PAZ VANEGA ORTIZ
20	26	Huila	HUILA	Acevedo	INSTITUCION EDUCATIVA BATEAS	BATEAS
21	27	Cauca	CAUCA	Piamonte	CENTRO EDUCATIVO PUERTO GUAYUYACO	ESCUELA RURAL MIXTA LA ESPANOLA
22	28	Córdoba	CORDOBA	Cotorra	INSTITUCION EDUCATIVA LOS AGUACATES	CENT EDUC LOS AGUACATES
23	29	Bolívar	BOLIVAR	Mompós	INSTITUCIÒN EDUCATIVA TÈCNICA AMBIENTAL DE TIERRA FIRME	I.E.T.A. AMBIENTAL DE TIERRA FIRME - SEDE PRINCIPAL
24	30	Cesar	CESAR	Curumaní	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES
25	32	Magdalena	MAGDALENA	El Banco	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL SILVIA COTES DE BISWELL	ERM SANTA TERESA DE ISLITA
27	34	Guajira	RIOHACHA	Riohacha	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA #7	APÜNIMA´ANA1
28	36	Nariño	NARIÑO	Cumbal	INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCION DE TALLAMBI	INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCION DE TALLAMBI
29	41	Putumayo	PUTUMAYO	Puerto Asís	I. E. RUR CAUCACIA	ESC RUR MIX EL JARDIN ALTO TETEYE
30	42	Antioquia	ANTIOQUIA	Ciudad Bolívar	I. E. JOSE MARIA HERRAN	C. E. R. PAULINA PUERTA
31	43	Bolívar	BOLIVAR	San Martín de Loba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA PESQUERA LEONIDAS ORTIZ ALVEAR DE CHIMÍ	PLAN BONITO
32	44	Cauca	CAUCA	La Vega	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA SANTA RITA	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA RITA (sede principal)
33	45	Cesar	CESAR	La Paz(Robles)	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA CAÑO PADILLA YUKPA	SEDE EL COSO
34	46	Cauca	CAUCA	Balboa	C.E. BUENOS AIRES	CAPITANES
35	48	Cesar	VALLEDUPAR	Valledupar	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ	INSTITUTO TECNICO COMERCIAL JOSE EUGENIO MARTINEZ
36	49	Bolívar	BOLIVAR	Mompós	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DEL CHICAGUA	SAN LUIS
37	50	Guajira	MAICAO	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2	SEDE LA CAMPANA
38	51	Guajira	MAICAO	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6	YAMAIN - SEDE PRINCIPAL
39	53	Guajira	MAICAO	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2	SEDE KASICHE
40	54	Guajira	MAICAO	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2	SEDE WAYUUMA ANA
41	56	Arauca	ARAUCA	Saravena	CENTRO EDUCATIVO LA PAVA.	LA PAVA

42	57	Putumayo	PUTUMAYO	Puerto Asís	I. E. RUR CAUCACIA	ESC RUR MIX EL PROGRESO
43	58	Cauca	CAUCA	Bolívar	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO NUESTRA SENORA DEL CARMEN	CORRAL VIEJO
44	59	Cauca	CAUCA	Bolívar	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO NUESTRA SENORA DEL CARMEN	NUESTRA SENORA DEL CARMEN (sede principal)
45	60	Guajira	RIOHACHA	Riohacha	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN	COOPERATIVO
46	62	Valle del Cauca	BUGA	Guadalajara de Buga	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	JHON F. KENNEDY
47	64	Atlántico	ATLANTICO	Galapa	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA
48	65	Cauca	CAUCA	Balboa	I.E. OLAYA (ANTES C.E. OLAYA)	OLAYA (sede principal)
49	66	Antioquia	APARTADO	Apartadó	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS
50	67	Tolima	TOLIMA	Santa Isabel	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BOLIVAR	LA HUMAREDA
51	69	Córdoba	CORDOBA	Planeta Rica	INSTITUCION EDUCATIVA LOMA AZUL	LOS CERROS
52	70	Córdoba	CORDOBA	Puerto Libertador	INSTITUCION EDUCATIVA PICA PICA VIEJO	ESC NVA LA SOLITA
53	73	Bolívar	BOLIVAR	Córdoba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE TACAMOCHO	NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE TACAMOCHITO
54	74	Cesar	CESAR	El Paso	INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE LA ESPERANZA
55	75	Cesar	CESAR	El Paso	INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE EL VALLITO
56	77	Cesar	CESAR	El Paso	INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE SAN ANGEL
57	79	Cesar	CESAR	El Paso	INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE LA ESTACION
58	83	Atlántico	ATLANTICO	Repelón	INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS	INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS - SEDE PRINCIPAL
59	84	Atlántico	ATLANTICO	Repelón	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE VILLA ROSA	SEDE LA LOMA
60	85	Valle del Cauca	BUGA	Guadalajara de Buga	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	LA PLANTA
61	86	Antioquia	APARTADO	Apartadó	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO
62	87	Nariño	NARIÑO	BARBACOAS	INSTITUCION EDCUATIVA TERAIMBE	SEDE 9 CUMAINDE
63	88	Putumayo	PUTUMAYO	Puerto Leguízamo	IE RUR LUIS VIDALES DEL PIÑUÑA NEGRO	ESC RUR MIX PUERTO PRINCIPE DOS
64	90	Cauca	CAUCA	Bolívar	CENTRO EDUCATIVO EL TAMBO	LA FUENTE
65	92	Atlántico	ATLANTICO	Repelón	INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS	PITA
66	93	Cauca	CAUCA	Bolívar	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CARMEN	EL CARMEN (sede principal)
67	94	Chocó	CHOCO	Carmen del Darién	CE PUEBLO NUEVO	CE PUEBLO NUEVO - SEDE PRINCIPAL
68	95	Guajira	RIOHACHA	Riohacha	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN	JOSE ANTONIO GALAN
69	96	Meta	VILLAVICENCIO	Villavicencio	INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO FRANCISCO ARANGO	ESCUELA SIETE DE AGOSTO
70	97	Cesar	CESAR	Curumaní	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	SEDE CHINELA
71	98	Cesar	CESAR	Curumaní	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	SEDE GUAIMARAL
72	100	Tolima	TOLIMA	Santa Isabel	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BOLIVAR	EL BRASIL
73	101	Cesar	CESAR	Curumaní	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	SEDE LOS SERRENOS
74	103	Córdoba	CORDOBA	Ayapel	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO	ESC NVA PARCELAS LONDRES
75	104	Cundinamarca	CUNDINAMARCA	Anolaima	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE HUGO ENCISO	ESCUELA RURAL EL DESCANSO
76	105	Chocó	CHOCO	Bahía Solano (Mutis)	IE LUIS LOPEZ DE MESA	SEDE DE SAN JOSE (HUACA)
77	106	Chocó	CHOCO	Bahía Solano (Mutis)	IE LUIS LOPEZ DE MESA	SEDE SIRENA DEL MAR
78	107	Chocó	CHOCO	Bahía Solano (Mutis)	IE LUIS LOPEZ DE MESA	SEDE SECUNDINO RIVAS
79	110	Nariño	NARIÑO	BARBACOAS	INSTITUCION EDUCATIVA TERAIMBE	SEDE 2 BOMBÓN

80	111	Magdalena	MAGDALENA	Pueblo viejo	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS	ERM ISLA DE CATAQUITA
81	112	Magdalena	MAGDALENA	El Retén	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE	COL MPAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE
82	113	Magdalena	MAGDALENA	San Sebastián de Buenavista	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA	ERM MARIA AUXILIADORA
83	114	Magdalena	MAGDALENA	San Sebastián de Buenavista	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA	ERM LA PACHA
84	117	Guajira	RIOHACHA	Riohacha	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA #7	WAKUAPAMANA
85	118	Antioquia	APARTADO	Apartadó	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO
86	119	Córdoba	CORDOBA	Montelíbano	INSTITUCION EDUCATIVA EL PALMAR	INSTITUCION EDUCATIVA EL PALMAR SEDE PRINCIPAL
87	121	Cauca	CAUCA	Piamonte	CENTRO EDUCATIVO PUERTO GUAYUYACO	ESC RUR MIX SAN ANDRESITO
88	122	Antioquia	TURBO	Turbo	I.E. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	E.U. JESUS MORA
89	123	Bolívar	BOLIVAR	Simití	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CERRO DE VERACRUZ	CAMPO PAYARES
90	124	Bolívar	BOLIVAR	Simití	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CERRO DE VERACRUZ	I.E. DEL CERRO DE VERACRUZ - SEDE PRINCIPAL
91	125	Cauca	CAUCA	Piamonte	INST EDUC AGRIC PIAMONTE	PIAMONTE (sede principal)
92	126	Magdalena	MAGDALENA	Pueblo viejo	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS	ERM EL TRIUNFO
93	127	Putumayo	PUTUMAYO	Orito	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL UMADA WUARRARA	ESC RUR MIX ALTO ORITO
94	128	Valle del Cauca	BUGA	Guadalajara de Buga	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE - SEDE PRINCIPAL
95	129	Valle del Cauca	BUGA	Guadalajara de Buga	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	JULIAN MENDOZA GUERRERO
96	130	Valle del Cauca	BUGA	Guadalajara de Buga	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	LA HONDA
97	132	Norte de Santander	NORTE SANTANDER	La Playa	CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN PEDRO	SEDE LA PEÑA
98	133	Magdalena	MAGDALENA	El Banco	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL OSCAR PISCIOTTI NUMA	ERM INMACULADA CONCEPCION
99	134	Bolívar	BOLIVAR	María la Baja	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA	BUENOS AIRES
100	135	Bolívar	BOLIVAR	María la Baja	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA	I.E.T. AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA
102	138	Arauca	ARAUCA	Arauca	CENTRO EDUCATIVO MONSERRATE	CEAR MONSERRATE
104	142	Nariño	IPIALES	Ipiales	INSTITUCION EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL LOS PASTOS	ESCUELA LAS CRUCES
105	143	Guajira	LA GUAJIRA	Barrancas	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL PROVINCIAL	CENTRO ETNOEDUCATIVO PROVINCIAL
106	144	Atlántico	SOLEDAD	Soledad	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE
107	146	Cesar	CESAR	Chimichagua	CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO	SEDE TRONCONAL
108	147	Cesar	CESAR	Chimichagua	CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO	SEDE PUERTO LA ESTANCIA
109	148	Cesar	CESAR	Chimichagua	CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO	SEDE TORRECILLA
110	149	Nariño	NARIÑO	Mallama (Piedrancha)	CENTRO EDUCATIVO MALLAMA	CENTRO EDUCATIVO DE MALLAMA
111	150	Chocó	CHOCO	Tadó	IE TECNICO AGROAMBIENTAL - MARIA AUXILIADORA	SEDE MARÍA AUXILIADORA DE MANUNGARA
112	151	Guajira	LA GUAJIRA	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2	SEDE LA ESTRELLA
113	152	Guajira	MAICAO	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6	YAMAIN - KASPOLIMANA
114	153	Guajira	LA GUAJIRA	Maicao	ESCUELA RURAL MIXTA TALOULUMA'ANA	ESCUELA RURAL MIXTA TALOULUMA'ANA
115	154	Magdalena	CIENAGA	Ciénaga	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO
116	156	Magdalena	MAGDALENA	El Retén	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE	SEDE CONC.ESC GENERAL GREGORIO GARZON
117	158	Valle del Cauca	BUGA	Guadalajara de Buga	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	SEDE CRISTOBAL COLON

118	161	Antioquia	APARTADO	Apartadó	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL GUINEO	CENTRO EDUCATIVO RURAL EL OSITO
119	163	Cauca	CAUCA	La Vega	I.E AGROPECUARIA SAN FRANCISCO JAVIER SEDE GARAY	I.E AGROPECUARIA SAN FRANCISCO JAVIER SEDE GARAY
120	164	Cauca	CAUCA	Santander de Quilichao	IE DOMINGUILLO	SEDE DOMINGO LASSO
121	165	Cauca	CAUCA	Popayán	IE COMUNEROS	Sede Principal
122	172	Putumayo	PUTUMAYO	Puerto Asís	E. RUR CAUCACIA - SEDE PRINCIPAL	Sede Principal
123	173	Cauca	CAUCA	Piamonte	ESC RUR MIX FRAY EZEQUIEL	ESC RUR MIX FRAY EZEQUIEL
124	174	Cauca	CAUCA	Piamonte	E.D.R PORTO GUAYUYACO SEDE PRINCIPAL	E.D.R PORTO GUAYUYACO SEDE PRINCIPAL
125	175	Cauca	CAUCA	Rosas	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA	SANTA TERESITA (sede principal)
126	178	Cauca	CAUCA	Rosas	INSTITUCION EDUCATIVA MADRE CARIDAD BRADER	MADRE CARIDAD BRADER (sede principal)
127	182	Cauca	CAUCA	Rosas	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO CORDOBA	LAS YERBAS
128	183	Cauca	CAUCA	Rosas	CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO LEON VALENCIA	LA DESPENSA
129	184	Cauca	CAUCA	Rosas	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO CORDOBA	EL RETIRO
130	186	Cauca	CAUCA	Rosas	CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO LEON VALENCIA	EL ALTILLO
131	187	Cauca	CAUCA	Rosas	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO CORDOBA	BELLAVISTA
132	188	Cauca	CAUCA	Suarez	IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA	Sede Principal
133	189	Cauca	CAUCA	Suarez	IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA	SEDE MARIA INMACULADA
134	190	Cauca	CAUCA	Suarez	IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA	SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
135	192	Atlántico	SOLEDAD	Soledad	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE CABICA
136	194	Bolívar	Bolívar	Maria la Baja	INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA AGROINDUSTRIAL DE FLAMENCO	EL NISPERO
137	196	Atlántico	Atlántico	Malambo	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MESOLANDIA	Sede Principal
138	202	Chocó	CHOCO	Tadó	IE NORMAL SUPERIOR DEMETRIO SALAZAR CASTILLO	CENTRO EDUCATIVO ESCUELA FRANCISCO MIRANDA
139	203	Antioquia	TURBO	Turbo	IE SAN MARTIN DE PORRES	SEDE GONZALO MEJIA

En este periodo es importante resaltar que, bajo este listado de sedes focalizadas para intervención técnica, ya se adelantó la verificación predial, la cual da como resultado 136 sedes a intervenir.

Sedes despriorizar técnicamente: se tuvo que despriorizar las siguientes 9 instituciones educativas de los siguientes grupos:

GRUPO	ID MEN	Departamento	ETC	Municipio	IE	SEDE	OBERVACIONES
1	55	Chocó	CHOCO	Tadó	IE TECNICO AGROAMBIENTAL	SEDE CAMPO ALEGRE	En un principio, la sede priorizada en el municipio de Tadó era la sede la sede Campo Alegre. Esta perteneciente a la IE Técnico Agroambiental, la cual actualmente cuenta con una matrícula según el Sistema Integrado de Matricula -Simat de 40 estudiantes; no obstante, en la etapa de viabilidad técnica y jurídica adelantada por el contratista designado por Findeter determinó que esta sede presentaba limitaciones técnicas, normativas y

							administrativas por estar en zona de riesgo por inundación, por lo que se recomendó no efectuar intervención alguna.
	120	Antioquia	**TURBO**	Turbo	**I.E. DE DESARROLLO RURAL DE TURBO**	E.U. SANTISIMA TRINIDAD	Se tramito la exclusión del anexo "Listado de Instituciones Educativas Priorizadas por el MEN" a la sede IE. DE DESARROLLO RURAL DE TURBO EU SANTÍSIMA TRINIDAD., reemplazándola por la SEDE GONZALO MEJIA perteneciente a la IE. SAN MARTIN DE PORRES, ubicada en el municipio de Turbo, Antioquia en el marco del contrato de obra No. PAF-MENAM-O-049-2023 y contrato de interventoría No. PAF-MENAM-I-052-2023 Frente a lo anterior, es importante indicar en el presente concepto que, la solicitud se realiza enmarcada en el lineamiento dado por el Ministerio de Educación Nacional – MEN en Comité Técnico No. 30 No. CO1.PCCNTR.4917031 DE 2023 PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN AULAS MÓVILES POR OLA INVERNAL, de fecha 24 de enero de 2024
2	**91**	Atlántico	**ATLANTICO**	Palmar de Varela	**INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL DE PALMAR DE VARELA**	JOSE MARIA CORDOBA	Esta institución Educativa se tuvo que despriorizar porque ya estaba intervenida por la gobernación de Atlántico
	191	Atlántico	**ATLANTICO**	Luruaco	**IE CORREGIMIENTO DE SAN JUAN DE TOCAGUA**	CORREGIMIENTO DE SAN JUAN DE TOCAGUA	Se despriorizo esta institución educativa, debido a que el MEN define que esta IE seria intervenida por el FFIE
4	**71**	Bolívar	**BOLIVAR**	Córdoba	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE TACAMOCHO**	TACAMOCHO (SEDE PRIMARIA)	Esta sede tuvo que ser despriorizada, debido a que en el año 2015 ante esta situación la Corporación autónoma ambiental Cormagdalena, mediante Contrato Interadministrativo 0-0019 de 2015 suscrito con la Universidad Nacional de Colombia, elabora un estudio del cual se destaca la siguiente consideración general: "A partir de este análisis se puede considerar que Tocomocho se encuentra ubicado, prácticamente en la

							mitad del río, bajo la amenaza de inundaciones y procesos erosivos que se pueden activar en cualquier época".
	139	Magdalena	**MAGDALENA**	San Sebastián de Buenavista	**INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE TRONCOSO**	ERM DE JAIME	Esta sede tuvo que ser despriorizada, conforme a una recopilación de datos realizada por el contratista, JASA LTDA propone tener en cuenta que la ERM Jaime requiere una altura de palafito de 1,7 m, lo cual genera la construcción de acceso al aula, definida en el alcance contractual, de una infraestructura que debe contemplar el ingreso a toda la institución, siendo necesario la construcción de toda la sede con el fin de poder hacer funcional su ingreso. La interventoría, CONSORCIO INTER EDUCATIVO G4 considera que no se deben realizar obras de infraestructura de mejoramiento y/o construcción, debido a lo planteado por el contratista y a que los mejoramientos no tendrían estabilidad por efectos de los daños que ocasionará la inundación y la construcción debe ser de toda la institución con palafitos de 1,70 m, lo cual supera el alcance contractual.
9	**33**	Capital Bogotá, D.C	BOGOTA	Bogotá, D.C.	**COLEGIO LA CHUCUA (IED)**	CENT EDUC DIST LA CHUCUA	Sede retirada mediante comité técnico No. 70 y comité fiduciario No. 45.
	136	Capital Bogotá, D.C.	BOGOTA	Bogotá, D.C.	**COLEGIO ESTRELLA DEL SUR (IED)**	COL DIST ESTRELLA DEL SUR	Sede retirada mediante comité técnico No. 70 y comité fiduciario No. 45.
	141	Santander	BARRANCABERMEJA	Barrancabermeja	**CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN**	CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN	Sede retirada mediante comité técnico No. 70 y comité fiduciario No. 45.

De acuerdo con lo anterior se hace la inclusión de las siguientes 4 sedes educativas para tener un resultado total de intervención de 136 sedes educativas:

ID MEN	Departamento	ETC	Municipio	IE	SEDE
202	Chocó	CHOCO	Tadó	IE NORMAL SUPERIOR DEMETRIO SALAZAR CASTILLO	CENTRO EDUCATIVO ESCUELA FRANCISCO MIRANDA
203	Antioquia	TURBO	Turbo	IE SAN MARTIN DE PORRES	SEDE GONZALO MEJIA
196	Atlántico	Atlántico	Malambo	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MESOLANDIA	Sede Principal
194	Bolívar	Bolívar	Maria la Baja	INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA AGROINDUSTRIAL DE FLAMENCO	EL NISPERO

La viabilización jurídica de los predios priorizados por el Ministerio se realiza de manera eficiente, siempre que sea necesario y solicitado por el Ministerio de Educación Nacional (MEN). Es un paso fundamental para garantizar el adecuado desarrollo de proyectos educativos y el cumplimiento de los objetivos establecidos por el MEN, de acuerdo con lo anterior, en este periodo quedo la verificación predial y técnica así:

SEDES TOTAL INICIAL (150)	
SIN DOCUMENTOS	1 *
POSIBLE VIABILIDAD	0 **
NO VIABLE	9
VIABLES TÉCNICA Y JURÍDICAMENTE	**140**
TOTAL	150

SEDES NUEVAS A PRIORIZAR (9)	
POSIBLE VIABILIDAD	1 *
VIABLES JURÍDICAMENTE	8
TOTAL	9

SEDES PRIORIZACIÓN ACTUALIZADA (136)	
SEDES INICIALMENTE PRIORIZADAS	141
SEDES DESPRIORIZADAS	9
SEDES NUEVAS INCLUIDAS	4
TOTAL	**136**

b. *En consideración a que los proyectos a atender por este contrato se ejecutaran en el marco del Decreto de Emergencia, FINDETER debe acudir a lo establecido en su manual de contratación que permita que los procesos de selección sean eficientes y puedan ser proyectos de respuesta rápida.*

FINDETER implementa en el marco de lo establecido en el Manual Operativo la contratación que permita la ejecución eficiente de los procesos de selección que permita pluralidad de oferentes, asimismo, durante el proceso de ejecución, se ha establecido en la estructuración, la necesidad de optimizar tiempos de respuesta rápidos con sistemas constructivos industrializados.

c. *Elaborar los Estudios Previos e insumos precontractuales para la contratación de las obras y suministros necesarios para atender las necesidades prioritarias en infraestructura y dotación de mobiliario escolar de las sedes educativas afectadas por la temporada de lluvias que sean definidas por el Ministerio de Educación. Así como las interventorías correspondientes, solicitando que se*

acaten los principios que rigen la contratación pública, incluyendo la solicitud de las respectivas garantías que ampare cada contrato con siguientes riesgos: anticipo (si lo hubiere), calidad, cumplimiento, estabilidad de la obra, salarios y prestaciones sociales, responsabilidad civil extracontractual y todo riesgo de construcción, según sea aplicable.

Proyectos en proceso de estructuración

Se han elaborado los Estudios Previos e insumos precontractuales necesarios para la contratación de obras y suministros dirigidos a atender las necesidades prioritarias en infraestructura y dotación de mobiliario escolar en las sedes educativas afectadas por la temporada de lluvias, para apertura de las diferentes convocatorias, tal como ha sido definido por el Ministerio de Educación. Estos estudios y documentos precontractuales son esenciales para establecer las bases de las futuras contrataciones y asegurar la correcta ejecución de los proyectos.

Además, se ha solicitado que, en la contratación de las obras y suministros, así como en las interventorías correspondientes, se respeten los principios que rigen la contratación pública. Esto garantiza la transparencia, la igualdad de oportunidades y la eficiencia en los procesos de contratación.

Asimismo, se ha requerido la inclusión de las garantías correspondientes para amparar los diferentes riesgos asociados a cada contrato. Estas garantías incluyen aspectos como el anticipo, la calidad de la obra, el cumplimiento de los plazos, la estabilidad de la construcción, los salarios y prestaciones sociales de los trabajadores, la responsabilidad civil extracontractual y los posibles riesgos de construcción. Esto proporciona seguridad tanto para la entidad contratante como para los contratistas y contribuye a la adecuada ejecución de los proyectos en línea con las normativas y estándares requeridos.

En el presente periodo se establece definitivamente la estructuración y la contratación de los grupos de contratación de acuerdo con el siguiente listado:

GRUPO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ID MEN No.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	VR. TOTAL AULAS Y MEJORAMIENTO	VR. INTERVENTORÍA	VR. TOTAL OBRA + INTERVENTORÍA
1	Antioquia	Apartadó	66	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS	624.000.000	46.800.000	670.800.000
			86	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO	291.200.000	21.840.000	313.040.000
			118	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO	661.678.027	49.625.852	711.303.879
			161	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL GUINEO	CENTRO EDUCATIVO RURAL EL OSITO	403.329.013	30.249.676	433.578.689
		Turbo	120	I.E. DE DESARROLLO RURAL DE TURBO	E.U. SANTISIMA TRINIDAD	312.000.000	23.400.000	335.400.000
			122	I.E. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	E.U. JESUS MORA	499.200.000	37.440.000	536.640.000
		Ciudad Bolívar	42	I. E. JOSE MARIA HERRAN	C. E. R. PAULINA PUERTA	124.800.000	9.360.000	134.160.000
	Chocó	Carmen del Darién	94	CE PUEBLO NUEVO	CE PUEBLO NUEVO - SEDE PRINCIPAL	522.668.285	39.200.121	561.868.406
		Tadó	55	IE TECNICO AGROAMBIENTAL	SEDE CAMPO ALEGRE	266.693.962	20.002.047	286.696.010
			150	IE TECNICO AGROAMBIENTAL	SEDE MARÍA AUXILIADORA DE MANUNGARA	124.800.000	9.360.000	134.160.000
2	Atlántico	Galapa	64	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA	624.000.000	46.800.000	670.800.000

GRUPO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ID MEN No.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	VR. TOTAL AULAS Y MEJORAMIENTO	VR. INTERVENTORÍA	VR. TOTAL OBRA + INTERVENTORÍA
		Palmar de Varela	91	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL DE PALMAR DE VARELA	JOSE MARIA CORDOBA	561.600.000	42.120.000	603.720.000
		Repelón	83	INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS	INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS - SEDE PRINCIPAL	332.800.000	24.960.000	357.760.000
			84	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE VILLA ROSA	SEDE LA LOMA	229.439.280	17.207.946	246.647.226
			92	INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS	PITA	220.727.086	16.554.531	237.281.617
		Soledad	18	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE PRINCIPAL	665.600.000	49.920.000	715.520.000
			144	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE	915.200.000	68.640.000	983.840.000
			192	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE CABICA	372.384.464	27.928.835	400.313.298
		Luruaco	191	IE CORREGIMIENTO DE SAN JUAN DE TOCAGUA	CORREGIMIENTO DE SAN JUAN DE TOCAGUA	249.600.000	18.720.000	268.320.000
3	Magdalena	Ciénaga	154	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO	1.414.400.000	106.080.000	1.520.480.000
		El Retén	112	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE	COL MPAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE	2.801.018.341	210.076.376	3.011.094.717
			156	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE	SEDE CONC.ESC GENERAL GREGORIO GARZON	436.800.000	32.760.000	469.560.000
		Puebloviejo	111	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS	ERM ISLA DE CATAQUITA	83.200.000	6.240.000	89.440.000
			126	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS	ERM EL TRIUNFO	166.400.000	12.480.000	178.880.000
4	Bolívar	Córdoba	71	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE TACAMOCHO	TACAMOCHO (SEDE PRIMARIA)	447.519.640	33.563.973	481.083.613
			73	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE TACAMOCHO	NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE TACAMOCHITO	493.484.507	37.011.338	530.495.845
		Mompós	29	INSTITUCIÒN EDUCATIVA TÈCNICA AMBIENTAL DE TIERRA FIRME	I.E.T.A. AMBIENTAL DE TIERRA FIRME - SEDE PRINCIPAL	1.125.688.392	84.426.629	1.210.115.022
			49	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DEL CHICAGUA	SAN LUIS	340.577.024	25.543.277	366.120.301
	Magdalena	San Sebastián de Buenavista	113	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA	ERM MARIA AUXILIADORA	488.073.254	36.605.494	524.678.748
			114	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA	ERM LA PACHA	623.194.392	46.739.579	669.933.972
			139	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE TRONCOSO	ERM DE JAIME	161.669.820	12.125.237	173.795.057
5	Bolívar	Barranco de Loba	6	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR	I.E.T.A. LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR - SEDE PRINCIPAL	468.319.640	35.123.973	503.443.613
			9	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR	ATASCOZA	364.668.644	27.350.148	392.018.792
			10	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR	LOS CERRITOS	296.559.820	22.241.987	318.801.807
		San Martín de Loba	43	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA PESQUERA LEONIDAS ORTIZ ALVEAR DE CHIMÍ	PLAN BONITO	233.285.404	17.496.405	250.781.809
	Cesar	Chimichagua	146	CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO	SEDE TRONCONAL	133.346.981	10.001.024	143.348.005
			147	CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO	SEDE PUERTO LA ESTANCIA	130.159.820	9.761.987	139.921.807
			148	CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO	SEDE TORRECILLA	124.800.000	9.360.000	134.160.000

GRUPO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ID MEN No.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	VR. TOTAL AULAS Y MEJORAMIENTO	VR. INTERVENTORÍA	VR. TOTAL OBRA + INTERVENTORÍA
		Curumaní	30	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	603.200.000	45.240.000	648.440.000
			97	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	SEDE CHINELA	83.200.000	6.240.000	89.440.000
			98	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	SEDE GUAIMARAL	124.800.000	9.360.000	134.160.000
			101	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	SEDE LOS SERRENOS	83.200.000	6.240.000	89.440.000
	Magdalena	Concordia	13	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE BASICA Y MEDIA SANTA CRUZ DE BALSAMO	ERM DE BALSAMO	485.009.460	36.375.710	521.385.170
			14	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE BASICA Y MEDIA SANTA CRUZ DE BALSAMO	JAR INF MIS PRIMEROS SUEÑOS	161.669.820	12.125.237	173.795.057
		El Banco	24	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ANTONIO NARIÑO	CENT EDUC RUR MIX JOSE DE LA PAZ VANEGA ORTIZ	546.091.802	40.956.885	587.048.688
			32	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL SILVIA COTES DE BISWELL	ERM SANTA TERESA DE ISLITA	244.487.366	18.336.552	262.823.918
			133	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL OSCAR PISCIOTTI NUMA	ERM INMACULADA CONCEPCION	192.455.361	14.434.152	206.889.513
6	Cesar	El Paso	74	INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE LA ESPERANZA	291.200.000	21.840.000	313.040.000
			75	INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE EL VALLITO	145.600.000	10.920.000	156.520.000
			77	INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE SAN ANGEL	65.079.910	4.880.993	69.960.903
			79	INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE LA ESTACION	132.643.683	9.948.276	142.591.959
		La Paz (Robles)	45	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA CAÑO PADILLA YUKPA	SEDE EL COSO	150.447.043	11.283.528	161.730.571
		Valledupar	4	INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ	IE ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ	457.600.000	34.320.000	491.920.000
			48	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ	INSTITUTO TECNICO COMERCIAL JOSE EUGENIO MARTINEZ	956.800.000	71.760.000	1.028.560.000
7	Guajira	Barrancas	143	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL PROVINCIAL	CENTRO ETNOEDUCATIVO PROVINCIAL	249.600.000	18.720.000	268.320.000
		Maicao	50	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2	SEDE LA CAMPANA	499.200.000	37.440.000	536.640.000
			51	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6	YAMAIN - SEDE PRINCIPAL	62.400.000	4.680.000	67.080.000
			53	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2	SEDE KASICHE	339.830.481	25.487.286	365.317.767
			54	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2	SEDE WAYUUMA ANA	127.479.910	9.560.993	137.040.903
			151	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2	SEDE LA ESTRELLA	314.679.910	23.600.993	338.280.903
			152	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6	YAMAIN - KASPOLIMANA	252.966.903	18.972.518	271.939.421
			153	ESCUELA RURAL MIXTA TALOULUMA'ANA	ESCUELA RURAL MIXTA TALOULUMA'ANA	857.226.526	64.291.989	921.518.516
		Manaure	11	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	ESCUELA RURAL INDÍGENA KARALOUTAMANA	190.566.903	14.292.518	204.859.421
		Riohacha	34	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA #7	APÜNIMA´ANA1	252.279.910	18.920.993	271.200.903
			60	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN	COOPERATIVO	416.000.000	31.200.000	447.200.000
			95	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN	JOSE ANTONIO GALAN	374.400.000	28.080.000	402.480.000
			117	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA #7	WAKUAPAMANA	224.079.460	16.805.960	240.885.420
8	Bolívar	María la Baja	134	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA	BUENOS AIRES	249.600.000	18.720.000	268.320.000
			135	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA	I.E.T. AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA	1.800.127.638	135.009.573	1.935.137.211

GRUPO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ID MEN No.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	VR. TOTAL AULAS Y MEJORAMIENTO	VR. INTERVENTORÍA	VR. TOTAL OBRA + INTERVENTORÍA
	Córdoba	Ayapel	103	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO	ESC NVA PARCELAS LONDRES	220.984.367	16.573.828	237.558.194
		Cotorra	28	INSTITUCION EDUCATIVA LOS AGUACATES	CENT EDUC LOS AGUACATES	124.800.000	9.360.000	134.160.000
		Montelíbano	119	INSTITUCION EDUCATIVA EL PALMAR	ESCUELA NUEVA MIXTA DIVINO SALVADOR	745.087.893	55.881.592	800.969.485
		Planeta Rica	69	INSTITUCION EDUCATIVA LOMA AZUL	LOS CERROS	430.464.507	32.284.838	462.749.345
		Puerto Libertador	70	INSTITUCION EDUCATIVA PICA PICA VIEJO	ESC NVA LA SOLITA	254.085.404	19.056.405	273.141.809
		Tuchín	2	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ALVARO ULCUE CHOCUE	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ALVARO ULCUE CHOCUE	1.074.838.830	80.612.912	1.155.451.742
9	Arauca	Arauca	138	CENTRO EDUCATIVO MONSERRATE	CEAR MONSERRATE	299.239.730	22.442.980	321.682.710
		Saravena	56	CENTRO EDUCATIVO LA PAVA.	LA PAVA	83.200.000	6.240.000	89.440.000
	Bolívar	Morales	20	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PALMA	LA ARCADIA	83.200.000	6.240.000	89.440.000
		Simití	123	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CERRO DE VERACRUZ	CAMPO PAYARES	232.352.784	17.426.459	249.779.243
			124	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CERRO DE VERACRUZ	I.E. DEL CERRO DE VERACRUZ - SEDE PRINCIPAL	595.799.550	44.684.966	640.484.516
	Capital Bogotá, D.C.	Bogotá, D.C.	33	COLEGIO LA CHUCUA (IED)	CENT EDUC DIST LA CHUCUA	332.800.000	24.960.000	357.760.000
			136	COLEGIO ESTRELLA DEL SUR (IED)	COL DIST ESTRELLA DEL SUR	166.400.000	12.480.000	178.880.000
	Cundinamarca	Anolaima	104	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE HUGO ENCISO	ESCUELA RURAL EL DESCANSO	190.313.503	14.273.513	204.587.016
	Meta	Villavicencio	96	INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO FRANCISCO ARANGO	ESCUELA SIETE DE AGOSTO	924.437.134	69.332.785	993.769.919
	Norte de Santander	La Playa	132	CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN PEDRO	SEDE LA PEÑA	41.600.000	3.120.000	44.720.000
	Santander	Barrancabermeja	141	CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN	CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN	494.421.269	37.081.595	531.502.864
		Betulia	17	INSTITUCION EDUCATIVA EL RAMO	CENTRO EDUCATIVO SANTA BARBARA	62.400.000	4.680.000	67.080.000
		Vélez	7	COLEGIO UNIVERSITARIO	COLEGIO UNIVERSITARIO	926.718.332	69.503.875	996.222.206
	Tolima	Santa Isabel	67	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BOLIVAR	LA HUMAREDA	188.797.003	14.159.775	202.956.778
			100	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BOLIVAR	EL BRASIL	188.797.003	14.159.775	202.956.778
10	Cauca	Santander de Quilichao	16	INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO	DOMINGUILLO (sede principal)	1.235.282.193	92.646.164	1.327.928.358
			164	IE DOMINGUILLO	SEDE DOMINGO LASSO	124.800.000	9.360.000	134.160.000
		Suarez	188	IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA	SEDE PRINCIPAL	790.400.000	59.280.000	849.680.000
			189	IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA	SEDE MARIA INMACULADA	1.225.093.375	91.882.003	1.316.975.378
			190	IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA	SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	374.400.000	28.080.000	402.480.000
		Toribío	12	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PLAYA	CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO LA PLAYA - SEDE PRINCIPAL	338.159.820	25.361.987	363.521.807
	Chocó	Bahía Solano (Mutis)	105	IE LUIS LOPEZ DE MESA	SEDE DE SAN JOSE (HUACA)	148.792.381	11.159.429	159.951.810
			106	IE LUIS LOPEZ DE MESA	SEDE SIRENA DEL MAR	41.600.000	3.120.000	44.720.000
			107	IE LUIS LOPEZ DE MESA	SEDE SECUNDINO RIVAS	291.200.000	21.840.000	313.040.000
	Valle del Cauca	Guadalajara de Buga	62	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	JHON F. KENNEDY	540.800.000	40.560.000	581.360.000
			85	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	LA PLANTA	204.237.183	15.317.789	219.554.972
			128	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE - SEDE PRINCIPAL	166.400.000	12.480.000	178.880.000
			129	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	JULIAN MENDOZA GUERRERO	208.000.000	15.600.000	223.600.000

GRUPO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ID MEN No.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	VR. TOTAL AULAS Y MEJORAMIENTO	VR. INTERVENTORÍA	VR. TOTAL OBRA + INTERVENTORÍA
			130	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	LA HONDA	164.153.683	12.311.526	176.465.209
			158	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	SEDE CRISTOBAL COLON	162.637.183	12.197.789	174.834.972
11	Cauca	Balboa	46	C.E. BUENOS AIRES	CAPITANES	83.200.000	6.240.000	89.440.000
			65	I.E. OLAYA (ANTES C.E. OLAYA)	OLAYA (sede principal)	416.000.000	31.200.000	447.200.000
		Bolívar	3	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA NUESTRA SENORA DE LOS REMEDIOS	COLEGIO DEPARTAMENTAL NUESTRA SENORA DE LOS REMEDIOS	436.800.000	32.760.000	469.560.000
			58	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO NUESTRA SENORA DEL CARMEN	CORRAL VIEJO	127.479.910	9.560.993	137.040.903
			59	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO NUESTRA SENORA DEL CARMEN	NUESTRA SENORA DEL CARMEN (sede principal)	299.239.730	22.442.980	321.682.710
			90	CENTRO EDUCATIVO EL TAMBO	LA FUENTE	191.162.093	14.337.157	205.499.250
			93	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CARMEN	EL CARMEN (sede principal)	62.400.000	4.680.000	67.080.000
		El Tambo	22	I.E. HUISITO	HUISITO (sede principal)	1.041.842.757	78.138.207	1.119.980.964
		La Vega	44	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA SANTA RITA	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA RITA (sede principal)	166.400.000	12.480.000	178.880.000
			163	I.E AGROPECUARIA SAN FRANCISCO JAVIER SEDE GARAY	I.E AGROPECUARIA SAN FRANCISCO JAVIER SEDE GARAY	177.904.227	13.342.817	191.247.044
		Popayán	165	IE COMUNEROS	SEDE PRINCIPAL	457.600.000	34.320.000	491.920.000
		Rosas	175	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA	SANTA TERESITA (sede principal)	790.400.000	59.280.000	849.680.000
			178	INSTITUCION EDUCATIVA MADRE CARIDAD BRADER	MADRE CARIDAD BRADER (sede principal)	124.800.000	9.360.000	134.160.000
			182	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO CORDOBA	LAS YERBAS	83.200.000	6.240.000	89.440.000
			183	CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO LEON VALENCIA	LA DESPENSA	62.400.000	4.680.000	67.080.000
			184	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO CORDOBA	EL RETIRO	83.200.000	6.240.000	89.440.000
			186	CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO LEON VALENCIA	EL ALTILLO	62.400.000	4.680.000	67.080.000
			187	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO CORDOBA	BELLAVISTA	62.400.000	4.680.000	67.080.000
12	Cauca	Piamonte	27	CENTRO EDUCATIVO PUERTO GUAYUYACO	ESCUELA RURAL MIXTA LA ESPANOLA	62.400.000	4.680.000	67.080.000
			121	CENTRO EDUCATIVO PUERTO GUAYUYACO	ESC RUR MIX SAN ANDRESITO	41.600.000	3.120.000	44.720.000
			125	INST EDUC AGRIC PIAMONTE	PIAMONTE (sede principal)	1.553.938.473	116.545.386	1.670.483.859
			173	ESC RUR MIX FRAY EZEQUIEL	ESC RUR MIX FRAY EZEQUIEL	195.752.201	14.681.415	210.433.616
			174	E.D.R PORTO GUAYUYACO SEDE PRINCIPAL	E.D.R PORTO GUAYUYACO SEDE PRINCIPAL	166.400.000	12.480.000	178.880.000
	Huila	Acevedo	26	INSTITUCION EDUCATIVA BATEAS	BATEAS	310.453.360	23.284.002	333.737.362
	Nariño	BARBACOAS	87	INSTITUCION EDCUATIVA TERAIMBE	SEDE 9 CUMAINDE	62.400.000	4.680.000	67.080.000
			110	INSTITUCION EDUCATIVA TERAIMBE	SEDE 2 BOMBON	124.800.000	9.360.000	134.160.000
		Cumbal	36	INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCION DE TALLAMBI	INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCION DE TALLAMBI	764.787.529	57.359.065	822.146.593
		El Rosario	8	CENTRO EDUCATIVO LA CLAUDIA	CENTRO EDUCATIVO LA CLAUDIA	62.400.000	4.680.000	67.080.000
		Ipiales	142	INSTITUCION EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL LOS PASTOS	ESCUELA LAS CRUCES	208.000.000	15.600.000	223.600.000

GRUPO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ID MEN No.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	VR. TOTAL AULAS Y MEJORAMIENTO	VR. INTERVENTORÍA	VR. TOTAL OBRA + INTERVENTORÍA
		Mallama (Piedrancha)	149	CENTRO EDUCATIVO MALLAMA	CENTRO EDUCATIVO DE MALLAMA	62.400.000	4.680.000	67.080.000
		Pasto	1	I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE	I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - SEDE PRINCIPAL	436.800.000	32.760.000	469.560.000
	Putumayo	Orito	127	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL UMADA WUARRARA	ESC RUR MIX ALTO ORITO	127.913.503	9.593.513	137.507.016
		Puerto Asís	172	E. RUR CAUCACIA - SEDE PRINCIPAL	SEDE PRINCIPAL	249.600.000	18.720.000	268.320.000
		Puerto Asís	41	I. E. RUR CAUCACIA	ESC RUR MIX EL JARDIN ALTO TETEYE	197.100.201	14.782.515	211.882.716
			57	I. E. RUR CAUCACIA	ESC RUR MIX EL PROGRESO	167.997.003	12.599.775	180.596.778
		Puerto Leguizamo	88	IE RUR LUIS VIDALES DEL PIÑUÑA NEGRO	ESC RUR MIX PUERTO PRINCIPE DOS	124.800.000	9.360.000	134.160.000
Total general						52.593.871.997	3.944.540.400	56.538.412.397

d. *Evaluar los proponentes, así como las propuestas presentadas para la construcción de las obras de infraestructura educativa e interventorías correspondientes y realizar la adjudicación y contratación de dichos procesos.*

Una vez concluidos los procesos de convocatoria y realizadas las evaluaciones exhaustivas de los proponentes y sus respectivas propuestas para la construcción de las obras de infraestructura educativa y las interventorías correspondientes, nos complace informar en este periodo que dichos procesos han llegado a su fin. Se ha llevado a cabo una rigurosa revisión bajo los parámetros establecidos en los Términos de Referencia, asegurando que se cumplan los lineamientos de contratación pública en términos de transparencia y equidad.

Gracias a este esfuerzo, se ha procedido con éxito a la adjudicación de los contratos, seleccionando a los proponentes que demostraron las mejores capacidades técnicas, financieras y operativas. Todos los grupos han sido debidamente contratados, lo que asegura que las obras se desarrollarán dentro de los plazos previstos y bajo los más altos estándares de calidad.

Nuestro compromiso con la excelencia en la ejecución de las obras y el adecuado control mediante las interventorías asegurará que estas infraestructuras aporten un valor significativo a la comunidad educativa, garantizando su correcto desarrollo y el bienestar de los beneficiarios.

1.4 ACTIVIDADES CONTRACTUALES

1.4.1 Obligaciones:

a. *Ejecutar a través de los contratistas seleccionados y hacer seguimiento a la calidad y entrega de las obras de infraestructura educativa diseñadas para atender las afectaciones a las sedes educativas priorizadas por el MEN.*

FINDETER, en concordancia con la naturaleza de los proyectos a abordar bajo el marco del Decreto de Emergencia, ha adelantado en el presente periodo la ejecución de diversas sedes educativas. Estos proyectos se han llevado a cabo mediante la colaboración de contratistas que fueron rigurosamente seleccionados a través de procedimientos transparentes y estructurados, conforme a lo estipulado en el Manual de Contratación de FINDETER.

La selección de contratistas no fue un proceso aleatorio, sino que siguió una serie de etapas bien definidas, que incluyeron la evaluación de capacidades técnicas, experiencia previa en proyectos similares, y solidez financiera. Este enfoque metodológico garantiza que los proyectos se ejecuten con altos estándares de calidad y dentro de los plazos establecidos, lo cual es crucial en contextos de emergencia donde la eficiencia y la efectividad son primordiales.

Adicionalmente, la supervisión y el monitoreo continuo de los avances de las obras permiten asegurar que se cumplan todas las normativas vigentes y que los recursos asignados se utilicen de manera óptima. FINDETER ha implementado mecanismos de control y seguimiento que incluyen auditorías periódicas y la utilización de tecnología para el seguimiento en tiempo real de las obras. Esto no solo brinda transparencia al proceso, sino que también facilita la identificación temprana de posibles inconvenientes y la implementación de medidas correctivas oportunas.

b. *Ejercer la vigilancia de los contratos de obra contratando las respectivas interventorías y ejercer la supervisión a los contratos de interventoría que se deriven del presente contrato.*

FINDETER adelantó en el presente periodo un riguroso ejercicio de vigilancia de los contratos de obra mediante la contratación de las respectivas interventorías. Esta medida se implementó con el objetivo de asegurar el adecuado desarrollo de los proyectos de infraestructura, en línea con los estándares de calidad y los plazos establecidos.

La contratación de interventorías y la posterior supervisión de sus actividades permitirán crear un sistema de verificación y seguimiento continuo, asegurando la transparencia en el proceso de ejecución de las obras y proporcionando un mecanismo de retroalimentación para la garantía de la calidad, la eficiencia y el cumplimiento de los estándares requeridos en las obras de infraestructura educativa, quedando así el resumen de este periodo:

GRUPO	TIPO DE CONTRATO	CÓDIGO	DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS	FECHA DE ADJUDICACIÓN	CONTRATISTA	VALOR OFERTADO	OBSERVACIONES
1	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-052-2023	Antioquia - Apartadó Antioquia - Turbo Antioquia - Ciudad Bolívar Chocó - Carmen del Darién Chocó - Tadó	03/10/2023	INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S	$271.455.247	Liquidado el 25 de febrero del 2025
1	OBRA	PAF-MENAM-O-049-2023		06/10/2023	OBRAS CAPITAL S. A	$3.447.332.359	Liquidado el 31 de enero del 2025
2	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-053-2023	Atlántico - Repelón Atlántico - Galapa Atlántico – Soledad - Atlántico - Palmar De Varela Atlántico - Luruaco	26/09/2023	RM INGENIEROS S.A.S.	$295.715.000	Entregado el 15 de noviembre del 2024
2	OBRA	PAF-MENAM-O-050-2023		06/10/2023	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023	$4.044.124.630	Entregado el 15 de noviembre del 2024
3	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-054-2023	Magdalena - Ciénaga Magdalena - El Retén Magdalena - Pueblo viejo	26/09/2023	CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3	$351.774.412	Liquidado el 20 de diciembre del 2024
3	OBRA	PAF-MENAM-O-051-2023		06/10/2023	CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA	$4.744.960.153	Liquidado el 01 de noviembre del 2024
4	OBRA	PAF-MENAM-O-052-2023	Bolívar - Córdoba Bolívar - Mompós Magdalena - San Sebastián de Buenavista	20/09/2023	JASA LTDA	$3.566.467.466	Liquidado el 30 de septiembre del 2024
4	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-055-2023		26/09/2023	CONSORCIO INTER EDUCATIVO G4	$264.974.745	Entregado 22 de marzo del 2024
5	OBRA	PAF-MENAM-O-053-2023	Bolívar - Barranco De Loba Magdalena - Concordia Magdalena - El Banco Cesar - Curumaní Bolívar - San Martín De Loba Cesar - Chimichagua	03/10/2023	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5	$4.102.044.984	Terminado el 08 de noviembre del 2024
5	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-056-2023		06/10/2023	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5	$300.856.990	Terminado el 08 de enero del 2025

GRUPO	TIPO DE CONTRATO	CÓDIGO	DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS	FECHA DE ADJUDICACIÓN	CONTRATISTA	VALOR OFERTADO	OBSERVACIONES
6	OBRA	PAF-MENAM-O-056-2023	Cesar - Valledupar Cesar - La Paz Cesar - El paso	29/09/2023	DAR ARQUITECTURA S.A. S	$2.102.352.000	Liquidado el 20 de noviembre del 2024
6	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-058-2023		03/10/2023	CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023	$155.543.411	Liquidado el 27 de noviembre del 2024
8	OBRA	PAF-MENAM-O-055-2023	Córdoba – Tuchín Córdoba – Cotorra Córdoba - Planeta Rica Córdoba - Puerto Libertador Córdoba – Ayapel Córdoba - Montelíbano Bolívar - María la Baja	29/09/2023	DAR ARQUITECTURA S.A. S	$4.706.470.280	Entregado 21 de agosto del 2024
8	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-057-2023		13/10/2023	LUIS GUILLERMO NARVÁEZ RICARDO	$297.097.668	Entregado 21 de agosto del 2024
7	OBRA	PAF-ATMEN5-O-036-2024	Guajira – Manaure Guajira – Rioacha Guajira - Maicao Guajira - Barrancas	19/03/2024	Consorcio Guajira 7	4.158.777.879	Entregado el 28 de febrero del 2025
7	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-059-2023		17/04/2024	GERMÁN ADOLFO PERDOMO PACHÓN	295.239.000	Terminado el 17 de enero del 2025
9	OBRA	PAF-ATMEN5-O-037-2024	Santander - Vélez, Betulia, Barrancabermeja Bolívar – Morales Bogotá Arauca - Saravena -Arauca Tolima - Santa Isabel Meta – Villavicencio Cundinamarca – Anolaima Bolívar – Simiti Norte de Santander - La Playa	19/03/2024	CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9	4.810.476.306	Etapa 2
9	INTERVENTORÍA	PAF-ATMEN5-I-064-2024		28/06/2023	CONSORCIO SAN GABRIEL	313.800.000	Etapa 2
10	OBRA	PAF-MENAM-O-080-2023	Cauca - Suárez Cauca - Santander De Quilichao Chocó - Bahía Solano Cauca – Toribío Valle Del Cauca - Guadalajara De Buga	23/11/2023	CONSORCIO FIN GRUPO 10	$6.014.978.800	Etapa 2
10	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-062-2023		15/12/2023	CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO	$327.496.568	Etapa 2
11	OBRA	PAF-MENAM-O-079-2023	Cauca - El Tambo Cauca - La Vega Cauca - Balboa Cauca - Popayán Cauca - Rosas	27/11/2023	CONSORCIO FIN GRUPO 11	$ 4.728.021.810	Terminado el 27 de noviembre del 2024
11	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-063-2023		22/12/2023	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	$312.927.160,00	Terminado el 27 de noviembre del 2024
12	OBRA	PAF-MENAM-O-076-2023	Nariño – Pasto Putumayo - Puerto Asís Cauca – Piamonte Nariño – Ipiales Nariño - Mallama	27/11/2023	CONSORCIO FIN GRUPO 12	$ 4.918.276.400	Terminado el 05 de diciembre del 2024
12	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-064-2023		22/12/2023	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	$ 351.774.412	Terminado el 05 de diciembre del 2024
Dotación	SUMINISTRO	PAF-ATMEN5-S-041-2024	Choco - Carmen del Darién, Tadó Antioquia – Apartadó Atlántico – Repelón, Soledad Bolívar – Mompós, Barranco de Loba, San Martín de Loba, María la Baja Cauca - Santander de Quilichao, Suarez, El Tambo, Bolívar, La Vega, Rosas Cesar - La Paz (Robles), El Paso Córdoba - Planeta Rica, Puerto Libertador, Ayapel, Montelíbano Magdalena - El Retén, San Sebastián de Buenavista	22/08/2024	DOTAESCOL SAS	$ 584.310.000	Suspendido el día 26 de noviembre del 2024

Nota: Según el informe previo sobre el estado de los grupos de contratación y de cada institución educativa, se comunica que **el Grupo 4 ha sido entregado el 22 de marzo de 2024, el Grupo 3 ha sido entregado el 30 de abril de 2024, Grupo 6 ha sido entregado el 17 de mayo de 2024, el Grupo 8 ha sido entregado el 21 de agosto de 2024**, **el Grupo 1 ha sido entregado el 29 de octubre de 2024**, satisfacción entre rectores, estudiantes y familias. Además, se está avanzando en el proceso de estructuración de los estudios preliminares para equipar las nuevas aulas construidas, con el objetivo de entregarlas completamente dotadas.

c. *Conformar un Comité Fiduciario y un Comité Técnico Operativo al interior del PATRIMONIO AUTÓNOMO administrado por la FIDUCIARIA contratada, de acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo que para el efecto se adopte.*

Durante este periodo se realizaron los siguientes comités:

Comités Técnicos

Para el presente periodo no se adelantan actividades de este tipo.

Comités Fiduciarios

Para el presente periodo no se adelantan actividades de este tipo.

a. ACTIVIDADES DE CIERRE Y LIQUIDACIÓN

i. Obligaciones:

a. *Adelantar la liquidación o cierre de los contratos derivados para la ejecución de los proyectos y del Contrato Interadministrativo una vez estos hayan finalizado.*

De la contratación derivada

En el presente periodo se ha planificado anticipadamente la liquidación o cierre de los contratos derivados con el propósito de asegurar una ejecución eficiente de los proyectos. Esta estrategia no solo facilitó una gestión financiera más efectiva, sino que también permitió cumplir con los objetivos establecidos dentro de los plazos previstos, optimizando así los recursos disponibles y garantizando la correcta finalización de las obligaciones contractuales, así mismo se adelantaron las siguientes liquidaciones:

GRUPO	TIPO DE CONTRATO	CÓDIGO	DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS	FECHA INCIO	FECHA TERMINACIÓN	CONTRATISTA	OBSERVACIONES
1	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-052-2023	Antioquia - Apartadó Antioquia - Turbo Antioquia - Ciudad Bolívar Chocó - Carmen del Darién Chocó - Tadó	14/11/2023	29/10/2024	INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S	Liquidado el 25 de febrero del 2025
1	OBRA	PAF-MENAM-O-049-2023		14/11/2023	14/08/2024	OBRAS CAPITAL S. A	Liquidado el día 31/01/2025
2	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-053-2023	Atlántico - Repelón Atlántico - Galapa Atlántico – Soledad - Atlántico - Palmar De Varela Atlántico - Luruaco	26/09/2023	05/11/2024	RM INGENIEROS S.A.S.	Radicado el 27/02/2025 a través PRISA INC 2025-000621
2	OBRA	PAF-MENAM-O-050-2023		06/10/2023	05/09/2024	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023	Radicado el 27/02/2025 a través PRISA INC 2025-000620
3	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-054-2023	Magdalena - Ciénaga Magdalena - El Retén Magdalena - Pueblo viejo	14/11/2023	30/04/2024	CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3	Liquidado el día 20/12/2024
3	OBRA	PAF-MENAM-O-051-2023		14/11/2023	30/04/2024	CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA	Liquidado el día 01/10/2024

GRUPO	TIPO DE CONTRATO	CÓDIGO	DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS	FECHA INCIO	FECHA TERMINACIÓN	CONTRATISTA	OBSERVACIONES
1	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-052-2023	Antioquia - Apartadó Antioquia - Turbo Antioquia - Ciudad Bolívar Chocó - Carmen del Darién Chocó - Tadó	14/11/2023	29/10/2024	INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S	Liquidado el 25 de febrero del 2025
1	OBRA	PAF-MENAM-O-049-2023		14/11/2023	14/08/2024	OBRAS CAPITAL S. A	Liquidado el día 31/01/2025
2	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-053-2023	Atlántico - Repelón Atlántico - Galapa Atlántico – Soledad - Atlántico - Palmar De Varela Atlántico - Luruaco	26/09/2023	05/11/2024	RM INGENIEROS S.A.S.	Radicado el 27/02/2025 a través PRISA INC 2025-000621
2	OBRA	PAF-MENAM-O-050-2023		06/10/2023	05/09/2024	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023	Radicado el 27/02/2025 a través PRISA INC 2025-000620
4	OBRA	PAF-MENAM-O-052-2023	Bolívar - Córdoba Bolívar - Mompós Magdalena - San Sebastián de Buenavista	24/10/2023	22/03/2024	JASA LTDA	Liquidado el día 30/09/2024
4	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-055-2023		24/10/2023	22/03/2024	CONSORCIO INTER EDUCATIVO G4	Inicia su trámite de liquidación una vez que quede desembolsado el último pago.
6	OBRA	PAF-MENAM-O-056-2023	Cesar - Valledupar Cesar - La Paz Cesar - El paso	29/09/2023	17/05/2024	DAR ARQUITECTURA S.A. S	Liquidado el día 20/11/2024
6	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-058-2023		03/10/2023	17/05/2024	CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023	Liquidado el día 27/11/2024
8	OBRA	PAF-MENAM-O-055-2023	Córdoba – Tuchín Córdoba – Cotorra Córdoba - Planeta Rica Córdoba - Puerto Libertador Córdoba – Ayapel Córdoba - Montelíbano Bolívar - María la Baja	29/09/2023	DAR ARQUITECTURA S.A. S	$4.706.470.280	Se encuentra en revisión de la fiducia.
8	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-057-2023		13/10/2023	LUIS GUILLERMO NARVÁEZ RICARDO	$297.097.668	En consolidación y revisión documentos por la supervisión para el inicio del proceso de liquidación.

Del Contrato Interadministrativo

Para el presente periodo no se adelantan actividades de este tipo.

2. RESUMEN GENERAL DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL CONTRATO

CONTRATO No CO1.PCCNTR. 4917031 de 2023

Valor inicial del Contrato (CO1.PCCNTR. 4917031 de fecha 2023)	63.650.000.000
Valor del Contrato a la fecha de corte del Informe	**63.650.000.000**
Descuentos / Impuestos Estampilla Pro-Universidad Nacional / Tasas y Contribuciones (Correspondiente al 2% aplicado al valor Inicial del Contrato)	-
Asistencia Técnica No. 1 (Porcentaje de Asistencia Técnica y Administración de Recursos a reconocer a FINDETE, 7%)	4.164.018.692
Valor disponible para ejecutar los proyectos de acuerdo con el objeto del contrato y el plan operativo.	**59.485.981.308**

3. ANEXOS

Se remiten anexos de acuerdo con las actividades realizadas durante el periodo así:

1. 14 de febrero del 2025

HERNÁN PARDO BOTERO
Gerente de Infraestructura
FINDETER GB

JESÚS ALBERTO CAÑAS PÁEZ
Gestor del Contrato Interadministrativo
FINDETER

Elaboró: Geraldine Lorena Prada Pimiento – Profesional de la Gerencia de Infraestructura



Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Contrato No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023

14 FEBRERO DE 2025

Hacienda

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública


Contrato No. 4917031-2023

136 **sedes educativas**
[instalación de aulas y mejoramientos]

$ 63.650
Millones de pesos

Fecha inicio: 2/06/2023
Fecha Fin Actual: 01/07/2025

Grupo	Departamentos / Municipios	Etapa Actual del grupo/% de avance de contrato Fecha de Inicio –Fecha de Terminación
G1 [10 sedes]	Antioquia | Chocó	Entregado [100,00%] 14/11/2023 - 14/08/2024
G2 [8 sedes]	Atlántico	Entregado [100,00%] 27/11/2023 -06/09/2024
G3 [5 sedes]	Magdalena	Liquidado [100,00%] 14/11/2023 - 30/04/2024
G4 [5 sedes]	Bolívar	Entregado [100,00%] 26/10/2023 - 23/03/2024
G5 [16 sedes]	Bolívar | Magdalena | Cesar	Entregado [100,00%] 14/11/2023 – 08/11/2024
G6 [7 sedes]	Cesar	Entregado [100,00%] 15/11/2023 - 17/05/2024
G7 [13 sedes]	Guajira	Terminado [100,00%] 31/05/2024 - 17/01/2025
G8 [9 sedes]	Córdoba | Bolívar	Entregado [100,00%] 08/11/2023 - 23/08/2024
G9 [12 sedes]	Santander | Bolívar | Bogotá | Arauca | Tolima | Meta | Cundinamarca | Nte de Santander	En obra[33,97%] 23/08/2024 - 08/03/2025
G10 [15 sedes]	Cauca | Chocó | Valle Del Cauca	En Obra [90,22%] 19/02/2023 - 30/12/2024
G11 [18 sedes]	Cauca	Terminado [100,00%] 12/02/2023 - 27/11/2024
G12 [18 sedes]	Nariño | Putumayo | Cauca	Terminado [100,00%] 20/02/2023 - 04/12/2024
Dotación	46 Sedes a dotar - 99 aulas	Suspendido[100,00%] 03/10/2024 – 03/12/2024

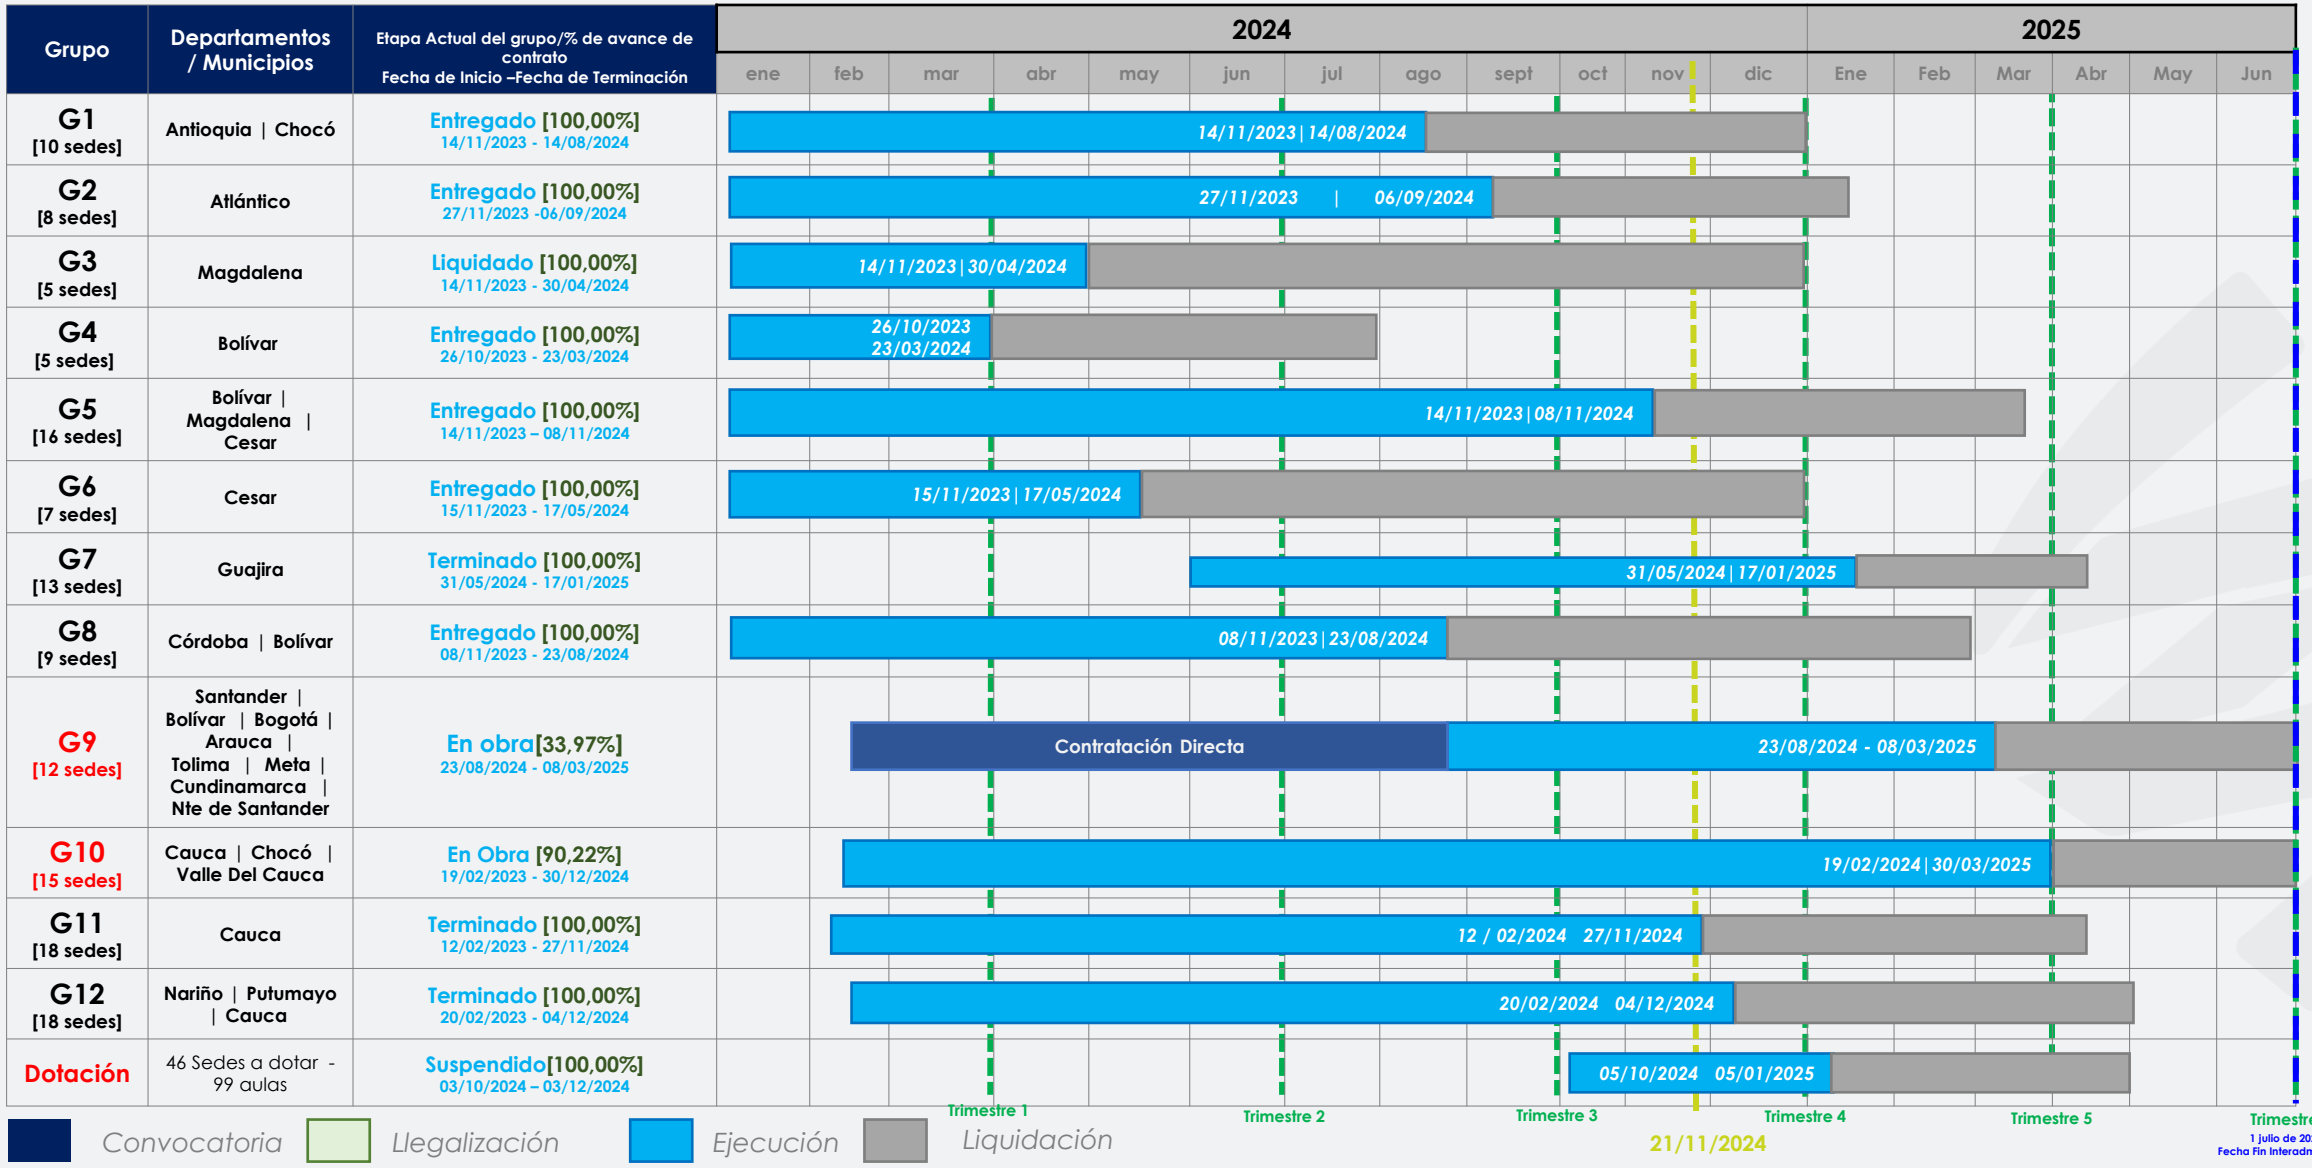

Convocatoria | Llegalización | Ejecución | Liquidación

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

Aulas Móviles
Contrato No. 4917031-2023

Educación

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

136 **sedes educativas**
[instalación de aulas y mejoramientos]

$ 63.650
Millones de pesos

Fecha inicio: 02/06/2023
Fecha Fin: 01/07/2025

ENTREGADAS 116 sedes 85,29%


TERMINADAS 5 sedes 3,68%

Físicamente culminadas. A la espera de firma de actas para ser entregadas

EN EJECUCIÓN 15 sedes 9,56%

POR INICIAR 2 sedes 1,47%

Estado de entrega y ejecución de Sedes

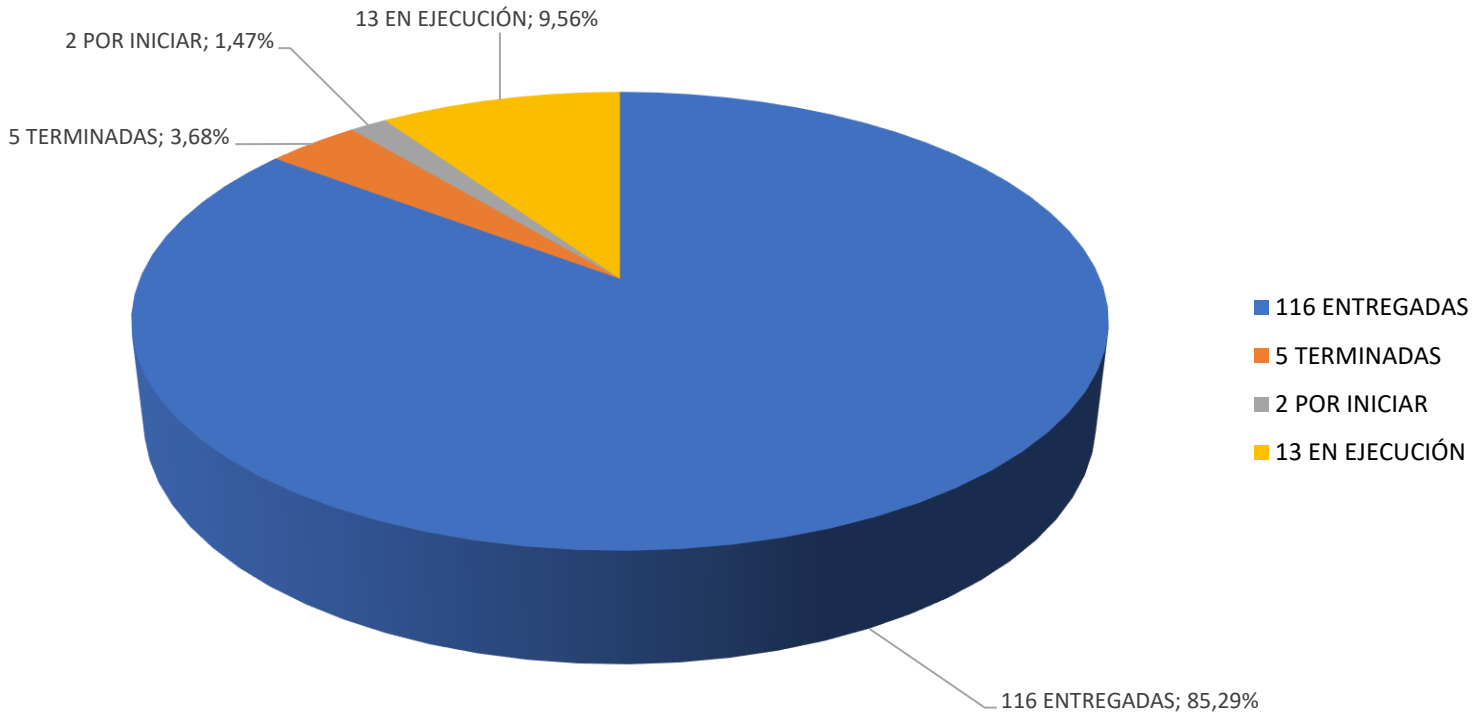

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Estado de entrega y ejecución de Sedes

136 **sedes educativas**
[instalación de aulas y mejoramientos]

$ 63.650
Millones de pesos

Fecha inicio: 02/06/2023
Fecha Fin: 01/07/2025

ENTREGADAS	TERMINADAS	EN EJECUCIÓN	POR INICIAR
116 sedes 85,29%	5 sedes 3,68%	13 sedes 9,56%	2 sedes 1,47%
Grupo 1 - 10 Grupo 2 - 8 Grupo 3 - 5 Grupo 4 - 5 Grupo 5 - 16 Grupo 6 - 7 Grupo 7- 13 Grupo 8 - 9 Grupo 10 - 10 Grupo 11 - 16 Grupo 12 - 17	Grupo 9 - 1 Grupo 10 - 1 Grupo 11 - 2 Grupo 12 - 1	Grupo 9 - 9 Grupo 10 - 4	Grupo 9 - 2 Grupo 10 - 4

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

PAGOS ASISTENCIA TECNICA

136 **sedes educativas**
[instalación de aulas y mejoramientos]

$ 63.650
Millones de pesos

Fecha inicio: 02/06/2023
Fecha Fin: 01/07/2025

VALOR AT

$ 4.164.018.692

Cobrado (a dic de 2024)	Pagado (a dic de 2024)	SALDO
$3.585.749.431,31	$3.585.749.431, 31	$ 578.269.260,69

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

Resumen Informe Financiero – Corte 31 de diciembre de 2024

136 **sedes educativas**
[instalación de aulas y mejoramientos]

$ 63.650
Millones de pesos

Fecha inicio: 02/06/2023
Fecha Fin: 01/07/2025

VALOR EJECUTADO

$ 49.435 mll

VALOR POR EJECUTAR

$ 14.573 mll

VALOR COMPROMETIDO

$ 59.515 mll

SALDO

$ 398,2 mll*

*El saldo es a corte de 09 de febrero de 2025

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

Rendimientos Financieros – Relación de Pagos

Educación


Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031
Ministerio de Educación Nacional
Financiera del Desarrollo S.A.
7. RENDIMIENTOS FINANCIEROS
01 de diciembre al 31 de diciembre de 2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

FECHA	RENDIMIENTOS CAUSADOS CUENTA DE AHORRO	VALORACIÓN /DESVALORIZACION CAUSADOS FONDO DE INVERSION COLECTIVA - FIC	TOTAL RENDIMIENTOS, VALORACION DEVALORIZACION CAUSADOS	FECHA TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS	VALOR TRASLADO RENDIMIENTOS	AJUSTES / RETENCIONES	SALDO PENDIENTE POR TRASLADAR RENDIMIENTOS	DESVALORIZACION ACUMULADA
ago-23	82.351.406,35	443.947.650,01	**526.299.056,36**				-	-
sep-23	108.927.246,74	548.880.836,71	**657.808.083,45**				-	-
oct-23	131.902.760,66	436.008.307,20	**567.911.067,86**				-	-
nov-23	144.907.033,92	718.224.229,49	**863.131.263,41**				-	-
dic-23	143.221.271,36	788.090.860,63	**931.312.131,99**	13/12/2023	**2.615.149.472,00**		-	-
ene-24	133.626.379,48	427.858.051,59	**561.484.431,07**	10/01/2024	**931.312.131,99**		-	-
feb-24	120.547.529,88	474.970.095,24	**595.517.625,12**	12/02/2024	**561.484.430,15**		-	-
mar-24	117.745.976,50	478.495.863,61	**596.241.840,11**	12/03/2024	**595.517.625,12**		-	-
abr-24	100.331.907,69	259.736.382,70	**360.068.290,39**	10/04/2024	**596.241.840,11**		-	-
may-24	89.374.457,56	353.632.163,66	**443.006.621,22**	11/05/2024	**360.068.290,39**		-	-
jun-24	76.820.331,89	266.323.590,41	**343.143.922,30**	13/06/2024	**443.006.621,22**		-	-
jul-24	68.012.790,67	294.233.627,01	**362.246.417,68**	15/07/2024	**343.143.922,30**		-	-
ago-24	21.741.419,32	313.006.436,96	**334.747.856,28**	14/08/2024	**362.246.417,68**		-	-
sep-24	20.861.120,00	192.185.501,19	**213.046.621,19**	10/09/2024	**334.747.856,28**		-	-
oct-24	27.022.756,52	71.175.915,03	**98.198.671,55**	18/10/2024	**213.046.621,19**		-	-
nov-24	21.729.373,21	129.213.183,82	**150.942.557,03**	13/11/2024	**98.198.671,55**		-	-
dic-24	19.252.522,64	66.886.746,40	**86.139.269,04**	10/12/2024	**150.942.557,03**		**86.139.269,04**	-
TOTAL	**1.428.376.284,39**	**6.262.869.441,66**	**7.691.245.726,05**		**7.605.106.457,01**	-	**86.139.269,04**	-

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

Rendimientos Financieros – Comprobante de pago

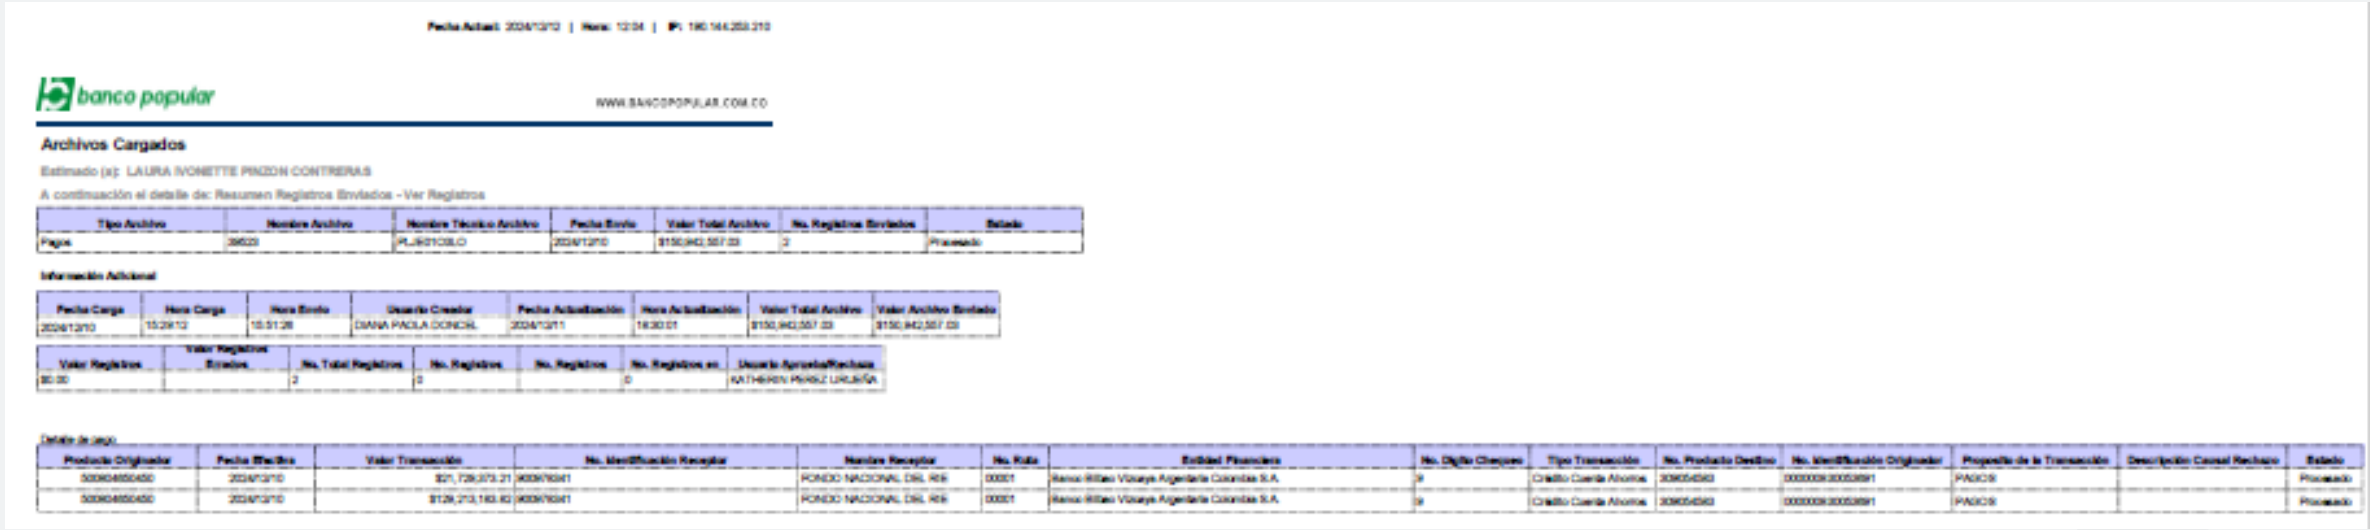

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Archivos Cargados

Estimado (a): LAURA IVONETTE PINZON CONTRERAS

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	39520	PLJ521C08.O	2024/12/10	$150,842,557.03	2	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/12/10	15:29:12	15:51:26	DIANA PAOLA DONCEL	2024/12/11	18:30:01	$150,842,557.03	$150,842,557.03

Valor Registros	Valor Registros Enviados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		2	0		0	KATHERIN PEREZ URUEÑA

Detalle de pago

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	No. Rubi	Entidad Financiera	No. Digito Chequeo	Tipo Transacción	No. Producto Destino	No. Identificación Originador	Propósito de la Transacción	Descripción Causal Rechazo	Estado
50090455450	2024/12/10	$21,728,073.21	900976041	FONDO NACIONAL DEL RIE	00001	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	9	Crédito Cuenta Ahorros	309054583	0000009300536891	PAGOS		Procesado
50090455450	2024/12/10	$128,213,183.82	900976041	FONDO NACIONAL DEL RIE	00001	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	9	Crédito Cuenta Ahorros	309054583	0000009300536891	PAGOS		Procesado

NOTA: Teniendo en cuenta el contrato MEN-4917031 2023 -TEMPORADA DE LLUVIAS, y en atención a la obligación descrita en la cláusula tercera, Obligaciones específicas del contratista, Numeral 8 el cual dice:

"8. El Patrimonio Autónomo — Findeter deberá reintegrar mensualmente los rendimientos financieros (si los hubiere) a la Dirección del Tesoro Nacional o en los términos que establezca la normatividad aplicable, es decir, que no ingresan ni hacen parte del Patrimonio Autónomo constituido por Findeter."

Se han consignado los rendimientos financieros a la siguiente cuenta:

- **Banco:** BBVA
- **Tipo:** Ahorros
- **No. Cuenta:** 309-054583
- **Nombre de la Cuenta:** FIDUPREVISORA S.A FNGRD – COLOMBIA VITAL

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

AULAS MOVILES
INFORME DETALLADO POR GRUPO DE INTERVENCION

Febrero 14 de 2025



NGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres

Educación

Colombia Vital

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

CONTRATOS EN EJECUCION

GRUPO	Departamento	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	ALERTAS, ASUNTOS PENDIENTES
GRUPO 9	Arauca, Bolívar, Cundinamarca Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima y Bogotá D.C.	**12**	23/08/2024	08/03/2025	82,61%	47,90%	Se han presentado inconvenientes por precipitaciones para los proyectos ubicados en el Tolima, lo cual está generando que se tenga que solicitar una prórroga por dos (2) meses y quince (15) días calendario para la culminación de actividades en estas sedes. Se han presentado demoras en la ejecución de actividades e inicio de obras en algunas sedes educativas, lo cual a la fecha genera un alto atraso; por lo anterior, se inició proceso de apremio el cual fue notificado por la fiduciaria el 03 de febrero de 2025 y se presentaron descargos el día 11/02/2024, los cuales están siendo analizados por la interventoría para la continuación del mismo.
GRUPO 10	Cauca, Valle del Cauca y Choco	**15**	19/02/2024	30/03/2025	89,07%	86,23%	Los proyectos del Cauca se han visto afectados por temas de orden público en los últimos días de enero y primeros de febrero, lo cual han generando suspensión actividades parciales y retiro de personal trabajador por temor a la situación, hechos que han afectado los avances de los proyectos y actualmente están generando atrasos frente a la programación. Adicional el proyecto de Santander de Quilichao se encuentra en avance a su programación pero pendiente de que la administración municipal construya las acometidas para realizar las conexiones pertinentes por parte del proyecto, se ha reiterado al solicitud y necesidad de la misma, sobre la cual informan que se encuentran adelantando los tramites para abrir la convocatoria y adjudicar el contrato, ya que en el mes de diciembre adelantaron este proceso pero el mismo se declaro desierto.

CCOM-FO-005 V1 / 05-Ago-2024 / Publica

Grupo 09

Fecha inicio: 23/08/2024
Fecha Fin: 08/03/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Departamento	**Arauca, Bolívar, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima y Bogotá D.C.**
$	**Valor Inicial** Obra: $ 4.810.476.306,00 Interventoría: $ 313.800.000
	Adiciones Obra: $ 0 Interventoría: $165.685.393,30
	Valor Pagado Obra: CI- $245.711.234,70 CII - $ 1.177.717.523,99 Interventoría: CI - $0 CII - $ 96.927.168,55
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Otrosí No. 1: Retiro de tres (3) sedes del alcance Otrosí No. 2: Prórroga tres (3) meses obra e interventoría, adición interventoría por $165.685.393,30
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	El contratista se retrasó en el inicio de las obras en todas las sedes educativas; se han iniciado actividades en algunas sedes educativas faltantes, sin embargo, esto no mitiga los atrasos que tiene el contrato. A la fecha se tienen en ejecución 10 de las 12 sedes educativas. Se encuentra en espera de presentación de descargos por parte del contratista e informe de la interventoría para continuación de aplicación de apremio. Se presenta la necesidad de hacer una prórroga por 2,5 meses para las sedes ubicadas en el departamento del Tolima por los inconvenientes en transporte que se han presentado.

47,90%
Porcentaje de avance

82,61%
Porcentaje Programado

Sedes:	**12**
En ejecución:	10
Por iniciar:	2

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Grupo 09


COLEGIO UNIVERSITARIO - ID No. 7




IE DEL CERRO DE VERACRUZ -ID No. 124




CENTRO EDUCATIVO MONSERRATE - ID No. 138

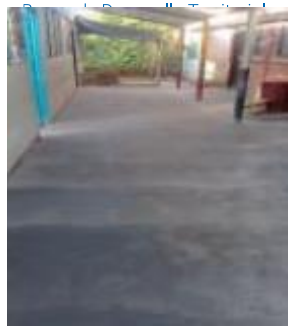CENTRO EDUCATIVO LA PAVA - ID No. 56




ESCUELA SIETE DE AGOSTO - ID No. 96




SEDE LA PEÑA – ID No. 132




EL DESCANSO - ID No. 104




CAMPO PAYARES -ID No. 123




CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Grupo 10

Fecha inicio: 19/02/2024
Fecha Fin: 30/03/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Departamento	**Cauca, Valle del Cauca y Choco**
$	**Valor Inicial** Obra: $6.014.978.800 Interventoría: $327.496.568
	Adiciones Obra: $602.576.550 Interventoría: $197.588.004,15 ($79.155.973,39 asumidos por el contrato de obra) ($118.432.030,76 asumidos por el contrato interadministrativo)
	Valor Pagado Obra: $5.620.758.289,00 Interventoría: $394.815.767,36
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	3 otrosíes obra: Prórrogas (9 meses y 27 dias) 3 otrosíes interventoría: Prórrogas (9 meses y 27 dias) y adiciones ($197.588.004,15)
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	En cumplimiento al alcance se tienen 11 sedes entregadas y AEP&SC suscritas, y 4 sedes en ejecución, (2 Suarez, 1 Santander de Quilichao, 1 Bahía Solano). Se adelanta programa para realizar la entrega de la sede la Huaca en Bahía solano de la semana del 18 al 21 si se logra coordinar la agenda con el rector, frente a las obras de Suarez y Santander de Quilichao se continua con el avance de actividades con un personal mínimo derivado de los temas de orden publico que están afectando los avances de los proyectos y se evalúa una no posible terminación dentro de los tiempos contractuales.

86,23%
Porcentaje de avance

89,07%
Porcentaje Programado

Sedes:	**15**
En ejecución:	4
Por iniciar:	0
Entregadas:	11

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial


INSTITUCION E.TECNICA AGRARIA SEDE PRINCIPAL ID MEN. 188.




INSTITUCION E.TECNICA AGRARIA SEDE INMACULADA ID MEN. 189.




INSTITUCION E.TECNICA AGRARIA SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ID MEN. 190

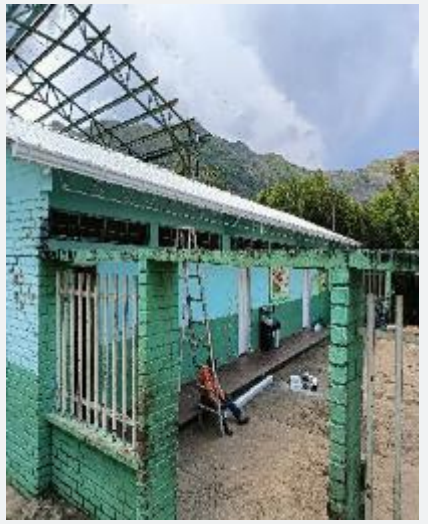INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PLAYA ID MEN: 12. MUNICIPIO DE TORIBIO ID MEN: 12.




INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO SEDE DOMINGO LASSO ID 164.




INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO SEDE PRINCIPAL ID 16




CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE JOHN F. KENNEDY




IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDEJULIAN MENDOZA GUERRERO




IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE PRINCIPAL




IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE LA HONDA .




IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE LA PLANTA .




IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE CRISTOBAL COLÓN




lica

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE. LUIS LOPEZ DE MESA SEDE SAN JOSE (HUACA)





IE. LUIS LOPEZ DE MESA SEDE SECUNDINO RIVAS




IE. LUIS LOPEZ DE MESA SEDE SIRENA DEL MAR




CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

CONTRATOS SUSPENDIDOS

GRUPO	Departamento	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	OBSERVACIONES
DOTACIÓN	Antioquia, Atlántico, Bolivar, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Putumayo, Santander, Tolima, Valle del Cauca	**46**	03/10/2024	02/12/2024	Valor del contrato inicial de $584.310.000,00 y otro sí proyectado de $364.000.000 y adición de 3 meses por las condiciones de accesibilidad de las nuevas sedes. Contrato Suspendido para la incorporación de los recursos. Se realiza el Otro Sí y se citará a comité la 3era semana del mes de febrero. Dotación entregada en los grupos 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 y 11 y, pendiente la entrega de los grupos 5, 7, 9, 10 y 12. La ejecución se realiza en 16 departamentos, 38 municipios y se realiza la dotación de 99 aulas nuevas construidas.

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Estado Entrega de Dotación



CENTRO EDUCATIVO INDIGENA CAÑO PADILLA YUKPA
Sede El Coso La Paz – Cesar



INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO
Sede Escuela Nueva Parcelas Londres
Ayapel - Córdoba



INSTITUCION EDUCATIVA EL PALMAR
Escuela Nueva Mixta Divino Salvador
Monte Líbano - Córdoba



INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO
Sede Principal Santander de Quilichao - Cauca



INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA ERM MARIA AUXILIADORA Sede
Sebastián de Buenavista - Magdalena



INSTITUCION EDUCATIVA TIERRA FIRME
Mompox - Bolivar

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

CONTRATOS TERMINADOS

GRUPO	Departamento	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	OBSERVACIONES
GRUPO 11	Cauca	**18**	12/02/2024	27/11/2024	Contratista avanza en las gestiones de entrega a Directivos de las sedes terminadas y recibidas por interventoría, las cuales son Santa Teresita en el municipio de Rosas y Francisco Javier sede Garay en el municipio de la Vega. Inicialmente el recibo de estas sedes se atrasó debido al periodo de vacaciones de los Directivos, y una vez reanudado el año escolar se informaron posventas en algunos espacios. En la IE Francisco Javier sede Garay las posventas ya fueron atendidas y se esta gestionando la firma del acta de recibo por parte del Rector. En la IE Santa Teresita están próximos a terminar la subsanación de las posventas informadas.
GRUPO 12	Cauca, Huila, Nariño y Putumayo	**1**	20/02/2024	05/12/2024	Contratista avanza en las gestiones de entrega a Directivos de las sedes terminadas y recibidas por interventoría, las cuales son Santa Teresita en el municipio de Rosas y Francisco Javier sede Garay en el municipio de la Vega. Inicialmente el recibo de estas sedes se atrasó debido al periodo de vacaciones de los Directivos, y una vez reanudado el año escolar se informaron posventas en algunos espacios. En la IE Francisco Javier sede Garay las posventas ya fueron atendidas y se esta gestionando la firma del acta de recibo por parte del Rector. En la IE Santa Teresita están próximos a terminar la subsanación de las posventas informadas.

CCOM-FO-005-V1.1/05-Ago-2024/-Pública

Grupo 11

Fecha inicio: 12/02/2024
Fecha Fin: 27/11/2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Departamento	**Cauca**
$	**Valor Inicial** Obra: $ 4.728.021.810 Interventoría: $ 312.927.160
	Adiciones Obra: $ 0 Interventoría: $ 99.972.853,00 ($ 54.867.110,00 asumidos por el contrato de obra) ($ 45.105.743,00 asumidos por el contrato interadministrativo)
	Valor Pagado Obra: $ 4.721.624.076,00 Interventoría: $ 379.820.020,17
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	3 otrosíes obra: Prórrogas (6 meses) 3 otrosíes interventoría: Prórrogas y adiciones (6 meses - $ 99.972.853,00)
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	Contratista avanza en las gestiones de entrega a Directivos de las sedes terminadas y recibidas por interventoría, las cuales son Santa Teresita en el municipio de Rosas y Francisco Javier sede Garay en el municipio de la Vega. Inicialmente el recibo de estas sedes se atrasó debido al periodo de vacaciones de los Directivos, y una vez reanudado el año escolar se informaron posventas en algunos espacios. En la IE Francisco Javier sede Garay las posventas ya fueron atendidas y se esta gestionando la firma del acta de recibo por parte del Rector. En la IE Santa Teresita están próximos a terminar la subsanación de las posventas informadas.





CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO




I.E. Agropecuaria Santa Rita – Sede principal
La vega




C.E. Buenos Aires – Sede Capitanes
Balboa




C.E. Guillermo León Valencia – Sede La Despensa
Rosas





C.E. Guillermo León Valencia – El Altillo
Rosas

CCOM-FO-005 V1 / 05 - Ago-2024 / Pública
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO




I.E. El Carmen – Sede principal
Bolívar




I.E. Alfonso Córdoba – Sede Las Yerbas
Rosas




I.E. Alfonso Córdoba – Sede Bellavista
Rosas




I.E. Técnica Agropecuaria Nuestra Señora de los
Remedios - Bolívar

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada
CCOM-FO-005 V1 / 05 - Ago-2024 / Pública

Grupo 12

Fecha inicio: 12/02/2024
Fecha Fin: 05/12/2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Departamento	**Cauca, Huila, Nariño y Putumayo**
$	**Valor Inicial** Obra: $ 4.918.276.400,00 Interventoría: $ 318.105.088,00
	Adiciones Obra: $ 0 Interventoría: $ 152,015,642,00
	Valor Pagado Obra: $ 4.906.706.463,00 Interventoría: $ 413.123.412
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	2 otrosíes obra: Prórrogas (6 meses) 2 otrosíes interventoría: Prórrogas y adiciones (6 meses - $ 152,015,642,00)
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	Total de 18 sedes, entregadas a satisfacción con recibo de interventoría y rectores de 17 sedes y pendiente la entrega de 1 sede en Piamonte ID 125. Inst Educ Agric Piamonte – Cauca, se encuentra pendiente recibo por el rector, se solicitó acompañamiento a Cobertura, Secretaria de Educación del Cauca y MEN para realizar la suscripción el día 14/02/2025. Se solicitó a la empresa de energía del Putumato y Alcaldía realizar los trámites necesarios sobre la ampliación de carga de la institución, dado que las obras realizadas por este contrato son de mejoramiento y no afecto la carga actual de la institución. Se solicita compromiso para realizar trámite por la Secretaria de Planeación de Piamonte – Cauca y reunión seguimiento 18/02/2025.





CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Estado GRUPO 12, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO




ID1 Pasto, Nariño - I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE




ID8 El Rosario - Nariño, CENTRO EDUCATIVO LA CLAUDIA




ID26 Acevedo, Huila - INSTITUCION EDUCATIVA BATEAS




ID27 Piamonte - Cauca, ESCUELA RURAL MIXTA LA ESPANOLA

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada
CCOM-FO-005 V1 / 05 - Ago-2024 / Pública

CONTRATOS ENTREGADOS

GRUPO	Departamento	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	OBSERVACIONES
Grupo 1	Antioquia, Chocó	**10**	14/11/2023	14/08/2024	• CONTRATO PAF-MENAM-O-049-2023: Liquidación realizada el 31.01.2025. • CONTRATO PAF-MENAM-I-052-2023: Terminado el 29.10.2024 - Liquidación radicada el 2 de diciembre de 2024, mediante prisa INC 2024-002246, asignación liquidador Mireya Artunduaga, el 11.02.2025 se traslada a revisión y VoBo de la Fiduciaria Popular para solicitar Firmas, proceso que se proyecta se de en la semana al 15 de febrero de 2025.
Grupo 2	Atlántico	**8**	27/11/2023	05/09/2024	CONTRATO PAF-MENAM-O-050-2023: Terminado el 05.09.2024 CONTRATO PAF-MENAM-I-053-2023: Terminado el 05.11.2024 **AERS COMPONENTE 2:** • Contrato de obra suscrita el 10.02.2025 y en proceso de actualización de pólizas para revisión y aprobación por parte de la Fiduciaria Popular. • Contrato de interventoría en proceso de revisión para presentar a firmas, proceso que se espera se de en la semana del 17 al 21 de febrero de 2025 En recopilación documental, cierre de balances y memorias entre el contratista e interventoría, se proyecta radicar la liquidación del contrato de obra al 28 de febrero de 2025 y posterior la de interventoría.

CCOM-FO-005 V1 / 05 Ago 2024 / Pública

CONTRATOS ENTREGADOS

GRUPO	Departamento	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	OBSERVACIONES
Grupo 4	Magdalena y Bolívar	**7**	24/10/2023	07/02/2024	Se encuentra liquidado el contrato de obra. El contrato de interventoría iniciará su trámite de liquidación una vez que quede desembolsado el último pago.
Grupo 5	Magdalena y Bolívar	**16**	14/11/2023	08/11/2024	CONTRATO PAF-MENAM-O-053-2023: Terminado el 08.11.2024 CONTRATO PAF-MENAM-I-056-2023: Terminado el 08.01.2025 **AERS COMPONENTE 2:** • Contrato de Obra e Interventoría, en proceso de revisión y VoBo por parte de la Fiduciaria Popular, para pasar a firmas, una vez se tenga las AERS suscritas se procederá a solicitar la actualización de pólizas. En recopilación documental, cierre de balances y memorias entre el contratista e interventoría, se proyecta radicar la liquidación del contrato de obra al 15 de marzo de 2025 y posterior la de interventoría.
Grupo 7	La Guajira	**13**	31/05/2024	17/01/2025	Se encuentra en elaboración por parte de la interventoría el AERS del componente II para tramitar firma ante fidupopular. El contrato de obra iniciará su trámite de liquidación una vez que quede desembolsado el último pago; el cual deben facturar a inicios de marzo y pagado a finales de marzo 2025. Con respecto a la interventoría le falta facturar casi un 60% y se estima si liquidación para iniciar a finales de abril 2025.
Grupo 8	Córdoba y Bolívar	**9**	08/11/2023	08/07/2024	En expedición el acta de liquidación del contrato. En consolidación la información del contrato de interventoría. Se proyecta su liquidación en el mes de marzo

CCOM-FO-005-V1.1/05-Ago-2024/ Pública

Grupo 1

Fecha inicio: 14/11/2023
Fecha Fin: 14/08/2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Departamento	**Antioquia, Chocó**
$	**Valor Inicial** Obra: $3.447.332.359 Interventoría: $271.455.247
	Adiciones Obra: $201.152.963 Interventoría: $53.764.065,32 ($28.580.295 asumidos por el contrato de obra) ($25.183.770,32 asumidos por el contrato interadministrativo)
	Valor Pagado Obra: $3.425.566.080,21 Interventoría: $300.482.403,41
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	2 otrosíes obra: Prórrogas (5 meses y 15 dias) y adición ($$201.152.963) 2 otrosíes interventoría: Prórrogas (6 meses) y adiciones ($53.764.065,32)
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	• CONTRATO PAF-MENAM-O-049-2023: Liquidación realizada el 31.01.2025. • CONTRATO PAF-MENAM-I-052-2023: Terminado el 29.10.2024 - Liquidación radicada el 2 de diciembre de 2024, mediante prisa INC 2024-002246, asignación liquidador Mireya Artunduaga, el 11.02.2025 se traslada a revisión y VoBo de la Fiduciaria Popular para solicitar Firmas, proceso que se proyecta se de en la semana al 15 de febrero de 2025.

100%
Porcentaje de avance

100%
Porcentaje Programado

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Publica

GRUPO 1, Departamentos de Antioquia – Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL GUINEO - SEDE CE EL OSITO - ID No. 161




INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO ID No. 118




INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS ID No. 66




INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO ID No. 86




INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS SEDE EU JESÚS MORA ID No. 112




INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MARTÍN DE PORRES SEDE EU GONZALO MEJÍA




CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

GRUPO 1, Departamentos de Antioquia – Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA HERRÁN SEDE CER PAULINA PUERTA
ID No. 42





INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROAMBIENTAL SEDE MARÍA AUXILIADORA DE MANUNGARA
ID No. 150





INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR DEMETRIO SALAZAR CASTILLO SEDE CE ESCUELA FRANCISCO MIRANDA





CENTRO EDUCATIVO PUEBLO NUEVO SEDE PRINCIPAL
ID No. 94







CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Grupo 2

Fecha inicio: 27/11/2023
Fecha Fin: 05/09/2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Departamento	**Atlántico**
$	**Valor Inicial** Obra: $4.044.124.630 Interventoría: $295.715.000
	Adiciones Obra: $ 0,00 Interventoría: $113.699.014 ($57.808.105,6 asumidos por el contrato de obra) ($55.890.908,4 asumidos por el contrato interadministrativo)
	Valor Pagado Obra: $4.028.747.780,96 Interventoría: $374.270.637,53
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	3 otrosíes obra: Prórrogas (5 meses y 5 dias) 3 otrosíes interventoría: Prórrogas (5 meses y 5 dias) y adiciones ($113.699.014)
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	CONTRATO PAF-MENAM-O-050-2023: Terminado el 05.09.2024 CONTRATO PAF-MENAM-I-053-2023: Terminado el 05.11.2024 AERS COMPONENTE 2: • Contrato de obra suscrita el 10.02.2025 y en proceso de actualización de pólizas para revisión y aprobación por parte de la Fiduciaria Popular. • Contrato de interventoría en proceso de revisión para presentar a firmas, proceso que se espera se de en la semana del 17 al 21 de febrero de 2025 En recopilación documental, cierre de balances y memorias entre el contratista e interventoría, se proyecta radicar la liquidación del contrato de obra al 28 de febrero de 2025 y posterior la de interventoría.

100%
Porcentaje de avance

100%
Porcentaje Programado

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Contratista de Diseño y Obra: PAF-MENAM-O-050-2023 CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 - G2
Contratista interventor: PAF-MENAM-I-053-2023 RM INGENIEROS S A S

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE PRINCIPAL - ID EN 018




INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE PRINCIPAL - ID EN 018




INSTITUCION EDUCATIVA BLAS TORRES DE LA TORRE (ITIDA) - ID MEN 144




INSTITUCION EDUCATIVA DE MESOLANDIA - ID MEN 197




INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS, LAS TABLAS Y PITA, SEDE PITA - ID MEN 092




INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS, LAS TABLAS Y PITA, SEDE LAS TABLAS - ID MEN 083




INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE VILLA ROSA, SEDE LA LOMA - ID MEN 084






INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA DE GALAPA - ID MEN 064






Grupo 4

Fecha inicio: 24/10/2023
Fecha Fin: 07/02/2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Departamento	**Magdalena y Bolívar**
$	**Valor Inicial Obra: $3.566.467.466.00** **Valor inicial Interventoria: $264.974.745,00**
	Adiciones Obra: $ 0 Interventoría: $20.000.000.00 (El contratista pago $10.000.000.00 y el convenio $10.000.000.00) **Valor final Interventoria $ 284.974.745,00**
	Valor Pagado Obra: $3.361.652.674.57 Valor Liberado contrato de obra: $204.814.791.43 Interventoría: $279.439.929.41 Valor a Liberar:$5.534.815.59
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Otro Sí 1: Prorroga un (1) y quince (15) días. Otro Sí 2: Exclusion de dos (2) (TACAMOCHO y EDM JAIME) por la imposiblidad técnica para ejecutar.
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	Contrato de Obra Liquidado y culminado. Se inicia tramite de liquidación de la interventoría el 17 de febrero 2025.

100%
Porcentaje de avance

100%
Porcentaje Programado

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Grupo 5

Fecha inicio: 14/11/2023
Fecha Fin: 08/11/2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Departamento	**Magdalena y Bolívar**
$	**Valor Inicial** Obra: $4.102.044.984 Interventoría: $300.856.990
	Adiciones Obra: $778.973.616 Interventoría: $172.224.091 ($91.100.000 asumidos por el contrato de obra) ($81.124.091 asumidos por el contrato interadministrativo)
	Valor Pagado Obra: $4.745.371.433 Interventoría: $420.967.384,31
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	5 otrosíes obra: Prórrogas (7 meses y 20 dias) y adiciones ($778.973.616) 5 otrosíes interventoría: Prórrogas (7 meses y 20 dias) y adiciones ($172.224.091)
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	CONTRATO PAF-MENAM-O-053-2023: Terminado el 08.11.2024 CONTRATO PAF-MENAM-I-056-2023: Terminado el 08.01.2025 AERS COMPONENTE 2: • Contrato de Obra e Interventoría, en proceso de revisión y VoBo por parte de la Fiduciaria Popular, para pasar a firmas, una vez se tenga las AERS suscritas se procederá a solicitar la actualización de pólizas. En recopilación documental, cierre de balances y memorias entre el contratista e interventoría, se proyecta radicar la liquidación del contrato de obra al 15 de marzo de 2025 y posterior la de interventoría.





CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

GRUPO 5, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES SEDE PRINCIPAL
ID No. 30




INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES SEDE SERENOS
ID No. 101




INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES SEDE SERENOS
ID No. 101




INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRISTIAN MORENO SEDE CHINELA
ID No. 97




INSTITUCION EDUCATIVA EL PUEBLITO SEDE PUERTO LA ESTANCIA
ID No. 147




INSTITUCION EDUCATIVA EL PUEBLITO SEDE TORRECILLA
ID No. 148





CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

GRUPO 5, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PUEBLITO SEDE TRONCONAL
ID No. 146




INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL SILVIA COTES DE BISWELL SEDE ISLITA
ID No. 32




INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL OSCAR PISCIOTTI NUMA SEDE INMACULADA CONCEPCION




INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ANTONIO NARIÑO SEDE JOSE DE LA PAZ VANEGAS




INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA CRUZ DE BALSAMO SEDE PRIMARIA
ID No. 13




INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA CRUZ DE BALSAMO SEDE JARDIN INFANTIL
ID No. 14




CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

GRUPO 5, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR SEDE PRINCIPAL
ID No. 06




INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR SEDE CERRITO
ID No. 10




INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR SEDE ATASCOZA
ID No. 09




INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA PESQUERA LEONIDAS ORTIZ ALVEAR SEDE PLAN BONITO
ID No. 43





CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Grupo 7

Fecha inicio: 31/05/2024
Fecha Fin: 17/01/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Departamento	**La Guajira**
$	**Valor Inicial** Obra: $**4.158.777.879** Interventoría: $**295.239.000**
	Adiciones Obra: $ 0 Interventoría: $0
	Valor Pagado Obra: $ 3.738.535.259,01 (89,89%) Interventoría: $121.499.000 (41,15%)
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Suspensión 1 por 20 días 28 de oct de 2024 Prórroga 1 por 45 días 13 de sep de 2024 Suspensión 2 por 30 días 18 de nov de 2024 Prórroga 2 por 30 días 19 de dic de 2024
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	CONTRATO PAF-ATMEN5-O-036-2024: Terminado el 17.01.2025 CONTRATO PAF-MENAM-I-059-2023: Fecha de Terminación el 17.03.2025 Actualmente el contrato de obra está en elaboración del AERS del componente II por parte de la interventoría para firma en fidupopular.





CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

REGISTRO FOTOGRAFICO

I.E. JOSE ANTONIO GALAN- SEDE COOPERATIVO -060-(RIOHACHA)





INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #7 - 034-APÜNIMA´ANA1 -(RIOHACHA)





ESCUELA ETNOEDUCATIVA LA CAMPANA -050--(MAICAO)







ESCUELA ETNOEDUCATIVA WAYUMA'ANA -054- (MAICAO)





CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

REGISTRO FOTOGRAFICO

INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #7 - 117-WAKUAPAMANA -(RIOHACHA)






I.E. JOSE ANTONIO GALAN- SEDE PRINCIPAL -060-(RIOHACHA)






INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #6 - 051-TALOULUMA `ANA -(MAICAO)




INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO RURAL PROVINCIAL - 0143-PROVINCIAL -(BARRANCAS)




CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Publica
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

REGISTRO FOTOGRAFICO

INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA - 011-
ESCUELA RURAL INDIGENA KARALOUTAMANA -(MANAURE)





ESCUELA ETNOEDUCATIVA SEDE KASICHE -053- (MAICAO)













INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #6 - 151-LA
ESTRELLA -(MAICAO)



INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #6 - 051-
YAMAIN SEDE PRINCIPAL -(MAICAO)



INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #6 - 152-
YAMAIN KASPOLIMANA -(MAICAO)









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Grupo 8

Fecha inicio: 08/11/2023
Fecha Fin: 08/07/2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Departamento	**Córdoba y Bolívar**
$	**Valor Inicial** Obra: $$4.706.470.280 M/CTE Interventoría: $297.097.668,00 M/CTE
	Adiciones Obra: $1.455.000.000 Interventoría: $144.106.877
	Valor Pagado Obra: $6.161.470.280 Interventoría: $277.437.804
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Prorroga 1: 2 meses y 15 días Prorroga 1: 2 meses
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	Contrato de obra: liquidado. Contrato de interventoría: En consolidación y revisión documentos por la supervisión para el inicio del proceso de liquidación.





CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

REGISTRO FOTOGRAFICO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Sede principal I. E. El Palmar - Montelíbano



Sede Buenos Aires - María La Baja



Sede Los Cerros - Planeta Rica



Sede Téc. Agrop. De Desarrollo Rural De María la baja - María La Baja



Sede Esc. Nueva Parcelas Londres - Ayapel



Sede Técnica Álvaro Ulcue Chocue - Tuchín



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

REGISTRO FOTOGRAFICO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Sede Esc. Nueva La Solita - Puerto Libertador



Sede Los Aguacates - Cotorra



Sede Níspero-María La Baja





CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

CONTRATOS LIQUIDADOS

GRUPO	Departamento	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	OBSERVACIONES
Grupo 3	Magdalena	**5**	14/11/2023	12/04/2024	**LIQUIDACIÓN Contrato de Obra No. PAF-MENAM-O-051-2023**: Suscrita Acta de liquidación de fecha 01/10/2024, pagado 100%. **LIQUIDACIÓN Contrato de Interventoría No. PAF-MENAM-I-054-2023:**Suscrita Acta de liquidación de fecha 20/12/2024, pagado 100%.
Grupo 6	Cesar	**7**	15/11/2023	29/04/2024	**LIQUIDACIÓN Contrato de Obra No. PAF-MENAM-O-056-2023:** Suscrita Acta de liquidación el 20/11/2024 y pagado al 100%. **LIQUIDACIÓN Contrato de Interventoría No. PAF-MENAM-I-058-2023:** Suscrita Acta de liquidación el 27/11/2024 y pagado al 100%.

CCOM-FO-005 V1 / 05-Ago-2024 / Pública

COMPROMISOS

- Definir por parte de Findeter el valor de la posible adición para el grupo 9.

- Revisar por parte de Findeter el cronograma general de ejecución del convenio teniendo en cuenta que aún no ha iniciado las actividades de 2 sedes en el grupo 9. Tiempos de liquidación será muy corto.

- Agilizar por parte de Findeter el Otro Sí de la dotación y su firma con base en los comité técnicos y fiduciarios a citar.

- Remitir por parte de Findeter el informe de avance de las sedes de Grupo 10, sobre todo de las sedes ejecutadas en Suárez.

- Compartir desde Findeter las actas de entregas de las sedes del Cauca al ing. Juan Carlos Folleco Olave de la secretaria de Educación del Cauca.

- Revisar y confirmar por parte de Findeter que el seguimiento con la Fiduprevisora se ha realizado permanentemente y que la información en la carpeta compartida se encuentra al día.

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública



Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

GRACIAS

www.findeter.gov.co

@findetercol @findetercol
@findeter linkedin.com/company/findeter

Gobierno de Colombia

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023

ATENCIÓN DE NECESIDADES PRIORITARIAS EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR DE LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS

Periodo comprendido entre el 02 de febrero al 01 de marzo de 2025

Bogotá D.C.

TABLA DE CONTENIDO

1. **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO MARCO**
2. **ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO**
   - 2.1 OBLIGACIONES GENERALES
   - 2.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS
   - 2.3 ACTIVIDADES PRECONTRACTUALES
     - 2.3.1 Obligaciones
   - 2.4 ACTIVIDADES CONTRACTUALES
     - 2.4.1 Obligaciones
   - 2.5 ACTIVIDADES DE CIERRE Y LIQUIDACIÓN
     - 2.5.1 Obligaciones
3. **RESUMEN GENERAL DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL CONTRATO**
4. **ANEXOS**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO MARCO

Objeto General:	Brindar Asistencia Técnica y Administración de Recursos para atender las necesidades prioritarias en infraestructura y dotación de mobiliario escolar de las sedes educativas afectadas por la temporada de lluvias que sean definidas por el Ministerio de Educación.	
Numero de Contrato:	CO1.PCCNTR. 4917031	
Integrantes:	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - MEN Y LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER	
Fecha de suscripción:	05 de mayo de 2023	
Perfeccionamiento	Póliza garantía aprobada 26 de mayo de 2023 Registro Presupuestal 02 de junio de 2023	
Fecha de Inicio:	02 de junio de 2023	
Fecha de Terminación:	01 de julio de 2025	
Modificaciones:	Modificatorio No. 1. Modificar la cláusula cuarta - plazo de ejecución del contrato, la cual quedará de la siguiente manera: "El plazo previsto para la ejecución del Contrato Interadministrativo será a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, hasta el 01 de noviembre de 2024, plazo en el que se debe llevar a cabo la ejecución física del contrato y la liquidación de la contratación derivada que suscriba FINDETER."	
	Modificatorio No. 2. "Prorrogar el plazo de ejecución del contrato número CO1.PCCNTR.4917031 de 2023, hasta el 01 de julio de 2025, plazo en el que se debe culminar la ejecución física de las obras de infraestructura educativa, dotación de aulas nuevas por reposición, y la liquidación de la contratación derivada suscrita por FINDETER."	
Aportes:	Valor de los recursos a administrar para la ejecución de los proyectos	$ 59.485.981.308
	Porcentaje de Asistencia Técnica y Administración de Recursos a reconocer a FINDETER (7%)	$ 4.164.018.692
Valor final del Contrato:		$ 63.650.000.000
Sociedad Fiduciaria:	FIDUCIARIA POPULAR S.A.	

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO

1.1 OBLIGACIONES GENERALES

1. *Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas en este contrato.*

En el transcurso del periodo actual, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. (FINDETER) asume con responsabilidad la tarea integral de estructurar, desarrollar y dar seguimiento a todas las actividades derivadas de la ejecución de las diversas obligaciones estipuladas en el contrato vigente. En virtud de su compromiso, FINDETER se esfuerza por cumplir con cada una de las responsabilidades asignadas, garantizando que cada etapa del contrato sea llevada a cabo de manera exitosa y en plena conformidad con los términos y condiciones acordadas previamente.

Es importante destacar que el compromiso de FINDETER no se limita únicamente a la ejecución técnica del contrato, sino que abarca también la garantía de la calidad y la excelencia en cada una de las etapas del proceso. La entidad se esfuerza por mantener altos estándares de rendimiento, asegurando que los resultados obtenidos sean de la más alta calidad posible y estén alineados con los objetivos y metas establecidas.

2. *Participar y apoyar al Ministerio de Educación Nacional en todas las reuniones periódicas a las que este lo convoque relacionadas con la ejecución del contrato que permitan realizar seguimiento integral a los avances de los proyectos.*

Durante el presente periodo FINDETER participó activamente y brindó el pleno apoyo al Ministerio de Educación Nacional en todas las reuniones periódicas a las que se convocaron, especialmente, aquellas relacionadas con la ejecución del contrato. FINDETER está comprometido con realizar un seguimiento integral y detallado de los avances del proyecto, por lo que se establecieron reuniones cada martes en la tarde a través del aplicativo Teams, reuniones programadas por FINDETER sobre las que realizan grabaciones y se informa los avances semanales.

Las fechas de las reuniones de seguimiento del periodo, sobre las cuales se realiza el acta correspondiente, la cual se adjunta al presente informe:

1. 14 de febrero del 2025

3. *Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la información objeto del presente contrato.*

FINDETER ha dispuesto todos los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la información objeto del presente contrato. La seguridad y confidencialidad de la información son de suma importancia, y se ha implementado medidas sólidas para garantizar su protección. Esto incluye la implementación de sistemas de almacenamiento seguro, protocolos de acceso restringido y medidas de respaldo que aseguran que la información esté resguardada de manera adecuada en todo momento. La prioridad es mantener la integridad de la información involucrada en el contrato, así mismo se habilitó los espacios adecuados en la Calle 103 No. 19-20 y en la segunda sede localizada en la Calle 104 # 18ª-65, piso 6 para tal fin.

4. *Entregar a EL MINISTERIO, periódicamente y al finalizar el contrato, o cuando el supervisor o interventor lo solicite, todos los documentos y archivos (físicos y electrónicos) a su cargo y que se produzcan en ejecución de sus obligaciones, lo anterior, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes en el Ministerio de Educación Nacional.*

Durante este periodo, FINDETER ha cumplido rigurosamente con la entrega de todos los documentos y archivos electrónicos que el MEN ha solicitado durante la ejecución del contrato. Esta entrega se realiza de manera periódica y al finalizar el contrato, tal como establecen las normas y disposiciones vigentes en el Ministerio de Educación Nacional. Además, en concordancia con las regulaciones vigentes, también se proporcionará dicha documentación cuando el supervisor o interventor así lo solicite. La prioridad es asegurar que todas las partes involucradas tengan acceso a la información necesaria y que cumplan con todas las obligaciones contractuales en cuanto a la entrega y custodia de documentación.

5. *Colaborar en el suministro y respuesta de la información correspondiente a los requerimientos efectuados por los organismos de control del Estado Colombiano o cualquier otra autoridad, en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato y de asuntos relacionados con el mismo.*

   En este periodo, FINDETER ha colaborado plenamente en el suministro y respuesta de toda la información correspondiente a los requerimientos efectuados por los Entes de Control del Estado Colombiano y cualquier otra autoridad pertinente. La cooperación en este sentido es absoluta y FINDETER está comprometido en proporcionar toda la información necesaria relacionada con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato, así como en asuntos relacionados con el mismo.

   Cumplir con los requisitos de los Entes de Control y las autoridades es fundamental para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en todas las acciones. La disposición a colaborar asegura que el proceso se realice de manera adecuada y en línea con las regulaciones y requerimientos establecidos por las autoridades correspondientes.

6. *Utilizar la imagen del Ministerio de Educación Nacional de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorización expresa y escrita de las partes ningún funcionario, podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole.*

   FINDETER ha seguido rigurosamente los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional en relación con el uso de su imagen. FINDETER es consciente de que, salvo autorización expresa y escrita de las partes involucradas, ningún funcionario puede utilizar el nombre, emblema o sello oficial del Ministerio con fines publicitarios o de cualquier otra índole. La colaboración se adhiere estrictamente a estas directrices para asegurar el respeto mutuo y la integridad en la utilización de la imagen y la identidad del Ministerio. Durante este periodo no se realizaron trámites que contengan la imagen del Ministerio de Educación Nacional.

7. *Guardar estricta confidencialidad sobre toda la información y los documentos obtenidos del MEN.*

   FINDETER ha mantenido una estricta confidencialidad sobre toda la información y los documentos obtenidos del Ministerio de Educación Nacional (MEN). Reconoce la importancia de salvaguardar la información confidencial y sensible proporcionada por el MEN, y se ha implementado medidas rigurosas para garantizar su protección. Se cumple con todas las regulaciones y acuerdos de confidencialidad establecidos para asegurar que la información no sea divulgada ni utilizada de manera inapropiada. El compromiso de FINDETER es mantener la integridad y confidencialidad de la información en todo momento.

8. *Realizar los pagos al SISS (salud, pensión y riesgos laborales), de acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago correspondientes.*

En el presente periodo, se han realizado los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral (SISS), incluyendo Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de acuerdo con la normatividad vigente.

Además, se pueden proporcionar los soportes de pago correspondientes como parte del compromiso con la legalidad y el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales. Cumplir con los requerimientos del SISS es fundamental para asegurar el bienestar de los colaboradores y garantizar el cumplimiento de las regulaciones pertinentes, lideradas por el área de gestión respectiva y validadas por la revisoría fiscal, soportes que serán presentados en el momento en el que se requiera.

1.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

a. *Presentar ante EL MINISTERIO dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes Al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (inicio SECOP), el cronograma de ejecución del objeto del Contrato Interadministrativo.*

FINDETER presentó en el periodo pasado ante el Ministerio de Educación Nacional, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (inicio SECOP), el cronograma actualizado de ejecución del objeto del Contrato Interadministrativo. FINDETER reconoce la importancia de establecer un cronograma claro y detallado para la ejecución de las actividades contractuales, y se ha cumplido con este requisito de manera oportuna. La intención es garantizar una planificación efectiva y transparente de las actividades a llevar a cabo, en consonancia con las regulaciones y directrices establecidas por el Ministerio.

b. *Crear una vez suscrito y legalizado el Contrato Interadministrativo, una cuenta contable para manejo exclusivo de los recursos de este Contrato Interadministrativo dentro del Patrimonio Autónomo constituido para tal fin por FINDETER.*

Una vez suscrito y legalizado el Contrato Interadministrativo, FINDETER ha creado una cuenta contable exclusiva para el manejo de los recursos de este contrato dentro del Patrimonio Autónomo constituido por FINDETER para tal fin. Se da cumplimiento a todos los requisitos y medidas establecidas para asegurar la correcta gestión financiera de los recursos relacionados con el Contrato Interadministrativo. La creación de esta cuenta contable específica en el Patrimonio Autónomo garantiza una administración transparente y adecuada de los recursos, en línea con las normativas y regulaciones pertinentes.

Por lo anteriormente mencionado, se crea la Cuenta de Ahorros No. 500-80465045-0 del Banco Popular para manejo exclusivo de los recursos de este contrato y respectivos reportes contables. Cabe recordar que, se adjuntó al Informe de Gestión N° 1 la Certificación de la Cuenta Bancaria.

Mediante correo electrónico del 24 de octubre de 2023, el MEN remitió oficio por parte del Ministerio de Hacienda, mediante el cual se oficializó la exención de gravamen financiero (GMF) de la cuenta del Patrimonio Autónomo. El cual se adjuntó en informes pasados.

c. *Administrar los recursos que transfiera EL MINISTERIO a través del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres- FNGRD a FINDETER a través del Patrimonio Autónomo constituido para cumplir con el objeto del presente contrato.*

FINDETER ha administrado de manera responsable los recursos que EL MINISTERIO ha transferido a través del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) a FINDETER, utilizando

el PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN AULAS MÓVILES POR OLA INVERNAL constituido por la Fiducia Mercantil FIDUCIARIA POPULAR S.A. para cumplir con el objeto del presente contrato.

El enfoque ha sido garantizar una gestión eficiente y transparente de los recursos para cumplir con los objetivos establecidos en el contrato. El uso adecuado de estos recursos es esencial para asegurar la ejecución exitosa de las actividades y proyectos acordados, en línea con las regulaciones y directrices establecidas por todas las partes involucradas.

d. *Presentar Informes mensuales y un informe final de ejecución financiera y técnica del presente Contrato, conforme los recursos aportados por EL FNGRD,*

Para el presente periodo, se presentará un informe mensual de ejecución financiera por el área de Negocios Fiduciarios de FINDETER y se ha presentado un informe técnico del presente contrato, conforme a los recursos aportados por el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD).

Estos informes son una parte integral de la transparencia y rendición de cuentas en la ejecución del contrato. A través de estos informes, se ha proporcionado una visión detallada de la utilización de los recursos, los avances técnicos logrados y otros aspectos relevantes de la ejecución del contrato. Cumplir con la presentación de estos informes es esencial para mantener una comunicación clara y abierta con EL MINISTERIO y garantizar que todas las partes estén informadas sobre el progreso y los resultados del contrato.

e. *El Patrimonio Autónomo — FINDETER deberá reintegrar mensualmente los rendimientos financieros (si los hubiere) a la Dirección del Tesoro Nacional o en los términos que establezca la normatividad aplicable, es decir, que no ingresan ni hacen parte del Patrimonio Autónomo constituido por FINDETER.*

El Patrimonio Autónomo - FINDETER reintegrará mensualmente los rendimientos financieros a la Dirección del Tesoro Nacional o en los términos que establezca la normatividad aplicable. Estos rendimientos financieros no ingresan ni hacen parte del Patrimonio Autónomo constituido por FINDETER, y la gestión de reintegro se realizará previa solicitud al Ministerio con el fin de que se informe la cuenta bancaria a la cual se debe realizar el mismo.

Este proceso de reintegro asegura la correcta gestión de los rendimientos generados por los recursos aportados y garantiza que estos sean manejados de acuerdo con las regulaciones y normativas pertinentes. De esta manera, se cumple con los requerimientos legales y se mantiene la transparencia en la administración financiera.

Para lo anterior, el 28 de agosto de 2023 se informa por el MEN la cuenta bancaria para el reintegro de rendimientos financieros del Contrato No. CO1.PCCNTR.4917031 la cual se indica a continuación:

Entidad Financiera:	**Banco BBVA**
Tipo de Cuenta:	**Ahorros**
Número de Cuenta:	**309-054583**
Nombre de la cuenta:	**FIDUPREVISORA S.A FNGRD – COLOMBIA VITAL**

1.3 ACTIVIDADES PRECONTRACTUALES

1.3.1 Obligaciones:

a. *Realizar la viabilización técnica y jurídica de los predios priorizados por EL MINISTERIO, cuando sea necesario y sea solicitado por el MEN.*

Durante el presente periodo, se llevó a cabo la viabilización técnica y jurídica priorizada por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) cada vez que ha sido necesario y solicitado por el MEN. La colaboración en este aspecto es esencial para asegurar que los predios sean evaluados y viabilizados de manera adecuada para cumplir con los requisitos técnicos necesarios. El compromiso es facilitar un proceso fluido y eficiente para que los predios sean utilizados de acuerdo con los objetivos y necesidades de cada Institución Educativa, siempre en línea con las regulaciones y disposiciones vigentes.

Durante el periodo, se finalizó la evaluación técnica y predial y que en resumen se describe a continuación en las siguientes tablas:

RESUMEN EVALUACIÓN TÉCNICA DE SEDES

UNIFICACIÓN DE LISTADOS: INICIAL (150) + ADICIONALES (42)	
SEDES VIABLES TÉCNICAMENTE	**150**

RESUMEN EVALUACIÓN JURÍDICA DE SEDES

SEDES TOTAL (150)	
SIN DOCUMENTOS	1 *
POSIBLE VIABILIDAD	0 **
NO VIABLE	9
VIABLES TÉCNICA Y JURÍDICAMENTE	**140**
TOTAL	150

* Sin Documentos:

- Falta de documentos para evidenciar la propiedad y reciprocidad en la revisión y remisión de documentos por la ETC y/o rectores

** Posible Viabilidad:

- Falta documentación soporte para continuar con revisión
- Pendientes gestiones con terceros para saneamiento predial
- Trámites para obtención de sana posesión

Asimismo, en el presente periodo, el listado actualizado de sedes focalizadas son las siguientes:

Consecutivo	ID MEN No.	Departamento	ETC	Municipio	IE	SEDE
1	1	**Nariño**	PASTO	**Pasto**	I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE	I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - SEDE PRINCIPAL
2	2	**Córdoba**	CORDOBA	**Tuchín**	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ALVARO ULCUE CHOCUE	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ALVARO ULCUE CHOCUE
3	3	**Cauca**	CAUCA	**Bolívar**	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA NUESTRA SENORA DE LOS REMEDIOS	COLEGIO DEPARTAMENTAL NUESTRA SENORA DE LOS REMEDIOS

4	4	Cesar	VALLEDUPAR	Valledupar	INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ	IE ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ
5	6	Bolívar	BOLIVAR	Barranco de Loba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR	I.E.T.A. LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR - SEDE PRINCIPAL
6	7	Santander	SANTANDER	Vélez	COLEGIO UNIVERSITARIO	COLEGIO UNIVERSITARIO
7	8	Nariño	NARIÑO	El Rosario	CENTRO EDUCATIVO LA CLAUDIA	CENTRO EDUCATIVO LA CLAUDIA
8	9	Bolívar	BOLIVAR	Barranco de Loba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR	ATASCOZA
9	10	Bolívar	BOLIVAR	Barranco de Loba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR	LOS CERRITOS
10	11	Guajira	LA GUAJIRA	Manaure	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	ESCUELA RURAL INDÍGENA KARALOUTAMANA
11	12	Cauca	CAUCA	Toribío	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PLAYA	CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO LA PLAYA - SEDE PRINCIPAL
12	13	Magdalena	MAGDALENA	Concordia	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE BASICA Y MEDIA SANTA CRUZ DE BALSAMO	ERM DE BALSAMO
13	14	Magdalena	MAGDALENA	Concordia	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE BASICA Y MEDIA SANTA CRUZ DE BALSAMO	JAR INF MIS PRIMEROS SUEÑOS
14	16	Cauca	CAUCA	Santander de Quilichao	INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO	DOMINGUILLO (sede principal)
15	17	Santander	SANTANDER	Betulia	INSTITUCION EDUCATIVA EL RAMO	CENTRO EDUCATIVO SANTA BARBARA
16	18	Atlántico	SOLEDAD	Soledad	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE PRINCIPAL
17	20	Bolívar	BOLIVAR	Morales	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PALMA	LA ARCADIA
18	22	Cauca	CAUCA	El Tambo	I.E. HUISITO	HUISITO (sede principal)
19	24	Magdalena	MAGDALENA	El Banco	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ANTONIO NARIÑO	CENT EDUC RUR MIX JOSE DE LA PAZ VANEGA ORTIZ
20	26	Huila	HUILA	Acevedo	INSTITUCION EDUCATIVA BATEAS	BATEAS
21	27	Cauca	CAUCA	Piamonte	CENTRO EDUCATIVO PUERTO GUAYUYACO	ESCUELA RURAL MIXTA LA ESPANOLA
22	28	Córdoba	CORDOBA	Cotorra	INSTITUCION EDUCATIVA LOS AGUACATES	CENT EDUC LOS AGUACATES
23	29	Bolívar	BOLIVAR	Mompós	INSTITUCIÒN EDUCATIVA TÈCNICA AMBIENTAL DE TIERRA FIRME	I.E.T.A. AMBIENTAL DE TIERRA FIRME - SEDE PRINCIPAL
24	30	Cesar	CESAR	Curumaní	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES
25	32	Magdalena	MAGDALENA	El Banco	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL SILVIA COTES DE BISWELL	ERM SANTA TERESA DE ISLITA
27	34	Guajira	RIOHACHA	Riohacha	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA #7	APÜNIMA´ANA1
28	36	Nariño	NARIÑO	Cumbal	INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCION DE TALLAMBI	INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCION DE TALLAMBI
29	41	Putumayo	PUTUMAYO	Puerto Asís	I. E. RUR CAUCACIA	ESC RUR MIX EL JARDIN ALTO TETEYE
30	42	Antioquia	ANTIOQUIA	Ciudad Bolívar	I. E. JOSE MARIA HERRAN	C. E. R. PAULINA PUERTA
31	43	Bolívar	BOLIVAR	San Martín de Loba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA PESQUERA LEONIDAS ORTIZ ALVEAR DE CHIMÍ	PLAN BONITO
32	44	Cauca	CAUCA	La Vega	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA SANTA RITA	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA RITA (sede principal)
33	45	Cesar	CESAR	La Paz(Robles)	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA CAÑO PADILLA YUKPA	SEDE EL COSO
34	46	Cauca	CAUCA	Balboa	C.E. BUENOS AIRES	CAPITANES
35	48	Cesar	VALLEDUPAR	Valledupar	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ	INSTITUTO TECNICO COMERCIAL JOSE EUGENIO MARTINEZ
36	49	Bolívar	BOLIVAR	Mompós	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DEL CHICAGUA	SAN LUIS
37	50	Guajira	MAICAO	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2	SEDE LA CAMPANA
38	51	Guajira	MAICAO	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6	YAMAIN - SEDE PRINCIPAL
39	53	Guajira	MAICAO	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2	SEDE KASICHE
40	54	Guajira	MAICAO	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2	SEDE WAYUUMA ANA
41	56	Arauca	ARAUCA	Saravena	CENTRO EDUCATIVO LA PAVA.	LA PAVA

42	57	Putumayo	PUTUMAYO	Puerto Asís	I. E. RUR CAUCACIA	ESC RUR MIX EL PROGRESO
43	58	Cauca	CAUCA	Bolívar	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO NUESTRA SENORA DEL CARMEN	CORRAL VIEJO
44	59	Cauca	CAUCA	Bolívar	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO NUESTRA SENORA DEL CARMEN	NUESTRA SENORA DEL CARMEN (sede principal)
45	60	Guajira	RIOHACHA	Riohacha	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN	COOPERATIVO
46	62	Valle del Cauca	BUGA	Guadalajara de Buga	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	JHON F. KENNEDY
47	64	Atlántico	ATLANTICO	Galapa	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA
48	65	Cauca	CAUCA	Balboa	I.E. OLAYA (ANTES C.E. OLAYA)	OLAYA (sede principal)
49	66	Antioquia	APARTADO	Apartadó	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS
50	67	Tolima	TOLIMA	Santa Isabel	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BOLIVAR	LA HUMAREDA
51	69	Córdoba	CORDOBA	Planeta Rica	INSTITUCION EDUCATIVA LOMA AZUL	LOS CERROS
52	70	Córdoba	CORDOBA	Puerto Libertador	INSTITUCION EDUCATIVA PICA PICA VIEJO	ESC NVA LA SOLITA
53	73	Bolívar	BOLIVAR	Córdoba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE TACAMOCHO	NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE TACAMOCHITO
54	74	Cesar	CESAR	El Paso	INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE LA ESPERANZA
55	75	Cesar	CESAR	El Paso	INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE EL VALLITO
56	77	Cesar	CESAR	El Paso	INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE SAN ANGEL
57	79	Cesar	CESAR	El Paso	INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE LA ESTACION
58	83	Atlántico	ATLANTICO	Repelón	INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS	INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS - SEDE PRINCIPAL
59	84	Atlántico	ATLANTICO	Repelón	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE VILLA ROSA	SEDE LA LOMA
60	85	Valle del Cauca	BUGA	Guadalajara de Buga	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	LA PLANTA
61	86	Antioquia	APARTADO	Apartadó	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO
62	87	Nariño	NARIÑO	BARBACOAS	INSTITUCION EDCUATIVA TERAIMBE	SEDE 9 CUMAINDE
63	88	Putumayo	PUTUMAYO	Puerto Leguízamo	IE RUR LUIS VIDALES DEL PIÑUÑA NEGRO	ESC RUR MIX PUERTO PRINCIPE DOS
64	90	Cauca	CAUCA	Bolívar	CENTRO EDUCATIVO EL TAMBO	LA FUENTE
65	92	Atlántico	ATLANTICO	Repelón	INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS	PITA
66	93	Cauca	CAUCA	Bolívar	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CARMEN	EL CARMEN (sede principal)
67	94	Chocó	CHOCO	Carmen del Darién	CE PUEBLO NUEVO	CE PUEBLO NUEVO - SEDE PRINCIPAL
68	95	Guajira	RIOHACHA	Riohacha	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN	JOSE ANTONIO GALAN
69	96	Meta	VILLAVICENCIO	Villavicencio	INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO FRANCISCO ARANGO	ESCUELA SIETE DE AGOSTO
70	97	Cesar	CESAR	Curumaní	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	SEDE CHINELA
71	98	Cesar	CESAR	Curumaní	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	SEDE GUAIMARAL
72	100	Tolima	TOLIMA	Santa Isabel	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BOLIVAR	EL BRASIL
73	101	Cesar	CESAR	Curumaní	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	SEDE LOS SERRENOS
74	103	Córdoba	CORDOBA	Ayapel	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO	ESC NVA PARCELAS LONDRES
75	104	Cundinamarca	CUNDINAMARCA	Anolaima	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE HUGO ENCISO	ESCUELA RURAL EL DESCANSO
76	105	Chocó	CHOCO	Bahía Solano (Mutis)	IE LUIS LOPEZ DE MESA	SEDE DE SAN JOSE (HUACA)
77	106	Chocó	CHOCO	Bahía Solano (Mutis)	IE LUIS LOPEZ DE MESA	SEDE SIRENA DEL MAR
78	107	Chocó	CHOCO	Bahía Solano (Mutis)	IE LUIS LOPEZ DE MESA	SEDE SECUNDINO RIVAS
79	110	Nariño	NARIÑO	BARBACOAS	INSTITUCION EDUCATIVA TERAIMBE	SEDE 2 BOMBÓN

80	111	Magdalena	MAGDALENA	Pueblo viejo	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS	ERM ISLA DE CATAQUITA
81	112	Magdalena	MAGDALENA	El Retén	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE	COL MPAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE
82	113	Magdalena	MAGDALENA	San Sebastián de Buenavista	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA	ERM MARIA AUXILIADORA
83	114	Magdalena	MAGDALENA	San Sebastián de Buenavista	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA	ERM LA PACHA
84	117	Guajira	RIOHACHA	Riohacha	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA #7	WAKUAPAMANA
85	118	Antioquia	APARTADO	Apartadó	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO
86	119	Córdoba	CORDOBA	Montelíbano	INSTITUCION EDUCATIVA EL PALMAR	INSTITUCION EDUCATIVA EL PALMAR SEDE PRINCIPAL
87	121	Cauca	CAUCA	Piamonte	CENTRO EDUCATIVO PUERTO GUAYUYACO	ESC RUR MIX SAN ANDRESITO
88	122	Antioquia	TURBO	Turbo	I.E. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	E.U. JESUS MORA
89	123	Bolívar	BOLIVAR	Simití	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CERRO DE VERACRUZ	CAMPO PAYARES
90	124	Bolívar	BOLIVAR	Simití	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CERRO DE VERACRUZ	I.E. DEL CERRO DE VERACRUZ - SEDE PRINCIPAL
91	125	Cauca	CAUCA	Piamonte	INST EDUC AGRIC PIAMONTE	PIAMONTE (sede principal)
92	126	Magdalena	MAGDALENA	Pueblo viejo	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS	ERM EL TRIUNFO
93	127	Putumayo	PUTUMAYO	Orito	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL UMADA WUARRARA	ESC RUR MIX ALTO ORITO
94	128	Valle del Cauca	BUGA	Guadalajara de Buga	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE - SEDE PRINCIPAL
95	129	Valle del Cauca	BUGA	Guadalajara de Buga	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	JULIAN MENDOZA GUERRERO
96	130	Valle del Cauca	BUGA	Guadalajara de Buga	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	LA HONDA
97	132	Norte de Santander	NORTE SANTANDER	La Playa	CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN PEDRO	SEDE LA PEÑA
98	133	Magdalena	MAGDALENA	El Banco	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL OSCAR PISCIOTTI NUMA	ERM INMACULADA CONCEPCION
99	134	Bolívar	BOLIVAR	María la Baja	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA	BUENOS AIRES
100	135	Bolívar	BOLIVAR	María la Baja	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA	I.E.T. AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA
102	138	Arauca	ARAUCA	Arauca	CENTRO EDUCATIVO MONSERRATE	CEAR MONSERRATE
104	142	Nariño	IPIALES	Ipiales	INSTITUCION EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL LOS PASTOS	ESCUELA LAS CRUCES
105	143	Guajira	LA GUAJIRA	Barrancas	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL PROVINCIAL	CENTRO ETNOEDUCATIVO PROVINCIAL
106	144	Atlántico	SOLEDAD	Soledad	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE
107	146	Cesar	CESAR	Chimichagua	CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO	SEDE TRONCONAL
108	147	Cesar	CESAR	Chimichagua	CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO	SEDE PUERTO LA ESTANCIA
109	148	Cesar	CESAR	Chimichagua	CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO	SEDE TORRECILLA
110	149	Nariño	NARIÑO	Mallama (Piedrancha)	CENTRO EDUCATIVO MALLAMA	CENTRO EDUCATIVO DE MALLAMA
111	150	Chocó	CHOCO	Tadó	IE TECNICO AGROAMBIENTAL - MARIA AUXILIADORA	SEDE MARÍA AUXILIADORA DE MANUNGARA
112	151	Guajira	LA GUAJIRA	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2	SEDE LA ESTRELLA
113	152	Guajira	MAICAO	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6	YAMAIN - KASPOLIMANA
114	153	Guajira	LA GUAJIRA	Maicao	ESCUELA RURAL MIXTA TALOULUMA'ANA	ESCUELA RURAL MIXTA TALOULUMA'ANA
115	154	Magdalena	CIENAGA	Ciénaga	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO
116	156	Magdalena	MAGDALENA	El Retén	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE	SEDE CONC.ESC GENERAL GREGORIO GARZON
117	158	Valle del Cauca	BUGA	Guadalajara de Buga	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	SEDE CRISTOBAL COLON

118	161	Antioquia	APARTADO	Apartadó	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL GUINEO	CENTRO EDUCATIVO RURAL EL OSITO
119	163	Cauca	CAUCA	La Vega	I.E AGROPECUARIA SAN FRANCISCO JAVIER SEDE GARAY	I.E AGROPECUARIA SAN FRANCISCO JAVIER SEDE GARAY
120	164	Cauca	CAUCA	Santander de Quilichao	IE DOMINGUILLO	SEDE DOMINGO LASSO
121	165	Cauca	CAUCA	Popayán	IE COMUNEROS	Sede Principal
122	172	Putumayo	PUTUMAYO	Puerto Asís	E. RUR CAUCACIA - SEDE PRINCIPAL	Sede Principal
123	173	Cauca	CAUCA	Piamonte	ESC RUR MIX FRAY EZEQUIEL	ESC RUR MIX FRAY EZEQUIEL
124	174	Cauca	CAUCA	Piamonte	E.D.R PORTO GUAYUYACO SEDE PRINCIPAL	E.D.R PORTO GUAYUYACO SEDE PRINCIPAL
125	175	Cauca	CAUCA	Rosas	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA	SANTA TERESITA (sede principal)
126	178	Cauca	CAUCA	Rosas	INSTITUCION EDUCATIVA MADRE CARIDAD BRADER	MADRE CARIDAD BRADER (sede principal)
127	182	Cauca	CAUCA	Rosas	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO CORDOBA	LAS YERBAS
128	183	Cauca	CAUCA	Rosas	CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO LEON VALENCIA	LA DESPENSA
129	184	Cauca	CAUCA	Rosas	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO CORDOBA	EL RETIRO
130	186	Cauca	CAUCA	Rosas	CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO LEON VALENCIA	EL ALTILLO
131	187	Cauca	CAUCA	Rosas	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO CORDOBA	BELLAVISTA
132	188	Cauca	CAUCA	Suarez	IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA	Sede Principal
133	189	Cauca	CAUCA	Suarez	IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA	SEDE MARIA INMACULADA
134	190	Cauca	CAUCA	Suarez	IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA	SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
135	192	Atlántico	SOLEDAD	Soledad	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE CABICA
136	194	Bolívar	Bolívar	Maria la Baja	INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA AGROINDUSTRIAL DE FLAMENCO	EL NISPERO
137	196	Atlántico	Atlántico	Malambo	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MESOLANDIA	Sede Principal
138	202	Chocó	CHOCO	Tadó	IE NORMAL SUPERIOR DEMETRIO SALAZAR CASTILLO	CENTRO EDUCATIVO ESCUELA FRANCISCO MIRANDA
139	203	Antioquia	TURBO	Turbo	IE SAN MARTIN DE PORRES	SEDE GONZALO MEJIA

En este periodo es importante resaltar que, bajo este listado de sedes focalizadas para intervención técnica, ya se adelantó la verificación predial, la cual da como resultado 136 sedes a intervenir.

Sedes despriorizar técnicamente: se tuvo que despriorizar las siguientes 9 instituciones educativas de los siguientes grupos:

GRUPO	ID MEN	Departamento	ETC	Municipio	IE	SEDE	OBERVACIONES
1	55	Chocó	CHOCO	Tadó	IE TECNICO AGROAMBIENTAL	SEDE CAMPO ALEGRE	En un principio, la sede priorizada en el municipio de Tadó era la sede la sede Campo Alegre. Esta perteneciente a la IE Técnico Agroambiental, la cual actualmente cuenta con una matrícula según el Sistema Integrado de Matricula -Simat de 40 estudiantes; no obstante, en la etapa de viabilidad técnica y jurídica adelantada por el contratista designado por Findeter determinó que esta sede presentaba limitaciones técnicas, normativas y

							administrativas por estar en zona de riesgo por inundación, por lo que se recomendó no efectuar intervención alguna.
	120	Antioquia	**TURBO**	Turbo	**I.E. DE DESARROLLO RURAL DE TURBO**	E.U. SANTISIMA TRINIDAD	Se tramito la exclusión del anexo "Listado de Instituciones Educativas Priorizadas por el MEN" a la sede IE. DE DESARROLLO RURAL DE TURBO EU SANTÍSIMA TRINIDAD., reemplazándola por la SEDE GONZALO MEJIA perteneciente a la IE. SAN MARTIN DE PORRES, ubicada en el municipio de Turbo, Antioquia en el marco del contrato de obra No. PAF-MENAM-O-049-2023 y contrato de interventoría No. PAF-MENAM-I-052-2023 Frente a lo anterior, es importante indicar en el presente concepto que, la solicitud se realiza enmarcada en el lineamiento dado por el Ministerio de Educación Nacional – MEN en Comité Técnico No. 30 No. CO1.PCCNTR.4917031 DE 2023 PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN AULAS MÓVILES POR OLA INVERNAL, de fecha 24 de enero de 2024
2	**91**	Atlántico	**ATLANTICO**	Palmar de Varela	**INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL DE PALMAR DE VARELA**	JOSE MARIA CORDOBA	Esta institución Educativa se tuvo que despriorizar porque ya estaba intervenida por la gobernación de Atlántico
	191	Atlántico	**ATLANTICO**	Luruaco	**IE CORREGIMIENTO DE SAN JUAN DE TOCAGUA**	CORREGIMIENTO DE SAN JUAN DE TOCAGUA	Se despriorizo esta institución educativa, debido a que el MEN define que esta IE seria intervenida por el FFIE
4	**71**	Bolívar	**BOLIVAR**	Córdoba	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE TACAMOCHO**	TACAMOCHO (SEDE PRIMARIA)	Esta sede tuvo que ser despriorizada, debido a que en el año 2015 ante esta situación la Corporación autónoma ambiental Cormagdalena, mediante Contrato Interadministrativo 0-0019 de 2015 suscrito con la Universidad Nacional de Colombia, elabora un estudio del cual se destaca la siguiente consideración general: "A partir de este análisis se puede considerar que Tocomocho se encuentra ubicado, prácticamente en la

							mitad del río, bajo la amenaza de inundaciones y procesos erosivos que se pueden activar en cualquier época".
	139	Magdalena	**MAGDALENA**	San Sebastián de Buenavista	**INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE TRONCOSO**	ERM DE JAIME	Esta sede tuvo que ser despriorizada, conforme a una recopilación de datos realizada por el contratista, JASA LTDA propone tener en cuenta que la ERM Jaime requiere una altura de palafito de 1,7 m, lo cual genera la construcción de acceso al aula, definida en el alcance contractual, de una infraestructura que debe contemplar el ingreso a toda la institución, siendo necesario la construcción de toda la sede con el fin de poder hacer funcional su ingreso. La interventoría, CONSORCIO INTER EDUCATIVO G4 considera que no se deben realizar obras de infraestructura de mejoramiento y/o construcción, debido a lo planteado por el contratista y a que los mejoramientos no tendrían estabilidad por efectos de los daños que ocasionará la inundación y la construcción debe ser de toda la institución con palafitos de 1,70 m, lo cual supera el alcance contractual.
9	**33**	Capital Bogotá, D.C	BOGOTA	Bogotá, D.C.	**COLEGIO LA CHUCUA (IED)**	CENT EDUC DIST LA CHUCUA	Sede retirada mediante comité técnico No. 70 y comité fiduciario No. 45.
	136	Capital Bogotá, D.C.	BOGOTA	Bogotá, D.C.	**COLEGIO ESTRELLA DEL SUR (IED)**	COL DIST ESTRELLA DEL SUR	Sede retirada mediante comité técnico No. 70 y comité fiduciario No. 45.
	141	Santander	BARRANCABERMEJA	Barrancabermeja	**CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN**	CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN	Sede retirada mediante comité técnico No. 70 y comité fiduciario No. 45.

De acuerdo con lo anterior se hace la inclusión de las siguientes 4 sedes educativas para tener un resultado total de intervención de 136 sedes educativas:

ID MEN	Departamento	ETC	Municipio	IE	SEDE
202	Chocó	CHOCO	Tadó	IE NORMAL SUPERIOR DEMETRIO SALAZAR CASTILLO	CENTRO EDUCATIVO ESCUELA FRANCISCO MIRANDA
203	Antioquia	TURBO	Turbo	IE SAN MARTIN DE PORRES	SEDE GONZALO MEJIA
196	Atlántico	Atlántico	Malambo	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MESOLANDIA	Sede Principal
194	Bolívar	Bolívar	Maria la Baja	INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA AGROINDUSTRIAL DE FLAMENCO	EL NISPERO

La viabilización jurídica de los predios priorizados por el Ministerio se realiza de manera eficiente, siempre que sea necesario y solicitado por el Ministerio de Educación Nacional (MEN). Es un paso fundamental para garantizar el adecuado desarrollo de proyectos educativos y el cumplimiento de los objetivos establecidos por el MEN, de acuerdo con lo anterior, en este periodo quedo la verificación predial y técnica así:

SEDES TOTAL INICIAL (150)	
SIN DOCUMENTOS	1 *
POSIBLE VIABILIDAD	0 **
NO VIABLE	9
VIABLES TÉCNICA Y JURÍDICAMENTE	**140**
TOTAL	150

SEDES NUEVAS A PRIORIZAR (9)	
POSIBLE VIABILIDAD	1 *
VIABLES JURÍDICAMENTE	8
TOTAL	9

SEDES PRIORIZACIÓN ACTUALIZADA (136)	
SEDES INICIALMENTE PRIORIZADAS	141
SEDES DESPRIORIZADAS	9
SEDES NUEVAS INCLUIDAS	4
TOTAL	**136**

b. *En consideración a que los proyectos a atender por este contrato se ejecutaran en el marco del Decreto de Emergencia, FINDETER debe acudir a lo establecido en su manual de contratación que permita que los procesos de selección sean eficientes y puedan ser proyectos de respuesta rápida.*

FINDETER implementa en el marco de lo establecido en el Manual Operativo la contratación que permita la ejecución eficiente de los procesos de selección que permita pluralidad de oferentes, asimismo, durante el proceso de ejecución, se ha establecido en la estructuración, la necesidad de optimizar tiempos de respuesta rápidos con sistemas constructivos industrializados.

c. *Elaborar los Estudios Previos e insumos precontractuales para la contratación de las obras y suministros necesarios para atender las necesidades prioritarias en infraestructura y dotación de mobiliario escolar de las sedes educativas afectadas por la temporada de lluvias que sean definidas por el Ministerio de Educación. Así como las interventorías correspondientes, solicitando que se*

acaten los principios que rigen la contratación pública, incluyendo la solicitud de las respectivas garantías que ampare cada contrato con siguientes riesgos: anticipo (si lo hubiere), calidad, cumplimiento, estabilidad de la obra, salarios y prestaciones sociales, responsabilidad civil extracontractual y todo riesgo de construcción, según sea aplicable.

Proyectos en proceso de estructuración

Se han elaborado los Estudios Previos e insumos precontractuales necesarios para la contratación de obras y suministros dirigidos a atender las necesidades prioritarias en infraestructura y dotación de mobiliario escolar en las sedes educativas afectadas por la temporada de lluvias, para apertura de las diferentes convocatorias, tal como ha sido definido por el Ministerio de Educación. Estos estudios y documentos precontractuales son esenciales para establecer las bases de las futuras contrataciones y asegurar la correcta ejecución de los proyectos.

Además, se ha solicitado que, en la contratación de las obras y suministros, así como en las interventorías correspondientes, se respeten los principios que rigen la contratación pública. Esto garantiza la transparencia, la igualdad de oportunidades y la eficiencia en los procesos de contratación.

Asimismo, se ha requerido la inclusión de las garantías correspondientes para amparar los diferentes riesgos asociados a cada contrato. Estas garantías incluyen aspectos como el anticipo, la calidad de la obra, el cumplimiento de los plazos, la estabilidad de la construcción, los salarios y prestaciones sociales de los trabajadores, la responsabilidad civil extracontractual y los posibles riesgos de construcción. Esto proporciona seguridad tanto para la entidad contratante como para los contratistas y contribuye a la adecuada ejecución de los proyectos en línea con las normativas y estándares requeridos.

En el presente periodo se establece definitivamente la estructuración y la contratación de los grupos de contratación de acuerdo con el siguiente listado:

GRUPO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ID MEN No.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	VR. TOTAL AULAS Y MEJORAMIENTO	VR. INTERVENTORÍA	VR. TOTAL OBRA + INTERVENTORÍA
1	Antioquia	Apartadó	66	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS	624.000.000	46.800.000	670.800.000
			86	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO	291.200.000	21.840.000	313.040.000
			118	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO	661.678.027	49.625.852	711.303.879
			161	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL GUINEO	CENTRO EDUCATIVO RURAL EL OSITO	403.329.013	30.249.676	433.578.689
		Turbo	120	I.E. DE DESARROLLO RURAL DE TURBO	E.U. SANTISIMA TRINIDAD	312.000.000	23.400.000	335.400.000
			122	I.E. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	E.U. JESUS MORA	499.200.000	37.440.000	536.640.000
		Ciudad Bolívar	42	I. E. JOSE MARIA HERRAN	C. E. R. PAULINA PUERTA	124.800.000	9.360.000	134.160.000
	Chocó	Carmen del Darién	94	CE PUEBLO NUEVO	CE PUEBLO NUEVO - SEDE PRINCIPAL	522.668.285	39.200.121	561.868.406
		Tadó	55	IE TECNICO AGROAMBIENTAL	SEDE CAMPO ALEGRE	266.693.962	20.002.047	286.696.010
			150	IE TECNICO AGROAMBIENTAL	SEDE MARÍA AUXILIADORA DE MANUNGARA	124.800.000	9.360.000	134.160.000
2	Atlántico	Galapa	64	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA	624.000.000	46.800.000	670.800.000

GRUPO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ID MEN No.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	VR. TOTAL AULAS Y MEJORAMIENTO	VR. INTERVENTORÍA	VR. TOTAL OBRA + INTERVENTORÍA
		Palmar de Varela	91	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL DE PALMAR DE VARELA	JOSE MARIA CORDOBA	561.600.000	42.120.000	603.720.000
		Repelón	83	INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS	INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS - SEDE PRINCIPAL	332.800.000	24.960.000	357.760.000
			84	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE VILLA ROSA	SEDE LA LOMA	229.439.280	17.207.946	246.647.226
			92	INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS	PITA	220.727.086	16.554.531	237.281.617
		Soledad	18	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE PRINCIPAL	665.600.000	49.920.000	715.520.000
			144	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE	915.200.000	68.640.000	983.840.000
			192	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE CABICA	372.384.464	27.928.835	400.313.298
		Luruaco	191	IE CORREGIMIENTO DE SAN JUAN DE TOCAGUA	CORREGIMIENTO DE SAN JUAN DE TOCAGUA	249.600.000	18.720.000	268.320.000
3	Magdalena	Ciénaga	154	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO	1.414.400.000	106.080.000	1.520.480.000
		El Retén	112	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE	COL MPAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE	2.801.018.341	210.076.376	3.011.094.717
			156	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE	SEDE CONC.ESC GENERAL GREGORIO GARZON	436.800.000	32.760.000	469.560.000
		Puebloviejo	111	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS	ERM ISLA DE CATAQUITA	83.200.000	6.240.000	89.440.000
			126	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS	ERM EL TRIUNFO	166.400.000	12.480.000	178.880.000
4	Bolívar	Córdoba	71	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE TACAMOCHO	TACAMOCHO (SEDE PRIMARIA)	447.519.640	33.563.973	481.083.613
			73	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE TACAMOCHO	NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE TACAMOCHITO	493.484.507	37.011.338	530.495.845
		Mompós	29	INSTITUCIÒN EDUCATIVA TÈCNICA AMBIENTAL DE TIERRA FIRME	I.E.T.A. AMBIENTAL DE TIERRA FIRME - SEDE PRINCIPAL	1.125.688.392	84.426.629	1.210.115.022
			49	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DEL CHICAGUA	SAN LUIS	340.577.024	25.543.277	366.120.301
	Magdalena	San Sebastián de Buenavista	113	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA	ERM MARIA AUXILIADORA	488.073.254	36.605.494	524.678.748
			114	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA	ERM LA PACHA	623.194.392	46.739.579	669.933.972
			139	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE TRONCOSO	ERM DE JAIME	161.669.820	12.125.237	173.795.057
5	Bolívar	Barranco de Loba	6	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR	I.E.T.A. LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR - SEDE PRINCIPAL	468.319.640	35.123.973	503.443.613
			9	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR	ATASCOZA	364.668.644	27.350.148	392.018.792
			10	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR	LOS CERRITOS	296.559.820	22.241.987	318.801.807
		San Martín de Loba	43	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA PESQUERA LEONIDAS ORTIZ ALVEAR DE CHIMÍ	PLAN BONITO	233.285.404	17.496.405	250.781.809
	Cesar	Chimichagua	146	CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO	SEDE TRONCONAL	133.346.981	10.001.024	143.348.005
			147	CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO	SEDE PUERTO LA ESTANCIA	130.159.820	9.761.987	139.921.807
			148	CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO	SEDE TORRECILLA	124.800.000	9.360.000	134.160.000

GRUPO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ID MEN No.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	VR. TOTAL AULAS Y MEJORAMIENTO	VR. INTERVENTORÍA	VR. TOTAL OBRA + INTERVENTORÍA
		Curumaní	30	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	603.200.000	45.240.000	648.440.000
			97	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	SEDE CHINELA	83.200.000	6.240.000	89.440.000
			98	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	SEDE GUAIMARAL	124.800.000	9.360.000	134.160.000
			101	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	SEDE LOS SERRENOS	83.200.000	6.240.000	89.440.000
	Magdalena	Concordia	13	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE BASICA Y MEDIA SANTA CRUZ DE BALSAMO	ERM DE BALSAMO	485.009.460	36.375.710	521.385.170
			14	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE BASICA Y MEDIA SANTA CRUZ DE BALSAMO	JAR INF MIS PRIMEROS SUEÑOS	161.669.820	12.125.237	173.795.057
		El Banco	24	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ANTONIO NARIÑO	CENT EDUC RUR MIX JOSE DE LA PAZ VANEGA ORTIZ	546.091.802	40.956.885	587.048.688
			32	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL SILVIA COTES DE BISWELL	ERM SANTA TERESA DE ISLITA	244.487.366	18.336.552	262.823.918
			133	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL OSCAR PISCIOTTI NUMA	ERM INMACULADA CONCEPCION	192.455.361	14.434.152	206.889.513
6	Cesar	El Paso	74	INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE LA ESPERANZA	291.200.000	21.840.000	313.040.000
			75	INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE EL VALLITO	145.600.000	10.920.000	156.520.000
			77	INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE SAN ANGEL	65.079.910	4.880.993	69.960.903
			79	INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE LA ESTACION	132.643.683	9.948.276	142.591.959
		La Paz (Robles)	45	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA CAÑO PADILLA YUKPA	SEDE EL COSO	150.447.043	11.283.528	161.730.571
		Valledupar	4	INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ	IE ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ	457.600.000	34.320.000	491.920.000
			48	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ	INSTITUTO TECNICO COMERCIAL JOSE EUGENIO MARTINEZ	956.800.000	71.760.000	1.028.560.000
7	Guajira	Barrancas	143	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL PROVINCIAL	CENTRO ETNOEDUCATIVO PROVINCIAL	249.600.000	18.720.000	268.320.000
		Maicao	50	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2	SEDE LA CAMPANA	499.200.000	37.440.000	536.640.000
			51	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6	YAMAIN - SEDE PRINCIPAL	62.400.000	4.680.000	67.080.000
			53	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2	SEDE KASICHE	339.830.481	25.487.286	365.317.767
			54	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2	SEDE WAYUUMA ANA	127.479.910	9.560.993	137.040.903
			151	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2	SEDE LA ESTRELLA	314.679.910	23.600.993	338.280.903
			152	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6	YAMAIN - KASPOLIMANA	252.966.903	18.972.518	271.939.421
			153	ESCUELA RURAL MIXTA TALOULUMA'ANA	ESCUELA RURAL MIXTA TALOULUMA'ANA	857.226.526	64.291.989	921.518.516
		Manaure	11	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	ESCUELA RURAL INDÍGENA KARALOUTAMANA	190.566.903	14.292.518	204.859.421
		Riohacha	34	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA #7	APÜNIMA´ANA1	252.279.910	18.920.993	271.200.903
			60	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN	COOPERATIVO	416.000.000	31.200.000	447.200.000
			95	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN	JOSE ANTONIO GALAN	374.400.000	28.080.000	402.480.000
			117	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA #7	WAKUAPAMANA	224.079.460	16.805.960	240.885.420
8	Bolívar	María la Baja	134	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA	BUENOS AIRES	249.600.000	18.720.000	268.320.000
			135	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA	I.E.T. AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA	1.800.127.638	135.009.573	1.935.137.211

GRUPO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ID MEN No.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	VR. TOTAL AULAS Y MEJORAMIENTO	VR. INTERVENTORÍA	VR. TOTAL OBRA + INTERVENTORÍA
	Córdoba	Ayapel	103	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO	ESC NVA PARCELAS LONDRES	220.984.367	16.573.828	237.558.194
		Cotorra	28	INSTITUCION EDUCATIVA LOS AGUACATES	CENT EDUC LOS AGUACATES	124.800.000	9.360.000	134.160.000
		Montelíbano	119	INSTITUCION EDUCATIVA EL PALMAR	ESCUELA NUEVA MIXTA DIVINO SALVADOR	745.087.893	55.881.592	800.969.485
		Planeta Rica	69	INSTITUCION EDUCATIVA LOMA AZUL	LOS CERROS	430.464.507	32.284.838	462.749.345
		Puerto Libertador	70	INSTITUCION EDUCATIVA PICA PICA VIEJO	ESC NVA LA SOLITA	254.085.404	19.056.405	273.141.809
		Tuchín	2	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ALVARO ULCUE CHOCUE	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ALVARO ULCUE CHOCUE	1.074.838.830	80.612.912	1.155.451.742
9	Arauca	Arauca	138	CENTRO EDUCATIVO MONSERRATE	CEAR MONSERRATE	299.239.730	22.442.980	321.682.710
		Saravena	56	CENTRO EDUCATIVO LA PAVA.	LA PAVA	83.200.000	6.240.000	89.440.000
	Bolívar	Morales	20	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PALMA	LA ARCADIA	83.200.000	6.240.000	89.440.000
		Simití	123	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CERRO DE VERACRUZ	CAMPO PAYARES	232.352.784	17.426.459	249.779.243
			124	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CERRO DE VERACRUZ	I.E. DEL CERRO DE VERACRUZ - SEDE PRINCIPAL	595.799.550	44.684.966	640.484.516
	Capital Bogotá, D.C.	Bogotá, D.C.	33	COLEGIO LA CHUCUA (IED)	CENT EDUC DIST LA CHUCUA	332.800.000	24.960.000	357.760.000
			136	COLEGIO ESTRELLA DEL SUR (IED)	COL DIST ESTRELLA DEL SUR	166.400.000	12.480.000	178.880.000
	Cundinamarca	Anolaima	104	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE HUGO ENCISO	ESCUELA RURAL EL DESCANSO	190.313.503	14.273.513	204.587.016
	Meta	Villavicencio	96	INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO FRANCISCO ARANGO	ESCUELA SIETE DE AGOSTO	924.437.134	69.332.785	993.769.919
	Norte de Santander	La Playa	132	CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN PEDRO	SEDE LA PEÑA	41.600.000	3.120.000	44.720.000
	Santander	Barrancabermeja	141	CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN	CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN	494.421.269	37.081.595	531.502.864
		Betulia	17	INSTITUCION EDUCATIVA EL RAMO	CENTRO EDUCATIVO SANTA BARBARA	62.400.000	4.680.000	67.080.000
		Vélez	7	COLEGIO UNIVERSITARIO	COLEGIO UNIVERSITARIO	926.718.332	69.503.875	996.222.206
	Tolima	Santa Isabel	67	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BOLIVAR	LA HUMAREDA	188.797.003	14.159.775	202.956.778
			100	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BOLIVAR	EL BRASIL	188.797.003	14.159.775	202.956.778
10	Cauca	Santander de Quilichao	16	INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO	DOMINGUILLO (sede principal)	1.235.282.193	92.646.164	1.327.928.358
			164	IE DOMINGUILLO	SEDE DOMINGO LASSO	124.800.000	9.360.000	134.160.000
		Suarez	188	IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA	SEDE PRINCIPAL	790.400.000	59.280.000	849.680.000
			189	IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA	SEDE MARIA INMACULADA	1.225.093.375	91.882.003	1.316.975.378
			190	IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA	SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	374.400.000	28.080.000	402.480.000
		Toribío	12	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PLAYA	CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO LA PLAYA - SEDE PRINCIPAL	338.159.820	25.361.987	363.521.807
	Chocó	Bahía Solano (Mutis)	105	IE LUIS LOPEZ DE MESA	SEDE DE SAN JOSE (HUACA)	148.792.381	11.159.429	159.951.810
			106	IE LUIS LOPEZ DE MESA	SEDE SIRENA DEL MAR	41.600.000	3.120.000	44.720.000
			107	IE LUIS LOPEZ DE MESA	SEDE SECUNDINO RIVAS	291.200.000	21.840.000	313.040.000
	Valle del Cauca	Guadalajara de Buga	62	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	JHON F. KENNEDY	540.800.000	40.560.000	581.360.000
			85	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	LA PLANTA	204.237.183	15.317.789	219.554.972
			128	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE - SEDE PRINCIPAL	166.400.000	12.480.000	178.880.000
			129	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	JULIAN MENDOZA GUERRERO	208.000.000	15.600.000	223.600.000

GRUPO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ID MEN No.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	VR. TOTAL AULAS Y MEJORAMIENTO	VR. INTERVENTORÍA	VR. TOTAL OBRA + INTERVENTORÍA
			130	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	LA HONDA	164.153.683	12.311.526	176.465.209
			158	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	SEDE CRISTOBAL COLON	162.637.183	12.197.789	174.834.972
11	Cauca	Balboa	46	C.E. BUENOS AIRES	CAPITANES	83.200.000	6.240.000	89.440.000
			65	I.E. OLAYA (ANTES C.E. OLAYA)	OLAYA (sede principal)	416.000.000	31.200.000	447.200.000
		Bolívar	3	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA NUESTRA SENORA DE LOS REMEDIOS	COLEGIO DEPARTAMENTAL NUESTRA SENORA DE LOS REMEDIOS	436.800.000	32.760.000	469.560.000
			58	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO NUESTRA SENORA DEL CARMEN	CORRAL VIEJO	127.479.910	9.560.993	137.040.903
			59	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO NUESTRA SENORA DEL CARMEN	NUESTRA SENORA DEL CARMEN (sede principal)	299.239.730	22.442.980	321.682.710
			90	CENTRO EDUCATIVO EL TAMBO	LA FUENTE	191.162.093	14.337.157	205.499.250
			93	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CARMEN	EL CARMEN (sede principal)	62.400.000	4.680.000	67.080.000
		El Tambo	22	I.E. HUISITO	HUISITO (sede principal)	1.041.842.757	78.138.207	1.119.980.964
		La Vega	44	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA SANTA RITA	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA RITA (sede principal)	166.400.000	12.480.000	178.880.000
			163	I.E AGROPECUARIA SAN FRANCISCO JAVIER SEDE GARAY	I.E AGROPECUARIA SAN FRANCISCO JAVIER SEDE GARAY	177.904.227	13.342.817	191.247.044
		Popayán	165	IE COMUNEROS	SEDE PRINCIPAL	457.600.000	34.320.000	491.920.000
		Rosas	175	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA	SANTA TERESITA (sede principal)	790.400.000	59.280.000	849.680.000
			178	INSTITUCION EDUCATIVA MADRE CARIDAD BRADER	MADRE CARIDAD BRADER (sede principal)	124.800.000	9.360.000	134.160.000
			182	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO CORDOBA	LAS YERBAS	83.200.000	6.240.000	89.440.000
			183	CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO LEON VALENCIA	LA DESPENSA	62.400.000	4.680.000	67.080.000
			184	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO CORDOBA	EL RETIRO	83.200.000	6.240.000	89.440.000
			186	CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO LEON VALENCIA	EL ALTILLO	62.400.000	4.680.000	67.080.000
			187	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO CORDOBA	BELLAVISTA	62.400.000	4.680.000	67.080.000
12	Cauca	Piamonte	27	CENTRO EDUCATIVO PUERTO GUAYUYACO	ESCUELA RURAL MIXTA LA ESPANOLA	62.400.000	4.680.000	67.080.000
			121	CENTRO EDUCATIVO PUERTO GUAYUYACO	ESC RUR MIX SAN ANDRESITO	41.600.000	3.120.000	44.720.000
			125	INST EDUC AGRIC PIAMONTE	PIAMONTE (sede principal)	1.553.938.473	116.545.386	1.670.483.859
			173	ESC RUR MIX FRAY EZEQUIEL	ESC RUR MIX FRAY EZEQUIEL	195.752.201	14.681.415	210.433.616
			174	E.D.R PORTO GUAYUYACO SEDE PRINCIPAL	E.D.R PORTO GUAYUYACO SEDE PRINCIPAL	166.400.000	12.480.000	178.880.000
	Huila	Acevedo	26	INSTITUCION EDUCATIVA BATEAS	BATEAS	310.453.360	23.284.002	333.737.362
	Nariño	BARBACOAS	87	INSTITUCION EDCUATIVA TERAIMBE	SEDE 9 CUMAINDE	62.400.000	4.680.000	67.080.000
			110	INSTITUCION EDUCATIVA TERAIMBE	SEDE 2 BOMBON	124.800.000	9.360.000	134.160.000
		Cumbal	36	INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCION DE TALLAMBI	INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCION DE TALLAMBI	764.787.529	57.359.065	822.146.593
		El Rosario	8	CENTRO EDUCATIVO LA CLAUDIA	CENTRO EDUCATIVO LA CLAUDIA	62.400.000	4.680.000	67.080.000
		Ipiales	142	INSTITUCION EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL LOS PASTOS	ESCUELA LAS CRUCES	208.000.000	15.600.000	223.600.000

GRUPO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ID MEN No.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	VR. TOTAL AULAS Y MEJORAMIENTO	VR. INTERVENTORÍA	VR. TOTAL OBRA + INTERVENTORÍA
		Mallama (Piedrancha)	149	CENTRO EDUCATIVO MALLAMA	CENTRO EDUCATIVO DE MALLAMA	62.400.000	4.680.000	67.080.000
		Pasto	1	I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE	I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - SEDE PRINCIPAL	436.800.000	32.760.000	469.560.000
	Putumayo	Orito	127	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL UMADA WUARRARA	ESC RUR MIX ALTO ORITO	127.913.503	9.593.513	137.507.016
		Puerto Asís	172	E. RUR CAUCACIA - SEDE PRINCIPAL	SEDE PRINCIPAL	249.600.000	18.720.000	268.320.000
		Puerto Asís	41	I. E. RUR CAUCACIA	ESC RUR MIX EL JARDIN ALTO TETEYE	197.100.201	14.782.515	211.882.716
			57	I. E. RUR CAUCACIA	ESC RUR MIX EL PROGRESO	167.997.003	12.599.775	180.596.778
		Puerto Leguizamo	88	IE RUR LUIS VIDALES DEL PIÑUÑA NEGRO	ESC RUR MIX PUERTO PRINCIPE DOS	124.800.000	9.360.000	134.160.000
Total general						52.593.871.997	3.944.540.400	56.538.412.397

d. *Evaluar los proponentes, así como las propuestas presentadas para la construcción de las obras de infraestructura educativa e interventorías correspondientes y realizar la adjudicación y contratación de dichos procesos.*

Una vez concluidos los procesos de convocatoria y realizadas las evaluaciones exhaustivas de los proponentes y sus respectivas propuestas para la construcción de las obras de infraestructura educativa y las interventorías correspondientes, nos complace informar en este periodo que dichos procesos han llegado a su fin. Se ha llevado a cabo una rigurosa revisión bajo los parámetros establecidos en los Términos de Referencia, asegurando que se cumplan los lineamientos de contratación pública en términos de transparencia y equidad.

Gracias a este esfuerzo, se ha procedido con éxito a la adjudicación de los contratos, seleccionando a los proponentes que demostraron las mejores capacidades técnicas, financieras y operativas. Todos los grupos han sido debidamente contratados, lo que asegura que las obras se desarrollarán dentro de los plazos previstos y bajo los más altos estándares de calidad.

Nuestro compromiso con la excelencia en la ejecución de las obras y el adecuado control mediante las interventorías asegurará que estas infraestructuras aporten un valor significativo a la comunidad educativa, garantizando su correcto desarrollo y el bienestar de los beneficiarios.

1.4 ACTIVIDADES CONTRACTUALES

1.4.1 Obligaciones:

a. *Ejecutar a través de los contratistas seleccionados y hacer seguimiento a la calidad y entrega de las obras de infraestructura educativa diseñadas para atender las afectaciones a las sedes educativas priorizadas por el MEN.*

FINDETER, en concordancia con la naturaleza de los proyectos a abordar bajo el marco del Decreto de Emergencia, ha adelantado en el presente periodo la ejecución de diversas sedes educativas. Estos proyectos se han llevado a cabo mediante la colaboración de contratistas que fueron rigurosamente seleccionados a través de procedimientos transparentes y estructurados, conforme a lo estipulado en el Manual de Contratación de FINDETER.

La selección de contratistas no fue un proceso aleatorio, sino que siguió una serie de etapas bien definidas, que incluyeron la evaluación de capacidades técnicas, experiencia previa en proyectos similares, y solidez financiera. Este enfoque metodológico garantiza que los proyectos se ejecuten con altos estándares de calidad y dentro de los plazos establecidos, lo cual es crucial en contextos de emergencia donde la eficiencia y la efectividad son primordiales.

Adicionalmente, la supervisión y el monitoreo continuo de los avances de las obras permiten asegurar que se cumplan todas las normativas vigentes y que los recursos asignados se utilicen de manera óptima. FINDETER ha implementado mecanismos de control y seguimiento que incluyen auditorías periódicas y la utilización de tecnología para el seguimiento en tiempo real de las obras. Esto no solo brinda transparencia al proceso, sino que también facilita la identificación temprana de posibles inconvenientes y la implementación de medidas correctivas oportunas.

b. *Ejercer la vigilancia de los contratos de obra contratando las respectivas interventorías y ejercer la supervisión a los contratos de interventoría que se deriven del presente contrato.*

FINDETER adelantó en el presente periodo un riguroso ejercicio de vigilancia de los contratos de obra mediante la contratación de las respectivas interventorías. Esta medida se implementó con el objetivo de asegurar el adecuado desarrollo de los proyectos de infraestructura, en línea con los estándares de calidad y los plazos establecidos.

La contratación de interventorías y la posterior supervisión de sus actividades permitirán crear un sistema de verificación y seguimiento continuo, asegurando la transparencia en el proceso de ejecución de las obras y proporcionando un mecanismo de retroalimentación para la garantía de la calidad, la eficiencia y el cumplimiento de los estándares requeridos en las obras de infraestructura educativa, quedando así el resumen de este periodo:

GRUPO	TIPO DE CONTRATO	CÓDIGO	DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS	FECHA DE ADJUDICACIÓN	CONTRATISTA	VALOR OFERTADO	OBSERVACIONES
1	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-052-2023	Antioquia - Apartadó Antioquia - Turbo Antioquia - Ciudad Bolívar Chocó - Carmen del Darién Chocó - Tadó	03/10/2023	INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S	$271.455.247	Liquidado el 25 de febrero del 2025
1	OBRA	PAF-MENAM-O-049-2023		06/10/2023	OBRAS CAPITAL S. A	$3.447.332.359	Liquidado el 31 de enero del 2025
2	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-053-2023	Atlántico - Repelón Atlántico - Galapa Atlántico – Soledad - Atlántico - Palmar De Varela Atlántico - Luruaco	26/09/2023	RM INGENIEROS S.A.S.	$295.715.000	Entregado el 15 de noviembre del 2024
2	OBRA	PAF-MENAM-O-050-2023		06/10/2023	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023	$4.044.124.630	Entregado el 15 de noviembre del 2024
3	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-054-2023	Magdalena - Ciénaga Magdalena - El Retén Magdalena - Pueblo viejo	26/09/2023	CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3	$351.774.412	Liquidado el 20 de diciembre del 2024
3	OBRA	PAF-MENAM-O-051-2023		06/10/2023	CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA	$4.744.960.153	Liquidado el 01 de noviembre del 2024
4	OBRA	PAF-MENAM-O-052-2023	Bolívar - Córdoba Bolívar - Mompós Magdalena - San Sebastián de Buenavista	20/09/2023	JASA LTDA	$3.566.467.466	Liquidado el 30 de septiembre del 2024
4	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-055-2023		26/09/2023	CONSORCIO INTER EDUCATIVO G4	$264.974.745	Entregado 22 de marzo del 2024
5	OBRA	PAF-MENAM-O-053-2023	Bolívar - Barranco De Loba Magdalena - Concordia Magdalena - El Banco Cesar - Curumaní Bolívar - San Martín De Loba Cesar - Chimichagua	03/10/2023	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5	$4.102.044.984	Terminado el 08 de noviembre del 2024
5	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-056-2023		06/10/2023	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5	$300.856.990	Terminado el 08 de enero del 2025

GRUPO	TIPO DE CONTRATO	CÓDIGO	DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS	FECHA DE ADJUDICACIÓN	CONTRATISTA	VALOR OFERTADO	OBSERVACIONES
6	OBRA	PAF-MENAM-O-056-2023	Cesar - Valledupar Cesar - La Paz Cesar - El paso	29/09/2023	DAR ARQUITECTURA S.A. S	$2.102.352.000	Liquidado el 20 de noviembre del 2024
6	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-058-2023		03/10/2023	CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023	$155.543.411	Liquidado el 27 de noviembre del 2024
8	OBRA	PAF-MENAM-O-055-2023	Córdoba – Tuchín Córdoba – Cotorra Córdoba - Planeta Rica Córdoba - Puerto Libertador Córdoba – Ayapel Córdoba - Montelíbano Bolívar - María la Baja	29/09/2023	DAR ARQUITECTURA S.A. S	$4.706.470.280	Entregado 21 de agosto del 2024
8	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-057-2023		13/10/2023	LUIS GUILLERMO NARVÁEZ RICARDO	$297.097.668	Entregado 21 de agosto del 2024
7	OBRA	PAF-ATMEN5-O-036-2024	Guajira – Manaure Guajira – Rioacha Guajira - Maicao Guajira - Barrancas	19/03/2024	Consorcio Guajira 7	4.158.777.879	Entregado el 28 de febrero del 2025
7	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-059-2023		17/04/2024	GERMÁN ADOLFO PERDOMO PACHÓN	295.239.000	Terminado el 17 de enero del 2025
9	OBRA	PAF-ATMEN5-O-037-2024	Santander - Vélez, Betulia, Barrancabermeja Bolívar – Morales Bogotá Arauca - Saravena -Arauca Tolima - Santa Isabel Meta – Villavicencio Cundinamarca – Anolaima Bolívar – Simiti Norte de Santander - La Playa	19/03/2024	CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9	4.810.476.306	Etapa 2
9	INTERVENTORÍA	PAF-ATMEN5-I-064-2024		28/06/2023	CONSORCIO SAN GABRIEL	313.800.000	Etapa 2
10	OBRA	PAF-MENAM-O-080-2023	Cauca - Suárez Cauca - Santander De Quilichao Chocó - Bahía Solano Cauca – Toribío Valle Del Cauca - Guadalajara De Buga	23/11/2023	CONSORCIO FIN GRUPO 10	$6.014.978.800	Etapa 2
10	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-062-2023		15/12/2023	CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO	$327.496.568	Etapa 2
11	OBRA	PAF-MENAM-O-079-2023	Cauca - El Tambo Cauca - La Vega Cauca - Balboa Cauca - Popayán Cauca - Rosas	27/11/2023	CONSORCIO FIN GRUPO 11	$ 4.728.021.810	Terminado el 27 de noviembre del 2024
11	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-063-2023		22/12/2023	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	$312.927.160,00	Terminado el 27 de noviembre del 2024
12	OBRA	PAF-MENAM-O-076-2023	Nariño – Pasto Putumayo - Puerto Asís Cauca – Piamonte Nariño – Ipiales Nariño - Mallama	27/11/2023	CONSORCIO FIN GRUPO 12	$ 4.918.276.400	Terminado el 05 de diciembre del 2024
12	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-064-2023		22/12/2023	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	$ 351.774.412	Terminado el 05 de diciembre del 2024
Dotación	SUMINISTRO	PAF-ATMEN5-S-041-2024	Choco - Carmen del Darién, Tadó Antioquia – Apartadó Atlántico – Repelón, Soledad Bolívar – Mompós, Barranco de Loba, San Martín de Loba, María la Baja Cauca - Santander de Quilichao, Suarez, El Tambo, Bolívar, La Vega, Rosas Cesar - La Paz (Robles), El Paso Córdoba - Planeta Rica, Puerto Libertador, Ayapel, Montelíbano Magdalena - El Retén, San Sebastián de Buenavista	22/08/2024	DOTAESCOL SAS	$ 584.310.000	Suspendido el día 26 de noviembre del 2024

Nota: Según el informe previo sobre el estado de los grupos de contratación y de cada institución educativa, se comunica que **el Grupo 4 ha sido entregado el 22 de marzo de 2024, el Grupo 3 ha sido entregado el 30 de abril de 2024, Grupo 6 ha sido entregado el 17 de mayo de 2024, el Grupo 8 ha sido entregado el 21 de agosto de 2024**, **el Grupo 1 ha sido entregado el 29 de octubre de 2024**, satisfacción entre rectores, estudiantes y familias. Además, se está avanzando en el proceso de estructuración de los estudios preliminares para equipar las nuevas aulas construidas, con el objetivo de entregarlas completamente dotadas.

c. *Conformar un Comité Fiduciario y un Comité Técnico Operativo al interior del PATRIMONIO AUTÓNOMO administrado por la FIDUCIARIA contratada, de acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo que para el efecto se adopte.*

Durante este periodo se realizaron los siguientes comités:

Comités Técnicos

Para el presente periodo no se adelantan actividades de este tipo.

Comités Fiduciarios

Para el presente periodo no se adelantan actividades de este tipo.

a. ACTIVIDADES DE CIERRE Y LIQUIDACIÓN

i. Obligaciones:

a. *Adelantar la liquidación o cierre de los contratos derivados para la ejecución de los proyectos y del Contrato Interadministrativo una vez estos hayan finalizado.*

De la contratación derivada

En el presente periodo se ha planificado anticipadamente la liquidación o cierre de los contratos derivados con el propósito de asegurar una ejecución eficiente de los proyectos. Esta estrategia no solo facilitó una gestión financiera más efectiva, sino que también permitió cumplir con los objetivos establecidos dentro de los plazos previstos, optimizando así los recursos disponibles y garantizando la correcta finalización de las obligaciones contractuales, así mismo se adelantaron las siguientes liquidaciones:

GRUPO	TIPO DE CONTRATO	CÓDIGO	DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS	FECHA INCIO	FECHA TERMINACIÓN	CONTRATISTA	OBSERVACIONES
1	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-052-2023	Antioquia - Apartadó Antioquia - Turbo Antioquia - Ciudad Bolívar Chocó - Carmen del Darién Chocó - Tadó	14/11/2023	29/10/2024	INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S	Liquidado el 25 de febrero del 2025
1	OBRA	PAF-MENAM-O-049-2023		14/11/2023	14/08/2024	OBRAS CAPITAL S. A	Liquidado el día 31/01/2025
2	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-053-2023	Atlántico - Repelón Atlántico - Galapa Atlántico – Soledad - Atlántico - Palmar De Varela Atlántico - Luruaco	26/09/2023	05/11/2024	RM INGENIEROS S.A.S.	Radicado el 27/02/2025 a través PRISA INC 2025-000621
2	OBRA	PAF-MENAM-O-050-2023		06/10/2023	05/09/2024	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023	Radicado el 27/02/2025 a través PRISA INC 2025-000620
3	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-054-2023	Magdalena - Ciénaga Magdalena - El Retén Magdalena - Pueblo viejo	14/11/2023	30/04/2024	CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3	Liquidado el día 20/12/2024
3	OBRA	PAF-MENAM-O-051-2023		14/11/2023	30/04/2024	CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA	Liquidado el día 01/10/2024

GRUPO	TIPO DE CONTRATO	CÓDIGO	DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS	FECHA INCIO	FECHA TERMINACIÓN	CONTRATISTA	OBSERVACIONES
1	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-052-2023	Antioquia - Apartadó Antioquia - Turbo Antioquia - Ciudad Bolívar Chocó - Carmen del Darién Chocó - Tadó	14/11/2023	29/10/2024	INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S	Liquidado el 25 de febrero del 2025
1	OBRA	PAF-MENAM-O-049-2023		14/11/2023	14/08/2024	OBRAS CAPITAL S. A	Liquidado el día 31/01/2025
2	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-053-2023	Atlántico - Repelón Atlántico - Galapa Atlántico – Soledad - Atlántico - Palmar De Varela Atlántico - Luruaco	26/09/2023	05/11/2024	RM INGENIEROS S.A.S.	Radicado el 27/02/2025 a través PRISA INC 2025-000621
2	OBRA	PAF-MENAM-O-050-2023		06/10/2023	05/09/2024	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023	Radicado el 27/02/2025 a través PRISA INC 2025-000620
4	OBRA	PAF-MENAM-O-052-2023	Bolívar - Córdoba Bolívar - Mompós Magdalena - San Sebastián de Buenavista	24/10/2023	22/03/2024	JASA LTDA	Liquidado el día 30/09/2024
4	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-055-2023		24/10/2023	22/03/2024	CONSORCIO INTER EDUCATIVO G4	Inicia su trámite de liquidación una vez que quede desembolsado el último pago.
6	OBRA	PAF-MENAM-O-056-2023	Cesar - Valledupar Cesar - La Paz Cesar - El paso	29/09/2023	17/05/2024	DAR ARQUITECTURA S.A. S	Liquidado el día 20/11/2024
6	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-058-2023		03/10/2023	17/05/2024	CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023	Liquidado el día 27/11/2024
8	OBRA	PAF-MENAM-O-055-2023	Córdoba – Tuchín Córdoba – Cotorra Córdoba - Planeta Rica Córdoba - Puerto Libertador Córdoba – Ayapel Córdoba - Montelíbano Bolívar - María la Baja	29/09/2023	DAR ARQUITECTURA S.A. S	$4.706.470.280	Se encuentra en revisión de la fiducia.
8	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-057-2023		13/10/2023	LUIS GUILLERMO NARVÁEZ RICARDO	$297.097.668	En consolidación y revisión documentos por la supervisión para el inicio del proceso de liquidación.

Del Contrato Interadministrativo

Para el presente periodo no se adelantan actividades de este tipo.

2. RESUMEN GENERAL DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL CONTRATO

CONTRATO No CO1.PCCNTR. 4917031 de 2023

Valor inicial del Contrato (CO1.PCCNTR. 4917031 de fecha 2023)	63.650.000.000
Valor del Contrato a la fecha de corte del Informe	**63.650.000.000**
Descuentos / Impuestos Estampilla Pro-Universidad Nacional / Tasas y Contribuciones (Correspondiente al 2% aplicado al valor Inicial del Contrato)	-
Asistencia Técnica No. 1 (Porcentaje de Asistencia Técnica y Administración de Recursos a reconocer a FINDETE, 7%)	4.164.018.692
Valor disponible para ejecutar los proyectos de acuerdo con el objeto del contrato y el plan operativo.	**59.485.981.308**

3. ANEXOS

Se remiten anexos de acuerdo con las actividades realizadas durante el periodo así:

1. 14 de febrero del 2025

HERNÁN PARDO BOTERO
Gerente de Infraestructura
FINDETER GB

JESÚS ALBERTO CAÑAS PÁEZ
Gestor del Contrato Interadministrativo
FINDETER

Elaboró: Geraldine Lorena Prada Pimiento – Profesional de la Gerencia de Infraestructura



Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Contrato No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023

14 FEBRERO DE 2025

Hacienda

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública


Contrato No. 4917031-2023

136 **sedes educativas**
[instalación de aulas y mejoramientos]

$ 63.650
Millones de pesos

Fecha inicio: 2/06/2023
Fecha Fin Actual: 01/07/2025

Grupo	Departamentos / Municipios	Etapa Actual del grupo/% de avance de contrato Fecha de Inicio –Fecha de Terminación
G1 [10 sedes]	Antioquia | Chocó	Entregado [100,00%] 14/11/2023 - 14/08/2024
G2 [8 sedes]	Atlántico	Entregado [100,00%] 27/11/2023 -06/09/2024
G3 [5 sedes]	Magdalena	Liquidado [100,00%] 14/11/2023 - 30/04/2024
G4 [5 sedes]	Bolívar	Entregado [100,00%] 26/10/2023 - 23/03/2024
G5 [16 sedes]	Bolívar | Magdalena | Cesar	Entregado [100,00%] 14/11/2023 – 08/11/2024
G6 [7 sedes]	Cesar	Entregado [100,00%] 15/11/2023 - 17/05/2024
G7 [13 sedes]	Guajira	Terminado [100,00%] 31/05/2024 - 17/01/2025
G8 [9 sedes]	Córdoba | Bolívar	Entregado [100,00%] 08/11/2023 - 23/08/2024
G9 [12 sedes]	Santander | Bolívar | Bogotá | Arauca | Tolima | Meta | Cundinamarca | Nte de Santander	En obra[33,97%] 23/08/2024 - 08/03/2025
G10 [15 sedes]	Cauca | Chocó | Valle Del Cauca	En Obra [90,22%] 19/02/2023 - 30/12/2024
G11 [18 sedes]	Cauca	Terminado [100,00%] 12/02/2023 - 27/11/2024
G12 [18 sedes]	Nariño | Putumayo | Cauca	Terminado [100,00%] 20/02/2023 - 04/12/2024
Dotación	46 Sedes a dotar - 99 aulas	Suspendido[100,00%] 03/10/2024 – 03/12/2024

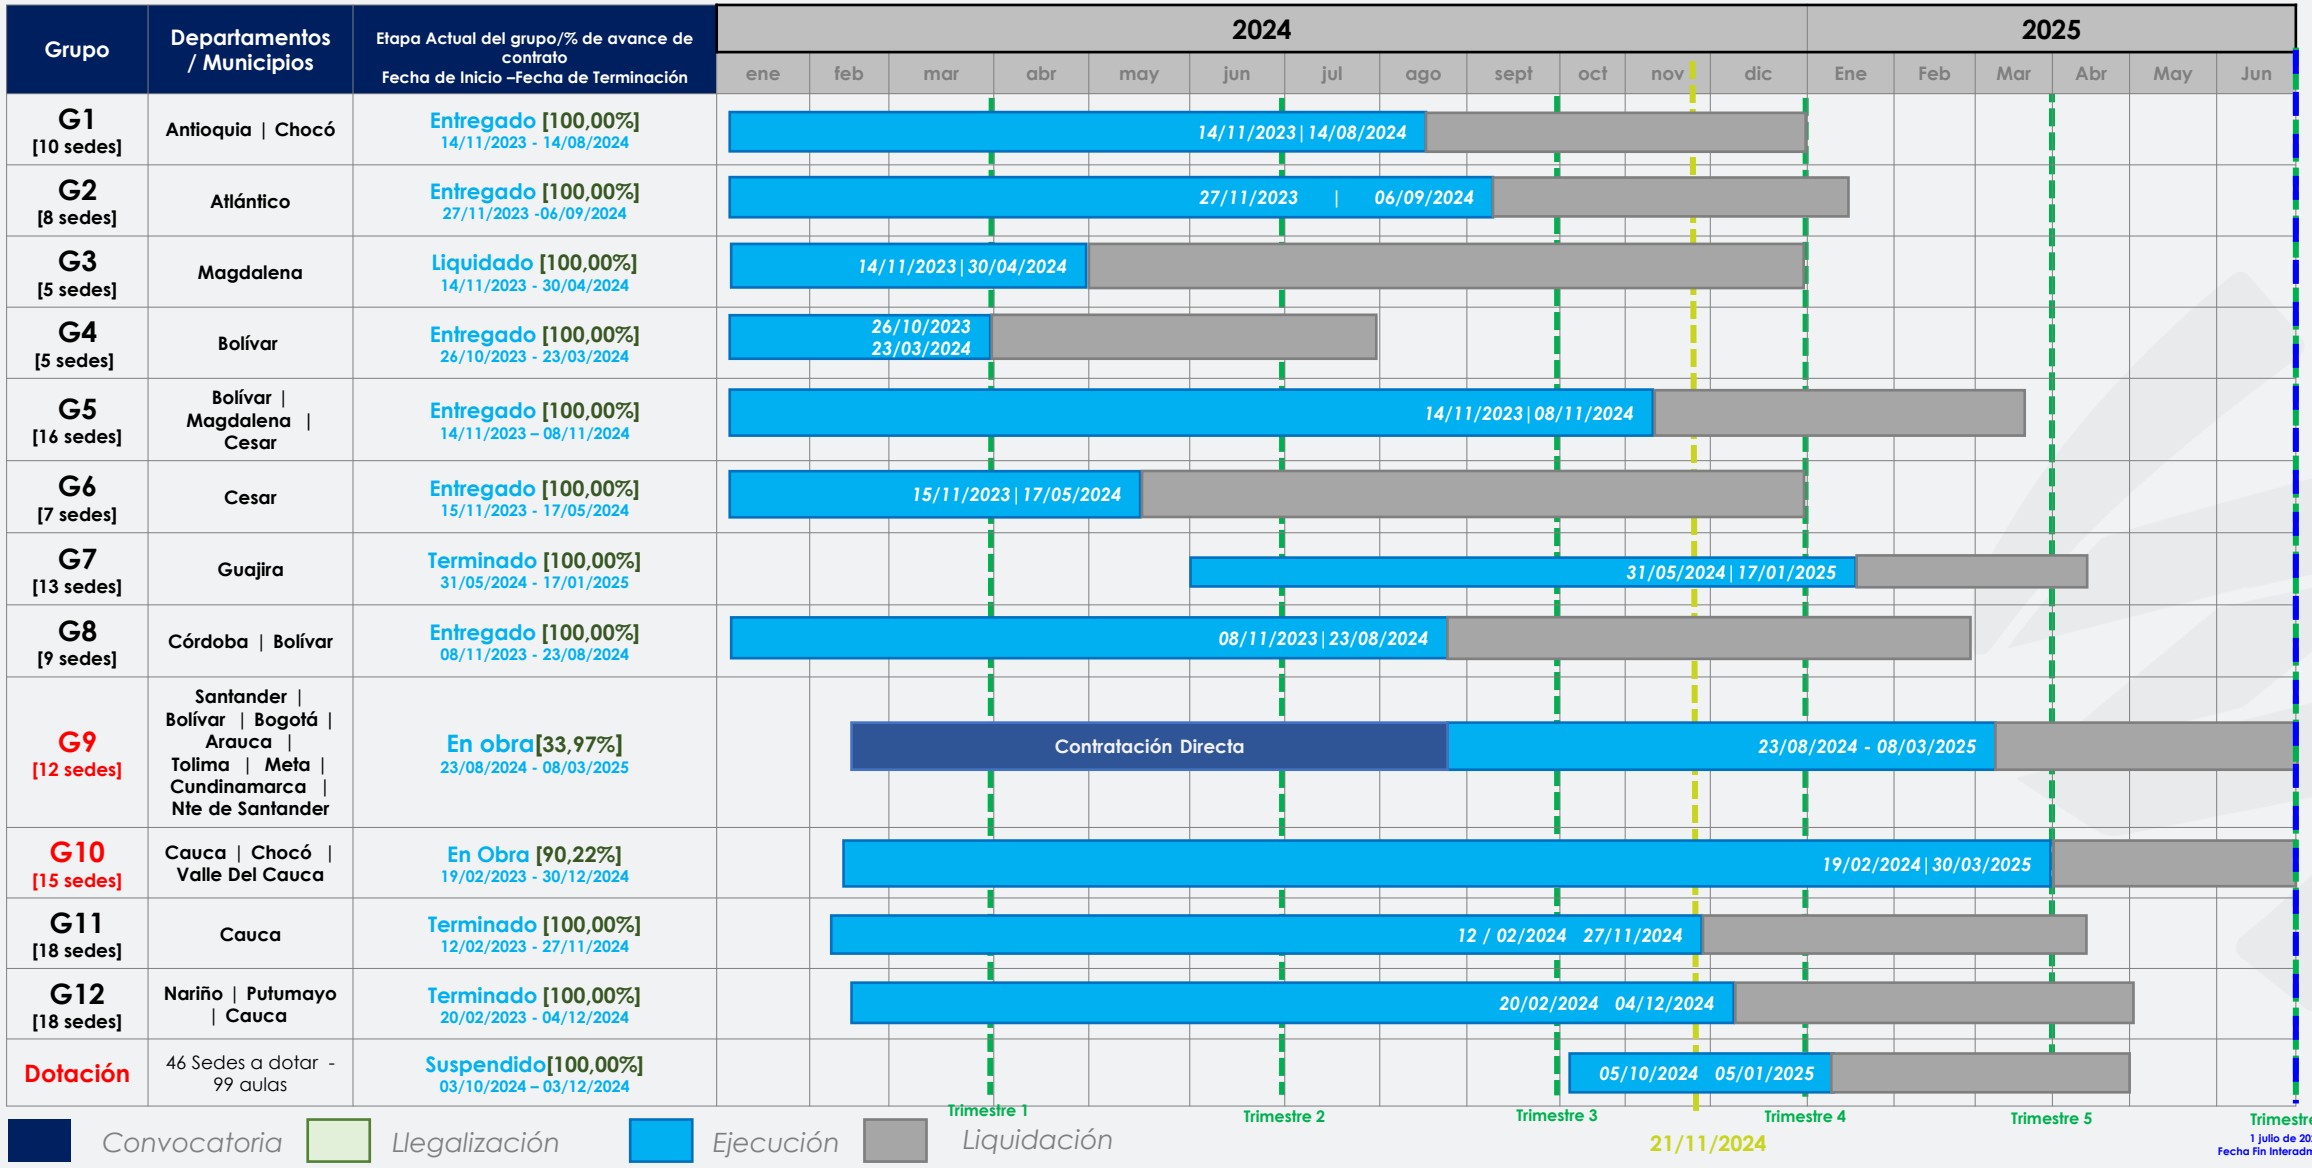

Convocatoria | Llegalización | Ejecución | Liquidación

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

Aulas Móviles
Contrato No. 4917031-2023

Educación

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

136 **sedes educativas**
[instalación de aulas y mejoramientos]

$ 63.650
Millones de pesos

Fecha inicio: 02/06/2023
Fecha Fin: 01/07/2025

ENTREGADAS 116 sedes 85,29%


TERMINADAS 5 sedes 3,68%

Físicamente culminadas. A la espera de firma de actas para ser entregadas

EN EJECUCIÓN 15 sedes 9,56%

POR INICIAR 2 sedes 1,47%

Estado de entrega y ejecución de Sedes

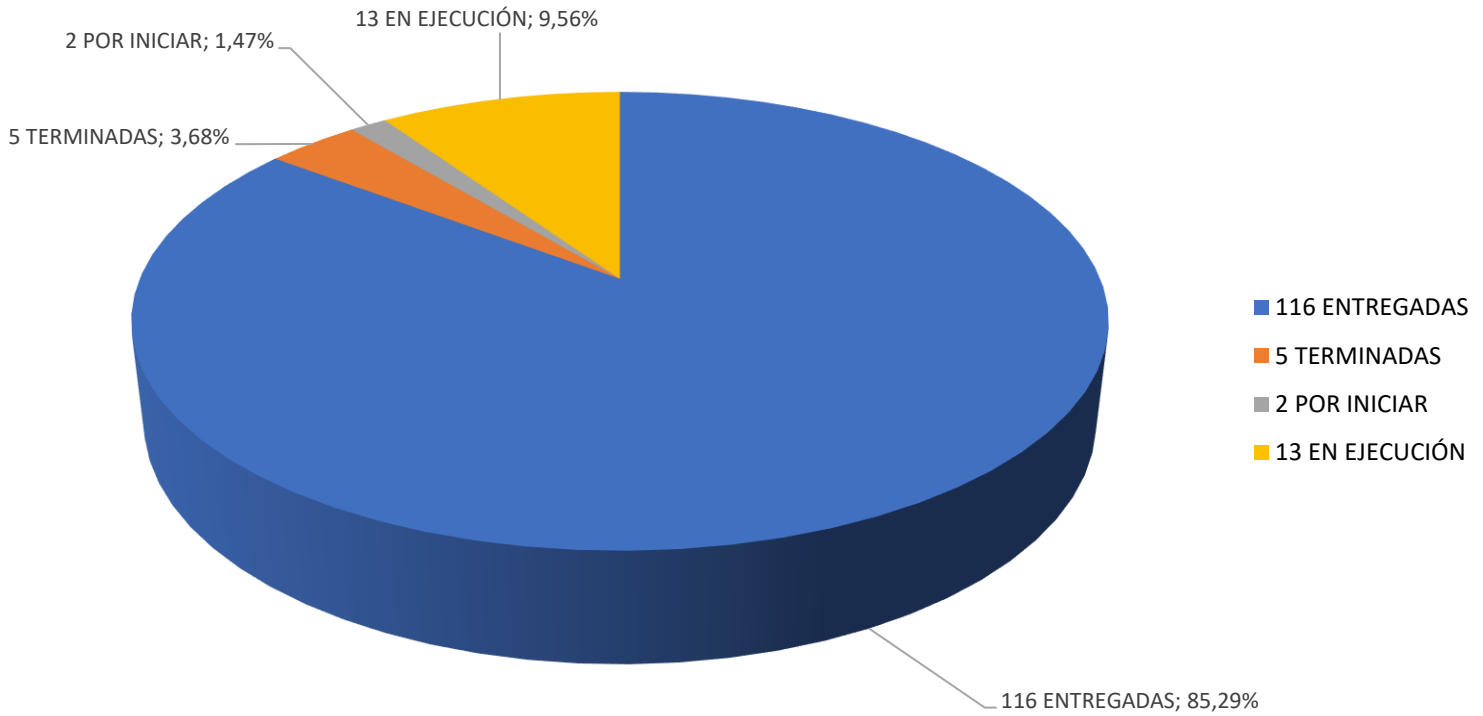

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Estado de entrega y ejecución de Sedes

136 **sedes educativas**
[instalación de aulas y mejoramientos]

$ 63.650
Millones de pesos

Fecha inicio: 02/06/2023
Fecha Fin: 01/07/2025

ENTREGADAS	TERMINADAS	EN EJECUCIÓN	POR INICIAR
116 sedes 85,29%	5 sedes 3,68%	13 sedes 9,56%	2 sedes 1,47%
Grupo 1 - 10 Grupo 2 - 8 Grupo 3 - 5 Grupo 4 - 5 Grupo 5 - 16 Grupo 6 - 7 Grupo 7- 13 Grupo 8 - 9 Grupo 10 - 10 Grupo 11 - 16 Grupo 12 - 17	Grupo 9 - 1 Grupo 10 - 1 Grupo 11 - 2 Grupo 12 - 1	Grupo 9 - 9 Grupo 10 - 4	Grupo 9 - 2 Grupo 10 - 4

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

PAGOS ASISTENCIA TECNICA

136 **sedes educativas**
[instalación de aulas y mejoramientos]

$ 63.650
Millones de pesos

Fecha inicio: 02/06/2023
Fecha Fin: 01/07/2025

VALOR AT

$ 4.164.018.692

Cobrado (a dic de 2024)	Pagado (a dic de 2024)	SALDO
$3.585.749.431,31	$3.585.749.431, 31	$ 578.269.260,69

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

Resumen Informe Financiero – Corte 31 de diciembre de 2024

136 **sedes educativas**
[instalación de aulas y mejoramientos]

$ 63.650
Millones de pesos

Fecha inicio: 02/06/2023
Fecha Fin: 01/07/2025

VALOR EJECUTADO

$ 49.435 mll

VALOR POR EJECUTAR

$ 14.573 mll

VALOR COMPROMETIDO

$ 59.515 mll

SALDO

$ 398,2 mll*

*El saldo es a corte de 09 de febrero de 2025

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

Rendimientos Financieros – Relación de Pagos

Educación


Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031
Ministerio de Educación Nacional
Financiera del Desarrollo S.A.
7. RENDIMIENTOS FINANCIEROS
01 de diciembre al 31 de diciembre de 2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

FECHA	RENDIMIENTOS CAUSADOS CUENTA DE AHORRO	VALORACIÓN /DESVALORIZACION CAUSADOS FONDO DE INVERSION COLECTIVA - FIC	TOTAL RENDIMIENTOS, VALORACION DEVALORIZACION CAUSADOS	FECHA TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS	VALOR TRASLADO RENDIMIENTOS	AJUSTES / RETENCIONES	SALDO PENDIENTE POR TRASLADAR RENDIMIENTOS	DESVALORIZACION ACUMULADA
ago-23	82.351.406,35	443.947.650,01	**526.299.056,36**				-	-
sep-23	108.927.246,74	548.880.836,71	**657.808.083,45**				-	-
oct-23	131.902.760,66	436.008.307,20	**567.911.067,86**				-	-
nov-23	144.907.033,92	718.224.229,49	**863.131.263,41**				-	-
dic-23	143.221.271,36	788.090.860,63	**931.312.131,99**	13/12/2023	**2.615.149.472,00**		-	-
ene-24	133.626.379,48	427.858.051,59	**561.484.431,07**	10/01/2024	**931.312.131,99**		-	-
feb-24	120.547.529,88	474.970.095,24	**595.517.625,12**	12/02/2024	**561.484.430,15**		-	-
mar-24	117.745.976,50	478.495.863,61	**596.241.840,11**	12/03/2024	**595.517.625,12**		-	-
abr-24	100.331.907,69	259.736.382,70	**360.068.290,39**	10/04/2024	**596.241.840,11**		-	-
may-24	89.374.457,56	353.632.163,66	**443.006.621,22**	11/05/2024	**360.068.290,39**		-	-
jun-24	76.820.331,89	266.323.590,41	**343.143.922,30**	13/06/2024	**443.006.621,22**		-	-
jul-24	68.012.790,67	294.233.627,01	**362.246.417,68**	15/07/2024	**343.143.922,30**		-	-
ago-24	21.741.419,32	313.006.436,96	**334.747.856,28**	14/08/2024	**362.246.417,68**		-	-
sep-24	20.861.120,00	192.185.501,19	**213.046.621,19**	10/09/2024	**334.747.856,28**		-	-
oct-24	27.022.756,52	71.175.915,03	**98.198.671,55**	18/10/2024	**213.046.621,19**		-	-
nov-24	21.729.373,21	129.213.183,82	**150.942.557,03**	13/11/2024	**98.198.671,55**		-	-
dic-24	19.252.522,64	66.886.746,40	**86.139.269,04**	10/12/2024	**150.942.557,03**		**86.139.269,04**	-
TOTAL	**1.428.376.284,39**	**6.262.869.441,66**	**7.691.245.726,05**		**7.605.106.457,01**	-	**86.139.269,04**	-

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

Rendimientos Financieros – Comprobante de pago

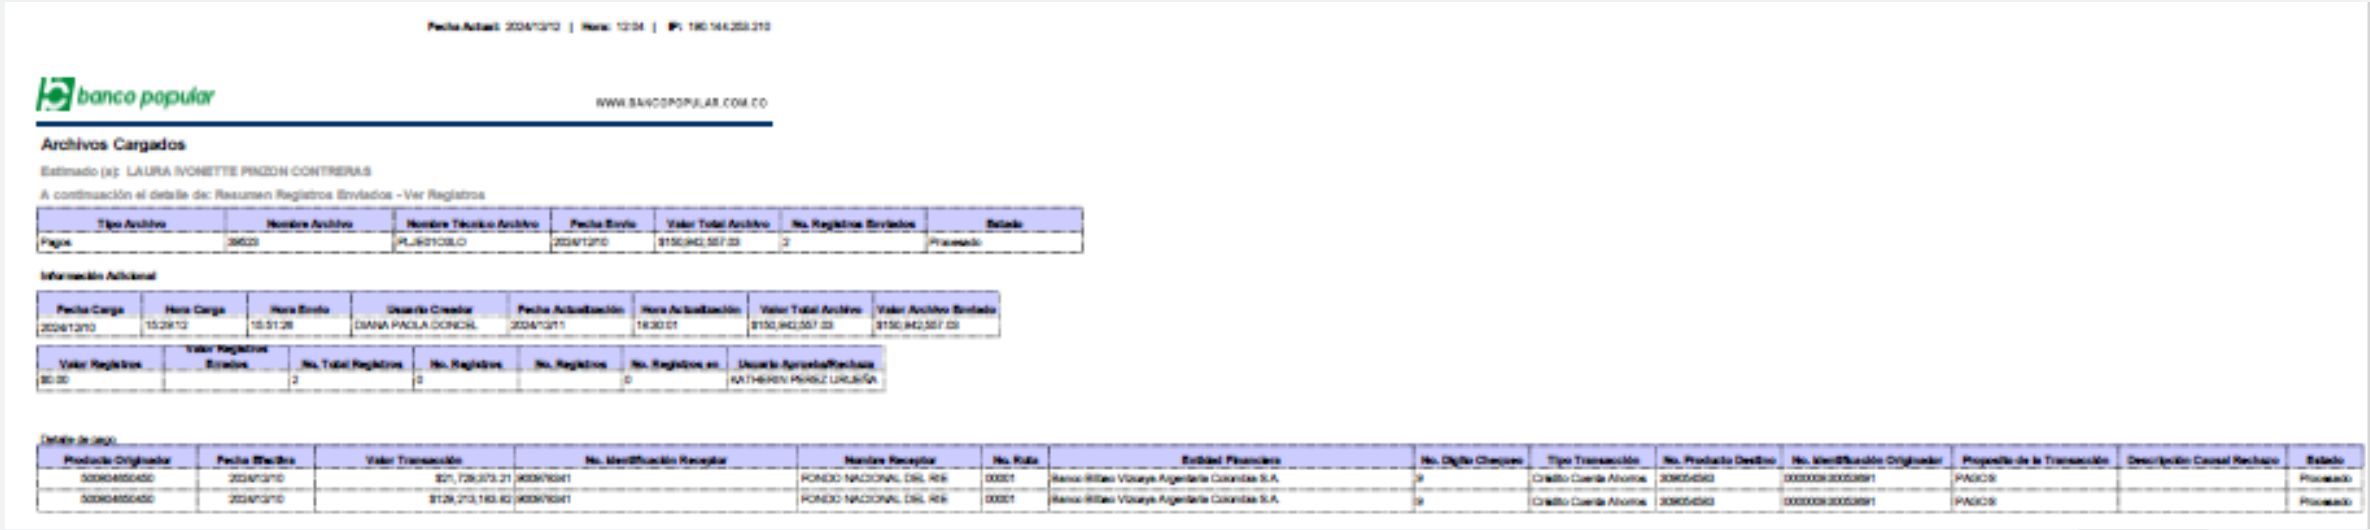

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Archivos Cargados

Estimado (a): LAURA IVONETTE PINZON CONTRERAS

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	39520	PLJ521C08.O	2024/12/10	$150,842,557.03	2	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/12/10	15:29:12	15:51:26	DIANA PAOLA DONCEL	2024/12/11	18:30:01	$150,842,557.03	$150,842,557.03

Valor Registros	Valor Registros Enviados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		2	0		0	KATHERIN PEREZ URUEÑA

Detalle de pago

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	No. Rubi	Entidad Financiera	No. Digito Chequeo	Tipo Transacción	No. Producto Destino	No. Identificación Originador	Propósito de la Transacción	Descripción Causal Rechazo	Estado
50090455450	2024/12/10	$21,728,073.21	900976041	FONDO NACIONAL DEL RIE	00001	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	9	Crédito Cuenta Ahorros	309054583	0000009300536891	PAGOS		Procesado
50090455450	2024/12/10	$128,213,183.82	900976041	FONDO NACIONAL DEL RIE	00001	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	9	Crédito Cuenta Ahorros	309054583	0000009300536891	PAGOS		Procesado

NOTA: Teniendo en cuenta el contrato MEN-4917031 2023 -TEMPORADA DE LLUVIAS, y en atención a la obligación descrita en la cláusula tercera, Obligaciones específicas del contratista, Numeral 8 el cual dice:

"8. El Patrimonio Autónomo — Findeter deberá reintegrar mensualmente los rendimientos financieros (si los hubiere) a la Dirección del Tesoro Nacional o en los términos que establezca la normatividad aplicable, es decir, que no ingresan ni hacen parte del Patrimonio Autónomo constituido por Findeter."

Se han consignado los rendimientos financieros a la siguiente cuenta:

- **Banco:** BBVA
- **Tipo:** Ahorros
- **No. Cuenta:** 309-054583
- **Nombre de la Cuenta:** FIDUPREVISORA S.A FNGRD – COLOMBIA VITAL

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

AULAS MOVILES
INFORME DETALLADO POR GRUPO DE INTERVENCION

Febrero 14 de 2025



NGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres

Educación

Colombia Vital

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

CONTRATOS EN EJECUCION

GRUPO	Departamento	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	ALERTAS, ASUNTOS PENDIENTES
GRUPO 9	Arauca, Bolívar, Cundinamarca Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima y Bogotá D.C.	**12**	23/08/2024	08/03/2025	82,61%	47,90%	Se han presentado inconvenientes por precipitaciones para los proyectos ubicados en el Tolima, lo cual está generando que se tenga que solicitar una prórroga por dos (2) meses y quince (15) días calendario para la culminación de actividades en estas sedes. Se han presentado demoras en la ejecución de actividades e inicio de obras en algunas sedes educativas, lo cual a la fecha genera un alto atraso; por lo anterior, se inició proceso de apremio el cual fue notificado por la fiduciaria el 03 de febrero de 2025 y se presentaron descargos el día 11/02/2024, los cuales están siendo analizados por la interventoría para la continuación del mismo.
GRUPO 10	Cauca, Valle del Cauca y Choco	**15**	19/02/2024	30/03/2025	89,07%	86,23%	Los proyectos del Cauca se han visto afectados por temas de orden público en los últimos días de enero y primeros de febrero, lo cual han generando suspensión actividades parciales y retiro de personal trabajador por temor a la situación, hechos que han afectado los avances de los proyectos y actualmente están generando atrasos frente a la programación. Adicional el proyecto de Santander de Quilichao se encuentra en avance a su programación pero pendiente de que la administración municipal construya las acometidas para realizar las conexiones pertinentes por parte del proyecto, se ha reiterado al solicitud y necesidad de la misma, sobre la cual informan que se encuentran adelantando los tramites para abrir la convocatoria y adjudicar el contrato, ya que en el mes de diciembre adelantaron este proceso pero el mismo se declaro desierto.

CCOM-FO-005 V1 / 05-Ago-2024 / Publica

Grupo 09

Fecha inicio: 23/08/2024
Fecha Fin: 08/03/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Departamento	**Arauca, Bolívar, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima y Bogotá D.C.**
$	**Valor Inicial** Obra: $ 4.810.476.306,00 Interventoría: $ 313.800.000
	Adiciones Obra: $ 0 Interventoría: $165.685.393,30
	Valor Pagado Obra: CI- $245.711.234,70 CII - $ 1.177.717.523,99 Interventoría: CI - $0 CII - $ 96.927.168,55
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Otrosí No. 1: Retiro de tres (3) sedes del alcance Otrosí No. 2: Prórroga tres (3) meses obra e interventoría, adición interventoría por $165.685.393,30
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	El contratista se retrasó en el inicio de las obras en todas las sedes educativas; se han iniciado actividades en algunas sedes educativas faltantes, sin embargo, esto no mitiga los atrasos que tiene el contrato. A la fecha se tienen en ejecución 10 de las 12 sedes educativas. Se encuentra en espera de presentación de descargos por parte del contratista e informe de la interventoría para continuación de aplicación de apremio. Se presenta la necesidad de hacer una prórroga por 2,5 meses para las sedes ubicadas en el departamento del Tolima por los inconvenientes en transporte que se han presentado.

47,90%
Porcentaje de avance

82,61%
Porcentaje Programado

Sedes:	**12**
En ejecución:	10
Por iniciar:	2

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Grupo 09


COLEGIO UNIVERSITARIO - ID No. 7




IE DEL CERRO DE VERACRUZ -ID No. 124




CENTRO EDUCATIVO MONSERRATE - ID No. 138

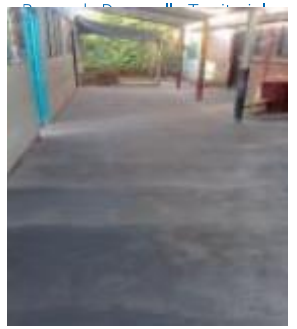CENTRO EDUCATIVO LA PAVA - ID No. 56




ESCUELA SIETE DE AGOSTO - ID No. 96




SEDE LA PEÑA – ID No. 132




EL DESCANSO - ID No. 104




CAMPO PAYARES -ID No. 123




CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Grupo 10

Fecha inicio: 19/02/2024
Fecha Fin: 30/03/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Departamento	**Cauca, Valle del Cauca y Choco**
$	**Valor Inicial** Obra: $6.014.978.800 Interventoría: $327.496.568
	Adiciones Obra: $602.576.550 Interventoría: $197.588.004,15 ($79.155.973,39 asumidos por el contrato de obra) ($118.432.030,76 asumidos por el contrato interadministrativo)
	Valor Pagado Obra: $5.620.758.289,00 Interventoría: $394.815.767,36
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	3 otrosíes obra: Prórrogas (9 meses y 27 dias) 3 otrosíes interventoría: Prórrogas (9 meses y 27 dias) y adiciones ($197.588.004,15)
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	En cumplimiento al alcance se tienen 11 sedes entregadas y AEP&SC suscritas, y 4 sedes en ejecución, (2 Suarez, 1 Santander de Quilichao, 1 Bahía Solano). Se adelanta programa para realizar la entrega de la sede la Huaca en Bahía solano de la semana del 18 al 21 si se logra coordinar la agenda con el rector, frente a las obras de Suarez y Santander de Quilichao se continua con el avance de actividades con un personal mínimo derivado de los temas de orden publico que están afectando los avances de los proyectos y se evalúa una no posible terminación dentro de los tiempos contractuales.

86,23%
Porcentaje de avance

89,07%
Porcentaje Programado

Sedes:	**15**
En ejecución:	4
Por iniciar:	0
Entregadas:	11

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial


INSTITUCION E.TECNICA AGRARIA SEDE PRINCIPAL ID MEN. 188.




INSTITUCION E.TECNICA AGRARIA SEDE INMACULADA ID MEN. 189.




INSTITUCION E.TECNICA AGRARIA SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ID MEN. 190

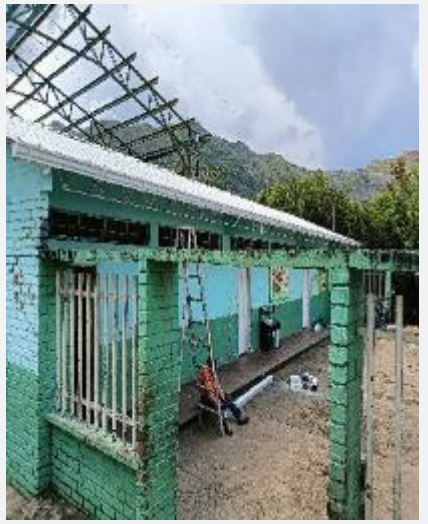INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PLAYA ID MEN: 12. MUNICIPIO DE TORIBIO ID MEN: 12.




INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO SEDE DOMINGO LASSO ID 164.




INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO SEDE PRINCIPAL ID 16




CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE JOHN F. KENNEDY




IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDEJULIAN MENDOZA GUERRERO




IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE PRINCIPAL




IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE LA HONDA .




IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE LA PLANTA .




IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE CRISTOBAL COLÓN




lica

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE. LUIS LOPEZ DE MESA SEDE SAN JOSE (HUACA)





IE. LUIS LOPEZ DE MESA SEDE SECUNDINO RIVAS




IE. LUIS LOPEZ DE MESA SEDE SIRENA DEL MAR




CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

CONTRATOS SUSPENDIDOS

GRUPO	Departamento	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	OBSERVACIONES
DOTACIÓN	Antioquia, Atlántico, Bolivar, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Putumayo, Santander, Tolima, Valle del Cauca	**46**	03/10/2024	02/12/2024	Valor del contrato inicial de $584.310.000,00 y otro sí proyectado de $364.000.000 y adición de 3 meses por las condiciones de accesibilidad de las nuevas sedes. Contrato Suspendido para la incorporación de los recursos. Se realiza el Otro Sí y se citará a comité la 3era semana del mes de febrero. Dotación entregada en los grupos 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 y 11 y, pendiente la entrega de los grupos 5, 7, 9, 10 y 12. La ejecución se realiza en 16 departamentos, 38 municipios y se realiza la dotación de 99 aulas nuevas construidas.

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Estado Entrega de Dotación



CENTRO EDUCATIVO INDIGENA CAÑO PADILLA YUKPA
Sede El Coso La Paz – Cesar



INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO
Sede Escuela Nueva Parcelas Londres
Ayapel - Córdoba



INSTITUCION EDUCATIVA EL PALMAR
Escuela Nueva Mixta Divino Salvador
Monte Líbano - Córdoba



INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO
Sede Principal Santander de Quilichao - Cauca



INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA ERM MARIA AUXILIADORA Sede
Sebastián de Buenavista - Magdalena



INSTITUCION EDUCATIVA TIERRA FIRME
Mompox - Bolivar

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

CONTRATOS TERMINADOS

GRUPO	Departamento	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	OBSERVACIONES
GRUPO 11	Cauca	**18**	12/02/2024	27/11/2024	Contratista avanza en las gestiones de entrega a Directivos de las sedes terminadas y recibidas por interventoría, las cuales son Santa Teresita en el municipio de Rosas y Francisco Javier sede Garay en el municipio de la Vega. Inicialmente el recibo de estas sedes se atrasó debido al periodo de vacaciones de los Directivos, y una vez reanudado el año escolar se informaron posventas en algunos espacios. En la IE Francisco Javier sede Garay las posventas ya fueron atendidas y se esta gestionando la firma del acta de recibo por parte del Rector. En la IE Santa Teresita están próximos a terminar la subsanación de las posventas informadas.
GRUPO 12	Cauca, Huila, Nariño y Putumayo	**1**	20/02/2024	05/12/2024	Contratista avanza en las gestiones de entrega a Directivos de las sedes terminadas y recibidas por interventoría, las cuales son Santa Teresita en el municipio de Rosas y Francisco Javier sede Garay en el municipio de la Vega. Inicialmente el recibo de estas sedes se atrasó debido al periodo de vacaciones de los Directivos, y una vez reanudado el año escolar se informaron posventas en algunos espacios. En la IE Francisco Javier sede Garay las posventas ya fueron atendidas y se esta gestionando la firma del acta de recibo por parte del Rector. En la IE Santa Teresita están próximos a terminar la subsanación de las posventas informadas.

CCOM-FO-005-V1.1/05-Ago-2024/-Pública

Grupo 11

Fecha inicio: 12/02/2024
Fecha Fin: 27/11/2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Departamento	**Cauca**
$	**Valor Inicial** Obra: $ 4.728.021.810 Interventoría: $ 312.927.160
	Adiciones Obra: $ 0 Interventoría: $ 99.972.853,00 ($ 54.867.110,00 asumidos por el contrato de obra) ($ 45.105.743,00 asumidos por el contrato interadministrativo)
	Valor Pagado Obra: $ 4.721.624.076,00 Interventoría: $ 379.820.020,17
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	3 otrosíes obra: Prórrogas (6 meses) 3 otrosíes interventoría: Prórrogas y adiciones (6 meses - $ 99.972.853,00)
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	Contratista avanza en las gestiones de entrega a Directivos de las sedes terminadas y recibidas por interventoría, las cuales son Santa Teresita en el municipio de Rosas y Francisco Javier sede Garay en el municipio de la Vega. Inicialmente el recibo de estas sedes se atrasó debido al periodo de vacaciones de los Directivos, y una vez reanudado el año escolar se informaron posventas en algunos espacios. En la IE Francisco Javier sede Garay las posventas ya fueron atendidas y se esta gestionando la firma del acta de recibo por parte del Rector. En la IE Santa Teresita están próximos a terminar la subsanación de las posventas informadas.





CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO




I.E. Agropecuaria Santa Rita – Sede principal
La vega




C.E. Buenos Aires – Sede Capitanes
Balboa




C.E. Guillermo León Valencia – Sede La Despensa
Rosas





C.E. Guillermo León Valencia – El Altillo
Rosas

CCOM-FO-005 V1 / 05 - Ago-2024 / Pública
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO




I.E. El Carmen – Sede principal
Bolívar




I.E. Alfonso Córdoba – Sede Las Yerbas
Rosas




I.E. Alfonso Córdoba – Sede Bellavista
Rosas




I.E. Técnica Agropecuaria Nuestra Señora de los
Remedios - Bolívar

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada
CCOM-FO-005 V1 / 05 - Ago-2024 / Pública

Grupo 12

Fecha inicio: 12/02/2024
Fecha Fin: 05/12/2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Departamento	**Cauca, Huila, Nariño y Putumayo**
$	**Valor Inicial** Obra: $ 4.918.276.400,00 Interventoría: $ 318.105.088,00
	Adiciones Obra: $ 0 Interventoría: $ 152,015,642,00
	Valor Pagado Obra: $ 4.906.706.463,00 Interventoría: $ 413.123.412
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	2 otrosíes obra: Prórrogas (6 meses) 2 otrosíes interventoría: Prórrogas y adiciones (6 meses - $ 152,015,642,00)
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	Total de 18 sedes, entregadas a satisfacción con recibo de interventoría y rectores de 17 sedes y pendiente la entrega de 1 sede en Piamonte ID 125. Inst Educ Agric Piamonte – Cauca, se encuentra pendiente recibo por el rector, se solicitó acompañamiento a Cobertura, Secretaria de Educación del Cauca y MEN para realizar la suscripción el día 14/02/2025. Se solicitó a la empresa de energía del Putumato y Alcaldía realizar los trámites necesarios sobre la ampliación de carga de la institución, dado que las obras realizadas por este contrato son de mejoramiento y no afecto la carga actual de la institución. Se solicita compromiso para realizar trámite por la Secretaria de Planeación de Piamonte – Cauca y reunión seguimiento 18/02/2025.





CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Estado GRUPO 12, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO




ID1 Pasto, Nariño - I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE




ID8 El Rosario - Nariño, CENTRO EDUCATIVO LA CLAUDIA




ID26 Acevedo, Huila - INSTITUCION EDUCATIVA BATEAS




ID27 Piamonte - Cauca, ESCUELA RURAL MIXTA LA ESPANOLA

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada
CCOM-FO-005 V1 / 05 - Ago-2024 / Pública

CONTRATOS ENTREGADOS

GRUPO	Departamento	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	OBSERVACIONES
Grupo 1	Antioquia, Chocó	**10**	14/11/2023	14/08/2024	• CONTRATO PAF-MENAM-O-049-2023: Liquidación realizada el 31.01.2025. • CONTRATO PAF-MENAM-I-052-2023: Terminado el 29.10.2024 - Liquidación radicada el 2 de diciembre de 2024, mediante prisa INC 2024-002246, asignación liquidador Mireya Artunduaga, el 11.02.2025 se traslada a revisión y VoBo de la Fiduciaria Popular para solicitar Firmas, proceso que se proyecta se de en la semana al 15 de febrero de 2025.
Grupo 2	Atlántico	**8**	27/11/2023	05/09/2024	CONTRATO PAF-MENAM-O-050-2023: Terminado el 05.09.2024 CONTRATO PAF-MENAM-I-053-2023: Terminado el 05.11.2024 **AERS COMPONENTE 2:** • Contrato de obra suscrita el 10.02.2025 y en proceso de actualización de pólizas para revisión y aprobación por parte de la Fiduciaria Popular. • Contrato de interventoría en proceso de revisión para presentar a firmas, proceso que se espera se de en la semana del 17 al 21 de febrero de 2025 En recopilación documental, cierre de balances y memorias entre el contratista e interventoría, se proyecta radicar la liquidación del contrato de obra al 28 de febrero de 2025 y posterior la de interventoría.

CCOM-FO-005 V1 / 05 Ago 2024 / Pública

CONTRATOS ENTREGADOS

GRUPO	Departamento	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	OBSERVACIONES
Grupo 4	Magdalena y Bolívar	**7**	24/10/2023	07/02/2024	Se encuentra liquidado el contrato de obra. El contrato de interventoría iniciará su trámite de liquidación una vez que quede desembolsado el último pago.
Grupo 5	Magdalena y Bolívar	**16**	14/11/2023	08/11/2024	CONTRATO PAF-MENAM-O-053-2023: Terminado el 08.11.2024 CONTRATO PAF-MENAM-I-056-2023: Terminado el 08.01.2025 **AERS COMPONENTE 2:** • Contrato de Obra e Interventoría, en proceso de revisión y VoBo por parte de la Fiduciaria Popular, para pasar a firmas, una vez se tenga las AERS suscritas se procederá a solicitar la actualización de pólizas. En recopilación documental, cierre de balances y memorias entre el contratista e interventoría, se proyecta radicar la liquidación del contrato de obra al 15 de marzo de 2025 y posterior la de interventoría.
Grupo 7	La Guajira	**13**	31/05/2024	17/01/2025	Se encuentra en elaboración por parte de la interventoría el AERS del componente II para tramitar firma ante fidupopular. El contrato de obra iniciará su trámite de liquidación una vez que quede desembolsado el último pago; el cual deben facturar a inicios de marzo y pagado a finales de marzo 2025. Con respecto a la interventoría le falta facturar casi un 60% y se estima si liquidación para iniciar a finales de abril 2025.
Grupo 8	Córdoba y Bolívar	**9**	08/11/2023	08/07/2024	En expedición el acta de liquidación del contrato. En consolidación la información del contrato de interventoría. Se proyecta su liquidación en el mes de marzo

CCOM-FO-005-V1.1/05-Ago-2024/ Pública

Grupo 1

Fecha inicio: 14/11/2023
Fecha Fin: 14/08/2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Departamento	**Antioquia, Chocó**
$	**Valor Inicial** Obra: $3.447.332.359 Interventoría: $271.455.247
	Adiciones Obra: $201.152.963 Interventoría: $53.764.065,32 ($28.580.295 asumidos por el contrato de obra) ($25.183.770,32 asumidos por el contrato interadministrativo)
	Valor Pagado Obra: $3.425.566.080,21 Interventoría: $300.482.403,41
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	2 otrosíes obra: Prórrogas (5 meses y 15 dias) y adición ($$201.152.963) 2 otrosíes interventoría: Prórrogas (6 meses) y adiciones ($53.764.065,32)
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	• CONTRATO PAF-MENAM-O-049-2023: Liquidación realizada el 31.01.2025. • CONTRATO PAF-MENAM-I-052-2023: Terminado el 29.10.2024 - Liquidación radicada el 2 de diciembre de 2024, mediante prisa INC 2024-002246, asignación liquidador Mireya Artunduaga, el 11.02.2025 se traslada a revisión y VoBo de la Fiduciaria Popular para solicitar Firmas, proceso que se proyecta se de en la semana al 15 de febrero de 2025.

100%
Porcentaje de avance

100%
Porcentaje Programado

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Publica

GRUPO 1, Departamentos de Antioquia – Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL GUINEO - SEDE CE EL OSITO - ID No. 161




INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO ID No. 118




INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS ID No. 66




INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO ID No. 86




INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS SEDE EU JESÚS MORA ID No. 112




INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MARTÍN DE PORRES SEDE EU GONZALO MEJÍA




CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

GRUPO 1, Departamentos de Antioquia – Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA HERRÁN SEDE CER PAULINA PUERTA
ID No. 42





INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROAMBIENTAL SEDE MARÍA AUXILIADORA DE MANUNGARA
ID No. 150





INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR DEMETRIO SALAZAR CASTILLO SEDE CE ESCUELA FRANCISCO MIRANDA





CENTRO EDUCATIVO PUEBLO NUEVO SEDE PRINCIPAL
ID No. 94







CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Grupo 2

Fecha inicio: 27/11/2023
Fecha Fin: 05/09/2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Departamento	**Atlántico**
$	**Valor Inicial** Obra: $4.044.124.630 Interventoría: $295.715.000
	Adiciones Obra: $ 0,00 Interventoría: $113.699.014 ($57.808.105,6 asumidos por el contrato de obra) ($55.890.908,4 asumidos por el contrato interadministrativo)
	Valor Pagado Obra: $4.028.747.780,96 Interventoría: $374.270.637,53
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	3 otrosíes obra: Prórrogas (5 meses y 5 dias) 3 otrosíes interventoría: Prórrogas (5 meses y 5 dias) y adiciones ($113.699.014)
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	CONTRATO PAF-MENAM-O-050-2023: Terminado el 05.09.2024 CONTRATO PAF-MENAM-I-053-2023: Terminado el 05.11.2024 AERS COMPONENTE 2: • Contrato de obra suscrita el 10.02.2025 y en proceso de actualización de pólizas para revisión y aprobación por parte de la Fiduciaria Popular. • Contrato de interventoría en proceso de revisión para presentar a firmas, proceso que se espera se de en la semana del 17 al 21 de febrero de 2025 En recopilación documental, cierre de balances y memorias entre el contratista e interventoría, se proyecta radicar la liquidación del contrato de obra al 28 de febrero de 2025 y posterior la de interventoría.

100%
Porcentaje de avance

100%
Porcentaje Programado

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Contratista de Diseño y Obra: PAF-MENAM-O-050-2023 CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 - G2
Contratista interventor: PAF-MENAM-I-053-2023 RM INGENIEROS S A S

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE PRINCIPAL - ID EN 018




INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE PRINCIPAL - ID EN 018




INSTITUCION EDUCATIVA BLAS TORRES DE LA TORRE (ITIDA) - ID MEN 144




INSTITUCION EDUCATIVA DE MESOLANDIA - ID MEN 197




INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS, LAS TABLAS Y PITA, SEDE PITA - ID MEN 092




INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS, LAS TABLAS Y PITA, SEDE LAS TABLAS - ID MEN 083




INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE VILLA ROSA, SEDE LA LOMA - ID MEN 084






INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA DE GALAPA - ID MEN 064






Grupo 4

Fecha inicio: 24/10/2023
Fecha Fin: 07/02/2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Departamento	**Magdalena y Bolívar**
$	**Valor Inicial Obra: $3.566.467.466.00** **Valor inicial Interventoria: $264.974.745,00**
	Adiciones Obra: $ 0 Interventoría: $20.000.000.00 (El contratista pago $10.000.000.00 y el convenio $10.000.000.00) **Valor final Interventoria $ 284.974.745,00**
	Valor Pagado Obra: $3.361.652.674.57 Valor Liberado contrato de obra: $204.814.791.43 Interventoría: $279.439.929.41 Valor a Liberar:$5.534.815.59
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Otro Sí 1: Prorroga un (1) y quince (15) días. Otro Sí 2: Exclusion de dos (2) (TACAMOCHO y EDM JAIME) por la imposiblidad técnica para ejecutar.
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	Contrato de Obra Liquidado y culminado. Se inicia tramite de liquidación de la interventoría el 17 de febrero 2025.

100%
Porcentaje de avance

100%
Porcentaje Programado

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Grupo 5

Fecha inicio: 14/11/2023
Fecha Fin: 08/11/2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Departamento	**Magdalena y Bolívar**
$	**Valor Inicial** Obra: $4.102.044.984 Interventoría: $300.856.990
	Adiciones Obra: $778.973.616 Interventoría: $172.224.091 ($91.100.000 asumidos por el contrato de obra) ($81.124.091 asumidos por el contrato interadministrativo)
	Valor Pagado Obra: $4.745.371.433 Interventoría: $420.967.384,31
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	5 otrosíes obra: Prórrogas (7 meses y 20 dias) y adiciones ($778.973.616) 5 otrosíes interventoría: Prórrogas (7 meses y 20 dias) y adiciones ($172.224.091)
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	CONTRATO PAF-MENAM-O-053-2023: Terminado el 08.11.2024 CONTRATO PAF-MENAM-I-056-2023: Terminado el 08.01.2025 AERS COMPONENTE 2: • Contrato de Obra e Interventoría, en proceso de revisión y VoBo por parte de la Fiduciaria Popular, para pasar a firmas, una vez se tenga las AERS suscritas se procederá a solicitar la actualización de pólizas. En recopilación documental, cierre de balances y memorias entre el contratista e interventoría, se proyecta radicar la liquidación del contrato de obra al 15 de marzo de 2025 y posterior la de interventoría.





CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

GRUPO 5, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES SEDE PRINCIPAL
ID No. 30




INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES SEDE SERENOS
ID No. 101




INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES SEDE SERENOS
ID No. 101




INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRISTIAN MORENO SEDE CHINELA
ID No. 97




INSTITUCION EDUCATIVA EL PUEBLITO SEDE PUERTO LA ESTANCIA
ID No. 147




INSTITUCION EDUCATIVA EL PUEBLITO SEDE TORRECILLA
ID No. 148





CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

GRUPO 5, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PUEBLITO SEDE TRONCONAL
ID No. 146




INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL SILVIA COTES DE BISWELL SEDE ISLITA
ID No. 32




INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL OSCAR PISCIOTTI NUMA SEDE INMACULADA CONCEPCION




INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ANTONIO NARIÑO SEDE JOSE DE LA PAZ VANEGAS




INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA CRUZ DE BALSAMO SEDE PRIMARIA
ID No. 13




INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA CRUZ DE BALSAMO SEDE JARDIN INFANTIL
ID No. 14




CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

GRUPO 5, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR SEDE PRINCIPAL
ID No. 06




INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR SEDE CERRITO
ID No. 10




INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR SEDE ATASCOZA
ID No. 09




INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA PESQUERA LEONIDAS ORTIZ ALVEAR SEDE PLAN BONITO
ID No. 43





CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Grupo 7

Fecha inicio: 31/05/2024
Fecha Fin: 17/01/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Departamento	**La Guajira**
$	**Valor Inicial** Obra: $**4.158.777.879** Interventoría: $**295.239.000**
	Adiciones Obra: $ 0 Interventoría: $0
	Valor Pagado Obra: $ 3.738.535.259,01 (89,89%) Interventoría: $121.499.000 (41,15%)
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Suspensión 1 por 20 días 28 de oct de 2024 Prórroga 1 por 45 días 13 de sep de 2024 Suspensión 2 por 30 días 18 de nov de 2024 Prórroga 2 por 30 días 19 de dic de 2024
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	CONTRATO PAF-ATMEN5-O-036-2024: Terminado el 17.01.2025 CONTRATO PAF-MENAM-I-059-2023: Fecha de Terminación el 17.03.2025 Actualmente el contrato de obra está en elaboración del AERS del componente II por parte de la interventoría para firma en fidupopular.





CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

REGISTRO FOTOGRAFICO

I.E. JOSE ANTONIO GALAN- SEDE COOPERATIVO -060-(RIOHACHA)





INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #7 - 034-APÜNIMA´ANA1 -(RIOHACHA)





ESCUELA ETNOEDUCATIVA LA CAMPANA -050--(MAICAO)







ESCUELA ETNOEDUCATIVA WAYUMA'ANA -054- (MAICAO)





CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

REGISTRO FOTOGRAFICO

INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #7 - 117-WAKUAPAMANA -(RIOHACHA)






I.E. JOSE ANTONIO GALAN- SEDE PRINCIPAL -060-(RIOHACHA)






INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #6 - 051-TALOULUMA `ANA -(MAICAO)




INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO RURAL PROVINCIAL - 0143-PROVINCIAL -(BARRANCAS)




CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Publica
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

REGISTRO FOTOGRAFICO

INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA - 011-
ESCUELA RURAL INDIGENA KARALOUTAMANA -(MANAURE)





ESCUELA ETNOEDUCATIVA SEDE KASICHE -053- (MAICAO)













INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #6 - 151-LA
ESTRELLA -(MAICAO)



INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #6 - 051-
YAMAIN SEDE PRINCIPAL -(MAICAO)



INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #6 - 152-
YAMAIN KASPOLIMANA -(MAICAO)









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Grupo 8

Fecha inicio: 08/11/2023
Fecha Fin: 08/07/2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Departamento	**Córdoba y Bolívar**
$	**Valor Inicial** Obra: $$4.706.470.280 M/CTE Interventoría: $297.097.668,00 M/CTE
	Adiciones Obra: $1.455.000.000 Interventoría: $144.106.877
	Valor Pagado Obra: $6.161.470.280 Interventoría: $277.437.804
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Prorroga 1: 2 meses y 15 días Prorroga 1: 2 meses
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	Contrato de obra: liquidado. Contrato de interventoría: En consolidación y revisión documentos por la supervisión para el inicio del proceso de liquidación.





CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

REGISTRO FOTOGRAFICO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Sede principal I. E. El Palmar - Montelíbano



Sede Buenos Aires - María La Baja



Sede Los Cerros - Planeta Rica



Sede Téc. Agrop. De Desarrollo Rural De María la baja - María La Baja



Sede Esc. Nueva Parcelas Londres - Ayapel



Sede Técnica Álvaro Ulcue Chocue - Tuchín



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

REGISTRO FOTOGRAFICO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Sede Esc. Nueva La Solita - Puerto Libertador



Sede Los Aguacates - Cotorra



Sede Níspero-María La Baja





CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

CONTRATOS LIQUIDADOS

GRUPO	Departamento	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	OBSERVACIONES
Grupo 3	Magdalena	**5**	14/11/2023	12/04/2024	**LIQUIDACIÓN Contrato de Obra No. PAF-MENAM-O-051-2023**: Suscrita Acta de liquidación de fecha 01/10/2024, pagado 100%. **LIQUIDACIÓN Contrato de Interventoría No. PAF-MENAM-I-054-2023:**Suscrita Acta de liquidación de fecha 20/12/2024, pagado 100%.
Grupo 6	Cesar	**7**	15/11/2023	29/04/2024	**LIQUIDACIÓN Contrato de Obra No. PAF-MENAM-O-056-2023:** Suscrita Acta de liquidación el 20/11/2024 y pagado al 100%. **LIQUIDACIÓN Contrato de Interventoría No. PAF-MENAM-I-058-2023:** Suscrita Acta de liquidación el 27/11/2024 y pagado al 100%.

CCOM-FO-005 V1 / 05-Ago-2024 / Pública

COMPROMISOS

- Definir por parte de Findeter el valor de la posible adición para el grupo 9.

- Revisar por parte de Findeter el cronograma general de ejecución del convenio teniendo en cuenta que aún no ha iniciado las actividades de 2 sedes en el grupo 9. Tiempos de liquidación será muy corto.

- Agilizar por parte de Findeter el Otro Sí de la dotación y su firma con base en los comité técnicos y fiduciarios a citar.

- Remitir por parte de Findeter el informe de avance de las sedes de Grupo 10, sobre todo de las sedes ejecutadas en Suárez.

- Compartir desde Findeter las actas de entregas de las sedes del Cauca al ing. Juan Carlos Folleco Olave de la secretaria de Educación del Cauca.

- Revisar y confirmar por parte de Findeter que el seguimiento con la Fiduprevisora se ha realizado permanentemente y que la información en la carpeta compartida se encuentra al día.

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública



Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

GRACIAS

www.findeter.gov.co

@findetercol @findetercol
@findeter linkedin.com/company/findeter

Gobierno de Colombia

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Bogotá D.C.,

Ingeniera
DIANA MILENA MALDONADO TORRES
Supervisora del Contrato Ministerio de Educación Nacional - MEN
dmaldonado@mineducacion.gov.co
Calle 43 # 57-14 Piso 3
Bogotá D.C.

Ref: **Contrato No. NO. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER**. Cuyo Objeto es "BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES PRIORITARIAS EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR DE LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS QUE SEAN DEFINIDAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN"

Asunto*:* Remisión Informe Mensual No. 22 / Contrato No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023

Estimada Doctora:

Me permito remitir el Informe de Gestión y ejecución No. 22 correspondiente al periodo de 02 de marzo al 01 de abril de 2025, en cumplimiento de las obligaciones descritas en el anexo al contrato de la referencia.

Así mismo, y en caso de estar de acuerdo solicitamos amablemente emitir la aprobación de éste para soporte al Patrimonio Autónomo FINDETER MEN Aulas Móviles por Ola Invernal (Fiduciaria POPULAR S.A) con la siguiente información:

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MEN
AULAS MÓVILES POR OLA INVERNAL
Fiduciaria Popular S.A.
Carrera 13A No. 29-24 Pisos 20, 21 y 24
Bogotá

Cordialmente,

HERNÁN PARDO BOTERO
Gerente de Infraestructura

Anexo lo enunciado
Elaboró: Geraldine Lorena Prada Pimiento- Profesional de la Gerencia de Infraestructura
Revisó: Jesús Alberto Cañas Páez – Gestor de la Gerencia de Infraestructura

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Bogotá D.C.,

Ingeniera
DIANA MILENA MALDONADO TORRES
Supervisora del Contrato Ministerio de Educación Nacional - MEN
dmaldonado@mineducacion.gov.co
Calle 43 # 57-14 Piso 3
Bogotá D.C.

Ref: **Contrato No. NO. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER**. Cuyo Objeto es "BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES PRIORITARIAS EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR DE LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS QUE SEAN DEFINIDAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN"

Asunto*:* Remisión Informe Mensual No. 22 / Contrato No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023

Estimada Doctora:

Me permito remitir el Informe de Gestión y ejecución No. 22 correspondiente al periodo de 02 de marzo al 01 de abril de 2025, en cumplimiento de las obligaciones descritas en el anexo al contrato de la referencia.

Así mismo, y en caso de estar de acuerdo solicitamos amablemente emitir la aprobación de éste para soporte al Patrimonio Autónomo FINDETER MEN Aulas Móviles por Ola Invernal (Fiduciaria POPULAR S.A) con la siguiente información:

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MEN
AULAS MÓVILES POR OLA INVERNAL
Fiduciaria Popular S.A.
Carrera 13A No. 29-24 Pisos 20, 21 y 24
Bogotá

Cordialmente,

HERNÁN PARDO BOTERO
Gerente de Infraestructura

Anexo lo enunciado
Elaboró: Geraldine Lorena Prada Pimiento- Profesional de la Gerencia de Infraestructura
Revisó: Jesús Alberto Cañas Páez – Gestor de la Gerencia de Infraestructura

CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023

ATENCIÓN DE NECESIDADES PRIORITARIAS EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR DE LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS

Periodo comprendido entre el 02 de marzo al 01 de abril de 2025

Bogotá D.C.

TABLA DE CONTENIDO

1. **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO MARCO**
2. **ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO**
   - 2.1 OBLIGACIONES GENERALES
   - 2.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS
   - 2.3 ACTIVIDADES PRECONTRACTUALES
     - 2.3.1 Obligaciones
   - 2.4 ACTIVIDADES CONTRACTUALES
     - 2.4.1 Obligaciones
   - 2.5 ACTIVIDADES DE CIERRE Y LIQUIDACIÓN
     - 2.5.1 Obligaciones
3. **RESUMEN GENERAL DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL CONTRATO**
4. **ANEXOS**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO MARCO

Objeto General:	Brindar Asistencia Técnica y Administración de Recursos para atender las necesidades prioritarias en infraestructura y dotación de mobiliario escolar de las sedes educativas afectadas por la temporada de lluvias que sean definidas por el Ministerio de Educación.	
Numero de Contrato:	CO1.PCCNTR. 4917031	
Integrantes:	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - MEN Y LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER	
Fecha de suscripción:	05 de mayo de 2023	
Perfeccionamiento	Póliza garantía aprobada 26 de mayo de 2023 Registro Presupuestal 02 de junio de 2023	
Fecha de Inicio:	02 de junio de 2023	
Fecha de Terminación:	01 de julio de 2025	
Modificaciones:	Modificatorio No. 1. Modificar la cláusula cuarta - plazo de ejecución del contrato, la cual quedará de la siguiente manera: "El plazo previsto para la ejecución del Contrato Interadministrativo será a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, hasta el 01 de noviembre de 2024, plazo en el que se debe llevar a cabo la ejecución física del contrato y la liquidación de la contratación derivada que suscriba FINDETER."	
	Modificatorio No. 2. "Prorrogar el plazo de ejecución del contrato número CO1.PCCNTR.4917031 de 2023, hasta el 01 de julio de 2025, plazo en el que se debe culminar la ejecución física de las obras de infraestructura educativa, dotación de aulas nuevas por reposición, y la liquidación de la contratación derivada suscrita por FINDETER."	
Aportes:	Valor de los recursos a administrar para la ejecución de los proyectos	$ 59.485.981.308
	Porcentaje de Asistencia Técnica y Administración de Recursos a reconocer a FINDETER (7%)	$ 4.164.018.692
Valor final del Contrato:		$ 63.650.000.000
Sociedad Fiduciaria:	FIDUCIARIA POPULAR S.A.	

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO

1.1 OBLIGACIONES GENERALES

1. *Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas en este contrato.*

En el transcurso del periodo actual, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. (FINDETER) asume con responsabilidad la tarea integral de estructurar, desarrollar y dar seguimiento a todas las actividades derivadas de la ejecución de las diversas obligaciones estipuladas en el contrato vigente. En virtud de su compromiso, FINDETER se esfuerza por cumplir con cada una de las responsabilidades asignadas, garantizando que cada etapa del contrato sea llevada a cabo de manera exitosa y en plena conformidad con los términos y condiciones acordadas previamente.

Es importante destacar que el compromiso de FINDETER no se limita únicamente a la ejecución técnica del contrato, sino que abarca también la garantía de la calidad y la excelencia en cada una de las etapas del proceso. La entidad se esfuerza por mantener altos estándares de rendimiento, asegurando que los resultados obtenidos sean de la más alta calidad posible y estén alineados con los objetivos y metas establecidas.

2. *Participar y apoyar al Ministerio de Educación Nacional en todas las reuniones periódicas a las que este lo convoque relacionadas con la ejecución del contrato que permitan realizar seguimiento integral a los avances de los proyectos.*

Durante el presente periodo FINDETER participó activamente y brindó el pleno apoyo al Ministerio de Educación Nacional en todas las reuniones periódicas a las que se convocaron, especialmente, aquellas relacionadas con la ejecución del contrato. FINDETER está comprometido con realizar un seguimiento integral y detallado de los avances del proyecto, por lo que se establecieron reuniones cada martes en la tarde a través del aplicativo Teams, reuniones programadas por FINDETER sobre las que realizan grabaciones y se informa los avances semanales.

Las fechas de las reuniones de seguimiento del periodo, sobre las cuales se realiza el acta correspondiente, la cual se adjunta al presente informe:

1. 03 de marzo del 2025

3. *Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la información objeto del presente contrato.*

FINDETER ha dispuesto todos los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la información objeto del presente contrato. La seguridad y confidencialidad de la información son de suma importancia, y se ha implementado medidas sólidas para garantizar su protección. Esto incluye la implementación de sistemas de almacenamiento seguro, protocolos de acceso restringido y medidas de respaldo que aseguran que la información esté resguardada de manera adecuada en todo momento. La prioridad es mantener la integridad de la información involucrada en el contrato, así mismo se habilitó los espacios adecuados en la Calle 103 No. 19-20 y en la segunda sede localizada en la Calle 104 # 18ª-65, piso 6 para tal fin.

4. *Entregar a EL MINISTERIO, periódicamente y al finalizar el contrato, o cuando el supervisor o interventor lo solicite, todos los documentos y archivos (físicos y electrónicos) a su cargo y que se produzcan en ejecución de sus obligaciones, lo anterior, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes en el Ministerio de Educación Nacional.*

Durante este periodo, FINDETER ha cumplido rigurosamente con la entrega de todos los documentos y archivos electrónicos que el MEN ha solicitado durante la ejecución del contrato. Esta entrega se realiza de manera periódica y al finalizar el contrato, tal como establecen las normas y disposiciones vigentes en el Ministerio de Educación Nacional. Además, en concordancia con las regulaciones vigentes, también se proporcionará dicha documentación cuando el supervisor o interventor así lo solicite. La prioridad es asegurar que todas las partes involucradas tengan acceso a la información necesaria y que cumplan con todas las obligaciones contractuales en cuanto a la entrega y custodia de documentación.

5. *Colaborar en el suministro y respuesta de la información correspondiente a los requerimientos efectuados por los organismos de control del Estado Colombiano o cualquier otra autoridad, en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato y de asuntos relacionados con el mismo.*

   En este periodo, FINDETER ha colaborado plenamente en el suministro y respuesta de toda la información correspondiente a los requerimientos efectuados por los Entes de Control del Estado Colombiano y cualquier otra autoridad pertinente. La cooperación en este sentido es absoluta y FINDETER está comprometido en proporcionar toda la información necesaria relacionada con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato, así como en asuntos relacionados con el mismo.

   Cumplir con los requisitos de los Entes de Control y las autoridades es fundamental para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en todas las acciones. La disposición a colaborar asegura que el proceso se realice de manera adecuada y en línea con las regulaciones y requerimientos establecidos por las autoridades correspondientes.

6. *Utilizar la imagen del Ministerio de Educación Nacional de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorización expresa y escrita de las partes ningún funcionario, podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole.*

   FINDETER ha seguido rigurosamente los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional en relación con el uso de su imagen. FINDETER es consciente de que, salvo autorización expresa y escrita de las partes involucradas, ningún funcionario puede utilizar el nombre, emblema o sello oficial del Ministerio con fines publicitarios o de cualquier otra índole. La colaboración se adhiere estrictamente a estas directrices para asegurar el respeto mutuo y la integridad en la utilización de la imagen y la identidad del Ministerio. Durante este periodo no se realizaron trámites que contengan la imagen del Ministerio de Educación Nacional.

7. *Guardar estricta confidencialidad sobre toda la información y los documentos obtenidos del MEN.*

   FINDETER ha mantenido una estricta confidencialidad sobre toda la información y los documentos obtenidos del Ministerio de Educación Nacional (MEN). Reconoce la importancia de salvaguardar la información confidencial y sensible proporcionada por el MEN, y se ha implementado medidas rigurosas para garantizar su protección. Se cumple con todas las regulaciones y acuerdos de confidencialidad establecidos para asegurar que la información no sea divulgada ni utilizada de manera inapropiada. El compromiso de FINDETER es mantener la integridad y confidencialidad de la información en todo momento.

8. *Realizar los pagos al SISS (salud, pensión y riesgos laborales), de acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago correspondientes.*

En el presente periodo, se han realizado los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral (SISS), incluyendo Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de acuerdo con la normatividad vigente.

Además, se pueden proporcionar los soportes de pago correspondientes como parte del compromiso con la legalidad y el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales. Cumplir con los requerimientos del SISS es fundamental para asegurar el bienestar de los colaboradores y garantizar el cumplimiento de las regulaciones pertinentes, lideradas por el área de gestión respectiva y validadas por la revisoría fiscal, soportes que serán presentados en el momento en el que se requiera.

1.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

a. *Presentar ante EL MINISTERIO dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes Al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (inicio SECOP), el cronograma de ejecución del objeto del Contrato Interadministrativo.*

FINDETER presentó en el periodo pasado ante el Ministerio de Educación Nacional, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (inicio SECOP), el cronograma actualizado de ejecución del objeto del Contrato Interadministrativo. FINDETER reconoce la importancia de establecer un cronograma claro y detallado para la ejecución de las actividades contractuales, y se ha cumplido con este requisito de manera oportuna. La intención es garantizar una planificación efectiva y transparente de las actividades a llevar a cabo, en consonancia con las regulaciones y directrices establecidas por el Ministerio.

b. *Crear una vez suscrito y legalizado el Contrato Interadministrativo, una cuenta contable para manejo exclusivo de los recursos de este Contrato Interadministrativo dentro del Patrimonio Autónomo constituido para tal fin por FINDETER.*

Una vez suscrito y legalizado el Contrato Interadministrativo, FINDETER ha creado una cuenta contable exclusiva para el manejo de los recursos de este contrato dentro del Patrimonio Autónomo constituido por FINDETER para tal fin. Se da cumplimiento a todos los requisitos y medidas establecidas para asegurar la correcta gestión financiera de los recursos relacionados con el Contrato Interadministrativo. La creación de esta cuenta contable específica en el Patrimonio Autónomo garantiza una administración transparente y adecuada de los recursos, en línea con las normativas y regulaciones pertinentes.

Por lo anteriormente mencionado, se crea la Cuenta de Ahorros No. 500-80465045-0 del Banco Popular para manejo exclusivo de los recursos de este contrato y respectivos reportes contables. Cabe recordar que, se adjuntó al Informe de Gestión N° 1 la Certificación de la Cuenta Bancaria.

Mediante correo electrónico del 24 de octubre de 2023, el MEN remitió oficio por parte del Ministerio de Hacienda, mediante el cual se oficializó la exención de gravamen financiero (GMF) de la cuenta del Patrimonio Autónomo. El cual se adjuntó en informes pasados.

c. *Administrar los recursos que transfiera EL MINISTERIO a través del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres- FNGRD a FINDETER a través del Patrimonio Autónomo constituido para cumplir con el objeto del presente contrato.*

FINDETER ha administrado de manera responsable los recursos que EL MINISTERIO ha transferido a través del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) a FINDETER, utilizando

el PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN AULAS MÓVILES POR OLA INVERNAL constituido por la Fiducia Mercantil FIDUCIARIA POPULAR S.A. para cumplir con el objeto del presente contrato.

El enfoque ha sido garantizar una gestión eficiente y transparente de los recursos para cumplir con los objetivos establecidos en el contrato. El uso adecuado de estos recursos es esencial para asegurar la ejecución exitosa de las actividades y proyectos acordados, en línea con las regulaciones y directrices establecidas por todas las partes involucradas.

d. *Presentar Informes mensuales y un informe final de ejecución financiera y técnica del presente Contrato, conforme los recursos aportados por EL FNGRD,*

Para el presente periodo, se presentará un informe mensual de ejecución financiera por el área de Negocios Fiduciarios de FINDETER y se ha presentado un informe técnico del presente contrato, conforme a los recursos aportados por el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD).

Estos informes son una parte integral de la transparencia y rendición de cuentas en la ejecución del contrato. A través de estos informes, se ha proporcionado una visión detallada de la utilización de los recursos, los avances técnicos logrados y otros aspectos relevantes de la ejecución del contrato. Cumplir con la presentación de estos informes es esencial para mantener una comunicación clara y abierta con EL MINISTERIO y garantizar que todas las partes estén informadas sobre el progreso y los resultados del contrato.

e. *El Patrimonio Autónomo — FINDETER deberá reintegrar mensualmente los rendimientos financieros (si los hubiere) a la Dirección del Tesoro Nacional o en los términos que establezca la normatividad aplicable, es decir, que no ingresan ni hacen parte del Patrimonio Autónomo constituido por FINDETER.*

El Patrimonio Autónomo - FINDETER reintegrará mensualmente los rendimientos financieros a la Dirección del Tesoro Nacional o en los términos que establezca la normatividad aplicable. Estos rendimientos financieros no ingresan ni hacen parte del Patrimonio Autónomo constituido por FINDETER, y la gestión de reintegro se realizará previa solicitud al Ministerio con el fin de que se informe la cuenta bancaria a la cual se debe realizar el mismo.

Este proceso de reintegro asegura la correcta gestión de los rendimientos generados por los recursos aportados y garantiza que estos sean manejados de acuerdo con las regulaciones y normativas pertinentes. De esta manera, se cumple con los requerimientos legales y se mantiene la transparencia en la administración financiera.

Para lo anterior, el 28 de agosto de 2023 se informa por el MEN la cuenta bancaria para el reintegro de rendimientos financieros del Contrato No. CO1.PCCNTR.4917031 la cual se indica a continuación:

Entidad Financiera:	**Banco BBVA**
Tipo de Cuenta:	**Ahorros**
Número de Cuenta:	**309-054583**
Nombre de la cuenta:	**FIDUPREVISORA S.A FNGRD – COLOMBIA VITAL**

1.3 ACTIVIDADES PRECONTRACTUALES

1.3.1 Obligaciones:

a. *Realizar la viabilización técnica y jurídica de los predios priorizados por EL MINISTERIO, cuando sea necesario y sea solicitado por el MEN.*

Durante periodos pasados, se llevó a cabo la viabilización técnica y jurídica priorizada por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) cada vez que ha sido necesario y solicitado por el MEN. La colaboración en este aspecto es esencial para asegurar que los predios sean evaluados y viabilizados de manera adecuada para cumplir con los requisitos técnicos necesarios. El compromiso es facilitar un proceso fluido y eficiente para que los predios sean utilizados de acuerdo con los objetivos y necesidades de cada Institución Educativa, siempre en línea con las regulaciones y disposiciones vigentes.

En este periodo, ya está finalizada la evaluación técnica y predial y que en resumen se describe a continuación en las siguientes tablas:

RESUMEN EVALUACIÓN TÉCNICA DE SEDES

UNIFICACIÓN DE LISTADOS: INICIAL (150) + ADICIONALES (42)	
SEDES VIABLES TÉCNICAMENTE	**150**

RESUMEN EVALUACIÓN JURÍDICA DE SEDES

SEDES TOTAL (150)	
SIN DOCUMENTOS	1 *
POSIBLE VIABILIDAD	0 **
NO VIABLE	9
VIABLES TÉCNICA Y JURÍDICAMENTE	**140**
TOTAL	150

* Sin Documentos:

- Falta de documentos para evidenciar la propiedad y reciprocidad en la revisión y remisión de documentos por la ETC y/o rectores

** Posible Viabilidad:

- Falta documentación soporte para continuar con revisión
- Pendientes gestiones con terceros para saneamiento predial
- Trámites para obtención de sana posesión

Asimismo, en el presente periodo, el listado actualizado de sedes focalizadas son las siguientes:

Consecutivo	ID MEN No.	Departamento	ETC	Municipio	IE	SEDE
1	1	**Nariño**	PASTO	**Pasto**	I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE	I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - SEDE PRINCIPAL
2	2	**Córdoba**	CORDOBA	**Tuchín**	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ALVARO ULCUE CHOCUE	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ALVARO ULCUE CHOCUE
3	3	**Cauca**	CAUCA	**Bolívar**	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA NUESTRA SENORA DE LOS REMEDIOS	COLEGIO DEPARTAMENTAL NUESTRA SENORA DE LOS REMEDIOS

4	4	Cesar	VALLEDUPAR	Valledupar	INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ	IE ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ
5	6	Bolívar	BOLIVAR	Barranco de Loba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR	I.E.T.A. LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR - SEDE PRINCIPAL
6	7	Santander	SANTANDER	Vélez	COLEGIO UNIVERSITARIO	COLEGIO UNIVERSITARIO
7	8	Nariño	NARIÑO	El Rosario	CENTRO EDUCATIVO LA CLAUDIA	CENTRO EDUCATIVO LA CLAUDIA
8	9	Bolívar	BOLIVAR	Barranco de Loba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR	ATASCOZA
9	10	Bolívar	BOLIVAR	Barranco de Loba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR	LOS CERRITOS
10	11	Guajira	LA GUAJIRA	Manaure	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	ESCUELA RURAL INDÍGENA KARALOUTAMANA
11	12	Cauca	CAUCA	Toribío	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PLAYA	CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO LA PLAYA - SEDE PRINCIPAL
12	13	Magdalena	MAGDALENA	Concordia	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE BASICA Y MEDIA SANTA CRUZ DE BALSAMO	ERM DE BALSAMO
13	14	Magdalena	MAGDALENA	Concordia	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE BASICA Y MEDIA SANTA CRUZ DE BALSAMO	JAR INF MIS PRIMEROS SUEÑOS
14	16	Cauca	CAUCA	Santander de Quilichao	INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO	DOMINGUILLO (sede principal)
15	17	Santander	SANTANDER	Betulia	INSTITUCION EDUCATIVA EL RAMO	CENTRO EDUCATIVO SANTA BARBARA
16	18	Atlántico	SOLEDAD	Soledad	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE PRINCIPAL
17	20	Bolívar	BOLIVAR	Morales	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PALMA	LA ARCADIA
18	22	Cauca	CAUCA	El Tambo	I.E. HUISITO	HUISITO (sede principal)
19	24	Magdalena	MAGDALENA	El Banco	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ANTONIO NARIÑO	CENT EDUC RUR MIX JOSE DE LA PAZ VANEGA ORTIZ
20	26	Huila	HUILA	Acevedo	INSTITUCION EDUCATIVA BATEAS	BATEAS
21	27	Cauca	CAUCA	Piamonte	CENTRO EDUCATIVO PUERTO GUAYUYACO	ESCUELA RURAL MIXTA LA ESPANOLA
22	28	Córdoba	CORDOBA	Cotorra	INSTITUCION EDUCATIVA LOS AGUACATES	CENT EDUC LOS AGUACATES
23	29	Bolívar	BOLIVAR	Mompós	INSTITUCIÒN EDUCATIVA TÈCNICA AMBIENTAL DE TIERRA FIRME	I.E.T.A. AMBIENTAL DE TIERRA FIRME - SEDE PRINCIPAL
24	30	Cesar	CESAR	Curumaní	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES
25	32	Magdalena	MAGDALENA	El Banco	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL SILVIA COTES DE BISWELL	ERM SANTA TERESA DE ISLITA
27	34	Guajira	RIOHACHA	Riohacha	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA #7	APÜNIMA´ANA1
28	36	Nariño	NARIÑO	Cumbal	INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCION DE TALLAMBI	INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCION DE TALLAMBI
29	41	Putumayo	PUTUMAYO	Puerto Asís	I. E. RUR CAUCACIA	ESC RUR MIX EL JARDIN ALTO TETEYE
30	42	Antioquia	ANTIOQUIA	Ciudad Bolívar	I. E. JOSE MARIA HERRAN	C. E. R. PAULINA PUERTA
31	43	Bolívar	BOLIVAR	San Martín de Loba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA PESQUERA LEONIDAS ORTIZ ALVEAR DE CHIMÍ	PLAN BONITO
32	44	Cauca	CAUCA	La Vega	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA SANTA RITA	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA RITA (sede principal)
33	45	Cesar	CESAR	La Paz(Robles)	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA CAÑO PADILLA YUKPA	SEDE EL COSO
34	46	Cauca	CAUCA	Balboa	C.E. BUENOS AIRES	CAPITANES
35	48	Cesar	VALLEDUPAR	Valledupar	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ	INSTITUTO TECNICO COMERCIAL JOSE EUGENIO MARTINEZ
36	49	Bolívar	BOLIVAR	Mompós	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DEL CHICAGUA	SAN LUIS
37	50	Guajira	MAICAO	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2	SEDE LA CAMPANA
38	51	Guajira	MAICAO	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6	YAMAIN - SEDE PRINCIPAL
39	53	Guajira	MAICAO	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2	SEDE KASICHE
40	54	Guajira	MAICAO	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2	SEDE WAYUUMA ANA
41	56	Arauca	ARAUCA	Saravena	CENTRO EDUCATIVO LA PAVA.	LA PAVA

42	57	Putumayo	PUTUMAYO	Puerto Asís	I. E. RUR CAUCACIA	ESC RUR MIX EL PROGRESO
43	58	Cauca	CAUCA	Bolívar	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO NUESTRA SENORA DEL CARMEN	CORRAL VIEJO
44	59	Cauca	CAUCA	Bolívar	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO NUESTRA SENORA DEL CARMEN	NUESTRA SENORA DEL CARMEN (sede principal)
45	60	Guajira	RIOHACHA	Riohacha	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN	COOPERATIVO
46	62	Valle del Cauca	BUGA	Guadalajara de Buga	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	JHON F. KENNEDY
47	64	Atlántico	ATLANTICO	Galapa	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA
48	65	Cauca	CAUCA	Balboa	I.E. OLAYA (ANTES C.E. OLAYA)	OLAYA (sede principal)
49	66	Antioquia	APARTADO	Apartadó	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS
50	67	Tolima	TOLIMA	Santa Isabel	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BOLIVAR	LA HUMAREDA
51	69	Córdoba	CORDOBA	Planeta Rica	INSTITUCION EDUCATIVA LOMA AZUL	LOS CERROS
52	70	Córdoba	CORDOBA	Puerto Libertador	INSTITUCION EDUCATIVA PICA PICA VIEJO	ESC NVA LA SOLITA
53	73	Bolívar	BOLIVAR	Córdoba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE TACAMOCHO	NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE TACAMOCHITO
54	74	Cesar	CESAR	El Paso	INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE LA ESPERANZA
55	75	Cesar	CESAR	El Paso	INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE EL VALLITO
56	77	Cesar	CESAR	El Paso	INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE SAN ANGEL
57	79	Cesar	CESAR	El Paso	INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE LA ESTACION
58	83	Atlántico	ATLANTICO	Repelón	INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS	INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS - SEDE PRINCIPAL
59	84	Atlántico	ATLANTICO	Repelón	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE VILLA ROSA	SEDE LA LOMA
60	85	Valle del Cauca	BUGA	Guadalajara de Buga	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	LA PLANTA
61	86	Antioquia	APARTADO	Apartadó	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO
62	87	Nariño	NARIÑO	BARBACOAS	INSTITUCION EDCUATIVA TERAIMBE	SEDE 9 CUMAINDE
63	88	Putumayo	PUTUMAYO	Puerto Leguízamo	IE RUR LUIS VIDALES DEL PIÑUÑA NEGRO	ESC RUR MIX PUERTO PRINCIPE DOS
64	90	Cauca	CAUCA	Bolívar	CENTRO EDUCATIVO EL TAMBO	LA FUENTE
65	92	Atlántico	ATLANTICO	Repelón	INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS	PITA
66	93	Cauca	CAUCA	Bolívar	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CARMEN	EL CARMEN (sede principal)
67	94	Chocó	CHOCO	Carmen del Darién	CE PUEBLO NUEVO	CE PUEBLO NUEVO - SEDE PRINCIPAL
68	95	Guajira	RIOHACHA	Riohacha	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN	JOSE ANTONIO GALAN
69	96	Meta	VILLAVICENCIO	Villavicencio	INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO FRANCISCO ARANGO	ESCUELA SIETE DE AGOSTO
70	97	Cesar	CESAR	Curumaní	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	SEDE CHINELA
71	98	Cesar	CESAR	Curumaní	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	SEDE GUAIMARAL
72	100	Tolima	TOLIMA	Santa Isabel	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BOLIVAR	EL BRASIL
73	101	Cesar	CESAR	Curumaní	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	SEDE LOS SERRENOS
74	103	Córdoba	CORDOBA	Ayapel	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO	ESC NVA PARCELAS LONDRES
75	104	Cundinamarca	CUNDINAMARCA	Anolaima	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE HUGO ENCISO	ESCUELA RURAL EL DESCANSO
76	105	Chocó	CHOCO	Bahía Solano (Mutis)	IE LUIS LOPEZ DE MESA	SEDE DE SAN JOSE (HUACA)
77	106	Chocó	CHOCO	Bahía Solano (Mutis)	IE LUIS LOPEZ DE MESA	SEDE SIRENA DEL MAR
78	107	Chocó	CHOCO	Bahía Solano (Mutis)	IE LUIS LOPEZ DE MESA	SEDE SECUNDINO RIVAS
79	110	Nariño	NARIÑO	BARBACOAS	INSTITUCION EDUCATIVA TERAIMBE	SEDE 2 BOMBÓN

80	111	Magdalena	MAGDALENA	Pueblo viejo	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS	ERM ISLA DE CATAQUITA
81	112	Magdalena	MAGDALENA	El Retén	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE	COL MPAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE
82	113	Magdalena	MAGDALENA	San Sebastián de Buenavista	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA	ERM MARIA AUXILIADORA
83	114	Magdalena	MAGDALENA	San Sebastián de Buenavista	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA	ERM LA PACHA
84	117	Guajira	RIOHACHA	Riohacha	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA #7	WAKUAPAMANA
85	118	Antioquia	APARTADO	Apartadó	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO
86	119	Córdoba	CORDOBA	Montelíbano	INSTITUCION EDUCATIVA EL PALMAR	INSTITUCION EDUCATIVA EL PALMAR SEDE PRINCIPAL
87	121	Cauca	CAUCA	Piamonte	CENTRO EDUCATIVO PUERTO GUAYUYACO	ESC RUR MIX SAN ANDRESITO
88	122	Antioquia	TURBO	Turbo	I.E. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	E.U. JESUS MORA
89	123	Bolívar	BOLIVAR	Simití	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CERRO DE VERACRUZ	CAMPO PAYARES
90	124	Bolívar	BOLIVAR	Simití	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CERRO DE VERACRUZ	I.E. DEL CERRO DE VERACRUZ - SEDE PRINCIPAL
91	125	Cauca	CAUCA	Piamonte	INST EDUC AGRIC PIAMONTE	PIAMONTE (sede principal)
92	126	Magdalena	MAGDALENA	Pueblo viejo	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS	ERM EL TRIUNFO
93	127	Putumayo	PUTUMAYO	Orito	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL UMADA WUARRARA	ESC RUR MIX ALTO ORITO
94	128	Valle del Cauca	BUGA	Guadalajara de Buga	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE - SEDE PRINCIPAL
95	129	Valle del Cauca	BUGA	Guadalajara de Buga	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	JULIAN MENDOZA GUERRERO
96	130	Valle del Cauca	BUGA	Guadalajara de Buga	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	LA HONDA
97	132	Norte de Santander	NORTE SANTANDER	La Playa	CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN PEDRO	SEDE LA PEÑA
98	133	Magdalena	MAGDALENA	El Banco	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL OSCAR PISCIOTTI NUMA	ERM INMACULADA CONCEPCION
99	134	Bolívar	BOLIVAR	María la Baja	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA	BUENOS AIRES
100	135	Bolívar	BOLIVAR	María la Baja	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA	I.E.T. AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA
102	138	Arauca	ARAUCA	Arauca	CENTRO EDUCATIVO MONSERRATE	CEAR MONSERRATE
104	142	Nariño	IPIALES	Ipiales	INSTITUCION EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL LOS PASTOS	ESCUELA LAS CRUCES
105	143	Guajira	LA GUAJIRA	Barrancas	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL PROVINCIAL	CENTRO ETNOEDUCATIVO PROVINCIAL
106	144	Atlántico	SOLEDAD	Soledad	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE
107	146	Cesar	CESAR	Chimichagua	CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO	SEDE TRONCONAL
108	147	Cesar	CESAR	Chimichagua	CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO	SEDE PUERTO LA ESTANCIA
109	148	Cesar	CESAR	Chimichagua	CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO	SEDE TORRECILLA
110	149	Nariño	NARIÑO	Mallama (Piedrancha)	CENTRO EDUCATIVO MALLAMA	CENTRO EDUCATIVO DE MALLAMA
111	150	Chocó	CHOCO	Tadó	IE TECNICO AGROAMBIENTAL - MARIA AUXILIADORA	SEDE MARÍA AUXILIADORA DE MANUNGARA
112	151	Guajira	LA GUAJIRA	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2	SEDE LA ESTRELLA
113	152	Guajira	MAICAO	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6	YAMAIN - KASPOLIMANA
114	153	Guajira	LA GUAJIRA	Maicao	ESCUELA RURAL MIXTA TALOULUMA'ANA	ESCUELA RURAL MIXTA TALOULUMA'ANA
115	154	Magdalena	CIENAGA	Ciénaga	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO
116	156	Magdalena	MAGDALENA	El Retén	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE	SEDE CONC.ESC GENERAL GREGORIO GARZON
117	158	Valle del Cauca	BUGA	Guadalajara de Buga	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	SEDE CRISTOBAL COLON

118	161	Antioquia	APARTADO	Apartadó	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL GUINEO	CENTRO EDUCATIVO RURAL EL OSITO
119	163	Cauca	CAUCA	La Vega	I.E AGROPECUARIA SAN FRANCISCO JAVIER SEDE GARAY	I.E AGROPECUARIA SAN FRANCISCO JAVIER SEDE GARAY
120	164	Cauca	CAUCA	Santander de Quilichao	IE DOMINGUILLO	SEDE DOMINGO LASSO
121	165	Cauca	CAUCA	Popayán	IE COMUNEROS	Sede Principal
122	172	Putumayo	PUTUMAYO	Puerto Asís	E. RUR CAUCACIA - SEDE PRINCIPAL	Sede Principal
123	173	Cauca	CAUCA	Piamonte	ESC RUR MIX FRAY EZEQUIEL	ESC RUR MIX FRAY EZEQUIEL
124	174	Cauca	CAUCA	Piamonte	E.D.R PORTO GUAYUYACO SEDE PRINCIPAL	E.D.R PORTO GUAYUYACO SEDE PRINCIPAL
125	175	Cauca	CAUCA	Rosas	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA	SANTA TERESITA (sede principal)
126	178	Cauca	CAUCA	Rosas	INSTITUCION EDUCATIVA MADRE CARIDAD BRADER	MADRE CARIDAD BRADER (sede principal)
127	182	Cauca	CAUCA	Rosas	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO CORDOBA	LAS YERBAS
128	183	Cauca	CAUCA	Rosas	CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO LEON VALENCIA	LA DESPENSA
129	184	Cauca	CAUCA	Rosas	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO CORDOBA	EL RETIRO
130	186	Cauca	CAUCA	Rosas	CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO LEON VALENCIA	EL ALTILLO
131	187	Cauca	CAUCA	Rosas	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO CORDOBA	BELLAVISTA
132	188	Cauca	CAUCA	Suarez	IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA	Sede Principal
133	189	Cauca	CAUCA	Suarez	IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA	SEDE MARIA INMACULADA
134	190	Cauca	CAUCA	Suarez	IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA	SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
135	192	Atlántico	SOLEDAD	Soledad	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE CABICA
136	194	Bolívar	Bolívar	Maria la Baja	INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA AGROINDUSTRIAL DE FLAMENCO	EL NISPERO
137	196	Atlántico	Atlántico	Malambo	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MESOLANDIA	Sede Principal
138	202	Chocó	CHOCO	Tadó	IE NORMAL SUPERIOR DEMETRIO SALAZAR CASTILLO	CENTRO EDUCATIVO ESCUELA FRANCISCO MIRANDA
139	203	Antioquia	TURBO	Turbo	IE SAN MARTIN DE PORRES	SEDE GONZALO MEJIA

En este periodo es importante resaltar que, bajo este listado de sedes focalizadas para intervención técnica, ya se adelantó la verificación predial, la cual da como resultado 136 sedes a intervenir.

Sedes despriorizar técnicamente: se tuvo que despriorizar las siguientes 9 instituciones educativas de los siguientes grupos:

GRUPO	ID MEN	Departamento	ETC	Municipio	IE	SEDE	OBERVACIONES
1	55	Chocó	CHOCO	Tadó	IE TECNICO AGROAMBIENTAL	SEDE CAMPO ALEGRE	En un principio, la sede priorizada en el municipio de Tadó era la sede la sede Campo Alegre. Esta perteneciente a la IE Técnico Agroambiental, la cual actualmente cuenta con una matrícula según el Sistema Integrado de Matricula -Simat de 40 estudiantes; no obstante, en la etapa de viabilidad técnica y jurídica adelantada por el contratista designado por Findeter determinó que esta sede presentaba limitaciones técnicas, normativas y

							administrativas por estar en zona de riesgo por inundación, por lo que se recomendó no efectuar intervención alguna.
	120	Antioquia	**TURBO**	Turbo	**I.E. DE DESARROLLO RURAL DE TURBO**	E.U. SANTISIMA TRINIDAD	Se tramito la exclusión del anexo "Listado de Instituciones Educativas Priorizadas por el MEN" a la sede IE. DE DESARROLLO RURAL DE TURBO EU SANTÍSIMA TRINIDAD., reemplazándola por la SEDE GONZALO MEJIA perteneciente a la IE. SAN MARTIN DE PORRES, ubicada en el municipio de Turbo, Antioquia en el marco del contrato de obra No. PAF-MENAM-O-049-2023 y contrato de interventoría No. PAF-MENAM-I-052-2023 Frente a lo anterior, es importante indicar en el presente concepto que, la solicitud se realiza enmarcada en el lineamiento dado por el Ministerio de Educación Nacional – MEN en Comité Técnico No. 30 No. CO1.PCCNTR.4917031 DE 2023 PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN AULAS MÓVILES POR OLA INVERNAL, de fecha 24 de enero de 2024
2	**91**	Atlántico	**ATLANTICO**	Palmar de Varela	**INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL DE PALMAR DE VARELA**	JOSE MARIA CORDOBA	Esta institución Educativa se tuvo que despriorizar porque ya estaba intervenida por la gobernación de Atlántico
	191	Atlántico	**ATLANTICO**	Luruaco	**IE CORREGIMIENTO DE SAN JUAN DE TOCAGUA**	CORREGIMIENTO DE SAN JUAN DE TOCAGUA	Se despriorizo esta institución educativa, debido a que el MEN define que esta IE seria intervenida por el FFIE
4	**71**	Bolívar	**BOLIVAR**	Córdoba	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE TACAMOCHO**	TACAMOCHO (SEDE PRIMARIA)	Esta sede tuvo que ser despriorizada, debido a que en el año 2015 ante esta situación la Corporación autónoma ambiental Cormagdalena, mediante Contrato Interadministrativo 0-0019 de 2015 suscrito con la Universidad Nacional de Colombia, elabora un estudio del cual se destaca la siguiente consideración general: "A partir de este análisis se puede considerar que Tocomocho se encuentra ubicado, prácticamente en la

							mitad del río, bajo la amenaza de inundaciones y procesos erosivos que se pueden activar en cualquier época".
	139	Magdalena	**MAGDALENA**	San Sebastián de Buenavista	**INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE TRONCOSO**	ERM DE JAIME	Esta sede tuvo que ser despriorizada, conforme a una recopilación de datos realizada por el contratista, JASA LTDA propone tener en cuenta que la ERM Jaime requiere una altura de palafito de 1,7 m, lo cual genera la construcción de acceso al aula, definida en el alcance contractual, de una infraestructura que debe contemplar el ingreso a toda la institución, siendo necesario la construcción de toda la sede con el fin de poder hacer funcional su ingreso. La interventoría, CONSORCIO INTER EDUCATIVO G4 considera que no se deben realizar obras de infraestructura de mejoramiento y/o construcción, debido a lo planteado por el contratista y a que los mejoramientos no tendrían estabilidad por efectos de los daños que ocasionará la inundación y la construcción debe ser de toda la institución con palafitos de 1,70 m, lo cual supera el alcance contractual.
9	**33**	Capital Bogotá, D.C	BOGOTA	Bogotá, D.C.	**COLEGIO LA CHUCUA (IED)**	CENT EDUC DIST LA CHUCUA	Sede retirada mediante comité técnico No. 70 y comité fiduciario No. 45.
	136	Capital Bogotá, D.C.	BOGOTA	Bogotá, D.C.	**COLEGIO ESTRELLA DEL SUR (IED)**	COL DIST ESTRELLA DEL SUR	Sede retirada mediante comité técnico No. 70 y comité fiduciario No. 45.
	141	Santander	BARRANCABERMEJA	Barrancabermeja	**CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN**	CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN	Sede retirada mediante comité técnico No. 70 y comité fiduciario No. 45.

De acuerdo con lo anterior se hace la inclusión de las siguientes 4 sedes educativas para tener un resultado total de intervención de 136 sedes educativas:

ID MEN	Departamento	ETC	Municipio	IE	SEDE
202	Chocó	CHOCO	Tadó	IE NORMAL SUPERIOR DEMETRIO SALAZAR CASTILLO	CENTRO EDUCATIVO ESCUELA FRANCISCO MIRANDA
203	Antioquia	TURBO	Turbo	IE SAN MARTIN DE PORRES	SEDE GONZALO MEJIA
196	Atlántico	Atlántico	Malambo	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MESOLANDIA	Sede Principal
194	Bolívar	Bolívar	Maria la Baja	INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA AGROINDUSTRIAL DE FLAMENCO	EL NISPERO

La viabilización jurídica de los predios priorizados por el Ministerio se realiza de manera eficiente, siempre que sea necesario y solicitado por el Ministerio de Educación Nacional (MEN). Es un paso fundamental para garantizar el adecuado desarrollo de proyectos educativos y el cumplimiento de los objetivos establecidos por el MEN, de acuerdo con lo anterior, en este periodo quedo la verificación predial y técnica así:

SEDES TOTAL INICIAL (150)	
SIN DOCUMENTOS	1 *
POSIBLE VIABILIDAD	0 **
NO VIABLE	9
VIABLES TÉCNICA Y JURÍDICAMENTE	**140**
TOTAL	150

SEDES NUEVAS A PRIORIZAR (9)	
POSIBLE VIABILIDAD	1 *
VIABLES JURÍDICAMENTE	8
TOTAL	9

SEDES PRIORIZACIÓN ACTUALIZADA (136)	
SEDES INICIALMENTE PRIORIZADAS	141
SEDES DESPRIORIZADAS	9
SEDES NUEVAS INCLUIDAS	4
TOTAL	**136**

b. *En consideración a que los proyectos a atender por este contrato se ejecutaran en el marco del Decreto de Emergencia, FINDETER debe acudir a lo establecido en su manual de contratación que permita que los procesos de selección sean eficientes y puedan ser proyectos de respuesta rápida.*

FINDETER implementa en el marco de lo establecido en el Manual Operativo la contratación que permita la ejecución eficiente de los procesos de selección que permita pluralidad de oferentes, asimismo, durante el proceso de ejecución, se ha establecido en la estructuración, la necesidad de optimizar tiempos de respuesta rápidos con sistemas constructivos industrializados.

c. *Elaborar los Estudios Previos e insumos precontractuales para la contratación de las obras y suministros necesarios para atender las necesidades prioritarias en infraestructura y dotación de mobiliario escolar de las sedes educativas afectadas por la temporada de lluvias que sean definidas por el Ministerio de Educación. Así como las interventorías correspondientes, solicitando que se*

acaten los principios que rigen la contratación pública, incluyendo la solicitud de las respectivas garantías que ampare cada contrato con siguientes riesgos: anticipo (si lo hubiere), calidad, cumplimiento, estabilidad de la obra, salarios y prestaciones sociales, responsabilidad civil extracontractual y todo riesgo de construcción, según sea aplicable.

Proyectos en proceso de estructuración

Se han elaborado los Estudios Previos e insumos precontractuales necesarios para la contratación de obras y suministros dirigidos a atender las necesidades prioritarias en infraestructura y dotación de mobiliario escolar en las sedes educativas afectadas por la temporada de lluvias, para apertura de las diferentes convocatorias, tal como ha sido definido por el Ministerio de Educación. Estos estudios y documentos precontractuales son esenciales para establecer las bases de las futuras contrataciones y asegurar la correcta ejecución de los proyectos.

Además, se ha solicitado que, en la contratación de las obras y suministros, así como en las interventorías correspondientes, se respeten los principios que rigen la contratación pública. Esto garantiza la transparencia, la igualdad de oportunidades y la eficiencia en los procesos de contratación.

Asimismo, se ha requerido la inclusión de las garantías correspondientes para amparar los diferentes riesgos asociados a cada contrato. Estas garantías incluyen aspectos como el anticipo, la calidad de la obra, el cumplimiento de los plazos, la estabilidad de la construcción, los salarios y prestaciones sociales de los trabajadores, la responsabilidad civil extracontractual y los posibles riesgos de construcción. Esto proporciona seguridad tanto para la entidad contratante como para los contratistas y contribuye a la adecuada ejecución de los proyectos en línea con las normativas y estándares requeridos.

En el presente periodo se establece definitivamente la estructuración y la contratación de los grupos de contratación de acuerdo con el siguiente listado:

GRUPO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ID MEN No.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	VR. TOTAL AULAS Y MEJORAMIENTO	VR. INTERVENTORÍA	VR. TOTAL OBRA + INTERVENTORÍA
1	Antioquia	Apartadó	66	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS	624.000.000	46.800.000	670.800.000
			86	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO	291.200.000	21.840.000	313.040.000
			118	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO	661.678.027	49.625.852	711.303.879
			161	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL GUINEO	CENTRO EDUCATIVO RURAL EL OSITO	403.329.013	30.249.676	433.578.689
		Turbo	120	I.E. DE DESARROLLO RURAL DE TURBO	E.U. SANTISIMA TRINIDAD	312.000.000	23.400.000	335.400.000
			122	I.E. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	E.U. JESUS MORA	499.200.000	37.440.000	536.640.000
		Ciudad Bolívar	42	I. E. JOSE MARIA HERRAN	C. E. R. PAULINA PUERTA	124.800.000	9.360.000	134.160.000
	Chocó	Carmen del Darién	94	CE PUEBLO NUEVO	CE PUEBLO NUEVO - SEDE PRINCIPAL	522.668.285	39.200.121	561.868.406
		Tadó	55	IE TECNICO AGROAMBIENTAL	SEDE CAMPO ALEGRE	266.693.962	20.002.047	286.696.010
			150	IE TECNICO AGROAMBIENTAL	SEDE MARÍA AUXILIADORA DE MANUNGARA	124.800.000	9.360.000	134.160.000
2	Atlántico	Galapa	64	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA	624.000.000	46.800.000	670.800.000

GRUPO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ID MEN No.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	VR. TOTAL AULAS Y MEJORAMIENTO	VR. INTERVENTORÍA	VR. TOTAL OBRA + INTERVENTORÍA
		Palmar de Varela	91	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL DE PALMAR DE VARELA	JOSE MARIA CORDOBA	561.600.000	42.120.000	603.720.000
		Repelón	83	INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS	INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS - SEDE PRINCIPAL	332.800.000	24.960.000	357.760.000
			84	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE VILLA ROSA	SEDE LA LOMA	229.439.280	17.207.946	246.647.226
			92	INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS	PITA	220.727.086	16.554.531	237.281.617
		Soledad	18	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE PRINCIPAL	665.600.000	49.920.000	715.520.000
			144	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE	915.200.000	68.640.000	983.840.000
			192	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE CABICA	372.384.464	27.928.835	400.313.298
		Luruaco	191	IE CORREGIMIENTO DE SAN JUAN DE TOCAGUA	CORREGIMIENTO DE SAN JUAN DE TOCAGUA	249.600.000	18.720.000	268.320.000
3	Magdalena	Ciénaga	154	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO	1.414.400.000	106.080.000	1.520.480.000
		El Retén	112	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE	COL MPAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE	2.801.018.341	210.076.376	3.011.094.717
			156	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE	SEDE CONC.ESC GENERAL GREGORIO GARZON	436.800.000	32.760.000	469.560.000
		Puebloviejo	111	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS	ERM ISLA DE CATAQUITA	83.200.000	6.240.000	89.440.000
			126	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS	ERM EL TRIUNFO	166.400.000	12.480.000	178.880.000
4	Bolívar	Córdoba	71	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE TACAMOCHO	TACAMOCHO (SEDE PRIMARIA)	447.519.640	33.563.973	481.083.613
			73	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE TACAMOCHO	NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE TACAMOCHITO	493.484.507	37.011.338	530.495.845
		Mompós	29	INSTITUCIÒN EDUCATIVA TÈCNICA AMBIENTAL DE TIERRA FIRME	I.E.T.A. AMBIENTAL DE TIERRA FIRME - SEDE PRINCIPAL	1.125.688.392	84.426.629	1.210.115.022
			49	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DEL CHICAGUA	SAN LUIS	340.577.024	25.543.277	366.120.301
	Magdalena	San Sebastián de Buenavista	113	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA	ERM MARIA AUXILIADORA	488.073.254	36.605.494	524.678.748
			114	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA	ERM LA PACHA	623.194.392	46.739.579	669.933.972
			139	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE TRONCOSO	ERM DE JAIME	161.669.820	12.125.237	173.795.057
5	Bolívar	Barranco de Loba	6	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR	I.E.T.A. LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR - SEDE PRINCIPAL	468.319.640	35.123.973	503.443.613
			9	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR	ATASCOZA	364.668.644	27.350.148	392.018.792
			10	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR	LOS CERRITOS	296.559.820	22.241.987	318.801.807
		San Martín de Loba	43	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA PESQUERA LEONIDAS ORTIZ ALVEAR DE CHIMÍ	PLAN BONITO	233.285.404	17.496.405	250.781.809
	Cesar	Chimichagua	146	CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO	SEDE TRONCONAL	133.346.981	10.001.024	143.348.005
			147	CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO	SEDE PUERTO LA ESTANCIA	130.159.820	9.761.987	139.921.807
			148	CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO	SEDE TORRECILLA	124.800.000	9.360.000	134.160.000

GRUPO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ID MEN No.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	VR. TOTAL AULAS Y MEJORAMIENTO	VR. INTERVENTORÍA	VR. TOTAL OBRA + INTERVENTORÍA
		Curumaní	30	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	603.200.000	45.240.000	648.440.000
			97	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	SEDE CHINELA	83.200.000	6.240.000	89.440.000
			98	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	SEDE GUAIMARAL	124.800.000	9.360.000	134.160.000
			101	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	SEDE LOS SERRENOS	83.200.000	6.240.000	89.440.000
	Magdalena	Concordia	13	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE BASICA Y MEDIA SANTA CRUZ DE BALSAMO	ERM DE BALSAMO	485.009.460	36.375.710	521.385.170
			14	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE BASICA Y MEDIA SANTA CRUZ DE BALSAMO	JAR INF MIS PRIMEROS SUEÑOS	161.669.820	12.125.237	173.795.057
		El Banco	24	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ANTONIO NARIÑO	CENT EDUC RUR MIX JOSE DE LA PAZ VANEGA ORTIZ	546.091.802	40.956.885	587.048.688
			32	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL SILVIA COTES DE BISWELL	ERM SANTA TERESA DE ISLITA	244.487.366	18.336.552	262.823.918
			133	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL OSCAR PISCIOTTI NUMA	ERM INMACULADA CONCEPCION	192.455.361	14.434.152	206.889.513
6	Cesar	El Paso	74	INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE LA ESPERANZA	291.200.000	21.840.000	313.040.000
			75	INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE EL VALLITO	145.600.000	10.920.000	156.520.000
			77	INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE SAN ANGEL	65.079.910	4.880.993	69.960.903
			79	INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE LA ESTACION	132.643.683	9.948.276	142.591.959
		La Paz (Robles)	45	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA CAÑO PADILLA YUKPA	SEDE EL COSO	150.447.043	11.283.528	161.730.571
		Valledupar	4	INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ	IE ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ	457.600.000	34.320.000	491.920.000
			48	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ	INSTITUTO TECNICO COMERCIAL JOSE EUGENIO MARTINEZ	956.800.000	71.760.000	1.028.560.000
7	Guajira	Barrancas	143	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL PROVINCIAL	CENTRO ETNOEDUCATIVO PROVINCIAL	249.600.000	18.720.000	268.320.000
		Maicao	50	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2	SEDE LA CAMPANA	499.200.000	37.440.000	536.640.000
			51	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6	YAMAIN - SEDE PRINCIPAL	62.400.000	4.680.000	67.080.000
			53	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2	SEDE KASICHE	339.830.481	25.487.286	365.317.767
			54	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2	SEDE WAYUUMA ANA	127.479.910	9.560.993	137.040.903
			151	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2	SEDE LA ESTRELLA	314.679.910	23.600.993	338.280.903
			152	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6	YAMAIN - KASPOLIMANA	252.966.903	18.972.518	271.939.421
			153	ESCUELA RURAL MIXTA TALOULUMA'ANA	ESCUELA RURAL MIXTA TALOULUMA'ANA	857.226.526	64.291.989	921.518.516
		Manaure	11	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	ESCUELA RURAL INDÍGENA KARALOUTAMANA	190.566.903	14.292.518	204.859.421
		Riohacha	34	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA #7	APÜNIMA´ANA1	252.279.910	18.920.993	271.200.903
			60	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN	COOPERATIVO	416.000.000	31.200.000	447.200.000
			95	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN	JOSE ANTONIO GALAN	374.400.000	28.080.000	402.480.000
			117	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA #7	WAKUAPAMANA	224.079.460	16.805.960	240.885.420
8	Bolívar	María la Baja	134	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA	BUENOS AIRES	249.600.000	18.720.000	268.320.000
			135	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA	I.E.T. AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA	1.800.127.638	135.009.573	1.935.137.211

GRUPO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ID MEN No.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	VR. TOTAL AULAS Y MEJORAMIENTO	VR. INTERVENTORÍA	VR. TOTAL OBRA + INTERVENTORÍA
	Córdoba	Ayapel	103	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO	ESC NVA PARCELAS LONDRES	220.984.367	16.573.828	237.558.194
		Cotorra	28	INSTITUCION EDUCATIVA LOS AGUACATES	CENT EDUC LOS AGUACATES	124.800.000	9.360.000	134.160.000
		Montelíbano	119	INSTITUCION EDUCATIVA EL PALMAR	ESCUELA NUEVA MIXTA DIVINO SALVADOR	745.087.893	55.881.592	800.969.485
		Planeta Rica	69	INSTITUCION EDUCATIVA LOMA AZUL	LOS CERROS	430.464.507	32.284.838	462.749.345
		Puerto Libertador	70	INSTITUCION EDUCATIVA PICA PICA VIEJO	ESC NVA LA SOLITA	254.085.404	19.056.405	273.141.809
		Tuchín	2	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ALVARO ULCUE CHOCUE	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ALVARO ULCUE CHOCUE	1.074.838.830	80.612.912	1.155.451.742
9	Arauca	Arauca	138	CENTRO EDUCATIVO MONSERRATE	CEAR MONSERRATE	299.239.730	22.442.980	321.682.710
		Saravena	56	CENTRO EDUCATIVO LA PAVA.	LA PAVA	83.200.000	6.240.000	89.440.000
	Bolívar	Morales	20	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PALMA	LA ARCADIA	83.200.000	6.240.000	89.440.000
		Simití	123	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CERRO DE VERACRUZ	CAMPO PAYARES	232.352.784	17.426.459	249.779.243
			124	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CERRO DE VERACRUZ	I.E. DEL CERRO DE VERACRUZ - SEDE PRINCIPAL	595.799.550	44.684.966	640.484.516
	Capital Bogotá, D.C.	Bogotá, D.C.	33	COLEGIO LA CHUCUA (IED)	CENT EDUC DIST LA CHUCUA	332.800.000	24.960.000	357.760.000
			136	COLEGIO ESTRELLA DEL SUR (IED)	COL DIST ESTRELLA DEL SUR	166.400.000	12.480.000	178.880.000
	Cundinamarca	Anolaima	104	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE HUGO ENCISO	ESCUELA RURAL EL DESCANSO	190.313.503	14.273.513	204.587.016
	Meta	Villavicencio	96	INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO FRANCISCO ARANGO	ESCUELA SIETE DE AGOSTO	924.437.134	69.332.785	993.769.919
	Norte de Santander	La Playa	132	CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN PEDRO	SEDE LA PEÑA	41.600.000	3.120.000	44.720.000
	Santander	Barrancabermeja	141	CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN	CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN	494.421.269	37.081.595	531.502.864
		Betulia	17	INSTITUCION EDUCATIVA EL RAMO	CENTRO EDUCATIVO SANTA BARBARA	62.400.000	4.680.000	67.080.000
		Vélez	7	COLEGIO UNIVERSITARIO	COLEGIO UNIVERSITARIO	926.718.332	69.503.875	996.222.206
	Tolima	Santa Isabel	67	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BOLIVAR	LA HUMAREDA	188.797.003	14.159.775	202.956.778
			100	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BOLIVAR	EL BRASIL	188.797.003	14.159.775	202.956.778
10	Cauca	Santander de Quilichao	16	INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO	DOMINGUILLO (sede principal)	1.235.282.193	92.646.164	1.327.928.358
			164	IE DOMINGUILLO	SEDE DOMINGO LASSO	124.800.000	9.360.000	134.160.000
		Suarez	188	IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA	SEDE PRINCIPAL	790.400.000	59.280.000	849.680.000
			189	IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA	SEDE MARIA INMACULADA	1.225.093.375	91.882.003	1.316.975.378
			190	IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA	SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	374.400.000	28.080.000	402.480.000
		Toribío	12	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PLAYA	CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO LA PLAYA - SEDE PRINCIPAL	338.159.820	25.361.987	363.521.807
	Chocó	Bahía Solano (Mutis)	105	IE LUIS LOPEZ DE MESA	SEDE DE SAN JOSE (HUACA)	148.792.381	11.159.429	159.951.810
			106	IE LUIS LOPEZ DE MESA	SEDE SIRENA DEL MAR	41.600.000	3.120.000	44.720.000
			107	IE LUIS LOPEZ DE MESA	SEDE SECUNDINO RIVAS	291.200.000	21.840.000	313.040.000
	Valle del Cauca	Guadalajara de Buga	62	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	JHON F. KENNEDY	540.800.000	40.560.000	581.360.000
			85	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	LA PLANTA	204.237.183	15.317.789	219.554.972
			128	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE - SEDE PRINCIPAL	166.400.000	12.480.000	178.880.000
			129	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	JULIAN MENDOZA GUERRERO	208.000.000	15.600.000	223.600.000

GRUPO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ID MEN No.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	VR. TOTAL AULAS Y MEJORAMIENTO	VR. INTERVENTORÍA	VR. TOTAL OBRA + INTERVENTORÍA
			130	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	LA HONDA	164.153.683	12.311.526	176.465.209
			158	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	SEDE CRISTOBAL COLON	162.637.183	12.197.789	174.834.972
11	Cauca	Balboa	46	C.E. BUENOS AIRES	CAPITANES	83.200.000	6.240.000	89.440.000
			65	I.E. OLAYA (ANTES C.E. OLAYA)	OLAYA (sede principal)	416.000.000	31.200.000	447.200.000
		Bolívar	3	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA NUESTRA SENORA DE LOS REMEDIOS	COLEGIO DEPARTAMENTAL NUESTRA SENORA DE LOS REMEDIOS	436.800.000	32.760.000	469.560.000
			58	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO NUESTRA SENORA DEL CARMEN	CORRAL VIEJO	127.479.910	9.560.993	137.040.903
			59	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO NUESTRA SENORA DEL CARMEN	NUESTRA SENORA DEL CARMEN (sede principal)	299.239.730	22.442.980	321.682.710
			90	CENTRO EDUCATIVO EL TAMBO	LA FUENTE	191.162.093	14.337.157	205.499.250
			93	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CARMEN	EL CARMEN (sede principal)	62.400.000	4.680.000	67.080.000
		El Tambo	22	I.E. HUISITO	HUISITO (sede principal)	1.041.842.757	78.138.207	1.119.980.964
		La Vega	44	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA SANTA RITA	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA RITA (sede principal)	166.400.000	12.480.000	178.880.000
			163	I.E AGROPECUARIA SAN FRANCISCO JAVIER SEDE GARAY	I.E AGROPECUARIA SAN FRANCISCO JAVIER SEDE GARAY	177.904.227	13.342.817	191.247.044
		Popayán	165	IE COMUNEROS	SEDE PRINCIPAL	457.600.000	34.320.000	491.920.000
		Rosas	175	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA	SANTA TERESITA (sede principal)	790.400.000	59.280.000	849.680.000
			178	INSTITUCION EDUCATIVA MADRE CARIDAD BRADER	MADRE CARIDAD BRADER (sede principal)	124.800.000	9.360.000	134.160.000
			182	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO CORDOBA	LAS YERBAS	83.200.000	6.240.000	89.440.000
			183	CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO LEON VALENCIA	LA DESPENSA	62.400.000	4.680.000	67.080.000
			184	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO CORDOBA	EL RETIRO	83.200.000	6.240.000	89.440.000
			186	CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO LEON VALENCIA	EL ALTILLO	62.400.000	4.680.000	67.080.000
			187	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO CORDOBA	BELLAVISTA	62.400.000	4.680.000	67.080.000
12	Cauca	Piamonte	27	CENTRO EDUCATIVO PUERTO GUAYUYACO	ESCUELA RURAL MIXTA LA ESPANOLA	62.400.000	4.680.000	67.080.000
			121	CENTRO EDUCATIVO PUERTO GUAYUYACO	ESC RUR MIX SAN ANDRESITO	41.600.000	3.120.000	44.720.000
			125	INST EDUC AGRIC PIAMONTE	PIAMONTE (sede principal)	1.553.938.473	116.545.386	1.670.483.859
			173	ESC RUR MIX FRAY EZEQUIEL	ESC RUR MIX FRAY EZEQUIEL	195.752.201	14.681.415	210.433.616
			174	E.D.R PORTO GUAYUYACO SEDE PRINCIPAL	E.D.R PORTO GUAYUYACO SEDE PRINCIPAL	166.400.000	12.480.000	178.880.000
	Huila	Acevedo	26	INSTITUCION EDUCATIVA BATEAS	BATEAS	310.453.360	23.284.002	333.737.362
	Nariño	BARBACOAS	87	INSTITUCION EDCUATIVA TERAIMBE	SEDE 9 CUMAINDE	62.400.000	4.680.000	67.080.000
			110	INSTITUCION EDUCATIVA TERAIMBE	SEDE 2 BOMBON	124.800.000	9.360.000	134.160.000
		Cumbal	36	INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCION DE TALLAMBI	INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCION DE TALLAMBI	764.787.529	57.359.065	822.146.593
		El Rosario	8	CENTRO EDUCATIVO LA CLAUDIA	CENTRO EDUCATIVO LA CLAUDIA	62.400.000	4.680.000	67.080.000
		Ipiales	142	INSTITUCION EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL LOS PASTOS	ESCUELA LAS CRUCES	208.000.000	15.600.000	223.600.000

GRUPO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ID MEN No.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	VR. TOTAL AULAS Y MEJORAMIENTO	VR. INTERVENTORÍA	VR. TOTAL OBRA + INTERVENTORÍA
		Mallama (Piedrancha)	149	CENTRO EDUCATIVO MALLAMA	CENTRO EDUCATIVO DE MALLAMA	62.400.000	4.680.000	67.080.000
		Pasto	1	I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE	I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - SEDE PRINCIPAL	436.800.000	32.760.000	469.560.000
	Putumayo	Orito	127	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL UMADA WUARRARA	ESC RUR MIX ALTO ORITO	127.913.503	9.593.513	137.507.016
		Puerto Asís	172	E. RUR CAUCACIA - SEDE PRINCIPAL	SEDE PRINCIPAL	249.600.000	18.720.000	268.320.000
		Puerto Asís	41	I. E. RUR CAUCACIA	ESC RUR MIX EL JARDIN ALTO TETEYE	197.100.201	14.782.515	211.882.716
			57	I. E. RUR CAUCACIA	ESC RUR MIX EL PROGRESO	167.997.003	12.599.775	180.596.778
		Puerto Leguizamo	88	IE RUR LUIS VIDALES DEL PIÑUÑA NEGRO	ESC RUR MIX PUERTO PRINCIPE DOS	124.800.000	9.360.000	134.160.000
Total general						52.593.871.997	3.944.540.400	56.538.412.397

d. *Evaluar los proponentes, así como las propuestas presentadas para la construcción de las obras de infraestructura educativa e interventorías correspondientes y realizar la adjudicación y contratación de dichos procesos.*

En este periodo ya fueron concluidos los procesos de convocatoria y realizadas las evaluaciones exhaustivas de los proponentes y sus respectivas propuestas para la construcción de las obras de infraestructura educativa y las interventorías correspondientes, nos complace informar en este periodo que dichos procesos han llegado a su fin. Se ha llevado a cabo una rigurosa revisión bajo los parámetros establecidos en los Términos de Referencia, asegurando que se cumplan los lineamientos de contratación pública en términos de transparencia y equidad.

Gracias a este esfuerzo, se ha procedido con éxito a la adjudicación de todos los contratos, seleccionando a los proponentes que demostraron las mejores capacidades técnicas, financieras y operativas. Todos los grupos han sido debidamente contratados, lo que asegura que las obras se desarrollarán dentro de los plazos previstos y bajo los más altos estándares de calidad.

Nuestro compromiso con la excelencia en la ejecución de las obras y el adecuado control mediante las interventorías asegurará que estas infraestructuras aporten un valor significativo a la comunidad educativa, garantizando su correcto desarrollo y el bienestar de los beneficiarios.

1.4 ACTIVIDADES CONTRACTUALES

1.4.1 Obligaciones:

a. *Ejecutar a través de los contratistas seleccionados y hacer seguimiento a la calidad y entrega de las obras de infraestructura educativa diseñadas para atender las afectaciones a las sedes educativas priorizadas por el MEN.*

FINDETER, en concordancia con la naturaleza de los proyectos a abordar bajo el marco del Decreto de Emergencia, ha adelantado en el presente periodo la ejecución de diversas sedes educativas. Estos proyectos se han llevado a cabo mediante la colaboración de contratistas que fueron rigurosamente seleccionados a través de procedimientos transparentes y estructurados, conforme a lo estipulado en el Manual de Contratación de FINDETER.

La selección de contratistas no fue un proceso aleatorio, sino que siguió una serie de etapas bien definidas, que incluyeron la evaluación de capacidades técnicas, experiencia previa en proyectos similares, y solidez financiera. Este enfoque metodológico garantiza que los proyectos se ejecuten con altos estándares de calidad y dentro de los plazos establecidos, lo cual es crucial en contextos de emergencia donde la eficiencia y la efectividad son primordiales.

Adicionalmente, la supervisión y el monitoreo continuo de los avances de las obras permiten asegurar que se cumplan todas las normativas vigentes y que los recursos asignados se utilicen de manera óptima. FINDETER ha implementado mecanismos de control y seguimiento que incluyen auditorías periódicas y la utilización de tecnología para el seguimiento en tiempo real de las obras. Esto no solo brinda transparencia al proceso, sino que también facilita la identificación temprana de posibles inconvenientes y la implementación de medidas correctivas oportunas.

b. *Ejercer la vigilancia de los contratos de obra contratando las respectivas interventorías y ejercer la supervisión a los contratos de interventoría que se deriven del presente contrato.*

FINDETER adelantó en el presente periodo un riguroso ejercicio de vigilancia de los contratos de obra mediante la contratación de las respectivas interventorías. Esta medida se implementó con el objetivo de asegurar el adecuado desarrollo de los proyectos de infraestructura, en línea con los estándares de calidad y los plazos establecidos.

La contratación de interventorías y la posterior supervisión de sus actividades permitirán crear un sistema de verificación y seguimiento continuo, asegurando la transparencia en el proceso de ejecución de las obras y proporcionando un mecanismo de retroalimentación para la garantía de la calidad, la eficiencia y el cumplimiento de los estándares requeridos en las obras de infraestructura educativa, quedando así el resumen de este periodo:

GRUPO	TIPO DE CONTRATO	CÓDIGO	DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS	FECHA DE ADJUDICACIÓN	CONTRATISTA	VALOR OFERTADO	OBSERVACIONES
1	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-052-2023	Antioquia - Apartadó Antioquia - Turbo Antioquia - Ciudad Bolívar Chocó - Carmen del Darién Chocó - Tadó	03/10/2023	INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S	$271.455.247	Liquidado el 25 de febrero del 2025
1	OBRA	PAF-MENAM-O-049-2023		06/10/2023	OBRAS CAPITAL S. A	$3.447.332.359	Liquidado el 31 de enero del 2025
2	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-053-2023	Atlántico - Repelón Atlántico - Galapa Atlántico – Soledad - Atlántico - Palmar De Varela Atlántico - Luruaco	26/09/2023	RM INGENIEROS S.A.S.	$295.715.000	Liquidación Radicada por PRISA INC 2025-000621 el 27 de febrero del 2025
2	OBRA	PAF-MENAM-O-050-2023		06/10/2023	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023	$4.044.124.630	Liquidación Radicada por PRISA INC 2025-000620 el 05 de marzo del 2025
3	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-054-2023	Magdalena - Ciénaga Magdalena - El Retén Magdalena - Pueblo viejo	26/09/2023	CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3	$351.774.412	Liquidado el 20 de diciembre del 2024
3	OBRA	PAF-MENAM-O-051-2023		06/10/2023	CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA	$4.744.960.153	Liquidado el 01 de noviembre del 2024
4	OBRA	PAF-MENAM-O-052-2023	Bolívar - Córdoba Bolívar - Mompós Magdalena - San Sebastián de Buenavista	20/09/2023	JASA LTDA	$3.566.467.466	Liquidado el 30 de septiembre del 2024
4	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-055-2023		26/09/2023	CONSORCIO INTER EDUCATIVO G4	$264.974.745	Entregado 22 de marzo del 2024

GRUPO	TIPO DE CONTRATO	CÓDIGO	DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS	FECHA DE ADJUDICACIÓN	CONTRATISTA	VALOR OFERTADO	OBSERVACIONES
5	OBRA	PAF-MENAM-O-053-2023	Bolívar - Barranco De Loba Magdalena - Concordia Magdalena - El Banco Cesar - Curumaní Bolívar - San Martín De Loba Cesar - Chimichagua	03/10/2023	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5	$4.102.044.984	Terminado el 08 de noviembre del 2024
5	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-056-2023		06/10/2023	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5	$300.856.990	Terminado el 08 de enero del 2025
6	OBRA	PAF-MENAM-O-056-2023	Cesar - Valledupar Cesar - La Paz Cesar - El paso	29/09/2023	DAR ARQUITECTURA S.A. S	$2.102.352.000	Liquidado el 20 de noviembre del 2024
6	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-058-2023		03/10/2023	CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023	$155.543.411	Liquidado el 27 de noviembre del 2024
8	OBRA	PAF-MENAM-O-055-2023	Córdoba – Tuchín Córdoba – Cotorra Córdoba - Planeta Rica Córdoba - Puerto Libertador Córdoba – Ayapel Córdoba - Montelíbano Bolívar - María la Baja	29/09/2023	DAR ARQUITECTURA S.A. S	$4.706.470.280	Liquidado el 14 de marzo del 2025
8	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-057-2023		13/10/2023	LUIS GUILLERMO NARVÁEZ RICARDO	$297.097.668	Entregado 21 de agosto del 2024
7	OBRA	PAF-ATMEN5-O-036-2024	Guajira – Manaure Guajira – Rioacha Guajira - Maicao Guajira - Barrancas	19/03/2024	Consorcio Guajira 7	4.158.777.879	Entregado el 28 de febrero del 2025
7	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-059-2023		17/04/2024	GERMÁN ADOLFO PERDOMO PACHÓN	295.239.000	Terminado el 17 de enero del 2025
9	OBRA	PAF-ATMEN5-O-037-2024	Santander - Vélez, Betulia, Barrancabermeja Bolívar – Morales Bogotá Arauca - Saravena -Arauca Tolima - Santa Isabel Meta – Villavicencio Cundinamarca – Anolaima Bolívar – Simiti Norte de Santander - La Playa	19/03/2024	CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9	4.810.476.306	Etapa 2
9	INTERVENTORÍA	PAF-ATMEN5-I-064-2024		28/06/2023	CONSORCIO SAN GABRIEL	313.800.000	Etapa 2
10	OBRA	PAF-MENAM-O-080-2023	Cauca - Suárez Cauca - Santander De Quilichao Chocó - Bahía Solano Cauca – Toribío Valle Del Cauca - Guadalajara De Buga	23/11/2023	CONSORCIO FIN GRUPO 10	$6.014.978.800	Etapa 2
10	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-062-2023		15/12/2023	CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO	$327.496.568	Etapa 2
11	OBRA	PAF-MENAM-O-079-2023	Cauca - El Tambo Cauca - La Vega Cauca - Balboa Cauca - Popayán Cauca - Rosas	27/11/2023	CONSORCIO FIN GRUPO 11	$ 4.728.021.810	Terminado el 27 de noviembre del 2024
11	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-063-2023		22/12/2023	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	$312.927.160,00	Terminado el 27 de noviembre del 2024
12	OBRA	PAF-MENAM-O-076-2023	Nariño – Pasto Putumayo - Puerto Asís Cauca – Piamonte Nariño – Ipiales Nariño - Mallama	27/11/2023	CONSORCIO FIN GRUPO 12	$ 4.918.276.400	Terminado el 05 de diciembre del 2024
12	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-064-2023		22/12/2023	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	$ 351.774.412	Terminado el 05 de diciembre del 2024
Dotación	SUMINISTRO	PAF-ATMEN5-S-041-2024	Choco - Carmen del Darién, Tadó Antioquia – Apartadó Atlántico – Repelón, Soledad Bolívar – Mompós, Barranco de Loba, San Martín de Loba, María la Baja Cauca - Santander de Quilichao, Suarez, El Tambo, Bolívar, La Vega, Rosas Cesar - La Paz (Robles), El Paso Córdoba - Planeta Rica, Puerto Libertador, Ayapel, Montelíbano Magdalena - El Retén, San Sebastián de Buenavista	22/08/2024	DOTAESCOL SAS	$ 944.255.458,80	Acta de inicio del otro si firmada el 13 de marzo del 2025.

Nota: Según el informe previo sobre el estado de los grupos de contratación y de cada institución educativa, se comunica que **el Grupo 1 ha sido entregado el 18 de noviembre de 2024, el Grupo 2 ha**

sido entregado el 05 de noviembre del 2024, el Grupo 3 ha sido entregado el 30 de abril de 2024, el Grupo 4 ha sido entregado el 22 de marzo de 2024, el Grupo 5 ha sido entregado el 08 de enero de 2025, el Grupo 6 ha sido entregado el 17 de mayo de 2024, el Grupo 7 ha sido entregado el 28 de febrero de 2025, el Grupo 8 ha sido entregado el 21 de agosto de 2024, **el Grupo 11 ha sido entregado el 07 de marzo de 2025**, **el Grupo 12 ha sido entregado el 04 de marzo de 2025,** satisfacción entre rectores, estudiantes y familias. Además, se está avanzando en el proceso de estructuración de los estudios preliminares para equipar las nuevas aulas construidas, con el objetivo de entregarlas completamente dotadas.

c. *Conformar un Comité Fiduciario y un Comité Técnico Operativo al interior del PATRIMONIO AUTÓNOMO administrado por la FIDUCIARIA contratada, de acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo que para el efecto se adopte.*

Durante este periodo se realizaron los siguientes comités:

Comités Técnicos

FECHA	OBJETO	LUGAR DE LA REUNIÓN	TEMAS ABORDADOS
5 - 6 de marzo del 2025	Comité Técnico No. 82	PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-MEN - CI CO1.PCCNTR. 4917031 de 2023	1. Verificación del quorum; 2. Solicitud: PRÓRROGA POR EL TÉRMINO DE DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO AL CONTRATO DE OBRA No. PAF-ATMEN5-O-037-2024 CUYO OBJETO CONSISTE EN "ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 9". 3. Solicitud: PRÓRROGA POR EL TÉRMINO DE DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO SIN ADICIÓN DE RECURSOS AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. PAF-ATMEN5-I-064-2024 CUYO OBJETO CONSISTE EN "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 9". 4. Solicitud: INCLUSIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS AL LISTADO DE PRECIOS PARA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL CONTRATO DE OBRA No. PAF-ATMEN5-O-037-2024, CUYO OBJETO CONSISTE EN "ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS – GRUPO 9". 5. Solicitud: INCLUSIÓN NOTA ACLARATORIA A LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE OBRA No. PAF-ATMEN5-O-037-2024 EN LA QUE SE INDIQUE QUE LOS SALDOS DISPONIBLES DEL PRODUCTO "SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS. INCLUYE, MATERIAL ENVOLVENTE DE MUROS Y CUBIERTA", QUE CORRESPONDEN A UN VALOR DE $ 40.598.453 SEGÚN BALANCE FINANCIERO DEL COMPONENTE I, SEAN ASIGNADOS AL PRODUCTO DEL COMPONENTE II "EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD". 6. Proposiciones y varios

13 de marzo del 2025	Comité Técnico No. 83	PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-MEN - CI CO1.PCCNTR. 4917031 de 2023	1. Verificación del quorum 2. Solicitud: Modificación del alcance del contrato de suministro PAF-ATMEN5-S-041-2024 que tiene por objeto: "EL SUMINISTRO, ENTREGA E INSTALACIÓN DE DOTACIÓN DEL MOBILIARIO ESCOLAR EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS" en el sentido de incluir 22 sedes en 34 aulas móviles nuevas ubicadas en los departamentos del Magdalena, Cesar, Guajira, Santander, Tolima, Meta, Cundinamarca, Valle del cauca, Chocó, Nariño, Bolívar y Putumayo. 3. Solicitud: Adición No.1 al contrato PAF-ATMEN5-S-041-2024 que tiene por objeto: "EL SUMINISTRO, ENTREGA E INSTALACIÓN DE DOTACIÓN DEL MOBILIARIO ESCOLAR EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS", por valor de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE ($ 359.945.454,80). 4. Solicitud: Prórroga No. 1 por tres (3) meses al contrato PAF-ATMEN5-S-041-2024 que tiene por objeto: "EL SUMINISTRO, ENTREGA E INSTALACIÓN DE DOTACIÓN DEL MOBILIARIO ESCOLAR EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS" 5. Proposiciones y varios
16 de marzo del 2025	Comité Técnico No. 84	PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-MEN - CI CO1.PCCNTR. 4917031 de 2023	1. Verificación del quorum 2. Solicitud: Prórroga No. 4 por el término de UN (1) MES para la ejecución del componente 2 del contrato de obra PAF-MENAM-O-080-2023, para ejecutar, terminar y entregar las actividades diagnosticadas y programadas como alcance de intervención para las 3 sedes que se encuentran en ejecución de las 15 priorizadas por el MEN dentro del contrato Grupo 10 del programa Aulas Móviles afectadas por la temporada de lluvias. 3. Solicitud: Prórroga No. 4 por el término de UN (1) MES al componente 2 del contrato de interventoría PAF-MENAM-I-062-2023 para el seguimiento a la ejecución, terminación y entrega de las 3 sedes que se encuentran en ejecución de las 15 priorizadas por el MEN dentro del contrato Grupo 10 del programa Aulas Móviles afectadas por la temporada de lluvias. 4. Solicitud: Adición No. 4 por la suma de DOCE MILLONES CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($12.104.858,50) incluida IVA al valor de ejecución del componente 2 del contrato de interventoría PAF-MENAM-I-062-2023, los cuales corresponde al (100%) del valor adicionar y al (2.3%) del valor total del contrato, que serán cubiertos con los saldos disponibles del Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 de 2023. 5. Proposiciones y varios

Comités Fiduciarios

FECHA	OBJETO	LUGAR DE LA REUNIÓN	TEMAS ABORDADOS
6 - 7 de marzo del 2025	Comité Fiduciario No. 53	PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-MEN - CI CO1.PCCNTR. 4917031 de 2023	1. Verificación del quorum 2. Solicitud: PRÓRROGA POR EL TÉRMINO DE DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO AL CONTRATO DE OBRA No. PAF-ATMEN5-O-037-2024 CUYO OBJETO CONSISTE EN "ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 9". 3. Solicitud: PRÓRROGA POR EL TÉRMINO DE DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO SIN ADICIÓN DE RECURSOS AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. PAF-ATMEN5-I-064-2024 CUYO OBJETO CONSISTE EN "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 9". 4. Solicitud: INCLUSIÓN NOTA ACLARATORIA A LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE OBRA No. PAF-ATMEN5-O-037-2024 EN LA QUE SE INDIQUE

			QUE LOS SALDOS DISPONIBLES DEL PRODUCTO "SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS. INCLUYE, MATERIAL ENVOLVENTE DE MUROS Y CUBIERTA", QUE CORRESPONDEN A UN VALOR DE $ 40.598.453 SEGÚN BALANCE FINANCIERO DEL COMPONENTE I, SEAN ASIGNADOS AL PRODUCTO DEL COMPONENTE II "EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD". 5. Proposiciones y varios
14 de marzo del 2025	Comité Fiduciario No. 54	PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-MEN - CI CO1.PCCNTR. 4917031 de 2023	1. Verificación del quorum 2. Solicitud: Modificación del alcance del contrato de suministro PAF-ATMEN5-S-041-2024 que tiene por objeto: "EL SUMINISTRO, ENTREGA E INSTALACIÓN DE DOTACIÓN DEL MOBILIARIO ESCOLAR EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS" en el sentido de incluir 22 sedes en 34 aulas móviles nuevas ubicadas en los departamentos del Magdalena, Cesar, Guajira, Santander, Tolima, Meta, Cundinamarca, Valle del cauca, Chocó, Nariño, Bolívar y Putumayo. 3. Solicitud: Adición No.1 al contrato PAF-ATMEN5-S-041-2024 que tiene por objeto: "EL SUMINISTRO, ENTREGA E INSTALACIÓN DE DOTACIÓN DEL MOBILIARIO ESCOLAR EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS", por valor de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE ($ 359.945.454,80). 4. Solicitud: Prórroga No. 1 por tres (3) meses al contrato PAF-ATMEN5-S-041-2024 que tiene por objeto: "EL SUMINISTRO, ENTREGA E INSTALACIÓN DE DOTACIÓN DEL MOBILIARIO ESCOLAR EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS" 5. Proposiciones y varios
27 - 29 de marzo del 2025	Comité Fiduciario No. 55	PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-MEN - CI CO1.PCCNTR. 4917031 de 2023	1. Verificación del quorum 2. Solicitud: Prórroga No. 4 por el término de UN (1) MES para la ejecución del componente 2 del contrato de obra PAF-MENAM-O-080-2023, para ejecutar, terminar y entregar las actividades diagnosticadas y programadas como alcance de intervención para las 3 sedes que se encuentran en ejecución de las 15 priorizadas por el MEN dentro del contrato Grupo 10 del programa Aulas Móviles afectadas por la temporada de lluvias. 3. Solicitud: Prórroga No. 4 por el término de UN (1) MES al componente 2 del contrato de interventoría PAF-MENAM-I-062-2023 para el seguimiento a la ejecución, terminación y entrega de las 3 sedes que se encuentran en ejecución de las 15 priorizadas por el MEN dentro del contrato Grupo 10 del programa Aulas Móviles afectadas por la temporada de lluvias. 4. Solicitud: Adición No. 4 por la suma de DOCE MILLONES CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($12.104.858,50) incluida IVA al valor de ejecución del componente 2 del contrato de interventoría PAF-MENAM-I-062-2023, los cuales corresponde al (100%) del valor adicionar y al (2.3%) del valor total del contrato, que serán cubiertos con los saldos disponibles del Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 de 2023. 5. Proposiciones y varios.

a. ACTIVIDADES DE CIERRE Y LIQUIDACIÓN

i. Obligaciones:

a. *Adelantar la liquidación o cierre de los contratos derivados para la ejecución de los proyectos y del Contrato Interadministrativo una vez estos hayan finalizado.*

De la contratación derivada

En el presente periodo se ha planificado anticipadamente la liquidación o cierre de los contratos derivados con el propósito de asegurar una ejecución eficiente de los proyectos. Esta estrategia no solo facilitó una gestión financiera más efectiva, sino que también permitió cumplir con los objetivos establecidos dentro de los plazos previstos, optimizando así los recursos disponibles y garantizando la correcta finalización de las obligaciones contractuales, así mismo se adelantaron las siguientes liquidaciones:

GRUPO	TIPO DE CONTRATO	CÓDIGO	DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS	FECHA INCIO	FECHA TERMINACIÓN	CONTRATISTA	OBSERVACIONES
1	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-052-2023	Antioquia - Apartadó Antioquia - Turbo Antioquia - Ciudad Bolívar Chocó - Carmen del Darién Chocó - Tadó	14/11/2023	29/10/2024	INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S	Liquidado el 25 de febrero del 2025
1	OBRA	PAF-MENAM-O-049-2023		14/11/2023	14/08/2024	OBRAS CAPITAL S. A	Liquidado el día 31/01/2025
2	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-053-2023	Atlántico - Repelón Atlántico - Galapa Atlántico – Soledad - Atlántico - Palmar De Varela Atlántico - Luruaco	26/09/2023	05/11/2024	RM INGENIEROS S.A.S.	Liquidación Radicada por PRISA INC 2025-000621 el 27 de febrero del 2025
2	OBRA	PAF-MENAM-O-050-2023		06/10/2023	05/09/2024	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023	Liquidación Radicada por PRISA INC 2025-000620 el 05 de marzo del 2025
3	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-054-2023	Magdalena - Ciénaga Magdalena - El Retén Magdalena - Puebloviejo	14/11/2023	30/04/2024	CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3	Liquidado el día 20/12/2024
3	OBRA	PAF-MENAM-O-051-2023		14/11/2023	30/04/2024	CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA	Liquidado el día 01/10/2024
4	OBRA	PAF-MENAM-O-052-2023	Bolívar - Córdoba Bolívar - Mompós Magdalena - San Sebastián de Buenavista	24/10/2023	22/03/2024	JASA LTDA	Liquidado el día 30/09/2024
4	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-055-2023		24/10/2023	22/03/2024	CONSORCIO INTER EDUCATIVO G4	Inicia su trámite de liquidación una vez que quede desembolsado el último pago.
6	OBRA	PAF-MENAM-O-056-2023	Cesar - Valledupar Cesar - La Paz Cesar - El paso	29/09/2023	17/05/2024	DAR ARQUITECTURA S.A. S	Liquidado el día 20/11/2024
6	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-058-2023		03/10/2023	17/05/2024	CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023	Liquidado el día 27/11/2024
8	OBRA	PAF-MENAM-O-055-2023	Córdoba – Tuchín Córdoba – Cotorra Córdoba - Planeta Rica Córdoba - Puerto Libertador Córdoba – Ayapel Córdoba - Montelíbano Bolívar - María la Baja	29/09/2023	DAR ARQUITECTURA S.A. S	$4.706.470.280	Liquidado el 14 de marzo del 2025
8	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-057-2023		13/10/2023	LUIS GUILLERMO NARVÁEZ RICARDO	$297.097.668	Entregado 21 de agosto del 2024

Del Contrato Interadministrativo

Para el presente periodo no se adelantan actividades de este tipo.

2. RESUMEN GENERAL DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL CONTRATO

CONTRATO No CO1.PCCNTR. 4917031 de 2023

Valor inicial del Contrato (CO1.PCCNTR. 4917031 de fecha 2023)	63.650.000.000
Valor del Contrato a la fecha de corte del Informe	**63.650.000.000**
Descuentos / Impuestos Estampilla Pro-Universidad Nacional / Tasas y Contribuciones (Correspondiente al 2% aplicado al valor Inicial del Contrato)	-
Asistencia Técnica No. 1 (Porcentaje de Asistencia Técnica y Administración de Recursos a reconocer a FINDETE, 7%)	4.164.018.692
Valor disponible para ejecutar los proyectos de acuerdo con el objeto del contrato y el plan operativo.	**59.485.981.308**

3. ANEXOS

Se remiten anexos de acuerdo con las actividades realizadas durante el periodo así:

1. 03 de marzo del 2025

HERNÁN PARDO BOTERO
Gerente de Infraestructura
FINDETER

JESÚS ALBERTO CAÑAS PÁEZ
Gestor del Contrato Interadministrativo
FINDETER

Elaboró: Geraldine Lorena Prada Pimiento – Profesional de la Gerencia de Infraestructura



Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Contrato No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023

6 DE MARZO DE 2025

Hacienda

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública


Contrato No. 4917031-2023

136 **sedes educativas**
[instalación de aulas y mejoramientos]

$ 63.650
Millones de pesos

Fecha inicio: 2/06/2023
Fecha Fin Actual: 01/07/2025

Grupo	Departamentos / Municipios	Etapa Actual del grupo/% de avance de contrato Fecha de Inicio –Fecha de Terminación
G1 [10 sedes]	Antioquia | Chocó	Entregado [100,00%] 14/11/2023 - 14/08/2024
G2 [8 sedes]	Atlántico	Entregado [100,00%] 27/11/2023 -06/09/2024
G3 [5 sedes]	Magdalena	Liquidado [100,00%] 14/11/2023 - 30/04/2024
G4 [5 sedes]	Bolívar	Entregado [100,00%] 26/10/2023 - 23/03/2024
G5 [16 sedes]	Bolívar | Magdalena | Cesar	Entregado [100,00%] 14/11/2023 – 08/11/2024
G6 [7 sedes]	Cesar	Entregado [100,00%] 15/11/2023 - 17/05/2024
G7 [13 sedes]	Guajira	Terminado [100,00%] 31/05/2024 - 17/01/2025
G8 [9 sedes]	Córdoba | Bolívar	Entregado [100,00%] 08/11/2023 - 23/08/2024
G9 [12 sedes]	Santander | Bolívar | Bogotá | Arauca | Tolima | Meta | Cundinamarca | Nte de Santander	En obra[33,97%] 23/08/2024 - 08/03/2025
G10 [15 sedes]	Cauca | Chocó | Valle Del Cauca	En Obra [90,22%] 19/02/2023 - 30/12/2024
G11 [18 sedes]	Cauca	Terminado [100,00%] 12/02/2023 - 27/11/2024
G12 [18 sedes]	Nariño | Putumayo | Cauca	Terminado [100,00%] 20/02/2023 - 04/12/2024
Dotación	46 Sedes a dotar - 99 aulas	Suspendido[100,00%] 03/10/2024 – 03/12/2024

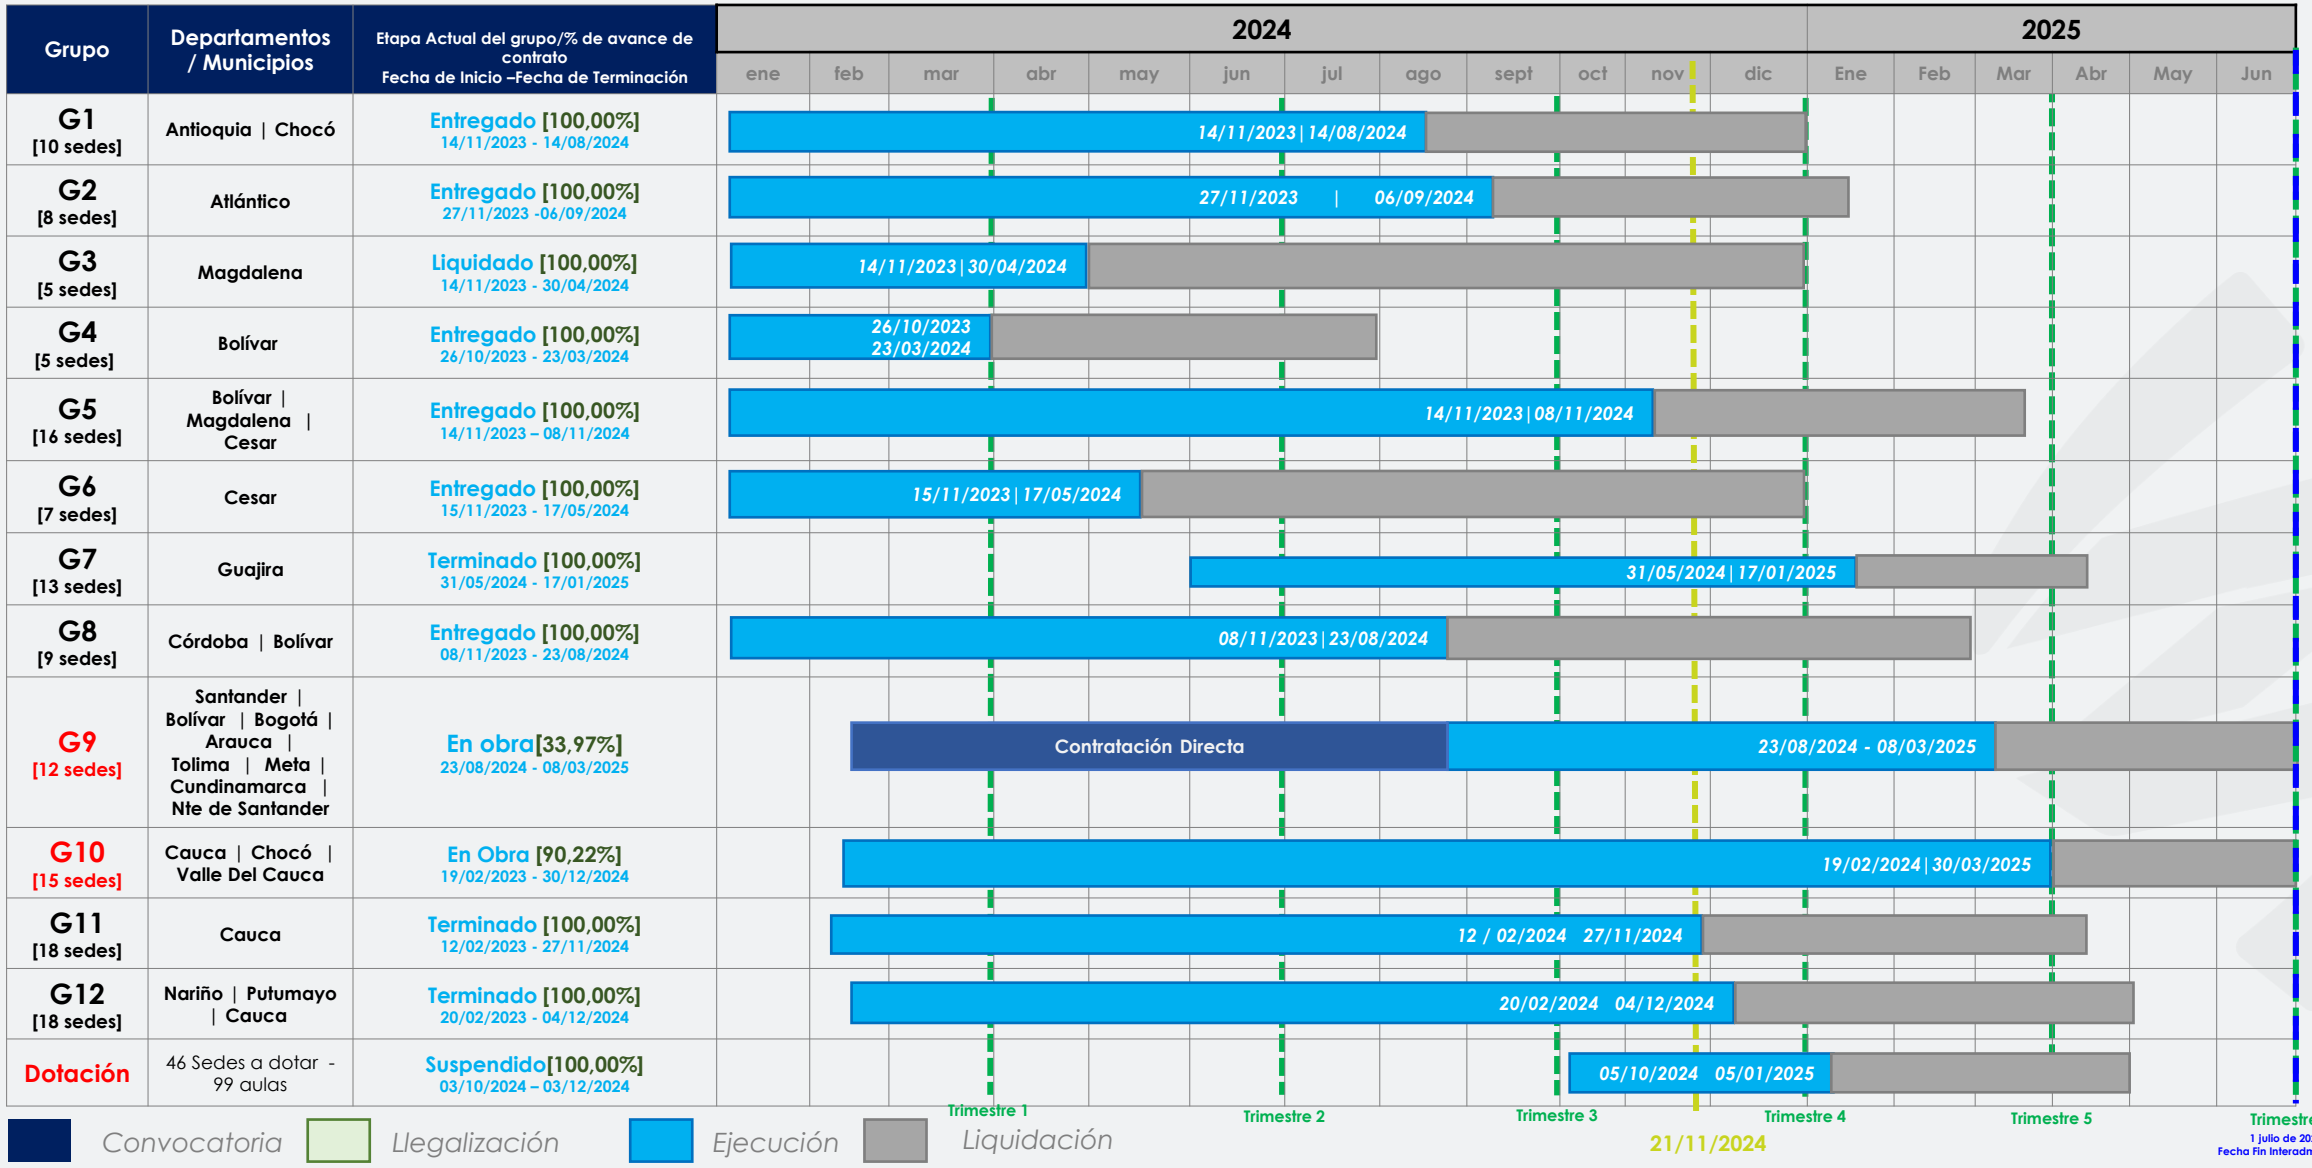

Convocatoria | Llegalización | Ejecución | Liquidación

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

Aulas Móviles
Contrato No. 4917031-2023

136 **sedes educativas**
[instalación de aulas y mejoramientos]

$ 63.650
Millones de pesos

Fecha inicio: 02/06/2023
Fecha Fin: 01/07/2025


ENTREGADAS 118 sedes 86,76%

TERMINADAS 8 sedes 3,68%

Físicamente culminadas. A la espera de firma de actas para ser entregadas

EN EJECUCIÓN 13 sedes 9,56%

Estado de entrega y ejecución de Sedes

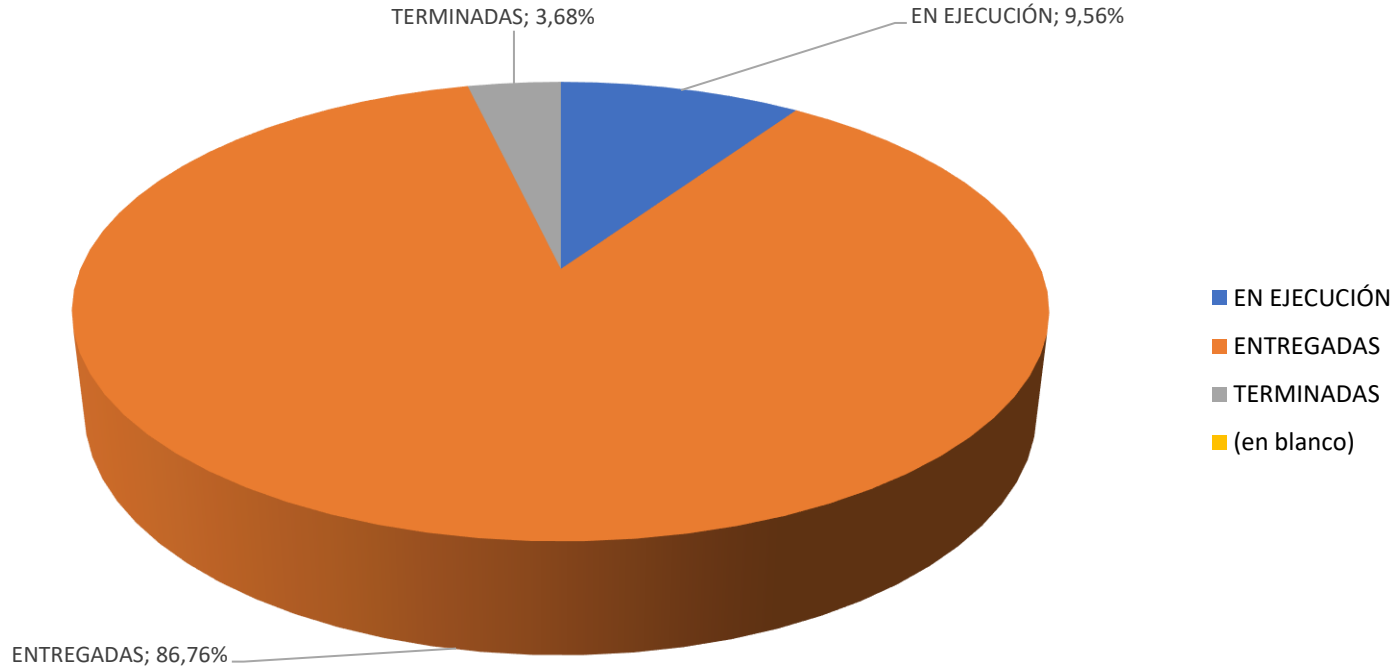

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Estado de entrega y ejecución de Sedes

136 **sedes educativas**
[instalación de aulas y mejoramientos]

$ 63.650
Millones de pesos

Fecha inicio: 02/06/2023
Fecha Fin: 01/07/2025

ENTREGADAS	TERMINADAS	EN EJECUCIÓN	POR INICIAR
118 sedes 85,29%	8 sedes 3,68%	13 sedes 9,56%	0 sedes 0%
Grupo 1 - 10 Grupo 2 - 8 Grupo 3 - 5 Grupo 4 - 5 Grupo 5 - 16 Grupo 6 - 7 Grupo 7- 13 Grupo 8 - 9 Grupo 10 - 10 Grupo 11 - 17 Grupo 12 - 18	Grupo 9 - 5 Grupo 10 - 1 Grupo 11 - 2	Grupo 9 - 9 Grupo 10 - 4	

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

PAGOS ASISTENCIA TECNICA

136 **sedes educativas**
[instalación de aulas y mejoramientos]

$ 63.650
Millones de pesos

Fecha inicio: 02/06/2023
Fecha Fin: 01/07/2025

VALOR AT

$ 4.164.018.692

Cobrado (a enero de 2025)	Pagado (a enero de 2025)	SALDO
$3.925.094.903,52	$ 3.925.094.903,52	$ 238.923.788,48

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

Resumen Informe Financiero – Corte 31 de diciembre de 2024

136 **sedes educativas**
[instalación de aulas y mejoramientos]

$ 63.650
Millones de pesos

Fecha inicio: 02/06/2023
Fecha Fin: 01/07/2025

VALOR EJECUTADO

$ 49.435 mll

VALOR POR EJECUTAR

$ 14.573 mll

VALOR COMPROMETIDO

$ 59.515 mll

SALDO

$ 398,2 mll*

*El saldo es a corte de 09 de febrero de 2025

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

Rendimientos Financieros – Relación de Pagos

Educación


Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031
Ministerio de Educación Nacional
Financiera del Desarrollo S.A.
7. RENDIMIENTOS FINANCIEROS
01 de enero al 31 de enero de 2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

FECHA	RENDIMIENTOS CAUSADOS CUENTA DE AHORRO	VALORACIÓN /DESVALORIZACION CAUSADOS FONDO DE INVERSION COLECTIVA - FIC	TOTAL RENDIMIENTOS, VALORACION DEVALORIZACION CAUSADOS	FECHA TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS	VALOR TRASLADO RENDIMIENTOS	AJUSTES / RETENCIONES	SALDO PENDIENTE POR TRASLADAR RENDIMIENTOS	DESVALORIZACION ACUMULADA
ago-23	82.351.406,35	443.947.650,01	**526.299.056,36**				-	-
sep-23	108.927.246,74	548.880.836,71	**657.808.083,45**				-	-
oct-23	131.902.760,66	436.008.307,20	**567.911.067,86**				-	-
nov-23	144.907.033,92	718.224.229,49	**863.131.263,41**				-	-
dic-23	143.221.271,36	788.090.860,63	**931.312.131,99**	13/12/2023	**2.615.149.472,00**		-	-
ene-24	133.626.379,48	427.858.051,59	**561.484.431,07**	10/01/2024	**931.312.131,99**		-	-
feb-24	120.547.529,88	474.970.095,24	**595.517.625,12**	12/02/2024	**561.484.430,15**		-	-
mar-24	117.745.976,50	478.495.863,61	**596.241.840,11**	12/03/2024	**595.517.625,12**		-	-
abr-24	100.331.907,69	259.736.382,70	**360.068.290,39**	10/04/2024	**596.241.840,11**		-	-
may-24	89.374.457,56	353.632.163,66	**443.006.621,22**	11/05/2024	**360.068.290,39**		-	-
jun-24	76.820.331,89	266.323.590,41	**343.143.922,30**	13/06/2024	**443.006.621,22**		-	-
jul-24	68.012.790,67	294.233.627,01	**362.246.417,68**	15/07/2024	**343.143.922,30**		-	-
ago-24	21.741.419,32	313.006.436,96	**334.747.856,28**	14/08/2024	**362.246.417,68**		-	-
sep-24	20.861.120,00	192.185.501,19	**213.046.621,19**	10/09/2024	**334.747.856,28**		-	-
oct-24	27.022.756,52	71.175.915,03	**98.198.671,55**	18/10/2024	**213.046.621,19**		-	-
nov-24	21.729.373,21	129.213.183,82	**150.942.557,03**	13/11/2024	**98.198.671,55**		-	-
dic-24	19.252.522,64	66.886.746,40	**86.139.269,04**	10/12/2024	**150.942.557,03**		-	-
ene-25	16.704.545,81	83.803.505,05	**100.508.050,86**	8/01/2025	**86.139.269,04**		**100.508.050,86**	-
TOTAL	**1.445.080.830,20**	**6.346.672.946,71**	**7.791.753.776,91**		**7.691.245.726,05**	-	**100.508.050,86**	-

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

Rendimientos Financieros – Comprobante de pago

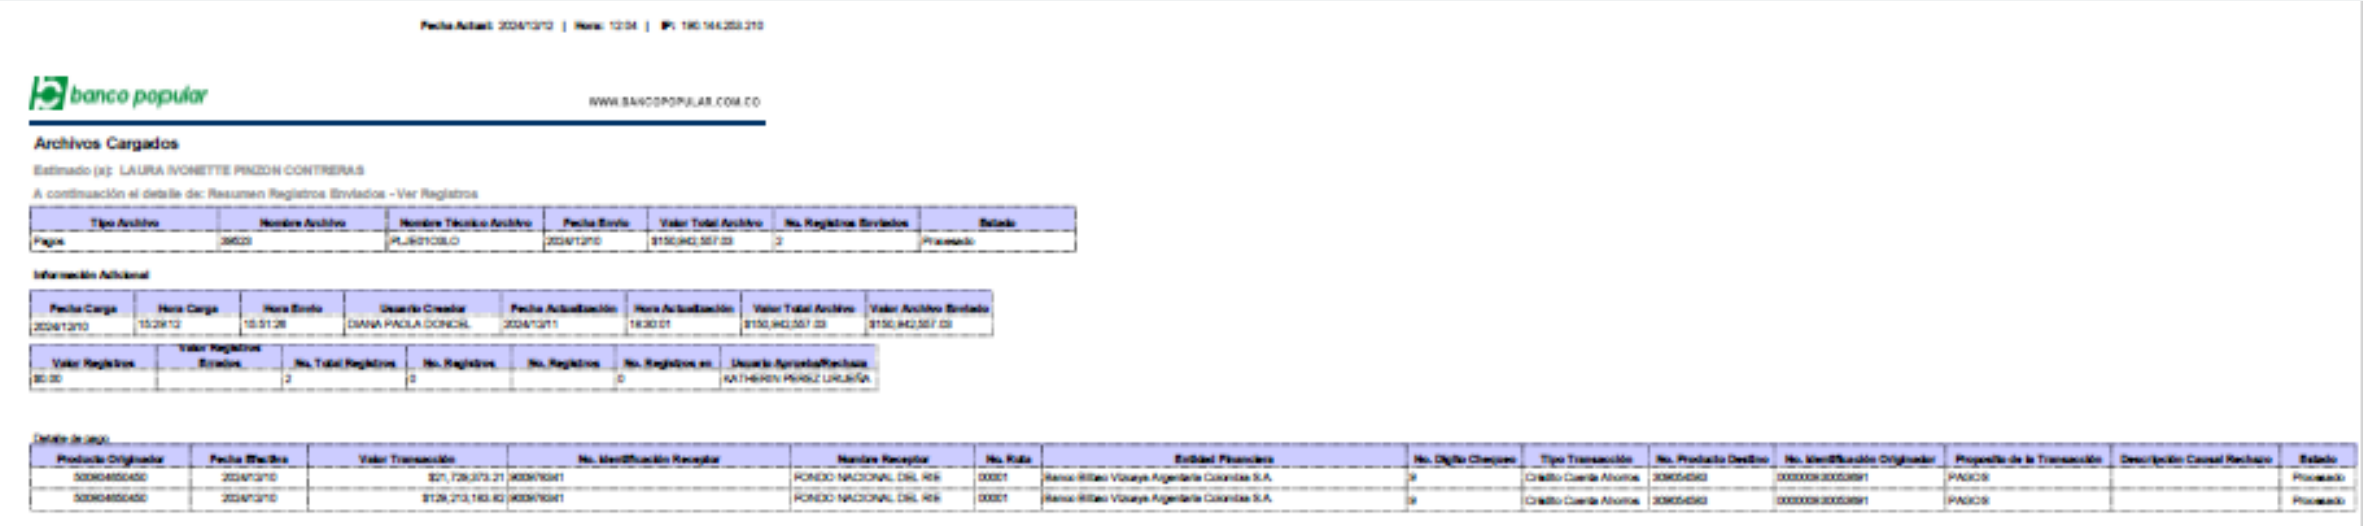

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Archivos Cargados

Estimado (a): LAURA IVONETTE PINZON CONTRERAS

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	39520	PLJ521039.O	2024/12/10	$150,842,557.03	2	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/12/10	15:29:12	15:31:26	DIANA PAOLA DONCEL	2024/12/11	18:30:01	$150,842,557.03	$150,842,557.03

Valor Registros	Valor Registros Enviados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		2	0		0	KATHERIN PEREZ URUEÑA

Detalle de pago

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	No. Rubi	Entidad Financiera	No. Digito Chequeo	Tipo Transacción	No. Producto Destino	No. Identificación Originador	Propósito de la Transacción	Descripción Causal Rechazo	Estado
309054650450	2024/12/10	$21,728,073.21	900976041	FONDO NACIONAL DEL RIE	00001	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	9	Crédito Cuenta Ahorros	309054583	0000009300539891	PAGOS		Procesado
309054650450	2024/12/10	$128,213,183.82	900976041	FONDO NACIONAL DEL RIE	00001	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	9	Crédito Cuenta Ahorros	309054583	0000009300539891	PAGOS		Procesado

NOTA: Teniendo en cuenta el contrato MEN-4917031 2023 -TEMPORADA DE LLUVIAS, y en atención a la obligación descrita en la cláusula tercera, Obligaciones específicas del contratista, Numeral 8 el cual dice:

"8. El Patrimonio Autónomo — Findeter deberá reintegrar mensualmente los rendimientos financieros (si los hubiere) a la Dirección del Tesoro Nacional o en los términos que establezca la normatividad aplicable, es decir, que no ingresan ni hacen parte del Patrimonio Autónomo constituido por Findeter."

Se han consignado los rendimientos financieros a la siguiente cuenta:

- **Banco:** BBVA
- **Tipo:** Ahorros
- **No. Cuenta:** 309-054583
- **Nombre de la Cuenta:** FIDUPREVISORA S.A FNGRD – COLOMBIA VITAL

AULAS MOVILES
INFORME DETALLADO POR GRUPO DE INTERVENCION

06 de marzo de 2025



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

CONTRATOS EN EJECUCION

GRUPO	Departamento	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	ALERTAS, ASUNTOS PENDIENTES
GRUPO 9	Arauca, Bolívar, Cundinamarca Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima y Bogotá D.C.	**12**	23/08/2024	08/03/2025	97,83%	68,88%	Se presentaron inconvenientes en las dos (2) sedes ubicadas en el municipio de Santa Isabel, departamento del Tolima en razón a precipitaciones presentadas que perjudicaron la vía de acceso a la zona, lo cual ha generado que se realice el transporte de materiales con el uso de mulas; para estas sedes se solicitó prórroga de dos (2) meses y quince (15) días calendario para culminación de actividades. Para las demás sedes se presenta un retraso en seis (6) de las diez (10) sedes que están en ejecución y tienen fecha de terminación el 8 de marzo de 2025. Por lo anterior, se debe continuar el proceso de apremio hacia el contratista de obra por las moras que se han presentado y que son imputables a este.
GRUPO 10	Cauca, Valle del Cauca y Choco	**15**	19/02/2024	30/03/2025	94,11%	87,94%	Los proyectos del Cauca se han visto afectados por temas de orden público en los últimos días de enero y primeros de febrero, lo cual han generando suspensión actividades parciales y retiro de personal trabajador por temor a la situación, hechos que han afectado los avances de los proyectos y actualmente están generando atrasos frente a la programación. Adicional el proyecto de Santander de Quilichao se encuentra en avance a su programación pero pendiente de que la administración municipal construya las acometidas para realizar las conexiones pertinentes por parte del proyecto, se ha reiterado al solicitud y necesidad de la misma, sobre la cual informan que se encuentran adelantando los tramites para abrir la convocatoria y adjudicar el contrato, ya que en el mes de diciembre adelantaron este proceso pero el mismo se declaro desierto.

CCOM-FO-005 V1 / 05-Ago-2024 / Publica

Grupo 09

Fecha inicio: 23/08/2024
Fecha Fin: 08/03/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Departamento	**Arauca, Bolívar, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima y Bogotá D.C.**
$	**Valor Inicial** Obra: $ 4.810.476.306,00 Interventoría: $ 313.800.000
	Adiciones Obra: $ 0 Interventoría: $165.685.393,30
	Valor Pagado Obra: CI- $245.711.234,70 CII - $ 1.412.969.897,09 Interventoría: CI - $0 CII - $ 141.822.709,23
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Otrosí No. 1: Retiro de tres (3) sedes del alcance Otrosí No. 2: Prórroga tres (3) meses obra e interventoría, adición interventoría por $165.685.393,30
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	**ID No. 56 – Arauca:** Entregada el 19/02/2025 **ID No. 138 - Arauca:** Terminada, entrega el 14/03/2025 **ID No. 132 – La Playa:** Terminada, entrega el 12/03/2025 **ID No. 7 – Vélez:** En actividades de aseo del aula nueva, entrega el 13/03/2025 **ID No. 104 – Anolaima:** En terminación de aula nueva y en ejecución de mejoramientos en aula existente y baterías sanitarias. Fecha estimada de entrega: 17 al 21 de marzo. **ID No. 96 – Villavicencio:** En terminación de muro de cerramiento. Fecha estimada de entrega: 17 al 21 de marzo. **ID No. 124 – Simití:** En actividades de pintura. Fecha estimada de entrega: 17 al 21 de marzo. **ID No. 123 – Simití:** Continúa en actividades de aula nueva. **ID No. 20 – Morales:** Continúan en actividades de mejoramientos. **ID No. 17 – Betulia:** Continúan en actividades de mejoramientos. **ID No. 67 y 100 – Santa Isabel:** La fabricación de los kits de materiales prefabricados finaliza el 15/03/2025, se está coordinando el transporte. Se encuentran en actividades de cimentación y armado de acero para fundida de placa de contrapiso. El contratista se retrasó en el inicio de las obras en todas las sedes educativas. Se solicita a la interventoría continuar con el proceso de apremio.

68,88%
Porcentaje de avance

97,83%
Porcentaje Programado

Sedes:	**12**
En ejecución:	8
Terminadas:	3
Entregadas:	1

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

COLEGIO UNIVERSITARIO - ID No. 7




IE DEL CERRO DE VERACRUZ -ID No. 124




CENTRO EDUCATIVO MONSERRATE - ID No. 138




EL DESCANSO - ID No. 104




ESCUELA SIETE DE AGOSTO - ID No. 96




SEDE LA PEÑA – ID No. 132




LA ARCADIA - ID No. 20




SANTA BARBARA - ID No. 17



CAMPO PAYARES - ID No. 123




EL BRASIL - ID No. 100




LA HUMAREDA - ID No. 67




CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Grupo 10

Fecha inicio: 19/02/2024
Fecha Fin: 30/03/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Departamento	**Cauca, Valle del Cauca y Choco**
$	**Valor Inicial** Obra: $6.014.978.800 Interventoría: $327.496.568
	Adiciones Obra: $602.576.550 Interventoría: $197.588.004,15 ($79.155.973,39 asumidos por el contrato de obra) ($118.432.030,76 asumidos por el contrato interadministrativo)
	Valor Pagado Obra: $5.620.758.289,00 Interventoría: $394.815.767,36
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	3 otrosíes obra: Prórrogas (9 meses y 27 dias) 3 otrosíes interventoría: Prórrogas (9 meses y 27 dias) y adiciones ($197.588.004,15)
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	En cumplimiento al alcance se tienen 11 sedes entregadas y AEP&SC suscritas, y 4 sedes en ejecución, (2 Suarez, 1 Santander de Quilichao, 1 Bahía Solano). Se adelanta programa para realizar la entrega de la sede la Huaca en Bahía solano de la semana del 10 al 14 de marzo si se logra coordinar la agenda con el rector. Frente a las obras de Suarez y Santander de Quilichao se continua con el avance de actividades con un personal mínimo derivado por los temas de orden publico que a la fecha han afectando los avances de los proyecto. Por lo anterior, se está evaluando los tiempos perdidos vs necesarios para lograr la terminación de los proyectos y de esta forma se adelantará un posible prórroga.

87,94%
Porcentaje de avance

94,11%
Porcentaje Programado

Sedes:	**15**
En ejecución:	4
Por iniciar:	0
Entregadas:	11

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial


INSTITUCION E.TECNICA AGRARIA SEDE PRINCIPAL ID MEN. 188.




INSTITUCION E.TECNICA AGRARIA SEDE INMACULADA ID MEN. 189.




INSTITUCION E.TECNICA AGRARIA SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ID MEN. 190

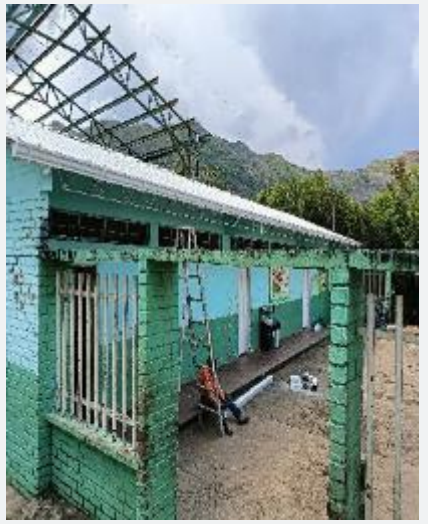INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PLAYA ID MEN: 12. MUNICIPIO DE TORIBIO ID MEN: 12.




INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO SEDE DOMINGO LASSO ID 164.




INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO SEDE PRINCIPAL ID 16




CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE JOHN F. KENNEDY




IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDEJULIAN MENDOZA GUERRERO




IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE PRINCIPAL




IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE LA HONDA .




IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE LA PLANTA .




IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE CRISTOBAL COLÓN




lica

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE. LUIS LOPEZ DE MESA SEDE SAN JOSE (HUACA)





IE. LUIS LOPEZ DE MESA SEDE SECUNDINO RIVAS




IE. LUIS LOPEZ DE MESA SEDE SIRENA DEL MAR




CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

CONTRATOS SUSPENDIDOS

GRUPO	Departamento	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	OBSERVACIONES
DOTACIÓN	Antioquia, Atlántico, Bolivar, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Putumayo, Santander, Tolima, Valle del Cauca	**46**	03/10/2024	02/12/2024	Valor del contrato inicial de $584.310.000,00 y otro sí proyectado de $364.000.000 y adición de 3 meses por las condiciones de accesibilidad de las nuevas sedes. Contrato Suspendido para la incorporación de los recursos. Se realiza el Otro Sí y se citará a comité la 3era semana del mes de febrero. Dotación entregada en los grupos 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 y 11 y, pendiente la entrega de los grupos 5, 7, 9, 10 y 12. La ejecución se realiza en 16 departamentos, 38 municipios y se realiza la dotación de 99 aulas nuevas construidas.

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Estado Entrega de Dotación

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

CONTRATO INICIAL

PAF-ATMEN5-S-041-2024

Publicada

17 DE JULIO DE 2024.

Informe Definitivo:

Comité Fiduciario No 41 del 25 de agosto.

Adjudicado:

DOTAESCOL SAS

Valor $ **$ 584.310.000,00**

Acta de Inicio: 3 de octubre de 2024

2 meses de ejecución.

Entregado 100%.

- 16 DEPARTAMENTOS
- 38 MUNICIPIOS
- 98 AULAS NUEVAS CON DOTACIÓN

CONTRATO ADICIÓN

Como resultado del desarrollo y entrega de los productos del Componente I, estableciendo que los grupos del programa **AULAS MOVILES 5, 7, 9, 10 y 12** tienen **22** sedes de instituciones educativas con **34** aulas nuevas para completar el 100% de aulas nuevas con dotación.

VALOR ADICIÓN: ($ 359.945.454,80).

Aulas nuevas ubicadas en los departamentos del Magdalena, Cesar, Guajira, Santander, Tolima, Meta, Cundinamarca, Valle del Cauca, Chocó, Nariño, Bolívar y Putumayo (12 departamentos)

Grupo	Sede	Municipio	Departamento	AULAS NUEVAS PREESCOLAR	AULAS NUEVAS BASICA PRIMARIA (1 A 5)	AULAS NUEVAS BASICA SECUNDARIA (6 a 11)	AULAS NUEVAS MULTIGRADO	TOTAL AULAS NUEVAS
5	CENTRO EDUCATIVO RURAL MIX JOS	El Banco	Magdalena	1				1
5	SEDE CHINELA	Curumaní	Cesar		1			1
5	SEDE TRONCONAL	Chimichagua	Cesar				1	1
7	ESCUELA RURAL INDÍGENA KARALOU	Manaure	La Guajira		1			1
7	YAMAIN - SEDE PRINCIPAL	Maicao	La Guajira			1		1
7	SEDE KASICHE	Maicao	La Guajira		1			1
7	CENTRO ETNOEDUCATIVO PROVINCI	Barrancas	La Guajira			1		1
7	SEDE LA ESTRELLA	Maicao	La Guajira		1			1
7	YAMAIN - KASPOLIMANA	Maicao	La Guajira		1			1
7	ESCUELA RURAL MIXTA TALOULUM	Maicao	La Guajira			2		2
9	COLEGIO UNIVERSITARIO	Vélez	Santander		4			4
9	LA HUMAREDA	Santa Isabel	Tolima				1	1
9	ESCUELA SIETE DE AGOSTO	Villavicencio	Meta		5			5
9	EL BRASIL	Santa Isabel	Tolima				1	1
9	ESCUELA RURAL EL DESCANSO	Anolaima	Cundinamarca				1	1
9	CAMPO PAYARES	Simití	Bolívar				1	1
10	LA PLANTA	Guadalajara de Bug	Valle del Cauca				1	1
10	SEDE DE SAN JOSE (HUACA)	Bahía Solano(Mutis	Chocó				1	1
12	INSTITUCION EDUCATIVA INMACULA	Cumbal	Nariño			5		5
12	ESC RUR MIX EL JARDIN ALTO TETE	Puerto Asís	Putumayo				1	1
12	ESC RUR MIX EL PROGRESO	Puerto Asís	Putumayo				1	1
12	ESC RUR MIX ALTO ORITO	Orito	Putumayo				1	1
SUBTOTAL				1	14	9	10	**34**

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado Entrega de Dotación



CENTRO EDUCATIVO INDIGENA CAÑO PADILLA YUKPA
Sede El Coso La Paz – Cesar



INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO
Sede Escuela Nueva Parcelas Londres
Ayapel - Córdoba



INSTITUCION EDUCATIVA EL PALMAR
Escuela Nueva Mixta Divino Salvador
Monte Líbano - Córdoba



INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO
Sede Principal Santander de Quilichao - Cauca



INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA ERM MARIA AUXILIADORA Sede
Sebastián de Buenavista - Magdalena



INSTITUCION EDUCATIVA TIERRA FIRME
Mompox - Bolivar

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

CONTRATOS TERMINADOS

GRUPO	Departamento	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	OBSERVACIONES
GRUPO 11	Cauca	18	12/02/2024	27/11/2024	Contratista avanza en las gestiones de entrega a Directivos de las sedes terminadas y recibidas por interventoría, las cuales son Santa Teresita en el municipio de Rosas y Francisco Javier sede Garay en el municipio de la Vega. Inicialmente el recibo de estas sedes se atrasó debido al periodo de vacaciones de los Directivos, y una vez reanudado el año escolar se informaron posventas en algunos espacios. En la IE Francisco Javier sede Garay las posventas ya fueron atendidas y se esta gestionando la firma del acta de recibo por parte del Rector. En la IE Santa Teresita están próximos a terminar la subsanación de las posventas informadas.

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Grupo 11

Fecha inicio: 12/02/2024
Fecha Fin: 27/11/2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Departamento	**Cauca**
$	**Valor Inicial** Obra: $ 4.728.021.810 Interventoría: $ 312.927.160
	Adiciones Obra: $ 0 Interventoría: $ 99.972.853,00 ($ 54.867.110,00 asumidos por el contrato de obra) ($ 45.105.743,00 asumidos por el contrato interadministrativo)
	Valor Pagado Obra: $ 4.721.624.076,00 Interventoría: $ 379.820.020,17
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	3 otrosíes obra: Prórrogas (6 meses) 3 otrosíes interventoría: Prórrogas y adiciones (6 meses - $ 99.972.853,00)
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	Contratista avanza en las gestiones de entrega a Directivo de la IE Francisco Javier sede Garay en el municipio de la Vega. En la IE Francisco Javier sede Garay los compromisos derivados de la reunión del 21/02/2025 acompañada por SED Cauca y MEN, fueron atendidos, razón por la cual se esta gestionando la firma del acta de recibo por parte del Rector. 17 sedes entregadas a Directivos. 1 sede en gestión de entrega.





CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO




I.E. Agropecuaria Santa Rita – Sede principal
La vega




C.E. Buenos Aires – Sede Capitanes
Balboa




C.E. Guillermo León Valencia – Sede La Despensa
Rosas





C.E. Guillermo León Valencia – El Altillo
Rosas

CCOM-FO-005 V1 / 05 - Ago-2024 / Pública
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO




I.E. El Carmen – Sede principal
Bolívar




I.E. Alfonso Córdoba – Sede Las Yerbas
Rosas




I.E. Alfonso Córdoba – Sede Bellavista
Rosas




I.E. Técnica Agropecuaria Nuestra Señora de los
Remedios - Bolívar

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada
CCOM-FO-005 V1 / 05 - Ago-2024 / Pública

CONTRATOS ENTREGADOS

GRUPO	Departamento	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	OBSERVACIONES
Grupo 2	Atlántico	8	27/11/2023	05/09/2024	CONTRATO PAF-MENAM-O-050-2023: Terminado el 05.09.2024 CONTRATO PAF-MENAM-I-053-2023: Terminado el 05.11.2024 CONTRATO PAF-MENAM-O-050-2023: Documentos Liquidación radicados el 27.02.2025 a través PRISA INC 2025-000620, asignación liquidador el 5.03.2025 Rubén Moscoso, actualmente se encuentra en revisión CONTRATO PAF-MENAM-I-053-2023: Documentos Liquidación radicados el 27.02.2025 a través PRISA INC 2025-000621, en espera asignación liquidador

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

CONTRATOS ENTREGADOS

GRUPO	Departamento	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	OBSERVACIONES
Grupo 4	Magdalena y Bolívar	7	24/10/2023	07/02/2024	Se encuentra liquidado el contrato de obra. El contrato de interventoría iniciará su trámite de liquidación una vez que quede desembolsado el último pago.
Grupo 5	Magdalena y Bolívar	16	14/11/2023	08/11/2024	CONTRATO PAF-MENAM-O-053-2023: Terminado el 08.11.2024 CONTRATO PAF-MENAM-I-056-2023: Terminado el 08.01.2025 **AERS COMPONENTE 2:** • Contrato de Obra e Interventoría, en proceso de revisión y VoBo por parte de la Fiduciaria Popular, para pasar a firmas, una vez se tenga las AERS suscritas se procederá a solicitar la actualización de pólizas. En recopilación documental, cierre de balances y memorias entre el contratista e interventoría, se proyecta radicar la liquidación del contrato de obra al 15 de marzo de 2025 y posterior la de interventoría.
Grupo 7	La Guajira	13	31/05/2024	17/01/2025	AERS del componente II Obra firmada 28feb2025 por Rep. legal Fidupopular. El contrato de obra iniciará su trámite de liquidación una vez que quede desembolsado el último pago; el cual deben facturar a inicios de marzo y pagado a finales de marzo 2025. Con respecto a la interventoría le falta facturar casi un 60% y se estima su liquidación para iniciar a finales de abril 2025.
Grupo 8	Córdoba y Bolívar	9	08/11/2023	08/07/2024	En expedición el acta de liquidación del contrato. En consolidación la información del contrato de interventoría. Se proyecta su liquidación en el mes de marzo

GCOM-FO-005 V1 / 05 Ago 2024 / Pública

CONTRATOS ENTREGADOS

GRUPO	Departamento	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	OBSERVACIONES
Grupo 12	Cauca, Huila, Nariño y Putumayo	18	12/02/2024	05/12/2024	**CONTRATO PAF-MENAM-O-076-2023:** Se inicia con recopilación de documentación de liquidación, radicación proyectada 31/03/2025. **CONTRATO PAF-MENAM-I-064-2023:** e inicia con recopilación de documentación de liquidación, radicación proyectada 31/03/2025.

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Grupo 2

Fecha inicio: 27/11/2023
Fecha Fin: 05/09/2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Departamento	**Atlántico**
$	**Valor Inicial** Obra: $4.044.124.630 Interventoría: $295.715.000
	Adiciones Obra: $ 0,00 Interventoría: $113.699.014 ($57.808.105,6 asumidos por el contrato de obra) ($55.890.908,4 asumidos por el contrato interadministrativo)
	Valor Pagado Obra: $4.028.747.780,96 Interventoría: $374.270.637,53
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	3 otrosíes obra: Prórrogas (5 meses y 5 dias) 3 otrosíes interventoría: Prórrogas (5 meses y 5 dias) y adiciones ($113.699.014)
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	CONTRATO PAF-MENAM-O-050-2023: Terminado el 05.09.2024 CONTRATO PAF-MENAM-I-053-2023: Terminado el 05.11.2024 AERS COMPONENTE 2: • Contrato de obra suscrita el 10.02.2025 y en proceso de actualización de pólizas para revisión y aprobación por parte de la Fiduciaria Popular. • Contrato de interventoría en proceso de revisión para presentar a firmas, proceso que se espera se de en la semana del 17 al 21 de febrero de 2025 En recopilación documental, cierre de balances y memorias entre el contratista e interventoría, se proyecta radicar la liquidación del contrato de obra al 28 de febrero de 2025 y posterior la de interventoría.

100%
Porcentaje de avance

100%
Porcentaje Programado

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Contratista de Diseño y Obra: PAF-MENAM-O-050-2023 CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 - G2
Contratista interventor: PAF-MENAM-I-053-2023 RM INGENIEROS S A S

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE PRINCIPAL - ID EN 018




INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE PRINCIPAL - ID EN 018




INSTITUCION EDUCATIVA BLAS TORRES DE LA TORRE (ITIDA) - ID MEN 144




INSTITUCION EDUCATIVA DE MESOLANDIA - ID MEN 197




INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS, LAS TABLAS Y PITA, SEDE PITA - ID MEN 092




INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS, LAS TABLAS Y PITA, SEDE LAS TABLAS - ID MEN 083




INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE VILLA ROSA, SEDE LA LOMA - ID MEN 084






INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA DE GALAPA - ID MEN 064






Grupo 4

Fecha inicio: 24/10/2023
Fecha Fin: 07/02/2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Departamento	**Magdalena y Bolívar**
$	**Valor Inicial Obra: $3.566.467.466.00** **Valor inicial Interventoria: $264.974.745,00**
	Adiciones Obra: $ 0 Interventoría: $20.000.000.00 (El contratista pago $10.000.000.00 y el convenio $10.000.000.00) **Valor final Interventoria $ 284.974.745,00**
	Valor Pagado Obra: $3.361.652.674.57 Valor Liberado contrato de obra: $204.814.791.43 Interventoría: $279.439.929.41 Valor a Liberar:$5.534.815.59
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Otro Sí 1: Prorroga un (1) y quince (15) días. Otro Sí 2: Exclusion de dos (2) (TACAMOCHO y EDM JAIME) por la imposiblidad técnica para ejecutar.
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	Contrato de Obra Liquidado y culminado. Se inicia tramite de liquidación: interventoría adelanta el proceso de radicación de los documentos para la liquidación 07/03/2025.

100%
Porcentaje de avance

100%
Porcentaje Programado

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Grupo 5

Fecha inicio: 14/11/2023
Fecha Fin: 08/11/2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Departamento	**Magdalena y Bolívar**
$	**Valor Inicial** Obra: $4.102.044.984 Interventoría: $300.856.990
	Adiciones Obra: $778.973.616 Interventoría: $172.224.091 ($91.100.000 asumidos por el contrato de obra) ($81.124.091 asumidos por el contrato interadministrativo)
	Valor Pagado Obra: $4.745.371.433 Interventoría: $420.967.384,31
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	5 otrosíes obra: Prórrogas (7 meses y 20 dias) y adiciones ($778.973.616) 5 otrosíes interventoría: Prórrogas (7 meses y 20 dias) y adiciones ($172.224.091)
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	CONTRATO PAF-MENAM-O-053-2023: Terminado el 08.11.2024 CONTRATO PAF-MENAM-I-056-2023: Terminado el 08.01.2025 AERS COMPONENTE 2: • Contrato de Obra e Interventoría, en proceso de revisión y VoBo por parte de la Fiduciaria Popular, para pasar a firmas, una vez se tenga las AERS suscritas se procederá a solicitar la actualización de pólizas. En recopilación documental, cierre de balances y memorias entre el contratista e interventoría, se proyecta radicar la liquidación del contrato de obra al 15 de marzo de 2025 y posterior la de interventoría.





CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

GRUPO 5, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES SEDE PRINCIPAL
ID No. 30




INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES SEDE SERENOS
ID No. 101




INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES SEDE SERENOS
ID No. 101




INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRISTIAN MORENO SEDE CHINELA
ID No. 97




INSTITUCION EDUCATIVA EL PUEBLITO SEDE PUERTO LA ESTANCIA
ID No. 147




INSTITUCION EDUCATIVA EL PUEBLITO SEDE TORRECILLA
ID No. 148





CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

GRUPO 5, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PUEBLITO SEDE TRONCONAL
ID No. 146




INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL SILVIA COTES DE BISWELL SEDE ISLITA
ID No. 32




INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL OSCAR PISCIOTTI NUMA SEDE INMACULADA CONCEPCION




INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ANTONIO NARIÑO SEDE JOSE DE LA PAZ VANEGAS




INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA CRUZ DE BALSAMO SEDE PRIMARIA
ID No. 13




INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA CRUZ DE BALSAMO SEDE JARDIN INFANTIL
ID No. 14




CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

GRUPO 5, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR SEDE PRINCIPAL
ID No. 06




INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR SEDE CERRITO
ID No. 10




INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR SEDE ATASCOZA
ID No. 09




INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA PESQUERA LEONIDAS ORTIZ ALVEAR SEDE PLAN BONITO
ID No. 43





CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Grupo 7

Fecha inicio: 31/05/2024
Fecha Fin: 17/01/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Departamento	**La Guajira**
$	**Valor Inicial** Obra: $**4.158.777.879** Interventoría: $**295.239.000**
	Adiciones Obra: $ 0 Interventoría: $0
	Valor Pagado Obra: $ 3.738.535.259,01 (89,89%) Interventoría: $121.499.000 (41,15%)
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Suspensión 1 por 20 días 28 de oct de 2024 Prórroga 1 por 45 días 13 de sep de 2024 Suspensión 2 por 30 días 18 de nov de 2024 Prórroga 2 por 30 días 19 de dic de 2024
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	CONTRATO PAF-ATMEN5-O-036-2024: Terminado el 17.01.2025 CONTRATO PAF-MENAM-I-059-2023: Fecha de Terminación el 17.03.20 AERS del componente II de Obra firmada 28feb2025 x Rep. legal Fidupopular. El contrato de obra iniciará su trámite de liquidación una vez que quede desembolsado el último pago; el cual deben facturar a inicios de marzo y pagado a finales de marzo 2025. Con respecto a la interventoría le falta facturar casi un 60% y se estima su liquidación para iniciar a finales de abril 2025.





CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

REGISTRO FOTOGRAFICO

I.E. JOSE ANTONIO GALAN- SEDE COOPERATIVO -060-(RIOHACHA)





INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #7 - 034-APÜNIMA´ANA1 -(RIOHACHA)





ESCUELA ETNOEDUCATIVA LA CAMPANA -050--(MAICAO)







ESCUELA ETNOEDUCATIVA WAYUMA'ANA -054- (MAICAO)





CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

REGISTRO FOTOGRAFICO

INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #7 - 117-WAKUAPAMANA -(RIOHACHA)






I.E. JOSE ANTONIO GALAN- SEDE PRINCIPAL -060-(RIOHACHA)






INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #6 - 051-TALOULUMA `ANA -(MAICAO)




INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO RURAL PROVINCIAL - 0143-PROVINCIAL -(BARRANCAS)




CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Publica
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

REGISTRO FOTOGRAFICO

INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA - 011-
ESCUELA RURAL INDIGENA KARALOUTAMANA -(MANAURE)





ESCUELA ETNOEDUCATIVA SEDE KASICHE -053- (MAICAO)













INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #6 - 151-LA
ESTRELLA -(MAICAO)



INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #6 - 051-
YAMAIN SEDE PRINCIPAL -(MAICAO)



INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #6 - 152-
YAMAIN KASPOLIMANA -(MAICAO)









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Grupo 8

Fecha inicio: 08/11/2023
Fecha Fin: 08/07/2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Departamento	**Córdoba y Bolívar**
$	**Valor Inicial** Obra: $$4.706.470.280 M/CTE Interventoría: $297.097.668,00 M/CTE
	Adiciones Obra: $1.455.000.000 Interventoría: $144.106.877
	Valor Pagado Obra: $6.161.470.280 Interventoría: $277.437.804
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Prorroga 1: 2 meses y 15 días Prorroga 1: 2 meses
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	Contrato de obra: liquidado. Contrato de interventoría: En consolidación y revisión documentos por la supervisión para el inicio del proceso de liquidación.





CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

REGISTRO FOTOGRAFICO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Sede principal I. E. El Palmar - Montelíbano



Sede Buenos Aires - María La Baja



Sede Los Cerros - Planeta Rica



Sede Téc. Agrop. De Desarrollo Rural De María la baja - María La Baja



Sede Esc. Nueva Parcelas Londres - Ayapel



Sede Técnica Álvaro Ulcue Chocue - Tuchín



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

REGISTRO FOTOGRAFICO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Sede Esc. Nueva La Solita - Puerto Libertador



Sede Los Aguacates - Cotorra



Sede Níspero-María La Baja





CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Grupo 12

Fecha inicio: 12/02/2024
Fecha Fin: 05/12/2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Departamento	**Cauca, Huila, Nariño y Putumayo**
$	**Valor Inicial** Obra: $ 4.918.276.400,00 Interventoría: $ 318.105.088,00
	Adiciones Obra: $ 0 Interventoría: $ 152,015,642,00
	Valor Pagado Obra: $ 4.906.706.463,00 Interventoría: $ 413.123.412
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	2 otrosíes obra: Prórrogas (6 meses) 2 otrosíes interventoría: Prórrogas y adiciones (6 meses - $ 152,015,642,00)
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	Total de 18 sedes, entregadas a satisfacción con recibo de interventoría y rectores de 18 sedes, se suscribió acta de entrega por rector el 05/03/2025 y nos encontramos en trámite de firmas. Con respecto al trámite con la empresa de servicio de Energía del Putumayo y Alcaldía de Piamonte se remitirá comunicado solicitando colaboración con el trámite a la Alcaldía para que se comprometa a realizar la compra del transformador para ampliación de la carga de toda la institución, dejando registro de la gestión realizada por el contratista sobre los mejoramientos y que no afecta la carga existente.





CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Estado GRUPO 12, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO




ID1 Pasto, Nariño - I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE




ID8 El Rosario - Nariño, CENTRO EDUCATIVO LA CLAUDIA




ID26 Acevedo, Huila - INSTITUCION EDUCATIVA BATEAS




ID27 Piamonte - Cauca, ESCUELA RURAL MIXTA LA ESPANOLA

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada
CCOM-FO-005 V1 / 05 - Ago-2024 / Pública

CONTRATOS LIQUIDADOS

GRUPO	Departamento	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	OBSERVACIONES
Grupo 3	Magdalena	5	14/11/2023	12/04/2024	**LIQUIDACIÓN Contrato de Obra No. PAF-MENAM-O-051-2023**: Suscrita Acta de liquidación de fecha 01/10/2024, pagado 100%. **LIQUIDACIÓN Contrato de Interventoría No. PAF-MENAM-I-054-2023:**Suscrita Acta de liquidación de fecha 20/12/2024, pagado 100%.
Grupo 6	Cesar	7	15/11/2023	29/04/2024	**LIQUIDACIÓN Contrato de Obra No. PAF-MENAM-O-056-2023:** Suscrita Acta de liquidación el 20/11/2024 y pagado al 100%. **LIQUIDACIÓN Contrato de Interventoría No. PAF-MENAM-I-058-2023:** Suscrita Acta de liquidación el 27/11/2024 y pagado al 100%.
Grupo 1	Antioquia y Chocó	10	14/11/2023	14/08/2024	**CONTRATO PAF-MENAM-O-049-2023:** Liquidación suscrita el 31 de enero e 2025 **CONTRATO PAF-MENAM-I-052-2023:** Liquidación suscrita el 25 de febrero e 2025

CCOM-FO-005 V1 / 05 - Ago-2024 / Pública

COMPROMISOS

- Definir por parte de Findeter el valor de la posible adición para el grupo 9. R/: Se realizó la prórroga del grupo para la ejecución de las 2 sedes de Tolima. No implicó costo al convenio.

- Revisar por parte de Findeter el cronograma general de ejecución del convenio teniendo en cuenta que aún no ha iniciado las actividades de 2 sedes en el grupo 9. Tiempos de liquidación será muy corto. R/: Se presenta cronograma de liquidaciones de cada grupo, sus etapas y su estado actual.

- Agilizar por parte de Findeter el Otro Sí de la dotación y su firma con base en los comité técnicos y fiduciarios a citar.

- Remitir por parte de Findeter el informe de avance de las sedes de Grupo 10, sobre todo de las sedes ejecutadas en Suárez. R/: Se remitió el 17 de febrero de 2025

- Compartir desde Findeter las actas de entregas de las sedes del Cauca al ing. Juan Carlos Folleco Olave de la secretaria de Educación del Cauca. R/: Fecha de entrega el 11 de marzo de 2025

- Revisar y confirmar por parte de Findeter que el seguimiento con la Fiduprevisora se ha realizado permanentemente y que la información en la carpeta compartida se encuentra al día. R/: Se está realizando la entrega de información a tiempo.

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

COMPROMISOS (06 DE MARZO DE 2025)

- MEN informa que por favor se adicione el plan de contingencia al comité, ya que esta difícil el acceso a las zonas de los grupos que están en ejecución.
- Revisar información para empezar la liquidación del CI, organizar información, esperar que el MEN nos envíen link de acceso.
- Revisar el presupuesto de pagos, donde se debe estar seguro que solo que se incluya el recurso del convenio.
- Revisar adiciones y valor final de la base detallada.
- Enviar información, una pieza comunicativa, con la información del contrato interadministrativo al MEN para publicar y socializar las intervenciones.
- Enviar todas fotos de las dotaciones en las aulas nuevas de cada IE.
- Enviar información de los beneficiarios. Plazo máximo 14 de marzo del 2025.
- Organizar el cronograma con todas las prorrogas.

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública



Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

GRACIAS

www.findeter.gov.co

@findetercol @findetercol
@findeter linkedin.com/company/findeter

Gobierno de Colombia

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023

ATENCIÓN DE NECESIDADES PRIORITARIAS EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR DE LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS

Periodo comprendido entre el 02 de marzo al 01 de abril de 2025

Bogotá D.C.

TABLA DE CONTENIDO

1. **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO MARCO**
2. **ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO**
   - 2.1 OBLIGACIONES GENERALES
   - 2.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS
   - 2.3 ACTIVIDADES PRECONTRACTUALES
     - 2.3.1 Obligaciones
   - 2.4 ACTIVIDADES CONTRACTUALES
     - 2.4.1 Obligaciones
   - 2.5 ACTIVIDADES DE CIERRE Y LIQUIDACIÓN
     - 2.5.1 Obligaciones
3. **RESUMEN GENERAL DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL CONTRATO**
4. **ANEXOS**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO MARCO

Objeto General:	Brindar Asistencia Técnica y Administración de Recursos para atender las necesidades prioritarias en infraestructura y dotación de mobiliario escolar de las sedes educativas afectadas por la temporada de lluvias que sean definidas por el Ministerio de Educación.	
Numero de Contrato:	CO1.PCCNTR. 4917031	
Integrantes:	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - MEN Y LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER	
Fecha de suscripción:	05 de mayo de 2023	
Perfeccionamiento	Póliza garantía aprobada 26 de mayo de 2023 Registro Presupuestal 02 de junio de 2023	
Fecha de Inicio:	02 de junio de 2023	
Fecha de Terminación:	01 de julio de 2025	
Modificaciones:	Modificatorio No. 1. Modificar la cláusula cuarta - plazo de ejecución del contrato, la cual quedará de la siguiente manera: "El plazo previsto para la ejecución del Contrato Interadministrativo será a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, hasta el 01 de noviembre de 2024, plazo en el que se debe llevar a cabo la ejecución física del contrato y la liquidación de la contratación derivada que suscriba FINDETER."	
	Modificatorio No. 2. "Prorrogar el plazo de ejecución del contrato número CO1.PCCNTR.4917031 de 2023, hasta el 01 de julio de 2025, plazo en el que se debe culminar la ejecución física de las obras de infraestructura educativa, dotación de aulas nuevas por reposición, y la liquidación de la contratación derivada suscrita por FINDETER."	
Aportes:	Valor de los recursos a administrar para la ejecución de los proyectos	$ 59.485.981.308
	Porcentaje de Asistencia Técnica y Administración de Recursos a reconocer a FINDETER (7%)	$ 4.164.018.692
Valor final del Contrato:		$ 63.650.000.000
Sociedad Fiduciaria:	FIDUCIARIA POPULAR S.A.	

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO

1.1 OBLIGACIONES GENERALES

1. *Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas en este contrato.*

En el transcurso del periodo actual, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. (FINDETER) asume con responsabilidad la tarea integral de estructurar, desarrollar y dar seguimiento a todas las actividades derivadas de la ejecución de las diversas obligaciones estipuladas en el contrato vigente. En virtud de su compromiso, FINDETER se esfuerza por cumplir con cada una de las responsabilidades asignadas, garantizando que cada etapa del contrato sea llevada a cabo de manera exitosa y en plena conformidad con los términos y condiciones acordadas previamente.

Es importante destacar que el compromiso de FINDETER no se limita únicamente a la ejecución técnica del contrato, sino que abarca también la garantía de la calidad y la excelencia en cada una de las etapas del proceso. La entidad se esfuerza por mantener altos estándares de rendimiento, asegurando que los resultados obtenidos sean de la más alta calidad posible y estén alineados con los objetivos y metas establecidas.

2. *Participar y apoyar al Ministerio de Educación Nacional en todas las reuniones periódicas a las que este lo convoque relacionadas con la ejecución del contrato que permitan realizar seguimiento integral a los avances de los proyectos.*

Durante el presente periodo FINDETER participó activamente y brindó el pleno apoyo al Ministerio de Educación Nacional en todas las reuniones periódicas a las que se convocaron, especialmente, aquellas relacionadas con la ejecución del contrato. FINDETER está comprometido con realizar un seguimiento integral y detallado de los avances del proyecto, por lo que se establecieron reuniones cada martes en la tarde a través del aplicativo Teams, reuniones programadas por FINDETER sobre las que realizan grabaciones y se informa los avances semanales.

Las fechas de las reuniones de seguimiento del periodo, sobre las cuales se realiza el acta correspondiente, la cual se adjunta al presente informe:

1. 03 de marzo del 2025

3. *Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la información objeto del presente contrato.*

FINDETER ha dispuesto todos los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la información objeto del presente contrato. La seguridad y confidencialidad de la información son de suma importancia, y se ha implementado medidas sólidas para garantizar su protección. Esto incluye la implementación de sistemas de almacenamiento seguro, protocolos de acceso restringido y medidas de respaldo que aseguran que la información esté resguardada de manera adecuada en todo momento. La prioridad es mantener la integridad de la información involucrada en el contrato, así mismo se habilitó los espacios adecuados en la Calle 103 No. 19-20 y en la segunda sede localizada en la Calle 104 # 18ª-65, piso 6 para tal fin.

4. *Entregar a EL MINISTERIO, periódicamente y al finalizar el contrato, o cuando el supervisor o interventor lo solicite, todos los documentos y archivos (físicos y electrónicos) a su cargo y que se produzcan en ejecución de sus obligaciones, lo anterior, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes en el Ministerio de Educación Nacional.*

Durante este periodo, FINDETER ha cumplido rigurosamente con la entrega de todos los documentos y archivos electrónicos que el MEN ha solicitado durante la ejecución del contrato. Esta entrega se realiza de manera periódica y al finalizar el contrato, tal como establecen las normas y disposiciones vigentes en el Ministerio de Educación Nacional. Además, en concordancia con las regulaciones vigentes, también se proporcionará dicha documentación cuando el supervisor o interventor así lo solicite. La prioridad es asegurar que todas las partes involucradas tengan acceso a la información necesaria y que cumplan con todas las obligaciones contractuales en cuanto a la entrega y custodia de documentación.

5. *Colaborar en el suministro y respuesta de la información correspondiente a los requerimientos efectuados por los organismos de control del Estado Colombiano o cualquier otra autoridad, en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato y de asuntos relacionados con el mismo.*

   En este periodo, FINDETER ha colaborado plenamente en el suministro y respuesta de toda la información correspondiente a los requerimientos efectuados por los Entes de Control del Estado Colombiano y cualquier otra autoridad pertinente. La cooperación en este sentido es absoluta y FINDETER está comprometido en proporcionar toda la información necesaria relacionada con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato, así como en asuntos relacionados con el mismo.

   Cumplir con los requisitos de los Entes de Control y las autoridades es fundamental para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en todas las acciones. La disposición a colaborar asegura que el proceso se realice de manera adecuada y en línea con las regulaciones y requerimientos establecidos por las autoridades correspondientes.

6. *Utilizar la imagen del Ministerio de Educación Nacional de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorización expresa y escrita de las partes ningún funcionario, podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole.*

   FINDETER ha seguido rigurosamente los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional en relación con el uso de su imagen. FINDETER es consciente de que, salvo autorización expresa y escrita de las partes involucradas, ningún funcionario puede utilizar el nombre, emblema o sello oficial del Ministerio con fines publicitarios o de cualquier otra índole. La colaboración se adhiere estrictamente a estas directrices para asegurar el respeto mutuo y la integridad en la utilización de la imagen y la identidad del Ministerio. Durante este periodo no se realizaron trámites que contengan la imagen del Ministerio de Educación Nacional.

7. *Guardar estricta confidencialidad sobre toda la información y los documentos obtenidos del MEN.*

   FINDETER ha mantenido una estricta confidencialidad sobre toda la información y los documentos obtenidos del Ministerio de Educación Nacional (MEN). Reconoce la importancia de salvaguardar la información confidencial y sensible proporcionada por el MEN, y se ha implementado medidas rigurosas para garantizar su protección. Se cumple con todas las regulaciones y acuerdos de confidencialidad establecidos para asegurar que la información no sea divulgada ni utilizada de manera inapropiada. El compromiso de FINDETER es mantener la integridad y confidencialidad de la información en todo momento.

8. *Realizar los pagos al SISS (salud, pensión y riesgos laborales), de acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago correspondientes.*

En el presente periodo, se han realizado los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral (SISS), incluyendo Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de acuerdo con la normatividad vigente.

Además, se pueden proporcionar los soportes de pago correspondientes como parte del compromiso con la legalidad y el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales. Cumplir con los requerimientos del SISS es fundamental para asegurar el bienestar de los colaboradores y garantizar el cumplimiento de las regulaciones pertinentes, lideradas por el área de gestión respectiva y validadas por la revisoría fiscal, soportes que serán presentados en el momento en el que se requiera.

1.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

a. *Presentar ante EL MINISTERIO dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes Al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (inicio SECOP), el cronograma de ejecución del objeto del Contrato Interadministrativo.*

FINDETER presentó en el periodo pasado ante el Ministerio de Educación Nacional, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (inicio SECOP), el cronograma actualizado de ejecución del objeto del Contrato Interadministrativo. FINDETER reconoce la importancia de establecer un cronograma claro y detallado para la ejecución de las actividades contractuales, y se ha cumplido con este requisito de manera oportuna. La intención es garantizar una planificación efectiva y transparente de las actividades a llevar a cabo, en consonancia con las regulaciones y directrices establecidas por el Ministerio.

b. *Crear una vez suscrito y legalizado el Contrato Interadministrativo, una cuenta contable para manejo exclusivo de los recursos de este Contrato Interadministrativo dentro del Patrimonio Autónomo constituido para tal fin por FINDETER.*

Una vez suscrito y legalizado el Contrato Interadministrativo, FINDETER ha creado una cuenta contable exclusiva para el manejo de los recursos de este contrato dentro del Patrimonio Autónomo constituido por FINDETER para tal fin. Se da cumplimiento a todos los requisitos y medidas establecidas para asegurar la correcta gestión financiera de los recursos relacionados con el Contrato Interadministrativo. La creación de esta cuenta contable específica en el Patrimonio Autónomo garantiza una administración transparente y adecuada de los recursos, en línea con las normativas y regulaciones pertinentes.

Por lo anteriormente mencionado, se crea la Cuenta de Ahorros No. 500-80465045-0 del Banco Popular para manejo exclusivo de los recursos de este contrato y respectivos reportes contables. Cabe recordar que, se adjuntó al Informe de Gestión N° 1 la Certificación de la Cuenta Bancaria.

Mediante correo electrónico del 24 de octubre de 2023, el MEN remitió oficio por parte del Ministerio de Hacienda, mediante el cual se oficializó la exención de gravamen financiero (GMF) de la cuenta del Patrimonio Autónomo. El cual se adjuntó en informes pasados.

c. *Administrar los recursos que transfiera EL MINISTERIO a través del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres- FNGRD a FINDETER a través del Patrimonio Autónomo constituido para cumplir con el objeto del presente contrato.*

FINDETER ha administrado de manera responsable los recursos que EL MINISTERIO ha transferido a través del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) a FINDETER, utilizando

el PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN AULAS MÓVILES POR OLA INVERNAL constituido por la Fiducia Mercantil FIDUCIARIA POPULAR S.A. para cumplir con el objeto del presente contrato.

El enfoque ha sido garantizar una gestión eficiente y transparente de los recursos para cumplir con los objetivos establecidos en el contrato. El uso adecuado de estos recursos es esencial para asegurar la ejecución exitosa de las actividades y proyectos acordados, en línea con las regulaciones y directrices establecidas por todas las partes involucradas.

d. *Presentar Informes mensuales y un informe final de ejecución financiera y técnica del presente Contrato, conforme los recursos aportados por EL FNGRD,*

Para el presente periodo, se presentará un informe mensual de ejecución financiera por el área de Negocios Fiduciarios de FINDETER y se ha presentado un informe técnico del presente contrato, conforme a los recursos aportados por el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD).

Estos informes son una parte integral de la transparencia y rendición de cuentas en la ejecución del contrato. A través de estos informes, se ha proporcionado una visión detallada de la utilización de los recursos, los avances técnicos logrados y otros aspectos relevantes de la ejecución del contrato. Cumplir con la presentación de estos informes es esencial para mantener una comunicación clara y abierta con EL MINISTERIO y garantizar que todas las partes estén informadas sobre el progreso y los resultados del contrato.

e. *El Patrimonio Autónomo — FINDETER deberá reintegrar mensualmente los rendimientos financieros (si los hubiere) a la Dirección del Tesoro Nacional o en los términos que establezca la normatividad aplicable, es decir, que no ingresan ni hacen parte del Patrimonio Autónomo constituido por FINDETER.*

El Patrimonio Autónomo - FINDETER reintegrará mensualmente los rendimientos financieros a la Dirección del Tesoro Nacional o en los términos que establezca la normatividad aplicable. Estos rendimientos financieros no ingresan ni hacen parte del Patrimonio Autónomo constituido por FINDETER, y la gestión de reintegro se realizará previa solicitud al Ministerio con el fin de que se informe la cuenta bancaria a la cual se debe realizar el mismo.

Este proceso de reintegro asegura la correcta gestión de los rendimientos generados por los recursos aportados y garantiza que estos sean manejados de acuerdo con las regulaciones y normativas pertinentes. De esta manera, se cumple con los requerimientos legales y se mantiene la transparencia en la administración financiera.

Para lo anterior, el 28 de agosto de 2023 se informa por el MEN la cuenta bancaria para el reintegro de rendimientos financieros del Contrato No. CO1.PCCNTR.4917031 la cual se indica a continuación:

Entidad Financiera:	**Banco BBVA**
Tipo de Cuenta:	**Ahorros**
Número de Cuenta:	**309-054583**
Nombre de la cuenta:	**FIDUPREVISORA S.A FNGRD – COLOMBIA VITAL**

1.3 ACTIVIDADES PRECONTRACTUALES

1.3.1 Obligaciones:

a. *Realizar la viabilización técnica y jurídica de los predios priorizados por EL MINISTERIO, cuando sea necesario y sea solicitado por el MEN.*

Durante periodos pasados, se llevó a cabo la viabilización técnica y jurídica priorizada por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) cada vez que ha sido necesario y solicitado por el MEN. La colaboración en este aspecto es esencial para asegurar que los predios sean evaluados y viabilizados de manera adecuada para cumplir con los requisitos técnicos necesarios. El compromiso es facilitar un proceso fluido y eficiente para que los predios sean utilizados de acuerdo con los objetivos y necesidades de cada Institución Educativa, siempre en línea con las regulaciones y disposiciones vigentes.

En este periodo, ya está finalizada la evaluación técnica y predial y que en resumen se describe a continuación en las siguientes tablas:

RESUMEN EVALUACIÓN TÉCNICA DE SEDES

UNIFICACIÓN DE LISTADOS: INICIAL (150) + ADICIONALES (42)	
SEDES VIABLES TÉCNICAMENTE	**150**

RESUMEN EVALUACIÓN JURÍDICA DE SEDES

SEDES TOTAL (150)	
SIN DOCUMENTOS	1 *
POSIBLE VIABILIDAD	0 **
NO VIABLE	9
VIABLES TÉCNICA Y JURÍDICAMENTE	**140**
TOTAL	150

* Sin Documentos:

- Falta de documentos para evidenciar la propiedad y reciprocidad en la revisión y remisión de documentos por la ETC y/o rectores

** Posible Viabilidad:

- Falta documentación soporte para continuar con revisión
- Pendientes gestiones con terceros para saneamiento predial
- Trámites para obtención de sana posesión

Asimismo, en el presente periodo, el listado actualizado de sedes focalizadas son las siguientes:

Consecutivo	ID MEN No.	Departamento	ETC	Municipio	IE	SEDE
1	1	**Nariño**	PASTO	**Pasto**	I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE	I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - SEDE PRINCIPAL
2	2	**Córdoba**	CORDOBA	**Tuchín**	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ALVARO ULCUE CHOCUE	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ALVARO ULCUE CHOCUE
3	3	**Cauca**	CAUCA	**Bolívar**	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA NUESTRA SENORA DE LOS REMEDIOS	COLEGIO DEPARTAMENTAL NUESTRA SENORA DE LOS REMEDIOS

4	4	Cesar	VALLEDUPAR	Valledupar	INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ	IE ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ
5	6	Bolívar	BOLIVAR	Barranco de Loba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR	I.E.T.A. LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR - SEDE PRINCIPAL
6	7	Santander	SANTANDER	Vélez	COLEGIO UNIVERSITARIO	COLEGIO UNIVERSITARIO
7	8	Nariño	NARIÑO	El Rosario	CENTRO EDUCATIVO LA CLAUDIA	CENTRO EDUCATIVO LA CLAUDIA
8	9	Bolívar	BOLIVAR	Barranco de Loba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR	ATASCOZA
9	10	Bolívar	BOLIVAR	Barranco de Loba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR	LOS CERRITOS
10	11	Guajira	LA GUAJIRA	Manaure	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	ESCUELA RURAL INDÍGENA KARALOUTAMANA
11	12	Cauca	CAUCA	Toribío	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PLAYA	CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO LA PLAYA - SEDE PRINCIPAL
12	13	Magdalena	MAGDALENA	Concordia	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE BASICA Y MEDIA SANTA CRUZ DE BALSAMO	ERM DE BALSAMO
13	14	Magdalena	MAGDALENA	Concordia	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE BASICA Y MEDIA SANTA CRUZ DE BALSAMO	JAR INF MIS PRIMEROS SUEÑOS
14	16	Cauca	CAUCA	Santander de Quilichao	INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO	DOMINGUILLO (sede principal)
15	17	Santander	SANTANDER	Betulia	INSTITUCION EDUCATIVA EL RAMO	CENTRO EDUCATIVO SANTA BARBARA
16	18	Atlántico	SOLEDAD	Soledad	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE PRINCIPAL
17	20	Bolívar	BOLIVAR	Morales	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PALMA	LA ARCADIA
18	22	Cauca	CAUCA	El Tambo	I.E. HUISITO	HUISITO (sede principal)
19	24	Magdalena	MAGDALENA	El Banco	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ANTONIO NARIÑO	CENT EDUC RUR MIX JOSE DE LA PAZ VANEGA ORTIZ
20	26	Huila	HUILA	Acevedo	INSTITUCION EDUCATIVA BATEAS	BATEAS
21	27	Cauca	CAUCA	Piamonte	CENTRO EDUCATIVO PUERTO GUAYUYACO	ESCUELA RURAL MIXTA LA ESPANOLA
22	28	Córdoba	CORDOBA	Cotorra	INSTITUCION EDUCATIVA LOS AGUACATES	CENT EDUC LOS AGUACATES
23	29	Bolívar	BOLIVAR	Mompós	INSTITUCIÒN EDUCATIVA TÈCNICA AMBIENTAL DE TIERRA FIRME	I.E.T.A. AMBIENTAL DE TIERRA FIRME - SEDE PRINCIPAL
24	30	Cesar	CESAR	Curumaní	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES
25	32	Magdalena	MAGDALENA	El Banco	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL SILVIA COTES DE BISWELL	ERM SANTA TERESA DE ISLITA
27	34	Guajira	RIOHACHA	Riohacha	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA #7	APÜNIMA´ANA1
28	36	Nariño	NARIÑO	Cumbal	INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCION DE TALLAMBI	INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCION DE TALLAMBI
29	41	Putumayo	PUTUMAYO	Puerto Asís	I. E. RUR CAUCACIA	ESC RUR MIX EL JARDIN ALTO TETEYE
30	42	Antioquia	ANTIOQUIA	Ciudad Bolívar	I. E. JOSE MARIA HERRAN	C. E. R. PAULINA PUERTA
31	43	Bolívar	BOLIVAR	San Martín de Loba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA PESQUERA LEONIDAS ORTIZ ALVEAR DE CHIMÍ	PLAN BONITO
32	44	Cauca	CAUCA	La Vega	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA SANTA RITA	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA RITA (sede principal)
33	45	Cesar	CESAR	La Paz(Robles)	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA CAÑO PADILLA YUKPA	SEDE EL COSO
34	46	Cauca	CAUCA	Balboa	C.E. BUENOS AIRES	CAPITANES
35	48	Cesar	VALLEDUPAR	Valledupar	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ	INSTITUTO TECNICO COMERCIAL JOSE EUGENIO MARTINEZ
36	49	Bolívar	BOLIVAR	Mompós	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DEL CHICAGUA	SAN LUIS
37	50	Guajira	MAICAO	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2	SEDE LA CAMPANA
38	51	Guajira	MAICAO	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6	YAMAIN - SEDE PRINCIPAL
39	53	Guajira	MAICAO	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2	SEDE KASICHE
40	54	Guajira	MAICAO	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2	SEDE WAYUUMA ANA
41	56	Arauca	ARAUCA	Saravena	CENTRO EDUCATIVO LA PAVA.	LA PAVA

42	57	Putumayo	PUTUMAYO	Puerto Asís	I. E. RUR CAUCACIA	ESC RUR MIX EL PROGRESO
43	58	Cauca	CAUCA	Bolívar	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO NUESTRA SENORA DEL CARMEN	CORRAL VIEJO
44	59	Cauca	CAUCA	Bolívar	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO NUESTRA SENORA DEL CARMEN	NUESTRA SENORA DEL CARMEN (sede principal)
45	60	Guajira	RIOHACHA	Riohacha	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN	COOPERATIVO
46	62	Valle del Cauca	BUGA	Guadalajara de Buga	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	JHON F. KENNEDY
47	64	Atlántico	ATLANTICO	Galapa	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA
48	65	Cauca	CAUCA	Balboa	I.E. OLAYA (ANTES C.E. OLAYA)	OLAYA (sede principal)
49	66	Antioquia	APARTADO	Apartadó	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS
50	67	Tolima	TOLIMA	Santa Isabel	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BOLIVAR	LA HUMAREDA
51	69	Córdoba	CORDOBA	Planeta Rica	INSTITUCION EDUCATIVA LOMA AZUL	LOS CERROS
52	70	Córdoba	CORDOBA	Puerto Libertador	INSTITUCION EDUCATIVA PICA PICA VIEJO	ESC NVA LA SOLITA
53	73	Bolívar	BOLIVAR	Córdoba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE TACAMOCHO	NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE TACAMOCHITO
54	74	Cesar	CESAR	El Paso	INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE LA ESPERANZA
55	75	Cesar	CESAR	El Paso	INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE EL VALLITO
56	77	Cesar	CESAR	El Paso	INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE SAN ANGEL
57	79	Cesar	CESAR	El Paso	INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE LA ESTACION
58	83	Atlántico	ATLANTICO	Repelón	INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS	INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS - SEDE PRINCIPAL
59	84	Atlántico	ATLANTICO	Repelón	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE VILLA ROSA	SEDE LA LOMA
60	85	Valle del Cauca	BUGA	Guadalajara de Buga	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	LA PLANTA
61	86	Antioquia	APARTADO	Apartadó	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO
62	87	Nariño	NARIÑO	BARBACOAS	INSTITUCION EDCUATIVA TERAIMBE	SEDE 9 CUMAINDE
63	88	Putumayo	PUTUMAYO	Puerto Leguízamo	IE RUR LUIS VIDALES DEL PIÑUÑA NEGRO	ESC RUR MIX PUERTO PRINCIPE DOS
64	90	Cauca	CAUCA	Bolívar	CENTRO EDUCATIVO EL TAMBO	LA FUENTE
65	92	Atlántico	ATLANTICO	Repelón	INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS	PITA
66	93	Cauca	CAUCA	Bolívar	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CARMEN	EL CARMEN (sede principal)
67	94	Chocó	CHOCO	Carmen del Darién	CE PUEBLO NUEVO	CE PUEBLO NUEVO - SEDE PRINCIPAL
68	95	Guajira	RIOHACHA	Riohacha	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN	JOSE ANTONIO GALAN
69	96	Meta	VILLAVICENCIO	Villavicencio	INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO FRANCISCO ARANGO	ESCUELA SIETE DE AGOSTO
70	97	Cesar	CESAR	Curumaní	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	SEDE CHINELA
71	98	Cesar	CESAR	Curumaní	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	SEDE GUAIMARAL
72	100	Tolima	TOLIMA	Santa Isabel	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BOLIVAR	EL BRASIL
73	101	Cesar	CESAR	Curumaní	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	SEDE LOS SERRENOS
74	103	Córdoba	CORDOBA	Ayapel	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO	ESC NVA PARCELAS LONDRES
75	104	Cundinamarca	CUNDINAMARCA	Anolaima	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE HUGO ENCISO	ESCUELA RURAL EL DESCANSO
76	105	Chocó	CHOCO	Bahía Solano (Mutis)	IE LUIS LOPEZ DE MESA	SEDE DE SAN JOSE (HUACA)
77	106	Chocó	CHOCO	Bahía Solano (Mutis)	IE LUIS LOPEZ DE MESA	SEDE SIRENA DEL MAR
78	107	Chocó	CHOCO	Bahía Solano (Mutis)	IE LUIS LOPEZ DE MESA	SEDE SECUNDINO RIVAS
79	110	Nariño	NARIÑO	BARBACOAS	INSTITUCION EDUCATIVA TERAIMBE	SEDE 2 BOMBÓN

80	111	Magdalena	MAGDALENA	Pueblo viejo	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS	ERM ISLA DE CATAQUITA
81	112	Magdalena	MAGDALENA	El Retén	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE	COL MPAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE
82	113	Magdalena	MAGDALENA	San Sebastián de Buenavista	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA	ERM MARIA AUXILIADORA
83	114	Magdalena	MAGDALENA	San Sebastián de Buenavista	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA	ERM LA PACHA
84	117	Guajira	RIOHACHA	Riohacha	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA #7	WAKUAPAMANA
85	118	Antioquia	APARTADO	Apartadó	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO
86	119	Córdoba	CORDOBA	Montelíbano	INSTITUCION EDUCATIVA EL PALMAR	INSTITUCION EDUCATIVA EL PALMAR SEDE PRINCIPAL
87	121	Cauca	CAUCA	Piamonte	CENTRO EDUCATIVO PUERTO GUAYUYACO	ESC RUR MIX SAN ANDRESITO
88	122	Antioquia	TURBO	Turbo	I.E. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	E.U. JESUS MORA
89	123	Bolívar	BOLIVAR	Simití	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CERRO DE VERACRUZ	CAMPO PAYARES
90	124	Bolívar	BOLIVAR	Simití	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CERRO DE VERACRUZ	I.E. DEL CERRO DE VERACRUZ - SEDE PRINCIPAL
91	125	Cauca	CAUCA	Piamonte	INST EDUC AGRIC PIAMONTE	PIAMONTE (sede principal)
92	126	Magdalena	MAGDALENA	Pueblo viejo	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS	ERM EL TRIUNFO
93	127	Putumayo	PUTUMAYO	Orito	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL UMADA WUARRARA	ESC RUR MIX ALTO ORITO
94	128	Valle del Cauca	BUGA	Guadalajara de Buga	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE - SEDE PRINCIPAL
95	129	Valle del Cauca	BUGA	Guadalajara de Buga	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	JULIAN MENDOZA GUERRERO
96	130	Valle del Cauca	BUGA	Guadalajara de Buga	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	LA HONDA
97	132	Norte de Santander	NORTE SANTANDER	La Playa	CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN PEDRO	SEDE LA PEÑA
98	133	Magdalena	MAGDALENA	El Banco	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL OSCAR PISCIOTTI NUMA	ERM INMACULADA CONCEPCION
99	134	Bolívar	BOLIVAR	María la Baja	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA	BUENOS AIRES
100	135	Bolívar	BOLIVAR	María la Baja	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA	I.E.T. AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA
102	138	Arauca	ARAUCA	Arauca	CENTRO EDUCATIVO MONSERRATE	CEAR MONSERRATE
104	142	Nariño	IPIALES	Ipiales	INSTITUCION EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL LOS PASTOS	ESCUELA LAS CRUCES
105	143	Guajira	LA GUAJIRA	Barrancas	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL PROVINCIAL	CENTRO ETNOEDUCATIVO PROVINCIAL
106	144	Atlántico	SOLEDAD	Soledad	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE
107	146	Cesar	CESAR	Chimichagua	CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO	SEDE TRONCONAL
108	147	Cesar	CESAR	Chimichagua	CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO	SEDE PUERTO LA ESTANCIA
109	148	Cesar	CESAR	Chimichagua	CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO	SEDE TORRECILLA
110	149	Nariño	NARIÑO	Mallama (Piedrancha)	CENTRO EDUCATIVO MALLAMA	CENTRO EDUCATIVO DE MALLAMA
111	150	Chocó	CHOCO	Tadó	IE TECNICO AGROAMBIENTAL - MARIA AUXILIADORA	SEDE MARÍA AUXILIADORA DE MANUNGARA
112	151	Guajira	LA GUAJIRA	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2	SEDE LA ESTRELLA
113	152	Guajira	MAICAO	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6	YAMAIN - KASPOLIMANA
114	153	Guajira	LA GUAJIRA	Maicao	ESCUELA RURAL MIXTA TALOULUMA'ANA	ESCUELA RURAL MIXTA TALOULUMA'ANA
115	154	Magdalena	CIENAGA	Ciénaga	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO
116	156	Magdalena	MAGDALENA	El Retén	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE	SEDE CONC.ESC GENERAL GREGORIO GARZON
117	158	Valle del Cauca	BUGA	Guadalajara de Buga	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	SEDE CRISTOBAL COLON

118	161	Antioquia	APARTADO	Apartadó	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL GUINEO	CENTRO EDUCATIVO RURAL EL OSITO
119	163	Cauca	CAUCA	La Vega	I.E AGROPECUARIA SAN FRANCISCO JAVIER SEDE GARAY	I.E AGROPECUARIA SAN FRANCISCO JAVIER SEDE GARAY
120	164	Cauca	CAUCA	Santander de Quilichao	IE DOMINGUILLO	SEDE DOMINGO LASSO
121	165	Cauca	CAUCA	Popayán	IE COMUNEROS	Sede Principal
122	172	Putumayo	PUTUMAYO	Puerto Asís	E. RUR CAUCACIA - SEDE PRINCIPAL	Sede Principal
123	173	Cauca	CAUCA	Piamonte	ESC RUR MIX FRAY EZEQUIEL	ESC RUR MIX FRAY EZEQUIEL
124	174	Cauca	CAUCA	Piamonte	E.D.R PORTO GUAYUYACO SEDE PRINCIPAL	E.D.R PORTO GUAYUYACO SEDE PRINCIPAL
125	175	Cauca	CAUCA	Rosas	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA	SANTA TERESITA (sede principal)
126	178	Cauca	CAUCA	Rosas	INSTITUCION EDUCATIVA MADRE CARIDAD BRADER	MADRE CARIDAD BRADER (sede principal)
127	182	Cauca	CAUCA	Rosas	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO CORDOBA	LAS YERBAS
128	183	Cauca	CAUCA	Rosas	CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO LEON VALENCIA	LA DESPENSA
129	184	Cauca	CAUCA	Rosas	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO CORDOBA	EL RETIRO
130	186	Cauca	CAUCA	Rosas	CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO LEON VALENCIA	EL ALTILLO
131	187	Cauca	CAUCA	Rosas	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO CORDOBA	BELLAVISTA
132	188	Cauca	CAUCA	Suarez	IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA	Sede Principal
133	189	Cauca	CAUCA	Suarez	IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA	SEDE MARIA INMACULADA
134	190	Cauca	CAUCA	Suarez	IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA	SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
135	192	Atlántico	SOLEDAD	Soledad	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE CABICA
136	194	Bolívar	Bolívar	Maria la Baja	INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA AGROINDUSTRIAL DE FLAMENCO	EL NISPERO
137	196	Atlántico	Atlántico	Malambo	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MESOLANDIA	Sede Principal
138	202	Chocó	CHOCO	Tadó	IE NORMAL SUPERIOR DEMETRIO SALAZAR CASTILLO	CENTRO EDUCATIVO ESCUELA FRANCISCO MIRANDA
139	203	Antioquia	TURBO	Turbo	IE SAN MARTIN DE PORRES	SEDE GONZALO MEJIA

En este periodo es importante resaltar que, bajo este listado de sedes focalizadas para intervención técnica, ya se adelantó la verificación predial, la cual da como resultado 136 sedes a intervenir.

Sedes despriorizar técnicamente: se tuvo que despriorizar las siguientes 9 instituciones educativas de los siguientes grupos:

GRUPO	ID MEN	Departamento	ETC	Municipio	IE	SEDE	OBERVACIONES
1	55	Chocó	CHOCO	Tadó	IE TECNICO AGROAMBIENTAL	SEDE CAMPO ALEGRE	En un principio, la sede priorizada en el municipio de Tadó era la sede la sede Campo Alegre. Esta perteneciente a la IE Técnico Agroambiental, la cual actualmente cuenta con una matrícula según el Sistema Integrado de Matricula -Simat de 40 estudiantes; no obstante, en la etapa de viabilidad técnica y jurídica adelantada por el contratista designado por Findeter determinó que esta sede presentaba limitaciones técnicas, normativas y

							administrativas por estar en zona de riesgo por inundación, por lo que se recomendó no efectuar intervención alguna.
	120	Antioquia	**TURBO**	Turbo	**I.E. DE DESARROLLO RURAL DE TURBO**	E.U. SANTISIMA TRINIDAD	Se tramito la exclusión del anexo "Listado de Instituciones Educativas Priorizadas por el MEN" a la sede IE. DE DESARROLLO RURAL DE TURBO EU SANTÍSIMA TRINIDAD., reemplazándola por la SEDE GONZALO MEJIA perteneciente a la IE. SAN MARTIN DE PORRES, ubicada en el municipio de Turbo, Antioquia en el marco del contrato de obra No. PAF-MENAM-O-049-2023 y contrato de interventoría No. PAF-MENAM-I-052-2023 Frente a lo anterior, es importante indicar en el presente concepto que, la solicitud se realiza enmarcada en el lineamiento dado por el Ministerio de Educación Nacional – MEN en Comité Técnico No. 30 No. CO1.PCCNTR.4917031 DE 2023 PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN AULAS MÓVILES POR OLA INVERNAL, de fecha 24 de enero de 2024
2	**91**	Atlántico	**ATLANTICO**	Palmar de Varela	**INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL DE PALMAR DE VARELA**	JOSE MARIA CORDOBA	Esta institución Educativa se tuvo que despriorizar porque ya estaba intervenida por la gobernación de Atlántico
	191	Atlántico	**ATLANTICO**	Luruaco	**IE CORREGIMIENTO DE SAN JUAN DE TOCAGUA**	CORREGIMIENTO DE SAN JUAN DE TOCAGUA	Se despriorizo esta institución educativa, debido a que el MEN define que esta IE seria intervenida por el FFIE
4	**71**	Bolívar	**BOLIVAR**	Córdoba	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE TACAMOCHO**	TACAMOCHO (SEDE PRIMARIA)	Esta sede tuvo que ser despriorizada, debido a que en el año 2015 ante esta situación la Corporación autónoma ambiental Cormagdalena, mediante Contrato Interadministrativo 0-0019 de 2015 suscrito con la Universidad Nacional de Colombia, elabora un estudio del cual se destaca la siguiente consideración general: "A partir de este análisis se puede considerar que Tocomocho se encuentra ubicado, prácticamente en la

							mitad del río, bajo la amenaza de inundaciones y procesos erosivos que se pueden activar en cualquier época".
	139	Magdalena	**MAGDALENA**	San Sebastián de Buenavista	**INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE TRONCOSO**	ERM DE JAIME	Esta sede tuvo que ser despriorizada, conforme a una recopilación de datos realizada por el contratista, JASA LTDA propone tener en cuenta que la ERM Jaime requiere una altura de palafito de 1,7 m, lo cual genera la construcción de acceso al aula, definida en el alcance contractual, de una infraestructura que debe contemplar el ingreso a toda la institución, siendo necesario la construcción de toda la sede con el fin de poder hacer funcional su ingreso. La interventoría, CONSORCIO INTER EDUCATIVO G4 considera que no se deben realizar obras de infraestructura de mejoramiento y/o construcción, debido a lo planteado por el contratista y a que los mejoramientos no tendrían estabilidad por efectos de los daños que ocasionará la inundación y la construcción debe ser de toda la institución con palafitos de 1,70 m, lo cual supera el alcance contractual.
9	**33**	Capital Bogotá, D.C	BOGOTA	Bogotá, D.C.	**COLEGIO LA CHUCUA (IED)**	CENT EDUC DIST LA CHUCUA	Sede retirada mediante comité técnico No. 70 y comité fiduciario No. 45.
	136	Capital Bogotá, D.C.	BOGOTA	Bogotá, D.C.	**COLEGIO ESTRELLA DEL SUR (IED)**	COL DIST ESTRELLA DEL SUR	Sede retirada mediante comité técnico No. 70 y comité fiduciario No. 45.
	141	Santander	BARRANCABERMEJA	Barrancabermeja	**CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN**	CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN	Sede retirada mediante comité técnico No. 70 y comité fiduciario No. 45.

De acuerdo con lo anterior se hace la inclusión de las siguientes 4 sedes educativas para tener un resultado total de intervención de 136 sedes educativas:

ID MEN	Departamento	ETC	Municipio	IE	SEDE
202	Chocó	CHOCO	Tadó	IE NORMAL SUPERIOR DEMETRIO SALAZAR CASTILLO	CENTRO EDUCATIVO ESCUELA FRANCISCO MIRANDA
203	Antioquia	TURBO	Turbo	IE SAN MARTIN DE PORRES	SEDE GONZALO MEJIA
196	Atlántico	Atlántico	Malambo	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MESOLANDIA	Sede Principal
194	Bolívar	Bolívar	Maria la Baja	INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA AGROINDUSTRIAL DE FLAMENCO	EL NISPERO

La viabilización jurídica de los predios priorizados por el Ministerio se realiza de manera eficiente, siempre que sea necesario y solicitado por el Ministerio de Educación Nacional (MEN). Es un paso fundamental para garantizar el adecuado desarrollo de proyectos educativos y el cumplimiento de los objetivos establecidos por el MEN, de acuerdo con lo anterior, en este periodo quedo la verificación predial y técnica así:

SEDES TOTAL INICIAL (150)	
SIN DOCUMENTOS	1 *
POSIBLE VIABILIDAD	0 **
NO VIABLE	9
VIABLES TÉCNICA Y JURÍDICAMENTE	**140**
TOTAL	150

SEDES NUEVAS A PRIORIZAR (9)	
POSIBLE VIABILIDAD	1 *
VIABLES JURÍDICAMENTE	8
TOTAL	9

SEDES PRIORIZACIÓN ACTUALIZADA (136)	
SEDES INICIALMENTE PRIORIZADAS	141
SEDES DESPRIORIZADAS	9
SEDES NUEVAS INCLUIDAS	4
TOTAL	**136**

b. *En consideración a que los proyectos a atender por este contrato se ejecutaran en el marco del Decreto de Emergencia, FINDETER debe acudir a lo establecido en su manual de contratación que permita que los procesos de selección sean eficientes y puedan ser proyectos de respuesta rápida.*

FINDETER implementa en el marco de lo establecido en el Manual Operativo la contratación que permita la ejecución eficiente de los procesos de selección que permita pluralidad de oferentes, asimismo, durante el proceso de ejecución, se ha establecido en la estructuración, la necesidad de optimizar tiempos de respuesta rápidos con sistemas constructivos industrializados.

c. *Elaborar los Estudios Previos e insumos precontractuales para la contratación de las obras y suministros necesarios para atender las necesidades prioritarias en infraestructura y dotación de mobiliario escolar de las sedes educativas afectadas por la temporada de lluvias que sean definidas por el Ministerio de Educación. Así como las interventorías correspondientes, solicitando que se*

acaten los principios que rigen la contratación pública, incluyendo la solicitud de las respectivas garantías que ampare cada contrato con siguientes riesgos: anticipo (si lo hubiere), calidad, cumplimiento, estabilidad de la obra, salarios y prestaciones sociales, responsabilidad civil extracontractual y todo riesgo de construcción, según sea aplicable.

Proyectos en proceso de estructuración

Se han elaborado los Estudios Previos e insumos precontractuales necesarios para la contratación de obras y suministros dirigidos a atender las necesidades prioritarias en infraestructura y dotación de mobiliario escolar en las sedes educativas afectadas por la temporada de lluvias, para apertura de las diferentes convocatorias, tal como ha sido definido por el Ministerio de Educación. Estos estudios y documentos precontractuales son esenciales para establecer las bases de las futuras contrataciones y asegurar la correcta ejecución de los proyectos.

Además, se ha solicitado que, en la contratación de las obras y suministros, así como en las interventorías correspondientes, se respeten los principios que rigen la contratación pública. Esto garantiza la transparencia, la igualdad de oportunidades y la eficiencia en los procesos de contratación.

Asimismo, se ha requerido la inclusión de las garantías correspondientes para amparar los diferentes riesgos asociados a cada contrato. Estas garantías incluyen aspectos como el anticipo, la calidad de la obra, el cumplimiento de los plazos, la estabilidad de la construcción, los salarios y prestaciones sociales de los trabajadores, la responsabilidad civil extracontractual y los posibles riesgos de construcción. Esto proporciona seguridad tanto para la entidad contratante como para los contratistas y contribuye a la adecuada ejecución de los proyectos en línea con las normativas y estándares requeridos.

En el presente periodo se establece definitivamente la estructuración y la contratación de los grupos de contratación de acuerdo con el siguiente listado:

GRUPO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ID MEN No.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	VR. TOTAL AULAS Y MEJORAMIENTO	VR. INTERVENTORÍA	VR. TOTAL OBRA + INTERVENTORÍA
1	Antioquia	Apartadó	66	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS	624.000.000	46.800.000	670.800.000
			86	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO	291.200.000	21.840.000	313.040.000
			118	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO	661.678.027	49.625.852	711.303.879
			161	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL GUINEO	CENTRO EDUCATIVO RURAL EL OSITO	403.329.013	30.249.676	433.578.689
		Turbo	120	I.E. DE DESARROLLO RURAL DE TURBO	E.U. SANTISIMA TRINIDAD	312.000.000	23.400.000	335.400.000
			122	I.E. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	E.U. JESUS MORA	499.200.000	37.440.000	536.640.000
		Ciudad Bolívar	42	I. E. JOSE MARIA HERRAN	C. E. R. PAULINA PUERTA	124.800.000	9.360.000	134.160.000
	Chocó	Carmen del Darién	94	CE PUEBLO NUEVO	CE PUEBLO NUEVO - SEDE PRINCIPAL	522.668.285	39.200.121	561.868.406
		Tadó	55	IE TECNICO AGROAMBIENTAL	SEDE CAMPO ALEGRE	266.693.962	20.002.047	286.696.010
			150	IE TECNICO AGROAMBIENTAL	SEDE MARÍA AUXILIADORA DE MANUNGARA	124.800.000	9.360.000	134.160.000
2	Atlántico	Galapa	64	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA	624.000.000	46.800.000	670.800.000

GRUPO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ID MEN No.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	VR. TOTAL AULAS Y MEJORAMIENTO	VR. INTERVENTORÍA	VR. TOTAL OBRA + INTERVENTORÍA
		Palmar de Varela	91	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL DE PALMAR DE VARELA	JOSE MARIA CORDOBA	561.600.000	42.120.000	603.720.000
		Repelón	83	INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS	INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS - SEDE PRINCIPAL	332.800.000	24.960.000	357.760.000
			84	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE VILLA ROSA	SEDE LA LOMA	229.439.280	17.207.946	246.647.226
			92	INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS	PITA	220.727.086	16.554.531	237.281.617
		Soledad	18	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE PRINCIPAL	665.600.000	49.920.000	715.520.000
			144	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE	915.200.000	68.640.000	983.840.000
			192	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE CABICA	372.384.464	27.928.835	400.313.298
		Luruaco	191	IE CORREGIMIENTO DE SAN JUAN DE TOCAGUA	CORREGIMIENTO DE SAN JUAN DE TOCAGUA	249.600.000	18.720.000	268.320.000
3	Magdalena	Ciénaga	154	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO	1.414.400.000	106.080.000	1.520.480.000
		El Retén	112	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE	COL MPAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE	2.801.018.341	210.076.376	3.011.094.717
			156	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE	SEDE CONC.ESC GENERAL GREGORIO GARZON	436.800.000	32.760.000	469.560.000
		Puebloviejo	111	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS	ERM ISLA DE CATAQUITA	83.200.000	6.240.000	89.440.000
			126	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS	ERM EL TRIUNFO	166.400.000	12.480.000	178.880.000
4	Bolívar	Córdoba	71	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE TACAMOCHO	TACAMOCHO (SEDE PRIMARIA)	447.519.640	33.563.973	481.083.613
			73	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE TACAMOCHO	NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE TACAMOCHITO	493.484.507	37.011.338	530.495.845
		Mompós	29	INSTITUCIÒN EDUCATIVA TÈCNICA AMBIENTAL DE TIERRA FIRME	I.E.T.A. AMBIENTAL DE TIERRA FIRME - SEDE PRINCIPAL	1.125.688.392	84.426.629	1.210.115.022
			49	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DEL CHICAGUA	SAN LUIS	340.577.024	25.543.277	366.120.301
	Magdalena	San Sebastián de Buenavista	113	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA	ERM MARIA AUXILIADORA	488.073.254	36.605.494	524.678.748
			114	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA	ERM LA PACHA	623.194.392	46.739.579	669.933.972
			139	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE TRONCOSO	ERM DE JAIME	161.669.820	12.125.237	173.795.057
5	Bolívar	Barranco de Loba	6	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR	I.E.T.A. LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR - SEDE PRINCIPAL	468.319.640	35.123.973	503.443.613
			9	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR	ATASCOZA	364.668.644	27.350.148	392.018.792
			10	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR	LOS CERRITOS	296.559.820	22.241.987	318.801.807
		San Martín de Loba	43	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA PESQUERA LEONIDAS ORTIZ ALVEAR DE CHIMÍ	PLAN BONITO	233.285.404	17.496.405	250.781.809
	Cesar	Chimichagua	146	CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO	SEDE TRONCONAL	133.346.981	10.001.024	143.348.005
			147	CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO	SEDE PUERTO LA ESTANCIA	130.159.820	9.761.987	139.921.807
			148	CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO	SEDE TORRECILLA	124.800.000	9.360.000	134.160.000

GRUPO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ID MEN No.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	VR. TOTAL AULAS Y MEJORAMIENTO	VR. INTERVENTORÍA	VR. TOTAL OBRA + INTERVENTORÍA
		Curumaní	30	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	603.200.000	45.240.000	648.440.000
			97	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	SEDE CHINELA	83.200.000	6.240.000	89.440.000
			98	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	SEDE GUAIMARAL	124.800.000	9.360.000	134.160.000
			101	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	SEDE LOS SERRENOS	83.200.000	6.240.000	89.440.000
	Magdalena	Concordia	13	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE BASICA Y MEDIA SANTA CRUZ DE BALSAMO	ERM DE BALSAMO	485.009.460	36.375.710	521.385.170
			14	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE BASICA Y MEDIA SANTA CRUZ DE BALSAMO	JAR INF MIS PRIMEROS SUEÑOS	161.669.820	12.125.237	173.795.057
		El Banco	24	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ANTONIO NARIÑO	CENT EDUC RUR MIX JOSE DE LA PAZ VANEGA ORTIZ	546.091.802	40.956.885	587.048.688
			32	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL SILVIA COTES DE BISWELL	ERM SANTA TERESA DE ISLITA	244.487.366	18.336.552	262.823.918
			133	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL OSCAR PISCIOTTI NUMA	ERM INMACULADA CONCEPCION	192.455.361	14.434.152	206.889.513
6	Cesar	El Paso	74	INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE LA ESPERANZA	291.200.000	21.840.000	313.040.000
			75	INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE EL VALLITO	145.600.000	10.920.000	156.520.000
			77	INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE SAN ANGEL	65.079.910	4.880.993	69.960.903
			79	INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE LA ESTACION	132.643.683	9.948.276	142.591.959
		La Paz (Robles)	45	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA CAÑO PADILLA YUKPA	SEDE EL COSO	150.447.043	11.283.528	161.730.571
		Valledupar	4	INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ	IE ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ	457.600.000	34.320.000	491.920.000
			48	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ	INSTITUTO TECNICO COMERCIAL JOSE EUGENIO MARTINEZ	956.800.000	71.760.000	1.028.560.000
7	Guajira	Barrancas	143	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL PROVINCIAL	CENTRO ETNOEDUCATIVO PROVINCIAL	249.600.000	18.720.000	268.320.000
		Maicao	50	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2	SEDE LA CAMPANA	499.200.000	37.440.000	536.640.000
			51	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6	YAMAIN - SEDE PRINCIPAL	62.400.000	4.680.000	67.080.000
			53	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2	SEDE KASICHE	339.830.481	25.487.286	365.317.767
			54	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2	SEDE WAYUUMA ANA	127.479.910	9.560.993	137.040.903
			151	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2	SEDE LA ESTRELLA	314.679.910	23.600.993	338.280.903
			152	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6	YAMAIN - KASPOLIMANA	252.966.903	18.972.518	271.939.421
			153	ESCUELA RURAL MIXTA TALOULUMA'ANA	ESCUELA RURAL MIXTA TALOULUMA'ANA	857.226.526	64.291.989	921.518.516
		Manaure	11	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	ESCUELA RURAL INDÍGENA KARALOUTAMANA	190.566.903	14.292.518	204.859.421
		Riohacha	34	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA #7	APÜNIMA´ANA1	252.279.910	18.920.993	271.200.903
			60	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN	COOPERATIVO	416.000.000	31.200.000	447.200.000
			95	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN	JOSE ANTONIO GALAN	374.400.000	28.080.000	402.480.000
			117	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA #7	WAKUAPAMANA	224.079.460	16.805.960	240.885.420
8	Bolívar	María la Baja	134	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA	BUENOS AIRES	249.600.000	18.720.000	268.320.000
			135	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA	I.E.T. AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA	1.800.127.638	135.009.573	1.935.137.211

GRUPO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ID MEN No.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	VR. TOTAL AULAS Y MEJORAMIENTO	VR. INTERVENTORÍA	VR. TOTAL OBRA + INTERVENTORÍA
	Córdoba	Ayapel	103	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO	ESC NVA PARCELAS LONDRES	220.984.367	16.573.828	237.558.194
		Cotorra	28	INSTITUCION EDUCATIVA LOS AGUACATES	CENT EDUC LOS AGUACATES	124.800.000	9.360.000	134.160.000
		Montelíbano	119	INSTITUCION EDUCATIVA EL PALMAR	ESCUELA NUEVA MIXTA DIVINO SALVADOR	745.087.893	55.881.592	800.969.485
		Planeta Rica	69	INSTITUCION EDUCATIVA LOMA AZUL	LOS CERROS	430.464.507	32.284.838	462.749.345
		Puerto Libertador	70	INSTITUCION EDUCATIVA PICA PICA VIEJO	ESC NVA LA SOLITA	254.085.404	19.056.405	273.141.809
		Tuchín	2	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ALVARO ULCUE CHOCUE	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ALVARO ULCUE CHOCUE	1.074.838.830	80.612.912	1.155.451.742
9	Arauca	Arauca	138	CENTRO EDUCATIVO MONSERRATE	CEAR MONSERRATE	299.239.730	22.442.980	321.682.710
		Saravena	56	CENTRO EDUCATIVO LA PAVA.	LA PAVA	83.200.000	6.240.000	89.440.000
	Bolívar	Morales	20	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PALMA	LA ARCADIA	83.200.000	6.240.000	89.440.000
		Simití	123	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CERRO DE VERACRUZ	CAMPO PAYARES	232.352.784	17.426.459	249.779.243
			124	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CERRO DE VERACRUZ	I.E. DEL CERRO DE VERACRUZ - SEDE PRINCIPAL	595.799.550	44.684.966	640.484.516
	Capital Bogotá, D.C.	Bogotá, D.C.	33	COLEGIO LA CHUCUA (IED)	CENT EDUC DIST LA CHUCUA	332.800.000	24.960.000	357.760.000
			136	COLEGIO ESTRELLA DEL SUR (IED)	COL DIST ESTRELLA DEL SUR	166.400.000	12.480.000	178.880.000
	Cundinamarca	Anolaima	104	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE HUGO ENCISO	ESCUELA RURAL EL DESCANSO	190.313.503	14.273.513	204.587.016
	Meta	Villavicencio	96	INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO FRANCISCO ARANGO	ESCUELA SIETE DE AGOSTO	924.437.134	69.332.785	993.769.919
	Norte de Santander	La Playa	132	CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN PEDRO	SEDE LA PEÑA	41.600.000	3.120.000	44.720.000
	Santander	Barrancabermeja	141	CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN	CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN	494.421.269	37.081.595	531.502.864
		Betulia	17	INSTITUCION EDUCATIVA EL RAMO	CENTRO EDUCATIVO SANTA BARBARA	62.400.000	4.680.000	67.080.000
		Vélez	7	COLEGIO UNIVERSITARIO	COLEGIO UNIVERSITARIO	926.718.332	69.503.875	996.222.206
	Tolima	Santa Isabel	67	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BOLIVAR	LA HUMAREDA	188.797.003	14.159.775	202.956.778
			100	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BOLIVAR	EL BRASIL	188.797.003	14.159.775	202.956.778
10	Cauca	Santander de Quilichao	16	INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO	DOMINGUILLO (sede principal)	1.235.282.193	92.646.164	1.327.928.358
			164	IE DOMINGUILLO	SEDE DOMINGO LASSO	124.800.000	9.360.000	134.160.000
		Suarez	188	IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA	SEDE PRINCIPAL	790.400.000	59.280.000	849.680.000
			189	IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA	SEDE MARIA INMACULADA	1.225.093.375	91.882.003	1.316.975.378
			190	IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA	SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	374.400.000	28.080.000	402.480.000
		Toribío	12	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PLAYA	CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO LA PLAYA - SEDE PRINCIPAL	338.159.820	25.361.987	363.521.807
	Chocó	Bahía Solano (Mutis)	105	IE LUIS LOPEZ DE MESA	SEDE DE SAN JOSE (HUACA)	148.792.381	11.159.429	159.951.810
			106	IE LUIS LOPEZ DE MESA	SEDE SIRENA DEL MAR	41.600.000	3.120.000	44.720.000
			107	IE LUIS LOPEZ DE MESA	SEDE SECUNDINO RIVAS	291.200.000	21.840.000	313.040.000
	Valle del Cauca	Guadalajara de Buga	62	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	JHON F. KENNEDY	540.800.000	40.560.000	581.360.000
			85	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	LA PLANTA	204.237.183	15.317.789	219.554.972
			128	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE - SEDE PRINCIPAL	166.400.000	12.480.000	178.880.000
			129	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	JULIAN MENDOZA GUERRERO	208.000.000	15.600.000	223.600.000

GRUPO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ID MEN No.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	VR. TOTAL AULAS Y MEJORAMIENTO	VR. INTERVENTORÍA	VR. TOTAL OBRA + INTERVENTORÍA
			130	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	LA HONDA	164.153.683	12.311.526	176.465.209
			158	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	SEDE CRISTOBAL COLON	162.637.183	12.197.789	174.834.972
11	Cauca	Balboa	46	C.E. BUENOS AIRES	CAPITANES	83.200.000	6.240.000	89.440.000
			65	I.E. OLAYA (ANTES C.E. OLAYA)	OLAYA (sede principal)	416.000.000	31.200.000	447.200.000
		Bolívar	3	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA NUESTRA SENORA DE LOS REMEDIOS	COLEGIO DEPARTAMENTAL NUESTRA SENORA DE LOS REMEDIOS	436.800.000	32.760.000	469.560.000
			58	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO NUESTRA SENORA DEL CARMEN	CORRAL VIEJO	127.479.910	9.560.993	137.040.903
			59	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO NUESTRA SENORA DEL CARMEN	NUESTRA SENORA DEL CARMEN (sede principal)	299.239.730	22.442.980	321.682.710
			90	CENTRO EDUCATIVO EL TAMBO	LA FUENTE	191.162.093	14.337.157	205.499.250
			93	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CARMEN	EL CARMEN (sede principal)	62.400.000	4.680.000	67.080.000
		El Tambo	22	I.E. HUISITO	HUISITO (sede principal)	1.041.842.757	78.138.207	1.119.980.964
		La Vega	44	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA SANTA RITA	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA RITA (sede principal)	166.400.000	12.480.000	178.880.000
			163	I.E AGROPECUARIA SAN FRANCISCO JAVIER SEDE GARAY	I.E AGROPECUARIA SAN FRANCISCO JAVIER SEDE GARAY	177.904.227	13.342.817	191.247.044
		Popayán	165	IE COMUNEROS	SEDE PRINCIPAL	457.600.000	34.320.000	491.920.000
		Rosas	175	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA	SANTA TERESITA (sede principal)	790.400.000	59.280.000	849.680.000
			178	INSTITUCION EDUCATIVA MADRE CARIDAD BRADER	MADRE CARIDAD BRADER (sede principal)	124.800.000	9.360.000	134.160.000
			182	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO CORDOBA	LAS YERBAS	83.200.000	6.240.000	89.440.000
			183	CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO LEON VALENCIA	LA DESPENSA	62.400.000	4.680.000	67.080.000
			184	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO CORDOBA	EL RETIRO	83.200.000	6.240.000	89.440.000
			186	CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO LEON VALENCIA	EL ALTILLO	62.400.000	4.680.000	67.080.000
			187	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO CORDOBA	BELLAVISTA	62.400.000	4.680.000	67.080.000
12	Cauca	Piamonte	27	CENTRO EDUCATIVO PUERTO GUAYUYACO	ESCUELA RURAL MIXTA LA ESPANOLA	62.400.000	4.680.000	67.080.000
			121	CENTRO EDUCATIVO PUERTO GUAYUYACO	ESC RUR MIX SAN ANDRESITO	41.600.000	3.120.000	44.720.000
			125	INST EDUC AGRIC PIAMONTE	PIAMONTE (sede principal)	1.553.938.473	116.545.386	1.670.483.859
			173	ESC RUR MIX FRAY EZEQUIEL	ESC RUR MIX FRAY EZEQUIEL	195.752.201	14.681.415	210.433.616
			174	E.D.R PORTO GUAYUYACO SEDE PRINCIPAL	E.D.R PORTO GUAYUYACO SEDE PRINCIPAL	166.400.000	12.480.000	178.880.000
	Huila	Acevedo	26	INSTITUCION EDUCATIVA BATEAS	BATEAS	310.453.360	23.284.002	333.737.362
	Nariño	BARBACOAS	87	INSTITUCION EDCUATIVA TERAIMBE	SEDE 9 CUMAINDE	62.400.000	4.680.000	67.080.000
			110	INSTITUCION EDUCATIVA TERAIMBE	SEDE 2 BOMBON	124.800.000	9.360.000	134.160.000
		Cumbal	36	INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCION DE TALLAMBI	INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCION DE TALLAMBI	764.787.529	57.359.065	822.146.593
		El Rosario	8	CENTRO EDUCATIVO LA CLAUDIA	CENTRO EDUCATIVO LA CLAUDIA	62.400.000	4.680.000	67.080.000
		Ipiales	142	INSTITUCION EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL LOS PASTOS	ESCUELA LAS CRUCES	208.000.000	15.600.000	223.600.000

GRUPO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ID MEN No.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	VR. TOTAL AULAS Y MEJORAMIENTO	VR. INTERVENTORÍA	VR. TOTAL OBRA + INTERVENTORÍA
		Mallama (Piedrancha)	149	CENTRO EDUCATIVO MALLAMA	CENTRO EDUCATIVO DE MALLAMA	62.400.000	4.680.000	67.080.000
		Pasto	1	I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE	I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - SEDE PRINCIPAL	436.800.000	32.760.000	469.560.000
	Putumayo	Orito	127	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL UMADA WUARRARA	ESC RUR MIX ALTO ORITO	127.913.503	9.593.513	137.507.016
		Puerto Asís	172	E. RUR CAUCACIA - SEDE PRINCIPAL	SEDE PRINCIPAL	249.600.000	18.720.000	268.320.000
		Puerto Asís	41	I. E. RUR CAUCACIA	ESC RUR MIX EL JARDIN ALTO TETEYE	197.100.201	14.782.515	211.882.716
			57	I. E. RUR CAUCACIA	ESC RUR MIX EL PROGRESO	167.997.003	12.599.775	180.596.778
		Puerto Leguizamo	88	IE RUR LUIS VIDALES DEL PIÑUÑA NEGRO	ESC RUR MIX PUERTO PRINCIPE DOS	124.800.000	9.360.000	134.160.000
Total general						52.593.871.997	3.944.540.400	56.538.412.397

d. *Evaluar los proponentes, así como las propuestas presentadas para la construcción de las obras de infraestructura educativa e interventorías correspondientes y realizar la adjudicación y contratación de dichos procesos.*

En este periodo ya fueron concluidos los procesos de convocatoria y realizadas las evaluaciones exhaustivas de los proponentes y sus respectivas propuestas para la construcción de las obras de infraestructura educativa y las interventorías correspondientes, nos complace informar en este periodo que dichos procesos han llegado a su fin. Se ha llevado a cabo una rigurosa revisión bajo los parámetros establecidos en los Términos de Referencia, asegurando que se cumplan los lineamientos de contratación pública en términos de transparencia y equidad.

Gracias a este esfuerzo, se ha procedido con éxito a la adjudicación de todos los contratos, seleccionando a los proponentes que demostraron las mejores capacidades técnicas, financieras y operativas. Todos los grupos han sido debidamente contratados, lo que asegura que las obras se desarrollarán dentro de los plazos previstos y bajo los más altos estándares de calidad.

Nuestro compromiso con la excelencia en la ejecución de las obras y el adecuado control mediante las interventorías asegurará que estas infraestructuras aporten un valor significativo a la comunidad educativa, garantizando su correcto desarrollo y el bienestar de los beneficiarios.

1.4 ACTIVIDADES CONTRACTUALES

1.4.1 Obligaciones:

a. *Ejecutar a través de los contratistas seleccionados y hacer seguimiento a la calidad y entrega de las obras de infraestructura educativa diseñadas para atender las afectaciones a las sedes educativas priorizadas por el MEN.*

FINDETER, en concordancia con la naturaleza de los proyectos a abordar bajo el marco del Decreto de Emergencia, ha adelantado en el presente periodo la ejecución de diversas sedes educativas. Estos proyectos se han llevado a cabo mediante la colaboración de contratistas que fueron rigurosamente seleccionados a través de procedimientos transparentes y estructurados, conforme a lo estipulado en el Manual de Contratación de FINDETER.

La selección de contratistas no fue un proceso aleatorio, sino que siguió una serie de etapas bien definidas, que incluyeron la evaluación de capacidades técnicas, experiencia previa en proyectos similares, y solidez financiera. Este enfoque metodológico garantiza que los proyectos se ejecuten con altos estándares de calidad y dentro de los plazos establecidos, lo cual es crucial en contextos de emergencia donde la eficiencia y la efectividad son primordiales.

Adicionalmente, la supervisión y el monitoreo continuo de los avances de las obras permiten asegurar que se cumplan todas las normativas vigentes y que los recursos asignados se utilicen de manera óptima. FINDETER ha implementado mecanismos de control y seguimiento que incluyen auditorías periódicas y la utilización de tecnología para el seguimiento en tiempo real de las obras. Esto no solo brinda transparencia al proceso, sino que también facilita la identificación temprana de posibles inconvenientes y la implementación de medidas correctivas oportunas.

b. *Ejercer la vigilancia de los contratos de obra contratando las respectivas interventorías y ejercer la supervisión a los contratos de interventoría que se deriven del presente contrato.*

FINDETER adelantó en el presente periodo un riguroso ejercicio de vigilancia de los contratos de obra mediante la contratación de las respectivas interventorías. Esta medida se implementó con el objetivo de asegurar el adecuado desarrollo de los proyectos de infraestructura, en línea con los estándares de calidad y los plazos establecidos.

La contratación de interventorías y la posterior supervisión de sus actividades permitirán crear un sistema de verificación y seguimiento continuo, asegurando la transparencia en el proceso de ejecución de las obras y proporcionando un mecanismo de retroalimentación para la garantía de la calidad, la eficiencia y el cumplimiento de los estándares requeridos en las obras de infraestructura educativa, quedando así el resumen de este periodo:

GRUPO	TIPO DE CONTRATO	CÓDIGO	DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS	FECHA DE ADJUDICACIÓN	CONTRATISTA	VALOR OFERTADO	OBSERVACIONES
1	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-052-2023	Antioquia - Apartadó Antioquia - Turbo Antioquia - Ciudad Bolívar Chocó - Carmen del Darién Chocó - Tadó	03/10/2023	INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S	$271.455.247	Liquidado el 25 de febrero del 2025
1	OBRA	PAF-MENAM-O-049-2023		06/10/2023	OBRAS CAPITAL S. A	$3.447.332.359	Liquidado el 31 de enero del 2025
2	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-053-2023	Atlántico - Repelón Atlántico - Galapa Atlántico – Soledad - Atlántico - Palmar De Varela Atlántico - Luruaco	26/09/2023	RM INGENIEROS S.A.S.	$295.715.000	Liquidación Radicada por PRISA INC 2025-000621 el 27 de febrero del 2025
2	OBRA	PAF-MENAM-O-050-2023		06/10/2023	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023	$4.044.124.630	Liquidación Radicada por PRISA INC 2025-000620 el 05 de marzo del 2025
3	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-054-2023	Magdalena - Ciénaga Magdalena - El Retén Magdalena - Pueblo viejo	26/09/2023	CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3	$351.774.412	Liquidado el 20 de diciembre del 2024
3	OBRA	PAF-MENAM-O-051-2023		06/10/2023	CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA	$4.744.960.153	Liquidado el 01 de noviembre del 2024
4	OBRA	PAF-MENAM-O-052-2023	Bolívar - Córdoba Bolívar - Mompós Magdalena - San Sebastián de Buenavista	20/09/2023	JASA LTDA	$3.566.467.466	Liquidado el 30 de septiembre del 2024
4	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-055-2023		26/09/2023	CONSORCIO INTER EDUCATIVO G4	$264.974.745	Entregado 22 de marzo del 2024

GRUPO	TIPO DE CONTRATO	CÓDIGO	DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS	FECHA DE ADJUDICACIÓN	CONTRATISTA	VALOR OFERTADO	OBSERVACIONES
5	OBRA	PAF-MENAM-O-053-2023	Bolívar - Barranco De Loba Magdalena - Concordia Magdalena - El Banco Cesar - Curumaní Bolívar - San Martín De Loba Cesar - Chimichagua	03/10/2023	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5	$4.102.044.984	Terminado el 08 de noviembre del 2024
5	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-056-2023		06/10/2023	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5	$300.856.990	Terminado el 08 de enero del 2025
6	OBRA	PAF-MENAM-O-056-2023	Cesar - Valledupar Cesar - La Paz Cesar - El paso	29/09/2023	DAR ARQUITECTURA S.A. S	$2.102.352.000	Liquidado el 20 de noviembre del 2024
6	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-058-2023		03/10/2023	CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023	$155.543.411	Liquidado el 27 de noviembre del 2024
8	OBRA	PAF-MENAM-O-055-2023	Córdoba – Tuchín Córdoba – Cotorra Córdoba - Planeta Rica Córdoba - Puerto Libertador Córdoba – Ayapel Córdoba - Montelíbano Bolívar - María la Baja	29/09/2023	DAR ARQUITECTURA S.A. S	$4.706.470.280	Liquidado el 14 de marzo del 2025
8	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-057-2023		13/10/2023	LUIS GUILLERMO NARVÁEZ RICARDO	$297.097.668	Entregado 21 de agosto del 2024
7	OBRA	PAF-ATMEN5-O-036-2024	Guajira – Manaure Guajira – Rioacha Guajira - Maicao Guajira - Barrancas	19/03/2024	Consorcio Guajira 7	4.158.777.879	Entregado el 28 de febrero del 2025
7	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-059-2023		17/04/2024	GERMÁN ADOLFO PERDOMO PACHÓN	295.239.000	Terminado el 17 de enero del 2025
9	OBRA	PAF-ATMEN5-O-037-2024	Santander - Vélez, Betulia, Barrancabermeja Bolívar – Morales Bogotá Arauca - Saravena -Arauca Tolima - Santa Isabel Meta – Villavicencio Cundinamarca – Anolaima Bolívar – Simiti Norte de Santander - La Playa	19/03/2024	CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9	4.810.476.306	Etapa 2
9	INTERVENTORÍA	PAF-ATMEN5-I-064-2024		28/06/2023	CONSORCIO SAN GABRIEL	313.800.000	Etapa 2
10	OBRA	PAF-MENAM-O-080-2023	Cauca - Suárez Cauca - Santander De Quilichao Chocó - Bahía Solano Cauca – Toribío Valle Del Cauca - Guadalajara De Buga	23/11/2023	CONSORCIO FIN GRUPO 10	$6.014.978.800	Etapa 2
10	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-062-2023		15/12/2023	CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO	$327.496.568	Etapa 2
11	OBRA	PAF-MENAM-O-079-2023	Cauca - El Tambo Cauca - La Vega Cauca - Balboa Cauca - Popayán Cauca - Rosas	27/11/2023	CONSORCIO FIN GRUPO 11	$ 4.728.021.810	Terminado el 27 de noviembre del 2024
11	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-063-2023		22/12/2023	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	$312.927.160,00	Terminado el 27 de noviembre del 2024
12	OBRA	PAF-MENAM-O-076-2023	Nariño – Pasto Putumayo - Puerto Asís Cauca – Piamonte Nariño – Ipiales Nariño - Mallama	27/11/2023	CONSORCIO FIN GRUPO 12	$ 4.918.276.400	Terminado el 05 de diciembre del 2024
12	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-064-2023		22/12/2023	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	$ 351.774.412	Terminado el 05 de diciembre del 2024
Dotación	SUMINISTRO	PAF-ATMEN5-S-041-2024	Choco - Carmen del Darién, Tadó Antioquia – Apartadó Atlántico – Repelón, Soledad Bolívar – Mompós, Barranco de Loba, San Martín de Loba, María la Baja Cauca - Santander de Quilichao, Suarez, El Tambo, Bolívar, La Vega, Rosas Cesar - La Paz (Robles), El Paso Córdoba - Planeta Rica, Puerto Libertador, Ayapel, Montelíbano Magdalena - El Retén, San Sebastián de Buenavista	22/08/2024	DOTAESCOL SAS	$ 944.255.458,80	Acta de inicio del otro si firmada el 13 de marzo del 2025.

Nota: Según el informe previo sobre el estado de los grupos de contratación y de cada institución educativa, se comunica que **el Grupo 1 ha sido entregado el 18 de noviembre de 2024, el Grupo 2 ha**

sido entregado el 05 de noviembre del 2024, el Grupo 3 ha sido entregado el 30 de abril de 2024, el Grupo 4 ha sido entregado el 22 de marzo de 2024, el Grupo 5 ha sido entregado el 08 de enero de 2025, el Grupo 6 ha sido entregado el 17 de mayo de 2024, el Grupo 7 ha sido entregado el 28 de febrero de 2025, el Grupo 8 ha sido entregado el 21 de agosto de 2024, **el Grupo 11 ha sido entregado el 07 de marzo de 2025**, **el Grupo 12 ha sido entregado el 04 de marzo de 2025,** satisfacción entre rectores, estudiantes y familias. Además, se está avanzando en el proceso de estructuración de los estudios preliminares para equipar las nuevas aulas construidas, con el objetivo de entregarlas completamente dotadas.

c. *Conformar un Comité Fiduciario y un Comité Técnico Operativo al interior del PATRIMONIO AUTÓNOMO administrado por la FIDUCIARIA contratada, de acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo que para el efecto se adopte.*

Durante este periodo se realizaron los siguientes comités:

Comités Técnicos

FECHA	OBJETO	LUGAR DE LA REUNIÓN	TEMAS ABORDADOS
5 - 6 de marzo del 2025	Comité Técnico No. 82	PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-MEN - CI CO1.PCCNTR. 4917031 de 2023	1. Verificación del quorum; 2. Solicitud: PRÓRROGA POR EL TÉRMINO DE DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO AL CONTRATO DE OBRA No. PAF-ATMEN5-O-037-2024 CUYO OBJETO CONSISTE EN "ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 9". 3. Solicitud: PRÓRROGA POR EL TÉRMINO DE DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO SIN ADICIÓN DE RECURSOS AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. PAF-ATMEN5-I-064-2024 CUYO OBJETO CONSISTE EN "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 9". 4. Solicitud: INCLUSIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS AL LISTADO DE PRECIOS PARA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL CONTRATO DE OBRA No. PAF-ATMEN5-O-037-2024, CUYO OBJETO CONSISTE EN "ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS – GRUPO 9". 5. Solicitud: INCLUSIÓN NOTA ACLARATORIA A LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE OBRA No. PAF-ATMEN5-O-037-2024 EN LA QUE SE INDIQUE QUE LOS SALDOS DISPONIBLES DEL PRODUCTO "SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS. INCLUYE, MATERIAL ENVOLVENTE DE MUROS Y CUBIERTA", QUE CORRESPONDEN A UN VALOR DE $ 40.598.453 SEGÚN BALANCE FINANCIERO DEL COMPONENTE I, SEAN ASIGNADOS AL PRODUCTO DEL COMPONENTE II "EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD". 6. Proposiciones y varios

13 de marzo del 2025	Comité Técnico No. 83	PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-MEN - CI CO1.PCCNTR. 4917031 de 2023	1. Verificación del quorum 2. Solicitud: Modificación del alcance del contrato de suministro PAF-ATMEN5-S-041-2024 que tiene por objeto: "EL SUMINISTRO, ENTREGA E INSTALACIÓN DE DOTACIÓN DEL MOBILIARIO ESCOLAR EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS" en el sentido de incluir 22 sedes en 34 aulas móviles nuevas ubicadas en los departamentos del Magdalena, Cesar, Guajira, Santander, Tolima, Meta, Cundinamarca, Valle del cauca, Chocó, Nariño, Bolívar y Putumayo. 3. Solicitud: Adición No.1 al contrato PAF-ATMEN5-S-041-2024 que tiene por objeto: "EL SUMINISTRO, ENTREGA E INSTALACIÓN DE DOTACIÓN DEL MOBILIARIO ESCOLAR EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS", por valor de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE ($ 359.945.454,80). 4. Solicitud: Prórroga No. 1 por tres (3) meses al contrato PAF-ATMEN5-S-041-2024 que tiene por objeto: "EL SUMINISTRO, ENTREGA E INSTALACIÓN DE DOTACIÓN DEL MOBILIARIO ESCOLAR EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS" 5. Proposiciones y varios
16 de marzo del 2025	Comité Técnico No. 84	PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-MEN - CI CO1.PCCNTR. 4917031 de 2023	1. Verificación del quorum 2. Solicitud: Prórroga No. 4 por el término de UN (1) MES para la ejecución del componente 2 del contrato de obra PAF-MENAM-O-080-2023, para ejecutar, terminar y entregar las actividades diagnosticadas y programadas como alcance de intervención para las 3 sedes que se encuentran en ejecución de las 15 priorizadas por el MEN dentro del contrato Grupo 10 del programa Aulas Móviles afectadas por la temporada de lluvias. 3. Solicitud: Prórroga No. 4 por el término de UN (1) MES al componente 2 del contrato de interventoría PAF-MENAM-I-062-2023 para el seguimiento a la ejecución, terminación y entrega de las 3 sedes que se encuentran en ejecución de las 15 priorizadas por el MEN dentro del contrato Grupo 10 del programa Aulas Móviles afectadas por la temporada de lluvias. 4. Solicitud: Adición No. 4 por la suma de DOCE MILLONES CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($12.104.858,50) incluida IVA al valor de ejecución del componente 2 del contrato de interventoría PAF-MENAM-I-062-2023, los cuales corresponde al (100%) del valor adicionar y al (2.3%) del valor total del contrato, que serán cubiertos con los saldos disponibles del Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 de 2023. 5. Proposiciones y varios

Comités Fiduciarios

FECHA	OBJETO	LUGAR DE LA REUNIÓN	TEMAS ABORDADOS
6 - 7 de marzo del 2025	Comité Fiduciario No. 53	PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-MEN - CI CO1.PCCNTR. 4917031 de 2023	1. Verificación del quorum 2. Solicitud: PRÓRROGA POR EL TÉRMINO DE DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO AL CONTRATO DE OBRA No. PAF-ATMEN5-O-037-2024 CUYO OBJETO CONSISTE EN "ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 9". 3. Solicitud: PRÓRROGA POR EL TÉRMINO DE DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO SIN ADICIÓN DE RECURSOS AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. PAF-ATMEN5-I-064-2024 CUYO OBJETO CONSISTE EN "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS Y/O BATERIAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 9". 4. Solicitud: INCLUSIÓN NOTA ACLARATORIA A LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE OBRA No. PAF-ATMEN5-O-037-2024 EN LA QUE SE INDIQUE

			QUE LOS SALDOS DISPONIBLES DEL PRODUCTO "SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS. INCLUYE, MATERIAL ENVOLVENTE DE MUROS Y CUBIERTA", QUE CORRESPONDEN A UN VALOR DE $ 40.598.453 SEGÚN BALANCE FINANCIERO DEL COMPONENTE I, SEAN ASIGNADOS AL PRODUCTO DEL COMPONENTE II "EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS Y SU PUESTA EN CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD". 5. Proposiciones y varios
14 de marzo del 2025	Comité Fiduciario No. 54	PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-MEN - CI CO1.PCCNTR. 4917031 de 2023	1. Verificación del quorum 2. Solicitud: Modificación del alcance del contrato de suministro PAF-ATMEN5-S-041-2024 que tiene por objeto: "EL SUMINISTRO, ENTREGA E INSTALACIÓN DE DOTACIÓN DEL MOBILIARIO ESCOLAR EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS" en el sentido de incluir 22 sedes en 34 aulas móviles nuevas ubicadas en los departamentos del Magdalena, Cesar, Guajira, Santander, Tolima, Meta, Cundinamarca, Valle del cauca, Chocó, Nariño, Bolívar y Putumayo. 3. Solicitud: Adición No.1 al contrato PAF-ATMEN5-S-041-2024 que tiene por objeto: "EL SUMINISTRO, ENTREGA E INSTALACIÓN DE DOTACIÓN DEL MOBILIARIO ESCOLAR EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS", por valor de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE ($ 359.945.454,80). 4. Solicitud: Prórroga No. 1 por tres (3) meses al contrato PAF-ATMEN5-S-041-2024 que tiene por objeto: "EL SUMINISTRO, ENTREGA E INSTALACIÓN DE DOTACIÓN DEL MOBILIARIO ESCOLAR EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS" 5. Proposiciones y varios
27 - 29 de marzo del 2025	Comité Fiduciario No. 55	PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-MEN - CI CO1.PCCNTR. 4917031 de 2023	1. Verificación del quorum 2. Solicitud: Prórroga No. 4 por el término de UN (1) MES para la ejecución del componente 2 del contrato de obra PAF-MENAM-O-080-2023, para ejecutar, terminar y entregar las actividades diagnosticadas y programadas como alcance de intervención para las 3 sedes que se encuentran en ejecución de las 15 priorizadas por el MEN dentro del contrato Grupo 10 del programa Aulas Móviles afectadas por la temporada de lluvias. 3. Solicitud: Prórroga No. 4 por el término de UN (1) MES al componente 2 del contrato de interventoría PAF-MENAM-I-062-2023 para el seguimiento a la ejecución, terminación y entrega de las 3 sedes que se encuentran en ejecución de las 15 priorizadas por el MEN dentro del contrato Grupo 10 del programa Aulas Móviles afectadas por la temporada de lluvias. 4. Solicitud: Adición No. 4 por la suma de DOCE MILLONES CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($12.104.858,50) incluida IVA al valor de ejecución del componente 2 del contrato de interventoría PAF-MENAM-I-062-2023, los cuales corresponde al (100%) del valor adicionar y al (2.3%) del valor total del contrato, que serán cubiertos con los saldos disponibles del Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 de 2023. 5. Proposiciones y varios.

a. ACTIVIDADES DE CIERRE Y LIQUIDACIÓN

i. Obligaciones:

a. *Adelantar la liquidación o cierre de los contratos derivados para la ejecución de los proyectos y del Contrato Interadministrativo una vez estos hayan finalizado.*

De la contratación derivada

En el presente periodo se ha planificado anticipadamente la liquidación o cierre de los contratos derivados con el propósito de asegurar una ejecución eficiente de los proyectos. Esta estrategia no solo facilitó una gestión financiera más efectiva, sino que también permitió cumplir con los objetivos establecidos dentro de los plazos previstos, optimizando así los recursos disponibles y garantizando la correcta finalización de las obligaciones contractuales, así mismo se adelantaron las siguientes liquidaciones:

GRUPO	TIPO DE CONTRATO	CÓDIGO	DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS	FECHA INCIO	FECHA TERMINACIÓN	CONTRATISTA	OBSERVACIONES
1	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-052-2023	Antioquia - Apartadó Antioquia - Turbo Antioquia - Ciudad Bolívar Chocó - Carmen del Darién Chocó - Tadó	14/11/2023	29/10/2024	INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S	Liquidado el 25 de febrero del 2025
1	OBRA	PAF-MENAM-O-049-2023		14/11/2023	14/08/2024	OBRAS CAPITAL S. A	Liquidado el día 31/01/2025
2	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-053-2023	Atlántico - Repelón Atlántico - Galapa Atlántico – Soledad - Atlántico - Palmar De Varela Atlántico - Luruaco	26/09/2023	05/11/2024	RM INGENIEROS S.A.S.	Liquidación Radicada por PRISA INC 2025-000621 el 27 de febrero del 2025
2	OBRA	PAF-MENAM-O-050-2023		06/10/2023	05/09/2024	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023	Liquidación Radicada por PRISA INC 2025-000620 el 05 de marzo del 2025
3	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-054-2023	Magdalena - Ciénaga Magdalena - El Retén Magdalena - Puebloviejo	14/11/2023	30/04/2024	CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3	Liquidado el día 20/12/2024
3	OBRA	PAF-MENAM-O-051-2023		14/11/2023	30/04/2024	CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA	Liquidado el día 01/10/2024
4	OBRA	PAF-MENAM-O-052-2023	Bolívar - Córdoba Bolívar - Mompós Magdalena - San Sebastián de Buenavista	24/10/2023	22/03/2024	JASA LTDA	Liquidado el día 30/09/2024
4	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-055-2023		24/10/2023	22/03/2024	CONSORCIO INTER EDUCATIVO G4	Inicia su trámite de liquidación una vez que quede desembolsado el último pago.
6	OBRA	PAF-MENAM-O-056-2023	Cesar - Valledupar Cesar - La Paz Cesar - El paso	29/09/2023	17/05/2024	DAR ARQUITECTURA S.A. S	Liquidado el día 20/11/2024
6	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-058-2023		03/10/2023	17/05/2024	CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023	Liquidado el día 27/11/2024
8	OBRA	PAF-MENAM-O-055-2023	Córdoba – Tuchín Córdoba – Cotorra Córdoba - Planeta Rica Córdoba - Puerto Libertador Córdoba – Ayapel Córdoba - Montelíbano Bolívar - María la Baja	29/09/2023	DAR ARQUITECTURA S.A. S	$4.706.470.280	Liquidado el 14 de marzo del 2025
8	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-057-2023		13/10/2023	LUIS GUILLERMO NARVÁEZ RICARDO	$297.097.668	Entregado 21 de agosto del 2024

Del Contrato Interadministrativo

Para el presente periodo no se adelantan actividades de este tipo.

2. RESUMEN GENERAL DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL CONTRATO

CONTRATO No CO1.PCCNTR. 4917031 de 2023

Valor inicial del Contrato (CO1.PCCNTR. 4917031 de fecha 2023)	63.650.000.000
Valor del Contrato a la fecha de corte del Informe	**63.650.000.000**
Descuentos / Impuestos Estampilla Pro-Universidad Nacional / Tasas y Contribuciones (Correspondiente al 2% aplicado al valor Inicial del Contrato)	-
Asistencia Técnica No. 1 (Porcentaje de Asistencia Técnica y Administración de Recursos a reconocer a FINDETE, 7%)	4.164.018.692
Valor disponible para ejecutar los proyectos de acuerdo con el objeto del contrato y el plan operativo.	**59.485.981.308**

3. ANEXOS

Se remiten anexos de acuerdo con las actividades realizadas durante el periodo así:

1. 03 de marzo del 2025

HERNÁN PARDO BOTERO
Gerente de Infraestructura
FINDETER

JESÚS ALBERTO CAÑAS PÁEZ
Gestor del Contrato Interadministrativo
FINDETER

Elaboró: Geraldine Lorena Prada Pimiento – Profesional de la Gerencia de Infraestructura



Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Contrato No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023

6 DE MARZO DE 2025

Hacienda

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública


Contrato No. 4917031-2023

136 **sedes educativas**
[instalación de aulas y mejoramientos]

$ 63.650
Millones de pesos

Fecha inicio: 2/06/2023
Fecha Fin Actual: 01/07/2025

Grupo	Departamentos / Municipios	Etapa Actual del grupo/% de avance de contrato Fecha de Inicio –Fecha de Terminación
G1 [10 sedes]	Antioquia | Chocó	Entregado [100,00%] 14/11/2023 - 14/08/2024
G2 [8 sedes]	Atlántico	Entregado [100,00%] 27/11/2023 -06/09/2024
G3 [5 sedes]	Magdalena	Liquidado [100,00%] 14/11/2023 - 30/04/2024
G4 [5 sedes]	Bolívar	Entregado [100,00%] 26/10/2023 - 23/03/2024
G5 [16 sedes]	Bolívar | Magdalena | Cesar	Entregado [100,00%] 14/11/2023 – 08/11/2024
G6 [7 sedes]	Cesar	Entregado [100,00%] 15/11/2023 - 17/05/2024
G7 [13 sedes]	Guajira	Terminado [100,00%] 31/05/2024 - 17/01/2025
G8 [9 sedes]	Córdoba | Bolívar	Entregado [100,00%] 08/11/2023 - 23/08/2024
G9 [12 sedes]	Santander | Bolívar | Bogotá | Arauca | Tolima | Meta | Cundinamarca | Nte de Santander	En obra[33,97%] 23/08/2024 - 08/03/2025
G10 [15 sedes]	Cauca | Chocó | Valle Del Cauca	En Obra [90,22%] 19/02/2023 - 30/12/2024
G11 [18 sedes]	Cauca	Terminado [100,00%] 12/02/2023 - 27/11/2024
G12 [18 sedes]	Nariño | Putumayo | Cauca	Terminado [100,00%] 20/02/2023 - 04/12/2024
Dotación	46 Sedes a dotar - 99 aulas	Suspendido[100,00%] 03/10/2024 – 03/12/2024

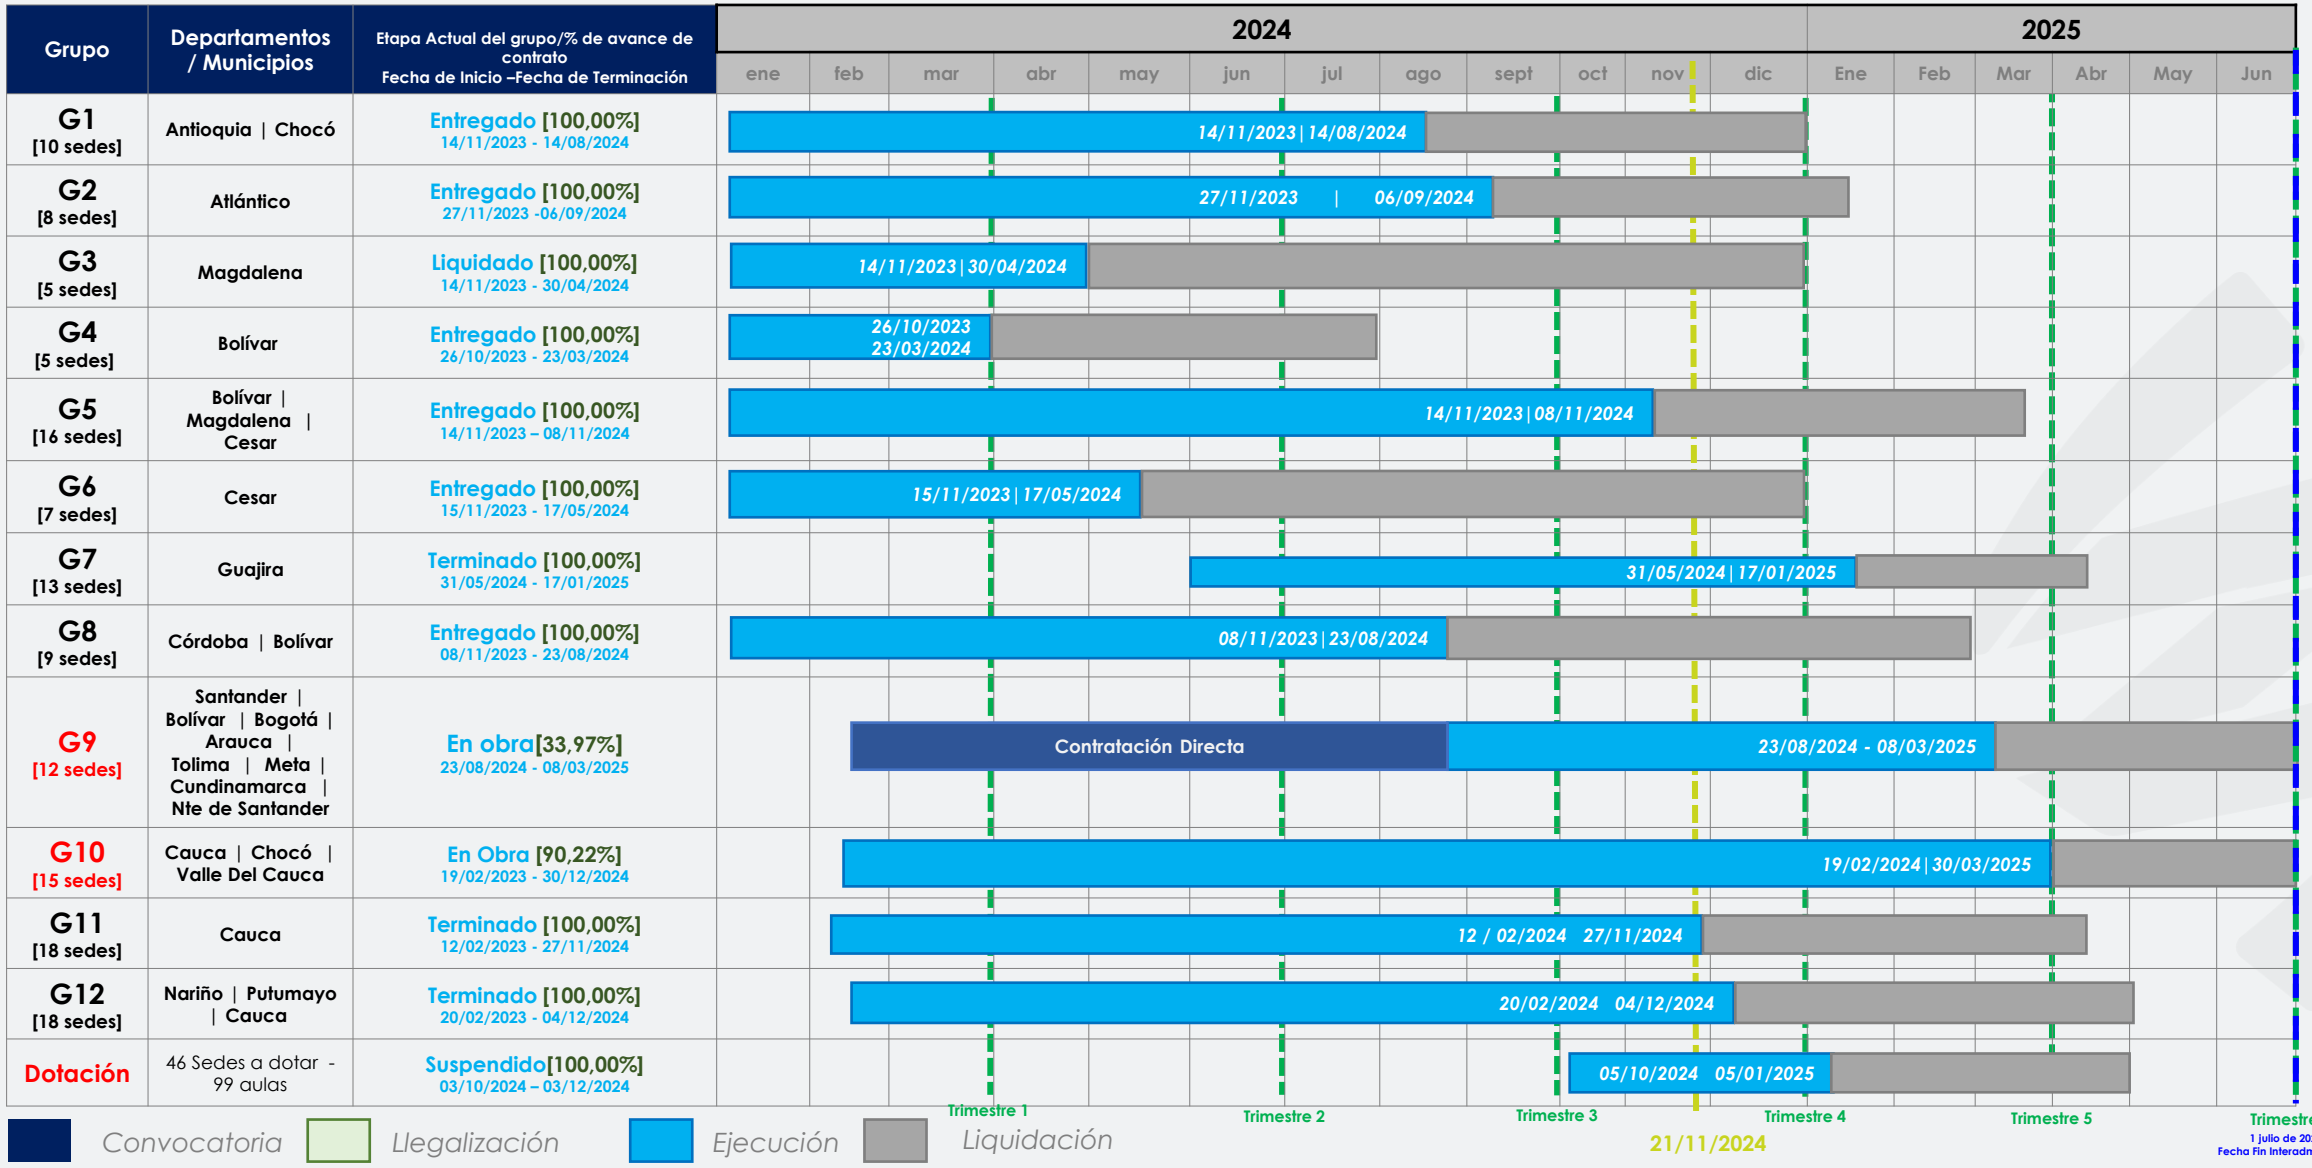

Convocatoria | Llegalización | Ejecución | Liquidación

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

Aulas Móviles
Contrato No. 4917031-2023

136 **sedes educativas**
[instalación de aulas y mejoramientos]

$ 63.650
Millones de pesos

Fecha inicio: 02/06/2023
Fecha Fin: 01/07/2025


ENTREGADAS 118 sedes 86,76%

TERMINADAS 8 sedes 3,68%

Físicamente culminadas. A la espera de firma de actas para ser entregadas

EN EJECUCIÓN 13 sedes 9,56%

Estado de entrega y ejecución de Sedes

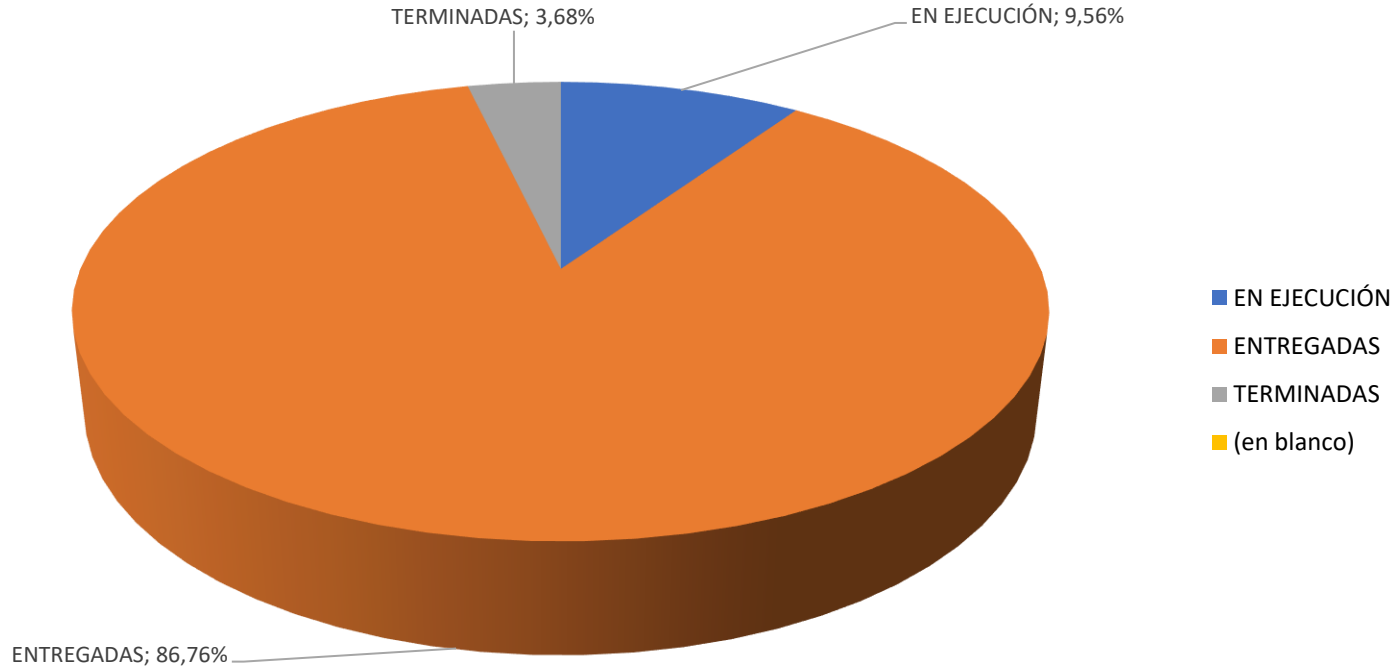

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Estado de entrega y ejecución de Sedes

136 **sedes educativas**
[instalación de aulas y mejoramientos]

$ 63.650
Millones de pesos

Fecha inicio: 02/06/2023
Fecha Fin: 01/07/2025

ENTREGADAS	TERMINADAS	EN EJECUCIÓN	POR INICIAR
118 sedes 85,29%	8 sedes 3,68%	13 sedes 9,56%	0 sedes 0%
Grupo 1 - 10 Grupo 2 - 8 Grupo 3 - 5 Grupo 4 - 5 Grupo 5 - 16 Grupo 6 - 7 Grupo 7- 13 Grupo 8 - 9 Grupo 10 - 10 Grupo 11 - 17 Grupo 12 - 18	Grupo 9 - 5 Grupo 10 - 1 Grupo 11 - 2	Grupo 9 - 9 Grupo 10 - 4	

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

PAGOS ASISTENCIA TECNICA

136 **sedes educativas**
[instalación de aulas y mejoramientos]

$ 63.650
Millones de pesos

Fecha inicio: 02/06/2023
Fecha Fin: 01/07/2025

VALOR AT

$ 4.164.018.692

Cobrado (a enero de 2025)	Pagado (a enero de 2025)	SALDO
$3.925.094.903,52	$ 3.925.094.903,52	$ 238.923.788,48

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

Resumen Informe Financiero – Corte 31 de diciembre de 2024

136 **sedes educativas**
[instalación de aulas y mejoramientos]

$ 63.650
Millones de pesos

Fecha inicio: 02/06/2023
Fecha Fin: 01/07/2025

VALOR EJECUTADO

$ 49.435 mll

VALOR POR EJECUTAR

$ 14.573 mll

VALOR COMPROMETIDO

$ 59.515 mll

SALDO

$ 398,2 mll*

*El saldo es a corte de 09 de febrero de 2025

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

Rendimientos Financieros – Relación de Pagos

Educación


Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031
Ministerio de Educación Nacional
Financiera del Desarrollo S.A.
7. RENDIMIENTOS FINANCIEROS
01 de enero al 31 de enero de 2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

FECHA	RENDIMIENTOS CAUSADOS CUENTA DE AHORRO	VALORACIÓN /DESVALORIZACION CAUSADOS FONDO DE INVERSION COLECTIVA - FIC	TOTAL RENDIMIENTOS, VALORACION DEVALORIZACION CAUSADOS	FECHA TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS	VALOR TRASLADO RENDIMIENTOS	AJUSTES / RETENCIONES	SALDO PENDIENTE POR TRASLADAR RENDIMIENTOS	DESVALORIZACION ACUMULADA
ago-23	82.351.406,35	443.947.650,01	**526.299.056,36**				-	-
sep-23	108.927.246,74	548.880.836,71	**657.808.083,45**				-	-
oct-23	131.902.760,66	436.008.307,20	**567.911.067,86**				-	-
nov-23	144.907.033,92	718.224.229,49	**863.131.263,41**				-	-
dic-23	143.221.271,36	788.090.860,63	**931.312.131,99**	13/12/2023	**2.615.149.472,00**		-	-
ene-24	133.626.379,48	427.858.051,59	**561.484.431,07**	10/01/2024	**931.312.131,99**		-	-
feb-24	120.547.529,88	474.970.095,24	**595.517.625,12**	12/02/2024	**561.484.430,15**		-	-
mar-24	117.745.976,50	478.495.863,61	**596.241.840,11**	12/03/2024	**595.517.625,12**		-	-
abr-24	100.331.907,69	259.736.382,70	**360.068.290,39**	10/04/2024	**596.241.840,11**		-	-
may-24	89.374.457,56	353.632.163,66	**443.006.621,22**	11/05/2024	**360.068.290,39**		-	-
jun-24	76.820.331,89	266.323.590,41	**343.143.922,30**	13/06/2024	**443.006.621,22**		-	-
jul-24	68.012.790,67	294.233.627,01	**362.246.417,68**	15/07/2024	**343.143.922,30**		-	-
ago-24	21.741.419,32	313.006.436,96	**334.747.856,28**	14/08/2024	**362.246.417,68**		-	-
sep-24	20.861.120,00	192.185.501,19	**213.046.621,19**	10/09/2024	**334.747.856,28**		-	-
oct-24	27.022.756,52	71.175.915,03	**98.198.671,55**	18/10/2024	**213.046.621,19**		-	-
nov-24	21.729.373,21	129.213.183,82	**150.942.557,03**	13/11/2024	**98.198.671,55**		-	-
dic-24	19.252.522,64	66.886.746,40	**86.139.269,04**	10/12/2024	**150.942.557,03**		-	-
ene-25	16.704.545,81	83.803.505,05	**100.508.050,86**	8/01/2025	**86.139.269,04**		**100.508.050,86**	-
TOTAL	**1.445.080.830,20**	**6.346.672.946,71**	**7.791.753.776,91**		**7.691.245.726,05**	-	**100.508.050,86**	-

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

Rendimientos Financieros – Comprobante de pago

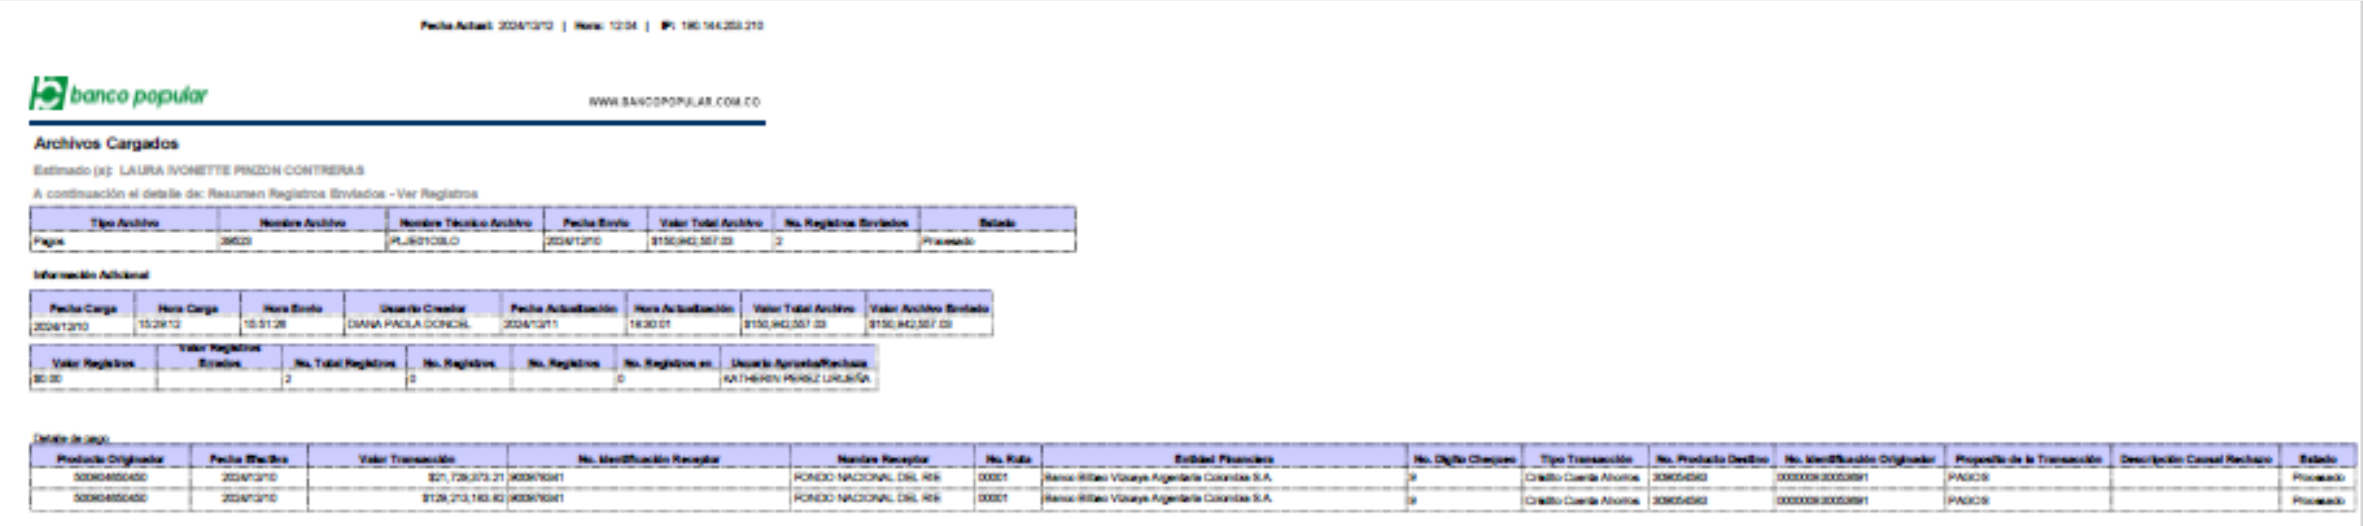

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Archivos Cargados

Estimado (a): LAURA IVONETTE PINZON CONTRERAS

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	39520	PLJ521039.O	2024/12/10	$150,842,557.03	2	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/12/10	15:29:12	15:31:26	DIANA PAOLA DONCEL	2024/12/11	14:30:01	$150,842,557.03	$150,842,557.03

Valor Registros	Valor Registros Enviados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		2	0		0	KATHERIN PEREZ URUEÑA

Detalle de pago

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	No. Rubi	Entidad Financiera	No. Dígito Chequeo	Tipo Transacción	No. Producto Destino	No. Identificación Originador	Propósito de la Transacción	Descripción Causal Rechazo	Estado
50090455450	2024/12/10	$21,728,073.21	900976041	FONDO NACIONAL DEL RIE	00001	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	9	Crédito Cuenta Ahorros	309054583	0000009300536891	PAGOS		Procesado
50090455450	2024/12/10	$128,213,183.82	900976041	FONDO NACIONAL DEL RIE	00001	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	9	Crédito Cuenta Ahorros	309054583	0000009300536891	PAGOS		Procesado

NOTA: Teniendo en cuenta el contrato MEN-4917031 2023 -TEMPORADA DE LLUVIAS, y en atención a la obligación descrita en la cláusula tercera, Obligaciones específicas del contratista, Numeral 8 el cual dice:

"8. El Patrimonio Autónomo — Findeter deberá reintegrar mensualmente los rendimientos financieros (si los hubiere) a la Dirección del Tesoro Nacional o en los términos que establezca la normatividad aplicable, es decir, que no ingresan ni hacen parte del Patrimonio Autónomo constituido por Findeter."

Se han consignado los rendimientos financieros a la siguiente cuenta:

- **Banco:** BBVA
- **Tipo:** Ahorros
- **No. Cuenta:** 309-054583
- **Nombre de la Cuenta:** FIDUPREVISORA S.A FNGRD – COLOMBIA VITAL

AULAS MOVILES
INFORME DETALLADO POR GRUPO DE INTERVENCION

06 de marzo de 2025



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

CONTRATOS EN EJECUCION

GRUPO	Departamento	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	ALERTAS, ASUNTOS PENDIENTES
GRUPO 9	Arauca, Bolívar, Cundinamarca Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima y Bogotá D.C.	**12**	23/08/2024	08/03/2025	97,83%	68,88%	Se presentaron inconvenientes en las dos (2) sedes ubicadas en el municipio de Santa Isabel, departamento del Tolima en razón a precipitaciones presentadas que perjudicaron la vía de acceso a la zona, lo cual ha generado que se realice el transporte de materiales con el uso de mulas; para estas sedes se solicitó prórroga de dos (2) meses y quince (15) días calendario para culminación de actividades. Para las demás sedes se presenta un retraso en seis (6) de las diez (10) sedes que están en ejecución y tienen fecha de terminación el 8 de marzo de 2025. Por lo anterior, se debe continuar el proceso de apremio hacia el contratista de obra por las moras que se han presentado y que son imputables a este.
GRUPO 10	Cauca, Valle del Cauca y Choco	**15**	19/02/2024	30/03/2025	94,11%	87,94%	Los proyectos del Cauca se han visto afectados por temas de orden público en los últimos días de enero y primeros de febrero, lo cual han generando suspensión actividades parciales y retiro de personal trabajador por temor a la situación, hechos que han afectado los avances de los proyectos y actualmente están generando atrasos frente a la programación. Adicional el proyecto de Santander de Quilichao se encuentra en avance a su programación pero pendiente de que la administración municipal construya las acometidas para realizar las conexiones pertinentes por parte del proyecto, se ha reiterado al solicitud y necesidad de la misma, sobre la cual informan que se encuentran adelantando los tramites para abrir la convocatoria y adjudicar el contrato, ya que en el mes de diciembre adelantaron este proceso pero el mismo se declaro desierto.

CCOM-FO-005 V1 / 05-Ago-2024 / Publica

Grupo 09

Fecha inicio: 23/08/2024
Fecha Fin: 08/03/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Departamento	**Arauca, Bolívar, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima y Bogotá D.C.**
$	**Valor Inicial** Obra: $ 4.810.476.306,00 Interventoría: $ 313.800.000
	Adiciones Obra: $ 0 Interventoría: $165.685.393,30
	Valor Pagado Obra: CI- $245.711.234,70 CII - $ 1.412.969.897,09 Interventoría: CI - $0 CII - $ 141.822.709,23
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Otrosí No. 1: Retiro de tres (3) sedes del alcance Otrosí No. 2: Prórroga tres (3) meses obra e interventoría, adición interventoría por $165.685.393,30
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	**ID No. 56 – Arauca:** Entregada el 19/02/2025 **ID No. 138 - Arauca:** Terminada, entrega el 14/03/2025 **ID No. 132 – La Playa:** Terminada, entrega el 12/03/2025 **ID No. 7 – Vélez:** En actividades de aseo del aula nueva, entrega el 13/03/2025 **ID No. 104 – Anolaima:** En terminación de aula nueva y en ejecución de mejoramientos en aula existente y baterías sanitarias. Fecha estimada de entrega: 17 al 21 de marzo. **ID No. 96 – Villavicencio:** En terminación de muro de cerramiento. Fecha estimada de entrega: 17 al 21 de marzo. **ID No. 124 – Simití:** En actividades de pintura. Fecha estimada de entrega: 17 al 21 de marzo. **ID No. 123 – Simití:** Continúa en actividades de aula nueva. **ID No. 20 – Morales:** Continúan en actividades de mejoramientos. **ID No. 17 – Betulia:** Continúan en actividades de mejoramientos. **ID No. 67 y 100 – Santa Isabel:** La fabricación de los kits de materiales prefabricados finaliza el 15/03/2025, se está coordinando el transporte. Se encuentran en actividades de cimentación y armado de acero para fundida de placa de contrapiso. El contratista se retrasó en el inicio de las obras en todas las sedes educativas. Se solicita a la interventoría continuar con el proceso de apremio.

68,88%
Porcentaje de avance

97,83%
Porcentaje Programado

Sedes:	**12**
En ejecución:	8
Terminadas:	3
Entregadas:	1

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

COLEGIO UNIVERSITARIO - ID No. 7




IE DEL CERRO DE VERACRUZ -ID No. 124




CENTRO EDUCATIVO MONSERRATE - ID No. 138




EL DESCANSO - ID No. 104




ESCUELA SIETE DE AGOSTO - ID No. 96




SEDE LA PEÑA – ID No. 132




LA ARCADIA - ID No. 20




SANTA BARBARA - ID No. 17



CAMPO PAYARES - ID No. 123




EL BRASIL - ID No. 100




LA HUMAREDA - ID No. 67




CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Grupo 10

Fecha inicio: 19/02/2024
Fecha Fin: 30/03/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Departamento	**Cauca, Valle del Cauca y Choco**
$	**Valor Inicial** Obra: $6.014.978.800 Interventoría: $327.496.568
	Adiciones Obra: $602.576.550 Interventoría: $197.588.004,15 ($79.155.973,39 asumidos por el contrato de obra) ($118.432.030,76 asumidos por el contrato interadministrativo)
	Valor Pagado Obra: $5.620.758.289,00 Interventoría: $394.815.767,36
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	3 otrosíes obra: Prórrogas (9 meses y 27 dias) 3 otrosíes interventoría: Prórrogas (9 meses y 27 dias) y adiciones ($197.588.004,15)
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	En cumplimiento al alcance se tienen 11 sedes entregadas y AEP&SC suscritas, y 4 sedes en ejecución, (2 Suarez, 1 Santander de Quilichao, 1 Bahía Solano). Se adelanta programa para realizar la entrega de la sede la Huaca en Bahía solano de la semana del 10 al 14 de marzo si se logra coordinar la agenda con el rector. Frente a las obras de Suarez y Santander de Quilichao se continua con el avance de actividades con un personal mínimo derivado por los temas de orden publico que a la fecha han afectando los avances de los proyecto. Por lo anterior, se está evaluando los tiempos perdidos vs necesarios para lograr la terminación de los proyectos y de esta forma se adelantará un posible prórroga.

87,94%
Porcentaje de avance

94,11%
Porcentaje Programado

Sedes:	**15**
En ejecución:	4
Por iniciar:	0
Entregadas:	11

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial


INSTITUCION E.TECNICA AGRARIA SEDE PRINCIPAL ID MEN. 188.




INSTITUCION E.TECNICA AGRARIA SEDE INMACULADA ID MEN. 189.




INSTITUCION E.TECNICA AGRARIA SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ID MEN. 190

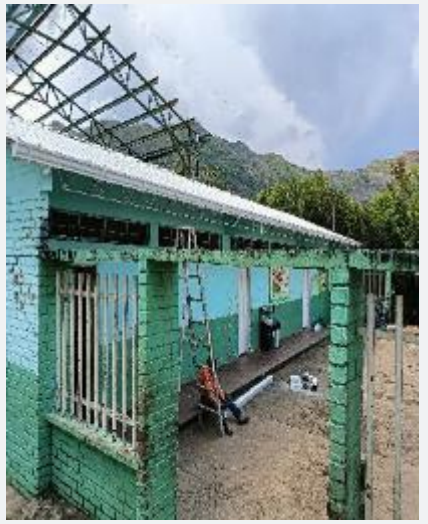INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PLAYA ID MEN: 12. MUNICIPIO DE TORIBIO ID MEN: 12.




INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO SEDE DOMINGO LASSO ID 164.




INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO SEDE PRINCIPAL ID 16




CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE JOHN F. KENNEDY




IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDEJULIAN MENDOZA GUERRERO




IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE PRINCIPAL




IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE LA HONDA .




IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE LA PLANTA .




IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE CRISTOBAL COLÓN




lica

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE. LUIS LOPEZ DE MESA SEDE SAN JOSE (HUACA)





IE. LUIS LOPEZ DE MESA SEDE SECUNDINO RIVAS




IE. LUIS LOPEZ DE MESA SEDE SIRENA DEL MAR




CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

CONTRATOS SUSPENDIDOS

GRUPO	Departamento	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	OBSERVACIONES
DOTACIÓN	Antioquia, Atlántico, Bolivar, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Putumayo, Santander, Tolima, Valle del Cauca	**46**	03/10/2024	02/12/2024	Valor del contrato inicial de $584.310.000,00 y otro sí proyectado de $364.000.000 y adición de 3 meses por las condiciones de accesibilidad de las nuevas sedes. Contrato Suspendido para la incorporación de los recursos. Se realiza el Otro Sí y se citará a comité la 3era semana del mes de febrero. Dotación entregada en los grupos 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 y 11 y, pendiente la entrega de los grupos 5, 7, 9, 10 y 12. La ejecución se realiza en 16 departamentos, 38 municipios y se realiza la dotación de 99 aulas nuevas construidas.

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Estado Entrega de Dotación

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

CONTRATO INICIAL

PAF-ATMEN5-S-041-2024

Publicada

17 DE JULIO DE 2024.

Informe Definitivo:

Comité Fiduciario No 41 del 25 de agosto.

Adjudicado:

DOTAESCOL SAS

Valor $ **$ 584.310.000,00**

Acta de Inicio: 3 de octubre de 2024

2 meses de ejecución.

Entregado 100%.

- 16 DEPARTAMENTOS
- 38 MUNICIPIOS
- 98 AULAS NUEVAS CON DOTACIÓN

CONTRATO ADICIÓN

Como resultado del desarrollo y entrega de los productos del Componente I, estableciendo que los grupos del programa **AULAS MOVILES 5, 7, 9, 10 y 12** tienen **22** sedes de instituciones educativas con **34** aulas nuevas para completar el 100% de aulas nuevas con dotación.

VALOR ADICIÓN: ($ 359.945.454,80).

Aulas nuevas ubicadas en los departamentos del Magdalena, Cesar, Guajira, Santander, Tolima, Meta, Cundinamarca, Valle del Cauca, Chocó, Nariño, Bolívar y Putumayo (12 departamentos)

Grupo	Sede	Municipio	Departamento	AULAS NUEVAS PREESCOLAR	AULAS NUEVAS BASICA PRIMARIA (1 A 5)	AULAS NUEVAS BASICA SECUNDARIA (6 a 11)	AULAS NUEVAS MULTIGRADO	TOTAL AULAS NUEVAS
5	CENTRO EDUCATIVO RURAL MIX JOS	El Banco	Magdalena	1				1
5	SEDE CHINELA	Curumaní	Cesar		1			1
5	SEDE TRONCONAL	Chimichagua	Cesar				1	1
7	ESCUELA RURAL INDÍGENA KARALOU	Manaure	La Guajira		1			1
7	YAMAIN - SEDE PRINCIPAL	Maicao	La Guajira			1		1
7	SEDE KASICHE	Maicao	La Guajira		1			1
7	CENTRO ETNOEDUCATIVO PROVINCI	Barrancas	La Guajira			1		1
7	SEDE LA ESTRELLA	Maicao	La Guajira		1			1
7	YAMAIN - KASPOLIMANA	Maicao	La Guajira		1			1
7	ESCUELA RURAL MIXTA TALOULUM	Maicao	La Guajira			2		2
9	COLEGIO UNIVERSITARIO	Vélez	Santander		4			4
9	LA HUMAREDA	Santa Isabel	Tolima				1	1
9	ESCUELA SIETE DE AGOSTO	Villavicencio	Meta		5			5
9	EL BRASIL	Santa Isabel	Tolima				1	1
9	ESCUELA RURAL EL DESCANSO	Anolaima	Cundinamarca				1	1
9	CAMPO PAYARES	Simití	Bolívar				1	1
10	LA PLANTA	Guadalajara de Bug	Valle del Cauca				1	1
10	SEDE DE SAN JOSE (HUACA)	Bahía Solano(Mutis	Chocó				1	1
12	INSTITUCION EDUCATIVA INMACULA	Cumbal	Nariño			5		5
12	ESC RUR MIX EL JARDIN ALTO TETE	Puerto Asís	Putumayo				1	1
12	ESC RUR MIX EL PROGRESO	Puerto Asís	Putumayo				1	1
12	ESC RUR MIX ALTO ORITO	Orito	Putumayo				1	1
SUBTOTAL				1	14	9	10	**34**

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado Entrega de Dotación



CENTRO EDUCATIVO INDIGENA CAÑO PADILLA YUKPA
Sede El Coso La Paz – Cesar



INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO
Sede Escuela Nueva Parcelas Londres
Ayapel - Córdoba



INSTITUCION EDUCATIVA EL PALMAR
Escuela Nueva Mixta Divino Salvador
Monte Líbano - Córdoba



INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO
Sede Principal Santander de Quilichao - Cauca



INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA ERM MARIA AUXILIADORA Sede
Sebastián de Buenavista - Magdalena



INSTITUCION EDUCATIVA TIERRA FIRME
Mompox - Bolivar

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

CONTRATOS TERMINADOS

GRUPO	Departamento	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	OBSERVACIONES
GRUPO 11	Cauca	18	12/02/2024	27/11/2024	Contratista avanza en las gestiones de entrega a Directivos de las sedes terminadas y recibidas por interventoría, las cuales son Santa Teresita en el municipio de Rosas y Francisco Javier sede Garay en el municipio de la Vega. Inicialmente el recibo de estas sedes se atrasó debido al periodo de vacaciones de los Directivos, y una vez reanudado el año escolar se informaron posventas en algunos espacios. En la IE Francisco Javier sede Garay las posventas ya fueron atendidas y se esta gestionando la firma del acta de recibo por parte del Rector. En la IE Santa Teresita están próximos a terminar la subsanación de las posventas informadas.

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Grupo 11

Fecha inicio: 12/02/2024
Fecha Fin: 27/11/2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Departamento	**Cauca**
$	**Valor Inicial** Obra: $ 4.728.021.810 Interventoría: $ 312.927.160
	Adiciones Obra: $ 0 Interventoría: $ 99.972.853,00 ($ 54.867.110,00 asumidos por el contrato de obra) ($ 45.105.743,00 asumidos por el contrato interadministrativo)
	Valor Pagado Obra: $ 4.721.624.076,00 Interventoría: $ 379.820.020,17
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	3 otrosíes obra: Prórrogas (6 meses) 3 otrosíes interventoría: Prórrogas y adiciones (6 meses - $ 99.972.853,00)
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	Contratista avanza en las gestiones de entrega a Directivo de la IE Francisco Javier sede Garay en el municipio de la Vega. En la IE Francisco Javier sede Garay los compromisos derivados de la reunión del 21/02/2025 acompañada por SED Cauca y MEN, fueron atendidos, razón por la cual se esta gestionando la firma del acta de recibo por parte del Rector. 17 sedes entregadas a Directivos. 1 sede en gestión de entrega.





CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO




I.E. Agropecuaria Santa Rita – Sede principal
La vega




C.E. Buenos Aires – Sede Capitanes
Balboa




C.E. Guillermo León Valencia – Sede La Despensa
Rosas





C.E. Guillermo León Valencia – El Altillo
Rosas

CCOM-FO-005 V1 / 05 - Ago-2024 / Pública
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO




I.E. El Carmen – Sede principal
Bolívar




I.E. Alfonso Córdoba – Sede Las Yerbas
Rosas




I.E. Alfonso Córdoba – Sede Bellavista
Rosas




I.E. Técnica Agropecuaria Nuestra Señora de los
Remedios - Bolívar

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada
CCOM-FO-005 V1 / 05 - Ago-2024 / Pública

CONTRATOS ENTREGADOS

GRUPO	Departamento	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	OBSERVACIONES
Grupo 2	Atlántico	8	27/11/2023	05/09/2024	CONTRATO PAF-MENAM-O-050-2023: Terminado el 05.09.2024 CONTRATO PAF-MENAM-I-053-2023: Terminado el 05.11.2024 CONTRATO PAF-MENAM-O-050-2023: Documentos Liquidación radicados el 27.02.2025 a través PRISA INC 2025-000620, asignación liquidador el 5.03.2025 Rubén Moscoso, actualmente se encuentra en revisión CONTRATO PAF-MENAM-I-053-2023: Documentos Liquidación radicados el 27.02.2025 a través PRISA INC 2025-000621, en espera asignación liquidador

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

CONTRATOS ENTREGADOS

GRUPO	Departamento	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	OBSERVACIONES
Grupo 4	Magdalena y Bolívar	7	24/10/2023	07/02/2024	Se encuentra liquidado el contrato de obra. El contrato de interventoría iniciará su trámite de liquidación una vez que quede desembolsado el último pago.
Grupo 5	Magdalena y Bolívar	16	14/11/2023	08/11/2024	CONTRATO PAF-MENAM-O-053-2023: Terminado el 08.11.2024 CONTRATO PAF-MENAM-I-056-2023: Terminado el 08.01.2025 **AERS COMPONENTE 2:** • Contrato de Obra e Interventoría, en proceso de revisión y VoBo por parte de la Fiduciaria Popular, para pasar a firmas, una vez se tenga las AERS suscritas se procederá a solicitar la actualización de pólizas. En recopilación documental, cierre de balances y memorias entre el contratista e interventoría, se proyecta radicar la liquidación del contrato de obra al 15 de marzo de 2025 y posterior la de interventoría.
Grupo 7	La Guajira	13	31/05/2024	17/01/2025	AERS del componente II Obra firmada 28feb2025 por Rep. legal Fidupopular. El contrato de obra iniciará su trámite de liquidación una vez que quede desembolsado el último pago; el cual deben facturar a inicios de marzo y pagado a finales de marzo 2025. Con respecto a la interventoría le falta facturar casi un 60% y se estima su liquidación para iniciar a finales de abril 2025.
Grupo 8	Córdoba y Bolívar	9	08/11/2023	08/07/2024	En expedición el acta de liquidación del contrato. En consolidación la información del contrato de interventoría. Se proyecta su liquidación en el mes de marzo

GCOM-FO-005 V1 / 05 Ago 2024 / Pública

CONTRATOS ENTREGADOS

GRUPO	Departamento	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	OBSERVACIONES
Grupo 12	Cauca, Huila, Nariño y Putumayo	18	12/02/2024	05/12/2024	**CONTRATO PAF-MENAM-O-076-2023:** Se inicia con recopilación de documentación de liquidación, radicación proyectada 31/03/2025. **CONTRATO PAF-MENAM-I-064-2023:** e inicia con recopilación de documentación de liquidación, radicación proyectada 31/03/2025.

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Grupo 2

Fecha inicio: 27/11/2023
Fecha Fin: 05/09/2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Departamento	**Atlántico**
$	**Valor Inicial** Obra: $4.044.124.630 Interventoría: $295.715.000
	Adiciones Obra: $ 0,00 Interventoría: $113.699.014 ($57.808.105,6 asumidos por el contrato de obra) ($55.890.908,4 asumidos por el contrato interadministrativo)
	Valor Pagado Obra: $4.028.747.780,96 Interventoría: $374.270.637,53
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	3 otrosíes obra: Prórrogas (5 meses y 5 dias) 3 otrosíes interventoría: Prórrogas (5 meses y 5 dias) y adiciones ($113.699.014)
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	CONTRATO PAF-MENAM-O-050-2023: Terminado el 05.09.2024 CONTRATO PAF-MENAM-I-053-2023: Terminado el 05.11.2024 AERS COMPONENTE 2: • Contrato de obra suscrita el 10.02.2025 y en proceso de actualización de pólizas para revisión y aprobación por parte de la Fiduciaria Popular. • Contrato de interventoría en proceso de revisión para presentar a firmas, proceso que se espera se de en la semana del 17 al 21 de febrero de 2025 En recopilación documental, cierre de balances y memorias entre el contratista e interventoría, se proyecta radicar la liquidación del contrato de obra al 28 de febrero de 2025 y posterior la de interventoría.

100%
Porcentaje de avance

100%
Porcentaje Programado

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Contratista de Diseño y Obra: PAF-MENAM-O-050-2023 CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 - G2
Contratista interventor: PAF-MENAM-I-053-2023 RM INGENIEROS S A S

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE PRINCIPAL - ID EN 018




INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE PRINCIPAL - ID EN 018




INSTITUCION EDUCATIVA BLAS TORRES DE LA TORRE (ITIDA) - ID MEN 144




INSTITUCION EDUCATIVA DE MESOLANDIA - ID MEN 197




INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS, LAS TABLAS Y PITA, SEDE PITA - ID MEN 092




INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS, LAS TABLAS Y PITA, SEDE LAS TABLAS - ID MEN 083




INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE VILLA ROSA, SEDE LA LOMA - ID MEN 084






INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA DE GALAPA - ID MEN 064






Grupo 4

Fecha inicio: 24/10/2023
Fecha Fin: 07/02/2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Departamento	**Magdalena y Bolívar**
$	**Valor Inicial Obra: $3.566.467.466.00** **Valor inicial Interventoria: $264.974.745,00**
	Adiciones Obra: $ 0 Interventoría: $20.000.000.00 (El contratista pago $10.000.000.00 y el convenio $10.000.000.00) **Valor final Interventoria $ 284.974.745,00**
	Valor Pagado Obra: $3.361.652.674.57 Valor Liberado contrato de obra: $204.814.791.43 Interventoría: $279.439.929.41 Valor a Liberar:$5.534.815.59
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Otro Sí 1: Prorroga un (1) y quince (15) días. Otro Sí 2: Exclusion de dos (2) (TACAMOCHO y EDM JAIME) por la imposiblidad técnica para ejecutar.
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	Contrato de Obra Liquidado y culminado. Se inicia tramite de liquidación: interventoría adelanta el proceso de radicación de los documentos para la liquidación 07/03/2025.

100%
Porcentaje de avance

100%
Porcentaje Programado

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Grupo 5

Fecha inicio: 14/11/2023
Fecha Fin: 08/11/2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Departamento	**Magdalena y Bolívar**
$	**Valor Inicial** Obra: $4.102.044.984 Interventoría: $300.856.990
	Adiciones Obra: $778.973.616 Interventoría: $172.224.091 ($91.100.000 asumidos por el contrato de obra) ($81.124.091 asumidos por el contrato interadministrativo)
	Valor Pagado Obra: $4.745.371.433 Interventoría: $420.967.384,31
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	5 otrosíes obra: Prórrogas (7 meses y 20 dias) y adiciones ($778.973.616) 5 otrosíes interventoría: Prórrogas (7 meses y 20 dias) y adiciones ($172.224.091)
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	CONTRATO PAF-MENAM-O-053-2023: Terminado el 08.11.2024 CONTRATO PAF-MENAM-I-056-2023: Terminado el 08.01.2025 AERS COMPONENTE 2: • Contrato de Obra e Interventoría, en proceso de revisión y VoBo por parte de la Fiduciaria Popular, para pasar a firmas, una vez se tenga las AERS suscritas se procederá a solicitar la actualización de pólizas. En recopilación documental, cierre de balances y memorias entre el contratista e interventoría, se proyecta radicar la liquidación del contrato de obra al 15 de marzo de 2025 y posterior la de interventoría.





CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

GRUPO 5, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES SEDE PRINCIPAL
ID No. 30




INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES SEDE SERENOS
ID No. 101




INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES SEDE SERENOS
ID No. 101




INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRISTIAN MORENO SEDE CHINELA
ID No. 97




INSTITUCION EDUCATIVA EL PUEBLITO SEDE PUERTO LA ESTANCIA
ID No. 147




INSTITUCION EDUCATIVA EL PUEBLITO SEDE TORRECILLA
ID No. 148





CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

GRUPO 5, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PUEBLITO SEDE TRONCONAL
ID No. 146




INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL SILVIA COTES DE BISWELL SEDE ISLITA
ID No. 32




INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL OSCAR PISCIOTTI NUMA SEDE INMACULADA CONCEPCION




INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ANTONIO NARIÑO SEDE JOSE DE LA PAZ VANEGAS




INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA CRUZ DE BALSAMO SEDE PRIMARIA
ID No. 13




INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA CRUZ DE BALSAMO SEDE JARDIN INFANTIL
ID No. 14




CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

GRUPO 5, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR SEDE PRINCIPAL
ID No. 06




INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR SEDE CERRITO
ID No. 10




INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR SEDE ATASCOZA
ID No. 09




INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA PESQUERA LEONIDAS ORTIZ ALVEAR SEDE PLAN BONITO
ID No. 43





CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Grupo 7

Fecha inicio: 31/05/2024
Fecha Fin: 17/01/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Departamento	**La Guajira**
$	**Valor Inicial** Obra: $**4.158.777.879** Interventoría: $**295.239.000**
	Adiciones Obra: $ 0 Interventoría: $0
	Valor Pagado Obra: $ 3.738.535.259,01 (89,89%) Interventoría: $121.499.000 (41,15%)
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Suspensión 1 por 20 días 28 de oct de 2024 Prórroga 1 por 45 días 13 de sep de 2024 Suspensión 2 por 30 días 18 de nov de 2024 Prórroga 2 por 30 días 19 de dic de 2024
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	CONTRATO PAF-ATMEN5-O-036-2024: Terminado el 17.01.2025 CONTRATO PAF-MENAM-I-059-2023: Fecha de Terminación el 17.03.20 AERS del componente II de Obra firmada 28feb2025 x Rep. legal Fidupopular. El contrato de obra iniciará su trámite de liquidación una vez que quede desembolsado el último pago; el cual deben facturar a inicios de marzo y pagado a finales de marzo 2025. Con respecto a la interventoría le falta facturar casi un 60% y se estima su liquidación para iniciar a finales de abril 2025.





CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

REGISTRO FOTOGRAFICO

I.E. JOSE ANTONIO GALAN- SEDE COOPERATIVO -060-(RIOHACHA)





INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #7 - 034-APÜNIMA´ANA1 -(RIOHACHA)





ESCUELA ETNOEDUCATIVA LA CAMPANA -050--(MAICAO)







ESCUELA ETNOEDUCATIVA WAYUMA'ANA -054- (MAICAO)





CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

REGISTRO FOTOGRAFICO

INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #7 - 117-WAKUAPAMANA -(RIOHACHA)






I.E. JOSE ANTONIO GALAN- SEDE PRINCIPAL -060-(RIOHACHA)






INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #6 - 051-TALOULUMA `ANA -(MAICAO)




INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO RURAL PROVINCIAL - 0143-PROVINCIAL -(BARRANCAS)




CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Publica
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

REGISTRO FOTOGRAFICO

INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA - 011-
ESCUELA RURAL INDIGENA KARALOUTAMANA -(MANAURE)





ESCUELA ETNOEDUCATIVA SEDE KASICHE -053- (MAICAO)













INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #6 - 151-LA
ESTRELLA -(MAICAO)



INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #6 - 051-
YAMAIN SEDE PRINCIPAL -(MAICAO)



INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #6 - 152-
YAMAIN KASPOLIMANA -(MAICAO)









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Grupo 8

Fecha inicio: 08/11/2023
Fecha Fin: 08/07/2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Departamento	**Córdoba y Bolívar**
$	**Valor Inicial** Obra: $$4.706.470.280 M/CTE Interventoría: $297.097.668,00 M/CTE
	Adiciones Obra: $1.455.000.000 Interventoría: $144.106.877
	Valor Pagado Obra: $6.161.470.280 Interventoría: $277.437.804
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Prorroga 1: 2 meses y 15 días Prorroga 1: 2 meses
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	Contrato de obra: liquidado. Contrato de interventoría: En consolidación y revisión documentos por la supervisión para el inicio del proceso de liquidación.





CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

REGISTRO FOTOGRAFICO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Sede principal I. E. El Palmar - Montelíbano



Sede Buenos Aires - María La Baja



Sede Los Cerros - Planeta Rica



Sede Téc. Agrop. De Desarrollo Rural De María la baja - María La Baja



Sede Esc. Nueva Parcelas Londres - Ayapel



Sede Técnica Álvaro Ulcue Chocue - Tuchín



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

REGISTRO FOTOGRAFICO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Sede Esc. Nueva La Solita - Puerto Libertador



Sede Los Aguacates - Cotorra



Sede Níspero-María La Baja





CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Grupo 12

Fecha inicio: 12/02/2024
Fecha Fin: 05/12/2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Departamento	**Cauca, Huila, Nariño y Putumayo**
$	**Valor Inicial** Obra: $ 4.918.276.400,00 Interventoría: $ 318.105.088,00
	Adiciones Obra: $ 0 Interventoría: $ 152,015,642,00
	Valor Pagado Obra: $ 4.906.706.463,00 Interventoría: $ 413.123.412
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	2 otrosíes obra: Prórrogas (6 meses) 2 otrosíes interventoría: Prórrogas y adiciones (6 meses - $ 152,015,642,00)
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	Total de 18 sedes, entregadas a satisfacción con recibo de interventoría y rectores de 18 sedes, se suscribió acta de entrega por rector el 05/03/2025 y nos encontramos en trámite de firmas. Con respecto al trámite con la empresa de servicio de Energía del Putumayo y Alcaldía de Piamonte se remitirá comunicado solicitando colaboración con el trámite a la Alcaldía para que se comprometa a realizar la compra del transformador para ampliación de la carga de toda la institución, dejando registro de la gestión realizada por el contratista sobre los mejoramientos y que no afecta la carga existente.





CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Estado GRUPO 12, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO




ID1 Pasto, Nariño - I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE




ID8 El Rosario - Nariño, CENTRO EDUCATIVO LA CLAUDIA




ID26 Acevedo, Huila - INSTITUCION EDUCATIVA BATEAS




ID27 Piamonte - Cauca, ESCUELA RURAL MIXTA LA ESPANOLA

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada
CCOM-FO-005 V1 / 05 - Ago-2024 / Pública

CONTRATOS LIQUIDADOS

GRUPO	Departamento	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	OBSERVACIONES
Grupo 3	Magdalena	5	14/11/2023	12/04/2024	**LIQUIDACIÓN Contrato de Obra No. PAF-MENAM-O-051-2023**: Suscrita Acta de liquidación de fecha 01/10/2024, pagado 100%. **LIQUIDACIÓN Contrato de Interventoría No. PAF-MENAM-I-054-2023:**Suscrita Acta de liquidación de fecha 20/12/2024, pagado 100%.
Grupo 6	Cesar	7	15/11/2023	29/04/2024	**LIQUIDACIÓN Contrato de Obra No. PAF-MENAM-O-056-2023:** Suscrita Acta de liquidación el 20/11/2024 y pagado al 100%. **LIQUIDACIÓN Contrato de Interventoría No. PAF-MENAM-I-058-2023:** Suscrita Acta de liquidación el 27/11/2024 y pagado al 100%.
Grupo 1	Antioquia y Chocó	10	14/11/2023	14/08/2024	**CONTRATO PAF-MENAM-O-049-2023:** Liquidación suscrita el 31 de enero e 2025 **CONTRATO PAF-MENAM-I-052-2023:** Liquidación suscrita el 25 de febrero e 2025

CCOM-FO-005 V1 / 05 - Ago-2024 / Pública

COMPROMISOS

- Definir por parte de Findeter el valor de la posible adición para el grupo 9. R/: Se realizó la prórroga del grupo para la ejecución de las 2 sedes de Tolima. No implicó costo al convenio.

- Revisar por parte de Findeter el cronograma general de ejecución del convenio teniendo en cuenta que aún no ha iniciado las actividades de 2 sedes en el grupo 9. Tiempos de liquidación será muy corto. R/: Se presenta cronograma de liquidaciones de cada grupo, sus etapas y su estado actual.

- Agilizar por parte de Findeter el Otro Sí de la dotación y su firma con base en los comité técnicos y fiduciarios a citar.

- Remitir por parte de Findeter el informe de avance de las sedes de Grupo 10, sobre todo de las sedes ejecutadas en Suárez. R/: Se remitió el 17 de febrero de 2025

- Compartir desde Findeter las actas de entregas de las sedes del Cauca al ing. Juan Carlos Folleco Olave de la secretaria de Educación del Cauca. R/: Fecha de entrega el 11 de marzo de 2025

- Revisar y confirmar por parte de Findeter que el seguimiento con la Fiduprevisora se ha realizado permanentemente y que la información en la carpeta compartida se encuentra al día. R/: Se está realizando la entrega de información a tiempo.

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

COMPROMISOS (06 DE MARZO DE 2025)

- MEN informa que por favor se adicione el plan de contingencia al comité, ya que esta difícil el acceso a las zonas de los grupos que están en ejecución.
- Revisar información para empezar la liquidación del CI, organizar información, esperar que el MEN nos envíen link de acceso.
- Revisar el presupuesto de pagos, donde se debe estar seguro que solo que se incluya el recurso del convenio.
- Revisar adiciones y valor final de la base detallada.
- Enviar información, una pieza comunicativa, con la información del contrato interadministrativo al MEN para publicar y socializar las intervenciones.
- Enviar todas fotos de las dotaciones en las aulas nuevas de cada IE.
- Enviar información de los beneficiarios. Plazo máximo 14 de marzo del 2025.
- Organizar el cronograma con todas las prorrogas.

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública



Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

GRACIAS

www.findeter.gov.co

@findetercol @findetercol
@findeter linkedin.com/company/findeter

Gobierno de Colombia

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Bogotá D.C.,

Ingeniera
DIANA MILENA MALDONADO TORRES
Supervisora del Contrato Ministerio de Educación Nacional - MEN
dmaldonado@mineducacion.gov.co
Calle 43 # 57-14 Piso 3
Bogotá D.C.

Ref: **Contrato No. NO. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER**. Cuyo Objeto es "BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES PRIORITARIAS EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR DE LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS QUE SEAN DEFINIDAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN"

Asunto: Remisión Informe Mensual No. 23 / Contrato No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023

Estimada Doctora:

Me permito remitir el Informe de Gestión y ejecución No. 23 correspondiente al periodo de 02 de abril al 01 de mayo de 2025, en cumplimiento de las obligaciones descritas en el anexo al contrato de la referencia.

Así mismo, y en caso de estar de acuerdo solicitamos amablemente emitir la aprobación de éste para soporte al Patrimonio Autónomo FINDETER MEN Aulas Móviles por Ola Invernal (Fiduciaria POPULAR S.A) con la siguiente información:

PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MEN
AULAS MÓVILES POR OLA INVERNAL
Fiduciaria Popular S.A.
Carrera 13A No. 29-24 Pisos 20, 21 y 24
Bogotá

Cordialmente,

HERNÁN PARDO BOTERO
Gerente de Infraestructura

Anexo lo enunciado
Elaboró: Geraldine Lorena Prada Pimiento- Profesional de la Gerencia de Infraestructura
Revisó: Jesús Alberto Cañas Páez – Gestor de la Gerencia de Infraestructura

CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023

ATENCIÓN DE NECESIDADES PRIORITARIAS EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR DE LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS

Periodo comprendido entre el 02 de abril al 01 de mayo de 2025

Bogotá D.C.

TABLA DE CONTENIDO

1. **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO MARCO**
2. **ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO**
   - 2.1 OBLIGACIONES GENERALES
   - 2.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS
   - 2.3 ACTIVIDADES PRECONTRACTUALES
     - 2.3.1 Obligaciones
   - 2.4 ACTIVIDADES CONTRACTUALES
     - 2.4.1 Obligaciones
   - 2.5 ACTIVIDADES DE CIERRE Y LIQUIDACIÓN
     - 2.5.1 Obligaciones
3. **RESUMEN GENERAL DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL CONTRATO**
4. **ANEXOS**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO MARCO

Objeto General:	Brindar Asistencia Técnica y Administración de Recursos para atender las necesidades prioritarias en infraestructura y dotación de mobiliario escolar de las sedes educativas afectadas por la temporada de lluvias que sean definidas por el Ministerio de Educación.	
Numero de Contrato:	CO1.PCCNTR. 4917031	
Integrantes:	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - MEN Y LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER	
Fecha de suscripción:	05 de mayo de 2023	
Perfeccionamiento	Póliza garantía aprobada 26 de mayo de 2023 Registro Presupuestal 02 de junio de 2023	
Fecha de Inicio:	02 de junio de 2023	
Fecha de Terminación:	01 de julio de 2025	
Modificaciones:	Modificatorio No. 1. Modificar la cláusula cuarta - plazo de ejecución del contrato, la cual quedará de la siguiente manera: "El plazo previsto para la ejecución del Contrato Interadministrativo será a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, hasta el 01 de noviembre de 2024, plazo en el que se debe llevar a cabo la ejecución física del contrato y la liquidación de la contratación derivada que suscriba FINDETER."	
	Modificatorio No. 2. "Prorrogar el plazo de ejecución del contrato número CO1.PCCNTR.4917031 de 2023, hasta el 01 de julio de 2025, plazo en el que se debe culminar la ejecución física de las obras de infraestructura educativa, dotación de aulas nuevas por reposición, y la liquidación de la contratación derivada suscrita por FINDETER."	
Aportes:	Valor de los recursos a administrar para la ejecución de los proyectos	$ 59.485.981.308
	Porcentaje de Asistencia Técnica y Administración de Recursos a reconocer a FINDETER (7%)	$ 4.164.018.692
Valor final del Contrato:		$ 63.650.000.000
Sociedad Fiduciaria:	FIDUCIARIA POPULAR S.A.	

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO

1.1 OBLIGACIONES GENERALES

1. *Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas en este contrato.*

En el transcurso del periodo actual, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. (FINDETER) asume con responsabilidad la tarea integral de estructurar, desarrollar y dar seguimiento a todas las actividades derivadas de la ejecución de las diversas obligaciones estipuladas en el contrato vigente. En virtud de su compromiso, FINDETER se esfuerza por cumplir con cada una de las responsabilidades asignadas, garantizando que cada etapa del contrato sea llevada a cabo de manera exitosa y en plena conformidad con los términos y condiciones acordadas previamente.

Es importante destacar que el compromiso de FINDETER no se limita únicamente a la ejecución técnica del contrato, sino que abarca también la garantía de la calidad y la excelencia en cada una de las etapas del proceso. La entidad se esfuerza por mantener altos estándares de rendimiento, asegurando que los resultados obtenidos sean de la más alta calidad posible y estén alineados con los objetivos y metas establecidas.

2. *Participar y apoyar al Ministerio de Educación Nacional en todas las reuniones periódicas a las que este lo convoque relacionadas con la ejecución del contrato que permitan realizar seguimiento integral a los avances de los proyectos.*

Durante el presente periodo FINDETER participó activamente y brindó el pleno apoyo al Ministerio de Educación Nacional en todas las reuniones periódicas a las que se convocaron, especialmente, aquellas relacionadas con la ejecución del contrato. FINDETER está comprometido con realizar un seguimiento integral y detallado de los avances del proyecto, por lo que se establecieron reuniones cada martes en la tarde a través del aplicativo Teams, reuniones programadas por FINDETER sobre las que realizan grabaciones y se informa los avances semanales.

Las fechas de las reuniones de seguimiento del periodo, sobre las cuales se realiza el acta correspondiente, la cual se adjunta al presente informe:

1. 28 de abril del 2025

3. *Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la información objeto del presente contrato.*

FINDETER ha dispuesto todos los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la información objeto del presente contrato. La seguridad y confidencialidad de la información son de suma importancia, y se ha implementado medidas sólidas para garantizar su protección. Esto incluye la implementación de sistemas de almacenamiento seguro, protocolos de acceso restringido y medidas de respaldo que aseguran que la información esté resguardada de manera adecuada en todo momento. La prioridad es mantener la integridad de la información involucrada en el contrato, así mismo se habilitó los espacios adecuados en la Calle 103 No. 19-20 y en la segunda sede localizada en la Calle 104 # 18ª-65, piso 6 para tal fin.

4. *Entregar a EL MINISTERIO, periódicamente y al finalizar el contrato, o cuando el supervisor o interventor lo solicite, todos los documentos y archivos (físicos y electrónicos) a su cargo y que se produzcan en ejecución de sus obligaciones, lo anterior, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes en el Ministerio de Educación Nacional.*

Durante este periodo, FINDETER ha cumplido rigurosamente con la entrega de todos los documentos y archivos electrónicos que el MEN ha solicitado durante la ejecución del contrato. Esta entrega se realiza de manera periódica y al finalizar el contrato, tal como establecen las normas y disposiciones vigentes en el Ministerio de Educación Nacional. Además, en concordancia con las regulaciones vigentes, también se proporcionará dicha documentación cuando el supervisor o interventor así lo solicite. La prioridad es asegurar que todas las partes involucradas tengan acceso a la información necesaria y que cumplan con todas las obligaciones contractuales en cuanto a la entrega y custodia de documentación.

5. *Colaborar en el suministro y respuesta de la información correspondiente a los requerimientos efectuados por los organismos de control del Estado Colombiano o cualquier otra autoridad, en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato y de asuntos relacionados con el mismo.*

   En este periodo, FINDETER ha colaborado plenamente en el suministro y respuesta de toda la información correspondiente a los requerimientos efectuados por los Entes de Control del Estado Colombiano y cualquier otra autoridad pertinente. La cooperación en este sentido es absoluta y FINDETER está comprometido en proporcionar toda la información necesaria relacionada con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato, así como en asuntos relacionados con el mismo.

   Cumplir con los requisitos de los Entes de Control y las autoridades es fundamental para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en todas las acciones. La disposición a colaborar asegura que el proceso se realice de manera adecuada y en línea con las regulaciones y requerimientos establecidos por las autoridades correspondientes.

6. *Utilizar la imagen del Ministerio de Educación Nacional de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorización expresa y escrita de las partes ningún funcionario, podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole.*

   FINDETER ha seguido rigurosamente los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional en relación con el uso de su imagen. FINDETER es consciente de que, salvo autorización expresa y escrita de las partes involucradas, ningún funcionario puede utilizar el nombre, emblema o sello oficial del Ministerio con fines publicitarios o de cualquier otra índole. La colaboración se adhiere estrictamente a estas directrices para asegurar el respeto mutuo y la integridad en la utilización de la imagen y la identidad del Ministerio. Durante este periodo no se realizaron trámites que contengan la imagen del Ministerio de Educación Nacional.

7. *Guardar estricta confidencialidad sobre toda la información y los documentos obtenidos del MEN.*

   FINDETER ha mantenido una estricta confidencialidad sobre toda la información y los documentos obtenidos del Ministerio de Educación Nacional (MEN). Reconoce la importancia de salvaguardar la información confidencial y sensible proporcionada por el MEN, y se ha implementado medidas rigurosas para garantizar su protección. Se cumple con todas las regulaciones y acuerdos de confidencialidad establecidos para asegurar que la información no sea divulgada ni utilizada de manera inapropiada. El compromiso de FINDETER es mantener la integridad y confidencialidad de la información en todo momento.

8. *Realizar los pagos al SISS (salud, pensión y riesgos laborales), de acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago correspondientes.*

En el presente periodo, se han realizado los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral (SISS), incluyendo Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de acuerdo con la normatividad vigente.

Además, se pueden proporcionar los soportes de pago correspondientes como parte del compromiso con la legalidad y el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales. Cumplir con los requerimientos del SISS es fundamental para asegurar el bienestar de los colaboradores y garantizar el cumplimiento de las regulaciones pertinentes, lideradas por el área de gestión respectiva y validadas por la revisoría fiscal, soportes que serán presentados en el momento en el que se requiera.

1.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

a. *Presentar ante EL MINISTERIO dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes Al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (inicio SECOP), el cronograma de ejecución del objeto del Contrato Interadministrativo.*

FINDETER presentó en el periodo pasado ante el Ministerio de Educación Nacional, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (inicio SECOP), el cronograma actualizado de ejecución del objeto del Contrato Interadministrativo. FINDETER reconoce la importancia de establecer un cronograma claro y detallado para la ejecución de las actividades contractuales, y se ha cumplido con este requisito de manera oportuna. La intención es garantizar una planificación efectiva y transparente de las actividades a llevar a cabo, en consonancia con las regulaciones y directrices establecidas por el Ministerio.

b. *Crear una vez suscrito y legalizado el Contrato Interadministrativo, una cuenta contable para manejo exclusivo de los recursos de este Contrato Interadministrativo dentro del Patrimonio Autónomo constituido para tal fin por FINDETER.*

Una vez suscrito y legalizado el Contrato Interadministrativo, FINDETER ha creado una cuenta contable exclusiva para el manejo de los recursos de este contrato dentro del Patrimonio Autónomo constituido por FINDETER para tal fin. Se da cumplimiento a todos los requisitos y medidas establecidas para asegurar la correcta gestión financiera de los recursos relacionados con el Contrato Interadministrativo. La creación de esta cuenta contable específica en el Patrimonio Autónomo garantiza una administración transparente y adecuada de los recursos, en línea con las normativas y regulaciones pertinentes.

Por lo anteriormente mencionado, se crea la Cuenta de Ahorros No. 500-80465045-0 del Banco Popular para manejo exclusivo de los recursos de este contrato y respectivos reportes contables. Cabe recordar que, se adjuntó al Informe de Gestión N° 1 la Certificación de la Cuenta Bancaria.

Mediante correo electrónico del 24 de octubre de 2023, el MEN remitió oficio por parte del Ministerio de Hacienda, mediante el cual se oficializó la exención de gravamen financiero (GMF) de la cuenta del Patrimonio Autónomo. El cual se adjuntó en informes pasados.

c. *Administrar los recursos que transfiera EL MINISTERIO a través del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres- FNGRD a FINDETER a través del Patrimonio Autónomo constituido para cumplir con el objeto del presente contrato.*

FINDETER ha administrado de manera responsable los recursos que EL MINISTERIO ha transferido a través del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) a FINDETER, utilizando

el PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN AULAS MÓVILES POR OLA INVERNAL constituido por la Fiducia Mercantil FIDUCIARIA POPULAR S.A. para cumplir con el objeto del presente contrato.

El enfoque ha sido garantizar una gestión eficiente y transparente de los recursos para cumplir con los objetivos establecidos en el contrato. El uso adecuado de estos recursos es esencial para asegurar la ejecución exitosa de las actividades y proyectos acordados, en línea con las regulaciones y directrices establecidas por todas las partes involucradas.

d. *Presentar Informes mensuales y un informe final de ejecución financiera y técnica del presente Contrato, conforme los recursos aportados por EL FNGRD,*

Para el presente periodo, se presentará un informe mensual de ejecución financiera por el área de Negocios Fiduciarios de FINDETER y se ha presentado un informe técnico del presente contrato, conforme a los recursos aportados por el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD).

Estos informes son una parte integral de la transparencia y rendición de cuentas en la ejecución del contrato. A través de estos informes, se ha proporcionado una visión detallada de la utilización de los recursos, los avances técnicos logrados y otros aspectos relevantes de la ejecución del contrato. Cumplir con la presentación de estos informes es esencial para mantener una comunicación clara y abierta con EL MINISTERIO y garantizar que todas las partes estén informadas sobre el progreso y los resultados del contrato.

e. *El Patrimonio Autónomo — FINDETER deberá reintegrar mensualmente los rendimientos financieros (si los hubiere) a la Dirección del Tesoro Nacional o en los términos que establezca la normatividad aplicable, es decir, que no ingresan ni hacen parte del Patrimonio Autónomo constituido por FINDETER.*

El Patrimonio Autónomo - FINDETER reintegrará mensualmente los rendimientos financieros a la Dirección del Tesoro Nacional o en los términos que establezca la normatividad aplicable. Estos rendimientos financieros no ingresan ni hacen parte del Patrimonio Autónomo constituido por FINDETER, y la gestión de reintegro se realizará previa solicitud al Ministerio con el fin de que se informe la cuenta bancaria a la cual se debe realizar el mismo.

Este proceso de reintegro asegura la correcta gestión de los rendimientos generados por los recursos aportados y garantiza que estos sean manejados de acuerdo con las regulaciones y normativas pertinentes. De esta manera, se cumple con los requerimientos legales y se mantiene la transparencia en la administración financiera.

Para lo anterior, el 28 de agosto de 2023 se informa por el MEN la cuenta bancaria para el reintegro de rendimientos financieros del Contrato No. CO1.PCCNTR.4917031 la cual se indica a continuación:

Entidad Financiera:	**Banco BBVA**
Tipo de Cuenta:	**Ahorros**
Número de Cuenta:	**309-054583**
Nombre de la cuenta:	**FIDUPREVISORA S.A FNGRD – COLOMBIA VITAL**

1.3 ACTIVIDADES PRECONTRACTUALES

1.3.1 Obligaciones:

a. *Realizar la viabilización técnica y jurídica de los predios priorizados por EL MINISTERIO, cuando sea necesario y sea solicitado por el MEN.*

Durante periodos pasados, se llevó a cabo la viabilización técnica y jurídica priorizada por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) cada vez que ha sido necesario y solicitado por el MEN. La colaboración en este aspecto es esencial para asegurar que los predios sean evaluados y viabilizados de manera adecuada para cumplir con los requisitos técnicos necesarios. El compromiso es facilitar un proceso fluido y eficiente para que los predios sean utilizados de acuerdo con los objetivos y necesidades de cada Institución Educativa, siempre en línea con las regulaciones y disposiciones vigentes.

En este periodo, ya está finalizada la evaluación técnica y predial y que en resumen se describe a continuación en las siguientes tablas:

RESUMEN EVALUACIÓN TÉCNICA DE SEDES

UNIFICACIÓN DE LISTADOS: INICIAL (150) + ADICIONALES (42)	
SEDES VIABLES TÉCNICAMENTE	**150**

RESUMEN EVALUACIÓN JURÍDICA DE SEDES

SEDES TOTAL (150)	
SIN DOCUMENTOS	1 *
POSIBLE VIABILIDAD	0 **
NO VIABLE	9
VIABLES TÉCNICA Y JURÍDICAMENTE	**140**
TOTAL	150

* Sin Documentos:

- Falta de documentos para evidenciar la propiedad y reciprocidad en la revisión y remisión de documentos por la ETC y/o rectores

** Posible Viabilidad:

- Falta documentación soporte para continuar con revisión
- Pendientes gestiones con terceros para saneamiento predial
- Trámites para obtención de sana posesión

Asimismo, en el presente periodo, el listado actualizado de sedes focalizadas son las siguientes:

Consecutivo	ID MEN No.	Departamento	ETC	Municipio	IE	SEDE
1	1	**Nariño**	PASTO	**Pasto**	I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE	I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - SEDE PRINCIPAL
2	2	**Córdoba**	CORDOBA	**Tuchín**	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ALVARO ULCUE CHOCUE	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ALVARO ULCUE CHOCUE
3	3	**Cauca**	CAUCA	**Bolívar**	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA NUESTRA SENORA DE LOS REMEDIOS	COLEGIO DEPARTAMENTAL NUESTRA SENORA DE LOS REMEDIOS

4	4	Cesar	VALLEDUPAR	Valledupar	INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ	IE ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ
5	6	Bolívar	BOLIVAR	Barranco de Loba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR	I.E.T.A. LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR - SEDE PRINCIPAL
6	7	Santander	SANTANDER	Vélez	COLEGIO UNIVERSITARIO	COLEGIO UNIVERSITARIO
7	8	Nariño	NARIÑO	El Rosario	CENTRO EDUCATIVO LA CLAUDIA	CENTRO EDUCATIVO LA CLAUDIA
8	9	Bolívar	BOLIVAR	Barranco de Loba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR	ATASCOZA
9	10	Bolívar	BOLIVAR	Barranco de Loba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR	LOS CERRITOS
10	11	Guajira	LA GUAJIRA	Manaure	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	ESCUELA RURAL INDÍGENA KARALOUTAMANA
11	12	Cauca	CAUCA	Toribío	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PLAYA	CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO LA PLAYA - SEDE PRINCIPAL
12	13	Magdalena	MAGDALENA	Concordia	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE BASICA Y MEDIA SANTA CRUZ DE BALSAMO	ERM DE BALSAMO
13	14	Magdalena	MAGDALENA	Concordia	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE BASICA Y MEDIA SANTA CRUZ DE BALSAMO	JAR INF MIS PRIMEROS SUEÑOS
14	16	Cauca	CAUCA	Santander de Quilichao	INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO	DOMINGUILLO (sede principal)
15	17	Santander	SANTANDER	Betulia	INSTITUCION EDUCATIVA EL RAMO	CENTRO EDUCATIVO SANTA BARBARA
16	18	Atlántico	SOLEDAD	Soledad	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE PRINCIPAL
17	20	Bolívar	BOLIVAR	Morales	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PALMA	LA ARCADIA
18	22	Cauca	CAUCA	El Tambo	I.E. HUISITO	HUISITO (sede principal)
19	24	Magdalena	MAGDALENA	El Banco	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ANTONIO NARIÑO	CENT EDUC RUR MIX JOSE DE LA PAZ VANEGA ORTIZ
20	26	Huila	HUILA	Acevedo	INSTITUCION EDUCATIVA BATEAS	BATEAS
21	27	Cauca	CAUCA	Piamonte	CENTRO EDUCATIVO PUERTO GUAYUYACO	ESCUELA RURAL MIXTA LA ESPANOLA
22	28	Córdoba	CORDOBA	Cotorra	INSTITUCION EDUCATIVA LOS AGUACATES	CENT EDUC LOS AGUACATES
23	29	Bolívar	BOLIVAR	Mompós	INSTITUCIÒN EDUCATIVA TÈCNICA AMBIENTAL DE TIERRA FIRME	I.E.T.A. AMBIENTAL DE TIERRA FIRME - SEDE PRINCIPAL
24	30	Cesar	CESAR	Curumaní	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES
25	32	Magdalena	MAGDALENA	El Banco	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL SILVIA COTES DE BISWELL	ERM SANTA TERESA DE ISLITA
27	34	Guajira	RIOHACHA	Riohacha	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA #7	APÜNIMA´ANA1
28	36	Nariño	NARIÑO	Cumbal	INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCION DE TALLAMBI	INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCION DE TALLAMBI
29	41	Putumayo	PUTUMAYO	Puerto Asís	I. E. RUR CAUCACIA	ESC RUR MIX EL JARDIN ALTO TETEYE
30	42	Antioquia	ANTIOQUIA	Ciudad Bolívar	I. E. JOSE MARIA HERRAN	C. E. R. PAULINA PUERTA
31	43	Bolívar	BOLIVAR	San Martín de Loba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA PESQUERA LEONIDAS ORTIZ ALVEAR DE CHIMÍ	PLAN BONITO
32	44	Cauca	CAUCA	La Vega	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA SANTA RITA	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA RITA (sede principal)
33	45	Cesar	CESAR	La Paz(Robles)	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA CAÑO PADILLA YUKPA	SEDE EL COSO
34	46	Cauca	CAUCA	Balboa	C.E. BUENOS AIRES	CAPITANES
35	48	Cesar	VALLEDUPAR	Valledupar	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ	INSTITUTO TECNICO COMERCIAL JOSE EUGENIO MARTINEZ
36	49	Bolívar	BOLIVAR	Mompós	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DEL CHICAGUA	SAN LUIS
37	50	Guajira	MAICAO	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2	SEDE LA CAMPANA
38	51	Guajira	MAICAO	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6	YAMAIN - SEDE PRINCIPAL
39	53	Guajira	MAICAO	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2	SEDE KASICHE
40	54	Guajira	MAICAO	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2	SEDE WAYUUMA ANA
41	56	Arauca	ARAUCA	Saravena	CENTRO EDUCATIVO LA PAVA.	LA PAVA

42	57	Putumayo	PUTUMAYO	Puerto Asís	I. E. RUR CAUCACIA	ESC RUR MIX EL PROGRESO
43	58	Cauca	CAUCA	Bolívar	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO NUESTRA SENORA DEL CARMEN	CORRAL VIEJO
44	59	Cauca	CAUCA	Bolívar	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO NUESTRA SENORA DEL CARMEN	NUESTRA SENORA DEL CARMEN (sede principal)
45	60	Guajira	RIOHACHA	Riohacha	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN	COOPERATIVO
46	62	Valle del Cauca	BUGA	Guadalajara de Buga	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	JHON F. KENNEDY
47	64	Atlántico	ATLANTICO	Galapa	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA
48	65	Cauca	CAUCA	Balboa	I.E. OLAYA (ANTES C.E. OLAYA)	OLAYA (sede principal)
49	66	Antioquia	APARTADO	Apartadó	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS
50	67	Tolima	TOLIMA	Santa Isabel	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BOLIVAR	LA HUMAREDA
51	69	Córdoba	CORDOBA	Planeta Rica	INSTITUCION EDUCATIVA LOMA AZUL	LOS CERROS
52	70	Córdoba	CORDOBA	Puerto Libertador	INSTITUCION EDUCATIVA PICA PICA VIEJO	ESC NVA LA SOLITA
53	73	Bolívar	BOLIVAR	Córdoba	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE TACAMOCHO	NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE TACAMOCHITO
54	74	Cesar	CESAR	El Paso	INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE LA ESPERANZA
55	75	Cesar	CESAR	El Paso	INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE EL VALLITO
56	77	Cesar	CESAR	El Paso	INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE SAN ANGEL
57	79	Cesar	CESAR	El Paso	INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE LA ESTACION
58	83	Atlántico	ATLANTICO	Repelón	INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS	INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS - SEDE PRINCIPAL
59	84	Atlántico	ATLANTICO	Repelón	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE VILLA ROSA	SEDE LA LOMA
60	85	Valle del Cauca	BUGA	Guadalajara de Buga	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	LA PLANTA
61	86	Antioquia	APARTADO	Apartadó	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO
62	87	Nariño	NARIÑO	BARBACOAS	INSTITUCION EDCUATIVA TERAIMBE	SEDE 9 CUMAINDE
63	88	Putumayo	PUTUMAYO	Puerto Leguízamo	IE RUR LUIS VIDALES DEL PIÑUÑA NEGRO	ESC RUR MIX PUERTO PRINCIPE DOS
64	90	Cauca	CAUCA	Bolívar	CENTRO EDUCATIVO EL TAMBO	LA FUENTE
65	92	Atlántico	ATLANTICO	Repelón	INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS	PITA
66	93	Cauca	CAUCA	Bolívar	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CARMEN	EL CARMEN (sede principal)
67	94	Chocó	CHOCO	Carmen del Darién	CE PUEBLO NUEVO	CE PUEBLO NUEVO - SEDE PRINCIPAL
68	95	Guajira	RIOHACHA	Riohacha	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN	JOSE ANTONIO GALAN
69	96	Meta	VILLAVICENCIO	Villavicencio	INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO FRANCISCO ARANGO	ESCUELA SIETE DE AGOSTO
70	97	Cesar	CESAR	Curumaní	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	SEDE CHINELA
71	98	Cesar	CESAR	Curumaní	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	SEDE GUAIMARAL
72	100	Tolima	TOLIMA	Santa Isabel	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BOLIVAR	EL BRASIL
73	101	Cesar	CESAR	Curumaní	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	SEDE LOS SERRENOS
74	103	Córdoba	CORDOBA	Ayapel	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO	ESC NVA PARCELAS LONDRES
75	104	Cundinamarca	CUNDINAMARCA	Anolaima	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE HUGO ENCISO	ESCUELA RURAL EL DESCANSO
76	105	Chocó	CHOCO	Bahía Solano (Mutis)	IE LUIS LOPEZ DE MESA	SEDE DE SAN JOSE (HUACA)
77	106	Chocó	CHOCO	Bahía Solano (Mutis)	IE LUIS LOPEZ DE MESA	SEDE SIRENA DEL MAR
78	107	Chocó	CHOCO	Bahía Solano (Mutis)	IE LUIS LOPEZ DE MESA	SEDE SECUNDINO RIVAS
79	110	Nariño	NARIÑO	BARBACOAS	INSTITUCION EDUCATIVA TERAIMBE	SEDE 2 BOMBÓN

80	111	Magdalena	MAGDALENA	Puebloviejo	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS	ERM ISLA DE CATAQUITA
81	112	Magdalena	MAGDALENA	El Retén	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE	COL MPAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE
82	113	Magdalena	MAGDALENA	San Sebastián de Buenavista	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA	ERM MARIA AUXILIADORA
83	114	Magdalena	MAGDALENA	San Sebastián de Buenavista	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA	ERM LA PACHA
84	117	Guajira	RIOHACHA	Riohacha	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA #7	WAKUAPAMANA
85	118	Antioquia	APARTADO	Apartadó	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO
86	119	Córdoba	CORDOBA	Montelíbano	INSTITUCION EDUCATIVA EL PALMAR	INSTITUCION EDUCATIVA EL PALMAR SEDE PRINCIPAL
87	121	Cauca	CAUCA	Piamonte	CENTRO EDUCATIVO PUERTO GUAYUYACO	ESC RUR MIX SAN ANDRESITO
88	122	Antioquia	TURBO	Turbo	I.E. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	E.U. JESUS MORA
89	123	Bolívar	BOLIVAR	Simití	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CERRO DE VERACRUZ	CAMPO PAYARES
90	124	Bolívar	BOLIVAR	Simití	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CERRO DE VERACRUZ	I.E. DEL CERRO DE VERACRUZ - SEDE PRINCIPAL
91	125	Cauca	CAUCA	Piamonte	INST EDUC AGRIC PIAMONTE	PIAMONTE (sede principal)
92	126	Magdalena	MAGDALENA	Puebloviejo	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS	ERM EL TRIUNFO
93	127	Putumayo	PUTUMAYO	Orito	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL UMADA WUARRARA	ESC RUR MIX ALTO ORITO
94	128	Valle del Cauca	BUGA	Guadalajara de Buga	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE - SEDE PRINCIPAL
95	129	Valle del Cauca	BUGA	Guadalajara de Buga	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	JULIAN MENDOZA GUERRERO
96	130	Valle del Cauca	BUGA	Guadalajara de Buga	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	LA HONDA
97	132	Norte de Santander	NORTE SANTANDER	La Playa	CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN PEDRO	SEDE LA PEÑA
98	133	Magdalena	MAGDALENA	El Banco	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL OSCAR PISCIOTTI NUMA	ERM INMACULADA CONCEPCION
99	134	Bolívar	BOLIVAR	María la Baja	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA	BUENOS AIRES
100	135	Bolívar	BOLIVAR	María la Baja	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA	I.E.T. AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA
102	138	Arauca	ARAUCA	Arauca	CENTRO EDUCATIVO MONSERRATE	CEAR MONSERRATE
104	142	Nariño	IPIALES	Ipiales	INSTITUCION EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL LOS PASTOS	ESCUELA LAS CRUCES
105	143	Guajira	LA GUAJIRA	Barrancas	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL PROVINCIAL	CENTRO ETNOEDUCATIVO PROVINCIAL
106	144	Atlántico	SOLEDAD	Soledad	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE
107	146	Cesar	CESAR	Chimichagua	CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO	SEDE TRONCONAL
108	147	Cesar	CESAR	Chimichagua	CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO	SEDE PUERTO LA ESTANCIA
109	148	Cesar	CESAR	Chimichagua	CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO	SEDE TORRECILLA
110	149	Nariño	NARIÑO	Mallama (Piedrancha)	CENTRO EDUCATIVO MALLAMA	CENTRO EDUCATIVO DE MALLAMA
111	150	Chocó	CHOCO	Tadó	IE TECNICO AGROAMBIENTAL - MARIA AUXILIADORA	SEDE MARÍA AUXILIADORA DE MANUNGARA
112	151	Guajira	LA GUAJIRA	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2	SEDE LA ESTRELLA
113	152	Guajira	MAICAO	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6	YAMAIN - KASPOLIMANA
114	153	Guajira	LA GUAJIRA	Maicao	ESCUELA RURAL MIXTA TALOULUMA'ANA	ESCUELA RURAL MIXTA TALOULUMA'ANA
115	154	Magdalena	CIENAGA	Ciénaga	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO
116	156	Magdalena	MAGDALENA	El Retén	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE	SEDE CONC.ESC GENERAL GREGORIO GARZON
117	158	Valle del Cauca	BUGA	Guadalajara de Buga	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	SEDE CRISTOBAL COLON

118	161	Antioquia	APARTADO	Apartadó	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL GUINEO	CENTRO EDUCATIVO RURAL EL OSITO
119	163	Cauca	CAUCA	La Vega	I.E AGROPECUARIA SAN FRANCISCO JAVIER SEDE GARAY	I.E AGROPECUARIA SAN FRANCISCO JAVIER SEDE GARAY
120	164	Cauca	CAUCA	Santander de Quilichao	IE DOMINGUILLO	SEDE DOMINGO LASSO
121	165	Cauca	CAUCA	Popayán	IE COMUNEROS	Sede Principal
122	172	Putumayo	PUTUMAYO	Puerto Asís	E. RUR CAUCACIA - SEDE PRINCIPAL	Sede Principal
123	173	Cauca	CAUCA	Piamonte	ESC RUR MIX FRAY EZEQUIEL	ESC RUR MIX FRAY EZEQUIEL
124	174	Cauca	CAUCA	Piamonte	E.D.R PORTO GUAYUYACO SEDE PRINCIPAL	E.D.R PORTO GUAYUYACO SEDE PRINCIPAL
125	175	Cauca	CAUCA	Rosas	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA	SANTA TERESITA (sede principal)
126	178	Cauca	CAUCA	Rosas	INSTITUCION EDUCATIVA MADRE CARIDAD BRADER	MADRE CARIDAD BRADER (sede principal)
127	182	Cauca	CAUCA	Rosas	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO CORDOBA	LAS YERBAS
128	183	Cauca	CAUCA	Rosas	CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO LEON VALENCIA	LA DESPENSA
129	184	Cauca	CAUCA	Rosas	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO CORDOBA	EL RETIRO
130	186	Cauca	CAUCA	Rosas	CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO LEON VALENCIA	EL ALTILLO
131	187	Cauca	CAUCA	Rosas	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO CORDOBA	BELLAVISTA
132	188	Cauca	CAUCA	Suarez	IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA	Sede Principal
133	189	Cauca	CAUCA	Suarez	IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA	SEDE MARIA INMACULADA
134	190	Cauca	CAUCA	Suarez	IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA	SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
135	192	Atlántico	SOLEDAD	Soledad	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE CABICA
136	194	Bolívar	Bolívar	Maria la Baja	INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA AGROINDUSTRIAL DE FLAMENCO	EL NISPERO
137	196	Atlántico	Atlántico	Malambo	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MESOLANDIA	Sede Principal
138	202	Chocó	CHOCO	Tadó	IE NORMAL SUPERIOR DEMETRIO SALAZAR CASTILLO	CENTRO EDUCATIVO ESCUELA FRANCISCO MIRANDA
139	203	Antioquia	TURBO	Turbo	IE SAN MARTIN DE PORRES	SEDE GONZALO MEJIA

En este periodo es importante resaltar que, bajo este listado de sedes focalizadas para intervención técnica, ya se adelantó la verificación predial, la cual da como resultado 136 sedes a intervenir.

Sedes despriorizar técnicamente: se tuvo que despriorizar las siguientes 9 instituciones educativas de los siguientes grupos:

GRUPO	ID MEN	Departamento	ETC	Municipio	IE	SEDE	OBERVACIONES
1	55	Chocó	CHOCO	Tadó	IE TECNICO AGROAMBIENTAL	SEDE CAMPO ALEGRE	En un principio, la sede priorizada en el municipio de Tadó era la sede la sede Campo Alegre. Esta perteneciente a la IE Técnico Agroambiental, la cual actualmente cuenta con una matrícula según el Sistema Integrado de Matricula -Simat de 40 estudiantes; no obstante, en la etapa de viabilidad técnica y jurídica adelantada por el contratista designado por Findeter determinó que esta sede presentaba limitaciones técnicas, normativas y

							administrativas por estar en zona de riesgo por inundación, por lo que se recomendó no efectuar intervención alguna.
	120	Antioquia	**TURBO**	Turbo	**I.E. DE DESARROLLO RURAL DE TURBO**	E.U. SANTISIMA TRINIDAD	Se tramito la exclusión del anexo "Listado de Instituciones Educativas Priorizadas por el MEN" a la sede IE. DE DESARROLLO RURAL DE TURBO EU SANTÍSIMA TRINIDAD., reemplazándola por la SEDE GONZALO MEJIA perteneciente a la IE. SAN MARTIN DE PORRES, ubicada en el municipio de Turbo, Antioquia en el marco del contrato de obra No. PAF-MENAM-O-049-2023 y contrato de interventoría No. PAF-MENAM-I-052-2023 Frente a lo anterior, es importante indicar en el presente concepto que, la solicitud se realiza enmarcada en el lineamiento dado por el Ministerio de Educación Nacional – MEN en Comité Técnico No. 30 No. CO1.PCCNTR.4917031 DE 2023 PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN AULAS MÓVILES POR OLA INVERNAL, de fecha 24 de enero de 2024
2	**91**	Atlántico	**ATLANTICO**	Palmar de Varela	**INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL DE PALMAR DE VARELA**	JOSE MARIA CORDOBA	Esta institución Educativa se tuvo que despriorizar porque ya estaba intervenida por la gobernación de Atlántico
	191	Atlántico	**ATLANTICO**	Luruaco	**IE CORREGIMIENTO DE SAN JUAN DE TOCAGUA**	CORREGIMIENTO DE SAN JUAN DE TOCAGUA	Se despriorizo esta institución educativa, debido a que el MEN define que esta IE seria intervenida por el FFIE
4	**71**	Bolívar	**BOLIVAR**	Córdoba	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE TACAMOCHO**	TACAMOCHO (SEDE PRIMARIA)	Esta sede tuvo que ser despriorizada, debido a que en el año 2015 ante esta situación la Corporación autónoma ambiental Cormagdalena, mediante Contrato Interadministrativo 0-0019 de 2015 suscrito con la Universidad Nacional de Colombia, elabora un estudio del cual se destaca la siguiente consideración general: "A partir de este análisis se puede considerar que Tocomocho se encuentra ubicado, prácticamente en la

							mitad del río, bajo la amenaza de inundaciones y procesos erosivos que se pueden activar en cualquier época".
	139	Magdalena	**MAGDALENA**	San Sebastián de Buenavista	**INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE TRONCOSO**	ERM DE JAIME	Esta sede tuvo que ser despriorizada, conforme a una recopilación de datos realizada por el contratista, JASA LTDA propone tener en cuenta que la ERM Jaime requiere una altura de palafito de 1,7 m, lo cual genera la construcción de acceso al aula, definida en el alcance contractual, de una infraestructura que debe contemplar el ingreso a toda la institución, siendo necesario la construcción de toda la sede con el fin de poder hacer funcional su ingreso. La interventoría, CONSORCIO INTER EDUCATIVO G4 considera que no se deben realizar obras de infraestructura de mejoramiento y/o construcción, debido a lo planteado por el contratista y a que los mejoramientos no tendrían estabilidad por efectos de los daños que ocasionará la inundación y la construcción debe ser de toda la institución con palafitos de 1,70 m, lo cual supera el alcance contractual.
9	**33**	Capital Bogotá, D.C	BOGOTA	Bogotá, D.C.	**COLEGIO LA CHUCUA (IED)**	CENT EDUC DIST LA CHUCUA	Sede retirada mediante comité técnico No. 70 y comité fiduciario No. 45.
	136	Capital Bogotá, D.C.	BOGOTA	Bogotá, D.C.	**COLEGIO ESTRELLA DEL SUR (IED)**	COL DIST ESTRELLA DEL SUR	Sede retirada mediante comité técnico No. 70 y comité fiduciario No. 45.
	141	Santander	BARRANCABERMEJA	Barrancabermeja	**CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN**	CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN	Sede retirada mediante comité técnico No. 70 y comité fiduciario No. 45.

De acuerdo con lo anterior se hace la inclusión de las siguientes 4 sedes educativas para tener un resultado total de intervención de 136 sedes educativas:

ID MEN	Departamento	ETC	Municipio	IE	SEDE
202	Chocó	CHOCO	Tadó	IE NORMAL SUPERIOR DEMETRIO SALAZAR CASTILLO	CENTRO EDUCATIVO ESCUELA FRANCISCO MIRANDA
203	Antioquia	TURBO	Turbo	IE SAN MARTIN DE PORRES	SEDE GONZALO MEJIA
196	Atlántico	Atlántico	Malambo	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MESOLANDIA	Sede Principal
194	Bolívar	Bolívar	Maria la Baja	INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA AGROINDUSTRIAL DE FLAMENCO	EL NISPERO

La viabilización jurídica de los predios priorizados por el Ministerio se realiza de manera eficiente, siempre que sea necesario y solicitado por el Ministerio de Educación Nacional (MEN). Es un paso fundamental para garantizar el adecuado desarrollo de proyectos educativos y el cumplimiento de los objetivos establecidos por el MEN, de acuerdo con lo anterior, en este periodo quedo la verificación predial y técnica así:

SEDES TOTAL INICIAL (150)	
SIN DOCUMENTOS	1 *
POSIBLE VIABILIDAD	0 **
NO VIABLE	9
VIABLES TÉCNICA Y JURÍDICAMENTE	**140**
TOTAL	150

SEDES NUEVAS A PRIORIZAR (9)	
POSIBLE VIABILIDAD	1 *
VIABLES JURÍDICAMENTE	8
TOTAL	9

SEDES PRIORIZACIÓN ACTUALIZADA (136)	
SEDES INICIALMENTE PRIORIZADAS	141
SEDES DESPRIORIZADAS	9
SEDES NUEVAS INCLUIDAS	4
TOTAL	**136**

b. *En consideración a que los proyectos a atender por este contrato se ejecutaran en el marco del Decreto de Emergencia, FINDETER debe acudir a lo establecido en su manual de contratación que permita que los procesos de selección sean eficientes y puedan ser proyectos de respuesta rápida.*

FINDETER implementa en el marco de lo establecido en el Manual Operativo la contratación que permita la ejecución eficiente de los procesos de selección que permita pluralidad de oferentes, asimismo, durante el proceso de ejecución, se ha establecido en la estructuración, la necesidad de optimizar tiempos de respuesta rápidos con sistemas constructivos industrializados.

c. *Elaborar los Estudios Previos e insumos precontractuales para la contratación de las obras y suministros necesarios para atender las necesidades prioritarias en infraestructura y dotación de mobiliario escolar de las sedes educativas afectadas por la temporada de lluvias que sean definidas por el Ministerio de Educación. Así como las interventorías correspondientes, solicitando que se*

acaten los principios que rigen la contratación pública, incluyendo la solicitud de las respectivas garantías que ampare cada contrato con siguientes riesgos: anticipo (si lo hubiere), calidad, cumplimiento, estabilidad de la obra, salarios y prestaciones sociales, responsabilidad civil extracontractual y todo riesgo de construcción, según sea aplicable.

Proyectos en proceso de estructuración

Se han elaborado los Estudios Previos e insumos precontractuales necesarios para la contratación de obras y suministros dirigidos a atender las necesidades prioritarias en infraestructura y dotación de mobiliario escolar en las sedes educativas afectadas por la temporada de lluvias, para apertura de las diferentes convocatorias, tal como ha sido definido por el Ministerio de Educación. Estos estudios y documentos precontractuales son esenciales para establecer las bases de las futuras contrataciones y asegurar la correcta ejecución de los proyectos.

Además, se ha solicitado que, en la contratación de las obras y suministros, así como en las interventorías correspondientes, se respeten los principios que rigen la contratación pública. Esto garantiza la transparencia, la igualdad de oportunidades y la eficiencia en los procesos de contratación.

Asimismo, se ha requerido la inclusión de las garantías correspondientes para amparar los diferentes riesgos asociados a cada contrato. Estas garantías incluyen aspectos como el anticipo, la calidad de la obra, el cumplimiento de los plazos, la estabilidad de la construcción, los salarios y prestaciones sociales de los trabajadores, la responsabilidad civil extracontractual y los posibles riesgos de construcción. Esto proporciona seguridad tanto para la entidad contratante como para los contratistas y contribuye a la adecuada ejecución de los proyectos en línea con las normativas y estándares requeridos.

En el presente periodo se establece definitivamente la estructuración y la contratación de los grupos de contratación de acuerdo con el siguiente listado:

GRUPO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ID MEN No.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	VR. TOTAL AULAS Y MEJORAMIENTO	VR. INTERVENTORÍA	VR. TOTAL OBRA + INTERVENTORÍA
1	Antioquia	Apartadó	66	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS	624.000.000	46.800.000	670.800.000
			86	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ PUEBLO	291.200.000	21.840.000	313.040.000
			118	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO	661.678.027	49.625.852	711.303.879
			161	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL GUINEO	CENTRO EDUCATIVO RURAL EL OSITO	403.329.013	30.249.676	433.578.689
		Turbo	120	I.E. DE DESARROLLO RURAL DE TURBO	E.U. SANTISIMA TRINIDAD	312.000.000	23.400.000	335.400.000
			122	I.E. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	E.U. JESUS MORA	499.200.000	37.440.000	536.640.000
		Ciudad Bolívar	42	I. E. JOSE MARIA HERRAN	C. E. R. PAULINA PUERTA	124.800.000	9.360.000	134.160.000
	Chocó	Carmen del Darién	94	CE PUEBLO NUEVO	CE PUEBLO NUEVO - SEDE PRINCIPAL	522.668.285	39.200.121	561.868.406
		Tadó	55	IE TECNICO AGROAMBIENTAL	SEDE CAMPO ALEGRE	266.693.962	20.002.047	286.696.010
			150	IE TECNICO AGROAMBIENTAL	SEDE MARÍA AUXILIADORA DE MANUNGARA	124.800.000	9.360.000	134.160.000
2	Atlántico	Galapa	64	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA	624.000.000	46.800.000	670.800.000

GRUPO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ID MEN No.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	VR. TOTAL AULAS Y MEJORAMIENTO	VR. INTERVENTORÍA	VR. TOTAL OBRA + INTERVENTORÍA
		Palmar de Varela	91	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL DE PALMAR DE VARELA	JOSE MARIA CORDOBA	561.600.000	42.120.000	603.720.000
		Repelón	83	INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS	INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS - SEDE PRINCIPAL	332.800.000	24.960.000	357.760.000
			84	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE VILLA ROSA	SEDE LA LOMA	229.439.280	17.207.946	246.647.226
			92	INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS Y LAS TABLAS	PITA	220.727.086	16.554.531	237.281.617
		Soledad	18	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE PRINCIPAL	665.600.000	49.920.000	715.520.000
			144	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL BLAS TORRES DE LA TORRE	915.200.000	68.640.000	983.840.000
			192	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE CABICA	372.384.464	27.928.835	400.313.298
		Luruaco	191	IE CORREGIMIENTO DE SAN JUAN DE TOCAGUA	CORREGIMIENTO DE SAN JUAN DE TOCAGUA	249.600.000	18.720.000	268.320.000
3	Magdalena	Ciénaga	154	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENOC MENDOZA RIAZCO	1.414.400.000	106.080.000	1.520.480.000
		El Retén	112	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE	COL MPAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE	2.801.018.341	210.076.376	3.011.094.717
			156	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ROQUE DE LOS RIOS VALLE	SEDE CONC.ESC GENERAL GREGORIO GARZON	436.800.000	32.760.000	469.560.000
		Puebloviejo	111	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS	ERM ISLA DE CATAQUITA	83.200.000	6.240.000	89.440.000
			126	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE PALOS PRIETOS	ERM EL TRIUNFO	166.400.000	12.480.000	178.880.000
4	Bolívar	Córdoba	71	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE TACAMOCHO	TACAMOCHO (SEDE PRIMARIA)	447.519.640	33.563.973	481.083.613
			73	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE TACAMOCHO	NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE TACAMOCHITO	493.484.507	37.011.338	530.495.845
		Mompós	29	INSTITUCIÒN EDUCATIVA TÈCNICA AMBIENTAL DE TIERRA FIRME	I.E.T.A. AMBIENTAL DE TIERRA FIRME - SEDE PRINCIPAL	1.125.688.392	84.426.629	1.210.115.022
			49	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DEL CHICAGUA	SAN LUIS	340.577.024	25.543.277	366.120.301
	Magdalena	San Sebastián de Buenavista	113	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA	ERM MARIA AUXILIADORA	488.073.254	36.605.494	524.678.748
			114	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE LA PACHA	ERM LA PACHA	623.194.392	46.739.579	669.933.972
			139	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE TRONCOSO	ERM DE JAIME	161.669.820	12.125.237	173.795.057
5	Bolívar	Barranco de Loba	6	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR	I.E.T.A. LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR - SEDE PRINCIPAL	468.319.640	35.123.973	503.443.613
			9	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR	ATASCOZA	364.668.644	27.350.148	392.018.792
			10	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA Y ACUÍCOLA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR	LOS CERRITOS	296.559.820	22.241.987	318.801.807
		San Martín de Loba	43	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA PESQUERA LEONIDAS ORTIZ ALVEAR DE CHIMÍ	PLAN BONITO	233.285.404	17.496.405	250.781.809
	Cesar	Chimichagua	146	CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO	SEDE TRONCONAL	133.346.981	10.001.024	143.348.005
			147	CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO	SEDE PUERTO LA ESTANCIA	130.159.820	9.761.987	139.921.807
			148	CENTRO EDUCATIVO EL PUEBLITO	SEDE TORRECILLA	124.800.000	9.360.000	134.160.000

GRUPO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ID MEN No.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	VR. TOTAL AULAS Y MEJORAMIENTO	VR. INTERVENTORÍA	VR. TOTAL OBRA + INTERVENTORÍA
		Curumaní	30	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	603.200.000	45.240.000	648.440.000
			97	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	SEDE CHINELA	83.200.000	6.240.000	89.440.000
			98	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	SEDE GUAIMARAL	124.800.000	9.360.000	134.160.000
			101	INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES	SEDE LOS SERRENOS	83.200.000	6.240.000	89.440.000
	Magdalena	Concordia	13	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE BASICA Y MEDIA SANTA CRUZ DE BALSAMO	ERM DE BALSAMO	485.009.460	36.375.710	521.385.170
			14	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE BASICA Y MEDIA SANTA CRUZ DE BALSAMO	JAR INF MIS PRIMEROS SUEÑOS	161.669.820	12.125.237	173.795.057
		El Banco	24	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ANTONIO NARIÑO	CENT EDUC RUR MIX JOSE DE LA PAZ VANEGA ORTIZ	546.091.802	40.956.885	587.048.688
			32	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL SILVIA COTES DE BISWELL	ERM SANTA TERESA DE ISLITA	244.487.366	18.336.552	262.823.918
			133	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL OSCAR PISCIOTTI NUMA	ERM INMACULADA CONCEPCION	192.455.361	14.434.152	206.889.513
6	Cesar	El Paso	74	INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE LA ESPERANZA	291.200.000	21.840.000	313.040.000
			75	INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE EL VALLITO	145.600.000	10.920.000	156.520.000
			77	INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE SAN ANGEL	65.079.910	4.880.993	69.960.903
			79	INSTITUCION EDUCATIVA OCTAVIO MENDOZA DURAN	SEDE LA ESTACION	132.643.683	9.948.276	142.591.959
		La Paz (Robles)	45	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA CAÑO PADILLA YUKPA	SEDE EL COSO	150.447.043	11.283.528	161.730.571
		Valledupar	4	INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ	IE ANTONIO ENRIQUE DIAZ MARTINEZ	457.600.000	34.320.000	491.920.000
			48	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ	INSTITUTO TECNICO COMERCIAL JOSE EUGENIO MARTINEZ	956.800.000	71.760.000	1.028.560.000
7	Guajira	Barrancas	143	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL PROVINCIAL	CENTRO ETNOEDUCATIVO PROVINCIAL	249.600.000	18.720.000	268.320.000
		Maicao	50	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2	SEDE LA CAMPANA	499.200.000	37.440.000	536.640.000
			51	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6	YAMAIN - SEDE PRINCIPAL	62.400.000	4.680.000	67.080.000
			53	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2	SEDE KASICHE	339.830.481	25.487.286	365.317.767
			54	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2	SEDE WAYUUMA ANA	127.479.910	9.560.993	137.040.903
			151	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2	SEDE LA ESTRELLA	314.679.910	23.600.993	338.280.903
			152	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6	YAMAIN - KASPOLIMANA	252.966.903	18.972.518	271.939.421
			153	ESCUELA RURAL MIXTA TALOULUMA'ANA	ESCUELA RURAL MIXTA TALOULUMA'ANA	857.226.526	64.291.989	921.518.516
		Manaure	11	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	ESCUELA RURAL INDÍGENA KARALOUTAMANA	190.566.903	14.292.518	204.859.421
		Riohacha	34	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA #7	APÜNIMA´ANA1	252.279.910	18.920.993	271.200.903
			60	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN	COOPERATIVO	416.000.000	31.200.000	447.200.000
			95	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN	JOSE ANTONIO GALAN	374.400.000	28.080.000	402.480.000
			117	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA #7	WAKUAPAMANA	224.079.460	16.805.960	240.885.420
8	Bolívar	María la Baja	134	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA	BUENOS AIRES	249.600.000	18.720.000	268.320.000
			135	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA	I.E.T. AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE MARIALABAJA	1.800.127.638	135.009.573	1.935.137.211

GRUPO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ID MEN No.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	VR. TOTAL AULAS Y MEJORAMIENTO	VR. INTERVENTORÍA	VR. TOTAL OBRA + INTERVENTORÍA
	Córdoba	Ayapel	103	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO	ESC NVA PARCELAS LONDRES	220.984.367	16.573.828	237.558.194
		Cotorra	28	INSTITUCION EDUCATIVA LOS AGUACATES	CENT EDUC LOS AGUACATES	124.800.000	9.360.000	134.160.000
		Montelíbano	119	INSTITUCION EDUCATIVA EL PALMAR	ESCUELA NUEVA MIXTA DIVINO SALVADOR	745.087.893	55.881.592	800.969.485
		Planeta Rica	69	INSTITUCION EDUCATIVA LOMA AZUL	LOS CERROS	430.464.507	32.284.838	462.749.345
		Puerto Libertador	70	INSTITUCION EDUCATIVA PICA PICA VIEJO	ESC NVA LA SOLITA	254.085.404	19.056.405	273.141.809
		Tuchín	2	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ALVARO ULCUE CHOCUE	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ALVARO ULCUE CHOCUE	1.074.838.830	80.612.912	1.155.451.742
9	Arauca	Arauca	138	CENTRO EDUCATIVO MONSERRATE	CEAR MONSERRATE	299.239.730	22.442.980	321.682.710
		Saravena	56	CENTRO EDUCATIVO LA PAVA.	LA PAVA	83.200.000	6.240.000	89.440.000
	Bolívar	Morales	20	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PALMA	LA ARCADIA	83.200.000	6.240.000	89.440.000
		Simití	123	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CERRO DE VERACRUZ	CAMPO PAYARES	232.352.784	17.426.459	249.779.243
			124	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL CERRO DE VERACRUZ	I.E. DEL CERRO DE VERACRUZ - SEDE PRINCIPAL	595.799.550	44.684.966	640.484.516
	Capital Bogotá, D.C.	Bogotá, D.C.	33	COLEGIO LA CHUCUA (IED)	CENT EDUC DIST LA CHUCUA	332.800.000	24.960.000	357.760.000
			136	COLEGIO ESTRELLA DEL SUR (IED)	COL DIST ESTRELLA DEL SUR	166.400.000	12.480.000	178.880.000
	Cundinamarca	Anolaima	104	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE HUGO ENCISO	ESCUELA RURAL EL DESCANSO	190.313.503	14.273.513	204.587.016
	Meta	Villavicencio	96	INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO FRANCISCO ARANGO	ESCUELA SIETE DE AGOSTO	924.437.134	69.332.785	993.769.919
	Norte de Santander	La Playa	132	CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN PEDRO	SEDE LA PEÑA	41.600.000	3.120.000	44.720.000
	Santander	Barrancabermeja	141	CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN	CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALAN	494.421.269	37.081.595	531.502.864
		Betulia	17	INSTITUCION EDUCATIVA EL RAMO	CENTRO EDUCATIVO SANTA BARBARA	62.400.000	4.680.000	67.080.000
		Vélez	7	COLEGIO UNIVERSITARIO	COLEGIO UNIVERSITARIO	926.718.332	69.503.875	996.222.206
	Tolima	Santa Isabel	67	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BOLIVAR	LA HUMAREDA	188.797.003	14.159.775	202.956.778
			100	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BOLIVAR	EL BRASIL	188.797.003	14.159.775	202.956.778
10	Cauca	Santander de Quilichao	16	INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO	DOMINGUILLO (sede principal)	1.235.282.193	92.646.164	1.327.928.358
			164	IE DOMINGUILLO	SEDE DOMINGO LASSO	124.800.000	9.360.000	134.160.000
		Suarez	188	IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA	SEDE PRINCIPAL	790.400.000	59.280.000	849.680.000
			189	IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA	SEDE MARIA INMACULADA	1.225.093.375	91.882.003	1.316.975.378
			190	IE TECNICA AGRICOLA DE SUAREZ CAUCA	SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	374.400.000	28.080.000	402.480.000
		Toribío	12	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PLAYA	CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO LA PLAYA - SEDE PRINCIPAL	338.159.820	25.361.987	363.521.807
	Chocó	Bahía Solano (Mutis)	105	IE LUIS LOPEZ DE MESA	SEDE DE SAN JOSE (HUACA)	148.792.381	11.159.429	159.951.810
			106	IE LUIS LOPEZ DE MESA	SEDE SIRENA DEL MAR	41.600.000	3.120.000	44.720.000
			107	IE LUIS LOPEZ DE MESA	SEDE SECUNDINO RIVAS	291.200.000	21.840.000	313.040.000
	Valle del Cauca	Guadalajara de Buga	62	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	JHON F. KENNEDY	540.800.000	40.560.000	581.360.000
			85	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	LA PLANTA	204.237.183	15.317.789	219.554.972
			128	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE - SEDE PRINCIPAL	166.400.000	12.480.000	178.880.000
			129	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	JULIAN MENDOZA GUERRERO	208.000.000	15.600.000	223.600.000

GRUPO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ID MEN No.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	VR. TOTAL AULAS Y MEJORAMIENTO	VR. INTERVENTORÍA	VR. TOTAL OBRA + INTERVENTORÍA
			130	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	LA HONDA	164.153.683	12.311.526	176.465.209
			158	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE	SEDE CRISTOBAL COLON	162.637.183	12.197.789	174.834.972
11	Cauca	Balboa	46	C.E. BUENOS AIRES	CAPITANES	83.200.000	6.240.000	89.440.000
			65	I.E. OLAYA (ANTES C.E. OLAYA)	OLAYA (sede principal)	416.000.000	31.200.000	447.200.000
		Bolívar	3	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA NUESTRA SENORA DE LOS REMEDIOS	COLEGIO DEPARTAMENTAL NUESTRA SENORA DE LOS REMEDIOS	436.800.000	32.760.000	469.560.000
			58	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO NUESTRA SENORA DEL CARMEN	CORRAL VIEJO	127.479.910	9.560.993	137.040.903
			59	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIO NUESTRA SENORA DEL CARMEN	NUESTRA SENORA DEL CARMEN (sede principal)	299.239.730	22.442.980	321.682.710
			90	CENTRO EDUCATIVO EL TAMBO	LA FUENTE	191.162.093	14.337.157	205.499.250
			93	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CARMEN	EL CARMEN (sede principal)	62.400.000	4.680.000	67.080.000
		El Tambo	22	I.E. HUISITO	HUISITO (sede principal)	1.041.842.757	78.138.207	1.119.980.964
		La Vega	44	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA SANTA RITA	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA RITA (sede principal)	166.400.000	12.480.000	178.880.000
			163	I.E AGROPECUARIA SAN FRANCISCO JAVIER SEDE GARAY	I.E AGROPECUARIA SAN FRANCISCO JAVIER SEDE GARAY	177.904.227	13.342.817	191.247.044
		Popayán	165	IE COMUNEROS	SEDE PRINCIPAL	457.600.000	34.320.000	491.920.000
		Rosas	175	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA	SANTA TERESITA (sede principal)	790.400.000	59.280.000	849.680.000
			178	INSTITUCION EDUCATIVA MADRE CARIDAD BRADER	MADRE CARIDAD BRADER (sede principal)	124.800.000	9.360.000	134.160.000
			182	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO CORDOBA	LAS YERBAS	83.200.000	6.240.000	89.440.000
			183	CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO LEON VALENCIA	LA DESPENSA	62.400.000	4.680.000	67.080.000
			184	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO CORDOBA	EL RETIRO	83.200.000	6.240.000	89.440.000
			186	CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO LEON VALENCIA	EL ALTILLO	62.400.000	4.680.000	67.080.000
			187	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO CORDOBA	BELLAVISTA	62.400.000	4.680.000	67.080.000
12	Cauca	Piamonte	27	CENTRO EDUCATIVO PUERTO GUAYUYACO	ESCUELA RURAL MIXTA LA ESPANOLA	62.400.000	4.680.000	67.080.000
			121	CENTRO EDUCATIVO PUERTO GUAYUYACO	ESC RUR MIX SAN ANDRESITO	41.600.000	3.120.000	44.720.000
			125	INST EDUC AGRIC PIAMONTE	PIAMONTE (sede principal)	1.553.938.473	116.545.386	1.670.483.859
			173	ESC RUR MIX FRAY EZEQUIEL	ESC RUR MIX FRAY EZEQUIEL	195.752.201	14.681.415	210.433.616
			174	E.D.R PORTO GUAYUYACO SEDE PRINCIPAL	E.D.R PORTO GUAYUYACO SEDE PRINCIPAL	166.400.000	12.480.000	178.880.000
	Huila	Acevedo	26	INSTITUCION EDUCATIVA BATEAS	BATEAS	310.453.360	23.284.002	333.737.362
	Nariño	BARBACOAS	87	INSTITUCION EDCUATIVA TERAIMBE	SEDE 9 CUMAINDE	62.400.000	4.680.000	67.080.000
			110	INSTITUCION EDUCATIVA TERAIMBE	SEDE 2 BOMBON	124.800.000	9.360.000	134.160.000
		Cumbal	36	INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCION DE TALLAMBI	INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCION DE TALLAMBI	764.787.529	57.359.065	822.146.593
		El Rosario	8	CENTRO EDUCATIVO LA CLAUDIA	CENTRO EDUCATIVO LA CLAUDIA	62.400.000	4.680.000	67.080.000
		Ipiales	142	INSTITUCION EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL LOS PASTOS	ESCUELA LAS CRUCES	208.000.000	15.600.000	223.600.000

GRUPO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ID MEN No.	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	VR. TOTAL AULAS Y MEJORAMIENTO	VR. INTERVENTORÍA	VR. TOTAL OBRA + INTERVENTORÍA
		Mallama (Piedrancha)	149	CENTRO EDUCATIVO MALLAMA	CENTRO EDUCATIVO DE MALLAMA	62.400.000	4.680.000	67.080.000
		Pasto	1	I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE	I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - SEDE PRINCIPAL	436.800.000	32.760.000	469.560.000
	Putumayo	Orito	127	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL UMADA WUARRARA	ESC RUR MIX ALTO ORITO	127.913.503	9.593.513	137.507.016
		Puerto Asís	172	E. RUR CAUCACIA - SEDE PRINCIPAL	SEDE PRINCIPAL	249.600.000	18.720.000	268.320.000
		Puerto Asís	41	I. E. RUR CAUCACIA	ESC RUR MIX EL JARDIN ALTO TETEYE	197.100.201	14.782.515	211.882.716
			57	I. E. RUR CAUCACIA	ESC RUR MIX EL PROGRESO	167.997.003	12.599.775	180.596.778
		Puerto Leguizamo	88	IE RUR LUIS VIDALES DEL PIÑUÑA NEGRO	ESC RUR MIX PUERTO PRINCIPE DOS	124.800.000	9.360.000	134.160.000
Total general						52.593.871.997	3.944.540.400	56.538.412.397

d. Evaluar los proponentes, así como las propuestas presentadas para la construcción de las obras de infraestructura educativa e interventorías correspondientes y realizar la adjudicación y contratación de dichos procesos.

En este periodo ya fueron concluidos los procesos de convocatoria y realizadas las evaluaciones exhaustivas de los proponentes y sus respectivas propuestas para la construcción de las obras de infraestructura educativa y las interventorías correspondientes, nos complace informar en este periodo que dichos procesos han llegado a su fin. Se ha llevado a cabo una rigurosa revisión bajo los parámetros establecidos en los Términos de Referencia, asegurando que se cumplan los lineamientos de contratación pública en términos de transparencia y equidad.

Gracias a este esfuerzo, se ha procedido con éxito a la adjudicación de todos los contratos, seleccionando a los proponentes que demostraron las mejores capacidades técnicas, financieras y operativas. Todos los grupos han sido debidamente contratados, lo que asegura que las obras se desarrollarán dentro de los plazos previstos y bajo los más altos estándares de calidad.

Nuestro compromiso con la excelencia en la ejecución de las obras y el adecuado control mediante las interventorías asegurará que estas infraestructuras aporten un valor significativo a la comunidad educativa, garantizando su correcto desarrollo y el bienestar de los beneficiarios.

1.4 ACTIVIDADES CONTRACTUALES

1.4.1 Obligaciones:

a. Ejecutar a través de los contratistas seleccionados y hacer seguimiento a la calidad y entrega de las obras de infraestructura educativa diseñadas para atender las afectaciones a las sedes educativas priorizadas por el MEN.

FINDETER, en concordancia con la naturaleza de los proyectos a abordar bajo el marco del Decreto de Emergencia, ha adelantado en el presente periodo la ejecución de diversas sedes educativas. Estos proyectos se han llevado a cabo mediante la colaboración de contratistas que fueron rigurosamente seleccionados a través de procedimientos transparentes y estructurados, conforme a lo estipulado en el Manual de Contratación de FINDETER.

La selección de contratistas no fue un proceso aleatorio, sino que siguió una serie de etapas bien definidas, que incluyeron la evaluación de capacidades técnicas, experiencia previa en proyectos similares, y solidez financiera. Este enfoque metodológico garantiza que los proyectos se ejecuten con altos estándares de calidad y dentro de los plazos establecidos, lo cual es crucial en contextos de emergencia donde la eficiencia y la efectividad son primordiales.

Adicionalmente, la supervisión y el monitoreo continuo de los avances de las obras permiten asegurar que se cumplan todas las normativas vigentes y que los recursos asignados se utilicen de manera óptima. FINDETER ha implementado mecanismos de control y seguimiento que incluyen auditorías periódicas y la utilización de tecnología para el seguimiento en tiempo real de las obras. Esto no solo brinda transparencia al proceso, sino que también facilita la identificación temprana de posibles inconvenientes y la implementación de medidas correctivas oportunas.

b. *Ejercer la vigilancia de los contratos de obra contratando las respectivas interventorías y ejercer la supervisión a los contratos de interventoría que se deriven del presente contrato.*

FINDETER adelantó en el presente periodo un riguroso ejercicio de vigilancia de los contratos de obra mediante la contratación de las respectivas interventorías. Esta medida se implementó con el objetivo de asegurar el adecuado desarrollo de los proyectos de infraestructura, en línea con los estándares de calidad y los plazos establecidos.

La contratación de interventorías y la posterior supervisión de sus actividades permitirán crear un sistema de verificación y seguimiento continuo, asegurando la transparencia en el proceso de ejecución de las obras y proporcionando un mecanismo de retroalimentación para la garantía de la calidad, la eficiencia y el cumplimiento de los estándares requeridos en las obras de infraestructura educativa, quedando así el resumen de este periodo:

GRUPO	TIPO DE CONTRATO	CÓDIGO	DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS	FECHA DE ADJUDICACIÓN	CONTRATISTA	VALOR OFERTADO	OBSERVACIONES
1	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-052-2023	Antioquia - Apartadó Antioquia - Turbo Antioquia - Ciudad Bolívar Chocó - Carmen del Darién Chocó - Tadó	03/10/2023	INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S	$271.455.247	Liquidado el 25 de febrero del 2025
1	OBRA	PAF-MENAM-O-049-2023		06/10/2023	OBRAS CAPITAL S. A	$3.447.332.359	Liquidado el 31 de enero del 2025
2	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-053-2023	Atlántico - Repelón Atlántico - Galapa Atlántico – Soledad - Atlántico - Palmar De Varela Atlántico - Luruaco	26/09/2023	RM INGENIEROS S.A.S.	$295.715.000	Liquidación Radicada por PRISA INC 2025-000621 el 27 de febrero del 2025
2	OBRA	PAF-MENAM-O-050-2023		06/10/2023	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023	$4.044.124.630	Liquidación Radicada por PRISA INC 2025-000620 el 05 de marzo del 2025
3	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-054-2023	Magdalena - Ciénaga Magdalena - El Retén Magdalena - Puebloviejo	26/09/2023	CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3	$351.774.412	Liquidado el 20 de diciembre del 2024
3	OBRA	PAF-MENAM-O-051-2023		06/10/2023	CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA	$4.744.960.153	Liquidado el 01 de noviembre del 2024
4	OBRA	PAF-MENAM-O-052-2023	Bolívar - Córdoba Bolívar - Mompós Magdalena - San Sebastián de Buenavista	20/09/2023	JASA LTDA	$3.566.467.466	Liquidado el 30 de septiembre del 2024
4	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-055-2023		26/09/2023	CONSORCIO INTER EDUCATIVO G4	$264.974.745	Entregado 22 de marzo del 2024, en proceso de liquidación.

GRUPO	TIPO DE CONTRATO	CÓDIGO	DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS	FECHA DE ADJUDICACIÓN	CONTRATISTA	VALOR OFERTADO	OBSERVACIONES
5	OBRA	PAF-MENAM-O-053-2023	Bolívar - Barranco De Loba Magdalena - Concordia Magdalena - El Banco Cesar - Curumaní Bolívar - San Martín De Loba Cesar - Chimichagua	03/10/2023	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5	$4.102.044.984	Liquidación Radicada por PRISA INC 2025-000861 el 25 de marzo del 2025
5	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-056-2023		06/10/2023	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5	$300.856.990	Liquidación Radicada por PRISA INC 2025-000983 el 08 de abril del 2025
6	OBRA	PAF-MENAM-O-056-2023	Cesar - Valledupar Cesar - La Paz Cesar - El paso	29/09/2023	DAR ARQUITECTURA S.A. S	$2.102.352.000	Liquidado el 20 de noviembre del 2024
6	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-058-2023		03/10/2023	CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023	$155.543.411	Liquidado el 27 de noviembre del 2024
8	OBRA	PAF-MENAM-O-055-2023	Córdoba – Tuchín Córdoba – Cotorra Córdoba - Planeta Rica Córdoba - Puerto Libertador Córdoba – Ayapel Córdoba - Montelíbano Bolívar - María la Baja	29/09/2023	DAR ARQUITECTURA S.A. S	$4.706.470.280	Liquidado el 14 de marzo del 2025
8	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-057-2023		13/10/2023	LUIS GUILLERMO NARVÁEZ RICARDO	$297.097.668	Entregado 21 de agosto del 2024, actualización de pólizas para iniciar liquidación.
7	OBRA	PAF-ATMEN5-O-036-2024	Guajira – Manaure Guajira – Rioacha Guajira - Maicao Guajira - Barrancas	19/03/2024	Consorcio Guajira 7	4.158.777.879	Entregado el 28 de febrero del 2025
7	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-059-2023		17/04/2024	GERMÁN ADOLFO PERDOMO PACHÓN	295.239.000	Terminado el 17 de enero del 2025
9	OBRA	PAF-ATMEN5-O-037-2024	Santander - Vélez, Betulia, Barrancabermeja Bolívar – Morales Bogotá Arauca - Saravena -Arauca Tolima - Santa Isabel Meta – Villavicencio Cundinamarca – Anolaima Bolívar – Simiti Norte de Santander - La Playa	19/03/2024	CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9	4.810.476.306	Etapa 2
9	INTERVENTORÍA	PAF-ATMEN5-I-064-2024		28/06/2023	CONSORCIO SAN GABRIEL	313.800.000	Etapa 2
10	OBRA	PAF-MENAM-O-080-2023	Cauca - Suárez Cauca - Santander De Quilichao Chocó - Bahía Solano Cauca – Toribío Valle Del Cauca - Guadalajara De Buga	23/11/2023	CONSORCIO FIN GRUPO 10	$6.014.978.800	Etapa 2
10	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-062-2023		15/12/2023	CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO	$327.496.568	Etapa 2
11	OBRA	PAF-MENAM-O-079-2023	Cauca - El Tambo Cauca - La Vega Cauca - Balboa Cauca - Popayán Cauca - Rosas	27/11/2023	CONSORCIO FIN GRUPO 11	$ 4.728.021.810	Terminado el 27 de noviembre del 2024
11	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-063-2023		22/12/2023	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	$312.927.160,00	Terminado el 27 de noviembre del 2024
12	OBRA	PAF-MENAM-O-076-2023	Nariño – Pasto Putumayo - Puerto Asís Cauca – Piamonte Nariño – Ipiales Nariño - Mallama	27/11/2023	CONSORCIO FIN GRUPO 12	$ 4.918.276.400	Liquidación Radicada por PRISA INC 2025-000928 el 04 de abril del 2025
12	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-064-2023		22/12/2023	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	$ 351.774.412	Liquidación Radicada por PRISA INC 2025-001001 el 10 de abril del 2025
Dotación	SUMINISTRO	PAF-ATMEN5-S-041-2024	Choco - Carmen del Darién, Tadó Antioquia – Apartadó Atlántico – Repelón, Soledad Bolívar – Mompós, Barranco de Loba, San Martín de Loba, María la Baja Cauca - Santander de Quilichao, Suarez, El Tambo, Bolívar, La Vega, Rosas Cesar - La Paz (Robles), El Paso Córdoba - Planeta Rica, Puerto Libertador, Ayapel, Montelíbano Magdalena - El Retén, San Sebastián de Buenavista	22/08/2024	DOTAESCOL SAS	$ 944.255.458,80	Acta de inicio del otro si firmada el 13 de marzo del 2025.

Nota: Según el informe previo sobre el estado de los grupos de contratación y de cada institución educativa, se comunica que **el Grupo 1 ha sido entregado el 18 de noviembre de 2024, el Grupo 2 ha sido entregado el 05 de noviembre del 2024, el Grupo 3 ha sido entregado el 30 de abril de 2024, el Grupo 4 ha sido entregado el 22 de marzo de 2024, el Grupo 5 ha sido entregado el 08 de enero de 2025, el Grupo 6 ha sido entregado el 17 de mayo de 2024, el Grupo 7 ha sido entregado el 28 de febrero de 2025, el Grupo 8 ha sido entregado el 21 de agosto de 2024**, **el Grupo 11 ha sido entregado el 07 de marzo de 2025**, **el Grupo 12 ha sido entregado el 04 de marzo de 2025,** satisfacción entre rectores, estudiantes y familias. Además, se está avanzando en el proceso de estructuración de los estudios preliminares para equipar las nuevas aulas construidas, con el objetivo de entregarlas completamente dotadas.

c. *Conformar un Comité Fiduciario y un Comité Técnico Operativo al interior del PATRIMONIO AUTÓNOMO administrado por la FIDUCIARIA contratada, de acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo que para el efecto se adopte.*

Durante este periodo se realizaron los siguientes comités:

Comités Técnicos

Para el presente periodo no se adelantan actividades de este tipo.

Comités Fiduciarios

Para el presente periodo no se adelantan actividades de este tipo.

a. ACTIVIDADES DE CIERRE Y LIQUIDACIÓN

i. Obligaciones:

a. *Adelantar la liquidación o cierre de los contratos derivados para la ejecución de los proyectos y del Contrato Interadministrativo una vez estos hayan finalizado.*

De la contratación derivada

En el presente periodo se ha planificado anticipadamente la liquidación o cierre de los contratos derivados con el propósito de asegurar una ejecución eficiente de los proyectos. Esta estrategia no solo facilitó una gestión financiera más efectiva, sino que también permitió cumplir con los objetivos establecidos dentro de los plazos previstos, optimizando así los recursos disponibles y garantizando la correcta finalización de las obligaciones contractuales, así mismo se adelantaron las siguientes liquidaciones:

GRUPO	TIPO DE CONTRATO	CÓDIGO	DEPARTAMENTOS / MUNICIPIOS	FECHA INCIO	FECHA TERMINACIÓN	CONTRATISTA	OBSERVACIONES
1	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-052-2023	Antioquia - Apartadó Antioquia - Turbo Antioquia - Ciudad Bolívar Chocó - Carmen del Darién Chocó - Tadó	14/11/2023	29/10/2024	INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S	Liquidado el 25 de febrero del 2025
1	OBRA	PAF-MENAM-O-049-2023		14/11/2023	14/08/2024	OBRAS CAPITAL S. A	Liquidado el día 31/01/2025
2	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-053-2023	Atlántico - Repelón Atlántico - Galapa Atlántico – Soledad - Atlántico - Palmar De Varela Atlántico - Luruaco	26/09/2023	05/11/2024	RM INGENIEROS S.A.S.	Liquidación Radicada por PRISA INC 2025-000621 el 27 de febrero del 2025
2	OBRA	PAF-MENAM-O-050-2023		06/10/2023	05/09/2024	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023	Liquidación Radicada por PRISA INC 2025-000620 el 05 de marzo del 2025
3	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-054-2023	Magdalena - Ciénaga Magdalena - El Retén Magdalena - Pueblo viejo	14/11/2023	30/04/2024	CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3	Liquidado el día 20/12/2024
3	OBRA	PAF-MENAM-O-051-2023		14/11/2023	30/04/2024	CONSORCIO INSTITUCIONES DEL MAGDALENA	Liquidado el día 01/10/2024
4	OBRA	PAF-MENAM-O-052-2023	Bolívar - Córdoba Bolívar - Mompós Magdalena - San Sebastián de Buenavista	24/10/2023	22/03/2024	JASA LTDA	Liquidado el día 30/09/2024
4	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-055-2023		24/10/2023	22/03/2024	CONSORCIO INTER EDUCATIVO G4	Inicia su trámite de liquidación una vez que quede desembolsado el último pago.
5	OBRA	PAF-MENAM-O-053-2023	Bolívar - Barranco De Loba Magdalena - Concordia Magdalena - El Banco Cesar - Curumaní Bolívar - San Martín De Loba Cesar - Chimichagua	14/11/2023	08/11/2024	CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5	Liquidación Radicada por PRISA INC 2025-000861 el 25 de marzo del 2025
5	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-056-2023		14/11/2023	08/11/2024	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5	Liquidación Radicada por PRISA INC 2025-000983 el 08 de abril del 2025
6	OBRA	PAF-MENAM-O-056-2023	Cesar - Valledupar Cesar - La Paz Cesar - El paso	29/09/2023	17/05/2024	DAR ARQUITECTURA S.A. S	Liquidado el día 20/11/2024
6	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-058-2023		03/10/2023	17/05/2024	CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 2023	Liquidado el día 27/11/2024
7	OBRA	PAF-ATMEN5-O-036-2024	Guajira – Manaure Guajira – Rioacha Guajira - Maicao Guajira - Barrancas	31/05/2024	17/01/2025	CONSORCIO GUAJIRA 7	Entregado el 28 de febrero del 2025
7	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-059-2023		31/05/2024	17/01/2025	GERMÁN ADOLFO PERDOMO PACHÓN	Terminado el 17 de enero del 2025
8	OBRA	PAF-MENAM-O-055-2023	Córdoba – Tuchín Córdoba – Cotorra Córdoba - Planeta Rica Córdoba - Puerto Libertador Córdoba – Ayapel Córdoba - Montelíbano Bolívar - María la Baja	29/09/2023	DAR ARQUITECTURA S.A. S	$4.706.470.280	Liquidado el 14 de marzo del 2025
8	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-057-2023		13/10/2023	LUIS GUILLERMO NARVÁEZ RICARDO	$297.097.668	Entregado 21 de agosto del 2024
12	OBRA	PAF-MENAM-O-076-2023	Nariño – Pasto Putumayo - Puerto Asís Cauca – Piamonte Nariño – Ipiales Nariño - Mallama	12/02/2024	04/12/2024	CONSORCIO FIN GRUPO 12	Liquidación Radicada por PRISA INC 2025-000928 el 04 de abril del 2025
12	INTERVENTORÍA	PAF-MENAM-I-064-2023		12/02/2024	04/12/2024	CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO	Liquidación Radicada por PRISA INC 2025-001001 el 10 de abril del 2025

Del Contrato Interadministrativo

Para el presente periodo no se adelantan actividades de este tipo.

2. RESUMEN GENERAL DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL CONTRATO

CONTRATO No CO1.PCCNTR. 4917031 de 2023

Valor inicial del Contrato (CO1.PCCNTR. 4917031 de fecha 2023)	63.650.000.000
Valor del Contrato a la fecha de corte del Informe	**63.650.000.000**
Descuentos / Impuestos Estampilla Pro-Universidad Nacional / Tasas y Contribuciones (Correspondiente al 2% aplicado al valor Inicial del Contrato)	-
Asistencia Técnica No. 1 (Porcentaje de Asistencia Técnica y Administración de Recursos a reconocer a FINDETE, 7%)	4.164.018.692
Valor disponible para ejecutar los proyectos de acuerdo con el objeto del contrato y el plan operativo.	**59.485.981.308**

3. ANEXOS

Se remiten anexos de acuerdo con las actividades realizadas durante el periodo así:

1. 28 de abril del 2025

HERNÁN PARDO BOTERO
Gerente de Infraestructura
FINDETER

JESÚS ALBERTO CAÑAS PÁEZ
Gestor del Contrato Interadministrativo
FINDETER

Elaboró: Geraldine Lorena Prada Pimiento – Profesional de la Gerencia de Infraestructura



Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Contrato No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 2023

28 DE ABRIL DE 2025

Hacienda

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Rendimientos Financieros – Relación de Pagos

Educación


Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031
Ministerio de Educación Nacional
Financiera del Desarrollo S.A.
7. RENDIMIENTOS FINANCIEROS
01 de marzo al 31 de marzo de 2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

FECHA	RENDIMIENTOS CAUSADOS CUENTA DE AHORRO	VALORACIÓN /DESVALORIZACION CAUSADOS FONDO DE INVERSION COLECTIVA - FIC	TOTAL RENDIMIENTOS, VALORACION DEVALORIZACION CAUSADOS	FECHA TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS	VALOR TRASLADO RENDIMIENTOS	AJUSTES / RETENCIONES	SALDO PENDIENTE POR TRASLADAR RENDIMIENTOS	DESVALORIZACION ACUMULADA
ago-23	82.351.406,35	443.947.650,01	**526.299.056,36**				-	-
sep-23	108.927.246,74	548.880.836,71	**657.808.083,45**				-	-
oct-23	131.902.760,66	436.008.307,20	**567.911.067,86**				-	-
nov-23	144.907.033,92	718.224.229,49	**863.131.263,41**				-	-
dic-23	143.221.271,36	788.090.860,63	**931.312.131,99**	13/12/2023	**2.615.149.472,00**		-	-
ene-24	133.626.379,48	427.858.051,59	**561.484.431,07**	10/01/2024	**931.312.131,99**		-	-
feb-24	120.547.529,88	474.970.095,24	**595.517.625,12**	12/02/2024	**561.484.430,15**		-	-
mar-24	117.745.976,50	478.495.863,61	**596.241.840,11**	12/03/2024	**595.517.625,12**		-	-
abr-24	100.331.907,69	259.736.382,70	**360.068.290,39**	10/04/2024	**596.241.840,11**		-	-
may-24	89.374.457,56	353.632.163,66	**443.006.621,22**	11/05/2024	**360.068.290,39**		-	-
jun-24	76.820.331,89	266.323.590,41	**343.143.922,30**	13/06/2024	**443.006.621,22**		-	-
jul-24	68.012.790,67	294.233.627,01	**362.246.417,68**	15/07/2024	**343.143.922,30**		-	-
ago-24	21.741.419,32	313.006.436,96	**334.747.856,28**	14/08/2024	**362.246.417,68**		-	-
sep-24	20.861.120,00	192.185.501,19	**213.046.621,19**	10/09/2024	**334.747.856,28**		-	-
oct-24	27.022.756,52	71.175.915,03	**98.198.671,55**	18/10/2024	**213.046.621,19**		-	-
nov-24	21.729.373,21	129.213.183,82	**150.942.557,03**	13/11/2024	**98.198.671,55**		-	-
dic-24	19.252.522,64	66.886.746,40	**86.139.269,04**	10/12/2024	**150.942.557,03**		-	-
ene-25	16.704.545,81	83.803.505,05	**100.508.050,86**	8/01/2025	**86.139.269,04**		-	-
feb-25	13.476.388,13	66.394.607,02	**79.870.995,15**	11/02/2025	**100.508.050,86**		-	-
mar-25	12.509.341,50	58.975.191,37	**71.484.532,87**	10/03/2025	**79.870.995,15**		**71.484.532,87**	-
TOTAL	**1.458.557.218,33**	**6.472.042.745,10**	**7.871.624.772,06**		**7.791.753.776,91**	-	**71.484.532,87**	-

DM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

Rendimientos Financieros – Comprobante de pago

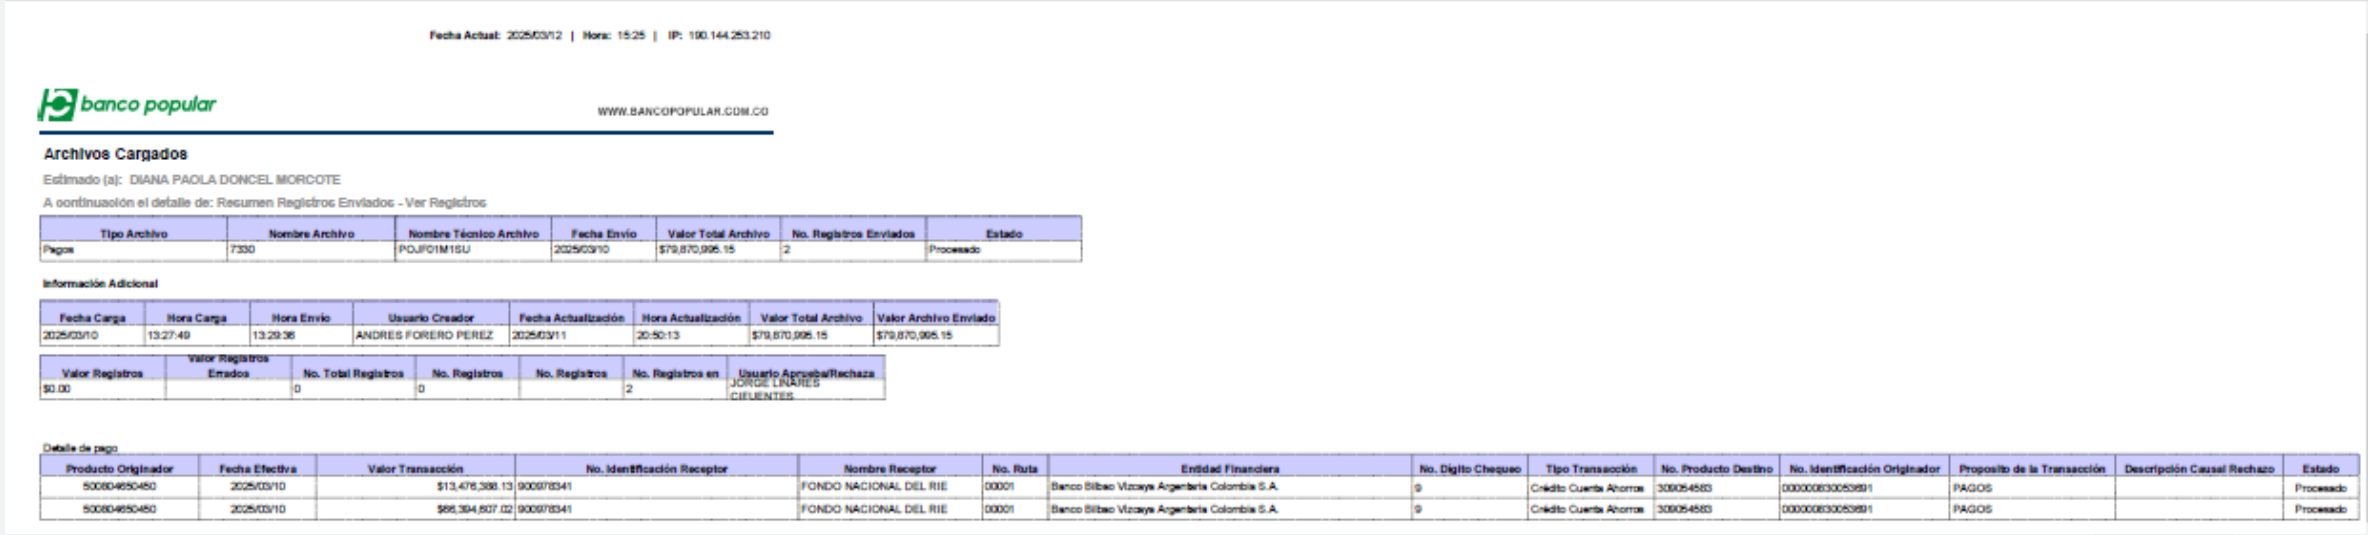

Fecha Actual: 2025/03/12 | Hora: 15:25 | IP: 190.144.253.210

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Archivos Cargados

Estimado (a): DIANA PAOLA DONCEL MORCOTE

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	7330	POJF01M1SU	2025/03/10	$79,870,995.15	2	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/03/10	13:27:49	13:29:36	ANDRES FORERO PEREZ	2025/03/11	20:50:13	$79,870,995.15	$79,870,995.15

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		0	0		2	JORGE LINARES CIFUENTES

Detalle de pago

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	No. Ruta	Entidad Financiera	No. Digito Chequeo	Tipo Transacción	No. Producto Destino	No. Identificación Originador	Proposito de la Transacción	Descripción Causal Rechazo	Estado
50080465046O	2025/03/10	$13,476,388.13	900978341	FONDO NACIONAL DEL RIE	00001	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	9	Crédito Cuenta Ahorros	309054583	000000830053691	PAGOS		Procesado
50080465046O	2025/03/10	$66,394,607.02	900978341	FONDO NACIONAL DEL RIE	00001	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	9	Crédito Cuenta Ahorros	309054583	000000830053691	PAGOS		Procesado

NOTA: Teniendo en cuenta el contrato MEN-4917031 2023 -TEMPORADA DE LLUVIAS, y en atención a la obligación descrita en la cláusula tercera, Obligaciones específicas del contratista, Numeral 8 el cual dice:

"8. El Patrimonio Autónomo — Findeter deberá reintegrar mensualmente los rendimientos financieros (si los hubiere) a la Dirección del Tesoro Nacional o en los términos que establezca la normatividad aplicable, es decir, que no ingresan ni hacen parte del Patrimonio Autónomo constituido por Findeter."

Se han consignado los rendimientos financieros a la siguiente cuenta:

- **Banco:** BBVA
- **Tipo:** Ahorros
- **No. Cuenta:** 309-054583
- **Nombre de la Cuenta:** FIDUPREVISORA S.A FNGRD – COLOMBIA VITAL


Contrato No. 4917031-2023

136 sedes educativas
[instalación de aulas y mejoramientos]

$ 63.650
Millones de pesos

Fecha inicio: 2/06/2023
Fecha Fin Actual: 01/07/2025

Grupo	Departamentos / Municipios	Etapa Actual del grupo/% de avance de contrato Fecha de Inicio –Fecha de Terminación
G1 [10 sedes]	Antioquia | Chocó	Entregado [100,00%] 14/11/2023 - 14/08/2024
G2 [8 sedes]	Atlántico	Entregado [100,00%] 27/11/2023 -06/09/2024
G3 [5 sedes]	Magdalena	Liquidado [100,00%] 14/11/2023 - 30/04/2024
G4 [5 sedes]	Bolívar	Entregado [100,00%] 26/10/2023 - 23/03/2024
G5 [16 sedes]	Bolívar | Magdalena | Cesar	Entregado [100,00%] 14/11/2023 – 08/11/2024
G6 [7 sedes]	Cesar	Entregado [100,00%] 15/11/2023 - 17/05/2024
G7 [13 sedes]	Guajira	Terminado [100,00%] 31/05/2024 - 17/01/2025
G8 [9 sedes]	Córdoba | Bolívar	Entregado [100,00%] 08/11/2023 - 23/08/2024
G9 [12 sedes]	Santander | Bolívar | Bogotá | Arauca | Tolima | Meta | Cundinamarca | Nte de Santander	En obra[81,83%] 23/08/2024 – 23/05/2025
G10 [15 sedes]	Cauca | Chocó | Valle Del Cauca	En Obra [93,91%] 19/02/2023 - 30/05/2025
G11 [18 sedes]	Cauca	Terminado [100,00%] 12/02/2023 - 27/11/2024
G12 [18 sedes]	Nariño | Putumayo | Cauca	Terminado [100,00%] 20/02/2023 - 04/12/2024
Dotación	46 Sedes a dotar - 99 aulas	En ejecución [67,45%] 03/10/2024 – 14/06/2025

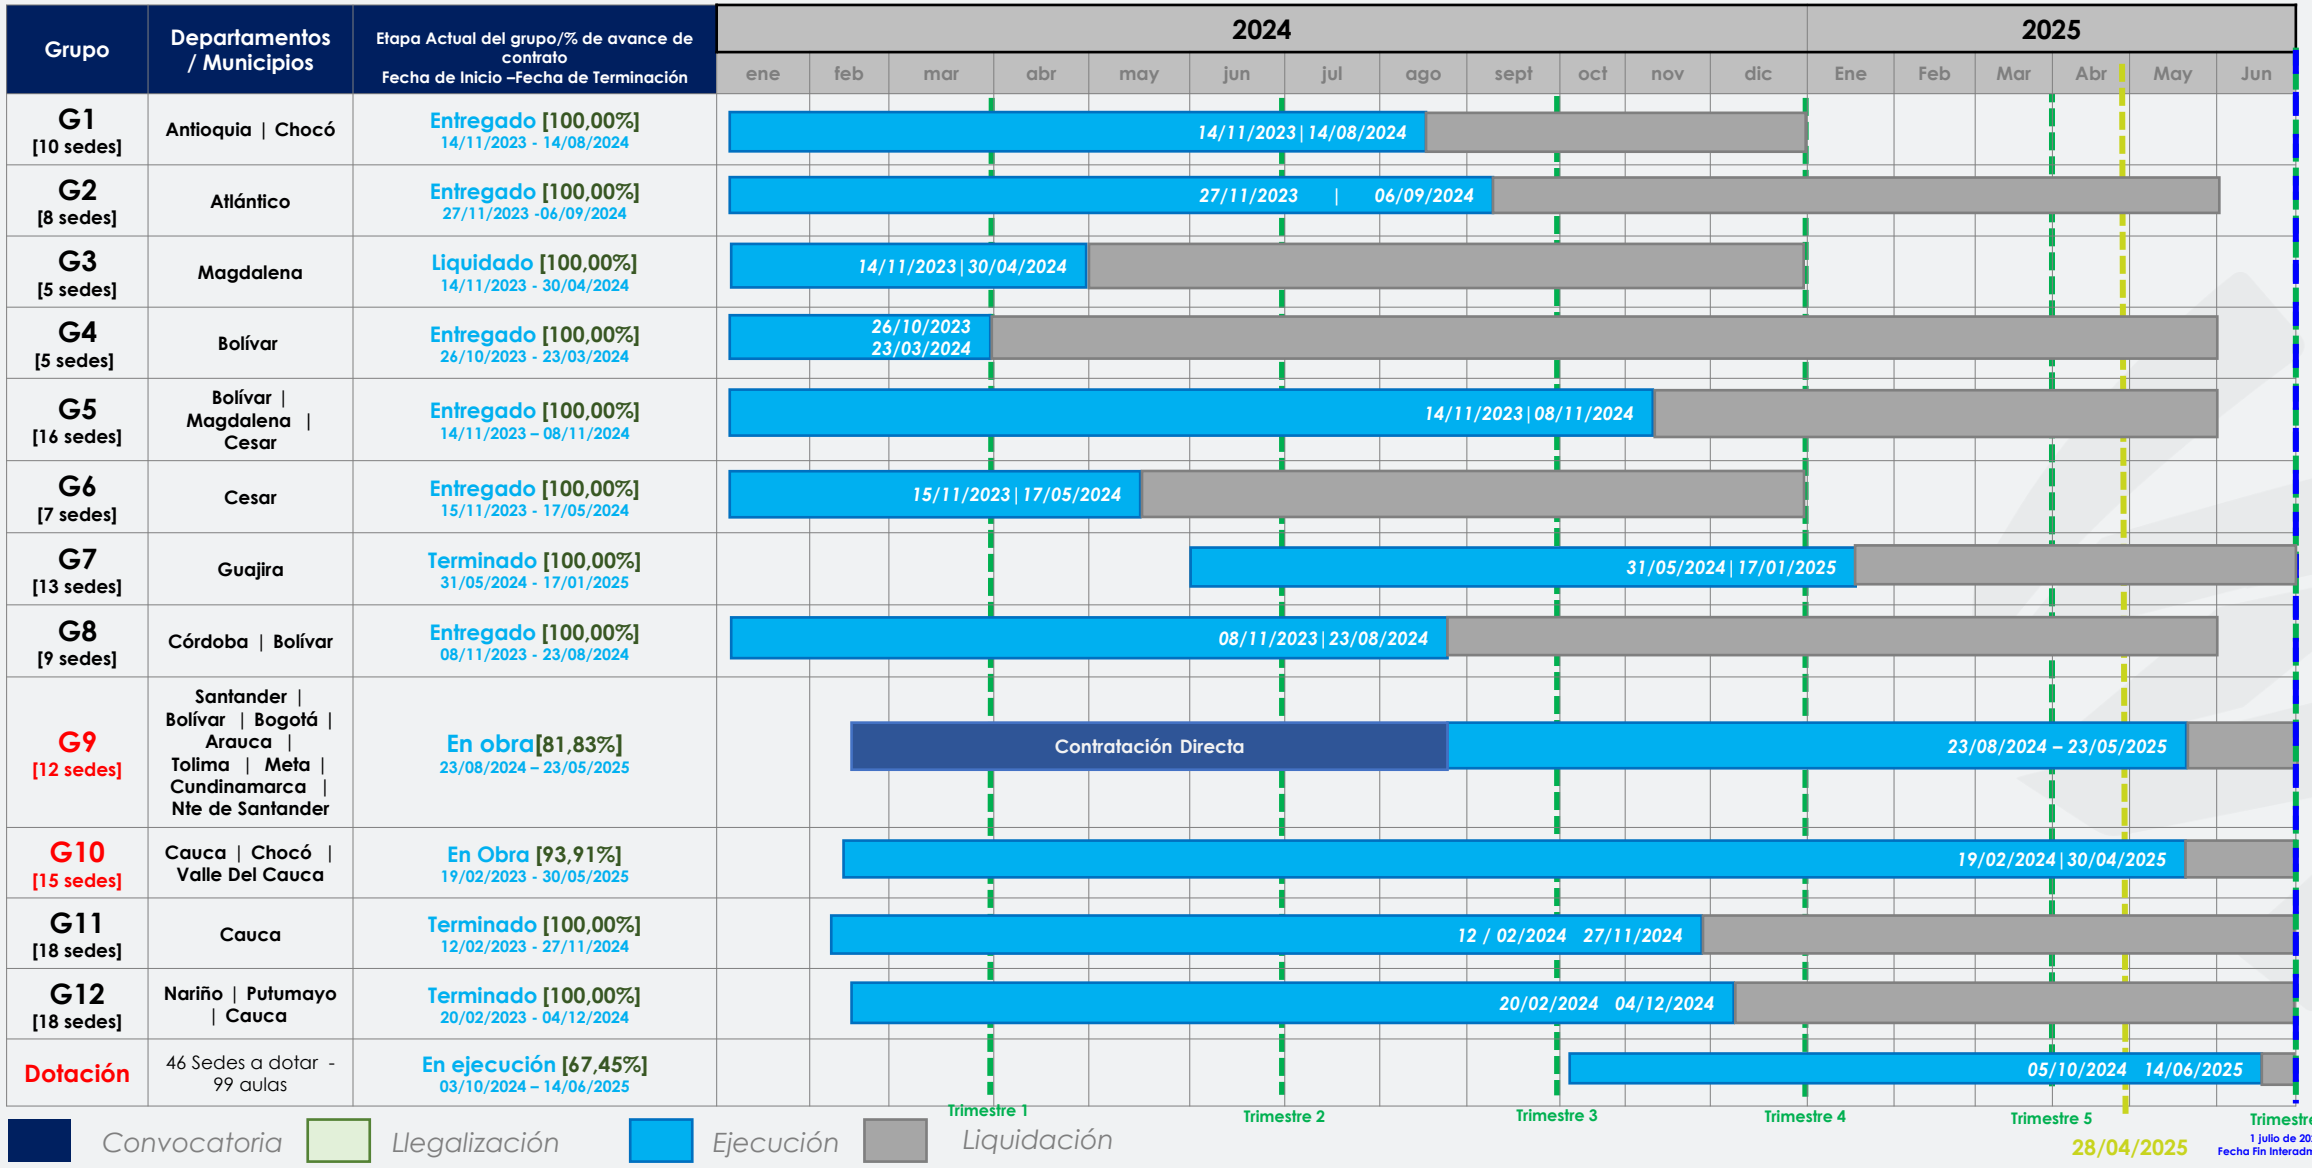

Convocatoria | Llegalización | Ejecución | Liquidación

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

Estado Entrega de Dotación

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

CONTRATO INICIAL

PAF-ATMEN5-S-041-2024

Publicada

17 DE JULIO DE 2024.

Informe Definitivo:

Comité Fiduciario No 41 del 25 de agosto.

Adjudicado:

DOTAESCOL SAS

Valor Inicial $ 584.310.000,00

Adición: $ 359.945.454,80

Valor final: $ 944.255.454,8

Acta de Inicio: 3 de octubre de 2024

5 meses de ejecución.

Terminación: 14 de junio de 2025

- 16 DEPARTAMENTOS
- 38 MUNICIPIOS
- 98 AULAS NUEVAS CON DOTACIÓN

CONTRATO ADICIÓN

Cronograma de Entregas Otro Sí (34 Aulas nuevas)

Grupo	Sede	Municipio	Departamento	CRONOGRAMA ENTREGAS
SEDES ADICIONALES				
5	CENTRO EDUCATIVO RURAL MIX JOSE DE LA	El Banco	Magdalena	22/04/2025
5	SEDE CHINELA	Curumaní	Cesar	24/04/2025
5	SEDE TRONCONAL	Chimichagua	Cesar	24/04/2025
7	ESCUELA RURAL INDÍGENA KARALOUTAMAI	Manaure	La Guajira	29/04/2025
7	YAMAIN - SEDE PRINCIPAL	Maicao	La Guajira	2/05/2025
7	SEDE KASICHE	Maicao	La Guajira	6/05/2025
7	CENTRO ETNOEDUCATIVO PROVINCIAL	Barrancas	La Guajira	7/05/2025
7	SEDE LA ESTRELLA	Maicao	La Guajira	8/05/2025
7	YAMAIN - KASPOLIMANA	Maicao	La Guajira	9/05/2025
7	ESCUELA RURAL MIXTA TALOULUMA'ANA	Maicao	La Guajira	10/05/2025
9	COLEGIO UNIVERSITARIO	Vélez	Santander	12/05/2025
9	LA HUMAREDA	Santa Isabel	Tolima	13/05/2025
9	ESCUELA SIETE DE AGOSTO	Villavicencio	Meta	14/05/2025
9	EL BRASIL	Santa Isabel	Tolima	15/05/2025
9	ESCUELA RURAL EL DESCANSO	Anolaima	Cundinamarca	16/05/2025
9	CAMPO PAYARES	Simití	Bolívar	16/05/2025
10	LA PLANTA	Guadalajara de Buga	Valle del Cauca	9/05/2025
10	SEDE DE SAN JOSE (HUACA)	Bahía Solano(Mutis)	Chocó	13/05/2025
12	INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA CON	Cumbal	Nariño	14/05/2025
12	ESC RUR MIX EL JARDIN ALTO TETEYE	Puerto Asís	Putumayo	19/05/2025
12	ESC RUR MIX EL PROGRESO	Puerto Asís	Putumayo	19/05/2025
12	ESC RUR MIX ALTO ORITO	Orito	Putumayo	19/05/2025
SUBTOTAL				
NO ENTREGADAS				
SUBTOTAL PARA FACTURAR				
TOTAL CONSOLIDADO				

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado Entrega de Dotación



CENTRO EDUCATIVO INDIGENA CAÑO PADILLA YUKPA
Sede El Coso La Paz – Cesar



INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO
Sede Escuela Nueva Parcelas Londres
Ayapel - Córdoba



INSTITUCION EDUCATIVA TIERRA FIRME
Mompox - Bolivar



INSTITUCION EDUCATIVA EL PALMAR
Escuela Nueva Mixta Divino Salvador Monte Líbano - Córdoba

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Estado Entrega de Dotación

Contrato Inicial



I.E LOMA AZUL – SEDE LOS CERROS
Planeta Rica - Córdoba



I.E PICA PICA VIEJO
Sede Escuela Nueva La Solita Puerto Libertador - Córdoba



C.E PUEBLO NUEVO
Carmen del Darién - Chocó



I.E EL GUINEO – C.E EL OSITO
Apartadó - Antioquia



I.E CIEN PESOS Y LAS TABLAS Sede Pita
Repelón - Atlántico



I.E JOSEFA DONADO – Sede Cábica
Soledad - Atlántico

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Estado Entrega de Dotación

Contrato Inicial



I.E LUIS GUILLERMO VIDES
Sede Atascoza
Barranco de Loba - Bolivar



I.E LEONIDAS ORTIZ
Sede Plan Bonito
San Martín de Loba - Bolivar



I.E.T.A DE MARIA LA BAJA
María La Baja - Bolivar



I.E MADRE CARIDAD BRADER
Rosas - Cauca

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Aulas Móviles
Contrato No. 4917031-2023

Educación

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

136 **sedes educativas**
[instalación de aulas y mejoramientos]

$ 63.650
Millones de pesos


Fecha inicio: 02/06/2023
Fecha Fin: 01/07/2025

ENTREGADAS
123 sedes
86,76%

TERMINADAS
Físicamente culminadas. A la espera de firma de actas para ser entregadas
6 sedes
3,68%

EN EJECUCIÓN
7 sedes
9,56%

Estado de entrega y ejecución de Sedes

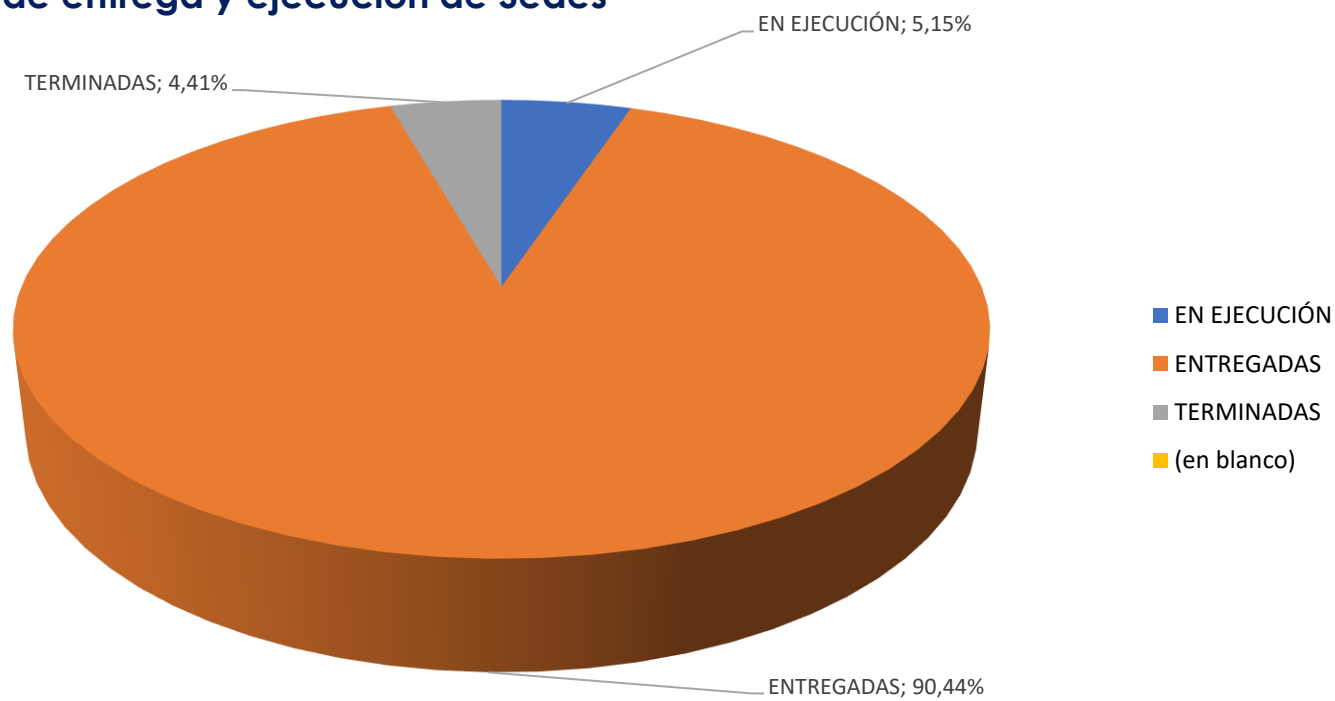

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Estado de entrega y ejecución de Sedes

136 **sedes educativas**
[instalación de aulas y mejoramientos]

$ 63.650
Millones de pesos

Fecha inicio: 02/06/2023
Fecha Fin: 01/07/2025

ENTREGADAS	TERMINADAS	EN EJECUCIÓN	POR INICIAR
123 sedes 91,18%	6 sedes 2,21%	7 sedes 6,62%	0 sedes 0%
Grupo 1 - 10 Grupo 2 - 8 Grupo 3 - 5 Grupo 4 - 5 Grupo 5 - 16 Grupo 6 - 7 Grupo 7- 13 Grupo 8 - 9 Grupo 9 - 3 Grupo 10 - 11 Grupo 11 - 18 Grupo 12 - 18	Grupo 9 - 5 Grupo 10 - 1	Grupo 9 - 4 Grupo 10 - 3	

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

PAGOS ASISTENCIA TECNICA

136 **sedes educativas**
[instalación de aulas y mejoramientos]

$ 63.650
Millones de pesos

Fecha inicio: 02/06/2023
Fecha Fin: 01/07/2025

VALOR AT

$ 4.164.018.692

Cobrado
(a enero de 2025)

$4.021.173.465,42
96,57%

Pagado
(a enero de 2025)

$ 3.925.094.903,52
94,26%

SALDO POR COBRAR

$ 238.923.788,48
3,43%

**La diferencia entre lo pagado y cobrado ya fue aprobado por el MEN y se encuentra en espera de aprobación y giro por parte de fiducia.*

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

Resumen Informe Financiero – Corte 28 de abril de 2024

136 sedes educativas
[instalación de aulas y mejoramientos]

$ 63.650
Millones de pesos

Fecha inicio: 02/06/2023
Fecha Fin: 01/07/2025

VALOR EJECUTADO	VALOR POR EJECUTAR	VALOR COMPROMETIDO	SALDO
$ 53.416 mll	$ 10.363 mll	$ 59.515 mll	$ 31,362

Con base en las liquidaciones de los grupos 12 y dotación, se proyecta que se liberen los siguientes recursos:

GRUPO 12:	$ 11.558.716,21
DOTACION:	$ 18.047.018,00
SALDO PROYECTADO A LIBERAR CONVENIO:	**$ 60.968.195,01 (0,09%)**

*El saldo es a corte de 28 de abril de 2025

CCOM-FO-001 V18 / 1-Jun-2023 / Clasificada

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

AULAS MOVILES
INFORME DETALLADO POR GRUPO DE INTERVENCION

28 de Abril de 2025



NGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres

Educación

Colombia Vital

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

CONTRATOS EN EJECUCION

GRUPO	Departamento	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	ALERTAS, ASUNTOS PENDIENTES
GRUPO 9	Arauca, Bolívar, Cundinamarca Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima y Bogotá D.C.	**12**	23/08/2024	23/05/2025	93,08%	81,83%	Se presentaron inconvenientes en las dos (2) sedes ubicadas en el municipio de Santa Isabel, departamento del Tolima en razón a precipitaciones presentadas que perjudicaron la vía de acceso a la zona, lo cual ha generado que se realice el transporte de materiales con el uso de mulas; para estas sedes se aprobó prórroga de dos (2) meses y quince (15) días calendario para culminación de actividades. Para las demás sedes se presenta un retraso en dos (2) de las diez (10) sedes que presentaron fecha de terminación el 8 de marzo de 2025 con pendientes. Por lo anterior, se debe continuar el proceso de apremio hacia el contratista de obra por las moras que se han presentado y que son imputables a este.
GRUPO 10	Cauca, Valle del Cauca y Choco	**15**	19/02/2024	30/04/2025	97,63%	93,91%	Los proyectos del Cauca residen afectación por temas de orden público que están generando atrasos en las actividades contractuales, frente a la programación. • El proyecto de la sede Dominguillo en el Municipio de Santander de Quilichao continua la ejecución de sus actividades contractuales, adicional la administración municipal continua avanzando en la ejecución de las obras de las acometidas eléctricas, hidráulicas y sanitarias, terminaciones que se proyectan para el 10 de mayo y de esta forma poder realizar la entrega del proyecto funcional de la semana del 13 al 17 de mayo. • El proyecto de la sede Inmaculada en el municipio de Suarez Cauca, continua la ejecución de sus actividades contractuales, se proyecta terminar las obras y actividades para el 23 de mayo y de esta forma poder realizar la entrega del proyecto funcional de la semana del 23 al 27 de mayo. • El proyecto la sede Francisco de Paula Santander en el municipio de Suarez Cauca, ya termino actividades de mejoramiento y se están adelantando remates para poder entregar al 30 de abril. • El proyecto la sede La Huaca en el municipio de Bahía Solano, ya termino actividades de obras nuevas y se está a la espera de la firma del AEP&SC por parte del rector, la cual se espera se de al 30 de abril.

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

CONTRATOS EN EJECUCION

GRUPO	Departamento	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	OBSERVACIONES
DOTACIÓN	Antioquia, Atlántico, Bolivar, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Putumayo, Santander, Tolima, Valle del Cauca	**46**	03/10/2024	14/06/2025	Valor del contrato inicial de $584.310.000,00. Dotación entregada en los grupos 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 y 11 y, pendiente la entrega de los grupos 5, 7, 9, 10 y 12. **Mediante comité Fiduciario N. 54 del 14 de marzo se aprobó el Otro Sí, a la fecha se espera la legalización por parte de la fiducia** **Valor : $359.945.454,80 y adición de 3 meses por las condiciones de accesibilidad de las nuevas sedes.** La ejecución se realiza en 16 departamentos, 38 municipios y se realiza la dotación de 98 aulas nuevas construidas.

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Grupo 09

Fecha inicio: 23/08/2024
Fecha Fin: 23/05/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Departamento	**Arauca, Bolívar, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima y Bogotá D.C.**
$	**Valor Inicial** Obra: $ 4.810.476.306,00 Interventoría: $ 313.800.000
	Adiciones Obra: $ 0 Interventoría: $165.685.393,30
	Valor Pagado Obra: CI- $245.711.234,70 CII - $ 1.412.969.897,09 Interventoría: CI - $0 CII - $ 184.217.809,91
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Otrosí No. 1: Retiro de tres (3) sedes del alcance Otrosí No. 2: Prórroga tres (3) meses obra e interventoría, adición interventoría por $165.685.393,30 Otrosí No. 3: Prórroga dos (2) meses y quince (15) días calendario para las sedes del Tolima
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	**ID No. 56 – Arauca:** Entregada el 19/02/2025 **ID No. 132 – La Playa:** Entregada el 17/03/2025 **ID No. 7 – Vélez:** Entregada el 20/03/2025 **ID No. 138 - Arauca:** Terminada, entrega el 29/04/2025 **ID No. 104 – Anolaima:** Terminada, entrega el 30/04/2025 (El rector solicitó esta fecha) **ID No. 96 – Villavicencio:** Terminada, entrega el 29/04/2025 **ID No. 124 – Simití:** Terminada, entrega el 05/05/2025 **ID No. 17 – Betulia:** Terminada, entrega tentativa el 29/04/2025 **ID No. 123 – Simití:** Continúa en actividades del aula nueva, entrega tentativa 06/05/2025 **ID No. 20 – Morales:** Continúan en actividades de mejoramientos, se han presenta inconvenientes de orden público, entrega tentativa 07/05/2025. **ID No. 67 y 100 – Santa Isabel:** Se encuentran en actividades de estructura, cimentación y traslado de los kits de las aulas al lugar de intervención. En esta continúan presentándose inconvenientes de acceso a los predios.





Sedes:	**12**
En ejecución:	4
Terminadas:	5
Entregadas:	3

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Inconvenientes – Sedes Tolima

El CONSORCIO INTERVENCIONES GRUPO 9, en su calidad de contratista del Contrato de Obra No. PAF-ATMEN5-O-037-2024, se permite presentar la solicitud formal de una **prórroga de Dos (02) meses y quince (15) días** en la ejecución del contrato, debido a las dificultades logísticas derivadas de las condiciones adversas de las vías terciarias que comunican al casco urbano del municipio de **Santa Isabel con las sedes ID 100 Institución educativa técnica Bolívar sede El Brasil e ID 67 Institución educativa técnica Bolívar sede La Humareda**.

Desde la firma del contrato y durante los primeros meses de ejecución, el municipio de Santa Isabel, Tolima, se vio severamente afectado por condiciones climáticas adversas. De acuerdo con los informes técnicos emitidos por el IDEAM, la región fue inicialmente declarada en **alerta amarilla debido a riesgos de deslizamientos de tierra y acumulación de humedad en los suelos,** Posteriormente, esta situación se agravó hasta llegar a una **alerta roja**, lo que hizo inviable el inicio de las obras según el cronograma previsto. **Los derrumbes en las vías de acceso, el estancamiento de agua en diferentes zonas y el riesgo para el personal dificultaron la movilización de equipos y materiales.**

Con la disminución de las lluvias en semanas recientes, se ha procedido a organizar e iniciar la logística para el transporte de materiales esenciales. No obstante, **el estado actual de las vías, que presentan hundimientos, acumulación de lodo y pérdida de banca, sigue representando un obstáculo.** El transporte en vehículos tipo volqueta en la zona rural del municipio de Santa Isabel es inviable, lo que ha obligado a realizar transbordos y recurrir al acarreo manual con animales de carga (mulas). Esta situación ha reducido significativamente los rendimientos operativos y ha dificultado la ejecución fluida de las actividades. A pesar de los esfuerzos realizados para mitigar estas dificultades, las limitaciones en la cantidad de animales disponibles y las condiciones de acceso continúan afectando el avance dentro de los tiempos estimados. A continuación, se describen las dificultades presentadas durante el presente periodo.

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

1. Situación actual de las vías de acceso y dificultades logísticas

Durante las inspecciones realizadas en la zona, se ha evidenciado que las vías presentan condiciones de accesibilidad críticas, caracterizadas por:

- **Erosión y socavación progresiva de la vía**, causada por la temporada invernal, lo que ha generado pérdida de banca y hundimientos en varios tramos.
- **Acumulación de lodo y material suelto**, lo que impide la adherencia de los vehículos, aumentando el riesgo de atascamientos y accidentes.
- **Inundaciones parciales y bloqueo de drenajes**, lo que ha ocasionado el estancamiento de agua y la progresiva inestabilidad del terreno.
- **Dificultades en la movilidad de maquinaria pesada,** lo que no permite el transporte del material en volquetas, esto afectando significativamente los rendimientos en la ejecución.

Como resultado, el transporte de materiales desde el casco urbano de Santa Isabel hasta las sedes ID 100 e ID 67 ha sido limitado mediante el uso de vehículos convencionales, obligando al traslado manual y animales de carga (mulas) en algunos tramos, lo cual ha generado demoras operativas significativas y sobrecostos logísticos.

2. Impacto en la ejecución del contrato

2.1 Impacto en la logística de transporte

- Agregados, cemento y acero
- Estructuras prefabricadas y elementos metálicos
- Herramientas y maquinaria menor

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública











CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Alertas del contratista de obra

- Comunicado del 11 noviembre de 2024:

"(…) Por medio de la presente comunicamos que el municipio de Santa Isabel, Tolima, enfrenta condiciones meteorológicas adversas que afectan el desarrollo de actividades planificadas en la región. Según el informe del IDEAM emitido el 11 de noviembre de 2024, Santa Isabel se encuentra bajo alerta amarilla, con una moderada probabilidad de deslizamientos de tierra, especialmente en áreas de ladera y terrenos inestables. Las lluvias intensificadas por el fenómeno de La Niña, que actualmente tiene un 60% de intensidad, han generado acumulación de agua en el suelo, incrementando los riesgos geológicos en la zona. Esto no solo compromete la seguridad de las actividades, sino que también dificulta la preparación y estabilización del terreno. (…)" "(…) La situación climática actual en Santa Isabel requiere de prudencia y planificación estratégica. Aunque se comprende la urgencia de iniciar las obras, las condiciones de riesgo exigen priorizar la seguridad y realizar ajustes en los cronogramas. Las medidas preventivas y la coordinación interinstitucional serán clave para enfrentar este desafío y garantizar la viabilidad del proyecto. (…)"

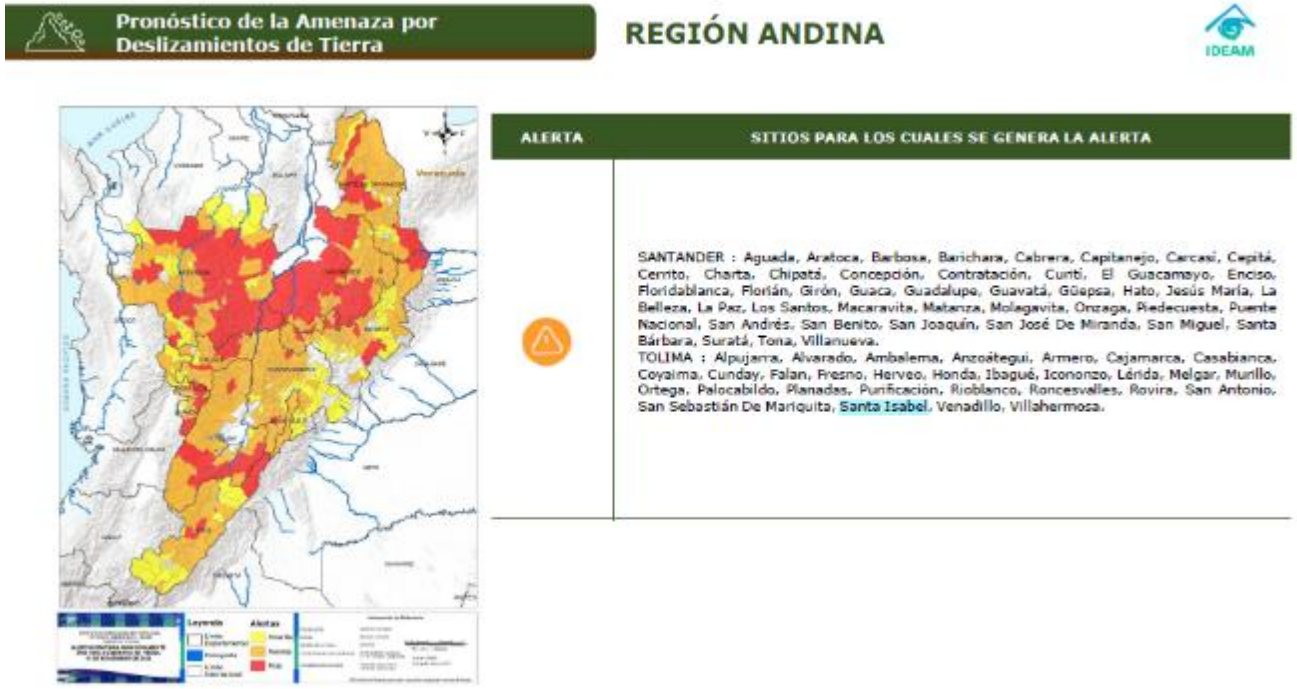

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Alertas del contratista de obra

- Comunicado del 22 noviembre de 2024:


"(…) Por medio de la presente se informa que, debido a las condiciones climáticas adversas en el departamento del Tolima, no ha sido posible iniciar las actividades correspondientes a la ejecución del contrato. Las intensas precipitaciones registradas en los últimos días han generado alertas significativas, tal como se detalla a continuación:

Impactos identificados

1. Alerta Roja en Santa Isabel y municipios aledaños: Santa Isabel se encuentra en una zona con alta probabilidad de deslizamientos de tierra por la saturación de humedad en los suelos y la pendiente del terreno. Esta situación ha impedido las labores de preparación y estabilización necesarias para el inicio de las obras.

2. Riesgos hidrológicos en cuencas importantes: Las cuencas de los ríos Coello, Sumapaz y otras en la región presentan riesgo de crecientes súbitas, lo que agrava las condiciones para el desarrollo seguro de las actividades.

3. Condiciones del terreno no aptas para intervención: El exceso de humedad y la inestabilidad del suelo representan riesgos críticos para cualquier tipo de trabajo preliminar en las zonas identificadas como afectadas.(…)"

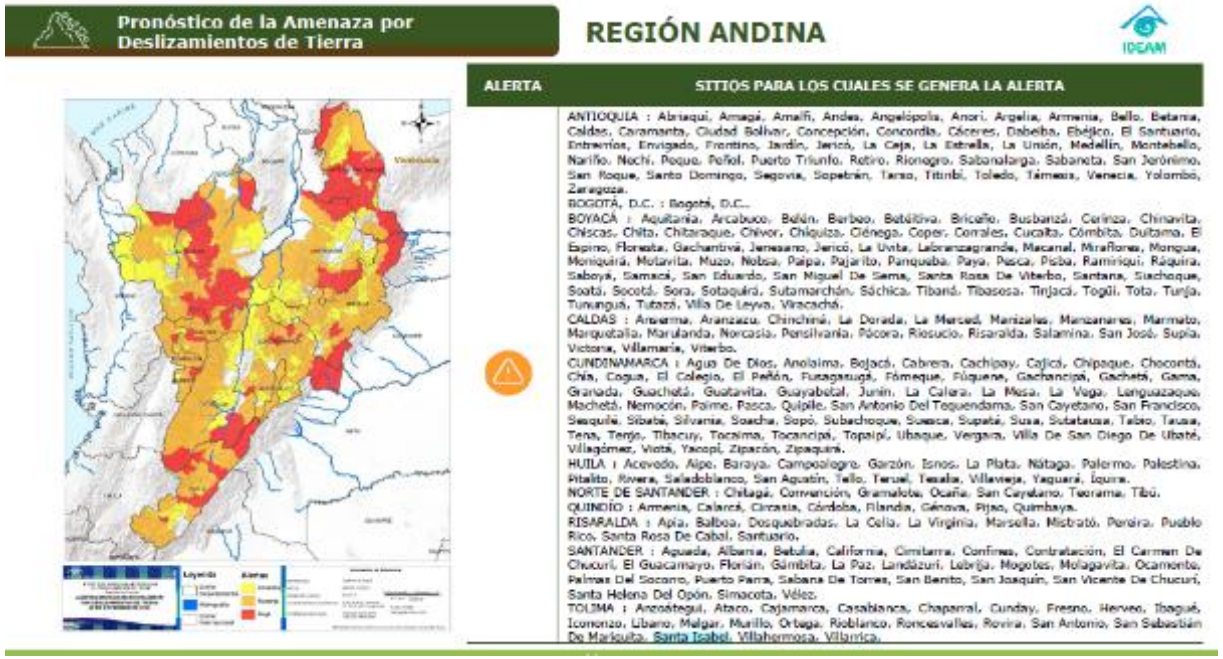

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

COLEGIO UNIVERSITARIO - ID No. 7




IE DEL CERRO DE VERACRUZ -ID No. 124




CENTRO EDUCATIVO MONSERRATE - ID No. 138




EL DESCANSO - ID No. 104




ESCUELA SIETE DE AGOSTO - ID No. 96




SEDE LA PEÑA – ID No. 132




LA ARCADIA - ID No. 20




SANTA BARBARA - ID No. 17




CAMPO PAYARES - ID No. 123




EL BRASIL - ID No. 100





LA HUMAREDA - ID No. 67





CCOM-FO-005 V1 / 05-Ago-2024 / Publica

Grupo 10

Fecha inicio: 19/02/2024
Fecha Fin: 30/04/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Departamento	**Cauca, Valle del Cauca y Choco**
$	**Valor Inicial** Obra: $6.014.978.800 Interventoría: $327.496.568
	Adiciones Obra: $602.576.550 Interventoría: $209.692.862,65 ($79.155.973,39 asumidos por el contrato de obra) ($130.536.889,26 asumidos por el contrato interadministrativo)
	Valor Pagado Obra: $6.113.290.045,00 Interventoría: $426.064.158,13
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	4 otrosíes obra: Prórrogas (10 meses y 27 dias) 4 otrosíes interventoría: Prórrogas (10 meses y 27 dias) y adiciones ($209.692.862,65)
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	En cumplimiento al alcance se tienen 11 sedes entregadas y AEP&SC suscritas, 2 en proceso de entrega y 2 en ejecución, (1 Suarez, 1 Santander de Quilichao). Sede la Huaca en Bahía solano entregada y AEP&SC en proceso de firma del rector, sede Francisco de Paula Santander en el municipio de Suarez Cauca, ya termino actividades y se están adelantando remates para poder entregar al 30 de abril, Frente a las obras de la sede Inmaculada de Suarez y Dominguillo en Santander de Quilichao se continua con el avance de actividades con un personal mínimo derivado por los temas de orden publico, situación que reside en la zona y que a la fecha están afectando los avances de los proyectos.

93,91%
Porcentaje de avance

97,63%
Porcentaje Programado

Sedes:	**15**
En ejecución:	2
Terminadas:	2
Por iniciar:	0
Entregadas:	11

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCION E.TECNICA AGRARIA SEDE INMACULADA ID MEN. 189.







INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO SEDE PRINCIPAL ID 16





CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE. LUIS LOPEZ DE MESA SEDE SAN JOSE (HUACA)





INSTITUCION E.TECNICA AGRARIA SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ID MEN. 190





CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCION E.TECNICA AGRARIA SEDE PRINCIPAL ID MEN. 188.





IE. LUIS LOPEZ DE MESA SEDE SECUNDINO RIVAS





INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PLAYA ID MEN: 12.
MUNICIPIO DE TORIBIO ID MEN: 12.





INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO SEDE DOMINGO LASSO ID 164.





IE. LUIS LOPEZ DE MESA SEDE SIRENA DEL MAR





ica
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE JOHN F. KENNEDY




IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDEJULIAN MENDOZA GUERRERO




IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE PRINCIPAL




IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE LA HONDA .




IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE LA PLANTA .




IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE CRISTOBAL COLÓN




lica

CONTRATOS ENTREGADOS

GRUPO	Departamento	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	OBSERVACIONES
Grupo 2	Atlántico	8	27/11/2023	05/09/2024	CONTRATO PAF-MENAM-O-050-2023: Terminado el 05.09.2024 CONTRATO PAF-MENAM-I-053-2023: Terminado el 05.11.2024 CONTRATO PAF-MENAM-O-050-2023: Documentos Liquidación radicados el 27.02.2025 a través PRISA INC 2025-000620, asignación de liquidador el 5.03.2025 Rubén Moscoso, el liquidador envía observaciones el 08.03.2025 las cuales fueron ajustadas y radicadas nuevamente el 25.03.2025 para continuar tramite de liquidación CONTRATO PAF-MENAM-I-053-2023: Documentos Liquidación radicados el 27.02.2025 a través PRISA INC 2025-000621, y en revisión del área de liquidaciones.

CCOM-FO-005 V1 / 05 - Ago-2024 / Pública

CONTRATOS ENTREGADOS

GRUPO	Departamento	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	OBSERVACIONES
Grupo 4	Magdalena y Bolívar	7	24/10/2023	07/02/2024	Se encuentra liquidado el contrato de obra. El contrato de interventoría tuvo observaciones al informe final para firma del acta de recibo a satisfacción. 16 de abril 2025, interventoría solicita reprogramar la revision de la documentacion para inicio del proceso de liquidacion, se encuentran realizando revision de proyectos con la contraloria. 29 de abril 2025 se programa reunion para dar inciio a la liquidacion..
Grupo 5	Magdalena y Bolívar	16	14/11/2023	08/11/2024	CONTRATO PAF-MENAM-O-053-2023: Terminado el 08.11.2024 CONTRATO PAF-MENAM-I-056-2023: Terminado el 08.01.2025 CONTRATO PAF-MENAM-O-053-2023: Liquidación radicada el 25.03.2025, PRISA INC 2025-000861, asignación liquidador el 1.04.2025 Hernán Erazo, envía observaciones el 08.04.2025 las cuales serán revisadas y atendidas por la supervisión CONTRATO PAF-MENAM-I-056-2023: Liquidación radicada el 08.04.2025, PRISA INC 2025-000983, en espera asignación liquidador.
Grupo 7	La Guajira	13	31/05/2024	17/01/2025	AERS del componente II Obra firmada 28feb2025; se pagó ultimo saldo pendiente por Obra a finales de marzo2025. El contrato de obra se estima iniciar su trámite de liquidación a final de abril; una vez adjunten toda la documentación correspondiente y se elabore acta conjunta con interventoría. Con respecto a la interventoría le falta facturar un 58,85% y se estima su liquidación para iniciar a finales de mayo 2025.
					El contrato de obra fue liquidado el 14/03/. Frente a la liquidación del

COM-FO-005 V1 / 05-Ago-2024 / Pública

CONTRATOS ENTREGADOS

GRUPO	Departamento	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	OBSERVACIONES
Grupo 11	Cauca	18	12/02/2024	27/11/2024	Las 18 sedes educativas que conforman el contrato de obra fueron entregadas y recibidas a satisfacción por parte de los Directivos de Cada Sede. Acta de entrega y recibo a satisfacción del componente 2 suscrita y legalizada. Contratista e interventoría terminaron de consolidar documentos de cierre de componente 2 y documentos que soportan el inicio de la liquidación del contrato de obra. Se prevé radicar este proceso en la semana del 28/04/2025.
Grupo 12	Cauca, Huila, Nariño y Putumayo	18	12/02/2024	04/12/2024	**CONTRATO PAF-MENAM-O-076-2023:** Radicado al equipo de liquidación de Findeter por PRISA No. INC 2025-000928 de fecha 04/04/2025 se hicieron observaciones 22/04/2025 y se subsano el mismo día en revisión (2). **CONTRATO PAF-MENAM-I-064-2023:** Radicado al equipo de liquidación de Findeter por PRISA No. INC 2025-001001 de fecha 10/04/2025 en revisión.

CCOM-FO-005-V1.1/05-Ago-2024/Pública

Grupo 2

Fecha inicio: 27/11/2023
Fecha Fin: 05/09/2024

Departamento	**Atlántico**
$	**Valor Inicial** Obra: $4.044.124.630 Interventoría: $295.715.000
	Adiciones Obra: $ 0,00 Interventoría: $113.699.014 ($57.808.105,6 asumidos por el contrato de obra) ($55.890.908,4 asumidos por el contrato interadministrativo)
	Valor Pagado Obra: $4.028.747.780,96 Interventoría: $374.270.637,53
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	3 otrosíes obra: Prórrogas (5 meses y 5 dias) 3 otrosíes interventoría: Prórrogas (5 meses y 5 dias) y adiciones ($113.699.014)
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	CONTRATO PAF-MENAM-O-050-2023: Terminado el 05.09.2024 CONTRATO PAF-MENAM-I-053-2023: Terminado el 05.11.2024 En cumplimiento al alcance se tienen 8 sedes entregadas, dando cumplimiento al alcancé contractual • **CONTRATO PAF-MENAM-O-050-2023**: Liquidación radicada el 27.02.2025, PRISA INC 2025-000620, liquidador Rubén Moscoso, envía observaciones jurídicas el 14.04.2025 las cuales son atendidas y radicadas nuevamente el 15.04.2025 para continuar tramite de liquidación. • **CONTRATO PAF-MENAM-I-053-2023**: Liquidación radicada el 27.02.2025 a través PRISA INC 2025-000621, el 21.04.2025 notifican cambio de liquidador, asignan a Viviana Marín, quien está adelantando la revisión. • Liquidaciones proyectadas para el 30 de junio de 2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

100%
Porcentaje de avance

100%
Porcentaje Programado

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Contratista de Diseño y Obra: PAF-MENAM-O-050-2023 CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 - G2
Contratista interventor: PAF-MENAM-I-053-2023 RM INGENIEROS S A S

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE PRINCIPAL - ID EN 018




INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE PRINCIPAL - ID EN 018




INSTITUCION EDUCATIVA BLAS TORRES DE LA TORRE (ITIDA) - ID MEN 144




INSTITUCION EDUCATIVA DE MESOLANDIA - ID MEN 197




INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS, LAS TABLAS Y PITA, SEDE PITA - ID MEN 092




INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS, LAS TABLAS Y PITA, SEDE LAS TABLAS - ID MEN 083




INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE VILLA ROSA, SEDE LA LOMA - ID MEN 084






INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA DE GALAPA - ID MEN 064






Grupo 4

Fecha inicio: 24/10/2023
Fecha Fin: 07/02/2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Departamento	**Magdalena y Bolívar**
$	**Valor Inicial Obra: $3.566.467.466.00** **Valor inicial Interventoria: $264.974.745,00**
	Adiciones Obra: $ 0 Interventoría: $20.000.000.00 (El contratista pago $10.000.000.00 y el convenio $10.000.000.00) **Valor final Interventoria $ 284.974.745,00**
	Valor Pagado Obra: $3.361.652.674.57 Valor Liberado contrato de obra: $204.814.791.43 Interventoría: $279.439.929.41 Valor a Liberar:$5.534.815.59
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Otro Sí 1: Prorroga un (1) y quince (15) días. Otro Sí 2: Exclusion de dos (2) (TACAMOCHO y EDM JAIME) por la imposiblidad técnica para ejecutar.
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	Contrato de Obra Liquidado y culminado. Se inicia tramite de liquidación: interventoría adelanta el proceso de radicación de los documentos para la liquidación 07/03/2025.

100%
Porcentaje de avance

100%
Porcentaje Programado

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Grupo 5

Fecha inicio: 14/11/2023
Fecha Fin: 08/11/2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Departamento	**Magdalena y Bolívar**
$	**Valor Inicial** Obra: $4.102.044.984 Interventoría: $300.856.990
	Adiciones Obra: $778.973.616 Interventoría: $172.224.091 ($91.100.000 asumidos por el contrato de obra) ($81.124.091 asumidos por el contrato interadministrativo)
	Valor Pagado Obra: $4.745.371.433 Interventoría: $420.967.384,31
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	5 otrosíes obra: Prórrogas (7 meses y 20 dias) y adiciones ($778.973.616) 5 otrosíes interventoría: Prórrogas (7 meses y 20 dias) y adiciones ($172.224.091)
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	CONTRATO PAF-MENAM-O-053-2023: Terminado el 08.11.2024 CONTRATO PAF-MENAM-I-056-2023: Terminado el 08.01.2025 En cumplimiento al alcance se tienen 16 sedes entregadas • **CONTRATO PAF-MENAM-O-053-2023**: Liquidación radicada el 25.03.2025, PRISA INC 2025-000861, asignación liquidador el 1.04.2025 Hernán Erazo, envía observaciones el 08.04.2025 las cuales fueron atendidas por la supervisión el 21.04.2025 para continuar tramite de liquidación. • **CONTRATO PAF-MENAM-I-056-2023**: Liquidación radicada el 08.04.2025, PRISA INC 2025-000983, asignación liquidador el 14.04.2025 Hernán Erazo. quien está adelantando la revisión. • Liquidaciones proyectadas para el 15 de julio de 2025

100%
Porcentaje de avance

100%
Porcentaje Programado

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Publica

GRUPO 5, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES SEDE PRINCIPAL
ID No. 30




INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES SEDE SERENOS
ID No. 101




INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES SEDE SERENOS
ID No. 101




INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRISTIAN MORENO SEDE CHINELA
ID No. 97




INSTITUCION EDUCATIVA EL PUEBLITO SEDE PUERTO LA ESTANCIA
ID No. 147




INSTITUCION EDUCATIVA EL PUEBLITO SEDE TORRECILLA
ID No. 148





CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

GRUPO 5, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PUEBLITO SEDE TRONCONAL
ID No. 146




INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RURAL SILVIA COTES DE BISWELL SEDE ISLITA
ID No. 32




INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL OSCAR PISCIOTTI NUMA SEDE INMACULADA CONCEPCION




INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL ANTONIO NARIÑO SEDE JOSE DE LA PAZ VANEGAS




INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA CRUZ DE BALSAMO SEDE PRIMARIA
ID No. 13




INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA CRUZ DE BALSAMO SEDE JARDIN INFANTIL
ID No. 14




CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

GRUPO 5, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR SEDE PRINCIPAL
ID No. 06




INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR SEDE CERRITO
ID No. 10




INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS GUILLERMO VIDES ESCOBAR SEDE ATASCOZA
ID No. 09




INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA PESQUERA LEONIDAS ORTIZ ALVEAR SEDE PLAN BONITO
ID No. 43





CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Grupo 7

Fecha inicio: 31/05/2024
Fecha Fin: 17/01/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Departamento	**La Guajira**
$	**Valor Inicial** Obra: $**4.158.777.879** Interventoría: $**295.239.000**
	Adiciones Obra: $ 0 Interventoría: $0
	Valor Pagado Obra: $ 4.158.777.879 (100,00%) Interventoría: $121.499.000 (41,15%)
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Suspensión 1 por 20 días 28 de oct de 2024 Prórroga 1 por 45 días 13 de sep de 2024 Suspensión 2 por 30 días 18 de nov de 2024 Prórroga 2 por 30 días 19 de dic de 2024
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	CONTRATO PAF-ATMEN5-O-036-2024: Terminado el 17.01.2025 CONTRATO PAF-MENAM-I-059-2023: Fecha de Terminación el 17.03.20 AERS del componente II Obra firmada 28feb2025; se pagó ultimo saldo pendiente por Obra a finales de marzo2025. El contrato de obra se estima iniciar su trámite de liquidación a final de abril; una vez adjunten toda la documentación correspondiente y se elabore acta conjunta con interventoría. Con respecto a la interventoría le falta facturar un 58,85% y se estima su liquidación para iniciar a finales de mayo 2025.

100%
Porcentaje de avance

100%
Porcentaje Programado

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

REGISTRO FOTOGRAFICO

I.E. JOSE ANTONIO GALAN- SEDE COOPERATIVO -060-(RIOHACHA)





INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #7 - 034-APÜNIMA´ANA1 -(RIOHACHA)





ESCUELA ETNOEDUCATIVA LA CAMPANA -050--(MAICAO)







ESCUELA ETNOEDUCATIVA WAYUMA'ANA -054- (MAICAO)





CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

REGISTRO FOTOGRAFICO

INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #7 - 117-WAKUAPAMANA -(RIOHACHA)






I.E. JOSE ANTONIO GALAN- SEDE PRINCIPAL -060-(RIOHACHA)






INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #6 - 051-TALOULUMA `ANA -(MAICAO)




INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO RURAL PROVINCIAL - 0143-PROVINCIAL -(BARRANCAS)




CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Publica
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

REGISTRO FOTOGRAFICO

INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA - 011-
ESCUELA RURAL INDIGENA KARALOUTAMANA -(MANAURE)





ESCUELA ETNOEDUCATIVA SEDE KASICHE -053- (MAICAO)













INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #6 - 151-LA
ESTRELLA -(MAICAO)



INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #6 - 051-
YAMAIN SEDE PRINCIPAL -(MAICAO)



INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #6 - 152-
YAMAIN KASPOLIMANA -(MAICAO)









CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Grupo 8

Fecha inicio: 08/11/2023
Fecha Fin: 08/07/2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Departamento	**Córdoba y Bolívar**
$	**Valor Inicial** Obra: $$4.706.470.280 M/CTE Interventoría: $297.097.668,00 M/CTE
	Adiciones Obra: $1.455.000.000 Interventoría: $144.106.877
	Valor Pagado Obra: $6.161.470.280 Interventoría: $277.437.804
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Prorroga 1: 2 meses y 15 días Prorroga 1: 2 meses
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	Contrato de obra: liquidado del 14 de marzo de 2025. Contrato de interventoría: En ajuste por parte del contratista, los documentos revisados por la supervisión previo al inicio del proceso de liquidación.





CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

REGISTRO FOTOGRAFICO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Sede principal I. E. El Palmar - Montelíbano



Sede Buenos Aires - María La Baja



Sede Los Cerros - Planeta Rica



Sede Téc. Agrop. De Desarrollo Rural De María la baja - María La Baja



Sede Esc. Nueva Parcelas Londres - Ayapel



Sede Técnica Álvaro Ulcue Chocue - Tuchín



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

REGISTRO FOTOGRAFICO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Sede Esc. Nueva La Solita - Puerto Libertador



Sede Los Aguacates - Cotorra



Sede Níspero-María La Baja





CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública
CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada

Grupo 11

Fecha inicio: 12/02/2024
Fecha Fin: 27/11/2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Departamento	**Cauca**
$	**Valor Inicial** Obra: $ 4.728.021.810 Interventoría: $ 312.927.160
	Adiciones Obra: $ 0 Interventoría: $ 99.972.853,00 ($ 54.867.110,00 asumidos por el contrato de obra) ($ 45.105.743,00 asumidos por el contrato interadministrativo)
	Valor Pagado Obra: $ 4.721.624.076,00 Interventoría: $ 379.820.020,17
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	3 otrosíes obra: Prórrogas (6 meses) 3 otrosíes interventoría: Prórrogas y adiciones (6 meses - $ 99.972.853,00)
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	Las 18 sedes educativas que conforman el contrato de obra fueron entregadas y recibidas a satisfacción por parte de los Directivos de Cada Sede. Acta de entrega y recibo a satisfacción del componente 2 suscrita y legalizada. Contratista e interventoría terminaron de consolidar documentos de cierre de componente 2 y documentos que soportan el inicio de la liquidación del contrato de obra. Se prevé radicar este proceso en la semana del 28/04/2025.

100%
Porcentaje de avance

100%
Porcentaje Programado

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO




I.E. Agropecuaria Santa Rita – Sede principal
La vega




C.E. Buenos Aires – Sede Capitanes
Balboa




C.E. Guillermo León Valencia – Sede La Despensa
Rosas





C.E. Guillermo León Valencia – El Altillo
Rosas

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada
CCOM-FO-005 V1 / 05 - Ago-2024 / Pública

Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO




I.E. El Carmen – Sede principal
Bolívar





I.E. Alfonso Córdoba – Sede Las Yerbas
Rosas




I.E. Alfonso Córdoba – Sede Bellavista
Rosas




I.E. Técnica Agropecuaria Nuestra Señora de los
Remedios - Bolívar

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada
CCOM-FO-005 V1 / 05 - Ago-2024 / Pública

Grupo 12

Fecha inicio: 12/02/2024
Fecha Fin: 04/12/2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Departamento	**Cauca, Huila, Nariño y Putumayo**
$	**Valor Inicial** Obra: $ 4.918.276.400,00 Interventoría: $ 318.105.088,00
	Adiciones Obra: $ 0 Interventoría: $ 152,015,642,00
	Valor Pagado Obra: $ 4.906.706.463,00 Interventoría: $ 413.123.412
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	2 otrosíes obra: Prórrogas (6 meses) 2 otrosíes interventoría: Prórrogas y adiciones (6 meses - $ 152,015,642,00)
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	Total de 18 sedes, entregadas a satisfacción con recibo de interventoría y rectores: • **CONTRATO PAF-MENAM-O-076-2023:** Radicado al equipo de liquidación de Findeter por PRISA No. INC 2025-000928 de fecha 04/04/2025 se hicieron observaciones 22/04/2025 y se subsano el mismo día en revisión (2). • **CONTRATO PAF-MENAM-I-064-2023:** Radicado al equipo de liquidación de Findeter por PRISA No. INC 2025-001001 de fecha 10/04/2025 en revisión.





CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Estado GRUPO 12, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO




ID1 Pasto, Nariño - I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE




ID8 El Rosario - Nariño, CENTRO EDUCATIVO LA CLAUDIA




ID26 Acevedo, Huila - INSTITUCION EDUCATIVA BATEAS




ID27 Piamonte - Cauca, ESCUELA RURAL MIXTA LA ESPANOLA

CCOM-FO-001 V19 / 27-Feb-2024 / Clasificada
CCOM-FO-005 V1 / 05 - Ago-2024 / Pública

CONTRATOS LIQUIDADOS

GRUPO	Departamento	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	OBSERVACIONES
Grupo 1	Antioquia y Chocó	10	14/11/2023	14/08/2024	**CONTRATO PAF-MENAM-O-049-2023:** Liquidación suscrita el 31 de enero e 2025 **CONTRATO PAF-MENAM-I-052-2023:** Liquidación suscrita el 25 de febrero e 2025
Grupo 3	Magdalena	**5**	14/11/2023	12/04/2024	**LIQUIDACIÓN Contrato de Obra No. PAF-MENAM-O-051-2023**: Suscrita Acta de liquidación de fecha 01/10/2024, pagado 100%. **LIQUIDACIÓN Contrato de Interventoría No. PAF-MENAM-I-054-2023:**Suscrita Acta de liquidación de fecha 20/12/2024, pagado 100%.
Grupo 6	Cesar	**7**	15/11/2023	29/04/2024	**LIQUIDACIÓN Contrato de Obra No. PAF-MENAM-O-056-2023:** Suscrita Acta de liquidación el 20/11/2024 y pagado al 100%. **LIQUIDACIÓN Contrato de Interventoría No. PAF-MENAM-I-058-2023:** Suscrita Acta de liquidación el 27/11/2024 y pagado al 100%.

CCOM-FO-005 V1 / 05 - Ago-2024 / Pública

Actualización Plan de Adquisiciones **Fecha de elaboración:** 28 de abril de 2025

Código UNSPSC (cada código separado por ;)	FUENTE DE RECURSOS (Seleccione- Lista desplegable)	LINEA DE INTERVENCIÓN (Seleccione- Lista desplegable)	OBJETO DE GASTO (Seleccione- Lista desplegable)	ACTIVIDAD	META		MONTO		Evidencia del Cumplimiento de la Actividad (Incluir aquí la evidencia de la ejecución de recursos)	ACTUALIZACION META ABRIL 2025	
					Cantidad	Unidades de medida de meta	Costo Unitario	Total Recursos		Cantidad Actualizada	Unidades de medida de meta
86140000;86140000;95140000;93142103	Asignación FNGRD - Colombia Vital - JD 24 de noviembre 2022	1.1. Servicios generales de respuesta	Aulas temporales prefabricadas y reparación de sedes educativas	Para el Departamento de Antioquia, fabricación, transporte, instalación de aulas prefabricadas y/o baterias de baños y/o mobiliario escolar, y/o reparación de sede educativa. Incluye la asistencia técnica y administración de los recursos	$ 3.796	Estudiantes beneficiarios de aulas prefabricadas o reparación de sedes educativas	$ 2.244.161	8.518.835.970	Actas de recibo y/o informes y/o registro fotográfico	4.181	Estudiantes beneficiarios de aulas prefabricadas o reparación de sedes educativas
86140000;86140000;95140000;93142103	Asignación FNGRD - Colombia Vital - JD 24 de noviembre 2022	1.1. Servicios generales de respuesta	Aulas temporales prefabricadas y reparación de sedes educativas	Para el Departamento de Arauca, fabricación, transporte, instalación de aulas prefabricadas y/o baterias de baños y/o mobiliario escolar, y/o reparación de sede educativa. Incluye la asistencia técnica y administración de los recursos	$ 302	Estudiantes beneficiarios de aulas prefabricadas o reparación de sedes educativas	$ 2.244.161	677.736.687	Actas de recibo y/o informes y/o registro fotográfico	311	Estudiantes beneficiarios de aulas prefabricadas o reparación de sedes educativas
86140000;86140000;95140000;93142103	Asignación FNGRD - Colombia Vital - JD 24 de noviembre 2022	1.1. Servicios generales de respuesta	Aulas temporales prefabricadas y reparación de sedes educativas	Para el Departamento de Atlántico, fabricación, transporte, instalación de aulas prefabricadas y/o baterias de baños y/o mobiliario escolar, y/o reparación de sede educativa. Incluye la asistencia técnica y administración de los recursos	$ 4.364	Estudiantes beneficiarios de aulas prefabricadas o reparación de sedes educativas	$ 2.244.161	9.793.519.539	Actas de recibo y/o informes y/o registro fotográfico	5.363	Estudiantes beneficiarios de aulas prefabricadas o reparación de sedes educativas
86140000;86140000;95140000;93142103	Asignación FNGRD - Colombia Vital - JD 24 de noviembre 2022	1.1. Servicios generales de respuesta	Aulas temporales prefabricadas y reparación de sedes educativas	Para el Departamento de Bolívar, fabricación, transporte, instalación de aulas prefabricadas y/o baterias de baños y/o mobiliario escolar, y/o reparación de sede educativa. Incluye la asistencia técnica y administración de los recursos	$ 1.354	Estudiantes beneficiarios de aulas prefabricadas o reparación de sedes educativas	$ 2.244.161	3.038.594.284	Actas de recibo y/o informes y/o registro fotográfico	2.593	Estudiantes beneficiarios de aulas prefabricadas o reparación de sedes educativas
86140000;86140000;95140000;93142103	Asignación FNGRD - Colombia Vital - JD 24 de noviembre 2022	1.1. Servicios generales de respuesta	Aulas temporales prefabricadas y reparación de sedes educativas	Para el Distrito de Bogotá, fabricación, transporte, instalación de aulas prefabricadas y/o baterias de baños y/o mobiliario escolar, y/o reparación de sede educativa. Incluye la asistencia técnica y administración de los recursos	$ 60	Estudiantes beneficiarios de aulas prefabricadas o reparación de sedes educativas	$ 2.244.161	134.649.673	Actas de recibo y/o informes y/o registro fotográfico	-	Estudiantes beneficiarios de aulas prefabricadas o reparación de sedes educativas

CCOM-FO-001 V18 // 1-Jun-2023 / Clasificada

Actualización Plan de Adquisiciones **Fecha de elaboración:** 28 de abril de 2025

Código UNSPSC (cada código separado por ;)	FUENTE DE RECURSOS (Seleccione- Lista desplegable)	LINEA DE INTERVENCIÓN (Seleccione- Lista desplegable)	OBJETO DE GASTO (Seleccione- Lista desplegable)	ACTIVIDAD	META		MONTO		Evidencia del Cumplimiento de la Actividad (Incluir aquí la evidencia de la ejecución de recursos)	ACTUALIZACION META ABRIL 2025	
					Cantidad	Unidades de medida de meta	Costo Unitario	Total Recursos		Cantidad Actualizada	Unidades de medida de meta
86140000;86140000;95140000;93142103	Asignación FNGRD - Colombia Vital - JD 24 de noviembre 2022	1.1. Servicios generales de respuesta	Aulas temporales prefabricadas y reparación de sedes educativas	Para el Departamento de Cauca, fabricación, transporte, instalación de aulas prefabricadas y/o baterias de baños y/o mobiliario escolar, y/o reparación de sede educativa. Incluye la asistencia técnica y administración de los recursos	$ 2.318	Estudiantes beneficiarios de aulas prefabricadas o reparación de sedes educativas	$ 2.244.161	5.201.965.695	Actas de recibo y/o informes y/o registro fotográfico	4.966	Estudiantes beneficiarios de aulas prefabricadas o reparación de sedes educativas
86140000;86140000;95140000;93142103	Asignación FNGRD - Colombia Vital - JD 24 de noviembre 2022	1.1. Servicios generales de respuesta	Aulas temporales prefabricadas y reparación de sedes educativas	Para el Departamento de Cesar, fabricación, transporte, instalación de aulas prefabricadas y/o baterias de baños y/o mobiliario escolar, y/o reparación de sede educativa. Incluye la asistencia técnica y administración de los recursos	$ 2.312	Estudiantes beneficiarios de aulas prefabricadas o reparación de sedes educativas	$ 2.244.161	5.188.500.728	Actas de recibo y/o informes y/o registro fotográfico	2.697	Estudiantes beneficiarios de aulas prefabricadas o reparación de sedes educativas
86140000;86140000;95140000;93142103	Asignación FNGRD - Colombia Vital - JD 24 de noviembre 2022	1.1. Servicios generales de respuesta	Aulas temporales prefabricadas y reparación de sedes educativas	Para el Departamento de Chocó, fabricación, transporte, instalación de aulas prefabricadas y/o baterias de baños y/o mobiliario escolar, y/o reparación de sede educativa. Incluye la asistencia técnica y administración de los recursos	$ 1.180	Estudiantes beneficiarios de aulas prefabricadas o reparación de sedes educativas	$ 2.244.161	2.648.110.233	Actas de recibo y/o informes y/o registro fotográfico	711	Estudiantes beneficiarios de aulas prefabricadas o reparación de sedes educativas
86140000;86140000;95140000;93142103	Asignación FNGRD - Colombia Vital - JD 24 de noviembre 2022	1.1. Servicios generales de respuesta	Aulas temporales prefabricadas y reparación de sedes educativas	Para el Departamento de Cordoba, fabricación, transporte, instalación de aulas prefabricadas y/o baterias de baños y/o mobiliario escolar, y/o reparación de sede educativa. Incluye la asistencia técnica y administración de los recursos	$ 652	Estudiantes beneficiarios de aulas prefabricadas o reparación de sedes educativas	$ 2.244.161	1.463.193.112	Actas de recibo y/o informes y/o registro fotográfico	2.691	Estudiantes beneficiarios de aulas prefabricadas o reparación de sedes educativas
86140000;86140000;95140000;93142103	Asignación FNGRD - Colombia Vital - JD 24 de noviembre 2022	1.1. Servicios generales de respuesta	Aulas temporales prefabricadas y reparación de sedes educativas	Para el Departamento de Cundinamarca, fabricación, transporte, instalación de aulas prefabricadas y/o baterias de baños y/o mobiliario escolar, y/o reparación de sede educativa. Incluye la asistencia técnica y administración de los recursos	$ 15	Estudiantes beneficiarios de aulas prefabricadas o reparación de sedes educativas	$ 2.244.161	33.662.418	Actas de recibo y/o informes y/o registro fotográfico	16	Estudiantes beneficiarios de aulas prefabricadas o reparación de sedes educativas
86140000;86140000;95140000;93142103	Asignación FNGRD - Colombia Vital - JD 24 de noviembre 2022	1.1. Servicios generales de respuesta	Aulas temporales prefabricadas y reparación de sedes educativas	Para el Departamento de La Guajira, fabricación, transporte, instalación de aulas prefabricadas y/o baterias de baños y/o mobiliario escolar, y/o reparación de sede educativa. Incluye la asistencia técnica y administración de los recursos	$ 1.414	Estudiantes beneficiarios de aulas prefabricadas o reparación de sedes educativas	$ 2.244.161	3.173.243.957	Actas de recibo y/o informes y/o registro fotográfico	2.130	Estudiantes beneficiarios de aulas prefabricadas o reparación de sedes educativas
86140000;86140000;95140000;93142103	Asignación FNGRD - Colombia Vital - JD 24 de noviembre 2022	1.1. Servicios generales de respuesta	Aulas temporales prefabricadas y reparación de sedes educativas	Para el Departamento de Huila, fabricación, transporte, instalación de aulas prefabricadas y/o baterias de baños y/o mobiliario escolar, y/o reparación de sede educativa. Incluye la asistencia técnica y administración de los recursos	$ 20	Estudiantes beneficiarios de aulas prefabricadas o reparación de sedes educativas	$ 2.244.161	44.883.224	Actas de recibo y/o informes y/o registro fotográfico	193	Estudiantes beneficiarios de aulas prefabricadas o reparación de sedes educativas

Actualización Plan de Adquisiciones **Fecha de elaboración:** 28 de abril de 2025

Código UNSPSC (cada código separado por ;)	FUENTE DE RECURSOS (Seleccione- Lista desplegable)	LINEA DE INTERVENCIÓN (Seleccione- Lista desplegable)	OBJETO DE GASTO (Seleccione- Lista desplegable)	ACTIVIDAD	META		MONTO		Evidencia del Cumplimiento de la Actividad (Incluir aquí la evidencia de la ejecución de recursos)	ACTUALIZACION META ABRIL 2025	
					Cantidad	Unidades de medida de meta	Costo Unitario	Total Recursos		Cantidad Actualizada	Unidades de medida de meta
86140000;86140000;95140000;93142103	Asignación FNGRD - Colombia Vital - JD 24 de noviembre 2022	1.1. Servicios generales de respuesta	Aulas temporales prefabricadas y reparación de sedes educativas	Para el Departamento de Magdalena, fabricación, transporte, instalación de aulas prefabricadas y/o baterias de baños y/o mobiliario escolar, y/o reparación de sede educativa. Incluye la asistencia técnica y administración de los recursos	$ 3.140	Estudiantes beneficiarios de aulas prefabricadas o reparación de sedes educativas	$ 2.244.161	7.046.666.213	Actas de recibo y/o informes y/o registro fotográfico	3.632	Estudiantes beneficiarios de aulas prefabricadas o reparación de sedes educativas
86140000;86140000;95140000;93142103	Asignación FNGRD - Colombia Vital - JD 24 de noviembre 2022	1.1. Servicios generales de respuesta	Aulas temporales prefabricadas y reparación de sedes educativas	Para el Departamento de Meta, fabricación, transporte, instalación de aulas prefabricadas y/o baterias de baños y/o mobiliario escolar, y/o reparación de sede educativa. Incluye la asistencia técnica y administración de los recursos	$ 360	Estudiantes beneficiarios de aulas prefabricadas o reparación de sedes educativas	$ 2.244.161	807.898.037	Actas de recibo y/o informes y/o registro fotográfico	301	Estudiantes beneficiarios de aulas prefabricadas o reparación de sedes educativas
86140000;86140000;95140000;93142103	Asignación FNGRD - Colombia Vital - JD 24 de noviembre 2022	1.1. Servicios generales de respuesta	Aulas temporales prefabricadas y reparación de sedes educativas	Para el Departamento de Nariño, fabricación, transporte, instalación de aulas prefabricadas y/o baterias de baños y/o mobiliario escolar, y/o reparación de sede educativa. Incluye la asistencia técnica y administración de los recursos	$ 3.562	Estudiantes beneficiarios de aulas prefabricadas o reparación de sedes educativas	$ 2.244.161	7.993.702.245	Actas de recibo y/o informes y/o registro fotográfico	1.401	Estudiantes beneficiarios de aulas prefabricadas o reparación de sedes educativas
86140000;86140000;95140000;93142103	Asignación FNGRD - Colombia Vital - JD 24 de noviembre 2022	1.1. Servicios generales de respuesta	Aulas temporales prefabricadas y reparación de sedes educativas	Para el Departamento de Norte de Santander, fabricación, transporte, instalación de aulas prefabricadas y/o baterias de baños y/o mobiliario escolar, y/o reparación de sede educativa. Incluye la asistencia técnica y administración de los recursos	$ 20	Estudiantes beneficiarios de aulas prefabricadas o reparación de sedes educativas	$ 2.244.161	44.883.224	Actas de recibo y/o informes y/o registro fotográfico	11	Estudiantes beneficiarios de aulas prefabricadas o reparación de sedes educativas
86140000;86140000;95140000;93142103	Asignación FNGRD - Colombia Vital - JD 24 de noviembre 2022	1.1. Servicios generales de respuesta	Aulas temporales prefabricadas y reparación de sedes educativas	Para el Departamento de Putumayo, fabricación, transporte, instalación de aulas prefabricadas y/o baterias de baños y/o mobiliario escolar, y/o reparación de sede educativa. Incluye la asistencia técnica y administración de los recursos	$ 545	Estudiantes beneficiarios de aulas prefabricadas o reparación de sedes educativas	$ 2.244.161	1.223.067.862	Actas de recibo y/o informes y/o registro fotográfico	190	Estudiantes beneficiarios de aulas prefabricadas o reparación de sedes educativas
86140000;86140000;95140000;93142103	Asignación FNGRD - Colombia Vital - JD 24 de noviembre 2022	1.1. Servicios generales de respuesta	Aulas temporales prefabricadas y reparación de sedes educativas	Para el Departamento de Risaralda, fabricación, transporte, instalación de aulas prefabricadas y/o baterias de baños y/o mobiliario escolar, y/o reparación de sede educativa. Incluye la asistencia técnica y administración de los recursos	$ 20	Estudiantes beneficiarios de aulas prefabricadas o reparación de sedes educativas	$ 2.244.161	44.883.224	Actas de recibo y/o informes y/o registro fotográfico	-	Estudiantes beneficiarios de aulas prefabricadas o reparación de sedes educativas
86140000;86140000;95140000;93142103	Asignación FNGRD - Colombia Vital - JD 24 de noviembre 2022	1.1. Servicios generales de respuesta	Aulas temporales prefabricadas y reparación de sedes educativas	Para el Departamento de Santander, fabricación, transporte, instalación de aulas prefabricadas y/o baterias de baños y/o mobiliario escolar, y/o reparación de sede educativa. Incluye la asistencia técnica y administración de los recursos	$ 540	Estudiantes beneficiarios de aulas prefabricadas o reparación de sedes educativas	$ 2.244.161	1.211.847.056	Actas de recibo y/o informes y/o registro fotográfico	691	Estudiantes beneficiarios de aulas prefabricadas o reparación de sedes educativas

CCOM-FO-001 V18 // 1-Jun-2023 / Clasificada

Actualización Plan de Adquisiciones **Fecha de elaboración:** 28 de abril de 2025

Código UNSPSC (cada código separado por ;)	FUENTE DE RECURSOS (Seleccione- Lista desplegable)	LINEA DE INTERVENCIÓN (Seleccione- Lista desplegable)	OBJETO DE GASTO (Seleccione- Lista desplegable)	ACTIVIDAD	META		MONTO		Evidencia del Cumplimiento de la Actividad (Incluir aquí la evidencia de la ejecución de recursos)	ACTUALIZACION META ABRIL 2025	
					Cantidad	Unidades de medida de meta	Costo Unitario	Total Recursos		Cantidad Actualizada	Unidades de medida de meta
86140000;86140000;95140000;93142103	Asignación FNGRD - Colombia Vital - JD 24 de noviembre 2022	1.1. Servicios generales de respuesta	Aulas temporales prefabricadas y reparación de sedes educativas	Para el Departamento de Tolima, fabricación, transporte, instalación de aulas prefabricadas y/o baterias de baños y/o mobiliario escolar, y/o reparación de sede educativa. Incluye la asistencia técnica y administración de los recursos	$ 33	Estudiantes beneficiarios de aulas prefabricadas o reparación de sedes educativas	$ 2.244.161	74.057.320	Actas de recibo y/o informes y/o registro fotográfico	13	Estudiantes beneficiarios de aulas prefabricadas o reparación de sedes educativas
86140000;86140000;95140000;93142103	Asignación FNGRD - Colombia Vital - JD 24 de noviembre 2022	1.1. Servicios generales de respuesta	Aulas temporales prefabricadas y reparación de sedes educativas	Para el Departamento de Valle del Cauca, fabricación, transporte, instalación de aulas prefabricadas y/o baterias de baños y/o mobiliario escolar, y/o reparación de sede educativa. Incluye la asistencia técnica y administración de los recursos	$ 500	Estudiantes beneficiarios de aulas prefabricadas o reparación de sedes educativas	$ 2.244.161	1.122.080.607	Actas de recibo y/o informes y/o registro fotográfico	841	Estudiantes beneficiarios de aulas prefabricadas o reparación de sedes educativas
80101600	Asignación FNGRD - Colombia Vital - JD 24 de noviembre 2022	1.1. Servicios generales de respuesta	Aulas temporales prefabricadas y reparación de sedes educativas	Porcentaje estimado de Asistencia Técnica y Adminstración de recursos a cargo de Findeter del 7%		7%	$ 59.485.981.308	4.164.018.692	Actas de recibo y/o informes y/o registro fotográfico		7%
TOTAL					$ 26.507			63.650.000.000		32.932	

CCOM-FO-001 V18 // 1-Jun-2023 / Clasificada



Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

GRACIAS

www.findeter.gov.co

@findetercol @findetercol
@findeter linkedin.com/company/findeter

Gobierno de Colombia

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública
