OFICIO DE APROBACIÓN DE ACTA DE COBRO

Bogotá, 23 de mayo de 2025.

ICCU-232-25-0075

Señores
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA.
Ing. LAURA DANIELA NIETO GUTIÉRREZ.
SUBGERENTE DE INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU.
Calle 26 No 51-53, Torre central, Piso 6
Bogotá.

Ref.: Contrato de obra No. ICCU- 767 de 2024.
Objeto: REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ- PASO ANCHO A LA INSPECCIÓN DE BRICEÑO MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA.

Ref.: Contrato de interventoría No. ICCU-CTO-232-2025.
Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ - PASO ANCHO A LA INSPECCIÓN DE BRICEÑO MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA.

ASUNTO: Remisión de acta parcial de obra No 1.

Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el Contrato de Interventoría No. ICCU-CTO-232-2025; nos permitimos en calidad de interventores del contrato de obra No. 767-2024 remitir el acta de obra No.1 correspondiente al mes de abril la cual fue revisada y una vez verificadas las cantidades en obra esta interventoría manifiesta que le CONSORCIO INCITECO IP cumple con las condiciones establecidas contractualmente acorde al contrato de obra No. ICCU- 767 de 2024.

Cordialmente,

EDGAR EDUARDO LARA GUZMÁN
Director de Interventoría.
CONSORCIO RED INFRANOVA
Proyectó: EJCB
Revisó: EELG
cc Luis Fernando Rojas Cruz – Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU)

OFICIO DEL CONTRATISTA

CONSORCIO INCITECO IP

Bogotá; 21 de mayo de 2025.

Señores
CONSORCIO RED INFRANOVA
Ing. Edgar Eduardo Lara Guzmán
Interventoría
Representante legal
Ciudad

CIIP-070-2025

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA ICCU No. 767 DE 2024, cuyo objeto es: "*REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ – PASO ANCHO A LA INSPECCIÓN DE BRICEÑO MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA.*"

Asunto: ENTREGA ACTA DE COBRO PARCIAL No. 1 VERSIÓN 1

Cordial saludo Ingeniero,

Por medio de la presente comunicación hacemos entrega del acta de cobro parcial No. 1 correspondiente al mes del 1 de abril al 30 de abril de 2025. Lo anterior para su revisión, aprobación, firma y trámite respectivo.

Sin otro particular,

IVÁN CAMILO LÓPEZ GÓMEZ
Representante Legal
CONSORCIO INCITECO IP

Anexo: Si – Carpeta
CC:
Elaboró: JARR
Revisó: RRR
Aprobó: ICLG
Folios No. 129

Calle 127 D # 70 D – 27. Teléfono (601) 5165799
Celular: 3175023770
Email: asistente@inciteco.co - licitaciones@inciteco.co
Bogotá, DC – Colombia.

FACTURA
ACTA DE COBRO
PARCIAL No.1

CONSORCIO INCITECO IP
NIT.: 901.899.095-6 - RESPONSABLE DE IVA
TELÉFONO: 5165799
DIRECCIÓN: CL 127 D # 70 D - 27
EMAIL: asistente@inciteco.co

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ECONÓMICA 4210
NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN Nº-18764088523900
FECHA VIGENCIA. 2025-02-07 HASTA 2027-02-07
AUTORIZA DESDE FEIP 1 HASTA FEIP 20

NOMBRE: INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU -
NIT: 900.258.711-1 -
DIRECCIÓN: CLL 26 51 53 TORRE CENTRAL P 6 - BOGOTÁ, D.C.
TELÉFONO: 6017491624 -
FORMA DE PAGO: Contado
EMAIL: facturacion.iccu@cundinamarca.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N° FEIP 1

Fecha generación
20/05/2025 03:50

Fecha transmisión
20/05/2025 03:55

Fecha vencimiento
19/06/2025

Nº	COD.	CANT.	CONCEPTO	VR. UNITARIO.	IVA	VALOR TOTAL
1	4	1	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 1 CONTRATO ICCU 767 DE 2024	$93,112,004	$0	$93,112,004
2	4	1	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	$1,234,291	$0	$1,234,291
3	4	1	PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL	$1,414,774	$0	$1,414,774

Cantidad de Items: 3

SON: NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UNO MIL SESENTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	$95,761,069
Saldo Anterior	$0
TOTAL	$95,761,069

DOCUMENTO SIN VALOR FISCAL

Factura generada por SEDI ERP | SEDI SOLUTIONS S.A.S NIT:901.356.496-6 | www.sedisolutions.co

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio Art. 774 del Código de Comercio en caso de mora se causará el interés a la tasa máxima autorizada por la ley. Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para firmar.
*Esta factura se considera aceptada por el comprador, si no es rechazada dentro de las 72 horas siguientes a la fecha de recibida.

CUFE:

ORIGINAL

OFICIO DE APROBACIÓN DE INFORMES MENSUALES

Bogotá, 07 mayo de 2025.

ICCU-232-25-0061

Señores
CONSORCIO INCITECO IP
Ing. IVÁN CAMILO LOPEZ GÓMEZ
Representante Legal
Calle 127 D # 70 D – 27.
Bogotá.

Ref.: Contrato de obra No. ICCU- 767 de 2024.
Objeto: REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ- PASO ANCHO A LA INSPECCIÓN DE BRICEÑO MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA.

ASUNTO: Aprobación informes técnicos No 1 y No 2.

Cordial saludo,

En cumplimiento a las obligaciones del contrato de referencia y conforme a la documentación allegada por usted bajo el comunicado CIIP-063-2025 me permito en calidad de interventor posterior a realizar la revisión de la información dar aprobación a los informes técnicos No 1 y No 2 del contrato ICCU-767-2024.

Cordialmente,

EDGAR EDUARDO LARA GUZMÁN
Director de Interventoría.
CONSORCIO RED INFRANOVA
Proyectó: YBLR
Revisó: EELG
cc Luis Fernando Rojas Cruz – Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU)

REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO - RUT

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141154028744

(415)7707212489984(8020) 000014115402874 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 9 0 9 5	6	Impuestos de Bogotá	3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO INCITECO IP

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 127 D # 70 D - 27

42. Correo electrónico asistente@inciteco.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 7 5 0 2 3 7 7 0	6 0 1 5 1 6 5 7 9 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 4 1 1 1 9							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 7 9 1 4 4 8 5 5

07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre LOPEZ GOMEZ IVAN CAMILO

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 09-01-2025 03:31:21PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141154028744

(415)7707212489984(8020) 000014115402874 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 9 0 9 5	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personeria jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 1 1 1 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 4 1 1 1 9	
81. Hasta	2 0 3 0 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141154028744

(415)7707212489984(8020) 000014115402874 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 9 0 9 5	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 1 1 1 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	8 0 7 7 1 3 6 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
LOPEZ	GOMEZ	IVAN	CAMILO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 1 1 1 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 4 2 5 5 1 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
QUINTANA	VARGAS	GONZALO	ENRIQUE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 1 1 1 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	3 6 7 5 2 2 5 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RUALES	GUZMAN	ADRIANA	MAGALI

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Página 4 de 4 **Hoja 4**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141154028744

(415)7707212489984(8020) 000014115402874 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 9 0 9 5	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 0 0 1 0 4 2 1 4	9	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INCITECO S A S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
2,000,000	9 0	2 0 2 4 1 1 1 9	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 4 9 8 3 6 1	6	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INGENIEROS PROYECTAR SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
2,000,000	1 0	2 0 2 4 1 1 1 9	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141053628483

(415)7707212489984(8020) 000014105362848 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 0 0 1 0 4 2 1 4	9	Impuestos de Bogotá	3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INCITECO S A S

36. Nombre comercial	37. Sigla
INCITECO S A S	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 127 D 70 D 27

42. Correo electrónico asistente@inciteco.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 5 1 6 5 7 9 9	3 1 7 5 0 2 3 7 7 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	1 9 9 0 0 8 0 3	4 9 2 3	2 0 2 3 1 1 0 1	4 2 1 0	7 1 1 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5 5 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
59 - Autorretención especial renta

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre LOPEZ GOMEZ IVAN CAMILO

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 10-01-2025 02:53:55PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141053628483

(415)7707212489984(8020) 000014105362848 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 0 0 1 0 4 2 1 4	9	Impuestos de Bogotá	3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	1 2 1 9	2 3 5 8
73. Fecha	1 9 9 0 0 8 0 3	2 0 0 5 0 6 0 9
74. Número de notaría	1 7	2 4
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 9 0 0 8 2 3	2 0 0 5 0 6 2 1
77. No. Matrícula mercantil	4 2 0 3 0 6	9 9 7 1 0 0
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4
Vigencia		
80. Desde	1 9 9 0 0 8 2 3	
81. Hasta	2 0 9 4 1 0 2 6	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 5		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

12

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 6 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141053628483

(415)7707212489984(8020) 000014105362848 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 0 4 2 1 4	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 4 1 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	8 0 7 7 1 3 6 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
LOPEZ	GOMEZ	IVAN	CAMILO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 9 0 9 2 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 1 1 1 0 1 5 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GIRALDO	JARAMILLO	IVAN	DE JESUS

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Página 4 de 6 Hoja 4

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141053628483

(415)7707212489984(8020) 000014105362848 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 0 4 2 1 4	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 9 2 9 5 1 6 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
LOPEZ	GOMEZ	ANTONIO	MARIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1,500,000	3 3	1 9 9 0 0 8 0 3	2 0 2 2 1 2 1 2

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 1 1 1 0 1 5 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
GIRALDO	JARAMILLO	IVAN	DE JESUS

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1,500,000	3 3	1 9 9 0 0 8 0 3	2 0 2 2 1 2 1 2

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 5 0 0 0 4 8 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
LOPEZ	GOMEZ	PASTOR	DE JESUS

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1,500,000	3 4	1 9 9 0 0 8 0 3	2 0 2 2 1 2 1 2

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 6 5 6 9 8 0	7	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social
ZAFIRO LT SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 2 1 2 1 2	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 6 6 1 9 1 4	0	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social
GIRALDO Y CASTILLO SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 2 1 2 1 2	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Página 5 de 6 Hoja 4

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141053628483

(415)7707212489984(8020) 000014105362848 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 0 4 2 1 4	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 6 5 9 5 4 4	2	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social
KALOGO SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 2 1 2 1 2	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 6 de 6 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141053628483

(415)7707212489984(8020) 000014105362848 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 0 0 1 0 4 2 1 4	9	Impuestos de Bogotá	3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 9 4 7 0 9 8 8		4 2 0 6 2 - T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
GOMEZ	GONZALEZ	ALFREDO	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 0 6 0 6 3 0

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 4 3 8 5 7 3 8 1	1	3 0 3 5 2 5 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
LONDOÑO	VICTORIA	KAREN	DAJHANA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 0 8 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14705224142

(415)7707212489984(8020) 000001470522414 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 9 8 3 6 1	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INGENIEROS PROYECTAR SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 113 83 A 42 TO 1 AP 603

42. Correo electrónico ingproyectar@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	7 5 8 1 3 5 4	3 1 4 2 9 5 9 6 9 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 2 0 2 1 0	4 1 1 2	2 0 1 2 0 2 1 0	7 1 1 0	4 2 1 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	9	1 4	4 2	4 8	5 2																			

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 08 - 21 / 18 : 52: 43

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 3 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14705224142

(415)7707212489984(8020) 000001470522414 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 9 8 3 6 1	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personeria jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 2 0 2 1 0	
74. Número de notaria		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 2 0 2 1 0	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 2 1 8 0 7 8 5	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 2 0 2 1 0	
81. Hasta	2 0 4 2 0 2 1 0	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. Pais	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO SIN COSTO
CERTIFICADO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14705224142

(415)7707212489984(8020) 000001470522414 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 9 8 3 6 1	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 2 0 2 1 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 4 2 5 5 1 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
QUINTANA	VARGAS	GONZALO	ENRIQUE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

CERTIFICACIÓN BANCARIA

NIT 890.300.279-4

CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **CONSORCIO INCITECO IP** identificada con el número de documento **9018990956** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 02 de enero de 2025 con la Cuenta de Ahorros 263-874646 la cual se encuentra Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **CONSORCIO INCITECO IP** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **13 de mayo de 2025.**

Carlos Echeverri B

Carlos Andres Echeverri Bustamante
Vicepresidencia de Empresas

CEDULAS DE CIUDADANÍA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 80771365

LOPEZ GOMEZ
APELLIDOS

IVAN CAMILO
NOMBRES

Ivan Camilo LopezG
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 14-MAR-1985
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA
B+ G.S. RH
M SEXO

28-MAR-2003 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ REMGIFO LOPEZ

P-1500117-42116618-M-0080771365-20030723 01612 03204O 02 146641574

23


REPUBLICA DE COLOMBIA
FUERZAS MILITARES
80771365
LOPEZ GOMEZ
IVAN CAMILO
PERTENECE AL EJERCITO DE:
1A. LINEA
31 - DIC
2015
2A. LINEA
31 - DIC
2025
3A. LINEA
31 - DIC
2025
PROFESION
BACHILLER
23 ABR 2003



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.425.517

QUINTANA VARGAS

APELLIDOS

GONZALO ENRIQUE

NOMBRES

Gonzalo E. Quintana V.

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 06-JUN-1967

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 ESTATURA | B+ G.S. RH | M SEXO

12-NOV-1985 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00162933-M-0079425517-20090715 0013493521A 1 1230102037

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-001
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	1
	ACTA DE INICIO	FECHA	4/03/2025

Acta No. 01

CONTRATO ☑	CONVENIO ☐	C.P. ☐	ICCU No.	767 DE 2025
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	19 de marzo de 2025			

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO:

REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ - PASO ANCHO A LA INSPECCIÓN DE BRICEÑO MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA

FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONVENIO O CONTRATO		24 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO		19 DE MARZO DE 2025
PLAZO		OCHO — DÍAS ☐ — MESES ☑
FECHA TERMINACIÓN		18 DE NOVIEMBRE DE 2025
VALOR TOTAL		$ 10.363.640.754,00
No CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL) Y FECHA		DIS-2025000186 DEL 3 DE MARZO DE 2025 DIS-2025000187 DEL 3 DE MARZO DE 2025
No RP (REGISTRO PRESUPUESTAL) Y FECHA		RES-2025000453 DEL 18 DE MARZO DE 2025 RES-2025000452 DEL 18 DE MARZO DE 2025
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS		10 DE MARZO DE 2025
CONTRATISTA	☑	CONSORCIO INCITECO IP
MUNICIPIO	☐	
INTERVENTOR	☑	CONSORCIO RED INFRANOVA
SUPERVISOR	☑	LAURA DANIEA NIETO GUTIERREZ
GESTOR DE PROYECTO	☐	
APOYO A LA SUPERVISIÓN	☑	LUIS FERNANDO ROJAS CRUZ

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATISTA ☑ EJECUTOR ☐	IVAN CAMILO LOPEZ GOMEZ	Iván Camilo López G
SUPERVISOR ☑ GESTOR DE PROYECTO ☑ APOYO A LA SUPERVISIÓN ☑	LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ LUIS FERNANDO ROJAS CRUZ	
INTERVENTOR ☑	EDGAR EDUARDO LARA GUZMAN	

NOTA: En el caso de los convenios el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca ICCU y el Municipio, se comprometen a suscribir acta de localización previo de la ejecución de las obras, de acuerdo a lo establecido en el convenio.

OBSERVACIONES:

VO. BO. LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ
1.121.939.147 DE VILLAVICENCIO
SUBDIRECTORA TECNIA (E)
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

ACTA DE COBRO N°1

FECHA: 15/07/2025

SUBGERENCIA: SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VÍAL — CUNDINAMARCA — ACTA No. 1 — VALOR BÁSICO ACTA: — MES: DEL 19 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2025

ACTA FINAL

CONTRATO No : ICCU-767-2024 (Indique número y año)

OBJETO: REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ – PASO ANCHO A LA INSPECCIÓN DE BRICEÑO MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: CONSORCIO INCITECO IP (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 232-2025 — INTERVENTOR: CONSORCIO RED INFRANOVA

PLAZO INICIAL: 8 MESES (En meses según contrato principal) — PLAZO ACUMULADO: 8 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 19/03/2025 (Indique día/mes/año) — FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 18/11/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) — FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 10.363.640.754,00 (Según contrato principal) — VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 10.363.640.754,00

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. ____ de fecha _____ CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	VALOR
				CAPITULO 1. ACTIVIDADES PRELIMINARES										
1,1				EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	4.233,00	$ 35.895,0	$ 151.943.535,00			1.396,78	$ 50.137.418,00	1.396,78	$ 50.137.418,00
1,2		201 P		DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	285,00	$ 271.106,0	$ 77.265.210,00			15,01	$ 4.069.301,00	15,01	$ 4.069.301,00
1,3				TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	309.721,00	$ 2.132,0	$ 660.325.172,00			2.455,20	$ 5.234.486,00	2.455,20	$ 5.234.486,00
Subtotal								$ 889.533.917,00				$ 59.441.205,00		$ 59.441.205,00
				CAPITULO 2. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO										
2,1		460.1		FRESADO CONCRETO ASFALTICO (E=5-15 cm)	M2	15.234,00	$ 9.784,0	$ 149.049.456						
2,2		330.1		BASE GRANULAR	M3	598,00	$ 256.843,0	$ 154.788.114						
2,3		340.1		BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-1	M3	6.210,00	$ 596.625,0	$ 3.705.041.250						
2,4		420.1		RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2	14.960,00	$ 7.511,0	$ 112.364.560						
2,5		421.1		RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	M2	18.817,00	$ 3.667,0	$ 69.001.939						
2,6		450.2 P		MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	980,00	$ 1.340.650,0	$ 1.313.837.000						
2,7		APU		MEZCLA SEMIDENSA EN CALIENTE TIPO MSC-25 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO	M3	1.505,00	$ 1.379.207,0	$ 2.075.706.535						
2,8		311.1		AFIRMADO	M3	155,00	$ 100.936,0	$ 15.645.080						
2,9		***		RAJON PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	465,00	$ 134.037,0	$ 62.327.205			246,90	$ 33.093.735,30	246,90	$ 33.093.735,00
Subtotal								$ 7.657.761.139				$ 33.093.735,00		$ 33.093.735,00
				CAPITULO 3. OBRAS DE ARTE Y ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN										
3,1		630.4		CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	29,00	$ 884.384,0	$ 25.647.136,00						
3,2		630.4		CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	M3	28,00	$ 1.074.145,0	$ 30.076.060,00						
3,3		APU		CUNETA DE CONCRETO CLASE D, 3000 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	543,00	$ 719.530,0	$ 390.704.790,00						
3,4		610.1		RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	75,00	$ 120.966,0	$ 9.072.450,00						
3,5		630.6		CONCRETO CLASE F. 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	13,00	$ 540.934,0	$ 7.032.142,00						
3,6		661.1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I. INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	73,00	$ 1.083.067,0	$ 79.063.891,00						
3,7		640.1		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	44.890,00	$ 9.630,0	$ 432.290.700,00						
3,8		682.1 P		COLCHONETA RENO	M3	42,00	$ 338.170,0	$ 14.203.140,00						
Subtotal								$ 998.090.309,00						
				CAPITULO 4. MANTENIMIENTO VIAL										
4,1		801.6		LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	UN	2,00	$ 288.532,0	$ 577.064,00			2,00	$ 577.064,00	2,00	$ 577.064,00
Subtotal								$ 577.064,00				$ 577.064,00		$ 577.064,00
				CAPITULO 5.SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL										
5,1				LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	6.760,00	$ 6.749,0	$ 45.623.240,00						
5,2				MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	510,00	$ 75.145,0	$ 38.323.950,00						
5,3		730.3		TOPE DEFENSA METÁLICA	UN	163,00	$ 142.185,0	$ 23.176.155,00						
5,4		730.2		SECCIÓN FINAL DEFENSA METÁLICA	UN	8,00	$ 118.787,0	$ 950.296,00						
5,5		730.1		DEFENSA METÁLICA	ML	653,00	$ 246.520,0	$ 160.977.560,00						
5,6		701.1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES	UN	970,00	$ 23.084,0	$ 22.391.480,00						
5,7				SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.75X0.75M. POSTE 3.5M	UN	54,00	$ 696.663,0	$ 37.619.802,00						
5,8				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPEROLES DE 10x3.0 CM	UN	480,00	$ 24.598,0	$ 11.807.040,00						
5,9				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPTAFAROS (EN DEFENSAS METÁLICAS)	UN	163,00	$ 61.501,0	$ 10.024.663,00						
Subtotal								$ 350.894.186,00						
SUBTOTAL								$ 9.886.856.615,00				$ 93.112.004,00		$ 93.112.004,00
				VALOR TOTAL OBRA			$	9.886.856.615				$ 93.112.004,00		$ 93.112.004,00
				PROVISIÓN PARA AJUSTE POR POSIBLE VARIACIÓN COSTOS EN INSUMOS			$	195.500.000						$ 1.234.291,00
				PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO			$	131.060.000				$ 1.234.291,00		$ 1.414.774,00
				PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUIA AMBIENTAL			$	150.224.139				$ 1.414.774,00		$ 95.761.069,00
				VALOR TOTAL			$	10.363.640.754				$ 95.761.069,00		

	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CODIGO	MA-GP-FR-038
ICCU		VERSION	O
		FECHA	6/06/2023

	FECHA	15/07/2025

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 35,00 %
Utilidad 2,00 %

		Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$	2.000.000.000,00	100%
Valor Amortizado Presenta Acta	$	18.480.198,47	0,92%
Valor Amortizado Acumulado	$	18.480.198,00	0,92%
Valor Saldo por Amortizar	$	1.981.519.802,00	99,08%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	AIU	TOTAL PRESENTE MES
CAPITULO 1. ACTIVIDADES PRELIMINARES	$ 44.030.522,22	$ 15.410.682,78	$ 59.441.205,00
CAPITULO 2. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	$ 24.513.877,78	$ 8.579.857,22	$ 33.093.735,00
CAPITULO 3. OBRAS DE ARTE Y ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN			
CAPITULO 4. MANTENIMIENTO VIAL	$ 427.454,81	$ 149.609,19	$ 577.064,00
CAPITULO 5.SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL			
PROVISIÓN PARA AJUSTE POR POSIBLE VARIACIÓN COSTOS EN			
PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	$ 1.234.291,00		$ 1.234.291,00
PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL	$ 1.414.774,00		$ 1.414.774,00
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 71.620.919,81**	**$ 24.140.149,19**	**$ 95.761.069,00**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA INCLUYENDO AIU	VR. ACUMULADO
CAPITULO 1. ACTIVIDADES PRELIMINARES	$ 59.441.205,00	$ 59.441.205,00
CAPITULO 2. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	$ 33.093.735,00	$ 33.093.735,00
CAPITULO 3. OBRAS DE ARTE Y ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN		
CAPITULO 4. MANTENIMIENTO VIAL	$ 577.064,00	$ 577.064,00
CAPITULO 5.SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL		
PROVISIÓN PARA AJUSTE POR POSIBLE VARIACIÓN		
PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	$ 1.234.291,00	$ 1.234.291,00
PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL	$ 1.414.774,00	$ 1.414.774,00
TOTAL	**$ 95.761.069,00**	**$ 95.761.069,00**

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

			% ejecución	
VALOR INICIAL CONTRATADO	$ 10.363.640.754,00			
VALOR ADICIÓN No. Xx				
ANTICIPO		$ 2.000.000.000	19,298%	19,298%
ACTA 1		$ 95.761.069	0,924%	0,746%
AMORTIZACION ACTA 1		-$ 18.480.198	-0,178%	
ACTA 2				
AMORTIZACION ACTA 2				
ACTA 3				
AMORTIZACION ACTA 3				
SALDO A FAVOR DEL ICCU		$ 8.286.359.883,0	79,956%	79,956%
SUMAS IGUALES	**$ 10.363.640.754,00**	**$ 10.363.640.754**	**100%**	**100%**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO $ 95.761.069,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO $ 77.280.871,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 77.280.871,00 **VALOR EN LETRAS:** SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la
2. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
3. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre:IVÁN CAMILO LÓPEZ GÓMEZ	Nombre: EDUARDO LARA GUZMAN	Nombre: LUIS FERNANDO ROJAS	Nombre: SANDRA ROCÍO CASTILLO GONZÁLEZ
Representante legal	Director de Interventoría	APOYO A LA SUPERVISION	SUBDIRECTORA TÉCNICA
Contratista	Interventor	ICCU	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VÍAL

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subgerencia Administrativa y Financiera).
Copias: Subgerencia Técnica (Concesiones, Construcciones o Infraestructura), Contratista, Interventor y Supervisor.

MEMORIAS DE CÁLCULO

ACTA DE COBRO No.1

ICCU	MEMORIAS DE CALCULO	

Fecha:	abr-25	Descripción del Item ó Actividad realizada:	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	CONTRATO :	ICCU 767 DE 2024
				ACTA:	1

ITEM	1,10	UND:	M3	CANTIDAD CONTRACTUAL	4233,00	CANTIDAD EJECUTADA	1.396,78	CANTIDAD ACUMULADA	1.396,78

ESPACIO DESTINADO PARA GRÁFICOS, PLANOS Y REGISTRO FOTOGRAFICO:





ID	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	ELEMENTO	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	DESCUENTO	VOLUMEN	OBSERVACION
1	K7+270	K7+760	LATERAL DERECHO	490	0,60	0,91		267,54	EXCAVACIONES LATERALES
2	K7+350	K7+760	VIA	380,00	4,30	0,54		882,36	PARA CONFORMACION ESTRUCTURA DE VIA CARRIL DERECHO
3	K7+600	K7+700	VÍA - RAJÓN	100,00	2,78	0,40		111,20	PARA ESTABILIZACION DE VIA CON RAJON
4	K7+440	K7+600	VÍA - RAJÓN	160,00	2,12	0,40		135,68	PARA ESTABILIZACION DE VIA CON RAJON
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
							TOTAL	1396,78	

OBSERVACIONES:	CANTIDAD TOTAL REPORTADA EN ESTA HOJA:	1.396,78
HOJA 1	CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD:	

CONTRATISTA: CONSORCIO INCITECO IP		Interventoria CONSORCIO RED INFRANOVA
Elaboro: ROVINSON RIVERA ROJAS		Aprobo: Ing. YENNY LEON
Cargo: Residente de Obra		Cargo: Residente Interventoria
FIRMA:		FIRMA:

ICCU	MEMORIAS DE CALCULO	

Fecha:	abr-25	Descripcion del Item o Actividad realizada:	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	CONTRATO :	ICCU 767 DE 2024
				ACTA:	1

ITEM	1,20	UND:	M3	CANTIDAD CONTRACTUAL	285,00	CANTIDAD EJECUTADA	15,01	CANTIDAD ACUMULADA	15,01

ESPACIO DESTINADO PARA GRÁFICOS, PLANOS Y REGISTRO FOTOGRAFICO:







ID	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	ELEMENTO	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	DESCUENTO	VOLUMEN	OBSERVACION
1	K7+460	K7+760	BORDILLOOS EXISTENTES	300	0,15	0,35		15,75	PARA COLOCACION DE DE PREFABRICADOS
2				-14,00	-0,15	-0,35		-0,74	DESCUENTO BOCACALLES
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
							TOTAL	15,01	

OBSERVACIONES:	CANTIDAD TOTAL REPORTADA EN ESTA HOJA:	15,01
	CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD:	15,01

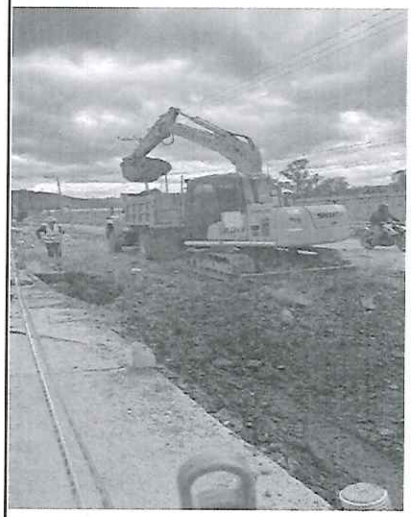
CONTRATISTA: CONSORCIO INCITECO IP		Interventoria CONSORCIO RED INFRANOVA
Elaboro: ROVINSON RIVERA ROJAS		Aprobo: Ing. YENNY LEON
Cargo: Residente de Obra		Cargo: Residente Interventoria
FIRMA:		FIRMA:

ICCU	MEMORIAS DE CALCULO	

Fecha:	abr-25	Descripción del Item ó Actividad realizada:	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	CONTRATO :	ICCU 767 DE 2024
				ACTA:	1

ITEM	1.30	UND:	M3-KM	CANTIDAD CONTRACTUAL	309721,00	CANTIDAD EJECUTADA	1.108,80	CANTIDAD ACUMULADA	

ESPACIO DESTINADO PARA GRÁFICOS, PLANOS Y REGISTRO FOTOGRAFICO:





ID	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	REMISION #	FECHA	MATERIAL	PROVVEDOR	DISTANCIA	VOLUMEN	M3/KM	OBSERVACION
1	K7+370	K7+760	21803	09-04-25	EXCAVACION	CUNDICOAL	7,20	7	50,40	TRANSPORTE PARA DISPOSICION DE REC
2	K7+440	K7+760	21801	09-04-25	EXCAVACION	CUNDICOAL	7,20	7	50,40	TRANSPORTE PARA DISPOSICION DE REC
3	K7+440	K7+760	21807	09-04-25	EXCAVACION	CUNDICOAL	7,20	7	50,40	TRANSPORTE PARA DISPOSICION DE REC
4	K7+440	K7+760	21821	10-04-25	EXCAVACION	CUNDICOAL	7,20	7	50,40	TRANSPORTE PARA DISPOSICION DE REC
5	K7+440	K7+760	21815	10-04-25	EXCAVACION	CUNDICOAL	7,20	7	50,40	TRANSPORTE PARA DISPOSICION DE REC
6	K7+440	K7+760	21828	10-04-25	EXCAVACION	CUNDICOAL	7,20	7	50,40	TRANSPORTE PARA DISPOSICION DE REC
7	K7+440	K7+760	21834	10-04-25	EXCAVACION	CUNDICOAL	7,20	7	50,40	TRANSPORTE PARA DISPOSICION DE REC
8	K7+440	K7+760	21817	10-04-25	EXCAVACION	CUNDICOAL	7,20	7	50,40	TRANSPORTE PARA DISPOSICION DE REC
9	K7+440	K7+760	21846	11-04-25	EXCAVACION	CUNDICOAL	7,20	7	50,40	TRANSPORTE PARA DISPOSICION DE REC
10	K7+440	K7+760	21842	11-04-25	EXCAVACION	CUNDICOAL	7,20	7	50,40	TRANSPORTE PARA DISPOSICION DE REC
11	K7+440	K7+760	21888	16-04-25	EXCAVACION	CUNDICOAL	7,20	7	50,40	TRANSPORTE PARA DISPOSICION DE REC
12	K7+440	K7+760	21906	21-04-25	EXCAVACION	CUNDICOAL	7,20	7	50,40	TRANSPORTE PARA DISPOSICION DE REC
13	K7+440	K7+760	21918	22-04-25	EXCAVACION	CUNDICOAL	7,20	7	50,40	TRANSPORTE PARA DISPOSICION DE REC
14	K7+440	K7+760	21923	22-04-25	EXCAVACION	CUNDICOAL	7,20	7	50,40	TRANSPORTE PARA DISPOSICION DE REC
15	K7+440	K7+760	21926	22-04-25	EXCAVACION	CUNDICOAL	7,20	7	50,40	TRANSPORTE PARA DISPOSICION DE REC
16	K7+440	K7+760	21930	22-04-25	EXCAVACION	CUNDICOAL	7,20	7	50,40	TRANSPORTE PARA DISPOSICION DE REC
17	K7+440	K7+760	21935	22-04-25	EXCAVACION	CUNDICOAL	7,20	7	50,40	TRANSPORTE PARA DISPOSICION DE REC
18	K7+440	K7+760	22816	22-04-25	EXCAVACION	CUNDICOAL	7,20	7	50,40	TRANSPORTE PARA DISPOSICION DE REC
19	K7+440	K7+760	21925	22-04-25	EXCAVACION	CUNDICOAL	7,20	7	50,40	TRANSPORTE PARA DISPOSICION DE REC
20	K7+440	K7+760	21932	22-04-25	EXCAVACION	CUNDICOAL	7,20	7	50,40	TRANSPORTE PARA DISPOSICION DE REC
21	K7+440	K7+760	21936	22-04-25	EXCAVACION	CUNDICOAL	7,20	7	50,40	TRANSPORTE PARA DISPOSICION DE REC
22	K7+440	K7+760	21937	23-04-25	EXCAVACION	CUNDICOAL	7,20	7	50,40	TRANSPORTE PARA DISPOSICION DE REC
								TOTAL	1108,80	

OBSERVACIONES:	CANTIDAD TOTAL REPORTADA EN ESTA HOJA:	1.108,80
	CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD:	1.108,80

CONTRATISTA: CONSORCIO INCITECO IP		Interventoria CONSORCIO RED INFRANOVA
Elaboro: ROVINSON RIVERA ROJAS		Aprobo: Ing. YENNY LEON
Cargo: Residente de Obra		Cargo: Residente Interventoria
FIRMA:		FIRMA:


23

ICCU	MEMORIAS DE CALCULO	

Fecha:	abr-25	Descripción del Item o Actividad realizada:	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	CONTRATO :	ICCU 767 DE 2024
				ACTA:	1

ITEM	1.30	UND:	M3-KM	CANTIDAD CONTRACTUAL	309721.00	CANTIDAD EJECUTADA	2.455,20	CANTIDAD ACUMULADA	

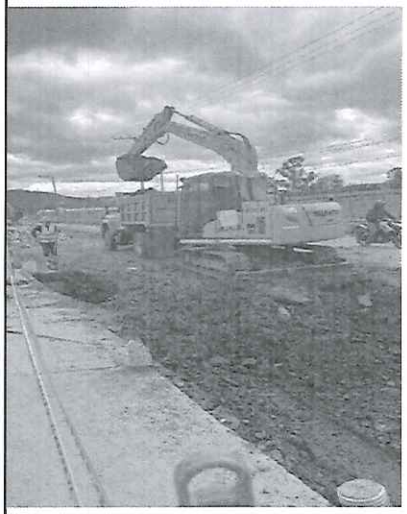ESPACIO DESTINADO PARA GRÁFICOS, PLANOS Y REGISTRO FOTOGRAFICO:





ID	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	REMISION #	FECHA	MATERIAL	PROVVEDOR	DISTANCIA	VOLUMEN	M3/KM	OBSERVACION
1	K7+440	K7+760	21946	23-04-25	EXCAVACION	CUNDICOAL	7,20	7	50,40	TRANSPORTE PARA DISPOSICION DE REC
2	K7+440	K7+760	21949	23-04-25	EXCAVACION	CUNDICOAL	7,20	7	50,40	TRANSPORTE PARA DISPOSICION DE REC
3	K7+440	K7+760	21947	23-04-25	EXCAVACION	CUNDICOAL	7,20	7	50,40	TRANSPORTE PARA DISPOSICION DE REC
4	K7+440	K7+760	21942	23-04-25	EXCAVACION	CUNDICOAL	7,20	7	50,40	TRANSPORTE PARA DISPOSICION DE REC
5	K7+440	K7+760	21945	23-04-25	EXCAVACION	CUNDICOAL	7,20	7	50,40	TRANSPORTE PARA DISPOSICION DE REC
6	K7+440	K7+760	21938	23-04-25	EXCAVACION	CUNDICOAL	7,20	7	50,40	TRANSPORTE PARA DISPOSICION DE REC
7	K7+440	K7+760	21985	26-04-25	EXCAVACION	CUNDICOAL	7,20	7	50,40	TRANSPORTE PARA DISPOSICION DE REC
8	K7+440	K7+760	22000	28-04-25	EXCAVACION	CUNDICOAL	7,20	15	108,00	TRANSPORTE PARA DISPOSICION DE REC
9	K7+440	K7+760	21997	28-04-25	EXCAVACION	CUNDICOAL	7,20	7	50,40	TRANSPORTE PARA DISPOSICION DE REC
10	K7+440	K7+760	21991	28-04-25	EXCAVACION	CUNDICOAL	7,20	7	50,40	TRANSPORTE PARA DISPOSICION DE REC
11	K7+440	K7+760	21990	28-04-25	EXCAVACION	CUNDICOAL	7,20	7	50,40	TRANSPORTE PARA DISPOSICION DE REC
12	K7+440	K7+760	22003	28-04-25	EXCAVACION	CUNDICOAL	7,20	7	50,40	TRANSPORTE PARA DISPOSICION DE REC
13	K7+440	K7+760	22001	28-04-25	EXCAVACION	CUNDICOAL	7,20	7	50,40	TRANSPORTE PARA DISPOSICION DE REC
14	K7+440	K7+760	21995	28-04-25	EXCAVACION	CUNDICOAL	7,20	15	108,00	TRANSPORTE PARA DISPOSICION DE REC
15	K7+440	K7+760	22004	29-04-25	EXCAVACION	CUNDICOAL	7,20	15	108,00	TRANSPORTE PARA DISPOSICION DE REC
16	K7+440	K7+760	22007	29-04-25	EXCAVACION	CUNDICOAL	7,20	7	50,40	TRANSPORTE PARA DISPOSICION DE REC
17	K7+440	K7+760	22012	29-04-25	EXCAVACION	CUNDICOAL	7,20	7	50,40	TRANSPORTE PARA DISPOSICION DE REC
18	K7+440	K7+760	22010	29-04-25	EXCAVACION	CUNDICOAL	7,20	15	108,00	TRANSPORTE PARA DISPOSICION DE REC
19	K7+440	K7+760	22017	29-04-25	EXCAVACION	CUNDICOAL	7,20	7	50,40	TRANSPORTE PARA DISPOSICION DE REC
20	K7+440	K7+760	22018	29-04-25	EXCAVACION	CUNDICOAL	7,20	7	50,40	TRANSPORTE PARA DISPOSICION DE REC
21	K7+440	K7+760	22028	30-04-25	EXCAVACION	CUNDICOAL	7,20	15	108,00	TRANSPORTE PARA DISPOSICION DE REC
22										
								TOTAL	1346,40	

OBSERVACIONES:	CANTIDAD TOTAL REPORTADA EN ESTA HOJA:	1.346,40
HOJA 2	CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD:	2.455,20


CONTRATISTA: CONSORCIO INCITECO IP		Interventoria CONSORCIO RED INFRANOVA
Elaboro: ROVINSON RIVERA ROJAS		Aprobo: Ing. YENNY LEON
Cargo: Residente de Obra		Cargo: Residente Interventoria
FIRMA:		FIRMA:

ICCU	MEMORIAS DE CALCULO	

Fecha:	abr-25	Descripción del Item o Actividad realizada:	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	CONTRATO :	ICCU 767 DE 2024
				ACTA:	1

ITEM	2,90	UND:	M3	CANTIDAD CONTRACTUAL	465,00	CANTIDAD EJECUTADA	246,90	CANTIDAD ACUMULADA	

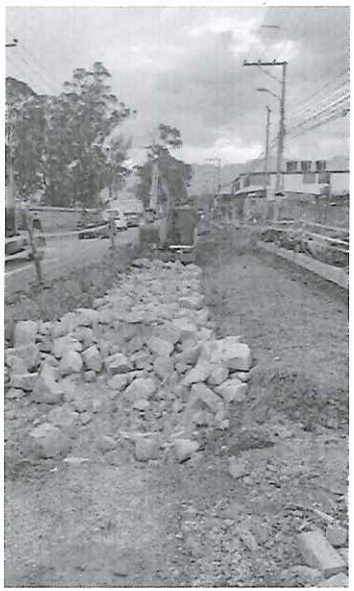ESPACIO DESTINADO PARA GRÁFICOS, PLANOS Y REGISTRO FOTOGRAFICO:





ID	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	ELEMENTO	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	DESCUENTO	VOLUMEN	OBSERVACION
1	K7+600	K7+700	VÍA - RAJÓN	100,00	2,78	0,40		111,20	ESTABILIZACION DE VIA
2	K7+440	K7+600	VÍA - RAJÓN	160,00	2,12	0,40		135,68	ESTABILIZACION DE VIA
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
							TOTAL	246,90	

OBSERVACIONES:	CANTIDAD TOTAL REPORTADA EN ESTA HOJA:	246,90
	CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD:	246,90

CONTRATISTA: CONSORCIO INCITECO IP		Interventoria CONSORCIO RED INFRANOVA
Elaboro: ROVINSON RIVERA ROJAS		Aprobo: Ing. YENNY LEON
Cargo: Residente de Obra		Cargo: Residente Interventoria
FIRMA:		FIRMA:


ICCU	MEMORIAS DE CALCULO	

Fecha:	abr-25	Descripcion del Item ó Actividad realizada:	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	CONTRATO :	ICCU 767 DE 2024
				ACTA:	1

ITEM	4,10	UND:	UN	CANTIDAD CONTRACTUAL	2,00	CANTIDAD EJECUTADA	2,00	CANTIDAD ACUMULADA	2,00

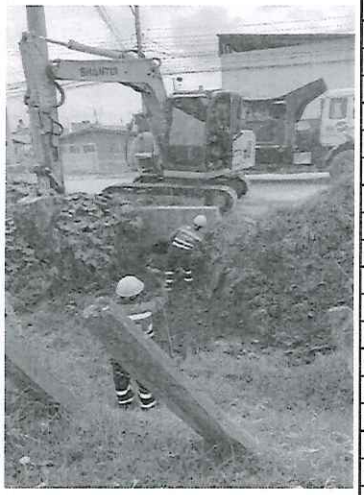ESPACIO DESTINADO PARA GRÁFICOS, PLANOS Y REGISTRO FOTOGRAFICO:





ID	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	ELEMENTO	CANTIDAD	ANCHO	ESPESOR	DESCUENTO	VOLUMEN	OBSERVACION
1	K07+720		ALCANTARILLA	1,00				1,00	LIMPIEZA MANUAL DE ALCANTRILA Ø 24"
2	K07+800		ALCANTARILLA	1,00				1,00	LIMPIEZA MANUAL DE ALCANTRILA Ø 36"
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

TOTAL	2,00

OBSERVACIONES:	CANTIDAD TOTAL REPORTADA EN ESTA HOJA:	2,00
	CANTIDAD TOTAL ACTIVIDAD:	2,00

CONTRATISTA: CONSORCIO INCITECO IP		Interventoria CONSORCIO RED INFRANOVA
Elaboro: ROVINSON RIVERA ROJAS		Aprobo: Ing. YENNY LEON
Cargo: Residente de Obra		Cargo: Residente Interventoria
FIRMA:		FIRMA:

ANEXOS ACTA DE COBRO PARCIAL No.1

ACTA DE CONCILIACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA CTO 767

ITEM	EXC- LATERAL DERECHA INTERVENOTRÍA M3	EXC- LATERAL DERECHA CONTRATISTA M3	EXC LATERAL DERECHA VALOR CONCILIADO (M3)	EXCAVACIÓN VIA INTERVENTORIA M3	EXCAVACIÓN VIA CONTRATISTA M3	EXCAVACIÓN VÍA CONCILIADA M3	EXCAVACIÓN MEJORAMIENTO RAJON INTERVENTORIA M3	EXCAVACIÓN MEJORAMIENTO RAJON CONTRATISTA M3	EXCAVACIÓN MEJORAMIENT RAJÓN CONCILIADO M3	EXCAVACIÓN TOTAL INTERVENTORIA M3	EXCAVACIÓN TOTAL CONTRATISTA M3	EXCAVACIÓN TOTAL CONCILIADA M3
CANTIDAD	266.925	276.08	**267.54**	884.15	893.72	**882.36**	242.40	249.71	**246.88**	1393.48	1419.51	**1396.78**

ITEM	MEJORAMIENTO EN RAJÓN INTERVENTORIA	MEJORAMIENTO EN RAJÓN CONTRATISTA	MEJORAMIENTO EN RAJÓN VALOR CONCILIADO (M3)	DEMOLICIÓN EN CONCRETO INTERVENTORIA	DEMOLICIÓN EN CONCRETO CONTRATISTA	DEMOLICIÓN EN CONCRETO VALOR CONCILIADO M3
CANTIDAD	242.40	249.71	**246.88**	14.70	15.35	**15.01**

YESID ESTIBEN CAICEDO
TOPOGRAFA INTERVENTORIA
CONSORCIO RED INFRANOVA
Matricula : 02-10983

RUDE ARTURO POLO
TOPOGRAFO CONTRATISTA
CONSORCIO INCITECO IP
Matricula : 01-13382

II		CARTERA TOPOGRAFICA CONTROL DE EXCAVACION LATERAL									
PROYECTO:		CONTRATO 767 DE 2024: REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ – PASO ANCHO A LA INSPECCIÓN DE BRICEÑO MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA									
ACTIVIDAD		EXCAVACION LATERAL DERECHA									
PUNTO	V+	ALT.INST.	COTA	ABSCISA	SUBRASANTE VIA	EXCAVACION FILTRO	DIFERENCIA ALTURAS	ANCHO ARRIBA	ANCHO ABAJO	DIFERENCIA ANCHOS	OBSERVACIONES
				K7+600	2558.526	2557.616	0.910	0.65	0.60	0.625	
				K7+610	2558.566	2557.656	0.910	0.65	0.65	0.650	
				K7+620	2558.606	2557.696	0.910	0.65	0.70	0.675	
				K7+630	2558.646	2557.736	0.910	0.65	0.65	0.650	
				K7+640	2558.686	2557.776	0.910	0.65	0.60	0.625	
				K7+650	2558.646	2557.736	0.910	0.65	0.65	0.650	
				K7+660	2558.606	2557.696	0.910	0.65	0.60	0.625	
				K7+670	2558.566	2557.656	0.910	0.65	0.70	0.675	
				K7+680	2558.526	2557.616	0.910	0.65	0.60	0.625	
				K7+690	2558.566	2557.656	0.910	0.65	0.60	0.625	
				K7+700	2558.606	2557.696	0.910	0.60	0.60	0.600	
				K7+710	2558.646	2557.736	0.910	0.60	0.60	0.600	
				K7+720	2558.686	2557.776	0.910	0.60	0.60	0.600	
				K7+730	2558.726	2557.816	0.910	0.60	0.60	0.600	
				K7+740	2558.686	2557.776	0.910	0.65	0.60	0.625	
				K7+750	2558.646	2557.736	0.910	0.65	0.65	0.650	
				K7+760	2558.606	2557.696	0.910	0.60	0.60	0.600	
		DISTANCIA		160			0.910			0.628	

VOLUMEN	91.485	M3	

TOPOGRAFO: RUDE ARTURO POLO VERTELL

FECHA: 20/05/2025

II		CARTERA TOPOGRAFICA CONTROL DE EXCAVACION LATERAL									
PROYECTO:		CONTRATO 767 DE 2024: REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ – PASO ANCHO A LA INSPECCIÓN DE BRICEÑO MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA									
ACTIVIDAD		EXCAVACION LATERAL DERECHA									
PUNTO	V+	ALT.INST.	COTA	ABSCISA	SUBRASANTE VIA	EXCAVACION FILTRO	DIFERENCIA ALTURAS	ANCHO ARRIBA	ANCHO ABAJO	DIFERENCIA ANCHOS	OBSERVACIONES
				K7+427	2558.474	2557.564	0.910	0.60	0.60	0.600	
				K7+430	2558.486	2557.576	0.910	0.60	0.60	0.600	
				K7+440	2558.526	2557.616	0.910	0.60	0.60	0.600	
				K7+450	2558.566	2557.656	0.910	0.60	0.60	0.600	
				K7+460	2558.606	2557.696	0.910	0.60	0.60	0.600	
				K7+470	2558.646	2557.736	0.910	0.65	0.60	0.625	
				K7+480	2558.686	2557.776	0.910	0.65	0.65	0.650	
				K7+485	2558.706	2557.796	0.910	0.60	0.65	0.625	
				K7+490	2558.686	2557.776	0.910	0.60	0.65	0.625	
				K7+500	2558.646	2557.736	0.910	0.65	0.65	0.650	
				K7+510	2558.606	2557.696	0.910	0.65	0.60	0.625	
				K7+515	2558.586	2557.676	0.910	0.65	0.65	0.650	
				K7+520	2558.606	2557.696	0.910	0.65	0.60	0.625	
				K7+530	2558.646	2557.736	0.910	0.65	0.65	0.650	
				K7+540	2558.686	2557.776	0.910	0.65	0.55	0.600	
				K7+550	2558.726	2557.816	0.910	0.65	0.55	0.600	
				K7+560	2558.686	2557.776	0.910	0.65	0.50	0.575	
				K7+570	2558.646	2557.736	0.910	0.60	0.60	0.600	
				K7+580	2558.606	2557.696	0.910	0.60	0.60	0.600	
				K7+590	2558.566	2557.656	0.910	0.60	0.60	0.600	
				K7+600	2558.526	2557.616	0.910	0.60	0.60	0.600	
		DISTANCIA		173			0.910			0.616	

VOLUMEN	96.944	M3

TOPOGRAFO: RUDE ARTURO POLO VERTELL

FECHA: 20/05/2025

II		CARTERA TOPOGRAFICA CONTROL DE EXCAVACION LATERAL									
PROYECTO:		CONTRATO 767 DE 2024: REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ – PASO ANCHO A LA INSPECCIÓN DE BRICEÑO MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA									
ACTIVIDAD		EXCAVACION LATERAL DERECHA									
PUNTO	V+	ALT.INST.	COTA	ABSCISA	SUBRASANTE VIA	EXCAVACION FILTRO	DIFERENCIA ALTURAS	ANCHO ARRIBA	ANCHO ABAJO	DIFERENCIA ANCHOS	OBSERVACIONES
				K7+270	2558.382	2557.472	0.910	0.60	0.60	0.600	
				K7+275	2558.402	2557.492	0.910	0.60	0.60	0.600	
				K7+280	2558.422	2557.512	0.910	0.60	0.60	0.600	
				K7+290	2558.462	2557.552	0.910	0.60	0.60	0.600	
				K7+300	2558.502	2557.592	0.910	0.55	0.50	0.525	
				K7+310	2558.542	2557.632	0.910	0.55	0.50	0.525	
				K7+320	2558.582	2557.672	0.910	0.55	0.50	0.525	
				K7+330	2558.542	2557.632	0.910	0.60	0.50	0.550	
				K7+340	2558.502	2557.592	0.910	0.58	0.50	0.540	
				K7+350	2558.462	2557.552	0.910	0.60	0.55	0.575	
				K7+360	2558.422	2557.512	0.910	0.65	0.54	0.595	
				K7+370	2558.462	2557.552	0.910	0.65	0.50	0.575	
				K7+380	2558.502	2557.592	0.910	0.56	0.50	0.530	
				K7+390	2558.542	2557.632	0.910	0.60	0.50	0.550	
				K7+400	2558.582	2557.672	0.910	0.54	0.50	0.520	
				K7+410	2558.542	2557.632	0.910	0.60	0.52	0.559	
				K7+420	2558.502	2557.592	0.910	0.58	0.50	0.540	
				K7+427	2558.474	2557.564	0.910	0.60	0.60	0.600	
		DISTANCIA		173			0.910			0.557	

VOLUMEN	87.654	M3	

TOPOGRAFO: RUDE ARTURO POLO VERTELL

FECHA: 20/05/2025

CARTERA TOPOGRAFICA
CONTROL DE EXCAVACION

PROYECTO:	**CONTRATO 767 DE 2024: REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ – PASO ANCHO A LA INSPECCIÓN DE BRICEÑO MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA**
ACTIVIDAD	**EXCAVACION MECANICA - MEDIA CALZADA COSTADO DERECHO DESDE EL K7+380 AL K7+760**

PUNTO	V+	ALT.INST.	COTA	ABSCISA	TN NATURAL EJE	SUBRASANTE EJE	DIFERENCIA EXCAVACION	TN NATURAL DERECHA	SUBRASANTE DERECHA	DIFERENCIA EXCAVACION	DIFERENCIAS PROMEDIO ALTURAS	ANCHO PROMEDIO	OBSERVACIONES
				K7+380	2559.013	2558.58	0.43	2558.943	2558.50	0.441	0.436	4.30	
				K7+390	2559.03	2558.62	0.41	2558.948	2558.54	0.406	0.407	4.30	
				K7+400	2559.076	2558.66	0.41	2559.055	2558.58	0.473	0.444	4.30	
				K7+410	2559.122	2558.62	0.50	2559.135	2558.54	0.593	0.547	4.30	
				K7+420	2559.143	2558.58	0.56	2559.183	2558.50	0.681	0.621	4.30	
				K7+427	2559.1	2558.55	0.55	2559.18	2558.47	0.706	0.626	4.30	
				K7+430	2559.078	2558.57	0.51	2559.17	2558.49	0.684	0.598	4.30	
				K7+440	2559.198	2558.61	0.59	2559.188	2558.53	0.662	0.627	4.30	
				K7+450	2559.148	2558.65	0.50	2559.162	2558.57	0.596	0.549	4.30	
				K7+460	2559.15	2558.69	0.46	2559.142	2558.61	0.536	0.500	4.30	
				K7+470	2559.261	2558.73	0.54	2559.147	2558.65	0.501	0.518	4.30	
				K7+480	2559.228	2558.77	0.46	2559.183	2558.69	0.497	0.480	4.30	
				K7+485	2559.273	2558.79	0.49	2559.1925	2558.71	0.487	0.487	4.30	
				K7+490	2559.318	2558.77	0.55	2559.202	2558.69	0.516	0.534	4.30	
				K7+500	2559.258	2558.73	0.53	2559.2	2558.65	0.554	0.543	4.30	
				K7+510	2559.273	2558.69	0.59	2559.195	2558.61	0.589	0.588	4.30	
				K7+515	2559.255	2558.67	0.59	2559.21	2558.59	0.624	0.607	4.30	
				K7+520	2559.237	2558.69	0.55	2559.225	2558.61	0.619	0.585	4.30	
				K7+530	2559.277	2558.73	0.55	2559.195	2558.65	0.549	0.550	4.30	
				K7+540	2559.275	2558.77	0.51	2559.259	2558.69	0.573	0.541	4.30	
				K7+550	2559.299	2558.81	0.49	2559.206	2558.73	0.480	0.487	4.30	
				K7+560	2559.275	2558.77	0.51	2559.205	2558.69	0.519	0.514	4.30	
				K7+570	2559.291	2558.73	0.57	2559.145	2558.65	0.499	0.532	4.30	
				K7+580	2559.272	2558.69	0.59	2559.203	2558.61	0.597	0.592	4.30	
				K7+590	2559.2	2558.65	0.55	2559.185	2558.57	0.619	0.587	4.30	
				K7+600	2559.225	2558.61	0.62	2559.245	2558.53	0.719	0.669	4.30	
				K7+610	2559.235	2558.65	0.59	2559.188	2558.57	0.622	0.606	4.30	
				K7+620	2559.249	2558.69	0.56	2559.204	2558.61	0.598	0.581	4.30	
				K7+630	2559.212	2558.73	0.49	2559.195	2558.65	0.549	0.518	4.30	
				K7+640	2559.213	2558.77	0.45	2559.24	2558.69	0.554	0.501	4.30	
				K7+650	2559.263	2558.73	0.54	2559.246	2558.65	0.600	0.569	4.30	
				K7+660	2559.22	2558.69	0.53	2559.195	2558.61	0.589	0.562	4.30	
				K7+670	2559.259	2558.65	0.61	2559.247	2558.57	0.681	0.647	4.30	
				K7+680	2559.253	2558.61	0.65	2559.2	2558.53	0.674	0.661	4.30	
				K7+690	2559.202	2558.65	0.56	2559.249	2558.57	0.683	0.620	4.30	
				K7+700	2559.297	2558.69	0.61	2559.332	2558.61	0.726	0.669	4.30	
				K7+710	2559.165	2558.73	0.44	2559.155	2558.65	0.509	0.474	4.30	
				K7+720	2559.242	2558.77	0.48	2559.239	2558.69	0.553	0.515	4.30	
				K7+730	2559.192	2558.81	0.39	2559.196	2558.73	0.470	0.428	4.30	
				K7+740	2559.205	2558.77	0.44	2559.117	2558.69	0.431	0.435	4.30	
				K7+750	2559.197	2558.73	0.47	2559.107	2558.65	0.461	0.466	4.30	
				K7+760	2559.219	2558.69	0.53	2559.181	2558.61	0.575	0.554	4.30	
		DISTANCIA	380								0.547	4.300	

TOPOGRAFO: RUD E ARTURO POLO VERTELL

FECHA: 20/05/2025

VOLUMEN	893.718	M3

HOJA 1 **DE** 1

CARTERA TOPOGRAFICA
CONTROL DE EXCAVACION

PROYECTO:	**CONTRATO 767 DE 2024: REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ – PASO ANCHO A LA INSPECCIÓN DE BRICEÑO MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA**
ACTIVIDAD	**EXCAVACION MEJORAMIENTO EN RAJON K7+440 AL K7+700**

PUNTO	V+	ALT.INST.	COTA	ABSCISA	SUBRASANTE EJE	EXCAVACION PARA RAJON	DIFERENCIA EXCAVACION	SUBRASANTE SEMI EJE	EXCAVACION PARA RAJON	DIFERENCIA EXCAVACION	DIFERENCIAS PROMEDIO ALTURAS	ANCHO PROMEDIO	OBSERVACIONES
				K7+440	2558.606	2558.21	0.40	2558.563	2558.163	0.400	0.400	2.15	
				K7+450	2558.646	2558.25	0.40	2558.603	2558.203	0.400	0.400	2.15	
				K7+460	2558.686	2558.29	0.40	2558.643	2558.243	0.400	0.400	2.15	
				K7+470	2558.726	2558.33	0.40	2558.683	2558.283	0.400	0.400	2.15	
				K7+480	2558.766	2558.37	0.40	2558.723	2558.323	0.400	0.400	2.15	
				K7+485	2558.786	2558.39	0.40	2558.743	2558.343	0.400	0.400	2.15	
				K7+490	2558.766	2558.37	0.40	2558.723	2558.323	0.400	0.400	2.15	
				K7+500	2558.726	2558.33	0.40	2558.683	2558.283	0.400	0.400	2.15	
				K7+510	2558.686	2558.29	0.40	2558.643	2558.243	0.400	0.400	2.15	
				K7+515	2558.666	2558.27	0.40	2558.623	2558.223	0.400	0.400	2.15	
				K7+520	2558.686	2558.29	0.40	2558.643	2558.243	0.400	0.400	2.15	
				K7+530	2558.726	2558.33	0.40	2558.682	2558.282	0.400	0.400	2.20	
				K7+540	2558.766	2558.37	0.40	2558.722	2558.322	0.400	0.400	2.20	
				K7+550	2558.806	2558.41	0.40	2558.762	2558.362	0.400	0.400	2.20	
				K7+560	2558.766	2558.37	0.40	2558.722	2558.322	0.400	0.400	2.20	
				K7+570	2558.726	2558.33	0.40	2558.682	2558.282	0.400	0.400	2.20	
				K7+580	2558.686	2558.29	0.40	2558.642	2558.242	0.400	0.400	2.20	
				K7+590	2558.646	2558.25	0.40	2558.602	2558.202	0.400	0.400	2.20	
				K7+600	2558.606	2558.21	0.40	2558.550	2558.150	0.400	0.400	2.78	
				K7+610	2558.566	2558.17	0.40	2558.510	2558.110	0.400	0.400	2.78	
				K7+620	2558.606	2558.21	0.40	2558.550	2558.150	0.400	0.400	2.78	
				K7+630	2558.646	2558.25	0.40	2558.590	2558.190	0.400	0.400	2.78	
				K7+640	2558.686	2558.29	0.40	2558.630	2558.230	0.400	0.400	2.78	
				K7+650	2558.646	2558.25	0.40	2558.590	2558.190	0.400	0.400	2.78	
				K7+660	2558.606	2558.21	0.40	2558.550	2558.150	0.400	0.400	2.78	
				K7+670	2558.566	2558.17	0.40	2558.510	2558.110	0.400	0.400	2.78	
				K7+680	2558.526	2558.13	0.40	2558.470	2558.070	0.400	0.400	2.78	
				K7+690	2558.566	2558.17	0.40	2558.510	2558.110	0.400	0.400	2.78	
				K7+700	2558.606	2558.21	0.40	2558.550	2558.150	0.400	0.400	2.78	
				260							0.400	2.401	

VOLUMEN	**249.708**	**M3**	

TOPOGRAFO: RUDE ARTURO POLO VERTELL

FECHA: 20/05/2025

HOJA 1 1

CARTERA TOPOGRAFICA
CONTROI MEJORAMIENTO EN RAJON

PROYECTO: CONTRATO 767 DE 2024: REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ – PASO ANCHO A LA INSPECCIÓN DE BRICEÑO MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA

ACTIVIDAD MEJORAMIENTO EN RAJON K7+440 AL K7+700

PUNTO	V+	ALT.INST.	COTA	ABSCISA	SUBRASANTE EJE	EXCAVACION PARA RAJON	DIFERENCIA EXCAVACION	SUBRASANTE SEMI EJE	EXCAVACION PARA RAJON	DIFERENCIA EXCAVACION	DIFERENCIAS PROMEDIO ALTURAS	ANCHO PROMEDIO	OBSERVACIONES
				K7+440	2558.606	2558.21	0.40	2558.563	2558.163	0.400	0.400	2.15	
				K7+450	2558.646	2558.25	0.40	2558.603	2558.203	0.400	0.400	2.15	
				K7+460	2558.686	2558.29	0.40	2558.643	2558.243	0.400	0.400	2.15	
				K7+470	2558.726	2558.33	0.40	2558.683	2558.283	0.400	0.400	2.15	
				K7+480	2558.766	2558.37	0.40	2558.723	2558.323	0.400	0.400	2.15	
				K7+485	2558.786	2558.39	0.40	2558.743	2558.343	0.400	0.400	2.15	
				K7+490	2558.766	2558.37	0.40	2558.723	2558.323	0.400	0.400	2.15	
				K7+500	2558.726	2558.33	0.40	2558.683	2558.283	0.400	0.400	2.15	
				K7+510	2558.686	2558.29	0.40	2558.643	2558.243	0.400	0.400	2.15	
				K7+515	2558.666	2558.27	0.40	2558.623	2558.223	0.400	0.400	2.15	
				K7+520	2558.686	2558.29	0.40	2558.643	2558.243	0.400	0.400	2.15	
				K7+530	2558.726	2558.33	0.40	2558.682	2558.282	0.400	0.400	2.20	
				K7+540	2558.766	2558.37	0.40	2558.722	2558.322	0.400	0.400	2.20	
				K7+550	2558.806	2558.41	0.40	2558.762	2558.362	0.400	0.400	2.20	
				K7+560	2558.766	2558.37	0.40	2558.722	2558.322	0.400	0.400	2.20	
				K7+570	2558.726	2558.33	0.40	2558.682	2558.282	0.400	0.400	2.20	
				K7+580	2558.686	2558.29	0.40	2558.642	2558.242	0.400	0.400	2.20	
				K7+590	2558.646	2558.25	0.40	2558.602	2558.202	0.400	0.400	2.20	
				K7+600	2558.606	2558.21	0.40	2558.550	2558.150	0.400	0.400	2.78	
				K7+610	2558.566	2558.17	0.40	2558.510	2558.110	0.400	0.400	2.78	
				K7+620	2558.606	2558.21	0.40	2558.550	2558.150	0.400	0.400	2.78	
				K7+630	2558.646	2558.25	0.40	2558.590	2558.190	0.400	0.400	2.78	
				K7+640	2558.686	2558.29	0.40	2558.630	2558.230	0.400	0.400	2.78	
				K7+650	2558.646	2558.25	0.40	2558.590	2558.190	0.400	0.400	2.78	
				K7+660	2558.606	2558.21	0.40	2558.550	2558.150	0.400	0.400	2.78	
				K7+670	2558.566	2558.17	0.40	2558.510	2558.110	0.400	0.400	2.78	
				K7+680	2558.526	2558.13	0.40	2558.470	2558.070	0.400	0.400	2.78	
				K7+690	2558.566	2558.17	0.40	2558.510	2558.110	0.400	0.400	2.78	
				K7+700	2558.606	2558.21	0.40	2558.550	2558.150	0.400	0.400	2.78	
				260							0.400	2.401	

TOPOGRAFO: RUDE ARTURO POLO VERTELL

FECHA: 20/05/2025

VOLUMEN	249.708	M3

HOJA 1 1

	CARTERA TOPOGRAFICA INTERVENTORIA	Código: TEC-FR-21
		Versión: 00
		Fecha: 04/09/2025

PROYECTO:	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ - PASO ANCHO A LA INSPECCIÓN DE BRICEÑO MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA.**
ACTIVIDAD	DEMOLICION EN CONCRETO

Nº	**CONSOLIDADO DE VOLUMENES DE DEMOLICION EN CONCRETO**						**OBSERVACIONES**
	ABCSISADO	**LONGITUD**	**ANCHO**	**ALTURA**	**VOLUMEN**	**UND**	
1	K7+760-K7+660	100	0.14	0.35	4.90	m3	
2	K7+660-K7+600	60	0.14	0.35	2.94	m3	
3	K7+600-K7+500	100	0.14	0.35	4.90	m3	
4	K7+500-K7+460	40	0.14	0.35	1.96	m3	
		VOLUMEN			14.70	m3	

TOPOGRAFO:

FECHA: 30/04/2025

CARTERA TOPOGRAFICA INTERVENTORIA

Código: TEC-FR-21
Versión: 00
Fecha: 04/09/2025

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ - PASO ANCHO A LA INSPECCIÓN DE BRICEÑO MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA.

ACTIVIDAD MEJORAMIENTO EN RAJÓN

CONSOLIDADO DE VOLUMENES DE MEJORAMIENTO-RAJÓN

Nº	ABCSISADO	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	VOLUMEN	UND	OBSERVACIONES
1	K7+670-K7+700	30	1.90	0.40	22.80	m3	
2	K7+670-K7+650	20	3.00	0.40	24.00	m3	
3	K7+650-K7+600	50	2.80	0.40	56.00	m3	
4	K7+590-K7+530	60	2.30	0.40	55.20	m3	
5	K7+530-K7+510	20	2.50	0.40	20.00	m3	
6	K7+510-K7+470	40	2.40	0.40	38.40	m3	
7	K7+470-K7+460	10	2.30	0.40	9.20	m3	
8	K7+460-K7+440	20	2.10	0.40	16.80	m3	
				VOLUMEN	242.40	m3	

TOPOGRAFO:

FECHA: 30/04/2025

CARTERA TOPOGRAFICA INTERVENTORIA

Código: TEC-FR-21
Versión: 00
Fecha: 04/09/2025

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ - PASO ANCHO A LA INSPECCIÓN DE BRICEÑO MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA.

ACTIVIDAD NIVELACIÓN EXCAVACIÓN LATERAL COSTADO DERECHO TRAMO A

PUNTO	V+	ALT.INST.	COTA	ABSCISA	COTAS RASANTE	EXCAVACIÓN	TN NATURAL	DIFERENCIA EXC	SUBRASANTE VIA TEORICO	COTA SUPERIOR REAL	DIFERENCIAS	ANCHO INFERIOR	ANCHO SUPERIOR	ALTURA	OBSERVACIONES
C1	1.562	62.502	60.94	k7+628	59.146	57.716			58.626	58.534	0.092	0.50	0.50	0.818	
				k7+630	59.166	57.736	59.352	1.616	58.646	58.512	0.134	0.50	0.50	0.776	
				k7+635	59.186	57.756			58.666	58.541	0.125	0.50	0.60	0.785	
				k7+640	59.206	57.776	59.368	1.592	58.686	58.576	0.110	0.50	0.65	0.800	
				k7+645	59.186	57.756			58.666	58.601	0.065	0.50	0.66	0.845	
				k7+650	59.166	57.736	59.298	1.562	58.646	58.613	0.033	0.50	0.69	0.877	
				k7+655	59.146	57.716			58.626	58.631	-0.005	0.50	0.73	0.915	
				k7+660	59.126	57.696	59.456	1.760	58.606	58.663	-0.057	0.50	0.77	0.967	
				k7+665	59.106	57.676			58.586	58.670	-0.084	0.50	0.80	0.994	
				k7+670	59.086	57.656	59.048	1.392	58.566	58.716	-0.150	0.50	0.83	1.060	
				k7+675	59.066	57.636			58.546	58.708	-0.162	0.50	0.81	1.072	
				k7+680	59.046	57.616	59.089	1.473	58.526	58.619	-0.093	0.50	0.75	1.003	
				k7+685	59.066	57.636			58.546	58.619	-0.073	0.50	0.70	0.983	
				k7+690	59.086	57.656	59.153	1.497	58.566	58.615	-0.049	0.50	0.76	0.959	
				k7+695	59.106	57.676			58.586	58.614	-0.028	0.50	0.75	0.938	
				k7+700	59.126	57.696	59.149	1.453	58.606	58.628	-0.022	0.50	0.78	0.932	
				k7+705	59.146	57.716			58.626	58.530	0.096	0.50	0.79	0.814	
GPS 5A	1.297	61.972	60.675	k7+710	59.166	57.736	59.147	1.411	58.646	58.510	0.136	0.50	0.80	0.774	
				k7+715	59.186	57.756			58.666	58.530	0.136	0.50	0.75	0.774	
				k7+720	59.206	57.776	59.137	1.361	58.686	58.570	0.116	0.50	0.70	0.794	
				k7+725	59.226	57.796			58.706	58.580	0.126	0.50	0.75	0.784	
				k7+730	59.246	57.816	59.152	1.336	58.726	58.590	0.136	0.50	0.80	0.774	
				k7+735	59.226	57.796			58.706	58.610	0.096	0.50	0.84	0.814	
				k7+740	59.206	57.776	59.164	1.388	58.686	58.630	0.056	0.50	0.85	0.854	
				k7+745	59.186	57.756			58.666	58.630	0.036	0.50	0.88	0.874	
				k7+750	59.166	57.736	59.157	1.421	58.646	58.670	-0.024	0.50	0.80	0.934	
				k7+755	59.146	57.716			58.626	58.690	-0.064	0.50	0.85	0.974	
				k7+760	59.126	57.696	59.053	1.357	58.606	58.705	-0.099	0.50	0.70	1.009	
				132				1.473			0.021	0.500	0.743	0.889	

	ALT PROM EXC	1.473	Promedio anchos en metros: 0.621
			Promedio altura en metros: 0.889

TOPOGRAFO:

volumen= 72.87 m3

FECHA: 9/4/2025

HOJA Nº. 1 **DE** 3

	CARTERA TOPOGRAFICA INTERVENTORIA	Código: TEC-FR-21
		Versión: 00
		Fecha: 04/09/2025

PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ - PASO ANCHO A LA INSPECCIÓN DE BRICEÑO MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA.
ACTIVIDAD	EXCAVACIÓN MEJORAMIENTO EN RAJÓN

Nº	CONSOLIDADO DE VOLUMENES DE EXACAVACIÓN-RAJON						OBSERVACIONES
	ABCSISADO	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	VOLUMEN	UND	
1	K7+670-K7+700	30	1.90	0.40	22.80	m3	
2	K7+670-K7+650	20	3.00	0.40	24.00	m3	
3	K7+650-K7+600	50	2.80	0.40	56.00	m3	
4	K7+590-K7+530	60	2.30	0.40	55.20	m3	
5	K7+530-K7+510	20	2.50	0.40	20.00	m3	
6	K7+510-K7+470	40	2.40	0.40	38.40	m3	
7	K7+470-K7+460	10	2.30	0.40	9.20	m3	
8	K7+460-K7+440	20	2.10	0.40	16.80	m3	
		VOLUMEN			242.40	m3	

TOPOGRAFO:

FECHA: 30/04/2025

HOJA Nº. 1 DE 1

CARTERA TOPOGRAFICA INTERVENTORIA

Código: TEC-FR-21
Versión: 00
Fecha: 04/09/2025

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ - PASO ANCHO A LA INSPECCIÓN DE BRICEÑO MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA.

ACTIVIDAD EXCAVACIóN SIN CLASIFICAR

ABSCISA	COTAS TERRENO NATURAL			COTAS TEORICAS DE EXCAVACIÓN -0.52m DE LA RASANTE			DIFERENCIAS DE ALTURAS			CONSOLIDADO DE VOLUMENES DE EXACAVACIÓN						OBSERVACIONES
	IZQ	EJE	DER	IZQ	EJE	DER	EJE	DERECHA	PROMEDIO	ABCSISAS	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	VOLUMEN	UND	
K7+380	58.998	59.013	58.943		58.592	58.513	0.421	0.430	0.43	K7+380 - K7+390	10.000	4.300	0.43	18.30	m3	
K7+390	59.035	59.030	58.948		58.632	58.544	0.398	0.404	0.40	K7+390 - K7+400	10.000	4.300	0.40	17.24	m3	
K7+400	59.021	59.076	59.055		58.672	58.582	0.404	0.473	0.44	K7+400 - K7+410	10.000	4.300	0.44	18.86	m3	
K7+410	59.021	59.122	59.135		58.632	58.542	0.490	0.593	0.44	K7+410 - K7+420	10.000	4.300	0.44	18.92	m3	
K7+420	59.055	59.143	59.183		58.592	58.502	0.551	0.681	0.52	K7+420 - K7+430	10.000	4.300	0.52	22.36	m3	
K7+430	59.191	59.078	59.170		58.576	58.486	0.502	0.684	0.52	K7+430 - K7+440	10.000	4.300	0.52	22.36	m3	
K7+440	59.198	59.198	59.188		58.616	58.526	0.582	0.662	0.53	K7+440 - K7+450	10.000	4.300	0.53	22.79	m3	
K7+450	59.183	59.148	59.162		58.656	58.566	0.492	0.596	0.53	K7+450 - K7+460	10.000	4.300	0.53	22.79	m3	
K7+460	59.151	59.150	59.142		58.696	58.606	0.454	0.536	0.50	K7+460 - K7+470	10.000	4.300	0.50	21.29	m3	
K7+470	59.206	59.261	59.147		58.736	58.646	0.525	0.501	0.51	K7+470 - K7+480	10.000	4.300	0.51	22.06	m3	
K7+480	59.193	59.228	59.183		58.776	58.686	0.452	0.497	0.47	K7+480 - K7+490	10.000	4.300	0.47	20.41	m3	
K7+490	59.248	59.318	59.202		58.776	58.686	0.542	0.516	0.53	K7+490 - K7+500	10.000	4.300	0.53	22.75	m3	
K7+500	59.278	59.258	59.200		58.736	58.646	0.522	0.554	0.54	K7+500 - K7+510	10.000	4.300	0.54	23.14	m3	
K7+510	59.251	59.273	59.195		58.696	58.606	0.577	0.589	0.55	K7+510 - K7+520	10.000	4.300	0.55	23.65	m3	
K7+520	59.165	59.237	59.225		58.696	58.606	0.541	0.619	0.58	K7+520 - K7+530	10.000	4.300	0.58	24.95	m3	
K7+530	59.245	59.277	59.195		58.736	58.646	0.541	0.549	0.55	K7+530 - K7+540	10.000	4.300	0.55	23.44	m3	
K7+540	59.124	59.275	59.259		58.776	58.686	0.499	0.573	0.54	K7+540 - K7+550	10.000	4.300	0.54	23.05	m3	
K7+550	59.160	59.299	59.206		58.816	58.726	0.483	0.480	0.48	K7+550 - K7+560	10.000	4.300	0.48	20.71	m3	
K7+560	59.210	59.275	59.205		58.776	58.686	0.499	0.519	0.51	K7+560 - K7+570	10.000	4.300	0.51	21.89	m3	
K7+570	59.158	59.291	59.145		58.736	58.646	0.555	0.499	0.53	K7+570 - K7+580	10.000	4.300	0.53	22.67	m3	
K7+580	59.202	59.272	59.203		58.696	58.606	0.576	0.597	0.52	K7+580 - K7+590	10.000	4.300	0.52	22.36	m3	
K7+590	59.185	59.200	59.185		58.656	58.566	0.544	0.619	0.58	K7+590 - K7+600	10.000	4.300	0.58	25.01	m3	
K7+600	59.190	59.225	59.245		58.616	58.526	0.609	0.719	0.66	K7+600 - K7+610	10.000	4.300	0.66	28.56	m3	
K7+610	59.151	59.235	59.188		58.656	58.566	0.579	0.622	0.60	K7+610 - K7+620	10.000	4.300	0.60	25.83	m3	
K7+620	59.160	59.249	59.204		58.696	58.606	0.553	0.598	0.58	K7+620 - K7+630	10.000	4.300	0.58	24.75	m3	
K7+630	59.125	59.212	59.195		58.736	58.646	0.476	0.549	0.50	K7+630 - K7+640	10.000	4.300	0.50	21.50	m3	
K7+640	59.136	59.213	59.240		58.776	58.686	0.437	0.554	0.49	K7+640 - K7+650	10.000	4.300	0.49	21.07	m3	
K7+650	59.164	59.263	59.246		58.736	58.646	0.527	0.600	0.56	K7+650 - K7+660	10.000	4.300	0.56	24.23	m3	
K7+660	59.137	59.220	59.195		58.696	58.606	0.524	0.589	0.56	K7+660 - K7+670	10.000	4.300	0.56	23.93	m3	
longitud	280	metros														
											VOLUMEN PARCIAL			650.87	m3	

TOPOGRAFO:

FECHA: 30/04/2025

CARTERA TOPOGRAFICA INTERVENTORIA

Código: TEC-FR-21
Versión: 00
Fecha: 04/09/2025

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ - PASO ANCHO A LA INSPECCIÓN DE BRICEÑO MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA.

ACTIVIDAD NIVELACIÓN EXCAVACIÓN LATERAL COSTADO DERECHO TRAMO A

PUNTO	V+	ALT.INST.	COTA	ABSCISA	COTAS RASANTE	EXCAVACIÓN	TN NATURAL	DIFERENCIA EXC	SUBRASANTE VIA TEORICO	COTA SUPERIOR REAL	DIFERENCIAS	ANCHO INFERIOR	ANCHO SUPERIOR	ALTURA	OBSERVACIONES-SECCIÓN INSTALADA
C-1	1.492	60.87	59.378	k7+628	59.1058	57.676	59.215	1.539	58.5858	58.600	-0.014	0.50	0.50	0.924	
				k7+625	59.0659	57.636	59.185	1.549	58.5459	58.520	0.026	0.50	0.50	0.884	
				k7+620	59.0459	57.616	59.194	1.578	58.5259	58.550	-0.024	0.95	0.95	0.934	
				k7+615	59.0659	57.636	59.203	1.567	58.5459	58.510	0.036	0.73	0.73	0.874	
C-1	1.825	61.203	59.378	k7+610	59.0859	57.656	59.174	1.518	58.5659	58.550	0.016	0.65	0.65	0.894	
				k7+605	59.1059	57.676	59.145	1.469	58.5859	58.610	-0.024	0.76	0.76	0.934	
				k7+600	59.1259	57.696	59.175	1.479	58.6059	58.635	-0.029	0.70	0.70	0.939	
				k7+595	59.1459	57.716	59.205	1.489	58.6259	58.670	-0.044	0.70	0.70	0.954	
				33				1.524			-0.007	0.500	0.686	0.917	
							ALT PROM EXC	1.524		Promedio anchos en metros		0.593			
										Promedio altura en metros				0.917	

TOPOGRAFO:

FECHA: 9/4/2025

volumen =17.94m3

HOJA Nº. 1 **DE** 1

CARTERA TOPOGRAFICA INTERVENTORIA

Código: TEC-FR-21
Versión: 00
Fecha: 04/09/2025

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ - PASO ANCHO A LA INSPECCIÓN DE BRICEÑO MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA.

ACTIVIDAD EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR

ABSCISA	COTAS TERRENO NATURAL			COTAS TEORICAS DE EXCAVACIÓN -0.52m DE LA RASANTE			DIFERENCIAS DE ALTURAS			CONSOLIDADO DE VOLUMENES DE EXACAVACIÓN						OBSERVACIONES
	IZQ	EJE	DER	IZQ	EJE	DER	EJE	DERECHA	PROMEDIO	ABCSISAS	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	VOLUMEN	UND	
K7+660	59.137	59.220	59.195		58.696	58.606	0.524	0.589	0.557	K7+660 - K7+670	10.000	4.300	0.56	23.93	m3	
K7+670	59.208	59.259	59.247		58.656	58.566	0.603	0.681	0.642	K7+670 - K7+680	10.000	4.300	0.64	27.61	m3	
K7+680	59.199	59.253	59.200		58.616	58.526	0.637	0.674	0.656	K7+680 - K7+690	10.000	4.300	0.66	28.19	m3	
K7+690	59.174	59.202	59.249		58.656	58.566	0.546	0.683	0.615	K7+690 - K7+700	10.000	4.300	0.61	26.43	m3	
K7+700	59.182	59.297	59.332		58.696	58.606	0.601	0.726	0.664	K7+700 - K7+710	10.000	4.300	0.66	28.53	m3	
K7+710	59.080	59.165	59.155		58.736	58.646	0.429	0.509	0.469	K7+710 - K7+720	10.000	4.300	0.47	20.17	m3	
K7+720	59.117	59.242	59.239		58.776	58.686	0.466	0.553	0.510	K7+720 - K7+730	10.000	4.300	0.51	21.91	m3	
K7+730	59.124	59.192	59.196		58.816	58.726	0.376	0.470	0.423	K7+730 - K7+740	10.000	4.300	0.42	18.19	m3	
K7+740	59.107	59.205	59.117		58.776	58.686	0.429	0.431	0.430	K7+740 - K7+750	10.000	4.300	0.43	18.49	m3	
K7+750	59.137	59.197	59.107		58.736	58.646	0.461	0.461	0.461	K7+750 - K7+760	10.000	4.300	0.46	19.82	m3	
K7+760	59.107	59.219	59.181		58.696	58.606	0.523	0.575	0.549							
longitud	100	metros														
											VOLUMEN PARCIAL			233.27	m3	

TOPOGRAFO:

FECHA: 30/04/2025

CARTERA TOPOGRAFICA INTERVENTORIA

Código: TEC-FR-21
Versión: 00
Fecha: 04/09/2025

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ - PASO ANCHO A LA INSPECCIÓN DE BRICEÑO MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA.

ACTIVIDAD NIVELACIÓN EXCAVACIÓN LATERAL COSTADO DERECHO TRAMO A

PUNTO	V+	ALT.INST.	COTA	ABSCISA	COTAS RASANTE	EXCAVACIÓN	TN NATURAL	DIFERENCIA EXC	SUBRASANTE VIA TEORICO	TRITURADO SUPERIOR REAL	DIFERENCIAS	ANCHO INFERIOR	ANCHO SUPERIOR	ALTURA	OBSERVACIONES-SECCIÓN INSTALADA
C-1	1.492	60.87	59.378	k7+595	59.066	57.636	59.215	1.579	58.546	58.600	-0.054	0.50	0.50	0.964	
				k7+590	59.086	57.656	59.185	1.529	58.566	58.620	-0.054	0.50	0.50	0.964	
				k7+585	59.106	57.676	59.194	1.518	58.586	58.650	-0.064	0.95	0.95	0.974	
				k7+580	59.126	57.696	59.203	1.507	58.606	58.670	-0.064	0.73	0.73	0.974	
C-1	1.825	61.203	59.378	k7+575	59.146	57.716	59.174	1.458	58.626	58.691	-0.065	0.65	0.65	0.975	
				k7+570	59.166	57.736	59.145	1.409	58.646	58.629	0.017	0.76	0.76	0.893	
				k7+565	59.186	57.756	59.175	1.419	58.666	58.635	0.031	0.70	0.70	0.879	
				k7+560	59.206	57.776	59.205	1.429	58.686	58.786	-0.100	0.70	0.70	1.010	
				k7+555	59.226	57.796	59.2055	1.410	58.706	58.672	0.034	0.84	0.84	0.876	
				k7+550	59.246	57.816	59.206	1.390	58.726	58.722	0.004	1.00	1.00	0.906	
				k7+545	59.226	57.796	59.2325	1.437	58.706	58.700	0.006	1.00	1.00	0.904	
GPS 5	1.51	61.133	59.623	k7+540	59.206	57.776	59.259	1.483	58.686	58.638	0.048	0.80	0.80	0.862	
				k7+535	59.186	57.756	59.227	1.471	58.666	58.704	-0.038	0.60	0.80	0.948	
				k7+530	59.166	57.736	59.195	1.459	58.646	58.678	-0.032	0.90	0.60	0.942	
				k7+525	59.146	57.716	59.21	1.494	58.626	58.614	0.012	1.00	1.00	0.898	
				k7+520	59.126	57.696	59.225	1.529	58.606	58.610	-0.004	0.80	0.7	0.914	
				k7+515	59.126	57.696	59.21	1.514	58.606	58.610	-0.004	0.8	1.00	0.914	
				k7+510	59.126	57.696	59.195	1.499	58.606	58.608	-0.002	0.75	0.95	0.912	
				k7+505	59.146	57.716	59.198	1.482	58.626	58.605	0.021	0.75	0.95	0.889	
				k7+500	59.166	57.736	59.200	1.464	58.646	58.716	-0.070	0.75	0.74	0.980	
				k7+495	59.186	57.756	59.201	1.445	58.666	58.658	0.008	0.75	1.00	0.902	
				k7+490	59.206	57.776	59.202	1.426	58.686	58.658	0.028	0.75	0.8	0.882	
GPS 5	1.51	61.133	59.623	k7+485	59.206	57.776	59.1925	1.416	58.686	58.701	-0.015	0.75	0.85	0.925	
				k7+480	59.206	57.776	59.183	1.407	58.686	58.671	0.015	0.75	1.00	0.895	
				k7+475	59.186	57.756	59.165	1.409	58.666	58.681	-0.015	0.75	0.85	0.925	
				k7+470	59.166	57.736	59.147	1.411	58.646	58.651	-0.005	0.75	0.83	0.915	
				k7+465	59.146	57.716	59.145	1.429	58.626	58.661	-0.035	0.75	0.82	0.945	
				k7+460	59.126	57.696	59.142	1.446	58.606	58.630	-0.024	0.6	0.50	0.934	
				k7+455	59.106	57.676	59.152	1.476	58.586	58.600	-0.014	0.6	0.60	0.924	
				k7+450	59.086	57.656	59.162	1.506	58.566	58.590	-0.024	0.6	0.60	0.934	
				k7+445	59.066	57.636	59.175	1.539	58.546	58.550	-0.004	0.6	0.60	0.914	
				k7+440	59.046	57.616	59.188	1.572	58.526	58.540	-0.014	0.6	0.60	0.924	
				k7+435	59.026	57.596	59.179	1.583	58.506	58.520	-0.014	0.6	0.60	0.924	
				k7+430	59.006	57.576	59.170	1.594	58.486	58.510	-0.024	0.6	0.60	0.934	
				k7+425	59.006	57.576	59.170	1.594	58.486	58.490	-0.004	0.6	0.60	0.914	
				170				1.478			-0.015	0.500	0.763	0.925	

ALT PROM EXC	1.478

Promedio anchos en metros	0.632
Promedio altura en metros	0.925

TOPOGRAFO:

FECHA: 9/4/2025

volumen 99.38 m3

CARTERA TOPOGRAFICA INTERVENTORIA

Código: TEC-FR-21
Versión: 00
Fecha: 04/09/2025

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ - PASO ANCHO A LA INSPECCIÓN DE BRICEÑO MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA.

ACTIVIDAD: NIVELACIÓN EXCAVACIÓN LATERAL COSTADO DERECHO TRAMO A

PUNTO	V+	ALT.INST.	COTA	ABSCISA	COTAS RASANTE	EXCAVACIÓN	TN NATURAL	DIFERENCIA EXC	SUBRASANTE VIA TEORICO	COTA SUPERIOR REAL	DIFERENCIAS	ANCHO INFERIOR	ANCHO SUPERIOR	ALTURA	OBSERVACIONES
C1	1.562	62.502	60.94	k7+425	59.066	57.636			58.546	58.457	0.089	0.50	0.60	0.821	
				k7+420	59.046	57.616	59.352	1.736	58.526	58.505	0.021	0.50	0.60	0.889	
				k7+415	59.066	57.636			58.546	58.520	0.026	0.50	0.60	0.884	
				k7+410	59.086	57.656	59.368	1.712	58.566	58.590	-0.024	0.50	0.60	0.934	
				k7+405	59.106	57.676			58.586	58.590	-0.004	0.50	0.60	0.914	
				k7+400	59.126	57.696	59.298	1.602	58.606	58.600	0.006	0.50	0.60	0.904	
				k7+395	59.146	57.716			58.626	58.624	0.002	0.50	0.60	0.908	
				k7+390	59.166	57.736	50.043	-7.693	58.646	58.638	0.008	0.50	0.60	0.902	
				k7+385	59.186	57.756			58.666	58.632	0.034	0.50	0.60	0.876	
				k7+380	59.206	57.776	59.048	1.272	58.686	58.657	0.029	0.50	0.60	0.881	
				k7+375	59.186	57.756			58.666	58.677	-0.011	0.50	0.60	0.921	
				k7+370	59.166	57.736	59.089	1.353	58.646	58.650	-0.004	0.50	0.60	0.914	
				k7+365	59.146	57.716			58.626	58.619	0.007	0.50	0.60	0.903	
				k7+360	59.126	57.696	59.153	1.457	58.606	58.607	-0.001	0.50	0.60	0.911	
				k7+355	59.106	57.676			58.586	58.654	-0.068	0.50	0.60	0.978	
				k7+350	59.086	57.656	59.149	1.493	58.566	58.533	0.033	0.50	0.60	0.877	
				k7+345	59.066	57.636			58.546	58.508	0.038	0.50	0.60	0.872	
GPS 5A	1.297	61.972	60.675	k7+340	59.046	57.616	59.147	1.531	58.526	58.493	0.033	0.50	0.60	0.877	
				k7+335	59.066	57.636			58.546	58.534	0.012	0.50	0.60	0.898	
				k7+330	59.086	57.656	59.137	1.481	58.566	58.554	0.012	0.50	0.60	0.898	
				k7+325	59.106	57.676			58.586	58.580	0.006	0.50	0.60	0.904	
				k7+320	59.126	57.696	59.152	1.456	58.606	58.590	0.016	0.50	0.60	0.894	
				k7+315	59.146	57.716			58.626	58.610	0.016	0.50	0.60	0.894	
				k7+310	59.166	57.736	59.164	1.428	58.646	58.630	0.016	0.50	0.60	0.894	
				k7+305	59.186	57.756			58.666	58.630	0.036	0.50	0.60	0.874	
				k7+300	59.206	57.776	59.157	1.381	58.686	58.670	0.016	0.50	0.60	0.894	
				k7+295	59.226	57.796			58.706	58.690	0.016	0.50	0.60	0.894	
				k7+290	59.246	57.816	59.053	1.237	58.726	58.705	0.021	0.50	0.60	0.889	
				k7+285	59.226	57.796			58.706	58.713	-0.007	0.50	0.60	0.917	
				k7+280	59.206	57.776	59.124	1.348	58.686	58.735	-0.049	0.50	0.60	0.959	
				k7+270	59.213	57.783			58.693	58.701	-0.008	0.50	0.60	0.918	
				155				0.853			0.010	0.500	0.600	0.900	
							ALT PROM EXC	0.853		Promedio anchos en metros			0.550		
										Promedio altura en metros				0.900	

volumen 76.73 m3

TOPOGRAFO:

FECHA: 9/4/2025

Cundicoal S.A.S
GESTOR AMBIENTAL
NIT. 900.392.471

CONSTANCIA GESTOR AMBIENTAL CUNDICOAL SAS
RESOL 472 / 2017 – RESOL 1257 / 2021
REGISTRO DE INSCRIPCIÓN – 007 - OFICIO N° 20182150408
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA (CAR)

Escanéame

N° ÚNICO DE CONSTANCIA
CUN-GA-RCD-00027-2025

CUNDICOAL S.A.S – PLANTA LA ESPERANZA identificada con **NIT: 900.392.471-1**, representada legalmente por el Sr. Camilo Andrés Chacón Cañón, hace constar que gestionó ambientalmente los RCD **Material Pétreo – Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno,** de la compañía **CONSORCIO INCITECO IP** ubicada en Bogotá D.C; al residuo se le realizaron procesos de almacenamiento, clasificación, recuperación y aprovechamiento, la cual permitió su reincorporación al ciclo económico.

Para las fechas comprendidas entre el 15 al 30 de abril de 2025 los datos de la empresa generadora y as cantidades recibidas se detallan en la tabla N1.

Tabla 1. Formato Constancia Gestores, Anexo II Resolución 1257/2021

DATOS BÁSICOS DEL GESTOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	007	
Nombre o razón social	CUNDICOAL SAS	
Documento de identificación o NIT	900.392.471-1	
Representante Legal	Camilo Andrés Chacón Cañón	
Dirección	Km. 7 Vía Zipaquirá – Ubaté; Vda. El Olivo	
Teléfono	311 4771536	
Correo electrónico	gestorambiental@cundicoal.co	
Municipio o distrito	Cogua	
Gestor	Punto limpio	
	Planta de aprovechamiento	X
	Disposición final	
DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	Número Gestor: 007 Código Interno Constancia: CUN-GA-RCD-00027-2025	
Nombre o razón social	CONSORCIO INCITECO IP	
Documento de identificación o NIT	901.899.095-6	
Representante Legal	Iván Camilo López Gómez	
Dirección domicilio	CL 127 D # 70 D - 27	
Teléfono	3175023770	
Correo electrónico	asistente@inciteco.co	

Dirección generación de RCD	Paso Ancho, Zipaquirá, Cundinamarca
CANTIDADES DE RDC RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO	
Tipo de Residuo	**Cantidad de RCD recibidos del generador (t)**
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	0
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	0
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	415,97
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	0
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	0
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	0
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	0
Total, RCD recibidos (t)	**415,97**
Fecha de recepción de los RCD	**16/04/2025 (21888, 21893). 21/04/2025 (21906). 22/04/2025 (21936, 21935, 21932, 21930, 21926, 21925, 21923, 21918). 23/04/2025 (21949, 21947, 21946, 21945, 21942, 21941, 21938, 21937). 26/04/2025 (21985). 28/04/2025 (22003, 22001, 22000, 21997, 21995, 21991, 21990). 29/04/2025 (22018, 22017, 22012, 22010, 22007, 22004). 30/04/2025 (22028).**

*NOTA: escaneando el código QR podrán verificar los vales de báscula, con el objetivo de asegurar la trazabilidad del residuo.

La anterior constancia se expide a solicitud de **CONSORCIO INCITECO IP**, a los cinco (05) días del mes de mayo de 2025.

Cordialmente,

Representante Legal
NIT. 900.392.471-1
CAMILO ANDRÉS CHACÓN CAÑÓN

Elaboró: Zharick Camila Chacón Gutiérrez
Reviso: Camilo Andrés Chacón

Cundicoal S.A.S
GESTOR AMBIENTAL
NIT. 900.392.471

CONSTANCIA GESTOR AMBIENTAL CUNDICOAL SAS
RESOL 472 / 2017 – RESOL 1257 / 2021
REGISTRO DE INSCRIPCIÓN – 007 - OFICIO N° 20182150408
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA (CAR)

Escanéame

N° ÚNICO DE CONSTANCIA
CUN-GA-RCD-00023-2025

CUNDICOAL S.A.S – PLANTA LA ESPERANZA identificada con **NIT: 900.392.471-1**, representada legalmente por el Sr. Camilo Andrés Chacón Cañón, hace constar que gestionó ambientalmente los RCD **Material Pétreo – Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno,** de la compañía **CONSORCIO INCITECO IP** ubicada en Bogotá D.C; al residuo se le realizaron procesos de almacenamiento, clasificación, recuperación y aprovechamiento, la cual permitió su reincorporación al ciclo económico.

Para las fechas comprendidas entre el 01 al 15 de abril de 2025 los datos de la empresa generadora y as cantidades recibidas se detallan en la tabla N1.

Tabla 1. Formato Constancia Gestores, Anexo II Resolución 1257/2021

DATOS BÁSICOS DEL GESTOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	007	
Nombre o razón social	CUNDICOAL SAS	
Documento de identificación o NIT	900.392.471-1	
Representante Legal	Camilo Andrés Chacón Cañón	
Dirección	Km. 7 Vía Zipaquirá – Ubaté; Vda. El Olivo	
Teléfono	311 4771536	
Correo electrónico	gestorambiental@cundicoal.co	
Municipio o distrito	Cogua	
Gestor	Punto limpio	
	Planta de aprovechamiento	X
	Disposición final	
DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR		
Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad ambiental por proyecto	Número Gestor: 007 Código Interno Constancia: CUN-GA-RCD-00023-2025	
Nombre o razón social	CONSORCIO INCITECO IP	
Documento de identificación o NIT	901.899.095-6	
Representante Legal	Iván Camilo López Gómez	
Dirección domicilio	CL 127 D # 70 D - 27	
Teléfono	3175023770	
Correo electrónico	asistente@inciteco.co	

Dirección generación de RCD	Paso Ancho, Zipaquirá, Cundinamarca
CANTIDADES DE RDC RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO	
Tipo de Residuo	**Cantidad de RCD recibidos del generador (t)**
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:	
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	0
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	0
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.	132,2
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	0
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no susceptibles de aprovechamiento:	
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.	0
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.	0
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	0
Total, RCD recibidos (t)	**132,2**
Fecha de recepción de los RCD	**09/04/2025 (21807, 21803, 21801). 10/04/2025 (21834, 21828, 21821, 21817, 21815). 11/04/2025 (21846, 21842).**

*NOTA: escaneando el código QR podrán verificar los vales de báscula, con el objetivo de asegurar la trazabilidad del residuo.

La anterior constancia se expide a solicitud de **CONSORCIO INCITECO IP**, a los dieciséis (16) días del mes de abril de 2025.

Cordialmente,

Representante Legal
NIT. 900.392.471-1
CAMILO ANDRÉS CHACÓN CAÑÓN

Elaboró: Zharick Camila Chacón Gutiérrez
Reviso: Camilo Andrés Chacón

No Punto de Intervención	REMISION	Fecha	Actividad	Punto de disposición	Distancia de disposición al Punto medio del corredor	Distancia de acarreo según APU	Distancia total	Cantidad m3	m3-km
1	21803	09-04-25	FILTRO-VIA	CUNDICOAL SAS	12,20	5,00	7,20	7	50,40
2	21801	09-04-25	FILTRO-VIA	CUNDICOAL SAS	12,20	5,00	7,20	7	50,40
3	21807	09-04-25	FILTRO-VIA	CUNDICOAL SAS	12,20	5,00	7,20	7	50,40
4	21821	10-04-25	FILTRO-VIA	CUNDICOAL SAS	12,20	5,00	7,20	7	50,40
5	21815	10-04-25	FILTRO-VIA	CUNDICOAL SAS	12,20	5,00	7,20	7	50,40
6	21828	10-04-25	FILTRO-VIA	CUNDICOAL SAS	12,20	5,00	7,20	7	50,40
7	21834	10-04-25	FILTRO-VIA	CUNDICOAL SAS	12,20	5,00	7,20	7	50,40
8	21817	10-04-25	FILTRO-VIA	CUNDICOAL SAS	12,20	5,00	7,20	7	50,40
9	21846	11-04-25	FILTRO-VIA	CUNDICOAL SAS	12,20	5,00	7,20	7	50,40
10	21842	11-04-25	FILTRO-VIA	CUNDICOAL SAS	12,20	5,00	7,20	7	50,40
2	21888	16-04-25	FILTRO-VIA	CUNDICOAL SAS	12,20	5,00	7,20	7	50,40
3	21906	21-04-25	FILTRO-VIA	CUNDICOAL SAS	12,20	5,00	7,20	7	50,40
4	21918	22-04-25	FILTRO-VIA	CUNDICOAL SAS	12,20	5,00	7,20	7	50,40
5	21923	22-04-25	FILTRO-VIA	CUNDICOAL SAS	12,20	5,00	7,20	7	50,40
6	21926	22-04-25	FILTRO-VIA	CUNDICOAL SAS	12,20	5,00	7,20	7	50,40
7	21930	22-04-25	FILTRO-VIA	CUNDICOAL SAS	12,20	5,00	7,20	7	50,40
8	21935	22-04-25	FILTRO-VIA	CUNDICOAL SAS	12,20	5,00	7,20	7	50,40
9	22816	22-04-25	FILTRO-VIA	CUNDICOAL SAS	12,20	5,00	7,20	7	50,40
10	21925	22-04-25	FILTRO-VIA	CUNDICOAL SAS	12,20	5,00	7,20	7	50,40
11	21932	22-04-25	FILTRO-VIA	CUNDICOAL SAS	12,20	5,00	7,20	7	50,40
3	21936	22-04-25	FILTRO-VIA	CUNDICOAL SAS	12,20	5,00	7,20	7	50,40
4	21937	23-04-25	FILTRO-VIA	CUNDICOAL SAS	12,20	5,00	7,20	7	50,40
5	21946	23-04-25	FILTRO-VIA	CUNDICOAL SAS	12,20	5,00	7,20	7	50,40
6	21949	23-04-25	FILTRO-VIA	CUNDICOAL SAS	12,20	5,00	7,20	7	50,40
7	21947	23-04-25	FILTRO-VIA	CUNDICOAL SAS	12,20	5,00	7,20	7	50,40
8	21942	23-04-25	FILTRO-VIA	CUNDICOAL SAS	12,20	5,00	7,20	7	50,40
9	21945	23-04-25	FILTRO-VIA	CUNDICOAL SAS	12,20	5,00	7,20	7	50,40
10	21938	23-04-25	FILTRO-VIA	CUNDICOAL SAS	12,20	5,00	7,20	7	50,40
11	21985	26-04-25	FILTRO-VIA	CUNDICOAL SAS	12,20	5,00	7,20	15	108,00
12	22000	28-04-25	FILTRO-VIA	CUNDICOAL SAS	12,20	5,00	7,20	7	50,40
4	21997	28-04-25	FILTRO-VIA	CUNDICOAL SAS	12,20	5,00	7,20	7	50,40
5	21991	28-04-25	FILTRO-VIA	CUNDICOAL SAS	12,20	5,00	7,20	7	50,40
6	21990	28-04-25	FILTRO-VIA	CUNDICOAL SAS	12,20	5,00	7,20	7	50,40
7	22003	28-04-25	FILTRO-VIA	CUNDICOAL SAS	12,20	5,00	7,20	7	50,40
8	22001	28-04-25	FILTRO-VIA	CUNDICOAL SAS	12,20	5,00	7,20	15	108,00
9	21995	28-04-25	FILTRO-VIA	CUNDICOAL SAS	12,20	5,00	7,20	15	108,00
10	22004	29-04-25	FILTRO-VIA	CUNDICOAL SAS	12,20	5,00	7,20	7	50,40
11	22007	29-04-25	FILTRO-VIA	CUNDICOAL SAS	12,20	5,00	7,20	7	50,40
12	22012	29-04-25	FILTRO-VIA	CUNDICOAL SAS	12,20	5,00	7,20	15	108,00
13	22010	29-04-25	FILTRO-VIA	CUNDICOAL SAS	12,20	5,00	7,20	7	50,40
5	22017	29-04-25	FILTRO-VIA	CUNDICOAL SAS	12,20	5,00	7,20	7	50,40
6	22018	29-04-25	FILTRO-VIA	CUNDICOAL SAS	12,20	5,00	7,20	7	50,40
7	22028	30-04-25	FILTRO-VIA	CUNDICOAL SAS	12,20	5,00	7,20	15	108,00

No Punto de Intervención	REMISION	Fecha	Actividad	Punto de disposición	Distancia de disposición al Punto medio del corredor	Distancia de acarreo según APU	Distancia total	Cantidad m3	m3-km
UBICACIÓN PUNTO DE DISPOSICIÓN DE RCDS -									



DECLARACIÓN
ORIGEN DE FONDOS

DECLARACIÓN ORIGEN DE FONDOS

IVÁN CAMILO LÓPEZ GÓMEZ, identificado con el documento de identidad No. **80.771.365** expedido en Bogotá D.C., obrando como representante legal de la persona jurídica **CONSORCIO INCITECO IP** y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente aclaración de fuente de fondos al **INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU**, con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado al respecto en la LEY 190 DE 1995 "Estatuto Anticorrupción" y demás normas legales concordantes para la adquisición de bienes del Estado.

1. Declaro que los recursos que entrego provienen de actividades licitas, de conformidad con la normatividad colombiana.

2. Que no admitiré que terceros efectúen depósitos en mis cuentas con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo adicione; ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionas con las mismas.

3. Autorizo a resolver cualquier acuerdo, negocio o contrato celebrado con **INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA-ICCU**, en caso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en este documento eximiendo a la entidad de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento, o de la violación del mismo.

4. Autoriza a **INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU** para que, en caso de que lo juzgue necesario, consulte mi información crediticia en las Centrales de Riesgo.

Bajo la gravedad de juramento manifiesto que los datos aquí consignados obedecen a la realidad, por lo que declaro haber leído, entendido y aceptado el presente documento.

En constancia firmo a los trece (13) días del mes de mayo del año 2025, en la ciudad de Bogotá.

Cordialmente



IVÁN CAMILO LÓPEZ GÓMEZ
C.C. 80.771.365 de Bogotá D.C
Represéntate Legal
CONSORCIO INCITECO IP
NIT: 901.899.095-6

DECLARACIÓN ORIGEN DE FONDOS

IVÁN CAMILO LÓPEZ GÓMEZ, identificado con el documento de identidad No. **80.771.365** expedido en Bogotá D.C., obrando como representante legal de la persona jurídica **INCITECO SAS** y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente aclaración de fuente de fondos al **INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU**, con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado al respecto en la LEY 190 DE 1995 "Estatuto Anticorrupción" y demás normas legales concordantes para la adquisición de bienes del Estado.

1. Declaro que los recursos que entrego provienen de actividades licitas, de conformidad con la normatividad colombiana.

2. Que no admitiré que terceros efectúen depósitos en mis cuentas con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo adicione; ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionas con las mismas.

3. Autorizo a resolver cualquier acuerdo, negocio o contrato celebrado con **INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU**, en caso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en este documento eximiendo a la entidad de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento, o de la violación del mismo.

4. Autoriza a **INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU** para que, en caso de que lo juzgue necesario, consulte mi información crediticia en las Centrales de Riesgo.

Bajo la gravedad de juramento manifiesto que los datos aquí consignados obedecen a la realidad, por lo que declaro haber leído, entendido y aceptado el presente documento.

En constancia firmo a los trece (13) días del mes de mayo del año 2025, en la ciudad de Bogotá.

Cordialmente

IVÁN CAMILO LÓPEZ GÓMEZ
C.C. 80.771.365 de Bogotá D.C
Represéntate Legal
INCITECO SAS
NIT: 800.104.214-9

GONZALO ENRIQUE QUINTANA VARGAS identificado con el documento de identidad No. **79.425.517** expedido en Bogotá D.C., obrando como representante legal de la persona jurídica **INGENIEROS PROYECTAR SAS** y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente aclaración de fuente de fondos al **INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU**, con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado al respecto en la LEY 190 DE 1995 "Estatuto Anticorrupción" y demás normas legales concordantes para la adquisición de bienes del Estado.

1. Declaro que los recursos que entrego provienen de actividades licitas, de conformidad con la normatividad colombiana.

2. Que no admitiré que terceros efectúen depósitos en mis cuentas con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo adicione; ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionas con las mismas.


3. Autorizo a resolver cualquier acuerdo, negocio o contrato celebrado con **INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU**, en caso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en este documento eximiendo a la entidad de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento, o de la violación del mismo.

4. Autoriza a **INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU** para que, en caso de que lo juzgue necesario, consulte mi información crediticia en las Centrales de Riesgo.

Bajo la gravedad de juramento manifiesto que los datos aquí consignados obedecen a la realidad, por lo que declaro haber leído, entendido y aceptado el presente documento.

En constancia firmo a los trece (13) días del mes de mayo del año 2025, en la ciudad de Bogotá.

Cordialmente



GONZALO ENRIQUE QUINTANA VARGAS
C.C. 79.425.517 de Bogotá D.C
Represéntate Legal
INGENIEROS PROYECTAR SAS
NIT: 900.498.361-6

PAGO CERTIFICACIONES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **FS PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S**, identificada con **NI** número **900355997**, aportó por **FABIAN TAFUR SANCHEZ** identificado(a) con **CC** número **79683578** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, el periodo de pensión de 03 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	IMO	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VRP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECION	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN VO APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-11	ARL SURA	59															0		30	$2,000,000	0.06960	$139,200	$0	$0	Marzo - 2025	85780552	22/04/2025	No

PAGADA

El presente certificado se expide a los 5 días del mes Mayo de 2025

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACION	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900081087	1	ESTUDIOS Y PROYECTOS CIVILES LTDA	B	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4290	Juridica
MUN-DEP	DIRECCION		TELEFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
11-1	CALLE 87 49 A 41		4105192			M.CIVILES2013@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-03	2025-03	32546801	Y	2025-04-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	167.100	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	32546801	2025-04-22	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																		DIAS	PENSION					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot	Sub Tipo Cot	Total	Exenta de Parafiscales	Actividad Económica
	CC 79468260	MAHECHA PULIDO LUIS HERNAN	2.400.000																0			0	0	0	30	SIN AFP-SIN AFP	0	0	0	0	SIN EPS-SIN EPS	0	0	SIN CCF-SIN CCF	0	0	2.400.000	167.100	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	167.100	N	5421001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACION	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900081087	1	ESTUDIOS Y PROYECTOS CIVILES LTDA	B	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4290	Juridica
MUN-DEP	DIRECCION		TELEFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
11-1	CALLE 87 49 A 41		4105192			M.CIVILES2013@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-03	2025-03	32546801	Y	2025-04-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	167.100	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	32546801	2025-04-22	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSION	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
0	0	2.400.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARP(Administradoras: 1)				1	167.100	0	0	0	167.100
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	167.100	0	0	0	167.100
Gran Total					167.100	0	0	0	167.100

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACION	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79468260	0	LUIS HERNAN MAHECHA PULIDO	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELEFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
11-1	CALLE 87 49 A 41		4105192		CONTABILIDADHERNANMAHECHA@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-03	2025-03	32601546	I	2025-03-21	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	684.000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	32601546	2025-04-14	Pagada							

EMPLEADO				NOVEDADES														DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF		RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EFST	ARPT	AFP	EPS	CCF	Alt	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot	Sub Tipo Cot	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
	CC 79468260	MAHECHA PULIDO LUIS HERNAN	2.400.000																	0			30	30	0	0	PROTECCION -230201	2.400.000	384.000	0	0	Univ. Nacional-RES008	2.400.000	300.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	0	0	0,00000	0	0	0	0	0	03	0	684.000	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACION	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79468260	0	LUIS HERNAN MAHECHA PULIDO	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELEFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
11-1	CALLE 87 49 A 41		4105192		CONTABILIDADHERNANMAHECHA@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-03	2025-03	32601546	I	2025-03-21	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	684.000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	32601546	2025-04-14	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.400.000	2.400.000	0	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	384.000	0	0	0	384.000
PROTECCION	230201	800229739	0	1	384.000	0	0	0	384.000
EPS(Administradoras: 1)				1	300.000	0	0	0	300.000
Univ. Nacional	RES008	899999063	3	1	300.000	0	0	0	300.000
Gran Total					684.000	0	0	0	684.000

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que SOPORTE GEOTECNICO SAS identificado(a) con NI 900826437 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DIEGO ALEXANDER REYES VELANDIA identificado(a) con CC 79057911

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9484147662	1386374813	E	2025-04-04	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	30																		$4,514,095	4%	$180,600
9484147662	1386374813	E	2025-04-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-03	30																		$4,514,095	16%	$722,300
9484147662	1386374813	E	2025-04-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-03	30																		$4,514,095		$0
9484147662	1386374813	E	2025-04-04	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-03	30																		$4,514,095		$0
9484147662	1386374813	E	2025-04-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-03	30																		$0	0%	$0
9484147662	1386374813	E	2025-04-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-03	30																		$0	0%	$0
9484147662	1386374813	E	2025-04-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-03	30																		$4,514,095	6.96%	$314,200
9484147662	1386374813	E	2025-04-04	CCF	CCF21	CAFAM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-03	30																		$4,514,095	4%	$180,600
9482172361	1307483395	E	2025-03-03	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-03	30																		$4,514,095	4%	$180,600
9482172361	1307483395	E	2025-03-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	30																		$4,514,095	16%	$722,300
9482172361	1307483395	E	2025-03-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-02	30																		$4,514,095		$0
9482172361	1307483395	E	2025-03-03	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-02	30																		$4,514,095		$0
9482172361	1307483395	E	2025-03-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-02	30																		$0	0%	$0
9482172361	1307483395	E	2025-03-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-02	30																		$0	0%	$0
9482172361	1307483395	E	2025-03-03	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	30																		$4,514,095	6.96%	$314,200
9482172361	1307483395	E	2025-03-03	CCF	CCF21	CAFAM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	30																		$4,514,095	4%	$180,600
9481303396	1241615000	E	2025-02-04	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	30																		$4,514,095	4%	$180,600
9481303396	1241615000	E	2025-02-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30																		$4,514,095	16%	$722,300
9481303396	1241615000	E	2025-02-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-01	30																		$4,514,095		$0
9481303396	1241615000	E	2025-02-04	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-01	30																		$4,514,095		$0

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79663578	FABIAN TAFUR SANCHEZ	CRA 46 NO. 22 B -21 ED SALITRE OFFICE	8985681	fabiantafsan@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-03	I	01/04/2025	85433825	$1.425.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	625.000	0		0		0	0	0	0	625.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	800.000	0	0	0	0	0	0		800.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	625.000	625.000
Pensión	1	800.000	800.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	1.425.000	1.425.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79683578	FABIAN TAFUR SANCHEZ		CRA 46 NO. 22 B -21 ED SALITRE OFFICE	8985681	fabiantafsan@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-03	2025-03	I	01/04/2025	85433825	$1.425.000

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colmena	Estrato	Extranjero	Colombia extranjero	Encontrado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79683578	TAFUR SANCHEZ FABIAN	3	0			N																	25-14	5.000.000	800.000	0	0	0	0	EPS005	5.000.000	625.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800104214	9	INCITECO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	CALLE 127 D 70 D 27	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5165799	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1381328982	9483890010	E	2025/04/03	2025/04/02	BANCO DE OCCIDENTE	0	$62,135,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		ingret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRATIVO (64 Afiliados)																						$207,158,500	$33,896,400			$226,717,000	$9,059,600			$226,691,312	$8,848,800			$226,717,000		$10,330,700		$0	$0		$62,135,500
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (44 Afiliados)																						$146,129,565	$23,754,400			$148,421,565	$5,926,700			$148,395,893	$5,779,300			$148,421,565		$9,846,200		$0	$0		$45,306,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (44 Afiliados)																						$146,129,565	$23,754,400			$148,421,565	$5,926,700			$148,395,893	$5,779,300			$148,421,565		$9,846,200		$0	$0		$45,306,600
1	CC	79801685	ACHURY LUIS								X									23020 1	30	$2,341,130	$374,600	EPS008	30	$2,341,130	$93,700	CCF22	30	$2,341,130	$93,700	14-11	30	$2,341,130	6.960%	$163,000	30	$0	$0	Si	$725,000
2	CC	79842948	AMAYA ALEXANDER																	25-14	4	$488,667	$78,200	EPS005	4	$488,667	$19,600	CCF22	4	$488,667	$19,600	14-11	4	$488,667	6.960%	$34,100	4	$0	$0	Si	$151,500
3	CC	79842948	AMAYA ALEXANDER										X							25-14	26	$2,117,663	$338,900	EPS005	26	$2,117,663	$84,800	CCF22	26	$2,117,663	$0	14-11	26	$2,117,663	0.000%	$0	26	$0	$0	Si	$423,700
4	CC	79842022	ARIAS PABLO																	23030 1	24	$2,870,400	$459,300	EPS002	24	$2,870,400	$114,900	CCF22	24	$2,870,400	$114,900	14-11	24	$2,870,400	6.960%	$199,800	24	$0	$0	Si	$888,900
5	CC	79842022	ARIAS PABLO												X					23030 1	6	$717,600	$114,900	EPS002	6	$717,600	$28,800	CCF22	6	$717,600	$28,800	14-11	6	$717,600	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$172,500
6	CC	1019050828	ARISMENDY BERSI																	23020 1	30	$4,500,000	$720,000	EPS005	30	$4,500,000	$180,000	CCF22	30	$4,500,000	$180,000	14-11	30	$4,500,000	6.960%	$313,200	30	$0	$0	Si	$1,393,200
7	CC	79464179	ARIZA JOSE								X									25-14	30	$2,360,619	$377,700	EPS002	30	$2,360,619	$94,500	CCF22	30	$2,360,619	$94,500	14-11	30	$2,360,619	6.960%	$164,300	30	$0	$0	Si	$731,000
8	CC	79994664	AVILA MILTON								X									23020 1	30	$2,239,337	$358,300	EPS017	30	$2,239,337	$89,600	CCF22	30	$2,239,337	$89,600	14-11	30	$2,239,337	6.960%	$155,900	30	$0	$0	Si	$693,400
9	CC	52727771	BARON SULAY	X																23030 1	27	$1,980,000	$316,800	EPS008	27	$1,980,000	$79,200	CCF22	27	$1,980,000	$79,200	14-11	27	$1,980,000	6.960%	$137,900	27	$0	$0	Si	$613,100
10	CC	52917763	BARRIOS LINA																	23030 1	30	$8,501,000	$1,445,400	EPS010	30	$8,501,000	$340,100	CCF22	30	$8,501,000	$340,100	14-11	30	$8,501,000	6.960%	$591,700	30	$0	$0	Si	$2,717,300
11	CC	79429322	BEJARANO ORLANDO								X									23030 1	29	$2,136,333	$341,900	EPS017	29	$2,136,333	$85,500	CCF22	29	$2,136,333	$85,500	14-11	29	$2,136,333	6.960%	$148,700	29	$0	$0	Si	$661,600
12	CC	79429322	BEJARANO ORLANDO												L					23030 1	1	$68,418	$11,000	EPS017	1	$68,418	$2,800	CCF22	1	$56,200	$2,300	14-11	1	$68,418	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$16,100
13	CC	1026584305	BELLO JOHN																	23020 1	30	$4,581,000	$733,000	EPS008	30	$4,581,000	$183,300	CCF22	30	$4,581,000	$183,300	14-11	30	$4,581,000	6.960%	$318,900	30	$0	$0	Si	$1,418,500
14	CC	52286951	BELTRAN BERENICE								X									23020 1	27	$1,745,296	$279,300	EPS002	27	$1,745,296	$69,900	CCF22	27	$1,745,296	$69,900	14-11	27	$1,745,296	6.960%	$121,500	27	$0	$0	Si	$540,600
15	CC	52286951	BELTRAN BERENICE									X								23020 1	3	$164,012	$19,700	EPS002	3	$164,012	$0	CCF22	3	$142,350	$0	14-11	3	$164,012	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$19,700
16	CC	79803554	BRICENO JORGE								X									23020 1	30	$2,538,734	$406,200	EPS037	30	$2,538,734	$101,600	CCF22	30	$2,538,734	$101,600	14-11	30	$2,538,734	6.960%	$176,700	30	$0	$0	Si	$786,100
17	CC	1063486876	CALLEJAS DIEGO																	23030 1	28	$4,423,067	$707,700	EPS008	28	$4,423,067	$177,000	CCF22	28	$4,423,067	$177,000	14-11	28	$4,423,067	6.960%	$307,900	28	$0	$0	Si	$1,369,600
18	CC	1063486876	CALLEJAS DIEGO										X							23030 1	2	$315,934	$50,600	EPS008	2	$315,934	$12,700	CCF22	2	$315,934	$0	14-11	2	$315,934	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$63,300
19	CC	79373476	CANTOR JOSE								X									23030 1	30	$1,978,478	$316,600	EPS017	30	$1,978,478	$79,200	CCF22	30	$1,978,478	$79,200	14-11	30	$1,978,478	6.960%	$137,800	30	$0	$0	Si	$612,800
20	CC	80164750	CASTELLANOS CLARET								X									25-14	27	$1,952,068	$312,400	EPS002	27	$1,952,068	$78,100	CCF22	27	$1,952,068	$78,100	14-11	27	$1,952,068	6.960%	$135,900	27	$0	$0	Si	$604,500
21	CC	80164750	CASTELLANOS CLARET										X							25-14	1	$69,367	$11,100	EPS002	1	$69,367	$2,800	CCF22	1	$69,367	$0	14-11	1	$69,367	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$13,900
22	CC	80164750	CASTELLANOS CLARET										X							25-14	2	$153,060	$18,400	EPS002	2	$153,060	$0	CCF22	2	$138,734	$0	14-11	2	$153,060	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$18,400
23	CC	2968756	CASTRO JULIO								X									23020 1	30	$2,742,261	$438,800	EPSC34	30	$2,742,261	$109,700	CCF22	30	$2,742,261	$109,700	14-11	30	$2,742,261	6.960%	$190,900	30	$0	$0	Si	$849,100
24	CC	1026281376	DURAN YULY																	23100 1	25	$2,805,000	$448,800	EPS002	25	$2,805,000	$112,200	CCF22	25	$2,805,000	$112,200	14-11	25	$2,805,000	6.960%	$195,300	25	$0	$0	Si	$868,500
25	CC	1026281376	DURAN YULY												L					23100 1	5	$561,000	$89,800	EPS002	5	$561,000	$22,500	CCF22	5	$561,000	$22,500	14-11	5	$561,000	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$134,800
26	CC	1032415332	FRANCO JULIETH																	23100 1	30	$3,682,000	$589,200	EPS002	30	$3,682,000	$147,300	CCF22	30	$3,682,000	$147,300	14-11	30	$3,682,000	6.960%	$256,300	30	$0	$0	Si	$1,140,100
27	CC	19384384	GAMEZ WILLIAM																		0	$0	$0	EPS017	30	$2,292,000	$91,700	CCF22	30	$2,292,000	$91,700	14-11	30	$2,292,000	6.960%	$159,600	30	$0	$0	Si	$343,000
28	CC	79818031	GARCIA SERGIO								X									25-14	30	$1,999,304	$319,900	EPS017	30	$1,999,304	$80,000	CCF22	30	$1,999,304	$80,000	14-11	30	$1,999,304	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,100
29	CC	1007751241	HERNANDEZ DANIEL																	25-14	30	$2,862,000	$458,000	EPS017	30	$2,862,000	$114,500	CCF22	30	$2,862,000	$114,500	14-11	30	$2,862,000	6.960%	$199,200	30	$0	$0	Si	$886,200

2025/04/02 01:52 PM

| | | |

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800104214	9	INCITECO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVO	CALLE 127 D 70 D 27	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5165799	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1381328982	9483890010	E	2025/04/03	2025/04/02	BANCO DE OCCIDENTE	0	$62,135,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				57	$33,896,400	$0	$0	$33,896,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	$4,686,200	$0	$0	$4,686,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	$9,678,000	$0	$0	$9,678,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	24	$13,798,700	$0	$0	$13,798,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	$4,895,500	$0	$0	$4,895,500
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$838,000	$0	$0	$838,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				64	$10,330,700	$0	$0	$10,330,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	64	$10,330,700	$0	$0	$10,330,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				64	$8,848,800	$0	$0	$8,848,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	64	$8,848,800	$0	$0	$8,848,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				64	$9,059,600	$0	$0	$9,059,600
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$96,400	$0	$0	$96,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$109,700	$0	$0	$109,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	10	$1,588,600	$0	$0	$1,588,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$926,600	$0	$0	$926,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	12	$1,068,700	$0	$0	$1,068,700
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	3	$520,000	$0	$0	$520,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$163,500	$0	$0	$163,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	11	$1,516,900	$0	$0	$1,516,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	20	$3,069,200	$0	$0	$3,069,200
TOTAL				64	$62,135,500	$0	$0	$62,135,500

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

CERTIFICACIÓN PARAFISCALES

CONSORCIO INCITECO IP

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTEA PARAFISCALES ARTICULO 9 DE LA LEY 828 DE 2003

CERTIFICACIÓN

El suscrito representante legal de **CONSORCIO INCITECO IP** identificado con Nit. 901.899.095-6, certifica que la empresa ha cumplido durante el termino del contrato con el pago de los aportes al sistema de seguridad social, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar exigidos por la ley y se encuentra a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

La anterior certificación se expide a los trece (13) días del mes de mayo de 2025. Para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la ley 789 de 2002 y de acuerdo con lo señalado en el articulo 9 de la ley 828 de 2003.

Cordialmente,

IVAN CAMILO LOPEZ GÓMEZ
C.C. 80.771.365 de Bta.
Representante legal
CONSORCIO INCITECO IP

ALFREDO GOMEZ GONZÁLEZ
C.C. 19.470.988 de Bta.
Revisor Fiscal
T.P.: No. 42062-T

Inciteco
INGENIEROS CONSTRUCTORES

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **ALFREDO GÓMEZ GONZÁLEZ**, identificado con C.C. No. 19´470.988 de Bogotá, y con Tarjeta Profesional No. 42062-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **INCITECO SAS** identificada con Nit **800.104.214-9,** debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, manifiesto que se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 13 días del mes de mayo de 2025.

Cordialmente,

ALFREDO GÓMEZ GONZÁLEZ
C.C. 19.470.988 de Bta.
Revisor Fiscal de INCITECO SAS
T.P.: No. 42062-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19470988**

GOMEZ GONZALEZ
APELLIDOS

ALFREDO
NOMBRES

Alfredo Gómez
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **06-MAY-1962**
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.85	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

28-JUL-1980 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-1500112-42089311-M-0019470988-20010907 **04655** 01242A 02 098205155

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

42062-T



ALFREDO
GOMEZ GONZALEZ
C.C. 19470988
RESOLUCION INSCRIPCION 7 FECHA 16/03/1995
UNIVERSIDAD CENTRAL

PRESIDENTE

LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 49842

IDEOS

FIRMA DEL TITULAR 2231

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

DUPLICADO

LOGOFORMAS.COM 2005/08

WWW.W

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4184000177ACBF5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ALFREDO GOMEZ GONZALEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19470988 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 42062-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

GONZALO ENRIQUE QUINTANA VARGAS identificado con C.C.79.425.517 de Bogotá en mi condición de representante legal de **INGENIEROS PROYECTAR SAS**, identificada con NIT. 900498361-6, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 13 días del mes de Mayo de 2025.

GONZALO ENRIQUE QUINTANA VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIEROS PROYECTAR SAS

FORMATO MS-GC-FR-013

SALARIO MINIMO LEGAL VIGENTE	2.025	$ 1.423.500

CANTIDAD	PERSONAL MINIMO REQUERIDO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	DÍAS TRABAJADOS	SUELDO SEGÚN PROPUESTA	PORCENTAJE DE DEDICACIÓN	VALOR MENSUAL DEVENGADO PROPUESTA ECONOMICA	TOTAL IBC SEGURIDAD SOCIAL	SALUD PATRONAL 8;5%	SALUD TRABAJADOR 4%	PENSION PATRONAL 12%	PENSION TRABAJADOR 4%	TOTAL IBC PARAFISCALES	CAJA DE COMPENSACIÓN 4%	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF 3%	SENA 2%	IBC RIESGOS	TARIFA SISTEMA	ARL
1	DIRECTOR DE OBRA	IVAN CAMILO LOPEZ GOMEZ	30	6.800.000	50%	3.400.000	3.400.000	289.000	136.000	408.000	136.000	3.400.000	136.000	102.000	68.000	3.400.000	0,0696	236.600
1	RESIDENTE DE OBRA	ROVINSON RIVERA ROJAS	30	6.000.000	100%	6.000.000	6.000.000	510.000	240.000	720.000	240.000	6.000.000	240.000	180.000	120.000	6.000.000	0,0696	417.600
1	INSPECTOR VIAL	DIEGO ARMANDO CALLEJAS ROCHA	30	2.200.000	100%	2.200.000	2.200.000	187.000	88.000	264.000	88.000	2.200.000	88.000	66.000	44.000	2.200.000	0,0696	153.100
1	INSPECTOR VIAL	DENNYS JULIANA PINZON ORJUELA	30	2.200.000	100%	2.200.000	2.200.000	187.000	88.000	264.000	88.000	2.200.000	88.000	66.000	44.000	2.200.000	0,0696	153.100
1	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	DIEGO ALEXANDER REYES	30	6.500.000	20%	1.300.000	1.423.500	121.000	52.000	170.800	56.900	1.300.000	52.000	39.000	26.000	1.423.500	0,0696	99.100
1	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	FABIAN TAFUR	30	6.500.000	40%	2.600.000	2.600.000	221.000	104.000	312.000	104.000	2.600.000	104.000	78.000	52.000	2.600.000	0,0696	181.000
1	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	HERNAN MAHECHA	30	6.500.000	20%	1.300.000	1.423.500	121.000	52.000	170.800	56.900	1.300.000	52.000	39.000	26.000	1.423.500	0,0696	99.100
1	ESPECIALISTA AMBIENTAL	YINA PAOLA MARIN DONADO	30	6.190.000	15%	928.500	1.423.500	121.000	37.100	170.800	56.900	928.500	37.100	27.900	18.600	1.423.500	0,0696	99.100
1	PROFESIONAL EN GESTION SOCIAL	SULAY YAMILE BARON MENDEZ	30	6.190.000	35%	2.166.500	2.166.500	184.200	86.700	260.000	86.700	2.166.500	86.700	65.000	43.300	2.166.500	0,0696	150.800
1	PROFESIONAL EN SEGURIDAD INDUSTRIAL	YULIETH ANDREA TORRES CABRERA	30	3.900.000	40%	1.560.000	1.560.000	132.600	62.400	187.200	62.400	1.560.000	62.400	46.800	31.200	1.560.000	0,0696	108.600
1	TOPOGRAFO	ALEXANDER AMAYA CHAVARRO	30	3.000.000	100%	3.000.000	3.000.000	255.000	120.000	360.000	120.000	3.000.000	120.000	90.000	60.000	3.000.000	0,0696	208.800
1	TOPOGRAFO	RUDE ARTURO POLO VERTELL	30	3.000.000	100%	3.000.000	3.000.000	255.000	120.000	360.000	120.000	3.000.000	120.000	90.000	60.000	3.000.000	0,0696	208.800
1	CADENERO	CARLOS EDUARDO LOPEZ DASILVA	30	1.423.500	100%	1.423.500	1.423.500	121.000	56.900	170.800	56.900	1.423.500	56.900	42.700	28.500	1.423.500	0,0696	99.100
1	CADENERO	ORLANDO BEJARANO JIMENEZ	30	1.423.500	100%	1.423.500	1.423.500	121.000	56.900	170.800	56.900	1.423.500	56.900	42.700	28.500	1.423.500	0,0696	99.100
14	TOTAL			61.827.000	100%	32.502.000	33.244.000	4.640.800	1.300.000	3.989.200	2.183.100	32.502.000	1.300.000	975.100	650.100	19.247.000	0	1.339.600
	TOTALES							$ 5.940.800		$ 6.172.300			$ 1.300.000	$ 975.100	$ 650.100			$ 1.339.600
																		$ 16.377.900

Contrato N° : ICCU-767-2024

Nombre del Supervisor: LUIS FERNANDO ROJAS

Firma de Revisión:

Fecha:

SALARIO MINIMO LEGAL VIGENTE	2.025	$ 1.423.500

CANTIDAD	PERSONAL MINIMO REQUERIDO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	DÍAS TRABAJADOS	SUELDO SEGÚN PROPUESTA	PORCENTAJE DE DEDICACIÓN	VALOR MENSUAL DEVENGADO PROPUESTA ECONOMICA	TOTAL IBC SEGURIDAD SOCIAL	SALUD PATRONAL 8:5%	SALUD TRABAJADOR 4%	PENSION PATRONAL 12%	PENSION TRABAJADOR 4%	TOTAL IBC PARAFISCALES	CAJA DE COMPENSACIÓN 4%	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF 3%	SENA 2%	IBC RIESGOS	TARIFA SISTEMA	ARL
1	DIRECTOR DE OBRA	IVAN CAMILO LOPEZ GOMEZ	13	6.800.000	50%	3.400.000	3.400.000	289.000	136.000	408.000	136.000	1.473.333	58.900	44.200	29.500	3.400.000	0,0696	236.600
1	RESIDENTE DE OBRA	ROVINSON RIVERA ROJAS	13	6.000.000	100%	6.000.000	6.000.000	510.000	240.000	720.000	240.000	2.600.000	104.000	78.000	52.000	6.000.000	0,0696	417.600
1	INSPECTOR VIAL	DIEGO ARMANDO CALLEJAS ROCHA	13	2.200.000	100%	2.200.000	2.200.000	187.000	88.000	264.000	88.000	953.333	38.100	28.600	19.100	2.200.000	0,0696	153.100
1	INSPECTOR VIAL	DENNYS JULIANA PINZON ORJUELA	13	2.200.000	100%	2.200.000	2.200.000	187.000	88.000	264.000	88.000	953.333	38.100	28.600	19.100	2.200.000	0,0696	153.100
1	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	DIEGO ALEXANDER REYES	13	6.500.000	20%	1.300.000	1.423.500	121.000	52.000	170.800	56.900	563.333	22.500	16.900	11.300	1.423.500	0,0696	99.100
1	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	FABIAN TAFUR	13	6.500.000	40%	2.600.000	2.600.000	221.000	104.000	312.000	104.000	1.126.667	45.100	33.800	22.500	2.600.000	0,0696	181.000
1	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	HERNAN MAHECHA	13	6.500.000	20%	1.300.000	1.423.500	121.000	52.000	170.800	56.900	563.333	22.500	16.900	11.300	1.423.500	0,0696	99.100
1	ESPECIALISTA AMBIENTAL	YINA PAOLA MARIN DONADO	13	6.190.000	15%	928.500	1.423.500	121.000	37.100	170.800	56.900	402.350	16.100	12.100	8.000	1.423.500	0,0696	99.100
1	PROFESIONAL EN GESTION SOCIAL	SULAY YAMILE BARON MENDEZ	13	6.190.000	35%	2.166.500	2.166.500	184.200	86.700	260.000	86.700	938.817	37.600	28.200	18.800	2.166.500	0,0696	150.800
1	PROFESIONAL EN SEGURIDAD INDUSTRIAL	YULIETH ANDREA TORRES CABRERA	13	3.900.000	40%	1.560.000	1.560.000	132.600	62.400	187.200	62.400	676.000	27.000	20.300	13.500	1.560.000	0,0696	108.600
1	TOPOGRAFO	ALEXANDER AMAYA CHAVARRO	13	3.000.000	100%	3.000.000	3.000.000	255.000	120.000	360.000	120.000	1.300.000	52.000	39.000	26.000	3.000.000	0,0696	208.800
1	TOPOGRAFO	RUDE ARTURO POLO VERTELL	13	3.000.000	100%	3.000.000	3.000.000	255.000	120.000	360.000	120.000	1.300.000	52.000	39.000	26.000	3.000.000	0,0696	208.800
1	CADENERO	CARLOS EDUARDO LOPEZ DASILVA	13	1.423.500	100%	1.423.500	1.423.500	121.000	56.900	170.800	56.900	616.850	24.700	18.500	12.300	1.423.500	0,0696	99.100
1	CADENERO	ORLANDO BEJARANO JIMENEZ	13	1.423.500	100%	1.423.500	1.423.500	121.000	56.900	170.800	56.900	616.850	24.700	18.500	12.300	1.423.500	0,0696	99.100
14	TOTAL			36.700.000	100%	19.000.000	19.247.000	1.636.000	760.000	2.309.600	769.800	8.233.333	329.200	247.000	164.800	19.247.000	0	1.339.600
	TOTALES							$ 2.396.000		$ 3.079.400			$ 329.200	$ 247.000	$ 164.800			$ 1.339.600
																		$ 7.556.000

Contrato N° : ICCU-767-2024

Nombre del Supervisor: LUIS FERNANDO ROJAS

Firma de Revisión:

Fecha:

OFICIO APROBACIÓN DEL PAGA

Bogotá,14 de abril de 2025. **ICCU-232-25-0037**

Señores
CONSORCIO INCITECO IP
Ing. IVÁN CAMILO LÓPEZ GÓMEZ
Representante Legal
Calle 127 #70d-27
Bogotá.

Ref.: Contrato de obra No. ICCU- 767 de 2024.
Objeto: REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ - PASO ANCHO A LA INSPECCIÓN DE BRICEÑO MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA.

Ref.: Contrato de interventoría No. ICCU-CTO-232-2025.
Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ - PASO ANCHO A LA INSPECCIÓN DE BRICEÑO MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA.

ASUNTO: Respuesta comunicación CIIP-025-2025 – Aprobación PAGA versión 2

Cordial saludo,

Después de verificar la información del asunto, esta interventoría se permite confirmar que el contratista cumplió con la subsanación de todas las observaciones remitidas y el documento cumple con lo estipulado en los requerimientos contractuales, por lo tanto, se da aprobación en su versión 2.

Se hace claridad que entro de la guía en el área social, se tendrán presentes los lineamientos específicos relacionados en el Plan de Gestión Social, avalado para el contrato.

Cordialmente.

EDGAR EDUARDO LARA GUZMÁN
Director de Interventoría.
CONSORCIO RED INFRANOVA
Proyectó: JRB
Revisó: EELG
cc Luis Fernando Rojas Cruz – Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU)

INFORMES MENSUALES TÉCNICOS

INFORME TÉCNICO DE OBRA No 1

Periodo comprendido del 19 de marzo al 31 de marzo de 2025

INSTITUTO DE CAMNINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

CONSORCIO INCITECO IP

CONTRATO ICCU No. 767 DE 2024

REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ – PASO ANCHO A LA INSPECCIÓN DE BRICEÑO MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA

BOGOTA, ABRIL DE 2025

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción del Cambio
0	7 Abril 2025	**Emisión del documento.**
1	14 Abril 2025	**Ajuste observaciones**


Elaborado por:	Revisado por:
	
Nombre: Rovinson Rivera Rojas	Nombre: Iván Camilo López Gómez
Cargo: Residente de Obra	Cargo: Director de Obra

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5
2. ALCANCE 5
3. LOCALIZACION DEL PROYECTO 5
4. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 6
4.1. INFORMACIÓN CONTRATISTA 6
5. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA 7
5.1. GARANTIAS CONSTRACTUALES 7
5.2. CUADRO DE CONTROL LEGAL 8
5.3. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 8
6. INFORMACIÓN TECNICA 9
6.1. PROGRAMACIÓN DE OBRA 9
6.2. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN DE OBRA 11
6.3. ESTADO DEL TIEMPO EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO 12
6.4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL MES 12
6.4.1. VERIFICACIÓN DEL SUELO 13
6.4.2. REPLANTEO TOPOGRAFICO Y GEOMETRICO 14
6.4.3. IDENTIFICACIÓN DE OBRAS DE ARTE EXISTENTES EN EL CORREDOR 15
6.4.4. ENSAYOS DE DEFLECTOMETRÍA 15
7. REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES REALIZADAS 16
8. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE ENSAYOS DE LABORATORIO Y DE CAMPO 20
9. CONCLUSIÓN 20

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Información del corredor vial a intervenir 5
Tabla 2. Información del Contrato de Obra ICCU-767-2024. 7
Tabla 3. Amparos contrato de obra – firma del contrato 7
Tabla 4. Amparos contrato de obra – Acta de inicio 8
Tabla *5*. Documentos contractuales del contrato de Obra ICCU-767-2024 8
Tabla *6*. Programación del contrato de Obra ICCU-767-2024 11

LISTA DE IMÁGENES

Imagen 1 Localización del proyecto – tramo A (Paso Ancho)..... 6
Imagen 2. Localización del proyecto – tramo B (Club Sabana) 6
Imagen 3. Estado del tiempo – Precipitaciones Sector de Paso Ancho 12
Imagén 4. Apiques exploratorios 13
Imagen 5. Actividades topográficas - replanteo 14
Imagen 6. Actividades de identificación y limpieza obras de arte 15
Imagen 7. Actividades ensayo deflectometría 16

Anexo 1 POLIZAS DEL CONTRATO

Anexo 2 DOCUMENTOS CONTRACTUALES

Anexo 3 PROGRAMACIÓN DE OBRA

Anexo 4 INFORMES SEMANALES

1. INTRODUCCIÓN

El proyecto que actualmente se ejecuta comprende la ejecución de los trabajos necesarios para la "**REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ – PASO ANCHO A LA INSPECCIÓN DE BRICEÑO MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA"** el cual consiste en el mejoramiento de las condiciones del corredor vial por medio de una estructura de pavimento flexible, construcción de estructuras de obras de drenaje, construcción de obras de arte tipo cuneta y señalización vial a lo largo de la vía que comunica el casco urbano del municipio de Zipaquirá haca la inspección de Briceño en el municipio de Sopó -Cundinamarca.

2. ALCANCE

El alcance del proyecto abarca todas las labores necesarias que se deben desarrollar para cumplir con el objeto del contrato y mejorar las condiciones del corredor vial. Los tramos priorizados (A y B) corresponden a aproximadamente 2.491m con un ancho promedio de 7.4m.

No obstante, si por razones técnicas o económicas o sociales, no es posible ejecutar el proyecto de acuerdo con los parámetros indicados en la zona priorizada, se podrán reajustar las condiciones técnicas teniendo en cuenta la situación actual de la vía y los resultados de la revisión del componente de estudios y diseños. En todo caso, en cualquier etapa del proyecto, será el ICCU quien estudiará y avalará los posibles reajustes presentados.

3. LOCALIZACION DEL PROYECTO

El proyecto comprende la intervención de 2.491 metros de rehabilitación de vía ubicados a lo largo del corredor vial que conecta a Zipaquirá, sector de Paso Ancho a la inspección de Briceño, municipio de Sopó en el departamento Cundinamarca.

TRAMO	LONGITUD	ANCHO PROMEDIO	AREA DE INTERVENCIÓN
SECTOR A – K 6 + 528 a K 7 + 862	1334	9.00 m	12.006 m2
SECTOR B K 4 + 623 a K 5 + 780	1157	6.50 m	7.520 m2

Tabla 1. Información del corredor vial a intervenir



Imagen 1 Localización del proyecto – tramo A (Paso Ancho)
Fuente: Google Earth



Imagen 2. Localización del proyecto – tramo B (Club Sabana)
Fuente: Google Earth

4. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

4.1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATO N°	ICCU-767-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO INCITECO IP
OBJETO	REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ – PASO ANCHO A LA INSPECCIÓN DE BRICEÑO MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 10.363.640.754,00 M/CTE
FECHA DE INICIO	19 DE MARZO DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	8 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	18 DE NOVIEMBRE DE 2025
DIRECTOR DE OBRA	IVÁN CAMILO LÓPEZ GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL	IVÁN CAMILO LÓPEZ GÓMEZ
DIRECCIÓN	Calle 127D # 70D-27
TELEFAX	516 5799 – 317 502 3770

Tabla 2. Información del Contrato de Obra ICCU-767-2024.

5. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA

5.1. GARANTIAS CONSTRACTUALES

Teniendo en cuenta lo contemplado en la **CLAUSULA 18 – GARANTIAS** del contrato de obra, el contratista generó, entregó y cargó a la plataforma del SECOP II, las siguientes garantías de cumplimiento las cuales ya contaron con aprobación por parte del ICCU el día 4 de marzo de 2025.

COMPAÑÍA DE SEGUROS: SEGUROS DEL ESTADO S.A
NÚMERO DE POLIZA: 21-44-101461107
FECHA DE EXPEDICIÓN: 09 DE ENERO DE 2025
ANEXO 0

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	08/01/2025	08/01/2026	2.072.728.150,80
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	08/01/2025	08/01/2026	2.000.000.000,00
PRESTACIONES SOCIALES	08/01/2025	08/09/2028	518.182.037,40
ESTABILIDAD DE LA OBRA	08/01/2026	08/01/2030	3.109.092.226,20

Tabla 3. Amparos contrato de obra – firma del contrato

Con la expedición de acta de inicio, documento firmado entre las partes el día 19 de marzo de 2025, el contratista de obra procedió actualizar las vigencias de los amparos y a cargas las pólizas en el portal electrónico SECOP II, las cuales ya cuentan con aprobación por parte de la entidad contratante. A continuación, se relacionan.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	19/03/2025	19/03/2026	2.072.728.150,80

BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	19/03/2025	19/03/2026	2.000.000.000,00
PRESTACIONES SOCIALES	19/03/2025	17/11/2028	518.182.037,40
ESTABILIDAD DE LA OBRA	17/11/2025	17/11/2030	3.109.092.226,20

Tabla 4. Amparos contrato de obra – Acta de inicio

Los documentos en sus distintos anexos se encuentran dentro del presente documento para su revisión, dentro del **Anexo 1 – Pólizas del contrato de obra.**

5.2. CUADRO DE CONTROL LEGAL

DOCUMENTO	NO.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	OBJETO
CONTRATO DE OBRA	1742-20	24/12/2024	"REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ – PASO ANCHO A LA INSPECCIÓN DE BRICEÑO MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA
ACTA DE INICIO DE OBRA	1	19/03/2025	SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO

Tabla 5. Documentos contractuales del contrato de Obra ICCU-767-2024
Fuente: Elaboración propia

Documentos que se encuentran anexos dentro del presente informe su revisión, dentro del **Anexo 2 – Documentos contractuales de obra.**

5.3. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Conforme a la **CLAUSULA 6 – FORMA DE PAGO,** la entidad entregará un anticipo por un valor equivalente a $2.000.000.000 M/Cte, el cual será amortizado mediante deducciones de las actas parciales de obra y deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situación que deberá ser controlada por la interventoría.

Teniendo como referencia la fecha de corte del presente periodo, se informa que el contratista se encuentra realizando el trámite y gestiones pertinentes para el desembolso del 100% de anticipo requeridos para el contrato de obra.

6. INFORMACIÓN TECNICA

6.1. PROGRAMACIÓN DE OBRA

El 19 de marzo de 2025, el contratista presentó la Programación General inicial del contrato de Obra No ICCU-767-2024 Versión 0 mediante el comunicado, CIIP– 013-2025, teniendo en cuenta los tiempos de ejecución y duración del contrato. Esta programación fue retroalimentada teniendo en cuenta las observaciones que realizó la interventoría teniendo aprobación final el día 21 de marzo de 2025 la cual se relaciona dentro del presente documento en el **Anexo 3 Programación de obra.**

767-24	**CTO ICCU 767 DE 2024 - REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ – PASO ANCHO A LA INSPECCIÓN DE BRICEÑO MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA**	**196 días**	**mié 19/03/25**	**mar 18/11/25**	**$ 10.363.640.754**
IN	**ACTA DE INICIO**	**0 días**	**mié 19/03/25**	**mié 19/03/25**	**$ 0**
F1	**FRENTE DE OBRA 1**	**191 días**	**mié 26/03/25**	**mar 18/11/25**	**$ 8.898.189.242**
CP 1	**CAPITULO 1. EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES**	**131 días**	**jue 27/03/25**	**lun 8/09/25**	**$ 889.533.917**
1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	130 días	jue 27/03/25	vie 5/09/25	$ 151.943.535
1.2	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	130 días	jue 27/03/25	vie 5/09/25	$ 77.265.210
1.3	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CNALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES)	130 días	vie 28/03/25	lun 8/09/25	$ 660.325.172
CP 2	**CAPITULO 2. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	**176 días**	**mié 26/03/25**	**mié 29/10/25**	**$ 7.657.761.139**
2.1	FRESADO CONCRETO ASFALTICO (E=5-15cm)	130 días	mié 26/03/25	mié 3/09/25	$ 149.049.456
2.2	BASE GRANULAR	120 días	mar 22/04/25	mié 17/09/25	$ 154.788.114
2.3	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-1	120 días	sáb 10/05/25	vie 3/10/25	$ 3.705.041.250
2.4	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	100 días	mar 10/06/25	jue 9/10/25	$ 112.364.560
2.5	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	100 días	mar 1/07/25	mié 29/10/25	$ 69.001.939

2.6	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	100 días	mar 1/07/25	mié 29/10/25	$ 1.313.837.000
2.7	MEZCLA SEMIDENSA EN CALIENTE TIPO MSC-25 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	100 días	mié 11/06/25	vie 10/10/25	$ 2.075.706.535
2.8	AFIRMADO	130 días	mar 8/04/25	mié 17/09/25	$ 15.645.080
2.9	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	130 días	jue 3/04/25	jue 11/09/25	$ 62.327.205
CP 5	**CAPITULO 5. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL**	**115 días**	**mar 1/07/25**	**mar 18/11/25**	**$ 350.894.186**
5.1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	40 días	lun 29/09/25	mar 18/11/25	$ 45.623.240
5.2	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	40 días	lun 29/09/25	mar 18/11/25	$ 38.323.950
5.3	TOPE DEFENSA METÁLICA	70 días	vie 18/07/25	vie 10/10/25	$ 23.176.155
5.4	SECCIÓN FINAL DEFENSA METÁLICA	20 días	vie 10/10/25	jue 6/11/25	$ 950.296
5.5	DEFENSA METÁLICA	90 días	mar 1/07/25	jue 16/10/25	$ 160.977.560
5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES	15 días	mié 29/10/25	mar 18/11/25	$ 22.391.480
5.7	SEÑAL DE VERTICAL GRUPO I 0.75X0.75M, POSTE 3.5M	90 días	vie 18/07/25	jue 6/11/25	$ 37.619.802
5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPEROLES DE 10x3.0 CM	15 días	mié 29/10/25	mar 18/11/25	$ 11.807.040
5.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPTAFAROS (EN DEFENSAS METÁLICAS)	90 días	lun 7/07/25	jue 23/10/25	$ 10.024.663
F2	**FRENTE DE OBRA 2**	**169 días**	**mié 19/03/25**	**mié 15/10/25**	**$ 988.667.373**
CP 3	**CAPITULO 3. OBRAS DE ARTE Y ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN**	**169 días**	**mié 19/03/25**	**mié 15/10/25**	**$ 988.090.309**
3.1	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	120 días	vie 25/04/25	vie 19/09/25	$ 25.647.136
3.2	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	120 días	mar 20/05/25	mié 15/10/25	$ 30.076.060
3.3	CUNETA DE CONCRETO CLASE D, 3000 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	100 días	vie 25/04/25	jue 28/08/25	$ 390.704.790
3.4	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	90 días	jue 27/03/25	vie 18/07/25	$ 9.072.450

3.5	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	110 días	lun 31/03/25	jue 14/08/25	$ 7.032.142
3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	80 días	mié 19/03/25	vie 27/06/25	$ 79.063.891
3.7	SUMINISTRO, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	130 días	vie 25/04/25	mié 1/10/25	$ 432.290.700
3.8	COLCHONETA RENO	150 días	mar 1/04/25	jue 2/10/25	$ 14.203.140
CP 4	**CAPITULO 4. MANTENIMIENTO VIAL**	**20 días**	**mié 19/03/25**	**vie 11/04/25**	**$ 577.064**
	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	20 días	mié 19/03/25	vie 11/04/25	$ 577.064
	PRIOVISIÓN PARA AJUSTE POR POSIBLE VARIACIÓN COSTOS EN INSUMOS	**196 días**		**mar 18/11/25**	**$ 195.500.000**
	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	**196 días**	**mié 19/03/25**	**mar 18/11/25**	**$ 131.060.000**
	PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL	**196 días**	**mié 19/03/25**	**mar 18/11/25**	**$ 150.224.139**
	FIN DE CONTRATO	**0 días**	**mar 18/11/25**	**mar 18/11/25**	**$ 0**

Tabla 6. Programación del contrato de Obra ICCU-767-2024
Fuente: Elaboración propia

6.2. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN DE OBRA

Durante el periodo a informe en el presente documento, es importante mencionar que se tiene una ejecución programada del 0.333% frente a una ejecución real del 0.23%. Entre las principales labores realizadas en los 12 días informados se encuentras las relacionadas con las actividades preliminares de inspección en el tramo (limpieza, replanteo topográfico) y las relacionadas con la implementación de la señalización del Plan de Manejo de tránsito (PMT).

La diferencia entre lo programado y lo ejecutado radica inicialmente en la imposibilidad de poder iniciar labores de intervención sobre el corredor vial con actividades de excavación dado los resultados del replanteo y alineamiento de la vía e información faltante por parte de la empresa de Servicios Públicos en relación con el sistema de alcantarillado construido anteriormente que han retardado las labores propias de construcción.

6.3. ESTADO DEL TIEMPO EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

El estado del tiempo quedará registrado de manera diaria en la bitácora de obra, consignando si en el día se presentaron lluvias intensas, lloviznas, lluvia intermitente o si el día estuvo seco.

Es importante mencionar que el mes de marzo se caracteriza por hacer parte de la primera época de lluvias del año (Marzo – Abril y mayo); no obstante, en la zona de influencia del proyecto, y este periodo informado se presentaron 3 días de lluvias con valores de precipitaciones mayores a los 3 mm que se consideran lluvias moderadas.

IDEAM

Reporte de información Hidrometeorológica de DHIME generado (04/04/2025 14:41)

Nombre estacion:	LA COSECHA [21205910]	**Corriente:**		**Categoría de estación:**	Climática Principal
Latitud:	4.989220	**Longitud:**	-74.001190	**Elevación:**	2570
Entidad:	INSTITUTO DE HIDROLOGI	**Area Operativa:**	Area Operativa 11 - Cundin	**Departamento:**	Cundinamarca
Municipio:	Zipaquirá	**Fecha instalacion:**	15/09/1976 00:00	**Fecha suspensión:**	
Variable:	PRECIPITACION	**Frecuencia:**	Diaria	**Fecha consulta:**	19/03/2025 00:00-31/03/2(
Parametro:	Día pluviométrico (conven	**Unidad medida:**	mm		

Fecha	Valor:	Nivel de Aprobación
2025-03-19 00:00	0	Preliminar
2025-03-20 00:00	0	Preliminar
2025-03-21 00:00	2	Preliminar
2025-03-22 00:00	0	Preliminar
2025-03-23 00:00	0	Preliminar
2025-03-24 00:00	0	Preliminar
2025-03-25 00:00	0	Preliminar
2025-03-26 00:00	0	Preliminar
2025-03-27 00:00	0	Preliminar
2025-03-28 00:00	0	Preliminar
2025-03-29 00:00	0	Preliminar
2025-03-30 00:00	2	Preliminar
2025-03-31 00:00	3	Preliminar

Imagen 3. Estado del tiempo – Precipitaciones Sector de Paso Ancho
Fuente: IDEAM

Según reportes de la estación hidrometereológica LA COSECHA que hace parte de las redes del IDEAM, ubicada en el sector de Paso Ancho, se relacionan aquellos días con precipitaciones. En ese orden de ideas, se precisa que estas lluvias no afectaron el desarrollo de las actividades de preliminares realizadas en campo, como lo fueron los recorridos de identificación de obras de arte existente, la verificación del diseño geométrico de la vía y la toma de apiques de verificación.

6.4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL MES

Durante el periodo comprendido para el presente informe el contratista realizó actividades preliminares como la revisión de estudios y diseños entregados por la entidad, actividades

exploratorias (apiques), el replanteo y localización de todo el corredor vial y labores relacionadas con la implementación del PMT. A continuación, se detallan

6.4.1. VERIFICACIÓN DEL SUELO

Como parámetro fundamental en el diseño de la estructura de pavimento del tramo en estudio, se hace necesaria la determinación de las características intrínsecas del subsuelo y sus propiedades mecánicas, con el fin de determinar la capacidad portante de la subrasante que funcionará como soporte de la estructura y resistirá los efectos del paso de vehículos.

Para validar la caracterización física y mecánica de los materiales que componen el suelo de subrasante de la vía a intervenir, se realizó mediante apiques una exploración geotécnica intrusiva, constituida por la excavación de dos (2) apiques, para determinar los perfiles estratigráficos del suelo con extracción de muestras alteradas de los materiales encontrados para la realización de ensayos de clasificación física y caracterización mecánica.



Imagén 4. Apiques exploratorios

Adicionalmente, se realizó un tercer apique sobre la margen izquierda del corredor vial para revalidar la existencia de la red de gas (Vanti), situación que no pudo ser corroborada en ese momento de la actividad exploratoria.

Finalmente, con la actividad de los apiques exploratorios se logró determinar que sobre la margen (derecha) de la vía donde se construyó la red de alcantarillado no se cuenta con estructura lo que indica que, conforme al alineamiento de la vía, se tendría que construir la estructura de la vía en su totalidad.

6.4.2. REPLANTEO TOPOGRAFICO Y GEOMETRICO

Teniendo en cuenta los puntos GPS suministrados previamente en los estudios y diseños entregados en los documentos del contrato, los días 20, 21 y 22 de marzo de 2025 se realizó en campo la verificación topográfica del corredor vial para el tramo A – SECTOR DE PASO ANCHO en una longitud de 1.334 metros lineales de intervención proyectados inicialmente como se puede observar.

De igual forma se realizó de demarcación en terreno con el respectivo abscisado para una mayor referencia en campo.



Imagen 5. Actividades topográficas - replanteo

6.4.3. IDENTIFICACIÓN DE OBRAS DE ARTE EXISTENTES EN EL CORREDOR

Consecutivamente, durante el periodo de revisión y complementación a los estudios y diseños se realizaron recorridos en campo para la identificación del estado actual de las obras de arte existentes en el corredor, donde se evidenció en que zonas existían pozos de inspección los cuales se encuentran en un estado funcional, pero en la mayoría de las ocasiones obstruidas por algunos elementos y tierra. Dicha identificación de los elementos se realizó conforme a los planos entregados por la empresa de Servicios públicos de Zipaquirá E.S.P – EPZ toda vez que sobre este corredor vial la empresa de servicios realizó la construcción del sistema de alcantarillado en el sector de paso ancho.






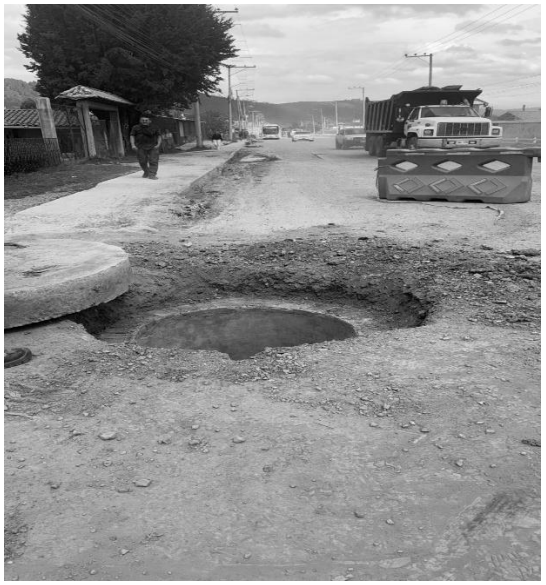Imagen 6. Actividades de identificación y limpieza obras de arte

6.4.4. ENSAYOS DE DEFLECTOMETRÍA

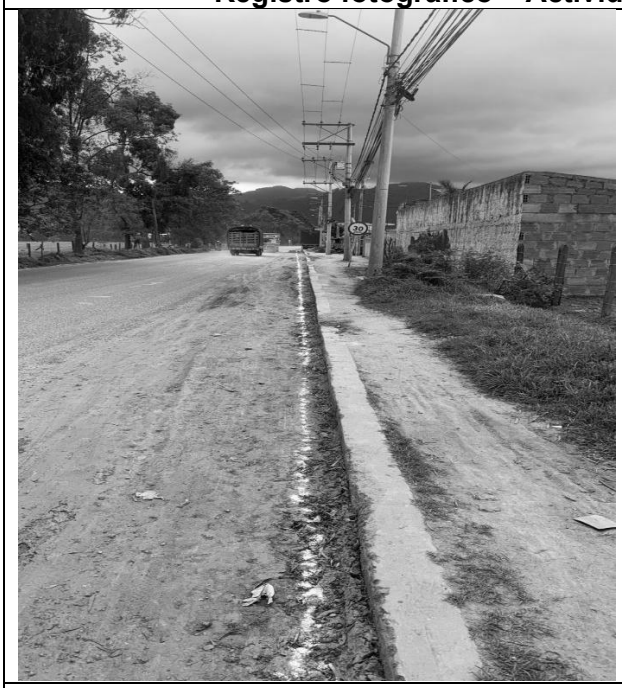
Con ocasión al estudio y validación de los diseños entregados por la entidad y atendiendo las recomendaciones de los especialistas del contratista e interventor, se programó y realizó el ensayo de deflectometría tanto en la zona pavimentadas como las que no están pavimentadas con la finalidad de estudiar el comportamiento de estos materiales y en conjunto con el resto de los insumos de los diseños poder emitir un concepto frente al estado actual de la estructura del corredor vial y la viabilidad del diseño de pavimento.

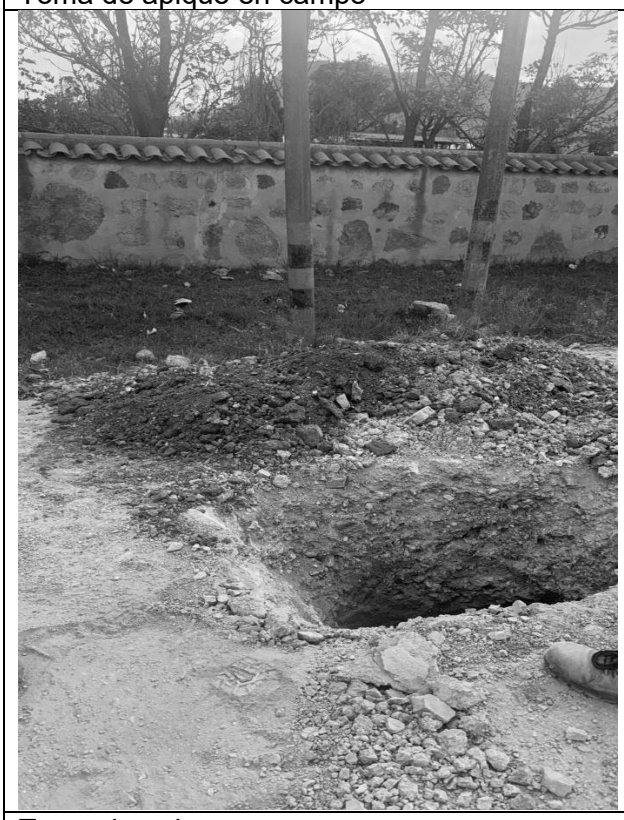
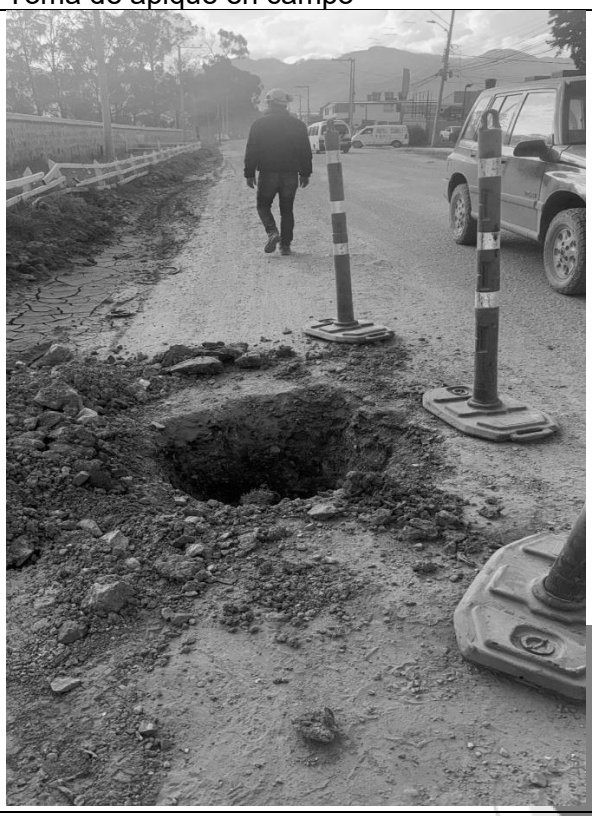


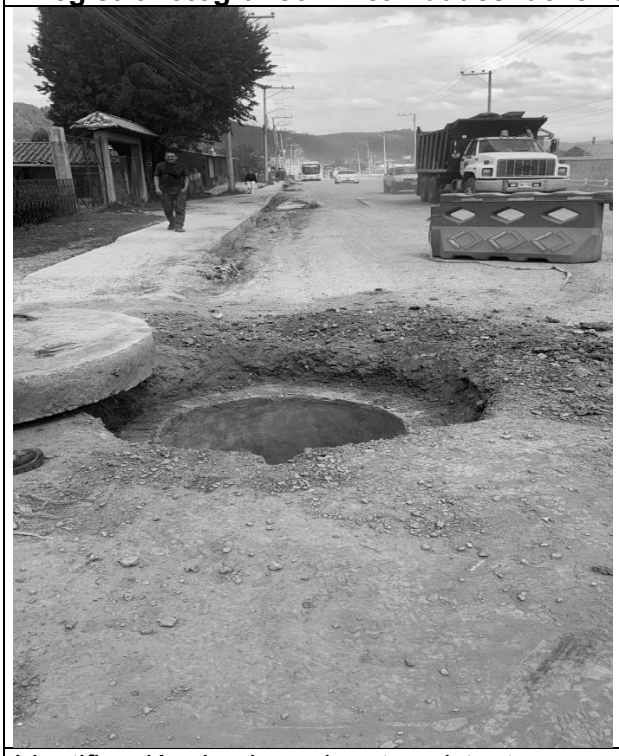
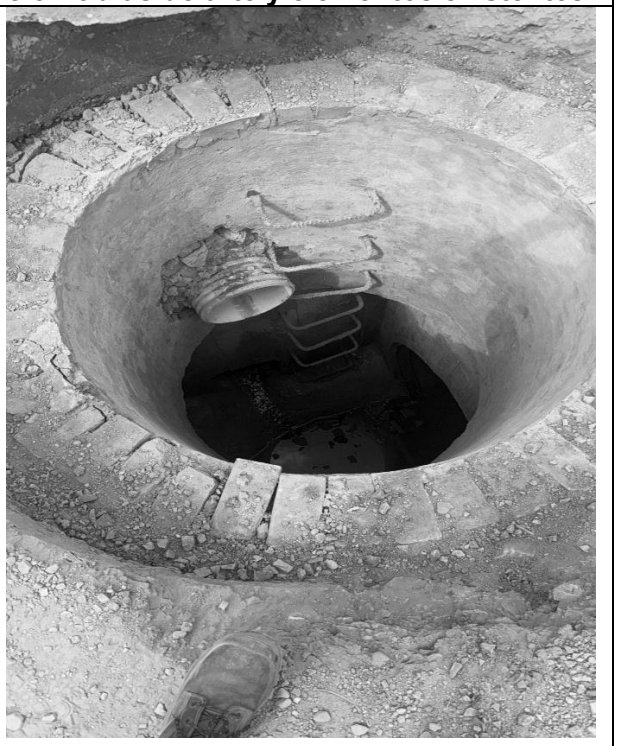
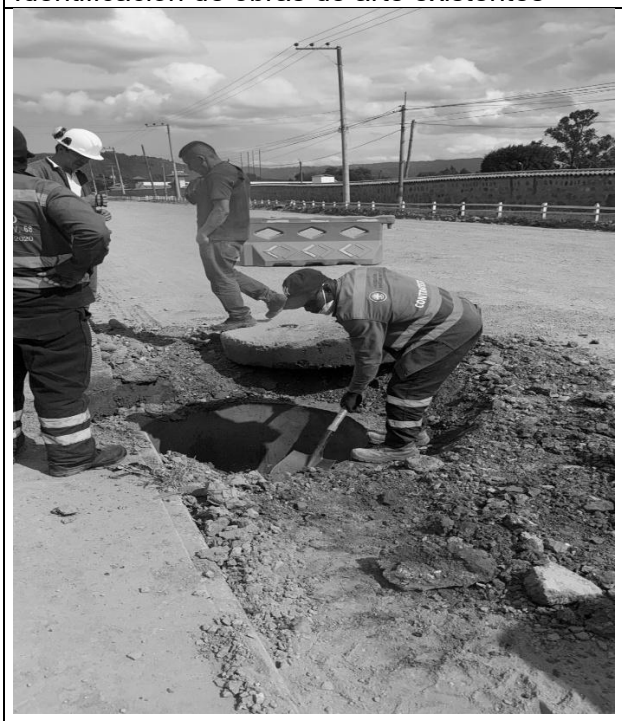
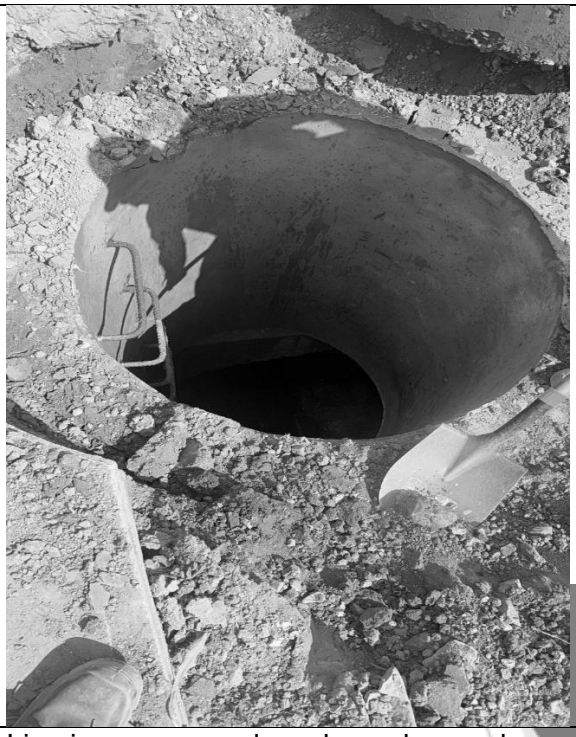

Imagen 7. Actividades ensayo deflectometría



7. REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES REALIZADAS


A continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas a fecha de corte del presente periodo, es decir, al periodo correspondiente entre el 19 de marzo de 2025, momento de inicio del contrato y el 31 de marzo de 2025.

Registro fotográfico – Actividades de replanteo topográfico	
	
Alineación de trazado de la vía	Alineación de trazado de la vía

Registro fotográfico – Actividades Exploratorias (Apiques)	
	
Toma de apique en campo	Toma de apique en campo
	
Toma de apique en campo	Toma de apique en campo

Registro fotográfico – Actividades identificación obras de arte y elementos existentes	
	
Identificación de obras de arte existentes	Identificación de obras de arte existentes
	
Limpieza para despejar obras de arte existentes	Limpieza para despejar obras de arte existentes
Registro fotográfico – Actividades Ensayo Deflectmetría	

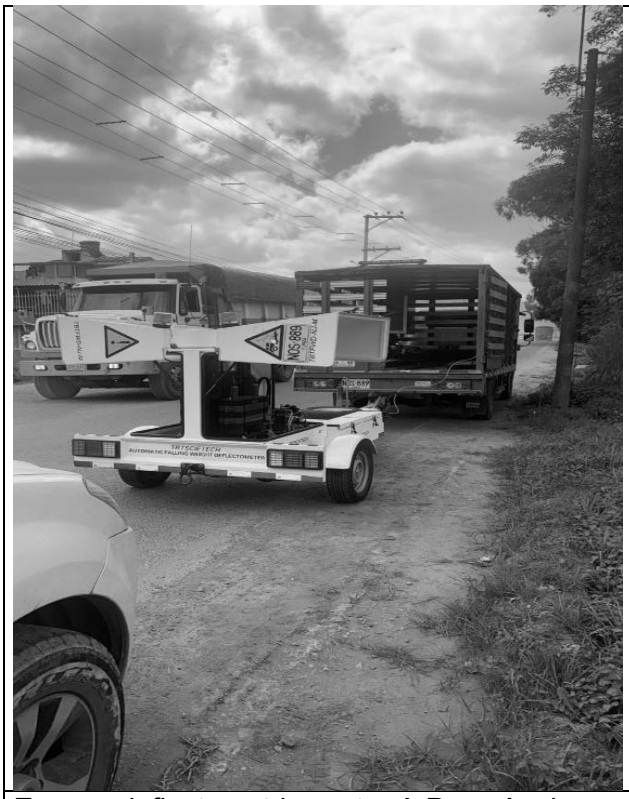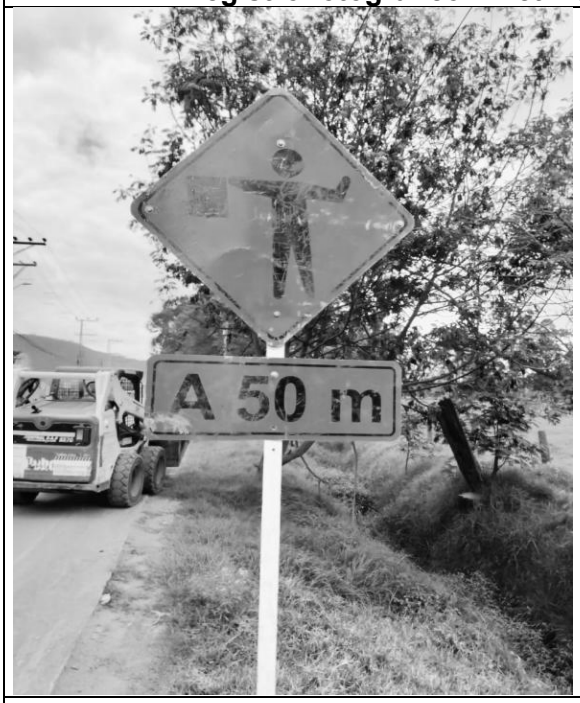	
Ensayo deflectometria sector A Paso Ancho	Ensayo deflectometria sector B Club Sabana
Registro fotográfico – Actividades Instalación señalización PMT	
	
Instalacion de señales del PMT	Instalacion de señales del PMT

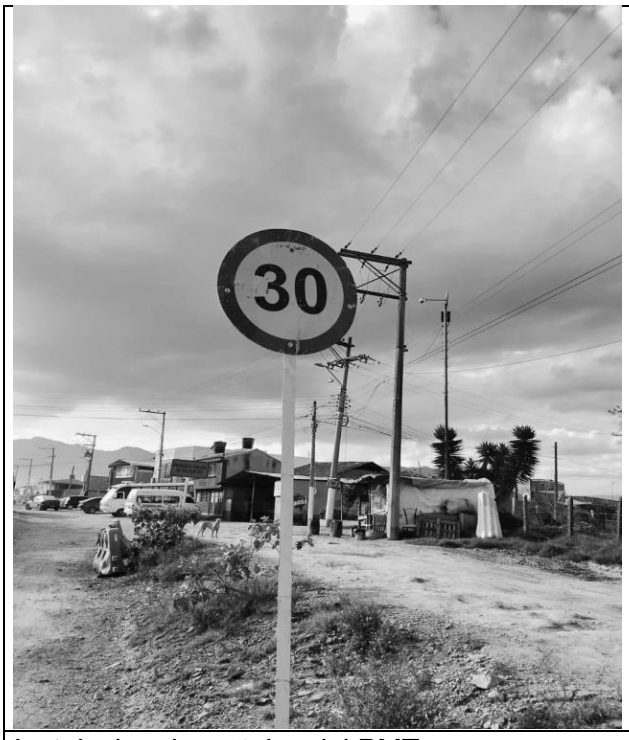	
Instalacion de señales del PMT	Instalacion de señales del PMT

8. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE ENSAYOS DE LABORATORIO Y DE CAMPO

ENSAYOS EJECUTADOS.

En el periodo no se realizaron controles de calidad de los materiales teniendo en cuenta que no se realizó obra.

9. CONCLUSIÓN

Durante el periodo que corresponde el presente informe se adelantaron sin contratiempos las actividades propias de la etapa preliminar; específicamente las relacionadas con el análisis de los diseños entregados, localización topográfica, replanteo y alineamiento de la vía, inspección de obras de arte existentes, identificación de redes de empresas de servicios públicos.

De igual manera, en este periodo informado, el contratista ha manifestado en los comités de obra la necesidad y pertinencia de la inclusión de actividades de obra hidráulicas para el manejo de las aguas sub- superficiales ante la ausencia de estas en el presupuesto oficial. El avance de esta iniciativa se irá madurando conforme se vaya avanzando en el replanteo en campo, tramites y gestiones con la empresa de servicios públicos y los conceptos que emitan los especialistas de las partes.

Anexo 1 POLIZAS DEL CONTRATO

Anexo 2 DOCUMENTOS CONTRACTUALES

Anexo 3 PROGRAMACIÓN DE OBRA

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-06
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	1
	ACTA APROBACION DE PÓLIZAS	FECHA	4/03/2025

Tipo de garantía (Artículo 2.2.1.2.3.1.2 del decreto 1082 de 2015):	Contrato de seguro contenido en una póliza	
	Patrimonio autónomo	
	Garantía Bancaria	
Otra:		

Contrato No:	767 DE 2024
Convenio No:	
Resolución No:	
Contratista o responsable:	CONSORCIO INCITECO IP NIT. 901.899.095-6
Garantía No:	21-44-101461107 ANEXO 2 CUMPLIMIENTO 21-40-101247126 ANEXO 2 RCE
Garantía emitida por:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de expedición de la garantía	27 DE MARZO DE 2025
Fecha de aprobación de la garantía:	31 DE MARZO DE 2025
Razón de la aprobación:	ACTA DE INICIO

CLASE GARANTÍA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		AÑO	MES	DIA	AÑO	MES	DIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$2.072.728.150,80	2025	03	19	2026	03	19
ANTICIPO	$2.000.000.000,00	2025	03	19	2026	03	19
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$518.182.037,70	2025	03	19	2028	11	17
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	*$3.109.092.226,20	*SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS					
RCE	$711.750.000,00	2025	03	19	2025	11	17

Notas u observaciones:

- Por medio del presente anexo, se traslada el inicio de la vigencia de la presente póliza de acuerdo al acta de inicio de fecha 19 de marzo de 2025, los demás términos y condiciones continúan vigentes sin ninguna modificación.
- *Este amparo inicia vigencia una vez se ha finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma del acta de entrega a satisfacción del mismo.
- Se aprueban las pólizas citadas en la referencia por reunir los requisitos de vigencia y cuantía exigidos, de acuerdo con el documento de la referencia.

JUAN DAVID OSPINA ORTEGÓN
Subdirector Técnico - Subdirección de Gestión Contractual – ICCU

Reviso y elaboró: Jonathan Fernando López Pachón – Profesional Universitario - Subdirección de Gestión Contractual - ICCU

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101461107	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	03	2025	19	03	2025	00:00	17	11	2030	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO INCITECO IP	NIT: 901.899.095-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 127 D NRO. 70 D - 27	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3175023770

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU	NIT: 900.258.711-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 26 NRO. 51 - 53 TORRE CENTRAL PISO 8	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7491806

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NO ICCU-767 DE 2024 CUYO OBJETO CONTRACTUAL ES: REHABILITACION DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA PASO ANCHO A LA INSPECCION DE BRICEÑO MUNICIPIO DE SOPO, CUNDINAMARCA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	19/03/2025	19/03/2026	$2,000,000,000.00	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/03/2025	19/03/2026	$2,072,728,150.80	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	19/03/2025	17/11/2028	$518,182,037.70	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$3,109,092,226.20	

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE TRASLADA EL INICIO DE VIGENCIA DE ACUERDO AL ACTA DE INICIO DE FECHA 19 DE MARZO DE 2025. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES SIN NINGUNA MODIFICACION.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **31,504,019.00	$ ******25,000.00	$ ***5,990,513.00	$ ********37,519,533.00	$ ****7,700,002,414.70	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
COLOCADORES DE SEGUROS SUAREZ JIMEN	204973	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

21-44-101461107

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101461107	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	03	2025	19	03	2025	00:00	17	11	2030	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO INCITECO IP	NIT: 901.899.095-6

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 127 D NRO. 70 D - 27	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3175023770

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU	NIT: 900.258.711-1

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 26 NRO. 51 - 53 TORRE CENTRAL PISO 8	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7491806

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INCITECO S.A.S	800104214-9	90.00
INGENIEROS PROYECTAR SAS	900498361-6	10.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101461107

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101461107, anexo 2, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 27 días del mes de MARZO de 2025

21-44-101461107

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101247126	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	03	2025	19	03	2025	00:00	17	11	2025	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO INCITECO IP	NIT: 901.899.095-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 127 D NRO. 70 D - 27	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3175023770

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU	NIT: 900.258.711-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 26 NRO. 51 - 53 TORRE CENTRAL PISO 8	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7491806

BENEFICIARIO: 900258711 - INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL CONTRATO NO ICCU-767 DE 2024 CUYO OBJETO CONTRACTUAL ES: REHABILITACION DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA PASO ANCHO A LA INSPECCION DE BRICEÑO MUNICIPIO DE SOPO, CUNDINAMARCA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	19/03/2025	17/11/2025	$711,750,000.00	
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	19/03/2025	17/11/2025	$711,750,000.00	
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	19/03/2025	17/11/2025	$711,750,000.00	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE TRASLADA EL INICIO DE VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA DE ACUERDO AL ACTA DE INICIO DE FECHA 19 DE MARZO DE 2025. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES SIN NINGUNA MODIFICACION.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****947,700.00	$ ******20,000.00	$ *****183,863.00	$ *********1,151,563.00	$ ******711,750,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
COLOCADORES DE SEGUROS SUAREZ JIMEN	204973	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101247126

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101247126	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	03	2025	19	03	2025	00:00	17	11	2025	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO INCITECO IP		NIT: 901.899.095-6
DIRECCIÓN: CL 127 D NRO. 70 D - 27	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3175023770

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU		NIT: 900.258.711-1
DIRECCIÓN: CL 26 NRO. 51 - 53 TORRE CENTRAL PISO 8	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	7491806

BENEFICIARIO: 900258711 - INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	19/03/2025	17/11/2025	$711,750,000.00	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	19/03/2025	17/11/2025	$711,750,000.00	
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	19/03/2025	17/11/2025	$711,750,000.00	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101247126

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101247126	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	03	2025	19	03	2025	00:00	17	11	2025	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO INCITECO IP		NIT: 901.899.095-6
DIRECCIÓN: CL 127 D NRO. 70 D - 27	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3175023770

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU		NIT: 900.258.711-1
DIRECCIÓN: CL 26 NRO. 51 - 53 TORRE CENTRAL PISO 8	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	7491800

BENEFICIARIO: 900258711 - INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INCITECO S.A.S	800104214-9	90.00
INGENIEROS PROYECTAR SAS	900498361-6	10.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101247126


FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

63


)T	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
57-24		**CTO ICCU 767 DE 2024 - REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ – PASO ANCHO A LA INSPECCIÓN DE BRICEÑO MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA**	**196 días**	**mié 19/03/25**	**mar 18/11/25**	**$ 10.363.640.754**
1		**ACTA DE INICIO**	**0 días**	**mié 19/03/25**	**mié 19/03/25**	**$ 0**
.		**FRENTE DE OBRA 1**	**191 días**	**mié 26/03/25**	**mar 18/11/25**	**$ 8.898.189.242**
▸ 1		**CAPITULO 1. EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES**	**131 días**	**jue 27/03/25**	**lun 8/09/25**	**$ 889.533.917**
1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	130 días	jue 27/03/25	vie 5/09/25	$ 151.943.535
2		DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	130 días	jue 27/03/25	vie 5/09/25	$ 77.265.210
3		TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CNALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES)	130 días	vie 28/03/25	lun 8/09/25	$ 660.325.172
▸ 2		**CAPITULO 2. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	**176 días**	**mié 26/03/25**	**mié 29/10/25**	**$ 7.657.761.139**
1		FRESADO CONCRETO ASFALTICO (E=5-15cm)	130 días	mié 26/03/25	mié 3/09/25	$ 149.049.456
2		BASE GRANULAR	120 días	mar 22/04/25	mié 17/09/25	$ 154.788.114
3		BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-1	120 días	sáb 10/05/25	vie 3/10/25	$ 3.705.041.250
4		RIEGO DE IMPRIMACIÓN	100 días	mar 10/06/25	jue 9/10/25	$ 112.364.560
5		RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	100 días	mar 1/07/25	mié 29/10/25	$ 69.001.939
6		MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	100 días	mar 1/07/25	mié 29/10/25	$ 1.313.837.000
7		MEZCLA SEMIDENSA EN CALIENTE TIPO MSC-25 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	100 días	mié 11/06/25	vie 10/10/25	$ 2.075.706.535
8		AFIRMADO	130 días	mar 8/04/25	mié 17/09/25	$ 15.645.080
9		RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	130 días	jue 3/04/25	jue 11/09/25	$ 62.327.205
▸ 5		**CAPITULO 5. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL**	**115 días**	**mar 1/07/25**	**mar 18/11/25**	**$ 350.894.186**

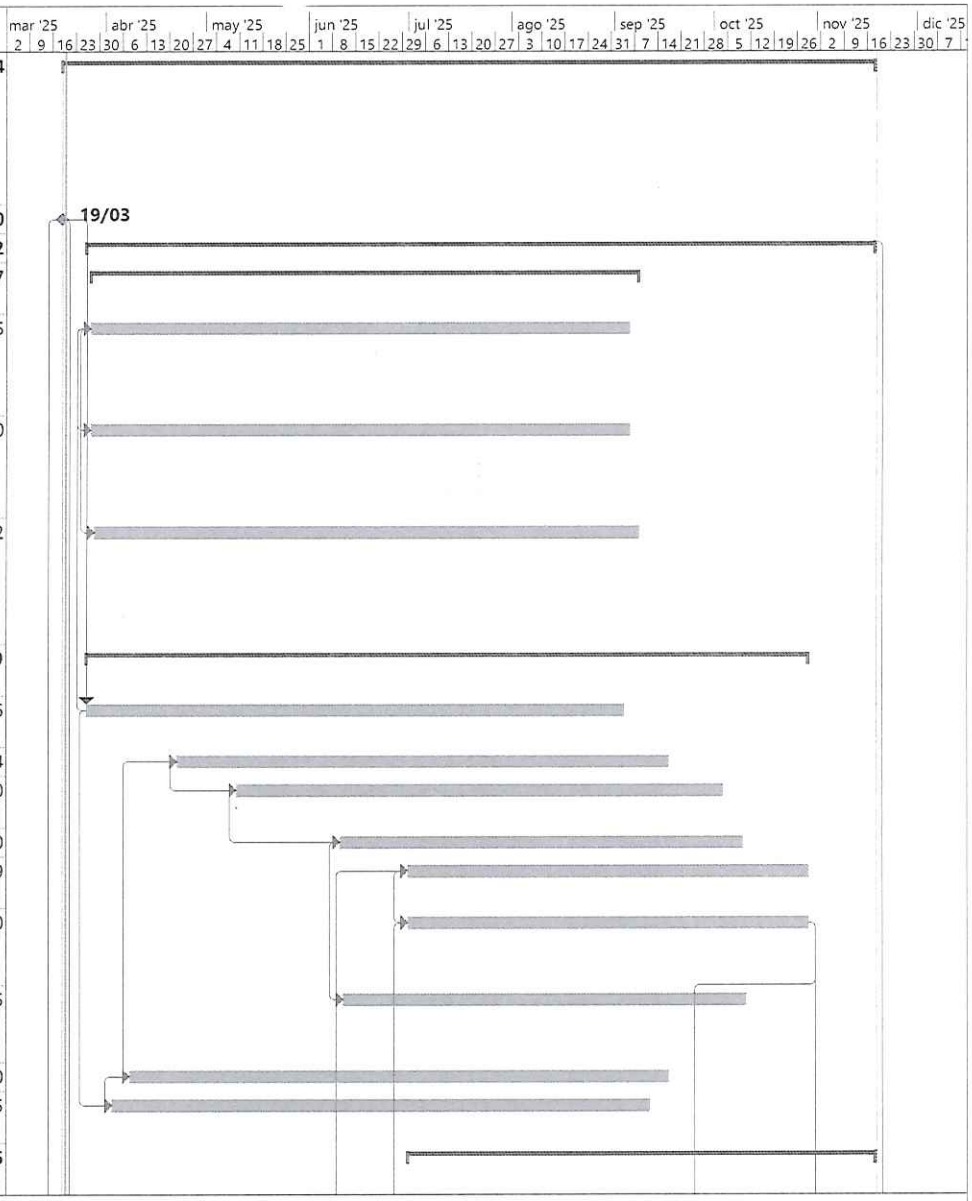

: Proyecto1
ie 20/03/25

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	Progreso manual
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Tareas críticas	
Resumen		Tarea manual		solo fin		División crítica	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas		Progreso	


ÐT	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
1		LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	40 días	lun 29/09/25	mar 18/11/25	$ 45.623.240
2		MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	40 días	lun 29/09/25	mar 18/11/25	$ 38.323.950
3		TOPE DEFENSA METÁLICA	70 días	vie 18/07/25	vie 10/10/25	$ 23.176.155
4		SECCIÓN FINAL DEFENSA METÁLICA	20 días	vie 10/10/25	jue 6/11/25	$ 950.296
5		DEFENSA METÁLICA	90 días	mar 1/07/25	jue 16/10/25	$ 160.977.560
6		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES	15 días	mié 29/10/25	mar 18/11/25	$ 22.391.480
7		SEÑAL DE VERTICAL GRUPO I 0.75X0.75M, POSTE 3.5M	90 días	vie 18/07/25	jue 6/11/25	$ 37.619.802
8		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPEROLES DE 10x3.0 CM	15 días	mié 29/10/25	mar 18/11/25	$ 11.807.040
9		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPTAFAROS (EN DEFENSAS METÁLICAS)	90 días	lun 7/07/25	jue 23/10/25	$ 10.024.663
!		**FRENTE DE OBRA 2**	**169 días**	**mié 19/03/25**	**mié 15/10/25**	**$ 988.667.373**
› 3		**CAPITULO 3. OBRAS DE ARTE Y ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN**	**169 días**	**mié 19/03/25**	**mié 15/10/25**	**$ 988.090.309**
1		CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	120 días	vie 25/04/25	vie 19/09/25	$ 25.647.136
2		CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	120 días	mar 20/05/25	mié 15/10/25	$ 30.076.060
3		CUNETA DE CONCRETO CLASE D, 3000 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	100 días	vie 25/04/25	jue 28/08/25	$ 390.704.790
4		RELLENO PARA ESTRUCTURAS	90 días	jue 27/03/25	vie 18/07/25	$ 9.072.450
5		CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	110 días	lun 31/03/25	jue 14/08/25	$ 7.032.142
6		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	80 días	mié 19/03/25	vie 27/06/25	$ 79.063.891
7		SUMINISTRO, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	130 días	vie 25/04/25	mié 1/10/25	$ 432.290.700
8		COLCHONETA RENO	150 días	mar 1/04/25	jue 2/10/25	$ 14.203.140
› 4		**CAPITULO 4. MANTENIMIENTO VIAL**	**20 días**	**mié 19/03/25**	**vie 11/04/25**	**$ 577.064**

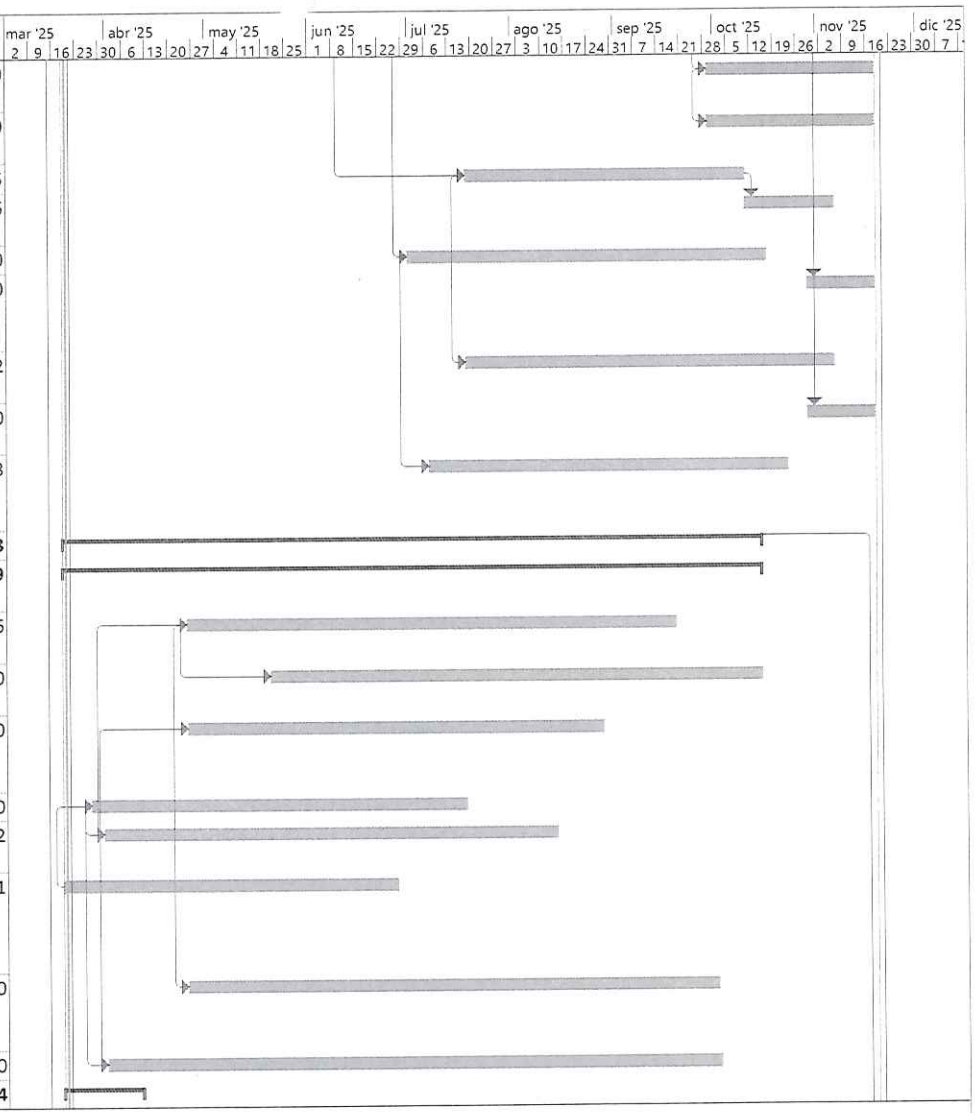

: Proyecto1
ıe 20/03/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

)T	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
1		LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	20 días	mié 19/03/25	vie 11/04/25	$ 577.064
I		**PRIOVISIÓN PARA AJUSTE POR POSIBLE VARIACIÓN COSTOS EN INSUMOS**	**196 días**	**mié 19/03/25**	**mar 18/11/25**	**$ 195.500.000**
VIT		**PLAN DE MANEJO DE TRAFICO**	**196 días**	**mié 19/03/25**	**mar 18/11/25**	**$ 131.060.000**
AGA		**PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL**	**196 días**	**mié 19/03/25**	**mar 18/11/25**	**$ 150.224.139**
N		**FIN DE CONTRATO**	**0 días**	**mar 18/11/25**	**mar 18/11/25**	**$ 0**

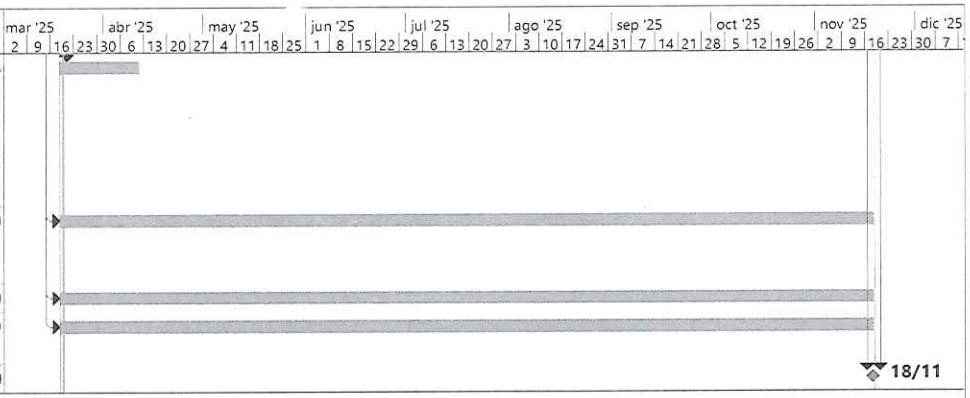

: Proyecto1
ie 20/03/25

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	

INFORME TÉCNICO DE OBRA No 2

Periodo comprendido del 1 de abril al 30 de abril de 2025

INSTITUTO DE CAMNINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

CONSORCIO INCITECO IP

CONTRATO ICCU No. 767 DE 2024

REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ – PASO ANCHO A LA INSPECCIÓN DE BRICEÑO MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA

BOGOTA, MAYO DE 2025

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción del Cambio
0	6 Mayo 2025	**Emisión del documento.**

Elaborado por:	Revisado por:
	
Nombre: Rovinson Rivera Rojas	Nombre: Iván Camilo López Gómez
Cargo: Residente de Obra	Cargo: Director de Obra

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5
2. ALCANCE 5
3. LOCALIZACION DEL PROYECTO 5
4. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 6
4.1. INFORMACIÓN CONTRATISTA 6
5. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA 7
5.1. GARANTIAS CONSTRACTUALES 7
5.2. CUADRO DE CONTROL LEGAL 8
5.3. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 8
6. INFORMACIÓN TECNICA 9
6.1. PROGRAMACIÓN DE OBRA 9
6.2. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN DE OBRA 11
6.3. ESTADO DEL TIEMPO EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO 12
6.4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL MES 13
6.4.1. EXCAVACIONES EN MATERIAL COMÚN PARA MANEJO DE AGUAS 13
6.4.2. LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS 14
6.4.3. CORTE MECANICO PARA CAJEO DE VÍA 14
6.4.4. COLOCACIÓN DE RAJÓN PARA ESTABILIZAR EL TERRENO 15
6.4.5. COLOCACIÓN Y EXTENDIDO DE MATERIAL GRANULAR 16
7. REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES REALIZADAS 17
8. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE ENSAYOS DE LABORATORIO Y DE CAMPO 19
9. GESTIONES DEL CONTRATISTA PARA DEFINIR ALCANCE DE LAS OBRAS 19
10. CONCLUSIÓNES 20

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Información del corredor vial a intervenir 5
Tabla 2. Información del Contrato de Obra ICCU-767-2024. 7
Tabla 3. Amparos contrato de obra – firma del contrato 7
Tabla 4. Amparos contrato de obra – Acta de inicio 8
Tabla *5*. Documentos contractuales del contrato de Obra ICCU-767-2024 8
Tabla *6*. Programación del contrato de Obra ICCU-767-2024 11

LISTA DE IMÁGENES

Imagen 1 Localización del proyecto – tramo A (Paso Ancho)..... 6
Imagen 2. Localización del proyecto – tramo B (Club Sabana) 6
Imagen 3. Estado del tiempo – Precipitaciones Sector de Paso Ancho 12
Imagen 4. Excavaciones para estructuras de manejo de aguas..... 13
Imagen 5. Limpieza de Alcantarillas 14
Imagen 6. Actividades de identificación y limpieza obras de arte 15
Imagen 7. Colocación de material de Rajón 15
Imagen 8. Extendido de material granular 16

Anexo 1 **POLIZAS DEL CONTRATO**

Anexo 2 **DOCUMENTOS CONTRACTUALES**

Anexo 3 **PROGRAMACIÓN DE OBRA**

Anexo 4 **INFORMES SEMANALES**

1. INTRODUCCIÓN

El proyecto que actualmente se ejecuta comprende la ejecución de los trabajos necesarios para la "**REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ – PASO ANCHO A LA INSPECCIÓN DE BRICEÑO MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA"** el cual consiste en el mejoramiento de las condiciones del corredor vial por medio de una estructura de pavimento flexible, construcción de estructuras de obras de drenaje, construcción de obras de arte tipo cuneta y señalización vial a lo largo de la vía que comunica el casco urbano del municipio de Zipaquirá haca la inspección de Briceño en el municipio de Sopó -Cundinamarca.

2. ALCANCE

El alcance del proyecto abarca todas las labores necesarias que se deben desarrollar para cumplir con el objeto del contrato y mejorar las condiciones del corredor vial. Los tramos priorizados (A y B) corresponden a aproximadamente 2.491m con un ancho promedio de 7.4m.

No obstante, si por razones técnicas o económicas o sociales, no es posible ejecutar el proyecto de acuerdo con los parámetros indicados en la zona priorizada, se podrán reajustar las condiciones técnicas teniendo en cuenta la situación actual de la vía y los resultados de la revisión del componente de estudios y diseños. En todo caso, en cualquier etapa del proyecto, será el ICCU quien estudiará y avalará los posibles reajustes presentados.

3. LOCALIZACION DEL PROYECTO

El proyecto comprende la intervención de 2.491 metros de rehabilitación de vía ubicados a lo largo del corredor vial que conecta a Zipaquirá, sector de Paso Ancho a la inspección de Briceño, municipio de Sopó en el departamento Cundinamarca.

TRAMO	LONGITUD	ANCHO PROMEDIO	AREA DE INTERVENCIÓN
SECTOR A – K 6 + 528 a K 7 + 862	1334	9.00 m	12.006 m2
SECTOR B K 4 + 623 a K 5 + 780	1157	6.50 m	7.520 m2

Tabla 1. Información del corredor vial a intervenir



Imagen 1 Localización del proyecto – tramo A (Paso Ancho)
Fuente: Google Earth



Imagen 2. Localización del proyecto – tramo B (Club Sabana)
Fuente: Google Earth

4. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

4.1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATO N°	ICCU-767-2024
CONTRATISTA	CONSORCIO INCITECO IP
OBJETO	REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ – PASO ANCHO A LA INSPECCIÓN DE BRICEÑO MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 10.363.640.754,00 M/CTE
FECHA DE INICIO	19 DE MARZO DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	8 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	18 DE NOVIEMBRE DE 2025
DIRECTOR DE OBRA	IVÁN CAMILO LÓPEZ GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL	IVÁN CAMILO LÓPEZ GÓMEZ
DIRECCIÓN	Calle 127D # 70D-27
TELEFAX	516 5799 – 317 502 3770

Tabla 2. Información del Contrato de Obra ICCU-767-2024.

5. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA

5.1. GARANTIAS CONSTRACTUALES

Teniendo en cuenta lo contemplado en la **CLAUSULA 18 – GARANTIAS** del contrato de obra, el contratista generó, entregó y cargó a la plataforma del SECOP II, las siguientes garantías de cumplimiento las cuales ya contaron con aprobación por parte del ICCU el día 4 de marzo de 2025.

COMPAÑÍA DE SEGUROS: SEGUROS DEL ESTADO S.A
NÚMERO DE POLIZA: 21-44-101461107
FECHA DE EXPEDICIÓN: 09 DE ENERO DE 2025
ANEXO 0

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	08/01/2025	08/01/2026	2.072.728.150,80
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	08/01/2025	08/01/2026	2.000.000.000,00
PRESTACIONES SOCIALES	08/01/2025	08/09/2028	518.182.037,40
ESTABILIDAD DE LA OBRA	08/01/2026	08/01/2030	3.109.092.226,20

Tabla 3. Amparos contrato de obra – firma del contrato

Con la expedición de acta de inicio, documento firmado entre las partes el día 19 de marzo de 2025, el contratista de obra procedió actualizar las vigencias de los amparos y a cargas las pólizas en el portal electrónico SECOP II, las cuales ya cuentan con aprobación por parte de la entidad contratante. A continuación, se relacionan.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	19/03/2025	19/03/2026	2.072.728.150,80

BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	19/03/2025	19/03/2026	2.000.000.000,00
PRESTACIONES SOCIALES	19/03/2025	17/11/2028	518.182.037,40
ESTABILIDAD DE LA OBRA	17/11/2025	17/11/2030	3.109.092.226,20

Tabla 4. Amparos contrato de obra – Acta de inicio

Los documentos en sus distintos anexos se encuentran dentro del presente documento para su revisión, dentro del **Anexo 1 – Pólizas del contrato de obra.**

5.2. CUADRO DE CONTROL LEGAL

DOCUMENTO	NO.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	OBJETO
CONTRATO DE OBRA	1742-20	24/12/2024	"REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ – PASO ANCHO A LA INSPECCIÓN DE BRICEÑO MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA
ACTA DE INICIO DE OBRA	1	19/03/2025	SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO

Tabla 5. Documentos contractuales del contrato de Obra ICCU-767-2024
Fuente: Elaboración propia

Documentos que se encuentran anexos dentro del presente informe su revisión, dentro del **Anexo 2 – Documentos contractuales de obra.**

5.3. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Conforme a la **CLAUSULA 6 – FORMA DE PAGO,** la entidad entregará un anticipo por un valor equivalente a $2.000.000.000 M/Cte, el cual será amortizado mediante deducciones de las actas parciales de obra y deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situación que deberá ser controlada por la interventoría.

Teniendo como referencia la fecha de corte del presente periodo, se informa que el contratista radicó el día 11 de abril de 2025 al ICCU el expediente para el desembolso de los recursos del anticipo. Dicho esto, a la fecha de emisión del presente informe la entidad sigue realizando las gestiones internas para el desembolso a la cuenta de la fiducia.

6. INFORMACIÓN TECNICA

6.1. PROGRAMACIÓN DE OBRA

El 19 de marzo de 2025, el contratista presentó la Programación General inicial del contrato de Obra No ICCU-767-2024 Versión 0 mediante el comunicado, CIIP– 013-2025, teniendo en cuenta los tiempos de ejecución y duración del contrato. Esta programación fue retroalimentada teniendo en cuenta las observaciones que realizó la interventoría teniendo aprobación final el día 21 de marzo de 2025 la cual se relaciona dentro del presente documento en el **Anexo 3 Programación de obra.**

767-24	**CTO ICCU 767 DE 2024 - REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ – PASO ANCHO A LA INSPECCIÓN DE BRICEÑO MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA**	**196 días**	**mié 19/03/25**	**mar 18/11/25**	**$ 10.363.640.754**
IN	**ACTA DE INICIO**	**0 días**	**mié 19/03/25**	**mié 19/03/25**	**$ 0**
F1	**FRENTE DE OBRA 1**	**191 días**	**mié 26/03/25**	**mar 18/11/25**	**$ 8.898.189.242**
CP 1	**CAPITULO 1. EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES**	**131 días**	**jue 27/03/25**	**lun 8/09/25**	**$ 889.533.917**
1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	130 días	jue 27/03/25	vie 5/09/25	$ 151.943.535
1.2	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	130 días	jue 27/03/25	vie 5/09/25	$ 77.265.210
1.3	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CNALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES)	130 días	vie 28/03/25	lun 8/09/25	$ 660.325.172
CP 2	**CAPITULO 2. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	**176 días**	**mié 26/03/25**	**mié 29/10/25**	**$ 7.657.761.139**
2.1	FRESADO CONCRETO ASFALTICO (E=5-15cm)	130 días	mié 26/03/25	mié 3/09/25	$ 149.049.456
2.2	BASE GRANULAR	120 días	mar 22/04/25	mié 17/09/25	$ 154.788.114
2.3	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-1	120 días	sáb 10/05/25	vie 3/10/25	$ 3.705.041.250
2.4	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	100 días	mar 10/06/25	jue 9/10/25	$ 112.364.560
2.5	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	100 días	mar 1/07/25	mié 29/10/25	$ 69.001.939

2.6	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	100 días	mar 1/07/25	mié 29/10/25	$ 1.313.837.000
2.7	MEZCLA SEMIDENSA EN CALIENTE TIPO MSC-25 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	100 días	mié 11/06/25	vie 10/10/25	$ 2.075.706.535
2.8	AFIRMADO	130 días	mar 8/04/25	mié 17/09/25	$ 15.645.080
2.9	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	130 días	jue 3/04/25	jue 11/09/25	$ 62.327.205
CP 5	**CAPITULO 5. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL**	**115 días**	**mar 1/07/25**	**mar 18/11/25**	**$ 350.894.186**
5.1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	40 días	lun 29/09/25	mar 18/11/25	$ 45.623.240
5.2	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	40 días	lun 29/09/25	mar 18/11/25	$ 38.323.950
5.3	TOPE DEFENSA METÁLICA	70 días	vie 18/07/25	vie 10/10/25	$ 23.176.155
5.4	SECCIÓN FINAL DEFENSA METÁLICA	20 días	vie 10/10/25	jue 6/11/25	$ 950.296
5.5	DEFENSA METÁLICA	90 días	mar 1/07/25	jue 16/10/25	$ 160.977.560
5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES	15 días	mié 29/10/25	mar 18/11/25	$ 22.391.480
5.7	SEÑAL DE VERTICAL GRUPO I 0.75X0.75M, POSTE 3.5M	90 días	vie 18/07/25	jue 6/11/25	$ 37.619.802
5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPEROLES DE 10x3.0 CM	15 días	mié 29/10/25	mar 18/11/25	$ 11.807.040
5.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPTAFAROS (EN DEFENSAS METÁLICAS)	90 días	lun 7/07/25	jue 23/10/25	$ 10.024.663
F2	**FRENTE DE OBRA 2**	**169 días**	**mié 19/03/25**	**mié 15/10/25**	**$ 988.667.373**
CP 3	**CAPITULO 3. OBRAS DE ARTE Y ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN**	**169 días**	**mié 19/03/25**	**mié 15/10/25**	**$ 988.090.309**
3.1	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	120 días	vie 25/04/25	vie 19/09/25	$ 25.647.136
3.2	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	120 días	mar 20/05/25	mié 15/10/25	$ 30.076.060
3.3	CUNETA DE CONCRETO CLASE D, 3000 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	100 días	vie 25/04/25	jue 28/08/25	$ 390.704.790
3.4	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	90 días	jue 27/03/25	vie 18/07/25	$ 9.072.450

3.5	CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	110 días	lun 31/03/25	jue 14/08/25	$ 7.032.142
3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	80 días	mié 19/03/25	vie 27/06/25	$ 79.063.891
3.7	SUMINISTRO, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	130 días	vie 25/04/25	mié 1/10/25	$ 432.290.700
3.8	COLCHONETA RENO	150 días	mar 1/04/25	jue 2/10/25	$ 14.203.140
CP 4	**CAPITULO 4. MANTENIMIENTO VIAL**	**20 días**	**mié 19/03/25**	**vie 11/04/25**	**$ 577.064**
	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	20 días	mié 19/03/25	vie 11/04/25	$ 577.064
	PRIOVISIÓN PARA AJUSTE POR POSIBLE VARIACIÓN COSTOS EN INSUMOS	**196 días**		**mar 18/11/25**	**$ 195.500.000**
	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	**196 días**	**mié 19/03/25**	**mar 18/11/25**	**$ 131.060.000**
	PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL	**196 días**	**mié 19/03/25**	**mar 18/11/25**	**$ 150.224.139**
	FIN DE CONTRATO	**0 días**	**mar 18/11/25**	**mar 18/11/25**	**$ 0**

Tabla 6. Programación del contrato de Obra ICCU-767-2024
Fuente: Elaboración propia

6.2. CONTROL A LA PROGRAMACIÓN DE OBRA

Durante el periodo a informe en el presente documento, es importante mencionar que se tiene una ejecución programada del **3.06**% frente a una ejecución real del **1.83%.** Entre las principales labores realizadas en los 30 días informados se encuentras las relacionadas con las actividades de excavación para la construcción de estructuras de manejo de aguas, corte mecánico para la conformación y cajeo de la vía e instalación de material granular.

La diferencia entre lo programado y lo ejecutado radica inicialmente en la imposibilidad de poder iniciar labores de intervención profundas sobre el corredor vial con actividades de instalación de materiales granulares dada la ausencia de información por parte de la empresa de Servicios Públicos de Zipaquirá en relación con el sistema de alcantarillado faltante en algunos tramos del corredor intervenido, específicamente en el sector de Paso Ancho.

6.3. ESTADO DEL TIEMPO EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

El estado del tiempo quedará registrado de manera diaria en la bitácora de obra, consignando si en el día se presentaron lluvias intensas, lloviznas, lluvia intermitente o si el día estuvo seco.

Como se mencionó en el informe mensual anterior, el mes de abril hace parte de la primera etapa de lluvias fuertes. En ese sentido, se presentaron nueve (9) días con presencia de precipitaciones al interior del área de influencia del proyecto con una intensidad moderada (precipitaciones mayores a 3 mm)

IDEAM

Reporte de información Hidrometeorológica de DHIME generado (04/04/2025 14:41)

Nombre estacion:	LA COSECHA [21205910]	**Corriente:**		**Categoría de estación:**	Climática Principal
Latitud:	4.989220	**Longitud:**	-74.001190	**Elevación:**	2570
Entidad:	INSTITUTO DE HIDROLOGI	**Area Operativa:**	Area Operativa 11 - Cundin	**Departamento:**	Cundinamarca
Municipio:	Zipaquirá	**Fecha instalacion:**	15/09/1976 00:00	**Fecha suspensión:**	
Variable:	PRECIPITACION	**Frecuencia:**	Diaria	**Fecha consulta:**	19/03/2025 00:00-31/03/2(
Parametro:	Día pluviométrico (conven	**Unidad medida:**	mm		

Fecha	Valor:	Nivel de Aprobación
2025-03-19 00:00	0	Preliminar
2025-03-20 00:00	0	Preliminar
2025-03-21 00:00	2	Preliminar
2025-03-22 00:00	0	Preliminar
2025-03-23 00:00	0	Preliminar
2025-03-24 00:00	0	Preliminar
2025-03-25 00:00	0	Preliminar
2025-03-26 00:00	0	Preliminar
2025-03-27 00:00	0	Preliminar
2025-03-28 00:00	0	Preliminar
2025-03-29 00:00	0	Preliminar
2025-03-30 00:00	2	Preliminar
2025-03-31 00:00	3	Preliminar

Imagen 3. Estado del tiempo – Precipitaciones Sector de Paso Ancho
Fuente: IDEAM

Según reportes de la estación hidrometereológica LA COSECHA que hace parte de las redes del IDEAM, ubicada en el sector de Paso Ancho, se relacionan aquellos días con precipitaciones. En ese orden de ideas, se precisa que estas lluvias preliminarmente no afectaron significativamente el desarrollo de las actividades realizadas, como lo fueron las excavaciones e instalación de material granular. Sin embargo, la presencia de precipitaciones de manera constante durante el día ha repercutido en menores tiempos de operación del equipo mínimo disponible y de las cuadrillas, situación que, de seguirse presentando en los meses venideros de manera acumulada si afectará significativamente la programación y ejecución del contrato.

6.4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL MES

Durante el periodo comprendido para el presente informe el contratista realizó actividades de excavaciones varias para la construcción de estructuras de manejo de las aguas (escorrentía y subterráneas), corte mecánico para cajeo y conformación de la vía, y extendido de material granular.

Estas actividades se han realizado inicialmente en el tramo A (K7 + 440 a K 7 + 760), específicamente en el sector de Paso Ancho.

6.4.1. EXCAVACIONES EN MATERIAL COMÚN PARA MANEJO DE AGUAS

Como parámetro fundamental en el diseño de la estructura de pavimento del tramo en estudio, se hace necesaria la construcción de estructuras para el manejo de aguas superficiales (escorrentía) y eventualmente para las aguas subterráneas.

Se realizaron excavaciones por el sector derecho del tramo A (Paso Ancho) a la altura de la abscisa K7+ 440 y la abscisa K7+760 en una sección típica de 1.50X0.5



Imagen 4. Excavaciones para estructuras de manejo de aguas.

6.4.2. LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS

Como parte de las labores relacionadas con la construcción de estructuras para el manejo de aguas, se realizó la limpieza de las alcantarillas encontradas en el sector de paso Ancho las cuales presentaban alto grado de contaminación y sedimentación lo que impedía el normal curso del agua sobre estas estas estructuras. Se realizó la limpieza por medio de ayudas mecánicas y manuales garantizando el curso de las aguas hacia el sector del vallado (costado izquierdo)



Imagen 5. Limpieza de Alcantarillas

6.4.3. CORTE MECANICO PARA CAJEO DE VÍA

Se inicia la actividad de corte mecánico para la ejecución del cajeo y la conformación de la estructura de la vía, en el sector de Paso Ancho, comprendido entre las abscisas K7+ 440 y K7+760. Esta labor se desarrolla conforme a las especificaciones técnicas del diseño geométrico y estructural aprobado para el proyecto. En cumplimiento del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) aprobado por la autoridad competente, la intervención se ejecuta en media calzada, permitiendo la continuidad del flujo vehicular en ambos sentidos mediante pasos alternos controlados.

La excavación se realiza con equipos mecánicos especializados, asegurando la precisión en los niveles de corte para garantizar los espesores establecidos en el diseño de la estructura de pavimento, preservando la estabilidad de los taludes temporales y minimizando impactos en la operación del corredor vial



Imagen 6. Actividades de identificación y limpieza obras de arte

6.4.4. COLOCACIÓN DE RAJÓN PARA ESTABILIZAR EL TERRENO

Una vez finalizadas las actividades de cajeo y conformación de la vía, y previo al extendido del material granular, se identificaron zonas críticas con deficiencias en la capacidad portante del terreno natural, mediante inspección visual y verificación de consistencia con equipo manual y pruebas de campo. Como medida de estabilización, se procedió a la colocación de material de rajón, el cual se dispuso en capas uniformes en los sectores comprometidos, con el fin de mejorar la capacidad estructural y garantizar una adecuada transferencia de cargas hacia el subsuelo.

La instalación del rajón se realizó con equipo de cargue y extendido, asegurando su correcta distribución y nivelación, permitiendo así generar una plataforma firme y estable sobre la cual continuar con el proceso constructivo del paquete estructural del pavimento.



Imagen 7. Colocación de material de Rajón

6.4.5. COLOCACIÓN Y EXTENDIDO DE MATERIAL GRANULAR

Posteriormente a la ejecución del cajeo en el sector de Paso Ancho, entre las abscisas K7+440 y K7+760, se inició la actividad de extendido de la capa granular utilizando material clasificado tipo INVIAS conforme a lo establecido en el diseño estructural del pavimento. El extendido se llevó a cabo mediante el uso de equipos mecánicos apropiados para asegurar una distribución uniforme del material garantizando una densificación homogénea.

Los espesores y cotas establecidos en los planos de diseño fueron verificados con apoyo de equipos topográficos de precisión, como estación total y nivel automático, lo cual permitió el control riguroso de las elevaciones y pendientes transversales.




Imagen 8. Extendido de material granular

7. REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES REALIZADAS

A continuación, se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas a fecha de corte del presente periodo, es decir, al periodo correspondiente entre el 1 de abril de 2025, y el 30 de abril de 2025.

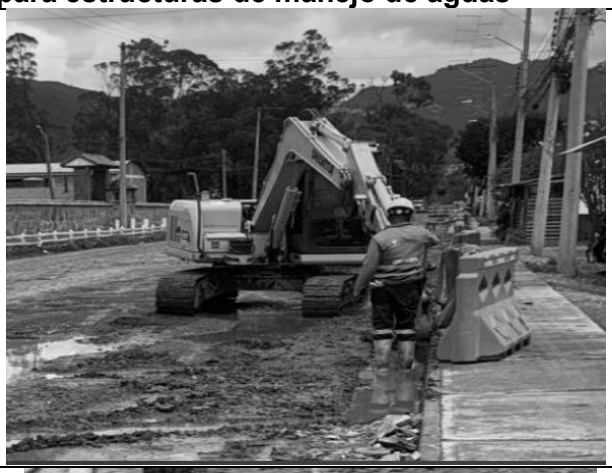Registro fotográfico – Excavaciones para estructuras de manejo de aguas









Registro fotográfico – Excavaciones para cajeo de vía













Registro fotográfico – Instalación de material de rajón









8. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE ENSAYOS DE LABORATORIO Y DE CAMPO

En el periodo no se realizaron controles de calidad de los materiales teniendo que el grueso de actividades correspondió a excavaciones y corte mecánico para el cajeo de la vía.

9. GESTIONES DEL CONTRATISTA PARA DEFINIR ALCANCE DE LAS OBRAS

Una vez ejecutadas las actividades preliminares, tales como el análisis de los diseños entregados por la entidad contratante, los trabajos de topografía en campo y la recepción de las respuestas por parte de las empresas de servicios públicos respecto a las posibles interferencias de sus redes con las obras proyectadas, el contratista, en conjunto con los especialistas del contrato, realizó un análisis riguroso de estos insumos. Como resultado, se emitieron comunicaciones a la entidad contratante con el propósito de incluir dentro del alcance contractual una serie de actividades consideradas esenciales para garantizar la estabilidad de las obras, así como su adaptación a las condiciones geográficas y funcionales del corredor vial objeto del contrato.

Entre las actividades propuestas para ser incorporadas se destacan: el manejo de aguas subterráneas, la utilización de geo sintéticos para la separación de capas granulares, y la implementación de elementos prefabricados para el confinamiento lateral de la vía, una vez realizado su alineamiento.

Mediante las comunicaciones CIIP-050-2025 y CIIP-057-2025 se remitieron los respectivos análisis de precios unitarios de las actividades adicionales propuestas. A la fecha, dichas

solicitudes se encuentran en trámite de evaluación y aprobación por parte de la interventoría y del comité evaluador.

10. CONCLUSIÓNES

Durante el período correspondiente al presente informe, se adelantaron labores de excavación en material común para la construcción de estructuras de manejo de aguas en el sector de Paso Ancho, específicamente entre las abscisas K7+440 y K7+760, costado derecho. Estas excavaciones se ejecutaron con el respectivo control topográfico, conforme a los lineamientos establecidos.

Asimismo, se dio inicio a las actividades de corte mecánico para el cajeo y conformación de la vía, de acuerdo con los niveles y cotas obtenidos en el replanteo topográfico y en los diseños entregados por la entidad contratante. Esta actividad comenzó en el sector de Paso Ancho, entre las abscisas K7+520 y K7+710, costado derecho.

Como resultado de los cortes realizados, se evidenció la necesidad de ejecutar actividades de estabilización del terreno mediante la incorporación de piedra rajón, debido a las bajas características portantes del suelo identificado en dicho tramo. De igual manera, en este periodo informado, el contratista ha manifestado en los comités de obra la necesidad y pertinencia de la inclusión de actividades de obra hidráulicas para el manejo de las aguas sub- superficiales ante la ausencia de estas en el presupuesto oficial. El avance de esta iniciativa se irá madurando conforme se vaya avanzando en el replanteo en campo, tramites y gestiones con la empresa de servicios públicos y los conceptos que emitan los especialistas de las partes.

Anexo 1 POLIZAS DEL CONTRATO

Anexo 2 DOCUMENTOS CONTRACTUALES

Anexo 3 PROGRAMACIÓN DE OBRA
