CÓDIGO: MM-GI-DO-F-036

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

I. Datos Generales del contrato:

1. Denominación del contrato	**Informe No.: 3**	**Periodo: 1 – 31 julio 2025**			
Contrato No.:	LP – 026 – 2024 LOTE 1				
Nombre del supervisor:	Arq. ARMANDO MOVILLA NAVARRO Jefe de Oficina de Control y Programación de Obras				
Nombre del Interventor:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA SA - EDUBAR SA				
2. De la etapa contractual					
Tipo de contrato:	Prestación de servicios	Obra X	Consultoría	Suministro	Otro
Nombre del contratista:	CONSORCIO VÍAS URBANAS BQ				
No. de identificación del contratista:	901.940.706-2				
Objeto del contrato:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO I				
Localización:	CINCO (5) LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA				
Plazo:	DIECIOCHO (18) MESES				
Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P):	NA				
Número de Registro Presupuestal (R.P.):	NA				

Fecha de inicio del contrato (dd-mm-yyyy)	**12-05-2025**	**Fecha de suspensión (dd-mm-yyyy)**	**Fecha de reinicio (dd-mm-yyyy)**
Fecha de terminación del contrato (dd-mm-yyyy)	09-11-2026	-	-
Prorroga No. 1	**-**		
Prorroga No. 2	**-**		
Prorroga No. 3	**-**		

3. Garantías constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato)

Amparos	**Aseguradora**	**No. de póliza**	**Vigencia**	
			Desde (dd-mm-yyyy)	**Hasta (dd-mm-yyyy)**
Calidad del servicio:	**SEGUROS MUNDIAL**			
Cumplimiento:	**SEGUROS MUNDIAL**	BQ-100102117	23/04/2025	23/02/2027
Anticipo:				
Pago anticipado:				
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados:				
Salarios y prestaciones:	**SEGUROS MUNDIAL**	BQ-100102117	23/04/2025	23/10/2029
Estabilidad de la obra:	**SEGUROS MUNDIAL**	BQ-100102117	23/10/2026	23/10/2031
Responsabilidad civil extracontractual:	**SEGUROS MUNDIAL**	BQ-100028579	23/04/2025	23/10/2026
Otros:				

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-036

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Nota: la vigencia deberá actualizarse acorde a las modificaciones de la póliza.

4. Ejecución del contrato

Descripción		Valor
Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de que aplique):		$ 52.085.450.531,00
Adición No. 1		$ 0
Adición No. 2		$ 0
Adición No. 3		$ 0
Valor total del contrato:		$ 52.085.450.531,00
Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de que aplique):		$ 0
Porcentaje del anticipo:	%	$ 0
Porcentaje del pago anticipado:	%	$ 0
Valor ejecutado del contrato (incluye el presente cobro):		$ 0
Valor por ejecutar (valor total del contrato – valor ejecutado del contrato):		$ 0
Valor a pagar en el presente informe:		$ 0
Nota crédito (-):		$ 0
No. factura o cuenta de cobro:		

Descripción del Objeto: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO I

II. Aspectos administrativos:

1. Resumen sobre el cumplimiento mensual de la programación de la ejecución del contrato.

El día 12 de mayo de 2025 se suscribió el acta de inicio del contrato de obra. La interventoría solicitó formalmente la programación de la ejecución del contrato para el respectivo seguimiento técnico, de su competencia.

Se encuentra pendiente de aprobación las pólizas por acta de inicio en la plataforma SECOP II.

A la fecha, el contratista presenta un porcentaje de ejecución física del 10.13% de su contrato.

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-036

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

2. Se relaciona a continuación las actividades mensuales realizadas por el contratista.

FRENTE	TIPO DE INTERVENCION	DIRECCIÓN	BARRIO	VIAS ML	REPARCHEO M2	ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN
1	**52 (VN)**	CALLE 14 ENTRE CARRERAS 10 Y 11A / CALLE 14 ENTRE CARRERAS 13A Y 15	LA CHINITA	270		- Nivelación: 539.25 m2 - Demolición: 18.95 m2 - Excavaciones: 501.26 m3 - Rellenos: 271.18 m3 - Base SC E=0.20: 75 m2 - Concreto MR39 E=0.15: 75 m2 - Bordillos: 44 m - Domiciliarias Acu.: 50 un - Conexiones Alc.:50 un - Tubería PE40: 125 m - Silleta Electrof.: 50 un - Tubería Alc. 8": 179.75 m - Tee 200 x 160 mm: 50 un - Triturado ¾": 31.92 m3 - Tuberia PE100: 171.27 m - Desmonte Tub. 6" y 8": 179.75 m - Registro Un. Domi.: 50 un
	55 (VN)	CARRERA 11 ENTRE CALLES 13 Y 17; CALLE 14 ENTRE LA CARRERA 11 Y ARROYO	LA CHINITA	250		- Nivelación: 750 m2
	56A (VN)	CARRERA 13 ENTRE DIAGONAL 5 Y CALLE 14 / CARRERA 13A ENTRE CALLES 14 Y 17	LA CHINITA	184,14		- Nivelación: 632.86 m2 - Demolición: 98.07 m2 - Excavaciones: 538.97 m3 - Rellenos: 290.01 m3 - Base SC E=0.20: 384 m2 - Concreto 1500psi – Base Pav. E=0.10: 248.86 m2 - Concreto MR39 E=0.15: 632.86 m2 - Bordillos: 320 m - Domiciliarias Acu.: 66 un - Conexiones Alc.:66 un - Tubería PE40: 171.6 m - Silleta Electrof.: 66 un - Tubería Alc. 8": 189 m - Tee 200 x 160 mm: 66 un - Triturado ¾": 189 m3

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

						- Tuberia PE100: 171.27 m - Desmonte Tub. 6" y 8": 189 m - Registro Un. Domi.: 66 un
	57 (VN)	CALLE 14A ENTRE CARRERAS 12C Y 15	LA CHINITA	179,26		- Nivelación: 523.16 m2 - Demolición: 82.09 m2 - Excavaciones: 535.38 m3 - Rellenos: 285.6 m3 - Base SC E=0.20: 152.51 m2 - Concreto 1500psi – Base Pav. E=0.10: 210 m2 - Concreto MR39 E=0.15: 362.51 m2 - Bordillos: 90 m - Domiciliarias Acu.: 51 un - Conexiones Alc.:51 un - Tubería PE40: 124.95 m - Silleta Electrof.: 51 un - Tubería Alc. 8": 180.4 m - Tee 200 x 160 mm: 51 un - Triturado ¾": 32.03 m3 - Tuberia PE100: 180.4 m - Desmonte Tub. 6" y 8": 180.4 m - Registro Un. Domi.: 51 un
	68 (VN)	CARRERA 4A ENTRE CALLES 38B Y 41B	LA MAGDALENA	260		- Nivelación: 521.52 m2 - Demolición: 705.89 m2 - Excavaciones: 51.01 m3 - Concreto 1500psi – Base Pav. E=0.10: 705.89 m2 - Concreto Ac.3d MR45 E=0.20: 705.89 m2 - Acero Ref. ½": 282.88 kg
	69 (VN)	CARRERA 7C ENTRE CALLES 36B Y 42 (RECONSTRUCCION)	LA MAGDALENA		703	- Nivelación: 1038.83 m2 - Demolición: 1038.83 m2 - Excavaciones: 111.67 m3 - Concreto 1500psi – Base Pav. E=0.10: 1038.83 m2 - Concreto Ac.3d MR45 E=0.20: 1038.83 m2 - Acero Ref. ½": 16.95 kg
	70 (VN)	CALLE 38B ENTRE CARRERAS 6B Y 8 (RECONSTRUCCIÓN)	LA MAGDALENA	250	1040	- Nivelación: 1081.30 m2 - Demolición: 1208.01 m2 - Excavaciones: 249.08 m3 - Concreto 1500psi – Base Pav. E=0.10: 1081.30 m2 - Concreto Ac.3d MR45 E=0.20: 1081.3 m2

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

						- Acero Ref. ½": 612.31 kg
3	**73 (VN)**	CARRERA 11 ENTRE CALLES 26 Y 27 (RECONSTRUCCION)	LAS NIEVES	160		- Demolición: 1002 m2 - Excavaciones: 637.25 m3 - Rellenos: 362.64 m3 - Base SC E=0.20: 865.62 m2 - Concreto MR39 E=0.15: 865.62 m2 - Conexiones Alc. 6": 34 un - Tubería Alc. 8": 166.5 m - Tee 200 x 160 mm: 34 un - Triturado ¾": 24.57 m3 - Pozo Insp.: 1 un - Tuberia PE100: 166 m - Desmonte Tub. 6" y 8": - Registro Un. Domi.: 37 un
	74 (VN)	CARRERA 11 ENTRE CALLES 27 Y 28 (RECONSTRUCCION)	LAS NIEVES	350		- Nivelación: 2,235.87 m2 - Demolición: 2,235.87 m2 - Excavaciones: 128.52 m3 - Rellenos: 64.26 m3 - Base SC E=0.20: 321.30 m2 - Concreto MR39 E=0.15: 160.65 m2 - Plástico negro (PBO): 160.65 m2 - Triturado ¾": - - Tubería PE100 (PEAD 110 mm PN10): 168.20 m
4	**83 (VN)**	VIA DESDE EL PUENTE DE SIETE DE ABRIL HASTA SEVILLA REAL	VILLA SEVILLA	372		- Nivelación: 1,501.50 m2 - Demolición pavimento: 1,501.50 m2 - Demolición andén: 136.50 m2 - Demolición bordillo: 390.00 m - Excavación a máquina: 288.46 m3 - Relleno en material seleccionado compactado: 568.02 m3 - Concreto 1500 PSI premezclado para base E=0.15: 1,149.66 m2 - Pavimento en concreto rígido MR=45 E=0.20: 930.66 m2 - Acero de refuerzo 1/2" 60,000 PSI (8 kg/m2): 982.77 kg

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

						- Tubería alcantarillado Novafort 200 mm (8"): 199.30 m - Pozo de inspección (1.45 m < H ≤ 1.80 m): 7 un
5	**81 (VN)**	CALLE 33A ENTRE CARRERAS 8 Y 10 (RECONSTRUCCIÓN)	LAS PALMAS	300		- Nivelación: 1,121.40 m2 - Demolición pavimento: 1,068.00 m2 - Demolición andén: 296.25 m2 - Excavación manual: 96.16 m3 - Excavación a máquina: 430.71 m3 - Relleno con material del sitio: 26.06 m3 - Relleno en material seleccionado compactado: 475.95 m3 - Concreto 1500 PSI premezclado para base E=0.15: 1,121.40 m2 - Plástico negro (PBO): 1,121.40 m2 - Pavimento en concreto rígido MR=39 E=0.15: 1,121.40 m2 - Acero de refuerzo 1/2" 60,000 PSI (8 kg/m2): 226.91 kg - Conexiones domiciliarias alcantarillado 6": 28 un - Tubería alcantarillado Novafort 200 mm (8"): 74 m - Tee Novafort 200x160 mm: 28 un - Triturado 3/4" para soporte tubería: 10.92 m3 - Tubería PEAD PE100 110 mm PN10: 130 m - Registro unión domiciliaria 0.30x0.30 m: 28 un
6	**10 (R)**	Calle 38B entre Carreras 9C y 11	EL CAMPITO		838	- Nivelación: 532.54 m2 - Demolición pavimento: 532.54 m2 - Excavación a máquina: 186.39 m3 - Relleno en material seleccionado compactado: 53.25 m3

						- Concreto 1500 PSI premezclado para base E=0.15: 532.54 m2 - Concreto rígido MR=45 acelerado a 3 días E=0.20: 532.54 m2
	11 (R)	Calle 38B entre Carreras 11 y 13C	EL CAMPITO		148	- Nivelación: 209.02 m2 - Demolición pavimento: 209.02 m2 - Excavación a máquina: 73.16 m3 - Relleno en material seleccionado compactado: 20.90 m3 - Concreto 1500 PSI premezclado para base E=0.15: 209.02 m2 - Pavimento en concreto rígido MR=45 acelerado a 3 días E=0.20: 209.02 m2
	12 (R)	Carrera 8C entre Calles 41 y 40	EL CAMPITO		198	- Nivelación: 176.33 m2 - Demolición pavimento: 176.34 m2 - Excavación a máquina: 26.45 m3 - Concreto 1500 PSI premezclado para base E=0.15: 176.34 m2 - Pavimento en concreto rígido MR=45 acelerado a 3 días E=0.20: 176.34 m2 - Acero de refuerzo 1/2" 60,000 PSI (8 kg/m2): 78.04 kg
	15 (R)	CARRERA 5 CON CALLE 40	LA MAGDALENA		434	- Nivelación: 316.50 m2 - Demolición pavimento: 316.50 m2 - Demolición andén: 96.24 m2 - Demolición bordillo: 135.00 m - Excavación manual (incluye retiro): 53.90 m3 - Excavación a máquina y retiro de materiales: 54.86 m3 - Concreto 1500 PSI premezclado para base E=0.15: 316.50 m2 - Pavimento en concreto rígido MR=45 acelerado a 3 días E=0.20: 316.50 m2

	16 (R)	CARRERA 7H ENTRE CALLES 38B Y 36B	LA MAGDALENA		112	- Nivelación: 128.50 m2 - Demolición pavimento: 128.50 m2 - Concreto 1500 PSI premezclado para base E=0.15: 128.50 m2 - Pavimento en concreto rígido MR=45 acelerado a 3 días E=0.20: 128.50 m2
	9 (R)	Calle 37 con Carrera 9D	EL CAMPITO		617	- Nivelación: 360.74 m2 - Demolición pavimento: 360.74 m2 - Excavación a máquina: 126.26 m3 - Relleno en material seleccionado compactado: 36.07 m3 - Concreto 1500 PSI premezclado para base E=0.15: 360.74 m2 - Pavimento en concreto rígido MR=45 acelerado a 3 días E=0.20: 360.74 m2 - Acero de refuerzo 1/2" 60,000 PSI (8 kg/m2): 231.70 kg
TOTAL				**2300**	**4113**	-

3. Acta de vecindad. (En los casos que aplique)

El contratista ha realizado las respectivas actas de vecindad en los tramos asignados. Los soportes están incluidos en el informe mensual #3 de interventoría.

4. Acta de reunión de la comunidad (En los casos que aplique)

El contratista ha realizado las socializaciones de cada tramo a intervenir en conjunto con la supervisión, interventoría y el área social de cada tramo. Los soportes están incluidos en el informe mensual #3 de interventoría.

5. Otras actas suscritas durante el mes respectivo. (En los casos que aplique)

Durante el presente periodo se suscribieron las siguientes actas:

DESCRIPCIÓN	FECHA
Acta de comité #10	04/07/2025
Acta de comité #11	17/07/2025
Acta de comité #12	24/07/2025

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-036

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

6. Control del personal del contratista y del interventor.

El día 9 de junio de 2025 se solicitó por oficio copia de las hojas de vida con sus respectivos soportes, con el fin de aprobarlas.

A la fecha el contratista no ha enviado las hojas de vida del personal profesional requerido contractualmente. Se reiterará la solicitud mediante oficio.

7. Relación de correspondencia entre contratista e interventora y/o DISTRITO. (En los casos que aplique)

A continuación, se presenta la correspondencia entre contratista e interventoría y/o distrito.

OFICIO No	FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO
L1-BAOIX-0025	21/07/2025	EDUBAR S.A.	CONSORCIO VÍAS URBANAS BQ	Recomendaciones para el diligenciamiento de las actas de vecindad
L1-BAOIX-0026	25/07/2025	EDUBAR S.A.	CONSORCIO VÍAS URBANAS BQ	Incorrecta ejecución en las juntas de transferencia de carga de losas de pavimento
L1-BAOIX-0027	28/07/2025	EDUBARS.A.	CONSORCIO VÍAS URBANAS BQ	Lineamientos para el recibo definitivo de tramos viales intervenidos
QUILLA-2025-0168668	29/07/2025	SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSORCIO VÍAS URBANAS BQ	Solicitud de listado de pegadores y certificados de equipos – Programa Barrios A la Obra Etapa IX – Modulo 1
QUILLA-2025-0169267	30/07/2025	SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSORCIO VÍAS URBANAS BQ	Aprobación presupuestal
QUILLA-2025-0171718	31/07/2025	SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS	CONSORCIO VÍAS URBANAS BQ	Solicitud de documentos faltantes - Contrato: LP-026-2024

8. Copia de respuestas a autoridades frente a los requerimientos efectuados en el período.

No aplica

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

9. Copia de respuestas a los derechos de petición formulados durante el período. (En los casos que aplique)

No aplica

10. Estado de cumplimiento de obligaciones contractuales administrativas y financieras

OBLIGACIONES CARÁCTER ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS			
OBLIGACIONES	**CUMPLE**		
	SI	**NO**	**OBSERVACIÓN**
1. Personal profesional mínimo exigido para la ejecución de la obra.		X	Pendiente Aprobación
2. Organigrama del contratista		X	Pendiente Aprobación
3. Cronograma de ejecución de la obra	X		Se ha solicitado el cronograma actualizado.
4, Análisis de precios unitarios (Contractuales)		X	Pendiente Aprobación
5. Plan de Calidad para el contrato de obra		X	Pendiente Aprobación
6. Actualización de Pólizas		X	Pendiente Aprobación de pólizas por Acta de Inicio.
7. Vehículo exclusivo para la supervisión	X		

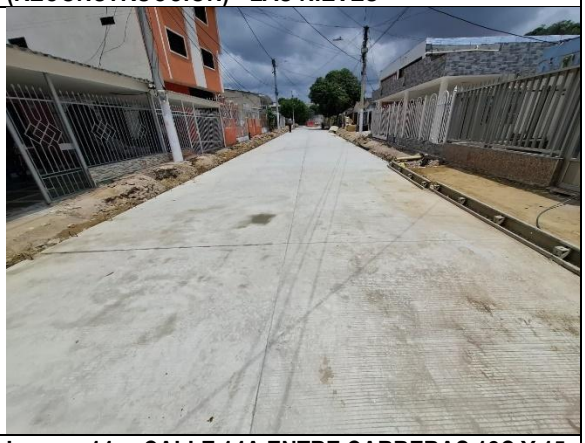
11. Registro fotográfico

Imagen 1. - VIA DESDE EL PUENTE DE SIETE DE ABRIL HASTA SEVILLA REAL - VILLA SEVILA	**Imagen 2. - VIA DESDE EL PUENTE DE SIETE DE ABRIL HASTA SEVILLA REAL - VILLA SEVILA**
	
Imagen 3. CALLE 100 ENTRE CARRERA 13 y 13B (PASO SAN CAMILO) - LA PAZ	**Imagen 4. CALLE 100 ENTRE CARRERA 13 y 13B (PASO SAN CAMILO) - LA PAZ**

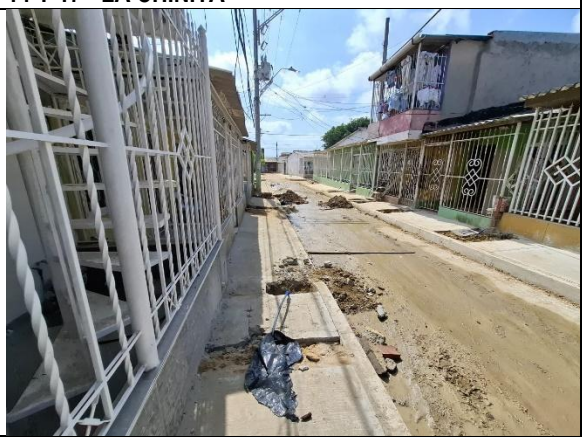
FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

	
Imagen 5. CALLE 33A ENTRE CARRERAS 8 Y 10 (RECONSTRUCCIÓN) - LAS PALMAS.	**Imagen 6. CALLE 33A ENTRE CARRERAS 8 Y 10 (RECONSTRUCCIÓN) - LAS PALMAS.**
	
Imagen 7. - CALLE 33A ENTRE CARRERAS 8 Y 10 (RECONSTRUCCIÓN) - LAS PALMAS.	**Imagen 8. - CALLE 33A ENTRE CARRERAS 8 Y 10 (RECONSTRUCCIÓN) - LAS PALMAS.**
	

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Imagen 9. – CARRERA 11 ENTRE CALLES 26 Y 27 (RECONSTRUCCION) - LAS NIEVES	**Imagen 10. - CARRERA 11 ENTRE CALLES 26 Y 27 (RECONSTRUCCION) - LAS NIEVES**
	
Imagen 11. - CARRERA 11 ENTRE CALLES 27 Y 28 (RECONSTRUCCION) - LAS NIEVES	**Imagen 12. - CARRERA 11 ENTRE CALLES 27 Y 28 (RECONSTRUCCION) - LAS NIEVES**
	
IMAGEN 13. - CALLE 14A ENTRE CARRERAS 12C Y 15 - LA CHINITA	**Imagen 14. – CALLE 14A ENTRE CARRERAS 12C Y 15 - LA CHINITA**

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

	
Imagen 15. - CALLE 14 ENTRE CARRERAS 12C Y 15 - LA CHINITA	**Imagen 16. - CALLE 14 ENTRE CARRERAS 12C Y 15 - LA CHINITA**
	
Imagen 17. - 56A (VN) CARRERA 13A ENTRE CALLES 14 Y 17 - LA CHINITA	**Imagen 18. - 56A (VN) CARRERA 13A ENTRE CALLES 14 Y 17 - LA CHINITA**
	

Versión: V 1
Fecha Aprobación: 22/05/2025

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

IV. Aspectos financieros y presupuéstales:

1. Análisis de precios contractuales
Mediante oficio QUILLA-2025-0169267, del 30 de julio de2025, se realizó la aprobación parcial del presupuesto contractual del contratista, evidenciando que: *"…solo se aprueba el 95.10% del presupuesto presentado, hasta tanto no se subsanen los aspectos observados y se presente una nueva versión ajustada conforme a los requerimientos técnicos y normativos de la entidad…"*

2. Análisis de precios de actividades no previstas
Durante este periodo no se han presentado precios de actividades no previstas.

3. Informe de manejo del anticipo y estado de la amortización. (En los casos que aplique)
No aplica

4. Balance financiero del contrato.
Durante el presente periodo no se han presentado Actas de recibo Parcial.

5. Informe sobre los rendimientos financieros del anticipo. (En los casos que aplique)
No aplica

V. RIESGOS DE INCUMPLIMIENTO

A la fecha no se han presentado eventos que pongan en riesgo de incumplimiento el contrato. No obstante, cabe aclarar que el tema de acueducto y alcantarillado en los tramos asignados ha ido generando leves retrasos en la correcta ejecución de la obra. Para esto, se invita semanalmente a los comités técnicos al personal de Triple A, con el fin de subsanar cualquier evento y minimizar el retraso.

II. Aspectos administrativos:
1. Resumen sobre el estado general del contrato.

✓ El contrato de obra tiene fecha de finalización de 09 de noviembre de 2026.

2. Documentos de ejecución del contrato

Para el presente periodo se cuenta con:

a. Contrato
b. Acta de Inicio
c. Pólizas de contrato

ARMANDO MOVILLA NAVARRO, quien actúa en calidad de supervisor de la Secretaría Distrital de Obras Públicas designado por la ordenadora del gasto del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-036

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

BARRANQUILLA, deja constancia que el contratista ejecutó las obligaciones administrativas y financieras del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla a los 31 días del mes de julio de 2025.

ARMANDO MOVILLA NAVARRO
SUPERVISOR
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA

Versión: V 1
Fecha Aprobación: 22/05/2025
