BITACORA DE OBRA

SAN JOSE GUAVIARE

CTO 2150 “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)”

Bitacora de obra

CTO 2150-2024 - ORIP San Jose Guaviare (Guaviare).

Contratante: Superintendencia de Registro y Notariado

Contratista: Soluciones Integrales Union SAS

Interventoria: Consorcio Regionet PRIA

2024.

MIERCOLES 2 OCTUBRE - 2024.

SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS, ARQ. XIOMARA TOVAR, RESIDENTE DEL CONTRATISTA DE OBRA, ARQ. RODOLFO VARGAS AYALA, DE INTERVENTORIA Y EL ING. BAYARDO LINARES BUSOT SUPERVISOR DEL CONTRATO, DR. RICARDO HERRERA REGISTRADOR ENCARGADO Y LA SRA LUZ MERCEDES PEREZ DELEGADA DE LA SNR EN EL CUAL SE DETERMINA EL ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN ESTA OFICINA.

LA CUAL COMPRENDE CAMBIO DE COBERTA, CAMBIO DE CIELO RASO, MANTENIMIENTO, ESTUCO Y PINTURA DE MUROS, ADECUACION BAÑOS, ADECUACION PISOS, CARPINTERIA METALICA, ADECUACION COCINA, ANDEN ACCESO, SE DETERMINA QUE EN LA EJECUCION DE OBRA SE EJECUTEN DEMAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR. YA QUE SE CUENTA AUN CON DINERO PARA EJECUCION.

ARQ. XIOMARA TOVAR AVILA.
CONTRATISTA SIU.

ARQ. RODOLFO VARGAS AYALA.
RESIDENTE INTERVENTORIA

LUNES. 21 OCTUBRE 2024.

INICIO: 5:00 pm.
FIN: 1:00 am.

Sensacion termica 33°
LLUVIAS LIGERAS ENTRE 8:30 y 9:00 pm.

- SE INICIAN TRABAJOS DE DESMONTE MACHIMBRE (MADERA EN MUROS) EN PERIMETRO ZONA OFICINAS, ZONA ATENCION A PUBLICO.
- SE REALIZA TRASLADO DE MUEBLES MODULARES OFICINA PARA REALIZAR DESMONTE MACHIMBRE
- SE INICIA CON DEMOLICION DESMONTE GUARDAESCOBAS EN CERAMICA EN EL MISMO PERIMETRO DE DESMONTE MACHIMBRE MUROS
- SE REALIZA DEMOLICIÓN DE LAVADERO EXISTENTE EN ZONA PATIO PARA HABILITAR NUEVO INGRESO BAÑOS, RETIRO DE CERAMICA Y MUROS, MOVIMIENTO PUNTOS HIDRAULICOS.
- SE REALIZA DEMOLICIÓN DE MURO EN ALCO EN ZONA ACCESO OFICINAS COSTADO IZQUIERDO QUE PRESENTABA FISURAS, SE ADECUARA PARA REALIZAR CONFINAMIENTO DE CUERDO CON SOLICITUD VISITA TECNICA INICIAL EN COMPAÑIA CON SUPERVISION E INTERVENTORIA.
- SE REALIZA DEMOLICION DE ENCHAPES EN BAÑO COSTADO IZQUIERDO, SE DESHABILITARON

UNO DE los BAÑOS, DESMONTE DE SANITARIO Y LAVAMANOS.

- SE INICIA CON EL DESMONTE DE MARCOS EN MADERA EN ZONA BAÑOS Y ZONA ACCESO ARCHIVO.
- SE INICIA CON EL ACOPIO DE MADERA EN ZONA PATIO, RESULTANTE DESMONTES.
- SE REALIZA TRASLADO DE MUEBLES MODULARES OFICINA PARA REALIZAR DESMONTE MACHIMBRE
- SE REALIZA PROTECCION DE MOBILIARIO, ASEO EN AREAS INTERVENIDAS
- ACOPIO DE ESCOMBROS PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN.

EQUIPOS/HERRAMIENTAS

- POLIFORD
- ROTOMARTILLO
- ESCALERAS
- CORTADORA CERAMICA.

TEMAS SST AMBIENTAL

- SUPERVISION
- INSPECCION DE EPC
- GESTION DE DISPOSICION FINAL RESIDUOS DE OBRA
- CHARLA SEGURIDAD.

PERSONAL EN OBRA.

CONTRATISTA SIU

- RESIDENTE OBRA
- MAESTRO OBRA.
- OFICIALES (2)
- AYUDANTES OBRA (4).

NOVEDAD. REGISTRADOR CRIP SOLICITA CAMBIO DE CAIDAS CUBIERTA, SE LE INFORMA QUE. SEGUN LA VISITA DE CAMPO REALIZADA PARA DEFINIR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SE ACORDO REALIZAR EL CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIENDO LAS CAIDAS ORIGINALES. ADICIONALMENTE SE APROBO EL REMPLAZO DE LAS CANALES Y LA INSTALACION DE FILTROS CON EL FIN DE MEJORAR LAS FILTRACIONES EXISTENTES. SE COMUNICA TAMBIEN QUE EL MATERIAL NECESARIO PARA LA OBRA

INCLUYENDO LAS TEJAS DE UPVC, YA SE HAN ADQUIRIDO Y CORTADO DEBIDAMENTE CON LAS DIMENSIONES Y POSICIONES APROBADAS PREVIAMENTE.

CONTRATISTA SIV.

RONALDO JONES A.
INTERVENTORIA.

MARTES 22 OCTUBRE 2024.

INICIO: 5:00 PM
FIN. 1:00 AM.

SENSACION TERMICA.

ACTIVIDADES:

- CONTINUAN TRABAJOS ACOPIO MATERIALES. RESULTANTES DEMOLICION MUROS, DESMONTES MAMPOSTERIAS.
- DEMOLICION DE MURO PARA QUITAR ARCOS EXISTENTES.
- SE INICIA CON RETIRO DE PINTURA AFECTADA QUE SE ENCONTRABA DATO MAMPOSTERIA PEGADO DE MUROS.
- SE REALIZA PROTECCION DE APARATOS Y MOBILIARIO FUNCIONARIOS PARA EJECUCION AREA.
- SE REALIZA ACOPIO DE MATERIALES PETREOS.
- SE REALIZA ORDEN Y ASEO EN AREAS INTERVENIDAS.

EQUIPOS/HERRAMIENTAS.

- PULIDORA
- ESCALERAS

TEMAS SST.

- SUPERVISIÓN
- GESTION DISPOSICION FINAL RESIDUOS DE OBRA

PERSONAL OBRA.

CONTRATISTA SIU

- RESIDENTE OBRA
- MAESTRO OBRA.
- OFICIALES (2)
- AYUDANTES (4)

CONTRATISTA SIU

ROMULO VANEGAS A.
INGENIERO OBRA

MEDELLIN. 23-OCTUBRE-2024.

INICIO: 5:00 pm
FIN: 1:00 am

SENSACION TERMICA:

ACTIVIDADES:

- SE REALIZA ENCOFRADO VIGA PARA CONFINAMIENTO MURO, DESPUES DEL RETIRO DE ARCO.
- SE REALIZAN TRABAJOS LIMPIEZA EXTERIOR CORREDOR SERVIDUMBRE COSTADO LATERAL IZQUIERDO PARA REALIZAR REMATES MURO EXTERIOR
- SE REALIZA FUNDIDA VIGUETA CONFINAMIENTO, CONCRETO.
- SE REALIZA DESMONTE DE CANALETA TIPO AMAZONA EXISTENTE SOBRE COSTADO IZQUIERDO.
- SE REALIZA DESMONTE DE ENCHAPE EN SECCION COCINA.
- SE REALIZAN REGATAS EN MURO PARA PUNTOS HIDRAULICOS NUEVA LOCALIZACION BAÑOS.
- SE REALIZA INSTALACION DE PUNTOS SANITARIOS BAÑO DERECHO NUEVA UBICACION
- SE REALIZA CORTE Y AJUSTE EN AREAS INTERVENIDAS.

EQUIPOS / HERRAMIENTAS

Quincenal
Explicada
Autoparticipativa.

Temas SST.

- Gestion Disposicion final residuos obra.

Personal obra.
Contratista SIV
-
- Residente obra. (1).
Maestro obra (1)
Oficiales (2)
Ayudantes (4).

Contratista SIV

Rodolfo Vargas A.
Ingeniero Civil.

Jueves 24 Octubre-2024.

Inicio: 5:00 pm
Fin. 1:00 am.

Sensacion termica.

Actividades.

- Continuan Adecuaciones en muro exterior lateral derecho.
- Se realiza aplicacion de pañete en muro exterior para garantizar aplicacion estuco y pintura exterior.
- Continuan trabajos acopio de materiales enlonado residuos de obra.
- Se realiza demolicion arco muro costado derecho hall acceso, Continuan resanes
- Acopio de materiales teja upvc, cielo raso, pegacor

EQUIPOS/HERRAMIENTAS

PULIDORA
ESMERIL
ROTOMARTILLO.

TEMAS SST

- GESTION DISPOSICION FINAL RESIDUOS OBRA
- CHARLAS SST
- INSPECCION EPP.

PERSONAL OBRA.

CONTRATISTA SEV.

RESIDENTE DE OBRA (1)
MAESTRO OBRA (1).
OFICIALES (2)
AYUDANTES (4)

CONTRATISTA SEV.

RONALD VARGAS AYALA.
INTERVENTORIA.

VIERNES 25 OCTUBRE-2024

INICIO: 5:00 pm
FIN: 1:00 am

SENSACION TERMICA.
LLUVIAS
ACTIVIDADES.

- SE DA INICIO A PINTURA ANTICORROSIVO SOBRE PERFILERIA TIPO C. PARA ESTRUCTURA CUBIERTA
- SE REALIZA LIMPIEZA DE TANQUE, SE DEJA REGISTRO FOTOGRAFICO EN INFORMES
- SE INICIA CON APLICACION EPOXICO SOBRE AREAS EXTERIOR OFICINAS.

- SE CONTINUA CON DESMONTE MACHIMBRE (MADERA MUROS) EN OFICINA REGISTRADOR.
- CONTINUAN CON RASPADO MUROS INTERIORES, CERCA A ALTINO
- SE INICIA CON MANTENIMIENTO PRELIMINAR PISO EXTERIOR OFICINA, LAVADO CON GRATA
- CONTINUAN TRABAJOS DEMOLICION ENCIMPES. GUARDA ESCOMBROS
- LAVADO MURO EXTERIOR PATIO, QUE PRESENTA MOHOSIDAD POR HUMEDAD, LAVADO CON HIDROLAVADORA.
- EJECUCION APLICACION EMERIONES. PARA REMATES ACCESOS.

EQUIPOS / HERRAMIENTAS

PULIDORA
ESCALERAS
AUTOMARTILLO.

TEMA SST.
- GESTION DISPOSICION FINAL RESIDUOS DE OBRA
- CHARLAS SST.

PERSONAL OBRA
CONTRATISTA SIV.

RESIDENTE DE OBRA (1)
MAESTRO OBRA (1)
OFICIALES (AYUDANTES (2) y (4)

Rodolfo Vargas A.
INGENIERO OBRA.

CONTRATISTA SIV.

SABADO 26-OCTUBRE-2024

INICIO: 08:00 am
FIN: 4:00 pm.
SENSACION TERMICA.

ACTIVIDADES

- SE INICIA DESMONTE CUBIERTA COSTADO DERECHO, NEGRO TOTAL, RETIRO CERCOS MADERA, SE REALIZA RETIRO INSTALACION ESTRUCTURA Y CUBIERTA BLANCA UPVC, SE EJECUTA DE ESTA FORMA YA QUE TEMAT DE LLUVIAS INCLEMENCIAS SE PRESENTAN
- SE REALIZA DESMONTE DE AVISO, REINSTALACION Y TRASLADO PUNTO ACOPIO, PENDIENTE INSTALACION YA QUE ESTAMOS A LA ESPERA DE ARTE PARA NUEVA IMPRESION.
- SE REALIZA LAVADO FACHADAS SOBRE MURO LATERAL DERECHO.
- SE INSTALA CANALETE PROVISIONAL SOBRE AREA CAMBIO CUBIERTA

EQUIPOS / HERRAMIENTAS

PULIDORA
ESCALERAS
ROTOMARTILLO

TEMA SST

- GESTION DISPOCION FINAL RESIDUOS DE OBRA
- CHARLAS SST.

PERSONAL OBRA
CONTRATISTA SIU.

RESIDENTE OBRA (1)
MAESTRO OBRA (1)
OFICIALES AYUDANTES (2) Y (4)

CONTRATISTA SIU.

RODRIGO VARGAS A.
INSPECTOR DE OBRA

Domingo 27-OCTUBRE-2024.

INICIO: 8:00 am SENSACION TERMICA: LLUVIAS.
FIN: 4:00 pm.

ACTIVIDADES.

- SE REALIZAN ACTIVIDADES INTERNAS, SE INICIA ESTRUCTURACION OFICINA REGISTRADOR CIELORASO PVC. EN ALA COSTADO IZQUIERDO QUE SE REALIZO CAMBIO CUBIERTA.
- SE REALIZAN REMATES CARPINTERIA PARA ZONA ANTIGUOS MARCOS.
- NO SE ADELANTAN MAS ACTIVIDADES CUBIERTA POR TEMAS LLUVIAS.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

ESCALERAS

PULIDORA.

TEMAS SST

GESTION DISPOSICION FINAL RESIDUOS DE OBRA.

CHARLAS SST

PERSONAL OBRA.

CONTRATISTA SIU

RESIDENTE OBRA (1)

MAESTRO OBRA (1)

OFICIAL (1)

AYUDANTE (1).

CONTRATISTA SIU

DORIAN VARGAS A.
INTERVENTORIA

LUNES 28 OCTUBRE

INICIO: 5:00 pm.

FIN: 11:30 pm.

SENSACION TERMICA 31° SIN LLUVIAS.

ACTIVIDADES.

- SE INICIA CON ACTIVIDADES SOLDADURA PARA CONFORMACION ESTRUCTURA EXTERNA PATIO 3m AUTORIZADO AMPLIACION CUBIERTA.
- SE CONTINUAN CON TRABAJOS APLICACION ESTUCO EN ZONA OFICINA REGISTRADOR, REMATES EN ESTA AREA, SE REALIZA REMATES EN CORREDOR
- SE REALIZA VERIFICACION DENOMICION TABLETA EN ZONA INGRESO OFICINA, SE SOLICITA VALIDAR ESPECIFICACION PIXO PARA REALIZAR CAMBIO.
- SE SOLICITA POR PARTE INTERVENTORIA CAMBIAL CAJA DE ACOMETIDA ELECTRICA OFICINA REGISTRADOR, SE VERIFICA Y SE EVIDENCIA NO SE PUEDE RETIRAR NI MODIFICAR LA MISMA YA QUE ES LA ACOMETIDA PRINCIPAL, DENTRO DEL ALCANCE NO ESTA APROBADO REALIZAR ESTA ACTIVIDAD QUE TIENE INCIDENCIA MANIOBRAS ELECTRICAS MAYORES YA QUE ES LA ACOMETIDA ALIMENTACION REGISTRADURIA.
- SE RETIENEN ACTIVIDADES SOBRE LAS 11:00PM POR PARTE POLICIA BATALLA, SE INFORMA QUE NO SE PUEDEN REALIZAR MAS ACTIVIDADES EN HORARIO NOCTURNO POR CONSTANTES QUEJAS, EL DIA DE MAÑANA SE EXPEDIRA AUTORIZACION CON REGISTRADOR PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN HORARIO DIURNO, EN TANTO SE FORMALICE SUSPENCION DE OBRA ACTIVIDADES PARA FUNCIONARIOS OFICINA.
- SE REALIZA ORDEN Y ASEO EN LAS DIFERENTES AREAS.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

- ESCALERA
- EQUIPO SOLDADURA
- DOLLADORA.
- BOTOMARTILLO.

PERSONAL OBRA.
CONTRATISTA SIU.

RESIDENTE OBRA (1)
MAESTRO OBRA (1)
OFICIAL (2)
AYUDANTE (4).

ROMAN VARGAS S.
CONTRATISTA SIU. INTERVENTORIA.

MARTES 29 29 OCTUBRE

INICIO: 2:00 PM
FIN:

SENSACION TERMICA 33°
LLUVIAS FUERTES

ACTIVIDADES:

- DE ACUERDO CON AUTORIZACION SE REGISTRADOR SE INICIAN ACTIVIDADES A LAS 2:00 PM AUTORIZACION TRABAJOS EN PATIO.
- SE DETIENEN ACTIVIDADES TRABAJOS ESTRUCTURAS YA QUE SE PRESENTAN LLUVIAS FUERTES
- SE INICIAN ACTIVIDADES CIERRE MAMPOSTERIA BAÑOS PARA NUEVOS BAÑOS ACCESO LATERAL DERECHO.
- SE VERIFICA ALA CUBIERTA QUE SE CAMBIO, NO SE PRESENTAN FILTRACIONES AUN CON FUERTES LLUVIAS.
- SE REALIZA APLICACION DE INYECRIL PARA MUROS ZONA CORREDOR Y COSTADO IZQUIERDO OFICINAS
- SE REALIZA RESANE EN MUROS BAÑO PARA REALIZAR ENCHAPES.
- SE REALIZA INSTALACION DE PUNTO SANITARIO E HIDRAULICO.
- SE CONTINUA CON APLICACION ESTUCO OFICINA REGISTRADOR
- SE REALIZAN ACTIVIDADES DE MENOR IMPACTO EN ZONA OFICINA EN HORARIO NOCTURNO.
-

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

ESCALERA.
PULIDORA.

PERSONAL OBRA
CONTRATISTA SIU.
RESIDENTE OBRA (1)
MAESTRO OBRA (1)
OFICIAL (2)
AYUDANTE (4)

CONTRATISTA SIU

RODRIGO VARGAS L.
INTERVENTORIA

Miercoles 30 octubre

Inicio: 5: pm
Fin: 2:00 Am

Sensacion Termica 31°
Dia Nublado
Actividades- Mediacara

En visita realizada por solicitud de Guillermo Castro Bernal solicita el no retiro de piso, solicita se instale un guardaescoba prefabricado.
Solicita muestra piso Porcelanato Gris para autorizacion zona ingreso y anden
Solicita tambien mantenimiento puerta vidrio acceso cambio pivote (Bisagra hidraulica)
Solicita se evalue inspeccion electrica para cableado y garantizar cargas.
Tomas e interruptores en su mayoria no funcionan.

Ramiro Vargas

Por solicitud del señor Registrador. Se solicita cerrar vano ventana Rack, con mamposteria.
Ajustar ventana y cerreria hacia la zona contigua oficina.
Solicita y aprueba guardaescuba pvc wenge en zona perimetro antiguo guardaescuba
Realizar remate de junta ceramica-entreme y muro.

Ramiro Vargas A.

Se Realiza impermiabilizada de muro exterior, aplicacion de cloro, aplicacion de invecryl.
Se Realiza. aplicacion de estuco exterior.
Se intala perfiles para la cubierta del patio.
Desmonte de cielo raso Drywall.
estuco interior s..

Herramientas.
escalera.
Taladro inalambrico
Pulidora
Soldador

Temas SST.
Se enlona Escombro de demolicion de ciclo Thox Dywall
chala SST

Orden y asco.

Gestion y disposicion final de Residuos de obra.

Personal de obra.
Contratista SIU

Residente de obra (1).
Maestro de obra (1).
Oficial (1).
Ayudante (3).
Soldador (1).

Contratista SIU Intervencion toria.

Jueves 31 de Novi octubre


Inicio: 2:00 pm.
Fin: 11:00 pm

CLIMA: SOLEADO, SIN ENERGIA DESDE LAS 2:00 PM,


ACTIVIDADES.


- POR SOLICITUD DE OBRA SE SOLICITA MOVER LAS CONDENSADORAS PARA CONTINUAR CON EL PENDIENTE DE LA CUBIERTA, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ZONA PATIO. IGUALMENTE SE ESTA VIENDO LA VIABILIDAD DE RETIRAR UNA SECCION DE TEJA DE SE PUEDA MOVER PARA TENER ACCESO A EL TANQUE PARA MANTENIMIENTO
- SE INICIA ACTIVIDAD DEMOLICION PAÑETE EXTERNO ESTUCO PARA IMPERMEABILIZACION
- SE SOLICITA CAMBIO MALLA PUERTA ACCESO POR PARQUE COLLADIZO.
- CANALIZACION DE MANGUERA ACOMETIDA PRINCIPAL OFICINA.


ANDEN ACTUAL

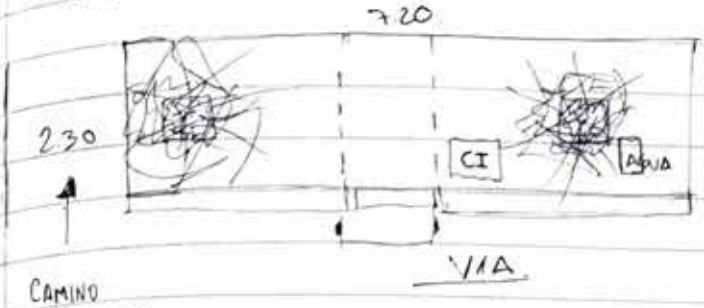

ANDEN PROPUESTO

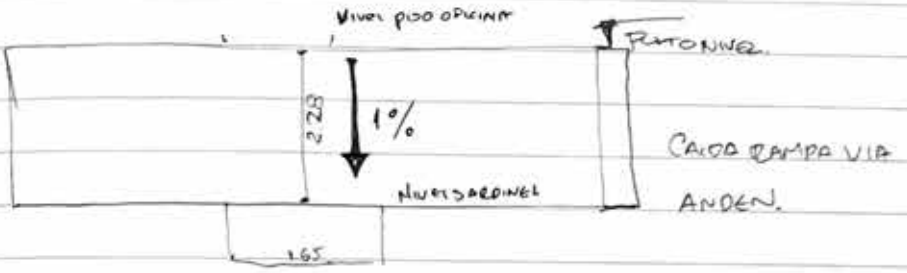

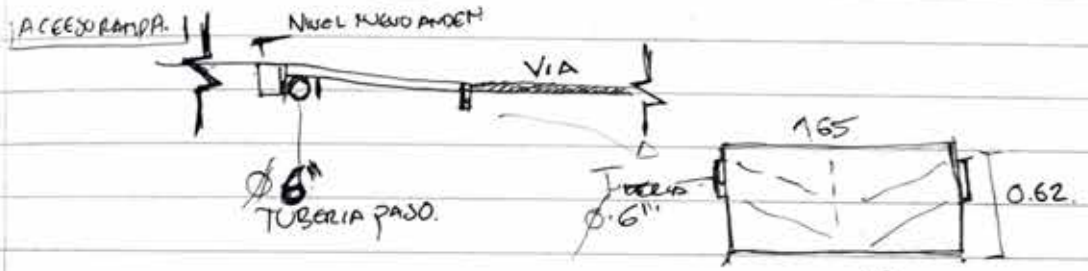

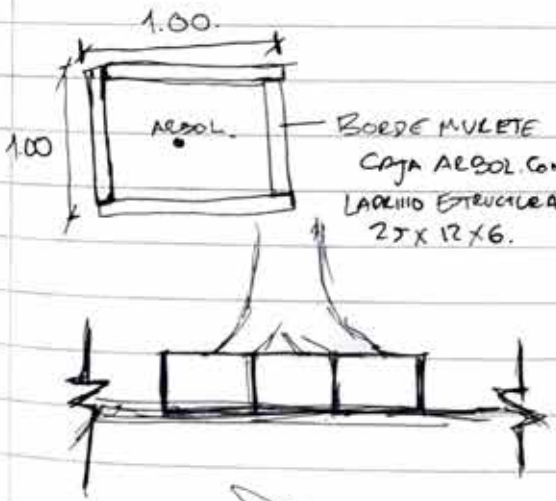

Contratista SIU

Rodrigo Zúñiga A
Ingeniero

· Se realiza compra 60.000 ACPM para funcionamiento planta, departamento se encuentra sin energía.

- SE CONTINUA CON TRABAJOS PINTORES EN BAÑO.
- CONTINUAN TRABAJOS ESTUCO Y REMATES EN MUROS.
- SE REALIZA DESMONTE DE MARCOS ANTIGUA ESTRUCTURA CUBIERTA EN VEREDA EXTERIOR
- SE REALIZA DESMONTE DE BIDON DE DESCARGAS, EXTINTOR, CORTAFUEGO.
- SEGUN APROBACION ACTIVIDADES SE PROCEDE A REALIZAR DEMOLICION PARCIAL EXTERIOR H=0.90. IGUALMENTE CONTINUA EXCAVACION MANUAL PARA RETIRO TUBERIA ANTIGUA EXISTENTE, YA SE HABIA REALIZADO APLICACION 1 MANO DE ESTUCO
- SE REALIZA DESMONTE DE PUNTO HIDRAULICO. ANTIGUA DUCHA. BAÑO QUE SE ENCUENTRA DEMOLICIONES.
-

EQUIPOS.

PULIDORA
ROTOMARTILLO
ESCALERAS

SST.
GESTION PRODUCCION FINAL RESIDUOS.
CHARLAS SST.

PERSONAL OBRA.
CONTRATISTA SIU.

RESIDENTE OBRA (1)
MAESTRO OBRA (1)
OFICIAL (1)
AYUDANTE (1)
SOLDADOR. (1).

CONTRATISTA SIU.

RODOLFO VARGAS A
INDEPENDIENTE

VIERNES 01 NOVIEMBRE.

INICIO: 2 00 pm
FIN. 11.00 pm

ACTIVIDADES

- CONTINUAN TRABAJOS EXCAVACION PARA DESAGUES CANAL
- SE REALIZA AFINADO DE PAÑETES
- CONTINUA RETIRO DE ESTRUCTURA CUBIERTAS SOBRE VENTANAS EN EL EXTERIOR
- CONTINUAN TRABAJOS APLICACION ESTUCO CATORCE3 MURO LATERAL IZQUIERDO ZONA ACCESO PATIO
- REMATES MURO CON NUEVA CUBIERTA PARTE POSTERIOR
- REMATES Y FILOS EN ZONA APLICACION PASIVO MURO POR DEMOLICION APICOT
- CONTINUA APLICACION DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN MUROS EXTERIORES DESPUES RETIRO PAÑETE CON APLICACION POR HUMEDAD
- RETIRO Y CONSTRUCCION MURO CUCHILLA ACCESO A TANQUE
- ALISTADO PISO PARA ENCHAPES BAÑO EN INTERVENCIÓN
- DEMOLICION PISCA APICE EXISTENTE ACCESO LATERAL ZONA PATIO

EQUIPO:

RETROEXCAVADORA
RETROMARTILLO
ESCALERAS.

SST.
CHARLAS SST.
INSPECCION EPC.

PERSONAL OBRA:
CONTRATISTA SIU.

RESIDENTE OBRA (1)
MAESTRO OBRA (1)
OFICIAL (2)
AYUDANTE (3)
SOLDADOR (1).

CONTRATISTA SIU.

ROMULO VARGAS A
INTERVENTORIA

18

SABADO 02 NOVIEMBRE 2024

INICIO: 7:00 am
FIN: 6:00 pm
SENSACION TERMICA 18°
SE PRESENTAN LLUVIAS

ACTIVIDADES:

- EN CONJUNTO CON INTERVENTORIA SE PRESENTA Y SE ELABORA NP DISEÑO E INSPECCION RED ELECTRICA, INFORME FALLAS ELECTRICAS DISEÑO ANALISIS DE CARGAS
SE HACE RECORRIDO EN AREAS YA QUE SE MUEVE MOBILIARIO Y SE EVIDENCIAN AUN MAS AFECTACIONES AL MOMENTO DE DESMONTAR CIELO RASO.
SE REALIZA ENVIO FORMAL DE ESTA INFORMACION PARA LEGALIZACION ACTIVIDAD OCI100047-SN-SNR-2150-24 QUEDAMOS A LA ESPERA DE VAPROBACION PARA ANALIZAR Y VERIFICAR ALCANCE ELECTRICO.
- SE REALIZA APECUACION PARA BAJANTE LAVAMANOS Y CANAL INTERNA ZONA PATIO.
- SE REALIZA MOVIMIENTO DE ESCRITORIOS MODULARES, CAJAS ARCHIVO, ESTANTERIAS SILLAS Y DEMAS MOBILIARIO PARA CONTINUAR CON PROCESO DEMOLICION PAÑETE
- CONTINUAN TRABAJOS INSTALACION TUBERIA PARA BAJANTES CAÑAL VERTICAL Y HORIZONTAL
- SE INICIA CON DESMONTE Y MOVIMIENTOS DE APARATOS ESTUFA - NEVERA EN ZONA COCINA, MICROONDAS, MESAS Y UTENSILIOS
- SE INICIAN ADECUACIONES ANDEN FRONTAL REACUERDO CON ACTIVIDADES DEFINIDAS EN ESTA AREA
- SE REALIZA TRASLADO MOBILIARIO JUNTO A ZONA ARCHIVO SE EVIDENCIA GRAN AFECTACIÓN EN MURO HACIA FACHADA LATERAL
- SE REALIZA DEMOLICION PAÑETE EN ZONA OFICINA CAJAS DESPUES DE MOVIMIENTOS ESTANTERIAS.
- SE INICIA DEMOLICION DE CERAMICA MESON COCINA, INICIO DEMOLICION ENCHAPE MUROS, Y PISOS.
- SE INICIA CONSTRUCCIÓN DE ANDEN. MURO LATERAL 0.60m. ANCHO PARA GARANTIZAR PROTECCION MURO. INSTALACION MALLA
- SE REALIZA ADECUACIÓN DE CAJA EXISTENTE INSPECCIÓN ZONA ANDEN.
- SE REALIZA CORRECCION DE SOLDADURAS ESTRUCTURA APLICACION DE SOLDADURAS PINTU

AMBIENTE PROXIMO

- AGENTE PUNTO DE RED GAS, DESMONTE PLATERO (LAVAPLATOS)

EQUIPO

PULIDORA

ROTOMARTILLO

ESMERIL

EQUPO SOLDADURAS.

SST

GESTION DISPOSICION FINAL RESIDUOS.

RESIDENTE OBRA

CONTRATISTA SIU

RESIDENTE OBRA (1)

MAESTRO OBRA (1)

OFICIAL (2)

AYUDANTE (2)

SOLDADOR (1)

CONTRATISTA SIU.

RODOLFO VARGAS A.

INTERVENTORIA

DOMINGO 03 NOVIEMBRE 2024

INICIO: 7:00 am

FIN: 5:00 pm.

SENSACION TERMICA 22°

LLUVIAS FUERTES

ACTIVIDADES:

SE INICIA CON DESMONTE DE CONDENSADORAS AIRES PARA CONTINUAR CON AMPLIACION.

DE CUBIERTA EN ZONA PATIOS.

- REMATES Y FIJOT VIGA. DEMOLICION ZONA ALCOT, REMATES Y ESTUCOS.
- LIMPIEZA DE MUROS ZONA DEMOLICION PAREDES APLICACION INVECRYL PARA CARBONIZADO IMPERMEABILIZACION
- CONTINUAN TRABAJOS ADECUACION CORREA FINAL AMPLIACION CERCHA PERFIL TUBULAR 120X50X1.5 APLICACION ANTICORROSIVO, SOLDADURA JUNTAS.
- VERIFICACION PUNTO HIDRAULICO, PUNTO ELECTRICO. TOMACORRIENTE Y TOMA GFCI TOMA PARA NEVERA Y MICROONDAS.
- ACTIVIDADES ORDEN Y ASEO DE OBRA.
- ACOPIO DE RESIDUANTES OBRA.

EQUIPOS.

PULIDORA
ESCALERAS
EQUIPO SOLDADURAS.

TEMAS SST.

ORDEN Y ASEO
GESTION RETIRO DE RESIDUOS.

PERSONAL OBRA.
CONTRATISTA SIV.
RESIDENTE OBRA. (1)
MAESTRO OBRA (1)
OFICIAL (2)
AYUDANTE (2)
SOLDADOR. (1)

CONTRATISTA SIV.

RODOLFO VARGAS A.
INGENIERO/A

LUNES 04 NOVIEMBRE

INICIO: 7:00am
FIN- 8:00 pm

SENSACION TERMICA 33°
LLUVIAS SUAVES.

ACTIVIDADES

- SE INICIA CON DESMONTE 2 VENTANAS INTERNAS PARA CAMBIO ALUMINIO
- PROTECCION DE ARCHIVO RODANTE
- DEMOLICION 3 MOTROS MAMPOSTERIA X 0.30 PARA CAIDA CUBIERTA AMPLIACION ZONA PATIO.
- EN VISITA TECNICA, SE ACERCA EL SR ROBERTO VECINO DE LA OFICINA, 3 CASAS Y QUE TIENE PROPIEDAD SERVIDUMBRE HACIA FONDO DEL ALEA SOBRE LA FACHADA LATERAL MANIFIESTA QUE ESA SERVIDUMBRE NO SE PUEDE INTERVENIR. SOLO PERMITE ENTERRAR TUBERIA PARA DESAGÜE CUBIERTA. LAGUNA REJI SE PROCEDE A REMOLER. ANDEN Y A FONDO 0.60 x 5.70 QUE SE HABIA COLOCADO COMO PROTECCION MURO, SE PROCEDERA A ENTERRAR TUBERIA YA QUE NO SE PUEDE EJECUTAR PORQUE SERVIDUMBRE PERTENECE A 4 PREDIOS Y SOLO CUANDO LOS PROPIETARIOS NO ACEPTA ESTA INTERVENCION.

-EQUIPOS.
PULIDORA
ESMERILES
EQUIPOS SOLDADURAS.
-TEMAS SST.
ORDEN Y ASEO
GESTION RETIRO DE RESIDUOS.
-PERSONAL OBRA
CONTRATISTA SIU.
RESIDENTE OBRA (1).
MAESTRO OBRA (1)
OFICIAL (2)
AYUDANTE (2)
SOLDADOR (1)
MAESTRO OT NUNCIABLE

INICIO: 7:00 am.
FIN: 9:00 pm.

SENSACION TERMICA 33°
SIN LLUVIAS.
ACTIVIDADES:

CONTRATISTA SIU.

ROMEO VARGAS A
INTERVENTORIA.

> ENVIADA DESALOJADA CON EL VECINO SR. ROBERTO BECERRA SE LE INFORMA DEL ANDEN POR MURO LATERAL PARA PROTECCION MURO POR HUMEDAD SE GARANTIZA RELLENO EN CORRECTA SERVIDUMBRE HACIA LOT DEMAS PREDIOS, ENTIENDE QUE ESTO TAMBIEN BENEFICIA EL TRABAJO POR ESTA AREA

vecino y dueño

> POR SOLICITUD SR NOTARIO SE SOLICITA RETIRAR CONDENSADOR QUE ESTA SOBRE MURO LATERAL IZQUIERDO YA QUE LAS CONDENSADORAS DE MUEBLES AIRES ESTAN EN 2DO PATIO, SE DESMONTARA Y SE ENTREGARA A FUNCIONARIOS.

- SE REALIZA FUNDICION DE ANDEN FRONTAL PARA NIVELACION ACCESO, SE HACE CIERRE PERIMETRAL CONTORNO DE 10 ARMEX, SE FUNDE CONCRETO 3000psi CON MALLA FUNDIDA 10CM.
- RETIRE ESTUCO ZONA OFICINA JUNTO A CAJAS RECEPCION PUBLICO
- TRASLADO DE ESCOMBROS Y MADERA A PUNTO AUTORIZADO LOTE ALEDAÑO CON AUTORIZACION PROPIETARIO, SE ESTA A LA ESPERA DE RETIRO DE MADERA POR DEMOLICION.
- DEMOLICION ANDEN TABIQUILLO GRES ZONA ESPERA PUBLICO.
- MOVIMIENTO TIERRAS PARA GARANTIZAR CAMINO SERVIDUMBRE VECINOS.
- CONTINUAN DESMONTES DE CIELO RASO PARA OFICINA Nº 3.

EQUIPOS.
PULIDORA
ESMERILES
EQUIPOS SOLDADURAS.

TEMAS SST.
GESTION DISPOSICION RESIDUOS

PERSONAL OBRA
CONTRATISTA SIV.
RESIDENTE OBRA (1)
MAESTRO OBRA (1)
OFICIAL (2)
AYUDANTE (3).

CONTRATISTA SIV

LUNES 06 NOVIEMBRE

INICIO: 7:00 am.
FIN. 8:00 pm

Sensacion termica 33°
Sin lluvias

Actividades

- Se Realiza Trabajos de Pañete en "Sala de espera, Donde se finaliso el trabajo, En la Oficina N°03".

- Se Continua Realizando Remate de Estuco En la Oficina N°2, Oficina N°3

- Desmonte de Cielo Raso en Drawall

- Demolicion del Ante Jardin Zona de Espera

- Se Desmonto Condensadora de la Oficina N°03

- Se Tapa la Parte donde Estaba Ubicado Anteriormente el Condensador de la Oficina N°03 y Se Pañeta.

- Se Realiza la Tapa Registro de la Cocina, Fundida.

Equipos

Polidora
Escaleras
Equipos de Soldadura.

Temas SST

Gestion Disposición Residuos

Persona De Obra

Contratista Siv

Residente De Obra (1)
Maestro Obra (1)
Oficial (2)
Ayudante (3)

Contratista SIV
RODRIGO VARGAS L.
INTERVENTORIA

Jueves 07 Noviembre.

Inicio: 9:00 Am
Fin: 9:00 Pm

Sensacion Termica: 35°

Sin Lluvia:

Actividades

- Se Continua el Desmonte del Cielo Raso en Drywall
- Desmonte de Perfileria del Cielo Raso
- Se lija y Se le Aplica Una Mano de Pintura a la Oficina Principal
- Se Hacen Remates De la Filetaria de las Ventanas de la Oficina N° 03
- Se Empieza Con el Enchape De la Cocina
- Se Realiza La Limpieza para Colocación de la Cinta en Granito

- Se Empezo A Montar Estructura Para Cielo Raso en PVC

Equipos

Polidora)
Escaleras)
Equipos De Soldadura)

Temas SST

Gestion Disposición Residuos)

Personal Obra

Contratista SIU

Residente De Obra (1) Ronaldo Vanegas A.
Maestro De Obra (1)
Oficial (2) Contratista SIU
Ayudantes (3)

Viernes 08 Noviembre

Inicio: 7:00 Am
Fin: 5:00 Pm

Sensacion Termica 32°
Nevisna

Actividades

- Se Desmonta Cielo Raso y Estructura

- Se Terminan El Panite interno.
- Se Continua Montando Estructura Del Cielo Raso
- Se Continua Enchapando Cocina y Baño
- Se Continua Pandeleteando Con Estuco Interior
- Se Finaliza Limpieza para Aplicar la Cinta Granito
- La Jornada Laboral Finaliza A La 5:00 Pm. Por Que Llegaron A Fumigar
- No Notifican Que El Dia De Mañana No Abra energia
-

Equipos

Poliadoras
Escaleras
Equipos De Soldadura

Temas Sst

Gestión Deposición Residuos

Personal De Obra

Contratista Siv

Residente De Obra (1)
Maestro De Obra (1)
Oficial (2)
Ayudante (3)

Contratista Siv

Ronaldo Vargas A

Sabado 09 Noviembre

Inicio: 7:00
Fin : 9:00

Sensacion Termica

Actividades

- Se Continua Encofrando en el Baño
- Se Continua Acodando con Estos Interior Oficina Principal y N°02
- Se Pinta Estructura Con Antioxidante
- Se Realiza El Desmonte de Canal y Se Realiza Dicha limpieza de Bajo canal, Se le Aplica el producto y Se Coloca manto
- Se le Pide A los Jefes de Obra Conseguida Permiso Para hacer Actividades en Altura y Encima del Techo, de conseguida.
- Se Empieza Aplicar el granito.
- Se Realiza Aseo en la Obra Al final de la jornada.
- Se Realiza Soldadura de Canal.

Equipos

Pulidora
Escalera
Equipos de Soldadura

Temas SST

Gestion Disposicion Residuos

Personal de Obra

Contratista SJ
Residente de Obra (1)

Maestro De Obra (1)
Oficial (2)
Ayudante(s) (3)

Contratista Sub

Rodolfo Vargas A.

Domingo 10 Noviembre

Inicio 07:00 am
Fin: 07:00 p.m

Sensacion Termica.

Actividades

- Se Aplica El Producto A la Aplicación De Granito Interior
- Se Continua Estructurando Para Cielo Raso En Pvc
- Se Continua Pandeo de Remates Con Estuco interior
- Se Realiza la fabricación de Canal, Se Masilla y Se Pinta.
- Se Organiza El Patio. Se Recoje Escombros y Basura
- Se Organiza Material De Obra.
- Al Final De Jornada Se Realiza El Debido Aseo

Equipos

Escaleras
Pulidoras
Equipos De Soldadura.

Temas Sst

Gestion Disposicion Residuos

Personal De Obra

Contratista Sin
Residente De Obra (1)
Maestro De Obra (1)
Oficial (2)
Ayudantes (3)

Contratista Sin

Ronaldo Vargas

Jueves 11- Noviembre

Inicio: 07:00 am
Fin: 07:00 pm

Sensación Termica.

Actividades

- Se Termina de Emchapar Paredes de Baño y Cocina
- Se Lija y Se Pinta Oficina N°01 y Pasillo, Se Deja Lijado la Oficina N°02
- Se Continua Estructurando Cielo Raso
- Se Continua Aplicando Estuco interior "Remates"
- Se Hace Jornada de Aseo, Limpieza de los Ventanales, Se Organizan las Mesas, Sillas, Cajas y Demas objetos

Equipos

Escaleras
Pulidoras
Equipos de Soldadura

30

Tema SST

Gestion Proposición Pasados

Personal De Obra

Contratista SIV
Residente De Obra (1)
Maestro De obra (1)
Oficial (2)
Ayudantes (3)

Contratista SIV

Ronaldo Vargas A.

Martes 12 Noviembre

Inicio: 07:00 am
Fin: 02:00 pm

Sensación Termica 33° - Nublado Lluvioso

Actividades

- Se Empieza A Colocar Permanentes De Ciclo Raso
- Se Empieza A Lijar y Pulir La Cinta Granito
- Se Continua Aplicando Estuco Interior (Pendiente)
- Se Sigue Emchapando Baño y Cocina
- Se Continua Estructurando Ciclo Raso
-

Equipos

Escaleras
Pulidora
Equipos De Soldadura.

Temas SST

Gestion Disposicion Residuos

Personal De Obra

Contratista SIV
Residente De Obra (1)
Maestro De Obra (1)
Oficial (2)
Ayudantes (3)

Contratista SIV

RONALDO VARGAS A

Fecha 13 Noviembre

Inicio: 07:00 Am
Fin: 02:00 Am

Sensacion Termica 38°

Actividades:

- Se le da Acabado De Enchape De Cocina.
- Se Realiza Soldadura Para Cubierta Donde Esta Ubicada La Planta
- Se Realiza El Entechado De Cubierta Donde Esta Ubicada La Planta.
- Se Realiza Desmonte De Tejas De Eternit Con El Patio - Fondo
- Se Continua Dando Remate De Estuco.
- Se instala Pararrayos Para Puc

Equipos

Escaleras
Pulidoras

Equipos De Soldadura.

Temas SST

Gestion Disposicion Residuos

Personal De Obra

Contratista SW
Residente De Obra (1)
Maestro De Obra (1)
Oficial (2)
Ayudante (3)

Contratista SW

RONALDO VANEGAS A

Jueves 14 Noviembre.

Inicio: 07:00 Am
Fin: 10:00 Pm

Sensacion Termica. 30° Nublado

Actividades

- Se le Ri El Dedaleo Al Enchape De Baño Con La Respectiva Fragua y Se Pego Sanitario
- Se Continua Fundicion De Muro Lateral
- Se instala Perimetrales Para Pvc
- Se Hace Arreglo De Filtreria Oficina Principal
- Se Hacen Retoques De Estuco Interior.

Equipos
Excalera
Pulidora
Equipos De Soldadura

Temas SST

Gestion Disposicion Residuos

Personal Obra

Contratista Siv
Residente Obra (1)
Maestro Obra (1)
Oficial (2)
Ayudante (3)

Contratista Siv

RODRIGO VARGAS A

Fecha 15 Noviembre

Inicio: 07:00
Fin: 10:30

Sensacion Termica 31° Nuvado

Actividades

- Se Realiza Pasta Losa Trapecios Fundida.
- Se Realiza La Soldadura de Canal
- Se Organiza Patio
- Se Recoge Escombros y Basura Del Patio
- Se Revisa Destoque De Bajante
- Se Realiza Aseo Al Final De La Obra
- Se Hace Soldadura de Perfiles Para Cubierta Frontal
- Se Cambia Estructura De Techo Frontal
-

Equipos

Escaleras

Relatores
Equipos de Soldadores

Temas SST

Gestión Disposición Residuos

Personal de Obra

Contratista Sic
Residente Obra (1)
Maestro Obra (1)
Oficial Obra (2)
Ayudante (3)

Contratista Sic

RODOLFO VARGAS A

Sabado 16 Noviembre

Inicio: 07:30
Fin: 05:00

Sensacion Termica 24° Nublado

Actividades

- Se Termina de Soldar Estructura Metalica Para Cubierta Frontal
- Se Deja Techado Cubierta Frontal
- Por Condiciones del clima No se Puede Realizar Cubierta, donde Esta Ubicado Las Oficinas
- Se Cubre Con Plastico la Oficina N°02, Cocina y Baño Cocina
- los Computadores de la Oficina N°02, Se Guarda en Caja
-

Equipos

Exaltores)
Pulidores)
Equipo De Soldadores.

Temas SST

Gestion Disposicion Residuos

Puesta a Obra

Contratista Siv
Residente Obra (1)
Maestro Obra
Oficial (2)
Ayudantes (2)

Contratista Siv

Rodolfo Vargas A

Domingo 17 Noviembre

Inicio: 07:00
Fin: 05:00

Sensación Termica 25° Nuble - Lluvioso

Actividades

- Por Cuestiones Del clima No Se puede Realizar Trabajos En Cubiertas.
- Se maquilla y Se Pule Estructura De Cubierta Frontal
- Se Suelda Pie Amigos para Canal Lateral
- Se Empieza Demolicion De Baño

Equipos

Escaleras
Pulidoras
Equipos de Soldadura

Temas Sst

Gestión Disposición Residuos

Personal De Obra.

Contratista Sw
Residente De Obra (1) Contratista Sw
Maestro Obra (1)
Oficial (3)
Ayudante (2)

Ronaldo Vargas A

Lunes 18 Noviembre

Inicio: 05:00 Pm
Fin: 03:00 Am

Sensación Termica 22°

Actividades

- Se Demuele Baño y Se Desinfala Sanitario, Lavamanos, y Demas Accesorios
- Se instala Lavamanos En Baño
- Se Corren Cielorraso y Demas Objetos Que Estaban Ubicados En El Costado Cocina
- Se Aplica Segunda Mano De Pintura En Estructura Metalica De La Cubierta Frontal
- Se Recoge y Se Sacan Escombros De La Demolición
- Se Aplica Malla Para Estructura De La Cubierta Frontal
- Se Organiza y Se Recoge Material Del Patio

Equipos

Escaleras

Peluderos
Equipos De Soldadura

Temas SST

Gestión Disposición Residuos

Personal Obra

Contratista SIV
Residente De Obra (1) Contratista SIV
Maestro ( )
Oficial (2)
Ayudante (2)

Rodolfo Vanegas A

Fecha: 19 Noviembre

Inicio: 02:00 Pm
Fin: 10:00 Pm

Sensación Termica 33°

Actividades

- Se Continua Demoliendo Baño
- Se Retoca Fachada Lateral para Aplicarle la primera capa de Pintura.
- Se Hacen Arreglos De Tuberia por El Agua.
- Se Desmonta Techo de Cocina y Se monta Canal y Perfil Metalico Sosteniendo la Canal.
- Se Encarpa Escaparates Ubicados Pasillo Cocina.
- Se Recojen Escombros De la Medicion Echa en el Baño
- Se Techa Con Eternit y Se Coloca Flanchon Pegado A la Canal.
- Se Realiza Aseo General De la Obra.

Equipos

Polidoras
Exaleras
Equipos De Soldadura.

Temas Sst

Gestion Disposición Residuos

Personal Obra

Contratista SIU
Residente Obra (1)
Maestro ( )
Oficial (2)
Ayudante (2)

Contratista SIU

Ronaldo Vargas A.

Miercoles 20 Noviembre

Inicio 06:00 Am
Fin 06:30 Pm

Sensación Termica: 33°

Actividades

- Se Continua Adelantando Detalles Fachada Lateral
- Se Empieza A Quitar Cubierta Parte Pasillo y Cocina
- Se Quita Vigas De Madera y Se Coloca Nueva Perfileria

Equipos

Polidoras
Escaleras

Temas SST

Gestion Desposicion Residuos

Personal De Obra

Contratista SIU
Residente Obra (1)
Maestro (1)
Oficial (2)
Ayudante (2)

Contratista SIU

ROMULO VARGAS S.

Viernes 22 Noviembre

Inicio: 09:30 Am
Fin: 10:20 Pm

Sensación Termica 30°

Actividades

- Descargue De Carro Con Material
- Se Desmonta tejas Fondo Patio y Se Quita Porteleria y Se Colaca Porteleria En C. y Se Vuelve A Techar Cubierta
- Se Colaca Porteleria y Se Da Acabado A la Cubierta Frontal
- Se Lija y Se Continua Detallando Fachada Lateral
- Se Hace la Demolicion Final De Piso Roja Sala Espera "Exterior"
- Se Continua Doublo Remates De Estuco Interior
- Se Corren y Se Tapan Muelles Oficina N°02 y Sala de Espera "Interior" Computadore Encrgadas y Moviles
- Se Realiza Sobre Piso Del Piso Sala Espera "Exterior"

Equipos

Escaleras

Peluderos)
Equipos De Soldadura

Temas SST

Gestión Disposición Residuos

Contratista SIU
Residente obra (1) Contratista SIU
Maestro (1)
Oficial (1)
Ayudante (2)

RODOLFO VARGAS A.

Sabado 23 Noviembre.

Inicio
Fin:

Sensación Termica 29° Nublado

Actividades

- Se Obtuvo y Se Aplico Lectura En la Oficina N°2
- Se le es Pedido A la Cobertor Frontal
- Se Fija Oficina y Cielo
- Se Aplico Lectura A Estructura De Red De Datos Oficina N°2
- Se Fija y Se Pide Estructura De Red De Datos Oficina N° 2 y N°3
- Se Empieza Enchape De Pared Sala De Espera "Exterior"
- Se Levanta Enchape De Pared Sala de Espera "Exterior", del instalador de Cerveda Linea de Ceramica Con la de Adentro.
- Se Organiza de Oficina N°2
- Se Realiza Aseo general

Equipos

Soldadores
Escaleras
Equipo de Soldadura

Temas SST

Gestion Disposición Residuos

Personal de Obra

Contratista SIV
Residente Obra (1)
Maestro (1)
Oficial (2)
Ayudante (2)

Contratista SIV

DOMINGO VARGAS A.

Domingo 24 Noviembre

Inicio: 08:00 Am
Sensación Termica 32° Nevosas Fin: 10:00 Pm

Actividades

- Realizamos Desmontaje Cubierta, Retiro Madera y Cambiarla Por La Particion Nueva.
- Se da Avance de Demolición de Enchape de Baño
- Se Realiza Nuevamente el Enchapado del Piso Exterior
- Se Continua Pendeh Acabado Pasillo Cocina
- Se Realiza Aseo General
- Se da inicio a la Demolicion del Pañete Fondo Alpes de Cocina
- Se Resanan Paredes, Ventana Cocina
- Se Organizan Muebles y Computadores de los Oficinas N°02 - N°03

Equipo

Escalera
Alidores
Soldador
Herr. Espatula

Tema SST

Gestión Disposición Residuos

Personal Obra

Contratista SIV
Residente Obra (1)
Maestro (1)
Oficial (1)
Ayudante (2)

Contratista SIV

Ronaldo Vargas A.

Lunes 26 Noviembre

Sensación Termica: 33°

Inicio: 08:00 Am
Fin: 06:00 Pm

Actividades

- Se Finaliza instalación de Caballetes de la Cubierta
- Se Organiza y Se Corren Herramientas, Material y demas Cosas Para Iniciar A Resanar Paredes del Patio
- Se Resanan Paredes del Patio y Se le Aplica Imprimy
- Se Finaliza Enchape del frente "Piso"
- Se Cuadran Filos de la Puerta Pasillo
- Se le Aplica Segunda Mano de Estuco Piso "Ventana Cocina"

Equipos

Escalera
Equipos de Soldadura

Temas SST

Gestión Disposición Residuos

Personal De Obra.

Contratista SIU
Residente Obra (1)
Maestro (1)
Oficial (2)
Ayudante (2)

Contratista SIU.

Ramiro Vargas A

Martes 26 Noviembre

Inicio: 08:00 Am
Fin: 06:00 Pm

Sensación Termica. 32°

Actividades

- Empezamos A Raspar Pegado En Patio
- Aplicamos imprimgl En Paredes Raspadas
- Aplicamos repellante En Paredes Raspadas
- Recogimos Escombros y limpiamos Patio
- Corrimos muebles que Se encontraban Ubicados Cerca A La Planta Electrica y Demas Cosas
- Lijamos Paredes donde Se instalo las Ventanas de Aluminio y luego Se le Aplica Una mano de Pinturas
- Se le Aplica La Ultima mano de Color a las Paredes de la Oficina N°03

- No Se Pudieron Seguir Realizando Actividad de Limpiar Pared y Cerca A la Rueda de Acceso del Patio por cuestiones de Corte Cerca A ella.
- Se Aplica Sikaco En Pasillo Externo
- Se Realiza Aseo General de la Obra.

Equipos

Escaleras
Pulidoras
Equipos De Soldadura

Temas SST

Gestion Reparación Rendos

Personal de Obra

Contratista SIU
Residente Obra (4)
Maestro ( )
Oficial (2)
Ayudante (2)

Contratista SIU

RONALDO VARGAS X

Fecha 27 Noviembre

Inicio : 08:00 am
Fin : 08:00 pm

Sensación Térmica

SE INFORMA AL REGISTRADOR DEL COLOR PARA MUEBLES SE ENTREGAN 3 MUESTRAS DE BARNIZADO FASINO, MILAN, ESCOGEN PARA PUERTAS Y MUEBLE COCINA COLOR ROBLE OSCURO.

Actividades.

- Se realiza orden y aseo general de la obra
- Continuan trabajos resane de muros en patio interior.
- Aplicacion de pañete en baño N° 2.
- Proteccion general de mobiliario. - Proteccion zona back para retiro y trabajos de ventana
- Desmonte de ventanas existentes sobre fachada.
- Instalacion red sanitaria en baño N° 2.
-

Equipos: Extensiones
Pulidoras
Equipo soldadura.

Temas SST: Limpieza general espacios, retiro de ventaneria en lote aledaño
Segun indicacion Registrados, en tanto se termine la obra.

Personal de obra:
Contratista SIO
Residente de obra (1)
Maestro (1)
Oficial (2)
Ayudantes (2)

Contratista SIO

Rodolfo Vargas A

Jueves 28 Noviembre

Inicio 2:00 pm.
Fin. 10:00 pm.
Sin lluvias, Dias Soleados.

Actividades.
- Continuan trabajos aplicacion de vanos para 4 viviendas faltantes

- CONSTRUCCION MURO EN BLOCK PARA CIERRE VANO VENTANA QUE SE TRASLADO
- CANALIZACION REGAGUE AIRES ACONDICIONADOS
- SE REALIZO INSTALACION DE VENTANERIA ALUMINIO, 3 VENTANAS FACHADA LATERAL IGUALMENTE VENTANAS INTERNAS
- REGISTRADOR SOLICITA POLIZA SEGUROS COLOR BLANCO.
- CONTINUAN TRABAJOS ESTUCO - LIJADO.
- POR SOLICITUD SE REALIZARA A INTERVENTORIA Y SUPERVISION Y SEGUN INDICACION DE LOS MISMOS, LOS ITEMS ELECTRICOS QUE SE TRAIGAN DE LA MATRIZ PARA CUMPLIR CON EL DISEÑO ELECTRICO TENDRAN UN INCREMENTO 10% YA QUE POR CONDUCTAS DE LOCAL EJECUCION, TANTO MANO DE OBRA COMO MATERIALES NO SE AJUSTAN A PRECIOS DE LA ZONA.

EQUIPOS: ESCALERAS
PULIDORAS
EQUIPO SOLDADURA

TEMAS SST.: ASEO.
TRASIEGO BASURA RESULTANTE OBRA.

PERSONAL
CONTRATISTA SU
RESIDENTE OBRA (1)
MAESTRO (1)
OFICIAL (2)
AYUDANTES. (2).

CONTRATISTA SU.

RODOLFO VARGAS A

SIGUIENTE 29 NOVIEMBRE

INICIO: 2:00 pm
FIN: 10: pm.
DIA SOLEADO SIN LLUVIAS

ACTIVIDADES:

- CONTINUAN TRABAJOS SOBRE FACHADA LATERAL DERECHA INTERNA Y LATERAL IZQUIERDA.
- CONTINUA TRABAJO VARIOS, CONSTRUCCION MURO VENTANA QUE SE RETIRO EN ZONA RACK.
- CONTINUA INSTALACION DE VENTANERIA.
- REMATES GRUESO.
- BODEGUILLA PISO INTERIOR ZONA ESPERA FACHADA.

EQUIPOS ESCALERA
PULIDORA.

TEMAS SST. LIMPIEZA GENERAL ESPACIOS, RETIRO VENTANERIA EN LOTE TRASLEGO.

PERSONAL.
CONTRATISTA SIV.

RESIDENTE OBRA (1)
MAESTRO (1)
OFICIAL (2)
AYUDANTE (2).

CONTRATISTA SIV.

RONALDO VARGAS A.

SABADO 30 NOVIEMBRE
INICIO: 7:00 am.
FIN: 5:00 pm.
DIA SOLEADO

ACTIVIDADES.

- CONTINUAR TRABAJOS SOBRE FACHADA LATERAL IZQUIERDA, RETIRO VENTANA OFICINA REGISTRADOR.

- TERMINOS VANOS PUERTAS ACCESO BAÑOS.
- RETIRO REJAS. PULIDO, AJUSTE PIEZAS TORCIDAS RETIRO GROUT Y PULIDORA DE OXIDACIÓN
- APLICACION UÑA BARANDE
- CANALIZACION MANGUERA SUMINISTRO ACUEDUCTO SOBRE FACHADA LATERAL IZQUIERDA
- CONTINUAN REMATES ESTUCO INTERNO

EQUIPO: ESCALERA
PULIDORA.

TEMAS SST. ASEO GENERAL.
CHARLAS SST.

PERSONAL
CONTRATISTA SIU.

RESIDENTE OBRA (1)
MAESTRO (1)
OFICIAL (2)
AYUDANTE (2)

CONTRATISTA SIU.
RONALDO VARGAS A

DOMINGO 01 DICIEMBRE
NO SE REALIZAN ACTIVIDADES.

LUNES 02 DICIEMBRE
INICIO 2:00 pm.
FIN: 11:00 pm.
DIA SOLEADO SIN LLUVIAS.

ACTIVIDADES:

- CONTINUAN TRABAJOS ESTUCO ZONA INTERNA OFICINAS ULTIMA CAPA.
- CONTINUAN TRABAJOS OFICINA REGISTRADOR.
- SE TERMINA INSTALACION DE VENTANERIA EN COCINA Y ZONA RECLIVO
- SE INICIA LIJADO DE CINTA GRANO CERAMICA Y MURO EN PERIMETRO DEMOLICION GUARDAESCOBAS.

511

EQUIPOS: PULIDORA
ESMERILES

TEMAS SST: ORDEN Y ASEO.

PERSONAL OBRA
RESIDENTE OBRA (1)
MAESTRO (1)
OFICIAL (2)
AYUDANTE (4)



COMERCIALIZA SIU

RODOLFO VARGAS D.

MARTES 03 DICIEMBRE

INICIO:

FIN.

SIN LLUVIA, DIA SOLEADO

ACTIVIDADES

- SE INICIA MANTENIMIENTO DE REJAS FACHADA FRONTAL LIJADO, RETIRO DE OXIDACION, APLICACION HUESO DURO. ENCINTADO PARA PINTURA ESTRUCTURA NUEVA CUBIERTA FACHADA PRINCIPAL
- PINTURA ESMALTE BLANCO PRIMERA MANO REJA FACHADA + ANTICORROSIVO.
- CAMBIOS MARCO BLOQUE CUBRE VANO VENTANA BACK.
- INSTALACION RED SANITARIA PARED 02.

EQUIPOS: PULIDORA
ESMERILES.

TEMAS SST: ORDEN ASEO
CHARLAS

PERSONAL OBRA.

RESIDENTE OBRA. (1)
MAESTRO (1)
OFICIAL (4)
AYUDANTE (3)

CONTRATISTA SLU

RODOLFO VANCAS A

MIERCOLES 04 DICIEMBRE

INICIO:
FIN:

SIN LLUVIAS DIA SOLEADO.

ACTIVIDADES:

- CONTINUAN TRABAJOS INSTALACION RED SANITARIA BAÑOS
- APLICACION 2DA MANO ESTUCO ZONA ENCUENTRO LIMPIEZA
- LIMPIEZA JUNTA GRANITO ENTRE CERAMICA Y MURO.
- APLICACION PINTURA VINILO MUROS FACHADA PRINCIPAL
- ASEO GENERAL OFICINA

EQUIPOS: ROTOMARTILLO
ESCALERAS
TALADRO.

TOPOS SST. ORDEN Y ASEO
CHARLAS.

PERSONAL OBRA

CONTRATISTA SLU.

RODOLFO VANCAS A

RESIDENTE OBRA (1)
MAESTRO (1)
OFICIAL (4)
AYUDANTE (3).

JUEVES 05 DICIEMBRE

INICIO

FIN.

DIA SOLEADO, SIN LLUVIAS.

ACTIVIDADES:

- RESANO SOBRANTES OBRA ALMACENADOS, DESCARGUE VENTANAS, APARATOS
- SE TERMINA FUNDICION ANDEN PARTE POSTERIOR FACHADA LATERAL, ARREGLO Y ADECUACION CAJA SUMINISTRO HIDRAULICO
- DEMOLICION PISO FACHADA PRINCIPAL POR CAMBIO PISO CERAMICO INSTALADO
- APLICACION 2DA MANO ESTUCO ZONA INTERNA PATIO, BODEGA ARCHIVO
- SE REALIZA INSTALACION DE ANDEN ORD SEGUN ANTE OFICIAL SE REALIZA PRUEBA ILUMINACION, INSTALACION DEACUERDO A APROBACION REGISTRADOR
- ALINEACION CUBIERTA FACHADA, TEJAS UPVC
- ASEO GENERAL
- INICIAN TRABAJOS ELECTRICOS / DESMONTE TABLERO CAJA ALIMENTACION PRINCIPAL

EQUIPOS PULIDORA
TALADROS
ESCALERAS

TOMAS TST. ORDEN Y ASEO
LIMPIEZA GENERAL

PERSONAL OBRA

RESIDENTE OBRA (1)
MAESTRO (1)
OFICIAL (4)
AYUDANTE (3).

COMERMIKA SAS.

RODOLFO VARGAS A.

VIERNES 06. DICIEMBRE.

INICIO:

FIN:

DIA SOLEADO SIN LLUVIAS

ACTIVIDADES:

INSTALACION ENCHAPE PARED MURO 02.

- ALISTADO PISO BAÑO 02, INSTALACION ENCHAPE.
- PULIDO CON GRATA DE REJAS FACHADA LATERAL IZQ, RETIRO PINTURA, OXIDACION PLANEACION DE ESTRUCTURA
- ALINEACION FILOS SOBRE FACHADA LATERAL IZQUIERDA ACCESO
- APLICACION D2 MANO PINTURA EXTERIOR FACHADA LATERAL IZQUIERDA
- LIMPIEZA REJAS CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE PROTECTOR VENTANERIA EXTERIOR LATERAL IZQUIERDA
- ARMADO DE SOPORTES PARA CANAL APLICACION DE ANTICORROSIVO, SOLDADURA.
- UNION CANAL METALICA PARA FACHADA LATERAL IZQUIERDA.
- EMBOQUILLE DE CERAMICA BAÑO 02.
- ASEO GENERAL.

EQUIPO: PULIDORA
TALADRO
ESMALGRAS

TEMAS SST. ORDEN Y ASEO
CHARLAS SEGURIDAD
INSPECCION EPP.

PERSONAL OBRA
RESIDENTE OBRA (1)
MAESTRO (1)
OFICIAL (1)
AYUDANTE (3).

CONTRATISTA SEU.

RONALDO VARGAS A.

5-1

SABADO 07 DICIEMBRE

INICIO

FIN.

DIA SOLEADO / SIN LLUVIAS

ACTIVIDADES

- SE REALIZA INSTALACION DE MANTO RICAPA IMPERMEABILIZACION SOBRE PLACA TANQUE
- CAMBIO DE UNIVERSAL Y EMPAQUES PARA ~~LAVA~~ TANQUE, CAMBIO DE FLOTADOR
- RESANE Y PINTURA EN EXTERIOR ZONA CAJAS ESPERA PUBLICO.
- ESTUCO EN ZONA BAÑOS Nº 02. Y 01 PARTE SUPERIOR ENCHAPE
- LIJADO GENERAL OFICINA.
- SE REALIZA DESPUNTEO ANDEN ACCESO PRINCIPAL
- PEGATAS Y DESMONTE INSTALACION NUEVO TABLERO ZONA ATENCION A PUBLICO, DESMONTE CAJA METALICA.
- SE REALIZA INSTALACION TABLON GRES, ESPERA MENA PARA ACABADO PISO.

EQUIPOS PULIDORA
TALADRO
ESCALERAS

TOMAS DST. ORDEN Y ASEO
LIMPIEZA GENERAL

PERSONAL OBRA
RESIDENTE OBRA (1)
MAESTRO (1)
OFICIAL (4)
AYUDANTE (3).

CONTRATISTA SIV.

RODOLFO VARGAS

08 DICIEMBRE

INICIO
FIN

DIA SOLEADO / SIN LLUVIA.

ACTIVIDADES

- CONTINUAN TRABAJOS EN ANDEN FACHADA PRINCIPAL
- PINTURA 2DA MANO INTERNA, EN TODOS LOS MUROS
- CONTINUAN TRABAJOS ELECTRICOS INSTALACION TUBERIA EMT, CABLEADO
- APLICACION ESTUCO ZONA BAÑOS INTERIOR EXTERIOR
- ORDEN Y ASEO

EQUIPOS PULIDORA,
ESCALERAS
TALADRO

TEMAS SST ORDEN Y ASEO
LIMPIEZA GENERAL.

PERSONAL OBRA
RESIDENTE OBRA (1)
MAESTRO (1)
OFICIAL (4)
AYUDANTE (2)

CONTRATISTA SEO RODOLFO VARGAS A

09 DICIEMBRE

INICIO
FIN.

DIA SOLEADO / SIN LLUVIAS.

ACTIVIDADES:

- CONTINUAN TRABAJOS APLICACION ESTUCO EN ZONA CONDENSADORAS.
- LIJADO DE CINTA GRANITO PARA UNION ENCHAPE PISO MUROS
- CONTINUAN TRABAJOS INSTALACION TUBERIA EMT, CAMBIANDO GARGANTA INSTALACION DE CAJAS.
- SE REALIZA PARCHE IMPERMEABILIZADO EN MURO JUNTO A COLUMNA, INSTALACION MALLA VIDRIADA YA QUE MURO PRESENTA DESPRENDIMIENTO HUMEDAD, APLICACION ACRONAL, SE PINTARA GUARNECIDOS.
- RETIRO DE MUEBLES HACIA ZONA POSTERIOR PARA NUEVA ZONA CUBICATA.
- SE REALIZA INSTALACION DE CIELO RASO PVC EN ZONA ATENCION PUBLICO, INSTALACION DE LAMPARAS EN ESTA ZONA
- INSTALACION DE CIELO RASO PVC EN OFICINA REGISTRADOR INSTALACION, TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES, LAMPARAS
- INSTALACION GUARNECIDOS OFICINA REGISTRADOR.
- APLICACION ULTIMA MANO PINTURA REGISTRADOR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

PULIDORA

ESCALERAS.

TALADROS.

PERSONAL OBRA

CONTRATISTA SEU

REGISTRO OBRA (1)

MAESTRO (1)

OFICIAL (4)

AYUDANTE (2).

CONTRATISTA SEU

RONALDO VARGAS R.

MARTES 10 DICIEMBRE

INICIO

FIN

DIA SOLEADO SIN NUBES.

ACTIVIDADES.

-ENCIMPE PUESTA, WIN BOQUILLA
- SE SUBE PUNTO HIDRAULICO SEGUN SOLICITUD RECIRCULACION.
-SE INSTALAN SANITARIOS Y LAVAMANOS, REMATES BOQUILLA. PARA ZONA BAÑOS.
-APOYO DE VARIOS PARA PUESTAS BAÑOS.
-SE REALIZA APOYO Y ORGANIZACION DE TUBERIA CONDENSADORES, INSTALACION PIEZOMETROS PARA CONDENSADORA QUE SE DESMONTO POR NUEVA CUBIERTA
-ABOCINADO TRASLADO PUNTO BRAZALETE 3" PARA CANAL
- CONTINUAN TRABAJOS ELECTRICOS INSTALACION TUBERIA, BREACKERS / TOMAS CORRIENTES PARA SALIDAS LAMPARAS.
- SE INICIA INSTALACION CIELO RASO EN OFICINA JUNTO A ARCHIVO.
LIMPIEZA GENERAL TRASIEGO DE MUEBLES.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
PULIDORA
ESMERILES
TALADROS

PERSONAL OBRA
CONTRATISTA SEV.

RESIDENTE OBRA (1)
MAESTRO (1)
OFICIAL (4)
AYUDANTE (2)

CONTRATISTA SEV

RODOLFO VARGAS A

MIERCOLES 11 DICIEMBRE

INICIO
FIN

DIA SOLEADO SIN LLUVIAS.

ACTIVIDADES.

- CONTINUAN TRABAJOS CONATE PATIO, CAMBIO CERAMICA EN MAL ESTADO
- APLICACION GRANITO LAVADO BLANCO EN ACCESOS BARCOS.
- CONTINUA INSTALACION DE CIELO RASO PVC EN AREA OFICINAS JUNTO COCINA
  INSTALACION LAMPARAS
- CONTINUAN TRABAJOS INSTALACION EN AREA ESCRITORIOS
- CONTINUAN REMATES PINTURA SEGUNDA MANO
- INSTALACION MUEBLES TERMINACIONES Y TEMAS EN AREA EN GENERAL
- INSTALACION PUERTA ACCESO LATERAL IZQUIERDA, PUERTA CUARTO MAQUINAS
- ASEO GENERAL ORDEN Y ASEO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
pulidora/ Escaleras/ Taladros

PERSONAL OBRA:
CONTRATISTA SEU

Rodillo (1)
Maestro (1)
Oficial (4)
Ayudante (2).

CONTRATISTA SEU.

RONALDO VARGAS B

JUEVES 17 DICIEMBRE

INICIO
FIN
DIA SOLEADO / SIN LLUVIA

ACTIVIDADES

- CONTINUAN TRABAJOS DE INSTALACION CIELO RASO EN PVC
- CONTINUAN CON INSTALACION DE LUMINARIAS, INSTALACION ELECTRICA PUERTAS
- CONTINUAN REMATES ESTRUCTURA PARA SOPORTES CANAL APLICACION ANTICORROSIVO
- INSTALACION DE REJA SEGURIDAD FACHADA LATERAL IZQUIERDA.
- APLICACION GRANITO PULIDO ACCESOS PRINCIPALES.

EQUIPOS y HERRAMIENTAS
PULIDORA / ESCALERAS / TALADRO

PERSONAL OBRA
CONTRATISTA SEU.

PERSONAL OBRA
CONTRATISTA SEU

RESIDENTE OBRA (1)
MAESTRO (1)
OFICIAL (4)
AYUDANTE (2)

CONTRATISTA SEU.

RONALDO VARGAS A.

FECHA: 13 DICIEMBRE

INICIO
FIN

DIA SOLEADO / SIN LLUVIA

ACTIVIDADES

- CONTINUAN TRABAJOS INSTALACION CIELO RASO EN PVC ZONA CORREDOR, OFICINA, PUNTO A RALLE
- CONTINUAN CON INSTALACIONES ELECTRICAS, ORDEN EN TABLERO PARA MARQUILLADO, INSTALACION LAMPARAS EMERGENCIA LAMPARAS TIPO TORTUGA EN FACHADA Y PATIO.
- CONTINUAN RESANES FACHADA PRINCIPAL
- INSTALACION BARRAS SEGURIDAD ABATIBLE / BARRA FIJA
- INSTALACION INCRUSTACIONES BAÑOS 01
- INSTALACION DE LAMPARAS Y CIELO RASO PVC BAÑOS.
- SE REALIZAN AJUSTES TUBERIA CONTRAINCENDIOS SE COLOCAN UNIONES Y CURVAS QUE GENERARON UNA ALTERACION A LA ESTRUCTURA CABLE, POR PARTE DE OBRA NO SE MANIFESTARON
- SE REALIZA ASEO GENERAL

EQUIPOS HERRAMIENTAS
PULIDORA / ESCALERA / TALADRO.

PERSONAL OBRA
CONTRATISTA SEV.

RESIDENTE OBRA (1)
MAESTRO (1)
OFICIAL (4)
AYUDANTE (7)

CONTRATISTA SEV
RODOLFO VARGAS A

SABADO 19 DICIEMBRE

INICIO 7:00 am
FIN 5:00 pm.
DIA SOLEADO / SIN LLUVIAS

ACTIVIDADES:

- CONTINUAN CON INSTALACION CIELO RASO OFICINA CENTRAL PVC BLANCO
- LIGADO DE ESTUFA EN TABLERO ELECTRICO NUEVO.
- PINTURA, REMATES EN OFICINA FACHADA PRINCIPAL
- INSTALACION DE REJAS SEGURIDAD FALTANTES
- ACOMODACION SOPORTES CANAL, AJUSTES SUJECIONES, UNION CANAL.
- SE INICIA ASEO GENERAL RESTOS SOBRANTES OBRA.

EQUIPOS SUMINISTRO
TALADRO
PULIDORA
LIJADORA

PERSONAL OBRA
CONTRATISTA SEV.

RESIDENTE OBRA (1)
MAESTRO (1)
OFICIAL (3)
AYUDANTE (3)

CONTRATISTA SEV
RODOLFO VARGAS A

MARTES 15 DICIEMBRE

INICIO: 7.00 am.
FIN. 9.00 pm
DIA SOLEADO / SIN LLUVIAS.

ACTIVIDADES.

- CONTINUAN REMATES CIELO CASO QUE, INSTALACION MARCOS NUEVOS.
- INSTALACION GRAPAS PARA TUBERIA GAS COCINA.
- Remover PINTURA GENERAL
- PINTURA CANALETA INTERNA
- INSTALACION FIBRACEM FACHADA PRINCIPAL
- PINTURA BASE SEGUNDA MANO FACHADA
- ASEO GENERAL FACHADA Y ZONA INTERNA.
- REVISION CIRCUITOS ELECTRICOS PARA PROTECCION MARQUILLADO
- INSTALACION LAMPARAS, Y MARCOS NUEVOS

EQUIPOS.
SOLDADORA
TALADRO
PULIDORA
LIJADORA.

PERSONAL OBRA
CONTRATISTA SJV.

CONTRATISTA SJV.
RODOLFO VARGAS A

RESIDENTE OBRA (1)
MAESTRO (1)
OFICIAL (3)
AYUDANTE (3)

MIERCOLES 16 DICIEMBRE.
INICIO:
FIN.
DIA CON LLUVIAS FUERTES EN LA TARDE

Actividades.

- Continuan trabajos remates y limpieza zona patio
- Comienza traslado de residuos de obra.
- Se acopian materiales desmonte - cerchas canal - cuartas en zona planta recuerdo con indicacion registrador
- Traslado de muebles. Realizado a punta indicado por personal SNE
- Instalacion muebles en bodega existente
- Instalacion de cantonera, buzon. En zona atencion publico.
- Continuan con instalacion de flanches en fachada y zona patio.
- Limpieza general comienza acceso lateral derecho
- Instalacion grapas para ordenar tuberia trasdosado aires acondicionados en la unica intervención.
- Instalacion soportes y canal fachada lateral izquierda.

Equipos
- Soldadura
- Escaleras
- Taladro
- Pulidora
- Lijadora.

Personal obra
- Contratista SEU.
- Responsable obra (1)
- Maestro (1)
- Oficial (3)
- Ayudante (3)

Contratista SEU

Rodrigo Vanegas B.

Martes 18 Diciembre.

Inicio
Fin.
Dia con lluvias / nublado.

Actividades.
