CONTROL INFORMES CTO 2150-2024 SNR

			CENTRO								ORINOQUIA	ANDINA	
			BOGOTA	CUNDINAMARCA		BOYACA		SANTANDER	HUILA		GUAVIARE	ANTIOQUIA	QUINDIO
INFORMES SEMANALES			FRENTE 1	FRENTE 2	FRENTE 3	FRENTE 4	FRENTE 5	FRENTE 6	FRENTE 7	FRENTE 8	FRENTE 9	FRENTE 10	FRENTE 11
			BOGOTA	AGUA DE DIOS	LA PALMA	SANTA ROSA DE VITERBO	GUATEQUE	CONVENCION	NEIVA	GARZON	SAN JOSE GUAVIARE	SANTO DOMINGO	FILANDIA
0	3-sep-24	martes											
1	10-sep-24	martes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	17-sep-24	martes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	24-sep-24	martes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	1-oct-24	martes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	8-oct-24	martes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	15-oct-24	martes	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
7	22-oct-24	martes	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
8	29-oct-24	martes	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
9	5-nov-24	martes	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
10	12-nov-24	martes	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
11	19-nov-24	martes	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
12	26-nov-24	martes	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
13	3-dic-24	martes	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
14	10-dic-24	martes	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
15	17-dic-24	martes	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
16	24-dic-24	martes	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
17	31-dic-24	martes	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
			$ 213.115.377,00	$ 59.371.523,00	$ 126.341.463,00	$ 129.729.468,00	$ 140.521.985,00	$ 105.053.125,00	$ 200.238.984,00	$ 143.094.539,00	$ 202.730.968,00	$ 70.411.191,00	$ 46.740.812,00
			SEDE SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL	OFICINA ORIP AGUA DE DIOS (Cundinamarca)	OFICINA ORIP LA PALMA (Cundinamarca)	ORIP SANTA ROSA DE VITERBO (Boyaca)	ORIP GUATEQUE (Boyaca)	ORIP CONVENCION (Norte de Santander)	ORIP NEIVA (Huila)	ORIP GARZON (Huila)	ORIP SAN JOSE DEL GUAVIARE (Guaviare)	ORIP SANTO DOMINGO (Antioquia)	ORIP FILANDIA (Quindio)

$ 1.437.349.435,00

Informe Semanal
CONSORCIO REGIONES PRIA
NIT 901.863.627-9 Contrato 2147 DE 2024

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL

Semana Número: **5** Del: **1 de octubre de 2024** Al: **8 de octubre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **35** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **SEDE SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL** SUPERVISOR ING. BAYARDO BUSTOS LINARES

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)		
Valor básico de la Obra programada:	$ 213.115.377,00	$

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)		
Valor básico de la Obra Ejecutada:		

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS**
Contrato No.	No. 2150-2024 DE 2024
Valor Inicial:	$ 1.437.349.435,00
Valor Actualizado:	$ 1.437.349.435,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024


CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**CONSORCIO REGIONES PRIA**
Contrato No.	2147 DE 2024
Valor Inicial:	$ 210.823.861,00
Valor Actualizado:	$ 210.823.861,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA





AVANCE

EN LA SEMANA NUMERO CINCO SE HA AVANZADO Y TRABAJADO EN EL ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES REMITIDA A LA INTERVENTORIA PARA SU RESPECTIVA REVISION Y APROBACION CON EL FIN DE AVANZAR EL LA DOCUMENTACION DEL PERSONAL OPERATIVO IDONEO PARA CADA ACTIVIDAD A EJECUTAR. ADICIONALMENTE SE REALIZO UNA SEGUNDA VISITA CON INTERVENTORIA PARA REVISAR EL INVENTARIO DE REDES SANITARIAS Y DE AGUA POTABLE CON EL FIN DE DARLE ALCANCE A ESTOS CAPITULOS EN COMPANIA DEL PLOMERO DE LA SEDE PARA ACLARAR Y CUATINFICAR DICHAS ACTIVIDADES. SE PROGRAMA Y ENVIA DOCUMENTACION PARA AUTORIZACION DE INGRESO DE PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO A LA SEDE.



IMAGENES AVANCE

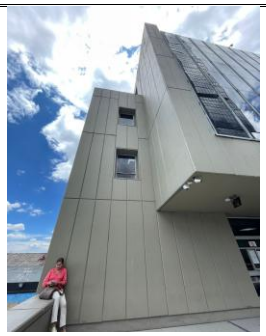

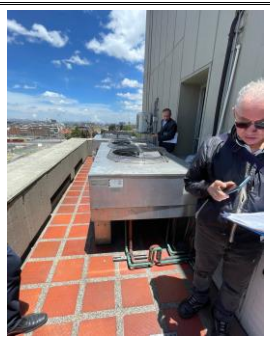

Comentario: TOMA DE MEDIDAS Y REVISION DE CANTIDADES PARA DAR ALCANCE AL BALANCE INCIAL

Comentario: VISITA TECNICA SEDE PRINCIPAL BOGOTA

Informe Semanal
CONSORCIO REGIONES PRIA
NIT 901.863.627-9 Contrato 2147 DE 2024

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL

Semana Número: **5** Del: **1 de octubre de 2024** Al: **8 de octubre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **35** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **SEDE SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL** SUPERVISOR ING. BAYARDO BUSTOS LINARES

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)		
Valor básico de la Obra programada:	$ 213.115.377,00	$


	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)		
Valor básico de la Obra Ejecutada:		

CONTRATO DE OBRA


Contratista:	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS**
Contrato No.	No. 2150-2024 DE 2024
Valor Inicial:	$ 1.437.349.435,00
Valor Actualizado:	$ 1.437.349.435,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:


Interventor:	**CONSORCIO REGIONES PRIA**
Contrato No.	2147 DE 2024
Valor Inicial:	$ 210.823.861,00
Valor Actualizado:	$ 210.823.861,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

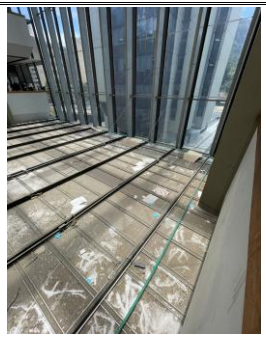


Comentario: AREA DE INTERVENCION CIELO RASO PVC EN TABLILLA

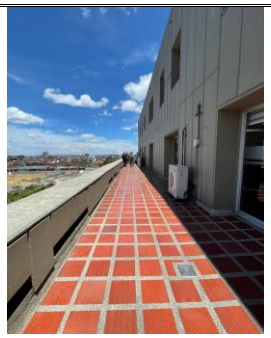

Comentario: AREA DE INTERVENCION A DEMOLER PISO Y ALISTADO DE PISO TERRAZA PISO 3

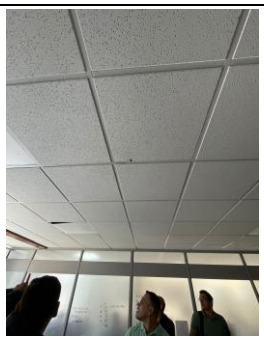

Comentario: REVISION DE AREAS Y OFICINAS PARA MANTENIMIENTO DE CIELO RASOS Y PINTURA

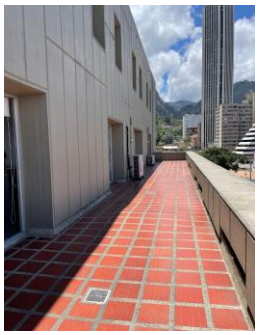

Comentario: REVISION DE AREAS Y OFICINAS PARA MANTENIMIENTO DE CIELO RASOS Y PINTURA

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	Firma: Nombre : ARQ SONIA PEÑARANDA Matrícula No.: DIRECTORA DE CONTRATISTA DE OBRA
	Firma: Nombre : Matrícula No.:

Informe Semanal
CONSORCIO REGIONES PRIA
NIT 901.863.627-9 Contrato 2147 DE 2024

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL

Semana Número: **5** Del: **1 de octubre de 2024** Al: **8 de octubre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **35** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **AGUA DE DIOS** SUPERVISOR ING. BAYARDO BUSTOS LINARES

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)		
Valor básico de la Obra programada:	$ 59.371.523,00	$

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)		
Valor básico de la Obra Ejecutada:		

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS**
Contrato No.	No. 2150-2024 DE 2024
Valor Inicial:	$ 1.437.349.435,00
Valor Actualizado:	$ 1.437.349.435,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**CONSORCIO REGIONES PRIA**
Contrato No.	2147 DE 2024
Valor Inicial:	$ 210.823.861,00
Valor Actualizado:	$ 210.823.861,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



AVANCE

EN LA SEMANA NUMERO CINCO SE HA AVANZADO Y TRABAJADO EN LA VISITA TECNICA EN SITIO PARA DARLE ALCANCE A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DE NUESTRA PROPUESTA ECONOMICA ESTO CON EL FIN DE DARLE TRAMITE AL ACTA NUMERO UNO DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES PARA REMITIRLA A INTERVENTORIA Y LA SUPERVISION PARA SU REVSION Y APROBACION Y POSTERIOR A ESTO EMPEZAR A ENVIAR LA DOCUMENTACION DEL PERSONAL OPERATIVO QUE VA ESTAR EN OBRA PARA SU APROBACION E INGRESO AL FRENTE. SE ESTA TRABAJANDO EN LOS CRONOGRAMAS CON LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN OBRA PARA REALIZAR EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS ACORDE CON LAS MISMAS.



IMAGENES AVANCE



Comentario: FACHADA PRINCIPAL



Comentario: ARCHIVO

Informe Semanal
CONSORCIO REGIONES PRIA
NIT 901.863.627-9 Contrato 2147 DE 2024

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL

Semana Número: **5** Del: **1 de octubre de 2024** Al: **8 de octubre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **35** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **AGUA DE DIOS** SUPERVISOR ING. BAYARDO BUSTOS LINARES

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)		
Valor básico de la Obra programada:	$ 59.371.523,00	$

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)		
Valor básico de la Obra Ejecutada:		

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS**
Contrato No.	No. 2150-2024 DE 2024
Valor Inicial:	$ 1.437.349.435,00
Valor Actualizado:	$ 1.437.349.435,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**CONSORCIO REGIONES PRIA**
Contrato No.	2147 DE 2024
Valor Inicial:	$ 210.823.861,00
Valor Actualizado:	$ 210.823.861,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024



Comentario: REVISION DE TEMA ELECTRICO Y EQUIPOS



Comentario: FACHADA CON VECINOS



Comentario: REVISION TEMA ELECTRICO EN SITIO POR FALLAS



Comentario: PATIO TRASERO

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	Firma: Nombre : ARQ SONIA PEÑARANDA Matrícula No.: DIRECTORA DE CONTRATISTA DE OBRA Firma: Nombre : Matrícula No.:

Informe Semanal
CONSORCIO REGIONES PRIA
NIT 901.863.627-9 Contrato 2147 DE 2024

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL

Semana Número: **5** Del: **1 de octubre de 2024** Al: **8 de octubre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **35** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **LA PALMA** SUPERVISOR ING. BAYARDO BUSTOS LINARES

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)		
Valor básico de la Obra programada:	$ 126.341.463,00	$

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)		
Valor básico de la Obra Ejecutada:		

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS**
Contrato No.	No. 2150-2024 DE 2024
Valor Inicial:	$ 1.437.349.435,00
Valor Actualizado:	$ 1.437.349.435,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024


CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**CONSORCIO REGIONES PRIA**
Contrato No.	2147 DE 2024
Valor Inicial:	$ 210.823.861,00
Valor Actualizado:	$ 210.823.861,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA

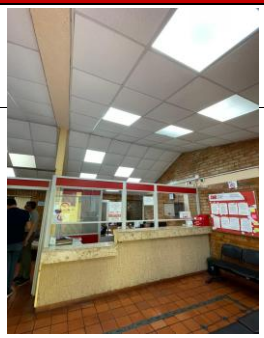

AVANCE

EN LA SEMANA NUMERO CINCO SE HA AVANZADO Y TRABAJADO EN LA VISITA TECNICA EN SITIO PARA DARLE ALCANCE A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DE NUESTRA PROPUESTA ECONOMICA ESTO CON EL FIN DE DARLE TRAMITE AL ACTA NUMERO UNO DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES PARA REMITIRLA A INTERVENTORIA Y LA SUPERVISION PARA SU REVSION Y APROBACION Y POSTERIOR A ESTO EMPEZAR A ENVIAR LA DOCUMENTACION DEL PERSONAL OPERATIVO QUE VA ESTAR EN OBRA PARA SU APROBACION E INGRESO AL FRENTE. SE ESTA TRABAJANDO EN LOS CRONOGRAMAS CON LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN OBRA PARA REALIZAR EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS ACORDE CON LAS MISMAS.



IMAGENES AVANCE





Comentario: FACHADA PRINCIPAL

Comentario: CAMBIO DE CUBIERTA EXISTENTE EN MAL ESTADO

Informe Semanal
CONSORCIO REGIONES PRIA
NIT 901.863.627-9 Contrato 2147 DE 2024

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL

Semana Número: **5** Del: **1 de octubre de 2024** Al: **8 de octubre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **35** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **LA PALMA** SUPERVISOR ING. BAYARDO BUSTOS LINARES

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)		
Valor básico de la Obra programada:	$ 126.341.463,00	$

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)		
Valor básico de la Obra Ejecutada:		

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS**
Contrato No.	No. 2150-2024 DE 2024
Valor Inicial:	$ 1.437.349.435,00
Valor Actualizado:	$ 1.437.349.435,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**CONSORCIO REGIONES PRIA**
Contrato No.	2147 DE 2024
Valor Inicial:	$ 210.823.861,00
Valor Actualizado:	$ 210.823.861,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024



Comentario: MANTENIMIENTO DE CIELO RASOS EXISTENTES EN FIBRA MINERAL Y CAMBIO A PVC



Comentario: CAMBIO DE CUBIERTA EXISTENTE EN MAL ESTADO, CABALLETES Y MANTNIMIENTO DE VIGAS CANAL



Comentario: CAMBIO Y SUMINISTRO DE PUERTAS EN MADERA EXISTENTES EN MAL ESTADO



Comentario: ACCESO PRINCIPAL ATENCION AL USUARIO

OBSERVACIONES

CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA

Firma:
Nombre : ARQ SONIA PEÑARANDA
Matrícula No.:
DIRECTORA DE CONTRATISTA DE OBRA

Firma:
Nombre :
Matrícula No.:

Informe Semanal
CONSORCIO REGIONES PRIA
NIT 901.863.627-9 Contrato 2147 DE 2024

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL

Semana Número: **5** Del: **1 de octubre de 2024** Al: **8 de octubre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **35** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **SANTA ROSA DE VITERBO** SUPERVISOR ING. BAYARDO BUSTOS LINARES

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)		
Valor básico de la Obra programada:	$ 129.729.468,00	$

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)		
Valor básico de la Obra Ejecutada:		

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS**
Contrato No.	No. 2150-2024 DE 2024
Valor Inicial:	$ 1.437.349.435,00
Valor Actualizado:	$ 1.437.349.435,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**CONSORCIO REGIONES PRIA**
Contrato No.	2147 DE 2024
Valor Inicial:	$ 210.823.861,00
Valor Actualizado:	$ 210.823.861,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



AVANCE

EN LA SEMANA NUMERO CINCO SE HA AVANZADO Y TRABAJADO EN LA VISITA TECNICA EN SITIO PARA DARLE ALCANCE A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DE NUESTRA PROPUESTA ECONOMICA ESTO CON EL FIN DE DARLE TRAMITE AL ACTA NUMERO UNO DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES PARA REMITIRLA A INTERVENTORIA Y LA SUPERVISION PARA SU REVSION Y APROBACION Y POSTERIOR A ESTO EMPEZAR A ENVIAR LA DOCUMENTACION DEL PERSONAL OPERATIVO QUE VA ESTAR EN OBRA PARA SU APROBACION E INGRESO AL FRENTE. SE ESTA TRABAJANDO EN LOS CRONOGRAMAS CON LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN OBRA PARA REALIZAR EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS ACORDE CON LAS MISMAS.



IMAGENES AVANCE





Comentario: FCHADA PRINCIPAL DE LA SEDE

Comentario: CUBIERTA TRASITABLE PARA CAMBIO DE FOIL E IMPERMEABILIZACION DEL 100 POR CIENTO

Informe Semanal
CONSORCIO REGIONES PRIA
NIT 901.863.627-9 Contrato 2147 DE 2024

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL

Semana Número: **5** Del: **1 de octubre de 2024** Al: **8 de octubre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **35** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **SANTA ROSA DE VITERBO** SUPERVISOR ING. BAYARDO BUSTOS LINARES

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)		
Valor básico de la Obra programada:	$ 129.729.468,00	$


	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)		
Valor básico de la Obra Ejecutada:		

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS**
Contrato No.	No. 2150-2024 DE 2024
Valor Inicial:	$ 1.437.349.435,00
Valor Actualizado:	$ 1.437.349.435,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**CONSORCIO REGIONES PRIA**
Contrato No.	2147 DE 2024
Valor Inicial:	$ 210.823.861,00
Valor Actualizado:	$ 210.823.861,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

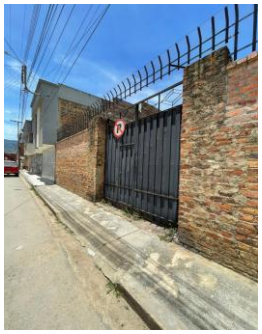


Comentario: ACCESO FACHADA LATERAL PARA PARQUEADERO Y CAMBIO DE PUERTA



Comentario: ACCESO PRINCIPAL PARA UBICACIÓN DE NUEVO LETRERO SNR



Comentario: CUBIERTA EN PLACA PARA MANTENIMIENTO

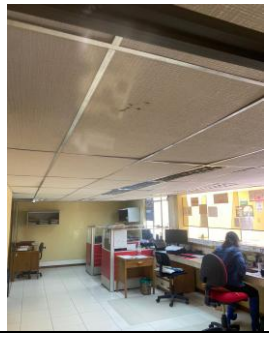

Comentario: OFICINAS ADMINISTRATIVAS CAMBIO DE CIELO RASO A PVC

OBSERVACIONES

CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA

Firma:
Nombre : ARQ SONIA PEÑARANDA
Matrícula No.:
DIRECTORA DE CONTRATISTA DE OBRA

Firma:
Nombre :
Matrícula No.:

Informe Semanal
CONSORCIO REGIONES PRIA
NIT 901.863.627-9 Contrato 2147 DE 2024

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL

Semana Número: **5** Del: **1 de octubre de 2024** Al: **8 de octubre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **35** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **GUATEQUE** SUPERVISOR ING. BAYARDO BUSTOS LINARES

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)		
Valor básico de la Obra programada:	$ 140.521.985,00	$

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)		
Valor básico de la Obra Ejecutada:		

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS**
Contrato No.	No. 2150-2024 DE 2024
Valor Inicial:	$ 1.437.349.435,00
Valor Actualizado:	$ 1.437.349.435,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024


CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**CONSORCIO REGIONES PRIA**
Contrato No.	2147 DE 2024
Valor Inicial:	$ 210.823.861,00
Valor Actualizado:	$ 210.823.861,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA

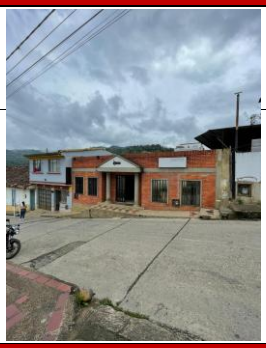

AVANCE

EN LA SEMANA NUMERO CINCO SE HA AVANZADO Y TRABAJADO EN LA VISITA TECNICA EN SITIO PARA DARLE ALCANCE A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DE NUESTRA PROPUESTA ECONOMICA ESTO CON EL FIN DE DARLE TRAMITE AL ACTA NUMERO UNO DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES PARA REMITIRLA A INTERVENTORIA Y LA SUPERVISION PARA SU REVSION Y APROBACION Y POSTERIOR A ESTO EMPEZAR A ENVIAR LA DOCUMENTACION DEL PERSONAL OPERATIVO QUE VA ESTAR EN OBRA PARA SU APROBACION E INGRESO AL FRENTE. SE ESTA TRABAJANDO EN LOS CRONOGRAMAS CON LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN OBRA PARA REALIZAR EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS ACORDE CON LAS MISMAS.



IMAGENES AVANCE



Comentario: FACHADA PRINCIPAL DE LA SEDE



Comentario: CUBIERTA SOLICITUD DE CAMBIO POR MAL ESTADO

Informe Semanal
CONSORCIO REGIONES PRIA
NIT 901.863.627-9 Contrato 2147 DE 2024

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL

Semana Número: **5** Del: **1 de octubre de 2024** Al: **8 de octubre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **35** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **GUATEQUE** SUPERVISOR ING. BAYARDO BUSTOS LINARES

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)		
Valor básico de la Obra programada:	$ 140.521.985,00	$

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)		
Valor básico de la Obra Ejecutada:		

CONTRATO DE OBRA


Contratista:	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS**
Contrato No.	No. 2150-2024 DE 2024
Valor Inicial:	$ 1.437.349.435,00
Valor Actualizado:	$ 1.437.349.435,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**CONSORCIO REGIONES PRIA**
Contrato No.	2147 DE 2024
Valor Inicial:	$ 210.823.861,00
Valor Actualizado:	$ 210.823.861,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024



Comentario: CAMBIO DE CUBIERTA POR TRAMOS ROTOS EN MAL ESTADO

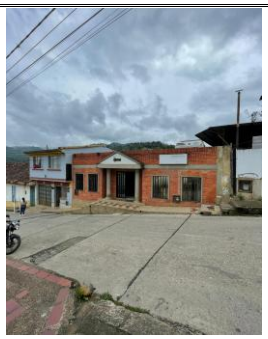

Comentario: ENTORNO INMEDIATO, VECINOS FACHADA PRINCIPAL



Comentario: FACHADA VECINO LATERAL DERECHO



Comentario: MAL ESTADO DE CUBIERTA Y TEJAS ROTAS EN EXISTENCIA DE LA SEDE

OBSERVACIONES

CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA

Firma:
Nombre : ARQ SONIA PEÑARANDA
Matrícula No.:
DIRECTORA DE CONTRATISTA DE OBRA

Firma:
Nombre :
Matrícula No.:

Informe Semanal
CONSORCIO REGIONES PRIA
NIT 901.863.627-9 Contrato 2147 DE 2024

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL

Semana Número: **5** Del: **1 de octubre de 2024** Al: **8 de octubre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **35** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **CONVENCION** SUPERVISOR ING. BAYARDO BUSTOS LINARES

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)		
Valor básico de la Obra programada:	$ 105.053.125,00	$

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)		
Valor básico de la Obra Ejecutada:		

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS**
Contrato No.	No. 2150-2024 DE 2024
Valor Inicial:	$ 1.437.349.435,00
Valor Actualizado:	$ 1.437.349.435,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**CONSORCIO REGIONES PRIA**
Contrato No.	2147 DE 2024
Valor Inicial:	$ 210.823.861,00
Valor Actualizado:	$ 210.823.861,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



AVANCE

EN LA SEMANA NUMERO CINCO SE HA AVANZADO Y TRABAJADO EN LA VISITA TECNICA EN SITIO PARA DARLE ALCANCE A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DE NUESTRA PROPUESTA ECONOMICA ESTO CON EL FIN DE DARLE TRAMITE AL ACTA NUMERO UNO DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES PARA REMITIRLA A INTERVENTORIA Y LA SUPERVISION PARA SU REVSION Y APROBACION Y POSTERIOR A ESTO EMPEZAR A ENVIAR LA DOCUMENTACION DEL PERSONAL OPERATIVO QUE VA ESTAR EN OBRA PARA SU APROBACION E INGRESO AL FRENTE. SE ESTA TRABAJANDO EN LOS CRONOGRAMAS CON LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN OBRA PARA REALIZAR EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS ACORDE CON LAS MISMAS.



IMAGENES AVANCE





Comentario: FACHADA PRINCIPAL SEDE CONVENCION

Comentario: OFICINAS AREA ADMINISTRATIVA

Informe Semanal
CONSORCIO REGIONES PRIA
NIT 901.863.627-9 Contrato 2147 DE 2024

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL

Semana Número: **5** Del: **1 de octubre de 2024** Al: **8 de octubre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **35** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **CONVENCION** SUPERVISOR ING. BAYARDO BUSTOS LINARES

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)		
Valor básico de la Obra programada:	$ 105.053.125,00	$

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)		
Valor básico de la Obra Ejecutada:		

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS**
Contrato No.	No. 2150-2024 DE 2024
Valor Inicial:	$ 1.437.349.435,00
Valor Actualizado:	$ 1.437.349.435,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**CONSORCIO REGIONES PRIA**
Contrato No.	2147 DE 2024
Valor Inicial:	$ 210.823.861,00
Valor Actualizado:	$ 210.823.861,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024




Comentario: SALA DE ESPERA ATENCION AL USUARIO



Comentario: TERRAZA Y PATIO POSTEROR DE LA SEDE EN VISITA



Comentario: FACHADA TRASERA

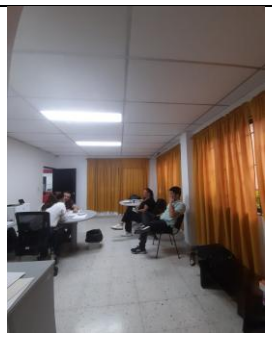

Comentario: VISITATECNICA DEFICION DE ACTIVIDADES Y ALCANCE DE LAS MISMAS.

OBSERVACIONES

CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA

Firma:
Nombre : ARQ SONIA PEÑARANDA
Matrícula No.:
DIRECTORA DE CONTRATISTA DE OBRA

Firma:
Nombre :
Matrícula No.:

Informe Semanal
CONSORCIO REGIONES PRIA
NIT 901.863.627-9 Contrato 2147 DE 2024

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL

Semana Número: **5** Del: **1 de octubre de 2024** Al: **8 de octubre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **35** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **NEIVA** SUPERVISOR ING. BAYARDO BUSTOS LINARES

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)		
Valor básico de la Obra programada:	$ 200.238.984,00	$

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)		
Valor básico de la Obra Ejecutada:		

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS**
Contrato No.	No. 2150-2024 DE 2024
Valor Inicial:	$ 1.437.349.435,00
Valor Actualizado:	$ 1.437.349.435,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**CONSORCIO REGIONES PRIA**
Contrato No.	2147 DE 2024
Valor Inicial:	$ 210.823.861,00
Valor Actualizado:	$ 210.823.861,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

IMAGEN OFICINA



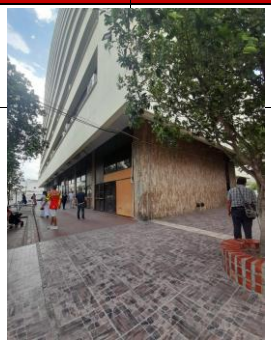


IMAGEN OFICINA



AVANCE


EN LA SEMANA NUMERO CINCO SE HA AVANZADO Y TRABAJADO EN LA VISITA TECNICA EN SITIO PARA DARLE ALCANCE A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DE NUESTRA PROPUESTA ECONOMICA ESTO CON EL FIN DE DARLE TRAMITE AL ACTA NUMERO UNO DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES PARA REMITIRLA A INTERVENTORIA Y LA SUPERVISION PARA SU REVSION Y APROBACION Y POSTERIOR A ESTO EMPEZAR A ENVIAR LA DOCUMENTACION DEL PERSONAL OPERATIVO QUE VA ESTAR EN OBRA PARA SU APROBACION E INGRESO AL FRENTE. SE ESTA TRABAJANDO EN LOS CRONOGRAMAS CON LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN OBRA PARA REALIZAR EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS ACORDE CON LAS MISMAS.



IMAGENES AVANCE



Comentario: FACHADA PRINCIPAL ACCESO SEDE NEIVA

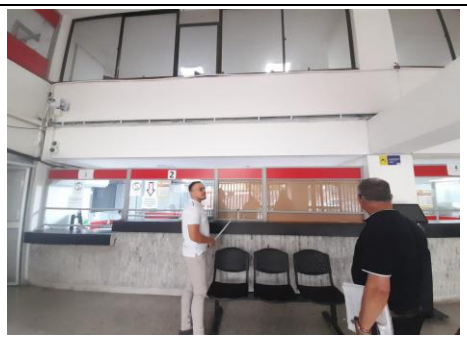

Comentario: SALA DE ESPERA Y ATENCION AL USUARIO SEDE NEIVA

Informe Semanal
CONSORCIO REGIONES PRIA
NIT 901.863.627-9 Contrato 2147 DE 2024

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL

Semana Número: **5** Del: **1 de octubre de 2024** Al: **8 de octubre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **35** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **NEIVA** SUPERVISOR ING. BAYARDO BUSTOS LINARES

OBJETO:


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)			Obra Física Ejecutada (%)		
Valor básico de la Obra programada:	$ 200.238.984,00	$	Valor básico de la Obra Ejecutada:		

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS	**Interventor:**	CONSORCIO REGIONES PRIA
Contrato No.	No. 2150-2024 DE 2024	Contrato No.	2147 DE 2024
Valor Inicial:	$ 1.437.349.435,00	Valor Inicial:	$ 210.823.861,00
Valor Actualizado:	$ 1.437.349.435,00	Valor Actualizado:	$ 210.823.861,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024	Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024	Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024




Comentario: VISITA TECNICA Y TOMA DE MEDIDAS

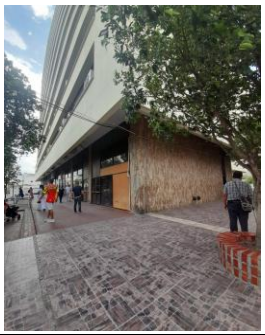

Comentario: FACHADA PRINCIPAL Y LATERAL SNR NEIVA



Comentario: ACCESO PRINCIPAL VISITA

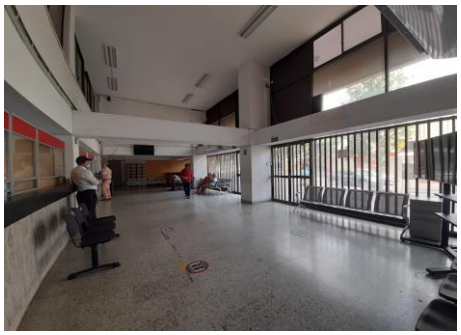

Comentario: ATENCION AL USUARIO AREA INTERVENIR DE LA SEDE

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	Firma: Nombre : ARQ SONIA PEÑARANDA Matrícula No.: DIRECTORA DE CONTRATISTA DE OBRA
	Firma: Nombre : Matrícula No.:

Informe Semanal
CONSORCIO REGIONES PRIA
NIT 901.863.627-9 Contrato 2147 DE 2024

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL

Semana Número: **5** Del: **1 de octubre de 2024** Al: **8 de octubre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **35** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **GARZON** SUPERVISOR ING. BAYARDO BUSTOS LINARES

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)		
Valor básico de la Obra programada:	$ 143.094.539,00	$

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)		
Valor básico de la Obra Ejecutada:		

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS**
Contrato No.	No. 2150-2024 DE 2024
Valor Inicial:	$ 1.437.349.435,00
Valor Actualizado:	$ 1.437.349.435,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**CONSORCIO REGIONES PRIA**
Contrato No.	2147 DE 2024
Valor Inicial:	$ 210.823.861,00
Valor Actualizado:	$ 210.823.861,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

IMAGEN OFICINA


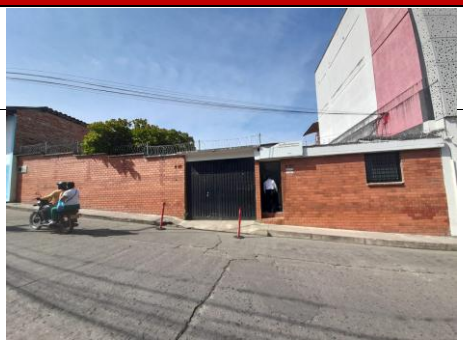


IMAGEN OFICINA



AVANCE

EN LA SEMANA NUMERO CINCO SE HA AVANZADO Y TRABAJADO EN LA VISITA TECNICA EN SITIO PARA DARLE ALCANCE A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DE NUESTRA PROPUESTA ECONOMICA ESTO CON EL FIN DE DARLE TRAMITE AL ACTA NUMERO UNO DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES PARA REMITIRLA A INTERVENTORIA Y LA SUPERVISION PARA SU REVSION Y APROBACION Y POSTERIOR A ESTO EMPEZAR A ENVIAR LA DOCUMENTACION DEL PERSONAL OPERATIVO QUE VA ESTAR EN OBRA PARA SU APROBACION E INGRESO AL FRENTE. SE ESTA TRABAJANDO EN LOS CRONOGRAMAS CON LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN OBRA PARA REALIZAR EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS ACORDE CON LAS MISMAS.

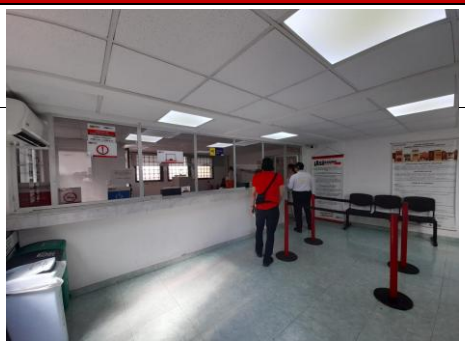

IMAGENES AVANCE





Comentario: FACHADA PRINCIPAL DE LA SEDE

Comentario: ACCESO PARTE INTERNA PRINCIPAL PARQUEADERO

Informe Semanal
CONSORCIO REGIONES PRIA
NIT 901.863.627-9 Contrato 2147 DE 2024

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL

Semana Número: **5** Del: **1 de octubre de 2024** Al: **8 de octubre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **35** Días


ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **GARZON** SUPERVISOR ING. BAYARDO BUSTOS LINARES

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)


	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)			Obra Física Ejecutada (%)		
Valor básico de la Obra programada:	$ 143.094.539,00	$	Valor básico de la Obra Ejecutada:		

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS	**Interventor:**	CONSORCIO REGIONES PRIA
Contrato No.	No. 2150-2024 DE 2024	Contrato No.	2147 DE 2024
Valor Inicial:	$ 1.437.349.435,00	Valor Inicial:	$ 210.823.861,00
Valor Actualizado:	$ 1.437.349.435,00	Valor Actualizado:	$ 210.823.861,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024	Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024	Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

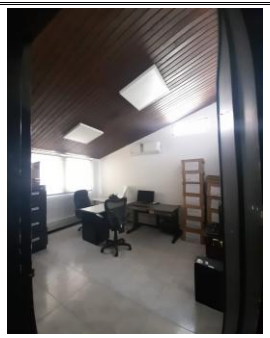




Comentario: REVISION DE CUBIERTA Y CIELO RASOS DE LA SEDE EN MADERA

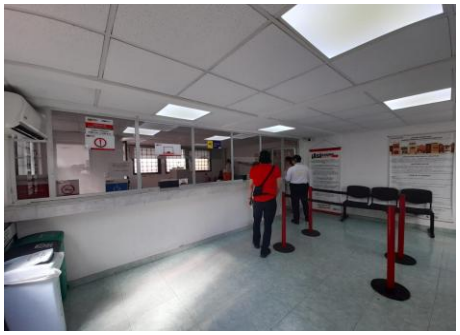

Comentario: SALA DE ESPERA Y ZONA DE ATENCION AL USUARIO EN VENTANILLA

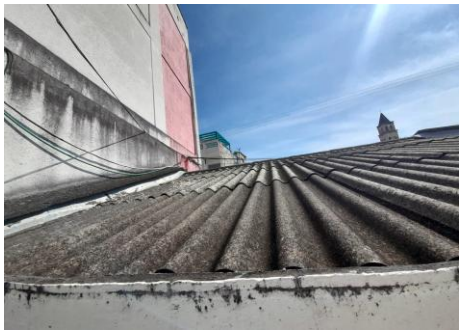

Comentario: CUBIERTA EN ADBESTO Y FIBROCEMENTO DE LA SEDE



Comentario: SALA DE ESPERA Y LOBBY DE LA SEDE FUNCIONARIOS

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	Firma: Nombre : ARQ SONIA PEÑARANDA Matrícula No.: DIRECTORA DE CONTRATISTA DE OBRA
	Firma: Nombre : Matrícula No.:

Informe Semanal
CONSORCIO REGIONES PRIA
NIT 901.863.627-9 Contrato 2147 DE 2024

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL

Semana Número: **5** Del: **1 de octubre de 2024** Al: **8 de octubre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **35** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **SAN JOSE DEL GUAVIARE** SUPERVISOR ING. BAYARDO BUSTOS LINARES

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)		
Valor básico de la Obra programada:	$ 202.730.968,00	$

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)		
Valor básico de la Obra Ejecutada:		

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS**
Contrato No.	No. 2150-2024 DE 2024
Valor Inicial:	$ 1.437.349.435,00
Valor Actualizado:	$ 1.437.349.435,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**CONSORCIO REGIONES PRIA**
Contrato No.	2147 DE 2024
Valor Inicial:	$ 210.823.861,00
Valor Actualizado:	$ 210.823.861,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



AVANCE

EN LA SEMANA NUMERO CINCO SE HA AVANZADO Y TRABAJADO EN LA VISITA TECNICA EN SITIO PARA DARLE ALCANCE A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DE NUESTRA PROPUESTA ECONOMICA ESTO CON EL FIN DE DARLE TRAMITE AL ACTA NUMERO UNO DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES PARA REMITIRLA A INTERVENTORIA Y LA SUPERVISION PARA SU REVSION Y APROBACION Y POSTERIOR A ESTO EMPEZAR A ENVIAR LA DOCUMENTACION DEL PERSONAL OPERATIVO QUE VA ESTAR EN OBRA PARA SU APROBACION E INGRESO AL FRENTE. SE ESTA TRABAJANDO EN LOS CRONOGRAMAS CON LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN OBRA PARA REALIZAR EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS ACORDE CON LAS MISMAS.



IMAGENES AVANCE



Comentario: FACHADA PRINCIPAL DE LA SEDE



Comentario: AREA DE COCINA O CAFETERIA DE LA SEDE

Informe Semanal
CONSORCIO REGIONES PRIA
NIT 901.863.627-9 Contrato 2147 DE 2024

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL

Semana Número: **5** Del: **1 de octubre de 2024** Al: **8 de octubre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **35** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **SAN JOSE DEL GUAVIARE** SUPERVISOR ING. BAYARDO BUSTOS LINARES

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)			Obra Física Ejecutada (%)		
Valor básico de la Obra programada:	$ 202.730.968,00	$	Valor básico de la Obra Ejecutada:		

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS**
Contrato No.	No. 2150-2024 DE 2024
Valor Inicial:	$ 1.437.349.435,00
Valor Actualizado:	$ 1.437.349.435,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**CONSORCIO REGIONES PRIA**
Contrato No.	2147 DE 2024
Valor Inicial:	$ 210.823.861,00
Valor Actualizado:	$ 210.823.861,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024



Comentario: AREA DE PATIO TRASERO



Comentario: FILTRACIONES Y TEMAS ELECTRICOS POR CABLE EXPUESTO EN CAFETERIA



Comentario: ACCESO PRINCIPAL ZONA DE ATENCION AL USUARIO





Comentario: CONDENSADORAS PATIO TRASERO Y SALA DE ESPERA ATENCION AL USUARIO

OBSERVACIONES

CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA

Firma:
Nombre : ARQ SONIA PEÑARANDA
Matrícula No.:
DIRECTORA DE CONTRATISTA DE OBRA

Firma:
Nombre :
Matrícula No.:

Informe Semanal
CONSORCIO REGIONES PRIA
NIT 901.863.627-9 Contrato 2147 DE 2024

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL

Semana Número: **5** Del: **1 de octubre de 2024** Al: **8 de octubre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **35** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **SANTO DOMINGO** SUPERVISOR ING. BAYARDO BUSTOS LINARES

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)		
Valor básico de la Obra programada:	$ 70.411.191,00	$

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)		
Valor básico de la Obra Ejecutada:		

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS**
Contrato No.	No. 2150-2024 DE 2024
Valor Inicial:	$ 1.437.349.435,00
Valor Actualizado:	$ 1.437.349.435,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**CONSORCIO REGIONES PRIA**
Contrato No.	2147 DE 2024
Valor Inicial:	$ 210.823.861,00
Valor Actualizado:	$ 210.823.861,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



AVANCE

EN LA SEMANA NUMERO CINCO SE HA AVANZADO Y TRABAJADO EN LA VISITA TECNICA EN SITIO PARA DARLE ALCANCE A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DE NUESTRA PROPUESTA ECONOMICA ESTO CON EL FIN DE DARLE TRAMITE AL ACTA NUMERO UNO DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES PARA REMITIRLA A INTERVENTORIA Y LA SUPERVISION PARA SU REVSION Y APROBACION Y POSTERIOR A ESTO EMPEZAR A ENVIAR LA DOCUMENTACION DEL PERSONAL OPERATIVO QUE VA ESTAR EN OBRA PARA SU APROBACION E INGRESO AL FRENTE. SE ESTA TRABAJANDO EN LOS CRONOGRAMAS CON LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN OBRA PARA REALIZAR EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS ACORDE CON LAS MISMAS.

IMAGENES AVANCE



Comentario: FACHADA PRINCIPAL SNR SANTO DOMINGO



Comentario: ACCESO PRINCIPAL SEDE SANTO DOMINGO

Informe Semanal
CONSORCIO REGIONES PRIA
NIT 901.863.627-9 Contrato 2147 DE 2024

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL

Semana Número: **5** Del: **1 de octubre de 2024** Al: **8 de octubre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **35** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **SANTO DOMINGO** SUPERVISOR ING. BAYARDO BUSTOS LINARES

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)			Obra Física Ejecutada (%)		
Valor básico de la Obra programada:	$ 70.411.191,00	$	Valor básico de la Obra Ejecutada:		


CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
Contratista:	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS**	**Interventor:**	**CONSORCIO REGIONES PRIA**
Contrato No.	No. 2150-2024 DE 2024	Contrato No.	2147 DE 2024
Valor Inicial:	$ 1.437.349.435,00	Valor Inicial:	$ 210.823.861,00
Valor Actualizado:	$ 1.437.349.435,00	Valor Actualizado:	$ 210.823.861,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024	Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024	Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024



Comentario: ACCESO PRINCIPAL Y ATENCION AL USUARIO CIELO RASO EN MADERA



Comentario: ACCESO PASILLO PRINCIPAL SANTO DOMINGO

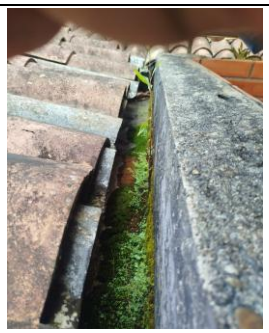

Comentario: VIGAS CANALES SATURADAS PARA MANTENIMIENTO CON VEGETACION Y MAL ESTADO DEL FOIL EXISTENTE



Comentario: FACHADA LATERAL DE LA SEDE SANTO DOMINGO

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	Firma: Nombre : ARQ SONIA PEÑARANDA Matrícula No.: DIRECTORA DE CONTRATISTA DE OBRA
	Firma: Nombre : Matrícula No.:

Informe Semanal
CONSORCIO REGIONES PRIA
NIT 901.863.627-9 Contrato 2147 DE 2024

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL

Semana Número: **5** Del: **1 de octubre de 2024** Al: **8 de octubre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **35** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **FILANDIA** SUPERVISOR ING. BAYARDO BUSTOS LINARES

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)		
Valor básico de la Obra programada:	$ 46.740.812,00	$

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)		
Valor básico de la Obra Ejecutada:		

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS**
Contrato No.	No. 2150-2024 DE 2024
Valor Inicial:	$ 1.437.349.435,00
Valor Actualizado:	$ 1.437.349.435,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**CONSORCIO REGIONES PRIA**
Contrato No.	2147 DE 2024
Valor Inicial:	$ 210.823.861,00
Valor Actualizado:	$ 210.823.861,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA



AVANCE

EN LA SEMANA NUMERO CINCO SE HA AVANZADO Y TRABAJADO EN LA VISITA TECNICA EN SITIO PARA DARLE ALCANCE A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DE NUESTRA PROPUESTA ECONOMICA ESTO CON EL FIN DE DARLE TRAMITE AL ACTA NUMERO UNO DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES PARA REMITIRLA A INTERVENTORIA Y LA SUPERVISION PARA SU REVSION Y APROBACION Y POSTERIOR A ESTO EMPEZAR A ENVIAR LA DOCUMENTACION DEL PERSONAL OPERATIVO QUE VA ESTAR EN OBRA PARA SU APROBACION E INGRESO AL FRENTE. SE ESTA TRABAJANDO EN LOS CRONOGRAMAS CON LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN OBRA PARA REALIZAR EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS ACORDE CON LAS MISMAS.

IMAGENES AVANCE



Comentario: FACHADA PRINCIPAL SNR FILANDIA



Comentario: FACHADA PRINCIPAL SNR FILANDIA Y ESPACIO PUBLICO INMEDIATO A LAS INSTALACIONES

Informe Semanal
CONSORCIO REGIONES PRIA
NIT 901.863.627-9 Contrato 2147 DE 2024

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1

INFORME SEMANAL

Semana Número: **5** Del: **1 de octubre de 2024** Al: **8 de octubre de 2024**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: **35** Días

ENTIDAD CONTRATANTE **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** SEDE **FILANDIA** SUPERVISOR ING. BAYARDO BUSTOS LINARES

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)		
Valor básico de la Obra programada:	$ 46.740.812,00	$


	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)		
Valor básico de la Obra Ejecutada:		

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	**SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS**
Contrato No.	No. 2150-2024 DE 2024
Valor Inicial:	$ 1.437.349.435,00
Valor Actualizado:	$ 1.437.349.435,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	**CONSORCIO REGIONES PRIA**
Contrato No.	2147 DE 2024
Valor Inicial:	$ 210.823.861,00
Valor Actualizado:	$ 210.823.861,00
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

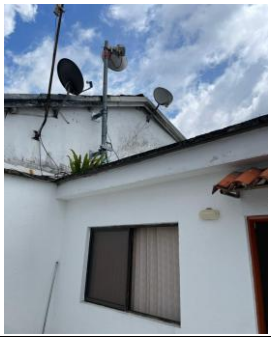

Comentario: FACHADA TECRER PISO Y TERRAZA - VIGA CANAL SATURADA CON VEGETACION



Comentario: VISITA DE OBRA CON EL REGISTRADOR DE LA SEDE



Comentario: PISO 1 RECEPCION Y OFOCINAS - ACCESO PRINCIPAL



Comentario: TERRAZA TERCER PISO OFICINA REGISTRADOR

OBSERVACIONES

CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA

Firma:
Nombre : ARQ SONIA PEÑARANDA
Matrícula No.:
DIRECTORA DE CONTRATISTA DE OBRA

Firma:
Nombre :
Matrícula No.:
