GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	**11**		FECHA:	18	de	MARZO	de	2025			
PERIODO: DEL	19	de	FEBRERO	de	2025	AL	17	de	MARZO	de	2025

CONTRATO No:	**3269**	DE	2023	REGISTRO BP Y P No	**2022004150318**

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MONIQUIRÁ - TOGÜÍ, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

LOCALIZACIÓN:

El corredor vial Moniquirá – Togüi, es una vía departamental la cual comunica principalmente a los municipios de Moniquirá y Togüi que sirve ruta alterna para llegar al municipio de Chitaraque; así mismo la vía en mención se localiza desde el ramal en la ruta 62 (Tunja - Moniquirá) hacia el municipio de Togüi con una longitud aproximada de 12.5 Km

PROGRAMA DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO:

MEJORES VÍAS PARA BOYACÁ QUE AVANZA

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:
CONSORCIO MONIQUIRA NIT 901.740.222-1	**JAVIER LINARES**
NOMBRE DEL INTERVENTOR:	NOMBRE DEL SUPERVISOR:
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS NIT 900.916.608-4	**JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA**

ADICIONALES Y PRORROGAS


No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	ADICION 1	$ 2.395.852.200,55	18/03/2025
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 2.395.852.200,55	

VALOR INICIAL:	$ 4.936.601.853,14	VALOR ADICIONALES:	$ 2.395.852.200,55	VALOR TOTAL:	$ 7.332.454.053,69

FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prorrogas y suspensiones)	18	de	MARZO	de	**2025**

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO	**100,0%**	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADO	**84,0%**	% DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO	**98,6%**



GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE OBRA

No PÓLIZA	C-100062294	ANEXO No.	7	ASEGURADORA	Seguros Mundial	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Cumplimiento	8	4	2024	19	7	2025	$ 1.466.490.810,74
Buen manejo del anticipo	8	4	2024	19	7	2025	$ 1.480.980.555,94
Prestaciones sociales	8	4	2024	19	3	2028	$ 1.466.490.810,74
Estabilidad de obra	8	12	2024	19	3	2030	$ 2.199.736.216,11

ESTADO DEL TIEMPO

BUENO		REGULAR	X	MALO		PÉSIMO	

Descripción: Durante el presente periodo se han presentado lluvias constantes lo cual ha afectado el avance de las actividades en obra.

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, suspensión, reinicio, etc.)

DESCRIPCIÓN	FECHA		
	dd	mm	aaaa
ACTA DE INICIO	8	4	2024
ACTA DE SUSPENSIÓN	7	12	2024
ACTA DE REINICIO	19	12	2024

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
Verificación de cotas y niveles con topografía.	
Implementación del PMT.	
Amarre de acero de refuerzo y fundida de zapatas en muro No. 1	K4+090
Amarre de acero de refuerzo y fundida de pantallas en muro No. 1	K4+090
Amarre de acero de refuerzo y fundida de cunetas en muro No. 6	K4+940
Instalación de geodren vial y relleno con material de afirmado compactado en muro No. 1	K4+090
Amarre de acero de refuerzo y fundida de pantallas en concreto en muro No. 11	K5+450
Instalación de geodren vial y relleno con material de afirmado compactado en muro No. 11	K5+450
Amarre de acero de refuerzo y fundida de pantallas en concreto en muro No. 13	K5+910
Fundida de solado de limpieza en muro No. 14	K6+140
Amarre de acero de refuerzo para zapatas en muro No. 14	K6+140
Fundida de solado de limpieza en muro No. 15	K6+270
Amarre de acero de refuerzo y fundida de pilotes en concreto en muro No. 15	K6+270

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
Verificación de actividades ejecutadas en obra	K4+090-K6+270
Revisión de documentación entregada por el contratista	N/A
Verificación de afiliaciones del personal a seguridad social	N/A
Registro diario en bitácora de obra	N/A

EQUIPO UTILIZADO CONTRATISTA DE OBRA			
DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTILIZACIÓN	OBSERVACIONES
Volqueta JTX 454	Transporte de material de excavación		Muros No. 1, 11, 13, 14 y 15.
Retroexcavadora Cat 416D	Excavación mecánica		Muros No. 1, 11, 13, 14 y 15.
Camioneta de platon	Transporte materiales, equipo y personal		Muros No. 1, 11, 13, 14 y 15.
Compresor y martillos neumáticos	Excavación caisson		N/A
Planta eléctrica 100 KVA	Perforaciones de anclajes		Muros No. 1, 11, 13, 14 y 15.
Unidad eléctrica 50 HP	Perforaciones de anclajes		Muros No. 1, 11, 13, 14 y 15.
Unidad hidráulica 30 HP	Perforaciones de anclajes		Muros No. 1, 11, 13, 14 y 15.
Mezcladora de Concreto autocargante	Fundida de caisson, zapatas y pantallas.		Muros No. 1, 11, 13, 14 y 15.
Saltarín compactador	Relleno con material de afirmado		Muros No. 1, 11, 13, 14 y 15.

MATERIALES UTILIZADOS CONTRATISTA DE OBRA		
DESCRIPCIÓN	SUMINISTRADO POR	OBSERVACIONES
Material granular	Cantera La roca	Se entregan certificados ambientales
Cemento		Se entregan certificados de calidad
Acero		Se entregan certificados de calidad

EQUIPO UTILIZADO POR CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA			
DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTLIZACIÓN	OBSERVACIONES
Automovil EIQ365	Transporte	100%	
Campamento oficina		100%	

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			VALOR
ANTICIPO	23	5	2024	$ 1.480.980.555,95
ACTA PARCIAL No. 1	6	9	2024	$ 1.119.311.146,69
ACTA PARCIAL No. 2	11	10	2024	$ 620.107.380,08
ACTA PARCIAL No. 3	5	12	2024	$ 167.571.070,90
ACTA PARCIAL No. 4	5	2	2025	$ 893.811.712,77
ACTA PARCIAL No. 5	18	2	2025	$ 680.913.755,57

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

ACTA PARCIAL No. 6	17	3	2025	$ 526.619.863,24
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS				**$ 5.489.315.485,20**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA			VALOR
ANTICIPO				
ACTA PARCIAL No. 1	6	9	2024	$ 117.239.989,00
ACTA PARCIAL No. 2	11	10	2024	$ 64.972.455,00
ACTA PARCIAL No. 3	28	11	2024	$ 17.555.232,00
ACTA PARCIAL No. 4	5	2	2025	$ 93.618.755,00
ACTA PARCIAL No. 5	18	2	2025	$ 70.483.711,00
ACTA PARCIAL No. 6	17	2	2025	$ 38.602.063,00
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS				**$ 402.472.205,00**

CORRESPONDENCIA PRESENTADA

FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
CMONIQUIRA-CE-224	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	ENTREGA INFORMES SEMANALES 43 Y 44	SE REALIZA REVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.
CMONIQUIRA-CE-225	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	ENTREGA INFORME MENSUAL NO 10.	SE REALIZA REVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.
GIC-CB-293-23 19/02/24	CONSORCIO MONIQUIRÁ	OBSERVACIONES SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE OBRA	SE REMITE AL CONTRATISTA
CMONIQUIRA-CE-226	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	MODIFICACIÓN NO.2 AL CONTRATO DE OBRA Y ADICIÓN DE RECURSOS.	SE REALIZA REVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.
CMONIQUIRA-CE-227	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	ENTREGA INFORME SEMANAL 45	SE REALIZA REVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.
GIC-CB-294-23 22/02/24	GOBERNACIÓN DE BOYACA	MODIFICACIÓN NO. 2 DEL CONTRATO DE OBRA - ADICIÓN Y PRORROGA	SE REMITE A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
GIC-CB-295-23 24/02/24	CONSORCIO MONIQUIRÁ	ALCANCE COMUNICACIÓN GIC-GB-293-25 OBSERVACIONES SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE OBRA	SE REMITE AL CONTRATISTA
GIC-CB-296-23 24/02/24	GOBERNACIÓN DE BOYACA	REMISIÓN INFORME MENSUAL NO. 9 DE INTERVENTORÍA	SE REMITE A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
GIC-CB-297-23 24/02/24	GOBERNACIÓN DE BOYACA	REMISIÓN INFORMES SEMANALES NO. 43 A NO. 44 DE OBRA	SE REMITE A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
GIC-CB-298-23 25/02/24	GOBERNACIÓN DE BOYACA	ENTREGA INFORME SEMANAL NO. 45 CTO 3230-2023	SE REMITE A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
GIC-CB-299-23 27/02/24	GOBERNACIÓN DE BOYACA	REMISIÓN INFORME SEMANAL NO. 45 DE OBRA	SE REMITE A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
S-2025-000129-SECINF	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	TRSLADO DE COMUNICACIÓN	SE REALIZA REVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0** **CÓDIGO: A-AD-GC-F-046**
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

GIC-CB-300-23 05/03/24	GOBERNACIÓN DE BOYACA	REMISIÓN INFORME SEMANAL NO. 46 DE OBRA	SE REMITE A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
GIC-CB-301-23 05/03/24	CONSORCIO MONIQUIRÁ	COMUNICACIÓN S-2025-000129-SECINF - CONTRATO 3230 DE 2023-TRASLADO DE COMUNICADO	SE REMITE A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
CMONIQUIRA-CE-229	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	RESPUESTA- TRASLADO DE COMUNICADO DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA HAYDEE CAMACHO SAAVEDRA	SE REALIZA REVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.
CMONIQUIRÁ-CE-230	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	RESPUESTA COMUNICADO FORMATO DE REGISTRO DE DEVOLUCIONES ÓRDENES DE PAGO	SE REALIZA REVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.
GIC-CB-302-23 07/03/24	GOBERNACIÓN DE BOYACA	SUBSANACION ACTA PARCIAL DE OBRA NO. 5	SE REMITE A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
GIC-CB-303-23 10/03/24	GOBERNACIÓN DE BOYACA	RESPUESTA COMUNICACIÓN S-2025-000129-SECINF	SE REMITE A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
GIC-CB-304-23 11/03/24	GOBERNACIÓN DE BOYACA	REMISIÓN INFORME SEMANAL NO. 46 DE OBRA	SE REMITE A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
GIC-CB-305-23 12/03/24	GOBERNACIÓN DE BOYACA	SUBSANACIÓN ACTA PARCIAL DE OBRA NO. 5	SE REMITE A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
S-2025-000164-SECINF	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	CONTRATO 3269 DE 2023-DEVOLUCIÓN N°02 DE ACTA PARCIAL DE OBRA	SE REALIZA REVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.
GIC-CB-306-23 13/03/24	GOBERNACIÓN DE BOYACA	SUBSANACIÓN ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA NO. 5	SE REMITE A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
GIC-CB-307-23 14/03/24	CONSORCIO MONIQUIRÁ	SOLICITUD INCREMENTO DE PERSONAL DE OBRA	SE REMITE AL CONTRATISTA
GIC-CB-308-23 14/03/24	CONSORCIO MONIQUIRÁ	SOLICITUD LIMPIEZA MURO 15	SE REMITE AL CONTRATISTA
GIC-CB-309-23 14/03/24	GOBERNACIÓN DE BOYACA	REITERACIÓN COMUNICACIÓN NECESIDAD DE ACTIVIDADES DE DESMONTE, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CUNETAS EN EL CORREDOR VIAL QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE MONIQUIRÁ Y TOGÜI	SE REMITE A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
CMONIQUIRÁ-CE-232	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	SOLICITUD DE SUSPENSIÓN CONTRATO DE OBRA NO.2_MARZO 2025.	SE REALIZA REVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.
GIC-CB-310-23 17/03/24	GOBERNACIÓN DE BOYACA	COMUNICACIÓN CMONIQUIRÁ-CE-231-ACTA DE OBRA NO. 6	SE REMITE A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
GIC-CB-311-23 17/03/24	GOBERNACIÓN DE BOYACA	REMISIÓN ACTA DE INTERVENTORÍA NO. 6	SE REMITE A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
GIC-CB-312-23 17/03/24	GOBERNACIÓN DE BOYACA	SOLICITUD DE SUSPENSION CTOS DE OBRA E INTERVENTORIA	SE REMITE A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

VERIFICACIÓN DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

NOBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	PERIODO DESDE dd	DESDE mm	DESDE aaaa	HASTA dd	HASTA mm	HASTA aaaa
EDWIN JAVIER LINARES GARCIA	1.013.623.379	X	X	X	8	4	2024			
BRAYAN STVEN GARCIA GARCIA	1.024.488.768	X	X	X	8	4	2024			
ANDRES FELIPE ABRIL	1.097.395.263	X	X	X	8	4	2024			
JUAN JOSE PIEDRAHITA	18.496.698	X	X	X	8	4	2024			
HECTOR EDUARDO RODRIGUEZ	79.788.119	X	X	X	8	4	2024			
JUAN CARLOS BONILLA	93.401.974	X	X	X	8	4	2024			
ANDREA LOPEZ	1.018.422.772	X	X	X	27	5	2024			
MAYER ALONSO CUBIDES	1.054.681.464	X	X	X	29	6	2024			
IVAN ANDRES GAMBOA SIERRA	1.054.679.767	X	X	X	18	3	2025			
CAROL LOPEZ	1.022.443.543	X	X	X	8	4	2024			
MARIA IRMA SEGURA	1.054.678.073	X	X	X	30	4	2024			
PEDRO VANEGAS	19.417.792	X	X	X	29	4	2024			
JOSE ROBERTO ARIZA PIZA	91.013.366	X	X	X	3	12	2024			
JOSE AGUDELO	1.054.679.889	X	X	X	29	4	2024			
FERNANDO GUIZA	1.022.335.387	X	X	X	29	4	2024			
LUZ IDALY PINILLA	1.030.609.168	X	X	X	6	5	2024			
EDWIN YESID PINILLA QUINTERO	1.057.710	X	X	X	18	3	2025			
PATRICIA PINILLA QUINTERO	1.057.710.789	X	X	X	11	5	2024			
ADRIANO MORENO CRUZ	7.183.149	X	X	X	11	2	2025			
JESUS ANTONIO ZAMBRANO	5.609.435	X	X	X	3	2	2025			
JUAN JOSE SALCEDO MACERO	6.056.470	X	X	X	3	2	2025			
JEAN CARLOS VALERO	1.010.296	X	X	X	3	2	2025			
JOSE JULIO FLORES	6.060.358	X	X	X	10	2	2025			
YOENDER JOSE TERAN MATERNA	5.337.169	X	X	X	10	2	2025			
ELVER DANIEL OCAMPO	1.081.414.650	X	X	X	6	2	2025			
JHON FERNANDO SAAVEDRA	74.243.683	X	X	X	23	1	2025			
CRISTIAN JAVIER BOCANEGRA	1.077.173.526	X	X	X	28	5	2024			
JOSE LUIS RUIZ DIAZ	72.428.541	X	X	X	9	9	2024			
EDIGUER VANEGAS SOLORZANO	5.829.289	X	X	X	4	9	2024			
YEISON SAENZ SAAVEDA	74.244.727	X	X	X	1	11	2024			

Se verificó que todo el personal de obra cumple con la afiliación a seguridad social de los trabajadores?	SI	x	NO	

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE OBRA

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN
DIRECTOR DE OBRA	EDWIN JAVIER LINAREZ GARCIA	1.013.623.379
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN STEVEN GARCIA GARCIA	1.024.488.768
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA	ANDRES FELIPE ABRIL	1.097.395.263

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	JUAN JOSE PIEDRAHITA	18.496.698
ESPECIALISTA EN PAIMENTOS	HECTOR EDUARDO RODRIGUEZ	79.788.119
ESPECIALISTA EN HIDRAULICA	JUAN CARLOS BONILLA	93.401.974
ESPECIALISTA EN HSQ	ANDREA MARCELA LÓPEZ ECHEVERRY	1.018.422.772
TOPOGRAFO INSPECTOR	MAYER ALONSO CUBIDES	1.054.681.464
CADENERO 1	ALEANDRO SARAI	80.050.329
CADENERO 2	JOSE IGNACIO MARQUEZ	1.095.906.061

Se verificó que el personal cumple con los requerimientos del contrato?	SI	x	NO	

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida y la aprobación de interventoría

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	EDGAR ALFONSO ARAGON OTERO	1.022.363.189
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CESAR CAMILO PARDO RUIZ	7.176.397
ESPECIALISTA GEOTECNIA	NEIMAR ARLEY CASTAÑO PELAES	79.758.293
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	JAIRO ANDRÉS MEZA ROSAS	13.874.430
ESPECIALISTA DE PAVIMENTOS	DIANA PATRICIA APONTE LOZANO	60.422.959
TOPÓGRAFO	IVAN ANDRES PINILLA CORTES	80.174.574
CADENERO 1	RUBIEL EUGENIO ESPITIA	88.210.062
CADENERO 2	IVAN DARÍO CRUZ SANCHEZ	1.016.110.151

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida .

ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EL CONTROL, MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
Se verifica que todo el personal cuente con sus respectivos elementos de protección personal y se verifica la implementación del Plan de Manejo del Tránsito aprobado por la gobernación.	N/A
Se realiza verificación de afiliaciones y seguridad social del personal que se encuentra en obra.	N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN
Se realiza verificación diaria del uso de elementos de protección personal por parte de los trabajadores en obra.	N/A
Se verifica la realización de preoperacionales de maquinaria, charlas de seguridad y demás actividades de seguridad y salud ocupacional.	N/A

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

RELACIÓN DE LABORATORIOS PRUEBAS Y ENSAYOS REALIZADAS

POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Resistencia concreto pantallas muro No. 1, 4000 psi	26	2	2025	50% de resistencia a los 4 dias.
Resistencia concreto pantallas muro No. 1, 4000 psi	26	2	2025	73% de resistencia a los 3 dias.
Resistencia concreto pantallas muro No. 1, 4000 psi	1	3	2025	124% de resistencia a los 6 dias.
Resistencia concreto zapatas muro No. 1, 4000 psi	27	2	2025	84% de resistencia a los 6 dias.
Resistencia concreto zapatas muro No. 1, 4000 psi	22	3	2025	124% de resistencia a los 27 dias.
Resistencia concreto pantallas muro No. 1, 4000 psi	25	3	2025	98% de resistencia a los 21 dias.
Resistencia concreto zapatas muro No. 11, 4000 psi	22	2	2025	69% de resistencia a los 7 dias.
Resistencia concreto zapatas muro No. 11, 4000 psi	21	2	2025	71% de resistencia a los 11 dias.
Resistencia concreto zapatas muro No. 13, 4000 psi	21	2	2025	67% de resistencia a los 6 dias.
Resistencia concreto pantallas muro No. 13, 4000 psi	25	3	2025	112% de resistencia a los 14 dias.
Resistencia concreto pilotes muro No. 15, 3000 psi	21	2	2025	118% de resistencia a los 17 dias.

POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Resistencia concreto pilotes muro No. 15, 3000 psi	6	3	2025	165% de resistencia a los 28 dias.

RELACIÓN Y UBICACIÓN DE FUENTES DE MATERIALES

DESCRIPCIÓN	FUENTE	DISTANCIA A LA OBRA (Km)	OBSERVACIÓN

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

Cantera La Roca	6 Km	Material granular

RELACIÓN DE COMITÉS DE OBRA REALIZADOS

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Comité de obra	6	3	2025	Acta de comité
Comité de obra	13	3	2025	Acta de comité

RELACIÓN DE INFORMES DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe semanal de Interventoría No. 45	17	2	2025	23	2	2025	
Informe semanal de Interventoría No. 46	24	2	2025	2	3	2025	
Informe semanal de Interventoría No. 47	3	3	2025	9	3	2025	
Informe semanal de Interventoría No. 48	10	3	2025	17	3	2025	

OBSERVACIONES:

A través de la comunicación GIC-GB-257-23 del 24 de diciembre de 2024, se remitio la reprogramación de obra avalada por la interventoria. versión No. 8


CONTENIDO MÍNIMO DEL INFORME*

	VERIFICACIÓN	FOLIOS No.
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra	SI	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación)	SI	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)	SI	
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	SI	
Bitácora de obra diligenciada por los residentes con visto bueno de los directores de obra e interventoría	SI	
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo	SI	
Amortización del anticipo	SI	
Flujograma de actividades e inversión del contrato de obra	SI	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	SI	
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	**SI**	
Certificado de recibo de estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios cálculos y especificaciones.	**SI**	
Memorias y planos de diseño aprobados	**SI**	
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)	**SI**	
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"	**SI**	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	**SI**	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	**SI**	
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	**SI**	
Copia de licencias y permisos ambientales y de construcción	**SI**	
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones,planillas, fotos, etc.)	**SI**	
Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)	**SI**	
Análisis de riesgos de las actividades, identificando los peligros, y formulando los controles correspondientes	**SI**	
Generales		
Registro fotográfico	**SI**	
Soportes de Correspondencia enviada y recibida	**SI**	


* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.
Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICÓ)
Folios No.: Indica en qué folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA: 

Interventor / RL. Interventoría

NOMBRE:	Luz Andrea Fajardo Corredor

INFORME MENSUAL: No. 11
PERIODO: 19/02/2025 – 17/03/2025
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: No. 3230 DE 2023
INTERVENTORÍA: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

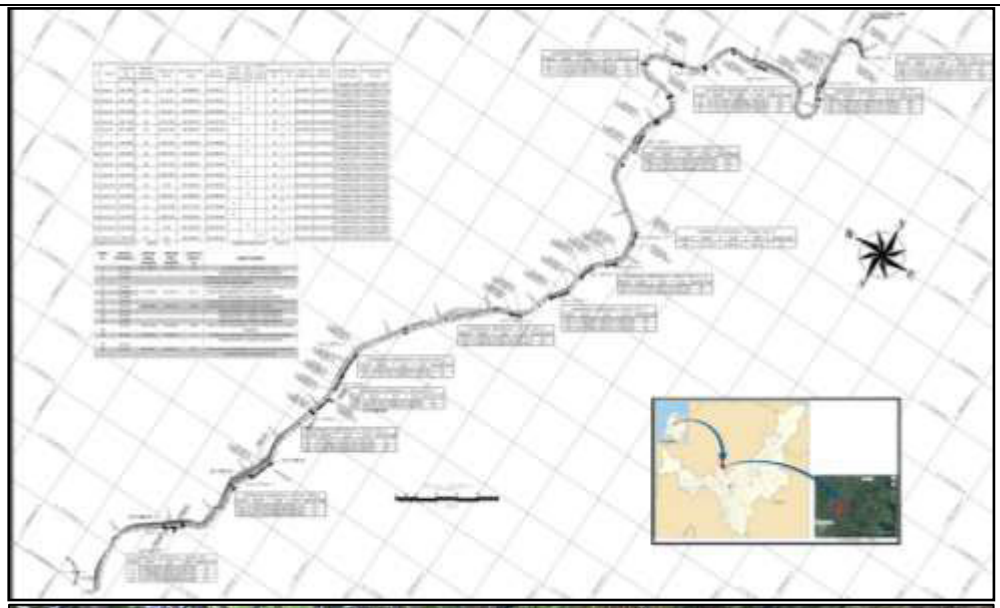



OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGÜI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 7
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 9
2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 9
2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA 9
2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA 9
2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 18
3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 19
3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 19
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 19
3.3 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 26
4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 28
4.1 INFORME SEMANAL 28
4.2 MAQUINARÍA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 28
4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA 29
4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 30
4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 30
4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 30
4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA 30
4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE OBRA 31
4.9 OTROS DOCUMENTOS 31
4.9.1 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 31
4.9.2 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA 32
4.9.3 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES 32
4.9.4 ACTAS DE COMITÉ DE OBRA 34
4.9.5 ACTAS DE REUNIÓN SOCIAL 34
5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 35
5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 35
5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR 35
5.2.1. SEGUIMIENTO TÉCNICO 35
5.2.2. SEGUIMIENTO AMBIENTAL 40
5.2.3. SEGUIMIENTO SST 41
5.2.3. SEGUIMIENTO SOCIAL 41
5.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES 41
6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 42
6.1 EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 42
6.2 PERSONAL CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 42
6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 42
6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA 42
6.5 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 43
6.6 REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DE LAS OBRAS 43
6.7 BITÁCORA DE OBRA 43
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 44
7.1 CONCLUSIONES 44
7.2 RECOMENDACIONES 44

IMÁGENES

Imagen 1. Localización Togui 9
Imagen 2. Sitio crítico No. 1 K4 + 090.....10
Imagen 3. Sitio crítico No. 2 K4+ 320.....10
Imagen 4. Sitio crítico No. 3 K4+ 500.....11
Imagen 5. Sitio crítico No. 4 K4+ 544.....11
Imagen 6. Sitio crítico No. 5 K4+ 600.....12
Imagen 7. Sitio crítico No. 6 K4+940.....12
Imagen 8. Sitio crítico No. 7 K5+040.....13
Imagen 9. Sitio crítico No. 8 K5+100.....13
Imagen 10. Sitio crítico No. 9 K5+170.....14
Imagen 11. Sitio crítico No. 10 K5+240.....14
Imagen 12. Sitio crítico No. 11 K5+450.....15
Imagen 13. Sitio crítico No. 12 K5+730.....15
Imagen 14. Sitio crítico No. 13 K5+910.....16
Imagen 15. Sitio crítico No. 14 K6+140.....16
Imagen 16. Sitio crítico No. 15 K6+270.....17
Imagen 17. Registro inicial de la vía Moniquirá - Togui. 17

TABLAS

Tabla 1. Datos generales del Contrato de Obra 19
Tabla 2. Informes semanales 28
Tabla 3. Relación de maquinaria contratista de obra 28
Tabla 4. Personal mínimo exigido del contrato de obra. 29
Tabla 5. Garantías actualizadas del contrato de obra 3269 de 2023. 31
Tabla 6. Resumen informe de inversión y buen manejo de anticipo: 31
Tabla 7. % de avance 32
Tabla 8. Flujo de inversión 32
Tabla 9. Acta de Comité. 34
Tabla 10. Datos generales del Contrato de Interventoría 35
Tabla 11. Estado actual muros 40
Tabla 12. Personal Contractual del contrato de Interventoría. 42
Tabla 13. Garantías actualizadas del contrato de interventoría No. 3230 de 2023 43

ANEXOS

Anexo 1. Formato A-AD-GC-F-046 INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA _____ 28
Anexo 2. Formato Informes semanales _____ 28
Anexo 3. Relación maquinaria y equipos del Contrato de Obra. _____ 29
Anexo 4. Control de aportes legales del Contrato de Obra _____ 30
Anexo 5. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 Estado general del tiempo. _____ 30
Anexo 6. Garantías contrato de obra (Pólizas). _____ 31
Anexo 7. Seguimiento plan de calidad de obra _____ 31
Anexo 8. Seguimiento programación de obra y flujo de inversión. _____ 32
Anexo 9. Programa de inversión _____ 33
Anexo 10. Actas de comité. _____ 34
Anexo 11. Acta de socialización _____ 34
Anexo 12. Seguimiento plan de calidad contrato de Interventoría _____ 35
Anexo 13. Seguimiento ambiental _____ 41
Anexo 14. Seguimiento SST _____ 41
Anexo 15. Aporte Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría. _____ 42
Anexo 16. Garantías contrato de Interventoría (Pólizas) _____ 43
Anexo 17. Relación de correspondencia _____ 43
Anexo 18. Registro Fotográfico _____ 43
Anexo 19. Copia de la bitácora. _____ 43

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

Copias de este documento serán entregadas a las dependencias indicadas en el cuadro siguiente. Todas aquellas observaciones que resulten de su revisión y aplicaciones deben ser informadas al director del Proyecto para proceder a ejecutar sus modificaciones.

ÁREAS O DEPENDENCIA		No. DE COPIAS
Copia No. 1	Gobernación de Boyacá	1 (original)
Copia No. 2	Supervisor contrato	1
Copia No. 3	Folder del Proyecto	1

ÍNDICE DE MODIFICACIONES

ÍNDICE VERSIÓN	CAPITULO MODIFICADO	FECHA DE MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

TITULO DOCUMENTO:	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11	
PERIODO:	Del 19 de febrero de 2025 al 17 de marzo de 2025	
RESPONSABLE ELABORACIÓN Residente de Interventoría	Nombre:	César Camilo Pardo Ruiz
	Firma:	
	Fecha:	24/03/2025
RESPONSABLE DE LA REVISIÓN Coordinador de proyectos	Nombre:	Dayana González
	Firma:	
	Fecha:	24/03/2025
Vo. Bo. Director de Interventoría	Nombre:	Edgar Alfonso Aragón Otero
	Firma:	
	Fecha:	24/03/2025

1. INTRODUCCIÓN

El corredor vial Moniquirá – Togüi, es una vía departamental, la cual comunica principalmente a los municipios de Moniquirá y Togüi; sin embargo, sirve de ruta alterna para llegar al municipio de Chitaraque; así mismo, la vía en mención se localiza desde el ramal en la ruta 62 (Tunja - Moniquirá) hacia el municipio de Togüi con una longitud aproximada de 12.5 Km; cabe resaltar que esta vía se comunica con la ruta 62, anteriormente relacionada, la cual comunica al departamento de Boyacá con Santander. El corredor citado, se considera de gran importancia debido al desarrollo económico por la actividad minera, ganadera y agrícola que se desarrolla en estos municipios y que por su influencia generan desarrollo en toda la provincia de Ricaurte, sin olvidar que esta conecta con departamentos vecinos.

En la actualidad, el corredor vial Moniquirá - Togüi presenta dificultad en la intercomunicación terrestre, teniendo en cuenta que esta vía presenta sitios con inestabilidad geotécnica, lo cual ha afectado la superficie de rodadura, generando que se encuentra en condiciones no óptimas para una buena movilidad.

Actualmente, el corredor vial que comunica los municipios de Moniquirá y Togüi en el Departamento de Boyacá, se encuentra en mal estado, lo cual significa un riesgo para los usuarios. Este corredor vial tiene una longitud total de 12,5 Km en los cuales se presentan 15 puntos críticos, con una longitud total de 384,5 m, en los cuales se deben adelantar obras de estabilización. Con respecto al mejoramiento vial propuesto, este se pretende implementar en los sectores donde se realizarán obras de estabilización con una longitud de 437 m de mejoramiento, cabe resaltar que las cantidades de mejoramiento son mayores debido a que se deben generar empalmes entre los segmentos de vía. Es importante resaltar que en 14 muros se realizará mejoramiento de 1 calzada (3 m) y en un muro (muro 11) se realizará mejoramiento en los 2 sentidos con un ancho de (6 m).

Estas situaciones incrementan los tiempos de viaje, generando un bajo desarrollo socio-económico para estos municipios y de la región, así mismo, el aumento en los costos de transporte tanto de pasajeros como de productos agropecuarios y el incremento en los costos de mantenimiento de vehículos.

La estructura de pavimento en el corredor vial en los puntos críticos, no es la adecuada para soportar el volumen de vehículos que transitan la vía; Por consiguiente, la Gobernación de Boyacá, ordenó mediante la Resolución No. 477 del 04 de mayo de 2023, abrir el proceso de contratación número LP-GB-002-2023 y que mediante la Resolución No. 1002 del 02 de agosto de 2023 adjudicó el contrato de obra No. 3269 de 2023 al CONSORCIO MONIQUIRÁ integrado por VINCOL CONSTRUCCIONES SAS (80% de participación), JOSE GABRIEL VARGAS CARVAJAL (10% de participación) y PROCIVING SAS (10% de participación) para la ejecución del objeto “MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA”.

En concordancia, la Gobernación de Boyacá, a fin de contar con la adecuada supervisión del proyecto, presentó apertura del proceso de contratación No. CM – GB- 02 – 2023 y mediante la Resolución del 10 de agosto de 2023 la Entidad adjudicó el contrato de Interventoría No. 3230 del 2023 a GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. cuyo objeto es “INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES

“MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGÜI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”.


A lo largo de este documento, se desarrolla la evaluación y descripción de los trabajos y actividades realizadas bajo los aspectos técnicos, jurídicos, administrativos y de control presupuestal de los contratos de obra e interventoría, conforme a los requerimientos establecidos contractualmente.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El Proyecto se encuentra localizado en el Departamento de Boyacá, en el corredor vial que comunica los municipios de Moniquirá y Togui, se localiza desde el ramal en la ruta 62 (Tunja - Moniquirá) hacia el municipio de Togüi con una longitud aproximada de 12.5 Km

Imagen 1. Localización Togui

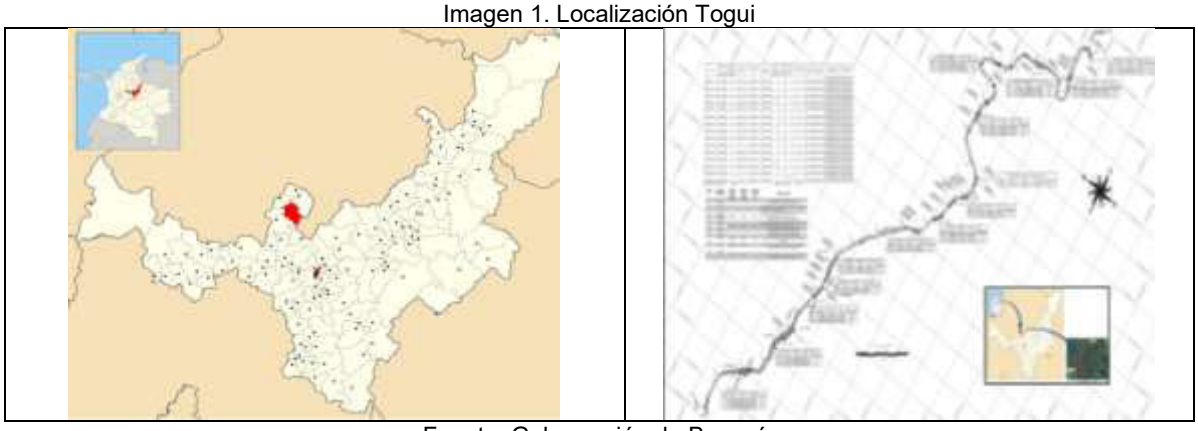

Fuente. Gobernación de Boyacá.

2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA

De acuerdo con el contrato 3269 de 2023 el proyecto "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MONIQUIRÁ - TOGÜÍ, MUROS DE CONTENCIÓN, se ejecutará en la zona de influencia de los municipios de Togui y Moniquirá del Departamento de Boyacá.


2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

De acuerdo con lo relacionado en el Plan de Calidad de Interventoría entregado en el Informe Cero mediante comunicación GIC-GB-064-23 del día 21 de marzo de 2024 las principales actividades y obras por ejecutar que deben ser supervisadas, controladas, verificadas, aprobadas, medidas y constatadas por la interventoría, comprenden entre otras, las siguientes:

SITIO CRÍTICO No. 1 K4+ 090

Se ha definido como la mejor solución, un muro tipo voladizo cimentado superficialmente con altura de 4,0m, con su zapata embebida cerca de 1,0m dentro del macizo rocoso. Los valores de capacidad de carga admisible calculados en función del ancho efectivo de la zapata son: Ancho (B) 2m=12,6 Ton/m^2 y Ancho (B) 3m=15,0Ton/m^2. Para disminuir las dimensiones de ancho de zapata y mejorar la resistencia al deslizamiento se ha propuesto utilizar anclajes pasivos que deben instalarse en dos filas, la resistencia a la tensión de cada anclaje de longitud 6,0m incluyendo gancho= 5,7 Ton, el diámetro de la perforación mínimo será de 4 pulgadas, y se recomienda el uso de lechada con relación agua/cemento=0,45 a 0,5 para conformar bulbo o fuste del elemento.

Imagen 2. Sitio crítico No. 1 K4 + 090

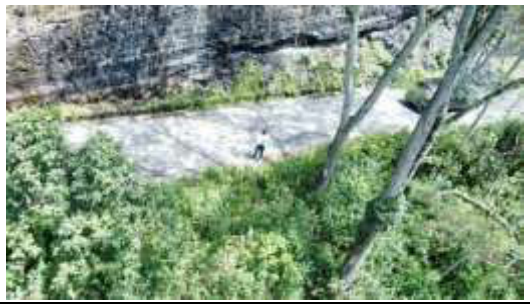MURO	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	 

SITIO CRÍTICO No. 2 K4+ 320

Se ha definido como la mejor solución un muro tipo voladizo cimentado superficialmente con altura de 4,0m, con su zapata embebida cerca de 1,0m dentro del macizo rocoso. Los valores de capacidad de carga admisible calculados en función del ancho efectivo de la zapata son: Ancho (B) 2m=12,6 Ton/m^2 y Ancho (B) 3m=14,8Ton/m^2. Para disminuir las dimensiones de ancho de zapata y mejorar la resistencia al deslizamiento se ha propuesto utilizar anclajes pasivos que deben instalarse en dos filas, la resistencia a la tensión de cada anclaje de longitud 6,0m incluyendo gancho= 5,7 Ton, el diámetro de la perforación mínimo será de 4 pulgadas, y se recomienda el uso de lechada con relación agua/cemento=0,45 a 0,5 para conformar bulbo o fuste del elemento.

Imagen 3. Sitio crítico No. 2 K4+ 320

MURO	REGISTRO FOTOGRAFICO
2	 

SITIO CRÍTICO No. 3 K4+ 500

Se ha definido como la mejor solución un muro tipo voladizo cimentado superficialmente con altura de 3,6m. Con su zapata embebida cerca de 1,0m dentro del macizo rocoso. Los valores de capacidad de carga admisible calculados en función del ancho efectivo de la zapata son: Ancho (B) 2m=16,7 Ton/m^2 y Ancho (B) 3m=17,8Ton/m^2. Para disminuir las dimensiones de ancho de zapata y mejorar la resistencia al deslizamiento se ha propuesto utilizar anclajes pasivos que deben instalarse en dos filas, la resistencia a la tensión de cada anclaje de longitud 6,0m incluyendo gancho= 5,7 Ton, el diámetro de la perforación mínimo será de 4 pulgadas, y se recomienda el uso de lechada con relación agua/cemento=0,45 a 0,5 para conformar bulbo o fuste del elemento.

Imagen 4. Sitio crítico No. 3 K4+ 500

MURO	REGISTRO FOTOGRAFICO
3	

SITIO CRÍTICO No. 4 K4+ 544

Debido a que el macizo rocoso competente aparece a una profundidad cercana a los 5,5m, medidos desde la superficie de la vía, se han encontrado fuerzas de empujes considerables generadas por una masa deslizada sobre la roca, de tal forma que aplicando soluciones de muro en voladizo anclado con anclas pasivas resultaría ineficaz, por lo que se plantea el uso de elementos de mayor diámetro para resistir las fuerzas de empuje. Se plantea la construcción de un muro tipo voladizo con altura de vástago cercana a 2,5m sin bordillo, cimentado sobre una fila de pilotes tipo caisson de diámetro 1,2m, separados 3 diámetros centro a centro, con una longitud mínima de 7,0m, estimada mediante cálculo de deformaciones. Se deberá garantizar un empotramiento de cada elemento dentro del macizo, al menos 4,0m.

Imagen 5. Sitio crítico No. 4 K4+ 544

MURO	REGISTRO FOTOGRAFICO
4	

SITIO CRÍTICO No. 5 K4+ 600

Se ha definido como la mejor solución un muro tipo voladizo cimentado superficialmente con altura de 3,0m. Con su zapata embebida cerca de 1,0m dentro del macizo rocoso. Los valores de capacidad de carga admisible calculados en función del ancho efectivo de la zapata son: Ancho (B) 2m=13,7 Ton/m^2 y Ancho (B) 3m=14,4Ton/m^2. Para disminuir las dimensiones de ancho de zapata y mejorar la resistencia al deslizamiento se ha propuesto utilizar anclajes pasivos que deben instalarse en dos filas, la resistencia a la tensión de cada anclaje de longitud 6,0m incluyendo gancho= 5,7 Ton, el diámetro de la perforación mínimo será de 4 pulgadas, y se recomienda el uso de lechada con relación agua/cemento=0,45 a 0,5 para conformar bulbo o fuste del elemento.

Imagen 6. Sitio crítico No. 5 K4+ 600

MURO	REGISTRO FOTOGRAFICO
5	

SITIO CRÍTICO No. 6 K4+940

Se ha definido como la mejor solución un muro tipo voladizo cimentado superficialmente con altura de 3,5m. Con su zapata embebida cerca de 1,0m dentro del macizo rocoso. Los valores de capacidad de carga admisible calculados en función del ancho efectivo de la zapata son: Ancho (B) 2m=18,4 Ton/m^2 y Ancho (B) 3m=19,1Ton/m^2. Para disminuir las dimensiones de ancho de zapata y mejorar la resistencia al deslizamiento se ha propuesto utilizar anclajes pasivos que deben instalarse en dos filas, la resistencia a la tensión de cada anclaje de longitud 6,0m incluyendo gancho= 5,7 Ton, el diámetro de la perforación mínimo será de 4 pulgadas, y se recomienda el uso de lechada con relación agua/cemento=0,45 a 0,5 para conformar bulbo o fuste del elemento.

Imagen 7. Sitio crítico No. 6 K4+940

MURO	REGISTRO FOTOGRAFICO
6	

SITIO CRÍTICO No. 7 K5+040

Se ha definido como la mejor solución un muro tipo voladizo cimentado superficialmente con altura de 4,0m. Con su zapata embebida cerca de 1,0m dentro del macizo rocoso. Los valores de capacidad de carga admisible calculados en función del ancho efectivo de la zapata son: Ancho (B) 2m=17,1 Ton/m^2 y Ancho (B) 3m=17,8 Ton/m^2. Para disminuir las dimensiones de ancho de zapata y mejorar la resistencia al deslizamiento se ha propuesto utilizar anclajes pasivos que deben instalarse en dos filas, la resistencia a la tensión de cada anclaje de Longitud 6,0m incluyendo gancho= 5,7 Ton, el diámetro de la perforación mínimo será de 4 pulgadas, y se recomienda el uso de lechada con relación agua/cemento=0,45 a 0,5 para conformar bulbo o fuste del elemento.

Imagen 8. Sitio crítico No. 7 K5+040

MURO	REGISTRO FOTOGRAFICO
7	

SITIO CRÍTICO No. 8 K5+100

Debido a que el macizo rocoso competente aparece a una profundidad cercana a los 3,0m medidos desde la superficie de la vía, se han encontrado fuerzas de empujes considerables generadas por una masa deslizada sobre la roca, de tal forma que aplicando soluciones de muro en voladizo anclado con anclas pasivas resultaría ineficaz, por lo que se plantea el uso de elementos de mayor diámetro para resistir las fuerzas de empuje. Se plantea la construcción de un muro tipo voladizo con altura de vástago cercana a 3,0m sin bordillo, cimentado sobre una fila de pilotes tipo caisson de diámetro 1,2m, con una longitud mínima de 5,0m, estimada mediante cálculo de deformaciones, se deberá garantizar un empotramiento de cada elemento dentro del macizo, al menos 3,6m.

Imagen 9. Sitio crítico No. 8 K5+100

MURO	REGISTRO FOTOGRAFICO
8	

SITIO CRÍTICO No. 9 K5+170

Se ha definido como la mejor solución un muro tipo voladizo cimentado superficialmente con altura de 4,0m. Con su zapata embebida cerca de 1,0m dentro del macizo rocoso. Los valores de capacidad de carga admisible calculados en función del ancho efectivo de la zapata son: Ancho (B) 2m=17,1 Ton/m^2 y Ancho (B) 3m=17,8 Ton/m^2. La roca se encuentra aproximadamente a 3,0m en la parte externa de la calzada. Para disminuir las dimensiones de ancho de zapata y mejorar la resistencia al deslizamiento se ha propuesto utilizar anclajes pasivos que deben instalarse en dos filas, la resistencia a la tensión de cada anclaje de Longitud 6,0m incluyendo gancho= 5,7 Ton, el diámetro de la perforación mínimo será de 4 pulgadas, y se recomienda el uso de lechada con relación agua/cemento=0,45 a 0,5 para conformar bulbo o fuste del elemento.

Imagen 10. Sitio crítico No. 9 K5+170

MURO	REGISTRO FOTOGRAFICO
9	

SITIO CRÍTICO No. 10 K5+240

Se ha definido como la mejor solución un muro tipo voladizo cimentado superficialmente con altura de 4,0m. similar al del sitio crítico 9, pero debido a que la roca aparece a una profundidad un poco mayor (3,7m), se recomienda usar un mejoramiento de 50cm con concreto ciclópeo de tal forma que se garantice el empotramiento de la cimentación en el macizo. Los valores de capacidad de carga admisible calculados en función del ancho efectivo de la zapata son: Ancho (B) 2m=17,1 Ton/m^2 y Ancho (B) 3m=17,8 Ton/m^2. La roca se encuentra aproximadamente a 3,7m en la parte externa de la calzada. Para disminuir las dimensiones de ancho de zapata y mejorar la resistencia al deslizamiento se ha propuesto utilizar anclajes pasivos que deben instalarse en dos filas, la resistencia a la tensión de cada anclaje de Longitud 6,0m incluyendo gancho= 5,7 Ton, el diámetro de la perforación mínimo será de 4 pulgadas, y se recomienda el uso de lechada con relación agua/cemento=0,45 a 0,5 para conformar bulbo o fuste del elemento.

Imagen 11. Sitio crítico No. 10 K5+240

MURO	REGISTRO FOTOGRAFICO
10	

SITIO CRÍTICO No. 11 K5+450

Para conformar el ancho de calzada adecuado en el sitio, se ha definido como la mejor solución un muro tipo voladizo cimentado superficialmente con altura de 4,0m. Con su zapata embebida cerca de 1,0m dentro del macizo rocoso. Los valores de capacidad de carga admisible calculados en función del ancho efectivo de la zapata son: Ancho (B) 2m=17,1 Ton/m^2 y Ancho (B) 3m=17,8 Ton/m^2. La roca se encuentra aproximadamente a 3,0m en la parte externa de la calzada. Para disminuir las dimensiones de ancho de zapata y mejorar la resistencia al deslizamiento se ha propuesto utilizar anclajes pasivos que deben instalarse en dos filas, la resistencia a la tensión de cada anclaje de Longitud 6,0m incluyendo gancho= 5,7 Ton, el diámetro de la perforación mínimo será de 4 pulgadas, y se recomienda el uso

de lechada con relación agua/cemento=0,45 a 0,5 para conformar bulbo o fuste del elemento.

Imagen 12. Sitio crítico No. 11 K5+450

MURO	REGISTRO FOTOGRAFICO
11	

SITIO CRÍTICO No. 12 K5+730 CODIGO:PL-CAL-001

El macizo rocoso competente aparece a una profundidad cercana a los 5,0m medido desde la superficie de la vía, se han encontrado fuerzas de empujes considerables generadas por una masa de suelo con cuña de falla tipo Rankine o Coulomb, de tal forma que aplicando soluciones de muro en voladizo anclado con anclas pasivas resultaría ineficaz o una zapata demasiado grande, por lo que se plantea el uso de elementos profundos de mayor diámetro para resistir las fuerzas de empuje. Se plantea la construcción de un muro tipo voladizo con altura de vástago cercana a 3,3m, cimentado sobre una fila de pilotes tipo caisson de diámetro 1,2m, espaciados 3,6m centro a centro, con una longitud mínima de 6,0m, se deberá garantizar un empotramiento de cada elemento dentro del macizo, al menos 4,0m.

Imagen 13. Sitio crítico No. 12 K5+730

MURO	REGISTRO FOTOGRAFICO
12	

SITIO CRÍTICO No. 13 K5+910

En el sitio se evidencia el inicio de una falla, por ahora un pequeño hundimiento y fisuras en el pavimento, que progresarán hasta afectar la calzada mediante pérdida total por deslizamiento, se encontró suelo suelto tipo Coluvial hasta unos 4.0m, el cual tiende a deslizarse sobre otro estrato arcilloso duro, que a su vez subrayase el macizo rocoso que se encuentra aproximadamente a 9,0m de profundidad medidos desde la rasante vial. Se plantea la construcción de un muro tipo voladizo con altura de vástago cercana a 3,0m sin bordillo, cimentado sobre una fila de pilotes tipo caisson de diámetro 1,2m, separados cada 3,6m centro a centro, con una longitud mínima de 9,0m, se deberá garantizar un empotramiento de cada elemento dentro del macizo, al menos 3,6m.

Imagen 14. Sitio crítico No. 13 K5+910

MURO	REGISTRO FOTOGRAFICO
13	

SITIO CRÍTICO No. 14 K6+140

Se ha definido como la mejor solución un muro tipo voladizo cimentado superficialmente con altura de 1,5m. Con su zapata apoyada sobre la roca embebida 5.0cm. Los valores de capacidad de carga admisible calculados en función del ancho efectivo de la zapata son: Ancho (B) 1m=18,4 Ton/m^2 y Ancho (B) 2m=18,8Ton/m^2. Para disminuir las dimensiones de ancho de zapata y mejorar la resistencia al deslizamiento se ha propuesto utilizar anclajes pasivos que deben instalarse en dos filas, la resistencia a la tensión de cada anclaje de Longitud 3,0m incluyendo gancho= 3,0 Ton, el diámetro de la perforación mínimo será de 4 pulgadas, y se recomienda el uso de lechada con relación agua/cemento=0,45 a 0,5 para conformar bulbo o fuste del elemento.

Imagen 15. Sitio crítico No. 14 K6+140

MURO	REGISTRO FOTOGRAFICO
14	

SITIO CRÍTICO No. 15 K6+270

Se ha definido como la mejor solución un muro en suelo reforzado, con altura de 6.5m, con su cimentación apoyada sobre arcillas competentes. Se presentan como anexo las memorias de cálculo del muro y para el sitio se presenta el plano de detalles. El cuerpo del muro se realizará con material aprobado para terraplenes tipo adecuado o seleccionado que cumpla con los requisitos sugeridos en el Artículo 220 INVIAS y que tenga los mismos o mejores parámetros que los usados en el diseño, que se muestran en el capítulo 8 para el suelo denominado “relleno”. Se recomienda revestir la cara del muro con concreto lanzado con espesor cercano a 10 cm de tal forma que se protejan los geotextiles contra efectos ambientales como los rayos UV. Las capas de suelo se deberán compactar al menos al 95% del proctor modificado en espesores no mayores a 30 cm. Se recomienda mejorar la cimentación con un colchón de material granular, que permitirá drenar y aumentar la capacidad de soporte, este se construirá utilizando geotextil no tejido NT2500 o similar, es

importante durante la construcción, realizar conducción de las aguas de drenaje, evitando que se estanquen y saturen los suelos locales.

Imagen 16. Sitio crítico No. 15 K6+270

MURO	REGISTRO FOTOGRAFICO
15	 

A continuación, se relaciona el registro fotográfico general de la vía:

Imagen 17. Registro inicial de la vía Moniquirá - Togui.













2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El corredor vial posee una longitud de 12,5 Km, en el cual se presenta inestabilidad de la banca en 15 puntos críticos distribuidos a lo largo de este corredor. La sumatoria de cada uno de estos sectores donde se deben implementar obras de mitigación es de 384,5 m y en la capa de rodadura de 437m. Estos puntos críticos, generan demoras y pérdidas de tiempo en el desplazamiento por esta vía, así mismo, inseguridad debido al riesgo inminente, por lo tanto, se proyectan obras de estabilización tipo Muro de Contención, que se ajusten a la necesidad y cumplan con lo establecido en la normativa vigente.

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

La Gobernación de Boyacá, a través de la secretaria de Infraestructura, realizó el proceso de formulación del proyecto denominado: “MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MONIQUIRA – TOGÜI, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, debido a los movimientos en masa, que afectan la estructura existente, generando riesgos a la comunidad.

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

A continuación, se relaciona la información del contrato No. 3269 de 2023

Tabla 1. Datos generales del Contrato de Obra

CONTRATO No.	3269 de 2023
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MONIQUIRÁ - TOGÜÍ, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO MONIQUIRÁ. NIT. 901.740.222-1,
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA:	JAVIER LINARES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON 14 VENTAVOS M/CTE. ($ 4.936.601.853,14). INCLUIDO IVA.
ADICION	DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE. ($ 2.395.852.200,55). INCLUIDO IVA.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE. ($7.332.454.053,69). INCLUIDO IVA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	28 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE INICIO	8 DE ABRIL DE 2024
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	8 (OCHO) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
PRORROGA	3 (MESES)
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	11 (MESES)
FECHA DE SUSPENSION 1:	7 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE REINCIO 1:	19 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE FINALIZACION (CON PRORROGA)	18 DE MARZO DE 2025
ESTADO ACTUAL	EN EJECUCIÓN

Fuente: Elaboración propia

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el periodo del informe se realizaron las siguientes actividades:

1. Muro No. 01 abscisa K4+090

- Excavación mecánica en el muro No. 1.

- Perforaciones para anclajes verticales en muro No. 1.
- Amarre de acero de refuerzo y fundida de zapatas en el muro No. 1.
- Amarre de acero de refuerzo y fundida de pantallas en el muro No. 1.
- Instalación de geodren vial.
- Relleno con material de afirmado compactado.

	
Fundida de zapatas en concreto en muro No. 1.	Fundida de pantallas en concreto en muro No. 1.
	
Instalación de geodren vial en muro No. 1.	Relleno con material de afirmado compactado en muro No.1.

2. Muro No. 02 abscisa K4+320

- Pantallas en concreto terminadas en el muro No. 2.
- Carpeta asfáltica terminada en el muro No. 2.

	
Carpeta asfáltica terminada en muro No. 2.	Carpeta asfáltica terminada en muro No. 2.

3. Muro No 3 Abscisa K4+500

- Pantallas en concreto terminadas en el muro No. 3.
- Carpeta asfáltica terminada en el muro No. 3.
- Construcción de cunetas en concreto en muro No. 3

	
Carpeta asfáltica terminada en muro No. 3.	Pantallas terminadas en muro No. 3.
	
Construcción de cunetas en concreto en muro No. 3	Construcción de cunetas en concreto en muro No. 3

4. Muro No. 4 abscisa K4+544

- Pantallas en concreto terminadas en el muro No. 4.
- Carpeta asfáltica terminada en el muro No. 4.
- Construcción de cunetas en concreto en muro No. 4

	
Carpeta asfáltica terminada en muro No. 4.	Pantallas terminadas en muro No. 4.
	
Construcción de cunetas en concreto en muro No. 4	Construcción de cunetas en concreto en muro No. 4

5. Muro No. 5 abscisa K4+600

- Pantallas en concreto terminadas en el muro No. 5.
- Carpeta asfáltica terminada en el muro No. 5.
- Construcción de cunetas en concreto en muro No. 5

	
Carpeta asfáltica terminada en muro No. 5.	Pantallas terminadas en muro No. 5.
	
Construcción de cunetas en concreto en muro No. 5	Construcción de cunetas en concreto en muro No. 5

6. Muro No 6 Abscisa K4+940

- Pantallas en concreto terminadas en el muro No. 6.
- Carpeta asfáltica terminada en el muro No. 6.
- Construcción de cunetas en concreto en muro No. 6.

	
Construcción de cunetas en concreto en muro No. 6	Construcción de cunetas en concreto en muro No. 6

7. Muro No 7 Abscisa K5+040

- Pantallas en concreto terminadas en el muro No. 7.
- Carpeta asfáltica terminada en el muro No. 7.

	
Carpeta asfáltica terminada en muro No. 7.	Pantallas terminadas en muro No. 7.

8. Muro No 08 Abscisa K5+100

- Pantallas en concreto terminadas en el muro No. 8.
- Carpeta asfáltica terminada en el muro No. 8.

	
Carpeta asfáltica terminada en muro No. 8.	Pantallas terminadas en muro No. 8.

9. Muro No 09 Abscisa K5+170

- Pantallas en concreto terminadas en el muro No. 9.
- Carpeta asfáltica terminada en el muro No. 9.

	
Carpeta asfáltica terminada en muro No. 9.	Pantallas terminadas en muro No. 9.

10. Muro No 10 Abscisa K5+240

- Pantallas en concreto terminadas en el muro No. 10.
- Carpeta asfáltica terminada en el muro No. 10.

	
Carpeta asfáltica terminada en muro No. 10.	Pantallas terminadas en muro No. 10.

11. Muro No 11 Abscisa K5+450

- Perforaciones para anclajes verticales en muro No. 11.
- Amarre de acero de refuerzo y fundida de zapatas y pantallas en el muro No. 11.
- Instalación de geodren vial.
- Relleno con material de afirmado para cunetas en el muro No. 11.

	
Fundida de zapatas en concreto en muro No. 11.	Pantallas terminadas en muro No. 11.
	
Instalación de geodren vial en muro No. 11.	Relleno con material de afirmado en el muro No. 11

12. Muro No 12 Abscisa K5+730

- Pantallas en concreto terminadas en el muro No. 12.

	
Estado muro No. 12.	Pantallas terminadas muro No. 12.

13. Muro No 13 Abscisa K5+910

- Perforaciones para anclajes verticales en muro No. 13.
- Amarre de acero de refuerzo y fundida de zapatas y pantallas en el muro No. 13.

	
Amarre de acero de refuerzo y fundida de zapatas en concreto en muro No. 13.	Amarre de acero de refuerzo y fundida de pantallas en concreto en muro No. 13.

	
Pantallas terminadas en muro No. 13	Pantallas terminadas en muro No. 13

14. Muro No 14 Abscisa K6+140

- Perforaciones para anclajes verticales en muro No. 14.
- Fundida de solado de limpieza en el muro No. 14.
- Amarre de acero de refuerzo y fundida de zapatas y pantallas en el muro No. 14

.

	
Perforación para anclajes verticales en muro No. 14.	Fundida de solado de limpieza en muro No. 14.
	
Amarre de acero de refuerzo para zapatas y pantallas en concreto en muro No. 14.	Pantallas terminadas en muro No. 14

15. Muro No 15 Abscisa K6+270

- Perforaciones para pilotes en concreto en muro No. 15.
- Fundida de solado de limpieza en el muro No. 15.
- Perforaciones para drenes horizontales en muro No. 15.
- Amarre de acero de refuerzo y fundida de zapatas en el muro No. 15.

	
Perforaciones para drenes horizontales en muro No.15.	Fundida de solado de limpieza en muro No. 15.
	
Amarre de acero de refuerzo de zapatas en el muro No 15	Amarre de acero de refuerzo de zapatas en el muro No 15
	
Fundida de zapatas en el muro No. 15	Fundida de zapatas en el muro No. 15

16. Implementación Plan de Manejo de Tráfico

- Se procedió a la instalación de señalización móvil de acuerdo al Plan de Manejo de Tráfico.

17. Remisión informes mensuales

El presente informe mensual del periodo comprendido del 19 de febrero de 2025 al 17 de marzo del 2025 es el onceavo que se realiza por parte de la interventoría.

3.3 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

- Al cierre del presente informe, Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S. se encuentra realizando seguimiento y control al desarrollo del contrato de obra.

- Se efectuó comité de obra el día 6 de marzo con presencia del contratista e interventoría, cuyos temas quedaron consignados en el acta respectiva.

- El 7 de marzo de 2025 se realiza socialización del proyecto con la comunidad docente del colegio Haydee Camacho cuyos temas quedaron consignados en el acta respectiva.

- Se realizó comité de seguimiento el día 13 de marzo con presencia del contratista e interventoría, cuyos temas quedaron consignados en el acta respectiva

- Se reitera la observación del desprendimiento de bancada entre los muros No. 7 y 8 y por recomendación del especialista de interventoría se realizan obras temporales para el control del agua de escorrentía y se revisará la posibilidad de ejecutar obras de contención en este sitio, de acuerdo a balance del proyecto.



- El 17 de marzo de 2025 mediante el comunicado GIC-GB-312-25 se realiza la solitud de suspensión del contrato de obra e interventoría con el fin de que la Entidad Contratante pueda completar los tramites internos necesarios para la legalización de la prórroga y adición de los contratos.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

Para el periodo comprendido entre el 19 de febrero de 2025 y el 17 de marzo del 2025 y en cumplimiento de las obligaciones contractuales, la interventoría Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S. ha remitido los informes semanales de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico y el manual de interventoría de obra pública de la gobernación de Boyacá.

El informe mensual presenta el estado general de la obra teniendo en cuenta los aspectos técnicos, económicos, financieros, presupuestales, legales, contractuales; de igual forma, se presenta el estado del equipo, personal, materiales, programa de trabajo y avance en la ejecución de la obra.

Anexo 1. Formato A-AD-GC-F-046 INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA

4.1 INFORME SEMANAL

Durante el presente periodo Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S. remitió cuatro (4) informes semanales de la siguiente manera:

Tabla 2. Informes semanales

Informe Semanal	Periodo
45	Del 17 al 23 de febrero 2025
46	Del 24 de febrero al 02 de marzo 2025
47	Del 03 al 09 de marzo 2025
48	Del 10 al 17 de marzo 2025

Fuente: Elaboración propia

Anexo 2. Formato Informes semanales

4.2 MAQUINARÍA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

Mediante la comunicación CMONIQUIRÁ-CE-061, el contratista remitió a la interventoría la relación de maquinaria y personal que inició actividades en obra el 29 de abril de 2024.

Tabla 3. Relación de maquinaria contratista de obra

MAQUINARIA (ANEXO TÉCNICO)	CAN	MAQUINARIA O HERRAMIENTA MENOR PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR CONTRATISTA
BULLDOZER TIPO D-6 O SIMILAR	1	BULLDOZER MARCA KOMATSU LÍNEA D41P-6 MODELO 2006	CONTRATO
			DECLARACIÓN DE IMPORTANCIÓN
RETROEXCAVADORA 320 O SIMILAR	1	EXCAVADORA DOOSAN LÍNEA DX225LCA MODELO 2013	TARJETA DE REGISTRO DE LA MAQUINARIA
			FICHA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
RETROEXCAVADORA 320 O SIMILAR	1	RETROEXCAVADORA SANY LÍNEA SY007CEQ690K8 MODELO 2025	DECLARACIÓN DE IMPORTANCIÓN
			TARJETA DE PROPIEDAD
			TARJETA DE PROPIEDAD
RETROEXCAVADORA JD-510 O SIMILAR	1	RETROEXCAVADORA KOMATSU LÍNEA WB140-2N MODELO 2006	TARJETA DE REGISTRO DE LA MAQUINARIA
			FICHA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
MOTONIVELADORA POTENCIA MÍNIMA 120 HP Y MÁX. 215 HP	1	MOTONIVELADORA KOMATSU LÍNEA GD555-3A MODELO 2006 POTENCIA 196 HP	DECLARACIÓN DE IMPORTANCIÓN
			TARJETA DE REGISTRO DE LA MAQUINARIA
			FICHA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
VIBROCOMPACTADOR CA-15 O SIMILAR	1	VIBROCOMPACTADOR ATLAS COPCO DYNAPAC LINEA DYNAPAC CC1200 MODELO 2015	DECLARACIÓN DE IMPORTANCIÓN
			TARJETA DE REGISTRO DE LA MAQUINARIA

MAQUINARIA (ANEXO TÉCNICO)	CAN	MAQUINARIA O HERRAMIENTA MENOR PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR CONTRATISTA
VIBROCOMPACTADOR RANA	1	SIN REFERENCIA	FACTURA DE COMPRA (REGISTRO FOTOGRÁFICO)
MAQUINARIA (ANEXO TÉCNICO)	N/A	MAQUINARIA O HERRAMIENTA MENOR PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR CONTRATISTA
CORTADORA DE PAVIMENTO	1	CORTADOR DE PISO ESTRUCTURA NACIONAL DISCO NAIROZ 14" DIAMANTADO	FACTURA DE COMPRA
COMPRESOR DE 250 PIES 3 CON MARTILLO	1	WOLFOX COMPRESOR HORIZONTAL 2HP 24L (IRX)	FACTURA DE COMPRA
EQUIPO DE PERFORACIÓN TRACKDRILL	1	TRACKDRILL MARCA KOMATSU MODELO PC40-7	CERTIFICADO DE MAQUINARIA
			FICHA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
CARROTANQUE	1	SEMIREMOLQUE TANQUE MARCA INARC	TARJETA DE PROPIEDAD
			SOAT
			TECNO MECANICA
BOMBA DE INYECCIÓN	1	BOMBA DE INYECCION ELECTRO-HIDRAULICA SIN REFERENCIA	CERTIFICADO DE MAQUINARIA
COMPRESOR	1	AIRMAN AIR COMPRESSOR MODEL PDS 18SS-6C2	FACTURA DE COMPRA
TALADRO PERCUTOR 2W-R1/2 700W 0.1000/0.3000 RPM	1	BOSH GBH 2-26 DFR Professional	FACTURA DE COMPRA (REGISTRO FOTOGRÁFICO)
			ESPECIFICACIONES
FORMALETA PARA CAMISA DE PILOTE	1	NA	CERTIFICADO DE CAMISA PARA CAISSON
MOTOBOMBA DE CONCRETO	1	BOMBA 1HP SUMERGIBLE BARNES 11M/800L	FACTURA DE COMPRA (REGISTRO FOTOGRÁFICO)
CILINDRO NEUMÁTICO	1	VIBROCOMPACTADOR NEUMATICO DE 9 LLANTAS INGERSOLL RAND SERIAL 152037	HV EQUIPO
			DECLARACIÓN DE IMPORTANCIÓN
TERMINADORA DE ASFALTO	1	FINISHER IGERSOLL RAND MODELO 500P AÑO 1990	CONTRATO
			DECLARACIÓN DE IMPORTANCIÓN
CAMIONETA D300	1	CAMIONETA MITSUBISHI MODELO 2011 LÍNEA 2,5L	TARJETA DE PROPIEDAD
			SOAT
			TECNO MECANICA

Fuente: Elaboración propia

Anexo 3. Relación maquinaria y equipos del Contrato de Obra.

4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

A continuación, se relaciona el personal mínimo contractual del contratista, el cual fue revisado y aprobado por parte de la interventoría.

Tabla 4. Personal mínimo exigido del contrato de obra.

CARGO	NOMBRE	APROBACIÓN
Director de obra	EDWIN JAVIER LINARES GARCIA	GIC-GB-025-23 del 13 de octubre de 2023
Residente de obra	BRAYAN STIVENS GARCÍA GARCÍA	GIC-GB-025-23 del 13 de octubre de 2023
Especialista Geotecnia	JUAN JOSE PIEDRAHITA RIOS	GIC-GB-025-23 del 13 de octubre de 2023
Especialista Estructuras	ANDRES FELIPE ABRIL ROJAS	GIC-GB-067-23 del 01 de abril de 2024
Especialista Pavimentos	HECTOR EDUARDO RODRIGUEZ FRANCO	GIC-GB-025-23 del 13 de octubre de 2023

CARGO	NOMBRE	APROBACIÓN
Especialista Hidráulico	JUAN CARLOS BONILLA CABEZAS	GIC-GB-025-23 del 13 de octubre de 2023
Especialista HSEQ	ANDREA MARCELA LÓPEZ ECHEVERRY	GIC-GB-109-24 del 30 de mayo de 2024
Topógrafo	MAYER ALFONSO CUBIDES SAAVEDRA	GIC-GB-025-23 del 13 de octubre de 2023
Cadenero 1	ALEJANDRO ESTEVE SARAY HERNÁNDEZ	GIC-GB-132-24 del 16 de julio de 2024
Cadenero 2	JOSE IGNACIO MARQUEZ	GIC-GB-244-24 del 12 de diciembre de 2024

Fuente: Elaboración propia

Anexo 4. Control de aportes legales del Contrato de Obra

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

La interventoría realizó la entrega de la subsanación del acta de obra No. 5 la cual fue remitida a la entidad mediante las comunicaciones GIC-GB-302-25 y GIC-GB-305-25.

La interventoría realizo la revisión de la modificación No. 2 del contrato de obra el cual fue enviado mediante la comunicación GIC-GB-294-25 del 22 de febrero de 2025.

La interventoría realizo la revisión y entrega del acta de obra No. 6 mediante la comunicación GIC-GB-310-25 del 17 de marzo de 2025.

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Para el periodo del informe, la interventoría ha realizado el reporte diario del estado del tiempo. A la fecha se han presentado lluvias fuertes en el sector, por lo que se ha visto afectado el desarrollo normal de la ejecución del proyecto, se están realizando actividades de perforaciones para pilotes, fundida de zapatas y pantallas en concreto y relleno con material de afirmado compactado, las cuales han disminuido su rendimiento por causa de las lluvias.

Anexo 5. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 Estado general del tiempo.

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Para el periodo del informe, el contratista realizó ensayos de resistencia al concreto de zapatas y pantallas de los muros No. 1, 11, 13 y 15 y pilotes del muro No. 15.

4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

A continuación, se relacionan las garantías del contrato de obra No. 3269 de 2023, actualizadas con respecto al modificatorio No. 2 mediante el cual se realiza la adición y prórroga del contrato de obra.

Tabla 5. Garantías actualizadas del contrato de obra 3269 de 2023.

Aseguradora:		Seguros Mundial	
Amparo	**Vigencia Desde**	**Vigencia Hasta**	**Valor**
Póliza de Cumplimiento No.		C-100015745	
Amparo básico-predios, labores y operaciones	8/04/2024	19/03/2025	$ 520.000.000,00
Patronal	8/04/2024	19/03/2025	$ 520.000.000,00
Contratistas y subcontratistas	8/04/2024	19/03/2025	$ 520.000.000,00
Vehículos propios y no propios	8/04/2024	19/03/2025	$ 520.000.000,00
Póliza de Cumplimiento No.		C-100062294	
Cumplimiento	19/12/2024	19/09/2025	$ 1.466.490.810,74
Buen manejo del anticipo	19/12/2024	19/09/2025	$ 1.480.980.555,94
Prestaciones sociales	19/12/2024	19/03/2028	$ 1.466.490.810,74
Estabilidad de obra	19/03/2025	19/03/2030	$ 2.199.736.216,11

Fuente: Elaboración propia

Anexo 6. Garantías contrato de obra (Pólizas).

4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE OBRA

Respecto al plan de calidad, el contratista remite la documentación del laboratorio López Hermanos, el cual se encuentra certificado para la realización de los ensayos. De igual manera, se recibe la documentación de la cantera La Roca, la cual suministrará los materiales granulares para el proyecto y cumple con la normatividad exigida.

Se presentan los certificados de calidad del cemento Argos y acero cumpliendo con las especificaciones exigidas.

Anexo 7. Seguimiento plan de calidad de obra

4.9 OTROS DOCUMENTOS

4.9.1 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

Para el periodo del informe, se deja registro de que el contratista agoto la totalidad del recurso del anticipo, en un total de 46 órdenes de giro, correspondiente al 30% del valor del contrato como se relaciona a continuación:

Tabla 6. Resumen informe de inversión y buen manejo de anticipo:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	COMPRA DE MATERIALES	$ 509.009.857,37	$ 487.689.858,37	$ 509.009.857,37	$ -
2	ALQUILER DE EQUIPOS	$ 69.299.999,95	$ 69.299.999,95	$ 69.299.999,95	$ -
3	TRANSPORTE DE MATERIALES CANTERA, EXCAVACIÓN, CEMENTOS, ACERO Y EQUIPOS	$ 119.540.000,00	$ 119.540.000,00	$ 119.540.000,00	$ -
4	MANO DE OBRA Y OBRA CIVIL	$ 783.130.697,63	$ 783.130.697,63	$ 783.130.697,63	$ -
	TOTALES	**$ 1.480.980.554,95**	**$ 1.408.337.926,74**	**$ 1.480.980.554,95**	**$ -**

Fuente: Elaboración propia

En el Anexo 8. Seguimiento anticipo del informe mensual No. 6 se encuentra el consolidado de los documentos del plan de inversión y de las ordenes de giro aprobadas.

4.9.2 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA

Mediante comunicado CMONIQUIRÁ-CE-203 del 20 de diciembre de 2024, el contratista hace entrega de la programación de obra y flujo de inversión versión No. 8, los cuales fueron revisados y aprobados por interventoría y es la que actualmente está vigente para el control del avance del proyecto.

De acuerdo al informe semanal No. 48, del 10 al 17 de maro de 2025, el proyecto presenta:

Tabla 7. % de avance

Meta Física Programada %	98.58%
Meta Física Ejecutada %	83.97%
Avance o Atraso Físico %	-14.61%

Fuente: Elaboración propia

Anexo 8. Seguimiento programación de obra y flujo de inversión.

4.9.3 SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES

De acuerdo con el último plan de trabajo e inversión entregado por el contratista V8, y según el informe semanal No. 48, del 10 al 17 de marzo de 2025, se tiene:


FLUJO DE INVERSIÓN SEMANAL

Tabla 8. Flujo de inversión

	VALOR PROGRAMADO	VALOR PROGRAMADO ACUMULADO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	% Ejecutado acumulado
S1	$ 2,413,337.90	$ 2,413,337.90	$ 2,413,337.90	0.05%
S2	$ 2,413,337.90	$ 4,826,675.80	$ 4,826,675.80	0.10%
S3	$ 2,413,337.90	$ 7,240,013.70	$ 7,240,013.70	0.15%
S4	$ 1,930,670.32	$ 9,170,684.02	$ 9,170,684.02	0.19%
S5	$ 2,884,245.40	$ 12,054,929.42	$ 20,577,232.02	0.42%
S6	$ 3,814,300.32	$ 15,869,229.74	$ 30,291,955.14	0.61%
S7	$ 13,247,610.40	$ 29,116,840.14	$ 50,093,223.40	1.01%
S8	$ 30,646,412.90	$ 59,763,253.04	$ 128,007,281.23	2.59%
S9	$ 37,126,999.67	$ 96,890,252.71	$ 258,596,713.92	5.24%
S10	$ 61,084,491.45	$ 157,974,744.16	$ 325,131,539.59	6.59%
S11	$ 109,617,692.68	$ 267,592,436.84	$ 535,160,897.11	10.84%
S12	$ 133,794,010.84	$ 401,386,447.68	$ 832,058,765.93	16.85%
S13	$ 206,770,417.83	$ 608,156,865.51	$ 1,127,339,323.27	22.84%
S14	$ 266,947,867.43	$ 875,104,732.94	$ 1,389,639,987.61	28.15%
S15	$ 223,922,807.91	$ 1,099,027,540.85	$ 1,606,389,761.37	32.54%
S16	$ 256,292,363.06	$ 1,355,319,903.91	$ 1,776,304,584.23	35.98%
S17	$ 336,209,109.78	$ 1,691,529,013.69	$ 2,001,044,608.06	40.53%
S18	$ 344,496,844.31	$ 2,036,025,858.00	$ 2,066,988,275.83	41.87%
S19	$ 305,977,677.99	$ 2,342,003,535.99	$ 2,165,874,474.80	43.87%
S20	$ 301,167,505.31	$ 2,643,171,041.30	$ 2,353,538,585.16	47.68%
S21	$ 349,991,311.20	$ 2,993,162,352.50	$ 2,718,886,105.57	55.08%
S22	$ 324,925,224.40	$ 3,318,087,576.90	$ 2,823,597,476.36	57.20%
S23	$ 205,020,280.52	$ 2,864,196,756.55	$ 2,901,260,847.14	58.77%
S24	$ 205,049,718.02	$ 3,069,246,474.57	$ 2,928,308,847.14	59.32%
S25	$ 205,550,155.52	$ 3,274,796,630.09	$ 3,110,021,447.88	63.00%
S26	$ 205,812,109.52	$ 3,480,608,739.61	$ 3,172,796,639.57	64.27%
S27	$ 207,129,381.02	$ 3,687,738,120.63	$ 3,222,078,328.42	65.27%
S28	$ 207,041,068.52	$ 3,894,779,189.15	$ 3,325,542,239.38	67.37%

	VALOR PROGRAMADO	VALOR PROGRAMADO ACUMULADO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	% Ejecutado acumulado
S29	$ 208,204,205.55	$ 4,102,983,394.70	$ 3,449,209,589.02	69.87%
S30	$ 215,850,057.77	$ 4,318,833,452.47	$ 4,051,558,067.91	82.07%
S31	$ 174,821,944.63	$ 4,493,655,397.10	$ 4,110,973,516.71	83.28%
S32	$ 111,113,231.45	$ 4,604,768,628.55	$ 4,213,467,390.92	85.35%
S33	$ 73,852,267.49	$ 4,678,620,896.04	$ 4,372,412,211.89	88.57%
S34	$ 46,889,701.73	$ 4,725,510,597.77	$ 4,412,670,375.64	89.39%
S35	$ 211,091,255.39	$ 4,936,601,853.16	$ 4,419,683,625.64	89.53%
S36	$ 239,770,724.41	$ 3,558,770,987.17	$ 4,422,537,909.33	60.31%
S37	$ 112,090,554.06	$ 4,514,379,898.05	$ 4,598,858,875.34	62.02%
S38	$ 224,181,108.11	$ 4,738,561,006.16	$ 4,793,136,158.54	65.37%
S39	$ 112,090,554.03	$ 4,850,651,560.19	$ 4,968,647,439.06	67.76%
S40	$ 188,643,128.72	$ 5,039,294,688.91	$ 5,045,982,962.35	68.82%
S41	$ 240,744,728.15	$ 5,280,039,417.06	$ 5,176,058,693.38	70.59%
S42	$ 231,938,725.58	$ 5,511,978,142.64	$ 5,225,924,864.41	71.27%
S43	$ 194,697,060.02	$ 5,706,675,202.66	$ 5,272,178,870.45	71.90%
S44	$ 181,751,479.50	$ 5,888,426,682.16	$ 5,445,683,909.52	74.27%
S45	$ 163,496,049.99	$ 6,051,922,732.15	$ 5,655,885,501.07	77.13%
S46	$ 478,122,343.75	$ 6,530,045,075.90	$ 5,827,201,396.11	79.47%
S47	$ 533,258,029.56	$ 7,063,303,105.46	$ 5,883,258,077.15	80.24%
S48	$ 164.891.527,84	$ 7.228.194.633,30	$ 6.156.955.965,66	83,97%

Fuente: Elaboración propia

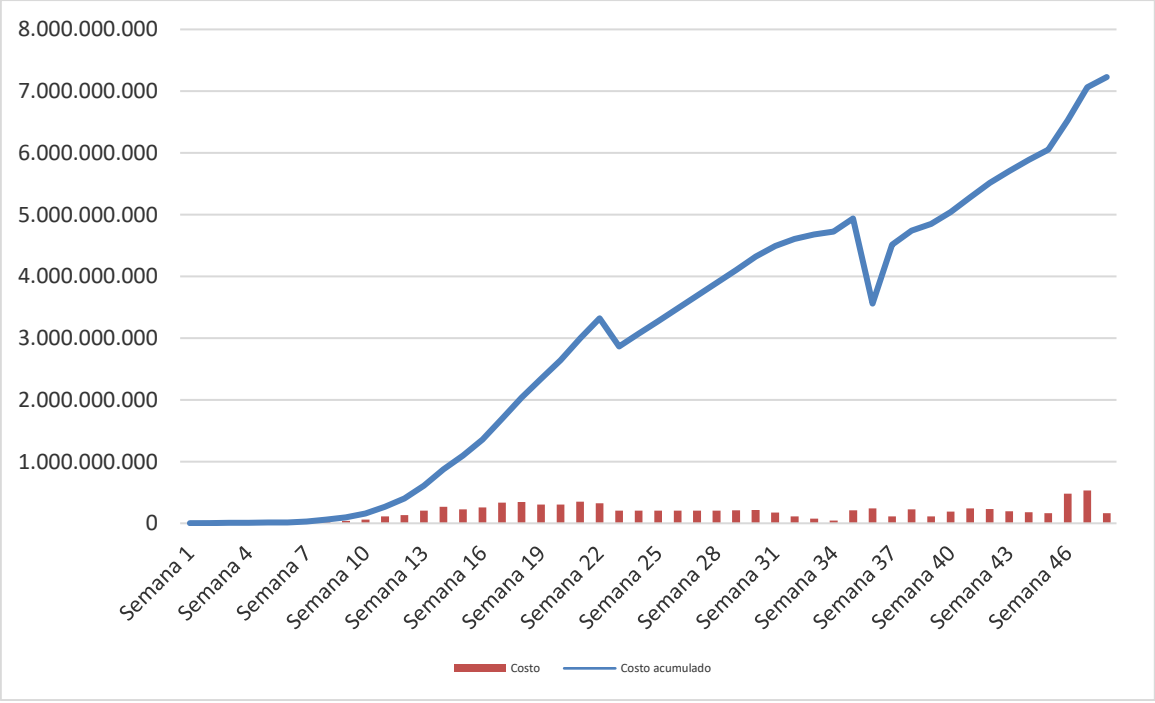

Flujo de inversión semanal.

Anexo 9. Programa de inversión

4.9.4 ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

Se efectuaron comités de seguimiento los días 6 y 13 de marzo de 2025 con presencia del contratista e interventoría, cuyos temas quedaron consignados en el acta respectiva.

Tabla 9. Acta de Comité.

Comité de Obra	Fecha
Comité de obra	06/03/2025
Comité de obra	13/03/2025

Fuente: Elaboración propia

Anexo 10. Actas de comité.

4.9.5 ACTAS DE REUNIÓN SOCIAL

Para el periodo del informe no se adelantaron actas de reunión social, no obstante, en el Anexo 12 del informe mensual #2 se anexaron las actas de vecindad correspondientes al proyecto.

El 7 de marzo de 2025 se realiza socialización del proyecto con la comunidad docente del colegio Haydee Camacho cuyos temas quedaron consignados en el acta respectiva.

Anexo 11. Acta de socialización

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

A continuación, se relaciona la información del contrato Interventoría No. 3230 de 2023

Tabla 10. Datos generales del Contrato de Interventoría

CONTRATO NO.	3230 DE 2023
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MONIQUIRÁ – TOGÜI, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S NIT. 900.916.608-4
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA:	LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($361.963.536.00) M/CTE
ADICION	CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($175.669.652,93) M/CTE.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($537.633.188,93) M/CTE.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	16 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE INICIO	8 DE ABRIL DE 2024.
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	OCHO (8) MESES, CONTADOS A PARTIR DE ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL MISMO Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.
PRORROGA	3 (MESES)
PLAZO TOTAL DE EJECUCION DEL CONTRATO:	11 (MESES)
FECHA DE SUSPENSION 1:	7 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE REINCIO 1:	19 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE FINALIZACION (CON PRORROGA)	18 DE MARZO DE 2025
ESTADO ACTUAL	EN EJECUCIÓN

Fuente: Elaboración propia

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

5.2.1. SEGUIMIENTO TÉCNICO

Gavinco Ingenieros Consultores en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales ha realizado el acompañamiento al desarrollo del contrato de obra No. 3269 de 2023 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MONIQUIRÁ - TOGÜÍ, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".

Anexo 12. Seguimiento plan de calidad contrato de Interventoría

- **INFORME CERO**.

En cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato de Interventoría No. 3230-2023 se procedió a presentar con la comunicación GIC-GB-064-23 del día 21 de marzo de 2024 a la Gobernación de Boyacá, la actualización del informe cero con la documentación relacionada en la siguiente tabla:

<table>
<tr><th colspan="2">DOCUMENTO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Tomo I.</td><td>A-AD-GC-F-046 Informe De Interventoría De Obra</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>Anexo I. Revisión Y Verificación De Documentos Para Ejecución Del Contrato De Obra</td><td>Con carta GIC-GB-025-23 del 13 de octubre de 2023 se dio aprobación del siguiente personal:

<table><tr><th>NOMBRE</th><th>CARGO</th></tr><tr><td>DIRECTOR DE OBRA</td><td>EDWIN JAVIER LINARES GARCIA</td></tr><tr><td>RESIDENTE DE OBRA</td><td>BRAYAN STIVENS GARCÍA GARCÍA</td></tr><tr><td>ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA</td><td>FELIPE STAND VILLAREAL</td></tr><tr><td>ESPECIALISTA EN GEOTECNIA</td><td>TEÓFILO CARLOS YIDI VILLAREAL</td></tr><tr><td>ESPECIALISTA EN PAVIMENTO</td><td>HECTOR EDUARDO RODRÍGUEZ FRANCO</td></tr><tr><td>ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA</td><td>JUAN CARLOS BONILLA CABEZAS</td></tr><tr><td>ESPECIALISTA HSEQ</td><td>LORENA ANDREA GOMEZ RAMIREZ</td></tr><tr><td>TOPOGRAFO INSPECTOR</td><td>ALEANDRO ESTEVE SARAY HERNANDEZ</td></tr><tr><td>CADENERO 1</td><td>SERGIO ENRIQUE CASTIBLANCO GALINDO</td></tr><tr><td>CADENERO 2</td><td>HERNAN SABOGAL SANCHEZ</td></tr></table>
Con carta GIC-GB-057-23 del 06 de febrero de 2024 se dio aprobación al siguiente personal:
<table><tr><th>NOMBRE</th><th>CARGO</th></tr><tr><td>ESPECIALISTA EN GEOTECNIA</td><td>JUAN JOSE PIEDRAHITA</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Entrega De Información Preliminar</td><td>Mediante la comunicación GIC-GB-003-23 del 14 de septiembre de 2023 y GIC-GB-004-23 del 14 de septiembre de 2023 se entregó al Contratista de Obra la información precontractual y estudios y diseños de la Entidad.

Así mismo mediante oficio S-2023-001643-INFDDIV del 06 de septiembre de 2023 la Gobernación de Boyacá informó que estos se encuentran en la plataforma del Secop II en el proceso LP-GB-002-2023.

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.
4013472&isFromPublicArea=True&isModal=False</td></tr>
<tr><td>Tomo II.</td><td>Equipo Mínimo Contratista</td><td>Mediante la comunicación GIC-GB-032-23 del 19 de octubre de 2023 se dio aprobación al siguiente equipo mínimo presentado por el Consorcio Moniquirá:

<table><tr><th>MAQUINARIA (ANEXO TÉCNICO)</th><th>CANTIDAD</th><th>MAQUINARIA O HERRAMIENTA MENOR PRESENTADA</th><th>DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR CONTRATISTA</th></tr><tr><td rowspan="2">BULLDOZER TIPO D-6 O SIMILAR</td><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">BULLDOZER MARCA KOMATSU
LÍNEA D41P-6 MODELO 2006</td><td>CONTRATO</td></tr><tr><td>DECLARACIÓN DE IMPORTANCIÓN</td></tr></table></td></tr>
</table>

DOCUMENTO		DESCRIPCIÓN			
		RETROEXCAVADORA 320 O SIMILAR	1	EXCAVADORA DOOSAN LÍNEA DX225LCA MODELO 2013	TARJETA DE REGISTRO DE LA MAQUINARIA FICHA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
		RETROEXCAVADORA JD-510 O SIMILAR	1	RETROEXCAVADORA KOMATSU LÍNEA WB140-2N MODELO 2006	TARJETA DE REGISTRO DE LA MAQUINARIA FICHA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
		MOTONIVELADORA POTENCIA MÍNIMA 120 HP Y MÁX. 215 HP	1	MOTONIVELADORA KOMATSU LÍNEA GD555-3A MODELO 2006 POTENCIA 196 HP	DECLARACIÓN DE IMPORTANCIÓN TARJETA DE REGISTRO DE LA MAQUINARIA FICHA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
		VIBROCOMPACTADOR CA-15 O SIMILAR	1	VIBROCOMPACTADOR ATLAS COPCO DYNAPAC LINEA DYNAPAC CC1200 MODELO 2015	DECLARACIÓN DE IMPORTANCIÓN TARJETA DE REGISTRO DE LA MAQUINARIA
		VIBROCOMPACTADOR RANA	1	SIN REFERENCIA	FACTURA DE COMPRA (REGISTRO FOTOGRÁFICO)
		MAQUINARIA (ANEXO TÉCNICO)	N/A	MAQUINARIA O HERRAMIENTA MENOR PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR CONTRATISTA
		CORTADORA DE PAVIMENTO	1	CORTADOR DE PISO ESTRUCTURA NACIONAL DISCO NAIROZ 14" DIAMANTADO	FACTURA DE COMPRA
		COMPRESOR DE 250 PIES 3 CON MARTILLO	1	WOLFOX COMPRESOR HORIZONTAL 2HP 24L (IRX)	FACTURA DE COMPRA
		EQUIPO DE PERFORACIÓN TRACKDRILL	1	TRACKDRILL MARCA KOMATSU MODELO PC40-7	CERTIFICADO DE MAQUINARIA FICHA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
		CARROTANQUE	1	SEMIREMOLQUE TANQUE MARCA INARC	TARJETA DE PROPIEDAD SOAT TECNO MECANICA
		BOMBA DE INYECCIÓN	1	BOMBA DE INYECCION ELECTRO- HIDRAULICA SIN REFERENCIA	CERTIFICADO DE MAQUINARIA
		COMPRESOR	1	AIRMAN AIR COMPRESSOR MODEL PDS 18SS-6C2	FACTURA DE COMPRA
		TALADRO PERCUTOR 2W-R1/2 700W 0.1000/0.3000 RPM	1	BOSH GBH 2-26 DFR Professional	FACTURA DE COMPRA (REGISTRO FOTOGRÁFICO) ESPECIFICACIONES
		FORMALETA PARA CAMISA DE PILOTE	1	NA	CERTIFICADO DE CAMISA PARA CAISSON
		MOTOBOMBA DE CONCRETO	1	BOMBA 1HP SUMERGIBLE BARNES 11M/800L	FACTURA DE COMPRA (REGISTRO FOTOGRÁFICO)
		CILINDRO NEUMÁTICO	1	VIBROCOMPACTADOR NEUMATICO DE 9 LLANTAS INGERSOLL RAND SERIAL 152037	HV EQUIPO DECLARACIÓN DE IMPORTANCIÓN
		TERMINADORA DE ASFALTO	1	FINISHER IGERSOLL RAND MODELO 500P AÑO 1990	CONTRATO DECLARACIÓN DE IMPORTANCIÓN
		CAMIONETA D300	1		TARJETA DE PROPIEDAD

DOCUMENTO		DESCRIPCIÓN
		CAMIONETA MITSUBISHI MODELO 2011 LÍNEA 2,5L — SOAT; TECNO MECANICA
Tomo III.	Certificado De Cumplimiento De Afiliaciones SGSS Contratista	Se adjuntó los siguientes documentos: - Certificación de Cumplimiento de Obligaciones con los Sistemas Generales de Seguridad Social y Aportes Parafiscales del CONSORCIO MONIQUIRÁ. - Certificación de Pagos de Seguridad Social y Aportes Parafiscales de la empresa PROCIVING S.A.S. - Documentos de la revisora fiscal del CONSORCIO MONIQUIRÁ y la empresa PROCIVING S.A.S (Cédula de Ciudadanía, Tarjeta Profesional y Certificación de la Junta Central de Contadores). - Certificación de Cumplimiento de Obligaciones con los Sistemas Generales de Seguridad Social y Aportes Parafiscales de la empresa VINCOL CONSTRUCCIONES S.A.S. - Documentos de la revisora de la empresa VINCOL CONSTRUCCIONES S.A.S (Cédula de Ciudadanía, Tarjeta Profesional y Certificación de la Junta Central de Contadores).
	Sistema de Gestión de salud y seguridad en el trabajo (Vol. 1)	Mediante comunicación GIC-GB-039-23 del día 20 de octubre de 2023 se dio aprobación al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo entregado por el Consorcio Moniquirá entregados con cartas CE-006 y CE-031.
Tomo IV.	Sistema de Gestión de salud y seguridad en el trabajo (Vol. 2)	
Tomo V.	Plan de trabajo	Mediante la comunicación GIC-GB-040-23 del 20 de octubre de 2023 se dio aprobación al plan de trabajo entregado por el Consorcio Moniquirá.
	Presupuesto De Obra	Se remitió para conocimiento de la Gobernación de Boyacá.
	Programación De Obra Y Flujo De Caja	Se remitió para conocimiento de la Gobernación de Boyacá.
	Plan De Inspección Y Ensayos	Se remitió para conocimiento de la Gobernación de Boyacá.
	Programa De Implementación Plan De Manejo Ambiental	Mediante comunicación GIC-GB-011-23 del día 29 de septiembre de 2023 se dio aprobación al PAGA del Consorcio Moniquirá.
	Programación De Obra, APUS Y AIU	Mediante comunicación GIC-GB-036-23 del 19 de octubre de 2023 se dio aprobación a los documentos entregados por el Consorcio Moniquirá con carta CE-006.
	Discriminación De AIU	Mediante la comunicación GIC-GB-037-23 del 19 de octubre de 2023 se dio aprobación de la discriminación del AIU entregada por el Contratista de obra.
	APUS	Con la carta GIC-GB-038-23 del 20 de octubre de 2023 se dio aprobación a los APU´s contractuales presentados por el Consorcio Moniquirá.
	Plan De Manejo De Tránsito PMT	Con carta GIC-GB-028-23 del 18 de octubre de 2023 se dio aprobación al PMT presentado por el Contratista de Obra.
	Requisitos de suscripción, perfeccionamiento y ejecución	1. Contrato de Obra. 2. Pólizas contractuales. 3. Certificado de Disponibilidad presupuestal.

<table>
<tr><th colspan="2">DOCUMENTO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr>
<tr><td>Tomo VI.</td><td>ACTAS DE VECINDAD (Vol. 1)</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Tomo VII.</td><td>ACTAS DE VECINDAD (Vol. 2)</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>COPIA ACTA DE SOCIALIZACIÓN CON LA COMUNIDAD</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Tomo VIII.</td><td>Anexo II. Presentación De Documentos Para Ejecución Del Contrato De Interventoría</td><td>A continuación se relaciona el personal aprobado por la Gobernación de Boyacá:
<table>
<tr><th>PROFESIONAL</th><th>CARGO</th><th>APROBACIÖN</th></tr>
<tr><td>ING. OLGA ACOSTA (Hasta el 30 de marzo de 2024)</td><td>DIRECTOR DE INTERVENTORÍA DEDICACIÓN 20%</td><td>S-2023-001790-INFDDIV del 29/09/2023</td></tr>
<tr><td>ING. TATIANA RODRÍGUEZ DE LA OSSA (Desde el 01 de abril de 2024)</td><td>DIRECTOR DE INTERVENTORÍA DEDICACIÓN 20%</td><td>S-2024-000456-INFDDIV del 20/03/2024</td></tr>
<tr><td>ING. CESAR PARDO</td><td>RESIDENTE DE INTERVENTORÍA DEDICACIÓN 100%</td><td>S-2023-001790-INFDDIV del 29/09/2023</td></tr>
<tr><td>ING. JAIRO MEZA</td><td>ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS DEDICACIÓN 30%</td><td>S-2023-001790-INFDDIV del 29/09/2023</td></tr>
<tr><td>ING. NEIMAR CASTAÑO</td><td>ESPECIALISTA EN GEOTÉCNIA DEDICACIÓN 30%</td><td>S-2023-001790-INFDDIV del 29/09/2023</td></tr>
<tr><td>ING. OLGA ACOSTA</td><td>ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS DEDICACIÓN 20%</td><td>S-2023-001790-INFDDIV del 29/09/2023</td></tr>
<tr><td>ING. JULIAN DIMATE</td><td>TOPÓGRAFO INSPECTOR DEDICACIÓN 80%</td><td>S-2023-001790-INFDDIV del 29/09/2023</td></tr>
<tr><td>IVAN ALBERTO MORENO PARRA</td><td>CADENERO 1 DEDICACIÓN 40%</td><td>S-2023-001790-INFDDIV del 29/09/2023</td></tr>
<tr><td>IVAN DARIO CRUZ SANCHEZ</td><td>CADENERO 2 DEDICACIÓN 40%</td><td>S-2023-001790-INFDDIV del 29/09/2023</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Recursos Administrativos Interventoría</td><td>1. Oficina: La oficina central de la firma interventora “Gavinco Ingeniero s Consultores S.A.S.”, se encuentra localizada en la ciudad de Bogotá, en la Carrera 48 No. 101ª - 29 en el barrio Pasadena. Una vez firmada la orden de inicio, la interventoría, para garantizar la adecuada ejecución del contrato, dispondrá de una Oficina en el sitio de ejecución de las obras.
2. Vehículos: Para el desplazamiento del personal, la interventoría contará con el siguiente vehículo: Camioneta doble cabina - Fotón. A la presente se adjunta la documentación del vehículo, tarjeta de propiedad, póliza de seguro y SOAT.
3. Servicio de laboratorio de suelos: para el control de calidad, la interventoría contará con los servicios del laboratorio de suelos certificado, “LOPEZ HERMANOS SAS”. A la presente se adjunta la disponibilidad de servicio del laboratorio y la certificación del laboratorio.
4. Comisión topográfica: para seguimiento y control de las actividades de obra, la interventoría contará con una comisión de topografía conformada por el siguiente personal:
<table>
<tr><th>PROFESIONAL CARGO</th><th>PROFESIONAL CARGO</th></tr>
<tr><td>ING. JULIAN DIMATE</td><td>TOPÓGRAFO</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

DOCUMENTO		DESCRIPCIÓN	
			INSPECTOR DEDICACIÓN 80%
		IVAN ALBERTO	**CADENERO 1** DEDICACIÓN 40%
		IVAN DARIO CRUZ SANCHEZ	**CADENERO 2** DEDICACIÓN 40%
Tomo IX.	Sistema De Gestión De La Seguridad Y Salud En El Trabajo SGSST – Interventoría. (Vol. 1)		
Tomo X.	Sistema De Gestión De La Seguridad Y Salud En El Trabajo SGSST – Interventoría. (Vol. 2)		
Tomo XI.	Plan De Calidad – Interventoría		
	Pólizas Y Garantías - Interventoría		

- **ESTUDIOS Y DISEÑOS**

El contratista, en el desarrollo de las actividades preliminares, entregó la revisión y complementación de los diseños iniciales de los muros No. 1 al 15.

En la siguiente tabla se muestra el estado en que se encuentra los diseños de los sitios críticos para los componentes Geotécnico y Estructural:

Tabla 11. Estado actual muros

Ajuste diseño Muro	Entregado Consorcio Moniquirá	Estado
Muro 1	Correo electrónico 05/06/2024	Aprobado por especialista de geotecnia
Muro 2	Correo electrónico 15/05/2024	Aprobado por especialista de geotecnia
Muro 3	Correo electrónico 05/06/2024	Aprobado por especialista de geotecnia
Muro 4	Correo electrónico 15/05/2024	Aprobado por especialista de geotecnia
Muro 5	Correo electrónico 11/06/2024	Aprobado por especialista de geotecnia
Muro 6	Correo electrónico 14/06/2024	Aprobado por especialista de geotecnia
Muro 7	Correo electrónico 14/06/2024	Aprobado por especialista de geotecnia
Muro 8	Correo electrónico 15/05/2024	Aprobado por especialista de geotecnia
Muro 9	Correo electrónico 14/06/2024	Aprobado por especialista de geotecnia
Muro 10	Correo electrónico 14/06/2024	Aprobado por especialista de geotecnia
Muro 11	Correo electrónico 14/06/2024	Aprobado por especialista de geotecnia
Muro 12	Correo electrónico 14/06/2024	Aprobado por especialista de geotecnia
Muro 13	Correo electrónico 14/06/2024	Aprobado por especialista de geotecnia
Muro 14	Correo electrónico 14/06/2024	Aprobado por especialista de geotecnia
Muro 15	Correo electrónico 14/06/2024	Aprobado por especialista de geotecnia

Fuente: Elaboración propia

5.2.2. SEGUIMIENTO AMBIENTAL

El seguimiento ambiental de la Interventoría se desarrolla con el fin de verificar y controlar las medidas de cumplimiento a las exigencias ambientales, establecidas dentro de los Términos de Referencia del contrato y acordes con la normatividad legal vigente, de tal manera que se reduzcan, mitiguen y controlen en forma eficiente los impactos que generan en la obra.

- **Plan de manejo ambiental RCD**

Mediante la comunicación GIC-GB-120-24 del 12 de junio de 2024, la interventoría remite al contratista respuesta al oficio de alcance CMONIQUIRÁ-CE -090 Plan de Manejo Ambiental RCD, en donde se da aprobación al documento. Mediante la comunicación CMONIQUIRÁCE-106 del 17 de junio de 2024, el contratista radica el programa de manejo ambiental de residuos de construcción y demolición (RCD) ante la secretaria de medio ambiente de la alcaldía de Moniquirá.

- **Cierre forestal**

Mediante la comunicación GIC-GB-125-24 del 18 de junio de 2024, la interventoría da respuesta a la comunicación CMONIQUIRÁ-CE-088 del contratista con respecto al cierre forestal, dando concepto favorable a este documento.

Anexo 13. Seguimiento ambiental

5.2.3. SEGUIMIENTO SST

La interventoría en su compromiso con la salud y seguridad en el trabajo, toma las medidas necesarias para prevenir, mitigar, compensar y controlar los impactos negativos que se puedan presentar en el desarrollo del proyecto. Esta es la principal herramienta de gestión de SST del proyecto y requiere del aporte de los encargados y profesionales que intervienen en la ejecución de obra.

Se verifica que todo el personal cuente con sus respectivos elementos de protección personal y se verifica la implementación del Plan de Manejo del Tránsito aprobado por la gobernación. De igual manera, se realiza la verificación de afiliaciones y seguridad social del personal que se encuentra en obra.

Se presentan las charlas y capacitaciones realizadas durante el periodo, así como los preoperacionales del equipo en obra y las entregas de EPP. Por otro lado, se presenta la documentación del AT presentado en el periodo.

Anexo 14. Seguimiento SST

5.2.3. SEGUIMIENTO SOCIAL

El 7 de marzo de 2025 se realiza socialización del proyecto con la comunidad docente del colegio Haydee Camacho del municipio de Togüi, cuyos temas quedaron consignados en el acta respectiva.

5.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

Para el periodo del informe no se realizó la entrega de ningún concepto por parte de los especialistas tanto de obra como de interventoría.

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Gavinco Ingenieros Consultores cuenta para el desarrollo del proyecto con un (1) vehículo para el desplazamiento a los 15 puntos críticos a ejecutar y equipo de topografía.

6.2 PERSONAL CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

En cumplimiento de las obligaciones contractuales, Gavinco Ingenieros Consultores cuenta con el personal requerido de acuerdo con el anexo técnico del contrato No. 3230 del 2023. A continuación se relaciona el personal de la plantilla mínima de interventoría que se encuentra aprobado:

Tabla 12. Personal Contractual del contrato de Interventoría.

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	APROBACION
Director De Interventoría	Edgar Alfonso Aragón Otero	S-2024-001837-SECINF del 06/11/2024
Residente De Interventoría	Cesar Camilo Pardo Ruiz	S-2023-001790-INFDDIV del 29/09/2023
Especialista Geotecnia	Neimar Arley Castaño Pelaes	S-2023-001790-INFDDIV del 29/09/2023
Especialista Estructural	Jairo Andrés Meza Rosas	S-2023-001790-INFDDIV del 29/09/2023
Especialista De Pavimentos*	Diana Patricia Aponte Lozano	En revisión Gobernación de Boyacá
Topógrafo	Iván Andrés Pinilla Cortes	En revisión Gobernación de Boyacá
Cadenero 1	Rubiel Eugenio Espitia	Se notificó cambio con carta GIC-GB-129-24
Cadenero 2	Iván Darío Cruz Sánchez	S-2023-001790-INFDDIV del 29/09/2023

Fuente: Elaboración propia

Anexo 15. Aporte Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría.

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Para el periodo del informe, se remitió la subsanación del acta de interventoría No. 5 la cual fue remitida mediante la comunicación GIC-GB-306-25 del 13 de marzo de 2025. De igual manera, se realizó la entrega del acta de interventoría No. 6 la cual fue enviada mediante la comunicación GIC-GB-311-25 del 17 de marzo de 2025

6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A continuación, se relacionan las garantías del contrato de interventoría No. 3230 de 2023, actualizadas de acuerdo a la suspensión, reinicio y modificatorio No. 1.

Tabla 13. Garantías actualizadas del contrato de interventoría No. 3230 de 2023

Aseguradora:		Seguros Mundial	
Póliza de Cumplimiento No.		CSC-100035562	
Amparo	**Vigencia Desde**	**Vigencia Hasta**	**Valor**
Cumplimiento del contrato	08/04/2024	19/09/2025	$ 107.526.637,79
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	08/04/2024	19/03/2028	$ 26.881.659,45
Calidad del servicio	08/12/2024	19/03/2030	$ 107.526.637,79

Fuente: Elaboración propia

Anexo 16. Garantías contrato de Interventoría (Pólizas)

6.5 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se remite relación de correspondencia entre Contratista de Obra e Interventoría durante el periodo reportado en el presente informe.

Anexo 17**.** Relación de correspondencia

6.6 REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DE LAS OBRAS

Anexo 18**.** Registro Fotográfico

6.7 BITÁCORA DE OBRA

Durante el periodo reportado en el presente informe se presenta la bitácora del proyecto correspondiente al periodo del 19 de enero de 2025 al 17 de febrero de 2025.

Anexo 19**.** Copia de la bitácora**.**

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 CONCLUSIONES

- De acuerdo con la última programación y flujo de inversión remitidos por el contratista V8 el 20 de diciembre de 2024, a corte del presente informe mensual, se registra un avance programado de obra del 98.58% y un avance ejecutado del 83.97%, lo cual representa un atraso de las actividades del 14.61%

- El Consorcio Moniquirá se encuentra ejecutando el muro No. 01 abscisa K4+090, No. 02 abscisa K4+320, muro No. 03 abscisa K4+500, muro No. 4 abscisa K4+544, muro No. 05 abscisa K4+600, muro No. 06 abscisa K4+940, muro No. 07 abscisa K5+040, muro No. 8. abscisa K5+100, muro No. 9. abscisa K5+170, muro No 10. abscisa K5+240, muro No 11. abscisa K5+450, muro No. 12 K5+730, muro No 13. abscisa K5+910, muro No 14. abscisa K6+140 y muro No 15. abscisa K6+270.

- Se efectuó comité de obra los días 6 y 13 de marzo de 2025 con presencia del contratista e interventoría, cuyos temas quedaron consignados en las actas respectivas.

- El 7 de marzo de 2025 se realiza socialización del proyecto con la comunidad docente del colegio Haydee Camacho cuyos temas quedaron consignados en el acta respectiva.

- Mediante comunicación No. GIC-GB-307-25 del 14 de marzo de 2025, la interventoría remitió al contratista la solicitud de incremento de personal de obra para cumplir con el plazo contractual.

- A través del oficio No. GIC-GB-309-25 del 14 de marzo de 2025, la interventoría remite a la supervisión del contrato la reiteración de la comunicación GIC-GB-267-24 en el cual se manifiesta la necesidad de las actividades de desmonte, limpieza y mantenimiento de cunetas en el corredor vial que comunica los municipios de Moniquirá y Togüi.

- Se reitera la observación del desprendimiento de bancada entre los muros No. 7 y 8 y por recomendación del especialista de interventoría se realizan obras temporales para el control del agua de escorrentía y se revisará la posibilidad de ejecutar obras de contención en este sitio, de acuerdo a balance del proyecto.

- El 17 de marzo de 2025 mediante el comunicado GIC-GB-312-25 se realiza la solitud de suspensión del contrato de obra e interventoría con el fin de que la Entidad Contratante pueda completar los tramites internos necesarios para la legalización de la prórroga y adición de los contratos.

7.2 RECOMENDACIONES

- Se recomienda al contratista aumentar el personal y frentes de trabajo en obra con el fin de revertir el atraso que presenta el proyecto y cumplir con el plazo contractual de terminación.

- Se recomienda a la Entidad Contratante tramitar la adición y prorroga de los contratos de obra e interventoría que fueron radicados con la comunicación GIC-GB-282-25 del 10 de febrero de 2025, la cual es objeto de la suspensión No. 02 de los contratos.

- Teniendo en cuenta que a la fecha de corte del presente informe quedan abiertas las excavaciones de los muros 14 y 15, se recomienda a la Entidad Contratante agilizar los trámites de adición y prorroga de los contratos con el fin de reiniciar los contratos lo más pronto posible y evitar desconfinamiento de la calzada.

ANEXO 1

FORMATO A-AD-GC-F-046

INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	**11**		FECHA:	18	de	MARZO	de	2025			
PERIODO: DEL	19	de	FEBRERO	de	2025	AL	17	de	MARZO	de	2025

CONTRATO No:	**3269**	DE	2023	REGISTRO BP Y P No	**2022004150318**

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MONIQUIRÁ - TOGÜÍ, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

LOCALIZACIÓN:

El corredor vial Moniquirá – Togüi, es una vía departamental la cual comunica principalmente a los municipios de Moniquirá y Togüi que sirve ruta alterna para llegar al municipio de Chitaraque; así mismo la vía en mención se localiza desde el ramal en la ruta 62 (Tunja - Moniquirá) hacia el municipio de Togüi con una longitud aproximada de 12.5 Km

PROGRAMA DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO:

MEJORES VÍAS PARA BOYACÁ QUE AVANZA

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:
CONSORCIO MONIQUIRA NIT 901.740.222-1	**JAVIER LINARES**
NOMBRE DEL INTERVENTOR:	NOMBRE DEL SUPERVISOR:
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS NIT 900.916.608-4	**JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA**

ADICIONALES Y PRORROGAS


No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	ADICION 1	$ 2.395.852.200,55	18/03/2025
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 2.395.852.200,55	

VALOR INICIAL:	$ 4.936.601.853,14	VALOR ADICIONALES:	$ 2.395.852.200,55	VALOR TOTAL:	$ 7.332.454.053,69

FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prorrogas y suspensiones)	18	de	MARZO	de	**2025**

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO	**100,0%**	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADO	**84,0%**	% DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO	**98,6%**



GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE OBRA

No PÓLIZA	C-100062294	ANEXO No.	7	ASEGURADORA	Seguros Mundial	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Cumplimiento	8	4	2024	19	7	2025	$ 1.466.490.810,74
Buen manejo del anticipo	8	4	2024	19	7	2025	$ 1.480.980.555,94
Prestaciones sociales	8	4	2024	19	3	2028	$ 1.466.490.810,74
Estabilidad de obra	8	12	2024	19	3	2030	$ 2.199.736.216,11

ESTADO DEL TIEMPO

BUENO		REGULAR	X	MALO		PÉSIMO	

Descripción: Durante el presente periodo se han presentado lluvias constantes lo cual ha afectado el avance de las actividades en obra.

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, suspensión, reinicio, etc.)

DESCRIPCIÓN	FECHA		
	dd	mm	aaaa
ACTA DE INICIO	8	4	2024
ACTA DE SUSPENSIÓN	7	12	2024
ACTA DE REINICIO	19	12	2024

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
Verificación de cotas y niveles con topografía.	
Implementación del PMT.	
Amarre de acero de refuerzo y fundida de zapatas en muro No. 1	K4+090
Amarre de acero de refuerzo y fundida de pantallas en muro No. 1	K4+090
Amarre de acero de refuerzo y fundida de cunetas en muro No. 6	K4+940
Instalación de geodren vial y relleno con material de afirmado compactado en muro No. 1	K4+090
Amarre de acero de refuerzo y fundida de pantallas en concreto en muro No. 11	K5+450
Instalación de geodren vial y relleno con material de afirmado compactado en muro No. 11	K5+450
Amarre de acero de refuerzo y fundida de pantallas en concreto en muro No. 13	K5+910
Fundida de solado de limpieza en muro No. 14	K6+140
Amarre de acero de refuerzo para zapatas en muro No. 14	K6+140
Fundida de solado de limpieza en muro No. 15	K6+270
Amarre de acero de refuerzo y fundida de pilotes en concreto en muro No. 15	K6+270

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
Verificación de actividades ejecutadas en obra	K4+090-K6+270
Revisión de documentación entregada por el contratista	N/A
Verificación de afiliaciones del personal a seguridad social	N/A
Registro diario en bitácora de obra	N/A

EQUIPO UTILIZADO CONTRATISTA DE OBRA			
DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTILIZACIÓN	OBSERVACIONES
Volqueta JTX 454	Transporte de material de excavación		Muros No. 1, 11, 13, 14 y 15.
Retroexcavadora Cat 416D	Excavación mecánica		Muros No. 1, 11, 13, 14 y 15.
Camioneta de platon	Transporte materiales, equipo y personal		Muros No. 1, 11, 13, 14 y 15.
Compresor y martillos neumáticos	Excavación caisson		N/A
Planta eléctrica 100 KVA	Perforaciones de anclajes		Muros No. 1, 11, 13, 14 y 15.
Unidad eléctrica 50 HP	Perforaciones de anclajes		Muros No. 1, 11, 13, 14 y 15.
Unidad hidráulica 30 HP	Perforaciones de anclajes		Muros No. 1, 11, 13, 14 y 15.
Mezcladora de Concreto autocargante	Fundida de caisson, zapatas y pantallas.		Muros No. 1, 11, 13, 14 y 15.
Saltarín compactador	Relleno con material de afirmado		Muros No. 1, 11, 13, 14 y 15.

MATERIALES UTILIZADOS CONTRATISTA DE OBRA		
DESCRIPCIÓN	SUMINISTRADO POR	OBSERVACIONES
Material granular	Cantera La roca	Se entregan certificados ambientales
Cemento		Se entregan certificados de calidad
Acero		Se entregan certificados de calidad

EQUIPO UTILIZADO POR CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA			
DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTLIZACIÓN	OBSERVACIONES
Automovil EIQ365	Transporte	100%	
Campamento oficina		100%	

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			VALOR
ANTICIPO	23	5	2024	$ 1.480.980.555,95
ACTA PARCIAL No. 1	6	9	2024	$ 1.119.311.146,69
ACTA PARCIAL No. 2	11	10	2024	$ 620.107.380,08
ACTA PARCIAL No. 3	5	12	2024	$ 167.571.070,90
ACTA PARCIAL No. 4	5	2	2025	$ 893.811.712,77
ACTA PARCIAL No. 5	18	2	2025	$ 680.913.755,57

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

ACTA PARCIAL No. 6	17	3	2025	$ 526.619.863,24
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS				**$ 5.489.315.485,20**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA			VALOR
ANTICIPO				
ACTA PARCIAL No. 1	6	9	2024	$ 117.239.989,00
ACTA PARCIAL No. 2	11	10	2024	$ 64.972.455,00
ACTA PARCIAL No. 3	28	11	2024	$ 17.555.232,00
ACTA PARCIAL No. 4	5	2	2025	$ 93.618.755,00
ACTA PARCIAL No. 5	18	2	2025	$ 70.483.711,00
ACTA PARCIAL No. 6	17	2	2025	$ 38.602.063,00
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS				**$ 402.472.205,00**

CORRESPONDENCIA PRESENTADA

FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
CMONIQUIRA-CE-224	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	ENTREGA INFORMES SEMANALES 43 Y 44	SE REALIZA REVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.
CMONIQUIRA-CE-225	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	ENTREGA INFORME MENSUAL NO 10.	SE REALIZA REVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.
GIC-CB-293-23 19/02/24	CONSORCIO MONIQUIRÁ	OBSERVACIONES SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE OBRA	SE REMITE AL CONTRATISTA
CMONIQUIRA-CE-226	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	MODIFICACIÓN NO.2 AL CONTRATO DE OBRA Y ADICIÓN DE RECURSOS.	SE REALIZA REVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.
CMONIQUIRA-CE-227	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	ENTREGA INFORME SEMANAL 45	SE REALIZA REVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.
GIC-CB-294-23 22/02/24	GOBERNACIÓN DE BOYACA	MODIFICACIÓN NO. 2 DEL CONTRATO DE OBRA - ADICIÓN Y PRORROGA	SE REMITE A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
GIC-CB-295-23 24/02/24	CONSORCIO MONIQUIRÁ	ALCANCE COMUNICACIÓN GIC-GB-293-25 OBSERVACIONES SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE OBRA	SE REMITE AL CONTRATISTA
GIC-CB-296-23 24/02/24	GOBERNACIÓN DE BOYACA	REMISIÓN INFORME MENSUAL NO. 9 DE INTERVENTORÍA	SE REMITE A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
GIC-CB-297-23 24/02/24	GOBERNACIÓN DE BOYACA	REMISIÓN INFORMES SEMANALES NO. 43 A NO. 44 DE OBRA	SE REMITE A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
GIC-CB-298-23 25/02/24	GOBERNACIÓN DE BOYACA	ENTREGA INFORME SEMANAL NO. 45 CTO 3230-2023	SE REMITE A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
GIC-CB-299-23 27/02/24	GOBERNACIÓN DE BOYACA	REMISIÓN INFORME SEMANAL NO. 45 DE OBRA	SE REMITE A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
S-2025-000129-SECINF	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	TRSLADO DE COMUNICACIÓN	SE REALIZA REVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0** **CÓDIGO: A-AD-GC-F-046**
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

GIC-CB-300-23 05/03/24	GOBERNACIÓN DE BOYACA	REMISIÓN INFORME SEMANAL NO. 46 DE OBRA	SE REMITE A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
GIC-CB-301-23 05/03/24	CONSORCIO MONIQUIRÁ	COMUNICACIÓN S-2025-000129-SECINF - CONTRATO 3230 DE 2023-TRASLADO DE COMUNICADO	SE REMITE A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
CMONIQUIRA-CE-229	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	RESPUESTA- TRASLADO DE COMUNICADO DOCENTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA HAYDEE CAMACHO SAAVEDRA	SE REALIZA REVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.
CMONIQUIRÁ-CE-230	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	RESPUESTA COMUNICADO FORMATO DE REGISTRO DE DEVOLUCIONES ÓRDENES DE PAGO	SE REALIZA REVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.
GIC-CB-302-23 07/03/24	GOBERNACIÓN DE BOYACA	SUBSANACION ACTA PARCIAL DE OBRA NO. 5	SE REMITE A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
GIC-CB-303-23 10/03/24	GOBERNACIÓN DE BOYACA	RESPUESTA COMUNICACIÓN S-2025-000129-SECINF	SE REMITE A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
GIC-CB-304-23 11/03/24	GOBERNACIÓN DE BOYACA	REMISIÓN INFORME SEMANAL NO. 46 DE OBRA	SE REMITE A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
GIC-CB-305-23 12/03/24	GOBERNACIÓN DE BOYACA	SUBSANACIÓN ACTA PARCIAL DE OBRA NO. 5	SE REMITE A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
S-2025-000164-SECINF	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	CONTRATO 3269 DE 2023-DEVOLUCIÓN N°02 DE ACTA PARCIAL DE OBRA	SE REALIZA REVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.
GIC-CB-306-23 13/03/24	GOBERNACIÓN DE BOYACA	SUBSANACIÓN ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA NO. 5	SE REMITE A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
GIC-CB-307-23 14/03/24	CONSORCIO MONIQUIRÁ	SOLICITUD INCREMENTO DE PERSONAL DE OBRA	SE REMITE AL CONTRATISTA
GIC-CB-308-23 14/03/24	CONSORCIO MONIQUIRÁ	SOLICITUD LIMPIEZA MURO 15	SE REMITE AL CONTRATISTA
GIC-CB-309-23 14/03/24	GOBERNACIÓN DE BOYACA	REITERACIÓN COMUNICACIÓN NECESIDAD DE ACTIVIDADES DE DESMONTE, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CUNETAS EN EL CORREDOR VIAL QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE MONIQUIRÁ Y TOGÜI	SE REMITE A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
CMONIQUIRÁ-CE-232	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS	SOLICITUD DE SUSPENSIÓN CONTRATO DE OBRA NO.2_MARZO 2025.	SE REALIZA REVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.
GIC-CB-310-23 17/03/24	GOBERNACIÓN DE BOYACA	COMUNICACIÓN CMONIQUIRÁ-CE-231-ACTA DE OBRA NO. 6	SE REMITE A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
GIC-CB-311-23 17/03/24	GOBERNACIÓN DE BOYACA	REMISIÓN ACTA DE INTERVENTORÍA NO. 6	SE REMITE A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
GIC-CB-312-23 17/03/24	GOBERNACIÓN DE BOYACA	SOLICITUD DE SUSPENSION CTOS DE OBRA E INTERVENTORIA	SE REMITE A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

VERIFICACIÓN DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

NOBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	PERIODO DESDE dd	DESDE mm	DESDE aaaa	HASTA dd	HASTA mm	HASTA aaaa
EDWIN JAVIER LINARES GARCIA	1.013.623.379	X	X	X	8	4	2024			
BRAYAN STVEN GARCIA GARCIA	1.024.488.768	X	X	X	8	4	2024			
ANDRES FELIPE ABRIL	1.097.395.263	X	X	X	8	4	2024			
JUAN JOSE PIEDRAHITA	18.496.698	X	X	X	8	4	2024			
HECTOR EDUARDO RODRIGUEZ	79.788.119	X	X	X	8	4	2024			
JUAN CARLOS BONILLA	93.401.974	X	X	X	8	4	2024			
ANDREA LOPEZ	1.018.422.772	X	X	X	27	5	2024			
MAYER ALONSO CUBIDES	1.054.681.464	X	X	X	29	6	2024			
IVAN ANDRES GAMBOA SIERRA	1.054.679.767	X	X	X	18	3	2025			
CAROL LOPEZ	1.022.443.543	X	X	X	8	4	2024			
MARIA IRMA SEGURA	1.054.678.073	X	X	X	30	4	2024			
PEDRO VANEGAS	19.417.792	X	X	X	29	4	2024			
JOSE ROBERTO ARIZA PIZA	91.013.366	X	X	X	3	12	2024			
JOSE AGUDELO	1.054.679.889	X	X	X	29	4	2024			
FERNANDO GUIZA	1.022.335.387	X	X	X	29	4	2024			
LUZ IDALY PINILLA	1.030.609.168	X	X	X	6	5	2024			
EDWIN YESID PINILLA QUINTERO	1.057.710	X	X	X	18	3	2025			
PATRICIA PINILLA QUINTERO	1.057.710.789	X	X	X	11	5	2024			
ADRIANO MORENO CRUZ	7.183.149	X	X	X	11	2	2025			
JESUS ANTONIO ZAMBRANO	5.609.435	X	X	X	3	2	2025			
JUAN JOSE SALCEDO MACERO	6.056.470	X	X	X	3	2	2025			
JEAN CARLOS VALERO	1.010.296	X	X	X	3	2	2025			
JOSE JULIO FLORES	6.060.358	X	X	X	10	2	2025			
YOENDER JOSE TERAN MATERNA	5.337.169	X	X	X	10	2	2025			
ELVER DANIEL OCAMPO	1.081.414.650	X	X	X	6	2	2025			
JHON FERNANDO SAAVEDRA	74.243.683	X	X	X	23	1	2025			
CRISTIAN JAVIER BOCANEGRA	1.077.173.526	X	X	X	28	5	2024			
JOSE LUIS RUIZ DIAZ	72.428.541	X	X	X	9	9	2024			
EDIGUER VANEGAS SOLORZANO	5.829.289	X	X	X	4	9	2024			
YEISON SAENZ SAAVEDA	74.244.727	X	X	X	1	11	2024			

Se verificó que todo el personal de obra cumple con la afiliación a seguridad social de los trabajadores?	SI	x	NO	

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE OBRA

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN
DIRECTOR DE OBRA	EDWIN JAVIER LINAREZ GARCIA	1.013.623.379
RESIDENTE DE OBRA	BRAYAN STEVEN GARCIA GARCIA	1.024.488.768
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA	ANDRES FELIPE ABRIL	1.097.395.263

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	JUAN JOSE PIEDRAHITA	18.496.698
ESPECIALISTA EN PAIMENTOS	HECTOR EDUARDO RODRIGUEZ	79.788.119
ESPECIALISTA EN HIDRAULICA	JUAN CARLOS BONILLA	93.401.974
ESPECIALISTA EN HSQ	ANDREA MARCELA LÓPEZ ECHEVERRY	1.018.422.772
TOPOGRAFO INSPECTOR	MAYER ALONSO CUBIDES	1.054.681.464
CADENERO 1	ALEANDRO SARAI	80.050.329
CADENERO 2	JOSE IGNACIO MARQUEZ	1.095.906.061

Se verificó que el personal cumple con los requerimientos del contrato?	SI	x	NO	

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida y la aprobación de interventoría

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	EDGAR ALFONSO ARAGON OTERO	1.022.363.189
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CESAR CAMILO PARDO RUIZ	7.176.397
ESPECIALISTA GEOTECNIA	NEIMAR ARLEY CASTAÑO PELAES	79.758.293
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	JAIRO ANDRÉS MEZA ROSAS	13.874.430
ESPECIALISTA DE PAVIMENTOS	DIANA PATRICIA APONTE LOZANO	60.422.959
TOPÓGRAFO	IVAN ANDRES PINILLA CORTES	80.174.574
CADENERO 1	RUBIEL EUGENIO ESPITIA	88.210.062
CADENERO 2	IVAN DARÍO CRUZ SANCHEZ	1.016.110.151

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida .

ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EL CONTROL, MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
Se verifica que todo el personal cuente con sus respectivos elementos de protección personal y se verifica la implementación del Plan de Manejo del Tránsito aprobado por la gobernación.	N/A
Se realiza verificación de afiliaciones y seguridad social del personal que se encuentra en obra.	N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN
Se realiza verificación diaria del uso de elementos de protección personal por parte de los trabajadores en obra.	N/A
Se verifica la realización de preoperacionales de maquinaria, charlas de seguridad y demás actividades de seguridad y salud ocupacional.	N/A

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

RELACIÓN DE LABORATORIOS PRUEBAS Y ENSAYOS REALIZADAS

POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Resistencia concreto pantallas muro No. 1, 4000 psi	26	2	2025	50% de resistencia a los 4 dias.
Resistencia concreto pantallas muro No. 1, 4000 psi	26	2	2025	73% de resistencia a los 3 dias.
Resistencia concreto pantallas muro No. 1, 4000 psi	1	3	2025	124% de resistencia a los 6 dias.
Resistencia concreto zapatas muro No. 1, 4000 psi	27	2	2025	84% de resistencia a los 6 dias.
Resistencia concreto zapatas muro No. 1, 4000 psi	22	3	2025	124% de resistencia a los 27 dias.
Resistencia concreto pantallas muro No. 1, 4000 psi	25	3	2025	98% de resistencia a los 21 dias.
Resistencia concreto zapatas muro No. 11, 4000 psi	22	2	2025	69% de resistencia a los 7 dias.
Resistencia concreto zapatas muro No. 11, 4000 psi	21	2	2025	71% de resistencia a los 11 dias.
Resistencia concreto zapatas muro No. 13, 4000 psi	21	2	2025	67% de resistencia a los 6 dias.
Resistencia concreto pantallas muro No. 13, 4000 psi	25	3	2025	112% de resistencia a los 14 dias.
Resistencia concreto pilotes muro No. 15, 3000 psi	21	2	2025	118% de resistencia a los 17 dias.

POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Resistencia concreto pilotes muro No. 15, 3000 psi	6	3	2025	165% de resistencia a los 28 dias.

RELACIÓN Y UBICACIÓN DE FUENTES DE MATERIALES

DESCRIPCIÓN	FUENTE	DISTANCIA A LA OBRA (Km)	OBSERVACIÓN

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

Cantera La Roca	6 Km	Material granular

RELACIÓN DE COMITÉS DE OBRA REALIZADOS

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Comité de obra	6	3	2025	Acta de comité
Comité de obra	13	3	2025	Acta de comité

RELACIÓN DE INFORMES DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe semanal de Interventoría No. 45	17	2	2025	23	2	2025	
Informe semanal de Interventoría No. 46	24	2	2025	2	3	2025	
Informe semanal de Interventoría No. 47	3	3	2025	9	3	2025	
Informe semanal de Interventoría No. 48	10	3	2025	17	3	2025	

OBSERVACIONES:

A través de la comunicación GIC-GB-257-23 del 24 de diciembre de 2024, se remitio la reprogramación de obra avalada por la interventoria. versión No. 8


CONTENIDO MÍNIMO DEL INFORME*

	VERIFICACIÓN	FOLIOS No.
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra	SI	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación)	SI	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)	SI	
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	SI	
Bitácora de obra diligenciada por los residentes con visto bueno de los directores de obra e interventoría	SI	
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo	SI	
Amortización del anticipo	SI	
Flujograma de actividades e inversión del contrato de obra	SI	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	SI	
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	**SI**	
Certificado de recibo de estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios cálculos y especificaciones.	**SI**	
Memorias y planos de diseño aprobados	**SI**	
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)	**SI**	
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"	**SI**	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	**SI**	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	**SI**	
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	**SI**	
Copia de licencias y permisos ambientales y de construcción	**SI**	
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones,planillas, fotos, etc.)	**SI**	
Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)	**SI**	
Análisis de riesgos de las actividades, identificando los peligros, y formulando los controles correspondientes	**SI**	
Generales		
Registro fotográfico	**SI**	
Soportes de Correspondencia enviada y recibida	**SI**	

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.
Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICÓ)
Folios No.: Indica en qué folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA: 

Interventor / RL. Interventoría

NOMBRE:	Luz Andrea Fajardo Corredor

ANEXO 2

FORMATO INFORMES SEMANALES

GIC-GB-298-25

Bogotá, D.C., 25 de febrero de 2025

Ingeniero
JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA
Supervisor de proyecto
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
GOBERNACIÓN DE BOYACA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Carrera 9 #17-50 Edificio de la Contraloría Piso 2. Tunja – Boyacá
despacho.infraestructura@boyaca.gov.co
Tunja

Referencia: Contrato de interventoría No. 3230 de 2023 “Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, Contable y Ambiental al Contrato de Obra cuyo Objeto es “Mejoramiento y Rehabilitación de la Vía Moniquirá – Togüi, Muros de Contención, Departamento De Boyacá".

Asunto: Entrega Informe Semanal No. 45 Contrato de Interventoría No. 3230-2023

Respetado Ingeniero:

Dando cumplimiento a las obligaciones contractuales del Contrato de la referencia, adjunto al presente se remite el informe semanal para el periodo reportado a continuación:

Semana	Periodo
No. 45	Del 17/02/25 al 23/02/25

Lo anterior, se remite para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal
Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S

Anexo: Informe Semanal No. 45
Copia: Archivo
Elaboró: NDG
Revisó: EAO

WWW.GAVINCO.COM
CARRERA 48 # 101 A -29
BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA
TEL 601 621 5383 - 601 239 7974

INFORME SEMANAL
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA

FECHA: 23/02/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION — SEMANA No.: 45 del 17/02/2025 al 23/02/2025 (Numeración consecutiva)

ENTIDAD: GOBERNACIÓN DE BOYACÁ — **DIRECCIÓN:** SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 3269 de 2023 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MONIQUIRÁ - TOGÜÍ, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: Construcción de 15 muros de contención en punto críticos que se encuentran en la vía de Moniquirá a Togui

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MONIQUIRÁ - TOGÜÍ, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO MONIQUIRA			INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES		
CONTRATO No.	3269 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 4.936.601.853,14	CONTRATO No.	3230 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 361.963.536
FECHA DE INICIO:	8/04/2024	VALOR ADICIONES:	$ 2.395.852.200,55	FECHA DE INICIO:	8/04/2024	VALOR ADICIONES:	$ 175.669.652,93
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	8/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 7.332.454.053,69	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	4/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 537.633.188,93
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	19/03/2024	VALOR ANTICIPO:	$ 1.480.980.556,00	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	19/03/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ 1.200.343.358,77			VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 280.637.197,23			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.936.601.853	$ 2.395.852.201		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 4.001.144.729			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 935.457.124	$ 2.395.852.201		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 361.963.536	$ 175.669.653		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 293.386.431	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 68.577.105	$ 175.669.653		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	4.936.601.853,14	
ADICIÓN 1	$	2.395.852.200,55	
VALOR TOTAL CONTRATO	$	7.332.454.053,69	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	6.051.922.732,15	82,54% *
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	5.736.981.495,69	78,24% *
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	(314.941.236,46)	-4,30% *
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	-	% *
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	6.051.922.732,15	82,5% *
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	5.736.981.495,69	78,2% *
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	(314.941.236,46)	-4,3% *
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	163.496.049,99	2,23% *
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	291.297.586,17	5,90% *

Observaciones: N.A

INTERVENTORÍA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	$	361.963.536,00	
ADICIÓN 1	$	175.669.652,93	
VALOR TOTAL CONTRATO	$	537.633.188,93	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	493.744.765,34	91,84%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	493.744.765,34	91,84%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$	10.972.105,90	3,03%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	10.972.105,90	3,03%

Observaciones: N.A

ANTICIPOS		
Otorgado $	$	1.480.980.555,95
Amortizado $	$	1.200.343.358,77
Saldo $	$	280.637.197,18

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 82,54% — Avance o Atraso Físico % -4,30%
Meta Física Ejecutada % 78,24% — Avance tiempo contrato 94,59%

CAPITULO	PROGRAMADO	EJECUTADO
I. MURO DE CONTENCIÓN N° 1-15	95,33%	86,86%
II. VARIOS	13,97%	22,39%
III. ITEMS NO CONTRATADOS	70,65%	71,24%
TOTAL OBRA	**80,31%**	**78,24%**

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VOLQUETA JTX454	1	1
RETROEXCAVADORA CAT 416D	1	1
COMPRESOR	1	3
MEZCLADORA	1	1
CAMIONETA	1	1
PLANTA ELECTRICA 100 KVA		1
UNIDAD ELECTRICA 50 HP		1
UNIDAD HIDRAULICA 30 HP		1
MEZCLADORA DE CONCRETO AUTOCARGANTE		1
SALTARINES		2
Total	5	13

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO: VIA MONIQUIRA-TOGUI

OBSERVACIONES:


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

* Se realizaron trabajos de verificación de cotas y niveles con comisión topográfica.
* Se procedió a la instalación de señalización móvil de acuerdo al Plan de Manejo de Tráfico.
* Se llevó acabo las actividades de perforación y fundida de anclajes verticales en cimentación de muro No.14.
* Se realizó amarre de acero de refuerzo y fundida de zapatas en concreto en muro No.1.
* Se ejecutó perforación y fundida de pilotes en concreto en cimentación de muro No. 15.

XI. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Se realizarán actividades de perforación y fundida de pilotes en concreto para cimentación de muro No. 15.
* Se ejecutarán amarre de acero de refuerzo y fundida de pantallas en muro No. 1.
* Se realizarán actividades de excavación en roca y perforaciones para anclajes verticales en cimentación de muro No. 14
* Se desarrollaran trabajos de verificación de cotas y niveles con comisión topográfica.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

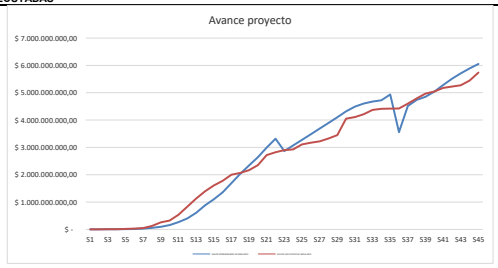

FECHA 23/02/2025 (Día / Mes / Año)

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO



PLANTA LOCALIZACIÓN PUNTOS CRITICOS VIA MONIQUIRÁ - TOGUI

Muro No. 01 abscisa K4+090



Amarre de acero de refuerzo para zapatas en cimentación de muro No. 1.



Fundida de zapatas en concreto en cimentación de muro No. 1.

Muro No. 02 abscisa K4+320



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 2.



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 2.

Muro No. 03 abscisa K4+500



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 3.



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 3.

Muro No. 04 abscisa K4+544



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 4.



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 4.

Muro No. 05 abscisa K4+600



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 5.



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 5.

Muro No. 06 abscisa K4+940





Carpeta asfáltica terminada en muro No. 6.



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 6.

Muro No. 07 abscisa K5+040



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 7.

Carpeta asfáltica terminada en muro No. 7.

Muro No. 08 abscisa K5+100



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 8.



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 8.

Muro No. 09 abscisa K5+170



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 9.



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 9.

Muro No. 10 abscisa K5+240



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 10.



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 10.

Muro No. 11 abscisa K5+450



Fundida de zapatas en cimentación de muro No. 11.



Fundida de zapatas en cimentación de muro No. 11.

Muro No. 12 abscisa K5+730



Estado actual muro No. 12



Estado actual muro No. 12

Muro No. 13 abscisa K5+910



Fundida de zapatas en cimentación de muro No. 13.



Fundida de zapatas en cimentación de muro No. 13.

Boyacá	**INFORME SEMANAL** **MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA**	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

FECHA 23/02/2025 (Día / Mes / Año)

Muro No. 14 abscisa K6+140



Solado de limpieza en cimentación de muro No. 14.



Perforaciones de anclajes verticales en cimentación de muro No. 14.

Muro No. 15 abscisa K6+270



Perforación y fundida de pilotes en concreto en muro No. 15.



Perforación y fundida de pilotes en concreto en muro No. 15.

DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
* Por medio del oficio No.GIC-GB-293-25 del 19 de febrero de 2025, la interventoría remite al contratista Observaciones seguimiento al cronograma de obra. * Mediante comunicado No.CMONIQUIRÁ-CE-225 del 19 de febrero de 2025, el contratista envía a la interventoría el informe mensual No. 10 de obra * Con el oficio No. GIC-GB-290-25 del 18 de febrero de 2025, la interventoría remite a la supervisión del contrato Comunicación CMONIQUIRÁ-CE-223 Acta de obra No. 5 . * Mediante comunicado No. GIC-GB-289-25 del 18 de febrero de 2025, la interventoría remite a la supervisión del contrato Entrega Informe Semanal No. 44 Contrato de Interventoría No. 3230 2023 . * A través del comunicado No.GIC-GB-294-25 del 22 de febrero de 2025, la interventoría remite a la supervisión del contrato Comunicación CMONIQUIRÁ-CE-226 Viabilidad Modificación No. 2 del contrato de obra - Adición y Prorroga	FIRMA NOMBRE: ING. EDGAR ARAGON OTERO Matrícula Profesional No.: 25202226695 CND

GIC-GB-300-25

Bogotá, D.C., 06 de marzo de 2025

Ingeniero
JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA
Supervisor de proyecto
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
GOBERNACIÓN DE BOYACA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Carrera 9 #17-50 Edificio de la Contraloría Piso 2. Tunja – Boyacá
despacho.infraestructura@boyaca.gov.co
Tunja

Referencia: Contrato de interventoría No. 3230 de 2023 “Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, Contable y Ambiental al Contrato de Obra cuyo Objeto es “Mejoramiento y Rehabilitación de la Vía Moniquirá – Togüi, Muros de Contención, Departamento De Boyacá".

Asunto: Entrega Informe Semanal No. 46 Contrato de Interventoría No. 3230-2023

Respetado Ingeniero:

Dando cumplimiento a las obligaciones contractuales del Contrato de la referencia, adjunto al presente se remite el informe semanal para el periodo reportado a continuación:

Semana	Periodo
No. 46	Del 24/02/25 al 02/03/25

Lo anterior, se remite para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal
Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S

Anexo: Informe Semanal No. 46
Copia: Archivo
Elaboró: NDG
Revisó: EAO

WWW.GAVINCO.COM
CARRERA 48 # 101 A -29
BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA
TEL 601 621 5383 - 601 239 7974

INFORME SEMANAL
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA

FECHA: 2/03/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION — SEMANA No.: 46 del 24/02/2025 al 2/03/2025 (Numeración consecutiva)

ENTIDAD: GOBERNACIÓN DE BOYACÁ — **DIRECCIÓN:** SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 3269 de 2023 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MONIQUIRÁ - TOGÜÍ, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: Construcción de 15 muros de contención en punto críticos que se encuentran en la vía de Moniquirá a Togui

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MONIQUIRÁ - TOGÜÍ, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO MONIQUIRA			INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES		
CONTRATO No.	3269 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 4.936.601.853,14	CONTRATO No.	3230 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 361.963.536
FECHA DE INICIO:	8/04/2024	VALOR ADICIONES:	$ 2.395.852.200,55	FECHA DE INICIO:	8/04/2024	VALOR ADICIONES:	$ 175.669.652,93
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	8/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 7.332.454.053,69	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	4/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 537.633.188,93
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	19/03/2024	VALOR ANTICIPO:	$ 1.480.980.556,00	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	19/03/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ 1.200.343.358,77			VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 280.637.197,23			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.936.601.853	$ 2.395.852.201		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 4.001.144.729			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 935.457.124	$ 2.395.852.201		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 361.963.536	$ 175.669.653		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 293.386.431	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 68.577.105	$ 175.669.653		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA			
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	4.936.601.853,14	
ADICIÓN 1	$	2.395.852.200,55	
VALOR TOTAL CONTRATO	$	7.332.454.053,69	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	6.530.045.075,90	89,06% *
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	5.827.201.396,11	79,47% *
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	(702.843.679,79)	-9,59% *
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	-	% *
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	6.530.045.075,90	89,1% *
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	5.827.201.396,11	79,5% *
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	(702.843.679,79)	-9,6% *
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	478.122.343,75	6,52% *
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	171.315.895,04	3,47% *

Observaciones: El atraso corresponde a los bajos rendimientos que se han tenido en las actividades de cimentacion del muro 15, las cuales se han visto afectadas debido a las lluvias que se presentaron en la zona durante el mes de febrero de 2025.

INTERVENTORÍA			
VALOR BÁSICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	$	361.963.536,00	
ADICIÓN 1	$	175.669.652,93	
VALOR TOTAL CONTRATO	$	537.633.188,93	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	504.716.871,24	93,88%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	504.716.871,24	93,88%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	10.972.105,90	3,03%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	10.972.105,90	3,03%

Observaciones: N.A

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.480.980.555,95
Amortizado $	$ 1.200.343.358,77
Saldo $	$ 280.637.197,18

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 89,06% — Avance o Atraso Físico %: -9,59%
Meta Física Ejecutada %: 79,47% — Avance tiempo contrato: 96,70%

CAPITULO	PROGRAMADO	EJECUTADO
I. MURO DE CONTENCIÓN N° 1-15	97,88%	87,81%
II. VARIOS	22,14%	22,39%
III. ITEMS NO CONTRATADOS	83,53%	73,04%
TOTAL OBRA	**89,06%**	**79,47%**

TRAMO: VIA MONIQUIRA-TOGUI

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VOLQUETA JTX454	1	1
RETROEXCAVADORA CAT 416D	1	1
COMPRESOR	1	3
MEZCLADORA	1	1
CAMIONETA	1	1
PLANTA ELECTRICA 100 KVA		1
UNIDAD ELECTRICA 50 HP		1
UNIDAD HIDRAULICA 30 HP		1
MEZCLADORA DE CONCRETO AUTOCARGANTE		1
SALTARINES		2
Total	5	13

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

OBSERVACIONES:


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

* Se realizaron trabajos de verificación de cotas y niveles con comisión topográfica.
* Se procedió a la instalación de señalización móvil de acuerdo al Plan de Manejo de Tráfico.
* Se llevó acabo las actividades de perforación y fundida de anclajes verticales en cimentación de muro No.14.
* Se realizó amarre de acero de refuerzo y fundida de pantallas en concreto en muro No.1.
* Se ejecutó perforación y fundida de pilotes en concreto en cimentación de muro No. 15.

XI. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Se continuará con la ejecución de actividades de perforación y fundida de pilotes en concreto para cimentación de muro No. 15.
* Se ejecutarán amarre de acero de refuerzo y fundida de pantallas en muro No. 11 y 13.
* Se realizarán actividades de amarre de refuerzo para zapatas en cimentación de muro No. 14
* Se desarrollaran trabajos de verificación de cotas y niveles con comisión topográfica.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

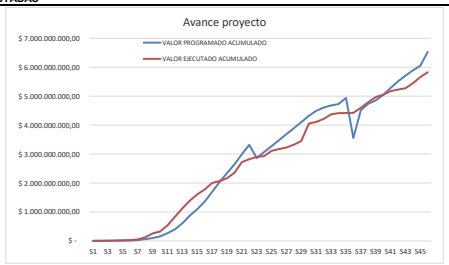

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO



N PUNTOS CRITICOS VIA MONIQUIRÁ - TOGUI

Muro No. 01 abscisa K4+090



Amarre de acero de refuerzo y fundida de pantallas en concreto muro No. 1.



Amarre de acero de refuerzo y fundida de pantallas en concreto muro No. 1.

Muro No. 02 abscisa K4+320



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 2.



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 2.

Muro No. 03 abscisa K4+500



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 3.



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 3.

Muro No. 04 abscisa K4+544



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 4.



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 4.

Muro No. 05 abscisa K4+600



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 5.



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 5.

Muro No. 06 abscisa K4+940







Carpeta asfáltica terminada en muro No. 6.



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 6.

Muro No. 07 abscisa K5+040

Carpeta asfáltica terminada en muro No. 7.

Carpeta asfáltica terminada en muro No. 7.

Muro No. 08 abscisa K5+100



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 8.



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 8.

Muro No. 09 abscisa K5+170



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 9.



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 9.

Muro No. 10 abscisa K5+240



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 10.



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 10.

Muro No. 11 abscisa K5+450



Fundida de zapatas en cimentación de muro No. 11.



Fundida de zapatas en cimentación de muro No. 11.

Muro No. 12 abscisa K5+730



Estado actual muro No. 12



Estado actual muro No. 12

Muro No. 13 abscisa K5+910



Fundida de zapatas en cimentación de muro No. 13.



Fundida de zapatas en cimentación de muro No. 13.

FECHA 2/03/2025 (Día / Mes / Año)

Muro No. 14 abscisa K6+140



Anclajes verticales para cimentación de muro No. 14.



Anclajes verticales para cimentación de muro No. 14.

Muro No. 15 abscisa K6+270



Perforación y fundida de pilotes en concreto en muro No. 15.



Perforación y fundida de pilotes en concreto en muro No. 15.

DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

* Por medio del oficio No.GIC-GB-295-25 del 24 de febrero de 2025, la interventoría remite al contratista Alcance comunicación GIC-GB-293-25 Observaciones seguimiento al cronograma de obra .
* Mediante comunicado No.CMONIQUIRÁ-CE-227 del 27 de febrero de 2025, el contratista envía a la interventoría el informe semanal No. 45 de obra.
* Se realiza reunión virtual el 28 de febrero de 2025 con presencia de supervisor, contratista, interventoría y personal de regalías para revisión de observaciones al modificatorio No. 2.
* Con el correo electrónico del 28 de febrero de 2025, la interventoría remite a la supervisión del contrato CORRECCION MODIFICATORIO No. 2 - PROYECTO MONIQUIRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: ING. EDGAR ARAGON OTERO
Matrícula Profesional No.: 25202226695 CND

GIC-GB-304-25

Bogotá, D.C., 11 de marzo de 2025

Ingeniero
JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA
Supervisor de proyecto
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
GOBERNACIÓN DE BOYACA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Carrera 9 #17-50 Edificio de la Contraloría Piso 2. Tunja – Boyacá
despacho.infraestructura@boyaca.gov.co
Tunja

Referencia: Contrato de interventoría No. 3230 de 2023 “Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, Contable y Ambiental al Contrato de Obra cuyo Objeto es “Mejoramiento y Rehabilitación de la Vía Moniquirá – Togüi, Muros de Contención, Departamento De Boyacá".

Asunto: Entrega Informe Semanal No. 47 Contrato de Interventoría No. 3230-2023

Respetado Ingeniero:

Dando cumplimiento a las obligaciones contractuales del Contrato de la referencia, adjunto al presente se remite el informe semanal para el periodo reportado a continuación:

Semana	Periodo
No. 47	Del 03/03/25 al 09/03/25

Lo anterior, se remite para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal
Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S
Anexo: Informe Semanal No. 47
Copia: Archivo
Elaboró: NDG
Revisó: EAO

WWW.GAVINCO.COM
CARRERA 48 # 101 A -29
BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA
TEL 601 621 5383 - 601 239 7974

INFORME SEMANAL
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA

FECHA: 9/03/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION — SEMANA No.: 47 del 3/03/2025 al 9/03/2025 (Numeración consecutiva)

ENTIDAD: GOBERNACIÓN DE BOYACÁ — **DIRECCIÓN:** SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 3269 de 2023 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MONIQUIRÁ - TOGÜÍ, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: Construcción de 15 muros de contención en punto críticos que se encuentran en la vía de Moniquirá a Togui

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MONIQUIRÁ - TOGÜÍ, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO MONIQUIRA			INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES		
CONTRATO No.	3269 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 4.936.601.853,14	CONTRATO No.	3230 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 361.963.536
FECHA DE INICIO:	8/04/2024	VALOR ADICIONES:	$ 2.395.852.200,55	FECHA DE INICIO:	8/04/2024	VALOR ADICIONES:	$ 175.669.652,93
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	8/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 7.332.454.053,69	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	4/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 537.633.188,93
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	19/03/2024	VALOR ANTICIPO:	$ 1.480.980.556,00	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	19/03/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ 1.200.343.358,77			VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 280.637.197,23			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.936.601.853	$ 2.395.852.201		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 4.001.144.729			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 935.457.124	$ 2.395.852.201		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 361.963.536	$ 175.669.653		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 293.386.431	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 68.577.105	$ 175.669.653		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	4.936.601.853,14	
ADICIÓN 1	$	2.395.852.200,55	
VALOR TOTAL CONTRATO	$	7.332.454.053,69	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	7.063.303.105,46	96,33% *
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	5.883.258.077,15	80,24% *
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	(1.180.045.028,31)	-16,09% *
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	-	% *
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	7.063.303.105,46	96,3% *
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	5.883.258.077,15	80,2% *
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	(1.180.045.028,31)	-16,09% *
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	533.258.029,56	7,27% *
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	56.056.681,03	1,14% *

Observaciones: El atraso corresponde a los bajos rendimientos que se han tenido en las actividades de cimentación del muro 15, las cuales se han visto afectadas debido a las lluvias que se presentaron en la zona durante el mes de febrero de 2025. A la fecha se encuentra en trámite la solicitud de prorroga y adición del contrato de obra

INTERVENTORÍA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	$	361.963.536,00	
ADICIÓN 1	$	175.669.652,93	
VALOR TOTAL CONTRATO	$	537.633.188,93	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	515.688.977,14	95,92%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	515.688.977,14	95,92%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$	10.972.105,90	3,03%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	10.972.105,90	3,03%

Observaciones: N.A

ANTICIPOS		
Otorgado $	$	1.480.980.555,95
Amortizado $	$	1.200.343.358,77
Saldo $	$	280.637.197,18

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 96,33% — Avance o Atraso Físico % -16,09%
Meta Física Ejecutada % 80,24% — Avance tiempo contrato 98,80%

CAPITULO	PROGRAMADO	EJECUTADO
I. MURO DE CONTENCIÓN N° 1-15	99,23%	88,28%
II. VARIOS	45,20%	23,66%
III. ITEMS NO CONTRATADOS	98,48%	74,15%
TOTAL OBRA	**89,06%**	**80,24%**

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VOLQUETA JTX454	1	1
RETROEXCAVADORA CAT 416D	1	1
COMPRESOR	1	3
MEZCLADORA	1	1
CAMIONETA	1	1
PLANTA ELECTRICA 100 KVA		1
UNIDAD ELECTRICA 50 HP		1
UNIDAD HIDRAULICA 30 HP		1
MEZCLADORA DE CONCRETO AUTOCARGANTE		1
SALTARINES		2
Total	5	13

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO: VIA MONIQUIRA-TOGUI

OBSERVACIONES:


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

* Se realizaron trabajos de verificación de cotas y niveles con comisión topográfica.
* Se procedió a la instalación de señalización móvil de acuerdo al Plan de Manejo de Tráfico.
* Se realizó instalación de geodren vial en muro No.1.
* Amarre de acero de refuerzo y fundida de cunetas en concreto en muro No. 6.
* Se ejecutaron actividades de amarra de acero de refuerzo y fundida de pantallas en concreto en muro No. 11.
* Se ejecutó perforación y fundida de pilotes en concreto y drenes horizontales en muro No. 15.

XI. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Se efectuarán trabajos de relleno con material de afirmado compactado en muro No. 1.
* Se continuará con la ejecución de actividades de perforación de drenes horizontales y amarre de acero de refuerzo para zapatas en muro No. 15.
* Se ejecutarán amarre de acero de refuerzo y fundida de pantallas en muro No. 13.
* Se realizarán actividades de amarre de refuerzo para zapatas en cimentación de muro No. 14
* Se desarrollaran trabajos de verificación de cotas y niveles con comisión topográfica.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

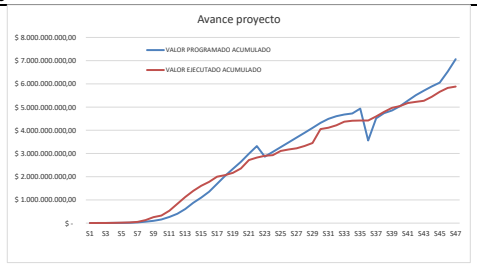

FECHA 9/03/2025 (Día / Mes / Año)

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO



N PUNTOS CRITICOS VIA MONIQUIRÁ - TOGUI

Muro No. 01 abscisa K4+090



Suministro e instalación de geodren vial en muro No. 1.



Verificación de cotas y niveles con topografía en muro No. 1.

Muro No. 02 abscisa K4+320



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 2.



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 2.

Muro No. 03 abscisa K4+500



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 3.



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 3.

Muro No. 04 abscisa K4+544



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 4.



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 4.

Muro No. 05 abscisa K4+600



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 5.



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 5.

Muro No. 06 abscisa K4+940





Amarre de acero de refuerzo y fundida de cunetas en concreto en muro No. 6.



Amarre de acero de refuerzo y fundida de cunetas en concreto en muro No. 6.

Muro No. 07 abscisa K5+040



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 7.

Carpeta asfáltica terminada en muro No. 7.

Muro No. 08 abscisa K5+100



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 8.



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 8.

Muro No. 09 abscisa K5+170



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 9.



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 9.

Muro No. 10 abscisa K5+240



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 10.



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 10.

Muro No. 11 abscisa K5+450



Amarre de acero de refuerzo y fundida de pantallas en concreto muro No. 11.



Amarre de acero de refuerzo y fundida de pantallas en concreto muro No. 11.

Muro No. 12 abscisa K5+730



Estado actual muro No. 12



Estado actual muro No. 12

Muro No. 13 abscisa K5+910



Acero de refuerzo para pantallas en muro No. 13.



Acero de refuerzo para pantallas en muro No. 13.

Boyacá	**INFORME SEMANAL** **MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA**	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

FECHA 9/03/2025
(Día / Mes / Año)

Muro No. 14 abscisa K6+140



Anclajes verticales para cimentación de muro No. 14.



Anclajes verticales para cimentación de muro No. 14.

Muro No. 15 abscisa K6+270



Perforaciones para drenes horizontales en muro No. 15.



Perforación y fundida de pilotes en concreto en muro No. 15.

DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
* Por medio del oficio No.GIC-GB-300-25 del 6 de marzo de 2025, la interventoría remite a la supervisión del contrato el informe semanal de interventoría No. 46. * Mediante comunicado No.GIC-GB-302-25 del 7 de marzo de 2025, la interventoría remite a la supervisión del contrato Subsanación acta parcial de obra No. 5. * Se realiza comité de seguimiento el día 6 de marzo de 2025 con presencia de supervisor, contratista e interventoría cuyos temas quedan consignados en el acta respectiva. * El 7 de marzo de 2025 se realiza socialización del proyecto con la comunidad docente del colegio Haydee Camacho cuyos temas quedaron consignados en el acta respectiva.	FIRMA NOMBRE: ING. EDGAR ARAGON OTERO Matrícula Profesional No.: 25202226695 CND

GIC-GB-313-25

Bogotá, D.C., 31 de marzo de 2025

Ingeniero
JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA
Supervisor de proyecto
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
GOBERNACIÓN DE BOYACA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
Carrera 9 #17-50 Edificio de la Contraloría Piso 2. Tunja – Boyacá
despacho.infraestructura@boyaca.gov.co
Tunja

Referencia: Contrato de interventoría No. 3230 de 2023 “Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, Contable y Ambiental al Contrato de Obra cuyo Objeto es “Mejoramiento y Rehabilitación de la Vía Moniquirá – Togüi, Muros de Contención, Departamento De Boyacá".

Asunto: Entrega Informe Semanal No. 8 7 Contrato de Interventoría No. 3230-2023

Respetado Ingeniero:

Dando cumplimiento a las obligaciones contractuales del Contrato de la referencia, adjunto al presente se remite el informe semanal para el periodo reportado a continuación:

Semana	Periodo
No. 48	Del 10/03/25 al 17/03/25

Lo anterior, se remite para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante legal
Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S
Anexo: Informe Semanal No. 48
Copia: Archivo
Elaboró: NDG
Revisó: EAO

WWW.GAVINCO.COM
CARRERA 48 # 101 A -29
BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA
TEL 601 621 5383 - 601 239 7974

INFORME SEMANAL
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA

FECHA: 17/03/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION — SEMANA No.: 48 del 10/03/2025 al 17/03/2025 (Numeración consecutiva)

ENTIDAD: GOBERNACIÓN DE BOYACÁ — **DIRECCIÓN:** SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 3269 de 2023 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MONIQUIRÁ - TOGÜÍ, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: Construcción de 15 muros de contención en punto críticos que se encuentran en la vía de Moniquirá a Togui

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MONIQUIRÁ - TOGÜÍ, MUROS DE CONTENCIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO MONIQUIRA			INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES		
CONTRATO No.	3269 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 4.936.601.853,14	CONTRATO No.	3230 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 361.963.536
FECHA DE INICIO:	8/04/2024	VALOR ADICIONES:	$ 2.395.852.200,55	FECHA DE INICIO:	8/04/2024	VALOR ADICIONES:	$ 175.669.652,93
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	8/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 7.332.454.053,69	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	4/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 537.633.188,93
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	19/03/2024	VALOR ANTICIPO:	$ 1.480.980.556,00	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	19/03/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ 1.200.343.358,77			VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 280.637.197,23			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4.936.601.853	$ 2.395.852.201		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 4.001.144.729			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 935.457.124	$ 2.395.852.201		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 361.963.536	$ 175.669.653		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 293.386.431	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 68.577.105	$ 175.669.653		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA			
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	4.936.601.853,14	
ADICIÓN 1	$	2.395.852.200,55	
VALOR TOTAL CONTRATO	$	7.332.454.053,69	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	7.228.194.633,30	98,58% *
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	6.156.955.965,66	83,97% *
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	(1.071.238.667,64)	-14,61% *
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	-	% *
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	7.228.194.633,30	98,6% *
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	6.156.955.965,66	84,0% *
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	(1.071.238.667,64)	-14,61% *
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	164.891.527,84	2,25% *
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	273.697.888,51	5,54% *

Observaciones: El atraso corresponde a los bajos rendimientos que se han tenido en las actividades de cimentación del muro 15, las cuales se han visto afectadas debido a las lluvias que se presentaron en la zona durante el mes de febrero de 2025. A la fecha se encuentra en trámite la solicitud de prorroga y adición del contrato de obra

INTERVENTORÍA			
VALOR BÁSICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	$	361.963.536,00	
ADICIÓN 1	$	175.669.652,93	
VALOR TOTAL CONTRATO	$	537.633.188,93	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	526.661.083,03	97,96%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	526.661.083,03	97,96%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	10.972.105,90	3,03%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	10.972.105,90	3,03%

Observaciones: N.A

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1.480.980.555,95
Amortizado $	$ 1.200.343.358,77
Saldo $	$ 280.637.197,18

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 98,58% — Avance o Atraso Físico %: -14,61%
Meta Física Ejecutada %: 83,97% — Avance tiempo contrato: 100,90%

CAPITULO	PROGRAMADO	EJECUTADO
I. MURO DE CONTENCIÓN N° 1-15	99,95%	89,44%
II. VARIOS	71,62%	60,32%
III. ITEMS NO CONTRATADOS	100,00%	77,74%
TOTAL OBRA	**98,58%**	**83,97%**

TRAMO: VIA MONIQUIRA-TOGUI

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VOLQUETA JTX454	1	1
RETROEXCAVADORA CAT 416D	1	1
COMPRESOR	1	3
MEZCLADORA	1	1
CAMIONETA	1	1
PLANTA ELECTRICA 100 KVA		1
UNIDAD ELECTRICA 50 HP		1
UNIDAD HIDRAULICA 30 HP		1
MEZCLADORA DE CONCRETO AUTOCARGANTE		1
SALTARINES		2
Total	5	13

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

OBSERVACIONES:


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

* Se realizaron trabajos de verificación de cotas y niveles con comisión topográfica.
* Se procedió a la instalación de señalización móvil de acuerdo al Plan de Manejo de Tráfico.
* Se realizó instalación de geodren vial en muro No.11.
* Amarre de acero de refuerzo y fundida de cunetas en concreto en muro No. 6.
* Se ejecutaron actividades de amarre de acero de refuerzo y fundida de pantallas en concreto en muro No. 13.
* Se ejecutó perforación y fundida de pilotes en concreto y drenes horizontales en muro No. 15.
* Se ejecutó la fundida de las zapatas del muro 15.

XI. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Se efectuarán trabajos de relleno con material de afirmado compactado en muro No. 11.
* Se continuará con la ejecución de actividades de amarre de acero de refuerzo para zapatas en muro No. 15.
* Se realizarán actividades de amarre de refuerzo y fundida de zapatas en cimentación de muro No. 14
* Se desarrollaran trabajos de verificación de cotas y niveles con comisión topográfica.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

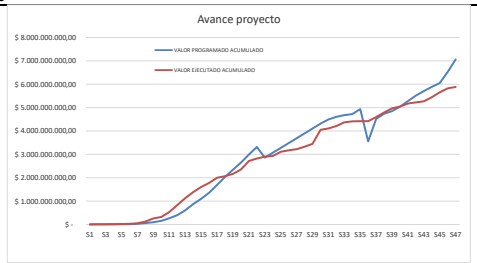

FECHA 17/03/2025
(Día / Mes / Año)

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO



N PUNTOS CRITICOS VIA MONIQUIRÁ - TOGUI

Muro No. 01 abscisa K4+090



Relleno con material de afirmado compactado en muro No. 1.



Relleno con material de afirmado compactado en muro No. 1.

Muro No. 02 abscisa K4+320



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 2.



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 2.

Muro No. 03 abscisa K4+500



Fundida de cunetas en concreto en muro No. 3



Fundida de cunetas en concreto en muro No. 3

Muro No. 04 abscisa K4+544



Fundida de cunetas en concreto en muro No. 4



Fundida de cunetas en concreto en muro No. 4

Muro No. 05 abscisa K4+600



Fundida de cunetas en concreto en muro No. 5



Fundida de cunetas en concreto en muro No. 5

Muro No. 06 abscisa K4+940





Fundida de cunetas en concreto en muro No. 6.



Fundida de cunetas en concreto en muro No. 6.

Muro No. 07 abscisa K5+040



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 7.

Perforación de drenes horizontales en muro No. 7.

Muro No. 08 abscisa K5+100



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 8.



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 8.

Muro No. 09 abscisa K5+170



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 9.



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 9.

Muro No. 10 abscisa K5+240



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 10.



Carpeta asfáltica terminada en muro No. 10.

Muro No. 11 abscisa K5+450



Relleno con material de afirmado compactado en muro No. 11



Relleno con material de afirmado compactado en muro No. 11

Muro No. 12 abscisa K5+730



Estado actual muro No. 12



Estado actual muro No. 12

Muro No. 13 abscisa K5+910



Acero de refuerzo y fundida de concreto para pantallas en muro No. 13.



Acero de refuerzo y fundida de concreto para pantallas en muro No. 13.

Boyacá	**INFORME SEMANAL** **MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MONIQUIRA – TOGUI, MUROS DE CONTENCION, DEPARTAMENTO DE BOYACA**	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

FECHA	17/03/2025 (Día / Mes / Año)

Muro No. 14 abscisa K6+140



Acero de refuerzo y fundida de concreto para pantallas en muro No. 14



Acero de refuerzo y fundida de concreto para pantallas en muro No. 14

Muro No. 15 abscisa K6+270



Construcción zapatas en muro No. 15.



Construcción zapatas en muro No. 15.

DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
* Por medio del oficio No.GIC-GB-303-25 del 10 de marzo de 2025, la interventoría remite a la supervisión del contrato Respuesta comunicación S-2025-000129-SECINF Acta de socialización. * Mediante comunicado No.GIC-GB-304-25 del 11 de marzo de 2025, la interventoría remite a la supervisión del contrato Entrega Informe Semanal No. 47 Contrato de Interventoría No. 3230-2023. * Con el oficio No. GIC-GB-305-25 del 12 de marzo de 2025, la interventoría remite a la supervisión del contrato Subsanación acta parcial de obra No. 5. * Mediante comunicación No. GIC-GB-307-25 del 14 de marzo de 2025, la interventoría remite al contratista Solicitud incremento de personal de obra. * Por medio del oficio No.GIC-GB-308-25 del 14 de marzo de 2025, la interventoría remite al contratista Solicitud de limpieza del muro 15. * A través del oficio No. GIC-GB-309-25 del 14 de marzo de 2025, la interventoría remite a la supervisión del contrato Reiteración comunicación GIC-GB-267-24 Necesidad de actividades de desmonte, limpieza y mantenimiento de cunetas en el corredor vial que comunica los municipios de Moniquirá y Togüi. * Se realiza comité de seguimiento y recorrido de obra el día 13 de marzo de 2025 con presencia de supervisor, contratista e interventoría cuyos temas quedan consignados en el acta respectiva. El 17 de marzo de 2025, se suspende los contratos de obra e interventoría a partir del 18 de marzo de 2025 hasta el 02 de abril del mismo año, debido a que entidad contratante se encuentra adelantando los tramites internos necesarios para la legalización de la solicitud correspondiente a prórroga y adición del contrato en mención.	FIRMA NOMBRE: ING. EDGAR ARAGON OTERO Matrícula Profesional No.: 25202226695 CND

ANEXO 3

RELACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONTRATO DE OBRA.



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 107301

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC065034	CATERPILLAR	416D	2005

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	RETROEXCAVADORA	CAT416DVBFP14221

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLO	CRS12966	NEUMATICOS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
6900 Kg	3585 mm	2352 mm	6949 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
SYMAQ S.A.S	NIT 901.370.790

SYMAQ S.A.S. SERVICIOS DE INGENIERÍA Y MAQUINARIA	HOJA DE VIDA MAQUINARIA Y EQUIPOS	Código: 1236 Versión: 1 Fecha: 26-02-2020

DATOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

NOMBRE DEL EQUIPO O MAQUINARIA:	**RETROCARGADOR CATERPILLAR 416D**		
CÓDIGO:	MC065034	**MARCA:**	CATERPILLAR
MODELO:	2005	**N° DE SERIE:**	CAT416DVBFP14221
FABRICANTE:	CATERPILLAR	**FECHA DE ADQUISICIÓN:**	8 ABRIL DE 2022
IMPORTADOR:	**GECOLSA**	**TELEFONO:**	18000919920
ANCHO:	2352 mm	**LARGO:**	6949 mm
ALTO:	3585 mm	**PESO:**	6900 Kg
VOLTAJE:	12 V	**CLASE DE PROTECCIÓN:**	CABINA CERRADA

FOTOGRAFIA DEL EQUIPO



TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA



DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASICO

ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	MATERIALES A UTILIZAR
ENGRASE PASADORES, CHEQUEO DE FLUIDOS, PRESION O INFLADO DE LLANTAS, REVISIÓN DE LUCES, PITO DE REVERSA	DIARIO	GRASA, ACPM, REFRIGERANTE, ACEITES
CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTROS	CADA 250 HORAS	ACEITE MX 15W40, FILTROS (ACEITE, COMBUSTIBLE, AIRE)
REVISION Y/O AJUSTE DE PASADORES	CADA 1000 HORAS	
CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO	CADA 2000 HORAS	ACEITE HIDRAULICO CAT


HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS

FECHA			DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO	AVERIA O DAÑO ENCONTRADO	REPUESTOS	NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL MTO.
DIA	MES	AÑO				
11	ABRIL	2022	PINTURA GENERAL	PINTURA DETERIORADA H750	PINTURA	RICARDO MONTAÑEZ
24	ABRIL	2022	CAMBIO ARRANQUE	ARRANQUE PEGADO NO ENCIENDE	ARRANQUE NUEVO	JAIME SANABRIA
9	MAYO	2022	REFUERZO LATERAL EN CABALLETE	FISURA LATERAL EN CABALLETE	SOLDADURA Y REFUERZO METALICO	RICARDO MONTAÑEZ
18	MAYO	2022	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	CAMBIO 908 HORAS	FILTRO ACPM, FILTROS DE AIRE, FILTRO ACEITE	RICARDO MONTAÑEZ
18	MAYO	2022	CAMBIO BUJE BASE SILLIN	BUJE PARTIDO BASE DEL SILLIN	BUJE	RICARDO MONTAÑEZ

9	JULIO	2022	CAMBIO DE MANGUERAS SISTEMA DEPOSITO A BOMBA DE FRENOS	HUMEDAD CONSTANTE EN LAS MAGUERAS POR FISURA	MANGUERAS	RICARDO MONTAÑEZ
10	JULIO	2022	CAMBIO DE LLANTA TRASERA IZQUIERDA, SOLDADURA TOPES BALDE FRONTAL	LLANTA AVERIADA POR CORTADURA Y DESGASTE DE TOPES BALDE FRONTAL	LLANTA USADA Y SOLDADURA	EVER MONTAÑEZ Y JUAN CARLOS OBREGON
13	JULIO	2022	CAMBIO DE MANGUERA STICK	MANGUERIA AVERIADA	1/2 MANGUERA	MULTITORNILLOS
15	JULIO	2022	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	CAMBIO 1155 HORAS	FILTRO ACPM, FILTROS DE AIRE, FILTRO ACEITE	RICARDO MONTAÑEZ
19	JULIO	2022	INSTALACION SOPORTES PARA CABINADO Y CAMBIO DE SWICH DE ENCENDIDO	SWICH DE ENCENDIDO FALLANDO	TUBERIA, LAMINA Y SWICH DE ENCENDIDO	ORLANDO ALARCON Y RICARDO MONTAÑEZ
27	JULIO	2022	REACTIVACIÓN GPS	GPS SIN SERVICIO	GPS	DETEKTOR
28	JULIO	2022	CAMBIO DE MANGUERA STICK	MANGUERIA AVERIADA EN LA BASE	MANGUERA COMPLETA	MULTITORNILLOS
30	JULIO	2022	INSTALACION ACRILICOS LATERALES CABINADO	CABINA ABIERTA	ACRILICOS TORNILLERIA	ALEXANDER ALARCON Y RICARDO MONTAÑEZ
13	AGOSTO	2022	INSTALACION ACRILICOS TRASEROS CABINADO	CABINA ABIERTA	ACRILICOS TORNILLERIA VENTANA	ALEXANDER ALARCON Y RICARDO MONTAÑEZ
16	AGOSTO	2022	CAMBIO GUAYA ACELERADOR MANUAL	GUAYA ROTA	GUAYA	RICARDO MONTAÑEZ
27	AGOSTO	2022	CAMBIO EMPAQUETADURA STICK Y BARRA DIRECCIÓN	ESCAPE EN BOTELLA STICK Y BARRA DIRECCIÓN	EMPAQUETADURAS	EDUARDO CARDENAS
13	SEPTIEMBRE	2022	CAMBIO EMPAQUETADURA GEMELA DERECHA Y ARREGLO TAPA	CAMISA SE ABRE Y TAPA SE SUELTA	RECONSTRUCCIÓN ROSCA TAPA Y EMPAQUETADURA	EDUARDO CARDENAS
17	SEPTIEMBRE	2022	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	CAMBIO 1388 HORAS	FILTRO ACPM, FILTROS DE AIRE, FILTRO ACEITE	RICARDO MONTAÑEZ
6	OCTUBRE	2022	CAMBIO BOMBA ELECTRICA COMBUSTIBLE	BOMBEA INTERMITENTE	BOMBA ELECTRICA	MECONS INGENIERIA
4	NOVIEMBRE	2022	CAMBIO MANGUERAS BOTELLA DE DIRECCIÓN	MANGUERA ROTA	MANGUERAS NUEVAS	MULTITORNILLOS
8	NOVIEMBRE	2022	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	CAMBIO 1606 HORAS	FILTRO ACPM, FILTROS DE AIRE, FILTRO ACEITE	RICARDO MONTAÑEZ
10	NOVIEMBRE	2022	CAMBIO DE DIENTES BALDE	DIENTES DESGASTADOS	DIENTES NUEVOS Y PASADORES	RICARDO MONTAÑEZ
30	NOVIEMBRE	2022	INSTALACIÓN PASADORES Y BUJES ESTABILIZADORAS, BUJE SILLIN CONICO Y BUJES TREN DELANTERO	1650 HORAS	BUJES Y PASADORES	HILDEBRANDO TORRES
7	DICIEMBRE	2022	INSTALACION PROTECTORES ESTABILIZADORAS	NO PRESENTA	LAMINAS PROTECTOR	HILDEBRANDO TORRES
28	DICIEMBRE	2022	AJUSTE MANDO PALA FRONTAL	PRESENTA DESGASTE Y PROTECTOR ROTO	BUJES Y GUARDAPOLVO	GREGORIO SILVA
30	DICIEMBRE	2022	CAMBIO SELENOIDE 4X4	NO RECIBE EL 4X4 QUEMA EL FUSIBLE	SELENOIDE 4X4	JAIME SANABRIA
3	ENERO	2023	SOLDADURA PASADORES FRONTAL	SOLDADURA EN PASADOR FRONTAL INFERIOR VENCIDA	SOLDADURA	ORLANDO ALARCON
6	ENERO	2023	MANTENIMIENTO TROQUE TRASERO FRENOS Y RODAMIENTOS	CAMBIO 4 DISCOS Y SEPARADORES, CRUCETA, RODAMIENTOS, EMPAQUETADURA	DISCOS, SEPARADORES, CRUCETA, BUJE CORONILLA, RODAMIENTOS FINALES	GREGORIO SILVA
11	ENERO	2023	CAMBIO LLANTAS TRASERAS	LLANTAS CON DESGASTE	LLANTAS JK	EVER MONTAÑEZ
14	ENERO	2023	CAMBIO RELAY Y CABLEADO BOMBA ELECTRICA	BOMBA ELECTRICA SE APAGA EN OCASIONES	RELAY Y CABLEADO BOMBA ELECTRICA	JAIME SANABRIA
26	ENERO	2022	CAMBIO MANGUERA RETORNO MOTOR, FILTRO HIDRAULICO Y DE SERVOTRANSMISION	MANGUERA ROTA, CAMBIO 1750 HORAS	MANGUERA ALTA TEMPERATURA, FILTRO HIDRAULICO Y SERVOTRANSMISION	RICARDO MONTAÑEZ
6	FEBRERO	2023	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	CAMBIO 1804 HORAS	FILTRO ACPM, FILTROS DE AIRE, FILTRO ACEITE	RICARDO MONTAÑEZ
25	FEBRERO	2023	REPARACION GENERAL MOTOR PREKINS, CAMBIO SELLO SERVOTRANSMISIÓN Y CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	REPARACIÓN Y CAMBIO 1834 HORAS	FILTRO ACPM, FILTROS DE AIRE, FILTRO ACEITE	GREGORIO SILVA
7	MARZO	2023	CAMBIO RODAMIENTOS Y EMPAQUES TROCHA DELANTERA	RODAMIENTOS Y EMPAQUES, CAMBIO 1860 HORAS	RODAMIENTOS, EMPAQUES, VALVULINA 80-90	GREGORIO SILVA
13	MARZO	2023	CAMBIO EMPAQUETADURA GEMELA IZQUIERDA	FUJA EN GEMELA IZQUIERDA	EMPAQUETADURAS	RICARDO MONTAÑEZ
17	MARZO	2023	INSTALACIÓN PUERTAS LATERALES CABINA	SIN PUERTAS	PUERTAS Y ACRILICOS	ORLANDO ALARCÓN
11	MAYO	2023	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	CAMBIO 2610 HORAS	FILTRO ACPM, FILTROS DE AIRE, FILTRO ACEITE	RICARDO MONTAÑEZ
7	JUNIO	2023	CAMBIO BALDE TRASERO	BALDE NUEVO	BALDE 70 CM ANCHO	HILDEBRANDO TORRES
26	JUNIO	2023	ARREGLO CAPO MOTOR	CAPO ROTO EN LA PARTE DELANTERA	RECONSTRUCCIÓN PARCIAL CON FIBRA	RICARDO MONTAÑEZ

27	JUNIO	2023	LIMPIEZA MANGUERAS COMBUSTIBLE	PRESENTA MUGRE EN EL SISTEMA DE INYECCIÓN	LAVADO INTERNO MAGUERAS Y FILTRO	RICARDO MONTAÑEZ
5	JULIO	2023	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	CAMBIO 2837 HORAS	FILTRO ACPM, FILTROS DE AIRE, FILTRO ACEITE	RICARDO MONTAÑEZ
8	AGOSTO	2023	CAMBIO EMPAQUETADURA BOTELLA BALDE TRASERO Y VOLTEO BALDE DELANTERO	FUJAS EN BOTELLAS INDICADAS	EMPAQUETADURAS	RICARDO MONTAÑEZ
3	AGOSTO	2023	REVISION INSTALACION MANDO MARCHA Y CONTRAMARCHA	SE BLOQUEA LA MARCHA	NINGUNO	JAIME SANABRIA
4	SEPTIEMBRE	2023	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	CAMBIO 3110 HORAS	FILTRO ACPM, FILTROS DE AIRE, FILTRO ACEITE	RICARDO MONTAÑEZ
5	SEPTIEMBRE	2023	CAMBIO CUCHILLAS BALDE FRONTAL	CUCHILLA DESGASTADA Y ROTA	CUCHILLAS NUEVAS	RICARDO MONTAÑEZ
20	SEPTIEMBRE	2023	SOLDADURA BRAZO TRASERO	BRAZO VENCIDO EN PARTE SUPERIOR	SOLDADURA Y REFUERZO METALICO	ORLANDO ALARCON
23	SEPTIEMBRE	2023	REVISION ENCENDIDO Y CABLEADO	NO PRENDE Y APAGA NORMALMENTE	NINGUNO	JAIME SANABRIA
28	SEPTIEMBRE	2023	CAMBIO DE MANDO MARCHA Y CONTRAMARCHA	SE BLOQUEA	MANDO NUEVO	TRACTOPESADOS - RICARDO MONTAÑEZ
10	OCTUBRE	2023	CAMBIO DE MANGUERA STICK	MANGUERIA AVERIADA	1/2 MANGUERA	MULTITORNILLOS
19	OCTUBRE	2023	SOLDADURA BRAZO TRASERO	BRAZO VENCIDO EN PARTE SUPERIOR	SOLDADURA Y REFUERZO METALICO	RICARDO MONTAÑEZ
31	OCTUBRE	2023	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	CAMBIO 3358 HORAS	FILTRO ACPM, FILTROS DE AIRE, FILTRO ACEITE	RICARDO MONTAÑEZ
21	NOVIEMBRE	2023	CAMBIO DE ALTERNADOR	ALTERNADOR SE FRENA Y DAÑA CORREAS	ALTERNADOR Y CORREAS DISTRIBUCIÓN (REF17540)	AUTOREPUESTOS VARCAR
31	DICIEMBRE	2023	REPARACION SILLIN, BOTELLAS (BALDE,STICK, VOLTEO, ESTABILIZADORA DER) CAMBIO DE BUJES SILLIN, REFORZAR BRAZO	SE ROMPE SILLIN Y BOTELLAS CON FUJAS, BRAZO CON FISURAS	SOLDADURA SILLIN, EMPAQUETAR Y CAMBIAR EMBOLOS, CAMISA STICK, CROMOS	GREGORIO SILVA, HIDRAULIC SEAL, EMIRO ALFONSO
1	FEBRERO	2024	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	CAMBIO 3600 HORAS	FILTRO ACPM, FILTROS DE AIRE, FILTRO ACEITE	RICARDO MONTAÑEZ
28	FEBRERO	2024	CAMBIO DE MANGUERA ESTABILIZADORA	MANGUERIA AVERIADA	MANGUERA NUEVA	TUNJA GRAFADOS
22	MARZO	2024	REVISION BOTELLA VOLTEO POR FUGA	RECROMADO, CAMBIO DE EMPAQUETADURA	EMPAQUETADURAS, RECROMADO	GREGORIO SILVA , HIDRAULIC SEAL
26	MARZO	2024	MANTENIMIENTO TROQUE TRASERO FRENOS Y RODAMIENTOS	CAMBIO SATELITE, CRUCETA, ARANDELAS, AJUSTE EJES	SATELITE, ARANDELAS, CRUCETA	GREGORIO SILVA , TRACTOPESADOS
1	ABRIL	2024	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	CAMBIO 3863 HORAS	FILTRO ACPM, FILTROS DE AIRE, FILTRO ACEITE	RICARDO MONTAÑEZ
26	ABRIL	2024	CAMBIO FILTRO HIDRAULICO (H3975,7)	FILTRO PARA CAMBIO	FILTRO HIDRAULICO	RICARDO MONTAÑEZ
27	ABRIL	2024	CAMBIO DE MANGUERA BOOM, CAMBIO LLANTAS DELANTERAS H3976	MANGUERIA AVERIADA Y LLANTAS DELANTERAS LISAS	1/2 MANGUERA, LLANTAS 12,5/80/R18	MULTITORNILLOS - CELY LLANTAS
20	JUNIO	2024	ARREGLO CODO NIVEL SERVOTRANSMISION	CODO NIVEL SERVOTRANSMISION ROTO	SOLDADURA	JUAN ACOSTA
22	JUNIO	2024	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	CAMBIO 4150 HORAS	FILTRO ACPM, FILTROS DE AIRE, FILTRO ACEITE	RICARDO MONTAÑEZ
27	JULIO	2024	SOLDADURA MUÑON STICK	CHITIADURA EN MUÑON DEL STICK	SOLDADURA	JUAN ACOSTA
20	AGOSTO	2024	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	CAMBIO 4402 HORAS	FILTRO ACPM, FILTROS DE AIRE, FILTRO ACEITE	RICARDO MONTAÑEZ
28	AGOSTO	2024	CAMBIO DE DIENTES BALDE	DIENTES DESGASTADOS	DIENTES NUEVOS Y PASADORES	RICARDO MONTAÑEZ

REVISO Y APROBO:



HUGO ALEXANDER ALARCÓN GONZÁLEZ
IG – EGV – MSc. Geotecnia.
M.P. 1522313887BYC



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10031265578

PLACA HGT066	MARCA NISSAN	LÍNEA D22/NP300	MODELO 2015
CILINDRADA CC 2.389	COLOR PLATA		SERVICIO PARTICULAR
CLASE DE VEHÍCULO CAMIONETA	TIPO CARROCERÍA DOBLE CABINA	COMBUSTIBLE GASOLINA	CAPACIDAD K/PSJ 1000 - 5
NÚMERO DE MOTOR KA24-716722A	REG N	VIN 3N6DD23T5ZK932592	
NÚMERO DE SERIE 3N6DD23T5ZK932592	REG N	NÚMERO DE CHASIS 3N6DD23T5ZK932592	REG N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
INGCONAL SAS

IDENTIFICACIÓN
NIT 901458026



RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
143

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
32014000731657

FE
I

FECHA IMPORT.
13/05/2014

PUERTAS
4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRÍCULA
02/09/2014

FECHA EXP. LIC. TTO.
04/03/2024

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
SECRETARIA DE MOVILIDAD MUNICIPAL DE CHIA

LT03007476292

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.
860.002.184-6

Cod. Sucursal	Nombre Sucursal	Ramo	POLIZA No.
5	BOGOTÁ SAN DIEGO	10	8002166255

PÓLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVILES — TIPO DE PÓLIZA: INDIVIDUAL (100% COMPAÑIA)

FECHA DE SOLICITUD Día	Mes	Año	CERTIFICADO DE EXPEDICIÓN	No. CERTIFICADO	No. AGRUPADOR
25	4	2024		0	

VIGENCIA DESDE Día	Mes	Año	Hora	HASTA Día	Mes	Año	Hora	NÚMERO DE DÍAS	FECHA MÁXIMA DE PAGO Día	Mes	Año	PRODUCTO
25	4	2024	00:00	25	4	2025	00:00	365	9	6	2024	AU VIP NUEVO

TOMADOR	INGCONAL SAS	NIT	901.458.026 - 6
DIRECCIÓN	carrera 71 b no 53 26, BOGOTA, BOGOTA	TELÉFONO	3117181601
ASEGURADO	INGCONAL SAS	NIT	901.458.026 - 6
DIRECCIÓN	carrera 71 b no 53 26, BOGOTA, BOGOTA	TELÉFONO	3117181601
BENEFICIARIO	INGCONAL SAS	NIT	901.458.026 - 6
DIRECCIÓN	carrera 71 b no 53 26, BOGOTA, BOGOTA	TELÉFONO	3117181601

DATOS DEL VEHICULO

Zona de Tarifación:	Edad Asegurado:	Genero:	Años Sin Reclamación:
BOGOTA			0

Tipo:	Marca:	Tipo Vehículo:	Color:	Modelo:	Código:
PICKUP DOBLE CABINA	NISSAN	NP 300 FRONTIER [1] 2.4L MT 2400CC 4X2 AA 2AB	NEGRO	2.015	06421052

Placas:	Motor:	Chasis:	Servicio:	0 Km:	Total Accesorios :
HGT066	KA24716722A	3N6DD23T5ZK932592	PARTICULAR	☐	$

AMPAROS CONTRATADOS	VALOR ASEGURADO	% VALOR PERDIDA	DEDUCIBLES MINIMO (SMMLV)
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	2.100.000.000,00		
DAÑOS A BIENES DE TERCEROS			
MUERTE O LESION A UNA PERSONA			
MUERTE O LESION A DOS O MAS PERSONAS			
PROTECCION PATRIMONIAL	SI AMPARA		
PERDIDA TOTAL POR DAÑOS	77.000.000,00		
PERDIDA PARCIAL POR DAÑOS	77.000.000,00	0,00 %	1 SMMLV
PERDIDA TOTAL POR HURTO	77.000.000,00		
PERDIDA PARCIAL POR HURTO	77.000.000,00	0,00 %	1 SMMLV
GASTOS DE TRANSPORTE POR PERDIDA TOTAL	20.000 * 60		
TERREMOTO	SI AMPARA		
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO PENAL	SI AMPARA		
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	SI AMPARA		
MUERTE ACC 50 MLLS IND	50 Millones		
ASISTENCIA EN VIAJE VIP	SI AMPARA		
ASISTENCIA MEDICA	SI AMPARA		

FACTURA A NOMBRE DE:	INGCONAL SAS	FORMA DE PAGO:	CONTADO 45 DIAS

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR PRIMA	GASTOS	IVA-RÉGIMEN COMÚN	AJUSTE AL PESO	TOTAL A PAGAR EN PESOS
$ 77.000.000,00	$ 2.906.654,89	$ 20.000,00	$ 556.064,43	$ -0,32	$ 3.482.719,00


LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA ASEGURADORA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO (ARTÍCULO 81 Y 82, LEY 45 DE 1990).

FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO, LAS CLÁUSULAS, CONDICIONES GENERALES FORMA 01/08/2023-1306-P-03-AUTOMLIV/AGT2023-D00I Y PARTICULARES DE AU VIP NUEVO, LAS CUÁLES PODRÁ CONSULTAR Y/O IMPRIMIR EN NUESTRA PÁGINA www.axacolpatria.co, SIN PERJUICIO DE QUE USTED PUEDA OBTENER UNA COPIA IMPRESA A TRAVÉS DE NUESTRA RED DE OFICINAS A NIVEL NACIONAL, CUANDO ASÍ LO REQUIERA.

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES DE RETENCIÓN, SEGÚN RESOLUCIÓN 2509 DE DICIEMBRE 3 DE 1993.

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN BOGOTA D.C A LOS 25 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2.024

EN MI CALIDAD DE TOMADOR DE LA PÓLIZA REFERENCIADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE, QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN, EL TEXTO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN DE LA PÓLIZA, ME HAN SIDO ANTICIPADAMENTE EXPLICADAS POR LA ASEGURADORA Y/O POR EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS LAS EXCLUSIONES Y EL ALCANCE O CONTENIDO DE LA COBERTURA DE LA PÓLIZA Y DE LAS GARANTÍAS, Y EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMAR LA PÓLIZA DE SEGUROS AQUÍ CONTENIDA.



FIRMA AUTORIZADA DIANA INES TORRES - REPRESENTANTE LEGAL

EL TOMADOR

DISTRIBUCIÓN DEL COASEGURO			
CODIGO	COMPAÑIA	% PARTICIPACION	PRIMA

INTERMEDIARIOS			
CODIGO	TIPO	NOMBRE	% PARTICIPACION
53296	AGCIA DE SEG	MACA INSURANCE LTDA	100,00

USUARIO: WEB SERVICIO

Consulte información sobre la Defensoría del Consumidor Financiero aquí
https://www.axacolpatria.co/documents/42201273/76141280/Folleto-virtual-consumidor-financiero.pdf Línea de Atención al Cliente 57-601 4235757 en Bogotá, 018000512620 resto del país o #247 o página web www.axacolpatria.co contáctenos Escríbanos su PQRS. Usted también cuenta con la Defensoría del Consumidor Financiero en el buzón defensoria@consuelorodriguezvalero.com, teléfono 3134998023.

- ORIGINAL - CLIENTE -

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.
860.002.184-6

Cod. Sucursal	Nombre Sucursal	Ramo	POLIZA No.
5	BOGOTÁ SAN DIEGO	10	8002166255

POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVILES

CERTIFICADO DE :	EXPEDICIÓN	HOJA ANEXA No. 1	
TOMADOR	INGCONAL SAS	NIT	901.458.026 - 6
DIRECCIÓN	carrera 71 b no 53 26, BOGOTA, BOGOTA	TELÉFONO	3117181601
ASEGURADO	INGCONAL SAS	NIT	901.458.026 - 6
DIRECCIÓN	carrera 71 b no 53 26, BOGOTA, BOGOTA	TELÉFONO	3117181601
BENEFICIARIO	INGCONAL SAS	NIT	901.458.026 - 6
DIRECCIÓN	carrera 71 b no 53 26, BOGOTA, BOGOTA	TELÉFONO	3117181601

CLAUSULAS:

****

VEHICULO SUSTITUTO

EL SERVICIO DE VEHÍCULO SUSTITUTO SE PRESTARA EN LAS SIGUIENTES CIUDADES:
ARMENIA; BARRANCABERMEJA, BARRANQUILLA, BOGOTÁ, BUCARAMANGA, BUGA, CALI, CARTAGENA, CÚCUTA, GIRARDOT, IBAGUÉ, MANIZALES, MEDELLÍN, MONTERÍA, NEIVA, PALMIRA, PASTO, PEREIRA, POPAYÁN, SANTA MARTA, SINCELEJO, TULUÁ, TUNJA, VALLEDUPAR, VILLAVICENCIO, YOPAL.
SERÁN POR CUENTA DE LA COMPAÑÍA LOS COSTOS DE ALQUILER DEL VEHÍCULO SUSTITUTO HASTA POR 10 DÍAS CALENDARIO O HASTA LA ENTREGA DEL VEHÍCULO REPARADO SI ESTA SE EFECTÚA ANTES DEL TÉRMINO AQUÍ SEÑALADO.
PARA ESTOS CASOS, EL ASEGURADO PODRÁ DISFRUTAR DE UN VEHÍCULO SUSTITUTO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: AUTOMÓVIL DE TRANSMISIÓN SIMILAR AL VEHÍCULO ASEGURADO, 4 PUERTAS CON BAÚL, DE 1,400 A 1,800 C.C., SEGÚN DISPONIBILIDAD.
LAS ANTERIORES CIUDADES TAMBIÉN APLICAN PARA SOLICITAR EL VEHÍCULO A DOMICILIO

****

COND.ELEGI

CLAUSULA DE CONDUCTOR ELEGIDO

LA COBERTURA DE CONDUCTOR ELEGIDO SE EXTIENDE HASTA 30 KILÓMETROS FUERA DEL PERÍMETRO URBANO DE LAS SIGUIENTES CIUDADES DE COLOMBIA: BOGOTÁ, MEDELLÍN, CALI, CARTAGENA, BUCARAMANGA, BARRANQUILLA, PEREIRA, RIONEGRO, MANIZALES, ARMENIA, IBAGUÉ, CHINCHINÁ, CÚCUTA, MONTERÍA, NEIVA, PASTO, SANTA MARTA, VALLEDUPAR, VILLAVICENCIO, SINCELEJO Y POPAYÁN.

EL SERVICIO DEBERÁ SER SOLICITADO AL MENOS CON TRES (3) HORAS DE ANTELACIÓN POR PARTE DEL ASEGURADO"

****

PROL. VIGE

CLÁUSULA PROLONGACIÓN DE VIGENCIA

EN CASO DE REPARACIÓN DEL VEHÍCULO POR SINIESTRO EN PÉRDIDA PARCIAL EN LOS TALLERES AUTORIZADOS POR AXA COLPATRIA, ESTA PÓLIZA SERÁ PRORROGADA HASTA POR UN TIEMPO IGUAL A LA PERMANENCIA DEL VEHÍCULO EN EL TALLER, SIN COBRO ADICIONAL DE PRIMA. LA AMPLIACIÓN DE VIGENCIA APLICA DENTRO DE LA VIGENCIA DE OCURRENCIA DEL SINIESTRO.

****

CLAUSULADO

EL CLAUSULADO DE ESTE PRODUCTO LO PUEDE ENCONTRAR INGRESANDO A LA PÁGINA WEB www.axacolpatria.co EN LA SIGUIENTE RUTA: PRODUCTOS PARA PERSONAS – SEGUROS DE AUTO – CONSULTA DE CLAUSULADO.

****

CLAUSULA S

CLAUSULA DE SANCIONES

LA ASEGURADORA NO ESTARÁ OBLIGADA A PROVEER COBERTURA NI SERÁ RESPONSABLE DE PAGAR CUALQUIER RECLAMACIÓN O PROPORCIONAR ALGÚN BENEFICIO EN LA MEDIDA EN QUE LA PRESTACIÓN DE DICHA COBERTURA, EL PAGO DE DICHA RECLAMACIÓN O LA DISPOSICIÓN DE DICHO BENEFICIO, EXPONGA A LA ASEGURADORA A CUALQUIER SANCIÓN, PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN SEGÚN LAS RESOLUCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS O SANCIONES DE COMERCIO O ECONÓMICAS, LEYES O REGLAMENTOS DE LA UNIÓN EUROPEA, REINO UNIDO O ESTADOS UNIDOS.

****

PÉRDIDA DE LLAVES

EN CASO DE PRESENTARSE PERDIDA DE LLAVES DEL VEHÍCULO ASEGURADO, LA COMPAÑÍA ASUMIRÁ LA REPOSICIÓN DE LA MISMA DE ACUERDO CON EL TIPO DE ASISTENCIA CONTRATADA. ESTE SERVICIO OPERA EN LAS SIGUIENTES CIUDADES: BOGOTÁ, CALI, MEDELLÍN, BARRANQUILLA, BUCARAMANGA, PEREIRA Y MANIZALES, SANTA MARTA.

****

CLAUSULA LLANTA ESTALLADA

EL SERVICIO DE LLANTA ESTALLADA SE PRESTARÁ EN LAS SIGUIENTES CIUDADES:

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.
860.002.184-6

Cod. Sucursal	Nombre Sucursal	Ramo	POLIZA No.
5	BOGOTÁ SAN DIEGO	10	8002166255

POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVILES

CERTIFICADO DE : EXPEDICIÓN		HOJA ANEXA No. 2	
TOMADOR	INGCONAL SAS	NIT	901.458.026 - 6
DIRECCIÓN	carrera 71 b no 53 26, BOGOTA, BOGOTA	TELÉFONO	3117181601
ASEGURADO	INGCONAL SAS	NIT	901.458.026 - 6
DIRECCIÓN	carrera 71 b no 53 26, BOGOTA, BOGOTA	TELÉFONO	3117181601
BENEFICIARIO	INGCONAL SAS	NIT	901.458.026 - 6
DIRECCIÓN	carrera 71 b no 53 26, BOGOTA, BOGOTA	TELÉFONO	3117181601

ARMENIA; BARRANQUILLA; BOGOTA; BUCARAMANGA; BUGA; CALI; CARTAGENA; CUCUTA; IBAGUE; MANIZALES; MEDELLIN; MONTERIA; NEIVA;PALMIRA; PEREIRA; SANTA MARTA; TUNJA; SINCELEJO; VALLEDUPAR Y VILLAVICENCIO.

****

RESPONSABILIDAD CIVIL

EL AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRATADO EN ESTA PÓLIZA, SE PRESENTA COMO LÍMITE ASEGURADO ÚNICO, QUE CUBRE LAS INDEMNIZACIONES POR: DAÑOS A BIENES DE TERCEROS, MUERTE O LESIÓN A UNA PERSONA, MUERTE O LESIÓN A DOS O MÁS PERSONAS. EN TODO CASO, EL VALOR DEL DAÑO GENERADO SUMADO POR CADA UNO DE ESTOS RUBROS NO PODRÁ SUPERAR EL VALOR ASEGURADO PARA ESTE AMPARO.

****

VIGENCIA Y RENOVACIÓN

LA VIGENCIA DE ESTE SEGURO ES ANUAL Y SERÁ RENOVADA POR PERÍODOS IGUALES A LA VIGENCIA INICIAL. EN CASO DE NO DESEAR SU RENOVACIÓN, SE DEBE NOTIFICAR DICHA DECISIÓN A LA ASEGURADORA

POR LO ANTERIOR SE COBRA LA PRIMA INDICADA.

********** **FIN POLIZA** **********

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.
860.002.184-6

Cod. Sucursal	Nombre Sucursal	Ramo	POLIZA No.
5	BOGOTÁ SAN DIEGO	10	8002166255

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO.

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INCIAL :	$	3.482.719,00
VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :	$	0
FORMA DE PAGO CONVENIDA :		CONTADO 45 DIAS

PLAN DE PAGOS

FECHA DE PAGO	VALOR DE LA PRIMA SEGUN CONVENIO
09/06/2024	$ 3.482.719,00

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA (30) TREINTA DÍAS CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTA D.C EN ABRIL 25 DE 2.024

AXA COLPATRIA SEGUROS S. A.

Consulte información sobre la Defensoría del Consumidor Financiero aquí
https://www.axacolpatria.co/documents/42201273/76141280/Folleto-virtual-consumidor-financiero.pdf Línea de Atención al Cliente 57-601 4235757 en Bogotá, 018000512620 resto del país o #247 o página web www.axacolpatria.co contáctenos Escríbanos su PQRS. Usted también cuenta con la Defensoría del Consumidor Financiero en el buzón defensoria@consuelorodriguezvalero.com, teléfono 3134998023.

USUARIO:WEB_SERVICIO

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.
860.002.184-6

REFERENCIA DE PAGO
0361172386

Nombre Tomador	INGCONAL SAS		
Póliza Número	8002166255	Anexo	0
Dirección	carrera 71 b no 53 26		
Ciudad	BOGOTA		
Teléfono	3117181601		
Producto	PÓLIZA AUTOMOVILES INDIVIDUAL		
Intermediario	MACA INSURANCE LTDA		
Sucursal Agente	BOGOTÁ SAN DIEGO		
Número de Documento (Ref 2)	NIT 901.458.026 - 6		

PAGOS EN LÍNEA

Botón Pagos en línea en **www.axacolpatria.co**

Pagos recurrentes por PSE o con tarjetas de crédito.

PAGOS PRESENCIALES EN ENTIDADES FINANCIERAS

Banco de Bogotá · Banco de Occidente · Bancolombia Corresponsal Bancario Pagos hasta $3.000.000

Realiza tu pago presentando este formato.

Valor a pagar	3.482.719
Fecha Máxima de Pago	09/06/2024

Cuota No: 1 de: 1

(415)7707336880018(8020)0361172386(8020)9014580266(3900)0003482719(96)20240609

Recuerde que el no pago oportuno del valor de su póliza de seguro, generará la cancelación de la misma

Espacio para Timbre o Firma y Sello del Cajero

ADVERTENCIA: este pago sólo tendrá validez con el sello y firma del cajero. El pago del presente recibo no otorga amparos diferentes a los estipulados en la carátula de la póliza. Para pagos en cheque favor girar a nombre de: AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.

Haz tus pagos personalmente sin ayuda de terceros, protege tus datos. Es fácil y seguro, sigue estos pasos:

Paso 1
Ingesa a **www.axacolpatria.co**

Paso 2
Selecciona el botón **Pagos en Línea** y luego **Pagos recurrentes**.

Paso 3
Paga en línea con **cuentas de ahorro y corriente.**

Paso 4
Al finalizar el pago, recibirás un correo de **confirmación.**

Cualquier inquietud, comunícate con tu Asesor de Seguros o con nuestras líneas de atención al cliente en Bogotá al 423 57 57 y en el resto del país 01 8000 512 620

Consulte información sobre la Defensoría del Consumidor Financiero aquí https://www.axacolpatria.co/documents/42201273/76141280/Folleto-virtual-consumidor-financiero.pdf
Línea de Atención al Cliente 57-601 4235757 en Bogotá, 018000512620 resto del país o #247 o página web www.axacolpatria.co contáctenos Escríbanos su PQRS. Usted también cuenta con la Defensoría del Consumidor Financiero en el buzón defensoria@consuelorodriguezvalero.com, teléfono 3134998023.

COPIA CLIENTE

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.
860.002.184-6

REFERENCIA DE PAGO
0361172386

Nombre Tomador	INGCONAL SAS
Póliza Número	8002166255
Dirección	carrera 71 b no 53 26
Teléfono	3117181601
Número de Documento (Ref 2)	NIT 901.458.026 - 6
Valor a pagar	3.482.719
Fecha de Pago(DD/MM/AAAA)	

PAGOS EN LÍNEA

Botón Pagos en línea en **www.axacolpatria.co**

Pagos recurrentes por PSE o con tarjetas de crédito.

PAGOS PRESENCIALES EN ENTIDADES FINANCIERAS

Banco de Bogotá · Banco de Occidente · Bancolombia Corresponsal Bancario Pagos hasta $3.000.000

Realiza tu pago presentando este formato.

(415)7707336880018(8020)0361172386(8020)9014580266(3900)0003482719(96)20240609

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 176239595

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA CARMOTOS SAS

NIT: 900966370

No. de Certificado de Acreditación: 17-OIN-002-001

Fecha de expedición: 2024/12/24

Fecha de vencimiento: 2025/12/24

DATOS VEHÍCULO

PLACA: HGT066

CLASE: CAMIONETA

MARCA: NISSAN

MODELO: 2015

SERVICIO: Particular

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CILINDRAJE: 2389

NRO. MOTOR: KA24-716722A

NRO. CHASIS: 3N6DD23T5ZK932592

VIN: 3N6DD23T5ZK932592

LÍNEA: D22/NP300

COLOR: PLATA

NOMBRE PROPIETARIO: INGCONAL SAS

FIRMA DEL RESPONSABLE

JHOAN FABIAN HEREDIA VALDERRAMA

Powered by CamScanner

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

seguros mundial®

tu compañía siempre

FECHA DE EXPEDICIÓN	AÑO	MES	DÍA
	2025	1	10

VIGENCIA	AÑO	MES	DÍA
DESDE LAS 00 HORAS DEL	2025	1	13
HASTA LAS 23:59 HORAS DEL	2026	1	12

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
90266095 - 600058649	HGT066	CAMPEROS Y CAMIONETAS	PARTICULAR	2389	2015

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHÍCULO	CARROCERÍA
5	NISSAN	D22NP300	DOBLE CABINA

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
KA24716722A	3N6DD23T5ZK932592	3N6DD23T5ZK932592	1,00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
INGCONAL SAS	3125242195	NIT	901458026	BOGOTA D.C.

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	469	13158	90266095	11001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
22	$ 733.400	$ 381.300	$ 2.100

TOTAL A PAGAR

$ 1.116.800

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	



¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?



Seguro Ter-cero

Cero preocupaciones al manejar tu vehículo

Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.

Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: **www.segurotercero.com**

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza esté registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas, la inmovilización del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o la ADRES solo lo puede realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos:
La Aseguradora podrá modificar la vigencia de la póliza de forma unilateral y exclusivamente en beneficio del consumidor, en aquellos casos que se corrobore la existencia de duplicidad de amparos y pago de primas respecto del mismo vehículo. (Circular Externa 021 de 2017 – Superintendencia Financiera)

Datos personales
Autorizo a la compañía para que trate mis datos personales, incluso los de salud que son sensibles, con la finalidad de vincularme como tomador del contrato de seguro, incluyendo todas las acciones requeridas para el cumplimiento del mismo, así como para las demás finalidades incluidas en la política de tratamiento de datos personales, disponible en www.segurosmundial.com.co/legal/, donde se encuentran los canales para ejercer mis derechos, en especial a actualizar, rectificar, conocer y suprimir mis datos. Declaro que, la información otorgada es veraz, completa, exacta y actualizada.

Topes de cobertura gastos médicos
[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

¡AMPLIAMOS NUESTROS BENEFICIOS!

Con la compra y/o renovación de tu SOAT eres parte del Club Tu Beneficio Mundial donde obtendrás descuentos y promociones de manera ilimitada, en diferentes establecimientos de comercio a nivel nacional: **registro.tubeneficiomundial.com**

Solo tienes que registrarte y en el enlace recibirás tu usuario y contraseña y haz click en el botón **www.tubeneficiomundial.com** para disfrutarlos.

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.01.10 15:32:44 -05:00

seguros mundial®
tu compañía siempre



Existimos porque **CREEMOS** *que tus sueños* deben ser una realidad

- SOAT
- Accidentes Personales
- Arriendos
- Disfruta Tranquilo
- Conduce Tranquilo
- Vida
- Responsabilidad Cívil Familiar

SOLUCIONES CORPORATIVAS

- Cumplimiento
- Judiciales
- Ingeniería
- RCE Transporte Público dePasajeros
- Crédito
- Patrimonio

Líneas de Atención al Cliente:

- **Bogotá:** **(+601)** 327 47 12/13
- **Nacional:** 018000 111 935

www.segurosmundial.com.co

@SegurosMundial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10021829793

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
JTX454	INTERNATIONAL	7600 SBA 6X4	2021

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
10.824	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	15900

NUMERO DE MOTOR	REG	VIN
35367274	N	3HTWYAHT9MN213519

NUMERO DE SERIE	REG	NUMERO DE CHASIS	REG
3HTWYAHT9MN213519	N	3HTWYAHT9MN213519	N

PROPIETARIO(S) APELLIDOS Y NOMBRES(S) — IDENTIFICACIÓN

DIAZ DAZA JHONY FERNEY Y OTRO(S) — C.C. 1013632556

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 375

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 482020000445233

I/E: I

FECHA IMPORT.: 08/09/2020

PUERTAS: 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

PRENDA - BANCO DAVIVIENDA SA

FECHA MATRÍCULA: 14/12/2020

FECHA EXP. LIC. TTO.: 14/12/2020

FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA

LT07000479950



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 19417792

PEDRO ANICETO VANEGAS TORRES

15-07-1960

O+

12-05-2022

CONDUCIR CON LENTES

SDM - BOGOTA D.C.



CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B3	AUTOMOVIL, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMION, BUSETA, BUS Y ARTICULADO	12-05-2027	PARTICULAR
C3	AUTOMOVIL, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMION, BUSETA, BUS Y ARTICULADO	12-05-2022	PUBLICO

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC03004517363

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 177804686

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR MONTEARROYO LTDA

NIT: 900133823

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-071-001

Fecha de expedición: 2024/12/11

Fecha de vencimiento: 2025/12/11

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	JTX454	**CLASE:**	VOLQUETA
MARCA:	INTERNATIONAL	**MODELO:**	2021
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	10824	**NRO. MOTOR:**	35367274
NRO. CHASIS:	3HTWYAHT9MN213519	**VIN:**	3HTWYAHT9MN213519
LÍNEA:	7600 SBA 6X4		
COLOR:	BLANCO		

NOMBRE PROPIETARIO: CONSTRUMAT FL SAS

FIRMA DEL RESPONSABLE

BARBARA YAMILE MEDINA SOSA

Escaneado con CamScanner

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

seguros mundial®

tu compañía siempre

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO	MES	DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA
2024	12	11	2024	12	14	2025	12	13

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
89927422 - 600048323	JTX454	CARGA O MIXTOS	PUBLICO	10824	2021

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHÍCULO	CARROCERÍA
3	INTERNATIONAL	7600SBA6X4	PLATON

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
35367274	3HTWYAHT9MN213519	3HTWYAHT9MN213519	15,90

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
CONSTRUMAT FL SAS	3125242195	NIT	901646532	BOGOTA D.C.

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	469	13158	89927422	11001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
33	$ 1.162.400	$ 604.400	$ 2.100

TOTAL A PAGAR

$ 1.768.900

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	



¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?



Seguro Ter-cero

Cero preocupaciones al manejar tu vehículo

Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.

Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: **www.segurotercero.com**

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

•Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data

Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales; la cuál puede ser consultada en www.segurosmundial.com.co/legal. Dentro de la Política encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras que tiene para ejercerlos Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibles, o los relacionados a niños, niñas y adolescentes.

Topes de cobertura gastos médicos

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2] Para las demás tarifas no citadas en [illegible]

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.12.11 16:07:19 -05:00

seguros mundial®
tu compañía siempre



Existimos porque **CREEMOS** *que tus sueños* deben ser una realidad

- SOAT
- Accidentes Personales
- Arriendos
- Disfruta Tranquilo
- Conduce Tranquilo
- Vida
- Responsabilidad Cívil Familiar

SOLUCIONES CORPORATIVAS

- Cumplimiento
- Judiciales
- Ingeniería
- RCE Transporte Público dePasajeros
- Crédito
- Patrimonio

Líneas de Atención al Cliente:

- **Bogotá:** **(+601)** 327 47 12/13
- **Nacional:** 018000 111 935

www.segurosmundial.com.co

@SegurosMundial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

JM EQUIPOS	F- CERTIFICADO DE AJUSTE	Código: O-F-04 Versión: 04 Edición: 12/02/2018 Copia controlada Hoja 1 de 2

SERVICIO DE LABORATORIO OPTICOMECÁNICO Y ELECTRÓNICO

CERTIFICADO NO. C5807

INSTRUMENTO:	Estación total	**FECHA DE REVISIÓN:**	30 DE DICIEMBRE DE 2024
MARCA:	RUIDE	**SUGERIMOS NUEVA REVISIÓN:**	30 DE JUNIO DE 2025
REFERENCIA:	RQS	**CLIENTE:**	PROCIVING SAS
PRECISIÓN ANGULAR R:	5"	**CC:**	900905675
PRECISIÓN A DISTANCIA:	2mm + 2ppm	**DIRECCIÓN:**	CALLE 51 # 71A - 18 - OF 201
SERIAL:	288988	**CIUDAD:**	BOGOTA, D.C., Bogota
		CELULAR:	3142513079

DATOS DE TRAZABILIDAD EQUIPO PATRON UTILAZADO PARA REALIZAR EL AJUSTE

SURVEY RENTAL & SALES SAC EXPIDE CERTIFICADO DE CALIBRACION N° 25583-23 PARA ESTACION TOTAL MARCA GEOMAX REFERENCIA ZOOM 25 1" SERIAL: 2839480.

METODO DE AJUSTE UTILIZADO

SUSTITUCION O (TRANSFERENCIA) MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE CON PATRON DE TRABAJO LAS MEDIDAS MATERIALIZADAS DE REFERENCIA, LAS CUALES SERAN COMPARADAS CON LOS VALORES DEL EQUIPO A REALIZAR EL AJUSTE PARA POSTERIORMENTE APLICAR LA CORRECCION DE ACUERDO CON LOS PARAMENTROS DE TOLERANCIA ESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE.

INSPECCIÓN OPTICOMECÁNICA

BASE NIVELANTE
NIVELES TABULARES Y ESFERICOS
VERTICALIDAD
OPTICA GENERAL
EJE VERTICAL Y HORIZONTAL
FRENOS Y MOVIMIENTOS TANGENCIALES
PLOMADA OPTICA Y/O LASER

AJUSTE Y VERIFICACIÓN GENERAL DE FUNCIONES

ACEPTABLE

INSPECCIÓN Y AJUSTE SISTEMA ANGULAR

INSPECCIÓN DE ENTRADA

POSICIÓN 1 (VERTICAL D)	90°	00'	40"
POSICIÓN 1 (HORIZONTAL D)	00°	00'	00"
POSICIÓN 1 (VERTICAL I)	269°	59'	09"
POSICIÓN 1 (HORIZONTAL I)	180°	00'	05"
ERROR OBSERVADO V	00°	00'	11"
ERROR OBSERVADO H	00°	00'	5"

INSPECCIÓN DE SALIDA

POSICIÓN 1 (VERTICAL D)	90°	00'	00"
POSICIÓN 1 (HORIZONTAL D)	00°	00'	00"
POSICIÓN 1 (VERTICAL I)	269°	59'	57"
POSICIÓN 1 (HORIZONTAL I)	180°	00'	02"
ERROR OBSERVADO V	00°	00'	3"
ERROR OBSERVADO H	00°	00'	2"

MENSURADO
N°1 PRISMA; N°2 LASERA; N°3 DIANA

MENSURANDO	PATRON	EQUIPO AJUSTADO	DIFERENCIA
N°1	11.591	1.591	0
N°2	11.620	11.620	0
N°3	11.605	11.605	0

Distribuidores en Colombia autorizados por:
GEOMAX TOPCON Leica Geosystems PENTAX SOKKIA Nikon
Medellín: Calle 30B #71-42 PBX:(574) 3220619 Ext. 102 Cel: 310-7983526
Bogotá: Calle 51 # 71A-18 OF 101 Tel: (571) 7559969
www.jmequipos.com - laboratorio@jmequipos.com - laboratorio.bogota@jmequipos.com - ventas@jmequipos.

Escaneado con CamScanner

SERVICIO DE LABORATORIO OPTICOMECÁNICO Y ELECTRÓNICO

CERTIFICADO NO. C5807

INSTRUMENTO:	Estación total	**FECHA DE REVISIÓN:**	30 DE DICIEMBRE DE 2024
MARCA:	RUIDE	**SUGERIMOS NUEVA REVISIÓN:**	30 DE JUNIO DE 2025
REFERENCIA:	RQS	**CLIENTE:**	PROCIVING SAS
SERIAL:	288988	**CC:**	900905675

CONDICIONES PRESENTES EN EL LABORATORIO EN EL PROCESO DE AJUSTE

TEMPERATURA AMBIENTE MINIMA: 22°C
HUMEDAD RELATIVA MINIMA: 63%
PRESION ATMOSFERICA: 760 mmHg

TEMPERATURA MAXIMA: 25°C
HUMEDAD RELATIVA MAXIMA 69%

INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE MEDIDA ANGULAR, COLIMADOR DE CUATRO TUBOS MODELO S/N:12-0663

	AJUSTE Y VERIFICACIÓN GENERAL DE FUNCIONES
COMPENSADOR OPTICOMECÁNICO	
COMPENSADOR ELECTRÓNICO	
AJUSTE Y VERIFICACIÓN	**ACEPTABLE**

INSPECCIÓN EDM SOBRE LÍNEA BASE 17.006 m (DISTANCIOMETRO) CONDICIONES: TEMPERATURA 25°C, PRESIÓN ATMOSFERICA 760mmhg, CONSTANTE DEL PRISMA -30

	AJUSTE Y VERIFICACIÓN GENERAL DE FUNCIONES
PRISMAS	
MEDIDA DISTANCIA	
CONSTANTE DEL PRISMA	
CONSTANTE PPM	**ACEPTABLE**

CONTROLES Y VISUALIZACIÓN ELECTRÓNICA

	AJUSTE Y VERIFICACIÓN GENERAL DE FUNCIONES
TECLADO	
DISPLAY	
ACCESO MEMORIA	
BATERÍA	
COMUNICACIÓN DISPOSITIVO EXTERNO	**ACEPTABLE**

JMENDOZA Equipos S.A.S
NIT 900.374.226-1
TÉCNICO JM EQUIPOS

JM EQUIPOS. CERTIFICA QUE EL INSTRUMENTO SE ENTREGA EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO REALIZANDO EL AJUSTE Y/O REPARACION (SEGÚN PROTOCOLO DE NORMA ISO 9001:2015 Y BASADOS EN PROCEDIMIENTOS DE NORMA ISO 17123-3) Y QUE LOS ERRORES ENCONTRADOS AL INGRESO DEL EQUIPO, HAN SIDO CORREGIDOS DE ACUERDO CON LOS PARAMENTROS DE TOLERANCIA ESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE.

CERTIFICADO POR:

SUPERVISOR DE LABORATORIO **FIRMA:**_____

Este certificado no es válido sin el simbolo de aceptación, no puede ser reproducido parcialmente, excepto en su totalidad, con autorización previa por escrito del servicio técnico de JM EQUIPOS.

Verifique la validez de este certificado en
www.jmequipos.com/consultar-certificados.php

Recuerde nuestro sitio web www.jmequipos.com, en la tienda virtual tenemos los productos con los mejores precios para usted.

Distribuidores en Colombia autorizados por:
GEOMAX TOPCON Leica Geosystems PENTAX SOKKIA Nikon
Medellín: Calle 30B #71-42 PBX:(574) 3220619 Ext. 102 Cel: 310-7983526

Escaneado con CamScanner

JM EQUIPOS	F- CERTIFICADO DE AJUSTE	Código: O-F-04 Versión: 04 Edición: 12/02/2018 Copia controlada Hoja 1 de 2

SERVICIO DE LABORATORIO OPTICOMECÁNICO Y ELECTRÓNICO

CERTIFICADO NO. C5808

INSTRUMENTO:	Nivel	**FECHA DE REVISIÓN:**	30 DE DICIEMBRE DE 2024
MARCA:	TOPCON	**SUGERIMOS NUEVA REVISIÓN:**	30 DE JUNIO DE 2025
REFERENCIA:	AT-B4A	**CLIENTE:**	PROCIVING SAS
SERIAL:	WP097336	**CC:**	900905675
		DIRECCIÓN:	CALLE 51 # 71A - 18 - OF 201
		CIUDAD:	BOGOTA, D.C., Bogota
		CELULAR:	3142513079

DATOS DE TRAZABILIDAD EQUIPO PATRON UTILAZADO PARA REALIZAR EL AJUSTE

PATRON N°1:

LABORATORIO DE CALIBRACION DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS- LACET DEL CDHC-SENA EXPIDE CERTIFICADO DE CALIBRACION N° CAL-2023-0006 PARA NIVEL TOPOGRAFICO MARCA GEOMAX REFERENCIA ZOOM ZAL232 SERIAL: 214232213376.

PATRON N°2:

LABORATORIO DE METROLOGIA ICONTEC EXPIDE CERTIFICADO N°56959 PARA CINTA METRICA MARCA STRAPPING REFERENCIA QK-5022.

METODO DE AJUSTE UTILIZADO

SUSTITUCION O (TRANSFERENCIA) MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE CON PATRON DE TRABAJO LAS MEDIDAS MATERIALIZADAS DE REFERENCIA, LAS CUALES SERAN COMPARADAS CON LOS VALORES DEL EQUIPO A REALIZAR EL AJUSTE PARA POSTERIORMENTE APLICAR LA CORRECCION DE ACUERDO CON LOS PARAMENTROS DE TOLERANCIA ESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE.

INSPECCIÓN OPTICOMECÁNICA

BASE NIVELANTE NIVELES TABULARES Y ESFERICOS HORIZONTALIDAD OPTICA GENERAL MOVIMIENTOS TANGENCIALES	AJUSTE Y VERIFICACIÓN GENERAL DE FUNCIONES **ACEPTABLE**

INSPECCIÓN DE CONTROL DE COLIMADOR DE CUATRO TUBOS MODELO F420-4TA

COMPENSADOR OPTICOMECÁNICO COMPENSADOR ELECTRÓNICO HORIZONTALIDAD DE RETICULA	AJUSTE Y VERIFICACIÓN GENERAL DE FUNCIONES **ACEPTABLE**

INSPECCION DEL SISTEMA DIFERENCIA DE ALTURA

INSPECCIÓN DE ENTRADA

LECTURA DE PUNTO A	1.490	m
LECTURA DE PUNTO B	1.490	m
DIFERENCIAL DE ALTURA	0	mm

INSPECCIÓN DE SALIDA

LECTURA DE PUNTO A	1.490	m
LECTURA DE PUNTO B	1.490	m
DIFERENCIAL DE ALTURA	0	mm

Distribuidores en Colombia autorizados por:
GEOMAX TOPCON Leica Geosystems PENTAX SOKKIA Nikon
Medellín: Calle 30B #71-42 PBX:(574) 3220619 Ext. 102 Cel: 310-7983526
Bogotá: Calle 51 # 71A-18 OF 101 Tel: (571) 7559969
www.jmequipos.com - laboratorio@jmequipos.com - laboratorio.bogota@jmequipos.com - ventas@jmequipos.

Escaneado con CamScanner

JM EQUIPOS	F- CERTIFICADO DE AJUSTE	Código: O-F-04 Versión: 04 Edición: 12/02/2018 Copia controlada Hoja 2 de 2

SERVICIO DE LABORATORIO OPTICOMECÁNICO Y ELECTRÓNICO

CERTIFICADO NO. C5808

INSTRUMENTO:	Nivel	**FECHA DE REVISIÓN:**	30 DE DICIEMBRE DE 2024
MARCA:	TOPCON	**SUGERIMOS NUEVA REVISIÓN:**	30 DE JUNIO DE 2025
REFERENCIA:	AT-B4A	**CLIENTE:**	PROCIVING SAS
SERIAL:	WP097336	**CC:**	900905675

CONDICIONES PRESENTES EN EL LABORATORIO EN EL PROCESO DE AJUSTE

TEMPERATURA AMBIENTE MINIMA: 22°C
HUMEDAD RELATIVA MINIMA: 63%
PRESION ATMOSFERICA: 760 mmHg

TEMPERATURA MAXIMA: 25°C
HUMEDAD RELATIVA MAXIMA 69%

JMENDOZA Equipos S.A.S
NIT: 900.374.225-1

TÉCNICO JM EQUIPOS

JM EQUIPOS. CERTIFICA QUE EL INSTRUMENTO SE ENTREGA EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO REALIZANDO EL AJUSTE Y/O REPARACION (SEGÚN PROTOCOLO DE NORMA ISO 9001:2015 Y BASADOS EN PROCEDIMIENTOS DE NORMA ISO 17123-3) Y QUE LOS ERRORES ENCONTRADOS AL INGRESO DEL EQUIPO, HAN SIDO CORREGIDOS DE ACUERDO CON LOS PARAMENTROS DE TOLERANCIA ESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE.

CERTIFICADO POR:

SUPERVISOR DE LABORATORIO **FIRMA:**_____

Este certificado no es válido sin el simbolo de aceptación, no puede ser reproducido parcialmente, excepto en su totalidad, con autorización previa por escrito del servicio técnico de JM EQUIPOS.

Verifique la validez de este certificado en
www.jmequipos.com/consultar-certificados.php

Recuerde nuestro sitio web www.jmequipos.com, en la tienda virtual tenemos los productos con los mejores precios para usted.

Distribuidores en Colombia autorizados por:
GEOMAX TOPCON Leica Geosystems PENTAX SOKKIA Nikon

Medellín: Calle 30B #71-42 PBX:(574) 3220619 Ext. 102 Cel: 310-7983526
Bogotá: Calle 51 # 71A-18 OF 101 Tel: (571) 7559969
www.jmequipos.com - laboratorio@jmequipos.com - laboratorio.bogota@jmequipos.com - ventas@jmequipos.

Escaneado con CamScanner

CIMENTAR
Soluciones en Perforación

HOJA DE VIDA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

EQUIPO O MAQUINARIA:	UNIDAD HIDRAULICA 30HP			
N° DE SERIE:	MMDM002358			
MARCA:	SIEMENS			
MODELO:	2012			
REFERENCIA:				
MOTOR:	30H0 1800RPM 4 17ZZTE0291			
PESO:	130 KILOS			
DIMENSION:	**LARGO**		**ANCHO**	
REQ. DE TRANSPORTE:	Este equipo se debe transportar en planchon grua			



MOTOR		**HIDRAULICO**	
FILTRO ACPM:	**N/A**	**ACEITE:**	**NUEVO**
FILTRO AIRE:	**N/A**	**FILTRO:**	**NUEVO**
FILTRO ACEITE:	**N/A**		

MANTENIMIENTOS	
Horometro de MTTO	**N/A**
Proximo MTTO Horometro	**N/A**

OBSERVACIONES	**RESPONSABLE DE REVISION**
Se realizo mantenimiento general 25 de mayo 2024	
	CARLOS ANDRES COTES
	DIRECTOR TECNICO

CIMENTAR
Soluciones en Perforación

HOJA DE VIDA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

EQUIPO O MAQUINARIA:	COMPRESOR PORTATIL MOBILAIR			
N° DE SERIE:	1155			
MARCA:	KAESER			
MODELO:	M100			
REFERENCIA:	WKA0F1601E5004521			
MOTOR:	KUBOTA			
PESO:	1.462 KILOS			
DIMENSION:	**LARGO**	**3 mts**	**ANCHO**	**2 mts**
REQ. DE TRANSPORTE:	Este equipo se debe transportar en planchon grua			



MOTOR		**HIDRAULICO**	
FILTRO ACPM:	**NUEVO**	**ACEITE:**	**NUEVO**
FILTRO AIRE:	**NUEVO**	**FILTRO:**	**NUEVO**
FILTRO ACEITE:	**NUEVO**		

MANTENIMIENTOS	
Horometro de MTTO	**4255**
Proximo MTTO Horometro	**4455**

OBSERVACIONES	**RESPONSABLE DE REVISION**
El mantenimiento del equipo fue realizado el dia 25 de mayo de 2024, en el que se hizo mantenimiento general como:	
cambio aceite del motor y sus respectivos filtros	
	CARLOS ANDRES COTES
	DIRECTOR TECNICO

CIMENTAR
Soluciones en Perforación

HOJA DE VIDA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

EQUIPO O MAQUINARIA:	COMPRESOR PORTATIL MOBILAIR			
N° DE SERIE:	1156			
MARCA:	KAESER			
MODELO:	M100			
REFERENCIA:	WKA0F1601E5006919			
MOTOR:	KUBOTA			
PESO:	1.462 KILOS			
DIMENSION:	**LARGO**	**3 mts**	**ANCHO**	**2 mts**
REQ. DE TRANSPORTE:	Este equipo se debe transportar en planchon grua			



MOTOR		**HIDRAULICO**	
FILTRO ACPM:	**NUEVO**	**ACEITE:**	**NUEVO**
FILTRO AIRE:	**NUEVO**	**FILTRO:**	**NUEVO**
FILTRO ACEITE:	**NUEVO**		

MANTENIMIENTOS	
Horometro de MTTO	**4432**
Proximo MTTO Horometro	**4632**

OBSERVACIONES	**RESPONSABLE DE REVISION**
El mantenimiento del equipo fue realizado el dia25 de mayo de 2024, en el que se hizo mantenimiento general como:	
cambio aceite del motor y sus respectivos filtros	
	CARLOS ANDRES COTES
	DIRECTOR TECNICO

CIMENTAR
Soluciones en Perforación

HOJA DE VIDA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

EQUIPO O MAQUINARIA:	PLANTA ELECTRICA 100 KVA				
N° DE SERIE:	297739				
MARCA:	KOHLER				
MODELO:	1992				
REFERENCIA:	48159-7157982				
MOTOR:	6059T-377338-6059TF001				
PESO:	2.380 KILOS				
DIMENSION:	**LARGO**	**4 mts**	**ANCHO**	**2 mts**	
REQ. DE TRANSPORTE:	Este equipo se debe transportar en planchon grua				



MOTOR		**HIDRAULICO**	
FILTRO ACPM: BALDWIN BT-909	**NUEVO**	**ACEITE:**	**NUEVO**
FILTRO AIRE: PARTMO AP-2244	**NUEVO**	**FILTRO:**	**NUEVO**
FILTRO ACEITE: BALDWIN BT-259	**NUEVO**		

MANTENIMIENTOS	
Horometro de MTTO	**3409**
Proximo MTTO Horometro	**3659**

OBSERVACIONES	**RESPONSABLE DE REVISION**
Se reliza Mantenimiento general el dia 24 mayo 2024	
	CARLOS ANDRES COTES
	DIRECTOR TECNICO

CIMENTAR
Soluciones en Perforación

HOJA DE VIDA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

EQUIPO O MAQUINARIA:	UNIDAD ELECTRICA 50 HP			
N° DE SERIE:	MMDM002273			
MARCA:	SIEMENS			
MODELO:	2012			
REFERENCIA:				
MOTOR:	50HP 1800RPM 4 17MS1LA5207-4YA80			
PESO:	130 KILOS			
DIMENSION:	**LARGO**		**ANCHO**	
REQ. DE TRANSPORTE:	Este equipo se debe transportar en planchon grua			



MOTOR		**HIDRAULICO**	
FILTRO ACPM:	**N/A**	**ACEITE:**	**NUEVO**
FILTRO AIRE:	**N/A**	**FILTRO:**	**NUEVO**
FILTRO ACEITE:	**N/A**		

MANTENIMIENTOS	
Horometro de MTTO	**N/A**
Proximo MTTO Horometro	**N/A**

OBSERVACIONES	**RESPONSABLE DE REVISION**
Se realizo mantenimiento general 25 de mayo 2024	
	CARLOS ANDRES COTES
	DIRECTOR TECNICO

ANEXO 4

CONTROL DE APORTES LEGALES DEL CONTRATO DE OBRA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901740222-1	CONSORCIO MONIQUIRA	CALLE 51 # 71A 18	3837687	RECURSOSHUMANOS.PROCIVING@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOYACÁ	MONIQUIRÁ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-02	E	05/03/2025	84559073	$4.178.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC55	EPS-S Cajacopi	901543211-6	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	47.500	0		0		0	0	0	0	47.500	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	209.000	0		0		0	0	0	0	209.000	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	171.000	0		0		0	0	0	0	171.000	3
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.199.200	0	0	0	0	0	0		1.199.200	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	965.400	0	0	0	0	0	0		965.400	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	935.100				935.100	0	0	935.100			9.351	935.100	9

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	537.700	0	0	537.700	9

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	541.500	541.500
Pensión	2	2.164.600	2.164.600
Riesgos Laborales	1	935.100	935.100
CCF	1	537.700	537.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	4.178.900	4.178.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901740222-1	CONSORCIO MONIQUIRA		CALLE 51 # 71A 18	3837687	RECURSOSHUMANOS.PROCIVING@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOYACÁ	MONIQUIRÁ	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-02	E	05/03/2025	84559073	$4.178.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1022335387	GUIZA QUITIAN FERNANDO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF10	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1030609168	PINILLA QUINTERO LUZ IDALY	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF10	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	1054678073	SEGURA MORENO MARIA IRMA	1	0			S																	25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS017	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF10	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
4	CC	1054679889	AGUDELO SAMACA JOSE DOMINGO	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF10	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
5	CC	1054681469	CUBIDES SAAVEDRA MAYER ALONSO	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS017	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	5	125.300	CCF10	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
6	CC	1057710789	PINILLA QUINTERO CLAUDIA PATRICIA	1	0			S																	230301	1.328.600	212.600	0	0	0	0	CCFC55	1.328.600	53.200	14-11	1.328.600	5	92.500	CCF10	1.328.600	53.200	0	0	0	0	0
7	CC	1057710789	PINILLA QUINTERO CLAUDIA PATRICIA	1	0			S										X							230301	94.900	15.200	0	0	0	0	CCFC55	94.900	3.800	14-11	94.900	5	0	CCF10	94.900	0	0	0	0	0	0
8	CC	1081414650	OCAMPO BOLAÑOS ELVER DANIEL	1	0			S	X																25-14	1.186.250	189.800	0	0	0	0	EPS005	1.186.250	47.500	14-11	1.186.250	5	82.600	CCF10	1.186.250	47.500	0	0	0	0	0
9	CC	74243683	SAAVEDRA GUERRERO JOHN FERNANDO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF10	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
10	CC	91013366	ARIZA PIZA JOSE ROBERTO	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF10	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901740222-1	CONSORCIO MONIQUIRA	CALLE 51 # 71A 18	3837687	RECURSOSHUMANOS.PROCIVING@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOYACÁ	MONIQUIRÁ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-02	Y	05/03/2025	84559161	$99.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	99.100				99.100	0	0	99.100			991	99.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	99.100	99.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	99.100	99.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información
