ALCALDÍA MUNICIPAL DE CÓMBITA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001 AL CONTRATO IPMC-026-2025

1. INFORMACIÓN REFERENTE AL CONTRATO

CONTRATO	INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA N° IPMC-026-2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CÓMBITA NIT.: 891801932-1
CONTRATISTA:	FABIAN STIBEN REMOLINA MARTINEZ C.C 1.100.974.033 DE SAN GIL
OBJETO DEL CONTRATO	ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	NUEVE (09) DE JULIO DE 2025
SUPERVISOR	ING. RODRIGO FERNEY TORRES GARCÍA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
PLAZO INICIAL:	UN (01) MES TÉRMINO DENTRO DEL CUAL EL CONTRATISTA DEBERÁ CUMPLIR A CABALIDAD CON EL OBJETO DEL CONTRATO.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($ 39.474.972,00)
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	NO APLICA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($ 39.474.972,00)
FECHA DE INICIO	VEINTIUNO (21) DE JULIO DE 2025
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	N° 499 DEL DOS (02) DE JULIO DE DOS MIL VEINTICINCO (2025), EXPEDIDO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA.
REGISTROS DE COMPROMISOS	N°. 1031 DEL NUEVE (09) DE JULIO DE DOS MIL VEINTICINCO (2025), EXPEDIDO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA.
FECHA DE INICIO:	VEINTIUNO (21) DE JULIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTE (20) DE AGOSTO DE 2025.
FECHA DE PRESENTE ACTA:	CATORCE (14) DE AGOSTO DE 2025

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

El objeto de esta contratación es la "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."

- Valor total de contrato: **TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($ 39.474.972,00)**

3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

A continuación, se relacionan las actividades realizadas por el contratista del periodo de ejecución del contrato comprendido entre el periodo comprendido el VEINTIUNO (21) de JULIO y el CATORCE de (14) de AGOSTO de Dos mil veinticinco (2025):

CONDICIONES INICIALES CONTRACTUALES

ESPECIFICACIONES GENERAL	ITEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES				
		DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARI	VALOR TOTAL
PART	1	DISEÑO SEÑALIZACIÓN VIAL	UND	1	$1,000,000.00	$ 1,000,000.00
PART	2	DISEÑO ESTRUCTURAL DE REDUCTORES DI	UND	1	$ 500,000.00	$ 500,000.00
SUBTOTAL						$ 1,500,000.00
TOTAL DISEÑOS						$ 1,500,000.00
REDUCTORES DE VELOCIDAD (POMPEYANOS O REDUCTORES DE VELOCIDAD						
3.05.01	3	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO 24.5 MPA - (3500 PSI), (INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS)	M^3	18.06	$ 877,000.00	$ 15,838,620.00
2.02.35	4	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420	kg	1008.46	$ 7,828.00	$ 7,894,224.88
3.03.15	5	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR	M^3	6	$ 122,397.00	$ 734,382.00
SEÑALIZACIÓN						
3.09.10	6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE TRÁNSITO PREVENTIVA, REGLAMENTARIA O INFORMATIVA DE 60 X 60 CM.	UND	9	$ 399,343.00	$ 3,594,087.00
3.09.04	7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCAS VIALES CON PINTURA DE TRÁFICO SEGÚN NORMA INVIAS, (INCLUYE MICROESFERAS)	M^2	17	$ 67,659.00	$ 1,150,203.00
COSTO DIRECTO						$ 29,211,516.88
ADMINISTRACIÓN					22%	$ 6,426,533.71
IMPREVISTOS					3%	$ 876,345.51
UTILIDAD					5%	$ 1,460,575.84
COSTO DIRECTO AIU REDONDEADO AL PESO						$ 8,763,455.00
COSTO TOTAL DE LA OBRA REDONDEADO AL PESO						$ 37,974,972.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO REDONDEADO AL PESO						$ 39,474,972.00

CONDICIONES INICIALES CONTRACTUALES, SEGÚN ACTAS DE MODIFICACIONES DE CANTIDADES

ESPECIFICACIONES GENERAL	ITEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES					CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 01	
		DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PART	1	DISEÑO SEÑALIZACIÓN VIAL	UND	1	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	1	$ 1,000,000.00
PART	2	DISEÑO ESTRUCTURAL DE REDUCTORES DE V	UND	1	$ 500,000.00	$ 500,000.00	1	$ 500,000.00
SUBTOTAL						$ 1,500,000.00		$ 1,500,000.00
TOTAL DISEÑOS						$ 1,500,000.00		$ 1,500,000.00
REDUCTORES DE VELOCIDAD (POMPEYANOS O REDUCTORES DE VELOCIDAD								
3.05.01	3	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO 24.5 MPA - (3500 PSI), (INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS)	M^3	18.06	$ 877,000.00	$ 15,838,620.00	15.7	$ 13,768,900.00
2.02.35	4	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420	kg	1008.46	$ 7,828.00	$ 7,894,224.88	555.05	$ 4,344,931.40
3.03.15	5	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR	M^3	6	$ 122,397.00	$ 734,382.00	0	$ -

SEÑALIZACIÓN											
3.09.10	6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE TRÁNSITO PREVENTIVA, REGLAMENTARIA O INFORMATIVA DE 60 X 60 CM.	UND	9	$ 399,343.00	$ 3,594,087.00	8	$ 3,194,744.00	8	$ 3,194,744.00
3.09.04	7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCAS VIALES CON PINTURA DE TRÁFICO SEGÚN NORMA INVIAS, (INCLUYE MICROESFERAS)	M^2	17	$ 67,659.00	$ 1,150,203.00	45.52	$ 3,079,837.68	$ -	$ -
ITEMS NO PREVISTOS											
3.13.16	NP1	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE E = 10 CM. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES CON ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.	M2	0	$ 22,575.00	$ -	68.12	$ 1,537,809.00	68.12	$ 1,537,809.00
2.01.70	NP2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	0	$ 70,577.00	$ -	9.16	$ 646,272.52	9.16	$ 646,272.52
REF. 3.13.21	NP3	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE REJILLA PEATONAL PARA PASO DE AGUA EN POMPEYANO CON ÁNGULO METÁLICO DE 1 1/2" X 3/16" Y PLATINA 1" X 3/16"	ML	0	$ 219,336.00	$ -	8.4	$ 1,842,422.40	8.4	$ 1,842,422.40
REF. 3.09.04	NP4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPRIMANTE NEGRO PARA BASE DE PINTURA TRÁFICO SEGÚN NORMA INVIAS	M2	0	$ 17,500.00	$ -	45.52	$ 796,600.00	0	$ -
					$ 29,211,516.88			$ 29,211,516.88		$ 25,335,079.32

ADMINISTRACIÓN	22%	$ 5,573,717.45
IMPREVISTOS	3%	$ 760,052.38
UTILIDAD	5%	$ 1,266,753.97
COSTO INDIRECTO AIU REDONDEADO AL PESO	30%	$ 7,600,524.00

COSTO TOTAL DE LA OBRA	$ 32,935,603.32

COSTO TOTAL DEL PROYECTO	$ 34,435,603.32

4. INFORMACIÓN DE GARANTÍAS

ESTADO DE PÓLIZAS DEL CONTRATO ACTUALIZADAS

El contrato en mención se encuentra respaldado por la póliza de garantía única de Cumplimiento N° 600-47-994000073302; de SEGUROS DEL ESTADO., la cual ampara los siguientes aspectos: cumplimiento del contrato.

Valor Contrato Final:	**$ 39.474.972,00**		**Aprobación: 09/07/2025**
Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO COLOMBIA		**Acta de Inicio:** 21/07/2025
GARANTÍAS	**% Asegurado**	**VIGENCIA DE LA PÓLIZA**	
		Desde	**Hasta**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO N° 39-44-101172550; de SEGUROS DEL ESTADO COLOMBIA	10%	21/07/2025	22/12/2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES Y E INDEMNIZACIONES N°39-44-101172550; de SEGUROS DEL ESTADO COLOMBIA	5%	21/07/2025	22/08/2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DEL OBRA N° 39-44-101172550; de SEGUROS DEL ESTADO COLOMBIA	15%	DOS (02) AÑOS, CERO (0) MESES, CERO (0) DÍAS	

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL N° 39-40-101045475	200 SMMLV	21/07/2025	22/08/2025

5. DIFICULTADES TÉCNICAS

En términos generales no se han presentado dificultades y se realizó la verificación de las actividades ejecutadas en el **CONTRATO DE INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA No. IPMC-026-2025.**

6. RECURSOS FINANCIEROS INICIALES:

FECHA RP	N° RP	CUENTA	NOMBRE	VALOR A PAGAR
09/07/2025	1031	2320202008-13-124304- 16-2409039:	: Implementar gradualmente el plan de movilidada y señalización vial: SGP- propósito general- libre destinación municipios categorías 4,5 y 6- dep: alcaldía – SEC Transporte- PROG Seguridad de transporte – SUBP: intersubsectorial Transporte – PROD: Vías con dispositivos de control y señalización -CPC Señales viales en material plástico. (10.000.000,00)	$ 10.000.000,00
		2320202008-23-133100-16-2409039-3699046:	Implementar el plan de movilidad y señalización vial FTE RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACIÓN DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACIÓN – DEP Alcaldia- SEC- Transporte – PROG: Seguridad de transporte – SUBP: Intersubsectorial Transporte – PROD: Vías con dispositivos de control y señalización – CPC: Señales viales en material de plástico (25.000.000,00)	$ 25.000.000,00
		2320202008-27-124303-16-2409039-3699046:	Implementar el plan de movilidad y señalización vial FTE RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACIÓN DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACIÓN – DEP Alcaldia- SEC- Transporte – PROG: Seguridad de transporte – SUBP: Intersubsectorial Transporte – PROD: Vías con Dispositivos de control y señalización – CPC: Señales viales en material de plástico (4.474.972,00) Total: Treinta y nueve millones cuatrocientos setenta y cuatro mil novecientos setenta y dos pesos ($39,474.972,00)	$ 4.474.972,00
TOTAL: TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($39,474.972,00)				**($39,474.972,00)**

7. BALANCE ECONÓMICO

ÍTEM	PAGOS/SALDO	VALOR INICIAL/ADICIONES
Valor inicial del contrato	-	$ 39,474,972.00
Valor Adicional	-	-
Valor Acta Anteriores	-	-
Valor a pagar presente acta	$ 34,435,603.32	-
Saldo No Ejecutado por liberar	$ 5,039,368.68	-
Valor a Reintegrar al MUNICIPIO	0	
SUMAS IGUALES	**$ 39,474,972.00**	**$ 39,474,972.00**

8. INFORMACIÓN DE PAGOS

Para el contrato **IPMC-019-2025**, se estipuló como forma de pago la siguiente:

DESCRIPCIÓN	VALOR PRESENTE ACTA
ACTA PARCIAL No. 01	ACTA PARCIAL No. 01 POR VALOR DE **TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TRES PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($34.435.603,32 M/CTE),** PERIODO DEL 21 DE JULIO DE 2025 AL CATORCE DE AGOSTO 2025.

Con afectación a los rubros descritos a continuación:

FECHA RP	N° RP	CUENTA	NOMBRE	VALOR A PAGAR
		2320202008-13-124304-16-2409039:	Implementar gradualmente el plan de movilidada y señalización vial: SGP- propósito general- libre destinación municipios categorías 4,5 y 6- dep: alcaldía – SEC Transporte- PROG Seguridad de transporte – SUBP: intersubsectorial Transporte – PROD: Vías con dispositivos de control y señalización -CPC Señales viales en material plástico.	**$ 10.000.000,00**
09/08/2025	1031	2320202008-23-133100-16-2409039-3699046:	Implementar el plan de movilidad y señalización vial FTE RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACIÓN DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACIÓN – DEP Alcaldia-SEC- Transporte – PROG: Seguridad de transporte – SUBP: Intersubsectorial Transporte – PROD: Vías con dispositivos de control y señalización – CPC: Señales viales en material de plástico.	**$ 24.435.603,32**

TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TRES PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS	($34.435.603,32 M/CTE)

9. COMENTARIOS INFORMES DEL CONTRATISTA

De acuerdo a lo pactado en los ítems del presupuesto el contratista presentó los siguientes documentos:

a. Informe de Actividades.
b. Factura Electrónica.
c. Pago de seguridad social.
d. Entregables de las diferentes actividades pactadas.
e. Cuenta de cobro
f. Certificación bancaria.

10. PROCESOS SANCIONATORIOS

Como supervisor del contrato relacionado en el numeral 1, me permito dejar constancia que en desarrollo de la etapa contractual no se generaron situaciones que se pudieran tipificar al marco obligacional, del mismo por lo que la entidad no tuvo que iniciar acción Administrativa o judicial alguna en contra del contratista.

11. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS:

En el siguiente link se presentan los entregables de las actividades del contrato **IPMC-026-2025.**

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eM5PngboZQHF5LrjgcDaC9Bx_Y5AaEvp

A continuación, se presentan el registro fotográfico de las actividades contratadas en el contrato **IPMC-026-2025.**

11.1.1 CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO 24.5 MPA - (3500 PSI), (INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS)





Alcaldía de Combita
Calle 3 No 5-63 Combita
PBX (57) (8) 7310010
http://www.combita-boyaca.gov.co

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
Fax: (57) (8) 7310010
Código postal: 150201
Correo: infraestructuraysp@combita-boyaca.gov.co

















11.1.2 SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPA








Alcaldía de Combita
Calle 3 No 5-63 Combita
PBX (57) (8) 7310010
http://www.combita-boyaca.gov.co

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
Fax: (57) (8) 7310010
Código postal: 150201
Correo: infraestructuraysp@combita-boyaca.gov.co

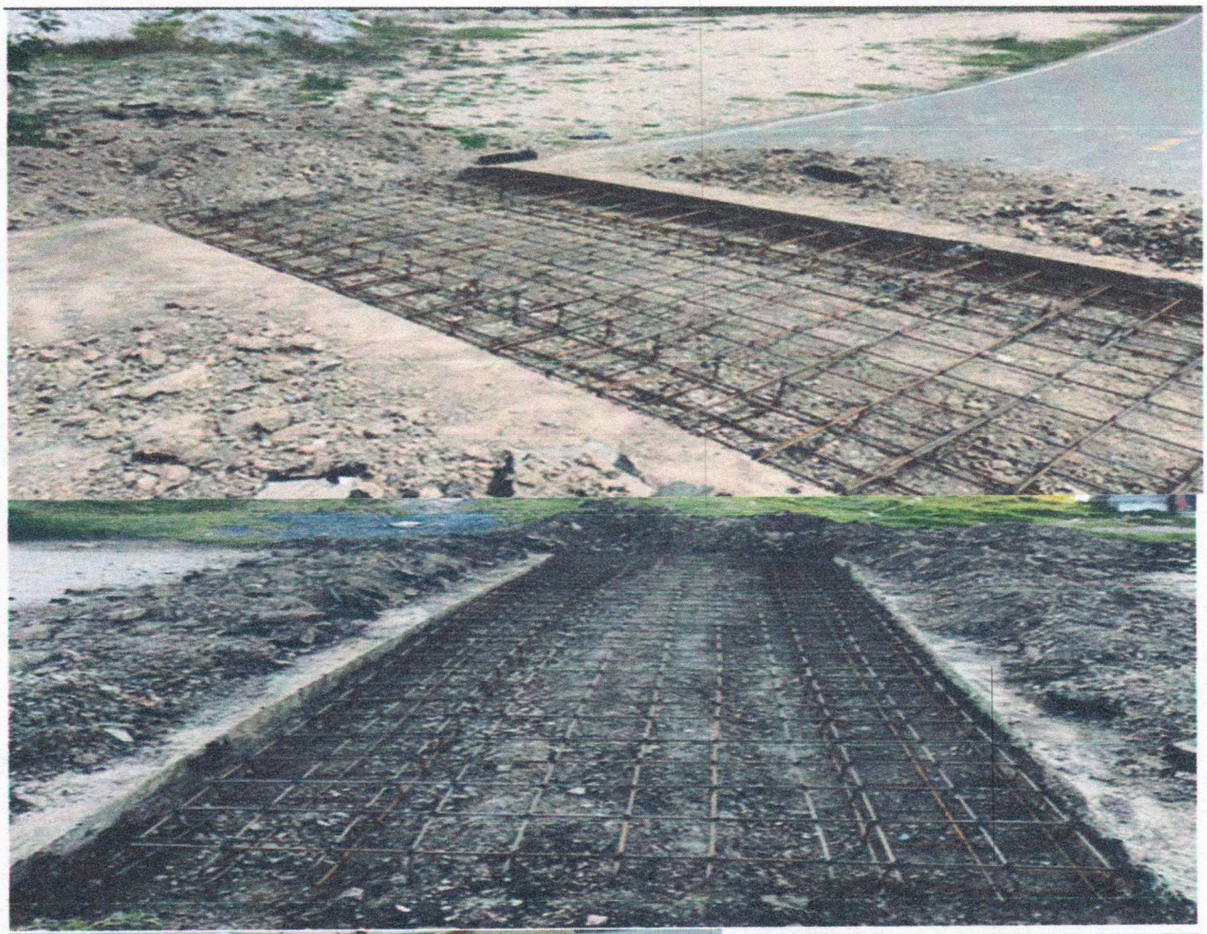






11.1.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE TRÁNSITO PREVENTIVA, REGLAMENTARIA O INFORMATIVA DE 60 X 60 CM.



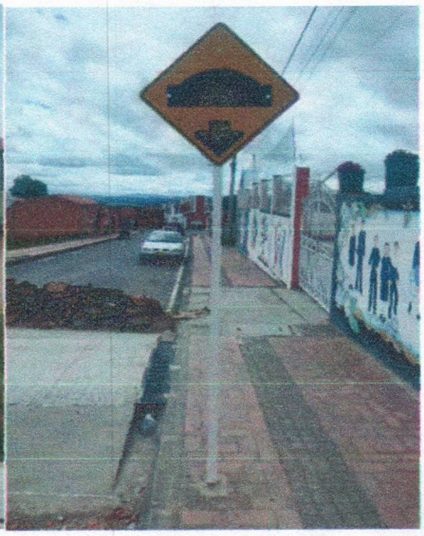






11.1.4 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE E = 10 CM. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES CON ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)



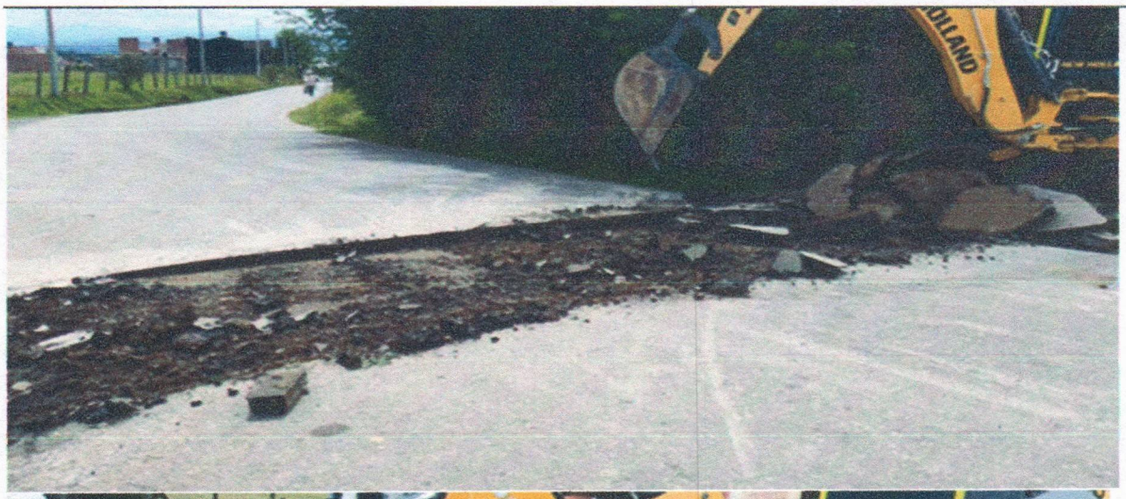







Alcaldía de Combita
Calle 3 No 5-63 Combita
PBX (57) (8) 7310010
http://www.combita-boyaca.gov.co

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
Fax: (57) (8) 7310010
Código postal: 150201
Correo: infraestructuraysp@combita-boyaca.gov.co









11.1.5 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN











11.1.6 SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE REJILLA PEATONAL PARA PASO DE AGUA EN POMPEYANO CON ÁNGULO METÁLICO DE 1 1/2" X 3/16" Y PLATINA 1" X 3/16"

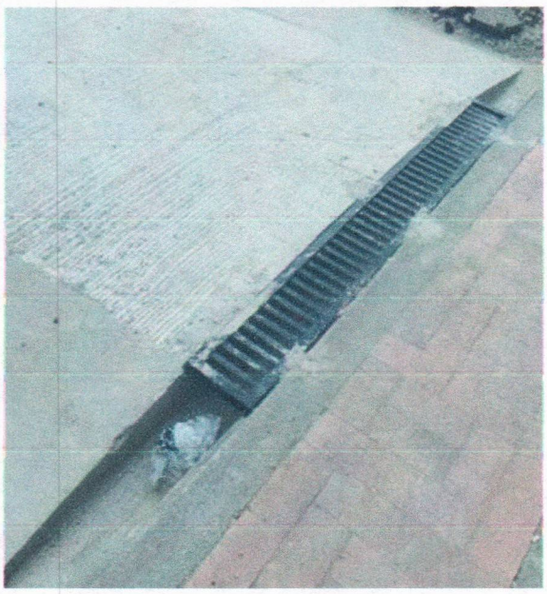



12. ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE SUPERVISIÓN:

- Verificación del proceso contractual
- Elaboración actas (Inicio, actas parciales)
- Verificación de las actividades ejecutadas
- Verificación del pago de Seguridad Social
- Elaboración de informe de supervisión

Se concluye que el Contrato **IPMC-026-2025** ha transcurrido con normalidad, y se ha dado cumplimiento a los requerimientos de la Ley y a las actividades del objeto contractual a entera satisfacción.

ING. RODRIGO FERNEY TORRES GARCIA
Secretario de infraestructura y Servicios Públicos
SUPERVISOR

Elaboro: Ing. Andrés Felipe Aguilar Tibacuy- Profesional de apoyo a la secretaría de infraestructura y Servicios Públicos
Aprobó: Ing Rodrigo Ferney Torres García-Secretario de infraestructura y Servicios Públicos
