
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. MS - CM- 001-2025

INFORME DE INTERVENTORÍA
TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE RECIBO FINAL
PARA EL CONTRATO DE OBRA No. MS-LP-002-2025



CONTRATISTA DE OBRA

COMLINRED SAS

820.004.070-9

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

BYD MULTIPROYECTOS S.A.S.

900.268.419- 8

ENTIDAD CONTRATANTE

MUNICIPIO DE SAMACÁ

15 DE MAYO DE 2025 – 19 DE AGOSTO DE 2025

DIRECCION: CARRERA 9A # 22-56 SOGAMOSO - BOYACÁ
EMAIL: MULTIPROYECTOSBYD@GMAIL.COM
TEL. 3143595318

1. GENERALIDADES:

El Municipio de Samacá han hecho posible el desarrollo de proyectos que benefician a la comunidad del municipio; este se ha beneficiado con el proyecto en referencia. El proyecto a desarrollar se denomina. "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS ÁREAS RURAL Y/O URBANA DEL MUNICIPIO SAMACÁ – BOYACÁ 2025"

Para el desarrollo de las actividades nombradas, constituye el punto de partida para la organización de proyectos tendientes a mejorar la calidad de vida de esta comunidad, a la vez permite el surgimiento del municipio como ente organizado, que busca el mejoramiento en general.

El proyecto consiste en "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS ÁREAS RURAL Y/O URBANA DEL MUNICIPIO SAMACÁ – BOYACÁ 2025"

Para garantizar el cumplimiento y la calidad de las obras del contrato de acuerdo a las especificaciones existentes, el contratista realiza el siguiente informe, en este documento se describen todas las actividades realizadas por la firma COMLINRED S.A.S.

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. LOCALIZACION GENERAL



Ilustración 1. Ubicación General del municipio en el departamento

2.2 LOCALIZACION ESPECIFICA

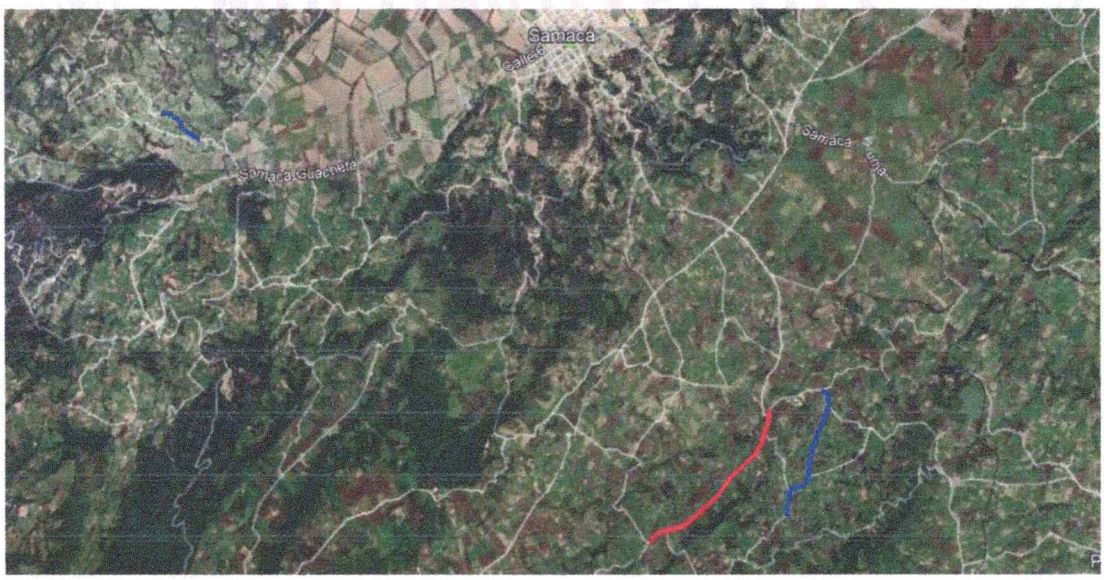


Ilustración 2. Ubicación especifica tramos a intervenir

2.3 FICHA TECNICA RESUMEN DEL CONTRATO OBRA

CONTRATO DE OBRA N.º:	MS-LP-002-2025
N.º DE PROCESO:	MS-LP-002-2025
OBJETO CONTRACTUAL:	"AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS ÁREAS RURAL Y/O URBANA DEL MUNICIPIO SAMACÁ – BOYACÁ 2025"
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	SETECIENTOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE. **($700.443.588,oo).**
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SAMACA
NIT:	800.016.757
ALCALDE MUNICIPAL:	WILSON CASTIBLANCO GIL
CONTRATISTA:	COMLINRED SAS
NIT:	820.004.070-9
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS C.C. 1.019.068.303 de Bogotá D.C.
INTERVENTORIA:	BYD MULTIPROYECTOS S.A.S.
NIT:	900.268.419-8
REPRESENTANTE LEGAL:	GILBERTO CELY VARGAS C.C. 1.052.020.418 DE FLORESTA
PLAZO:	TRES (03) MESES
FECHA DE INICIO:	TREINTA (30) DE ABRIL DE 2025
ACTA PARCIAL 1:	CATORCE (14) DE MAYO DE 2025
SUSPENSIÓN 1	29 DE JULIO DE 2025
REINICIO 1	19 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	19 DE AGOSTO DE 2025

2.4 FICHA TECNICA RESUMEN DEL CONTRATO INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA N.º:	MS - CM- 001-2025
N.º DE PROCESO:	MS - CM- 001-2025
OBJETO CONTRACTUAL:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS ÁREAS RURAL Y/O URBANA DEL MUNICIPIO SAMACÁ – BOYACÁ 2025"
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y UN MIL CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE. **($49'031.051,oo).**
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SAMACA
NIT:	800.016.757
ALCALDE MUNICIPAL:	WILSON CASTIBLANCO GIL
CONTRATISTA:	BYD MULTIPROYECTOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

NIT:	900.268.419-8
REPRESENTANTE LEGAL:	GILBERTO CELY VARGAS 74.374.894 DE DUITAMA
SUPERVISOR ACTUAL:	DANILO ALEXANDER VIANCHÀ VALDERRAMA Secretario de Planeación y Obras Públicas
PLAZO:	TRES (03) MESES
FECHA DE INICIO:	TREINTA (30) DE ABRIL DE 2025
SUSPENSIÓN 1	29 DE JULIO DE 2025
REINICIO 1	19 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	19 DE AGOSTO DE 2025

3. SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO DE OBRA

3.1.CONDICIONES ORIGINALES

CONDICIONES ORIGINALES					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE 40 - 60 W - 4000K- PARA ALUMBRADO PUBLICO INCLUYE (BRAZO PARA LUMINARIA, CABLE, FOTOCELDAS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN)	UND	156.00	$ 1,082,556.00	$168,878,736.00
1,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE 8 M X 510 KG	UND	156.00	$ 995,504.00	$155,298,624.00
1,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TENDIDO DE RED TRENZADA PARA ALUMBRADO PUBLICO CABLE (TRIPLEX 2X35MM+35MM) (INCLUYE HERRAJES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE CONEXIÓN)	ML	4,650.00	$ 46,156.00	$214,625,400.00
	SUBTOTAL - COSTOS DIRECTOS				$ 538,802,760.00

3.2.CONDICIONES ACTUALIZADAS

3.3. SABANA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA (19/08/2025):

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PRESENTE ACTA		ACUMULADO EJECUTADO	
1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE 40 - 60 W - 4000K- PARA ALUMBRADO PUBLICO INCLUYE (BRAZO PARA LUMINARIA, CABLE, FOTOCELDAS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN)	156.00	$168,878,736.00	156.00	$168,878,736.00
1,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE 8 M X 510 KG	156.00	$155,298,624.00	156.00	$155,298,624.00
1,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TENDIDO DE RED TRENZADA PARA ALUMBRADO PUBLICO CABLE (TRIPLEX 2X35MM+35MM) (INCLUYE HERRAJES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE CONEXIÓN)	4,650.00	$214,625,400.00	4,650.00	$214,625,400.00
	SUBTOTAL - COSTOS DIRECTOS		$538,802,760.00		$538,802,760.00

3.4.ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CONTRATISTA DE OBRA

I. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE 40 - 60 W - 4000K- PARA ALUMBRADO PUBLICO INCLUYE (BRAZO PARA LUMINARIA, CABLE, FOTOCELDAS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN)

UNIDAD:	UND
CANTIDAD EJECUTADA A LA FECHA:	156
CANTIDAD POR EJECUTAR	0

DESCRIPCION: Los requisitos mínimos que debe llegar el "LUMINARIA 40W - 60 W DRIVER, IP 66, IK 08, 100.000H O MÁS TEMPERATURA DE COLOR DE 4000K INCLUYE (CONECTOR DE TORNILLO DE PERFORACIÓN DE CHAQUETA AISLADA Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN) 5 AÑOS O MÁS DE GARANTÍA con el fin de garantizar el funcionamiento correcto de los mismos. Todo el tiempo basado estrictamente a las normas y reglamentos técnicos vigentes RETIE y RETILAP.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

· Armada y alistamiento de luminaria con el brazo, sus respectivos accesorios, cable y herrajes, esta actividad se hace en el piso, esto con el fin de cerciorarse de la conexión luego se procede a subir al poste con el camión grúa de canasta.

· Instalación de la luminaria en el poste de concreto que va soportada por con 2 collarines y/o conectores para garantizar su anclaje al poste, además de esto se realiza la conexión del cable que alimentara a la luminaria con el cable que alimenta la red eléctrica y para esto usamos el conector.

EQUIPOS

- Herramienta y equipo menor
- Grúa canasta hidráulica




EVIDENCIA FOTOGRAFICA



- TRAMO 1 VEREDA GACAL SECTOR KIOSCO

UNIDADES INSTALADAS	69







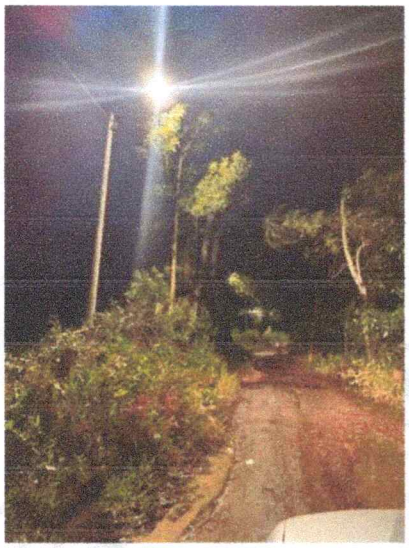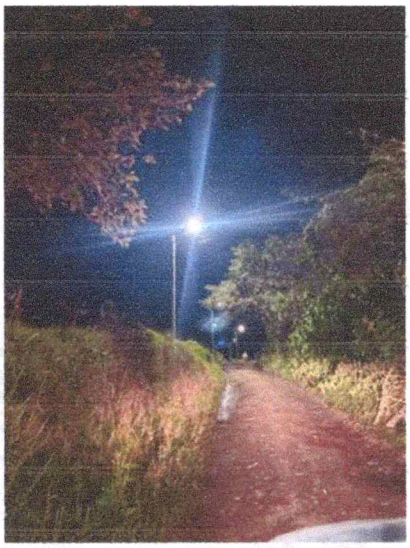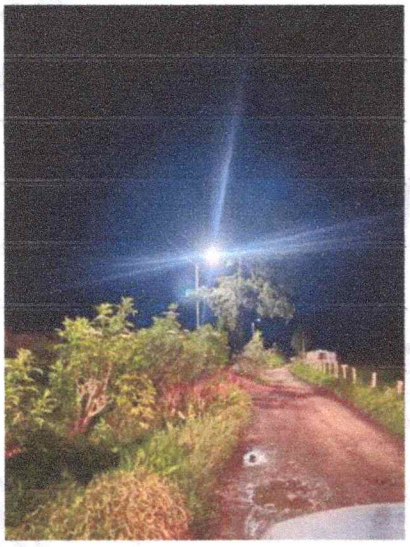





DIRECCION: CARRERA 9A # 22-56 SOGAMOSO - BOYACÁ
EMAIL: MULTIPROYECTOSBYD@GMAIL.COM
TEL. 3143595318



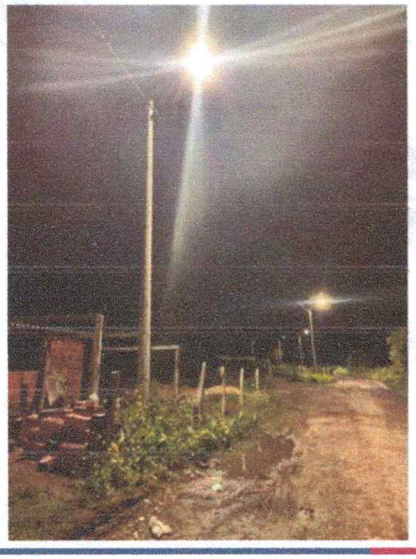
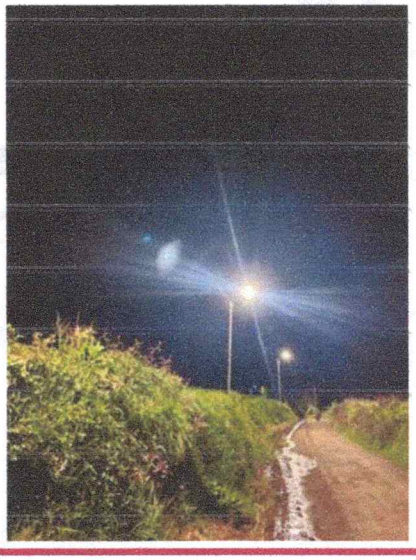
- TRAMO 2 VEREDA GACAL SECTOR IGLESIA SAN ISIDRO


UNIDADES INSTALADAS	57

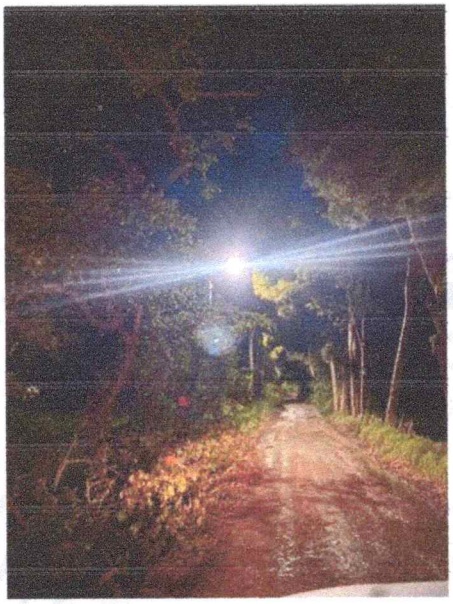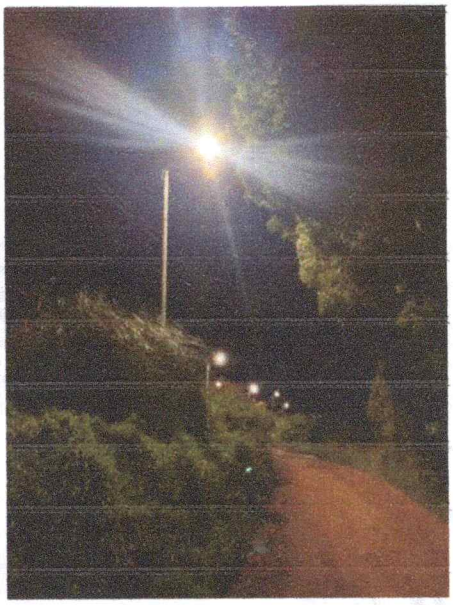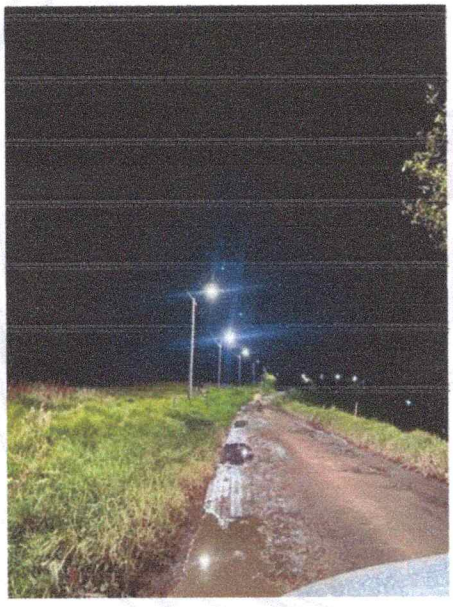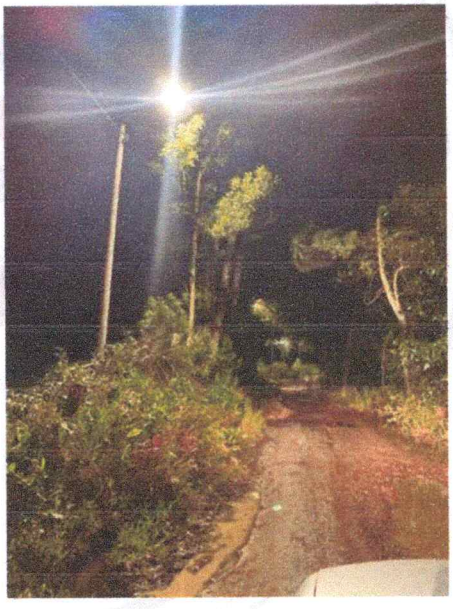





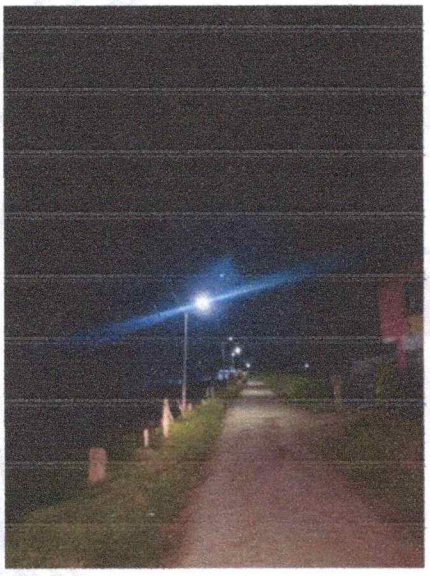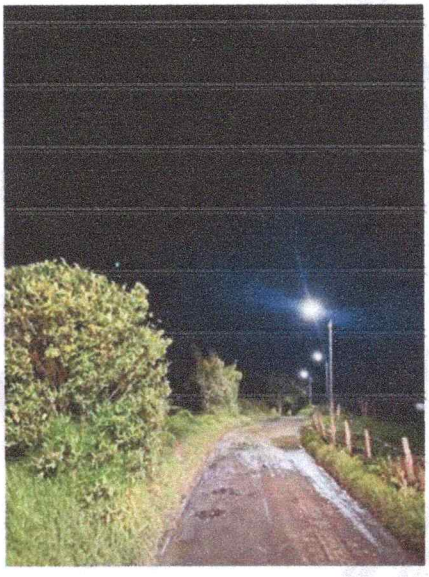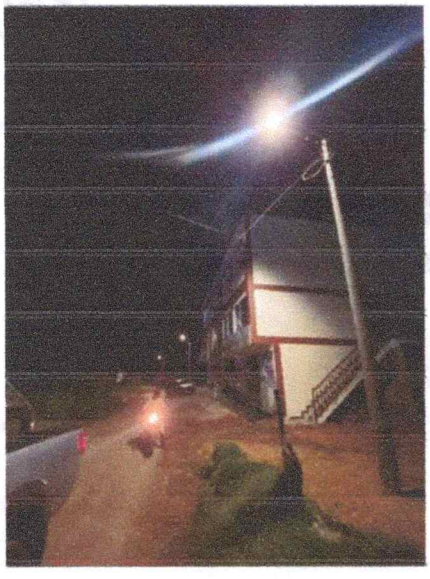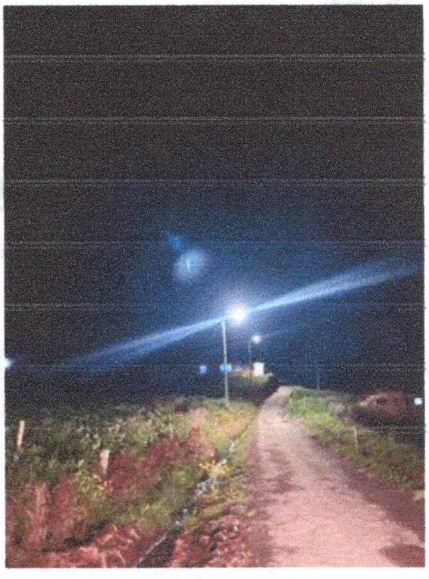

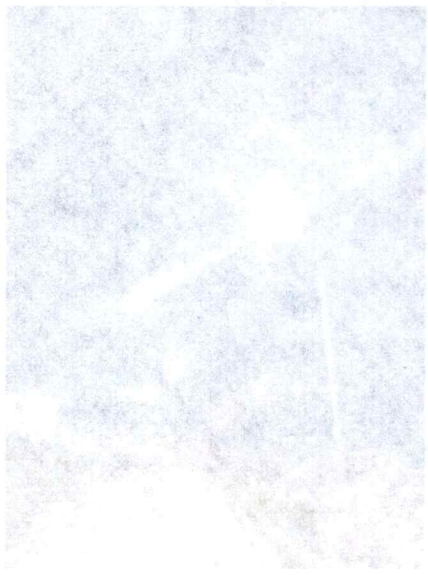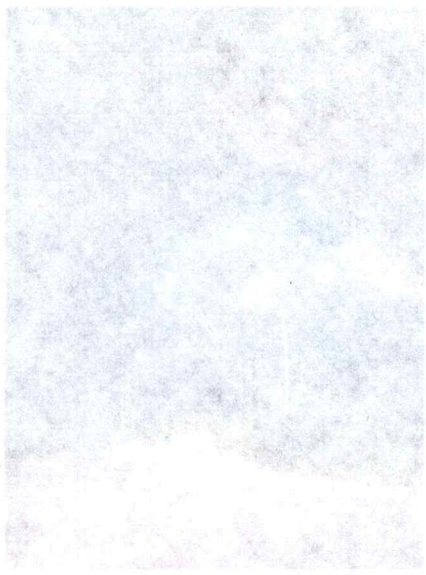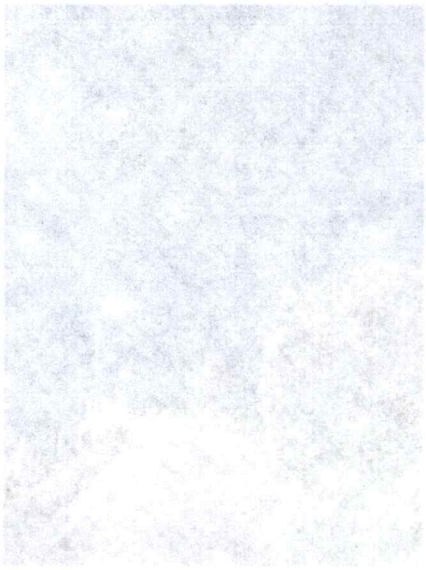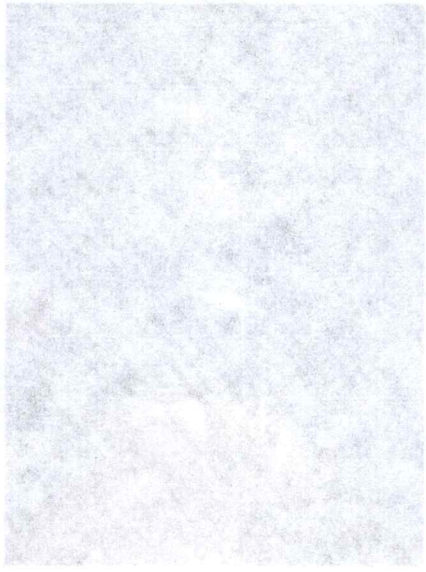
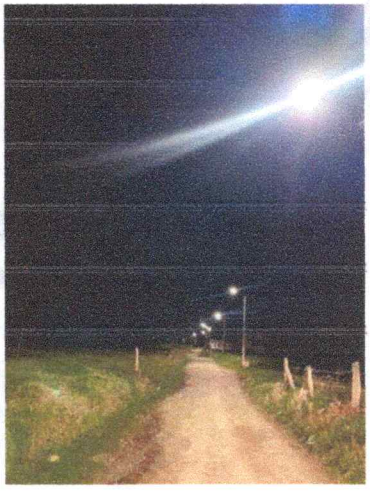
DIRECCION: CARRERA 9A # 22-56 SOGAMOSO - BOYACÁ
EMAIL: MULTIPROYECTOSBYD@GMAIL.COM
TEL. 3143595318

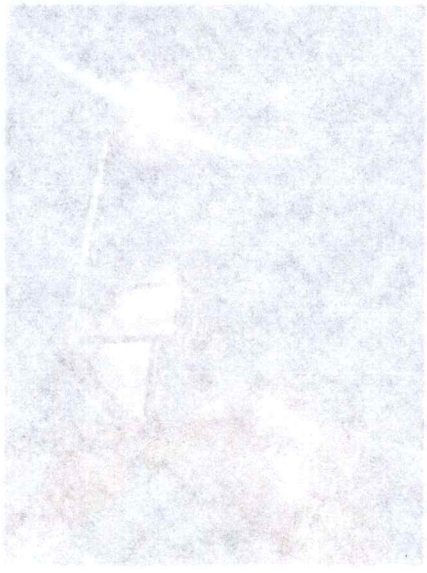


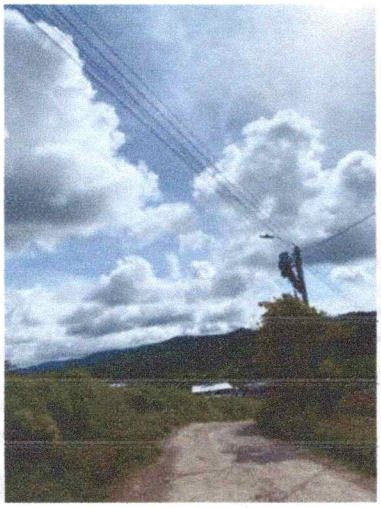

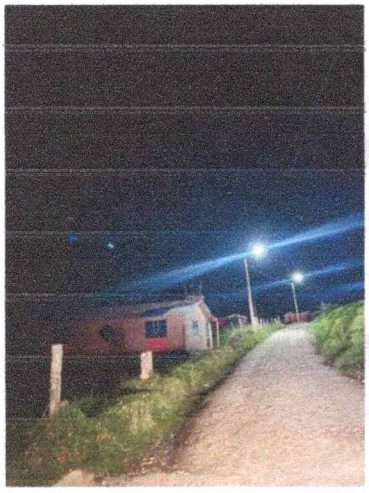

DIRECCION: CARRERA 9A # 22-56 SOGAMOSO - BOYACÁ
EMAIL: MULTIPROYECTOSBYD@GMAIL.COM
TEL. 3143595318

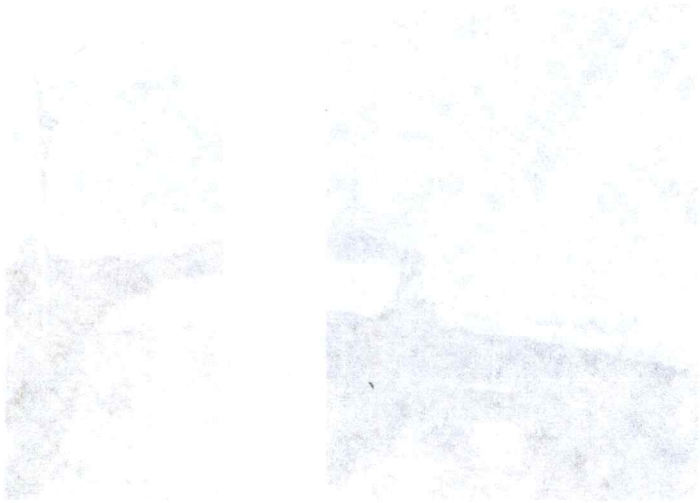

- TRAMO 3 VEREDA RUCHICAL

UNIDADES INSTALADAS	30





II. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE 8 M X 510 KG

UNIDAD:	UND
CANTIDAD EJECUTADA A LA FECHA:	156
CANTIDAD POR EJECUTAR	0

DESCRIPCION: Los requisitos mínimos que debe llegar el "SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE 8 M X 510 KG" con el fin de garantizar el funcionamiento correcto de los mismos. Todo el tiempo basado estrictamente a las normas y reglamentos técnicos vigentes RETIE y RETILAP.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

- Apertura de hueco en sitio según la normatividad vigente.
- Plomada del poste, esta actividad se realiza girando el poste con la ayuda de una manila y una barra hasta obtener el ángulo adecuado, y se rellena el sobrante del hueco con material pétreo para fijarlo al suelo y evitar perder el ángulo.

MANO DE OBRA:

- Instalador
- Maestro
- Ayudante

EQUIPOS

- Herramienta y equipo menor
- Grúa brazo hidráulica

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

- TRAMO 1 VEREDA GACAL SECTOR KIOSCO

UNIDADES INSTALADAS	69





- TRAMO 2 VEREDA GACAL SECTOR IGLESIA SAN ISIDRO

UNIDADES INSTALADAS	57





- TRAMO 3 VEREDA RUCHICAL

UNIDADES INSTALADAS	30





III. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TENDIDO DE RED TRENZADA PARA ALUMBRADO PUBLICO CABLE (TRIPLEX 2X35MM+35MM) (INCLUYE HERRAJES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE CONEXIÓN)

UNIDAD:	ML
CANTIDAD EJECUTADA A LA FECHA:	4650
CANTIDAD POR EJECUTAR	0

DESCRIPCION: Los requisitos mínimos que debe llegar el "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TENDIDO DE RED TRENZADA PARA ALUMBRADO PUBLICO CABLE (TRIPLEX 2X35MM+35MM) (INCLUYE HERRAJES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESESARIOS DE CONEXIÓN)" con el fin de garantizar el funcionamiento correcto de los mismos. Todo el tiempo basado estrictamente a las normas y reglamentos técnicos vigentes RETIE y RETILAP.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

- Una vez se encuentra fijado el poste de concreto se procede a la instalación de los herrajes en su parte superior, allí se instala la percha que va fijada con el perno y la arandela y se pone el aislador y el capuchón que permite separar el cable conductor del de la percha y el poste, esto con el fin de evitar daños a la red, además se coloca la grapa en la red que hace parte del proceso constructivo.

MANO DE OBRA:

- Profesional liniero
- Instalador
- Ayudante
- Maestro

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

- TRAMO 1 VEREDA GACAL SECTOR KIOSCO


METROS LINEALES INSTALADOS	2060 ml






- TRAMO 2 VEREDA GACAL SECTOR IGLESIA SAN ISIDRO

METROS LINEALES INSTALADOS	1590 ML

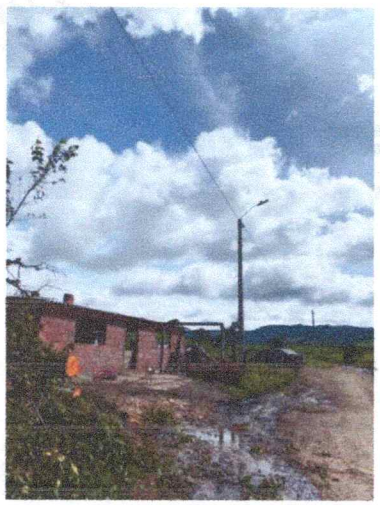

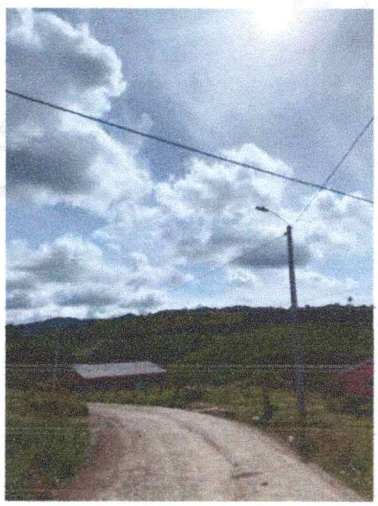

- TRAMO 3 VEREDA RUCHICAL

METROS LINEALES INSTALADOS	1000 ml





4. RESUMEN ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

A. CUADRO DE RELACION DE LAS ACTAS GENERADAS OBRA

Contrato de obra No. MS-LP-002-2025:

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	día	mes	año	
Contrato de obra	10	04	2025	
Acta de inicio obra	30	04	2025	
Parcial 01	15	05	2025	
Acta de suspension 01	29	07	2025	
Acta de reinicio 01	19	08	2025	

B. CUADRO DE RELACION DE LAS ACTAS GENERADAS INTERVENTORIA

Contrato de interventoría No. MS - CM- 001-2025


DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	día	mes	año	

Contrato de obra	21	04	2025	
Acta de inicio obra	30	04	2025	
Acta de suspension 01	29	07	2025	
Acta de reinicio 01	19	08	2025	

C. CRONOGRAMA AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN VS CRONOGRAMA DE OBRA

AVANCE DE EJECUCIÓN					
% DE TIEMPO TRANSCURRIDO	100%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADO	100%	% DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO	100%

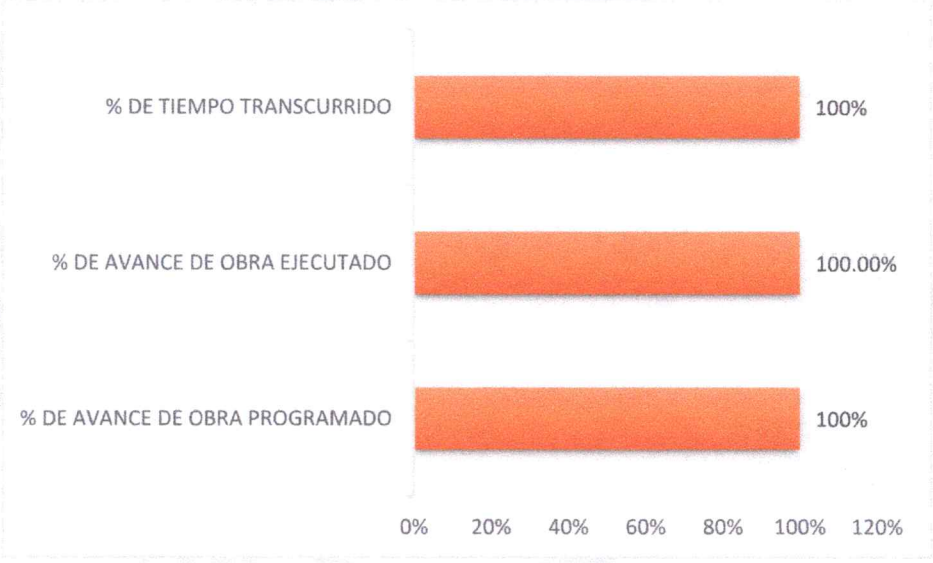

D. INFORMACION FINANCIERA DE OBRA

BALANCE DE PAGO		
ITEM	DETALLE	VALOR
1	Valor inicial	**$700.443.588,00**
2	Valor cobrado Parcial 01	**$630,218,680.00**

3	Valor ejecutado	**$700.443.588,00**
4	Saldo por ejecutar	**$0.00**
5	Valor a cobrar Acta Final	**$70,224,908.00**

E. POLIZAS DEL CONTRATO OBRA

PÓLIZAS CONTRATO (10/04/2025)

Aseguradora solidaria de Colombia

- Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal

POLIZAS No.	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ESTADO DE LAS PÓLIZAS
		DESDE	HASTA		
600-47-994000075704	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/04/2025	16/01/2026	$105.066.538,20	Aprobada
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	10/04/2025	16/07/2028	$105.066.538,20	Aprobada
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	10/04/2025	29/07/2025	$70.044.358,20	Aprobada

- Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento.

POLIZAS No.	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ESTADO DE LAS PÓLIZAS
		DESDE	HASTA		
600-74-994000012092	AMPARO BASICO PREDIOS LABORALES	10/04/2025	29/07/2025	$ 284,700,000.00	Aprobada
	PATRONAL	10/04/2025	29/07/2025	$ 284,700,000.00	Aprobada
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10/04/2025	29/07/2025	$ 284,700,000.00	Aprobada

	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10/04/2025	29/07/2025	$ 284,700,000.00	Aprobada

POLIZAS INICIO (30/04/2025)

Aseguradora solidaria de Colombia

- Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal

POLIZAS No.	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ESTADO DE LAS PÓLIZAS
		DESDE	HASTA		
600-47-994000075704	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/04/2025	30/01/2026	$105.066.538,20	Actualizado
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	10/04/2025	30/07/2028	$105.066.538,20	Actualizado
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	10/04/2025	29/07/2025	$70.044.358,20	Actualizado

- Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento.

POLIZAS No.	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ESTADO DE LAS PÓLIZAS
		DESDE	HASTA		
600-74-994000012092	AMPARO BASICO PREDIOS LABORALES	10/04/2025	29/07/2025	$ 284,700,000.00	Actualizado
	PATRONAL	10/04/2025	29/07/2025	$ 284,700,000.00	Actualizado
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10/04/2025	29/07/2025	$ 284,700,000.00	Actualizado
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10/04/2025	29/07/2025	$ 284,700,000.00	Actualizado

F. POLIZAS DEL CONTRATO INTERVENTORIA

POLIZAS CONTRATO (21/04/2025)

Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO

- Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal

POLIZAS No.	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ESTADO DE LAS PÓLIZAS
		DESDE	HASTA		
51-44-101029685	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21/04/2025	26/01/2026	$7.354.657,65	Actualizado
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	21/04/2025	26/07/2028	$7.354.657,65	Actualizado
	CALIDAD DEL SERVICIO	21/04/2025	21/07/2030	$9.806.210,20	Actualizado

- Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento.

POLIZAS No.	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ESTADO DE LAS PÓLIZAS
		DESDE	HASTA		
51-40-101010032	AMPARO BASICO PREDIOS LABORALES	21/04/2025	26/07/2025	$ 284,700,000.00	Actualizado

POLIZAS INICIO (30/04/2025)

Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO

- Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal

POLIZAS No.	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ESTADO DE LAS PÓLIZAS
		DESDE	HASTA		
51-44-101029685	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/04/2025	04/02/2026	$7.354.657,65	Actualizado
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	30/04/2025	04/08/2028	$7.354.657,65	Actualizado
	CALIDAD DEL SERVICIO	30/07/2025	30/07/2030	$9.806.210,20	Actualizado

- Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento.

POLIZAS No.	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ESTADO DE LAS PÓLIZAS
		DESDE	HASTA		
51-40-101010032	AMPARO BASICO PREDIOS LABORALES	30/04/2025	04/08/2025	$ 284,700,000.00	Actualizado

5. PERSONAL CONTRATO OBRA

ESPECIALIDAD	NOMBRE PROPUESTA	APROBACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS	OK

ESPECIALIDAD	NOMBRE PROPUESTA	APROBACIÓN
DIRECTOR DE OBRA	ERWIN MENDEZ BERMUDEZ	OK
RESIDENTE DE OBRA	EDWIN LEONARDO VARGAS TORRES	OK
ASESOR ELECTRICO	OLMER WILCHES GARCIA	OK
TECNICO ELECTRICISTA, INSPECTOR	LUIS IGNACIO ARENAS GARCIA	OK
PROFESIONAL SISO	DIEGO FERNANDO SALDAÑA	OK

5.1. PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

ESPECIALIDAD	NOMBRE PROPUESTA	APROBACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	GILBERTO CELY VARGAS	OK

ESPECIALIDAD	NOMBRE PROPUESTA	APROBACIÓN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	LEONARDO JOHNY PATIÑO QUIJANO	OK
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	OSCAR RENE FAJARDO RINCON	OK
ASESOR DE INTERVENTORIA	EDISON FABIAN VELANDIA RODRIGUEZ	OK
ASESOR SISO	BRIGGITTE KATHERINE FARFAN CORTES	OK

6. PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL OBRA

EQUIPO	Periodos trabajados	Salario base cotización (Salario propuesto)	40% Salario base	Salud (12,5 %)	Pensiòn (16%)	ARL (%)	JUL-25			
							SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	CCF
Erwin Mendez Bermudez Director de obra	De: 01/07/2025 28/07/2025	$ 1.423.500,00	$ 1.423.500,00	$ 1900,00	$ 7600.00	$ 3400.00	Planilla No.:		4617168428	
							OK	OK	OK	OK
Edwin Leonardo Vargas Torres Residente de obra	De: 01/07/2025 28/07/2025	$ 1.423.500,00	$ 1.423.500,00	$ 1900,00	$ 7600.00	$ 3400.00	Planilla No.:		4617168428	
							OK	OK	OK	OK
Olmer Wilches Garcia Asesor electrico	De: 01/07/2025 28/07/2025	$ 1.423.500,00	$ 1.423.500,00	$ 1900,00	$ 7600.00	$ 3400.00	Planilla No.:		4617168428	
							OK	OK	OK	OK
Luis Ignacio Arenas Garcia	De: 01/07/2025	$ 1.423.500,00	$ 1.423.500,00	$ 1900,00	$ 7600.00	$ 3400.00	Planilla No.:		4617168428	

Tecnico Electricista	28/07/2025						OK	OK	OK	OK
Diego Fernando Saldaña Sanchez	De: 01/07/2025	$ 1.423.500,00	$ 1.423.500,00	$ 1900,00	$ 7600.00	$ 3400.00	Planilla No.:		4617168428	
Asesor SISO	28/07/2025						OK	OK	OK	OK

7. CONCLUSIONES

- El proyecto consiste en la ampliación del sistema de alumbrado público con tecnología led en áreas rural y/o urbana del municipio de Samacá", con el fin de mejorar la calidad de vida de la comunidad, embellecer el casco rural del municipio a la vez permite el surgimiento del municipio como ente organizado, que busca el mejoramiento en general.

- El tiempo transcurrido desde la firma del acta de inicio equivale a 100% del tiempo programado para la ejecución de la obra.

- Las actividades ejecutadas a la fecha por el contratista de obra, corresponden a un 100%, este porcentaje se formula con las cantidades ejecutadas a la fecha sobre las cantidades de las actividades.

- El contratista de obra cumple con la adecuada herramienta, equipos y maquinaria los cuales se encuentran en optimo estado, verificados por la interventoría.

- El contratista de obra realizo las actividades con el personal operativo adecuado y capacitado para cada labor ejecutada, usando de manera correcta y permanente los elementos de protección personal (EPP).

- El contratista de obra trabajo en forma veraz y precisa con la interventoría llevando un control y seguimiento a cada actividad desarrollada, esto con el fin de realizar correcto proceso constructivo para cada actividad ejecutada.

- El material usado por el contratista de obra es de buena calidad y están

certificados por los proveedores.

- A las situaciones presentadas por las condiciones climáticas de lluvia se tomaron alternativas de solución para evitar los posibles daños a futuro.

- EL contratista de obra la empresa COMLINRED SAS, como la interventoría cuentan con las pólizas de seguro actualizadas según el estado del contrato a la fecha.

- EL contratista de obra la empresa COMLINRED SAS, como la interventoría cuentan con el pago de seguridad social y aporte a parafiscales.

- A la fecha de corte de este informe se presentan las certificaciones de RETIE y RETILAP.

GILBERTO CELY VARGAS
Rep. Legal BYD MULTIPROYECTOS SAS
Nit. No. 900.268.419-8

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MS-LP-002-2025

INFORME TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE OBRA PARA RECIBO FINAL



"AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS ÁREAS RURAL Y/O URBANA DEL MUNICIPIO SAMACÁ – BOYACÁ 2025"

CONTRATISTA

COMLINRED SAS

820.004.070-9

ENTIDAD CONTRATANTE

MUNICIPIO DE SAMACÁ

15 DE MAYO DE 2025 – 19 DE AGOSTO DE 2025

Cra 8 No. 58 - 75 Barrio Sta Rita Tunja – Tel: 7474300 – Cel: 3125938847 313 3922615 -Email: luisignacioarenas@com -Juancaarenas.92@hotmail.com

1. GENERALIDADES:

El Municipio de Samacá han hecho posible el desarrollo de proyectos que benefician a la comunidad del municipio; este se ha beneficiado con el proyecto en referencia. El proyecto a desarrollar se denomina. "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS ÁREAS RURAL Y/O URBANA DEL MUNICIPIO SAMACÁ – BOYACÁ 2025"."

Para el desarrollo de las actividades nombradas, constituye el punto de partida para la organización de proyectos tendientes a mejorar la calidad de vida de esta comunidad, a la vez permite el surgimiento del municipio como ente organizado, que busca el mejoramiento en general.

El proyecto consiste en "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS ÁREAS RURAL Y/O URBANA DEL MUNICIPIO SAMACÁ – BOYACÁ 2025".

Para garantizar el cumplimiento y la calidad de las obras del contrato de acuerdo a las especificaciones, el contratista realiza el siguiente informe, en este documento se describen todas las actividades realizadas por la firma COMLINRED S.A.S.

2. INFORMACIÓN GENERAL

2.1. LOCALIZACIÓN GENERAL

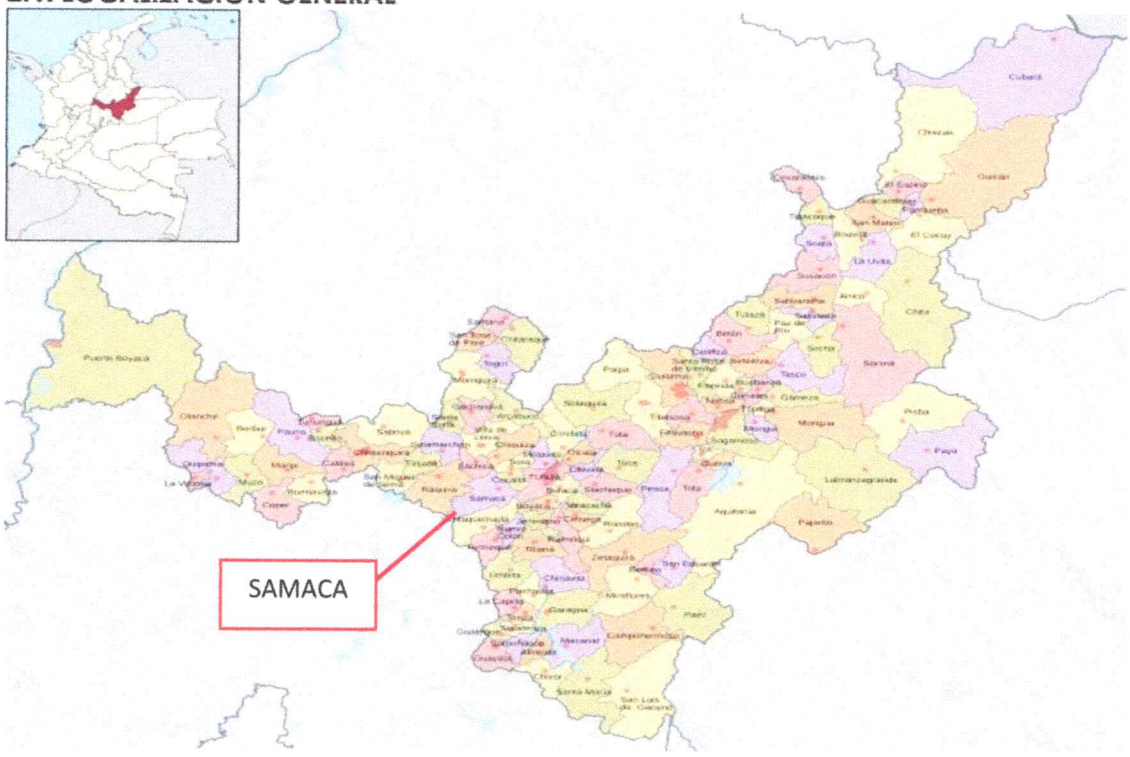


Ilustración 1. Ubicación General del municipio en el departamento

2.2 LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

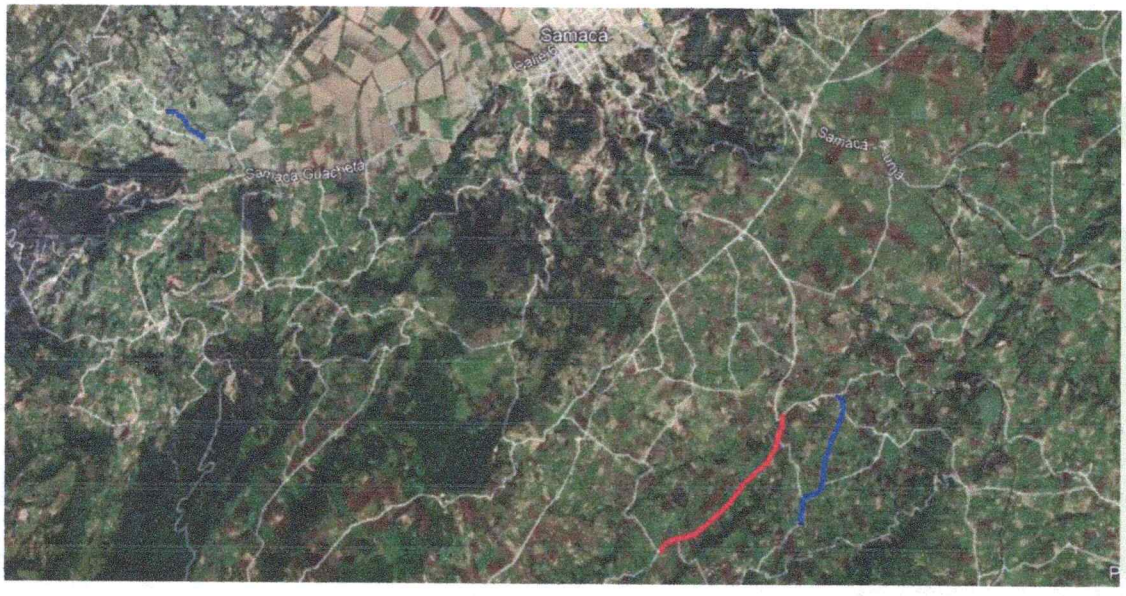


Ilustración 2. Ubicación especifica tramos a intervenir

2.3 FICHA TÉCNICA RESUMEN DEL CONTRATO OBRA

CONTRATO DE OBRA N.°:	MS-LP-002-2025
N.° DE PROCESO:	MS-LP-002-2025
OBJETO CONTRACTUAL:	"AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS ÁREAS RURAL Y/O URBANA DEL MUNICIPIO SAMACÁ – BOYACÁ 2025"
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	SETECIENTOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE. **($700.443.588,oo).**
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SAMACA
NIT:	800.016.757
ALCALDE MUNICIPAL:	WILSON CASTIBLANCO GIL
CONTRATISTA:	COMLINRED SAS
NIT:	820.004.070-9
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS C.C. 1.019.068.303 de Bogotá D.C.
INTERVENTORIA:	BYD MULTIPROYECTOS S.A.S.
NIT:	900.268.419-8
REPRESENTANTE LEGAL:	GILBERTO CELY VARGAS C.C. 1.052.020.418 DE FLORESTA
PLAZO:	TRES (03) MESES
FECHA DE INICIO:	TREINTA (30) DE ABRIL DE 2025
ACTA PARCIAL 1:	CATORCE (14) DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTINUEVE (29) DE JULIO DE 2025

3. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO DE OBRA

4.

4.1. CONDICIONES ORIGINALES

CONDICIONES ORIGINALES					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE 40 - 60 W - 4000K- PARA ALUMBRADO PUBLICO INCLUYE (BRAZO PARA LUMINARIA, CABLE, FOTOCELDAS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN)	UND	156.00	$ 1,082,556.00	$168,878,736.00
1,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE 8 M X 510 KG	UND	156.00	$ 995,504.00	$155,298,624.00

1,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TENDIDO DE RED TRENZADA PARA ALUMBRADO PUBLICO CABLE (TRIPLEX 2X35MM+35MM) (INCLUYE HERRAJES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE CONEXIÓN)	ML	4,650.00	$ 46,156.00	$214,625,400.00
	SUBTOTAL - COSTOS DIRECTOS				$ 538,802,760.00

4.2. SABANA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA (19/08/2025):

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALO TOTAL		ACUMULADO EJECUTADO	
1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE 40 - 60 W - 4000K- PARA ALUMBRADO PUBLICO INCLUYE (BRAZO PARA LUMINARIA, CABLE, FOTOCELDAS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN)	156.00	168,878,736.00	156.00	168,878,736.00
1,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE 8 M X 510 KG	156.00	155,298,624.00	156.00	155,298,624.00
1,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TENDIDO DE RED TRENZADA PARA ALUMBRADO PUBLICO CABLE (TRIPLEX 2X35MM+35MM) (INCLUYE HERRAJES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE CONEXIÓN)	4,650.00	214,625,400.00	4,650.00	214,625,400.00
	SUBTOTAL - COSTOS DIRECTOS		$538,802,760.00		$538,802,760.00

4.3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

I. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE 40 - 60 W - 4000K- PARA ALUMBRADO PUBLICO INCLUYE (BRAZO PARA LUMINARIA, CABLE, FOTOCELDAS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN)

UNIDAD:	UND
CANTIDAD EJECUTADA A LA FECHA:	156
CANTIDAD POR EJECUTAR	0

DESCRIPCIÓN: Los requisitos mínimos que debe llegar el "LUMINARIA 40W - 60 W DRIVER, IP 66, IK 08, 100.000H O MÁS TEMPERATURA DE COLOR DE 4000K INCLUYE (CONECTOR DE TORNILLO DE PERFORACIÓN DE CHAQUETA AISLADA Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN) 5 AÑOS O MÁS DE GARANTÍA con el fin de garantizar el funcionamiento correcto de los mismos. Todo el tiempo basado estrictamente a las normas y reglamentos técnicos vigentes RETIE y RETILAP.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

• Armada y alistamiento de luminaria con el brazo, sus respectivos accesorios, cable y herrajes, esta actividad se hace en el piso, esto con el fin de cerciorarse de la conexión luego se procede a subir al poste con el camión grúa de canasta.

• Instalación de la luminaria en el poste de concreto que va soportada por con 2 collarines y/o conectores para garantizar su anclaje al poste, además de esto se realiza la conexión del cable que alimentara a la luminaria con el cable que alimenta la red eléctrica y para esto usamos el conector.

• Luego procedemos a instalar la fotocelda en la parte superior de la luminaria, para comprobar su funcionamiento tapamos la celda de entrada de luz de la fotocelda y esto permitirá que se active y encienda la luminaria.

MANO DE OBRA:

- Profesional liniero
- Instalador

EQUIPOS

- Herramienta y equipo menor
- Grúa canasta hidráulica

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

- TRAMO 1 VEREDA GACAL SECTOR KIOSCO


UNIDADES INSTALADAS	69






- TRAMO 2 VEREDA GACAL SECTOR IGLESIA SAN ISIDRO

UNIDADES INSTALADAS	57

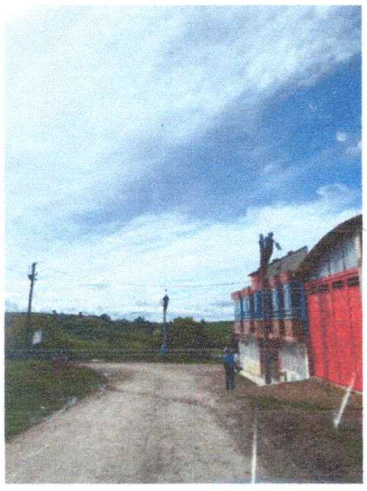

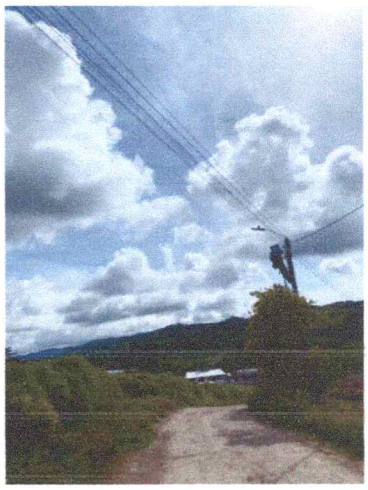

- TRAMO 3 VEREDA RUCHICAL SECTOR ESCUELA

UNIDADES INSTALADAS	30





II. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE 8 M X 510 KG

UNIDAD:	UND
CANTIDAD EJECUTADA A LA FECHA:	156
CANTIDAD POR EJECUTAR	0

DESCRIPCIÓN: Los requisitos mínimos que debe llegar el "SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE 8 M X 510 KG" con el fin de garantizar el funcionamiento correcto de los mismos. Todo el tiempo basado estrictamente a las normas y reglamentos técnicos vigentes RETIE y RETILAP.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

- Apertura de hueco en sitio según la normatividad vigente

- Plomada del poste, esta actividad se realiza girando el poste con la ayuda de una manila y una barra hasta obtener el ángulo adecuado, y se rellena el sobrante del hueco con material pétreo para fijarlo al suelo y evitar perder el ángulo.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

- TRAMO 1 VEREDA GACAL SECTOR KIOSCO

UNIDADES INSTALADAS	69







- TRAMO 2 VEREDA GACAL SECTOR IGLESIA SAN ISIDRO

UNIDADES INSTALADAS	57








- TRAMO 3 VEREDA RUCHICAL SECTOR ESCUELA

UNIDADES INSTALADAS	30







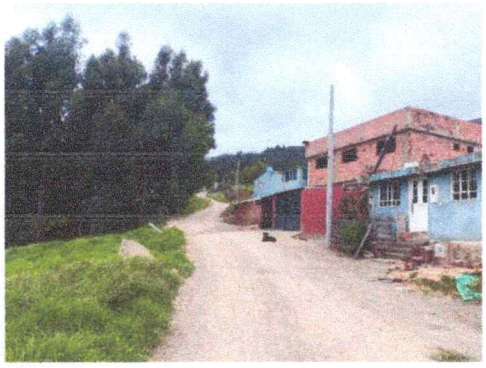

III. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TENDIDO DE RED TRENZADA PARA ALUMBRADO PUBLICO CABLE (TRIPLEX 2X35MM+35MM) (INCLUYE HERRAJES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE CONEXIÓN)

UNIDAD:	ML
CANTIDAD EJECUTADA A LA FECHA:	4650
CANTIDAD POR EJECUTAR	0

DESCRIPCIÓN: Los requisitos mínimos que debe llegar el "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TENDIDO DE RED TRENZADA PARA ALUMBRADO PUBLICO CABLE (TRIPLEX 2X35MM+35MM) (INCLUYE HERRAJES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE CONEXIÓN)" con el fin de garantizar el funcionamiento correcto de los mismos. Todo el tiempo basado estrictamente a las normas y reglamentos técnicos vigentes RETIE y RETILAP.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

- Una vez se encuentra fijado el poste de concreto se procede a la instalación de los herrajes en su parte superior, allí se instala la percha que va fijada con el perno y la arandela y se pone el aislador y el capuchón que permite separar el cable conductor del de la percha y el poste, esto con el fin de evitar daños a la red, además se coloca la grapa en la red que hace parte del proceso constructivo, esta actividad se repite en cada una de las estructuras.

MANO DE OBRA:

- Profesional liniero
- Instalador
- Ayudante
- Maestro

EQUIPOS

- Herramienta y equipo menor
- Grúa canasta hidráulica

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

- TRAMO 1 VEREDA GACAL SECTOR KIOSCO


METROS LINEALES INSTALADOS	2060 ml






- TRAMO 2 VEREDA GACAL SECTOR IGLESIA SAN ISIDRO

METROS LINEALES INSTALADOS	1590 ML

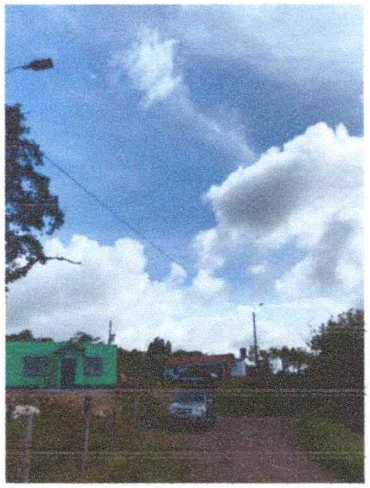

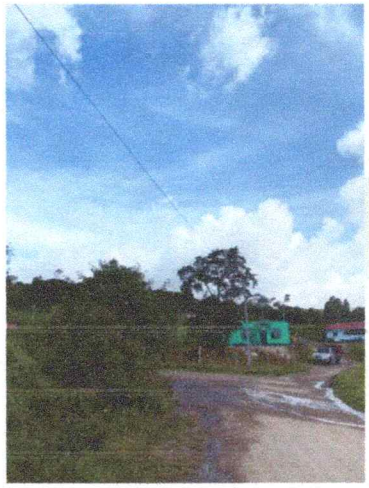

- TRAMO 3 VEREDA RUCHICAL SECTOR ESCUELA

METROS LINEALES INSTALADOS	1000 ML





5. RESUMEN ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO DE OBRA NO. MS-LP-002-2025

A. CUADRO DE RELACION DE LAS ACTAS GENERADAS


Contrato de obra No. MS-LP-002-2025:

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	día	mes	año	
Contrato de obra	10	04	2025	
Acta de inicio obra	30	04	2025	
Parcial 01	15	05	2025	
Acta de suspension 01	29	07	2025	
Acta de reinicio 01	19	08	2025	

B. CRONOGRAMA AVANCE:

EJECUCIÓN VS CRONOGRAMA DE OBRA

AVANCE DE EJECUCIÓN					
% DE TIEMPO TRANSCURRIDO	**100%**	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADO	**100%**	% DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO	**100%**

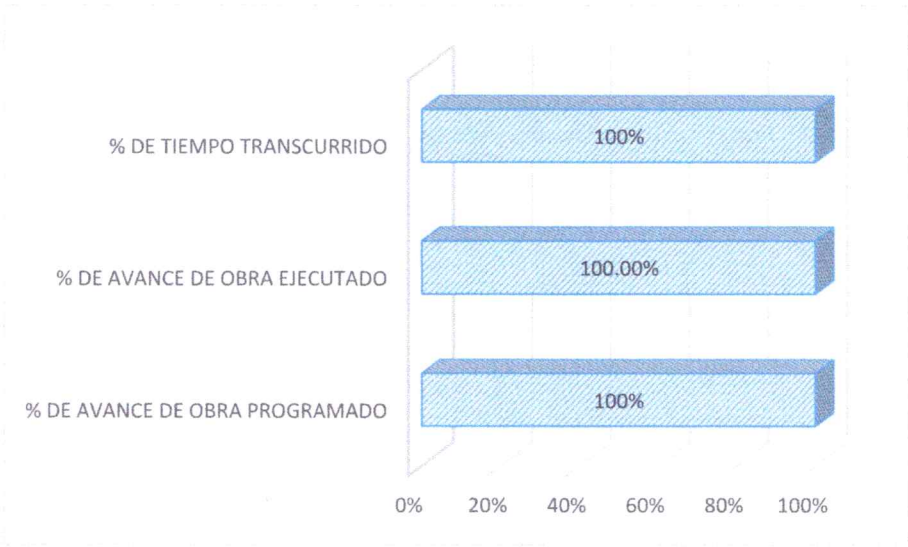

C. SEGUIMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA			VALOR
		día	mes	año	
ACTA PARCIAL 1	89.97%	15	05	2025	$630,218,680.00
ACTA FINAL	10.03%	19	08	2025	$70,224,908.00

BALANCE DE PAGO		
ITEM	DETALLE	VALOR
1	Valor inicial	**$700.443.588,00**
2	Valor cobrado	**$630,218,680.00**
3	Valor ejecutado	**$700.443.588,00**
4	Saldo por ejecutar	**$0.00**
5	Valor a cobrar en acta	**$70,224,908.00**

D. PÓLIZAS DEL CONTRATO

PÓLIZAS CONTRATO (10/04/2025)

Aseguradora solidaria de Colombia

- Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal

PÓLIZAS No.	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ESTADO DE LAS PÓLIZAS
		DESDE	HASTA		
600-47-994000075704	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/04/2025	16/01/2026	$105.066.538,20	Aprobada
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	10/04/2025	16/07/2028	$105.066.538,20	Aprobada
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	10/04/2025	29/07/2025	$70.044.358,20	Aprobada

- Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento.

POLIZAS No.	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ESTADO DE LAS PÓLIZAS
		DESDE	HASTA		
600-74-994000012092	AMPARO BASICO PREDIOS LABORALES	10/04/2025	29/07/2025	$ 284,700,000.00	Aprobada
	PATRONAL	10/04/2025	29/07/2025	$ 284,700,000.00	Aprobada
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10/04/2025	29/07/2025	$ 284,700,000.00	Aprobada
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10/04/2025	29/07/2025	$ 284,700,000.00	Aprobada

POLIZAS INICIO (30/04/2025)

Aseguradora solidaria de Colombia

- Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal

POLIZAS No.	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ESTADO DE LAS PÓLIZAS
		DESDE	HASTA		
600-47-994000075704	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/04/2025	30/01/2026	$105.066.538,20	Actualizado

	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	10/04/2025	30/07/2028	$105.066.538,20	Actualizado
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	10/04/2025	29/07/2025	$70.044.358,20	Actualizado

- Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento.

POLIZAS No.	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ESTADO DE LAS PÓLIZAS
		DESDE	HASTA		
600-74-994000012092	AMPARO BASICO PREDIOS LABORALES	10/04/2025	29/07/2025	$ 284,700,000.00	Actualizado
	PATRONAL	10/04/2025	29/07/2025	$ 284,700,000.00	Actualizado
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10/04/2025	29/07/2025	$ 284,700,000.00	Actualizado
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10/04/2025	29/07/2025	$ 284,700,000.00	Actualizado

6. CONCLUSIONES

- Todos los equipos utilizados fueron revisados para que funcionaran de forma correcta y el equipo utilizado cuenta con la certificación vigente.
- El personal que labora cuenta con la idoneidad, la capacidad, equipos, herramienta menor, y disponibilidad para llevar a cabo dichos trabajos.
- Durante la ejecución del contrato de obra se comunicó en forma veraz y precisa cada uno de los pasos a seguir en la obra.
- Los equipos suministrados y utilizados para la ejecución de la obra son de buena calidad.
- Durante la ejecución de la obra se lleva un control y seguimiento a cada actividad desarrollada.
- A las situaciones presentadas por las condiciones climáticas de lluvia se tomaron alternativas de solución para evitar los posibles daños a futuro.
- Las actividades realizadas por el contratista, se evidencia que el contrato se ha ejecutado en un 100% y cuenta con las certificaciones que garantizan la calidad de la obra.

Ing. JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS
Rep. Legal COMLINRED SAS
Nit. No. 820.004.070-9

EN ATENCIÓN A LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR LA INTERVENTORÍA, SEGÚN MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA, CLÁUSULAS CONTRACTUALES Y DEMÁS NORMAS APLICABLES EN ATENCIÓN A COMPETENCIAS LEGALES,

EL SUSCRITO INTERVENTOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. MS-CM-001-2025, cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS ÁREAS RURAL Y/O URBANA DEL MUNICIPIO SAMACÁ – BOYACÁ 2025"

CERTIFICA QUE:

Para la liquidación del contrato de obra No: **MS-LP-002-2025,** cuyo objeto es **"AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS ÁREAS RURAL Y/O URBANA DEL MUNICIPIO SAMACÁ – BOYACÁ 2025",** se certifica absoluto cumplimiento en cuanto a los requisitos de:

- Totalidad de aportes a Seguridad Social, Pensión, Riesgos Profesionales y demás aportes Parafiscales que apliquen según normatividad vigente, y durante el plazo de ejecución del contrato de obra, de: la firma Contratista, Profesionales y No Profesionales que hicieron parte de la obra, Mano de obra calificada y no calificada y demás involucrados en la ejecución del contrato de obra en términos del debido proceso.

- Existencia y totalidad de paz y salvos y demás que apliquen según normatividad vigente, de: Profesionales y No Profesionales que hicieron parte de la obra, Mano de obra calificada y no calificada, proveedores y demás involucrados en la ejecución del contrato de obra en términos del debido proceso.

- Existencia y legalidad de la totalidad de Actas de Vecindad, Actas de concertación, Actas de entrega y recibo a satisfacción y demás actas que apliquen con la comunidad según normatividad vigente, de todos los vecinos e involucrados en el área de influencia del proyecto.

- Cumplimiento absoluto de las obligaciones contractuales adquiridas por el contratista de obra, establecidas en las cláusulas DOS del contrato de obra **MS-LP-002-2025,** todo en términos del debido proceso.

Como constancia de lo anterior, se firma a los 25 días del mes de agosto del año 2025, como requisito para proceder con la liquidación de los contratos de obra e interventoría en mención.

Firma: _____

Interventor: BYD MULTIPROYECTOS SAS

RL: GILBERTO CELY VARGAS

NIT: 900.268.419-8

Sogamoso, 25 de agosto de 2025


Señores
DANILO ALEXANDER VIANCHÀ VALDERRAMA
Secretario de Planeación y Obras Públicas
Samacá- Boyacá

Referencia: **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MS-LP-002-2025** cuyo objeto es **"AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS ÁREAS RURAL Y/O URBANA DEL MUNICIPIO SAMACÁ – BOYACÁ 2025"**

Asunto: aval cumplimiento del objeto contractual

Estimados señores:

El suscrito GILBERTO CELY VARGAS, identificado con Cédula de Ciudadanía Número No. 1.052.020.348 de Floresta actuando como Representante legal de la empresa **BYD MULTIPROYECTOS S.A.S.** con Número de **Nit: 900.268.419 - 8** en calidad de Contratista de interventoría, **CERTIFICA** que la empresa **COMLINRED SAS** identificada con Número de **Nit: 820.004.070-9** en calidad de Contratista de obra ejecutó y cumplió a cabalidad con el objeto contractual del proceso.



GILBERTO CELY VARGAS
R/L BYD MULTIPROYECTOS LTDA
NIT: 900.268.419 -8

Sogamoso, 25 de agosto de 2025

Señores
DANILO ALEXANDER VIANCHÀ VALDERRAMA
Secretario de Planeación y Obras Públicas
Samacá- Boyacá

Referencia: **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MS-LP-002-2025** cuyo objeto es **"AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS ÁREAS RURAL Y/O URBANA DEL MUNICIPIO SAMACÁ – BOYACÁ 2025"**


Asunto: AVAL PROFESIONALES CONTRATISTA DE OBRA

Estimados señores:

El suscrito GILBERTO CELY VARGAS, identificado con Cédula de Ciudadanía Número No. 1.052.020.348 de Floresta actuando como Representante legal de la empresa **BYD MULTIPROYECTOS S.A.S.** con Número de **Nit: 900.268.419 - 8** en calidad de Contratista de interventoría, **CERTIFICA** que la empresa **COMLINRED SAS** identificada con Número de **Nit: 820.004.070-9** en calidad de Contratista de obra se encuentra a paz y salvo por todo concepto con los profesionales relacionados a continuación

ESPECIALIDAD	NOMBRE PROPUESTA	APROBACIÓN
DIRECTOR DE OBRA	ERWIN MENDEZ BERMUDEZ	OK
RESIDENTE DE OBRA	EDWIN LEONARDO VARGAS TORRES	OK
ASESOR ELECTRICO	OLMER WILCHES GARCIA	OK
TECNICO ELECTRICISTA, INSPECTOR	LUIS IGNACIO ARENAS GARCIA	OK
PROFESIONAL SISO	DIEGO FERNANDO SALDAÑA	OK

Cordialmente



GILBERTO CELY VARGAS
R/L BYD MULTIPROYECTOS LTDA
NIT: 900.268.419 -8

Sogamoso, 25 de agosto de 2025

Señores
DANILO ALEXANDER VIANCHÀ VALDERRAMA
Secretario de Planeación y Obras Públicas
Samacá- Boyacá

Referencia: **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MS-LP-002-2025** cuyo objeto es **"AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS ÁREAS RURAL Y/O URBANA DEL MUNICIPIO SAMACÁ – BOYACÁ 2025"**

Asunto: AVAL PROFESIONALES CONTRATISTA DE OBRA

Estimados señores:

El suscrito GILBERTO CELY VARGAS, identificado con Cédula de Ciudadanía Número No. 1.052.020.348 de Floresta actuando como Representante legal de la empresa **BYD MULTIPROYECTOS S.A.S.** con Número de **Nit: 900.268.419 - 8** en calidad de Contratista de interventoría, **CERTIFICA** que la empresa **COMLINRED SAS** identificada con Número de **Nit: 820.004.070-9** en calidad de Contratista de obra se encuentra a paz y salvo por todo concepto con la mano de obra no calificada relacionados a continuación

ESPECIALIDAD	NOMBRE PROPUESTA	APROBACIÓN
AUXILIAR ELECTRICO	NESTOR SOSSA SOSSA	OK
AUXILIAR ELECTRICO	JOSE AURELIO RIVERA	OK

Cordialmente

GILBERTO CELY VARGAS
R/L BYD MULTIPROYECTOS LTDA
NIT: 900.268.419 -8

Sogamoso, 25 de agosto de 2025

Señores
DANILO ALEXANDER VIANCHÀ VALDERRAMA
Secretario de Planeación y Obras Públicas
Samacá- Boyacá

Referencia: **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MS-LP-002-2025** cuyo objeto es **"AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS ÁREAS RURAL Y/O URBANA DEL MUNICIPIO SAMACÁ – BOYACÁ 2025"**

Asunto: AVAL PROVEEDORES CONTRATISTA DE OBRA

Estimados señores:

El suscrito GILBERTO CELY VARGAS, identificado con Cédula de Ciudadanía Número No. 1.052.020.348 de Floresta actuando como Representante legal de la empresa **BYD MULTIPROYECTOS S.A.S.** con Número de **Nit: 900.268.419 - 8** en calidad de Contratista de interventoría, **CERTIFICA** que la empresa **COMLINRED SAS** identificada con Número de **Nit: 820.004.070-9** en calidad de Contratista de obra se encuentra a paz y salvo por todo concepto con los proveedores relacionados a continuación

PROVEEDORES	APROBACIÓN
ELECTRICO H.R. SAS	OK
ELECTRICOS Y POSTERIA HMG	OK
GRUPO DEFA SAS	OK

Cordialmente

GILBERTO CELY VARGAS
R/L BYD MULTIPROYECTOS LTDA
NIT: 900.268.419 -8

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA:

Que el constructor con razón social COMLINRED S.A.S. identificado con el NIT 820004070, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

N° Licencia/Contrato	Nombre Obra	Ciudad Ejecución	Valor Pago	Periodo	Fecha	Ticket
MS-LP-002-2025	AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO	SAMACA	1,751,150	2025-08	22-AGO-2025	138815029
		Total	1,751,150			

Expedido por el SENA, a los veinticinco (25) dias del mes de Agosto de 2025

"LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC."

NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS

Este documento no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2025-08-25

Generado por : Sandra Milena Estepa Fonseca

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor ingrese a la página web enlace CONSULTAR
CODIGO CERTIFICADO y digite:

el código de verificación: 46085574 y el Número de Certificado: 416250

@SENAComunica
www.sena.edu.co

comfaboy
unidos para crecer

EL SUSCRITO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO DE LA
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY
NIT 891800213 - 8
C E R T I F I C A

1. Que los aportes recibidos por la Caja de Compensación Familiar de Boyacá - COMFABOY, se originaron de una relación laboral, por tanto, todo pago de aportes parafiscales que aquí se certifican, se tomaron únicamente de la autoliquidación que efectuó la empresa aportante a través de Planilla PILA.

2. Que los aportes recibidos correspondieron a la autoliquidación de la empresa aportante, quien es la que relaciona trabajadores en la planilla PILA de acuerdo al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 la entidad contratante es quien tiene la obligación de validar y certificar que todos los trabajadores vinculados en la ejecución de la obra debieron estar afiliados a la seguridad social y pago de parafiscales.

3. Que la Caja de compensación al no poder establecer que todos los trabajadores que ejecutaron el contrato están relacionados en esta autoliquidación, se reserva el derecho a realizar las auditorias que correspondan, tanto a la entidad contratante como al contratista sobre los pagos que se debieron cancelar a la seguridad social y parafiscales.


4. Que esta certificación expedida por COMFABOY no tiene efectos de paz y salvo sobre los valores que debería cancelar el contratista respecto de la ejecución del contrato, ni tiene efectos para la afiliación a otra Caja de Compensación Familiar.

5. Que los pagos de aportes mensuales efectuados por la empresa COMLINRED LTDA con nit 820004070 en la vigencia solicitada, se relacionan a continuación:

Fecha	Planilla	# Trab	Val Tot Consig	Mes Pago	Valor 4% Pagado	Valor Nomina	Valor Nomina Con Subs. Transp. paplceap
28/03/2025	824597111510	1	57,000	202501	57,000	$1,423,500	$1,423,500
28/03/2025	824597114080	3	127,300	202502	127,300	$3,179,150	$3,179,150
12/05/2025	824603882969	3	171,000	202503	171,000	$4,270,500	$4,270,500
15/05/2025	824604397509	5	9,500	202504	9,500	$237,250	$237,250
30/05/2025	824606378188	3	171,000	202504	171,000	$4,270,500	$4,270,500
18/06/2025	824607874510	4	174,800	202505	174,800	$4,365,400	$4,365,400
15/08/2025	824617173758	5	222,300	202505	222,300	$5,551,650	$5,551,650
11/08/2025	824615838426	3	171,000	202506	171,000	$4,270,500	$4,270,500
15/08/2025	824617173871	5	222,300	202506	222,300	$5,551,650	$5,551,650
15/08/2025	824617168428	5	210,900	202507	210,900	$5,266,950	$5,266,950
TOTALES:			$1,537,100		$1,537,100	$38,387,050	$38,387,050

FECHA DE EXPEDICION: 21/08/2025

Cordialmente;



LUIS VICENTE AVENDANO ALBA
JEFE DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO

VALIDO: LUIS ARIEL RODRIGUEZ - subapo15

DPTO. APORTES Y SUBSIDIO

F - 12 - 276 | Versión 2 | 13/09/2018
Certificación de aportes 2025 Afil.:17433 NIT: 820004070

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
6003816383

PÓLIZA No: 600 - 47 - 994000075704 ANEXO: 2

AGENCIA EXPEDIDORA: **TUNJA** COD. AGENCIA: 600 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
21	08	2025	21	08	2025

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **COMLINRED S.A.S.** IDENTIFICACIÓN: NIT **820.004.070-9**

DIRECCIÓN: CR 8 A 58 75 BRR SANTA RITA CIUDAD: TUNJA, BOYACÁ TELÉFONO: 3133922615

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **MUNICIPIO DE SAMACA** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.016.757-9**

BENEFICIARIO: **MUNICIPIO DE SAMACA** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.016.757-9**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	30/04/2025	22/02/2026	105,066,538.20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	30/04/2025	22/08/2028	105,066,538.20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	70,044,358.80

BENEFICIARIOS
NIT 800016757 - MUNICIPIO DE SAMACA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS, SEGUN:

* ACTA DE SUSPENSION N.01 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2025
* ACTA DE REINICIO N.01 DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2025
* ACTA DE RECIBO FINAL DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2025.

VIGENCIA ESTABILIDAD DE OBRA SEGUN ACTA DE RECIBO FINAL DE FECHA 20/08/2025:
VIGENCIA DESDE: 20/08/2025 VIGENCIA HASTA:20/08/2030

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO NO. MS-LP-002-2025 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS ÁREAS RURAL Y/O URBANA DEL MUNICIPIO SAMACÁ-BOYACÁ 2025.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***280,177,435.20	$ **********9,499	$*****6,000.00	$ ********2,945	$ **********18,444

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
CLARA MARTINEZ AGENCIA DE SEGUROS LT	10834	100.00			

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS"

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000600381638

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

C8D8207B0707FA7C5C

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Juan Sebastián Portilla Portilla - Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: José Guillermo Peña González
Dirección: Av 19 # 114 – 09 oficina 502 Bogotá – Teléfonos: (601) 213 13 70 – 213 13 22 - Celular: 321 924 04 79 – 323 232 29 34 - Correo electrónico: contacto@pgabogados.com
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2025/DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-2025F.pdf

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601. ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Compañía de Seguros

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: TUNJA COD. AGENCIA: 600 RAMO: 47 No PÓLIZA: **994000075704** ANEXO: 2

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **COMLINRED S.A.S.** IDENTIFICACIÓN: NIT **820.004.070-9**

ASEGURADO: **MUNICIPIO DE SAMACA** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.016.757-9**

BENEFICIARIO: **MUNICIPIO DE SAMACA** IDENTIFICACIÓN: NIT **800.016.757-9**

TEXTO ITEM 1

*** NOTA ACLARATORIA ***
EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

EL AMPARO MENCIONADO EN LA CARATULA DE LA PÓLIZA COMO "PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND." HACE REFERENCIA A "PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, E INDEMNIZACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO LABORAL".

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO NO. MS-LP-002-2025 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS ÁREAS RURAL Y/O URBANA DEL MUNICIPIO SAMACÁ-BOYACÁ 2025.

*** NOTA ACLARATORIA ***
EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

EL AMPARO MENCIONADO EN LA CARATULA DE LA PÓLIZA COMO "PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND." HACE REFERENCIA A "PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, E INDEMNIZACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO LABORAL".

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Sobre la Decimocuarta Mejor Empresa para Trabajar en Colombia — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar COLOMBIA 2024

Sobre la novena mejor Empresa para Trabajar en América Latina — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar AMERICA LATINA 2025

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
6003816391

PÓLIZA No: 600 -74 - 994000012092 ANEXO:2

AGENCIA EXPEDIDORA: **TUNJA** COD. AGE: 600 RAMO: 74 PAP:

	DIA	MES	AÑO	HORAS		DIA	MES	AÑO	HORAS		DIA	MES	AÑO
FECHA DE EXPEDICIÓN	21	08	2025		VIGENCIA DE LA PÓLIZA	29	07	2025	23:59		20	08	2025	23:59	22	21	08	2025
					VIGENCIA DESDE				A LAS	VIGENCIA HASTA				A LAS	DIAS	FECHA DE IMPRESIÓN		

MODALIDAD FACTURACIÓN: **ANUAL** TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO PRORROGA

	DIA	MES	AÑO	HORAS		DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS
VIGENCIA DEL ANEXO	29	07	2025	23:59		20	08	2025	23:59	22
	VIGENCIA DESDE			A LAS		VIGENCIA HASTA			A LAS	

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: **COMLINRED S.A.S.** IDENTIFICACIÓN: NIT **820.004.070-9**

DIRECCIÓN: CR 8 A 58 75 BRR SANTA RITA CIUDAD: TUNJA, BOYACÁ TELÉFONO: 3133922615

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **COMLINRED S.A.S.** IDENTIFICACIÓN: NIT **820.004.070-9**

DIRECCIÓN: CR 8 A 58 75 BRR SANTA RITA CIUDAD: **TUNJA, BOYACÁ** TELÉFONO: 3133922615

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: COMLINRED S.A.S. NIT : 820004070

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: BOYACÁ CIUDAD: TUNJA

DIRECCION: CARRERA 8A No. 58-75

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: COMERCIAL MANZANA: 58-8A

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 284,700,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	284,700,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS, SEGUN:

* ACTA DE SUSPENSION N.01 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2025
* ACTA DE REINICIO N.01 DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2025
* ACTA DE RECIBO FINAL DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2025.

SE ACLARA QUE LA VIGENCIA DE LA POLIZA ES: VIGENCIA DESDE:30-04-2025 VIGENCIA HASTA:20-08-2025.

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO # MS-LP-002-2025 REFERENTE A AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS ÁREAS RURAL Y/O URBANA DEL MUNICIPIO SAMACÁ-BOYACÁ 2025

SISTEMA BASE DE COBERTURA: OCURRENCIA

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***284,700,000.00	$ **********34,320	$*********0.00	$ ********6,521	$ **********40,841

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
CLARA MARTINEZ AGENCIA DE SEGUROS LT	10834	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000600381639

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

MBOLIVAR 0

C8D8207B0707FA7C5A CLIENTE

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Juan Sebastián Portilla Portilla - **Defensor del Consumidor Financiero – Suplente:** José Guillermo Peña González
Dirección: Av 19 # 114 – 09 oficina 502 Bogotá – **Teléfonos:** (601) 213 13 70 – 213 13 22 - **Celular:** 321 924 04 79 – 323 232 29 34 - **Correo electrónico:** contacto@pgabogados.com
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m **Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:**
https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2025/DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-2025F.pdf

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: TUNJA COD. AGENCIA: 600 RAMO: 74 No PÓLIZA: **994000012092** ANEXO: 2

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **COMLINRED S.A.S.** IDENTIFICACIÓN: NIT **820.004.070-9**

ASEGURADO: **COMLINRED S.A.S.** IDENTIFICACIÓN: NIT **820.004.070-9**

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

TEXTO ITEM 1

LA PRESENTE POLIZA EXCLUYE, ADEMÁS DE LAS EXCLUSIONES INDICADAS EN LAS CONDICIONES GENERALES DEL SEGURO, LAS SIGUIENTES COBERTURAS:
- TODA RC CONTRACTUAL
- RC PROFESIONAL MÉDICA
- RC PROFESIONAL CLINICAS Y HOSPITALES
- RC PRODUCTOS CUALQUIER OTRO TIPO DE RC PROFESIONAL

CLIENTE

LISTADO DE ASEGURADOS

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000012092 ANEXO: 2 TIPO DE MOVIMIENTO: 0 PAGINA: 3

TOMADOR: COMLINRED S.A.S. IDENTIFICACION: 820.004.070-9

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	COMLINRED S.A.S.	820004070-9	CARRERA 8A No. 58-75	TUNJA	284,700,000.00	34,320	40,841

PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
34,320	40,841

DETALLE DE LA GARANTÍA

Aprobado por ALCALDIA DE SAMACA 26-05-2026 10:52

(•) Aprobar ( ) Rechazar

Id de la garantía CO1.WRT.17744793

Referencia de la garantía POLIZAS ACTA DE RECIBO

Estado Aprobada

Justificación
- [x] Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- [x] Cumplimiento - Pago de salarios
- [x] Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra
- [x] Responsabilidad civil extra contractual

Tipo de garantía
- (•) Contrato de seguro
- ( ) Patrimonio autónomo
- ( ) Garantía bancaria

Entidad aseguradora ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Número de póliza 600-74-994000012092

Tomador COMLINRED S.A.S.

Beneficiario MUNICIPIO DE SAMACA

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	105,066,538.20 COP	2/22/2026 12:00:00 AM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Pago de salarios	105,066,538.20 COP	8/22/2026 12:00:00 AM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Estabilidad y calidad de	70,044,358.80 COP	8/20/2030 12:00:00 AM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

SM SERVIMETERS

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17020:2012
10-OIN-059

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL RETIE

A. IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN

Lugar y fecha de expedición:	Bogotá D.C., 04 de agosto de 2025	**Dictamen No.**	SM-867809
Nombre Organismo de inspección:	Servimeters S.A.S.		
Nit. Organismo de inspección:	830117370-5	Resolución de Acreditación:	10-OIN-059 del 19 de Septiembre de 2016
Dirección domicilio:	Cr 20C # 74 A - 10, Bogotá D.C.	Teléfono:	7420887 / 2100833

B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN

Localización	Municipio	SAMACA - BOYACÁ	Dirección	Vereda Ruchical y Paramo Centro				Barrio o Sector	Vereda Ruchical y Paramo Centro
Tipo de servicio:	Público:	■	Residencial:	☐	Comercial:	☐	Industrial: ☐	Especial-Tipo:	
Cap. instalada [kVA ó kW]:	9,6 kW	Tensión [kV]:	0.208 / 0.120	Fases:	1	2	3	Año de terminación:	2025

C. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACIÓN

Diseñador:	FREDY ROBLES CELY	Mat. Prof. No.	BY25036108
Interventor (si lo hay):	N.A.	Mat. Prof. No.	N.A.
Responsable de la construcción:	LUIS IGNACIO ARENAS GARCIA	Mat. Prof. No.	9641

D. ASPECTOS EVALUADOS

ÍTEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR	APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Diseño Eléctrico	Planos, Diagramas y Esquemas *	Si	X	
2		Análisis de Riesgo de Origen Eléctrico *	Si	X	
3		Especificaciones Técnicas - Memorias de Cálculo *	Si	X	
4		Matrículas Profesionales de personas calificadas	Si	X	
5	Campos	Valores de campos electromagnéticos	No		
6	Distancias	Distancias de seguridad	Si	X	
7	Iluminación	Iluminación que requiere dictamen de RETILAP	Si		
8	Protecciones	Accesibilidad a todos los dispositivos de protección*	Si	X	
9		Funcionamiento del corte automático de alimentación*	Si	X	
10		Selección de conductores*	Si	X	
11		Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes*	Si	X	
12		Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones	No		
13	Protección contra rayos	Evaluación del nivel de riesgo*	Si	X	
14		Implementación de la protección	Si	X	
15	Sistema de puesta a tierra	Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales*	Si	X	
16		Corrientes en el sistema de puesta a tierra*	Si	X	
17		Resistencia de puesta a tierra*	Si	X	
18	Señalización	Identificación de Tableros y Circuitos*	Si	X	
19		Identificación de canalizaciones*	Si	X	
20		Identificación de conductores de fase, neutro y tierra*	Si	X	
21		Diagramas, Esquemas, Avisos y Señales	Si	X	
22	Documentación final	Memoria del Proyecto	Si	X	
23		Plano(s) de lo construido	Si	X	
24		Certificaciones de productos*	Si	X	
25	Otros	Bomba contra incendios	No		
26		Compatibilidad térmica de equipos y materiales	Si	X	
27		Ejecución de las conexiones*	Si	X	
28		Ensayos funcionales*	Si	X	
29		Materiales acordes con las condiciones ambientales*	Si	X	
30		Protección contra arcos internos	No		
31		Protección contra electrocución por contacto directo*	Si	X	
32		Protección contra electrocución por contacto indirecto*	Si	X	
33		Resistencia de aislamiento*	Si	X	
34		Sistemas de emergencia	No		
35		Sujeción mecánica de elementos de la instalación	Si	X	
36		Ventilación de equipos	No		

Nota: * Ítems a verificar en instalaciones de vivienda y pequeños comercios

E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES

Esta inspección comprendió la revisión de una instalación NUEVA de Uso Final localizada en la dirección: Vereda Ruchical y Paramo Centro del Municipio de SAMACA - BOYACÁ, alimentadores desde nodos de conexión en baja tension redes EBSA ESP (segun memorias de calculo y planos) para mejoramiento de alumbrado público vereda Ruchical y Paramo Centro en longitud de 4,718 kM, en conductores XLPE - AAAC No 2x35 + 1x35 mm, con un total de 160 luminarias LED de 60 W LED Street ZD229 60W nuevas implementadas en estructuras de concreto de 8 metros.Se confirma cumplimiento de medidas de resistencia de puesta a tierra e estructuras acorde a lo establecido en RETIE Articulo 15. Esta inspección se realizó el día 24 de junio de 2025. Esta inspección se hizo bajo la Resolución 90708 de agosto 30 de 2013 (RETIE 2013). La vigencia de este dictamen segun articulo 34.6 para instalaciones basicas es de 10 años contados a partir de la fecha de emisión de este dictamen. Cualquier modificación posterior a la fecha de la inspección será responsabilidad del propietario y deberá ejecutarse de acuerdo al RETIE. El propietario de la instalación es MUNICIPIO DE SAMACA - BOYACÁ con NIT o 800016757-9.

F. RELACIÓN DE ANEXOS

Se anexa en proceso de inspección formato de declaración RETIE No 001 firmado y en original por parte del responsable de la construcción de las instalaciones objeto de la inspección.

G. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

RESULTADO: APROBADA ■ NO APROBADA ☐

Nombredirector técnico Organismo de inspección:	Randy Sergey Rojas Vanegas	Firma y sello:	
Mat. Prof.	CN20548102		
Nombre y Apellidos del Inspector:	José Leonardo Guerrero Cortés	Firma:	
Mat. Prof.	BY25038306		

www.servimeters.com
Para comprobar su validéz, comuníquese con nosotros
Bogotá Cra 20C No. 74A-10 · Barrio San Felipe
PBX. (57) (601) 210 0833 · Cel. (57) 320 888 2407
Compruebe su validez escaneando el código QR.

SM SERVIMETERS

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17020:2012
10-OIN-059

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE ILUMINACIÓN EXTERIOR O ALUMBRADO PÚBLICO SEGÚN RETILAP

Lugar y fecha: Bogotá D.C., 14 de agosto de 2025 | Organismo de inspección: Servimeters S.A.S. | Dictamen No.: SM-869131

Nombre o razón social del propietario de la instalación:	ALCALDIA MUNICIPIO DE SAMACA NIT 800016757-9				
Nombre del proyecto	AMPLIACION ALUMBRADO PÚBLICO VEREDA RUCHICAL Y PARAMO CENTRO MUNICIPIO DE SAMACA				
Dirección de la instalación:	VEREDA PARAMO CENTRO MUNICIPIO DE SAMACA - BOYACÁ				
Tipo de instalación:	Pública ■	Privada ☐		Total de luminarias	160
Red de alimentación:	Circuito exclusivo ☐	Uso general ■	Con sistema de medida de energía:	Si ☐	No ■
Objeto de la instalación:	Parque ☐	Vías ■	Longitud total: 4.718 km	Área total:	
Capacidad instalada (kVA):	10,66	Tensiones (V): 208 / 120		Año terminación construcción	2025
Diseño:	FREDY ROBLES CELY			Mat. Profesional	BY25036108
Interventoría (si la hay):	N.A.			Mat. Profesional	N.A.
Responsable de la construcción:	LUIS IGNACIO ARENAS GARCIA			Mat. Profesional	9641

ITEM	ASPECTO A EVALUAR		APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Memorias de cálculo		SI	X	
2	Determinación de clases de iluminación		SI	X	
3	Selección de las fuentes luminosas (IRC, vida útil) y compatibilidad con luminarias y ambiente de		SI	X	
4	Información fotométrica de las luminarias utilizadas certificada (Matriz de intensidades, curvas o		SI	X	
5	Validación del software de diseño		SI	X	
6	Cálculo manual (alcance, parámetros incluidos y supuestos realizados)		SI	X	
7	Cumplimiento de los parámetros de diseño establecidos en el RETILAP		SI	X	
8	Resultados del diseño	Factor de uniformidad longitudinal UL	SI	X	
		Relación de alrededores (SR)	SI	X	
		Iluminancia promedio mínima mantenida (luxes)	SI	X	
		Coeficiente de uniformidad de iluminancias	SI	X	
		Iluminancia horizontal promedio (luxes)	SI	X	
		Luminancia promedio (cd/m2)	SI	X	
		Factor de uniformidad general (Uo)	SI	X	
		Incremento del umbral TI (%)	SI	X	
9	Determinación del factor de mantenimiento de las instalaciones de alumbrado		SI	X	
10	Esquema de mantenimiento disponible al operador o propietario		SI	X	
11	Planos del proyecto de alumbrado aprobados por responsable de la prestación del servicio de alumbrado		SI	X	
12	Accesibilidad a todos los dispositivos de control de luminarias		NO		
13	Mediciones fotométricas del sistema de alumbrado (a las 100 horas de funcionamiento)	Coeficiente de uniformidad de iluminancias	SI	X	
		Iluminancia promedio (luxes)	SI	X	
14	Control de iluminación de exteriores (incluye avisos)		NO		
15	Cumplimiento de los valores ofrecidos en el diseño		SI	X	
16	Cumplimiento de valores de densidad de potencia de la instalación (DPEA)		SI	X	
17	Sistema de control automático (fotocontroles) de alumbrado público (Ensayos funcionales)		SI	X	
18	Puesta a tierra de carcasas de luminarias		SI	X	
19	Revisión de certificados de conformidad de productos de iluminación		SI	X	
20	Certificación de instalaciones eléctricas con RETIE		SI	X	

Nota: Todos los proyectos de alumbrado público Nivel C deben cumplir con todos los trámites y el procedimiento establecido en el Capítulo 6 del RETILAP, sin perjuicio del alcance que se establezca por los municipios para otras categorías de proyectos de alumbrado público

OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES (si las hay) e identificación de anexos.

Esta inspección comprendió la revisión de la iluminación AMPLIACION de alumbrado publico sectores vereda Ruchical y Paramo centro del municipio de Samaca - Boyacá. Dictamen RETIE de la instalación numero SM-867809 de Organismo SERVIMETERS S.A.S. Se efectuaron mediciones de comprobación en campo de los valores arrojados en el software de diseño encontrandose a conformidad con lo establecido en RETILAP para iluminacion implementada en vias secundarias segun planos record anexos a proceso. La inspección se realizó el 24 de junio de 2025. Se anexa a este dictamen formato de declaración del constructor y de diseñador del sistema de iluminación. Cualquier modificación posterior a la fecha de la inspección será responsabilidad del propietario y deberá ejecutarse de acuerdo al RETILAP.

RESULTADO DE CONFORMIDAD: APROBADA ■ NO APROBADA ☐

Responsables de dictamen:

Nombre organismo de inspección	Servimeters S.A.S.	Resolución de acreditación	10-OIN-059 del 19 de Septiembre de 2016
Dirección domicilio	CR 20C # 74A - 10, Bogotá D.C.	Teléfono	7420887 / 2100833
Director Técnico Organismo de Inspección:	Randy Sergey Rojas Vanegas	Inspector:	José Leonardo Guerrero Cortés
Matrícula profesional:	CN20548102	Matrícula profesional:	BY25038306

Director Técnico Organismo de Inspección

Inspector

www.servimeters.com
Para comprobar su validéz, comuníquese con nosotros
Bogotá Cra 20C No. 74A-10 · Barrio San Felipe
PBX. (57) (601) 210 0833 · Cel. (57) 320 888 2407
Compruebe su validez escaneando el código QR.

Tunja, 20 de agosto de 2025

Referencia: **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MS-LP-002-2025** cuyo objeto es **"AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS ÁREAS RURAL Y/O URBANA DEL MUNICIPIO SAMACÁ – BOYACÁ 2025"**

CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO

El suscrito JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS, identificado con Cédula de Ciudadanía Número No. 1.019.068.303 de Bogotá D.C. y además siendo el Representante legal de la empresa **COMLINRED S.A.S.** con Número de **Nit: 820.004.070-9** en calidad de Contratista, **CERTIFICA** que la empresa se encuentra a **PAZ Y SALVO** a la fecha por todo concepto en actividades de **DIRECTOR DE OBRA** y actividades propias del contrato correspondiente a **EL PAGO** según la **CLÁUSULA TERCERA** del contrato de prestación de servicios del día treinta (30) de abril del año 2025 entre la empresa **COMLINRED S.A.S.** y el ingeniero **ERWIN MENDEZ BERMUDEZ**

CONTRATANTE:

Ing. JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS
Rep. Legal COMLINRED SAS
Nit. No. 820.004.070-9

CONTRATISTA:

ERWIN MENDEZ BERMUDEZ
DIRECTOR DE OBRA
INGENIERO ELECTRICISTA
M.P. No. CN205-31223

NOTA: *La empresa* ***COMLINRED S.A.S.*** *no se hace responsable de cobros de establecimientos comerciales por parte de sus propietarios ya que no tenemos vínculo con ellos. Es responsabilidad del trabajador estar a paz y salvo llegado el caso con los establecimientos comerciales del municipio.*

Cra 8 No. 58 - 75 Barrio Sta Rita Tunja – Tel: 7474300 – Cel: 3125938847 313 3922615 -Email: luisignacioarenas@com -Juancaarenas.92@hotmail.com

Tunja, 20 de agosto de 2025

Referencia: **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MS-LP-002-2025** cuyo objeto es **"AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS ÁREAS RURAL Y/O URBANA DEL MUNICIPIO SAMACÁ – BOYACÁ 2025"**

CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO

El suscrito JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS, identificado con Cédula de Ciudadanía Número No. 1.019.068.303 de Bogotá D.C. y además siendo el Representante legal de la empresa **COMLINRED S.A.S.** con Número de **Nit: 820.004.070-9** en calidad de Contratista, **CERTIFICA** que la empresa se encuentra a **PAZ Y SALVO** a la fecha por todo concepto en actividades de **PROFESIONAL SISO** y actividades propias del contrato correspondiente a **EL PAGO** según la **CLÁUSULA TERCERA** del contrato de prestación de servicios del día primero treinta (30) de abril del año 2025 entre la empresa **COMLINRED S.A.S.** y el ingeniero **DIEGO FERNANDO SALDAÑA**

CONTRATANTE:

Ing. JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS
Rep. Legal COMLINRED SAS
Nit. No. 820.004.070-9

CONTRATISTA:

DIEGO FERNANDO SALDAÑA
PROFESIONAL SISO
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO
M.P. No. 15238-309041

NOTA: *La empresa* ***COMLINRED S.A.S.*** *no se hace responsable de cobros de establecimientos comerciales por parte de sus propietarios ya que no tenemos vínculo con ellos. Es responsabilidad del trabajador estar a paz y salvo llegado el caso con los establecimientos comerciales del municipio.*

Cra 8 No. 58 - 75 Barrio Sta Rita Tunja – Tel: 7474300 – Cel: 3125938847 313 3922615 -Email: luisignacioarenas@com -Juancaarenas.92@hotmail.com

Tunja, 20 de agosto de 2025

Referencia: **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MS-LP-002-2025** cuyo objeto es **"AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS ÁREAS RURAL Y/O URBANA DEL MUNICIPIO SAMACÁ – BOYACÁ 2025"**

CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO

El suscrito JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS, identificado con Cédula de Ciudadanía Número No. 1.019.068.303 de Bogotá D.C. y además siendo el Representante legal de la empresa **COMLINRED S.A.S.** con Número de **Nit: 820.004.070-9** en calidad de Contratista, **CERTIFICA** que la empresa se encuentra a **PAZ Y SALVO** a la fecha por todo concepto en actividades de **RESIDENTE DE OBRA** y actividades propias del contrato correspondiente a **EL PAGO** según la **CLÁUSULA TERCERA** del contrato de prestación de servicios del día treinta (30) de abril del año 2025 entre la empresa **COMLINRED S.A.S.** y el ingeniero **EDWIN LEONARDO VARGAS TORRES**

CONTRATANTE:

Ing. JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS
Rep. Legal COMLINRED SAS
Nit. No. 820.004.070-9

CONTRATISTA:

EDWIN LEONARDO VARGAS TORRES
RESIDENTE DE OBRA
INGENIERO ELECTROMECANICO
M.P. No. BY250-46384

NOTA: *La empresa* ***COMLINRED S.A.S.*** *no se hace responsable de cobros de establecimientos comerciales por parte de sus propietarios ya que no tenemos vínculo con ellos. Es responsabilidad del trabajador estar a paz y salvo llegado el caso con los establecimientos comerciales del municipio.*

Cra 8 No. 58 - 75 Barrio Sta Rita Tunja – Tel: 7474300 – Cel: 3125938847 313 3922615 -Email: luisignacioarenas@com -Juancaarenas.92@hotmail.com

Tunja, 20 de agosto de 2025

Referencia: **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MS-LP-002-2025** cuyo objeto es **"AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS ÁREAS RURAL Y/O URBANA DEL MUNICIPIO SAMACÁ – BOYACÁ 2025"**

CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO

El suscrito JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS, identificado con Cédula de Ciudadanía Número No. 1.019.068.303 de Bogotá D.C. y además siendo el Representante legal de la empresa **COMLINRED S.A.S.** con Número de **Nit: 820.004.070-9** en calidad de Contratista, **CERTIFICA** que la empresa se encuentra a **PAZ Y SALVO** a la fecha por todo concepto en actividades de **ASESOR ELECTRICO** y actividades propias del contrato correspondiente a **EL PAGO** según la **CLÁUSULA TERCERA** del contrato de prestación de servicios del día treinta (30) de abril del año 2025 entre la empresa **COMLINRED S.A.S.** y el ingeniero **OLMER WILCHES GARCIA**

CONTRATANTE:

Ing. JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS
Rep. Legal COMLINRED SAS
Nit. No. 820.004.070-9

CONTRATISTA:

OLMER WILCHES GARCIA
ASESOR ELECTRICO
INGENIERO ELECTRICO
M.P. No. RS 205-0547

NOTA: *La empresa* ***COMLINRED S.A.S.*** *no se hace responsable de cobros de establecimientos comerciales por parte de sus propietarios ya que no tenemos vínculo con ellos. Es responsabilidad del trabajador estar a paz y salvo llegado el caso con los establecimientos comerciales del municipio.*

Cra 8 No. 58 - 75 Barrio Sta Rita Tunja – Tel: 7474300 – Cel: 3125938847 313 3922615 -Email: luisignacioarenas@com -Juancaarenas.92@hotmail.com

Tunja, 20 de agosto de 2025

Referencia: **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MS-LP-002-2025** cuyo objeto es **"AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS ÁREAS RURAL Y/O URBANA DEL MUNICIPIO SAMACÁ – BOYACÁ 2025"**

CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO

El suscrito JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS, identificado con Cédula de Ciudadanía Número No. 1.019.068.303 de Bogotá D.C. y además siendo el Representante legal de la empresa **COMLINRED S.A.S.** con Número de **Nit: 820.004.070-9** en calidad de Contratista, **CERTIFICA** que la empresa se encuentra a **PAZ Y SALVO** a la fecha por todo concepto en actividades de **TECNICO ELECTRICISTA, INSPECTOR** y actividades propias del contrato correspondiente a **EL PAGO** según la **CLÁUSULA TERCERA** del contrato de prestación de servicios del día treinta (30) de abril del año 2025 entre la empresa **COMLINRED S.A.S.** y el ingeniero **LUIS IGNACIO ARENAS GARCIA**

CONTRATANTE:

Ing. JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS
Rep. Legal COMLINRED SAS
Nit. No. 820.004.070-9

CONTRATISTA:

LUIS IGNACIO ARENAS GARCIA
TECNICO ELECTRICISTA, INSPECTOR
TECNICO ELECTRICISTA, INSTALADOR Y MANTENIMIENTO
M.P. No. 009641

NOTA: *La empresa* ***COMLINRED S.A.S.*** *no se hace responsable de cobros de establecimientos comerciales por parte de sus propietarios ya que no tenemos vínculo con ellos. Es responsabilidad del trabajador estar a paz y salvo llegado el caso con los establecimientos comerciales del municipio.*

Cra 8 No. 58 - 75 Barrio Sta Rita Tunja – Tel: 7474300 – Cel: 3125938847 313 3922615 -Email: luisignacioarenas@com -Juancaarenas.92@hotmail.com

Tunja, 20 de agosto de 2025

Referencia: **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MS-LP-002-2025** cuyo objeto es **"AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS ÁREAS RURAL Y/O URBANA DEL MUNICIPIO SAMACÁ – BOYACÁ 2025"**

CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO

El suscrito JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS, identificado con Cédula de Ciudadanía Número No. 1.019.068.303 de Bogotá D.C. y además siendo el Representante legal de la empresa **COMLINRED S.A.S.** con Número de **Nit: 820.004.070-9** en calidad de Contratista, **CERTIFICA** que la empresa se encuentra a **PAZ Y SALVO** a la fecha por todo concepto con **GERMAN HERNÁNDEZ MORENO** identificado con NIT: 6.764.609-5.

CONTRATANTE:

Ing. JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS
Rep. Legal COMLINRED SAS
Nit. No. 820.004.070-9

CONTRATISTA:

GERMAN HERNÁNDEZ MORENO
NIT: 6.764.609-5.

Cra 8 No. 58 - 75 Barrio Sta Rita Tunja – Tel: 7474300 – Cel: 3125938847 313 3922615 -Email: luisignacioarenas@com -Juancaarenas.92@hotmail.com

Tunja, 20 de agosto de 2025

Referencia: **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MS-LP-002-2025** cuyo objeto es **"AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS ÁREAS RURAL Y/O URBANA DEL MUNICIPIO SAMACÁ – BOYACÁ 2025"**

CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO

El suscrito JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS, identificado con Cédula de Ciudadanía Número No. 1.019.068.303 de Bogotá D.C. y además siendo el Representante legal de la empresa **COMLINRED S.A.S.** con Número de **Nit: 820.004.070-9** en calidad de Contratista, **CERTIFICA** que la empresa se encuentra a **PAZ Y SALVO** a la fecha por todo concepto con **ELÉCTRICOS H.R SAS** identificado con Nit:800.186.332-0.

CONTRATANTE:

Ing. JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS
Rep. Legal COMLINRED SAS
Nit. No. 820.004.070-9

CONTRATISTA:

ELÉCTRICOS H.R SAS
Nit:800.186.332-0.

Cra 8 No. 58 - 75 Barrio Sta Rita Tunja – Tel: 7474300 – Cel: 3125938847 313 3922615 -Email: luisignacioarenas@com -Juancaarenas.92@hotmail.com

ComlinRED
Ingeniería Civil y Eléctrica
NIT. 820004070-9 Régimen común

Tunja, 20 de agosto de 2025

Referencia: **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MS-LP-002-2025** cuyo objeto es **"AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS ÁREAS RURAL Y/O URBANA DEL MUNICIPIO SAMACÁ – BOYACÁ 2025"**

CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO

El suscrito JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS, identificado con Cédula de Ciudadanía Número No. 1.019.068.303 de Bogotá D.C. y además siendo el Representante legal de la empresa **COMLINRED S.A.S.** con Número de **Nit: 820.004.070-9** en calidad de Contratista, **CERTIFICA** que la empresa se encuentra a **PAZ Y SALVO** a la fecha por todo concepto con **GRUPO DEFA SAS** identificado con Nit: 900.795.612-3.

CONTRATANTE:

Ing. JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS
Rep. Legal COMLINRED SAS
Nit. No. 820.004.070-9

CONTRATISTA:

GRUPO DEFA SAS
Nit: 900.795.612-3

Cra 8 No. 58 - 75 Barrio Sta Rita Tunja – Tel: 7474300 – Cel: 3125938847 313 3922615 -Email: luisignacioarenas@com -Juancaarenas.92@hotmail.com

VICTOR JULIO GAMBOA

Contador Público

El SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO DEBIDAMENTE INSCRITO ANTE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad del juramento:

CERTIFICO

Que: **COMLINRED S.A.S**
NIT: **820.004.070-9**

Ha dado cumplimiento oportuno y completo desde los últimos seis meses, con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales y cuando ha sido del caso con los aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

Se expide a solicitud del interesado a los veinticinco (25) días del mes de agosto del dos mil veinticinco (2025).

Atentamente,

VICTOR JULIO GAMBOA
CONTADOR PÚBLICO
TP 279880-T

JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS
CC 1.019.068.303
REPRESENTANTE LEGAL

DIRECCION: CALLE 20 No 10 -61 OFICINA 204 EDIFICIO RINCON MARIÑO
TUNJA- BOYACA
FIJO 743 40 81 CELULAR 3186559248 - 3112863978

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6 3 6 F 4 C 5 6 E 3 B 0 8 3 2 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **VICTOR JULIO GAMBOA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7179372 de TUNJA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 279880-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

279880-T

VICTOR JULIO
GAMBOA
C.C. 7179372
RES. INSCRIPCION 617 DEL 12/04/2021
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL


302187 310374



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 7.179.372
GAMBOA
APELLIDOS
VICTOR JULIO
NOMBRES

FIRMA

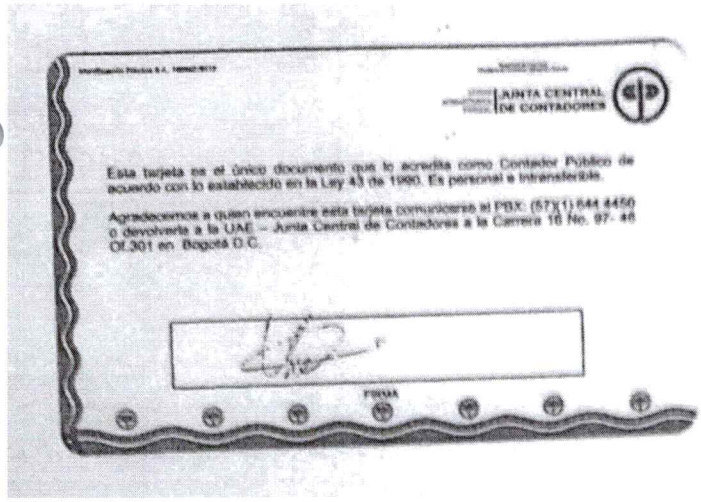

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 01-MAY-1981
TUNJA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.67 ESTATURA
B+ G.S. RH
M SEXO
10-MAY-1999 TUNJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL

ComlinRED
Ingenieria Civil y Eléctrica
NIT. 820004070-9 Régimen común

EL SUSCRITO REPRESENTATE LEGAL

CERTIFICA QUE

La empresa **COMLINRED S.A.S**, Identificada con el **NIT. No. 820.004.070-9** expedido por la DIAN, ha cumplido en los últimos seis (6) meses con los respectivos pagos de Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las cajas de Compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA según lo dispuesto por la ley.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Se expide la presente certificación en la ciudad de Tunja a los 25 días del mes de agosto de 2025

Cordialmente,

JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS
C.C. 1.019.068.303 de Bogotá
REP LEGAL.
COMLINRED S.A.S
NIT : 820.004.070-9

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	820004070
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			COMLINRED LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CENTRO	TELÉFONO:	7455555
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	009 - INGRESOS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		4617173758	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO	2025
DÍAS DE MORA:		58			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/09/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9993681063

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 455.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.700	$ 0	$ 455.600	$ 16.700	$ 472.300
230301	230301-PORVENIR	1	$ 91.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.400	$ 0	$ 91.200	$ 3.400	$ 94.600
230201	230201- PROTECCION	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.400	$ 0	$ 227.800	$ 8.400	$ 236.200
SUBTOTALES:										**$ 774.900**	**$ 28.500**	**$ 803.100**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		L QUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VA_OR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 79.800	$ 0	$ 3.000	$ 0	$ 79.800	$ 3.000	$ 0	$ 82.800
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 28.500	$ 0	$ 1.100	$ 0	$ 28.500	$ 1.100	$ 0	$ 29.600
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 114.000	$ 0	$ 4.200	$ 0	$ 114.000	$ 4.200	$ 0	$ 118.200
SUBTOTALES:													**$ 222.300**	**$ 8.300**	**$ 0**	**$ 230.600**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	5		$ 0	$ 0		$ 0	$ 386.900	$ 386.900	$ 14.200	$ 0	$ 400.800
SUBTOTALES:									**$ 386.900**	**$ 14.200**	**$ 0**	**$ 400.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES.	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	5	$ 222.300	$ 8.200	$ 230.500
SUBTOTALES:			**$ 222.300**	**$ 8.200**	**$ 230.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES								
																										PENSIÓN							SALUD								ARP							CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
N°	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	PERMANENTE TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	IRE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 10110010	WILCHES GARCIA OLMER	DEPEND	REG CUMP PENS	$ 1.423.500	FIJO			SI	15																	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS017-FAMISANAR	15	$ 711.750	$ 28.500	$ 0	$ 28.500	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	15	$ 711.750		$ 49.600	15	$ 711.750	CCF10-COMFABOY	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1067582845	SALDAÑA SANCHEZ DIEGO FERNANDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF10-COMFABOY	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 7176028	VARGAS TORRES EDWIN LEONARDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF10-COMFABOY	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 7213326	ARENAS GARCIA LUIS IGNACIO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF10-COMFABOY	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 88168516	MENDEZ BERMUDEZ ERWIN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	12																230301-PORVENIR	12	$ 569.400	$ 91.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 91.200	EPS005-SANITAS S.A.	12	$ 569.400	$ 22.800	$ 0	$ 22.800	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	12	$ 569.400		$ 29.700	12	$ 569.400	CCF10-COMFABOY	$ 22.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.665.000

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	820304070
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			COMLINRED LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CENTRO	TELÉFONO:	7455555
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	009 - INGRESOS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4617173371	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			30				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/05/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9993681088

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 455.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.600	$ 0	$ 455.600	$ 9.600	$ 464.200
230201	230201- PROTECCION	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.300	$ 0	$ 227.800	$ 4.300	$ 232.100
230301	230301-PORVENIR	1	$ 91.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.800	$ 0	$ 91.200	$ 1.800	$ 93.000
SUBTOTALES:										**$ 774.600**	**$ 14.700**	**$ 789.300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		L QUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 114.000	$ 0	$ 2.200	$ 0	$ 114.000	$ 2.200	$ 0	$ 116.200
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 79.800	$ 0	$ 1.600	$ 0	$ 79.800	$ 1.600	$ 0	$ 81.400
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 28.500	$ 0	$ 600	$ 0	$ 28.500	$ 600	$ 0	$ 29.100
SUBTOTALES:													**$ 222.300**	**$ 4.400**	**$ 0**	**$ 226.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	5		$ 0	$ 0		$ 0	$ 386.900	$ 386.600	$ 7.300	$ 0	$ 393.900
SUBTOTALES:									**$ 386.600**	**$ 7.300**	**$ 0**	**$ 393.900**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	5	$ 222.300	$ 4.200	$ 226.500
SUBTOTALES:			**$ 222.300**	**$ 4.200**	**$ 226.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE											NOVEDADES												SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES									
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	TRAYECTORIA TRASLADADA	IBG	RET	TDA	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																										ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1010 10010	WILCHES GARCIA OLMER	DEPEND	REG CUMPENS	$ 1.423.500	FIJO			SI	16																																									
																											$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS017-FAMISANAR	15	$ 711.750	$ 28.500	$ 0	$ 28.500	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	15	$ 711.750		$ 49.600	15	$ 711.750	CCF10-COMFABOY	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1057582849	SALDAÑA SANCHEZ DIEGO FERNANDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF10-COMFABOY	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 7175028	VARGAS TORRES EDWIN LEONARDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF10-COMFABOY	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 7213326	ARENAS GARCIA LUIS IGNACIO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF10-COMFABOY	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 86 68516	MENDEZ BARRIGUEZ ERWIN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	12																230301-PORVENIR	12	$ 569.400	$ 91.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 91.200	EPS005-SANITAS S.A.	12	$ 569.400	$ 22.800	$ 0	$ 22.800	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	12	$ 569.400		$ 39.700	12	$ 569.400	CCF10-COMFABOY	$ 22.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.636.400

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	820304070
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			COMLINRED LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CENTRO	TELÉFONO:	7455555
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	009 - INGRESOS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		4617168428	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	Julio AÑO 2325	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/09/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9993681114

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 91.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 91.200	$ 0	$ 91.200
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 425.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 425.200	$ 0	$ 425.200
230201	230201- PROTECCION	1	$ 212.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 212.600	$ 0	$ 212.600
SUBTOTALES:										**$ 729.000**	**$ 0**	**$ 729.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		L QUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 106.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 106.400	$ 0	$ 0	$ 106.400
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 28.500
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 76.000
SUBTOTALES:													**$ 210.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 210.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	5		$ 0	$ 0		$ 0	$ 366.800	$ 366.800	$ 0	$ 0	$ 366.800
SUBTOTALES:									**$ 366.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 366.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	5	$ 210.900	$ 0	$ 210.900
SUBTOTALES:			**$ 210.900**	**$ 0**	**$ 210.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
																										PENSIÓN						SALUD							ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	IRPF/FIRMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1011010010	WILCHES GARCIA OLMER	DEPEND	REG COMP PENS	$ 1.423.500	FIJO			SI	01	16																$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	EPS017-FAMISANAR	16	$ 711.750	$ 28.500	$ 0	$ 28.500	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	16	$ 711.750		$ 49.600	16	$ 711.750	CCF10-COMFABOY	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1057582849	BALDAVA SANCHEZ DIEGO FERNANDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	01	28															230201-PROTECCION	28	$ 1.328.600	$ 212.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 212.600	EPS037-NUEVA EPS	28	$ 1.328.600	$ 53.200	$ 0	$ 53.200	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	28	$ 1.328.600		$ 92.500	28	$ 1.328.600	CCF10-COMFABOY	$ 53.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 7175028	VARGAS TORRES EDWIN LEONARDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	01	28															25-14 COLPENSIONES	28	$ 1.328.600	$ 212.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 212.600	EPS005-SANITAS S.A.	28	$ 1.328.600	$ 53.200	$ 0	$ 53.200	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	28	$ 1.328.600		$ 92.500	28	$ 1.328.600	CCF10-COMFABOY	$ 53.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 7213326	ARENAS GARCIA LUIS IGNACIO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	01	28															25-14 COLPENSIONES	28	$ 1.328.600	$ 212.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 212.600	EPS037-NUEVA EPS	28	$ 1.328.600	$ 53.200	$ 0	$ 53.200	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	28	$ 1.328.600		$ 92.500	28	$ 1.328.600	CCF10-COMFABOY	$ 53.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 85188516	MENDEZ SERRALVEZ ERWIN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	01	12															230301-PORVENIR	12	$ 569.400	$ 91.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 91.200	EPS005-SANITAS S.A.	12	$ 569.400	$ 22.800	$ 0	$ 22.800	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	12	$ 569.400		$ 39.700	12	$ 569.400	CCF10-COMFABOY	$ 22.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.517.600

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	820004070
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			COMLINRED LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CENTRO	TELÉFONO:	7455555
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	002 - EMPRESA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4606378188	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo AÑO	2025
DIAS DE MORA:			11				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/05/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9892819607

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA				APORTES VOLUNTARIOS				FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO		
230201	230201- PROTECCION	2	$ 455.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.300	$ 0	$ 455.600	$ 3.300	$ 458.900		
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.700	$ 0	$ 227.800	$ 1.700	$ 229.500		
SUBTOTALES:										**$ 683.400**	**$ 5.000**	**$ 688.400**		

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA			INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 500	$ 0	$ 57.000	$ 500	$ 0	$ 57.500
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 500	$ 0	$ 57.000	$ 500	$ 0	$ 57.500
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 500	$ 0	$ 57.000	$ 500	$ 0	$ 57.500
SUBTOTALES:													**$ 171.000**	**$ 1.500**	**$ 0**	**$ 172.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA			INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 297.300	$ 297.300	$ 2.200	$ 0	$ 299.500
SUBTOTALES:									**$ 297.300**	**$ 2.200**	**$ 0**	**$ 299.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA			TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	3	$ 171.000	$ 1.300	$ 172.300
SUBTOTALES:			**$ 171.000**	**$ 1.300**	**$ 172.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	820004070
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			COMUNRED LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CENTRO	TELÉFONO:	7456655
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	002 - EMPRESA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		4607874510	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO	2025
DIAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/06/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		993040861

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA				APORTES VOLUNTARIOS						MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	FSP	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO	
230201	230201- PROTECCION	2	$ 455.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 455.600	$ 0		$ 455.600
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0		$ 227.800
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.200	$ 0		$ 15.200
SUBTOTALES:											**$ 698.600**	**$ 0**		**$ 698.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 60.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.800	$ 0	$ 0	$ 60.800
SUBTOTALES:													**$ 174.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 174.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 304.000	$ 304.000	$ 0	$ 0	$ 304.000
SUBTOTALES:									**$ 304.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 304.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES		
			APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	4	$ 174.800	$ 0	$ 174.800
SUBTOTALES:			**$ 174.800**	**$ 0**	**$ 174.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT	820004070
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	COMUNRED LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CENTRO	TELÉFONO:	7455555
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	002 - EMPRESA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4615838426	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio AÑO	2025
DÍAS DE MORA			26				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/08/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9993606522

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA			APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.800	$ 0	$ 227.800	$ 3.800	$ 231.600
230201	230201- PROTECCION	2	$ 455.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.500	$ 0	$ 455.600	$ 7.500	$ 463.100
SUBTOTALES:										**$ 683.400**	**$ 11.300**	**$ 694.700**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA			INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 57.000	$ 1.000	$ 0	$ 58.000
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 57.000	$ 1.000	$ 0	$ 58.000
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 57.000	$ 1.000	$ 0	$ 58.000
SUBTOTALES:													**$ 171.000**	**$ 3.000**	**$ 0**	**$ 174.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA			INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 297.300	$ 297.300	$ 4.900	$ 0	$ 302.200
SUBTOTALES:									**$ 297.300**	**$ 4.900**	**$ 0**	**$ 302.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA			TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	3	$ 171.000	$ 2.800	$ 173.800
SUBTOTALES:			**$ 171.000**	**$ 2.800**	**$ 173.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE											NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES									
																											PENSIÓN								SALUD						ARP																											
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1019088303	ARENAS CARDENAS JUAN CAMILO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.423.500	002	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF10-COMFABOY	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1049819895	SOSA BOSSA NESTOR FERNEY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF10-COMFABOY	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1051568326	RIVERA ORTEGA JORGE AURELIO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS041-NUEVA EPS CM	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF10-COMFABOY	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.344.700

ACTA RECIBO FINAL

CONTRATO DE OBRA No. MS-LP-002-2025

CIUDAD Y FECHA	SAMACÁ, 20 DE AGOSTO DE 2025
OBJETO	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS ÁREAS RURAL Y/O URBANA DEL MUNICIPIO SAMACÁ – BOYACÁ 2025
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
REPRESENTANTE LEGAL Y/O CONTRATISTA	COMLINRED SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA RL. JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS
NIT y/o C.C	NIT 820.004.070-9 C.C NO. 1.019.068.303 EXPEDIDA EN BOGOTÁ
RUBRO Y REGISTRO PRESUPUESTAL	CDP No. 2025000225 de fecha 15 de febrero de 2025 Rubro No. 2.3.2.02.02.005.01– Mantenimiento y expansión alumbrado público / IMPUESTO ALUMB
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SETECIENTOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($700.443.588,00)
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO (SI APLICA)	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SETECIENTOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($700.443.588,00)
DURACIÓN DEL CONTRATO	TRES (03) MESES
PLAZO ADICIONAL (SI APLICA)	N/A
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	DIEZ (10) DE ABRIL DE 2025
FECHA DE INICIO	TREINTA (30) DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL	VEINTINUEVE (29) DE JULIO DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	VEINTINUEVE (29) DE JULIO DE 2025
FECHA DE REINICIO No. 1	VEINTE (20) DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	VEINTE (20) DE AGOSTO DE 2025
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	CUMPLE.
INTERVENTOR	BYD MULTIPROYECTOS SAS RL. GILBERTO CELY VARGAS
'CUMPLIMIENTO	T

T: Cumple totalmente actividades pactadas) (P: Cumple parcialmente las actividades pactadas) (N: No cumple las actividades pactadas)

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

DETALLE	VALORES (Cifra en pesos colombianos)	VALORES (Cifra en pesos colombianos)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$700.443.588,00	
*Aporte Alcaldía		
*Aporte Entidad Conveniente		

ACTA RECIBO FINAL

VALOR ADICION (SI HAY LUGAR A ELLO)	$0,00	
VALOR PAGADO SEGÚN ACTAS PARCIALES		$630.218.680,00
VALOR A PAGAR CON ACTA DE LIQUIDACIÓN		$70.224.908,00
SUMAS IGUALES	**$ 700.443.588,00**	**$ 700.443.588,00**

* Aplica solo para convenios.

En Samacá, a los veinte (20) días del mes de agosto de Dos Mil Veinticinco (2025) los abajo firmantes se reunieron con el objeto de suscribir el Acta de Recibo Final del **Contrato de Obra Pública No. MS-LP-002-2025.**

Una vez verificado el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, se encontró que el contratista desarrollo satisfactoriamente el objeto del contrato en el periodo establecido, por lo tanto, se procede a formalizar la presente acta.

En constancia se firma a los veinte (20) días del mes de agosto de Dos Mil Veinticinco (2025).

JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS
COMLINRED SAS
C.C. No. 1.019.068.303 / Nit. No. 820.004.070-9
CONTRATISTA

GILBERTO CELY VARGAS
BYD MULTIPROYECTOS SAS
C.C. No. 1.052.020.348 / Nit. No. 900.268.419-8
INTERVENTOR

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAMACÁ 2024-2027	ALCALDIA DE SAMACÁ	MACROPROCESO	
		PROCESO	
		FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (MECI 1000:2014 – NTCGP 1000:2009)	F-GTI-023	
		Versión 1	

SABANA - CUADRO DE CANTIDADES CONTRATADAS Y EJECUTADAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. MS-LP-002-2025

CIUDAD Y FECHA	SAMACA - 19 DE AGOSTO DE 2025
ACTA N°	No 2 . RECIBO FINAL
OBJETO	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS ÁREAS RURAL Y/O URBANA DEL MUNICIPIO SAMACÁ – BOYACÁ 2025
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS
REPRESENTANTE LEGAL Y/O CONTRATISTA	JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS / COMI NRED S.A.S.
NIT y/o C.C	1.019.068.303 / 820004070-9
RUBRO Y REGISTRO PRESUPUESTAL	Rubros No. 2.3.2.02.02.005.01 Mantenimiento y expansión alumbrado publico / IMPUESTO ALUMB SETECIENTOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE. ($700.443.588,00)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SETECIENTOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE. ($700.443.588,00).
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ 0.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SETECIENTOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE. ($700.443.588,00).
DURACIÓN DEL CONTRATO	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
PLAZO ADICIONAL (SI APLICA)	N.A
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	10 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE INICIÓ	Treinta (30) de abril de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	Diecinueve (19) de agosto de 2025
FORMA DE PAGO	Mediante actas parciales así: Acta parcial No.1, equivalente al 40% de su ejecución o más del valor total del contrato, una vez se acredite su % de ejecución; Acta parcial No.2, equivalente al 40% o más del valor del contrato una vez se acredite su % de ejecución, posterior al primer pago, por lo cual se debe acreditar avance igual o superior al 80% acumulado; Un tercer pago, una vez suscrita y formalizada el acta de liquidación, el cual no podrá ser inferior al 10% del valor del contrato.
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	T
SUPERVISOR	DANILO ALEXANDER VIANCHA-Secretario de Planeación y Obra Públicas
CUMPLIMIENTO	T

(T: CUMPLE TOTALMENTE LAS ACTIVIDADES PACTADAS) (P: CUMPLE PARCIALMENTE LAS ACTIVIDADES PACTADAS) (N: NO CUMPLE LAS ACTIVIDADES PACTADAS)

CONDICIONES ORIGINALES						COND. ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA RECIBO FINAL			ACUMULADO ACTAS ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% AVANCE	CANTIDAD	VR. TOTAL	% AVANCE	CANTIDAD	VR. TOTAL	% AVANCE
PRODUCTO I																
1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE 40 - 69 W - 4000K- PARA ALUMBRADO PUBLICO INCLUYE (BRAZO PARA LUMINARIA, CABLE, FOTOCELDAS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN)	UND	156.00	1,082,556.00	168,878,736.00	156.00	168,878,736.00	16.00	17,320,896.00	10.26	140.00	151,557,840.00	0.90	156.00	168,878,736.00	1.00
1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE 8 M X 510 KG	UND	156.00	995,504.00	155,298,624.00	156.00	155,298,624.00	16.00	15,928,064.00	10.26	140.00	139,370,560.00	0.90	156.00	155,298,624.00	1.00
1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TENDIDO DE RED TRENZADA PARA ALUMBRADO PUBLICO CABLE (TRIPLEX 2X(6)MM+(6)MM) (INCLUYE HERRAJES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE CONEXIÓN)	ML	4,650.00	46,156.00	214,625,400.00	4,650.00	214,625,400.00	450.00	20,770,200.00	9.68	4,200.00	193,855,200.00	0.90	4,650.00	214,625,400.00	1.00
	SUBTOTAL - COSTOS DIRECTOS				538,802,760.00		538,802,760.00		54,019,160.00			484,783,600.00			538,802,760.00	

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS		538,802,760.00	538,802,760.00	54,019,160.00	484,783,600.00	538,802,760.00
ADMINISTRACION	20%	107,760,552.00	107,760,552.00	10,803,832.00	96,955,720.00	107,760,552.00
IMPREVISTOS	5%	26,940,138.00	26,940,138.00	2,700,958.00	24,239,180.00	26,940,138.00
UTILIDADES	5%	26,940,138.00	26,940,138.00	2,700,958.00	24,239,180.00	26,940,138.00
TOTAL AIU	30%	161,640,828.00	161,640,828.00	16,205,748.00	145,435,080.00	161,640,828.00
TOTAL		700,443,588.00	700,443,588.00	70,224,908.00	630,218,080.00	700,443,588.00

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	700,443,588.00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	0.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	700,443,588.00
VALOR TOTAL NO EJECUTADO	0.00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	70,224,908.00
SON: SETENTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS M/CTE	

10.03 %

NOTA:

1: El Interventor Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la interventoria y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria.

3: Interventoria manifiesta su absoluta responsabilidad en cuanto a la calidad de materiales, camidad y cantidades de obra y cumplimiento a especificaciones tecnicas, librando al MUNICIPIO DE SAMACA y a sus funcionarios de cualquier proceso que se pueda adelantar por parte de los entes de control, durante la ejecucion y/o posterior al recibo de los CONTRATOS

En constancia se firma a los (19) días del mes de agosto del año dos mil veinticinco (2025).

JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS / COMI NRED S.A.S.
1.019.068.303 / 820004070-9
EL CONTRATISTA

GILBERTO CELY VARGAS / BYD MULTIPROYECTOS SAS
1.052.020.348 / 900.268.410-8
INTERVENTOR

MEMORIA DE CANTIDADES				Versión
OBJETO	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS ÁREAS RURAL Y/O URBANA DEL MUNICIPIO SAMACÁ – BOYACÁ 2025			
ITEM	1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE 40 - 60 W - 4000K- PARA ALUMBRADO PUBLICO INCLUYE (BRAZO PARA LUMINARIA, CABLE, FOTOCELDAS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN)	UNIDAD	UND

FECHA 2024-20-11	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto		
	TRAMO 3 VEREDA RUCHICAL SECTOR IETNS SEDE DIVINO NIÑO				16.00	16.00
			TOTAL			16.00

ESQUEMA / FOTO





NOTA:

1: El Interventor Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafisicales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoria y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria.

3: Interventoria manifiesta su absoluta responsabilidad en cuanto a la calidad de materiales, camidad y cantidades de obra y cumplimiento a especificaciones tecnicas, librando al MUNICIPIO DE SAMACA y a sus funcionarios de cualquier proceso que se pueda adelantar por parte de los entes de control durante la ejecucion y/o posterior al recibo de los CONTRATOS

CONTRATISTA

JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS / COMLINRED S.A.S.
1.019.068.303 / 820004070-9

INTERVENTOR

GILBERTO CELY VARGAS / BYD MULTIPROYECTOS SAS
1.052.020.348 / 900.268.419-8

MEMORIA DE CANTIDADES				Versión
OBJETO	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS ÁREAS RURAL Y/O URBANA DEL MUNICIPIO SAMACÁ – BOYACÁ 2025			
ITEM	1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE 8 M X 510 KG	UNIDAD	UND

FECHA 2024-20-11	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto		
	TRAMO 3 VEREDA RUCHICAL SECTOR IETNS SEDE DIVINO NIÑO				16.00	16.00
			TOTAL			16.00

ESQUEMA / FOTO





NOTA:

1: El Interventor Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafisicales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoria y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria.

3: Interventoría manifiesta su absoluta responsabilidad en cuanto a la calidad de materiales, camidad y cantidades de obra y cumplimiento a especificaciones tecnicas, librando al MUNICIPIO DE SAMACA y a sus funcionarios de cualquier proceso que se pueda adelantar por parte de los entes de control, durante la ejecucion y/o posterior al recibo de los CONTRATOS

CONTRATISTA

JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS / COMLINRED S.A.S.
1.019.068.303 / 820004070-9

INTERVENTOR

GILBERTO CELY VARGAS / BYD MULTIPROYECTOS SAS
1.052.020.348 / 900.268.419-8

MEMORIA DE CANTIDADES				Versión
OBJETO	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS ÁREAS RURAL Y/O URBANA DEL MUNICIPIO SAMACÁ – BOYACÁ 2025			
ITEM	1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TENDIDO DE RED TRENZADA PARA ALUMBRADO PUBLICO CABLE (TRIPLEX 2X35MM+35MM) (INCLUYE HERRAJES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS DE CONEXIÓN)	UNIDAD	ML

FECHA 2024-20-11	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL
		Largo	Ancho	Alto		ACUMULADO
	TRAMO 3 VEREDA RUCHICAL SECTOR IETNS SEDE DIVINO NIÑO	450.00				450.00
			TOTAL			450.00

ESQUEMA / FOTO





NOTA:

1: El Interventor Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafisicales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoria y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria.

3: Interventoria manifiesta su absoluta responsabilidad en cuanto a la calidad de materiales, camidad y cantidades de obra y cumplimiento a especificaciones tecnicas, librando al MUNICIPIO DE SAMACA y a sus funcionarios de cualquier proceso que se pueda adelantar por parte de los entes de control, durante la ejecucion y/o posterior al recibo de los CONTRATOS

CONTRATISTA

JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS / COMLINRED S.A.S.
1.019.068.303 / 820064070-9

INTERVENTOR

GILBERTO CELY VARGAS / BYD MULTIPROYECTOS SAS
1.052.020.348 / 900.268.419-8

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE OBRA No. MS-LP-002-2025

CIUDAD Y FECHA	SAMACÁ, 26 DE AGOSTO DE 2025
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
RUBRO	Rubro No. 2.3.2.02.02.005.01– Mantenimiento y expansión alumbrado público / IMPUESTO ALUMB
CODIGO BPIN	202500000010055
REPRESENTANTE LEGAL Y/O CONTRATISTA	COMLINRED SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA RL. JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS
NIT y/o C.C	NIT 820.004.070-9 C.C NO. 1.019.068.303 EXPEDIDA EN BOGOTÁ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SETECIENTOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($700.443.588,00)
VALOR ADICIÓN	N/A
VALOR EJECUTADO	SETECIENTOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($700.443.588,00)
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	DIEZ (10) DE ABRIL DE 2025
FECHA DE INICIACIÓN	TREINTA (30) DE ABRIL DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	VEINTINUEVE (29) DE JULIO DE 2025
FECHA DE REINICIO	VEINTE (20) DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	VEINTINUEVE (29) DE JULIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	VEINTE (20) DE AGOSTO DE 2025
TERMINO DEL CONTRATO	TRES (03) MESES
TERMINO ADICIONAL	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL	Registro Presupuestal No. 2025000430 de Fecha 11 de abril de 2025
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	CUMPLE
INTERVENTOR	BYD MULTIPROYECTOS S.A.S R/L GILBERTO CELY VARGAS INTERVENTORÍA DE OBRA
GARANTÍA UNICA	N/A
OBJETO: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS ÁREAS RURAL Y/O URBANA DEL MUNICIPIO SAMACÁ – BOYACÁ 2025	

ACTA DE LIQUIDACIÓN

EL CONTRATO SE AMPARA EN

NUMERO DE PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
600-47-994000075704 600-74-994000012092	Cumplimiento	$105.066.538,20	30/04/2025	22/02/2026
	Pago de salarios, prestaciones sociales	$105.066.538,20	30/04/2025	22/08/2028
	Estabilidad y calidad de la obra	$70.044.358,80	20/08/2025	20/08/2030
600-74-994000012092	Resp. Civil extracontractual	$284.700.000,00	30/04/2025	20/08/2025

ESTADO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 700,443,588.00	
VALOR ADICIÓN (SI HAY LUGAR A ELLO)	N/A	
VALOR TOTAL DE PAGOS		$630,218,680.00
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA		$70,224,908.00
SALDO A LIBERAR		$ 0.00
SUMAS IGUALES	**$ 700,443,588.00**	**$ 700,443,588.00**

En virtud de lo establecido en los Artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007, Entre los suscritos a saber, **WILSON CASTIBLANCO GIL**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 7.171.754 Expedida en Tunja, obrando en representación del Municipio de Samacá, con Nit. No. 800.016.757 – 9; por otra parte, **JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.019.068.303 expedida en BOGOTÁ obrando en representación de **COMLINRED SAS** identificada con NIT No. 820.004.070-9 en calidad de Contratista y **GILBERTO CELY VARGAS** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.052.020.348 expedida en Floresta obrando en representación de **BYD MULTIPROYECTOS SAS** identificada con NIT No. 900.268.419-8 En calidad de interventor del CONTRATO DE OBRA No. MS-LP-002-2025 hemos acordado suscribir la presente acta de liquidación.

Que el objeto y obligaciones contratados fueron ejecutados por el Contratista y recibidos por la Entidad tal como consta en el acta de recibo final expedida por el Supervisor.

Que durante el plazo de ejecución del contrato que se liquida, el contratista acreditó el cumplimiento de sus obligaciones frente a los sistemas de seguridad social y parafiscal de conformidad con lo señalado en las normas legales pertinentes.

Queda entendido que el **CONTRATO DE OBRA No. MS-LP-002-2025** que se liquida con la presente acta, no generó ningún tipo de relación laboral entre el Municipio de Samacá y el Contratista.

Por lo anterior las partes declaran encontrase a paz y salvo por todo concepto respecto a las obligaciones mutuas pactadas en el **CONTRATO DE OBRA No. MS-LP-002-2025** por lo tanto acordamos liquidarlo.

ACTA DE LIQUIDACIÓN

OBSERVACIONES:

Para constancia se firma la presente acta de liquidación, por quienes en ella intervinieron. Dada en Samacá, el día veintiséis (26) del mes de agosto de Dos Mil Veinticinco (2025).

JUAN CAMILO ARENAS CARDENAS
C.C. No. 1.019.068.303 expedida en Bogotá
R/L COMLINRED SAS
CONTRATISTA

GILBERTO CELY VARGAS
C.C. No. 1.052.020.348 de Floresta
R/L BYD MULTIPROYECTOS SAS
INTERVENTOR

WILSON CASTIBLANCO GIL
Alcalde Municipal

COMLINRED S.A.S.

COMLINRED S.A.S. NIT 820004070-9

Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidades Tributarias - IVA

CR 8 A 58 75 BRR SANTA RITA - Tunja, Boyacá - Colombia

Tel.3133922615

luisignacioarenas@hotmail.com

Responsabilidad Fiscal
R-99-PN - No aplica – Otros

Act. Económica:4220

Cliente: MUNICIPIO DE SAMACA

NIT ó CC: 800016757-9 **PERSONA:** Persona Jurídica

DIRECCIÓN: CRA 6 No 4 53

CIUDAD: Samacá, Boyacá - Colombia

CORREO: contactenos@samaca-boyaca.gov.co

TELEFONO: 3223059115

RESPONS FISCAL: R-99-PN

RESPONS TRIBUTARIA: IVA

Factura Electrónica de Venta COM126

Fecha Creación: 2025-08-25 14:03

Fecha Validación: 2025-08-25 14:34

Fecha Vencimiento: 2025-08-25 23:59

Forma Pago: Contado

Medio Pago: Efectivo

CUFE:27281a2ebc364a40cef15a6e08e2b96750ec280aeefb99f8cdacf5c1277a8eeafaa126bf1b7d4298e5e30d8a10ae55d3

Modalidad: Electrónica - Número de Autorización: 18764085319894 desde COM105 hasta COM200 Vigencia: 2024-12-13 al 2025-12-13

N°	Codigo	Descripción	Cant	Precio	Impuesto	Total Impt.	Dto	Valor Total
1		ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. MS-LP-002-2025 QUE TIENE COMO OBJETO " AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS ÁREAS RURAL Y/O URBANA DEL MUNICIPIO SAMACÁ – BOYACÁ 2025"	1.0	$ 54,019,160.00			0.0	$ 54,019,160.00
2	ADMIN	Administracion - 20.0%	1.0	$ 10,803,832.00	0.0%		0.0	$ 10,803,832.00
3	IMPRE	Imprevistos - 5.0%	1.0	$ 2,700,958.00	0.0%		0.0	$ 2,700,958.00
4	UTIL	Utilidad - 5.0%	1.0	$ 2,700,958.00	0.0%		0.0	$ 2,700,958.00

Información Adicional

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Valor en letras

SETENTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS M/CTE

Base no gravada
$ 67,523,950.00

SUBTOTAL	$ 70,224,908.00
DESCUENTOS (-)	$ 0.00
PRECIO BASE	$ 2,700,958.00
IMPUESTOS (+)	$ 0.00
ANTICIPO	$ 0.00
TOTAL	**$ 70,224,908.00**

Generado en clarisa.co – Todo es más fácil! – Clarisa Cloud S.A.S NIT 900707639 - 6

República de Colombia
Departamento de Boyacá
Municipio de Samacá
Nit. 800016757-9

Samacá, 26 de agosto de 2025

Doctor
EDGAR PUERTO FIGUEREDO
Secretario de Hacienda
Alcaldía
Samacá

Respetado Doctor:

Comedidamente me permito solicitarle se sirva cancelar la suma de SETENTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS M/CTE ($70.224.908,00), a **COMLINRED SAS,** IDENTIFICADO CON NIT Nro. 820.004.070-9, POR CONCEPTO DE PAGO DE ACTA DE LIQUIDACIÓN DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2025, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MS-LP-002–2025, CUYO OBJETO ES **"AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED EN LAS ÁREAS RURAL Y/O URBANA DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ – BOYACÁ 2025".**

Atentamente,

WILSON CASTIBLANCO GIL
Alcalde municipal

V.Bo. DANILO ALEXANDER VIANCHÁ VALDERRAMA
Secretario de Planeación y Obras Públicas
Supervisor Contrato Interventoría

Revisó: Dr. WILLIAM ALEXANDER GIL GARAVITO.
Secretario General

Proyectó. CAMILO ANDRÉS IBAÑEZ PRIETO
Apoyo supervisión
