INFORME SUPERVISIÓN FEBRERO 2023 INFORMES SEMANALES DE OBRA

INFORMES SEMANALES TÉCNICOS

Secretaría de Obras Publicas

Informe No 5

Desde 30 de hasta el 05 de febrero.

Cód. dependc	Serie	Sub serie	Modalidad	Año	Consecutivo
1000	12	C1	SA	2020	1482

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	Concre-acero S.A.S	**Contratista:**	Construcciones Azimut SAS
Contrato No.		Contrato No.	
Objeto.	ATENCION E INTERVENCION DEL SEGUNDO TRAMO VIA LA BANCA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DE LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PUBLICA DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO 20220400046I DEL 07 DE JUNIO DE 2022 Y AMPLIADA MEDIANTE EL DECRETO 20220400058I DEL 06 DE AGOSTO DE 2022 Y LA URGENCIA MANIFIESTA ADOPTADA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 20220000574I DEL 06 DE AGOSTO DE 2022 Y LOS DEMÁS	Objeto.	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA SUSCRITO PARA LA ATENCIÓN E INTERVENCIÓN DEL SEGUNDO TRAMO VÍA LA BANCA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DE LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO 20220400046I DEL 07 DE JUNIO DE 2022 Y AMPLIADA MEDIANTE EL DECRETO 20220400058I DEL 06 DE AGOSTO DE 2022 Y LA URGENCIA MANIFIESTA ADOPTADA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN
Valor Inicial:	$ 6.652.306.217,00	Valor Inicial:	$ 382.151.416,00
Valor Actualizado:		Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	365	Plazo Inicial:	365
Plazo Actualizado:	365	Plazo Actualizado:	365
Fecha de Iniciación:	1/01/2023	Fecha de Iniciación:	1 de enero de 2023
Fecha de Vencimiento:	31/12/2023	Fecha de Vencimiento:	31/12/2023

Semana Número: 5 Del: 30/01/2022 Al: 5/02/2023 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 35 días

Nombre del Supervisor LUZ ADRIANA TORO ARIAS (Secretaaria Obras Públicas)
DANIEL CHAVARRIAGA RAVE (Apoyo técnico)

AVANCE DEL CONTRATO


	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	3,2%	26,7%	Obra Física Ejecutada (%)	4,0%	18,5%
Valor de la Obra	$ 212.873.798,94	$ 1.776.165.759,94	Valor de la Obra	$ 266.092.248,68	$ 1.230.676.650,15

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	23,5%	14,5%	-8,2%
Durante el periodo	3,2%	4,0%	
Acumulado actual	26,7%	18,5%	



REGISTRO FOTOGRÁFICO

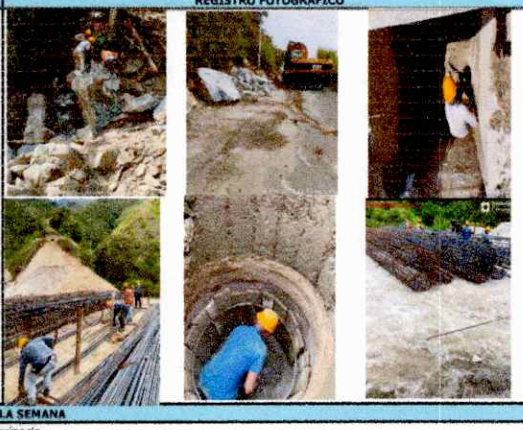

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Minería aplicada a roca de gran densidad sobre la carpeta de rodadura, cargue y bote de material a sitio autorizado.

Excavacion de pilas de fundación en el punto de intervención K4+100 y sobre el km 4+100, equipo de minería.

Limpieza de transversales y obras de arte, cargue y retiro a sitios autorizados.

Construccion de bordillos y cunetas

Se realiza el ajuste y calibración de diseño lo que permite al contratsita realizar compras de insumos de acero tanto de refuerzo como de los viaductos, suministro de maquinaria, material de concretos.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Acero de refurzo para pilas y Fabricación estructura metálica para viaducto sitio El Poste

Minería aplicada a roca de gran densidad sobre la carpeta de rodadura, cargue y bote de material a sitio autorizado. Minería rocas de gran tamaño

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

las actividades programadas se ejecutaron satisfactoriamente y sin inconvenientes considerables, las intervenciones técnicas y estructurales atendieron con éxito las solicitudes demandantes, se espera continuar con la programación de obra para así poder subsanar todas las particularidades de la urgencia y brindad la tranquilidad anhelada a la comunidad Bellanita.

OBSERVACIONES

Para evitar encharcamientos en la vía y evitar problemas de infiltración a las capas subyacentes, deben las cunetas de drenaje estar libres de cualquier obstrucción.

El desacato del transeúnte a la señalización vial y a las indicaciones del personal humano de pare y siga, puede incurrir a

Se identificaron algunas transversales que fueron condenadas o inhabilitadas por la comunidad, lo que se traduce a entorpecer la

Se identificaron algunos arboles que se encuentran en peligro de colapso sobre la vía, se recomienda su traslado y trasplante.

FIRMAS

Residente de Interventoria
Nombre: Albertina Guerrero Vitola
C.C: 45.458.856

Residente Contratista
Nombre: Dahiana Bartolo
C.C:

	INFORMES SEMANALES TÉCNICOS		Secretaría de Obras Publicas
			Informe No 5
			Desde 30 de hasta el 05 de febrero.

Cod. depende	Serie	Sub serie	Modalidad	Año	Consecutivo
1000	12	C1	5A	2020	1482

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	Concre-acero S.A.S	**Contratista:**	Construcciones Azimut SAS
Contrato No.		Contrato No.	
Objeto.	ATENCIÓN E INTERVENCIÓN DEL SEGUNDO TRAMO VÍA LA BANCA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DE LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO 20220400483 DEL 07 DE JUNIO DE 2022 Y AMPLIADA MEDIANTE EL DECRETO 20220400586 DEL 06 DE AGOSTO DE 2022 Y LA URGENCIA MANIFIESTA ADOPTADA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 20220000742 DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 Y LOS DEMÁS	Objeto.	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA SUSCRITO PARA LA ATENCIÓN E INTERVENCIÓN DEL SEGUNDO TRAMO VÍA LA BANCA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DE LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO 20220400483 DEL 07 DE JUNIO DE 2022 Y AMPLIADA MEDIANTE EL DECRETO 20220400586 DEL 06 DE AGOSTO DE 2022 Y LA URGENCIA MANIFIESTA ADOPTADA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN
Valor Inicial:	$ 6.652.306.217,00	Valor Inicial:	"$ 382.151.416,00"
Valor Actualizado:		Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	365	Plazo Inicial:	365
Plazo Actualizado:	365	Plazo Actualizado:	365
Fecha de Iniciación:	1/01/2023	Fecha de Iniciación:	1 de enero de 2023
Fecha de Vencimiento:	31/12/2023	Fecha de Vencimiento:	31/12/2023

Semana Número: 5 Del: 30/01/2023 Al: 5/02/2023 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 35 días

Nombre del Supervisor LUZ ADRIANA TORO ARIAS (Secretaaria Obras Públicas)
DANIEL CHAVARRIAGA RAVE (Apoyo técnico)

AVANCE DEL CONTRATO


	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	3,0%	29,7%	Obra Física Ejecutada (%)	2,0%	20,5%
Valor de la Obra	$ 199.569.186,51	$ 1.975.734.946,45	Valor de la Obra	$ 133.046.124,34	$ 1.363.722.774,49

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	26,7%	18,5%	-9%
Durante el periodo	3,0%	2,0%	
Acumulado actual	29,7%	20,5%	



REGISTRO FOTOGRÁFICO

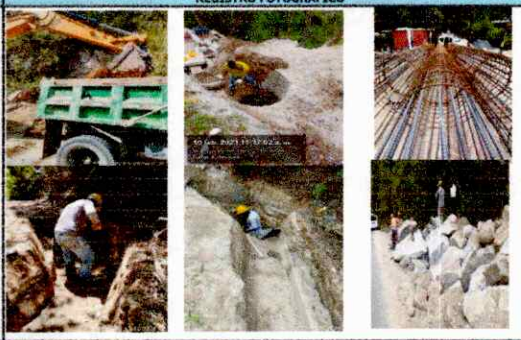

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Limpieza de derrumbes sobre la carpeta de rodadura, rocas de gran densidad, cargue y bote a sitio autorizado.
Limpieza de transversales y obras de arte totalmente colmatadas.
Minería aplicada a rocas de gran densidad que se encuentran sobre la vía, cargue y bote.
Corte y figuración Acero de refuerzo vigas y elementos estructurales
Fabricación estructura de semiviaductos

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

limpieza de derrumbes sobre la carpeta de rodadura, rocas de gran densidad, cargue y bote a sitio autorizado.
Minería aplicada a rocas de gran densidad que se encuentran sobre la vía, cargue y retiro
Corte y figuración Acero de refuerzo vigas y elementos estructurales
Fabricación estructura de semiviaductos

OBSERVACIONES

FIRMAS

Residente de Interventoria
Nombre: Albertina Guerrero Vitale
C.C: 45.458.856

Residente Contratista
Nombre: Dahiana Bartolo
C.C:

	INFORMES SEMANALES TÉCNICOS	Secretaría de Obras Publicas
		Informe No 7
Cód. dependc	Serie / Sub serie / Modalidad / Año: 2022 / Consecutl	Desde 13 de hasta el 19 de febrero.

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	Conora-acero S.A.S	**Contratista:**	Construcciones Azimut SAS
Contrato No.		Contrato No.	
Objeto.	ATENCIÓN E INTERVENCIÓN DEL SEGUNDO TRAMO VIA LA BANCA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DE LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO 2022040000463 DEL 07 DE JUNIO DE 2022 Y AMPLIADA MEDIANTE EL DECRETO 2022040000588 DEL 06 DE AGOSTO DE 2022 Y LA URGENCIA MANIFIESTA ADOPTADA MEDIANTE LA	Objeto.	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA SUSCRITO PARA LA ATENCIÓN E INTERVENCIÓN DEL SEGUNDO TRAMO VÍA LA BANCA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DE LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO 2022040000463 DEL 07 DE JUNIO DE 2022 Y AMPLIADA MEDIANTE EL DECRETO 2022040000588 DEL 06 DE
Valor Inicial:	$ 6.652.306.217,00	Valor Inicial:	$ 382.151.416,00
Valor Actualizado:		Valor Actualizado:	$ 0,00
Plazo Inicial:	365	Plazo Inicial:	365
Plazo Actualizado:	365	Plazo Actualizado:	365
Fecha de Iniciación:	1/01/2023	Fecha de Iniciación:	1 de enero de 2023
Fecha de Vencimiento:	31/12/2023	Fecha de Vencimiento:	31/12/2023


Semana Número: 28 Del: 13/02/2023 Al: 19/02/2023 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 49 días

Nombre del Supervisor LUZ ADRIANA TORO ARIAS (Secretaaria Obras Públicas)
DANIEL CHAVARRIAGA RAVE (Apoyo técnico)

AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	2,00%	31,70%	Obra Física Ejecutada (%)	1,00%	21,50%
Valor de la Obra	$ 133.046.124,34	$ 2.108.781.070,79	Valor de la Obra	$ 66.523.062,17	$ 1.430.245.836,66

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	29,7%	20,5%	-10%
Durante el periodo	2,0%	1,0%	
Acumulado actual	31,7%	21,5%	



REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA (LA VÍA)

Se realizo topografía para describir de manera detallada la superficie de los puntos de intervención "la falla" y "falla nueva" localizados sobre el km 8+200 y respectivamente.

Recorrido del contratista a lo largo de todo el trayecto vial en compañía de obras publicas e interventoria, en donde se abordaron temas técnicos, programación y calidad de los diferentes puntos de intervención.

Continúa corte, figuración y armada acero de pilas y elementos estructurales

Demolición y construcción (encofrado, vaciado, alineamiento y pendiente según la norma) de cunetas de drenaje.
Fabricación en planta de vigas de viaducto y riostras
Fundida anillos en pilas

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA (LA VÍA)

Demolición y construcción (encofrado, vaciado, alineamiento y pendiente según la norma) de cunetas de drenaje.

Excavaciones y concretos en pilas

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

En proceso de Gestión de recurso para contrato y presupuesto contractual.

OBSERVACIONES	FIRMAS
Contratista adelanta en la fabricación de estructura metálica, y compra de insumos , sin embargo manifiesta preocupación por no tener recurso aprobado , teniendo en cuenta que la estructura metálica es un ítem de gran peso contractual.	
Las actividades programadas se ejecutaron satisfactoriamente y sin inconvenientes considerables con la comunidad, las intervenciones técnicas y estructurales atendieron con éxito , se espera continuar con la programación de obra para así poder subsanar todas las particularidades de la urgencia y brindad la tranquilidad anhelada a la comunidad	
En el punto crítico La Falla, se hace necesario el levantamiento topográfico y el estudio de suelo que nos arrojaría el tipo de suelo y las variables para poder determinar que alternativa es la más viable para atender esta afectación y contener el talud para recuperar la banca.	
	Residente de Interventoría Nombre: Albertina Guerrero Vitola CC. 45.458.886 Residente Contratista CC.

	INFORMES SEMANALES TÉCNICOS		Secretaría de Obras Publicas
			Informe No 8
			Desde 20 de hasta el 26 de febrero.

Cód. depende	Serie	Sub serie	Modalidad	Año	Consecuti
				2022	

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	Concre-acero S.A.S	**Contratista:**	Construcciones Azimut SAS
Contrato No.		Contrato No.	
Objeto.	ATENCIÓN E INTERVENCIÓN DEL SEGUNDO TRAMO VÍA LA BANCA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DE LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO 2022040000483 DEL 07 DE JUNIO DE 2022 Y AMPLIADA MEDIANTE EL DECRETO 2022040000599 DEL 06 DE AGUSTO DE 2022 Y LA URGENCIA MANIFIESTA ADOPTADA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 2022000057AR DEL 06 DE AGOSTO DE 2022	Objeto.	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA SUSCRITO PARA LA ATENCIÓN E INTERVENCIÓN DEL SEGUNDO TRAMO VÍA LA BANCA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DE LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO 2022040000483 DEL 07 DE JUNIO DE 2022 Y AMPLIADA MEDIANTE EL DECRETO 2022040000599 DEL 06 DE AGOSTO DE 2022 Y LA URGENCIA MANIFIESTA ADOPTADA
Valor Inicial:	$ 6.652.306.217,00	Valor Inicial:	
Valor Actualizado:		Valor Actualizado:	$ 0,00
Plazo Inicial:	365	Plazo Inicial:	365
Plazo Actualizado:	365	Plazo Actualizado:	365
Fecha de Iniciación:	1/01/2023	Fecha de Iniciación:	1 de enero de 2023
Fecha de Vencimiento:	31/12/2023	Fecha de Vencimiento:	31/12/2023

Semana Número: 29 Del: 20/02/2023 Al: 26/02/2023 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 56 días


Nombre del Supervisor LUZ ADRIANA TORO ARIAS (Secretaaria Obras Públicas)
DANIEL CHAVARRIAGA RAVE (Apoyo técnico)

AVANCE DEL CONTRATO


	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	1,00%	32,70%
Valor de la Obra	$ 66.523.062,17	$ 2.175.304.132,96

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	2,00%	23,50%
Valor de la Obra	$ 133.046.124,34	$ 1.563.291.961,00

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	31,7%	21,5%	-9%
Durante el periodo	1,0%	2,0%	
Acumulado actual	32,7%	23,5%	



REGISTRO FOTOGRÁFICO

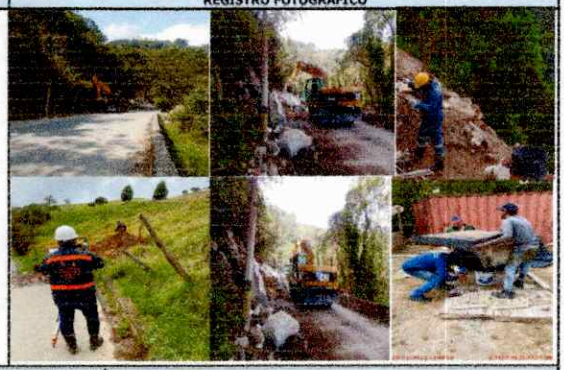

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA (LA VÍA)

Limpieza de derrumbe sobre la carpeta de rodadura, cargue y bote de material a espacio autorizado. Limpieza y mantenimiento de maquinaria pesada

Minería aplicada a roca de gran densidad, posterior cargue y botada a espacio autorizado.

Demolición y construcción (encofrado, vaciado, alineamiento y pendiente según la norma) de cunetas de drenaje.
Excavaciones y Concreto en pilas K1+40, K3+200 y K4+100

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA (LA VÍA)

demolición y construcción (encofrado, vaciado, alineamiento y pendiente según la norma) de cunetas de drenaje.

Roceria y limpieza de cunetas de drenaje a lo largo de todo el trayecto vial.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

las actividades programadas se ejecutaron satisfactoriamente y sin inconvenientes considerables, las intervenciones técnicas y estructurales atendieron con éxito las solicitudes demandantes, se espera continuar con la programación de obra para así poder subsanar todas las particularidades de la urgencia y brindad la tranquilidad anhelada a la comunidad Bellanita.

OBSERVACIONES	FIRMAS
Para evitar encharcamientos en la vía y evitar problemas de infiltración a las capas subyacentes, deben las cunetas de drenaje estar libres de cualquier obstrucción.	Residente de Supervisión Nombre: Albertina Guerrero Vitola CC. 45458856
El desacato del transeúnte a la señalización vial y a las indicaciones del personal humano de pare y siga, puede incurrir a accidentes de cualquier índole.	
Se identificaron algunas transversales que fueron condenadas o inhabilitadas por la comunidad, lo que se traduce a entorpecer la evacuación de el agua procedente de las precipitaciones para que la superficie de rodadura quede libre de encharcamientos y evitar así evitar el deterioro de la vía	Residente Contratista CC.
Se identificaron algunos arboles que se encuentran en peligro de colapso sobre la vía, se recomienda su traslado y trasplante.	
