INFORME SUPERVISIÓN MARZO 2023 INFORMES SEMANALES DE OBRA

	INFORMES SEMANALES TÉCNICOS	Secretaría de Obras Publicas
		Informe No 9
		Desde 27 de hasta el 5 de marzo.

Cód. depende	Serie	Sub serie	Modalidad	Año	Consecuti
				2022	

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	Concre-acero S.A.S	**Contratista:**	Construcciones Azimut SAS
Contrato No.		Contrato No.	
Objeto.	ATENCIÓN E INTERVENCIÓN DEL SEGUNDO TRAMO VÍA, LA BANCA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DE LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO 2022040000483 DEL 07 DE JUNIO DE 2022 Y AMPLIADA MEDIANTE EL DECRETO 2022040000588 DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 Y LA URGENCIA MANIFIESTA ADOPTADA MEDIANTE LA RESOLUCION 2022000005745 DEL 08 DE AGOSTO DE 2022	Objeto.	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA SUSCRITO PARA LA ATENCIÓN E INTERVENCIÓN DEL SEGUNDO TRAMO VÍA LA BANCA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DE LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PUBLICA DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO 2022040000483 DEL 07 DE JUNIO DE 2022 Y AMPLIADA MEDIANTE EL DECRETO 2022040000588 DEL 08 DE AGOSTO DE 2022 Y LA URGENCIA MANIFIESTA ADOPTADA
Valor Inicial:	$ 6.652.306.217,00	Valor Inicial:	
Valor Actualizado:		Valor Actualizado:	$ 0,00
Plazo Inicial:	365	Plazo Inicial:	365
Plazo Actualizado:	365	Plazo Actualizado:	365
Fecha de Iniciación:	1/01/2023	Fecha de Iniciación:	1 de enero de 2023
Fecha de Vencimiento:	31/12/2023	Fecha de Vencimiento:	31/12/2023


Semana Número: 30 Del: 27/02/2023 Al: 5/03/2023 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 63 días

Nombre del Supervisor VANESSA RAMIREZ (Apoyo técnico)
DANIEL CHAVARRIAGA RAVE (Apoyo técnico)

AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	9,00%	41,7%	Obra Física Ejecutada (%)	13,00%	36,50%
Valor de la Obra	$ 598.707.559,53	$ 2.774.011.692,49	Valor de la Obra	$ 864.799.808,21	$ 2.428.091.769,21

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	32,7%	23,5%	-5%
Durante el periodo	9,0%	13,0%	
Acumulado actual	41,7%	36,5%	



REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA (LA VÍA)

Figuración de acero estructural para pilas de fundación de los sitios de intervención "el poste", "barandal" y "hitos amarillos"

Demolición y construcción (encofrado, vaciado, alineamiento y pendiente según la norma) de cunetas de drenaje.

Excavacion de pilas de fundación en el "barandal" km4+100 equipo de minería.

Minería aplicada a rocas de gran densidad sobre la carpeta de rodadura, corte y perfilación de talud colapsado sobre la vía, cargue y bote a sitio autorizado.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA (LA VÍA)

demolición y construcción (encofrado, vaciado, alineamiento y pendiente según la norma) de cunetas de drenaje. Excavacion de pilas de fundación en el "barandal" km4+100 equipo de minería.

minería aplicada a rocas de gran densidad sobre la carpeta de rodadura, corte y perfilación de talud colapsado sobre la vía, cargue y bote a sitio autorizado.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

las actividades programadas se ejecutaron satisfactoriamente y sin inconvenientes considerables, las intervenciones técnicas y estructurales atendieron con éxito las solicitudes demandantes, se espera continuar con la programación de obra para así poder subsanar todas las particularidades de la urgencia y brindad la tranquilidad anhelada a la comunidad bellanita.

OBSERVACIONES

En Planta de Concre acero, continúa buen ritmo la fabricación de vigas de viaducto y elementos de acero

El desacato del transeunte a la señalización vial y a las indicaciones del personal humano de pare y siga, puede incurrir a accidentes de cualquier índole.

Se identificaron algunas transversales que fueron condenadas o inhabilitadas por la comunidad, lo que se traduce a entorpecer la evacuación de el agua procedente de las precipitaciones para que la superficie de rodadura quede libre de encharcamientos y evitar así evitar el deterioro de la vía

Se identificaron algunos arboles que se encuentran en peligro de colapso sobre la vía, se recomienda su traslado y trasplante.
Contratista manifiesta preocupación por tramite de disponibilidad presupuestal, ya que considera que se necesitan

FIRMAS

Residente de Interventoría _____
Nombre: Adriana Guerrero Vitola
CC. 45458856

Residente Contratista _____
Nombre:
CC:

	INFORMES SEMANALES TÉCNICOS		Secretaría de Obras Publicas
			Informe No 10
			Desde 05 al 12 de marzo

Cód. dependa	Serie	Sub serie	Modalidad	Año	Consecuti
1000	12	C1	SA	2020	1482

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	Concre-acero S.A.S	**Contratista:**	Construcciones Azimut SAS
Contrato No.		Contrato No.	
Objeto.	ATENCIÓN E INTERVENCIÓN DEL SEGUNDO TRAMO VÍA LA BANCA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DE LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO 20220400046 DEL 07 DE JUNIO DE 2022 Y AMPLIADA MEDIANTE EL DECRETO 20220400088 DEL 06 DE AGOSTO DE 2022 Y LA URGENCIA MANIFESTA ADOPTADA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 20220004540 DEL 04 DE AGOSTO DE 2022 Y DEMÁS	Objeto.	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA SUSCRITO PARA LA ATENCIÓN E INTERVENCIÓN DEL SEGUNDO TRAMO VÍA LA BANCA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DE LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PUBLICA DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO 20220400046 DEL 07 DE JUNIO DE 2022 Y AMPLIADA MEDIANTE EL DECRETO 20220400088 DEL 06 DE AGOSTO DE 2022 Y LA URGENCIA MANIFESTA ADOPTADA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN
Valor Inicial:	$ 6.652.306.217,00	Valor Inicial:	
Valor Actualizado:		Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	365	Plazo Inicial:	365
Plazo Actualizado:	365	Plazo Actualizado:	365
Fecha de Iniciación:	1/01/2023	Fecha de Iniciación:	1 de enero de 2023
Fecha de Vencimiento:	31/12/2023	Fecha de Vencimiento:	31/12/2023

Semana Número: 10 Del: 5/02/2023 Al: 12/03/2023 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 70 días

Nombre del Supervisor VANESSA RAMIREZ (Apoyo técnico)
DANIEL CHAVARRIAGA RAVE (Apoyo técnico)

AVANCE DEL CONTRATO


	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	5,00%	46,70%	Obra Física Ejecutada (%)	4,00%	40,50%
Valor de la Obra	$ 332.615.310,85	$ 3.106.627.003,34	Valor de la Obra	$ 266.092.248,68	$ 2.694.184.017,89

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	41,7%	36,5%	-6,2%
Durante el periodo	5,0%	4,00%	
Acumulado actual	46,7%	40,50%	



REGISTRO FOTOGRÁFICO

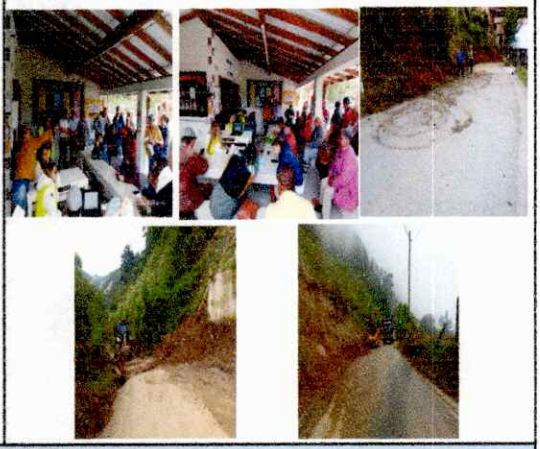

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Continúa con rocería, limpieza de cunetas , retiro de material colmatado en transversales,

Cargue y retiro de material de derrumbes y de limpieza a botadero autorizado.

Socialización con la comunidad del impacto del proyecto a lo largo del tramo de La vía la banca. En compañía de las diferentes secretarías que intervienen en el proyecto.

Perfilamiento de talud y retiro de material

Se incrementa e instala número de señales de obra en la vía

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Señalización de obra, limpieza de cunetas y transversales,reconstrucción de cunetas, perforaciones en suelo, remoción y cargue de derrumbes.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Actualmente se están Perfeccionando los Contratos de obra y de interventoría.

OBSERVACIONES

Se insiste que las autoridades competentes deben socializar con la comunidad los riesgos que presenta la ya y que si bien se ha venido ejecutando actividades de limpieza y mantenimiento, los problemas de la vía se hacen mas visibles en.

Con el fin de proteger los taludes inestables y evitar su saturación por efectos de lluvias, contratista cubre estos con plástico transparente

FIRMAS

Residente de Supervisión
Nombre: Albertina Guerrero Vitola
CC.: 45458856

Residente Contratista
Nombre:
CC.:

	INFORMES SEMANALES TÉCNICOS	Secretaría de Obras Publicas
		Informe No 11
		Desde 12 al 19 de marzo

Cód. depende	Serie	Sub serie	Modalidad	Año	Consecuti
1000	12	C1	SA	2020	1482

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	Concre-acero S.A.S	**Contratista:**	Construcciones Azimut SAS
Contrato No.		Contrato No.	
Objeto.	ATENCIÓN E INTERVENCIÓN DEL SEGUNDO TRAMO VÍA LA BANCA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DE LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO 202204000463 DEL 07 DE JUNIO DE 2022 Y AMPLIADA MEDIANTE EL DECRETO 202204000588 DEL 06 DE AGOSTO DE 2022 Y LA URGENCIA MANIFIESTA ADOPTADA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 202200006743 DEL 06 DE AGOSTO DE 2022 Y LOS DEMÁS	Objeto.	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA SUSCRITO PARA LA ATENCIÓN E INTERVENCIÓN DEL SEGUNDO TRAMO VÍA LA BANCA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DE LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO 202204000463 DEL 07 DE JUNIO DE 2022 Y AMPLIADA MEDIANTE EL DECRETO 202204000588 DEL 06 DE AGOSTO DE 2022 Y LA URGENCIA MANIFIESTA ADOPTADA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN
Valor Inicial:	$ 6.652.306.217,00	Valor Inicial:	
Valor Actualizado:		Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	365	Plazo Inicial:	365
Plazo Actualizado:	365	Plazo Actualizado:	365
Fecha de Iniciación:	1/01/2023	Fecha de Iniciación:	1 de enero de 2023
Fecha de Vencimiento:	31/12/2023	Fecha de Vencimiento:	31/12/2023

Semana Número: 11 Del: 12/03/2023 Al: 19/03/2023 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 77 días

Nombre del Supervisor VANESSA RAMIREZ (Apoyo técnico)
DANIEL CHAVARRIAGA RAVE (Apoyo técnico)

AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	5,00%	51,70%	Obra Física Ejecutada (%)	3,00%	43,50%
Valor de la Obra	$ 332.615.310,85	$ 3.439.242.314,19	Valor de la Obra	$ 199.569.186,51	$ 2.893.753.204,40

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	46,7%	40,5%	-8,2%
Durante el periodo	5,0%	3,00%	
Acumulado actual	51,7%	43,50%	



REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Continúa con rocería, limpieza de cunetas , retiro de material colmatado en transversales,
Cargue y retiro de material de derrumbes y de limpieza a botadero autorizado.
Reconstrucción de cunetas y bordillos.
Perfilamiento de talud y retiro de material
Excavaciones en pilas , armada acero de refuerzo para puntos críticos . Cortes y excavaciones para elementos estructurales

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Limpieza, y reparación de cunetas, cargue y retiro material de derrumbes, perfilamiento de taludes. Excavaciones en pilas y corte para viaductos y muros Colocación de canastas de refuerzo en pilas

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Actualmente se están Perfeccionando los Contratos de obra y de interventoría y se avanza con la entrega de los ajustes y calibración de los diseños.

OBSERVACIONES

La limpieza de transversales se ha visto impedida por que algunos dueños de predios no permiten la limpieza y retiro de material en estos, es por esta razón que desde la profesional social del contratista en acompañamiento con la
Continúa fabricación de estructura de viaductos en planta taller del Contratsita
Contratsita acondicona campamentos provisionales cerca acada punto critico

FIRMAS

Residente de Interventoria
Nombre: Albertina Guerrero Vitola
CC.: 45458856

Residente Contratista
Nombre:
CC.:

	INFORMES SEMANALES TÉCNICOS	Secretaría de Obras Publicas
		Informe No 12
		Desde 19 al 26 de marzo

Cód. dependa	Serie	Sub serie	Modalidad	Año	Consecuti
1000	12	C1	SA	2020	1482

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	Concre-acero S.A.S	**Contratista:**	Construcciones Azimut SAS
Contrato No.		Contrato No.	
Objeto.	ATENCIÓN E INTERVENCIÓN DEL SEGUNDO TRAMO VÍA LA BANCA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DE LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO 20220400048 DEL 07 DE JUNIO DE 2022 Y AMPLIADA MEDIANTE EL DECRETO 20220400568 DEL 06 DE AGOSTO DE 2022 Y LA URGENCIA MANIFIESTA ADOPTADA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN [illegible] DEL 06 DE AGOSTO DE 2022 Y LOS DEMÁS	Objeto.	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA SUSCRITO PARA LA ATENCIÓN E INTERVENCIÓN DEL SEGUNDO TRAMO VÍA LA BANCA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DE LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO 20220400048 DEL 07 DE JUNIO DE 2022 Y AMPLIADA MEDIANTE EL DECRETO 20220400568 DEL 06 DE AGOSTO DE 2022 Y LA URGENCIA MANIFIESTA ACORTADA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN [illegible]
Valor Inicial:	$ 6.652.306.217,00	Valor Inicial:	
Valor Actualizado:		Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	365	Plazo Inicial:	365
Plazo Actualizado:	365	Plazo Actualizado:	365
Fecha de Iniciación:	1/01/2023	Fecha de Iniciación:	1 de enero de 2023
Fecha de Vencimiento:	31/12/2023	Fecha de Vencimiento:	31/12/2023

Semana Número: 12 Del: 19/03/2023 Al: 26/03/2023 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 84 días

Nombre del Supervisor VANESSA RAMIREZ (Apoyo técnico)
DANIEL CHAVARRIAGA RAVE (Apoyo técnico)

AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	2,00%	53,70%	Obra Física Ejecutada (%)	3,00%	46,50%
Valor de la Obra	$ 133.046.124,34	$ 3.572.288.438,53	Valor de la Obra	$ 199.569.186,51	$ 3.093.322.390,91

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	51,7%	43,5%	-7,2%
Durante el periodo	2,0%	3,00%	
Acumulado actual	53,70%	46,50%	



REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Continúa con rocería, limpieza de cunetas , retiro de material colmatado en transversales,
Cargue y retiro de material de derrumbes y de limpieza a botadero autorizado.
Reconstrucción de cunetas y bordillos
Excavaciones en pilas, construcción de anillos, corte, figuración y armada de acero de refuerzo. Colocación de canastas de refuerzo en pilas
Corte en vía para excavaciones
Perfilamiento de talud y retiro de material

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Cargue y retiro material de derrumbes, perfilamiento de taludes. Reconstrucción de cunetas. Acero de refuerzo, fabricación vigas viaductos. Concretos en pilas

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Actualmente se están Perfeccionamiento los Contratos de obra y de interventoría , en ejecución obras civiles de mitigación .

OBSERVACIONES

Se recalca que las autoridades competentes deben socializar con la comunidad los riesgos que presenta la vía y que si bien se ha venido ejecutando actividades de limpieza y mantenimiento, los problemas de la vía se hacen mas visibles en
Se realiza constante barrido por parte de personal operativo en la Vía
La inestabilidad en taludes con movimiento en masa hace que se produzcan en reiteradas ocasiones derrumbes, por lo que se ha optado con el uso de maquinaria tipo pajarita en perfilar esos taludes inestables.

FIRMAS

Residente de Interventoría
Nombre: Albertina Guerrero Vitola
CC.: 45458856

Residente Contratista
Nombre:
CC.:
