INFORME SUPERVISIÓN JULIO 2023 INFORMES SEMANALES DE OBRA

	INFORMES SEMANALES TÉCNICOS	Secretaría de Obras Publicas
		Informe No 26
		Desde 25 de Junio al 02 de Julio

Cód. depende	Serie	Sub serie	Modalidad	Año	Consecuti
1100			CD	2023	1168

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	Concre-acero S.A.S	**Contratista:**	Construcciones Azimut SAS
Contrato No.	1168 DE 2023	Contrato No.	1169 DE 2023
Objeto.	ATENCIÓN E INTERVENCIÓN DEL SEGUNDO TRAMO VÍA LA BANCA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DE LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PUBLICA DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO 20220400046 DEL 07 DE JUNIO DE 2022 Y AMPLIADA MEDIANTE EL DECRETO 20220400568 DEL 06 DE AGOSTO DE 2022 Y LA URGENCIA MANIFIESTA ADOPTADA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN	Objeto.	INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA SUSCRITO PARA LA ATENCION E INTERVENCION DEL SEGUNDO TRAMO VÍA LA BANCA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DE LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PUBLICA DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO 20220400463 DEL 07 DE JUNIO DE 2022 Y AMPLIADA MEDIANTE EL DECRETO 20220400568 DEL 06 DE AGOSTO DE
Valor Inicial:	$ 7.689.800.471,00	Valor Inicial:	$ 533.292.550,00
Valor Actualizado:		Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	365	Plazo Inicial:	365
Plazo Actualizado:	365	Plazo Actualizado:	365
Fecha de Iniciación:	1/01/2023	Fecha de Iniciación:	1 de enero de 2023
Fecha de Vencimiento:	31/12/2023	Fecha de Vencimiento:	31/12/2023

Semana Número: 26 Del: 25/06/2023 Al: 2/07/2023 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 182 días

Nombre del Supervisor CLAUDIA MARCELA ARISTIZABAL
VANESSA RAMIREZ G (Apoyo técnico)

AVANCE DEL CONTRATO


	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	3,00%	59,50%
Valor de la Obra	$ 230.694.014,13	$ 4.575.431.280,25

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	2,00%	57,00%
Valor de la Obra	$ 153.796.009,42	$ 4.383.186.268,47

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	56,5%	55,00%	
Durante el periodo	3,0%	2,0%	-3%
Acumulado actual	59,5%	57,0%	



REGISTRO FOTOGRÁFICO

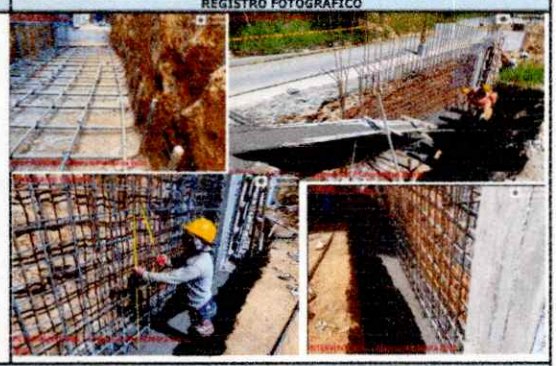

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Corte, excavaciones y banqueo para procedimiento de cimentaciones y zapatas de muro, estribos y aletas
Se arma refuerzo para diferentes elementos estructurales de muros de viaductos como estribos y aletas
Continúa excavaciones en pilas con construcción de anillos y concretos vigas de cimentación y pilas
Reconstrucción de bordillos y cunetas en concreto. Minería en puntos donde se presente desprendimiento de material rocoso.
Concretos para diferentes elementos estructurales ,zapatas, estribos, viga cimentación muros

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Corte, figuración y armada acero en cimentaciones, muros, estribos, aletas, Remoción de derrumbes, Armada de formaleta y concretos para diferentes elementos estructurales, instalación de neoprenos, y platinas.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

las actividades programadas se ejecutaron satisfactoriamente y sin inconvenientes considerables, las intervenciones técnicas y estructurales atendieron con éxito las solicitudes demandantes, se espera continuar con la programación de obra para así poder subsanar todas las particularidades de la urgencia y brindad la tranquilidad anhelada a la comunidad Bellanita.

OBSERVACIONES

Contratista prepara acta de corte con el fin de tener suficiente recurso para las adquisiciones en lo que se refiere a
Se intervino diferentes puntos paralelamente con la construcción de las diferentes alternativas de acuerdo al ajuste y calibración de diseños.
Se visualiza un nuevo punto Crítico K7+400
En los procedimientos constructivios, en espeial fundidas en concreto reforzao, ha sido necesario el manejo de una buena logistica y comunicación con la comunidad para evitar inconformismo y traumatismo.

FIRMAS

Residente de Interventoría
Nombre: Albertina Guerrero Vitola
CC. 45.4588.856

Residente Contratista
CC:

	INFORMES SEMANALES TÉCNICOS	Secretaría de Obras Publicas
		Informe No 27
		Desde 02 hasta el 9 de Julio

Cód. depende	Serie	Sub serie	Modalidad	Año	Consecutivo
1100			CD	2023	1168

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	Concre-acero S.A.S	**Contratista:**	Construcciones Azimut SAS
Contrato No.	1168 DE 2023	Contrato No.	1169 DE 2023
Objeto.	TRAMO VÍA LA BANCA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DE LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO 202204000463 DEL 07 DE JUNIO DE 2022 Y AMPLIADA MEDIANTE EL DECRETO 202204000588 DEL 06 DE AGOSTO DE 2022 Y LA	Objeto.	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA SUSCRITO PARA LA ATENCION E INTERVENCION DEL SEGUNDO TRAMO VÍA LA BANCA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DE LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO 202204000463 DEL 07 DE JUNIO DE 2022 Y AMPLIADA MEDIANTE EL DECRETO 202204000588 DEL 06 DE AGOSTO DE
Valor Inicial:	$ 7.689.800.471,00	Valor Inicial:	$ 533.292.550,00
Valor Actualizado:		Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	365	Plazo Inicial:	365
Plazo Actualizado:	365	Plazo Actualizado:	365
Fecha de Iniciación:	1/01/2023	Fecha de Iniciación:	1 de enero de 2023
Fecha de Vencimiento:	31/12/2023	Fecha de Vencimiento:	31/12/2023

Semana Número: 27 Del: 2/06/2023 Al: 9/07/2023 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 189 días


Nombre del Supervisor CLAUDIA MARCELA ARISTIZABAL
VANESSA RAMIREZ G (APOYO TECNICO)

AVANCE DEL CONTRATO


	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	1,50%	61,00%
Valor de la Obra	$ 115.347.007,07	$ 4.690.778.287,31

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Fisica Ejecutada (%)	1,00%	58,00%
Valor de la Obra	$ 76.898.004,71	$ 4.460.084.273,18

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	59,5%	57,0%	
Durante el periodo	1,5%	1,0%	-3%
Acumulado actual	61,0%	58,0%	



REGISTRO FOTOGRÁFICO

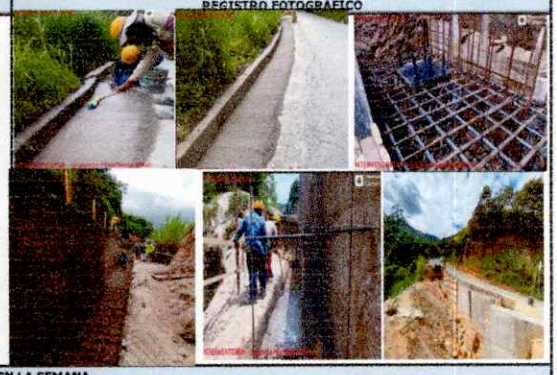

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Continúa corte, figuración y armada acero de refuerzo para cimentaciones, estribos, aletas y muros de contención
Concretos y desencofre de muros de contención en viaductos K1+400 y K3 +200,
Construcción de bordillos y cunetas
Continúa en planta fabricación elementos estructurales de acero para semiviaductos
Instalación de neoprenos en zapatas de semiviaductos
Construcción de cunetas y bordillos

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continúa corte, figuración y armada acero de refuerzo para cimentaciones, estribos, aletas y muros de contención
Construcción de cunetas y bordillos

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

En perfeccionamiento, emisión de garantías. Contratista prepara Acta de corte No. 1

OBSERVACIONES

Contratista prepara acta de corte con el fin de tener suficiente recurso para las adquisiciones en lo que se refiere a
Se interviene diferentes puntos paralelamente con la construcción de las diferentes alternativas de acuerdo al ajuste y
Se visualiza un nuevo punto Critico K7+400
En los procedimientos constructivos, en especial fundidas en concreto reforzado, ha sido necesario el manejo de una buena logística y comunicación con la comunidad para evitar inconformismo y traumatismo.

FIRMAS

Residente de Interventoría
Nombre: Albertina Guarrero Vitola
CC. 45.4588.856

Residente Contratista
CC:

	INFORMES SEMANALES TÉCNICOS	Secretaría de Obras Publicas
		Informe No 28
		Desde 09 hasta el 16 de Julio.

Cód. depende	Serie	Sub serie	Modalidad	Año	Consecuti
1100			CD	2023	1168

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	Concre-acero S.A.S	**Contratista:**	Construcciones Azimut SAS
Contrato No.	1168 DE 2023	Contrato No.	1169 DE 2023
Objeto.	TRAMO VÍA LA BANCA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DE LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO 202204000463 DEL 07 DE JUNIO DE 2022 Y AMPLIADA MEDIANTE EL DECRETO 202204000588 DEL 06 DE AGOSTO DE 2022 Y	Objeto.	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA SUSCRITO PARA LA ATENCIÓN E INTERVENCIÓN DEL SEGUNDO TRAMO VÍA LA BANCA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DE LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO 202204000463 DEL 07 DE JUNIO DE 2022 Y AMPLIADA MEJIANTE EL DECRETO 202204000588 DEL 06 DE AGOSTO DE 2022 Y ADICIONES DE PRORROGA Y ADICIONAL"
Valor Inicial:	$ 7.689.800.471,00	Valor Inicial:	$ 533.292.550,00
Valor Actualizado:	$ 0,00	Valor Actualizado:	$ 0,00
Plazo Inicial:	365	Plazo Inicial:	365
Plazo Actualizado:	365	Plazo Actualizado:	365
Fecha de Iniciación:	1/01/2023	Fecha de Iniciación:	1 de enero de 2023
Fecha de Vencimiento:	31/12/2023	Fecha de Vencimiento:	31/12/2023

Semana Número: 28 Del: 9/07/2023 Al: 16/07/2023 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 196 días


Nombre del Supervisor CLAUDIA MARCELA ARISTIZABAL
VANESSA RAMIREZ G (APOYO TECNICO)

AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	1,00%	62,00%
Valor de la Obra	$ 168.910.791,00	$ 3.910.207.658,00

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,50%	58,50%
Valor de la Obra	$ 57.707.487,00	$ 4.131.014.695,00

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	61,0%	58,0%	-4%
Durante el periodo	1,0%	0,5%	
Acumulado actual	62,0%	58,5%	



REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA (LA VÍA)

Se realizó topografía para levantamiento de manera detallada la ubicación y extensión de los puntos de intervención "La Falla" y "Punto nuevo" localizados sobre el km 8+200 y Recorrido del contratista a lo largo de todo el trayecto vial en compañía de obras publicas e interventoria, en donde se abordaron temas técnicos, programación y calidad de los

Continúa corte, figuración y armada acero de refuerzo para cimentaciones, estribos, aletas y muros de contención

Concretos y desencofre de muros de contención en viaductos K1+400 y K3 +200,

Construcción de bordillos y cunetas

Continúa en planta fabricación elementos estructurales de acero para semiviaductos

Instalación de neoprenos en zapatas de semiviaductos

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA (LA VÍA)

Armada acero de refuerzo elementos estructurales, pilas, vigas de cimentación, muros de contención, estribos aletas concretos en cimentaciones , pilas y muros

Armada de formaleta para muros e instalación de neoprenos

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

En legalización y ejecución

OBSERVACIONES

Contratista prepara acta de corte con el fin de tener suficiente recurso para las adquisiciones en lo que se refiere a

Se interviene diferentes puntos paralelamente con la construcción de las diferentes alternativas de acuerdo al ajuste

Se visualiza un nuevo punto Crítico K7+400

En los procedimientos constructivos, en especial fundidas en concreto reforzado, ha sido necesario el manejo de una buena logística y comunicación con la comunidad para evitar inconformismo y traumatismo.

FIRMAS

Residente de Interventoría
Nombre: Albertina Guerrero Vitola
CC. 45.458.856

Residente Contratista
CC:

	INFORMES SEMANALES TÉCNICOS	Secretaría de Obras Publicas
		Informe No 30
		Desde 23 de hasta el 30 de Julio.

Cód. depende	Serie	Sub serie	Modalidad	Año	Consecuti
1100			CD	2023	1168

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	Concre-acero S.A.S	**Contratista:**	Concre-acero S.A.S
Contrato No.	1168 DE 2023	Contrato No.	1169 DE 2023
Objeto.	CONSTRUCCIÓN E INTERVENCIÓN DEL SEGUNDO TRAMO VÍA LA BANCA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DE LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO 202204000463 DEL 07 DE JUNIO DE 2022 Y AMPLIADA MEDIANTE EL DECRETO 202204000588 DEL 06 DE AGOSTO DE 2022 Y LA URGENCIA MANIFIESTA ADOPTADA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 202200005742 DEL 06 DE AGOSTO DE 2022 Y LOS DEMÁS	Objeto.	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA SUSCRITO PARA LA ATENCIÓN E INTERVENCIÓN DEL SEGUNDO TRAMO VÍA LA BANCA EN EL MARCO DE LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PUBLICA DECLARADA MEDIANTE AL DECRETO 202204000463 DEL 07 DE JUNIO DE 2022 Y AMPLIADA MEDIANTE EL DECRETO 2022 202204000588 DEL 06 DE AGOSTO DE 2022 Y LA URGENCIA MANIFIESTA ADOPTADA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 202200005742 DE 06 DE AGOSTO DE 2022 Y LOS DEMÁS ACTOS QUE COMPLEMENTEN, MODIFIQUEN, ACLAREN Y/O LOS ADICIONEN"
Valor Inicial:	$ 7.689.800.471,00	Valor Inicial:	$ 533.292.550,00
Valor Actualizado:		Valor Actualizado:	$ 0,00
Plazo Inicial:	365	Plazo Inicial:	365
Plazo Actualizado:	365	Plazo Actualizado:	365
Fecha de Iniciación:	1/01/2023	Fecha de Iniciación:	1 de enero de 2023
Fecha de Vencimiento:	31/12/2023	Fecha de Vencimiento:	31/12/2023

Semana Número: 30 Del: 23/07/2023 Al: 30/07/2023 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 210 días

Nombre del Supervisor CLAUDIA MARCELA ARISTIZABAL

VANESSA RAMIREZ G (APOYO TECNICO)

AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,30%	62,80%
Valor de la Obra	$ 23.069.401,41	$ 4.829.194.695,79

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,30%	59,30%
Valor de la Obra	$ 23.069.401,41	$ 4.560.051.679,30

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	62,5%	59,0%	-4%
Durante el periodo	0,3%	0,3%	
Acumulado actual	62,8%	59,3%	



REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA (LA VÍA)

Figuración de acero estructural para pilas de fundación , vigas de cimentación , muros, estribos, y aletas

Corte y demolición carpeta asfáltica Demolición

Excavacion de pilas de fundación en el punto crítico K7+400 Punto nuevo y en tubería expuesta K4+900

Minería aplicada a rocas de gran densidad sobre la carpeta de rodadura, corte y perfilación de talud colapsado sobre la vía, cargue y bote a sitio autorizado.

Encofrada, y concreto pilas, cimentaciones, muros

Izaje de canastas refuerzo de pilas

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA (LA VÍA)

Excavaciones en pilas, cimentaciones, banqueo

Encofrado y concretos para elementos estructurales

Minería aplicada a rocas de gran densidad sobre la carpeta de rodadura, corte y perfilación ,

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

En ejecución legalizado, Se adelantan actividades en cada uno de los puntos críticos identificados y contemplados en el alcance contractual

OBSERVACIONES	**FIRMAS**
En el sitio crítico Punto nuevo K7+400 se encuentra suelo rocoso que se hace necesario aplicar minería	
Se interviene diferentes puntos paralelamente con la construcción de las diferentes alternativas de acuerdo al ajuste	
En los procedimientos constructivos, en especial fundidas en concreto reforzado, ha sido necesario el manejo de una buena logística y comunicación con la comunidad para evitar inconformismo y traumatismo.	Residente de Interventoría Nombre: Albertina Guerrero Vitola CC. 45458856 Residente Contratista CC:
