INFORME SUPERVISIÓN AGOSTO 2023 INFORMES SEMANALES DE OBRA

	INFORMES SEMANALES TÉCNICOS	Secretaría de Obras Publicas
		Informe No 31
		Desde 30 de julio hasta el 06 de agosto.

Cód. depende	Serie	Sub serie	Modalidad	Año	Consecuti
1100			CD	2023	1168

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	Concre-acero S.A.S	**Contratista:**	Construcciones Azimut SAS
Contrato No.	1168 DE 2023	Contrato No.	1169 DE 2023
Objeto.	TRAMO VÍA LA BANCA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DE LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO 202204000463 DEL 07 DE JUNIO DE 2022 Y AMPLIADA MEDIANTE EL DECRETO 202204000588 DEL 06 DE AGOSTO DE 2022 Y	Objeto.	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA SUSCRITO PARA LA ATENCIÓN E INTERVENCIÓN DEL SEGUNDO TRAMO VÍA LA BANCA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DE LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO 202204000463 DEL 07 DE JUNIO DE 2022 Y AMPLIADA MEDIANTE EL DECRETO 202204000588 DEL 06 DE AGOSTO DE 2022 Y LA URGENCIA MANIFIESTA ADOPTADA
Valor Inicial:	$ 7.689.800.471,00	Valor Inicial:	$ 533.292.550,00
Valor Actualizado:	$ 0,00	Valor Actualizado:	$ 0,00
Plazo Inicial:	365	Plazo Inicial:	365
Plazo Actualizado:	365	Plazo Actualizado:	365
Fecha de Iniciación:	1/01/2023	Fecha de Iniciación:	1 de enero de 2023
Fecha de Vencimiento:	31/12/2023	Fecha de Vencimiento:	31/12/2023

Semana Número: 31 Del: 30/07/2023 Al: 6/08/2023 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 217 días

Nombre del Supervisor CLAUDIA MARCELA ARISTIZABAL
VANESSA RAMIREZ G (APOYO TECNICO)

AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	1,00%	63,80%
Valor de la Obra	$ 76.898.004,71	$ 4.906.092.700,50

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,20%	59,50%
Valor de la Obra	$ 15.379.600,94	$ 4.575.431.280,25

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	62,8%	59,3%	-4%
Durante el periodo	1,0%	0,2%	
Acumulado actual	63,8%	59,5%	



REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA (LA VÍA)

Armada de acero de refuerzo para zapatas , viga y muro de contención en K7+400 y encofrado y fundida de muros K3+200

Chequeos de niveles, alineamiento para encofrado y armada acero de refuerzo con topografía

Rocería en tramos de vías

Construcción de cunetas y bordillos

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA (LA VÍA)

Excavaciones en pilas en Punto nuevo K7+400 con minería, fundida de pilas, banqueo. Excavaciones de pilas K4 + 900 Tubería expuesta

Izaje de canastas de refuerzo y concretos de pilas y demás elementos estructurales-

Construcción de cunetas y bordillos

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

En ejecución, Avanza en cumplimiento del alcance contractual.

OBSERVACIONES	FIRMAS
En los procedimientos constructivos en los nuevos puntos críticos, se ha observado el rendimiento ha bajado debido a la roca encontrada que ha sido necesario el uso de equipo de minería y la situación de riesgo para los operativos ya que el movimiento en masa y el desprendimiento de la banca es constante, sin embargo se maneja una logística	Residente de Interventoría Nombre: Albertina Guerrero Vitola CC. 45458856
Se le pide a la comunidad un poco de paciencia ya que en fundida de pilas se interrumpe el tráfico en tiempo extendido.	Residente Contratista Nombre: CC:

	INFORMES SEMANALES TÉCNICOS	Secretaría de Obras Publicas
		Informe No 32
		Desde 08 de agosto hasta el 13 de agosto.

Cód. depende	Serie	Sub serie	Modalidad	Año	Consecuti
1100			CD	2023	1168

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	Concre-acero S.A.S	**Contratista:**	Construcciones Azimut SAS
Contrato No.	1168 DE 2023	Contrato No.	1169 DE 2023
Objeto.	TRAMO VÍA LA BANCA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DE LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO 202204000463 DEL 07 DE JUNIO DE 2022 Y AMPLIADA MEDIANTE EL DECRETO 202204000588 DEL 06 DE AGOSTO DE 2022 Y	Objeto.	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA SUSCRITO PARA LA ATENCIÓN E INTERVENCIÓN DEL SEGUNDO TRAMO VÍA LA BANCA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DE LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO 202204000463 DEL 07 DE JUNIO DE 2022 Y AMPLIADA MEDIANTE EL DECRETO 202204000588 DEL 06 DE AGOSTO DE 2022 Y LA LIGENCIA MANIFESTA ACEPTADA
Valor Inicial:	$ 7.689.800.471,00	Valor Inicial:	$ 533.292.550,00
Valor Actualizado:	$ 0,00	Valor Actualizado:	$ 0,00
Plazo Inicial:	365	Plazo Inicial:	365
Plazo Actualizado:	365	Plazo Actualizado:	365
Fecha de Iniciación:	1/01/2023	Fecha de Iniciación:	1 de enero de 2023
Fecha de Vencimiento:	31/12/2023	Fecha de Vencimiento:	31/12/2023

Semana Número: 32 Del: 6/08/2023 Al: 13/08/2023 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 224 días

Nombre del Supervisor CLAUDIA MARCELA ARISTIZABAL
VANESSA RAMIREZ G (APOYO TECNICO)

AVANCE DEL CONTRATO


	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,20%	64,00%
Valor de la Obra	$ 15.379.600,94	$ 4.921.472.301,44

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,20%	59,70%
Valor de la Obra	$ 15.379.600,94	$ 4.590.810.881,19

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	63,8%	59,5%	-4%
Durante el periodo	0,2%	0,2%	
Acumulado actual	64,0%	59,7%	



REGISTRO FOTOGRÁFICO

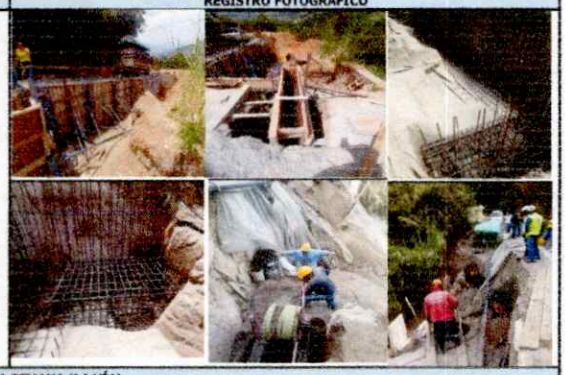

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA (LA VÍA)

Armada de acero de refuerzo para zapatas , viga y muro de contención en K7+400 y encofrado y fundida de muros K3+200

Chequeos de niveles, alineamiento para encofrado y armada acero de refuerzo con topografía

Izaje canastas de refuerzo pilas

Construcción de cunetas y bordillos

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA (LA VÍA)

Excavaciones en pilas en los puntos intervenidos, construcción de anillos ye izaje de canastas de refuerzo

Concretos varios para pilas , cimentaciones y muros. Banqueo, corte u excavaciones caja para viaductos y Retiro de material

Construcción de cunetas y bordillos

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

En ejecución , en cumplimiento alcance contractual

OBSERVACIONES
En los procedimientos constructivos en los nuevos puntos críticos, se ha observado el rendimiento ha bajado debido a la roca encontrada que ha sido necesario el uso de equipo de minería y la situación de riesgo para los operativos ya que el movimiento en masa y el desprendimiento de la banca es constante, sin embargo se maneja una logística segura y que no afecte el libre paso de trafico
Se le pide a la comunidad un poco de paciencia ya que en fundida de pilas se interrumpe el tráfico en tiempo extendido.

FIRMAS

Residente de Interventoría _____
Nombre: 45458856
CC. : 45458856

Residente Contratista _____
CC:

	INFORMES SEMANALES TÉCNICOS	Secretaría de Obras Publicas
		Informe No 33
		Desde 13 hasta el 20 de agosto.

Cód. dependie	Serie	Sub serie	Modalidad	Año	Consecuti
1100			CD	2023	1168

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	Concre-acero S.A.S	**Contratista:**	Construcciones Azimut SAS
Contrato No.	1168 DE 2023	Contrato No.	1169 DE 2023
Objeto.	TRAMO VÍA LA BANCA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DE LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PUBLICA DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO 202204000463 DEL 07 DE JUNIO DE 2022 Y AMPLIADA MEDIANTE EL DECRETO 202204000588 DEL 06 DE AGOSTO DE 2022 Y	Objeto.	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA SUSCRITO PARA LA ATENCIÓN E INTERVENCIÓN DEL SEGUNDO TRAMO VÍA LA BANCA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DE LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO 202204000463 DEL 07 DE JUNIO DE 2022 Y AMPLIADA MEDIANTE EL DECRETO 202204000588 DEL 06 DE AGOSTO DE 2022 Y LA EMERGENCIA MANIFIESTA ECONÓMICA
Valor Inicial:	$ 7.689.800.471,00	Valor Inicial:	$ 533.292.550,00
Valor Actualizado:	$ 0,00	Valor Actualizado:	$ 0,00
Plazo Inicial:	365	Plazo Inicial:	365
Plazo Actualizado:	365	Plazo Actualizado:	365
Fecha de Iniciación:	1/01/2023	Fecha de Iniciación:	1 de enero de 2023
Fecha de Vencimiento:	31/12/2023	Fecha de Vencimiento:	31/12/2023

Semana Número: 33 Del: 13/08/2023 Al: 20/08/2023 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 231 días


Nombre del Supervisor CLAUDIA MARCELA ARISTIZABAL
VANESSA RAMIREZ G (APOYO TECNICO)

AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	64,00%	65,00%
Valor de la Obra	$ 231.062.534,00	$ 4.927.521.991,00

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	58,00%	60,70%
Valor de la Obra	$ 195.113.433,00	$ 4.573.993.218,00

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	64,0%	59,7%	-4%
Durante el periodo	1,0%	1,0%	
Acumulado actual	65,0%	60,7%	



REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA (LA VIA)

Excavaciones en pilasy construcción de anillos sitios K7+400 y K4+900, Punto Nuevo y Tubería expuesta . Minería por gran tamaño de rocas encontradas , izaje de canastas de refuerzo, Corte, figuración y armada de acero de refuerzo.

Concreto en pilas para muros y elementos estructurales para semiviaductos , Refuerzo en zapatas, vigas y muros estribos y aletas

Continúa la reconstrucción de bordillos y cunetas
Cargue y retiro de material a sitio autorizado

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA (LA VIA)

Continuar con las fundidads para cimentaciones y muros en diferentes puntos intervenidos, armada de refuerzo en viaductos y muros de contención

Excavaciones en pilas para muros en K4+900 y en k7+400

Continúa proceso de fabricación de vigas en acero estructural y demas elementos en la planta del contratista para construcción de semiviaductos

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

En ejecución y en cumplimiento de alcance contractual

OBSERVACIONES	FIRMAS
En los procedimientos constructivos en los nuevos puntos críticos, se ha observado el rendimiento ha bajado debido a la roca encontrada que ha sido necesario el uso de equipo de minería y la situación de riesgo para los operativos ya que el movimiento en masa y el desprendimiento de la banca es constante, sin embargo se maneja una logística segura y que no afecte el libre paso de trafico	Residente de Interventoría Nombre: Albertina Guerrero Vitola CC. 45458856 Residente Contratista CC:
Se le pide a la comunidad un poco de paciencia ya que en fundida de pilas se interrumpe el tráfico en tiempo extendido.	
Se da la necesidad de minería para excavaciones en roca, ítem que por su costo y cantidad, se refleja en el presupuesto con mayores cantidades, esto es en K7+400	

	INFORMES SEMANALES TÉCNICOS	Secretaría de Obras Publicas
		Informe No 34
		Desde 20 hasta el 27 de agosto.

Cód. depende	Serie	Sub serie	Modalidad	Año	Consecuti
1100			CD	2023	1168

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	Concre-acero S.A.S	**Contratista:**	Construcciones Azimut SAS
Contrato No.	1168 DE 2023	Contrato No.	1169 DE 2023
Objeto.	TRAMO VÍA LA BANCA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DE LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO 202204000463 DEL 07 DE JUNIO DE 2022 Y AMPLIADA MEDIANTE EL DECRETO 202204000588 DEL 06 DE AGOSTO DE 2022 Y	Objeto.	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA SUSCRITO PARA LA ATENCIÓN E INTERVENCIÓN DEL SEGUNDO TRAMO VÍA LA BANCA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DE LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO 202204000463 DEL 07 DE JUNIO DE 2022 Y AMPLIADA MEDIANTE EL DECRETO 202204000588 DEL 06 DE AGOSTO DE 2022 Y LA URGENCIA MANIFIESTA ADOPTADA
Valor Inicial:	$ 7.689.800.471,00	Valor Inicial:	$ 533.292.550,00
Valor Actualizado:	$ 0,00	Valor Actualizado:	$ 0,00
Plazo Inicial:	365	Plazo Inicial:	365
Plazo Actualizado:	365	Plazo Actualizado:	365
Fecha de Iniciación:	1/01/2023	Fecha de Iniciación:	1 de enero de 2023
Fecha de Vencimiento:	31/12/2023	Fecha de Vencimiento:	31/12/2023

Semana Número: 34 Del: 20/08/2023 Al: 27/08/2023 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 238 días


Nombre del Supervisor CLAUDIA MARCELA ARISTIZABAL
VANESSA RAMIREZ G (APOYO TECNICO)

AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	5,00%	70,00%
Valor de la Obra	$ 384.490.023,55	$ 5.382.860.329,70

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	2,00%	62,70%
Valor de la Obra	$ 153.796.009,42	$ 4.821.504.895,32

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	65,0%	60,7%	-7%
Durante el periodo	5,0%	2,0%	
Acumulado actual	70,0%	62,7%	



REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA (LA VÍA)

Excavaciones en pilas y construcción de anillos sitios K7+400 y K4+900, Punto Nuevo y Tubería expuesta . Minería por gran tamaño de rocas encontradas , izaje de canastas de
Concreto en pilas para muros y elementos estructurales para semiviaductos , Refuerzo en zapatas, vigas y muros estribos y aletas
Continúa la reconstrucción de bordillos y cunetas
Cargue y retiro de material a sitio autorizado

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA (LA VÍA)

Fundida de pilas concreto 4000 psi, izaje de canastas de refuerzo para pilas,

Armada de refuerzo y Encofrado de muros en viaductos

Banqueo y excavaciones en roca. Minería

Cargue y retiro de material

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

En ejecución , avanza en el cumplimiento del alcance contractual.

OBSERVACIONES	FIRMAS
En los procedimientos constructivos en los nuevos puntos críticos, se ha observado el rendimiento ha bajado debido a la roca encontrada que ha sido necesario el uso de equipo de minería y la situación de riesgo para los operativos ya que el movimiento en masa y el desprendimiento de la banca es constante. sin embargo se maneja una logística segura y que no afecte el libre paso de trafico	Residente de Interventoría Nombre: Albertina Guerrero Vitola CC. 45458856
Se le pide a la comunidad un poco de paciencia ya que en fundida de pilas se interrumpe el tráfico en tiempo extendido.	Residente Contratista Nombre: CC:
Se da la necesidad de minería para excavaciones en roca, ítem que por su costo y cantidad, se refleja en el presupuesto con mayores cantidades, esto es en K7+400 por lo que se hace necesario un acta de cambio	
