INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES
No. 1914, MUNICIPIO DE COROZAL- DEPARTAMENTO DE SUCRE
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE JUNIO DE 2024

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE	
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	**Coordenadas geográficas:** **9°19´31.86´´Latitud Norte** **75°17´02.19´´Longitud Oeste** Número de Matrícula Inmobiliaria: 342-24084 No. Catastral: N°70215000100000001089600000000 Calle 40 # 34 -826 Salida de Corozal hacia el municipio de Los Palmitos, con frente hacia la carretera troncal margen derecho, a 700m antes de la entrada del Aeropuerto Las Brujas de Corozal.	
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO COROZAL – DEPARTAMENTO SUCRE	
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**	$13.952.556.111,07
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS	$2.447.914.327,00
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO	$16.400.470.438,07
FECHA SUSCRIPCIÓN	06/08/2022	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	31/12/2024	

SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	CARMEN ANA MERCADO PÉREZ.		
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No. 2-2022-030809	19/07/2022	DD/MM/AAAA
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No. 2022VFE001	18/07/2022	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No. 240-00046	31/01/2024	DD/MM/AAAA
	No. 240-00107	27/02/2024	DD/MM/AAAA
	No. 240-00129	12/03/2024	DD/MM/AAAA
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 540-47-994000022350	16/12/2022 - 1/07/2025	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	16/12/2022		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	ADICION UNO (1)	FECHA: 28/12/2023	
	ADICION DOS (2)	FECHA: DD/MM/AAAA	
	ADICIÓN TRES (3)	FECHA: DD/MM/AAAA	
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01	FECHA: DD/MM/AAAA	
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN	FECHA: DD/MM/AAAA	
	REINICIO	FECHA: DD/MM/AAAA	
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: 01/07/2025		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 663.023.252,00		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 397.813.951,00		
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)			
VALOR DE OBRA	$ 11.912.622.965,00		
VALOR INTERVENTORÍA	$ 1.012.572.952,00		
VALOR ADICIONAL DE OBRA	$ 350.000.000,00		

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	Previo cumplimiento de los requisitos de ejecución y la entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. designación del supervisor del convenio por parte del municipio C. Aprobación del cronograma de ejecución del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO. D. Aprobación del componente de estudios y diseños por parte del interventor del contrato y del supervisor del municipio.	NO APLICA	21/02/ 2024	$5.944.059.397
SEGUNDO DESEMBOLSO	previa presentación por parte del Supervisor del Convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral (SSSI) y la presentación de: A. Perfeccionamiento de la modificación de la adición B. Entregar al Ministerio, certificación suscrita por el contratista y el interventor, en la que manifiesten que conocen y aprueban el valor del proyecto de manera previa al inicio de la ejecución de obra, adicionalmente indique que las cantidades determinadas en el presupuesto son suficientes para la ejecución y construcción total	NO APLICA	11/03/ 2024	$2.064.437.318 ,07

	del proyecto, incluido el presupuesto necesario para el trámite de la certificación RETIE Y RETILAP de la obra. C. Cronograma del convenio actualizado.			
TERCER DESEMBOLSO	Contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 60% de ejecución del proyecto de acuerdo con el cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños. B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de avance del proyecto avalada por el interventor. D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP	60%	DD/MM/AAAA	$4.755.247.517
ÚLTIMO DESEMBOLSO	Contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el cumplimiento del 100% de ejecución del proyecto de acuerdo con el cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de ejecución del proyecto avalada	100%	DD/MM/AAAA	$1.188.811.879

	por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP C. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado			
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 8.008.496.715,07
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00
Pago de acta parcial No. 2. Contrato de obra L- AM- CS -001 – 01 -23.			17/05/2024	$1.699.578.627,00
Pago de acta parcial No. 2 Contrato de Consultoría CM- Am – Cs – 001 -01 – 23.			30/05/2024	120.090.999
Saldo Cuenta Ahorros 11100001378 Convenio + rendimientos financieros.			31/05/2024	$5.614.732.528,41
Saldo Cuenta Ahorros Municipio 11100001656			30/06/2024	$450.401.979,14

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
540-47-994000022350	Cumplimiento	$ 1.398.603.312,00	28/09/2022	1/07/2025

Según PRIMERA ADICIÓN AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1914 DE 2022, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR, FONDO PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE COROZAL – SUCRE - OTROSÍ No. 01

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
540-47-994000022350	Cumplimiento	$ 1.640.047.043,80	28/09/2022	1/07/2025

Observación: Anexo 1 de póliza expedido el día 09/01/2024, aprobada por el ministerio el día 15/01/2024.

INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA: L-AM-CS-001-01-23	ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE	$12.575.307.132
Etapa del proceso	En aras de garantizar el cumplimiento del objeto contractual del convenio en el marco de los contratos derivados (obra e interventoría) por parte del Ministerio del Interior se llevó a cabo comité de seguimiento presencial los días 12 y 27 del mes de junio de 2024, con el objeto de establecer los avances de ejecución en obra conforme al cronograma. Por otra parte, se realizaron visitas técnicas diarias de supervisión en obra por parte de la Secretaría de Planeación Municipal como	

	apoyo a la supervisión por parte del Municipio de Corozal.		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	29/12/2023		$ 350.000.000,00
	11/03/2024		$ 2.064.777.686,07
Nombre contratista	CONSORCIO EP-C identificado con el Nit: 901.694.070-1, representado legalmente por JESUS DAVID DURAN ROMERO, identificado con cédula de ciudadanía 15.679.759 de Planeta Rica.		
Fecha de Acta de inicio del contrato	17/04/2023		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	18/08/2023	
	REINICIO	29/01/2024	
Fecha de terminación del contrato	**26/11/2024**		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 14.990.084.818
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S. A**		
PÓLIZA No.	15 - 44 -101277891		
FECHA DE LA PÓLIZA INICIAL DE CUMPLIMIENTO ANEXO 0	31/03/2023		
FECHA DE LA PÓLIZA ACTUALIZADA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 1	25/04/2023		
FECHA DE LA PÓLIZA	25/04/2023		

ACTUALIZADA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 2	
FECHA DE LA PÓLIZA ACTUALIZADA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 3	13/06/2023
FECHA DE LA PÓLIZA ACTUALIZADA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 4	10/01/2024
FECHA DE LA PÓLIZA ACTUALIZADA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 5	29/02/2024
FECHA DE LA PÓLIZA ACTUALIZADA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 6	01/03/2024
FECHA DE LA PÓLIZA ACTUALIZADA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 7	10/0/2024
FECHA DE LA PÓLIZA ACTUALIZADA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 8	10/05/2024
FECHA DE LA PÓLIZA ACTUALIZADA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 9	10/05/2024
FECHA DE LA PÓLIZA ACTUALIZADA DE	10/05/2024

CUMPLIMIENTO ANEXO 10	
FECHA DE LA PÓLIZA DE RCE ANEXO 0	31/03/2023
FECHA DE LA PÓLIZA INICIAL DE RCE ANEXO 1	31/03/2023
FECHA DE LA PÓLIZA ACTUALIZADA DE RCE ANEXO 2	25/04/2023
FECHA DE LA PÓLIZA ACTUALIZADA DE RCE ANEXO 3	25/04/2023
FECHA DE LA PÓLIZA ACTUALIZADA DE RCE ANEXO 3	13/06/2023
PÓLIZA ACTUALIZADA DE RCE ANEXO 4	13/06/2023
FECHA DE LA PÓLIZA ACTUALIZADA DE RCE ANEXO 5	10/01/2024
FECHA DE LA PÓLIZA ACTUALIZADA DE RCE ANEXO 6	29/02/2024
FECHA DE LA PÓLIZA ACTUALIZADA DE RCE ANEXO 7	10/05/2024
FECHA DE LA PÓLIZA ACTUALIZADA DE RCE ANEXO 8	10/05/2024
FECHA DE LA PÓLIZA	10/05/2024

ACTUALIZADA DE RCE ANEXO 9	
FECHA DE LA PÓLIZA ACTUALIZADA DE RCE ANEXO 10	10/05/2024

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato: CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CM-AM-CS-001-01-23	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO DENOMINADO: ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE.	$ 1.410.385.620
Etapa del proceso	Por parte de la interventoría durante el mes de junio se realizaron las subsanaciones respecto al cumplimiento de compromisos derivados del cumplimiento del objeto contractual del convenio 1914 de 2022, conforme a las solicitudes de la supervisión del Ministerio del Interior, reportando los informes mensuales de supervisión del Municipio y los informes semanales de avance No. 36 y No. 37, los días 07, 12 y 25 de junio de 2024. Con el cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia de suministro de información conforme al ítem No. 32 del convenio, desaparece cualquier situación de presunto incumplimiento por parte del municipio de Corozal. Respecto a la solicitud del Ministerio del Interior sobre el traslado de las redes	

	hidrosanitarias encontradas en el proceso de excavación de las zapatas en bloque A y tanque de reserva, el municipio de Corozal a través del convenio con la empresa prestadora de servicio VEOLIA – Aguas de la Sabana, adelantó las acciones de excavación, armado de conexiones de tubería de asbesto cemento, empalme e instalación con la tubería principal a partir del 17 de junio de 2024. En relación al carril de desaceleración, la supervisión del municipio realizó las gestiones administrativas ante la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, para la aprobación de los trabajos en obra, una vez de subsane la documentación solicitada por la ANI y se provean los recursos por parte del municipio para adelantar las obras respectivas.		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO I – POLICE identificado con el NIT 901.694.067-9, representado legalmente por OSCAR ALFONSO CARRASCAL SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía 1.007.801.563 de Sahagún		
Fecha de Acta de inicio del contrato	17/04/2023		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	18/08/2023	
	REINICIO	29/01/2024	

Fecha de terminación del contrato	**26/11/2024**	
VALOR TOTAL CONTRATADO:		$ 1.410.385.620
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A**	
PÓLIZA No.	15-44-101277693	
FECHA DE LA PÓLIZA INICIAL DE CUMPLIMIENTO ANEXO 0	27/03/2023	
FECHA DE LA PÓLIZA INICIAL DE CUMPLIMIENTO ANEXO 1	13/04/2023	
FECHA DE LA PÓLIZA ACTUALIZADA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 2	25/04/2023	
FECHA DE LA PÓLIZA ACTUALIZADA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 3	25/04/2023	
FECHA DE LA PÓLIZA ACTUALIZADA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 4	15/06/2023	
FECHA DE LA PÓLIZA ACTUALIZADA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 5	29/02/2024	
FECHA DE LA PÓLIZA ACTUALIZADA DE	01/03/2024	

CUMPLIMIENTO ANEXO 6	

4. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	SI	NO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	X	
INFORME FINANCIERO	X	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	X	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X	
OTROS		

❖ RESUMEN TECNICO

AVANCE DE ACTIVIDADES. Las actividades ejecutadas en el periodo del tiempo del presente informe de supervisión son las siguientes:

- Vaciado muro de cerramiento perimetral
- Instalación de redes hidrosanitarias
- Figurado de acero para estructuras

A continuación, se muestra los avances acumulados en el periodo de tiempo del presente informe de supervisión del mes de junio de 2024.

CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	% EJECUTADO
PRELIMINARES	2,54%
MOVIMIENTOS DE TIERRA CIMENTACION	0,59%
CIMENTACION Y CONCRETOS	11,13%
SISTEMA HIDROSANITARIO	0,43%
MAMPOSTERIA Y PAÑETES	0,00%
ENCHAPES PARA PISOS Y MUROS	0,00%
PUERTAS Y VENTANAS	0,00%
DIVISIONES	0,00%
CIELO FALSO	0,00%
PINTURA Y ESTUCO	0,00%

BARANDA METALICA	0,00%
ASCENSOR	1,94%
PLACA EXTERIOR - PARQUEADERO	0,00%
MURO DE CERRAMIENTO	0,59%
RED CONTRA INCENDIOS	0,00%
GAS NATURAL	0,00%
SISTEMA ELECTRICO	1,33%
SISTEMA DE DETECCION RCI	0,00%
EQUIPOS DE AIRE ACONDICONADO TIPO MINI SPLIT Y CASSETTES	0,00%
CARPINTERIA DE MADERA	0,00%
CARPINTERIA DE METALICA	0,00%
Tramites de legalización ante el operador de red	0,00%
Certificacion de Instalaciones de Cables de Datos	0,00%
Certificación RETIE por distribución, transformación y uso final	0,00%
Certificación RETILAP	0,00%
TOTAL	**18,55%**

En el presente informe se tiene un avance de obras acumulado del 18,55%.

CONSOLIDADO DEL AVANCE DE OBRA.

Hasta la fecha se tiene el siguiente avance consolidado:

AVANCE DE OBRA			
EJECUCION	**EJECUTADO**	**PROGRAMADO**	**ATRASO (-) ADELANTO (+)**
Acumulado Actual	18,55%	21,60%	-3,05%

- **RESUMEN JURIDICO**

Teniendo en cuenta las reiteradas comunicaciones enviadas por parte del Ministerio del Interior, a través de la supervisión, el municipio de Corozal, en el marco de los presuntos incumplimientos de obligaciones contractuales, ha venido realizando el seguimiento de las actividades en obra, así como el requerimiento tanto al contratista de obra como a la interventoría respecto a suministro de información relacionada con el avance de la ejecución del convenio y contratos derivados, así

como citaciones a reuniones con el contratista para adelantar acciones encaminadas a la armonización del cronograma de trabajo conforme al PAC del Ministerio.

En este sentido, como parte de los compromisos asumidos por el municipio de Corozal, se realizó una nueva mesa de trabajo con el operador VEOLIA para culminar las labores de excavación e instalación de tubería de asbesto cemento y hierro dúctil, para adelantar las actividades de instalación de redes hidrosanitarias por parte del contratista de obra, así como la construcción del tanque subterráneo, dichas labores si bien se contemplaron realizar en la semana del 17 de junio de 2024, sufrieron retrasos, debido al incremento de las lluvias y el retraso en la llegada del accesorio necesario para la instalación de la tubería de hierro dúctil tal como se informó en el comité de seguimiento realizado el 12 de junio.

En cuanto a las obras complementarias como el carril de desaceleración, el municipio adelantó las gestiones con el CONSORCIO AUTIPISTAS DE LA SABANA, con la finalidad de establecer los requisitos para el respectivo permiso conforme lo establece la ANI, para lo cual se requirió al contratista de interventoría para la remisión del presupuesto y el diseño para que el municipio provea los recursos necesarios para su construcción como compromiso contractual asumido ante el Ministerio del Interior, en la reunión del 23 de mayo de 2024, celebrada en la ciudad de Bogotá.

5. INFORME DEL SUPERVISOR

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**3,76%**
% EJECUTADO DE OBRA	**18,14%**
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Las actividades administrativas desarrolladas en el período comprendido entre el 01 y 30 de junio de 2024, en el marco de la ejecución del convenio suscrito entre el	

Ministerio del Interior Fondo para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana – FONSECON y el Municipio de Corozal, por parte de la supervisión del municipio son las siguientes:

- El 2 de junio de 2024, el arquitecto Gonzalo Flórez Peña, apoyo a la supervisión del Convenio por parte del Ministerio del Interior, remite copia digital de las actas de comités de seguimiento presencial realizados en Bogotá los días 23 y 29 de mayo de 2024.

- El 4 de junio de 2024, se envía requerimiento 0245 de fecha 4 de junio de 2024, a los Consorcios I Police y Consorcio EP-C; a través del cual se solicitó la remisión de informe de implementación del Plan Integral de Gestión Ambiental, así como el pago de aportes a la seguridad social y la subsanación de fallas estructurales en el proceso de cimentación, de acuerdo a las observaciones realizadas en visita a la obra el día 30 de mayo.

- El 4 de junio de 2024, el arquitecto Gonzalo Flórez Peña, apoyo a la Supervisión del convenio del Ministerio del Interior - FONSECON, envía citación a comité de seguimiento virtual para el día 6 de junio de 2024, para realizar la verificación del cumplimiento de compromisos del comité realizado el 30 de mayo de 2024, así como el avance de la obra.

- El 6 de junio de 2024, se cita a comité de seguimiento virtual a los representantes legales de los consorcios I Police y Consorcio EP-C, mediante oficio 0246 y 0247 de 2024.

- El 6 de junio se recibe oficio CIP – 2024 – 012 del Consorcio I Police, a través del cual realizan requerimiento al contratista de obra por el incumplimiento en la entrega de información enmarcados en el cumplimiento del objeto contractual del convenio 1914 de 2022.

- El 7de junio de 2024, el Consorcio I Police envía el reporte del informe semanal de avance No. 36 con corte 02 de junio, y flujo de caja por actividad aprobado.

- El 7 de junio de 2024, se envía al arquitecto Gonzalo Flórez Peña, apoyo a la Supervisión del convenio del Ministerio del Interior – FONSECON, informe semanal de avance No. 36 con corte 2 de junio de 2024.

- El 11 de junio de 2024, el arquitecto Gonzalo Flórez Peña, apoyo a la Supervisión del convenio del Ministerio del Interior – FONSECON, envía citación a comité de seguimiento presencial el día 12 de junio en las instalaciones de la alcaldía de Corozal, a través de correo electrónico.

- El 11 de junio de 2024, el arquitecto Gonzalo Flórez Peña, apoyo a la Supervisión del convenio del Ministerio del Interior – FONSECON, envía solicitud de remisión de informe financiero correspondiente al mes de mayo de 2024, sobre las dos cuentas aperturadas por parte del municipio para el manejo de los recursos del convenio 1914 de 2022. Así mismo, solicita el informe de supervisión del mes de mayo, informes mensuales de obra del periodo comprendido entre enero – abril de 2024, soportes de pagos realizados con recursos del Ministerio del Interior y remisión del informe semanal de avance de obra No. 37 con corte 9 de junio de 2024.

- El 11 de junio de 2024, el arquitecto Gonzalo Flórez Peña, apoyo a la Supervisión del convenio del Ministerio del Interior – FONSECON, envía requerimiento de información relacionada con la armonización del cronograma aprobado por el supervisor del Ministerio del Interior, así como la presentación de un plan de contingencia que permita avances en obra por parte del contratista. De igual manera el envío de copia física de documentos y acciones llevadas a cabo por el Municipio frente a los atrasos en la implementación del cronograma.

- El día 11 de junio de 2024, la supervisión del municipio convocó a Mesa Técnica de Seguimiento al contrato de obra en el cual participaron la directora de interventoría, asesor jurídico externo por parte del municipio y Secretaria de Planeación Municipal, con el objeto de tomar acciones correctivas respecto al incumplimiento de obligaciones por parte del contratista de obra.

- El día 11 de junio de envío al Ministerio del Interior copia digital de la mesa técnica realizada en la misma fecha, en la cual se adoptaron acciones para garantizar el cumplimiento de obligaciones por parte del contratista.

- El día 12 de junio de 2024, se llevó a cabo el comité de seguimiento virtual convocado por el Ministerio del Interior – FONSECON, en el cual participaron la supervisión del municipio de Corozal, representante del Consorcio EP-C.

- El 12 de junio de 2024, se envía informe de supervisión del municipio e informe financiero anexo a oficio 0259 de fecha 12 de junio de 2024.

- El 18 de junio de 2024, el arquitecto Gonzalo Flórez Peña, apoyo a la Supervisión del convenio del Ministerio del Interior – FONSECON, envía correo electrónico solicitando informe en el cual se evidencie la instalación de la tubería de asbesto cemento y la ampliación del frente de trabajo para el inicio de actividades de armado de acero del tanque subterráneo en el marco del cumplimiento de los compromisos suscritos en el acta de comité del 12 de junio de 2024.

- El 19 de junio de 2024, la Secretaria de Planeación – Supervisora por parte del municipio, remite informe de supervisión correspondiente a la ejecución del mes de mayo para su revisión y aprobación.

- El 20 de junio de 2024, la Secretaria de Planeación – Supervisora por parte del municipio, realiza solicitud a la supervisión del Ministerio del Interior de copia del acta de comité de seguimiento presencial al convenio, desarrollada el día 12 de junio de 2024.

- El 22 de junio del 2024, el arquitecto Gonzalo Flórez Peña, apoyo a la Supervisión del convenio del Ministerio del Interior – FONSECON, envía solicitud de reiteración del envío inmediato del informe en el cual se evidencie la instalación de la tubería de asbesto cemento y la ampliación del frente de trabajo para el inicio de actividades de armado de acero del tanque subterráneo en el marco del cumplimiento de los compromisos suscritos en el acta de comité del 12 de junio de 2024.

- El 22 de junio de 2024, el arquitecto Gonzalo Flórez Peña, apoyo a la Supervisión del convenio del Ministerio del Interior – FONSECON, envía solicitud de los informes semanales de interventoría No. 37, con corte al 9 de junio de 2024, No. 38 con corte al 16 de junio de 2024. Así mismo solicita actualización de los informes en la plataforma SECOP II, la remisión del informe de interventoría del mes de mayo del 2024 y los informes mensuales de obra, las acciones administrativas que se han adelantado en relación al cumplimiento de obligaciones contractuales debido a los atrasos en el cronograma de obra y en el suministro de la información.

- El 24 de junio de 2024, se envía requerimiento de información pendiente al Consorcio I Police, mediante oficio 0279 de 2024 radicado vía electrónica.

- El 24 de junio de 2024, el Consorcio I Police envía informes mensuales de interventoría de los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2024, así como el informe semanal de interventoría No. 37 y el documento de Plan de Compras conforme a los compromisos del comité virtual de seguimiento realizado.

- El 22 de junio de 2024, el arquitecto Gonzalo Flórez Peña, apoyo a la Supervisión del convenio del Ministerio del Interior – FONSECON, solicita vía correo electrónico el envío de información de trazabilidad de las acciones administrativas adelantada por el Municipio de Corozal desde la firma del convenio hasta la fecha, así como los anexos que la respaldan (procesos licitatorios, desembolsos, modificaciones de los contratos derivados).

- El 26 de junio de 2024, la Secretaria de Planeación Municipal, supervisora del municipio de Corozal, envía información solicitada por Ministerio del Interior el día 22 de junio de 2024, referente a soportes de trazabilidad de acciones administrativas adelantadas por el municipio desde la firma del convenio.

- El 28 de junio de 2024, el arquitecto Gonzalo Flórez Peña, apoyo a la Supervisión del convenio del Ministerio del Interior – FONSECON, solicita informe en Word donde se evidencie la trazabilidad solicitada con los soportes de validación de la misma.

- El 29 de junio de 2024, el arquitecto Gonzalo Flórez Peña, apoyo a la Supervisión del convenio del Ministerio del Interior – FONSECON, envía observaciones a la supervisión del municipio sobre el informe mensual de interventoría No. 3, para las respectivas acciones de entrega inmediata y conforme a los aspectos, técnicos, administrativos, jurídicos, financieros y ambientales.

RESUMEN GENERAL ESTADO DEL CONTRATO

- El Ministerio del Interior convocó a mesa de trabajo para coadyuvar en el inicio de la etapa 2.
- El contrato inició la etapa 2 correspondiente a ejecución de obra, de acuerdo con los términos contractuales, para esta fase que finaliza el día 26/11/2024.

- Teniendo en cuenta el cronograma de actividades del convenio interadministrativo, el Ministerio del Interior convocó a Comité de Seguimiento presencial los días 23 y 29 de mayo, para coadyuvar en la armonización del cronograma del contrato de obra, debido a los atrasos en el avance en obra.

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE: En este periodo en mención se realizaron las actividades de trazado y replanteo; además de las de movimiento de relleno y compactación de material seleccionado, con un avance de ejecución del 3,76% comparado con un porcentaje de programado del 18,14%. Se espera que una vez se termine esta etapa de rellenos aumente en gran manera los porcentajes de avances con las actividades de excavaciones y concretos de cimentación.

6. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

08/02/2023	18/01/2024	22/02/2024	30/04/2024	29/05/2024	
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

7. SUPERVISOR

BAYRON JOAQUIN OSPINA TRESPALACIO Alcalde Municipal de Corozal	**CARMEN ANA MERCADO PÉREZ** Supervisor del Convenio Secretaria de Planeación Municipal

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó	Jorge Márquez Pérez	Ing. Civil – Secretaría de Planeación	
Revisó y aprobó	Carmen Ana Mercado Pérez	Secretaria de Planeación Municipal	
Los arribas firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustados a las normas legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente			

Gmail PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>

ACTAS COMITE DE SEGUIMIENTO - CONVENIO No. 1914-2022 MUNCIPIO DE COROZAL

2 mensajes

Gonzalo Antonio Flórez Peña <gonzalo.florez@mininterior.gov.co> 2 de junio de 2024, 4:18 p.m.
Para: PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>, "planeacion@corozal-sucre.gov.co" <planeacion@corozal-sucre.gov.co>

Bogotá D.C., 2 de junio de 2024

Doctor
BAIRON OSPINA
Alcalde
Municipio de Corozal - Sucre

Ingeniera
Carmen Ana Mercado Perez
Secretaria de Planeación Municipal
Alcaldía de Corozal

ASUNTO: CITACIÓN CONVENIO No. 1914 DE 2022 MUNICIPIO DE COROZAL - SUCRE

Cordial saludo:

En el marco de las obligaciones del convenio interadministrativo No. 1914 de 2022 celebrado entre MINISTERIO DEL INTERIOR – MUNICIPIO DE COROZAL - SUCRE, cuyo objeto *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE COROZAL-DEPARTAMENTO DE SUCRE"*, se remiten las Actas del 23 y 29 de mayo de 2024, apara su conocimiento y cumplimiento de los compromisos acordados.

Cordialmente;

ARQ GONZALO FLOREZ PEÑA
Ministerio del Interior
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana

2 archivos adjuntos

20240523 Acta seguimiento Corozal.pdf
778K

20240529 Acta seguimiento Corozal.pdf
1652K

PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com> 7 de junio de 2024, 2:00 p.m.
Para: consorcioipolice@gmail.com

Buenas tardes ingeniera

Adjunto se remite copia digital de las actas de Comité de Seguimiento solicitadas se remiten las Actas del 23 y 29 de mayo de 2024, apara su conocimiento y cumplimiento de los compromisos acordados.

Cordialmente,

CARMEN ANA MERCADO PEREZ
Secretario de Planeación Municipal

---

2 archivos adjuntos

20240523 Acta seguimiento Corozal.pdf
778K

20240529 Acta seguimiento Corozal.pdf
1652K

Gmail PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>

Remisión de solicitud de información

1 mensaje

PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com> 4 de junio de 2024, 12:17 p.m.
Para: consorcioipolice@gmail.com
CC: consorcioepc23@gmail.com, hgarciaplaneacioncorozal@gmail.com

Buenas tardes.

Adjunto al presente se remite oficio 0245 de 04 de junio de 2024, a través del cual se solicita el reporte de información relacionada con la ejecución de contratos derivados del Convenio 1914 de 2022, para fines pertinentes.

Atentamente,

CARMEN ANA MERCADO PEREZ
Secretaria de PlaneaciónMunicipal

OFICIO 0245-2024.pdf
705K

Gmail PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>

CITACIÓN COMITE DE SEGUIMIENTO VIRTUAL CONVENIO No. 1914 -2022 MUNICIPIO DE COROZAL

2 mensajes

Gonzalo Antonio Flórez Peña <gonzalo.florez@mininterior.gov.co> 4 de junio de 2024, 8:00 a.m.
Para: PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>, "planeacion@corozal-sucre.gov.co" <planeacion@corozal-sucre.gov.co>
CC: Julian Felipe Valencia Marin <julian.valencia@mininterior.gov.co>, Ingrith Lladith Nuñez Jaimes <ingrith.nunez@mininterior.gov.co>

Bogotá D.C., 4 de junio de 2024

Doctor
BAIRON OSPINA
Alcalde
Municipio de Corozal - Sucre

Ingeniera
Carmen Ana Mercado Perez
Secretaria de Planeación Municipal
Alcaldía de Corozal

ASUNTO: CITACIÓN CONVENIO No. 1914 DE 2022 MUNICIPIO DE COROZAL - SUCRE

Cordial saludo:

En el marco de las obligaciones del convenio interadministrativo No. 1914 de 2022 celebrado entre MINISTERIO DEL INTERIOR – MUNICIPIO DE COROZAL - SUCRE, cuyo objeto *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE COROZAL-DEPARTAMENTO DE SUCRE"*, y teniendo los compromisos del comité realizado el 30 de mayo de 2024, se cita a comité de seguimiento virtual el jueves 6 de junio de 2024 a las 2:30 pm, para verificar el cumplimiento de los mismos, así como el avance de la obra.

"(...) CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: En virtud del presente convenio, EL MUNICIPIO tiene las siguientes obligaciones: I. ESPECÍFICAS: 32) Suministrar oportunamente la información solicitada por EL MINISTERIO, a través del supervisor o el apoyo a la supervisión y acompañar el desarrollo de las visitas de seguimiento que se realicen (...)"

Se solicita por parte del Municipio de Corozal, convocar al Representante legal del Contrato de Estudios, diseños, obra, así como la interventoría a los mismos.

Atentamente;

ARQ GONZALO FLOREZ PEÑA
Ministerio del Interior

Gmail PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>

Citación comité de seguimiento

1 mensaje

PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com> 4 de junio de 2024, 4:53 p.m.
Para: consorcioipolice@gmail.com

Señor
OSCAR ALFONSO CARRASCAL

Cordial saludo.

mediante el presente me permito remitir citación de Comitè de Seguimiento virtual para el día jueves 06 de junio a las 2:30 p.m.

Atentamente,

CARMEN ANA MERCADO PEREZ
Secretaria de Planeación Municipal

oficio 0246-2024.pdf
462K

Gmail PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>

Citación comité de seguimiento virtual

1 mensaje

PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com> 4 de junio de 2024, 4:58 p.m.
Para: consorcioepc23@gmail.com

Señor
ROGER ESTEBAN GUTIERREZ CORDOBA

Cordial saludo:

Mediante el presente se remite citación a comité de seguimiento virtual en el marco de las obligaciones contractuales del Convenio 1914 de 2022.

Atentamente,

CARMEN ANA MERCADO PEREZ
Secretaria de Planeación Municipal

oficio 0247-2024.pdf
462K

Gmail PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>

Cumplimiento de obligaciones contractuales

1 mensaje

CONCORCIO I-POLICE <consorcioipolice@gmail.com> 6 de junio de 2024, 12:48 p.m.
Para: consorcioepc23@gmail.com
CC: PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>

Buenas tardes.

Señor
ROGER GUTIERREZ
R.L. CONSORCIO EP-C

Mediante el presente correo, adjunto oficio con el fin de solicitar información y recordar compromisos incumplidos hasta la fecha, compromisos y obligaciones enmarcados en el contrato de obra pública No. L-AM-CS-001-01-23 DEL 15 DE MARZO DE 2023.

Cordialmente,

OSCAR CARRASCAL
R.L. CONSORCIO I-POLICE

CIP-2024-012.pdf
210K

Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana

---

Gonzalo Antonio Flórez Peña <gonzalo.florez@mininterior.gov.co> 6 de junio de 2024, 2:28 p.m.
Para: PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>, "planeacion@corozal-sucre.gov.co" <planeacion@corozal-sucre.gov.co>
CC: Julian Felipe Valencia Marin <julian.valencia@mininterior.gov.co>, Ingrith Lladith Nuñez Jaimes <ingrith.nunez@mininterior.gov.co>

Ingeniera
CARMEN ANA MERCADO
Secretaría de Planeación
Municipio de Corozal - Sucre

Cordial saludo

En el marco de las obligaciones del Convenio No 19114 de 2022, se informa que por temas de citación de la Contraloría General de la República, el comité citado se reprograma para él día 7 de junio de 2024 a las 7:00 am.

Atentamente

ARQ.GONZALO FLOREZ
MINISTERIO DEL INTERIOR

Obtener Outlook para Android

From: Gonzalo Antonio Flórez Peña
Sent: Monday, June 3, 2024 11:46:38 PM
To: PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>; planeacion@corozal-sucre.gov.co <planeacion@corozal-sucre.gov.co>
Cc: Julian Felipe Valencia Marin <julian.valencia@mininterior.gov.co>; Ingrith Lladith Nuñez Jaimes <ingrith.nunez@mininterior.gov.co>
Subject: CITACIÓN COMITE DE SEGUIMIENTO VIRTUAL CONVENIO No. 1914 -2022 MUNICIPIO DE COROZAL

[Texto citado oculto]

Gmail PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>

Informe semanal 18 Etapa II

1 mensaje

CONCORCIO I-POLICE <consorcioipolice@gmail.com> 6 de junio de 2024, 2:11 p.m.
Para: PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>, HAROLD GARCIA <hgarciaplaneacioncorozal@gmail.com>

Buenas tardes.

Adjunto informe semanal del periodo 27/05/2024 al 02/06/2024

2 archivos adjuntos

INFORME SEMANAL COROZAL 36.xlsx
3187K

Flujo de Caja por Actividad - APROBADO.xlsx
564K

Gmail PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>

Envío de informe semanal 36

1 mensaje

PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com> 7 de junio de 2024, 1:22 p.m.
Para: gonzalo.florez@mininterior.gov.co

Corozal- Sucre, junio 07 de 2024

Arquitecto Gonzalo.

Adjunto se remite informe semanal de avances número 36 y flujo de caja, con corte a 3 de junio de 2024.

Atentamente,

CARMEN ANA MERCADO PEREZ
Secretaria de Planeación Municipal

INFORME SEMANAL COROZAL 36.pdf
558K

Gmail PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>

CITACION VISITA DE SEGUIMIENTO CONVENIO No. 1914 DE 2022 MUNICIPIO DE COROZAL

1 mensaje

Gonzalo Antonio Flórez Peña <gonzalo.florez@mininterior.gov.co> 11 de junio de 2024, 7:30 a.m.
Para: PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>, "planeacion@corozal-sucre.gov.co" <planeacion@corozal-sucre.gov.co>
CC: Julian Felipe Valencia Marin <julian.valencia@mininterior.gov.co>, Ingrith Lladith Nuñez Jaimes <ingrith.nunez@mininterior.gov.co>

Bogotá D.C., 11 de junio de 2024

Doctor
BAIRON OSPINA
Alcalde
Municipio de Corozal - Sucre

Ingeniera
Carmen Ana Mercado Perez
Secretaria de Planeación Municipal
Alcaldía de Corozal

ASUNTO: CITACIÓN CONVENIO No. 1914 DE 2022 MUNICIPIO DE COROZAL - SUCRE

Cordial saludo:

En el marco de las obligaciones del convenio interadministrativo No. 1914 de 2022 celebrado entre MINISTERIO DEL INTERIOR – MUNICIPIO DE COROZAL - SUCRE, cuyo objeto *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE COROZAL-DEPARTAMENTO DE SUCRE"*, teniendo en cuenta la visita del 29 de mayo de 2024, el comité de seguimiento virtual el 7 de junio de 2024, se cita al Señor Alcalde y supervisión del convenio, a un comité presencial el miércoles 12 de junio de 2024 a las 9:30 am en la Alcaldía y de manera posterior a la obra, con el fin de realizar verificación a la ejecución contractual y el cumplimiento de los compromisos.

"(...) CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: En virtud del presente convenio, EL MUNICIPIO tiene las siguientes obligaciones: I. ESPECÍFICAS: 32) Suministrar oportunamente la información solicitada por EL MINISTERIO, a través del supervisor o el apoyo a la supervisión y acompañar el desarrollo de las visitas de seguimiento que se realicen (...)".

Se solicita por parte del Municipio de Corozal, convocar a los Representantes legales de los Contratos de Estudios, diseños, obra e interventoría a los mismos.

Atentamente;

ARQ. GONZALO FLÓREZ PEÑA
Ministerio del Interior


	LISTA DE ASISTENCIA	
		PÁGINA: 1 de 2

FECHA:	11	Junio	2024	**HORA:**	2:30	**LUGAR:**	Seet de Planeación Virtual.

DEPENDENCIA A CARGO:	Secretaría de Planeación Municipal – Alcaldía de Corozal
RESPONSABLE DE REUNIÓN	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL
OBJETIVO:	Revisar el cumplimiento de avances de la obra, conforme a los compromisos contractuales derivados de la ejecución del convenio 1914 de 2022.

COMPROMISOS: • Se remitira solicitud por Parte de la interventoria al contratista, Para que el mismo cumpla con los requerimientos que se le han realizado; con un Plazo no mayor a 48 horas para dar Cumplimiento.

• De no Cumplirse con la solucion de requerimientos dentro del tiempo estipulado, la alcaldia Procedera a dar apertura del respectivo Proceso o acciones pertinentes.

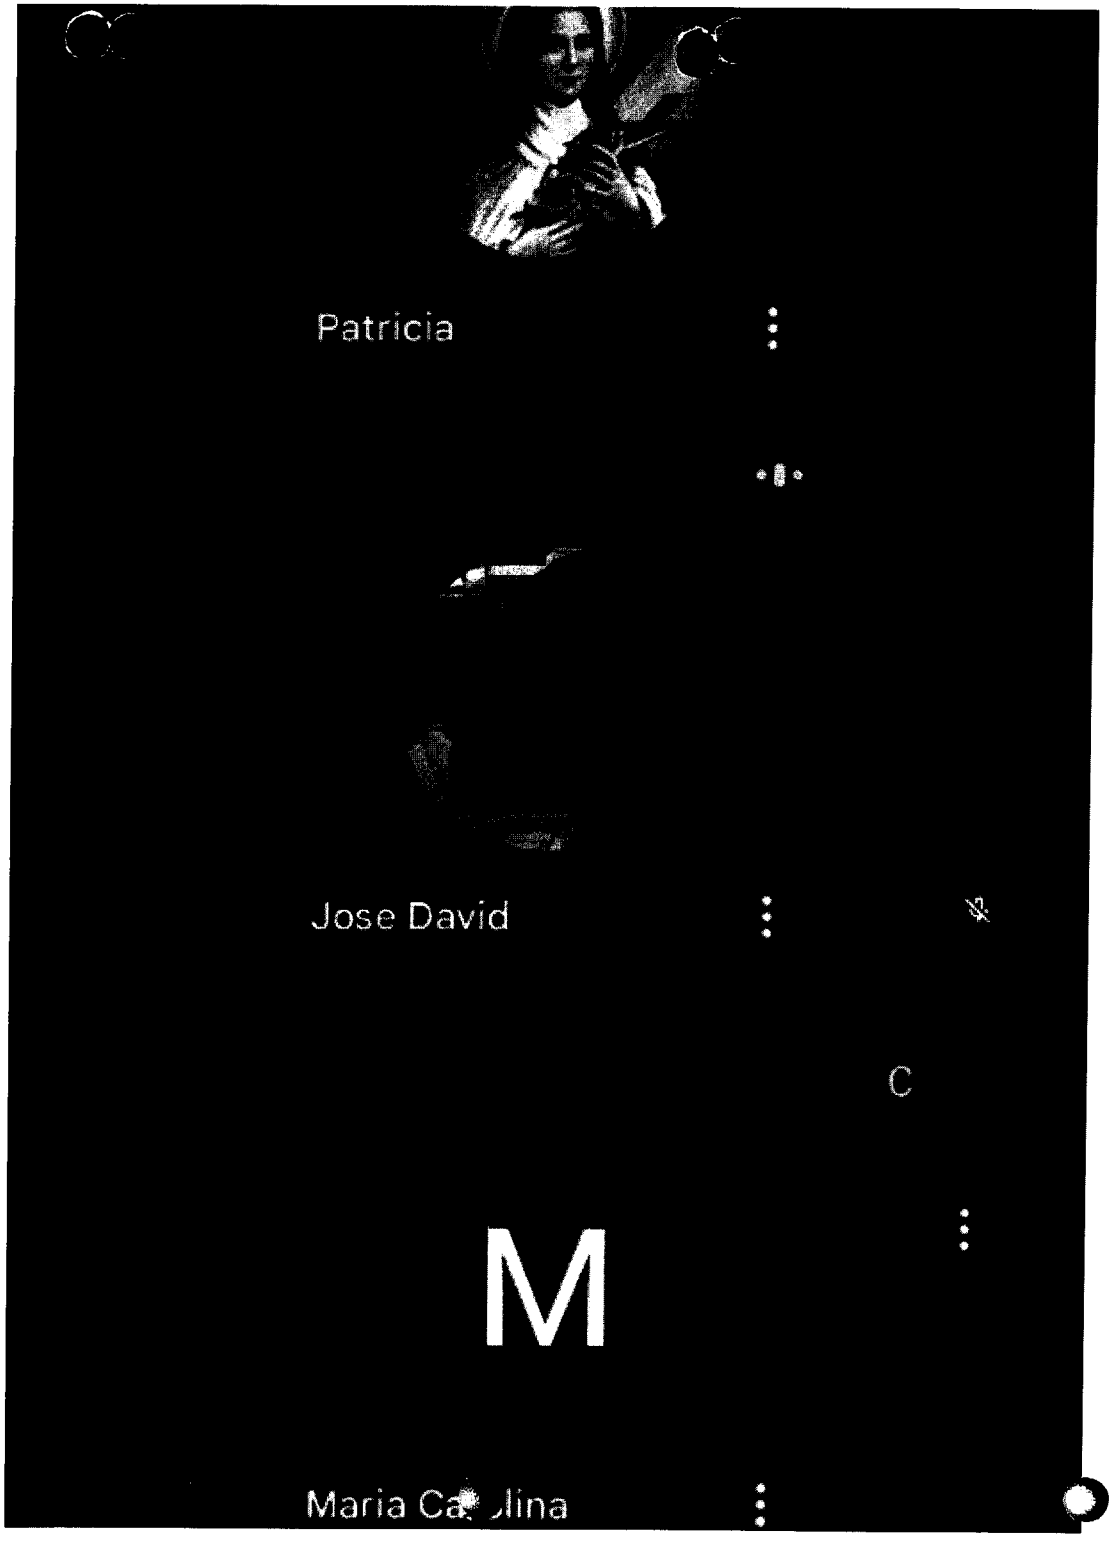
Patricia
Jose David
C
M
Maria Ca lina

	LISTA DE ASISTENCIA	
		PÁGINA: 2 de 2

ASISTENTES

No.	Nombre	Entidad o Dependencia / Cargo	E-mail	Teléfono o Ext.	Firma
1	Carmen Ana Mercado P.	Sect. de Planeación	sec.planeacion corozal @ gmail.com	3015827561	
2	Jairo Figueroa Herrera	Secret. de Planeación	ingjairofigueroa63@hotmail.com	3046772768	
3	Julio J. Pérez G.	Secr. de Planeac.	Rabolitoperez@hotmail.com	3116985636	
4	Jose Arturo Navarro	Secretario Jurídico	Josedungund@yahoo.es	3002980947	
5					
6					
7					
8					
9					
10					

	LISTA DE ASISTENCIA	
		PÁGINA: 1 de 4

FECHA:	12	06	24	**HORA:**	10:am	**LUGAR:**	Secretaria de Planeación.
DEPENDENCIA A CARGO:	Secretaría de Planeación Municipal – Alcaldía de Corozal						
RESPONSABLE DE REUNIÓN	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL						
OBJETIVO:							
COMPROMISOS:							

LISTA DE ASISTENCIA

ASISTENTES

No.	Nombre	Entidad o Dependencia / Cargo	E-mail	Teléfono o Ext.	Firma
1	Alfonso Enrique Barrios Perez	Sec. Planeacion Corozal	abarrios65@hotmail.com	3046596983	
2	Carmen Rua Mercado P.	Sect de Planeación	sec.planeacion.corozal@gmail.com	3015827561	
3	Jose David Vergara B.	Alcalde - Asesor Ext.	Josedavidvergara@yahoo.c.	3002900975	
4	Julio J. Perez G.	Sec. Planeación	Rapolitoboxe@gmail.com	3116985686	
5	Angelica Burgos Martinez	Residente de obra.	consorciopaz23@gmail.com	3016796846	
6	Eric Mario Gomez G.	Policia	Jefe.publico@policia.gov.co	3217341751	
7	Jairo A. Duran Romero	Director de obra	Jairo.Duran1982@gmail.com	3022279238	
8	Sebastian Acevedo Mejia	Contador Publico	Sebastianacevedomejia@gmail.com	3136030702	
9	Julian Andres Arrieta P.	Min Interior - Apoyo la gestión - ARC	Julian.arrieta@mininterior.gov.co	3103347252	
10	Gonzalo Flores Pertuz	Min Interior Proposición	gonzalo.flores@mininterior.gov.co	3106505064	
11	Julieth Diaz Cinero	Tesorera	tesoreria@corozal-sucre.gov.co	3042900474	
12	Maria Caroline Castillo Rodriguez	Consorcio I-Police Directora Interv.	Consorcioipolice@gmail.com	3146147271	
13					
14					

Gmail PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONVENIO No. 1914 de 2022 MUNICIPIO DE COROZAL

1 mensaje

Gonzalo Antonio Flórez Peña <gonzalo.florez@mininterior.gov.co> 11 de junio de 2024, 7:30 a.m.
Para: PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>, "planeacion@corozal-sucre.gov.co" <planeacion@corozal-sucre.gov.co>
CC: Julian Felipe Valencia Marin <julian.valencia@mininterior.gov.co>, Ingrith Lladith Nuñez Jaimes <ingrith.nunez@mininterior.gov.co>

Bogotá D.C., 11 de junio de 2024

Doctor
BAIRON OSPINA
Alcalde
Municipio de Corozal - Sucre

Ingeniera
Carmen Ana Mercado Perez
Secretaria de Planeación Municipal
Alcaldía de Corozal

Cordial saludo:

En el marco de las obligaciones del convenio interadministrativo No. 1914 de 2022 celebrado entre MINISTERIO DEL INTERIOR – MUNICIPIO DE COROZAL - SUCRE, cuyo objeto *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE COROZAL-DEPARTAMENTO DE SUCRE"*, el Ministerio del Interior reitera la solicitud del cumplimiento de obligaciones pendientes a la fecha, así:

"(...) CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: En virtud del presente convenio, EL MUNICIPIO tiene las siguientes obligaciones: I. ESPECÍFICAS:

31) Mantener un control contable y financiero con sus respectivos documentos soportes, sobre las cuentas aperturadas para el presente convenio de las que tratan los numerales anteriores. Estos documentos deberán ser presentados en el informe mensual al MINISTERIOFONSECON, de tal forma que le permita a este hacer un seguimiento y control de dichos recursos.

El Municipio de Corozal, debe remitir el Informe financiero del mes de mayo de 2024, el cual tiene plazo de entrega del 11 de junio de 2024.

35) Elaborar, presentar al MINISTERIO-FONSECON para aprobación y publicar en la plataforma SECOP II, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del MUNICIPIO. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado,

adjuntando: ***a) Los informes de ejecución tanto del contrato de estudios, diseño y obra como el de interventoría.*** *B) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del MUNICIPIO, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el MINISTERIO, donde se depositan dichos recursos. C) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto.*

El Municipio de Corozal, debe remitir la siguiente información:

1.Informe de supervisión del mes de mayo de 2024, el cual tiene plazo de entrega del 11 de junio de 2024.
2.Informe mensual de interventoría del mes de mayo de 2024, el cual tiene plazo de entrega el 11 de junio de 2024.
3.Informes mensuales de obra de los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2024. El Informe del mes de mayo de 2024, tiene plazo de ejecución hasta el 11 de junio de 2024.
4.Soportes de los pagos realizados con recursos del Ministerio del Interior por valor de $457.816.383,00 (Contrato de estudios, diseños, obra) y $348.170.781,47(Contrato de interventoría de estudios, diseños, obra).

37) Adicionalmente, entregar durante la ejecución de la obra el informe semanal de interventoría el primer día hábil de cada semana, con corte a la semana inmediatamente anterior, conforme al formato ya avalado por el MINISTERIO.

El Municipio de Corozal, debe remitir el Informe semanal de interventoría No. 19 con corte al 9 de junio de 2024, el cual tiene plazo de entrega del 10 de junio de 2024.

51) Remitir mensualmente los extractos de las cuentas bancarias aperturadas para el manejo de los recursos del proyecto, el cual deberá ser expedido por la entidad financiera correspondiente. En el evento en que la entidad financiera no genere extracto mensual, esta deberá expedir documento equivalente avalado por el supervisor y el tesorero del MUNICIPIO, reflejando los movimientos financieros de la cuenta, durante el respectivo mes. Cuando se efectúen movimientos financieros en dicha cuenta, éstos deberán guardar estricta relación con los pagos efectuados a los contratos derivados del cumplimiento del convenio, para lo cual, el supervisor y el tesorero por parte del MUNICIPIO, expedirán certificación en la que conste dicho cumplimiento.

El Municipio de Corozal, debe remitir el extracto bancario del mes de mayo de 2024, el cual tiene plazo de entrega el 11 de junio de 2024.

Por lo anterior, el Ministerio del Interior solicita se de cumplimiento a las obligaciones pendientes de manera inmediata.

Cordialmente;

ARQ GONZALO FLOREZ PEÑA
Ministerio del Interior
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana

Gmail PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CONVENIO No. 1914 DE 2022 MUNICIPIO DE COROZAL.

1 mensaje

Gonzalo Antonio Flórez Peña <gonzalo.florez@mininterior.gov.co> 11 de junio de 2024, 7:30 a.m.
Para: PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>, "planeacion@corozal-sucre.gov.co" <planeacion@corozal-sucre.gov.co>
CC: Julian Felipe Valencia Marin <julian.valencia@mininterior.gov.co>, Ingrith Lladith Nuñez Jaimes <ingrith.nunez@mininterior.gov.co>

Bogotá D.C., 11 de junio de 2024

Doctor
BAIRON OSPINA
Alcalde
Municipio de Corozal - Sucre

Ingeniera
Carmen Ana Mercado Perez
Secretaria de Planeación Municipal
Alcaldía de Corozal

Cordial saludo:

En el marco de las obligaciones del convenio interadministrativo No. 1914 de 2022 celebrado entre MINISTERIO DEL INTERIOR – MUNICIPIO DE COROZAL - SUCRE, cuyo objeto *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE COROZAL-DEPARTAMENTO DE SUCRE"*, el Ministerio del Interior reitera la solicitud del cumplimiento de obligaciones pendientes a la fecha, así:

"(...) CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: En virtud del presente convenio, EL MUNICIPIO tiene las siguientes obligaciones: I. ESPECÍFICAS:

5) Dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el supervisor del MINISTERIO DEL INTERIOR.

El Municipio de Corozal debía contar con un avance en la ejecución del 47.14% pero solo cuenta a la fecha con un ejecutado del 11.97%. Se ha solicitado que se presente un plan de contingencia que permita armonizar el cronograma del convenio con los contratos derivados, incrementando los frentes de trabajo y el personal, sin embargo, a la fecha no se ha presentado el plan solicitado.

57) Adelantar las acciones necesarias para garantizar que los contratistas que van a ejecutar el contrato de estudios, diseños y obra, y su respectiva interventoría, cumplan sus obligaciones hasta la terminación, entrega y liquidación de los mismos. Para tal fin, deberá aplicar, cuando sea del caso, los mecanismos previstos en la ley para conminar a sus contratistas al cumplimiento contractual y

para obtener la indemnización de los perjuicios derivados de posible incumplimiento, en los términos de los artículos 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474de 2011 o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

Se solicita al Municipio de Corozal, remitir al Ministerio del Interior los documentos oficios, comunicados, actas de comité en las cuales se evidencie que se han adelantado acciones al constructor e interventor, teniendo en cuenta los atrasos en el cronograma de la obra.

Por lo anterior, el Ministerio del Interior solicita se de cumplimiento a las obligaciones pendientes de manera inmediata. De no atender los requerimientos el Ministerio del Interior dará inicio al presunto incumplimiento ante la Subdirección de Gestión Contractual del Ministerio del Interior.

Cordialmente;

ARQ GONZALO FLOREZ PEÑA
Ministerio del Interior
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana

Gmail PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>

Mesa de Trabajo virtual Convenio 1914 de 2022

1 mensaje

PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com> 11 de junio de 2024, 4:47 p.m.
Para: gonzalo.florez@mininterior.gov.co

Corozal - Sucre, junio 11 de 2024

Arquitecto
GONZALO ANTONIO FLOREZ PEÑA
Ministerio del Interior
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana

Cordial saludo:

De acuerdo a su solicitud de fecha 11 de junio de 2024, se remite copia del acta de la Mesa de Trabajo conjunta celebrada en el día de hoy entre la Supervisión del Municipio, Interventoría, Asesor jurídico del municipio y profesionales de apoyo a la supervisión del contrato de la Secretaría de Planeación Municipal, con el objeto de adelantar acciones sobre el cumplimiento del objeto contractual en los tèrminos del ítem 57 del Convenio Interadministrativo celebrado entre el Ministerio del Interior y el municipio de Corozal - Sucre.

Atentamente,

CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
Secretaria de Planeación Municipal

ACTA MESA TECNICA JUNIO 11.pdf
961K

Gmail PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>

Envío de informe de supervisión mes de mayo de 2024

1 mensaje

PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com> 12 de junio de 2024, 9:20 a.m.
Para: gonzalo.florez@mininterior.gov.co

Buenos días arquitecto Gonzalo

Adjunto se remite oficio informe de supervisión mes de mayo de 2024, y de igual forma el informe financiero con los respectivos soportes para su revisión y aprobación.

Atentamente,

CARMEN ANA MERCADO PEREZ
Secretaria de Planeación Municipal

INFORME DE EJECUCION MAYO DISTRITO.pdf

OFICIO 0259.pdf
279K

CUMPLIMIENTO COMPROMISOS COMITÉ 12 JUNIO 2024 - CONVENIO No. 1914 DE 2022 MUNICIPIO DE COROZAL -SUCRE

Bogotá D.C., 18 de junio de 2024

Doctor
BAIRON OSPINA
Alcalde
Municipio de Corozal - Sucre

Ingeniera
Carmen Ana Mercado Pérez
Secretaria de Planeación Municipal
Alcaldía de Corozal

Cordial saludo:

En el marco de las obligaciones del convenio interadministrativo No. 1914 de 2022 celebrado entre MINISTERIO DEL INTERIOR – MUNICIPIO DE COROZAL - SUCRE, cuyo objeto *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE COROZAL-DEPARTAMENTO DE SUCRE"*, el Ministerio del Interior reitera la solicitud del cumplimiento de los compromisos de acuerdo con el acta del comité del 12 de junio de 2024 en el cual se indicó:

"(...)

1. *6. Con respecto al traslado de las redes encontradas en el proceso de excavación de las zapatas en bloque A y tanque de reserva, la Supervisión por parte del municipio indica:*

   6.1. Con respecto a la red de asbesto cemento (tanque subterráneo) se realizó la excavación por parte del contratista y se avanza en el armado de conexiones de la tubería por parte de VEOLIA como operador de la red para ser instalada. Se indica por parte del Municipio de Corozal que, para el 17 de junio de 2024, se debe contar con la actividad terminada, por ende, para esta fecha se pude implementar el frente de trabajo del tanque subterráneo al quedar condenada la red que atraviesa el tanque (...)".

"(...) CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: En virtud del presente convenio, EL MUNICIPIO tiene las siguientes obligaciones: I. ESPECÍFICAS:

57) Adelantar las acciones necesarias para garantizar que los contratistas que van a ejecutar el contrato de estudios, diseños y obra, y su respectiva interventoría, cumplan sus obligaciones hasta la terminación, entrega y liquidación de los mismos. Para tal fin, deberá aplicar, cuando sea del caso, los mecanismos previstos en la ley para conminar a sus contratistas al cumplimiento contractual y
para obtener la indemnización de los perjuicios derivados de posible incumplimiento, en los términos de los artículos 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011 o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan (...)".

Por lo anterior, se solicita por parte del Ministerio del Interior al Municipio de Corozal remitir el día de hoy 18 de junio de 2024 el informe en el cual se evidencie la terminación de la instalación de la tubería de asbesto cemento, el retiro de la tubería que atraviesa el tanque subterráneo y la implementación del frente de trabajo para el inicio de actividades de armado de acero del tanque subterráneo.

Cordialmente;

ARQ GONZALO FLOREZ PEÑA
Ministerio del Interior
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana
...

Oficio 0269/SP-2024

Corozal- Sucre, junio 18 de 2024

Arquitecto
GONZALO FLOREZ PEÑA
Ministerio del Interior
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana

Cordial saludo:

En cumplimiento de los compromisos derivados del objeto contractual en el marco de la ejecución del Convenio Interadministrativo 1914 de 2022, celebrado entre el Ministerio del Interior – Municipio de Corozal – Sucre, cuyo objeto es "*AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE*", conforme a la solicitud del Ministerio del Interior en el día de hoy, me permito dar respuesta.

Ítem 1.6. "*Con respecto al traslado de las redes encontradas en el proceso de excavación de las zapatas en bloque A y tanque de reserva, la Supervisión por parte del municipio indica:*

De acuerdo a las visitas de supervisión realizadas el día de hoy, se pudo establecer que conforme a las actividades realizadas por el contratista en relación a la conexión de tubería de asbesto cemento, la tubería se encuentra unida totalmente y se dispone de todos los accesorios para la respectiva conexión a la tubería principal; con lo cual se verifica la continuidad de las obras en el lugar de sitio, con el compromiso de terminar esta primera actividad programada el dia de mañana 19 de junio, por parte de la empresa VEOLIA. De igual forma se pudo comprobar la fundición de tres columnas.

A si mismo, en el día de hoy se ha hecho requerimiento a los consorcios tanto de interventoría como de obra, a fin establecer el porcentaje de avance en obra, de acuerdo a los informes semanales y la remisión del plan de compras conforme a los compromisos acordados en la reunión de comité de seguimiento el día 12 de junio de 2024.

Atentamente,

CARMEN ANA MERCADO PEREZ
Secretaria de Planeación Municipal

Gmail PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>

CUMPLIMIENTO COMPROMISOS COMITÉ 12 JUNIO 2024 - CONVENIO No. 1914 DE 2022 MUNICIPIO DE COROZAL -SUCRE

1 mensaje

Gonzalo Antonio Flórez Peña <gonzalo.florez@mininterior.gov.co> 18 de junio de 2024, 7:30 a.m.
Para: PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>
CC: Julian Felipe Valencia Marin <julian.valencia@mininterior.gov.co>, Ingrith Lladith Nuñez Jaimes <ingrith.nunez@mininterior.gov.co>

Bogotá D.C., 18 de junio de 2024

Doctor
BAIRON OSPINA
Alcalde
Municipio de Corozal - Sucre

Ingeniera
Carmen Ana Mercado Perez
Secretaria de Planeación Municipal
Alcaldía de Corozal

Cordial saludo:

En el marco de las obligaciones del convenio interadministrativo No. 1914 de 2022 celebrado entre MINISTERIO DEL INTERIOR – MUNICIPIO DE COROZAL - SUCRE, cuyo objeto *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE COROZAL-DEPARTAMENTO DE SUCRE"*, el Ministerio del Interior reitera la solicitud del cumplimiento de los compromisos de acuerdo con el acta del comité del 12 de junio de 2024 en el cual se indicó:

"(...)

6. Con respecto al traslado de las redes encontradas en el proceso de excavación de las zapatas en bloque A y tanque de reserva, la Supervisión por parte del municipio indica:

6.1. Con respecto a la red de asbesto cemento (tanque subterráneo) se realizó la excavación por parte del contratista y se avanza en el armado de conexiones de la tubería por parte de VEOLIA como operador de la red para ser instalada. Se indica por parte del Municipio de Corozal que, para el 17 de junio de 2024, se debe contar con la actividad terminada, por ende, para esta fecha se pude implementar el frente de trabajo del tanque subterráneo al quedar condenada la red que atraviesa el tanque (...)".

"(...) CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: En virtud del presente convenio, EL MUNICIPIO tiene las siguientes obligaciones: I. ESPECÍFICAS:

57) Adelantar las acciones necesarias para garantizar que los contratistas que van a ejecutar el contrato de estudios, diseños y obra, y su respectiva interventoría, cumplan sus obligaciones hasta la terminación,

entrega y liquidación de los mismos. Para tal fin, deberá aplicar, cuando sea del caso, los mecanismos previstos en la ley para conminar a sus contratistas al cumplimiento contractual y para obtener la indemnización de los perjuicios derivados de posible incumplimiento, en los términos de los artículos 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011 o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan (...)".

Por lo anterior, se solicita por parte del Ministerio del Interior al Municipio de Corozal remitir el día de hoy 18 de junio de 2024 el informe en el cual se evidencie la terminación de la instalación de la tubería de asbesto cemento, el retiro de la tubería que atraviesa el tanque subterraneo y la implementación del frente de trabajo par el inicio de actividades de armado de acero del tanque subterraneo.

Cordialmente;

ARQ GONZALO FLOREZ PEÑA
Ministerio del Interior
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana

Gmail PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>

Aplazamiento comité semanal de obra

1 mensaje

CONCORCIO I-POLICE <consorcioipolice@gmail.com> 19 de junio de 2024, 2:32 p.m.
Para: PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>
CC: consorcioepc23@gmail.com

Buenas tardes.

De acuerdo a nuestro cronograma, el día de hoy, miércoles 19 de junio de 2024, se tiene contemplado la realización de comité técnico de obra, sin embargo, por temas de salud de la Directora de Interventoría, se solicita y se agradece sea aplazado para el día de mañana.

Agradecemos su comprensión.

Cordialmente,

Oscar Carrascal
R.L. CONSORCIO I POLICE

Gmail PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>

Reenvío de informe de supervisión mes de mayo 2024

1 mensaje

PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com> 19 de junio de 2024, 4:50 p.m.
Para: gonzalo.florez@mininterior.gov.co

Buenas tardes arquitecto Gonzalo.

Se remite nuevamente informe de supervisión correspondiente al mes de mayo de 2024, para su revisión y aprobación.

Atentamente,

CARMEN ANA MERCADO PEREZ
Secretaria de Planeación Municipal

INFORME DE EJECUCION MAYO DISTRITO.zip
25323K

Gmail PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>

Solicitud de copia digital de acta de comité de seguimiento 12 de junio de 2024

1 mensaje

PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com> 20 de junio de 2024, 11:57 a.m.
Para: gonzalo.florez@mininterior.gov.co, planeacion@corozal-sucre.gov.co

Corozal - Sucre, junio 20 de 2024

Arquitecto
GONZALO FLÓREZ PEÑA
Ministerio del Interior
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana

Cordial saludo:

Mediante el presente me permito solicitar copia del acta de comité de seguimiento presencial realizada el día 12 de junio de 2024; con el objeto de realizar el seguimiento a los compromisos suscritos por parte del contratista y la interventoría en relación a la ejecución de actividades en el marco del objeto contractual del convenio 1914 de 2022.

Atentamente,

CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
Secretaria de Planeación Municipal

Gmail PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>

REITERACIÓN CUMPLIMIENTO COMPROMISOS COMITÉ 12 JUNIO 2024 - CONVENIO No. 1914 DE 2022 MUNICIPIO DE COROZAL -SUCRE

1 mensaje

Gonzalo Antonio Flórez Peña <gonzalo.florez@mininterior.gov.co> 22 de junio de 2024, 11:36 a.m.
Para: PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>
CC: Julian Felipe Valencia Marin <julian.valencia@mininterior.gov.co>, Ingrith Lladith Nuñez Jaimes <ingrith.nunez@mininterior.gov.co>

Bogotá D.C., 22 de junio de 2024

Doctor
BAIRON OSPINA
Alcalde
Municipio de Corozal - Sucre

Ingeniera
CARMEN ANA MERCADO
Secretaria de Planeación Municipal
Alcaldía de Corozal

Cordial saludo:

En el marco de las obligaciones del convenio interadministrativo No. 1914 de 2022 celebrado entre MINISTERIO DEL INTERIOR – MUNICIPIO DE COROZAL - SUCRE, cuyo objeto *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE COROZAL-DEPARTAMENTO DE SUCRE"*, el Ministerio del Interior reitera la solicitud del cumplimiento de los compromisos de acuerdo con el acta del comité del 12 de junio de 2024 en el cual se indicó:

"(...)

6. Con respecto al traslado de las redes encontradas en el proceso de excavación de las zapatas en bloque A y tanque de reserva, la Supervisión por parte del municipio indica:

6.1. Con respecto a la red de asbesto cemento (tanque subterráneo) se realizó la excavación por parte del contratista y se avanza en el armado de conexiones de la tubería por parte de VEOLIA como operador de la red para ser instalada. Se indica por parte del Municipio de Corozal que, para el 17 de junio de 2024, se debe contar con la actividad terminada, por ende, para esta fecha se pude implementar el frente de trabajo del tanque subterráneo al quedar condenada la red que atraviesa el tanque (...)".

"(...) CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: En virtud del presente convenio, EL MUNICIPIO tiene las siguientes obligaciones: I. ESPECÍFICAS:

57) Adelantar las acciones necesarias para garantizar que los contratistas que van a ejecutar el contrato de estudios, diseños y obra, y su respectiva interventoría, cumplan sus obligaciones hasta la terminación,

entrega y liquidación de los mismos. Para tal fin, deberá aplicar, cuando sea del caso, los mecanismos previstos en la ley para conminar a sus contratistas al cumplimiento contractual y para obtener la indemnización de los perjuicios derivados de posible incumplimiento, en los términos de los artículos 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011 o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan (...)".

Por lo anterior, se REITERA al Municipio de Corozal el envío al Ministerio del Interior el envío de manera inmediata del informe en el cual se evidencie la terminación de la instalación de la tubería de asbesto cemento por el exterior del proyecto, el retiro de la tubería que atraviesa el área del tanque y la implementación del frente de trabajo para el inicio de actividades de armado de acero del tanque subterráneo.

Cordialmente;

ARQ GONZALO FLOREZ PEÑA
Ministerio del Interior
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana

Gmail PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>

REITERACIÓN CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONVENIO No. 1914 DE 2022 MUNICIPIO DE COROZAL - SUCRE

1 mensaje

Gonzalo Antonio Flórez Peña <gonzalo.florez@mininterior.gov.co> 22 de junio de 2024, 11:43 a.m.
Para: PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>
CC: Julian Felipe Valencia Marin <julian.valencia@mininterior.gov.co>, Ingrith Lladith Nuñez Jaimes <ingrith.nunez@mininterior.gov.co>

Bogotá D.C., 22 de junio de 2024

Doctor
BAIRON OSPINA
Alcalde
Municipio de Corozal - Sucre

Ingeniera
CARMEN ANA MERCADO PEREZ
Secretaria de Planeación Municipal
Alcaldía de Corozal

Cordial saludo:

En el marco de las obligaciones del convenio interadministrativo No. 1914 de 2022 celebrado entre MINISTERIO DEL INTERIOR – MUNICIPIO DE COROZAL - SUCRE, cuyo objeto *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE COROZAL-DEPARTAMENTO DE SUCRE"*, el Ministerio del Interior reitera la solicitud del cumplimiento de obligaciones pendientes a la fecha, así:

"(...) CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: En virtud del presente convenio, EL MUNICIPIO tiene las siguientes obligaciones: I. ESPECÍFICAS:

37) Adicionalmente, entregar durante la ejecución de la obra el informe semanal de interventoría el primer día hábil de cada semana, con corte a la semana inmediatamente anterior, conforme al formato ya avalado por el MINISTERIO.

El Municipio de Corozal no ha remitido los siguientes informes:

1. Informe semanal de interventoría No. 37 con corte al 9 de junio de 2024.
2. Informe semanal de interventoría No. 38 con corte al 16 de junio de 2024.

35) Elaborar, presentar al MINISTERIO-FONSECON para aprobación y publicar en la plataforma SECOP II, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del MUNICIPIO. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a) Los informes de ejecución tanto del contrato de estudios, diseño y obra como el de

interventoría. B) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del MUNICIPIO, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el MINISTERIO, donde se depositan dichos recursos. C) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto.

El Municipio de Corozal, no ha remitido a la fecha el Informe de Interventoría del mes de mayo de 2024, ni los informes mensuales de obra.

57) Adelantar las acciones necesarias para garantizar que los contratistas que van a ejecutar el contrato de estudios, diseños y obra, y su respectiva interventoría, cumplan sus obligaciones hasta la terminación, entrega y liquidación de los mismos. Para tal fin, deberá aplicar, cuando sea del caso, los mecanismos previstos en la ley para conminar a sus contratistas al cumplimiento contractual y para obtener la indemnización de los perjuicios derivados de posible incumplimiento, en los términos de los artículos 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011 o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

Se solicita al Municipio de Corozal, remitir al Ministerio del Interior los documentos oficios, comunicados, actas de comité en las cuales se evidencie que se han adelantado acciones al constructor e interventor, teniendo en cuenta los atrasos en el cronograma de la obra y en la entrega de la información

Por lo anterior, el Ministerio del Interior solicita se de cumplimiento a las obligaciones pendientes de manera inmediata. De no atender los requerimientos el Ministerio del Interior dará inicio al presunto incumplimiento ante la Subdirección de Gestión Contractual del Ministerio del Interior.

Cordialmente;

ARQ GONZALO FLOREZ PEÑA
Ministerio del Interior
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana

Gmail PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>

cumplimiento de obligaciones

1 mensaje

PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com> 24 de junio de 2024, 12:42 p.m.
Para: consorcioipolice@gmail.com

Buenas tardes

Adjunto se remite solicitud de información, de acuerdo a los compromisos adquiridos en acta de 12 de junio de 2024.

Atentamente,

CARMEN ANA MERCADO PEREZ
Secretaria de Planeación Municipal

Oficio 0279-2024.pdf
503K

Gmail PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>

Respuesta a Solicitud de información.

1 mensaje

CONCORCIO I-POLICE <consorcioipolice@gmail.com> 24 de junio de 2024, 11:25 p.m.
Para: PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>

De acuerdo a compromiso adquirido el día de hoy en comité de seguimiento y avance de obra de manera virtual, adjunto oficio de respuesta a requerimientos de su parte y los anexos que corresponden.

7 archivos adjuntos

- **INFORME MENSUAL BASE DISTRITO II-2.pdf** 2631K
- **INFORME MENSUAL BASE DISTRITO II-3.pdf** 2294K
- **INFORME MENSUAL BASE DISTRITO II-4.pdf** 2360K
- **INFORME MENSUAL BASE DISTRITO II-1.pdf** 2553K
- **CIP-2024-013.pdf** 195K
- **INFORME SEMANAL COROZAL 37.xlsx** 3186K
- **PLAN DE COMPAS ESTACION.xlsx** 58K

Gmail PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>

SOLICITUD DOCUMENTOS CONVENIO No. 1914 DE 2022

1 mensaje

Gonzalo Antonio Flórez Peña <gonzalo.florez@mininterior.gov.co> 25 de junio de 2024, 7:30 a.m.
Para: PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>

Bogotá D.C., 25 de junio de 2024

Doctor
BAIRON OSPINA
Alcalde
Municipio de Corozal - Sucre

Ingeniera
CARMEN ANA MERCADO PEREZ
Secretaria de Planeación Municipal
Alcaldía de Corozal

Cordial saludo:

En el marco de las obligaciones del convenio interadministrativo No. 1914 de 2022 celebrado entre MINISTERIO DEL INTERIOR – MUNICIPIO DE COROZAL - SUCRE, cuyo objeto *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE COROZAL-DEPARTAMENTO DE SUCRE"*, y la Auditoria que adelanta la Contraloría General de la República, se solicita presentar la trazabilidad de las acciones administrativas adelantadas por el Municipio de Corozal desde la firma del convenio a la fecha, así como los anexos que la respaldan (procesos licitatorios, desembolsos, modificaciones de los contratos derivados).

"(...) CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: En virtud del presente convenio, EL MUNICIPIO tiene las siguientes obligaciones: I. ESPECÍFICAS:

32) Suministrar oportunamente la información solicitada por EL MINISTERIO, a través del supervisor o el apoyo a la supervisión y acompañar el desarrollo de las visitas de seguimiento que se realicen (...)".

Por lo anterior, se solicita entregar dicha información el miércoles 26 de junio de 2024.

Cordialmente;

ARQ GONZALO FLOREZ PEÑA
Ministerio del Interior
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana

Gmail PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com>

Cumplimiento de obligaciones en el marco del convenio 1914 de 2022

1 mensaje

PLANEACION MUNICIPAL DE COROZAL <sec.planeacioncorozal@gmail.com> 25 de junio de 2024, 9:26 a.m.
Para: gonzalo.florez@mininterior.gov.co

Buenos días arquitecto Gonzalo

Se remite información conforme a los compromisos adquiridos en el día por parte de la interventoría y de la supervisión del Municipio.

Atentamente,

CARMEN ANA MERCADO PEREZ
Secretaria de Planeación Municipal

INFORMACION CONVENIO 1914 DE 2024 JUNIO.zip

Alcaldía Municipal de COROZAL

FORMATO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROCESO
EJECUCIÓN DE OBRA

CONSORCIO I-POLICE

1. FECHA ELABORACIÓN:	3	6	2024	2. No. INFORME	18	3. SEMANA No.	36
4. NOMBRE DE LA INFRAESTRUCTURA:	ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A			5. PERIODO:	DEL: 27/05/2024	AL:	2/06/2024

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	L-AM-CS-001-01-23	7. FECHA CONTRATO:	15	3	2023	8. VALOR CONTRATO:	$ 12.575.307.132
9. FECHA ACTA INICIO:	17	4	2023	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	14	6	2024
12. PRORROGAS:	N.A.	13. SUSPENSIONES:	165	Dias		14. ADICIONES:	$ 2.414.774.705
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE						
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO EP-C						
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	CM-AM-CS-001-01-23	18. FECHA CONTRATO:	15	3	2023	19. VALOR CONTRATO:	$ 1.410.385.620
20. FECHA ACTA INICIO:	17	4	2023	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	14	6	2024
23. PRORROGAS:	N.A.	24. SUSPENSIONES:	165	Días		25. ADICIONES:	$ -
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO I-POLICE						
27. SUPERVISOR:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL						

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGUN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	2,54%	2,54%	Relleno y compactacion con material seleccionado.	100%
MOVIMIENTOS DE TIERRA CIMENTACION	0,59%	0,59%	Excavaciones de foso ascensor y aljibe	100%
CIMENTACION Y CONCRETOS	5,64%	8,41%	Concreto de zapatas y pedestales bloque 2 y bloque 1, concreto para vigas de cimientos, foso del ascensor, concreto para tanque de almacenamiento, concreto para piso. Acero de refuerzo zapatas, pedestales y columnas, vigas de cimentación,	22,06%
SISTEMA HIDROSANITARIO	0,00%	0,02%	Se realizaron las excavaciones de las tuberias hidrosanitarias del primer piso	0,82%
MAMPOSTERIA Y PAÑETES	0,00%	0,00%		
ENCHAPES PARA PISOS Y MUROS	0,00%	0,00%		
PUERTAS Y VENTANAS	0,00%	0,00%		
DIVISIONES	0,00%	0,00%		
CIELO FALSO	0,00%	0,00%		
PINTURA Y ESTUCO	0,00%	0,00%		
BARANDA METALICA	0,00%	0,00%		
ASCENSOR	0,36%	0,00%		
PLACA EXTERIOR - PARQUEADERO	0,00%	0,00%		
MURO DE CERRAMIENTO	0,00%	0,36%	Concreto para pilotes, para viga de cimentación, acero de refuerzo y concreto para columnas	41%
RED CONTRA INCENDIOS	0,00%	0,00%		
GAS NATURAL	0,00%	0,00%		
SISTEMA ELECTRICO	0,00%	0,00%		
SISTEMA DE DETECCION RCI	0,00%	0,00%		
EQUIPOS DE AIRE ACONDICONADO TIPO MINI SPLIT Y CASSETTES	0,00%	0,00%		
CARPINTERIA DE MADERA	0,00%	0,00%		
CARPINTERIA DE METALICA	0,00%	0,00%		
Tramites de legalización ante el operador de red	0,00%	0,00%		
Certificacion de Instalaciones de Cables de Datos	0,00%	0,00%		
Certificación RETIE por distribución , transformación y uso final	0,00%	0,00%		
Certificación RETILAP	0,00%	0,00%		
TOTAL	9,13%	11,82%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	11,92%	7,93%	3,99%
Durante el periodo	0,00%	1,19%	-1,19%
Acumulado Actual	11,92%	9,12%	2,80%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	1,19%	9,12%
Valor de la Obra Programada	$ 171.502.276,45	$ 1.309.445.083,93

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,00%	11,92%
Valor de la Obra Ejecutada	$ -	$ 1.710.324.452,93

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

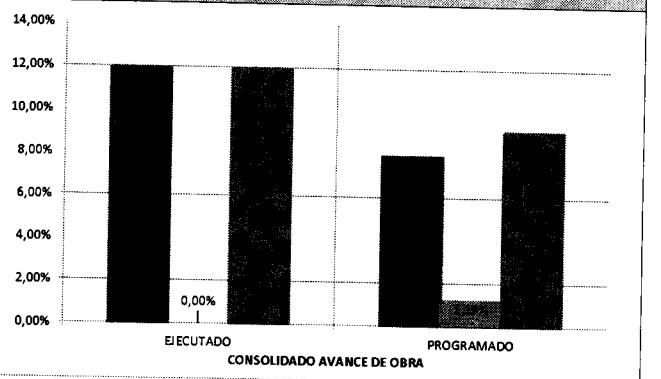

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
DIRECTOR DE OBRA	1	PC	1	LUNES	S
RESIDENTE DE OBRA	1	PC	1	MARTES	S
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1	PC	1	MIERCOLES	S
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	PC	1	JUEVES	S
TOPOGRAFO	1	Estacion topografica	1	VIERNES	S
AYUDANTE	1	0	0	SÁBADO	S
MAESTRO	1	Pica	7	DOMINGO	S
OFICIAL	3	Paladraga	8		
AYUDANTE	32	Martillo, pala, buggy	20		
MAQUINISTA	0	Minicargador	0		
MAQUINISTA	0	Vibrador 7 Ton.	0		
MAQUINISTA	1	Volqueta	1		

LLUVIOSO (L)
FAVORABLE (F)
SOLEADO (S)

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Figurado de acero para vigas y losa de primer piso

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo a la grafica y la valoración de las actividades realizadas, durante la semana se presenta una diferencia entre lo programado con lo ejecutado, presentando un avance acumulado de las actividades ejecutadas de 11,92%, con un porcentaje por encima de lo programado de 2,80%.

Nombre: MARIA CAROLINA GONZALEZ DE LA HOZ
DIRECTORA - INTEREVENTOR DE LA OBRA

Nombre: JAIRO ALBERTO DURAN ROMERO
DIRECTOR - CONTRATISTA DE OBRA


Nombre: CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
SUPERVISOR - SECRETARIA DE PLANEACION

Original: Secretaría de Planeación municipal
Copia: Interventor
Copia: Contratista


FECHA ELABORACIÓN:	3	6	2024	**No. INFORME**	18	**SEMANA No.**	36

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE	**PERIODO:**	**DEL:** 27/05/2024	**AL:**	2/06/2024
CONTRATO OBRA No:	L-AM-CS-001-01-23	**CONTRATISTA**	CONSORCIO EP-C		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	CM-AM-CS-001-01-23	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO I-POLICE		


F. REGISTRO FOTOGRAFICO

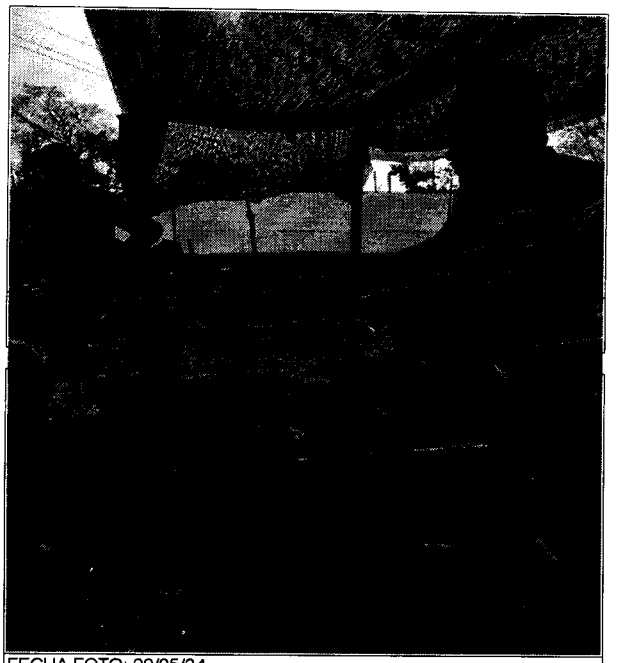

FECHA FOTO: 29/05/24
DESCRIPCIÓN:

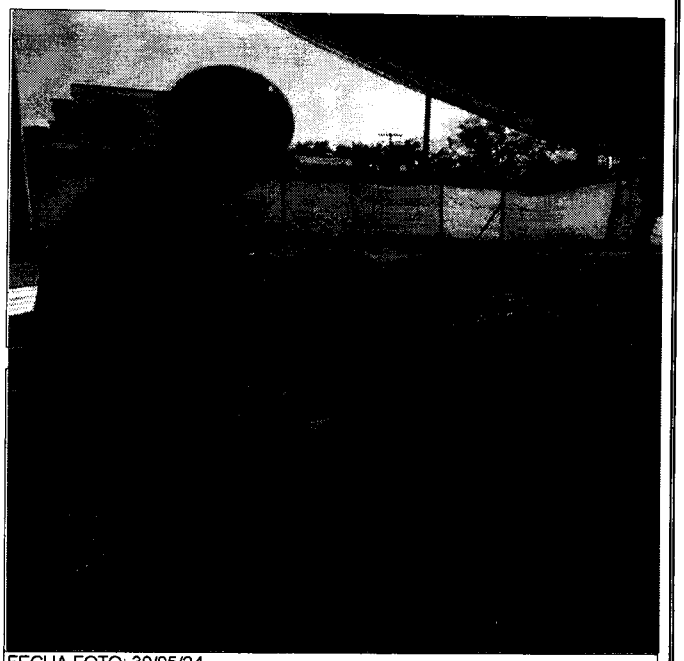

FECHA FOTO: 30/05/24
DESCRIPCIÓN:



FECHA FOTO: 31/05/24
DESCRIPCIÓN: Fundición de zapatas.



FECHA FOTO: 01/06/24
DESCRIPCIÓN:

Alcaldía Municipal de COROZAL

FORMATO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROCESO
EJECUCIÓN DE OBRA

CONSORCIO I - POLICE

1. FECHA ELABORACIÓN:	10	6	2024	2. No. INFORME	19	3. SEMANA No.	37
4. NOMBRE DE LA INFRAESTRUCTURA:	ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A			5. PERIODO:	DEL: 3/06/2024	AL:	9/06/2024

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	L-AM-CS-001-01-23	7. FECHA CONTRATO:	15	3	2023	8. VALOR CONTRATO:	$ 12.575.307.132
9. FECHA ACTA INICIO:	17	4	2023	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	14	6	2024
12. PRORROGAS:	N.A.	13. SUSPENSIONES:	165	Dias		14. ADICIONES:	$ 2.414.774.705
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE						
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO EP-C						
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	CM-AM-CS-001-01-23	18. FECHA CONTRATO:	15	3	2023	19. VALOR CONTRATO:	$ 1.410.385.620
20. FECHA ACTA INICIO:	17	4	2023	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	14	6	2024
23. PRORROGAS:	N.A.	24. SUSPENSIONES:	165	Días		25. ADICIONES:	$ -
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO I-POLICE						
27. SUPERVISOR:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL						

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	2,54%	2,54%	Relleno y compactacion con material seleccionado.	100%
MOVIMIENTOS DE TIERRA CIMENTACION	0,59%	0,59%	Excavaciones de foso ascensor y aljibe	100%
CIMENTACION Y CONCRETOS	5,64%	8,41%	Concreto de zapatas y pedestales bloque 2 y bloque 1, concreto para vigas de cimientos, foso del ascensor, concreto para tanque de almacenamiento, concreto para piso. Acero de refuerzo zapatas, pedestales y columnas, vigas de cimentación,	22,06%
SISTEMA HIDROSANITARIO	0,00%	0,02%	Se realizaron las excavaciones de las tuberias hidrosanitarias del primer piso	0,82%
MAMPOSTERIA Y PAÑETES	0,00%	0,00%		
ENCHAPES PARA PISOS Y MUROS	0,00%	0,00%		
PUERTAS Y VENTANAS	0,00%	0,00%		
DIVISIONES	0,00%	0,00%		
CIELO FALSO	0,00%	0,00%		
PINTURA Y ESTUCO	0,00%	0,00%		
BARANDA METALICA	0,00%	0,00%		
ASCENSOR	0,36%	0,00%		
PLACA EXTERIOR - PARQUEADERO	0,00%	0,00%		
MURO DE CERRAMIENTO	0,00%	0,36%	Concreto para pilotes, para viga de cimentación, acero de refuerzo y concreto para columnas	41%
RED CONTRA INCENDIOS	0,00%	0,00%		
GAS NATURAL	0,00%	0,00%		
SISTEMA ELECTRICO	0,00%	0,00%		
SISTEMA DE DETECCION RCI	0,00%	0,00%		
EQUIPOS DE AIRE ACONDICONADO TIPO MINI SPLIT Y CASSETTES	0,00%	0,00%		
CARPINTERIA DE MADERA	0,00%	0,00%		
CARPINTERIA DE METALICA	0,00%	0,00%		
Tramites de legalización ante el operador de red	0,00%	0,00%		
Certificacion de Instalaciones de Cables de Datos	0,00%	0,00%		
Certificación RETIE por distribución , transformación y uso final	0,00%	0,00%		
Certificación RETILAP	0,00%	0,00%		
TOTAL	9,13%	11,82%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	11,92%	7,93%	3,99%
Durante el periodo	0,00%	1,19%	-1,19%
Acumulado Actual	11,92%	9,12%	2,80%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	1,19%	9,12%
Valor de la Obra Programada	$ 171.502.276,45	$ 1.309.445.083,93

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,00%	11,92%
Valor de la Obra Ejecutada	$ -	$ 1.710.324.452,93

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

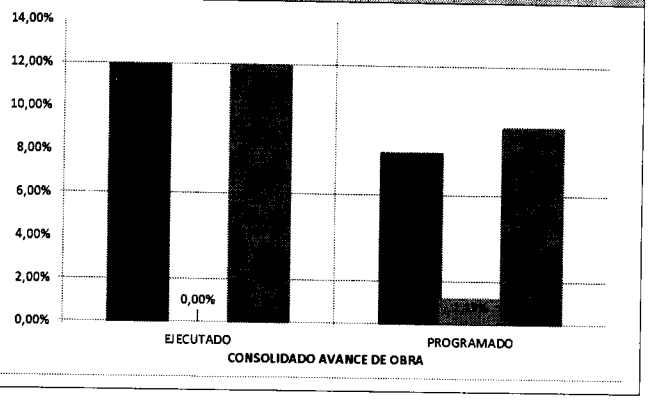

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
DIRECTOR DE OBRA	1	PC	1	LUNES	S
RESIDENTE DE OBRA	1	PC	1	MARTES	S
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1	PC	1	MIERCOLES	S
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	PC	1	JUEVES	S
TOPOGRAFO	1	Estacion topografica	1	VIERNES	S
AYUDANTE	1	0	0	SÁBADO	S
MAESTRO	1	Pica	7	DOMINGO	S
OFICIAL	3	Paladraga	8		
AYUDANTE	32	Martillo, pala, buggy	20		
MAQUINISTA	0	Minicargador	0		
MAQUINISTA	0	Vibrador 7 Ton.	0		
MAQUINISTA	1	Volqueta	1		

LLUVIOSO (L)
FAVORABLE (F)
SOLEADO (S)

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Figurado de acero para vigas y losa de primer piso

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo a la grafica y la valoración de las actividades realizadas, durante la semana se presenta una diferencia entre lo programado con lo ejecutado, presentando un avance acumulado de las actividades ejecutadas de 11,92%, con un porcentaje por encima de lo programado de 2,80%.

Nombre: MARIA CAROLINA GONZALEZ DE LA HOZ
DIRECTORA - INTEREVENTOR DE LA OBRA

Nombre: JAIRO ALBERTO DURAN ROMERO
DIRECTOR - CONTRATISTA DE OBRA


Nombre: CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
SUPERVISOR - SECRETARIA DE PLANEACION

Original: Secretaría de Planeación municipal
Copia: Interventor
Copia: Contratista


FECHA ELABORACIÓN:	10	6	2024	**No. INFORME**	19	**SEMANA No.**	37

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE	**PERIODO:**	**DEL:** 3/06/2024	**AL:**	9/06/2024
CONTRATO OBRA No:	L-AM-CS-001-01-23	**CONTRATISTA**	CONSORCIO EP-C		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	CM-AM-CS-001-01-23	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO I-POLICE		


F. REGISTRO FOTOGRAFICO

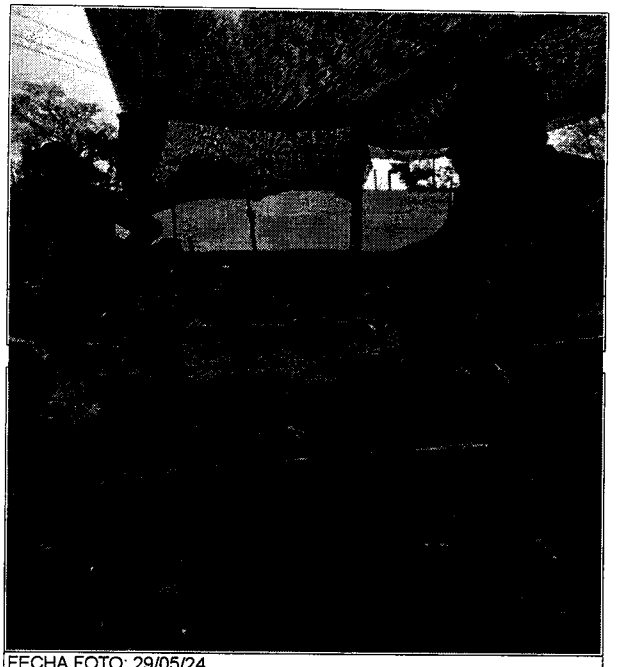


FECHA FOTO: 29/05/24
DESCRIPCIÓN:

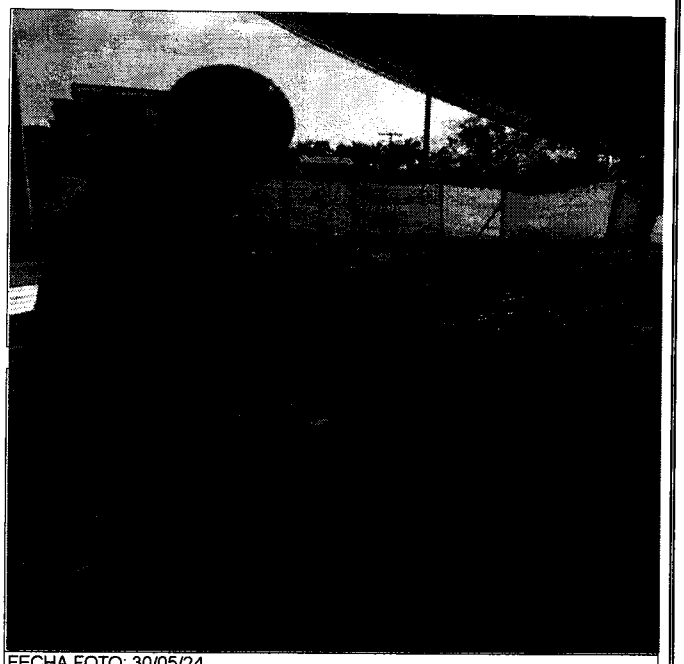

FECHA FOTO: 30/05/24
DESCRIPCIÓN:

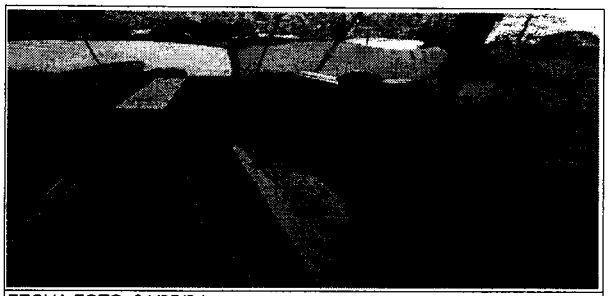

FECHA FOTO: 31/05/24
DESCRIPCIÓN: Fundición de zapatas.



FECHA FOTO: 01/06/24
DESCRIPCIÓN:

Alcaldía Municipal de COROZAL	**FORMATO** INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA **PROCESO** EJECUCIÓN DE OBRA	I-POLICE Página: 1 de 2

1. FECHA ELABORACIÓN:	17	6	2024	2. No. INFORME	20	3. SEMANA No.	38			
4. NOMBRE DE LA INFRAESTRUCTURA:	ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A			5. PERIODO:	DEL:	10/06/2024	AL:	16/06/2024		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	L-AM-CS-001-01-23			7. FECHA CONTRATO:	15	3	2023	8. VALOR CONTRATO:	$	12.575.307.132
9. FECHA ACTA INICIO:	17	4	2023	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	14	6	2024	11. PLAZO:	14	Meses
12. PRORROGAS:	N.A.			13. SUSPENSIONES:	165	Dias		14. ADICIONES:	$	2.414.774.705
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE									
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO EP-C									
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	CM-AM-CS-001-01-23			18. FECHA CONTRATO:	15	3	2023	19. VALOR CONTRATO:	$	1.410.385.620
20. FECHA ACTA INICIO:	17	4	2023	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	14	6	2024	22. PLAZO:	14	Meses
23. PRORROGAS:	N.A.			24. SUSPENSIONES:	165	Dias		25. ADICIONES:	$	-
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO I-POLICE									
27. SUPERVISOR:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL									

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPITULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	2,54%	2,54%	Actividad ejecutado en su totalidad	**100%**
MOVIMIENTOS DE TIERRA CIMENTACION	0,59%	0,59%	Actividad ejecutado en su totalidad	**100%**
CIMENTACION Y CONCRETOS	9,80%	8,69%	Acero de refuerzo para todos los elementos estructurales de la edificación	**22,77%**
SISTEMA HIDROSANITARIO	0,00%	0,02%	Se inició la instalación de las tuberias del primer piso.	**0,82%**
MAMPOSTERIA Y PAÑETES	0,00%	0,00%		
ENCHAPES PARA PISOS Y MUROS	0,00%	0,00%		
PUERTAS Y VENTANAS	0,00%	0,00%		
DIVISIONES	0,00%	0,00%		
CIELO FALSO	0,00%	0,00%		
PINTURA Y ESTUCO	0,00%	0,00%		
BARANDA METALICA	0,00%	0,00%		
ASCENSOR	0,57%	0,00%		**0%**
PLACA EXTERIOR - PARQUEADERO	0,00%	0,00%		
MURO DE CERRAMIENTO	0,00%	0,34%	Concreto para pilotes, para viga de cimentación, acero de refuerzo y concreto para columnas	**39%**
RED CONTRA INCENDIOS	0,00%	0,00%		
GAS NATURAL	0,00%	0,00%		
SISTEMA ELECTRICO	0,00%	1,33%	Transformador	**12**
SISTEMA DE DETECCION RCI	0,00%	0,00%		
EQUIPOS DE AIRE ACONDICONADO TIPO MINI SPLIT Y CASSETTES	0,00%	0,00%		
CARPINTERIA DE MADERA	0,00%	0,00%		
CARPINTERIA DE METALICA	0,00%	0,00%		
Tramites de legalización ante el operador de red	0,00%	0,00%		
Certificacion de Instalaciones de Cables de Datos	0,00%	0,00%		
Certificación RETIE por distribución , transformación y uso final	0,00%	0,00%		
Certificación RETILAP	0,00%	0,00%		
TOTAL	13,50%	13,51%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	11,92%	10,93%	0,99%
Durante el periodo	1,59%	2,57%	-0,98%
Acumulado Actual	13,51%	13,50%	0,01%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	2,57%	13,50%
Valor de la Obra Programada	$ 368.274.429,80	$ 1.937.009.688,00

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	1,59%	13,51%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 227.687.053,00	$ 1.938.011.505,93

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

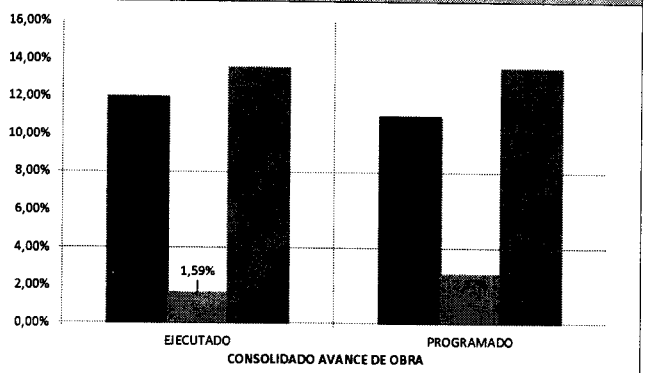

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA

CARGO	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1
TOPOGRAFO	1
AYUDANTE	1
MAESTRO	1
OFICIAL	3
AYUDANTE	25
MAQUINISTA	0
MAQUINISTA	0
MAQUINISTA	1

36. EQUIPOS EN OBRA

EQUIPO	CANTIDAD
PC	1
PC	1
PC	1
PC	1
Estacion topografica	1
0	0
Pica	7
Paladraga	8
Martillo, pala, buggy	20
Minicargador	0
Vibrador 7 Ton.	0
Volqueta	1

37. ESTADO DEL TIEMPO

DIA	ESTADO
LUNES	S
MARTES	S
MIERCOLES	S
JUEVES	S
VIERNES	S
SÁBADO	S
DOMINGO	S

LLUVIOSO (L)
FAVORABLE (F)
SOLEADO (S)

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Figurado de acero para vigas y losa de primer piso
Concreto para vigas de amarre superior y losa del bloque 1
Acero e instalación de mampostería en bloque estructural para muro de cerramiento

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo a la grafica y la valoración de las actividades realizadas, durante la semana no se presenta diferencia significativa entre lo programado con lo ejecutado, presentando un avance acumulado de las actividades ejecutadas de 13,51%.

Nombre: MARIA CAROLINA GONZALEZ DE LA HOZ
DIRECTORA - INTEREVENTOR DE LA OBRA

Nombre: JAIRO ALBERTO DURAN ROMERO
DIRECTOR - CONTRATISTA DE OBRA


Nombre: CARMEN ANA MERCADO PÉREZ
SUPERVISOR - SECRETARIA DE PLANEACION

Original: Secretaria de Planeación municipal
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	17	6	2024	**No. INFORME**	20	**SEMANA No.**	38

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE	**PERIODO:**	**DEL:** 10/06/2024	**AL:** 16/06/2024	
CONTRATO OBRA No:	L-AM-CS-001-01-23	**CONTRATISTA**	CONSORCIO EP-C		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	CM-AM-CS-001-01-23	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO I-POLICE		

F. REGISTRO FOTOGRAFICO

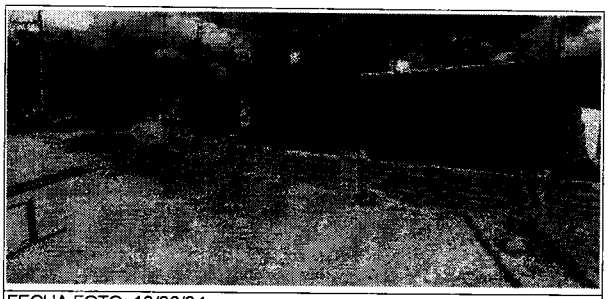


FECHA FOTO: 10/06/24
DESCRIPCIÓN:




FECHA FOTO: 10/06/24
DESCRIPCIÓN:




FECHA FOTO: 11/06/24
DESCRIPCIÓN:



FECHA FOTO: 11/06/24
DESCRIPCIÓN:



FECHA FOTO: 12/06/24
DESCRIPCIÓN:

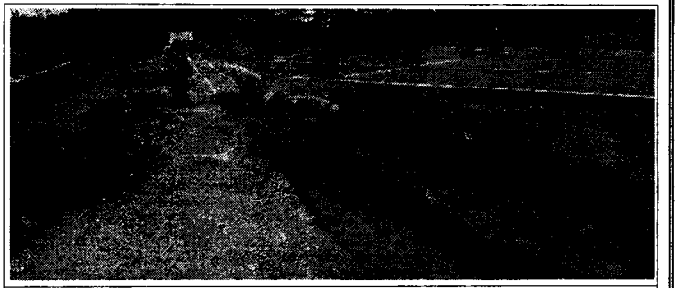

FECHA FOTO: 12/06/24
DESCRIPCIÓN:

FORMATO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROCESO
EJECUCIÓN DE OBRA

1. FECHA ELABORACIÓN:	24	6	2024	2. No. INFORME	21	3. SEMANA No.	39
4. NOMBRE DE LA INFRAESTRUCTURA:	ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A			5. PERIODO:	DEL: 17/06/2024	AL:	23/06/2024

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	L-AM-CS-001-01-23	7. FECHA CONTRATO:	15	3	2023	8. VALOR CONTRATO:	$ 12.575.307.132
9. FECHA ACTA INICIO:	17	4	2023	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	14	6	2024
11. PLAZO:	14 Meses						
12. PRORROGAS:	N.A.	13. SUSPENSIONES:	165 Días			14. ADICIONES:	$ 2.414.774.705
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE						
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO EP-C						
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	CM-AM-CS-001-01-23	18. FECHA CONTRATO:	15	3	2023	19. VALOR CONTRATO:	$ 1.410.385.620
20. FECHA ACTA INICIO:	17	4	2023	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	14	6	2024
22. PLAZO:	14 Meses						
23. PRORROGAS:	N.A.	24. SUSPENSIONES:	165 Días			25. ADICIONES:	$ -
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO I-POLICE						
27. SUPERVISOR:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL						

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
PRELIMINARES	2,54%	2,54%	Actividad ejecutado en su totalidad	100%
MOVIMIENTOS DE TIERRA CIMENTACION	0,59%	0,59%	Actividad ejecutado en su totalidad	100%
CIMENTACION Y CONCRETOS	13,45%	11,13%	Acero de refuerzo para todos los elementos estructurales de la edificación	22,77%
SISTEMA HIDROSANITARIO	0,00%	0,02%	Se inició la instalación de las tuberías del sistema hidrosanitario del primer piso.	0,82%
MAMPOSTERIA Y PAÑETES	0,00%	0,00%		
ENCHAPES PARA PISOS Y MUROS	0,00%	0,00%		
PUERTAS Y VENTANAS	0,00%	0,00%		
DIVISIONES	0,00%	0,00%		
CIELO FALSO	0,00%	0,00%		
PINTURA Y ESTUCO	0,00%	0,00%		
BARANDA METALICA	0,00%	0,00%		
ASCENSOR	0,67%	1,94%	Ascensor	75%
PLACA EXTERIOR - PARQUEADERO	0,00%	0,00%		
MURO DE CERRAMIENTO	0,00%	0,59%		67%
RED CONTRA INCENDIOS	0,00%	0,00%		
GAS NATURAL	0,00%	0,00%		
SISTEMA ELECTRICO	0,00%	1,33%		12%
SISTEMA DE DETECCION RCI	0,00%	0,00%		
EQUIPOS DE AIRE ACONDICONADO TIPO MINI SPLIT Y CASSETTES	0,00%	0,00%		
CARPINTERIA DE MADERA	0,00%	0,00%		
CARPINTERIA DE METALICA	0,00%	0,00%		
Tramites de legalización ante el operador de red	0,00%	0,00%		
Certificacion de Instalaciones de Cables de Datos	0,00%	0,00%		
Certificación RETIE por distribución , transformación y uso final	0,00%	0,00%		
Certificación RETILAP	0,00%	0,00%		
TOTAL	17,25%	16,14%		


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	13,51%	13,50%	0,01%
Durante el periodo	4,63%	3,76%	0,87%
Acumulado Actual	18,14%	17,26%	0,88%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	3,76%	17,26%
Valor de la Obra Programada	$ 538.944.563,89	$ 2.475.954.251,89

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	4,63%	18,14%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 664.848.562,08	$ 2.602.860.068,01

34. GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

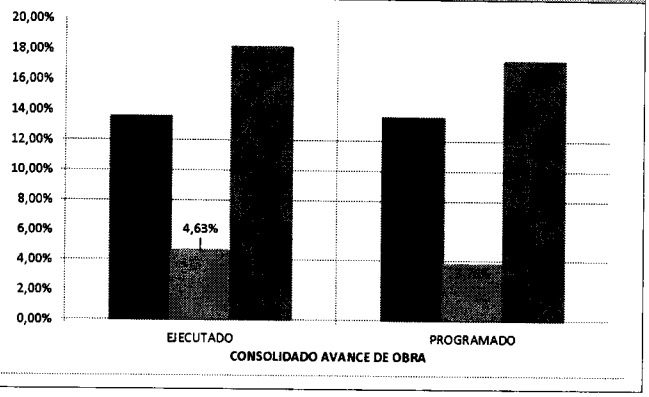

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA

CARGO	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	1
RESIDENTE DE OBRA	1
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1
TOPOGRAFO	1
AYUDANTE	1
MAESTRO	1
OFICIAL	3
AYUDANTE	25
MAQUINISTA	0
MAQUINISTA	0
MAQUINISTA	1

36. EQUIPOS EN OBRA

EQUIPO	CANTIDAD
PC	1
PC	1
PC	1
PC	1
Estacion topografica	1
0	0
Pica	7
Paladraga	8
Martillo, pala, buggy	20
Minicargador	0
Vibrador 7 Ton.	0
Volqueta	1

37. ESTADO DEL TIEMPO

DIA	ESTADO
LUNES	S
MARTES	S
MIERCOLES	S
JUEVES	S
VIERNES	S
SÁBADO	S
DOMINGO	S

LLUVIOSO (L)
FAVORABLE (F)
SOLEADO (S)

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Figurado de acero para continuidad de la estructura
Instalación de redes hidrosanitarias

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo a la grafica y la valoración de las actividades realizadas, durante la semana se presenta una diferencia de 0,87% entre lo programado con lo ejecutado, presentando un avance acumulado de las actividades ejecutadas de 18,14%.

Nombre: MARIA CAROLINA GONZALEZ DE LA HOZ
DIRECTORA - INTEREVENTOR DE LA OBRA

Nombre: JAIRO ALBERTO DURAN ROMERO
DIRECTOR - CONTRATISTA DE OBRA

Nombre: CARMEN ANA MERCADO PEREZ
SUPERVISOR - SECRETARIA DE PLANEACION


Original: Secretaría de Planeación municipal
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	24	6	2024	**No. INFORME**	21	**SEMANA No.**	39
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE			**PERIODO:**	**DEL:** 17/06/2024	**AL:**	23/06/2024
CONTRATO OBRA No:	L-AM-CS-001-01-23			**CONTRATISTA**	CONSORCIO EP-C		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	CM-AM-CS-001-01-23			**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO I-POLICE		


F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 17/06/24
DESCRIPCIÓN:

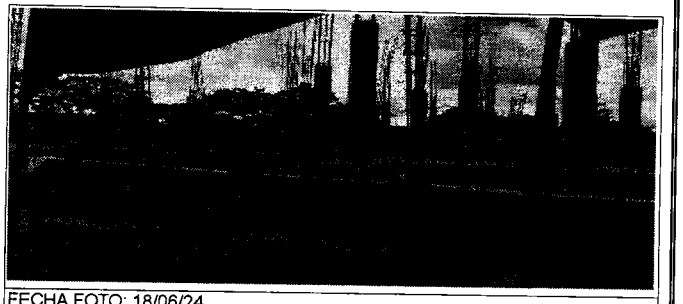


FECHA FOTO: 18/06/24
DESCRIPCIÓN:




FECHA FOTO: 19/06/24
DESCRIPCIÓN:



FECHA FOTO: 20/06/24
DESCRIPCIÓN:



FECHA FOTO: 21/06/24
DESCRIPCIÓN:



FECHA FOTO: 22/06/24
DESCRIPCIÓN:

	ACTA DE VISITA TÉCNICA	
		PÁGINA: 1 de 2

ACTA DE VISITA TÉCNICA

FECHA:	25	06	2024	**HORA:**	8:30 A.M.	**LUGAR:**	Construcción Distrito de Policía
DEPENDENCIA A CARGO:	Secretaría de Planeación Municipal – Alcaldía de Corozal						
RESPONSABLE – VISITA	Miguel Pereira P.						
OBJETIVO DE LA VISITA	Supervisión e Inspección de obra.						

REPORTE DE HALLAZGOS

Se Inicio con Un recorrido en toda la obra Para realizar Una Inspección de los actividades ejecutadas y en ejecucion, así Como los materiale en obra.
Donde Se encuentran 33 Columnas fundidas altura de losa (4.5mts)
En el dia de hoy se encuentran trabajando en el muro perimetral de Cerramiento en bloque (0,10 mts).
En obra se Pudo evidenciar el material para la fundación y levante del mura (triturado, Arena, hierro) Solo falta el bloque Para levante muro (0,20 mts)
Por otra lado se esta realizando actuidad de limpieza del aljibe por derrumbe debido a los lluvias.

	ACTA DE VISITA TÉCNICA	
		PÁGINA: 2 de 2

SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO: SI X NO ___ PARCIALMENTE ___

INTERVIENEN:

Jorge Luis Ozuna
Residente de Obra (Constratista)

LUKAS BLANCO
Residente de Obra (Interventoria)

Sec. Planeación.

COFINANCIACION MUNICIPIO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1914 DE 2022

OBJETO: AUNAR ESFUERZOSTÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN BASE DISTRITO TIPO A, EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE

CORRECCION INFORME FINANCIERO 01 JUNIO A 30 JUNIO 2024
MUNICIPIO DE COROZAL - SUCRE

PROYECTO (5): ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE

CUENTA (AHORROS) No. 11100001656 **DEL BANCO:** **BANCOLOMBIA**

VALOR CONVENIO **$ 16.400.470.438,07**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 13.952.556.111,07**
VALOR APORTE MUNICIPIO **$ 2.447.914.327,00**

	FECHA DE GIRO		
VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO:	ABRIL 20 2023	GIRO 1	$ 897.914.327,00
VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO:	JULIO 24 2023	GIRO 2	$ 850.000.000,00
VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO:	SEPT 27 2023	GIRO 3	$ 350.000.000,00
VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO:	FEB 02 2024	GIRO 4	$ 350.000.000,00
	TOTAL GIRADO MUNICIPIO DE COROZAL		**$ 2.447.914.327,00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1) **$ 2.447.914.327,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO	VALOR FINANCIADO CON ESTE CONVENIO
L-AM-CS-001-01-23	CONSORCIO EP-C	$ 12.575.307.132,00	$ 0,00	$ 12.575.307.132,00	$ 10.827.402.805,00
CM-AM-CS-001-01-23	CONSORCIO I– POLICE	$ 1.410.385.620,00	$ 0,00	$ 1.410.385.620,00	$ 1.060.375.620,00
	TOTAL CONTRATADO			**$ 13.985.692.752,00**	**$ 11.887.778.425,00**

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
L-AM-CS-001-01-23	PAGO 15% DE ANTICIPO DEL CONTRATO L-AM-CS-001-01-23 , ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE	2024000018	2024000013	2/02/2024		$ 1.747.904.327,00	$ 1.747.904.327,00
L-AM-CS-001-01-23	PAGO 15% DE ANTICIPO DEL CONTRATO L-AM-CS-001-01-23 , ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE	2024000019	2024000014	2/02/2024		$ 138.391.743,00	$ 138.391.743,00
CM-AM-CS-001-01-23	PAGO DE ACTA PARCIAL N2 DEL CONTRATO Nº CM-AM-CS-001-01-23 CUYO OBJETO ES EL ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE	2024000503	2024000679	31/05/2024		$ 120.090.999,00	$ 120.090.999,00
	VALOR TOTAL PAGADO (2)				**$ 0,00**	**$ 2.006.387.069,00**	**$ 2.006.387.069,00**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
30/04/2023	$ 135.040,73
31/05/2023	$ 380.678,60
30/06/2023	$ 368.552,29
23/07/2023	$ 282.659,13
31/07/2023	$ 248.432,86
31/08/2023	$ 963.010,64
26/09/2023	$ 808.095,12
30/09/2023	$ 149.210,89
31/10/2023	$ 1.156.743,74
30/11/2023	$ 1.120.035,74
31/12/2023	$ 1.157.997,12
31/01/2024	$ 1.158.634,60
29/02/2024	$ 432.263,87
31/03/2024	$ 156.875,68
30/04/2024	$ 140.598,21
31/05/2024	$ 143.182,52
30/05/2024	$ 72.706,38

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/05/31 HASTA: 2024/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 11100001656

SUCURSAL COROZAL

COFINANCIACION MPIO CONV 1914 DE 2022 ES

CR 28 31 08 PI 2

COROZAL SUCRE

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	465,315,416.45	*SALDO PROMEDIO*	$	442,292,395
TOTAL ABONOS	$	24,071,082.38	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	38,984,516.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	72,706.38
SALDO ACTUAL	$	450,401,982.83	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
5/06	ABONO INTERESES AHORROS			12,748.48	465,328,164.93
6/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-28,892,836.00	436,435,328.93
16/06	ABONO INTERESES AHORROS			26,306.35	436,461,635.28
17/06	ABONO INTERESES AHORROS			2,358.39	436,463,993.67
17/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-2,018,336.00	434,445,657.67
17/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-4,036,672.00	430,408,985.67
18/06	PAGO A PROV MUNICIPIO DE COROZ			-1,009,168.00	429,399,817.67
18/06	PAGO A PROV estampillproelectr			-1,009,168.00	428,390,649.67
18/06	PAGO A PROV MUNICIPIO DE COROZ			-1,009,168.00	427,381,481.67
18/06	PAGO A PROV Ahorros			-1,009,168.00	426,372,313.67
23/06	ABONO INTERESES AHORROS			14,017.88	426,386,331.55
24/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			23,998,376.00	450,384,707.55
30/06	ABONO INTERESES AHORROS			17,275.28	450,401,982.83
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1914 DE 2022

OBJETO: AUNAR ESFUERZOSTÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN BASE DISTRITO TIPO A, EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE

CORRECCION INFORME FINANCIERO DEL 01 DE JUNIO AL 30 JUNIO 2024
MUNICIPIO DE COROZAL - SUCRE

PROYECTO ($): ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACION BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL – DEPARTAMENTO DE SUCRE

CUENTA (AHORROS) No. 11100001378 **DEL BANCO:** **BANCOLOMBIA**

VALOR CONVENIO **$ 16.400.470.438,07**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 13.952.556.111,07**
VALOR APORTE MUNICIPIO **$ 2.447.914.327,00**

	FECHA DE GIRO		
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	FEB 21 DE 2024	GIRO 1	$ 5.944.059.397,00
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	MARZO 21 DE 2024	GIRO 2	$ 2.064.437.318,07
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:		GIRO 3	$ 0,00
		GIRO 4	$ 0,00
	TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR		**$ 8.008.496.715,07**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1) **$ 8.008.496.715,07**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO	VALOR FINANCIADO CON ESTE CONVENIO
L-AM-CS-001-01-23	CONSORCIO EP-C	$ 12.575.307.132,00	$ 0,00	$ 12.575.307.132,00	$ 10.827.402.805,00
CM-AM-CS-001-01-23	CONSORCIO I – POLICE	$ 1.410.385.620,00	$ 0,00	$ 1.410.385.620,00	$ 1.060.375.620,00
	TOTAL CONTRATADO			$ 13.985.692.752,00	$ 11.887.778.425,00

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
L-AM-CS-001-01-23	PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA Nº1 L-AM-CS-001-01-23 , CUYO OBJETO ES EL ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE	2024000185	2024000285	21/03/2024	$ 563.568.320,00		$ 563.568.320,00
CM-AM-CS-001-01-23	PAGO ACTA Nº1 CM-AM-CS-001-01-23 , CUYO OBJETO ES EL ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE	2024000277	2024000392	9/04/2024	$ 397.813.951,00		$ 397.813.951,00
L-AM-CS-001-01-23	PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA Nº2 L-AM-CS-001-01-23 , CUYO OBJETO ES EL ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN BASE DE DISTRITO TIPO A EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE	2024000447	2024000611	17/05/2024	$ 1.444.641.832,95		$ 1.444.641.832,95
	VALOR TOTAL PAGADO (2)				$ 2.406.024.103,95		$ 2.406.024.103,95

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
29/02/2024	$ 1.094.936,67
31/03/2024	$ 3.050.427,06
30/04/2024	$ 2.982.150,41
31/05/2024	$ 2.767.694,00
31/06/2024	$ 2.364.709,15

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

ESTUDIOS DISEæO Y CONSTRUCCION DE ESTACI
CR 28 31 08 PI 2
COROZAL SUCRE

DESDE: 2024/05/31 HASTA: 2024/06/30
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 11100001378
SUCURSAL COROZAL

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	5,885,521,885.99	*SALDO PROMEDIO*	$	5,765,484,851
TOTAL ABONOS	$	28,885,571.15	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	299,261,208.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	2,364,709.15
SALDO ACTUAL	$	5,615,146,249.14	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCION	SUCURSAL	PCTO	VALOR	SALDO
5/06	ABONO INTERESES AHORROS			402,322.70	5,885,924,208.69
6/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-2,876,128.00	5,883,048,080.69
6/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-2,018,336.00	5,881,029,744.69
16/06	ABONO INTERESES AHORROS			884,470.61	5,881,914,215.30
17/06	ABONO INTERESES AHORROS			78,031.39	5,881,992,246.69
17/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-33,991,572.00	5,848,000,674.69
17/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-67,983,145.00	5,780,017,529.69
17/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-72,232,091.00	5,707,785,438.69
18/06	PAGO A PROV estampillproelectr			-16,995,786.00	5,690,789,652.69
18/06	PAGO A PROV MUNICIPIO DE COROZ			-16,995,786.00	5,673,793,866.69
18/06	PAGO A PROV Ahorros			-16,995,786.00	5,656,798,080.69
18/06	PAGO A PROV MUNICIPIO DE COROZ			-16,995,786.00	5,639,802,294.69
23/06	ABONO INTERESES AHORROS			462,634.09	5,640,264,928.78
24/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			20,520,862.00	5,660,785,790.78
24/06	ABONO INTERESES AHORROS			76,676.59	5,660,862,467.37
24/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-23,998,376.00	5,636,864,091.37
24/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-28,178,416.00	5,608,685,675.37
25/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			6,000,000.00	5,614,685,675.37
30/06	ABONO INTERESES AHORROS			460,573.77	5,615,146,249.14
	FIN ESTADO DE CUENTA				
